FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 41 (Numero) **DEL** 13 de julio de 2023 (Fecha de Inicio) **AL** 19 de julio de 2023 (Fecha de Fin)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (Numero de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** COP 690 de 2022 (Numero de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 **NIT** 901.628.933-1 (Escribir el nombre del Consorcio o Unión Temporal)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV **NIT** 900.547.145-2 (Escribir el nombre del Consorcio o Unión Temporal)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 19.621.435.784,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ** (Escriba el nombre del Supervisor (es))

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN **ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO** (Escriba el nombre del profesional de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra (Escriba el número del oficio radicado) **de fecha** (Mes/año)

TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$			
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
		13224,93	3,78	50


A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo Programado	2,54%	2,54%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,54%
Valor del Trabajo Programado	$	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado			$ (498,07)

FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,24%	Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,24%	-0,48%
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.972.839,44	$ 47.947.678,88	Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.972.839,44	$ 47.947.678,88	$ 0,00
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$ -	$ -	Obra Ejecutada ($)	$ -	$ -	$ -

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,00%	7,21%
10	2,33%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,54%	7,22%
13	3,46%	7,23%
14	4,62%	8,21%
15	6,07%	8,27%
16	7,67%	8,35%
17	9,07%	8,57%
18	11,53%	8,95%
19	13,68%	9,14%
20	8,41%	10,01%
21	3,00%	7,23%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,52%	7,22%
25	6,41%	7,22%
26	8,68%	7,22%
27	10,10%	7,22%
28	14,04%	7,22%
29	18,59%	7,22%
30	19,39%	7,22%
31	23,23%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,36%	9,52%
34	53,73%	9,52%
35	55,94%	9,52%
36	57,99%	9,52%
37	59,99%	9,52%
38	62,48%	9,52%
39	64,49%	9,52%
40	66,07%	17,78%
41	70,47%	17,78%

Análisis de la Gráfica:

No se cuenta con cronograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	23%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	23%
Fase preliminar programada (Und)	6	12	24%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	12	12	24%
Fase preliminar entoramada (Km/carril)	0,001714286	0,00428571	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,001714286	0,00428571	0,09%
Estudios y Diseños Prosram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Prosramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%
Meta Física Prosramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (Km/carril)	0	0	0%
Meta Física Prosramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%
Meta Física Prosramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%
Meta Física Prosramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)			

AVANCE PROJECT

Avance Programado (%)	0%	Avance Ejecutado (%)	0%
Avance Prosramado Mantenimiento cenódico	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento cenódico	0%
Avance Prosramado Mantenimiento Rutinario	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%
Avance Prosramado Mantenimiento Rencvonvirvio	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Rencvonvirvio	0%
Avance Prosramado Mantenimiento Buhahitarvio	0%	Avance Ejecutado Mantenimiento Buhahitarvio	0%

%Atraso /%Avance
0%
%Atraso /%Avance
%Atraso /%Avance
0%
%Atraso /%Avance
0%
0%
0%
0%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBERÍAN INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
															FECHA DE INICIACION PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil.	1-abr-23		
45	8002718	155148	28037	28038	KR 89B	CL 40B SUR	CL 40 SUR	51,58	6	CALZADA	4,38	129,94	569,35	Sin iniciar	8-jul-23	SIN PMT	
46	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,55	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	SIN ACTIVIDADES	10-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.	24-jul-23		
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Se realiza excavación y conformación pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock	10-may-23		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002795	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	28,19	6	CALZADA	2,36	72,08	170,02	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 89C	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,63	41,49	109,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,16	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005471	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81I	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Sin iniciar	25-jul-23	SIN PMT	
56	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,79	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Sin iniciar	16-ago-23	SIN PMT	
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,55	6	CALZADA	4,63	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	28-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,82	6	CALZADA	5	79,19	395,73	SIN ACTIVIDADES	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	SIN ACTIVIDADES	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,97	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	4-may-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,03	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programación por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Vaciado de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de fresado	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	SIN ACTIVIDADES	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	Calzada: Excavación manual para la instalación de tubería pozo. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto MR-41	9-mar-23		
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	3-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Se realiza instalación de concreto MR-41	18-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza excavación manual. Andén occidental: Excavación manual	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de anden. Andén occidental: Sin actividad.	4-abr-23		
71	8001771	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	SIN ACTIVIDADES	21-abr-23		
72	8001545	155900	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,97	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	5-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062684	92062617	CL 38A SUR	KR 94C	KR 93D	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	SIN ACTIVIDADES	26-ene-23		
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Excavación manual para la instalación de tubería pozo. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad			
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado. Andén occidental: Excavación manual	24-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	SIN ACTIVIDADES	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	30,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,16	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT	
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Sin iniciar	12-sep-23	SIN PMT	
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-may-23	SIN PMT	
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Sin iniciar	6-jun-23	SIN PMT	
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	SIN ACTIVIDADES	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	SIN ACTIVIDADES	3-ene-23		
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,68	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,91	6	CALZADA	2,87	27,86	79,87	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005065	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,43	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902163	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programación		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	Calzada: Excavación mecánica y conformación de tubería para pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Sin iniciar	No se tiene programación por CIV		
92	8004910	153106	24295	92062924	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	49,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	16-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,06	6	CALZADA	2,95	56,74	167,56	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Técnicas de Interventoría

• Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
• Se cuenta con PMT aprobados de los CIV 8004757-8004699-8004816-8004663-8002162-8002265-8001931-2002008-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001841 - 8001390
• Seguimiento en la conformación de espacio público 44-50-66-68-69-75, a la instalación de monoblock 49, mejoramiento de vía y excavación mecánica 89-79. Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P68-P64

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista

• **P81:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P82:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P60:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P61:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P64:** Calzada: Instalación de fresado estabilizado. Andén oriental: Vaciado de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de fresado
• **P65:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P73:** Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P74:** Calzada: Excavación manual para la instalación de tubería pozo. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P75:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de fresado. Andén occidental: Excavación manual
• **P76:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P66:** Calzada: Excavación manual para la instalación de tubería pozo. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto MR-41
• **P44:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil.
• **P50:** Calzada: Se realiza excavación y conformación pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
• **P68:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Se realiza instalación de concreto MR-41
• **P69:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza excavación manual. Andén occidental: Excavación manual
• **P70:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de anden. Andén occidental: Sin actividad.
• **P71:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P49:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.
• **P48:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P56:** Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P89:** Calzada: Excavación mecánica y conformación de tubería para pozo. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P79:** Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana

• Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.

2. COMPONENTE AMBIENTAL

• La calificación fue de 100%
• RCD GENERADO: Para este periodo se ha emitado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 360m3.
• Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial. de Patio IDU 210 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Excavacion Andén - Cargué y retiro de material de excavacion Andén - Instalación Bordillo A-80 espacio público - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén - Conformacion espacio público - Adecuación entradas a Predios - Construcción cajas inspección
CIV 8004699 (48) - Instalación Geotextil -Geocelda y Fresado - Lleno Fresado capa Geocelda
CIV 8004816 (49) - Excavacion e instalación monoblock
CIV 8004663 (50) - Excavacion manual espacio público Ciccicidental
CIV 8004947 (56) - Instalación Geotextil -Geocelda y Fresado - Instalación Geotextil -Geocelda y Fresado - Compactación de lleno de fresado - Compactación Capa Geocelda - Mezclado Estabilizado RAP
CIV 8002162 (60) - Extendido concreto - Estampado andén punta sur
CIV 8002265 (61) - Extendido concreto - Inicio estampado topanil - Estampado en andén
CIV 8001931 (64) - Extendida de concreto 3000psi en andenes - Estampado en anden - Compactacion en anden capa 2 - Descargue de concreto MR41 y vibrador - Compactacion en anden e instalación de contador y cajilla de acueducto - Instalación de cabezal sumidero
CIV 8002008 (65) - Descargue de concreto de 3000psi en anden - Estampado de topenil en anden
CIV 8001876 (66) - Extendida de concreto 3000psi en andenes - Estampado en anden occidental - Compactacion de anden capa 2 - Acabado del concreto MR41 rampas - Estampado en rampas - Instalación de bordillo A80 en via occidental - Descargue de concreto de 3000psi en anden
CIV 8001715 (68) - Compactación con canguro 1ra capa De Fresado anden - Instalación bordillo A-80 Andén - Riego con agua para compactación 1ra capa andén - Demolición caja inferior de sumidero para conexión tubería 12" - Instalación tubería para sumideros - Construcción de pozo y pañete -Conformacion de anden - Instalación de contadores - Fundida cañuela para pozo - Relleno de sumideros - Compactación material de relleno sumideros y pozo - Instalación medidor de agua - Construcción de caja de inspección - Excavacion manual para sumidero - Colocación Geotextil anden occidental - Instalación contador de agua Cra 92B 40 - 46S - Colocación geotextil y extendido de 1ra capa de fresado
CIV 8001823 (69) - Perfilamiento de anden - montaje de tubería y construcción caja de inspección - Demolición caja de inspección anden - Cargue y retiro de Volqueta con material de excavación - Vibrador de concreto en rampas
CIV 8001657 (70) - Excavación manual de vía - Demolición placa andén oriental
CIV 8001771 (71) - Sin actividad
CIV 8001148 (73) - Sin actividad
CIV 8001184 (74) - Excavación sumidero - Excavación tubería sumidero a pozo - Compactación con canguro anden occidental - Instalación medidores de agua - Excavación tubería sumidero a pozo - Excavación e instalación de bordillo A80
CIV 8001223 (75) - Riago con agua para compactar primera capa, andén costado occidental - Compactación con canguro andén costado oriental - Compactación para instalación Monoblock 230 - Compactación con canguro andén parte occidental - Compactación de fresado andenes costado occidental y extendido segunda capa costado occidental - Instalación monoblock - Instalación bordillo A80 andén oriental - Compactación capa 2 asfalto fresado
CIV 8001183 (76) - Excavación sumidero - Excavación sumidero - Conformación de anden costado oriental - Excavacion manual para sumidero costado oriental - Compactacion de fresado en anden costado occidental - Excavacion manual para instalación de monobloc 220 costado oriental
CIV 8001390 (79) - Cargue de excavación - Excavacion mecanica en via - Retiro de excavación mecanica en via - Excavación zanja para tubería agua potable - Actividad de señalización - Excavación y relleno para tubería agua potable entre KD+015 a KD+020
CIV 8005000 (81) - Sin actividad
CIV 8005078 (82) - Sin actividad
CIV 8001841 (89) - Lleno con arena de peña tubería 12" ALL - Instalación de geotextil para pozo y lleno con fresado - Pañete y cañuela de pozo ALL - Excavación manual - Lleno con fresado de zanja tubería 12" ALL a nivel de subrasante - Conformada de punta nivel subrasante - Conformacion de via - Instalación de geotextil y geocelda - Compactación de fresado zanja tubería 12" ALL a subrasante - Instalación de geotextil , geocelda y lleno con fresado - Conformación de la subrasante y compactacion de fresado zanja tubería 12" - Conformacion y compactacion de subrasante

En recorrido realizado el 18 de julio de 2023 en forma conjunta Residente ambiental de Interventoría con el residente ambiental del contratista se evidenció lo siguiente:

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
1. Consorcio SCLV: 0	1. Consorcio SCLV: 22	0	52
	2. Silva Carreño y Asociados S.A.S: 10		
	3. La Vialidad Limitada: 13		
	4. Cense Ingeniería Ltda: 1		
	5. J.V.R Estudios: 1		
	6. Geovial Limitada:5		

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 13 de julio de 2023 al 19 de julio de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El 13 de julio de 2023 se llevó a cabo recorrido da obra con el FDLK, Interventoría y Contratista, donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, en las diferentes prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla) e información de conformación de brigada de emergencias. Sin embargo se evidencia que hay varias prioridades que están sin actividades de obra.
• El 13 de julio de 2023 se llevó a cabo comité de seguimiento semanal de manera presencial con el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista Consorcio Vías Kennedy 22, donde en el componente SST reporto el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, estado del informe mensual N°8 observaciones al informe, calificación semanal documentos de ingreso e indicadores de rotación del personal de obra.
• El 18 de julio de 2023 los componentes SST, social y ambiental y técnico de la Interventoría realizaron recorrido de obra por los CIV en ejecución al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, adicional a esto el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace uso de los elementos de Protección Personal (EPP) para las actividades de obra.
•Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UPZ CORABASTOS:

P81: No se encuentran desarrollando actividades
P82: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV junto con el CIV 81 cuenta con unidades sanitarias, se evidencia punto ecológico, de hidratación, kit de emergencias, el frente de obra se encuentra señalizado referente a rutas de emergencia
P44: Actividades de conformación de espacio público, el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con punto ecológico, de hidratación, kit de emergencias.
P48: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con punto ecológico.
P49: Actividades de instalación de Monoblok, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP, este CIV cuenta con kit de emergencia, punto ecológico y kit anti derrame
P50: Actividades de demolición de anden, este CIV cuenta con cartelera informativa, baño portátil y kit de emergencia.
P56: Actividades de instalación de fresado, este CIV cuenta con punto ecológico y kit de emergencia.

UPZ PATIO BONITO:

P60: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con cartelera informativa y kit de emergencia.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: Actividades de instalación de estabilizado, el personal cuenta con la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, así mismo hacen uso de los EPP, se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación, unidad sanitaria, cartelera informativa y kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia estos elementos son compartido con el CIV 60, 61 y 65.
P65: No se encuentran desarrollando actividades
P66: Excavación de tubería de sumideros, este CIV cuenta con kit de emergencia. punto ecológico, kit anti derrame y cartelera informativa.
P68: Actividades de instalación de concreto el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual, este CIV cuenta con kit de emergencia punto ecológico y kit antiderrame.
P69: Actividades de excavación de anden y construcción de cajas.
P70: Actividades de excavación de anden costado oriental
P71: No se encuentran desarrollando actividades.
P73: No se encuentran desarrollando actividades.
P74: No se encuentran desarrollando actividades
P75: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con kit de emergencia, cartelera informativa y kit anti derrame estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
P76: No se encuentran desarrollando actividades.
P89: Actividades de instalación de Geocelda, Geotextil e instalación de fresado este CIV cuenta con kit de emergencia, carpa vester, una (1) unidad sanitaria y punto ecológico.

• De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista orden y aseo, adicional a esto revisar y garantizar los senderos peatonales y el acceso a las viviendas, esto aplica para todas las prioridades.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 17 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
• El 17 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con el personal información sobre autocuidado "El dedo gordo: soporte del cuerpo", teniendo en cuenta que el dedo gordo del pie es el encargado del desgaste, equilibrio y el soporte del cuerpo a la hora de caminar;
• El 19 de julio de 2023 se llevó a cabo comité semanal de seguimiento en el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST informó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado del informe mensual N°8, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría.

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 13 julio de 2023 al 19 de julio de 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:	
AIKA HUMANA = 13	1. CVK2 = 9		1. AIKA HUMANA = 3	131
SAM INGENIERIA = 1	2. AIKA HUMANA = 74			
TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1	3. MMAPV SAS = 5			
	4. MR GROUP COL SAS = 1			
	5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1			
	6. MABERIK = 1			
	7. WITS = 1			
	8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1			
	9. V&V CONSTRUCCIONES = 1			
	10. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 10			
	11. CONSTRUBERNAL = 1			
	12. SAM INGENIERIA = 10			
	13. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1			
	14. GUILLERMO CABALLERO GONZALEZ = 1			
	16. HA CIVILES = 3			
	17. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1			

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 13 julio de 2023 al 19 de julio de 2023, el contratista reporto ausentismo de seis (6) trabajadores, cuatro (4) generados por enfermedad general, y dos (2) que no asistieron.
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 13 julio de 2023 al 19 de julio de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:
N° de días de ausencia = 4
N° de días de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 61
% de ausentismo 1,09%

Es así como se evidencia que el 1,09% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
• Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Público y Fenómenos naturales
• Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato COP 690-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
• El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
• El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra
• Se llevo a cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra.
• Se llevó a cabo inspección de [illegible] en el predio D-6 MJO, cuenta con espacio para el almacenamiento de materiales, herramientas y elementos de trabajo, [illegible] en el momento de la inspección [illegible] en el momento de la inspección se encontraron [illegible] en el momento de la inspección [illegible] en el momento de la inspección [illegible] en el momento de la inspección

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 41 **DEL** 13 de julio de 2023 **AL** 19 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Instalación de fresado estabilizado



Descripción Foto 2.

CIV: No.60 - 8002162
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 3.

CIV: No.56 - 8004947
Descripción: Instalación de geoceldа



Descripción Foto 4.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Excavación manual espacio público



Descripción Foto 5.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Excavación manual para monoblock e instalación monoblock



Descripción Foto 6.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Excavación manual para instalación monoblock



Descripción Foto 7.

CIV: No.48 - 8004699
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Excavacion y demolicion de cajas



Descripción Foto 9.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Instalación de concreto MR-41



Descripción Foto 10.

CIV: No.79 - 8001390
Descripción: Excavación mecánica en vía

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 11.

CIV: No.75 - 8001223
Descripción: Excavación para instalación tubería sumideros



Descripción Foto 12.

CIV: No.70 - 8001657
Descripción: Demolición para espacio publico



Descripción Foto 13.

CIV: No.89 - 8001841
Descripción: Conformación de pozo

Descripción Foto 14.


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

diecinueve (Día en letras) (19) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba Rojas
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 18-JULIO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 307.829.014,10	1,76%	92,98%	-1,07%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 332.182.707,83	1,90%	96,82%	-0,85%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 272.745.212,76	1,56%	85,04%	-1,39%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 346.097.096,78	1,98%	97,44%	-0,66%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 341.094.074,89	1,96%	94,60%	-0,52%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 339.784.393,32	1,95%	90,28%	-0,59%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 269.281.829,64	1,54%	94,25%	-0,40%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 124.289.639,38	0,71%	85,12%	-0,63%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 102.601.318,05	0,59%	71,15%	-0,46%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 283.919.995,52	1,63%	81,72%	1,63%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 32.050.753,20	0,18%	9,36%	-2,08%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 192.079.618,71	1,10%	60,36%	-1,37%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 226.660.864,68	1,30%	41,61%	-1,09%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 21.299.305,87	0,12%	6,06%	-2,25%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 101.220.892,84	0,58%	28,00%	-1,88%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 60.484.381,90	0,35%	17,71%	-2,19%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 544.782.393,83	3,12%	$ 134.335.950,39	0,77%	17,44%	-2,35%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 44.772.878,74	0,26%	11,86%	-2,29%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 0,00	0,00%	$ 189.381.518,51	1,09%	39,52%	1,09%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 272.148.899,24	1,56%	$ 70.740.088,69	0,41%	7,19%	-1,15%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 202.865.571,23	1,16%	$ 36.569.601,57	0,21%	6,30%	-0,95%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 573.373.535,77	3,29%	$ 1.595.442,92	0,01%	0,25%	-3,28%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,85%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,50%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 521.618.723,00	2,99%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,99%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 336.784.262,65	1,93%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,93%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 278.894.470,07	1,60%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,60%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 182.207.952,22	1,04%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,04%
45	8002718	$ 739.233.204,00	$ 96.697.594,17	0,55%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,55%
46	8005377	$ 280.055.154,00	$ 101.009.110,50	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,58%
47	8005506	$ 625.940.380,00	$ 8.315.660,80	0,05%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,05%
TOTALES			**$ 12.540.981.532,48**	**71,89%**	**$ 3.831.016.580,28**	**21,96%**		**-49,93%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

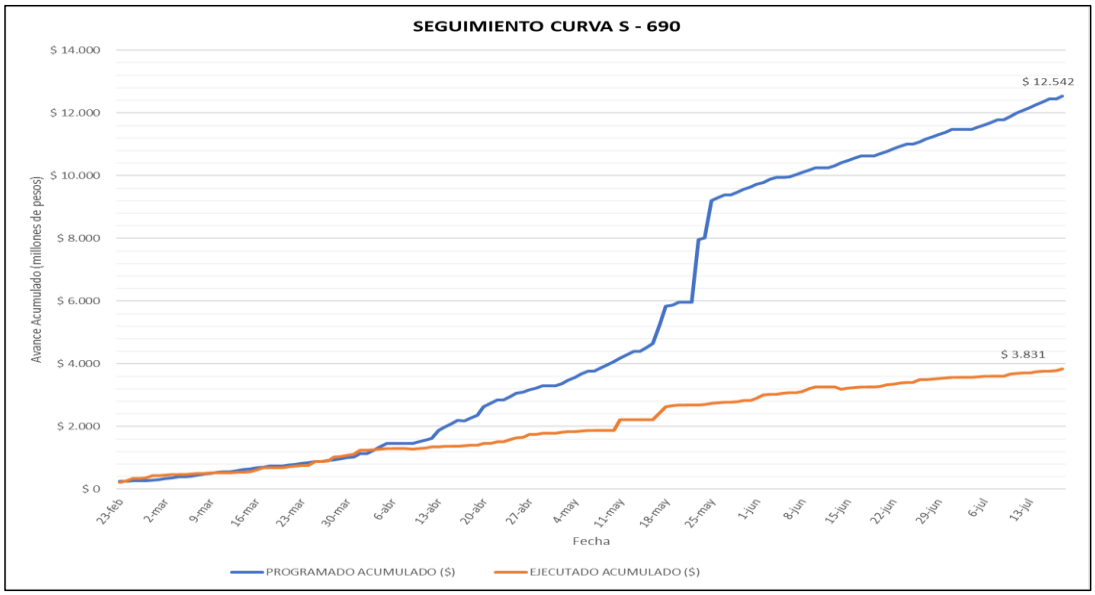


CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			20-jun	27-jun	4-jul	11-jul	18-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	92,98%	92,98%	92,98%	92,98%	92,98%
82	8005078	$ 343.085.920,00	96,82%	96,82%	96,82%	96,82%	96,82%
60	8002162	$ 320.721.252,00	83,78%	83,84%	83,84%	83,84%	85,04%
61	8002265	$ 355.199.128,00	87,19%	96,31%	96,31%	96,31%	97,44%
65	8002008	$ 360.580.405,00	84,39%	93,34%	93,34%	93,61%	94,60%
64	8001931	$ 376.367.569,00	80,95%	84,23%	85,98%	87,34%	90,28%
73	8001148	$ 285.710.532,00	86,80%	94,25%	94,25%	94,25%	94,25%
76	8001183	$ 146.013.903,00	80,41%	82,47%	82,85%	85,12%	85,12%
75	8001223	$ 144.206.710,00	67,87%	67,87%	67,87%	68,39%	71,15%
74	8001184	$ 347.413.004,00	77,97%	80,98%	80,98%	81,72%	81,72%
70	8001657	$ 342.553.149,00	8,40%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%
66	8001876	$ 318.216.103,00	49,56%	52,05%	53,13%	57,36%	60,36%
44	8004757	$ 544.689.706,00	41,13%	41,13%	41,21%	41,21%	41,61%
68	8001715	$ 351.516.714,00	0,00%	0,00%	1,30%	4,42%	6,06%
71	8001771	$ 361.446.034,00	17,91%	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	2,52%	16,14%	16,14%	17,01%	17,71%
50	8004663	$ 770.232.864,00	14,48%	15,04%	15,04%	17,44%	17,44%
56	8004947	$ 377.475.477,00	0,18%	0,85%	4,71%	6,57%	11,86%
49	8004816	$ 479.216.394,00	20,87%	21,00%	22,25%	33,77%	39,52%
48	8004699	$ 983.197.315,00	1,47%	2,75%	3,80%	3,80%	7,19%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,00%	0,00%	2,39%	4,21%	6,30%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%

FECHA EVALUACIÓN			18-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	1,21%
61	8002265	$ 355.199.128,00	1,12%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,99%
64	8001931	$ 376.367.569,00	2,94%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	0,00%
75	8001223	$ 144.206.710,00	2,76%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,00%
70	8001657	$ 342.553.149,00	0,00%
66	8001876	$ 318.216.103,00	3,00%
44	8004757	$ 544.689.706,00	0,41%
68	8001715	$ 351.516.714,00	1,64%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	0,70%
50	8004663	$ 770.232.864,00	0,00%
56	8004947	$ 377.475.477,00	5,29%
49	8004816	$ 479.216.394,00	5,75%
48	8004699	$ 983.197.315,00	3,39%
89	8001841	$ 580.698.248,00	2,09%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,25%

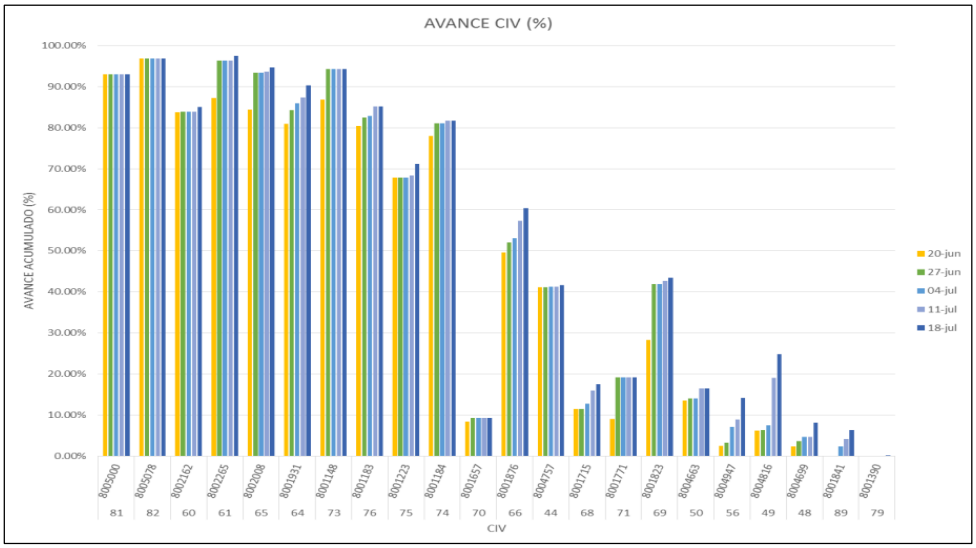

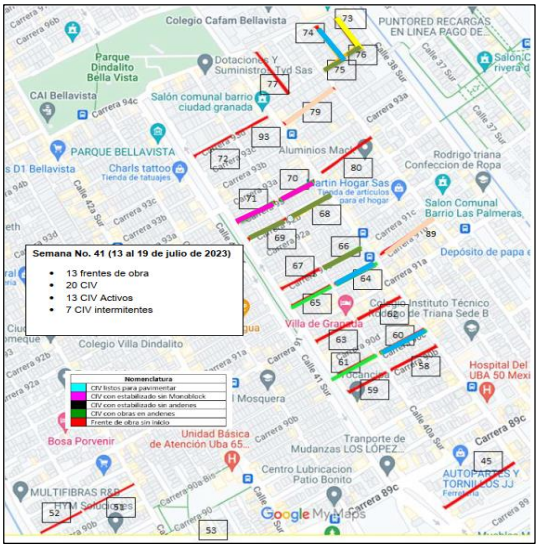



CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo 13 de julio al 18 de julio de 2023

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	70,47%	71,89%	70,47%
%Ejecutado	22,81%	22,51%	17,78%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-47,66%	-49,38%	-52,69%

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN	PK_ID ANDEN	44			50			60			61			64			65			66			68			69			71			70			49			73			74			75			76			81			82			48			56			89			79		
VIA	ORIENTAL	OCCIDENTAL	VIA (152907)	ORI (23937)	OCC (23938)	VIA (152906)	ORI (23935)	OCC (23936)	VIA (155776)	ORI (29122)	OCC (29123)	VIA(155777)	ORI (29124)	OCC (29125)	VIA (155852)	ORI (29274)	OCC (29275)	VIA (155853)	ORI (29276)	OCC (29277)	VIA (155860)	ORI (29290)	OCC (29291)	VIA (155875)	ORI(29320)	OCC (29321)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155878)	ORI(155878)	OCC(155878)	VIA(155878)	ORI(29326)	OCC (29327)	VIA(152905)	ORI(23933)	OCC (23934)	VIA(155917)	SUR(92062684)	NOR(92062817)	VIA(155918)	SUR(92062720)	NOR(92062828)	VIA(155893)	ORI(29356)	OCC(29357)	VIA(155872)	ORI(29354)	OCC(29355)	VIA(24146)	ORI(24149)	OCC(92062836)	VIA(153027)	ORI(24151)	OCC(24152)	VIA(152904)	ORI(23931)	OCC(23932)	VIA(153132)	ORI(24347)	OCC(92062895)	VIA(155851)	ORI(29272)	OCC(29273)	VIA(155851)	ORI(29272)	OCC(29273)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y CAJAS DE INSPECCION.																																																																			
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.																																																																		
REDES HIDRAULICAS	GEOTEXTIL	GEOTEXTIL																																																																			
GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE PERFORADA, RELLENO CON FRESADO SOBRE GEOCELDA	PRIMERA CAPA DE FRESADO	PRIMERA CAPA DE FRESADO																																																																
PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	SEGUNDA CAPA DE FRESADO	SEGUNDA CAPA DE FRESADO																																																																
CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO MONOBLOCK.	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA POTABLE																																																																	
SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	BORDILLO PREFABRICADO A80	BORDILLO PREFABRICADO A80																																																															
TERCER CAPA FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).	PISO EN CONCRETO GRIS MR41	PISO EN CONCRETO GRIS MR41																																																														
MEZCLA ASFALTICA	CONCRETO DE 3000PSI	CONCRETO DE 3000 PSI																																																																

TERMINADO	
EJECUCION	
INTERMITENTE	
SIN INICIAR	
NO APLICA	
