FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 42 **DEL** 20 de julio de 2023 **AL** 26 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No No 717 de 2022 (Nº de contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. COP 690 de 2022 (Nº de contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22 (Entidad o persona natural objeto del contrato de obra) **NIT** 901.628.933-1 (Entidad o persona natural objeto del contrato de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV (Entidad o persona natural objeto del contrato de interventoría) **NIT** 900.547.145-2 (Entidad o persona natural objeto del contrato de interventoría)

CONTRATO DE OBRA	
Valor	$ 19.621.435.784,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. de empleos generados	30

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 4.897.418.342,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	
Plazo Inicial	12 meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5 de octubre de 2022
Fecha de Terminación Inicial	4 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	
No. De empleos generados	45

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ (Nombre y cargo del supervisor)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS - DANILO MENESES TORO (Nombre y cargo del profesional del Equipo de apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoria del alcance físico del contrato de obra (Diligenciar el número del último radicado) **de fecha** (dd-mm-aa)

TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	Unidad
Calzada CIV	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50
TOTALES	$ 19.621.435.784,00	13224,93	3,78	50


A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso Avance
Trabajo Programado	2,64%	2,64%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%	-2,64%
Valor del Trabajo Programado	$	$ 0,00	Valor del Trabajo Ejecutado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso Avance
Fase preliminar Programada (%)	0,12%	0,24%	Fase preliminar Ejecutada (%)	0,12%	0,24%	0,48%
Fase preliminar Programada ($)	$ 23.973.828,48	$ 47.947.676,99	Fase preliminar Ejecutada ($)	$ 23.973.828,48	$ 47.947.676,99	$ 0,00
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso Avance
Obra Programada (%)	0%	0%	Obra Ejecutada (%)	0%	0%	0%
Obra Programada ($)	$	$	Obra Ejecutada ($)	$	$	$

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



Semana No.	ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO	ACUMULADO FINANCIERO EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	2,00%	7,21%
10	2,35%	7,21%
11	1,73%	7,21%
12	2,94%	7,22%
13	3,46%	7,23%
14	4,62%	8,21%
15	5,62%	8,47%
16	7,47%	9,05%
17	9,07%	9,57%
18	11,12%	9,98%
19	13,98%	9,13%
20	9,41%	10,01%
21	3,92%	7,22%
22	3,87%	7,22%
23	4,77%	7,22%
24	5,82%	7,44%
25	6,41%	7,22%
26	6,88%	7,22%
27	10,33%	7,22%
28	13,99%	7,22%
29	18,03%	7,22%
30	19,35%	7,22%
31	23,20%	7,22%
32	26,73%	9,52%
33	46,36%	9,52%
34	53,23%	9,52%
35	55,94%	9,52%
36	57,80%	9,52%
37	59,95%	9,52%
38	62,48%	9,52%
39	64,49%	9,52%
40	66,82%	17,78%
41	70,47%	17,78%
42	72,55%	17,78%

Análisis de la Gráfica: No se cuenta con cronograma

AVANCE FISICO

PROGRAMADO				EJECUTADO					
Fase preliminar	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.	%Atraso /%Avance	
Fase preliminar programada (m²)	1542,91	3085,82	23%	Fase preliminar Ejecutada (m2)	1542,91	3085,82	23%		
Fase preliminar programada (Und)	13	26	23%	Fase preliminar Ejecutada (Und)	13	26	23%	0%	
Fase preliminar cronamada (Km/carril)	0,0017142857	0,0034285714	0,09%	Fase preliminar Ejecutada (Km/carril)	0,0017142857	0,0034285714	0,09%		
								%Atraso /%Avance	
Estudios y Diseños Prosram. (m2)	0	0	0%	Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	0	0	0%		
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.		
Meta Física Prosramada (m2)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (m2)	0	0	0%		
Meta Física Prosramada (Km/carril)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km/carril)	0	0	0%	%Atraso /%Avance	
Meta Física Prosramada (und)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (und)	0	0	0%	0%	
Meta Física Prosramada (km)	0	0	0%	Meta Física Ejecutada (km)	0	0	0%		
Meta Física Prosramada (%)				Meta Física Ejecutada (%)					
AVANCE PROJECT								%Atraso /%Avance	
Avance Programado (%)	0%			Avance Ejecutado (%)	0%			0%	
Avance Prosramado Mantenimiento periódico	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento periódico	0%			0%	
Avance Prosramado Mantenimiento Rutinario	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rutinario	0%			0%	
Avance Prosramado Mantenimiento Reconstrucción	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Reconstrucción	0%			0%	
Avance Prosramado Mantenimiento Rehabilitación	0%			Avance Ejecutado Mantenimiento Rehabilitación	0%			0%	

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

														INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DESEARON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
No	CIV	PK_ID CALZADA	PK_ID ANDEN 1	PK_ID ANDEN 2	EJE	DESDE	HASTA	IPR	TIPO SUPERFICIE	TIPO DE ELEMENTO	ANCHO CALZADA (m)	LONGITUD (m)	AREA CALZADA (m²)	ESTADO	FECHA DE INICIACION PROGRAMADA	MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA INICIADO	Acciones a seguir
44	8004757	152907	23937	23938	KR 84	CL 42B SUR	CL 42A SUR	33,44	6	CALZADA	3,19	82,04	261,84	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado y geotextil	1-abr-23		
45	8005377	152793	23725	23726	KR 81C	CL 42 SUR	CL 41F SUR	29,06	6	CALZADA	3,83	62,8	240,73	Sin iniciar	7-jul-23	SIN PMT	
47	8005506	152794	23727	23728	KR 81C	CL 42 SUR	DG 42A SUR	33,56	6	CALZADA	2,93	100,38	294,44	Sin iniciar	17-jul-23	SIN PMT	
48	8004699	152904	23931	23932	KR 83	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	4,74	144,13	683,05	SIN ACTIVIDADES	15-jun-23		
49	8004816	152905	23933	23934	KR 83	CL 42B SUR	CL 42A SUR	32,6	6	CALZADA	2,7	82,01	221,4	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual e instalación de monoblock. Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.	24-jul-23		
50	8004663	152906	23935	23936	KR 84	CL 42A SUR	CL 41A SUR	52,51	6	CALZADA	5,25	136,17	714,24	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado y geotextil	10-may-22		
51	8002727	155809	29188	29189	KR 90C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	28,88	6	CALZADA	2,59	88,19	228,81	Sin iniciar	No se tiene programación		
52	8002785	155810	29190	29191	KR 90C	CL 42G SUR	CL 42 SUR	28,19	6	CALZADA	2,38	72,08	170,92	Sin iniciar	No se tiene programación		
53	8002995	155822	29214	29215	CL 42F BIS SUR	KR 88C	KR 89F	30,14	6	CALZADA	2,43	41,49	109,22	Sin iniciar	No se tiene programación		
54	8004508	152883	23891	23892	KR 83	CL 40D SUR	CL 41 SUR	37,56	6	CALZADA	4,88	88,16	430,2	Sin iniciar	No se tiene programación		
55	8005671	153124	24331	24332	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81J	29,06	6	CALZADA	3,74	27,95	104,45	Sin iniciar	25-jul-23	SIN PMT	
56	8004947	153132	24347	92062895	KR 83	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	29,79	6	CALZADA	4,24	71,14	301,74	Calzada: Excavación mecánica e instalación de fresado y geo cartila. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	25-feb-23		
57	8005351	153126	24335	24336	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,45	27,73	95,75	Sin iniciar	18-ago-23	SIN PMT	
58	8002225	155774	29118	29119	KR 90B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	33,56	6	CALZADA	4,63	80,45	372,11	Sin iniciar	23-feb-23	SIN PMT	
59	8002331	155775	29120	29121	KR 90B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	32,51	6	CALZADA	4,32	66,67	288,2	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
60	8002162	155776	29122	29123	KR 90C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	52,62	6	CALZADA	5	79,19	395,73	Calzada: Reinstalación para instalación de adiafa . Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	22-dic-22		
61	8002265	155777	29124	29125	KR 90C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	51,58	6	CALZADA	4,54	65,92	299,32	SIN ACTIVIDADES	6-ene-23		
62	8002055	155780	29130	29131	KR 91	CL 40 SUR	CL 40A SUR	48,97	6	CALZADA	4,54	76,23	345,98	SIN INICIAR	6-mar-23		
63	8002132	155781	29132	29133	KR 91	CL 40A SUR	CL 41 SUR	63,03	6	CALZADA	4,41	66,53	293,12	SIN INICIAR	No se tiene programacion por CIV		
64	8001931	155852	29274	29275	KR 91B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,93	69,19	272,04	Calzada: Instalación de fresado estabilizado y reinstalación para instalación de adiafa. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	21-mar-23		
65	8002008	155853	29276	29277	KR 91B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	29,06	6	CALZADA	3,5	67,82	237,35	SIN ACTIVIDADES	28-feb-23		
66	8001876	155860	29290	29291	KR 91C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	27,35	6	CALZADA	3,84	67,47	259,4	Calzada: Excavación manual para instalación de tubería pozo e instalación de concreto 3000 psi para placa de tubería de pozo. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Sin actividad	9-mar-23		
67	8001968	155861	29292	29293	KR 91C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	3,79	66,96	253,67	Sin iniciar	3-abr-23	SIN PMT	
68	8001715	155875	29320	29321	KR 92B	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	4,15	68,59	284,73	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Instalación de concreto 3000 psi.	18-mar-23		
69	8001823	155876	29322	29323	KR 92B	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,26	67,66	288,51	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil	8-abr-23		
70	8001657	155878	29326	29327	KR 93	CL 40 SUR	CL 40A SUR	28,19	6	CALZADA	3,87	62,49	241,97	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación mecánica y excavación manual. Andén occidental: Sin actividad.	4-abr-23		
71	8001774	155879	29328	29329	KR 93	CL 40A SUR	CL 41 SUR	27,35	6	CALZADA	4,04	67,46	272,75	SIN ACTIVIDADES	21-abr-22		
72	8001545	155969	29370	29371	KR 93D	CL 40A SUR	CL 41 SUR	48,97	6	CALZADA	3,4	67,15	228,19	Sin iniciar	5-jun-23	SIN PMT	
73	8001148	155917	92062684	92062817	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	49,32	6	CALZADA	4,21	55,04	231,7	SIN ACTIVIDADES	20-ene-23		
74	8001184	155918	92062720	92062828	CL 38B SUR	KR 93D	KR 94C	50,01	6	CALZADA	4,18	62,56	261,7	Calzada: Excavación manual para instalación de tubería pozo. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad			
75	8001223	155893	29356	29357	KR 93D	CL 38B SUR	CL 38C SUR	49,32	6	CALZADA	3,56	29,93	106,54	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Conformación espacio público, instalación de bordillo, fresado y de concreto.	24-ene-23		
76	8001183	155892	29354	29355	KR 93D	CL 38A SUR	CL 38B SUR	49,32	6	CALZADA	3,92	31,84	124,92	Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Sin actividad	24-ene-23		
77	8001285	155920	29410	29411	CL 38A SUR	KR 93D	KR 94C	30,59	6	CALZADA	4,17	84,31	351,16	Sin iniciar	16-may-23	SIN PMT	
78	8005282	153127	24337	24338	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	28,19	6	CALZADA	3,47	27,72	96,23	Sin iniciar	12-sep-23	SIN PMT	
79	8001390	155890	29350	29351	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR	31,4	6	CALZADA	4,09	96,82	395,99	Calzada: Excavación mecánica, instalación de geotextil, geomalla y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-may-23		
80	8001581	155877	29324	29325	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	2	CALZADA	4,06	96,35	391,11	Calzada: Excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	6-jun-23		
81	8005000	153026	24149	92062836	KR 82D	CL 42C SUR	CL 42F BIS SUR	28,95	6	CALZADA	4,3	73,09	314,48	SIN ACTIVIDADES	16-dic-22		
82	8005078	153027	24151	24152	KR 82D	CL 42F BIS SUR	CL 42H SUR	28,54	6	CALZADA	4,89	72,7	355,66	SIN ACTIVIDADES	3-ene-23		
83	8005258	153095	24273	24274	CL 42F BIS SUR	KR 81L	KR 82	31,84	6	CALZADA	3,21	27,68	88,78	Sin iniciar	21-jul-23	SIN PMT	
84	8005192	153096	24275	24276	CL 42F BIS SUR	KR 82	KR 82A	50,91	6	CALZADA	2,87	27,86	79,97	Sin iniciar	31-jul-23	SIN PMT	
85	8005126	153097	24277	24278	CL 42F BIS SUR	KR 82A	KR 82B	50,91	6	CALZADA	3,11	27,9	86,74	Sin iniciar	10-ago-23	SIN PMT	
86	8005055	153098	24279	24280	CL 42F BIS SUR	KR 82B	KR 82D	47,26	2	CALZADA	3,53	27,59	97,42	Sin iniciar	19-ago-23	SIN PMT	
87	8013930	902162	902161	902163	CL 42A BIS SUR	KR 80D	KR 80F	29,06	6	CALZADA	3,59	55,42	199,15	Sin iniciar	No se tiene programacion por CIV		
88	8006231	152956	24009	24010	CL 42B SUR	KR 80D	KR 80F	28,04	6	CALZADA	4,28	53,74	230,06	Sin iniciar	No se tiene programacion por CIV		
89	8001841	155851	29272	29273	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR	28,54	6	CALZADA	4,34	99,91	433,99	Calzada: Instalación de geotextil, geocelda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad	21-jun-23		
90	8005210	153128	24339	24340	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	31,84	6	CALZADA	3,23	27,95	90,26	Sin iniciar	No se tiene programacion por CIV		
91	8005408	153125	24333	24334	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	29,06	6	CALZADA	4,1	27,99	114,7	Sin iniciar	No se tiene programacion por CIV		
92	8004910	153106	24295	92062824	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 83D	49,21	6	CALZADA	2,22	112,12	248,59	Sin iniciar	18-mar-23	SIN PMT	
93	8001427	155899	29368	29369	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	29,06	6	CALZADA	2,35	56,74	167,56	Sin iniciar	16-jun-23	SIN PMT	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1.COMPONENTE TECNICO

1.1. Actividades Tecnicas de Interventoría

• Se realiza verificación del PMT y del cerramiento del frente de obra.
• Se cuenta con PMT aprobadas de los CIV 8004757-8004899-8004916-8004983-8002162-8002265-8001931-2002006-8001876-8001715-8001823-8001657-8001148-8001223-8001184-8001183-8004947 - 8001841 - 8001390
• Seguimiento en la conformación de espacio público 44-50-75-76-69-70, a la instalación de monoblock 49, mejoramiento de vía y excavación mecánica 89-79. Seguimiento a la instalación de concreto MR-41 y concreto 3000 psi P68-P64. Seguimiento a la apertura de CIV 8001581 - 80

1.2 Seguimiento de las actividades del contratista

• **P81:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P82:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P83:** Calzada: Reinstalación para la instalación de asfalto . Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P61:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P84:** Calzada: Instalación de fresado estabilizado, reinstalación para la instalación de asfalto. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P85:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad.
• **P73:** Calzada: Sin actividad. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P74:** Calzada: Excavación manual para la instalación de tubería pozo. Andén norte: Sin actividad. Andén sur: Sin actividad
• **P75:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad Andén occidental: Conformación espacio público, instalación de bordillo, fresado e instalación de concreto
• **P76:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Sin actividad
• **P66:** Calzada: Excavación manual para la instalación de tubería pozo e instalación de concreto 3000 psi para placa de tubería de pozo. Andén oriental: Instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Sin actividad
• **P44:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado y geotextil
• **P92:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Excavación manual e instalación de fresado y geotextil
• **P88:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Se realiza instalación de concreto MR-41. Andén occidental: Se realiza instalación de concreto 3000 psi.
• **P89:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil
• **P70:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Demolición de cajas de inspección, excavación mecánica y excavación manual. Andén occidental: Sin actividad.
• **P71:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P49:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Excavación manual e instalación de monoblock. Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.
• **P48:** Calzada: Sin actividad. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P56:** Calzada: Excavación mecánica e instalación de fresado y geo celda. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P58:** Calzada: Se realiza instalación de geotextil, geo celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P79:** Calzada: Se realiza con excavación mecánica, instalación de geotextil, geo celda y fresado. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad
• **P80:** Calzada: Se realiza apertura al CIN e inician con excavación mecánica. Andén oriental: Sin actividad. Andén occidental: Sin actividad

1.5 Actividades a realizar la siguiente semana

• Excavación mecánica y transporte de material proveniente de excavación.
• Instalación y construcción de la estructura , instalación de fresado estabilizado, de sumideros y monobloc

2. COMPONENTE AMBIENTAL

• La calificación fue de 1'00%
• RCD GENERADO. Para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación, por un total de 360m3.
• Material fresado: De la Unidad de Mantenimiento Vial. de Patio EDJ 285 m3

Se continúan con las actividades en los CIVs de la siguiente manera:
CIV 8004757 (44) - Conformación andén - Descargue Concreto 3000 psi Espacio público
CIV 8004899 (48) - Sin actividades
CIV 8004916 (49) - Instalación Monoblock C/Oriental y occidental
CIV 8004983 (50) - Demolición y excavación Andén Occidental - Cargué y retiro de material de excavación Anden Occidental - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén occidental - Conformación excavación espacio público y retiro medidores agua potable C/occidental
CIV 8004947 (56) - Estabilizado fresado RAP 1a capa - Compactación Estabilizado RAP 1a capa
CIV 8002162 (60) - Retiro escombro - Humectación y limpieza para aplicación segunda capa de Fresado estabilizado - Extendido mezcla fresado estabilizado - Compactación con canguro primera capa fresado estabilizado
CIV 8002265 (61) - Sin actividades
CIV 8001931 (64) - Corte y perforada de sumidero costado oriental - Mezcla de estabilizado RAP y nivelación 2da capa - Instalación de monobloc con accesorios de 6" pvc - Cereo de estabilizado RAP - Compactación de estabilizado RAP 2da capa - Compactación de geoceldа - Excavación manual para instalación de bordillo A80 - Conformación vía para asfalto
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Concreto solado de limpieza para tubería 12" - Parrillas en acero para tapas cárcamo tubería 12" y fundida en concreto - Instalación prefabricado sumidero - Instalación de tubería 12" colilla rotura de sumidero para condicionar el cabezal - Instalación de bordillo A80 - excavación manual para sumidero - Instalación de caja sumidero costado oriental
CIV 8001715 (68) - Descargue concreto 3000 psi andén - Alistado concreto andén 3000 PSI - Riego y compactación andén oriental - Estampado andén - Compactación con canguro anderes - Extendida de concreto 3000psi en anden - Estampado en anden tipo loperol - Se inicia estampado en anden tipo adoquín - Adecuación para accesos a los predios
CIV 8001823 (69) - Lleno con fresado alrededor cajas de inspección - Instalación geotextil andén y fresado primera capa - Riego con agua andén occidental - Compactación con canguro andén - Excavación para fundida placa fondo en pozo en sitio - Concreto solado de limpieza y figurada de acero parrilla pozo - Vibrado de concreto para placa fondo pozo
CIV 8001123 (75) - Excavación sumidero andén oriental y occidental - Compactación con canguro andén oriental - Instalación medidor de agua - Riego de rampas con agua - Llega concreto MR-41 para fundir rampas
CIV 8001183 (76) - Excavación para fundir de sumidero a pozo - Instalación de geotextil y geoceldа- Excavación de zanja para tubería de sumidero a pozo - Se instalaron 4 tapas de cajas de inspección - Compactación con canguro andén oriental - Cama de arena para instalación tubería 12" sumidero a pozo - Recubrimiento de zanja para tubería sumidero a pozo con fresado - Instalación de geotextil para esquina de andén - Capa de recubrimiento (solado) para sumideros anderes oriental y occidental - Instalación de monoblock - Instalación medidor de agua potable
CIV 8001390 (79) - Cargue material de excavación - Instalación de geotextil y geoceldа - Extendida de fresado sobre geoceldа - Extendido de fresado 1ra capa de vía - Nivelación primera capa de fresado con geo celda - Compactación de mejoramiento con geoceldа - Riego de agua sobre primera capa de fresado con geoceldа - Compactación de 1ra capa, fresado con geoceldа
CIV 8001581 (80) - Se inicia excavación mecánica en vía - Cargue y retiro de excavación en vía - Nivelación y compactación de la subrasante.
CIV 8005000 (81) - Remates
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Instalación de geotextil , geoceldа y lleno con fresado - Cereo de fresado capa geoceldа

En recorrido realizado en forma conjunta Residente ambiental de Interventoría con el residente ambiental del contratista se evidenció lo siguiente:

• Se solicita al contratista el retiro de los residuos de las excavaciones que se encuentran acopiados
• Los frentes de obra se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo, es de anotar que varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de bajo impacto.
• Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y baños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.
• El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.
• Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.
• Se [illegible] con [illegible] de Personal y de [illegible] en algunos CIVs. En algunos puntos se encuentran realizando actividades de [illegible]

3. COMPONENTE SST

3.1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA
0	1. Consorcio SCLV = 22	0	52
	2. Silva Carreño y Asociados S.A.S = 10		
	3. La Viabilidad Limitada = 13		
	4. Cense Ingeniería Ltda = 1		
	5. J.V.R Estudios = 1		
	6. Geovial Limitada = 5		

3.2 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 20 julio de 2023 al 26 de julio de 2023, no se presentó ausentismo del personal de la Interventoría:

3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• El 25 de julio de 2023 los componentes SST, Ambiental, social y ambiental y técnico de la Interventoría realizaron recorrido de obra por los CIV en ejecución al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, adicional a esto el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace uso de los elementos de Protección Personal (EPP) para las actividades de obra.
•Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

UPZ CORABASTOS:

P81: Actividades de instalación de rejillas
P82: Actividades de concreto para tapas, este CIV junto con el CIV 81 cuenta con unidades sanitarias para uso de los trabajadores que desarrollan actividades, se evidencia punto ecológico, de hidratación y kit de emergencias.
P84: Actividades de conformación de espacio público, el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con punto ecológico, de hidratación y kit de emergencias
P48: Actividades de instalación de estabilizado, el persona porta dotación y hace uso de los EPP, este CIV cuenta con punto ecológico, kit de emergencia, kit antiderrame.
P49: No se encuentran desarrollando actividades
P50: Actividades de espacio público el personal porta la dotación de acuerdo con el manual de identificación visual, este CIV cuenta con baño portátil, kit de emergencia.
P58: No se encuentran desarrollando actividades

UPZ PATIO BONITO:

P60: No se encuentran desarrollando actividades, este CIV cuenta con cartelera informativa y kit de emergencia.
P61: No se encuentran desarrollando actividades
P64: No se encuentran desarrollando actividades
P65: No se encuentran desarrollando actividades
P66: Instalación de geotextil y fresado este CIV cuenta con kit de emergencia. punto ecológico, kit anti derrame y cartelera informativa.
P68: No se encuentran desarrollando actividades
P69: Actividades de excavación de anden y construcción de cajas. este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico.
P70: Actividades de espacio público, el personal cuenta con la dotación de acuerdo al manual de identificación visual así mismo hace uso de los EPP este CIV Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico y cartelera informativa.
P72: No se encuentran desarrollando actividades.
P74: No se encuentran desarrollando actividades
P75: Actividades de vaciado de concreto, este CIV cuenta con kit de emergencia, cartelera informativa y kit anti derrame estos insumos están compartidos con los CIV 73,74 y 76.
P76: Vaciado de concreto en espacio público
P89: No se encuentran desarrollando actividades

• De acuerdo con lo antes expuesto se realizaron recomendaciones al contratista con el fin de cumplir con los requisitos mínimos en gestión SST y así mismo para apertura a los próximos CIV a ejecutar. Como recomendaciones generales se solicitó al contratista orden y aseo, revisar y garantizar senderos peatonales y acceso a las viviendas, aplica para todas las prioridades.
• Durante la semana se revisaron documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.
• El 26 de julio de 2023 se llevó a cabo comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.
• El 26 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.
• Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría.

3.4 ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 20 julio de 2023 al 26 de julio, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

3.5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Ingreso	Antiguos	Retiros	PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:
PROURBANOS = 1	1. CVK22 = 9	1. CARLOS ALDEMAR DIAZ CASAS = 1	134
CARLOS ALDEMAR DIAZ CASAS = 1	2. AIKA HUMANA = 84	2. SAM INGENIERIA = 1	
AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 1	3. MMAPV SAS = 6		
	4. MR GROUP COL SAS = 1		
	5. SOLTEC PROYECTOS INGENIERÍA SAS = 1		
	6. MABERK = 1		
	7. WITS = 1		
	8. SOLUCIONES TECMARQ SAS = 1		
	9. AREVALO Y ARDILA CONSTRUCTORA SAS = 10		
	10. CONSTRUBERNAL = 1		
	11. SAM INGENIERIA = 11		
	12. MAQUINARIA Y SERVICIOS = 1		
	13. CARLOS ALDEMAR DIAZ CASAS = 1		
	14. CIVILES = 1		
	15. TRANSPORTE Y MAQUINARIA C&C = 1		
	16. PROURBANOS = 1		

3.6 AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 20 julio de 2023 al 26 de julio de 2023, el contratista reporto ausentismo de seis (6) trabajadores, cuatro (4) generados por enfermedad general, y dos (2) que no asistieron.
De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 20 julio de 2023 al 26 de julio de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia = 1
N° de días de trabajo programados = 6
N° Trabajadores en la semana = 52
% de ausentismo 0,27%

Es así como se evidencia que el 0,27% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

3.7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

• Se realizó inducción al personal nuevo, donde se presentan las Generalidades sobre el SG-SST, Estructura Organizacional- Reglamento Interno de Trabajo- de Higiene industrial- Políticas de SST, alcohol, drogas y tabaquismo- Aspectos legales relacionados con SST. Condiciones de Salud y Medicina laboral, Higiene y Seguridad Industrial- Identificación de peligros, Uso de EPP, matriz de peligros entre otros.
• Se hace la notificación de riesgos al personal que ingresa a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con cada cargo: Riesgo mecánico, Químico, Locativo, Biológico, Biomecánico, Físico, Eléctrico, de seguridad, Publico y Fenómenos naturales
• Se realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ingresó a laborar al contrato CCP 030-22, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra
• El personal de obra cuenta con los espacios requeridos para almacenar su ropa durante el horario de trabajo, de igual manera cuentan con baterías sanitarias en óptimas condiciones y en cantidad suficiente de acuerdo con el género. de trabajadores presente en el frente de obra.
• El contratista reporto que se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra
• Se hace y cabo inspecciones de maquinaria y EPP en los frentes de obra

4.COMPONENTE SOCIAL

4.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

• En este periodo el PAC es atendido de acuerdo con el horario aprobado previamente por la interventoría; lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Adicionalmente, el contratista realizó recorridos sociales para atender inquietudes de la comunidad y acercar la atención a la ciudadanía en el área de intervención, los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo anterior, para completar 40 horas de atención según lo requerido contractualmente.
• En el corte reportado se atendió el PAC de acuerdo con el horario aprobado por la interventoría. En este periodo no se reportaron solicitudes de veedurías ciudadanas.

PQRSD:

A la fecha el contratista cuenta con 37 PQRSD; de las cuales 1 se encuentra en trámite, a continuación, se realiza la trazabilidad por cada una
• PQRSD 23: Se encuentra pendiente la firma de esta PQRSD por parte del Director de interventoría.
• PQRSD 34: El 25/05/2023 se realiza cierre de esta PQRSD en compañía de la interventoría, adjuntando a la PQRSD el acta de reunión con la firma de los especialistas de espacio público del contratista y la interventoría, queda pendiente envío de documento a la interventoría.
• PQRSD 55: El 25/05/2023 se realiza cierre de esta PQRSD en compañía de la interventoría, adjuntando a la PQRSD el acta de reunión con la firma de los especialistas de espacio público del contratista y la interventoría, queda pendiente envío de documento a la interventoría.
El 24/07/23 la interventoría remite correo electrónico de la ciudadana Blanca Velandia por motivo de afectación de muro interno de 1er nivel. El contratista apertura acta de compromiso donde se le informa a la ciudadana que una vez finalice la obra, se realizará la respectiva subsanación de su predio.

Recorridos Urbanos:

• El 20 y 25 de julio 2023 se realiza recorrido por los frentes de obra activos enCorabastos Patio Bonito en los cuales se verifica las vallas informativas de los frentes de obra. Dentro de estas se encuentra nuevamente desactualizada una de las vallas por lo que se dará al contratista un ultimátum respecto a este inconveniente, sino se procederá a llamado de atención oficial.
• El 25/07/23 interventoría brinda observaciones del recorrido realizado en campo por los frentes activos, los cuales quedan socializados en el acta de comité social de la presente semana.

4.2 Programa de Diálogo y participación ciudadana

• El 22/07/23 se realiza envío de la PPT de las UPZ 80 y 82 a la interventoría
• El 24/07/23 la interventoría remite las observaciones generadas por cada área para su ajuste y envío nuevamente

4.3 Programa de acompañamiento técnico

Actas de vecindad y rampas vehiculares

• El 21/07/23 Se envía oficio CE-CVK22-ADM-608 Radicación actas de vecindad CIV 8001285 P.77 a la interventoría para su revisión y aprobación.
• El 22/07/23 Se inicia con el levantamiento de actas de vecindad del CIV 8001427 P. 93
Total, de actas realizadas en el contrato: 686

• El 21/07/23 Se envía oficio CE-CVK22-ADM-608 Radicación actas de acceso vehicular CIV 8001285 P.77 a la interventoría para su revisión y aprobación.
• El 22/07/23 Se inicia con el levantamiento de actas de acceso vehicular del CIV 8001427 P. 93
Total, de actas realizadas en el contrato: 412

Cierres de Actas de Vecindad:
• Se continúa realizando las actas de vecindad y actas de acceso vehicular de cierre en las P. 60, 73, 81 y 82, algunos predios se encuentran pendiente de cierre por remates.

Actas de compromiso:
• El 24/07/23 se inicia con el levantamiento de 10 actas de suspensión de acceso vehicular del CIV 8001285 P. 77
• El 24/07/2023 se realizó la apertura de 1 acta de compromiso de adecuación cubierta del CIV 8001285 P 7, además, el día 24/07/2023 se realiza acta de compromiso de arreglo de muro del predio de la Cr 92 B N. 40-34 CIV 8001715 P. 68 una vez se finalicen las actividades constructivas.
• El 25/07/2023 se remite oficio de notificación a Alcaldía local de Kennedy de los predios Cra 84 N. 41 A 11 sur y Carrera 82 D N. 42 C 24 sur de la UPZ 80.

4.4 Programa de cultura ciudadana

• El 19/07/2023, la interventoría remite las observaciones de la metodología, a la fecha el contratista se encuentra pendiente del envío de la misma, una vez se defina el grupo poblacional.

4.5 Programa de gobernanza para la movilidad

• A la fecha el contrato cuenta con 69 personas de MO/NC; de las cuales 12 de ellos residen en la localidad, 05 de estos trabajadores son mujeres y 07 son hombres, sus cargos dentro de la obra son de auxiliares de tráfico, BOAL y ayudantes de obra. El porcentaje de contratación general a la fecha es de 17.39 % correspondiente a trabajadoras residentes en la localidad de Kennedy, de ellos 7,24 % son mujeres.

4.6 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Vallas informativas

• Para el periodo reportado, los frentes de obra cuentan con valla informativa de inicio a fin y cuentan con el porcentaje de obra actual.
• El contratista realiza subsanación de las vallas que han sido hurtadas o afectadas con el fin de garantizar la información, se encuentra pendiente instalación de la valla informativa del CIV 79. Referente al CIV 56 la valla se encuentra en custodia, ya que se instala únicamente cuando hay personal que pueda cuidar de ella, teniendo en cuenta la inseguridad de este sector.
• A corte de este periodo el avance de obra se encuentra en el 27.89% con 113 días para finalización de obra, se le notifica a la interventoría en comité de seguimiento, que esta información será actualizada los días de corte de entrega de informe semanal del área técnica.

Volantes de información:

• El 21/07/23 se reciben y aprueban los volantes:
119 volante inicio de actividades de obra CIV 8001285.
120 informativo punto de recolección de basura. CIV 8001285.
121 de convocatoria a comité FDLK N°1 UPZ 80.
122 de convocatoria a comité FDLK N°1 UPZ 82
• El 21/07/23 se realiza la entrega de 14 Volantes N° 116 actas de vecindad CIV 8001427-8001545 primera visita.
• El 24/07/23 se realiza la socialización de 21 volantes N° 119. Volante inicio de actividades de obra CIV 8001285, 21 Volantes 120 informativo punto de recolección de basura. CIV 8001285.
• El 25/07/23 se inicia con la distribución de volantes de convocatoria al comité FDLK de la UPZ 80 y 82.

Puntos Satélites de información:

• El 25/07/23 se realiza actualización de PSI de las UPZ 80 y 82 con los últimos volantes aprobados por parte de la interventoría, respecto a inicio de actividades constructivas de malla vial, espacio público, puntos de recolección, convocatoria comité FDLK UPZ 80 Y 82

4.6 Comités

• Se realizó el comité social N°40, el 25 de julio a las 9:00 am de manera virtual.
• Se brinda en el comité de seguimiento la calificación semanal la cual es de 98% de cumplimiento.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

No se presentaron

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC.)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	X	
2. Registro Fotográfico	X	
3. Avance	X	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

días del mes de julio (Mes en letras) de 2023 (Año en letras del informe)

veintiseis (Día en letras) 26 (Día en número)

[illegible] Jose Manuel Vilca Rojas
Director de Interventoría

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 42 **DEL** 20 de julio de 2023 **AL** 26 de julio de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 717 de 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 690 de 2022 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

CIV: No. 64 - 8001931
Descripción: Instalación de asfalto



Descripción Foto 2.

CIV: No.60 - 8002162
Descripción: Renivelación de calzada



Descripción Foto 3.

CIV: No.66 - 8001876
Descripción: Conformación de pozo



Descripción Foto 4.

CIV: No.69 - 8001823
Descripción: Reinstalación de monoblock



Descripción Foto 5.

CIV: No.50 - 8004663
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 6.

CIV: No.49 - 8004816
Descripción: Instalación de monoblock



Descripción Foto 7.

CIV: No.73 - 8001148
Descripción: Sin actividad



Descripción Foto 8.

CIV: No.44 - 8004757
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 9.

CIV: No.68 - 8001715
Descripción: Instalación de concreto 3000 psi



Descripción Foto 10.

CIV: No.79 - 8001390
Descripción: Instalación de geotextil, geocelda y fresado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Descripción Foto 11.

CIV: No.75 - 8001223
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 12.

CIV: No.70 - 8001657
Descripción: Conformación de espacio público



Descripción Foto 13.

CIV: No.89 - 8001841
Descripción: Instalación de geotextil y geoceldа



Descripción Foto 14.

CIV: No.74 - 8001184
Descripción: Excavacaión manual para instalación de tubería


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintiseis (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) Juan Manuel Alba Forero
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL - GRUPO 2
SEGUIMIENTO AL 25-JULIO-2023


P	CIV	VALOR CIV	PROG-ACUM ($)	PROG-ACUM (%)	EJEC-ACUM ($)	EJEC-ACUM (%)	PESO EJEC PROG (%)	ATRASO (%)
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 307.829.014,10	1,76%	92,98%	-1,07%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 332.182.707,83	1,90%	96,82%	-0,85%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 272.745.212,76	1,56%	85,04%	-1,39%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 346.097.096,78	1,98%	97,44%	-0,66%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 341.094.074,89	1,96%	94,60%	-0,52%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 357.236.009,42	2,05%	94,92%	-0,49%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 269.281.829,64	1,54%	94,25%	-0,40%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 126.084.120,01	0,72%	86,35%	-0,62%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 107.253.828,79	0,61%	74,38%	-0,44%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 285.772.459,85	1,64%	82,26%	1,64%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 32.050.753,20	0,18%	9,36%	-2,08%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 192.450.595,43	1,10%	60,48%	-1,37%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 234.729.639,86	1,35%	43,09%	-1,04%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 43.582.475,31	0,25%	12,40%	-2,12%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 101.220.892,84	0,58%	28,00%	-1,88%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 60.606.237,32	0,35%	17,75%	-2,19%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 594.308.066,00	3,41%	$ 134.335.950,39	0,77%	17,44%	-2,64%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 52.026.056,18	0,30%	13,78%	-2,25%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 6.542.040,85	0,04%	$ 189.381.518,51	1,09%	39,52%	1,05%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 324.485.226,02	1,86%	$ 70.740.088,69	0,41%	7,19%	-1,45%
89	8001841	$ 580.698.248,00	$ 248.971.382,87	1,43%	$ 58.219.173,53	0,33%	10,03%	-1,09%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 593.145.037,00	3,40%	$ 52.688.433,41	0,30%	8,37%	-3,10%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,85%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,50%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 521.618.723,00	2,99%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,99%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 387.812.181,23	2,22%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,22%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 321.151.207,96	1,84%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,84%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 218.649.542,67	1,25%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,25%
45	8002718	$ 739.233.204,00	$ 157.133.590,53	0,90%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,90%
46	8005377	$ 280.055.154,00	$ 157.125.283,00	0,90%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,90%
47	8005506	$ 625.940.380,00	$ 49.893.964,80	0,29%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,29%
83	8005258	$ 124.373.507,00	$ 21.981.257,25	0,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,13%
TOTALES			**$ 13.025.100.862,18**	**74,66%**	**$ 3.967.608.168,73**	**22,74%**		**-51,92%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

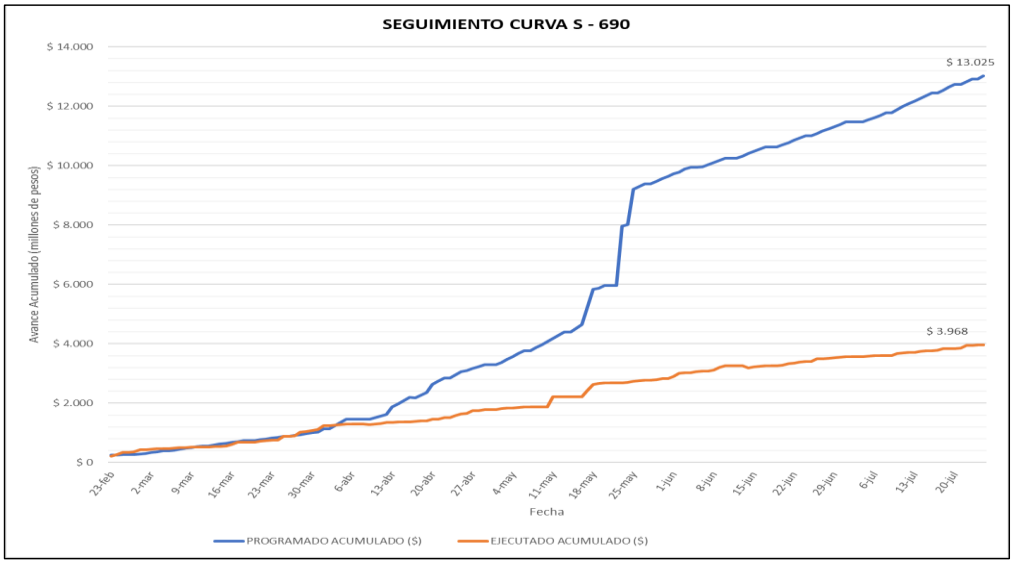



CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2
EVALUACIÓN CIV

FECHA EVALUACIÓN			27-jun	4-jul	11-jul	18-jul	25-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	92,98%	92,98%	92,98%	92,98%	92,98%
82	8005078	$ 343.085.920,00	96,82%	96,82%	96,82%	96,82%	96,82%
60	8002162	$ 320.721.252,00	83,84%	83,84%	83,84%	85,04%	85,04%
61	8002265	$ 355.199.128,00	96,31%	96,31%	96,31%	97,44%	97,44%
65	8002008	$ 360.580.405,00	93,34%	93,34%	93,61%	94,60%	94,60%
64	8001931	$ 376.367.569,00	84,23%	85,98%	87,34%	90,28%	94,92%
73	8001148	$ 285.710.532,00	94,25%	94,25%	94,25%	94,25%	94,25%
76	8001183	$ 146.013.903,00	82,47%	82,85%	85,12%	85,12%	86,35%
75	8001223	$ 144.206.710,00	67,87%	67,87%	68,39%	71,15%	74,38%
74	8001184	$ 347.413.004,00	80,98%	80,98%	81,72%	81,72%	82,26%
70	8001657	$ 342.553.149,00	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%
66	8001876	$ 318.216.103,00	52,05%	53,13%	57,36%	60,36%	60,48%
44	8004757	$ 544.689.706,00	41,13%	41,21%	41,21%	41,61%	43,09%
68	8001715	$ 351.516.714,00	0,00%	1,30%	4,42%	6,06%	12,40%
71	8001771	$ 361.446.034,00	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	16,14%	16,14%	17,01%	17,71%	17,75%
50	8004663	$ 770.232.864,00	15,04%	15,04%	17,44%	17,44%	17,44%
56	8004947	$ 377.475.477,00	0,85%	4,71%	6,57%	11,86%	13,78%
49	8004816	$ 479.216.394,00	21,00%	22,25%	33,77%	39,52%	39,52%
48	8004699	$ 983.197.315,00	2,75%	3,80%	3,80%	7,19%	7,19%
89	8001841	$ 580.698.248,00	0,00%	2,39%	4,21%	6,30%	10,03%
79	8001390	$ 443.969.911,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	8,37%

FECHA EVALUACIÓN			25-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	0,00%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,00%
64	8001931	$ 376.367.569,00	4,64%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	1,23%
75	8001223	$ 144.206.710,00	3,23%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,53%
70	8001657	$ 342.553.149,00	0,00%
66	8001876	$ 318.216.103,00	0,12%
44	8004757	$ 544.689.706,00	1,48%
68	8001715	$ 351.516.714,00	6,34%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	0,04%
50	8004663	$ 770.232.864,00	0,00%
56	8004947	$ 377.475.477,00	1,92%
49	8004816	$ 479.216.394,00	0,00%
48	8004699	$ 983.197.315,00	0,00%
89	8001841	$ 580.698.248,00	3,73%
79	8001390	$ 443.969.911,00	8,12%

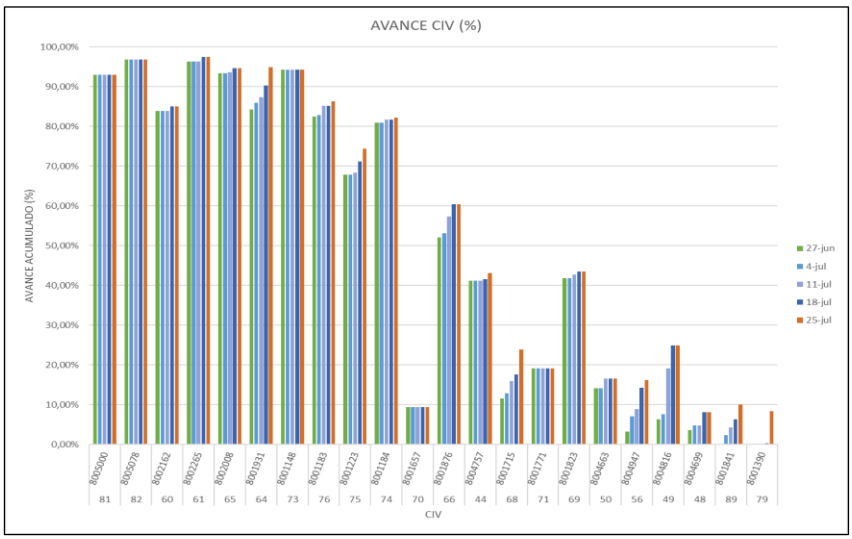

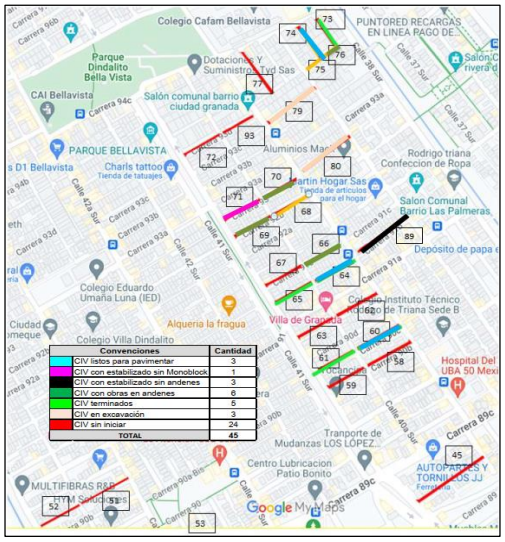

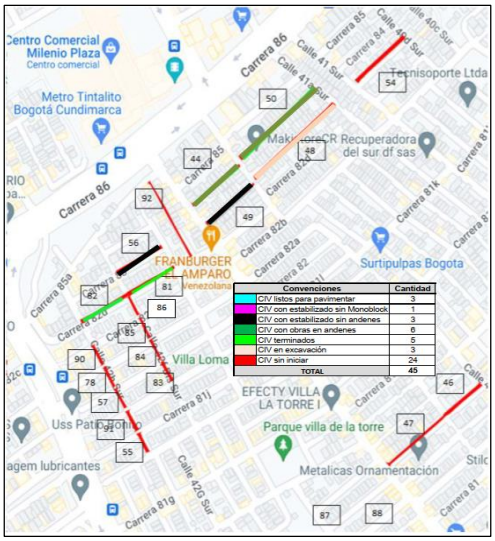

CONSORCIO SCLV
NIT. 900.547.145-2

REPORTE AVANCE SEMANAL
GRUPO 2 - CONTRATO COP-690-22
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Periodo 20 de julio al 25 de julio de 2023

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	72,55%	74,66%	72,55%
%Ejecutado	23,61%	23,31%	17,78%
Atraso(-)/Adelanto(+)	-48,94%	-51,35%	-54,77%

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

| PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 44 | | | 50 | | | 60 | | | 61 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 68 | | | 69 | | | 71 | | | 70 | | | 49 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 81 | | | 82 | | | 48 | | | 56 | | | 89 | | | 79 | | | 80 | | |
|---|---|---
