Bogotá, D. C.,25 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad


Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: No aprobación de informe semanal No. 37. Responde comunicación KNXIE22-621-756.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicación KNXIE22-621-756 recibida el 28 de junio de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, el informe semanal No.37, correspondiente al periodo 15 al 21 de junio de 2023.

La información enviada por el Contratista es la siguiente:

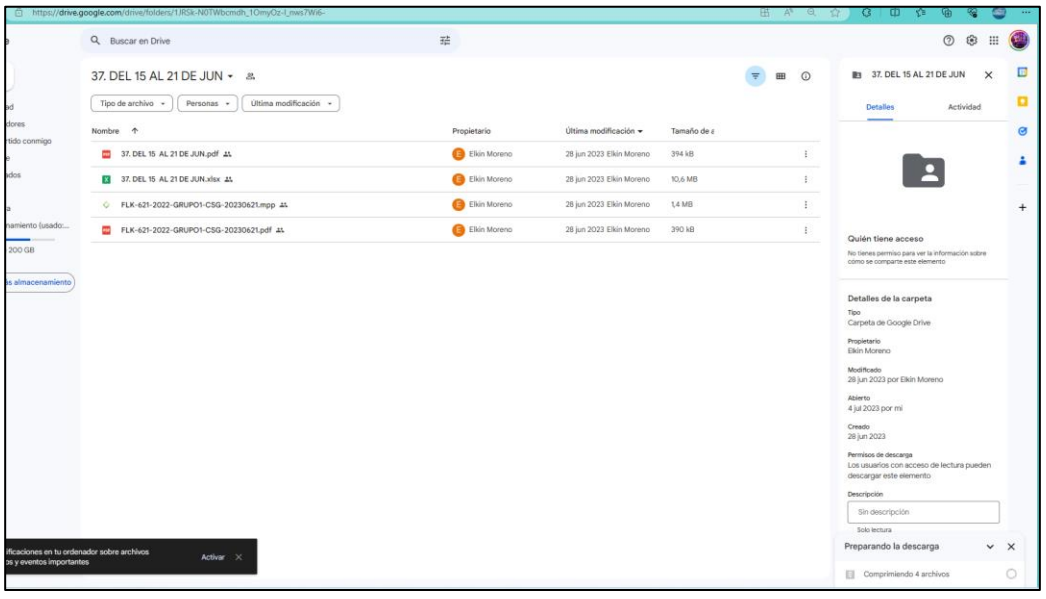

La Interventoría revisó el archivo PDF del informe semanal, encontrando las siguientes observaciones:

1. El Contratista persiste en relacionar el comité de seguimiento fuera del periodo del informe semanal.

2. Sale incompleta la descripción de actividades en las prioridades 28 y 29; 21 y 22.

3. Falta relacionar el estado de actividades en los 21 CIV abiertos a la fecha de cierre del informe, dada que el Contratista sólo hace mención a 13 CIV.

4. La interventoría hizo revisión de los archivos en PDF del informe semanal y concluyo que los porcentajes ejecutados y programados que se presentan durante esta semana no son acordes a los avances ejecutados en obra y a la programación aprobada para este periodo, así mismo, es de aclarar que después del 18 de mayo la programación que aplica para este periodo es la programación inicial del mes de enero del presente año

Así las cosas, La Interventoría no aprueba el informe semanal No.37 correspondiente al periodo 15 al 21 de junio de 2023 y solicita al Contratista la subsanación de las observaciones en un plazo no mayor a un (1) día hábil.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró :LRL-LDD-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR
