Bogotá D.C. 11 de julio de 2023 **KNXIE22-621-773**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta a comunicado **U233-G1-541-23** Observaciones a la entrega de cuenta No.8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023. Atendiendo observaciones**.**

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A, se permite dar respuesta al comunicado U233-G1-541-23 mediante el cual se emitieron observaciones a la preacta No. 8.
Debido a la información dada verbalmente por la interventoría sobre el retiro de las mesas de trabajo, se entrega a continuación la atención de las observaciones con sus respectivas rutas las cuales se encuentras en los anexos de este comunicado.

Observaciones generales:

1. No están firmadas por el Contratista las memorias de cálculo de cantidades de obra.
   Respuesta: Se incluyen firmas en las memorias de cálculo de cantidades de obra.
2. En los ajustes por decimales ocultos, el Contratista debe verificar que no se exceda la medida de los soportes y memorias técnicas
   Respuesta: Se presenta un balance de decimales en las memorias que presentan esta observación el cual permite concluir que no se ha excedido las medidas de soportes y memorias técnicas. Dicho balance se encuentra en el archivo Excel INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx en cada pestaña correspondiente a memorias de cantidades.
3. Se debe incluir los ajustes de debidos a las observaciones del FDLK al acta parcial de obra de abril, de forma clara, se sugiere en cada ítem con la misma ubicación con que se cobró en abril dos filas por cada ajuste, por ejemplo, para el Ítem 3001, que fue observado por el FDLK:

P31/CIV8001125/PKID156199/K0+065,1 a K0+065,18/Descuento del Pago en Acta 7	65,18	4,16	0,78	-1,00	-211,50


P31/CIV8001125/PKID156199/K0+065,1 a K0+065,18/Se corrige abscisado de pago en acta 7	65,18	4,16	0,78	1,00	211,50

Respuesta: Se hace la corrección a las observaciones especificas tomando en cuenta el formato para el ajuste de observaciones del FDLK al acta parcial de obra de abril.

3.1. Atención a observaciones del FDLK al acta parcial de abril.

3.1.1. Ítem 3001 - EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE):

- Abscisado errado

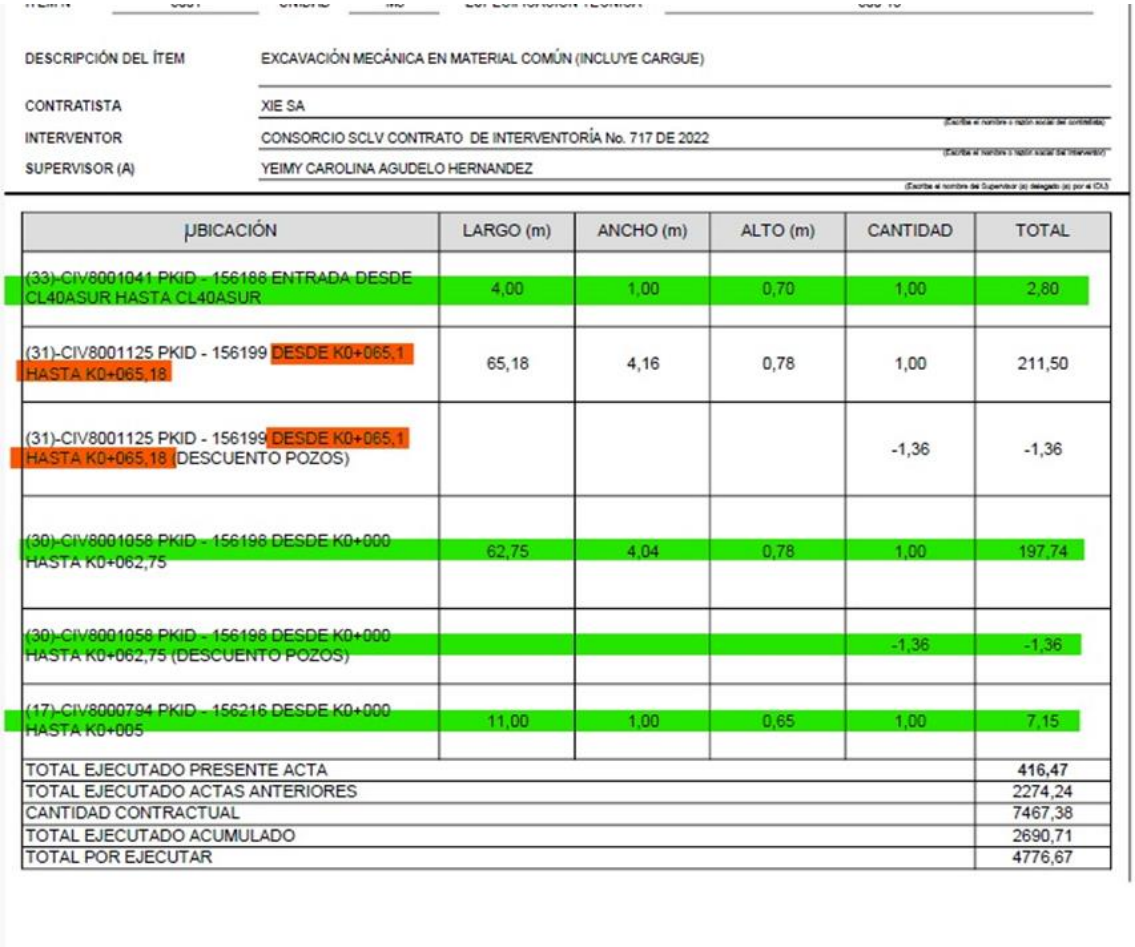

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA: XIE SA

INTERVENTOR: CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A): YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(33)-CIV8001041 PKID - 156188 ENTRADA DESDE CL40ASUR HASTA CL40ASUR	4,00	1,00	0,70	1,00	2,80
(31)-CIV8001125 PKID - 156199 DESDE K0+065,1 HASTA K0+065,18	65,18	4,16	0,78	1,00	211,50
(31)-CIV8001125 PKID - 156199 DESDE K0+065,1 HASTA K0+065,18 (DESCUENTO POZOS)				-1,36	-1,36
(30)-CIV8001058 PKID - 156198 DESDE K0+000 HASTA K0+062,75	62,75	4,04	0,78	1,00	197,74
(30)-CIV8001058 PKID - 156198 DESDE K0+000 HASTA K0+062,75 (DESCUENTO POZOS)				-1,36	-1,36
(17)-CIV8000794 PKID - 156216 DESDE K0+000 HASTA K0+005	11,00	1,00	0,65	1,00	7,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					416,47
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					2274,24
CANTIDAD CONTRACTUAL					7467,38
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2690,71
TOTAL POR EJECUTAR					4776,67

Respuesta: Se realiza la corrección del abscisado en el acta de mayo. A continuación, se indica ubicación en archivo Excel y pdf.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3001 / Filas 32 y 33.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.199

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 6 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº 3001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 300-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 ORIENTAL/K0+000 a K0+006	5,46	0,65	0,720	1,00	2,56
P17/CIV8000794/PKID156216 OCCIDENTAL/K0+000 a K0+005	4,63	0,65	0,720	1,00	2,17
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+065,1 a K0+065,18/Descuento del Pago en Acta 7	65,18	4,16	0,760	-1,00	-211,50
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+000 a K0+065,18/Se corrige abscisado de pago en acta 7	65,18	4,16	0,760	1,00	211,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**4,73**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					2690,71
CANTIDAD CONTRACTUAL					7467,38
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2695,44
TOTAL POR EJECUTAR					4771,94

3.1.2. Ítem 3003 - NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE:

- Valores que no coinciden entre la memoria de cálculo y el soporte:

RECIBO PARCIAL No 7 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/4/2023 **HASTA** 30/4/2023

ÍTEM Nº 3003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 400-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P31)-CIV8001125 PKID - 156199 DESDE K0+000 HASTA K0+065,18	65,18	4,08		1,00	265,93
(P31)-CIV8001125 PKID - 156199 DESDE K0+000 HASTA K0+065,18 - DESCUENTO POZOS	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P30)-CIV8001058 PKID - 156198 DESDE K0+000 HASTA K0+062,75	62,75	4,01		1,00	251,63
(P30)-CIV8001058 PKID - 156198 DESDE K0+000 HASTA K0+062,75 - DESCUENTO POZOS	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P31)-CIV8000831 - COSTADO DERECHO - PKID 29818					

Descuento en la memoria es de solo 0.64m2? y en la cartera de 2.27m2

FECHA: 24-04-2023 PRIORIDAD: 31

CANTIDADES DE OBRA EXCAVACION CIV 8001125 ANCHO VIA 4m

B-RASANTE CAMPO		ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)	DIF.EJE (m)	DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
EJE	DER		IZQ	EJE	DER			
0	2		2	0	2			
2538,872	2538,841	6,200	0,794	0,592	0,733	0,706		
2538,930	2538,905	4,000	0,834	1,237	0,747	0,939	25,500	20,980
2539,000	2538,976	4,000	0,737	0,708	0,833	0,759	20,000	16,985
2539,050	2539,024	4,000	0,759	0,808	0,821	0,796	20,000	15,553
2539,075	2539,042	4,000	0,764	0,844	0,703	0,770	20,000	15,663
2539,060	2539,030	4,000	0,872	0,819	0,589	0,760	20,000	15,303
2539,043	2539,010	4,000	0,848	0,812	0,854	0,838	20,000	15,980
2539,030	2538,994	4,000	0,828	0,784	0,685	0,766	20,000	16,037
2539,020	2538,985	4,000	0,625	0,849	0,873	0,782	20,000	15,480
2539,000	2538,970	4,000	0,795	0,829	0,763	0,796	20,000	15,780
2538,980	2538,940	4,000	0,837	0,819	0,784	0,813	20,000	16,090
2538,973	2538,940	4,000	0,835	0,759	0,805	0,800	20,000	16,130
2538,966	2538,929	4,000	0,754	0,672	0,935	0,787	20,000	15,867
2538,948	2538,908	4,000	0,708	0,526	0,888	0,707	20,720	15,481
							266,220	211,330
						POZOS	2,27	1,362
						TOTAL	263,950	209,968

RECIBE:
YECID CRIOLLO
TOPOGRAFIA INTERVENTORIA CONSORCIO SCLV

- Lo mismo para la P30:

PRIORIDAD: 21

CANTIDADES DE OBRA EXCAVACION ANDENES CIV 8000821 COSTADO IZQUIERDO PK - 29919

CARRERA 97D- CALLE 40ASUR

PO	LONGITUD CASA (m)	LONGITUD TOTAL CASA (m)	ANCHO (m)	DIF. PARAMENTO (m)	DIF. 0.90 (m)	DIF. B.V DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA SIN DESCUENTOS (m2)	VOLUMEN SIN DESCUENTOS (m3)	CAJAS DE INSPECCION EXISTENTE		CAJAS DE INSPECCION NUEVAS		REG
B.V IZQ				IZQ	EJE	DER				AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	ARE (M2)
2538,998	6,00	6,90	1,89	0,456	0,771	0,523	0,58			0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,086			1,87	0,662	0,689	0,533	0,63	12,97	7,85					
2539,036	5,98	5,98	1,87	0,551	0,647	0,670	0,69			0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,136			1,84	0,770	0,768	0,738	0,76	11,09	8,04					
2539,136	3,22	6,03	1,84	0,697	0,793	0,742	0,74							
2539,158			1,84	0,677	0,773	0,720	0,72	5,92	4,32	0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,108	2,81		1,89	0,359	0,681	0,753	0,60							
2539,130			1,89	0,359	0,659	0,731	0,58	5,31	3,13					
2539,180	6,01	6,01	1,95	0,573	0,611	0,651	0,61			0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,177			1,97	0,534	0,574	0,766	0,62	11,78	7,24					
2539,227	3,38	6,06	1,97	0,818	0,824	0,764	0,80							
2539,251			1,97	0,795	0,794	0,740	0,78	6,66	5,26	0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,201	2,68		1,93	0,566	0,839	0,815	0,74							
2539,225			1,93	0,566	0,824	0,791	0,73	5,17	3,80					
2539,275	3,32	6,03	1,92	0,823	0,784	0,746	0,78							
2539,301			1,92	0,797	0,758	0,720	0,76	6,37	4,90	0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,251	2,71		1,92	0,558	0,768	0,710	0,68							
2539,271			1,92	0,558	0,747	0,690	0,66	5,20	3,48					
2539,322	3,19	5,98	1,92	0,677	0,691	0,634	0,67							
2539,347			1,92	0,652	0,666	0,609	0,64	6,12	4,01	0,64	0,27	0,36	0,29	0,1
2539,297	2,79		1,98	0,513	0,704	0,722	0,65							
2539,318			1,98	0,513	0,683	0,701	0,63	5,52	3,53					
2539,368	9,68	9,68	1,98	0,664	0,653	0,648	0,66							
2539,445			2,10	0,567	0,563	0,471	0,53	19,75	11,75					
	51,77	52,67						101,86	67,31	4,48	1,89	2,52	2,03	1,2
								A	B	C	D	E	F	G

DEMO

Respuesta: Corrección de descuento realizada en acta de mayo, se completó la cantidad de descuento de tal manera que la sumatoria del descuento en el acta de abril -0.64 más el cobro en el acta de mayo -1.63 de los -2.27 de la cartera conciliada.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3003 / Filas 133 y 134.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.208

ÍTEM Nº 3003 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 400-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P30/CIV6001058/PKID29690/41-26 SUR PEATONAL	3,63	2,06		1,00	7,48
P30/CIV6001058/PKID29690/41-26 SUR VEHICULAR	2,57	2,12		1,00	5,45
P30/CIV6001058/PKID29690/41-26 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
P30/CIV6001058/PKID29690/41-20 SUR PEATONAL	3,10	2,15		1,00	6,67
P30/CIV6001058/PKID29690/41-20 SUR VEHICULAR	2,70	2,15		1,00	5,81
P30/CIV6001058/PKID29690/41-20 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
P30/CIV6001058/PKID29690/41-14 SUR PEATONAL	3,14	2,15		1,00	6,75
P30/CIV6001058/PKID29690/41-14 SUR VEHICULAR	2,86	2,15		1,00	6,15
P30/CIV6001058/PKID29690/41-14 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
P30/CIV6001058/PKID29690/41-61 SUR PEATONAL	7,12	2,04		1,00	14,52
P30/CIV6001058/PKID29690/41-61 SUR	0,80	0,80		-1,00	-0,64
P30/CIV6001058/PKID29690/41-55 SUR VEHICULAR	2,65	2,04		1,00	5,41
P30/CIV6001058/PKID29690/41-55 SUR PEATONAL	3,35	2,03		1,00	6,80
P30/CIV6001058/PKID29690/41-55 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
P30/CIV6001058/PKID29691/97-05	5,95	2,02		1,00	12,02
P30/CIV6001058/PKID29691/97-05	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P31)-CIV6001125 PKID - 156199 DESDE K0+000 HASTA K0+065,16 - DESCUENTO POZOS / Se corrige descuento realizado en Acta 7 completando el area de descuento correspondiente a los pozos según cartera topografica conciliada.				-1,63	-1,63
(P30)-CIV6001058 PKID - 156196 DESDE K0+000 HASTA K0+062,75 - DESCUENTO POZOS / Se corrige descuento realizado en Acta 7 completando el area de descuento correspondiente a los pozos según cartera topografica conciliada.				-1,63	-1,63

- Para la P13 hay diferencia de 17.53m2 de lo reportado en cartera contra lo cobrado en la memoria

Respuesta: Se realiza la corrección en el acta de Mayo descontando el cobro que se realizó doble en abril.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3003 / Filas 135 y 136.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.209.

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM N° 3003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 400-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ


UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P13)-CIV8000772 PKID - 29934 DESDE KR98 #40-22 SUR HASTA KR98 #40-22 SUR / Descuento de cobro duplicado en Pago de Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29934 DESDE KR98 #40-22 SUR HASTA KR98 #40-22 SUR (DESCUENTO CAJA DE INSPECCION) / Corrección de descuento debido a cobro de predio duplicado.	0,80	0,80		1,00	0,64
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**432,63**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					5339,79
CANTIDAD CONTRACTUAL					12445,61
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					5772,42
TOTAL POR EJECUTAR					6673,19

- Diferencias encontradas por decimales

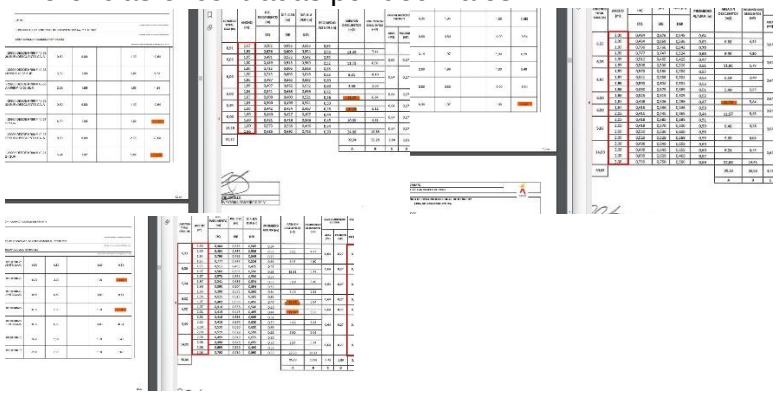

Respuesta: Realizando el balance de las aproximaciones realizadas a las cantidades reportadas en las carteras conciliadas las cuales tienen 3 decimales se puede verificar que en el cobro total del ítem 3003 no se esta cobrando cantidades por encima de las medidas de soportes y memorias técnicas totales.

Ruta de balance: Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3003 / Columnas AJ,AK,AL y AM.

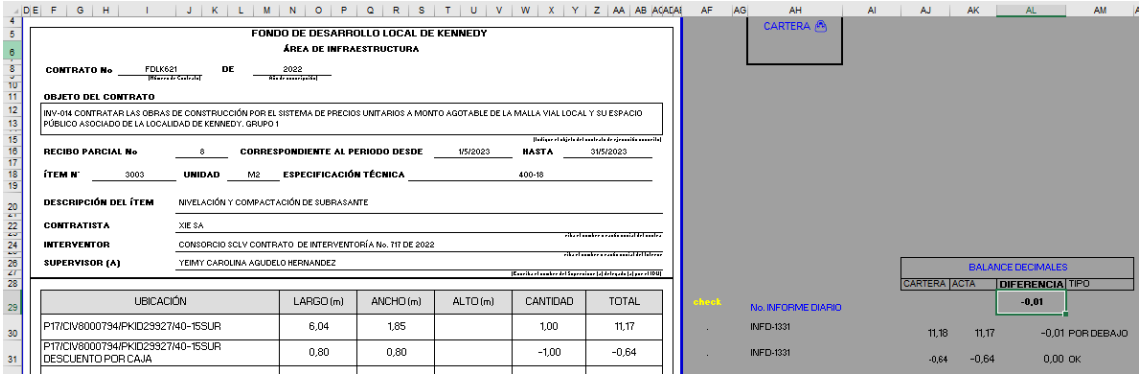

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° 3003 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 400-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID29327/40-15SUR	6,04	1,85		1,00	11,17
P17/CIV8000794/PKID29327/40-15SUR DESCUENTO POR CAJA	0,80	0,80		-1,00	-0,64


CARTERA

BALANCE DECIMALES


check	No. INFORME DIARIO	CARTERA	ACTA	DIFERENCIA	TIPO
				-0,01	
.	INFD-1331	11,18	11,17	-0,01	POR DEBAJO
.	INFD-1331	-0,64	-0,64	0,00	OK

3.1.3. Ítem NP12 - GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.):

- Valores que no coinciden entre la memoria de cálculo y el soporte. Estas observaciones también se presentan en el NP-12 y NP-13.
  En la P21 se indica 5.2m de ancho, cuando la calzada tiene 4 metros?
  La cartera indica 16m2 y la memoria 33.28m2.

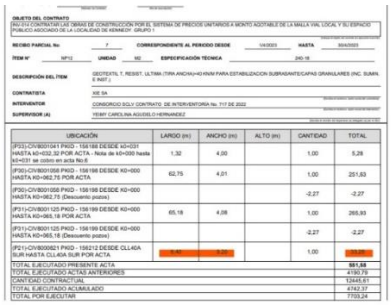



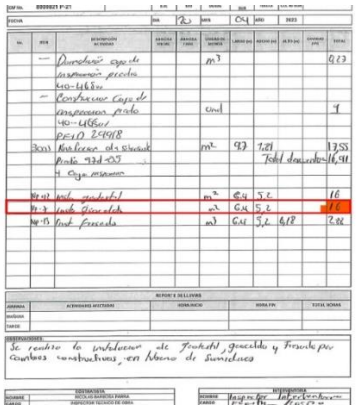

Respuesta: Las medidas tomadas en conjunto con el supervisor técnico de la interventoría se realizaron en la intersección entre la calle 40ª SUR y KR97D. La medida del largo fue tomada desde antes de los sumideros hasta la mitad de la intersección por lo cual da los 6.40m. La diferencia en el resultado del área radica en que la operación largo x ancho (medidas correctas tomadas en campo) se realizó erróneamente en el informe diario.
Con base en lo anterior se conservan las medidas del largo y ancho en el item NP12 y NP13 cobradas en el acta de abril.

3.1.4. Ítem NP14 - FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

- La especificación no corresponde con la actividad:

AREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO
INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/4/2023 HASTA 30/4/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ITEM NO NP-06

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P4)-CIV80001069 PKID - 156189 PRIMERA CAPA DESDE k0+000 HASTA k0+022 POR ACTA	22,00	4,00	0,15	1,00	13,20

Respuesta: Se corrige especificación en acta de mayo y futuras.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.226-228.

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL

3.1.5. Ítem 4001 - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

- Cantidades sin soporte:

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/4/2023 HASTA 30/4/2023

ÍTEM N° 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

P21-CIV8000821-PKID29918-KR97D-No.40-10SUR - DESCUENTO DEMOLICION				-0,35	-0,35
P21-CIV8000821-PKID29918-KR97C-No.40-17SUR	10,18	2,00	0,49	1,00	9,98
P21-CIV8000821-PKID29918-KR97C-No.40-17SUR - DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,27	-0,27
P21-CIV8000821-PKID29918-KR97C-No.40-17SUR - DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,35	-1,00	-0,06
(P21)-CIV8000821 - COSTADO IZQUIERDO - PKID 29919				1,00	1,00

Respuesta: Se corrige cobro en acta de mayo.


Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/ Fila 343.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.275

RECIBO PARCIAL No	6	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE**	1/5/2023	**HASTA**	31/5/2023
ÍTEM Nº	4001	**UNIDAD**	M3	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	301-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV8001041/PKID29671/40A-03 SUR PEATONAL	2,67	1,95	0,660	1,00	3,51
P33/CIV8001041/PKID29671/40A-03 SUR VEHICULAR	3,15	1,95	0,600	1,00	3,69
P33/CIV8001041/PKID29671/40A- 03 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,54	-0,54
P33/CIV8001041/PKID29671/40A- 03 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P33/CIV8001041/PKID29671/40A- 03 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,70	-0,70
P33/CIV8001041/PKID29670/40A- 29 SUR	20,00	1,96	0,500	1,00	19,60
(P21)-CIV8000821 - COSTADO IZQUIERDO - PKID 29919 / Correción y descuento del Pago en Acta 7				-1,00	-1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**555,20**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1189,57
CANTIDAD CONTRACTUAL					4916,37
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1744,77
TOTAL POR EJECUTAR					3171,60


3.1.6. Ítem NP12(2) - GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.):

- Valores que no coinciden entre la memoria de cálculo y el soporte:

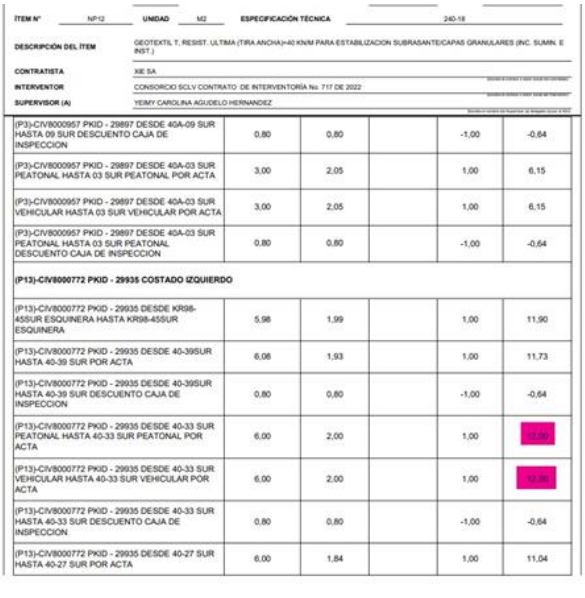

ÍTEM Nº	NP12	**UNIDAD**	M2	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	240-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

(P3)-CIV8000957 PKID - 29897 DESDE 40A-09 SUR HASTA 09 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P3)-CIV8000957 PKID - 29897 DESDE 40A-03 SUR PEATONAL HASTA 03 SUR PEATONAL POR ACTA	3,00	2,05		1,00	6,15
(P3)-CIV8000957 PKID - 29897 DESDE 40A-03 SUR VEHICULAR HASTA 03 SUR VEHICULAR POR ACTA	3,00	2,05		1,00	6,15
(P3)-CIV8000957 PKID - 29897 DESDE 40A-03 SUR PEATONAL HASTA 03 SUR PEATONAL DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 COSTADO IZQUIERDO					
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE KR98-45SUR ESQUINERA HASTA KR98-45SUR ESQUINERA	5,98	1,99		1,00	11,90
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-39SUR HASTA 40-39 SUR POR ACTA	6,06	1,93		1,00	11,73
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-39SUR HASTA 40-39 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA	6,00	2,00		1,00	12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA	6,00	2,00		1,00	12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR HASTA 40-33 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-27 SUR HASTA 40-27 SUR POR ACTA	6,00	1,84		1,00	11,04

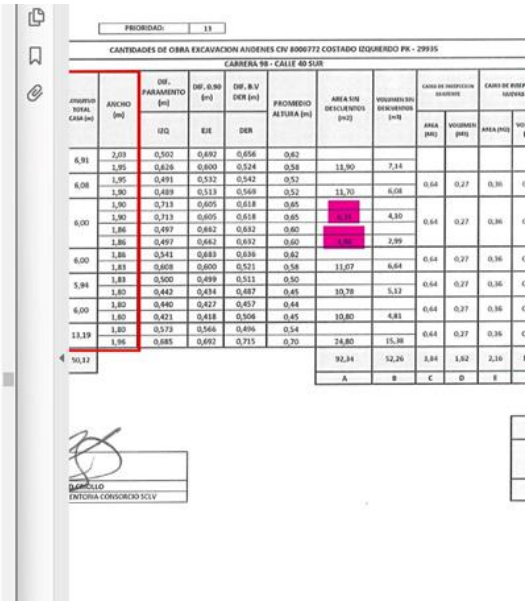

PRIORIDAD: 13

CANTIDADES DE OBRA EXCAVACION ANDENES CIV 8000772 COSTADO IZQUIERDO PK - 29935

CARRERA 98 - CALLE 40 SUR

ANCHO TOTAL CASA (m)	ANCHO (m)	DIF. PARAMENTO (m) IZQ	DIF. 0,90 (m) EJE	DIF. 0,V DER (m) DER	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA SIN DESCUENTOS (m2)	VOLUMEN SIN DESCUENTOS (m3)	CAJA DE INSPECCION EXISTENTE AREA (M2)	CAJA DE INSPECCION EXISTENTE VOLUMEN (M3)	CAJA DE REGISTRO NUEVA AREA (M2)	CAJA DE REGISTRO NUEVA VOLUMEN (M3)
6,91	2,03	0,502	0,692	0,656	0,62						
	1,95	0,626	0,600	0,524	0,58	11,90	7,14				
6,08	1,95	0,491	0,532	0,542	0,52						
	1,90	0,489	0,513	0,569	0,52	11,70	6,08	0,64	0,27	0,36	
	1,90	0,713	0,605	0,618	0,65						
6,00	1,90	0,713	0,605	0,618	0,65	6,65	4,30	0,64	0,27	0,36	
	1,86	0,497	0,662	0,632	0,60						
	1,86	0,497	0,662	0,632	0,60	4,98	2,99				
6,00	1,86	0,541	0,683	0,630	0,62			0,64	0,27	0,36	
	1,83	0,608	0,600	0,521	0,58	11,07	6,64				
5,94	1,83	0,500	0,499	0,511	0,50			0,64	0,27	0,36	
	1,80	0,442	0,434	0,487	0,45	10,78	5,12				
6,00	1,80	0,440	0,427	0,457	0,44			0,64	0,27	0,36	
	1,80	0,421	0,418	0,506	0,45	10,80	4,81				
13,19	1,80	0,573	0,566	0,496	0,54			0,64	0,27	0,36	
	1,96	0,685	0,692	0,715	0,70	24,80	15,38				
50,12						92,34	52,26	3,84	1,62	2,16	
						A	B	C	D	E	

Respuesta: Se corrige cobro duplicado en acta de mayo.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP12(2)/ Filas 96 a 99.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.347.

RECIBO PARCIAL No 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP12 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 240-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV8001041/PKID29671/40A-09/	5,95	1,94		1,00	11,54
P33/CIV8001041/PKID29670/40A - 29 SUR/	20,00	1,95		1,00	39,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	3,32	1,90		1,00	6,31
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	2,66	1,66		1,00	4,96
(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 27 SUR HASTA 27 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION / Se corrige cantidad no cuantificada en pago de acta 7.	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 21 SUR PEATONAL HASTA 21 SUR PEATONAL POR ACTA / Se corrige cantidad no cuantificada en pago de acta 7.	3,38	1,97		1,00	6,66
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**382,66**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					656,01
CANTIDAD CONTRACTUAL					10260,20

- Cantidades no cuantificadas:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

AREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/4/2023 HASTA 30/4/2023

ÍTEM Nº NP12 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 240-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 33 SUR HASTA 33 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 27 SUR HASTA 27 SUR POR ACTA	6,01	1,96		1,00	11,78
(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 27 SUR	0,80	0,80		-1,00	
(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 21 SUR	3,38	1,97		1,00	
(P21)-CIV8000821 PKID - 29919 DESDE 21 SUR					

Respuesta: Se corrige en acta de mayo el cobro y descuento no realizado.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP12(2)/ Filas 100-101.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.347.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP12 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 240-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV6001041/PKID29571/40A-09/	5,95	1,94		1,00	11,54
P33/CIV6001041/PKID29570/40A - 29 SUR/	20,00	1,95		1,00	39,00
(P13)-CIV6000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV6000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	3,32	1,90		1,00	6,31
(P13)-CIV6000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV6000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	2,66	1,66		1,00	4,96
(P21)-CIV6000821 PKID - 29919 DESDE 27 SUR HASTA 27 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION / Se corrige cantidad no cuantificada en pago de acta 7.	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P21)-CIV6000821 PKID - 29919 DESDE 21 SUR PEATONAL HASTA 21 SUR PEATONAL POR ACTA / Se corrige cantidad no cuantificada en pago de acta 7.	3,38	1,97		1,00	6,66
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					382,66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					856,01

3.1.7 ítem NP29- PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

- Cantidades no cuantificadas:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/4/2023 HASTA 30/4/2023

ÍTEM N° NP29 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 801-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-39 HASTA 40A-39 POR ACTA	3,05	2,02		1,00	6,16
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-33 HASTA 40A-33 POR ACTA	3,05	2,02		1,00	6,16
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-39 HASTA 40A-39 DESCUENTO POR CAJA	0,60	0,60		-1,00	-0,36
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-39 HASTA 40A-39 DESCUENTO CAJILLAS	0,50	0,35		-1,00	-0,18
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-27 HASTA 40A-27 POR ACTA	3,07	2,08		1,00	6,39
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-46 HASTA 40A-46 POR ACTA	2,40	1,89		1,00	4,54
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-40 HASTA 40A-40 POR ACTA	2,67	0,90		1,00	2,40
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-28 HASTA 40A-28 POR ACTA	3,21	2,05		1,00	6,58
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-15SUR HASTA 40A-15SUR DESCUENTO CAJA Y CAJILLA	0,00	0,84		-1,00	0,00

Respuesta: Se corrige en acta de mayo el descuento no realizado con base en cartera conciliada.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP29/ Filas 129-130.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.499

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO
INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 6 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº NP29 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 801-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-15SUR HASTA 40A-15SUR DESCUENTO CAJA Y CAJILLA / Se corrigen descuentos de caja no cuantificados en pago de acta 7.	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-15SUR HASTA 40A-15SUR DESCUENTO CAJA Y CAJILLA / Se corrigen descuentos de cajilla no cuantificados en pago de acta 7.	0,50	0,35		-1,00	-0,18
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-10 HASTA 40A-10 DESCUENTO CAJILLAS /Se corrigen descuento de caja de inspección no cuantificada en pago de acta 7.	0,70	0,70		-1,00	-0,49
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**361,25**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					267,40
CANTIDAD CONTRACTUAL					5985,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					628,65
TOTAL POR EJECUTAR					5356,95

- Cantidades no cuantificadas:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO
INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/4/2023 HASTA 30/4/2023

ÍTEM Nº NP29 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 801-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-10 HASTA 40A-10 POR ACTA	1,36	0,90		1,00	1,22
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-10 HASTA 40A-10 POR ACTA	0,87	0,95		1,00	0,83
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-10 HASTA 40A-10 DESCUENTO CAJILLAS	0,00	0,21		-1,00	0,00

Respuesta: Se corrige en acta de mayo el descuento no realizado con base en cartera conciliada.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP29/ Filas 131.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.499

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO
INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 6 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº NP29 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 601-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (250 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-15SUR HASTA 40A-15SUR DESCUENTO CAJA Y CAJILLA / Se corrigen descuentos de caja no cuantificados en pago de acta 7.	0,80	0,80		-1,00	-0,64
(P22)-CIV8000864 PKID - 29921 DESDE 40A-15SUR HASTA 40A-15SUR DESCUENTO CAJA Y CAJILLA / Se corrigen descuentos de cajilla no cuantificados en pago de acta 7.	0,50	0,35		-1,00	-0,18
(P22)-CIV8000864 PKID - 29920 DESDE 40A-10 HASTA 40A-10 DESCUENTO CAJILLAS /Se corrigen descuento de caja de inspección no cuantificada en pago de acta 7.	0,70	0,70		-1,00	-0,49
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**361,25**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					267,40
CANTIDAD CONTRACTUAL					5985,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					628,65
TOTAL POR EJECUTAR					5356,95

Observaciones especificas acta de Mayo:

1. **Ítem 1002: "TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)"**

1.1. (P17)-CIV8000794 PKID – 156216 CATIDAD: 150,00 m3: 1 soporte está sin firma de interventoría.
Respuesta: Se anexa soporte firmado.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag 15-24

1.2. (P21)-CIV8000821 PKID – 156212 CANTIDAD: 60 M3: 3 soportes de retiro de material 15m3, faltan soportes para el total 60m3.
Respuesta: Se ajusta cantidad en memoria de calculo con base en los 3 soportes de 15m3.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 1002/ Fila 37.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.1

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 1002 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 101-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ


UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P26)-CIV8000929 PKID - 156196				75,00	75,00
(P29)-CIV8000996 PKID - 156197				15,00	15,00
(P24)-CIV8000671 PKID - 156204				30,00	30,00
(P25)-CIV8000923 PKID - 156205				15,00	15,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 156220				45,00	45,00
(P17)-CIV8000794 PKID - 156216				150,00	150,00
(P18)-CIV8000839 PKID - 156217				30,00	30,00
(P21)-CIV8000821 PKID - 156212				45,00	45,00

1.3. (P32)-CIV8000979 PKID – 156186 CANTIDAD: 60 M3: 2 soportes de retiro de material 15m3, faltan soportes para el total 45m3.

Respuesta: Se anexan los dos soportes faltantes 0593 y 0768.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag 30-33

1.4. (P31)-CIV8001125 PKID – 156199 cantidad :180m3: 14 soportes de retiro de material 15m3, de los cuales 3 está sin firma de interventoría y suma más de lo que se encuentra en cantidad cobrada.

Respuesta: Se anexan soportes firmados y se ajusta la memoria de cantidades.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 1002/ Fila 42.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.43-56

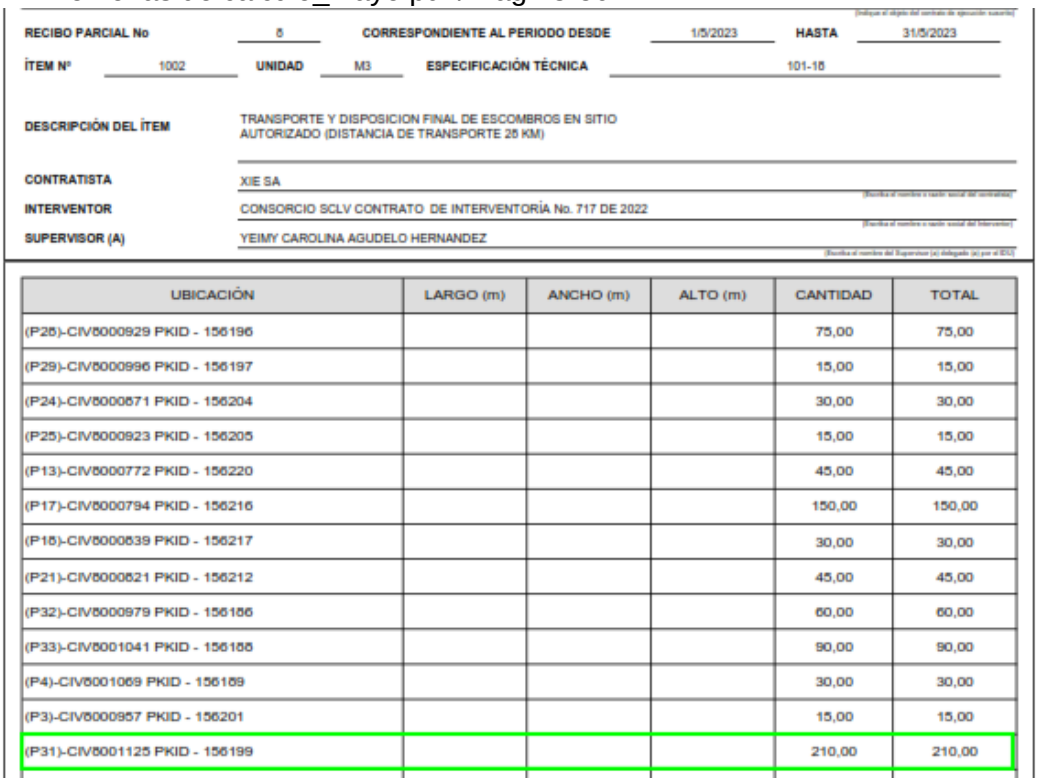

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 1002 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 101-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P26)-CIV8000929 PKID - 156196				75,00	75,00
(P29)-CIV8000996 PKID - 156197				15,00	15,00
(P24)-CIV8000671 PKID - 156204				30,00	30,00
(P25)-CIV8000923 PKID - 156205				15,00	15,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 156220				45,00	45,00
(P17)-CIV8000794 PKID - 156216				150,00	150,00
(P18)-CIV8000839 PKID - 156217				30,00	30,00
(P21)-CIV8000821 PKID - 156212				45,00	45,00
(P32)-CIV8000979 PKID - 156186				60,00	60,00
(P33)-CIV8001041 PKID - 156188				90,00	90,00
(P4)-CIV8001069 PKID - 156189				30,00	30,00
(P3)-CIV8000957 PKID - 156201				15,00	15,00
(P31)-CIV8001125 PKID - 156199				210,00	210,00

1.5. (P30)-CIV8001058 PKID – 156198 cantidad: 225m3: 14 soportes de retiro de material 15m3, de los cuales 1 está sin firma de interventoría y faltan soportes para el total 225m3

Respuesta: Se anexan soportes firmados que acumulan 210m3, se ajusta cantidad en memoria de cobro.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 1002/ Fila 43.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.57-70

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM)
CONTRATISTA	XIE SA
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
(P26)-CIV8000929 PKID - 156196				75,00	75,00
(P29)-CIV8000996 PKID - 156197				15,00	15,00
(P24)-CIV8000871 PKID - 156204				30,00	30,00
(P25)-CIV8000923 PKID - 156205				15,00	15,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 156220				45,00	45,00
(P17)-CIV8000794 PKID - 156216				150,00	150,00
(P18)-CIV8000839 PKID - 156217				30,00	30,00
(P21)-CIV8000821 PKID - 156212				45,00	45,00
(P32)-CIV8000979 PKID - 156186				60,00	60,00
(P33)-CIV8001041 PKID - 156188				90,00	90,00
(P4)-CIV8001069 PKID - 156189				30,00	30,00
(P3)-CIV8000957 PKID - 156201				15,00	15,00
(P31)-CIV8001125 PKID - 156199				210,00	210,00
(P30)-CIV8001058 PKID - 156198				210,00	210,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**1020,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					5359,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					16501,38
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6379,00
TOTAL POR EJECUTAR					10122,38

2. Ítem 2013: " TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)"

2.1. Las abscisas no coinciden con la longitud reportada.
Respuesta: La abscisa es indicativa de la ubicación aproximada de la tubería mas no se usa como medida de la misma ya que esta viene en distinta dirección al abscisado, se está reportando la medida registrada en los formatos conciliados con el inspector de interventoría.

2.2. En la prioridad 28 no corresponde el CIV.
Respuesta: Se corrige el PKID.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 2013/ Fila 30.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.75

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 5 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº 2013 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 330-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P28/CIV8000929/PKID156196/K0+000 a K0+004	3,90			1,00	3,90
P18/CIV8000839/PKID156217/K0+055 a K0+060 Costado oriental	7,90			1,00	7,90
P18/CIV8000839/PKID156217/K0+055 a K0+060 Costado occidental	6,65			1,00	6,65
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+006 Costado oriental	5,80			1,00	5,80
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+005 Costado occidental	5,10			1,00	5,10
P32/CIV8000979/PKID156186/ k0+000 a k0+004	3,50			1,00	3,50
P32/CIV8000979/PKID156186/ k0+000 a k0+004	4,10			1,00	4,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**36,95**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					79,15
CANTIDAD CONTRACTUAL					1074,89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					116,10
TOTAL POR EJECUTAR					958,79

2.3. En la prioridad 32 falta complementar la abscisa entre las que se instaló la tubería.

Respuesta: Se añade abscisas de instalación de tubería de acuerdo a informe diario.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 2013/ Fila 35-36.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.75

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 5 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº 2013 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 330-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P28/CIV8000929/PKID156196/K0+000 a K0+004	3,90			1,00	3,90
P18/CIV8000839/PKID156217/K0+055 a K0+060 Costado oriental	7,90			1,00	7,90
P18/CIV8000839/PKID156217/K0+055 a K0+060 Costado occidental	6,65			1,00	6,65
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+006 Costado oriental	5,80			1,00	5,80
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+005 Costado occidental	5,10			1,00	5,10
P32/CIV8000979/PKID156186/ k0+000 a k0+004	3,50			1,00	3,50
P32/CIV8000979/PKID156186/ k0+000 a k0+004	4,10			1,00	4,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**36,95**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					79,15
CANTIDAD CONTRACTUAL					1074,89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					116,10
TOTAL POR EJECUTAR					958,79

3. **Ítem 2020: " CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)"**


3.1. La nomenclatura 40A-27 no se encuentra en la prioridad 28.



38	P28/CIV8000929/PKID29887/40A-27				1,00	1,00

Respuesta: Se corrige predio P28/CIV8000929/PKID29887/40-27
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 2020/ Fila 38.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.85

3.2. Verificar nomenclatura 41-10 sur, porque no se encuentra en campo.
Respuesta: Se corrige predio a P30/CIV8001058/PKID29890/41-20
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 2020/ Fila 87.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.88.

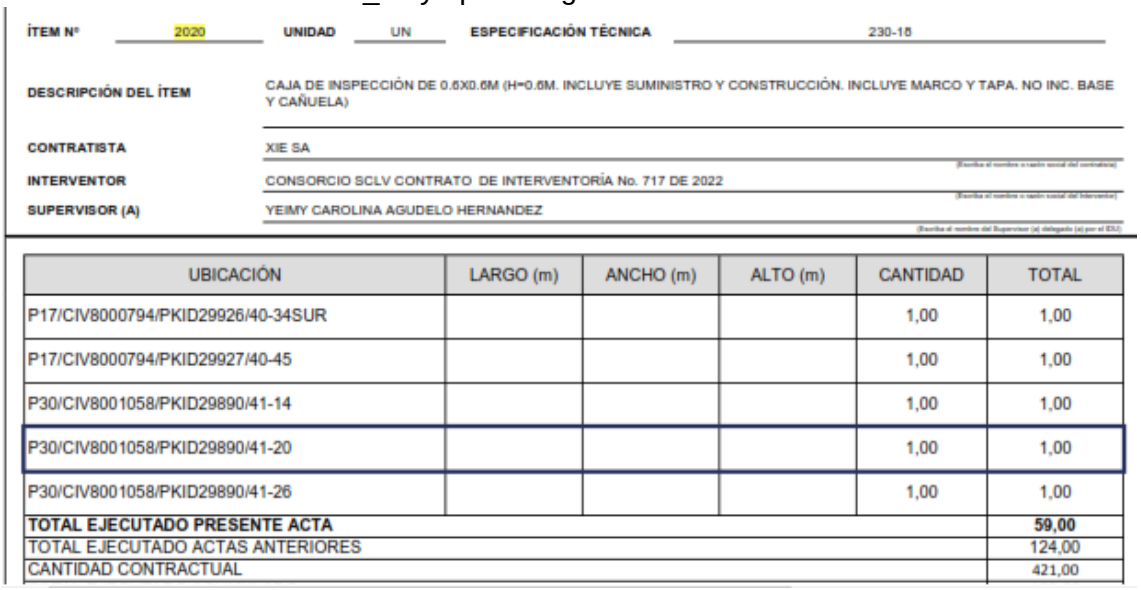

ÍTEM Nº 2020 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 230-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID29926/40-34SUR				1,00	1,00
P17/CIV8000794/PKID29927/40-45				1,00	1,00
P30/CIV8001058/PKID29890/41-14				1,00	1,00
P30/CIV8001058/PKID29890/41-20				1,00	1,00
P30/CIV8001058/PKID29890/41-26				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**59,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					124,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					421,00

3.3. La P28/CIV8000929/PKID29887/40-33, En el Acta 7 se pagó como 40A-33



87	P30/CIV8001058/PKID29890/41-10				1,00	1,00

Respuesta: Se elimina cobro del acta de mayo.

4. **Ítem 2030: "RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2"" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2"", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.)."**

4.1. La dirección 40A08 no corresponde con la prioridad.



33	4	P3/CIV8000957/PKID29896/40A08				1,00	1,00

Respuesta: Se elimina el predio 40ª-08, las dos relocalizaciones se realizaron en el predio 40ª-10**,** información validada con informes diarios conciliados con inspector de interventoría.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 2030/ Fila 33.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.145.

RECIBO PARCIAL No	5	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	1/5/2023	HASTA	31/5/2023		
ÍTEM Nº	2030	UNIDAD	UN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	330-18		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).						
CONTRATISTA	XIE SA						
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022						
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ						

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-38				1,00	1,00
P3/CIV8000957/PKID29897/40A-45				1,00	1,00
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-32				1,00	1,00
P3/CIV8000957/PKID29896/40A10				2,00	2,00

5. Ítem NP25: "DEMOLICIÓN MANUAL DE Pnp252OZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE."

5.1. Verificar nomenclatura 41-10 sur, porque no se encuentra en campo


62	33	P30/CIV8001058/PKID29890/41-10 a 41-10/					0,27	0,27

Respuesta: Se corrige predio P30/CIV8001058/PKID29890/41-20. Sin embargo, el predio es eliminado por ajuste a cantidad de balance de este ítem. Se cobrará en actas futuras.

5.2. Las cantidades no coinciden con la memoria.

59	30	P30/CIV8001058/PKID29891/41-19 SUR a 41-19 SUR/				0,14	0,14
60	31	P30/CIV8001058/PKID29891/41-13 SUR a 41-13 SUR/				0,14	0,14

Respuesta: Coinciden con el informe y la memoria. Sin embargo, el predio es eliminado por ajuste a cantidad de balance de este ítem. Se cobrará en actas futuras.

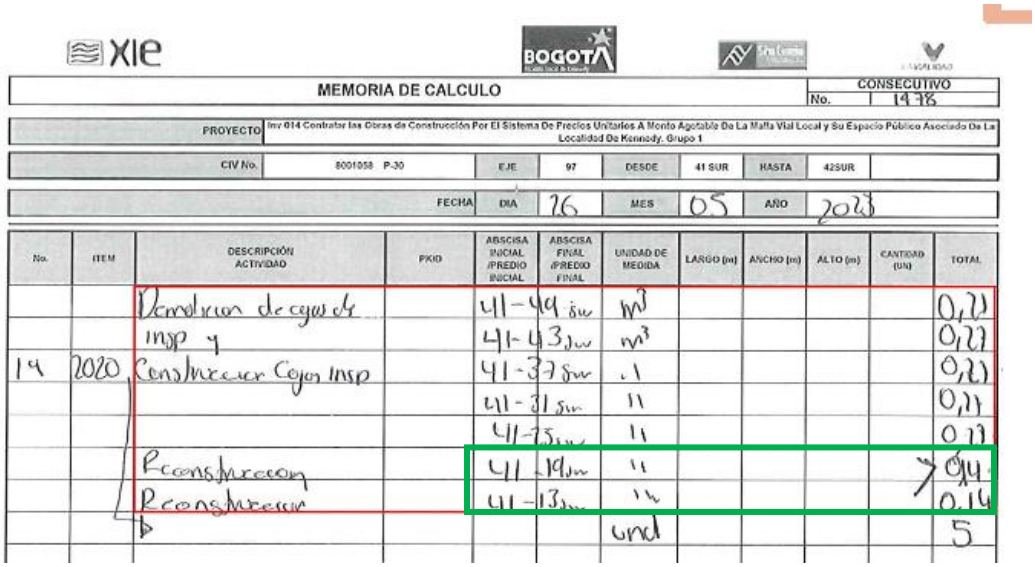

MEMORIA DE CALCULO — CONSECUTIVO No. 1498

PROYECTO: Inv 014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

CIV No. 8001058 P-30 | EJE 97 | DESDE 41 SUR | HASTA 42SUR

FECHA: DIA 26 | MES 05 | AÑO 2023

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PKID	ABSCISA INICIAL /PREDIO INICIAL	ABSCISA FINAL /PREDIO FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
		Demolicion de caja de		41-49 sur		M3					0,27
		insp y		41-43,5 sur		m3					0,27
14	2020	Construccion Caja insp		41-37 sur		.1					0,27
				41-31 sur		11					0,27
				41-25 sur		11					0,27
		Reconstruccion		41-19 sur		11					0,94
		Reconstruccion		41-13 sur		11					0,14
						und					5

5.3. Cantidades acumuladas no pueden exceder de lo cuantificado en el balance

Respuesta: Se ajusta a cantidad de balance dejando por fuera predios que se cobraran a futuro con el ajuste del balance. A continuación, se nombra los predios eliminados:

P28/CIV8000929/PKID29887/40-11 a 40-11/
P28/CIV8000929/PKID29887/40-15 a 40-15/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-49 SUR a 41-49 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-43 SUR a 41-43 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-37 SUR a 41-37 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-31 SUR a 41-31 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-25 SUR a 41-25 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-19 SUR a 41-19 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-13 SUR a 41-13 SUR/
P30/CIV8001058/PKID29890/41-14 a 41-14/
P30/CIV8001058/PKID29890/41-10 a 41-20/
P30/CIV8001058/PKID29890/41-26 a 41-26/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-55 a 41-55/
P30/CIV8001058/PKID29891/41-61 a 41-61/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-20 a 42-20/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-26 a 42-26 /
P31/CIV8001125/PKID29892/42-32 a 42-32/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-50 a 42-50/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-44 a 42-44/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-38 a 42-38/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-56 SUR a 42-56 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29892/42-62 SUR a 42-62 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-57 SUR a 42-57 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-63 SUR a 42-63 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-31 SUR a 42-31 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-37 SUR a 42-37 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-45 SUR a 42-45 SUR/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-25 a 42-25/
P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 a 42-19/
P32/CIV8000979/PKID29867/40-13 a 40-13/
P32/CIV8000979/PKID29867/96A-5 a 96A-5/
P32/CIV8000979/PKID29866/96-45 SUR a 96-45 SUR /
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-27 a 40A-27/
P33/CIV8001041/PKID29871/40A21 a 40A21/
P33/CIV8001041/PKID29871/40A09 a 40A09/
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-15 a 40A-15/

6. Ítem 3003: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

6.1. Falta incluir el descuento por registros de agua potable
Respuesta: La conformación se realiza en el área completa, las cajillas están 5cm por encima del nivel de excavación, por lo tanto, no se deben descontar.

6.2. Decimales ocultos:

41	14	P17/CIV8000794/PKID29926/40-40 SUR PEATONAL	3,17	2,03		1,00	6,42
59	43	P31/CIV8001125/PKID29893/42-63 SUR VEHICULAR	2,82	2,10		1,00	5,91
75	59	P31/CIV8001125/PKID29893/42-31 SUR VEHICULAR	2,83	1,94		1,00	5,48
81	65	P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 SUR PEATONAL	3,23	1,98		1,00	6,39
89	72	P31/CIV8001125/PKID29892/42-62 SUR VEHICULAR	3,29	2,18		1,00	7,16
90	73	P31/CIV8001125/PKID29892/42-62 SUR PEATONAL	2,42	2,16		1,00	5,22
92	75	P31/CIV8001125/PKID29892/42-56 SUR VEHICULAR	2,93	2,13		1,00	6,23
95	78	P31/CIV8001125/PKID29892/42-50 SUR VEHICULAR	2,94	2,10		1,00	6,17
96	79	P31/CIV8001125/PKID29892/42-50 SUR PEATONAL	3,11	2,07		1,00	6,45
100	83	P31/CIV8001125/PKID29892/42-38 SUR VEHICULAR	2,90	1,98		1,00	5,73
103	86	P31/CIV8001125/PKID29892/42-32 SUR PEATONAL	3,02	1,97		1,00	5,93

Página 3
Página 4

109	92	P31/CIV8001125/PKID29892/42-20 SUR PEATONAL	3,18	1,98		1,00	6,28


Respuesta: Se quitan decimales ocultos aproximando a dos cifras. Realizando el balance de las aproximaciones realizadas a las cantidades reportadas en las carteras conciliadas las cuales tienen 3 decimales se puede verificar que en el cobro total del ítem 3003 no se está cobrando cantidades por encima de las medidas de soportes y memorias técnicas totales.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3003/Columnas AJ,AK,AL,AM.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 203-216.

6.3. Verificar la siguiente nomenclatura:

57	41	P31/CIV8001125/PKID29893/42A-97-04 SUR PEATONAL	8,10	1,67		1,00	13,53
58	42	P31/CIV8001125/PKID29893/42A-97-04 SUR PEATONAL DESCUENTO CAJA	0,80	0,80		-1,00	-0,64

Respuesta: Nomenclatura de acuerdo a carteras topogradicas conciliadas y predios de planos.

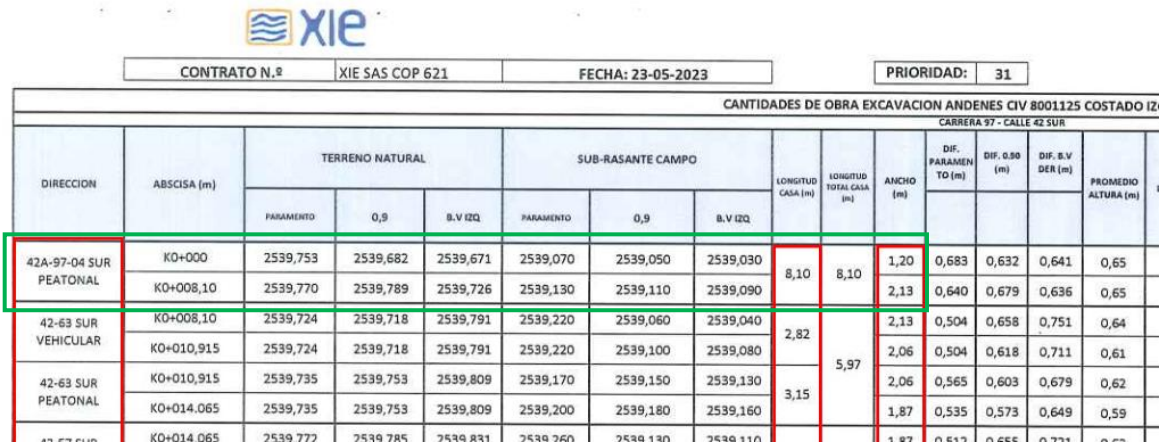


CONTRATO N.º: XIE SAS COP 621 | FECHA: 23-05-2023 | PRIORIDAD: 31

CANTIDADES DE OBRA EXCAVACION ANDENES CIV 8001125 COSTADO IZ

CARRERA 97 - CALLE 42 SUR

DIRECCION	ABSCISA (m)	TERRENO NATURAL			SUB-RASANTE CAMPO			LONGITUD CASA (m)	LONGITUD TOTAL CASA (m)	ANCHO (m)	DIF. PARAMENTO (m)	DIF. 0.90 (m)	DIF. B.V DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)
		PARAMENTO	0,9	B.V IZQ	PARAMENTO	0,9	B.V IZQ							
42A-97-04 SUR PEATONAL	K0+000	2539,753	2539,682	2539,671	2539,070	2539,050	2539,030	8,10	8,10	1,20	0,683	0,632	0,641	0,65
	K0+008,10	2539,770	2539,789	2539,726	2539,130	2539,110	2539,090			2,13	0,640	0,679	0,636	0,65
42-63 SUR VEHICULAR	K0+008,10	2539,724	2539,718	2539,791	2539,220	2539,060	2539,040	2,82	5,97	2,13	0,504	0,658	0,751	0,64
	K0+010,915	2539,724	2539,718	2539,791	2539,220	2539,100	2539,080			2,06	0,504	0,618	0,711	0,61
42-63 SUR PEATONAL	K0+010,915	2539,735	2539,753	2539,809	2539,170	2539,150	2539,130	3,15		2,06	0,565	0,603	0,679	0,62
	K0+014.065	2539,735	2539,753	2539,809	2539,200	2539,180	2539,160			1,87	0,535	0,573	0,649	0,59

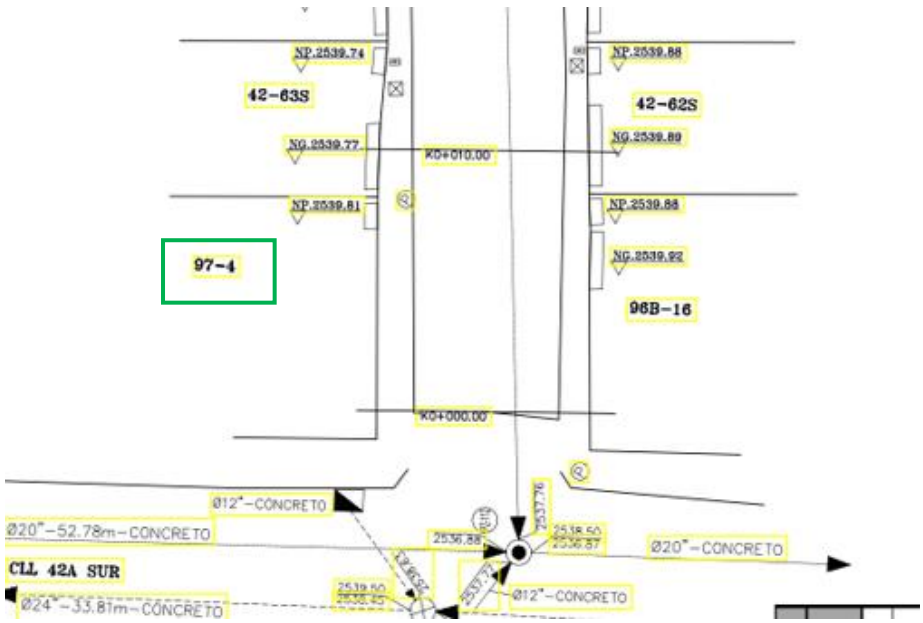


6.4. Promedio del ancho no coincide con el soporte:



Respuesta: Se corrige con promedio de ancho de cartera.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3003/Fila 63.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 204.


6.5. El descuento está mal formulado:



64	48	P31/CIV8001125/PKID29893/42-57 SUR DESCUENTO CAJA	0,80	0,80		.1	0,64

Respuesta: Se corrige formulación de descuento.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 3003/Fila 64.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 204.

6.6. El descuento no corresponde con el soporte:



88	71	P31/CIV8001125/PKID29892/42A-96B-16 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80		-1,00	-0,64

Respuesta: Se elimina descuento ya que no se encuentra en el soporte de cartera conciliado.

7. Ítem 3015: CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.

No se aprueba el ítem. Esta actividad la ejecutó el contratista por su procedimiento constructivo al no contar con monoblock para confinar el estabilizado.
Respuesta: Se elimina el item de las cantidades cobradas en mayo.

8. Ítem NP7: GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

8.1. P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+005: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+045.
Respuesta: Se elimina cobro, ya fue pagado en acta 5.

8.2. P17/CIV8000794/PKID156216/K0+044 a K0+050: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+045
Respuesta: Se ajustan abscisas y medidas de cobro de acuerdo a lo cobrado en actas pasadas.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP07/Fila 30.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 217.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP07 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 241-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+045 a K0+050	5,00	4,00		1,00	20,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**20,00**

8.3. P18/CIV8000839/PKID156217/K0+050 a K0+064: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+064

Respuesta: Se elimina cobro, ya fue pagado en acta 5.

9. Ítem NP12: GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.

9.1. P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+005: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+045.

Respuesta: Se elimina cobro de acta de mayo, ya fue pagado en acta 5.

9.2. P17/CIV8000794/PKID156216/K0+044 a K0+050: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+045

Respuesta: Se ajustan abscisas y medidas de cobro de acuerdo a lo cobrado en actas pasadas.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP12/Fila 30.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 220.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP12 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 240-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+045 a K0+050	5,00	4,00		1,00	20,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**20,00**

9.3. P18/CIV8000839/PKID156217/K0+050 a K0+064: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+064.

Respuesta: Se elimina cobro, ya fue pagado en acta 5.

10. Ítem NP13: ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO)

10.1. P17/CIV8000794/PKID156216/K0+000 a K0+005: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+040.

Respuesta: Se elimina cobro de acta de mayo, ya fue pagado en acta 5.

10.2. P17/CIV8000794/PKID156216/K0+044 a K0+050: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+045

Respuesta: Se ajustan abscisas y medidas de cobro de acuerdo a lo cobrado en actas pasadas.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP13/Fila 30.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 223.

RECIBO PARCIAL No	5	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE**	1/5/2023	**HASTA**	31/5/2023
ÍTEM Nº	NP13	**UNIDAD**	M3	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	412-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO)				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216/K0+045 a K0+050	6,00	4,00	0,180	1,00	4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**4,32**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					614,05
CANTIDAD CONTRACTUAL					2209,68
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					618,37
TOTAL POR EJECUTAR					1591,31

10.3. P18/CIV8000839/PKID156217/K0+050 a K0+064: Se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa entre K0+000 y K0+064


Respuesta: Se elimina cobro, ya fue pagado en acta 5.

11. Ítem NP14: FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

11.1. La Especificación no corresponde con la actividad, es la Especificación 514-18.

Respuesta: Se corrige especificación en acta de mayo y futuras.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.226-228.

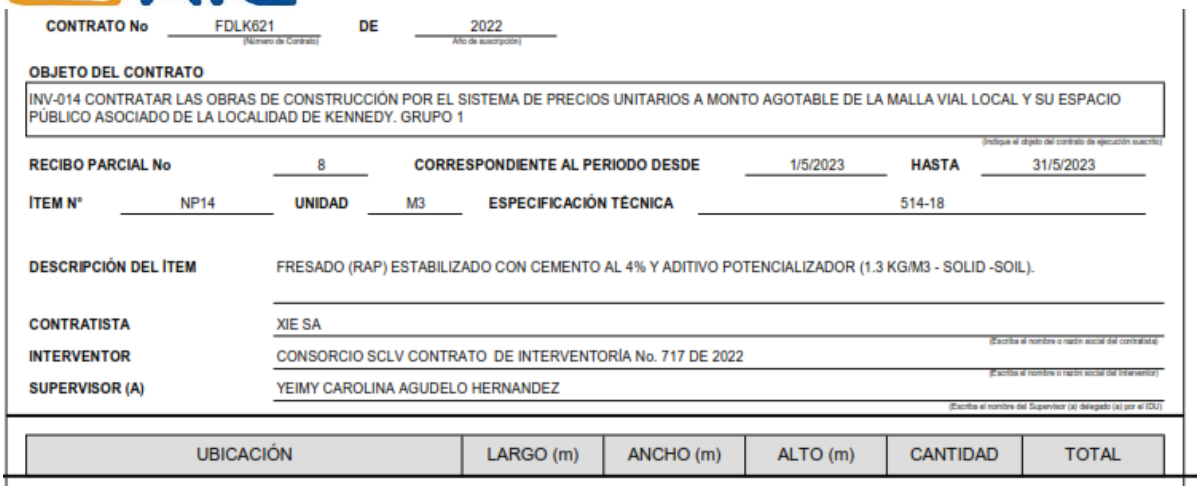

CONTRATO No FDLK621 (Número de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)


UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL

11.2. P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+040: Se repite abscisa, en el acta 6 fue cobrado desde la abscisa K0+010 y K0+044.

Respuesta: Se ajustan abscisas y medidas para cobro de acta de Mayo teniendo en cuenta cantidades pagadas en actas anteriores.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 30.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 226.

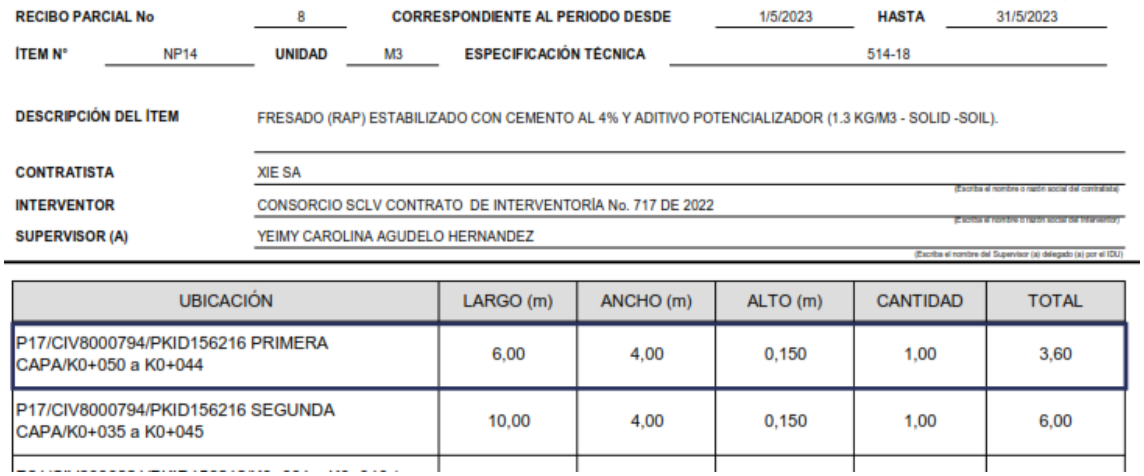

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00

11.3. P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+011: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se ajustan abscisas y medidas teniendo en cuenta que es la primera capa y en el acta 5 se pagó de la abscisa k0+010 a k0+055.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 32.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 226.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25

11.4. P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se especifica que es segunda capa con base en el informe diario conciliado con interventoría. No se han realizado pagos en actas anteriores.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 33.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 226.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45

11.5. P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa, si es el caso que sea primera capa, se repite abscisa, en el acta 6 fue cobrado desde la abscisa K0+055 y K0+064.8.

Respuesta: Se especifica que es segunda capa con base en el informe diario conciliado con interventoría. No se han realizado pagos en actas anteriores.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 34.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 226.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 / SEGUNDA CAPA	9,00	3,50	0,180	1,00	5,67

11.6. P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se especifica que es primera capa con base en la información suministrada por inspectores de obra y registro de actividades diarias.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 35.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 226.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP14 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 514-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 / SEGUNDA CAPA	9,00	3,50	0,180	1,00	5,67
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050 PRIMERA CAPA	30,00	4,08	0,200	1,00	24,48
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+050 a K0+058 / PRIMERA CAPA	8,00	4,08	0,200	1,00	6,53

11.7. P31/CIV8001125/PKID156199/K0+050 a K0+058: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se especifica que es primera capa con base en la información suministrada por inspectores de obra y registro de actividades diarias.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 36.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 226.

RECIBO PARCIAL No	8	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE**	1/5/2023	**HASTA**	31/5/2023		
ÍTEM N°	NP14	**UNIDAD**	M3	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	514-18		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	FRESADO (RAP) ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR (1.3 KG/M3 - SOLID -SOIL).						
CONTRATISTA	XIE SA						
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022						
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ						

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 / SEGUNDA CAPA	9,00	3,50	0,180	1,00	5,67
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050 PRIMERA CAPA	30,00	4,08	0,200	1,00	24,48
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+050 a K0+058 / PRIMERA CAPA	8,00	4,08	0,200	1,00	6,53
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**60,98**

12. Ítem NP13(2): ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO ESTABILIZADO)

12.1. P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+011: Indicar si la instalación de estabilización con RCD es de primera capa o segunda capa, si de ser correspondiente es primera capa se repite abscisa, en el acta 5 fue cobrado desde la abscisa K0+000 y K0+055.


Respuesta: Se ajustan abscisas y medidas teniendo en cuenta que es primera capa y en el acta 5 se pagó de la abscisa k0+010 a k0+055**.**
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP13(2)/Fila 32.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 241.

RECIBO PARCIAL No	8	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE**	1/5/2023	**HASTA**	31/5/2023		
ÍTEM N°	NP13	**UNIDAD**	M3	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	412-16		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO ESTABILIZADO)						
CONTRATISTA	XIE SA						
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022						
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ						

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25

12.2. P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se especifica que es segunda capa con base en el informe diario conciliado con interventoría. No se han realizado pagos en actas anteriores.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 33.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 241.

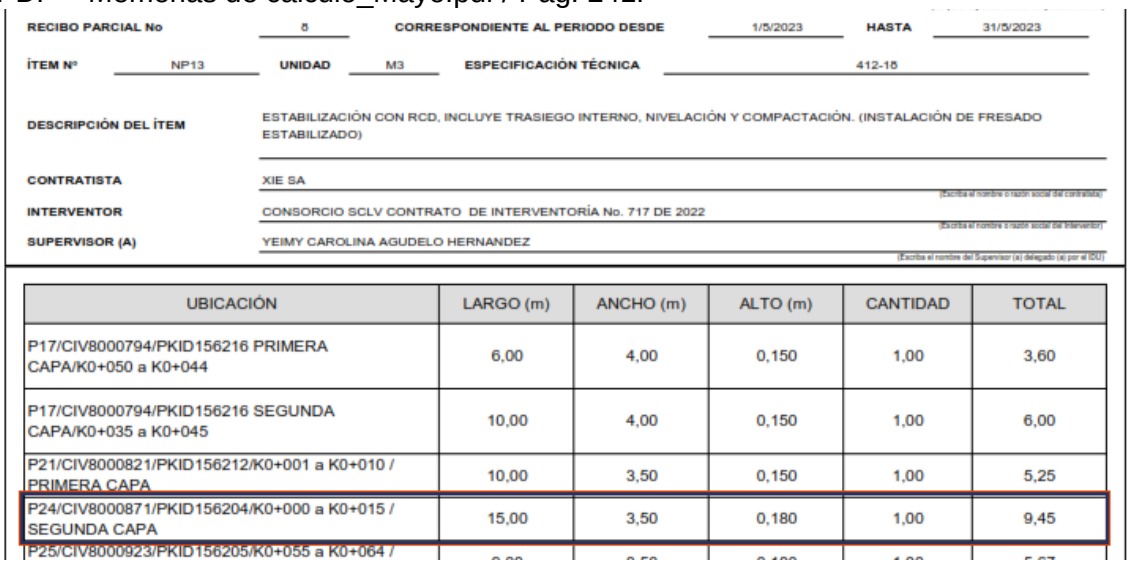

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP13 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 412-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO ESTABILIZADO)

CONTRATISTA: XIE SA


INTERVENTOR: CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A): YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 /					

12.3. P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se especifica que es segunda capa con base en el informe diario conciliado con interventoría. No se han realizado pagos en actas anteriores.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 34.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 241.

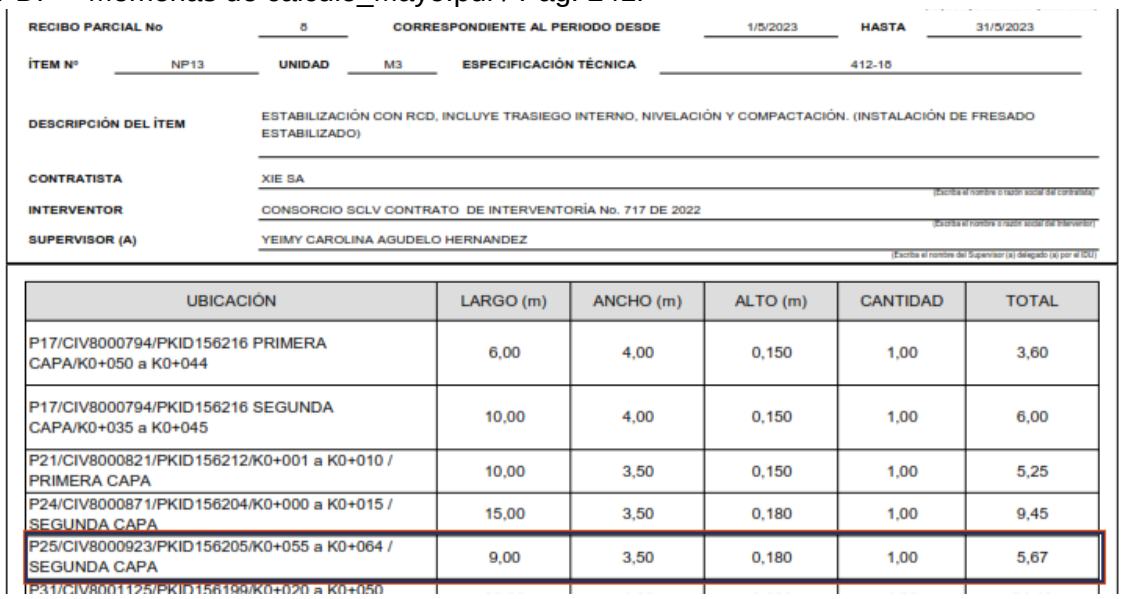

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP13 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 412-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO ESTABILIZADO)

CONTRATISTA: XIE SA


INTERVENTOR: CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A): YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 / SEGUNDA CAPA	9,00	3,50	0,180	1,00	5,67
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050					

12.4. P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa).

Respuesta: Se especifica que es primera capa con base en la información suministrada por inspectores de obra.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 35.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 241.

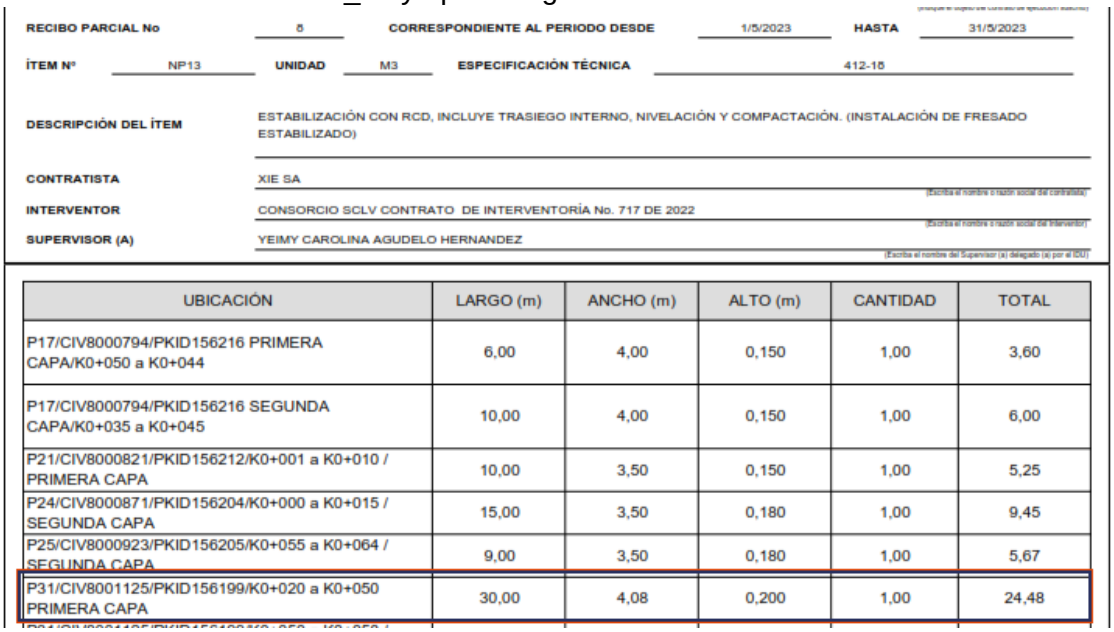

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP13 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 412-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO ESTABILIZADO)

CONTRATISTA XIE SA


INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 / SEGUNDA CAPA	9,00	3,50	0,180	1,00	5,67
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050 PRIMERA CAPA	30,00	4,08	0,200	1,00	24,48

12.5. P31/CIV8001125/PKID156199/K0+050 a K0+058: Indicar si la instalación del estabilizado es de primera capa o segunda capa.

Respuesta: Se especifica que es primera capa con base en la información suministrada por inspectores de obra.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP14/Fila 36.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 241.

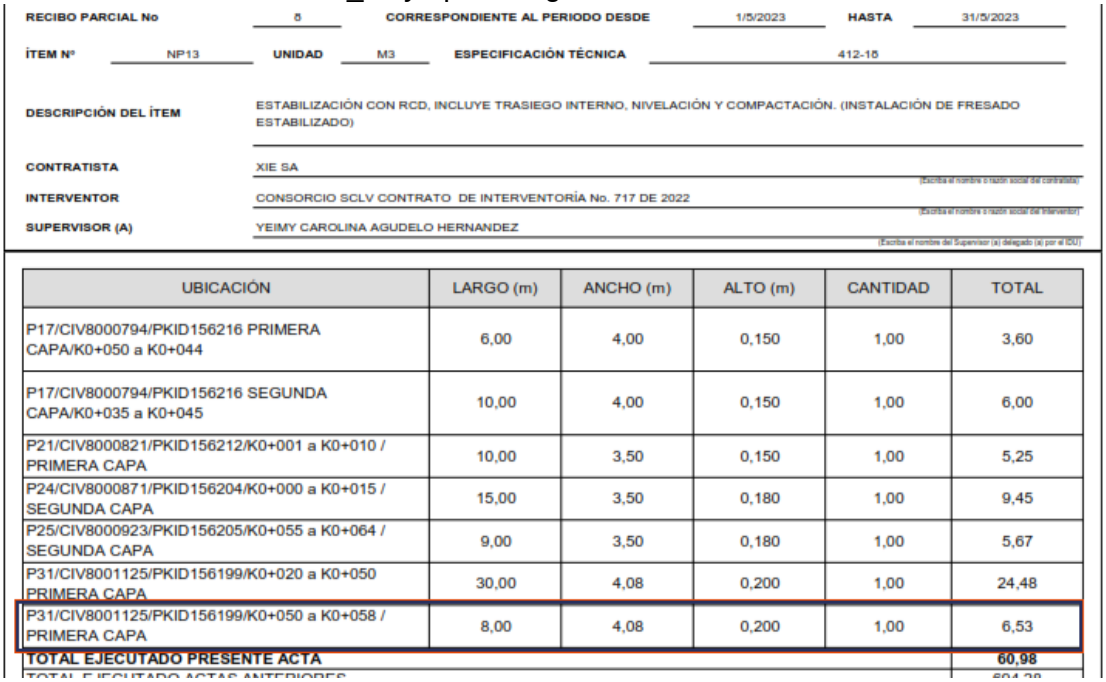

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP13 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 412-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO ESTABILIZADO)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P17/CIV8000794/PKID156216 PRIMERA CAPA/K0+050 a K0+044	6,00	4,00	0,150	1,00	3,60
P17/CIV8000794/PKID156216 SEGUNDA CAPA/K0+035 a K0+045	10,00	4,00	0,150	1,00	6,00
P21/CIV8000821/PKID156212/K0+001 a K0+010 / PRIMERA CAPA	10,00	3,50	0,150	1,00	5,25
P24/CIV8000871/PKID156204/K0+000 a K0+015 / SEGUNDA CAPA	15,00	3,50	0,180	1,00	9,45
P25/CIV8000923/PKID156205/K0+055 a K0+064 / SEGUNDA CAPA	9,00	3,50	0,180	1,00	5,67
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+020 a K0+050 PRIMERA CAPA	30,00	4,08	0,200	1,00	24,48
P31/CIV8001125/PKID156199/K0+050 a K0+058 / PRIMERA CAPA	8,00	4,08	0,200	1,00	6,53
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**60,98**

13. Ítem 4001: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

13.1. Decimales ocultos.

13.2. Cantidades y /o sumatoria no coinciden con la memoria:

33	P4/CIV8001069/PKID29873/40B-21 SUR	5,80	1,70	0,550	1,00	5,41
38	P4/CIV8001069/PKID29873/40B-15 SUR PEATONAL	2,90	1,83	0,610	1,00	3,23
51	P4/CIV8001069/PKID29872/40B-22 SUR PEATONAL	4,21	1,73	0,465	1,00	3,38
52	P4/CIV8001069/PKID29872/40B-22 SUR VEHICULAR	2,50	1,78	0,560	1,00	2,49
53	P4/CIV8001069/PKID29872/40B-22 SUR PEATONAL	1,24	1,85	0,485	1,00	1,11
57	P4/CIV8001069/PKID29872/40B-18 SUR PEATONAL	3,10	1,85	0,470	1,00	2,69
61	P4/CIV8001069/PKID29872/KR96A -31 SUR	12,03	1,86	0,570	1,00	12,72
136	P28/CIV8000929/PKID29887/0-33 SUR VEHICULAR	3,14	1,97	0,660	1,00	4,07
146	P28/CIV8000929/PKID29887/40-21SUR PEATONAL	2,96	1,80	0,560	1,00	2,98
150	P28/CIV8000929/PKID29887/40-15 SUR VEHICULAR	6,06	1,85	0,570	1,00	6,37
163	P30/CIV8001058/PKID29890/41-61 SUR PEATONAL	7,12	2,04	0,645	1,00	9,35
186	P30/CIV8001058/PKID29891/41-25 SUR PEATONAL	3,11	1,98	0,680	1,00	4,18
237	P30/CIV8001058/PKID29890/96B 41-17 SUR PEATONAL	5,95	2,01	0,760	1,00	9,09
274	P31/CIV8001125/PKID29893/42-63 SUR VEHICULAR	2,82	2,10	0,630	1,00	3,72
300	P31/CIV8001125/PKID29893/42-31 SUR VEHICULAR	2,83	1,94	0,610	1,00	3,34
340	P33/CIV8001041/PKID29871/40A-15 SUR VEHICULAR	2,76	1,96	0,690	1,00	3,72
349	P33/CIV8001041/PKID29871/40A-03 SUR PEATONAL	2,87	1,95	0,680	1,00	3,80

Respuesta: Se quitan decimales ocultos aproximando a dos cifras. Realizando el balance de las aproximaciones realizadas a las cantidades reportadas en las carteras conciliadas las cuales tienen 3 decimales se puede verificar que en el cobro total del ítem 4001 no se está cobrando cantidades por encima de las medidas de soportes y memorias técnicas totales.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Columnas AJ,AK,AL y AM.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 225-296.

13.3. Falta indicar las abscisas de ubicación de la cantidad descrita.

Respuesta: Se complementa descripción con base en informe diario conciliado.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Fila 148.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 263.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P28/CIV8000929/PKID29887/97-05	13,95	1,88	0,610	1,00	16,00
P28/CIV8000929/PKID29887/97-05				-1,49	-1,49
P30/CIV8001058/PKID156198/EXCAVACIÓN PARA SUMIDERO COSTADO OCCIDENTE ENTRE ABSCISAS K0+000 A K0+010	1,31	1,10	1,200	1,00	1,73

13.4. No es legible la ubicación:

Respuesta: Se corrige visualización de celdas.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 264.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ


UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P30/CIV8001058/PKID29891/41-49 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV8001058/PKID29891/41-49 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,56	-0,56
P30/CIV8001058/PKID29891/41-43	3,06	1,96	0,640		3,90
P30/CIV8001058/PKID29891/41-43	2,99	1,97	0,630		3,71
P30/CIV8001058/PKID29891/41-43 DESCUENTO POR CAJA				-0,27	-0,27
P30/CIV8001058/PKID29891/41-43 DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV8001058/PKID29891/41-43 DESCUENTO DEMOLICION				-0,54	-0,54
P30/CIV8001058/PKID29891/41-37	3,35	1,95	0,620		4,05
P30/CIV8001058/PKID29891/41-37	2,61	1,94	0,530		2,66
P30/CIV8001058/PKID29891/41-37 DESCUENTO POR CAJA				-0,27	-0,27
P30/CIV8001058/PKID29891/41-37 DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV8001058/PKID29891/41-37 DESCUENTO DEMOLICION				-0,60	-0,60
P30/CIV8001058/PKID29891/41-25 SUR VEHICULAR	2,67	1,99	0,600	1,00	3,43

13.5. Nomenclatura no coincide con la memoria

198	P30/CIV8001058/PKID29891/97-05	5,95	2,02	0,650	1,00	7,81
199	P30/CIV8001058/PKID29891/97-05 DESCUENTO POR CAJA				-0,27	-0,27
200	P30/CIV8001058/PKID29891/97-05 DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50	0,350	-1,00	-0,06
201	P30/CIV8001058/PKID29891/97-05				-0,53	-0,53

Respuesta: Corrección de nomenclatura según cartera conciliada con interventoría.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Fila 186.189.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 265.

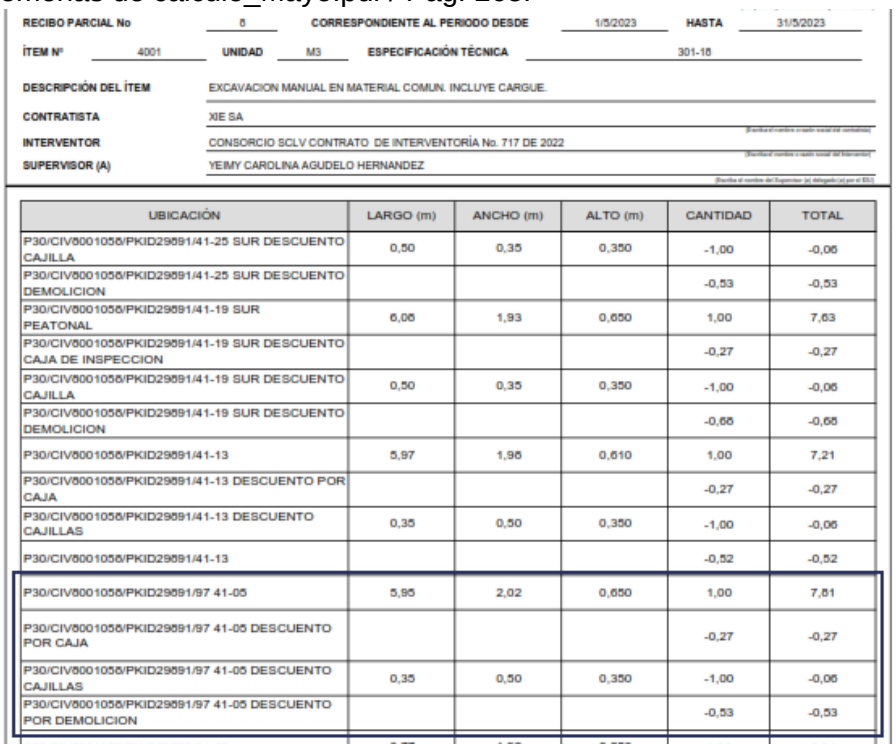

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022


SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P30/CIV6001056/PKID29691/41-25 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV6001056/PKID29691/41-25 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,53	-0,53
P30/CIV6001056/PKID29691/41-19 SUR PEATONAL	6,06	1,93	0,650	1,00	7,63
P30/CIV6001056/PKID29691/41-19 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,27	-0,27
P30/CIV6001056/PKID29691/41-19 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV6001056/PKID29691/41-19 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,66	-0,66
P30/CIV6001056/PKID29691/41-13	5,97	1,96	0,610	1,00	7,21
P30/CIV6001056/PKID29691/41-13 DESCUENTO POR CAJA				-0,27	-0,27
P30/CIV6001056/PKID29691/41-13 DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV6001056/PKID29691/41-13				-0,52	-0,52
P30/CIV6001056/PKID29691/97 41-05	5,95	2,02	0,650	1,00	7,81
P30/CIV6001056/PKID29691/97 41-05 DESCUENTO POR CAJA				-0,27	-0,27
P30/CIV6001056/PKID29691/97 41-05 DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50	0,350	-1,00	-0,06
P30/CIV6001056/PKID29691/97 41-05 DESCUENTO POR DEMOLICION				-0,53	-0,53



VEHICULAR	K0+057,140	2540,162	2540,164	2540,175	2539,750	2539,470	2539,450	2,71		1,99	0,412	0,694	0,725	0,61	5,39	3,26															
97 41-05 SUR PEATONAL	K0+057,140	2540,165	2540,162	2540,160	2539,500	2539,480	2539,460			1,99	0,665	0,682	0,700	0,68																	
	K0+062,752	2540,135	2540,124	2540,037	2539,490	2539,470	2539,450	5,95	5,95	2,05	0,645	0,654	0,587	0,63	12,02	7,87	0,64	0,27	0,36	0,22	0,18	0,06	5,95	1,02	5,25	0,1	0,53	7,01			
								61,15	61,15						121,69	77,51	6,40	2,70	3,60	2,20	1,80	0,60	54,07		50,86		5,11	69,10			
															A	B	C	D	E	F	G	H			I		J	K			

13.6. No indica a que corresponde el descuento:
Respuesta: Se especifica que es una corrección de cobro en acta 7.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Fila 343.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 275.

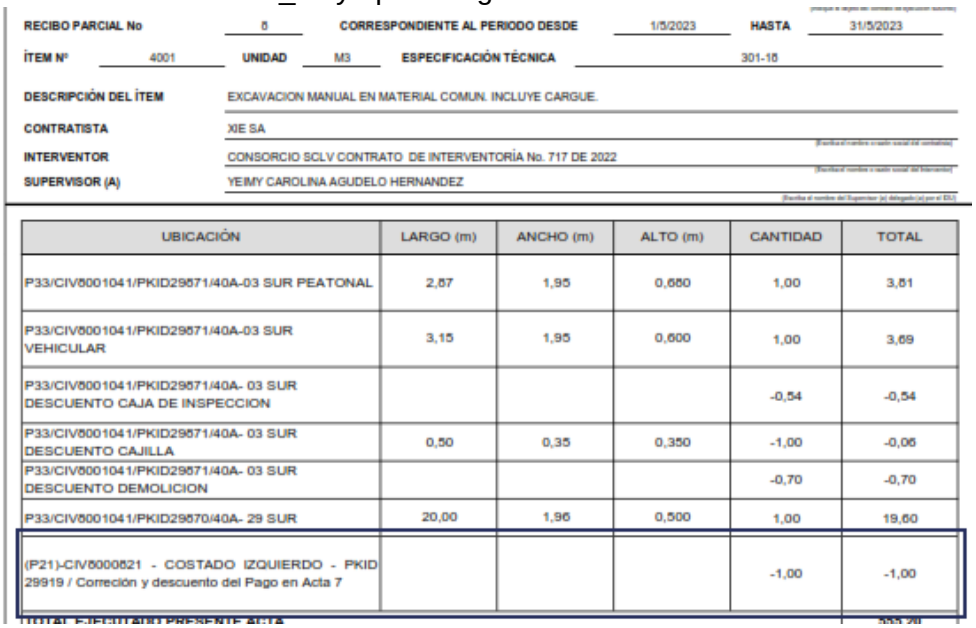

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV6001041/PKID29671/40A-03 SUR PEATONAL	2,67	1,95	0,660	1,00	3,51
P33/CIV6001041/PKID29671/40A-03 SUR VEHICULAR	3,15	1,95	0,600	1,00	3,69
P33/CIV6001041/PKID29671/40A- 03 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,54	-0,54
P33/CIV6001041/PKID29671/40A- 03 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P33/CIV6001041/PKID29671/40A- 03 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,70	-0,70
P33/CIV6001041/PKID29670/40A- 29 SUR	20,00	1,96	0,500	1,00	19,60
(P21)-CIV6000821 - COSTADO IZQUIERDO - PKID 29919 / Corrección y descuento del Pago en Acta 7				-1,00	-1,00

13.7. P21/CIV8000821/PKID29918/40-46SUR: predio fue cobrado en el acta 7.

P21-CIV8000821-PKID29918-KR97D-No.40-46SUR	6,81	1,75	0,58	1,00	6,85

Respuesta: Se elimina cobro de predio, ya fue pagado.

13.8. P21/CIV8000821/PKID29919/97C-17: predio fue cobrado en el acta 7.

P21-CIV8000821-PKID29918-KR97C-No.40-17SUR	10,18	2,00	0,49	1,00	9,98

Respuesta: Se elimina cobro de predio, ya fue pagado.

13.9. P21/CIV8000821/PKID29919/40-45SUR: predio fue cobrado en el acta 7.

P21-CIV8000821-PKID29919-KR97D-No.40-45SUR	6,90	1,88	0,61	1,00	7,85

Respuesta: Se elimina cobro de predio, ya fue pagado.

13.10. P21/CIV8000821/PKID29919/97D-5: predio fue cobrado en el acta 7.

P21-CIV8000821-PKID29919-KR97D-No.40-05SUR	9,68	2,04	0,60	1,00	11,75


Respuesta: Se elimina cobro de predio, ya fue pagado.

13.11. P28/CIV8000929/PKID29887/0-33 SUR PEATONAL: dirección no corresponde con la prioridad.

Respuesta: Se corrige dirección de predio.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Fila 123-127.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 275.

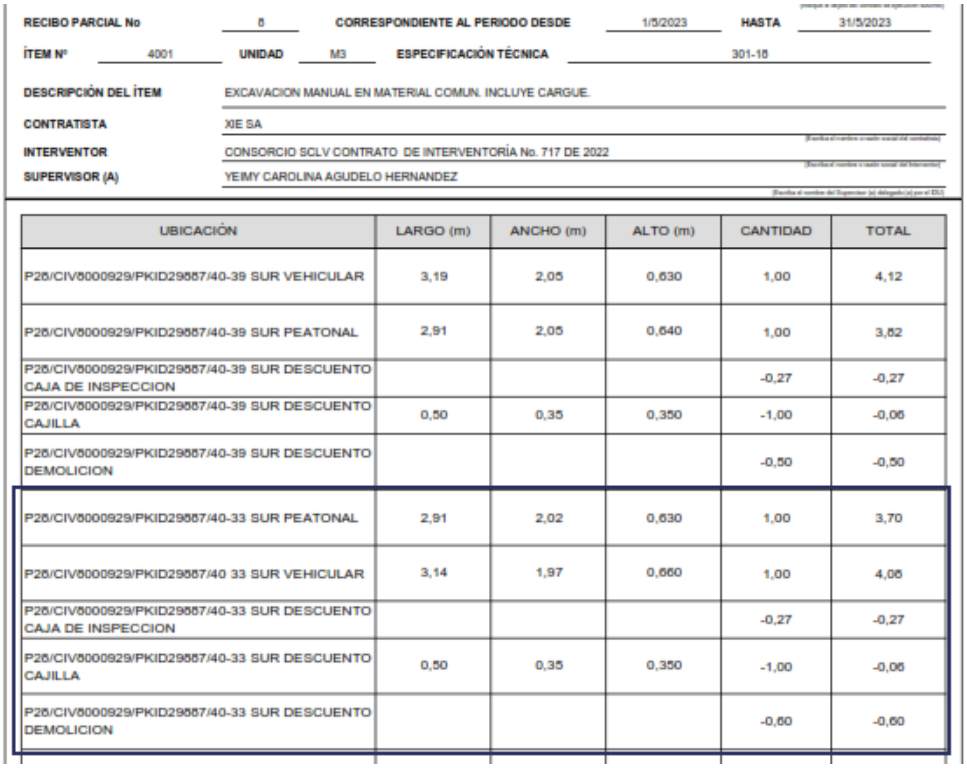

RECIBO PARCIAL No 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº 4001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022


SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P28/CIV8000929/PKID29887/40-39 SUR VEHICULAR	3,19	2,05	0,630	1,00	4,12
P28/CIV8000929/PKID29887/40-39 SUR PEATONAL	2,91	2,05	0,640	1,00	3,82
P28/CIV8000929/PKID29887/40-39 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,27	-0,27
P28/CIV8000929/PKID29887/40-39 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P28/CIV8000929/PKID29887/40-39 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,50	-0,50
P28/CIV8000929/PKID29887/40-33 SUR PEATONAL	2,91	2,02	0,630	1,00	3,70
P28/CIV8000929/PKID29887/40 33 SUR VEHICULAR	3,14	1,97	0,660	1,00	4,06
P28/CIV8000929/PKID29887/40-33 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,27	-0,27
P28/CIV8000929/PKID29887/40-33 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P28/CIV8000929/PKID29887/40-33 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,60	-0,60

13.12. P32/CIV8000979/PKID29867/ SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO: indicar abscisa donde se realizó la excavación en calzada.

13.13. P32/CIV8000979/PKID29866/ SUMIDERO COSTADO DERECHO: indicar abscisa donde se realizó la excavación en calzada.

Respuesta: Se completan abscisas de excavación de sumideros para la P32.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Fila 302-303.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 272.

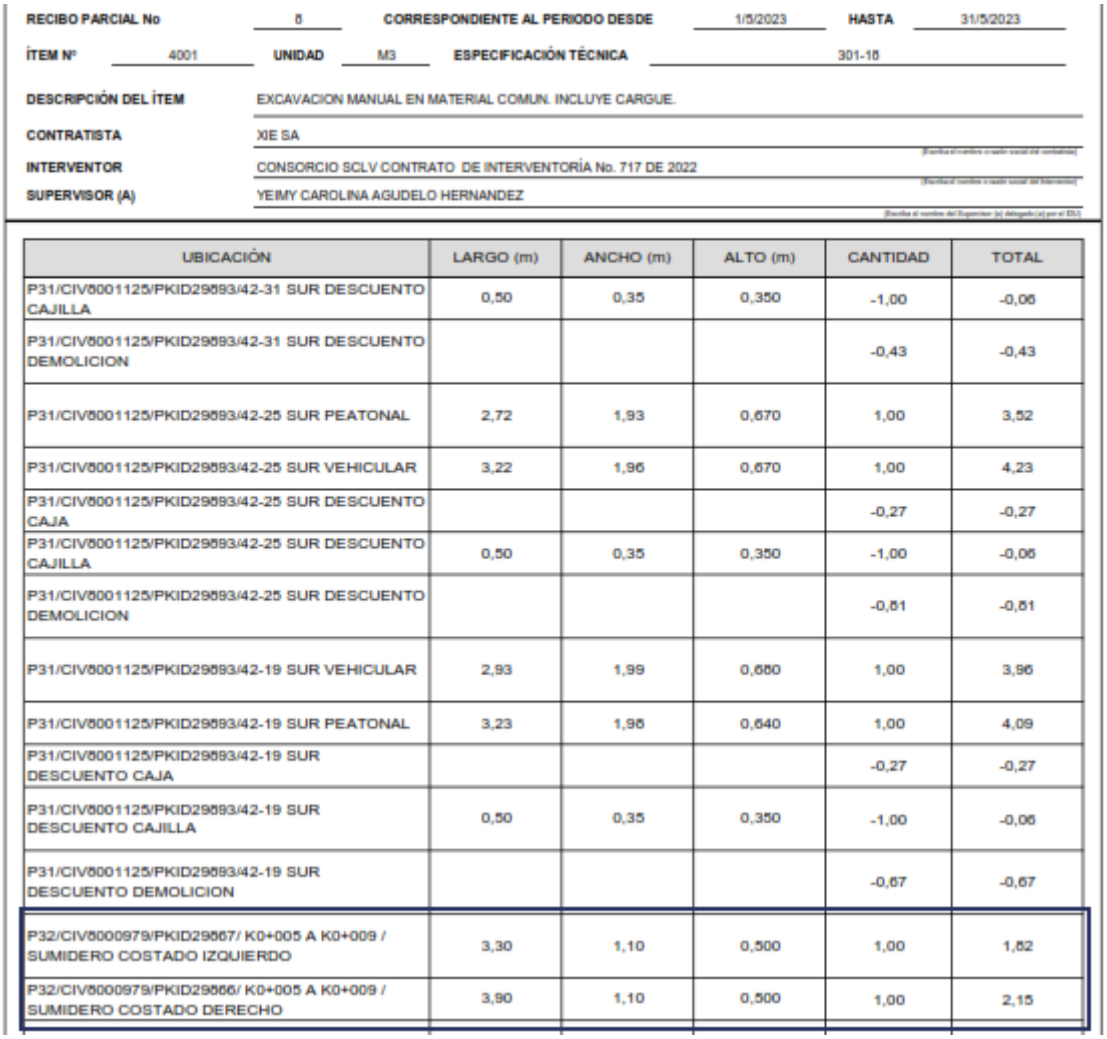

RECIBO PARCIAL No 6 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº 4001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P31/CIV8001125/PKID29893/42-31 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P31/CIV8001125/PKID29893/42-31 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,43	-0,43
P31/CIV8001125/PKID29893/42-25 SUR PEATONAL	2,72	1,93	0,670	1,00	3,52
P31/CIV8001125/PKID29893/42-25 SUR VEHICULAR	3,22	1,96	0,670	1,00	4,23
P31/CIV8001125/PKID29893/42-25 SUR DESCUENTO CAJA				-0,27	-0,27
P31/CIV8001125/PKID29893/42-25 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P31/CIV8001125/PKID29893/42-25 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,61	-0,61
P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 SUR VEHICULAR	2,93	1,99	0,660	1,00	3,96
P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 SUR PEATONAL	3,23	1,96	0,640	1,00	4,09
P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 SUR DESCUENTO CAJA				-0,27	-0,27
P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P31/CIV8001125/PKID29893/42-19 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,67	-0,67
P32/CIV8000979/PKID29867/ K0+005 A K0+009 / SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	3,30	1,10	0,500	1,00	1,82
P32/CIV8000979/PKID29866/ K0+005 A K0+009 / SUMIDERO COSTADO DERECHO	3,90	1,10	0,500	1,00	2,15

13.14. (P21)-CIV8000821 - COSTADO IZQUIERDO - PKID 29919 / DESCUENTO: no indica dirección donde se debe realizar el descuento.

Respuesta: Se especifica que es corrección de cobro en acta 7.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4001/Fila 343.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 275.

RECIBO PARCIAL No 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-03 SUR PEATONAL	2,87	1,95	0,680	1,00	3,81
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-03 SUR VEHICULAR	3,15	1,95	0,600	1,00	3,69
P33/CIV8001041/PKID29871/40A- 03 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,54	-0,54
P33/CIV8001041/PKID29871/40A- 03 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P33/CIV8001041/PKID29871/40A- 03 SUR DESCUENTO DEMOLICION				-0,70	-0,70
P33/CIV8001041/PKID29870/40A- 29 SUR	20,00	1,96	0,500	1,00	19,60
(P21)-CIV8000821 - COSTADO IZQUIERDO - PKID 29919 / Correción y descuento del Pago en Acta 7				-1,00	-1,00

13.15. (Adicional) Cobro doble de P4/CIV8001069/PKID29873/40B- 03 SUR

Respuesta: Se deja únicamente un cobro del predio.

RECIBO PARCIAL No 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 4001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 301-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P4/CIV8001069/PKID29873/40B-09 SUR PEATONAL	3,00	1,64	0,570	1,00	3,15
P4/CIV8001069/PKID29873/40B-09 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION				-0,27	-0,27
P4/CIV8001069/PKID29873/40B-09 SUR DESCUENTO CAJILLA	0,50	0,35	0,350	-1,00	-0,06
P4/CIV8001069/PKID29873/40B-09 SUR DESCUENTO POR DEMOLICION				-0,57	-0,57
P4/CIV8001069/PKID29873/40B- 03 SUR	6,05	1,66	0,570	1,00	6,41
P4/CIV8001069/PKID29873/40B- 03 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	1,10	1,10	1,100	-2,00	-2,66

14. Ítem 4002: "BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)"

14.1. La Especificación no tiene relación con la actividad:

Respuesta: Se modifica especificación con base en IDU en generalidades de espacio publico donde se nombran características de los mismos y tipos de confinamiento.

PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 297.

14.2. P3/CIV8000957/PKID29897/40A-60: el PKID no corresponde con la dirección, los soportes de las cantidades tienen dos cantidades diferentes en el de inspector 3,8 ML y en la memoria de cálculo 6,5ML.

Respuesta: El predio tiene escalones, se especifica según formato conciliado con interventoría cual es el primer y segundo escalón confinado con bordillo de los cuales se realiza el cobro.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4002/Fila 30 y 33.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 297.



RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° 4002 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1000-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BORDILLO

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-60 SUR / PRIMER ESCALON	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-54 SUR	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-46 SUR	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29897/40A-60 / SEGUNDO ESCALON	3,80			1,00	3,80
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-46 / CONTINUACIÓN					

14.3. P13/CIV8000772/PKID156220/K0+045 a K0+035: Se debe indicar en que costado de la calzada fue la instalación izquierdo o derecho.

Respuesta: Se especifica costado según esquema de informe diario conciliado con interventoría.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4002/Fila 38.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 297.

RECIBO PARCIAL No 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM N° 4002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 1000-18


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BORDILLO

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-60 SUR / PRIMER ESCALON	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-54 SUR	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-46 SUR	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29897/40A-60 / SEGUNDO ESCALON	3,80			1,00	3,80
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-46 / CONTINUACIÓN DE PREDIO	4,66			1,00	4,66
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-54 CONTINUACIÓN DE PREDIO	4,75			1,00	4,75
P3/CIV8000957/PKID156201/40A-04	5,30			1,00	5,30
P3/CIV8000957/PKID29897/40A-03	3,35			1,00	3,35
P13/CIV8000772/PKID156220/K0+045 a K0+035 COSTADO IZQUIERDO	10,00			1,00	10,00

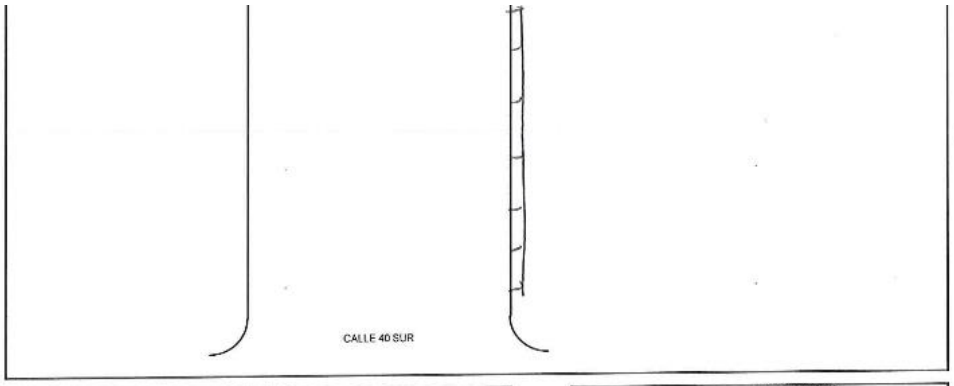

CONTRATISTA	
NOMBRE	NICOLAS BARBOSA PARRA
CARGO	INSPECTOR TECNICO DE OBRA
FIRMA	Nicolas Barbosa

INTERVENTORIA	
NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

14.4. P21/CIV8000821/PKID156212 COSTADO DERECHO/: Se debe indicar la abscisa donde se realizó la instalación del bordillo A-80 en la calzada.

Respuesta: Se complementa abscisas de instalación según esquema de formato diario conciliado con interventoría.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4002/Fila 44.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 297.

RECIBO PARCIAL No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº 4002 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1000-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BORDILLO

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-60 SUR / PRIMER ESCALON	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-54 SUR	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-46 SUR	6,10			1,00	6,10
P3/CIV8000957/PKID29897/40A-60 / SEGUNDO ESCALON	3,80			1,00	3,80
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-46 / CONTINUACIÓN DE PREDIO	4,66			1,00	4,66
P3/CIV8000957/PKID29896/40A-54 CONTINUACIÓN DE PREDIO	4,75			1,00	4,75
P3/CIV8000957/PKID156201/40A-04	5,30			1,00	5,30
P3/CIV8000957/PKID29897/40A-03	3,35			1,00	3,35
P13/CIV8000772/PKID156220/K0+045 a K0+035 COSTADO IZQUIERDO	10,00			1,00	10,00
P13/CIV8000772/PKID29935/40-33	3,04			1,00	3,04
P14/CIV8000814/PKID29936/40A-28	1,17			1,00	1,17
P14/CIV8000814/PKID29936/40A-22	1,18			1,00	1,18
P14/CIV8000814/PKID29936/40A-40	0,80			1,00	0,80
P14/CIV8000814/PKID29935/40-27	0,80			1,00	0,80
P21/CIV8000821/PKID156212/k0+000 a k0+001 / COSTADO DERECHO	3,00			1,00	3,00



14.5. P21/CIV8000821/PKID29919/97D-05: no concuerda la cantidad cobrada con la memoria 2,23 ML.

Respuesta: En el formato diario 1336 del 17/05/2023 se reporta la cantidad total del predio que son 15.6m, el informe 1353 se elimina de cobro en Mayo ya que es una medida parcial del bordillo del mismo predio.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4002/Fila 54.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 298.

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° 4002 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1000-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BORDILLO

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022


SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P21/CIV8000821/PKID29919/40-21SUR	3,83			1,00	3,83
P21/CIV8000821/PKID156212 COSTADO DERECHO/K0+047,5 a K0+055	7,30			1,00	7,30
P21/CIV8000821/PKID29919/40-45 sur	3,10			1,00	3,10
P21/CIV8000821/PKID29918/40-11SUR	2,91			1,00	2,91
P21/CIV8000821/PKID29918/40-15SUR	2,45			1,00	2,45
P21/CIV8000821/PKID29918/97C-17	11,62			1,00	11,62
P21/CIV8000821/PKID29919/97D-5	15,60			1,00	15,60

14.6. P24/CIV8000871/PKID29903/ 97B-5: la cantidad cobrada no concuerda con la memoria de cálculo 8,96.

Respuesta: Se corrige el largo según formato diario conciliado con interventoría.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4002/Fila 58.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 298.

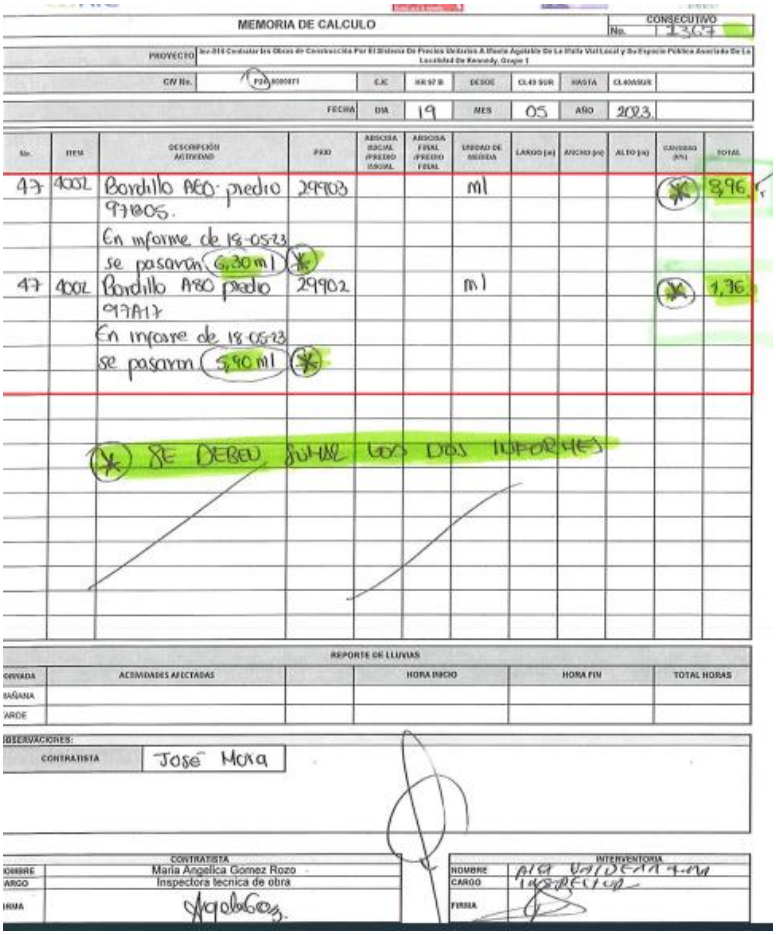

ÍTEM Nº 4002 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1000-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BORDILLO

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ


UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P21/CIV8000821/PKID29919/40-21SUR	3,83			1,00	3,83
P21/CIV8000821/PKID156212 COSTADO DERECHO/K0+047,5 a K0+055	7,30			1,00	7,30
P21/CIV8000821/PKID29919/40-45 sur	3,10			1,00	3,10
P21/CIV8000821/PKID29918/40-11SUR	2,91			1,00	2,91
P21/CIV8000821/PKID29918/40-15SUR	2,45			1,00	2,45
P21/CIV8000821/PKID29918/97C-17	11,62			1,00	11,62
P21/CIV8000821/PKID29919/97D-5	15,60			1,00	15,60
P22/CIV8000864/PKID29920/40A-04	2,86			1,00	2,86
P24/CIV8000871/PKID29902/97B-05	6,30			1,00	6,30
P24/CIV8000871/PKID29903/97A-17	5,90			1,00	5,90
P24/CIV8000871/PKID29903/ 97B-5	8,96			1,00	8,96

14.7. P25/CIV8000923/PKID156205 COSTADO DERECHO/ a: se debe indicar la abscisa en la calzada donde se realizó la instalación del bordillo A-80.

14.8. P25/CIV8000923/PKID156205 COSTADO IZQUIERDO/ a: se debe indicar la abscisa en la calzada donde se realizó la instalación del bordillo A-80.

Respuesta: Se complementa ubicación de instalación según información de informe diario conciliado con interventoría donde se describe la instalación de bordillos a la llegada a la cll 41 sur, es decir al inicio del abscisado de la P25.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña 4002/Fila 62-63.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 298.

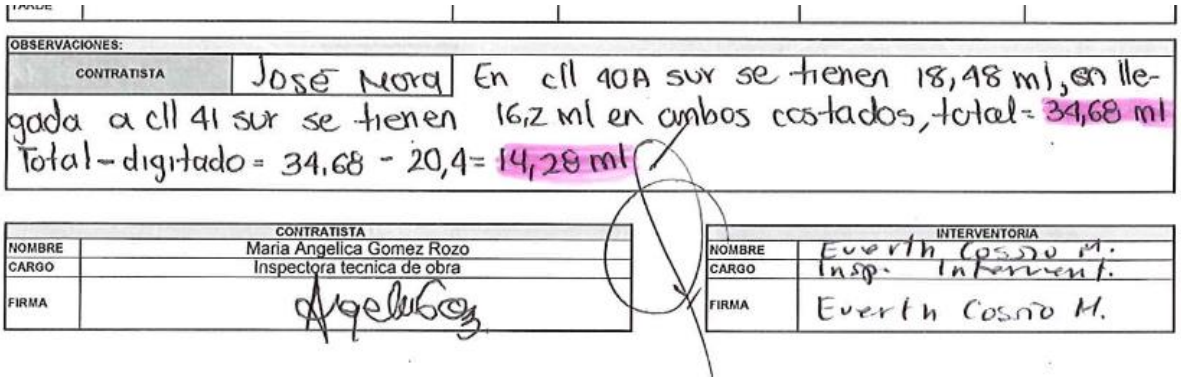


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA José Mora En cll 40A sur se tienen 18,48 ml, en llegada a cll 41 sur se tienen 16,2 ml en ambos costados, total= 34,68 ml
Total-digitado = 34,68 - 20,4 = 14,28 ml

CONTRATISTA	
NOMBRE	Maria Angelica Gomez Rozo
CARGO	Inspectora tecnica de obra
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	Everth Cossio M.
CARGO	Insp. Interventoría
FIRMA	Everth Cossio M.

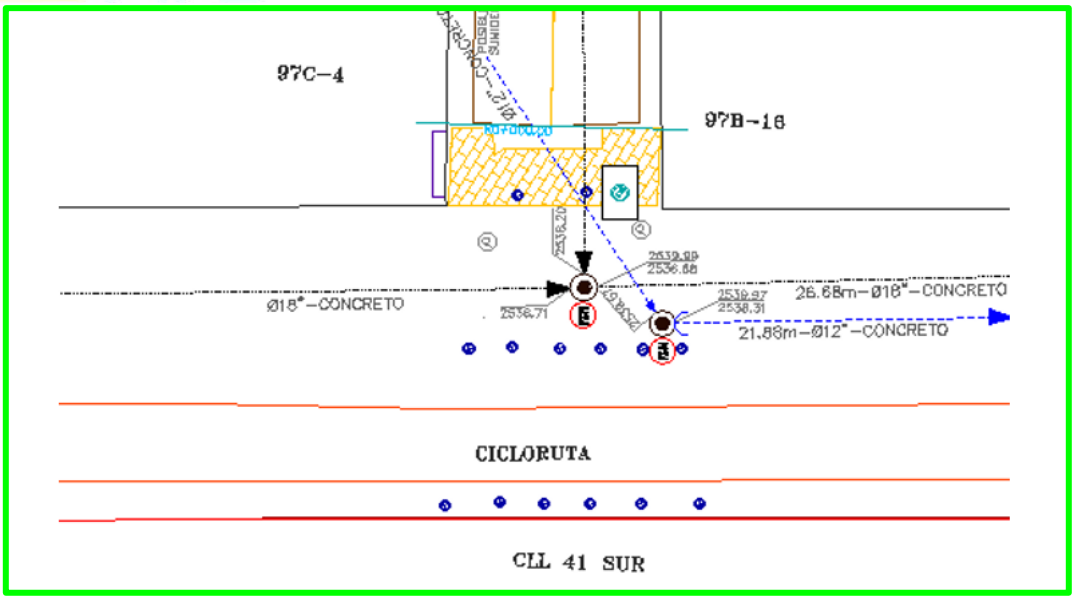

RECIBO PARCIAL No	8	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	1/5/2023	HASTA	31/5/2023
ÍTEM Nº	4002	UNIDAD	ML	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	1000-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	BORDILLO				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P21/CIV6000621/PKID29919/40-21SUR	3,63			1,00	3,63
P21/CIV6000621/PKID156212 COSTADO DERECHO/K0+047,5 a K0+055	7,30			1,00	7,30
P21/CIV6000621/PKID29919/40-45 sur	3,10			1,00	3,10
P21/CIV6000621/PKID29918/40-11SUR	2,91			1,00	2,91
P21/CIV6000621/PKID29918/40-15SUR	2,45			1,00	2,45
P21/CIV6000621/PKID29918/97C-17	11,62			1,00	11,62
P21/CIV6000621/PKID29919/97D-5	15,60			1,00	15,60
P22/CIV6000564/PKID29920/40A-04	2,66			1,00	2,66
P24/CIV6000571/PKID29902/97B-05	6,30			1,00	6,30
P24/CIV6000571/PKID29903/97A-17	5,90			1,00	5,90
P24/CIV6000571/PKID29903/ 97B-5	5,96			1,00	5,96
P24/CIV6000571/PKID29902/ 97A-17	1,76			1,00	1,76
P24/CIV6000571/PKID156204 / INTERSECCION CON CL40ASUR/COSTADO DERECHO	5,09			1,00	5,09
P24/CIV6000571/PKID156204/ INTERSECCION CON CL40ASUR/COSTADO IZQUIERDO	5,09			1,00	5,09
P25/CIV6000923/PKID156205/K0+000 A INTERSECCION CON CALLE 41SUR / COSTADO DERECHO	7,14			1,00	7,14
P25/CIV6000923/PKID156205 K0+000 A INTERSECCION DE KR97B CON CALLE 41SUR / COSTADO IZQUIERDO	7,14			1,00	7,14

15. **Ítem NP12(2): GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)**

15.1. Decimales ocultos que modifican el resultado:

40	P17/CIV8000794/PKID29926/40-28 SUR/	6,02	2,05		1,00	12,31
63	P30/CIV8001058/PKID29891/41-25 SUR PEATONAL/	3,11	1,98		1,00	6,14
90	P33/CIV8001041/PKID29871/40A-21 SUR/	2,98	1,97		1,00	5,86
99	P13/CIV8000772/PKID29935/40-33/ DESCUENTO	6,36	2,00		-1,00	-12,71

Respuesta: Se quitan decimales ocultos aproximando a dos cifras. Realizando el balance de las aproximaciones realizadas a las cantidades reportadas en las carteras conciliadas las cuales tienen 3 decimales se puede verificar que en el cobro total del ítem NP12(2) no se está cobrando cantidades por encima de las medidas de soportes y memorias técnicas totales.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP12(2) /Columnas AJ,AK,AL,AM.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 243-348.


15.2. El descuento no coincide con la memoria de cálculo:

97	P33/CIV8001041/PKID29871/40A-09/DESCUENTO POR CAJA	0,80	0,80		-1,00	-0,64

Página 5

Respuesta: Se corrige descuento de acuerdo a cartera topográfica conciliada con interventoría.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP12(2) /Fila 95.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 347.

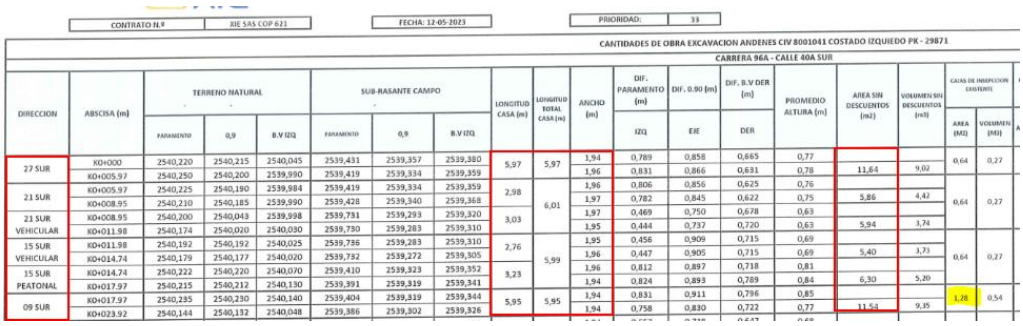

CONTRATO N.º: XIE SAS COP 621 | FECHA: 12-05-2023 | PRIORIDAD: 33

CANTIDADES DE OBRA EXCAVACION ANDENES CIV 8001041 COSTADO IZQUIEDO PR - 29871

CARRERA 96A - CALLE 40A SUR

DIRECCION	ABSCISA (m)	TERRENO NATURAL			SUB-RASANTE CAMPO			LONGITUD CASA (m)	LONGITUD TOTAL CASA (m)	ANCHO (m)	DIF. PARAMENTO (m)	DIF. 0.90 (m)	DIF. B.V DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA SIN DESCUENTOS (m2)	VOLUMEN SIN DESCUENTOS (m3)	CAJAS DE INSPECCION EXISTENTE	
		PARAMENTO	0,9	B.V IZQ	PARAMENTO	0,9	B.V IZQ				IZQ	EJE	DER				AREA (M2)	VOLUMEN (M3)
27 SUR	KD+000	2540,220	2540,215	2540,045	2539,431	2539,357	2539,380	5,97	5,97	1,94	0,789	0,858	0,665	0,77	11,64	9,02	0,64	0,27
	KD+005.97	2540,250	2540,200	2539,990	2539,419	2539,334	2539,359			1,96	0,831	0,866	0,631	0,78				
21 SUR	KD+005.97	2540,225	2540,190	2539,984	2539,419	2539,334	2539,359	2,98	6,01	1,96	0,806	0,856	0,625	0,76	5,86	4,42	0,64	0,27
	KD+008.95	2540,210	2540,185	2539,990	2539,428	2539,340	2539,368			1,97	0,782	0,845	0,622	0,75				
21 SUR VEHICULAR	KD+008.95	2540,200	2540,043	2539,998	2539,731	2539,293	2539,320	3,03		1,97	0,469	0,750	0,678	0,63	5,94	3,74		
	KD+011.98	2540,174	2540,020	2540,030	2539,730	2539,283	2539,310			1,95	0,444	0,737	0,720	0,63				
15 SUR VEHICULAR	KD+011.98	2540,192	2540,192	2540,025	2539,736	2539,283	2539,310	2,76	5,99	1,95	0,456	0,909	0,715	0,69	5,40	3,73	0,64	0,27
	KD+014.74	2540,179	2540,177	2540,020	2539,732	2539,272	2539,305			1,96	0,447	0,905	0,715	0,69				
15 SUR PEATONAL	KD+014.74	2540,222	2540,220	2540,070	2539,410	2539,323	2539,352	3,23		1,96	0,812	0,897	0,718	0,81	6,30	5,20		
	KD+017.97	2540,215	2540,212	2540,130	2539,391	2539,319	2539,341			1,94	0,824	0,893	0,789	0,84				
09 SUR	KD+017.97	2540,235	2540,230	2540,140	2539,404	2539,319	2539,344	5,95	5,95	1,94	0,831	0,911	0,796	0,85	11,53	9,35	1,28	0,54
	KD+023.92	2540,144	2540,132	2540,048	2539,386	2539,302	2539,326			1,94	0,758	0,830	0,722	0,77				

RECIBO PARCIAL No 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº NP12 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 240-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)


CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-09/	5,95	1,94		1,00	11,54
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-09/DESCUENTO CAJA	0,80	0,80		-2,00	-1,28
P33/CIV8001041/PKID29870/40A - 29 SUR/	20,00	1,95		1,00	39,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	3,32	1,90		1,00	6,31

15.3. P24/CIV8000871/PKID29902/40-04/: dirección no corresponde con la prioridad.
Respuesta: Predio descrito en cartera topográfica conciliada con interventoría.

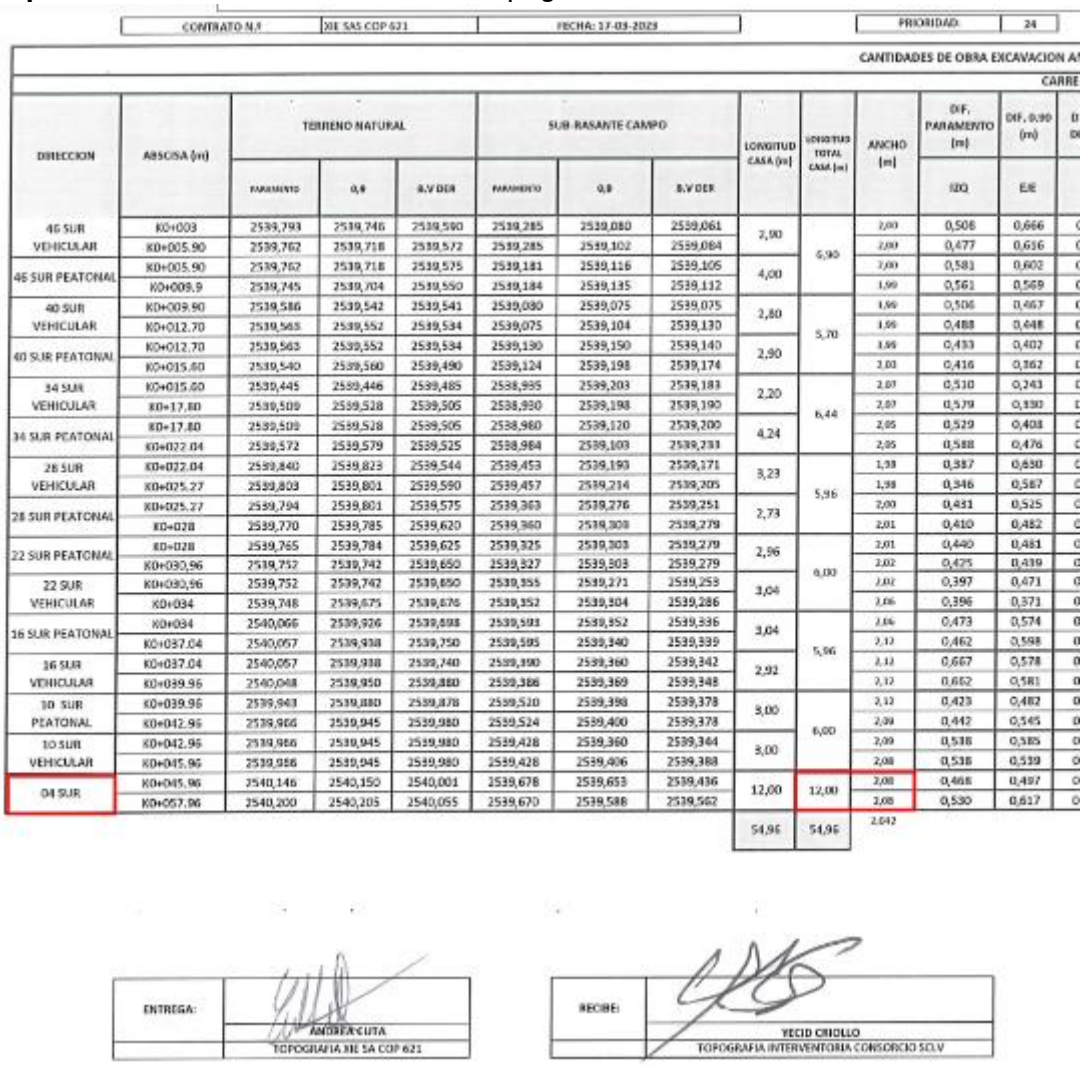

CONTRATO N.º	XIE SAS COP 621	FECHA: 17-03-2023	PRIORIDAD:	24

CANTIDADES DE OBRA EXCAVACION A

CARRE

DIRECCION	ABSCISA (m)	TERRENO NATURAL			SUB-RASANTE CAMPO			LONGITUD CASA (m)	LONGITUD TOTAL CASA (m)	ANCHO (m)	DIF. PARAMENTO (m)	DIF. 0.90 (m)	D
		PARAMENTO	0,0	B.V DER	PARAMENTO	0,0	B.V DER				IZQ	EJE	
46 SUR VEHICULAR	K0+003	2539,793	2539,746	2539,590	2539,285	2539,080	2539,061	2,00	6,90	2,00	0,508	0,666	
	K0+005.90	2539,762	2539,718	2539,572	2539,285	2539,102	2539,084			2,00	0,477	0,636	
46 SUR PEATONAL	K0+005.90	2539,762	2539,718	2539,575	2539,181	2539,116	2539,105	4,00		2,00	0,581	0,602	
	K0+009.9	2539,745	2539,704	2539,550	2539,184	2539,135	2539,112			1,99	0,561	0,569	
40 SUR VEHICULAR	K0+009.90	2539,586	2539,542	2539,541	2539,080	2539,075	2539,075	2,80	5,70	1,99	0,506	0,467	
	K0+012.70	2539,563	2539,552	2539,534	2539,075	2539,104	2539,130			1,99	0,488	0,448	
40 SUR PEATONAL	K0+012.70	2539,563	2539,552	2539,534	2539,130	2539,150	2539,140	2,90		1,99	0,433	0,402	
	K0+015.60	2539,540	2539,560	2539,490	2539,124	2539,198	2539,174			2,00	0,416	0,362	
34 SUR VEHICULAR	K0+015.60	2539,445	2539,446	2539,485	2538,995	2539,203	2539,183	2,20	6,44	2,07	0,510	0,243	
	K0+17.80	2539,509	2539,528	2539,505	2538,930	2539,198	2539,190			2,07	0,579	0,330	
34 SUR PEATONAL	K0+17.80	2539,509	2539,528	2539,505	2538,980	2539,120	2539,200	4,24		2,05	0,529	0,408	
	K0+022.04	2539,572	2539,579	2539,525	2538,984	2539,103	2539,233			2,05	0,588	0,476	
28 SUR VEHICULAR	K0+022.04	2539,840	2539,823	2539,544	2539,453	2539,193	2539,171	3,23	5,96	1,98	0,387	0,630	
	K0+025.27	2539,803	2539,801	2539,590	2539,457	2539,214	2539,205			1,98	0,346	0,587	
28 SUR PEATONAL	K0+025.27	2539,794	2539,801	2539,575	2539,363	2539,276	2539,251	2,73		2,00	0,481	0,525	
	K0+028	2539,770	2539,785	2539,620	2539,360	2539,308	2539,279			2,01	0,410	0,482	
22 SUR PEATONAL	K0+028	2539,765	2539,784	2539,625	2539,325	2539,303	2539,279	2,96	6,00	2,01	0,440	0,481	
	K0+030,96	2539,752	2539,742	2539,650	2539,327	2539,303	2539,279			2,02	0,425	0,439	
22 SUR VEHICULAR	K0+030,96	2539,752	2539,742	2539,650	2539,355	2539,271	2539,253	3,04		2,02	0,397	0,471	
	K0+034	2539,748	2539,675	2539,676	2539,352	2539,304	2539,286			2,06	0,396	0,371	
16 SUR PEATONAL	K0+034	2540,066	2539,926	2539,898	2539,593	2539,352	2539,336	3,04	5,96	2,06	0,473	0,574	
	K0+037.04	2540,057	2539,938	2539,750	2539,595	2539,340	2539,339			2,12	0,462	0,598	
16 SUR VEHICULAR	K0+037.04	2540,057	2539,938	2539,740	2539,390	2539,360	2539,342	2,92		2,12	0,667	0,578	
	K0+039.96	2540,048	2539,950	2539,880	2539,386	2539,369	2539,348			2,12	0,652	0,581	
10 SUR PEATONAL	K0+039.96	2539,943	2539,880	2539,878	2539,520	2539,398	2539,378	3,00	6,00	2,12	0,423	0,482	
	K0+042.96	2539,906	2539,945	2539,980	2539,524	2539,400	2539,378			2,09	0,442	0,545	
10 SUR VEHICULAR	K0+042.96	2539,986	2539,945	2539,980	2539,428	2539,360	2539,344	3,00		2,09	0,538	0,585	
	K0+045.96	2539,986	2539,945	2539,980	2539,428	2539,406	2539,388			2,08	0,538	0,539	
04 SUR	K0+045.96	2540,146	2540,150	2540,001	2539,678	2539,653	2539,436	12,00	12,00	2,08	0,468	0,497	
	K0+057.96	2540,200	2540,205	2540,055	2539,670	2539,588	2539,562			2,08	0,530	0,617	
								54,96	54,96	2,042			

ENTREGA:	ANDREA CUTA TOPOGRAFIA XIE SA COP 621

RECIBE:	YECID CRIOLLO TOPOGRAFIA INTERVENTORIA CONSORCIO SCLV

15.4. P24/CIV8000871/PKID29903/97B-05/: este predio ya fue cobrado en el acta 6:

(P24)-CIV8000871 ANDEN IZQUIERDO PKID 29903 CALLE 40 SUR No. 97 B - 05	12,00	2,18		1,00	26,16

Respuesta: Se elimina cobro de predio, ya fue pagado.

15.5. P13/CIV8000772/PKID29935/40-33/ DESCUENTO: No se indicada a que corresponde el descuento.

Respuesta: Se completa descripción de descuento la cual fue una corrección a un pago realizado en el acta 7.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP12(2) /Filas 97 a 100.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 347.

RECIBO PARCIAL No	8	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	1/5/2023	HASTA	31/5/2023
ÍTEM Nº	NP12	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	240-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-09/	5,95	1,94		1,00	11,54
P33/CIV8001041/PKID29871/40A-09/DESCUENTO CAJA	0,80	0,80		-2,00	-1,28
P33/CIV8001041/PKID29870/40A - 29 SUR/	20,00	1,95		1,00	39,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR PEATONAL HASTA 40-33 SUR PEATONAL POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	3,32	1,90		1,00	6,31
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA / Descuento del Pago en Acta 7	6,00	2,00		-1,00	-12,00
(P13)-CIV8000772 PKID - 29935 DESDE 40-33 SUR VEHICULAR HASTA 40-33 SUR VEHICULAR POR ACTA / Se corrigen dimensiones de pago en acta 7	2,68	1,86		1,00	4,98

16. NP13(3): ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO)

16.1. Falta complementar la ubicación y descripción:

48	29	P13/CIV8000772/PKID/	6,00	2,07	0,200	1,00	2,48

Respuesta: Se completa descripción con base en información suministrada por inspectores de obra XIE e interventoría del informe diario conciliado.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP13(3) /Fila 51
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 363.

RECIBO PARCIAL No	8	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	1/5/2023	HASTA	31/5/2023
ÍTEM Nº	NP13	UNIDAD	M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	412-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO)				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P4/CIV8001069/PKID29872/40B-18 / DESCUENTO CAJILLA	0,35	0,50	0,350	-2,00	-0,12
P4/CIV8001069/PKID29872/KR96A -31 SUR	7,18	1,85	0,400	1,00	5,31
P13/CIV8000772/PKID29934/ 40-28SUR	6,00	2,07	0,200	1,00	2,48

16.2. No debe exceder de los 0.35 m de diseño > 0.16 + 0.20 (Pago en acta 7) = 0.36 m:

Respuesta: se ajusta toda la memoria de tal manera que no se excedan los 0.35m de diseño.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP13(3)
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 362-374.


16.3. Falta indicar “descuento cajillas” o “Descuento por caja de inspección” según sea el caso:

Respuesta: se ajusta toda la memoria indicando tipo de descuento a cada predio.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP13(3)
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 362-374.

16.4. Falta incluir el descuento por caja de inspección, está en el mismo soporte del fresado:

191	172	P32/CIV8000979/PKID29866/96-45 SUR	9,00	2,00	0,200	1,00	3,60

Respuesta: El soporte de informe diario conciliado con interventoría, no indica ningún descuento de caja de inspección.

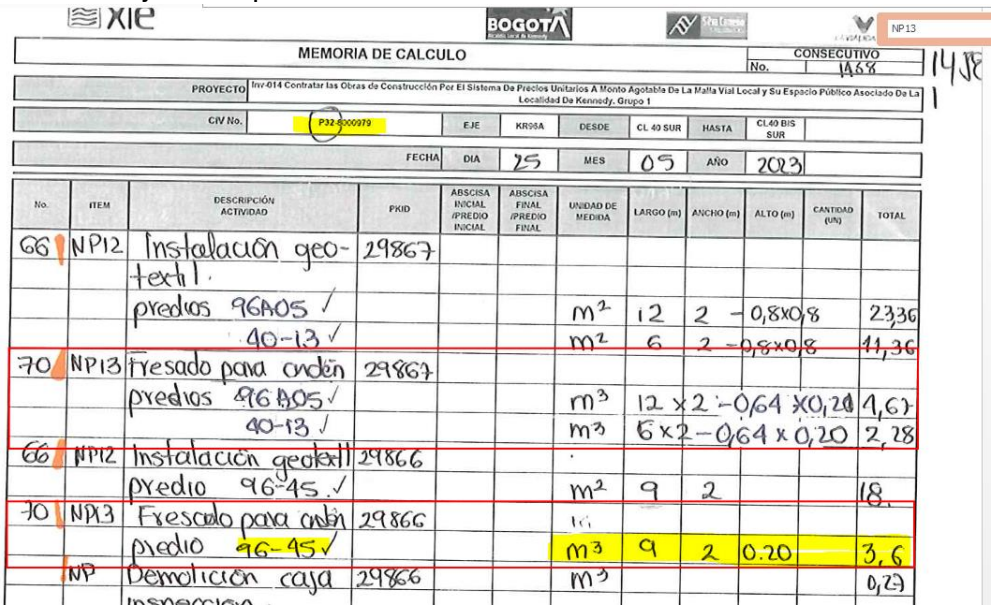

MEMORIA DE CALCULO — CONSECUTIVO No. 1458 — NP13

PROYECTO: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy, Grupo 1

CIV No. P32/8000979 | EJE: KR98A | DESDE: CL 40 SUR | HASTA: CL 40 BIS SUR

FECHA: DIA 25 | MES 05 | AÑO 2023

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PKID	ABSCISA INICIAL /PREDIO INICIAL	ABSCISA FINAL /PREDIO FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD (Un)	TOTAL
66	NP12	Instalacion geo-textil.	29867								
		predios 96A05 ✓				m^2	12	2	-0,8x0,8		2336
		40-13 ✓				m^2	6	2	-0,8x0,8		11,36
70	NP13	Fresado para ondén	29867								
		predios 96A05 ✓				m^3	12 x 2 - 0,64	X0,20			1,67
		40-13 ✓				m^3	6 x 2 - 0,64 x 0,20				2,28
66	NP12	Instalacion geotextil	29866								
		predio 96-45 ✓				m^2	9	2			18.
70	NP13	Fresado para ondén	29866								
		predio 96-45 ✓				m^3	9	2	0.20		3,6
	NP	Demolicion caja	29866			m^3					0,23
		inspeccion									

16.5. Falta complementar la nomenclatura con 40-18 sur:

196	177	P32/CIV8000979/PKID29866/18	12,10	2,00	0,200	1,00	4,84
197	178	P32/CIV8000979/PKID29866/18 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80	0,200	-1,00	-0,13

Respuesta: Se completa nomenclatura.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP13(3) / Filas 196 y 197.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 373,374.

P32/CIV6000979/PKID29567/40-19 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,60	0,60	0,200	-1,00	-0,13
P32/CIV6000979/PKID29566/40-18SUR	12,10	2,00	0,200	1,00	4,84

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLK621 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1

RECIBO PARCIAL No 6 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM N° NP13 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 412-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. (INSTALACIÓN DE FRESADO)

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P32/CIV6000979/PKID29566/40-18 SUR DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,60	0,60	0,200	-1,00	-0,13

17. Ítem NP17: DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

17.1. Falta indicar “descuento cajillas” o “Descuento por caja de inspección” según sea el caso:

Respuesta: se ajusta toda la memoria indicando tipo de descuento a cada predio.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP17
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 417-426.

17.2. P13/CIV8000772/PKID/: No indica la una dirección donde se realiza la actividad.
17.3. P3/CIV8000957/PKID29896/40A08/: Dirección no corresponde con la prioridad.


Respuesta: No se cobran dichas prioridades en item descrito.

18. Ítem NP29: PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

18.1. Verificar el PKID, porque no corresponde con la prioridad:

69	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-52/	1,10	1,10		-1,00	-1,21
70	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-28/	2,94	1,95		1,00	5,73
71	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-33 SUR/	2,80	1,86		1,00	5,21
72	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-45/	3,18	1,83		1,00	5,82
73	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-45/	1,10	1,10		-1,00	-1,21
74	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-51/	3,09	1,86		1,00	5,75
75	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-51/	0,70	0,70		-1,00	-0,49
76	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-51/	0,40	0,25		-1,00	-0,10
77	P21/CIV8000821/PKID29920/40-10SUR/	3,02	2,12		1,00	6,40

Respuesta: Se corrigen PKID de acuerdo a prioridad correspondiente.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP29/ Filas 68-77.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 495.

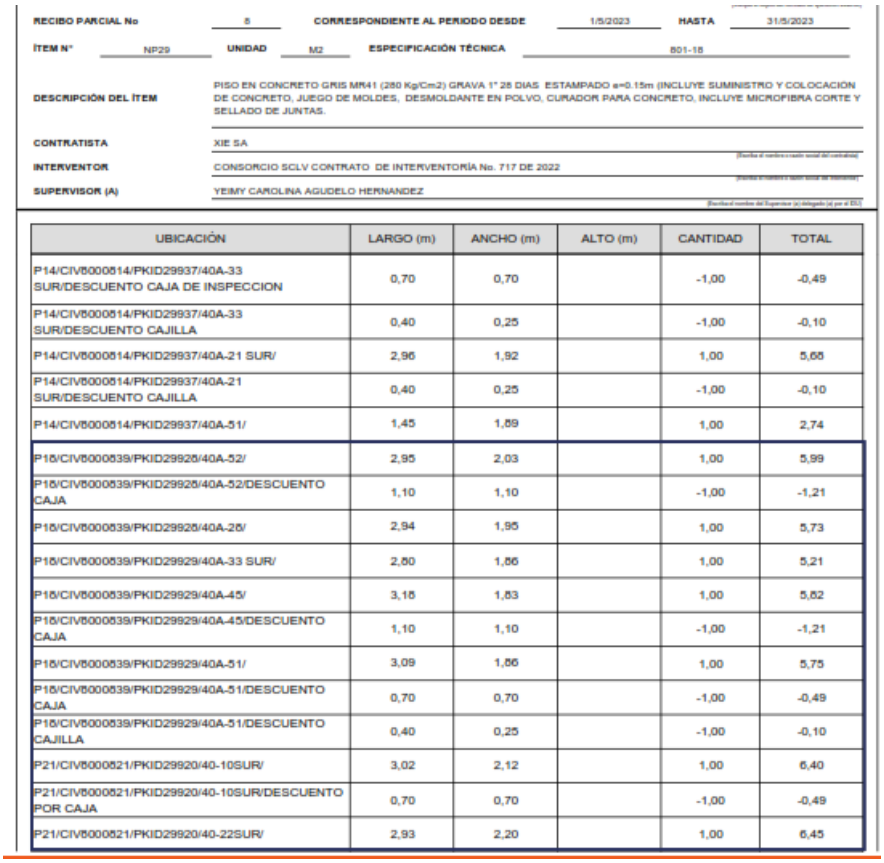

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM N° NP29 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 801-18

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE MICROFIBRA CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-33 SUR/DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-33 SUR/DESCUENTO CAJILLA	0,40	0,25		-1,00	-0,10
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-21 SUR/	2,96	1,92		1,00	5,66
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-21 SUR/DESCUENTO CAJILLA	0,40	0,25		-1,00	-0,10
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-51/	1,45	1,89		1,00	2,74
P18/CIV8000839/PKID29926/40A-52/	2,95	2,03		1,00	5,99
P18/CIV8000839/PKID29926/40A-52/DESCUENTO CAJA	1,10	1,10		-1,00	-1,21
P18/CIV8000839/PKID29926/40A-26/	2,94	1,95		1,00	5,73
P18/CIV8000839/PKID29929/40A-33 SUR/	2,80	1,86		1,00	5,21
P18/CIV8000839/PKID29929/40A-45/	3,18	1,83		1,00	5,82
P18/CIV8000839/PKID29929/40A-45/DESCUENTO CAJA	1,10	1,10		-1,00	-1,21
P18/CIV8000839/PKID29929/40A-51/	3,09	1,86		1,00	5,75
P18/CIV8000839/PKID29929/40A-51/DESCUENTO CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P18/CIV8000839/PKID29929/40A-51/DESCUENTO CAJILLA	0,40	0,25		-1,00	-0,10
P21/CIV8000821/PKID29920/40-10SUR/	3,02	2,12		1,00	6,40
P21/CIV8000821/PKID29920/40-10SUR/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P21/CIV8000821/PKID29920/40-22SUR/	2,93	2,20		1,00	6,45

18.2. Falta indicar “descuento cajillas” o “Descuento por caja de inspección” según sea el caso:

46	P13/CIV8000772/PKID29934/40-22/	0,70	0,70		-1,00	-0,49
47	P13/CIV8000772/PKID29934/40-22/	0,40	0,25		-1,00	-0,10
69	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-52/	1,10	1,10		-1,00	-1,21
73	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-45/	1,10	1,10		-1,00	-1,21
75	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-51/	0,70	0,70		-1,00	-0,49
76	P18/CIV8000839/PKID29934/40A-51/	0,40	0,25		-1,00	-0,10
122	P29/CIV8000996/PKID29888/40A-10/	0,80	0,80		-1,00	-0,64
125	P29/CIV8000996/PKID29889/40A-15/	0,80	0,80		-1,00	-0,64

Respuesta: se ajusta toda la memoria indicando tipo de descuento a cada predio.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP29
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag. 493-500.

19. Ítem NP30: PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

19.1. Verificar el PKID, porque no corresponde con la prioridad:

30	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-60/	6,25	2,00		1,00	12,5
31	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-60/DESCUENTO	6,25	0,20		-1,00	-1,2
32	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-60/DESCUENTO BORDILLO	1,40	0,20		-1,00	-0,2
33	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-60/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,4
34	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-60/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,1
35	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-54/	6,00	2,03		1,00	12,1
36	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-54/DESCUENTO	6,00	0,20		-1,00	-1,2
37	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-54/DESCUENTO BORDILLO	5,30	0,20		-1,00	-1,0
38	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-54/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,4
39	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-54/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,1
40	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-46/	6,00	0,87		1,00	5,2
41	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-46/	4,80	0,67		1,00	3,2
42	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-46/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,1
43	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-04/	6,80	1,94		1,00	13,1
44	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-04/DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,70	0,70		-1,00	-0,4
45	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-04/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,1
46	P3/CIV8000957/PKID29996/40A-04/DESCUENTO	1,20	0,28		-1,00	-0,3

Página 1

Respuesta: Se corrigen PKID de acuerdo a prioridad correspondiente.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP30/ Filas 30-46.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.529.

RECIBO PARCIAL No 8 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/5/2023 **HASTA** 31/5/2023

ÍTEM Nº NP30 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 801-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022

SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-60/	6,25	2,00		1,00	12,50
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-60/DESCUENTO	6,25	0,20		-1,00	-1,25
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-60/DESCUENTO BORDILLO	1,40	0,20		-1,00	-0,28
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-60/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-60/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,18
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-54/	6,00	2,03		1,00	12,18
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-54/DESCUENTO	6,00	0,20		-1,00	-1,20
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-54/DESCUENTO BORDILLO	5,30	0,20		-1,00	-1,06
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-54/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-54/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,18
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-46/	6,00	0,87		1,00	5,22
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-46/	4,80	0,67		1,00	3,22
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-46/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,18
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-04/	6,80	1,94		1,00	13,19
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-04/DESCUENTO CAJA DE INSPECCION	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-04/DESCUENTO CAJILLAS	0,35	0,50		-1,00	-0,18
P3/CIV8000957/PKID29696/40A-04/DESCUENTO	1,20	0,28		-1,00	-0,34
P3/CIV8000957/PKID29697/40A-03/	1,25	0,90		1,00	1,13
P3/CIV8000957/PKID29697/40A-03/	1,46	0,90		1,00	1,31
P3/CIV8000957/PKID29697/40A-03/	2,90	0,90		1,00	2,61
P3/CIV8000957/PKID29697/40A-09/	1,00	0,90		1,00	0,90
P3/CIV8000957/PKID29697/40A-09/	1,30	1,10		1,00	1,43
P3/CIV8000957/PKID29697/40A-09/	2,64	0,90		1,00	2,38

.

19.2. Falta indicar “descuento cajillas” o “Descuento por caja de inspección” según sea el caso:


Respuesta: se ajusta toda la memoria indicando tipo de descuento a cada predio.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP30
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.529-539

19.3. Decimales ocultos que afectan la operación:

22	P14/CIV8000814/PKID29937/40A-57/	3,7950	2,18		1,00	8,27
23	P14/CIV8000814/PKID29937/40A-57/DESCUENTO CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
24	P14/CIV8000814/PKID29937/40A-51/	3,80	2,18		1,00	8,27

Respuesta: Se ajusta medidas para cobro de cantidad según soporte de informe diario.

Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP30/Filas 122 y 124
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.533.

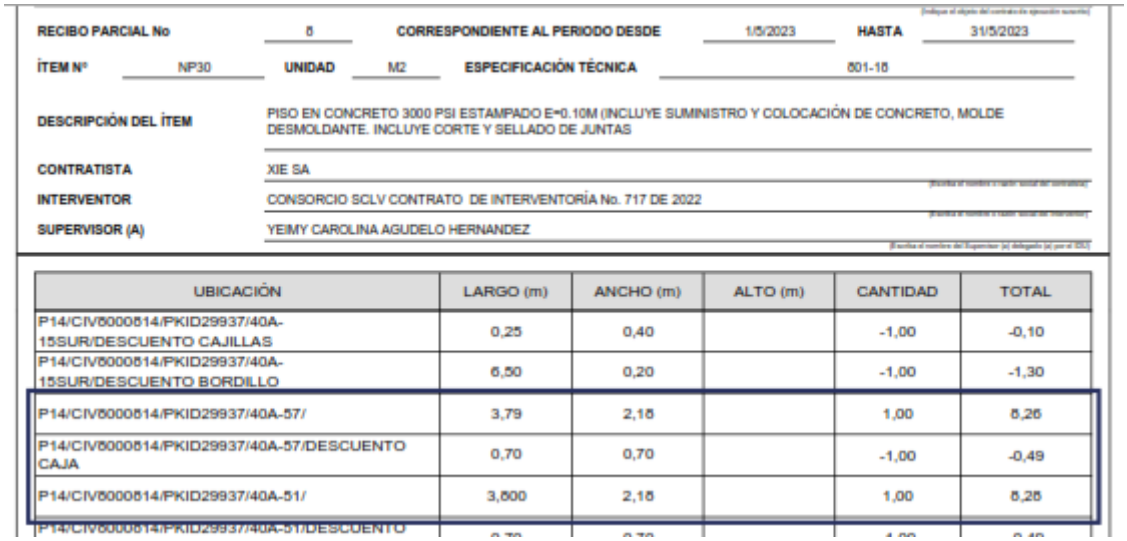

RECIBO PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/5/2023 HASTA 31/5/2023

ÍTEM Nº NP30 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 601-16

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

CONTRATISTA XIE SA

INTERVENTOR CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022


SUPERVISOR (A) YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-15SUR/DESCUENTO CAJILLAS	0,25	0,40		-1,00	-0,10
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-15SUR/DESCUENTO BORDILLO	6,50	0,20		-1,00	-1,30
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-57/	3,79	2,16		1,00	8,26
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-57/DESCUENTO CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-51/	3,800	2,16		1,00	8,26
P14/CIV8000814/PKID29937/40A-51/DESCUENTO					

19.4. Revisar acumulado y saldo contra el balance:

248	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	578,25
249	TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
250	CANTIDAD CONTRACTUAL	0,00
251	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	578,25
252	TOTAL POR EJECUTAR	-578,25

Respuesta: Se ajustan acumulados de item.
Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP30
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.539.

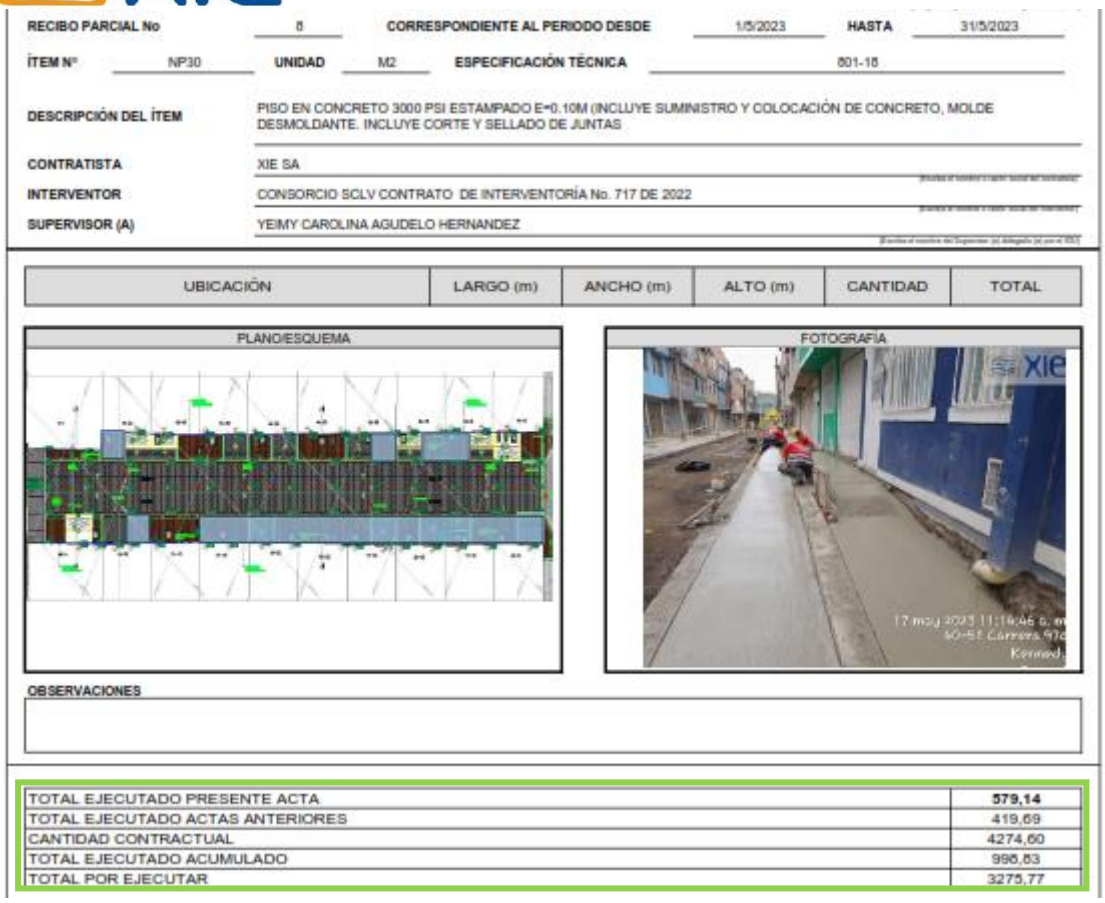

RECIBO PARCIAL No	8	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	1/5/2023	HASTA	31/5/2023
ÍTEM Nº	NP30	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	601-18
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL


PLANO/ESQUEMA

FOTOGRAFIA

OBSERVACIONES

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	579,14
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	419,69
CANTIDAD CONTRACTUAL	4274,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	996,83
TOTAL POR EJECUTAR	3275,77

19.5. Error de digitación.



112	2TSUR/DESCUENTO CAJILLAS	83	2TSUR/DESCUENTO CAJILLAS	0,25	0,40	-1,00	-0,10
113	P14/CIV8000814/PKID2933T/40A-2TSUR/DESCUENTO BORDILLO	84	P14/CIV8000814/PKID2933T/40A-2TSUR/DESCUENTO BORDILLO	4,30	0,20	-1,00	-0,86
114	P14/CIV8000814/PKID2933T/40A-21SUR/	85	P14/CIV8000814/PKID2933T/40A-21SUR/	1,,49	1,82	1,00	1,82
	P14/CIV8000814/PKID2933T/40A-	86	P14/CIV8000814/PKID2933T/40A-	0,25	0,40	-1,00	-0,10

Respuesta: Se corrige error de digitación.


Excel > INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx / Pestaña NP30/ Fila 114.
PDF > Memorias de calculo_Mayo.pdf / Pag.532.

RECIBO PARCIAL No	6	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE**	1/5/2023	**HASTA**	31/5/2023
ÍTEM Nº	NP30	**UNIDAD**	M2	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	501-16
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE. INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS				
CONTRATISTA	XIE SA				
INTERVENTOR	CONSORCIO SCLV CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 717 DE 2022				
SUPERVISOR (A)	YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ				

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-39SUR/DESCUENTO CAJILLA	0,25	0,40		-1,00	-0,10
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-39SUR/DESCUENTO CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV6000614/PKID29937/97F-16SUR/	5,92	2,08		1,00	12,31
P14/CIV6000614/PKID29937/97F-16SUR/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV6000614/PKID29936/40A-32/	3,05	2,15		1,00	6,56
P14/CIV6000614/PKID29936/40A-32/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV6000614/PKID29936/40A-32/DESCUENTO CAJILLAS	0,25	0,40		-1,00	-0,10
P14/CIV6000614/PKID29936/40A-46SUR/	2,95	2,15		1,00	6,50
P14/CIV6000614/PKID29936/40A-46SUR/DESCUENTO CAJILLAS	0,25	0,40		-1,00	-0,10
P14/CIV6000614/PKID29936/40A-46SUR/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-45SUR/	3,00	1,85		1,00	5,64
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-45SUR/DESCUENTO CAJILLAS	0,25	0,40		-1,00	-0,10
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-27SUR/	6,32	1,97		1,00	12,45
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-27SUR/DESCUENTO POR CAJA	0,70	0,70		-1,00	-0,49
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-27SUR/DESCUENTO CAJILLAS	0,25	0,40		-1,00	-0,10
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-27SUR/DESCUENTO BORDILLO	4,30	0,20		-1,00	-0,86
P14/CIV6000614/PKID29937/40A-21SUR/	1,49	1,82		1,00	2,71

19.6. Falta incluir el valor mensual del PMT.

Respuesta: Incluido en preacta ajustada y anexos de radicado.



Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **DC**
Anexo: 1. INFORME 8-MAYO DE 2023-COP621-2022-XIESA. xlsx
2. Memorias de calculo_Mayo.pdf
3. OFICIO KNXIE22-621-773.pdf
4. Calificaciones y laboratorio
Con copia: Archivo
