BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 7 de julio 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62 - CVK 22

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimento # 39-FDLK.

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Arturo Zarate M.			X						X	SCLV INTERV,	arturozarate1@yahoo.com	315	
Jorge E. Tamayo M.			X						X	SCLV Interv. Financiera	kennedy.financiera@gmail.com	317.4410997	
Martha Rodríguez H			X						X	CVK 22	cvksocial@gmail.com	3114883	
Carlos E Salazar			X						X	CVK22.SST@gmail.com	CVK22.SST@gmail.com	314330	
Adriana Casho Alba			X						X	CVK 22 -	CVK22ambientalb@gmail.com	3033911	
Wisa James Rodriguez.			X						X	SCLV interventoria - Social	saralguz.fdlk@gmail.com	3214357623	
Sandra Gonzalez			X						X	SCLV Interventoria - SST	sstkennedy@outlook.com	3178935803	
Yarnet Claro Peñaranda			X							scl Vinterventoria - Amb	Yaretclaro3@gmail.com	3143955825	
Danilo Buitrago			X						X	CVK 22	cvkresidente2@gmail.com	3104769300	
Gladys Sarita Molina P.			X						X	CVK22 - Contratista	cvk22.director@gmail.com	3004938576	
Héctor Maldonado Barrio			X						X	CVK22 - Contratista	gerencia@aiegroup.co	3188590	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 07/Julio/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 02

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 39 CIN-717-2022 / COP-690-2022

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Oswaldo Ludino Chaves			X						X	SCLV - INTELVENTORÍA	dir-viales@silcarra.com.co	3103178077	
Juan Manuel Silva R			X						X	SCLV-Interventoría	Gerencia@LVL.com	3107671842	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Laura Daniela Díaz			X							SCLV - Interventoría	dlauri0898@gmail.com	3168270441	
Karen Jaketh Perales Ramírez			X							SCLV - Interventoría	u233sclvkennedy@outlook.com	3143253124	
Anyeli Curiel Acosta			X							SCLV - Interventoría	u233sclvkennedy@outlook.com	3227401848	

CONSENTIMIENTO: El(la) firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:50 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

La Interventoría manifiesta que, cuando se cambia de etapa, entre etapa 1 y etapa 2, es porque se han terminado las actividades de la etapa anterior, en principio el Contratista tenia ciertas actividades de la etapa 1 que incluía el monoblock, pero la instalación del monoblock la están ejecutando en la etapa 2, lo cual no fue informado a la Interventoría. El Contratista indica que, no se informó a la Interventoría del cambio del procedimiento constructivo porque no se sabía que habían definidas unas etapas, simplemente que, para pasar de vía a andenes, se tiene que asegurar que la vía esté conformada y darle el transito a las personas por esa vía e iniciar a intervenir los andenes. Por lo anterior, se solicita al Contratista que si va a cambiar de sistema constructivo se notifique a la Interventoría para conocimiento.

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que, de los 50 CIVs, hay 26 que cuentan con permiso:

- 12 CIVs en etapa 1
- 12 CIVs en etapa 2
- 0 en etapa 3
- P81 y P82 no cuentan con PMT vigente desde el 15 de junio de 2023

El Contratista informa que:

- No puede solicitar el PMT de la prioridad 82 porque la prioridad 56 restringe dicho PMT, así las cosas, se da por terminado este CIV.
- De movistar solicitaron enviar planos referenciando la ubicación de la cámara y que cuando se vaya a intervenir la otra vía, ellos se encargan de realizar la adecuación. El Contratita enviará lo solicitado a Movistar para que den respuesta por escrito.
- De las prioridades 81 y 82 hacen falta los sumideros, la esquina donde está la cámara de movistar en asfalto y bolardos. En cuanto a sumideros, el Contratista indica que aproximadamente para el 19 de julio de 2023 estarían listos.

La Interventoría indica que:

- Se solicitaron 11 CIVs para cambio de etapa y 1 para iniciar la etapa 1, al final quedaron 11 CIVs para etapa 1, 4 para etapa 2 y 9 para etapa 3.
- El Contratista no ha atendido las observaciones por interferencia en obras de la Av. Cali del PMT para la prioridad 92 realizadas por la SDM y se le recuerda que tiene hasta el 14 de julio de 2023 para dar respuesta a la SDM, de lo contrario, se debe radicar nuevamente. El Contratista indica que, se hará un acercamiento con el Contratista para evaluar que tanto es la afectación y coordinar el PMT si es posible desviar por otro lado para poder intervenir el CIV.
- Quedan 23 CIVS de los cuales no se ha solicitado ningún permiso, para la próxima semana se tiene programado solicitar PMT de las prioridades 90, 78,57,91,55,85,84,83. Con relación a lo anterior, el FDLK solicita que los especialistas de espacio público realicen un chequeo de los diseños de estas prioridades para

verificar si el espacio público está cumpliendo con las pendientes, y evaluar la solución para los puntos donde las pendientes sean elevadas.

- El viernes 14 de julio de 2023 se realizará recorrido de obra con especialista de espacio público de Interventoría y Contratista.

Componente Social

El Contratista informa que:

- Se tienen 4 PQRSD abiertas
- El Informe mensual No. 9 se encuentra en atención de observaciones.
- El viernes se llevó a cabo el comité veedor FDLK, desde la Interventoría se brindaron algunas recomendaciones al área técnica del contratista con el fin de que se aproveche el espacio para comentar a la comunidad los inconvenientes que se están evidenciando en campo.
- El lunes 10 de julio de 2023 se inicia con cerramiento e instalación de PMT en la prioridad 79, se avisó a la comunidad y se hicieron las actas de suspensión de garaje.
- El 8 de julio de 2023 se realizará capacitación sobre estilo de vida saludable con el personal de obra

Adicionalmente, el Contratista manifiesta que, la calificación de la última semana de junio se afectó en un ítem, dado que, no se informó a la comunidad con antelación sobre la instalación del asfalto en horario nocturno, pero el Contratista manifiesta que no se avisó debido a que no estaba programado instalar asfalto en horas de la noche, pero se presentaron algunos retrasos, lo cual llevo a la extensión del horario para esta actividad. Por su parte, la Interventoría reevaluara la calificación, teniendo en cuenta que se debió a una contingencia.

Sin embargo, este ítem también se afectó debido a la divulgación de volantes de inicio de actividades en uno de los frentes, puesto que no cumplieron con la fecha de apertura de uno de los CIVs. Por lo anterior, y para que no se vea afectada la calificación se sugiere al Contratista entregar volantes por frentes y con una sola fecha de inicio.

El oficio de solicitud de permiso para trabajos nocturnos se radicó a la alcaldía el 28 de octubre de 2023 con radicado de ventanilla virtual 20224213546852, pero el Contratista manifiesta que no ha recibido respuesta por parte de la Alcaldía.

Componente SST

Informe semanal 39: Aprobado
Informe mensual 8: Observado y el lunes radicarían a la Interventoría está atención de observaciones
Informe mensual 9: En elaboración, se entregarían a la Interventoría el miércoles
Ingresos: 1
Retiros: 3
Ausentismo: 4,58%

Componente Ambiental

Informe semanal 39: Aprobado

Informe mensual 8: Observado
Informe mensual 9: Observado
Calificación: 100%

<u>Programación</u>
La Interventoría informa que:

- La desviación es de 45.65% con respecto a la programación inicial.
- Revisando la programación enviada en enero, se evidencia que hay 9 CIVs que no están incluidos dentro de la programación, como por ejemplo la prioridad 74, por lo tanto, cuando se compara el avance ejecutado con el avance de la programación, no se tiene avance porque en la programación no se encuentra ese CIV.
- Con respecto al último balance que radicaron en abril, no se incluyeron las prioridades 54 y 87.

Desde el apoyo a la supervisión se solicita al Contratista entregar el ajuste a la programación, donde efectivamente se pueda reflejar la realidad de la obra. Por su parte el Contratista manifiesta que, no se puede realizar el ajuste a la programación inicial debido al proceso sancionatorio que está en curso.

Por lo anterior, el FDLK solicita al Contratista, presentar un insumo donde se detallen las actividades de obra que van a ejecutar día a día y como tienen programado la intervención de cada segmento vial, teniendo en cuenta que no hará el ajuste a la programación por el sancionatorio que presenta.

<u>Diseño Geométrico</u>

La Interventoría manifiesta que, se solicitó al Contratista remitir los volúmenes teóricos como marco de referencia, de esta manera determinar si está dentro de la tolerancia, en caso de que no se hace la justificación. Además, en febrero para poder establecer un valor, se acordaron unos volúmenes teóricos como marco de referencia y se corrieron las secciones transversales con la estructura de pavimentos que en ese momento se había definido y se sacaron las cantidades y en función de eso se validaron las cantidades, pero, la estructura cambio y se necesitan los diseños definitivos ajustados y correr con la estructura definitiva. El Contratista solo hizo entrega de 19 CIVs con la nueva estructura y con los diseños ajustados, se solicita entregar todos los CIVs con su diseño ajustado. El Contratista solicita mesa de trabajo con especialista de la Interventoría para definir los volúmenes.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Cronograma de actividades de obra	CVK22	11-jul-23
4	Alcance al NP 31- Sumidero con su respectivo soporte	CVK22	12-jul-23
3	Cantidades de diseño geométrico de los 50 CIVs	CVK22	12-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 13 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.39

Fecha: 7 de julio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	6-jul-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	6-jul-23	NO
3	Justificación de volumen de fresado no reportado en informes mensuales AM*.	Contratista	28-jun-23 Radico el 30-jun-23	SI
4	Carta de CEMEX donde manifieste que no cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	Contratista	6-jul-23	NO
5	Póliza extracontractual maquinaria y equipo (daños a terceros). Investigar si aplica para el contrato.	Contratista	6-jul-23	NO
6	Tapas de cajas de inspección de monoblock	Contratista	6-jul-23	NO
7	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	Contratista	6-jul-23	NO
8	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	6-jul-23	NO
9	Alcance a la radicación NP-31 sumidero	Contratista	6-jul-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales junio:** En revisión				
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Observado				
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** Observada				
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar				
- **Calificación semanal:** 95%				
- **Calificación mes de junio:**87%				
B. SST				
- **Informe semanal 39:** Aprobado				


-	**Informe Mensual 8 (mayo)**: Observado
-	**Ingresos en la semana:** 1
-	**Retiros en la semana:** 3
-	**Calificación semanal:** 100%
-	**Calificación del mes de junio:**98.75%
C.	**Ambiental**
-	**Informe semanal 39:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8 (mayo):** Observado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Observado
-	**Calificación semanal:** 100%
-	**Calificación mes de junio:**98.75%
D.	**Gestión Social**
-	**Informe semanal 39:** Aprobado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Observado
-	**Calificación semanal:** 100%
-	**Calificación mes de junio:**99%
Varios	
Obra	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Instalación de mezcla asfáltica **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
82	8005078	**Calzada:** Instalación de mezcla asfáltica **Andén oriental:** Terminación cajas **Andén occidental:** Terminación cajas
60	8002162	**Calzada:** Excavación manual para sumideros. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
61	8002265	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental**: Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Vaciado de concreto 3000 psi **Andén occidental:** Se realiza la instalación de geotextil y fresado.
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad. **Andén norte:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén sur: Sin actividad.
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Se realiza instalación de concreto 3000 **Andén sur:** Sin actividad.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se inicia con demolición y excavación manual **Andén occidental:** Sin actividad
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual **Andén occidental:** Sin actividad**.**
66	8001876	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental: E**xcavación manual e instalación de fresado. **Andén occidental: E**xcavación manual e instalación de fresado e instalación de concreto 3000.
44	8004757	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado.
50	8004663	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
68	8001715	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual
69	8001823	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual
70	8001657	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
71	8001771	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad**.** **Anden occidental:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
49	8004816	**Calzada:** Se realiza la instalación de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
48	8004699	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
56	8004947	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
89	8001841	**Calzada:** Se realiza apertura de civ e inicia con excavación mecánica. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad


GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

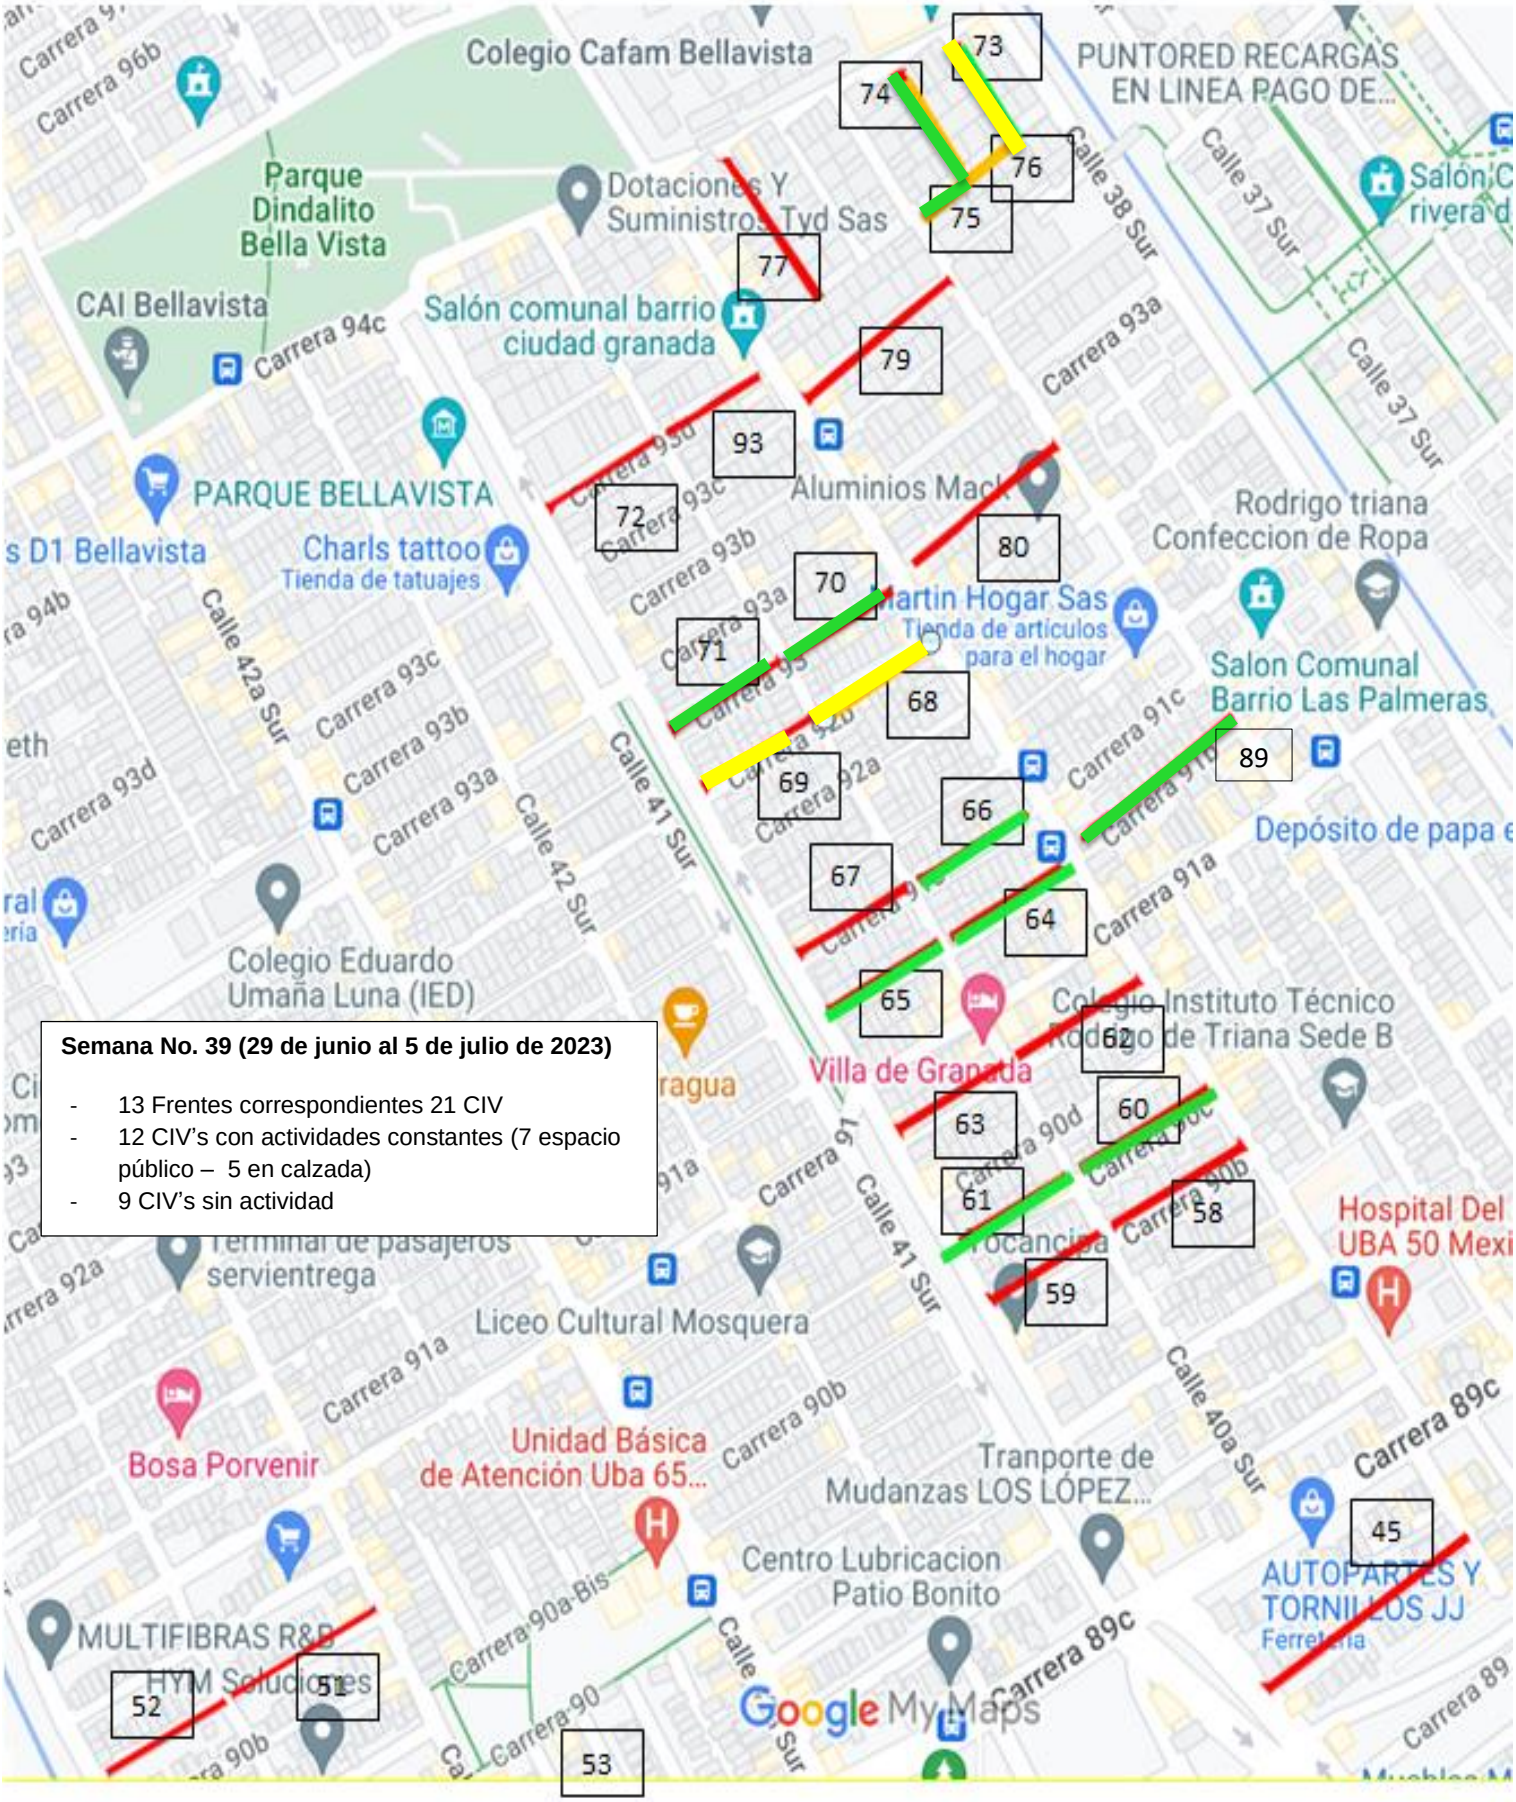

Semana No. 39 (29 de junio al 5 de julio de 2023)

- 13 Frentes correspondientes 21 CIV
- 12 CIV's con actividades constantes (7 espacio público – 5 en calzada)
- 9 CIV's sin actividad

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

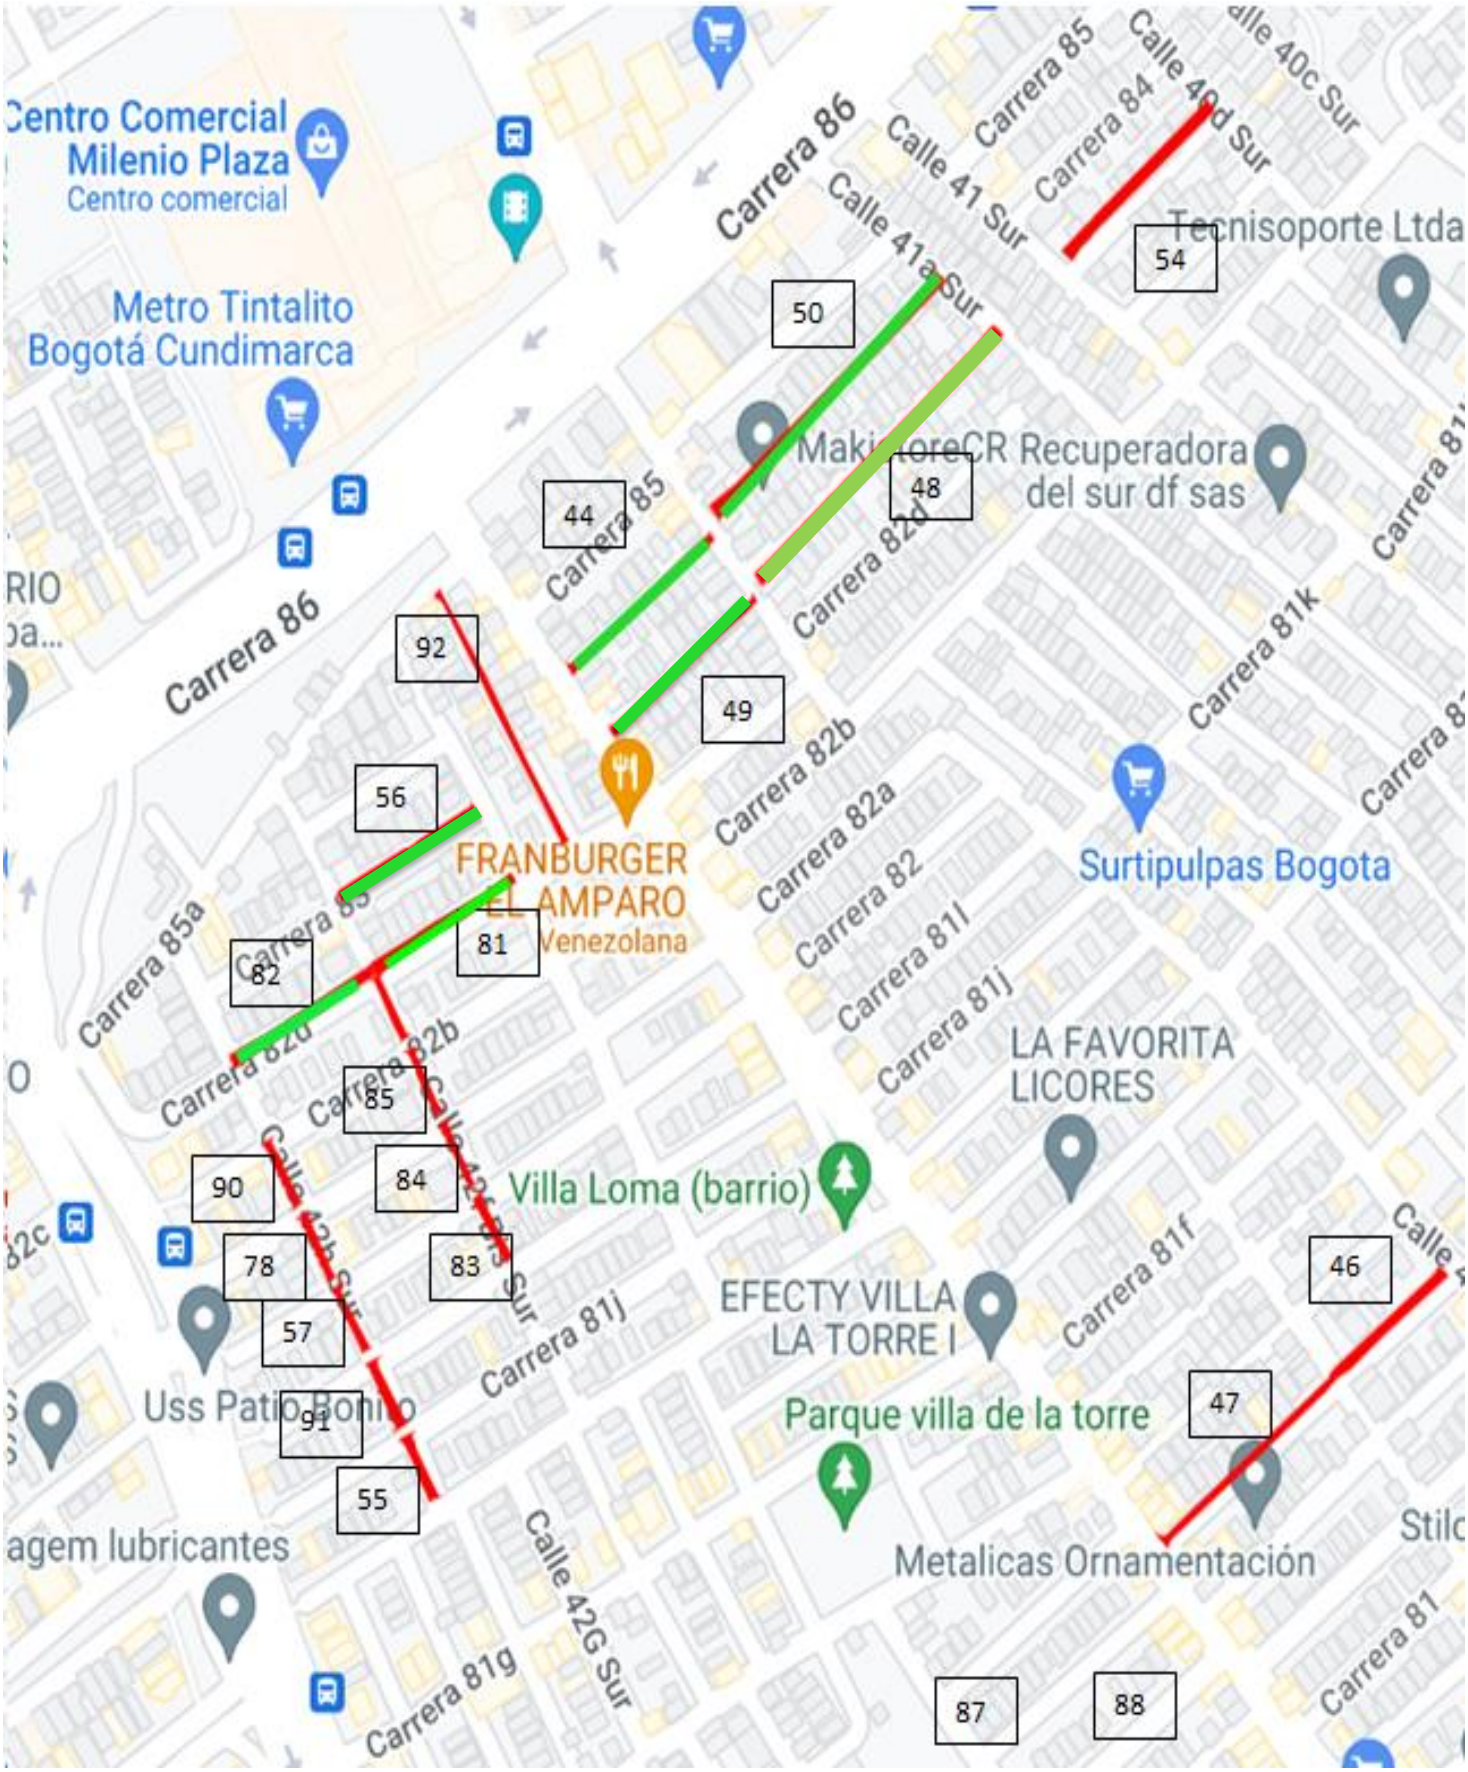

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

| PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 44 | | | 50 | | | 60 | | | 61 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 68 | | | 69 | | | 71 | | | 70 | | | 49 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 81 | | | 82 | | | 48 | | 56 | | | 89 | | |
|---|---|---





CONSORCIO SCLV
NIT 900.547.145-2

GRUPO 2 COP-690-22



			SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 4-JULIO-2023					
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
81	8005000	$ 331.062.908,00	$ 493.706.016,00	2,83%	$ 307.829.014,10	1,76%	92,98%	-1,07%
82	8005078	$ 343.085.920,00	$ 479.749.662,00	2,75%	$ 332.182.707,83	1,90%	96,82%	-0,85%
60	8002162	$ 320.721.252,00	$ 514.640.546,00	2,95%	$ 268.879.408,07	1,54%	83,84%	-1,41%
61	8002265	$ 355.199.128,00	$ 460.559.675,00	2,64%	$ 342.108.113,38	1,96%	96,31%	-0,68%
65	8002008	$ 360.580.405,00	$ 432.646.968,00	2,48%	$ 336.556.828,81	1,93%	93,34%	-0,55%
64	8001931	$ 376.367.569,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 323.585.893,13	1,85%	85,98%	-0,69%
73	8001148	$ 285.710.532,00	$ 338.441.580,00	1,94%	$ 269.281.829,64	1,54%	94,25%	-0,40%
76	8001183	$ 146.013.903,00	$ 233.768.926,00	1,34%	$ 120.970.675,38	0,69%	82,85%	-0,65%
75	8001223	$ 144.206.710,00	$ 183.177.144,00	1,05%	$ 97.870.154,88	0,56%	67,87%	-0,49%
74	8001184	$ 347.413.004,00	$ 0,00	0,00%	$ 281.327.500,09	1,61%	80,98%	1,61%
70	8001657	$ 342.553.149,00	$ 394.266.995,00	2,26%	$ 32.050.753,20	0,18%	9,36%	-2,08%
66	8001876	$ 318.216.103,00	$ 430.902.424,00	2,47%	$ 169.063.757,16	0,97%	53,13%	-1,50%
44	8004757	$ 544.689.706,00	$ 416.946.070,00	2,39%	$ 224.452.888,05	1,29%	41,21%	-1,10%
62	8002055	$ 443.969.911,00	$ 497.195.104,00	2,85%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,85%
68	8001715	$ 351.516.714,00	$ 413.456.981,00	2,37%	$ 45.055.465,96	0,26%	12,82%	-2,11%
71	8001771	$ 361.446.034,00	$ 429.157.879,00	2,46%	$ 69.339.454,86	0,40%	19,18%	-2,06%
69	8001823	$ 341.507.411,00	$ 443.114.233,00	2,54%	$ 142.935.819,28	0,82%	41,85%	-1,72%
63	8002132	$ 301.695.957,00	$ 436.136.056,00	2,50%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,50%
50	8004663	$ 770.232.864,00	$ 435.825.915,07	2,50%	$ 108.722.072,80	0,62%	14,12%	-1,88%
77	8001285	$ 564.687.707,00	$ 452.069.559,93	2,59%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,59%
79	8001390	$ 629.262.662,00	$ 464.630.278,98	2,66%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,66%
92	8004910	$ 456.639.023,00	$ 546.042.342,00	3,13%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,13%
67	8001968	$ 386.650.290,00	$ 427.413.335,00	2,45%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,45%
59	8002331	$ 360.017.625,00	$ 439.625.145,00	2,52%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-2,52%
58	8002225	$ 370.268.458,00	$ 523.363.268,00	3,00%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-3,00%
56	8004947	$ 377.475.477,00	$ 444.858.777,00	2,55%	$ 26.671.750,29	0,15%	7,07%	-2,40%
80	8001581	$ 584.822.489,00	$ 224.522.841,77	1,29%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,29%
72	8001545	$ 348.655.292,00	$ 185.929.646,71	1,07%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-1,07%
49	8004816	$ 479.216.394,00	$ 0,00	0,00%	$ 36.274.647,29	0,21%	7,57%	0,21%
48	8004699	$ 983.197.315,00	$ 157.008.980,33	0,90%	$ 46.304.089,49	0,27%	4,71%	-0,63%
93	8001427	$ 321.630.570,00	$ 102.036.453,24	0,58%	$ 0,00	0,00%	0,00%	-0,58%
89	8001841		$ 101.432.785,61	0,58%		0,00%	0,00%	-0,58%
TOTALES			**$ 11.545.739.820,64**	**66,18%**	**$ 3.581.462.823,68**	**20,53%**		**-45,65%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17.445.442.250,00**					

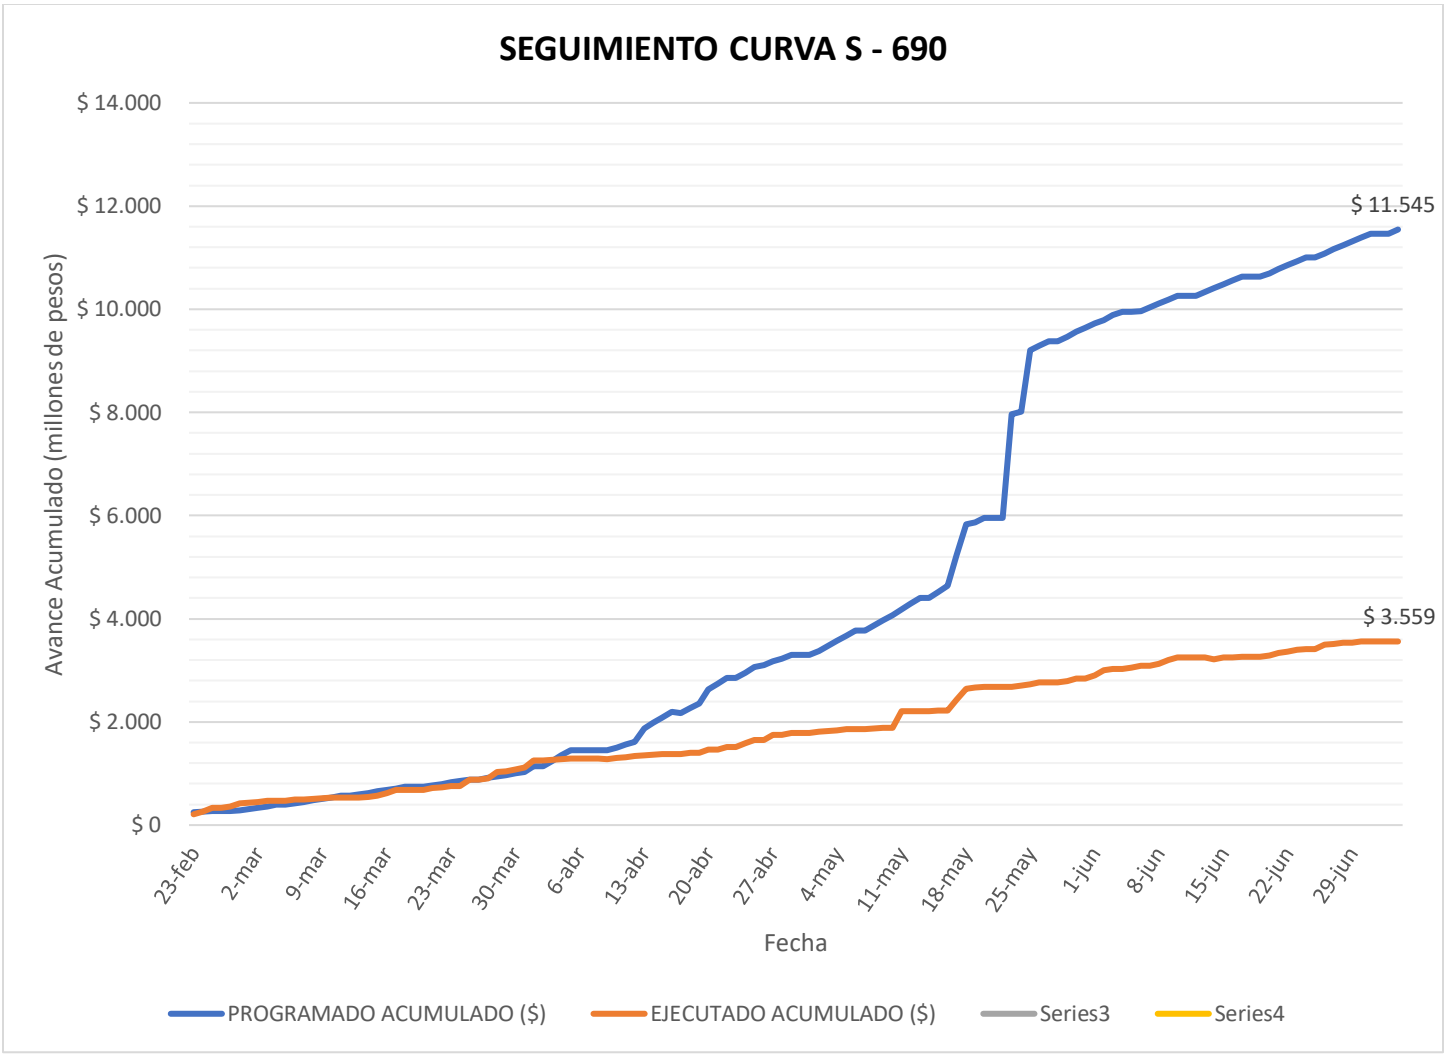
SEGUIMIENTO CURVA S - 690
$ 14.000
$ 12.000
$ 10.000
$ 8.000
$ 6.000
$ 4.000
$ 2.000
$ 0
Avance Acumulado (millones de pesos)
$ 11.545
$ 3.559
23-feb
2-mar
9-mar
16-mar
23-mar
30-mar
6-abr
13-abr
20-abr
27-abr
4-may
11-may
18-may
25-may
1-jun
8-jun
15-jun
22-jun
29-jun
Fecha
PROGRAMADO ACUMULADO ($)
EJECUTADO ACUMULADO ($)
Series3
Series4

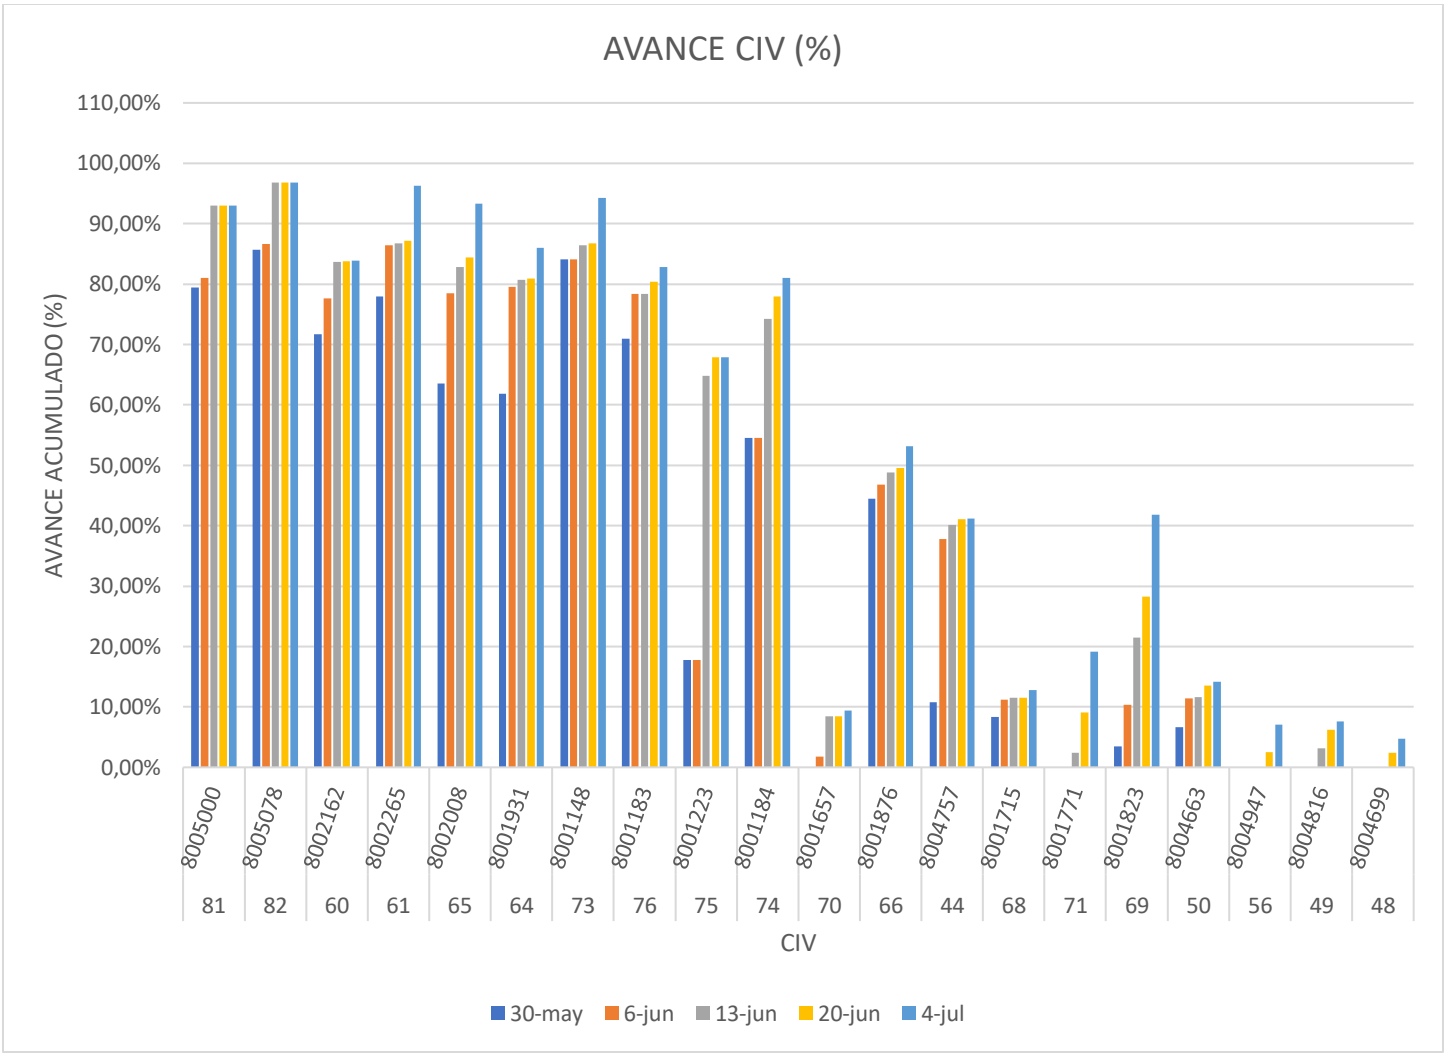
AVANCE CIV (%)
AVANCE ACUMULADO (%)
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
8005000
8005078
8002162
8002265
8002008
8001931
8001148
8001183
8001223
8001184
8001657
8001876
8004757
8001715
8001771
8001823
8004663
8004947
8004816
8004699
81
82
60
61
65
64
73
76
75
74
70
66
44
68
71
69
50
56
49
48
CIV
30-may
6-jun
13-jun
20-jun
4-jul



CONSORCIO
SCLV
NIT 900.547.145-2



EVALUACIÓN PROGRAMACION INICIAL- GRUPO 2 COP-690-22

FECHA EVALUACIÓN			6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	66,37%	76,51%	92,98%	92,98%	92,98%
82	8005078	$ 343.085.920,00	78,05%	92,57%	96,82%	96,82%	96,82%
60	8002162	$ 320.721.252,00	55,79%	63,71%	83,78%	83,84%	83,84%
61	8002265	$ 355.199.128,00	73,98%	76,66%	87,19%	96,31%	96,31%
65	8002008	$ 360.580.405,00	66,01%	74,80%	84,39%	93,34%	93,34%
64	8001931	$ 376.367.569,00	64,41%	66,02%	80,95%	84,23%	85,98%
73	8001148	$ 285.710.532,00	64,29%	70,45%	86,80%	94,25%	94,25%
76	8001183	$ 146.013.903,00	51,30%	55,34%	80,41%	82,47%	82,85%
75	8001223	$ 144.206.710,00	25,77%	25,77%	67,87%	67,87%	67,87%
74	8001184	$ 347.413.004,00	44,54%	44,86%	77,97%	80,98%	80,98%
70	8001657	$ 342.553.149,00	1,79%	10,86%	8,40%	9,36%	9,36%
66	8001876	$ 318.216.103,00	30,99%	31,11%	49,56%	52,05%	53,13%
44	8004757	$ 544.689.706,00	41,20%	41,20%	41,13%	41,13%	41,21%
62	8002055	$ 443.969.911,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
68	8001715	$ 351.516.714,00	0,00%	0,00%	11,52%	11,52%	12,82%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%	0,00%	9,09%	19,18%	19,18%
69	8001823	$ 341.507.411,00	7,40%	7,40%	28,24%	41,85%	41,85%
63	8002132	$ 301.695.957,00	12,72%	12,85%	0,00%	0,00%	0,00%
50	8004663	$ 770.232.864,00	7,66%	7,66%	13,56%	14,12%	14,12%
56	8004947	$ 377.475.477,00	0,00%	0,00%	2,54%	3,21%	7,07%
49	8004816	$ 479.216.394,00	0,00%	5,61%	6,19%	6,32%	7,57%
48	8004699	$ 983.197.315,00	0,00%	0,00%	2,37%	3,65%	4,71%

FECHA EVALUACIÓN			4-jul
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331.062.908,00	0,00%
82	8005078	$ 343.085.920,00	0,00%
60	8002162	$ 320.721.252,00	0,00%
61	8002265	$ 355.199.128,00	0,00%
65	8002008	$ 360.580.405,00	0,00%
64	8001931	$ 376.367.569,00	1,75%
73	8001148	$ 285.710.532,00	0,00%
76	8001183	$ 146.013.903,00	0,38%
75	8001223	$ 144.206.710,00	0,00%
74	8001184	$ 347.413.004,00	0,00%
70	8001657	$ 342.553.149,00	0,00%
66	8001876	$ 318.216.103,00	1,08%
44	8004757	$ 544.689.706,00	0,08%
62	8002055	$ 443.969.911,00	0,00%
68	8001715	$ 351.516.714,00	1,30%
71	8001771	$ 361.446.034,00	0,00%
69	8001823	$ 341.507.411,00	0,00%
63	8002132	$ 301.695.957,00	0,00%
50	8004663	$ 770.232.864,00	0,00%
77	8001285	$ 564.687.707,00	0,00%
79	8001390	$ 629.262.662,00	0,00%
92	8004910	$ 456.639.023,00	0,00%
67	8001968	$ 386.650.290,00	0,00%
59	8002331	$ 360.017.625,00	0,00%
58	8002225	$ 370.268.458,00	0,00%
56	8004947	$ 377.475.477,00	3,85%
80	8001581	$ 584.822.489,00	0,00%
72	8001545	$ 348.655.292,00	0,00%
49	8004816	$ 479.216.394,00	1,25%
48	8004699	$ 983.197.315,00	1,06%

G2	4-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	64,49%	66,18%	64,49%
% EJECUTADO	20,83%	20,53%	9,52%
% DESVIACIÓN	-43,66%	-45,65%	-54,97%
