BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 13/Julio/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____ (02)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No 40 CIN-717-2022 LCOP-690-2022.

HORA DE INICIO: 4:30 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Laura Daniela Díaz			X							Interventoría	dlaura0898@gmail.com	3168270441	
Mauricio Rojas			X						X	FDLK-Infraestructura	andres.m.llanes@gobiernobogota.gov.co	3057039773	
Danilo Meneses Toto			X						X	FDLK-Infraestructura	danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988634	
Héctor Maldonado Barrio			X						X	CVK22	gerencia@gaegroup.co	3188747030	
Gladys Sorita Molina Pita			X						X	CVK22- Contratista	cvk22.director@gmail.com	3004938576	
Steven Beltran Goluis			X						X	CVK22	CVK22.Residente@gmail.com	3123181328	
Martha C Rodriguez A.			X						X	CVK22	CVK22.social@gmail.com	3114883477	
Luisa Jaimes Rodriguez			X						X	interventoria.	socialgrupo2.fdlk@gmail.	3214357623	
Adriana Casho Alba			X						X	CVK22	CVK22.ambiental@gmail.com	3103391462	
Sandra Patricia Gonzalez C			X						X	Interventoria	sstkennedy@outlook.com	3178958603	
Carlos Eduardo Salazar S.			X						X	CVK22	CVK22.SST@gmail.com	3143308880.	
Jorge E. Tamayo Mejía			X						X	Consorcio SCLV Interventoría	Kennedy.financiero@gmail.com	317-4410997	

CONSENTIMIENTO: El(la) abajo firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 13/Julio/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 40 CIN-77-2022 / CDP-690-2022

HORA DE INICIO: 4:30 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ARTURO ZARATE			X						X	INTERV. SCLV	arturozarate09@yahoo.com	3152368011	
Katerine Samboni			Y							Interventoria.	ksamboni@hotmail.com	3138896513	
Juan Manuel Alba R.			X							Interventoria	juan.alba@cavalidad.co	3107671842	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:30 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Componente social

El Contratista informa que:

- A la fecha todas las PQRSD se encuentran cerradas.
- Se encuentran atendiendo observaciones del Informe mensual 9.
- El Comité FDLK se llevará a cabo el 28 de julio de 2023 en las 2 UPZ
- Se ha realizado seguimiento a las actas de bajantes de aguas lluvias y se han atendido las recomendaciones que ha hecho la Interventoría.
- Se inicio con el cierre de actas de vecindad de la prioridad 81 y 82, se presentaron 5 actas de compromiso de los predios que en algún momento se les afectó la fachada.
- Se hizo entrega de volantes para inicio de actividades de espacio público en las prioridades P49, P70 y P71.

Por otra parte, se reitera al Contratista que, el cambio del proceso constructivo debe ser informado a la Interventoría con antelación, y el 10 de julio de 2023 mediante comunicación CE-CVK22-ADM-578 el Contratista radicó el proceso constructivo que se va a implementar de ahora en adelante en los CIV que se vayan a intervenir.

Componente ambiental

El Contratista solicita mesa de trabajo para poder hacer la conciliación entre Interventoría y Contratista de las cantidades de acuerdo con las RPO ya generadas y que están conciliadas.
El Contratista indica que, no ha recibido observaciones de manera formal de los Informes mensuales 8 y 9, pero se han revisado en mesas de trabajo con Interventoría.
El FDLK indica que, ya se había dado respuesta a la solicitud de permiso para trabajos nocturnos, por lo cual el Contratista informa que, se encuentran elaborando el oficio de respuesta atendiendo las observaciones.
Calificación: 100%

Componente SST

El informe No. 8 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y mañana se daría concepto al Contratista y el Informe No. 9 se encuentra en elaboración y radicarían mañana a la Interventoría
Ingresos: 1 ayudante
Retiros: 3 (1 operador y 2 ayudantes)
Ausentismo: 0.71%

Tránsito y Transporte:

La Interventoría informa que:

- De los 50 CIVs, 11 se encuentran en etapa 1, 4 en etapa 2, 9 en etapa 3 y 2 CIVs terminados.
- La prioridad 92 se encuentra en proceso por interferencia por obras en la Av Cali y se envió el acta para la firma de los contratistas del IDU.

- Hay 23 CIVs de los cuales no se ha solicitado permiso de PMT ante la SDM
- Se solicito PMT para las prioridades, 90, 78, 57, 91, 55, 83, 84, 85 y 86 y adicionalmente se solicitó PMT para etapa 2 de las prioridades 70 y 71

Por otra parte, la Interventoría presenta las siguientes observaciones de 3 oficios radicados por el Contratista:

CE-CVK22-ADM-570 Daño en espacio público: El Contratista en su oficio, incluye el plano que se encuentra aprobado y donde se puede estacionar el vehículo para hacer el cargue o descargue, por lo anterior, la Interventoría realiza las siguientes precisiones:

- Se puede realizar el cargue o descargue, pero el vehículo y toda la zona debe tener un cierre con señalización de aproximación para independizar la zona de cargue y descargue de las vías o áreas destinadas al flujo peatonal y vehicular. Estos cierres deberán estar apoyados con la cantidad de auxiliares de tránsito incluidos y aprobados por la SDM en el documento técnico y en el plano presentado por el contratista.
- El horario de cargue y descargue es el solicitado por el contratista y autorizado por la SDM mediante el COI publicado para PMT y que en la mayoría de los casos es nocturno desde las 22:00 horas (10:00 pm) y las 05:00 horas (05:00 am del día siguiente).
- Finalmente, el contratista en la solicitud de PMT que presenta para revisión y aprobación de la interventoría y la SDM adjunta un formato denominado Acta 7, donde se compromete a la restitución de las condiciones encontradas antes del inicio de la obra.

CE-CVK22-ADM-578 Instalación monoblock: En el numeral 2, el Contratista afirma que: *"por error la SDM dio por terminada la Etapa 1 de ejecución de la vía porque el segmento está ligado al PMT de la prioridad 44"* es importante hacer las siguientes precisiones:

- Cuando se solicitó finalizar el 44, se dijo en el formato COI presentado para la aprobación de la etapa 2 para la prioridad 44 se solicitó terminar el PMT aprobado en el COI 12-2023 renglón 13323
- De acuerdo con la anterior solicitud en el COI 25-2023 la SDM terminó la etapa 1 para las prioridades 44 y 50. En el mismo COI 25-2023 la SDM aprobó la etapa 2 de la prioridad 44.

Por lo anterior, el Contratista ha presentado los PMTs de manera independiente para poder darle cierre de la misma manera así estén juntos.

CE-CVK22-ADM-580 Reposición de robo de señales: Como bien lo indica el contratista, es su obligación reponer las señales robadas y/o deterioradas y mantener en buen estado la implementación de los PMTs aprobados y autorizados por la SDM. En cuanto al presupuesto oficial del contrato para el componente del Plan de Manejo de Tránsito, se considera que como lo indica el contratista 52 señales es una cifra muy baja para atender los 50 CIVs del contrato, motivo por el cual fácilmente la cantidad se verá superada, sin que represente un desequilibrio económico del contrato, si no el resultado de un deficiente presupuesto.

<u>Componente técnico</u>

Frentes de obra abiertos: 13 (20 CIVs)
CIVs activos: 9
CIVs inactivos: 2 (P70-P71)
CIVs intermitentes: 9

Informe mensual No. 8: Observado
Informe mensual No. 9: En elaboración del contratista
Preacta No. 8 – mayo: El Contratista radicó ayer atendiendo observaciones, se encuentra en revisión, pero se evidencia que agregaron nuevos ítems para cobrar. (Lavados e inspecciones CCTV)
Preacta No. 9 – junio: En revisión de la Interventoría
Los Informes semanales de mayo y junio se encuentran observados por programación, teniendo en cuenta que, después del 16 de mayo, que es cuando finaliza el plan de contingencia, el Contratista debe volver con la programación inicial para el reporte de los avances semanales. El Contratista indica que, hasta que no se tenga el acta final aprobada, no se pueden ajustar los informes semanales del periodo, por lo cual, el FDLK le reitera al Contratista que, en comités pasados se acordó que, se ajustaba solo el ultimo semanal del periodo, es decir, los primeros 3 semanales cerraban con las cantidades que se reportaran y si había algo más o algo menos, se ajustaba en el último semanal.

Adicionalmente, el Contratista manifiesta que no se puede hacer una reprogramación debido al proceso sancionatorio que presenta, por lo tanto, se le solicita que, en los informes semanales se deje una nota donde haga la salvedad de que, los porcentajes de avance programado reportados corresponden a la programación inicial aprobada en enero del 2023, dado que, jurídicamente no se puede realizar ajustes a la programación inicial debido a que el contrato se en encuentra bajo un proceso sancionatorio.

Por otra parte, el Contratista radico la cuenta No. 8 con los soportes, pero, se evidencia que los informes mensuales anexos de algunos componentes no se encuentran aprobados y otros corresponden al periodo de abril, por lo tanto, se realizará la devolución de la misma sin revisión.

Programación
La Interventoría informa que, el avance semanal del Contratista fue de 0.46%.

11-jul-23		
GENERAL	OBRA	FINANCIERO
66.97%	68.72%	66.97%
21.66%	21.36%	17.78%
-45.31%	-47.36%	-49.19%

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Plan detallado de trabajo actualizado - PDT	CVK22	19-jul-23
2	Tapas de cajas de inspección de monoblock	CVK22	19-jul-23
3	Respuesta al oficio de solicitud permiso trabajo nocturno	CVK22	19-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 19 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.40

Fecha: 13 de julio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	12-jul-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	12-jul-23	NO
3	Respuesta a la comunicación U233-G2-534-23 *Observaciones al reporte de instalación de fresado a junio de 2023.*	Contratista	12-jul-23	NO
4	Carta de CEMEX donde manifieste que no cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	Contratista	12-jul-23	NO
5	Póliza extracontractual maquinaria y equipo (daños a terceros). Investigar si aplica para el contrato.	Contratista	12-jul-23	NO
6	Tapas de cajas de inspección de monoblock	Contratista	12-jul-23	NO
7	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	Contratista	12-jul-23	NO
8	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	12-jul-23	NO
9	Alcance a la radicación NP-31 sumidero	Contratista	12-jul-23	SI
10	Revisión de NPs 31 al 44	Interventoría	11-jul-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales junio:** Observados				
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Observado				
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** En revisión de atención de observaciones V2				
- **Cuenta No. 8 (mayo):** En revisión				
- **Calificación semanal:** 100%				


B. SST	
-	**Informe semanal 40:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8 (mayo)**: En revisión
-	**Ingresos en la semana:** 1
-	**Retiros en la semana:** 3
-	**Calificación semanal:** 100%
C. Ambiental	
-	**Informe semanal 40:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8 (mayo):** Observado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Observado
-	**Calificación semanal:** 100%
D. Gestión Social	
-	**Informe semanal 40:** Aprobado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Observado
-	**Calificación semanal:** 100%
Varios	
Obra	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Terminación sumideros **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
82	8005078	**Calzada:** Terminación sumideros **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
60	8002162	**Calzada:** Terminación sumideros **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
61	8002265	**Calzada:** Terminación sumideros **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Vaciado de concreto MR-41 **Andén occidental:** Se realiza la instalación de geotextil y fresado.
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Terminación esquina sur. **Andén occidental:** Terminación esquina sur.
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad. **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad.

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
74	8001184	**Calzada:** Sin actividad **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Excavación sumideros.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se inicia con demolición y excavación manual **Andén occidental:** Se inicia con demolición y excavación manual
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad**.**
66	8001876	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Instalación de concreto MR-41. **Andén occidental:** Instalación de concreto MR-41.
44	8004757	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil.
50	8004663	**Calzada:** Se realiza excavación y conformación pozo. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
68	8001715	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Excavación manual para monoblock e instalación de bordillo **Andén occidental:** Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
69	8001823	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual **Andén occidental:** Se realiza demolición concreto y excavación manual
70	8001657	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
71	8001771	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad**.** **Anden occidental:** Sin actividad.
49	8004816	**Calzada:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén oriental: Sin actividad **Andén occidental:** Excavación manual e instalación de monoblock.
48	8004699	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
56	8004947	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
89	8001841	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica y excavación para tubería para pozo. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 20J88I22 COP-690-22

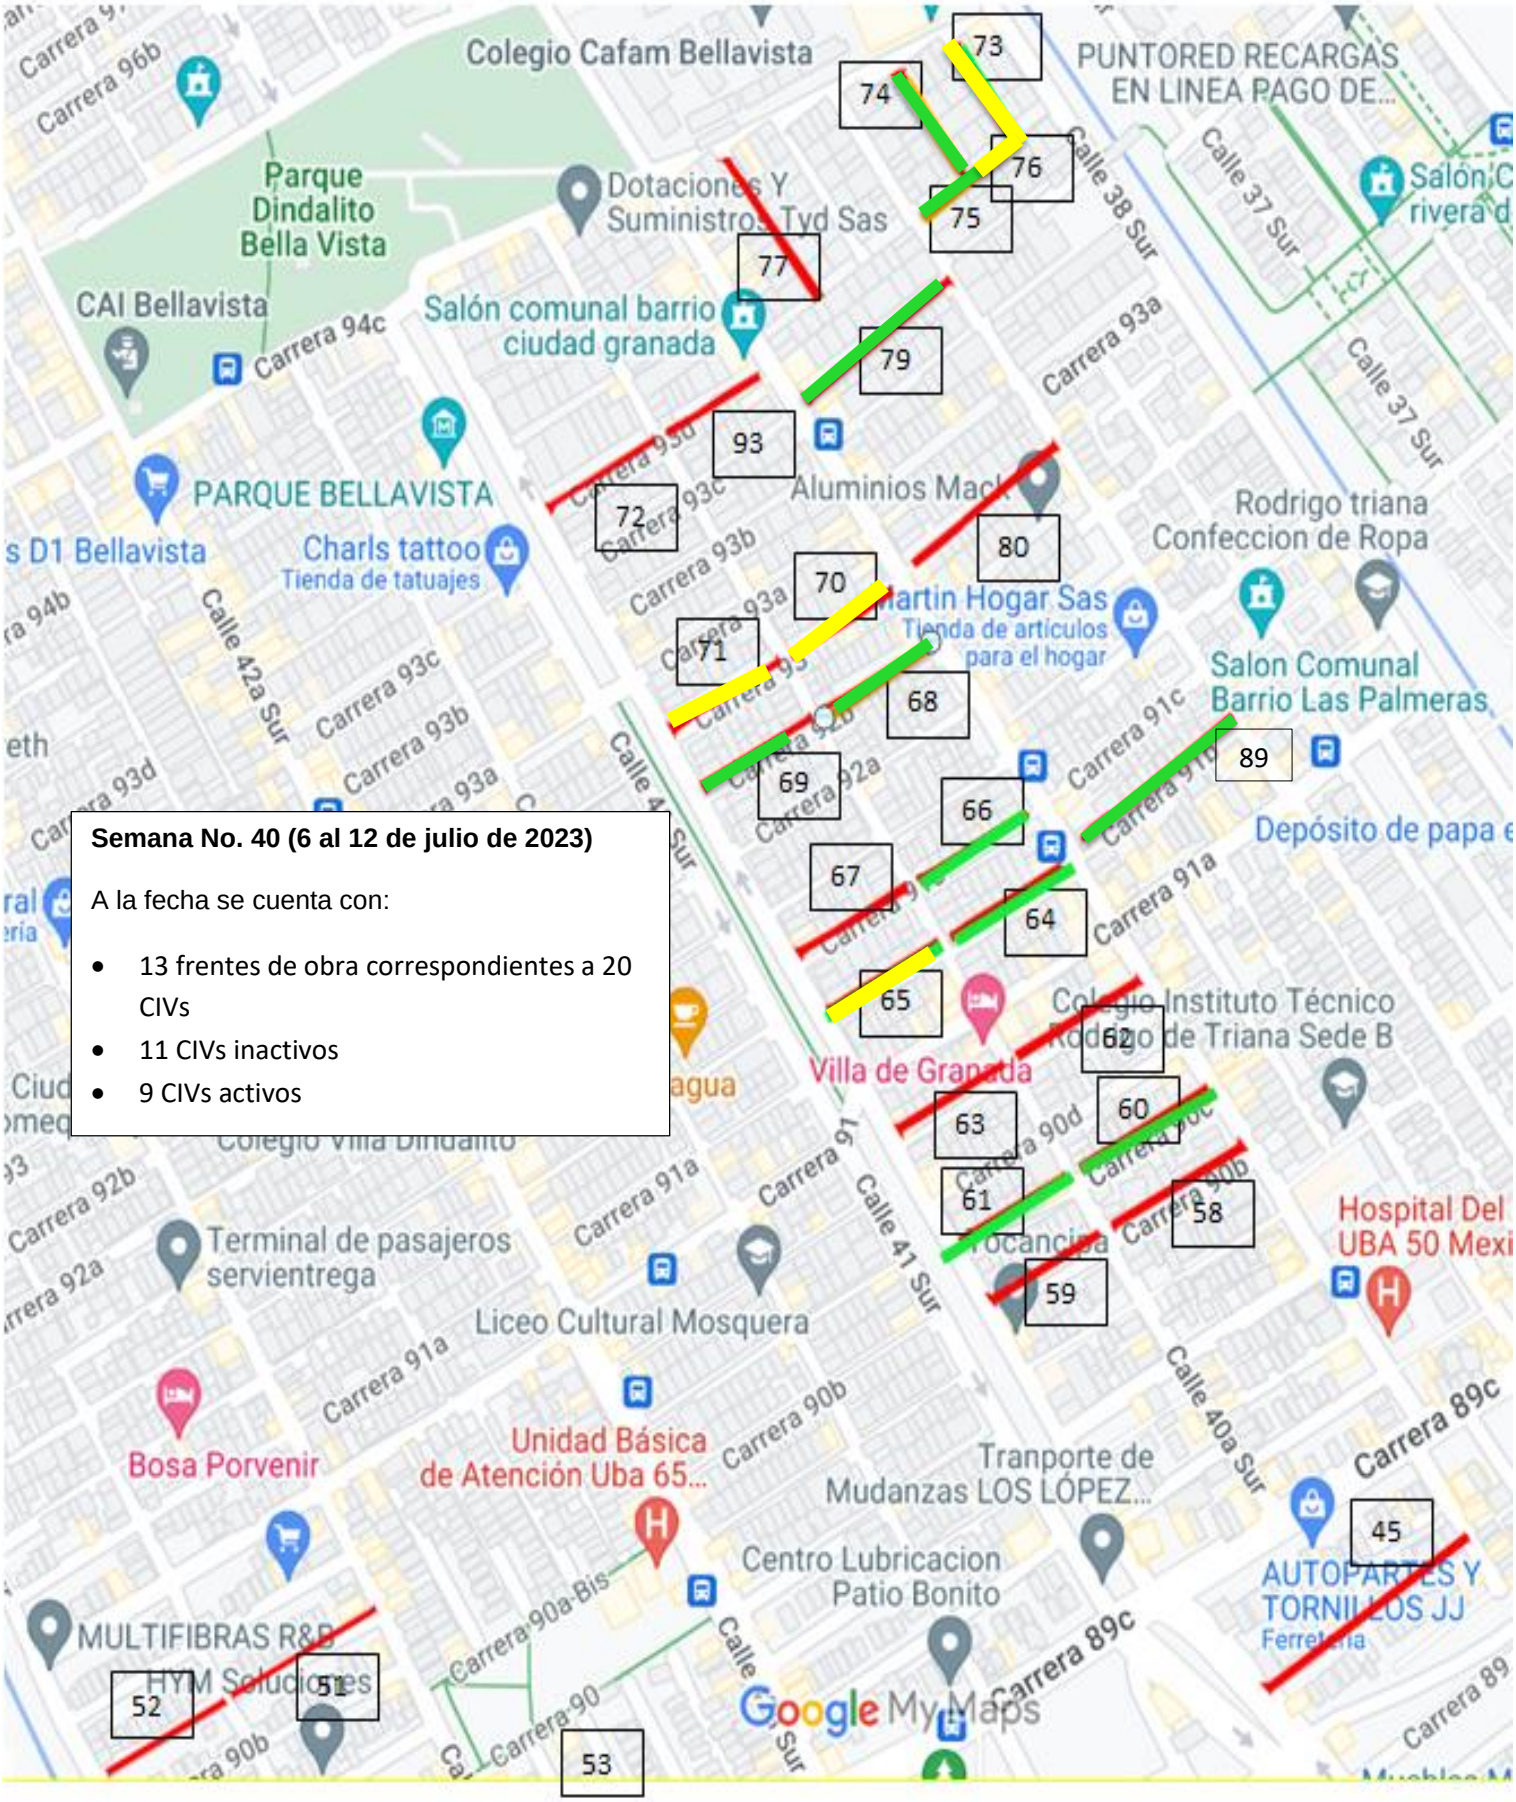


Semana No. 40 (6 al 12 de julio de 2023)


A la fecha se cuenta con:

- 13 frentes de obra correspondientes a 20 CIVs
- 11 CIVs inactivos
- 9 CIVs activos

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

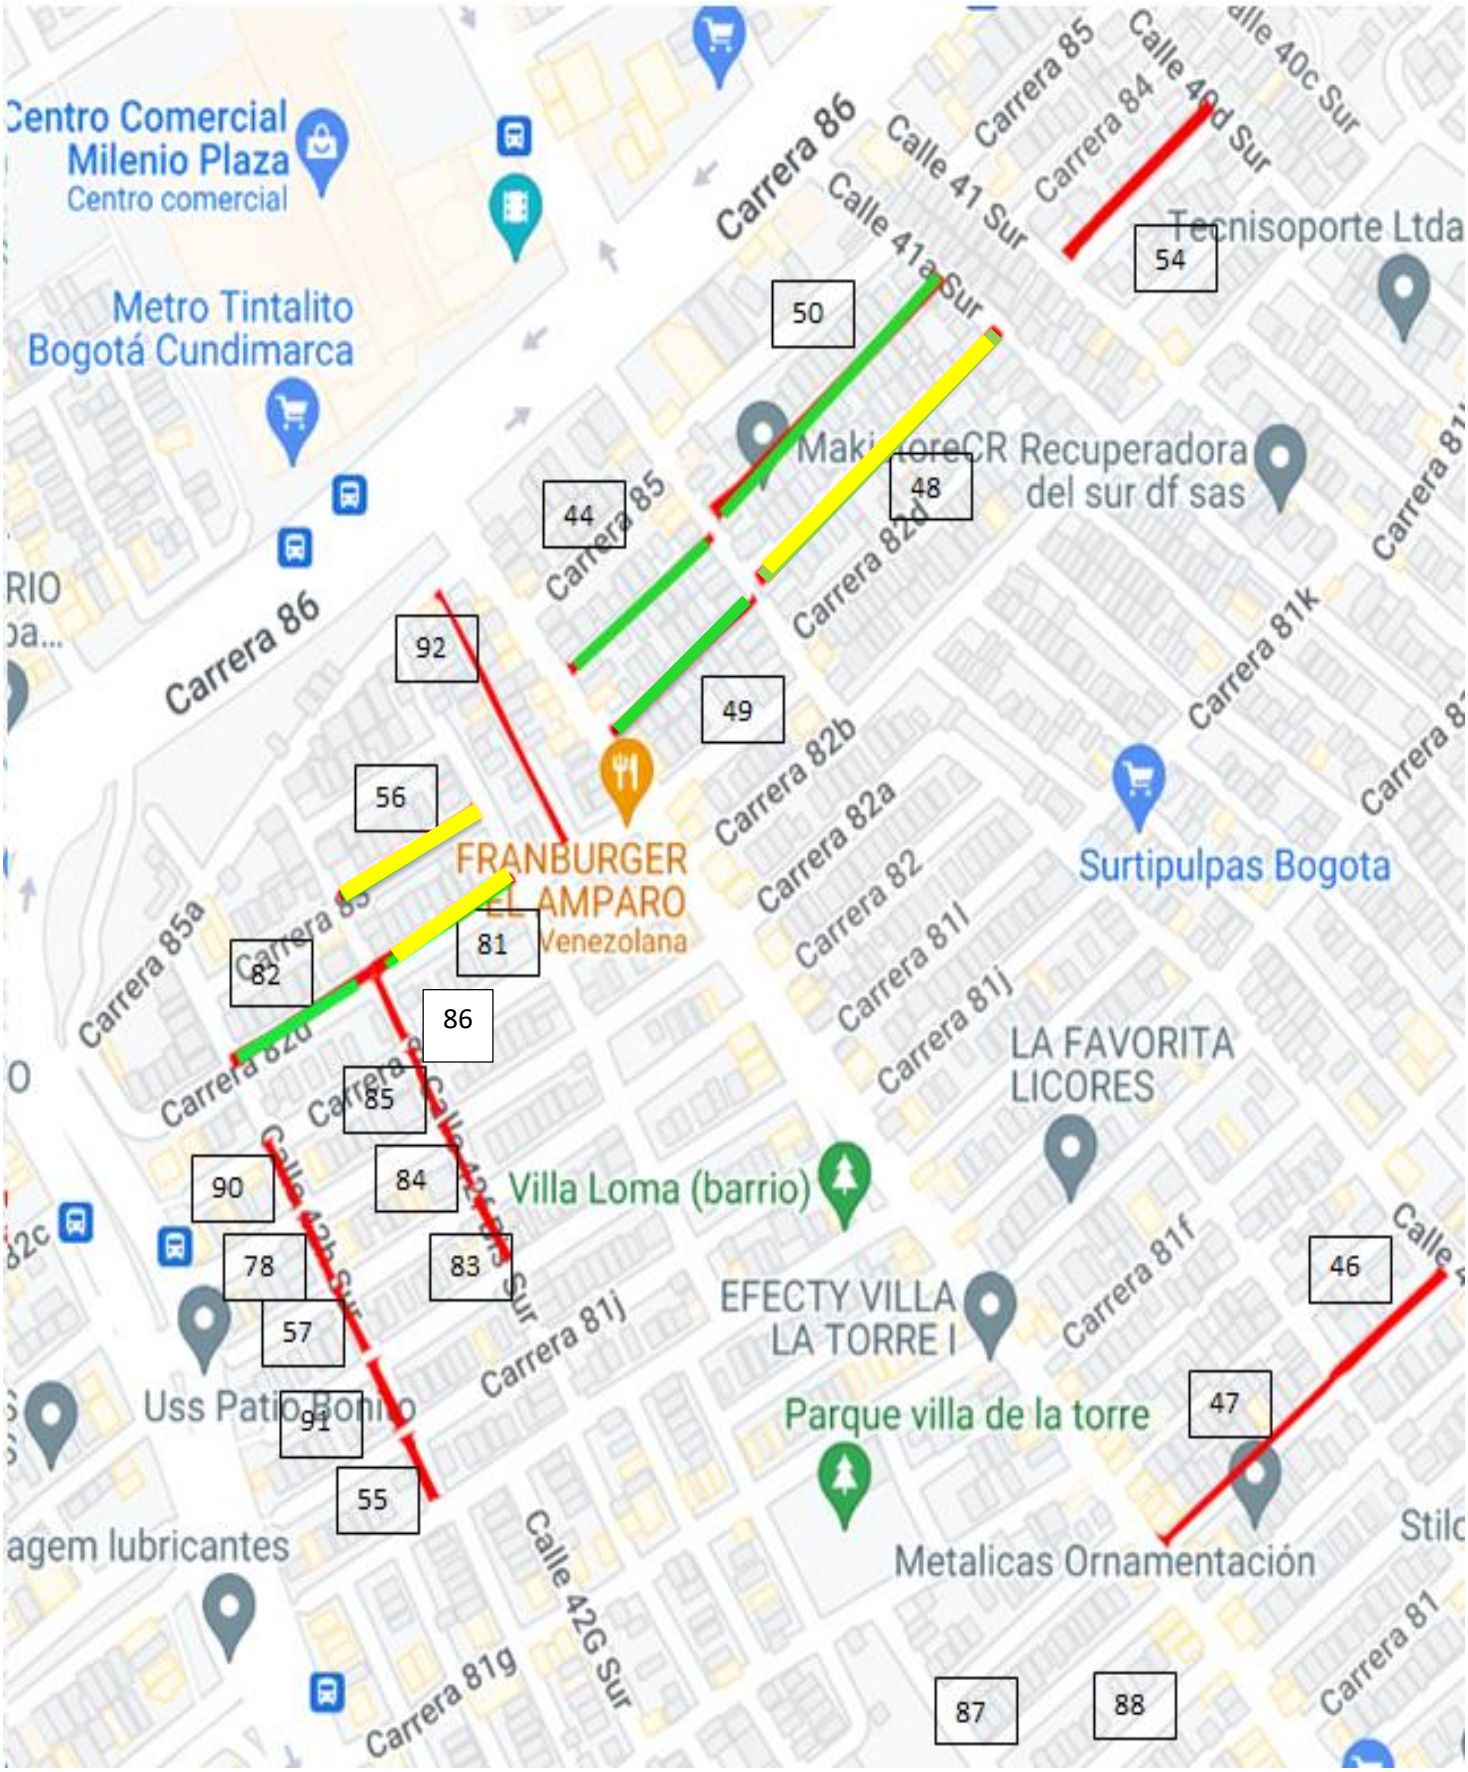

11-jul-23		
GENERAL	OBRA	FINANCIERO
66.97%	68.72%	66.97%
21.66%	21.36%	17.78%
-45.31%	-47.36%	-49.19%

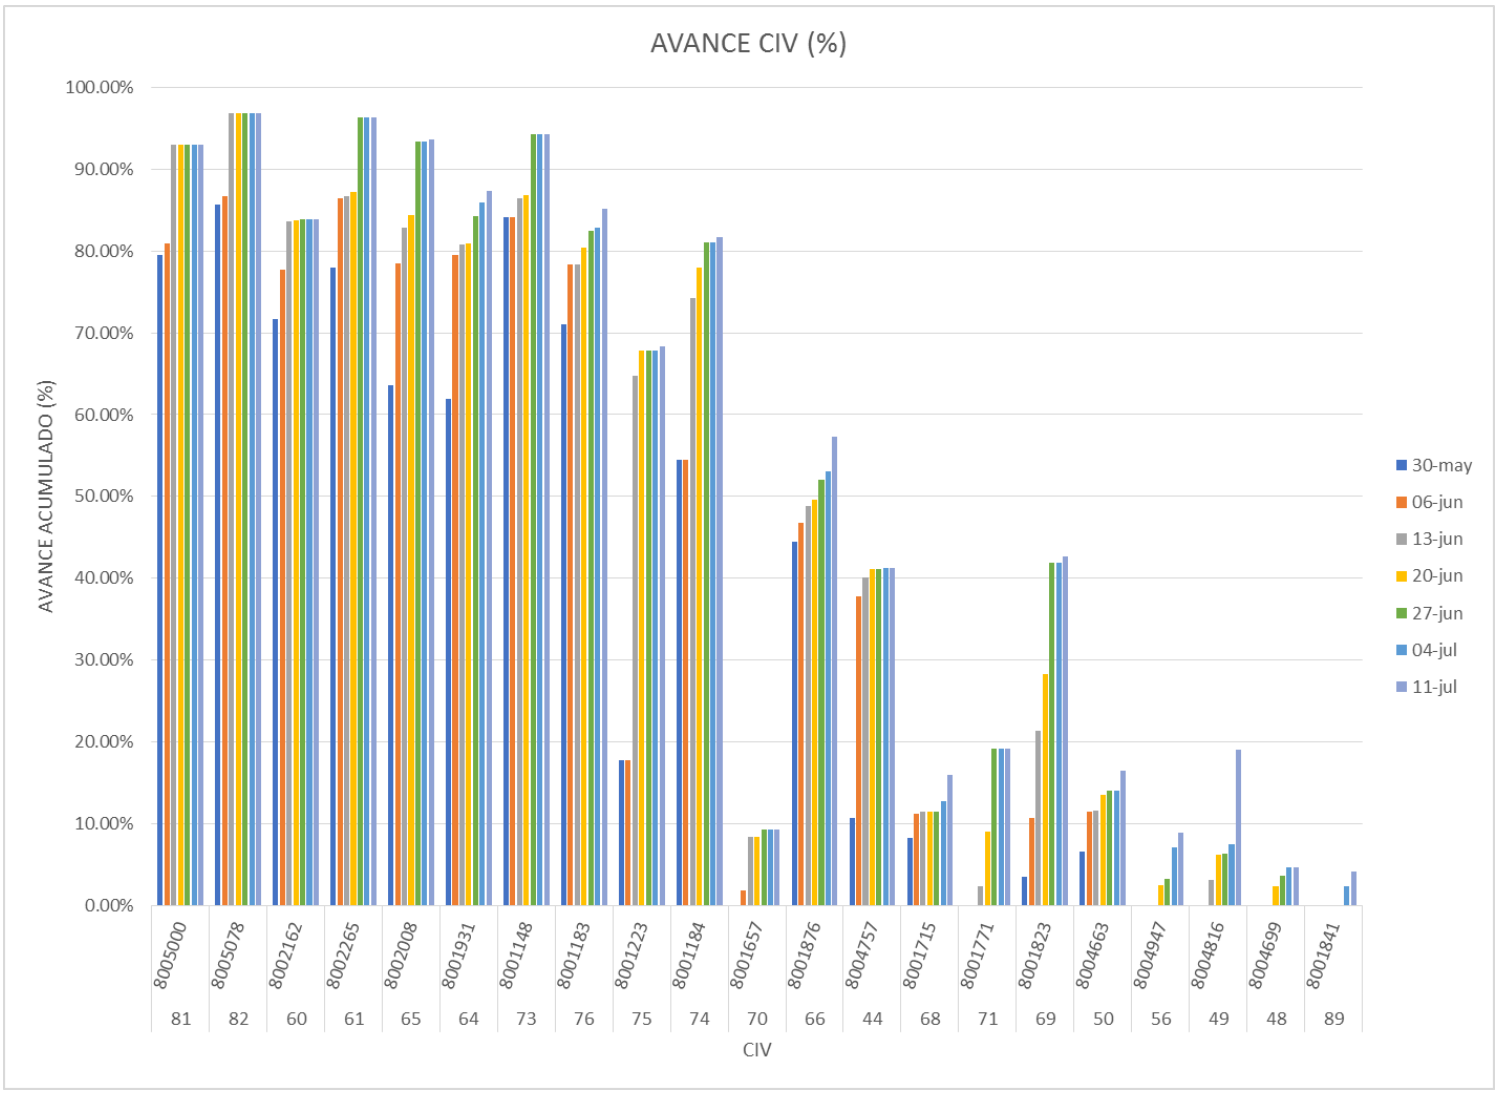

CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA - GRUPO 2 COP-690-22

			SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 11-JULIO-2023					
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
81	8005000	$ 331 062 908.00	$ 493 706 016.00	2.83%	$ 307 829 014.10	1.76%	92.98%	-1.07%
82	8005078	$ 343 085 920.00	$ 479 749 662.00	2.75%	$ 332 182 707.83	1.90%	96.82%	-0.85%
60	8002162	$ 320 721 252.00	$ 514 640 546.00	2.95%	$ 268 879 408.07	1.54%	83.84%	-1.41%
61	8002265	$ 355 199 128.00	$ 460 559 675.00	2.64%	$ 342 108 113.38	1.96%	96.31%	-0.68%
65	8002008	$ 360 580 405.00	$ 432 646 968.00	2.48%	$ 337 524 579.03	1.93%	93.61%	-0.55%
64	8001931	$ 376 367 569.00	$ 443 114 233.00	2.54%	$ 328 723 679.84	1.88%	87.34%	-0.66%
73	8001148	$ 285 710 532.00	$ 338 441 580.00	1.94%	$ 269 281 829.64	1.54%	94.25%	-0.40%
76	8001183	$ 146 013 903.00	$ 233 768 926.00	1.34%	$ 124 289 639.38	0.71%	85.12%	-0.63%
75	8001223	$ 144 206 710.00	$ 183 177 144.00	1.05%	$ 98 623 477.79	0.57%	68.39%	-0.48%
74	8001184	$ 347 413 004.00	$ 0.00	0.00%	$ 283 919 995.52	1.63%	81.72%	1.63%
70	8001657	$ 342 553 149.00	$ 394 266 995.00	2.26%	$ 32 050 753.20	0.18%	9.36%	-2.08%
66	8001876	$ 318 216 103.00	$ 430 902 424.00	2.47%	$ 182 541 962.00	1.05%	57.36%	-1.42%
44	8004757	$ 544 689 706.00	$ 416 946 070.00	2.39%	$ 224 452 888.05	1.29%	41.21%	-1.10%
62	8002055	$ 443 969 911.00	$ 497 195 104.00	2.85%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.85%
68	8001715	$ 351 516 714.00	$ 413 456 981.00	2.37%	$ 56 038 162.53	0.32%	15.94%	-2.05%
71	8001771	$ 361 446 034.00	$ 429 157 879.00	2.46%	$ 69 339 454.86	0.40%	19.18%	-2.06%
69	8001823	$ 341 507 411.00	$ 443 114 233.00	2.54%	$ 145 922 685.53	0.84%	42.73%	-1.70%
63	8002132	$ 301 695 957.00	$ 436 136 056.00	2.50%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.50%
50	8004663	$ 770 232 864.00	$ 485 351 587.84	2.78%	$ 127 218 164.92	0.73%	16.52%	-2.05%
77	8001285	$ 564 687 707.00	$ 510 027 202.56	2.92%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.92%
79	8001390	$ 629 262 662.00	$ 514 059 059.20	2.95%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.95%
92	8004910	$ 456 639 023.00	$ 546 042 342.00	3.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.13%
67	8001968	$ 386 650 290.00	$ 427 413 335.00	2.45%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.45%
59	8002331	$ 360 017 625.00	$ 439 625 145.00	2.52%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.52%
58	8002225	$ 370 268 458.00	$ 523 363 268.00	3.00%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.00%
56	8004947	$ 377 475 477.00	$ 444 858 777.00	2.55%	$ 33 721 664.76	0.19%	8.93%	-2.36%
80	8001581	$ 584 822 489.00	$ 275 550 760.96	1.58%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.58%
72	8001545	$ 348 655 292.00	$ 228 186 398.72	1.31%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.31%
49	8004816	$ 479 216 394.00	$ 0.00	0.00%	$ 91 479 867.08	0.52%	19.09%	0.52%
48	8004699	$ 983 197 315.00	$ 209 345 310.72	1.20%	$ 46 304 089.49	0.27%	4.71%	-0.93%
93	8001427	$ 321 630 570.00	$ 138 478 049.28	0.79%	$ 24 445 841.27	0.14%	7.60%	-0.65%
89	8001841		$ 147 538 595.84	0.85%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.85%
45	8002718		$ 24 174 397.44	0.14%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.14%
46	8005377		$ 33 669 703.68	0.19%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.19%
TOTALES			**$ 11 988 664 425.24**	**68.72%**	**$ 3 726 877 978.27**	**21.36%**		**-47.36%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17 445 442 250.00**					


FECHA EVALUACIÓN			11-jul
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331 062 908.00	0.00%
82	8005078	$ 343 085 920.00	0.00%
60	8002162	$ 320 721 252.00	0.00%
61	8002265	$ 355 199 128.00	0.00%
65	8002008	$ 360 580 405.00	0.27%
64	8001931	$ 376 367 569.00	1.37%
73	8001148	$ 285 710 532.00	0.00%
76	8001183	$ 146 013 903.00	2.27%
75	8001223	$ 144 206 710.00	0.52%
74	8001184	$ 347 413 004.00	0.75%
70	8001657	$ 342 553 149.00	0.00%
66	8001876	$ 318 216 103.00	4.24%
44	8004757	$ 544 689 706.00	0.00%
62	8002055	$ 443 969 911.00	0.00%
68	8001715	$ 351 516 714.00	3.12%
71	8001771	$ 361 446 034.00	0.00%
69	8001823	$ 341 507 411.00	0.87%
63	8002132	$ 301 695 957.00	0.00%
50	8004663	$ 770 232 864.00	2.40%
77	8001285	$ 564 687 707.00	0.00%
79	8001390	$ 629 262 662.00	0.00%
92	8004910	$ 456 639 023.00	0.00%
67	8001968	$ 386 650 290.00	0.00%
59	8002331	$ 360 017 625.00	0.00%
58	8002225	$ 370 268 458.00	0.00%
56	8004947	$ 377 475 477.00	1.87%
80	8001581	$ 584 822 489.00	0.00%
72	8001545	$ 348 655 292.00	0.00%
49	8004816	$ 479 216 394.00	11.52%
48	8004699	$ 983 197 315.00	0.00%
89	8001841	$ 321 630 570.00	3.28%

CONSORCIO SCLV

NIT 900.547.145-2

EVALUACIÓN PROGRAMACION INICIAL - GRUPO 2 COP-690-22

FECHA EVALUACIÓN			13-jun	20-jun	27-jun	04-jul	11-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331 062 908.00	76.51%	115.60%	115.60%	92.98%	92.98%
82	8005078	$ 343 085 920.00	92.57%	123.47%	123.47%	96.82%	96.82%
60	8002162	$ 320 721 252.00	63.71%	104.98%	105.04%	83.84%	83.84%
61	8002265	$ 355 199 128.00	76.66%	105.16%	114.28%	96.31%	96.31%
65	8002008	$ 360 580 405.00	74.80%	105.30%	114.25%	93.34%	93.61%
64	8001931	$ 376 367 569.00	66.02%	94.91%	98.19%	85.98%	87.34%
73	8001148	$ 285 710 532.00	70.45%	86.11%	93.56%	94.25%	94.25%
76	8001183	$ 146 013 903.00	55.34%	96.99%	99.04%	82.85%	85.12%
75	8001223	$ 144 206 710.00	25.77%	81.06%	81.06%	67.87%	68.39%
74	8001184	$ 347 413 004.00	44.86%	67.95%	70.96%	80.98%	81.72%
70	8001657	$ 342 553 149.00	10.86%	8.40%	9.36%	9.36%	9.36%
66	8001876	$ 318 216 103.00	31.11%	47.07%	49.55%	53.13%	57.36%
44	8004757	$ 544 689 706.00	41.20%	42.34%	42.34%	41.21%	41.21%
62	8002055	$ 443 969 911.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
68	8001715	$ 351 516 714.00	0.00%	11.89%	11.89%	12.82%	15.94%
71	8001771	$ 361 446 034.00	0.00%	9.09%	19.18%	19.18%	19.18%
69	8001823	$ 341 507 411.00	7.40%	26.90%	40.51%	41.85%	42.73%
63	8002132	$ 301 695 957.00	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
50	8004663	$ 770 232 864.00	7.66%	17.33%	17.89%	14.12%	16.52%
56	8004947	$ 377 475 477.00	0.00%	2.54%	3.21%	7.07%	8.93%
49	8004816	$ 479 216 394.00	5.61%	6.19%	6.32%	7.57%	19.09%
48	8004699	$ 983 197 315.00	0.00%	2.37%	3.65%	4.71%	4.71%
89	8001841	$ 321 630 570.00	0.00%	0.00%	0.00%	4.32%	7.60%

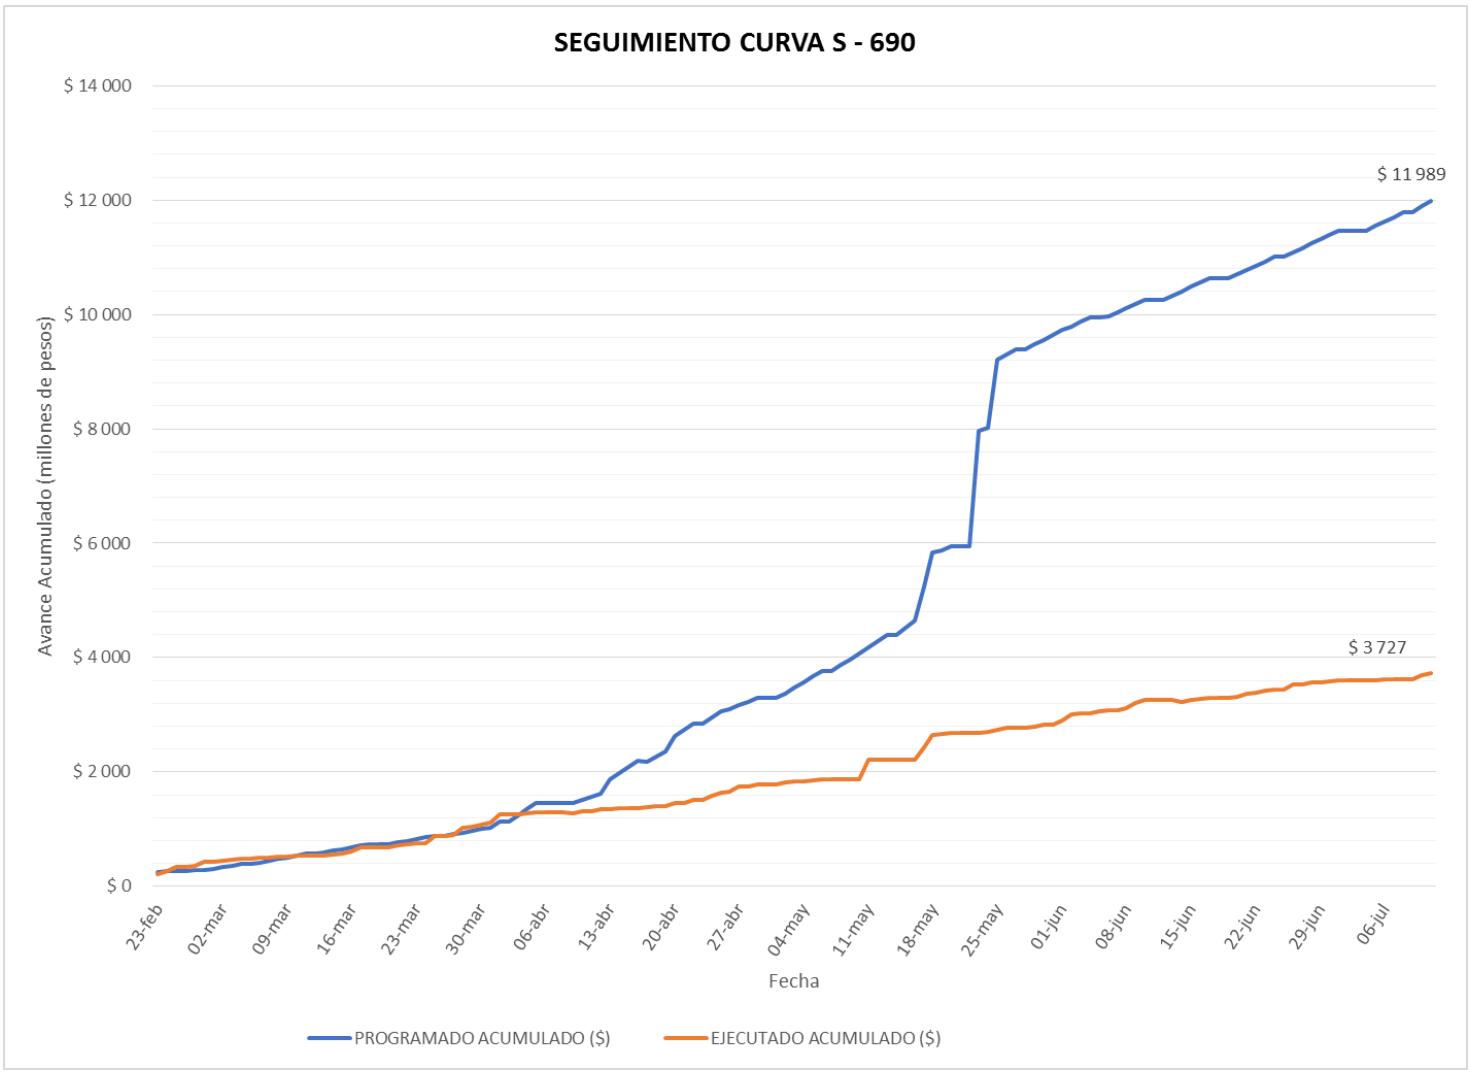

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**06-jul**	**07-jul**	**08-jul**	**09-jul**	**10-jul**	**11-jul**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$ 11 622	$ 11 699	$ 11 788	$ 11 788	$ 11 889	$ 11 989
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	66.62%	67.06%	67.57%	67.57%	68.15%	68.72%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$ 3 613	$ 3 613	$ 3 613	$ 3 613	$ 3 693	$ 3 727
EJECUTADO ACUMULADO (%)	20.71%	20.71%	20.71%	20.71%	21.17%	21.36%
DESVIACIÓN ($)	$ 8 009	$ 8 086	$ 8 175	$ 8 175	$ 8 196	$ 8 262
DESVIACIÓN (%)	**-45.91%**	**-46.35%**	**-46.86%**	**-46.86%**	**-46.98%**	**-47.36%**
