BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 19/Julio/2023 **Virtual:** ___ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ___

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 41 CIN-717-2022 / CDP-690-2022.

HORA DE INICIO: 4:40 P.m **HORA DE FINALIZACIÓN:** ___

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Danilo Meneses Toro			x						x	FDLK- Infraestructura	Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3189888034	
Andrés Mauricio Rojas Ll.			x						x	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gob	3057039773	
Laura Daniela Díaz			x							SCLV-Interventoría	dlaura0898@gmail.com	3168270441	
Karen Julieth Peñata Ramírez.			x							SCLV- Interventoría	u2333sclvkennedy@outlook.com	3143253729	
Anyeli Curiel Acosta			x							SCLV - Interventoría	u2333sclvkennedy@outlook.com	3227401848	
Katerine Samboni Ordoñez			x							SCLV - Interventoría.	Ksamboni@outlook.com	3138896513	
Carlos Eduardo Baeza			x							Consorcio Ucs Kennedy	cvk22.sst@gmail.com	3143308880.	
Sandra Gonzalez			x							SCLV Interventoría	sstkennedy@outlook.com	3178955603	
Adriana Castro Alba			x						x	CVK.22 consorcio	cvk22ambiental@gmail.com	3103391102	
Danilo Buitrago			x						x	CVK 22	CVK22residente2@gmail.com	3104749300	
Gladys Sanita Molina Pita			x						x	CVK22 - Contratista	CVK22.director@gmail.com	3004938516	
Héctor Maldonado Barrios			x						x	CVK22 - Rep. Legal	gerencia@gaiagroup.co	5188590022	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 19 / Julio / 2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** G2

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 41 COP- 690-2022 / CIN - 717-2022

HORA DE INICIO: ____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Manuel Alba			X						X	Interventoría	gerencia@kennedy.gov	3103741842	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4:40 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

La Interventoría cita al Contratista para realizar mesa de trabajo para el 25 de julio de 2023 a las 8:00 am, con el fin de revisar detalladamente los NPs, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Interventoría.
Hoy se realizó recorrido de obra en compañía del FDLK, se evidencia un avance y se observaron sumideros ya instalados con la adaptación, por lo que el FDLK solicita que en la mesa de trabajo del martes queden definidos los precios de estos NPs.

Componente técnico

El Contratista informa que:

- **Bordillos:** Se disminuirá al máximo su instalación en cuanto a separación de rampas y de andén dilatación, sin embargo, hay puntos específicos donde no se podrá hacer está dilatación.
- En la prioridad 48 se está instalando monoblock, pero, en los planos iniciales marca que se deben trasladar los postes de energía, la solución para no mover los postes que se encuentran en la mitad de la longitud del CIV, es bordear el poste con una cañuela, darle continuidad al flujo del agua y que llegue al monoblock.

P49: En la última sección del monoblock en el sentido del flujo del agua conectarlo a un pozo pluvial con la misma conexión que se va a hacer en la P50 y, el otro tramo quedaría como inicial se haría una cañuela para encausar el agua, que llegue al monoblock y sigue su curso hasta el sumidero. La Interventoría solicita plantear una solución gráfica del pozo de la P49, y el levantamiento debe venir con el VoBo de la Interventoría, para que el Especialista Hidráulico de Interventoría realice el acercamiento con el acueducto.

- Por otra parte, continua el robo constante de señalización en las prioridades 44, 50, 48 y 49 del Amparo.

Frentes de obra activos: 13 (20 CIVs)
CIVs activos: 13
CIVs intermitentes: 7 (P60, P61, P65, P73, P76, P48 y P71)
Calificación: 100%

Componente Social

El Contratista informa que:

- El Informe semanal No. 41 y el Informe mensual No. 9 se encuentras aprobados
- Se hizo entrega de la presentación para el comité FDLK que se llevara a cabo el 28 de julio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
- En recorrido realizado con la Interventoría y el FDLK, se solicitó que los predios que tienen 2 ingresos a parqueaderos, se le debe hacer los accesos si ya estaban preexistentes, pero en la UPZ de patio bonito, de acuerdo con la norma y el criterio de los especialistas de espacio público, se les ha deja un solo ingreso a parqueadero. Por lo anterior, tanto la Interventoría como el FDLK reiteran que debe primar la

preexistencia del predio, es decir, si cuando se hicieron las actas de vecindad tenían 2 ingresos se deben dejar los 2 ingresos.

- Por otra parte, dentro de los pliegos y dentro del plan social, se contempla la elaboración de 2 talleres pedagógicos dirigida a niños acerca de temas de cultura ciudadana, en la UPZ de patio Bonito ya se cuenta con un grupo focal con el que se puede hacer dicho taller, pero en Corabastos no se ha encontrado un grupo focal dado que no hay colegios cerca de la obra, por lo tanto, el Contratista propone incrementar el número de beneficiarios en la UPZ de Patio Bonito y no hacerla en la otra UPZ. Al respecto, la Interventoría indica que, el área de intervención es en las dos UPZ, por lo tanto, se debe realizar está actividad en las 2 UPZ, no necesariamente puede ser población escolar, se podría implementar con el grupo de comité veedor o con la junta de acción de comunal, hay mucha población aledaña con la que se podrían implementar los talleres. El FDLK sugiere plantearlo con el comité veedor, de igual manera, solicita al Contratista que evalué cual sería la población más adecuada para realizar esta actividad.

Calificación: 100%

Componente SST

Informe semanal 41: Aprobado
Informe mensual 8: Se radicó hoy y está en revisión de Interventoría
Informe mensual 9: En elaboración

Ingresos: 10 ayudantes 3 oficiales y se completó la plantilla mínima con el inspector laboratorista.
Retiros: 2 auxiliares de tráfico y 1 Boal
Ausentismo: 1,09%
Rotación: 0%

Componente Ambiental

Informe semanal 41: Aprobado
Informe mensual 8: Observado por cantidades de fresado
Informe mensual 9: Observado por cantidades de fresado

El Contratista solicitó mesa de trabajo para la conciliación de cantidades y desde la Interventoría se le dijo al Contratista que, se realizaba la mesa de trabajo una vez se validaran las cantidades por parte del componente técnico y se verificaba de cuanto era el desfase.

El Contratista indica que, se hizo el arqueo por diseño de los segmentos que estaban en ejecución en ese momento y si estaban en vía o en andén y cuanto fresado se iba por diseño, y a la diferencia se le hacia la justificación.

La Interventoría indica que, con el fin de dar celeridad a la revisión de la cuenta No. 8, el Contratista debe dar alcance al Informe mensual No. 8 con la nota donde se deje salvedad que se tiene un desfase en las cantidades de fresado con su respectiva justificación, de esta manera, la Interventoría emite aprobación condicional del Informe en comente. Luego, las cantidades se ajustarán con base en el resultado de la mesa de trabajo del 25 de

julio de 2023, es decir, para el Informe mensual No. 9 deben venir las cantidades ajustadas, de lo contrario no se dará aprobación del mismo.

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que, de los 50 CIVs se tienen:

- 11 CIVs en etapa 1
- 4 CIVs en etapa 2
- 9 CIVs en etapa 3
- 2 CIVs terminados
- 10 CIVs en proceso de aprobación por parte de la SDM
- 14 CIVs sin permiso

- El PMT de las prioridades 48 y 49 vencen el 3 de agosto de 2023, pero está semana se radicaron para la siguiente etapa.
- Hoy llegó el oficio de aprobación por parte de la SDM con la aprobación de la señalización para el oficio del 30 de junio de 2023 para 39 CIVs.
- Se solicita al Contratista notificar a la SDM de la terminación de los CIVs finalizados, de lo contrario se sigue calificando y es posible que la SDM remita oficio de incumplimiento al PMT. La próxima semana se notificará a la SDM, dado que, están terminando la instalación de sumideros.
- Para la instalación de bolardos, se puede solicitar un PMT típico

El FDLK invita a que se defina el precio de los NPs, dado que, pueden impactar de una manera importante el presupuesto y una vez definidos los precios hacer el ajuste del balance para conocer la metafísica del contrato. Adicionalmente. El Contratista debe justificar porque hubo la disminución en esa meta física.

Programación

El avance semanal fue de 0.67%. Mesa de trabajo el 24 de junio de 2023.

G2	18-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	70.47%	71.89%	70.47%
% EJECUTADO	22.26%	21.96%	17.78%
% DESVIACIÓN	-48.21%	-49.93%	-52.69%

Facturación

Preacta No. 8 de mayo: El Contratista radicó hoy la atención a observaciones y la Interventoría da concepto el lunes de la revisión de la misma.

Informe mensual No. 8: El Contratista radica el martes 25 de julio de 2023.

Cuenta No. 8 con todos los soportes: El Contratista se compromete a radicar el miércoles 26 de julio de 2023 y la Interventoría da concepto de la revisión el viernes 28 de julio de 2023.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo para revisión de NPS 31 a 44	CVK22	25-jul-23
2	Mesa de trabajo para revisión de cantidades de fresado	CVK22	25-jul-23
3	Informe mensual técnico No. 8	CVK22	25-jul-23
4	Cuenta No. 8 - Soportes	CVK22	26-jul-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 27 de julio de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.41

Fecha: 19 de julio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	19-jul-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	19-jul-23	NO
3	Respuesta a la comunicación U233-G2-534-23 *Observaciones al reporte de instalación de fresado a junio de 2023.*	Contratista	13-jul-23	SI
4	Carta de CEMEX donde manifieste que no cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	Contratista	19-jul-23	NO
5	Póliza extracontractual maquinaria y equipo (daños a terceros). Investigar si aplica para el contrato.	Contratista	19-jul-23	NO
6	Tapas de cajas de inspección de monoblock	Contratista	19-jul-23	SI
7	Balance y justificación del total de CIV que van a intervenir.	Contratista	19-jul-23	SI
8	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	19-jul-23	NO
9	Respuesta a el oficio 20225833427711 *Solicitud permiso trabajo nocturno*	Contratista	19-jul-23	NO
2. Componentes				
A. Técnico				
- **Informes semanales mayo:** En revisión de interventoría - **Informes semanales junio:** Observados				
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Observado				
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** Observada				
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin revisión				
- **Calificación semanal:** 100%				


B. SST	
-	**Informe semanal 41:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8 (junio)**: En revisión de la interventoría.
-	**Ingresos en la semana:** 10 ayudantes, 3 oficiales, 1 inspector laboratorista.
-	**Retiros en la semana:** 2 auxiliares de tráfico, 1 Boal.
-	**Calificación semanal:** 100%
C. Ambiental	
-	**Informe semanal 41:** Aprobado
-	**Informe Mensual 8 (mayo):** Observado por validación de cantidades de fresado por el componente técnico.
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Observado por validación de cantidades de fresado por el componente técnico.
-	**Calificación semanal:** 100%
D. Gestión Social	
-	**Informe semanal 41:** Aprobado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
-	**Calificación semanal:** 100%
Varios	
Obra	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
82	8005078	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
60	8002162	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
61	8002265	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Instalación de fresado estabilizado **Andén oriental:** Vaciado de concreto MR-41 **Andén occidental:** Se realiza la instalación de fresado.
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad. **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad.


Priorida	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
74	8001184	**Calzada:** Excavación manual para la instalación de tubería pozo **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza instalación de fresado **Andén occidental:** Se realiza excavación manual
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad**.**
66	8001876	**Calzada:** Excavación manual para la instalación de tubería pozo. **Andén oriental:** Instalación de concreto MR-41. **Andén occidental:** Instalación de concreto MR-41.
44	8004757	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. **Andén occidental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil.
50	8004663	**Calzada:** Se realiza excavación y conformación pozo. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Excavación manual para monoblock e instalación monoblock
68	8001715	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto MR-41 **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto MR-41
69	8001823	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Se realiza excavación manual **Andén occidental:** Se realiza excavación manual
70	8001657	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Inician con demolición anden **Andén occidental:** Sin actividad.
71	8001771	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad**.** **Anden occidental:** Sin actividad.
49	8004816	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Excavación manual e instalación de monoblock.
48	8004699	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad

Priorida	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén occidental: Sin actividad.
56	8004947	**Calzada:** Excavación mecánica. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
89	8001841	**Calzada:** Se realiza excavación mecánica y conformación de tubería para pozo. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
79	8001390	**Calzada:** Se realiza con excavación mecánica. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

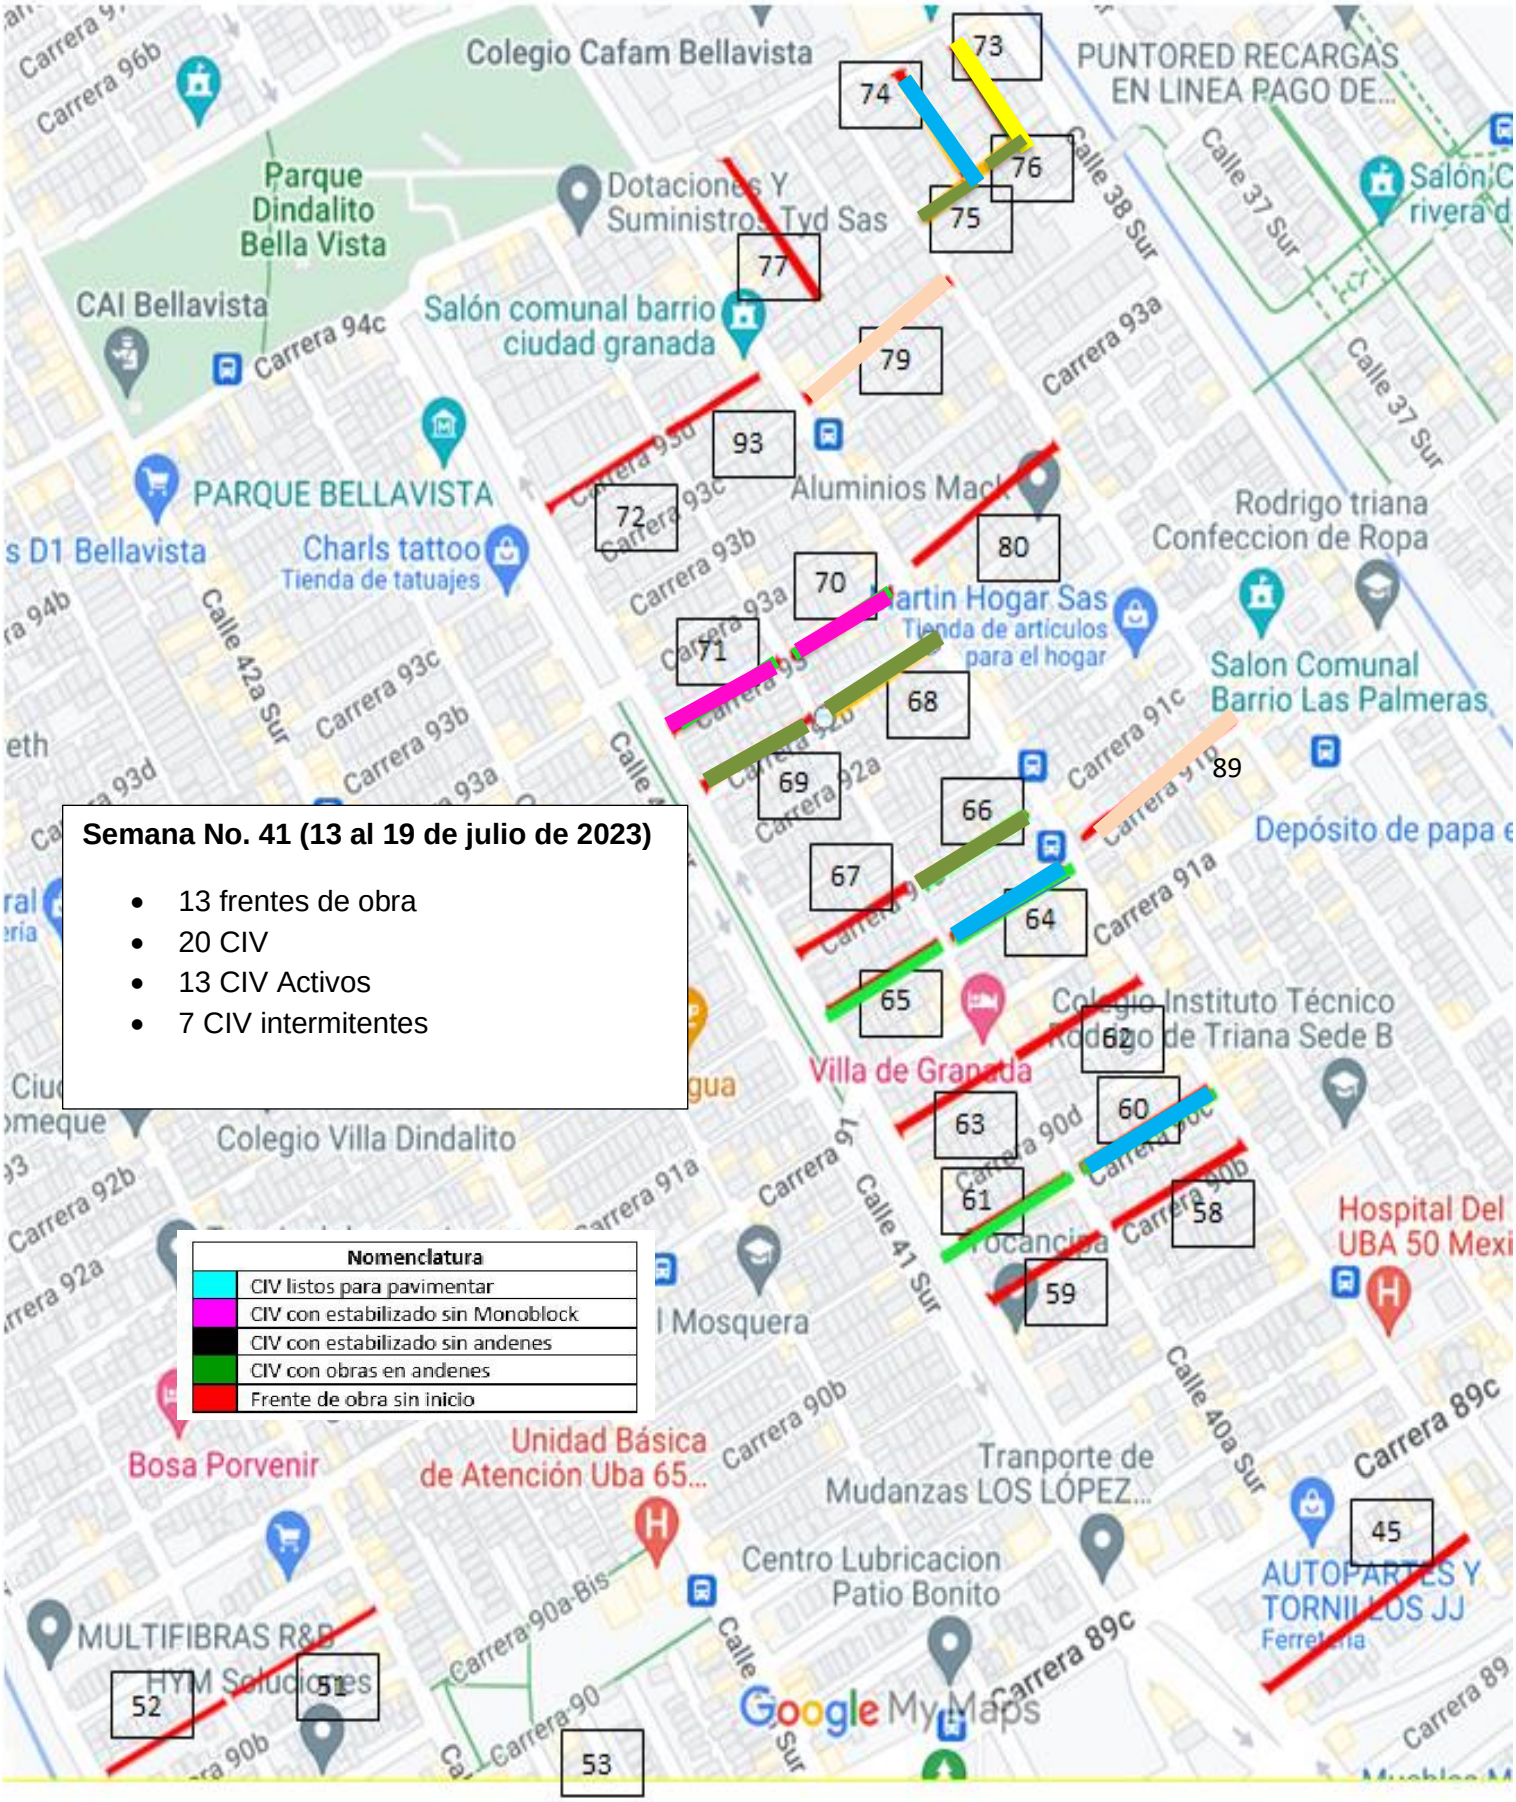

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

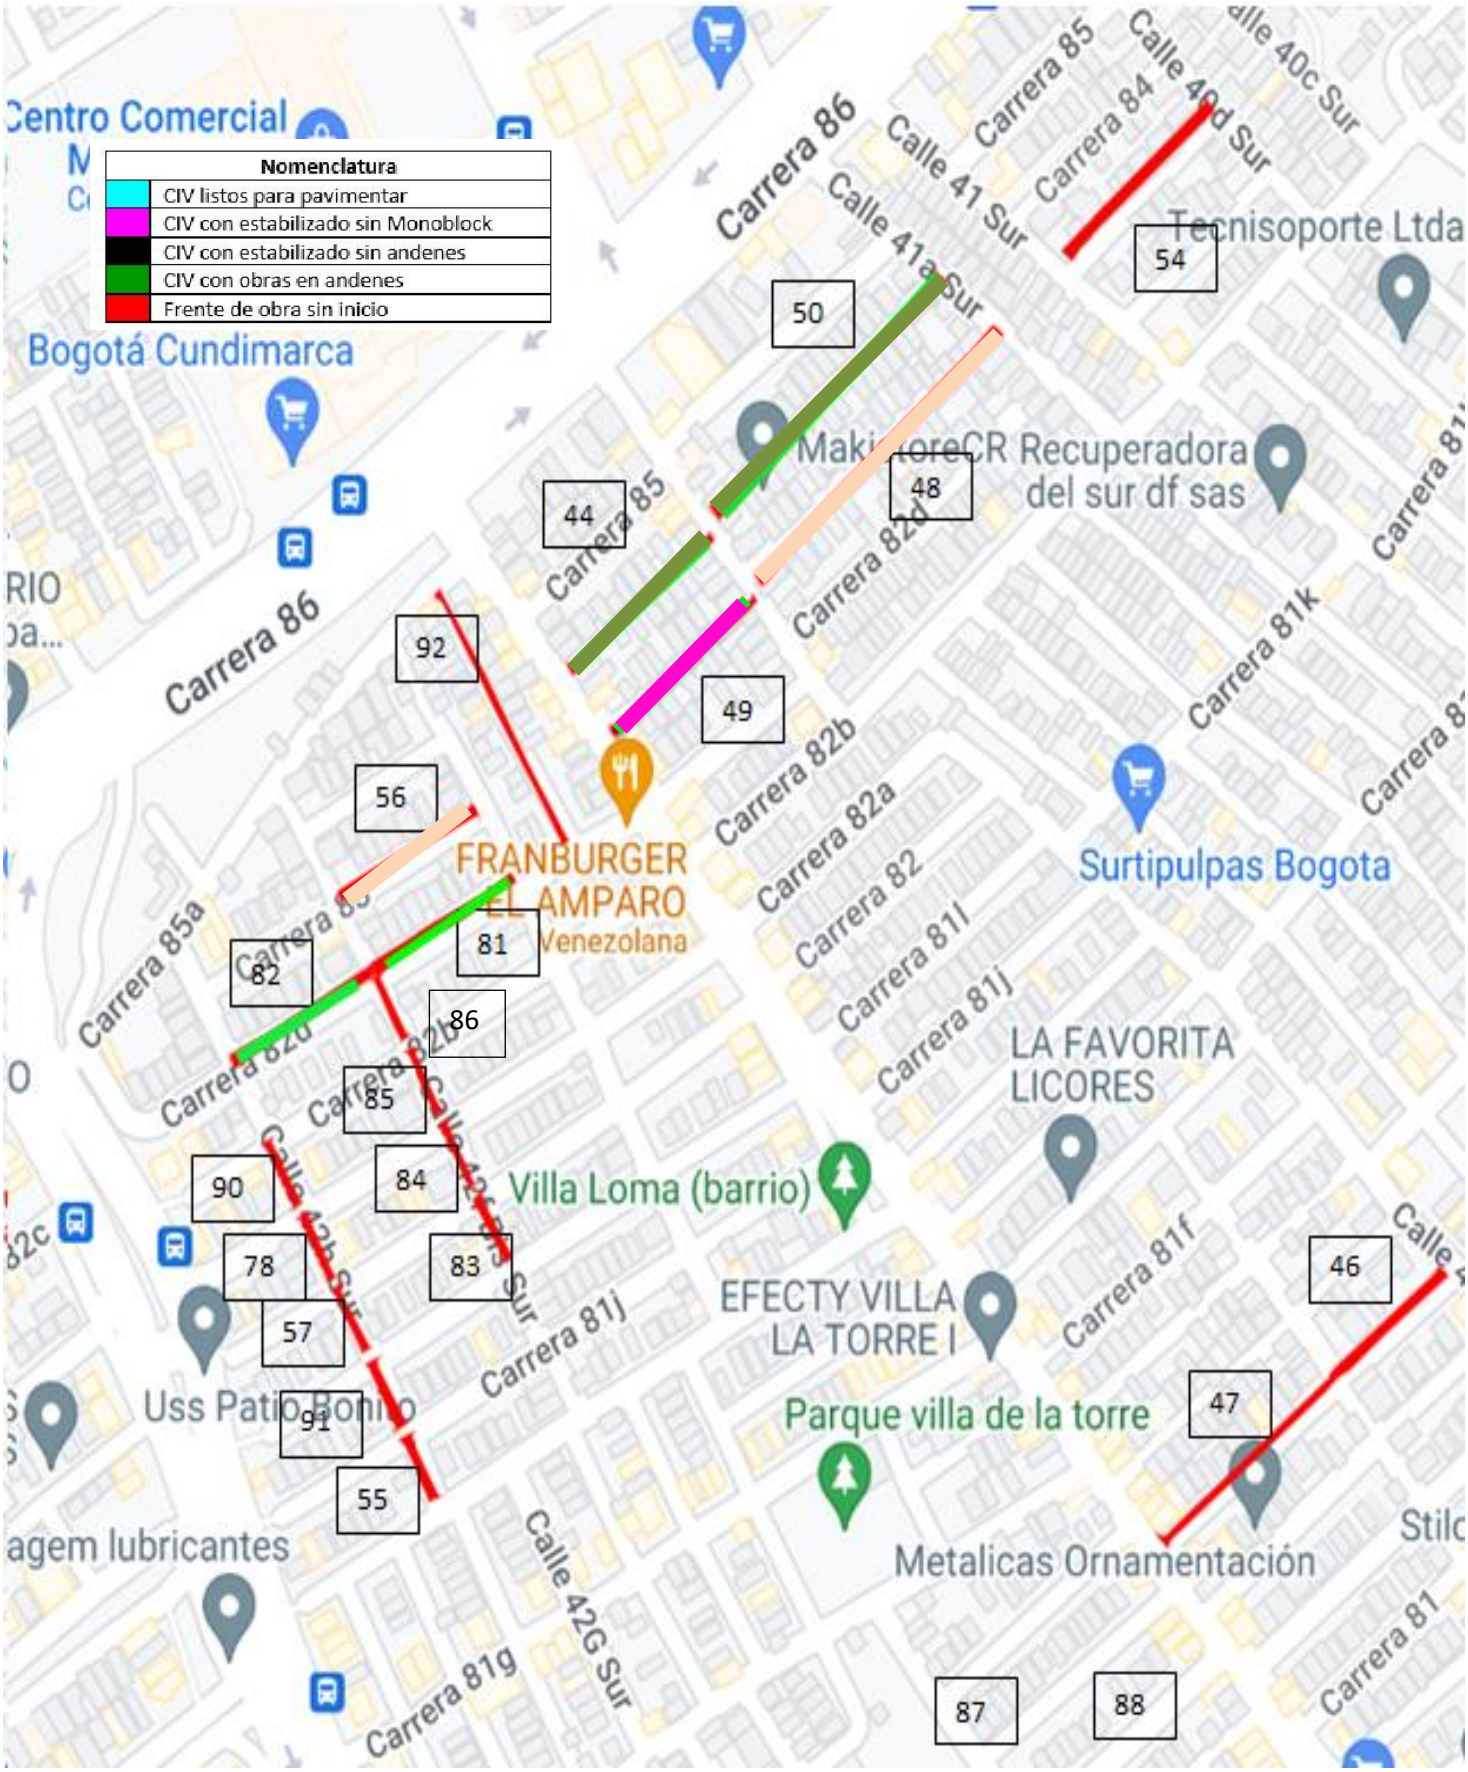


ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO


CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

| PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 44 | | | 50 | | | 60 | | | 61 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 68 | | | 69 | | | 71 | | | 70 | | | 49 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 81 | | | 82 | | | 48 | | | 56 | | | 89 | | | 79 | | |
|---|---|---

AVANCE GRUPO 2

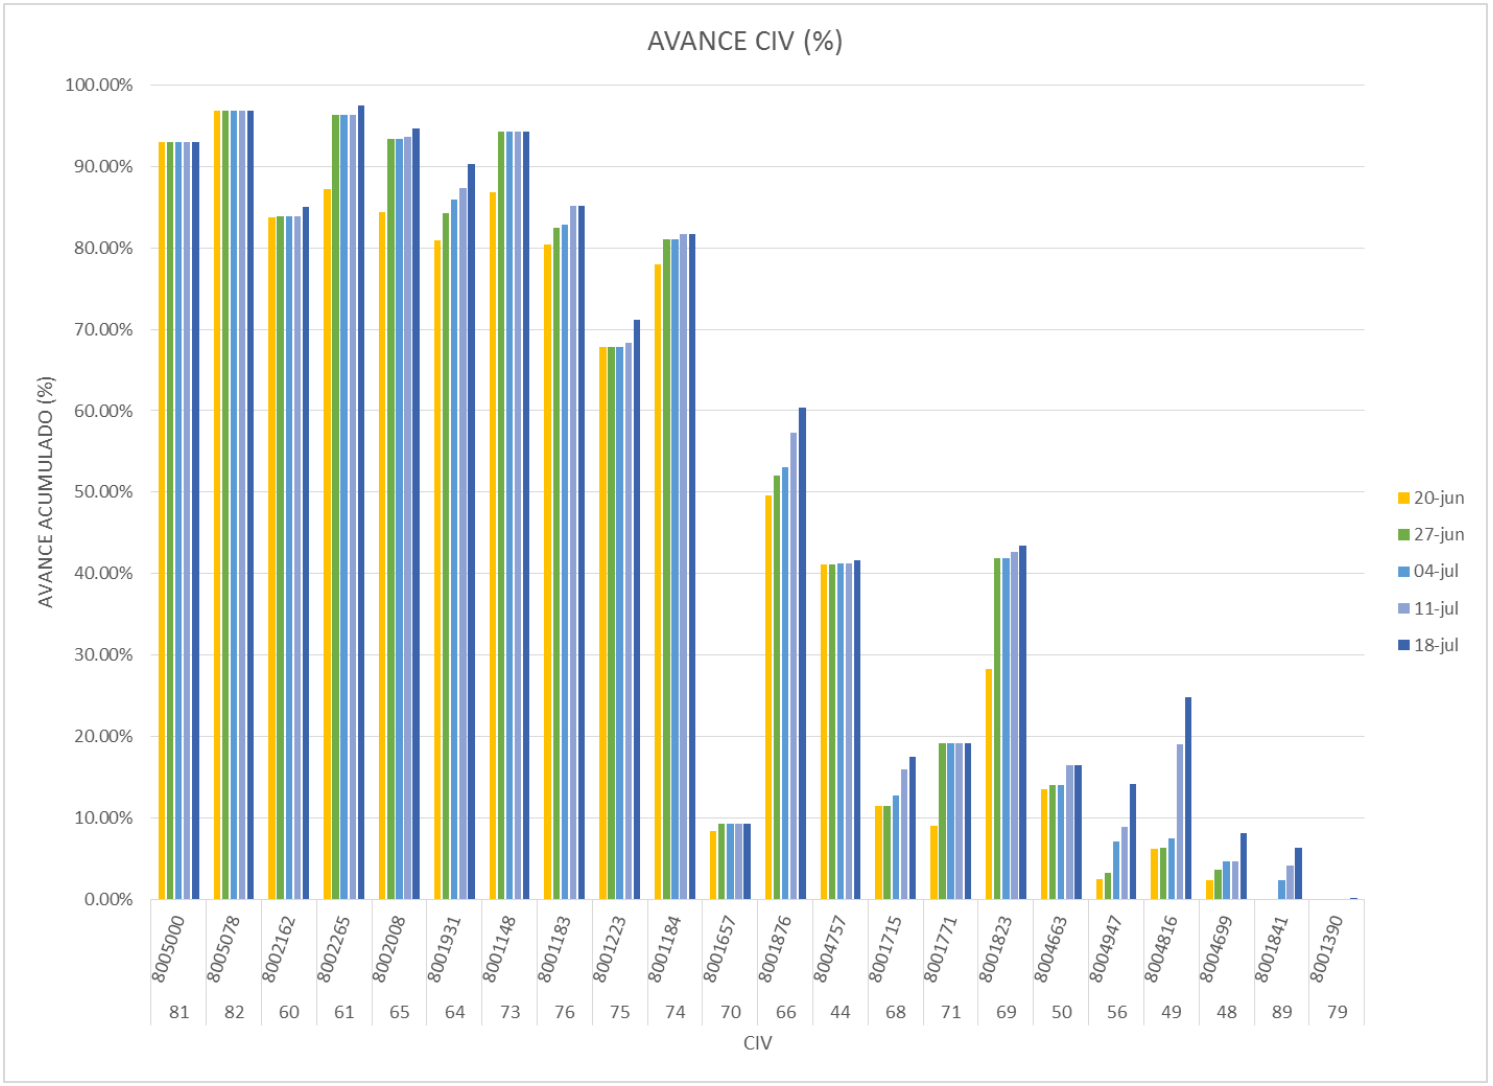

G2	18-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	70.47%	71.89%	70.47%
% EJECUTADO	22.26%	21.96%	17.78%
% DESVIACIÓN	-48.21%	-49.93%	-52.69%

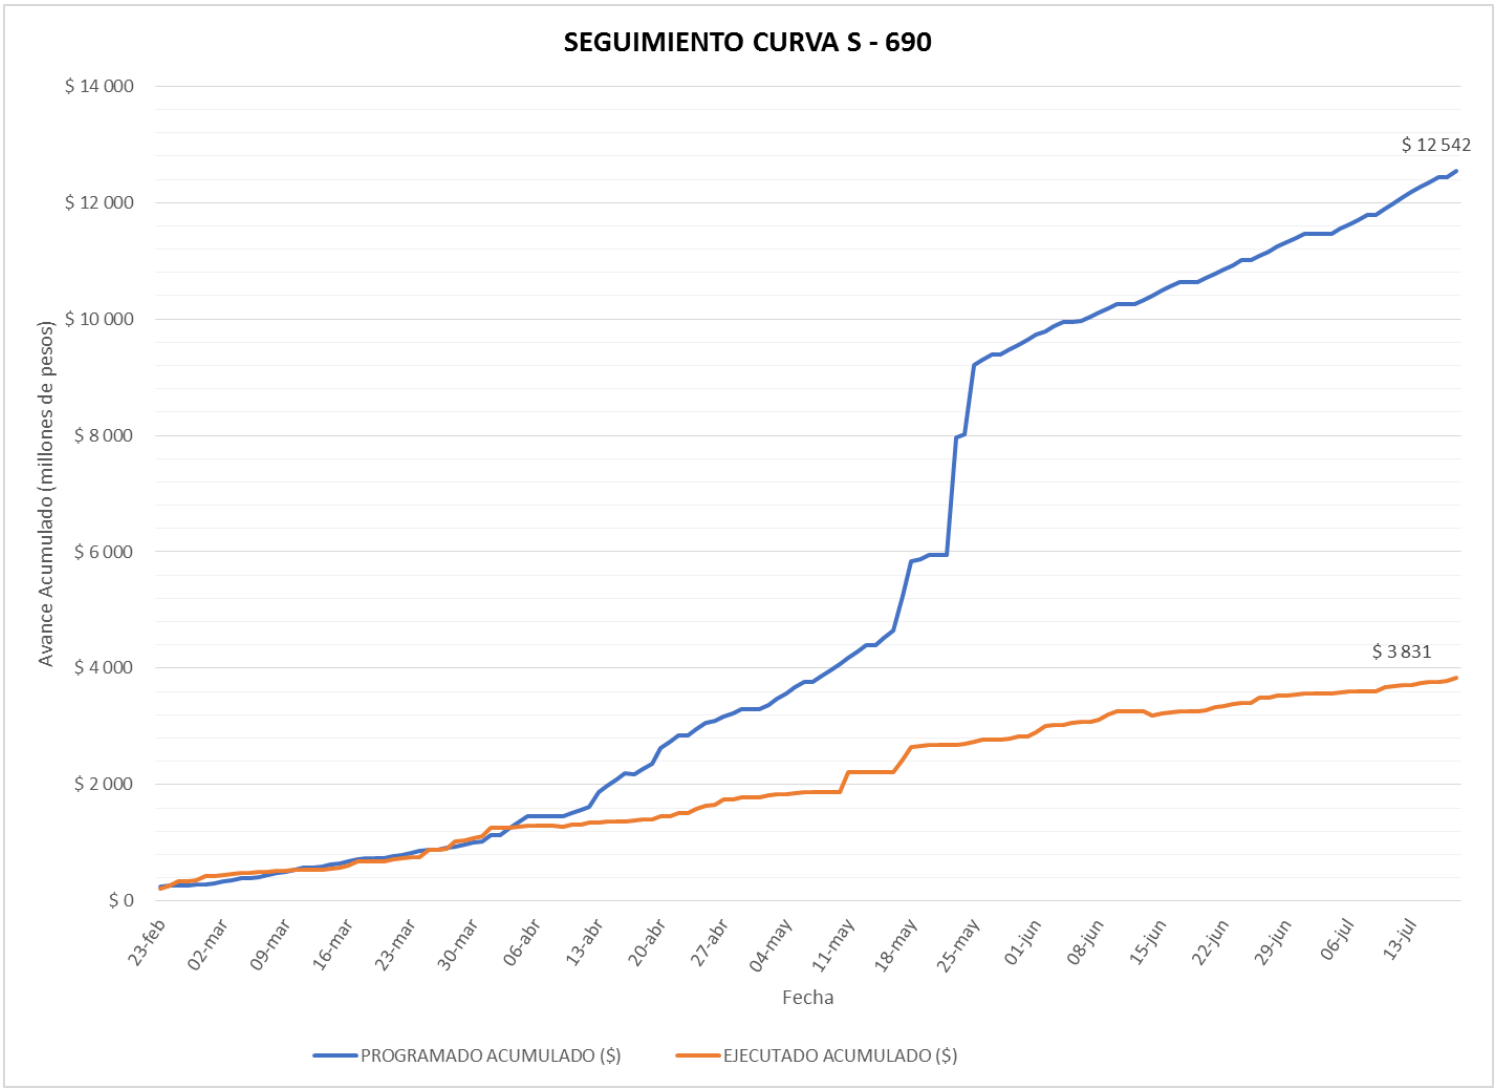
SEGUIMIENTO CURVA S - 690
$ 14 000
$ 12 000
$ 10 000
$ 8 000
$ 6 000
$ 4 000
$ 2 000
$ 0
Avance Acumulado (millones de pesos)
$ 12 542
$ 3 831
23-feb
02-mar
09-mar
16-mar
23-mar
30-mar
06-abr
13-abr
20-abr
27-abr
04-may
11-may
18-may
25-may
01-jun
08-jun
15-jun
22-jun
29-jun
06-jul
13-jul
Fecha
PROGRAMADO ACUMULADO ($)
EJECUTADO ACUMULADO ($)

			SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 18-JULIO-2023					
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
81	8005000	$ 331 062 908.00	$ 493 706 016.00	2.83%	$ 307 829 014.10	1.76%	92.98%	-1.07%
82	8005078	$ 343 085 920.00	$ 479 749 662.00	2.75%	$ 332 182 707.83	1.90%	96.82%	-0.85%
60	8002162	$ 320 721 252.00	$ 514 640 546.00	2.95%	$ 272 745 212.76	1.56%	85.04%	-1.39%
61	8002265	$ 355 199 128.00	$ 460 559 675.00	2.64%	$ 346 097 096.78	1.98%	97.44%	-0.66%
65	8002008	$ 360 580 405.00	$ 432 646 968.00	2.48%	$ 341 094 074.89	1.96%	94.60%	-0.52%
64	8001931	$ 376 367 569.00	$ 443 114 233.00	2.54%	$ 339 784 393.32	1.95%	90.28%	-0.59%
73	8001148	$ 285 710 532.00	$ 338 441 580.00	1.94%	$ 269 281 829.64	1.54%	94.25%	-0.40%
76	8001183	$ 146 013 903.00	$ 233 768 926.00	1.34%	$ 124 289 639.38	0.71%	85.12%	-0.63%
75	8001223	$ 144 206 710.00	$ 183 177 144.00	1.05%	$ 102 601 318.05	0.59%	71.15%	-0.46%
74	8001184	$ 347 413 004.00	$ 0.00	0.00%	$ 283 919 995.52	1.63%	81.72%	1.63%
70	8001657	$ 342 553 149.00	$ 394 266 995.00	2.26%	$ 32 050 753.20	0.18%	9.36%	-2.08%
66	8001876	$ 318 216 103.00	$ 430 902 424.00	2.47%	$ 192 079 618.71	1.10%	60.36%	-1.37%
44	8004757	$ 544 689 706.00	$ 416 946 070.00	2.39%	$ 226 660 864.68	1.30%	41.61%	-1.09%
68	8001715	$ 351 516 714.00	$ 413 456 981.00	2.37%	$ 21 299 305.87	0.12%	6.06%	-2.25%
71	8001771	$ 361 446 034.00	$ 429 157 879.00	2.46%	$ 101 220 892.84	0.58%	28.00%	-1.88%
69	8001823	$ 341 507 411.00	$ 443 114 233.00	2.54%	$ 60 484 381.90	0.35%	17.71%	-2.19%
50	8004663	$ 770 232 864.00	$ 544 782 393.83	3.12%	$ 134 335 950.39	0.77%	17.44%	-2.35%
56	8004947	$ 377 475 477.00	$ 444 858 777.00	2.55%	$ 44 772 878.74	0.26%	11.86%	-2.29%
49	8004816	$ 479 216 394.00	$ 0.00	0.00%	$ 189 381 518.51	1.09%	39.52%	1.09%
48	8004699	$ 983 197 315.00	$ 272 148 899.24	1.56%	$ 70 740 088.69	0.41%	7.19%	-1.15%
89	8001841	$ 580 698 248.00	$ 202 865 571.23	1.16%	$ 36 569 601.57	0.21%	6.30%	-0.95%
79	8001390	$ 629 262 662.00	$ 573 373 535.77	3.29%	$ 1 595 442.92	0.01%	0.25%	-3.28%
62	8002055	$ 443 969 911.00	$ 497 195 104.00	2.85%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.85%
63	8002132	$ 301 695 957.00	$ 436 136 056.00	2.50%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.50%
58	8002225	$ 370 268 458.00	$ 523 363 268.00	3.00%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.00%
59	8002331	$ 360 017 625.00	$ 439 625 145.00	2.52%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.52%
67	8001968	$ 386 650 290.00	$ 427 413 335.00	2.45%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.45%
92	8004910	$ 456 639 023.00	$ 546 042 342.00	3.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.13%
77	8001285	$ 564 687 707.00	$ 521 618 723.00	2.99%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.99%
80	8001581	$ 584 822 489.00	$ 336 784 262.65	1.93%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.93%
72	8001545	$ 348 655 292.00	$ 278 894 470.07	1.60%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.60%
93	8001427	$ 321 630 570.00	$ 182 207 952.22	1.04%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.04%
45	8002718	$ 739 233 204.00	$ 96 697 594.17	0.55%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.55%
46	8005377	$ 280 055 154.00	$ 101 009 110.50	0.58%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.58%
47	8005506	$ 625 940 380.00	$ 8 315 660.80	0.05%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.05%
TOTALES			**$ 12 540 981 532.48**	**71.89%**	**$ 3 831 016 580.28**	**21.96%**		**-49.93%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17 445 442 250.00**					

FECHA EVALUACIÓN			20-jun	27-jun	04-jul	11-jul	18-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331 062 908.00	92.98%	92.98%	92.98%	92.98%	92.98%
82	8005078	$ 343 085 920.00	96.82%	96.82%	96.82%	96.82%	96.82%
60	8002162	$ 320 721 252.00	83.78%	83.84%	83.84%	83.84%	85.04%
61	8002265	$ 355 199 128.00	87.19%	96.31%	96.31%	96.31%	97.44%
65	8002008	$ 360 580 405.00	84.39%	93.34%	93.34%	93.61%	94.60%
64	8001931	$ 376 367 569.00	80.95%	84.23%	85.98%	87.34%	90.28%
73	8001148	$ 285 710 532.00	86.80%	94.25%	94.25%	94.25%	94.25%
76	8001183	$ 146 013 903.00	80.41%	82.47%	82.85%	85.12%	85.12%
75	8001223	$ 144 206 710.00	67.87%	67.87%	67.87%	68.39%	71.15%
74	8001184	$ 347 413 004.00	77.97%	80.98%	80.98%	81.72%	81.72%
70	8001657	$ 342 553 149.00	8.40%	9.36%	9.36%	9.36%	9.36%
66	8001876	$ 318 216 103.00	49.56%	52.05%	53.13%	57.36%	60.36%
44	8004757	$ 544 689 706.00	41.13%	41.13%	41.21%	41.21%	41.61%
68	8001715	$ 351 516 714.00	0.00%	0.00%	1.30%	4.42%	6.06%
71	8001771	$ 361 446 034.00	17.91%	28.00%	28.00%	28.00%	28.00%
69	8001823	$ 341 507 411.00	2.52%	16.14%	16.14%	17.01%	17.71%
50	8004663	$ 770 232 864.00	14.48%	15.04%	15.04%	17.44%	17.44%
56	8004947	$ 377 475 477.00	0.18%	0.85%	4.71%	6.57%	11.86%
49	8004816	$ 479 216 394.00	20.87%	21.00%	22.25%	33.77%	39.52%
48	8004699	$ 983 197 315.00	1.47%	2.75%	3.80%	3.80%	7.19%
89	8001841	$ 580 698 248.00	0.00%	0.00%	2.39%	4.21%	6.30%
79	8001390	$ 443 969 911.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	13-jul	14-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$ 12 177	$ 12 266	$ 12 355	$ 12 444	$ 12 444	$ 12 542
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	69.80%	70.31%	70.82%	71.33%	71.33%	71.89%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$ 3 714	$ 3 753	$ 3 755	$ 3 755	$ 3 778	$ 3 831
EJECUTADO ACUMULADO (%)	21.29%	21.51%	21.53%	21.53%	21.66%	21.96%
DESVIACIÓN ($)	$ 8 463	$ 8 513	$ 8 600	$ 8 689	$ 8 665	$ 8 711
DESVIACIÓN (%)	-48.51%	-48.80%	-49.29%	-49.80%	-49.67%	-49.93%

FECHA EVALUACIÓN			18-jul
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331 062 908.00	0.00%
82	8005078	$ 343 085 920.00	0.00%
60	8002162	$ 320 721 252.00	1.21%
61	8002265	$ 355 199 128.00	1.12%
65	8002008	$ 360 580 405.00	0.99%
64	8001931	$ 376 367 569.00	2.94%
73	8001148	$ 285 710 532.00	0.00%
76	8001183	$ 146 013 903.00	0.00%
75	8001223	$ 144 206 710.00	2.76%
74	8001184	$ 347 413 004.00	0.00%
70	8001657	$ 342 553 149.00	0.00%
66	8001876	$ 318 216 103.00	3.00%
44	8004757	$ 544 689 706.00	0.41%
68	8001715	$ 351 516 714.00	1.64%
71	8001771	$ 361 446 034.00	0.00%
69	8001823	$ 341 507 411.00	0.70%
50	8004663	$ 770 232 864.00	0.00%
56	8004947	$ 377 475 477.00	5.29%
49	8004816	$ 479 216 394.00	5.75%
48	8004699	$ 983 197 315.00	3.39%
89	8001841	$ 580 698 248.00	2.09%
79	8001390	$ 443 969 911.00	0.25%
