BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 27/Julio/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite integral # 10 de seguimiento # 42.

HORA DE INICIO: 10:40 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andres Mauricio Rojas LL.			X						X	FDLK - Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3053034773	
Danilo Meneses Toro			X						X	FDLK - Infraestructura	Danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co	3118988024	
Oswaldo Ladino Chaves			X						X	SCLV - Interventoría	dir.viales@silcarsa.com	3103178077	
Juan Manuel Alba Rojas			X						X	SCLV - Interventoría	gerencia@lavialidad.com	3107671842	
Katerine Samboni			X							SCLV - Interventoría	KSamboni@Outlook.com	3138896513	
ARTURO ZARATE			X						X	INTERV. SCLV	arturo zarate 91 @yahoo.com	3152360071	
Fernando A Osma P			X						X	CVK22	fernando.osmap@gmail.com	3169963905	
Steven Beltran Solis			X						X	CVK22	Steven619@hotmail.com	3123181328	
Gladys Sarita Molina Pita			X						X	CVK22 - Contratista	cvk22.director@gmail.com	3004938576	
STEBAN GONZALEZ			X						X	CVK22		3106192989	
CAROLINA ROCHA		X							X	CVK22	crochad@aiegrap.co	3506787891	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: _____ **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Laura Daniela Diaz			X							Interventoria-Consorcio SCLV	dlaura0896@gmail.com	3168270441	
Karen Julieth Perales Ramirez.			X							Interventoria - Consorcio SCLV	u2333scukennedy@outlook.com	3143253724	
Anyeli Curiel Acosta			X							Interventoria Consorcio SCLV	u2335scukennedy@outlook.com	3227401898	
Carlos Benavides M.			X							Interventoria. SCLV	maquinaria.sclv@outlook.com	3132110586	
Sandra Patricia Gonzalez C.			X							Interventoria SCLV	sstkennedy@outlook.com	3178955603	
Jorge E. Ramayo M			X						X	Interventoria SCLV	[illegible]	317.4410997	
Carlos Eduardo Zabala			X							Consorcio Vias Kennedy	CVK22.SST@gmail.com	3143305882.	
Eliana Salamanca.			X							CVK22.	ing.elianasalamanca@gmail.	3002633301	
Adriana Geisha Alba			X						X	CVK.22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391167	
Yanet Claro Peñaranda			X							Interv. SCLV	Yanet.claro3@gmail.com	3143955825	
Luisa Jaimes Rodriguez.			X						X	interv. SCLV	sociogrupo2@gmail.com	3214557623.	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar infonnación sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: _____ **Virtual:** ____ **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Martha C. Rodriguez H.										CVK. Área social	cvksocial2@gmail.com	3114883473	
Mario Javier Delgado C.			X						X	Interventora / Esp. Urbanismo	maja.arq@gmail.com	3132124564	
John Fonseca H.			X						X	CVK - Forestal	ambiental_kennedy@yahoo.es	3105626865	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité integral No. 10 de seguimiento No. 42 a las 10:40 am en las instalaciones de Interventoría con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Supervisión del FDLK.

Componente Ambiental
Informe semanal 42: Aprobado
Informe mensual 8: La Interventoría indica que, de acuerdo con la mesa de trabajo no se ha terminado de validar las cantidades de fresado, sin embargo, se aprobó el Informe quedando condicionado el Informe mensual No. 9 correspondiente a junio
Calificación: 100%

La Interventoría indica que, en cuanto a las bolsas de cemento, se están llevando a Soluciones Integrales y ya se recibió la certificación. Por otra parte, el Contratista informa que, ya se atendieron las observaciones realizadas por la alcaldía con respecto a la solicitud de los permisos nocturnos.

Componente SST
Informe semanal 42: Aprobado
Informe mensual 9: En revisión en mesa de trabajo.
Ingresos: 3 trabajadores (1 ayudante y 2 operadores)
Retiros: 1 operador
Ausentismo: 0,27%
Rotación: 0% con personal de mano de obra no calificada
Calificación semanal: 100%
Calificación mensual junio: 98,75%, se afectó el ítem de señalización por el paflón cuando ocurrió el accidente con un ciudadano.

Componente Social
La Interventoría informa que:

- El Contratista se encuentra atendiendo observaciones de la presentación del comité veedor.
- Mañana se realizará el comité veedor FDLK a las 8:00 am y 10:30 am.
- El Contratista continúa con los remates en las prioridades 81, 82, 61, 65 y 73 para hacer el cierre de actas de vecindad.
- Para el taller de cultura ciudadana, el Contratista ya cuenta con los 2 grupos focales para realizar el taller, el cual se tiene programado para la segunda semana de agosto.
- Se entregó volante para el inicio de la malla vial en la P77, que tiene fecha de inicio mañana, 28 de julio de 2023.
- Se entregaron volantes por trabajos nocturnos que se realizaron en las prioridades 60 y 64, donde asfaltaron hasta las 8:00 pm.
- Se tiene 1 PQRSD abierta, dado que, el martes se presentó un inconveniente en el punto PAC, un ciudadano de la P61 se acercó un poco disgustado porque comenta que lleva 2 meses esperando que se

haga un arreglo en el predio y no ha sido solucionado, lo que comenta el Contratista es que en recorrido con la Interventoría se acordó que se hiciera un redondeo en la rejilla del predio en el punto PAC. El ciudadano manifestaba que tenía un empozamiento en el predio, se verificó por parte del Contratista y encontraron que tenía una bolsa que tapaba la rejilla para el desagüe, se le retiró, pero comenta que se sigue inundando, se ha tratado de hacer visita al predio, pero no ha sido posible encontrar al ciudadano. La PQRSD se abrió debido a la inundación que se presenta en el predio, el ciudadano solicita que se le haga en la rejilla la ampliación del diámetro de captación (adecuar el sifón). El Contratista informa que, se están haciendo los remates de los sumideros para poder hacer todos los remates de predios.

- El Contratista solicita acompañamiento de la Interventoría para hacer el cierre del acta de vecindad del predio del señor Edgar Ávila de la prioridad 82. Se estuvo haciendo seguimiento y el ciudadano manifiesta que tiene unas fisuras en el cuarto piso.
- Ayer se acercó un ciudadano al PAC manifestando que tiene un medidor que está en ceros y solicita que se le haga la conexión de la red de acueducto al predio, pero el señor no cuenta con red ni mangueras, solamente está el medidor en ceros sin collarín. El Contratista informa que, se encontró un medidor instalado puesto con una cajilla, al retirarse el medidor no se tiene conexión con la tubería principal, el ciudadano si tiene una cuenta contrato en el acueducto y hoy se hizo acercamiento con el acueducto para saber en que estado está la cuenta y el acueducto indicó que va a realizar visita al predio.
- En la P70 se encontró un medidor dañado, se hizo acercamiento, pero el ciudadano no se encontraba en el predio, por lo que se llamó a un líder comunal de la zona y se dejó un acta con registro fotográfico donde se evidencia como se encontró el medidor. La solución sería informarle al propietario que su medidor está dañado y que él haga la gestión de comprarlo y que lo instale.

El Contratista manifiesta que, dentro de las excavaciones de los andenes, en las demoliciones se ha encontrado que mucho de los predios no tienen sus acometidas eléctricas organizadas, en la P70 las acometidas están por el anden adosadas en la placa de concreto, al momento de demoler la placa se daña y el Contratista indica que no pueden ser garantes de esto. Por lo anterior, el apoyo a la supervisión va a gestionar acercamiento con Codensa.

Calificación: 98%
El Contratista no se encuentra de acuerdo con la calificación de la semana, porque en la calificación se afectaron 2 ítems con respecto a actas de compromiso que se tenían que elaborar, pero no se hicieron el día que era.

La señora Blanca Velandia se comunicó con la parte social del Contratista, donde manifestó que no se encontraba de acuerdo con la pendiente de la rampa vehicular que se le iba a hacer, el residente técnico y la profesional se acercaron al predio y le explicaron a la señora como se tenía que hacer la pendiente y se dejo por escrito en acta de reunión social. Ese mismo día, la señora manifestó que cuando se estaba demoliendo el espacio público se le daño la fachada por la parte interna de la vivienda. La señora para dejar soporte de está actividad, envía la queja al correo del contratista y de interventoría, y se quedo con la Interventoría de no abrir una PQRSD porque ya se tenia conocimiento, sin embargo, se abrió un acta de compromiso en el formato de acta de compromiso, donde se le reitera a la ciudadana que se le iba a arreglar la fachada y ayer se le arregló el predio y se cerró el acta de compromiso. La Interventoría indica que, la ciudadana fue al PAC y la queja no fue atendida y por eso remitió la queja por correo electrónico, porque necesitaba un soporte que le garantizara que le iban a hacer el arreglo en el predio.

Se solicita al Contratista no ascender temas como la calificación a comités de seguimiento, y que se le de un manejo interno entre los pares. Asimismo, el Contratista solicita que las calificaciones se les informe en el comité interno del componente social.

Tránsito y Transporte

La Interventoría informa que, de los 50 CIVs se tienen:

- 9 CIVs en etapa 1
- 6 CIVs en etapa 2
- 9 CIVs en etapa 3
- 2 CIVs terminados
- 10 CIVs en proceso de aprobación por parte de la SDM
- 14 CIVs sin solicitud de ningún permiso

- El PMT de las prioridades 48 y 49 vencen el 3 de agosto de 2023, pero posiblemente salen mañana con aprobación de la SDM para la etapa 1 el 48 y etapa 2 el 49.
- Es importante indicar que, para que haya un PMT terminado debe ser porque se venció la fecha, se terminó o porque se haya oficiado a la SDM que ya no se requiere y se cierre oficialmente.
- Para obra, cuando haya terminaciones, o cuando haya rejillas, sumideros, cajas, señalización, bolardos etc., debe haber un PMT que respalde dicho trabajo, estos PMTs pueden ser típicos y el FDLK sugiere que se vayan tramitando con antelación.
- A partir de está semana y de aquí en adelante se debe pasar el PMT para solicitud de firma y aprobación la semana antes de cuando se vaya a radicar a la SDM y los martes siguientes se van a realizar recorrido para verificar el PMT, para el cual debe asistir el especialista del Contratista. Siempre que haya PMT se hará ese recorrido para revisión de esa solicitud y posteriormente cuando ya este aprobado por la SDM se realiza recorrido para revisar la implementación. Esto implica que por lo menos una semana antes se debe enviar para que la radicación sea oportuna la semana siguiente a la SDM.
- Se recibieron 2 oficios de incumplimiento por parte de la SDM para la prioridad 56, 48 y 49. Ayer el Contratista dio respuesta a la SDM, para la P56 la SDM indicaba que había un camión haciendo cargue y descargue obstruyendo la intersección sin tener aprobación para esto, el Contratista le responde que este camión no pertenece al Contrato, sino de una empresa de telecomunicaciones. Para las P48 y P49, estaban mal implementados unos cierres y una intersección y el Contratista en la respuesta a la SDM le allegó registro fotográfico donde esta corregida la implementación. El siguiente incumplimiento es de las prioridades 81 y 82, por estar trabajando sin PMT, la Interventoría informa se avisó con anticipación que se iban a terminar las vigencias y el 7 de junio de 2023 se firmó para solicitar la prórroga, pero nunca la radicó el Contratista a la SDM.

Redes húmedas

P49: El Contratista indica que, se tiene un inconveniente en un CIV con la conexión final de la salida a los sumideros, según diseños toca hacerlos sobre una red de 2.10 metros y tiene un pozo proyectado encima, por el diámetro de esa tubería obliga a hacer una cámara de inspección de la cual no hay diseños, no se puede hacer un pozo típico porque no lo permite la norma. Además, el Contratista manifiesta que, el problema es que no se

tiene cámara existente en la bocacalle donde va el CIV, por tanto, la sugerencia que se está elaborando, teniendo en cuenta que no está entre norma, es dejar el desagüe por el sardinel del monoblock del CIV directamente a la calzada existente, hay unas estructuras de captación aledañas, si dan la viabilidad, sería evaluar hidráulicamente esas estructuras si tienen la capacidad y la conexión final hacerla directamente a la calzada. La Interventoría solicita al Contratista que, esta propuesta se le dé a conocer al acueducto, para tener visto bueno por parte de la entidad.

Por otra parte, la Interventoría informa que, en casos donde se tengan colectores colmatados, el tema de contratación del vactor implica un factor económico, al vactor se le debe pagar por hora laborada, y es un cobro el cual no está dispuesto a cubrir el Contratista. Por lo anterior, el FDLK indica que se puede proyectar un oficio en el cual se indique que la solicitud se realiza en el marco de la misionalidad de la EAAB, la cual tienen como finalidad mantener las redes, y así se podría surtir el tema, porque finalmente las redes existentes son de la EAAB y por lo tanto, deben garantizar la estabilidad hidráulica del sistema y si está represado aguas abajo, eso va a represar las nuevas obras y al presentarse alguna calamidad le imputan el tema de algún desborde o de algún pozo al Contratista, lo cual no se puede permitir. El contratista deberá enviar la solicitud el estado de los pozos y el colector para que se escale el tema desde el FDLK.

El Contratista informa que, se han hecho las inspecciones CCTV de las prioridades que están siendo intervenidas y en la P44 se debe hacer de cambio de unas conexiones erradas.

Diseño Geométrico

El Contratista informa que, se envió la atención de observaciones de las áreas separadas de andén de los CIVs, y se ha ido retroalimentando esas mismas cantidades con la nivelación que se hace en terreno antes de iniciar cada segmento para verificar que los empalmes con vías existentes estén de acuerdo con el diseño.

La Interventoría informa que:

- Se encuentran 20 CIVs los cuales las cantidades están acordes.
- Se vienen haciendo ajustes a medida que se va haciendo la intervención. Cuando se inició el contrato, se identificaron una serie de cambios o ajustes que había que hacer y unas implementaciones de acuerdo con los parámetros de diseño que se han implementado, sobre todo en aquellos puntos donde la diferencia algebraica entre las dos pendientes era superior al 1%, es decir, se debían hacer ajustes a los diseños originales porque en muchos de los empalmes las condiciones cambiaron de acuerdo con el diseño original, por lo tanto, hay que hacer ajustes en todos los CIVs por los empalmes y también de acuerdo con las condiciones que se vayan encontrando en la zona.
- El 13 de julio de 2023, el Contratista remitió las cantidades de 21 CIVs, el 14 de julio envían los 50 CIVs y dejan una nota donde indican que 21 ya son intervenidos y los otros 29 sin intervenir. De acuerdo con la revisión, de los 21 se encontró que en la prioridad 48 hay unas diferencias entre el diseño que esta en el civil 3D vs lo que estaba en el plano de diseños definitivos, por lo tanto, no coincide la cartera de replanteo, sin embargo, los otros 20 las cantidades sí coinciden.
- De los 29 CIVs, el Contratista corrió las secciones transversales con la nueva estructura de pavimentos, pero manteniendo los diseños originales, es decir, no se ha hecho el ajuste con la topografía actualizada de

acuerdo con las condiciones actuales, por lo tanto, las cantidades no corresponden a un diseño geométrico ajustado.

Por lo anterior, el Contratista manifiesta que, la idea es ir enviando con suficiente tiempo el ajuste de los CIVs que se vayan interviniendo.

Espacio Público

El contratista manifiesta que, el cambio de bolardo se debe hacer debido a la inseguridad de la zona y el hurto de bolardos metálicos. La Interventoría indica que, se debe revisar el cambio de bolardo con la nueva cartilla donde se encuentran unos más pequeños y mirar si se pueden implementar. Adicionalmente, se debe programar recorrido para la próxima semana con el Contratista.

Pavimentos

El Contratista informa que:

- Se ha dispuesto la última capa de 2 segmentos, la idea es cada semana ir terminando por lo menos 2 o 3 segmentos de los que se tienen abiertos en este momento.
- Adicionalmente, el material de fresado que se retira del patio IDU está llegando con material granular el cual no es contaminado es material granular limpio, sin embargo, dentro de la disposición que se hace del fresado con la estabilización y demás, queda parte de este material granular, se van a realizar ensayos de laboratorio de límites, caracterización entre otros, donde se demuestre que este material no es contaminado. Mientras tanto, el material esta siendo utilizado para espacio público.

El FDLK indica que, para liberar las capas de estabilizado de espacio público y poder fundir, se deben tomar densidades, pero el Contratista manifiesta que, en el plan de inspección de ensayos se tiene la toma de briquetas con el cumplimiento a los 7 días en cada jornada de mezclado y no se tiene la verificación para los andenes. Asimismo, indica que. para el fresado estabilizado de calzada se están haciendo unas briquetas de acuerdo con lo que se ha hablado en oportunidades anteriores. Por lo anterior, el FDLK solicita que se realice la toma de densidades para espacio público y a su vez la revisión del plan de inspección de ensayos de Contratista e Interventoría y que los especialistas evalúen como se están liberando esas capas y si es el caso actualizar el mismo.

Maquinaria y Equipo

La Interventoría indica que, contractualmente y por ley se pide que las volquetas presenten la revisión preoperacional diariamente para su ingreso a obra, se va a llevar un control mas estricto porque es posible que no se esté cumpliendo diariamente. Se le solicitó al Contratista que, por lo menos presentarán el formato del subcontratista del dueño de las volquetas, que debe hacer la revisión antes de que la volqueta salga a hacer su recorrido, puesto que este formato es la base para diligenciar el formato que se presenta en el Informe. Por su parte, el Contratista manifiesta que, el control se vuelve un poco dispendioso porque las volquetas no solo trabajan en este contrato, pero, sin embargo, se compromete a realizar un seguimiento diario de las mimas.

Redes secas

La Interventoría indica que, el Contratista no ha entregado planos de gas de inventario, ni tampoco ha dado respuesta a los oficios donde se solicitó que se entregara estos planos, así como la respuesta a las afectaciones a las redes de MOVISTAR, tampoco han entregado actualización de inventario de redes secas, de acuerdo con lo que se habían comprometido hace más de 2 meses.

P82: Se encuentra cámara de movistar, el 80% de la cámara es por fuera del limite del proyecto y el otro 20% ya está bajo asfalto que se instaló. La empresa, informa que no es una cámara que en este momento estuvieran requiriendo, si en algún momento se necesita movistar se encarga de hacer la renivelación.

Forestal

Se recibió un requerimiento de la SDA para continuar con el trámite de permiso de tala de unos arboles que ya se talaron por un tercero desconocido, lo cual fue informado en su momento a la SDA por parte del FDLK que no se iba a continuar con el proceso de solicitud de tala de los individuos arbóreos.

Componente técnico

Frentes de obra activos: 14 (23 CIVs)
CIVs intermitentes: 13
CIVs Pavimentados: 7
CIVs listos para pavimentar: 1 (P74)
Calificación: 100%

La Interventoría solicita que, la entrega de los CIVs que se vayan a pavimentar se haga con 2 o 3 días de anticipación para poder hacer la verificación y la validación de los mismos y en caso de que haya alguna observación el Contratista tenga el tiempo para atenderla.

En las prioridades 44 y 74 se deben hacer perforaciones dirigidas, el Contratista indica que solicitó otro concepto de otro proveedor el cual informa que si se debe hacer la dirigida con camisa metálica y está semana se pasaría el precio a la Interventoría para que lo evalúe y hay otros cortos que si se pueden manejar con zanja abierta. El FDLK solicita gestionar las perforaciones dirigidas para poder liberar el tramo de la P74.

Programación

El avance semanal fue de 0.73%.

G2	25-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	72.55%	74.66%	72.55%
% EJECUTADO	23.04%	22.74%	17.78%
% DESVIACIÓN	-49.51%	-51.92%	-54.77%

Facturación

Preacta No. 8 de mayo: El Contratista radicó hoy la atención a observaciones y la Interventoría da concepto hoy mismo.
Informe mensual No. 8: El Contratista radica mañana 28 de julio de 2023.

Cuenta No. 8 con todos los soportes: El Contratista indica que, teniendo la aprobación del acta, mañana radicarían la cuenta para revisión de la Interventoría y la Interventoría da concepto de la revisión el martes 1 de agosto de 2023.

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Inventario de redes secas	CVK22	4-agos-23
2	Remisión de oficio para la EAAB respecto a limpieza de colectores colmatados.	CVK22	3-agos-23
3	Informe mensual técnico No. 8	CVK22	28-jul-23
4	Cuenta No. 8 con todos los soportes	CVK22	28-jul-23
5	Mesa de trabajo PIE	CVK22 SCLV	Por confirmar

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas
Fecha de la próxima reunión: 3 de agosto de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

AGENDA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

Contratista de Obra Consorcio Vías de Kennedy – COP -690-22 Grupo 2

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.42

Fecha: 27 de julio de 2023

ORDEN DEL DIA

1.Compromisos				
No	**Asunto**	**Responsable**	**Fecha de compromiso**	**Cumplió SI/NO**
1	Inventario de redes secas	Contratista	26-jul-23	NO
2	Respuesta a la comunicación U233-G2-492-23 *Observaciones a Plan Detallado de Trabajo – PDT.*	Contratista	26-jul-23	NO
3	Carta de CEMEX donde manifieste que no cuenta con espacio en bodega para recibo de bolsas de cemento.	Contratista	26-jul-23	SI
4	Simulación de acta parcial final con cantidades a la fecha	Contratista e interventoría	26-jul-23	NO
5	Respuesta a el oficio 20225833427711 *Solicitud permiso trabajo nocturno*	Contratista	26-jul-23	NO
6	Mesa de trabajo revisión NP 31 al 44.	Contratista e interventoría	25-jul-23	SI
7	Mesa de trabajo conciliación de cantidades de fresado.	Contratista e interventoría	25-jul-23	SI
8	Solución grafica continuidad de monoblock P48 costado oriental por interferencia de postes.	Contratista	26-jul-23	NO

2. Componentes
A. Técnico
- **Informes semanales mayo:** En revisión de interventoría - **Informes semanales junio:** Observados
- **Informe Mensual 8 (mayo):** Pendiente por definir cantidades de pre-acta
- **Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo):** En atención de observaciones por el contratista.
- **Cuenta No. 8 (mayo):** Sin radicar
- **Calificación semanal:** 100%
B. SST
- **Informe semanal 42:** Aprobado
- **Informe Mensual 9 (junio)**: En revisión de la interventoría.


-	**Ingresos en la semana:** 1 ayudante, 2 operadores
-	**Retiros en la semana:** 1 operador
-	**Calificación semanal:** 100%
C.	**Ambiental**
-	**Informe semanal 42:** Sin radicar
-	**Informe Mensual 8 (mayo):** Aprobado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Observado
-	**Calificación semanal:** 100%
D.	**Gestión Social**
-	**Informe semanal 41:** Aprobado
-	**Informe Mensual 9 (junio):** Aprobado
-	**Calificación semanal:** 98%
Especialidades	
Obra	

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
81	8005000	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
82	8005078	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
60	8002162	**Calzada:** Renivelación para la instalación de asfalto **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
61	8002265	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
64	8001931	**Calzada:** Instalación de fresado estabilizado, renivelación para la instalación de asfalto **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
65	8002008	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad.
73	8001148	**Calzada:** Sin actividad. **Andén norte:** Sin actividad **Andén sur:** Sin actividad.
74	8001184	**Calzada:** Excavación manual para la instalación de tubería pozo en parte oriental de la calzada **Andén norte:** Sin actividad

Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén sur: Sin actividad.
75	8001223	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Conformación espacio público, instalación de bordillo, fresado e instalación de concreto
76	8001183	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Instalación de concreto MR-41 **Andén occidental:** Sin actividad**.**
66	8001876	**Calzada:** Excavación manual para la instalación de tubería pozo e instalación de concreto 3000 psi para placa de tubería de pozo. **Andén oriental:** Instalación de concreto MR-41. **Andén occidental:** Sin actividad.
44	8004757	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil. **Andén occidental:** Excavación manual e instalación de fresado y geotextil.
50	8004663	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Excavación manual e instalación de fresado y geotextil
68	8001715	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Se realiza instalación de concreto MR-41 **Andén occidental:** Se realiza instalación de concreto 3000 psi.
69	8001823	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil **Andén occidental:** Demolición de cajas de inspección, excavación manual e instalación de fresado y geotextil
70	8001657	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Demolición de cajas de inspección, excavación mecánica y excavación manual. **Andén occidental:** Sin actividad.
71	8001771	**Calzada:** Sin actividad **Anden oriental:** Sin actividad**.** **Anden occidental:** Sin actividad.
49	8004816	**Calzada:** Sin actividad **Andén oriental:** Excavación manual e instalación de monoblock


Prioridad	CIV	Actividades desarrolladas en la semana
		Andén occidental: Excavación manual e instalación de monoblock.
48	8004699	**Calzada:** Sin actividad. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad.
56	8004947	**Calzada:** Excavación mecánica e instalación de fresado y geo celda. **Andén oriental:** Sin actividad. **Andén occidental:** Sin actividad
89	8001841	**Calzada:** Se realiza instalación de geotextil, geo celda y fresado **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
79	8001390	**Calzada:** Se realiza con excavación mecánica, instalación de geotextil, geo celda y fresado. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad
80	8001581	**Calzada:** Se realiza apertura al CIN e inician con excavación mecánica. **Andén oriental:** Sin actividad **Andén occidental:** Sin actividad

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

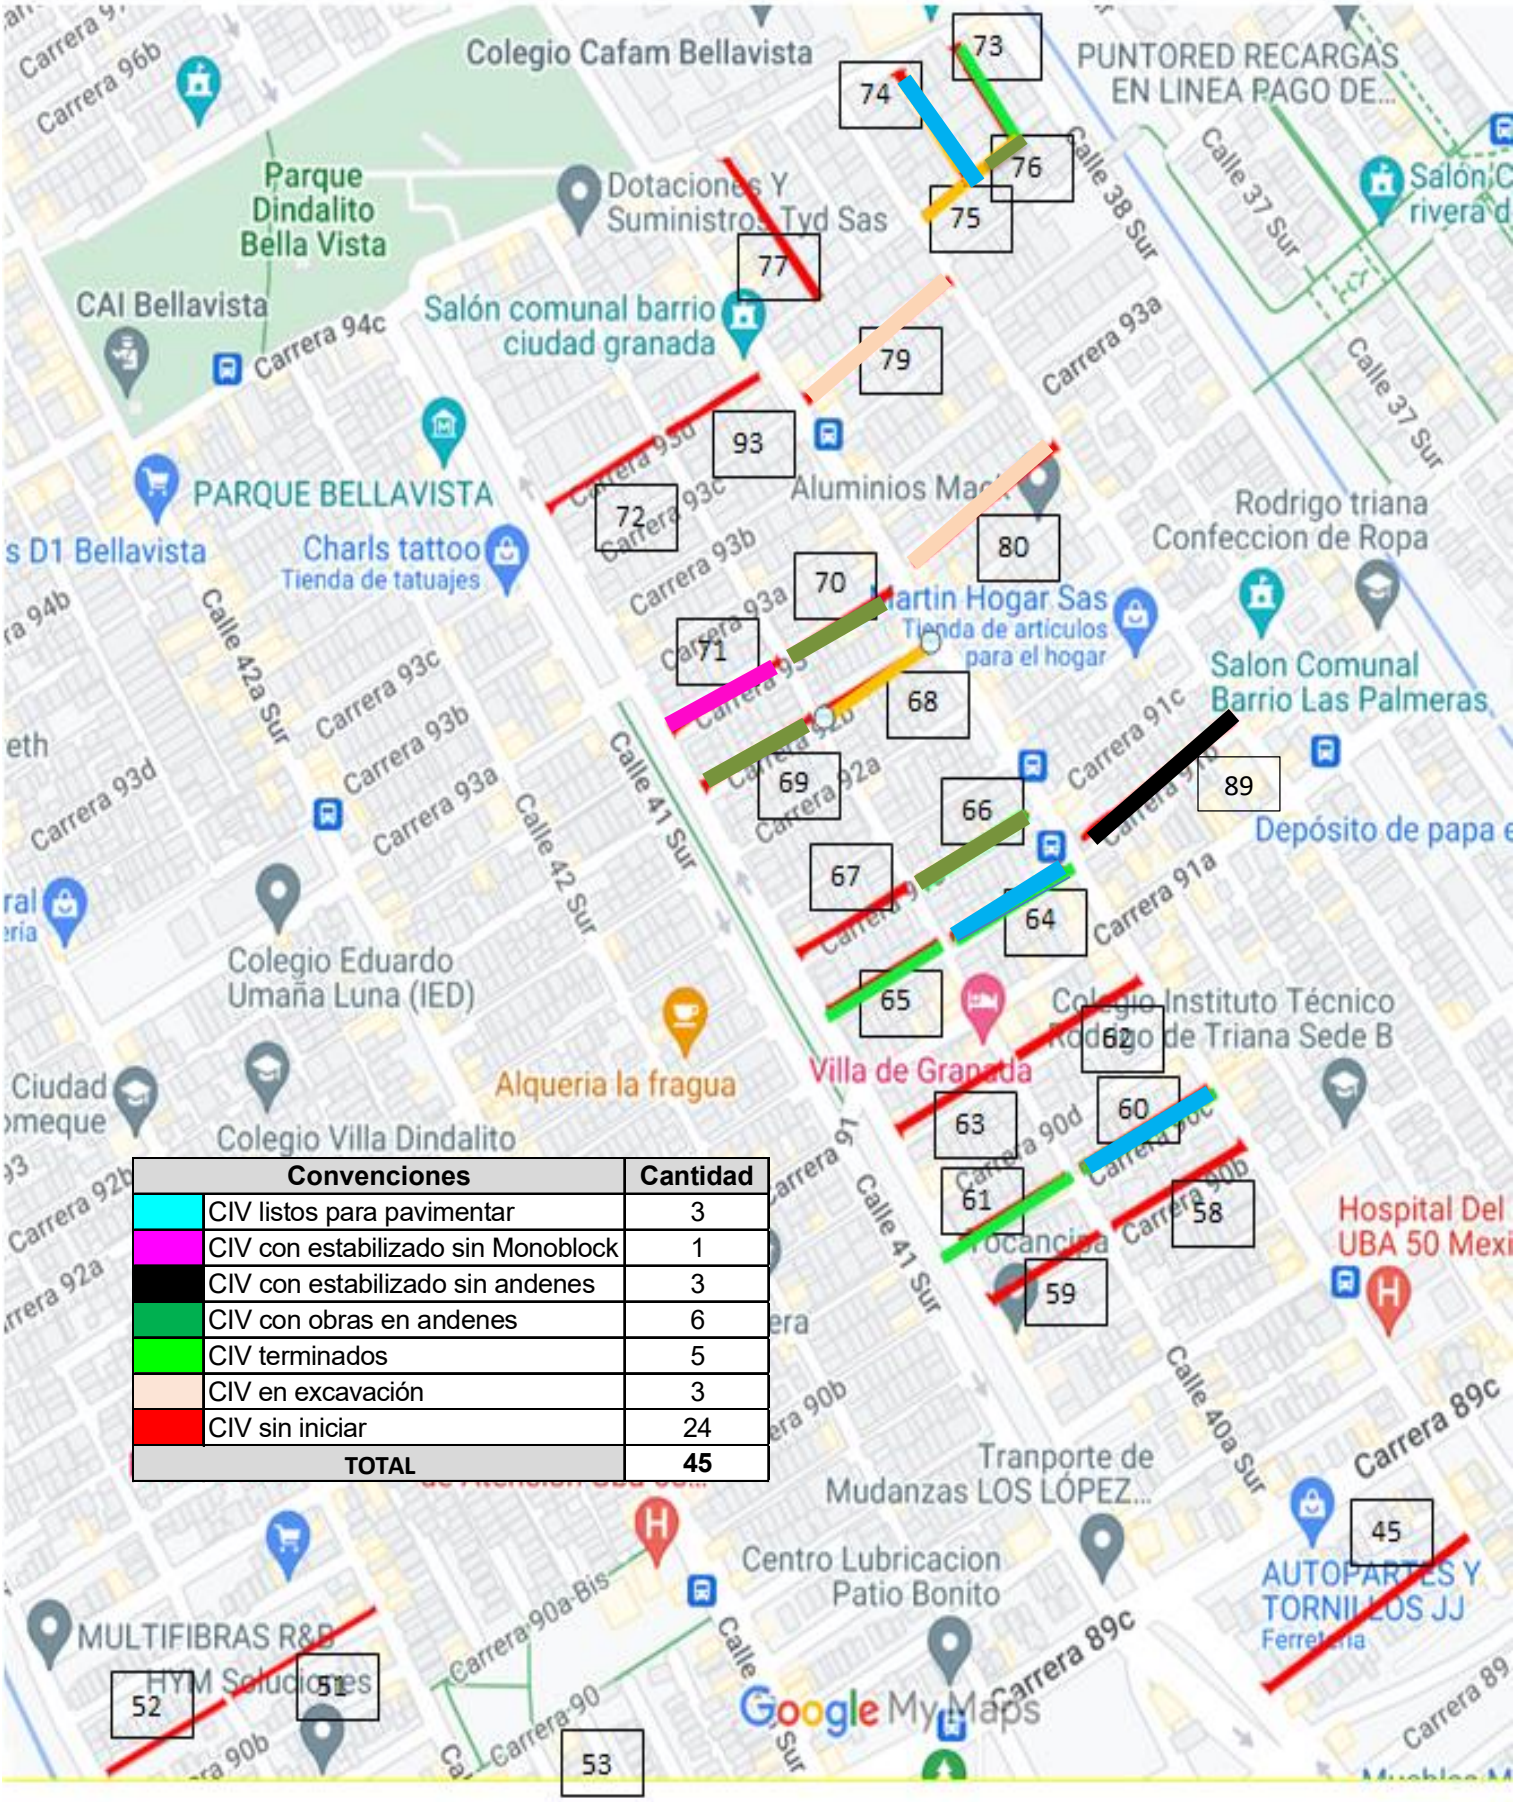

Convenciones	Cantidad
CIV listos para pavimentar	3
CIV con estabilizado sin Monoblock	1
CIV con estabilizado sin andenes	3
CIV con obras en andenes	6
CIV terminados	5
CIV en excavación	3
CIV sin iniciar	24
TOTAL	**45**

GRUPO 2 – CONSORCIO VÍAS KENNEDY 2022 COP-690-22

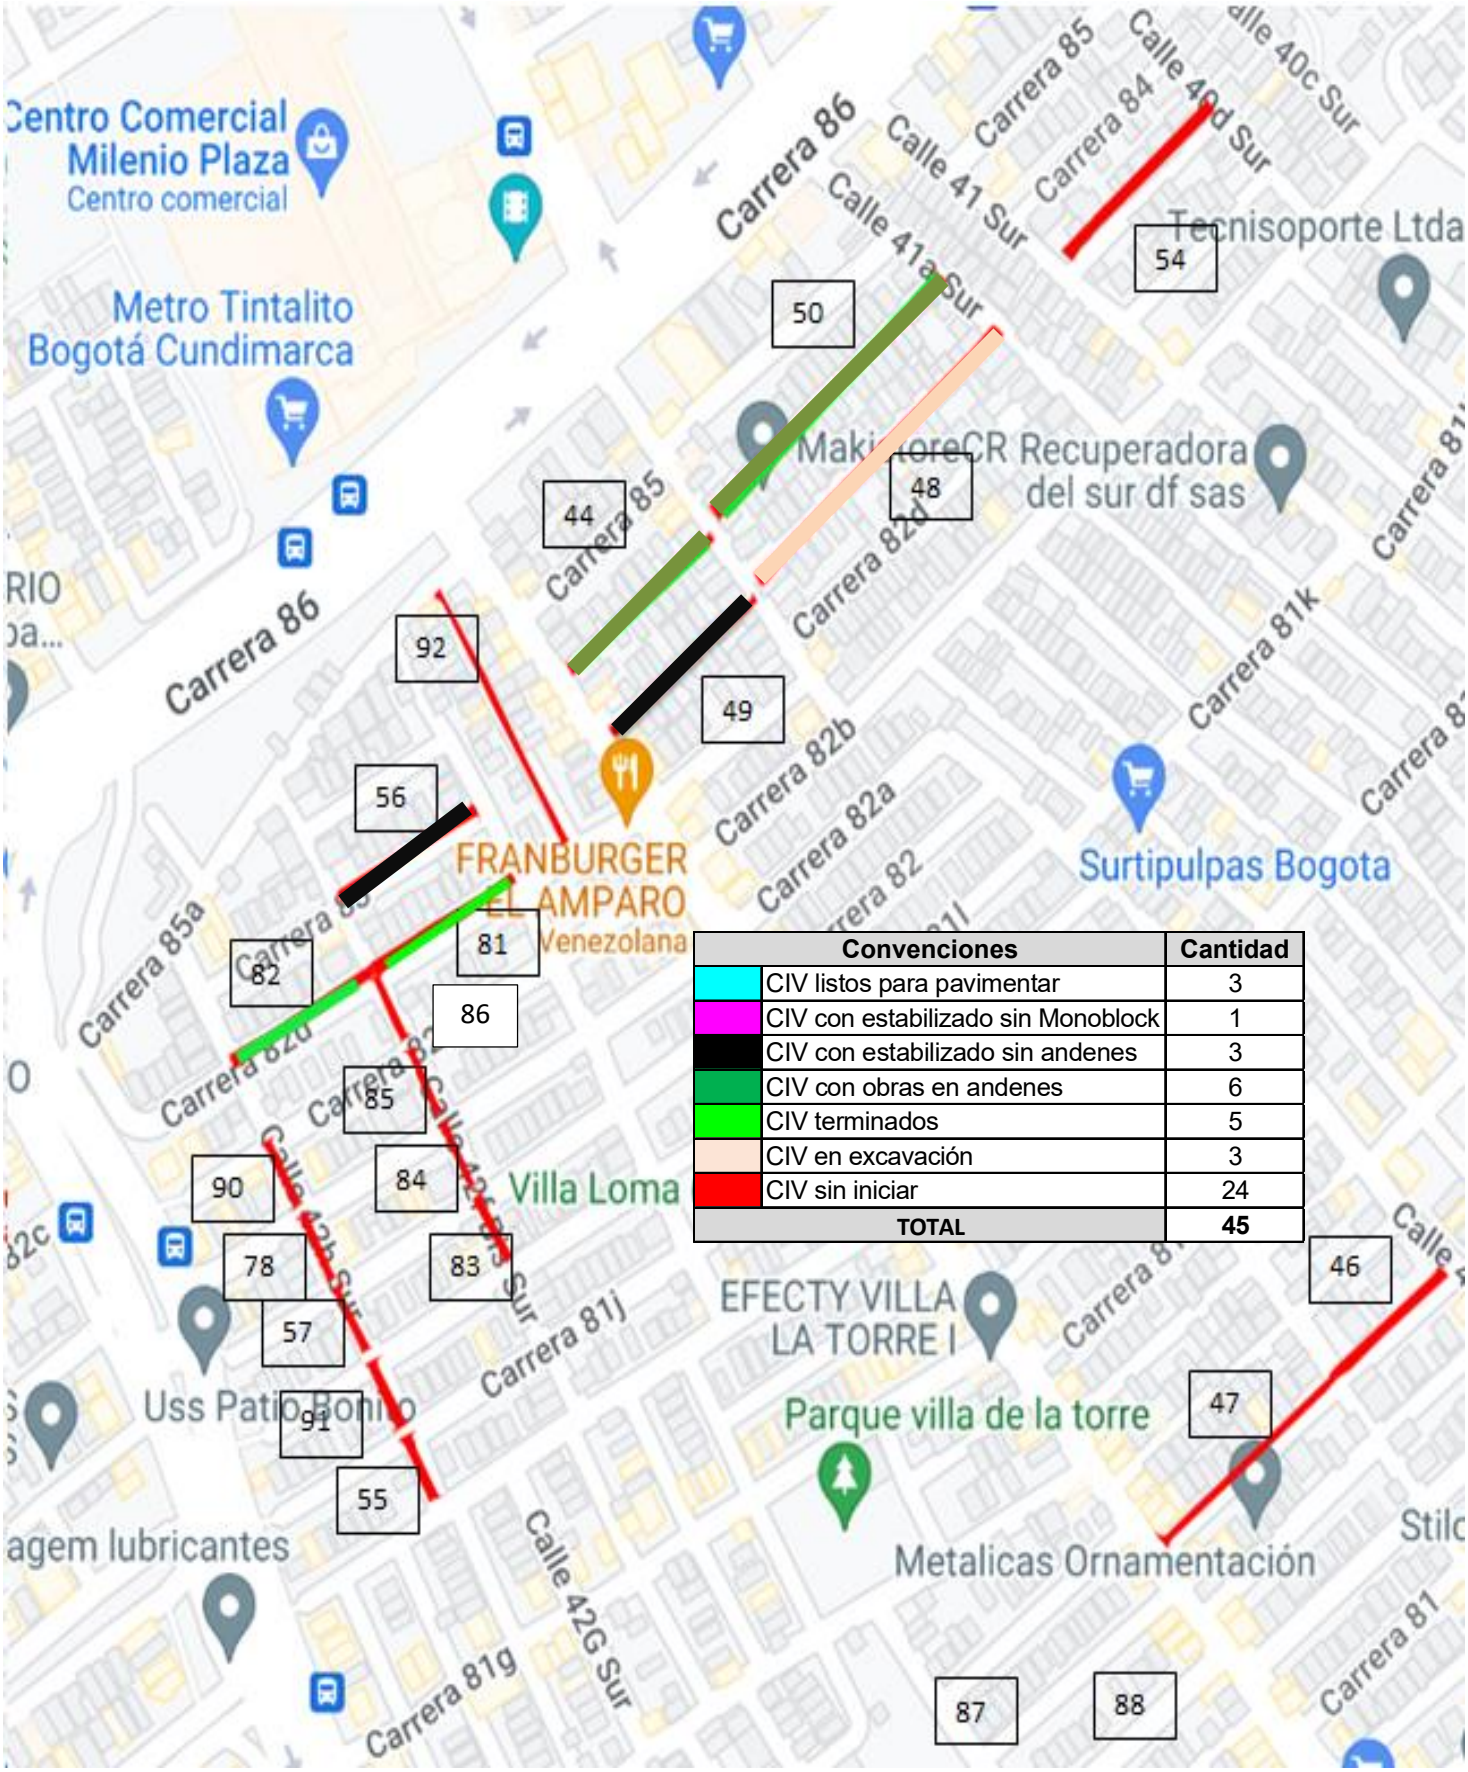

Convenciones	Cantidad
CIV listos para pavimentar	3
CIV con estabilizado sin Monoblock	1
CIV con estabilizado sin andenes	3
CIV con obras en andenes	6
CIV terminados	5
CIV en excavación	3
CIV sin iniciar	24
TOTAL	**45**


ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22


| PK_ID CALZADA | PK_ID ANDEN | PK_ID ANDEN | 44 | | | 50 | | | 60 | | | 61 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 68 | | | 69 | | | 71 | | | 70 | | | 49 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 81 | | | 82 | | | 48 | | | 56 | | | 89 | | | 79 | | | 80 | | |
|---|---|---

AVANCE SEMANA No.42

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 COP-690-22 CVK22

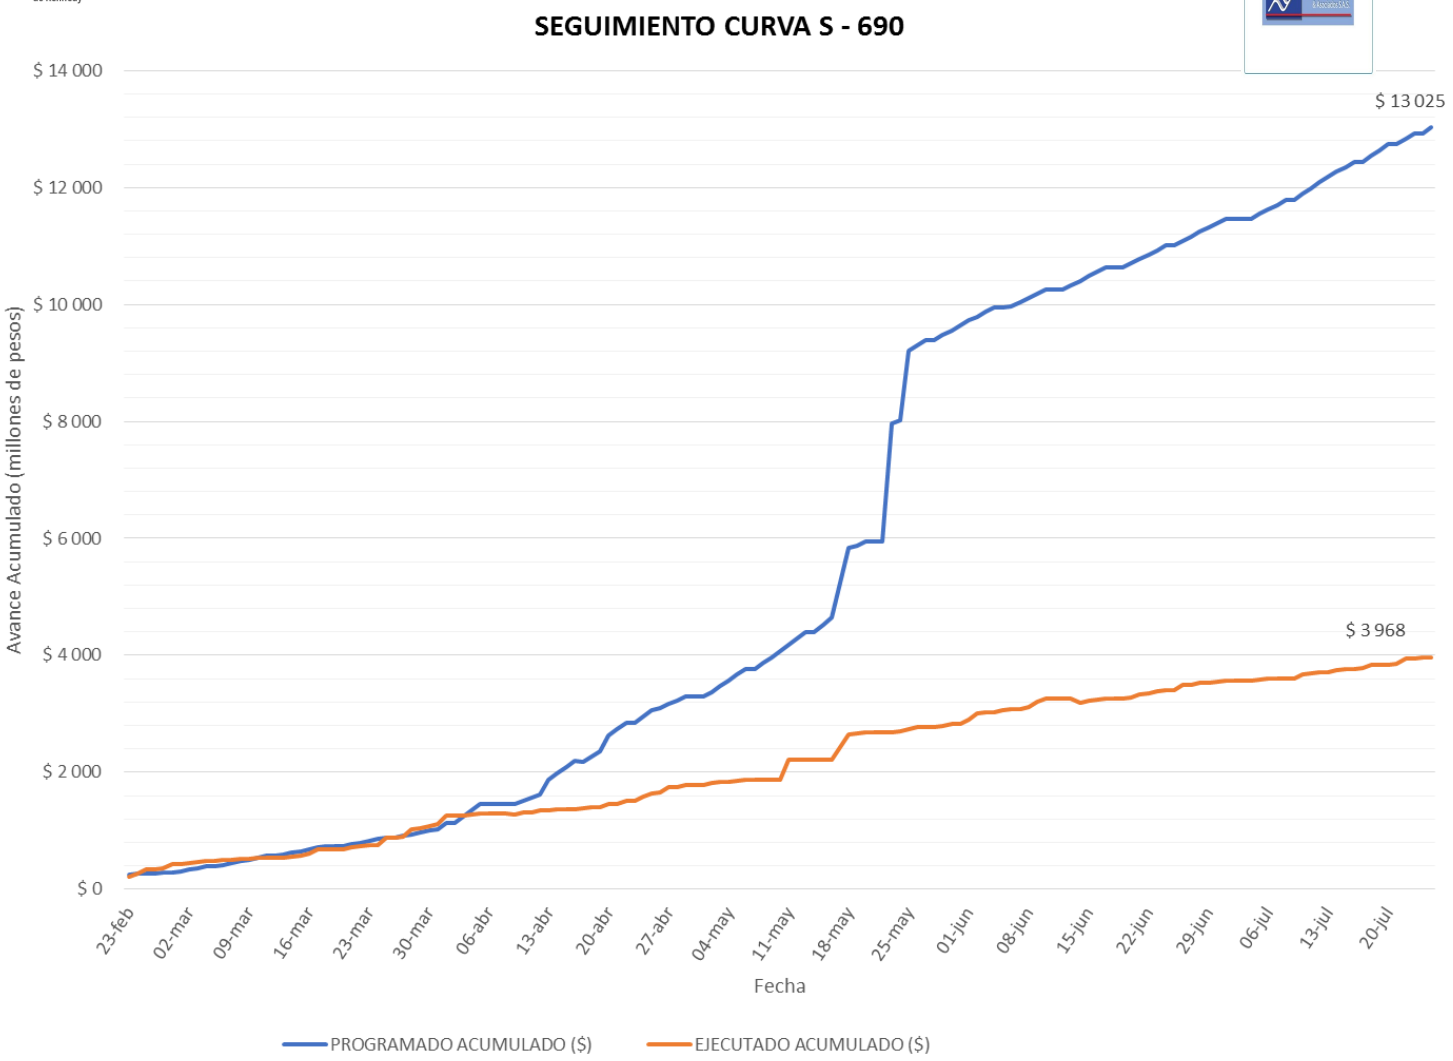

SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	**20-jul**	**21-jul**	**22-jul**	**23-jul**	**24-jul**	**25-jul**
PROGRAMADO ACUMULADO ($)	$ 12 735	$ 12 735	$ 12 829	$ 12 924	$ 12 924	$ 13 025
PROGRAMADO ACUMULADO (%)	73.00%	73.00%	73.54%	74.08%	74.08%	74.66%
EJECUTADO ACUMULADO ($)	$ 3 840	$ 3 860	$ 3 949	$ 3 949	$ 3 959	$ 3 968
EJECUTADO ACUMULADO (%)	22.01%	22.13%	22.64%	22.64%	22.69%	22.74%
DESVIACIÓN ($)	$ 8 895	$ 8 875	$ 8 880	$ 8 974	$ 8 965	$ 9 057
DESVIACIÓN (%)	**-50.99%**	**-50.87%**	**-50.90%**	**-51.44%**	**-51.39%**	**-51.92%**

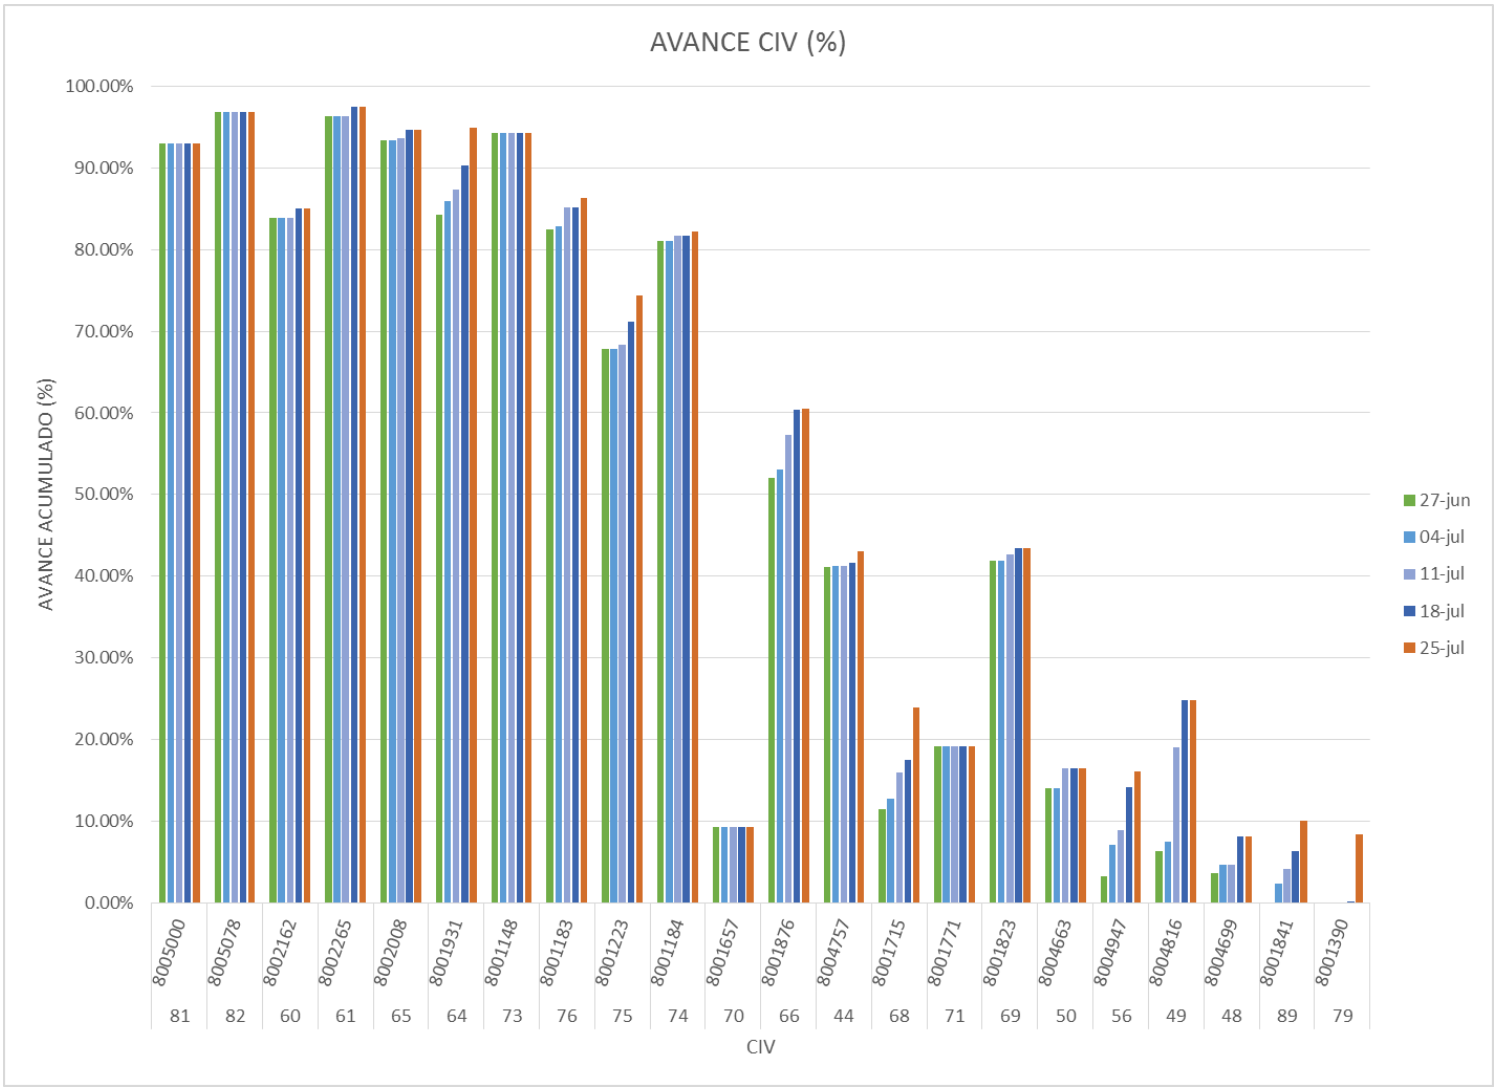

G2	25-jul-23		
	GENERAL	OBRA	FINANCIERO
% PROGRAMADO	72.55%	74.66%	72.55%
% EJECUTADO	23.04%	22.74%	17.78%
% DESVIACIÓN	-49.51%	-51.92%	-54.77%

			SEGUIMIENTO GRUPO 2 AL 25-JULIO-2023					
P	**CIV**	**VALOR CIV**	**PROG-ACUM ($)**	**PROG-ACUM (%)**	**EJEC-ACUM ($)**	**EJEC-ACUM (%)**	**PESO EJEC PROG (%)**	**ATRASO (%)**
81	8005000	$ 331 062 908.00	$ 493 706 016.00	2.83%	$ 307 829 014.10	1.76%	92.98%	-1.07%
82	8005078	$ 343 085 920.00	$ 479 749 662.00	2.75%	$ 332 182 707.83	1.90%	96.82%	-0.85%
60	8002162	$ 320 721 252.00	$ 514 640 546.00	2.95%	$ 272 745 212.76	1.56%	85.04%	-1.39%
61	8002265	$ 355 199 128.00	$ 460 559 675.00	2.64%	$ 346 097 096.78	1.98%	97.44%	-0.66%
65	8002008	$ 360 580 405.00	$ 432 646 968.00	2.48%	$ 341 094 074.89	1.96%	94.60%	-0.52%
64	8001931	$ 376 367 569.00	$ 443 114 233.00	2.54%	$ 357 236 009.42	2.05%	94.92%	-0.49%
73	8001148	$ 285 710 532.00	$ 338 441 580.00	1.94%	$ 269 281 829.64	1.54%	94.25%	-0.40%
76	8001183	$ 146 013 903.00	$ 233 768 926.00	1.34%	$ 126 084 120.01	0.72%	86.35%	-0.62%
75	8001223	$ 144 206 710.00	$ 183 177 144.00	1.05%	$ 107 253 828.79	0.61%	74.38%	-0.44%
74	8001184	$ 347 413 004.00	$ 0.00	0.00%	$ 285 772 459.85	1.64%	82.26%	1.64%
70	8001657	$ 342 553 149.00	$ 394 266 995.00	2.26%	$ 32 050 753.20	0.18%	9.36%	-2.08%
66	8001876	$ 318 216 103.00	$ 430 902 424.00	2.47%	$ 192 450 595.43	1.10%	60.48%	-1.37%
44	8004757	$ 544 689 706.00	$ 416 946 070.00	2.39%	$ 234 729 639.86	1.35%	43.09%	-1.04%
68	8001715	$ 351 516 714.00	$ 413 456 981.00	2.37%	$ 43 582 475.31	0.25%	12.40%	-2.12%
71	8001771	$ 361 446 034.00	$ 429 157 879.00	2.46%	$ 101 220 892.84	0.58%	28.00%	-1.88%
69	8001823	$ 341 507 411.00	$ 443 114 233.00	2.54%	$ 60 606 237.32	0.35%	17.75%	-2.19%
50	8004663	$ 770 232 864.00	$ 594 308 066.00	3.41%	$ 134 335 950.39	0.77%	17.44%	-2.64%
56	8004947	$ 377 475 477.00	$ 444 858 777.00	2.55%	$ 52 026 056.18	0.30%	13.78%	-2.25%
49	8004816	$ 479 216 394.00	$ 6 542 040.85	0.04%	$ 189 381 518.51	1.09%	39.52%	1.05%
48	8004699	$ 983 197 315.00	$ 324 485 226.02	1.86%	$ 70 740 088.69	0.41%	7.19%	-1.45%
89	8001841	$ 580 698 248.00	$ 248 971 382.87	1.43%	$ 58 219 173.53	0.33%	10.03%	-1.09%
79	8001390	$ 629 262 662.00	$ 593 145 037.00	3.40%	$ 52 688 433.41	0.30%	8.37%	-3.10%
62	8002055	$ 443 969 911.00	$ 497 195 104.00	2.85%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.85%
63	8002132	$ 301 695 957.00	$ 436 136 056.00	2.50%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.50%
58	8002225	$ 370 268 458.00	$ 523 363 268.00	3.00%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.00%
59	8002331	$ 360 017 625.00	$ 439 625 145.00	2.52%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.52%
67	8001968	$ 386 650 290.00	$ 427 413 335.00	2.45%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.45%
92	8004910	$ 456 639 023.00	$ 546 042 342.00	3.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-3.13%
77	8001285	$ 564 687 707.00	$ 521 618 723.00	2.99%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.99%
80	8001581	$ 584 822 489.00	$ 387 812 181.23	2.22%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-2.22%
72	8001545	$ 348 655 292.00	$ 321 151 207.96	1.84%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.84%
93	8001427	$ 321 630 570.00	$ 218 649 542.67	1.25%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-1.25%
45	8002718	$ 739 233 204.00	$ 157 133 590.53	0.90%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.90%
46	8005377	$ 280 055 154.00	$ 157 125 283.00	0.90%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.90%
47	8005506	$ 625 940 380.00	$ 49 893 964.80	0.29%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.29%
83	8005258	$ 124 373 507.00	$ 21 981 257.25	0.13%	$ 0.00	0.00%	0.00%	-0.13%
TOTALES			**$ 13 025 100 862.18**	**74.66%**	**$ 3 967 608 168.73**	**22.74%**		**-51.92%**
TOTAL DE OBRA			**$ 17 445 442 250.00**					

FECHA EVALUACIÓN			27-jun	04-jul	11-jul	18-jul	25-jul
P	CIV	VALOR TOTAL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV	% AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331 062 908.00	92.98%	92.98%	92.98%	92.98%	92.98%
82	8005078	$ 343 085 920.00	96.82%	96.82%	96.82%	96.82%	96.82%
60	8002162	$ 320 721 252.00	83.84%	83.84%	83.84%	85.04%	85.04%
61	8002265	$ 355 199 128.00	96.31%	96.31%	96.31%	97.44%	97.44%
65	8002008	$ 360 580 405.00	93.34%	93.34%	93.61%	94.60%	94.60%
64	8001931	$ 376 367 569.00	84.23%	85.98%	87.34%	90.28%	94.92%
73	8001148	$ 285 710 532.00	94.25%	94.25%	94.25%	94.25%	94.25%
76	8001183	$ 146 013 903.00	82.47%	82.85%	85.12%	85.12%	86.35%
75	8001223	$ 144 206 710.00	67.87%	67.87%	68.39%	71.15%	74.38%
74	8001184	$ 347 413 004.00	80.98%	80.98%	81.72%	81.72%	82.26%
70	8001657	$ 342 553 149.00	9.36%	9.36%	9.36%	9.36%	9.36%
66	8001876	$ 318 216 103.00	52.05%	53.13%	57.36%	60.36%	60.48%
44	8004757	$ 544 689 706.00	41.13%	41.21%	41.21%	41.61%	43.09%
68	8001715	$ 351 516 714.00	0.00%	1.30%	4.42%	6.06%	12.40%
71	8001771	$ 361 446 034.00	28.00%	28.00%	28.00%	28.00%	28.00%
69	8001823	$ 341 507 411.00	16.14%	16.14%	17.01%	17.71%	17.75%
50	8004663	$ 770 232 864.00	15.04%	15.04%	17.44%	17.44%	17.44%
56	8004947	$ 377 475 477.00	0.85%	4.71%	6.57%	11.86%	13.78%
49	8004816	$ 479 216 394.00	21.00%	22.25%	33.77%	39.52%	39.52%
48	8004699	$ 983 197 315.00	2.75%	3.80%	3.80%	7.19%	7.19%
89	8001841	$ 580 698 248.00	0.00%	2.39%	4.21%	6.30%	10.03%
79	8001390	$ 443 969 911.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	8.37%

FECHA EVALUACIÓN			25-jul
P	CV	VALOR TOTAL CIV	%AVANCE DEL CIV
81	8005000	$ 331 062 908.00	0.00%
82	8005078	$ 343 085 920.00	0.00%
60	8002162	$ 320 721 252.00	0.00%
61	8002265	$ 355 199 128.00	0.00%
65	8002008	$ 360 580 405.00	0.00%
64	8001931	$ 376 367 569.00	4.64%
73	8001148	$ 285 710 532.00	0.00%
76	8001183	$ 146 013 903.00	1.23%
75	8001223	$ 144 206 710.00	3.23%
74	8001184	$ 347 413 004.00	0.53%
70	8001657	$ 342 553 149.00	0.00%
66	8001876	$ 318 216 103.00	0.12%
44	8004757	$ 544 689 706.00	1.48%
68	8001715	$ 351 516 714.00	6.34%
71	8001771	$ 361 446 034.00	0.00%
69	8001823	$ 341 507 411.00	0.04%
50	8004663	$ 770 232 864.00	0.00%
56	8004947	$ 377 475 477.00	1.92%
49	8004816	$ 479 216 394.00	0.00%
48	8004699	$ 983 197 315.00	0.00%
89	8001841	$ 580 698 248.00	3.73%
79	8001390	$ 443 969 911.00	8.12%
