PHAROS

INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS

Chinchiná, 01 de septiembre de 2023

TRE-PHAROS-006/01-09-23

Señores
Alcaldía Municipal de Chinchiná.
Arq. Alberto Uribe Varón
Supervisor – jefe de Oficina de Infraestructura

REF: CONTRATO No S.A.M.C 014 - 633 DE 2023

OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

ASUNTO: Entrega oficial de acta de obra No 1.

Por medio de la presente me permito hacer entrega oficial del acta de obra No 1 del contrato de la referencia.

Adicionalmente se entregan los anexos y/o complementos exigidos por la entidad

A continuación, se listan los documentos entregados anexoas a este oficio.

- Factura de venta electrónica
- Certificación Bancaria
- RUT
- Acta de Obra No 1
- Pre Actas
- Informe Técnico de Obra
- Paz y salvo de aportes parafiscales
- Seguridad social representante legal
- Seguridad social empleados dependientes

MELISSA VARGAS G.

CONSTRUCTORA PHAROS NIT:
901.422.837-0
RL - MELISSA VARGAS GIRALDO
CC: 24.335.406

CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
901.422.847-0
Cra 6 No 9-70
(606) 3014143817
Manizales - Colombia
constructorapharos@gmail.com

PHAROS
INGENIERIA CONSTRUCTORA SAS

Factura electrónica de venta N°. FE 6

Cliente: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
Nit: 890.801.133-8
Teléfono: (057) 3113006092 - Ext. 000
Dirección: CR 8 CL 11 CL ESQ
Ciudad: Chinchiná - Colombia
Correo: hugot_asesor@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2023, 15:12
Expedición	01/09/2023, 15:17
Vencimiento	30/09/2023
Vendedor	CONSTRUCTORA PHAROS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Acta No 1 del contrato No S.A.M.C 014-633-2023, cuyo objeto es: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS	50,375,670.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones setecientos noventa y ocho mil ciento treinta y ocho pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 66,798,138.42

Observaciones:

Total Bruto	50,375,670.00
Administración 27.60%	13,903,684.92
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,518,783.50
Total a Pagar	66,798,138.42

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051329995 aprobado en 20230704 prefijo FE desde el número 5 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 4.5
CUFE: 4cf739a23ff5d4c2249e6749d73b2490493b4db829e8a0ecb63ce3b7684759941a805df07f5820384a0ce5aeb18c4f01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ACTA PARCIAL DE PAGO # 01	Septiembre de 2023
CONTRATO	S.A.M.C 014-633-2023 del 2 de agosto de 2023
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS
CONTRATISTA	Constructora PHAROS S.A.S Nit: 901.422.847 – Representado Legalmente Por: Melissa Vargas G. CC:24.335.406
CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ.
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN Jefe Oficina de Infraestructura.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($221.778.151,00) equivalentes a 191,18 SMLMV con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (**CDP**): **31129** del 23 de mayo de 2023 y con registro presupuestal (**RP**) **42351** del 2 de agosto de 2023 con rubro 16.01.2.3.2.02.02.009.22.003 mejorar al menos 8IE en convenio con el departamento
VALOR DEL ACTA	**Sesenta y seis millones setecientos noventa y ocho ciento treinta y ocho pesos con cuarenta y dos centavos m/cte ($66.798.138,42)**
FECHA DE INICIO	2 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACION	2 de noviembre de 2023

En septiembre de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago parcial del Contrato de Obra Pública S.A.M.C 014-633-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS", con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**
9.1 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el Anexo 1 – Anexo Técnico. En caso de justa causa comprobada una	ACTIVIDADES: Revisión previa de hojas de vida y experiencia del personal profesional para que cumpla con los parámetros exigidos por la alcaldía de Chinchiná. EL contratista realiza control permanente para que haya en obra un ingeniero civil por lo menos el 70% del tiempo laboral Se encuentra vinculado el ingeniero residente

vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión. 2) El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 3) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 4) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	debidamente presentado y aprobado por la supervisión de obra que se llama NICOLÁS ANDRÉS CORRALES GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.992.442, el cual tiene potestad para decidir aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras. EL contratista está con plena disposición a responder en cualquier requerimiento legal y para ello se ha estado en permanente comunicación con la supervisión El contratista siguió todos los parámetros consignados en la normativa laboral vigente EVIDENCIAS: Hojas de vida de personal profesional propuesto entregadas a la alcaldía
9.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales. 1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 2) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente.	ACTIVIDADES: Se utilizó para la ejecución de actividades maquinaria y herramientas en óptimo estado, además se programan revisiones periódicas con un técnico para mantener el buen funcionamiento y seguridad de los equipos. Se realiza inspección de materiales cuando llegan a obra y antes de instalarse y/o utilizarse con el fin de garantizar la mejor calidad posible.
9.3. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 2) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del	ACTIVIDADES: En el periodo correspondiente a este informe se ejecutan las siguientes actividades: CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR Y TELA DE CERRAMIENTO DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE FIBROCEMENTO INCLUYE RETIRO DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO DESMONTE CIELO RASO INCLUYE RETIRO DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE RETIRO DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS INCLUYE RETIRO DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE INCLUYE RETIRO DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO

personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. 3) Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 4) Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras. 5) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común y escombros. 6) Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas. 7) El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.	HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO) EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA ZAPATAS RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 Φ 5.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ENTREPISO (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI EVIDENCIAS: Informe Técnico de Obra 1
9.4. Obligaciones de información. 1) Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo: · Avance de cada una de las actividades programadas. · Cantidades de obra ejecutadas. · Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista. · Resumen de las actividades realizadas. · Actualización del programa de obra. 2) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación.	ACTIVIDADES: Elaboración de acta de obra número 1 en donde se toman medidas en campo de la obra las cuales son revisadas y aprobadas por la supervisión adicionalmente, se presenta a la supervisión de manera semanal el avance de la obra. Se realizan recorridos de obra en conjunto con la supervisión en donde se toman decisiones técnicas. EVIDENCIAS: Acta de obra 1
9.5. Obligaciones de carácter ambiental (Cuando Aplique). 1) El contratista designado está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076 de 2015. 2) El contratista asumirá los costos correspondientes a la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que serán tramitados y obtenidos por su	ACTIVIDADES: Estamos cumpliendo con todos los lineamientos ambientales que este tipo de obras exige, en especial disposición adecuada de sobrantes de materiales especiales para que no vayan a los sistemas de alcantarillado de la ciudad. Los trabajadores son capacitados de manera recurrente sobre temas ambientales como

cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades correspondientes. 3) Deberá elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control de las áreas físico, biótico y social. 4) El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista.	reciclaje y cuidado del medio ambiente

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que la señora Melissa Vargas G, representante legal de la empresa Constructora Pharos S.A.S, identificada con CC 24.335.406, aportó para el pago de la presente acta soporte de pago de la seguridad social correspondiente y se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de septiembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

ALBERTO URIBE VARON **SUPERVISOR**	Melissa Vargas G. Constructora Pharos S.A.S RL Melissa Vargas G **CONTRATISTA**

ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8	PROYECTO	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"
	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	APOYO SUPERVISIÓN	MÓNICA JULIETH VERGARA MEJIA
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR ACUMULADO GENERAL	% GENERAL ACUMULADO
P	1	PRELIMINARES								
	1.1	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PARA ENTREGA DE LA OBRA	M2	95,52	$ 2.792,00	0,00	$ -			
	1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR Y TELA DE CERRAMIENTO	ML	53,15	$ 5.741,00	30,50	$ 175.101,00			
DE	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES								
	2,1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE FIBROCEMENTO INCLUYE RETIRO	M2	99,2	$ 12.263,00	127,50	$ 1.563.533,00			
	2,2	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO	M2	99,2	$ 17.176,00	127,50	$ 2.189.940,00			
	2,3	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE RETIRO	M2	70,27	$ 10.373,00	76,64	$ 794.987,00			
	2,4	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE RETIRO	M	23,15	$ 4.224,00	34,00	$ 143.616,00			
	2,5	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS INCLUYE RETIRO	M	9	$ 5.912,00	40,00	$ 236.480,00			
	2,6	DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS	UND	6	$ 53.861,00	0,00	$ -			
	2,7	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE INCLUYE RETIRO	M2	21,5	$ 21.540,00	7,26	$ 156.380,00			
	2,8	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	18,08	$ 35.789,00	18,62	$ 666.391,00			
	2,9	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS	UND	3	$ 69.252,00	0,00	$ -			
EX	3	EXCAVACIONES								
	3,1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA ZAPATAS	M3	37,05	$ 30.919,00	22,47	$ 694.750,00			
	3,2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	12,95	$ 39.347,00	6,25	$ 245.919,00			
EC	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
	4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	7,6	$ 1.141.986,00	3,87	$ 4.419.486,00			
	4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	9,89	$ 1.078.406,00	6,83	$ 7.365.513,00			
	4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN STEEL DECK lamina 2" Calibre 18, h= 0.12 m. Concreto 3000 PSI	M2	66,26	$ 172.658,00	0,00	$ -			
	4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	144,41	$ 9.671,00	0,00	$ -			
	4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 Φ 5.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	45,5	$ 11.300,00	30,84	$ 348.492,00			
	4,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ENTREPISO (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	116,53	$ 18.638,00	250,49	$ 4.668.633,00			
	4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	KG	4332,43	$ 8.365,00	2531,20	$ 21.173.488,00			
	4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	18,08	$ 89.716,00	14,50	$ 1.300.882,00			
	4,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M2	18,08	$ 25.589,00	14,50	$ 371.041,00			
	4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	6.33	$ 761.546,00	5,07	$ 3.861.038,00			
M	5	MUROS								
	5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 30x20x10 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	123,82	$ 64.729,00	0,00	$ -			
	5,2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	148,19	$ 25.776,00	0,00	$ -			
	5,3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) (EXTERIORES)	M2	70,77	$ 27.219,00	0,00	$ -			
	5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	148,19	$ 20.697,00	0,00	$ -			

	ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8		PROYECTO			"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"						
			SUPERVISOR			ALBERTO URIBE VARÓN						
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		APOYO SUPERVISIÓN			MÓNICA JULIETH VERGARA MEJIA						
			INTERVENTORIA			N/A						
			CONTRATISTA			CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S						
		CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUTADO					
	5,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO 3 MANOS FACHADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES).	M2	70,77	$	24.693,00	0,00	$ -				
	5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m.	ML	50	$	72.713,00	0,00	$ -				
	5,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m.	ML	55,14	$	51.204,00	0,00	$ -				
C	6	CUBIERTA										
	6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	585,36	$	18.638,00	0,00	$ -				
	6,2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	104,36	$	37.362,00	0,00	$ -				
	6,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	11,61	$	49.577,00	0,00	$ -				
	6,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	108,63	$	100.383,00	0,00	$ -				
IE	7	INSTALACIONES ELECTRICAS										
	7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 40W BLANCO . INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	14	$	168.898,00	0,00	$ -				
	7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER 12W	UND	11	$	62.263,00	0,00	$ -				
	7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	32	$	171.303,00	0,00	$ -				
	7,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	3	$	156.854,00	0,00	$ -				
	7,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE NO 12 AWG HFFR LS	UND	1	$	159.611,00	0,00	$ -				
	7,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	1	$	157.396,00	0,00	$ -				
	7,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	2	$	170.192,00	0,00	$ -				
	7,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA LED SALIDA EMERGENCIA	UND	5	$	126.708,00	0,00	$ -				
	7,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AVISO LED SALIDA EMERGENCIA	UND	2	$	160.598,00	0,00	$ -				
	7.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	7	$	146.457,00	0,00	$ -				
	7,11	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO, EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	1	$	193.688,00	0,00	$ -				
	7,12	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DATOS CAT 6A EN TUBERA CONDUIT EMT 1"	UND	1	$	329.933,00	0,00	$ -				
	7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$	31.453,00	0,00	$ -				
	7,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$	409.259,00	0,00	$ -				
	7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H Cu HFFR LS EN CABLE 2X8AWG + 68AWG (N) + 8AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	25	$	27.743,00	0,00	$ -				
	7,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	25	$	38.039,00	0,00	$ -				
	7,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	8	$	15.406,00	0,00	$ -				
IH	8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
	8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	28,2	$	38.756,00	0,00	$ -				

	ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8		PROYECTO			"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"					
			SUPERVISOR			ALBERTO URIBE VARÓN					
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			APOYO SUPERVISIÓN			MÓNICA JULIETH VERGARA MEJIA					
			INTERVENTORIA			N/A					
			CONTRATISTA			CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S					
CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO					
	8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	10	$ 40.819,00	0,00	$ -				
	8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	16	$ 29.393,00	0,00	$ -				
	8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UN	1	$ 674.569,00	0,00	$ -				
A	9	ACABADOS									
	9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	4,6	$ 556.009,00	0,00	$ -				
	9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	10	$ 305.614,00	0,00	$ -				
	9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco. Referencia en Sitio (Incluye boquilla.)	M2	96,3	$ 60.564,00	0,00	$ -				
	9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Antique h = 10 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño (Incluye boquilla.)	ML	83,84	$ 21.288,00	0,00	$ -				
SUBTOTAL OBRAS							$ 50.375.670,00				
ADMINISTRACIÓN			27,6%				$ 13.903.684,92				
UTILIDAD			5,0%				$ 2.518.783,50				
TOTAL AIU			32,6%				$ 16.422.468,42				
TOTAL EJECUTADO							$ 66.798.138,42				

MELISSA VARGAS G.

MELISSA VARGAS GIRALDO
RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
NIT 901.422.847

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
4.10	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Zapatas de 1.25x1.25	1,25	0,35	1,25	0,55	6	3,28
	Zapatas de 1.6x1.6	1,6	0,35	1,6	0,90	2	1,79
						SUBTOTAL	5,07
						TOTAL	5,07

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

4,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm

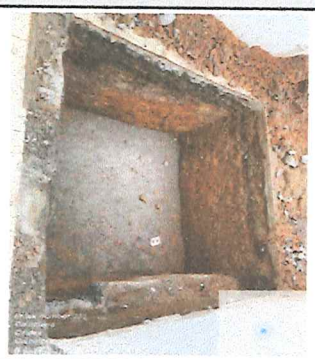REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Solado zapatas de 1.25x1.25	1,25		1,25	1,56	6	9,38
	Solado zapatas de 1.6x1.6	1,6		1,6	2,56	2	5,12
						SUBTOTAL	14,50
						TOTAL	14,50

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
4,8	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Placa de contrapiso sobre zapatas de	1,25		1,25	1,56	6	9,38
	Placa de contrapiso sobre zapatas de	1,6		1,6	2,56	2	5,12
						SUBTOTAL	14,50
						TOTAL	14,50

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

KG	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	







REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	# VARILLA	Kg/Ml	LONG	CANT. VARILLAS	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	OBSERVACIÓN
	ACTA DE OBRA 1							
	Refuerzo de Zapatas							
	Refuerzo Zapata A1 #4@0.15	4	1	1,5	20,00	1	30,00	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata B1 #4@0.15	4	1	1,5	20,00	1	30,00	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata C1 #4@0.13	4	1	1,5	20,00	1	30,00	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata D1 #4@0.13	4	1	1,5	20,00	1	30,00	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata A2 #4@0.15	4	1	1,5	20,00	1	30,00	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata B2 #4@0.11	4	1	1,95	32,00	1	62,40	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata C2 #4@0.11	4	1	1,95	32,00	1	62,40	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo Zapata D2 #4@0.13	4	1	1,5	20,00	1	30,00	Para ambos sentidos (incluye ganchos)
	Refuerzo de Columnas							
	Refuerzo longitudinal Columna tipo 1 Primer Piso (Incluye Pedestal)	5	1,5625	5,725	8	1	71,56	Incluye traslapo y gancho H excavación - 0.35/2 + 0.10 Losa + 2.85 H libre columna + 0.90 Traslapo + 0.5 Gancho
	Refuerzo longitudinal Columna tipo 2 Primer Piso (Incluye Pedestal)	5	1,5625	5,725	10	1	89,45	
	Refuerzo longitudinal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal)	5	1,5625	5,725	8	2	143,13	
	Refuerzo longitudinal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Columna B2	5	1,5625	5,725	8	1	71,56	
	Refuerzo longitudinal Columna tipo 4 Primer Piso (Incluye Pedestal)	5	1,5625	5,725	12	3	322,03	
	Refuerzo transversal Columna tipo 1 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	1,25	60	1	42,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 1 Primer Piso (Incluye Pedestal) Gancho	3	0,5625	0,45	60	1	15,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 1 Primer Piso (Incluye Pedestal) Gancho	3	0,5625	0,4	60	1	13,50	
	Refuerzo transversal Columna tipo 2 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	1,25	60	1	42,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 2 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	0,9	60	1	30,38	
	Refuerzo transversal Columna tipo 2 Primer Piso (Incluye Pedestal) Gancho	3	0,5625	0,45	60	1	15,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	1,25	60	2	84,38	
	Refuerzo Transversal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Gancho	3	0,5625	0,45	60	2	30,38	
	Refuerzo transversal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Gancho	3	0,5625	0,45	60	2	30,38	
	Refuerzo transversal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Columna B2 Fleje	3	0,5625	1,25	60	1	42,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Columna B2 Gancho	3	0,5625	0,45	60	1	15,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 3 Primer Piso (Incluye Pedestal) Columna B2 Gancho	3	0,5625	0,45	60	1	15,19	
	Refuerzo transversal Columna tipo 4 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	1,25	60	3	126,56	
	Refuerzo transversal Columna tipo 4 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	1	60	3	101,25	
	Refuerzo transversal Columna tipo 4 Primer Piso (Incluye Pedestal) Fleje	3	0,5625	1	60	3	101,25	
	Refuerzo Logitudinal Viga V1 Vena Superior	5	1,56	6	4	1	37,50	
		5	1,56	3,21	2	1	10,03	
	Refuerzo Logitudinal Viga V1 Vena Inferior	5	1,56	6	1	1	9,38	
		5	1,56	2,31	2	1	7,22	
	Refuerzo Logitudinal Viga V2 Vena Superior	4	1,00	3,55	1	1	3,55	
		5	1,56	6	4	1	37,50	
		5	1,56	3,21	2	1	10,03	
	Refuerzo Logitudinal Viga V2 Vena Inferior	5	1,56	6	1	1	9,38	
		5	1,56	2,31	2	1	7,22	
		4	1,00	3,55	1	1	3,55	
	Refuerzo Logitudinal Viga V3 Vena Superior	5	1,56	3,6	2	1	11,25	
		5	1,56	4,5	2	1	14,06	
		4	1,00	2,05	1	1	2,05	
	Refuerzo Logitudinal Viga V3 Vena Inferior	5	1,56	4,5	2	1	14,06	
		5	1,56	3,6	2	1	11,25	
	Refuerzo Logitudinal Viga V4 Vena Superior	5	1,56	3,85	2	1	12,03	
		4	1,00	3,85	1	1	3,85	
		5	1,56	4,7	2	1	14,69	
		4	1,00	2,1	1	1	2,10	
	Refuerzo Logitudinal Viga V4 Vena Inferior	5	1,56	4,75	2	1	14,84	
		4	1,00	4,75	1	1	4,75	
		5	1,56	3,8	2	1	11,88	
		4	1,00	3,8	2	1	7,60	
	Refuerzo Logitudinal Viga V5 Vena Superior	5	1,56	3,85	2	1	12,03	
		4	1,00	3,85	1	1	3,85	
		5	1,56	4,7	2	1	14,69	
		5	1,56	3,8	1	1	5,94	
		4	1,00	4,7	1	1	4,70	
	Refuerzo Logitudinal Viga V5 Vena Inferior	5	1,56	4,75	2	1	14,84	
		4	1,00	4,75	1	1	4,75	
		5	1,56	3,8	2	1	11,88	
		4	1,00	3,8	2	1	7,60	
	Refuerzo Logitudinal Viga V6 Vena Superior	5	1,56	3,85	2	1	12,03	
		5	1,56	4,7	2	1	14,69	

Refuerzo Logitudinal Viga V6 Vena Inferior	5	1,56	4,75	2	1	14,84	
	4	1,00	2,1	1	1	2,10	
Refuerzo Logitudinal Viga VT2 Vena Superior	5	1,56	3,8	2	1	11,88	
	4	1,00	3,7	2	1	7,40	
	4	1,00	6	2	1	12,00	
	4	1,00	2,65	2	1	5,30	
Refuerzo Logitudinal Viga VT2 Vena Inferior	4	1,00	4,45	2	1	8,90	
	4	1,00	1,5	1	1	1,50	
	4	1,00	6	2	1	12,00	
	4	1,00	1,5	1	1	1,50	
	4	1,00	2	1	1	2,00	
Refuerzo Logitudinal Viga VT3 Vena Superior	4	1,00	2,3	3	1	6,90	
Refuerzo Logitudinal Viga VT3 Vena Inferior	4	1,00	2,3	2	1	4,60	
Refuerzo Transversal Viga V1	3	0,56	1,25	125	1	87,89	
Refuerzo Transversal Viga V2	3	0,56	1,25	125	1	87,89	
Refuerzo Transversal Viga V3	3	0,56	1,25	63	1	44,30	
Refuerzo Transversal Viga V4	3	0,56	1,25	68	1	47,81	
Refuerzo Transversal Viga V5	3	0,56	1,25	68	1	47,81	
Refuerzo Transversal Viga V6	3	0,56	1,25	68	1	47,81	
						SUBTOTAL	2.531,20
						TOTAL	2.531,20

Columna tipo 1: 0.30*0.35; A1 8#5;. Columna tipo 2: 0.35*0.30; A2 10#5; Columna tipo 3: 0.35*0.35; B1 - C1 - D1 8#5; Columna tipo 4: 0.35*0.35; B2 - C2 - D2 12#5

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINA
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 1/09/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS"

CONTRATO DE OBRA S.A.M.C 014-633-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

SUPERVISOR ALBERTO URIBE VARÓN

FECHA DE INICIO: 2/08/2023

PLAZO FINAL: 2/11/2023

KG	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 Φ 5,5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	ESP MALLA	Kg/m2	LONG	ANCHO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	OBSERVACIÓN
	ACTA DE OBRA 1							
	Malla para losa de contrapiso	15X15 5,5mm	2,13	1,25	1,25	6	19,95	
	Malla para losa de contrapiso	15X15 5,5mm	2,13	1,6	1,6	2	10,89	
						SUBTOTAL		30,84
						TOTAL		30,84

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	

KG		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
4,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ENTREPISO (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Kg*ML	LONG			
	Vigueta Tipo 2p-8-14 TRAMO AB	11,76	2,45	28,81	2	57,62
	Vigueta Tipo 2p-8-14 TRAMO BC	11,76	4,10	48,22	2	96,43
	Vigueta Tipo 2p-8-14 TRAMO CD	11,76	4,1	48,22	2	96,43

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
4,2	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONG			
	Concreto V1 Eje 1 Nivel N+2.85	0,3	0,4	12	1,44	1	1,44
	Concreto V2 Eje 2 Nivel N+2.85	0,3	0,4	12	1,44	1	1,44
	Concreto V3 Eje Nivel N+2.85	0,3	0,4	5,83	0,70	1	0,70
	Concreto V4 Eje B Nivel N+2.85	0,35	0,4	6,1	0,85	1	0,85
	Concreto VC Eje 1 Nivel N+2.85	0,35	0,4	6,1	0,85	1	0,85
	Concreto VD Eje 1 Nivel N+2.85	0,3	0,4	6,1	0,73	1	0,73
	Concreto VT2 Nivel N+2.85	0,2	0,3	12	0,72	1	0,72
	Concreto VT3 Nivel N+2.85	0,2	0,3	1,45	0,09	1	0,09
						SUBTOTAL	6,83
						TOTAL	6,83

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR Y TELA DE CERRAMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Cerrameinto paso peatonal entrada auxiliar			5,5			5,50
	Cerramiento de obra Herreria (cancha)			25			25,00
						SUBTOTAL	30,50
						TOTAL	30,50

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
2,1	**DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE FIBROCEMENTO INCLUYE RETIRO**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Demonte de teja de fibrocemento	7,4		17,23	127,50		127,50

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-6 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

2,2 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 1						
	Demonte de estructura metálica de cubierta	7,4		17,23	127,50		127,50
						SUBTOTAL	127,50
						TOTAL	127,50



Melissa Vargas G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
2,3	**DESMONTE CIELO RASO INCLUYE RETIRO**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Desmonte de cielo raso en Icopor y Superboard NIVEL 1 Oficinas	1,98		5,5	10,89		10,89
	Desmonte de cielo raso en Icopor y Superboard NIVEL 1 Salón 1	5,975		5,5	32,86		32,86
	Desmonte de cielo raso en Icopor y Superboard NIVEL 1 Salón 2	5,98		5,5	32,89		32,89
						SUBTOTAL	76,64
						TOTAL	76,64

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	INTERVENTORIA	**N/A**
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**
2,4	**DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE RETIRO**	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Canal Hacia Vía Principal			17			17,00
	Canal hacia Cancha			17			17,00
						SUBTOTAL	34,00
						TOTAL	34,00

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
2,5	**DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS INCLUYE RETIRO**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Desmonte de redes existentes sobre cielo raso			40			40,00
						SUBTOTAL	40,00
						TOTAL	40,00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
2,7	**DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE INCLUYE RETIRO**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Demolición por traslado de puertas	1		1,86	1,86	2	3,72
	Demolición para entrada auxiliar para plantel	0,98		1,67	1,64	1	1,64
	Demolición sobre viga estructura existente para nivelar a +2.80m, muro hacia cancha	0,2		9,5	1,90	1	1,90
						SUBTOTAL	7,26
						TOTAL	7,26

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
2,8	**DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Demolición de piso para zapatas de 1.25x1.25			1,25	1,56	6	9,38
	Demolición de piso para zapatas de 1.6x1.6			1,6	2,56	2	5,12
	Demolición Salientes en concreto cubierta	1,47		0,49	0,72	3	2,16
	Demoliciones viga de cimentación estructura existente para ubicación de pedestales de zapatas						
	Zapata A2	0,9		0,4	0,36	1	0,36
	Zapata B2	0,5		0,45	0,225	1	0,23
		0,25		0,4	0,1	1	0,10
	Zapata B3	0,5		0,4	0,2	1	0,20
	Zapata A3	0,6		0,7	0,42	1	0,42
	Zapata B4	0,6		0,5	0,3	1	0,30
	Zapata A4	0,6		0,6	0,36	1	0,36
						SUBTOTAL	18,62
						TOTAL	18,62

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M3	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

3,1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA ZAPATAS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Excavacione para zapata A1	1,25	1,55	1,25	2,42	1	2,42
	Excavacione para zapata B1	1,25	1,55	1,25	2,42	1	2,42
	Excavacione para zapata C1	1,25	1,55	1,25	2,42	1	2,42
	Excavacione para zapata D1	1,25	1,55	1,25	2,42	1	2,42
	Excavacione para zapata A2	1,25	1,55	1,25	2,42	1	2,42
	Excavacione para zapata B2	1,6	1,55	1,6	3,97	1	3,97
	Excavacione para zapata C2	1,6	1,55	1,6	3,97	1	3,97
	Excavacione para zapata D2	1,25	1,55	1,25	2,42	1	2,42
						SUBTOTAL	22,47
						TOTAL	22,47

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-6 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
3,2	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Retiro excavación sobrante para pedestal A1	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal B1	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal C1	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal D1	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal A2	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal B2	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal C2	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Retiro excavación sobrante para pedestal D2	0,35	1,2	0,35	0,15	1	0,15
	Excavacione para zapata A1	1,25	0,35	1,25	0,55	1	0,55
	Excavacione para zapata B1	1,25	0,35	1,25	0,55	1	0,55
	Excavacione para zapata C1	1,25	0,35	1,25	0,55	1	0,55
	Excavacione para zapata D1	1,25	0,35	1,25	0,55	1	0,55
	Excavacione para zapata A2	1,25	0,35	1,25	0,55	1	0,55
	Excavacione para zapata B2	1,6	0,35	1,6	0,90	1	0,90
	Excavacione para zapata C2	1,6	0,35	1,6	0,90	1	0,90
	Excavacione para zapata D2	1,25	0,35	1,25	0,55	1	0,55
						SUBTOTAL	6,25
						TOTAL	6,25

MELISSA VARGAS G

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 1/09/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA**	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	**FECHA DE INICIO:**	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	**PLAZO FINAL:**	2/11/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**	
	INTERVENTORIA	**N/A**	
	CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S**	
4,1	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI**		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	LONG			
	**ACTA DE OBRA 1**						
	Columna eje A1 (incluye pedestal) Primer Piso	0,3	0,35	4,1	0,43	1	0,43
	Columna eje B1 (incluye pedestal) Primer Piso	0,35	0,35	4,1	0,50	1	0,50
	Columna eje C1 (incluye pedestal) Primer Piso	0,35	0,35	4,1	0,50	1	0,50
	Columna eje D1 (incluye pedestal) Primer Piso	0,35	0,35	4,1	0,50	1	0,50
	Columna eje A2 (incluye pedestal) Primer Piso	0,3	0,35	4,1	0,43	1	0,43
	Columna eje B2 (incluye pedestal) Primer Piso	0,35	0,35	4,1	0,50	1	0,50
	Columna eje C2 (incluye pedestal) Primer Piso	0,35	0,35	4,1	0,50	1	0,50
	Columna eje D2 (incluye pedestal) Primer Piso	0,35	0,35	4,1	0,50	1	0,50
						SUBTOTAL	3,87
						TOTAL	3,87

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSTRUCTORA PHAROS SAS *Identificado con* *NI9014228470*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0524 AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24115252709*
Fecha de Apertura	:	*01 de julio de 2022*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0524 AVENIDA SANTANDER de la ciudad de MANIZALES, el día miércoles, 6 de julio de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:
V4C3V2A8 - VALENTINA CAMPIÑO VALDERRAMA

Banco Caja Social
Gerente
Oficina Santander
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14824150801

(415)7707212489984(8020) 000001482415080 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0

41. Dirección principal
CL 7 8 23 BRR CHIPRE

42. Correo electrónico adrianquinteroa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 1 4 3 8 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 1 0 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 21 / 12 : 18: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14824150801

(415)7707212489984(8020) 000001482415080 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insútutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 0 1 0 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 0 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 0 2 0 9	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0
87. Extranjero privado	0 . 0

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 1 0 2 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14824150801

(415)7707212489984(8020) 000001482415080 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 4 3 3 5 4 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	GIRALDO	MELISA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 9 7 6 5 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	ARROYAVE	WILSON	ADRIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

MANIZALES, 1 de septiembre de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S.
9014228470

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Fernando Alonso Aránzazu Ospina
Contador publico
C.C 9.857.124
TP: 166878-T
Teléfono: 606-8823050


MELISSA VARGAS G.

REPRESENTANTE LEGAL

MELISA VARGAS GIRALDO

C.C. No. 24.335.406




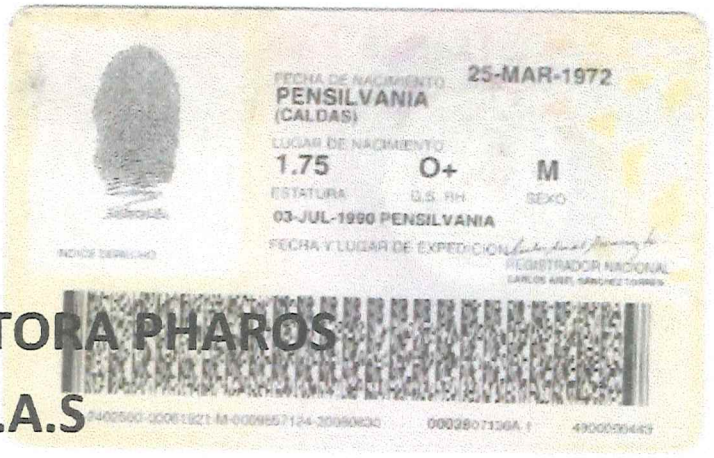

CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

ABRIL /2023



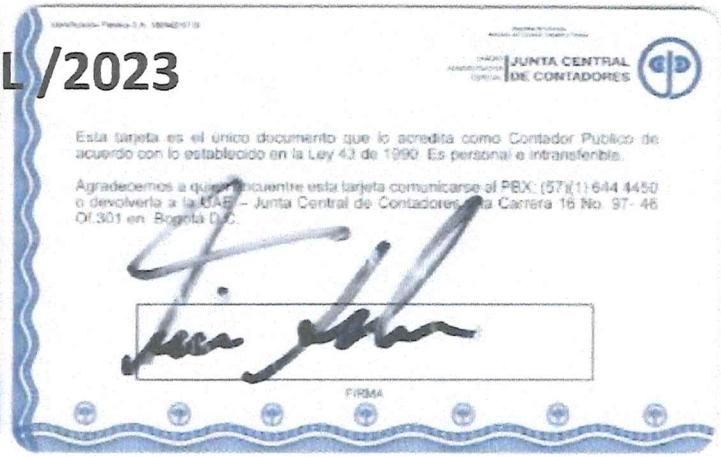

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FC5F8C5B0EFAF87

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO ALONSO ARANZAZU OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9857124 de PENSILVANIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 166878-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901422847	0	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELA EL TREBOL CHINCHINA	VEREDA EL TREVOL	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	134416996	9455844138	Y	2023/09/12	2023/09/01	BANCOLOMBIA	0	$45,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Lma	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vc
1	CC	1054992442	CORRALES GARCIA NICOLAS ANDRES	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2023/08/14																												
Total Afiliados(1)																																						

2023/09/01 01:23 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
																					$ 0						$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	COLPATRIA ARP	17	$ 657.334	6,96%	5	$ 45.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 0						$ 0						$ 45.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2023/09/01 01:23 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901422847	0	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELA EL TREBOL CHINCHINA	VEREDA EL TREVOL	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	134416996	9455844138	Y	2023/09/12	2023/09/01	BANCOLOMBIA	0	$45,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,800	$0	$0	$45,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$45,800	$0	$0	$45,800
TOTAL				1	$45,800	$0	$0	$45,800

2023/09/01 01:23 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901422847	0	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELA EL TREBOL CHINCHINA	VEREDA EL TREVOL	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	134406108	9455844730	E	2023/09/12	2023/09/01	BANCOLOMBIA	0	$1,416,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	17	$ 657.334	16%	SIN RIESGO	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200		NUEVA E.P.S.	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	17	$ 657.334	16%	SIN RIESGO	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200		SALUD TOTAL	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		SALUD TOTAL	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	14	$ 541.334	16%	SIN RIESGO	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.700		SALUD TOTAL	14	$ 541.334	4%	$ 21.700	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		SANITAS	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo		0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		NUEVA E.P.S.	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	17	$ 657.334	16%	SIN RIESGO	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		NUEVA EPS MOVILIDAD	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	17	$ 657.334	16%	SIN RIESGO	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200		NUEVA E.P.S.	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		NUEVA E.P.S.	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
																					$ 680.800						$ 195.800	

2023/09/01 01:23 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 26.300		CONFAMILIARES	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	COLPATRIA ARP	17	$ 657.334	6,96%	5	$ 45.800	17	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 26.300		CONFAMILIARES	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	COLPATRIA ARP	17	$ 657.334	6,96%	5	$ 45.800	17	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 14.000		CONFAMILIARES	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	COLPATRIA ARP	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 21.700		CONFAMILIARES	14	$ 541.334	4%	$ 21.700	COLPATRIA ARP	14	$ 541.334	6,96%	5	$ 37.700	14	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 14.000		CONFAMILIARES	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	COLPATRIA ARP	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 26.300		CONFAMILIARES	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	COLPATRIA ARP	17	$ 657.334	6,96%	5	$ 45.800	17	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 26.300		CONFAMILIARES	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	COLPATRIA ARP	17	$ 657.334	6,96%	5	$ 45.800	17	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 14.000		CONFAMILIARES	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	COLPATRIA ARP	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 26.300		CONFAMILIARES	17	$ 657.334	4%	$ 26.300	COLPATRIA ARP	17	$ 657.334	6,96%	5	$ 45.800	17	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 1.600		CONFAMILIARES	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	COLPATRIA ARP	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 196.800						$ 196.800						$ 342.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2023/09/01 01:23 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901422847	0	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELA EL TREBOL CHINCHINA	VEREDA EL TREVOL	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	134406108	9455844730	E	2023/09/12	2023/09/01	BANCOLOMBIA	0	$1,416,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$680,800	$0	$0	$680,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$111,400	$0	$0	$111,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$266,100	$0	$0	$266,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$216,600	$0	$0	$216,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$86,700	$0	$0	$86,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$342,300	$0	$0	$342,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$342,300	$0	$0	$342,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$196,800	$0	$0	$196,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	$196,800	$0	$0	$196,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$196,800	$0	$0	$196,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$26,300	$0	$0	$26,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$80,500	$0	$0	$80,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$14,000	$0	$0	$14,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$62,000	$0	$0	$62,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$14,000	$0	$0	$14,000
TOTAL				10	$1,416,700	$0	$0	$1,416,700

2023/09/01 01:23 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

ACTA DE OBRA No 1 PARCIAL

Contrato No S.A.M.C 014 - 633 DE 2023

OBJETO:

"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA PHAROS
901.422.837-0
RL - MELISSA VARGAS GIRALDO
CC: 24.335.406

PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS

Tabla de contenido

Contenido

GENERALIDADES DEL CONTRATO **3**

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA **3**

INFORMACIÓN FINANCIERA **5**

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA **5**

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 5

PLANTA PRIMER PISO *5*

PLANTA SEGUNDO PISO (OBRA NUEVA) *5*

CORTES *6*

REGISTRO FOTOGRÁFICO 10

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	S.A.M.C 014 - 633 DE 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CHINCHINÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS 901.422.837-0 RL - MELISSA VARGAS GIRALDO CC: 24.335.406
DURACIÓN:	90 días
VALOR	$221’778.152
SUPERVISIÓN	Alberto Uribe Varón – Jefe Oficina de Infraestructura
OBJETO	“CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS”

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

Durante las visitas realizadas a las instalaciones en las que opera actualmente la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TRÉBOL, así como en las conversaciones sostenidas con la comunidad, se ha identificado la necesidad de ampliar la superficie de los espacios disponibles para los niños y jóvenes. El objetivo es poder ofrecer una mayor variedad de oportunidades académicas y culturales que promuevan su formación integral y, al mismo tiempo, ayuden a desarrollar sus habilidades sociales y emocionales.

El Municipio de Chinchiná ha incluido en su plan de desarrollo "CONSTRUYENDO REALIDADES 2020-2023", en la dimensión cognitiva, emocional y afectiva del ser humano, una línea dedicada a la educación. Su objetivo general es "Garantizar las condiciones físicas (infraestructura) y motivacionales (calidad) para que ningún niño, adolescente o joven quede excluido del sistema educativo". En este contexto, se ha implementado el programa 10: "NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR Y CON EDUCACIÓN DE BUENA CALIDAD". Dentro de este programa, la meta de bienestar 10.4 es "MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON BUENAS CONDICIONES DE INTERNET". Para lograr la meta de producto "MEJORAR AL MENOS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO", el municipio ha destinado sus propios recursos para llevar a cabo el presente contrato.

Por estas razones, la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, presenta el estudio de conveniencia y oportunidad para seleccionar a la persona natural o jurídica adecuada que llevará a cabo las actividades relacionadas con el objeto del contrato, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa y utilizando el procedimiento de selección abreviada.

Este proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal correspondiente, con el siguiente código UNSPSC y descripción. Además, está registrado en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS de inversión municipal, bajo el nombre "APOYO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ", con la ficha BPIN 2023171740005, emitida por la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura de la entidad estatal. (Tomado del Anexo Técnico)


INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 221,778,152.00
ADICIÓN		$ -
ACTA DE OBRA 1	$ 66,798,138.42	
VALOR EJECUTADO	$ 66,798,138.42	
POR EJECUTAR	$ 154,980,013.58	
SUMAS IGUALES	$ 221,778,152.00	$ 221,778,152.00
% AVANCE	30.12%	
% POR EJECUTAR	69.88%	

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA


DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO

PLANTA PRIMER PISO

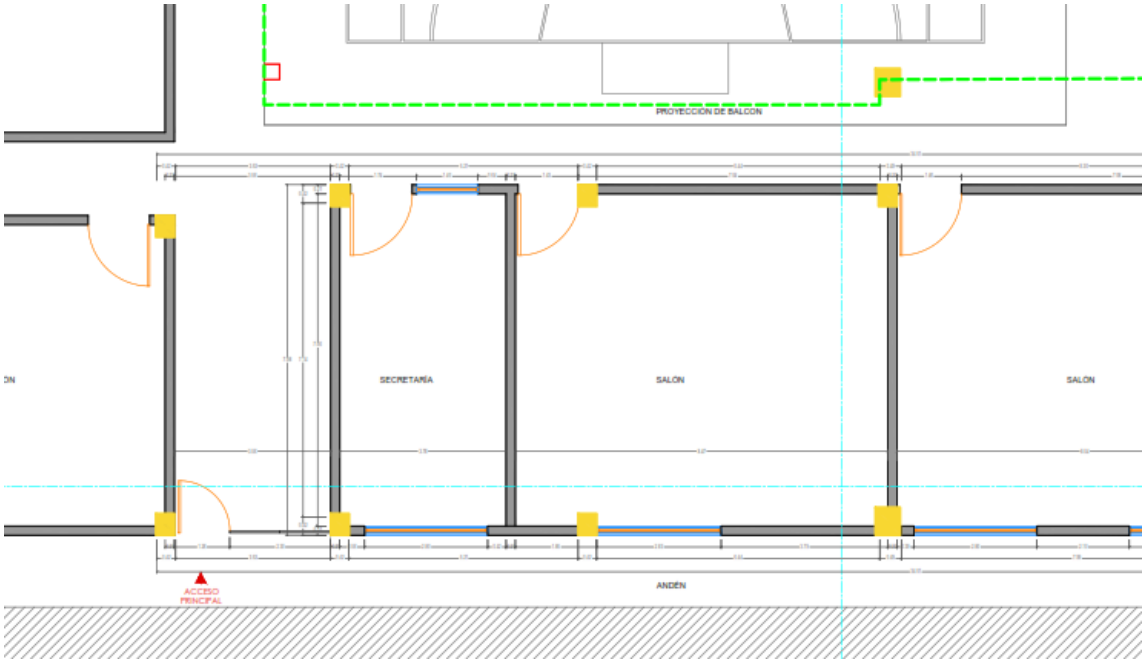


PLANTA SEGUNDO PISO (OBRA NUEVA)


PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS

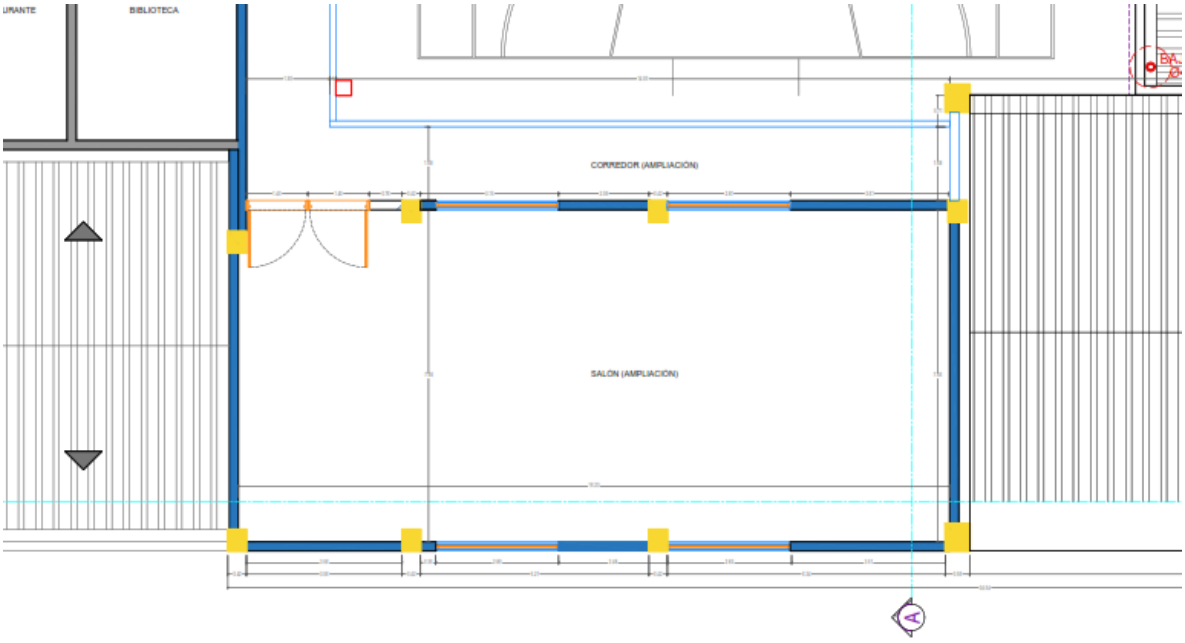


CORTES

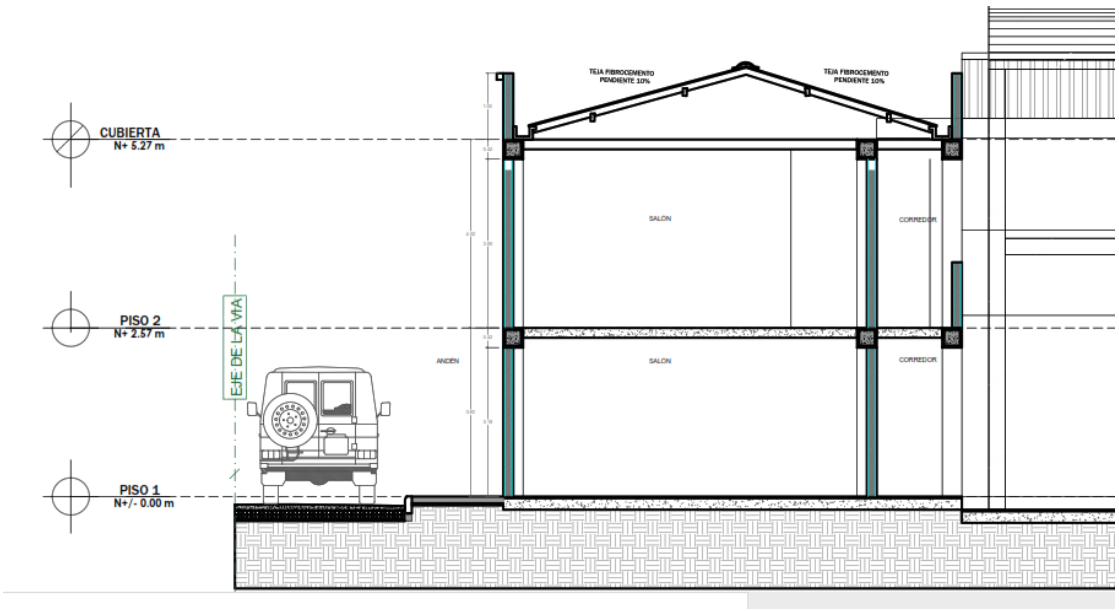

PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS

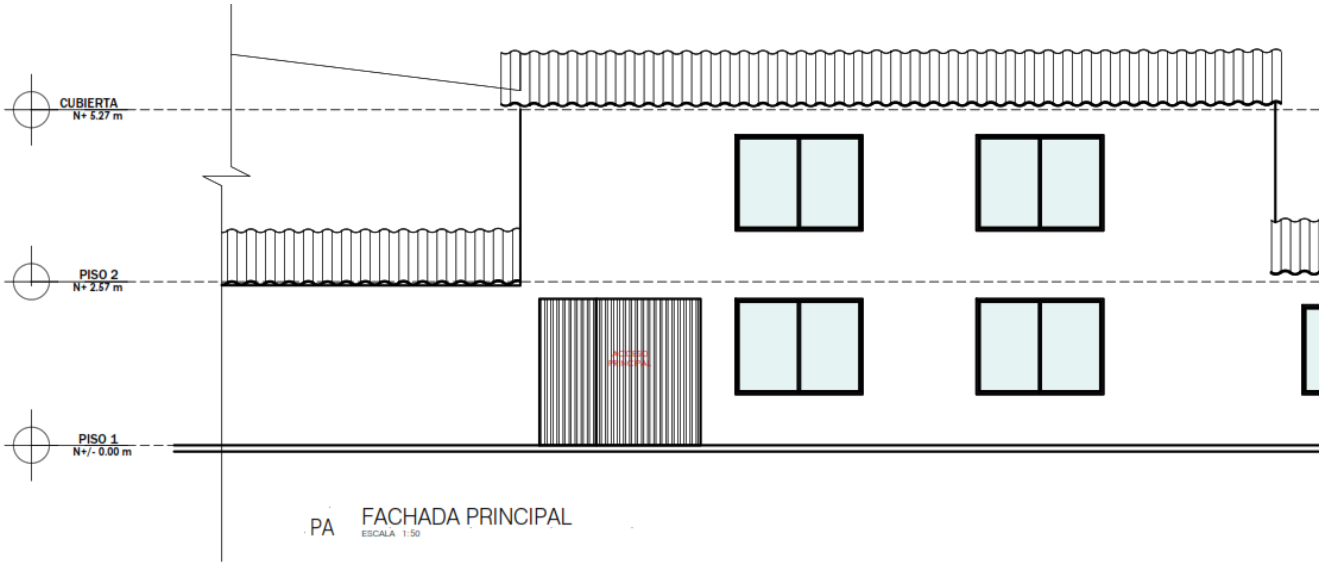

PA FACHADA PRINCIPAL
ESCALA 1:50

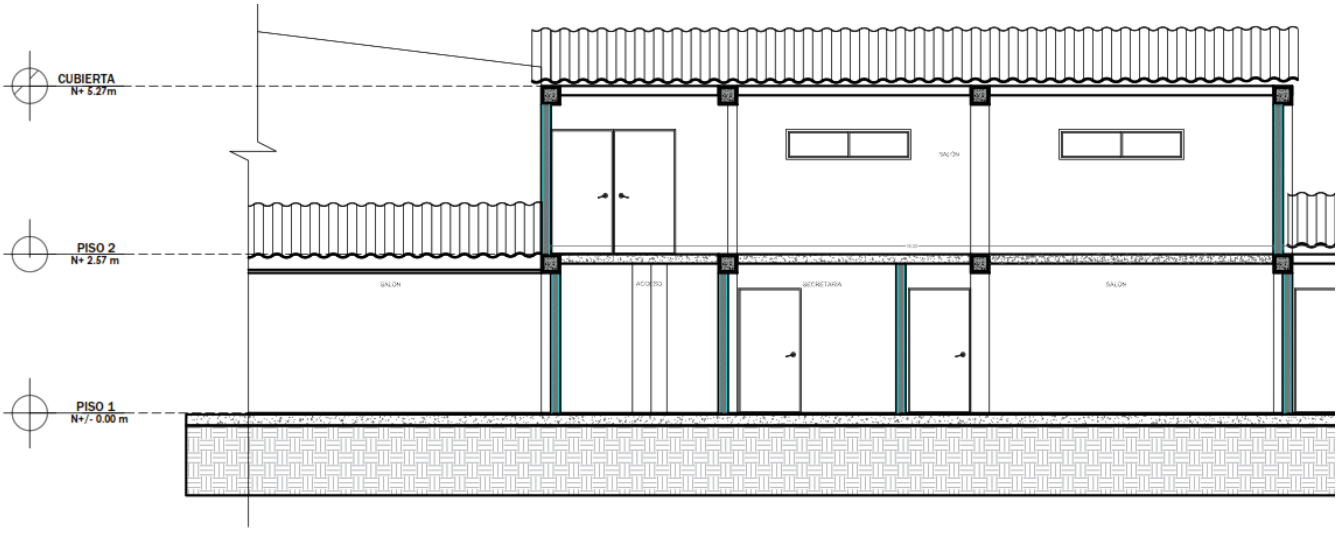

PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS

Se inician las operaciones de obra con una evaluación de campo que contó con la presencia del maestro de obra, el ingeniero residente, los oficiales y el contratista. Se determina llevar a cabo un estudio de suelos con el propósito de ajustar el diseño estructural y, por consiguiente, analizar la viabilidad de reducir las dimensiones de zapatas, columnas y/o vigas, con el fin de optimizar los recursos financieros y canalizarlos eficientemente dentro del proyecto.

La secuencia operativa continúa con la desinstalación del cielo raso en las áreas de oficinas, salones uno y dos, seguida por la eliminación de la cubierta en fibrocemento preexistente, la cual se encontraba en un estado deteriorado, cubierta de musgo y compuesta por fragmentos de teja. Se procede a desmontar las cerchas metálicas que soportaban la cubierta, y finalmente, se retiran todos los elementos desmontados.

Se procede a la desinstalación de las puertas, las cuales se almacenan en la bodega para su posterior reinstalación. Cabe destacar que, durante el proceso de desinstalación, los marcos de las puertas sufrieron daños debido a la presencia de mortero en su interior, lo que requerirá su sustitución por nuevos marcos.

Se realizan cortes en la losa para llevar a cabo las demoliciones en las áreas destinadas a las zapatas. A continuación, se excava y se vierte el solado de limpieza. En resumen, se efectúa la excavación de ocho agujeros para alojar las ocho zapatas correspondientes.

Se inicia la tarea de conformación del acero para las zapatas, que se instala en los orificios correspondientes antes de proceder a su colado. Simultáneamente, se instala el refuerzo longitudinal de las columnas, asegurando su embebimiento en el concreto de las zapatas.

Posteriormente, se coloca el acero de refuerzo en las columnas y pedestales, se monta el encofrado y se procede con el vertido de concreto.

Los agujeros se rellenan con el material previamente excavado, se instala la malla electrosoldada y se coloca el concreto para las losas previamente demolidas, las cuales se someten a un proceso de acabado superficial utilizando mineral amarillo, que incluye esmaltado y pulido.

Se continúa con la fijación de las vigas y se inicia la instalación del acero de refuerzo correspondiente. Las caras laterales del encofrado se colocan en su lugar y se efectúa el colado en dos fases: la primera entre el eje D y el tercio entre los ejes B y C, y la segunda entre el tercio entre los ejes B y C y el eje A. De esta manera, se completa la construcción de toda la estructura desde el nivel N+3,20 hacia abajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS















PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS







PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS





PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS







PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS



CONSTRUCTORA PHAROS

NIT: 901.422.837-0

RL - MELISSA VARGAS GIRALDO

CC: 24.335.406

INFORME SST Corte 1 – Acta de Obra 1

ELABORADO POR:
Jobany Lopez Ravagli
PROFESIONAL SST
LIC N° 4012

PERIODO: Del 2 de agosto al 1 de septiembre de 2023

Contrato No S.A.M.C 014 - 633 DE 2023

Objeto del contrato: "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

CONSTRUCTORA PHAROS
901.422.837-0
RL - MELISSA VARGAS GIRALDO
CC: 24.335.406

Chinchiná

1 de septiembre de 2023

PHAROS
INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS

Contenido

INTRODUCCION 3

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 4

ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES 5

AUSENTISMOS: 5

EPP entregados durante la semana 5

PERSONAL EN OBRA POR CARGO 6

INTRODUCCION

La seguridad y salud en el trabajo SST es una actividad multidisciplinaria que busca proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y control de enfermedades y accidentes y la eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo, generando y promoviendo el trabajo sano y seguro y procurando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores todo esto apoyado por los contratistas, interventoría, personal administrativo y trabajadores.

Objeto del contrato: Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa rural el trébol en la zona rural del municipio de Chinchiná.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

Actividad	Evidencia
Se realiza inducción, entrega de los elementos de protección personal EPP, y se dan recomendaciones autocuidado, actos y condiciones inseguras	Formato de inducción y evidencia fotográfica **(anexo 1)**
Se hace acompañamiento y recorrido de obra, se dan recomendaciones diarias.	Evidencia fotográfica
Se señalizan áreas y sitios de trabajo, senderos peatonales y cerramientos.	Evidencia fotográfica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
 	
Se evidencia Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Acompañamiento en el armado de andamios.
 	 
Cierre y señalización con yute y cinta de precaución	Jornada de orden y aseo de la obra
	
Acompañamiento en actividades de trabajo en alturas y verificando el uso de los equipos de protección contra caídas	Acompañamiento en campo en fundición de la primera columna.



Acompañamiento en actividades de alto riesgo

ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES	
Accidentes	0
Incidentes	0

.

AUSENTISMOS:	
Ausentismo por accidente laboral	0
Ausentismo por enfermedad general	0
Ausentismo por enfermedad laboral	0

EPP entregados durante la semana	
7	Guantes de nitrilo
7	Gafas de seguridad
0	Tapa oídos de inserción
0	Tapabocas N95 o industriales
7	Chalecos reflectivos
7	Casco de seguridad

PERSONAL EN OBRA POR CARGO	
Maestro de obra	**1**
Oficiales	**2**
Ayudantes practico	**1**
Tecnólogo en Seguridad y salud en el Trabajo	**1**
Administrativos (Ing. Residente, director de obra.	**2**

Listado de personal activo proyecto Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa el Trébol							
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Fecha de ingreso**	**Frente de trabajo**	**EPS**	**Fondo de pensión**	**ARL**
Jose Daniel Restrepo	9846142	Maestro	14/08/2023	Institución educativa el Trébol	Nueva EPS	Colfondos	AXA Colpatria
Oscar Ivan Escalante	105487931	Oficial	14/08/2023	Institución educativa el Trébol	Nueva EPS	Positiva	AXA Colpatria
Octavio Enrique Tapias Zapata	1054989997	Oficial	29/08/2023	Institución educativa el Trébol	Nueva EPS	Colfondos	AXA Colpatria
Jhony Escalante	80831095	Ayudante practico	14/08/2023	Institución educativa el Trébol	Salud total EPS	Colpensiones	AXA Colpatria
Orlando Henao	10242750	Ayudante	14/08/2023	Institución educativa el Trébol	Nueva EPS	Colpensiones	AXA Colpatria
Jaime Eduardo Llanos	1002546292	Ayudante	22/08/2023	Institución educativa el Trébol	EPS Sanitas	Porvenir	AXA Colpatria

Rubén Arles Ochoa Álzate	1053768002	Ayudante	22/08/2023	Institución educativa el Trébol	Asmet salud	Bello Horizonte	AXA Colpatria
Nicolas Andrés Corrales García	1054992442	Residente de Obra	14/08/2023	Institución educativa el Trébol	Salud Total	Protección	AXA Colpatria
Jobany Lopez Ravagli	1053868381	Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo	15/08/2023	Institución educativa el Trébol	SURA	Colpensiones	AXA Colpatria

PERSONAL RETIRADO

N°	Cedula de Ciudadanía	Nombres y apellidos	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
		No personal retirado durante la semana			

Cordialmente,



Jobany Lopez Ravagli
TECNOLOGO SST
LIC N° 4012



CONSTRUCTORA PHAROS

NIT: 901.422.837-0

RL - MELISSA VARGAS GIRALDO

CC: 24.335.406

PHAROS INGENIERIA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST FORMATO DE INDUCCION Y/O REINDUCCION	Código	SST-FT-01
		Fecha:	21/07/2022
		Elaborado por: Diana Patricia Giraldo Jaramillo	

FECHA 22 | 08 | 23

YO, Jaime Eduardo G. Llanos Cedula Nº 1002546292
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo. ☑
- Derechos y deberes de los trabajadores en SST ☑
- Responsabilidades del empleador ☑
- Que es accidente y accidente de trabajo. ☑
- Enfermedad laboral ☑
- Que hacer en caso de accidente e incidente de trabajo. ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Factores de riesgos asociados a la labor.. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Jaime Llanos	1002546292
FIRMA TRABAJADOR	**No. IDENTIFICACIÓN**
Sdany López Ravagli	Sdany L.
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	**FIRMA**

Powered by CamScanner

PHAROS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
		SST-F-02	01
	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA CREACION DEL FORMATO	PAGINAS
		28/07/2022	1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE	Jaime Eduardo Llanos			CEDULA Nº	1002546292
FECHA:	22/08/23	CARGO	Ay	AREA	Operativa

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes de Nitrilo	1	22/08/23	Jaime
2	Casco	1	22/08/23	Jaime
3	Gafas de seguridad	1	22/08/23	Jaime
4	Chaleco Reflectivo	1	22/08/23	Jaime
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Jobany López Ravagli	CEDULA Nº	1053-868.381
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Jobany L.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.10. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de la UNION TEMPORAL MUNDO SOCIAL.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jaime Llanos

CEDULA Nº: 1002546292

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERIA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST FORMATO DE INDUCCION Y/O REINDUCCION	Código	SST-FT-01
		Fecha:	21/07/2022
		Elaborado por: Diana Patricia Giraldo Jaramillo	

FECHA 16 | 08 | 23

YO, JHONS ESCAMILLA C. Cedula Nº 80831095
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo. ☑
- Derechos y deberes de los trabajadores en SST ☑
- Responsabilidades del empleador ☑
- Que es accidente y accidente de trabajo. ☑
- Enfermedad laboral ☑
- Que hacer en caso de accidente e incidente de trabajo. ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Factores de riesgos asociados a la labor.. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ☑

CARGO O ACTIVIDAD: AY practico

JHONS ESCAMILLA.	80831095.
FIRMA TRABAJADOR	**No. IDENTIFICACIÓN**
Sebastian Lopez Rendon	Sebastian L.
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	**FIRMA**

Powered by CamScanner

PHAROS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
		SST-F-02	01
	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA CREACION DEL FORMATO	PAGINAS
		28/07/2022	1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE	Jhomy Escalante			CEDULA Nº	80831095
FECHA:	16/08/2023	CARGO	A y P.	AREA	Operativa

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Cascos	1	16/08/23	Jhomy Escalante
2	Guantes de Nitrilo	1	16/08/23	Jhomy Escalante
3	Gafas de Seguridad	1	16/08/23	Jhomy Escalante
4	Chaleco Reflectivo	1	16/08/23	Jhomy Escalante
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Sharry López R.	CEDULA Nº	1053 868 381
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Sharry L.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.10. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de la **UNION TEMPORAL MUNDO SOCIAL**.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jhomy Escalante

CEDULA Nº: 80831095

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST FORMATO DE INDUCCION Y/O REINDUCCION	Código	SST-FT-01
		Fecha:	21/07/2022
		Elaborado por: Diana Patricia Giraldo Jaramillo	

FECHA 16 | 08 | 23

YO, Daniel Castrepo Cedula N° 9846142
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo. ☑
- Derechos y deberes de los trabajadores en SST ☑
- Responsabilidades del empleador ☑
- Que es accidente y accidente de trabajo. ☑
- Enfermedad laboral ☑
- Que hacer en caso de accidente e incidente de trabajo. ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Factores de riesgos asociados a la labor.. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Maestro de Obra

Daniel Castrepo	9846142
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN
Edwin López Rapagli	Edwin L.
PROFESIONAL QUE REALIZO LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERIA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
		SST-F-02	01
	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA CREACION DEL FORMATO	PAGINAS
		28/07/2022	1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE	Daniel Restrepo			CEDULA Nº	98461 42
FECHA:	16/08/2023	CARGO	Maestro	AREA	Operativo

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco	1	16/08/23	daniel restrepo
2	Guantes de Nitrilo	1	16/08/23	daniel restrepo
3	Gafas de Seguridad	1	16/08/23	daniel restrepo
4	Chaleco Reflectivo	1	16/08/23	daniel restrepo
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Sebany Lopez Ravagli	CEDULA Nº	1053868381
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.10. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de la **UNION TEMPORAL MUNDO SOCIAL**.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

daniel restrepo

CEDULA Nº: 9846142

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERIA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST FORMATO DE INDUCCION Y/O REINDUCCION	Código	SST-FT-01
		Fecha:	21/07/2022
		Elaborado por: Diana Patricia Giraldo Jaramillo	

FECHA 16 | 08 | 23

YO, ORLANDO HENAO Cedula N° 10242750
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo. ☑
- Derechos y deberes de los trabajadores en SST ☑
- Responsabilidades del empleador ☑
- Que es accidente y accidente de trabajo. ☑
- Enfermedad laboral ☑
- Que hacer en caso de accidente e incidente de trabajo. ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Factores de riesgos asociados a la labor.. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ☑

CARGO O ACTIVIDAD: AYUDANTE

Orlando Henao Ríos	10242750
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN
Sebastián López Ravagli	Sebastián L.
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
		SST-F-02	01
	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA CREACION DEL FORMATO	PAGINAS
		28/07/2022	1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE	Orlando Herao			CEDULA Nº	10242750
FECHA:	16/08/2023	CARGO	Ay	AREA	Operativo

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco	1	16/08/23	Orlando
2	Guantes de Nitrilo	1	16/08/23	Orlando
3	Gafas de Seguridad	1	16/08/23	Orlando
4	Chaleco Reflectivo	1	16/08/23	Orlando
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Ibary López Ravagli	CEDULA Nº	1053868381
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Ibary L.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.10. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de la **UNION TEMPORAL MUNDO SOCIAL**.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Orlando

CEDULA Nº: 10242750

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST FORMATO DE INDUCCION Y/O REINDUCCION	Código	SST-FT-01
		Fecha:	21/07/2022
		Elaborado por: Diana Patricia Giraldo Jaramillo	

FECHA 16 | 08 | 23

YO, Oscar Iván Escalante G. Cedula N° 1.054.987.931
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo. ☑
- Derechos y deberes de los trabajadores en SST ☑
- Responsabilidades del empleador ☑
- Que es accidente y accidente de trabajo. ☑
- Enfermedad laboral ☑
- Que hacer en caso de accidente e incidente de trabajo. ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Factores de riesgos asociados a la labor.. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Oficial

Oscar I. Escalante G.	1.054.987.931
FIRMA TRABAJADOR	**No. IDENTIFICACIÓN**
Sobany López Ramos	Sobany L.
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN	**FIRMA**

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
		SST-F-02	01
	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA CREACION DEL FORMATO	PAGINAS
		28/07/2022	1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE	Oscar Ivan Escalante G.			CEDULA Nº	1094984931
FECHA:	16/08/2023	CARGO	Oficial	AREA	Operativa

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco	1	16/08/23	Oscar I. Escalante
2	Guantes de Nitrilo	1	16/08/23	Oscar I. Escalante
3	Gafas de seguridad	1	16/08/23	Oscar I. Escalante
4	Chaleco Reflectivo	1	16/08/23	Oscar I Escalante
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Sobany López Ravagli	CEDULA Nº	1093868381
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.10. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de la **UNION TEMPORAL MUNDO SOCIAL.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Oscar I. Escalante G.

CEDULA Nº: 1.054.984.931

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERIA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG –SST FORMATO DE INDUCCION Y/O REINDUCCION	Código	SST-FT-01
		Fecha:	21/07/2022
		Elaborado por: Diana Patricia Giraldo Jaramillo	

FECHA 22 | 08 | 23

YO, Rubén Arlés Ochoa Alzate Cedula Nº 1053768002
certifico que tuve Inducción o Reinducción completa en los siguientes temas:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo. ☑
- Derechos y deberes de los trabajadores en SST ☑
- Responsabilidades del empleador ☑
- Que es accidente y accidente de trabajo. ☑
- Enfermedad laboral ☑
- Que hacer en caso de accidente e incidente de trabajo. ☑
- Política de SST. ☑
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo. ☑
- Reglamento Interno de Trabajo. ☑
- Reglamento de higiene y seguridad industrial. ☑
- Funcionamiento del comité paritario de SST o del vigía de SST. ☑
- Funcionamiento del comité de convivencia laboral. ☑
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta para Emergencias. ☑
- Factores de riesgos asociados a la labor.. ☑
- Responsabilidades generales en SST. ☑
- Derechos y deberes del Sistema General de Riesgos Laborales. ☑
- Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ☑

CARGO O ACTIVIDAD: Ayudante

Rubén Arlés Ochoa Alzate	1053768002
FIRMA TRABAJADOR	No. IDENTIFICACIÓN
Sobany López Ramírez	Sobany
PROFESIONAL QUE REALIZO LA INDUCCIÓN	FIRMA

Powered by CamScanner

PHAROS INGENIERÍA CONSTRUCTORA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSIÓN
		SST-F-02	01
	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA CREACION DEL FORMATO	PAGINAS
		28/07/2022	1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO					
NOMBRE	Ruben Ades Ochoa Alzate			CEDULA Nº	1053768002
FECHA:	22/08/2023	CARGO	Ay	AREA	Operativo.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco	1	22/08/23	Ruben Ades O Alzate
2	Guantes de Nitrilo	1	22/08/23	Ruben Ades O Alzate
3	Chaleco Reflectivo	1	22/08/23	Ruben Ades O Alzate
4	Gafas de Seguridad	1	22/08/23	Ruben Ades O Alzate
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Sdany López Ravagli	CEDULA Nº	1053 868 381
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Sdany L.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.10. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de la **UNION TEMPORAL MUNDO SOCIAL**.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Ruben Ades Ochoa Alzate

CEDULA Nº: 1053768002

Powered by CamScanner
