GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	INFORME 3 PARA PAGO 2										
SUPERVISION	X										
INTERVENTORÍA	☐										
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐					
PERIODO DE INFORME	Desde:	25/08/2023		Hasta:	22/09/2023						
PERIODO PARA PAGO	Desde:	25/08/2023		Hasta:	22/09/2023						

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600015629		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	19/05/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14823		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			09/06/2023		
OBJETO: MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, SALAS DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"					
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.		
	NIT		900.509.251 – 3		
VALOR [$]:	INICIAL:		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ML ($277.142.138) incluido AU del 28,14%		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		1	$75.076.472	27,09%	
	VALOR TOTAL:		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ML ($352.218.610) Incluido AU del 28,14%.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060118		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/05/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			09/06/2023	09/09/2023	

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	1 MES	09/10/2023	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		09/10/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

SUPERVISOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA C.C.98544168 SERGIO ANDRÉS GIRALDO BLANDON C.C. 8031066
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	50,00%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	40,00 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

A la fecha se han efectuado las siguientes acciones.

FECHA	ACCIÓN	OBSERVACIÓN
24/08/2023	Envío a la aseguradora del requerimiento de mora de cumplimiento	Radicado 2023030335088
04/09/2023	Solicitud de adición y Prórroga	Office 365,Outlook.
08/09/2023	Suscripción adición y prórroga	Secop
11/09/2023	Oficio de requerimiento para cumplir entregas	Rad. 2023030415733
18/09/2023	Solicitud de evidencias de compras de material	
18/09/2023	Oficio respuesta y solicitud de prórroga	Enviado por Bayith
19/09/2023	Respuesta a oficio de solicitud de prórroga	Office 365,Outlook.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

2.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1- Perfeccionar conjuntamente laminuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas,modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato, incluyendoel acta de liquidación.	Cumple	Contrato 4600015629 de 19/05/23	Se verificó en Secop II

2- Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	Cumple	Hojas de vida-seguridad social	Maestro de obra ingresó
3- Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.	Cumple	Entregas e informes	Acorde a lo contratado
4- Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.	Cumple	Actas de visitas y reuniones	Según ítem 3 de este informe
5- Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.	Cumple	Actas de visitas yreuniones	Según ítem 3 de este informe
6- Propender por el logro de los productos pactados.	No Cumple	Recorrido de obra	No se avanza con la celeridad requerida
7- Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato.	Cumple	Informes, correos, llamadas, visitas yreuniones	Acorde a lo contratado
8- Mantener actualizado el contrato a través de la plataforma transaccional Secop II según lo que respecta a las obligaciones de las partes.	Cumple	Minuta adición y prórroga Pólizas Adición y prórroga	Se verificó en Secop II
9- Realizar un cronograma de trabajo entre las partes.	Cumple	Cronograma	Se deben realizar ajustes

2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

El contrato de obra, según su estructuración pre-contractual, está diseñado, para tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamientos y ejecución.

El contrato de obra tuvo adición y prórroga de un mes más con fecha de terminación de 09/10/2023:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1-Presentar las hojas de vida con todos los soportes del personal mínimo requerido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la revisión y aprobación de los documentos la cual será realizada por parte del supervisor del contrato.	100%	50%	Documentos aportados por correo	conforme
2-Cumplir cabalmente con los requerimientos y especificaciones técnicas descritas en los documentos del proceso, así como con los requerimientos ambientales, autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos, descritos en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos del proceso.	100%	50%	Documentos aportados por correo	conforme

3- Garantizar que todo el personal a su cargo esté debidamente identificado, con escarapela y uniforme distintivo de la empresa, cumpliendo con la normatividad vigente en cuanto a vestimenta y calzado apropiado para la labor a desarrollar	50%	50%	Revisión en obra	Pendiente identificación
4- Presentar los formatos de permisos para trabajo en alturas, y realizar diariamente el registro de este durante la ejecución de las obras que así lo requieran. Al finalizar los trabajos debe presentar un informe con registro fotográfico y evidencias de la actividad realizada, antes, durante y después de la intervención realizada.	**N/A**			**N/A**
5- Garantizar que los equipos y elementos de protección personal que utilice para realizar la labor en alturas, cumplan con los requerimientos normativos existentes al respecto de acuerdo al reglamento técnico de trabajo en alturas.	**N/A**			**N/A**
6-Garantizar la correcta instalación de piezas y demás elementos.	100%	50%		conforme
7- Suministrar los bienes y la mano de obra de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en las fichas técnicas de proveedores y fabricantes, las cuales deben ser aportadas por el contratista para validar que los productos a instalar corresponden a los especificados.	100%	50%	Revisión en obra	Conforme a lo contratado
8- Realizar el cambio de forma inmediata y sin ningún costo para el ente departamental, de cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las necesidades del Departamento de Antioquia.	**N/A**			A la fecha No se requiere.
9- Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.	**N/A**			A la fecha no hay entregas
10- Cumplir con el objeto del contrato desarrollando las actividades necesarias en los términos establecidos en el estudio previo, pliego de condiciones, propuesta presentada y demás documentos precontractuales, que hacen parte integral del contrato que se derive.	50%	50%	Cronograma	A la fecha no se cumple programación.
11- Programar con la supervisión del contrato el horario para la ejecución de los trabajos, para minimizar la afectación de la prestación de los servicios en las edificaciones a intervenir, de ser necesario dicho horario podrá ser nocturno y fines de semana.	100%	50%	Verificación en obra	Se puede laborar durante toda la jornada incluso sábados, domingos y festivos sin costo para la entidad. No habido suspensiones
12- Suministrar el personal requerido para la ejecución de las obras en las cantidades y calidades descritas en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos del proceso.	50%	50%	Verificación en obra	Ha mejorado la cantidad de personal
13- Proteger todo el trabajo y material contra, robo, desperfecto o daños causados por su mismo trabajo o sus trabajadores, y será responsable por estos daños.	100%	50%	Verificación en obra	Conforme a lo contratado

14- Almacenar cuidadosamente el material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente.	100%	50%	Verificación en obra	Conforme a lo contratado
15- Proteger aquellos espacios, equipos o mobiliario susceptible de daño durante la ejecución de los trabajos.	100%	50%	Verificación en obra	Conforme a lo contratado
16- Señalizar adecuadamente y de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, todos los espacios de trabajo para evitar accidentes.	100%	50%	Verificación en obra	Conforme a lo contratado
17- Aplicar los métodos de mantenimiento y construcción recomendados de acuerdo con las normas NTC 1642 (Requisitos de Seguridad) y para cada actividad específica se deben cumplir también con las recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y elementos utilizados.	100%	50%	Verificación en obra	Conforme a lo contratado
18- Será responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten.	100%	50%	Verificación en obra	Conforme a lo contratado
19- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las necesidades del Departamento de Antioquia será cambiado de inmediato, sin ningún costo para el Departamento de Antioquia.	N/A			Aún no hay requerimientos
20- Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de ejecución de las obras objeto del contrato.	100%	50%		Conforme a lo contratado
21- Suministrar los sistemas de seguridad y medios internos de transporte necesarios para llevar a su sitio los equipos, herramientas y materiales que pueda necesitar para la ejecución de las obras.	100%	50%		Conforme a lo contratado
22- Suministrar los sistemas de seguridad, equipos, andamios, y herramientas que deberán cumplir con la normatividad vigente para trabajos en altura.	100%	50%		Conforme a lo contratado
23- Realizar la disposición final del RCD que se genere y entregar la certificación correspondiente en cumplimiento con lo dispuesto en Resolución 472 del 28 de febrero de 2017.	100%	50%		Conforme a lo contratado
24- Cumplir con los lineamientos establecidos en el sistema de gestión BASURA CERO.	100%	50%		Conforme a lo contratado
25- Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	100%	50%		Conforme a lo contratado
26- El contratista adjudicatario, deberá acreditar que cuenta con mínimo el 5% del personal para la ejecución del contrato en condición de especial protección constitucional, situación que será verificada por parte del Supervisor designado para el contrato, en un plazo máximo de 15 días calendario posterior a la firma del acta de inicio. En todo caso, el contratista, desde el inicio y durante el tiempo de ejecución del contrato, deberá contar con el mismo porcentaje de	100%	50%		Conforme a lo contratado

personal para la ejecución en condición de sujetos de especial protección constitucional, so pena de incurrir en la multa dispuesta para tal efecto.				
27-Entregar para revisión de la Supervisión los siguientes documentos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato • Análisis del Precio Unitario (APU) • Cálculo del A.I.U • Programa de Trabajo e Inversión • Listado del personal que se empleará en la ejecución del contrato • Hojas de vida y documentos de todo el equipo de trabajo solicitado en el requisito habilitante y los documentos que dieron lugar a asignación de puntaje en caso de que aplique • Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal se empleará en la ejecución del contrato de conformidad con el salario ofertado • Plan de Acción Socio-Ambiental en Obra (PASAO) • Equipos (Tipo, cantidad, estado)	100%	50%		Conforme a lo contratado
28- Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.	100%	50%		Conforme a lo contratado
TOTAL	**100 %**	**50%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Cada obligación/compromiso va de 0 % a 100 %, siendo cero ningún avance o ejecución y 100 % cumplimiento de la obligación/ compromiso, por lo tanto, su acumulado variará en dicho rango, para cada periodo comprendido en el informe.

El porcentaje total se calcula así

Porcentaje Total = Σ (Sumatoria OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO) / (Número de COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO)

Promedio de los Porcentajes (%) ejecución del periodo informado, para cada obligación/compromiso pactado del componente técnico.

Frente al porcentaje (%) ejecución acumulada, nunca superará el 100 % para cada obligación/compromiso pactado del componente técnico y se divide de manera proporcional en el número de informes a entregar (mensuales y final) o según lo estipulado en el cronograma, para el valor a tener en cuenta por informe entregado.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/ COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**MEDIO DE VERIFIACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
1- Acompañar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunión y formatos de visita.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
2- Mantener actualizada la base de datos de los actores involucrados en el proceso y ejecución de las obras.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
3-Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos críticos, identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el Supervisor del contrato.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
4- Realizar capacitaciones y entrenamientos al personal en temas sociales, con la periodicidad definida en la Guía de Manejo Socio Ambiental y/o cuando las condiciones de la obra así lo requieran.	N/A		
5- Participar activamente de las reuniones solicitadas por personal del Departamento de Antioquia, para tratar temas relacionados con el proyecto.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
6- Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la Secretaría de Suministros y Servicios, sobre temas relacionados con el proyecto.	Cumple		Aporta pruebas de compras
7- Divulgar oportunamente, con anterioridad a la ejecución de las actividades, las intervenciones y actividades que se vayan a adelantar en la obra que puedan alterar la cotidianidad del público y/o funcionarios del área de influencia del proyecto.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
8- Coordinar la inserción de la mano de obra no calificada y realizar las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administración Departamental en ese sentido.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
9- Consolidar y presentar al supervisor del contrato la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/ COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
1- Cumplir con los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas.	cumple		pasan acta de cobro
2. Cumplir con las normas vigentes de seguridad y Salud en el Trabajo.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado

3. Cumplir la normatividad ambiental que aplique para el desarrollo de las actividades del proyecto.	cumple	Revisión documentos	Acorde a lo contratado
4. Elaborar, presentar y dar cumplimiento al Plan de Acción Socio Ambiental en Obra (PASAO), durante el plazo de ejecución del contrato.	cumple	Aportan documento	Acorde a lo contratado
5. Presentar mensualmente o cuando la supervisión lo requiera el consolidado de la gestión socio ambiental en obra.	cumple		Acorde a lo contratado
6. Garantizar y mantener el aseo y limpieza de los sitios de obra.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
7. Realizar capacitaciones y entrenamientos a su personal en temas ambientales, con la periodicidad definida en la Guía de Manejo Socio Ambiental y/o cuando las condiciones de la obra así lo requieran.	cumple		Acorde a lo contratado
8. Dar el manejo adecuado a los residuos sólidos de cualquier tipo generados en el proyecto y reportar al Supervisor del contrato mensualmente las cantidades dispuestas.	cumple		Presentan certificados botaderos y RCD
9. Hacer uso racional y óptimo de los recursos naturales, en especial del agua.	N/A		
10. Dotar a todo el personal que participe en la ejecución del contrato de los Elementos de Protección Personal (EPP) que apliquen para cada actividad y garantizar que se haga uso permanente y adecuado de los mismos.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
11. Realizar un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones provisionales.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
12. Cumplir con la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así como velar por su uso apropiado.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
13. Realizar una adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación tanto peatonal como vehicular.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
14. Acompañar al Supervisor del contrato en la atención a los técnicos encargados del control y vigilancia de los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados permisos e informes de gestión.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
15. Cumplir con las medidas de seguridad, supervisar el estado mecánico y condiciones de operación de vehículos y equipos al servicio de la obra y el cumplimiento de las normas sobre licencias de conducción, dotación de vehículos, etc. exigidos por las autoridades del tránsito.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado

16. Cumplir con las disposiciones del Manual de Señalización Vial, divulgado a través de la Resolución 1885 de 2015, cuando aplique.	N/A		
17. Cumplir con todo lo establecido en la resolución 541 de diciembre 14 de 1994 por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de construcción de demolición y capa orgánica suelo y subsuelo de excavación y lo establecido en el Decreto 948 de 1995 por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto # Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado
18. Las demás que sean inherentes a sus funciones y/o que por razones del proyecto deban asumirse	cumple	Revisión en obra	Acorde a lo contratado

2.1.1.2 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/ COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1- El contratante deberá mantener, mientras se realice cualquier actividad en el sitio de la obra, un responsable de SST (SISO) (profesional o tecnólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente).	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
2. Presentar el certificado expedido por la ARL de la evaluación de estándares mínimos de acuerdo con la resolución 0312 de 2019 (Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) 3. Si el contrato inicia antes del 27 de junio del año en curso debe cumplir con la resolución 1409 del 23 de julio del 2012 (Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas)	N/A		
3. Si el contrato inicia antes del 27 de			

junio del año en curso debe cumplir con la resolución 1409 del 23 de julio del 2012 (Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas) y a partir del 27 de junio del presente año se cumplirá con la resolución 4272 del 2021 (Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas).	N/A		
4. Dar cumplimiento al manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a contratistas MA-M7-P6-003 el cual puede ser consultado en la plataforma de isolución de la Gobernación de Antioquia	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
5. Al momento de iniciar la ejecución del contrato se deberá presentar la planilla de pago de seguridad social para cada uno de los trabajadores, el pago deberá corresponder al nivel de riesgo de la actividad a ejecutar.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
6. Se deberá contar con un profesional en SST (siso) debidamente certificados.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
7. Antes de iniciar la actividad, todas las personas que van a participar en la ejecución del contrato, administrativas como operativas deben recibir inducción por parte de funcionarios de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gobernación de Antioquia.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
8. Los proponentes deberán tener implementado el SG-SST de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015, y esto lo acreditarán con la certificación que al respecto expida la ARL correspondiente.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
9. El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento, a través del supervisor del contrato, pedir información adicional que permita verificar cualquier requisito en materia de SST.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
10. Otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**

1. Presentar un programa de manejo ambiental RCD en los Términos de la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante los primeros 10 días de ejecución del contrato.	cumple		
2. Presentar el Programa de Salud Ocupacional, donde se evidencie la Gestión del Riesgo, de acuerdo a la actividad propia de la empresa.	cumple		
3. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato.	cumple		
4. Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.	NO cumple		Falta mas personal
5. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto.	cumple		
6. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido;	cumple	PÓLIZA CUMPLIMIENTO #-101238728 anexo 4 PÓLIZA -101074730 RCE – anexo 3	Actualización Póliza de adición y prórroga Seguros del estado
7. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	cumple		Fecha de presentación 22 de septiembre
8. Garantizar durante toda la ejecución del contrato, el valor de los ítems de conformidad con la propuesta económica presentada.	cumple		Acorde a lo contratado
9. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	cumple	documentos	Aportó documentos
10. Si el contratista es personal natural, adicionalmente deberá aportar al sistema de seguridad social sobre el 40% del valor del contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de la ley 1753 de 2015 y la Circular de la Secretaria de Hacienda y Secretaria General 201709000086 del 02-02-2017 de la Gobernación de Antioquia.	N/A		

11.Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.	CUMPLE		
12.Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato.	CUMPLE		
13. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.	CUMPLE		
14. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.	CUMPLE		
15. Para los trabajadores que por su actividad lo requieran, deberá acreditar certificado en nivel avanzado para trabajos en altura emitido por el SENA o empresas certificadas por este.	N/A		
16. Los equipos y elementos de protección personal que utilice para realizar la labor en alturas, deben cumplir con los requerimientos normativos existentes al respecto de acuerdo al reglamento técnico de trabajo en alturas.	CUMPLE		
17. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el contratista y las personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, están obligados a adoptar todas las disposiciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, que puedan establecerse por motivos de salud u orden público.	CUMPLE		
18. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	CUMPLE		
19. La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4.	CUMPLE		

Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.			
20. Suministrar al Departamento y/o al supervisor del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.	CUMPLE		
21. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	cumple		Factura electrónica N° FEC 181 formato DIAN
22. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	CUMPLE		
23. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	CUMPLE	CERTIFICADO	Aportó certificado
24. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio.	N/A		
25. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N°de 01 de 2020 (prohibición de plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	N/A		

26. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres, y población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta. Para verificar el cumplimento de esta obligación el contratista se obliga a aportar oportunamente los soportes correspondientes	N/A		
27. Mantener indemne a la Gobernación de Antioquia frente a cualquier reclamación que resultare del incumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.	N/A		
28. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.	Cumple		

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL DEPARTAMENTO	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	Cumple	CDP y RPC	4500060118 de 18/05/2023
2. Suministrar al contratista al inicio de ejecución del contrato, toda la información requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual. (Planimetría, permisos de acceso, acompañamiento de Seguridad Interna, sitio para la disposición de material sobrante).	Cumple		Secop y Soporte office 365,Outlook.
3. Asignar un supervisor por parte del Departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones.	Cumple	Designación	N° 2023020025834 de 29/05/23
4. Ejercerá el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.	cumple	Informe de Supervisión	N°3
5. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
6. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
7. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.	cumple		Autorización de pago 22/09/23

8. Informar por escrito, de manera oportuna al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	cumple	Oficios	Oficio de Requerimiento rad. # 2023030415733
9. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la normativa vigente.	cumple		
10. Verificar el cumplimiento de los protocolos o disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal ante situaciones de salud u orden público (cuando aplique).	N/A		
11. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado
12. Elaborar un informe mensual que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte del contratista, según sus obligaciones y alcance del mismo.	cumple	Informe de seguimiento	N° 3 de 22/09/23
13. Proyectar y tramitar acta de liquidación del contrato.	N/A		En ejecución
14. Mantener actualizada la información contractual en la plataforma SECOP.	cumple	documentos	Secop II - 4600015629
15. Asignar el funcionario competente para que realice la inducción acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las personas que van a participar en la ejecución del contrato			
16. Las demás que sean necesarias para coadyuvar a la supervisión del Contrato y para la correcta ejecución contractual.	cumple	Revisión en obra y documentos	Acorde a lo contratado

2.2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$277.142.138	$0	$0	$277.142.138
2. Adiciones	$75.076.472	$0	$0	$75.076.472
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$352.218.610	$0	$0	$352.218.610
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 37.243.342	$0	$0	$37.243.342
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 37.243.342	$0	$0	$37.243.342
7. Recursos ejecutados	$111.464.202	$0	$0	$111.464.202
8. Recursos no ejecutados	$240.754.408	$0	$0	$240.754.408

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Agosto 2023	Recorridos técnicos en obra	
18/09/2023	Comité de obra N°4	Ver acta de comité
Sept 2023	Recorridos técnicos en obra	

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: En contraprestación por las obras ejecutadas, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA actas de pago parciales sin superar el 90% del valor del contrato, conforme al avance de obra realmente ejecutada y cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado, las actividades de qué tratan estos Estudios y Documentos Previos, y un acta de pago final del 10% del valor del contrato, cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del supervisor contratado y el respectivo supervisor designado la totalidad de las actividades. Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las obras, acompañada del Acta de Pago parcial y Memorias de cantidades de obra de acuerdo al avance de obra y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia.

El supervisor del contrato solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas, y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por EL CONTRATISTA, en cantidades, calidades y siguiendo cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto oficial.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	19/05/2023	$277.142.138		$0		$277.142.138	
Pago No.1	22/08/2023		$ 37.243.342	N/A	$ 37.243.342	$239.898.796	
Adición 1	08/09/2023	$75.076.472				$352.218.610	
Pago N° 2	22/09/2023		$74.220.860	N/A	$74.220.860	$240.754.408	
TOTALES		$352.218.610	$111.464.202	$0	$74.220.860		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N° 5000221075 de 22/09/23 anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 2 al contratista, por valor de: SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($74.220.860) el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente que acreditan el pago por concepto de seguridades sociales y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

RIESGO	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**QUIEN TIENE EL RIESGO ASIGNADO**	**TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN**	**CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO**	**EVIDENCIA**
Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Etapa precontractual y contractual. Estudio de documentos	Acompañamiento to permanente, del CAE
Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	Entidad	Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Etapa precontractual y contractual. Estudio de documentos	Acompañamiento to permanente, del CAE
La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen las necesidades	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	Entidad	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Etapa precontractual y contractual. Estudio de documentos	Acompañamiento to permanente, del CAE
Errores en los cálculos y planos de la obra	1. Riesgos de accidentes 2. Mala calidad de la obra 3. No consecución del objetivo	Entidad / Contratista	Hacer estudios de ingeniería previo a la ejecución teniendo en cuenta aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, de	Etapa precontractual y contractual. Estudio de documentos	Rol Técnico y Supervisor

			ubicación		
Retrasos en el proceso, por inconvenientes durante aprobación de documentos, montaje a SAP, cierre de procesos	1. Afectación de los plazos de las etapas precontractual y contractual 2. Dificultad en la ejecución luego de la adjudicación	Entidad	Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Etapa precontractual	Acompañamiento to permanente, del CAE
Baja participación de proponentes	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	Entidad	Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria	Etapa de selección	Acompañamiento to permanente, del CAE
Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Etapa precontractual Y de selección	Acompañamiento to permanente, del CAE
Declaratoria de desierto del proceso de selección	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	Entidad	Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre alguno de ellos	Etapa de selección	Acompañamiento to permanente, del CAE
Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Mayores costos 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la	Entidad	Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente	Etapa de selección	Acompañamiento to permanente, del CAE

	ejecución				
Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. Desgaste administrativo 2.. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución	Entidad	Hacer público, a través de los medios autorizados el proceso del contrato y su desarrollo	Etapa de selección	Acompañamiento to permanente, del CAE
Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	Entidad	Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente	Etapa contractual	Rol Jurídico
No firma del contrato	1. Reprocesos de contratación 2. No cumplimiento del contrato	Entidad	Establecimiento inicial de un plazo máximo de firma del contrato comunicado al proponente	Etapa contractual	Rol Jurídico
No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	Entidad	Analizar qué garantías exigibles son necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato	Etapa contractual	Rol Jurídico
Afectación al medio ambiente como resultado del contrato	1. Demandas o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayores costos	Entidad / Contratista	Evaluar que el proveedor seleccionado cuente con buenas prácticas ambientales	Etapa contractual	Supervisor
Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	Entidad / Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Etapa contractual	Supervisor
Cambios en los	1. Mayores costos	Entidad /	Aplicación inmediata	Etapa	Supervisor

tributos, aranceles o la regulación aplicable	del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	Contratista	de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato	contractual	
El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	Contratista	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	Etapa contractual	Contratista
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la documentación	Contratista	Definición de las condiciones de facturación y pago entre contratista y entidad	Etapa contractual	Contratista
Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento	Etapa contractual	Contratista

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato de interventoría durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

No aplica a la fecha.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

- El contrato N° 4600015629 de 2023, se planeó para ejecutar en tres (3) mes.
- Se suscribió adición y prórroga por un (1) mes más.
- Contratista presenta los certificados solicitados.

- ANEXOS

- Certificado de paz y salvo a los aportes de seguridad social y parafiscales.
- Documentos del Revisor Fiscal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron 25/09/2023:



ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
Profesional universitario-Supervisor
Dirección de Servicios Generales
Secretaría de Suministros y Servicios



SERGIO ANDRÉS GIRADO BLANDÓN
Director –Supervisor
Secretaría de Suministros y Servicios

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

BAYITH CONSTRUCTORA

INFORME DE ACTIVIDADES
No2

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, CUARTO DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA".

Fecha:	09/08/2023
Entidad Contratante	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Contratista:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Nombre	Cargo
Yamidt de Jesús Tamayo Posada	Residente de Obra
Diana Milena Higuita	Residente SST
Julián Arboleda Salazar	Residente SST
Nota: Se anexa listado del personal.	

PERSONAL INTERVENTORIA / SUPERVISIÓN

Nombre	Cargo
Alejandro del Valle Acosta	Supervisor Técnico
Sergio Giraldo	Supervisor Financiero

HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

Descripción	Unidad	Cantidad
Herramienta menor	Gl	1
Extensión 110 V – Longitud 8m	Un	1
Taladro Roto percutor	Un	1
Pulidora de 4"	Un	1
Escobas - Traperas	Un	1
Barras de Acero	Un	2
Pulidora de 7"	Un	1
Andamios	Un	2
Extensión de 30m	un	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Durante este periodo de ejecución se ha procedido a:

- Terminación de actividades de Retiros
- Terminación de actividades de demolicion
- Cerramientos en Dywall y Superboard
- Instalaciones Técnicas Eléctricas
- Instalaciones Técnicas hidrosanitarias
- Actividades de ejecución de pisos

ANOTACIONES - OBSERVACIONES – FOTOGRAFÍAS

La obra esta dividida en 3 frentes de trabajo:

1. Zona de conductores
2. Zona de Patio
3. Zona de Consultorios

ACTIVIDADES DE RETIROS Y DEMOLICIÓN

Se completan las actividades de retiro y demolición realizadas en el periodo anterior, incluyendo las regatas o canchas para las instalaciones técnicas, en los 3 frentes de trabajo.

INSTALACIONES TECNICAS HIDROSANITARIAS

6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
6,1	Suministro, transporte y colocación de lavamanos de pared en acero inoxidable cal.18 - 304 medidas 0,45m x 0,45m x 0,20m. Incluye Grifería Artesa sencilla de Grival o similar, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00
6,2	Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	4,00

13	**REDES HIDROSANITARIAS**		
13,1	Suministro, transporte e instalación de **salidas de abasto** en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	2
13,2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	2

Se realizan las actividades concernientes a la instalación de puntos nuevos de abasto y desagues tanto en los frentes de conductores como en el frente de trabajo de consultorios, se hace la exploración, chanchas e instalación, incluyendo los cambios solicitados.





Se realizan pruebas de presión, antes de terminar de cerrar y hacer los respectivos resanes.




INSTALACIONES TECNICAS ELECTRICAS

5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
5,1	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de toma doble** con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	un	14,00
5,2	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de interruptor sencillo** de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	un	5,00

5,3	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de interruptor doble** de alumbrado. TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 m).	un	2,00
5,4	Suministro, transporte e instalación de **lámparas sellada de 60cm x 60cm** 48w PANEL LED 110V para sobreponer en cielo modulado. Incluye trasporte interno, conexión a energía y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00
5,5	Suministro, transporte e instalación de **lámparas sellada de 60cm x 60cm** 48w PANEL LED 110V para sobreponer sobre cielo en Drywall. Incluye apertura de registro y refuzo de cielo, trasporte interno, conexión a energía y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13,00

Se realizan las instalaciones eléctricas de conductores y consultorios, el patio no posee ningún tipo de instalación..

12	**ELECTRICO**		
12,1	Desmonte y desconexión puntos eléctricos y datos. Incluye todos los elementos y herramienta necesaria para su correcto desmonte y entrega en custodia	sal	10
12,2	Desmonte de lámparas existentes, Incluye traslado hacia el punto de acopio	un	17
12,3	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de toma doble** con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	un	20
12,4	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	un	4
12,5	Suministro, transporte e instalación de lámpara de incrustar LED de 18 w, color blanco, tipo de iluminación neutra. Obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	27

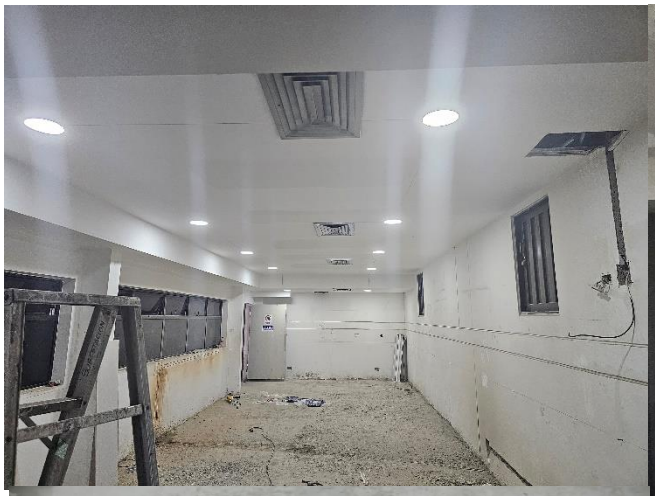







CERRAMIENTOS

Se ejecutan obras de cerramiento y cielos en placas de yeso y fibrocemento según la indicaciones planimétricas y se hace los ajustes correspondientes identificados en el desarrollo de la obra.

2	MUROS Y CIELOS	-	-
2,1	Suministro, transporte e instalación de muros en Drywall 2 caras con placas en yeso tipo estandar de 1/2", con un espesor de aprox de 12 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 3 1/2" en acero galvanizado calibre 26 con parales separados cada 24" (61cm), tratamiento de juntas con cinta de papel 2" (5cm)., tornillería de 6x1" y #7 x 7/16", masilla para drywall, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filetes, fajas y refuerzos en perfiles calibre 20 + listón de madera en jambas de puertas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m2	44,22
2,2	Suministro, transporte e instalación de muros en Drywall 2 caras con con doble estructura y placas en yeso tipo estandar de 1/2", con un espesor de aprox de 14 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). Incluye doble estructura metálica en acero galvanizado de 40 mm (1 5/8") cal. 26 para vanos de puertas, masillado con cinta de papel 2" (5cm)., tornillería de 6x1" y #7 x 7/16", masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m2	3,65
2,3	Cielo raso en drywall con placa de yeso tipo estandar de 1/2", perfiles vigueta y omega en acero galv. Cal 26 espaciados cada 61cm, tratamiento de juntas con cinta de papel 2" + masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye detallada, pulida y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m2	18,92
2,4	Ajustes menores a 1m de ancho de Cielo raso en drywall con placa de yeso tipo estandar de 1/2", perfiles vigueta y omega en acero galv. Cal 26 espaciados cada 61cm, tratamiento de juntas con cinta de papel 2" + masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye detallada, pulida y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m	8,20
2,5	Cielo Modulado en fibra mineral 60cm x 60cm color blanco, perfiles de autoensamble en acero galvanizado y acabado en pintura blanca. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m2	11,05


2,6	Suministro, transporte e instalación de aislante térmico y acústico en fibra de vidrio de e= 89 mm. (3 1/2") de 0.85 N.R.C. Sin papel, instalada al interior de muros en drywall . Incluye amarres y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se deben seguir las especificaciones y recomendaciones del fabricante. (en muros)	m2	47,88
2,7	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, alistamiento de la superficie a trabajar, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	16,83

10	MUROS	-	-
10,1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m^2	170,5
10,2	Suministro, transporte e instalación de muros en Drywall una cara con placas en yeso tipo regular de 1/2", con un espesor de aprox de 12 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 3 1/2" en acero galvanizado calibre 26 con parales separados cada 24" (61cm), tratamiento de juntas con cinta de papel 2" (5cm)., tornillería de 6x1" y #7 x 7/16", masilla para drywall, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filetes, fajas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m^2	4,5
10,3	Suministro, transporte e instalación de muros en fibrocemento dos caras con placas en fibrocemento de 11mm, con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 2 1/2" en acero galvanizado calibre 20 , tratamiento de juntas con cinta en fibra de vidiro 2" (5cm)., tornillería # 8 x 1 1/4" auto avellanante y #8 x 1/2" punta broca, masilla para fibrocemento, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 2 filetes, 1 faja y refuerzo en madera para recibir marco de puerta y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m^2	3







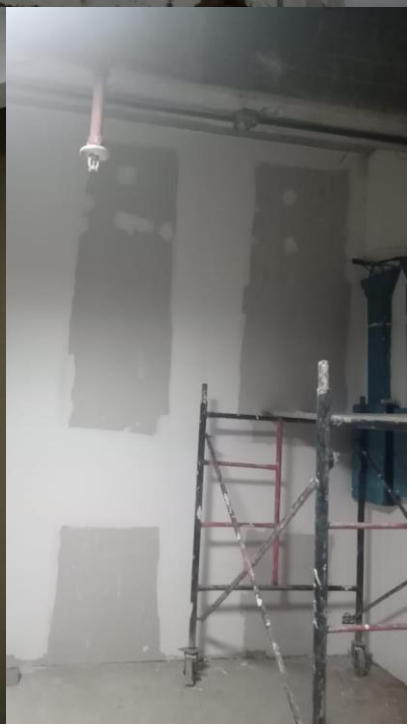




Se realizan los cerramientos y cielos de los frentes de trabajo de Consultorios y conductores y se retiran parcialmente del patio un cerramiento provisional.

PISOS

9	PISOS	-	-
9,1	Construcción de PISO EN MORTERO AUTONIVELANTE , espesor de 6mm. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m^2	104
9,4	Suministro e instalación de piso SPC en polvo de piedra Caliza de 4,0 mm + 1,5 mm de capa de espuma o corcho para un total de 5,5 mm de espesor, formato 1,54 x 0,23, capa UV, capa de desgaste de 0,5 mm mas capa de impresión con acabado liso, brillante y tráfico comercial alto. Incluye suministro y transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m^2	110

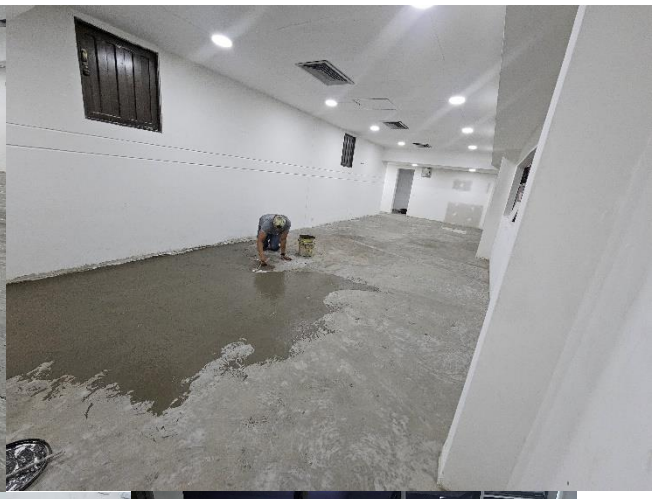

Se ejecutan obras para realizer la instalacion de pisos .

Notas:

C	OBRAS NO PREVISTAS	-	-
NP 1	Suministro, transporte e Instalacion de Mortero de nivelación de 8.5 cm de espesor promedio para pisos, de 21 Mpa, dosificado con 1,8 kg/m3 de fibra TUF STRAND SF fabricado con medios mecánico, utilización de corte para las juntas, deberá vaciarse de acuerdo a la conformación del piso y las pendientes existentes, y ajustándose al sistema de evacuación de aguas lluvias (donde aplique), y modulado con juntas de dilatación.	m2	286
NP 2	Suministro, transporte, fabricación y colocación de REVOQUE con mortero 1:5 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	26,83

NP 3	Suministro, transporte, fabricación y colocación de REVOQUE para fajas de 0.05 a 0.25 m con mortero 1:5. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	27,3
NP 4	Sub base granular de triturado y arena para lleno de pisos, compacatado manualmente, con un espesor entre 100 mm y 175 mm	m2	107,36
NP 5	Desmonte de marco metálico existente (dimensiones aproximadas: 2,1 x 0,80m). Incluye traslado hacia el punto de acopio, evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	un	3

- Se ejecutan obras no previstas para poder ejecutar actividades correspondientes a obras contractuales definidas en el objeto contractual

- Se realizan las actividades complementarias al desarrollo de la obra
- Aseos y lavados.

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Yamidt de J. Tamayo Posada  1036.610.187. FIRMA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.09.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000221075

FACTURA: FEC-181	**Nro ACTA:** 2	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200016074	**NIT:** 9005092513	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Nro CONTRATO: 4600015629	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE SUMIN Y SERVICIOS	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24.05.2023	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500060118 SRÍA DE SUMIN Y SERVICIOS

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-1010	1002547	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN	4917443	UN	1,000	0%	1,0000	4.917.443,000
	2		0-1010	1002547	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN	14347867	UN	1,000	0%	1,0000	14.347.867,000
	3		0-1010	1002547	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN	54955550	UN	1,000	0%	1,0000	54.955.550,000
										V/R TOTAL NETO	74.220.860,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.09.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000221075

V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	74.220.860,000

MOVIMIENTO REALIZADO POR: María Camila Chavarriaga Vaneg

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

ANEXO
MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Fecha, 19 de septiembre del 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Ref.: CONTRATO 4600015629

El suscrito FREDY JOSE ARGUELLES JIMENEZ, Revisor fiscal de CONSTRUCTORA BAYITH SAS, certifica que CONSTRUCTORA BAYITH SAS se encuentra PAZ Y SALVO durante los últimos seis (06) meses por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (X)	No ()

LEER NOTA

Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

FREDY JOSE ARGUELLES JIMENEZ
Revisor Fiscal
C.C 1.143.424.917 DE BARRANQUILLA
Tarjeta Profesional No. 290372-T de la Junta Central de Contadores de Colombia

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-19, 09:12:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	CONSTRUCTORA BAYITH SAS
NIT	NI 900509251
Código Sucursal (Nombre)	001 (MEDELLIN)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057659167
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	169232158
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 1.121.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 389.800	$ 2.600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 1.300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 46.400	$ 400
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 97.500	$ 700
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	4	$ 250.500	$ 1.700
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	$ 143.900	$ 1.000
		SubTotales:		$ 1.113.700	$ 7.700
		Total a Pagar:			$ 1.121.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 08:01:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1057659167

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 19/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORA BAYITH SAS	**Nombre Sucursal**	MEDELLIN	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900509251	**Dirección**	CL 77 #59 - 35 OFICINA 1001		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3131933		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	RUIZ GUERRERO EDGARDO ENRIQUE	**Identificación**	CC72274612		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43109597	HIGUITA DAVID DIANA MILENA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 2.200.000	$ 46.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.200.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 2.200.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71667680	ATEHORTUA TANGARIFE MARIO ALBERTO	01	00	X															0	3	3	3	3	PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	EPS SURA	$ 116.000	$ 4.700	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 116.000	$ 8.100	COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 1036610137	TAMAYO POSADA YAMIDT DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 4.440.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 4.440.000	$ 46.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 4.440.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 4.440.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1128434795	ARBOLEDA SALAZAR JULIAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.525.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 2.525.000	$ 46.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.525.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 2.525.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 9.281.000	$ 9.281.000	$ 9.281.000	$ 9.281.000	$ 575.400	$ 0	$ 0	$ 143.900	$ 250.500	$ 143.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.113.700	$ 7.700	$ 1.121.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FORMATO DE ACTA N° 2 - 21/09/2023

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, CUARTO DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA".

PRESUPUESTO PROPUESTA ECONOMICA - BALAMCE 1						ACTA 1		ACTA 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACTA 1	VL TOTAL ACTA 1	CANT ACTA 2	VL TOTAL ACTA 2
A	**CONSULTORIOS**								
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**								
1.1	Desmonte y traslado temporal de puertas en madera existentes (dimensiones aproximadas: 2,1 x 0,80m). Incluye desmonte de ala, marco, traslado hacia el punto de acopio	un	5,00	$ 47.497,00	$ 237.485,00	5,00	$ 237.485,00	0,00	$ -
1.2	Desmonte y traslado temporal de puertas en vidrio existentes (dimensiones aproximadas: 2,1 x 0,90m). Incluye herramienta para su desmonte en buen estado y traslado hacia el punto de acopio	un	2,00	$ 112.063,00	$ 224.126,00	2,00	$ 224.126,00	0,00	$ -
1.3	Retiro, desinstalación y traslado de media caña existente, incluye todas las actividades y herramientas para su retiro en buen estado.	m	70,00	$ 4.132,00	$ 289.240,00	56,40	$ 233.044,80	0,00	$ -
1,4	Retiro y desinstalación de muros en drywall, incluye todas las actividades y herramientas para su retiro y disposición final en sitios de acopio. (los perfiles metálicos y tornillería se deben conservar). traslado en costales hasta punto de acopio. Evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	m^2	29,11	$ 9.981,00	$ 290.575,00	33,70	$ 336.359,70	0,00	$ -
1,5	Demolición de muros en mampostería (h=3,00m y 2,10m) Incluye todos los elementos necesarios para su demolición, traslado en costales hasta punto de acopio y evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	m^2	40,50	$ 39.488,00	$ 1.599.264,00	29,80	$ 1.176.742,40	0,00	$ -
1,6	Desmonte y desconexión puntos eléctricos y datos. Incluye todos los elementos y herramienta necesaria para su correcto desmonte y entrega en custodia	sal		$ 31.251,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 218.757,00
1,7	Desmonte de caja de inspección y llave de paso de abasto. (se traslada 0,70m por demolición de muro en mampostería). Incluye: Suministro, transporte e instalación de nueva Tapa Registro en Acero Inoxidable de 20x20 y nueva VÁLVULA CORTINA 250 PSI DE BRONCE tipo Red White o equivalente, para un diámetro de ½". además suministro, transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 270.204,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,8	Desmonte de marco en madera acceso (1,51m x 2,10m) Incluye traslado hacia el punto de acopio	un	1,00	$ 57.716,00	$ 57.716,00	1,00	$ 57.716,00	0,00	$ -
1,9	Desmonte mesón cocineta (1,25m x 0,60m) Incluye desconexión de abastos y traslado hacia punto de acopio	un	1,00	$ 149.710,00	$ 149.710,00	1,00	$ 149.710,00	0,00	$ -
1,10	Desmonte de cielo modulado en circulación acceso (hacia baños) Incluye traslado hacia el punto de acopio, evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	m2	44,36	$ 35.130,00	$ 1.558.367,00	67,20	$ 2.360.736,00	0,00	$ -
1,11	Desmonte de lámparas existentes, Incluye traslado hacia el punto de acopio	un	13,00	$ 21.376,00	$ 277.888,00	10,00	$ 213.760,00	3,00	$ 64.128,00
1,12	S.T.I. de Cerramiento Provisional en drywall una cara sin tratamiento en perfil de 1 5/8" (41mm) y h=2,44m + una placa de yeso tipo estandar de 1/2", anclado con cinta doble faz al piso, y vientos en la parte superior para garantizar estabilidad. Incluye transporte interno y demás elementos necesarios para para su correcta instalación.	m2	5,00	$ 67.187,00	$ 335.935,00	7,80	$ 524.058,60	0,00	$ -

1,13	Desmonte y traslado de lava-escobas en acero inoxidable de cuarto de aseo. Incluye empotramiento o anclaje requerido para su correcta instalación y funcionamiento. (dentro del mismo cuarto)	un	1,00	$ 108.835,00	$ 108.835,00	1,00	$ 108.835,00	0,00	$ -
1,14	Demolición de enchape tipo baldosin 10cm x 10cm blanco de paredes de depósito, incluye traslado en costales hacia el punto de acopio, evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	m2	26,93	$ 24.714,00	$ 665.548,00	24,00	$ 593.136,00	0,00	$ -
2	**MUROS Y CIELOS**				$ -		$ -	0,00	$ -
2,1	Suministro, transporte e instalación de **muros en Drywall 2 caras** con placas en yeso tipo estandar de 1/2", con un espesor de aprox de 12 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 3 1/2" en acero galvanizado calibre 26 con parales separados cada 24" (61cm), tratamiento de juntas con cinta de papel 2" (5cm)., tornillería de 6x1" y #7 x 7/16", masilla para drywall, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filetes, fajas y refuerzos en perfiles calibre 20 + listón de madera en jambas de puertas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m2	54,25	$ 105.566,00	$ 5.726.860,00	17,40	$ 1.836.848,40	24,50	$ 2.586.367,00
2,2	Suministro, transporte e instalación de **muros en Drywall 2 caras** con con doble estructura y placas en yeso tipo estandar de 1/2", con un espesor de aprox de 14 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). Incluye doble estructura metálica en acero galvanizado de 40 mm (1 5/8") cal. 26 para vanos de puertas, masillado con cinta de papel 2" (5cm)., tornillería de 6x1" y #7 x 7/16", masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m2	3,65	$ 146.969,00	$ 537.025,00	2,05	$ 301.286,45	2,01	$ 295.407,69
2,3	**Cielo raso en drywall** con placa de yeso tipo estandar de 1/2", perfiles vigueta y omega en acero galv. Cal 26 espaciados cada 61cm, tratamiento de juntas con cinta de papel 2" + masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye detallada, pulida y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m2	18,92	$ 82.436,00	$ 1.559.689,00	6,63	$ 546.550,68	18,03	$ 1.486.321,08
2,4	**Ajustes menores a 1m de ancho de Cielo raso en drywal**l con placa de yeso tipo estandar de 1/2", perfiles vigueta y omega en acero galv. Cal 26 espaciados cada 61cm, tratamiento de juntas con cinta de papel 2" + masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye detallada, pulida y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m	8,20	$ 65.771,00	$ 539.322,00		$ -	9,20	$ 605.093,20
2,5	**Cielo Modulado en fibra mineral** 60cm x 60cm color blanco, perfiles de autoensamble en acero galvanizado y acabado en pintura blanca. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m2	11,05	$ 123.785,00	$ 1.367.824,00		$ -	11,41	$ 1.412.386,85
2,6	Suministro, transporte e instalación de **aislante térmico y acústico** en fibra de vidrio de e= 89 mm. (3 1/2") de 0.85 N.R.C. Sin papel, instalada al interior de muros en drywall . Incluye amarres y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se deben seguir las especificaciones y recomendaciones del fabricante. (en muros)	m2	57,90	$ 29.347,00	$ 1.699.282,00	17,40	$ 510.637,80	41,90	$ 1.229.639,30
2,7	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, alistamiento de la superficie a trabajar, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	26,93	$ 10.306,00	$ 277.541,00	23,97	$ 247.034,82		$ -

2,8	Suministro, transporte e instalación de muros en fibrocemento dos caras con placas en fibrocemento de 11mm, con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 2 1/2" en acero galvanizado calibre 20 , tratamiento de juntas con cinta en fibra de vidiro 2" (5cm)., tornillería # 8 x 1 1/4" auto avellanante y #8 x 1/2" punta broca, masilla para fibrocemento, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 2 filetes, 1 faja y refuerzo en madera para recibir marco de puerta y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m^2		$ 127.356,00	$ -		$ -	3,73	$ 475.037,88
3	**ACABADO DE PISOS**				$ -		$ -	0,00	$ -
3,1	Suministro, transporte e Instalación de **piso en vinilo** homogeneo en rollo antibacterial, (para áreas de salud), para instalar sobrepuesto en baldosa de grano pulido existente. Incluye remate en media caña contra muros (81m) y colillas en esquinas o remates en puertas (42un) y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	71	$ 222.506,00	$ 15.797.926,00		$ -		$ -
4	**CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA**				$ -		$ -	0,00	$ -
4,1	Suministro, transporte e Instalación de **puertas en madera** de 1,00m x 2,10m, acabado Barniz. Incluye marco, ala, chapa, bisagras, trasporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00	$ 559.817,00	$ 1.679.451,00		$ -	0,00	$ -
4,2	Suministro, transporte e Instalación de **puertas en madera** de 0,70m x 2,10m acabado barniz. Incluye instalación de marco, ala, chapa, trasporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2,00	$ 458.307,00	$ 916.614,00		$ -	0,00	$ -
4,3	**Instalación de puerta en madera** desmontada de 0,90m x 2,10m. Incluye trasiego desde punto de acopio, instalación de marco, ala, chapa y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	$ 98.583,00	$ 98.583,00		$ -	0,00	$ -
4,4	Suministro, transporte e Instalación de **puerta en vidrio** 5mm de 1,50m x 2,10m : Dos Alas Batientes de 0,75m x 2,10m. Incluye marco en aluminio anodizado natural de 7cm x 3 cm con pisa vidrio proyectante y barra central horizontal, sistema para apertura hacia ambos lados, bisagras de vaivén. Incluye chapa con llave, trasporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	$ 2.872.854,00	$ 2.872.854,00		$ -	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ -		$ -	0,00	$ -
5,1	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de toma doble** con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	un	14,00	$ 67.344,00	$ 942.816,00		$ -	14,00	$ 942.816,00
5,2	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de interruptor sencillo** de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	un	5,00	$ 75.568,00	$ 377.840,00		$ -	5,00	$ 377.840,00

5,3	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de interruptor doble** de alumbrado. TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 m).	un	2,00	$ 94.167,00	$ 188.334,00		$ -	2,00	$ 188.334,00
5,4	Suministro, transporte e instalación de **lámparas sellada de 60cm x 60cm** 48w PANEL LED 110V para sobreponer en cielo modulado. Incluye trasporte interno, conexión a energía y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00	$ 167.783,00	$ 503.349,00		$ -	3,00	$ 503.349,00
5,5	Suministro, transporte e instalación de **lámparas sellada de 60cm x 60cm** 48w PANEL LED 110V para sobreponer sobre cielo en Drywall. Incluye apertura de registro y refuzo de cielo, trasporte interno, conexión a energía y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13,00	$ 206.024,00	$ 2.678.312,00		$ -	15,00	$ 3.090.360,00
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -		$ -	0,00	$ -
6,1	Suministro, transporte y colocación de lavamanos de pared en acero inoxidable cal.18 - 304 medidas 0,45m x 0,45m x 0,20m. Incluye Grifería Artesa sencilla de Grival o similar, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00	$ 1.896.867,00	$ 5.690.601,00		$ -	0,00	$ -
6,2	Suministro, transporte e instalación de s**alidas de abasto** en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	4,00	$ 57.370,00	$ 229.480,00	1,00	$ 57.370,00	3,00	$ 172.110,00
6,3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	3	$ 83.010,00	$ 249.030,00		$ -	4,00	$ 332.040,00
7	**PINTURAS Y ACABADOS**				$ -		$ -	0,00	$ -
7,1	Suministro, transporte y Aplicación de **PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN MUROS** (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. Incluye transporte interno, protección de pisos, puertas y otras superficies y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	196,656	$ 30.695,00	$ 6.036.356,00		$ -	0,00	$ -
7,2	Suministro, transporte y Aplicación de **PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN CIELOS** (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre estuco plástico, 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. Incluye transporte interno, protección de pisos,puertas, lámparas y otras superficies y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	58,95	$ 33.183,00	$ 1.956.138,00		$ -	0,00	$ -
7,3	Suministro, transporte y aplicación de una (1) manos de **pintura vinilo tipo 2**, como fondeo. Incluye transporte interno, protección de pisos y otras superficies y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	255,61	$ 7.710,00	$ 1.970.722,00		$ -	0,00	$ -

					$ -		$ -	0,00	$	-
B	**CONDUCTORES Y PATIO INTERNO**				$ -		$ -	0,00	$	-
8	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ -		$ -	0,00	$	-
8,1	Demolición de piso con acabado en baldosa de terrazo o piedra pizarra, h promedio:3 cm (no incluye demolición de mortero de nivelación), retiro y disposición final de escombros en botadero oficial, cargue, trasiego al interior de la obra, transporte y derechos de botadero).	m^2	286	$ 10.425,00	$ 2.981.550,00	541,50	$ 5.645.137,50	0,00	$	-
8,2	Demolición de fuente en concreto enchapada en piedra pizarra h promedio: 40cm, ancho: 30cm espesor promedio: 15cm (incluye demolición de mortero de nivelación, retiro y disposición final de escombros en botadero oficial, cargue, trasiego al interior de la obra, transporte y derechos de botadero).	m	12	$ 29.015,00	$ 348.180,00	11,00	$ 319.165,00	0,00	$	-
8,3	Demolición de muros en mampostería (h=3,00m y 2,10m) Incluye todos los elementos necesarios para su demolición, traslado en costales hasta punto de acopio y evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	m^2	11	$ 39.488,00	$ 434.368,00	6,58	$ 259.831,04	0,00	$	-
8,4	Demolición de carcamos y cunetas en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo de 0.70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio indicado.	m		$ 16.138,00	$ -		$ -	0,00	$	-
8,5	Demolición de zócalo en granito de 10 cms de alto,incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría..	m	76	$ 8.012,00	$ 608.912,00	144,31	$ 1.156.211,72	0,00	$	-
8,6	Desmonte de tablón en madera 10 cms de ancho - 3 cms de espesor incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión.	m	45	$ 5.166,00	$ 232.470,00	46,30	$ 239.185,80	0,00	$	-
8,7	Desmonte de banca en concreto. Incluye transporte interno hasta el sitio que indique la suervisión.	un	2	$ 20.429,00	$ 40.858,00	2,00	$ 40.858,00	0,00	$	-
8,8	Desmonte y traslado temporal de puertas en madera existentes (dimensiones aproximadas: 2,1 x 0,80m). Incluye desmonte de ala, marco, traslado hacia el punto de acopio	un	4	$ 47.497,00	$ 189.988,00	3,00	$ 142.491,00	0,00	$	-
8,9	Desmonte y traslado temporal de puertas en vidrio existentes (dimensiones aproximadas: 2,1 x 0,90m). Incluye herramienta para su desmonte en buen estado y traslado hacia el punto de acopio	un	2	$ 112.063,00	$ 224.126,00	2,00	$ 224.126,00	0,00	$	-
8,10	Desmonte y traslado de lava-escobas en acero inoxidable de cuarto de aseo. Incluye empotramiento o anclaje requerido para su correcta instalación y funcionamiento. (dentro del mismo cuarto)	un	1	$ 108.835,00	$ 108.835,00	1,00	$ 108.835,00	0,00	$	-
8,11	Desmonte de cocineta, Incluye desinstalación de mueble superior e inferior, mesón en acero inoxidable, griferías, desconexión de abastos y traslado hasta punto de acopio.	un	1	$ 258.545,00	$ 258.545,00	1,00	$ 258.545,00	0,00	$	-
8,12	S.T.I. de Cerramiento Provisional en drywall una cara sin tratamiento en perfil de 1 5/8" (41mm) y h=2,44m + una placa de yeso tipo estandar de 1/2", anclado con cinta doble faz al piso, y vientos en la parte superior para garantizar estabilidad. Incluye transporte interno y demás elementos necesarios para para su correcta instalación.	m2	113	$ 67.187,00	$ 7.592.131,00	120,40	$ 8.089.314,80	0,00	$	-
9	**PISOS**				$ -		$ -	0,00	$	-
9,1	Construcción de PISO EN MORTERO AUTONIVELANTE , espesor de 6mm. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m^2	286	$ 38.949,00	$ 11.139.414,00		$ -	109,81	$	4.276.989,69

9,2	Suministro e instalación de acabado de piso en piedra Royal Veta, formato de ancho 30cm x longitud variable y espesor de 15 mm, instalado a junta perdida con puente de adherencia adhesivo bajo en polvo, cementicio (C), que cumpla la norma NTC 6050, y clasificación como C2. (Incluye emboquillado con boquilla látex color gris, lavado con hidrolavadora de mín. 2000 PSI y ácido nítrico al 5% y aplicación en toda el área de sellador hidrófugo especializado para piedra en las concentraciones y diluciones recomendadas por el fabricante).	m^2	148,25	$ 287.664,00	$ 42.646.735,00		$ -	0,00	$ -
9,3	Construcción de carcamo con tapa tipo alcancia (con ranura en la parte superior) en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un ancho libre de 0,20m, altura libre promedio de 0,20m, y un espesor de paredes y losas de 0,07 m., adicionado con fibra sintetica para refuerzo de concreto e impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, plastocrete DM o equivalente, con acabado supeior en piedra royal veta. Cajas de registro de 0,40 x 0,40 m colocadas cada 7.50 m aproximadamente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista donde sea necesarios, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m		$ 263.645,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,4	Suministro e instalación de piso SPC en polvo de piedra Caliza de 4,0 mm + 1,5 mm de capa de espuma o corcho para un total de 5,5 mm de espesor, formato 1,54 x 0,23, capa UV, capa de desgaste de 0,5 mm mas capa de impresión con acabado liso, brillante y tráfico comercial alto. Incluye suministro y transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m^2	110	$ 134.325,00	$ 14.775.750,00		$ -	109,81	$ 14.750.228,25
9,5	Suministro, transporte e instalación de zócalo en madera roble (80 mm de alto y 15 mm de espesor) inmunizado y con acabado en barniz natural mate. Incluye todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento	m	72,05	$ 31.207,00	$ 2.248.464,00		$ -	0,00	$ -
10	**MUROS**				$ -		$ -	0,00	$ -
10,1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m^2	187,5	$ 13.386,00	$ 2.509.875,00		$ -	0,00	$ -
10,2	Suministro, transporte e instalación de muros en Drywall una cara con placas en yeso tipo regular de 1/2", con un espesor de aprox de 12 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 3 1/2" en acero galvanizado calibre 26 con parales separados cada 24" (61cm), tratamiento de juntas con cinta de papel 2" (5cm)., tornillería de 6x1" y #7 x 7/16", masilla para drywall, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filetes, fajas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m^2	20,5	$ 72.937,00	$ 1.495.209,00	8,03	$ 585.684,11	0,00	$ -
10,3	Suministro, transporte e instalación de muros en fibrocemento dos caras con placas en fibrocemento de 11mm, con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil mas espesor de placas). estructura metálica de 2 1/2" en acero galvanizado calibre 20 , tratamiento de juntas con cinta en fibra de vidiro 2" (5cm)., tornillería # 8 x 1 1/4" auto avellanante y #8 x 1/2" punta broca, masilla para fibrocemento, acabado nivel 4 según normas, mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 2 filetes, 1 faja y refuerzo en madera para recibir marco de puerta y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye pintura)	m^2	3	$ 127.356,00	$ 382.068,00	1,44	$ 183.392,64	1,47	$ 187.213,32
11	**CIELORRASOS**				$ -		$ -	0,00	$ -

11,1	Cielo raso en drywall con placa de yeso tipo regular de 1/2", perfiles vigueta y omega en acero galv. Cal 26 espaciados cada 61cm, tratamiento de juntas con cinta de papel 2" + masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye detallada, pulida y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m^2	30	$ 82.436,00	$ 2.473.080,00	8,83	$ 727.909,88	20,64	$ 1.701.479,04
11,2	Aplicación de pintura a base de agua en cielorraso, con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir.	m^2	30	$ 14.036,00	$ 421.080,00		$ -	0,00	$ -
11,3	**Ajustes menores a 1m de ancho de Cielo raso en drywall** con placa de yeso tipo estandar de 1/2", perfiles vigueta y omega en acero galv. Cal 26 espaciados cada 61cm, tratamiento de juntas con cinta de papel 2" + masilla para acabado nivel 4 según normas. mínimo tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye detallada, pulida y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (No incluye Pintura)	m	30	$ 65.771,00	$ 1.973.130,00	10,00	$ 657.710,00	2,00	$ 131.542,00
11,4	Retiro de estuco EN CIELOS de patio. Incluye retiro y disposición final de reciduos en botadero oficial, cargue, trasiego al interior de la obra, transporte y derechos de botadero).	m^2	69,3	$ 10.577,00	$ 732.986,00	51,50	$ 544.715,50	31,90	$ 337.406,30
11,5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN CIELOS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m^2	69,3	$ 21.011,00	$ 1.456.062,00		$ -	83,50	$ 1.754.418,50
11,6	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE CIELOS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sea necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m^2	69,3	$ 10.978,00	$ 760.775,00		$ -	63,30	$ 694.907,40
11,7	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA EN CIELOS para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría.	m^2	69,3	$ 19.236,00	$ 1.333.055,00		$ -	0,00	$ -
11,8	RESANE Y REPINTE a fajas de nervios en losa de patio con PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m	214,5	$ 8.259,00	$ 1.771.556,00		$ -	0,00	$ -
12	**ELECTRICO**				$ -		$ -		$ -
12,1	Desmonte y desconexión puntos eléctricos y datos. Incluye todos los elementos y herramienta necesaria para su correcto desmonte y entrega en custodia	sal	10	$ 31.251,00	$ 312.510,00		$ -	6,00	$ 187.506,00
12,2	Desmonte de lámparas existentes, Incluye traslado hacia el punto de acopio	un	17	$ 21.376,00	$ 363.392,00		$ -	17,00	$ 363.392,00

12,3	Suministro, transporte e instalación de materiales para **salida eléctrica de toma doble** con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	un	20	$ 67.344,00	$ 1.346.880,00		$ -	16,00	$ 1.077.504,00
12,4	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	un	4	$ 75.568,00	$ 302.272,00		$ -	3,00	$ 226.704,00
12,5	Suministro, transporte e instalación de lámpara de incrustar LED de 18 w, color blanco, tipo de iluminación neutra. Obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	42	$ 47.290,00	$ 1.986.180,00		$ -	16,00	$ 756.640,00
13	**REDES HIDROSANITARIAS**				$ -		$ -		$ -
13,1	Suministro, transporte e instalación de **salidas de abasto** en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	2	$ 57.370,00	$ 114.740,00		$ -	2,00	$ 114.740,00
13,2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	2	$ 83.010,00	$ 166.020,00	2,00	$ 166.020,00		$ -
13,3	Desmonte de caja de inspección y llave de paso de abasto. (se traslada 0,70m por demolición de muro en mampostería). Incluye: Suministro, transporte e instalación de nueva Tapa Registro en Acero Inoxidable de 20x20 y nueva VÁLVULA CORTINA 250 PSI DE BRONCE tipo Red White o equivalente, para un diámetro de ½". además suministro, transporte de los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0,00	$ 270.204,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 270.204,00
14	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ -		$ -	0,00	$ -

14,1	Suministro, transporte e instalación de mueble bajo en L para cocina según diseño, con medidas generales de 2,65m + 0,6m de largo, altura de 0,9m y profundidad de 0,6m, fabricado en aglomerado RH de 18mm con acabado interior y exterior en laminado de alta presion f8 color a definir por la supervisión y recubrimiento perimetral en PVC de 2mm termofundido, incluye patas en acero inoxidable con niveladores,tapa en la base de 10cms de alto en aglomerado RH de 18 mm, mesón en Quarztone de 2cm de espesor o equivalente color a definir por la supervisión con las perforaciones necesarias para la instalacion de poceta y griferias, salpicadero en Quarztone de 50cm de altura contra los muros, poceta de submontar doble en acero inoxidable, griferia monocontrol para lavaplatos tipo Corona Vera Basic o equivalente, canastilla y accesorios sanitarios; los cajones deben incluir rieles full extension. Con mueble superior de pared para cocina según diseño, con medidas generales de 2,65m de largo, altura de 0,8m y profundidad de 0,35m, fabricado en aglomerado RH de 18mm con acabado interior y exterior en laminado de alta presion f8 color a definir por la supervisión y recubrimiento perimetral en PVC de 2mm termofundido;Puertas sin tiraderas, Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño específico de planos.	un	1	$ 9.090.678,00	$ 9.090.678,00		$ -	0,00	$ -
14,2	Construccion de muro alistonado en madera, incluye suministro e instalacion de listones en madera de 5 x 3cm fabricados en roble con acabado en barniz natural mate instalados con un espaciado de 3cm. Dimensiones 4,05m x 2,37m y 2,06 x 2,37m. Según diseño específico de planos.	un	1	$ 1.480.724,00	$ 1.480.724,00		$ -	0,00	$ -
14,3	Construccion de muro alistonado en madera, incluye suministro e instalacion de listones en madera de 5 x 3cm fabricados en roble con acabado en barniz natural mate instalados con un espaciado de 3cm. Dimensiones 3,21 x 2,26m. Según diseño específiico de planos	un	1	$ 1.140.327,00	$ 1.140.327,00		$ -	0,00	$ -
14,4	Construcción de muro divisorio con listones de madera en roble, con barniz natural, dimensiones de 8cm x 4cm y 4 cms de espaciamiento entre listones. Según diseño específico de planos	un	1	$ 789.100,00	$ 789.100,00		$ -	0,00	$ -
14,5	Suministro, transporte e instalación de mueble de tacos de billar en aglomerado RH dimensiones 0,95m x 2,7m y panel anexo con corcho de dimensiones 2,7m x 0,7m. Según diseño específico de planos.	un	1	$ 563.643,00	$ 563.643,00		$ -	0,00	$ -
14,6	Suministro, transporte e instalación de barra en madera roble, con estructura interna de refuerzo,acabado con barniz natural mate, dimensiones 5,36m x 0,35m x 0,07m. Según diseño específico de planos.	un	1	$ 762.576,00	$ 762.576,00		$ -	0,00	$ -
14,7	Suministro, transporte e instalación de mueble para Virgen en aglomerado RH, 2,7m x 0,53m x 0,35m, con ojo de buey empotrado. Según diseño específico de planos.	un	1	$ 862.042,00	$ 862.042,00		$ -	0,00	$ -
14,8	Suministro, transporte e instalación de mueble de biblioteca, en aglomerado RH, sin fondo, con divisiones aleatorias de 3cms de espesor y base de 10 cms de alto. Dimensiones 2,26m x 0,82m x 0,3m. Según diseño específico de planos.	un	1	$ 1.027.820,00	$ 1.027.820,00		$ -	0,00	$ -
14,9	Suministro, transporte e instalación de Panel fijo en aglomerado RH de 8 cms de espesor, con capacidad de carga de un televisor de 55 pulgadas, cables de tv escondidos en su interior, y puerta pibotante en aglomerado RH, con gato hidraulico, incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 2.144.054,00	$ 2.144.054,00		$ -	0,00	$ -
15	**OTROS**				$ -		$ -	0,00	$ -
15,1	Suministro e instalación de cubierta en vidrio de 1,2m de ancho segun diseño. Incluye estructura de soporte en tuberia de acero cuadrada de 2" x 2" con anticorrosivo y acabado en esmalte negro mate, lamina de vidrio templado y laminado 4+4mm, ruana superior instalada contra el muro, sello perimetral en poliuretano tipo Sikaflex 1a plus, accesorios y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m	40	$ 603.025,00	$ 24.121.000,00		$ -	0,00	$ -

15,2	Suministro y aplicación de pintura para PUERTA METALICA Y ESCALERA. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color a definir por el diseñador, tipo Pintuco o su equivalente y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la supervisión. Según diseños.	un	3	$ 69.628,00	$ 208.884,00		$ -	0,00	$ -
15,3	Suministro, transporte y siembra de especies ornamentales, cobertura vegetal (balazo, equisetum, sansevieria, helecho azul o similares). Incluye tierra negra abonada, piedra filtro de 3/4" y geotextil no tejido.	un	45	$ 34.920,00	$ 1.571.400,00		$ -	0,00	$ -
4,3	**Instalación de puerta en madera** desmontada de 0,90m x 2,10m. Incluye trasiego desde punto de acopio, instalación de marco, ala, chapa y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2,00	$ 98.583	$ 197.166,00		$ -		$ -
5,4	Suministro, transporte e instalación de **lámparas sellada de 60cm x 60cm** 48w PANEL LED 110V para sobreponer en cielo. Incluye trasporte interno, conexión a energía y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6,00	$ 167.783	$ 1.006.698,00		$ -	0,00	$ -
C	**OBRAS NO PREVISTAS**				$ -		$ -		$ -
NP 1	Suministro, transporte e Instalacion de Mortero de nivelación de 8.5 cm de espesor promedio para pisos, de 21 Mpa, dosificado con 1,8 kg/m3 de fibra TUF STRAND SF fabricado con medios mecánico, utilización de corte para las juntas, deberá vaciarse de acuerdo a la conformación del piso y las pendientes existentes, y ajustándose al sistema de evacuación de aguas lluvias (donde aplique), y modulado con juntas de dilatación.	m2	286	$ 73.607	$ 21.051.602,00		$ -	146,40	$ 10.776.064,80
NP 2	Suministro, transporte, fabricación y colocación de REVOQUE con mortero 1:5 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	26,83	$ 32.091	$ 861.002,00		$ -	26,83	$ 861.001,53
NP 3	Suministro, transporte, fabricación y colocación de REVOQUE para fajas de 0.05 a 0.25 m con mortero 1:5. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	27,3	$ 22.908	$ 625.388,00		$ -	93,91	$ 2.151.290,28
NP 4	Sub base granular de triturado y arena para lleno de pisos, compacatado manualmente, con un espesor entre 100 mm y 175 mm	m2	107,36	$ 28.340	$ 3.042.582,00		$ -	106,40	$ 3.015.376,00
NP 5	Desmonte de marco metálico existente (dimensiones aproximadas: 2,1 x 0,80m). Incluye traslado hacia el punto de acopio, evacuación y traslado para disposicipon final hacia botadero certificado.	un	3	$ 24.657	$ 73.971,00		$ -	3,00	$ 73.971,00
NP 6	Suministro, transporte e Instalación de botón Push tipo Touch, para Válvula Dupelx de sanitario. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	3	$ 279.133	$ 837.399,00		$ -	0,00	$ -
NP 7	Suministro, transporte e Instalación de Rejillas metálica blanca de hasta 60cm x 60cm para difusores de aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	7	$ 93.954	$ 657.678,00		$ -	0,00	$ -
NP 8	Suministro, transporte e Instalación de tapa regístro metálica blanca de hasta 60cm x 60cm para inspección de cielos. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	4	$ 143.591	$ 574.364,00		$ -	0,00	$ -
NP9	Suministro, transporte e Instalación de estructura metalica de soporte con platina en acero 1/4" por 9" anclada mediante anclaje de 2" 1/2" epoxico y reforzada ccon angulo o pie amigo en acero, anclajes cada 60cm soporte en malla de fribra de vidrio para mayor adherencia	m	56,48	$ 290.919	$ 16.431.105,00		$ -	0,00	$ -
NP10	Suministro e instalación de zócalo en piedra Royal Veta, formato de ancho hasta 10cm x longitud variable y espesor de 15mm, instalado a junta perdida con puente de adherencia adhesivo bajo en polvo, cementicio (C), que cumpla la norma NTC 6050, y clasificación como C2. (Incluye emboquillado con boquilla látex color gris, lavado con hidrolavadora de mín. 2000 PSI y ácido nítrico al 5% y aplicación en toda el área de sellador hidrófugo especializado para piedra en las concentraciones y diluciones recomendadas por el fabricante).	m	84	$ 128.287	$ 10.776.108,00		$ -	0,00	$ -

NP11	Demolición de losa en concreto enchapada en piedra pizarra h promedio: 12cm, (incluye retiro y disposición final de escombros en botadero oficial, cargue, trasiego al interior de la obra, transporte y derechos de botadero).	m2	10	$ 23.313	$ 233.130,00		$ -	10,00	$ 233.130,00
NP12	Suministro, transporte y colocación de "Cierra Puerta" Mecánico (Para puerta de vidrio) con Potencia regulable mediante regulador continuo que permite la variacion de las fuerzas de apertura .	un	2	$ 544.658	$ 1.089.316,00		$ -	0,00	$ -
NP13	Suministro, transporte e instalación de Panel fijo en aglomerado RH de 8 cms de espesor, incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 1.663.594	$ 1.663.594,00		$ -	0,00	$ -
NP14	Construccion de muro alistonado en madera, incluye suministro e instalacion de listones en madera de 5 x 3cm fabricados en roble con acabado en barniz natural mate instalados con un espaciado de 3cm. Dimensiones 3,21 x 1,30m. Según diseño específiico de planos	un	1	$ 672.508	$ 672.508,00		$ -	0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	**$ 266.977.693,00**		**$ 29.064.571**		**$ 57.921.695**
				ADMINISTRACIÓN 23,14%	**$ 61.778.638,00**	**23,14%**	**$ 6.725.542**	**23,14%**	**$ 13.403.080**
				UTILIDAD 5%	**$ 13.348.885,00**	**5%**	**$ 1.453.229**	**5%**	**$ 2.896.085**
				COSTO TOTAL INCLUIDO AU	**$ 342.105.216,00**		**$ 37.243.342**		**$ 74.220.860**

Nombre del proponente CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Nombre del representante legal EDGARDO RUIZ GUERRERO
C. C. No. 72.274.612 de BARRANQUILLA
Dirección de correo CALLE 77#59-36 OF. 1001
Correo electrónico proyectos@bayith.com.co
Ciudad BARRANQUILLA

EDGARDO RUIZ GUERRERO
RE. LEGAL CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.

1036.610.187.

Arq. Residente de obra Contratista

Supervisor Técnico Depto




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.424.917
ARGUELLES JIMENEZ

APELLIDOS
FREDDY JOSE

NOMBRES

FIRMA

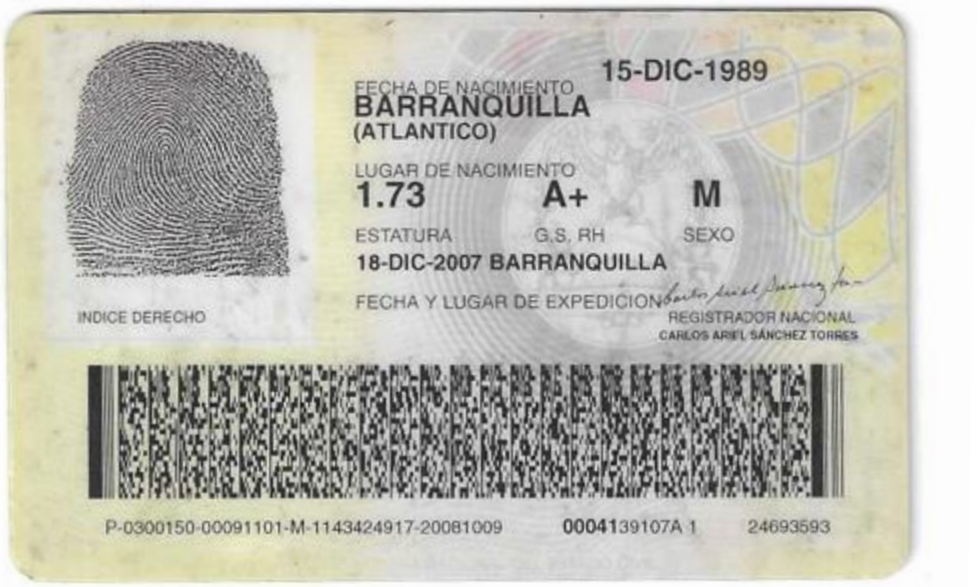

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1989
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-DIC-2007 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0300150-00091101-M-1143424917-20081009 0004139107A 1 24693593

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d4011063c2ca863359f2501b32a1941efe20ed64930b50ddbdfd54c0bc8b26598bba38205d2291c4bc61313b09829689

Número de Factura: FEC-181
Fecha de Emisión: 22/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA BAYITH S.A S
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA BAYITH S.A S
Nit del Emisor: 900509251
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CL 77 59 35 OF 1001
Teléfono / Móvil: 6053131933
Correo: contabilidad@bayith.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890900286
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CLL 42B No 52 - 106
Teléfono / Móvil:
Correo: alejandro.delvalle@antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	NP 45	TOTAL COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO REMODELACION Y ADECUACION DE CONSULTORIOS EN PISO 2 SALAS DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SOTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL JOSE MARIA CORDOVA ACTA PARCIAL No 2 Contrato No 4600015629	NIU	1,00	$ 57.921.695,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.921.695,10
2	2.	ADMINISTRACION 23	NIU	1,00	$ 13.403.080,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.403.080,25
3	223	UTILIDAD 5	NIU	1,00	$ 2.896.084,76	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.896.084,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-22 11:58:45
Documento generado el: 2023-09-22 11:58:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			74.220.860,11
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			74.220.860,11
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			74.220.860,11
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	74.220.860,11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039025413 Rango desde: 140 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-11-03

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E46868687D3C8204

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FREDDY JOSE ARGUELLES JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143424917 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 290372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
