SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA No. 01
CONVENIO/CONTRATO DE OBRA No. 011-2023

SUPERVISOR/INTERVENTOR: Arq. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ

APOYO A LA SUPERVISIÒN: Ing. JORGE ANDRES BONILLA SEPULVEDA

CONTRATISTA: ROBERT ALFARO GARCIA

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. Proceso	No 014 DE 2023
Tipo de Contrato	Obra
Secretaría que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
Dependencia que genera el proceso	SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
No. Del contrato	011 DE 2023
Fecha de suscripción del contrato	17 de julio de 2023
Contratista	ROBERT ALFARO GARCÍA
NIT / CC	7.557.466
Valor Inicial del Contrato	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS MCTE ($ 195.983.080,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS
Forma de pago	El departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así: a) Pagos Parciales, correspondientes al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,

Powered by CamScanner

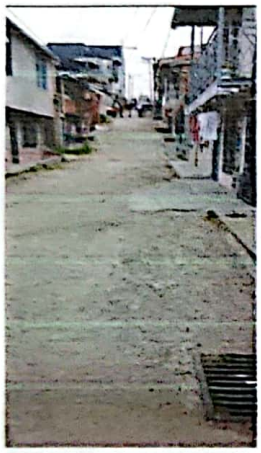
	mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y el presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley. b). Un último Pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
Plazo Inicial del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio:	16 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación inicial	14 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Fecha de terminación final:	14 DE OCTUBRE DE 2023
Modificación No.	N/A
Supervisor por parte del Departamento	Arq. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ

1. DATOS FINANCIEROS	
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No 2085 - $ 209.656.318.00
No. y valor Registro Presupuestal	No 7053 - $ 195.983.080.00
Adición (Modificatorio No. _____ de 20_____	N/A
Valor Total del Contrato	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS MCTE ($ 195.983.080,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS

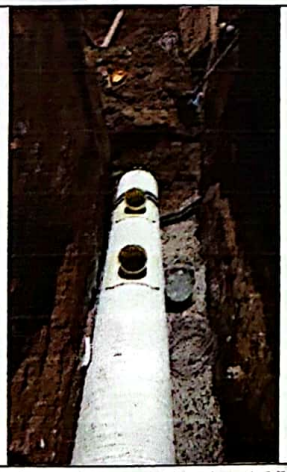
Powered by CamScanner

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Localización y replanteo	Señalización preventiva	Pasos peatonales
		
Manejo aguas	Excavación 0-2 mts	Excavación 2-4 mts

Powered by CamScanner

		
Lleno material de sitio	Lleno con material de prestamo	Cama en triturado
		
Entibado	Tubería perfilada 6”	Tubería perfilada12”
		
Tubería perfilada 16”	Silla yee	Cajas de inspección

Powered by CamScanner

5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERA 11 Y 12 ENTRE CAMARAS 685 Y 569 CIRCASIA-QUINDIO			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNID**	**EJECUTADO**
1	**PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN**		
1,1	Localización y replanteo	Ml	38
1,2	Señalización preventiva con tela PP	Ml	90
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	3
1,4	Manejo de aguas	Ml	38
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	98
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	12
2,3	Lleno compactado con material de sitio	M3	79
2,4	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	63
2,5	Cama para cimentación con material triturado	M3	23
2,6	Entibado Tipo B	M2	76
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO**		
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	Ml	57
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	Ml	38
3,3	Suministro e instalación Kit Silla Yee 12" x6"	Un	10
4	**OBRAS EN CONCRETO**		
4,1	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	11

Powered by CamScanner

4,2	Imprimación asfalto con emulsión asfáltica	M2	0
4,3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 E=0,07m	M3	0
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**		
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	M3	0
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	56
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	ML	0

OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANA A Y BARRIO OBRERO CIRCASIA-QUINDIO			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNID**	**EJECUTADO**
1	**PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN**		
1,1	Localización y replanteo	Ml	120
1,2	Señalización preventiva con tela PP	Ml	250
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	12
1,4	Manejo de aguas	Ml	120
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	220
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	168
2,3	Lleno compactado con material de sitio	M3	364
2,4	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	115
2,5	Cama para cimentación con material triturado	M3	46
2,6	Entibado Tipo B	M2	223

Powered by CamScanner

3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO**		
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	Ml	69
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	Ml	27
3,3	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=16"	ML	75
3,4	Suministro e instalación Kit Silla Yee 16" x6"	Un	14
4	**OBRAS EN CONCRETO**		
4,1	Cuerpo cámara D=1,2m en concreto de 21MPa (incluye peldaños)	Ml	0
4,2	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	14
4,3	Losa tapa 1,6*1,6*0.2m en concreto (incluye tapa en HF)	Un	0
4,4	Construcción base y cañuela	Un	0
4,5	Brazo de caída en tubería de diámetro 12" incluye accesorios y concreto	Un	0
4,6	Empalme cámaras existentes	Un	4
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**		
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	M3	0
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	56
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	M	0

Powered by CamScanner

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$195.983.080.00	$0.00	$195.983.080.00
ADICION No.	$ 0	$ 0	$ 0
ACTA No. 01	$195.983.080.00	$154.323.257.00	$41.659.823.00
TOTAL	$195.983.080.00	$154.323.257.00	$41.659.823.00

Valor a pagar presente acta: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 154.323.257), que corresponden al 78,74315324% del valor total del contrato de obra.

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **(profesional a cargo)**, en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **MIRIAM GARCIA CRIALES con** tarjeta profesional No. 10118-T donde certifica que **ROBERT ALFARO GARCIA con C.C. 7.557.466**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. **(si aplica)**

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Robert Alfaro García	145.000	185.600	6.100	9455580516	08

Powered by CamScanner

INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN PROPUESTA.

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Robert Alfaro García	145.000	185.600	6.100	9455580516	08
Mayra Alejandra Ramírez Ramírez	145.000	185.600	28.300	7888505522	07
María del Rosario Sabogal Ramírez	35.600	142.300	61.900	9456480775	08

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	**x**

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0560136960006387	ROBERT ALFARO GARCIA

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

Arq. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ
Departamento del Quindío
Supervisor / Interventor

Ing. JORGE ANDRES BONILLA SEPULVEDA
Departamento del Quindío
Apoyo a la Supervisión

VoBo. Secretario Despacho
Elaboró:

Powered by CamScanner
