EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA

Que el contrato No. 253 de 2023, se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Nombre del Contratista	**Número Nit o C.C. y lugar expedición**	**No. informe**		
DC PROJECT S.A.S R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA	NIT. 901.410.401-8 C.C N° 1.061.686.538 de Popayán Cauca.	1	de	2

Fecha de presentación			**Periodo del informe:**		**Municipio prestación del servicio**
Día	**Mes**	**Año**	**De**	**Al**	
28	SEPTIEMBRE	2023	07/09/2023	21/09/2023	San Francisco

Objeto del contrato	ADECUACION A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO.		
Tipo de contrato:	Obra		
Fecha de Inicio	07/09/2023	**Fecha de Terminación**	06/10/2023
Plazo	Un mes		
Valor total del contrato	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($156.496.207) MDA/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS.		
Prorrogas	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Adiciones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Suspensiones	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Modificatorios	**Acta No.** X de **dd/mm/aaaa – Tiempo:** En días y/o meses		
Interventoría	N/A		
Nueva fecha de terminación	N/A		
Forma de pago	El valor del contrato a suscribir será por la suma CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($156.496.207) MDA/CTE, Incluido IVA y todos los costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir EL CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato que se suscribe.		

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

	El valor inicial o precio del contrato es estimativo del costo total, y se establecerá para efectos fiscales teniendo en cuenta los servicios a adquirir (alquilar) y los precios unitarios por los cuales se hará la respectiva adjudicación. El valor o precio inicial del contrato no tiene alcance vinculante u obligacional, pues el valor real se establecerá una vez se concluya el objeto contractual. En todo caso, las modificaciones o ajustes a las cantidades, así como el establecimiento de ítems nuevos, requerirá de autorización expresa por parte de la entidad. La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Pagará al contratista en dos actas parciales cada una por el 50% valor del contrato, previa verificación del cumplimiento, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial y total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del acta de liquidación. Para el trámite de pago el contratista debe presentar los siguientes documentos: a) Factura de los bienes y/o servicios suministrados o documento que haga sus veces. b) Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo 1o del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 La factura deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

	d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes y/o servicios. f) Valor total de la operación Del derecho de turno. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. **PARAGRAFO 1. -** Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la correspondiente factura o cuenta de cobro previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes legalmente exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva. Además, deberá presentar la factura electrónica y su respectiva representación gráfica.

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó que el contratista cumplió con el pago a sus aportes al Sistema General de seguridad social integral (salud, pensiones, ARL) según lo establece el contrato. Además, anexa certificado expedido por el representante legal de la empresa DC PROJECT S.A.S con NIT. 901.410.401-8, ALEJANDRO QUINTANA ANACONA, identificado con cédula 1.061.686.538 de Popayán Cauca

La (s) planilla (s) aportada (s) se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
9455028918	2023/08/18	PENSION AGOSTO- SALUD SEPTIEMBRE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el producto presentado y aprobado por el supervisor y la factura electrónica de venta No. DC1 27 Ver. UBL 2.1 con fecha 27/09/2023, AUTORIZO el pago PARCIAL por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (**$78.247.933,33**) MDA/CTE.

DOCUMENTOS SOPORTES (entregados)	
ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 156.496.207,00
Valor total de adiciones	$ 0
Valor total de reducciones	N/A
Valor total del Contrato	$ 156.496.207,00
Valor total pagado	$ 0
Valor a pagar en la presente certificación	$ 78.247.933,33
Saldo a favor del Contratante	$ 78.248.273,67

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023.

JUAN CARLOS CALVACHE ALOMÍA
CC 98.384.386 De Pasto (Nariño)
Cargo o Vinculación: PLANEACIÓN SUPERVISOR

[1] Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

Factura Electrónica De Venta No. DC1 27
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 10

Fecha de Validación: 27/09/2023 04:35 PM
Fecha de Generación: 27/09/2023 04:35 PM
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : DC PROJECT SAS
Razón Social: DC PROJECT S.A.S
NIT: 901410401-8
Teléfono: + (57) 312 2595903
Correo Electrónico: dcprojectsas@gmail.com
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
NIT: 800247940-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: atencionalusuario@itp.edu.co
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	174	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	und	1.00	unidad	46,653,700.00	46,653,700.00	0	0.00	**46,653,700.00**
2	175	POSTES CONCRETO12MTS* 750	und	2.00	cada	2,575,000.00	5,150,000.00	0	0.00	**5,150,000.00**
3	176	ESTRUCTURA 711	und	1.00	unidad	2,645,600.00	2,645,600.00	0	0.00	**2,645,600.00**
4	177	ESTRUCTURA 550	und	1.00	unidad	1,953,468.00	1,953,468.00	0	0.00	**1,953,468.00**
5	178	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	und	4.00	unidad	5,232.00	20,928.00	0	0.00	**20,928.00**
6	179	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0	und	24.00	unidad	329,760.00	7,914,240.00	0	0.00	**7,914,240.00**
7	180	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (38	und	1.00	unidad	8,960,054.00	8,960,054.00	0	0.00	**8,960,054.00**
8	ADM	ADMINISTRACION 17%	ADMI	1.00	cada	3,700,116.30	3,700,116.30	0	0.00	**3,700,116.30**
9	IMP	IMPREVISTO 2%	IMP	1.00	cada	448,770.93	448,770.93	0	0.00	**448,770.93**
10	UTL	UTILIDAD 3%	UTI	1.00	cada	673,156.39	673,156.39	19	127,899.71	**801,056.10**

Detalles:
Son: SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
CUFE :
896425e4c69fe0e7f607c4f1e5a5045a561cff849fd3512e56a41baa05473cef1f121b72fd5e8acd6fd2d8b228e3bbce

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 78,120,033.62
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 78,120,033.62
Monto IVA :	COP 127,899.71
Total Venta:	COP 78,247,933.33
Total a pagar :	COP 78,247,933.33
Saldo Restante :	COP78,247,933.33

Firma Digital:
gQeUkNH9xicV8kDdxA3pn72Ulh+THvLFRQcJsCud9B6TMAq9scNLzMP55VQNHHO4 X/WDR/xlqszI1mxSbnio8vq7U1CAY2XKvhV5j9uYpAMeqr/1U7tlb1V21+8KGPx8
QDAjwoqJyz2LNnSSVMT9kDTus+/QTRAf1Y+K7tiVA4xYUJVe5CEvRwb01TyDPXcb t4gRa1Do4IiYFgnelKYY+pd89lUs7i+3XaJQyLHNgjQWnL3M4+SgLXeFKZLghF6R
BFd0MH+k0XtSnWlvGcBWa6Ex5T7S5h0sRwKiI9k0Kh8JzyRQyVaJGc3NddJAtDxC CGh3YcZFAmxgK41bU+qrOA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043674628 entre los rangos de Facturación del 13 al 200 usando el prefijo DC1 con vigencia entre las fechas 2023-01-31 al 2024-01-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		
Nombre del contratista	*DC PROJECT S.A.S.*	*C.C. o NIT*	*901410401*
Dirección	*CR 29 10 16, BARRIO CONDOMINIO NORTE - MOCOA, PTYO*	*Telefono*	*3114773419*
Correo electrónico	*dc.projectsas@gmail.com*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*253*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$156.496.207,00*	*Numero de Proceso*	*ITP-253-2023*
Tipo de contrato	*CONTRATOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO (ITP)*	*Fecha generación*	*2023-09-27*
Objeto	*ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2023-09-07*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Instituto Tecnológico del Putumayo	*$4.695.000,00*	*214387*	*(415)8000000031548(8020)0000214387(3900)0004695000*
Total	*$4.695.000,00*		*KELLY TATIANA GARCIA VILLOTA*

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230927
OFIC: 0598 31548 IMP ESTAMP PROITP PUTUM CONVENIO: 0031548
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200291664 HORA : 10:03

REFERENCIA NO. 1 0000214387 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000012558
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,695,000.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 4,695,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 896425e4c69fe0e7f607c4f1e5a5045a561cff849fd3512e56a41baa05473cef1f121b72fd5e8acd6fd2d8b228e3bbce

Número de Factura: DC1-27
Fecha de Emisión: 27/09/2023
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DC PROJECT SAS
Nombre Comercial: DC PROJECT SAS
Nit del Emisor: 901410401
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: BRR ALTOS DE LA COLINA
Teléfono / Móvil:
Correo: dcprojectsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800247940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: atencionalusuario@itp.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	174	und	94	1,00	$ 46.653.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.653.700,00
2	175	und	EA	2,00	$ 2.575.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.150.000,00
3	176	und	94	1,00	$ 2.645.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.645.600,00
4	177	und	94	1,00	$ 1.953.468,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.953.468,00
5	178	und	94	4,00	$ 5.232,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.928,00
6	179	und	94	24,00	$ 329.760,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.914.240,00
7	180	und	94	1,00	$ 8.960.054,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.960.054,00
8	ADM	ADMI	EA	1,00	$ 3.700.116,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700.116,30
9	IMP	IMP	EA	1,00	$ 448.770,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 448.770,93
10	UTL	UTI	EA	1,00	$ 673.156,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.899,71	19.00			$ 673.156,39

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-27 16:36:24
Documento generado el: 2023-09-27 21:36:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal			78.120.033,62
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			78.120.033,62
IVA			127.899,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			127.899,71
Total neto factura (=)			78.247.933,33
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	78.247.933,33


Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043674628 Rango desde: 13 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-01-31

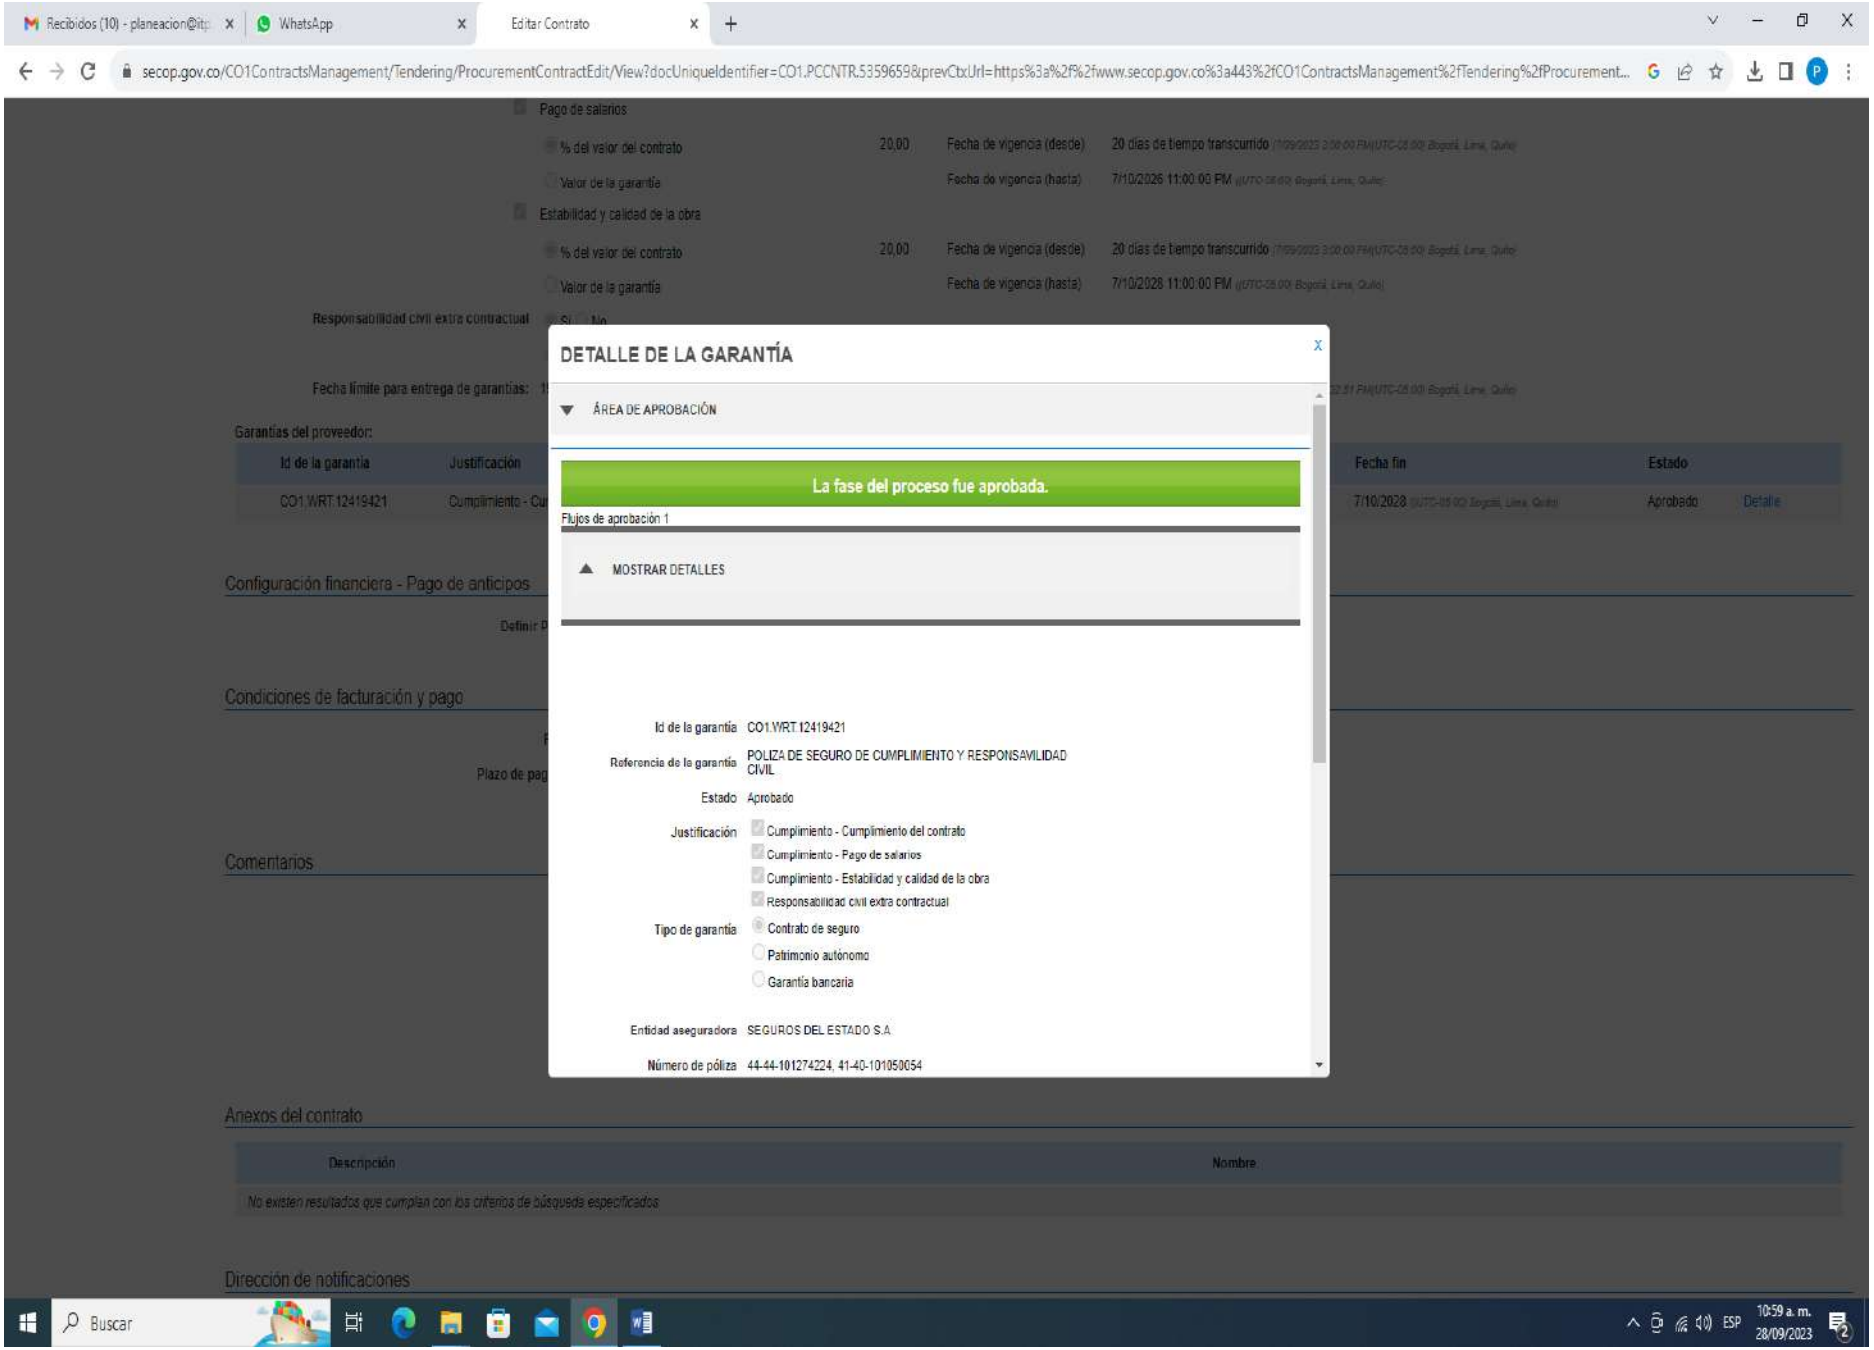
Recibidos (10) - planeacion@it
WhatsApp
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5359659&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurement...
Pago de salarios
% del valor del contrato
20,00
Fecha de vigencia (desde)
20 días de tiempo transcurrido
Valor de la garantía
Fecha de vigencia (hasta)
7/10/2026 11:00:00 PM
Estabilidad y calidad de la obra
% del valor del contrato
20,00
Fecha de vigencia (desde)
20 días de tiempo transcurrido
Valor de la garantía
Fecha de vigencia (hasta)
7/10/2028 11:00:00 PM
Responsabilidad civil extra contractual
Fecha límite para entrega de garantías:
Garantías del proveedor:
Id de la garantía
Justificación
Fecha fin
Estado
CO1.WRT.12419421
Cumplimiento - Cu
7/10/2028
Aprobado
Detalle
Configuración financiera - Pago de anticipos
Condiciones de facturación y pago
Comentarios
Anexos del contrato
Descripción
Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Dirección de notificaciones
DETALLE DE LA GARANTÍA
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Id de la garantía
CO1.WRT.12419421
Referencia de la garantía
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSAVILIDAD CIVIL
Estado
Aprobado
Justificación
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Número de póliza
44-44-101274224, 41-40-101050054
Buscar
ESP
10:59 a. m.
28/09/2023

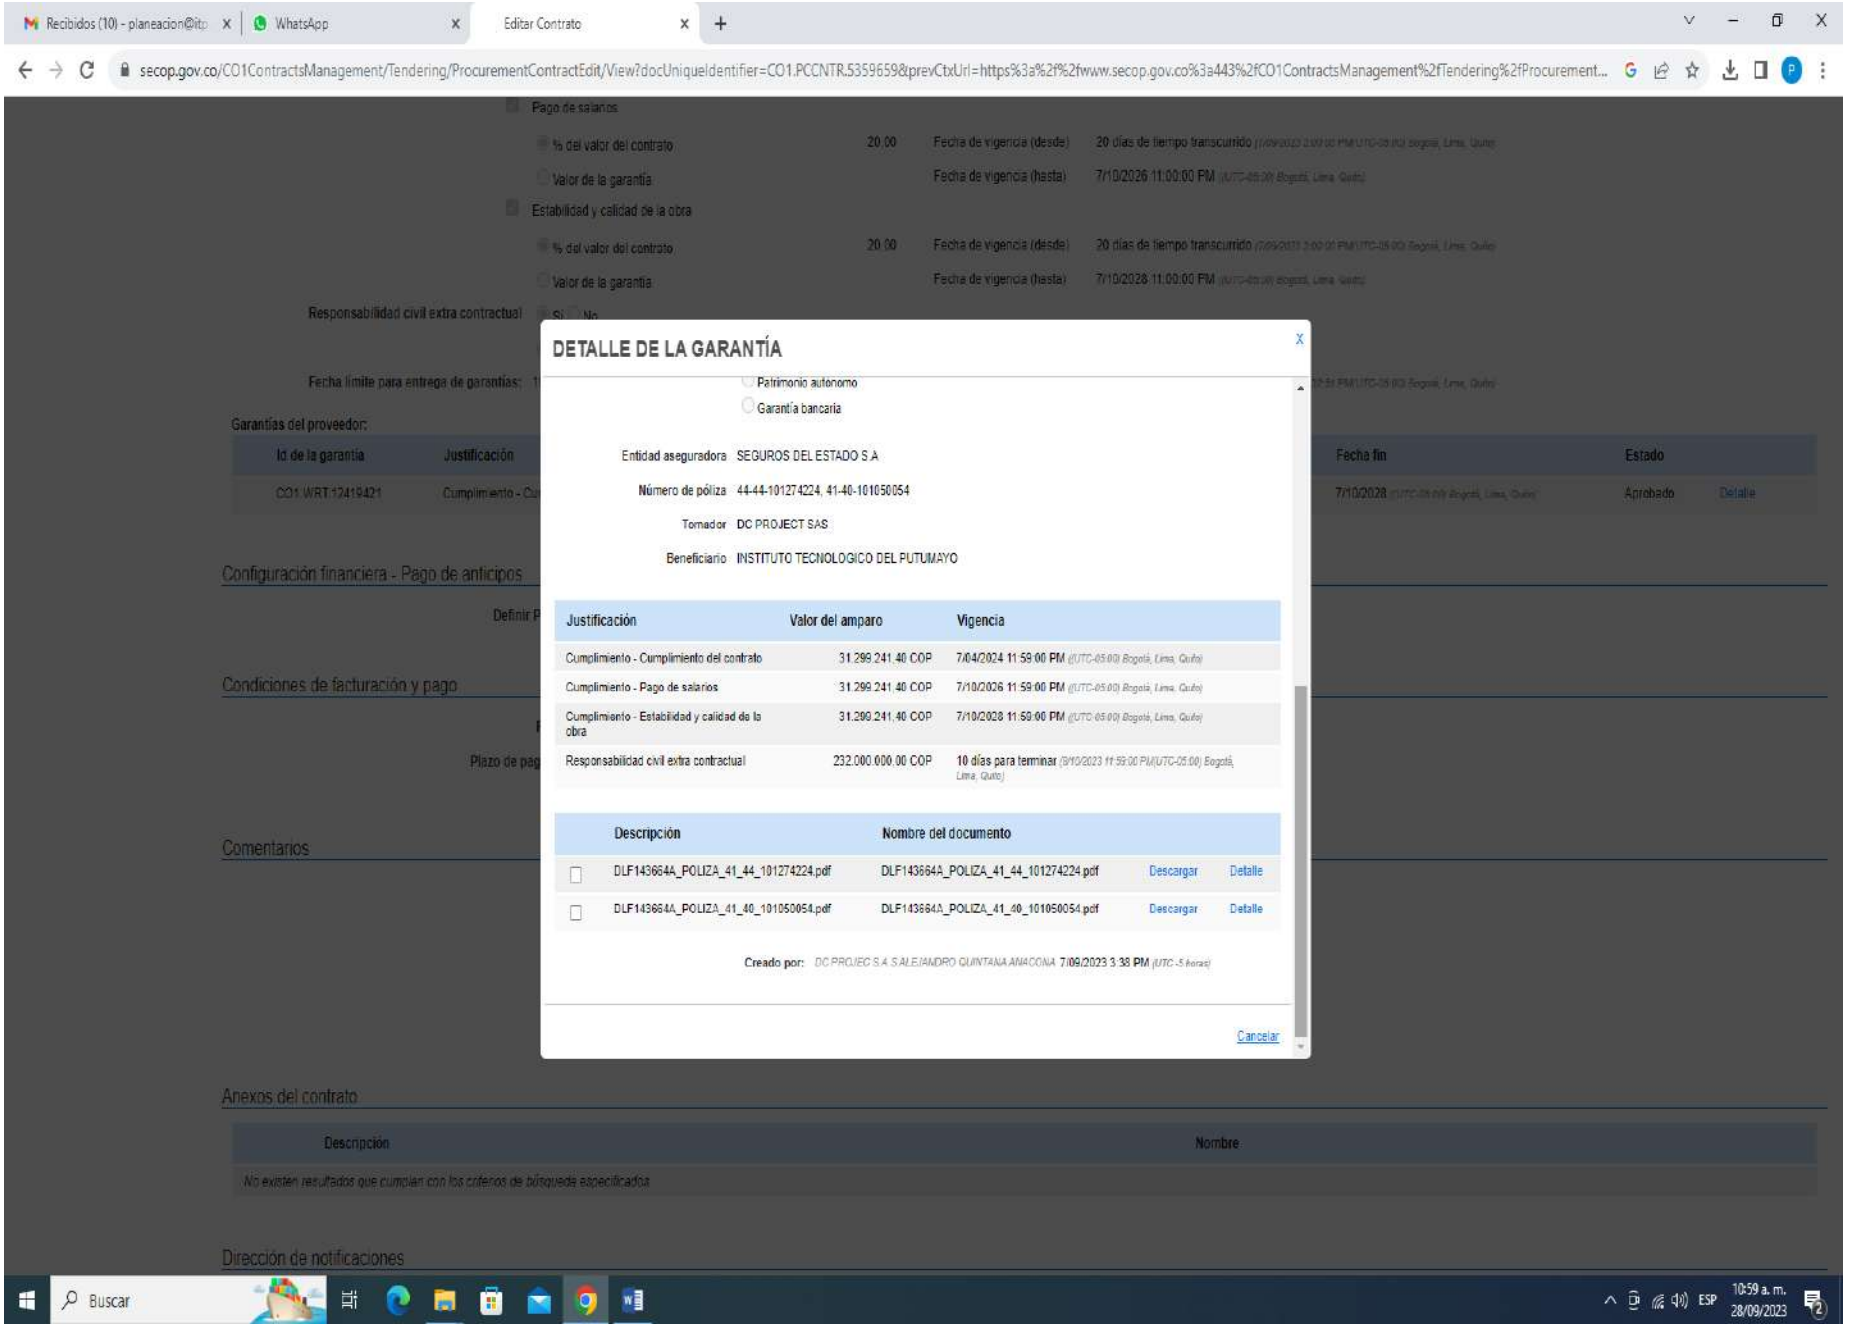
Recibidos (10) - planeacion@it
WhatsApp
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5359659&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurement...
Pago de salarios
% del valor del contrato
20.00
Fecha de vigencia (desde)
20 días de tiempo transcurrido
Valor de la garantía
Fecha de vigencia (hasta)
7/10/2026 11:00:00 PM
Estabilidad y calidad de la obra
% del valor del contrato
20.00
Fecha de vigencia (desde)
20 días de tiempo transcurrido
Valor de la garantía
Fecha de vigencia (hasta)
7/10/2028 11:00:00 PM
Responsabilidad civil extra contractual
Fecha límite para entrega de garantías:
Garantías del proveedor:
Id de la garantía
Justificación
Fecha fin
Estado
CO1.WRT.12419421
Cumplimiento - Cu
7/10/2028
Aprobado
Detalle
Configuración financiera - Pago de anticipos
Definir P
Condiciones de facturación y pago
Plazo de pag
Comentarios
Anexos del contrato
Descripción
Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Dirección de notificaciones
DETALLE DE LA GARANTÍA
X
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A
Número de póliza 44-44-101274224, 41-40-101050054
Tomador DC PROJECT SAS
Beneficiario INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
Justificación
Valor del amparo
Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
31.299.241,40 COP
7/04/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios
31.299.241,40 COP
7/10/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
31.299.241,40 COP
7/10/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual
232.000.000,00 COP
10 días para terminar (9/10/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Descripción
Nombre del documento
DLF143664A_POLIZA_41_44_101274224.pdf
DLF143664A_POLIZA_41_44_101274224.pdf
Descargar
Detalle
DLF143664A_POLIZA_41_40_101050054.pdf
DLF143664A_POLIZA_41_40_101050054.pdf
Descargar
Detalle
Creado por: DC PROJEC S.A.S ALEJANDRO QUINTANA ANACONA 7/09/2023 3:38 PM (UTC -5 horas)
Cancelar
Buscar
ESP
10:59 a. m.
28/09/2023

INFORME DE OBRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

CONTRATO 253 DE 2023



Mocoa, Putumayo.
Septiembre de 2023

INFORME PARCIAL N° 01 DE OBRA

CONTRATO N° 253 DE 2023

OBJETO:

ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO".

CONTRATISTA:

DC PROJECT S.A.S
NIT: 901.410.401-8
R/L ALEJANDRO QUINTANA ANACONA

PERIODO DEL INFORME:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE ENTREGA INFORME:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Contenido

1 INTRODUCCION 4
2 LOCALIZACION ESPECIFICA 4
3 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
4 AVANCE DE OBRA 6
4.1 AVANCE FISICO 6
4.2 AVANCE EN TIEMPO 6
4.3 AVANCE FINANCIERO 6
5 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO 7
5.1 ITEMS CONTRATADOS 7
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 8
6 CONTROLOES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA 8
6.1 GARANTIAS DEL CONTRATO 8
6.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS 9
6.3 FORMA DE PAGO 9
6.4 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 10
7 CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA 10
8 INCOVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 11
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO 11


1 INTRODUCCION

El presente informe consiste en la ejecución de obra en la planta productiva ASOCIACION NUTRILAC, con respecto a la adecuación y fortalecimiento de los procesos de acopio, almacenamiento, producción y comercialización de los derivados de la leche que la asociación ejerce como actividad comercial.

Se conoce como adecuación a la revisión de las instalaciones del sistema fotovoltaico e instalaciones internas de la planta con el fin de optimizar el funcionamiento de la instalación de la planta productiva para fortalecer los procesos de acopio, almacenamiento, producción y comercialización de los productos derivados de la leche.

2 LOCALIZACION ESPECIFICA

El proyecto se encuentra ubicado en las instalaciones de físicas de la ASOCIACIÓN NUTRILAC, en la ciudad de San francisco, Putumayo.

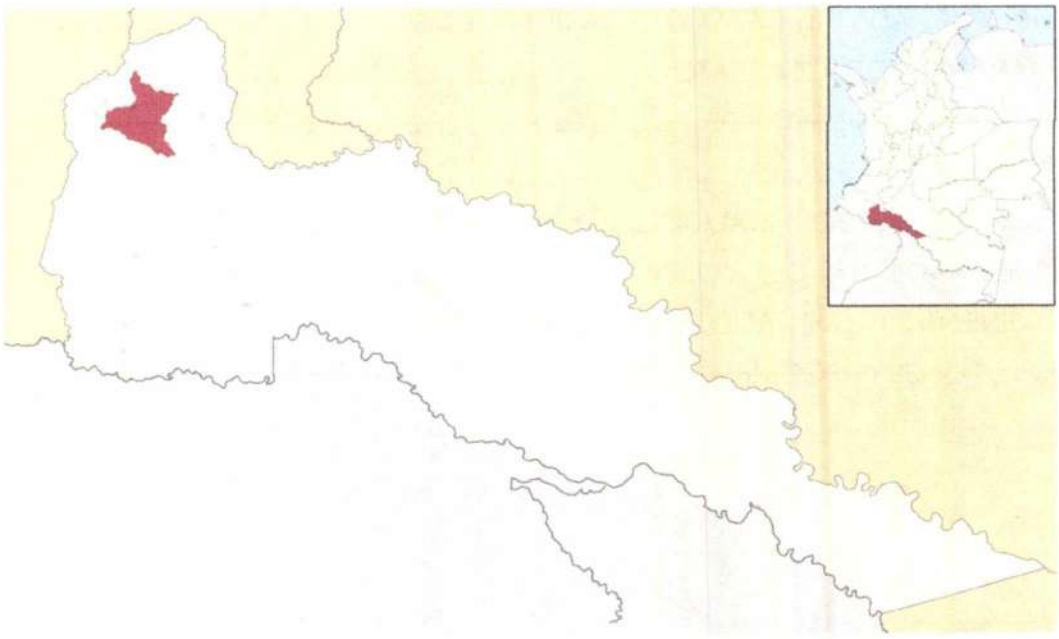

3 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	253 DEL 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DC PROJECT S.A.S. – NIT: 901.410.401-8
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ITP.
OBJETO	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($ 156.496.207.00) MCTE IVA incluido, gastos directos e indirectos y demás impuestos que correspondan.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

4 AVANCE DE OBRA

A continuación, se presenta los componentes y la proyección de actividades, de la ejecución de la obra del presente contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, cantidades y demás consideraciones para cada caso.

4.1 AVANCE FISICO

De acuerdo a las actividades ejecutadas y el reporte de avance físico, en el periodo del reporte se ejecutó un 49.99% del objeto contractual y según los tiempos estipulados en el contrato, se debería tener un avance del 50%, por lo tanto, se cuenta con un avance optimo acorde a los tiempos de ejecución y los establecidos de acuerdo al cronograma de obra presentado.

4.2 AVANCE EN TIEMPO

A la fecha del presente informe del contrato de obra No. 253 del 2023 presenta un avance en tiempo del 50% de acuerdo a la siguiente información.

PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	07 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	06 de octubre de 2023
PERIODO DEL INFORME	07 de septiembre 2023 a 21 de septiembre 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO	QUINCE (15) DIAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	49.99%

4.3 AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe del contrato de obra No. 253 de 2023, presenta un avance financiero del 0% de acuerdo a los siguientes valores.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 156.496.207,00
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0,00
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA	$ 78.247.933
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	49.99%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 78.248.274
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	**$ 78.247.933**

5 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

5.1 ITEMS CONTRATADOS

ITEM	DETALLE	UND
1	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	UND
2	POSTES CONCRETO12MTS* 750	UND
3	ESTRUCTURA 711	UND
4	ESTRUCTURA 550	UND
5	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	ML
6	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0	ML
7	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110)	UND
8	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	UND
9	DISEÑO ELECTRICO	UND
10	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND
11	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	UND
12	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND
13	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND
14	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª	UND
15	Tomacorriente 15A, 125V doble polo a tierra certificado en tubería y accesorios EMT de 1/2", caja tipo Radweld y cable CU No. 12	UND
16	Luminaria LED 18W	UND
17	INTERRUPTOR DOBLE	UND
18	INTERRUPTOR SENCILLO	UND
19	Auto certificación RETIE y trámites de aprobación ante el Operador de Red	GLB
20	TRAMITES ANTE EL OR (Derechos de Conexión, Matrícula Y D.N.A.)	GLB

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas durante el periodo del 07 de septiembre de 2023 al 21 de septiembre de 2023 se describen de acuerdo a los ítems contratados y se llevó a cabo las actividades y registro fotográfico:

Item	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	PRIMER COBRO
1	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	1	$ 46.653.700	$ 46.653.700
2	POSTES CONCRETO12MTS* 750	2	$ 2.575.000	$ 5.150.000
3	ESTRUCTURA 711	1	$ 2.645.600	$ 2.645.600
4	ESTRUCTURA 550	1	$ 1.953.468	$ 1.953.468
5	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	4	$ 5.232	$ 20.928
6	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0	24	$ 329.760	$ 7.914.240
7	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110)	1	$ 8.960.054	$ 8.960.054
TOTAL COSTO DIRECTO				$ 73.297.990
ADMINISTRACION				$ 3.700.116,30
IMPREVISTOS				$ 448.770,93
UTILIDAD				$ 673.156,39
IVA A LA UTILIDAD 19%				$ 127.899,71
VALOR DE FACTURA				**$ 78.247.933**

Las obras ejecutadas en el periodo del informe, corresponden a la construcción de la adecuación a las instalaciones eléctricas y fotovoltaicas de la planta productiva de la asociación NUTRILAC, de acuerdo a los ítems contratados:

Anexo registro fotográfico y descripción de actividades de la obra.

6 CONTROLOES ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

6.1 GARANTIAS DEL CONTRATO

El contrato presenta el estado de garantías.

ASEGURADORAS: Seguros del Estado S.A. identificada con Nit: 860.009.578-6

ANEXO 0

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL **No. 41-44-101274224**

Fecha de expedición 07 de septiembre de 2023 y aprobado mediante acta de aprobación de póliza No. 290-2022

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	07/09/2023	07/04/2024	$ 31.299.241,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/09/2023	07/10/2026	$ 31.299.241,40
Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años		$ 31.299.241,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ETRACONTRACTUAL **No. 41-40-101050054**

Fecha de expedición 07 de septiembre de 2023 y aprobado mediante acta de aprobación de póliza No. 290-2022

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	07/09/2023	08/10/2023	$ 232.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	07/09/2023	08/10/2023	$ 232.000.000,00
Vehículos propios y no propios	07/09/2023	08/10/2023	$ 232.000.000,00

6.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato, se han suscrito los siguientes actos administrativos

- ACTA DE INICIO con fecha de 07 de septiembre de 2023.

6.3 FORMA DE PAGO

El INSTITUTO cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera.

1. Anticipo.

La entidad pagara en dos actas parciales cada una del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, previa verificación del cumplimiento, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial y total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en

la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del acta de liquidación.

Pagos realizados

Al contratista de obra se le han realizado los siguientes pagos

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$ 156.496.207,00
Valor parcial pagado	$ 0,00
Valor presente informe	$ 78.247.933
Saldo pendiente por pagar	$ 78.248.274

6.4 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023			
PERSONAL		TOTAL	NUMERO PLANILLA PILA
NOMBRE	CARGO		
CARLOS ORLANDO ARAQUE PARADA	DIRECTOR DE OBRA	**$ 2.547.500**	**9455028918**
RUTH ESTELA PANTOJA CADENA	INGENIERA RESIDENTE		
JHORDAN WILSON PALOMEQUE PALMA	TECNICO ELECTRICISTA		
CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ	PROFESIONAL SST		
GERMAN SIGIFREDO CHAMORRO	AUXILIAR TECNICO		

Se presenta planillas como soporte de pago de salud pensión, riesgos y parafiscales del mes de septiembre de 2023, anexos al presente informe. (Anexo planillas PILA)

7 CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

- Durante la obra el contratista realizó actividades encaminadas a la protección ambiental de la zona.
- Se dispuso puntos para el almacenamiento adecuado de residuos naturales del área y residuos sólidos de la obra.
- Se tuvo especial cuidado con las zonas verdes de las instalaciones del Instituto; para no perjudicar las diferentes especies de árboles que hay en el lugar.

8 INCOVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Hasta la fecha no se ha presentado dificultades significativas o de impacto que modifiquen el rendimiento de la obra.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN FUNCION DEL PROYECTO

- Hasta la fecha se encuentra ejecutado el 49.99% del objeto contractual
- El valor ejecutado del contrato de obra número 253 de 2023 a la fecha es de $78.247.933 y el valor a ejecutar es por la suma de $ 78.248.274 valores que son el producto de multiplicar el valor unitario de cada ítem contratado, por la cantidad requerida en la obra donde el saldo pendiente de ejecución fue calculado por la diferencia entre el valor contractual y el valor ejecutado.

ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
C.C. 1.061.686.538
R/L DC PROJECT SAS

Anexo 1. Registro fotográfico y descripción de actividades ejecutadas.


Ítem 1. Suministro, transporte e instalación de Postes de concreto de 12 metros

Descripción: Se realizó proceso de transporte de carga, maniobras y anclaje de cada uno de los dos postes de concreto de 12 metros en los puntos establecidos según el diseño de la obra.
 


Ítem 2. Suministro, transporte e instalación de Estructura 712-225-kVA-380V

Descripción: Actividad realizada para la instalación y conexión de un transformador de 225kVA en apoyos tipo H de 712.



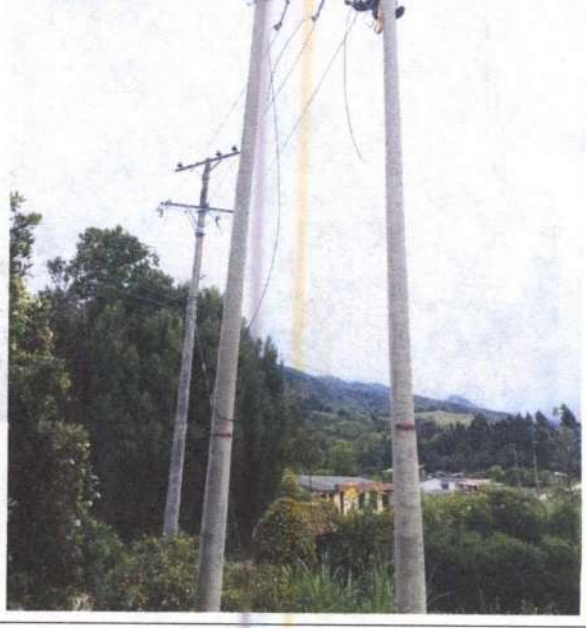





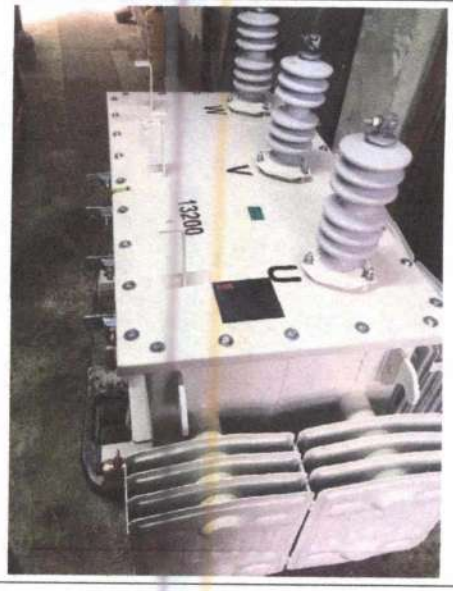

Ítem 3. Suministro, transporte e instalación de ESTRUCTURA 711

Descripción: Se instaló estructura de media tensión para conexión de transformador de 225kva.	
	


Ítem 4. Suministro, transporte e instalación de ESTRUCTURA 550.

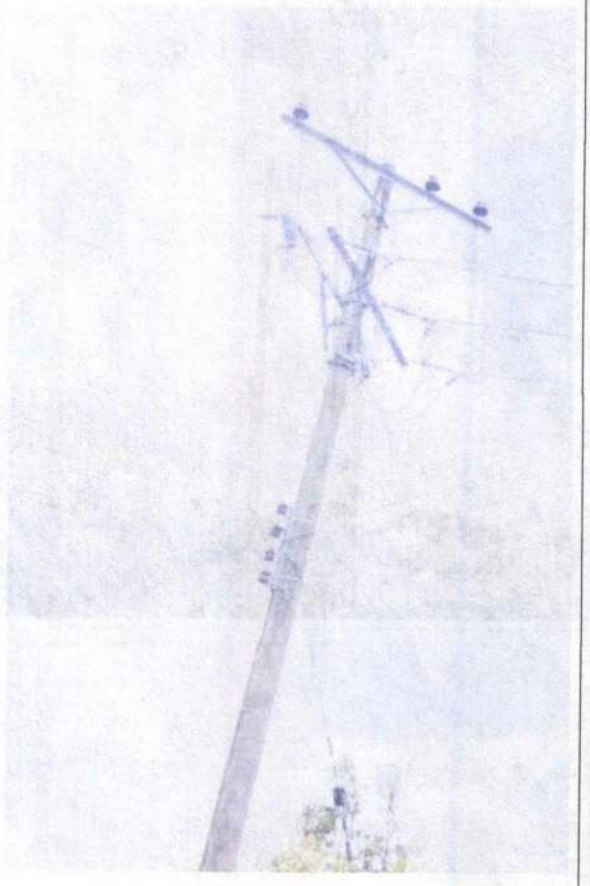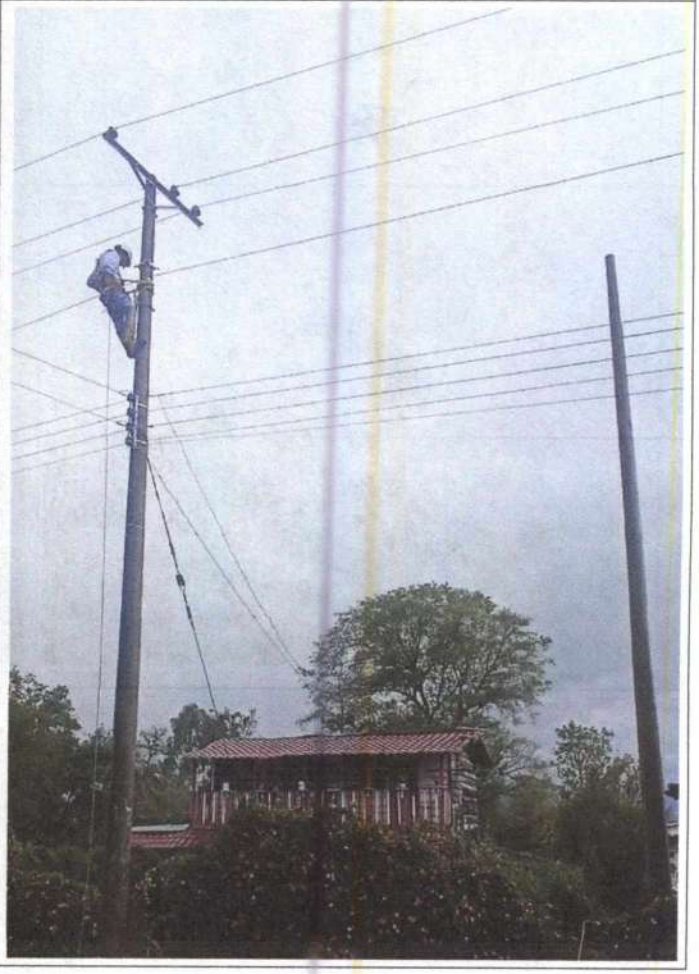Descripción: Instalado estructura de paso de media tensión sobre el apoyo de 10 metros.	
	

Ítem 5. Suministro, transporte e instalación de LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR


Descripción: se realizó la conexión y tendido del cableado ACSR en media tensión.



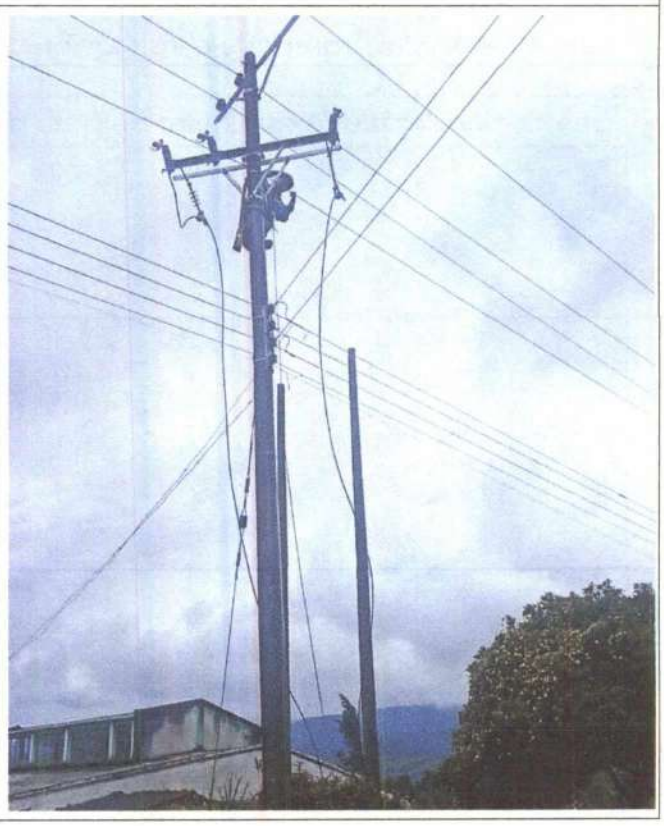

Ítem 6. Suministro, transporte e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL

Descripción: Se realiza instalación y conexión de gabinete de distribución de 220V con barraje trifásico con espacio para 6 totalizadores de 2m*0,80m lamina 14 intemperie (380-110)

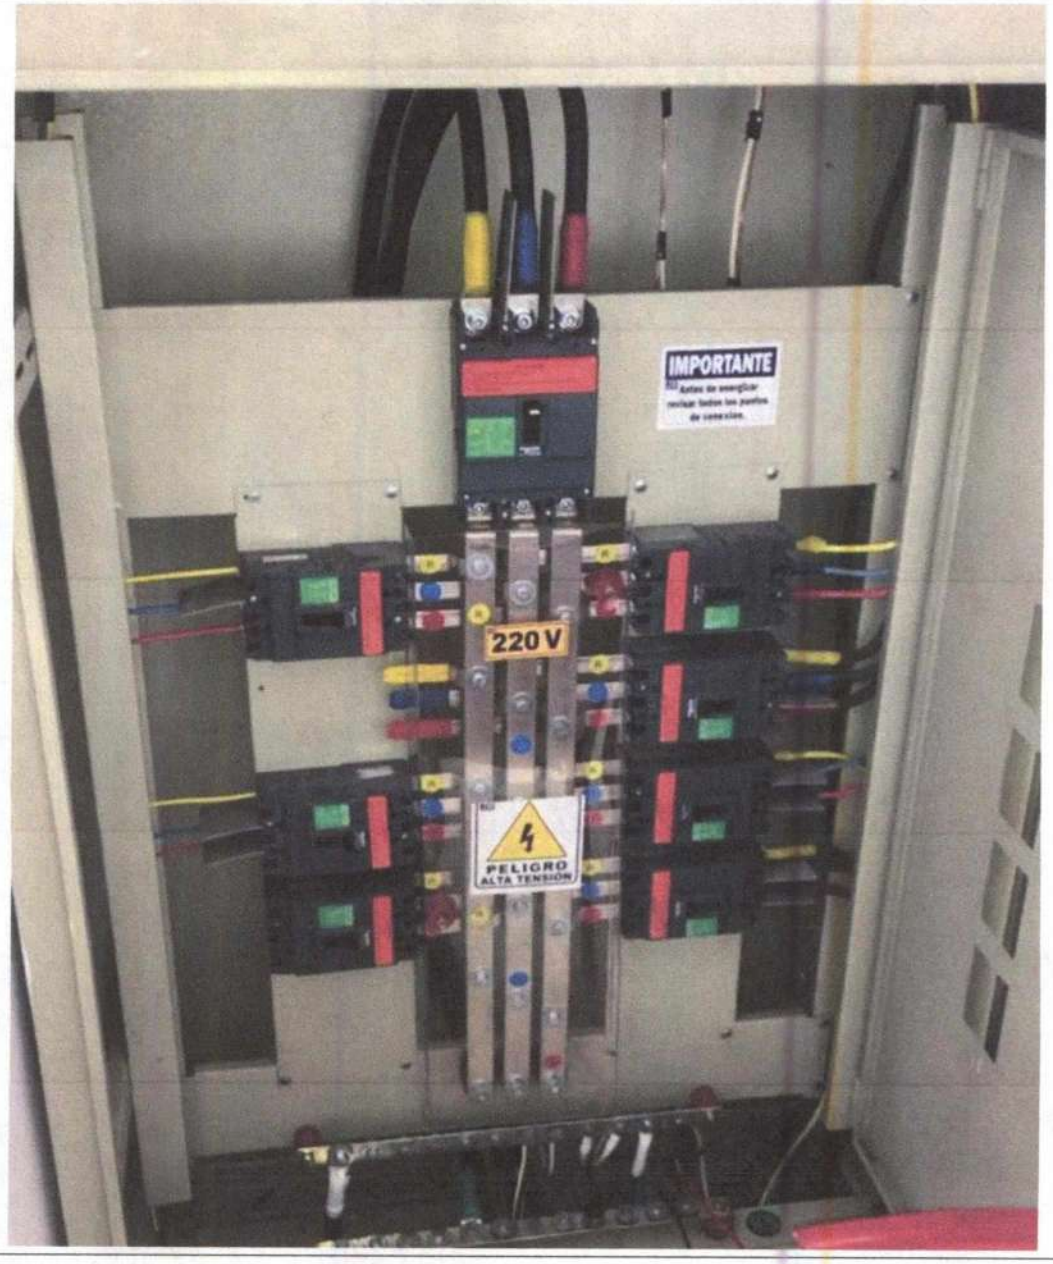

ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO

IES Vigilada por: La educación es de todos — Mineducación

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 01

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: DC PROJECT SAS
SUPERVISOR: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

FECHA ACTA: 22 de septiembre de 2023

Mediante la presente acta, CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ, en calidad de contratista y director de obra, MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO rector ITP, en calidad de supervisor, JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA, en calidad de profesional universitario area de planeacion ITP, JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS profesional de apoyo en el área de Planeación ITP como apoyo a la supervision, dejan constancia de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.01	DISEÑO Y REPLANTEO	UND	1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.800.000,00
2	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES**												
2.01	ESTRUCTURA 712-225-KVA-380V	UND	1,00	$ 46.653.700	$ 46.653.700,00	0,00	$ -	1,00	$ 46.653.700,00	1,00	$ 46.653.700,00	0,00	$ -
2.02	POSTES CONCRETO12MTS* 750	UND	2,00	$ 2.575.000	$ 5.150.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.150.000,00	2,00	$ 5.150.000,00	0,00	$ -
2.03	ESTRUCTURA 711	UND	1,00	$ 2.645.600	$ 2.645.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.645.600,00	1,00	$ 2.645.600,00	0,00	$ -
2.04	ESTRUCTURA 550	UND	1,00	$ 1.953.468	$ 1.953.468,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.953.468,00	1,00	$ 1.953.468,00	0,00	$ -
2.05	LINEA 3No 1/0 AWG-ACSR	UND	5,00	$ 5.232	$ 26.160,00	0,00	$ -	4,00	$ 20.928,00	4,00	$ 20.928,00	1,00	$ 5.232,00
2.06	ACOMETIDA A GABINETE 3No 3/0 + 1No3/0	ML	48,00	$ 329.760	$ 15.828.480,00	0,00	$ -	24,00	$ 7.914.240,00	24,00	$ 7.914.240,00	24,00	$ 7.914.240,00
2.07	GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE (380-110)	UND	1,00	$ 8.960.054	$ 8.960.054,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.960.054,00	1,00	$ 8.960.054,00	0,00	$ -
2.08	CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	UND	1,00	$ 12.626.520	$ 12.626.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 12.626.520,00
3	**EQUIPO DE MEDIDA**												
3.01	EQUIPO DE MEDIDA * MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1,00	$ 5.460.000	$ 5.460.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.460.000,00
3.02	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5ª	UND	3,00	$ 456.700	$ 1.370.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.370.100,00
3.03	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1,00	$ 2.295.700	$ 2.295.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.295.700,00
3.04	ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1,00	$ 765.400	$ 765.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 765.400,00
3.05	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250ª	UND	1,00	$ 1.654.300	$ 1.654.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.654.300,00
3.06	Tomacorriente 15A, 125V doble polo a tierra certificado en tubería y accesorios EMT de 1/2", caja tipo Radweld y cable CU No. 12	UND	10,00	$ 208.050	$ 2.080.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.080.500,00
3.07	Luminaria LED 18W	UND	27,00	$ 27.850	$ 751.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 751.950,00
3.08	INTERRUPTOR DOBLE	UND	8,00	$ 17.850	$ 142.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 142.800,00
3.09	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10,00	$ 2.800	$ 28.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 28.000,00
TOTAL					**$ 112.192.732,00**		**$ -**		**$ 73.297.990,00**		**$ 51.803.700,00**		**$ 38.894.742,00**
ADMINISTRACION (A)			**17%**		**$ 19.072.764,44**		**$ -**		**$ 3.700.116,30**		**$ 8.806.629,00**		**$ 15.372.648,14**
IMPREVISTOS (I)			**2%**		**$ 2.243.854,64**		**$ -**		**$ 448.770,93**		**$ 1.036.074,00**		**$ 1.795.083,71**
UTILIDAD (U)			**3%**		**$ 3.365.781,96**		**$ -**		**$ 673.156,39**		**$ 1.554.111,00**		**$ 2.692.625,57**
IVA A LA UTILIDAD			**19%**		**$ 639.498,57**		**$ -**		**$ 127.899,71**		**$ 11.396.814,00**		**$ 511.598,86**
TRAMITES ANTE EL OR (Derechos de Conexión, Matrícula Y D.N.A.)					**$ 14.731.575,39**		**$ -**						**$ 14.731.575,39**
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP (Según Factura - incluye impuestos y deducciones)					**$ 4.250.000,00**		**$ -**						**$ 4.250.000,00**
VALORES TOTALES DEL CONTRATO					**$ 156.496.207**		**$ -**		**$ 78.247.933**		**$ 63.200.514**		**$ 78.248.274**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 156.496.207**
VALOR ACUMULADO	$ -	
VALOR ACTA Nº 1	**$ 78.247.933**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 78.248.274**	
SUMAS IGUALES	**$ 156.496.207**	**$ 156.496.207**

Vo.Bo. CONTRATISTA		**Vo.Bo. INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO**					
		SUPERVISOR DEL CONTRATO		**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION**		**PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION**	
NOMBRE	DC PROJECT SAS	**NOMBRE**	MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO	**NOMBRE**	JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA	**NOMBRE**	JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS
FIRMA		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	

PROJECT S.A.S
Ingeniería a su Servicio

NIT 901.410.401-8

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA:

Que el ingeniero **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**, identificado con C.C 1.061.686.538, en calidad de representante legal, de la empresa DC PROJECT S.A.S. con NIT No. 901.410.401-8 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el ARTÍCULO 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 y el ARTÍCULO 23 de la LEY 1150 de 2007.

Dado en Mocoa, Putumayo a (24) días del mes de Agosto de 2023

ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY
Contador Público Titulado
T.P 167769-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



167769-T

ROBINSON FERNANDO
VEGA MAVISOY
C.C. 18130095
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD CESMAG

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 174914

95219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B4E17273ACDF310F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18130095 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 167769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B4E17273ACDF31DF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBINSON FERNANDO VEGA MAVISOY** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 18130095 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 167769-T SI tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Julio de 2023 con vigencia de 13. Meses. contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certif cado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO MIRADOR DE LA COLINA	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	110854104	9455028918	E	2023/09/04	2023/08/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$2,547,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: POSITIVA (4 Afiliados)						$4,693,334	$751,000			$4,693,334	$586,700			$4,693,334	$187,800			$4,693,334	$326,800		$4,693,334	$234,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)						$4,693,334	$751,000			$4,693,334	$586,700			$4,693,334	$187,800			$4,693,334	$326,800		$4,693,334	$234,800
1	CC	18124275	CHAMORRO NARVAEZ GERMAN SIGIFREDO	25-14	22	$1,100,000	$176,000	ESSC18	22	$1,100,000	$137,500	CCF63	22	$1,100,000	$44,000	14-23	22	$1,100,000	$76,600	22	$1,100,000	$55,000
2	CC	1124862071	PALOMEQUE PALMA JHORDAN WILSON	25-14	22	$1,100,000	$176,000	EPS037	22	$1,100,000	$137,500	CCF63	22	$1,100,000	$44,000	14-23	22	$1,100,000	$76,600	22	$1,100,000	$55,000
3	CC	1123324852	PANTOJA CADENA RUTH ESTELA	25-14	22	$1,393,334	$223,000	EPS037	22	$1,393,334	$174,200	CCF63	22	$1,393,334	$55,800	14-23	22	$1,393,334	$97,000	22	$1,393,334	$69,800
4	CC	17653275	VARGAS GALVIS AVELINO	230301	22	$1,100,000	$176,000	EPS037	22	$1,100,000	$137,500	CCF63	22	$1,100,000	$44,000	14-23	22	$1,100,000	$76,600	22	$1,100,000	$55,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$137,500			$1,100,000	$44,000			$1,100,000	$47,900		$1,100,000	$55,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$137,500			$1,100,000	$44,000			$1,100,000	$47,900		$1,100,000	$55,000
5	CC	1124861171	PAZMIÑO GOMEZ CARLOS GERMAN	25-14	22	$1,100,000	$176,000	EPS037	22	$1,100,000	$137,500	CCF63	22	$1,100,000	$44,000	14-23	22	$1,100,000	$47,900	22	$1,100,000	$55,000
Total Afiliados(5)						$5,793,334	$927,000			$5,793,334	$724,200			$5,793,334	$231,800			$5,793,334	$374,700		$5,793,334	$289,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410401	8	DC PROJECT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO MIRADOR DE LA COLINA	MOCOA-PUTUMAYO	4200600	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	110854104	9455028918	E	2023/09/04	2023/08/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$2,547,500

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$927,000	$0		$927,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$751,000	$0		$751,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$176,000	$0		$176,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$374,700	$0		$374,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$374,700	$0		$374,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$231,800	$0		$231,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$231,800	$0		$231,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$724,200	$0		$724,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$137,500	$0		$137,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$586,700	$0		$586,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$173,900	$0		$173,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$173,900	$0		$173,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$115,900	$0		$115,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$115,900	$0		$115,900

2023/08/23 02:49 PM

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14938859936

(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DC PROJECT S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CARR 29 10 16 BRR CONDOMINIO NORTE

42. Correo electrónico dcprojectsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 7 7 3 4 1 9	3 1 9 2 2 2 4 8 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 1	2 0 2 0 0 9 0 9	4 6 6 3	2 0 2 0 0 9 0 9		4 2 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 14 : 47: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTANA ANACONA ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-08-2023 02:47:55PM

Formulario del Registro Único Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938859936

(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 9 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 9 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 7 7 2 4 0	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	4 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 9 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 1 0 2 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938859936

(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 0 0 9 1 0	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 6 8 6 5 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTANA	ANACONA	ALEJANDRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938859936

(415)7707212489984(8020) 000001493885993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 0 4 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 7 3 5 3 5 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALAS	GOMEZ	ALICIA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 9 1 0	2 0 2 1 0 2 0 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DC PROJECT S.A.S. DC PROJECT S.A.S.**, identificado(a) con NIT número **901.410.401-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0598427789** aperturada el **22 de septiembre del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **18 de septiembre del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0598427789**
Cuenta de 16 dígitos:**0598000200427789**
Cuenta de 20 dígitos:**00130598000200427789**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
