INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 001.
PARA TRÁMITE DE ACTA DE COBRO

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.4316863 (Número interno 697)**	06 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR G.M. SANTANDER R.L **ANTONY WONG LORDUY**	
Nit o C.C. No.	**NIT** 901.670.456-7	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES - CORREDOR - BARICHARA - ZAPATOCA.	

VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS **($143.941.663.113,00 COP)**	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS **($143.941.663.113,00 COP)**	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	0,06%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,06%	
PLAZO INICIAL:	(84) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses	
PLAZO TOTAL:	Días, meses	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057-2022	CONTRATO INVIAS 1057-2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAS CONXION AC R.L **CARLOS ALBERTO RAMÍREZ QUINTERO**	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT** 901.577.958-5	
SUPERVISOR:	**PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARÍA**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	**Acto Administrativo del 08 de febrero del 2023.**	

FECHA DE INICIACIÓN:	**27 de febrero de 2023**

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	**26 de febrero de 2030**

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 84.639.189,64)**

Periodo de Pago:	**Desde:**	27/02/2023	**Hasta:**	**31/05/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES – CORREDOR – BARICHARA – ZAPATOCA
No. SSEPI	**20220680000061**
No. BPIN	**2022004680069**
Valor total del Proyecto	$ 147.936.000.000
Alcance	CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES – CORREDOR – BARICHARA – ZAPATOCA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.4316863 (Número interno 697) del 06 DE FEBRERO DE 2023.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.4316863 (Número interno 697)**	06 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR G.M. SANTANDER R.L ANTONY WONG LORDUY	
Nit o C.C. No.	**NIT** 901.670.456-7	
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES - CORREDOR - BARICHARA - ZAPATOCA.**	

VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS ($143.941.663.113,00 COP)
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS ($143.941.663.113,00 COP)
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00

ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	0,06%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,06%	
PLAZO INICIAL:	(84) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses	
PLAZO TOTAL:	(84) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057-2022	CONTRATO INVIAS 1057-2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAS CONXION AC R.L **CARLOS ALBERTO RAMÍREZ QUINTERO** CONTRATO INVIAS 1057-2022	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT** 901.577.958-5	
SUPERVISOR:	Paola Andrea Aguilera Santamaría	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	**Acto Administrativo del 08 de febrero del 2023.**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 de febrero de 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**	Secretaria de XXXXX
FECHA DE TERMINACIÓN:	**26 de febrero de 2030**	DD/MMM/AAAA

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	24/02/2023	Se firmo el acta de aprobación de pólizas.
INICIO	27/02/2023	Se da inicio a las actividades de obra e interventoría.
MODIFICACION 1	N/A	N/A
PARCIAL 1	31/05/2023	Se firma el acta parcial N°1 de pago.
SUSPENSION 1		
REINICIACION 1		
ADICIONAL		
PRÓRROGA		
RECIBO FINAL		
LIQUIDACION		

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Relación en orden cronológico de las actas de modificación de cantidades y precios no previstos y/o adicionales.

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
N/A	N/A
N/A	

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

- ✓ Desmonte y limpieza de zonas no boscosas desde el K48+200 hasta el K52+070

CANTIDAD CONTRACTUAL (Ha)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (Ha)	CANT EJECUTADA (Ha)	CANT ACUMULADA (Ha)
16.74		2.902	2.902

- ✓ Demolición estructuras existentes: Se realiza demolición de box culvert existentes en los K50+790, K50+536 y K51+284.

CANTIDAD CONTRACTUAL (M3)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (M3)	CANT EJECUTADA (M3)	CANT ACUMULADA (M3)
2,105.00		25.25	25.25

- ✓ Excavaciones varias sin clasificar: Excavaciones para alcantarilla ubicada en el K+ 50+790, box culvert ubicado en el K50+536 y K50+284 y muro ubicado en el K51+160 y K21+200.

CANTIDAD CONTRACTUAL (M3)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (M3)	CANT EJECUTADA (M3)	CANT ACUMULADA (M3)
2,105.00		25.25	25.25

- ✓ Concreta resistencia 14 MPA (F): Instalación de concreto para solado de box culvert ubicada en el K50+536 y K51+284.

CANTIDAD CONTRACTUAL (M3)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (M3)	CANT EJECUTADA (M3)	CANT ACUMULADA (M3)
1,906.70		2.21	2.21

- ✓ Concreta resistencia 21 MPA (D): instalación de concreto para atraque de alcantarilla ubicada en el K50+790.

CANTIDAD CONTRACTUAL (M3)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (M3)	CANT EJECUTADA (M3)	CANT ACUMULADA (M3)

3,722.20		7.85	7.85

- ✓ Acero de refuerzo Fy 420 MPa: Se inicia armado de acero de refuerzo para parrilla de refuerzo atraque alcantarilla ubicada en el K50+790, box culvert ubicados en el K50+536 y K51+284.

CANTIDAD CONTRACTUAL (KG)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (KG)	CANT EJECUTADA (KG)	CANT ACUMULADA (KG)
3,722.20		7.85	7.85

- ✓ Concreta resistencia 28 MPA (D): instalación de concreto para loza de piso y muros de box culvert ubicado en el K50+536 y K51+824.

CANTIDAD CONTRACTUAL (M3)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (M3)	CANT EJECUTADA (M3)	CANT ACUMULADA (M3)
3,491.90		28.44	28.44

- ✓ Relleno para estructuras: Relleno en material seleccionado para alcantarilla ubicada en el K50+790.

CANTIDAD CONTRACTUAL (M3)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (M3)	CANT EJECUTADA (M3)	CANT ACUMULADA (M3)
6,649.00		21.62	21.62

- ✓ Tubería de Concreto Reforzado 21 MPA de 900 MM de Diámetro Interior: Instalación de tubería para alcantarilla, ubicada en la K50+790.

CANTIDAD CONTRACTUAL (ML)	CANTIDAD AJUSTADA MAY Y MEN (ML)	CANT EJECUTADA (ML)	CANT ACUMULADA (ML)
1,300.00		9.00	9.00

Las actividades realizadas en el presente periodo fueron:

ANEXO AL ACTA Nº 01 DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR. 4316863
(ACTA DE RECIBO PARCIAL: 27 FEB 2023 - 31 MAY 2023 ACTA DE RECIBO FINAL _____)


GOBERNACION DE SANTANDER	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 4316863
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES – CORREDOR – BARICHARA- ZAPATOCA
	VALOR: $ 143.941.663.113,00 PORCENTAJE DE EJECUCION: 0,06%


ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. Nº XX)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	MESES	PRECIO UNITARIO	DEDICACION	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES – CORREDOR – BARICHARA- ZAPATOCA																
CAPITULO I - PRELIMINARES									$ 401,975,720.00					$ 8,815,863.0		$ 8,815,863.02
200.2	200-13	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSA	Ha	16.74	NA	$ 1,478,698.00	NA	NA	$ 24,753,405.00				2.902	$ 4,291,883.28	2.90	$ 4,291,883.28
201.7	201-13	DEMOLICION	M3	2,105.00	NA	$ 179,203.00	NA	NA	$ 377,222,315.00				25.25	$ 4,523,979.74	25.25	$ 4,523,979.74
CAPITULO II - EXPLANACION									$ 30,823,559,015.00					$ 0.0		$ -
210.1.1	210-13	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	598,976.66	NA	$ 24,743.00	NA	NA	$ 14,820,479,498.00				0.00	$ -	0.00	$ -
220.1	220-13	TERRAPLENES	M3	296,498.83	NA	$ 14,241.00	NA	NA	$ 4,222,439,838.00				0.00	$ -	0.00	$ -
230.1	230-13	MEJORAMIENTO DE A SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	275,000.00	NA	$ 2,991.00	NA	NA	$ 822,525,000.00				0.00	$ -	0.00	$ -
231.1	231-13	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA GRANULARES	M3	567,600.00	NA	$ 10,502.00	NA	NA	$ 5,960,935,200.00				0.00	$ -	0.00	$ -
236.1	236-13	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE CAL	M3	44,827.00	NA	$ 111,477.00	NA	NA	$ 4,997,179,479.00				0.00	$ -	0.00	$ -
CAPITULO III - SUB SASES Y BASES									$ 51,677,090,400.00					$ 0.0		$ -
320.2	320-13	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	116,100.00	NA	$ 212,692.00	NA	NA	$ 24,693,541,200.00				0.00	$ -	0.00	$ -
330.2	330-13	BASE GRANULAR	M3	109,650.00	NA	$ 246,088.00	NA	NA	$ 26,983,549,200.00				0.00	$ -	0.00	$ -
CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFALTICOS									$ 29,093,949,042.00					$ 0.0		$ -
421.2	421-13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFASTICA CRR-2	M2	412,800.00	NA	$ 1,728.00	NA	NA	$ 713,318,400.00				0.00	0	0.00	$ -
	450-13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	28,327.46	NA	$ 1,001,877.00	NA	NA	$ 28,380,630,642.00				0.00	0	0.00	$ -
CAPITULO V - MUROS DE CONTENCION									$ 9,169,250,447.00					$ 2,033,904.6		$ 2,033,904.60
600.1.1	600-13	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	17,550.60	NA	$ 28,973.00	NA	NA	$ 508,493,534.00				70.20	$ 2,033,904.60	70.20	$ 2,033,904.60
	221.1P	MEJORAMIENTO MATERIAL GRANULAR (PEDRAPLEN)	M3	1,277.00	NA	$ 20,500.00	NA	NA	$ 26,178,500.00				0.00	$ -	0.00	$ -
630.6	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)	M3	323.40	NA	$ 471,783.00	NA	NA	$ 152,574,622.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	674-13	DRENES TUBERIA PERFORADA 3" L=0,50 M (und)	UND	1,416.00	NA	$ 137,317.00	NA	NA	$ 194,440,872.00				0.00	$ -	0.00	$ -
640.1	640-13	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm (kg)	KG	286,070.00	NA	$ 7,994.00	NA	NA	$ 2,286,843,580.00				0.00	$ -	0.00	$ -
630.4	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA ©	M3	4,377.00	NA	$ 1,063,072.00	NA	NA	$ 4,653,066,144.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	673.1P	GEODREN PLANAR	M2	4,794.00	NA	$ 21,348.00	NA	NA	$ 102,342,312.00				0.00	$ -	0.00	$ -
610.1	610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	13,724.40	NA	$ 90,737.00	NA	NA	$ 1,245,310,883.00				0.00	$ -	0.00	$ -
CAPITULO VI - PUENTE QUEBRADA BARICHADA K7-090 L=35 m									$ 1,596,355,292.00					$ 0.0		$ -
600.1.1	600-13	EXCAVACIONES VARIAS SIN CALSIFICAR	M3	138.60	NA	$ 28,973.00	NA	NA	$ 4,015,658.00				0.00	$ -	0.00	$ -
630.6	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	5.00	NA	$ 471,783.00	NA	NA	$ 2,358,915.00				0.00	$ -	0.00	$ -
630.4.1	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3	326.90	NA	$ 802,396.00	NA	NA	$ 262,303,252.00				0.00	$ -	0.00	$ -
630.1	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 35 MPA (A)	M3	106.40	NA	$ 1,150,297.00	NA	NA	$ 122,391,601.00				0.00	$ -	0.00	$ -
641.1	641-13	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	79,838.00	NA	$ 1,961.00	NA	NA	$ 156,562,318.00				0.00	$ -	0.00	$ -
640.1	640-13	ACERO DE REFUERZO, Fy 4200 Mpa	KG	86,602.00	NA	$ 7,994.00	NA	NA	$ 692,296,388.00				0.00	$ -	0.00	$ -
621.1	621-13	PILOTES ø 1,5 m (No Incluye Refuerzo)	ML	120.00	NA	$ 2,658,475.00	NA	NA	$ 319,017,000.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	642.1P1	NEOPRENOS D-60 50*50*7 cm	UND	8.00	NA	$ 692,995.00	NA	NA	$ 5,543,960.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	642.1P2	NEOPRENOS D-50 30*30*2 cm	UND	4.00	NA	$ 368,352.00	NA	NA	$ 1,473,408.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	PARTICULAR	BARRERA VEHICULAR METALICA MIXTA	ML	70.00	NA	$ 273,419.00	NA	NA	$ 19,139,330.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	PARTICULAR	JUNTA DE DILATACION	ML	18.00	NA	$ 526,691.00	NA	NA	$ 9,480,438.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	PARTICULAR	DRENES PVC ø 3" L=2,20 m	UND	11.00	NA	$ 161,184.00	NA	NA	$ 1,773,024.00				0.00	$ -	0.00	$ -
CAPITULO VII - OBRAS HIDRAULICAS (CUNETAS, ALCANTARILLA, BOX CULVERT, PONTONES)									$ 18,306,124,599.00					$ 73,789,422.03		$ 73,789,422.03
600.1.1	600-13	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	24,347.40	NA	$ 28,973.00	NA	NA	$ 705,417,220.00				138.56	$ 4,014,498.88	138.56	$ 4,014,498.88
630.6	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa	M3	1,906.70	NA	$ 471,783.00	NA	NA	$ 899,548,646.00				2.21	$ 1,040,281.52	2.21	$ 1,040,281.52
630.4.1	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa	M3	3,722.20	NA	$ 802,396.00	NA	NA	$ 2,986,678,391.00				7.85	$ 6,296,575.53	7.85	$ 6,296,575.53
640.1	640-13	ACERO DE REFUERZO, Fy 4200 Mpa	KG	781,327.00	NA	$ 7,994.00	NA	NA	$ 6,245,928,038.00				3186.00	$ 25,468,884.00	3186.00	$ 25,468,884.00
630.4	630-13	CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	M3	3,491.90	NA	$ 1,063,072.00	NA	NA	$ 3,712,141,117.00				28.44	$ 30,233,767.68	28.44	$ 30,233,767.68
	673.1P	GEODREN PLANAR	M2	716.40	NA	$ 21,348.00	NA	NA	$ 15,293,707.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	642.1P1	NEOPRENOS D-60 50*50*7 cm	UND	16.00	NA	$ 692,995.00	NA	NA	$ 11,087,920.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	642.1P2	NEOPRENOS D-50 30*30*2 cm	UND	8.00	NA	$ 368,352.00	NA	NA	$ 2,946,816.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	PARTICULAR	BARRERA VEHICULAR METALICA MIXTA	ML	48.00	NA	$ 273,419.00	NA	NA	$ 13,124,112.00				0.00	$ -	0.00	$ -
		JUNTA DE DILATACION	ML	36.00	NA	$ 526,691.00	NA	NA	$ 18,960,876.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	PARTICULAR	DRENES PVC ø 3" L=2,20 m	UND	16.00	NA	$ 161,184.00	NA	NA	$ 2,578,944.00				0.00	$ -	0.00	$ -
610.1	610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	6,649.00	NA	$ 90,737.00	NA	NA	$ 603,310,313.00				22	$ 1,961,481.42	21.62	$ 1,961,481.42
661.13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	1,300.00	NA	$ 530,437.00	NA	NA	$ 689,568,100.00				9.00	$ 4,773,933.00	9.00	$ 4,773,933.00
661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa DE 1100 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	36.00	NA	$ 604,295.00	NA	NA	$ 21,754,620.00				0.00	$ -	0.00	$ -
661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa DE 1200 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	24.00	NA	$ 715,691.00	NA	NA	$ 17,176,584.00				0.00	$ -	0.00	$ -
661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa DE 1400 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	12.00	NA	$ 915,540.00	NA	NA	$ 10,986,480.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	PARTICULAR	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METALICOS CON PARALES METALICOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	4,215.00	NA	$ 81,200.00	NA	NA	$ 342,258,000.00				0.00	$ -	0.00	$ -
671.3	671-13	CUNETA EN CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE CONFORMACION DE LA SUPERFICIE	M3	2,345.00	NA	$ 613,347.00	NA	NA	$ 1,438,298,715.00				0.00	$ -	0.00	$ -
673.1	673-13	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	2,300.00	NA	$ 113,740.00	NA	NA	$ 261,602,000.00				0.00	$ -	0.00	$ -
673.1.2	673-13	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	27,600.00	NA	$ 11,140.00	NA	NA	$ 307,464,000.00				0.00	$ -	0.00	$ -
CAPITULO VIII - MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO									$ 1,553,075,767.00					$ 0.0		$ -
610.1	610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	11,847.70	NA	$ 90,737.00	NA	NA	$ 1,075,024,755.00				0.00	$ -	0.00	$ -
683.1	683-10	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO____PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	M2	28,950.50	NA	$ 14,463.00	NA	NA	$ 418,711,082.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	673.1P	GEODRENA PLANAR	M2	1,560.00	NA	$ 21,348.00	NA	NA	$ 33,302,880.00				0.00	$ -	0.00	$ -
	221.1P	MEJORAMIENTO MATERIAL GRANULAR (PEDRAPLEN)	M3	1,270.10	NA	$ 20,500.00	NA	NA	$ 26,037,050.00				0.00	$ -	0.00	$ -
SEÑALIZACIÓN									$ 1,320,282,831.00					$ 0.0		$ -
700.1	700-13	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	212,000.00	NA	$ 2,751.00	NA	NA	$ 583,212,000.00				0.00	$ -	0.00	$ -
700.3	700-13	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	210.00	NA	$ 40,389.00	NA	NA	$ 8,481,690.00				0.00	$ -	0.00	$ -
701.	701-13	TACHA REFRELCTIVA	UND	15,459.00	NA	$ 9,110.00	NA	NA	$ 140,831,490.00				0.00	$ -	0.00	$ -
710.1	710-13	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75*75) cm	UND	636.00	NA	$ 705,220.00	NA	NA	$ 448,519,920.00				0.00	$ -	0.00	$ -
730.1	730-13	DEFENSAS METALICAS	ML	477.00	NA	$ 291,903.00	NA	NA	$ 139,237,731.00				0.00	$ -	0.00	$ -
TOTAL A PAGAR POR AVANCE CONTRACTUAL									$ 143,941,663,113.00					$ 84,639,189.64		$ 84,639,189.64
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS									$ -					$ -		$ -
IVA (19%)									$ -					$ -		$ -
COSTO TOTAL									$ -					$ -		$ -
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%)									$ -					$ -		$ -
MENOS ACTA PARCIAL N°1														$ -		$ -
TOTAL									$ 143,941,663,113.00					$ 84,639,189.64		$ 84,639,189.64

El acumulado a la fecha corresponde al cero punto seis (0.06 %) de ejecución.

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROGRAMACION DE OBRA**	**218.33 días**	**27/2/23**	**26/12/23**	
2		INICIO	0 días	10/4/23	10/4/23	
3		**Revision Estudios y Diseños**	60 días	27/2/23	17/5/23	
4		**CAPITUO I - PRELIMINAR**	**153.67 días**	**10/4/23**	**9/11/23**	
5		Desmonte y limpieza en zonas no boscosa	85.67 días	10/4/23	8/8/23	
6		Demolicion	133.33 días	8/5/23	9/11/23	5FC-93 días
7		**CAPITULO II - EXPLANACION**	**180 días**	**17/4/23**	**23/12/23**	
8		Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales	180 días	17/4/23	23/12/23	6FC-180 días
9		Terraplenes	170 días	18/4/23	12/12/23	28FF+2 días
10		Mejoramiento de la subrasante con adicion de material	156 días	15/5/23	20/12/23	8CC+21 días
11		Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares	156 días	15/5/23	20/12/23	8CC+21 días
12		Mejoramiento de la subrasante con adicion de cal	156 días	15/5/23	20/12/23	8CC+21 días
13		**CAPITULO III - SUB SASES Y BASES**	**142 días**	**8/6/23**	**26/12/23**	
14		Sub-base granular clase B	138 días	8/6/23	20/12/23	12CC+18 días
15		Base granular	130 días	27/6/23	26/12/23	14CC+12 días
16		**CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFALTICOS**	**62 días**	**26/7/23**	**19/10/23**	
17		Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-2	60 días	26/7/23	17/10/23	15CC+20 días
18		Mezcla densa en caliente MDC-19	60 días	28/7/23	19/10/23	17CC+2 días
19		**CAPITULO V - MUROS DE CONTENCION**	**131 días**	**24/4/23**	**24/10/23**	
20		Excavacion varias sin clasificar	120 días	24/4/23	9/10/23	8CC+6 días
21		Mejoramiento material granular (pedraplen)	120 días	26/4/23	11/10/23	20CC+2 días
22		Concreto resistencia 14 Mpa (F)	120 días	26/4/23	11/10/23	21CC
23		Drenes tuberia perforada 3" L= 0.50 M (und)	120 días	2/5/23	17/10/23	24CC+2 días
24		Acero de refuerzo 4200 kg/cm (Kg)	120 días	27/4/23	12/10/23	22CC+1 día
25		Concreto resistencia 28 Mpa ©	120 días	3/5/23	18/10/23	24CC+3 días
26		Geodren planar	120 días	25/4/23	10/10/23	20CC+1 día
27		Rellenos para estructuras	120 días	10/5/23	24/10/23	25CC+5 días
28		**CAPITULO VII - OBRAS HIDRAULICAS (CUNETAS, ALCANTARILLA, BOX CULVERT, PONTONES)**	**158.67 días**	**2/5/23**	**9/12/23**	
29		Excavaciones varias sin clasificar	132 días	15/5/23	16/11/23	8CC+12 días
30		Concreto resistencia 14 Mpa	132 días	17/5/23	18/11/23	29CC
31		Concreto resistencia 21 Mpa	132 días	25/5/23	27/11/23	32CC+3 días
32		Acero de refuerzo, fy 4200 Mpa	132 días	20/5/23	22/11/23	30CC+1 día
33		Concreto resistencia 28 Mpa	132 días	25/5/23	27/11/23	31CC
34		Geodren planar	156 días	2/5/23	5/12/23	8CC-138 días
35		Rellenos para estructuras	138 días	30/5/23	9/12/23	31CC+3 días
36		Tuberia de concreto reforzado 21 Mpa de 900mm de Diametro interior	138 días	19/5/23	29/11/23	30CC+1 día
37		Entibado tipo EC3 continuo metalicos con parales metalicos Incluye suministro e instalacion	138 días	19/5/23	29/11/23	36CC
38		Cuneta en concreto vaciada in situ; Incluye conformacion de la superficie	84 días	15/8/23	7/12/23	18CC+12 días
39		Material granualar drenante	156 días	2/5/23	5/12/23	34CC
40		**CAPITULO IX - SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION**	**30 días**	**3/11/23**	**18/12/23**	
41		Linea de demarcacion con pintura en frio	24 días	3/11/23	7/12/23	18CC+72 días
42		Marca vial con pintura en frio	24 días	15/11/23	18/12/23	41CC+6 días,45
43		Tacha reflectiva	12 días	15/11/23	30/11/23	42CC
44		Señal vertical de transito tipo I con lamina retroreflectiva tipo III (75x75)cm	12 días	3/11/23	22/11/23	41CC

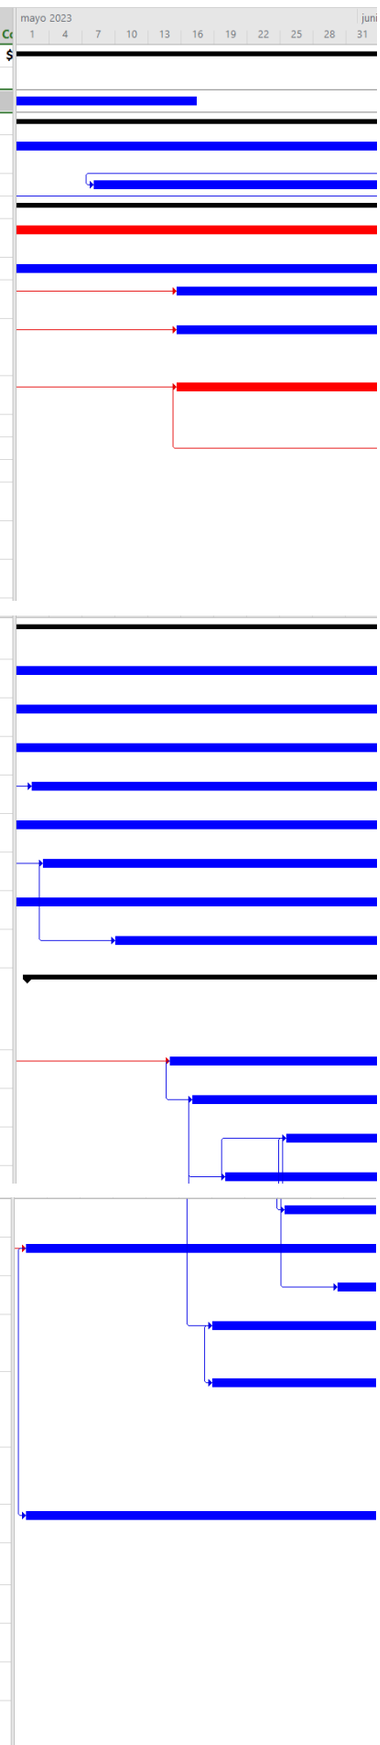

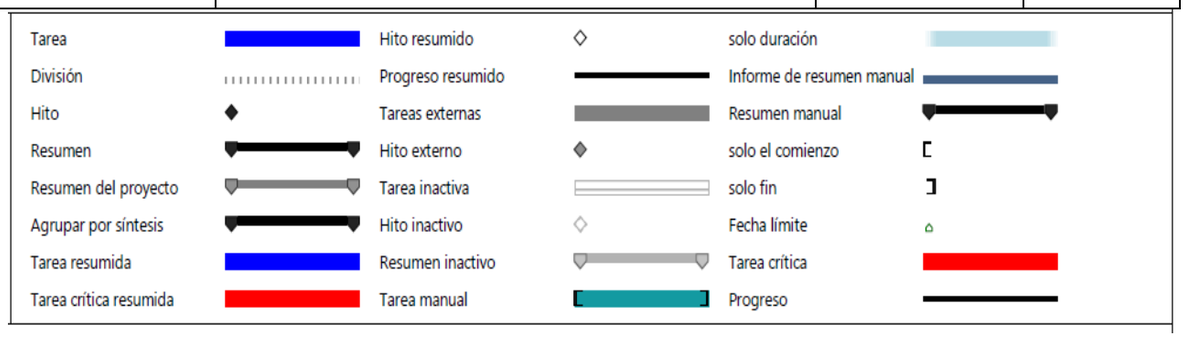

1.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

2. En este periodo de trabajo se presentaron las siguientes novedades con respecto al clima en la zona de trabajo.

FECHA	DIA	SOLEADO	LLUVIA	HORA INICIO LLUVIA	HORA FIN LLUVIA	TIEMPO TOTAL DE LLUVIA
01/05/2023	Lunes	X				
02/05/2023	Martes	X				
03/05/2023	Miércoles	X				
04/05/2023	Jueves	X				
05/05/2023	Viernes	X				
06/05/2023	Sábado	X				
07/05/2023	Domingo	X				
08/05/2023	Lunes	X				
09/05/2023	Martes	X				
10/05/2023	Miércoles	X				
11/05/2023	Jueves		X	5:00 AM	8:00 AM	3
12/05/2023	Viernes	X				
13/05/2023	Sábado	X				
14/05/2023	Domingo		X	6:00 AM	8:00 AM	2
15/05/2023	Lunes	X				
16/05/2023	Martes	X				
17/05/2023	Miércoles	X				
18/05/2023	Jueves	X				
19/05/2023	Viernes	X				
20/05/2023	Sábado	X				
21/05/2023	Domingo		X	6:00 AM	10:00 AM	4
22/05/2023	Lunes	X				
23/05/2023	Martes	X				
24/05/2023	Miércoles	X				
25/05/2023	Jueves		X	4:00 AM	6:00 AM	0
26/05/2023	Viernes	X				
27/05/2023	Sábado	X				

28/05/2023	Domingo		X	4:00 AM	7:00 AM	
29/05/2023	Lunes	X				
30/05/2023	Martes	X				
31/05/2023	Miércoles	X				

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra	Ver Anexos en el informe.
Seguimiento a la programación	Ver Anexos en el informe.
Trámite de permisos	Ver Anexos en el informe.
Mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad	Ver Anexos en el informe.
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	Ver Anexos en el informe.
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Ver Anexos en el informe.
Actualización de las pólizas del contrato	Ver Anexos en el informe.

NOTA 8: Inserte las filas necesarias de acuerdo con las obligaciones contractuales.

- Se hace la respectiva entrega de los informes correspondientes a seguridad y salud en el trabajo, informe ambiental e informe social del proyecto.
- Se procede con el registro de las actividades diarias de obra, para esto se lleva a cabo el libro bitácora, el cual es completado en conjunto por el ingeniero residente del proyecto y el ingeniero residente de interventoría
- Se continua con la gestión de los materiales para el proyecto, donde se hace la respectiva negociación de las mezclas asfálticas, triturado y arena para los concretos que se usaran en el proyecto.
- Se gestiona la disposición del material de excavación del proyecto, punto autorizado y certificado.
- Se continúa dando el adecuado manejo de tránsito del proyecto donde se hace el respectivo análisis de las condiciones actuales y se procede a ejecutar de la mejor manera.

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	100%	JOAQUIEN ARDIILA	91.040.694	27/02/2023	N.A
RESIDENTE DE OBRA	100%	FRANCISCO LEON	1.064.794.223	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA EN VIAS	60%	ALEJANDRO DULCEY	91.527.305	27/02/2023	N.A

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	70%	FERNANDO VARGAS	17.975.755	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA GEOTECNIA	60%	JAVIER CABALLERO ESTEBAN	91.509.767	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA HIDRAULICO	60%	RODOLFO AMARA	79.795.094	27/02/2023	N.A
PROFESIONAL HSEQ	100%	ELIANA MARCEA	63.454.189	27/02/2023	N.A

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

MARZO 2023:

República de Colombia / Gobernación de Santander	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	CODIGO	AP-CCP-RG-74
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	2/05/2023
		PAGINA	1 DE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR GM SANTANDER
NIT: 901670456-7
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1057 ( ) **FECHA** DE 2022
OBJETO: LOTE No 1 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES- CORREDOR- BARICHARA- ZAPATOCA
PERIODO FACTURADO: MARZO

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
JOAQUÍN ARDILA GÓMEZ	91040694	Director	Directa	16.000.000	100%	6/03/2023		25	marzo	13.333.334	9449283875	13.333.334	1.666.700	2.266.800	928.100	4.861.600
DEISY TATIANA BAEZ GÓMEZ	1102386917	Contadora	Directa	2.262.665	100%	27/03/2023		4	marzo	301.689	9449283875	301.689	12.100	48.300	21.000	81.400
NELSON ENRIQUE DAZA CALDERÓN	1100890071	Cadenero 1	Directa	1.600.000	100%	21/03/2023		10	marzo	533.334	9449283875	533.334	21.400	85.400	37.200	144.000
JUAN DAVID MARTÍNEZ PRADA	1102375655	Topógrafo	Directa	2.800.000	100%	15/03/2023		16	marzo	1.493.334	9449283875	1.493.334	59.800	239.000	104.000	402.800
BLENDY MAYERLY PEÑA ABELLO	1098618895	Auxiliar contable	Directa	1.438.439	100%	16/03/2023		15	marzo	719.220	9449283875	719.220	28.800	115.100	50.100	194.000
HUEYMER ESTERLÍN REYES CALDE	1102550258	Ayudante de obra	Directa	1.160.000	100%	30/03/2023		1	marzo	38.667	9449283875	38.667	1.600	6.200	2.700	10.500
DIANA PATRICIA RUEDA	1102363190	Secretaria	Directa	1.250.000	100%	21/03/2023		10	marzo	416.667	9449283875	416.667	16.700	66.700	29.100	112.500

ABRIL 2023:

AMYO

República de Colombia Gobernación de Santander	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	CODIGO	AP-CCP-RG-74
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	2/05/2023
		PAGINA	1 DE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR GM SANTANDER
NIT: 901670456-7
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1057 ( ) **FECHA** **DE** 2022
OBJETO: LOTE No 1 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES- CORREDOR- BARICHARA- ZAPATOCA
PERIODO FACTURADO: ABRIL

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
JOAQUÍN ARDILA GÓMEZ	91040694	Director	Directa	16.000.000	100%	6/03/2023		30	abril	16.000.000	9450659223	16.000.000	2.000.000	2.720.000	1.113.600	5.833.600
DEISY TATIANA BAEZ GÓMEZ	1102386917	Contadora	Directa	2.262.665	100%	27/03/2023		30	abril	2.262.665	9450659223	2.262.665	90.600	362.100	157.500	610.200
DANIELA FERNANDA BAUTISTA VAL	1095828841	Profesional social	Directa	2.000.000	100%	14/04/2023		17	abril	1.133.334	9450659223	1.133.334	45.400	181.400	78.900	305.700
CARLOS ANDRES CABALLERO CAS	1095838755	Operador de vibro	Directa	1.600.000	100%	1/04/2023		30	abril	1.700.000	9450659223	1.700.000	68.000	272.000	118.400	458.400
NELSON ENRIQUE DAZA CALDERÓN	1100890071	Cadenero 1	Directa	1.600.000	100%	14/03/1900		30	abril	1.600.000	9450659223	1.600.000	64.000	256.000	111.400	431.400
LUIS FRANCISCO LEON AROCO	1064794223	Residente de obra	Directa	3.500.000	100%	1/04/2023		30	abril	3.500.000	9450659223	3.500.000	140.000	560.000	243.600	943.600
JUAN DAVID MARTINEZ PRADA	1102375655	Topógrafo	Directa	2.800.000	100%	15/03/2023		30	abril	2.800.000	9450659223	2.800.000	112.000	448.000	194.900	754.900
JOSE DE JESUS MAYORGA VASQUE	91043332	Oficios Varios	Directa	1.160.000	100%	21/04/2023		10	abril	386.667	9450659223	386.667	15.500	61.900	27.000	104.400
BLENDY MAYERLY PEÑA ABELLO	1098618895	Auxiliar contable	Directa	1.438.439	100%	16/03/2023	30/04/2023	30	abril	1.429.159	9450659223	1.429.159	57.300	228.700	96.800	382.800
HUEYMER ESTERLIN REYES CALDE	1102550258	Ayudante de obra	Directa	1.160.000	100%	30/03/2023		30	abril	1.160.000	9450659223	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
DIANA PATRICIA RUEDA	1102363190	Secretaria	Directa	1.250.000	100%	21/03/2023		30	abril	1.250.000	9450659223	1.250.000	50.000	200.000	87.000	337.000
Zaida Isadora Torres Vera	63507533	Residente SST	Directa	2.300.000	100%	14/04/2023		17	abril	1.303.334	9450659223	1.303.334	52.200	208.600	90.800	351.600

MAYO 2023:

República de Colombia Gobernación de Santander	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	CODIGO	AP-CCP-RG-74
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	2/05/2023
		PAGINA	1 DE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR GM SANTANDER
NIT: 901670456-7
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1057 ( ) **FECHA** **DE** 2022
OBJETO: LOTE No 1 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES- CORREDOR- BARICHARA- ZAPATOCA
PERIODO FACTURADO: MAYO

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
JOAQUÍN ARDILA GÓMEZ	91040694	Director	Directa	16.000.000	100%	6/03/2023		30	mayo	16.000.000	9452055230	16.000.000	2.000.000	2.720.000	1.113.600	5.833.600
JULIETH ANDREA BADILLO GRISALE	1098815238	Auxiliar contable	Directa	1.369.940	100%	4/05/2023		27	mayo	1.232.946	9452055230	1.232.946	49.400	197.300	85.900	332.600
DEISY TATIANA BAEZ GÓMEZ	1102386917	Contadora	Directa	2.262.665	100%	27/03/2023		30	mayo	2.262.665	9452055230	2.262.665	90.600	362.100	157.500	610.200
DANIELA FERNANDA BAUTISTA VAL	1095828841	Profesional social	Directa	2.000.000	100%	14/04/2023		17	mayo	2.000.000	9452055230	2.000.000	80.000	320.000	139.200	539.200
CARLOS ANDRES CABALLERO CAS	1095838755	Operador de vibro	Directa	1.600.000	100%	1/04/2023		30	mayo	1.600.000	9452055230	1.600.000	64.000	256.000	111.400	431.400
NELSON ENRIQUE DAZA CALDERÓN	1100890071	Cadenero 1	Directa	1.600.000	100%	14/03/1900		30	mayo	1.600.000	9452055230	1.600.000	64.000	256.000	111.400	431.400
GUILLERMO DIAZ OLAVE	13516463	Conductor	Directa	1.160.000	100%	2/05/2023		29	mayo	1.121.334	9452055230	1.121.334	44.900	179.500	78.100	302.500
LIZETH YOANNA GUERRERO CALDE	1102550161	Controlador vial	Directa	1.160.000	100%	11/05/2023		20	mayo	773.334	9452055230	773.334	31.000	123.800	53.900	208.700
REINALDO LEAL GARZON	6597615	Operador de excav	Directa	1.800.000	100%	3/05/2023		28	mayo	1.680.000	9452055230	1.680.000	67.200	268.800	117.000	453.000
LUIS FRANCISCO LEON AROCO	1064794223	Residente de obra	Directa	3.500.000	100%	1/04/2023		30	mayo	3.500.000	9452055230	3.500.000	140.000	560.000	243.600	943.600
CARLOS ARTURO LOPEZ	1102548357	Oficios Varios	Directa	1.160.000	100%	15/05/2023		16	mayo	618.667	9452055230	618.667	24.800	99.000	43.100	166.900
ANDRES FELIPE MARTINEZ ORTIZ	1102549336	Oficios Varios	Directa	1.160.000	100%	15/05/2023		16	mayo	618.667	9452055230	618.667	24.800	99.000	43.100	166.900
JUAN DAVID MARTINEZ PRADA	1102375655	Topógrafo	Directa	2.800.000	100%	15/03/2023		30	mayo	2.800.000	9452055230	2.800.000	112.000	448.000	194.400	754.400
SERGIO ANDRES MARTINEZ GARCI	1102359486	Operador de retro	Directa	1.700.000	100%	25/05/2023		6	mayo	340.000	9452055230	340.000	13.600	54.400	23.700	91.700
JOSE DE JESUS MAYORGA VASQUE	91043332	Oficios Varios	Directa	1.160.000	100%	21/04/2023		10	mayo	1.160.000	9452055230	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
HUEYMER ESTERLIN REYES CALDE	1102550258	Ayudante de obra	Directa	1.160.000	100%	30/03/2023	6/05/2023	6	mayo	232.000	9452055230	232.000	9.300	37.200	16.200	62.700
DIANA PATRICIA RUEDA	1102363190	Secretaria	Directa	1.250.000	100%	21/03/2023		30	mayo	1.250.000	9452055230	1.250.000	50.000	200.000	87.000	337.000
KAROLINE DAYANA RUEDA VILLAN	1102550209	Servicios Generale	Directa	580.000	50%	15/05/2023		16	mayo	618.667	9452055230	618.667	24.800	99.000	43.100	166.900
OSCAR RODOLFO RUEDA RUEDA	13515664	Conductor doblete	Directa	1.160.000	100%	18/05/2023		13	mayo	522.267	9452055230	522.267	20.900	83.600	36.400	140.900
DARIO ANDRES SOLANO SUAREZ	1101979280	Oficios Varios	Directa	1.160.000	100%	15/05/2023		16	mayo	618.667	9452055230	618.667	24.800	99.000	43.100	166.900
CAMILA ANDREA TORRES ARENAS	1102550449	Controlador vial	Directa	1.160.000	100%	11/05/2023		20	mayo	773.334	9452055230	773.334	31.000	123.800	53.900	208.700
ZAIDA ISADORA TORRES VERA	63507533	Residente SST	Directa	2.300.000	100%	14/04/2023		30	mayo	2.300.000	9452055230	2.300.000	92.000	368.000	160.100	620.100

PERSONAL DE PLIEGOS:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	100%	JOAQUIN ARDIILA	91.040.694	27/02/2023	N.A
RESIDENTE DE OBRA	100%	FRANCISCO LEON	1.064.794.223	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA EN VIAS	60%	ALEJANDRO DULCEY	91.527.305	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	70%	FERNANDO VARGAS	17.975.755	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA GEOTECNIA	60%	JAVIER CABALLERO ESTEBAN	91.509.767	27/02/2023	N.A
ESPECIALISTA HIDRAULICO	60%	RODOLFO AMARA	79.795.094	27/02/2023	N.A
PROFESIONAL HSEQ	100%	ELIANA MARCEA	63.454.189	27/02/2023	N.A

NOTA 10: La información que se tramita en los cuadros es a nivel general ya que las planillas especifican el número de personas, cantidad de personas, etc.

NOTA 11: La información se realiza por meses, si el periodo de ejecución varios meses, el reporte se hace copiando el cuadro anterior las veces que sea necesario.

NOTA 12: Se debe tener en cuenta que el periodo de ejecución debe corresponde con el periodo de PENSIÓN.

NOTA 13: Se debe presentar por separado la relación de los pagos de seguridad social del personal mínimo requerido aprobado, indicando el nombre, cargo y periodo de pago.

NOTA 14: Se deben presentar las planillas del personal de obra del contratista.

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: Nacional de Seguros

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 400046601 anexo 01 Y 02			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 10/05/23			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$14.394.166.311.30	06/02/2023	31/12/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$28.788.332.622.60	06/02/2023	31/12/2030
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$45.514.353.876.33	31/12/2027	31/12/2032
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 7.197.083.155,00	06/02/2023	31/12/2027

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

A continuación, se relacionan los municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor:

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
ZAPATOCA	RETEICA	2,5%	

NOTA 15: Relacione si aplica el Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio.

NOTA 16: Para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio debe distribuir el valor de acuerdo a los porcentajes, a la normatividad y a las tarifas vigentes.

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de acta de recibo 001	Anexo No, 001 Relacione la Evidencia

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	($143.941.663.113,00 COP)
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	($143.941.663.113,00 COP)
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0,06%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
23000802	14/02/2023	$9.530.000.000.00	23001947	15/02/2023	$5.535.663.113.00	$0,00	$00.000.00
23000803	14/02/2023	$8.100.000.000.00	23001948	15/02/2023	$8.100.000.000.00	$0,00	$00.000.00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	NO APLICA
PARCIAL N° 02	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	$00.000.00
PARCIAL N° 02	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	$00.000.00
PARCIAL N° 02	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	$00.000.00
PRESENTE ACTA	**31/05/2023**	**$ 84.639.189,64**	$00.000.00
TOTAL		**$ 84.639.189,64**	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	$00.000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	$00.000.00
REINTEGROS:	Indicar valor, concepto y fecha.
FIDUCIARIA:	XXXXX
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	XXXXX
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	Correo electrónico y teléfono de la persona encargada.
OBSERVACIONES: Indique las conclusiones del análisis del programa de inversión del contrato de obra, balance del contrato, flujo de caja.	

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
➢ Revisión de las observaciones realizadas mediante oficio INV-VIAS conexión AC-100-2023. ➢ Revisión de los objetivos y metodología del PAGA. ➢ Revisión del índice de modificaciones – revisiones y aprobaciones. ➢ Revisión y ajuste del marco legal y metodología. ➢ Revisión de la descripción del proyecto. ➢ Revisión del capítulo de la definición del área de influencia y la línea base. ➢ Revisión cartográfica del área de influencia. ➢ Revisión del capítulo de demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. ➢ Revisión de las fichas de manejo ambiental y sus indicadores. ➢ Se realizó visita para la verificación del estado fitosanitario de la ceiba ubicada en el punto de inicio para la ejecución de las obras en el municipio de Zapatoca. ➢ Se realizó una reunión con la comunidad y las asociaciones ambientalistas de la zona.	Anexos adjuntos al informe.

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
• Se cumplen con las condiciones de calidad necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, con respecto al ambiente laboral. • Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 el cual obliga a las empresas a implementar dentro de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la realización de la inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a los trabajadores dependientes, cooperadores, en misión y contratistas. • Se hace la revisión e inspección de los equipos con el fin de verificar que su estado sea el adecuado y cumplir con el buen uso de los mismos. • Se cumple con la señalización requerida en el PMT, para las actividades que se están realizando, teniendo todos los elementos en buen estado, los controladores viales cumplen con su capacitación y con los equipos necesarios para su comunicación y trabajo. • Actualmente está cumpliendo con el plan de trabajo presentado	Anexos adjuntos al informe.

previamente, cumpliendo con los estándares de calidad y con los tiempos requeridos para cada actividad.	

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio de la firma PI S.A.S: Laboratorio de Ingeniería S.A.S • 10 Apiques de 0.5x0.5x0.5, INV E-101:2013 • Compactación de proctor modificado, INV E-142:2013 • Clasificación Material: Granulometría, Limites de Consistencia y Humedad Natural: Normas INV E-122:2013, INV E-123:2013, INV E-125:2013, INV E-126:2013 • Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E-410-13	ANEXO AL INFORME

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Estación total	1	Stonex / R1-Plus
Nivel	1	Geomaax / ZAL 232
Excavadora sobre orugas	1	Doosan / DX225LCA-7M
Vibro compactador	1	Caterpillar / CS10
Volqueta	1	International / 7600SBA
Retroexcargador	1	JCB / 3CX

NOTA 18: En los contratos de obra debe anexar la planilla diaria del equipo y/o maquinaria

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

CONSECUTIVO	FECHA	ÁREA	A QUE OFICIO DIO RESPUESTA (CODIGO DE LA CARTA)	DESTINATARIO	ASUNTO
CONGMS-093-2023	15/06/2023	SST		INTERVENTORIA- SST	SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
CONGMS-094-2023	15/06/2023	SST		INTERVENTORIA-SST	INGRESO DE PERSONAL
CONGMS-095-2023	21/06/2023	OBRA		INTERVENTORIA - DIRECT	ACTAS DE OBRA
CONGMS-096-2023	21/06/2023	OBRA		SUPERVISORA DE OBRA	ESTUDIOS Y DISEÑOS; GESTION PREDIAL
CONGMS-097-2023	27/06/2023	OBRA		INTERVENTORIA - DIRECT	ITEMS NO PREVISTOS - APUS
CONGMS-098-2023	28/06/2023	SST		INTERVENTORIA-SST	INGRESO DE PERSONAL
CONGMS-099-2023	28/06/2023	OBRA		INTERVENTORIA - PAGA	PAGA
CONGMS-100-2023	29/06/2023	DIRECCION		INTERVENTORIA - DISEÑO	ENTREGA DISEÑO PAVIMENTO
CONGMS-101-2023	29/06/2023	TECNICA		INTERVENTORIA-TECNICA	RESPUESTA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO
CONGMS-102-2023	1/07/2023	TECNICA		INTERVENTORIA-TECNICA	PRESUPUESTO ALTERNATIVAS ESTRUCTURA PAVIMENTO
CONGMS-103-2023	3/07/2023	TECNICA		INTERVENTORIA-TECNICA	PLAN DE CONTINGENCIA
CONGMS-104-2023	4/07/2023	SOCIAL		INTERVENTORIA-SOCIAL	ENTREGA DE INFORME Y ACTAS DE VECINDAD JUNIO
CONGMS-105-2023	4/07/2023	SST		INTERVENTORIA-SST	INFORME SST MES DE JUNIO
CONGMS-106-2023	4/07/2023	SST		INTERVENTORIA-SST	INGRESO DE PERSONAL
CONGMS-107-2023	5/07/2023	SST		INTERVENTORIA-SST	INGRESO DE PERSONAL
CONGMS-108-2023	6/07/2023	SOCIAL		MINISTERIO DEL INTERIOR	CONSULTA PREVIA

.

3. RECOMENDACIONES

A. Se observa gran interés y entusiasmo por parte de la comunidad frente al desarrollo de la obra .

NOTA 20: Indique las recomendaciones que considere, con respecto a las obligaciones del contratista de obra.

4. ANEXOS

A. Memoria de cantidades.
B. Registro fotográfico.
C. Bitácora de obra.
D. Programación de obra.
E. Permisos ambientales.
F. Actas de socialización.
G. Actas de vecindad.
H. Actas de reuniones.
I. Actas de recibo de la comunidad y/o municipio.
J. Planilla de dotación de implementos de seguridad industrial.
K. Planillas de capacitaciones.
L. Plan de Manejo de Tráfico.
M. Plan de Manejo Ambiental.
N. Informes del clima.
O. Documentos equipo del contratista de obra.
P. Certificado ICA del Municipio.
Q. Pólizas del contrato de obra.
R. Planillas de seguridad social del contratista de obra.
S. Ensayos de laboratorio del contratista de obra.
T. Comunicaciones.
U. Planos As-Built.
V. Certificaciones (Caracterización vial, RETIE, RETILAP, Bomberos, legalización de servicios públicos, etc.)
W. Paz y Salvo Personería del municipio.
X. Paz y salvo ambiental (CAS, CDMB).
