Bermudez SAS
Nit. 816.000.531-1

BER-156-23
19 de Septiembre de 2023

SRS
CONSORCIO INGEALDEIC
Atn. ARQ. GERMAN GARZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
csj.interventoria@ingeplan.co

ASUNTO: REMISION ACTA 4 CONTRATO 084-22

Para su respectiva autorización remitimos el Acta Parcial de obra N° 04 por valor de $1.227.240.780 a la cual se le descuenta la amortización del anticipo por valor de $613.620.390, resultando un valor neto de $613.620.390.

Se anexan los siguientes documentos:

1 Factura de venta para aprobacion
2 Resolución de facturación
3 Acta de recibo obra con memorias anexas y estado de ejecución del contrato
4 Certificación de consignación de rendimientos e informe de inversión y amortización del anticipo
5 Certificado representante legal pago seguridad social y planillas
6 Certificación bancaria

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS



BERMUDEZ SAS
NIT: 816000531-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 24 A # 2 A - 71, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3206386352
Email. administracion@bermudezycia.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764038465438 válida desde 2022-10-25 hasta 2023-10-25 rango desde FEL1 hasta FEL20.
No grandes contribuyentes - No autorretenedores
Agente de retencion a titulo de renta

Cliente: RAMA JUDICIAL
NIT : 800093816
Dirección: CL 72796, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6012127389
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/09/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEL10**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:25:02**
FECHA FIRMADO: **20/09/2023 16:25:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	09	2023	20	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$974.387.281,00		0,00	$974.387.281,00
2	N/A	IMPREVISTOS 3%	WSD	1,00	$29.231.618,00		0,00	$29.231.618,00
3	N/A	ADMINISTRACION 17%	WSD	1,00	$165.645.838,00		0,00	$165.645.838,00
4	04	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$48.719.364,00	19,00	0,00	$48.719.364,00

Notas:
#$27-01-02-000;CONTRATO084-2022;;smonsalveac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Anticipos:
Monto: $613.620.390,00 **Fecha:** 20/09/2023, **Fecha de recepción:** 20/09/2023, **No. Pago:** 4, **Instrucciones de pago:** AMORTIZACION DE ANTICIPOACTA 4 CONT-084-2022

SON: (mil doscientos veintisiete millones doscientos cuarenta mil setecientos ochenta pesos)
CUFE: 65cfe3dd626ce98b5b5b14bcd0ea19a40608b92f1d87266e88d6d314291f421238c37c9e4bcf956ef4db38448066bd12

Subtotal:	$1.217.984.101,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.256.679,00
Total:	$1.227.240.780,00
Anticipos:	$613,620,390.00
Neto Factura:	$613.620.390,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$48.719.364,00	19,00%	$9.256.679,00

Firma Digital: 2LCYF5ri5zD22P0tWb6zyQLVsS/jziNRCvFF1EkOYYhan16hmzTnJDrnGpF4keJL L0xYdbN0AyQn4DZGGsax0GqeNDUT7XxKoslBZv6XryKzgAdlLK jecvOm3i1GjSYS HVkHkn+eLtWXxrbOAjfirt9u5Y/Alos5BhN4Es/4hVqWJw7DjPzVPC8C8c3uGZFr g5VKTVWA+C4hj8gfGWHzpjG0k3/GsTJ0pUw 1TvYnzg9CQLu3VvWlO8dDc4AXCpWp J3f1q1Wxnkn6ZdFphC7Ko+yfD+rY0gSBFDZpWg8fJLxBWXX3RP/r7ggwtt5B7wWa r9NpaJFpyeauV5TEMehu bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038465438

(415)7707212489984(8020) 001876403846543 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 6 0 0 0 5 3 1	1				

11. Razón social
BERMUDEZ S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 2 116 420 CA 55

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-10-25 / 05:42:08 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BERMUDEZ OSORIO CARLOS EDUARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 16363838 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización BERMUDEZ S.A.S.

997. Fecha formalización 2022-10-25 17:42:08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038465438

(415)7707212489984(8020) 001876403846543 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 6 0 0 0 5 3 1	1				

11. Razón social
BERMUDEZ S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	BERMUDEZ S.A.S. VICHADA CL 23 6 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEL	1	20	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14870144840

(415)7707212489984(8020) 000001487014484 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 6 0 0 0 5 3 1	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BERMUDEZ S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 116 420 CA 55

42. Correo electrónico bermudezycia@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 3 1	3 2 0 6 3 8 6 3 5 2	0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 5 1 0 1 8	4 1 1 2	1 9 9 5 1 0 1 8	3 6 0 0	4 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 07 / 14 : 20: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERMUDEZ OSORIO CARLOS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Escriba el texto

Fecha generación documento PDF: 25-06-2023 04:04:11PM

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | **084 DE 2022**

RAMA JUDICIAL | **OBJETO:** **REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)**

| | | |

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.2	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	29.55	$ 902,738	$ 26,675,908	29.55	$ 26,675,908	29.55	$ 26,675,908	0.00	$ -	8.97	$ 8,097,560		$ -	17.05	$ 15,391,683	26.02	$ 23,489,243	88%
4.3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.	M3	72.09	$ 840,384	$ 60,583,283	72.09	$ 60,583,283	72.09	$ 60,583,283	0.00	$ -		$ -	23.72	$ 19,933,908	47.03	$ 39,523,260	70.75	$ 59,457,168	98%
4.4	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA VIGA CINTA INCLUYE FORMALETA DE MADERA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	3.92	$ 805,002	$ 3,155,608	3.92	$ 3,155,608	13.92	$ 11,205,628	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
4.5	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA. SIN IMPERMEABILIZAR.NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.	M3	140.59	$ 796,990	$ 112,048,824	140.59	$ 112,048,824	94.59	$ 75,387,284	0.00	$ -		$ -	44.54	$ 35,497,935	49.19	$ 39,203,938	93.73	$ 74,701,873	99%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V - 15 PARA JUNTAS PARA TANQUE	ML	41.71	$ 40,009	$ 1,668,775	41.71	$ 1,668,775	41.71	$ 1,668,775	0.00	$ -		$ -		$ -	41.71	$ 1,668,775	41.71	$ 1,668,775	100%
4.7	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	26.51	$ 859,783	$ 22,792,847	26.51	$ 22,792,847	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
4.8	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	35047.39	$ 7,267	$ 254,689,383	35047.39	$ 254,689,383	39247.39	$ 285,210,783	6009.32	$ 43,669,728	6,732.85	$ 48,927,621	19,592.15	$ 142,376,154	2,698.62	$ 19,610,872	35,032.94	$ 254,584,375	89%
4.9	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN CIMENTACIÓN, PANTALLAS, PLACA CONTRAPISO Y PLACA CUBIERTA. INCLUYE ALAMBRE, CORTE Y FIJACIÓN CON SEPARADORES Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL ADICIONAL DONDE SE REQUIERA.	KG	930.01	$ 7,355	$ 6,840,224	930.01	$ 6,840,224	945.01	$ 6,950,549	0.00	$ -		$ -	919.25	$ 6,761,084		$ -	919.25	$ 6,761,084	97%
5	**TANQUES DE AGUA POTABLE**																			
5.1	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS, IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	28.87	$ 727,355	$ 20,998,739	28.87	$ 20,998,739	28.87	$ 20,998,739	0.00	$ -		$ -		$ -	7.22	$ 5,251,503	7.22	$ 5,251,503	25%
5.2	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	20.03	$ 884,654	$ 17,719,620	20.03	$ 17,719,620	20.03	$ 17,719,620	0.00	$ -		$ -		$ -	20.03	$ 17,719,620	20.03	$ 17,719,620	100%
5.3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	4.33	$ 817,142	$ 3,538,225	4.33	$ 3,538,225	4.33	$ 3,538,225	0.00	$ -		$ -		$ -	4.33	$ 3,538,225	4.33	$ 3,538,225	100%
6	**POZOS SEPTICOS**																			
6.1	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	3.52	$ 727,355	$ 2,560,290	3.52	$ 2,560,290	3.52	$ 2,560,290	0.00	$ -		$ -		$ -	3.51	$ 2,553,016	3.51	$ 2,553,016	100%
6.2	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	9.01	$ 884,654	$ 7,970,733	9.01	$ 7,970,733	9.01	$ 7,970,733	0.00	$ -		$ -		$ -	9.01	$ 7,970,733	9.01	$ 7,970,733	100%
6.3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	2.11	$ 817,142	$ 1,724,170	2.11	$ 1,724,170	2.11	$ 1,724,170	0.00	$ -		$ -		$ -	2.11	$ 1,724,170	2.11	$ 1,724,170	100%
7	**ESCALERAS**																			
7.1	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA MESONES Y PASOS DE ESCALERAS. INCLUYE FORMALETA EN CUALQUIER MATERIAL. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	3.35	$ 792,079	$ 2,653,465	3.35	$ 2,653,465	4.35	$ 3,445,544	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
7.2	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALERA VER DETALLE	KG	8651.44	$ 12,447	$ 107,684,474	8651.44	$ 107,684,474	8651.44	$ 107,684,474	0.00	$ -	3,748.14	$ 46,653,099		$ -		$ -	3,748.14	$ 46,653,099	43%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
7.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA ASCENSO CURVO, CAPACIDAD DE CARGA 135 KG, APOYA PIES, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A CADA NECESIDAD, ONTROLES EN LA SILLA, BOTONERAS EN CADA NIVEL PARA LLAMAR LA SILLA SI NO ESTÁ EL PISO REQUERIDO, LLAVE DE SEGURIDAD QUE PERMITE TENER EL CONTROL DE LA SILLA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	1.00	$ 47,140,192	$ 47,140,192	1.00	$ 47,140,192	1.00	$ 47,140,192	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**																			
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	79.20	$ 45,142	$ 3,575,246	79.20	$ 3,575,246	109.20	$ 4,929,506	0.00	$ -		$ -	51.20	$ 2,311,270		$ -	51.20	$ 2,311,270	47%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	79.20	$ 34,238	$ 2,711,650	79.20	$ 2,711,650	79.20	$ 2,711,650	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.3	CAJA DE INSPECCIÓN, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X80 CM, SOBRE SOLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM² (21 MPA), PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE CONCRETO, PAÑETADA Y PULIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN OBRA, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, DOSIFICACIÓN 1:3 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON UNA TAPA EN CONCRETO F'C=210 KG/CM² (21 MPA), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y SELLADA HERMÉTICAMENTE CON MORTERO DE CEMENTO. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN	UNIDAD	1.00	$ 394,802	$ 394,802	1.00	$ 394,802	6.00	$ 2,368,812	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	10.80	$ 34,238	$ 369,770	10.80	$ 369,770	30.80	$ 1,054,530	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UNIDAD	6.00	$ 269,663	$ 1,617,978	6.00	$ 1,617,978	6.00	$ 1,617,978	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.6	SANITARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDOS + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO, PARA ALTA PRESION.	UNIDAD	2.00	$ 969,013	$ 1,938,026	2.00	$ 1,938,026	2.00	$ 1,938,026	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE ORINAL, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UNIDAD	2.00	$ 932,779	$ 1,865,558	2.00	$ 1,865,558	1.00	$ 932,779	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UNIDAD	2.00	$ 179,101	$ 358,202	2.00	$ 358,202	2.00	$ 358,202	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.9	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	8.00	$ 199,266	$ 1,594,128	8.00	$ 1,594,128	8.00	$ 1,594,128	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.10	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA ORINAL INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	1.00	$ 187,720	$ 187,720	1.00	$ 187,720	1.00	$ 187,720	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIVANDALICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO COMBI, INCLUYE KIT DE FLUXOMETRO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UNIDAD	1.00	$ 2,906,066	$ 2,906,066	1.00	$ 2,906,066	1.00	$ 2,906,066	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
9	**INSTALACIONES AGUA LLUVIA**																			
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	15.50	$ 18,790	$ 291,245	15.50	$ 291,245	45.50	$ 854,945	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	66.60	$ 18,790	$ 1,251,414	66.60	$ 1,251,414	66.60	$ 1,251,414	0.00	$ -		$ -	15.50	$ 291,245		$ -	15.50	$ 291,245	23%
10	**INSTALACIONES AGUA POTABLE**																			
10.1	REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNIDAD	5.00	$ 138,740	$ 693,700	5.00	$ 693,700	5.00	$ 693,700	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.2	REGISTRO RED WHITE 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNIDAD	2.00	$ 168,944	$ 337,888	2.00	$ 337,888	2.00	$ 337,888	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.3	REGISTRO RED WHITE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNIDAD	4.00	$ 228,564	$ 914,256	4.00	$ 914,256	4.00	$ 914,256	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 9 DE 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ARENA, RELLENO COMPACTADO.	ML	28.50	$ 7,851	$ 223,754	28.50	$ 223,754	88.50	$ 694,814	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	6.80	$ 10,401	$ 70,727	6.80	$ 70,727	66.80	$ 694,787	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	34.00	$ 17,222	$ 585,548	34.00	$ 585,548	216.00	$ 3,719,952	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	13.60	$ 14,785	$ 201,076	13.60	$ 201,076	25.60	$ 378,496	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	38.00	$ 19,644	$ 746,472	38.00	$ 746,472	68.00	$ 1,335,792	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	50.00	$ 38,487	$ 1,924,350	50.00	$ 1,924,350	50.00	$ 1,924,350	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
10.10	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA 2 BOMBAS USO ALTERNO CADA UNA 100% DEL CAUDAL CADA BOMBA; CAUDAL 77 GPM, PRESIÓN:59 PSI, HIDROACUMULADOR 500 LITROS, INCLUYE TABLEROS Y ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	$ 38,236,948	$ 38,236,948	1.00	$ 38,236,948	1.00	$ 38,236,948	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 24,854,016	0.65	$ 24,854,016	65%
10.11	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS; BOMBAS 1; PRESIÓN 15 PSI, CAUDAL 14 GPM, HIDROACUMULADOR 50 LITROS	UNIDAD	1.00	$ 10,426,136	$ 10,426,136	1.00	$ 10,426,136	1.00	$ 10,426,136	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 6,776,988	0.65	$ 6,776,988	65%
11	**MUROS Y DIVISIONES**																			
11.1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5, INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	1077.69	$ 41,735	$ 44,977,392	1077.69	$ 44,977,392	1277.69	$ 53,324,392	0.00	$ -	-	$ -	435.54	$ 18,177,262	642.15	$ 26,800,130	1,077.69	$ 44,977,392	84%
12	**PISOS**																			
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA DE MADERA, RELACIÓN 1:3. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	34.87	$ 620,154	$ 21,624,770	34.87	$ 21,624,770	34.87	$ 21,624,770	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO EN RELACIÓN 1:3. INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO TOXEMENT 1A O SIKA 1 O SIMILAR. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	4.90	$ 647,434	$ 3,172,427	4.90	$ 3,172,427	4.90	$ 3,172,427	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA METÁLICA Y/O ALLANADORA METÁLICA, RELACIÓN 1:3. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. NO INCLUYE ENDURECEDOR. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	12.03	$ 664,453	$ 7,993,370	12.03	$ 7,993,370	12.03	$ 7,993,370	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.4	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =3.000 PSI/20.68 MPA, PARA ANDEN. INCLUYE ESCOBILLADO, FILOS Y Y DILATACIONES. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	9.81	$ 654,155	$ 6,417,261	9.81	$ 6,417,261	9.81	$ 6,417,261	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO (ESPESOR ENTRE 8,0 MM Y 10 MM). TRÁFICO PESADO. INCLUYE MORTERO PARA INSTALACIÓN TIPO PEGACOR O SIMILAR Y BOQUILLA. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES E INSTALACION DE WIN METALICO EN DONDE SE REQUIERA. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	766.34	$ 88,438	$ 67,773,577	766.34	$ 67,773,577	766.34	$ 67,773,577	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13	**PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES**																			

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
13.1	PAÑETE PARA MUROS, NO IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	1413.21	$ 28,238	$ 39,906,224	1413.21	$ 39,906,224	1733.21	$ 48,942,384	0.00	$ -		$ -		$ -	1,023.27	$ 28,895,098	1,023.27	$ 28,895,098	59%
13.2	PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	780.13	$ 30,330	$ 23,661,343	780.13	$ 23,661,343	780.13	$ 23,661,343	0.00	$ -		$ -		$ -	55.45	$ 1,681,799	55.45	$ 1,681,799	7%
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE CERÁMICA PARA PARED, (ESPESOR ENTRE 4MM Y 6MM). INCLUYE ADHESIVO EN POLVO TIPO PEGACOR O SIMILAR, BOQUILLA Y WIN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	105.81	$ 64,218	$ 6,794,907	105.81	$ 6,794,907	105.81	$ 6,794,907	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.4	CONCRETO DE 3,000 PSI/20.68 MPA PARA MESONES Y PASOS DE ESCALERAS. INCLUYE FORMALETA EN CUALQUIER MATERIAL. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	0.41	$ 792,079	$ 324,752	0.41	$ 324,752	1.13	$ 895,049	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE NEGRO, ESPESOR 1.5 CM, COMPUESTO POR 93% DE CUARZO Y 7% DE RESINA DE CALIDAD. INCLUYE SALPICADERO ENTRE 7 A 10 CM Y FALDERO DE 25CM. INCLUYE SELLANTE POLIURETANO Y SILICONA FRÍA TRANSPARENTE. VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	ML	6.76	$ 637,967	$ 4,312,657	6.76	$ 4,312,657	6.76	$ 4,312,657	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14	**ESTUCOS Y PINTURAS**																			
14.1	PINTURA PARA MUROS INTERIORES SOBRE PAÑETE, ESTUCO, PLACA DE YESO, FIBROCEMENTO. 2 MANOS + 1 MANO FINAL DE ENTREGA, CUMPLE NTC PARA PINTURA DE INTERIORES. NO INCLUYE ESTUCO. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA.	M2	702.39	$ 9,017	$ 6,333,451	702.39	$ 6,333,451	1022.39	$ 9,218,891	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.2	ESTUCO PARA MUROS NO IMPERMEABLE LISO EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE ESTUCADA.	M2	702.39	$ 10,770	$ 7,564,740	702.39	$ 7,564,740	1022.39	$ 11,011,140	0.00	$ -		$ -		$ -	702.39	$ 7,564,740	702.39	$ 7,564,740	69%
14.3	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES).	M2	54.96	$ 37,980	$ 2,087,381	54.96	$ 2,087,381	54.96	$ 2,087,381	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
14.4	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE PAÑETE, ESTUCO, PLACA DE YESO, FIBROCEMENTO. 2 MANOS + 1 MANO FINAL DE ENTREGA, CUMPLE NTC PARA PINTURA DE FACHADAS. NO INCLUYE ESTUCO. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA.	M2	1030.84	$ 9,482	$ 9,774,425	1030.84	$ 9,774,425	1030.84	$ 9,774,425	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15	**CARPINTERIA METALICA Y DE VIDRIO**																			
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN PANEL PERFORADO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. SEGÚN DISEÑO	m2	248.44	$ 308,526	$ 76,650,199	248.44	$ 76,650,199	248.44	$ 76,650,199	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR EN TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 40X20MM ESP. 2,5MM, INCLUYE CHAPA PARA EXTERIOR Y PORTACANDADO . ACABADO SEGÚN DISEÑO	m2	12.40	$ 197,350	$ 2,447,140	12.40	$ 2,447,140	12.40	$ 2,447,140	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40MM ESP. 2,5MM . ACABADO SEGÚN DISEÑO	M2	1.80	$ 275,678	$ 496,220	1.80	$ 496,220	10.95	$ 3,018,674	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.4	PUERTA METALICA EN PERSIANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE MARCO METALICO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 GALVANIZADO EN COLOR NEGRO MATE, CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE. CERROJO DE SEGURIDAD CON PASADORES EN ACERO. LLAVE EN EL EXTERIOR E INTERIOR DIMENSIONES ACABADO SEGÚN DETALLE.	M2	24.80	$ 339,199	$ 8,412,135	24.80	$ 8,412,135	25.80	$ 8,751,334	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.5	ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	m2	6.12	$ 128,345	$ 785,471	6.12	$ 785,471	6.12	$ 785,471	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS (1.6M*0.8M)	UNIDAD	6.00	$ 3,507,483	$ 21,044,898	6.00	$ 21,044,898	6.00	$ 21,044,898	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.7	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD CURVA CROMO	UNIDAD	2.00	$ 106,084	$ 212,168	2.00	$ 212,168	2.00	$ 212,168	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
15.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERÍA EN ALUMINIO MONTANTE FIJA VP 3831 VIDRIO DE 3 MM + 3 MM CAL 6, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DETALLE.	m2	185.11	$ 266,692	$ 49,367,356	185.11	$ 49,367,356	185.11	$ 49,367,356	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
15.9	VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR ALUMINIO CRUDO + ALFAJIA TIPO PESADO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA PB 6038 O EQUIVALENTE). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	m2	30.46	$ 311,140	$ 9,477,324	30.46	$ 9,477,324	69.46	$ 21,611,784	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
16	**CIELO RASOS**																			
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DIMENSIONES APROXIMADAS (60 CM X 60 CM), ESPESOR APROXIMADO DE LA LÁMINA= 5,0 A 6,5 MM. INCLUYE PERFILERIA AUTOENSAMBLE Y ANGULO PERIMETRAL AUTOENSAMBLE.	M2	787.79	$ 77,010	$ 60,667,708	787.79	$ 60,667,708	787.79	$ 60,667,708	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
17	**ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA**																			
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA EN CONCRETO LADRILLO COMÚN, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, MARCO Y TAPA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	3.00	$ 2,203,762	$ 6,611,286	3.00	$ 6,611,286	3.00	$ 6,611,286	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 4" NORMA CODENSA CS 400. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 735,916	$ 735,916	1.00	$ 735,916	1.00	$ 735,916	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES MARCA 3M O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 739,532	$ 739,532	1.00	$ 739,532	1.00	$ 739,532	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES MARCA 3M O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 1,313,899	$ 1,313,899	1.00	$ 1,313,899	1.00	$ 1,313,899	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS - PARA CANALIZACIÓN DE 6 Ø 6" TIPO TDP- EN ZONA DURA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA DE PEÑA, RELLENO BASE GRANULAR B-600, BANDA PLÁSTICA Y CONCRETO PARA PAVIMENTO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	50.00	$ 228,115	$ 11,405,750	50.00	$ 11,405,750	50.00	$ 11,405,750	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
17.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLPE, 15 KV, 120 MM2, PANTALLA EN HILOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 46,298	$ 9,722,580	210.00	$ 9,722,580	210.00	$ 9,722,580	0.00	$ -	105.00	$ 4,861,290	-105.00	-$ 4,861,290		$ -	0.00	$ -	0%
18	**ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA**																			
18.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH EN CALIDAD SIEMENS O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES, VN: 17.5 KV, IN: 630 A, ICC: MIN 25KA (1S), FRECUENCIA 60 HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR, METAL CLAD, CUBA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO INTERIOR, OPERACIÓN MANUAL Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE TENSIÓN, CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE TRES POSICIONES (CONECTADO, DESCONECTADO-TIERRA), ACONDICIONADO CON ENCLAVAMIENTOS LÓGICOS MECÁNICOS Y DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN, GRADO DE PROTECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN IP65, BAJA TENSIÓN IP3X Y ENVOLVENTE CELDAS PROTECCIÓN MÍNIMO IP2X, TERMINALES CONECTADORES TIPO T ACORDE AL OR PARA EL MEDIDOR PARA LOS CABLES EN 17.5 KV, PUESTA A TIERRA DE LA CELDA, ELEMENTOS CALEFACTORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES	UNIDAD	2.00	$ 33,762,841	$ 67,525,682	2.00	$ 67,525,682	3.00	$ 101,288,523	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 4" NORMA CODENSA CS 400. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	1.00	$ 405,219	$ 405,219	1.00	$ 405,219	1.00	$ 405,219	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
18.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 11.4 KV - VSEC 208/120 V) INCLUYE CELDA PARA TRANSFORMADOR, NORMA NTC, 60 HZ, TRES (3) DPS 12 KV - 10 KA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 26,128,298	$ 26,128,298	1.00	$ 26,128,298	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	#¡DIV/0!

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
18.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 6, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 300/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X300A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1.00	$ 7,644,875	$ 7,644,875	1.00	$ 7,644,875	1.00	$ 7,644,875	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 4,969,169	0.65	$ 4,969,169	65%
18.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 7, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 400/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X400A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 4,511,459	$ 4,511,459	1.00	$ 4,511,459	1.00	$ 4,511,459	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 2,932,448	0.65	$ 2,932,448	65%
18.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA STAND-BY 75 KVA, ALTURA DE OPERACIÓN 2600 MSNM APROX, TANQUE PARA COMBUSTIBLE, CABINA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 69,012,778	$ 69,012,778	1.00	$ 69,012,778	1.00	$ 69,012,778	0.00	$ -	0.70	$ 48,308,945	-0.70	-$ 48,308,945	0.65	$ 44,858,306	0.65	$ 44,858,306	65%
18.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESFOGUE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KAV, AISLAMIENTO TÉRMICO, CODOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.00	$ 98,442	$ 984,420	10.00	$ 984,420	10.00	$ 984,420	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
18.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA (C-EMER), CELDA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA PARA SISTEMA RCI DE FABRICACIÓN ESPECIAL, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO SITIO), PRUEBAS DE ARCO, VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UNIDAD	1.00	$ 71,184,373	$ 71,184,373	1.00	$ 71,184,373	1.00	$ 71,184,373	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 46,269,842	0.65	$ 46,269,842	65%
18.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGD, PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X300A, ICC 10KA, NIVEL DE TENSIÓN 208/120V, PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LOS TABLEROS (TN-1, TN-2, TN-3, T-AA, T-AA*, T-UPS-P1, T-UPS-P2, T-UPS-P3),CON MARCA DE TABLERO EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE DE LA CELDA Y MARCACIÓN INTERIOR DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE LA COMPONE, PRUEBAS DE ARCO EN TABLERO, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO EN SITIO), VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 86,423,535	$ 86,423,535	1.00	$ 86,423,535	1.00	$ 86,423,535	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 56,175,298	0.65	$ 56,175,298	65%
20	**ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**																			
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30 CM, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4.00	$ 398,210	$ 1,592,840	4.00	$ 1,592,840	4.00	$ 1,592,840	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" X 2.40 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4.00	$ 171,867	$ 687,468	4.00	$ 687,468	10.00	$ 1,718,670	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
20.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE NO. 2/0 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	90.00	$ 37,616	$ 3,385,440	90.00	$ 3,385,440	120.00	$ 4,513,920	0.00	$ -	45.00	$ 1,692,720	-45.00	-$ 1,692,720	90.00	$ 3,385,440	90.00	$ 3,385,440	75%
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA DE 60 CM, PARARRAYO PUNTA FRANKLIN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	14.00	$ 143,461	$ 2,008,454	14.00	$ 2,008,454	14.00	$ 2,008,454	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO. 1/0 EN ALUMINIO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	350.00	$ 8,704	$ 3,046,400	350.00	$ 3,046,400	380.00	$ 3,307,520	0.00	$ -	175.00	$ 1,523,200	-175.00	-$ 1,523,200	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
21	**ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES**																	0.00		
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (TRANSFORMADOR-CELDA DE MEDIDA NO. 6- TGD) (2X(3N°250(F) + 1N°250(N)) + 1N°6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN POR CÁRCAMO, VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	$ 496,126	$ 9,922,520	20.00	$ 9,922,520	20.00	$ 9,922,520	0.00	$ -	10.00	$ 4,961,260	-10.00	-$ 4,961,260		$ -	0.00	$ -	0%
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (PLANTA-CEMER-TGD) (2X(3N°250(F) + 1N°250(N)) + 1N°6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN POR CÁRCAMO, VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	$ 496,126	$ 9,922,520	20.00	$ 9,922,520	20.00	$ 9,922,520	0.00	$ -	10.00	$ 4,961,260	-10.00	-$ 4,961,260		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
21.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (TRANSFORMADOR-CELDA DE MEDIDA NO. 7-C-EMER) (3Nº1/0 (F) + 1Nº1/0 (N) + 1Nº6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN DUCTO PVC 2", VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20.00	$ 158,045	$ 3,160,900	20.00	$ 3,160,900	20.00	$ 3,160,900	0.00	$ -	-	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº4(F) + 1Nº4(N) + 1Nº10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERÍA EMT 1 X Ø 2". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	25.00	$ 294,281	$ 7,357,025	25.00	$ 7,357,025	25.00	$ 7,357,025	0.00	$ -	12.50	$ 3,678,513	-12.50	-$ 3,678,513		$ -	0.00	$ -	0%
21.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº6(F) + 1Nº6(N) + 1Nº10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERÍA EMT 1 X Ø 1 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100.00	$ 52,841	$ 5,284,100	100.00	$ 5,284,100	100.00	$ 5,284,100	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
21.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO , INCLUYE: - ACOMETIDA 3Nº8(F) + 1Nº8(N) + 1Nº10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERIA EMT 1 X Ø 1 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100.00	$ 42,180	$ 4,218,000	100.00	$ 4,218,000	100.00	$ 4,218,000	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
21.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: ACOMETIDA 3Nº2(F) + 1Nº2(N) + 1Nº8(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERIA EMT 1 X Ø 2 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15.00	$ 113,882	$ 1,708,230	15.00	$ 1,708,230	15.00	$ 1,708,230	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22	**ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS**																			
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 773,141	$ 773,141	1.00	$ 773,141	1.00	$ 773,141	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	6.00	$ 622,458	$ 3,734,748	6.00	$ 3,734,748	6.00	$ 3,734,748	0.00	$ -	3.00	$ 1,867,374	-3.00	-$ 1,867,374		$ -	0.00	$ -	0%
22.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS TRIFASICO, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2.00	$ 258,661	$ 517,322	2.00	$ 517,322	2.00	$ 517,322	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	65.00	$ 16,290	$ 1,058,850	65.00	$ 1,058,850	65.00	$ 1,058,850	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	10.00	$ 94,022	$ 940,220	10.00	$ 940,220	10.00	$ 940,220	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2.00	$ 65,005	$ 130,010	2.00	$ 130,010	2.00	$ 130,010	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 76,739	$ 76,739	1.00	$ 76,739	1.00	$ 76,739	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 100,181	$ 100,181	1.00	$ 100,181	1.00	$ 100,181	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 100,253	$ 100,253	1.00	$ 100,253	1.00	$ 100,253	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X63A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 100,253	$ 100,253	1.00	$ 100,253	1.00	$ 100,253	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	3.00	$ 157,820	$ 473,460	3.00	$ 473,460	3.00	$ 473,460	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X25A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	8.00	$ 157,820	$ 1,262,560	8.00	$ 1,262,560	8.00	$ 1,262,560	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
22.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2.00	$ 157,820	$ 315,640	2.00	$ 315,640	2.00	$ 315,640	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2.00	$ 157,820	$ 315,640	2.00	$ 315,640	2.00	$ 315,640	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X80A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 157,820	$ 157,820	1.00	$ 157,820	1.00	$ 157,820	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X125A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 349,135	$ 349,135	1.00	$ 349,135	1.00	$ 349,135	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
22.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X150A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1.00	$ 349,135	$ 349,135	1.00	$ 349,135	1.00	$ 349,135	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23	**ELECTRICOS - ILUMINACIÓN**																			
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1Ø1/2" (10 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	19.00	$ 148,877	$ 2,828,663	19.00	$ 2,828,663	19.00	$ 2,828,663	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (10 MTS), INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	294.00	$ 191,812	$ 56,392,728	294.00	$ 56,392,728	294.00	$ 56,392,728	0.00	$ -	147.00	$ 28,196,364	-147.00	-$ 28,196,364	111.00	$ 21,291,132	111.00	$ 21,291,132	38%
23.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES ULTRASÓNICOS PARA MONTAJE EN TECHO, COBERTURA180° - 46,45 M² MÍNIMO, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 40 KHZ MÍNIMO, CALIDAD LEVITON O SUPERIOR, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (1 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	23.00	$ 357,654	$ 8,226,042	23.00	$ 8,226,042	23.00	$ 8,226,042	0.00	$ -	11.50	$ 4,113,021	-11.50	-$ 4,113,021		$ -	0.00	$ -	0%
23.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN SENCILLO EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	19.00	$ 98,834	$ 1,877,846	19.00	$ 1,877,846	19.00	$ 1,877,846	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN DOBLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	7.00	$ 144,858	$ 1,014,006	7.00	$ 1,014,006	7.00	$ 1,014,006	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN TRIPLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	7.00	$ 192,004	$ 1,344,028	7.00	$ 1,344,028	7.00	$ 1,344,028	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN DOBLE CONMUTABLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	2.00	$ 149,751	$ 299,502	2.00	$ 299,502	2.00	$ 299,502	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
23.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN TRIPLE CONMUTABLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4.00	$ 192,004	$ 768,016	4.00	$ 768,016	4.00	$ 768,016	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE EMERGENCIA, 2 FAROS, AUTONOMÍA DE ENERGÍA POR 3 HORAS, MÍNIMO 200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE	UNIDAD	85.00	$ 121,214	$ 10,303,190	85.00	$ 10,303,190	85.00	$ 10,303,190	0.00	$ -	42.50	$ 5,151,595	-42.50	-$ 5,151,595		$ -	0.00	$ -	0%
23.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 18W, PARA INCRUSTAR, CHASIS EN ALUMINIO+ PC, MÓDULO LED DE 3W 3000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-277VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	15.00	$ 95,832	$ 1,437,480	15.00	$ 1,437,480	15.00	$ 1,437,480	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 18W, PARA INCRUSTAR, CHASIS EN ALUMINIO+ PC, MÓDULO LED DE 18W 4000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-240VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	21.00	$ 81,281	$ 1,706,901	21.00	$ 1,706,901	21.00	$ 1,706,901	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
23.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED 60 CM X 60 CM +- 1CM, INCRUSTAR O SUSPENDER, CHASIS DE ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO (PMMA) OPAL, MÓDULO LED DE 40W, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-277VAC. DURACIÓN 25 MIL A 40 MIL HORAS	UNIDAD	47.00	$ 192,887	$ 9,065,689	47.00	$ 9,065,689	47.00	$ 9,065,689	0.00	$ -	23.50	$ 4,532,845	-23.50	-$ 4,532,845		$ -	0.00	$ -	0%
23.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO LINEAL 7.5CMX.25CMX1240CM (ANCHOXALTOXLARGO) 32W, PARA DESCOLGAR,CHASIS EN ALUMINIO+ PC, DIFUSOR OPAL EN ACRÍLICO (PMMA), MÓDULO LED DE 32W 4000K DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 85-265VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	79.00	$ 55,906	$ 4,416,574	79.00	$ 4,416,574	79.00	$ 4,416,574	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
24	**ELECTRICOS - RESPALDO DE ENERGÍA UPS**																			
24.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS TRIFÁSICA DE 10 KVA ONLINE, AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS, 60 HZ, NIVEL DE TENSIÓN 208V/110V, ONLINE, MANUALES DE OPERACIÓN, CAPACITACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 54,046,271	$ 54,046,271	1.00	$ 54,046,271	1.00	$ 54,046,271	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
25	**ELECTRICOS - RED INTERNA**																			
25.1	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M.	UNIDAD	83.00	$ 180,075	$ 14,946,225	83.00	$ 14,946,225	98.00	$ 17,647,350	0.00	$ -		$ -		$ -	54.00	$ 9,724,050	54.00	$ 9,724,050	55%
25.2	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR NARANJA CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M.	UNIDAD	54.00	$ 180,095	$ 9,725,130	54.00	$ 9,725,130	64.00	$ 11,526,080	0.00	$ -	27.00	$ 4,862,565	-27.00	-$ 4,862,565	36.00	$ 6,483,420	36.00	$ 6,483,420	56%
25.3	SALIDA TOMACORRIENTE 4H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 10 AWG. SIN APARATO PROM 4M.	UNIDAD	20.00	$ 82,850	$ 1,657,000	20.00	$ 1,657,000	20.00	$ 1,657,000	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26	**ELECTRICOS - VOZ Y DATOS**																			
26.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X150 MM. ACABADO ELECTROZINCADO, BANDEJA CON MALLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS. ACABADO ELECTROZINCADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	100.00	$ 126,678	$ 12,667,800	100.00	$ 12,667,800	100.00	$ 12,667,800	0.00	$ -	50.00	$ 6,333,900	-50.00	-$ 6,333,900	52.40	$ 6,637,927	52.40	$ 6,637,927	52%
26.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS, CATEGORIA 6, TUBERIA EMT DE 1/2", CAJA METALICA 5800, FACEPLATE RJ45, DOS PUERTOS, AJUSTE SENCILLO, 2 TOMAS (OUTLETS) JACK RJ45, SUMINISTRO Y ENSAMBLE DE 4 JACKS (EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE CABLE)	UNIDAD	29.00	$ 270,276	$ 7,838,004	29.00	$ 7,838,004	48.00	$ 12,973,248	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS DOBLE CATEGORIA 6, TUBERIA EMT DE 1/2", CAJA METALICA 5800, FACEPLATE RJ45, DOS PUERTOS, AJUSTE SENCILLO, 2 TOMAS (OUTLETS) JACK RJ45, SUMINISTRO Y ENSAMBLE DE 4 JACKS (EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE CABLE)	UNIDAD	10.00	$ 522,158	$ 5,221,580	10.00	$ 5,221,580	15.00	$ 7,832,370	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
26.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, 4 PARES, CARACTERIZADO HASTA 650 MHZ MÍN. MONOMARCA, COLOR SEGÚN USO, EN CALIDAD ORTRONICS, PANDUIT O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	2949.00	$ 3,079	$ 9,079,971	2949.00	$ 9,079,971	2949.00	$ 9,079,971	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRADO DE PISO 42 UR, DIMENSIÓN ALTO X FRENTE X FONDO (210X61X67) CM APROX., UNA (1) PUESTA TIERRA BARRAJE EN COBRE PARA PUESTA A TIERRA EN "L" 3X3CM DE LONGITUD EN PLATINA DE COBRE DE 1/2"X1/8", REMACHADO AL PISO DEL GABINETE, EN CALIDAD TRIPPLITE O SUPERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	63.00	$ 7,382,600	$ 465,103,800	63.00	$ 465,103,800	2.00	$ 14,765,200	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL CAT6A U/UTP 24 PORTS 1U ANGULADO, EN CALIDAD COMMSCOPE SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	6.00	$ 2,028,186	$ 12,169,116	6.00	$ 12,169,116	6.00	$ 12,169,116	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTENA EXTERNA DE TV DE 10 ELEMENTOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 164,003	$ 164,003	1.00	$ 164,003	1.00	$ 164,003	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOMETIDA PARA ANTENA EXTERNA DE TV EN TUBERÍA DE 3/4", CABLE BLINDADO RG-59U TV. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 80,599	$ 80,599	1.00	$ 80,599	1.00	$ 80,599	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH POE+ ADMINISTRABLE CAPA 3, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS, 4 SFP GIGABIT, POTENCIA 370 W, NIVEL DE TENSIÓN 100-240 VAC, FRECUENCIA 50-60HZ, CORRIENTE 2.4 A, DIMENSIÓN 1 U RACK 44X440X290 MM. APROX., MONITOREO SNMP V1, V2C & V3, REF: AT-X230-28GP-10 O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, SOPORTE TÉCNICO POR 3 AÑOS O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	2.00	$ 4,909,662	$ 9,819,324	2.00	$ 9,819,324	2.00	$ 9,819,324	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMÚN, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, MARCO Y TAPA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4.00	$ 1,506,843	$ 6,027,372	4.00	$ 6,027,372	4.00	$ 6,027,372	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE STRIP TELEFÓNICO DE 100 PARES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 1,802,307	$ 1,802,307	1.00	$ 1,802,307	1.00	$ 1,802,307	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA (IP-ANALOGA), 4 LINEAS DE COBRE, 8 EXTENSIONES ANALOGAS Y 6 TRONCALES IP, 24 EXTENSINES IP (LICENCIAMIENTO INCLUIDO), CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ANALOGO HASTA 8 LINEAS DE COBRE Y 24 EXTENSIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	$ 1,645,173	$ 1,645,173	1.00	$ 1,645,173	1.00	$ 1,645,173	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.13	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE UTP, CATEGORÍA 6A, S/STP, 10G, RJ45, COLOR AZUL, LONGITUD DE 3 MTRS, EN CALIDAD AMP, LEVITON, PANDUIT SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	UNIDAD	39.00	$ 111,052	$ 4,331,028	39.00	$ 4,331,028	39.00	$ 4,331,028	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TELEVISOR 4K-UHD DE 60 PULGADAS TIPO LED, POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS O SUPERIOR, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL TELEVISOR DE 60 HZ O SUPERIOR, SMART TV, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD TIPO WIFI, BLUETOOTH, CONTROL REMOTO (INFRARROJO), PUERTOS USB, HDMI, LAN/ETHERNET. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN PARED.	UNIDAD	6.00	$ 3,281,373	$ 19,688,238	6.00	$ 19,688,238	6.00	$ 19,688,238	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
26.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS TIPO INDOOR, OM3+OM4. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100.00	$ 15,028	$ 1,502,800	100.00	$ 1,502,800	100.00	$ 1,502,800	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27	**SISTEMAS CONTRAINCENDIOS**																			

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
27.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PREENSAMBLADO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO END SUCTION CON MOTOR ELECTRICO, BOMBA 100 GPM A 85 PSIG, BOMBA AUXILIAR JOCKEY DE 10 GPM A PRESIÓN DE 90 PSGI, INCLUYE ACCESORIOS Y TABLERO ELECTRICO	UNIDAD	1.00	$ 110,524,935	$ 110,524,935	1.00	$ 110,524,935	1.00	$ 110,524,935	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 71,841,208	0.65	$ 71,841,207	65%
27.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 1 1/2" RANURADA	ML	3.50	$ 42,229	$ 147,802	3.50	$ 147,802	3.50	$ 147,802	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 2" RANURADA	ML	6.00	$ 55,120	$ 330,720	6.00	$ 330,720	6.00	$ 330,720	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 4" RANURADA	ML	1.70	$ 151,705	$ 257,899	1.70	$ 257,899	1.70	$ 257,899	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C900 4" ENTERRADA	ML	31.00	$ 393,945	$ 12,212,295	31.00	$ 12,212,295	39.00	$ 15,363,855	0.00	$ -		$ -	31.00	$ 12,212,295		$ -	31.00	$ 12,212,295	79%
27.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 1 1/2"	UNIDAD	3.00	$ 16,354	$ 49,062	3.00	$ 49,062	3.00	$ 49,062	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 2"	UNIDAD	3.00	$ 22,497	$ 67,491	3.00	$ 67,491	5.00	$ 112,485	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 4"	UNIDAD	1.00	$ 57,074	$ 57,074	1.00	$ 57,074	7.00	$ 399,518	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA PVC C900 4"	UNIDAD	3.00	$ 317,594	$ 952,782	3.00	$ 952,782	19.00	$ 6,034,286	0.00	$ -		$ -	3.00	$ 952,782		$ -	3.00	$ 952,782	16%
27.10	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLNG HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 2"	UNIDAD	6.00	$ 7,347	$ 44,082	6.00	$ 44,082	14.00	$ 102,858	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.11	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLNG HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 4"	UNIDAD	2.00	$ 26,432	$ 52,864	2.00	$ 52,864	6.00	$ 158,592	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.12	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II	UNIDAD	3.00	$ 761,779	$ 2,285,337	3.00	$ 2,285,337	3.00	$ 2,285,337	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.13	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4"X2.1/2" (2)	UNIDAD	1.00	$ 926,592	$ 926,592	1.00	$ 926,592	1.00	$ 926,592	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
27.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4"X2.1/2"X2.1/2"	UNIDAD	1.00	$ 899,123	$ 899,123	1.00	$ 899,123	1.00	$ 899,123	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28	**SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EQUIPOS**																			
28.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE HUMOFOTO-ELÉCTRICO2HILOS,DIRECCIONABLECERTIFICADO(LISTADO UL Y/O APROBADO FM), INCLUYE BASE PARA DETECTOR	UNIDAD	50.00	$ 482,167	$ 24,108,350	50.00	$ 24,108,350	50.00	$ 24,108,350	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR ESTACIÓN MANUAL, CERTIFICADA NFPA72 (ESTACIÓNMANUALDIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN LISTADA UL Y/O APROBADA FM)	UNIDAD	15.00	$ 644,269	$ 9,664,035	15.00	$ 9,664,035	15.00	$ 9,664,035	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR TÉRMICO, 2 HILOS DIRECCIONABLE, CERTIFICADO, NFPA72,12-24 VDC (LISTADO UL Y/O APROBADO FM) INCLUYE BASE PARA DETECTOR)	UNIDAD	2.00	$ 452,098	$ 904,196	2.00	$ 904,196	2.00	$ 904,196	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE, 4 LAZOS, 99 ZONAS (PROGRAMACIÓN), CERTIFICADA NFPA72, INCLUYE FUENTE DE VOLTAJE Y BATERÍA 12 AMP/H (LISTADO UL Y/O APROBADO FM) 125 DETECTORES, 125 MODULOS POR CADA LAZO DE CONTROL	UNIDAD	1.00	$ 14,553,665	$ 14,553,665	1.00	$ 14,553,665	1.00	$ 14,553,665	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANUNCIADOR PARA SISTEMA DE INCENDIO, CERTIFICADO ALISTADA NFPA 72 (LISTADO UL, APROBADO FM)	UNIDAD	3.00	$ 11,110,238	$ 33,330,714	3.00	$ 33,330,714	3.00	$ 33,330,714	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN TELEFÓNICA PARA EMERGENCIA Y PARA SERVICIO DE INCENDIO CON COMUNICACIÓN A BOMBEROS	UNIDAD	3.00	$ 3,939,720	$ 11,819,160	3.00	$ 11,819,160	3.00	$ 11,819,160	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE GAS MONÓXIDO DE CARBONO CO2	UNIDAD	1.00	$ 1,228,583	$ 1,228,583	1.00	$ 1,228,583	1.00	$ 1,228,583	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 20X20X15 MS_CON CHAPA	UNIDAD	4.00	$ 244,624	$ 978,496	4.00	$ 978,496	4.00	$ 978,496	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓ Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORNETA CON LUZ ESTROBO 12-24 VDC (LISTADA UL APROBADA FM)	UNIDAD	14.00	$ 422,214	$ 5,910,996	14.00	$ 5,910,996	14.00	$ 5,910,996	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULO DE MONITOREO GPRS PARA CONEXIÓN A BOMBEROS.	UNIDAD	1.00	$ 2,728,997	$ 2,728,997	1.00	$ 2,728,997	1.00	$ 2,728,997	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 1-1/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	50.00	$ 136,651	$ 6,832,550	50.00	$ 6,832,550	50.00	$ 6,832,550	0.00	$ -	25.00	$ 3,416,275	-25.00	-$ 3,416,275		$ -	0.00	$ -	0%
28.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 1" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	40.00	$ 105,657	$ 4,226,280	40.00	$ 4,226,280	40.00	$ 4,226,280	0.00	$ -	20.00	$ 2,113,140	-20.00	-$ 2,113,140		$ -	0.00	$ -	0%
28.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 3/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	660.00	$ 65,872	$ 43,475,520	660.00	$ 43,475,520	860.00	$ 56,649,920	0.00	$ -	330.00	$ 21,737,760	-330.00	-$ 21,737,760		$ -	0.00	$ -	0%
28.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BAJO EN HALÓGENOS FPRL 2X18	ML	660.00	$ 7,871	$ 5,194,860	660.00	$ 5,194,860	660.00	$ 5,194,860	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BAJO EN HALÓGENOS FPRL 4X18	ML	2600.00	$ 9,336	$ 24,273,600	2600.00	$ 24,273,600	2600.00	$ 24,273,600	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
28.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO DIGITAL PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CERTIFICADO, CONCONEXIÓN A PANEL DE INCENDIOS (ANUNCIADOR REMOTO LISTADO UL Y/O APROBADO FM)	UNIDAD	1.00	$ 3,636,332	$ 3,636,332	1.00	$ 3,636,332	1.00	$ 3,636,332	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
29	**ELECTRICOS - ENERGIA ALTERNATIVA**																			

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
29.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 30 KW, CONSTA DE 96 PANELES SOLARES AMORFOS DE 330 VATIOS, 2 INVERSORES DE 15 KW TRIFÁSICOS Y UN SISTEMA DE RESPALDO COMPUESTO POR 32 BATERÍAS	UNIDAD	1.00	$ 386,736,778	$ 386,736,778	1.00	$ 386,736,778	1.00	$ 386,736,778	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 251,378,906	0.65	$ 251,378,905	65%
30	**AIRE ACONDICIONADO**																			
30.1	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE 11 UNIDAD TIPO CASSETTE 4 VIAS; 8 UNIDAD TIPO WALLMOUNT, 3 UNIDAD CONDENSADORA, CONTROL REMOTO EQUIPOS, SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE MAQUINAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RUTINAS TRIMESTRALES, HASTA COMPLETAR UN (1) AÑO DE SERVICIO, INCLUYE SOPORTES 7X24. MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL CON PH Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410ª, TUBERÍAS EN COBRE, RUBATEX, ACOMETIDAS DE CONTROL (CONFIGURACIÓN RED LAN POR PISO) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DISEÑO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS.	GLB	1.00	$ 161,020,482	$ 161,020,482	1.00	$ 161,020,482	1.00	$ 161,020,482	0.00	$ -		$ -		$ -	0.65	$ 104,663,313	0.65	$ 104,663,313	65%
31	**SEGURIDAD Y CONTROL**																			
31.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR DE METALES 18 ZONAS ARCO	UNIDAD	1.00	$ 4,716,890	$ 4,716,890	1.00	$ 4,716,890	1.00	$ 4,716,890	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO VARIFOCAL, TECNOLOGÍA IP DE 5 MEGAPÍXEL, TECNOLOGÍA INFRAROJO, LENTE DE 2.8MM-12MM, TIPO DOMO INTERIOR, ANTIVANDÁLICA, 1/3" CMOS, POE IP65, H2.65+SD. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	26.00	$ 666,816	$ 17,337,216	26.00	$ 17,337,216	26.00	$ 17,337,216	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.3	CÁMARA TIPO DOMO PTZ IP 1080P@60FPS H.265+ DARKFIGHTER 32X IR 150M WDR 120DB RASTREO Y DETECCIÓN INTELIGENTE. 2 MP. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	4.00	$ 4,092,555	$ 16,370,220	4.00	$ 16,370,220	4.00	$ 16,370,220	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 64 CANALES IP / 16 BAHÍAS DE DISCO DURO / 2 TARJETAS DE RED / SOPORTA RAID CON HOT SWAP / HDMI EN 4K / SOPORTA POS - CUATRO DISCOS DURO SATA CON CAPACIDAD DE 4 TB CADA UNO. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	1.00	$ 7,047,952	$ 7,047,952	1.00	$ 7,047,952	1.00	$ 7,047,952	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA EXTERIOR BALA VARIFOCAL TECNOLOGÍA IP 4 MEGAPIXELES D/N VF 2.8-12MM IR 50M 120DB METAL H265+ IP67 TIPO HIKVISION O SIMILAR. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	8.00	$ 1,475,275	$ 11,802,200	8.00	$ 11,802,200	8.00	$ 11,802,200	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TELEVISOR 4K-UHD DE 60 PULGADAS TIPO LED, POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS O SUPERIOR, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL TELEVISOR DE 60 HZ O SUPERIOR, SMART TV, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD TIPO WIFI, BLUETOOTH, CONTROL REMOTO (INFRARROJO), PUERTOS USB, HDMI, LAN/ETHERNET, MARCA TIPO SAMSUMG O SIMILAR. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN PARED.	UNIDAD	1.00	$ 3,281,373	$ 3,281,373	1.00	$ 3,281,373	1.00	$ 3,281,373	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR WQHD (2560X1440) DE 32 PULGADAS TIPO LCD, TECNOLOGÍA HDR, PUERTOS HDMI, DISPLAY PORT, SALIDA DE AUDIFONOS, TASA DE REFRESCO DE 144 HZ, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL MONITOR DE 1 MILISEGUNDO, MARCA TIPO SAMSUMG O SIMILAR.	UNIDAD	1.00	$ 2,007,923	$ 2,007,923	1.00	$ 2,007,923	1.00	$ 2,007,923	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA PARA PTZ IP JOYSTICK DE 4 EJES, PANTALLA DE 128 X 64 PIXELES. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	1.00	$ 1,171,350	$ 1,171,350	1.00	$ 1,171,350	1.00	$ 1,171,350	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.9	BANDEJA PORTACABLES DE 30X10 CMS TIPO CABLO FILL, CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	220.00	$ 89,513	$ 19,692,860	220.00	$ 19,692,860	220.00	$ 19,692,860	0.00	$ -	110.00	$ 9,846,430	-110.00	-$ 9,846,430	52.00	$ 4,654,676	52.00	$ 4,654,676	24%
31.10	TUBERÍA METÁLICA TIPO EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO, CAJAS TIPO RAD WELD	ML	360.00	$ 11,619	$ 4,182,840	360.00	$ 4,182,840	360.00	$ 4,182,840	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.11	CABLE DE PAR TRENZADO UTP CATEGORÍA 6ª, 100% COBRE, CERTIFICADO	ML	2600.00	$ 13,022	$ 33,857,200	2600.00	$ 33,857,200	2600.00	$ 33,857,200	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
31.12	RACK DE COMUNICACIONES TIPO GABINETE DE 1,80X0.60X0.50 M, CERTIFICADO, CON CHAPA LLAVE Y VENTILADORES, INCLUYE MULTITOMA DE 6 TOMA-CORRIENTES REGULADOS Y 2 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CERTIFICADO `CABLE UTP CAT 6ª, CON 74 PATCH CORD 6ª DE 1 MT	UNIDAD	1.00	$ 1,519,168	$ 1,519,168	1.00	$ 1,519,168	1.00	$ 1,519,168	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
31.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE TV, CABLE BLINDADO RG-59U TV, CERCO ORDINARIO EN CALIDAD 3M O SUPERIOR, SUPLEMENTO CAJA DOBLE REF: 2400 GALV. TOMA COAXIAL TV AMERICANA+DERIV. 75 OHM, TUBO EMT ¾". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	3.00	$ 64,854	$ 194,562	3.00	$ 194,562	3.00	$ 194,562	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
32	PLAZOLETAS, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO																			
32.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO MACIZO PREFABRICADO CON FORMALETA METALICA, CONCRETO 3000 PSI H=35 CM, B=20 CM, L=75 CM. DEBIDAMENTE ALINEADO, INCLUYE MORTERO DE PEGA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NO INCLUYE CAMA DE RECEBO.	M3	9.23	$ 587,325	$ 5,421,010	9.23	$ 5,421,010	9.23	$ 5,421,010	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
32.1	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	m2	105.69	$ 92,881	$ 9,816,593	105.69	$ 9,816,593	105.69	$ 9,816,593	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
32.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA BERMUDA GRASS INCLUYE TIERRA NEGRA	m2	60.81	$ 16,796	$ 1,021,365	60.81	$ 1,021,365	60.81	$ 1,021,365	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
33	ASEO DE OBRA																			
33.1	ASEO GENERAL FINO PARA ENTREGA DE OBRA (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA EDIFICACIÓN). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO, NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE). EL VALOR A PAGAR ES POR METRO CUADRADO EN PLANTA.	M2	1103.98	$ 3,410	$ 3,764,572	1103.98	$ 3,764,572	1103.98	$ 3,764,572	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0%
	ITEMS NO PREVISTOS 01																			
NP01	TALA DE ARBOL R1 - PERIMETRO 1,0 M; GUARATARO H=11 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 538,047	$ -	1.00	$ 538,047	1.00	$ 538,047	1.00	$ 538,047		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 538,047	100%
NP02	TALA DE ARBOL R2 - PERIMETRO 1,2 M; TAMARINDO H=14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 538,047	$ -	1.00	$ 538,047	1.00	$ 538,047	1.00	$ 538,047		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 538,047	100%
NP03	TALA DE ARBOL R3 - PERIMETRO 1,2 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 538,047	$ -	1.00	$ 538,047	1.00	$ 538,047	1.00	$ 538,047		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 538,047	100%
NP04	TALA DE ARBOL R4 - PERIMETRO 2,0 M; ALMENDRO H=15 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 1,076,094	$ -	1.00	$ 1,076,094	1.00	$ 1,076,094	1.00	$ 1,076,094		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,076,094	100%
NP05	TALA DE ARBOL R5 - PERIMETRO 1,90 M; HOBO H=18 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 1,076,094	$ -	1.00	$ 1,076,094	1.00	$ 1,076,094	1.00	$ 1,076,094		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,076,094	100%
NP06	TALA DE ARBOL R6 - PERIMETRO 1,70 M; MANGO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 635,059	$ -	1.00	$ 635,059	1.00	$ 635,059	1.00	$ 635,059		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 635,059	100%
NP07	TALA DE ARBOL A1 - PERIMETRO 1,3 M; MANGO H= 10 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 635,059	$ -	1.00	$ 635,059	1.00	$ 635,059	1.00	$ 635,059		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 635,059	100%
NP08	TALA DE ARBOL A2 - PERIMETRO 1,70 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 635,059	$ -	1.00	$ 635,059	1.00	$ 635,059	1.00	$ 635,059		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 635,059	100%
NP09	TALA DE ARBOL A3 - PERIMETRO 2,20 M; TAMARINDO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 829,083	$ -	1.00	$ 829,083	1.00	$ 829,083	1.00	$ 829,083		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 829,083	100%
NP10	TALA DE ARBOL A4 - PERIMETRO 2,90 M; MANGO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	0.00	$ 1,076,094	$ -	1.00	$ 1,076,094	1.00	$ 1,076,094	1.00	$ 1,076,094		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,076,094	100%
	ITEMS NO PREVISTOS 02																			

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
NP11	ARBOL NATIVO POR REPOSICION FLOR AMARILLO y/o YOPO y/o CONGRIO H<=130 M	UND		$ 32,038				50.00	$ 1,601,900								$ -	0.00	$ -	0%
NP12	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTOS O ANDENES	ML		$ 14,594				48.00	$ 700,512								$ -	0.00	$ -	0%
NP13	DEMOLICION DE ASFALTO - ANDEN	M2		$ 24,709				16.00	$ 395,344								$ -	0.00	$ -	0%
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO ASFALTICO ESPESOR E = 4" . INCLUYE IMPRIMACION	M3		$ 1,729,932				4.00	$ 6,919,728								$ -	0.00	$ -	0%
NP15	EXCAVACION MANUAL H < 1 MT. INCLUYE RETIRO	M3		$ 57,351				150.00	$ 8,602,650								$ -	0.00	$ -	0%
NP16	DADOS DE CONCRETO APOYOS ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES	UND		$ 30,500				80.00	$ 2,440,000								$ -	0.00	$ -	0%
NP17	ALFAGIA CONCRETO TERRAZA - MURO CERRAMIENTO	ML		$ 61,061				180.00	$ 10,990,980								$ -	0.00	$ -	0%
NP18	ANCLAJES PARA COLUMNETAS, INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UND		$ 11,140				600.00	$ 6,684,000								$ -	0.00	$ -	0%
NP19	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO INCLUYE DILATACION ICOPOR POR ML	ML		$ 70,549				885.00	$ 62,435,865								$ -	0.00	$ -	0%
NP20	PLACA MACIZA CUBIERTA IMPERMEABILIZADA	M3		$ 855,098				46.86	$ 40,073,612							44.40	$ 37,966,351	44.40	$ 37,966,351	95%
NP21	REMARCO EN CONCRETO VENTANAS 50 cm X 10 cm	ML		$ 87,569				148.00	$ 12,960,212								$ -	0.00	$ -	0%
NP22	PASAMUROS 4" ACERO	UND		$ 384,788				3.00	$ 1,154,364								$ -	0.00	$ -	0%
NP23	ESCALERA TIPO GATO	UND		$ 88,891				2.00	$ 177,782								$ -	0.00	$ -	0%
NP24	TAPA METALICA MARCO Y CONTRAMARCO, Y/O ESCOTILLA	UND		$ 396,609				6.00	$ 2,379,654								$ -	0.00	$ -	0%
NP25	PLATINAS DE ANCLAJE CONCRETO PARA COLUMNAS METALICAS, ESTRUCTURA PANELES, ESTRUCTURA CUBIERTA	UND		$ 67,864				56.00	$ 3,800,384								$ -	0.00	$ -	0%
NP26	BANDEJAS EN LAMINA DE 1/4" Y PLATINAS SOPORTE PASOS DE ESCALERA Y DESCANSOS ANCHO = 0,28 MT	ML		$ 287,786				186.00	$ 53,528,196								$ -	0.00	$ -	0%
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA ESCALERA	ML		$ 313,940				72.00	$ 22,603,680								$ -	0.00	$ -	0%
NP28	CAJA INSPECCION CONCRETO 60 X 60 H =0.60	UND		$ 340,851				2.00	$ 681,702								$ -	0.00	$ -	0%
NP29	TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML		$ 56,800				12.00	$ 681,600								$ -	0.00	$ -	0%
NP30	SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR DE AGUA, INCLUYE CAJA	UND		$ 265,254				1.00	$ 265,254								$ -	0.00	$ -	0%
NP31	DILATACION EN PISOS CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML		$ 14,607				86.00	$ 1,256,202								$ -	0.00	$ -	0%
NP32	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO (PI-005) BAÑOS	ML		$ 46,805				120.00	$ 5,616,600								$ -	0.00	$ -	0%
NP33	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO TIPO ROCK TOP. PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACION	M2		$ 53,577				9.00	$ 482,193								$ -	0.00	$ -	0%
NP34	GUARDAESCOBA PORCELANATO H = 0.07 MT	ML		$ 13,298				660.00	$ 8,776,680								$ -	0.00	$ -	0%
NP35	CINTA ANTIDESLIZANTE PASO ESCALERA	ML		$ 15,439				70.00	$ 1,080,730								$ -	0.00	$ -	0%
NP36	REJAS DE FACHADA 40 X 20 MM	M2		$ 366,969				37.65	$ 13,816,383								$ -	0.00	$ -	0%
NP37	REJA DE FACHADA 100 X 40 MM	M2		$ 545,605				33.48	$ 18,266,855								$ -	0.00	$ -	0%
NP38	PUERTAS EN ALUMINIO	M2		$ 413,721				48.00	$ 19,858,608								$ -	0.00	$ -	0%
NP39	PUERTA PRINCIPAL VIDRIO LAMINADO 4+4	M2		$ 602,519				7.50	$ 4,518,893								$ -	0.00	$ -	0%
NP40	TAPA CARCAMO EN LAMINA ALFAJOR 3 MM	ML		$ 278,586				6.00	$ 1,671,516								$ -	0.00	$ -	0%
NP41	CARCAMO MEDIA TESION SUBESTACION. NO INCLUYE TAPA	ML		$ 108,815				7.00	$ 761,705								$ -	0.00	$ -	0%
NP42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 13,2 KV - VSEC 208/120 V) FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 38,651,632				1.00	$ 38,651,632							0.65	$ 25,123,561	0.65	$ 25,123,560	65%
NP43	SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA POR ML DE CABLER	ML		$ 72,898				46.00	$ 3,353,308								$ -	0.00	$ -	0%
NP44	TUBERIA CONDUIT PVC 4" PARA ACOMETIDAS	ML		$ 36,797				40.00	$ 1,471,880								$ -	0.00	$ -	0%
NP45	KIT DE TRANSICION PVC C900 - ACERO NEGRO SIAMESA-GABINETE-TUBERIA	UND		$ 1,563,478				3.00	$ 4,690,434								$ -	0.00	$ -	0%
NP46	ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES SOLARES	M2		$ 185,633				79.64	$ 14,783,641								$ -	0.00	$ -	0%
	ITEMS NO PREVISTOS - PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																			
NP 46	ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES SOLARES	M2		$ 185,633				200.36	$ 37,193,428								$ -	0.00	$ -	0%
NP 47	CUBIERTA POLICARBONATO (C-000) Y ACCESO LATERAL	M2		$ 95,545				14.00	$ 1,337,630								$ -	0.00	$ -	0%
NP 48	MEDIA CAÑA MORTERO CUBIERTA(PI-008)	ML		$ 20,421				74.00	$ 1,511,154								$ -	0.00	$ -	0%
NP 49	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SIKA FILL O SIMILAR 320	M2		$ 84,062				360.00	$ 30,262,320								$ -	0.00	$ -	0%
NP 50	TRAGANTE TIPO CUPULA 6"X4"(C-002)	UND		$ 79,295				6.00	$ 475,770								$ -	0.00	$ -	0%
NP 51	FLANCHES DE SELLO CUBIERTAS (SIN DETALLE) - O ALFAGIAS DE BORDE	ML		$ 33,804				74.00	$ 2,501,496								$ -	0.00	$ -	0%
NP 52	CANAL EN LAMINA GALV CALIBRE 22 Ld=0.60 MT	ML		$ 111,348				10.00	$ 1,113,480								$ -	0.00	$ -	
COSTO DIRECTO TOTAL DEL CONTRATO					**$ 3,567,069,037**		**$ 3,574,645,720**		**$ 3,649,040,999**		**$ 97,945,692**		**$ 285,545,472**		**$ 100,067,002**		**$ 974,387,281**		**$ 1,457,945,444**	
ADMINISTRACIÓN				17%	$ 606,401,736		$ 607,689,772		$ 620,336,970		$ 16,650,768		$ 48,542,730		$ 17,011,390		$ 165,645,838		**$ 247,850,726**	
IMPREVISTOS				3%	$ 107,012,071		$ 107,239,372		$ 109,471,230		$ 2,938,371		$ 8,566,364		$ 3,002,010		$ 29,231,618		**$ 43,738,363**	
UTILIDAD				5%	$ 178,353,452		$ 178,732,286		$ 182,452,050		$ 4,897,285		$ 14,277,274		$ 5,003,350		$ 48,719,364		**$ 72,897,273**	
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 33,887,156		$ 33,959,134		$ 34,665,890		$ 930,484		$ 2,712,682		$ 950,637		$ 9,256,679		**$ 13,850,482**	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 925,654,415**		**$ 927,620,564**		**$ 946,926,140**		**$ 25,416,908**		**$ 74,099,050**		**$ 25,967,387**		**$ 252,853,499**		**$ 378,336,844**	
				VALOR TOTAL OBRA	**$ 4,492,723,452**		**$ 4,502,266,284**		**$ 4,595,967,139**											
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					$ 336,518,736		$ 326,975,904		$ 233,275,049											
PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					$ 100,000,000		$ 100,000,000		$ 100,000,000											
VALOR TOTAL					**$ 4,929,242,188**		**$ 4,929,242,188**		**$ 4,929,242,188**		**$ 123,362,600**		**$ 359,644,522**		**$ 126,034,389**		**$ 1,227,240,780**		**$ 1,836,282,291**	37.25%
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO																				
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO											**$ 63,250,807**		**$ 194,240,668**		**$ 63,017,195**		**$ 613,620,390**		**$ 934,129,060**	
VALOR A PAGAR EN ACTA											**$ 60,111,793**		**$ 165,403,854**		**$ 63,017,195**		**$ 613,620,390**		**$ 902,153,232**	

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS

GERMAN GARZON SALCEDO
Director de interventoria
CONSORCIO INGEALDEIC

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	1.2			1 de 1
DESCRIPCION	CERRAMIENTO PROVISIONAL TIPO 2: TUBOS RECTANGULARES Y COLUMNAS DE 50 X 25 MM CALIBRE 16, PINTADOS CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO NEGRO. LÁMINA EN TEJA METÁLICA GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL 2.44 M X 0.86 M, ESPESOR CALIBRE 28 0 30, PINTADA EN EL EXTERIOR CON UNA MANO DE IMPRIMANTE Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA BRILLANTE, ALTURA 2.44 M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE).					








CERRAM IENTO

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		32.76	2.40				78.62
		18.15	2.40				43.56
		28.15	2.40				67.56
		15.00	2.40				36.00
		0.94	2.40				2.26
							228.00
						TOTAL	**228.00**

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.2			1 de 1	
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.						

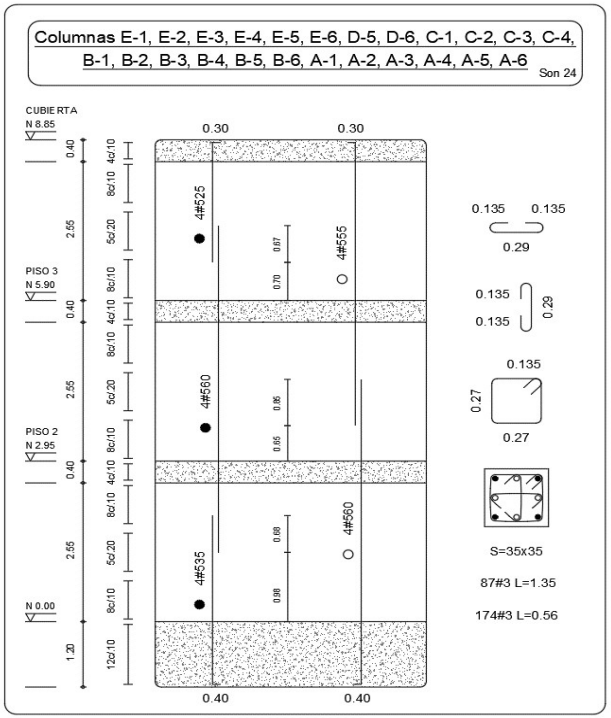

4.2 COLUMNAS EN CONCRETO

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	0.35	0.35	8.85	M3	24	E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, D-5, D-6, C-1, C-2, C-3, C-4, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6	26.02





						TOTAL	26.02
	PAGADOS EN ACTAS ANTERIORES						8.97
						TOTAL	17.05

OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.3			1 de 3

DESCRIPCION

CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.

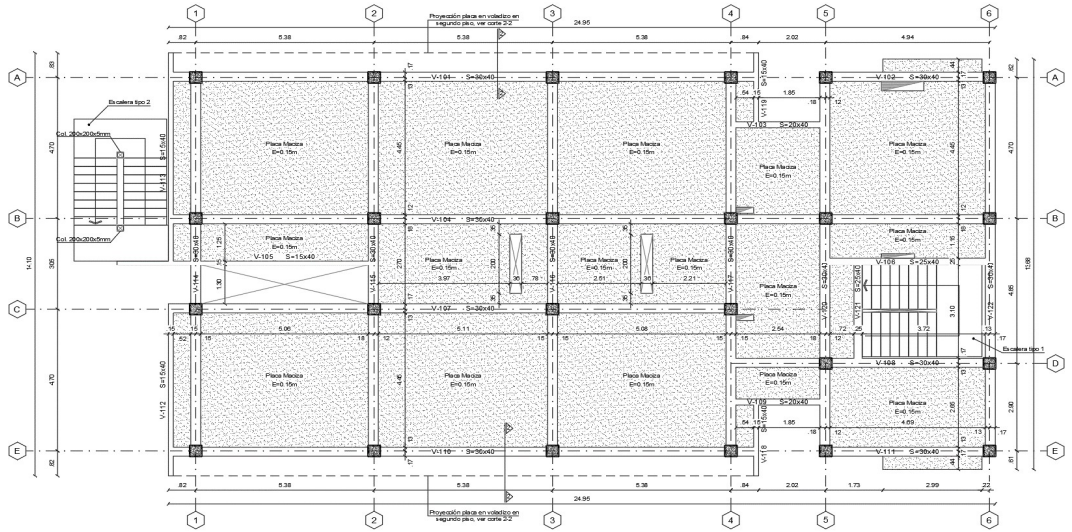

4.3 VIGA AEREA CONCRETO 2 PISO

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
V-101	0.30	17.81	0.40	M3	1	2 PISO	2.14
V-102	0.30	5.29	0.40	M3	1	2 PISO	0.63
V-103	0.20	3.14	0.40	M3	1	2 PISO	0.25
V-104	0.30	24.95	0.40	M3	1	2 PISO	2.99
V-105	0.15	7.88	0.40	M3	1	2 PISO	0.47
V-106	0.25	5.30	0.40	M3	1	2 PISO	0.53
V-107	0.30	17.15	0.40	M3	1	2 PISO	2.06
V-108	0.30	8.13	0.40	M3	1	2 PISO	0.98
V-109	0.20	3.14	0.40	M3	1	2 PISO	0.25
V-110	0.30	17.81	0.40	M3	1	2 PISO	2.14
V-111	0.30	5.30	0.40	M3	1	2 PISO	0.64
V-112	0.15	5.70	0.40	M3	1	2 PISO	0.34
V-113	0.15	7.10	0.40	M3	1	2 PISO	0.43
V-114	0.30	12.80	0.40	M3	1	2 PISO	1.54
V-115	0.30	12.80	0.40	M3	1	2 PISO	1.54
V-116	0.30	12.80	0.40	M3	1	2 PISO	1.54
V-117	0.30	12.80	0.40	M3	1	2 PISO	1.54
V-118	0.15	2.55	0.40	M3	1	2 PISO	0.15
V-119	0.15	2.30	0.40	M3	1	2 PISO	0.14
V-120	0.30	12.80	0.40	M3	1	2 PISO	1.54
V-121	0.25	3.65	0.40	M3	1	2 PISO	0.37
V-122	0.30	12.80	0.40	M3	1	2 PISO	1.54
						TOTAL ACUMULADO	23.72




OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.3			2 de 3
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.					

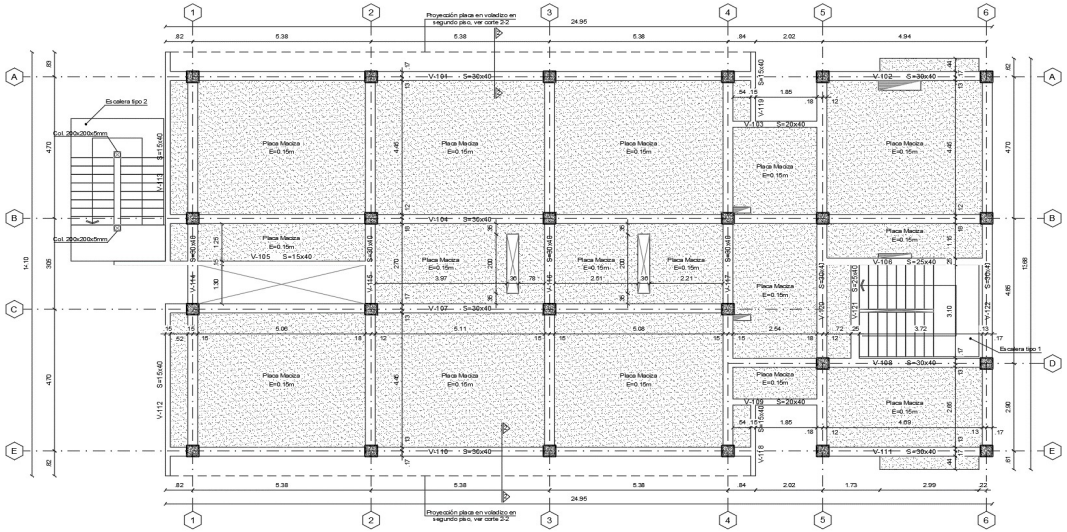

4.3 VIGA AEREA CONCRETO 3 PISO


Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
V-101	0.30	17.81	0.40	M3	1	3 PISO	2.14
V-102	0.30	5.29	0.40	M3	1	3 PISO	0.63
V-103	0.20	3.14	0.40	M3	1	3 PISO	0.25
V-104	0.30	24.95	0.40	M3	1	3 PISO	2.99
V-105	0.15	7.88	0.40	M3	1	3 PISO	0.47
V-106	0.25	5.30	0.40	M3	1	3 PISO	0.53
V-107	0.30	17.15	0.40	M3	1	3 PISO	2.06
V-108	0.30	8.13	0.40	M3	1	3 PISO	0.98
V-109	0.20	3.14	0.40	M3	1	3 PISO	0.25
V-110	0.30	17.81	0.40	M3	1	3 PISO	2.14
V-111	0.30	5.30	0.40	M3	1	3 PISO	0.64
V-112	0.15	5.70	0.40	M3	1	3 PISO	0.34
V-113	0.15	7.10	0.40	M3	1	3 PISO	0.43
V-114	0.30	12.80	0.40	M3	1	3 PISO	1.54
V-115	0.30	12.80	0.40	M3	1	3 PISO	1.54
V-116	0.30	12.80	0.40	M3	1	3 PISO	1.54
V-117	0.30	12.80	0.40	M3	1	3 PISO	1.54
V-118	0.15	2.55	0.40	M3	1	3 PISO	0.15
V-119	0.15	2.30	0.40	M3	1	3 PISO	0.14
V-120	0.30	12.80	0.40	M3	1	3 PISO	1.54
V-121	0.25	3.65	0.40	M3	1	3 PISO	0.37
V-122	0.30	12.80	0.40	M3	1	3 PISO	1.54

		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.3			3 de 3

DESCRIPCION

CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.

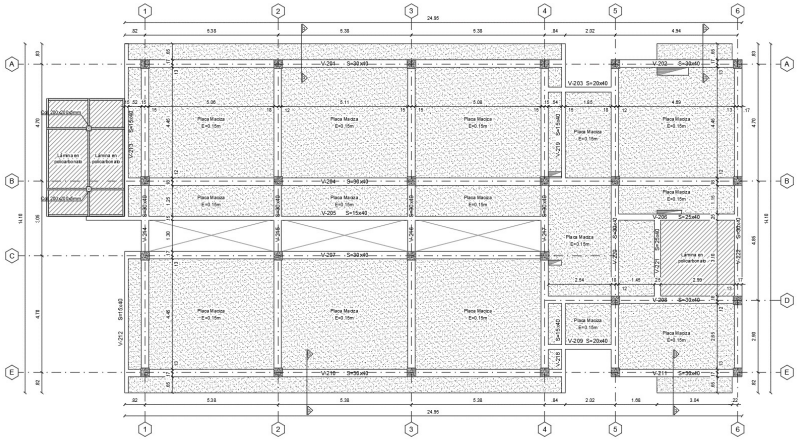



4.3 VIGA AEREA CONCRETO CUBIERTA

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
V-201	0.30	17.81	0.15	M2	1	CUBIERTA	0.80
V-202	0.30	5.30	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.64
V-203	0.20	3.14	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.25
V-204	0.30	24.95	0.40	M3	1	CUBIERTA	2.99
V-205	0.15	18.68	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.12
V-206	0.25	5.30	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.53
V-207	0.30	17.15	0.40	M3	1	CUBIERTA	2.06
V-208	0.30	8.12	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.97
V-209	0.20	3.14	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.25
V-210	0.30	17.81	0.40	M3	1	CUBIERTA	2.14
V-211	0.30	5.30	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.64
V-212	0.15	5.70	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.34
V-213	0.15	7.10	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.43
V-214	0.30	12.80	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.54
V-215	0.30	12.80	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.54
V-216	0.30	12.80	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.54
V-217	0.30	12.80	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.54
V-218	0.15	3.90	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.23
V-219	0.15	5.70	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.34
V-220	0.30	12.80	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.54
V-221	0.25	3.65	0.40	M3	1	CUBIERTA	0.37
V-222	0.30	12.80	0.40	M3	1	CUBIERTA	1.54
						TOTAL ACUMULADO	70.75

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


TOTAL VIGAS	70.75
PAGADO ACTAS ANTERIORES	23.72

TOTAL VIGAS	47.03

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.5			1 de 2

DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.

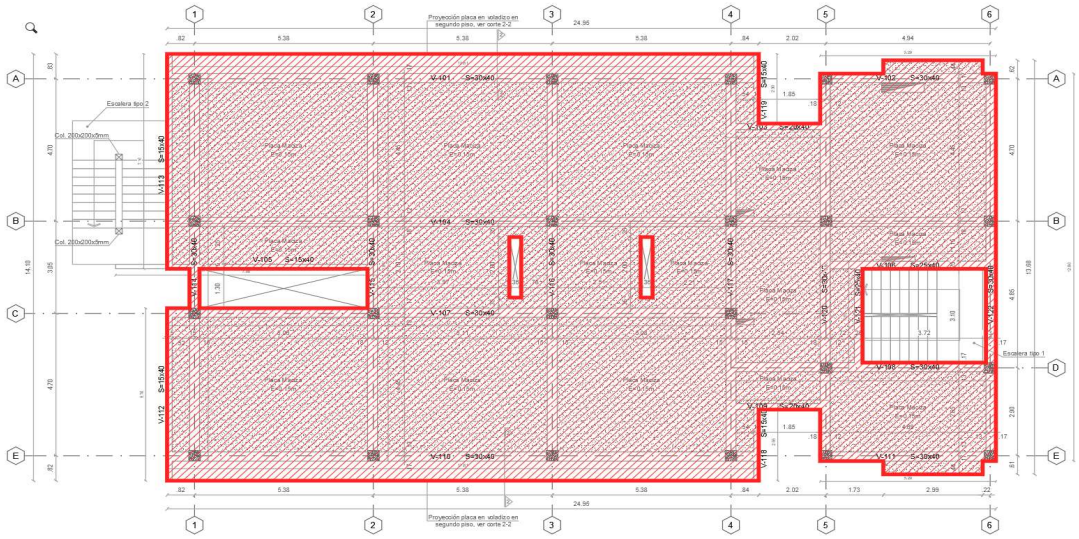

4.5 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 2 PISO

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	312.42			M2	1	PLACA 2 PISO	312.42
						TOTAL ACUMULADO	312.42




OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.5			2 de 2
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA. SIN IMPERMEABILIZAR.NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.					

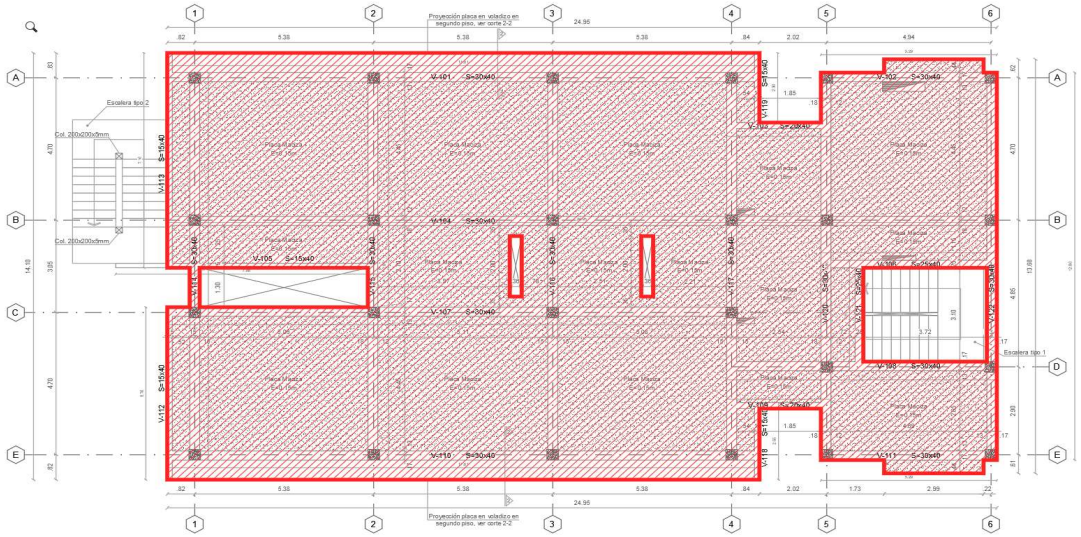

OB

4.5 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3 PISO

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	312.42			M2	1	PLACA 3 PISO	312.42
						TOTAL ACUMULADO	624.84




TOTAL M2	624.84
TOTAL M3 CON 0.15 DE ESPESOR	93.73
PAGADO ACTAS ANTERIORES	44.54

TOTAL PLACA MACIZA	49.19


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	ML			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.6			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V - 15 PARA JUNTAS PARA TANQUE					

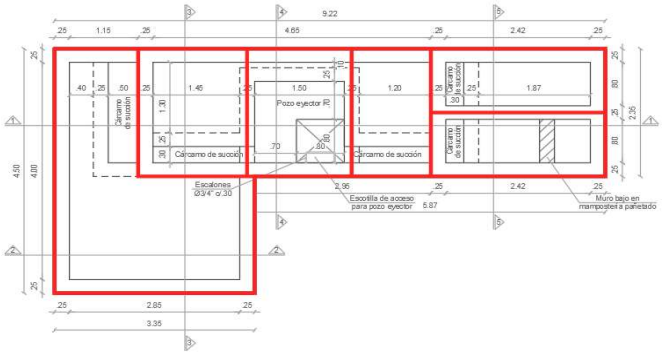

PLANTA VISTA INFERIOR TANQUE (GEOMETRÍA)
ESC. 1:50

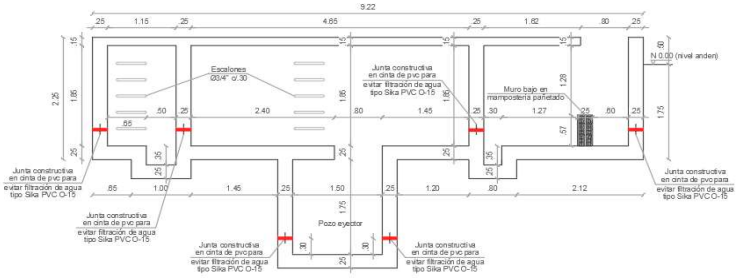

CORTE 1 - 1 (GEOMETRÍA)
ESC. 1:50

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

4.6 CINTA PVC TANQUE

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
		2.35		ML	5	TANQUE	11.75
		2.92		ML	1	TANQUE	2.92
		1.95		ML	1	TANQUE	1.95
		25.09		ML	1	TANQUE	25.09
						TOTAL	41.71






	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	


PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4..8			1 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

CUADRO DE DESPIECE DE ZAPATAS


TIPO	DIMENSIONES				REFUERZO INFERIOR		CANT
	A	B	H	h	Sentido A	Sentido B	
Z1	1.00	1.00	.30	.30	7#412.5c/.14	7#412.5c/.14	22
Z2	1.50	1.00	.50	.30	11#412.5c/.14	7#417.5c/.14	3
Z3	1.00	1.00	.50	.30	7#412.5c/.14	7#412.5c/.14	1



PLANTA ZAPATA



CORTE ZAPATA

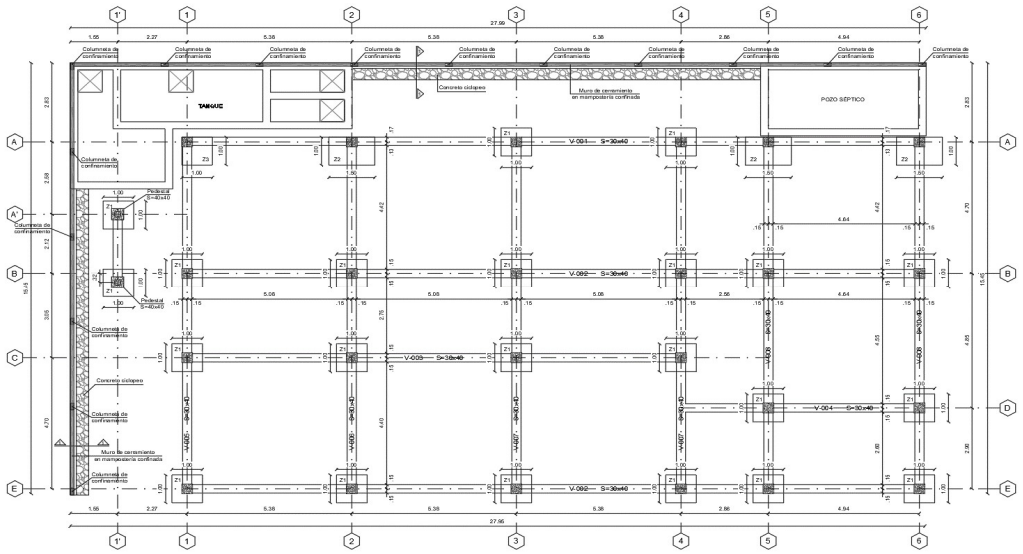

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC. 1:75

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

5.1 ACERO ZAPATAS


CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
Z1	7	4	1.25	0.994	22	CIMENTACION	191.35
	7	4	1.25	0.994	22	CIMENTACION	191.35
Z2	11	4	1.25	0.994	3	CIMENTACION	41.00
	7	4	1.75	0.994	3	CIMENTACION	36.53
Z3	7	4	1.25	0.994	1	CIMENTACION	8.70
	7	4	1.25	0.994	1	CIMENTACION	8.70

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			2 de 27	

DESCRIPCION

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.

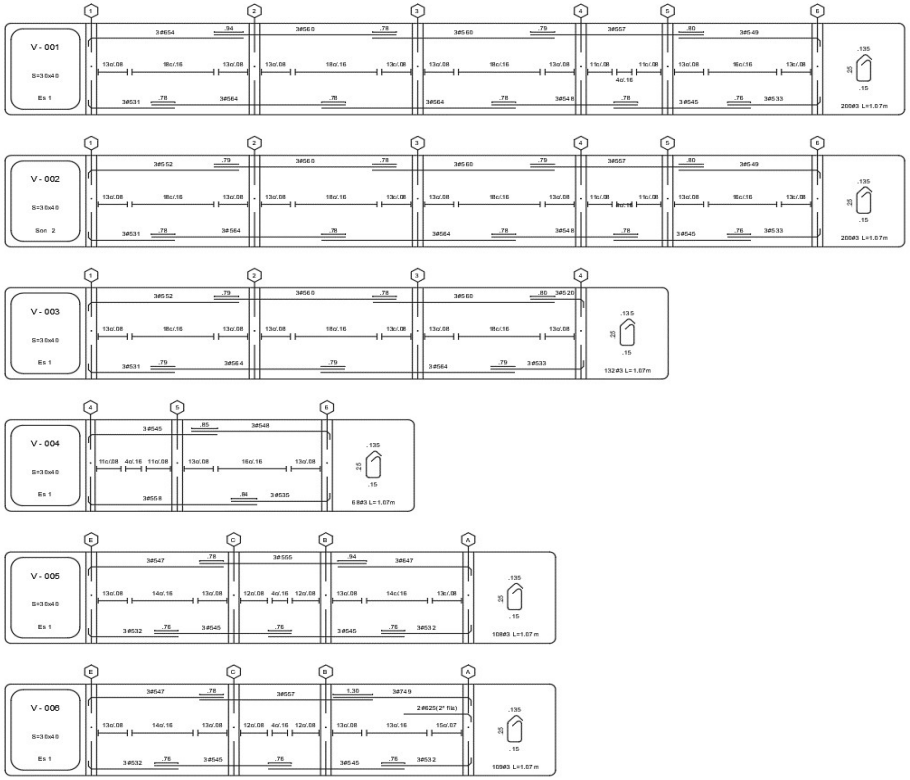

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS DE CIMENTACION

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-001	3	6	5.40	2.235	1	CIMENTACION	36.21
	6	5	6.00	1.552	1	CIMENTACION	55.87
	3	5	5.70	1.552	1	CIMENTACION	26.54
	3	5	4.90	1.552	1	CIMENTACION	22.81
	3	5	3.10	1.552	1	CIMENTACION	14.43
	3	5	6.40	1.552	1	CIMENTACION	29.80
	3	5	4.80	1.552	1	CIMENTACION	22.35
	3	5	4.50	1.552	1	CIMENTACION	20.95
	3	5	3.30	1.552	1	CIMENTACION	15.36
	200	3	1.07	0.560	1	CIMENTACION	119.84
V-002	3	5	5.20	1.552	2	CIMENTACION	48.42
	6	5	6.00	1.552	2	CIMENTACION	111.74
	3	5	5.70	1.552	2	CIMENTACION	53.08
	3	5	4.90	1.552	2	CIMENTACION	45.63
	3	5	3.10	1.552	2	CIMENTACION	28.87
	6	5	6.40	1.552	2	CIMENTACION	119.19
	3	5	4.80	1.552	2	CIMENTACION	44.70
	3	5	5.45	1.552	2	CIMENTACION	50.75
	3	5	3.30	1.552	2	CIMENTACION	30.73
	200	3	1.07	0.560	2	CIMENTACION	239.68
V-003	3	5	5.20	1.552	1	CIMENTACION	24.21
	6	5	6.00	1.552	1	CIMENTACION	55.87
	3	5	2.00	1.552	1	CIMENTACION	9.31
	3	5	3.10	1.552	1	CIMENTACION	14.43
	6	5	6.40	1.552	1	CIMENTACION	59.60
	3	5	3.30	1.552	1	CIMENTACION	15.36
	132	3	1.07	0.560	1	CIMENTACION	79.09
V-004	3	5	4.50	1.552	1	CIMENTACION	20.95
	3	5	4.80	1.552	1	CIMENTACION	22.35
	3	5	5.80	1.552	1	CIMENTACION	27.00
	3	5	3.50	1.552	1	CIMENTACION	16.30
	68	3	1.07	0.560	1	CIMENTACION	40.75
V-005	3	5	4.70	1.552	1	CIMENTACION	21.88
	3	5	5.50	1.552	1	CIMENTACION	25.61
	3	6	4.70	2.235	1	CIMENTACION	31.51
	3	5	3.20	1.552	1	CIMENTACION	14.90
	6	5	4.50	1.552	1	CIMENTACION	41.90
	3	5	3.20	1.552	1	CIMENTACION	14.90
	108	3	1.07	0.560	1	CIMENTACION	64.71
V-006	3	5	4.70	1.552	1	CIMENTACION	21.88
	3	5	5.70	1.552	1	CIMENTACION	26.54
	3	7	4.90	3.042	1	CIMENTACION	44.72
	2	6	2.50	2.235	1	CIMENTACION	11.18
	3	5	3.20	1.552	1	CIMENTACION	14.90
	6	5	4.50	1.552	1	CIMENTACION	41.90
						TOTAL ACUMULADO	2,376.35

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			3 de 27	

DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.

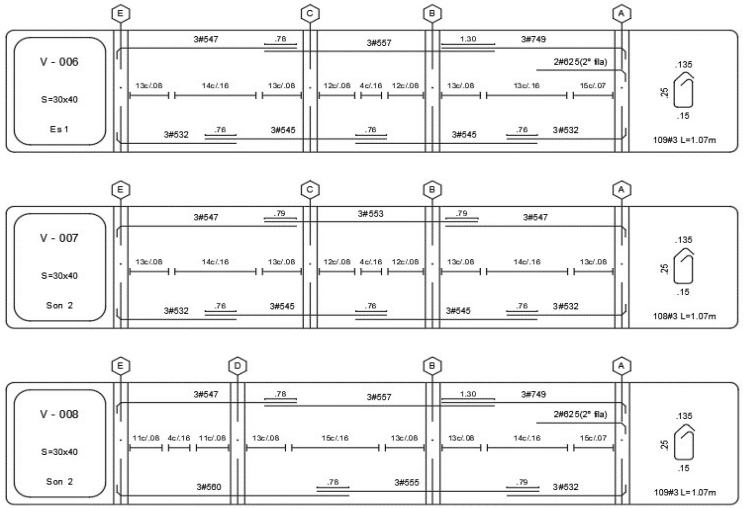

OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

5.1 ACERO VIGAS DE CIMENTACION

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-006	3	5	0.15	M2	1	CIMENTACION	0.45
	109	3	1.07	0.560	1	CIMENTACION	65.31
V-007	3	5	4.70	1.552	2	CIMENTACION	43.77
	3	5	5.30	1.552	2	CIMENTACION	49.35
	3	5	4.70	1.552	2	CIMENTACION	43.77
	3	5	3.20	1.552	2	CIMENTACION	29.80
	6	5	4.50	1.552	2	CIMENTACION	83.81
	3	5	3.20	1.552	2	CIMENTACION	29.80
	108	3	1.07	0.560	2	CIMENTACION	129.43
V-008	3	5	4.70	1.552	2	CIMENTACION	43.77
	3	5	5.70	1.552	2	CIMENTACION	53.08
	3	7	4.90	3.042	2	CIMENTACION	89.43
	2	6	2.50	2.235	2	CIMENTACION	22.35
	3	5	6.00	1.552	2	CIMENTACION	55.87
	3	5	5.50	1.552	2	CIMENTACION	51.22
	3	5	3.20	1.552	2	CIMENTACION	29.80
	109	3	1.07	0.560	2	CIMENTACION	130.63
						TOTAL ACUMULADO	3,327.97

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			4 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

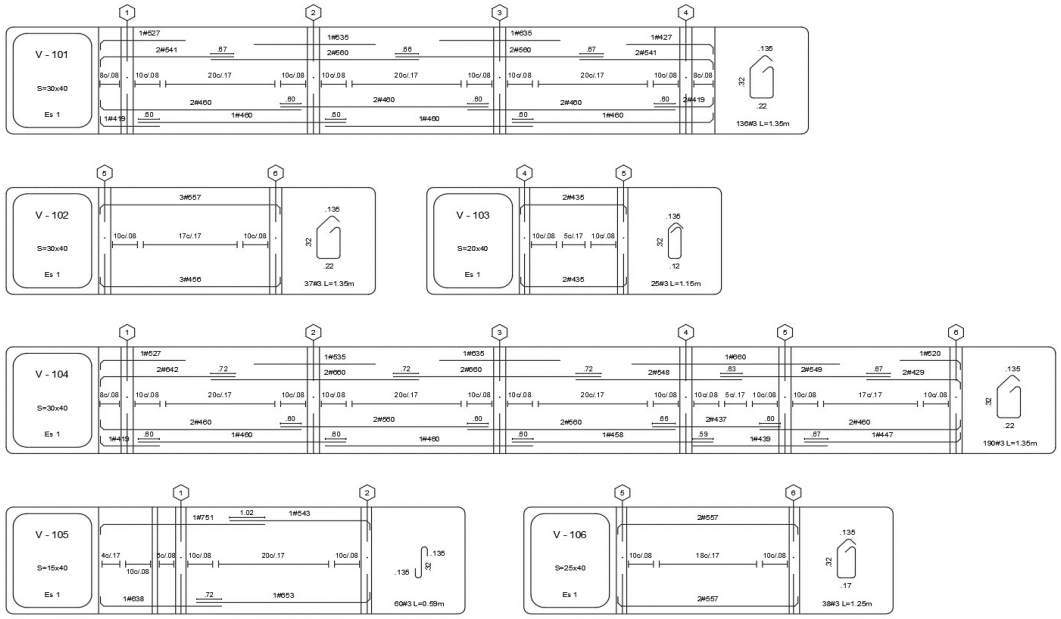

5.1 ACERO VIGAS 2 PISO

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-101	1	5	2.70	1.552	1	2 PISO	4.19
	1	5	3.50	1.552	1	2 PISO	5.43
	1	6	3.50	2.235	1	2 PISO	7.82
	1	4	2.70	0.994	1	2 PISO	2.68
	2	5	4.10	1.552	1	2 PISO	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	2 PISO	37.25
	2	5	4.10	1.552	1	2 PISO	12.73
	6	4	6.00	0.994	1	2 PISO	35.78
	2	4	1.90	0.994	1	2 PISO	3.78
	1	4	1.90	0.994	1	2 PISO	1.89
	3	4	6.00	0.994	1	2 PISO	17.89
	136	3	1.35	0.560	1	2 PISO	102.82
V-102	3	5	5.70	1.552	1	2 PISO	26.54
	3	4	5.60	0.994	1	2 PISO	16.70
	37	3	1.35	0.560	1	2 PISO	27.97
V-103	4	4	3.50	0.994	1	2 PISO	13.92
	25	3	1.15	0.560	1	2 PISO	16.10
V-104	1	5	2.70	1.552	1	2 PISO	4.19
	1	5	3.50	1.552	1	2 PISO	5.43
	1	6	3.50	2.235	1	2 PISO	7.82
	1	6	6.00	2.235	1	2 PISO	13.41
	1	5	2.00	1.552	1	2 PISO	3.10
	2	6	4.20	2.235	1	2 PISO	18.77
	4	6	6.00	2.235	1	2 PISO	53.64
	2	5	4.80	1.552	1	2 PISO	14.90
	2	5	4.90	1.552	1	2 PISO	15.21
	2	4	2.90	0.994	1	2 PISO	5.77
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	4	5	6.00	1.552	1	2 PISO	37.25
	2	4	3.70	0.994	1	2 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	1.90	0.994	1	2 PISO	1.89
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	5.80	0.994	1	2 PISO	5.77
	1	4	3.90	0.994	1	2 PISO	3.88
	1	4	4.70	0.994	1	2 PISO	4.67
	190	3	1.35	0.560	1	2 PISO	143.64
V-105	1	7	5.10	3.042	1	2 PISO	15.51
	1	5	4.30	1.552	1	2 PISO	6.67
	1	6	3.80	2.235	1	2 PISO	8.49
	1	6	5.30	2.235	1	2 PISO	11.85
	60	3	0.59	0.560	1	2 PISO	19.82
V-106	4	5	5.70	1.552	1	2 PISO	35.39
	38	3	1.25	0.560	1	2 PISO	26.60
						TOTAL ACUMULADO	4,181.00

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			5 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

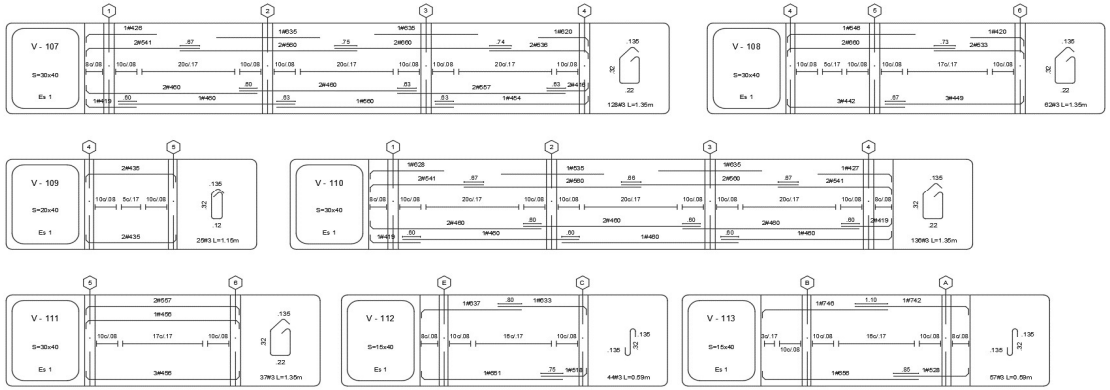

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS 2 PISO

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-107	1	4	2.60	0.994	1	2 PISO	2.58
	2	6	3.50	2.235	1	2 PISO	15.65
	1	6	2.00	2.235	1	2 PISO	4.47
	2	5	4.10	1.552	1	2 PISO	12.73
	2	5	6.00	1.552	1	2 PISO	18.62
	2	6	6.00	2.235	1	2 PISO	26.82
	2	5	3.60	1.552	1	2 PISO	11.17
	4	4	6.00	0.994	1	2 PISO	23.86
	2	5	5.70	1.552	1	2 PISO	17.69
	2	4	1.60	0.994	1	2 PISO	3.18
	1	4	1.90	0.994	1	2 PISO	1.89
	1	4	6.00	0.994	1	2 PISO	5.96
	1	5	6.00	1.552	1	2 PISO	9.31
	1	4	5.40	0.994	1	2 PISO	5.37
	128	3	1.35	0.560	1	2 PISO	96.77
V-108	1	5	4.60	1.552	1	2 PISO	7.14
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	6	6.00	2.235	1	2 PISO	26.82
	2	5	3.30	1.552	1	2 PISO	10.24
	3	4	4.20	0.994	1	2 PISO	12.52
	3	4	4.90	0.994	1	2 PISO	14.61
	62	3	1.35	0.560	1	2 PISO	46.87
V-109	4	4	3.50	0.994	1	2 PISO	13.92
	25	3	1.15	0.560	1	2 PISO	16.10
V-110	1	6	2.80	2.235	1	2 PISO	6.26
	1	5	3.50	1.552	1	2 PISO	5.43
	1	6	3.50	2.235	1	2 PISO	7.82
	1	4	2.70	0.994	1	2 PISO	2.68
	2	5	4.10	1.552	1	2 PISO	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	2 PISO	37.25
	2	5	4.10	1.552	1	2 PISO	12.73
	6	4	6.00	0.994	1	2 PISO	35.78
	3	4	1.90	0.994	1	2 PISO	5.67
	3	4	6.00	0.994	1	2 PISO	17.89
	136	3	1.35	0.560	1	2 PISO	102.82
V-111	2	5	5.70	1.552	1	2 PISO	17.69
	4	4	5.60	0.994	1	2 PISO	22.27
	37	3	1.35	0.560	1	2 PISO	27.97
V-112	1	6	3.70	2.235	1	2 PISO	8.27
	1	6	3.30	2.235	1	2 PISO	7.38
	1	6	5.10	2.235	1	2 PISO	11.40
	1	5	1.80	1.552	1	2 PISO	2.79
	44	3	0.59	0.560	1	2 PISO	14.54
						TOTAL ACUMULADO	4,946.65

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			6 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

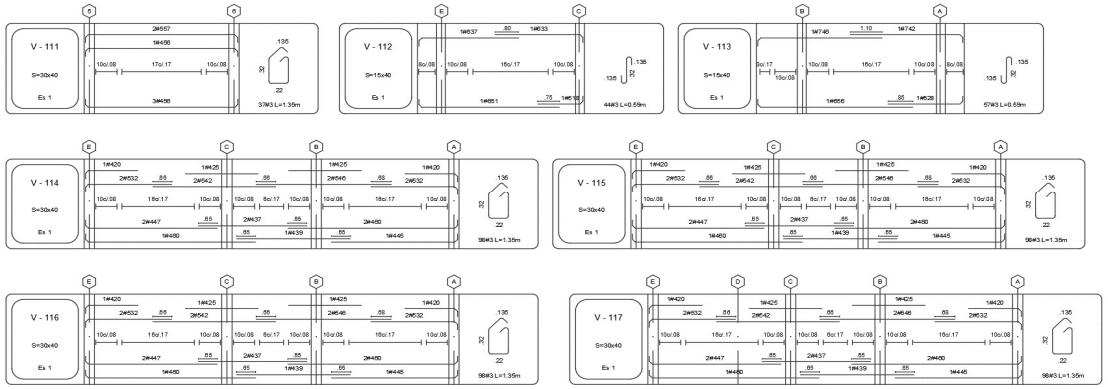

5.1 ACERO VIGAS 2 PISO

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-113	1	7	4.60	3.042	1	2 PISO	13.99
	1	7	4.20	3.042	1	2 PISO	12.78
	1	6	5.60	2.235	1	2 PISO	12.52
	1	5	2.80	1.552	1	2 PISO	4.35
	57	3	0.59	0.560	1	2 PISO	18.83
V-114	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	2 PISO	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	2 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	2 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	2 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	2 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	2 PISO	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	2 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	2 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	2 PISO	74.09
V-115	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	2 PISO	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	2 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	2 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	2 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	2 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	2 PISO	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	2 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	2 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	2 PISO	74.09
V-116	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	1	4	2.50	0.994	1	2 PISO	2.49
	1	4	2.50	0.994	1	2 PISO	2.49
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	2 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	2 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	2 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	2 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	2 PISO	5.96
						TOTAL ACUMULADO	5,446.14

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			7 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

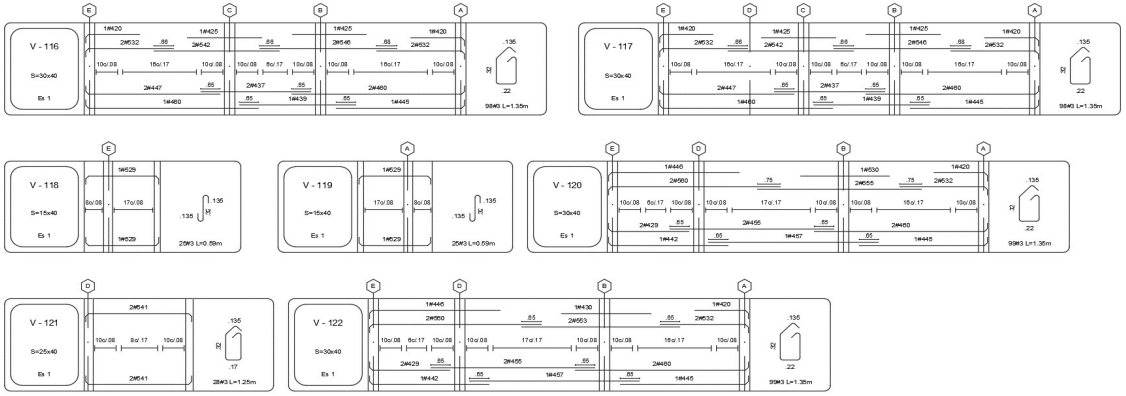

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS 2 PISO

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-116	1	4	3.90	0.994	1	2 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	2 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	2 PISO	74.09
V-117	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	2 PISO	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	2 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	2 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	2 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	2 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	2 PISO	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	2 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	2 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	2 PISO	74.09
V-118	2	5	2.90	1.552	1	2 PISO	9.00
	25	3	0.59	0.560	1	2 PISO	8.26
V-119	2	5	2.90	1.552	1	2 PISO	9.00
	25	3	0.59	0.560	1	2 PISO	8.26
V-120	1	4	4.60	0.994	1	2 PISO	4.57
	1	5	3.00	1.552	1	2 PISO	4.66
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	2 PISO	18.62
	2	6	5.50	2.235	1	2 PISO	24.59
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	4	2.90	0.994	1	2 PISO	5.77
	2	4	5.50	0.994	1	2 PISO	10.93
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
	1	4	4.20	0.994	1	2 PISO	4.17
	1	4	5.70	0.994	1	2 PISO	5.67
	1	4	4.50	0.994	1	2 PISO	4.47
	99	3	1.35	0.560	1	2 PISO	74.84
V-121	2	5	4.10	1.552	1	2 PISO	12.73
	28	3	1.25	0.560	1	2 PISO	19.60
V-122	1	4	4.60	0.994	1	2 PISO	4.57
	1	4	3.00	0.994	1	2 PISO	2.98
	1	4	2.00	0.994	1	2 PISO	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	2 PISO	18.62
	2	5	5.30	1.552	1	2 PISO	16.45
	2	5	3.20	1.552	1	2 PISO	9.93
	2	4	2.90	0.994	1	2 PISO	5.77
	2	4	5.50	0.994	1	2 PISO	10.93
	2	4	6.00	0.994	1	2 PISO	11.93
						TOTAL ACUMULADO	6,033.90

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			8 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

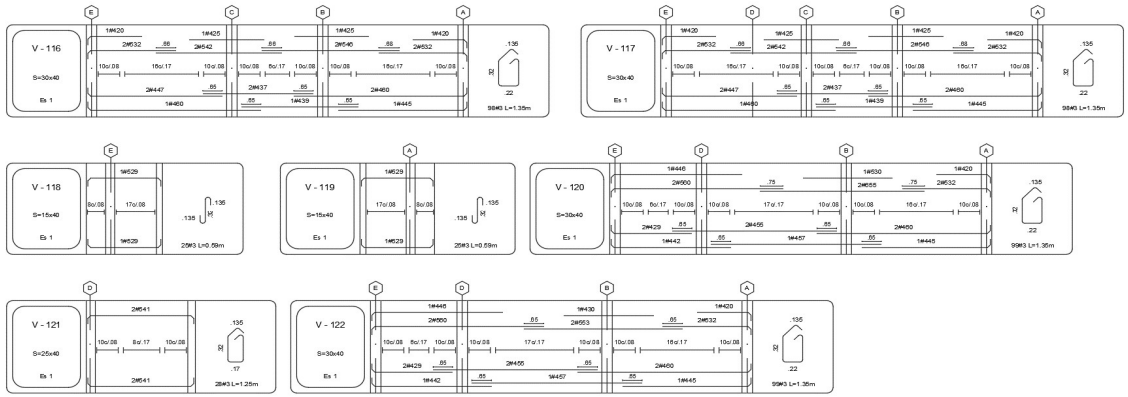

5.1 ACERO VIGAS 2 PISO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-122	1	4	4.20	0.994	1	2 PISO	4.17
	1	4	5.70	0.994	1	2 PISO	5.67
	1	4	4.50	0.994	1	2 PISO	4.47
	99	3	1.35	0.560	1	2 PISO	74.84
						TOTAL ACUMULADO	6,123.06


OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			9 de 27

DESCRIPCION: ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.

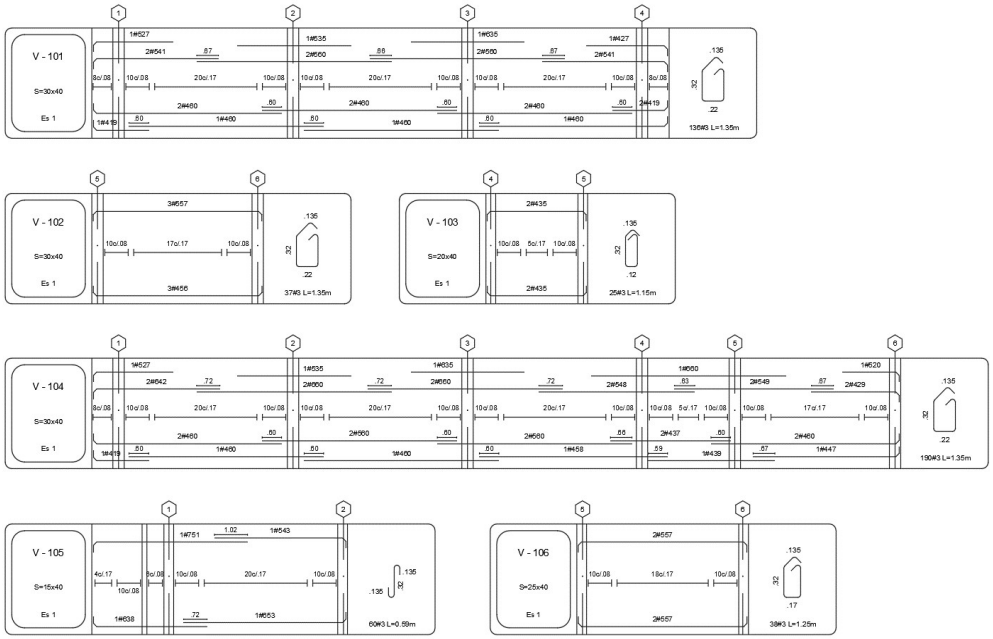

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS 3 PISO

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-101	1	5	2.70	1.552	1	3 PISO	4.19
	1	5	3.50	1.552	1	3 PISO	5.43
	1	6	3.50	2.235	1	3 PISO	7.82
	1	4	2.70	0.994	1	3 PISO	2.68
	2	5	4.10	1.552	1	3 PISO	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	3 PISO	37.25
	2	5	4.10	1.552	1	3 PISO	12.73
	6	4	6.00	0.994	1	3 PISO	35.78
	2	4	1.90	0.994	1	3 PISO	3.78
	1	4	1.90	0.994	1	3 PISO	1.89
	3	4	6.00	0.994	1	3 PISO	17.89
	136	3	1.35	0.560	1	3 PISO	102.82
V-102	3	5	5.70	1.552	1	3 PISO	26.54
	3	4	5.60	0.994	1	3 PISO	16.70
	37	3	1.35	0.560	1	3 PISO	27.97
V-103	4	4	3.50	0.994	1	3 PISO	13.92
	25	3	1.15	0.560	1	3 PISO	16.10
V-104	1	5	2.70	1.552	1	3 PISO	4.19
	1	5	3.50	1.552	1	3 PISO	5.43
	1	6	3.50	2.235	1	3 PISO	7.82
	1	6	6.00	2.235	1	3 PISO	13.41
	1	5	2.00	1.552	1	3 PISO	3.10
	2	6	4.20	2.235	1	3 PISO	18.77
	4	6	6.00	2.235	1	3 PISO	53.64
	2	5	4.80	1.552	1	3 PISO	14.90
	2	5	4.90	1.552	1	3 PISO	15.21
	2	4	2.90	0.994	1	3 PISO	5.77
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	4	5	6.00	1.552	1	3 PISO	37.25
	2	4	3.70	0.994	1	3 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	1.90	0.994	1	3 PISO	1.89
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	5.80	0.994	1	3 PISO	5.77
	1	4	3.90	0.994	1	3 PISO	3.88
	1	4	4.70	0.994	1	3 PISO	4.67
	190	3	1.35	0.560	1	3 PISO	143.64
V-105	1	7	5.10	3.042	1	3 PISO	15.51
	1	5	4.30	1.552	1	3 PISO	6.67
	1	6	3.80	2.235	1	3 PISO	8.49
	1	6	5.30	2.235	1	3 PISO	11.85
	60	3	0.59	0.560	1	3 PISO	19.82
V-106	4	5	5.70	1.552	1	3 PISO	35.39
	38	3	1.25	0.560	1	3 PISO	26.60
						TOTAL ACUMULADO	6,976.09

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			10 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

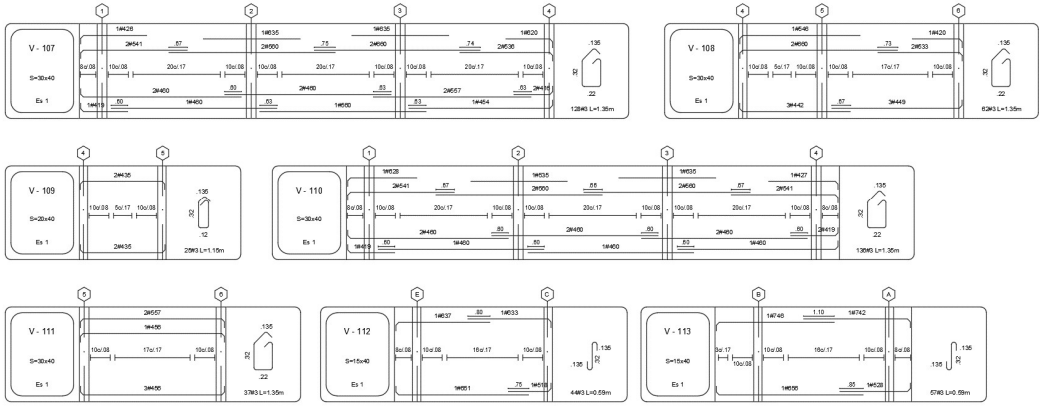

5.1 ACERO VIGAS 3 PISO

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-107	1	4	2.60	0.994	1	3 PISO	2.58
	2	6	3.50	2.235	1	3 PISO	15.65
	1	6	2.00	2.235	1	3 PISO	4.47
	2	5	4.10	1.552	1	3 PISO	12.73
	2	5	6.00	1.552	1	3 PISO	18.62
	2	6	6.00	2.235	1	3 PISO	26.82
	2	5	3.60	1.552	1	3 PISO	11.17
	4	4	6.00	0.994	1	3 PISO	23.86
	2	5	5.70	1.552	1	3 PISO	17.69
	2	4	1.60	0.994	1	3 PISO	3.18
	1	4	1.90	0.994	1	3 PISO	1.89
	1	4	6.00	0.994	1	3 PISO	5.96
	1	5	6.00	1.552	1	3 PISO	9.31
	1	4	5.40	0.994	1	3 PISO	5.37
	128	3	1.35	0.560	1	3 PISO	96.77
V-108	1	5	4.60	1.552	1	3 PISO	7.14
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	6	6.00	2.235	1	3 PISO	26.82
	2	5	3.30	1.552	1	3 PISO	10.24
	3	4	4.20	0.994	1	3 PISO	12.52
	3	4	4.90	0.994	1	3 PISO	14.61
	62	3	1.35	0.560	1	3 PISO	46.87
V-109	4	4	3.50	0.994	1	3 PISO	13.92
	25	3	1.15	0.560	1	3 PISO	16.10
V-110	1	6	2.80	2.235	1	3 PISO	6.26
	1	5	3.50	1.552	1	3 PISO	5.43
	1	6	3.50	2.235	1	3 PISO	7.82
	1	4	2.70	0.994	1	3 PISO	2.68
	2	5	4.10	1.552	1	3 PISO	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	3 PISO	37.25
	2	5	4.10	1.552	1	3 PISO	12.73
	6	4	6.00	0.994	1	3 PISO	35.78
	3	4	1.90	0.994	1	3 PISO	5.67
	3	4	6.00	0.994	1	3 PISO	17.89
	136	3	1.35	0.560	1	3 PISO	102.82
V-111	2	5	5.70	1.552	1	3 PISO	17.69
	4	4	5.60	0.994	1	3 PISO	22.27
	37	3	1.35	0.560	1	3 PISO	27.97
V-112	1	6	3.70	2.235	1	3 PISO	8.27
	1	6	3.30	2.235	1	3 PISO	7.38
	1	6	5.10	2.235	1	3 PISO	11.40
	1	5	1.80	1.552	1	3 PISO	2.79
	44	3	0.59	0.560	1	3 PISO	14.54
						TOTAL ACUMULADO	7,741.74

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			11 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

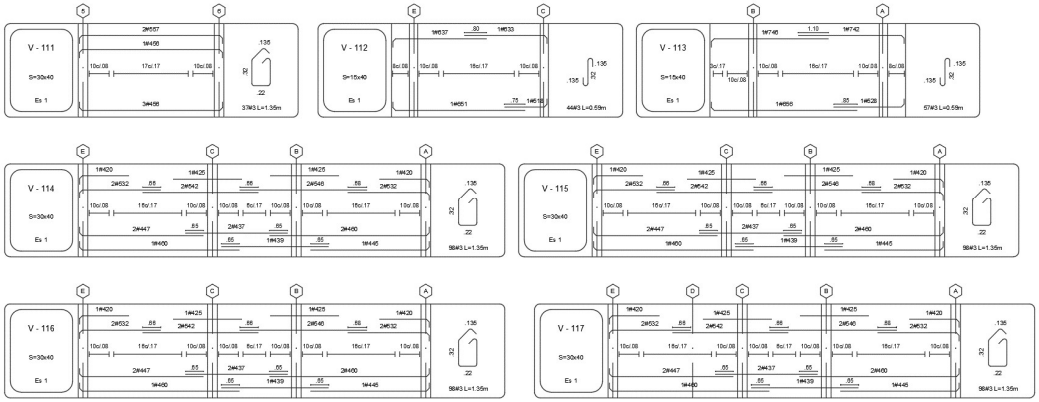

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS 3 PISO

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-113	1	7	4.60	3.042	1	3 PISO	13.99
	1	7	4.20	3.042	1	3 PISO	12.78
	1	6	5.60	2.235	1	3 PISO	12.52
	1	5	2.80	1.552	1	3 PISO	4.35
	57	3	0.59	0.560	1	3 PISO	18.83
V-114	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	3 PISO	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	3 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	3 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	3 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	3 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	3 PISO	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	3 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	3 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	3 PISO	74.09
V-115	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	3 PISO	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	3 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	3 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	3 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	3 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	3 PISO	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	3 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	3 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	3 PISO	74.09
V-116	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	1	4	2.50	0.994	1	3 PISO	2.49
	1	4	2.50	0.994	1	3 PISO	2.49
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	3 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	3 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	3 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	3 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	3 PISO	5.96
						TOTAL ACUMULADO	8,241.23

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			12 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

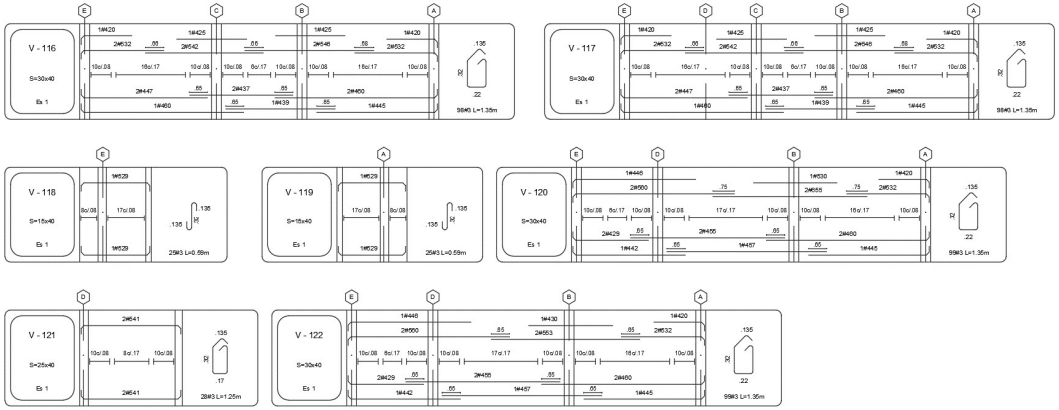

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS 3 PISO

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	1	4	3.90	0.994	1	3 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	3 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	3 PISO	74.09
V-117	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	3 PISO	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	3 PISO	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	3 PISO	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	3 PISO	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	3 PISO	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	3 PISO	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	3 PISO	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	3 PISO	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	3 PISO	74.09
V-118	2	5	2.90	1.552	1	3 PISO	9.00
	25	3	0.59	0.560	1	3 PISO	8.26
V-119	2	5	2.90	1.552	1	3 PISO	9.00
	25	3	0.59	0.560	1	3 PISO	8.26
V-120	1	4	4.60	0.994	1	3 PISO	4.57
	1	5	3.00	1.552	1	3 PISO	4.66
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	3 PISO	18.62
	2	6	5.50	2.235	1	3 PISO	24.59
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	4	2.90	0.994	1	3 PISO	5.77
	2	4	5.50	0.994	1	3 PISO	10.93
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
	1	4	4.20	0.994	1	3 PISO	4.17
	1	4	5.70	0.994	1	3 PISO	5.67
	1	4	4.50	0.994	1	3 PISO	4.47
	99	3	1.35	0.560	1	3 PISO	74.84
V-121	2	5	4.10	1.552	1	3 PISO	12.73
	28	3	1.25	0.560	1	3 PISO	19.60
V-122	1	4	4.60	0.994	1	3 PISO	4.57
	1	4	3.00	0.994	1	3 PISO	2.98
	1	4	2.00	0.994	1	3 PISO	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	3 PISO	18.62
	2	5	5.30	1.552	1	3 PISO	16.45
	2	5	3.20	1.552	1	3 PISO	9.93
	2	4	2.90	0.994	1	3 PISO	5.77
	2	4	5.50	0.994	1	3 PISO	10.93
	2	4	6.00	0.994	1	3 PISO	11.93
						TOTAL ACUMULADO	**8,828.99**

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			13 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

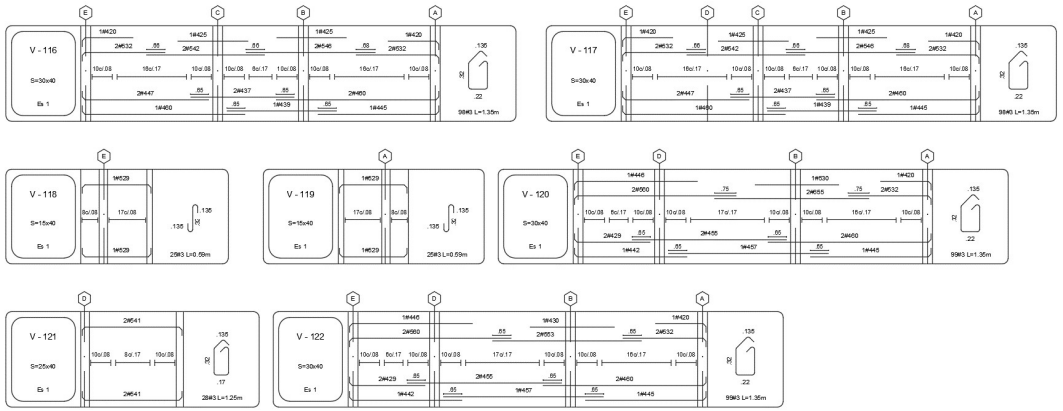

5.1 ACERO VIGAS 3 PISO

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-122	1	4	4.20	0.994	1	3 PISO	4.17
	1	4	5.70	0.994	1	3 PISO	5.67
	1	4	4.50	0.994	1	3 PISO	4.47
	99	3	1.35	0.560	1	3 PISO	74.84
						TOTAL ACUMULADO	8,918.15


OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			14 de 27

DESCRIPCION: ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.

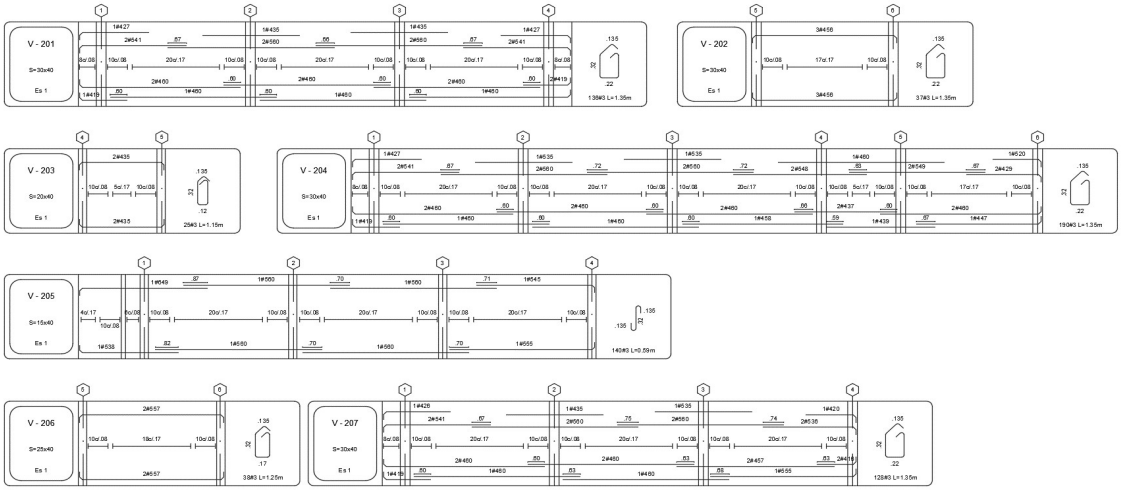

5.1 ACERO VIGAS CUBIERTA

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-201	1	4	2.70	0.994	1	CUBIERTA	2.68
	2	4	3.50	0.994	1	CUBIERTA	6.96
	1	4	2.70	0.994	1	CUBIERTA	2.68
	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	37.25
	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	6	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	35.78
	2	4	1.90	0.994	1	CUBIERTA	3.78
	1	4	1.90	0.994	1	CUBIERTA	1.89
	3	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	17.89
	136	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	102.82
V-202	6	4	5.60	0.994	1	CUBIERTA	33.40
	37	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	27.97
V-203	4	4	3.50	0.994	1	CUBIERTA	13.92
	25	3	1.15	0.560	1	CUBIERTA	16.10
V-204	1	4	2.70	0.994	1	CUBIERTA	2.68
	2	5	3.50	1.552	1	CUBIERTA	10.86
	1	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	5.96
	1	5	2.00	1.552	1	CUBIERTA	3.10
	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	37.25
	2	5	4.80	1.552	1	CUBIERTA	14.90
	2	5	4.90	1.552	1	CUBIERTA	15.21
	2	4	2.90	0.994	1	CUBIERTA	5.77
	8	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	47.71
	2	4	3.70	0.994	1	CUBIERTA	7.36
	1	4	1.90	0.994	1	CUBIERTA	1.89
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	1	4	5.80	0.994	1	CUBIERTA	5.77
	1	4	3.90	0.994	1	CUBIERTA	3.88
	1	4	4.70	0.994	1	CUBIERTA	4.67
	190	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	143.64
V-205	1	6	4.90	2.235	1	CUBIERTA	10.95
	2	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	18.62
	1	5	4.50	1.552	1	CUBIERTA	6.98
	1	5	3.80	1.552	1	CUBIERTA	5.90
	2	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	18.62
	1	5	5.50	1.552	1	CUBIERTA	8.54
	140	3	0.59	0.560	1	CUBIERTA	46.26
V-206	4	5	5.70	1.552	1	CUBIERTA	35.39
	38	3	1.25	0.560	1	CUBIERTA	26.60
						TOTAL ACUMULADO	9,759.88

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			15 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

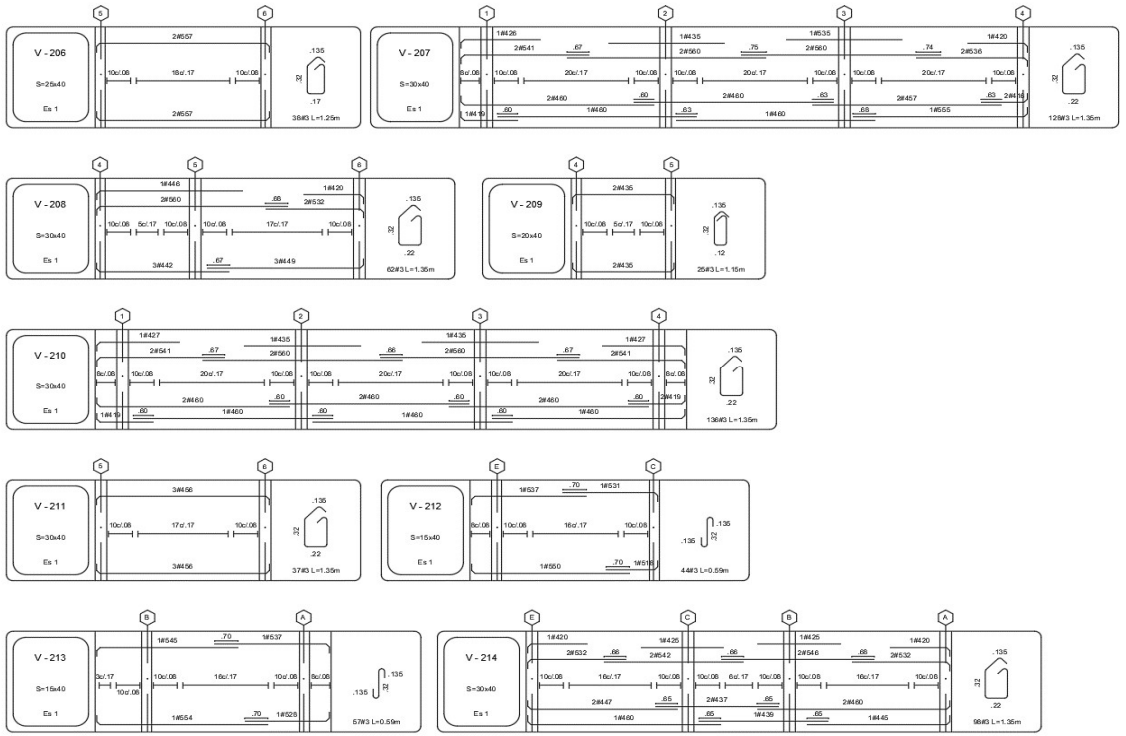

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS CUBIERTA

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-207	1	4	2.60	0.994	1	CUBIERTA	2.58
	1	4	3.50	0.994	1	CUBIERTA	3.48
	1	5	3.50	1.552	1	CUBIERTA	5.43
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	37.25
	2	5	3.60	1.552	1	CUBIERTA	11.17
	4	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	23.86
	2	4	5.70	0.994	1	CUBIERTA	11.33
	2	4	1.60	0.994	1	CUBIERTA	3.18
	1	4	1.90	0.994	1	CUBIERTA	1.89
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	1	5	5.50	1.552	1	CUBIERTA	8.54
	128	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	96.77
V-208	1	4	4.60	0.994	1	CUBIERTA	4.57
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	18.62
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	3	4	4.20	0.994	1	CUBIERTA	12.52
	3	4	4.90	0.994	1	CUBIERTA	14.61
	62	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	46.87
V-209	4	4	3.50	0.994	1	CUBIERTA	13.92
	25	3	1.15	0.560	1	CUBIERTA	16.10
V-210	1	4	2.70	0.994	1	CUBIERTA	2.68
	2	4	3.50	0.994	1	CUBIERTA	6.96
	1	4	2.70	0.994	1	CUBIERTA	2.68
	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	4	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	37.25
	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	6	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	35.78
	3	4	1.90	0.994	1	CUBIERTA	5.67
	3	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	17.89
	136	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	102.82
V-211	6	4	5.60	0.994	1	CUBIERTA	33.40
	37	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	27.97
V-212	1	5	3.70	1.552	1	CUBIERTA	5.74
	1	5	3.10	1.552	1	CUBIERTA	4.81
	1	5	5.00	1.552	1	CUBIERTA	7.76
	1	5	1.80	1.552	1	CUBIERTA	2.79
	44	3	0.59	0.560	1	CUBIERTA	14.54
V-213	1	5	4.50	1.552	1	CUBIERTA	6.98
	1	5	3.70	1.552	1	CUBIERTA	5.74
	1	5	5.40	1.552	1	CUBIERTA	8.38
	1	5	2.80	1.552	1	CUBIERTA	4.35
	57	3	0.59	0.560	1	CUBIERTA	18.83
						TOTAL ACUMULADO	10,509.63

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			16 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

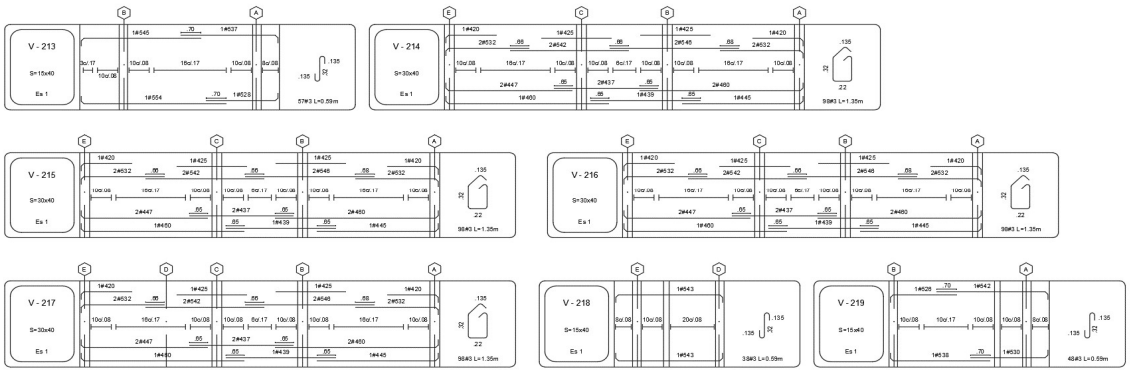

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS CUBIERTA


CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-214	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	CUBIERTA	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	CUBIERTA	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	CUBIERTA	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	CUBIERTA	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	CUBIERTA	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	CUBIERTA	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	CUBIERTA	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	74.09
V-215	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	4	2.50	0.994	1	CUBIERTA	4.97
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	CUBIERTA	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	CUBIERTA	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	CUBIERTA	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	CUBIERTA	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	CUBIERTA	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	CUBIERTA	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	74.09
V-216	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	1	4	2.50	0.994	1	CUBIERTA	2.49
	1	4	2.50	0.994	1	CUBIERTA	2.49
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	CUBIERTA	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	CUBIERTA	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	CUBIERTA	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	CUBIERTA	7.36
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	1	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	5.96
	1	4	3.90	0.994	1	CUBIERTA	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	CUBIERTA	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	74.09
						TOTAL ACUMULADO	11,029.10


	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	


PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			17 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					




















OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VIGAS CUBIERTA

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
V-217	2	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	3.98
	2	4	2.50	0.994	1	CUBIERTA	4.97
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	5	4.20	1.552	1	CUBIERTA	13.04
	2	5	4.60	1.552	1	CUBIERTA	14.28
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	4	4.70	0.994	1	CUBIERTA	9.34
	2	4	3.70	0.994	1	CUBIERTA	7.36
	3	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	17.89
	1	4	3.90	0.994	1	CUBIERTA	3.88
	1	4	4.50	0.994	1	CUBIERTA	4.47
	98	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	74.09
V-218	2	5	4.30	1.552	1	CUBIERTA	13.35
	38	3	0.59	0.560	1	CUBIERTA	12.56
V-219	1	5	2.60	1.552	1	CUBIERTA	4.04
	1	5	4.20	1.552	1	CUBIERTA	6.52
	1	5	3.80	1.552	1	CUBIERTA	5.90
	1	5	3.00	1.552	1	CUBIERTA	4.66
	48	3	0.59	0.560	1	CUBIERTA	15.86
V-220	1	4	4.60	0.994	1	CUBIERTA	4.57
	1	4	3.00	0.994	1	CUBIERTA	2.98
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	18.62
	2	5	5.50	1.552	1	CUBIERTA	17.07
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	4	2.90	0.994	1	CUBIERTA	5.77
	2	4	5.50	0.994	1	CUBIERTA	10.93
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	1	4	4.20	0.994	1	CUBIERTA	4.17
	1	4	5.70	0.994	1	CUBIERTA	5.67
	1	4	4.50	0.994	1	CUBIERTA	4.47
	99	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	74.84
V-221	2	5	4.10	1.552	1	CUBIERTA	12.73
	28	3	1.25	0.560	1	CUBIERTA	19.60
V-222	1	4	4.60	0.994	1	CUBIERTA	4.57
	1	4	3.00	0.994	1	CUBIERTA	2.98
	1	4	2.00	0.994	1	CUBIERTA	1.99
	2	5	6.00	1.552	1	CUBIERTA	18.62
	2	5	5.30	1.552	1	CUBIERTA	16.45
	2	5	3.20	1.552	1	CUBIERTA	9.93
	2	4	2.90	0.994	1	CUBIERTA	5.77
	2	4	5.50	0.994	1	CUBIERTA	10.93
	2	4	6.00	0.994	1	CUBIERTA	11.93
	3	4	5.70	0.994	1	CUBIERTA	17.00
	99	3	1.35	0.560	1	CUBIERTA	74.84
						TOTAL ACUMULADO	**11,645.42**

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA		Codigo	
			Versión	
			Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			18 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

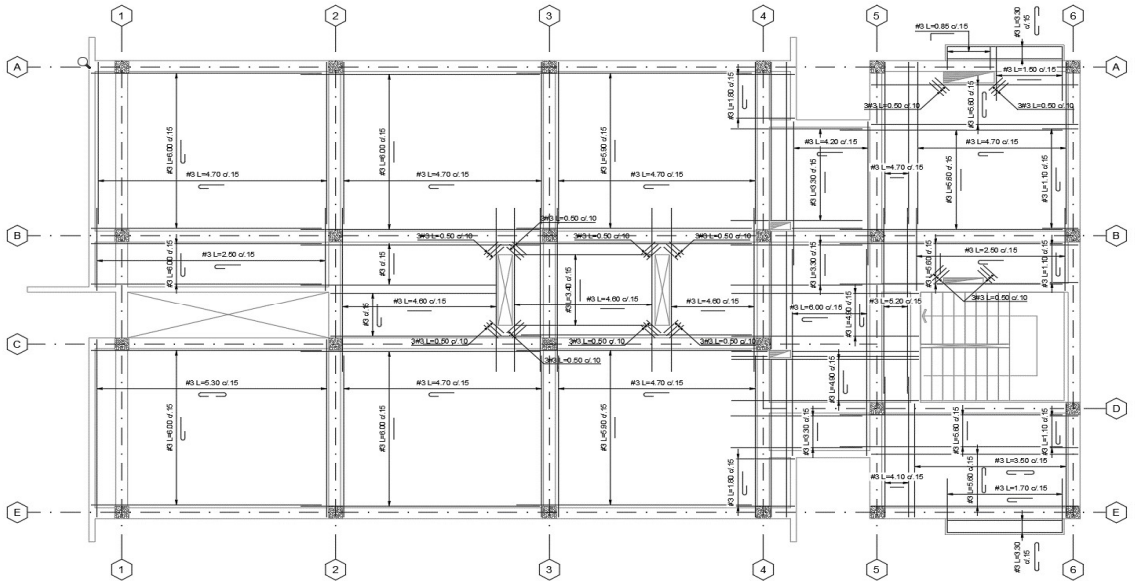

Indica geometria de la varilla, las que lleven doblez a 180°, tendran un gancho de 20cm.
La longitud de la varilla ya incluye gancho en donde según geometria debe llevar.

PLANTA DE REFUERZO INFERIOR (PLACA SEGUNDO Y TERCER PISO)
ESC. 1:75

OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

5.1 ACERO PLACA 2 PISO REFUERZO INFERIOR

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
PLACA DE 2 PISO REFUEZO INFERIOR	38	3	4.70	0.560	1	2 PISO	100.89
	29	3	6.00	0.560	2	2 PISO	193.54
	33	3	4.70	0.560	1	2 PISO	87.21
	29	3	5.90	0.560	1	2 PISO	95.16
	33	3	4.70	0.560	1	2 PISO	86.86
	38	3	2.50	0.560	1	2 PISO	53.67
	7	3	6.00	0.560	1	2 PISO	25.09
	63	3	4.60	0.560	1	2 PISO	161.43
	13	3	3.40	0.560	1	2 PISO	25.39
	29	3	6.00	0.560	1	2 PISO	96.77
	39	3	5.30	0.560	1	2 PISO	114.37
	66	3	4.70	0.560	1	2 PISO	174.06
	29	3	6.00	0.560	1	2 PISO	96.77
	29	3	5.90	0.560	1	2 PISO	95.16
	9	3	1.80	0.560	1	2 PISO	8.87
	25	3	3.50	0.560	1	2 PISO	49.78
	19	3	1.70	0.560	1	2 PISO	18.34
	10	3	5.60	0.560	1	2 PISO	30.31
	4	3	4.10	0.560	1	2 PISO	9.11
	2	3	3.30	0.560	1	2 PISO	4.19
	6	3	1.10	0.560	1	2 PISO	3.65
	6	3	5.60	0.560	1	2 PISO	18.61
	6	3	3.30	0.560	1	2 PISO	10.96
	8	3	4.90	0.560	1	2 PISO	21.04
	18	3	1.10	0.560	1	2 PISO	11.38
	7	3	1.10	0.560	1	2 PISO	4.31
	7	3	5.60	0.560	1	2 PISO	23.42
	8	3	4.90	0.560	1	2 PISO	22.32
	7	3	3.30	0.560	1	2 PISO	13.80
	17	3	3.30	0.560	1	2 PISO	31.42
	18	3	5.60	0.560	1	2 PISO	57.91
	7	3	5.60	0.560	1	2 PISO	23.00
	11	3	1.50	0.560	1	2 PISO	9.24
	7	3	0.85	0.560	1	2 PISO	3.43
	2	3	3.30	0.560	1	2 PISO	4.19
	12	3	4.20	0.560	1	2 PISO	29.32
	25	3	4.70	0.560	1	2 PISO	65.45
	25	3	2.50	0.560	1	2 PISO	34.81
	8	3	1.80	0.560	1	2 PISO	8.20
	4	3	4.70	0.560	1	2 PISO	10.44
	4	3	5.20	0.560	1	2 PISO	11.55
	12	3	6.00	0.560	1	2 PISO	41.89
	8	3	4.16	0.560	1	2 PISO	18.95
	7	3	6.00	0.560	1	2 PISO	25.09
	33	3	0.50	0.560	1	2 PISO	9.24
						TOTAL ACUMULADO	**13,685.97**

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			19 de 27	
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.						

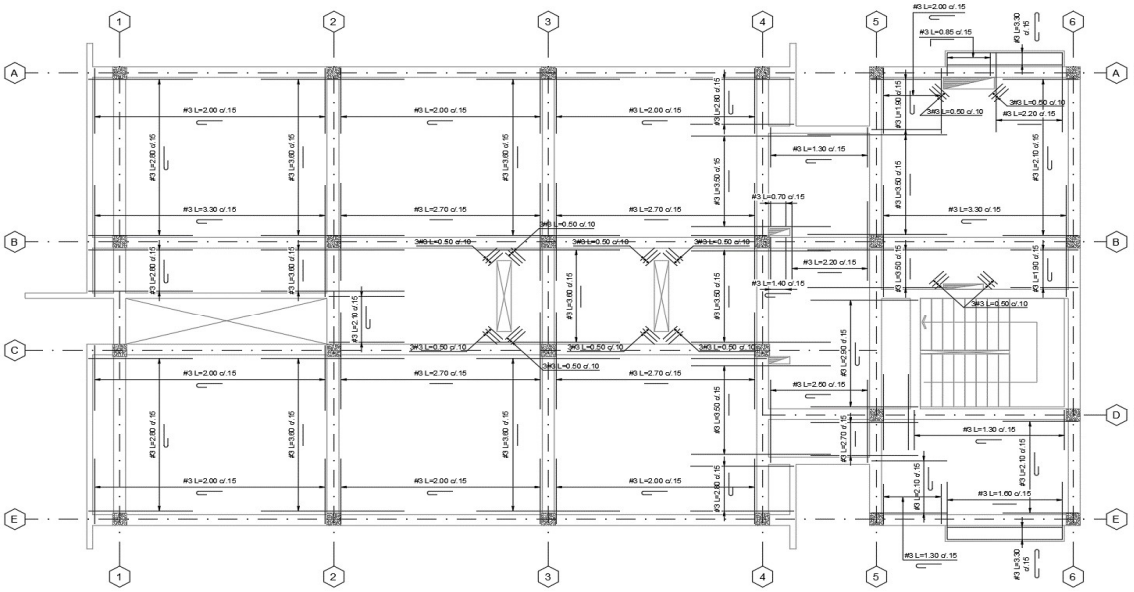

PLANTA DE REFUERZO SUPERIOR (PLACA SEGUNDO Y TERCER PISO)
ESC. 1:75

5.1 ACERO PLACA 2 PISO REFUERZO SUPERIOR

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
PLACA DE 2 PISO REFUEZO SUPERIOR	39	3	2.00	0.560	3	2 PISO	129.47
	39	3	3.30	0.560	1	2 PISO	71.21
	33	3	2.00	0.560	4	2 PISO	149.33
	33	3	2.70	0.560	4	2 PISO	201.60
	16	3	1.30	0.560	1	2 PISO	11.79
	13	3	2.20	0.560	1	2 PISO	15.61
	16	3	2.50	0.560	1	2 PISO	22.68
	7	3	0.85	0.560	1	2 PISO	3.43
	10	3	2.00	0.560	1	2 PISO	10.83
	11	3	2.20	0.560	1	2 PISO	13.55
	31	3	3.30	0.560	1	2 PISO	56.55
	25	3	1.30	0.560	1	2 PISO	18.25
	10	3	1.30	0.560	1	2 PISO	7.04
	19	3	1.60	0.560	1	2 PISO	17.26
	29	3	2.80	0.560	1	2 PISO	45.47
	29	3	3.60	0.560	2	2 PISO	116.93
	17	3	3.50	0.560	1	2 PISO	32.93
	8	3	2.80	0.560	1	2 PISO	13.07
	9	3	1.90	0.560	1	2 PISO	9.93
	18	3	3.50	0.560	1	2 PISO	36.19
	7	3	3.50	0.560	1	2 PISO	13.72
	29	3	2.10	0.560	1	2 PISO	34.10
	2	3	3.30	0.560	1	2 PISO	4.19
	7	3	1.90	0.560	1	2 PISO	7.45
	3	3	0.70	0.560	1	2 PISO	0.99
	3	3	1.40	0.560	1	2 PISO	1.99
	17	3	2.10	0.560	1	2 PISO	19.99
	2	3	3.30	0.560	1	2 PISO	4.19
	10	3	2.10	0.560	1	2 PISO	11.37
	8	3	2.80	0.560	1	2 PISO	12.02
	8	3	3.60	0.560	1	2 PISO	15.46
	9	3	2.10	0.560	1	2 PISO	10.19
	17	3	3.60	0.560	1	2 PISO	34.94
	17	3	3.50	0.560	1	2 PISO	33.97
	28	3	2.80	0.560	1	2 PISO	44.43
	28	3	3.60	0.560	2	2 PISO	114.24
	16	3	3.50	0.560	1	2 PISO	32.27
	8	3	2.80	0.560	1	2 PISO	13.07
	20	3	2.90	0.560	1	2 PISO	32.48
	6	3	2.70	0.560	1	2 PISO	9.27
	36	3	0.50	0.560	1	2 PISO	10.08
						TOTAL ACUMULADO	15,129.50

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA		Codigo	
			Versión	
			Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			20 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

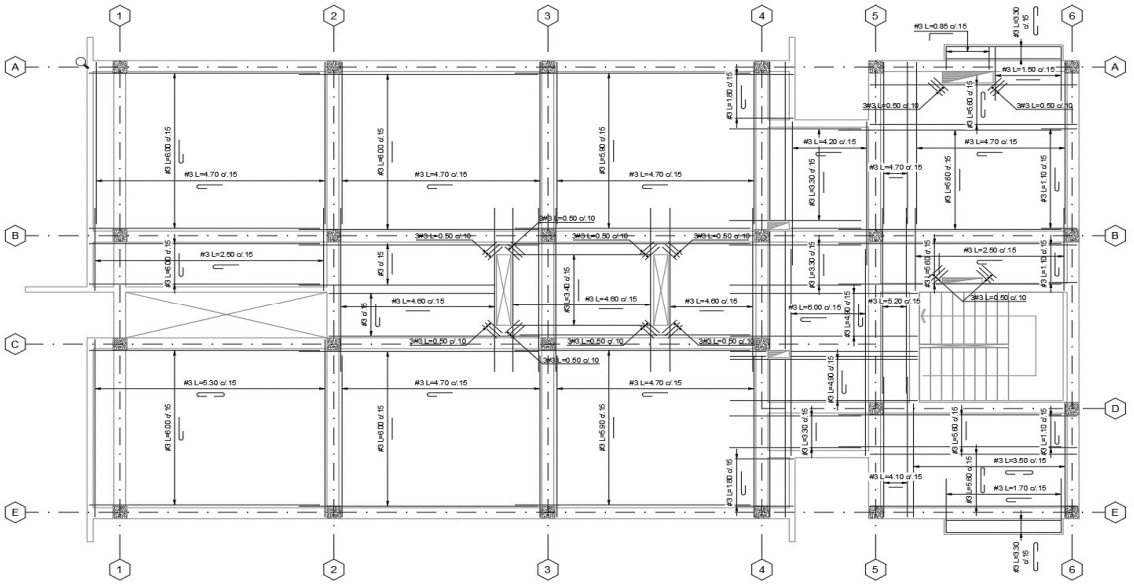

Indica geometria de la varilla, las que lleven doblez a 180°, tendran un gancho de 20cm.
La longitud de la varilla ya incluye gancho en donde según geometria debe llevar.

PLANTA DE REFUERZO INFERIOR (PLACA SEGUNDO Y TERCER PISO)
ESC. 1:75

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO PLACA 3 PISO REFUERZO INFERIOR

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
PLACA DE 3 PISO REFUEZO INFERIOR	38	3	4.70	0.560	1	3 PISO	100.89
	29	3	6.00	0.560	2	3 PISO	193.54
	33	3	4.70	0.560	1	3 PISO	87.21
	29	3	5.90	0.560	1	3 PISO	95.16
	33	3	4.70	0.560	1	3 PISO	86.86
	38	3	2.50	0.560	1	3 PISO	53.67
	7	3	6.00	0.560	1	3 PISO	25.09
	63	3	4.60	0.560	1	3 PISO	161.43
	13	3	3.40	0.560	1	3 PISO	25.39
	29	3	6.00	0.560	1	3 PISO	96.77
	39	3	5.30	0.560	1	3 PISO	114.37
	66	3	4.70	0.560	1	3 PISO	174.06
	29	3	6.00	0.560	1	3 PISO	96.77
	29	3	5.90	0.560	1	3 PISO	95.16
	9	3	1.80	0.560	1	3 PISO	8.87
	25	3	3.50	0.560	1	3 PISO	49.78
	19	3	1.70	0.560	1	3 PISO	18.34
	10	3	5.60	0.560	1	3 PISO	30.31
	4	3	4.10	0.560	1	3 PISO	9.11
	2	3	3.30	0.560	1	3 PISO	4.19
	6	3	1.10	0.560	1	3 PISO	3.65
	6	3	5.60	0.560	1	3 PISO	18.61
	6	3	3.30	0.560	1	3 PISO	10.96
	8	3	4.90	0.560	1	3 PISO	21.04
	18	3	1.10	0.560	1	3 PISO	11.38
	7	3	1.10	0.560	1	3 PISO	4.31
	7	3	5.60	0.560	1	3 PISO	23.42
	8	3	4.90	0.560	1	3 PISO	22.32
	7	3	3.30	0.560	1	3 PISO	13.80
	17	3	3.30	0.560	1	3 PISO	31.42
	18	3	5.60	0.560	1	3 PISO	57.91
	7	3	5.60	0.560	1	3 PISO	23.00
	11	3	1.50	0.560	1	3 PISO	9.24
	7	3	0.85	0.560	1	3 PISO	3.43
	2	3	3.30	0.560	1	3 PISO	4.19
	12	3	4.20	0.560	1	3 PISO	29.32
	25	3	4.70	0.560	1	3 PISO	65.45
	25	3	2.50	0.560	1	3 PISO	34.81
	8	3	1.80	0.560	1	3 PISO	8.20
	4	3	4.70	0.560	1	3 PISO	10.44
	4	3	5.20	0.560	1	3 PISO	11.55
	12	3	6.00	0.560	1	3 PISO	41.89
	8	3	4.16	0.560	1	3 PISO	18.95
	7	3	6.00	0.560	1	3 PISO	25.09
	33	3	0.50	0.560	1	3 PISO	9.24
						TOTAL ACUMULADO	**17,170.05**

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			21 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

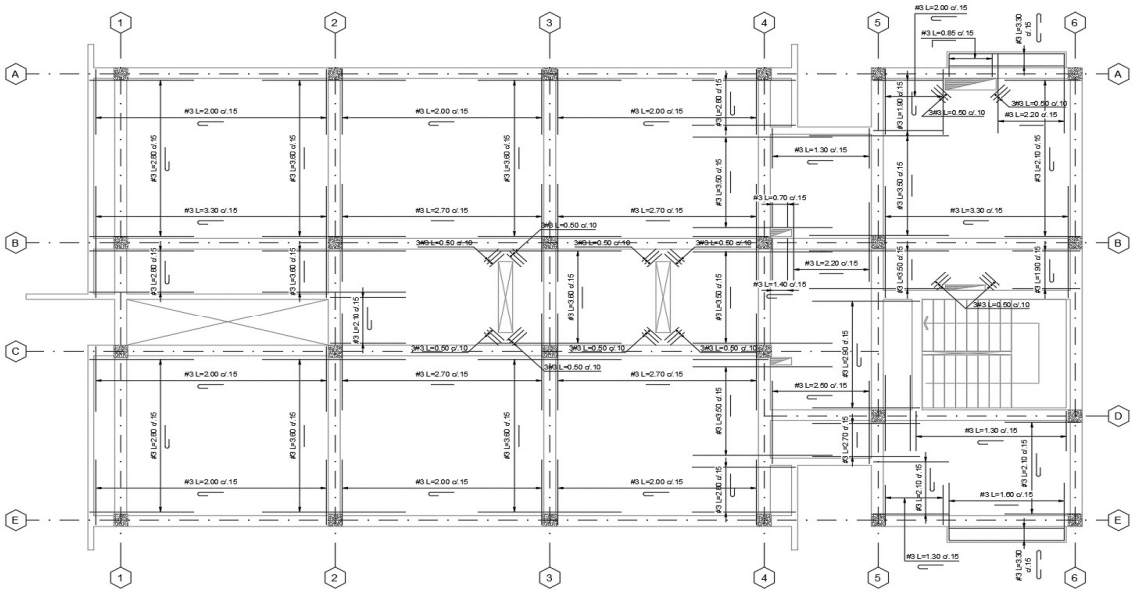

Indica geometría de la varilla, las que llevan doblez a 180°, tendran un gancho de 20cm.
La longitud de la varilla ya incluye gancho en donde según geometría debe llevar.

PLANTA DE REFUERZO SUPERIOR (PLACA SEGUNDO Y TERCER PISO)
ESC. 1:75

5.1 ACERO PLACA 3 PISO REFUERZO SUPERIOR

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
PLACA DE 3 PISO REFUEZO SUPERIOR	39	3	2.00	0.560	3	3 PISO	129.47
	39	3	3.30	0.560	1	3 PISO	71.21
	33	3	2.00	0.560	4	3 PISO	149.33
	33	3	2.70	0.560	4	3 PISO	201.60
	16	3	1.30	0.560	1	3 PISO	11.79
	13	3	2.20	0.560	1	3 PISO	15.61
	16	3	2.50	0.560	1	3 PISO	22.68
	7	3	0.85	0.560	1	3 PISO	3.43
	10	3	2.00	0.560	1	3 PISO	10.83
	11	3	2.20	0.560	1	3 PISO	13.55
	31	3	3.30	0.560	1	3 PISO	56.55
	25	3	1.30	0.560	1	3 PISO	18.25
	10	3	1.30	0.560	1	3 PISO	7.04
	19	3	1.60	0.560	1	3 PISO	17.26
	29	3	2.80	0.560	1	3 PISO	45.47
	29	3	3.60	0.560	2	3 PISO	116.93
	17	3	3.50	0.560	1	3 PISO	32.93
	8	3	2.80	0.560	1	3 PISO	13.07
	9	3	1.90	0.560	1	3 PISO	9.93
	18	3	3.50	0.560	1	3 PISO	36.19
	7	3	3.50	0.560	1	3 PISO	13.72
	29	3	2.10	0.560	1	3 PISO	34.10
	2	3	3.30	0.560	1	3 PISO	4.19
	7	3	1.90	0.560	1	3 PISO	7.45
	3	3	0.70	0.560	1	3 PISO	0.99
	3	3	1.40	0.560	1	3 PISO	1.99
	17	3	2.10	0.560	1	3 PISO	19.99
	2	3	3.30	0.560	1	3 PISO	4.19
	10	3	2.10	0.560	1	3 PISO	11.37
	8	3	2.80	0.560	1	3 PISO	12.02
	8	3	3.60	0.560	1	3 PISO	15.46
	9	3	2.10	0.560	1	3 PISO	10.19
	17	3	3.60	0.560	1	3 PISO	34.94
	17	3	3.50	0.560	1	3 PISO	33.97
	28	3	2.80	0.560	1	3 PISO	44.43
	28	3	3.60	0.560	2	3 PISO	114.24
	16	3	3.50	0.560	1	3 PISO	32.27
	8	3	2.80	0.560	1	3 PISO	13.07
	20	3	2.90	0.560	1	3 PISO	32.48
	6	3	2.70	0.560	1	3 PISO	9.27
	36	3	0.50	0.560	1	3 PISO	10.08
						TOTAL ACUMULADO	18,613.59

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA		Codigo	
			Versión	
			Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			22 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

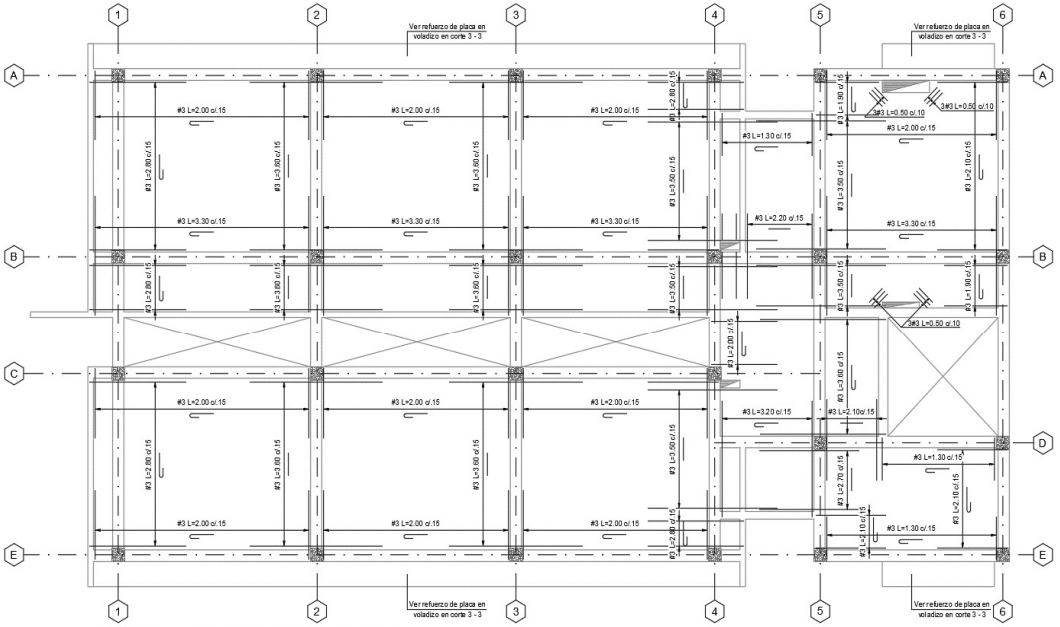

Indica geometria de la varilla, las que lleven doblez a 180°, tendran un gancho de 20cm.
La longitud de la varilla ya incluye gancho en donde según geometría debe llevar.

PLANTA DE REFUERZO SUPERIOR (PLACA DE CUBIERTA)
ESC. 1:75

5.1 ACERO PLACA VOLADIZO

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
PLACA DE CUBIERTA REFUEZO SUPERIOR	39	3	2.00	0.560	3	CUBIERTA	129.47
	33	3	2.00	0.560	4	CUBIERTA	149.33
	16	3	1.30	0.560	1	CUBIERTA	11.79
	31	3	2.00	0.560	1	CUBIERTA	34.27
	39	3	3.30	0.560	1	CUBIERTA	71.21
	33	3	3.30	0.560	2	CUBIERTA	123.20
	12	3	2.20	0.560	1	CUBIERTA	14.37
	31	3	3.30	0.560	1	CUBIERTA	56.55
	33	3	2.00	0.560	2	CUBIERTA	74.37
	16	3	3.20	0.560	1	CUBIERTA	29.03
	9	3	2.10	0.560	1	CUBIERTA	10.58
	20	3	1.30	0.560	1	CUBIERTA	14.71
	31	3	1.30	0.560	1	CUBIERTA	22.28
	29	3	2.80	0.560	1	CUBIERTA	45.47
	29	3	3.60	0.560	2	CUBIERTA	116.93
	20	3	3.50	0.560	1	CUBIERTA	40.11
	22	3	3.50	0.560	1	CUBIERTA	43.38
	29	3	2.10	0.560	1	CUBIERTA	34.10
	5	3	2.80	0.560	1	CUBIERTA	7.32
	6	3	1.90	0.560	1	CUBIERTA	6.03
	8	3	2.80	0.560	1	CUBIERTA	12.02
	8	3	3.60	0.560	2	CUBIERTA	30.91
	7	3	3.50	0.560	1	CUBIERTA	14.63
	8	3	2.00	0.560	1	CUBIERTA	8.44
	7	3	3.50	0.560	1	CUBIERTA	13.72
	7	3	1.90	0.560	1	CUBIERTA	7.45
	28	3	2.80	0.560	1	CUBIERTA	44.43
	28	3	3.60	0.560	2	CUBIERTA	114.24
	20	3	3.50	0.560	1	CUBIERTA	40.11
	4	3	2.80	0.560	1	CUBIERTA	6.79
	20	3	3.60	0.560	1	CUBIERTA	40.32
	10	3	2.70	0.560	1	CUBIERTA	15.32
	6	3	2.10	0.560	1	CUBIERTA	6.66
	17	3	2.10	0.560	1	CUBIERTA	19.99
	12	3	0.50	0.560	1	CUBIERTA	3.36
						TOTAL ACUMULADO	20,026.51

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			23 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

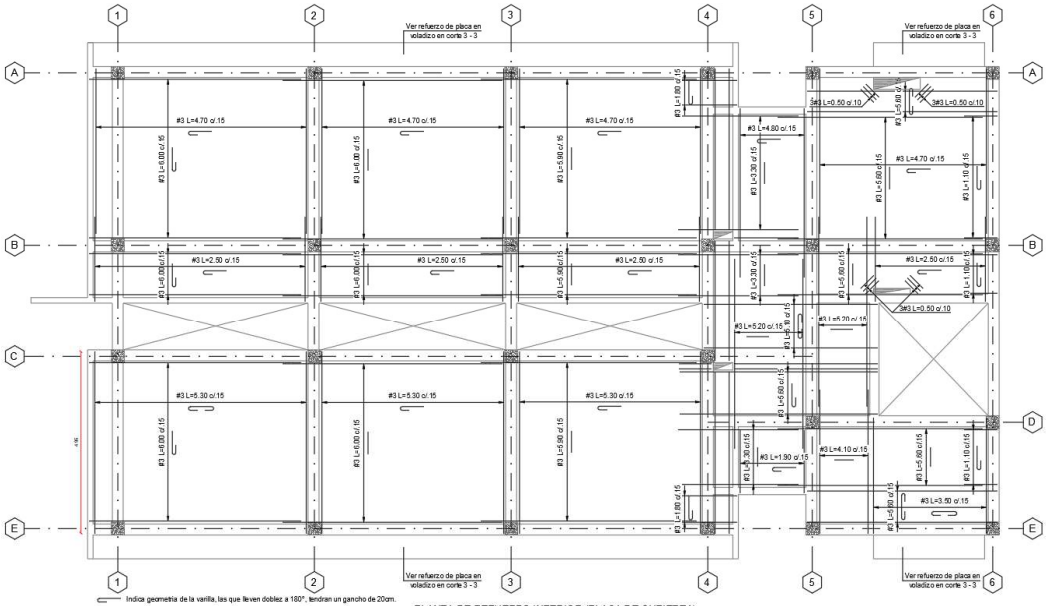

PLANTA DE REFUERZO INFERIOR (PLACA DE CUBIERTA)
ESC. 1:75

5.1 ACERO PLACA CUBIERTA REFUERZO INFERIOR

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
PLACA DE CUBIERTA REFUEZO INFERIOR	29	3	6.00	0.560	2	CUBIERTA	193.54
	29	3	5.90	0.560	1	CUBIERTA	95.16
	21	3	3.30	0.560	1	CUBIERTA	38.19
	22	3	5.60	0.560	1	CUBIERTA	69.41
	4	3	5.60	0.560	1	CUBIERTA	11.71
	21	3	1.10	0.560	1	CUBIERTA	13.22
	4	3	1.80	0.560	1	CUBIERTA	4.50
	7	3	6.00	0.560	2	CUBIERTA	50.18
	7	3	5.90	0.560	1	CUBIERTA	24.67
	7	3	3.30	0.560	1	CUBIERTA	13.80
	7	3	5.60	0.560	1	CUBIERTA	23.42
	7	3	1.10	0.560	1	CUBIERTA	4.31
	8	3	5.10	0.560	1	CUBIERTA	23.23
	8	3	5.60	0.560	1	CUBIERTA	24.04
	29	3	6.00	0.560	2	CUBIERTA	193.54
	29	3	5.90	0.560	2	CUBIERTA	190.31
	10	3	3.30	0.560	1	CUBIERTA	18.36
	10	3	5.60	0.560	1	CUBIERTA	32.41
	10	3	1.10	0.560	1	CUBIERTA	6.12
	5	3	1.80	0.560	1	CUBIERTA	4.84
	6	3	5.60	0.560	1	CUBIERTA	17.77
	38	3	4.70	0.560	1	CUBIERTA	100.89
	33	3	4.70	0.560	1	CUBIERTA	87.21
	33	3	4.70	0.560	1	CUBIERTA	87.21
	12	3	4.30	0.560	1	CUBIERTA	28.09
	30	3	4.70	0.560	1	CUBIERTA	80.01
	38	3	2.50	0.560	1	CUBIERTA	53.67
	33	3	2.50	0.560	2	CUBIERTA	92.77
	12	3	5.20	0.560	1	CUBIERTA	36.30
	9	3	5.20	0.560	1	CUBIERTA	25.63
	20	3	2.50	0.560	1	CUBIERTA	28.00
	39	3	5.30	0.560	1	CUBIERTA	114.37
	33	3	5.30	0.560	1	CUBIERTA	98.34
	33	3	5.30	0.560	1	CUBIERTA	97.94
	12	3	1.90	0.560	1	CUBIERTA	12.41
	9	3	4.10	0.560	1	CUBIERTA	20.20
	21	3	3.50	0.560	1	CUBIERTA	40.25
	12	3	0.50	0.560	1	CUBIERTA	3.36
						TOTAL ACUMULADO	22,085.87

OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM				24 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

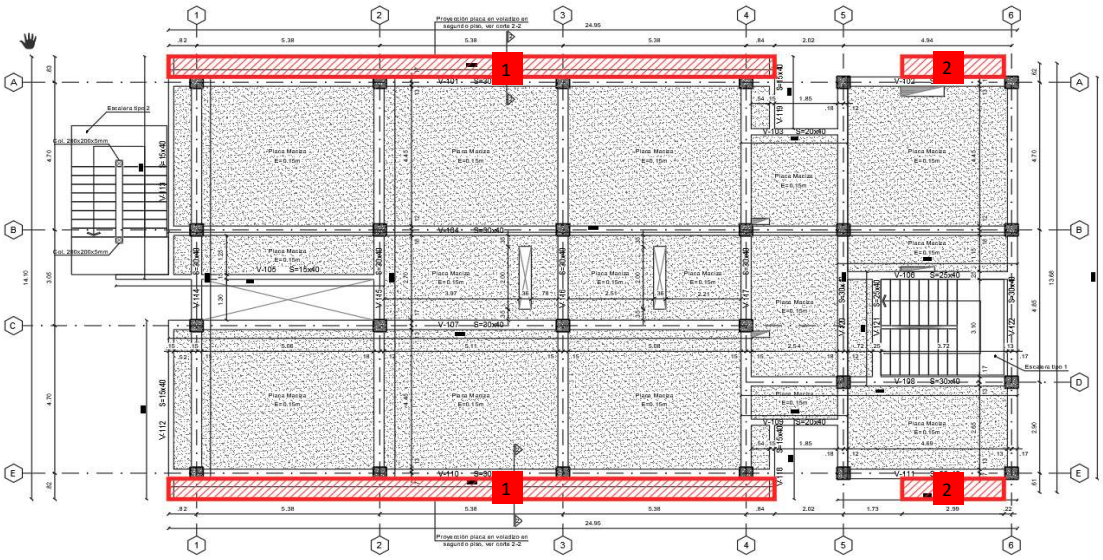

PLANTA DE SEGUNDO Y TERCER PISO
ESC. 1:75



CORTE 2 - 2
ESC. 1:20

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VOLADIZO 2 PISO

CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
1	119	4	1.43	0.994	2	2 PISO	337.54
	89	4	0.69	0.994	2	2 PISO	122.15
	119	3	1.09	0.560	2	2 PISO	144.95
2	20	4	1.43	0.994	2	2 PISO	56.86
	15	4	0.69	0.994	2	2 PISO	20.58
	20	3	1.09	0.560	2	2 PISO	24.42

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			25 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

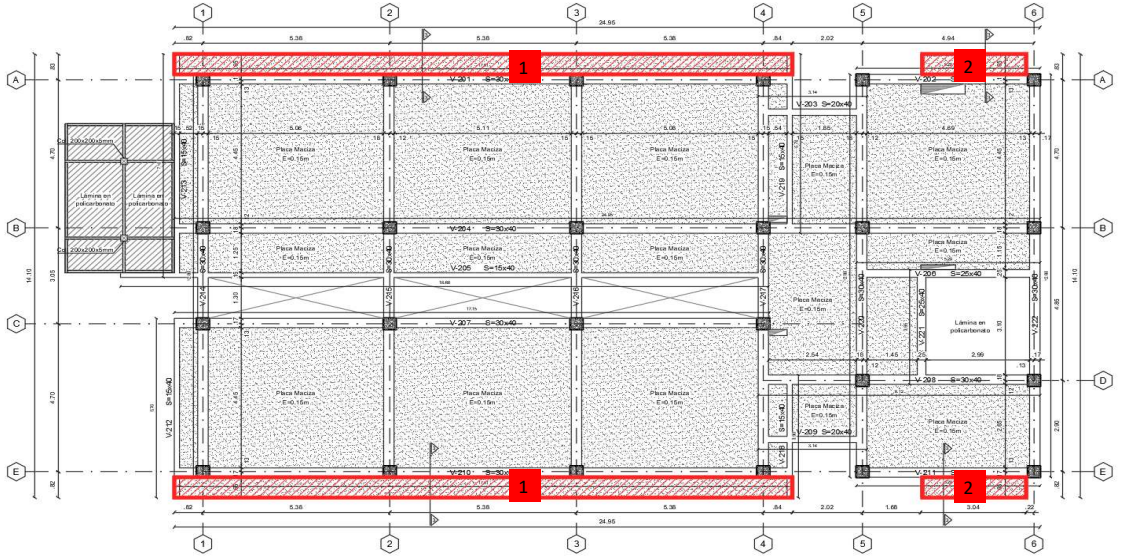

PLANTA DE CUBIERTA
ESC. 1:75



CORTE 3 - 3
ESC. 1:20

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


5.1 ACERO VOLADIZO CUBIERTA

CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
1	119	4	1.73	0.994	2	CUBIERTA	408.35
	119	3	1.09	0.560	2	CUBIERTA	144.95
2	20	4	1.73	0.994	2	CUBIERTA	68.78
	20	3	1.09	0.560	2	CUBIERTA	24.42

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			26 de 27
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.					

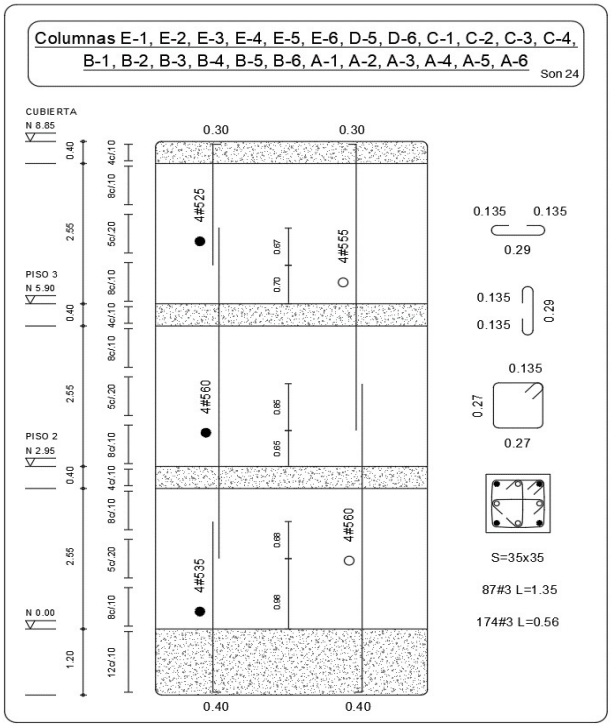

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

5.1 ACERO COLUMNAS


CALCULO DE HIERRO


NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
GANCHO	87	3	1.35	0.560	24	Columnas E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, D-5, D-6, C-1, C-2, C-3, C-4, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6	1,578.53
GANCHO C	174	3	0.56	0.560	24		1,309.59
V. NEGRAS	4	5	2.50	1.552	24		372.48
	4	5	6.00	1.552	24		893.95
	4	5	3.50	1.552	24		521.47
V. BLANCAS	4	5	5.50	1.552	24		819.46
	4	5	6.00	1.552	24		893.95
						TOTAL ACUMULADO	29,828.30

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	KG			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	4.8			27 de 27

DESCRIPCION: ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.

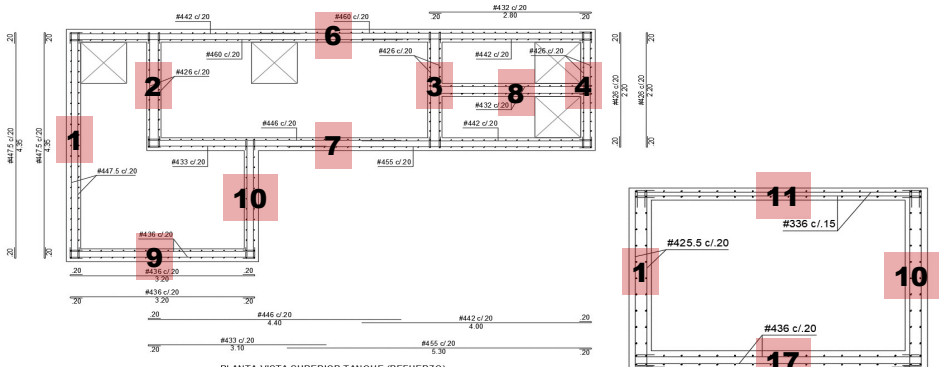

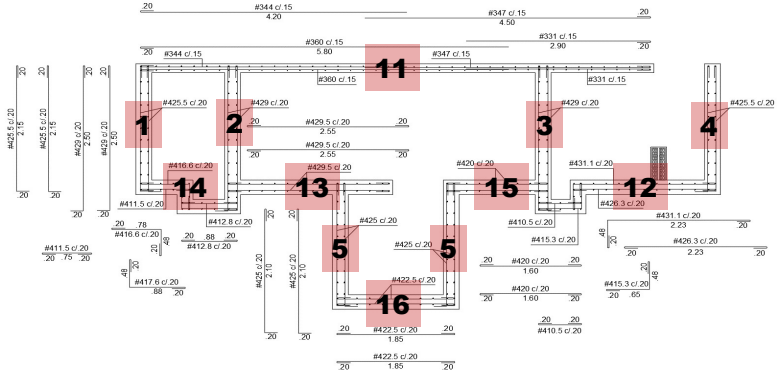

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

5.1 ACERO TANQUE


CALCULO DE HIERRO

NOMBRE	CANTIDAD	VARILLA #	LONGITUD	kg/m	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
1	13	4	4.75	0.994	2	TANQUE	122.76
	23	4	2.55	0.994	2	TANQUE	116.60
2	16	4	2.60	0.994	2	TANQUE	82.70
	13	4	2.90	0.994	2	TANQUE	74.95
3	16	4	2.60	0.994	2	TANQUE	82.70
	14	4	2.90	0.994	2	TANQUE	80.71
4	12	4	2.60	0.994	2	TANQUE	62.03
	14	4	2.55	0.994	2	TANQUE	70.97
5	13	4	2.50	0.994	4	TANQUE	129.22
	13	4	2.60	0.994	4	TANQUE	134.39
6	24	4	4.20	0.994	2	TANQUE	200.39
	24	4	6.00	0.994	2	TANQUE	286.27
	24	4	6.00	0.994	2	TANQUE	286.27
	24	4	4.20	0.994	2	TANQUE	200.39
	41	4	4.55	0.994	2	TANQUE	370.86
7	24	4	4.60	0.994	2	TANQUE	219.48
	24	4	4.20	0.994	2	TANQUE	200.39
	24	4	3.30	0.994	2	TANQUE	157.45
	24	4	5.50	0.994	2	TANQUE	262.42
8	12	4	3.20	0.994	2	TANQUE	76.34
	16	4	2.55	0.994	2	TANQUE	81.11
9	13	4	3.60	0.994	2	TANQUE	93.04
	18	4	2.55	0.994	2	TANQUE	91.25
10	13	4	2.80	0.994	2	TANQUE	72.36
	13	4	2.55	0.994	2	TANQUE	65.90
11	24	3	4.40	0.560	2	TANQUE	118.27
	24	3	4.70	0.560	2	TANQUE	126.34
	24	3	6.00	0.560	2	TANQUE	161.28
	24	3	3.10	0.560	2	TANQUE	83.33
	44	3	4.75	0.560	2	TANQUE	234.08
12	13	4	3.11	0.994	2	TANQUE	80.37
	13	4	2.63	0.994	2	TANQUE	67.97
	15	4	2.60	0.994	2	TANQUE	77.53
13	13	4	2.95	0.994	2	TANQUE	76.24
	15	4	2.65	0.994	2	TANQUE	79.02
14	13	4	1.66	0.994	2	TANQUE	42.90
	13	4	1.15	0.994	2	TANQUE	29.72
15	14	4	2.00	0.994	2	TANQUE	55.66
	10	4	2.60	0.994	2	TANQUE	51.69
16	11	4	2.25	0.994	2	TANQUE	49.20
	11	4	2.60	0.994	2	TANQUE	56.86
17	13	4	3.60	0.994	2	TANQUE	93.04
	18	4	2.80	0.994	2	TANQUE	100.20
						TOTAL ACUMULADO	35,032.94

TOTAL	**35,032.94**
PAGADO ACTAS ANTERIORES	32,334.32
TOTAL PLACA MACIZA	**2,698.62**

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	5.1			1 de 1
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.					

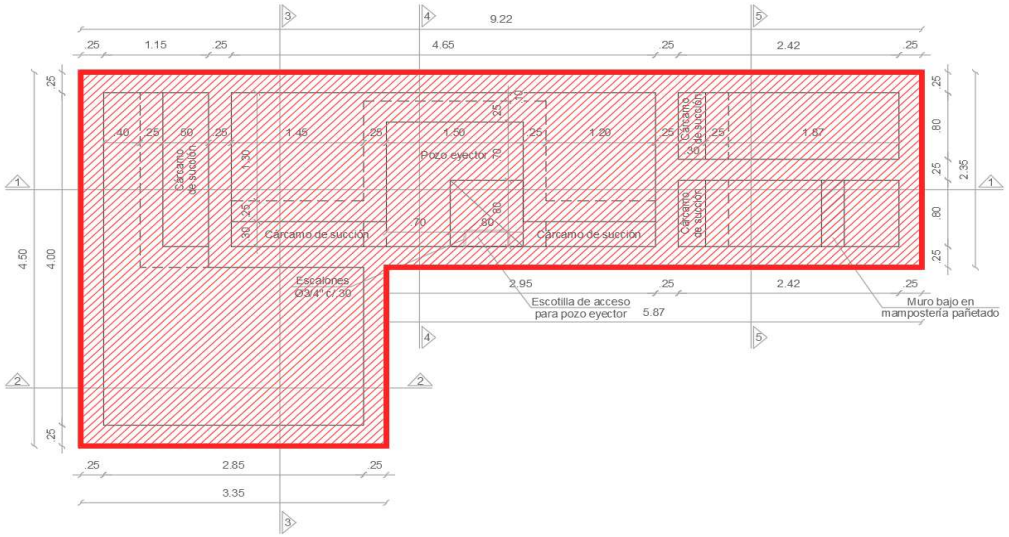

PLANTA VISTA INFERIOR TANQUE (GEOMETRÍA)
ESC. 1:50

4.7 PLACA CONTRAPISO TANQUE

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND. / %	ESPESOR	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	28.87			M3	0.25	TANQUE	7.22
						TOTAL	7.22



OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	


PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	5.2			1 de 1

DESCRIPCION

CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.

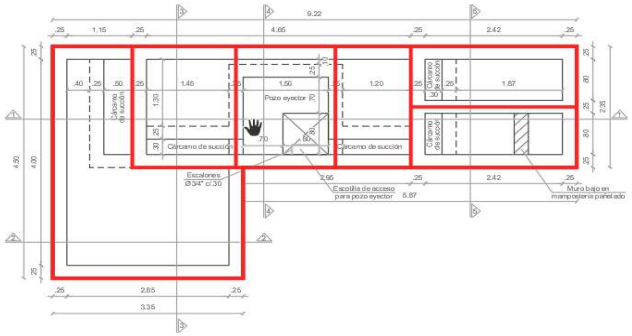

PLANTA VISTA INFERIOR TANQUE (GEOMETRÍA)
ESC. 1:50

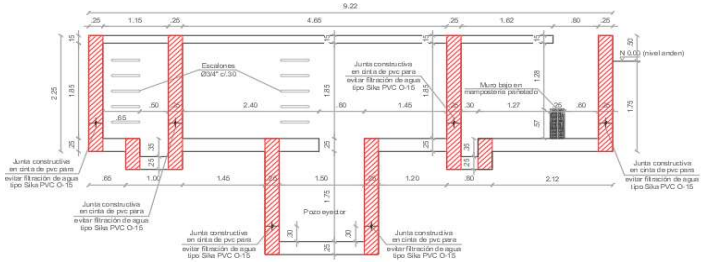

CORTE 1 - 1 (GEOMETRÍA)
ESC. 1:50

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

4.8 PANTALLAS PARA TANQUE EN CONCRETO


Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	0.25	22.44	2.25	M3	1	TANQUE	12.62
	0.25	4.30	2.25	M3	1	TANQUE	2.42
	0.25	2.35	2.25	M3	1	TANQUE	1.32
	0.25	2.92	2.25	M3	1	TANQUE	1.64
	0.25	2.35	2.25	M3	1	TANQUE	1.32
	0.25	2.35	0.60	M3	2	TANQUE	0.71
						TOTAL	20.03





	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA		Codigo	
			Versión	
			Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	5.3			1 de 1
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.					

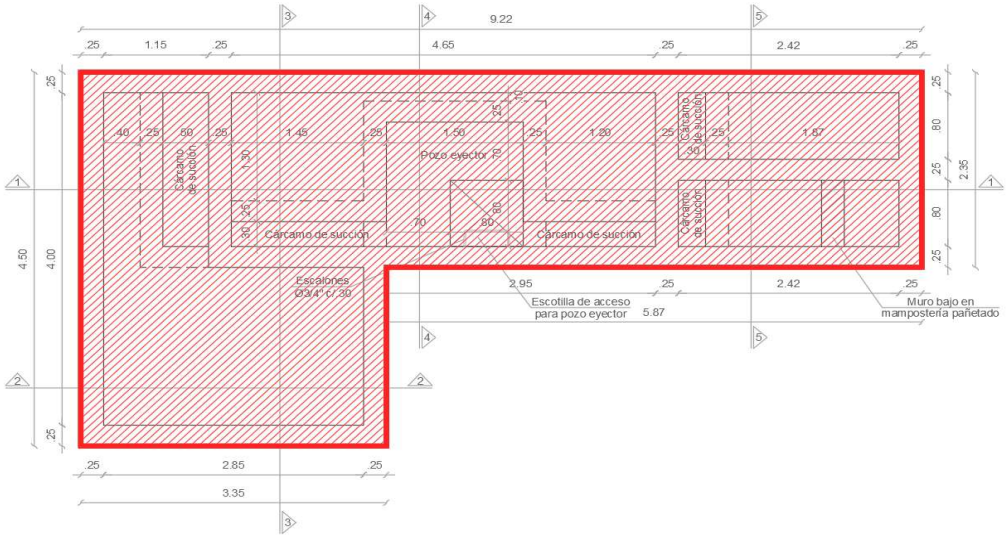

PLANTA VISTA INFERIOR TANQUE (GEOMETRÍA)
ESC. 1:50

4.9 PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO PARA TANQUE

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	4.50	3.35	0.15	M3	1	TANQUE	2.26
	5.87	2.35	0.15	M3	1		2.07
							4.33
						TOTAL	4.33




OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor


	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	6.1			1 de 1
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.					

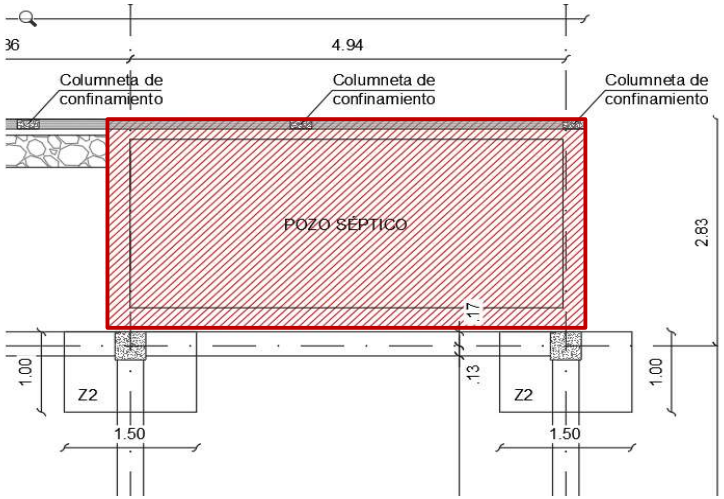

4.11 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO PARA POZO

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND. / %	ESPESOR	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	5.60	2.51	0.25	M3		POZO SEPTICO	3.51
						TOTAL	3.51

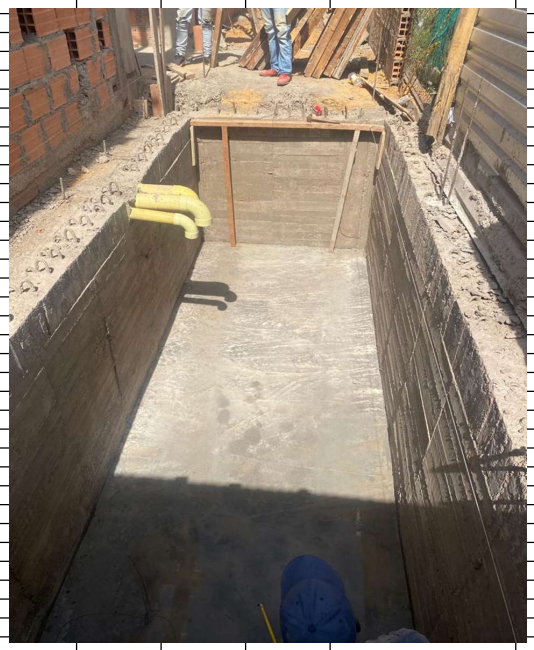



OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA		Codigo	
			Versión	
			Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	6.2			1 de 1
DESCRIPCION	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.					

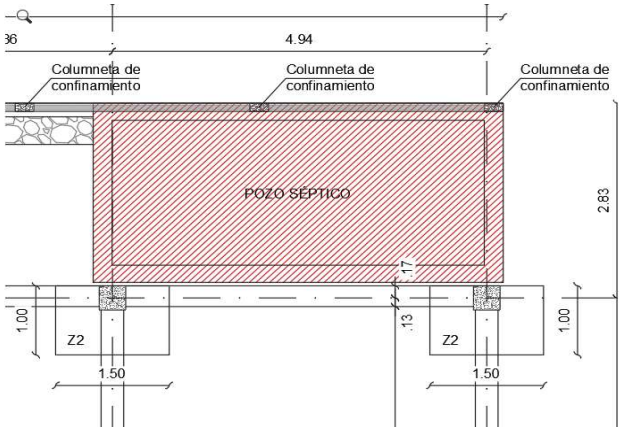




SECCION POZO SEPTICO

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

4.12 PANTALLAS PARA POZO EN CONCRETO


Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
	0.25	16.02	2.25	M3	1	POZO SEPTICO	9.01

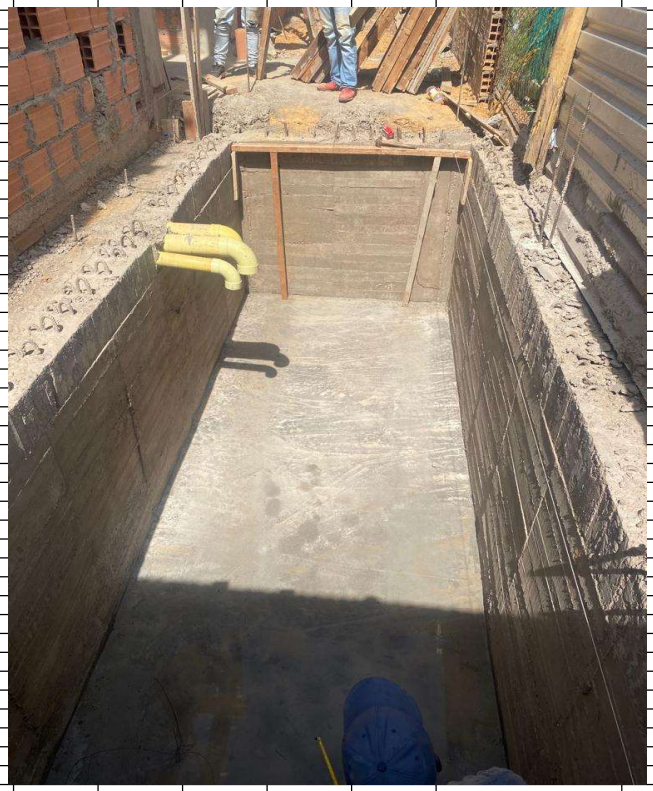

						TOTAL	9.01

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	6.3			1 de 1	

DESCRIPCION: CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.

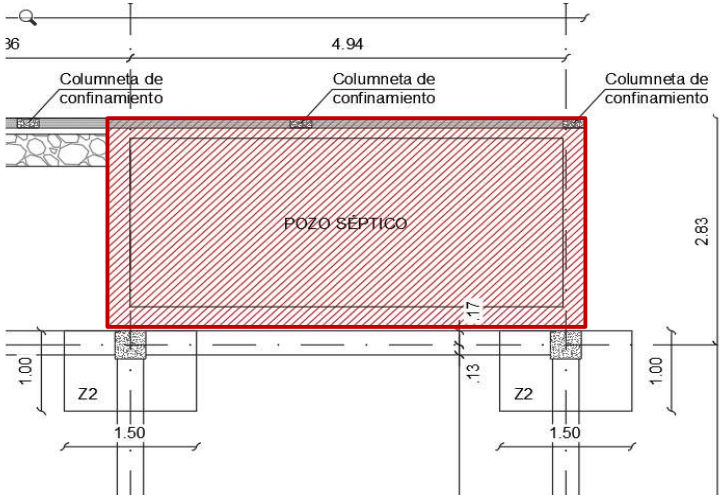

4.13 PLACA MACIZA AEREA PARA POZO

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	ESPESOR	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
		14.06		M3	0.15	POZO SEPTICO	2.11
						TOTAL	2.11





OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	10.10			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA 2 BOMBAS USO ALTERNO CADA UNA 100% DEL CAUDAL CADA BOMBA; CAUDAL 77 GPM, PRESIÓN:59 PSI, HIDROACUMULADOR 500 LITROS, INCLUYE TABLEROS Y ACCESORIOS					





OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

19.1 SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA

Nº	DIMENSIONES			UND.	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
				UND.	0.65		0.65

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	10.11			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS; BOMBAS 1; PRESIÓN 15 PSI, CAUDAL 14 GPM, HIDROACUMULADOR 50 LITROS					




19.2 SISTEMA DE BOMBEO REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIA

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
				UND	0.65		0.65

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	11.1			1 de 4
DESCRIPCION	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.					

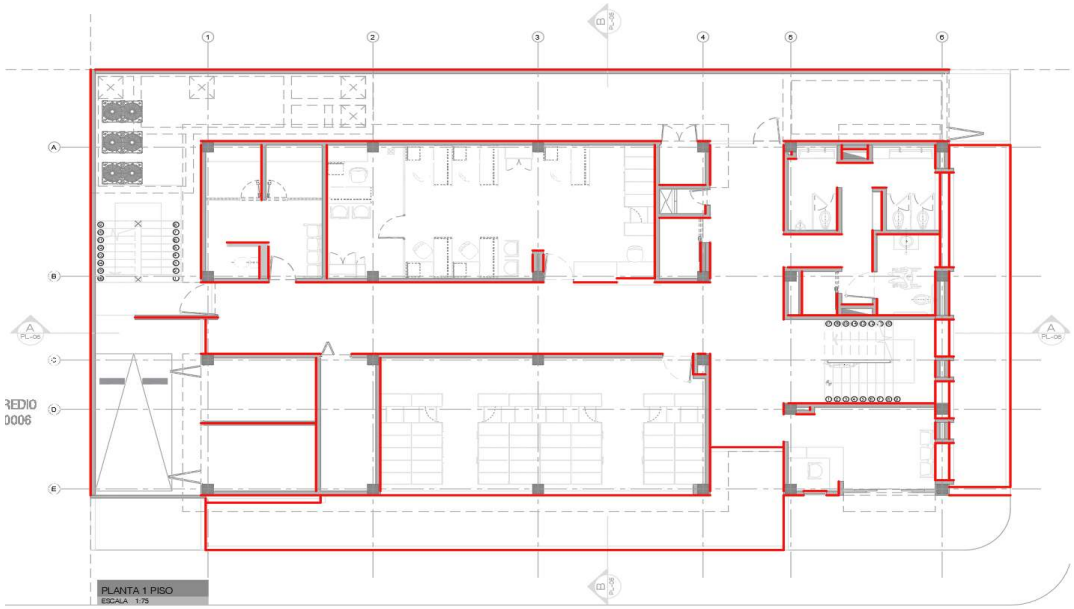

6.1 MURO BLOQUE #5 PRIMER PISO

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		2.70	9.00	M2	1	Primer Piso	24.30
		5.00	2.70	M2	1	Primer Piso	13.50
		4.85	2.70	M2	5	Primer Piso	65.48
		4.80	2.70	M2	2	Primer Piso	25.92
		3.90	2.70	M2	1	Primer Piso	10.53
		3.75	2.70	M2	1	Primer Piso	10.13
		3.25	2.70	M2	1	Primer Piso	8.78
		2.05	2.70	M2	1	Primer Piso	5.54
		2.00	2.70	M2	1	Primer Piso	5.40
		1.90	2.70	M2	2	Primer Piso	10.26
		1.80	2.70	M2	2	Primer Piso	9.72
		1.75	2.70	M2	1	Primer Piso	4.73
		1.65	2.70	M2	1	Primer Piso	4.46
		1.60	2.70	M2	4	Primer Piso	17.28
		1.55	2.70	M2	1	Primer Piso	4.19
		1.50	2.70	M2	2	Primer Piso	8.10
		1.40	2.70	M2	1	Primer Piso	3.78
		1.30	2.70	M2	1	Primer Piso	3.51
		1.15	2.70	M2	2	Primer Piso	6.21
		1.05	2.70	M2	1	Primer Piso	2.84
		1.00	2.70	M2	2	Primer Piso	5.40
		0.90	2.70	M2	1	Primer Piso	2.43
		0.85	2.70	M2	2	Primer Piso	4.59
		0.80	2.70	M2	1	Primer Piso	2.16
		0.76	2.70	M2	1	Primer Piso	2.05
		0.65	2.70	M2	1	Primer Piso	1.76
		0.60	2.70	M2	16	Primer Piso	25.92
		0.50	2.70	M2	2	Primer Piso	2.70
		0.45	2.70	M2	1	Primer Piso	1.22
		0.40	2.70	M2	2	Primer Piso	2.16
		0.35	2.70	M2	1	Primer Piso	0.95
		0.30	2.70	M2	1	Primer Piso	0.81
		0.25	2.70	M2	2	Primer Piso	1.35
		0.10	2.70	M2	2	Primer Piso	0.54
		16.60	2.00	M2	1	Primer Piso	33.20
		15.00	2.00	M2	1	Primer Piso	30.00
		9.35	2.00	M2	1	Primer Piso	18.70
		8.00	2.00	M2	1	Primer Piso	16.00
		5.10	2.00	M2	1	Primer Piso	10.20
		2.20	2.00	M2	1	Primer Piso	4.40
		1.35	1.20	M2	1	Primer Piso	1.62
		1.15	1.20	M2	2	Primer Piso	2.76
		3.45	1.15	M2	2	Primer Piso	7.94
		1.35	1.15	M2	6	Primer Piso	9.32
		1.23	0.90	M2	1	Primer Piso	1.11
		1.40	0.70	M2	2	Primer Piso	1.96
		22.73	0.50	M2	1	Primer Piso	11.37
		16.45	0.50	M2	1	Primer Piso	8.23
		4.02	0.50	M2	1	Primer Piso	2.01
		2.40	0.50	M2	1	Primer Piso	1.20
		2.00	0.50	M2	1	Primer Piso	1.00
		1.25	0.50	M2	1	Primer Piso	0.63


OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

					TOTAL ACUMULADO	460.27

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	11.1			2 de 4
DESCRIPCION	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.					

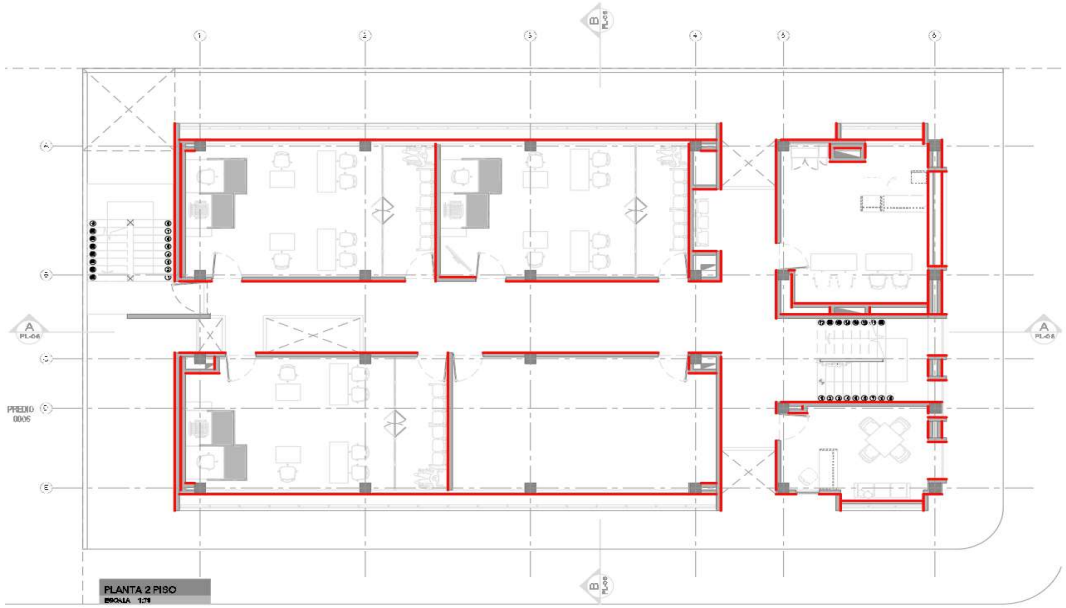


6.1 MURO BLOQUE #5 SEGUNDO PISO

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		2.70	0.85	M2	1	Segundo Piso	2.30
		1.80	2.70	M2	1	Segundo Piso	4.86
		5.25	2.70	M2	1	Segundo Piso	14.18
		5.60	2.70	M2	3	Segundo Piso	45.36
		1.05	2.70	M2	2	Segundo Piso	5.67
		0.90	2.70	M2	1	Segundo Piso	2.43
		5.70	2.00	M2	1	Segundo Piso	11.40
		15.75	0.85	M2	2	Segundo Piso	26.78
		5.00	2.70	M2	2	Segundo Piso	27.00
		1.85	2.70	M2	1	Segundo Piso	5.00
		3.35	2.00	M2	1	Segundo Piso	6.70
		4.85	2.70	M2	3	Segundo Piso	39.29
		1.10	2.70	M2	2	Segundo Piso	5.94
		1.65	2.70	M2	1	Segundo Piso	4.46
		1.20	2.70	M2	2	Segundo Piso	6.48
		5.30	2.00	M2	1	Segundo Piso	10.60
		1.30	2.00	M2	1	Segundo Piso	2.60
		4.95	2.00	M2	1	Segundo Piso	9.90
		2.40	2.70	M2	1	Segundo Piso	6.48
		3.75	2.70	M2	1	Segundo Piso	10.13
		2.75	2.70	M2	1	Segundo Piso	7.43
		1.90	1.15	M2	1	Segundo Piso	2.19
		1.15	2.70	M2	1	Segundo Piso	3.11
		0.85	2.70	M2	1	Segundo Piso	2.30
		1.00	2.70	M2	1	Segundo Piso	2.70
		3.45	1.15	M2	2	Segundo Piso	7.94
		1.60	2.70	M2	2	Segundo Piso	8.64
		4.35	2.70	M2	1	Segundo Piso	11.75
		1.75	2.70	M2	1	Segundo Piso	4.73
		5.40	2.70	M2	1	Segundo Piso	14.58
		0.60	2.70	M2	16	Segundo Piso	25.92
		0.70	2.70	M2	1	Segundo Piso	1.89
		0.65	2.70	M2	1	Segundo Piso	1.76
		0.25	2.70	M2	3	Segundo Piso	2.03
		0.40	2.70	M2	1	Segundo Piso	1.08
		0.10	2.70	M2	1	Segundo Piso	0.27
		0.45	2.70	M2	2	Segundo Piso	2.43
		0.90	2.70	M2	2	Segundo Piso	4.86
		0.85	2.70	M2	3	Segundo Piso	6.89
		0.30	2.70	M2	2	Segundo Piso	1.62
		0.75	2.70	M2	2	Segundo Piso	4.05
		0.20	2.70	M2	1	Segundo Piso	0.54
						TOTAL ACUMULADO	826.45

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA						Codigo	
							Versión	
							Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA		CORTE Nº	
			19	9	2023		4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2				HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	11.1				3 de 4	
DESCRIPCION	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.							

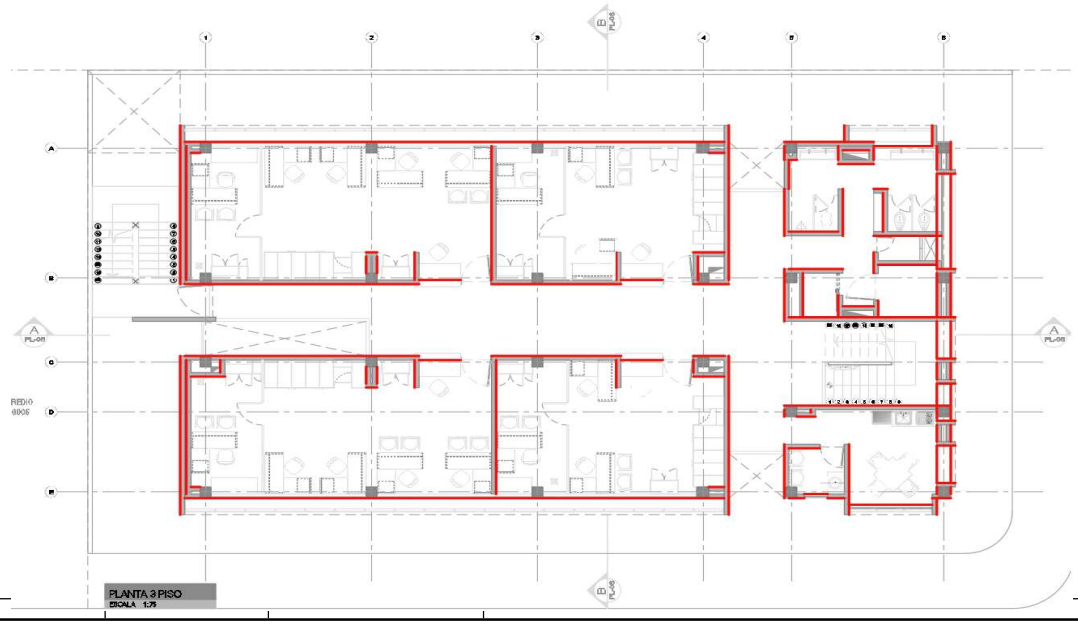

6.1 MURO BLOQUE #5 TERCER PISO


Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		2.70	0.85	M2	1	Tercer Piso	2.30
		2.55	2.70	M2	1	Tercer Piso	6.89
		1.00	2.70	M2	11	Tercer Piso	29.70
		1.95	2.70	M2	1	Tercer Piso	5.27
		5.40	2.70	M2	2	Tercer Piso	29.16
		5.75	2.70	M2	4	Tercer Piso	62.10
		15.75	0.85	M2	2	Tercer Piso	26.78
		1.35	0.90	M2	4	Tercer Piso	4.86
		4.05	2.00	M2	2	Tercer Piso	16.20
		5.00	2.70	M2	2	Tercer Piso	27.00
		1.70	2.70	M2	3	Tercer Piso	13.77
		4.58	2.00	M2	1	Tercer Piso	9.16
		1.30	2.70	M2	1	Tercer Piso	3.51
		1.10	2.70	M2	1	Tercer Piso	2.97
		4.29	2.70	M2	2	Tercer Piso	11.59
						TOTAL ACUMULADO	1,077.69

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	11.1			4 de 4	
DESCRIPCION	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.						

	TOTAL	1,077.69
###	TOTAL PISO 1 + PISO 2 + PISO 3	1,077.69
	COBRADO ACTAS ANTERIORES	435.54
	A COBRAR PRESENTE ACTA	642.15






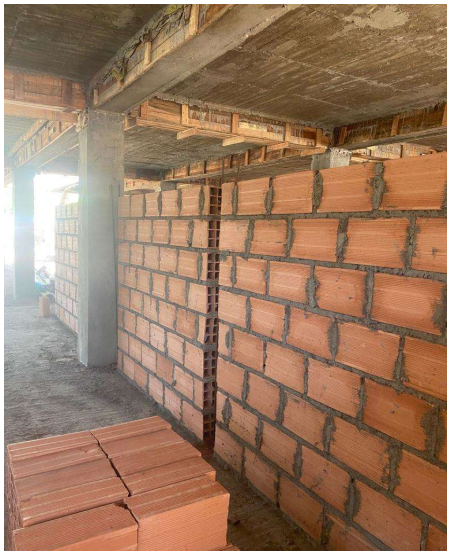



	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	13.1			1 de 2
DESCRIPCION	PAÑETE PARA MUROS, NO IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.					

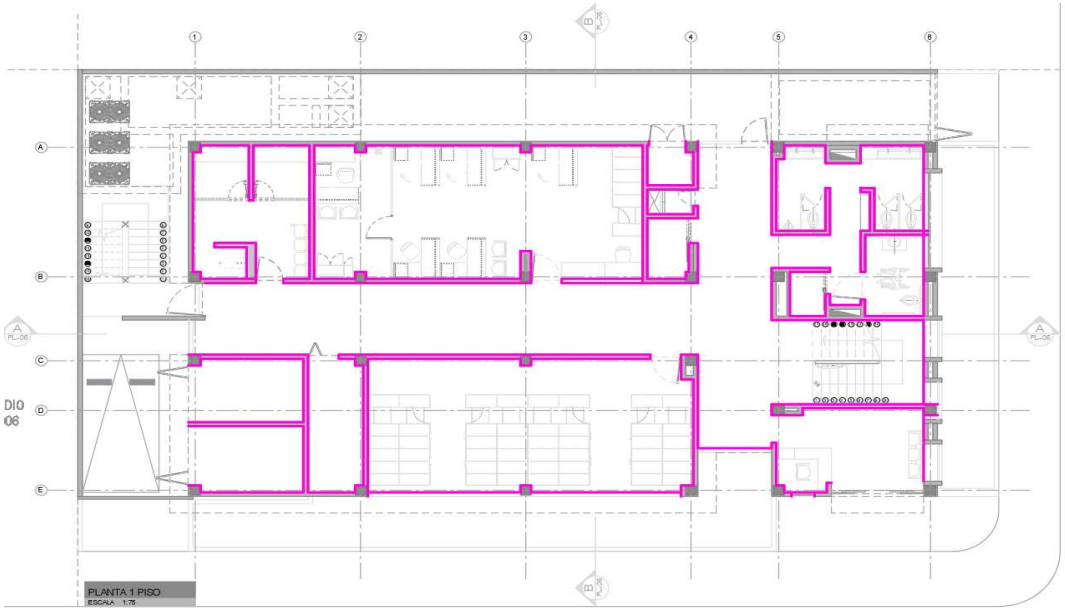

7.1 PAÑETE LISO PRIMER PISO


Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		11.70	2.70	M2	1	Primer piso	31.59
		0.15	1.15	M2	1	Primer piso	0.17
		0.90	2.70	M2	2	Primer piso	4.86
		1.35	1.15	M2	3	Primer piso	4.66
		1.05	2.70	M2	1	Primer piso	2.84
		0.75	1.00	M2	1	Primer piso	0.75
		2.80	2.70	M2	1	Primer piso	7.56
		2.40	0.50	M2	1	Primer piso	1.20
		9.90	2.70	M2	1	Primer piso	26.73
		13.23	2.00	M2	1	Primer piso	26.46
		0.85	2.70	M2	5	Primer piso	11.48
		4.96	2.00	M2	2	Primer piso	19.84
		5.00	2.70	M2	2	Primer piso	27.00
		4.88	2.00	M2	1	Primer piso	9.76
		7.00	2.70	M2	1	Primer piso	18.90
		1.50	2.00	M2	1	Primer piso	3.00
		8.90	2.70	M2	1	Primer piso	24.03
		10.05	2.70	M2	1	Primer piso	27.14
		6.15	2.70	M2	1	Primer piso	16.61
		3.35	2.00	M2	1	Primer piso	6.70
		0.65	2.70	M2	1	Primer piso	1.76
		4.10	2.70	M2	1	Primer piso	11.07
		5.00	1.20	M2	1	Primer piso	6.00
		4.35	2.00	M2	1	Primer piso	8.70
		0.50	2.70	M2	1	Primer piso	1.35
		1.57	2.00	M2	1	Primer piso	3.14
		4.15	2.70	M2	1	Primer piso	11.21
		1.83	2.00	M2	1	Primer piso	3.66
		4.85	2.70	M2	2	Primer piso	26.19
		9.21	2.00	M2	1	Primer piso	18.42
		2.37	2.70	M2	1	Primer piso	6.40
		5.00	2.00	M2	2	Primer piso	20.00
		1.33	2.00	M2	2	Primer piso	5.32
		3.63	2.00	M2	1	Primer piso	7.26
		21.75	2.70	M2	1	Primer piso	58.73
		1.23	0.90	M2	2	Primer piso	2.21
		2.95	0.70	M2	1	Primer piso	2.07
		13.65	2.70	M2	1	Primer piso	36.86
		1.34	2.00	M2	1	Primer piso	2.68
		2.45	2.70	M2	1	Primer piso	6.62
		2.05	2.00	M2	1	Primer piso	4.10
		1.00	2.70	M2	1	Primer piso	2.70
		3.45	1.15	M2	1	Primer piso	3.97
		10.95	2.70	M2	1	Primer piso	29.57
		19.90	2.70	M2	1	Primer piso	53.73
						TOTAL ACUMULADO	604.95

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	13.1			2 de 2
DESCRIPCION	PAÑETE PARA MUROS, NO IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.					

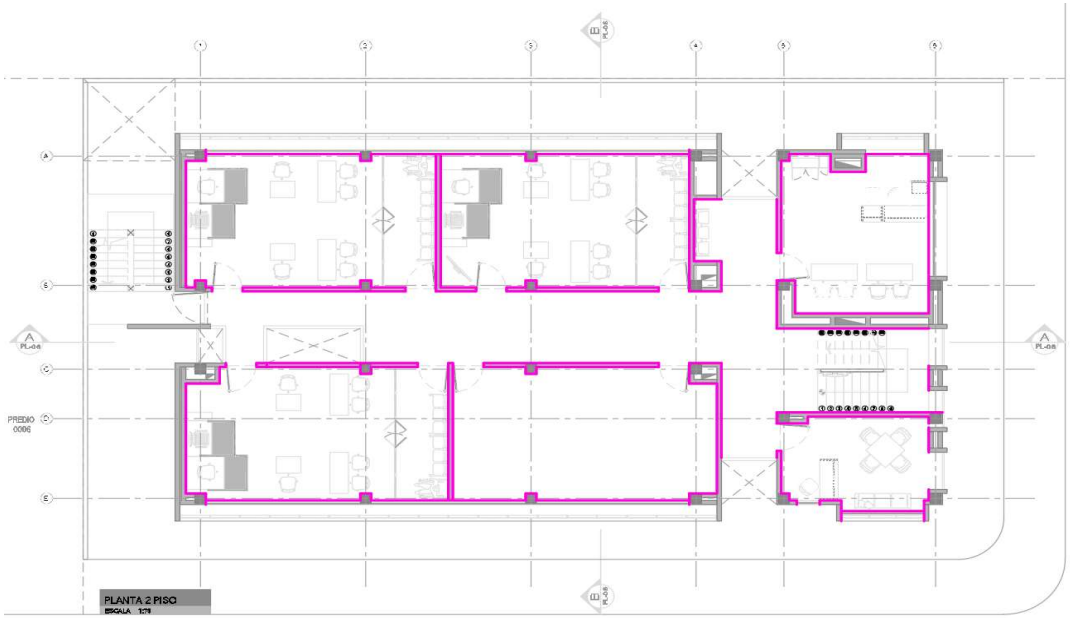

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

7.1 PAÑETE LISO SEGUNDO PISO

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		1.30	2.70	M2	1	Segundo piso	3.51
		2.70	0.85	M2	1	Segundo piso	2.30
		1.60	2.70	M2	1	Segundo piso	4.32
		2.85	2.70	M2	1	Segundo piso	7.70
		0.90	2.70	M2	2	Segundo piso	4.86
		11.25	2.70	M2	1	Segundo piso	30.38
		11.45	2.70	M2	1	Segundo piso	30.92
		11.36	2.00	M2	1	Segundo piso	22.72
		0.85	2.70	M2	7	Segundo piso	16.07
		5.00	0.85	M2	6	Segundo piso	25.50
		10.15	2.70	M2	1	Segundo piso	27.41
		7.10	2.70	M2	1	Segundo piso	19.17
		0.96	2.70	M2	1	Segundo piso	2.59
		3.05	2.00	M2	2	Segundo piso	12.20
		4.53	2.70	M2	1	Segundo piso	12.23
		7.15	2.70	M2	1	Segundo piso	19.31
		10.55	2.00	M2	1	Segundo piso	21.10
		5.00	2.70	M2	1	Segundo piso	13.50
		2.60	2.00	M2	1	Segundo piso	5.20
		4.85	2.70	M2	1	Segundo piso	13.10
		9.85	2.00	M2	1	Segundo piso	19.70
		11.35	2.70	M2	1	Segundo piso	30.65
		9.75	2.70	M2	1	Segundo piso	26.33
		1.90	1.15	M2	1	Segundo piso	2.19
		1.15	2.70	M2	1	Segundo piso	3.11
		3.45	1.15	M2	1	Segundo piso	3.97
		14.20	2.70	M2	1	Segundo piso	38.34
						TOTAL ACUMULADO	1,023.27








TOTAL PISO 1 + PISO 2	1,023.27
COBRADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A COBRAR PRESENTE ACTA	1,023.27

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	13.2			1 de 1
DESCRIPCION	PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.					

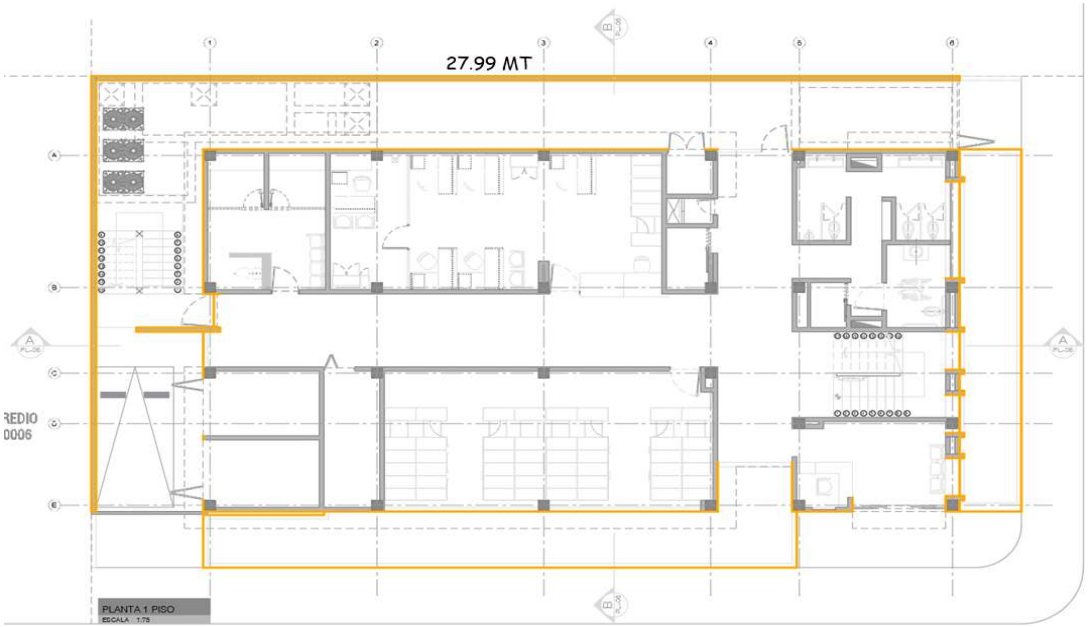

7.2 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO PRIMER PISO

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
		27.05	2.05	M2	1	Primer piso	55.45
						TOTAL	55.45




OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

TOTAL	55.45

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	14.2			1 de 2
DESCRIPCION	ESTUCO PARA MUROS NO IMPERMEABLE LISO EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE ESTUCADA.					

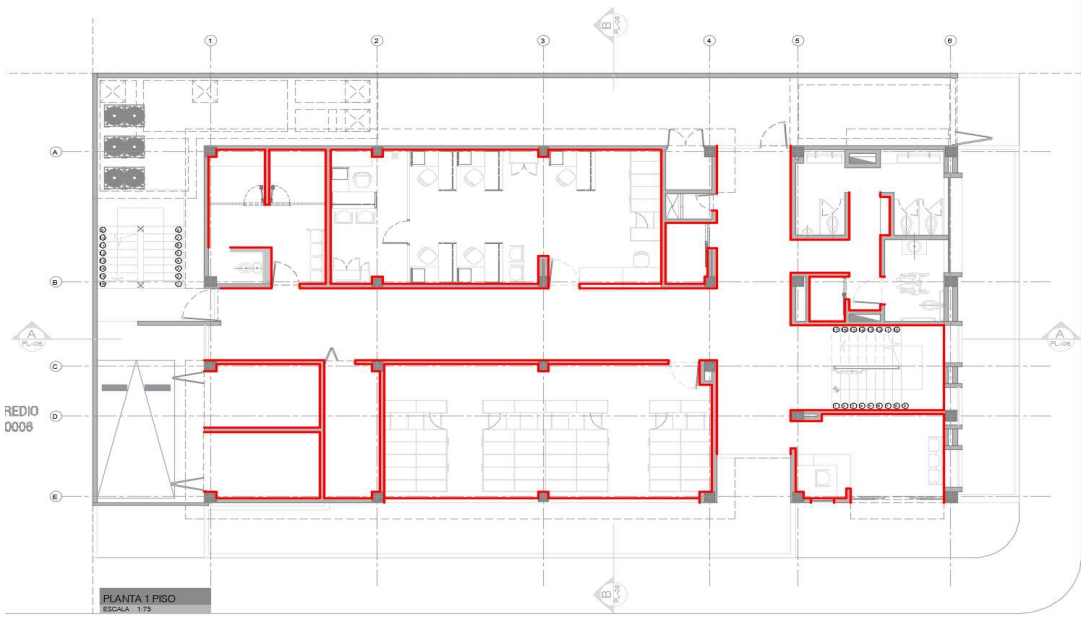

7.3 ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR PRIMER PISO


Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		2.80	2.70	M2	1	Primer piso	7.56
		0.75	1.00	M2	1	Primer piso	0.75
		1.55	2.70	M2	1	Primer piso	4.19
		1.35	1.15	M2	3	Primer piso	4.66
		0.55	2.70	M2	1	Primer piso	1.49
		0.90	2.70	M2	2	Primer piso	4.86
		10.80	2.70	M2	1	Primer piso	29.16
		9.90	2.70	M2	1	Primer piso	26.73
		13.25	2.00	M2	1	Primer piso	26.50
		0.85	2.70	M2	5	Primer piso	11.48
		4.96	2.00	M2	2	Primer piso	19.84
		7.00	2.70	M2	1	Primer piso	18.90
		5.00	2.70	M2	1	Primer piso	13.50
		4.88	2.00	M2	1	Primer piso	9.76
		1.53	2.00	M2	1	Primer piso	3.06
		8.90	2.70	M2	1	Primer piso	24.03
		10.05	2.70	M2	1	Primer piso	27.14
		6.15	2.70	M2	1	Primer piso	16.61
		3.35	2.00	M2	1	Primer piso	6.70
		0.65	2.70	M2	1	Primer piso	1.76
		2.65	1.20	M2	1	Primer piso	3.18
		1.80	2.70	M2	1	Primer piso	4.86
		3.29	2.00	M2	1	Primer piso	6.58
		0.50	2.70	M2	1	Primer piso	1.35
		1.57	2.00	M2	1	Primer piso	3.14
		4.15	2.70	M2	1	Primer piso	11.21
		1.83	2.00	M2	1	Primer piso	3.66
		4.85	2.70	M2	3	Primer piso	39.29
		9.05	2.00	M2	1	Primer piso	18.10
		2.52	2.70	M2	1	Primer piso	6.80
		5.00	2.00	M2	2	Primer piso	20.00
		1.32	2.00	M2	2	Primer piso	5.28
		3.63	2.00	M2	1	Primer piso	7.26
		1.23	0.90	M2	2	Primer piso	2.21
		2.95	0.70	M2	1	Primer piso	2.07
		10.65	2.70	M2	1	Primer piso	28.76
		1.75	2.70	M2	1	Primer piso	4.73
		7.00	2.70	M2	1	Primer piso	18.90
		3.80	2.70	M2	1	Primer piso	10.26
		15.65	2.70	M2	1	Primer piso	42.26
						TOTAL ACUMULADO	498.53

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M2			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	14.2			2 de 2
DESCRIPCION	ESTUCO PARA MUROS NO IMPERMEABLE LISO EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE ESTUCADA.					

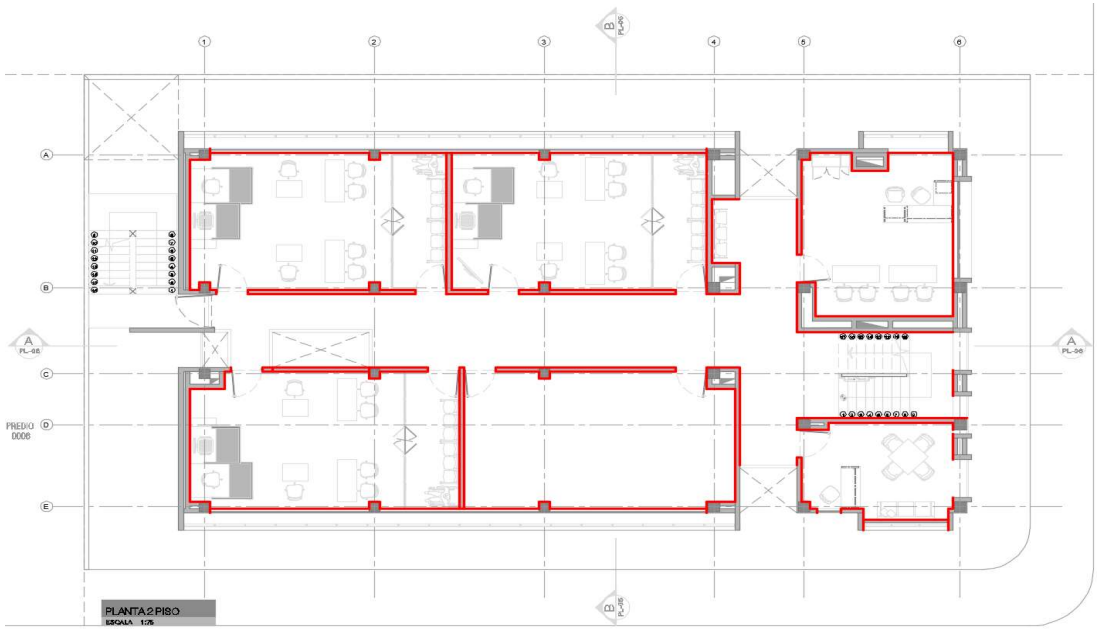

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

7.3 ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR SEGUNDO PISO

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
		1.30	2.70	M2	1	Segundo piso	3.51
		2.70	0.85	M2	1	Segundo piso	2.30
		1.60	2.70	M2	1	Segundo piso	4.32
		2.85	2.70	M2	1	Segundo piso	7.70
		11.25	2.70	M2	1	Segundo piso	30.38
		0.90	2.70	M2	2	Segundo piso	4.86
		11.45	2.70	M2	1	Segundo piso	30.92
		11.36	2.00	M2	1	Segundo piso	22.72
		0.85	2.70	M2	7	Segundo piso	16.07
		5.00	0.85	M2	6	Segundo piso	25.50
		10.15	2.70	M2	1	Segundo piso	27.41
		7.10	2.70	M2	1	Segundo piso	19.17
		0.96	2.70	M2	1	Segundo piso	2.59
		3.22	2.00	M2	2	Segundo piso	6.44
						TOTAL ACUMULADO	702.39


TOTAL ESTUCO PISO 1 + PISO 2	702.39
COBRADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A COBRAR PRESENTE ACTA	702.39

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	18.4			1 de 1

DESCRIPCION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 6, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 300/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X300A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

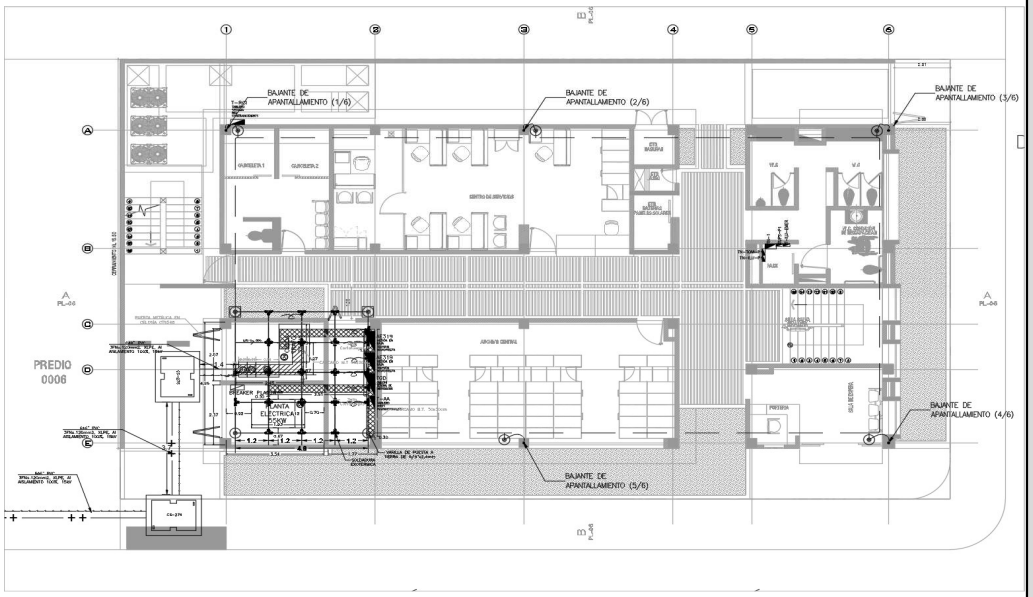

CELDA 5. CELDA DE MEDIDA

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND	0.65	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de celda , grupo de medida de tres elementos norma codensa ae319 (medida red normal), Incluye 3 tc's y 3 tp's, clase 0.5, rango 300/5a a 25 va, medidor electrónico, protección termo magnética de 3x300a con o sin unidad de disparo según lo indicado en planos,	0.65






			TOTAL	0.65

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	18.5			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 7, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 400/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X400A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						

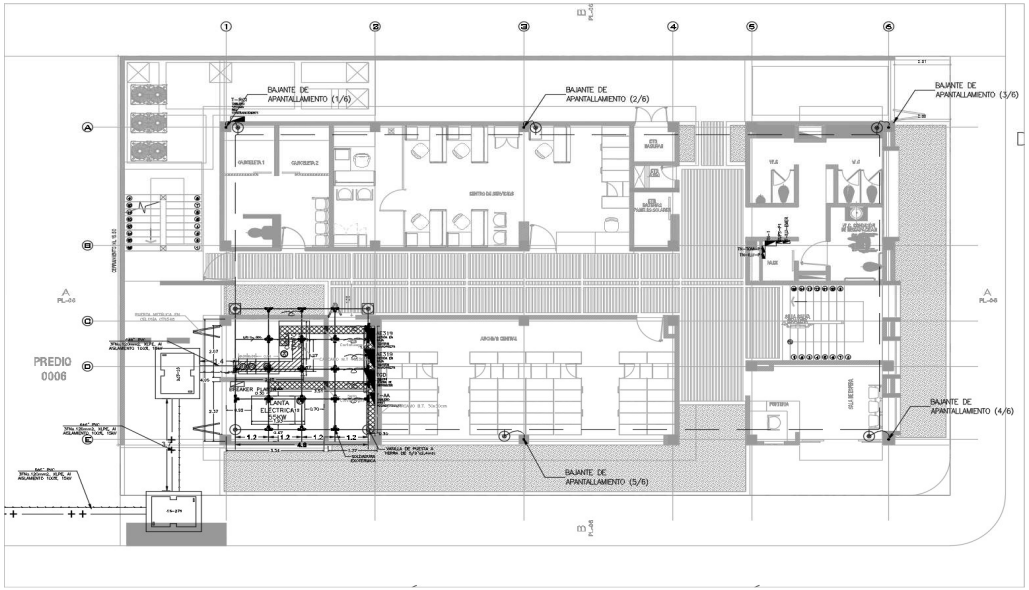

CELDA 6. CELDA DE MEDIDA

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND	0.65	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de celda , grupo de medida de tres elementos norma codensa ae319 (medida red normal), Incluye 3 tc's y 3 tp's, clase 0.5, rango 400/5a a 25 va, medidor electrónico, protección termomagnética de 3x400a con o sin unidad de disparo según lo indicado en planos, Corriente de cortocircuito icc:10ka	0.65






TOTAL			0.65

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	18.6			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA STAND-BY 75 KVA, ALTURA DE OPERACIÓN 2600 MSNM APROX, TANQUE PARA COMBUSTIBLE, CABINA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					

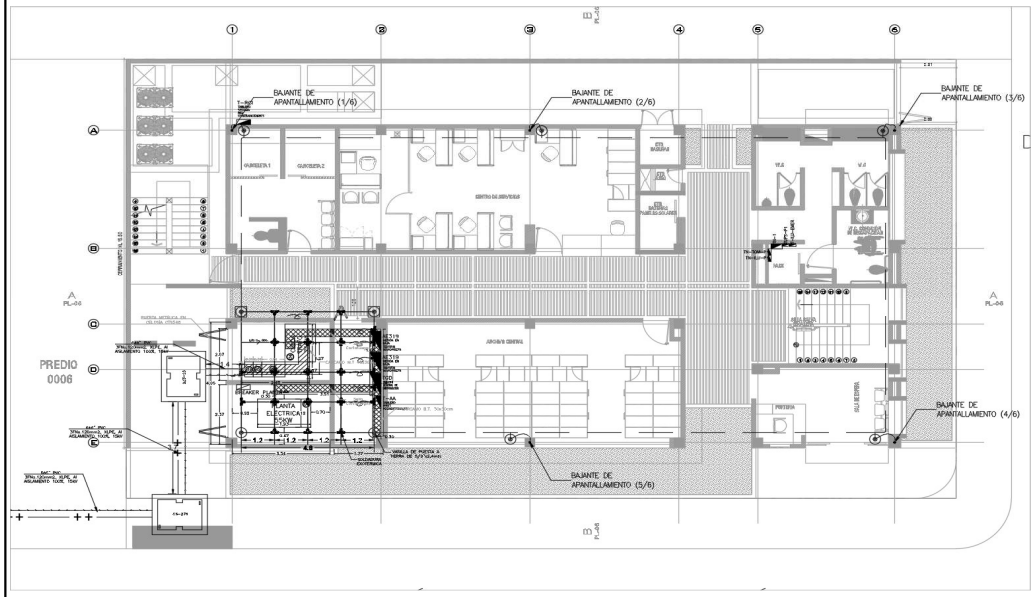

PLANTA ELECTR4ICA

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND	0.65	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de planta eléctrica stand-by 75 kva, altura de operación 2600 msnm aprox, tanque para combustible, cabina.	0.65
						TOTAL	0.65



OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

			DD	MM	AAAA	
PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	19	9	2023	CORTE Nº 4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	18.8			1 de 1

DESCRIPCION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA (C-EMER)-8, CELDA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA PARA SISTEMA RCI DE FABRICACIÓN ESPECIAL, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO SITIO), PRUEBAS DE ARCO, VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.

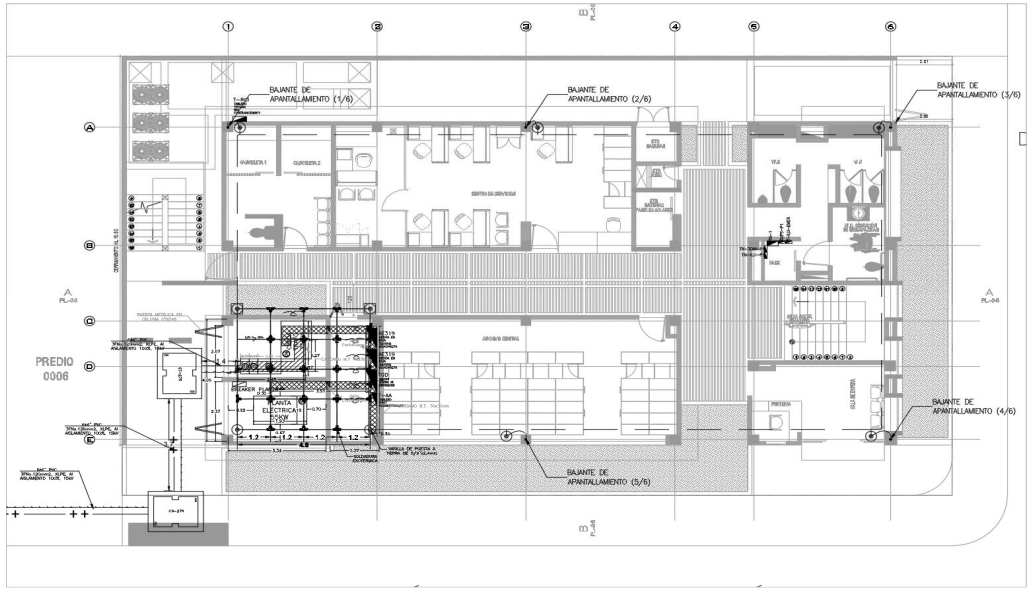

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

CELDA 8 DE BAJA TENSION DE EMERGENCIA - TRANSFERENCIA

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND	0.65	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de celda (c-emer), celda de transferencia eléctrica para sistema rci de fabricación especial, el Tablero debe ser ensamblado en fabrica (no sitio), pruebas de arco, ver diagrama unifilar.	0.65






						TOTAL	0.65

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	18.9			1 de 1

DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGD, PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X300A, ICC 10KA, NIVEL DE TENSIÓN 208/120V, PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LOS TABLEROS (TN-1, TN-2, TN-3, T-AA, T-AA*, T-UPS-P1, T-UPS-P2, T-UPS-P3),CON MARCA DE TABLERO EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE DE LA CELDA Y MARCACIÓN INTERIOR DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE LA COMPONE, PRUEBAS DE ARCO EN TABLERO, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO EN SITIO), VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

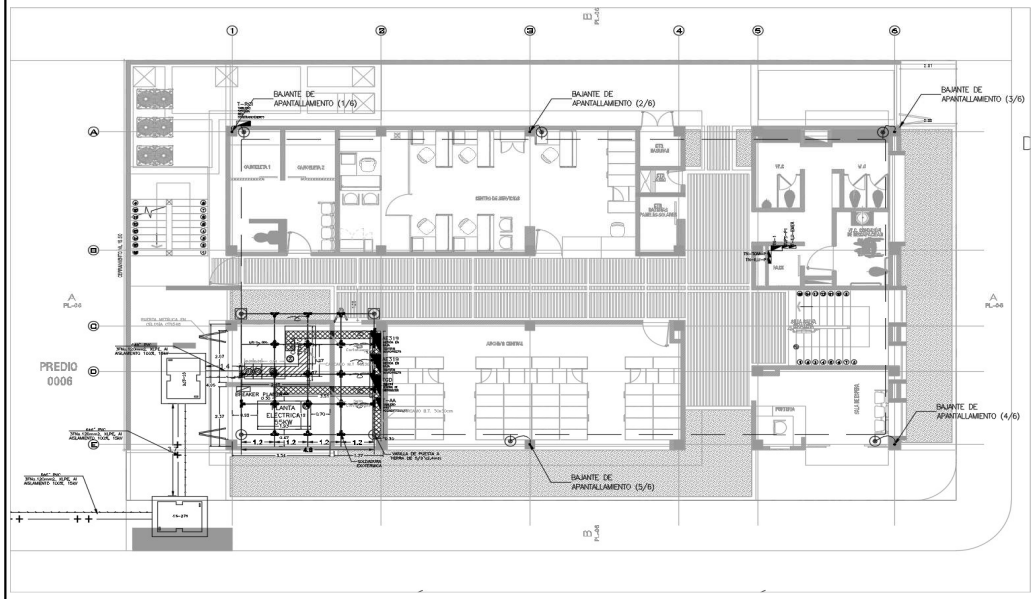

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND	0.65	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tablero general de acometidas tgd, protección principal de 3x300a, icc 10ka, nivel de tensión 208/120v,	0.65
						TOTAL	0.65






OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	ML			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	20.3			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE NO. 2/0 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					

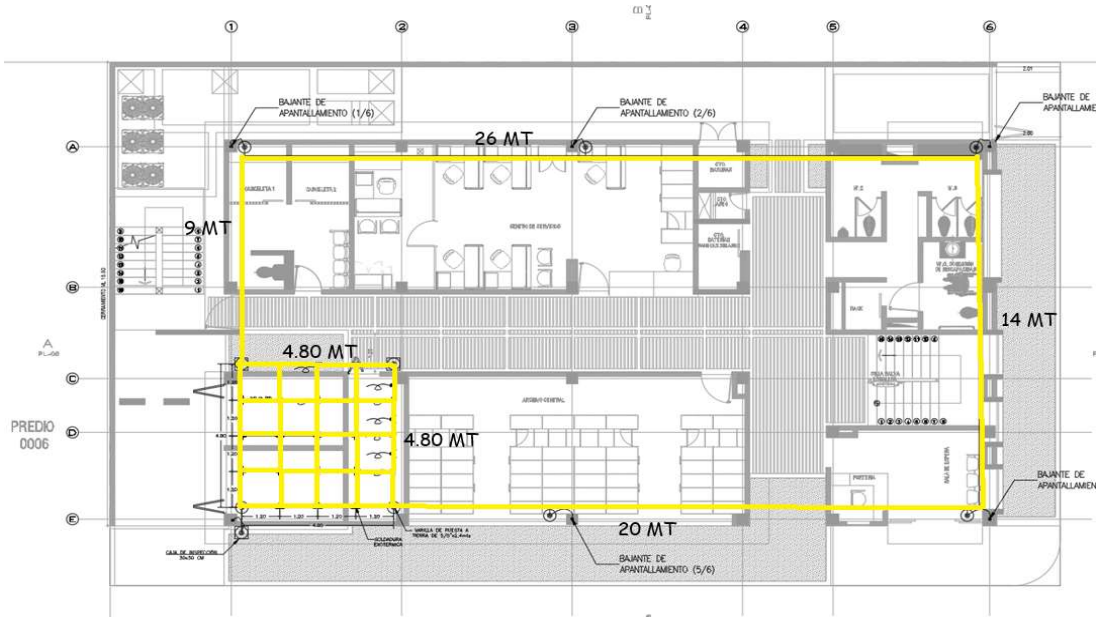

CABLE DESNUDO 2/0

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				ML		Suministro e instalación de cable desnudo de cobre no. 2/0 awg	
				4.80	10		48.00
							20.00
							14.00
							8.00
						TOTAL	90.00

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	23.2			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Φ1/2" (10 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					

SALIDAS DE ILUMINACION PISO 1

ITEM	CONVENCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALTURA DE INSTALACIÓN	UBICACIÓN
-		Luminaria LED 60x60cm 40W, incrustar o suspender, chasis de aluminio, difusor en acrílico (PMMA) opal, módulo LED de 40W 4000K, driver electrónico multivoltaje 100-277VAC.	13	2.5m	OFICINA
2		Luminaria LED tipo panel redondo de 24W, para incrustar, chasis en aluminio+ PC, módulo LED de 24W 4000K, driver electrónico multivoltaje 100-240VAC.	19	2.5m	PASILLO
3		Luminaria LED tipo panel redondo de 18W, para incrustar, chasis en aluminio+ PC, módulo LED de 18W 4000K, driver electrónico multivoltaje 100-240VAC.	13	2.5m	BAÑOS
4		Luminaria LED tipo panel redondo de 18W, para incrustar, chasis en aluminio+ PC, módulo LED de 3W 3000K, driver electrónico multivoltaje 100-277VAC.	3	2.5m2	OFICINA
5		Luminaria LED tipo lineal 7.5cmx.25cmx1240cm (AnchoxAltoxLargo) 32W, para descolgar,chasis en aluminio+ PC, difusor opal en acrílico (PMMA), módulo LED de 32W 4000K, driver electrónico multivoltaje 85-265VAC.	1	2.5m2	OFICINA
6		Luminaria LED tipo hermética de 40W , para descolgar o sobreponer, chasis en policarbonato, módulo LED de 40W 4000K, driver electrónico multivoltaje 100-277VAC.	9	2.5m2	CUARTOS TECNICOS

SALIDAS DE ILUMINACION PISO 2

CUADRO DE LUMINARIAS

ITEM	CONVENCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALTURA DE INSTALACIÓN	UBICACIÓN
1		Luminaria LED 60x60cm 40W, incrustar o suspender, chasis de aluminio, difusor en acrílico (PMMA) opal, módulo LED de 40W 4000K, driver electrónico multivoltaje 100-277VAC.	39	2.5m	OFICINA
2		Luminaria LED tipo panel redondo de 24W, para incrustar, chasis en aluminio+ PC, módulo LED de 24W 4000K, driver electrónico multivoltaje 100-240VAC.	10	2.5m	PASILLO
3		Luminaria LED tipo hermética de 40W , para descolgar o sobreponer, chasis en policarbonato, módulo LED de 40W 4000K,	4	2.5m2	CUARTOS TECNICOS

SALIDAS ILUMINACION


Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND		Salida para punto de iluminación en cable no. 12 awg cable de cobre hffr ls ct awg en tubería conduit pvc de 1ϕ1/2" (10 mts).	
	PISO 1			UND	58.00		
	PISO 2			UND	53.00		

		driver electrónico multivoltaje 100-277VAC.									
OBSERVACIONES:											
Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor							TOTAL	111.00


}

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	25.1			1 de 1
DESCRIPCION	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M					

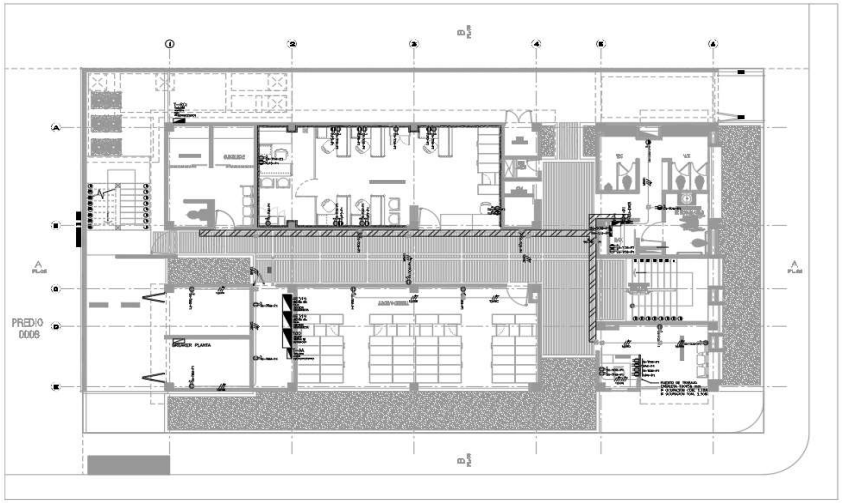

PLANTA GENERAL PISO 1
TOMAS

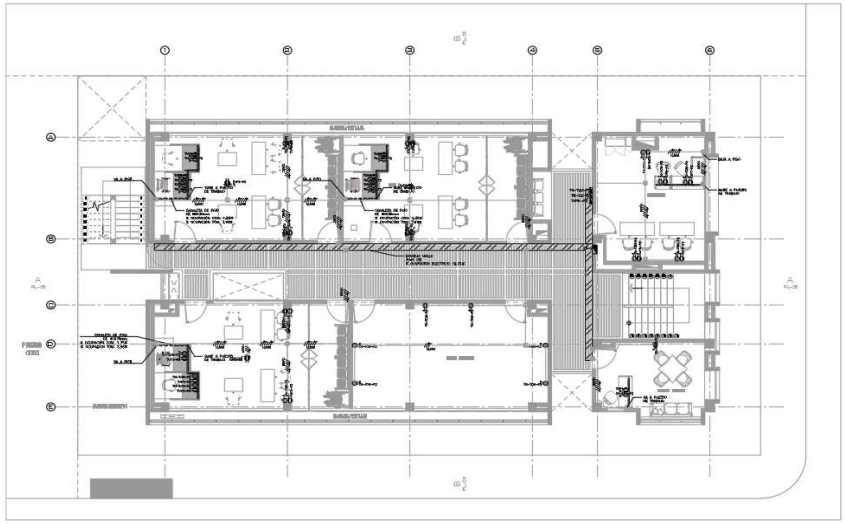

PLANTA GENERAL PISO 2
TOMAS


SALIDAS TOMACORRIENTES

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
						Salida tomacorriente doble con polo a tierra aislado nema 5-15r 15a 125v; conduit pvc 3/4" (incluye toma de la linea basica de leviton) prom 10 m	
				UND	26.00	PISO 1	
				UND	28.00	PISO 2	
					TOTAL		54.00


OBSERVACIONES:			
Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	25.2			1 de 1
DESCRIPCION	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR NARANJA CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M					

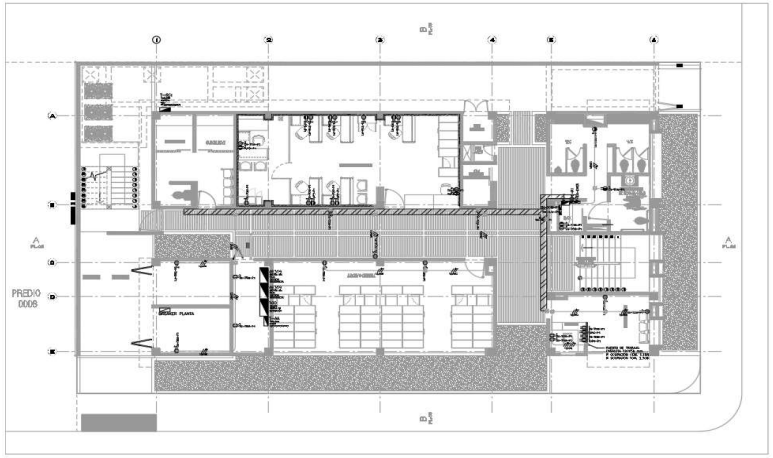

PLANTA GENERAL PISO 1
TOMAS

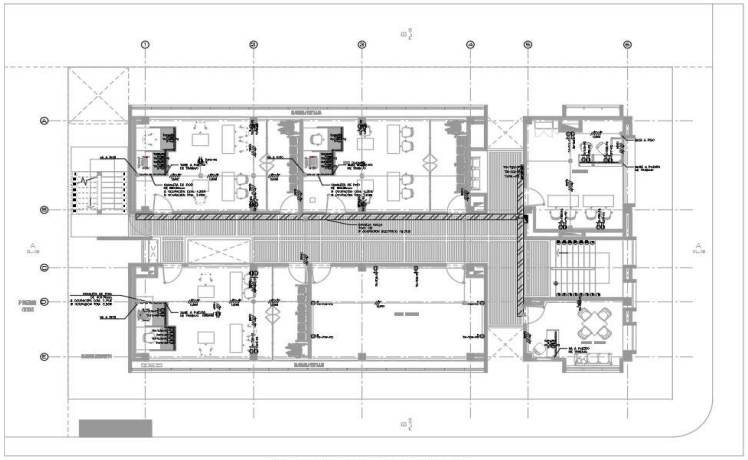

PLANTA GENERAL PISO 2
TOMAS

SALIDAS TOMACORRIENTES

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
						SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE COLOR NARANJA CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M	
				UND	12.00	PISO 1	
				UND	24.00	PISO 2	
						TOTAL	36.00

OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	ML			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	26.1			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X150 MM ACABADO ELECTROZINCADO, BANDEJA CON MALLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS. ACABADO ELECTROZINCADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					





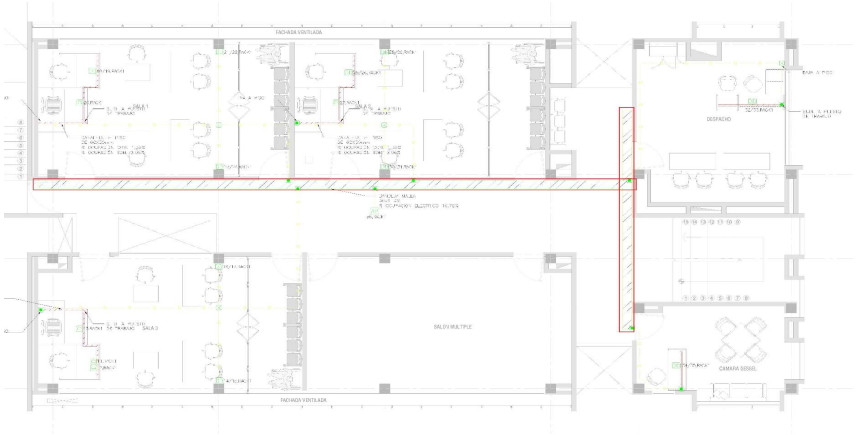

BANDEJA RED DE DATOS

PISO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
1		17.20					
		6.50					
		1.70					25.40
2		19.10					
		7.90					27.00
						TOTAL	52.40



OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	27.1			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PREENSAMBLADO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO END SUCTION CON MOTOR ELECTRICO, BOMBA 100 GPM A 85 PSIG, BOMBA AUXILIAR JOCKEY DE 10 GPM A PRESIÓN DE 90 PSGI, INCLUYE ACCESORIOS Y TABLERO ELECTRICO					




19.2 SISTEMA DE BOMBEO REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIA

Nº	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
				UND	0.65		0.65
						TOTAL	0.65

OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA					Codigo	
						Versión	
						Fecha	
PROYECTO /OC, # CONT.	**Despachos Judiciales Puerto Carreño**	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº	
			19	9	2023	4	
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	29.1			1 de 1	
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 30 KW, CONSTA DE 96 PANELES SOLARES AMORFOS DE 330 VATIOS, 2 INVERSORES DE 15 KW TRIFÁSICOS Y UN SISTEMA DE RESPALDO COMPUESTO POR 32 BATERÍAS						

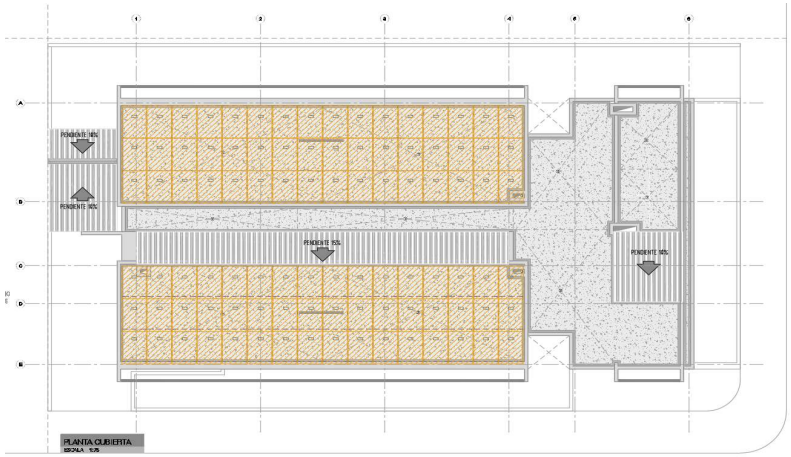

15.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO CUBIERTA

Nº	DIMENSIONES ANCHO	LONG	ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
				UND	0.65	Sistema Fotovoltaico	0.65









BATERIAS SOLARES — PANELES SOLARES

						TOTAL	0.65

OBSERVACIONES:


Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	30.1			1 de 1


DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE 11 UNIDAD TIPO CASSETTE 4 VIAS; 8 UNIDAD TIPO WALLMOUNT, 3 UNIDAD CONDENSADORA, CONTROL REMOTO EQUIPOS, SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE MAQUINAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RUTINAS TRIMESTRALES, HASTA COMPLETAR UN (1) AÑO DE SERVICIO, INCLUYE SOPORTES 7X24. MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL CON PH Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410ª, TUBERÍAS EN COBRE, RUBATEX, ACOMETIDAS DE CONTROL (CONFIGURACIÓN RED LAN POR PISO) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DISEÑO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS.

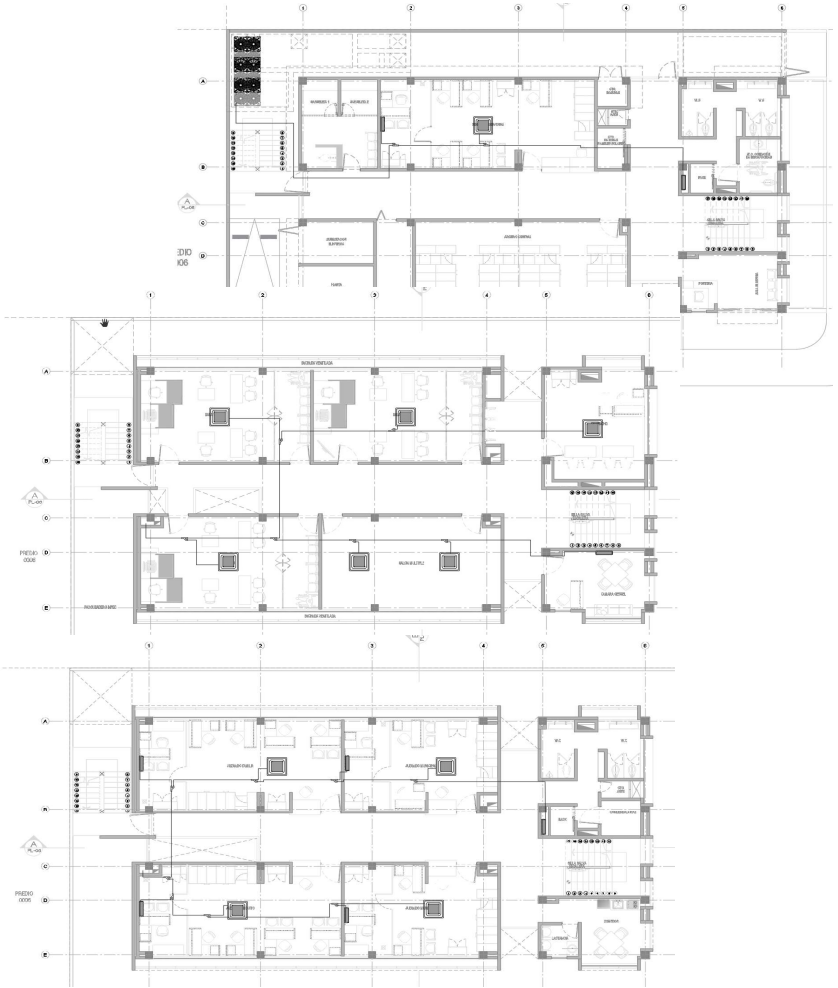

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Nº	DIMENSIONES			UND.	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
1.0				UND		Unidad Condensadora AM200MXVAFC/A	3
2.0				UND		Unidad Tipo Cassette 4 Vias AM030FN4DCH/AA	2
3.0				UND		Unidad Tipo Cassette 4 Vias AM036FN4DCH/AA	2
4.0				UND		Unidad Tipo Cassette 4 Vias AM048FN4DCH/AA	7
5.0				UND		Unidad Tipo Wallmount AM009MNVDCH/AA	1
6.0				UND		Unidad Tipo Wallmount AM012MNVDCH/AA	4
7.0				UND		Unidad Tipo Wallmount AM018MNVDCH/AA	2
8.0				UND		Unidad Tipo Wallmount AM024MNVDCH/AA	1
9.0				UND		Y Branch MXJ-TA4122M	1
10.0				UND		Y Branch MXJ-TA3419M	1
11.0				UND		Y Branch MXJ-YA4422M	2
12.0				UND		Y Branch MXJ-YA2512M	12
13.0				UND		Y Branch MXJ-YA3419M	1
14.0				UND		Y Branch MXJ-YA2815M	2
15.0				UND		Y Branch MXJ-YA1509M	1
16.0				Glb		Control remoto equipos	22
17.0				UND		Sistema control centralizado	1
18.0				Glb		Comisionamiento y arranque de maquinas	1
19.0				Rutina		Servicio de mantenimiento preventivo con rutinas trimestrales, hasta completar un (1) año de servicio, incluye soportes 7x24.	8
20.0				Glb		Movimiento vertical y horizontal con PH y movilización dentro del edificio	1

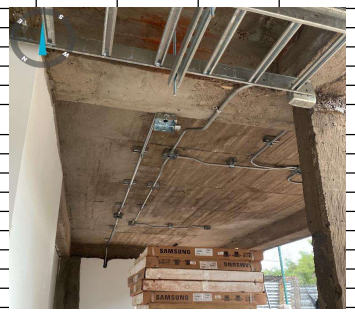



	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	ML			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	31.9			1 de 1
DESCRIPCION	BANDEJA PORTACABLES DE 30X10 CMS TIPO CABLO FILL, CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN					





BANDEJA RED DE DATOS

PISO	DIMENSIONES			UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTO				
1		17.20					
		6.20					
		1.60					25.00
2		19.00					
		8.00					27.00





			TOTAL	52.00


OBSERVACIONES:

Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	M3			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	NP.20			1 de 1
DESCRIPCION	PLACA MACIZA CUBIERTA IMPERMEABILIZADA					

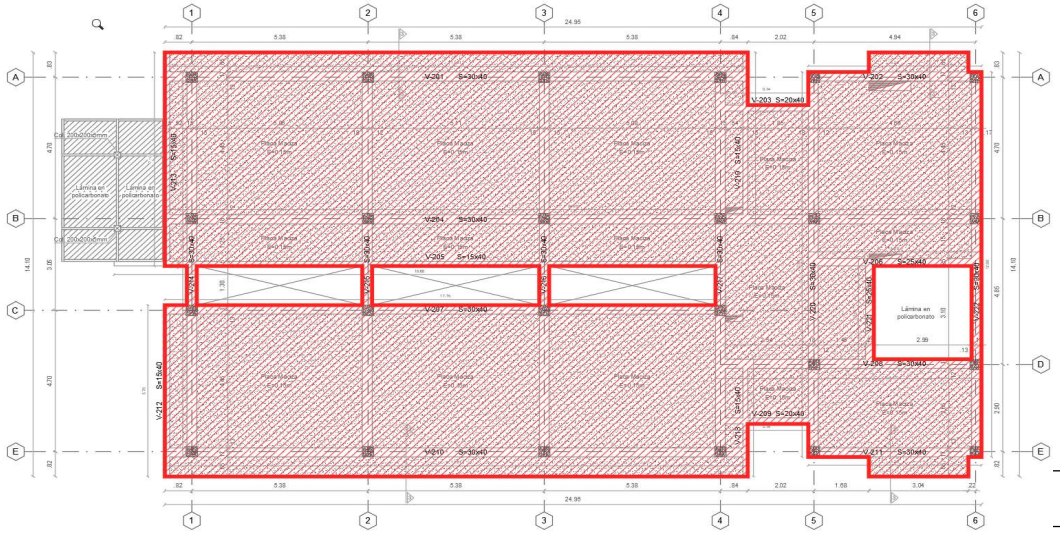

4.5 PLACA MACIZA AEREA CUBIERTA

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND. / %	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
	296.00		0.15	M2	1	PLACA CUBIERTA	296.00
						TOTAL	296.00





TOTAL ESPESOR 0.15 MT	44.40
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00

}


TOTAL PLACA MACIZA	44.40

OBSER\

Elaboro:

	CALCULO DE CANTIDADES Y MEMORIAS DE CORTES DE OBRA	Codigo	
		Versión	
		Fecha	

PROYECTO /OC, # CONT.	Despachos Judiciales Puerto Carreño	FECHA:	DD	MM	AAAA	CORTE Nº
			19	9	2023	4
CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD	UND			HOJA
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	ITEM	NP.42			1 de 1
DESCRIPCION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 13,2 KV - VSEC 208/120 V) FUNCIONAMIENTO.					

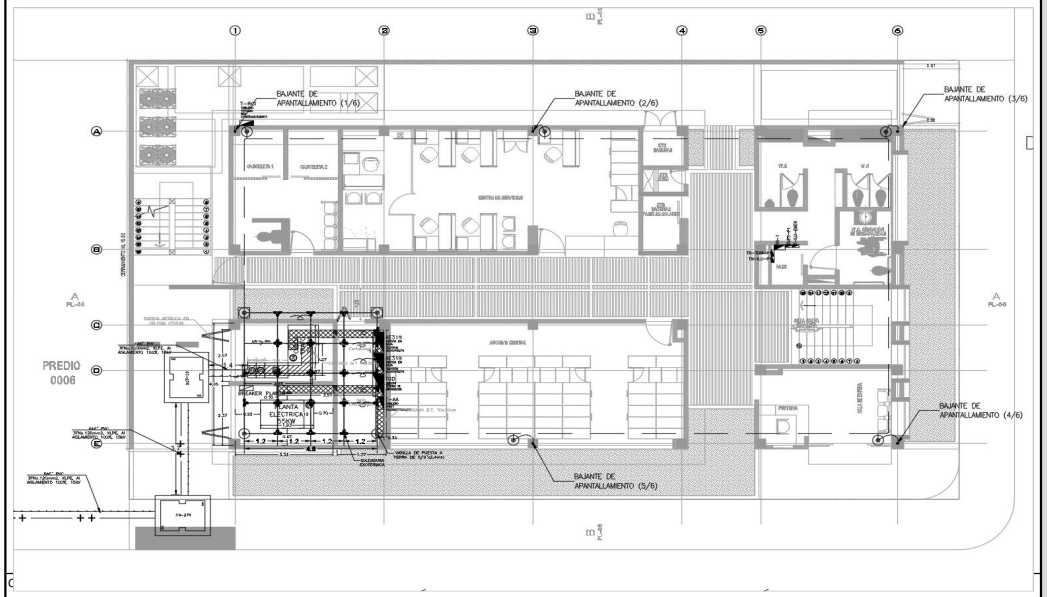

CELDA 4 TRANSFORMADOR

Nº	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	UND./ML	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				UND	0.65	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de celda no. 4, transformador tipo seco clase h de 75 kva, (vprim 11.4 kv - vsec 208/120 v)	0.65
						TOTAL	0.65



Elaboro:	Reviso:	Director de Obra :	Interventor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	CONTRATO 084 DE 2022
RAMA JUDICIAL	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA	**4**		VR.INICIAL OBRA	$	4,929,242,188.00		**ANTICIPO DEL 50%**
DEL MES DE	DICIEMBRE DE 2022		VR. ADICIONAL No. 01	$	-		
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS		**TOTAL CONTRATO**	**$**	**4,929,242,188.00**		**$ 2,464,621,094.00**
NIT	816.000.531-1						
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC		**ACTAS DE OBRA**			**% FACTURACION**	**AMORTIZACION ANTICIPO**
NIT	901.605.438-8		VR. ACTA No. 01. SEPTIEMBRE	$	123,362,600.00	2.50%	$ 63,250,807.00
FECHA INICIACIÓN	19-jul-22	31-dic-22	VR. ACTA No. 02 OCTUBRE	$	359,644,522.00	7.30%	$ 194,240,668.00
SUSPENSIÓN No. 01	27-dic-22	31-ene-23	VR. ACTA No. 03 NOV - DICIEMBRE	$	126,034,389.00	2.56%	$ 63,017,195.00
PRORROGA 1 SUSPENSION No. 01	1-feb-23	20-feb-23	VR. ACTA No. 04 MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO	$	1,227,240,780.00	24.90%	$ 613,620,390.00
PRORROGA 2 SUSPENSION No. 01	21-feb-23	27-feb-23	**TOTAL**	**$**	**1,836,282,291.00**	37.25%	**$ 934,129,060.00**
REINICIO SUSPENSION No. 01	28-feb-23	3-mar-23					
SUSPENSIÓN No. 2	3-mar-23	14-mar-23	**SALDO**	**$**	**3,092,959,897.00**	**62.75%**	**$ 1,530,492,034.00**
REINICIO SUSPENSION No. 2	15-mar-23	16-mar-23					
PRORROGA 01	17-mar-23	16-jun-23					
SUSPENSION No. 3	14-jun-23	14-sep-23					
REINICIO SUSPENSION No. 3	15-sep-23	19-sep-23					
PRORROGA 02	20-sep-23	4-dic-23					

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS

GERMAN GARZON SALCEDO
Director de interventoria
CONSORCIO INGEALDEIC

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

AMORTIZACION ANTCIPO

FECHA : 19 SEPTIEMBRE 23

ANTICIPO		VALOR		
MATERIALES		$ 1,779,621,094		
EQUIPO		$ 125,000,000		
MANO DE OBRA		$ 440,000,000		
COSTOS INDIRECTOS		$ 120,000,000		
VALOR ANTICIPO		**$ 2,464,621,094**		
ACTA	**PEIRODO**	**VALOR**	**AMORTIZACION**	**SALDO POR AMORTIZAR**
1	sep-22	$ 123,362,600	$ 63,250,807	$ 2,401,370,287
2	oct-22	$ 359,644,522	$ 194,240,668	$ 2,207,129,619
3	nov-22 / dic 22	$ 126,034,389	$ 63,017,195	$ 2,144,112,424.0
4	mar-22 / abril-22 / mayo-22 / junio-22	$ 1,227,240,780	$ 613,620,390	$ 1,530,492,034
			$ 934,129,060	

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
BERMUDEZ SAS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA : 19 SEPTIEMBRE DE 2023

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Sonia Monsalve
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	Sandra Carolina Cardozo Perez
NIT	901.605.438-8

INFORME DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES	DESEMBOLSO	ACUMULADO
RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 23	$ 471,082.57	$ 471,083
RENDIMIENTOS NOV 23 AL 28FEB23	$ 2,802,925.89	$ 3,274,008
RENDIMIENTOS AL 31 MARZO 23	$ 307,200.00	$ 3,581,208
RENDIMIENTOS AL 30 ABRIL 23	$ 267,033.00	$ 3,848,241
RENDIMIENTOS AL 30 MAYO 23	$ 196,246.00	$ 4,044,487
RENDIMIENTOS AL 30 JUNIO 23	$ 34,343.00	$ 4,078,830
RENDIMIENTOS AL 30 JULIO 23	$ 20,751.00	$ 4,099,581
TOTAL	**$ 4,099,581.46**	

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
BERMUDEZ SAS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME MANEJO ANTICIPO

FECHA: 19 sep 23	DESDE	27-sep-22	HASTA	16-jun-23

Nº CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Sonia Monsalve
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Sandra Carolina Cadozo
NIT	901.605.438-8

FECHA	DESCRIPCION INGRESOS	VR MATERIALES	VR EQUIPOS	VR MANO OBRA	VR COSTOS INDIRECTOS	VR TOTAL
20-sep-22	VALOR ANTICIPO	$ 1,731,582,567	$ 125,000,000	$ 487,056,543	$ 120,981,985	$ 2,464,621,094
FECHA	**DESCRIPCION EGRESOS**	**VR MATERIALES**	**VR EQUIPOS**	**VR MANO OBRA**	**VR COSTOS INDIRECTOS**	**VR TOTAL**
27-sep-22	ORDEN GIRO 1 - COMPRA ACEROS-PETREOS-CEMENTO	$ 478,972,404				$ 478,972,404
27-sep-22	ORDEN GIRO 2 - REEMBOLSO	$ 16,014,000			$ 34,703,419	$ 50,717,419
5-oct-22	ORDEN GIRO 3 - COMPRAS A TERCEROS	$ 312,841,640	$ 15,027,540			$ 327,869,180
5-oct-22	ORDEN GIRO 4 -REEMBOLSO	$ 8,949,380				$ 8,949,380
21-oct-22	ORDEN GIRO 5 - COMPRAS A TERCEROS	$ 8,237,195	$ 2,442,086			$ 10,679,281
ANULADA	ORDEN GIRO 6- ANULADA	$ -				$ -
24-oct-22	ORDEN GIRO 7 - REEMBOLSO	$ 781,146		$ 19,969,465	$ 3,938,828	$ 24,689,439
4-nov-22	ORDEN GIRO 8 - REEMBOLSO	$ 4,136,500		$ 38,723,210	$ 6,206,739	$ 49,066,449
4-nov-22	ORDEN GIRO 9 - TRANSPORTES MATERIAL ELECTRICO			$ 11,061,710		$ 11,061,710
10-nov-22	ORDEN GIRO 10 - COMPRAS A TERCEROS	$ 65,680,120				$ 65,680,120
12-nov-22	ORDEN GIRO 11 - ANULADA	$ -				$ -
12-nov-22	ORDEN GIRO 12 -ANULADA	$ -				$ -
16-nov-22	ORDEN GIRO 13 - REEMBOLSO	$ 10,588,842		$ 15,301,388	$ 4,455,850	$ 30,346,080
21-nov-22	ORDEN GIRO 14 - ANULADA	$ -				$ -
21-nov-22	ORDEN GIRO 15 - COMPRAS A TERCEROS	$ 179,437,282				$ 179,437,282
22-nov-22	ORDEN GIRO 16 - COMPRAS A TERCEROS	$ 167,863,873				$ 167,863,873
30-nov-22	ORDEN GIRO 17 - REEMBOLSO	$ 9,305,000	$ 574,500	$ 23,954,643	$ 1,173,130	$ 35,007,273
6-dic-22	ORDEN GIRO 18 - REEMBOLSO	$ 630,000		$ 16,465,140	$ 420,000	$ 17,515,140
6-dic-22	ORDEN GIRO 19 -TRANSP SIST FOTOVOLTAICO		$ 4,403,520			$ 4,403,520
16-dic-22	ORDEN GIRO 20 - REEMBOLSO	$ 8,805,032	$ 395,000	$ 55,077,091	$ 5,735,936	$ 70,013,059
16-dic-22	ORDEN GIRO 21 -- ANULADA	$ -				$ -
20-dic-22	ORDEN GIRO 22 -PISOS - INSUMOS RED DE DATOS	$ 79,352,581.50				$ 79,352,582
3-ene-23	ORDEN GIRO 23 -REEMBOLSO	$ 333,180		$ 34,695,867	$ 1,829,713	$ 36,858,760
3-ene-23	ORDEN GIRO 24 - TRANSPORTES				$ 8,995,940	$ 8,995,940
22-ene-23	ORDEN GIRO 25 - COMPRA MATERIALES-ANULADA					$ -
25-ene-23	ORDEN GIRO 26 - COMPRA MATERIALES-ANULADA					$ -
30-ene-23	ORDEN GIRO 27 - COMPRA MATERIALES	$ 13,357,905				$ 13,357,905
27-feb-23	ORDEN GIRO 28 - REEMBOLSO-ANULADA					$ -
28-feb-23	ORDEN GIRO 29 - REEMBOLSO	$ 14,760,639	$ 34,367,003	$ 4,520,239	$ 14,340,303	$ 67,988,184
23-mar-23	ORDEN GIRO 30 - COMPRA MATERIALES	$ 2,299,651				$ 2,299,651
28-mar-23	ORDEN GIRO 31 - REEMBOLSO			$ 33,458,428		$ 33,458,428
28-mar-23	ORDEN GIRO 32 - TRANSPORTES-EQUIPOS		$ 3,867,016		$ 4,003,560	$ 7,870,576
4-abr-23	ORDEN GIRO 33 - REEMBOLSO	$ 2,221,620		$ 13,733,614	$ 3,178,500	$ 19,133,734
14-abr-23	ORDEN GIRO 34 - REEMBOLSO			$ 23,267,243	$ 2,530,749	$ 25,797,992
26-abr-23	ORDEN GIRO 35 - REEMBOLSO	$ 14,596,300		$ 43,898,918	$ 675,000	$ 59,170,218
10-may-23	ORDEN GIRO 36 - REEMBOLSO	$ 3,879,902		$ 17,721,952	$ 337,000	$ 21,938,854
ANULADA	ORDEN GIRO 37 - ENERGIZAR CELDAS - ANULADA					$ -
10-may-23	ORDEN GIRO 38 - REEMBOLSO	$ 3,879,902		$ 44,433,447	$ 337,000	$ 48,650,349
ANULADA	ORDEN GIRO 39 - ELECTROVALLE-SALVAESCALERA-BANDEJAS					
18-may-23	ORDEN GIRO 40 - ENERGIZAR CELDAS	$ 81,537,784				$ 81,537,784
23-may-23	ORDEN GIRO 41 - ELECTROVALLE-SALVAESCALERA-BANDEJAS	$ 43,613,709	$ 52,751,821			$ 96,365,530
23-may-23	ORDEN GIRO 42 - ICOMALLAS -	$ 43,752,155				$ 43,752,155
23-may-23	ORDEN GIRO 43	$ 8,214,736	$ 300,000	$ 19,221,952	$ 721,106	$ 28,457,794
26-may-23	ORDEN GIRO 44 - DISNARDO- ANULADA					$ -
29-may-23	ORDEN GIRO 45 - DISNARDO		$ 10,871,514	$ 19,944,907		$ 30,816,421
13-jun-23	ORDEN GIRO 47- ENERGIZAR-MULTISERVICIOS ORIENTE-MPS GIS	$ 100,113,467				$ 100,113,467
13-jun-23	ORDEN DE REEMBOLSO 48 -13 JUN 23-ANULADO					$ -
15-jun-23	ORDEN DE REEMBOLSO 49 -13 JUN 23	$ 12,288,034		$ 4,550,786	$ 26,417,227	$ 43,256,047
16-jun-23	ORDEN DE REEMBOLSO 50 16JUN23	$ 35,138,587		$ 47,056,543	$ 981,985	$ 83,177,115
	GASTOS DE ANTICIPO	**$ 1,731,582,567**	**$ 125,000,000**	**$ 487,056,543**	**$ 120,981,985**	**$ 2,464,621,094**
	SALDOS PLAN DE ANTICIPO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CHEQUEO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
BERMUDEZ SAS

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 284,503,242.57

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	7/10/2022	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	899999090	NIT	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	300700011467	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	$ 471,082.57	Transacción Exitosa**
3	7/10/2022	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	830001362	NIT	ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S.	267017721	CTE	BANCO DE OCCIDENTE	$ 50,629,670.00	Transacción Exitosa**
3	7/10/2022	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	901032941	NIT	MADERAS LA ECONOMICA	347122392	CTE	BANCO DE BOGOTA	$ 15,027,540.00	Transacción Exitosa**
3	7/10/2022	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	890304345	NIT	ELECTRICOS DEL VALLE SA	256023698	CTE	BANCO DE BOGOTA	$ 209,425,570.00	Transacción Exitosa**
4	7/10/2022	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	816000531	NIT	BERMUDEZ S.A.S.	80600259123	CTE	BANCOLOMBIA	$ 8,949,380.00	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 2,802,925.89

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	9/03/2023	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	899999090	NIT	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	INTERNET	INTERNET	INTERNET	$ 2,802,926	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 307.199,68

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	11/04/2023	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	899999090	NIT	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN	INTERNET	INTERNET	INTERNET	$ 307.200	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 267.033,09

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	10/05/2023	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA S.A	899999090	NIT	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	INTERNET	INTERNET	INTERNET	$ 267.033	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 196.246,09

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	13/06/2023	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	899999090	NIT	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN	INTERNET	INTERNET	INTERNET	$ 196.246	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 34,343.48

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	6/07/2023	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA	899999090	NIT	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	INTERNET	INTERNET	INTERNET	$ 34,343	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	15513	**VALOR TOTAL**	$ 20,750.61

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	26/07/2023	82900008104	AHO	BANCOLOMBIA S.A	899999090	NIT	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	INTERNET	INTERNET	INTERNET	$ 20,751	Transacción Exitosa**

Transacción Exitosa** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

SRS
RAMA JUDICIAL
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que BERMUDEZ SAS, identificado con el Nit 816.000.531-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social cuando ello ha habido lugar en cuanto a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cala caja de compensación familiar, durante los últimos 6 meses.

De igual manera dejamos constancia que BERMUDEZ Y CIA S en C se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA e ICBF, de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, lo cual manifestamos bajo la gravedad del juramento.

Para constancia de lo anterior firmo en Cali, a los venticinco (25) días del mes agosto de 2023.

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Representante Legal
CC 16.363.838

Calle 2 # 116-420. Teléfono 57 2 3765950. Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Email: gerencia@bermudezycia.com

Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

SRS
RAMA JUDICIAL
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que BERMUDEZ SAS, identificado con el Nit 816.000.531-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social cuando ello ha habido lugar en cuanto a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cala caja de compensación familiar, durante los últimos 6 meses.

De igual manera dejamos constancia que BERMUDEZ Y CIA S en C se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA e ICBF, de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, lo cual manifestamos bajo la gravedad del juramento.

Para constancia de lo anterior firmo en Cali, a los venticinco (25) días del mes agosto de 2023.

MARTHA INES PAREDES
Contador Externo
T.P. 88406-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2023661838	9449552841	E	2023/04/12	2023/04/14	BANCOLOMBIA	2	$5,862,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (17 Afiliados)																							$18,386,169	$2,943,100			$18,386,169	$831,500			$18,386,169	$736,200			$18,386,169		$1,280,600		$1,121,334	$56,200		$5,847,600
Centro de Trabajo: OBRA (17 Afiliados)																							$18,386,169	$2,943,100			$18,386,169	$831,500			$18,386,169	$736,200			$18,386,169		$1,280,600		$1,121,334	$56,200		$5,847,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)																							$18,386,169	$2,943,100			$18,386,169	$831,500			$18,386,169	$736,200			$18,386,169		$1,280,600		$1,121,334	$56,200		$5,847,600
1	CC	1126708229	AGUILAR CARLOS	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
2	CC	16679777	CORTES SEGUNDO																		23020 1	30	$1,836,826	$293,900	EPS018	30	$1,836,826	$73,500	CCF57	30	$1,836,826	$73,500	14-11	30	$1,836,826	6.960%	$127,900	30	$0	$0	Si	$568,800
3	CC	1007653148	ESCOBAR ANDRIAN	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
4	CC	1121824455	FLOREZ JUAN	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
5	CC	1126705970	GARCIA ADELSON	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
6	CC	18264014	GARCIA MIGUEL	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
7	CC	1127391992	GONZALEZ EDINSON	X	X																23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
8	CC	1126711339	GONZALEZ JOSE	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$140,200	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$1,121,334	$56,200	No	$498,900
9	CC	18262808	HERNANDEZ ROSEVELT	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
10	CC	1007653270	MALPICA FARITH	X	X																23020 1	14	$541,334	$86,700	EPS041	14	$541,334	$21,700	CCF57	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	Si	$167,800
11	CC	18261567	MONTES DISNARDO	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
12	CC	1127386429	PEREZ ALBERTO	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
13	CC	1127387844	PEREZ FREDY	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
14	CC	1126711329	RODRIGUEZ ALEX																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	18264182	TORRES CLOVIN	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
16	CC	1127394735	TORRES CLOVIS	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
17	CC	1127394729	TORRES YUBER	X																	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
Total			**Afiliados(17)**																				$18,386,169	$2,943,100			$18,386,169	$831,500			$18,386,169	$736,200			$18,386,169		$1,280,600		$1,121,334	$56,200		$5,847,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2023661838	9449552841	E	2023/04/12	2023/04/14	BANCOLOMBIA	2	$5,862,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$2,943,100	$7,400	$0	$2,950,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,562,500	$6,400	$0	$2,568,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$380,600	$1,000	$0	$381,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,280,600	$3,200	$0	$1,283,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,280,600	$3,200	$0	$1,283,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$736,200	$1,900	$0	$738,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	$736,200	$1,900	$0	$738,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$831,500	$2,200	$0	$833,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$456,000	$1,200	$0	$457,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$302,000	$800	$0	$302,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$73,500	$200	$0	$73,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,700	$100	$0	$33,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$33,700	$100	$0	$33,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,500	$100	$0	$22,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$22,500	$100	$0	$22,600
TOTAL				**17**	**$5,847,600**	**$14,900**	**$0**	**$5,862,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2086393045	9450968873	E	2023/05/09	2023/05/17	BANCOLOMBIA	8	$10,661,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (32 Afiliados)																							$29,300,828	$4,842,700			$29,880,828	$2,604,100			$29,880,828	$1,196,500			$29,880,828		$1,089,400		$16,560,000	$828,000		$10,560,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)																							$1,276,000	$204,600			$1,856,000	$75,200			$1,856,000	$75,200			$1,856,000		$129,600		$0	$0		$484,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados)																							$1,276,000	$204,600			$1,856,000	$75,200			$1,856,000	$75,200			$1,856,000		$129,600		$0	$0		$484,600
1	CC	2000006110	ANDUEZA JOSE	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
2	PT	900383	APONTE YONARBI	X																		0	$0	$0	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$17,500
3	CC	92189235	CAMPO EVER	X																	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
4	CC	1104009268	CAMPO JESUS	X																	23100 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
5	CC	1121086154	CARIBAN DAVIER	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
6	CC	1192819270	FLOREZ CAMILO	X																	23100 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
7	CC	6847500	FLOREZ VICTOR	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
8	PT	5762415	GUALDRON ANDRES	X																		0	$0	$0	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$17,500
9	CC	1127394001	HERNANDEZ JUAN	X																	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
10	PT	1030316	JACOB LUIS	X																		0	$0	$0	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$17,500
11	CC	1127391927	MANCHOLA JAIME	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
12	PT	5473279	MORENO JACKSON	X																		0	$0	$0	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$17,500
13	PT	5967890	RODRIGUEZ JESUS	X																		0	$0	$0	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$17,500
14	CC	1127392157	RODRIGUEZ RAMIRO	X																	23100 1	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
15	CC	1127392803	RUBIO JULIO	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
16	CC	1127394326	RUBIO PEDRO	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2086393045	9450968873	E	2023/05/09	2023/05/17	BANCOLOMBIA	8	$10,661,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$4,842,700	$46,300	$0	$4,889,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$55,800	$600	$0	$56,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$37,200	$400	$0	$37,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$4,455,800	$42,500	$0	$4,498,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$293,900	$2,800	$0	$296,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,089,400	$10,400	$0	$1,099,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$1,089,400	$10,400	$0	$1,099,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,196,500	$11,400	$0	$1,207,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	32	$1,196,500	$11,400	$0	$1,207,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$2,604,100	$24,800	$0	$2,628,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,925,000	$18,300	$0	$1,943,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$438,100	$4,200	$0	$442,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$167,500	$1,600	$0	$169,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$73,500	$700	$0	$74,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$496,800	$4,800	$0	$501,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$496,800	$4,800	$0	$501,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$331,200	$3,200	$0	$334,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$331,200	$3,200	$0	$334,400
TOTAL				32	$10,560,700	$100,900	$0	$10,661,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2142831670	9452335207	E	2023/06/08	2023/06/20	BANCOLOMBIA	12	$6,966,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (36 Afiliados)																							**$18,403,498**	**$2,945,000**			**$23,275,501**	**$1,370,900**			**$23,275,501**	**$932,300**			**$23,275,501**		**$1,363,700**		**$5,160,000**	**$258,000**		**$6,869,900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)																							**$425,337**	**$68,200**			**$1,856,006**	**$75,200**			**$1,856,006**	**$75,200**			**$1,856,006**		**$129,400**		**$0**	**$0**		**$348,000**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (18 Afiliados)																							**$425,337**	**$68,200**			**$1,856,006**	**$75,200**			**$1,856,006**	**$75,200**			**$1,856,006**		**$129,400**		**$0**	**$0**		**$348,000**
1	CC	2000006110	ANDUEZA JOSE		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
2	PT	5909183	APONTE JOEL	X																		0	$0	$0	EPS041	20	$773,334	$31,000	CCF57	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$115,900
3	PT	900383	APONTE YONARBI		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$5,900
4	CC	92189235	CAMPO EVER		X																25-14	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
5	CC	1104009268	CAMPO JESUS		X																23100 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
6	CC	1121086154	CARIBAN DAVIER		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
7	CC	1192819270	FLOREZ CAMILO		X																23100 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
8	CC	6847500	FLOREZ VICTOR		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
9	PT	5762415	GUALDRON ANDRES		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$5,900
10	CC	1127394001	HERNANDEZ JUAN		X																25-14	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
11	PT	1030316	JACOB LUIS		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$5,900
12	CC	1127391927	MANCHOLA JAIME		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
13	PT	5473279	MORENO JACKSON		X																	0	$0	$0	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$5,900
14	PT	5967890	RODRIGUEZ JESUS		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$5,900
15	CC	1127392157	RODRIGUEZ RAMIRO		X																23100 1	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
16	CC	1127392803	RUBIO JULIO		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
17	CC	1127394326	RUBIO PEDRO		X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
18	PT	6243812	VILLAZANA JULIO	X																		0	$0	$0	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF57	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$69,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2142831670	9452335207	E	2023/06/08	2023/06/20	BANCOLOMBIA	12	$6,966,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$2,945,000	$41,400	$0	$2,986,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$18,600	$300	$0	$18,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$12,400	$200	$0	$12,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$2,620,100	$36,700	$0	$2,656,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$293,900	$4,200	$0	$298,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,363,700	$19,100	$0	$1,382,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$1,363,700	$19,100	$0	$1,382,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$932,300	$13,100	$0	$945,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	36	$932,300	$13,100	$0	$945,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				36	$1,370,900	$19,400	$0	$1,390,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$10,900	$200	$0	$11,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$500,000	$7,000	$0	$507,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$589,700	$8,300	$0	$598,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$196,800	$2,800	$0	$199,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$73,500	$1,100	$0	$74,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$154,800	$2,200	$0	$157,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$154,800	$2,200	$0	$157,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$103,200	$1,500	$0	$104,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$103,200	$1,500	$0	$104,700
TOTAL				36	$6,869,900	$96,700	$0	$6,966,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	153075954	9456159359	E	2023/07/11	2023/09/11	BANCOLOMBIA	62	$2,133,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (9 Afiliados)																								$6,438,161	$1,030,300			$6,438,161	$257,700			$6,438,161	$257,700			$6,438,161		$448,500		$0	$0		$1,994,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																								$1,121,335	$179,600			$1,121,335	$45,000			$1,121,335	$45,000			$1,121,335		$78,200		$0	$0		$347,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																								$1,121,335	$179,600			$1,121,335	$45,000			$1,121,335	$45,000			$1,121,335		$78,200		$0	$0		$347,800
1	CC	1127390030	ARANA CARLOS	X	X																	23020 1	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
2	CC	18264114	BENITEZ ANDRES	X																		25-14	17	$657,334	$105,200	EPS041	17	$657,334	$26,300	CCF57	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	6.960%	$45,800	17	$0	$0	Si	$203,600
3	CC	1127389354	GUACARAPARE YERSON	X	X																	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF57	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
4	CC	1127396584	RODRIGUEZ ALONSO	X	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$6,200	CCF57	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
5	CC	1006951850	ROZO DIEGO	X	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																								$5,316,826	$850,700			$5,316,826	$212,700			$5,316,826	$212,700			$5,316,826		$370,300		$0	$0		$1,646,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																								$5,316,826	$850,700			$5,316,826	$212,700			$5,316,826	$212,700			$5,316,826		$370,300		$0	$0		$1,646,400
6	CC	16679777	CORTES SEGUNDO																			23020 1	30	$1,836,826	$293,900	EPS018	30	$1,836,826	$73,500	CCF57	30	$1,836,826	$73,500	14-11	30	$1,836,826	6.960%	$127,900	30	$0	$0	Si	$568,800
7	CC	1126705970	GARCIA ADELSON																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	18264182	TORRES CLOVIN																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1127394729	TORRES YUBER																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(9)**																					$6,438,161	$1,030,300			$6,438,161	$257,700			$6,438,161	$257,700			$6,438,161		$448,500		$0	$0		$1,994,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	153075954	9456159359	E	2023/07/11	2023/09/11	BANCOLOMBIA	62	$2,133,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,030,300	$72,100	$0	$1,102,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$105,200	$7,400	$0	$112,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$612,600	$42,800	$0	$655,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$312,500	$21,900	$0	$334,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$448,500	$31,400	$0	$479,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$448,500	$31,400	$0	$479,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$257,700	$18,000	$0	$275,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	$257,700	$18,000	$0	$275,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$257,700	$18,200	$0	$275,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$49,500	$3,500	$0	$53,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$134,700	$9,500	$0	$144,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$73,500	$5,200	$0	$78,700
TOTAL				9	$1,994,200	$139,700	$0	$2,133,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	136287313	9455874360	E	2023/07/11	2023/09/04	BANCOLOMBIA	55	$302,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	16363838 BERMUDEZ CARLOS							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,158,840	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	136287313	9455874360	E	2023/07/11	2023/09/04	BANCOLOMBIA	55	$302,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$11,600	$0	$197,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$11,600	$0	$197,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$400	$0	$6,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$400	$0	$6,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$2,900	$0	$49,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400	$2,900	$0	$49,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$2,900	$0	$49,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$2,900	$0	$49,300
TOTAL				**1**	**$284,500**	**$17,800**	**$0**	**$302,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	143516907	9456018273	E	2023/07/11	2023/09/06	BANCOLOMBIA	57	$2,142,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (44 Afiliados)																						$5,568,011	$892,000			$7,462,679	$300,100			$7,462,679	$300,100			$7,462,679		$520,500		$0	$0		$2,012,700

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	136290785	9455880416	E	2023/08/09	2023/09/04	BANCOLOMBIA	26	$293,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	16363838 BERMUDEZ CARLOS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,158,840	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	136290785	9455880416	E	2023/08/09	2023/09/04	BANCOLOMBIA	26	$293,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$5,500	$0	$191,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$5,500	$0	$191,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$200	$0	$6,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
TOTAL				**1**	**$284,500**	**$8,500**	**$0**	**$293,000**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	136293981	9455880437	E	2023/09/08	2023/09/04	BANCOLOMBIA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	16363838 BERMUDEZ CARLOS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,158,840	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,158,840	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 816000531	1	BERMUDEZ Y CIA S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 2 #116-420	CALI-VALLE	3206386352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	136293981	9455880437	E	2023/09/08	2023/09/04	BANCOLOMBIA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**1**	**$284,500**	**$0**	**$0**	**$284,500**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.910.124**

PAREDES TRIANA

APELLIDOS

MARTHA INES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1964**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

31-AGO-1982 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00342681-F-0031910124-20111019 **0028**30579A 1 2811498999



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


88406-T

MARTHA INES
PAREDES TRIANA
C.C. 31910124
RESOLUCION INSCRIPCION 141
UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 05/09/02

PRESIDENTE
ELKIN ORLES SANCHEZ CORTES

97745

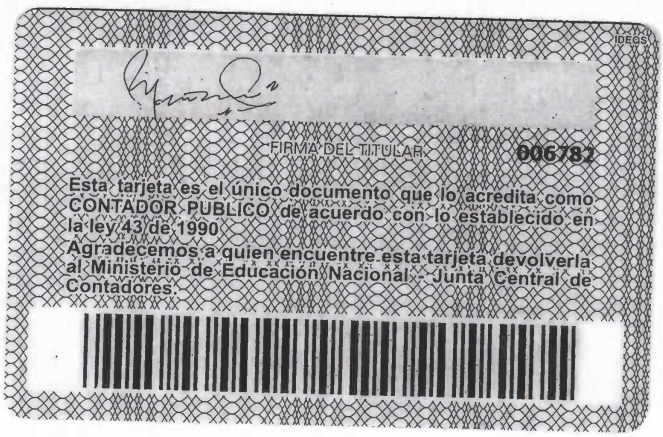

IDEBS

FIRMA DEL TITULAR

006782

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional -- Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0CCBEB0A68204DF2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA INES PAREDES TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31910124 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 88406-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Martes, 21 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BERMUDEZ S A S identificado(a) con NIT 816000531, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	80600259123	1998/11/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

BER-157-23
19 de Septiembre de 2023

SRS
CONSORCIO INGEALDEIC
Atn. ARQ. GERMAN GARZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
csj.interventoria@ingeplan.co

ASUNTO: **RELACION DE ENTRADAS A ALMACEN DE ELEMENTOS ENTREGADOS ACTA 4 . CONTRATO 084-2022**

Con la presente CERTIFICAMOS, que en desarrollo del contrato 084 – 2022, NO se nos ha entregado material alguno por parte de la Rama Judicial.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS

Calle 2 # 116-420. Teléfono 57 2 3765950. Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Email: gerencia@bermudezycia.com

Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

BER-158-23
19 de Septiembre de 2023

SRS
CONSORCIO INGEALDEIC
Atn. ARQ. GERMAN GARZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
csj.interventoria@ingeplan.co

ASUNTO: RELACION DE ENTRADAS A ALMACEN DE INSUMOS SIGNIFICATIVOS - ACTA 4 . CONTRATO 084-2022

Con la presente CERTIFICAMOS, que en desarrollo del contrato 084 – 2022, ha ingresado a la obra los siguientes insumos descritos a continuacion

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
29-sep-22	PUNTA PHILLIPS DE 2"	UND	1
29-sep-22	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 3"	UND	125
29-sep-22	LAMINAS DE ZINC	UND	185
29-sep-22	AEROSOL	UND	2
29-sep-22	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	UND	1
29-sep-22	TAPON LISO DE 1.1/2"	UND	4
29-sep-22	TUBERIA PRESION 1.1/2"	UND	7
29-sep-22	TUERCA HEXAGONAL ROSCADA 5/16	UND	80
29-sep-22	VARILLA ROSCADA 5/16	UND	6
29-sep-22	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10	MT	30
29-sep-22	TOMA INDUSTRIAL	UND	2
29-sep-22	CLAVIJA INDUSTRIAL	UND	2
29-sep-22	BROCA DE 3/8" X 1"	UND	1
29-sep-22	CANDADO REDONDO	UND	3
5-oct-22	TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 75 KVA A 220 VAC-1 A.	UND	1
10-oct-22	MATERIAL DE RELLENO	M3	220
21-oct-22	VARILLA CORRUGADA DE 5/8 X 6 MTS	UND	67
21-oct-22	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 6 MTS	UND	100
21-oct-22	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6 MTS	UND	100
21-oct-22	ALAMBRE NEGRO X KG	UND	50
21-oct-22	CEMENTO GRIS X 50 KG - USO GENERAL	UND	3
21-oct-22	CASCO DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AMARILLO	UND	3
21-oct-22	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DEPORTIVO	UND	2
21-oct-22	CARETA DE PROTECCION TRANSPARENTE	UND	1
21-oct-22	DISCO PARA TRONZADORA 14 BOSCH	UND	2
21-oct-22	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	UND	1
21-oct-22	DISCO CORTE METAL FINO 4.5 BOSCH	UND	2
21-oct-22	DISCO DESBASTE METAL DE 4.5 BOSCH	UND	1
21-oct-22	PUNTILLA PUMA DE 1 -1/2 X LB	UND	1
21-oct-22	BROCA ACERO 3/8	UND	2
21-oct-22	BROCA ACERO 13/64	UND	1
21-oct-22	PLASTICO NEGRO X 4 MTS - CAL. 6	UND	5
21-oct-22	GUANTE TIPO INGENIERO AMARILLO	UND	9
21-oct-22	CASCO DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AMARILLO	UND	5
21-oct-22	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 X 6 MTS	UND	18
21-oct-22	TUBO CONDUIT 1/2 PEASDO TIGRE O POLIPLEX	UND	15
21-oct-22	CURVA DE 1/2 CONDUIT T/PESADA/TUBAEZA	UND	12
21-oct-22	TERMINAL CONDUIT DE 1/2 PVC	UND	60
21-oct-22	TORNILLO GOLOSO 8X1-1/2	UND	100
21-oct-22	ALAMBRE 14 PROCABLES X100MTS COLORES	UND	1
21-oct-22	ALAMBRE CENTELSA No 12 AMARILLO X 100M	UND	1
21-oct-22	CAJA 4X4 PLASTICA RETIE INDUMA	UND	6
21-oct-22	SUPLEMENTO PVC 500	UND	6
21-oct-22	TOMA DOBLE P/TIERRA BLANCO 118Z-06 MERCURY	UND	13
21-oct-22	CAJA EXAGONAL PVC RETIE INDUMA	UND	4
21-oct-22	ROSETA PLASTICA 200W TP	UND	4

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
21-oct-22	INTERRUPTOR SENCILLO VIVE BASIC	UND	2
21-oct-22	BOMBILLO 9W ULTRA LED	UND	4
21-oct-22	CAJA 5800 PVC RECTANGULAR L	UND	14
21-oct-22	TABLERO 6 CIRCUITOS C/PUERTA 75 AMP	UND	1
21-oct-22	TACO ENCHUFABLE DE 30 AM MERCURY	UND	3
21-oct-22	TAMA DE INCRUSTAR 50A	UND	2
21-oct-22	TENSOR PARA CABLE BIFASICO-TRIFASICO	UND	2
21-oct-22	CABLE ANTIFRAUDE 3X8+8 EN COBRE PROCABLES	UND	30
21-oct-22	CONDULETA DE 3/4 MT	UND	1
21-oct-22	TUBO EMT 3/4 COLMENA	UND	1
21-oct-22	MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO IDISCO C/CERTIFICADO	UND	1
21-oct-22	CAJA PARA 1 MEDIDOR TRIFAS/BIFASICO 27X57	UND	1
21-oct-22	TERMINAL MT DE 3/4	UND	1
21-oct-22	CAJA DE 4 TACOS MODEVER	UND	1
21-oct-22	TACO DE 15 AMPERIOS LUMINEX	UND	2
21-oct-22	VARILLA DE COBRE 1/2" POR 2,40 MT	UND	1
21-oct-22	CONECTOR EN COBRE PARA VARILLA	UND	1
21-oct-22	CINTA AISLANTE 3M NEGRA X 18,30 MT	UND	2
21-oct-22	CINTA AISLANTE COLORES X 5M CELLUX	UND	3
21-oct-22	TUBO SANITARIO 3" X 6 MT PESADO	UND	1
21-oct-22	CINTA TAPA GOTERAS	UND	1
21-oct-22	MEDIDOR DE AGUA	UND	1
21-oct-22	PARALES DE MADERA	UND	130
21-oct-22	TANQUE DE 1.000 LT	UND	1
21-oct-22	CHALECOS ALTA VISIBILIDAD VERDE	UND	21
21-oct-22	GUANTE MULTIFLEX NYLON	UND	28
21-oct-22	GUANTE CARNAZA SENCILLLO	UND	29
21-oct-22	PUNO 5 CM	UND	
21-oct-22	CINTA AMARILLA 500 MTS ROLL	UND	3
21-oct-22	PRECAUCION	UND	
21-oct-22	GAFA LENTE CLARO TOP GUN AF	UND	30
21-oct-22	650078 GAFA TOP GUN GRIS CON AF UND 30 $5,500 $31,350 $196,350	UND	30
21-oct-22	FR609 CAPUCHA FRANELA BALACLAVA AZUL TURQ N/A	UND	14
21-oct-22	IN206 JEAN INDUSTRIAL HOMBRE AZUL TURQ 28	UND	28
21-oct-22	IN206 JEAN INDUSTRIAL HOMBRE AZUL TURQ 30 UND	UND	30
21-oct-22	IN206 JEAN INDUSTRIAL HOMBRE AZUL TURQ 32	UND	32
21-oct-22	IN206 JEAN INDUSTRIAL HOMBRE AZUL TURQ 34	UND	34
21-oct-22	IN206 JEAN INDUSTRIAL HOMBRE AZUL TURQ 36	UND	36
21-oct-22	IN206 JEAN INDUSTRIAL HOMBRE AZUL TURQ 38	UND	38
21-oct-22	300069 PROTECTOR AUDITIVO COPA U	UND	14
21-oct-22	IN272 JEAN DAMA PRETINA ANATOMICA AZUL TURQ 14	UND	14
21-oct-22	20922BI BOTA SEGURI BIDENSIDAD	UND	2
21-oct-22	20922BI BOTA SEGURI BIDENSIDAD PAR	UND	3
21-oct-22	20922BI BOTA SEGURI BIDENSIDAD PAR	UND	1
21-oct-22	20922BI BOTA SEGURI BIDENSIDAD PAR	UND	1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
21-oct-22	20922DAP BOTA SEG BIDENSIDAD DIEL PU DAP NEGRO 38 PAR	UND	4
21-oct-22	20922DAP BOTA SEG BIDENSIDAD DIEL PU DAP NEGRO 39 PAR	UND	6
22-oct-22	SACOS DE CEMENTO GRIS	UND	4,760
22-oct-22	ARENA GRUESA	M3	400
22-oct-22	ARENA MEDIANA	M3	120
22-oct-22	MATERIAL PETREO GRUESO	M3	450
22-oct-22	CHIPA CORRUGADA 1/4" G60	Kg	245
22-oct-22	ACERO FIGURADO 3/8" G60	Kg	17385.78
22-oct-22	ACERO FIGURADO 1/2" G60	Kg	5849.37
22-oct-22	ACERO FIGURADO 5/8" G60	Kg	4638.86
22-oct-22	ACERO FIGURADO 3/4" G60	Kg	480.83
22-oct-22	ACERO FIGURADO 7/8" G60	Kg	220.01
22-oct-22	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 x 6 mt	UND	615
22-oct-22	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 x 6 mt	UND	98
22-oct-22	BARRA CORRUGADA 5/8" G60 x 6 mt	UND	166
22-oct-22	BARRA CORRUGADA 3/4" G60 x 6 mt	UND	14
22-oct-22	ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1	Kg	1200
22-oct-22	MALLA ELECTRO XX-188	UND	34
22-oct-22	VARILLA GRAFILADA 5.00 m	UND	60
22-oct-22	VARILLA GRAFILADA 4.00 m	UND	12
22-oct-22	BARRA LISA 5/8" A36 6Mts	UND	3
22-oct-22	VIGA IPE200 - 200X100	UND	14
22-oct-22	VIGA IPE330 - 330X160	UND	5
22-oct-22	VIGA IPE140 - 140X73	UND	4
30-oct-22	[1301-160440] TUBO 1/2" EMT 3MTS S/UNION (COLMENA)	UND	950
30-oct-22	[1101-884015608/10] CABLE FTP CAT 6A F/UTP GRIS LSZH COMMSCOPE	ML	4575
30-oct-22	[1002-31353321001C] CABLE CU 250 MCM THHN/THWN AISL NYLON (PROCABLES)	ML	160
30-oct-22	[1305-040158] BANDEJA PORTACABLE 30X15X2.40CM LAMINA PREGA	UND	92
30-oct-22	[1301-B160652] TUBO 3/4" IMC GALV 3MTS (COLMENA BO)	UND	180
30-oct-22	[27-005796] .DUCTO 6" TDP 6MT CORRUGADO - TUBOSA	UND	37
30-oct-22	[27-P28399-41] .PANEL LED 60x60 40W 4000lm 6500K 100-240V -50.000 HORAS SYLVANIA	UND	50
30-oct-22	SWITCH 1000 /100/10 24 PUERTOS GIGABIT SMART MANAGED SWITCH DGS1210-26	UND	2
30-oct-22	[1003-3135261010-002B] CABLE CU 12 BLANCO LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES, BOBINA)	UND	2680
30-oct-22	[1003-3135261010-003B] CABLE CU 12 ROJO LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES, BOBINA)	UND	2680
30-oct-22	[27-60513300] .BANDEJA MALLA 60513314 RAPIDE 150X300 EZ C3 - REJIBAND	UND	35
30-oct-22	[1201-P28760-20] LAMPARA DE EMERGENCIA R3 2X1W ECUALIZABLE 120/277V 6000K LED 200 LUMENES 3 HORAS SYLVANIA	UND	85

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
30-oct-22	[1102-2153449-2] JACK CAT 6A RJ45 10GB NEGRO S/TAPA COMMSCOPE NETCONNECT	UND	144
30-oct-22	[1005-31321028000C] CABLE CU DESNUDO 2/0 AWG COBRE DURO 19H (PROCABLES)	UND	90
30-oct-22	[1301-B160442] TUBO 3/4" EMT 3MTS S/UNION (COLMENA BO)	UND	100
30-oct-22	[1003-3135261040-001] CABLE CU 6 NEGRO LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES)	UND	330
30-oct-22	[2201-ODCOS-I1W] SENSOR DE TECHO 360Á,° 1000W 120V BLANCO LEVITON	UND	23
30-oct-22	[1302-160903] TUBO 3/4" PVC 3 MTS (TUBOSA)	UND	400
30-oct-22	[1301-160444] TUBO 1" EMT 3MTS S/UNION (COLMENA)	UND	60
30-oct-22	[1102-NPC6ASZDB-GY001M] PATCH CORD 1MT CAT 6A GRIS LSZH COMMSCOPE NETCONNECT	UND	74
30-oct-22	[27-P37650-80] .LED HERMETICA 2X18W T8 PC DL Ensamblado 6500K 40000 HORAS 100-277V 3600 lm 36W IP65	UND	80
30-oct-22	[1102-2153449-2] JACK CAT 6A RJ45 10GB NEGRO S/TAPA COMMSCOPE NETCONNECT	UND	96
30-oct-22	[27-0069947] .CAJA INTEMPERIE 3/4X2 SALIDAS 2X4	UND	300
30-oct-22	[27-32580341301C] .CABLE CUBIERTO RAVEN 1/0 AWG ACSR (6/1)CPT XLPE- TK15kV90C BICAPA - CONDUCOL	UND	200
30-oct-22	[1002-31353147001C] CABLE CU 1/0 AWG THHN/THWN AISLA NYLON (PROCABLES)	UND	70
30-oct-22	[1101-209990] CABLE ALARMA CONTRA INCENDIO 2X18 INTERIOR CENTELSA	UND	600
30-oct-22	[1003-3135261030-001] CABLE CU 8 NEGRO LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES)	UND	332
30-oct-22	[1501-ZA000611096] TABLERO 12 CIRC TRIFASICO E/TO NTQ412T-611096 SCHNEIDER RETAIL	UND	6
30-oct-22	[27-GF-2203] .GABINETE PARA PISO 196 X58 X 61CM NEGRO - QUEST	UND	1
30-oct-22	[1102-NPC6ASZDB-BL003M] PATCH CORD 3MT CAT 6A AZUL LSZH COMMSCOPE NETCONNECT	UND	39
30-oct-22	[1301-B160658] TUBO 1 1/4" IMC GALV 3MTS (COLMENA BO)	UND	14
30-oct-22	[2002-101/ALU600-DX] PUNTA CAPTORA 60CM ALUMINIO C/BASE 101/ALU600-DX	UND	17
30-oct-22	[1011-32480035000C] CABLE AL 1/0 AWG ACSR (PROCABLES)	UND	280
30-oct-22	[1102-1-2153449-3] JACK CAT 6A RJ45 10GB BLANCO S/TAPA COMMSCOPE NETCONNECT	UND	49
30-oct-22	[1102-760237046] HERRAJE P/CAT 6A,7A 24PTS SL COMMSCOPE NETCONNET	UND	6
30-oct-22	[1301-B160450] TUBO 2" EMT 3MTS S/UNION (COLMENA BO)	UND	12
30-oct-22	[1103-700210982] FIBRA OPTICA 12H MM 50/125 OM3 INT/OUT LSZH Z-012-DS-5L- FSUBK COMMSCOPE NETCONNECT***	UND	129
30-oct-22	[1003-31352610501C] CABLE CU 4 LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES)	UND	80
30-oct-22	[1701-2410] TOMA 4X20 AMP 3P+T L14-20 250V INCR 2410 LEVITON	UND	20
30-oct-22	[1302-FDT010] DUCTO 4" DB 6MT TECNOSA	UND	6

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
30-oct-22	[1305-64010035] UNION CLICK RAPIDA CINCADA 50	UND	200
30-oct-22	[1003-31352610601C] CABLE CU 2 LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES)	UND	48
30-oct-22	[1907-LE000003760] TERMINAL PREMOLDEADO 15KV EXTERIOR 2-4/0 REF 5633K QTII (PRO 2-4/0) (CEN 2-4/0) 3M	UND	2
30-oct-22	[1301-B160654] TUBO 1" IMC GALV 3MTS (COLMENA BO)	UND	11
30-oct-22	[1602-HOM320] BREAKER 3X20 AMP INCRUSTAR HOM320 SCHNEIDER RETAIL	UND	10
30-oct-22	[1701-IG15CR] TOMA DOBLE 15 AMP TIERRA AISLADA 125VAC NARANJA HUBBELL	UND	54
30-oct-22	[2004-920201] VARILLA SOLIDA DE COBRE 9/16 X 2.40MTS 14MM	UND	4
30-oct-22	[1602-HOM120] BREAKER 1X20 AMP INCRUSTAR HOM120 SCHNEIDER RETAIL	UND	65
30-oct-22	[1102-760237047] HERRAJE P/CAT 6A,7A 48PTS SL COMMSCOPE NETCONNET	UND	2
30-oct-22	[2005-920118] SOLDADURA 115 GRAMOS IG5115P - THERMOWELLD	UND	25
30-oct-22	[1002-3135316990-001] CABLE CU 6 NEGRO THHN/THWN AISLA NYLON	UND	80
30-oct-22	[1402-40333] GRAPA 1/2" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00070 - EMT	UND	2000
30-oct-22	[1307-RR0470] CAJA INTEMPERIE 1/2X2 SALIDAS 2X4 RR0470 - RAWELT	UND	50
30-oct-22	[1201-P24338-33] PANEL LED 18W CIRCULAR 6500K 8" INCRUSTAR 30000H 1250LM P24338-19 SYLVANIA	UND	36
30-oct-22	[1301-CS-050] ADAPTADOR 1/2" EMT ACERO E.V	UND	560
30-oct-22	[1601-EZC250N3150] BREAKER 150 AMP 240V 50KA EASYPACT C250N SCHNEIDER PARTNER	UND	1
30-oct-22	[1603-EZ9F56325] BREAKER 3X25AMP P/RIEL 6KA DOMA	UND	8
30-oct-22	[1301-B160536] TUBO 4" IMC GALV 3MTS (COLMENA BO)	UND	1
30-oct-22	[1601-EZC250N3125] BREAKER 125 AMP 240V 50KA EASYPACT C250N SCHNEIDER PARTNER	UND	1
30-oct-22	[27-006454] .PANT40 AISLADOR APANTALLAMIENTO 2/0 DE 3/8"	UND	50
30-oct-22	[1501-ZA000611099] TABLERO 18 CIRC TRIFASICO E/TO NTQ418T-611099 SCHNEIDER RETAIL	UND	1
30-oct-22	[1104-MHX12] MULTITOMA PARA RACK 19" 6 TOMAS PT AISLADA 12 SALIDAS	UND	2
30-oct-22	[1301-RL-610] ADAPTADOR 1/2" EMT ACERO E.V c.bo-b-p	UND	300
30-oct-22	[1003-3135261020-003B] CABLE CU 10 ROJO LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES, BOBINA)	UND	90
30-oct-22	[1003-3135261020-002R] CABLE CU 10 BLANCO LIBRE DE HALOGENO (PROCABLES, ROLLO)	UND	90
30-oct-22	[1301-RL-620] UNION 1/2" EMT ACERO E.V SOLUTIONS	UND	300
30-oct-22	[1102-2-1427030-2] FACE PLATE 2 PTS BLANCO PLANO CON MARCACION Y TAPAS CIEGAS (SHUTTER)	UND	39
30-oct-22	[1402-040182] VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 METROS - S/M	UND	22
30-oct-22	[27-A9N1836580] .BREAKER C120N 3P 80A C 415V MINIATURE CI - SCHNEIDER	UND	1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
30-oct-22	[1701-RR15W] TOMA DOBLE 15 AMP P/TIERRA 125V BLANCO SIN TAPA HUBBELL	UND	83
30-oct-22	[1302-160901] TUBO 1/2" PVC 3 MTS (TUBOSA)	UND	50
30-oct-22	[1402-40338] GRAPA 3/4" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00080 - EMT	UND	800
30-oct-22	[1906-861763-000] BOTA PREMOLDEADA 3 SALIDAS DE 1" A 2" PARA TUBO DE 4" RAYCHEM	UND	1
30-oct-22	[1502-TRP306G] TABLERO 6 CIRC TRIFASICO C/P TRP 306G 225A C/GALV TERCOL	UND	2
30-oct-22	[27-84020-40] .TAPA P/ TOMA 20A-30A SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE - LEVITON	UND	20
30-oct-22	[2005-SG1TN434] MOLDE EN X 2/0-2/0 CABLE - CABLE - THERMOWELLD	UND	1
30-oct-22	[2005-SG1TN232] MOLDE EN T 2/0-2/0 CABLE - CABLE - THERMOWELLD	UND	1
30-oct-22	[1301-CK-050] UNION 1/2" EMT ACERO E.V	UND	240
30-oct-22	[1301-160502] CURVA 4" IMC GALVANIZADA	UND	1
30-oct-22	[1302-160911] TUBO 2" PVC 3 MTS (TUBOSA)	UND	6
30-oct-22	[27-KP4729] .KIT DE VENTILACIÓN DOBLE PARA GABINETE DE PISO - QUEST	UND	1
30-oct-22	[1302-160370] DUCTO 2" DB 6MT TELEF. PESADO TUBOSA	UND	4
30-oct-22	[1402-40338] GRAPA 3/4" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00080 - EMT	UND	500
30-oct-22	[1603-EZ9F56320] BREAKER 3X20 AMP P/RIEL 6KA DOMA 17081 SCHNEIDER RETAIL	UND	3
30-oct-22	[1602-HOM330] BREAKER 3X30 AMP INCRUSTAR HOM330 SCHNEIDER RETAIL	UND	2
30-oct-22	[1015-RG59 BC-BLACK] CABLE COAXIAL RG 59 95% CU SONATA	UND	120
30-oct-22	[27-006215] .ANTENA PARA TV Y DECOS CON TDT TIPO YAGI DAIRU	UND	1
30-oct-22	[1305-64010061] UNION REFORZADA CINCADA 50	UND	80
30-oct-22	[1603-EZ9F56340] BREAKER 3X40 AMP P/RIEL 6KA DOMA 17084 SCHNEIDER RETAIL	UND	2
30-oct-22	[1603-EZ9F56350] BREAKER 3X50 AMP P/RIEL 6KA DOMA 12619 SCHNEIDER RETAIL	UND	2
30-oct-22	[1808-880015] CINTA SEÑALIZACION PRECAUCION AMARILLO - NEGRO (100 MTS)	UND	10
30-oct-22	[1403-200468] TAPA PLASTICA PARA TOMA DOBLE BLANCA DXN5101B DEXSON	UND	83
30-oct-22	[1001-3135310000-002B] ALAMBRE CU 10 BLANCO THHN/THWN AISLADO NYLON (PROCABLES, BOBINA)	UND	40
30-oct-22	[1301-160490] CURVA 3/4" IMC GALVANIZADA	UND	15
30-oct-22	[1001-3135310000-001B] ALAMBRE CU 10 NEGRO THHN/THWN AISLADO NYLON (PROCABLES, BOBINA)	UND	32
30-oct-22	[1402-040212] CHAZO ANCLA HEMBRA HID 3/8 PARA CANAL	UND	160
30-oct-22	[27-420425] .ADAPTADOR 6" PVC CAMPANA TDP - CELTA	UND	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
30-oct-22	[1602-HOM340] BREAKER 3X40 AMP INCRUSTAR HOM340 SCHNEIDER RETAIL	UND	1
30-oct-22	[1602-HOM350] BREAKER 3X50 AMP INCRUSTAR HOM350 SCHNEIDER RETAIL	UND	1
30-oct-22	[1602-HOM360] BREAKER 3X60 AMP INCRUSTAR HOM360 SCHNEIDER RETAIL	UND	1
30-oct-22	[1301-160383] CURVA 1/2" EMT UL CERTIFICADO	UND	60
30-oct-22	[1701-23101-90] INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO S23 SIMON	UND	19
30-oct-22	[1307-RC0482] CAJA INTEMPERIE 1/2X2 SALIDAS 4X4 RC0482 - RAWELT	UND	3
30-oct-22	[1304-200466] TAPA PLASTICA PARA TOMA DOBLE NARANJA DXN5100N 100 DEXSON	UND	54
30-oct-22	[1402-40342] GRAPA 1" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00090 - EMT	UND	160
30-oct-22	[1701-23265-90] INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO S23 SIMON	UND	7
30-oct-22	[1301-160486] CAPACETE 4" IMC GALVANIZADO - S/M	UND	1
30-oct-22	[1301-160520] JUEGO DE BUSHING 4" ZINC - S/M	UND	2
30-oct-22	[2005-29006] CHISPERO TIPO PISTOLA PARA SOLDADURA - GROUNDING	UND	1
30-oct-22	[1701-23279-90] INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE BLANCO S23 SIMON	UND	4
30-oct-22	[1701-23260-90] INTERRUPTOR DOBLE BLANCO S23 SIMON	UND	7
30-oct-22	[1302-140053] CAJA OCTAGONAL PVC 100 PAVCO	UND	15
30-oct-22	[1502-CP2X4] CAJA 2x4 PLASTICA SENCILLA CP2X4 CERT- 450 TERCOL	UND	100
30-oct-22	[1602-PT349337] BREAKER 3X63 AMP INCRUSTAR 10KA BLANCO ETM2-H - CILES	UND	1
30-oct-22	[1301-160413] CURVA 3/4" EMT UL CERTIFICADO	UND	20
30-oct-22	[1402-40349] GRAPA 2" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00110 - EMT	UND	30
30-oct-22	[1301-160805] CURVA 3/4" PVC NACIONAL CONDUIT (90° / 1 CAMPANA) - TUBOSA/IMEC	UND	40
30-oct-22	[1301-160417] CURVA 2" EMT UL CERTIFICADO	UND	2
30-oct-22	[1402-40333] GRAPA 1/2" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00070 - EMT	UND	100
30-oct-22	[1301-160496] CURVA 1 1/4" IMC GALVANIZADA	UND	2
30-oct-22	[1402-040179] ARANDELA 3/8" GALVANIZADA EN FRIO PARA VARILLA ROSCADA	UND	160
30-oct-22	[1808-6215] CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ALTA TENSION AMARILLO - NEGRO (100 MTS)	UND	2
30-oct-22	[1301-160415] CURVA 1" EMT UL CERTIFICADO	UND	6
30-oct-22	[1402-040180] TUERCA HEXAGONAL 3/8" GALVANIZADA EN FRIO PARA VARILLA ROSCADA	UND	160
30-oct-22	[2002-230460] CONECTOR PARA VARILLA SOLIDA DE COBRE CU-CU 5/8" (CVCWS-Cu) - S/M	UND	4

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
30-oct-22	[1701-23278-90] INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO S23 SIMON	UND	2
30-oct-22	[1302-160822] ADAPTADOR 1/2" PVC TUBOSA	UND	40
30-oct-22	[1301-160492] CURVA 1" IMC GALVANIZADA	UND	2
30-oct-22	[1301-160812] CURVA 2" PVC NACIONAL CONDUIT (90° / 1 CAMPANA) - TUBOSA/IMEC	UND	3
30-oct-22	[1402-40347] GRAPA 1 1/4" CONDUIT SENCILLA GALVANIZADA 1114E00100 - EMT	UND	30
30-oct-22	[1802-ZA000611121] TAPA PLASTICA OBTURADA R:611121 PAQ X 2 UND SCHNEIDER RETAIL	UND	6
30-oct-22	[1905-040402] CINTA 1/2" EN ACERO INOXIDABLE - SIMELCA	UND	4
30-oct-22	[1802-2309051] TERMINAL PARA CABLE RG-6 CON ROSCA 03040154 - S/M***	UND	20
30-oct-22	[1802-230879] UNION PARA CABLE COAXIAL SIN TUERCA - S/M***	UND	10
30-oct-22	[1802-230902] CRUZ PARA CABLE COAXIAL - S/M***	UND	2
30-oct-22	[1905-040411] HEBILLA 1/2" PARA CINTA ACERO INOXIDABLE - SIMELCA	UND	4
30-oct-22	Suministro de un (1) Equipo de Presión Constante SKP 15H-5TW(2) LA500 220V Preensamblado. Son 2 bombas de Q=77 GPM P=59 PSI . Tanque hidroacumulador 500 Lt	UND	1
30-oct-22	Suministro de un (1) Equipo de Presión HIDROFLO JS1-1/2W C50H 220V Preensamblado. Es 2 bombas de Q=14 GPM P=15 PSI . Tanque hidroacumulador 50 Lt	UND	1
30-oct-22	Suministro de un (1) EQ.CI NAL TB150TW 4x26-20W R.O 220V VA. 3". Preensamblado Sistema contra incendio end suction con motor electrico, bomba 100 gpm a 85 PSI, bomba auxiliar jockey de 10 GPM a presión de 90 PSI	UND	1
30-oct-22	PLANTA ELECTRICA AC60S	UND	1
10-nov-22	PARALES DE MADERA	UND	43
10-nov-22	TABLAS	UND	31
10-nov-22	CUARTONES	UND	2
10-nov-22	ALAMBRE NEGRO X KG	KG	5
26-nov-22	LADRILLO	UND	15,000
26-nov-22	ARCO DETECTOR DE METALES 18 ZONAS 2.2M(H) X 0.84M(W) X 0.58M(L) 100-240VAC	UND	1
26-nov-22	DISCO DURO 8TB 3.5 5640RPM SATA WD 6GB/S 128MB CACHE	UND	2
26-nov-22	DOMO PTZ IP 2MP@60PFS ZOOM 30X TILT -15°~90° WDR H.265+ IP66 IR 150M POE+ AUTOTRACKING INCL. SOPORTE	UND	4
26-nov-22	CONTROLADORA PARA PTZ IP JOYSTICK DE 3 EJES PANTALLA 75 X 33MM PUERTOS RJ45 / RS485 / RS422/ RS232/USB	UND	1
26-nov-22	NVR 64CH H.265+ DECODIFICACION 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 320MBPS 4 SATA 2 HDMI	UND	1
26-nov-22	CAMARA IP BALA SEMIMETALICA 4MP LENTE MOTOR. 2.8 - 12MM FOV 98° - 31° DWDR IR 50M H.265+ POE IP67	UND	8
26-nov-22	MONITOR 32" RETROILUMINACION LED 1080P ÁNGULO DE VISIÓN 178°(H)/178°(V) HDMI/VGA/USB PARLANTE 4WX2	UND	1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
26-nov-22	CAMARA IP 4MP TIPO DOMO LENTE MOTORIZADA 2.8~12MM FOV 31°-98°WDR IR 30M IP67	UND	6
26-nov-22	CAMARA IP 4MP TIPO DOMO LENTE MOTORIZADA 2.8~12MM FOV31°-98°WDR IR 30M IP67	UND	20
29-nov-22	TUBERIA PRESION DE 2"	UND	30
29-nov-22	TUBERIA PRESION DE 1.1/4"	UND	30
29-nov-22	TUBERIA PRESION DE 3/4"	UND	6
29-nov-22	TUBERIA PRESION DE 1/2"	UND	24
5-dic-22	CODO 4 X 90 MJ MJB9004	UND	3
5-dic-22	TEE 4 X 4 MJ-MJT0404	UND	1
5-dic-22	4000 STRAG MJ RESTRAI FOR C900 4 PVC-PV	UND	9
5-dic-22	SERIE 1100C RESTRAINERS FOR C-900 4	UND	3
6-dic-22	TUBO 4 PVC C-900 DR18	UND	5
11-dic-22	UPS POWEST EA9910 UL 10 KVA + BANCO DE BATERIAS	UND	1
11-dic-22	MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS - RACK PDU	UND	3
11-dic-22	ORGANIZADOR HORIZONTAL PLASTICO 2U	UND	4
11-dic-22	JACK CAT 6A UTP NEGRO	UND	240
11-dic-22	PATCH CORD U/FTP CAT 6A 3FT AZUL	UND	113
11-dic-22	PATCH CORD U/FTP CAT 6A 10FT AZUL	UND	39
11-dic-22	CABLE F/UTP CAT 6A LSZH (305 MTS)	UND	13
11-dic-22	PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS 1U	UND	10
11-dic-22	GABINETE PISO 60 X 60 X 45U (AXPXAL)	UND	3
11-dic-22	GABINETE PISO 60 X 60 X 40U (AXPXAL)	UND	1
11-dic-22	KIT DE VENTILACION DOBLE CON CHASIS	UND	4
11-dic-22	KIT DE BARRAJE TIERRA	UND	1
11-dic-22	JACK CAT 6A UTP AZUL	UND	295
11-dic-22	BANDEJA SENCILLA VENTILADA 1 U X 35 CM	UND	6
11-dic-22	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 20KVA TRIFASICO 400v a 208v	UND	1
11-dic-22	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 24KVA TRIFASICO 208v a 400v	UND	1
11-dic-22	BATERIA SOLAR 12V-250AH REF. FLS122500	UND	32
11-dic-22	PANEL SOLAR MONO PERC 360W REF. POWEST PANEL SOLAR MONO PERC 360W	UND	96
11-dic-22	UPS 10KVA REF. POWEST HIBRIDA 10KVA	UND	2
15-dic-22	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10	ML	8
22-dic-22	CASCOS	UND	12
22-dic-22	CHEQUE VERTICAL 1"	UND	1
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Unidad Condensadora 208-230V/60Hz/3Φ Cooling Only 191.100 Btu	UND	3
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Cassette 4 Vías 30.000 Btu	UND	2
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Cassette 4 Vías 36.000 Btu	UND	2
23-dic-22	Cassette Samsung DVM 4 Vías Wind Free 48.000 Btu	UND	7
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Pared Boracay 9.000 Btu	UND	1
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Pared Boracay 12.000 Btu	UND	4
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Pared Boracay 18.000 Btu	UND	2
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Pared Boracay 24.000 Btu	UND	1
23-dic-22	Panel Cassete 4W samsung 2TR 3TR 4TR	UND	11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial

Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
23-dic-22	Y-Joint Unidad Exterior para capacidades menores a 456Kbtu	UND	1
23-dic-22	Y-Joint Unidad Interior Samsung para capacidades mayores a 461Kbtu	UND	2
23-dic-22	Y-Joint Multi Inverter DVM Unidad Interior para capacidades entre 51KBtu - 136KBtu	UND	12
23-dic-22	Y-Joint Unidad Interior para capacidades entre 240KBtu -336KBtu	UND	1
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Y-Joint Unidad Interior para capacidades entre 154KBtu - 240KBtu	UND	2
23-dic-22	Y-Joint Multi Inverter DVM Unidad Interior para capacidades menores a 51Kbtu	UND	1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
23-dic-22	Control remoto para cassette 4 vias y piso techo Samsung CAC y DVM	UND	11
23-dic-22	Y-Joint Unidad Exterior Samsung para capacidades mayores a 456Kbtu	UND	1
23-dic-22	SISTEMA DVM SAMSUNG Control Centralizado Pantalla Táctil / 128 Unidades Interiores / 10 Horarios	UND	1
25-dic-22	PORCELANATO	M2	823
5-feb-23	ARNES BICOLOR 4 PUNTOS DE ANCLAJE	UND	16
5-feb-23	ESLINGA POSICIONAMIENTO	UND	14
5-feb-23	ESLINGA RESTRICCION DOBLE GRAD	UND	2
5-feb-23	GUANTE INGENIERO REFORZADO CORTO	UND	24
5-feb-23	CONECTOR DE ANCLAJE GRADUABLE EN REATA	UND	2
5-feb-23	TAPABOCAS TERMOSELLADO X CAJA 50 UND	UND	2
5-feb-23	LENTES DE SEGURIDAD VIRTUA 11327	UND	16
5-feb-23	PROTECTOR AUDITIVO 1201	UND	16
5-feb-23	PROTECTOR AUDITIVO 1100	UND	16
5-feb-23	GUANTE POLIESTER CALIBRE 10-COVERGUARD	UND	40
5-feb-23	LINEA DE VIDA DE 20 MT	UND	1
10-feb-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 2" RANURADA	ML	6
10-feb-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 4" RANURADA	ML	3
10-feb-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 1 1/2" RANURADA	ML	3
10-feb-23	CODOS 90 TUBERÍA ACERO NEGRO - 4"	UNIDAD	1
10-feb-23	TEE ACERO AL CARBON 4 PULGADAS	UNIDAD	1
10-feb-23	REDUCCION DE 4" A 2" ACERO AL CARBON	UNIDAD	1
10-feb-23	REDUCCION DE 4" A 1 1/2" ACERO AL CARBON	UNIDAD	1
10-feb-23	TEE ACERO AL CARBON 2 PULGADAS	UNIDAD	1
10-feb-23	REDUCCION DE 2 A 1 1/2" ACERO AL CARBON	UNIDAD	2
10-feb-23	CODOS 90 TUBERÍA ACERO NEGRO - 2"	UNIDAD	1
10-feb-23	CODO PARA TUBERIA C 900 4 PULG	UNIDAD	1
10-feb-23	RESTRICTORES	UNIDAD	2
10-feb-23	SUMINISTROVALVULA ANGULAR EN BRONCE 4"X2.1/2" CON TAPA Y CADENA	UNIDAD	1
10-feb-23	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4"X2.1/2"X2.1/2"	UNIDAD	1
10-feb-23	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II. DERECHO	UNIDAD	3
10-feb-23	TUBERIA PRESION DE 3/4	TUBO	6
10-feb-23	TUBERIA PRESION DE 1/2	TUBO	8
10-feb-23	TUBERIA PRESION 1 1/2	TUBO	2
10-feb-23	TUBERIA PRESION DE 1 1/4	TUBO	4
10-feb-23	CODO PRESION DE 3/4	UNIDAD	10
10-feb-23	CODO PRESION DE 1/2	UNIDAD	12
10-feb-23	CODO PRESION DE 1 1/4	UNIDAD	12
10-feb-23	COODO PRESION DE 1 1/2	UNIDAD	10
10-feb-23	UNION PRESION DE 3/4	UNIDAD	6

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
10-feb-23	UNION PRESION DE 1 1/4	UNIDAD	4
10-feb-23	ADAPATADOR MACHO 1/2	UNIDAD	10
10-feb-23	NIPLE ROSCADO GALVANIZADO DE 1/2 X 15 CMS	UNIDAD	15
10-feb-23	CODO GALVANIZADO DE 1/2	UNIDAD	15
10-feb-23	UNION GALVANIZADA DE !/2	UNIDAD	15
10-feb-23	TUBO SANITARIO DE 3 PULG	TUBO	20
10-feb-23	SEMICODO SANITARIO DE 3 PULG	UNIDAD	12
10-feb-23	CODO SANITARIO DE 3 PULG	UNIDAD	18
10-feb-23	UNION SANITARIA DE 3 PULG	UNIDAD	6
10-feb-23	YEE SANITARIA DE 3 PULG	UNIDAD	15
10-feb-23	UNION SANITARIA DE 6 PULG	UNIDAD	4
10-feb-23	BUJE DE REDUCCION DE 6 A 4 PULG	UNIDAD	4
10-feb-23	CINTA PVC V - 15 PARA JUNTAS PARA TANQUE	ML	42
27-abr-23	FAVIGEL	SACOS	2
3-may-23	SOLDADURA CADWELL	UND	7
6-may-23	CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, NO INCLUYE TRANSFORMADOR	UND	1
6-may-23	CELDA NO. 5, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S,	UND	1
6-may-23	CELDA No 6 . TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGD, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X300A, ICC 10KA, NIVEL DE TENSIÓN 208/120V, PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LOS TABLEROS (TN-1, TN-2, TN-3, T-AA, T-AA*, T-UPS-P1, T-UPS-P2, T-UPS-P3),	UND	1
6-may-23	CELDA NO. 7, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S,	UND	1
6-may-23	CELDA No. 8 CELDA CELDA (C-EMER), CELDA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA PARA SISTEMA RCI DE FABRICACIÓN ESPECIAL	UND	1
16-may-23	VARILLAS DE 1/2"	UND	90
16-may-23	SANITARIO	UND	1
16-may-23	PTE 20 X 20 X 5 MM	UND	3
22-may-23	MINI SOPORTE GS - PEMSA	UND	200
22-may-23	CAJA EMPALME 10X10X5 IP55 TERMOPLAST 3 DEXSON	UND	50
22-may-23	CANAL ESTRUCTURADO 4X4 RANURADO 3.00MCALIBRE 16	UND	50
22-may-23	ABRAZADERA 1/2" AJUSTABLE (JUEGO)	UND	300
22-may-23	ABRAZADERA 3/4" AJUSTABLE (JUEGO)	UND	300
22-may-23	ABRAZADERA 1" AJUSTABLE (JUEGO)	UND	80
22-may-23	ABRAZADERA 1 1/2" AJUSTABLE (JUEGO)	UND	30
22-may-23	ABRAZADERA 1 1/4" AJUSTABLE (JUEGO)	UND	50
22-may-23	ABRAZADERA 2" AJUSTABLE (JUEGO)	UND	30
22-may-23	CURVA HORIZONTAL 30X8X2.40 18-18 P/BAND C18	UND	15
22-may-23	CURVA VERTICAL ASCENDENTE 30X8X.240 18-18 P/BAND	UND	6
22-may-23	CURVA VERTICAL DESCENDENTE 30X8X2.40 18-18 P/BAND	UND	8
22-may-23	CRUZ HORIZONTAL DE 8X30 CM CL	UND	6
22-may-23	TE HORIZONTAL 18-18 P/BAND 30X8X2.40 C18	UND	8
22-may-23	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA C20 RETIE	UND	360
22-may-23	CAJA 4X4 GALVANIZADA CUADRADA C20 RETIE (2400)	UND	200

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial

Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
22-may-23	MINI SOPORTE GS - PEMSA	UND	100
22-may-23	CONECTOR RESORTE RED-YELLOW 18-8AWG 80610984314 3M	UND	600
22-may-23	TERMINAL ANILLO AMAR 12-10AWG 1/4 VTA-5-5-6 VCP	UND	500
22-may-23	CINTA NARANJA 18 MTS AISLANTE TEMFLEX 3M	UND	30
22-may-23	VARILLA SOLIDA DE COBRE 9/16 X 2.40MTS 14MM	UND	6
22-may-23	RIEL 3 MTS PARA BANDEJA MALLA REJIBAND 1	UND	75
22-may-23	TRANSFORMADOR 75KVA TIPO SECO CLASE H 13200/208-120V CON CERTIFICADO	UND	1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. 084 de 2022, 10 de Junio de 2022

OBJETO Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)

CONTRATISTA DE OBRA BERMUDEZ SAS - NIT 816.000.531-1

FECHA INGRESO	MATERIAL	UND	CANT
22-may-23	DPS PARA PROTECCION TRANSFORMADOR	UND	3
22-may-23	JUEGO DE 4 RUEDAS CON FRENO PARA TRANSFORMADOR	UND	1
22-may-23	JUEGO DE RIELES	UND	1
22-may-23	BANDEJA PARA PASOS DE ESCALERA DE 1.49 x 0,28 x 0,06. LAMINA 1/4"	UND	18
22-may-23	BANDEJA PARA PASOS DE ESCALERA DE 3.10 x 0,275x 0,06. LAMINA 1/4"	UND	5
7-jun-23	ESTUCO X 25 Kg	UND	2
8-jun-23	ESTUCO X 25 Kg	UND	1
9-jun-23	KORAZA BLANCA	GLN	5
12-jun-23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA. CELDAS 1-2-3	UND	3
12-jun-23	INNOVA ARTISTIC PERSONALIZADO, COLL ROLLED (CR), CALIBRE 18, HUECO PERSONALIZADO, TERMINADOEN CRUDO, DOBLEZ, 30, 20, 0, CANTIDAD 24 UND, ANCHO 0.873, LARGO 1.6	UND	24.00
12-jun-23	INNOVA ARTISTIC PERSONALIZADO, COLL ROLLED (CR), CALIBRE 18, HUECO PERSONALIZADO, TERMINADOEN CRUDO, DOBLEZ, 30, 20, 0, CANTIDAD 160 UND, ANCHO 0.863, LARGO 1.6	UND	160.00
12-jun-23	ESTUCO X 25 Kg	UND	22
23-jun-23	Televisor Samsung FLAT LED Smart TV 65 pulgadas Crystal UHD 4K /	UND	7
23-jun-23	BANDEJA PARA PASOS DE ESCALERA DE 1.30 x 0,28 x 0,06. LAMINA 1/4"	UND	32
24-jun-23	CONDULETAS 3/4" - 1/2"	UND	530
5-jul-23	TOPEX ANCLAJES	UND	16
5-jul-23	PISO PARED NATAL BCO	M2	76
5-jul-23	PINTURA 5gl	UND	6
5-jul-23	PEGANTE TOPEX CERAMI	UND	15
5-jul-23	CONCOLOR ANTIHONGOS	UND	10
5-jul-23	CONCOLOR ANTIHONGOS	UND	45
5-jul-23	CRUCETA PLASTICA JUN	UND	3
5-jul-23	ESTUCO PLASTICO T	UND	20
6-jul-23	FAVIGEL	UND	9
6-jul-23	CABLE DESNUDO 2/0	ML	30
