Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.CSA-144-2023

OBJETO: ***"SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACION Y EMBELLECIMIENTO, QUE GARANTICEN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES URBANAS RURALES DEL MUNICIPIO."***

CARLOS ARTURO GIL GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

JUNIO 14 A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SAN CARLOS-ANTIOQUIA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

INTRODUCION

La infraestructura social y productiva del municipio de San Carlos es de gran importancia para la comunidad en general ya que con estas se fortalecen nuestras comunidades a través de proyectos sociales, culturales, educativos, deportivos y productivos es por tal motivo la importancia de que toda la infraestructura este en óptimas condiciones, de allí la importancia de realizar mantenimientos y adecuaciones con el fin de que se conserven en el tiempo.

las edificaciones del área rural y urbana, las vías que unen al municipio con todas y cada una de las veredas y centros poblados requieren de medidas de mantenimiento y adecuaciones necesarias para su buen funcionamiento, todo este desgaste o deterioro se da debido al uso normal y continuo de la infraestructura de allí surge la necesidad de realizar los trabajos de adecuación y mantenimiento. En general estas actividades se realizan para prolongar la vida útil de la infraestructura en general y poder garantizar en el tiempo que se sigan realizando todas las actividades sociales, culturales, educativas, productivas y deportivas.

Para el desarrollo de las actividades de adecuación y mejoramiento se requirió de personal idóneo que tenga tanto las capacidades físicas como de formación para adelantar las obras que requiere el municipio, a través de la oficina de Obras Públicas.

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

GENERALIDADES



SAN CARLOS-MUNICIPO-PARQUE PRINCIPAL

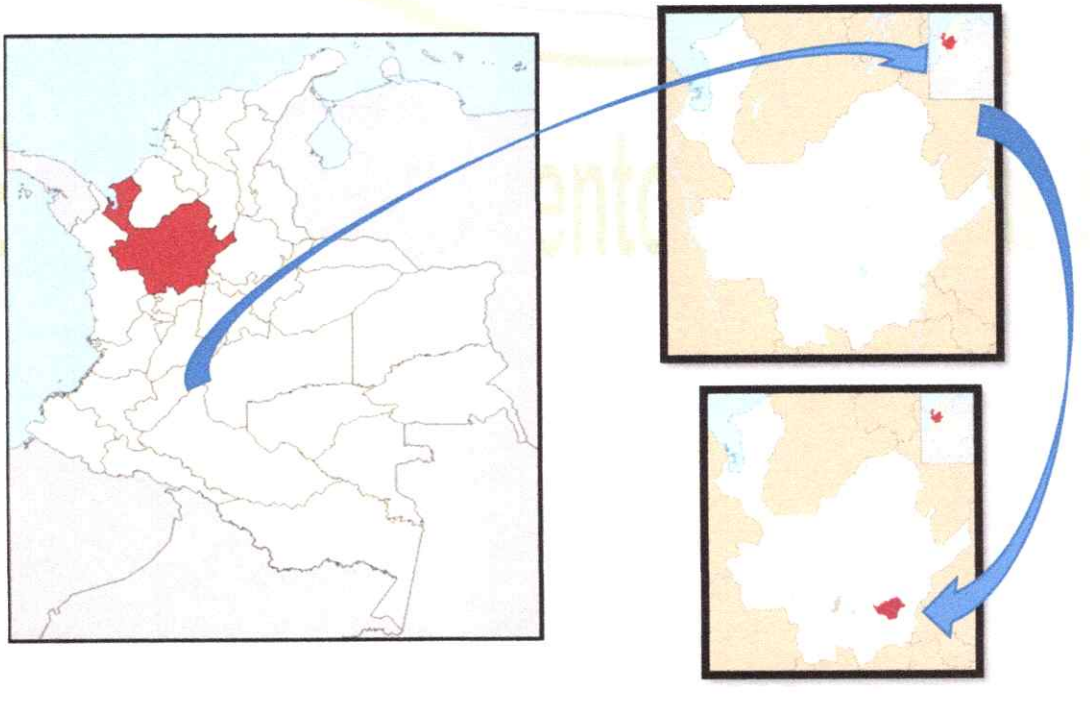
BANDERA





LOCALIZACION

ESCUDO



Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Para el desarrollo de estas actividades se realizó un contrato de obra entre el municipio de San Carlos y la empresa Básico Saneamiento Ambiental el cual tiene por objeto ***"SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACION Y EMBELLECIMIENTO, QUE GARANTICEN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES URBANAS RURALES DEL MUNICIPIO."***

A continuación, se relacionan los aspectos con mayor relevancia en dicho contrato.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA:	BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.
NIT	900.392.450-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO GIL GARCIA
C.C.	70.751.573
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
OBJETO	SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACION Y EMBELLECIMIENTO, QUE GARANTICEN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES URBANAS RURALES DEL MUNICIPIO.
VALOR	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($280.000.000), sin embargo, el valor final del mismo será el que resulte de evaluar lo realmente ejecutado.
PLAZO	SEIS (09) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta agotar el presupuesto oficial, sin superar la presente vigencia.
SUPERVISOR	Secretaria de obras publicas

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

ACTA DE INICIO

El 17 de abril de 2023, se reunieron NIDIA ALEXANDRA HINESTROZA GOMEZ como secretario de obras públicas en calidad de supervisor y el señor CARLOS ARTUTO GIL GARCIA como representante legal de la empresa BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. para dar inicio formal al contrato de obra. Allí se firmó el acta de inicio del con trato de obra N° CSA-144-2023 entre el municipio de San Carlos identificado con NIT 890.893.740-9 y la empresa Básico Saneamiento Ambiental S.A.S con NIT 900.392.450-7 cuyo representante legal es el señor Carlos Arturo Gil García, dicho contrato cuenta con una duración de seis (09) meses y cuya fecha de terminación es el 31 de diciembre del 2023.

San Carlos Somos Todos

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CSA-144-2023

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	
NIT	890.983.740-9	
CONTRATISTA	BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S	NIT 900.392.450-7
R/L	CARLOS ARTURO GIL GARCIA	C.C. 70.751.573
OBJETO:	**SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO, QUE GARANTICEN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO, según propuesta anexa.**	
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($280.000.000)	
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto oficial, previa evidencia e informe final de supervisión, sin superar la presente vigencia	
FECHA DE INICIO	17 de Abril de 2023.	
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre de 2023.	

En el municipio de San Carlos-Antioquia, el dia 17 de abril del 2023, se reunieron: **NIDIA ALEXANDRA HINESTROZA GOMEZ** como Secretaria de Obras Públicas, del Municipio de San Carlos - Antioquia, en calidad de supervisor del contrato, y el señor **CARLOS ARTURO GIL GARCIA** identificado con CC N° 70.751.573 en representación legal de **BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.** identificada con el NIT: 900.392.450-7 en su calidad de contratista, a fin de dar inicio formalmente a la ejecución del contrato citado.

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND
1	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	
	Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	
1.1	Demolición piso de baldosa. Incluye el mortero de nivelación, Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.(No incluye retiro de entresuelo)	m2
1.2	Demolición de piso en concreto. e=0.5m incluye cargue, transporte y botada de material	m2
1.3	Demolición enchape de baldosín o revoque. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m2
1.4	Demolición muro ladrillo. e=10/15 cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros	m2
1.5	Demolición muro ladrillo. e=20/25 cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros	m2
1.6	Demolición muro de tapia e=30/50 cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros	m2
1.7	Retiro de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	un
1.8	Retiro de canoas, ruanas, bajantes, tuberias. Incluye todo lo necesario para su correcto retiro	m
1.9	Demolicion de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple, ciclópeo, donde se requiera, como pavimentos, fundaciones, losas, muros, muros de concreto y demas estructuras diferentes a las especificadas, Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos debidamente autorizados.	m3

1.10	Demolicion de vigas y columnas, Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos debidamente autorizados.	m3
1.11	Demolicion de anden, Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos debidamente autorizados.	m3
1.12	Retiro de puertas (marco y ala) o puertas rejas . Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	un
1.13	Retiro de ventanas. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable	un
1.14	Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye todo lo necesario para su correcto retiro.	m2
1.15	Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento o traslucida, incluye todo lo necesario para su correcto retiro.	m2
1.16	Retiro de cielo falso	m2
1.17	Desmonte, rocería y limpieza, incluye cargue, transporte y botada de material, aplicación de herbicida para maleza.	m2
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	
2.1	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material .	m3
2.2	Excavación de 2 a 4 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3
2.3	Llenos compactados manualmente en material seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3
2.4	Llenos con material de prestamo compactados manualmente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3

2.5	Cargue y retiro de material sobrante, incluye cargue con paleros, transporte y botada de material.	m3
3	**ACERO DE REFUERZO**	
3.1	Transporte, corte, figuración y Instalación de acero de refuerzo de : F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²).	Kg
3.2	Colocacion de malla electrosoldada tipo D106. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.	m2
3.3	Colocacion de malla electrosoldada tipo U50. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.	m2
4	**CONCRETOS**	
4.1	Recinte en concreto de 21 Mpa ciclopéo 50% piedra, espesor 20/30 cm. No incluye materiales e Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m2
4.2	Concreto 21 Mpa para vigas de amarre de fundación. Según diseño No incluye materiales.	m3
4.3	Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 15x20 cm. Según diseño No incluye materiales	m3
4.4	Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 20x20 cm. Según diseño No incluye materiales.	m3
4.5	Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 30x30 cm. Según diseño No incluye materiales	m3
4.6	Concreto 21 Mpa para zapatas. Según diseño No incluye materiales	m3
4.7	Concreto 21 Mpa para pilas. Según diseño No incluye materiales	m3
4.8	concreto ciclopeo para solaos y remplazos de suelo	m3
5	**MAMPOSTERÍA**	
5.1	construccion de Sobrecimientos en concreto	m3
5.2	construccion de Sobrecimientos en bloque de 15x15	m²
5.3	construcion de muro en ladrillo de 6 huecos para revocar ambas caras. (primera calidad) de e=10 cm	m2
5.4	construcion de muro en ladrillo de 6 huecos para revocar ambas caras. (primera calidad) de e=15 cm	m2
5.5	Instalacion de Mamposteria muro 20 bloque de concreto 20*20*40 cm. No incluye materiales.	m²
5.6	Instalacion de Mamposteria muro 15 bloque de concreto 15*20*40 cm. No incluye materiales.	m2
5.7	Instalacion de Mamposteria muro 10 bloque de concreto 10*20*40 cm. No incluye materiales.	m2
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
6.1	Instalación de tubería PVC. Presión para abastos Ø = ½" RDE 9. No incluye materiales. La excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.	ml

6.2	Instalación de tubería PVC-S para aguas negras 2". No incluye materiales. La excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.	ml
6.3	Instalación de tubería PVC-S para aguas negras 3". No incluye materiales. La excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.	ml
6.4	Instalación de tubería PVC-S para aguas negras 4". No incluye materiales. La excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.	ml
6.5	construcion caja de inspeccion 100x100 cm medidas internas	ml
6.6	Instalación de sanitario sencillo bajo consumo 6lt.	un
6.7	Instalación de Lavamanos de encrustar.	un
6.8	Instalación de Orinal mediano colgado.	un
6.9	Instalación de juego de incrustaciones línea económica.	un
6.10	Instalación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio. Ø = 2".	un
6.11	Instalación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio. Ø = 3".	un
6.12	Reparación de unidades sanitarias (lavamanos, sanitarios, orinales). Incluye canche, obra civil y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un
6.13	Instalación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias Ø = 3". No incluye materiales.	ml
6.14	Instalación de tubería PVC - Novafort de 8"	m
6.15	Instalación de ducha, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	UN
7.0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.**	
7.1	Instalación de puertas madera, marco en roble y ala en triplex de 90 cm. No incluye materiales.	un
7.2	Instalación de puertas madera, marco en roble y ala en triplex de 100 cm. No incluye materiales.	un
7.3	Instalación de puertas metalica lamina calibre 20 de 100 cm, marco y ala en la mina troquelada . No incluye materiales.	un
7.4	instalacion ventana corrediza de aluminio anonizado color a definir. No incluye los materiales.	un
7.5	Instalación de malla de protecciòn para ventanas en angulo de 1" x 3/16", malla ondulada plana de 1" x 1", pintura anticorrosiva y de acabado final ademas fijaciòn con soldadura y pernos. No incluye materiales.	un
7.6	Instalación de vidrio de 4mm. . No incluye materiales.	m2

7.7	Instalación de reja de seguridad metálica con marco. No incluye materiales.	m²
7.8	Instalación de puerta-reja en tuberia negra pésada Ø 1". . No incluye materiales.	m2
8	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	
8.1	Revoque liso en muros incluye filetes, ranuras y dilatacion. No incluye materiales.	m2
8.2	Revoque liso en cielo incluye filetes, ranuras y dilatacion. No incluye materiales.	m2
8.3	Revoque guanteado en muros incluye filetes, ranuras y dilatacion. No incluye materiales.	m2
8.4	Revoque impermeabilizado 1:3 para muros con impermeabilizante integral para hormigon y morteros.(sika1,toxement1A o equivalente) a una dosificación de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas. No incluye materiales.	m2
8.5	Estuco en muros. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. No incluye materiales.	m2
8.6	Instalación de pintura a base de agua en muros, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos a satisfacción de la interventoria. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuacion de la superficiea intervenir. color a definir según aprobación de la interventoria. No incluye materiales.	m2
8.7	Instalación de pintura a base de agua en cielos, vinilo de primera calidad en cielos, 2 a 3 manos a satisfacción de la interventoria. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuacion de la superficiea intervenir. color a definir según aprobación de la interventoria. No incluye materiales.	m2
8.8	Instalación de pintura tipo I para exteriores acrilica (hidrorepelente) . Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. a satisfacción de la interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria. No incluye materiales.	m2
8.9	Barniz para techos, 1 mano (carguera, alfarda, tablilla). Incluye andamios y todo lo necesario para su correcta aplicación	m2
8.10	Pintura a base de aceite para PUERTAS DE MADERA y/o METALICAS. No incluye materiales.	m2
8.11	Pintura a base de aceite - esmalte para canoas y bajantes. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. No incluye materiales.	m2

8.12	Pintura de zócalo en paredes e=0,1m a base de aceite tipo I exteriores. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. No incluye materiales.	m2
8.13	Pintura de pasamanos a base de aceite tipo profesional. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. No incluye materiales.	m2
8.14	Impermeabilización en losa de concreto con productos acrilicos y todo lo necesario para su correcta construcción. No incluye materiales.	m2
8.15	Instalación de ENCHAPE PARED en cerámica de 25 x 35 cm ref. Incluye mortero de pega (o pegacor), lechada, remate en varilla de pvc de 3/8" acolillada para muros. No incluye materiales.	m2
8.16	Instalación de ENCHAPE en vitrificado antideslizante y arenón chino Nº 1 o N° 2 e= 3 cm., proporción 1:2, 40% em vitrificado. Incluye mortero 1:4, guardaescobas, remates y lechada, medido en proyección horizontal, incluye diseño aprobado. No incluye materiales.	ml
9	**PISOS**	
9.1	Acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo e= 0.5 cm. incluye adición de recebo compactado en arenilla e = 5 cm para su correcta nivelación	m2
9.2	Instalación de PISO EN MORTERO 1:5 reforzado e= 5 cm. Incluye mano de obra, formaletas, malla para cemento y todo lo necesario para su correcta construcción. No incluye materiales.	m2
9.3	Instalación de PISO EN CONCRETO de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye mano de obra. No incluye materiales.	m2
9.4	Instalación de PISO EN CONCRETO de 21 Mpa. e =10 cm. Incluye mano de obra, formaletas, vibrador y todo lo necesario para su correcta construcción. No incluye materiales.	m2
9.5	Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.	m2
9.6	Instalación de PISO en BALDOSA Blanca 30 cm Grano blanco # 1-2 Ref. 132112 Roca o simila. No incluye materiales.	m2
9.7	Construcción de GUARDAESCOBA en baldosa de granito No 1, h= 7,5 cm. No incluye materiales.	ml
9.8	Construcción de GUARDAESCOBA en granito pulido - media caña. No incluye materiales.	m
9.9	Construcción de PISO en TABLETA DE GRES en I o rectangular de 2/3 cm espesor. No incluye materiales.	m2

9.10	Instalacion de PISO tipo DUROPISO. No incluye materiales.	m2
9.11	Instalación de Guardaescoba en PISO tipo DUROPISO del color del piso. No incluye materiales.	m
9.12	Repulida y brillada de piso en baldosa de grano 30 x 30 cm.	m2
10	**CUBIERTA**	
10.1	Instalación y construcción de TECHO EN TEJA DE BARRO. No incluye materiales.	m²
10.2	Reparación de techo en TEJA DE BARRO. Incluye retiro total de tejas y de madera en mal estado. No incluye materiales.	m²
10.3	Reparación de techo en TEJA DE ASBESTO CEMENTO. Incluye retiro total de tejas y de madera en mal estado, Instalación de teja existente y nueva. No incluye materiales.	m²
10.4	Instalación de CANOA EN "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.70 m. No incluye materiales.	ml
10.5	Instalación de CANOA EN "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m. Con tapa ruana. No incluye materiales.	ml
10.6	Instalación de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 24 0.50 CM . No incluye materiales.	ml
10.7	Instalación de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 24 moldurada 0.70 CM No incluye materiales.	ml
10.8	Instalación de RUANAS en lámina galvanizada calibre 26. No incluye materiales.	ml
10.9	Instalación de TEJA TRANSLUCIDA en PVC (color marfil). No incluye materiales.	m²
10.10	Colocacion de TEJA EN ASBESTO CEMENTO tipo eternit o equivalente . No incluye materiales.	m2
10.11	Limpieza de TECHOS, CANOS, BAJANTES y todas las distintas actividades necesarias para su correcta funcionamiento	m2
10.12	Instalación de cercha metálica para soporte de cubierta en teja de barro L= 3,00 mt. No incluye materiales.	ml
10.13	Readecuación de cielo falso. No incluye materiales.	m2
11	**CERRAMIENTO METÁLICO**	
11.1	Construcción e Instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada de 1.9" calibre 14. No incluye materiales.	m
12	**MUROS Y CIELOS EN DRY WALL**	
12.1	Instalación de CIELO FALSO EN DRY WALL. No incluye materiales.	m2

12.2	Instalación de MUROS EN DRY WALL con placas en yeso 2 CARAS, con un espesor de aprox de 9 cm. No incluye materiales.	m2
13	**OBRAS VARIAS**	
13.1	Instalación de mesón en acero inoxidable tipo 304 calibre 18 con pozuelo. No incluye materiales.	ml
13.2	Instalación de PASAMANOS METALICO tuberia cuadrada negra liviana. No incluye materiales.	ml
13.3	Instalación de PASAMANOS METALICO tuberia redonda. No incluye materiales.	ml
13.4	Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 30x40 cm. en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye transporte y Instalación del concreto.	ml
13.50	Vaciado de concreto para muros de contencion, cunetas, recientes, pavimento, revestimiento, poceta, aleta, cabezote, disipador. No incluye materiales.	m3
13.60	Construccion de muro gavion en malla trpile torsion calibre 14. No incluye materiales.	m3
13.70	Instalación de tuberia de 24" pulgadas en concreto. No incluye materiales.	ml
13.80	construcción de trincho en columnas de concreto circulares y cuadradas c/da 1,5 mts de distancia h= 2.0-2.5 mt. con malla eslabonada, incluye acero de refuerzo, ángulos de 1-1/2, en diagonales. no incluye materiales	ml
13.90	construcción de trincho en guadua de 0,80 mts de altura, con poste cada 1,2 mt de h= 2.0 mt. . no incluye materiales	ml
13.10	colocacion de tubo en concreto reforzado 36", incluye: hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. no incluye materiales	ml
13.11	construcion de muro bolsacreto en concreto incluye: hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. no incluye materiales	ml

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	#POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento (10%)	Aseguradora solidaria de colombia	530-47-994000038674	17/04/2023	15/05/2024	**$ 28,000,000.00**
Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizacion	Aseguradora solidaria de colombia	530-47-994000038674	17/04/2023	15/01/2027	**$ 28,000,000.00**
Anticipo	Aseguradora solidaria de colombia	530-47-994000038674	17/04/2023	15/05/2024	**$ 84,000,000.00**
Responsabilidad civil extracontractual	Aseguradora solidaria de colombia	530-74-994000015833	17/04/2023	15/01/2024	**$ 232,000,000.00**

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA

- ING. Civil
- Ayudantes.
- Oficinales.

EQUIPOS

- Placa vibratoria (rana).
- Concretadora.
- Vibrador eléctrico.
- Planta.
- Motobomba.
- Pulidora.
- Taladro percutor
- Andamios

HERRAMIENTA MENOR

- Coches.
- Palas.
- Picas.
- Barras.
- Pisón.
- Almádana.
- taladros

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

INSTALACIONES

El personal tal como ayudantes y oficial son residentes de la zona, ya que siempre se ha querido contar con la participación de las personas que vivan en el área de influencia del proyecto, para la generación de empleo en nuestro municipio. Por otro lado, el ING. Civil residente de la obra pasa la mayoría de tiempo en campo realizando apoyo a la ejecución de obras que se vienen adelantando.

ESTADO DEL TIEMPO

En el transcurso del proyecto se ha tenido una temporada invernal alta, a pesar de esto se ejecutaron las diferentes actividades contempladas en el contrato.

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO.

Relación de pagos realizados

Hasta la presente acta se han realizado aportes por parte del municipio de San Carlos correspondientes al 30% por concepto de anticipo quedando por aportar por parte del municipio el 70%.

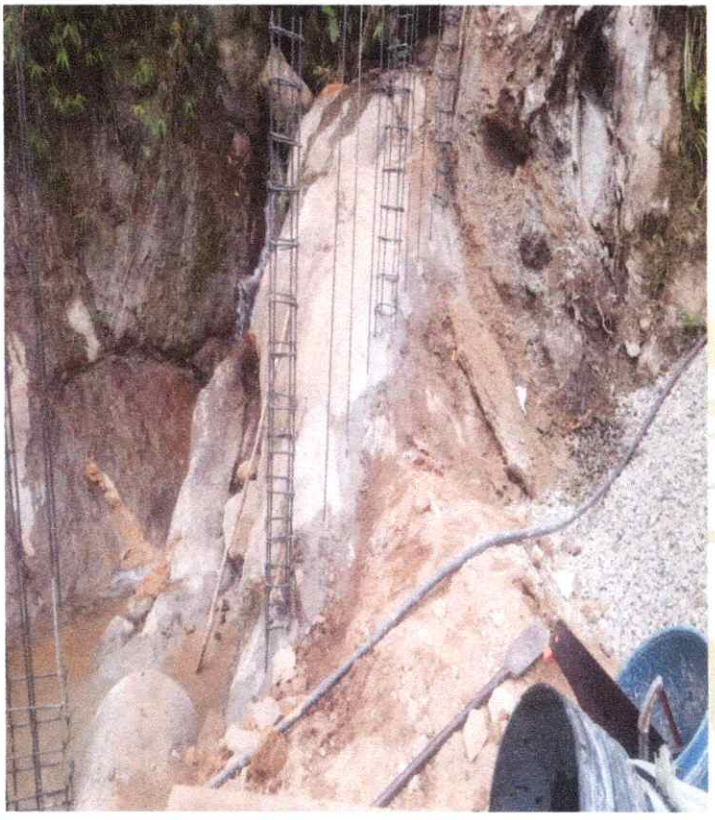
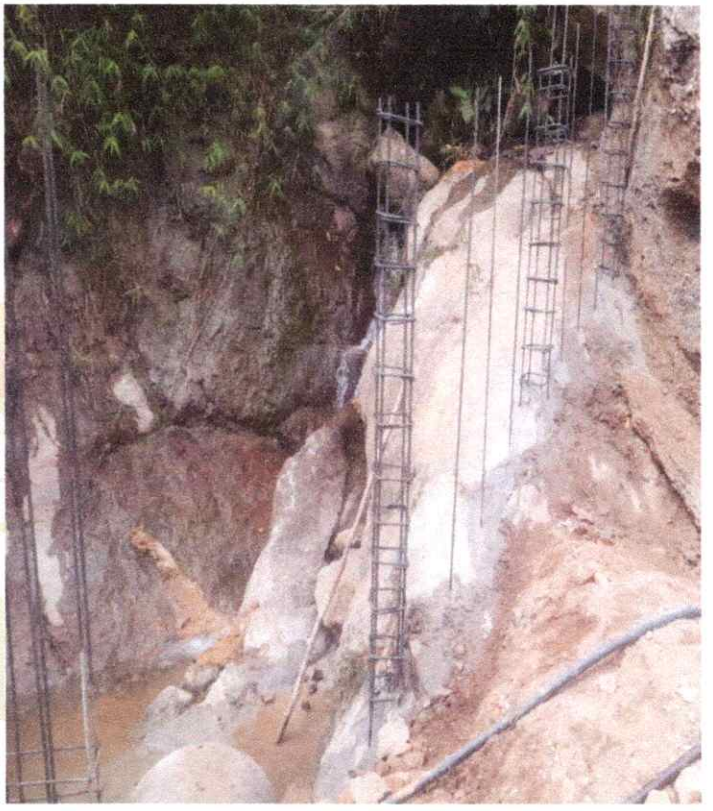
ACTA 001			
VALOR CONTRATADO:	$ 280,000,000		
VALOR ANTICIPO	$ 84,000,000	**AMORTIZACION**	$ 31.416.578
VALOR DE PRESENTE ACTA:	$ 104.721.928	**ACTA #2**	$ 64,075,176.00
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA.	0		0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 83.742.107		$ 83.742.107
SALDO POR EJECUTAR:	$ 83.742.107		$ 83.742.107
SUMAS IGUALES:	$ 280,000,000		$ 280,000,000
AVANCE FINANCIERO			
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO			70%
PORCENTAJE FINANCIERO POR EJECUTAR			30%

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE CABEZOTE Y OBRA TRANSVERSAL VEREDA PALMICHAL

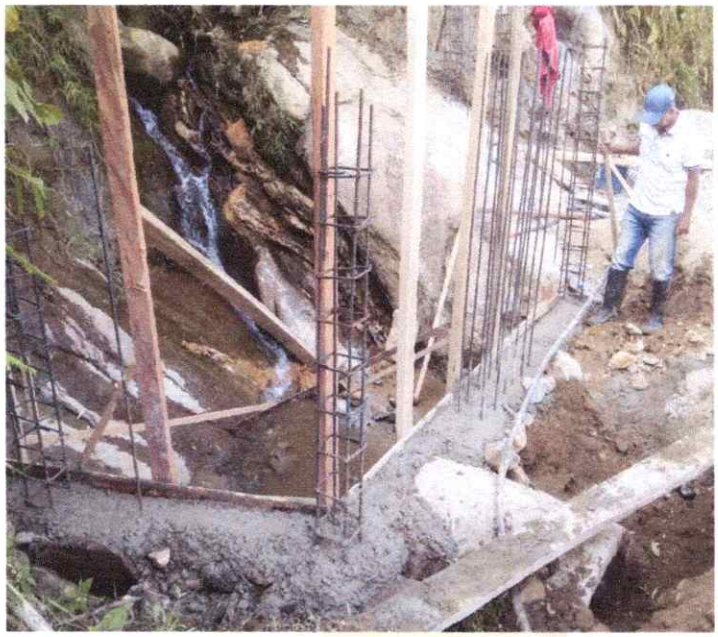
En la vereda la palmichal se realizo la construccion del cabezote de encole y descole de una obra trasversal, tambien se realizo la instalacion de tuberia de 36" y 24", se realizaron excavaciones, llenos, revestimientos, entre otras actividades complementarias.

	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL
	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL
	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL
	
CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL	CONSTRUCION DE OBRA TRANSVERSAL

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN LA ADMINIOSTRACIO, RESTAURANTE ESCOLAR Y COLEGIO

Se realizaron actividades de limpieza y mantenimiento en general en las 3 estructuras, la institucion educativa Joaquin Cardenas Gomez, Restaurate escolar y la Administracion Municipal.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LIMPIEZA DE CUBIERTA</td><td>LIMPIEZA DE CUBIERTA</td></tr>
</table>

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
LIMPIEZA DE CUBIERTA	LIMPIEZA DE CUBIERTA
	
LIMPIEZA DE CUBIERTA	LIMPIEZA DE CUBIERTA

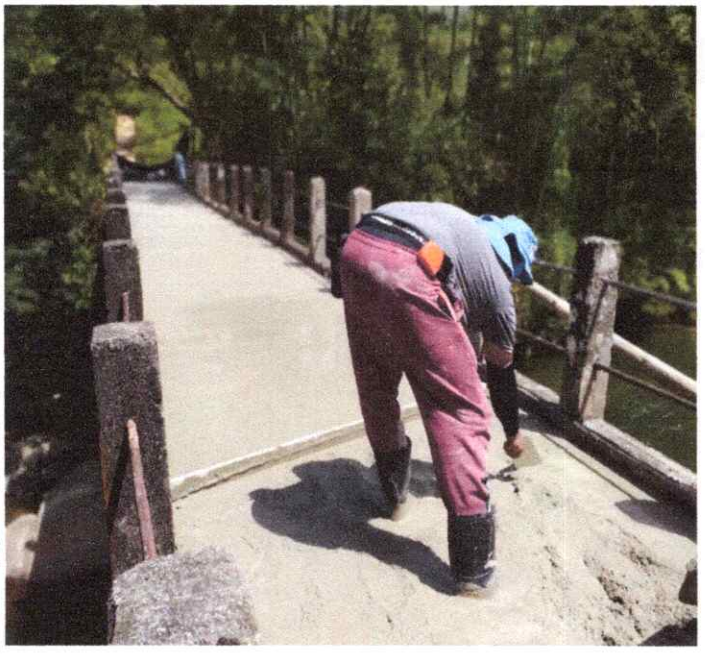
Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

MANTENIMIENTO A PUENTE DE LA CABAÑA

Se realizaron actividades de mantenimiento de losa del puente vehicular, construcción de accesos al puente, construcción de pasamanos en concreto.

	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA
	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA
	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA

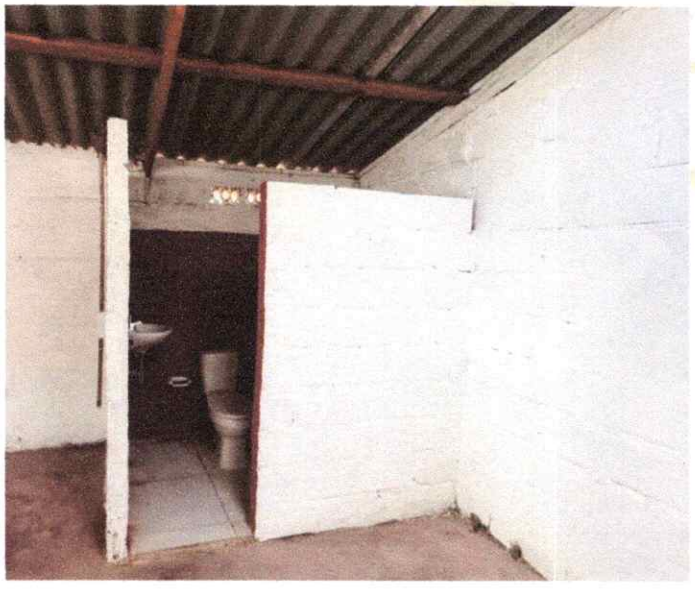
Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA
	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

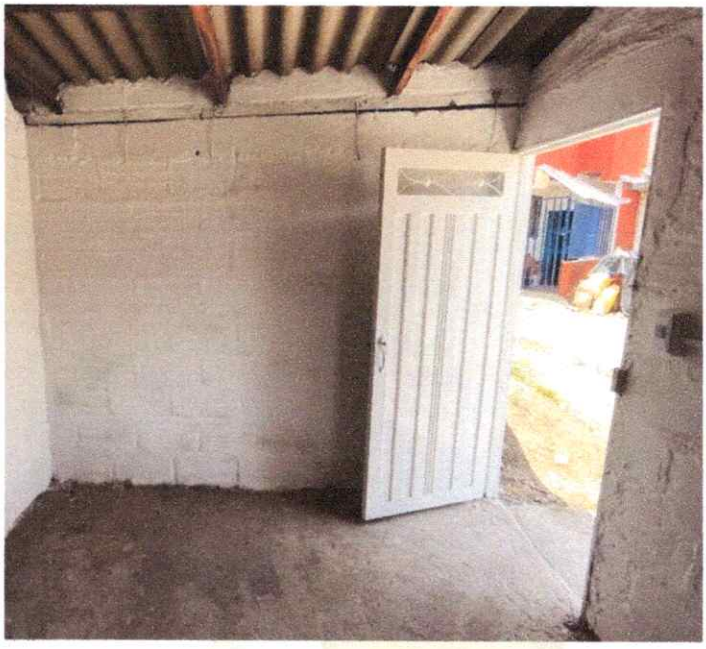
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 2 VIVENDAS EN EL BARRIO PORTON DE ORIENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

Se realizaron actividades de mampostería, retiro e instalación de cubierta, construcion de pisos, baños, instalación de puertas, ventanas, construcción de mesón y pintura.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</td><td>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</td><td>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</td></tr>
</table>

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S
Nit: 900392450-7 San Carlos ant.
Email: basicosas@hotmail.com

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA
	
MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA	MANTENIUENTO PUENTE LA CABAÑA

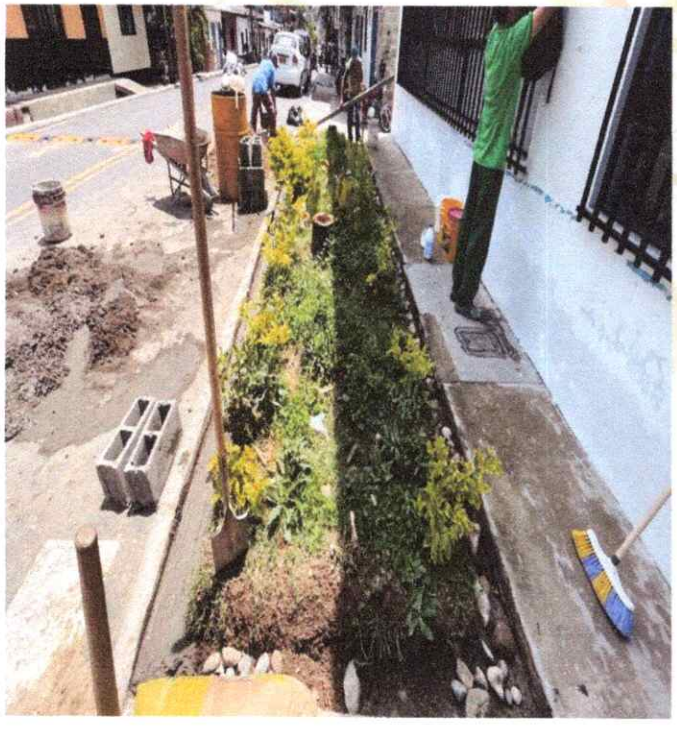
Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

CDI EL SAN CARLOS

En el CDI de San Carlos, se está realizando la construcción de un cerramiento para la zona verde ubicada al frente de esta institución con el fin, de evitar que los perros, gatos ingresen a esta zona a realizar sus necesidades. Toda vez que se esta muy cerca de un establecimiento donde van muchos niños a estudiar y se debe minimizar al máximo la generación de vectores que puedan afectar la salud de estos.

	
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
	
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

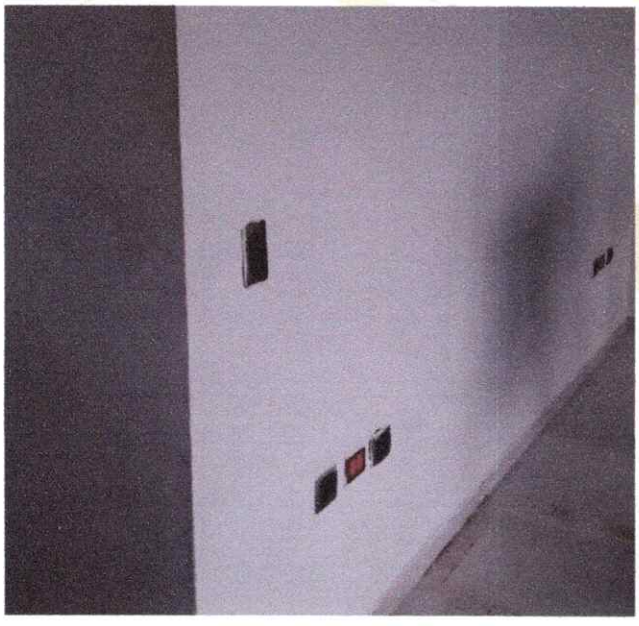
Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
	
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

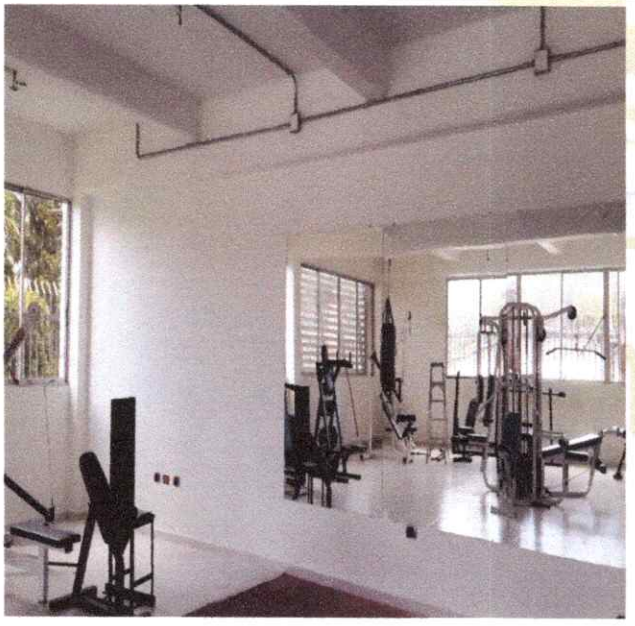
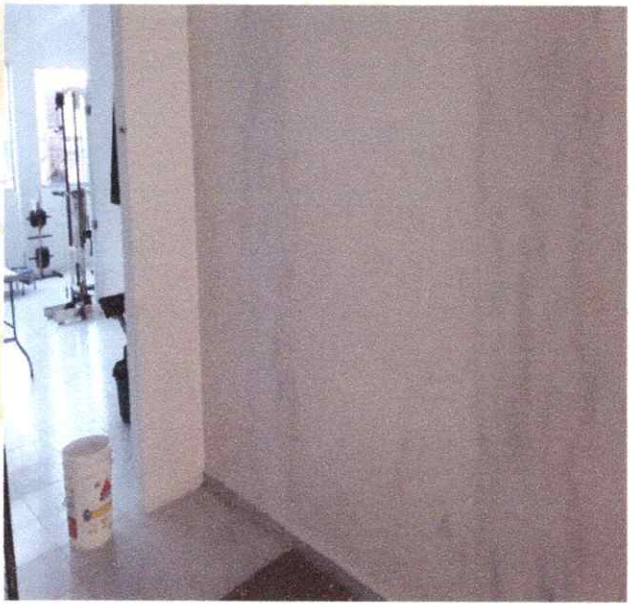
Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

GIMNASIO DEL COLISEO AUXILIAR

Se realizaron actividades de raspado de superficie, impermeabilización, estuco y pintura en el gimnasio del polideportivo.

	
APLICACIÓN DE PINTURA	APLICACIÓN DE PINTURA
	
APLICACIÓN DE PINTURA	APLICACIÓN DE PINTURA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
APLICACIÓN DE PINTURA	APLICACIÓN DE PINTURA
	
APLICACIÓN DE PINTURA	APLICACIÓN DE PINTURA

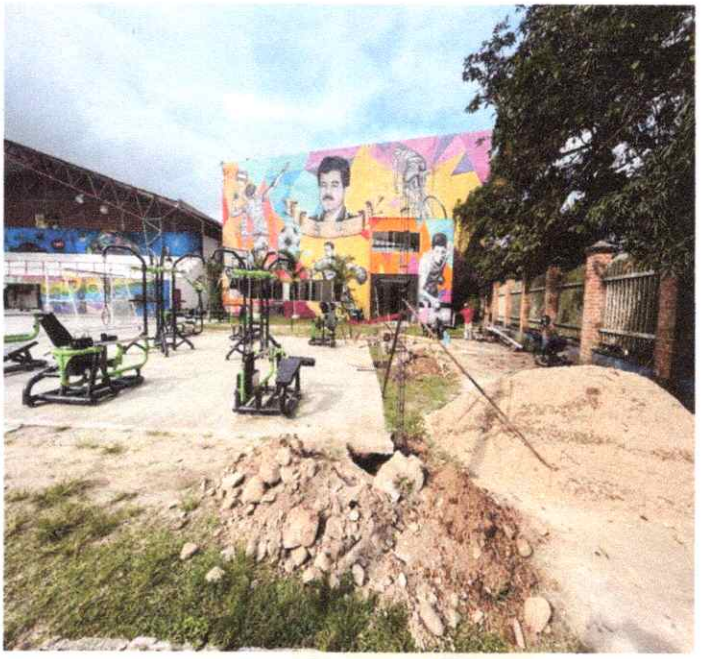
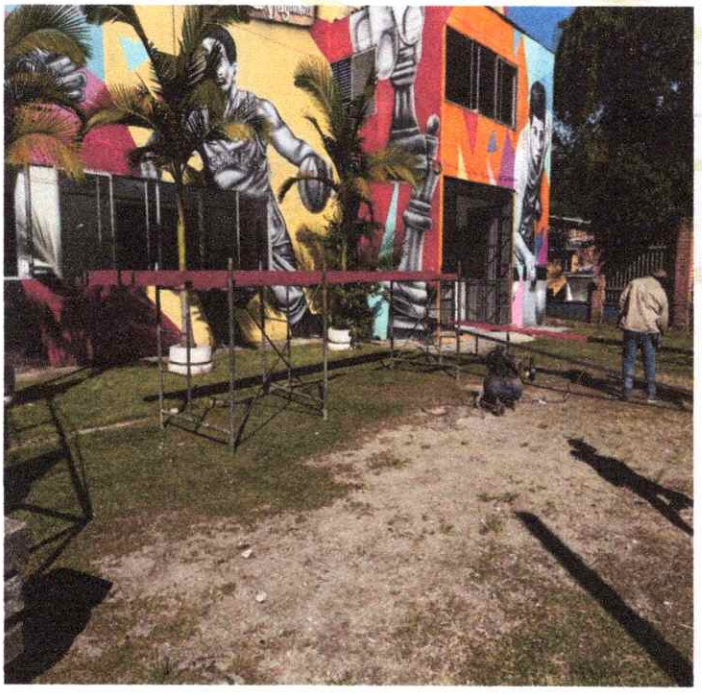
Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

GIMNASIO AL AIRE LIBRE

La estructura existente estaba hecha de guadua y zinc, durante un evento climático (fuertes vientos), este colapso por lo que se vio en la necesidad de construir una cubierta teniendo en cuenta que es un lugar muy concurrido e importante para la comunidad, aparte de que las máquinas que se encuentran allí se pueden deteriorar al sol y el agua. Se construyo una cubierta termoacústica con zapatas, columnas en concreto, estructura metalica y teja termoacústica.

	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA
	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA
	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA
	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA
	
CONSTRUCION DE CUBIERTA	CONSTRUCION DE CUBIERTA

Basico Saneamiento Ambiental S.A.S

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El supervisor del contrato la ING. NIDIA ALEXANDRA INESTROZA GOMEZ, la ING. LUISA FERNANDA VALENCIA residente de obra y el representante legal de la empresa BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL el señor CARLOS ARTURO GIL GARCIA realizan recorridos por los frentes de obra en los que se vienen ejecutando actividades, se habla de la importancia de que cuando se finalicen las actividades en determinado frente de obra se debe dejar totalmente aseado y organizado.

En el recorrido se tratan temas sobre las nuevas actividades que se deben realizar en algunos lugares críticos, como la intervención al puente de san Vicente, al puente de la cabaña, un muro de contencion en la vereda puerto rico, construcion de estructura para la cubierta del gimnasio al aire libre en el polideportivo, mejoramiento de dos viviendas del municipio, entre otras que vayan surgiendo.

En una reunión que se realizó en la oficina de obras públicas del municipio de San Carlos, se trataron temas como la adecuación de la villa olímpica, teniendo en cuenta que ahora se cuenta con iluminación y se debe contar con obras complementarias para el escenario, (cerramientos, tapas para cajas de inspección, seguridad para las torres donde están instaladas los proyectores, tala de algunos árboles, mantenimiento de obras de drenaje, entre otras.), también se deben mejorar algunas obras en las diferentes vías del municipio, (adecuación de obras trasversales, mejoramiento de puentes, construcción de muros de contencion, muros en gavion, trinchos, entre otras.) por lo que se debe realizar un balance de obra y ver si es necesario realizar alguna adición al contrato actual.

Luisa Fda Valencia H.
LUISA FERNANDA VALENCIA H.
ING. Residente de obra

CARLOS ARTURO GIL GARCIA
Representante legal
CONTRATISTA

NIDIA ALEXANDRA HINESTROZA GOMEZ
SECRETARIO (E) OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL
CONTADORA PÚBLICA
T.P 203048-T

San Carlos, Junio 28 de 2023.

CERTIFICO

Yo LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL identificada con C.C 1.036.619.399 en mi calidad de CONTADORA PUBLICA de la empresa BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S con NIT 900392450-7, manifiesto que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de las obligaciones con los sistemas de salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y los Aportes Parafiscales. (En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003). Correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2023.

La certificación se expide por solicitud del interesado.

Atentamente,

LEIDY RAMIREZ A.

LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL
C.C. 1036619399
Contadora Pública
T.P 203048-T

CALLE 22 # 19-57
CEL: 3217792980
SAN CARLOS-ANT.

LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL
CONTADORA PÚBLICA
T.P 203048-T

San Carlos, septiembre 23 de 2023.

CERTIFICO

Yo LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL identificada con C.C 1.036.619.399 en mi calidad de CONTADORA PUBLICA de la empresa BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S con NIT 900392450-7, manifiesto que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de las obligaciones con los sistemas de salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y los Aportes Parafiscales. (En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003). Por el mes de julio, agosto y septiembre del 2023.

La certificación se expide por solicitud del interesado.

Atentamente,

LEIDY RAMIREZ A.

LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL
C.C. 1036619399
Contadora Pública
T.P 203048-T

CALLE 22 # 19-57
CEL: 3217792980
SAN CARLOS-ANT.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D526B39F0E4DE09

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036619399 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 203048-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A61EE5130BCF416

LAREPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY VIVIANA RAMIREZ ARISTIZABAL** Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No1036619399 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 203048-TSI Tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NOREGISTRAANTECEDENTESDISCIPLINARIOS***

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

203048-T



LEIDY VIVIANA
RAMIREZ ARISTIZABAL
C.C. 1036619399
RES. INSCRIPCION 347 DEL 30/06/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272934 **213300**

Identificación Plástica S.A. 182942/2119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

LEIDY RAMIREZ A.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.036.619.399**

RAMIREZ ARISTIZABAL

APELLIDOS

LEIDY VIVIANA

NOMBRES



LEIDY RAMIREZ R.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1988**

SAN CARLOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-NOV-2006 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00421334-F-1036619399-20130115 **0032**126384A 1 2052095079

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-18, 09:55:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65113449

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 17/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS		
Documento	NI900392450	**Dirección**	CRA 29 N 28 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8586632
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN RAFAEL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GIL GARCIA CARLOS ARTURO	**Identificación**	CC 70751573
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP
CC 15527966	RIGOBERTO HERNANDEZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70161811	LEON GUARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70163825	ARBEY DARIO OSORIO ZULUAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70165970	FABIAN DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70166492	FABIAN ALEXIS LONDOÑO QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70166808	OLIVERIO LUIS GIRALDO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70166831	JHON FREDY QUINTANA GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70554029	JUAN DE LA ROSA CARTAGENA GARCES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70751573	CARLOS ARTURO GIL GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0
CC 7246931	FABIO DE JESUS JIMENEZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ 1.856.000	$ 464.000	$ 808.000	$ 484.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.592.000	$ 12.500	$ 3.604.500

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea I 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-28, 02:51:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65391812

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 25/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEISON ANDRES CARDONA VELASQUEZ		
Documento	CC15447289	**Dirección**	CR 78 #30 - 25 AP 406 RINCON DEL PARQUE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2975116
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP
CC 15447289	YEISON ANDRES CARDONA VELASQUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.292.760	$ 206.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.292.760	$ 161.600	0,522	$ 1.292.760	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.292.760	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.292.760	$ 1.292.760	$ 1.292.760	$ 1.292.760	$ 206.900	$ 161.600	$ 6.800	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 0	$ 383.100

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea I 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-31, 12:52:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64839515

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 30/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEISON ANDRES CARDONA VELASQUEZ		
Documento	CC15447289	**Dirección**	CR 78 #30 - 25 AP 406 RINCON DEL PARQUE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2975116
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP
CC 15447289	YEISON ANDRES CARDONA VELASQUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.292.760	$ 206.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.292.760	$ 161.600	0.522	$ 1.292.760	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.292.760	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.292.760	$ 1.292.760	$ 1.292.760	$ 1.292.760	$ 206.900	$ 161.600	$ 6.800	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 0	$ 383.100

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea l 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-09-15, 11:46:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 65678528

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-09-13

GUARDADA 12/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS				
Documento	NI900392450	**Dirección**	CRA 29 N 28 21		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8586632		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	SAN RAFAEL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL GARCIA CARLOS ARTURO	**Identificación**	CC70751573		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	A
CC 7248931	JIMENEZ LOPEZ FABIO DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 15527966	HERNANDEZ QUINTERO RIGOBERTO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70161811	GUARIN LEON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70163825	OSORIO ZULUAGA ARBEY DARIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70165970	HERNANDEZ HERNANDEZ FABIAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70166492	LONDOÑO QUINTERO FABIAN ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70166808	GIRALDO GARCIA OLIVERIO LUIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70166831	QUINTANA GUZMAN JHON FREDY	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70554029	CARTAGENA GARCES JUAN DE LA ROSA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 70751573	GIL GARCIA CARLOS ARTURO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESE
$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ 1.856.000	$ 0	$ 0	$ 464.000	$ 808.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.592.000	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S

NIT: 900392450-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 29 28 21, San Rafael, Antioquia, Colombia

Tel. 3117334771

Email. basicosas@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044291946 válida desde 2023-02-10 hasta 2024-02-10 rango desde BSA23 hasta BSA5000.

Cliente:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT :	890983740-9
Dirección:	CALLE 19 # 18-71, San Carlos, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8358090
Email:	alcaldia@sancarlos-antioquia.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**BSA27**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:59:34**
FECHA FIRMADO:	**24/09/2023 17:59:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	ACTA DE AVANCE N°2 PAGO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACION Y EMBELLECIMIENTO, QUE GARANTICEN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES URBANAS RURALESDEL MUNICIPIO.	WSD	1,00	$73.305.350,00		0,00	$73.305.350,00

Notas:

SON: (setenta y tres millones trescientos cinco mil trescientos cincuenta pesos)

CUFE: 414d33912ee3fb7b40b8adbceab17e7dc3ab2c7fe0ab18a15ac4c85ea14565a800c2e05338c2933637d667bac72fd3fa

Subtotal:	$73.305.350,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$73.305.350,00

Firma Digital: b8RPaImHNJQe6/WdvSgltrhx5i1MVfYaW73AtRlxlm5YpiJewY6sKhkx06ysa9qb XY5mZv97tBQbPAsifXxF0pBQs65CzcUkw1rbs1eczOJji5mh4L 7bC2UUJbR7EFtp INzpcXJheGezvf/s9PXZXjMin8OKsm6jVt1EHJjgXbk+UnuVRzle4tcgVgbX3kM1 +UWYjlDlrxgAXo1IfPF17PDeNPBdinlOvSR riqcoe3udbgjMtbl01AlVkm6Q/94C 9vRGehz3i5FdMICIwvP/VdXJ03Yb2WZmlHtH54XJkfNdhUlM7XkGD7DjgdaN7rOA 4b0l6mmvty9LoFMSRUPZ DA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
