INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023



Proyecto

REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR)."

1. GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No	: CO1.PCCNTR.4332011 No 323 del 29 de diciembre de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBICA No. 10 de 2022
CONTRATISTA	: CONSORCIO JUDICIALES (Integrante 1- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN 29%, Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33%- Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%)
OBJETO	: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)
VALOR DEL CONTRATO	: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.420.492.192) Incluido impuestos y contribuciones de Ley.
PLAZO INICIAL	: TREINTA Y CINCO (35) MESES
FECHA DE INICIO	: 11 DE ENERO DE 2023
FECHA FINAL	: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción de las obras en general

Obras

1. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Descripción**

En este séptimo informe se describe de manera detallada del control técnico administrativo de las actividades ejecutadas a la fecha por parte del Consorcio Obras Judiciales para *REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)*

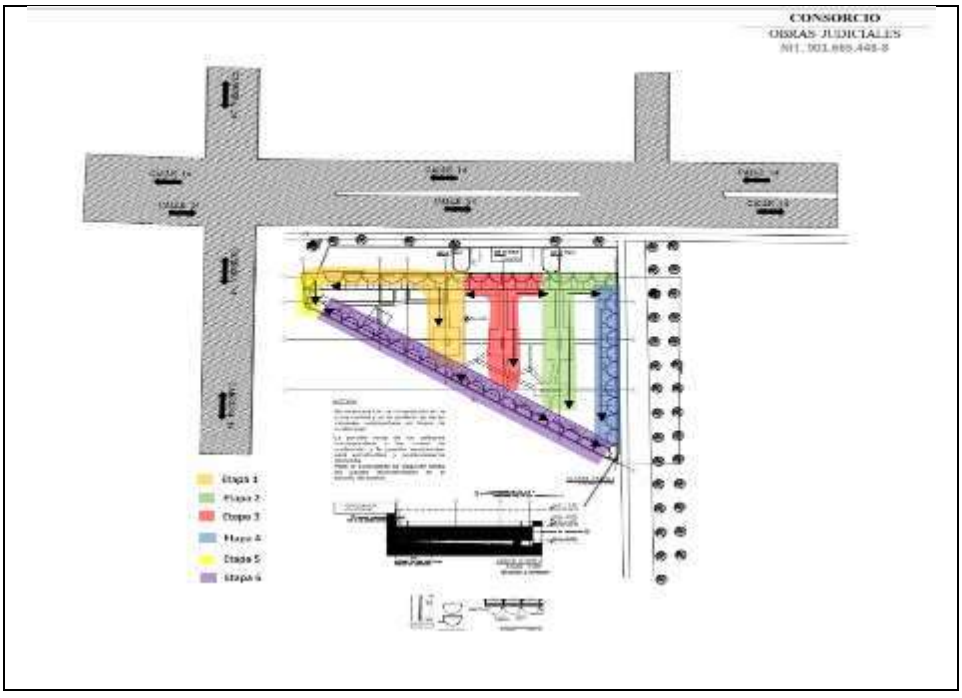


Figura. 1: Implantación construcción caisson

2. ANTECEDENTES

En las instalaciones del Palacio de Justicia, en esta etapa se están realizando las actividades de trazado y construcción de los caisson; trazado y construcción de cimentaciones.

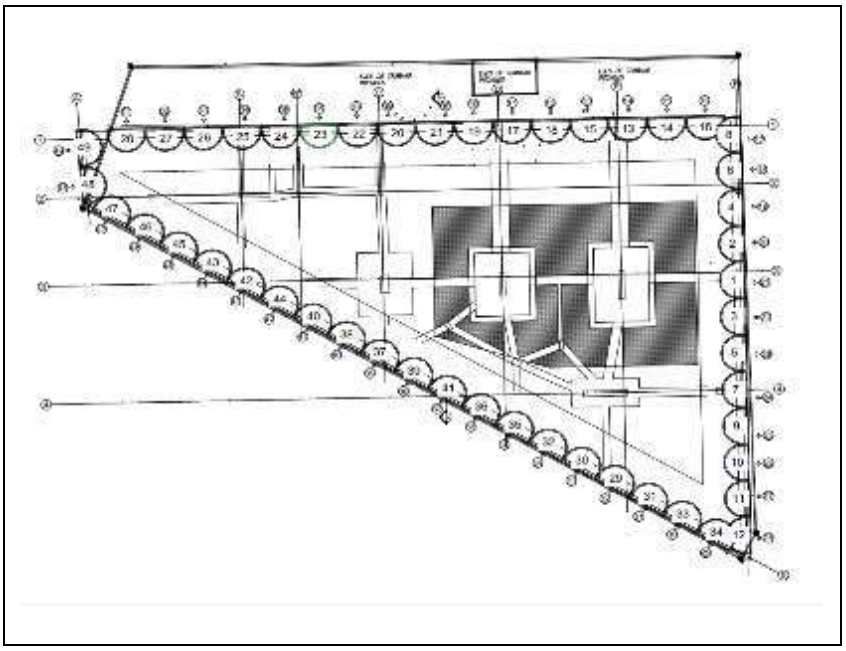


Figura. 2: Implantación sistema de caisson y estructura

3. INFORMACION GENERAL:

En este informe se encontrará información sobre el proceso y estado actual del Contrato de CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR). Ejecutado por el Consorcio Obras Judiciales

Con fecha 11 de enero de 2022 se firma el acta de inicio de Obras con Consorcio obras judiciales en calidad de contratista con su representante legal Julio Roberto Balbuena Alarcón, el señor Néstor Camilo Artunduaga Ávila como representante legal del consorcio Intervalledupar 2022 en calidad de interventoría externa y el arquitecto Jorge Enrique Fernández Becerra profesional universitario grado 20 del grupo de proyectos especiales de infraestructura de la dirección ejecutiva de administración judicial en calidad de coordinador de proyecto y la señora Ángela Aránzazu Montoya coordinadora grupo de proyectos especiales de infraestructura.

Se posesiona de parte del Consorcio Obras Judiciales al Ingeniero Julián Andrés Cogollo como Representante legal.

Que mediante Otro Si #1 con fecha 22 de febrero de 2023, el Consorcio Obras Judiciales delega al Señor Víctor Anderson Valbuena Quiroga como nuevo Representante Legal del Consorcio, y al Señor Julián Andrés Cogollo y al Señor Sergio Sereda Martínez como Representantes Suplentes del Consorcio.

Dificultades Presenciadas Durante el Desarrollo del Contrato

En el transcurso del mes agosto de 2023 el desarrollo del proyecto ha tenido que esperar los tiempos de la empresa prestadora de Servicios Públicos. AFINIA que como empresa encargada de las conexiones de provisionalidad para el desarrollo del proyecto. Se realizó el respectivo tramite y hasta la fecha estamos en el proceso de Instalación.

- AFINIA EPM. Prestadora del servicio de Energía eléctrica.

El nivel freático ha entorpecido los avances en la cimentación, haciendo necesario el mejoramiento de suelos a través de concretos ciclópeos. Adicional el uso de moto bomba para el manejo de las aguas subterráneas y no comprometer la calidad de ejecución en las labores contractuales.

Se ajusta el proceso constructivo dadas las condiciones presentadas en el terreno, siendo más dispendiosas que lo planteado inicialmente.

3.1 SITUACIÓN DE LA OBRA.

Al finalizar el 31 de agosto 2023, las actividades del Proyecto han progresado como a continuación se describe:

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO.
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE CONCRETO QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA ELEMENT - INCLUYE LA CONFORMACION DE TALUDES Y TRINCHERAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MANUAL CAISSONS CONSTRUCTIVOS
EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
PERFILADA FONDO DE EXCAVACION ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
BASES EN CONCRETO CICLOPEO TIPO_1 3000 PSI - 60% RAJON 40% CONCRETO - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
ZAPATAS EN CONCRETO TIPO_1 5000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE CAISSON EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI INCLUYE POSTERIOR DEMOLICION - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO Y MANEJO DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE TALUDES SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
ASEO GENERAL

3.2 CONTROLES DE OBRA

Controles Generales de procesos

De acuerdo con el desempeño de las actividades y procesos que se llevan a cabo para asegurar que los objetivos de la empresa y las obras contractuales sean alcanzados.

3.3 CONTROLES TÉCNICOS

Se cumple con las especificaciones técnicas en las ejecuciones de actividades realizadas a la fecha cumpliendo con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas. Se realizan actas de liberación de los elementos intervenidos.

3.4 Controles Generales

Se realiza el seguimiento al cronograma contractual, se está monitoreando semanalmente el avance de los trabajos, sin embargo, es necesario ajustarlo dadas las variaciones presentadas en campo.

3.5. Controles Generales de Subcontratistas

El porcentaje de los trabajos son realizados por personal de mano de obra calificada, siendo únicamente un subcontratista principal que viene desarrollando trabajos de excavación y retiro de material.

3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- Se realiza levantamiento topográfico para la ubicación y verificación de ejes estructurales del proyecto

EXCAVACION MANUAL Y A MAQUINA

- Excavación para caisson, sótano, vigas y zapatas principales.

ARMADO DE ACERO

- Armado y figurado de acero manual para caisson, armado de aceros para zapata Z-7, Z-8, columna E-3 y F-3, vigas 02, 05, 06 y 012.

CONSTRUCCION DE CAISSON

- Suministro e instalación de anillos de caisson en concreto tipo_1 3.000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

FUNDICION DE CIMENTACIONES

- Zapatas en concreto de baja permeabilidad 5000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento).

CONDICIONES CLIMATICAS

- Durante la ejecución de las obras correspondientes al mes de agosto de 2023 se presentaron días de lluvia; impidiendo la ejecución de las actividades durante 45 HH/m.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO														X																	

PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, Consorcio Obras Judiciales utilizó el siguiente personal:

PERSONAL	CANT.	ACTIVIDADES REALIZADAS
Director	1	Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, dirección de obras, administración de materiales.
Arq. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.

Ing. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Auxiliar Administrativo	1	Actividades administrativas, compras, recepción de Documentos, etc.
Residente SST	2	Actividades de seguridad y salud en el trabajo

CONTRATISTA TOPOGRAFÌA

Topógrafo	1	Trazado y levante de ejes estructurales
Auxiliar de topografía	1	Ayudante trazado y levante de ejes estructurales demolición de muros y retiro de materiales

CONTRATISTA EXCAVACION.

Operario maquinaria	1	Excavación mecánica.

MATERIALES UTILIZADOS.

- Acero
- Alambre negro
- Tablas
- Cemento UG
- Arena
- Gravilla

EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos usados para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fueron las siguientes:

- Tronzadora.
- Taladro.
- Mezcladora de concreto
- Herramientas menores
- Volquetas.
- Excavadora.
- Mixer.
- Bombas de succión de lodos.

4. CONTROL DE ACTIVIDADES

4.1 Actividades Realizadas

- Se realizó revisión completa de los contratos en el mes, tiempo de entrega, revisión de actividades, ajuste de programación de instalación de actividades a realizar.
- Se ha supervisado que se inicie cada actividad con los respectivos implementos de seguridad.
- Se lleva un control del proceso constructivo de cada actividad en todas las obras supervisadas.

- Elaboración de registros fotográficos de todas las actividades desde su inicio en el transcurso de las mismas.
- Revisión de entrega y revisión física de cantidades de obra ejecutada.
- Revisión y supervisión de los materiales utilizados en la obra.
- Se supervisa que se trabaje con las herramientas adecuadas en los procesos constructivos de las obras.
- Se controla que se mantenga despejado y limpio el área de trabajo para no crear congestión o traumas en el tiempo y espacio del desarrollo del contrato.
- De cada actividad en la construcción de las obras, el control de actividades está basado en la revisión de cada ítem y de las medidas de cada ítem en el desarrollo de las obras.
- Todo se está llevando de acuerdo con las normas de la construcción y las especificaciones técnicas.

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace la relación de las actividades administrativas realizadas por el Consorcio Obras Judiciales en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2023:

- Comités de obra: Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento de obra:
- 04 de agosto de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 28 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ.
- 11 de agosto de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 29 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 17 de agosto de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 30 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 18 de agosto de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 31 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

- Bitácora: Se ha diligenciado normalmente la bitácora de obra del proyecto por parte de interventoría

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se presentan mayores tiempos de ejecución a los contemplados en cronograma en las actividades de excavación por la cantidad y tamaño de roca encontrada en el terreno, además de ser mayor la cantidad real a ser retirada del sitio.
- El proceso constructivo es más complejo de lo planteado en los planos y documentos entregados, haciendo más lentos los avances en sitio.
- Debido a los cambios de algunos materiales necesarios y previos a la fundición de cimentaciones, dichas actividades están presentado retrasos.

- Se radica factura acta parcial No. 2 ajustada.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

No. O.P.	Fecha	Valor Factura	Concepto
1	2022/12/29	$ 9.884.098.438	Anticipo 20%
DESEMBOLSO	2023/02/13	$ 9.884.098.438	Anticipo 20%
FE 04	2023/06/28	$ 99.782.870,00	Acta 01

Nota: Ver en anexo reporte de rendimientos financieros del desembolso

7. CORREPONDECIA ENVIADA

8/1/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 331	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO INFORME SST MES DE JULIO 2023
8/1/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 332	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO INFORME AMBIENTAL MES DE JULIO 2023
8/2/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 333	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESPUESTA OFICIO No. 105 CONDICIONES INSEGURAS Y FALTA DE SUMINISTROS DE EPP
8/2/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 334	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA No.3 DE RELACIÓN DE FACTURAS PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO
8/3/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 335	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESPUESTA OFICIO No. CSJ-107-2023 DE ASUNTO "APREMIO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE COMITE Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL DIRECTOR DE OBRA" DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023
8/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 336	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME VISITA TECNICA - ELECTRICO
8/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 337	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN
8/9/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 338	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLAN DE TRABAJO EN ZONA DE ZAPATA Z-7
8/9/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 339	ARQ. FERNANDO PENAGOS ZAPATA	SOLICITUD DE FACTIBILIDAD EN LA REUBICACIÓN TANQUES DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y AGUA POTABLE
8/9/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 340	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	MEDICIÓN DE FLUJOS NIVEL FREATICO
8/16/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 341	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA CONCEPTO HIDRAULICO

8/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 342	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RTA COMUNICADO CSI-100-2023 Y CSI-106-2023
8/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 343	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD RELACION DE PROVEEDORES GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS APROVECHABLES
8/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 344	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA SUBTERRANEA
8/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 345	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLAN DE ACCIÓN TECNICO
8/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 346	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS RESOLUCIÓN 0017 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 EXPEDIENTE CG-RNEEAP 012-2023
8/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 347	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OBJ-PLJ-COJ-002-23
8/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 348	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023 - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
8/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 349	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	HALLAZGO EN LOS FOSOS DE LOS ASCENSORES
8/17/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 350	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA SST
8/16/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 351	SECTOR ASEGURADOR	CARTA DE NO SINIESTRO OBJ-PLJ-COJ-002-2023
8/16/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 352	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	VISITA GEOTECNICA 4 DE AGOSTO 2023
8/16/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 353	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RTA CON AJUSTE AL LISTADO No. 002 DE ACTIVIADES NO PREVISTAS
8/17/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 354	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OBJ-PLJ-COJ-002-23 ACTA DE RECIBO FINAL
8/18/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 355	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OBJ-PLJ-COJ-002-23 ACTA DE CESIÓN
8/18/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 356	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL AL DIA - CONTRATISTA ANILLOS DE SEGURIDAD
8/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 357	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023 - CONTRATISTA JER TOPOGRAFIA

8/22/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 358	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OBJ - PLJ - COJ - 002 - 23
8/22/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 359	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA CONCEPTO ELECTRICO Y DATOS
8/23/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 360	JOHAN ALEXANDER MARIN SANTANA	ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-026-23
8/23/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 361	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES AL LISTADO No.002 DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS
8/24/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 362	RAMON DE LA CRUZ ASCANIO ROCHA	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE MAQUINARIA
8/24/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 363	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN RESOLCUCIÓN 0017 DEL 28 DE FREBRERO DEL 2023
8/24/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 364	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA ACTUALIZACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO
8/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 365	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FACTURA ACTA DE CORTE DE OBRA No.2
8/28/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 366	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
8/29/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 367	MARLON EDUARDO BOADA PALOMINO	TERMINACIÓN UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO
8/30/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 368	SODIMAC COLOMBIA SA	AUTORIZACION DE APLICACION DE RECURSOS A CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
8/31/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 369	SANDRA PATRICIA GALEANO LOPEZ	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJ-PLJ-COJ-003-2023

8. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÀFICO	
	
Excavación caisson	Armado de acero para caisson
	
Excavación caisson	Demolición estructura existente

	
Excavación caisson	Manejo de agua freática
	
Excavación caisson.	Encofrado caisson

	
Excavación caisson	Manejo de agua freática
	
Perfilada de fondo Z-7	Excavación manual de terreno.

	
Fundición ciclópeo Z-7	Armado de acero zapata Z-7.
	
Armado acero vigas 02, 12 y columna E-3	Fundición zapata Z-7.

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JULIO DEL 2023

FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 112122

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 1/25/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006315

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSTRUCCI¨N NUEVA TORRE P

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	7,476,029,893.43	*SALDO PROMEDIO*	$	7,391,258,186
TOTAL ABONOS	$	9,758,853.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	196,237,113.66	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,689,755.69
SALDO ACTUAL	$	7,289,551,633.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,601,469.76	7,478,631,363.19
18/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	7,478,630,106.85
18/07	PAGO A PROV CONSTRUCCIONES Y C			-190,403,400.00	7,288,226,706.85
18/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-761,619.58	7,287,465,087.27
18/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	7,287,464,848.56
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,044,068.28	7,288,508,916.84
25/07	PAGO NO APLICADO DIRECCION DEL			5,069,098.00	7,293,578,014.84
25/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.34	7,293,576,758.50
25/07	PAGO A PROV DIRECCION DEL TESO			-5,069,098.00	7,288,507,660.50
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.98	7,288,507,654.52
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	7,288,507,415.81
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,044,217.65	7,289,551,633.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

112122 - FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 15

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 31/08/2023 Fecha de Registro de la Orden: 31/08/2023 Fecha de Pago: 01/09/2023

Proveedor: 899999090 - 2 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Teléfono:

Tipo de Retención: Gran Contribuyente Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_522646-GIRO DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES JULIO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	522646	31/08/2023	4,689,755.69

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,689,755.69	0.00	0	4,689,755.69

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		4,689,755.69	0.00	0.00
	Totales		4,689,755.69	0.00	0.00

Valor a Girar: 4,689,755.69

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 15 Periodo: 202308

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999090 - 2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4,689,755.69	
25110501001	PROVEEDORES			899999090 - 2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		4,689,755.69
						4,689,755.69	4,689,755.69

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901 665 448-8

FORMATO DE LIBERACION DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

FECHA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRERA 14 CON CALLE 14

CONTRATO DE OBRA No: 323 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

ACTIVIDAD: Armado y Vaciado de la Zapata (Z7)

OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACIONES
CONCRETO DE LIMPIEZA	✓			Concreto Ciclopeo ✓
DISTANCIAMIENTO DE LOS REFUERZOS EN ACERO	✓			De acuerdo a los planos Estruc
CALIBRE DEL ACERO DE REFUERZO	✓			De acuerdo a los planos Estruct
RECUBRIMIENTO DEL ACERO	✓			De acuerdo a los planos Estruct
PANELAS DE DISTANCIAMIENTO	✓			De acuerdo a los planos Estruc
ARMADO DE FORMALETA	✓			Segun dimensiones Z-7.
TIPO Y RESISTENCIA DE CONCRETO				5000 psi. impermabilizado
PRUEBA DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO				Zapata Z7
TIPO DE ELEMEMENTO A FUNDIR	✓			Zapata Z7
DIMENSIONES DEL ELEMENTO	✓			6.60 x 4.60 x 1.60m.
EQUIPO DE VIBRADO DEL CONCRETO				Vibrador eléctrico (2 un).
MATERIAL DE CURADO UTILIZADO				
TIPO DE ACABADO	✓			Elemento enterrado
EQUIPO DE COLOCACION DEL CONCRETO				Bomba estacionaria.
TIPO DE CURADO DEL CONCRETO				
MUESTRAS DE CONCRETO REALIZADAS				

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	Ing. Emiri Larios - Residente de obra	Ing. Jimmy Peña - Director de obra
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Inspector Miguel Angel Ngarin	Arq. Alejandra Gómez - Residente interventoria

Powered by CamScanner

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR

HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

FECHA: 16/08/2023

COD.CLIENTE: G024

RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	RESIST.	RESIST.	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
		DIAS	PSI	(KG/CM^2)				
9-ago	16-ago	7	3414	239	NO REPORTA	ZAPATA Z-7 CICLOPEO	Cono	
9-ago	16-ago	7	3422	240			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.

NOTA 2: De acuerdo con el artículo D.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

Sede operativa: Diagonal 20B # 18B - 63 Local #2 Tel: 3173310685 - Valledupar
E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR

HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

FECHA: 28/08/2023

COD.CLIENTE: G024

RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	RESIST.	RESIST.	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
		DIAS	PSI	(KG/CM^2)				
9-ago	23-ago	14	3675	257	NO REPORTA	ZAPATA Z-7 CICLOPEO	Cono	
9-ago	23-ago	14	3634	254			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.

NOTA 2: De acuerdo con el artículo D.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

INFORME TOPOGRAFICO DEL CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR-CESAR”.

AGOSTO 2023

TOPOGRAFO

JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ

CC. 1065580756

VALLEDUPAR CESAR

VALLEDUPAR 2023

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LOCALIZACION
4. ORGANIZACION
5. PERSONAL Y EQUIPOS
6. ASPECTOS TECNICOS
7. CONDICIONES LABORALES
    a. Condiciones climaticas
    b. Condiciones de orden publico
    c. Condiciones tecnicas
8. ACTIVIDADES DE CAMPO
9. ANEXOS FOTOGRAFICOS

1. GENERALIDADES

A continuación, se presenta un informe técnico detallado donde se describen las principales actividades realizadas necesarias para lograr un desarrollo de acuerdo con los diseños arquitectónicos y estructurales de la nueva torre y dotación del Palacio de Justicia del municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

2. OBJETIVOS

- Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de información usando equipos (Nivel de precisión, Estación total de alta precisión)
- Localizar con precisión el área haciendo los amarres en coordenadas y cotas, y la edición de planos topográficos definitivos al diseño a realizar.

3. LOCALIZACION

Este proyecto arquitectonico se encuentra ubicado en el municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar en la dirección Calle 14 Nro. 14-189, esquina.

A continuación, se presenta una imagen general del predio objeto de proyecto.

4. ORGANIZACION

Las actividades topográficas fueron realizadas por el topógrafo Joel Enrique Rocha Wilches; quien tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades:

- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y oficina.
- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de cálculos de volúmenes

5. PERSONAL Y EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades de campo se conformó un (1) grupo de topografía los cuales fueron encargados de suministrar y tomar la información pertinente en base a los diseños estructurales y arquitectónicos del objeto en ejecución.

La comisión de trabajo se conformó por el siguiente personal y equipos:

Personal

- Un (1) topógrafo
- Un (1) cadenero primero
- Un (1) cadenero segundo

Equipos

- Una (1) estación total (marca stonex)
- Un (1) nivel de precisión (marca topcon AT-B4)
- Herramientas menores (Estacas, puntillas, cincel, flexómetro, etc)

6. ASPECTOS TECNICOS

- **Complementación técnica:** Esta comisión de topografia establecio los controles pertinentes de cada estructura ejecutada durante este periodo.
- **Inspección de Obra:** Inicialmente la comision de topografia realiza el control de las actividades en el frente de trabajo, revisando que estas cumplan con las especificaciones tecnicas y constructivas del proyecto.

7. CONDICIONES LABORALES

- **Condiciones Climaticas:** En general, el desarrollo de la obra se ha dado en unas condiciones climaticas optimas aunque se han presentado precipitaciones pero no han afectado a la obra, solo se suspende mientras se presenta dichas precipitaciones.
- **Condiciones de Orden Publico:** No se ha presentado problema alguno en lo referente al orden publico con la ejecucion de los trabajos.
- **Condiciones Tecnicas**: Las obras se desarrollan según las instrucciones dadas por el director y el residente de obra contando con la participacion de la comision de topografia.

  Se estan ejecutando las actividades descritas con las caracteristicas indicadas en los respectivos pliegos de condiciones y especificaciones constructivas entregadas al contratista de obra, con las respectivas cotas y lineamientos.

  A continuacion se encuentra descrita la continuidad de las actividades ralizadas durante el desarrollo de la obra teniendo en cuenta la fecha de inicio ejecucion del proyecto.

8.ACTIVIDADES EN CAMPO

- **Replanteo**: Se procede a hacer las localizaciones de las zapatas Z-7 y Z-8 y de la columna C-3 de acuerdo con los diseños estructurales del proyecto.

  - Localizacion de Zapatas Z-7





  - Localizacion de Zapatas Z-8





- Localización de la columna C-3





➢ **Excavaciones**: Se avanzan las excavaciones de caisson en sus distintos niveles.

- Avance de excavaciones de caisson.





- **Fundida:** Se avanza en el armado de hierro y fundida de anillos de los caisson, fundida del ciclopeo y la zapata Z-7

  - Fundida anillos de Caisson.





  - Fundida del ciclopeo de la zapata Z-7.





- Fundida de la zapata Z-7





➢ **Niveles:** Se realiza la nivelacion de las excavaciones de Caisson,ciclopeo y zapata Z-7.

- Nivelacion de Caisson





- Nivelación del ciclópeo de la zapata Z-7





- Nivelación de zapata Z-7





- **Levantamientos topográficos:** Se realiza el levantamiento respectivo de las escaleras exteriores por el lado oriental del edificio existente, con el fin de proyectar la ubicación de los nuevos tanques de almacenamientos y de igual manera se realiza el levantamiento para el cálculo del volumen de excavación.

  - Levantamiento de las escaleras existentes.





  - Levantamiento topográfico en excavación.






- **Verticalidad:** Se verifican los puntos posesionados en la edificación existente, con el fin de revisar si la edificación está teniendo algún asentamiento a causas de las excavaciones realizadas en obra.











Fecha: 31/08/2023		CARTERA DE CONTROL DE VERTICALIDAD EDIFICACION PALACIO DE JUSTICIA EXISTENTE						
Número de punto	**Norte**	**Este**	**Ordenada de rejilla**	**Abscisa de rejilla**	**Latitud**	**Longitud**	**Elevación**	**Descripción completa**
1	1650194.203	1090345.242	1650194.203	1090345.242	N10° 28' 27.2''	W73° 15' 8.24''	187.711	E-06
2	1650205.584	1090363.47	1650205.584	1090363.47	N10° 28' 27.57''	W73° 15' 7.64''	187.861	E-07
3	1650179.123	1090339.813	1650179.123	1090339.813	N10° 28' 26.71''	W73° 15' 8.42''	188.218	P-1
4	1650181.135	1090369.808	1650181.135	1090369.808	N10° 28' 26.78''	W73° 15' 7.43''	188.214	P-2
5	1650181.745	1090378.998	1650181.745	1090378.998	N10° 28' 26.8''	W73° 15' 7.13''	188.199	P-3
6	1650182.609	1090392.018	1650182.609	1090392.018	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.7''	188.2	P-4
7	1650183.212	1090400.948	1650183.212	1090400.948	N10° 28' 26.84''	W73° 15' 6.41''	188.191	P-5
8	1650179.814	1090350.245	1650179.814	1090350.245	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.07''	192.214	P-6
9	1650181.418	1090373.985	1650181.418	1090373.985	N10° 28' 26.79''	W73° 15' 7.29''	192.276	P-7
10	1650180.818	1090365.154	1650180.818	1090365.154	N10° 28' 26.77''	W73° 15' 7.58''	198.739	P-8
11	1650182.623	1090392.124	1650182.623	1090392.124	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.7''	198.76	P-9
12	1650179.851	1090350.49	1650179.851	1090350.49	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.07''	198.728	P-10
13	1650179.843	1090350.213	1650179.843	1090350.213	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.08''	208.623	P-11
14	1650181.437	1090374.044	1650181.437	1090374.044	N10° 28' 26.79''	W73° 15' 7.29''	208.572	P-12
15	1650182.458	1090389.314	1650182.458	1090389.314	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.79''	208.548	P-13
16	1650170.798	1090346.505	1650170.798	1090346.505	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.08''	204.897	P-14
17	1650165.642	1090364.601	1650165.642	1090364.601	N10° 28' 26.79''	W73° 15' 7.29''	204.838	P-15
18	1650170.78	1096346.521	1650170.78	1096346.521	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.79''	191.298	P-16
19	1650165.672	1090364.666	1650165.672	1090364.666	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.08''	191.208	P-17

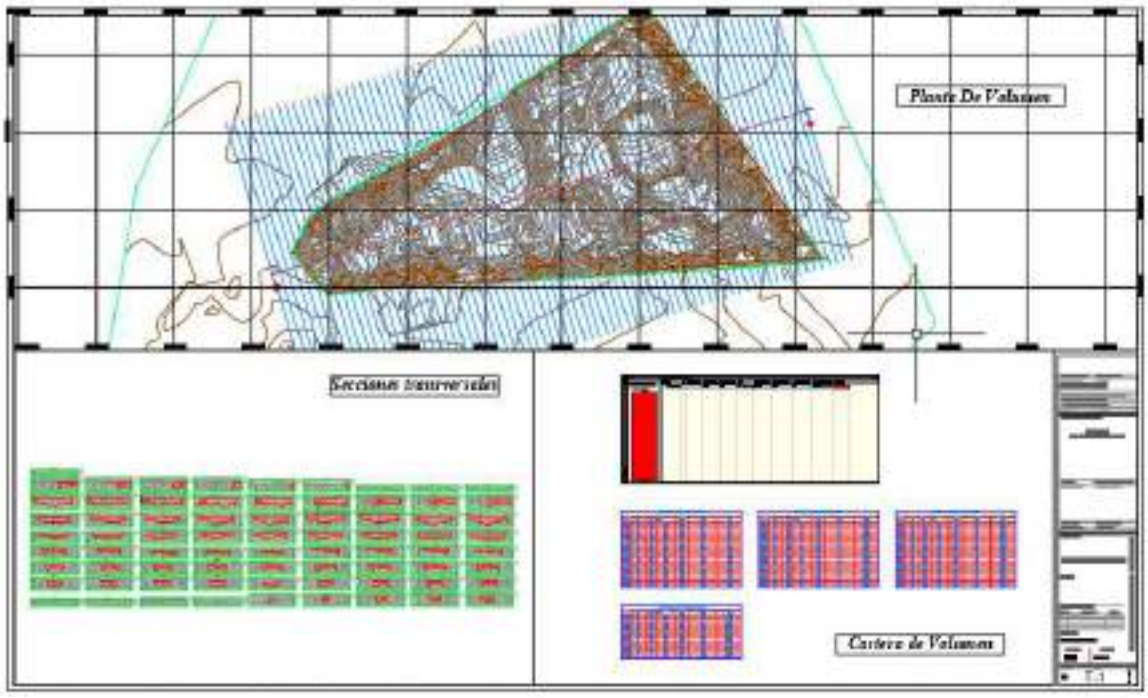
Planta De Volumen
Secciones transversales
Cortes de Volumen

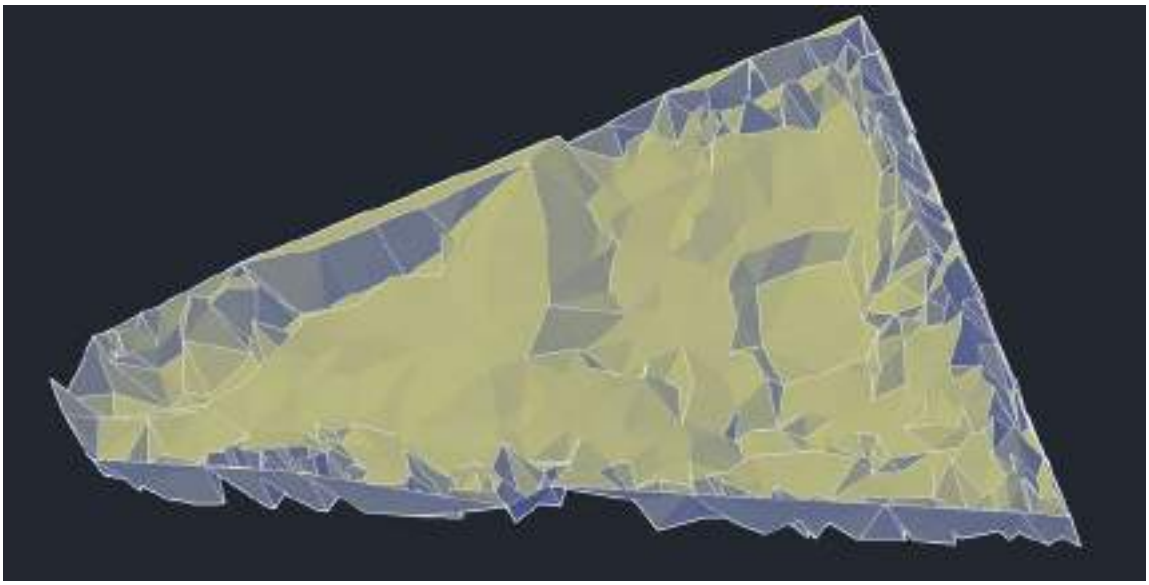

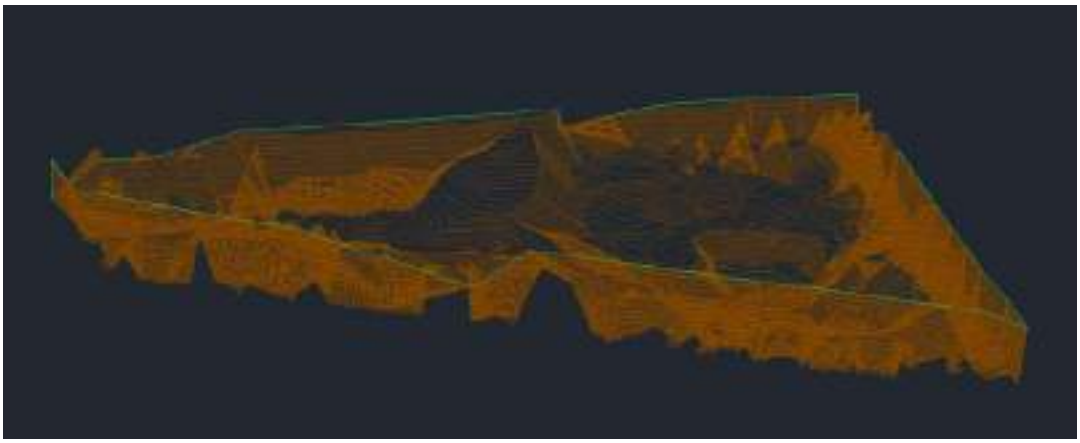

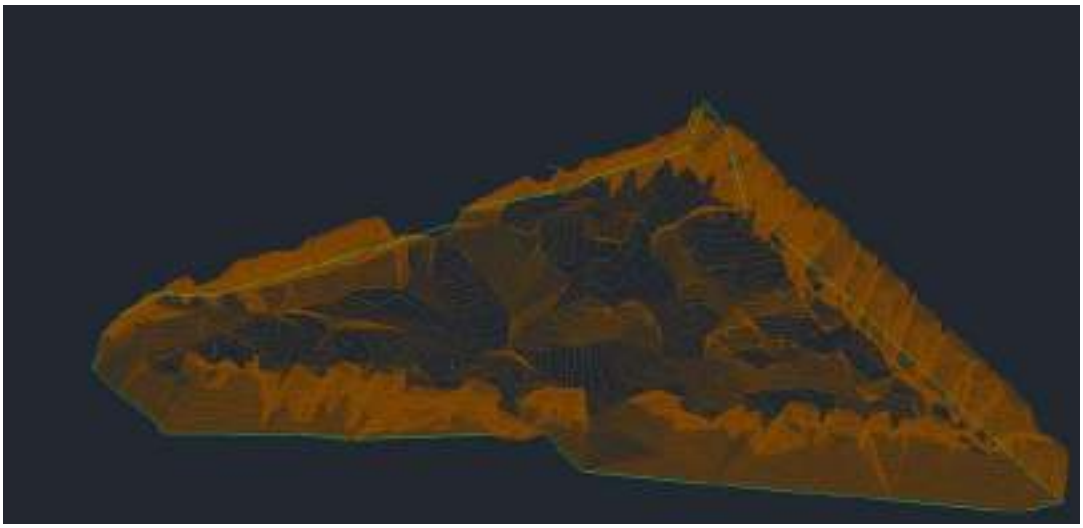

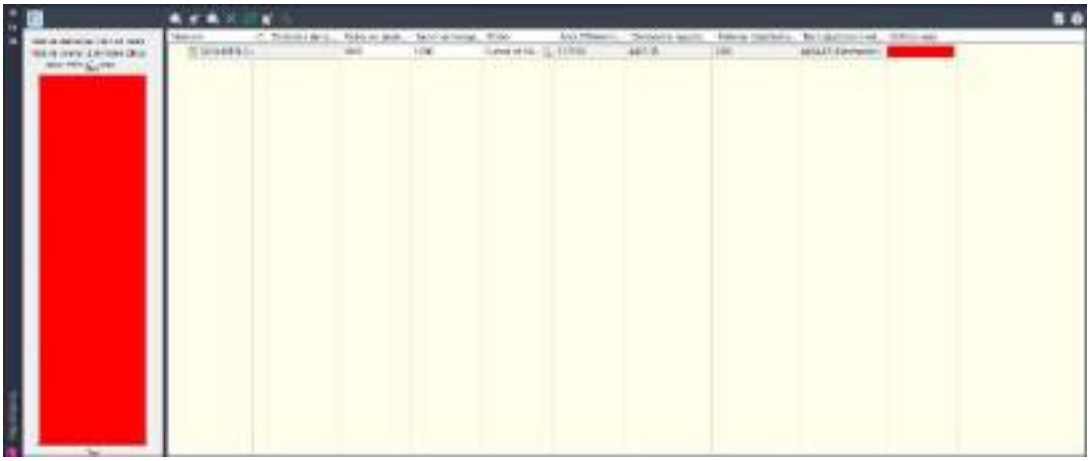







INFORME CARTERA DE CALCULO DE VOLUMEN

to: EDIFICIO RAMA JUDICIA DE VALLEDUPAER

Alineación: EJE_AGS-28-23
Grupo de líneas de muestreo: EJE_AGS-28-23 -
P.K. inicial: 0+000.000
P.K. final: 0+071.886

VOLUMEN DE EXCAVACION DE AVANCE 28_08_2023

P.K.	Área de desmonte (m2)	Vol. desmonte acumul. (m2)	Vol. reutilizable acumul. (m3)	Vol. neto acumul. (piesm3)
0+000.000	0	0	0	0
0+001.000	0	0	0	0
0+002.000	0	0	0	0
0+003.000	0	0	0	0
0+004.000	4.89	2.44	2.44	2.44
0+005.000	16.94	13.35	13.35	13.35
0+006.000	30.33	36.99	36.99	36.98
0+007.000	34.18	69.24	69.24	69.21
0+008.000	39.45	106.05	106.05	106
0+009.000	43.1	147.33	147.33	147.25
0+010.000	47.99	192.87	192.87	192.77
0+011.000	46.24	239.99	239.99	239.87
0+012.000	44.68	285.45	285.45	285.31
0+013.000	41.69	328.63	328.63	328.47
0+014.000	41.72	370.33	370.33	370.16
0+015.000	45.46	413.92	413.92	413.73
0+016.000	35.04	454.17	454.17	453.93
0+017.000	40.52	491.95	491.95	491.6
0+018.000	45.22	534.81	534.81	534.28
0+019.000	41.65	578.25	578.25	577.52
0+020.000	44.86	621.51	621.51	620.64
0+021.000	45.3	666.59	666.59	665.68
0+022.000	46.49	712.48	712.48	711.57
0+023.000	44.69	758.07	758.07	757.16
0+024.000	44.32	802.57	802.57	801.66
0+025.000	43.51	846.49	846.49	845.58
0+026.000	50.34	893.41	893.41	892.5
0+027.000	52.98	945.07	945.07	944.16
0+028.000	47.59	995.35	995.35	994.44
0+029.000	39.95	1039.12	1039.12	1038.21
0+030.000	36.74	1077.46	1077.46	1076.55
0+031.000	34.85	1113.25	1113.25	1112.34
0+032.000	41.65	1151.5	1151.5	1150.59
0+033.000	39.75	1192.2	1192.2	1191.29
0+034.000	34.12	1229.13	1229.13	1228.21
0+035.000	36.1	1264.25	1264.25	1263.3
0+036.000	44.33	1304.46	1304.46	1303.46
0+037.000	58.2	1355.73	1355.73	1354.68
0+038.000	74.51	1422.09	1422.09	1421.01
0+039.000	87	1502.84	1502.84	1501.74
0+040.000	93.92	1593.3	1593.3	1592.16
0+041.000	102.52	1691.52	1691.52	1690.36
0+042.000	105.03	1795.29	1795.29	1794.1
0+043.000	104.61	1900.12	1900.12	1898.89
0+044.000	107.84	2006.34	2006.34	2005.08
0+045.000	115.26	2117.89	2117.89	2116.59
0+046.000	123.3	2237.17	2237.17	2235.82
0+047.000	132.5	2365.07	2365.07	2363.65
0+048.000	140.98	2501.81	2501.81	2500.33
0+049.000	152.51	2648.55	2648.55	2647.02
0+050.000	156.26	2802.94	2802.94	2801.36
0+051.000	154.36	2958.25	2958.25	2956.63
0+052.000	159.03	3114.95	3114.95	3113.28
0+053.000	159.6	3274.26	3274.26	3272.54
0+054.000	152.93	3430.53	3430.53	3428.73
0+055.000	149.12	3581.56	3581.56	3579.65
0+056.000	142.11	3727.17	3727.17	3725.19
0+057.000	130.57	3863.51	3863.51	3861.47
0+058.000	114.89	3986.24	3986.24	3984.14
0+059.000	91.89	4089.63	4089.63	4087.46
0+060.000	75.32	4173.23	4173.23	4171
0+061.000	57.74	4239.76	4239.76	4237.46
0+062.000	49.93	4293.6	4293.6	4291.21
0+063.000	34.27	4335.7	4335.7	4333.22
0+064.000	37.63	4371.64	4371.64	4369.08
0+065.000	30.32	4405.62	4405.62	4402.96
0+066.000	27.22	4434.39	4434.39	4431.63
0+067.000	12.9	4454.45	4454.45	4451.62
0+068.000	3.3	4462.55	4462.55	4459.69
0+069.000	0	4464.2	4464.2	4461.33
0+070.000	0	4464.2	4464.2	4461.33
0+071.000	0	4464.2	4464.2	4461.33
0+071.886	0	4464.2	4464.2	4461.33

JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ

C.c. 1.065.580.756 de Valledupar

Tel: 3167833981-3217342538

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 2

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2

2.1 Descripción del proyecto 2

2.1.1 Localización general del proyecto 2

2.1.2 Contrato de Obra 3

3. PERSONAL DEL PROYECTO 4

3.1 Personal Administrativo del proyecto 4

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra 4

4. INDICADORES 7

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo 7

4.2 Ausentismo en el proyecto. 9

4.3 Accidentalidad del Proyecto 9

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL 10

6. ACTIVIDADES EN OBRA 10

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del presente año se realizaron las siguientes actividades: 10

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo. 11

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo 12

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL 14

8. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR** de acuerdo con las actividades definidas en el CONTRATODE OBRA No. 323 DEL 2022.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, zona urbana, en la calle14 # 12-189 (Palacio de justicia) sitio de ejecución.

2.1.1 Localización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en el bloque de parqueaderos y áreas complementarias del Palacio de Justicia.

Ubicación Palacio de Justicia



Figura 1. Localización del palacio de justicia (Valledupar)

Fuente: Google Earth



Figura 2. Localización de edificio Palacio de Justicia (Valledupar)

2.1.2 Contrato de Obra

CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE JUDICATURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
OBJETO:	"REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) "
PLAZO INICIAL DEEJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO MESAR (35) contados a partir de la respectiva acta de inicio, previa legalización del contrato.
VALOR PRESUPUESTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (49.420.492.192) incluidos impuestos y contribuciones de ley

Tabla No. 1

3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 01 Al 31 de Agosto del 2023 respectivamente.

3.1 Personal Administrativo del proyecto

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto del presente año, se mantiene el personal operativo en el proyecto el cual desarrolla las actividades de obra civil.

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra

Desde el 01 al 31 de Agosto de 2023 se contó con la participación permanente del siguiente personal en obra.

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Información Trabajadores						Estado		
No	CC	Nombres y apellidos del Trabajador	No ASIGNADO	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1	72339619	EMEL DARIO LARIOS MEDINA	3	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	06/03/2023	NA
2	40960020	LUZDAMARYS SALCEDO VALDEBLANQUEZ	5	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	15/04/2023	NA
3	1065809341	WENNDY JULIETH QUIRIZ AYOLA	6	RESIDENTE ADMON	ADMINISTRATIVA	SI	25/04/2023	NA
4	1065657761	OSCAR EDUARDO BUSTILLO ECHAVEZ	7	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
5	1065842379	JESÚS DAVID QUIROZ LÓPEZ	8	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
6	1193403152	JUAN YESITH BRITO ZABALETA	10	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
7	1193561205	SEGUNDO ANTONIO MARTÍNEZ CALDERA	11	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
8	1062398032	JUAN CARLOS MURGAS MINDIOLA	12	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
9	1065837582	DUBAN ENRIQUE PERALTA PORTO	13	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
10	77028189	WILMAN IGNACIO CORONADO SILVA	14	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
11	1004502067	FARID ALBERTO VAN STRALRN VIZCAINO	15	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
12	77186837	JOSE LUIS CAMPO CALDERÓN	16	AUXILIAR OF. VARIOS	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA

13	77186289	CESAR RAFAEL NÚÑEZ ACUÑA	17	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
14	1003376653	CESAR LUIS NÚÑEZ ARRIETA	18	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
15	91526911	JORGE USECHUE	23	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
16	77155343	LUIS ALBERTO CASTILLO CAMELO	25	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
17	77026504	REINALDO MOSCOTE PACHECO	26	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
18	1007392140	LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO	27	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
19	1065235505	JHON JAVIER OSMA ORTEGA	28	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
20	1052080418	CARLOS ANDRES OLIVERA FRANCO	29	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
21	5165243	YESMAN ENRRIQUE MENDOZA MENDOZA	30	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
22	1048600194	JHON JAIRO MORALES CABRERA	31	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
23	1064711685	JUAN DAVID MEJIA CININ	32	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
24	1080431816	JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	33	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
25	85442542	DANIEL ENRIQUE AGUILAR VANEGAS	34	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
26	77154925	ANIBAL JOSE JIMENEZ ESCORCIA	37	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
27	1065626852	LUIS MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ	38	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
28	1065809820	ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE	39	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
29	77171396	PEDRO JULIO SANDOVAL VANEGAS	42	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
30	1006714113	EDUARDO ENRIQUE RIVERA ALVAREZ	48	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
31	106556239	GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS	49	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
32	1065823637	CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA	50	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
33	77183812	WILLIAM ENRIQUE PALMERA SANTANA	54	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/06/2023	NA
34	1032449361	JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA	55	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	21/06/2023	NA
35	1120748067	KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES	56	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	07/07/2023	NA
36	79750423	YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	57	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	08/07/2023	NA
37	8664000	EMIRO EVENDAÑO GUERRA	58	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/07/2023	NA

Tabla No. 2

JER TOPOGRAFIA

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1003240689	ASNER ROCHA WILCHES	TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065576867	RAFAEL AUGUSTO BALCAZAR VERDECIA	CADENERO 2	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065815762	ELIANETH PALOMINO RANGEL	AUX TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	25/04/2023	

Tabla No. 3

ANILLOS DE SEGURIDAD

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	
1062400397	HAWIN NAVARRO ANGARITA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	
11800493	YELMER EMIR CORDOBA MENA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	

Tabla No. 4

TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1065639870	OLBER DONADO VILLAFAÑE	OPERADOR DE MAQUINARIA	OPERATIVA	SI	28/08/2023	N/A

Tabla No. 5

Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)

4. INDICADORES

Para este contrato se contemplan indicadores de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto a continuación se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023.

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe se determinó que se trabajaron las horas estipuladas. Así mismo se evidencia el reporte del ausentismo que tuvo incidencia en el proyecto durante el mes de julio como se relaciona en la siguiente tabla.

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8
Fecha: 31/05/2023		
Clsificación: Interno		

PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.										
MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS PERDIDOS 2023	OBSERVACIÓN
					Por Accidente Laboral	Por Enfermedad comun	Ausencia no Justificada	Ausencia Justificada		
MARZO	26	13	2704	0	0	0	1	0	0	
ABR	23	27	4968	0	0	0	0	0	0	
MAY	23	42	7728	0	0	0	0	0	0	
JUN	24	50	9600	0	2	37	6	0	45	
JUL	24	37	7104	0	0	37	0	28	65	Ausentismo por licencia de paternidad (trabajadores: Segundo Martinez, Juan Carlos Murgas.
AGO	25	36	7200	0	0	33	17	0	50	
TOTAL	***145***	**34**	**39304**	**0**	**2**	**107**	**24**	**28**	**160**	

Tabla No. 7

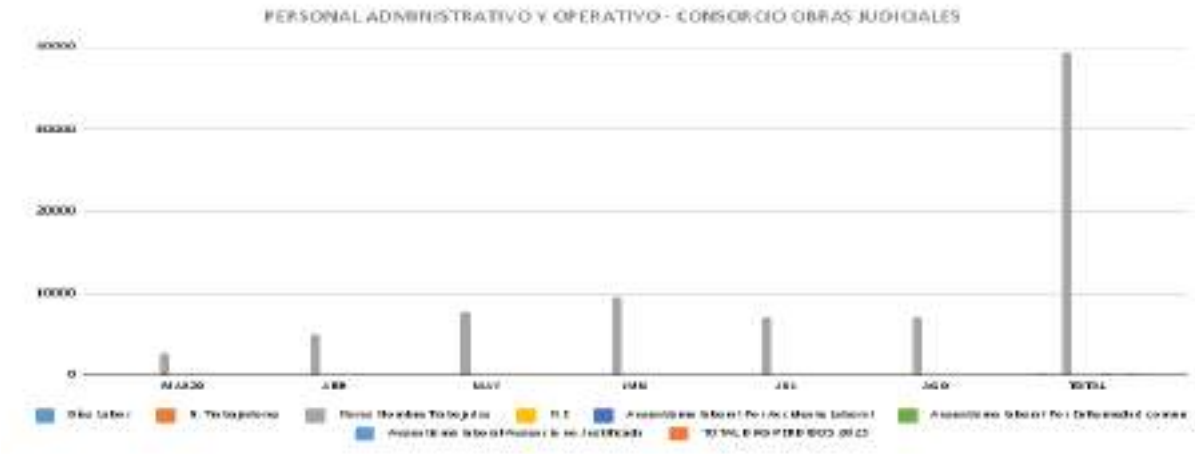


Gráfico No. 1

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8
Fecha: 31/05/2023		
Clsificación: Interno		

PERSONAL CONTRATISTAS										
MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS 2023	OBSERVACIÓN
					Accidente Laboral	Enfermedad comun	Ausencia no Justificada			
MARZO	13	6	624	0	0	0	0		0	
ABR	23	6	1104	0	0	0	0		0	
MAY	23	19	3496	0	0	0	0		0	
JUN	24	13	2496	0	0	0	0		0	
JUL	24	8	1536	0	0	0	0		0	
AGO	25	7	1400	0	0	0	0		0	
TOTAL	***132***	**10**	**10656**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

Tabla No. 8

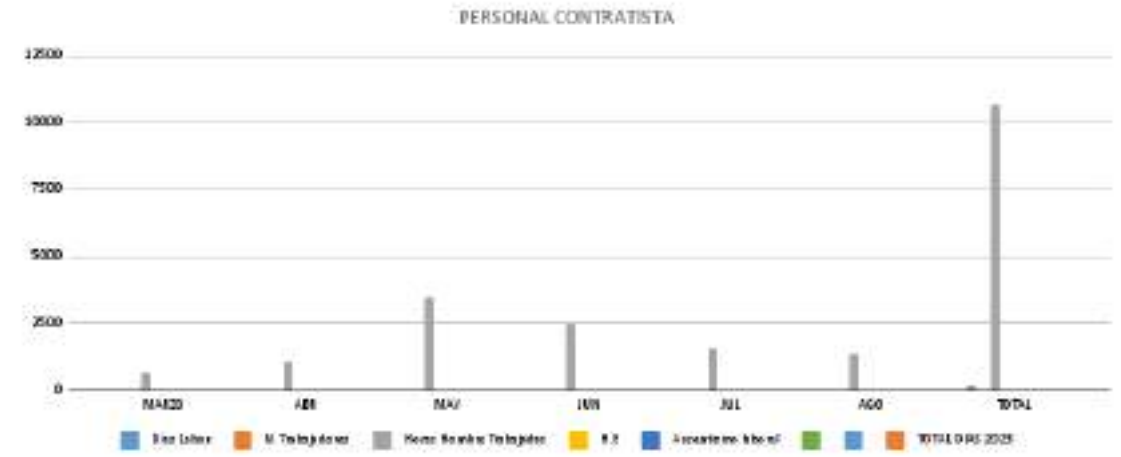


Gráfico No. 2

Se evidencia que el periodo de este informe no se aumentó los tiempos de labores en obra, por la cantidad de personal que hizo presencia en el mismo.

4.2 Ausentismo en el proyecto.

En el periodo de presentación de este informe se presentan ausentismo en el proyecto, los cuales son relacionados a continuación.

INCAPACIDADES AGOSTO 2023									
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CONTRATISTA	CARGO	FECHA INICIO DE INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL	DIAS TOTAL DE INCAPACIDAD
DUVAN ENRIQUE PERALTA PORTO	1065837582	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	28/07/2023	13/09/2023	0	30	0	30
JUAN DAVID MEJIA CININ	1064711685	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	07/08/2023	09/08/2023	0	3	0	3
TOTAL						0	33	0	33

Tabla No. 9

4.3 Accidentalidad del Proyecto

Para el periodo de este informe comprendido desde el día 01 al 31 de Agosto 2023 no se presentó accidente laboral en el proyecto.

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ago-23	NA	NA	NA
CONSOLIDADO 2023			

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ene-23	N/A	N/A	N/A
feb-23	N/A	N/A	N/A
mar-23	N/A	N/A	N/A
abr-23	N/A	N/A	N/A
may-23	N/A	N/A	N/A
jun-23	2,08	2,08	0
jul-23	N/A	N/A	N/A
ago-23	N/A	N/A	N/A

Tabla No. 9

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

Durante el mes de Agosto de 2023 se presentó nuevo ingreso de personal a obra, los cuales se valida todo lo reglamentario con Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y posteriormente se procede a realizar la inducción SST, evaluación, Notificación de Riesgos.

Anexo 2 Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.



Fotografía N°1: Inducción personal Contratista TIC INGENIERIA Y DESARROLLO 28-08-23

Anexo 3 Notificación de riesgo visitante

6. ACTIVIDADES EN OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto del presente año se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía**

Toma de niveles para excavación de caissón.

Localización de puntos de zapatas y columnas.

Chequeo de niveles para excavación de zapata.

- **Obra civil**

Excavación manual para caissón

Retiro manual de material.

Corte de acero

Armado de acero para caissón

Encofrado para fundir anillos

Fundida de anillos para caissón

Armado de acero para zapata

Colocación y aplomado de formaletas

Fundida de zapata

Desencofrado de zapata

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones.

Anexo 4 Pre operacionales

Anexo 5 ATS, Permisos para trabajo en excavación, permisos para trabajo en Alturas.

GESTIÓN DOCUMENTAL SST	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD
Inspección de pulidora, taladro, trazadora, Sierra circular mezclador de concreto herramientas manuales, Inspección de botiquín.	Agosto	28
Inspección de EPCC	Agosto	26
Análisis de Trabajo Seguro	Agosto	11
Permiso para trabajo en excavación.	Agosto	30
Permiso para trabajo en Alturas.	Agosto	38
Permiso para trabajo en caliente.	Agosto	16

Tabla No. 10

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

Charla SST – Capacitación.

Fecha	Tipo de actividad	Tema	Duración
01/08/2023	Charla SST	Condiciones inseguras	15 minutos
02/08/2023	Charla SST	Riesgo psicosocial	15 minutos
03/08/2023	Charla SST	Riesgo biomecánico	10 minutos
04/08/2023	Charla SST	Riesgo Bilógico	10 minutos
05/08/2023	Charla SST	Protección de la Flora y la fauna	15 minutos
08/08/2023	Charla SST	Socialización ATS-Riesgos y medidas de control	15 minutos
09/08/2023	Charla SST	Ahorro de recursos hídricos	12 minutos
10/08/2023	Charla SST	Socialización conflictos en el lugar de trabajo	30 minutos
11/08/2023	Charla SST	Cambios climáticos.	12 minutos
12/08/2023	Charla SST	El respeto	15 minutos
14/08/2023	Charla SST	Manejo integral de residuos sólidos, domésticos y peligrosos.	10 minutos
15/08/2023	Capacitación	Manejo de productos quimios utilizados en obra. Como prevenir accidentes en una excavación.	2 horas 2 horas

16/08/2023	Charla SST	Manejo de los recursos, convencionales, RESPEL, RAEC y RCD.	12 minutos
17/08/2023	Charla SST	Orden y aseo – Señalización en obra.	12 minutos
18/08/2023	Capacitación	Manejos de los residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto	8 minutos
19/08/2023	Charla SST	Actos inseguros – Socialización de llamado de Atención CCL	30 minutos
22/08/2023	Charla SST	Protección de los recursos hídricos, permisos y obligaciones al respeto.	8 minutos
23/08/2023	Capacitación	Uso eficiente del agua	1 Hora
24/08/2023	Charla SST	Manejo de sustancias peligrosas, aspectos ambientales relacionados.	10 minutos
25/08/2023	Charla SST	Golpe de Calor (Mantenerse hidratado)	8 minutos
26/08/2023	Charla SST	Responsabilidad social de un adecuado manejo ambiental en obra.	1 Hora
28/08/2023	Charla SST	Pausas Activas	10 minutos
29/08/2023	Charla SST	Cooperación entre compañeros de trabajo	10 minutos
30/08/2023	Charla SST	Buen uso de los EPP	10 minutos
31/08/2023	Charla SST	Manejo de material sobrante y material de construcción.	8 minutos

Tabla No. 11

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La prevención de accidentes como factor primordial en el proyecto se ha efectuado gracias a la colaboración obtenida por parte del personal y el área SST. Quienes mutuamente por medio de actividades de inspección, control, aprendizaje y mejora continua. Ayudan a prevenir la ocurrencia de factores que sean potenciales en la influencia para la generación de actos y condiciones inseguras.

En la siguiente tabla se exponen a manera de resumen algunas de las actividades potencialmente relevantes encaminadas a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes de Agosto de 2023.

DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Charlas de seguridad: las charlas de seguridad se realizan todos los días antes de iniciar la jornada laboral con el objetivo de informar y concienciar a los trabajadores sobre su propia seguridad y salud en el trabajo.	   

Orden y aseo: El orden y el aseo en obra son factores importantes para la prevención de incidentes y accidentes ayudan a mejorar las condiciones de seguridad en general.









Aseo parte externa de la obra





Pausas activas: su finalidad es contribuir con la liberación, descanso y esparcimiento del sistema locomotor de cada individuo.	   
Inspección pre operacional de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar: Se realiza con el fin de revisar y examinar el estado de cada uno de estos y determinar si están aptos para ser utilizados.	 

	 
Entrega de EPP: Se realiza la entrega del elemento y se les recuerda la importancia del su uso. (protegerse minimizando los riesgos de accidente)	   

Señalización áreas intervenidas: Se realiza con el fin mitigar el riesgo o peligro existente.	   
Inspección de EPCC: Se realiza la inspección cada vez que se va a utilizar con el fin de verificar que no tenga ningún desgaste, daños o corrosivos.	 

	 
Reunión de COPASST se realizan reuniones mensuales con el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así dando cumplimiento a la normatividad establecida.	  

Capacitación:

Uso Eficiente del Agua

Manejo de productos Químicos utilizados durante actividades

Como prevenir accidentes en una excavación













Supervisión y Acompañamiento de actividades: Se realiza con el fin de verificar y apoyar para que las actividades se realicen bajo los parámetros de seguridad.	  

Actos y condiciones inseguras

Se anexan formatos de actos y condiciones inseguras.

	
Condición Insegura: Se evidencia condición insegura por extensión sin tomacorrientes (con los cables sueltos)	Se corrige la condición insegura instalando tomacorrientesen caucho.

	
Condición insegura: Se evidencia sendero peatonal inestable por terrenos irregulares y deslizantes.	Se solicta la colaboración de dos trabajadores y se corrige la condicion insegura, realizando escalone para mejorar las condiciones del sendero.
	
Acto inseguro: Se evidencia trabajador realizando actividad de amarre de acero en un andamio en la baranda y realizando movimientos inapropiados para la actividad.	Se realiza charla de socializacion del actos inseguros por el trabaador para ue sirva como ejemplo prevenir sobre las consecuencias de realizar actos inseguros.

	 
Condición Insegura: Se evidencia trabajadores con dificultad para transitar por terreno irregular.	Se corrige condicion insegura replanteando el terreno al cual posteriormente se le realiza una adecuancion con cemento.

8. ANEXOS

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos).
- Anexo 2 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
- Anexo 3 Notificación de Riesgos visitantes.
- Anexo 4 Pre operacionales.
- Anexo 5 ATS –Permisos.
- Anexo 6 Planilla de seguridad Social.
- Anexo 7 Asistencia Charla SST.
- Anexo 8 Evaluación Capacitación.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST.
- Anexo 10 Socialización y llamado de atención CCL.
- Anexo 11 Inspección de pre-uso equipos de alturas.
- Anexo 12 Entrega de EPP.
- Anexo 13 Documentos maquinaria amarilla (Tarjeta de registro, Declaración de importación, Mantenimiento) y operador (licencia de conducción, certificado de idoneidad.
- Anexo 14 Actos y Condiciones inseguras.

Residente SST
KAREN SOTO FUENTES
CC: 1120748067
Resolución 1348 del 26 de Diciembre del 2017

OLBER DONADO VILLAFAÑE





Powered by CamScanner



ARL | sura

Medellin, 24 de August de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de TIC INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005742101 TIC INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1000630879	DONADO VILLAFAÑE OLIVER	25/08/2023	09/08/2023	2021/5/22	DEPENDIENTE	POR INDICAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/08/2023 15:17:29
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 168.90.52.165, 192.238.104.11, 172.16.42.57

MEPSI

NIT: 900933659

DIRECCION:
Calle 168 N° 19-54 BARRIO. DANGON
TEL: 5737972 CEL: 301 4503792
VALLEDUPAR-CESAR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN



Ciudad: Valledupar Cesar **Fecha:** 28-ago.-23
Paciente: OLBER DONADO VILLAFAÑE
Fecha nacimiento: 15/03/1992 **Edad:** 31 Años 5 Meses y 13 Días
Estado Civil: UNIÓN LIBRE **N° Documento:** 1065639870 **Tipo:** CC
Teléfonos: 3113145548 **Dirección:** VALENCIA DE JESUS
Nombre de la empresa: TIC INGENIERIA Y DESARROLLOSAS
Cargo: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL: INGRESO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

EXAMENES REALIZADOS:
EXAMEN MEDICO OSTEMUSCULAR CON ENFASIS EN MAQUINARIA PESADA :NORMAL

RECOMENDACIONES AUDIOMETRÍA:
NORMAL
CONTROL ANUAL

RECOMENDACIONES ESPIROMETRÍA:
N.R

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN VISUAL:
NORMAL
CONTROL ANUAL

RECOMENDACIONES MEDICAS:
VALORACION POR NUTRICION
ESTILO DE VIDA SALUDABLE
ACTIVIDAD FISICA
USO DE EPI
HIGIENE POSTURAL
MANEJO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19
CONTROL MEDICO ANUAL

REMISIÓN:
Apto para Trabajo en alturas: SI: [ ] NO: [ ] NO APLICA: [X]

Concepto de Aptitud: APTO CON PATOLOGIA MODIFICABLE CON ESTILO DE VIDA SALUDABLES

Katia Y. Perez D.

Nombre : KATIA YANETH PEREZ DOMINGUEZ
Especialidad : MEDICINA OCUPACIONAL
Licencia S.O. : R.M. 5830 LIC. 3745

Nombre : OLBER DONADO VILLAFAÑE
N° y Tipo Documento : CC: 1065639870

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2023-08
Periodo Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-08-24 la empresa TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS con documento de identificación Nit 900477384 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VILLAFAÑE OLBER DONADO identificado con CC-1065639870, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900477384	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27449467	E	2023-08-24	0.0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	6
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	6
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6
CCF	892399989	CCF15	Caja de Compensacion Familiar del Cesar COMFACESAR	6

PAGADO

Pagina 1 26-08-2023 10:55 AM

Powered by CamScanner

Versión: 01 Fecha: 13/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Induccion, Evaluacion de induccion, Identificacion de Riesgo				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	28-08-2023			LUGAR:	Palacio de Justicias

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	[illegible]	1065639970	TIC Ingeniería	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 03	PÚBLICO	
Fecha: 2021/12/22	INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Clasificación: Interna		

Fecha: 28-08-23 | Nombre y Apellido: [illegible] | Contratista: J & S INGENIERIA

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometido con llevar a cabo sus proyectos de manera que protejan la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cumplimiento de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo; contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, relacionando el ausentismo, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la manipulación de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, [illegible] la compañía en cumplimiento a la presente política efectuara pruebas sicotrópicas de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se define como requisito y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluya administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando y asumir los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dará en que ARL será diseñado de acuerdo a las afiliaciones realizadas por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización. Las denuncias son puestas por anónimos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador en incumplimiento al compromiso que se pacta desde el momento de su firma y generara las sanciones disciplinarias.

1. El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que lo integran (gorras, pañoletas, bragas, etc.).

2. El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; el jefe que el uso de elementos contra guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecuta y el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del trabajador la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal necesarios; así mismo es responsabilidad del trabajador un uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección con proporcionan.



3. Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.

4. Todo trabajo que se ejecuta y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, en de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal suministrados para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.




5. Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al monitor general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6. Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que son ejecutada por otra persona y que pueda generar daños sobre usted o sobre los demás trabajadores cerca en la salud.

7. Todo trabajador debe permanecer atento y respetar toda la señalización instalada en obra; uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, puntos restringidos, cordones de cinta en zonas de riesgo, concentrados, equipos de emergencia (extintores), excavaciones, etc.

8. Toda herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por yoyo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, bandas, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planeas, sierras, compresores, soldadores, taladros, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su superior inmediato, al monitor general o al [illegible]

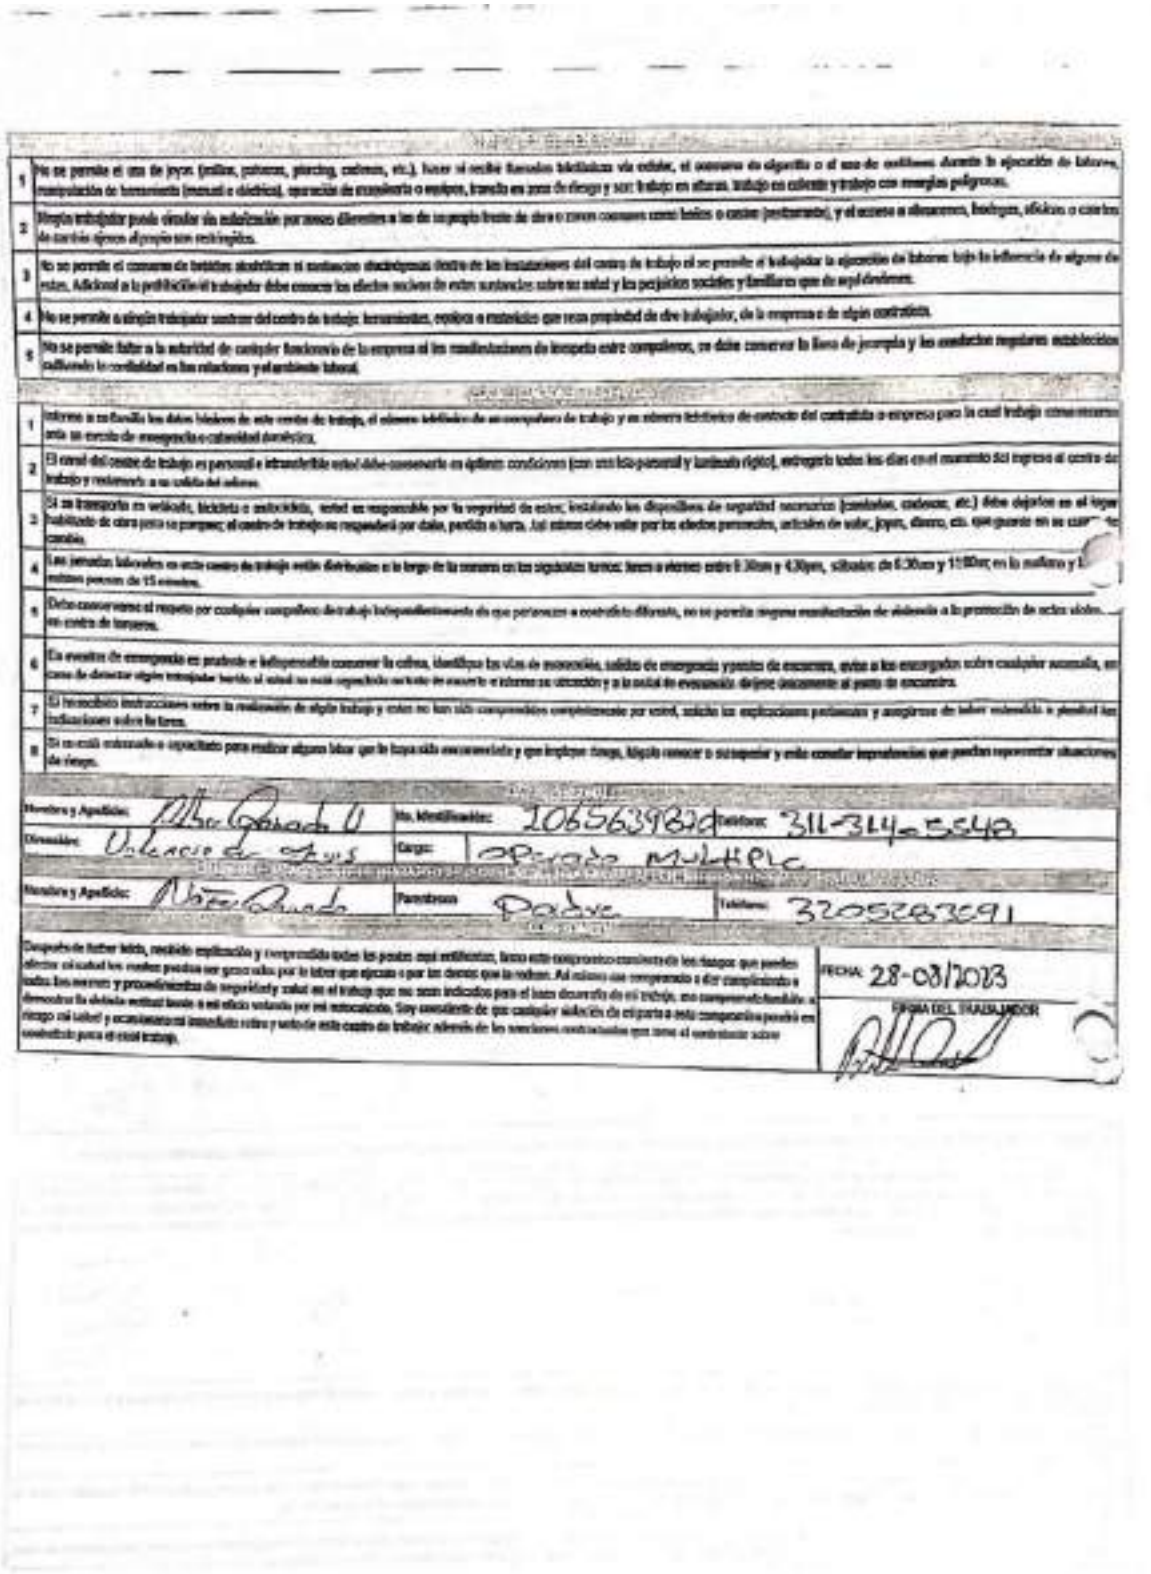

1	No se permite el uso de joyas (anillos, cadenas, piercing, cadenas, etc.). Hacer uso de celular durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de equipos, trabajo en zonas de riesgo y sus trabajo en alturas. trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas.
2	Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o casino (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control, éstos deben ser restringidos.
3	No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguno de estos. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de ella devienen.
4	No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista.
5	No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de falta de respeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las conductas regulares establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral.

1	Informar a su familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de su compañero de trabajo y el número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica.
2	El casco del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (con sus tres puntos y barbuquejo rígido), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo.
3	Si su transporte es vehículo, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos, instalando los dispositivos de seguridad necesarios (cerraduras, candados, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de otra parte no parquear, el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero cambio.
4	Las jornadas laborales en este centro de trabajo serán distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes turnos: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00m; en la mañana y [illegible] minutos para de 15 minutos.
5	Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ninguna manifestación de violencia o la promoción de actos vicios... en contra de terceros.
6	En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, avise a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido al salir no está capacitado no trate de mover o retirar su atención y a la salida de evacuación diríjase inmediatamente al punto de encuentro.
7	El no recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y antes no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea.
8	Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, dígalo conozca o no superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo.

Nombre y Apellido: [illegible]	No. Identificación: 1065639820	Teléfono: 311-314-5548	
Dirección: Valencia de Jesús	Cargo: Operario Multiple		
Nombre y Apellido: [illegible]	Parentesco: Padre	Teléfono: 3205283691	

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí enlistados, firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que la rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a denunciar la omisión verbal hacia mi mi oficio voluntario por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionará mi inmediato retiro y retiro de este centro de trabajo, además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre mi vinculación para el cual trabajo.

FECHA: 28-08/2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Versión: 01
Fecha: 21/03/2020
Clasificación: Interna

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: Dilber Zarate CÉDULA: 1065639870

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:
   - a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
   - b. Proteger y promover la salud
   - c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
   - X Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo
   - X a. Política SST
   - b. Política de alcohol y tabaquismo
   - c. Política de Calidad
   - d. Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.
   - a. Quemaduras
   - b. Fracturas - Esguinces
   - c. Cuerpo extraño en ojos
   - d. Lesiones osteomusculares
   - e. Perdida de peso
   - f. Mareos
   - X g. Caídas del mismo nivel
   - X h. Todas las anteriores
   - i. b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente si se enferma en el trabajo.
   a) Señalizacion
   b) Uso del EPP
   c) Mantener orden de limpieza
   d) No uzar elementos de joyeria

5. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.
   - X a. Protección auditiva
   - X b. Botas de seguridad con puntera
   - X c. Tapabocas
   - d. Overoles de camaza / Barqueta
   - e. Careta facial
   - f. Respirador de doble cartucho
   - g. Guantes plastizos
   - h. Gafantes de sintis
   - X i. Casco
   - X j. Overoles manga larga
   - X k. Tapaoidos de inserción
   - X l. Copa
   - X m. Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo afiliada y a quien debe reportarle en obra:
   Avisar a mi jefe Inmediato - Sura

7. Marque con un X los tipos de comité que existen en la Organización
   - a. Comité Paritario de Salud
   - b. Comité de Gestión y Higiene
   - X c. Comité de Convivencia
   - X d. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Marque con un X las prohibiciones
   - X a. Utilización de joyas y relojes
   - X b. Jugar en estado de embriaguez
   - X c. Consumir sustancias alucinógenas
   - X d. Laborar sin EPP
   - X e. Reportar tapabocas
   - f. c, i, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo
   - X a. Trabajos en Caliente
   - X b. Trabajos con energías peligrosas
   - X c. Trabajo en alturas
   - X d. Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo
   - X a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
   - X b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
   - c. Ninguna
   - X d. Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 1065639870

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Albeiro Conde Villazon, portador de la cedula de ciudadanía 1065639830 desempeñando el cargo de Ayudante minero, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declan que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer beber fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02	FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Alba Sandra Villota

Firma: [signature]

Fecha: 28-08/2023

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Versión:01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, [illegible] portador de la cedula de ciudadanía [illegible] desempeñando el cargo de [illegible], he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Roedoras	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalizarlo. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controla el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfaces persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Cuidarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Omar Guevara

Firma: Omar Guevara

Fecha: 10/08/2023

Versión 01	FORMATO	
Fecha 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, _____, portador de la cedula de ciudadanía _____ desempeñando el cargo de _____, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impulso intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión 01	FORMATO	
Fecha 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No omitir en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Juan Carlos Blanco

Firma: _____ Fecha: 10-08-23

Versión 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Juan Carlos Blanco portador de la cedula de ciudadanía 7.572.634 desempeñando el cargo de Coordinador he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.


INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar las carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual, guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en las frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01 Fecha: 21/03/2023 Clasificación: Interna	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jenny Piñi.

Firma:

Fecha: 04-08-2023

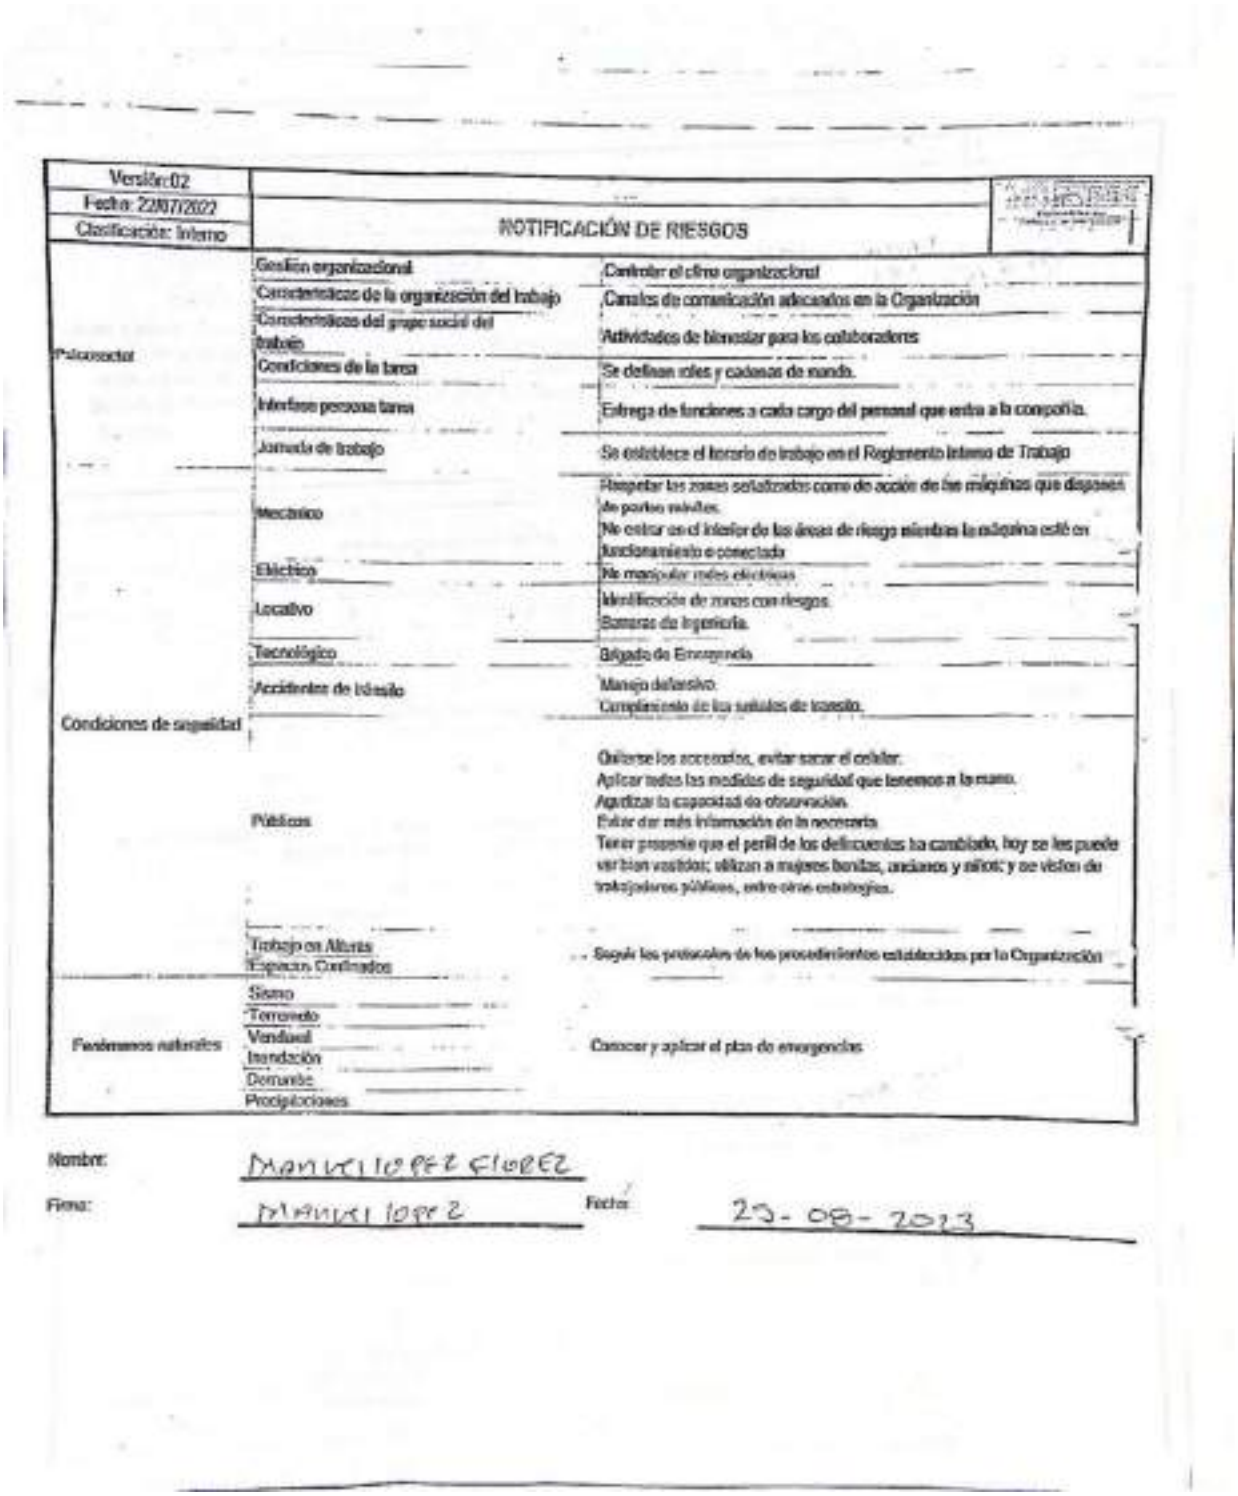

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Cuidarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias


Nombre: MANUEL LOPEZ FLOREZ

Firma: MANUEL LOPEZ Fecha: 29-08-2023

Versión: 02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, DANIEL LOPEZ LOPEZ, portador de la cedula de ciudadanía, 1019701931 desempeñando el cargo de OPERARIO DE MANTENIMIENTO he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lento del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Atenuación (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Pelaje parcialmente inexistente	

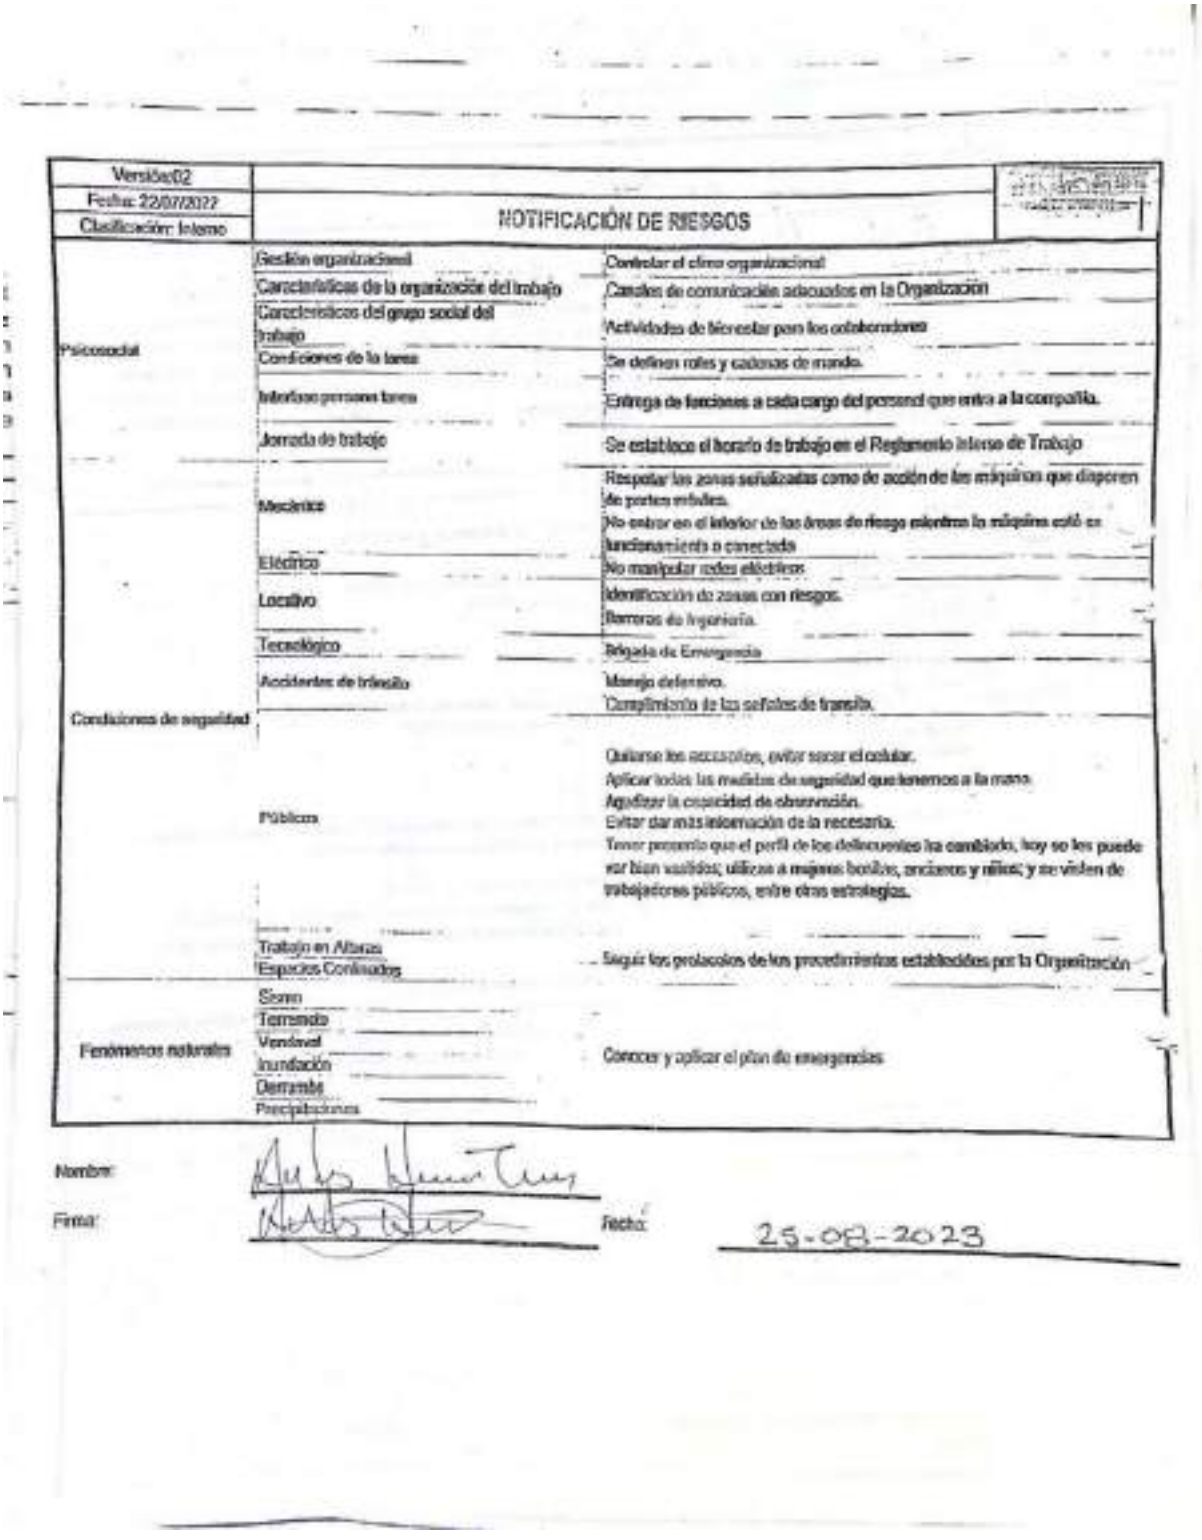

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Cuidarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre:

Firma:

Fecha: 25-08-2023

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Andres Herrera portador de la cedula de ciudadanía 7709717149 desempeñando el cargo de Auxiliar, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzos	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar las carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Al usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Mientras siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesaria. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras físicas (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	




Versión:02		
Fecha: 30/07/2020	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Contexto del clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes electricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajos en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Raigal Orozco

Firma: [signature]

Fecha: 23/08/23

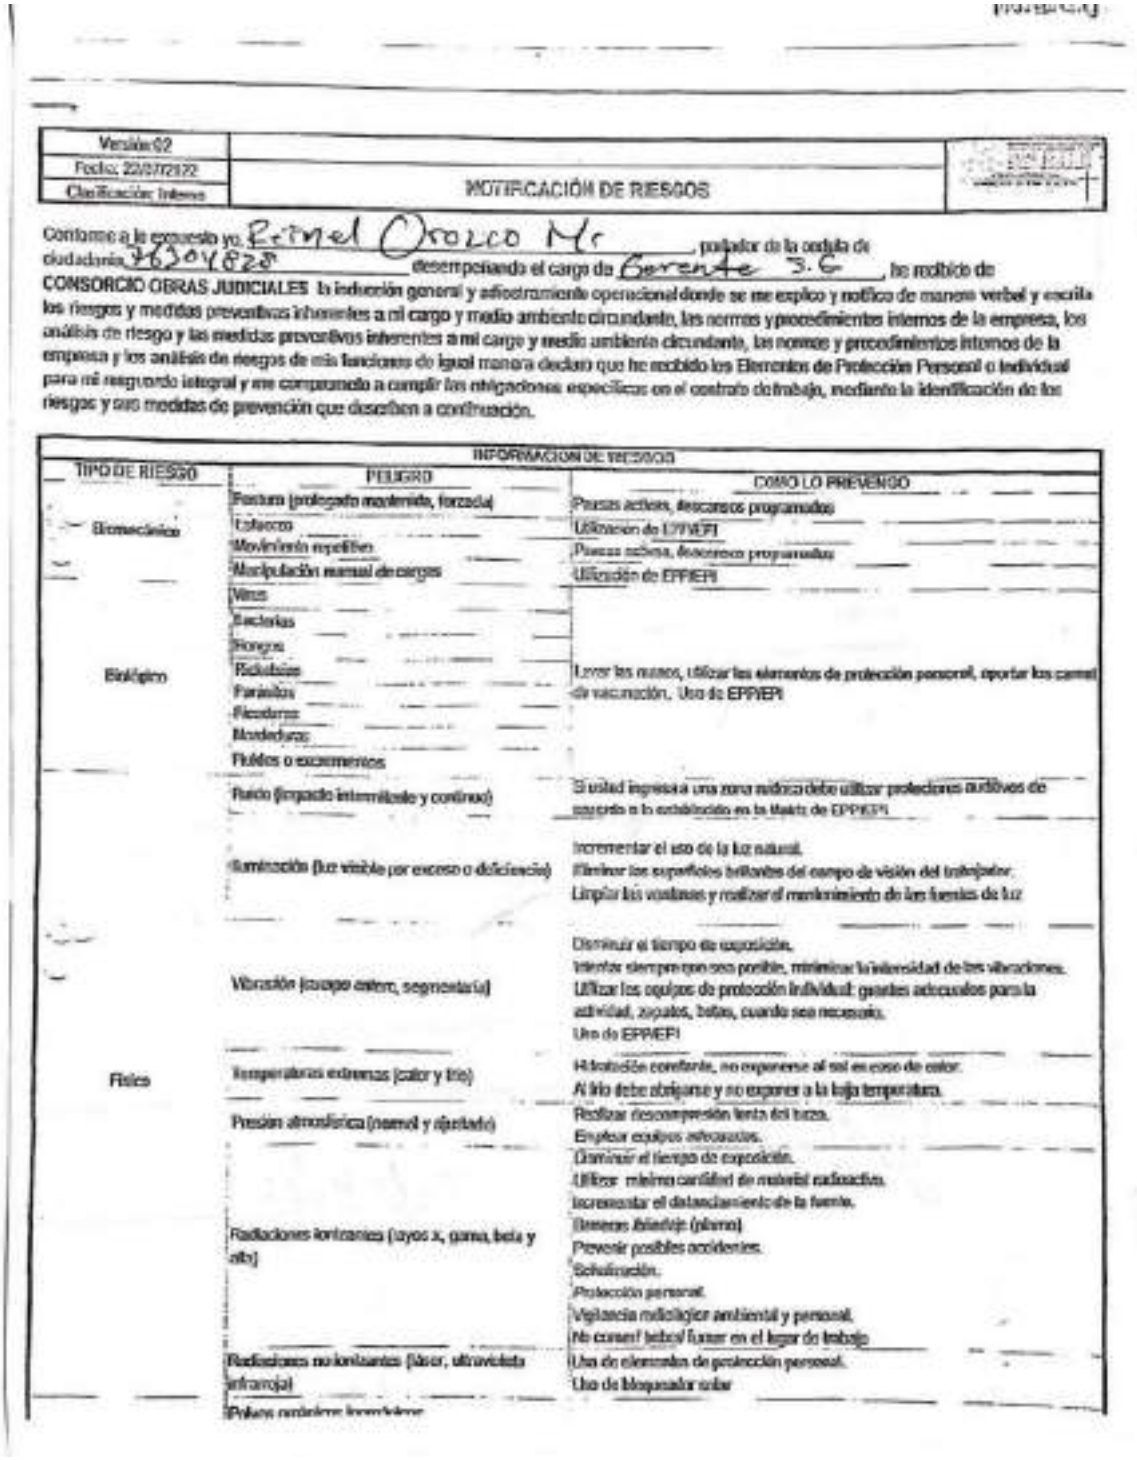

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo Rafael Orozco Mc, portador de la cedula de ciudadanía 7630482 desempeñando el cargo de Gerente S.G, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descanso programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parasitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar los superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras plomadas (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Jenaler Jose Becerra

Firma: [signature]

Fecha: 14/08/23

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Jorney Peña Rojas, portador de la cedula de ciudadanía, 8005868 desempeñando el cargo de Log, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión 01	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Junior José Bocanegra, portador de la cedula de ciudadanía 1065841219 desempeñando el cargo de Operador logístico, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivos inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y los medidas preventivos inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internes de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prologada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gamma, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interno	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfaso persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Normas de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarme los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Erick Alejandro Gómez Rodríguez

Firma: [signature] Fecha: 19-08/2023

Versión: 02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Ener Alejandro Gómez Rodriguez portador de la cedula de ciudadanía 80.177.190 desempeñando el cargo de residente interventoria, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, casco si necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno


NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Aguzar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Nelson Lozano

Firma:

Fecha: 19-08/2023

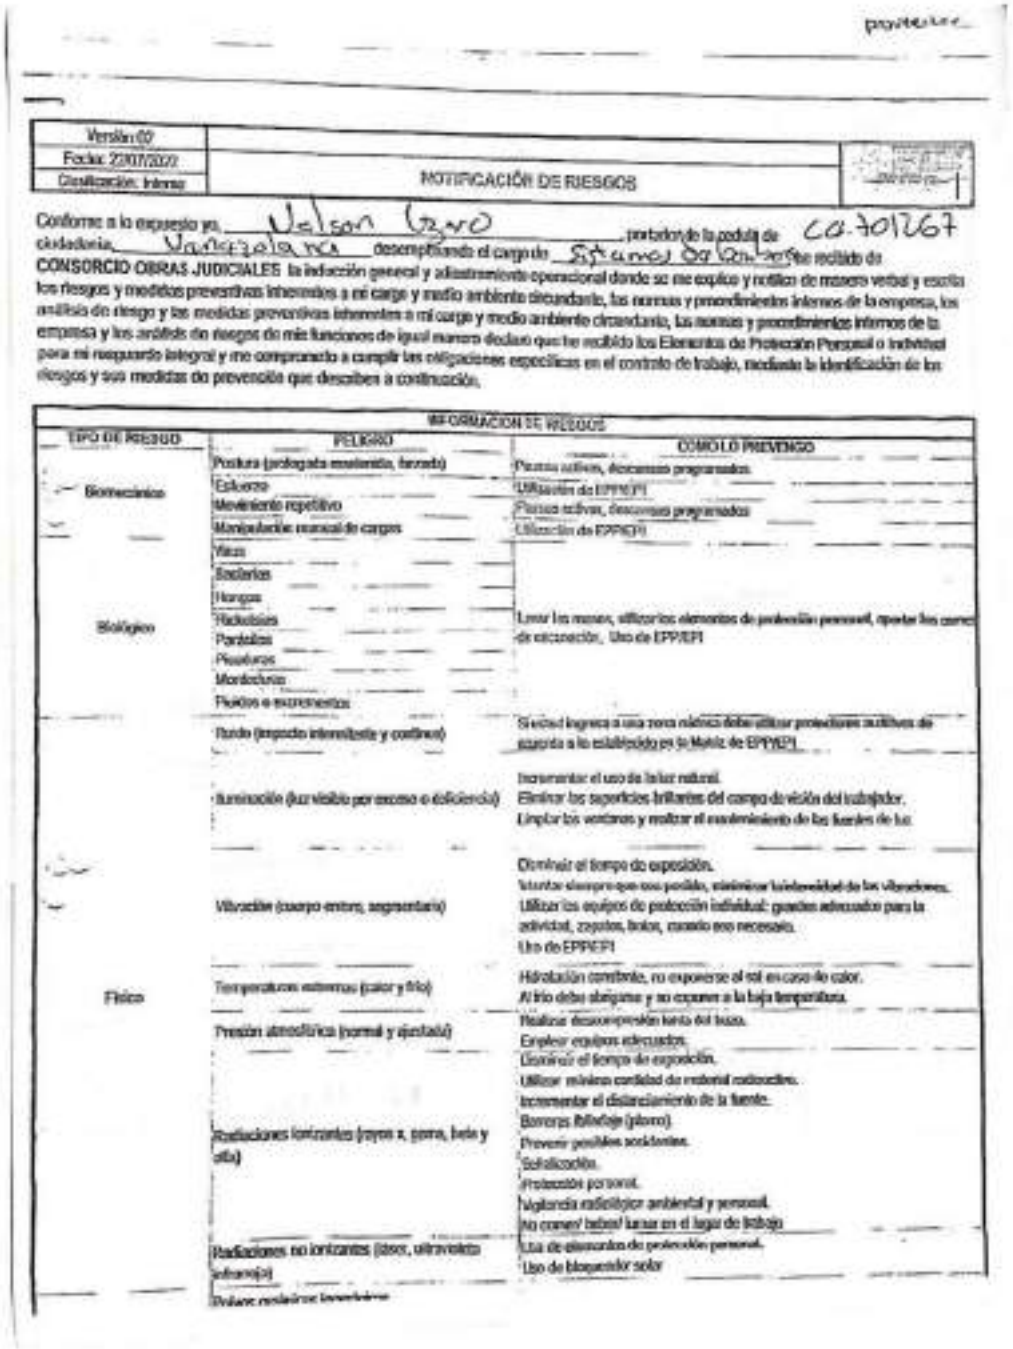

Versión:02
Fecha: 23/07/2020
Clasificación: Interna

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Conforme a lo expuesto yo, Nelson Lozano, portador de la cedula de C.a. 701267 ciudadanía Venezolana desempeñando el cargo de Ayudante de Carpintero me recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados.
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los casos de enfermedad., Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Hantavirus	
	Parásitos	
	Piojos	
	Micobacterias	
	Picados o mordeduras	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si el trabajador ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Mientras siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, casco si es necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión 02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interno	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Oniko Radiyer

Firma: Oniko R

Fecha: 19-8-2023

Versión 02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Dayan Jacke Rodriguez, portador de la cedula de ciudadanía 1066720940 desempeñando el cargo de Ayudante, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describes a continuación.

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona donde debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI.
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Mantte siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y su exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Peligros ergonómicos (manipulación	

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería
	Tecnológico	Reporte de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jairo Gómez

Firma:

Fecha: 18-08/2023

Proveedores

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Jesus Alberto Gomez Arbelaez, portador de la cedula de ciudadanía 1066636765 desempeñando el cargo de Oficial, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, reportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organizacion
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Teodoro Vargas

Firma:

Fecha: 10-08-23

Versión 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todos los medios de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se los puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Carlos Bermudez

Firma:

Fecha: 9 Agosto 2023.

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, Leonardo Vargas, portador de la cedula de ciudadanía, 9726198, desempeñando el cargo de Jefe Contratos, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarrojo)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entre a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles.
	Eléctrico	No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Tormenta Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jesús Ochoa

Firma:

Fecha: 17-08-2023

Versión 02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Jesus Ochoa, portador de la cedula de ciudadanía, 85012740 desempeñando el cargo de Ayudante electrico, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, ajustar las carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión: 02	* FORMATO	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entre a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Consuelo Ávila

Firma: Consuelo Ávila

Fecha: 17-08-23

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, Alba Consuelo Ruta A., portador de la cedula de ciudadanía 51.855578, desempeñando el cargo de Coordinador inventarios, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar las normas de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interna	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jesus Antonio Mora Flores

Firma:

Fecha: 15-08-2023

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Jesus Antonio Tejana Perez, portador de la cedula de ciudadanía 77095053 desempeñando el cargo de Asesor de Movilidad, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aplicar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Física	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo) Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina está en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Jose Javier Cano

Firma:

Fecha: 14/03/2023

Versión:01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interna	

Conforme a lo expuesto yo, Jose Jairo Cano, portador de la cedula de ciudadania, 1063952905 desempeñando el cargo de OP Guia, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Incentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Escalar equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras (blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compa
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interso de Trabaj
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina est funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se l ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se vis trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organi
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: [illegible]


Firma:

Fecha: 11-08/2023

Versión 01	FORMATO	
Fecha 27/04/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interna		

Conforme a lo expuesto yo, Carlos Benavides, portador de la cedula de ciudadanía 79593688 desempeñando el cargo de Ing. Esp. Gestión he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGO		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP'S/P
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP'S/P
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP'S/P
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP'S/P
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intervenir siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual, guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP'S/P
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en zona de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras. Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer, beber, fumar en el lugar de trabajo.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de blindajes solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP'S/P en los frentes de obra
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

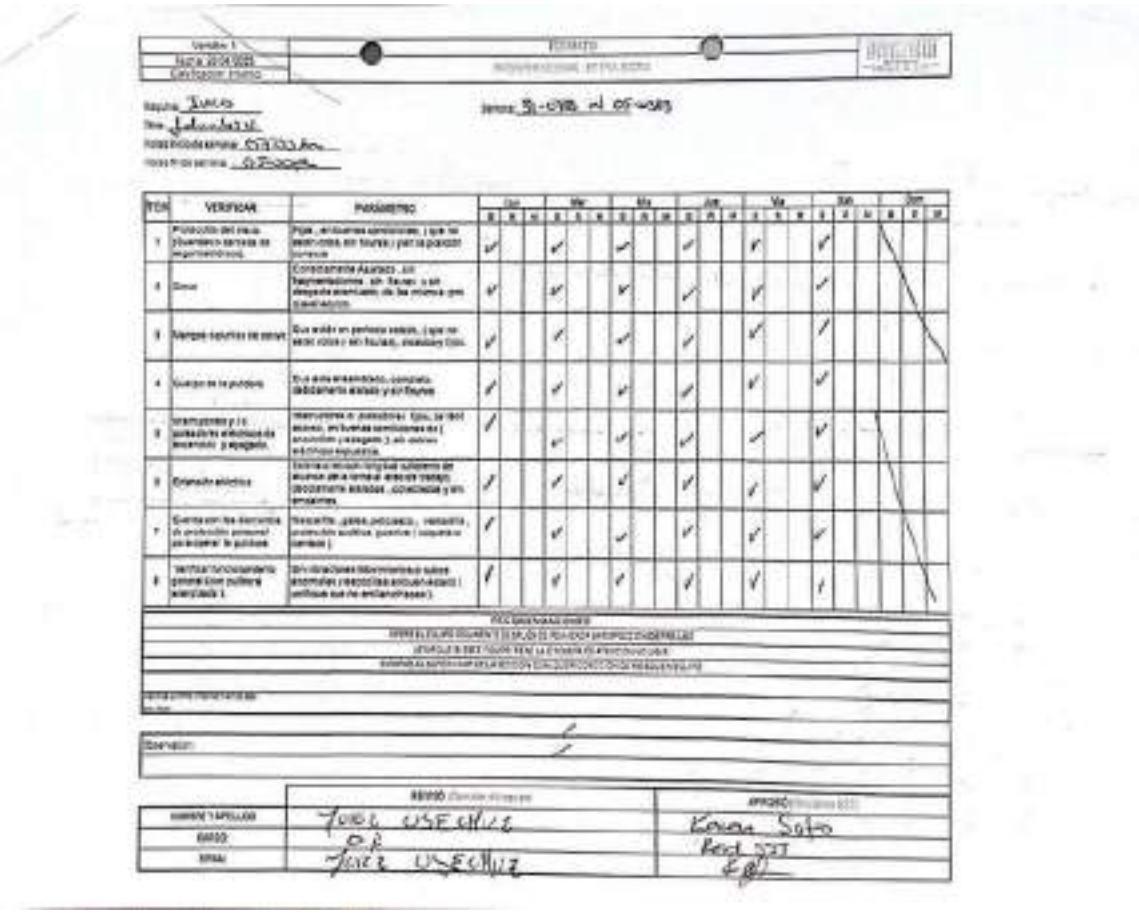

Versión: 1

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR


MARTILLO No 2 MARCA Trupey expert

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 10-05-2023 AL 12-05-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas							✓							
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo							✓							
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales							✓							
	* El seguro del cincel se muestra operativo y en buen estado.							✓							
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado							✓							
	* El cincel se encuentra en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o daños visibles.							✓							
	* El retén se encuentra en buen estado							✓							
	* Equipo sin daño estructural							✓							
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

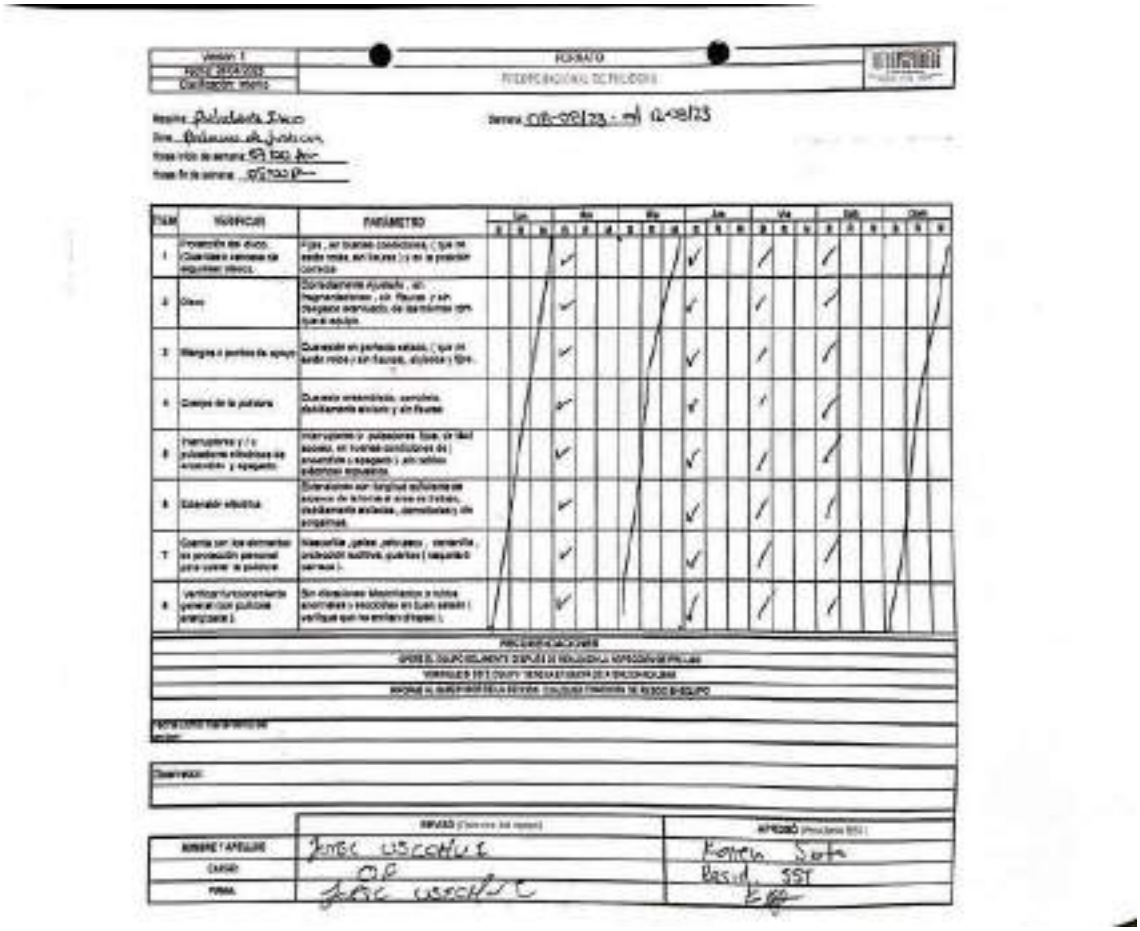

FORMATO


Nombre: Soluciones Sisco

Semana 08-08/23 - 12-08/23

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			D	S	M	D	S	M	D	S	M	D	S	M	D	S	M	D	S	M	D	S	M
1	Protección de ojos. ¿Cuentan con gafas de seguridad claras.	Ajus., en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta				✓						✓			✓			✓					
2	Oídos	Correctamente ajustado , sin deformaciones , sin fisuras y sin ningún elemento de terceros que no sea el adulto				✓						✓			✓			✓					
3	Manos o puntos de apoyo	Guantes en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras, elásticos y fijos.				✓						✓			✓			✓					
4	Cuerpo de la persona	Guantes ambidiestro, cerrados, debidamente ajustado y sin fisuras				✓						✓			✓			✓					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado	Interruptores o pulsadores bien, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado), sin cables pulsadores expuestos				✓						✓			✓			✓					
6	Extensión eléctrica	Extensión con longitud suficiente de acuerdo de la toma de zona de trabajo, debidamente aislados, demostrados y sin empalmes				✓						✓			✓			✓					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para cumplir de palanca	Mascarilla , gafas ,antiruido , cerrarilla , protección auditiva, guantes (seguridad) cerrados).				✓						✓			✓			✓					
8	Vertical/cursos/cerramiento general con puntos energizados)	Sin vibraciones descontrolados o notas anormales o inaceptables en buen estado (verifique que no emitan chispas).				✓						✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

	ENVIADO (Nombre del reporte)	APROBÓ (Presidente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	JORGE USCATEGUI	Karen Sarta
CARGO	OP	Resid. SST
FIRMA	JORGE USCATEGUI C	

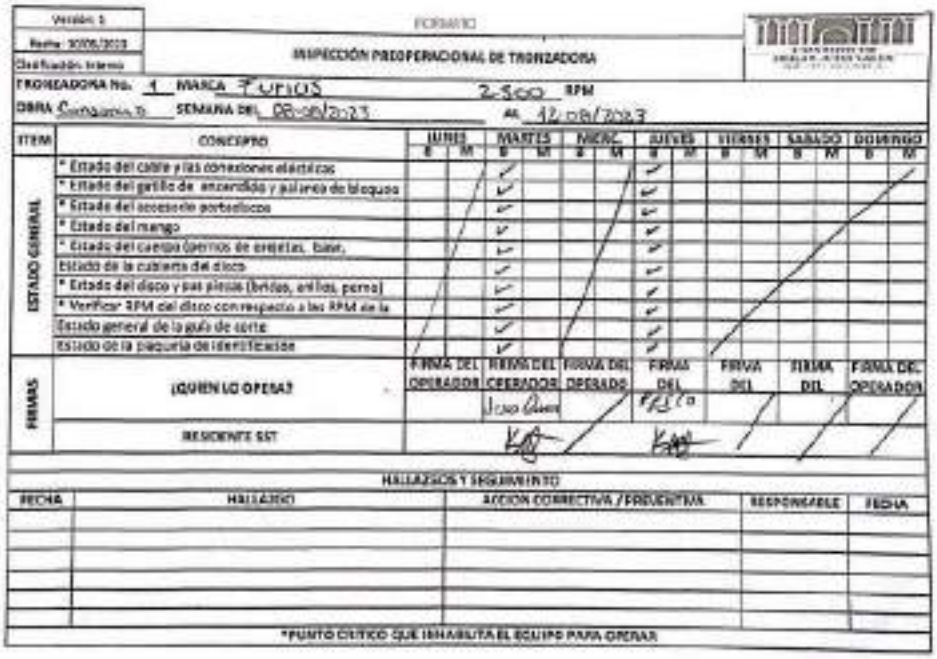

Versión: 1
Fecha: 30/05/2018
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TROZADORA


TROZADORA No. 1 MARCA TURIOS 2.500 RPM
OBRA Cartagena D. SEMANA DEL 08-06/2023 AL 12/08/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓				✓							
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			✓				✓							
	* Estado del accesorio portacuchilla			✓				✓							
	* Estado del mango			✓				✓							
	* Estado del cuerpo (perros de arrastre, base,			✓				✓							
	Estado de la cubierta del disco			✓				✓							
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			✓				✓							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la			✓				✓							
	Estado general de la guía de corte			✓				✓							
	Estado de la palanca de identificación			✓				✓							
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

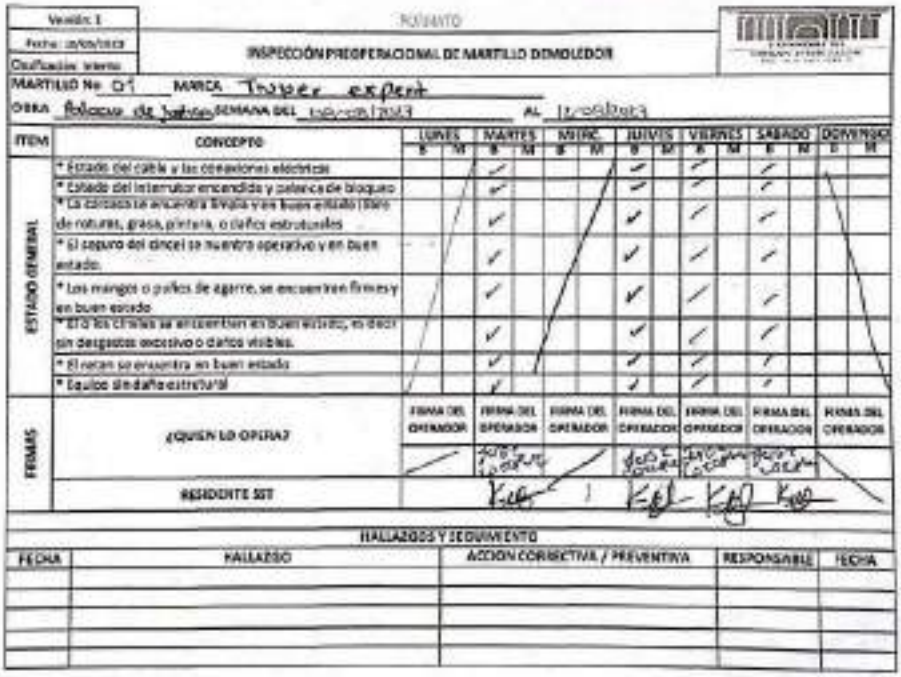

ROTANTO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

MARTILLO No. 01 MARCA Trupper expert

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 14/09/2023 AL 17/09/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES D	LUNES M	MARTES D	MARTES M	MIERC. D	MIERC. M	JUEVES D	JUEVES M	VIERNES D	VIERNES M	SABADO D	SABADO M	DOMINGO D	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓				✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo			✓				✓		✓		✓			
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales			✓				✓		✓		✓			
	* El seguro del cincel se muestra operativo y en buen estado.			✓				✓		✓		✓			
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado			✓				✓		✓		✓			
	* En los cilindros se encuentran en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o daños visibles.			✓				✓		✓		✓			
	* El motor se encuentra en buen estado			✓				✓		✓		✓			
	* Equipo sin daño estructural			✓				✓		✓		✓			
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 23/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)
Clasificación: Interno	

Maquina: 1
Obra: Obras Judiciales
Hora inicio: 7:30 a.m.
Hora fin: 05:00 p.m.

Semana: 14-08/23 al 19-08/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓		✓		✓		✓									
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓		✓		✓		✓									
VALEÑAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓									
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓		✓		✓		✓									

Fecha último mantenimiento del equipo:	

Observación:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	CASTILLO	Karen Soto
CARGO:	AY	Resi. SST
FIRMA:	CASTILLO	

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 14-08/2023 al 19-08/2023

HORA: 07:00A.m - 05:00P.m

OBRA: Construccion Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan prensas de banco	✓			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filos de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de las sierras macho o hembra			✓	
4	Inhibición de los hojas de seguetas			✓	
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos			✓	
7	Estado de los Mangos y función de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas ?			✓	
2	Estado de huellas y puntas de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de las mordazas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos			✓	
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores			✓	
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?			✓	
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?	✓			
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Aislamientos y sistemas de tierra	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y mandil de los taladros	✓			
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	✓			
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	✓			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?	✓			

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 14-08/2023 al 19-08/2023

HORA: 8:00Am - 05:00pm


OBRA:

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Bueno	No Existe	A Ajustar	
11	Los collarines estarán en diámetro y estén instalados según el nivel?			✓	
12	Estado de las rocas o tornillo en las mantas abrasivas			✓	
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos	✓			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS			✓	
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACION				
1	El personal es autorizado			✓	
2	Emplean los elementos de protección			✓	
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta			✓	
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizadas las áreas que revelen peligros específicos tales como alto voltaje, etc.	✓			

Nota: Los dieléctrico caseval H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Sudan Cubillos Muñoz	Karen Jojoa
CARGO:	Residente	Resp. SST
FIRMA:	Sudan Cubillos Muñoz	

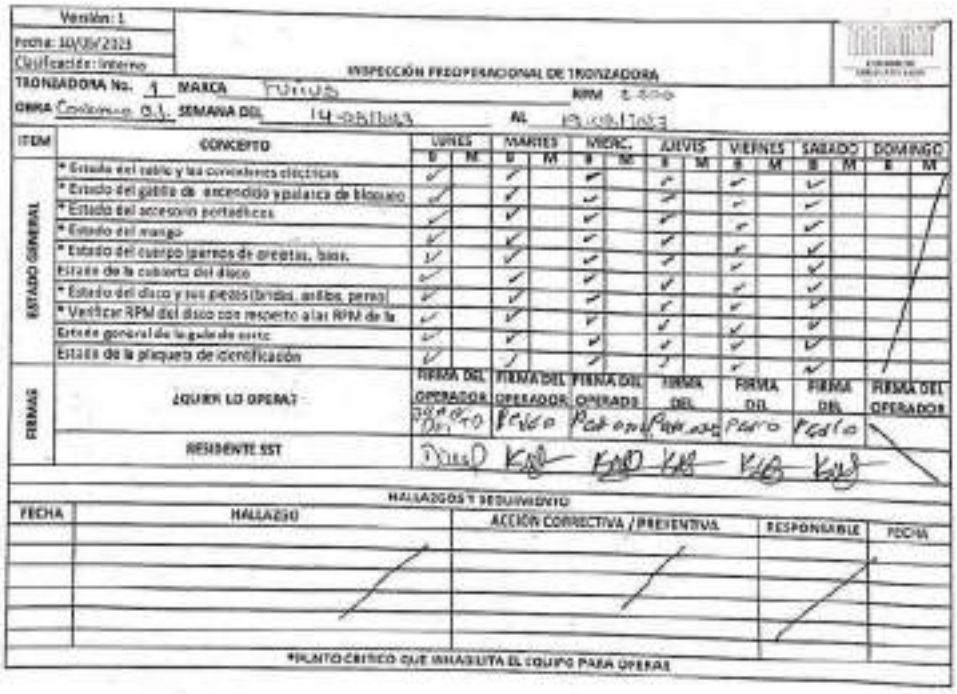

Versión: 1
Fecha: 10/08/2021
Clasificación: Interno

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA TURUS RPM 3.500


OBRA Corferias O.J. SEMANA DEL 14 AL 19 DE JUNIO

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (carros de oruga, base,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cubierta del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, pernos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guarda de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la placa de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			
	RESIDENTE SST	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

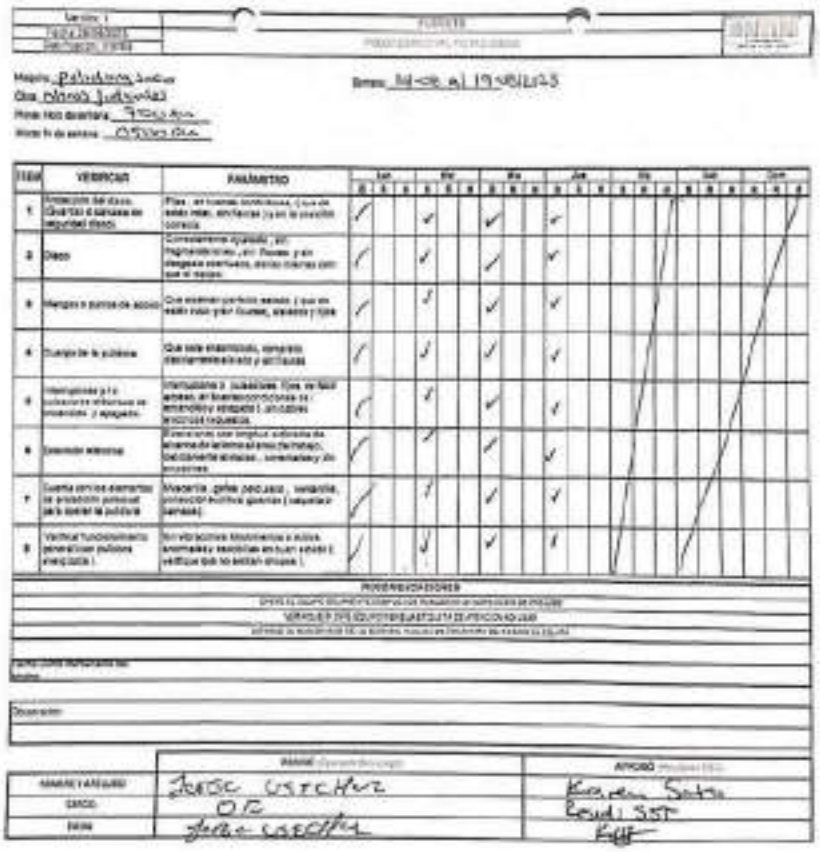

Versión 1	FORMATO	
Fecha: 18/05/2021	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interna		

TALADRO No 1 MARCA Truper expert


OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 14-08/2023 AL 19-08/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES D	LUNES M	MARTES D	MARTES M	MIERC. D	MIERC. M	JUEVES D	JUEVES M	VIERNES D	VIERNES M	SABADO D	SABADO M	DOMINGO D	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓						✓							
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo	✓						✓							
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales	✓						✓							
	* El seguro de uña o cincel se muestra operativo y en buen estado	✓						✓							
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓						✓							
	* El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o daños visibles.	✓						✓							
	* El retén se encuentra en buen estado	✓						✓							
	* Equipo sin daño estructural	✓						✓							
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

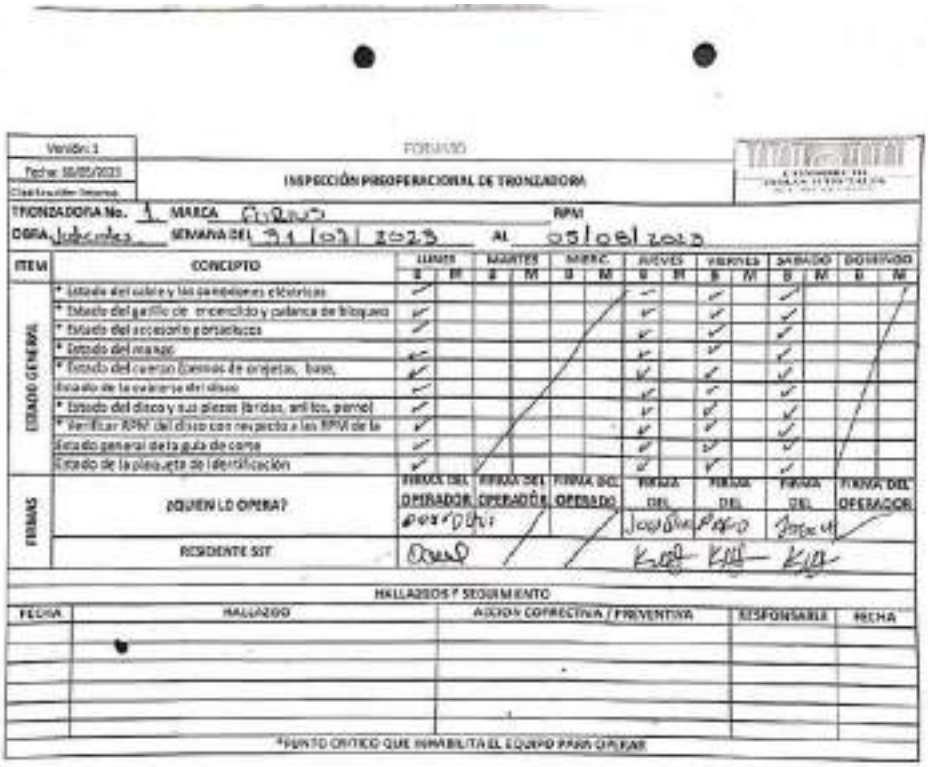

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Ridgid RPM
OBRA Judiciales SEMANA DEL 31/07/2023 AL 05/08/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓						✓		✓		✓			
	* Estado del guillo de encendido y palanca de bloqueo	✓						✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portaclisco	✓						✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓						✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (tornillos de conjetas, base,	✓						✓		✓		✓			
	Estado de la cubierta del disco	✓						✓		✓		✓			
	* Estado del disco y sus piezas (faldas, anillos, pernol	✓						✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la	✓						✓		✓		✓			
	Estado general de la guía de corte	✓						✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓						✓		✓		✓			
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 10/05/2018	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interna		

TALADRO No 2 MARCA Truper 40 Prot.

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 14-08-2023 AL 19-08-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓						✓							
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo	✓						✓							
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado (libre de rotulas, grasa, pintura, o daños estructurales	✓						✓							
	* El seguro de uña o cincel se muestra operativo y en buen estado	✓						✓							
	* Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓						✓							
	* El cincel se encuentra en buen estado, filoso y sin desgastes excesivo o daños visibles.	✓						✓							
	* El taladro se encuentra en buen estado	✓						✓							
	* Equipo sin daño estructural	✓						✓							
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
		[signature]						[signature]							
	RESIDENTE SST	[signature]						[signature]							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



ITEM	DESCRIPCION	lun			mar			mie			jue			vie			sab			dom		
		D	M	N	D	M	N	D	M	N	D	M	N	D	M	N	D	M	N	D	M	N
1	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)							✓														
2	Estado del extintor de incendio y su sitio							✓														
3	Estado del botiquín Punto Móviles (material)							✓														
4	Estado del mango							✓														
5	Estado del cuerpo							✓														
6	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)							✓														
7	Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)							✓														
8	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor							✓														
	REVISÓ (Operador del equipo)																					
	APROBÓ (Residente SST)							Daniel														

RECOMENDACIONES


OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE USO

VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR

INFORME AL SUPERVISOR EN LA SOLUCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Fecha última mantenimiento del equipo:

Observación:

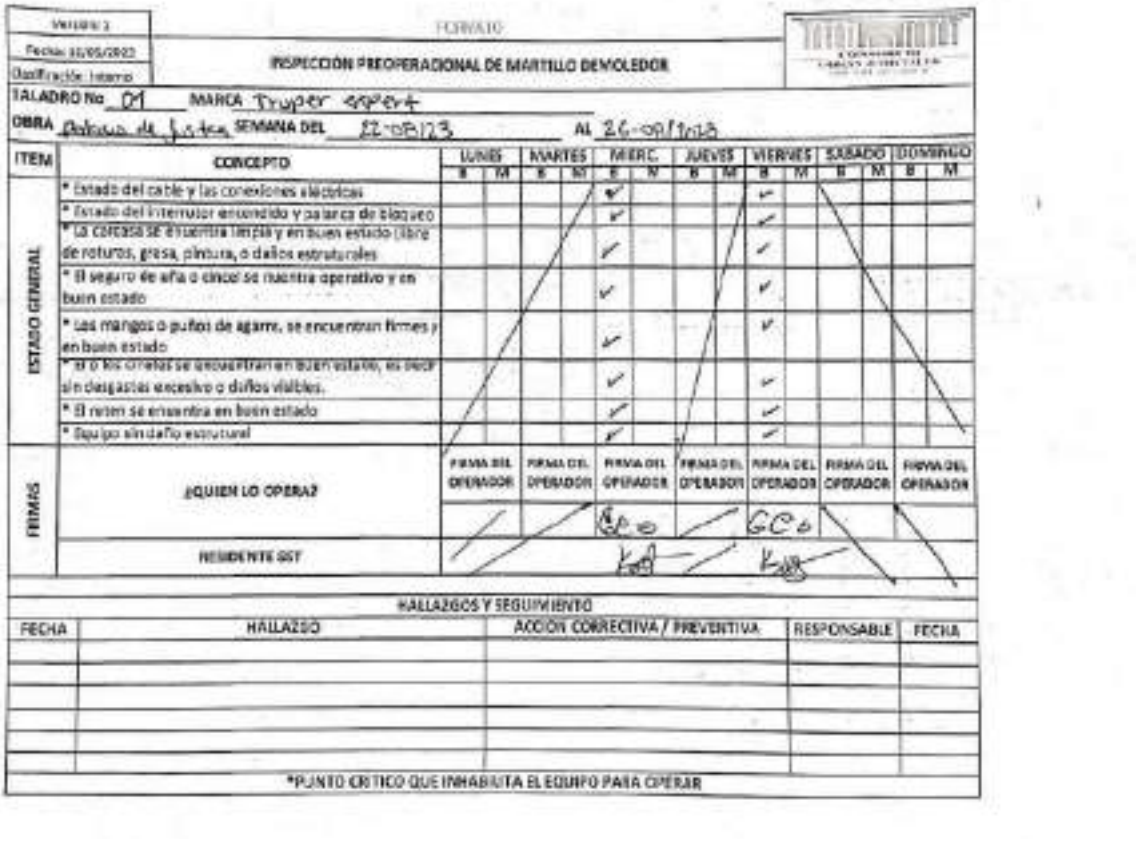

Versión: 1
Fecha: 01/05/2022
Clasificación: Interno

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

TALADRO No 01 MARCA Truper expert

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 22-08-123 AL 26-08-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓				✓					
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo					✓				✓					
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pintura, o daños estructurales					✓				✓					
	* El seguro de uña o cincel se muestra operativo y en buen estado					✓				✓					
	* Las mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado					✓				✓					
	* El o los cinceles se encuentran en buen estado, es decir sin desgastes excesivo o daños visibles.					✓				✓					
	* El retem se encuentra en buen estado					✓				✓					
	* Equipo sin daño estructural					✓				✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
						GCo				GCo					
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1
Fecha: 18/05/2021
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 22-08/23 al 26-08/23

HORA: 07:00 Am - 05:00 pm

OBRA: Palacio de justicia

CONTRATISTA: Consorcio obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N/Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan prensas de banco	✓			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filos de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de las tarrajas macho o hembra			✓	
4	Instalación de las hojas de segueta			✓	
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos			✓	
7	Estado de los filangos y bordes de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?			✓	
2	Estado de huellas y palancas de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de los mordazas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos			✓	
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores			✓	
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?			✓	
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?	✓			
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Abstenientes y sistemas de fijación	✓			
6	Estado del cable y ensilute	✓			
7	Estado y mandil de los taladros	✓			
8	Diámetro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	✓			
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	✓			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?	✓			

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 22-08/2023 al 26-08/2023

HORA: 07:00 A.M. - 05:00 P.M.

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Bueno	No Cargado	Malo	
11	Los cables conectan en diámetro y estan instalados según el enlace?				
12	Estado de los espigos o tornillo en las sondas atornilladas.				
13	Almacenamiento de los pulidores y discos	✓			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN			-	
1	El personal es autorizado			✓	
2	Emplean los elementos de protección			✓	
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta			✓	
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Los labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revistan peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	✓			

Nota: Las dos (2) numerales siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Jaime Mendoza	Reyes Soto
CARGO:	oficial.	R. SST
FIRMA:		

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)
Clasificación: Interno	

Maquina: 1
Obra: Obras Judiciales
Horas inicio: 7:00 Am
Horas fin: 05:00 p-


Semana: 22-08/23 al 26-08/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme					✓								✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas					✓								✓			
VALIERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento					✓								✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento					✓								✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento					✓								✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento					✓								✓			
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento					✓								✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento					✓								✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento					✓								✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento					✓								✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento					✓								✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento					✓								✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento					✓								✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento					✓								✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento					✓								✓			

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	24-06/2023

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	CASTILLO	Karen Soto
CARGO:	OY	Residente SST
FIRMA:	CASTILLO	

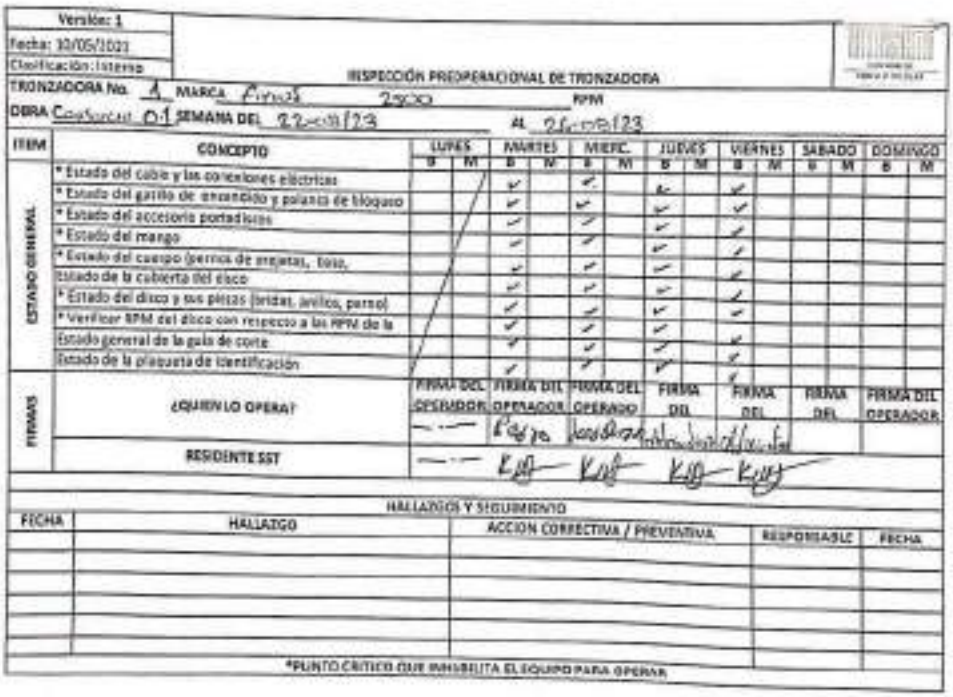

Versión: 1
Fecha: 30/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Pinzas 2500 RPM

OBRA Corferias 01 SEMANA DEL 22-05-23 AL 26-05-23

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del accesorio portadisco			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (perno de empate, tolva,			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la cubierta del disco			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			✓		✓		✓		✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la			✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía de corte			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la placueta de identificación			✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST	—		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 24/07/2021	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO
Clasificación: Interna	

Proyecto: Consorcio obras Judiciales — Semana del 22 al 26 de Agosto 23

Vibrador N°: 01 — Marca:

DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M
Botella vibrador en buenas condiciones									X					
Flexible en buen estado									X					
Cuerpo de acople en buenas condiciones									X					
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo									X					
Rodamiento de giro (acople) en buen estado									X					
Motor en buen estado de funcionamiento									X					
Estructura Metalica en buen estado									X					
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo.									X					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral protector facial, protector respiratorio, casco y guantes.									X					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

Nombre del operador: José Ruiz Duran Firma: José Ruiz

Vobo Residente SST: [illegible] Firma: [illegible]

OBSERVACIONES:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 24/08/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	
Clasificación: Interna		

Proyecto: Consorcio obras Judiciales

Semana del 22 al 26 de Agosto 23

Vibrador N°: 03

Marca: WORKIOR


DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M
Botella vibradora en buenas condiciones									X					
Flexible en buen estado									X					
Cuerpo de acople en buenas condiciones									X					
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.									X					
Rodamiento de giro (acople) en buen estado.									X					
Motor en buen estado de funcionamiento									X					
Estructura Metalica en buen estado									X					
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras,Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo.									X					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral,protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes.									X					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (Bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

Nombre del operador: José L. Cuero Firma: José L.

Valla Residente SST: Daniela S. Firma: Daniela

OBSERVACIONES:

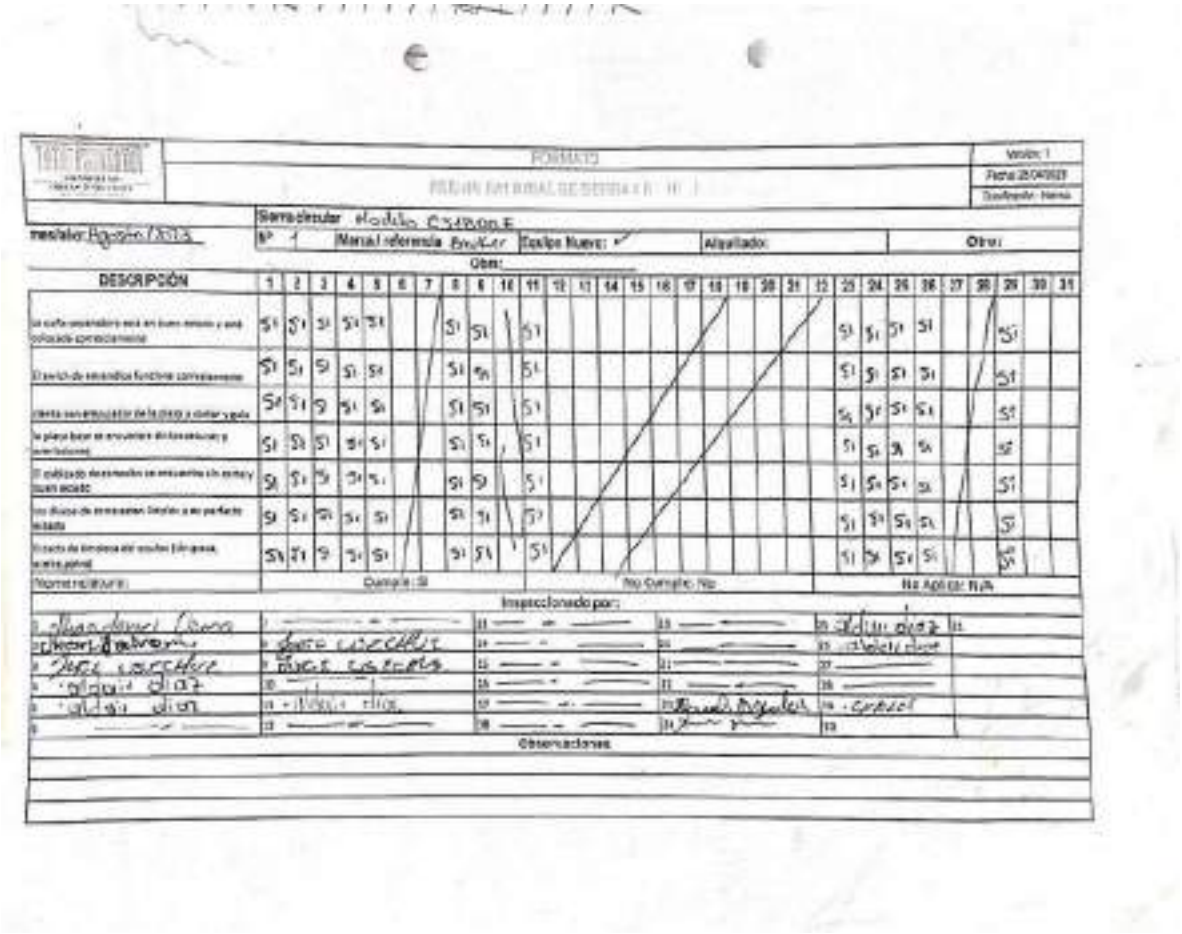

FORMATO

Versión: 1

Fecha: 20/04/2021

Clasificación: Interna

Sierra circular Modelo C5430 DLE

mes/año: Agosto /2015 | Nº 1 | Manual referencia Bruker | Equipo Nuevo: ✓ | Alquilado: | Otro:

Obs:

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		
El switch de encendido funciona correctamente	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		
Utiliza correctamente la ropa y calzado de trabajo	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		
Se plasma bajo el encuentro de la sierra y cortar y guía	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		
El cableado de extensión se encuentra sin cortes y bien aislado	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		
Los discos de trabajan filosos y en perfecto estado	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		
El carro de trabaja del equipo [illegible]	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI		SI												SI	SI	SI	SI			SI		

Normativa aplicable: | Cumple: SI | No Cumple: No | No Aplica: N/A

Inspeccionado por:

Observaciones

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 31-07/2023 - al 05-08/2023

HORA: 07:00 A-

OBRA: Obra en construcción P

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se cuenta con el(los) herramiento(s) adecuado al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	De unas prensas de banco			✓	
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filos de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de las bacajas macho o hembra			✓	
4	Instalación de las hojas de segueta	✓			
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	✓			
7	Estado de los Mangos y filudas de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	De empleo el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus cunas y bordes están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?			✓	
2	Estado de huellas y golpeces de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de los mordazas de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos eléctricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos eléctricos			✓	
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores			✓	
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?				
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			✓	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Alargaderas y sistemas de tierra	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y mandil de los taladros			✓	
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar			✓	
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?			✓	
10	Las esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?			✓	

Versión: 1
Fecha: 18/06/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: 31-07/2023 al 05-08/2023

HORA: 07:00 A.M.

OBRA: Construcción palacios de justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
11	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve?			✓	
12	Estado de las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓	
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos			✓	
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado			✓	
2	Emplean los elementos de protección			✓	
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta			✓	
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revelan peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	✓			

Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Pedro Julio	Kevin Vera
CARGO:	Aux	Resp. SST
FIRMA:	Pedro Julio	

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 28/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)
Clasificación: Interno	

Maquina: 1
Obra: obras judiciales
Horas inicio: 7:00 a.m.
Horas fin: 5:00 p.m.

Semana: 31-05/23 al 05-06/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	24-05/2023

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	PEDRO JULIO	Karen Soto
CARGO:	PEDRO JULIO oficial	Resid. SST
FIRMA:	OF: PEDRO JUL	

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS


FECHA: 09-08/2023 al 12-08/2023

HORA: 07:00 Am - 05:00 pm

OBRA: Construcción Palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio Obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	✓			
2	Estado de la Herramienta	✓			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	✓			
4	Estado de los mangos de madera	✓			
5	Se usan prensas de banco	✓			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles			✓	
2	Filos de los cinceles			✓	
3	Estado de los dientes de los tarrajos macho o hembra			✓	
4	Instalación de las hojas de seguetá			✓	
5	Estado de los mangos de las limas			✓	
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos			✓	
7	Estado de los filangos y hundas de los cuchillos			✓	
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	✓			
3	Estado en que se encuentra el mango	✓			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?			✓	
2	Estado de mordas y palancas de la llave			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear?			✓	
4	Estado de los mordazos de las llaves			✓	
5	Estado de las herramientas para trabajos eléctricos			✓	
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos eléctricos			✓	
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores			✓	
8	Se dispone las herramientas que no produzcan chispas?			✓	
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			✓	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	✓			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	✓			
4	Guardas de seguridad	✓			
5	Aislamientos y sistemas de blindaje	✓			
6	Estado del cable y enchufe	✓			
7	Estado y mandil de los taladros			✓	
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar			✓	
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?			✓	
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?			✓	

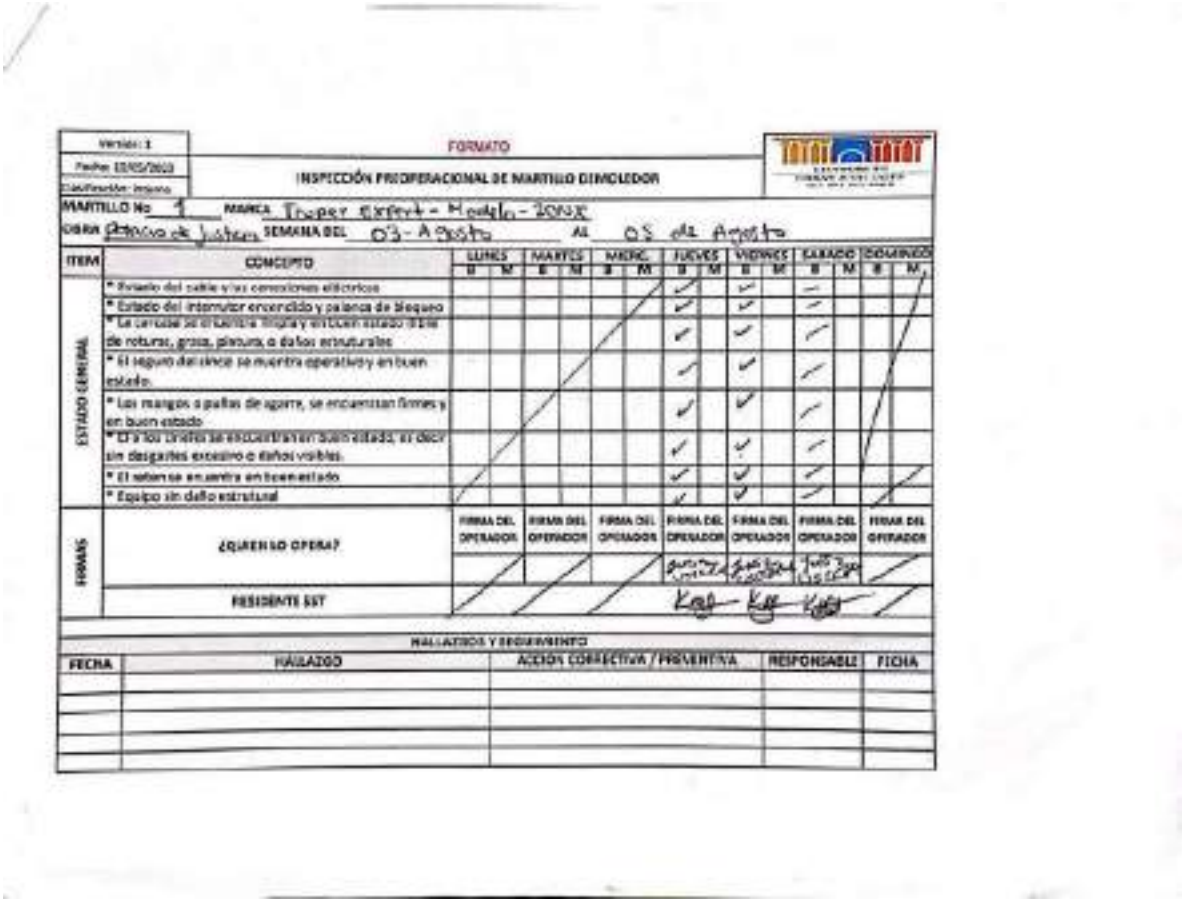

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR

MARTILLO No 1 MARCA Hoper Expert - Modelo - 2012

OBRA Palacio de Justicia SEMANA DEL 03 - Agosto AL 05 de Agosto

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas							✓		✓		—			
	* Estado del interruptor encendido y palanca de bloqueo							✓		✓		—			
	* La carcasa se encuentra limpia y en buen estado libre de roturas, grasa, pinturas o daños estructurales							✓		✓		—			
	* El seguro del cincel se muestra operativo y en buen estado.							✓		✓		—			
	* Las mangas o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado							✓		✓		—			
	* En los cinceles se encuentra en buen estado, el dado sin desgastes excesivo o daños visibles.							✓		✓		—			
	* El taladro se encuentra en buen estado							✓		✓		—			
	* Equipo sin daño estructural							✓		✓		—			
FIRMAS	¿QUIEN SO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FICHA

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 28/04/2023	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO MANUAL (TROMPO)
Clasificación: Interna	

Maquina: 1
Obra: Obras Judiciales
Horas inicio: 07:00
Horas fin: 05:00

Semana: 08-08/23 al 12-08/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIERC C	MIERC NC	JUEV C	JUEV NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme					✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas					✓		✓		✓		✓		✓			
VALIERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento					✓		✓		✓		✓		✓			

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	24-06/2023
Observación:	

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Alberto Castillo	Karen Soto
CARGO:	Ayudante	Resid. SST
FIRMA:	Castillo	

Versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FECHA: OB-081093 al 12-08/2023

HORA: 07:00 a.m. - 05:00 p.m.


OBRA: Construcción palacio de Justicia

CONTRATISTA: Consorcio obras Judiciales

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	N Aplica	
11	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el roteo?			✓	
12	Estado de las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓	
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos	✓			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples			✓	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?			✓	
3	Presiones indicadas			✓	
4	Descarga de la herramienta			✓	
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN			✓	
1	El personal es autorizado			✓	
2	Emplean los elementos de protección			✓	
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta			✓	
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	✓			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	✓			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	✓			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	✓			
5	Almacenamiento	✓			
6	Herramientas y equipos en buen estado	✓			
7	Se utilizan correctamente	✓			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	✓			

Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Pedro Julio Sanabria	Karen Soto
CARGO:	Oficial	Residente SST
FIRMA:		

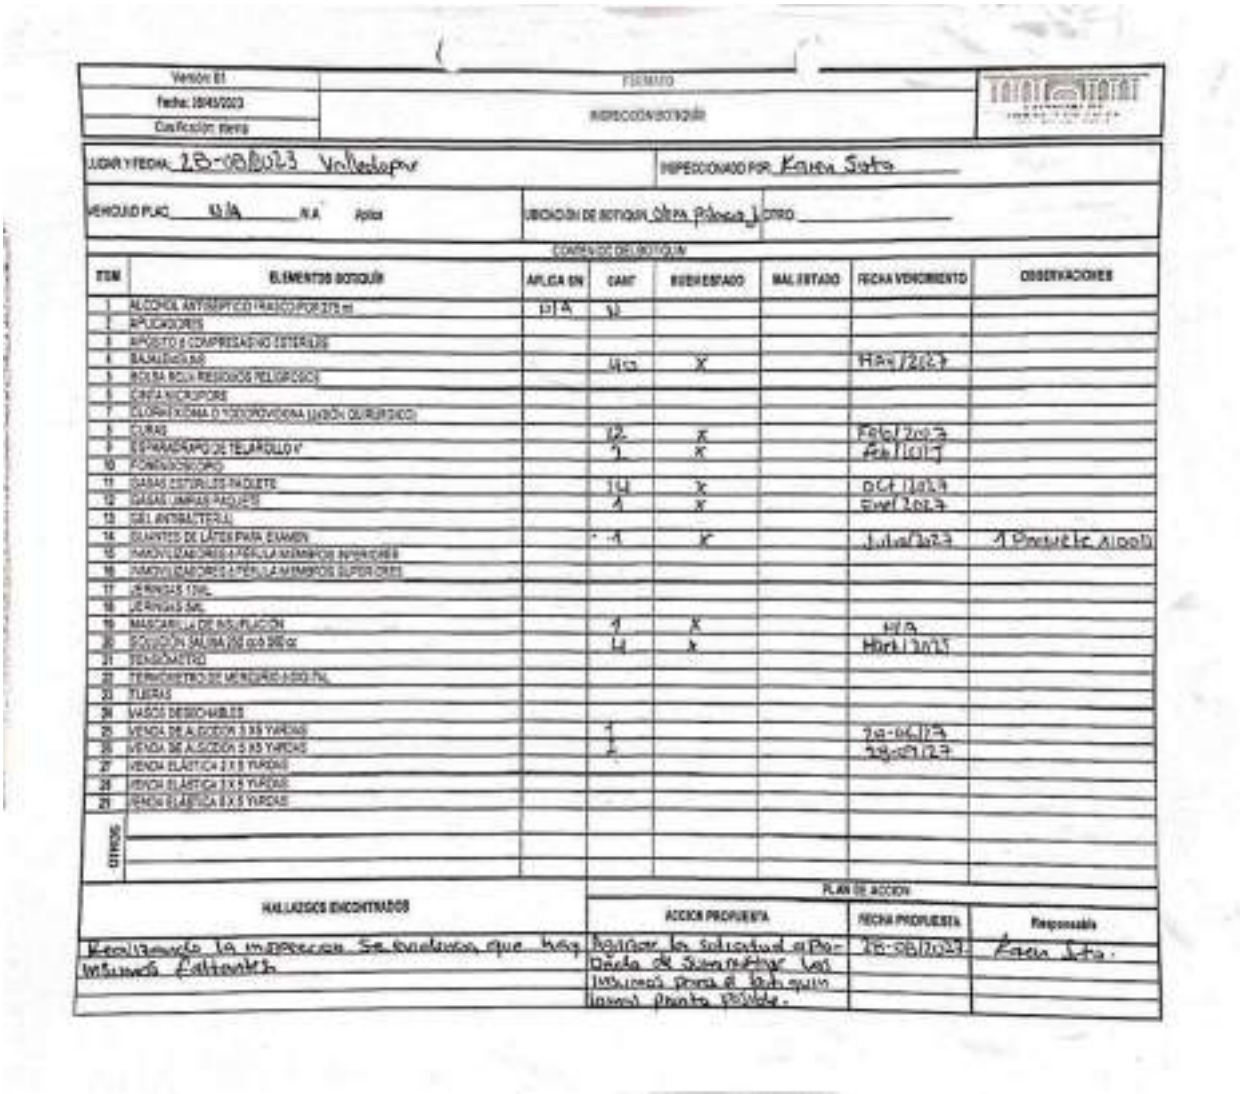

Versión: 01 | FORMATO
Fecha: 08/08/2023 | INSPECCIÓN BOTIQUÍN
Clasificación: Interna


LUGAR Y FECHA: 28-08-2023 Valledupar | INSPECCIONADO POR: Karen Sista

VEHÍCULO PLACA: N/A N.A Aplica | UBICACIÓN DE BOTIQUÍN: Obra Palosa 1 OTRO: _____

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	ELEMENTOS BOTIQUÍN	APLICA SI/N	CANT	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO (FRASCO POR 375 ml)	SI/A	1				
2	APLICADORES						
3	APOSITO O COMPRESA ESTERILES						
4	BANDAS/VENDAS		4	X		MAY/2024	
5	BOLSA ROJA RESIDUOS PELIGROSOS						
6	CINTA MICROPORE						
7	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (SOLUCIÓN QUIRÚRGICO)						
8	CURAS		12	X		Feb/2024	
9	ESFIGMOMANÓMETRO DE TEJADILLO O		1	X		Feb/2024	
10	FONENDOSCOPIO						
11	GASAS ESTERILES EN PAQUETE		14	X		OCT/2024	
12	GASAS LIMPIAS PAQUETE		1	X		Ene/2024	
13	GEL ANTIBACTERIAL						
14	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN		1	X		Julio/2023	1 Pequeño Aloolo
15	INMOVILIZADORES CERVICALES MIEMBROS INFERIORES						
16	INMOVILIZADORES CERVICALES MIEMBROS SUPERIORES						
17	JERINGAS 10ML						
18	JERINGAS 5ML						
19	MASCARILLA DE RESUCITACIÓN		1	X		N/A	
20	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc		4	X		Mar/2025	
21	TENSIOMETRO						
22	TERMOMETRO DE MERCURIO O DIGITAL						
23	TIJERAS						
24	VASOS DESECHABLES						
25	VENDA DE ADICCIÓN 3 X5 YARDAS		1			28-06-23	
26	VENDA DE ADICCIÓN 5 X5 YARDAS		1			28-07-23	
27	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS						
28	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS						
29	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS						
OTROS							

HALLAZGOS ENCONTRADOS	PLAN DE ACCIÓN		
	ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	Responsable
Realizando la inspección se evidencia que hay insumos faltantes	Agotar la solicitud a Pe- Dida de Suministros los insumos para el botiquín lo mas pronto posible.	28-08-2023	Karen Sista.

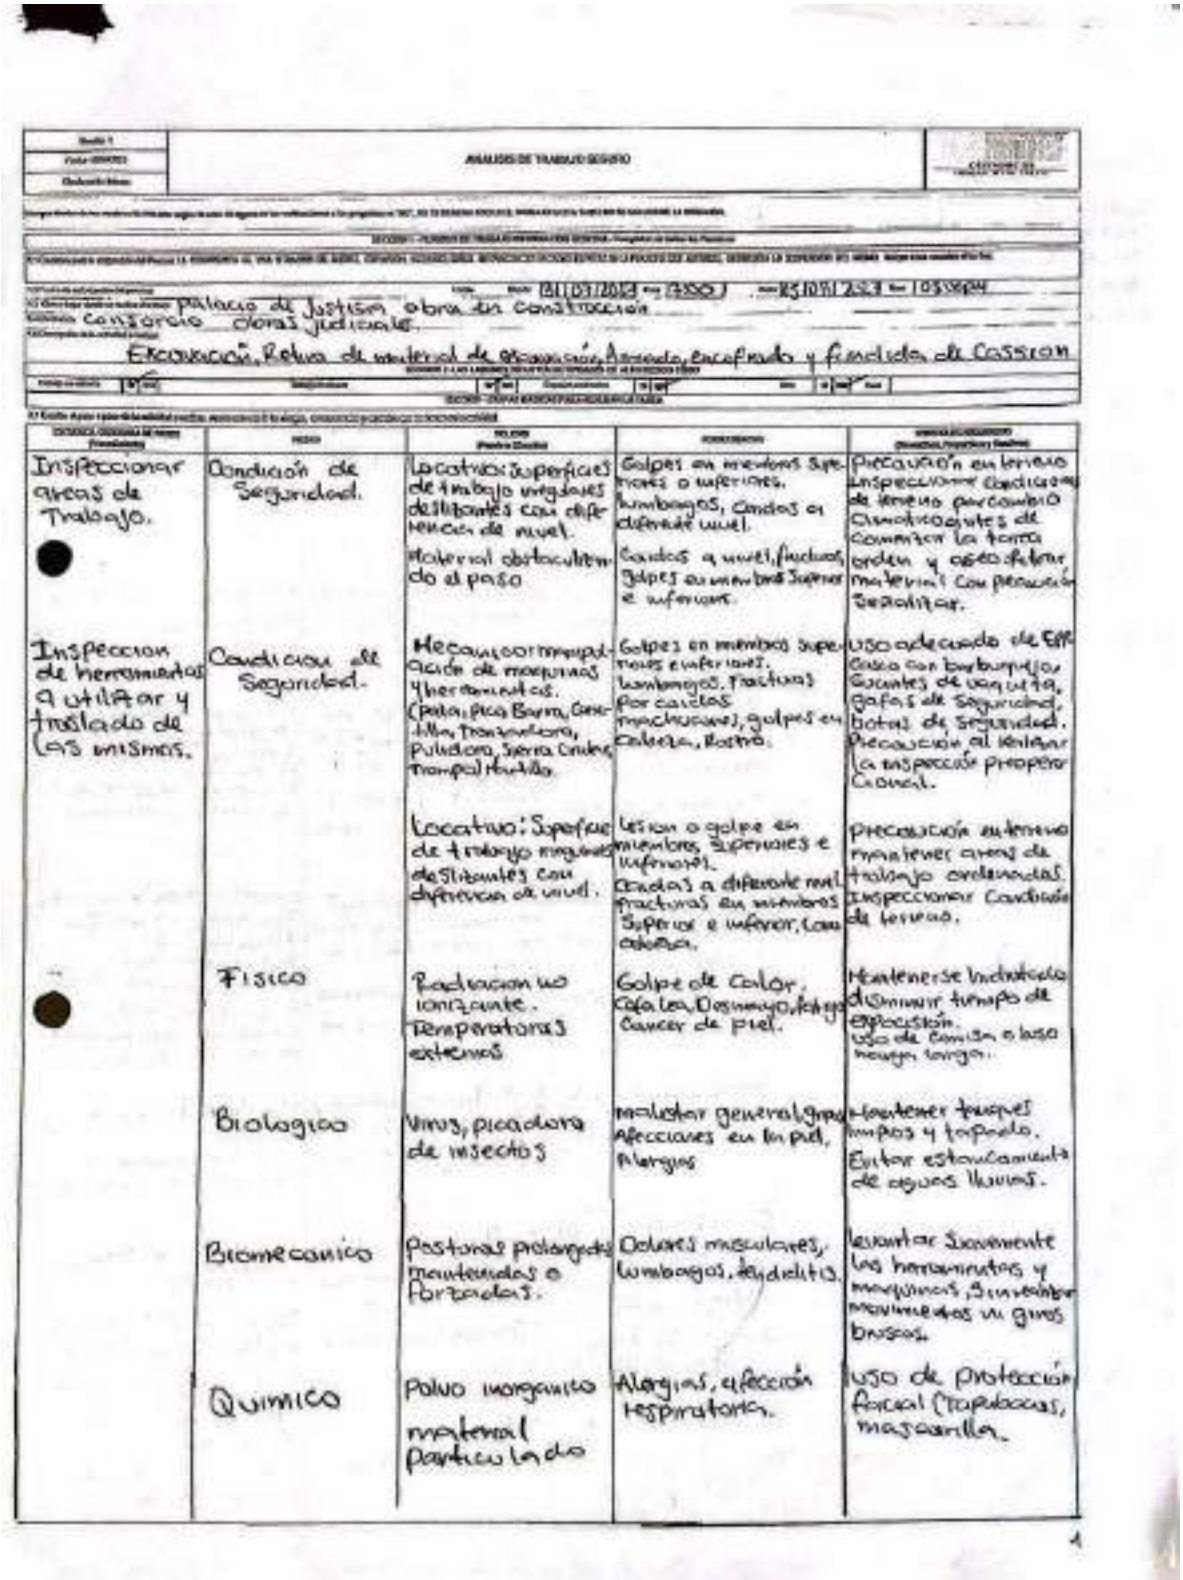

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha: 01/03/2023 — 7:55 — 15/05/2023 — 05:46pm


Palacio de Justicia obra en construcción

Consorcio obras judiciales


Excavación, Retiro de material de excavación, Armado, encofrado y fundida de Cassion

Inspeccionar áreas de Trabajo.	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes con diferencias de nivel.	Golpes en miembros superiores o inferiores, hundimientos, caidas a diferente nivel.	Precaución en terreno Inspeccionar condiciones de terreno para cambio Circunstancias de comenzar las tareas orden y aseo alrededor material con precaución señalizar.
		Material obstaculizando el paso	Caidas a nivel, fracturas Golpes en miembros superior e inferiores.	
Inspeccion de herramientas a utilizar y traslado de las mismas.	Condiciones de Seguridad.	Mecanico manipulación de maquinas y herramientas. (Pala, pica Barra, Cortadora, Trasnpaleta, Pulidora, Sierra Caladora, Trompo, Martillo	Golpes en miembros superiores e inferiores. Hundimientos. Fracturas por cortes machucones, golpes en cabeza, Rostro.	Uso adecuado de EPP casco con barbuquejo Guantes de vaqueta, gafas de seguridad, botas de seguridad. Precaución al retirar la inspección propero Cuidado.
		Locativo: Superficie de trabajo irregulares deslizantes con diferencias de nivel.	Lesion o golpe en miembros, superiores e inferiores. Caidas a diferente nivel fracturas en miembros Superior e inferior, cabeza.	Precaución en terreno mantener areas de trabajo ordenadas. Inspeccionar Condición de terreno.
	Fisico	Radiacion no ionizante. Temperaturas extremas	Golpe de Calor, Cefalea, Deshidratación, fatiga Cancer de piel.	Mantenerse hidratado disminuir tiempo de exposición. uso de camisa o ropa manga larga.
	Biologico	Virus, picadura de insectos	malestar general, Gripa Afecciones en la piel, Alergias	Mantener tanques limpios y tapados. Evitar estancamiento de aguas lluvias.
	Biomecanico	Posturas prolongadas mantenidas o forzadas.	Dolores musculares, lumbagos, dolidad.	levantar lentamente las herramientas y maquinas, Mantener movimientos en ejes basicos.
	Quimico	Polvo inorganico material particulado	Alergias, afección respiratoria.	Uso de Protección facial (Polaroides, mascarilla.


Inicio Excavación de Barga para el muro de limpieza.	Biomecanico	Postura Sedente Sin cambio de Posicion	Lesiones osteomus. culares (columna, espalda en miembros Superiores)	Asegurese que el personal realice las pausas activas intercaladas en las actividades
		Trabajo con alta carga de movimientos repetitivo en miembros superiores.	Lumbago, Fatiga fixaciones, hernia discal. Fracturas.	Fomentar el autocuidado en el puesto de trabajo Posturas adecuadas
	Fisico	Radiaciones no Ionizantes Exposicion a radiaciones por el Sol.	Dolor de cabeza, mareo, deshidratacion insolacion.	El personal debe hidratarse cada vez que su organismo lo requiere.
		Disconfort termico Exposicion a temperaturas extremas.	golpe de calor (mareo, deshidratacion, perdida de conciencia, desmayo)	Uso adecuado de dotacion (camisa manga larga, pantalon jean, mantenerse hidratado, realizar descanso de 15 minutos en un lugar fresco
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies y desplazamiento caida a diferente nivel.	Traumas, heridas, contusiones, lesiones en miembros superiores e inferiores.	Nivelación de terreno Autocuidado
		Material desplazando el peso.	esguince, fracturas Golpes que pueden Generar lesiones incapacitantes.	Señalizacion de areas con dificil acceso Realizar Jornadas de orden y aseo que permita la organizacion adecuada de las areas de trabajo
		Mecanico: Manipulación de herramental (pala, pico, Barra, carretilla)	Golpes, Fractura, Esguince, Contusion Lesiones incapacitante	Inspeccionar las herramientas antes de ser utilizadas, dando el uso adecuado para el cual son diseñadas
		Accidente de transito. Maquinaria en movimiento Ingreso de volquetas.	Golpes, atropellamiento, fracturas, lesiones miembros Superiores e inferiores, muerte. Traumatismo, muerte.	Pitar de retroceso, reflectivo Dirigirse actividad Autocuidado
	Biologico	Virus Cyripa) Picaduras de insectos	Infeccion respiratoria, malestar General Irritacion en la piel.	Uso adecuado de tapabocas Seguimiento frente a reportes grupales. Uso de Repelente.

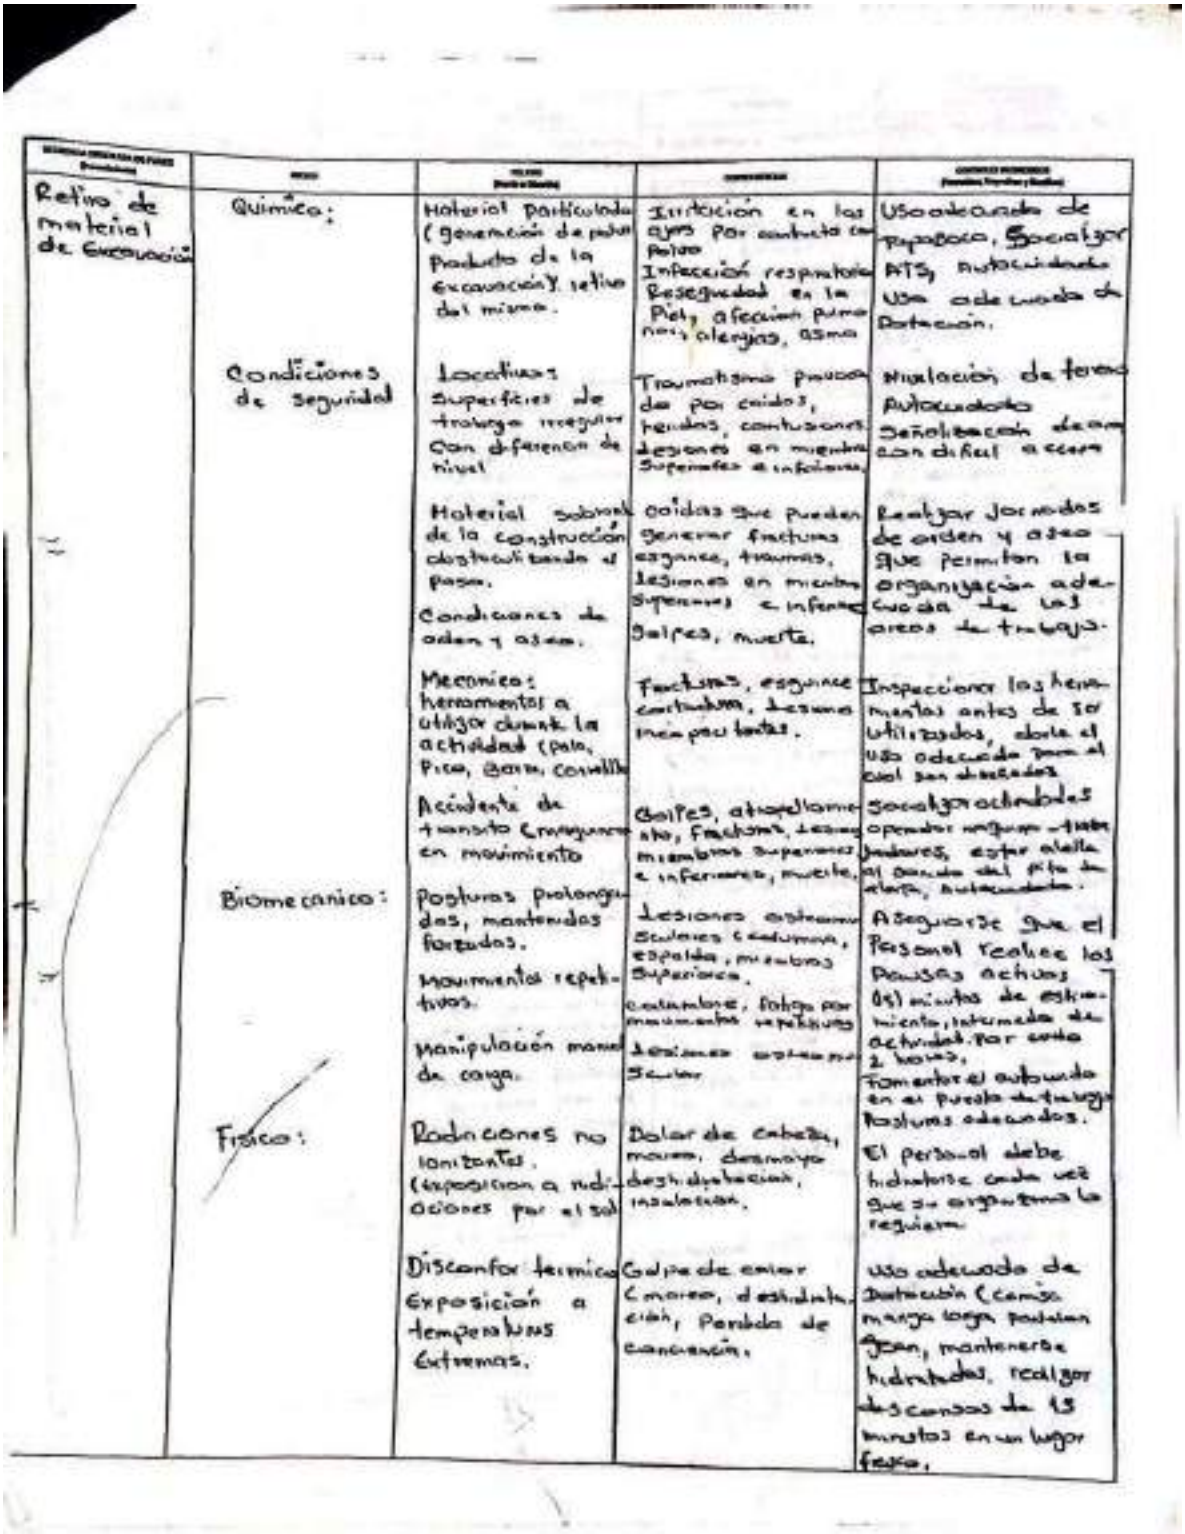



Retiro de material de Excavación	Químico:	Material particulado (generación de polvo) Producto de la excavación y retiro del mismo.	Irritación en los ojos por contacto con polvo Infección respiratoria Resequedad en la Piel, afección pulmonar, alergias, asma	Uso adecuado de tapabocas, gafas de seguridad, ATS, Autocuidado Uso adecuado de Protección.
	Condiciones de seguridad	Locativas: Superficies de trabajo irregular Con diferencia de nivel	Traumatismo producido por caídas, heridas, contusiones, lesiones en miembros Superiores e inferiores.	Nivelación de terreno Autocuidado Señalización de áreas con difícil acceso
		Material sobrante de la construcción obstaculizando el paso.	caídas que pueden generar fracturas esguince, traumas, lesiones en miembros Superiores e inferiores	Realizar Jornadas de orden y aseo que permitan la organización adecuada de las áreas de trabajo.
		Condiciones de orden y aseo.	Golpes, muerte.	
		Mecánico: herramientas a utilizar durante la actividad (pala, Pica, Barra, cornalla	Fracturas, esguince contusiones, lesiones incapacitantes.	Inspeccionar las herramientas antes de ser utilizados, dando el uso adecuado para el cual son diseñados
		Accidente de transito Cruzamiento en movimiento	Golpes, atropellamiento, fracturas, lesiones miembros superiores e inferiores, muerte.	Socializar actividades operador maquina trabajadores, estar alerta al sonido del pito de alerta, autocuidado.
	Biomecánico:	Posturas prolongadas, mantenidas forzadas.	Lesiones osteomusculares (columna, espalda, miembros Superiores.	Asegurarse que el Personal realice las Pausas activas Oficiantes de estiramiento, intermedio de actividad por cada 2 horas.
		Movimientos repetitivos.	columnalgia, fatiga por movimientos repetitivos	
		Manipulación manual de carga.	lesiones osteomusculares	Fomentar el autocuidado en el puesto de trabajo Posturas adecuadas.
	Físico:	Radiaciones no ionizantes. (exposición a radiaciones por el sol)	Dolor de cabeza, mareo, desmayo deshidratación, insolación.	El personal debe hidratarse cada vez que su organismo lo requiera.
		Disconfor térmico Exposición a temperaturas Extremas.	Golpe de calor (mareo, deshidratación, Perdida de conciencia.	Uso adecuado de Protección (camisa manga larga pantalón jean, mantenerse hidratados, realizar descansos de 15 minutos en un lugar fresco.

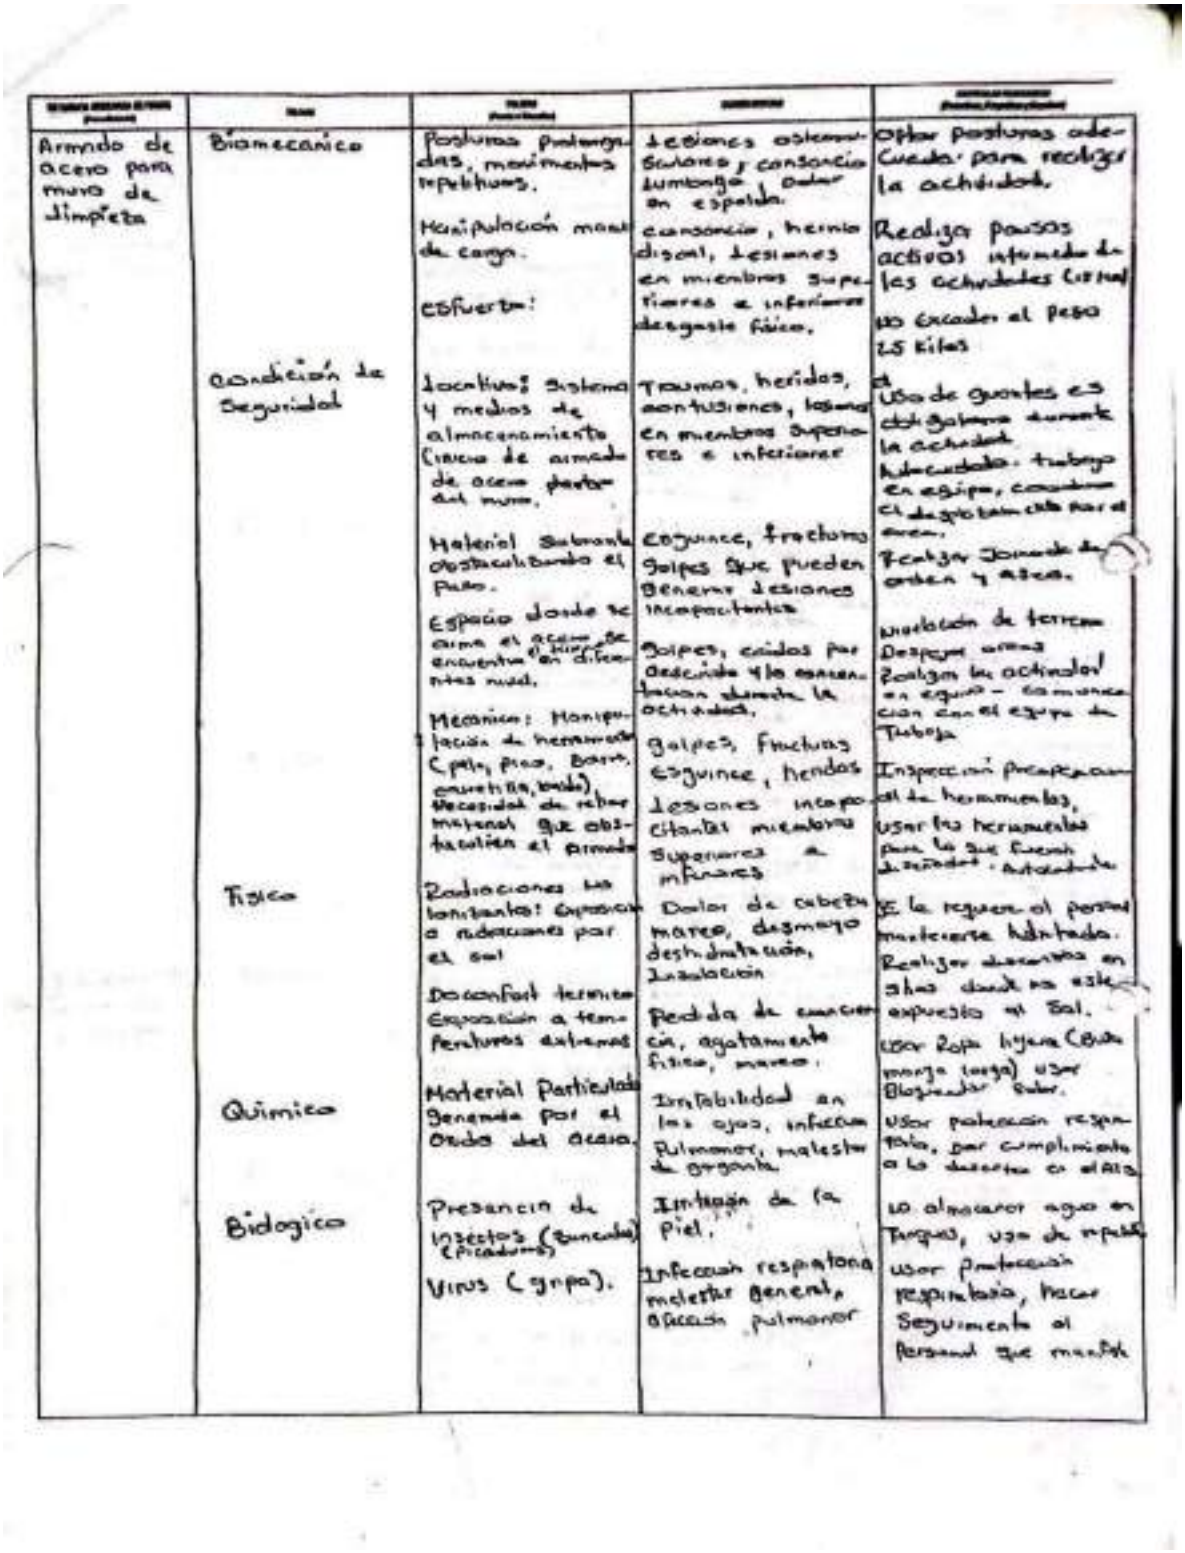



Armado de acero para muro de limpieza	Biomecanico	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Manipulación manual de carga. esfuerzo!	Lesiones osteomusculares y consancio lumbago y dolor en espalda. cansancio, hernia discal, lesiones en miembros superiores e inferiores desgaste físico.	Optar posturas adecuada para recalizar la actividad. Realiza pausas activas intermedio de las actividades (descanso) no exceder el peso 25 kilos
	condición de Seguridad	locativo: Sistema y medios de almacenamiento (riesgo de armado de acero dentro del muro. Material Suelto obstaculizando el paso. Espacio donde se arma el acero se encuentra en diferentes nivel. Mecanico: Manipulación de herramienta (pala, pica, Barra, cuerda, taladro) Necesidad de retirar material que obstaculizan el armado	Traumas, heridas, contusiones, lesiones en miembros superiores e inferiores Esguince, fracturas golpes que pueden Generar lesiones incapacitantes Golpes, caidas por descuido y la esencia hacia donde la actividad. Golpes, Fracturas Esguince, heridas lesiones incapacitantes miembros superiores e inferiores	Uso de guantes es obligatorio durante la actividad (descuidado. trabajo en equipo, cuidado el de los demas por el area. Realizar Jornada de orden y aseo. Disposición de terreno Despejar area Realizar las actividades en equipo - comunicación con el equipo de Trabajo Inspección precapacitación de herramientas, usar las herramientas para la que fueron diseñadas - Autocuidado
	Fisico	Radiaciones los ultravioletas: Exposición a radiaciones por el sol Disconfort termico Exposición a temperaturas extremas	Dolor de cabeza mareo, desmayo deshidratación, Insolación Perdida de conciencia, agotamiento fisico, mareo.	Se le requiere al personal mantenerse hidratado. Realizar descansos en sitios donde no este expuesto al Sol. Usar Ropa ligera (Blusa manga larga) usar Bloqueador Solar.
	Quimico	Material Particulado Generado por el Oxido del acero.	Irritabilidad en los ojos, infección Pulmonar, malestar de organismo	Usar protección respiratoria, por cumplimiento a la directiva de el Ais
	Biologico	Presencia de insectos (Zancudos) (Picaduras) Virus (gripa).	Irritación de la piel. Infección respiratoria malestar General, afección pulmonar	Al almacenar agua en Tanques, uso de repelente Usar protección respiratoria, hacer Seguimiento al Personal que maneje

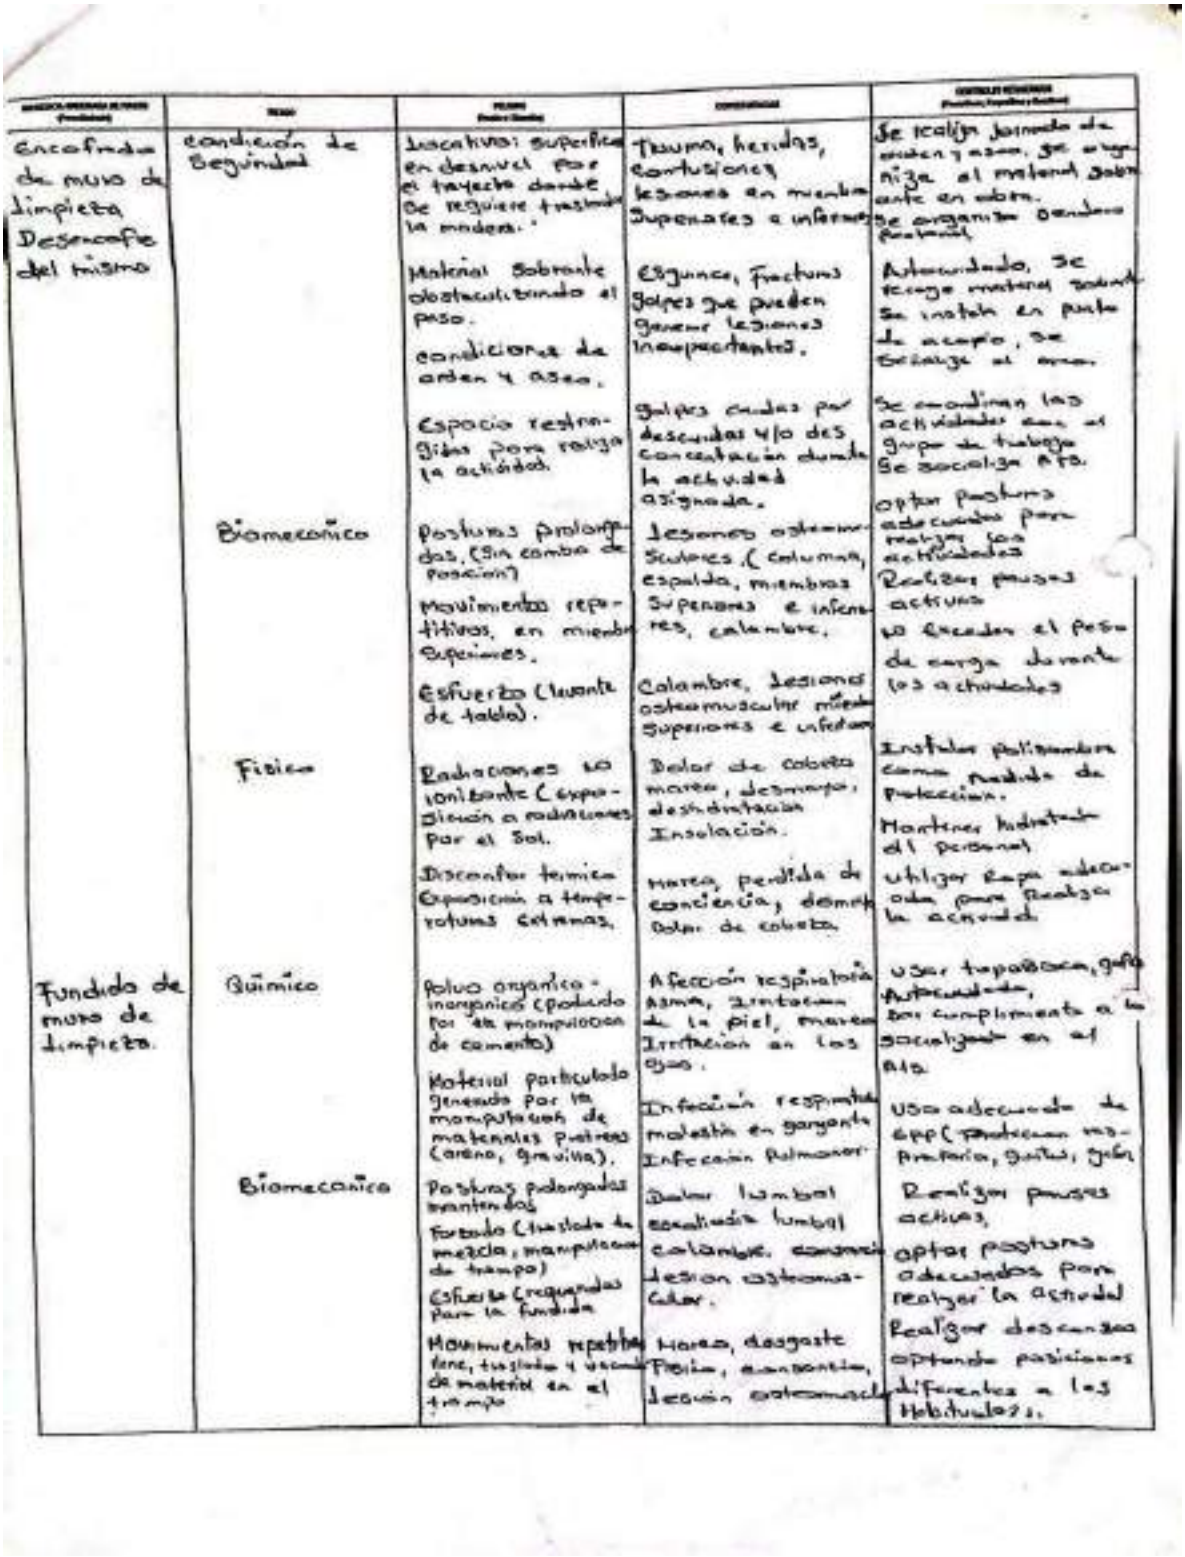

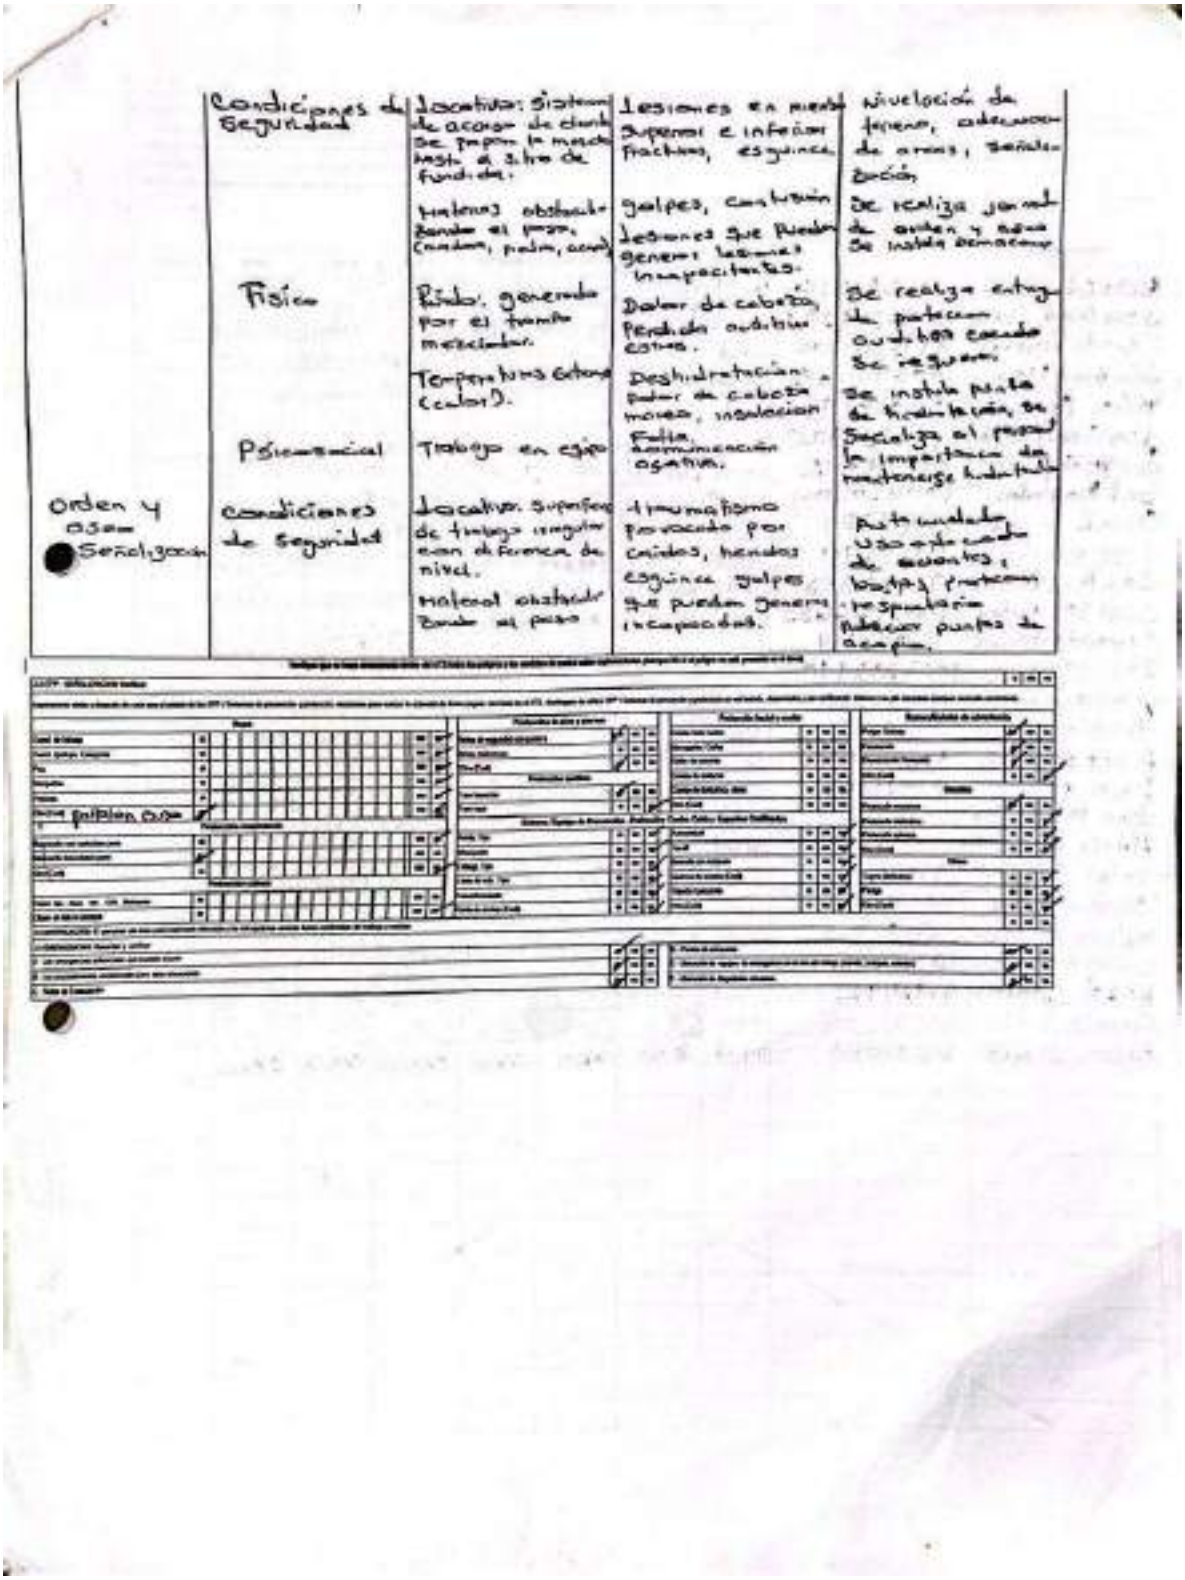
Condiciones de Seguridad
Locativa: Sistema de acceso de cierre de tapon la maquina hasta el 3.lvo de fundida.
Fisico
Ruido, generado por el tramo mecanizado.
Temperaturas Extrem (calor).
Psicosocial
Trabajo en equipo
Orden y aseo
Señalizacion
condiciones de Seguridad
Locativa. Superficie de trabajo irregular con diferencia de nivel.
Material obstaculiza Sobre el piso
Lesiones en miembros superiores e inferiores Fracturas, esguinces.
golpes, contusion
Lesiones que pueden generar lesiones incapacitantes.
Dolor de cabeza, perdida auditiva estres.
Deshidratacion: dolor de cabeza mareo, vomitacion
Falta comunicacion agotiva.
Inmunismo provocado por caidas, heridas esguinces golpes que pueden generar incapacidad.
Nivelacion de terreno, adecuacion de areas, señalizacion
Se realiza jornada de orden y aseo se instala almacen
Se realiza entrega de protectores auditivos cuando se ingresa.
Se instala punto de hidratacion, se Socializa al personal la importancia de mantenerse hidratado
Autocuidado uso adecuado de elementos, botas, protectores respiratorios
Mantener puntos de acopio.

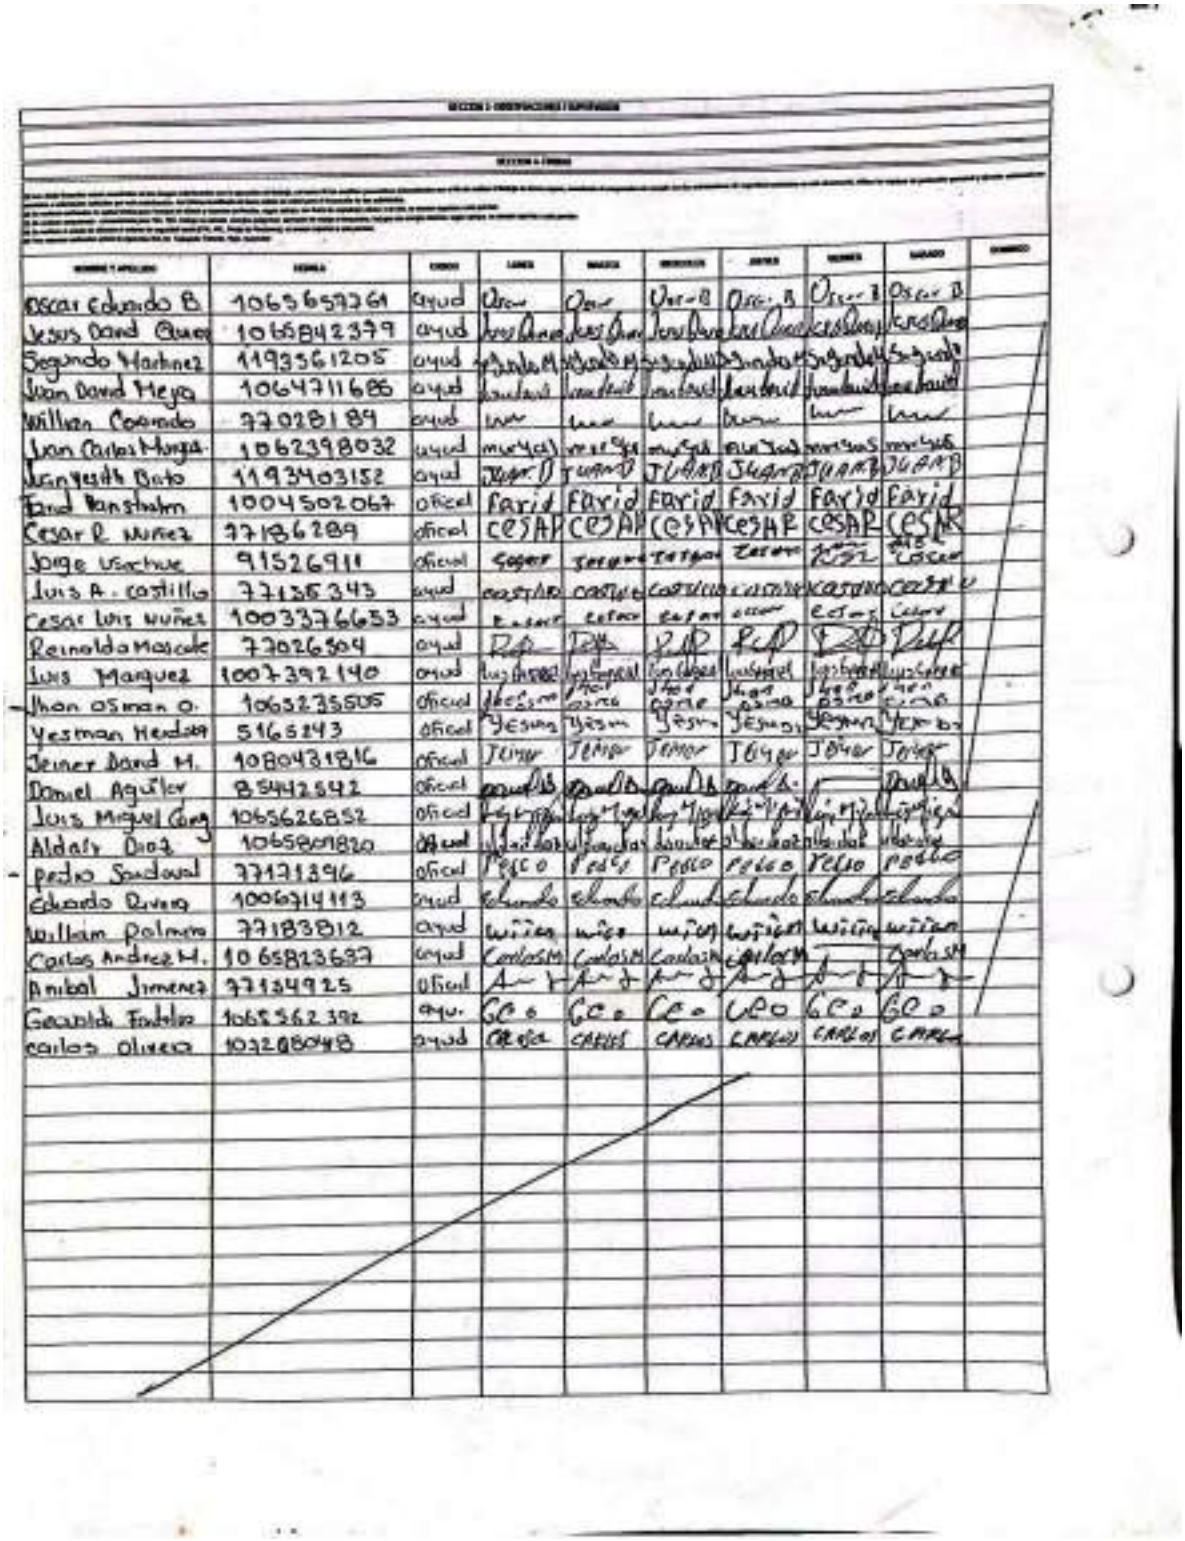

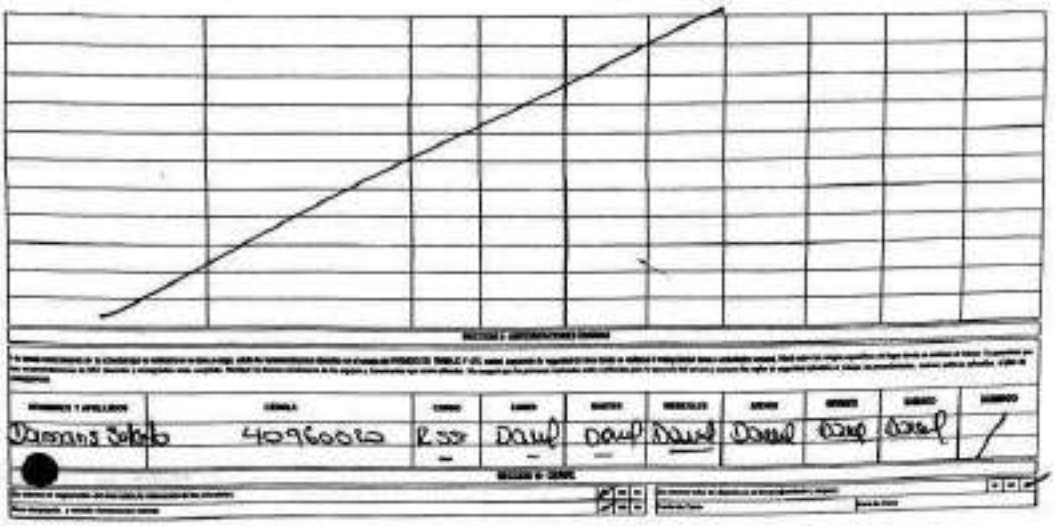


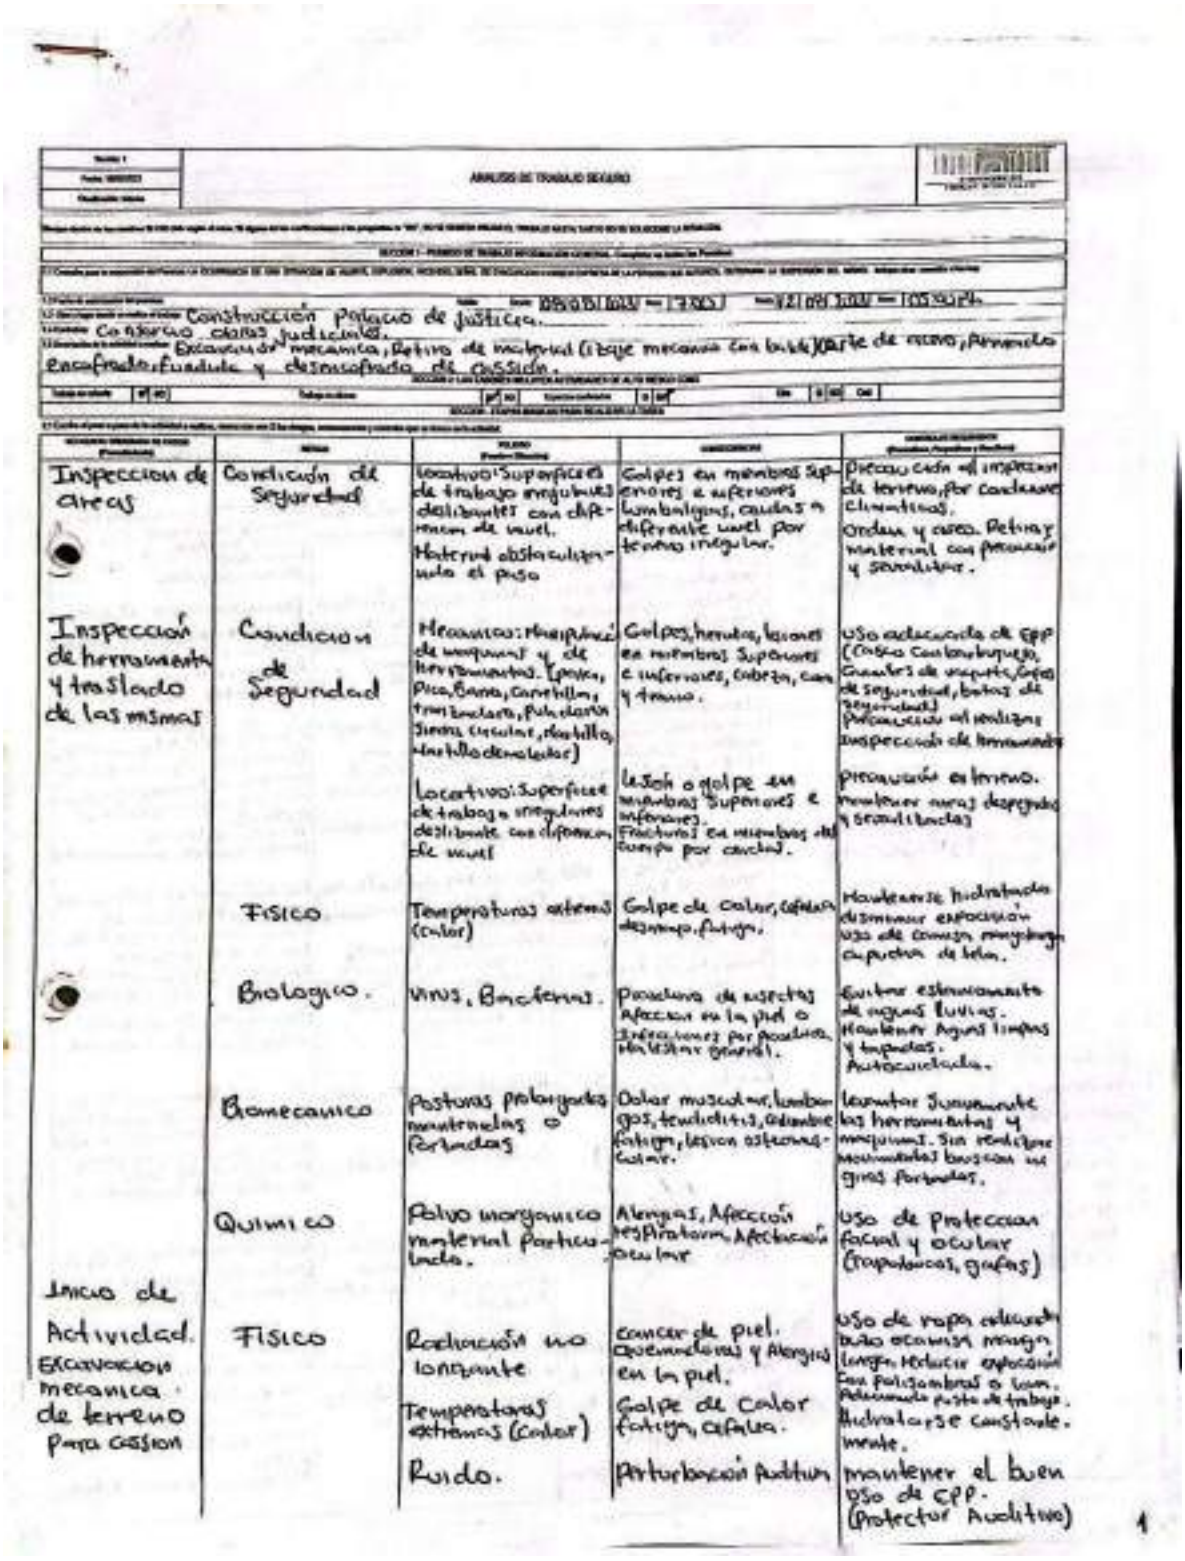


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Construcción palacio de justicia.
Consorcio obras judiciales.
Excavación mecanica, Retiro de material (Cargue mecanico con bobcat) Corte de acero, Armado, Encofrado, Fundido y desencofrado de cassión.

Inspeccion de areas	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficies de trabajo irregulares deslizantes con diferencias de nivel. Material obstaculizando el paso	Golpes en miembros superiores e inferiores Lumbalgias, caidas a diferente nivel por terreno irregular.	Precaucion cada vez inspeccion de terreno, por condiciones climaticas. Orden y aseo. Retirar material con precaucion y señalizar.
Inspeccion de herramienta y traslado de las mismas	Condicion de Seguridad	Mecanico: Manipulacion de maquinas y de herramientas. (pala, pica, Barra, Cortahierro, trompa cabra, Pulidora, Sierra circular, martillo, martillo demoledor)	Golpes, heridas, lesiones en miembros superiores e inferiores, cabeza, cara y trauma.	Uso adecuado de EPP (Casco con barbuquejo, Guantes de vaqueta, Gafas de seguridad, botas de seguridad) Precaucion al realizar inspeccion de herramientas
		Locativo: Superficie de trabajo irregulares deslizante con diferencias de nivel	Lesion o golpe en miembros superiores e inferiores. Fracturas en miembros del cuerpo por caidas.	Precaucion en terreno. Mantener vias despejadas y señalizadas
	Fisico	Temperaturas extremas (Calor)	Golpe de calor, cefalea, desmayo, fatiga.	Mantenerse hidratados disminuir exposicion uso de camisa manga larga y gorra de tela.
	Biologico.	Virus, Bacterias.	Presencia de insectos Afeccion en la piel o Infecciones por picadura. Mantener general.	Evitar estancamiento de aguas lluvias. Mantener Aguas limpias y tapadas. Autocuidado.
	Biomecanico	Posturas prolongadas mantenidas o forzadas	Dolor muscular, lumbagos, tendinitis, Calambre fatiga, lesion osteomuscular.	Levantar juiciosamente las herramientas y maquinas. Sin realizar movimientos bruscos ni giros forzados.
	Quimico	Polvo inorganico material particulado.	Alergias, Afeccion respiratoria, Afeccion ocular	Uso de Proteccion facial y ocular (respiradores, gafas)
Inicio de Actividad. Excavacion mecanica de terreno para cesion	Fisico	Radiacion no ionizante	Cancer de piel. Quemaduras y Alergias en la piel.	Uso de ropa adecuada bota camisa manga larga, Reducir exposicion con periodos a sombra. Adecuar puesto de trabajo. Hidratarse constantemente.
		Temperaturas extremas (Calor)	Golpe de calor fatiga, cefalea.	
		Ruido.	Perturbacion Auditiva	mantener el buen uso de EPP. (Protector Auditivo)

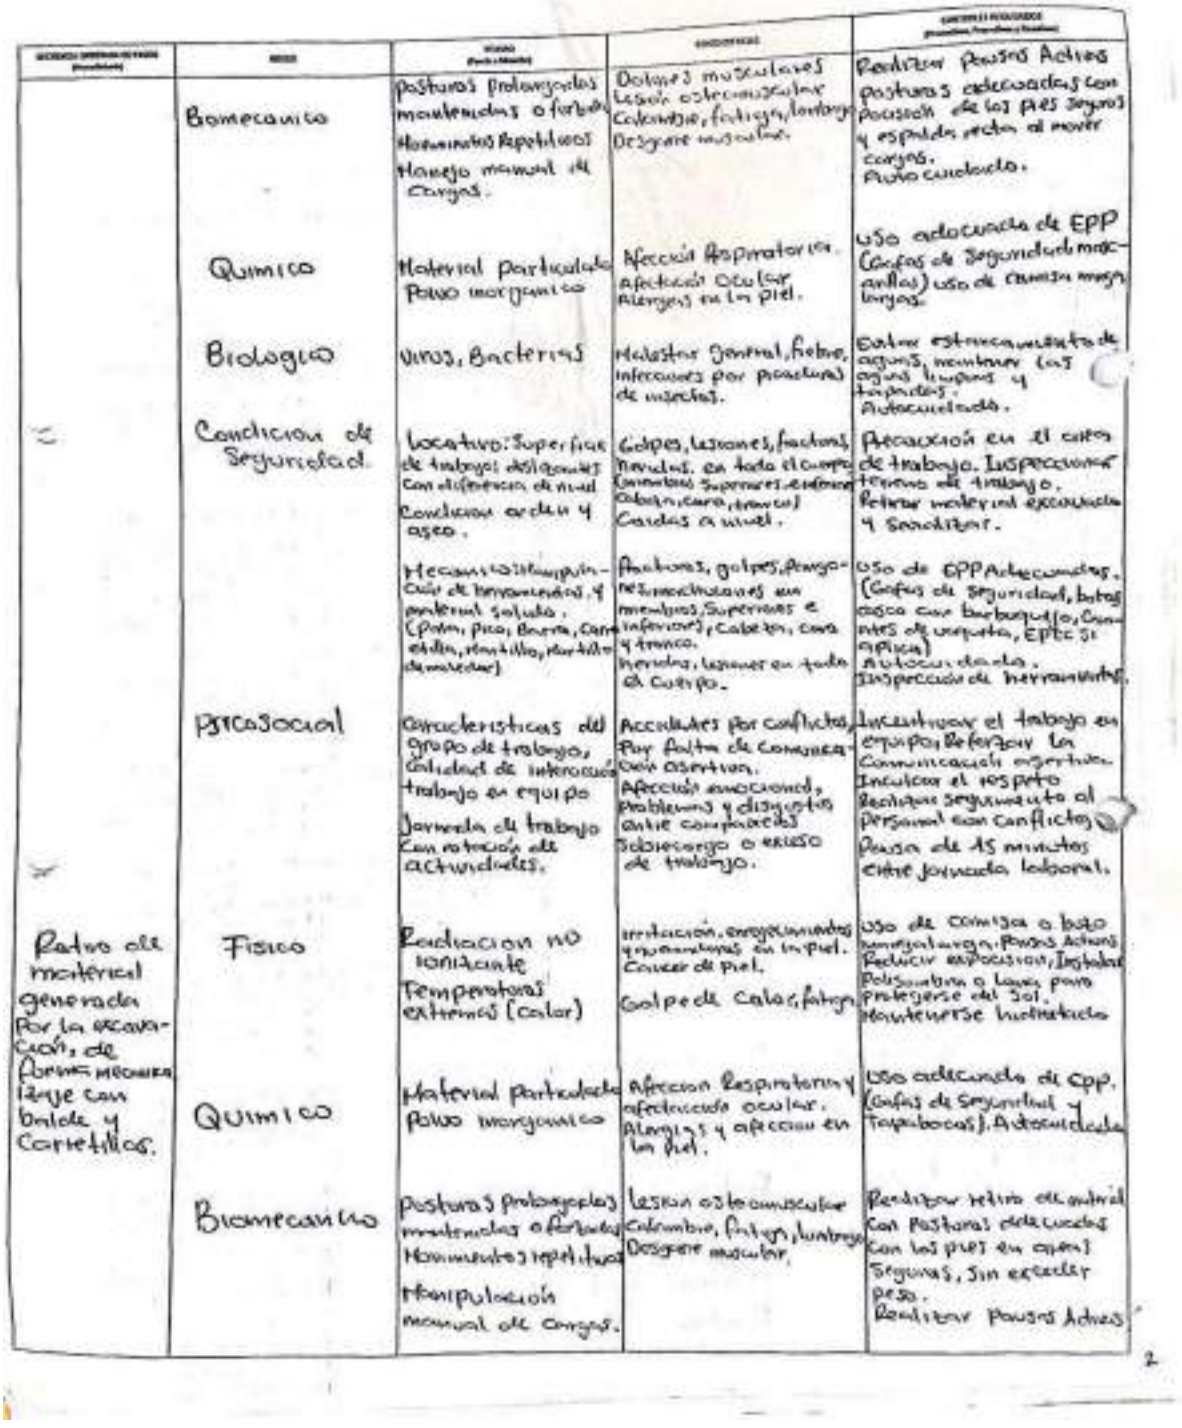


	Biomecanico	Posturas prolongadas mantenidas o forzadas Movimientos Repetitivos Manejo manual de cargas.	Dolores musculares Lesión osteomuscular Calambre, fatiga, lumbago Desgarre muscular.	Realizar Pausas Activas posturas adecuadas con posición de los pies Seguros y espalda recta al mover cargas. Peso calculado.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico	Afección Respiratoria. Afectación Ocular Alergias en la piel.	Uso adecuado de EPP (Gafas de Seguridad, mascarillas) uso de cremas manos largas.
	Biologico	Virus, Bacterias	Malestar General, fiebre, infecciones por picaduras de insectos.	Evitar estancamiento de aguas, mantener las aguas limpias y tapadas. Autocuidado.
	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficie de trabajo: desniveles con diferencia de nivel Conclusion orden y aseo.	Golpes, Lesiones, fracturas, heridas, en todo el cuerpo Caidas Superiores, enfermedades (cara, tronco) Caidas a nivel.	Atención en el sitio de trabajo. Inspecciones Terreno de trabajo. Retirar material excedente y Señalizar.
		Mecanico (manipulación de herramientas y material solido. (Palas, Pica, Barra, Carretilla, Martillo, Martillo de marcador)	Fracturas, golpes, Perforaciones en miembros, Superiores e inferiores), Cabeza, cara y tronco. Heridas, Lesiones en todo el Cuerpo.	Uso de EPP Adecuados. (Gafas de Seguridad, botas casco con barbuquejo, Guantes de carnaza, Epcc si aplica) Autocuidado. Inspección de herramientas.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo, Calidad de interacción trabajo en equipo Jornada de trabajo Con rotación de actividades.	Accidentes por conflictos, Por falta de comunicación asertiva. Afección emocional, Problemas y disgustos entre compañeros Sobrecargo o exceso de trabajo.	Incentivar el trabajo en equipo, Reforzar la Comunicación asertiva. Incluir el respeto Realizar seguimiento al Personal con Conflictos Pausa de 15 minutos entre jornada laboral.
Retiro del material generado Por la excavación, de forma mecanizada con balde y Cortadoras.	Fisico	Radiacion no ionizante Temperaturas externas (calor)	Irritación, enrojecimientos y quemaduras en la piel. Cancer de piel. Golpe de Calor, fatiga	Uso de camisa o bajo manga larga, Pausas Activas Reducir exposición, Instalar Polisombra o Lugar para protegerse del Sol. Mantenerse hidratado
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico	Afección Respiratoria y afectación ocular. Alergias y afección en la piel.	Uso adecuado de Epp. (Gafas de Seguridad y Tapabocas). Autocuidado
	Biomecanico	Posturas prolongadas mantenidas o forzadas Movimientos repetitivos Manipulación manual de cargas.	Lesion osteomuscular Calambre, fatiga, lumbago Desgarre muscular.	Realizar retiro del material con Posturas adecuadas con los pies en apoyo Seguros, Sin exceder peso. Realizar Pausas Activas

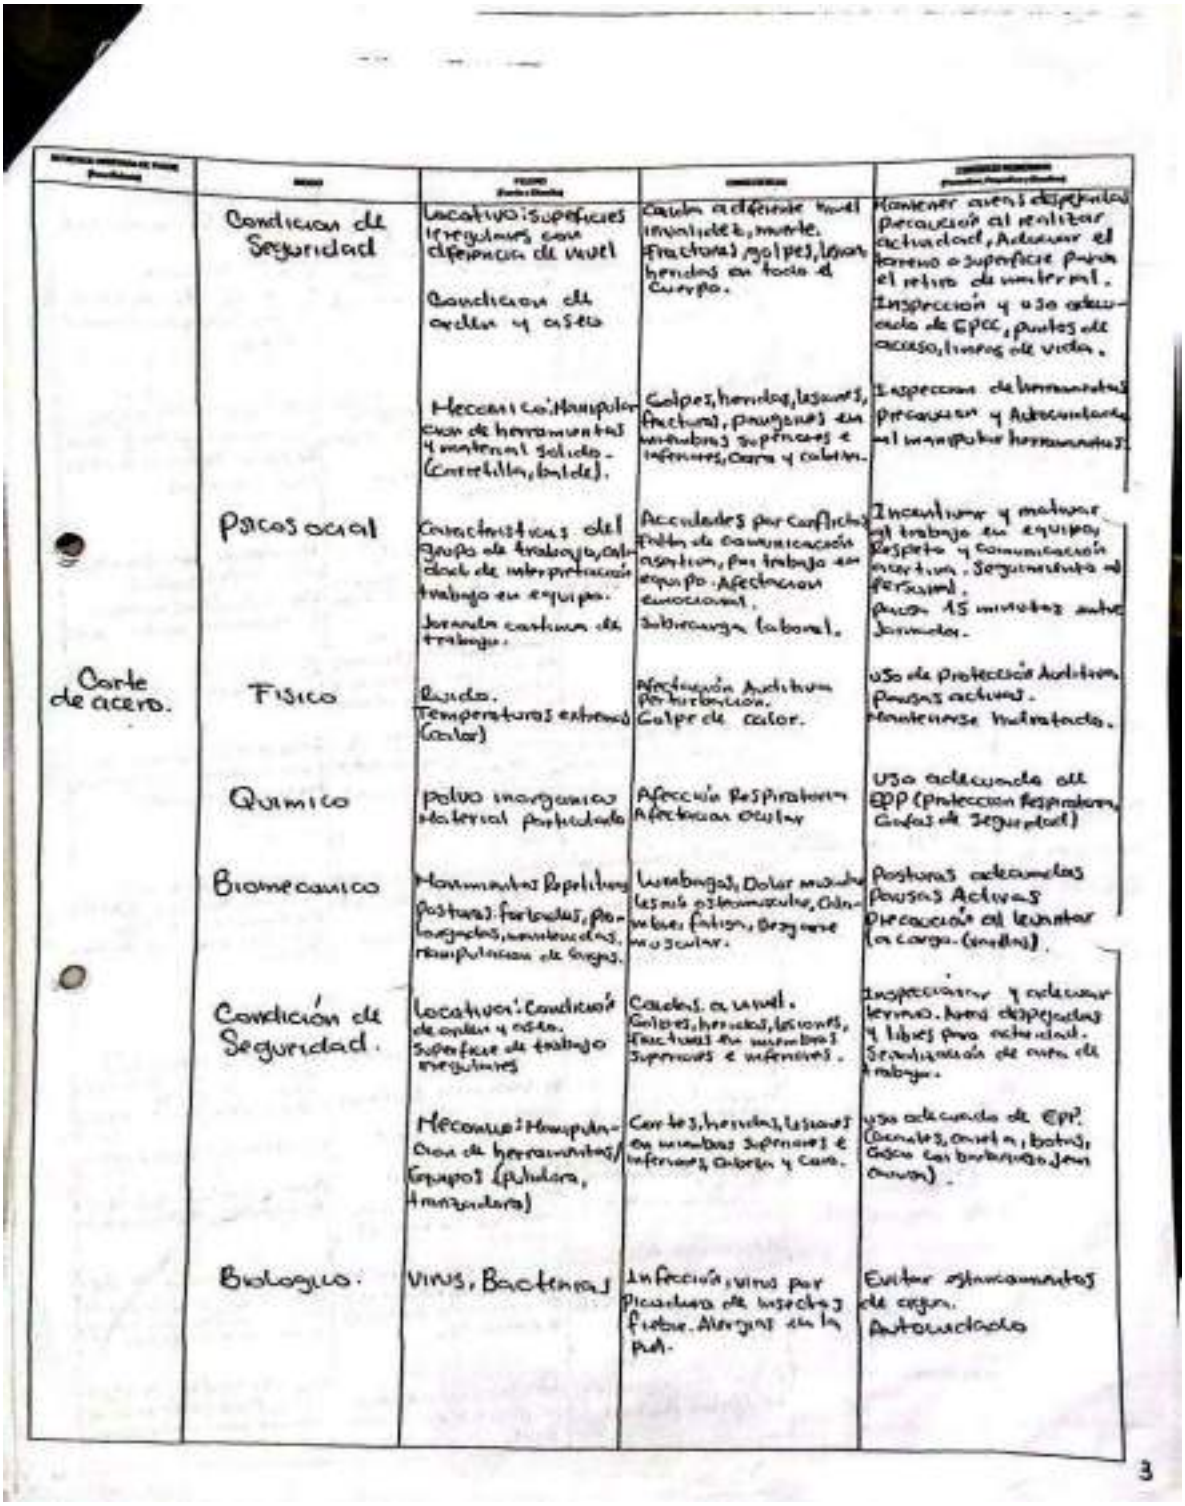


	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares con diferencia de nivel Condicion del orden y aseo	Caida a diferente nivel invalidez, muerte. Fracturas, golpes, lesiones en todo el cuerpo.	Mantener atencion y precaucion al realizar actividad, Adecuar el terreno o superficie para el retiro de material. Inspeccion y uso adecuado de EPCC, puntos de acceso, lineas de vida.
		Mecanico: Manipulacion de herramientas y material solido. (Cortantes, bruto).	Golpes, heridas, lesiones, fracturas, pinzamiento en miembros superiores e inferiores, Corte y cortes.	Inspeccion de herramientas precaucion y Adecuamiento al manipular herramientas.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo, calidad de interpretacion trabajo en equipo. Jornada continua de trabajo.	Accidentes por conflictos Falta de comunicacion asertiva, Por trabajo en equipo. Afectacion emocional. Sobrecarga laboral.	Incentivar y motivar el trabajo en equipo, Respeto y comunicacion asertiva. Seguimiento al personal. Pausa 15 minutos antes Jornadas.
Corte de acero.	Fisico	Ruido. Temperaturas extremas (Calor)	Afectacion Auditiva perturbacion. Golpe de calor.	Uso de proteccion Auditiva. Pausas activas. Mantenerse hidratado.
	Quimico	polvo inorganico material particulado	Afeccion Respiratoria Afectacion ocular	Uso adecuado del EPP (proteccion respiratoria, Gafas de seguridad)
	Biomecanico	Movimientos Repetitivos posturas forzadas, posturas, manipulacion de cargas.	Lumbagia, Dolor muscular lesion osteomuscular, Calambre, fatiga, Dezgarre muscular.	Posturas adecuadas Pausas Activas Precaucion al levantar (a carga. (cuidado).
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Condicion de orden y aseo. Superficie de trabajo irregulares	Caidas a nivel. Golpes, heridas, lesiones, fracturas en miembros Superiores e inferiores.	Inspeccionar y adecuar terreno. Area despejadas y libres para actividad. Socializacion de area de trabajo.
		Mecanico: Manipulacion de herramientas/ Equipos (pulidora, Amoladora)	Cortes, heridas, lesiones en miembros superiores e inferiores, Golpes y Cortes.	uso adecuado de EPP (Guantes, antifaz, botas, Gafas con barandas Jean Overol).
	Biologico.	Virus, Bacterias	Infeccion, virus por Picadura de insectos Fiebre. Alergias en la piel.	Evitar aglomeramientos de origen. Autocuidado


Inicio de actividad de excavación de terreno para Cassión	Fisico	Radiación no Ionizante. Temperaturas extremas (Calor)	Cancer de piel. Irritación, Envejecimiento en la piel. Golpe de calor	Usar Camisa o bloqueador manga larga, reducir el tiempo de exposición al Sol. mantenerse hidratado
	Biomecanico	Posturas prolongadas, mantenidas o forzadas. Herramientas Repetitivas. Manejo manual de Cargas	Dolores musculares lumbargos. Lesiones osteomuscular Calambres, fatiga. Desgarros musculor.	Realizar pausas Activas Autocuidado. Realizar la actividad con posturas adecuadas Posicion de los pies en zonas Seguras.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico	Afección respiratoria, Afección ocular	Uso Adecuado de EPP Uso de protección respiratoria uso de gafas de Seguridad
	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo desigualte irregulares con diferencia de nivel Caida de objetos y oseo.	Golpes, fracturas en miembros Superiores e inferiores, cabeza y Cara. Caidas a nivel y heridas en el cuerpo.	Precaución en el area de trabajo. Inspeccionar Condiciones de terreno. Mantener area despejada de escombros y Señalizada
		Mecanico: Manipulación de herramientas, maquinas, equipos y materiales Solidos (pala, Pica, Barra, Carretillas, martillo)	Golpes y fracturas en miembros Superiores inferiores. Cabeza y Cara. Punzones y machucones heridas o lesiones en el cuerpo.	Inspección de herramientas Precaucion al realizar la actividad. Autocuidado. Uso Adecuado de EPP (casco, botas de Seguridad Guantes de vaqueta, gafas de seguridad, barbuquejo)
	Biologico.	Virus, Presencia de insectos	Molestias gastralgias fiebre, Alergias en la Piel, infecciones por virus o bacterias	Mantener tanques limpios y tapados. Evitar estancamiento de Agua. Autocuidado.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo Calidad de interacción trabajo en equipo. Jornada de trabajo con rotación de actividades	Conflictos, Accidentes por falta de Comunicación Acertiva. Afección Emocional Problemas y disgustos entre compañeros. Sobre Cargo o exceso de trabajo	Incentivar el trabajo en equipo. Reforzar el buen uso de la comunicación Realizar Seguimiento al personal con Conflictos. Pausas de 15. en cada Jornada.

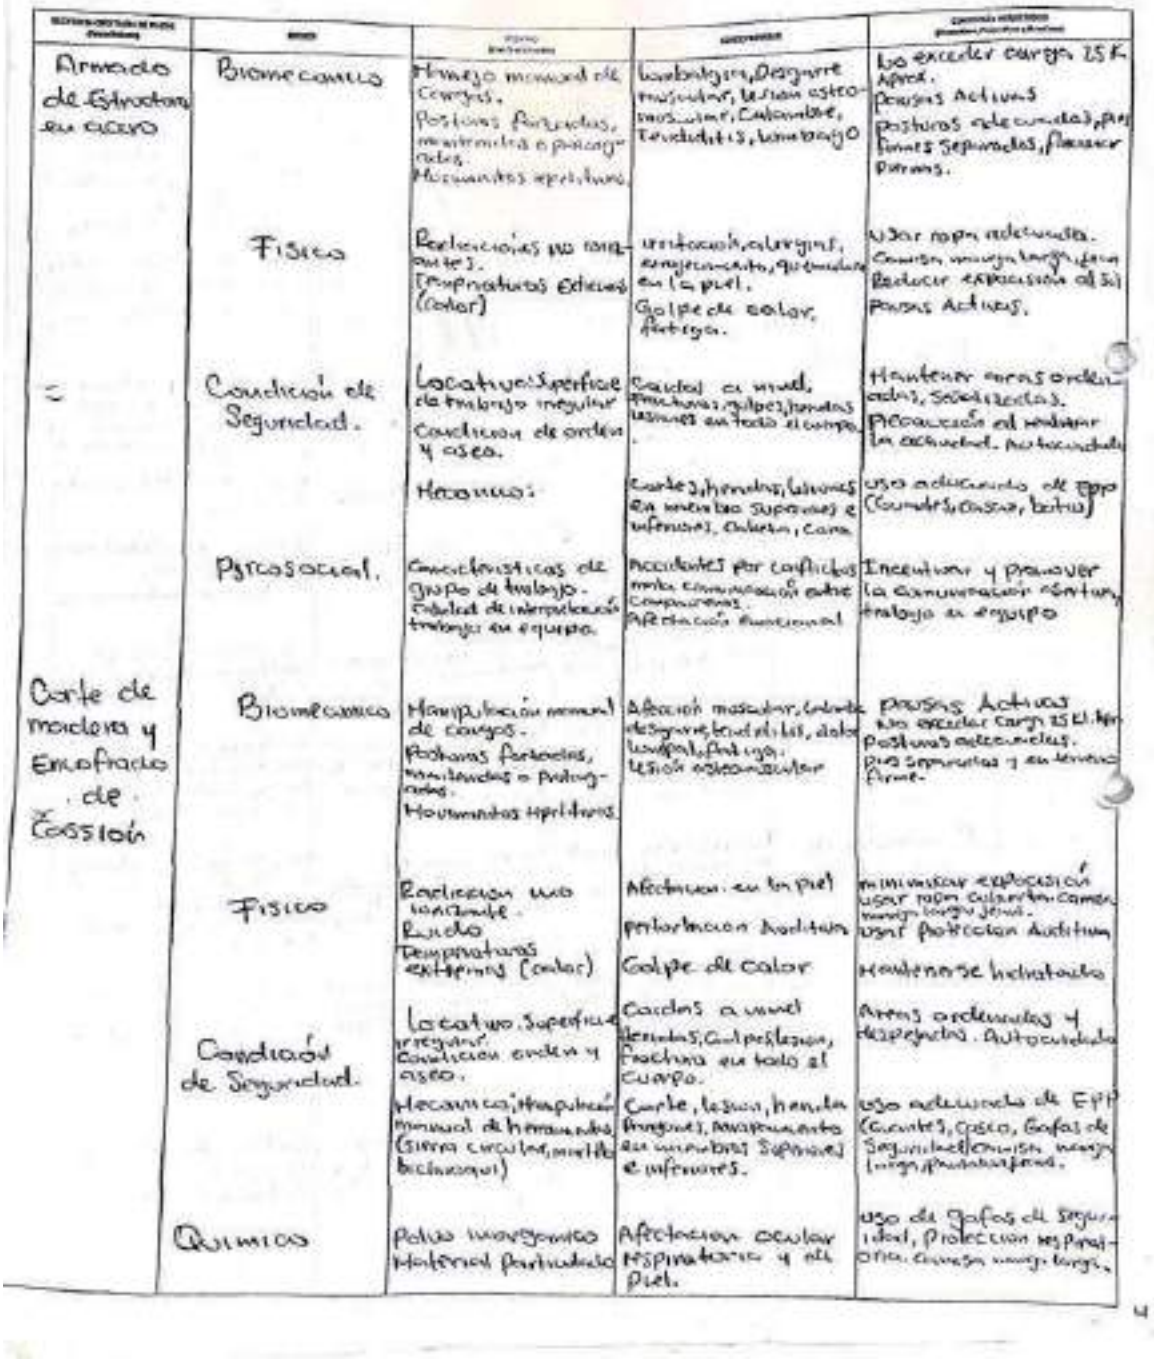



Armado de Estructura en acero	Biomecanico	Manejo manual de cargas. Posturas forzadas, monotonias o prolongadas. Movimientos repetitivos.	Lumbalgias, Desgarre muscular, lesion osteomuscular, Calambre, Tendinitis, Lumbalgia	No exceder cargas 25 K. Aprox. Pausas Activas Posturas adecuadas, Pausas Seguidas, flexionar piernas.
	Fisico	Radiaciones no ionizantes). Temperaturas Extremas (calor)	Irritacion, alergias, enrojecimiento, quemadura en la piel. Golpe de calor, fatiga.	Usar ropa adecuada. Cremas, manga larga, gafas Reducir exposicion al Sol Pausas Activas.
=	Condicion de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo irregular Condicion de orden y aseo.	Caidas a nivel, fracturas, golpes, heridas lesiones en todo el cuerpo.	Mantener areas ordenadas, señalizadas. Precaucion al caminar en la obra. Autocuidado
		Mecanico:	Cortes, heridas, lesiones en miembros superiores e inferiores, Quemadura, Caida	uso adecuado de EPP (Guantes, casco, botas)
	Psicosocial.	Caracteristicas de grupo de trabajo. Dificultad de interpretacion trabajo en equipo.	Accidentes por conflictos mala comunicacion entre Compañeros. Afectacion Funcional	Incentivar y promover la comunicacion asertiva, trabajo en equipo
Corte de madera y Encofrados de Losa	Biomecanico	Manipulacion manual de cargas. Posturas forzadas, monotonias o prolongadas. Movimientos repetitivos.	Afeccion muscular, Calambre, desgarre, debilidad, dolor lumbar, fatiga. Lesion osteomuscular	Pausas Activas No exceder carga 25 Kl. Posturas adecuadas. Pies separados y en terreno firme.
	Fisico	Radiacion no ionizante. Ruido Temperaturas extremas (calor)	Afeccion en la piel perforacion Auditiva Golpe de calor	minimizar exposicion usar ropa adecuada camisa manga larga jean. Usar Proteccion Auditiva Mantenerse hidratado
	Condicion de Seguridad.	Locativo. Superficie irregular. Condicion orden y aseo.	Caidas a nivel Heridas, Golpes, Lesion, Fractura en todo el cuerpo.	Areas ordenadas y despejadas. Autocuidado
		Mecanico; Manipulacion manual de herramientas (Sierra circular, martillo, Escuadra)	Corte, lesion, heridas Amputaciones, Aplastamiento en miembros Superiores e inferiores.	uso adecuado de EPP (Guantes, casco, Gafas de Seguridad, Camisa manga larga, pantalon jean.
	Quimicos	Polvo inorganico Material particulado	Afectacion ocular Respiratoria y de piel.	uso de Gafas de Seguridad, Proteccion respiratoria. Camisa manga larga,

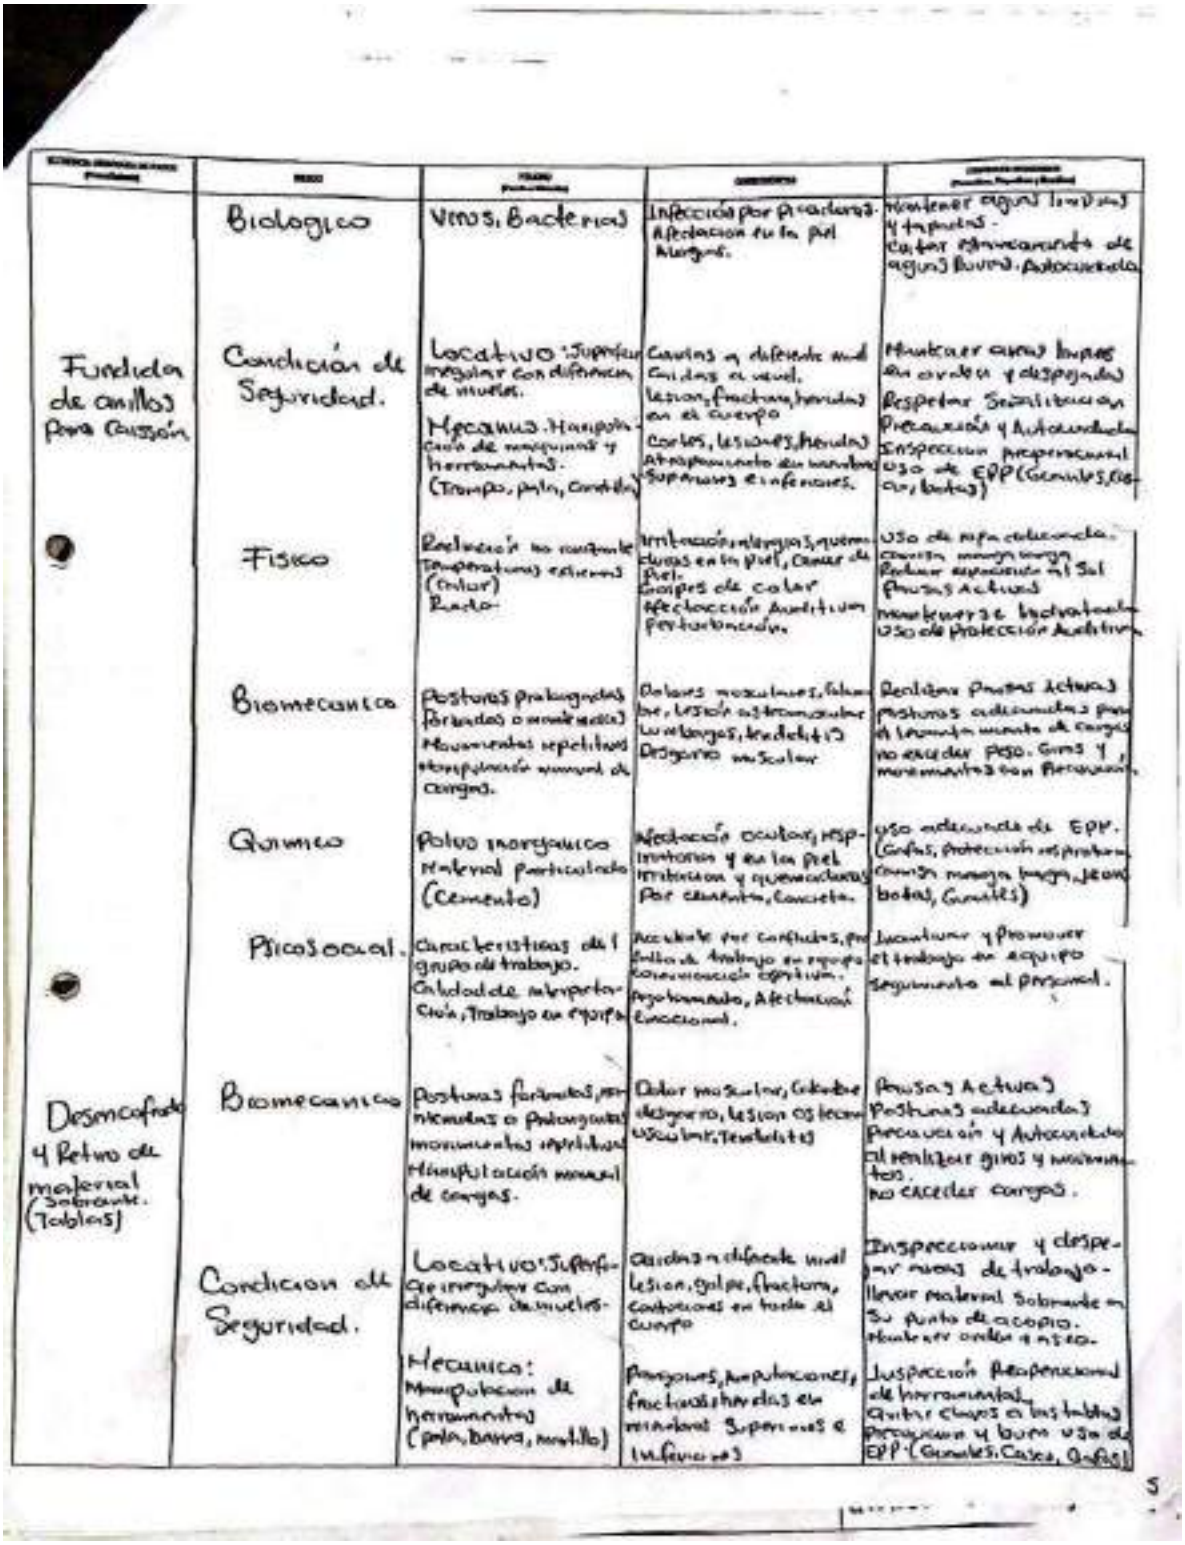


	Biologico	Virus, Bacterias	Infección por picaduras. Afectacion en la piel Alergias.	Mantener aseo (manos y implementos. Evitar almacenamiento de agua) Buena alimentación
Fundida de anillos para fusión	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficie irregular con diferencia de niveles.	Caidas a diferente nivel. Golpes a nivel. lesion, fracturas, heridas en el cuerpo	Mantener aseo limpias en orden y despejadas) Respetar señalizacion Precaución y Autocuidado
		Mecanico: Manipulación de maquinaria y herramientas. (Trompo, pala, Carretilla)	Cortes, lesiones, heridas) Atrapamiento en maquinas Supervisar e inferiores.	Inspeccion preoperacional uso de EPP (Guantes, Botas)
	Fisico	Radiación no ionizante Temperaturas extremas (Calor) Ruido.	Irritación, alergias, quemaduras en la piel, Cancer de piel. Golpes de calor Afectacion Auditiva perturbadora.	Uso de ropa adecuada. Cremas, mangas largas Retirar exposición al Sol Pausas Activas Mantenerse hidratado Uso de protección Auditiva
	Biomecanico	Posturas prolongadas forzadas o antigravitacionales Movimientos repetitivos Manipulación manual de cargas.	Dolores musculares, Fatiga, lesión osteomuscular Lumbalgias, tendinitis Dolor muscular	Realizar Pausas Activas Posturas adecuadas para el levantamiento de cargas no exceder peso. Giros y movimientos con precaución.
	Quimico	Polvo inorganico Material particulado (Cemento)	Afectación ocular, respiratorias y en la piel irritacion y quemaduras por cemento, Concreto.	Uso adecuado de EPP. (Gafas, Proteccion respiratoria, Crema, manga larga, Jean botas, Guantes)
	Psicosocial.	Caracteristicas del grupo de trabajo. Calidad de interpretación, Trabajo en equipo	Accidente por conflictos, Poca Fatiga de trabajo en equipo Comunicación ejecutiva. Agotamiento, Afectacion Emocional.	Incentivar y Promover el trabajo en equipo Seguimiento al personal.
Desencofrado y Retiro de material (Soporte. (Tablas)	Biomecanico	Posturas forzadas, inadecuadas o Prolongadas Movimientos repetitivos Manipulación manual de cargas.	Dolor muscular, Cefalea, desgarro, lesion osteomuscular, Tendinitis)	Pausas Activas Posturas adecuadas Precaución y Autocuidado al realizar giros y movimientos. No exceder cargas.
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Superficie irregulares con diferencia de niveles.	Caidas a diferente nivel lesion, golpe, fractura, contusiones en todo el cuerpo	Inspeccionar y despejar area de trabajo. Llevar material Solamente en su punto de acopio. Mantener orden y aseo.
		Mecanico: Manipulacion de herramientas (pala, barra, martillo)	Amputaciones, fracturas heridas en miembros Superiores e inferiores)	Inspección Preoperacional de herramientas Quitar clavos a los tablas) Precaucion y buen uso de EPP. (Guantes, Gafas, Botas)

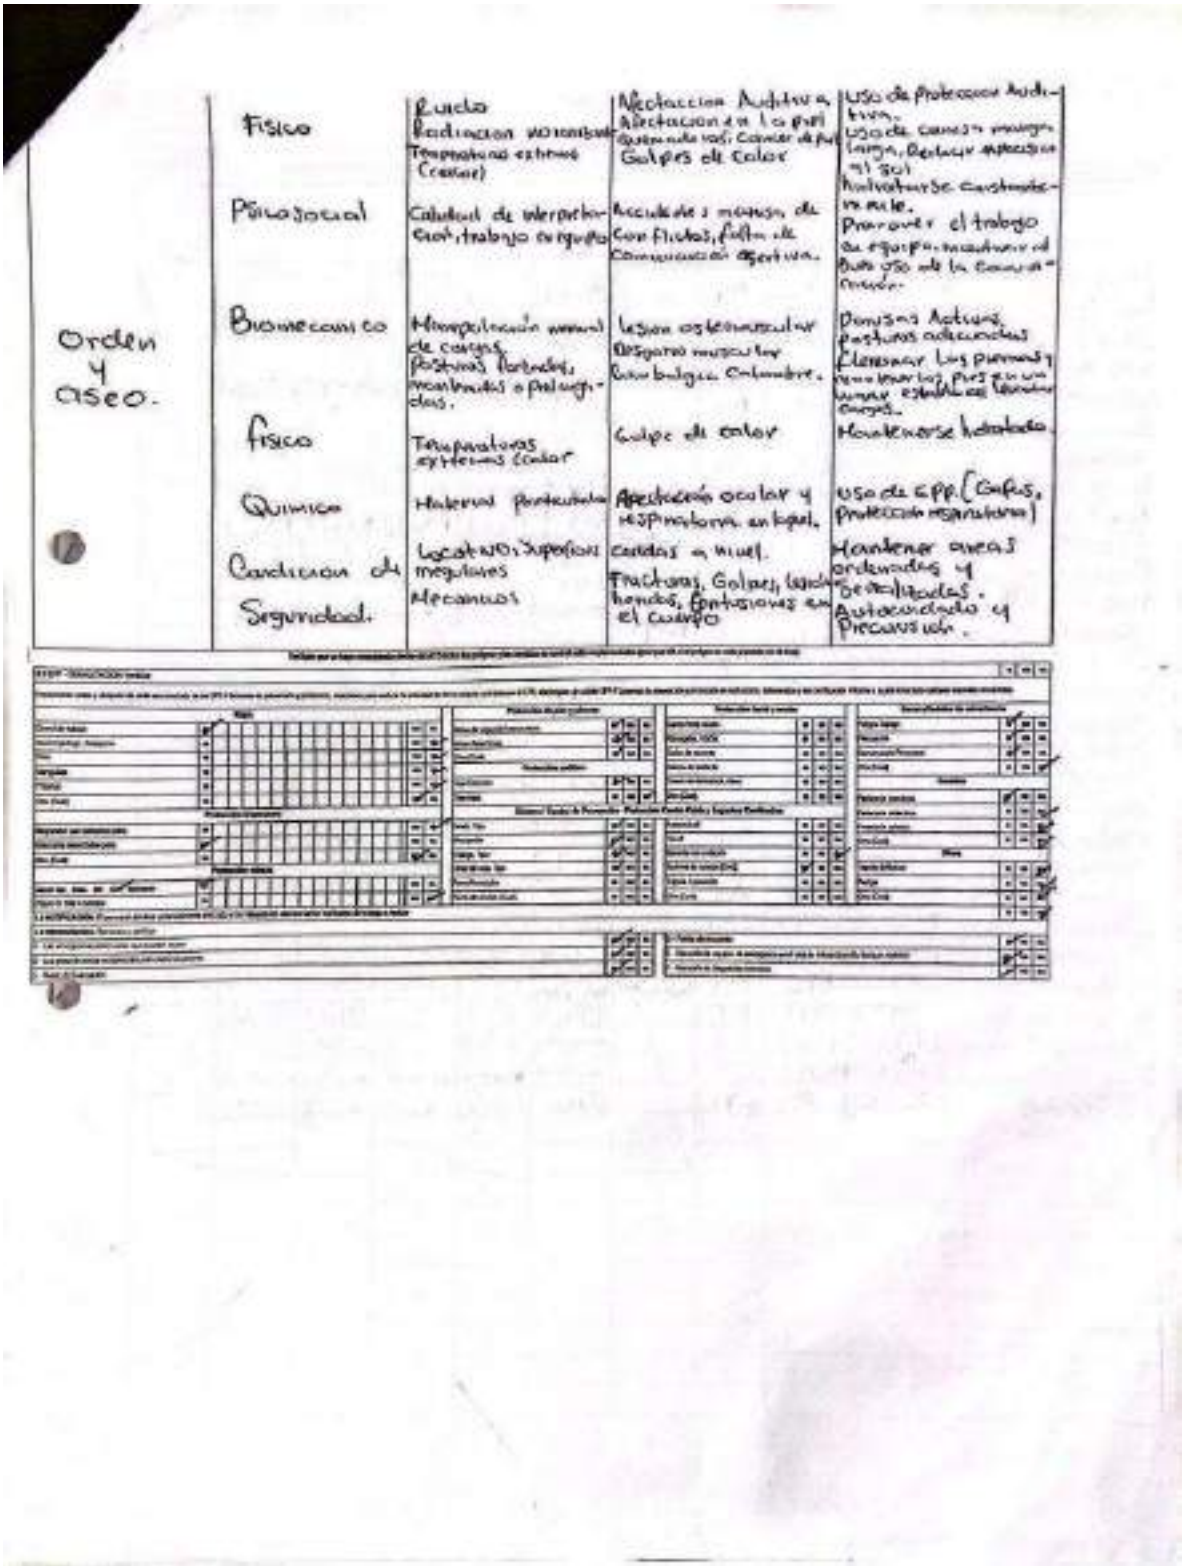
Orden y aseo.
Fisico
Psicosocial
Biomecanico
fisico
Quimica
Condicion de Seguridad.
Ruido
Radiacion no ionizante
Temperaturas extremas (Calor)
Golpes de Calor
Caida de altura
Trabajo en equipo
Accidentes y muertes de trabajadores
Conflictos, Falta de Comunicación efectiva.
Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas, movimientos repetitivos.
lesion osteomuscular
Esguince muscular
Golpe de calor
Material particulado
Locativo: Superficies irregulares
Mecanicos
Caidas a nivel.
Fracturas, Golpes, lesiones en manos, fracturas en el cuerpo
Uso de Proteccion Auditiva.
Uso de cremas protectoras, Bebeer agua
Pausas Activas, posturas adecuadas
Mantenerse hidratado.
Uso de EPP. (Gafas, Proteccion respiratoria)
Mantener areas ordenadas y desinfectadas.
Autocuidado y Precaucion.

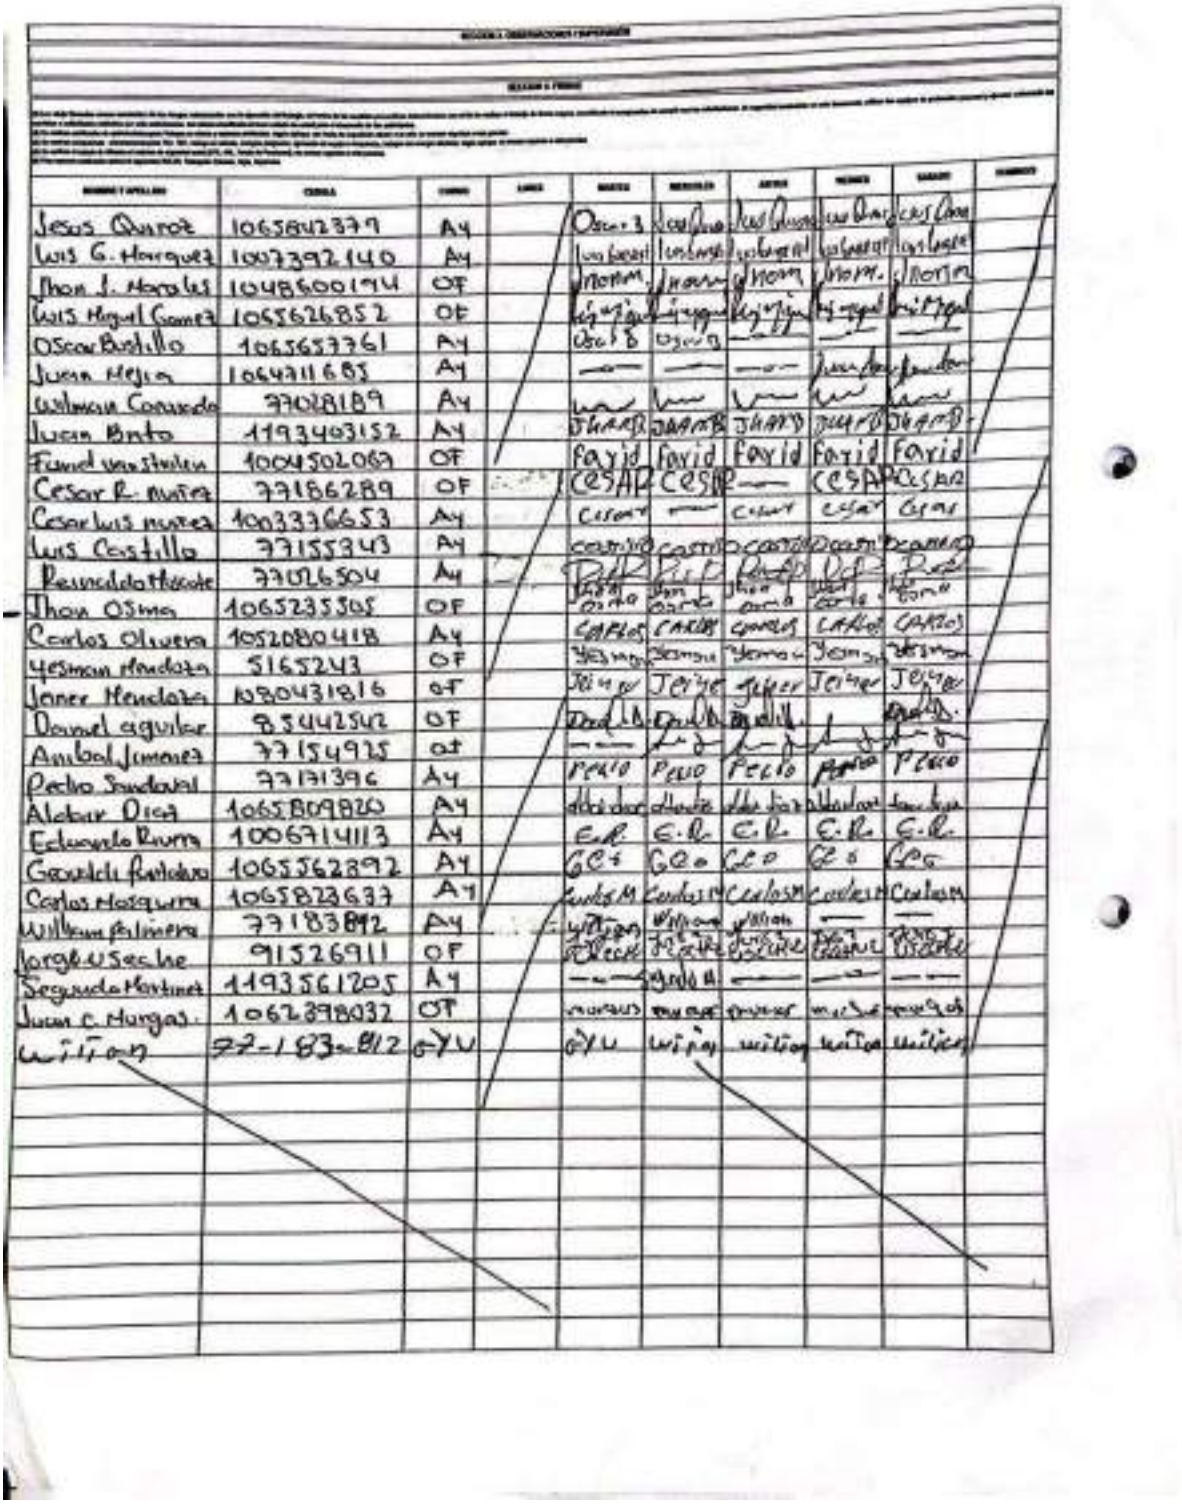

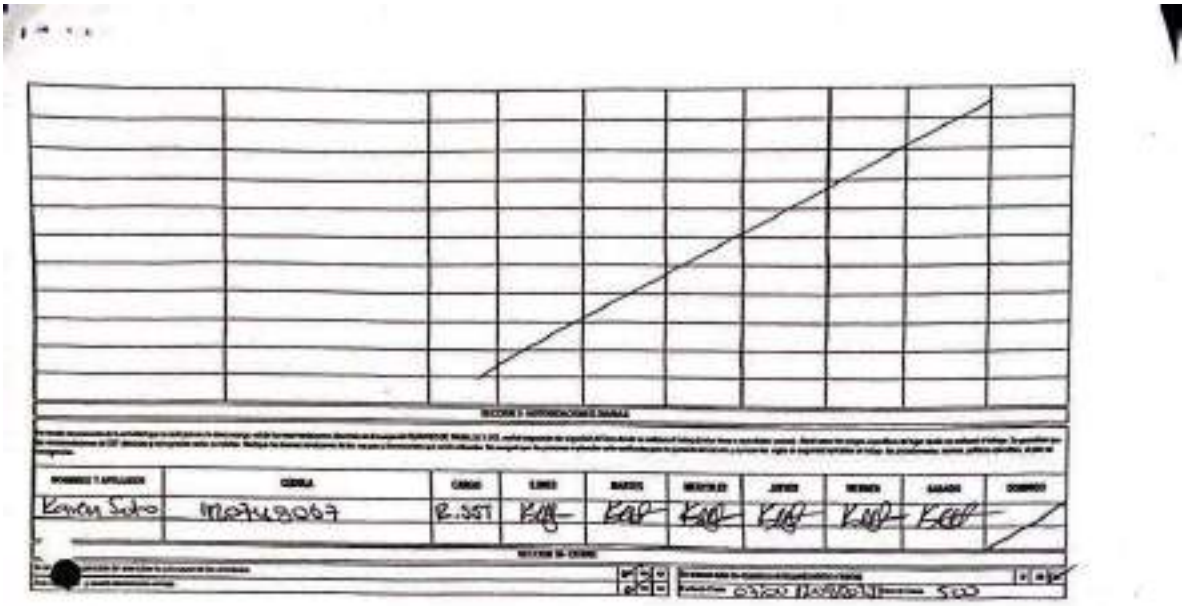


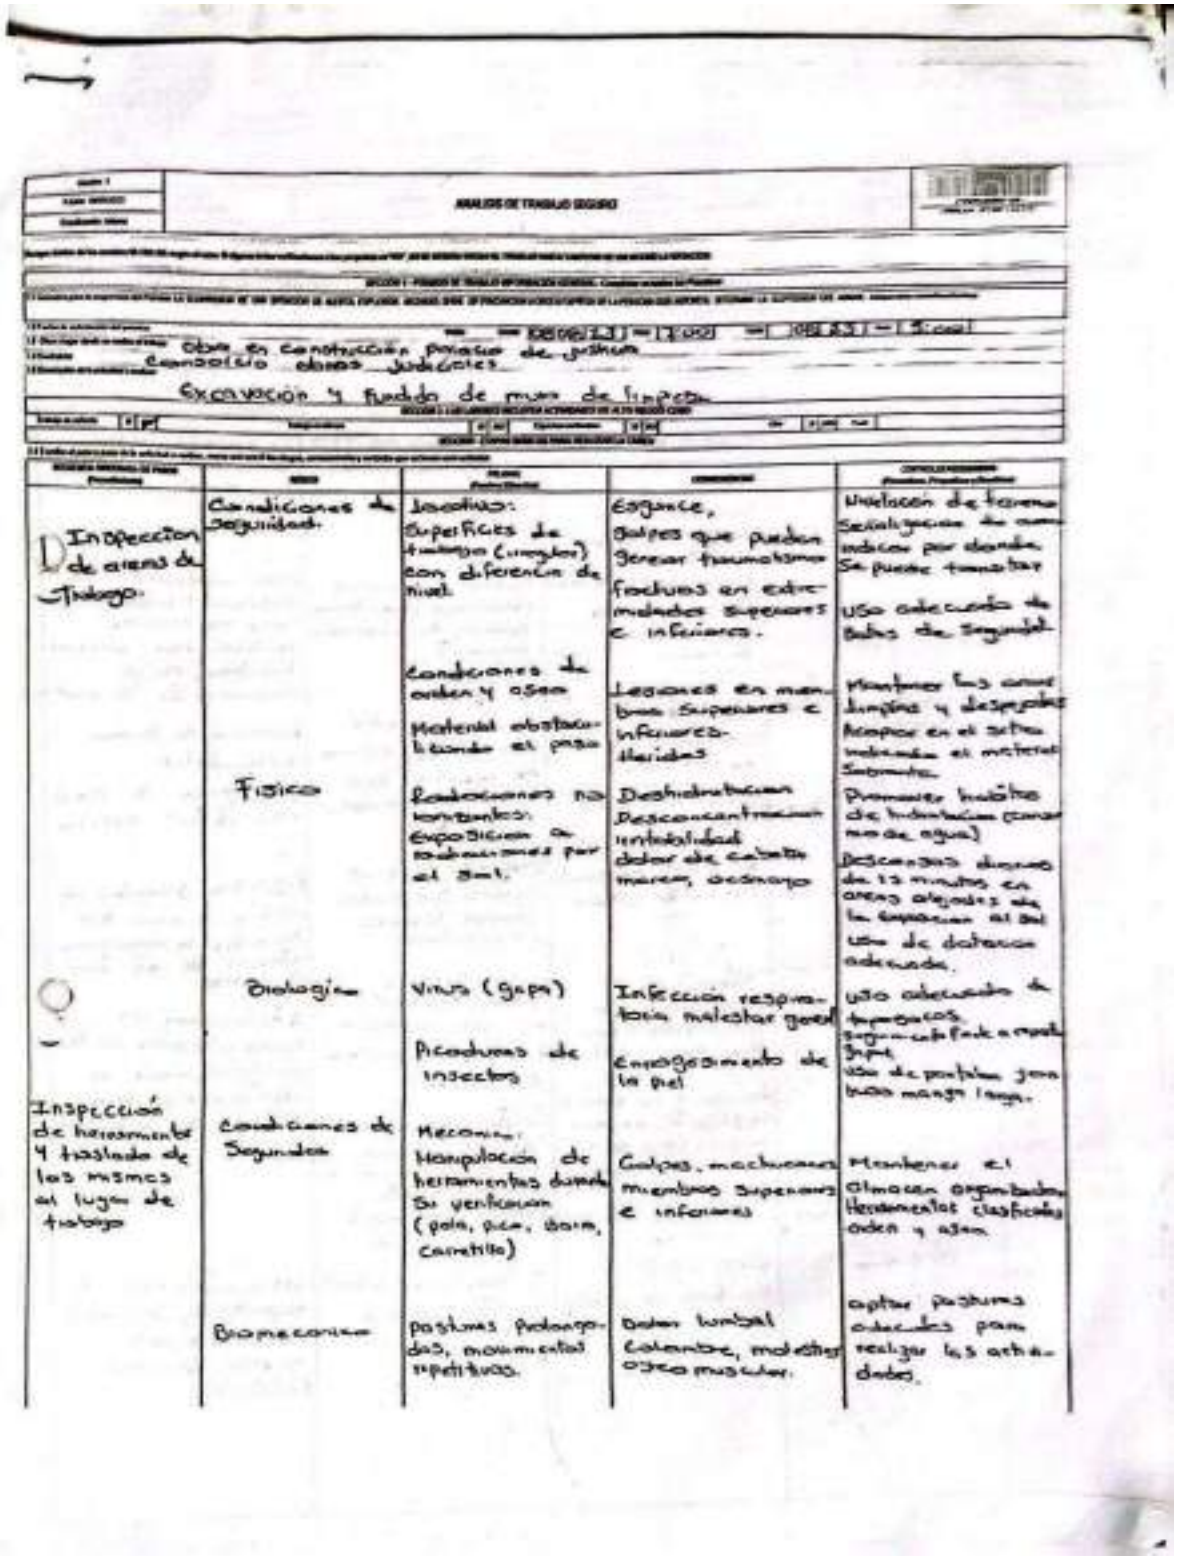


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


Obra en construcción proyecto de prisión
Consorcio obras judiciales
Excavación y fundida de muro de limpieza

Inspección de áreas de trabajo.	Condiciones de seguridad.	Locativas: Superficies de trabajo (irregular) con diferencia de nivel.	Esguince, Golpes que pueden generar traumatismo	Ubicación de tareas Señalización de áreas indicar por donde se puede transitar
			Fracturas en extremidades superiores e inferiores.	Uso adecuado de Botas de Seguridad
		Condiciones de orden y aseo	Lesiones en miembros superiores e inferiores. Heridas	Mantener las áreas limpias y despejadas Acopiar en el sitio indicado el material sobrante.
		Material obstaculizando el paso		
	Físico	Radiaciones no ionizantes: Exposición a radiaciones por el sol.	Deshidratación Descoordinación Irritabilidad dolor de cabeza mareo, cansancio	Primeros auxilios de hidratación (tomar mucha agua) Descansos durante de 15 minutos en áreas alejadas de la exposición al Sol Uso de dotación adecuada.
	Biologico	Virus (gripa)	Infección respiratoria malestar general	Uso adecuado de tapabocas. Suministro de agua potable a todo el personal.
		Picaduras de insectos	Envenenamiento de la piel	Uso de polainas y botas manga larga.
Inspección de herramienta y traslado de los mismos al lugar de trabajo	Condiciones de Seguridad	Mecanica: Manipulación de herramientas durante su verificación (pala, pica, barra, carretilla)	Golpes, machucones miembros superiores e inferiores	Mantener el almacen organizado. Herramientas clasificadas orden y aseo.
	Biomecanico	posturas prolongadas, movimientos repetitivos.	Dolor lumbar Calambre, molestias oseo muscular.	optar posturas adecuadas para realizar las actividades.

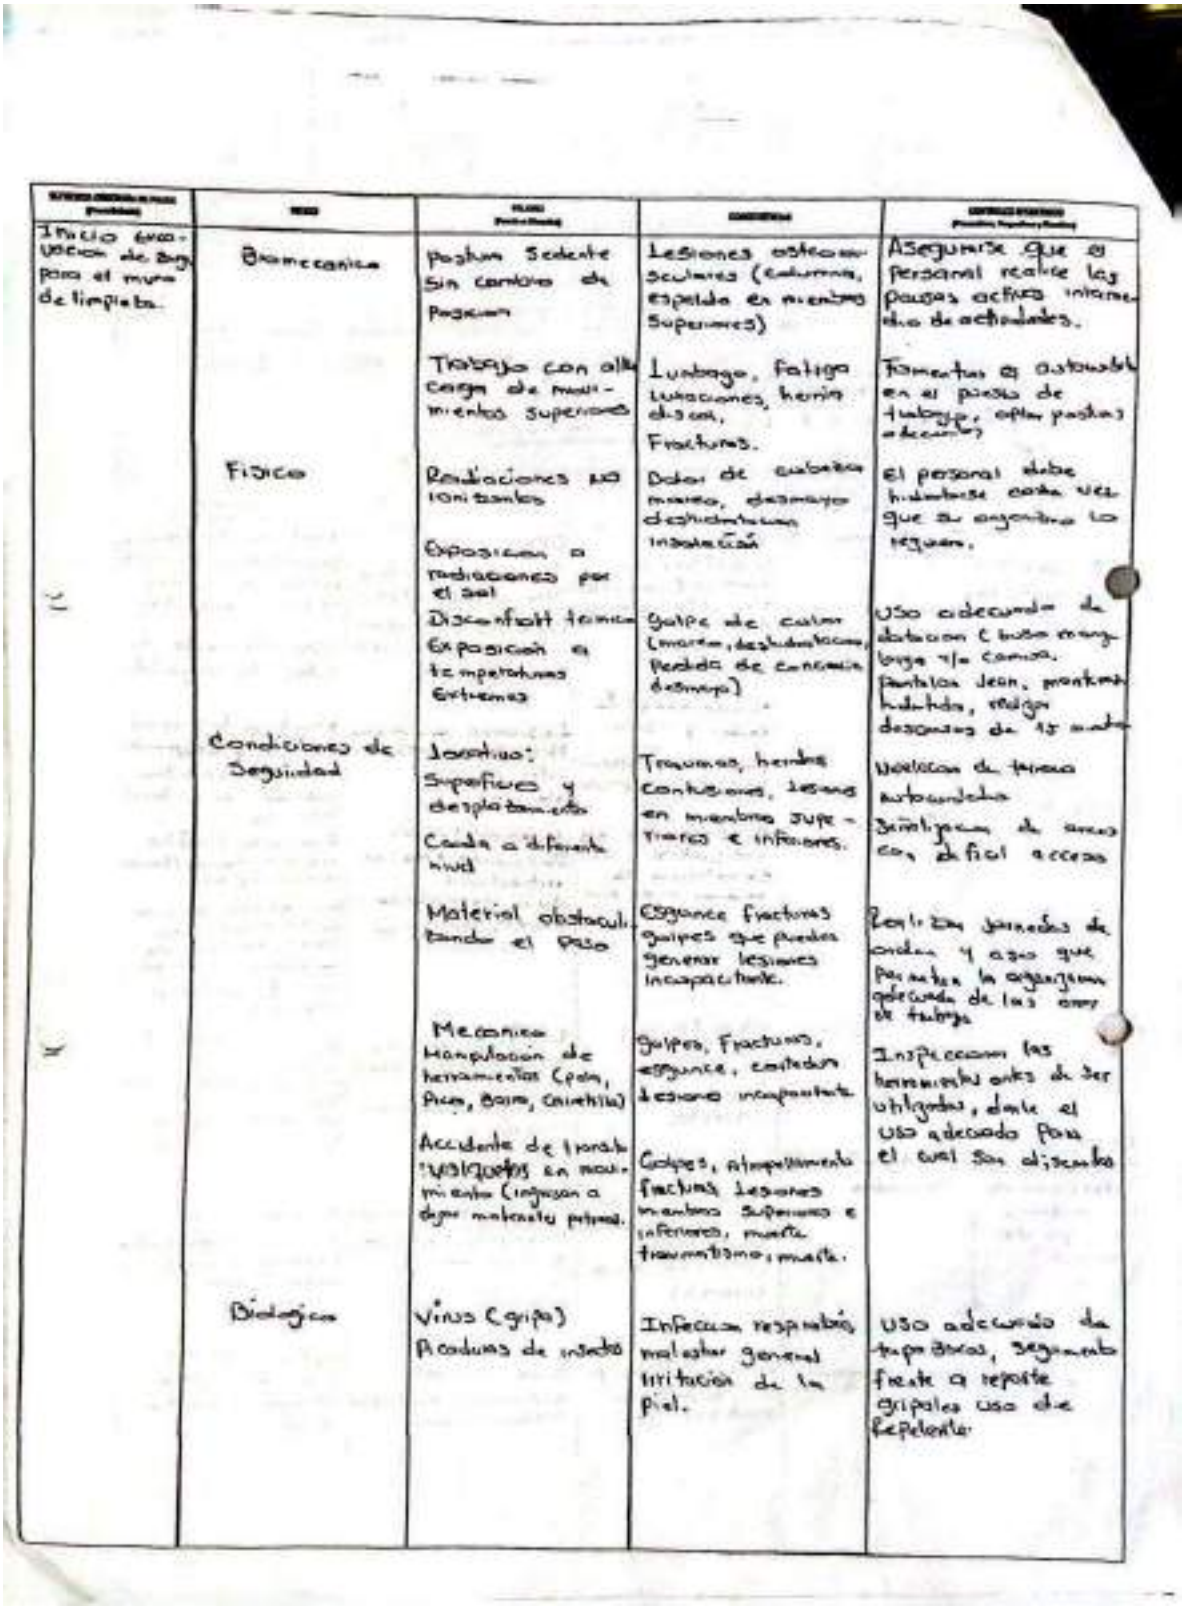


Inicio evaluación de áreas para el mural de limpieza.	Biomecanica	Postura Sedente Sin cambio de Posicion	Lesiones osteomusculares (columna, espalda en miembro Superiores)	Asegurese que el personal realice las pausas activas informadas de actividades.
		Trabajo con alta carga de movimientos superiores	Lumbago, Fatiga Luxaciones, hernia discal, Fracturas.	Fomentar el autocuidado en el puesto de trabajo, optar posturas adecuadas
	Fisico	Radiaciones no ionizantes	Dolor de cabeza mareo, desmayo deshidratacion insolacion	El personal debe hidratarse cada vez que su organismo lo requiera.
		Exposicion a radiaciones por el sol		
		Disconfort termico Exposicion a temperaturas Extremas	Golpe de calor (muerte, deshidratacion, Perdida de conciencia desmayo)	Uso adecuado de dotacion (buso manga larga y/o camisa. Pantalon jean, manten hidratado, realizar descansos de 15 min
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies y desplazamiento	Traumas, heridas contusiones, lesiones en miembros superiores e inferiores.	Verificar de forma autocuidado
		Caida a diferente nivel		Señalizacion de areas con dificil acceso
		Material obstaculizando el paso	Esguince fracturas golpes que pueden generar lesiones incapacitante.	Realizar jornadas de orden y aseo que permitan la organizacion adecuada de las area de trabajo
		Mecanico Manipulacion de herramientas (pala, Pica, Barra, cuchilla)	Golpes, Fracturas, esguince, contusion lesiones incapacitante	Inspeccionar las herramientas antes de ser utilizadas, darle el uso adecuado para el cual son diseñado
		Accidente de transito vehiculos en movimiento (ingresan a dejar materia prima).	Golpes, atropellamiento fracturas lesiones miembro superiores e inferiores, muerte traumatismo, muerte.	
	Biologico	Virus (gripa) Picaduras de insecto	Infeccion respiratoria malestar general irritacion de la piel.	Uso adecuado de tapabocas, seguimiento frente a reporte gripales uso de repelente

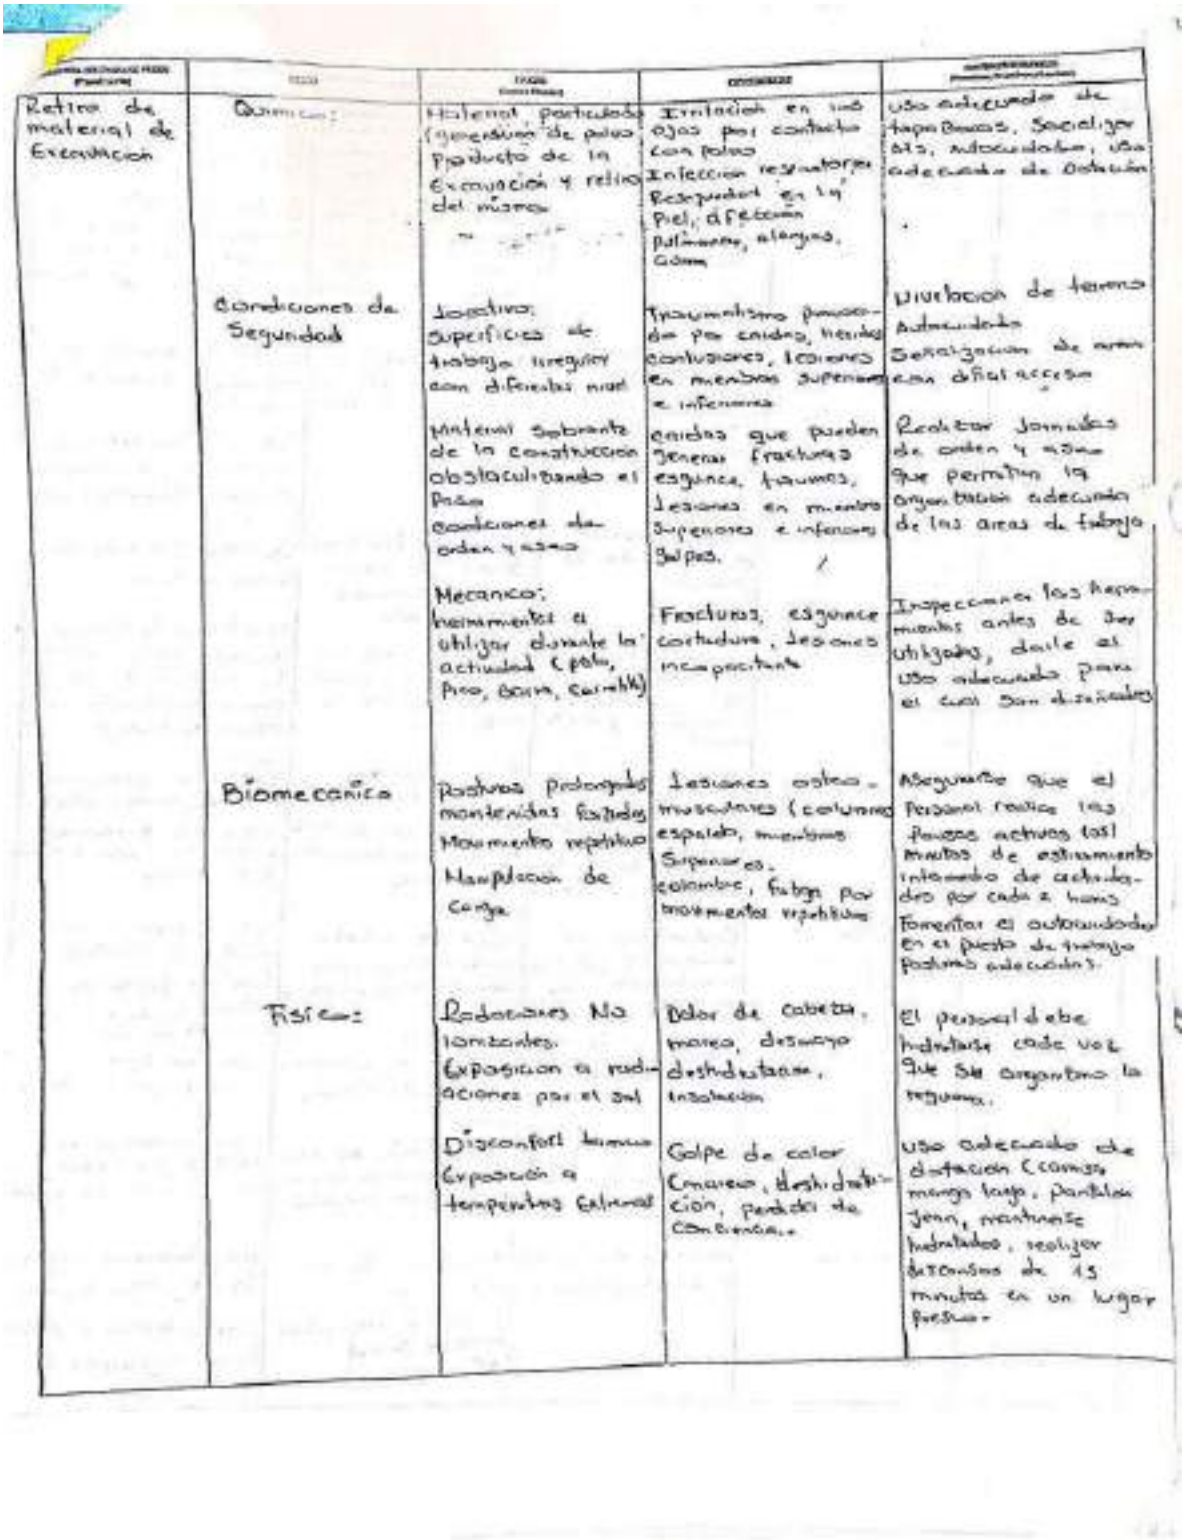


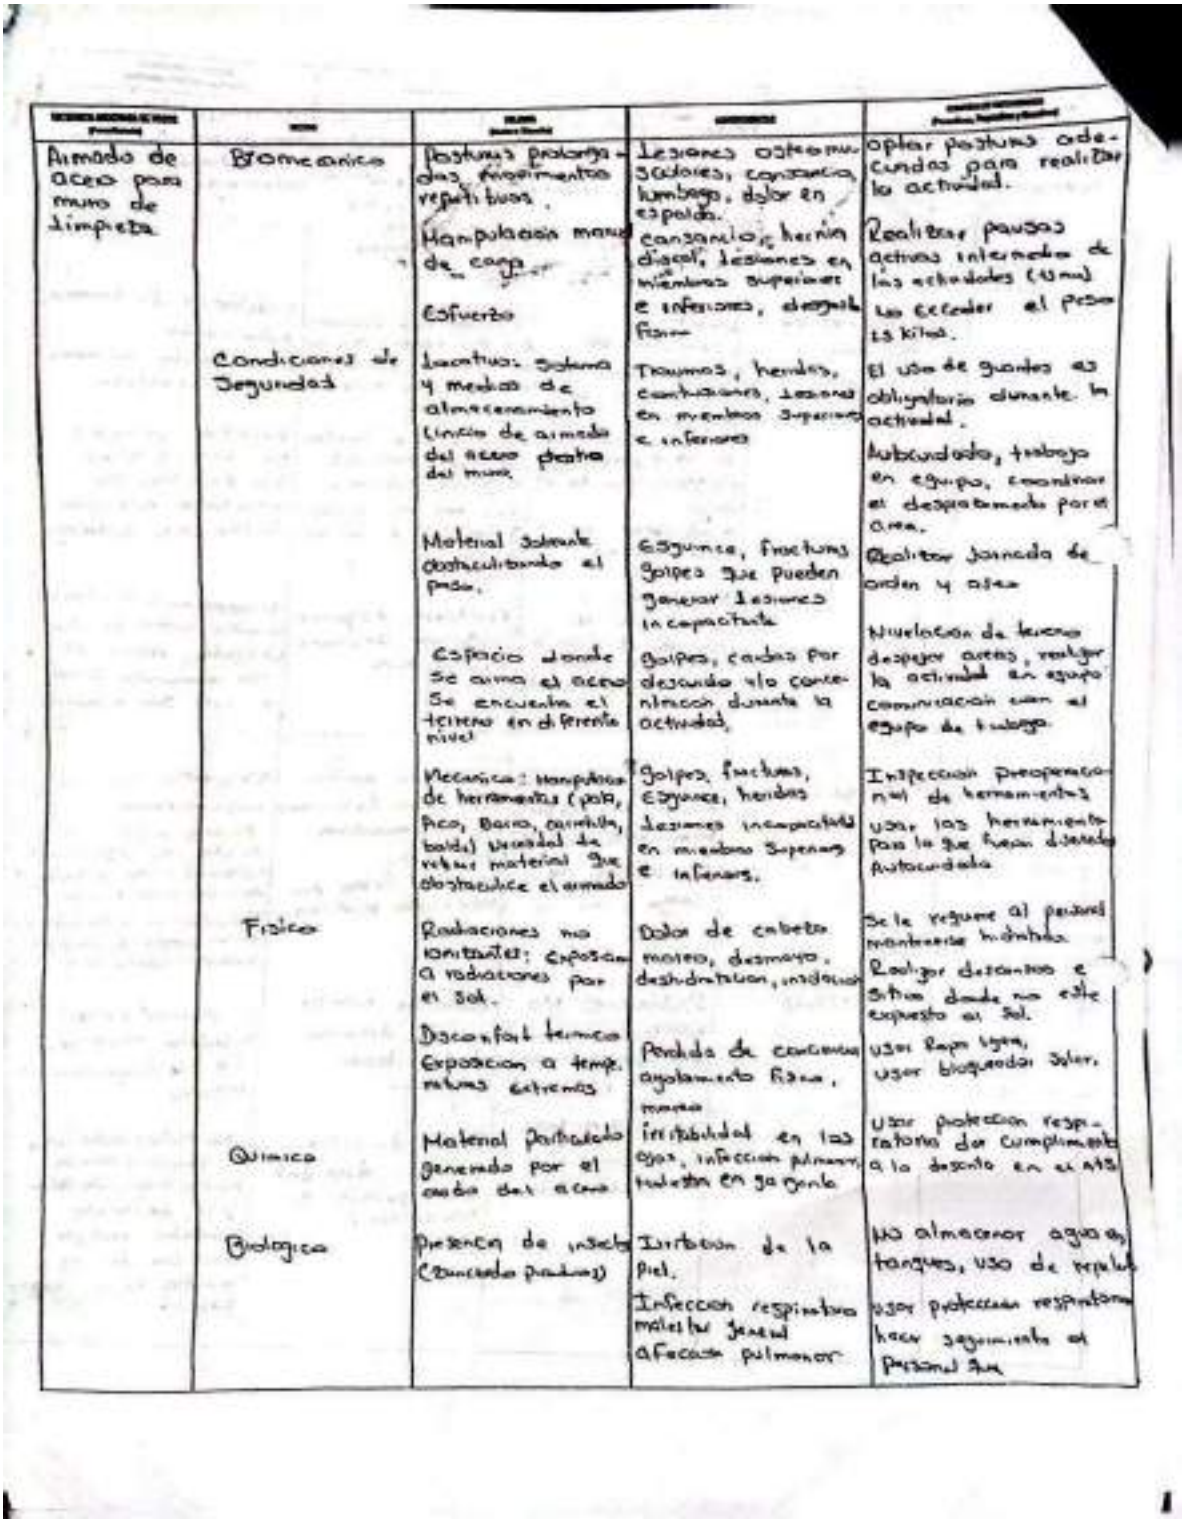


Armado de acero para muro de limpieza	Biomecanico	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos.	Lesiones osteomusculares, cansancio, lumbago, dolor en espalda.	Optar posturas adecuadas para realizar la actividad.
		Manipulacion manual de carga.	cansancio, hernia discal, lesiones en miembros superiores e inferiores, desgaste físico	Realizar pausas activas intermedias de las actividades (10 min) No exceder el peso de 25 kilos.
		Esfuerzo		
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Sistema y medios de almacenamiento (zona de armado del acero dentro del muro)	Traumas, heridas, contusiones, lesiones en miembros superiores e inferiores	El uso de guantes es obligatorio durante la actividad.
				Autocuidado, trabajo en equipo, coordinar el desplazamiento por el area.
		Material saliente obstaculizando el paso.	Esguince, fracturas golpes que pueden generar lesiones incapacitante	Realizar jornada de orden y aseo
		Espacio donde se arma el acero se encuentra el terreno en diferente nivel	Golpes, caidas por descuido y/o concentracion durante la actividad.	Nivelacion de terreno despejar antes, realizar la actividad en equipo comunicacion con el equipo de trabajo
		Mecanico: manipulacion de herramientas (pala, pico, barra, carretilla, balde) Unidad de retiro material que obstaculice el armado	Golpes, fracturas, esguince, heridas lesiones incapacitante en miembros superiores e inferiores.	Inspeccion preoperacional de herramientas usar las herramientas para lo que fueron diseñadas Autocuidado
	Fisico	Radiaciones no ionizantes: exposicion a radiaciones por el sol.	Dolor de cabeza mareo, desmayo, deshidratacion, insolacion	Se le requiere al personal mantenerse hidratado
		Disconfort termico Exposicion a temperaturas extremas	Perdida de concentracion agotamiento fisico, mareos	Realizar descansos en sitios donde no este expuesto al Sol.
				usar Ropa ligera, usar bloqueador solar.
	Quimica	Material particulado generado por el corte del acero	irritabilidad en los ojos, infeccion pulmonar, tuberculosis en ganancia	Usar proteccion respiratoria dar cumplimiento a lo descrito en el AST
	Biologica	Presencia de insectos (Zancudos, picaduras)	Irritacion de la piel.	No almacenar aguas en tanques, uso de repelente
			Infeccion respiratoria malestar general afeccion pulmonar	usar proteccion respiratoria hacer seguimiento al personal que

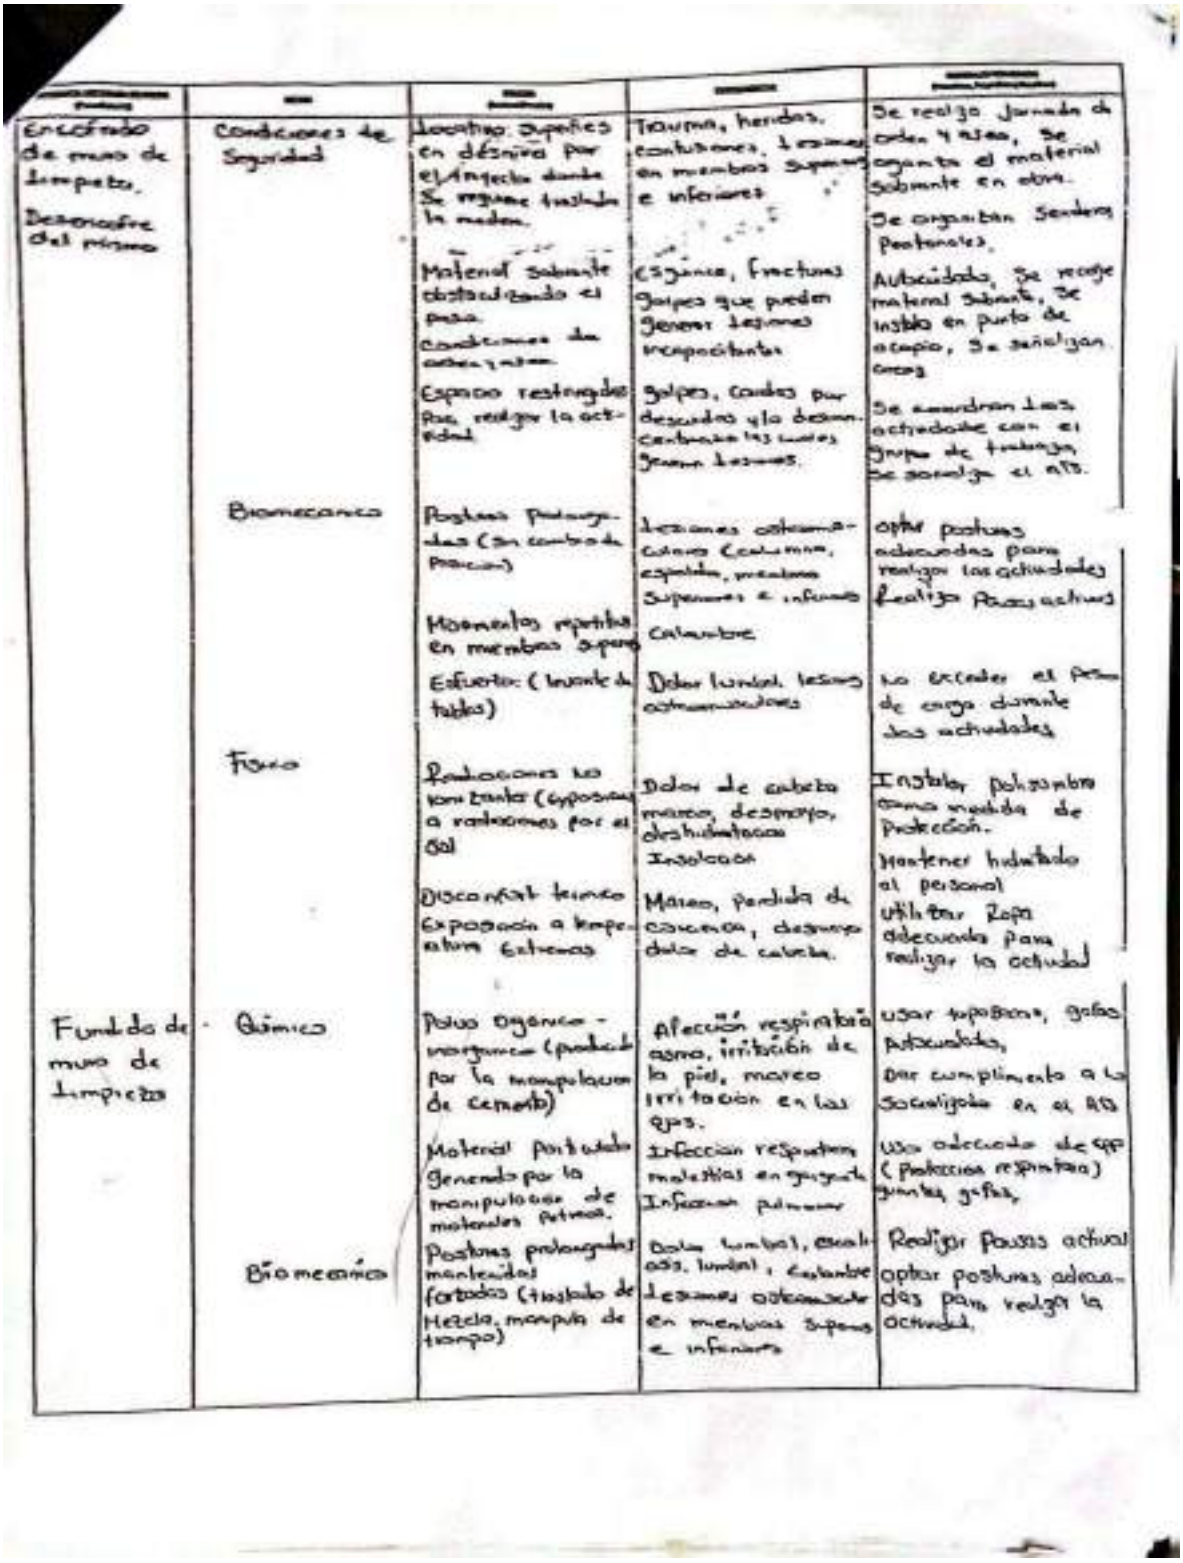



Encerrado de muro de limpieza. Desmontaje del mismo	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies en desnivel por el Angelo donde se ingresa inestable la medera.	Trauma, heridas, contusiones, lesiones en miembros superiores e inferiores	Se realiza jornada de orden y aseo, se organiza el material sobrante en obra.
		Material sobrante obstaculizando el paso.	Esguince, fracturas golpes que pueden generar lesiones incapacitantes	Se organizan senderos peatonales.
		Condiciones de orden y aseo.		Alrededor, se recoge material sobrante, se instala en punto de acopio, se señalizan zonas
		Espacio restringido para realizar la actividad	Golpes, caidas por descuidos y/o desconcentración las cuales generan lesiones.	Se coordinan las actividades con el grupo de trabajo, se socializa el ATS.
	Biomecanico	Posturas prolongadas (sin combinación)	Lesiones osteomusculares (columna, espalda, miembros superiores e inferiores	optar posturas adecuadas para realizar las actividades, realizar pausas activas
		Movimientos repetitivos en miembros superiores	Calambre	
		Esfuerzo: (levantamiento de tablas)	Dolor lumbar, lesiones osteomusculares	no exceder el peso de carga durante las actividades
	Fisico	Radiaciones no ionizantes (exposición a radiaciones por el sol)	Dolor de cabeza, mareo, desmayo, deshidratación, insolación	Instalar polisombra como medida de protección.
		Disconfort termico exposición a temperaturas extremas	Mareo, perdida de conciencia, desmayo, dolor de cabeza.	Mantener hidratado al personal, utilizar ropa adecuada para realizar la actividad
Fundido de muro de limpieza	Químico	Polvo organico - inorganico (producido por la manipulación de cemento)	Afección respiratoria asma, irritación de la piel, mareo irritación en los ojos.	usar tapabocas, gafas antiempañantes,
		Material particulado generado por la manipulación de materiales petreos.	Infección respiratoria enfermedades en general. Infección pulmonar	Dar cumplimiento a lo socializado en el ATS
	Biomecánico	Posturas prolongadas mantenidas forzadas (Instalación de Hierro, manipulación de tanque)	Dolor lumbar, cervicalgias, dolor lumbar, calambre, lesiones osteomusculares en miembros superiores e inferiores	uso adecuado de epp (Protección respiratoria) guantes, gafas, Realizar pausas activas, optar posturas adecuadas para realizar la actividad.

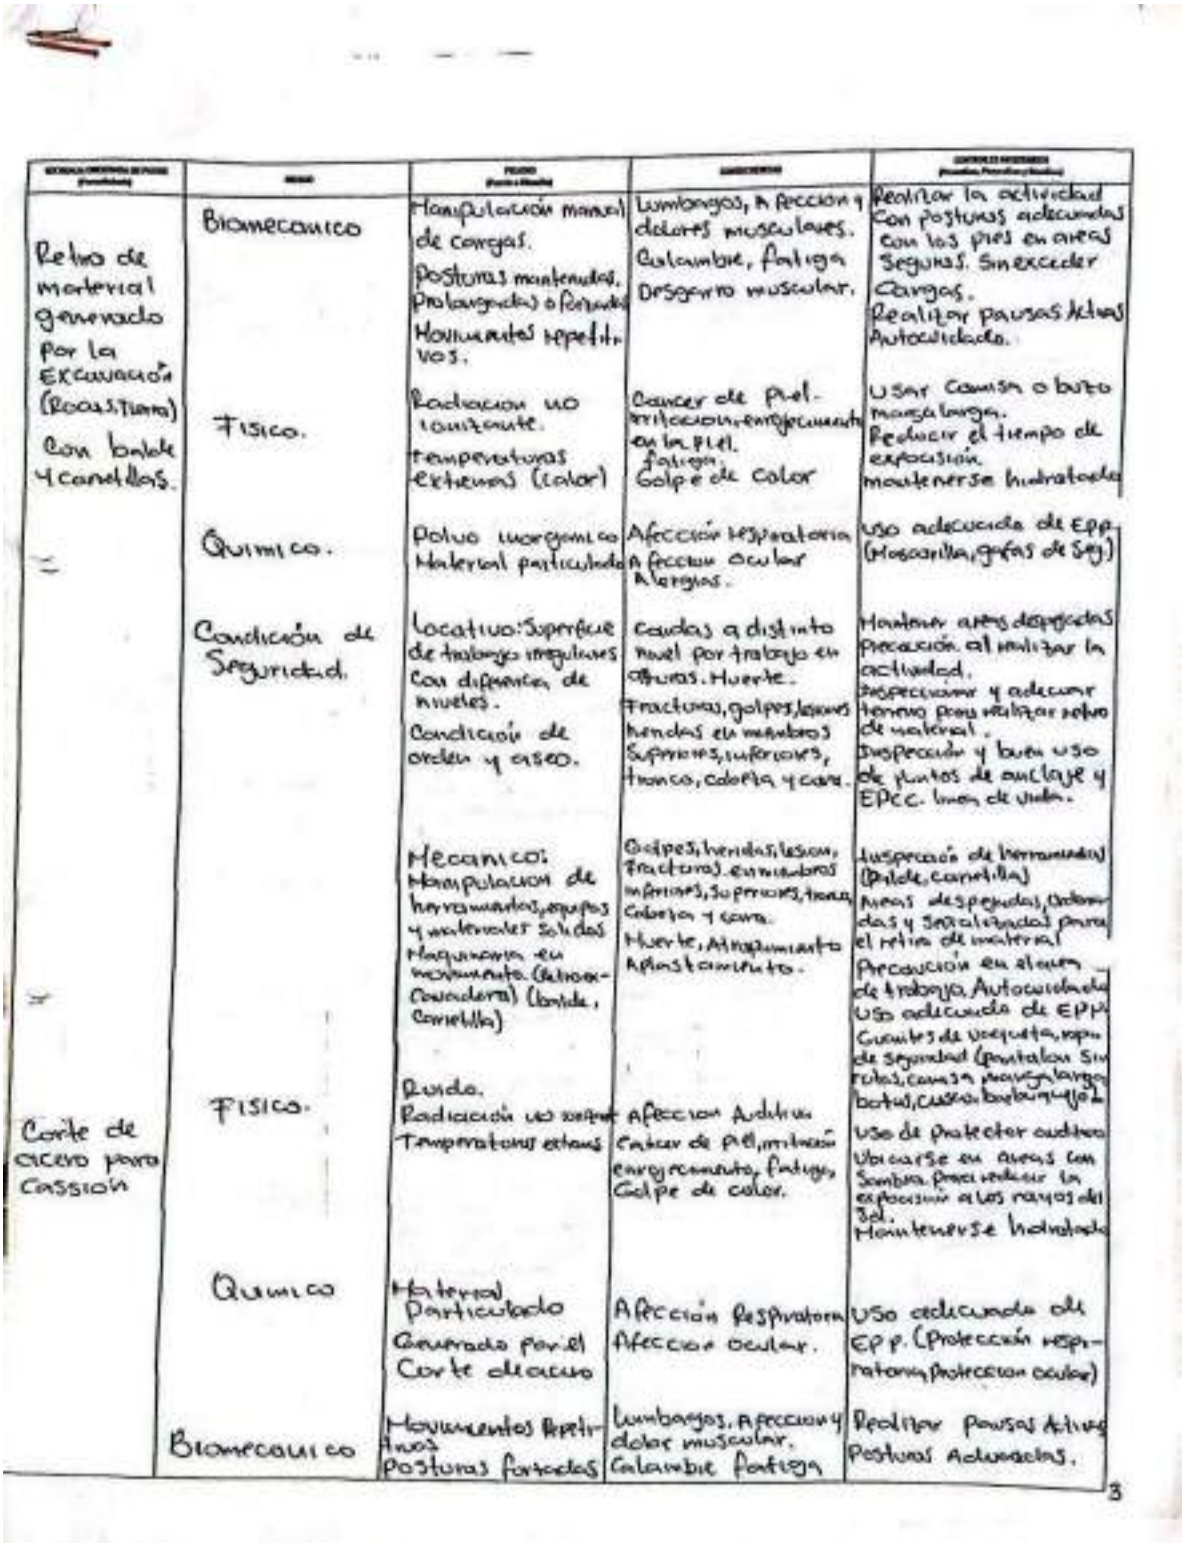


Retiro de material generado por la Excavación (Recostilera) Con balde y canastillas.	Biomecanico	Manipulación manual de cargas. Posturas mantenidas, Prolongadas o forzadas Movimientos repetitivos.	Lumbagos, Afección y dolores musculares. Calambre, fatiga Desgarro muscular.	Realizar la actividad Con posturas adecuadas con los pies en áreas Seguras. Sin exceder Cargas. Realizar pausas Activas Autocuidado.
	Fisico.	Radiacion no ionizante. Temperaturas Extremas (calor)	Cancer de piel. Irritacion, envejecimiento en la piel. fatiga. Golpe de Calor	Usar camisa o buzo manga larga. Reducir el tiempo de exposición. mantenerse hidratado
	Quimico.	Polvo inorganico Material particulado	Afección respiratoria Afección ocular Alergias.	Uso adecuado de EPP (Mascarilla, gafas de Seg.)
	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo irregulares Con diferencia de niveles. Condición de orden y aseo.	caidas a distinto nivel por trabajo en alturas. Muerte. Fracturas, golpes, lesiones hendas en miembros Superiores, inferiores, tronco, cabeza y cara.	Mantener áreas despejadas Precaución al realizar la actividad. Inspeccionar y adecuar terreno para realizar retiro de material. Inspección y buen uso de puntos de anclaje y EPCC. linea de vida.
		Mecanico: Manipulacion de herramientas, equipos y materiales Solidos Maquinaria en movimiento. (Retroexcavadora) (Balde, Canastilla)	Golpes, heridas, lesion, fracturas, en miembros inferiores, superiores, tronco, Cabeza y cara. Muerte, Atrapamiento Aplastamiento.	Inspección de herramientas (Balde, canastilla) Áreas despejadas, Ordenadas y señalizadas para el retiro de material Precaución en alturas de trabajo. Autocuidado Uso adecuado de EPP Cuentes de vioqueta, ropa de seguridad (pantalon Sin rotos, camisa manga larga, bota), casco, barbuquejo.
Corte de acero para cassion	Fisico.	Ruido. Radiacion no ionizante Temperaturas extremas	Afeccion Auditiva Cancer de Piel, irritacion envejecimiento, fatiga, Golpe de calor.	Uso de protector auditivo Ubicarse en areas con Sombra. Proteger la exposicion a los rayos del Sol. Mantenerse hidratado
	Quimico	Material Particulado Generado por el Corte del acero	Afeccion Respiratoria Afeccion ocular.	Uso adecuado de EPP. (Proteccion respiratoria, Proteccion ocular)
	Biomecanico	Movimientos Repetitivos Posturas forzadas	Lumbagos, Afeccion y dolor muscular. Calambre fatiga	Realizar pausas Activas Posturas Adecuadas.

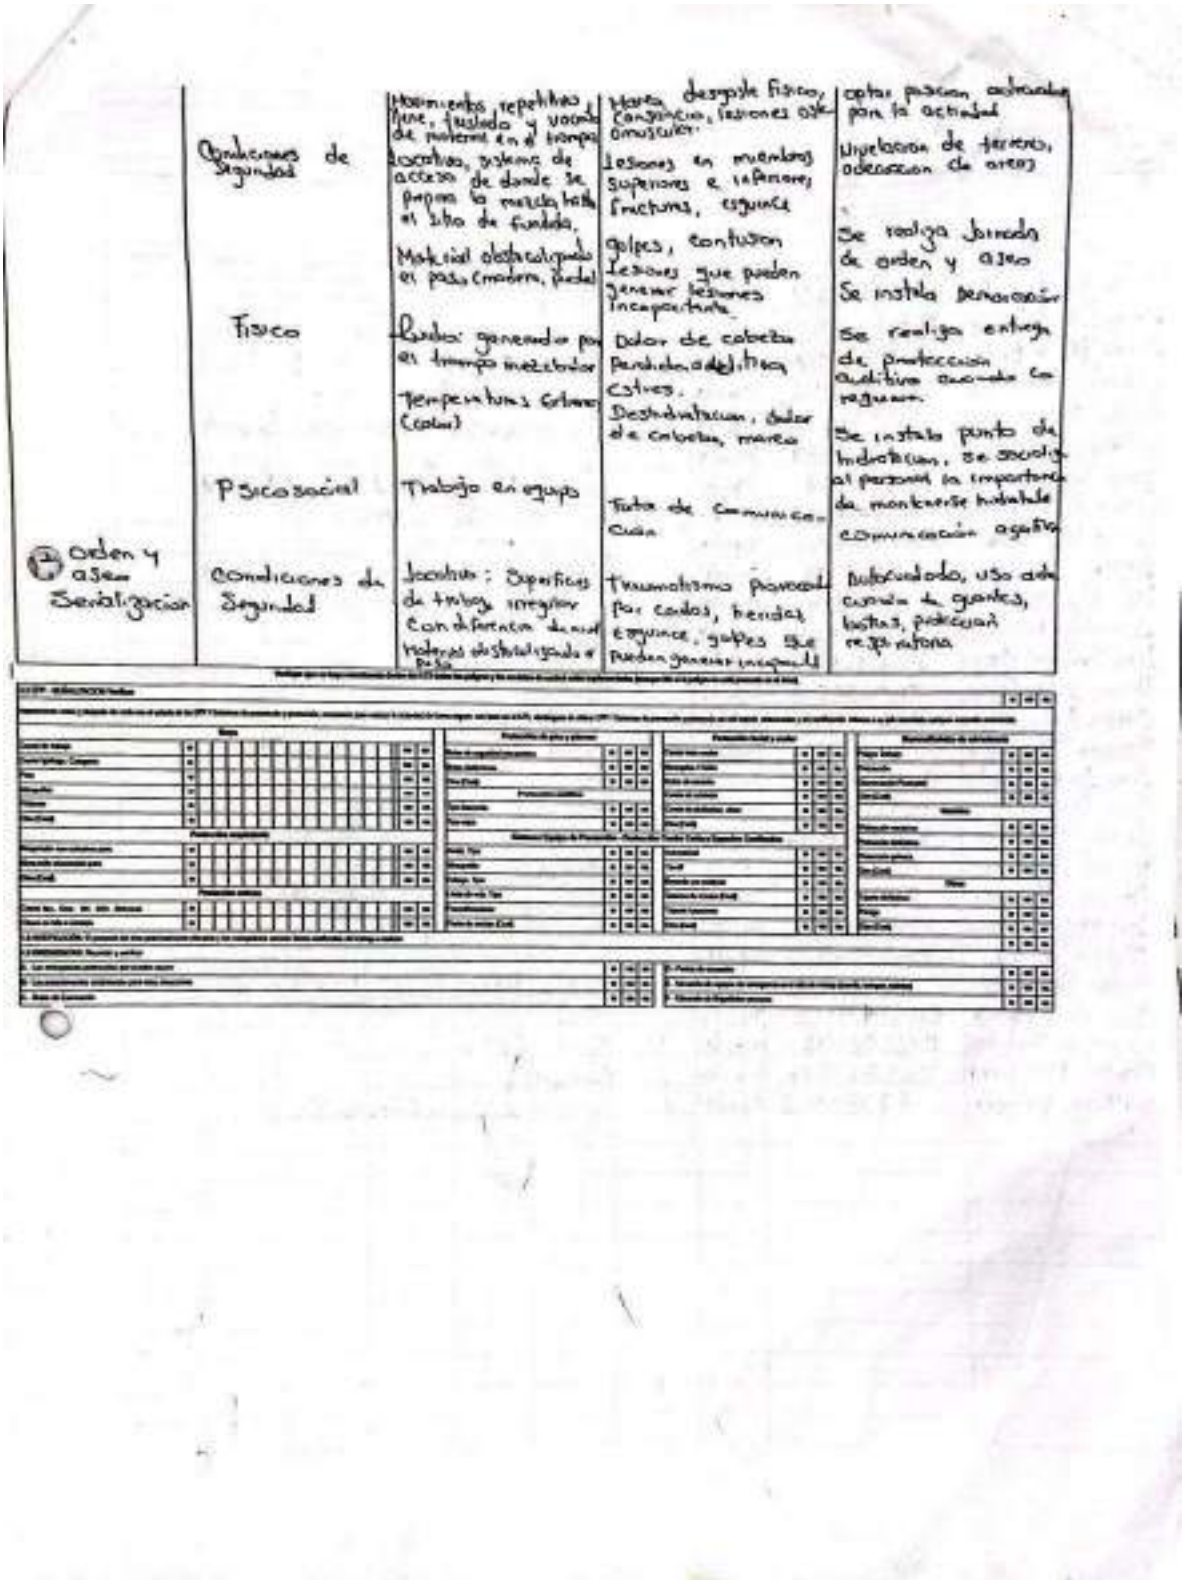
Orden y aseo Señalización
Condiciones de Seguridad
Locativas: Superficies de trabajo irregular
Psicosocial
Trabajo en equipo
Fisico
Ruido: generado por
Temperaturas extremas (calor)
Golpes, contusiones
Lesiones que pueden generar incapacidad
Dolor de cabeza
Deshidratacion, dolor de cabeza, mareo
Fatiga de Comunicación
Traumatismo provocado por caidas, heridas, esguince, golpes
Se realiza entrega de protección auditiva cuando se requiere.
Se instala punto de hidratacion, se socializa al personal la importancia de mantenerse hidratado
comunicación asertiva
Autocuidado, uso adecuado de guantes, gafas, protección respiratoria

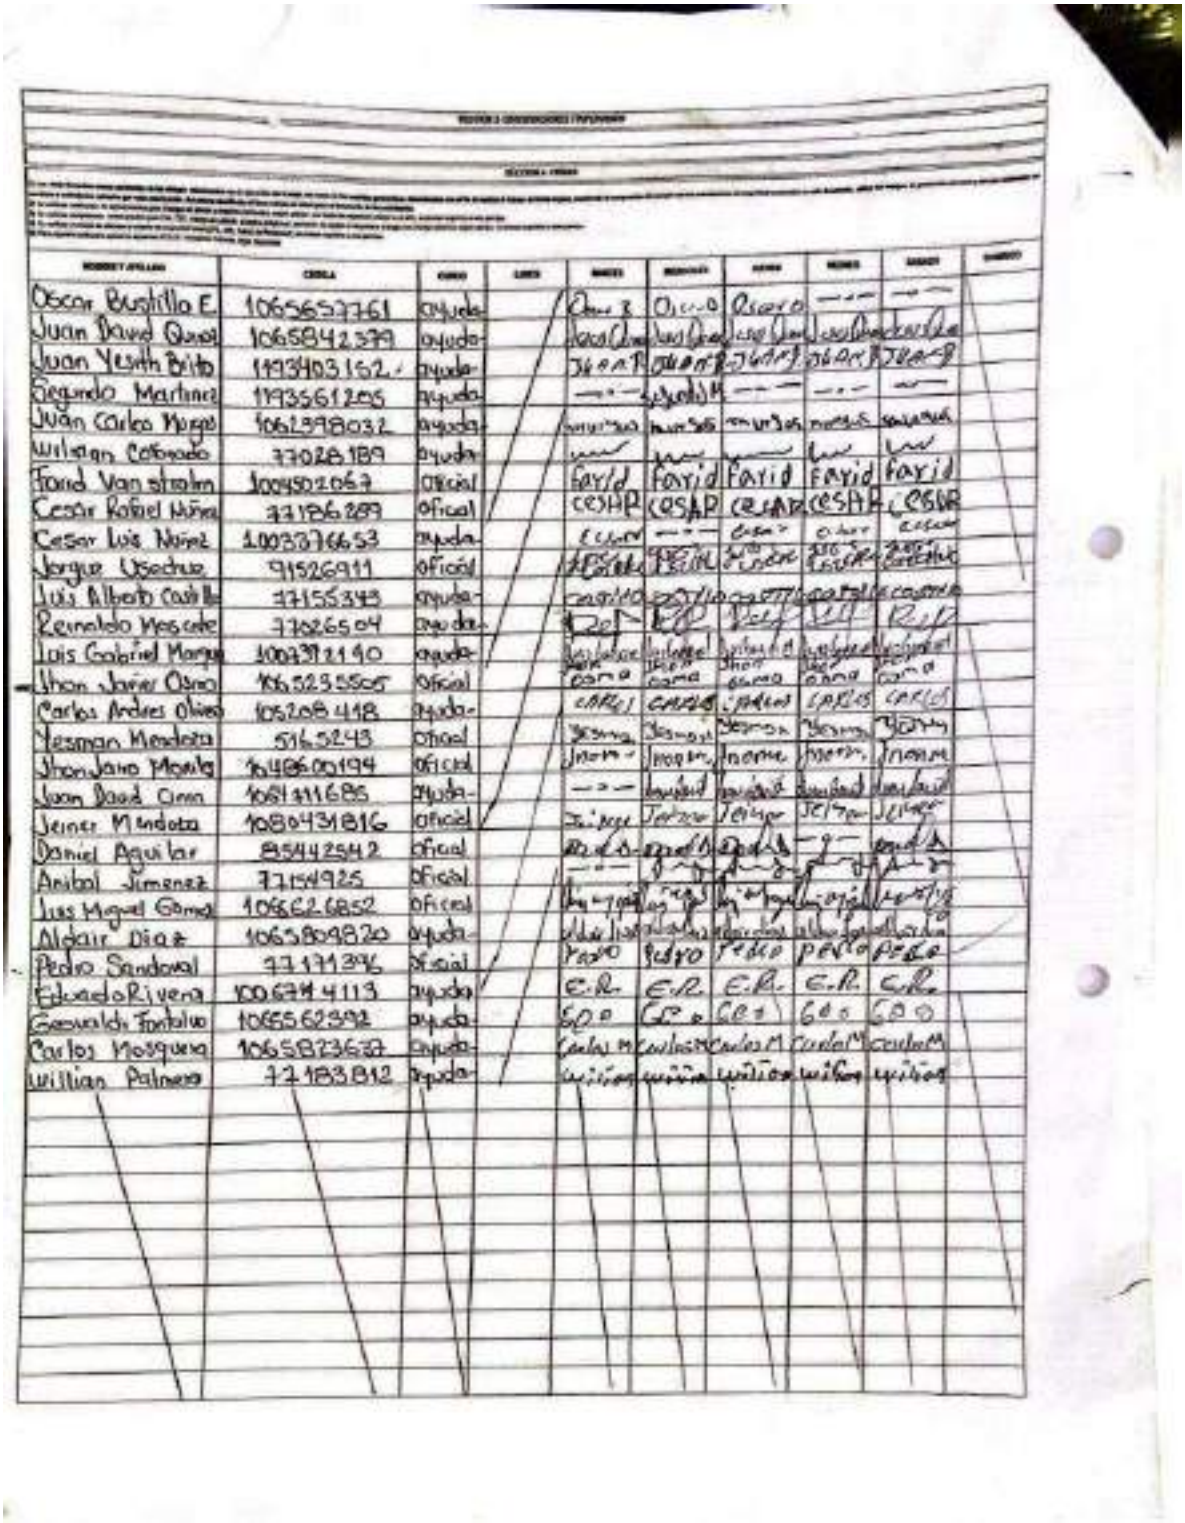

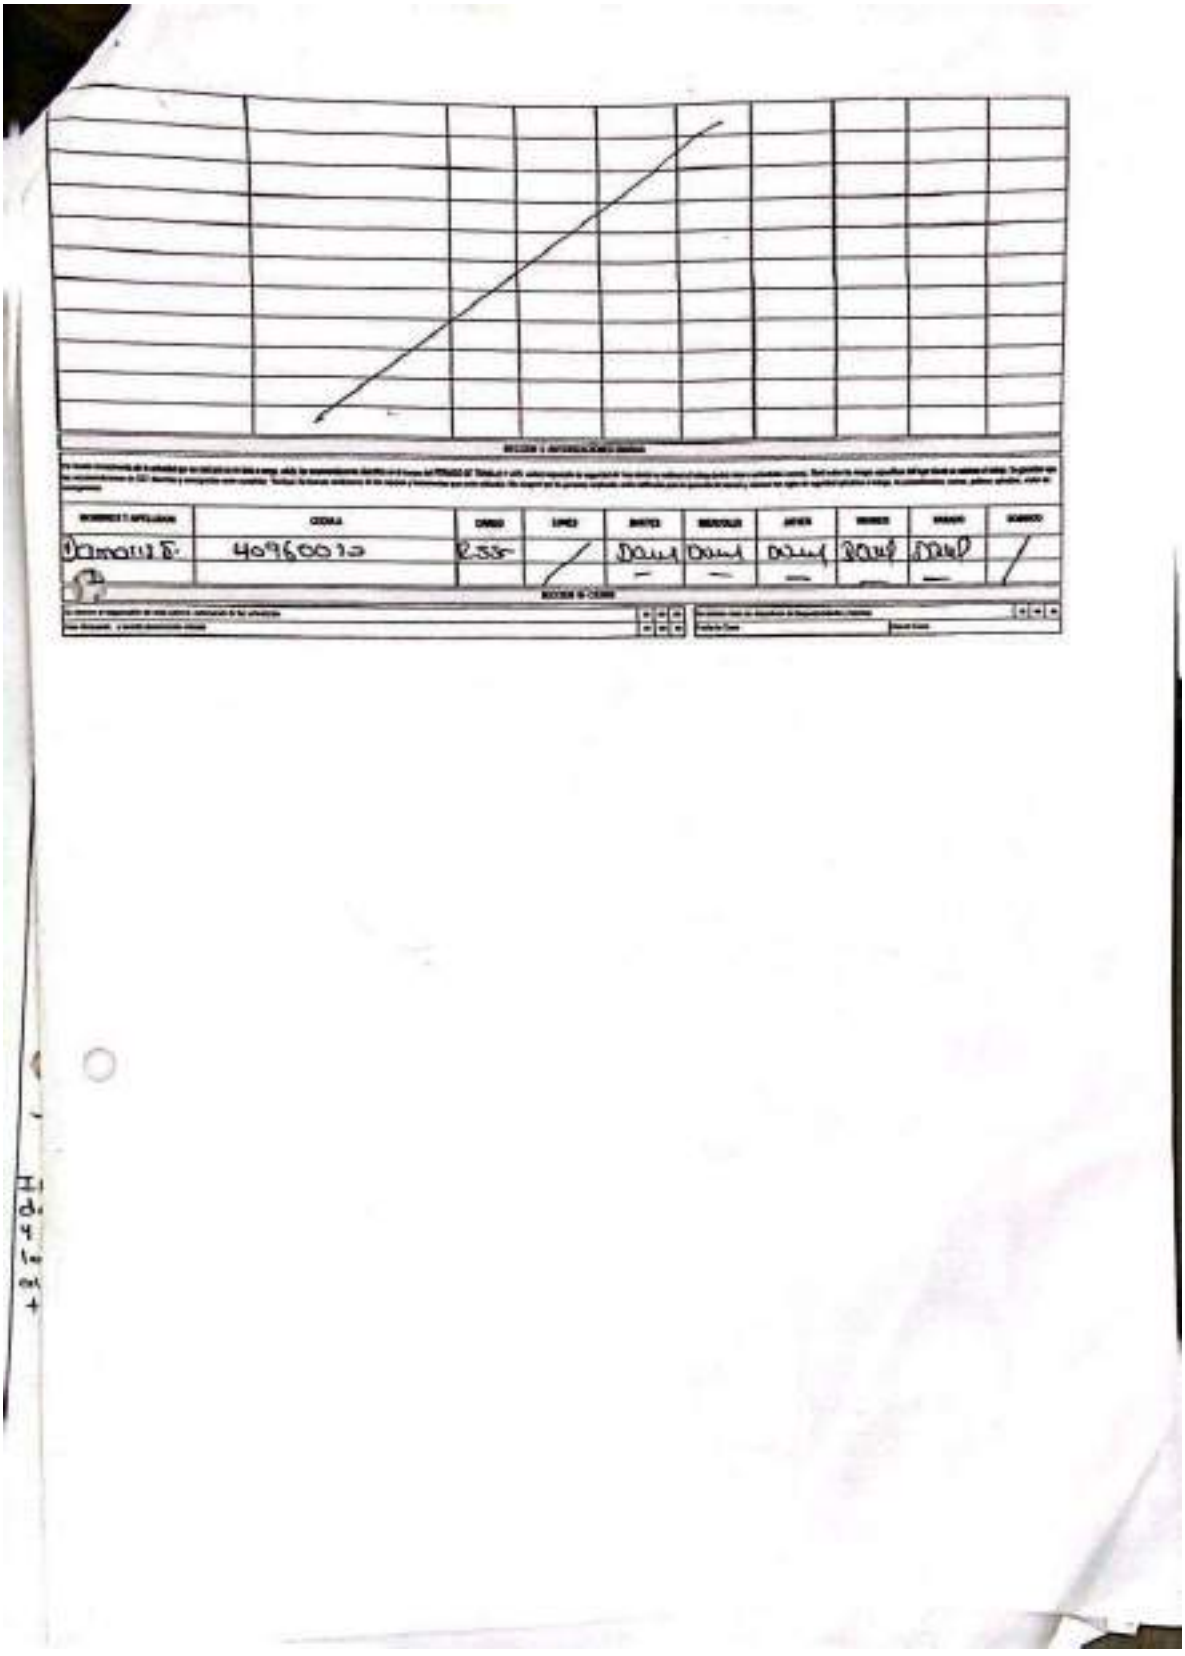


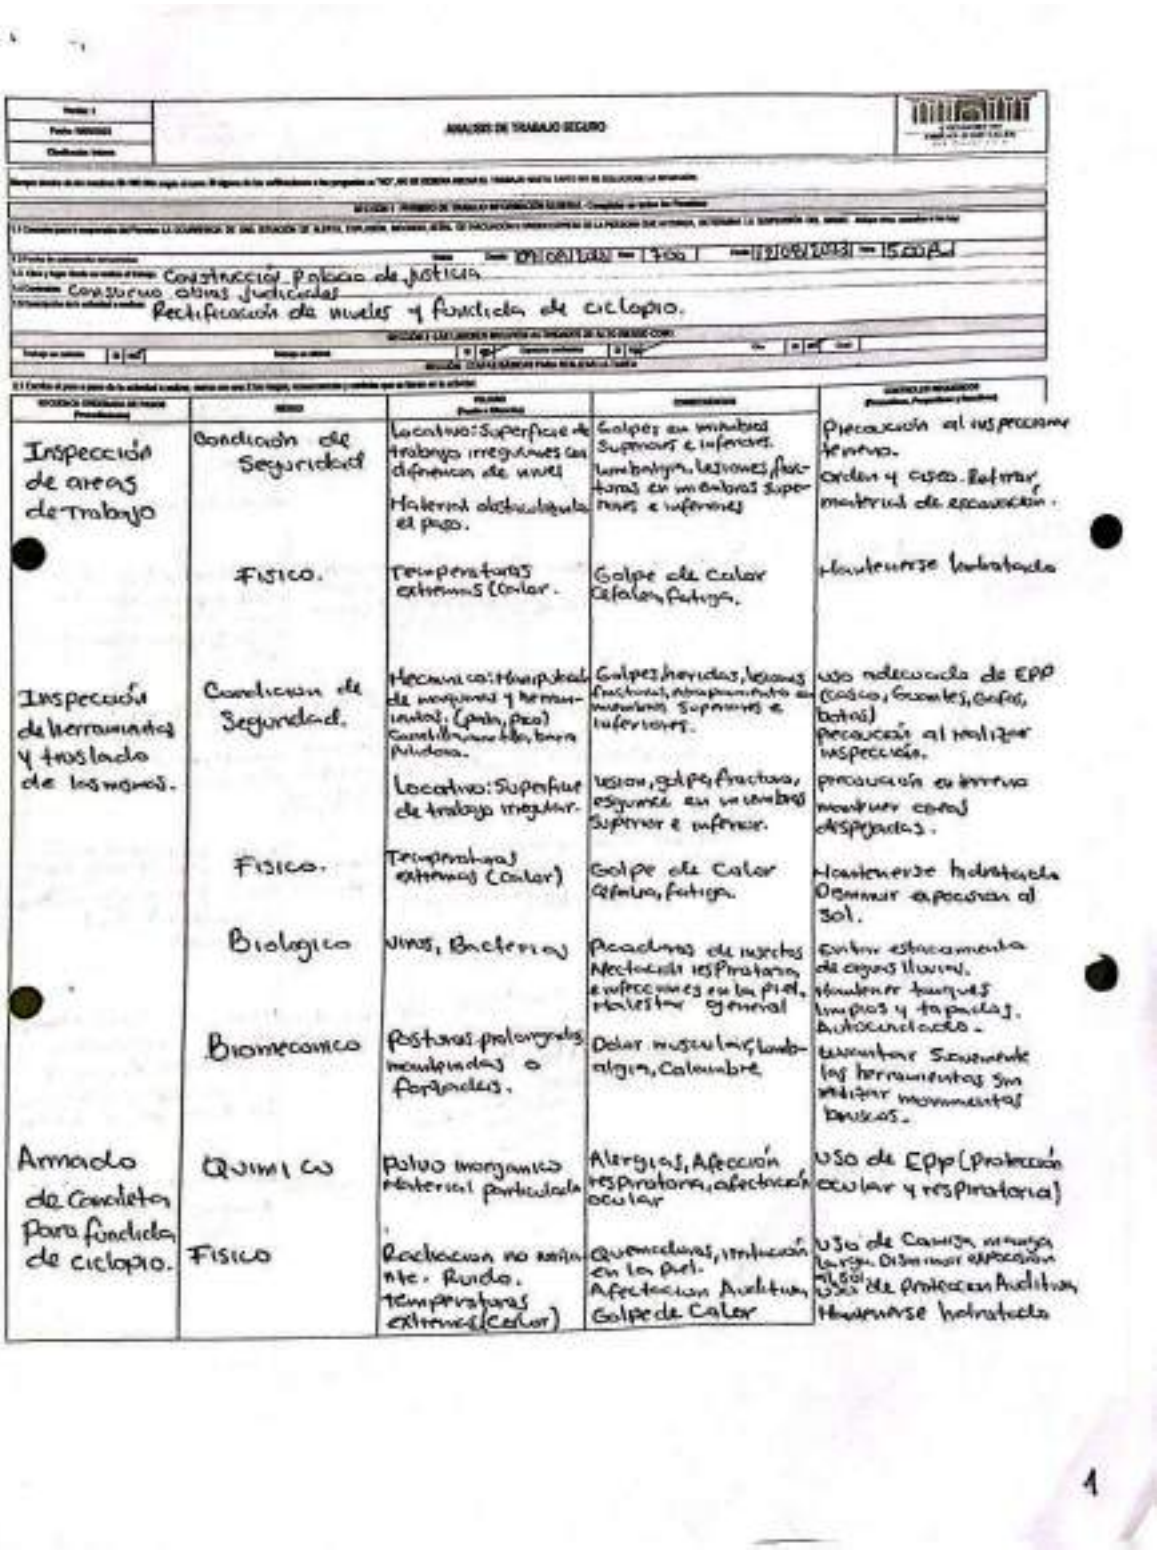


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Construcción Palacio de justicia
Construcción obras judiciales
Rectificación de niveles y fundición de ciclopio.


Inspección de areas de Trabajo	Condición de Seguridad	Locativo: Superficie de trabajo irregulares con diferencia de niveles Material obstaculiza el paso.	Golpes en miembros Superiores e inferiores. lumbalgia, lesiones, fracturas en miembros superiores e inferiores	Precaución al ingresar lentamente. orden y aseo. Retirar material de excavación.
	Fisico.	Temperaturas extremas (Calor.	Golpe de Calor Cefalea, fatiga.	Hidratarse hidratado
Inspección de herramientas y traslado de los mismos.	Condicion de Seguridad.	Mecanico: Manipulacion de maquinas y herramientas. (pala, pica) Combinacion, mala, mala postura.	Golpes, heridas, lesiones fracturas, atrapamiento en miembros superiores e inferiores.	uso adecuado de EPP (casco, Guantes, Gafas, botas) precaución al realizar inspección.
		Locativo: Superficie de trabajo irregular.	lesion, golpes, fractura, esguince en miembros Superior e inferior.	precaución en terreno irregular caminar despacio.
	Fisico.	Temperaturas extremas (Calor)	Golpe de Calor Cefalea, fatiga.	Hidratarse hidratado Disminuir exposicion al sol.
	Biologico	Virus, Bacterias	Picaduras de insectos Afectacion respiratoria, enfermedades en la piel, malestar general	Evitar estancamiento de aguas lluvias. Mantener tanques limpios y tapados. Autocuidado.
	Biomecanico	Posturas prolongadas, movimientos o forzados.	Dolor muscular, lumbalgias, Calambre	Levantar Suavemente las herramientas sin realizar movimientos bruscos.
Armado de Concreto Para fundida de ciclopio.	Quimico	Polvo inorganico material particulado	Alergias, Afección respiratoria, afectacion ocular	Uso de EPP (Protección ocular y respiratoria)
	Fisico	Radiacion no ionizante. Ruido. Temperaturas extremas (Calor)	Quemaduras, irritación en la piel. Afectacion Auditiva, Golpe de Calor	Uso de Camisa manga larga. Disminuir exposicion al sol. Uso de protección Auditiva. Hidratarse hidratado

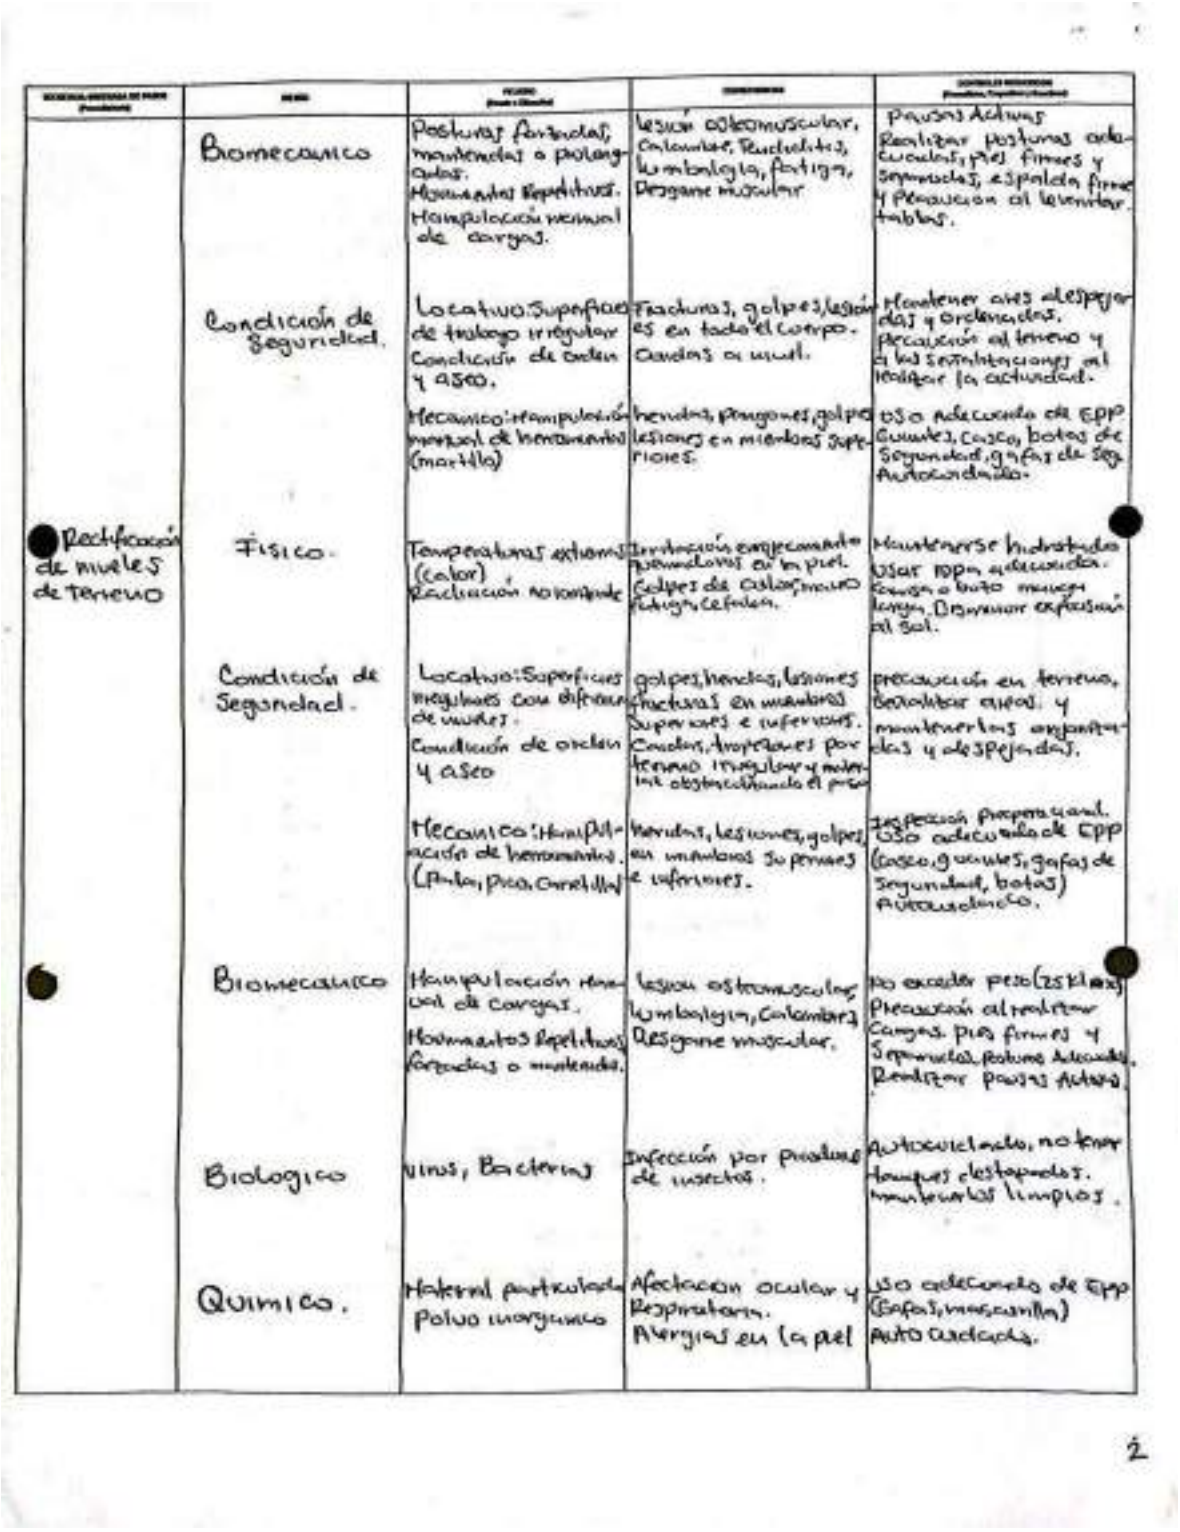


	Biomecanico	Posturas forzadas, mantenidas o prolongadas. Movimientos Repetitivos. Manipulación manual de cargas.	lesión osteomuscular, Calambres, Tendinitis, Lumbalgia, fatiga, Desgarre muscular	Pausas Activas Realizar posturas adecuadas, pies firmes y separados, espalda firme y precaución al levantar. tablas.
	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo irregular Condición de orden y aseo.	Fracturas, golpes, lesiones en todo el cuerpo. Caidas a nivel.	Mantener area despejada y ordenadas. precaución al terreno y a las señalizaciones al realizar la actividad.
		Mecanico: manipulación manual de herramientas (martillo)	heridas, pinzones, golpes lesiones en miembros superiores.	uso adecuado de EPP Guantes, casco, botas de Seguridad, gafas de Seg. Autocuidado.
Rectificación de niveles de terreno	Fisico.	Temperaturas extremas (calor) Radiación no ionizante	Irritación enrojecimiento quemaduras en la piel. Golpes de calor, mareo fatiga, cefalea.	Mantenerse hidratados usar ropa adecuada. Cremas o bloq mayor tiempo. Disminuir exposición al Sol.
	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficies irregulares con diferencia de niveles. Condición de orden y aseo	golpes, heridas, lesiones fracturas en miembros Superiores e inferiores. Caidas, tropezones por terreno irregular y material obstaculizando el paso	precaución en terreno, Señalizar areas. y mantenerlos organizados y despejados.
		Mecanico: Manipulación de herramientas. (Pala, pica, carretilla)	Heridas, lesiones, golpes en miembros Superiores e inferiores.	Inspección preoperacional. Uso adecuado de EPP (casco, guantes, gafas de Seguridad, botas) Autocuidado.
	Biomecanico	Manipulación manual de cargas. Movimientos Repetitivos forzados o mantenidos.	lesion osteomuscular Lumbalgia, Calambres Desgarre muscular.	No exceder peso (25 kilos) Precaución al realizar Cargas. Pies firmes y Separados. Postura Adecuada. Realizar pausas Activas.
	Biologico	Virus, Bacterias	Infección por picadura de insectos.	Autocuidado, no tener Charcos destapados. mantenerlos limpios.
	Quimico.	Material particulado Polvo inorganico	Afectacion ocular y Respiratoria. Alergias en la piel	Uso adecuado de Epp (Gafas, mascarilla) Auto cuidado.

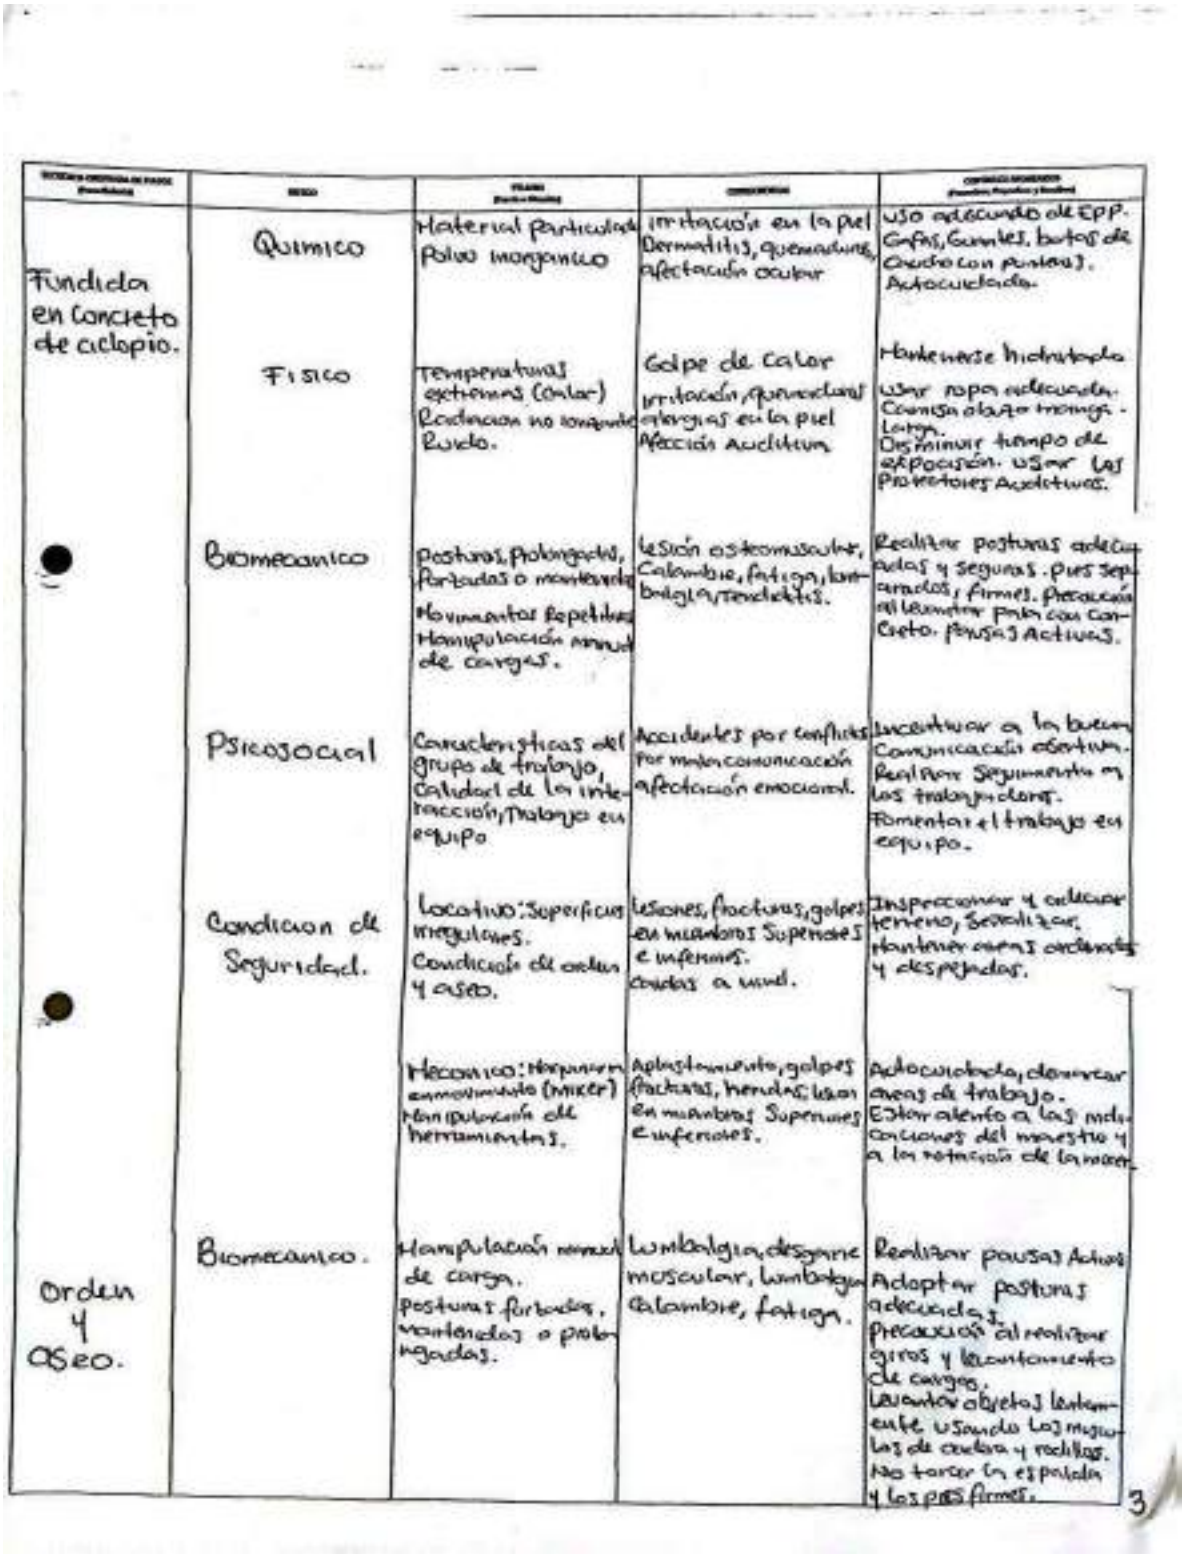



Fundida en Concreto de ciclopio.	Químico	Material particulado Polvo inorganico	irritación en la piel Dermatitis, quemaduras, afectación ocular	uso adecuado de EPP. Gafas, Guantes, botas de Caucho con puntas). Autocuidado.
	Físico	Temperaturas extremas (calor) Radiacion no ionizante Ruido.	Golpe de calor irritación, quemaduras alergias en la piel Afección Auditiva	Mantenerse hidratado usar ropa adecuada. Camisa de manga larga. Disminuir tiempo de exposición. usar los Protectores Auditivos.
	Biomecanico	Posturas Prolongadas, forzadas o mantenida Movimientos Repetitivos Manipulación manual de cargas.	lesión osteomuscular, Calambre, fatiga, lumbalgia/tendinitis.	Realizar posturas adecuadas y seguras. pies separados, firmes. Precaución al levantar pesos con concreto. pausas Activas.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo, Calidad de las interacción, Trabajo en equipo	Accidentes por conflictos por mala comunicación afectación emocional.	Incentivar a la buena Comunicación abierta. Realizar Seguimiento en los trabajos claros. Fomentar el trabajo en equipo.
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Superficies irregulares. Condición de orden y aseo.	lesiones, fracturas, golpes en miembros Superiores e inferiores. caidas a nivel.	Inspeccionar y delimitar terreno, Señalizar. Mantener areas ordenadas y despejadas.
		Mecanico: Herramienta en movimiento (MIXER) Manipulación de herramientas.	Aplastamiento, golpes fracturas, heridas; lesion en miembros Superiores e inferiores.	Adecuadamente, demarcar areas de trabajo. Estar atento a las indicaciones del maestro y a la señalización de la maq
Orden y aseo.	Biomecanico.	Manipulación manual de carga. posturas forzadas, mantenidas o prolongadas.	Lumbalgia, desgarro muscular, Lumbalgia Calambre, fatiga.	Realizar pausas Activas Adoptar posturas adecuadas, precaución al realizar giros y levantamiento de cargas. Levantar objetos lentamente usando los miembros de ceuda y rodillas. No torcer la espalda y los pies firmes.

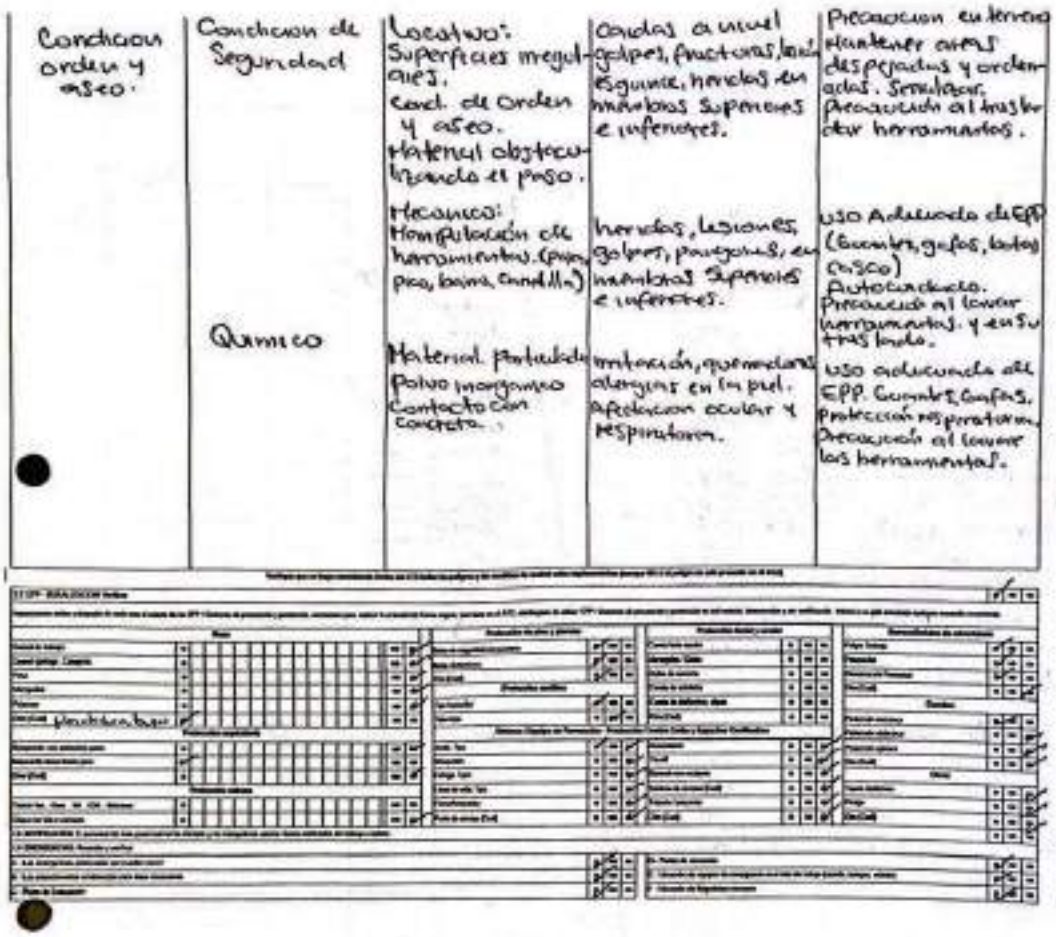

Condicion orden y aseo.	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares. Cond. de orden y aseo. Material obstaculizando el paso.	Caidas a nivel golpes, fracturas, lesiones, heridas en manos superiores e inferiores.	Precaucion en tiempo mantener area despejadas y ordenadas. Señalizar. Precaución al trasladar herramientas.
		Mecanico: Manipulación de herramientas. (pica, barra, candil...)	heridas, lesiones, golpes, pargoras, en manos superiores e inferiores.	uso Adecuado de EPP (Guantes, gafas, botas con casco) Autocuidado. Precaución al lavar herramientas. y en su traslado.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico Contacto con concreto.	intoxicación, quemaduras alergias en la piel. afecciones ocular y respiratorias.	uso adecuado del EPP. Guantes, Gafas. Protección respiratoria. Precaución al lavar las herramientas.

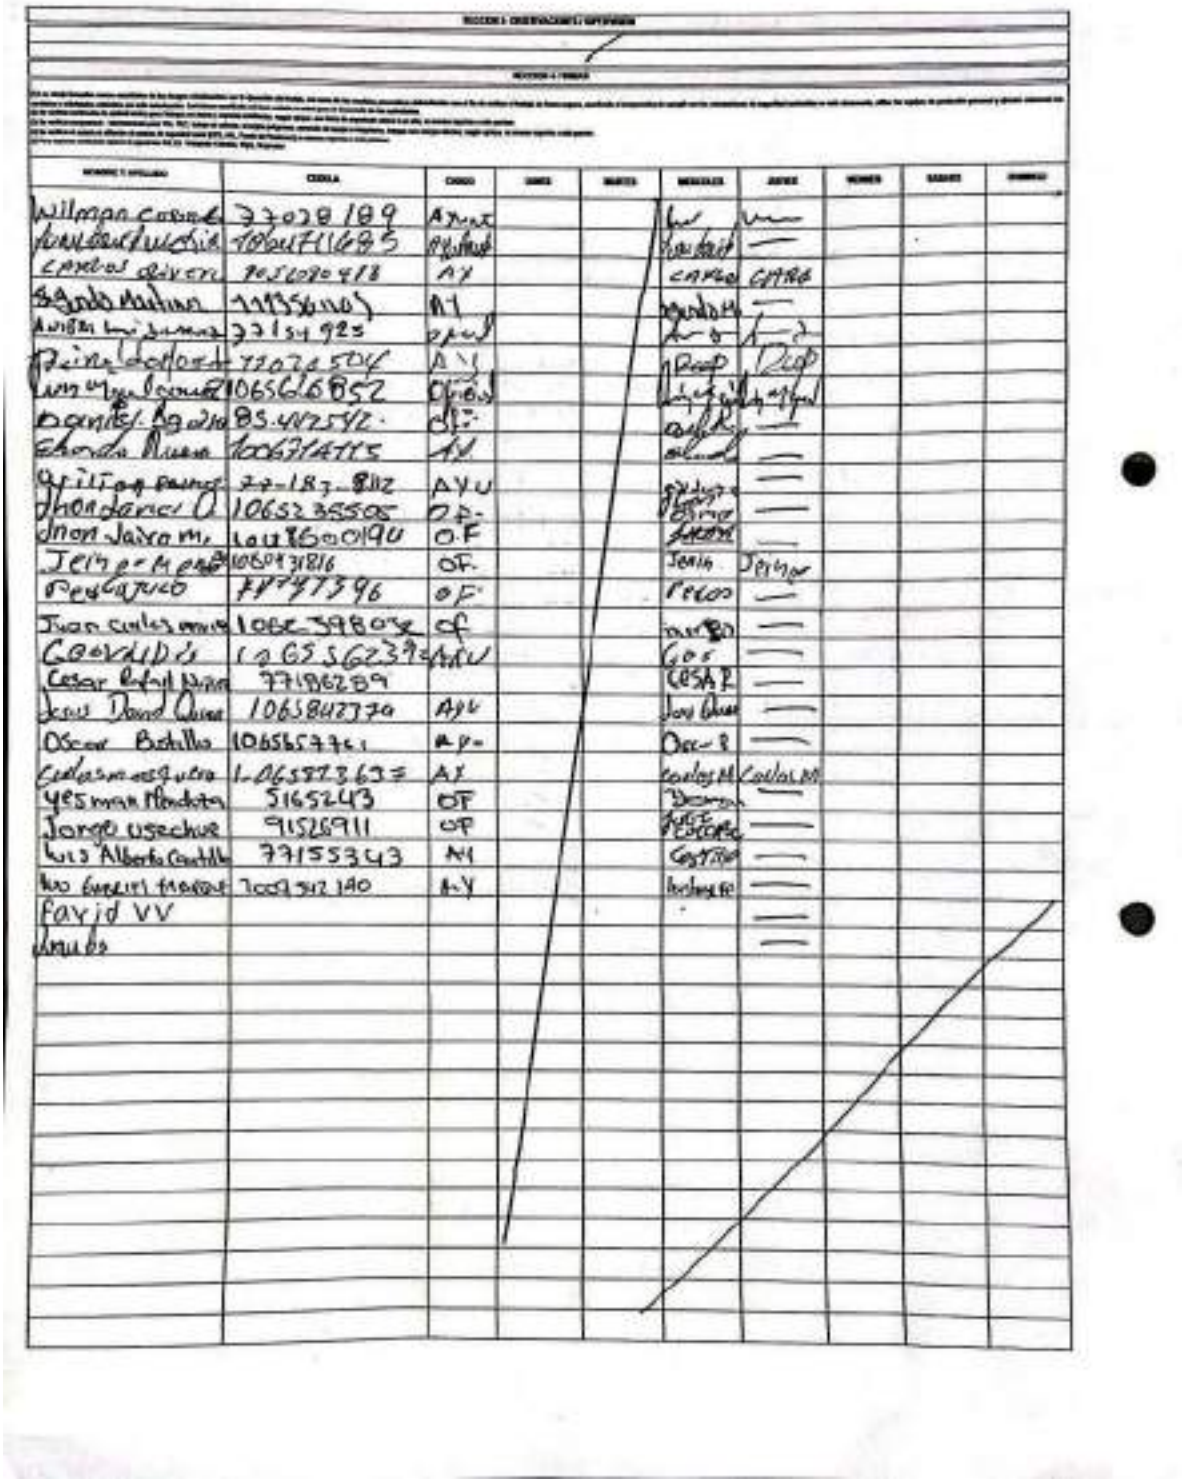

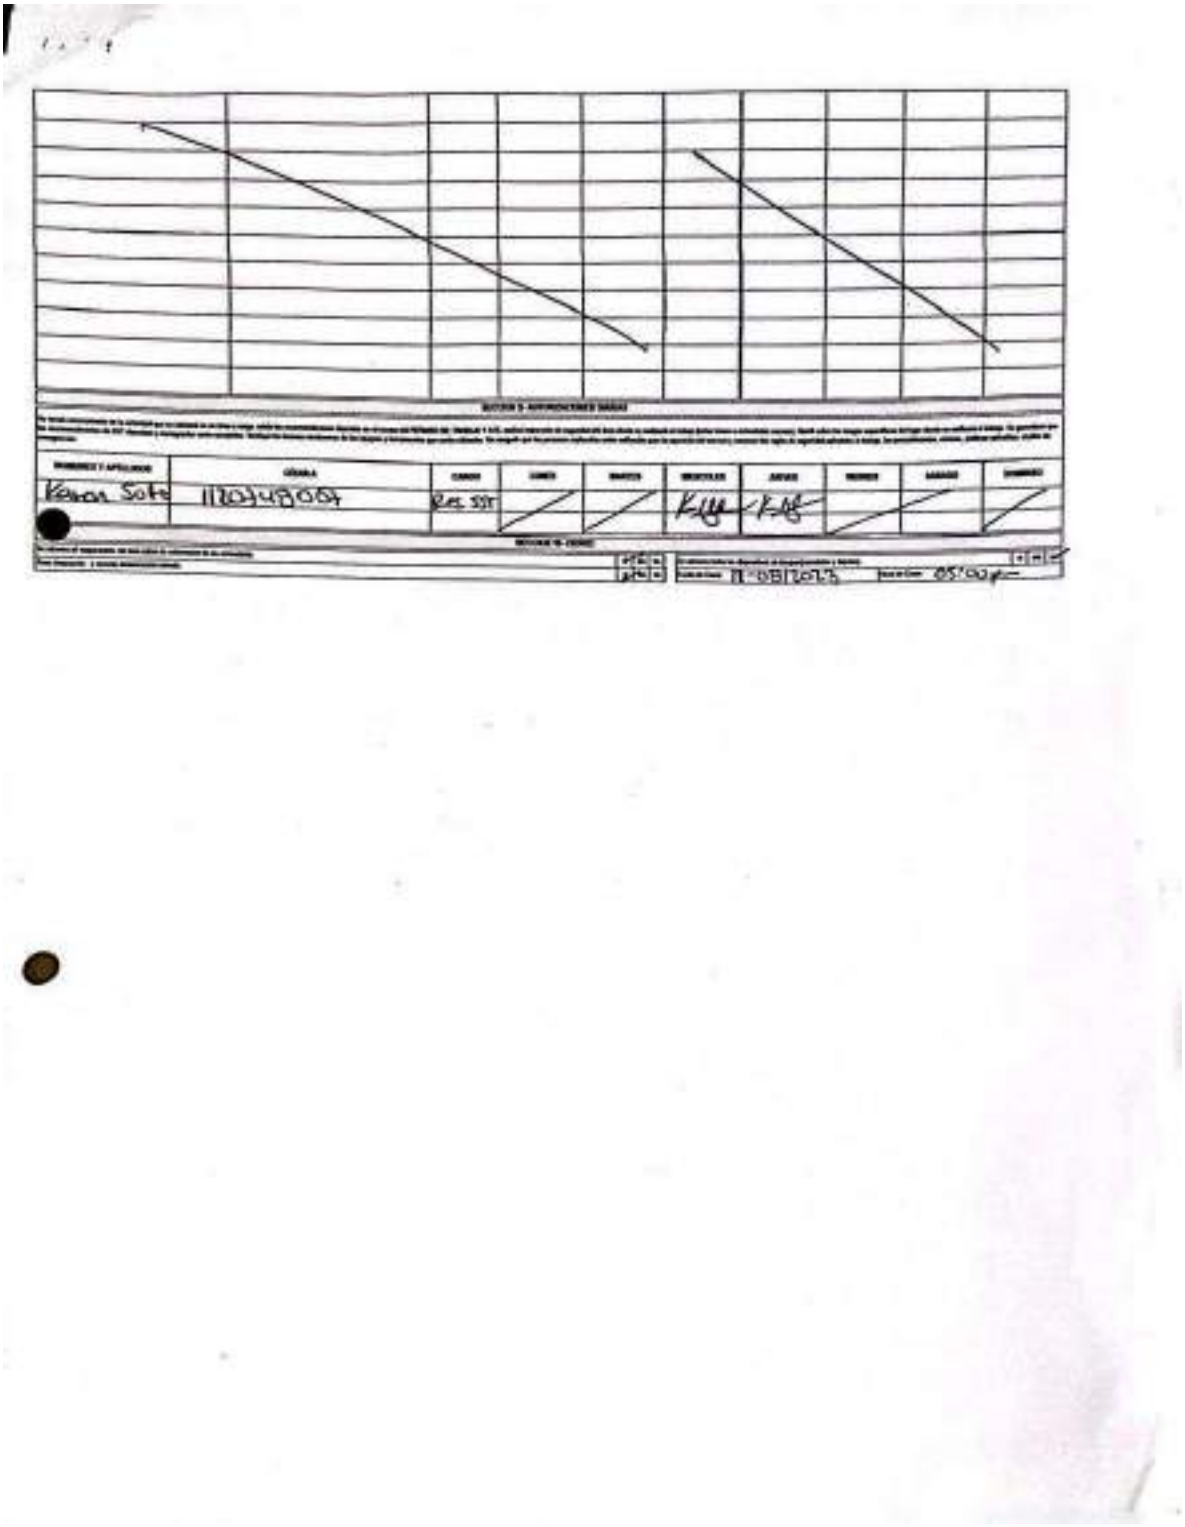


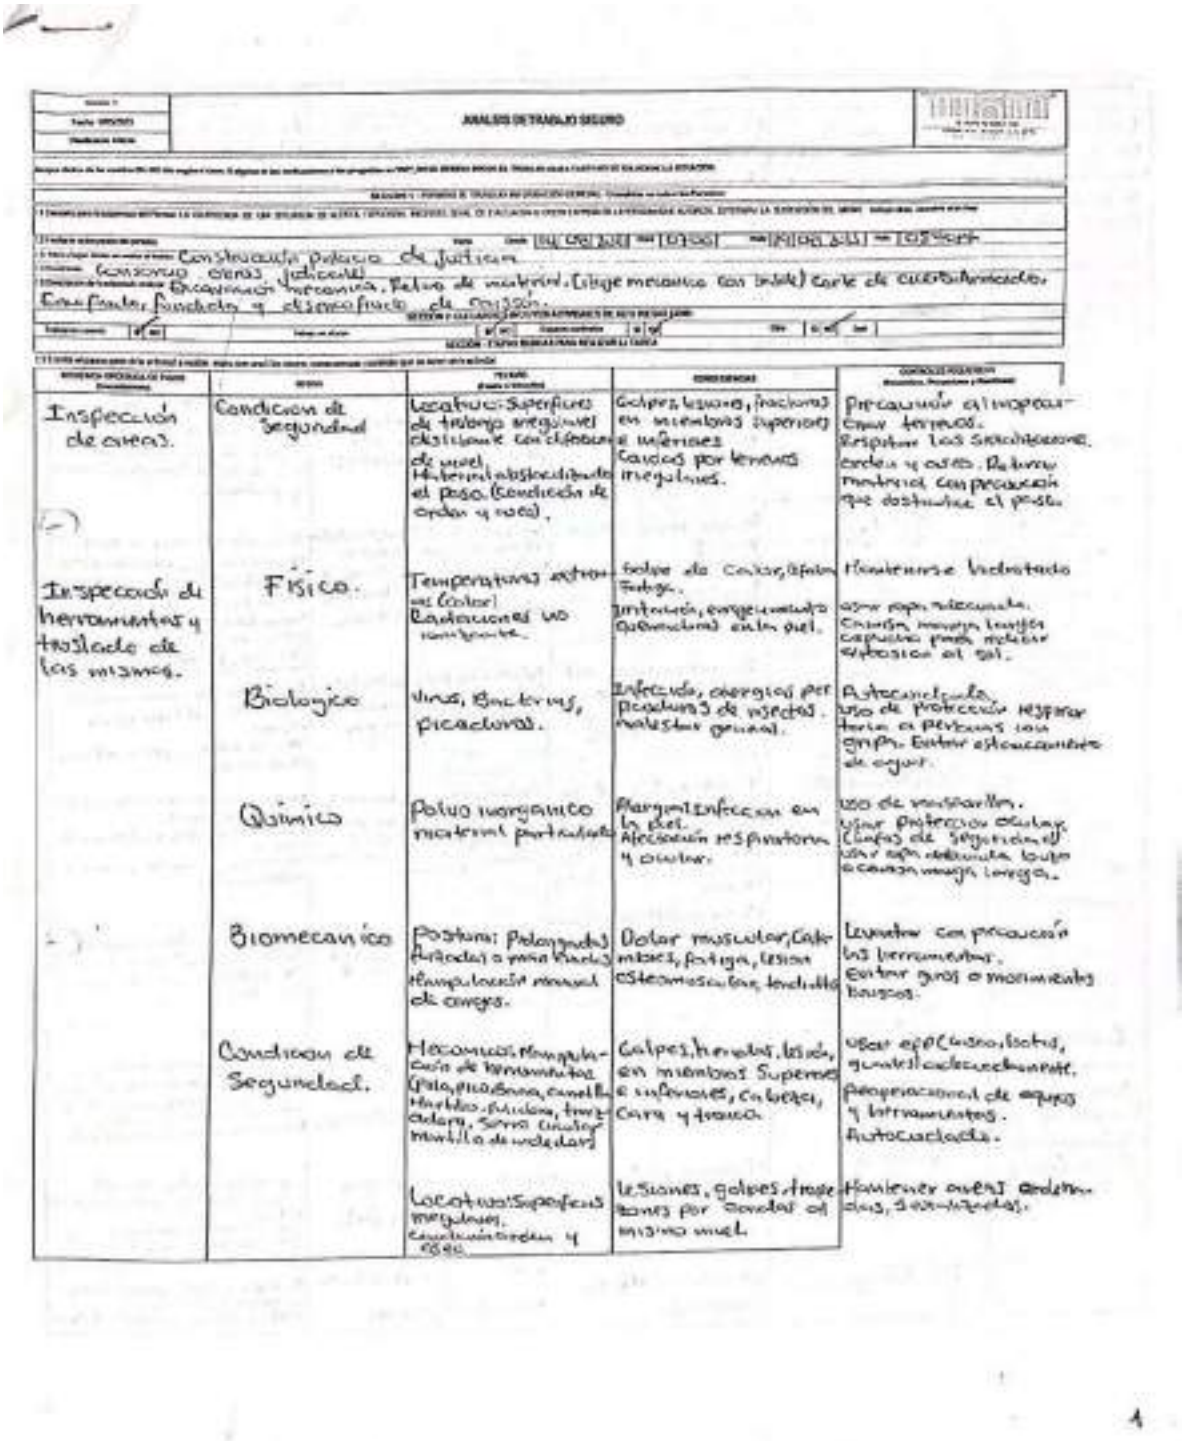


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Construcción palacio de justicia


Inspección de áreas.	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies de trabajo irregulares, obstáculos con diferencia de nivel, Material obstaculizando el paso. (Condición de orden y aseo).	Golpes, lesiones, fracturas en miembros superiores e inferiores. Caídas por terrenos irregulares.	Precaución al inspeccionar terrenos. Respetar las señalizaciones, orden y aseo. Retirar material con precaución que obstruya el paso.
Inspección de herramientas y traslado de las mismas.	Físico.	Temperaturas extremas (Calor) Radiaciones no ionizantes.	Golpe de calor, fatiga, fatiga. Irritación, enrojecimiento quemaduras en la piel.	Mantenerse hidratado usar ropa adecuada. Cremas, mangas largas, capuchas para retirar exposición al sol.
	Biológico	Virus, Bacterias, picaduras.	Infección, alergias por picaduras de insectos. malestar general.	Autocuidado. Uso de protección respiratoria en personas con gripa. Evitar aglomeraciones de agua.
	Químico	Polvo inorgánico material particulado	Alergia, Infección en la piel. Afección respiratoria y ocular.	Uso de mascarillas. Usar protección ocular. Cumplir de seguridad. Usar ropa adecuada, bajo exposición manga larga.
	Biomecánico	Posturas: Prolongadas, forzadas o mala, Manipulación manual de cargas.	Dolor muscular, Calambres, fatiga, lesión osteomuscular, lordosis	Levantar con precaución las herramientas. Evitar giros o movimientos bruscos.
	Condiciones de Seguridad.	Mecánicos: Manipulación de herramientas (pala, picadora, cancel, Martillo, Pulidora, trompo, Barra, Cinturón, Martillo de soldadura)	Golpes, heridas, lesión en miembros Superiores e inferiores, Cabeza, Cara y tronco.	Usar epp (casco, lentes, guantes) adecuadamente. Apropiación del uso de equipos y herramientas. Autocuidado.
		Locativos: Superficies irregulares, Condición orden y aseo.	Lesiones, golpes, fracturas por caídas del mismo nivel.	Mantener orden, limpieza.

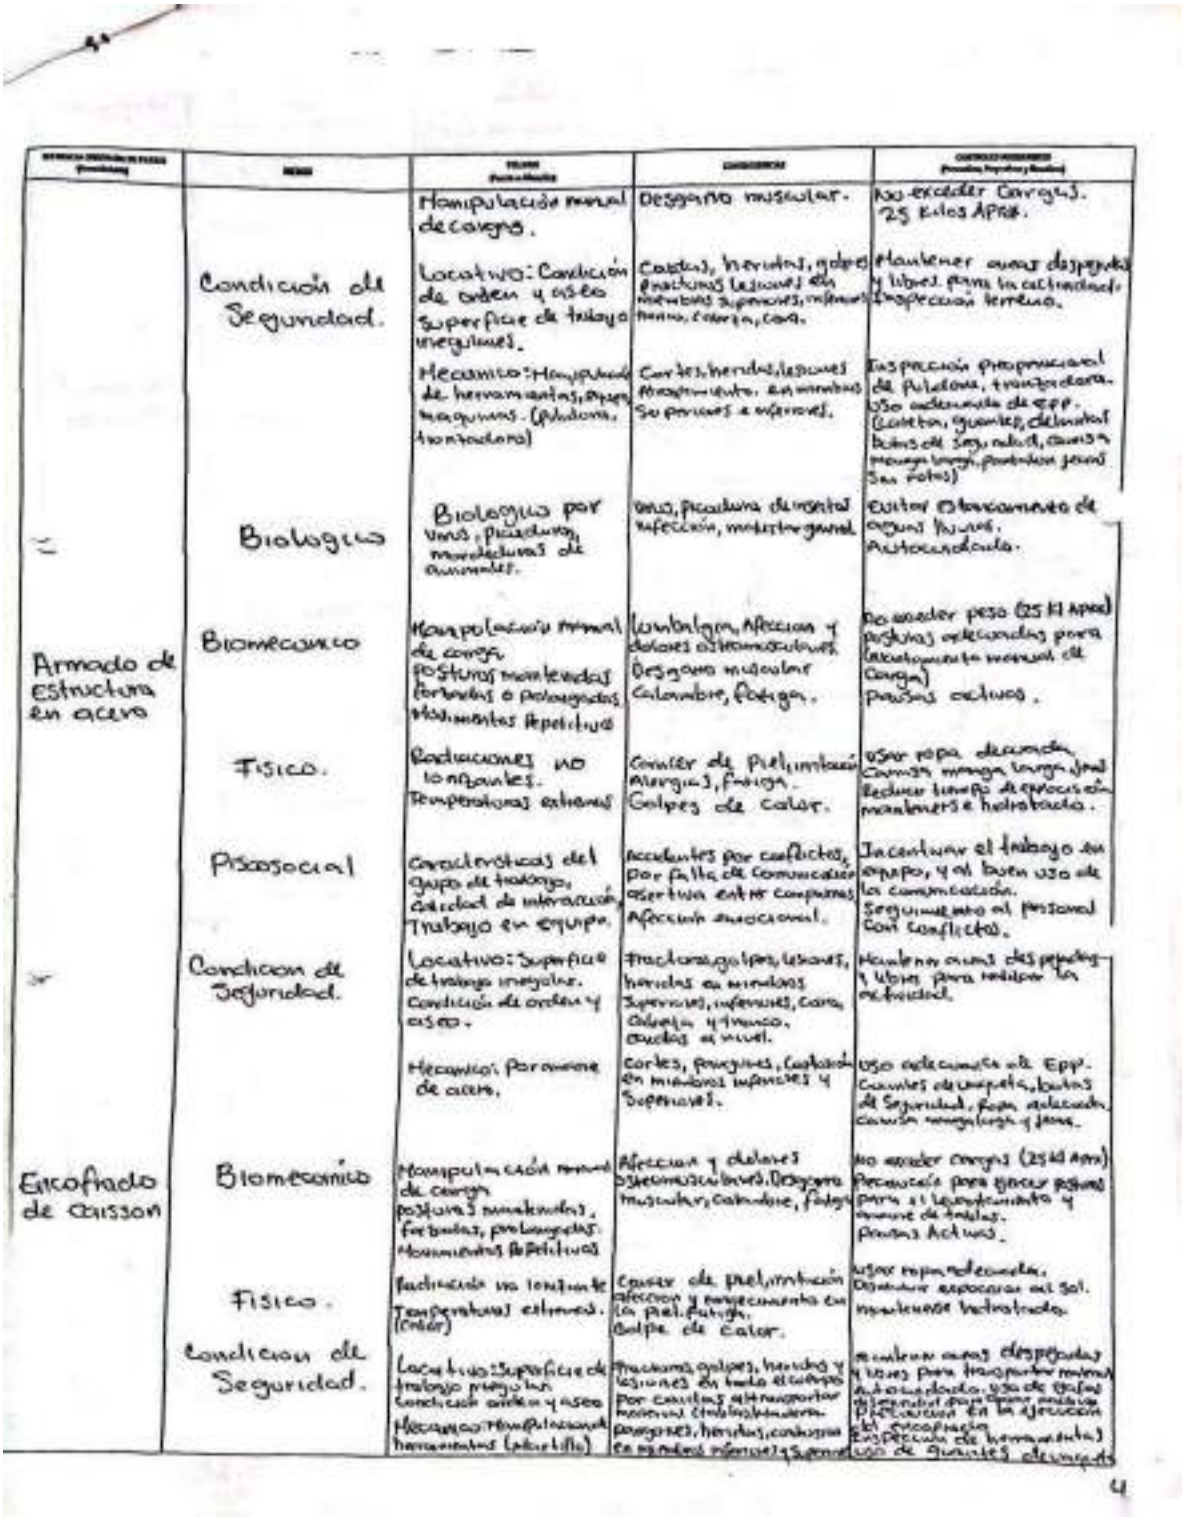


		Manipulación manual de cargas.	Desgarro muscular.	No exceder Cargas. 25 Kilos APRX.
	Condición de Seguridad.	Locativo: Condición de orden y aseo Superficie de trabajo irregulares.	Caídas, heridas, golpes fracturas lesiones en miembros superiores, inferiores, cara, cabeza, cuello.	Mantener áreas despejadas y libres para la actividad. Inspección terreno.
		Mecanico: Manipulación de herramientas, equipos, maquinas. (Pulidora, taladradora)	Cortes, heridas, lesiones atrapamiento. en miembros Superiores e inferiores.	Inspección preoperacional de Pulidora, taladradora. Uso adecuado de EPP. (Casco, guantes, delantal botas de Seg. nariz, careta manga larga, pantalon jean Sin Rotos)
	Biologico	Biologico por virus, picadura, mordeduras de animales.	virus, picadura de insecto infección, malestar general.	Evitar Almacenamiento de algun tipo. Autocuidado.
Armado de Estructura en acero	Biomecanico	Manipulación manual de cargas, posturas mantenidas forzadas o prolongadas Movimientos Repetitivos	Lumbalgia, Afección y dolores osteomusculares Desgarro muscular Calambre, fatiga.	No exceder peso (25 Kl Aprx) pausas adecuadas para levantamiento manual de Cargas) Pausas activas.
	Fisico.	Radiaciones no ionizantes. Temperaturas extremas	Cancer de piel, irritación Alergias, fatiga. Golpes de calor.	Usar ropa adecuada. Cremas manga larga, jean Reducir tiempo de exposición mantenerse hidratado.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo. Carácter de interacción. Trabajo en equipo.	Accidentes por conflictos, por falla de Comunicación asertiva entre compañeros Afección emocional.	Incentivar el trabajo en equipo, y el buen uso de la comunicación. Seguimiento al personal con conflictos.
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo irregular. Condición de orden y aseo.	Fracturas, golpes, lesiones, heridas en miembros Superiores, inferiores, cara, Cabeza y tronco. cuello a nivel.	Mantener áreas despejadas y libres para realizar la actividad.
		Mecanico: Por manejo de acero.	Cortes, punzones, Contusión en miembros inferiores y Superiores.	Uso adecuado de Epp. Cascos de seguridad, botas de Seguridad, ropa adecuada, Camisa manga larga y jean.
Encofrado de Caisson	Biomecanico	Manipulación manual de cargas posturas mantenidas, forzadas, prolongadas. Movimientos Repetitivos	Afección y dolores Osteomusculares. Desgarro muscular, Calambre, fatiga	No exceder cargas (25 kl Aprx) Precaución para ejercer fuerza para el levantamiento y manejo de tablas. Pausas Activas.
	Fisico.	Radiación no ionizante Temperaturas extremas. (Calor)	Cancer de piel, irritación afección y enrojecimiento en la piel. Fatiga. Golpe de Calor.	Usar ropa adecuada. Bloqueador especial al Sol. mantenerse hidratado.
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo irregular. Condición orden y aseo Mecanico: Manipulación herramientas (pulidor, taladro)	Fracturas, golpes, heridas y lesiones en todo el cuerpo por caidas al mismo nivel (Tablas) caidas. Punzones, heridas, contusiones en miembros inferiores y Superiores	Mantener áreas despejadas y libres para transportar material adecuadamente. Uso de Epp de seguridad para operar maquina Precaución en la ejecución del Encofrado Inspección de herramientas Uso de guantes al manejar

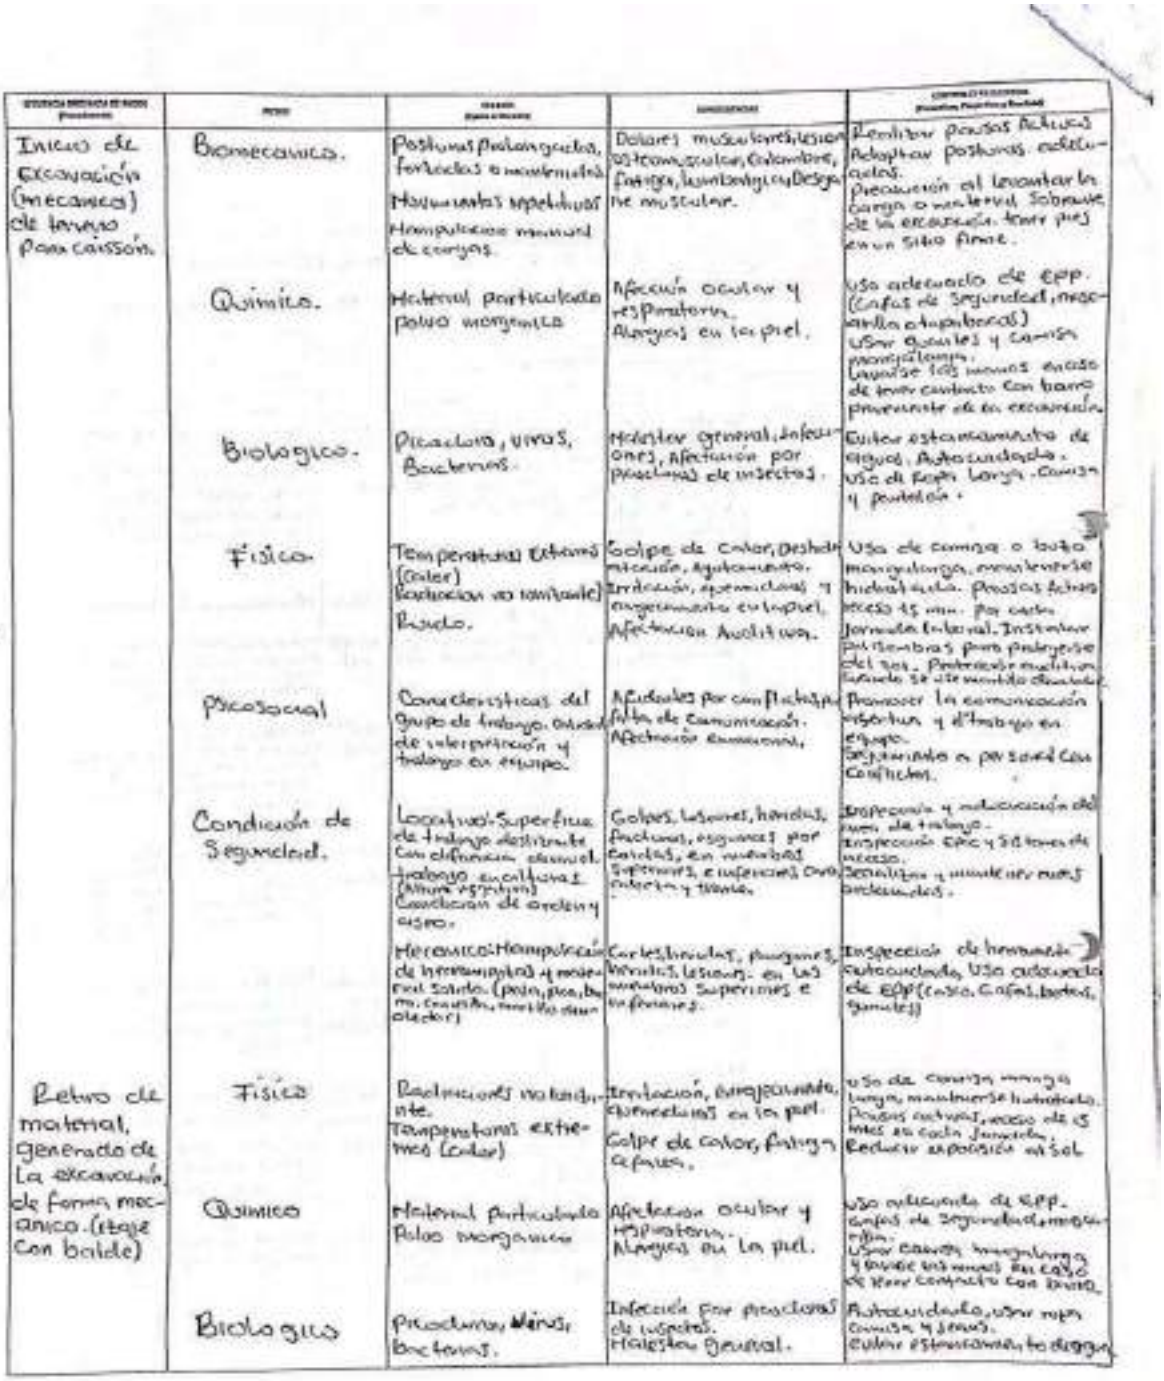


Inicio de Excavación (mecanica) de tanque para caisson.	Biomecanico.	Posturas prolongadas, forzadas o inadecuadas. Movimientos repetitivos. Manipulacion manual de cargas.	Dolores musculoesqueleticos osteomusculares, Calambres, fatiga, lumbalgia, y Desgarre muscular.	Realizar pausas activas. Adoptar posturas adecuadas. Precaución al levantar la carga o material. Sobrante de la excavación. tener pies en un sitio firme.
	Quimico.	Material particulado polvo inorganico	Afección ocular y respiratoria. Alergias en la piel.	Uso adecuado de EPP. (Gafas de Seguridad, mascarilla antipolvo) Usar guantes y camisa manga larga. Lavarse las manos antes de tener contacto con bocas preferible en la excavación.
	Biologico.	Picaduras, virus, Bacterias.	Malestar general, Infecciones, Afectación por picaduras de insectos.	Evitar estancamiento de agua. Autocuidado. Uso de ropa larga. Camisa y pantalón.
	Fisico.	Temperaturas Extremas (Calor) Radiacion no ionizable) Ruido.	Golpe de calor, Deshidratación, Agotamiento. Irritación, quemaduras y enrojecimiento en la piel. Afectacion Auditiva.	Uso de camisa o bota manga larga, mantenerse hidratado. Pausas activas acceso 15 min. por cada jornada laboral. Instalar pantallas para protegerse del sol. Protector auditivo.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo. Ritmo de interpretación y trabajo en equipo.	Afectación por conflictos. Falta de comunicación. Afectación emocional.	Promover la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Capacitando a personal con conflictos.
	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo desigual. Con diferencia de nivel. Trabajo en altura (Altura especifica) Caracteristicas de orden y aseo.	Golpes, Lesiones, heridas, fracturas, esguinces por caidas, en mismo nivel, superiores, e inferiores. Dermatitis y tiña.	Inspección y señalización del area de trabajo. Inspección cinc y SST antes de inicio. Señalizar y mantener vias de desplazamiento.
		Mecanico: Manipulación de herramientas y material solido. (pala, pica, barra, cruceta, martillo, cincel)	Cortes, heridas, magulladuras, hematomas, lesiones en las extremidades superiores e inferiores.	Inspección de herramienta autocuidado, Uso adecuado de EPP (casco, Gafas, botas, guantes)
Retiro de material, generado de la excavación de forma mecanica. (Izaje con balde)	Fisico	Radiaciones no ionizante. Temperaturas extremas (calor)	Irritación, enrojecimiento, quemaduras en la piel. Golpe de calor, fatiga y caidas.	Uso de camisa manga larga, mantenerse hidratado. Pausas activas, acceso de 15 min en cada jornada. Reducir exposición al sol.
	Quimico	Material particulado Polos inorganico	Afectacion ocular y respiratoria. Alergias en la piel.	Uso adecuado de EPP. Gafas de Seguridad, mascarilla. Usar camisa manga larga y lavar las manos antes de tener contacto con boca.
	Biologico	Picaduras, Virus, Bacterias.	Infección por picaduras de insectos. Malestar General.	Autocuidado, Uso ropa camisa y jean. Evitar estancamiento de agua.

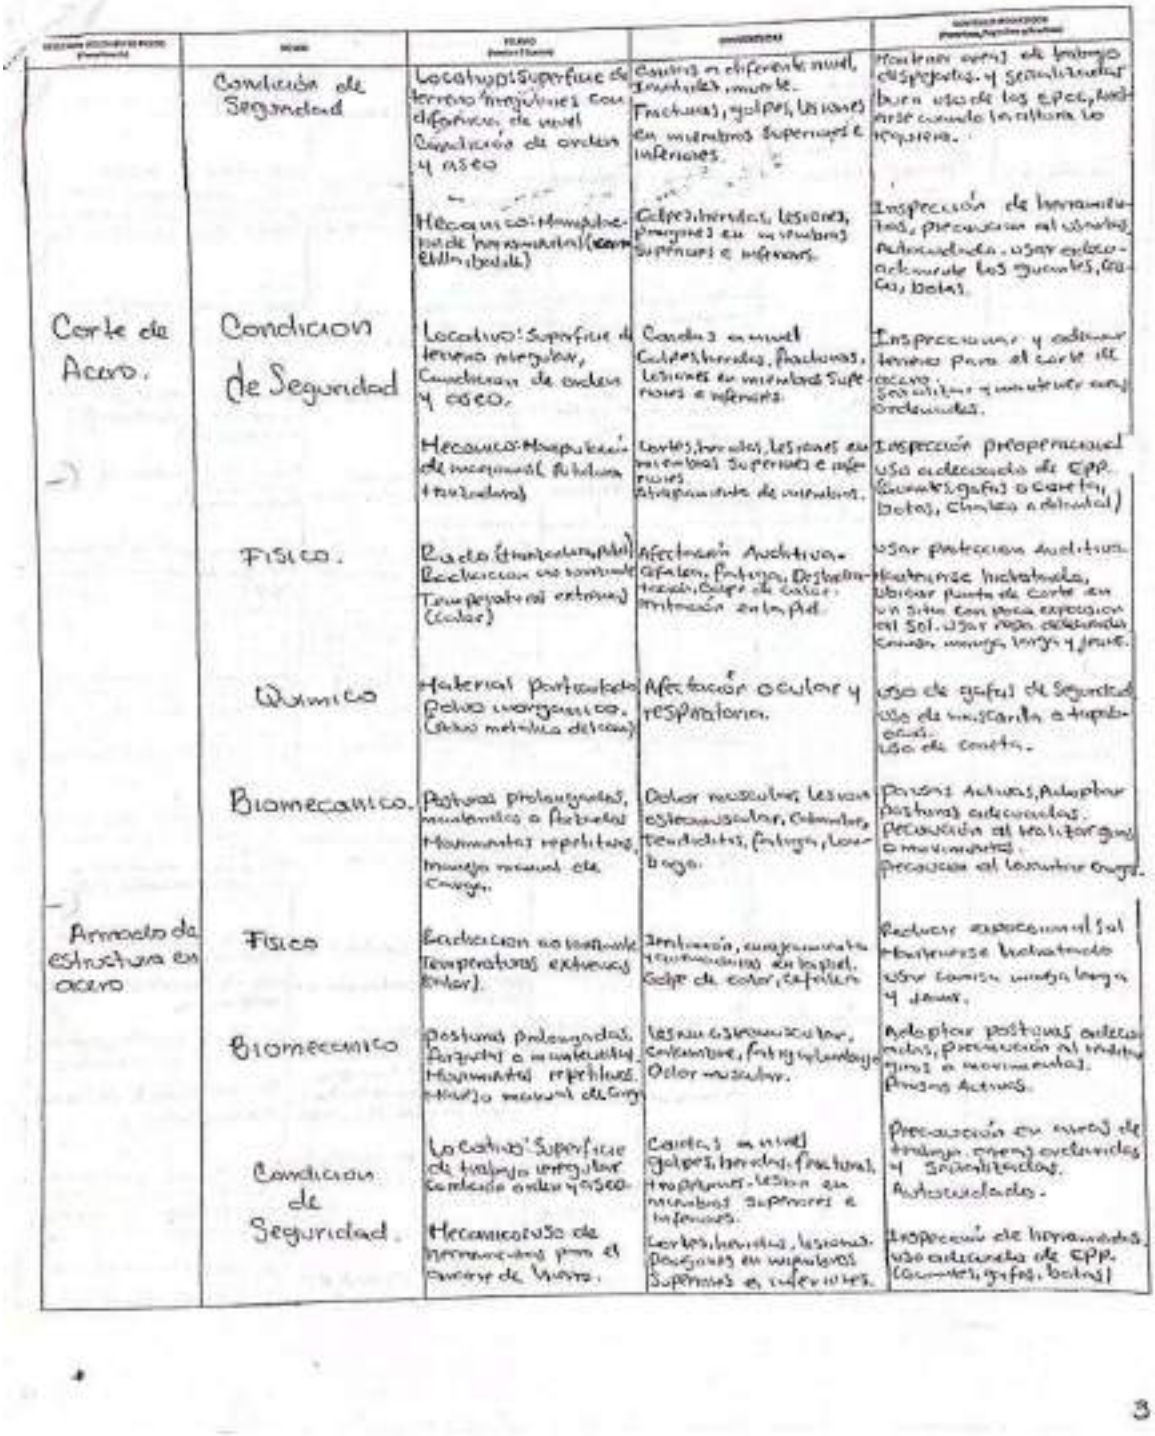



	Condición de Seguridad	Locativo: Superficie de terreno irregulares con diferentes de nivel Condiciones de orden y aseo.	Caidas a diferente nivel, Golpes, heridas, muerte. Fracturas, golpes, lesiones en miembros superiores e inferiores.	Mantener orden de trabajo, objetos y señalizados buen uso de los epp, cuando la tarea lo requiera.
		Mecanico: Manipulación de herramientas (con fallas o desgaste)	Golpes, heridas, lesiones, pinzones en miembros superiores e inferiores.	Inspección de herramientas, precaución al usarlas, Adecuadas, usar adecuadamente los guantes, gafas, botas.
Corte de Acero.	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficie de terreno irregular, Condiciones de orden y aseo.	Caidas a nivel Golpes, heridas, fracturas, lesiones en miembros Superiores e inferiores.	Inspeccionar y adecuar terreno para el corte de acero. Señalizar y mantener con Ordenadas.
		Mecanico: Manipulación de herramientas (fallas o inadecuadas)	Cortes, heridas, lesiones en miembros superiores e inferiores. Atrapamiento de miembros.	Inspección preoperacional uso adecuado de EPP. (Guantes, gafas, botas, Chaleco reflectivo)
	Fisico.	Ruido (Intermitente) Radiacion no ionizante Temperaturas extremas (Calor)	Afectación Auditiva. Cefalea, fatiga, Deshidratación, Golpe de calor. Irritación en la piel.	Usar protección auditiva. Hidratarse hidratada, Ubicar punto de corte en un sitio con poca exposición al Sol. Usar ropa adecuada Camisa, manga larga y jean.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico. (Oxido metalico de cemento)	Afectación ocular y respiratoria.	Uso de gafas de Seguridad uso de mascarilla antipolvo. Uso de casco.
	Biomecanico.	Posturas prolongadas, inadecuadas o forzadas Movimientos repetitivos, manejo manual de cargas.	Dolor muscular, lesiones osteomusculares, Calambres, tendinitis, fatiga, Lumbago.	Pausas Activas, Adoptar posturas adecuadas. Precaución al realizar giros o movimientos. Precaución al levantar cargas.
Armado de estructura en acero	Fisico	Radiacion no ionizante Temperaturas extremas (calor).	Irritación, enrojecimiento y quemaduras en la piel. Golpe de calor, cefalea	Reducir exposición al sol Hidratarse hidratada usar camisa manga larga y jean.
	Biomecanico	Posturas prolongadas, forzadas o inadecuadas Movimientos repetitivos. Manejo manual de Cargas	lesiones osteomusculares, calambres, fatiga y Lumbago. Dolor muscular.	Adoptar posturas adecuadas, Precaución al realizar giros o movimientos. Pausas Activas.
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Superficie de trabajo irregular Condición orden y aseo.	Caidas a nivel Golpes, heridas, fracturas, Atrapamiento. Lesiones en miembros Superiores e inferiores.	Precaución en areas de trabajo, areas ordenadas y Señalizadas. Adecuadas.
		Mecanico: uso de herramientas para el corte de Acero.	Cortes, heridas, lesiones, Pinzones en miembros Superiores e inferiores.	Inspección de herramientas uso adecuado de EPP. (Guantes, gafas, botas)

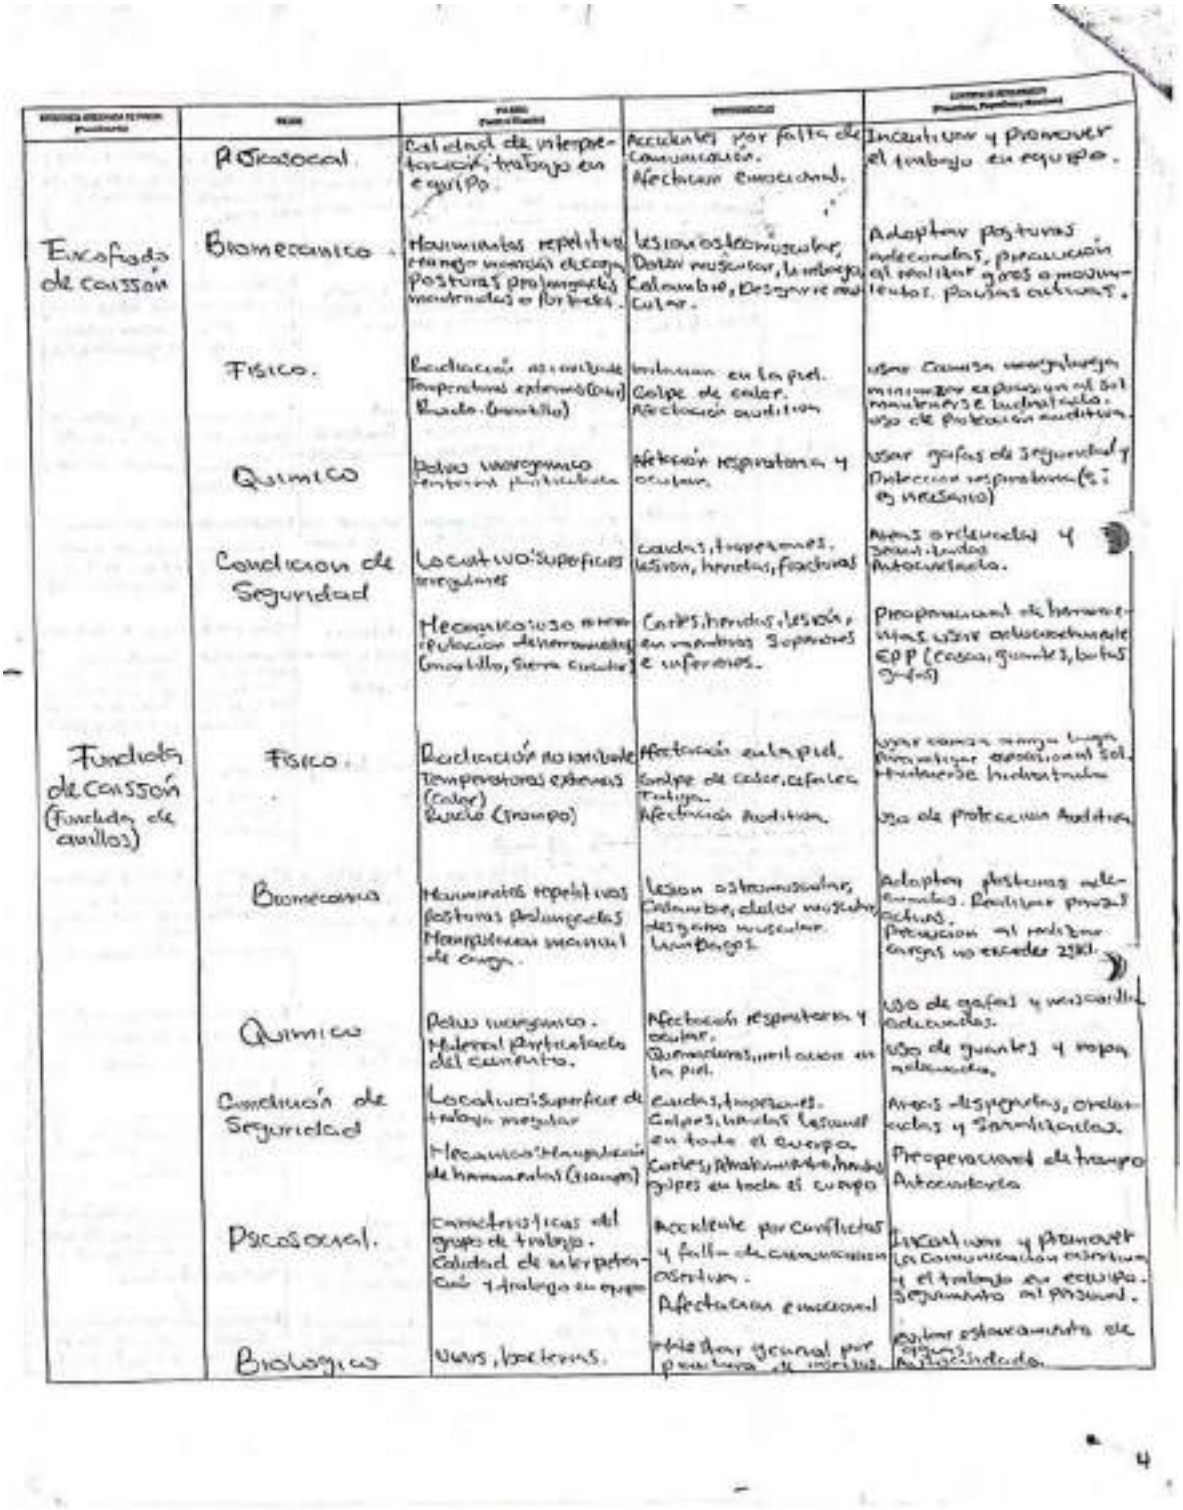


Excavación de cimentación	Psicosocial	Calidad de interpretación, trabajo en equipo.	Accidentes por falta de Comunicación. Afectación emocional.	Incentivar y promover el trabajo en equipo.
	Biomecanico	Movimientos repetitivos, cargue manual de cargas, Posturas prolongadas inadecuadas o forzadas.	lesion osteomuscular, Dolor muscular, lumbago, Calambre, Desgarre muscular.	Adoptar posturas adecuadas, precaución al realizar giros o movimientos bruscos, pausas activas.
	Fisico.	Radiación ambiental Temperaturas extremas (Calor) Ruido (trampa)	Irritacion en la piel. Golpe de calor. Afectación auditiva	Uso de camisa manga larga minimizar exposición al Sol mantenerse hidratado. uso de Protección auditiva.
	Quimico	Polvo inorganico material particulado	Afectación respiratoria y ocular.	Uso de gafas de seguridad y Protección respiratoria (Tapabocas)
	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares	caidas, trapeamos. lesiones, heridas, fracturas	Area ordenada y Señalizada Autocuidado.
		Mecanico uso inadecuado o mala relacion de herramientas (martillo, Sierra circular)	Cortes, heridas, lesión, en miembros Superiores e inferiores.	Preoperacional de herramientas, uso adecuado de EPP (casco, guantes, botas y gafas)
Excavación de cimentación (Excavación de anillos)	Fisico.	Radiación ambiental Temperaturas extremas (Calor) Ruido (trampa)	Afectación en la piel. Golpe de calor, cefalea Trabajo. Afectación Auditiva.	Uso de camisa manga larga, Disminuir exposicion al Sol, Hidratarse Inidentemente. Uso de Protección Auditiva
	Biomecanico	Movimientos repetitivos posturas prolongadas Manipulacion manual de cargas.	lesion osteomuscular, Calambre, dolor muscular, desgarro muscular. Lumbagos.	Adoptar posturas adecuadas. Realizar pausas activas. Precaucion al realizar cargas no exceder 25KL.
	Quimico	Polvo inorganico. Material Particulado del concreto.	Afectación respiratoria y ocular. Quemaduras, irritacion en la piel.	Uso de gafas y mascarilla adecuadas. Uso de guantes y ropa adecuada.
	Condición de Seguridad	Locativo: Superficie de trabajo irregular	cuidas, trapeamos. Golpes, heridas lesiones en todo el cuerpo.	Areas despejadas, ordenadas y Señalizadas.
		Mecanico: Manipulación de herramientas (trampa)	Cortes, Atrapamiento, heridas golpes en todo el cuerpo	Preoperacional de trampa Autocuidado
	Psicosocial.	Caracteristicas del grupo de trabajo. Calidad de interpretación y trabajo en equipo	Accidente por Conflictos y falta de comunicación asertiva. Afectacion emocional	Incentivar y promover la Comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Seguimiento al personal.
	Biologico	Virus, bacterias.	Infección general por picadura de insectos.	Aplicar esquema de vacunación adecuado.

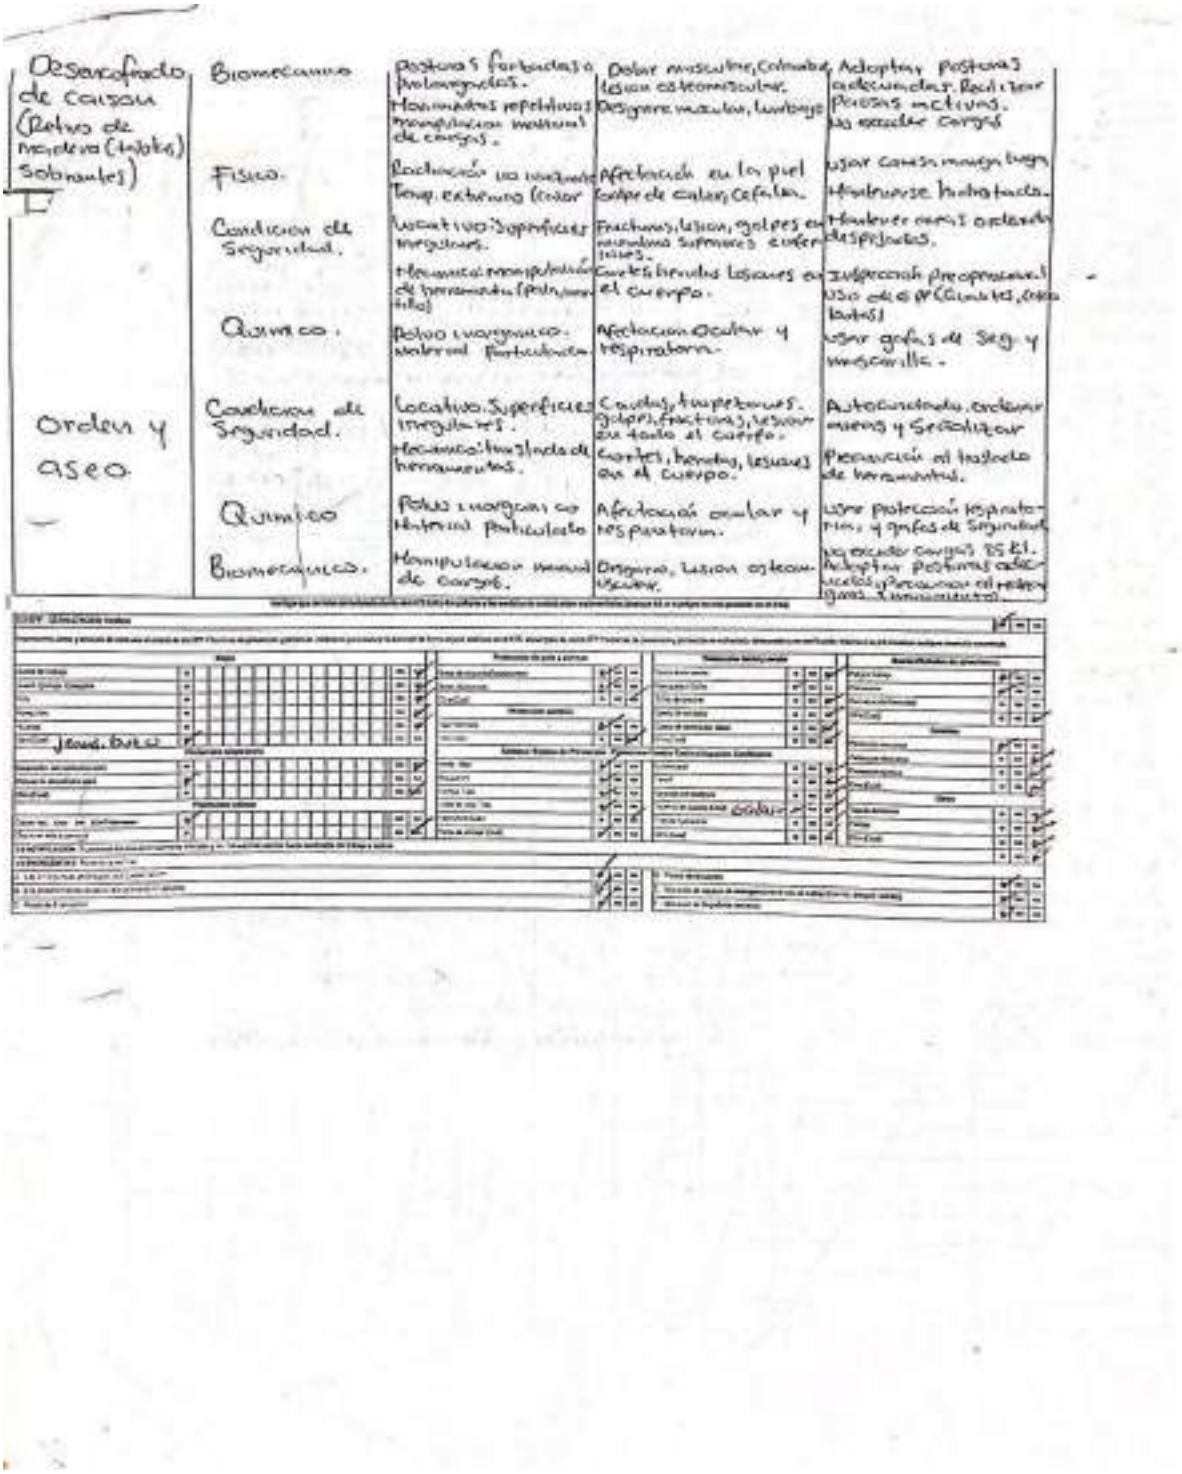
Desencofrado de columna (Retiro de madera (tablas) Sobrantes)
Orden y aseo
Biomecanico
Fisico.
Condicion de Seguridad.
Quimico.
Condicion de Seguridad.
Quimico
Biomecanicos.
Posturas forzadas o prolongadas.
Movimientos repetitivos
Manipulacion manual de cargas.
Radiación no ionizante
Temp. extremas (calor
Locativo: Superficies irregulares.
Mecanico: manipulación de herramientas (punzo-cortantes)
Polvo inorganico.
Material particulado
Locativo. Superficies irregulares.
Mecanico: manipulacion de herramientas.
Polvo inorganico
Material particulado
Manipulacion manual de cargas.
Dolor muscular, Calambres, lesion osteomuscular.
Desgarre muscular, lumbago
Afectación en la piel
Golpe de calor, Cefalea.
Fracturas, lesion, golpes en miembros superiores e inferiores.
Cortes, heridas lesiones en el cuerpo.
Afectacion ocular y respiratoria.
Golpes, fracturas, lesiones en todo el cuerpo.
Cortes, heridas, lesiones en el cuerpo.
Afectación ocular y respiratoria.
Dolores, lesion osteomuscular.
Adoptar posturas adecuadas. Realizar pausas activas. No exceder cargas
usar cargas manejables
Humedecer hasta fraguado.
Mantener orden y aseo despejados.
Inducción preoperacional uso de EPP (Guantes, Gafas)
usar gafas de Seg y mascarilla.
Autocuidado, ordenar mismo y señalizar
Reparación al inicio de herramientas.
usar protección respiratoria y gafas de Seguridad
No exceder cargas 25 kl.
Adoptar posturas adecuadas y Precaucion al realizar

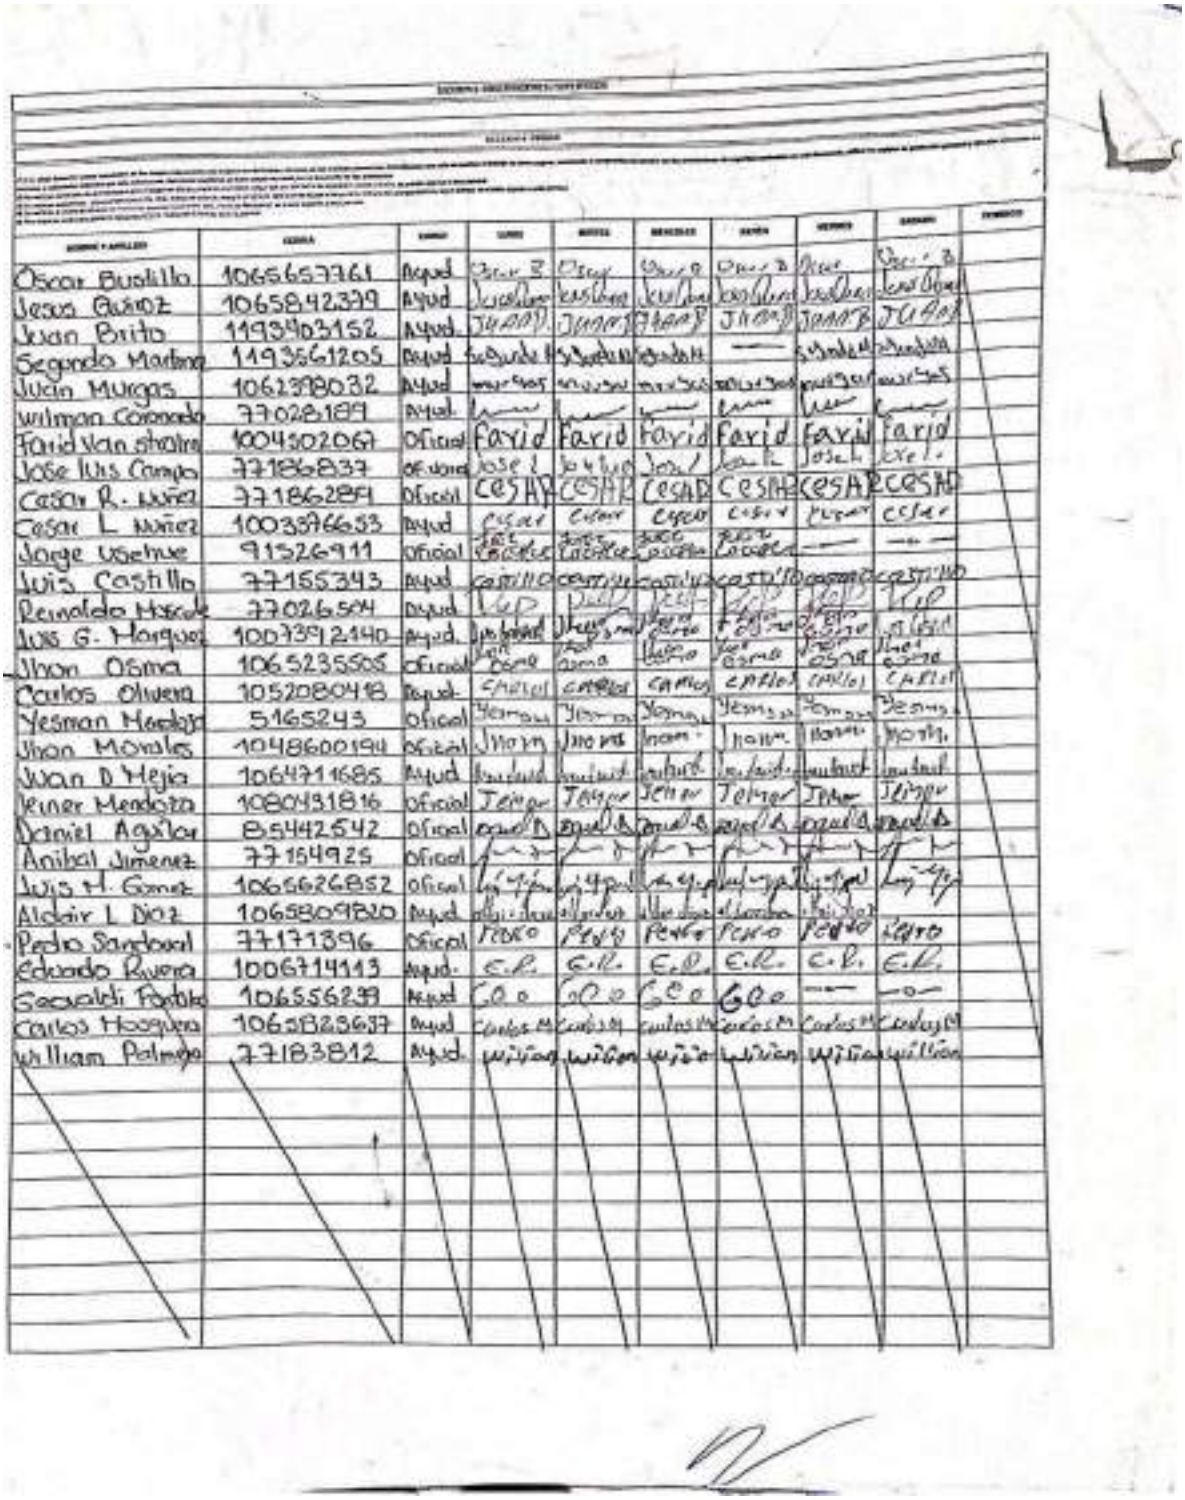

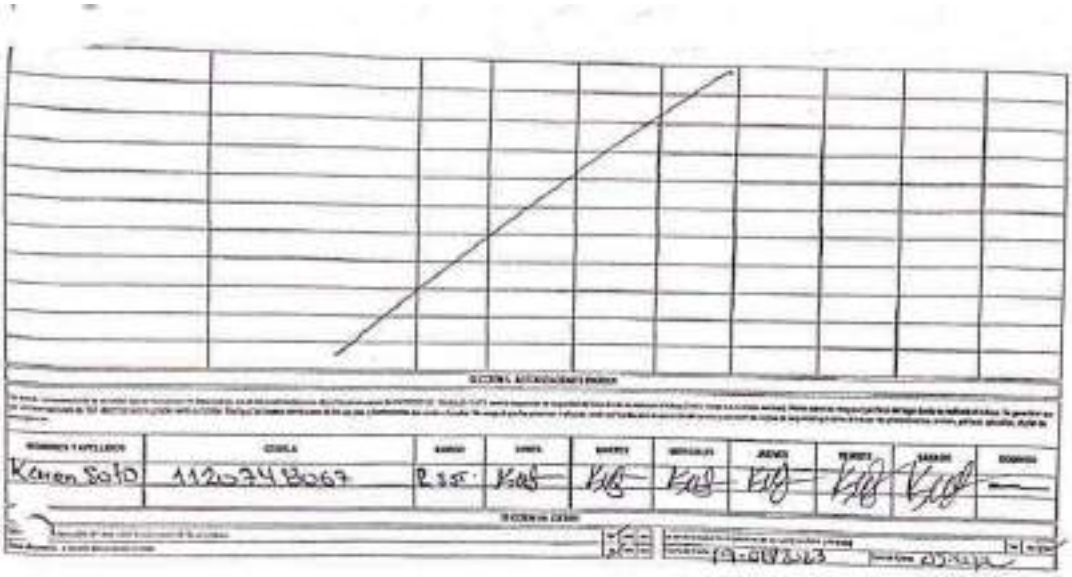

Karen Soto
112074B067

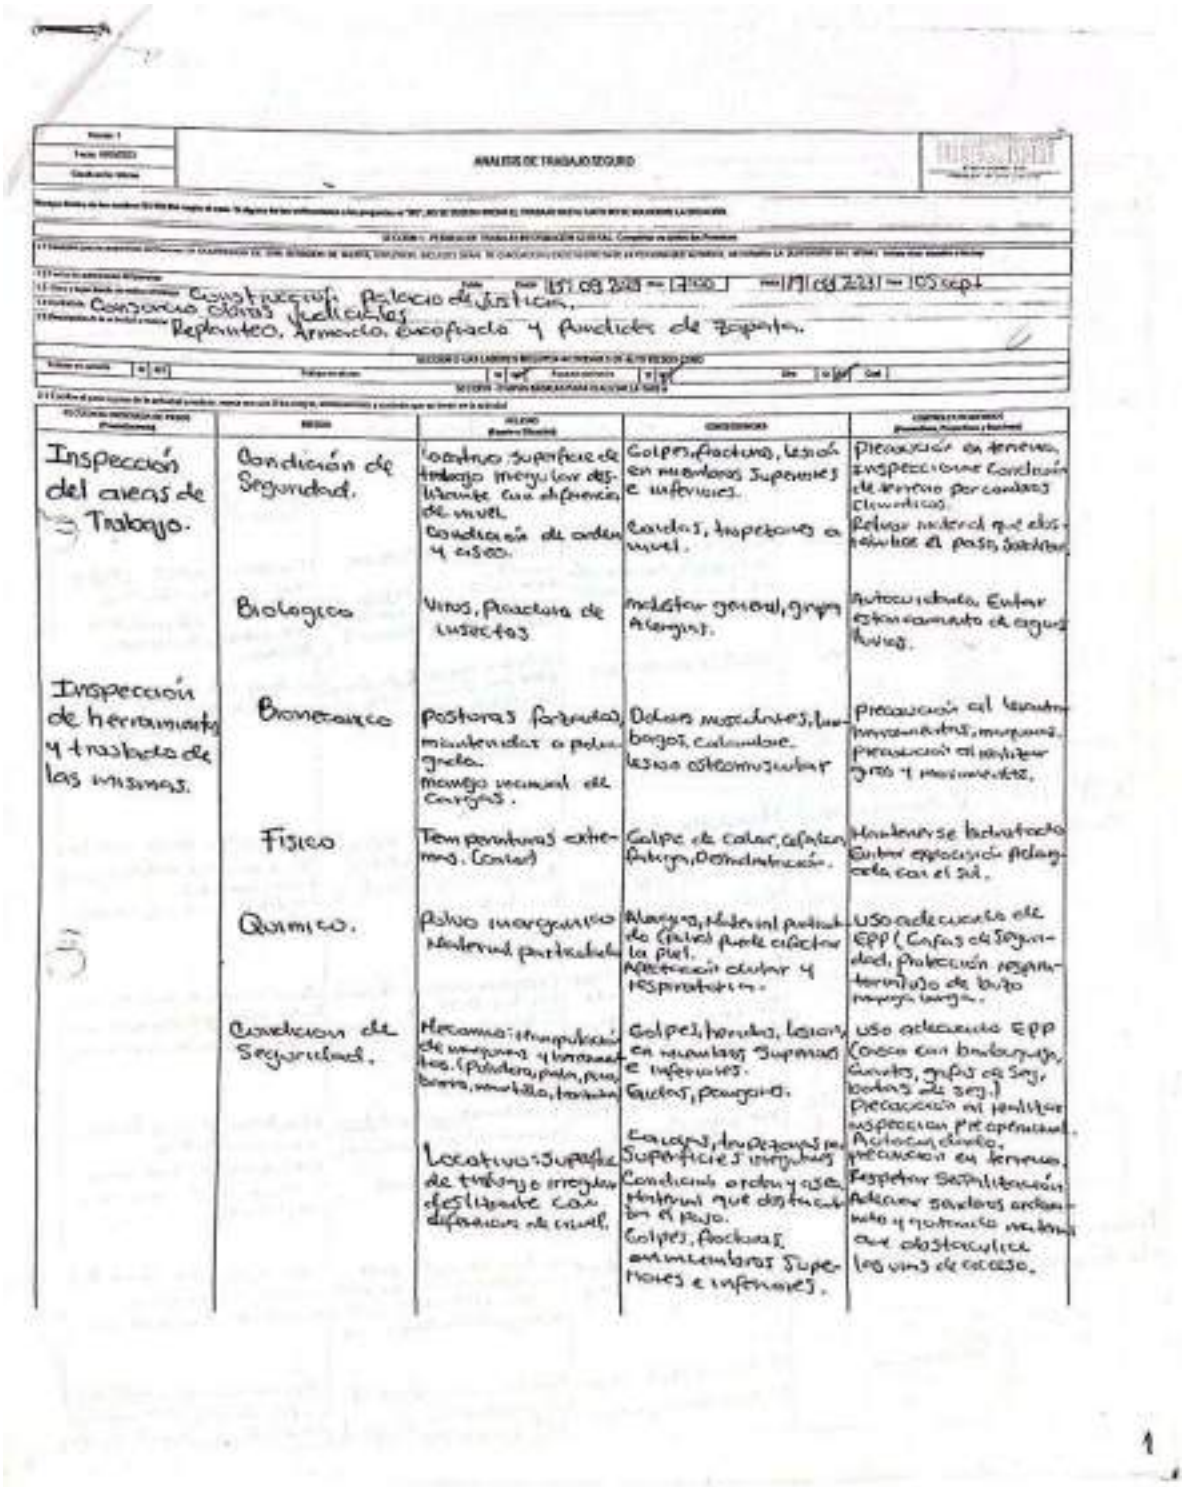


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Construcción Palacio de Justicia, Consorcio Obras Judiciales
Replanteo, Armado, encofrado y Fundición de Zapatas.


Inspección del area de Trabajo.	Condición de Seguridad.	Locativo superficie de trabajo irregular desnivel con diferencia de nivel. Condición de orden y aseo.	Golpes, fracturas, lesión en miembros Superiores e inferiores. Caidas, tropezones a nivel.	Precaución en terreno, inspeccionar condición de terreno por cambios climaticos. Retiro material que obstaculice el paso, señalizar.
	Biologico	Virus, Picadura de insectos	malestar general, gripa Alergias.	Autocuidado, Evitar contacto con agua lluvia.
Inspección de herramienta y traslado de las mismas.	Biomecanico	posturas forzadas, mantenerse a pleno, gracia. manejo manual de Cargas.	Dolores musculares, lumbago, Calambres. lesion osteomuscular	Precaución al levantar herramientas, maquinas. Precaución al realizar giros y movimientos.
	Fisico	Temperaturas extremas. (calor)	Golpe de calor, cefalea, fatiga, Deshidratación.	Hidratarse Constantemente Evitar exposición prolongada con el Sol.
	Quimico.	Polvo inorganico Material particulado	Alergia, Material particulado (polvo) puede afectar la piel. Afectación auditiva y respiratoria.	Uso adecuado del EPP (Gafas de Seguridad, Protección respiratoria de bajo mayor carga.
	Condicion de Seguridad.	Herramientas: manipulación de maquinas y herramientas. (Palustra, pala, pica barra, martillo, taladro)	Golpes, heridas, lesion en miembros Superiores e inferiores. Cortes, pinchazos.	Uso adecuado EPP (casco con barbuquejo, Guantes, gafas de Seg, botas de seg.) Precaución al realizar inspección pre operacional.
		Locativo: Superficie de trabajo irregular desnivelada con diferencia de nivel.	Caidas, tropezones por Superficies irregulares Condiciones orden y aseo, material que dificulte el paso. Golpes, fracturas, aplastamientos Superiores e inferiores.	Actividad diseño, precaución en terreno. Respetar señalización Adecuar sendas ordenado y retirar material que obstaculice los vias de acceso.

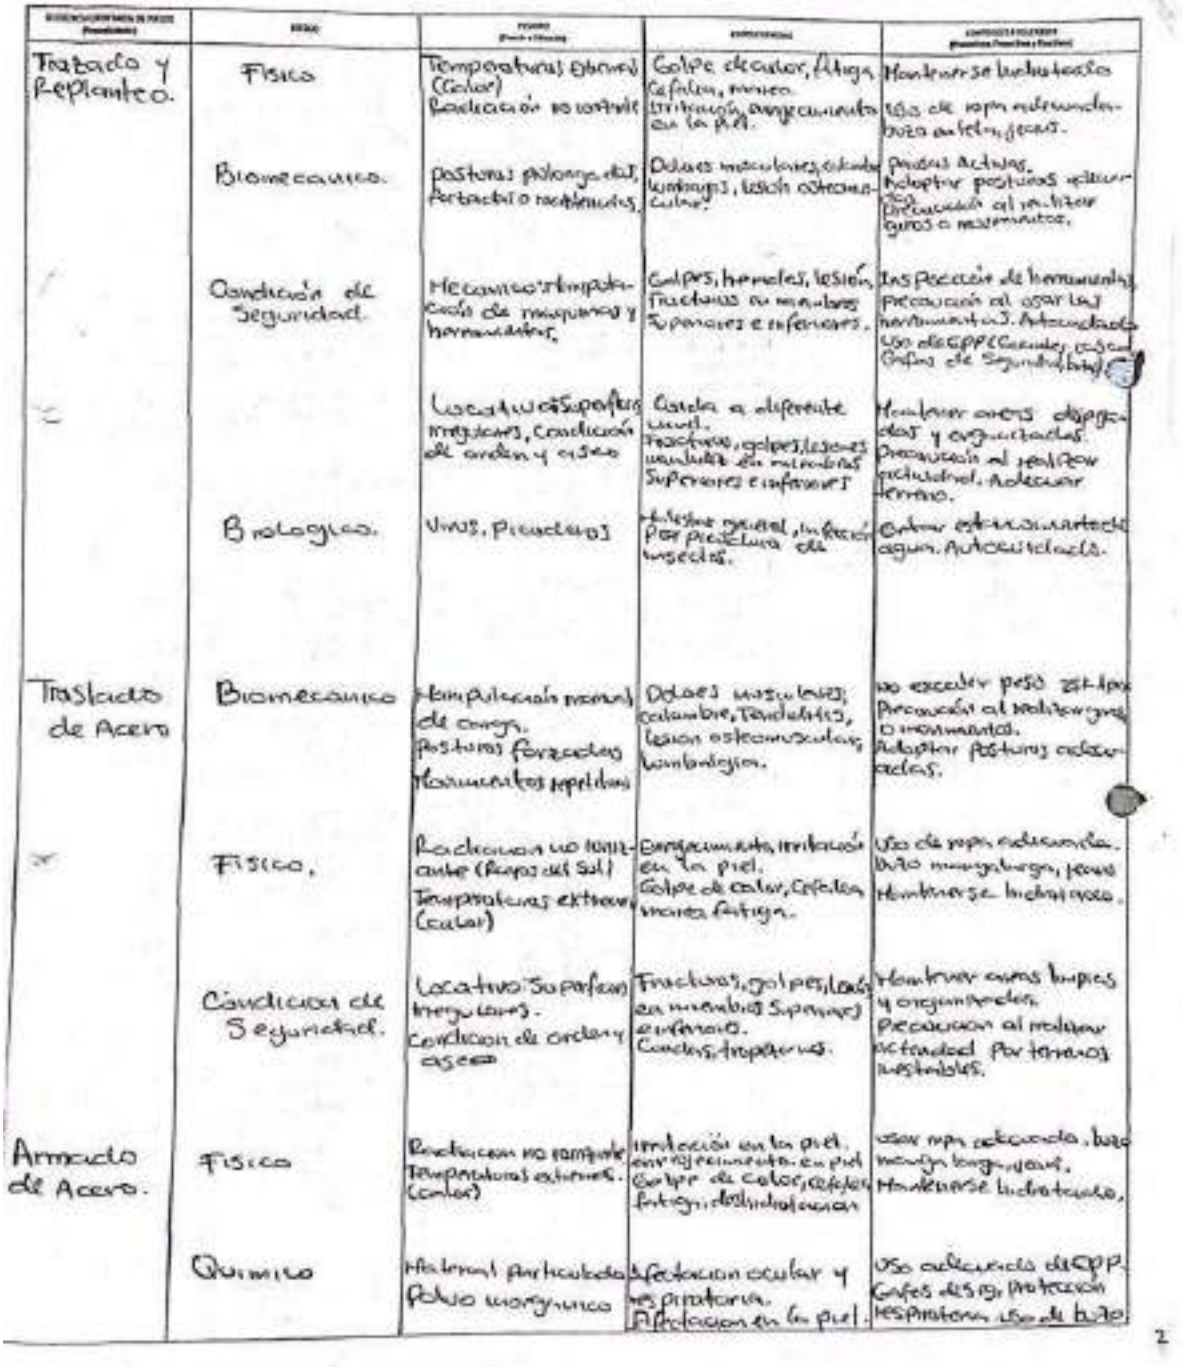


Trabajo y Replanteo.	Físico	Temperaturas Extremas (Calor) Radiación no ionizante	Golpe de calor, fatiga, Cefalea, mareo. Irritación, envejecimiento en la piel.	Mantenerse hidratado. Uso de ropa adecuada.
	Biomecanico.	posturas prolongadas, Forzadas o mantenidas.	Dolores musculares, calambres, lumbalgia, lesión osteomuscular.	Pausas Activas. Adoptar posturas adecuadas. Precaución al realizar giros o movimientos.
	Condición de Seguridad.	Mecanico: Inadecuado de maquinas y herramientas.	Golpes, hematomas, lesión, Fracturas en miembros Superiores e inferiores.	Inspección de herramientas, precaución al usar las herramientas. Adecuado Uso de EPP (Casco, Gafas de Seguridad, botas)
		Locativo: Superficies irregulares, Condición de orden y aseo	Caida a diferente nivel. Fracturas, golpes, lesiones en miembros Superiores e inferiores	Mantener orden y organizados. Precaución al realizar actividad. Adecuar terreno.
	Biologico.	Virus, Bacterias	Afección cutanea, infección por picadura de insectos.	Lavar adecuadamente con agua. Aplicar crema.
Traslado de Acero	Biomecanico	Manipulación manual de carga. Posturas forzadas Movimientos repetidos	Dolores musculares, calambre, Tendinitis, lesion osteomuscular, lumbalgias.	no exceder peso establecido. Precaución al realizar giros o movimientos. Adoptar posturas adecuadas.
	Fisico.	Radiaciones no ionizantes (Rayos del Sol) Temperaturas extremas (Calor)	Envejecimiento, irritación en la piel. Golpe de calor, Cefalea mareo, fatiga.	Uso de ropa adecuada. Uso manga larga, jeans Hidratarse bien antes.
	Condiciones de Seguridad.	Locativo: Superficies irregulares. Condicion de orden y aseo	Fracturas, golpes, lesión en miembros Superiores e inferiores. Caidas, trapiezos.	Mantener areas limpias y organizadas. Precaución al realizar actividad. Portar ropa adecuada.
Armado de Acero.	Fisico	Radiaciones no ionizante Temperaturas extremas. (calor)	Irritación en la piel. envejecimiento en piel Golpe de calor, cefalea fatiga, deshidratacion	usar ropa adecuada, bloqueador, manga larga, jeans. Hidratarse bien antes,
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico	Afectacion ocular y respiratoria. Afectacion en la piel.	Uso adecuado de EPP. Gafas de seg, protección respiratoria, uso de bata

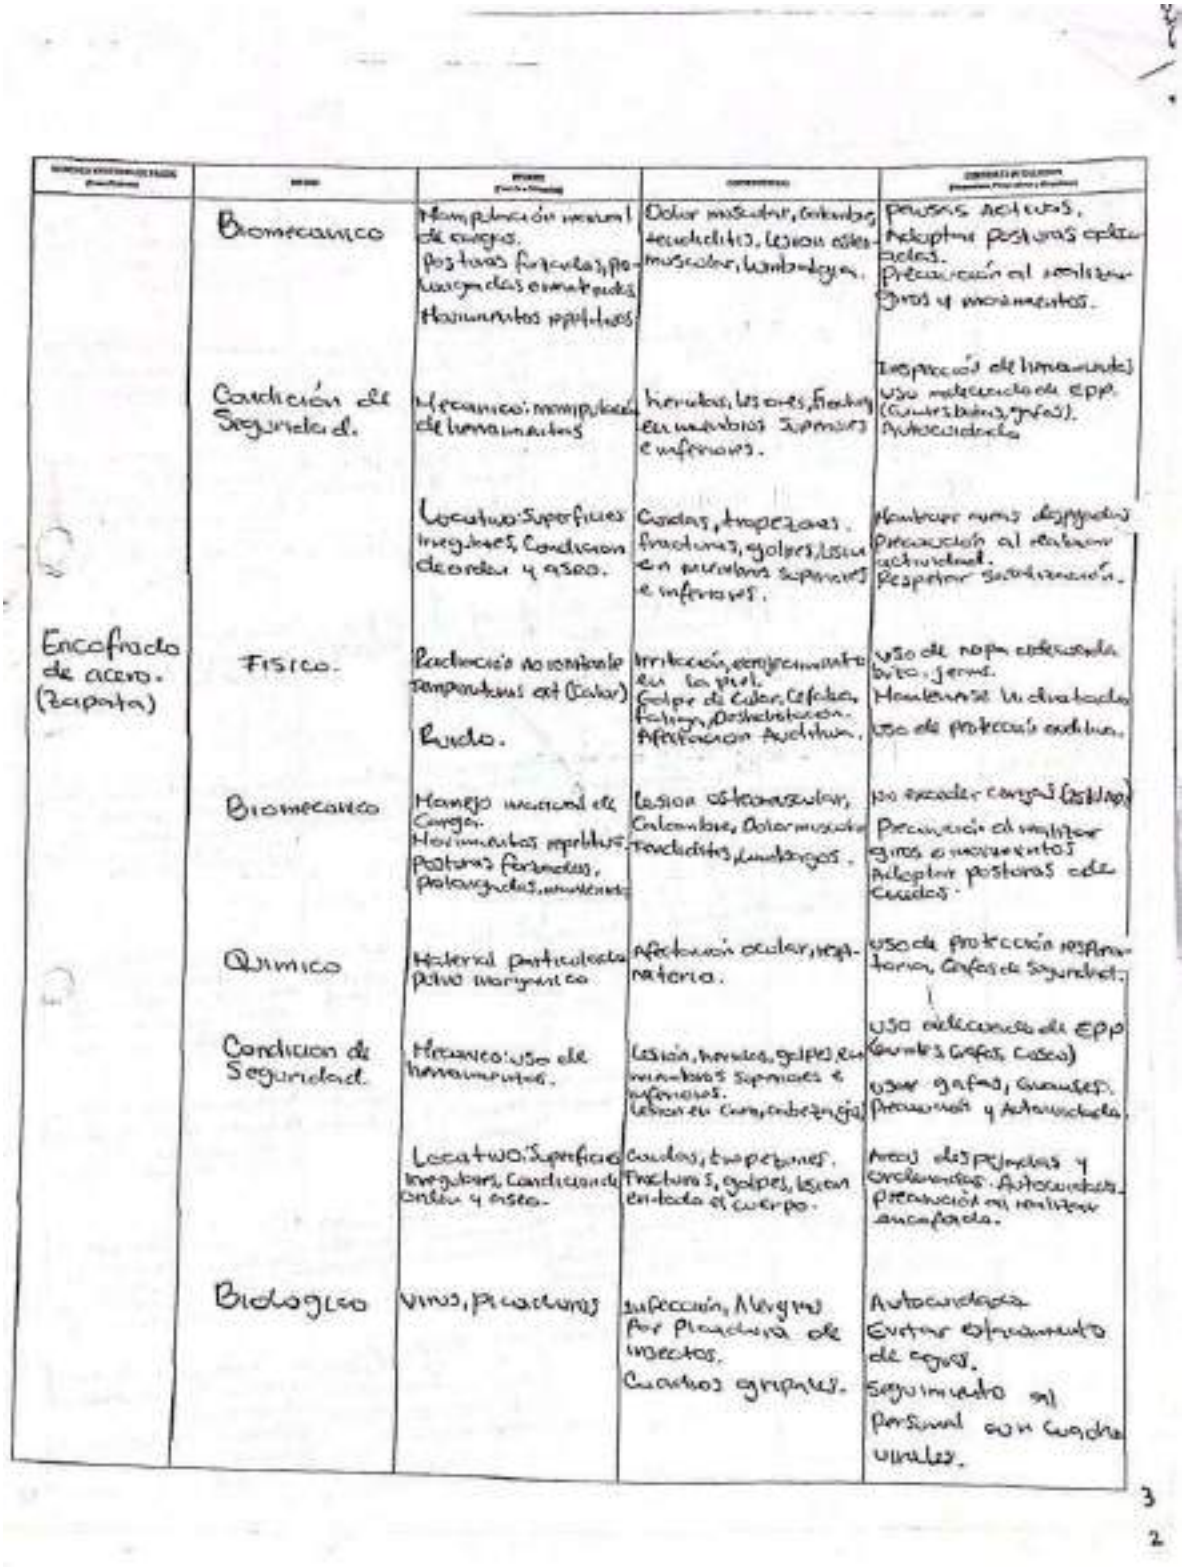


Encofrado de acero. (Zapata)	Biomecanico	Manipulación manual de cargas. Posturas forzadas, prolongadas e inadecuadas. Herramientas cortantes.	Dolor muscular, calambres, fatiga, lesiones osteomuscular, lumbalgias.	Pausas activas. Adoptar posturas adecuadas. Precaución al realizar giros y movimientos.
	Condición de Seguridad.	Mecanico: manipulación de herramientas	Heridas, golpes, fracturas en miembros superiores e inferiores.	Inspección de herramientas. Uso adecuado de EPP (Guantes, botas, gafas). Autocuidado.
		Locativo: Superficies irregulares, Condiciones desorden y aseo.	Caidas, tropezones. fracturas, golpes, lesiones en miembros superiores e inferiores.	Mantener zonas despejadas. Precaución al realizar actividad. Respetar señalización.
	Fisico.	Radiación no ionizante temperaturas ext (calor) Ruido.	Irritación, enrojecimiento en la piel. Golpe de calor, cefalea, fatiga, deshidratación. Afectación Auditiva.	Uso de ropa adecuada bloq. jerma. Mantenerse hidratado. Uso de protección auditiva.
	Biomecanico	Manejo inadecuado de cargas. Herramientas cortantes. Posturas forzadas, prolongadas, inadecuadas.	Lesión osteomuscular, Calambres, Dolor muscular, Fracturas, Lumbalgias.	No exceder cargas (25kg) Precaución al realizar giros o movimientos. Adoptar posturas adecuadas.
	Quimico	Material particulado polvo inorganico	Afectación ocular, respiratoria.	Uso de protección respiratoria, Gafas de seguridad.
	Condicion de Seguridad.	Mecanico: uso de herramientas.	Lesión, heridas, golpes en miembros superiores e inferiores. Lesión en cara, cabeza,	Uso adecuado del EPP (Guantes, Gafas, casco) Usar gafas, Guantes. Precaución y Autocuidado.
		Locativo: Superficies irregulares, Condiciones desorden y aseo.	Caidas, tropezones. Fracturas, golpes, lesiones en todo el cuerpo.	Areas despejadas y ordenadas. Autocuidado. Precaución al realizar encofrado.
	Biologico	Virus, Picaduras	Infección, Alergias por Picadura de insectos. Cuadros gripales.	Autocuidado. Evitar estancamiento de aguas. Seguimiento al personal con cuadros virales.

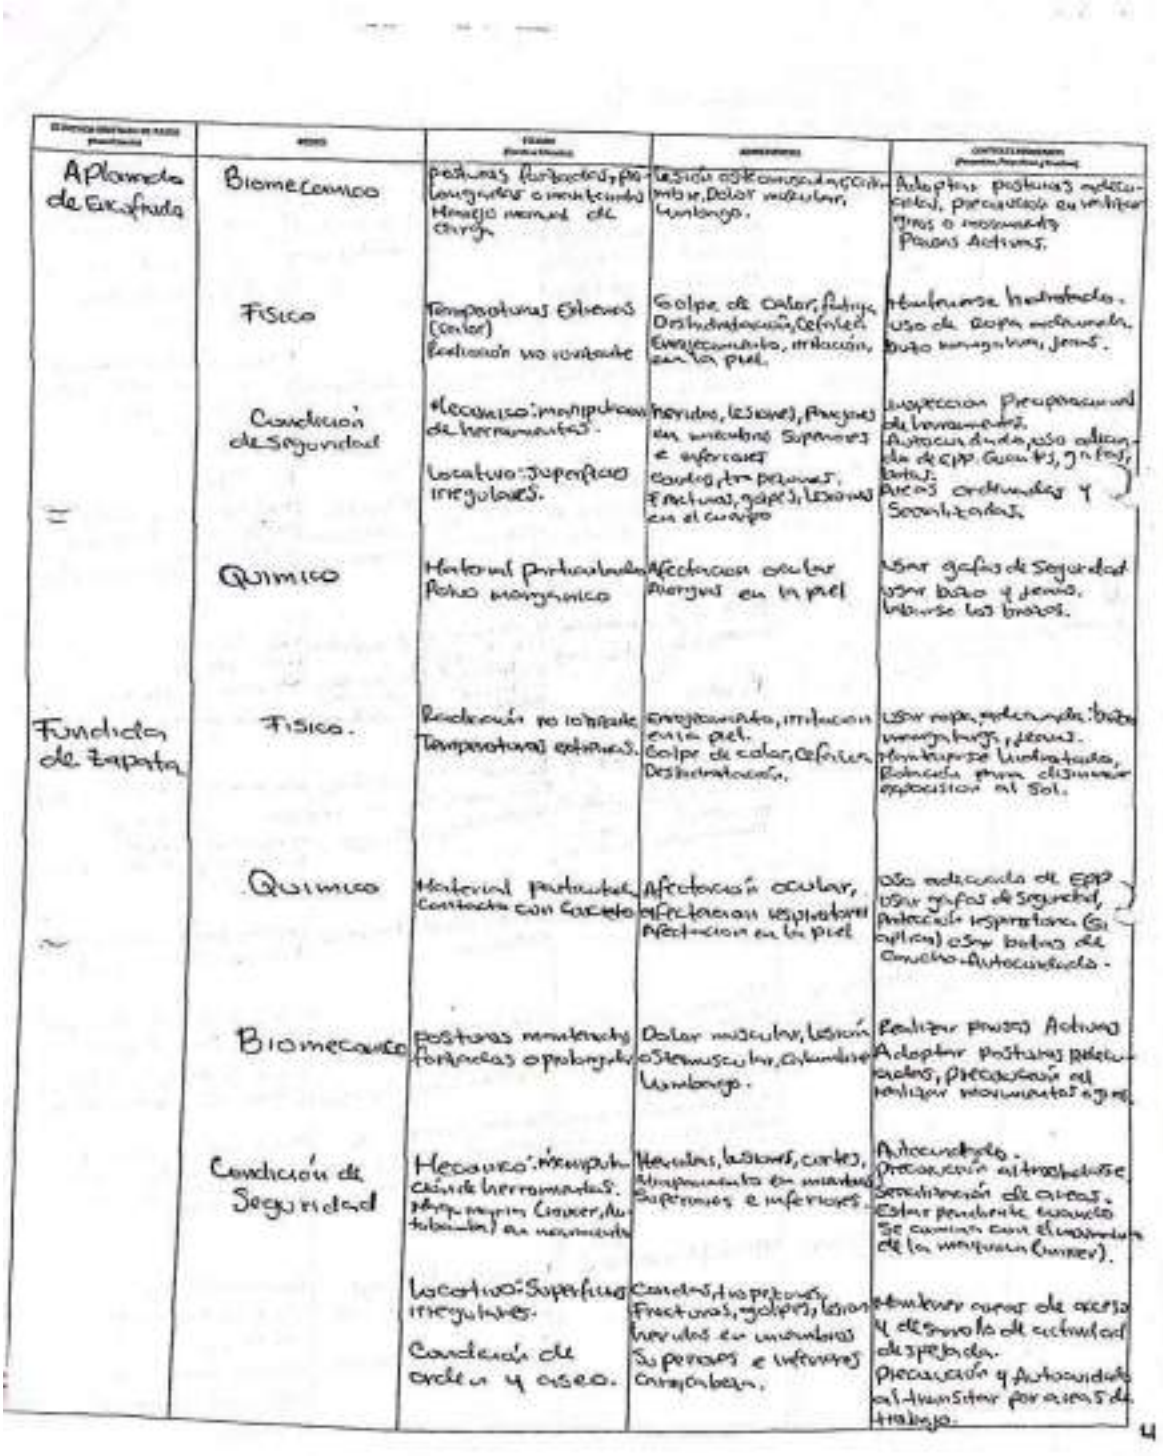


Aplomada de Excavación	Biomecanico	posturas forzadas, prolongadas o monotonas. Manejo manual de cargas.	Lesión osteomuscular, dolor muscular, lumbalgia.	Adoptar posturas adecuadas, precaución en realizar giros o movimientos bruscos.
	Fisico	Temperaturas Extremas (calor) Radiación no ionizante	Golpe de calor, fatiga, deshidratación, cefalea, envejecimiento, irritación en la piel.	Hidratarse hidratarse. uso de ropa adecuada. Bloqueador, gafas.
	Condición de Seguridad	*Locativo: manipulación de herramientas. Locativo: superficie irregulares.	heridas, lesiones, golpes en miembros superiores e inferiores. Caidas, golpes, fracturas, golpes, lesiones en el cuerpo	Inspección preoperacional de herramientas. Autocuidado, uso adecuado de EPP. Guantes, gafas, botas. Pausas activas y Socializadas.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico	Afectación ocular Alergias en la piel	Usar gafas de Seguridad usar botas y jeans. Lavarse las manos.
Fundición de Zapata	Fisico.	Radiación no ionizante Temperaturas extremas.	envejecimiento, irritación en la piel. Golpe de calor, deficiencia, deshidratación.	Usar ropa adecuada, botas, guantes, gafas, jeans. Hidratarse hidratada, Bloqueador para disminuir exposición al Sol.
	Quimico	Material particulado, Contacto con concreto	Afectación ocular, afectación respiratoria Afectación en la piel	Uso adecuado de EPP Usar gafas de seguridad, protección respiratoria (si aplica) usar botas de caucho-Autocuidado.
	Biomecanico	posturas mantenidas forzadas o prolongadas	Dolor muscular, lesión osteomuscular, Lumbalgia.	Realizar pausas Activas Adoptar posturas adecuadas, precaución al realizar movimientos bruscos.
	Condición de Seguridad	Locativo: Manipulación de herramientas. (Hyperextension, Cizaller, Aplastamiento) en miembros	Heridas, lesiones, cortes, Aplastamiento en miembros Superiores e inferiores.	Autocuidado. Precaución al manipular herramientas. Señalización de areas. Estar pendiente cuando se camina con el movimiento de la maquinaria (Cizaller).
		Locativo: Superficies irregulares. Caida de altura y oseo.	Caidas, hundimientos, Fracturas, golpes, lesiones heridas en miembros Superiores e inferiores Contusiones.	Mantener zonas de acceso y desarrollo de actividad despejada. Precaución y Autocuidado al transitar por areas de trabajo.

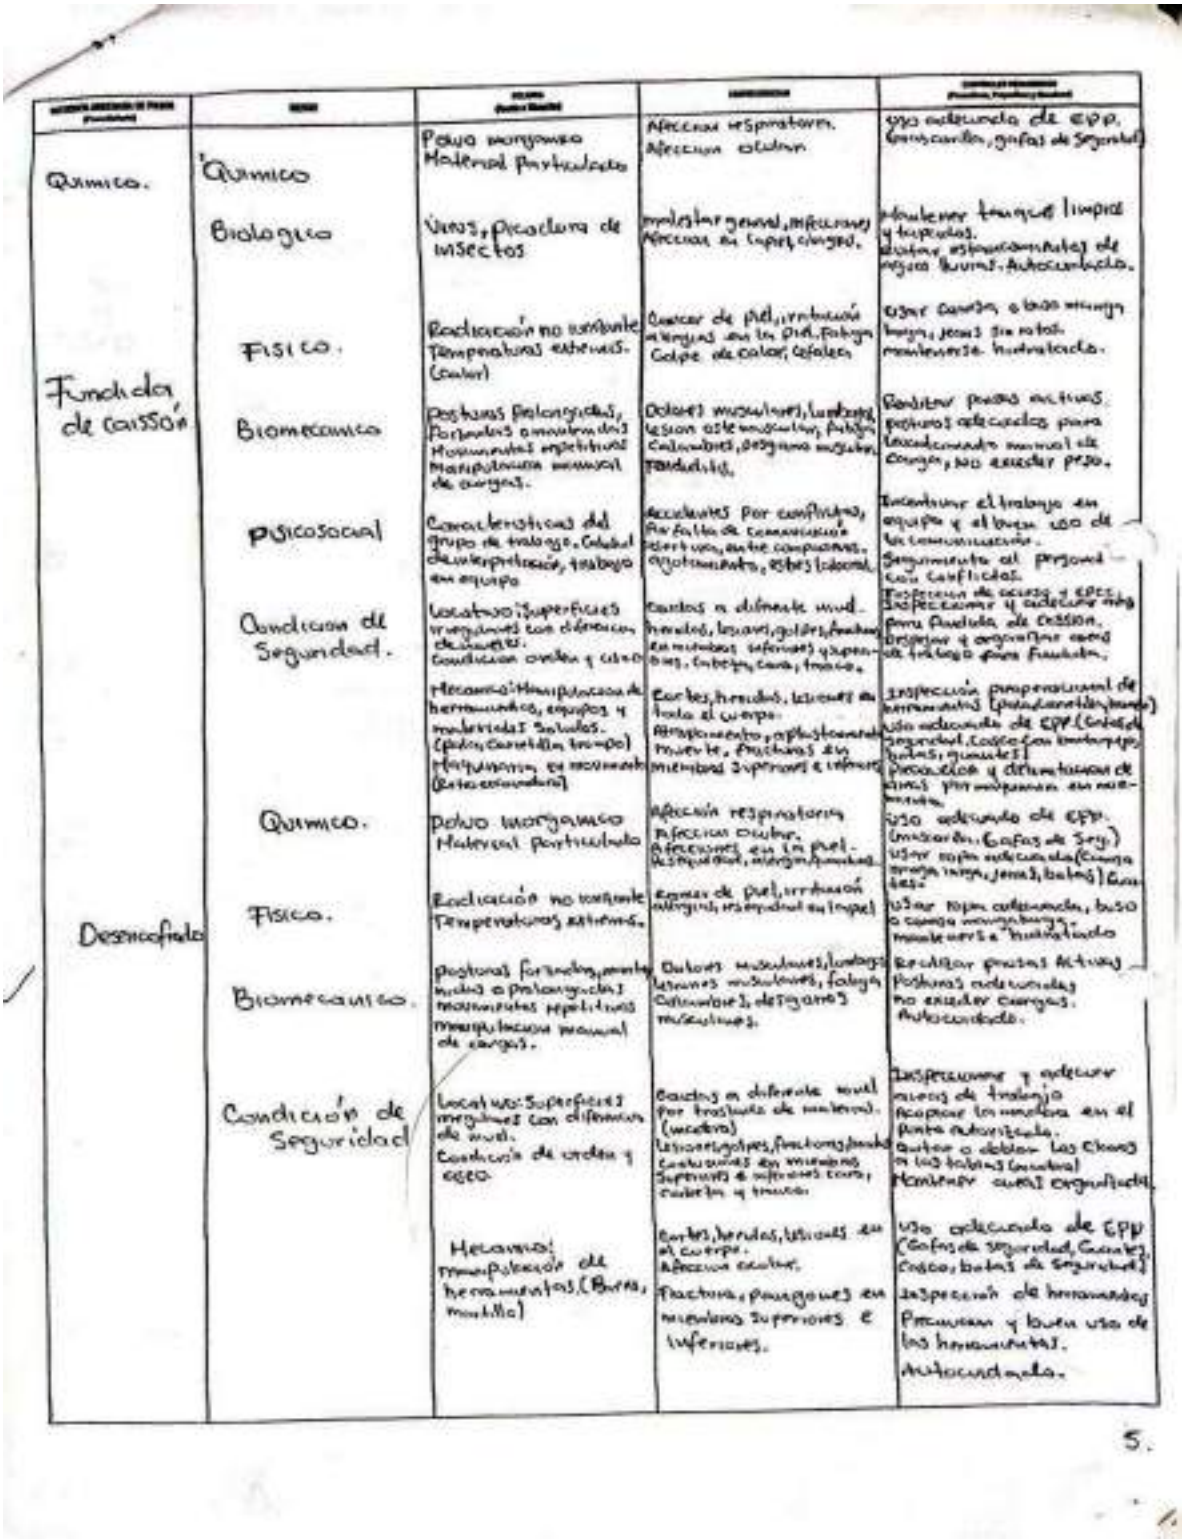



Fundición de caisson	Químico.	Polvo inorgánico Material particulado	Afección respiratoria. Afección ocular.	Uso adecuado de EPP. (gafas, guantes, gafas de seguridad)
	Biológico	Virus, picadura de insectos	malestar general, infecciones y afección en tejido cutáneo.	Mantener lugares limpios y ventilados. Realizar fumigación periódica. Autocuidado.
	Físico.	Radiación no ionizante Temperaturas extremas. (calor)	Cáncer de piel, irritación, alergias en la piel. Fatiga Golpe de calor, cefalea	Usar gafas, ropa manga larga, jeans sin rotos. Hidratación.
	Biomecánico	Posturas prolongadas, forzadas o antiergonómicas Movimientos repetitivos Manipulación manual de cargas.	Dolores musculares, lumbalgia, lesión osteomuscular, fatiga, calambres, desgarro muscular, tendinitis.	Realizar pausas activas, posturas adecuadas para levantamiento manual de cargas, no exceder peso.
	psicosocial	Características del grupo de trabajo. Calidad de interpretación, trabajo en equipo	Accidentes por conflictos, falta de comunicación asertiva, entre compañeros, ambientamiento, estrés laboral.	Incentivar el trabajo en equipo y el buen uso de la comunicación. Seguimiento al personal con conflictos.
	Condiciones de Seguridad.	Locativo: Superficies irregulares con diferencia de niveles. Condición orden y aseo	Caídas a diferente nivel. Heridas, lesiones, golpes, fracturas en miembros superiores y inferiores. Cabeza, cara, tronco.	Inspección de acceso y EPCS. Inspecciones y adecuación para fundida de caisson. Organizar y organizar cada vez trabajo para fundida.
		Mecanico: Manipulación de herramientas, equipos y maquinarias Salud. (Polvo, Caseína, tiempo) Maquinaria en movimiento (Retroexcavadora)	Cortes, heridas, lesiones en todo el cuerpo. Atrapamiento, aplastamiento, muerte, fracturas en miembros superiores e inferiores	Inspección preoperacional de herramientas (Pala, carretilla, barra) Uso adecuado de EPP (Casco, gafas, guantes) Precaución y distracciones de otros personas en movimiento.
Desmonte	Químico.	Polvo inorgánico Material particulado	Afección respiratoria. Afección ocular. Afecciones en la piel. Dermatitis, alergia, fumadas.	Uso adecuado de EPP. (mascarilla, Gafas de Seg.) Usar ropa adecuada (manga larga, jeans, botas) Guantes.
	Físico.	Radiación no ionizante Temperaturas extremas.	Cáncer de piel, irritación, alergias, inflamación en tejido.	Usar ropa adecuada, bloqueador y cambio constante. Mantenerse hidratado
	Biomecánico.	Posturas forzadas, prolongadas o antiergonómicas Movimientos repetitivos Manipulación manual de cargas.	Dolores musculares, lumbago, lesiones musculares, fatiga, calambres, desgarros musculares.	Realizar pausas Activas Posturas adecuadas, no exceder cargas. Autocuidado.
	Condición de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares con diferencia de nivel. Condición de orden y aseo.	Caídas a diferente nivel por traslado de material. (madera) Lesiones, golpes, fracturas, heridas, contusiones en miembros superiores e inferiores, cara, cabeza y tronco.	Inspeccionar y adecuar sitios de trabajo. Acopiar los materiales en el punto autorizado. Quitar o doblar los clavos en las tablas (madera) Mantener sitio organizado.
		Mecanico: Manipulación de herramientas (Barra, machete)	Cortes, heridas, lesiones en el cuerpo. Afección ocular. Fractura, aplastamiento en miembros superiores e inferiores.	Uso adecuado de EPP (Gafas de seguridad, Guantes, Casco, botas de seguridad) Inspección de herramientas. Precaución y buen uso de las herramientas. Autocuidado.

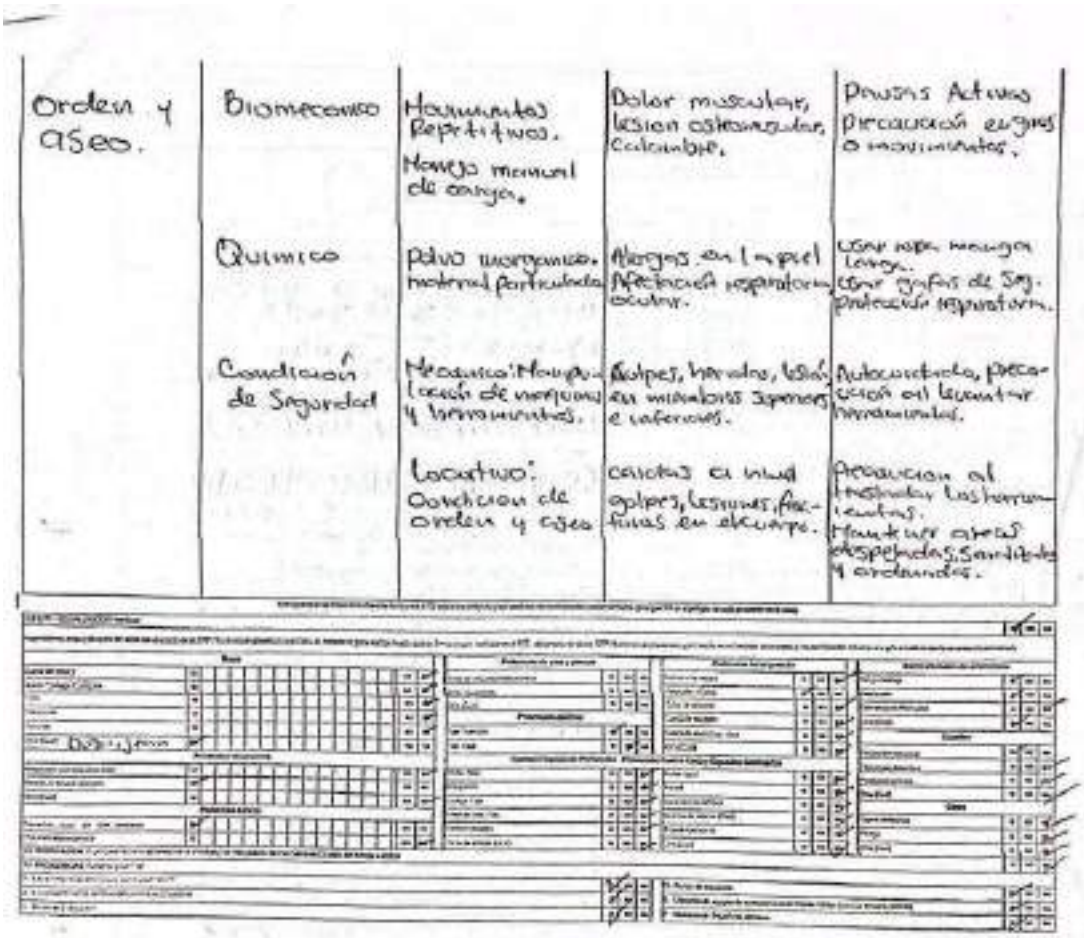

Orden y aseo.	Biomecanico	Movimientos Repetitivos. Manejo manual de cargas.	Dolor muscular, lesion osteomuscular, Calambre.	Pausas Activas precaución cargas o movimientos.
	Quimico	Polvo inorganico. material particulado	Alergias en la piel Afectación respiratoria ocular.	usar ropa manga larga. usar gafas de Seg. Protección respiratoria.
	Condicion de Seguridad	Mecanico: Manipulación de maquinas y herramientas.	Golpes, heridas, lesiones en miembros superiores e inferiores.	Autocuidado, precaución al levantar herramientas.
		Locativo: Condicion de orden y aseo	caidas a mismo nivel golpes, lesiones, fracturas en elcuerpo.	Precaucion al trasladar las herramientas. Mantener areas despejadas, Señaladas y ordenadas.

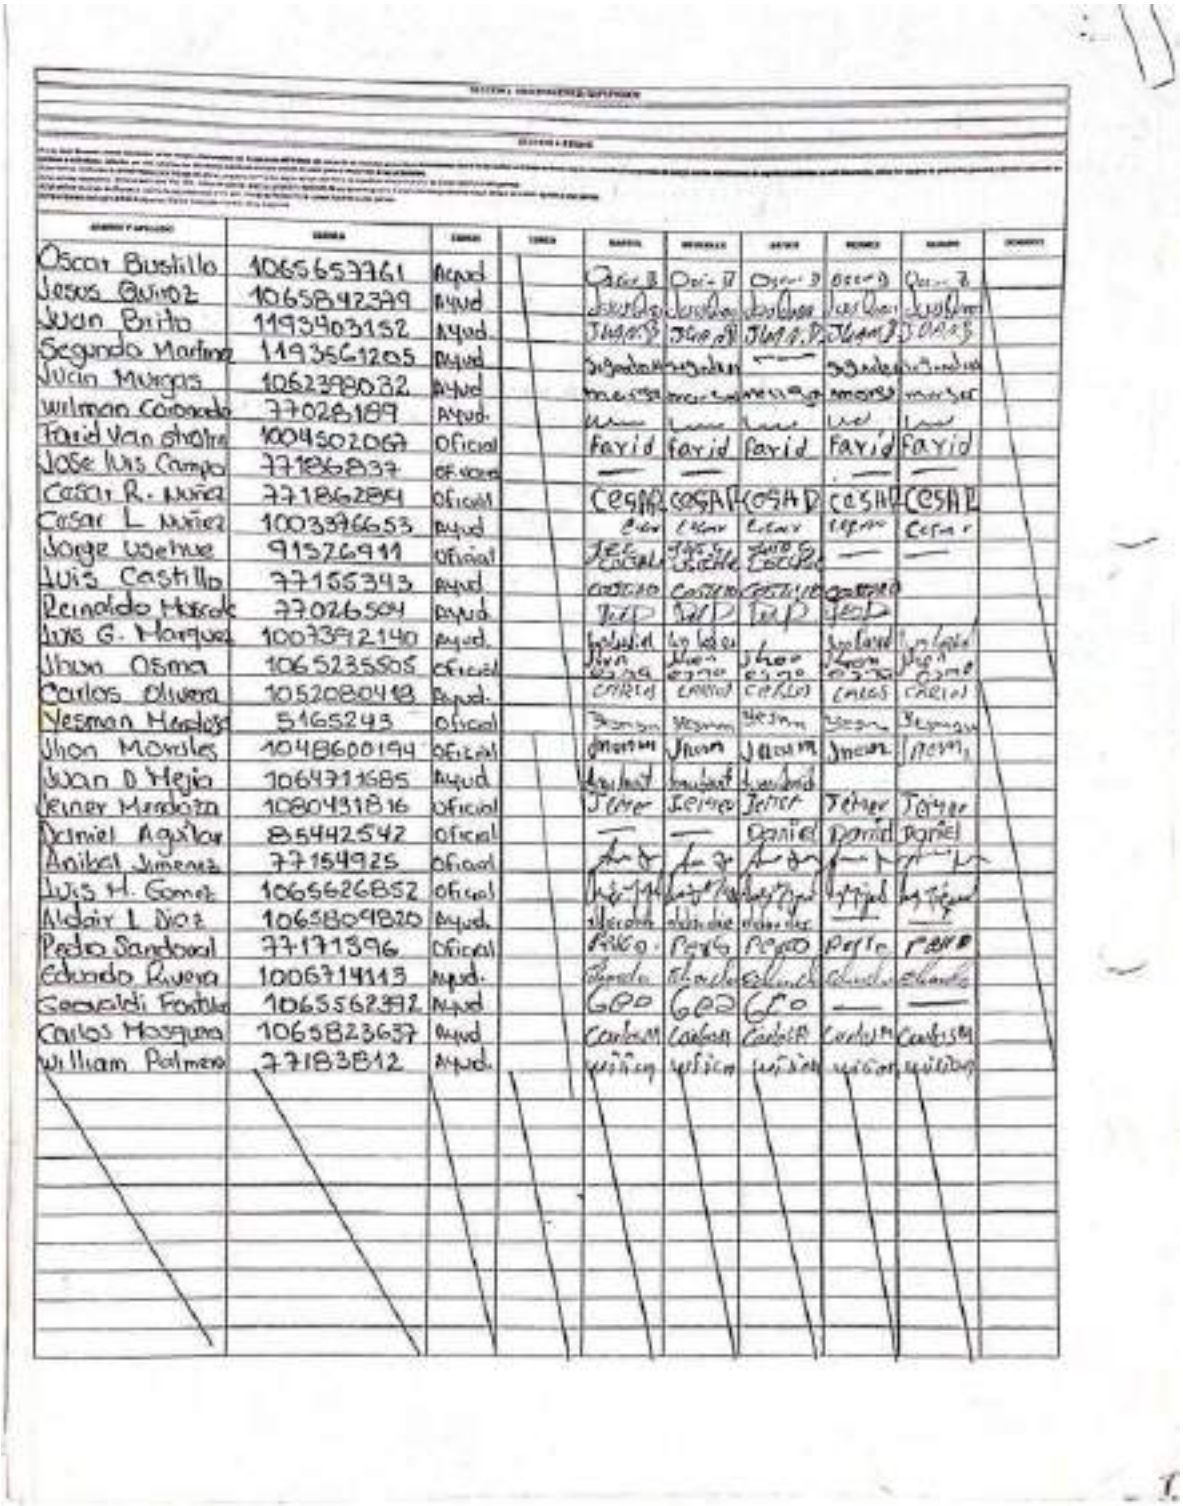

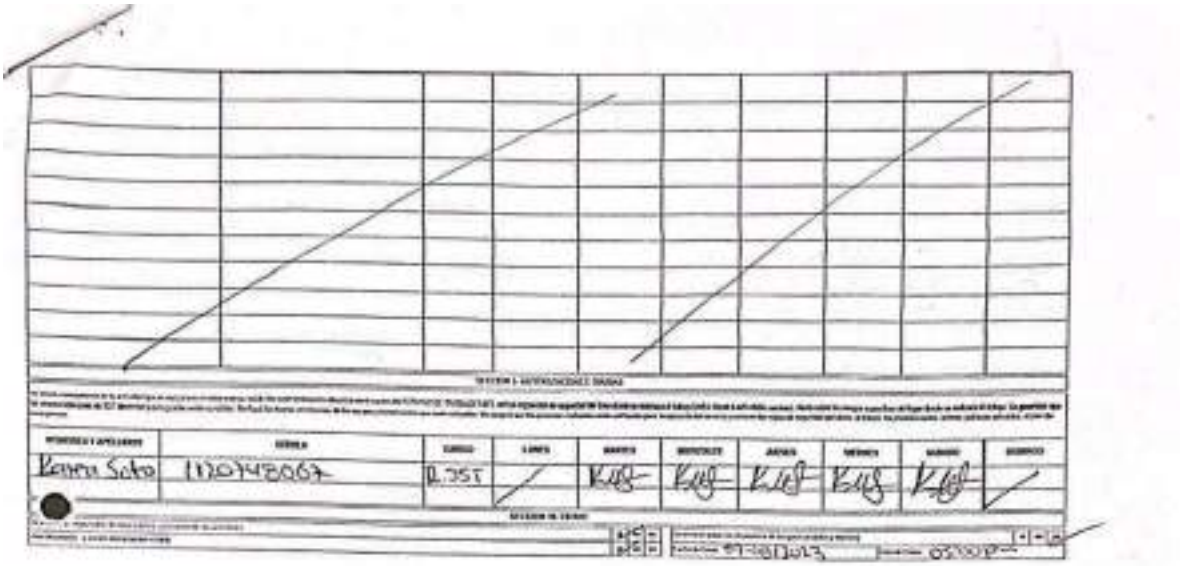


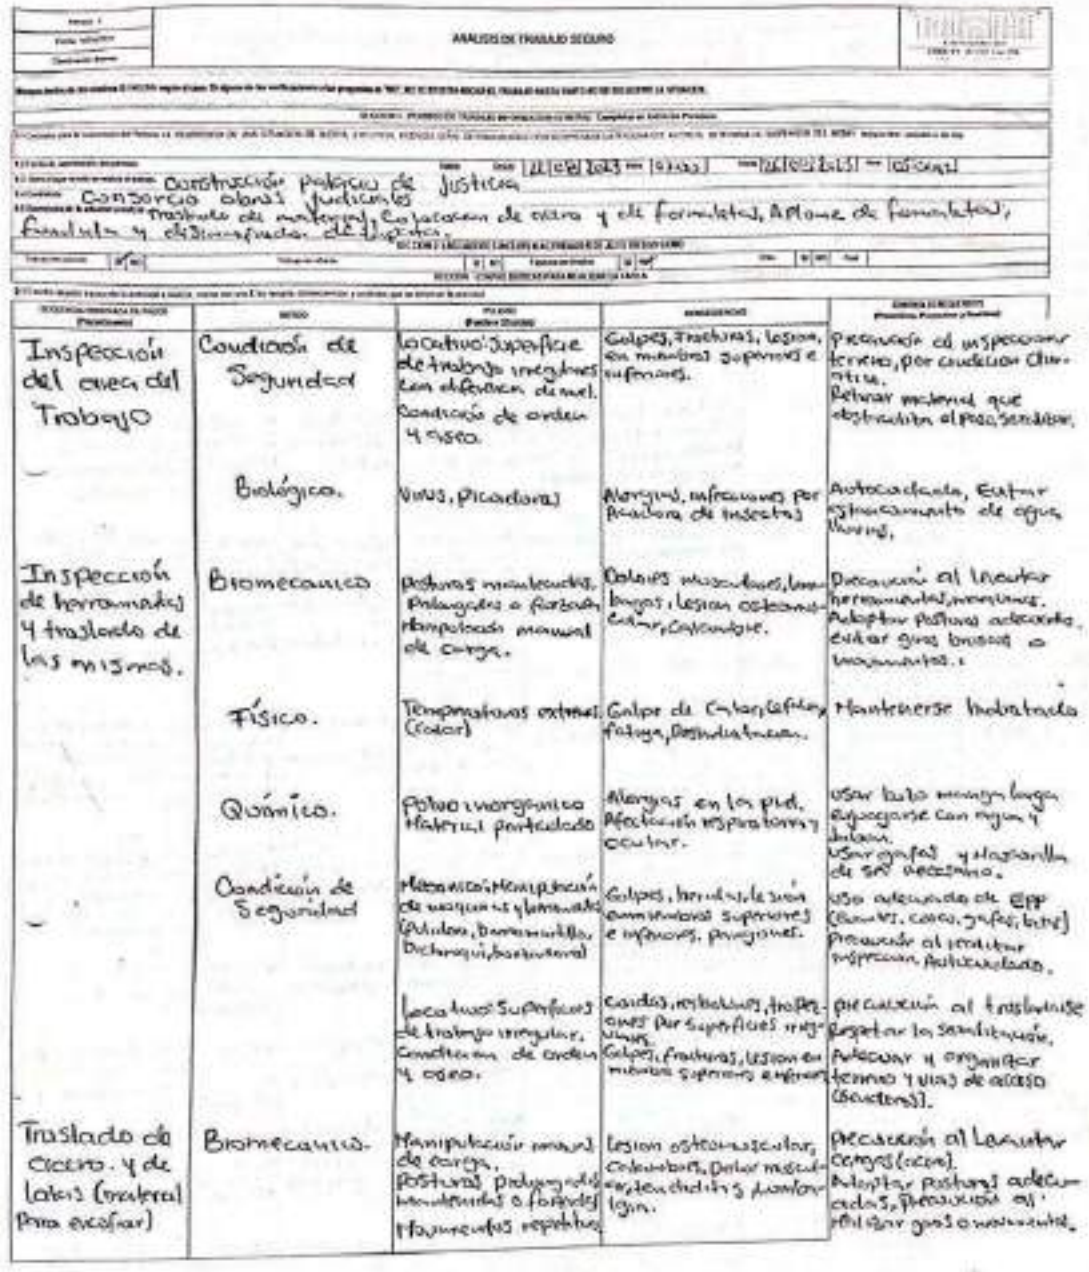



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Construcción palacio de Justicia
Consorcio obras judiciales
Traslado de material, Colocacion de cielo y de formaletas, Aplome de formaletas, Fundida y desformaleteo de Escalera.


Inspección del cielo del Trabajo	Condición de Seguridad	Locativo: Superficie de trabajo irregulares con diferencia de nivel. Condición de orden y aseo.	Golpes, Fracturas, Lesion, en miembros superiores e inferiores.	Precaución al inspeccionar terreno, por condicion climatica. Retirar material que obstaculice el paso, Señalizar.
	Biológica.	Virus, Picaduras)	Alergias, infecciones por picadura de insectos)	Autocuidado, Evitar estancamiento de aguas lluvias,
Inspección de herramientas y traslado de las mismas.	Biomecanico	Posturas inadecuadas. Prolongadas o forzadas, Manipulación manual de carga.	Dolores musculares, lumbagos, Lesion osteomuscular, Calambre.	Precaución al levantar herramientas, inservibles. Adoptar posturas adecuadas, evitar giros bruscos o innecesarios.
	Físico.	Temperaturas extremas (Calor)	Golpe de Calor, deshidratacion, fatiga, Desmayos.	Mantenerse hidratado
	Químico.	Polvo inorganico Material particulado	Alergias en la piel, Afectación respiratoria y ocular.	Usar ropa manga larga, Lavarse con agua y jabon. Usar gafas y mascarilla de ser necesario.
	Condición de Seguridad	Mala ubicación, Manipulación de maquinas y herramientas (Golpes, Quemaduras, Descargas, Electrocución)	Golpes, heridas, lesion en miembros superiores e inferiores, Amputaciones.	Uso adecuado de EPP (Casco, Gafas, botas) Precaución al momento de inspeccionar Autocuidado.
		Locativo: Superficies de trabajo irregulares, Condiciones de orden y aseo.	Caidas, golpes, fracturas, lesiones por superficies irregulares. Golpes, fracturas, Lesion en miembros superiores e inferiores	precaución al trasladarse, Respetar la señalización, Ubicar y organizar terreno y vias de acceso (Escaleras).
Traslado de cielo y de Latas (material para escalar)	Biomecanico	Manipulación manual de cargas, Posturas prolongadas inadecuadas o forzadas, Movimientos repetitivos	Lesion osteomuscular, Calambres, Dolor muscular, Lumbagos, Contracturas y Amputaciones.	Precaución al Levantar cargas (cielo). Adoptar posturas adecuadas, Precaución al utilizar gafas o innecesarios.

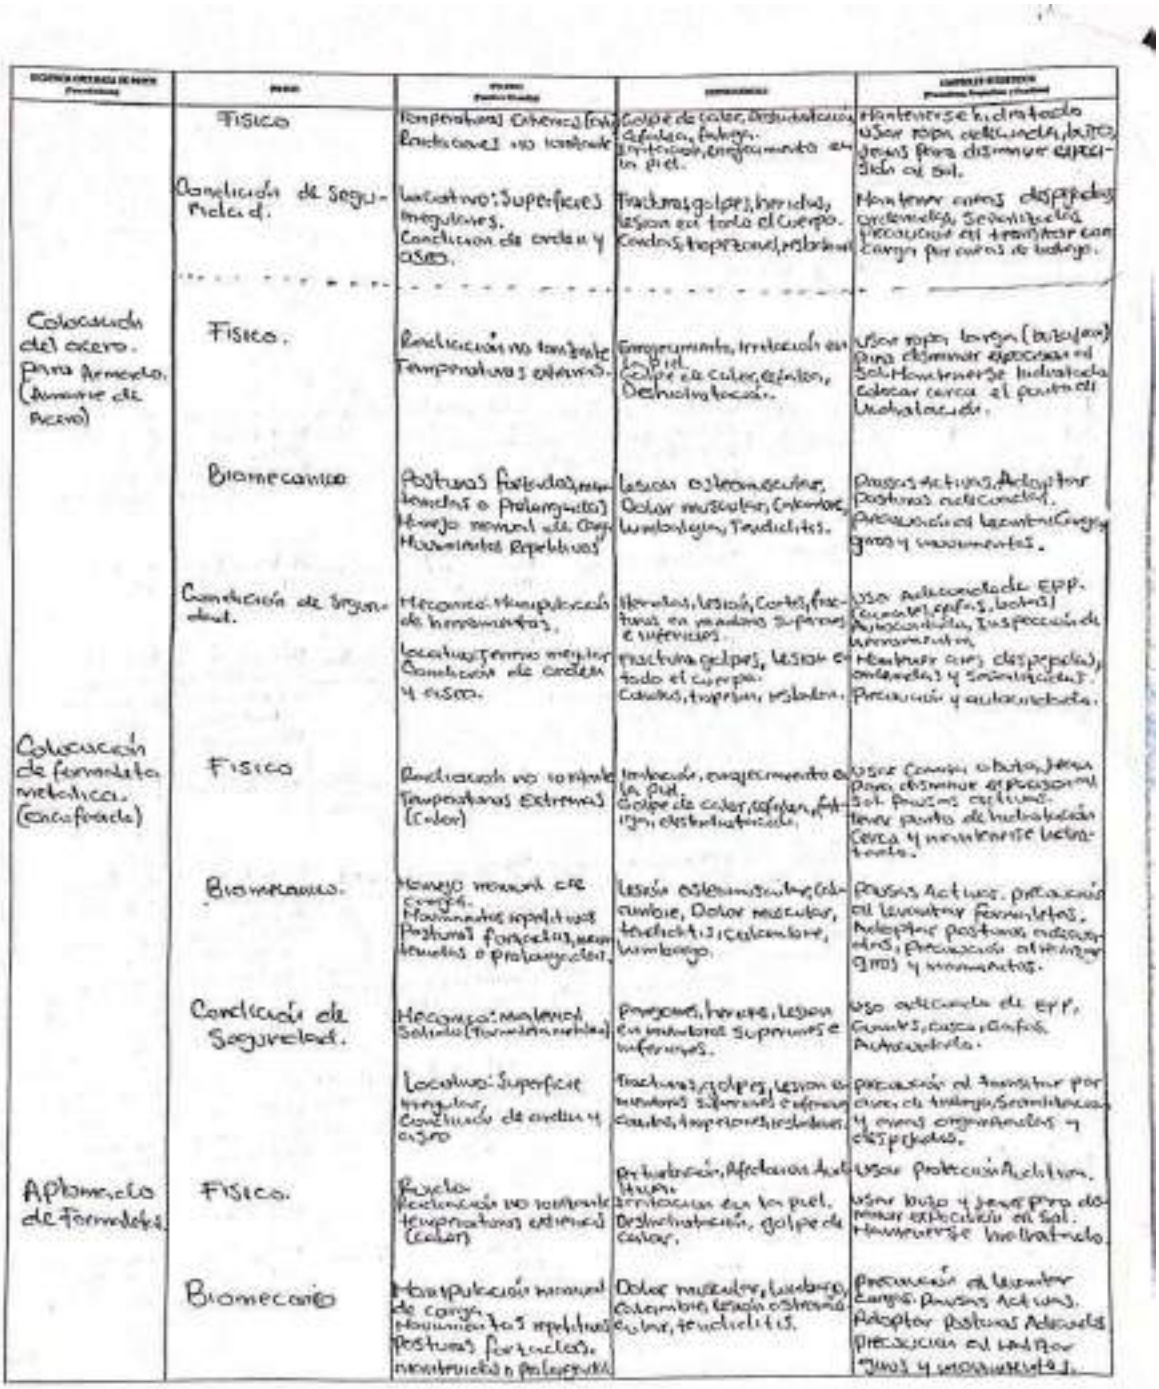


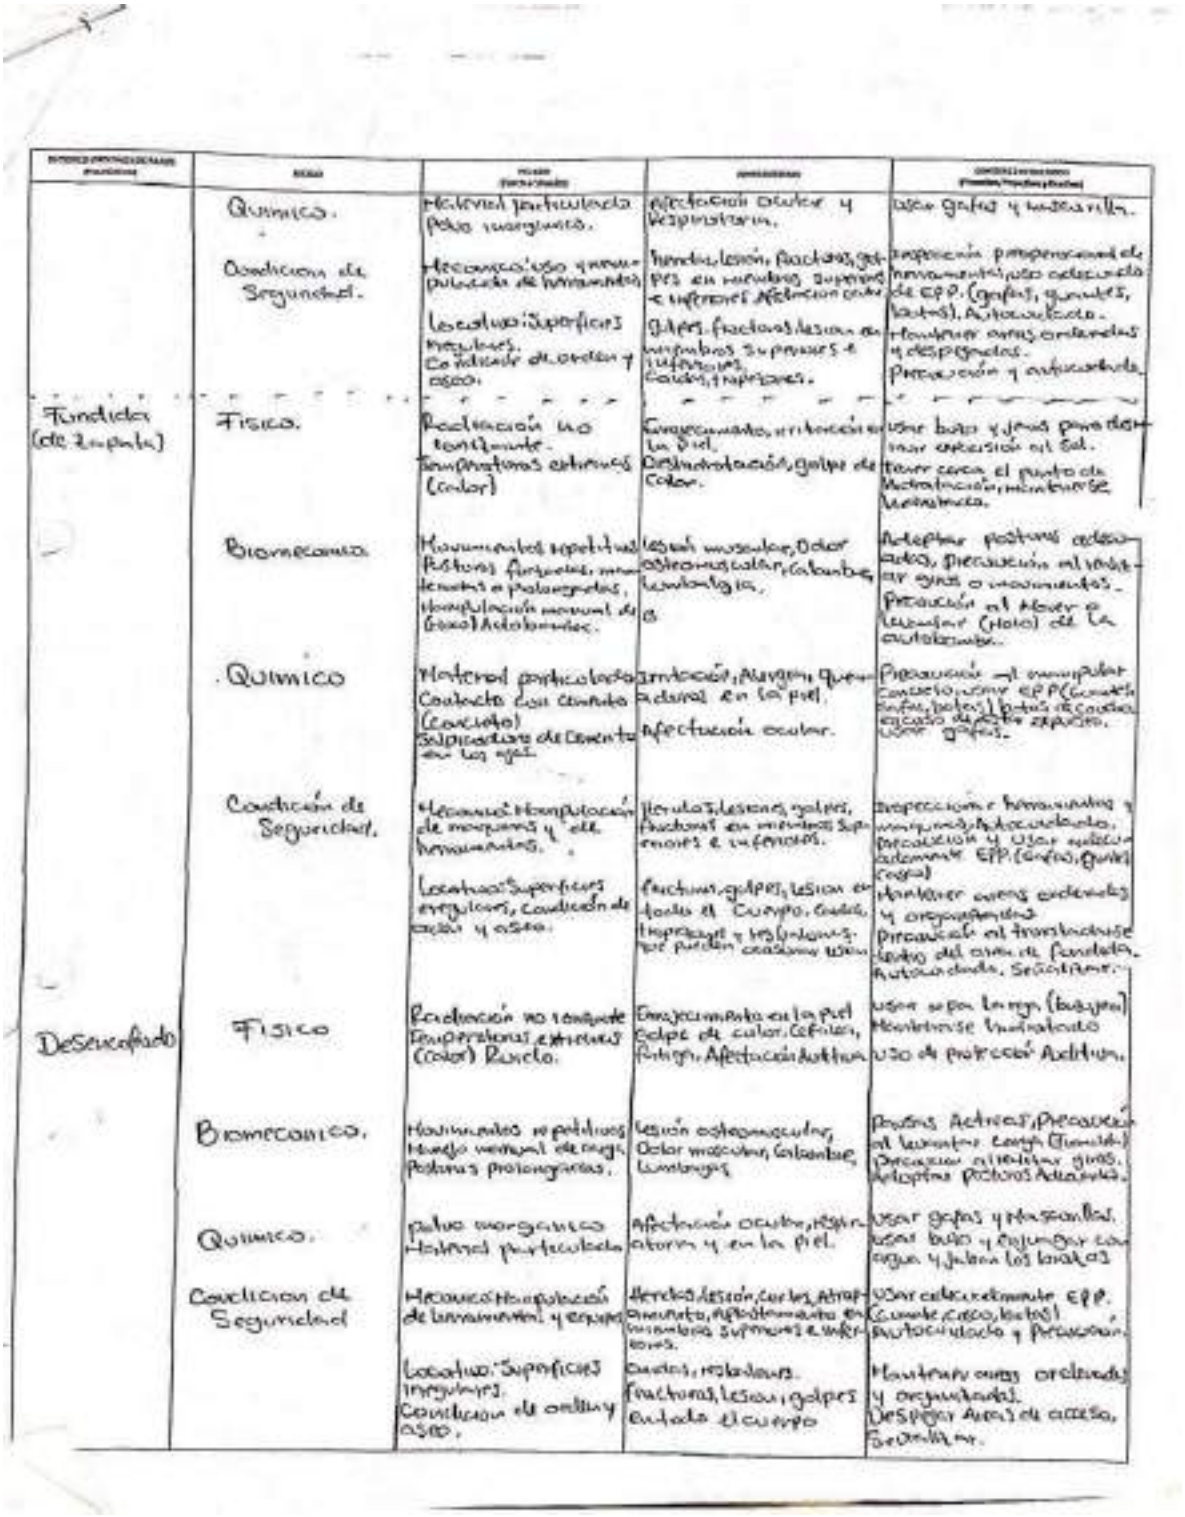


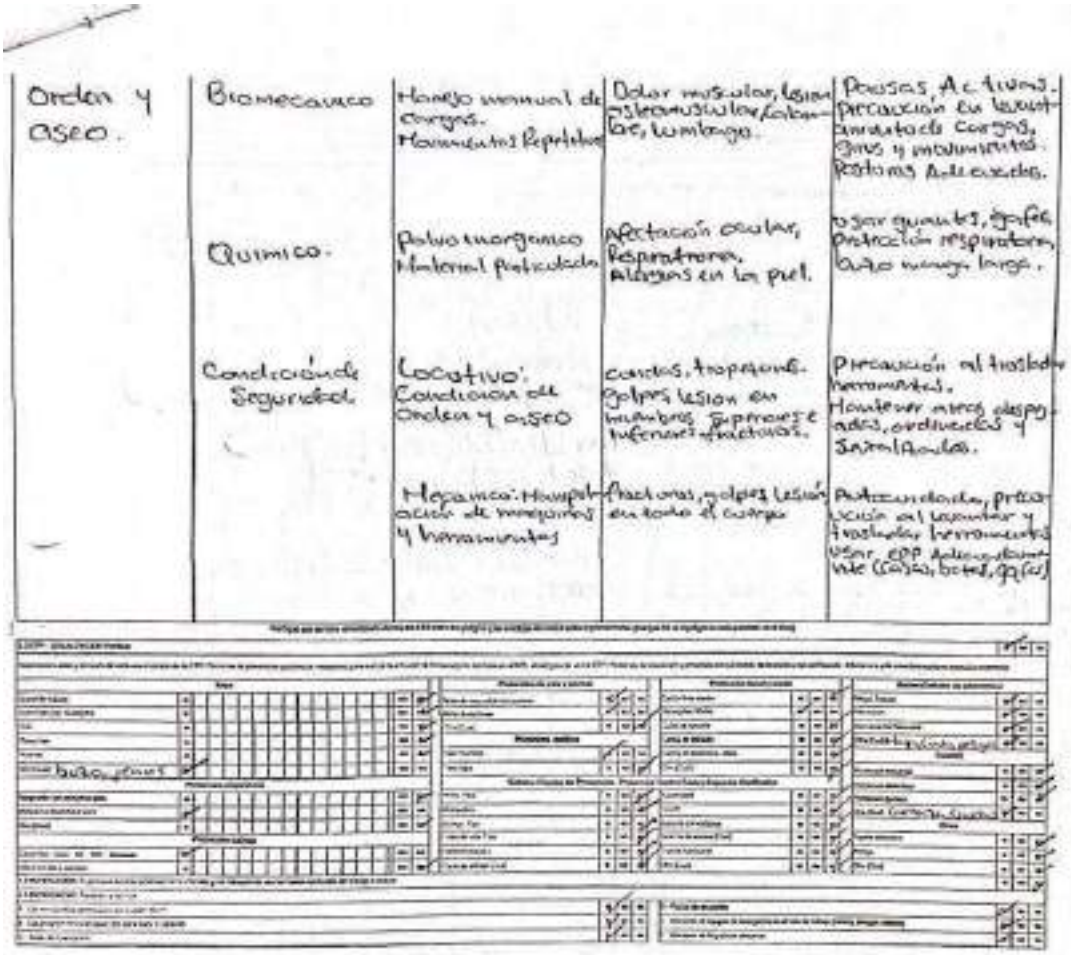

Orden y aseo.	Biomecanico	Manejo manual de cargas. Movimientos Repetitivo	Dolor muscular, lesion osteomuscular, lumbalgia.	Posturas, Actividad. precaución en levantamiento de cargas, usos y mantenimiento. Pausas Activas.
	Quimico.	Polvo inorganico Material particulado	Afectación ocular, Respiratorios. Alergias en la piel.	Uso de guantes, gafas, protección respiratoria, buen manejo.
	Condiciones de Seguridad.	Locativo: Condiciones de Orden y aseo	caidas, tropiezos. golpes, lesion en miembros superiores e inferiores, fracturas.	Precaución al trasladar herramientas. Mantener vias despejadas, ordenadas y señalizadas.
		Mecanico: Manipulación de maquinas y herramientas	fracturas, golpes, lesión en todo el cuerpo	Precaución al trasladar, precaución al levantar y trasladar herramientas, usar EPP adecuados (casco, botas, gafas)

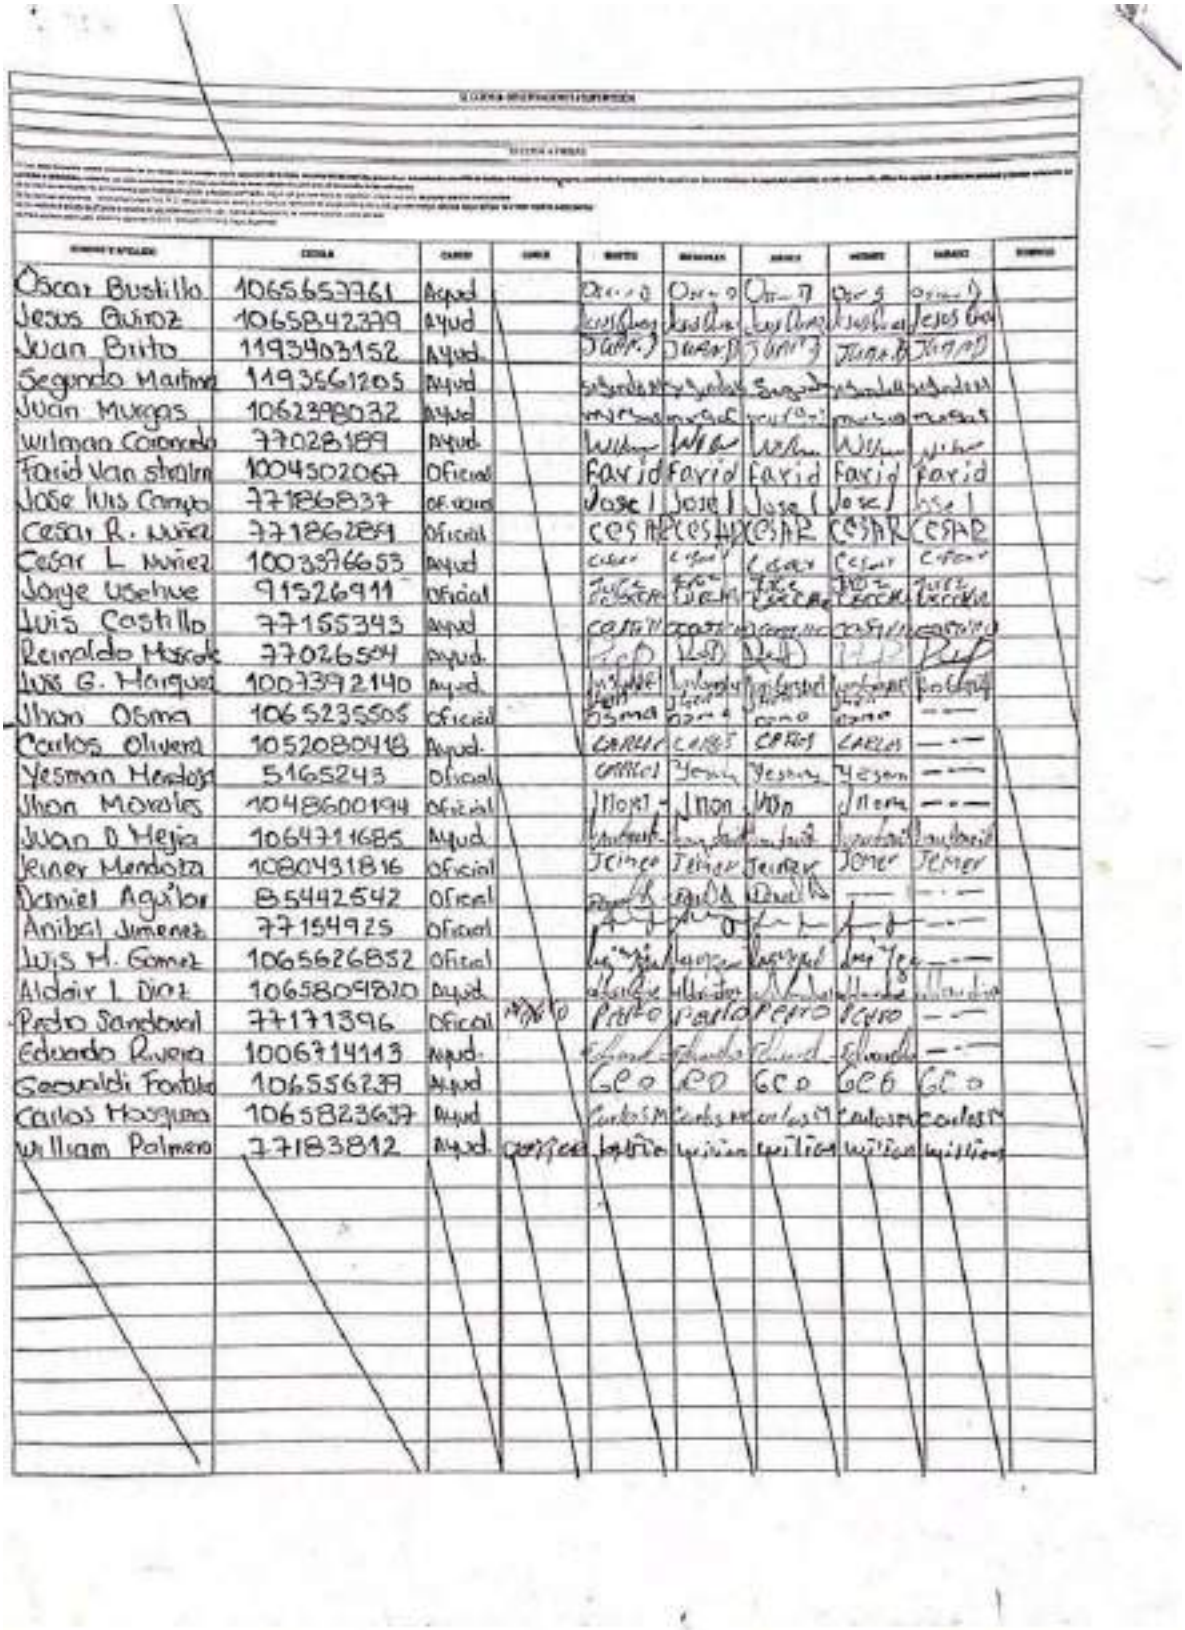

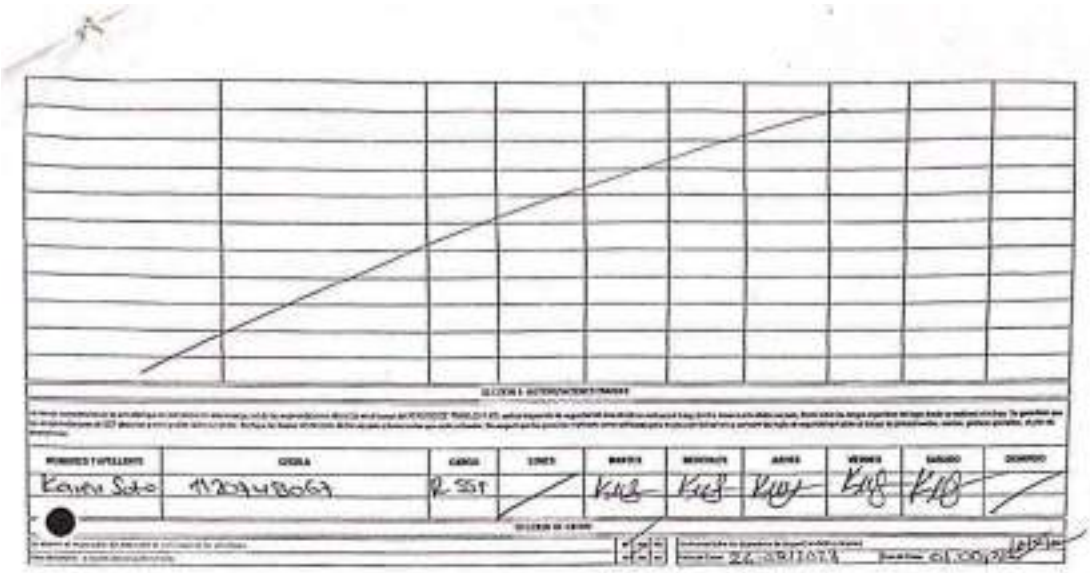


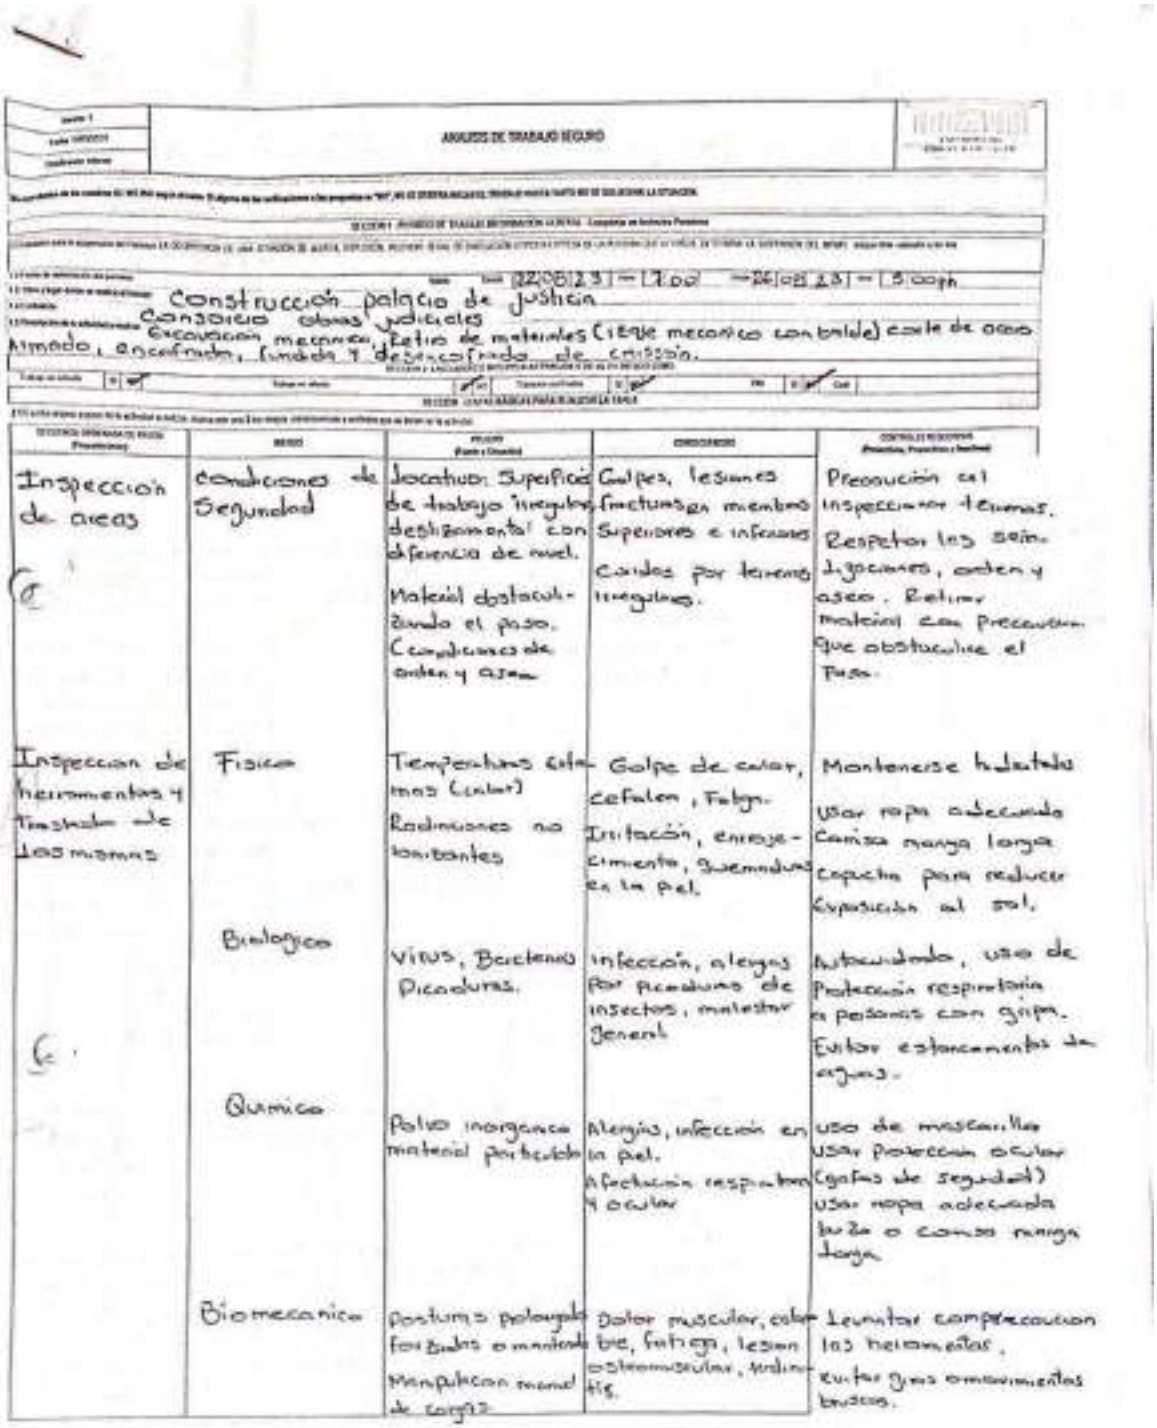


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Construcción palacio de justicia
Consorcio obras judiciales
Excavación mecanica, Retiro de materiales (Cargue mecanico con bridle) cargue de acero
Armado, encofrado, fundida y desencofrado de cimentación.


	RIESGO	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Inspección de areas	condiciones de Seguridad	Locativo: Superficie de trabajo irregular, deslizamiento con diferencia de nivel. Material dostaculizando el paso. Condiciones de orden y aseo.	Golpes, lesiones fracturas en miembros Superiores e inferiores Caidas por terrenos irregulares.	Precaución en inspeccionar terrenos. Respetar las señalizaciones, orden y aseo. Retirar material con precaución que obstaculice el Paso.
Inspeccion de herramientas y Traslado de las mismas	Fisico	Temperaturas extremas (calor) Radiaciones no ionizantes	Golpe de calor, cefalea, Fatiga. Irritación, enrojecimiento, Quemaduras en la piel.	Mantenerse hidratado Usar ropa adecuada Camisa manga larga capucha para reducir Exposición al sol.
	Biologico	Virus, Bacterias Picaduras.	Infección, alergias por picaduras de insectos, malestar General	Autocuidado, uso de Protección respiratoria a personas con gripa. Evitar estancamiento de aguas.
	Quimico	Polvo inorganico material particulado	Alergia, infección en la piel. Afectación respiratoria y ocular	uso de mascarillas Usar Proteccion ocular (gafas de seguridad) Usar ropa adecuada buzo o camisa manga larga
	Biomecanico	Posturas prolongadas forzadas o mantenidas Manipulacion manual de cargas	Dolor muscular, calambre, fatiga, lesion osteomuscular, tendinitis.	Levantar comprecaucion las herramientas. evitar giros o movimientos bruscos.

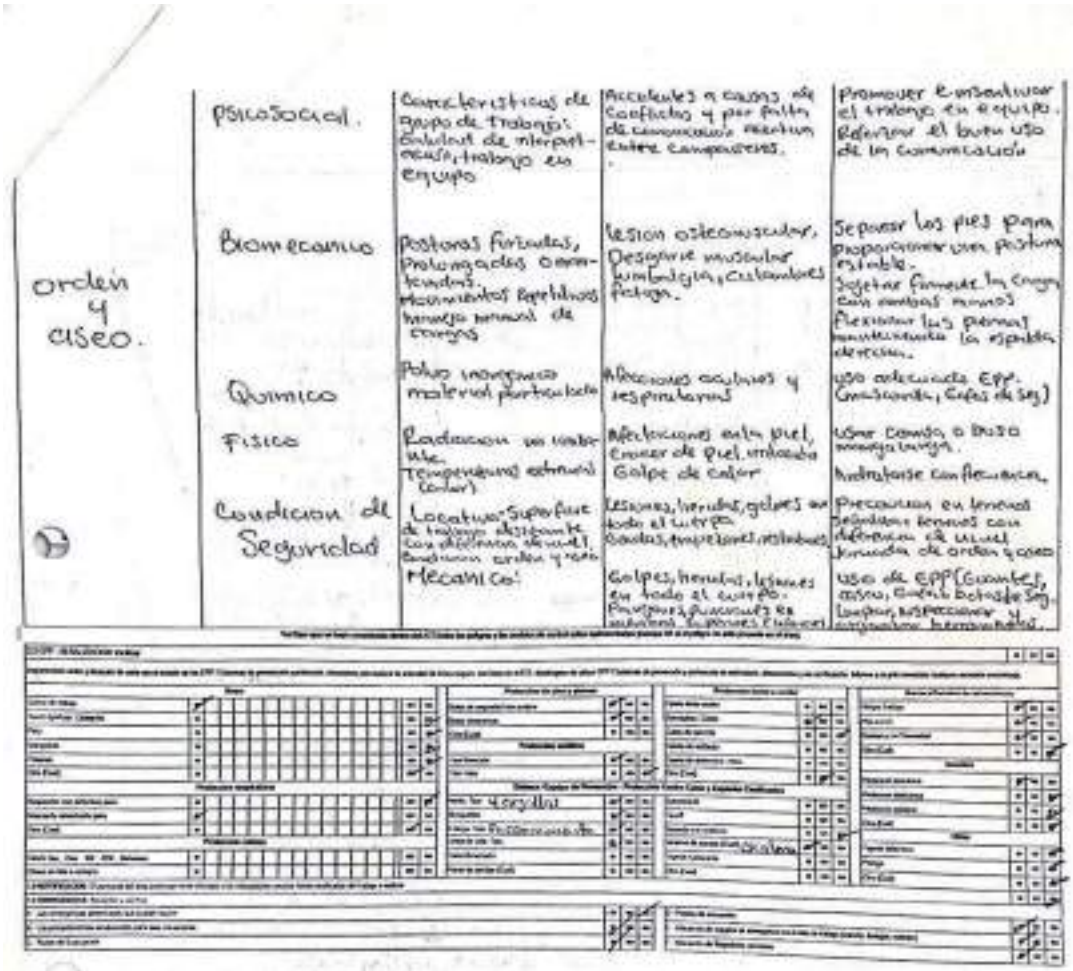
orden y aseo.
Psicosocial.
Características de grupo de trabajo: Calidad de interpersonal, trabajo en equipo
Accidentes o causas de Conflictos y por falta de comunicación asertiva entre compañeros.
Promover el trabajo en equipo. Reforzar el buen uso de la comunicación
Biomecanico
Posturas forzadas, Prolongadas o mantenidas. Movimientos Repetitivos Manejo manual de cargas
lesion osteomuscular. Desgarro muscular Lumbalgia, Calambres fatiga.
Separar los pies para proporcionar una postura estable. Sujetar firmemente la carga con ambas manos Flexionar las piernas manteniendo la espalda derecha.
Quimico
Polvo inorganico material particulado
Afecciones oculares y respiratorias
uso adecuado EPP. (Gafas, Guantes, Botas de Seg)
Fisica
Radiacion no ionizante. Temperaturas extremas (calor)
Afecciones en la piel, Cancer de piel, ulceras Golpe de calor
usar ropa de Dril manga larga. hidratarse con frecuencia.
Condicion de Seguridad
Locativo: Superficie de trabajo deslizante con diferencia de nivel, condiciones orden y aseo
Lesiones, heridas, golpes en todo el cuerpo. Caidas, empleones, esguinces
Precauciones en lesiones Señalizar lesiones con diferencia de nivel, Jornada de orden y aseo
Mecanico:
Golpes, heridas, lesiones en todo el cuerpo. Amputaciones, fracturas
uso de EPP (Guantes, casco, Gafas, Botas de Seg. Lugar, inspeccionar y


	Condiciones de Seguridad	Mecanico: Manipulación de herramientas (Pala, pico, Barra, Carretilla, martillo, Pulidora, Taladro, Sierra circular, martillo demoledor)	Golpes, heridas, lesión en miembros superiores e inferiores, cabeza, Cara y torso.	Usar EPP (casco, botas, Gantes) adecuadamente Preoperacional de equipos y herramientas. Autocuidados.
		Locativo: Superficies irregulares. Condiciones orden y aseo	Lesiones, Golpes, tropezones por Caidas al mismo nivel	Mantener areas ordenadas, señalizadas.
Inicio de Excavación (mecanica) de terreno Para Cimentación	Biomecanico	Posturas prolongadas forzadas o monotonas, movimientos repetitivos Manipulación manual de cargas.	Dolor musculares osteomuscular, calambre, fatiga, Lumbalgia, desgarro muscular.	Realizar pausas activas, adoptar Posturas adecuadas Precaución al levantar la carga o material Durante la excavación, tener pies en un sitio fijo.
	Quimico	Material Particulado Polvo inorganico	Afeccion ocular y respiratoria Alergias en la piel	Uso adecuadamente de Epp (gafas de Seguridad, mascarilla o tapabocas) usar Guantes y camisa manga larga Lavarse las manos en caso de tener contacto con Lluvia Provenientes de la excavación
	Biologico	Picaduras, virus, Bacterias	Malestar general, Infecciones por picadura de insectos.	Evitar estancamiento de agua. Auto cuidado uso de ropa larga. camisa y pantalon.
	Fisico	Temperaturas Extremas (calor) Radiaciones no ionizante. Ruido.	Golpe de calor, deshidratación, Agotamiento Irritación, quemaduras y envejecimiento en la piel. Afectación Auditiva	Uso de camisa o buzo manga larga mantenerse hidratados. Pausas activas Receso 15 min Por cada jornada laboral Instalar Pulsómetro Para Protegerse del sol. Aplicación continua cuando Se use mucho de exponer

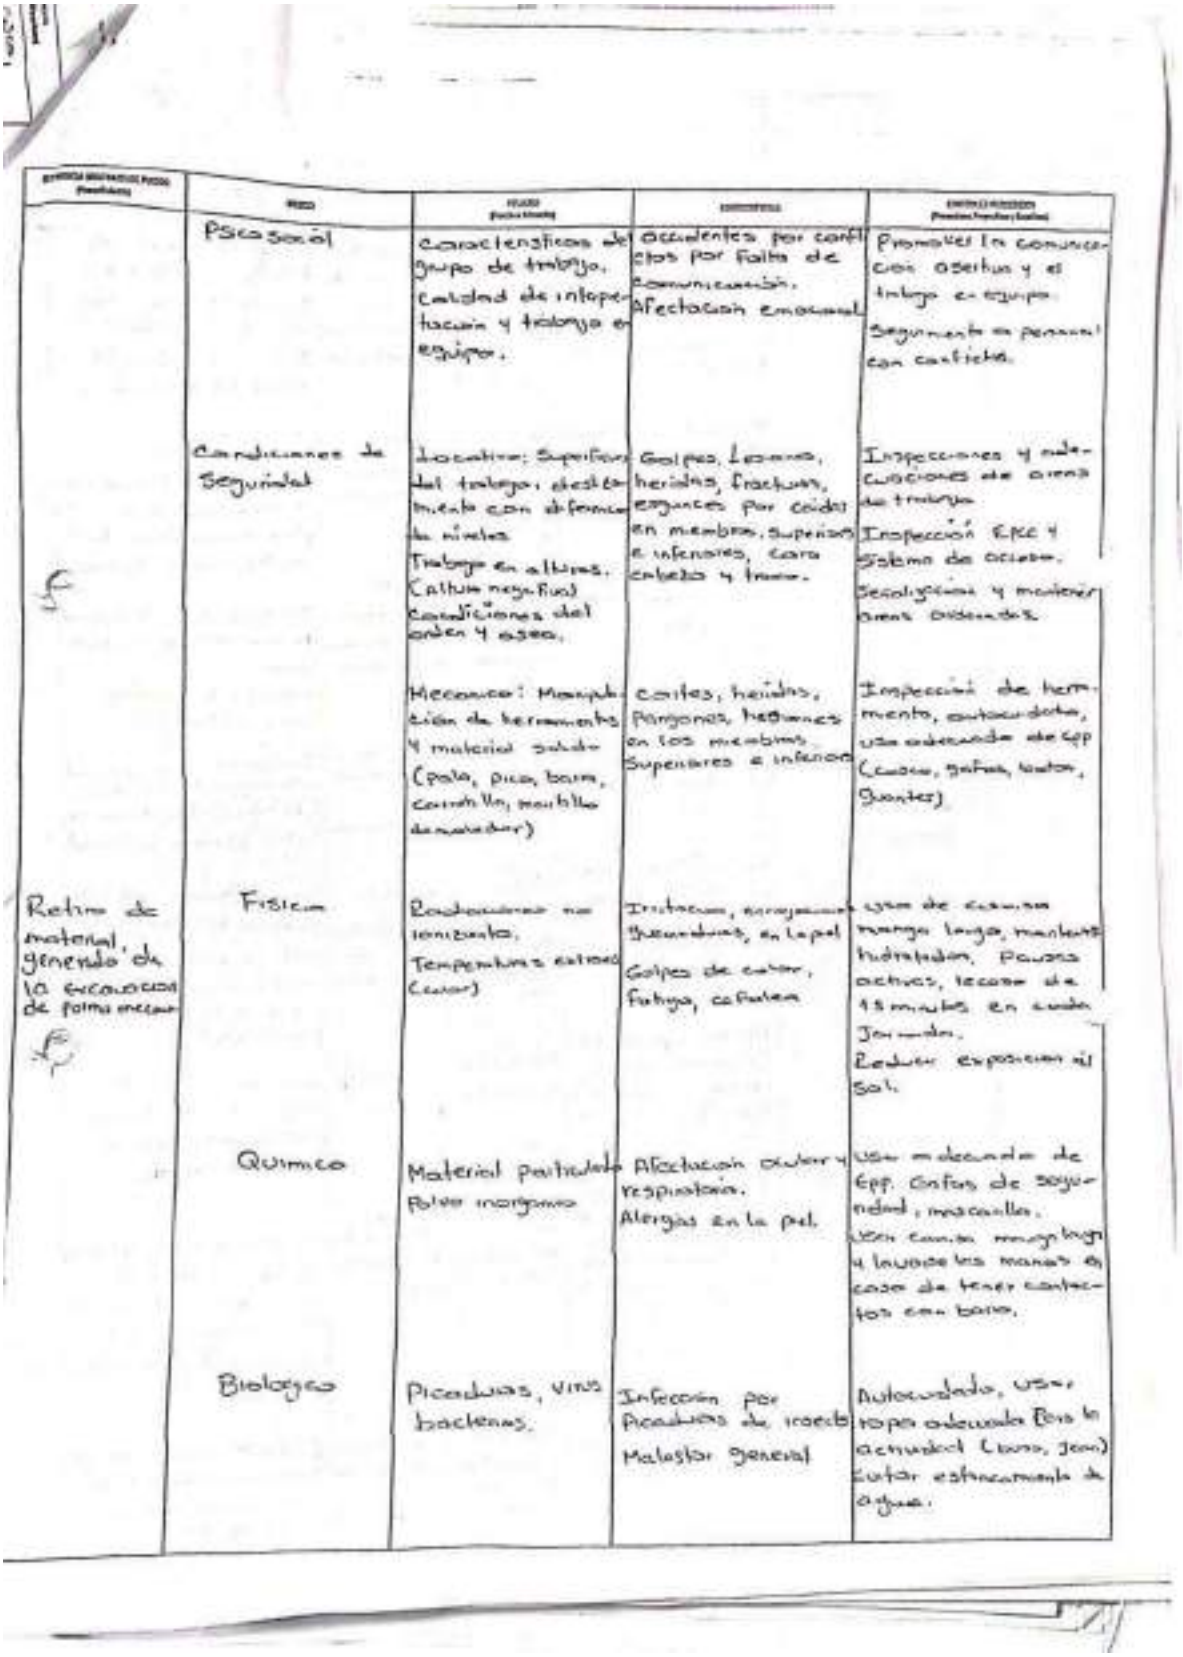


	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo. Calidad de interfacion y trabajo en equipo.	Accidentes por conflictos por falta de comunicacion. Afectacion emocional	Promover la comunicacion asertiva y el trabajo en equipo. Seguimiento al personal con conflicto.
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies del trabajo, desplazamiento con deformidades Trabajo en alturas. (Altura negativa) Condiciones del orden y aseo.	Golpes, Lesiones, heridas, fracturas, esguinces por caidas en miembros superiores e inferiores, cara cabeza y tronco.	Inspecciones y adecuaciones de areas de trabajo Inspección EPC y Sistema de acceso. Socializaciones y mantener areas ordenadas.
		Mecanico: Manipulación de herramientas y material solido (Pala, pica, barra, cornisa, martillo demoledor)	cortes, heridas, Pargones, hematomas en los miembros Superiores e inferiores	Inspección de herramienta, autocuidado, uso adecuado de EPP (Casco, gafas, tapon, guantes)
Retiro de material, generado de la excavacion de forma manual	Fisicos	Radiaciones no ionizantes. Temperaturas extremas (calor)	Irritacion, enrojecimiento, quemaduras, en la piel Golpes de calor, fatiga, cefalea	Uso de camisa manga larga, manten hidratados, Pausas activas, descanso de 15 minutos en cada jornada. Reducir exposicion al sol.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico	Afectacion ocular y respiratoria. Alergias en la pel.	Uso adecuado de EPP. Gafas de seguridad, mascarilla. Uso camisa manga larga y lavado de manos en caso de tener contactos con barro.
	Biologico	Picaduras, virus bacterias.	Infección por Picaduras de insecto Malestar general	Autocuidado, usar ropa adecuada para la actividad (botas, jean) tomar estrategicamente de agua.

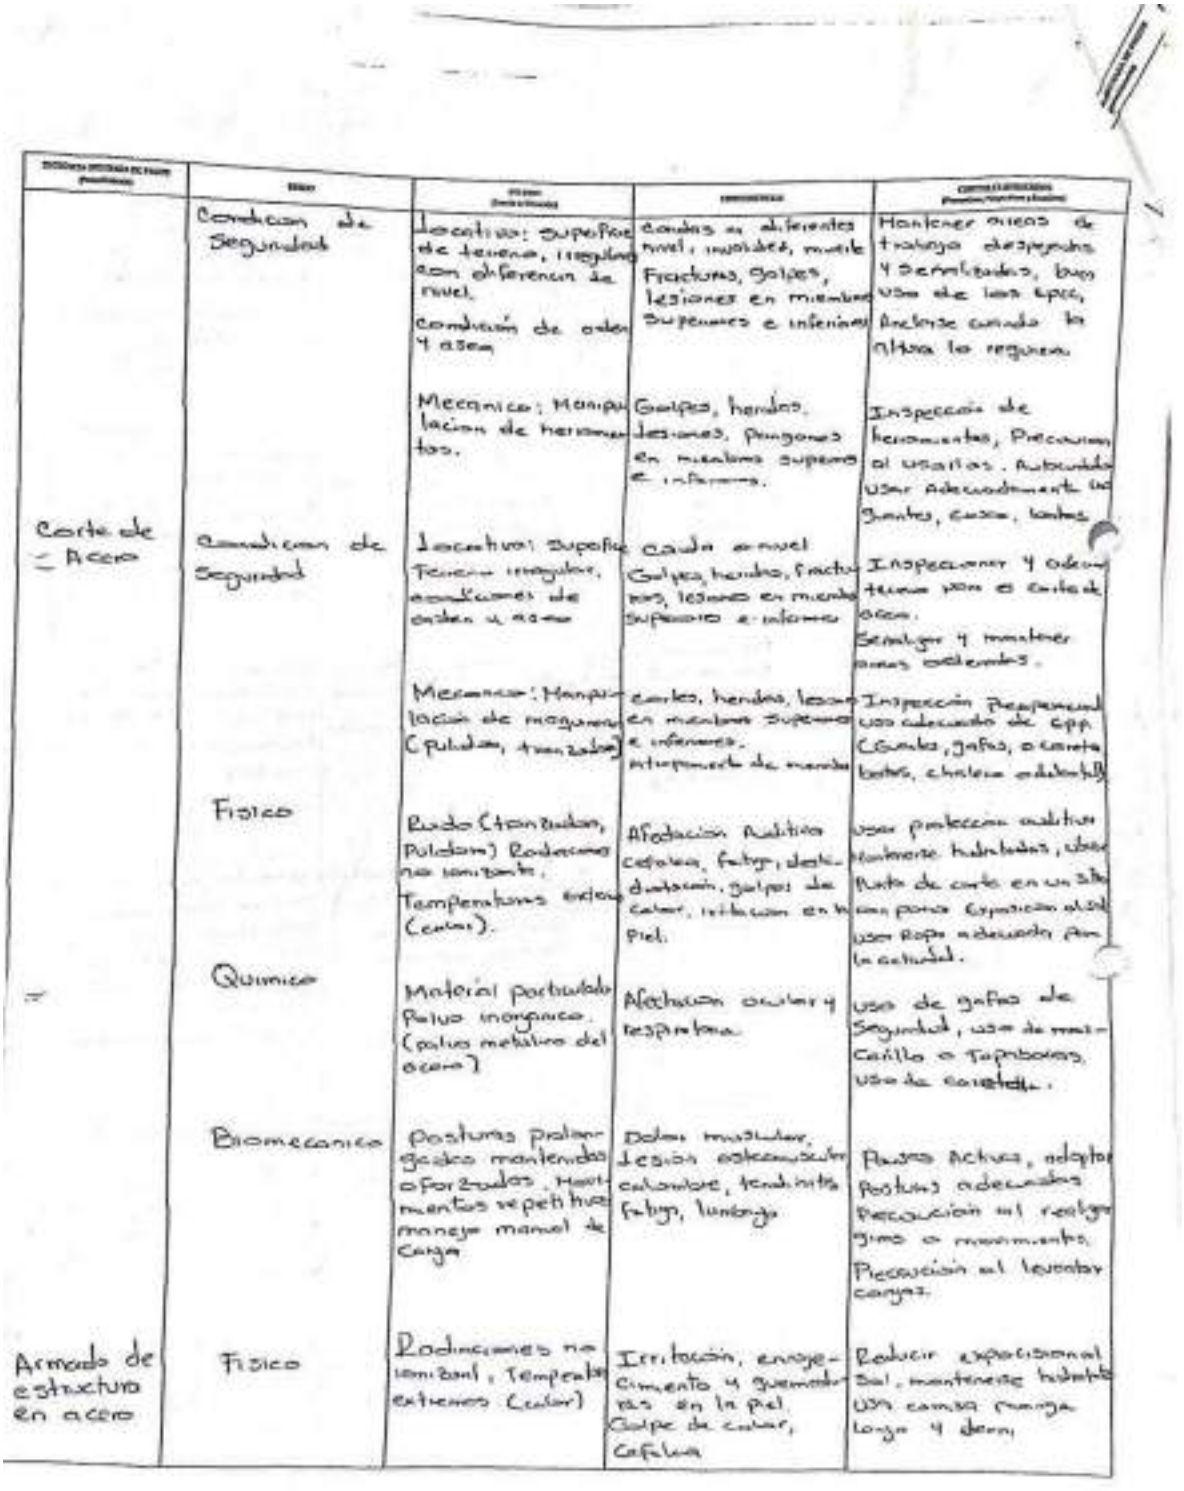



	Condicion de Seguridad	Locativa: Superficie de trabajo, irregulares con diferencia de nivel. Condición de orden y aseo	Caidas a diferentes nivel, inmobiles, muerte Fracturas, Golpes, lesiones en miembros Superiores e inferiores	Mantener sitios de trabajo despejados y demarcados, buen uso de las epcc, Archivar cuando la obra lo requiera.
		Mecanico: Manipulacion de herramientas.	Golpes, heridas, lesiones, pinzamientos en miembros superiores e inferiores.	Inspeccion de herramientas, Precauciones al usarlas. Autocuidado usar Adecuadamente los Guantes, cuero, botas.
Corte de Acero	Condicion de Seguridad	Locativa: Superficie Terreno irregular, condiciones de orden y aseo	caida a nivel Golpes, heridas, Fracturas, lesiones en miembros superiores e inferiores	Inspeccionar y ordenar terreno con el corte de acero. Señalizar y mantener zonas ordenadas.
		Mecanico: Manipulacion de maquinas (pulidora, trenzadora)	cortes, heridas, lesiones en miembros superiores e inferiores. Atrapamiento de manos	Inspección Preoperacional uso adecuado de EPP (Guantes, gafas, careta botas, chaleco antibalas)
	Fisico	Ruido (Constante, Puldsan) Radiaciones no ionizante. Temperaturas extremas (calor).	Afectacion Auditiva cefalea, fatiga, deshidratacion, golpes de calor, irritacion en la piel.	uso protector auditivo, mantener hidratadas, uso Ropa de corte en una zona con poca Exposicion al sol uso Ropa adecuada para la actividad.
	Quimico	Material particulado Polvo inorganico. (polvo metalico del acero)	Afectacion ocular y respiratoria.	uso de gafas de Seguridad, uso de mascarilla o Tapabocas, uso de careta.
	Biomecanico	Posturas prolongadas mantenidas o forzadas. Movimientos repetitivos manejo manual de Carga	Dolor muscular, lesion osteomuscular, calambre, tendinitis fatiga, lumbago	Pausas Activas, adoptar Posturas adecuadas Precaucion al realizar giros o movimientos. Precaucion al levantar cargas.
Armado de estructura en acero	Fisico	Radiaciones no ionizant, Temperaturas extremas (calor)	Irritacion, envejecimiento y quemaduras en la piel. Golpe de calor, Cefalea	Reducir exposicional Sol, mantenerse hidratado Usar camisa manga Larga y dem

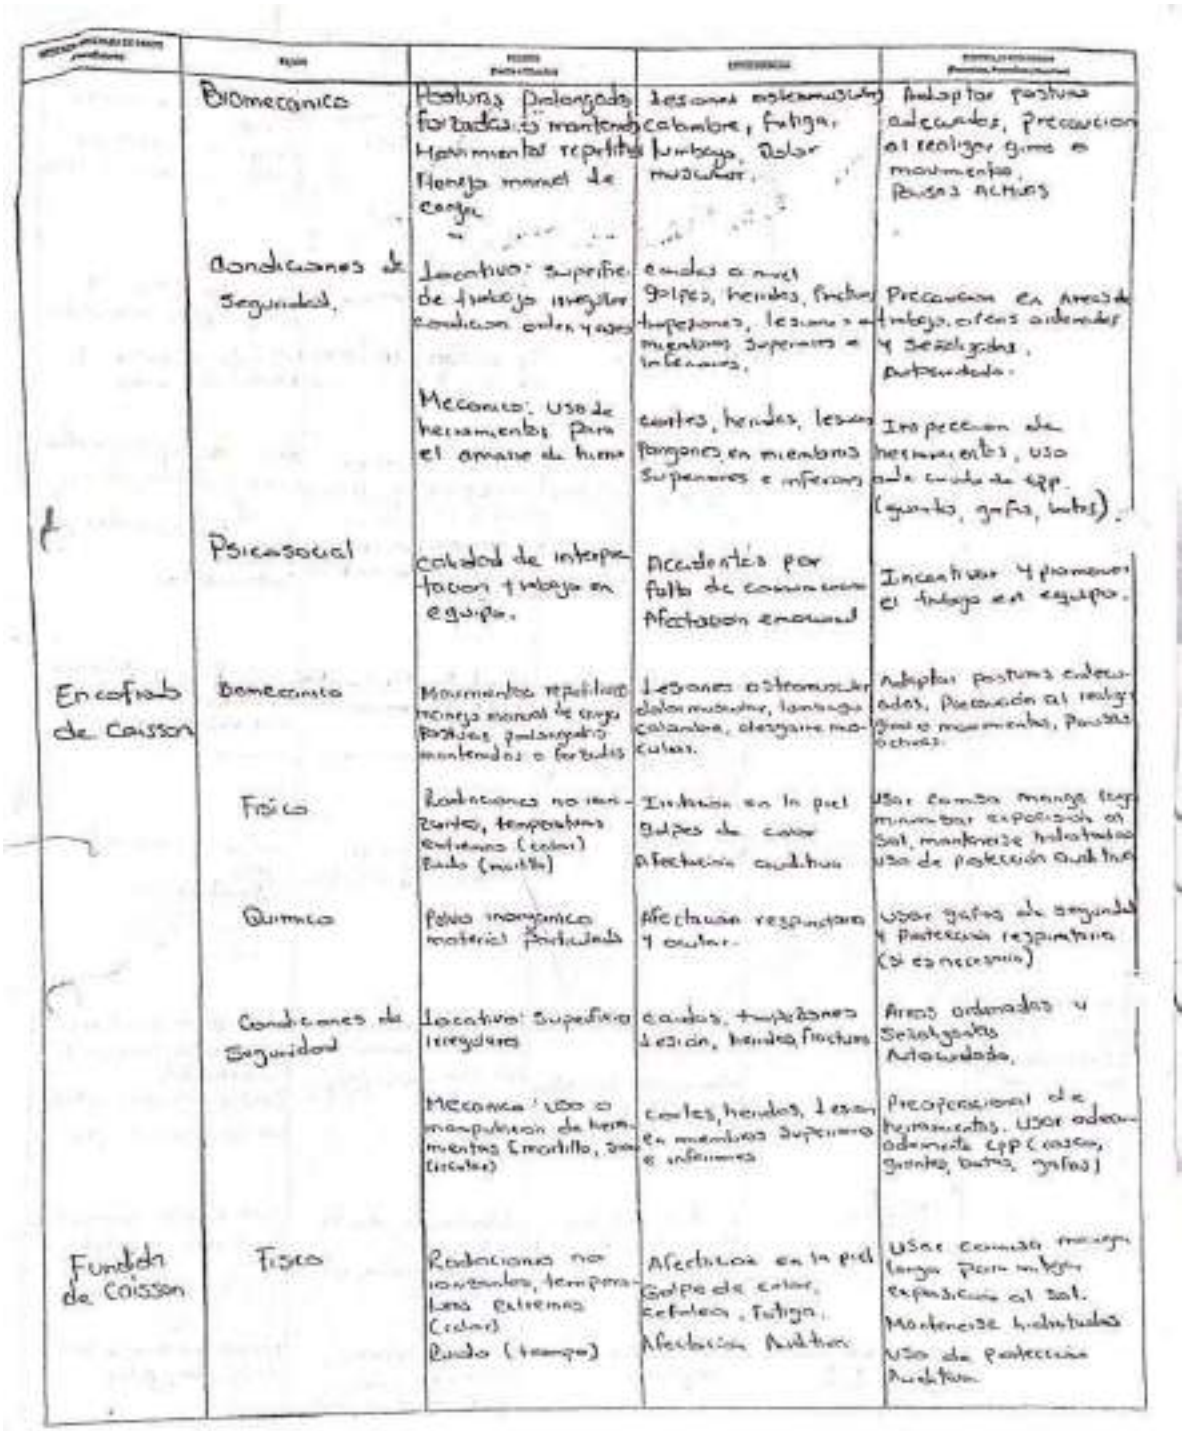


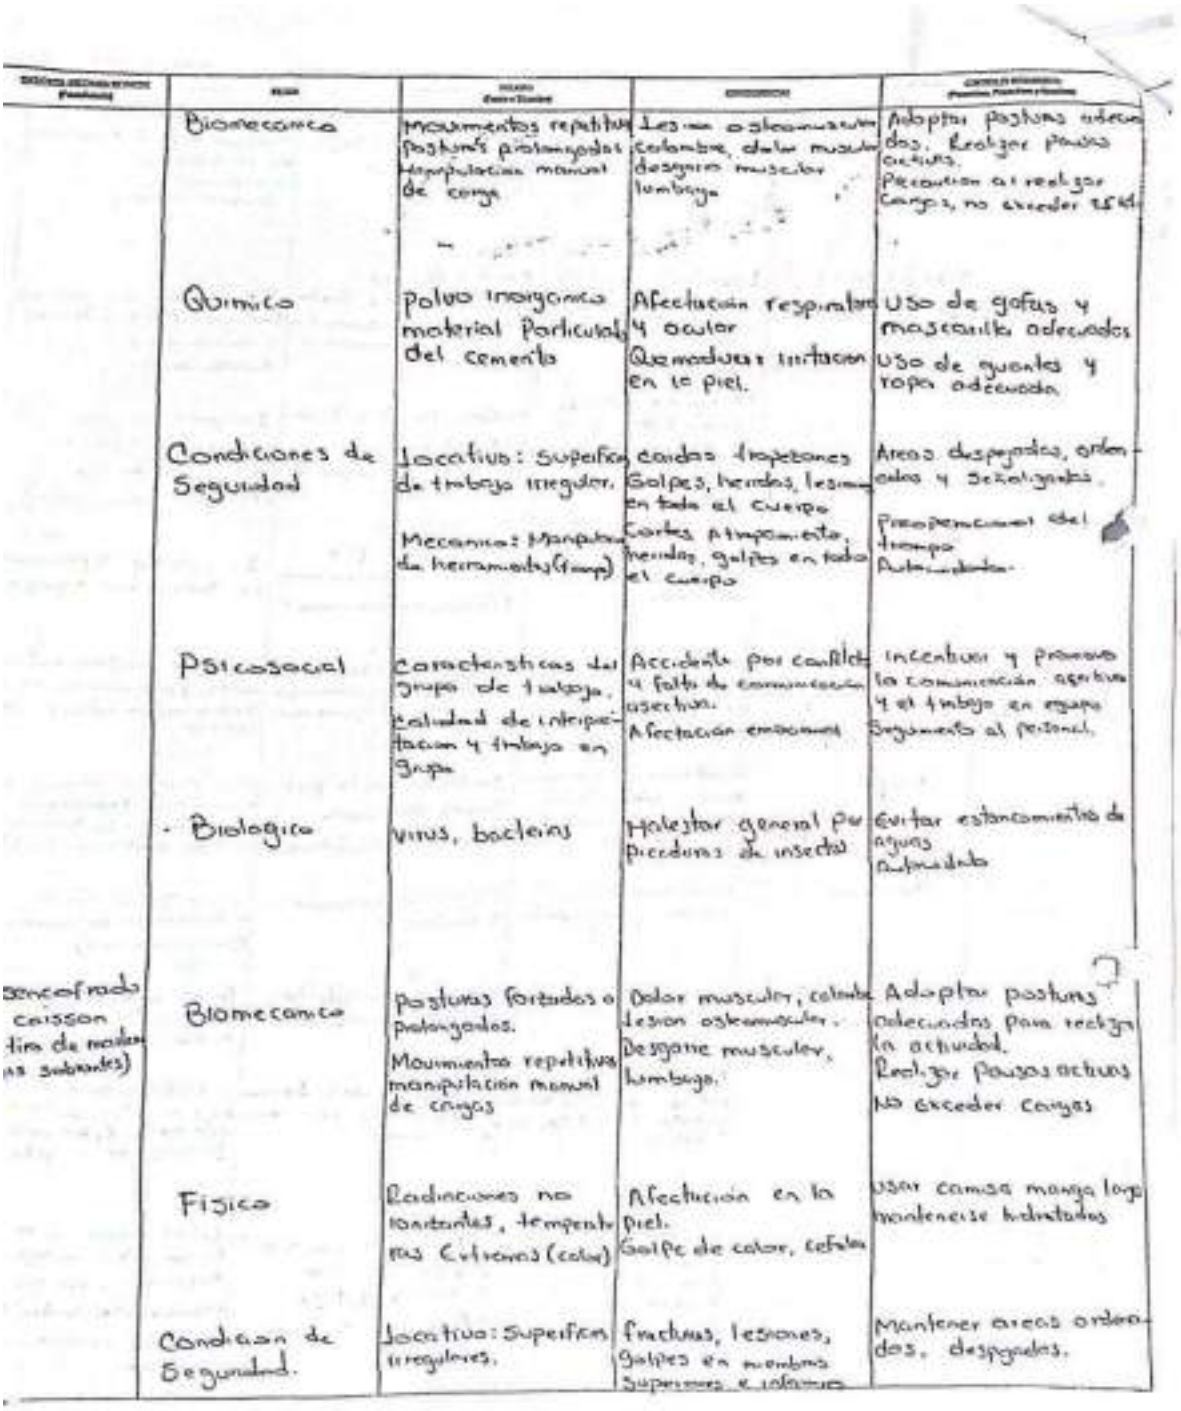



	Biomecanico	movimientos repetitivos, posturas prolongadas, manipulacion manual de cargas	Lesiones osteomusculares, calambres, dolor muscular, desgarros musculares, lumbagos	Adoptar posturas adecuadas. Realizar pausas activas. Precaucion al realizar cargas, no exceder 25kg
	Quimico	Polvo inorganico material particulado del cemento	Afectacion respiratoria y ocular. Quemaduras irritacion en la piel.	Uso de gafas y mascarilla adecuados. Uso de guantes y ropa adecuada.
	Condiciones de Seguridad	locativo: superficies de trabajo irregular. Mecanico: Manipulacion de herramientas (rampa)	caidas diferentes, Golpes, heridas, lesiones en todo el cuerpo. Cortes, atrapamiento, heridas, golpes en todo el cuerpo	Areas despejadas, ordenadas y señalizadas. Precauciones del trabajo. Autocuidado.
	Psicosocial	Caracteristicas del grupo de trabajo. Calidad de interpretacion y trabajo en grupo	Accidente por conflicto y falta de comunicacion asertiva. Afectacion emocional	Incentivar y promover la comunicacion asertiva y el trabajo en equipo. Seguimiento al personal.
	- Biologico	Virus, bacterias	Malestar general por picaduras de insectos	Evitar estancamiento de aguas. Autocuidado.
encofrado caisson tira de madera as salientes)	Biomecanico	Posturas forzadas o prolongadas. Movimientos repetitivos manipulacion manual de cargas	Dolor muscular, calambres, lesion osteomuscular. Desgarro muscular, lumbago.	Adoptar posturas adecuadas para realizar la actividad. Realizar pausas activas. No exceder cargas
	Fisico	Radiaciones no ionizantes, temperaturas extremas (calor)	Afectacion en la piel. Golpe de calor, cefalea	Usar camisa manga larga. Mantenerse hidratados
	Condicion de Seguridad.	locativo: Superficies irregulares.	Fracturas, lesiones, golpes en miembros superiores e inferiores	Mantener areas ordenadas, despejadas.

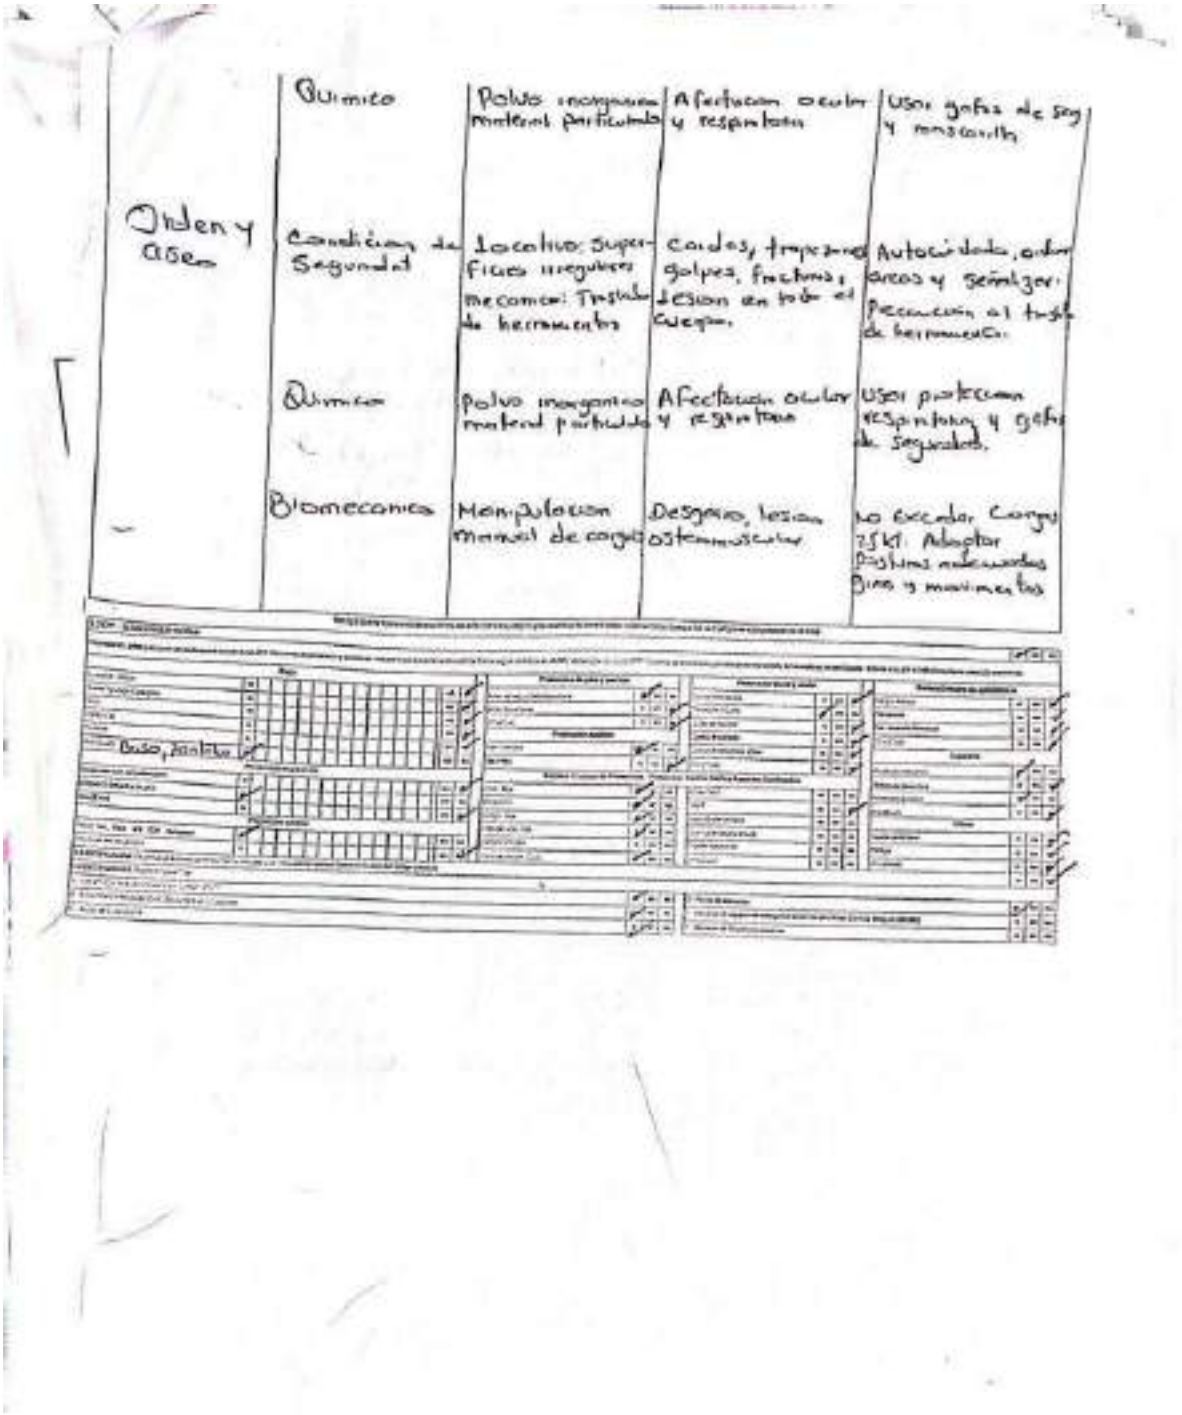

Químico
Polvo inorgánico material particulado
Afectación ocular y respiratoria
Uso gafas de seg y mascarilla
Orden y aseo
Condiciones de Seguridad
Locativo: Superficies irregulares
mecanico: Traslado de herramientas
caidas, tropezones golpes, fracturas, lesion en todo el cuerpo.
Autocuidado, orden aseo y señalizar.
Precaución al trasl de herramienta.
Química
Polvo inorgánico material particulado
Afectación ocular y respiratoria
Uso protección respiratoria y gafas de seguridad.
Biomecanica
Manipulacion manual de cargas
Desgarro, lesion osteomuscular
no excedar. Cargas 25 kl. Adoptar posturas adecuadas Pausas y movimientos

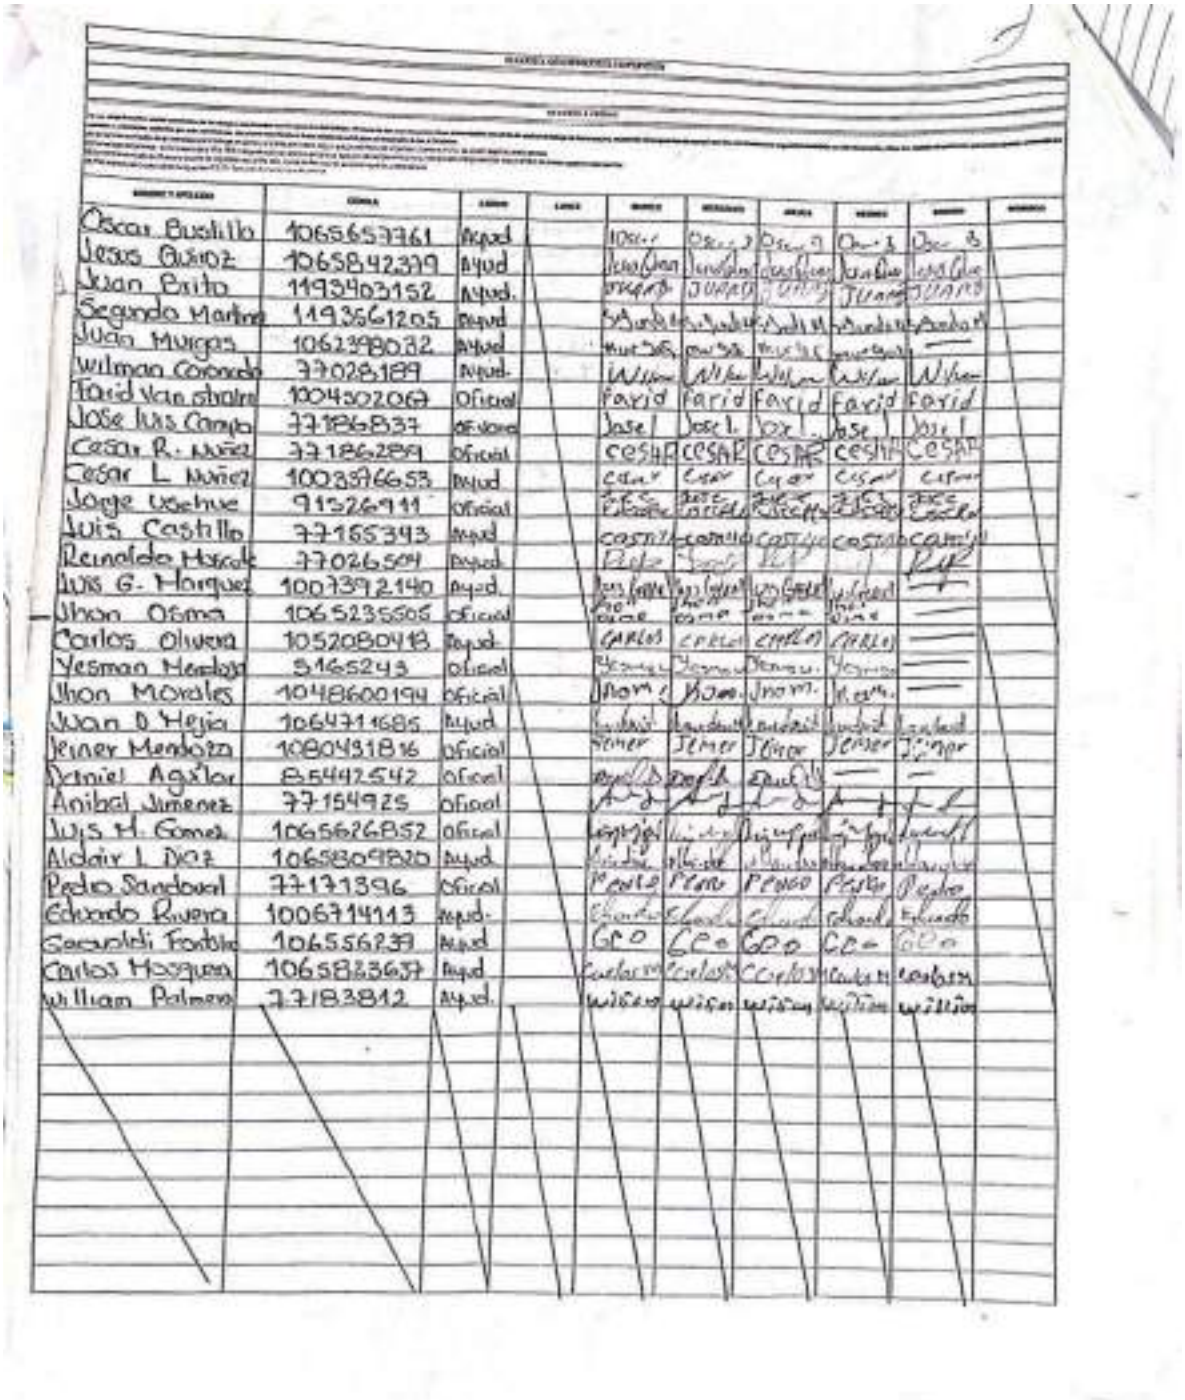

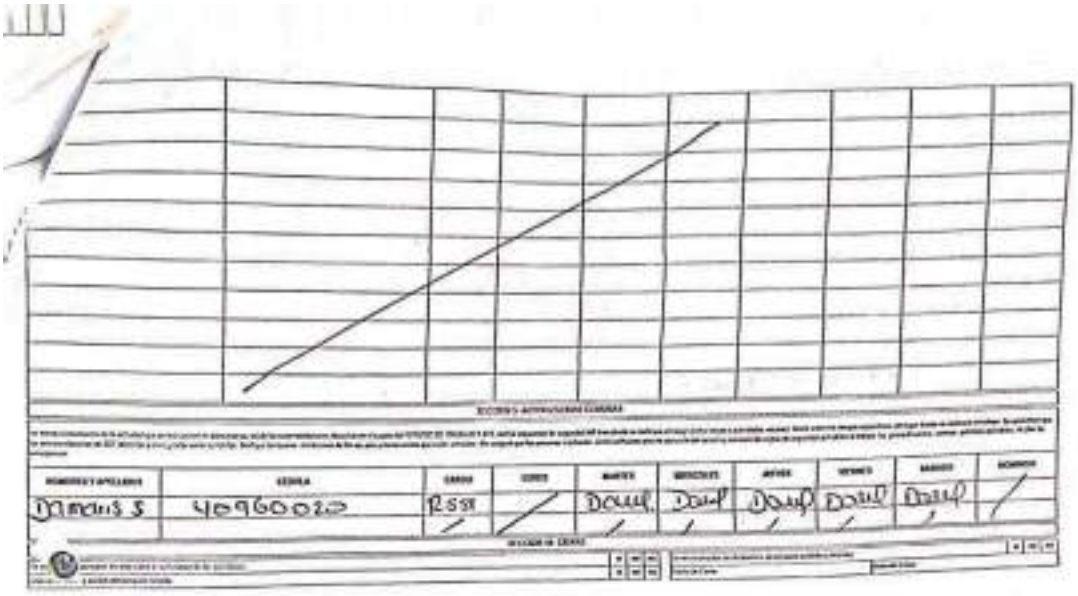

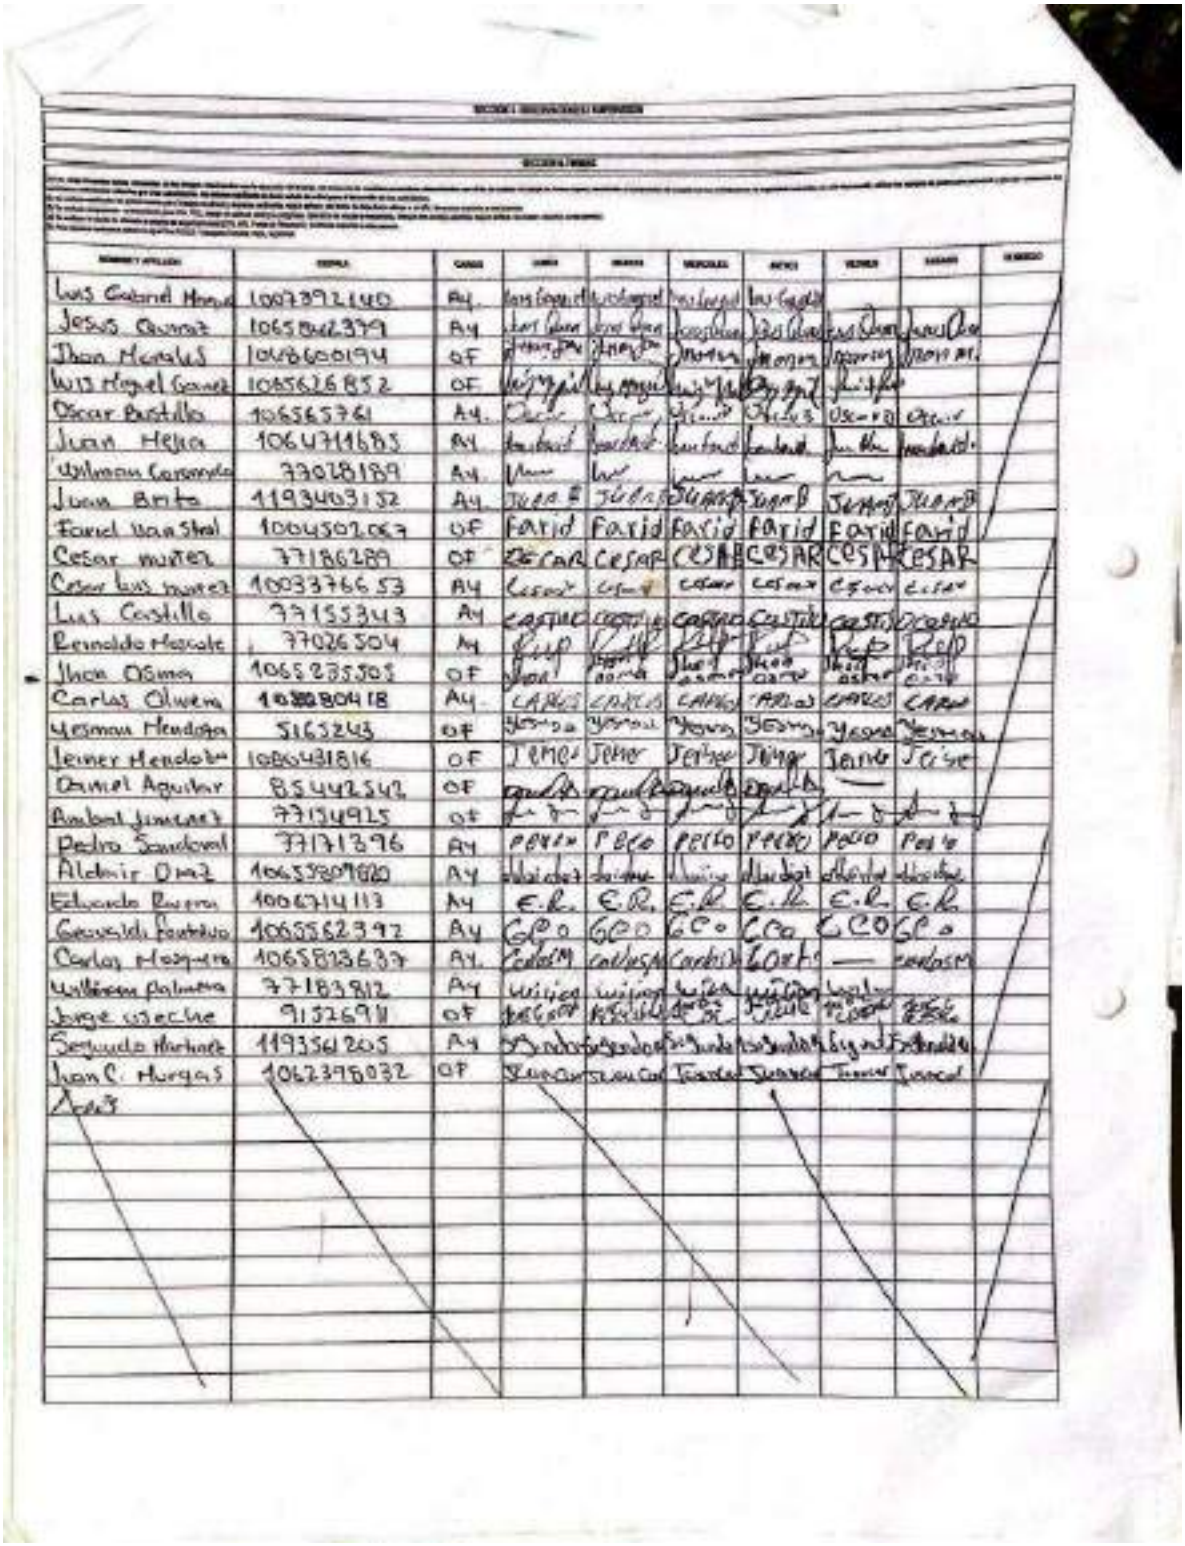

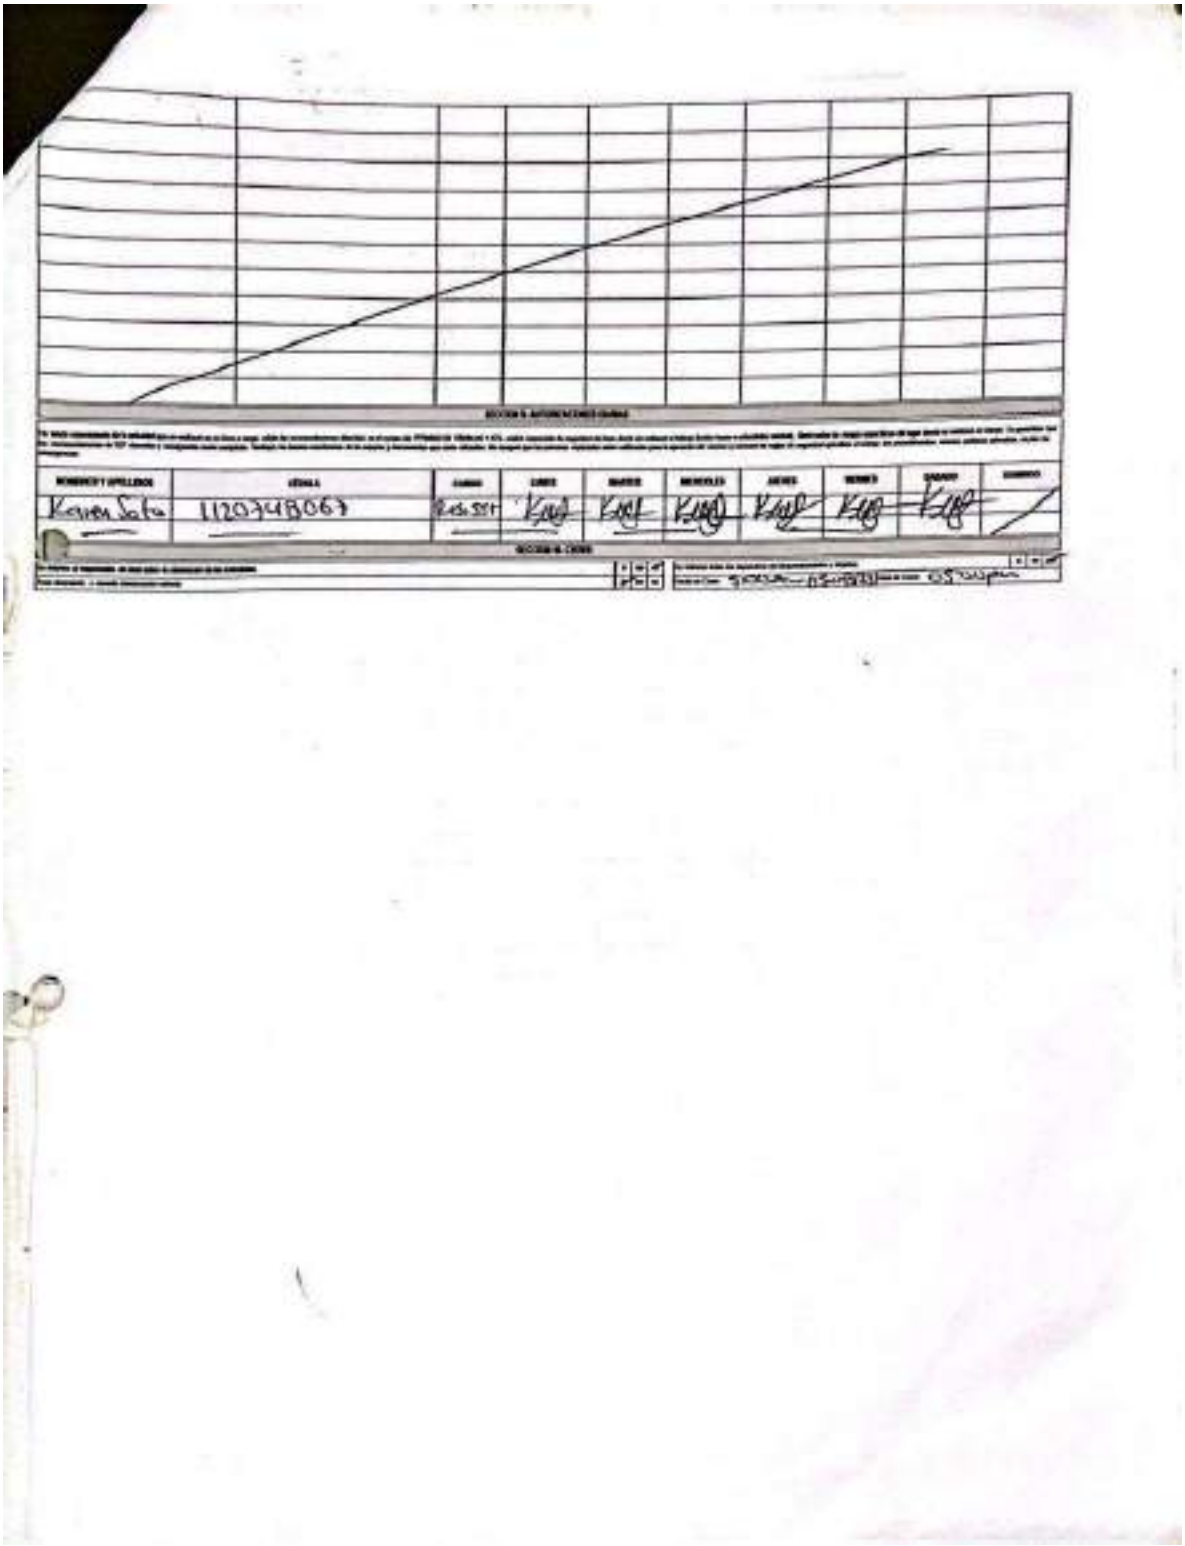


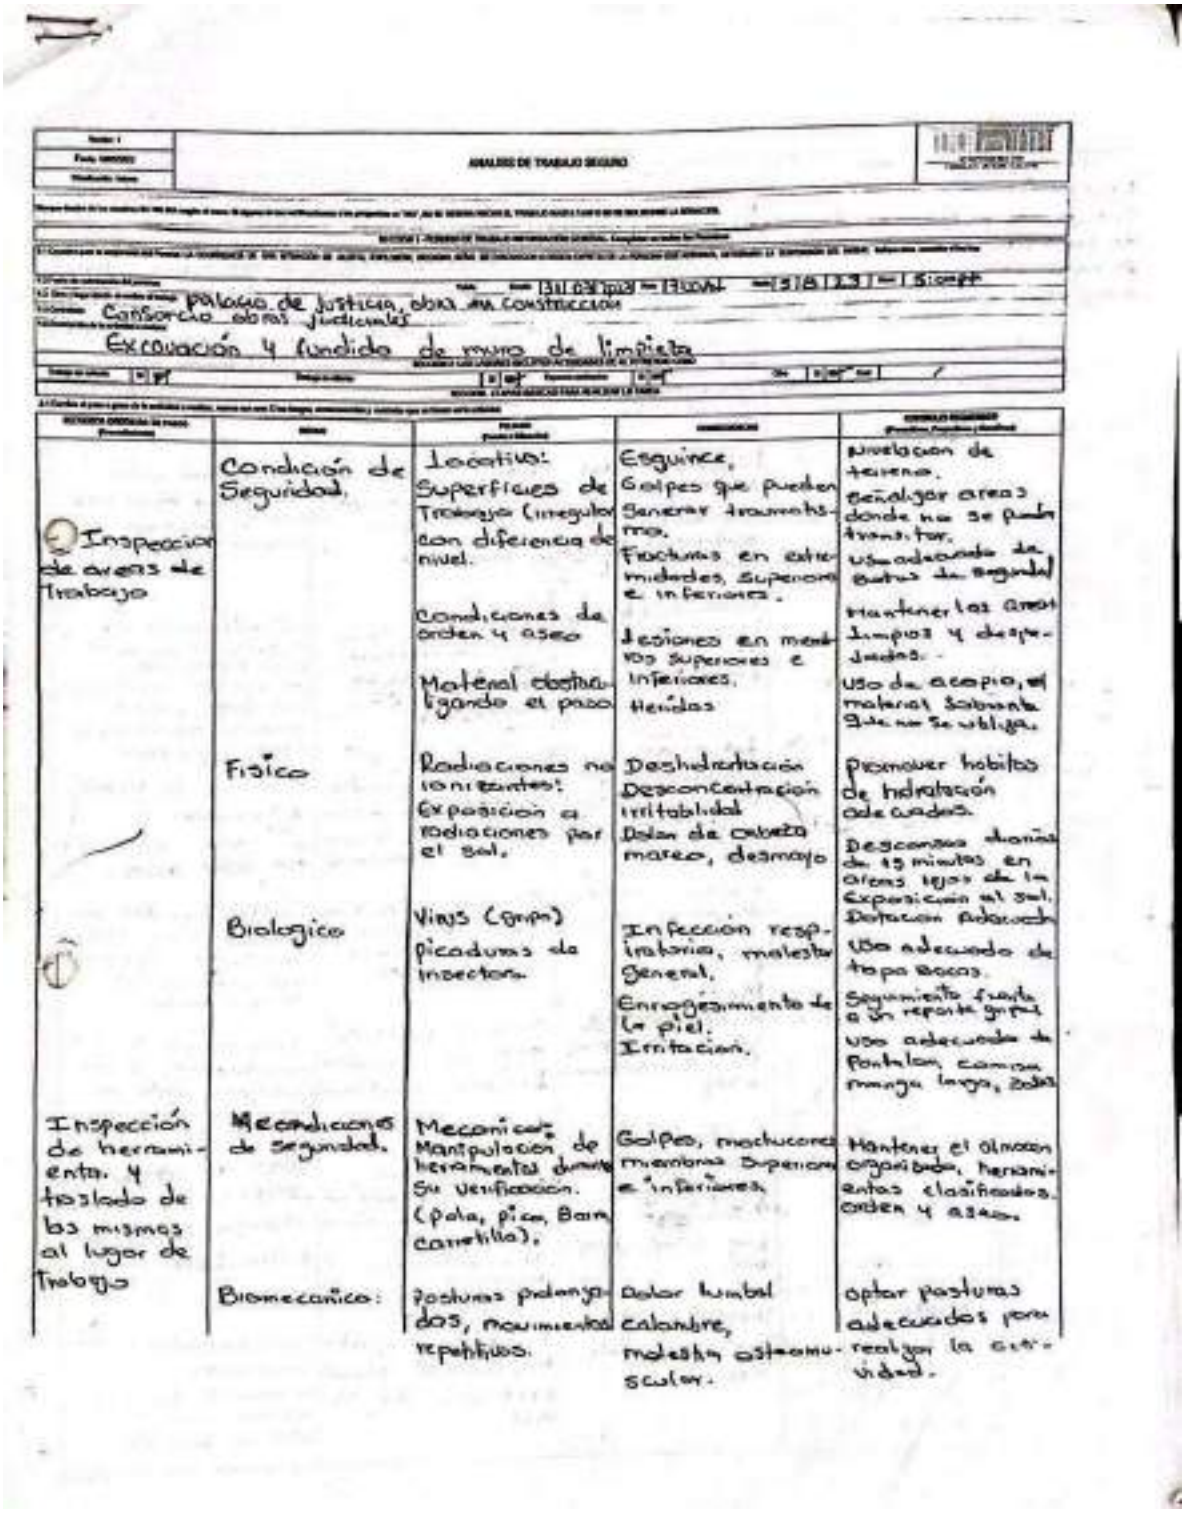


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Palacio de Justicia, obra en construcción
Consorcio obras judiciales
Excavación y fundido de muro de limpieza

Inspección de áreas de Trabajo	Condición de Seguridad.	Locativo: Superficies de Trabajo (irregulares con diferencia de nivel.	Esguince, Golpes que pueden generar traumatismo. Fracturas en extremidades, superiores e inferiores.	Delimitación de terreno. Señalizar áreas donde no se puede transitar. Uso adecuado de botas de seguridad
		Condiciones de orden y aseo	Lesiones en miembros superiores e inferiores. Heridas	Mantener las áreas limpias y despejadas.
		Material cortopunzante regado en el piso		Uso de acopio, el material cortopunzante que no se utilice.
	Físico	Radiaciones no ionizantes: Exposición a radiaciones por el sol.	Deshidratación Desconcentración Irritabilidad Dolor de cabeza mareo, desmayo	Promover hábitos de hidratación adecuados. Descansos durante de 15 minutos en áreas bajas de la exposición al sol. Detección adecuada
	Biologico	Virus (gripa) picaduras de insectos.	Infección respiratoria, malestar general. Enrojecimiento de la piel. Irritación.	Uso adecuado de tapa bocas. Seguimiento frente a un reporte gripal. Uso adecuado de Pantalon, camisa manga larga, botas
Inspección de herramienta y traslado de las mismas al lugar de Trabajo	Mecánicos de seguridad.	Mecánicos: Manipulación de herramientas durante su verificación. (pala, pica, Barra, carretilla).	Golpes, machucones miembros superiores e inferiores.	Mantener el almacen organizado, herramientas clasificadas, orden y aseo.
	Biomecánico:	Posturas prolongados, movimientos repetitivos.	Dolor lumbal calambre, molestia osteomuscular.	optar posturas adecuadas para realizar la actividad.

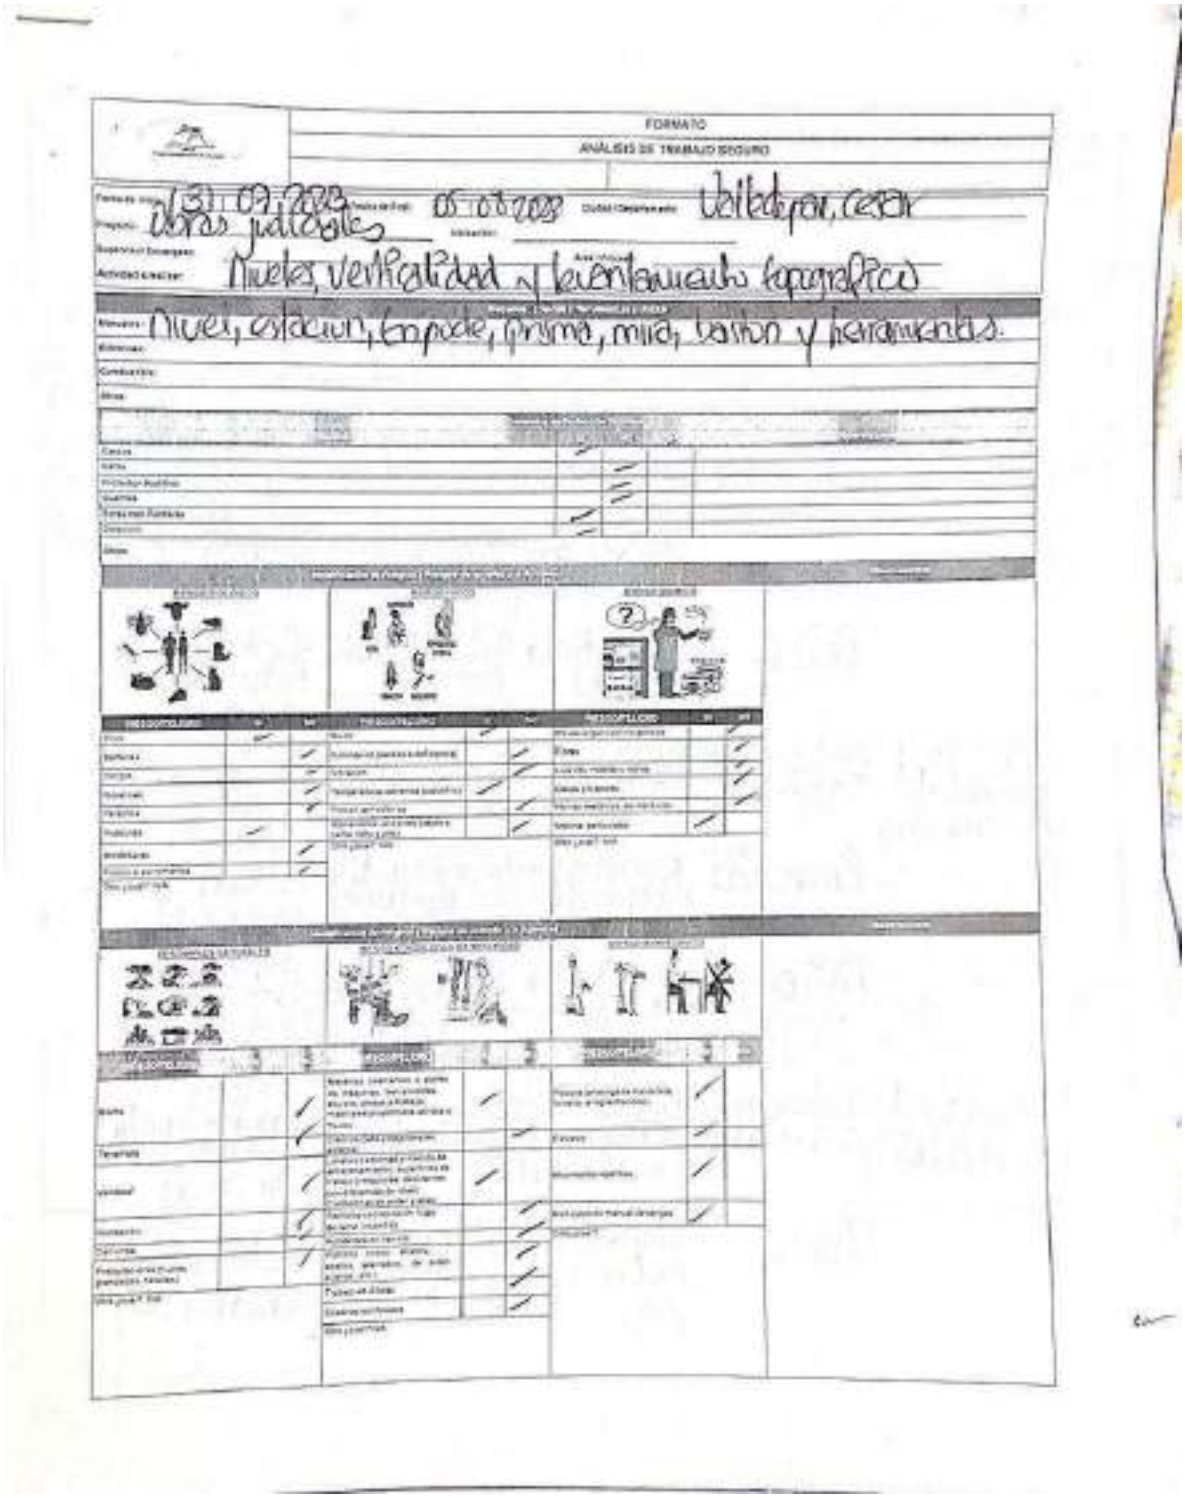
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Obras judiciales
Nivel, estación, trípode, prisma, mira, bastón y herramientas.

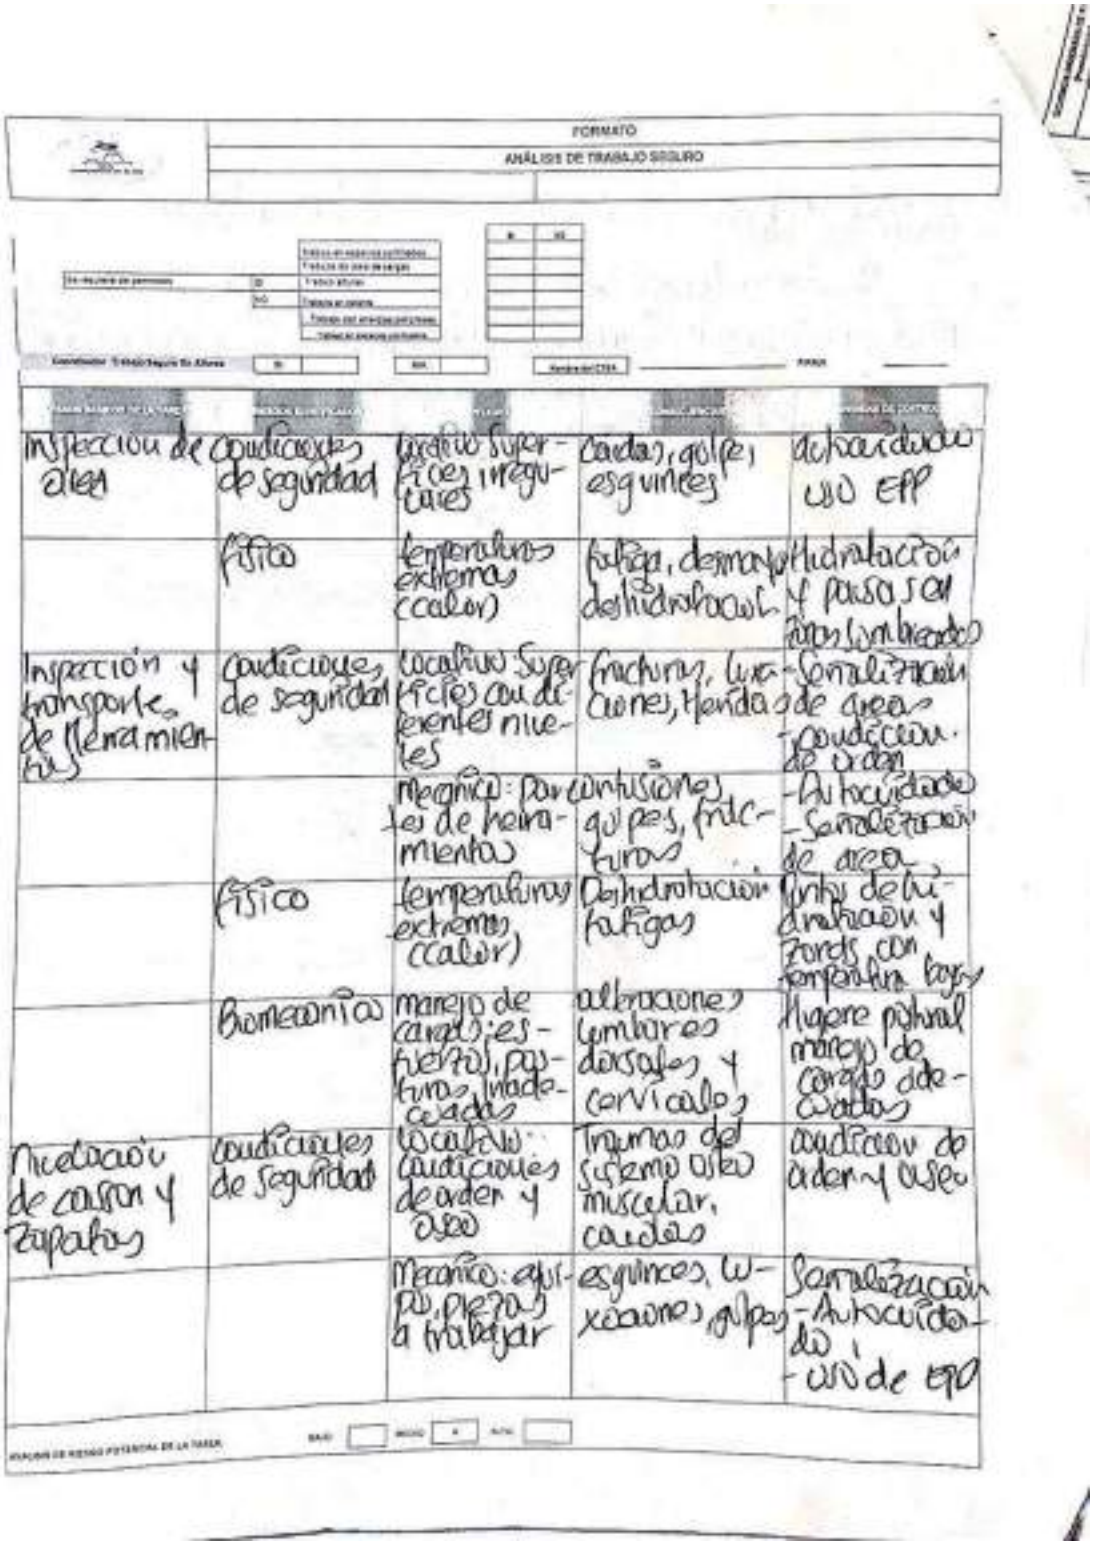


FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Inspección de área	Condiciones de seguridad	Objetos superficies irregulares	caídas, golpes, esguinces	dotación uso EPP
	Físico	temperaturas extremas (calor)	fatiga, deshidratación	hidratación y pausas activas
Inspección y transporte de herramientas	condiciones de seguridad	locativo superficies con diferentes niveles	fracturas, luxaciones, heridas	-Señalización de área -condiciones de orden
		Mecánico: por herramientas	contusiones, golpes, fracturas	-Autocuidado -Señalización de área
	Físico	temperaturas extremas (calor)	Deshidratación fatigas	Puntos de hidratación y pausas con temperaturas bajas
	Biomecánico	manejo de cargas; esfuerzos, postura inadecuada	alteraciones lumbares dorsales y cervicales	Higiene postural manejo de cargas adecuadas
Dotación de botas y zapatos	condiciones de seguridad	locativo: Condiciones de orden y aseo	Traumas del sistema oseo muscular, caídas	condiciones de orden y aseo
		Mecánico: equipo, piezas a trabajar	esguinces, luxaciones, golpes	Señalización -Autocuidado -uso de epp


VALORACIÓN DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA BAJO MEDIO ALTO

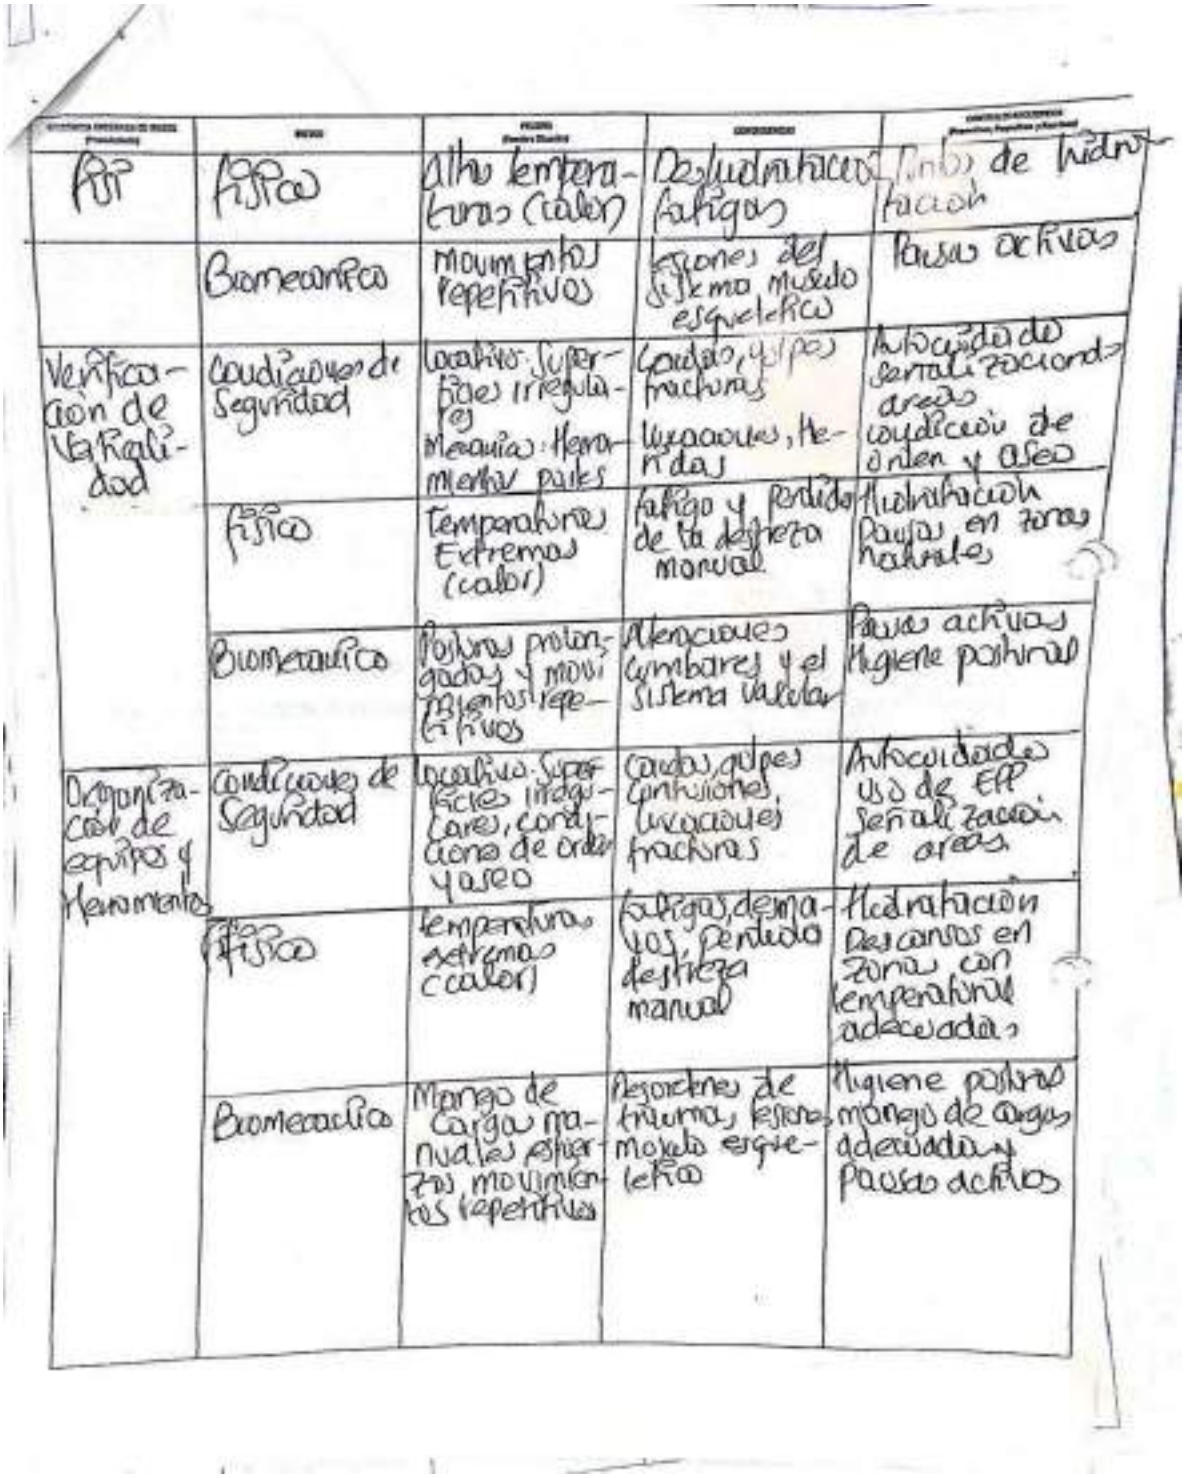

PST	Físico	Alta temperaturas (calor)	Deshidratación fatigas	Pausas de hidratación
	Biomecanica	Movimientos repetitivos	Lesiones del sistema muscular esqueletico	Pausas activas
Verificación de Validad	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares Mecanico: Herramientas	Caidas, golpes fracturas Lesiones, Heridas	Autocuidado señalización areas condiciones de orden y aseo
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Fatiga y perdida de la destreza manual	Hidratación Pausas en zonas habitadas
	Biomecanica	Posturas prolongadas y movimientos repetitivos	Afecciones lumbares y el sistema Valvular	Pausas activas Higiene postural
Demarcación de equipos y Herramientas	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares, condiciones de orden y aseo	Caidas, golpes contusiones, lesiones fracturas	Autocuidado uso de EPP señalización de areas
	Físico	Temperatura extremas (calor)	Fatigas, dermatosis, perdida destreza manual	Hidratación Descansos en zona con temperatura adecuadas
	Biomecanica	Manejo de Carga manuales esfuerzos movimientos repetitivos	Desordenes de trauma, lesiones musculo esqueletico	Higiene postural manejo de cargas adecuadas y pausas activas

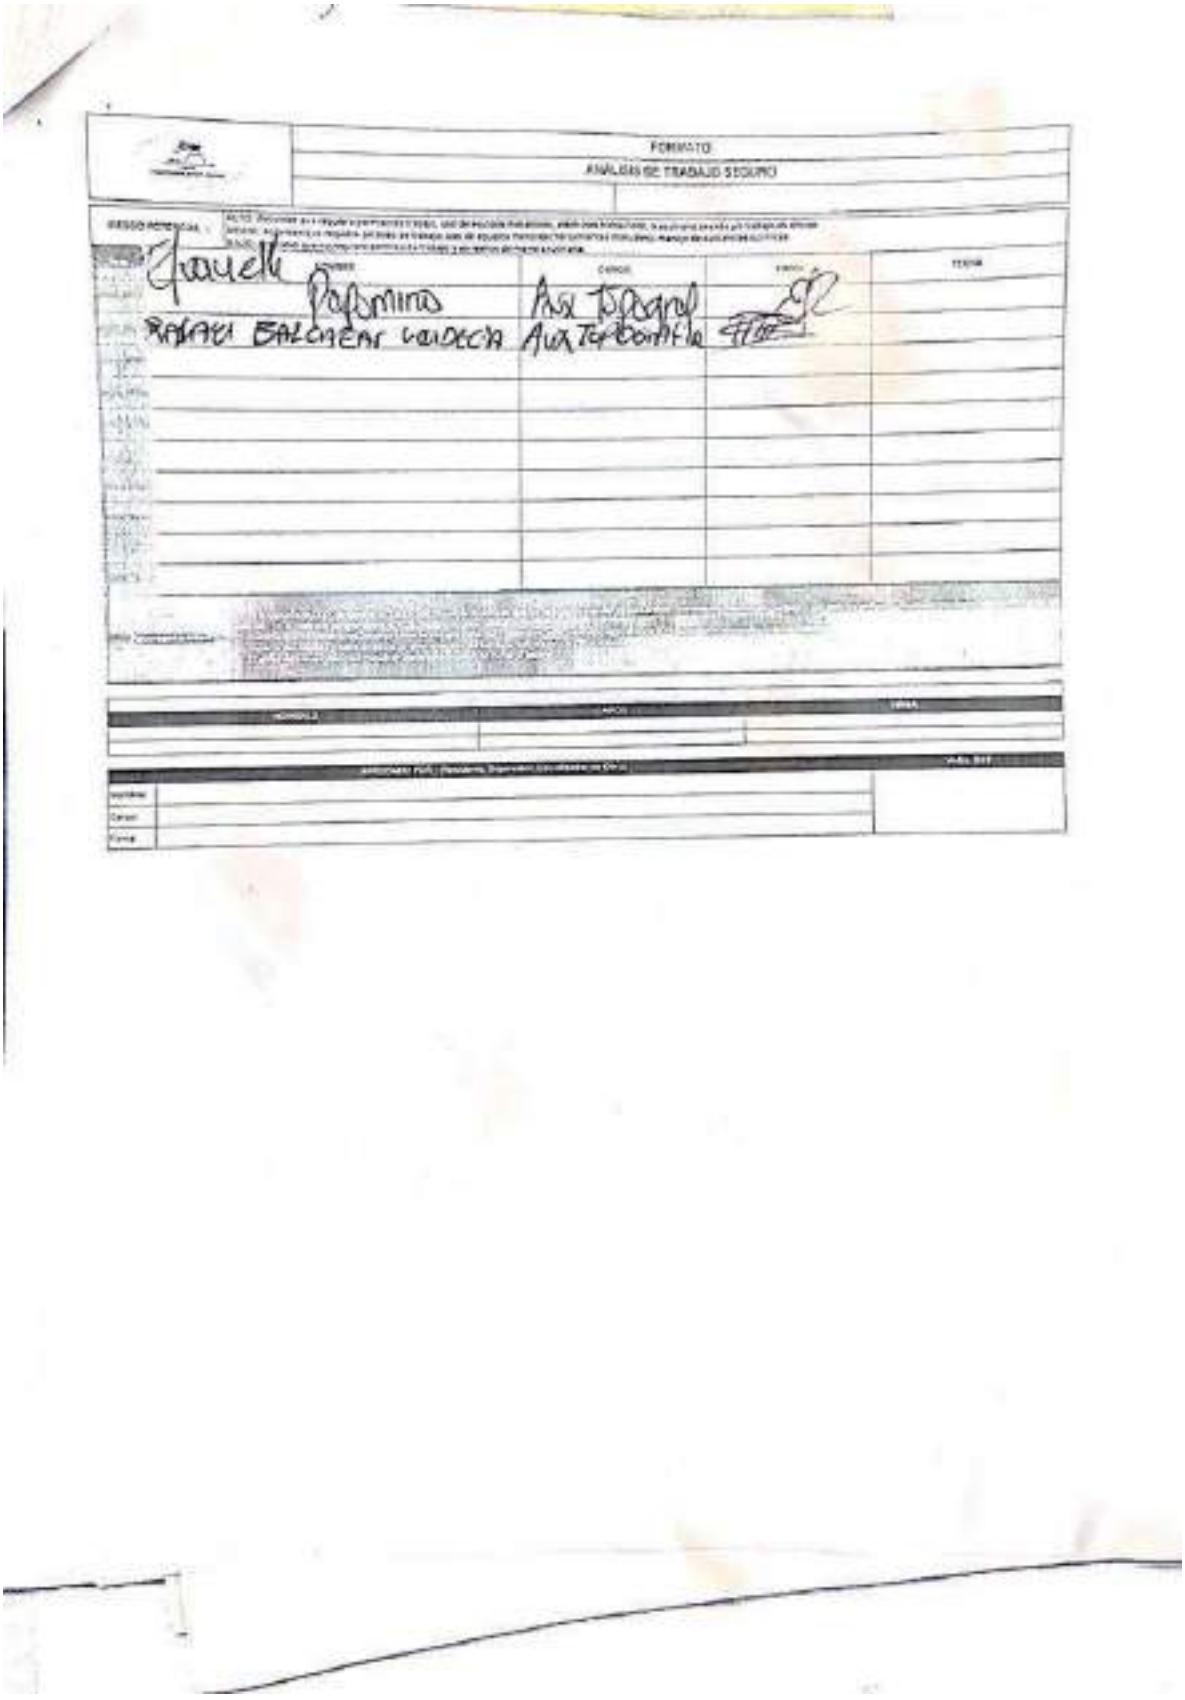
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Jaquelin Palomino
Aux Logistica
RAFAEL BALMEAR VALDECIA
Aux Tesorería

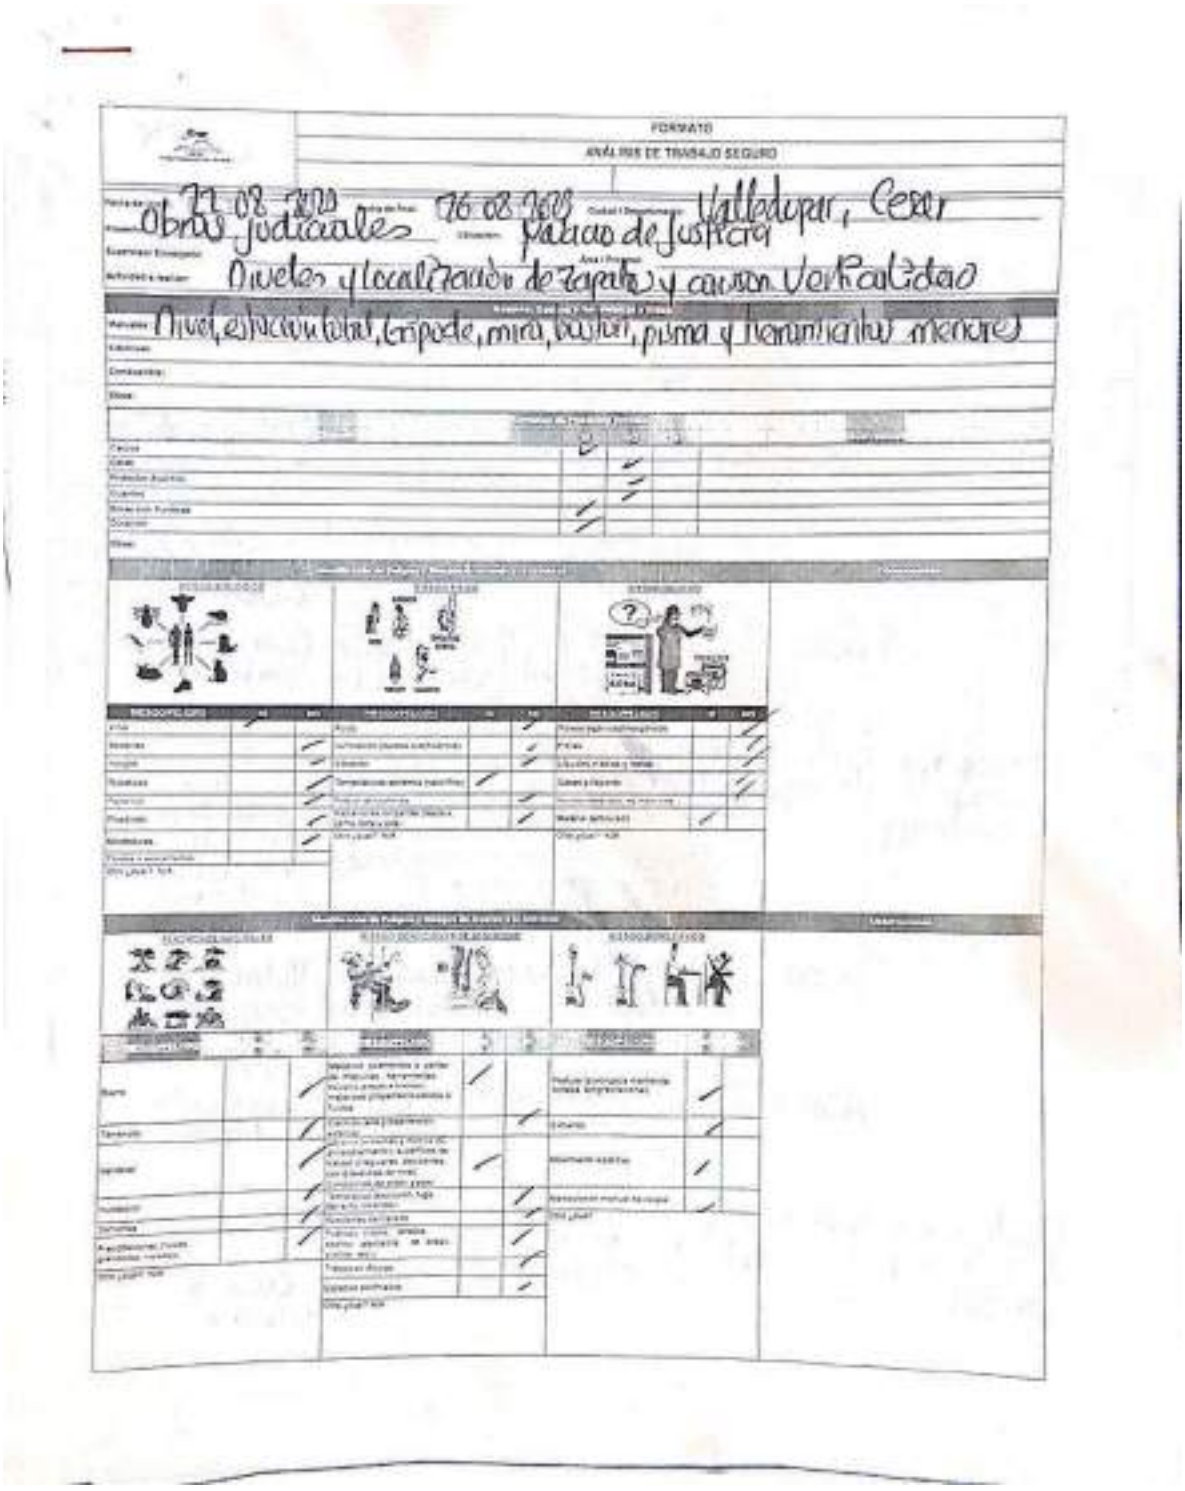

FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Obras judiciales
Palacio de Justicia
Valledupar, Cesar
Nivel, estación total, trípode, mira, bastón, pisma y herramienta menores

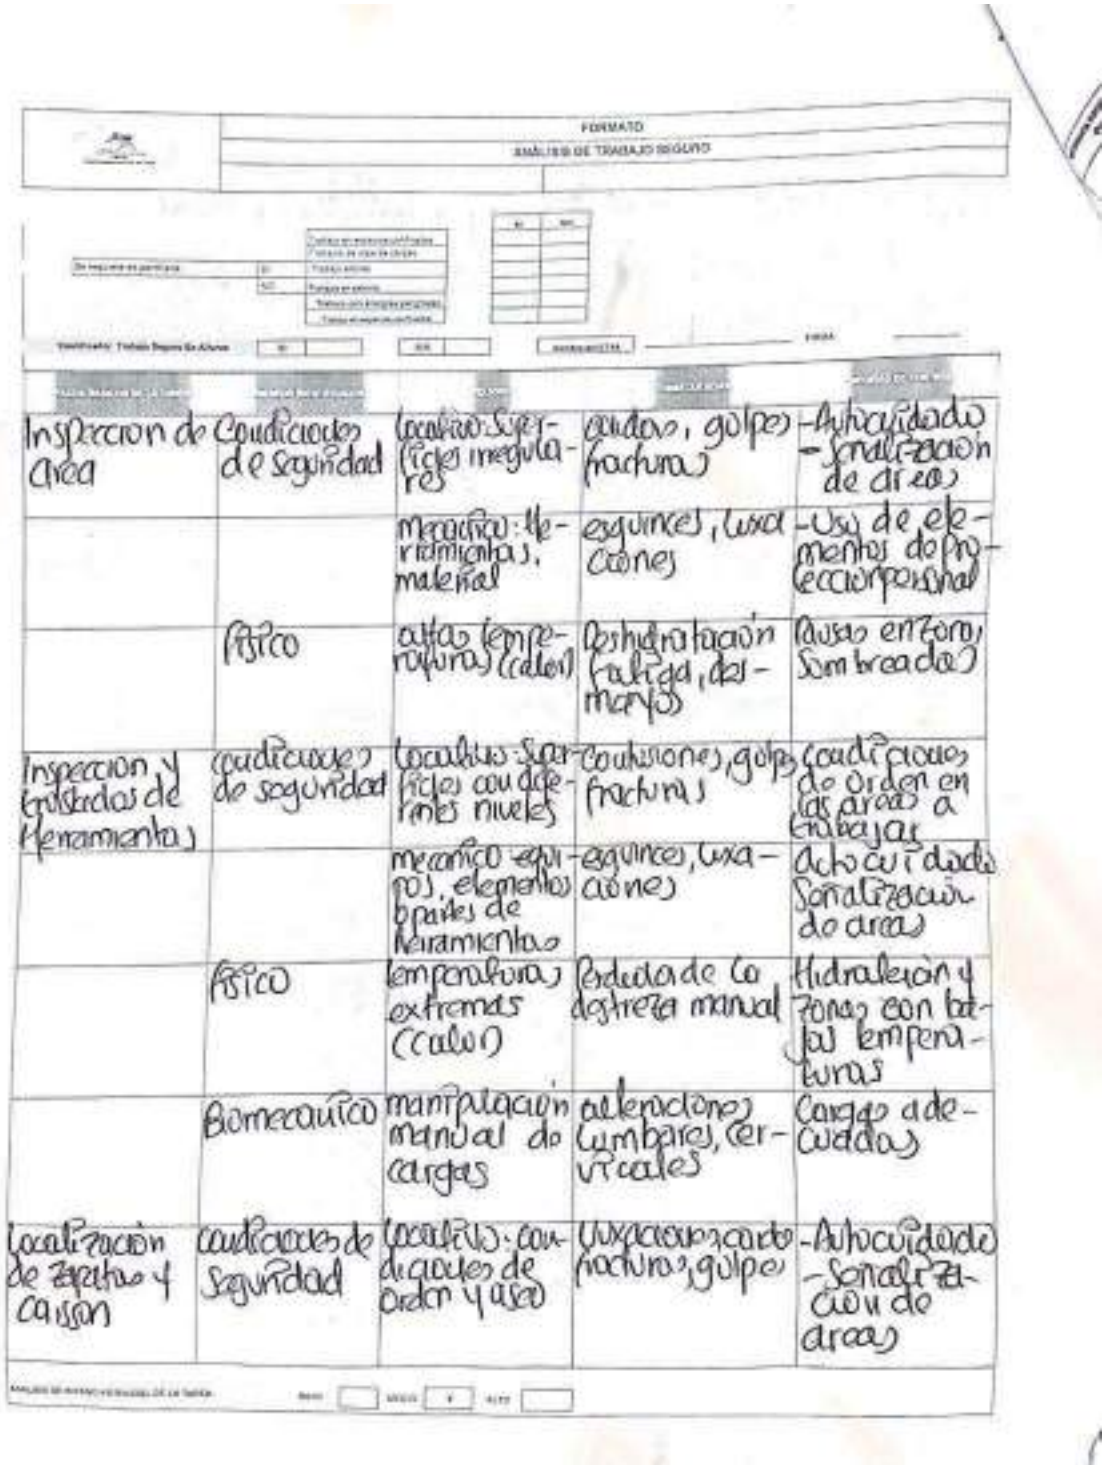


FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares	caídas, golpes, fractura	-Autocuidado -Señalización de área
		Mecánico: Herramientas, material	esguinces, luxaciones	-Uso de elementos de protección personal
	Físico	altas temperaturas (calor)	deshidratación fatiga, desmayos	Pausas activas, Sombreado
Inspección y entrega de Herramienta	condiciones de seguridad	locativo: Superficies con diferentes niveles	Colisiones, golpes, fracturas	Condiciones de orden en las áreas a trabajar
		mecánico equipos, elementos o partes de herramientas	esguinces, luxaciones	Actividades Señalización de áreas
	Físico	temperaturas extremas (calor)	Perdida de la destreza manual	Hidratación y zonas con baja temperaturas
	Biomecánico	manipulación manual de cargas	alteraciones lumbares, cervicales	Cargas adecuadas
Localización de zapatos y casco	condiciones de Seguridad	locativo: condiciones de orden y aseo	Luxaciones, golpes, fractura	-Autocuidado -Señalización de áreas

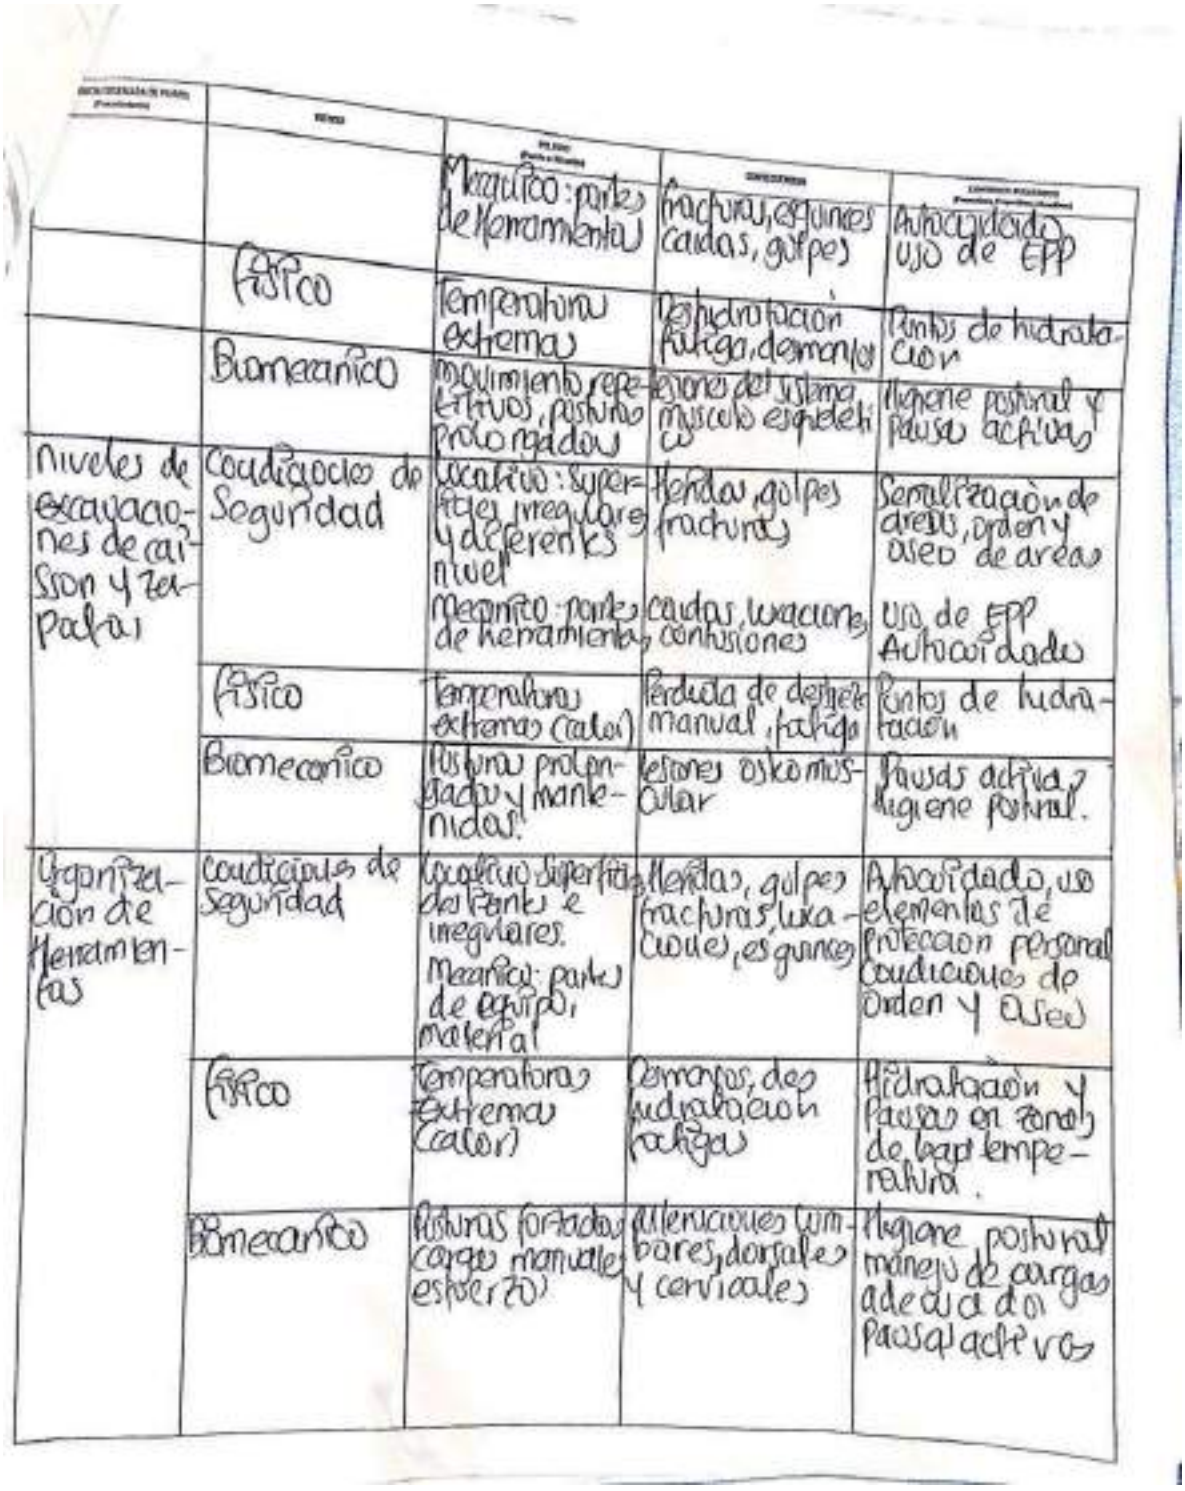

		Mecanico: parte de Herramienta	fracturas, esguinces caidas, golpes	Adecuado uso de EPP
	Fisico	Temperatura extrema	Deshidratacion fatiga, demanda	Puntos de hidratacion
	Biomecanico	movimiento repetitivos, posturas prolongadas	lesiones del sistema muscolo esqueletico	Higiene postural y pausa activa
Niveles de excavaciones de caisson y zapatas	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares y diferentes nivel Mecanico: parte de herramienta	Heridas, golpes fracturas caidas, lesiones, contusiones	Senalizacion de areas, orden y aseo de areas Uso de EPP Adecuados
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Perdida de destreza manual, fatiga	Puntos de hidratacion
	Biomecanico	Posturas prolongadas y manipuladas	lesiones osteomuscular	Pausas activas y higiene postural.
Organizacion de Herramientas	condiciones de Seguridad	Locativo superficies desparejas e irregulares. Mecanico: parte de equipo, material	Heridas, golpes fracturas, luxaciones, esguinces	Adecuado, uso elementos de proteccion personal Condiciones de Orden y Aseo
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Calambres, deshidratacion fatiga	Hidratacion y Pausas en zonas de bajas temperatura.
	Biomecanico	Posturas forzadas cargas manuales esfuerzo	Alteraciones lumbares, dorsales y cervicales	Higiene postural manejo de cargas adecuado pausas activas

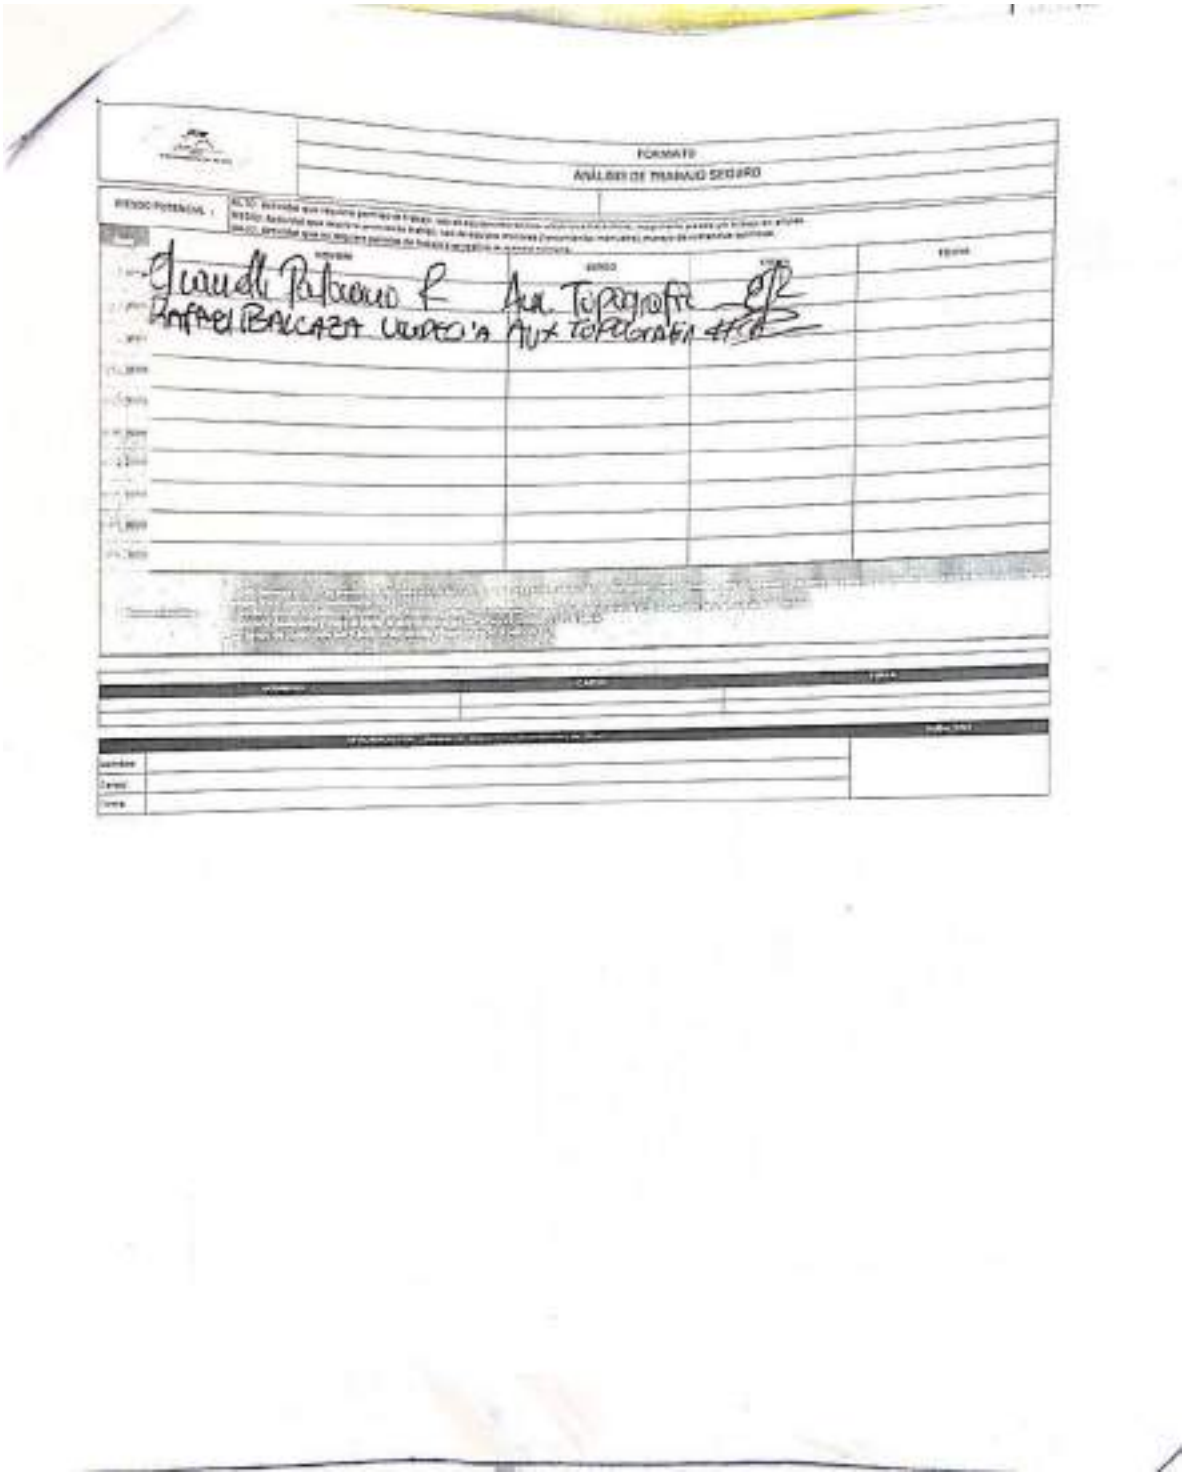

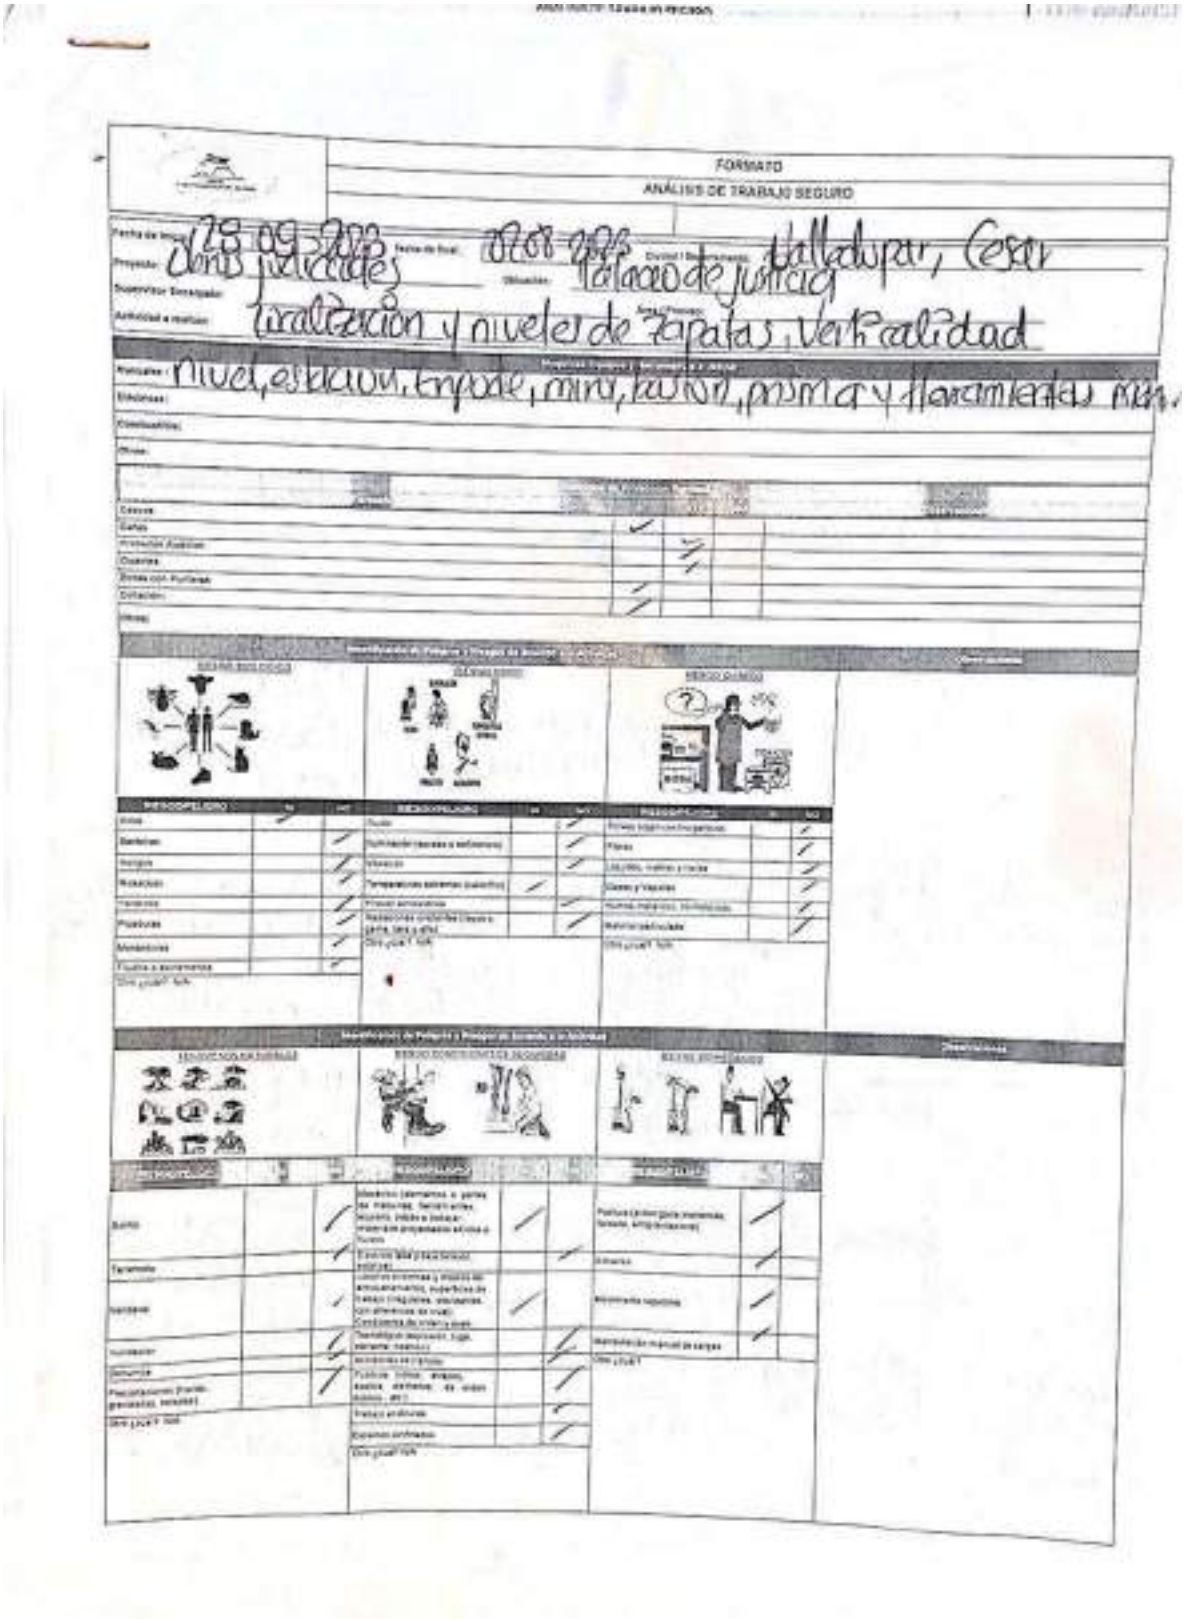

FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

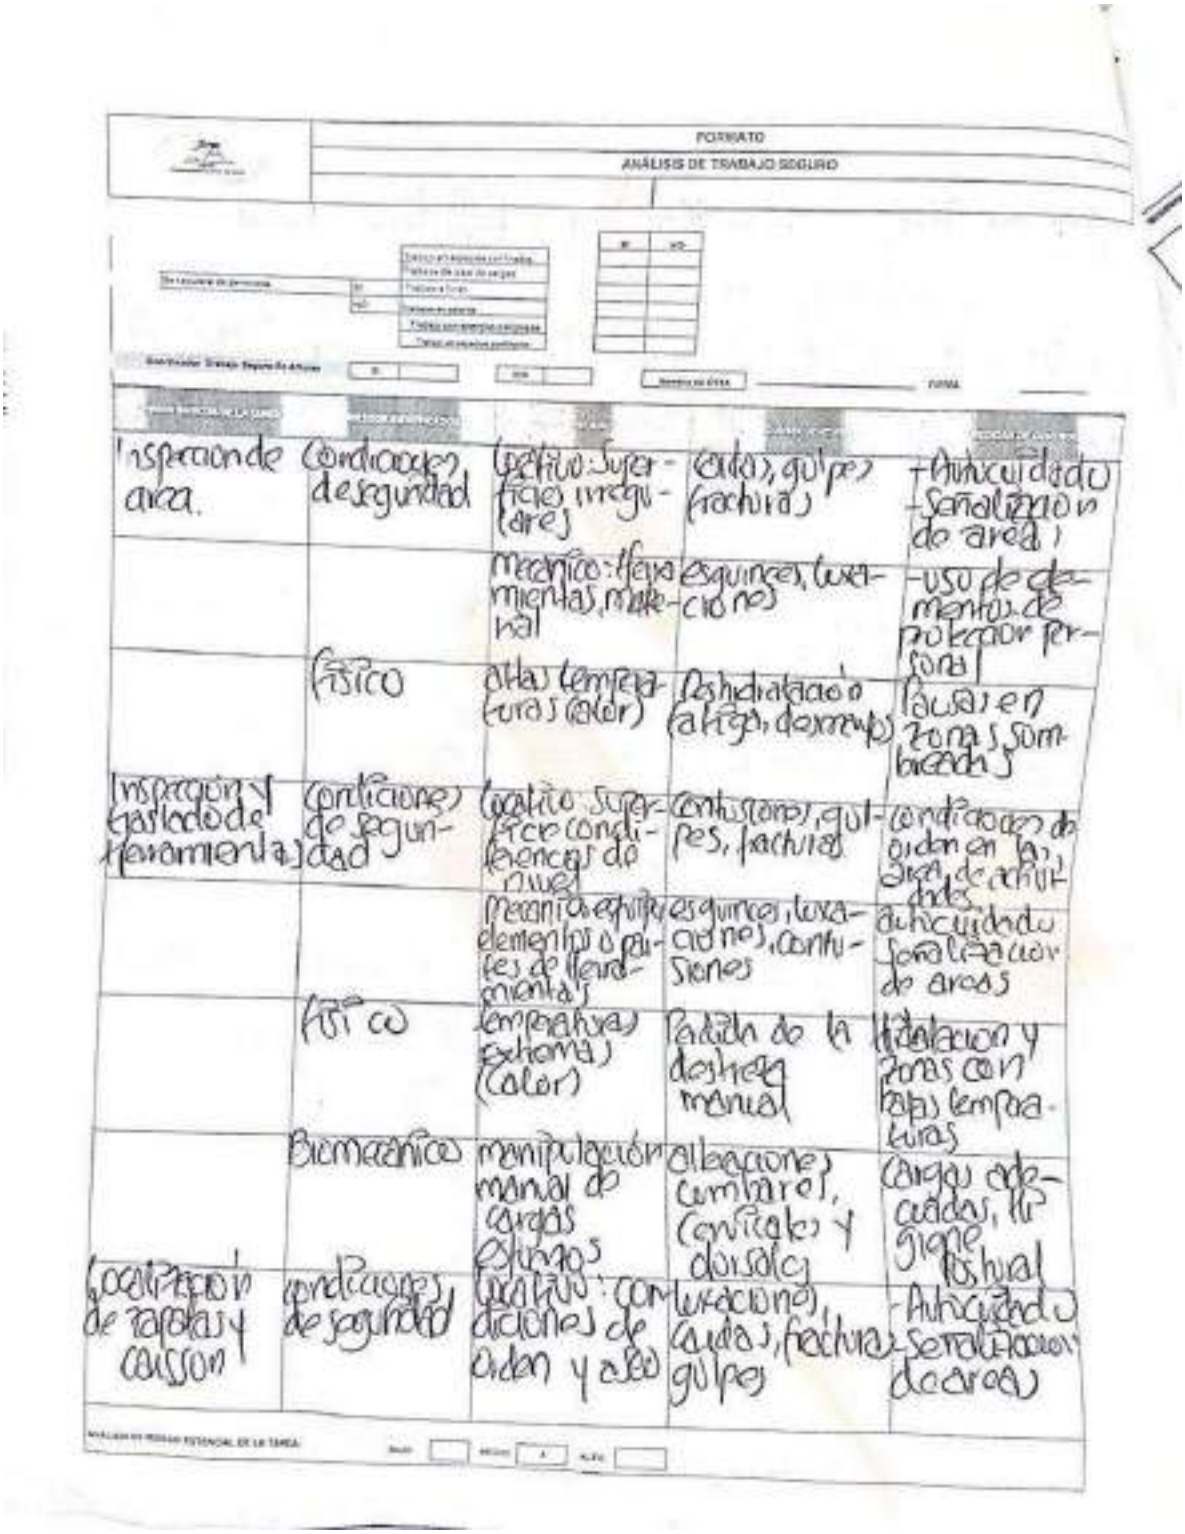


FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Inspección de área.	Condiciones de seguridad	Objetivo: Superficie irregular	Caídas, golpes (fracturas)	-Autocuidado -Señalización de área.
		Mecánico: Herramientas, Material	Esguinces, luxaciones	-Uso de elementos de protección personal
	Físico	Altas temperaturas (calor)	Deshidratación (fatiga, desmayo)	Pausas en zonas sombreadas
Inspección y estado de herramientas	Condiciones de seguridad	Objetivo: Superficie condiferencias de nivel	Contusiones, golpes, fracturas	Condiciones de orden en la área de actividades
		Mecánico: elementos o partes de herramientas	esguinces, luxaciones, contusiones	Autocuidado señalización de áreas
	Físico	temperaturas extremas (calor)	Pérdida de la destreza manual	Hidratación y zonas con bajas temperaturas
	Biomecánico	manipulación manual de cargas (pesadas)	alteraciones lumbares, cervicales y dorsales	Cargas adecuadas, higiene postural
Capacitación de tapetas y cuerpo	Condiciones de seguridad	Objetivo: Condiciones de orden y aseo	luxaciones, caídas, fracturas, golpes	-Autocuidado -Señalización de áreas

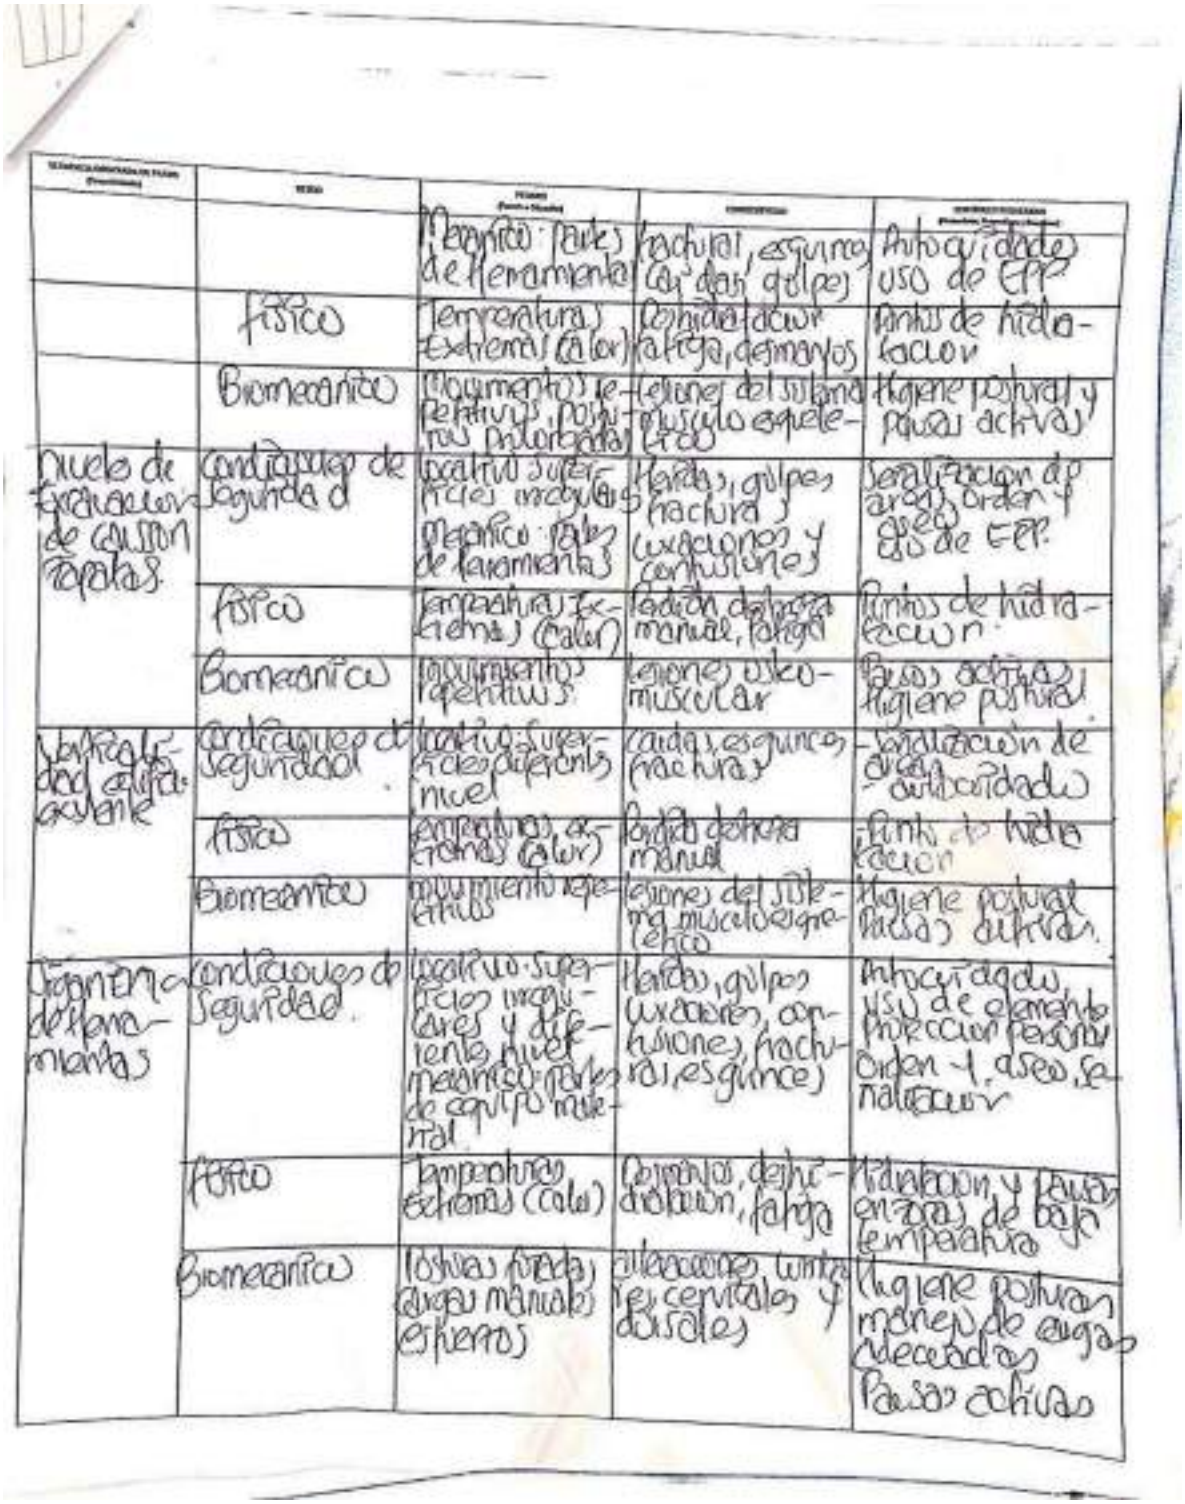

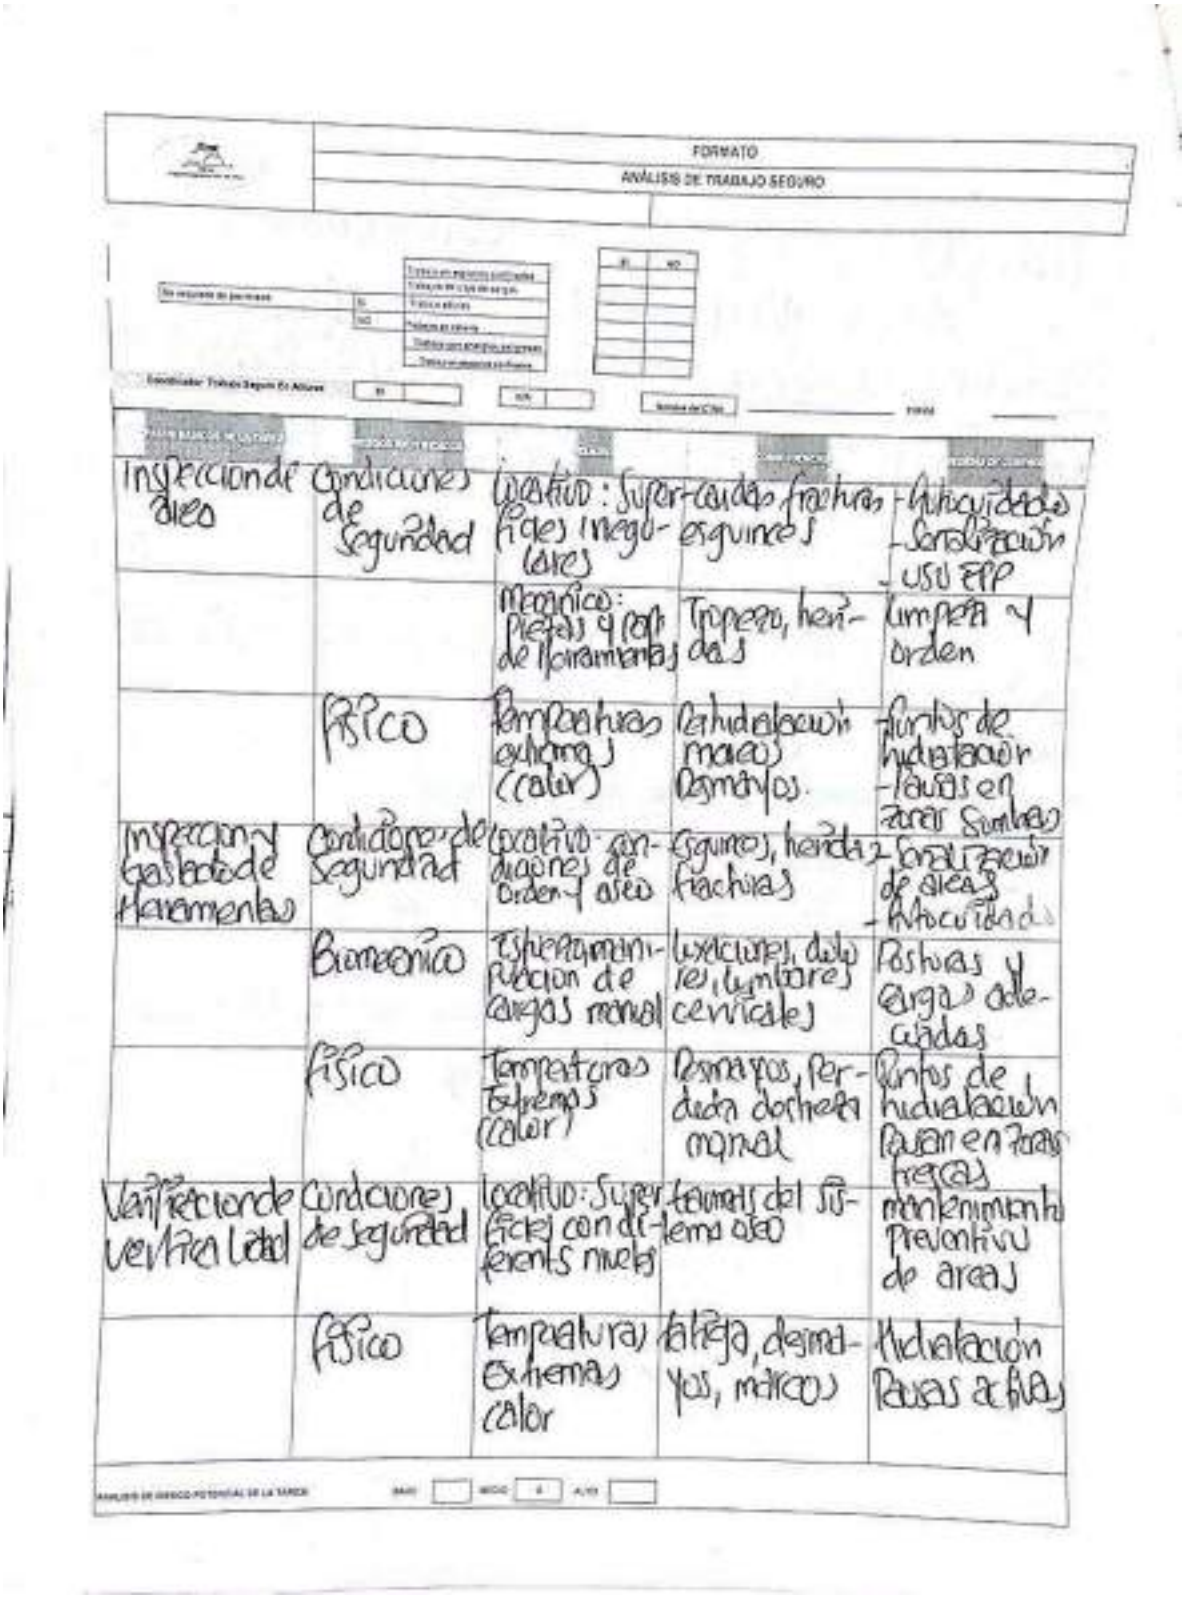


FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Inspección de áreas	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares	caídas, fracturas, esguinces	-Señalización -uso EPP
		Mecánico: Piezas y partes de herramientas	Tropezo, heridas	Limpieza y orden
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratación, mareos, Desmayos.	-puntos de hidratación -Pausas en zonas Sombras
Inspección y gestión de Herramientas	Condiciones de Seguridad	Locativo: condiciones de orden y aseo	Esguinces, heridas, fracturas	-Señalización de áreas -Autocuidado
	Biomecánico	Esfuerzo, manipulación de cargas manual	Luxaciones, dolores, lumbares cervicales	Posturas y cargas adecuadas
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Desmayos, Perdida de hidratación manual	Puntos de hidratación Pausas en zonas frescas
Verificación de vertical	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies con diferentes niveles	Caídas del mismo nivel	mantenimiento Preventivo de áreas
	Físico	Temperaturas Extremas calor	Deshidratación, desmayos, mareos	Hidratación Pausas activas


ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA: BAJO [ ] MEDIO [X] ALTO [ ]

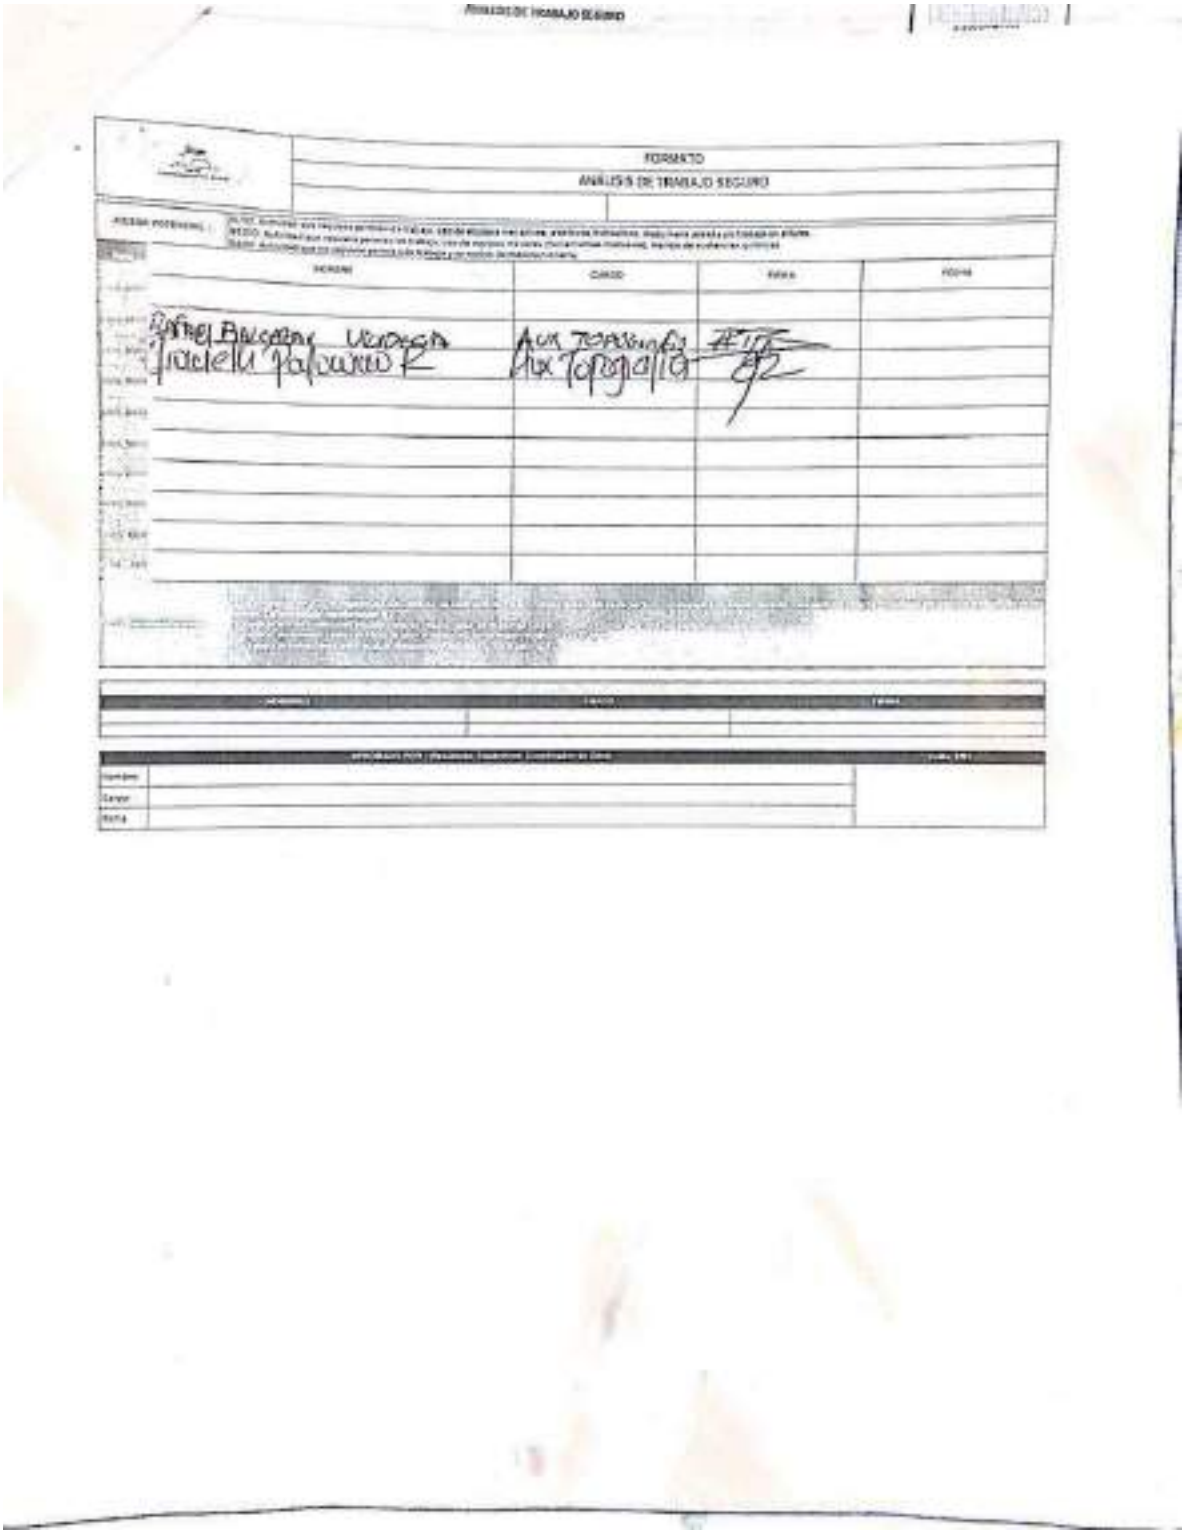

FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

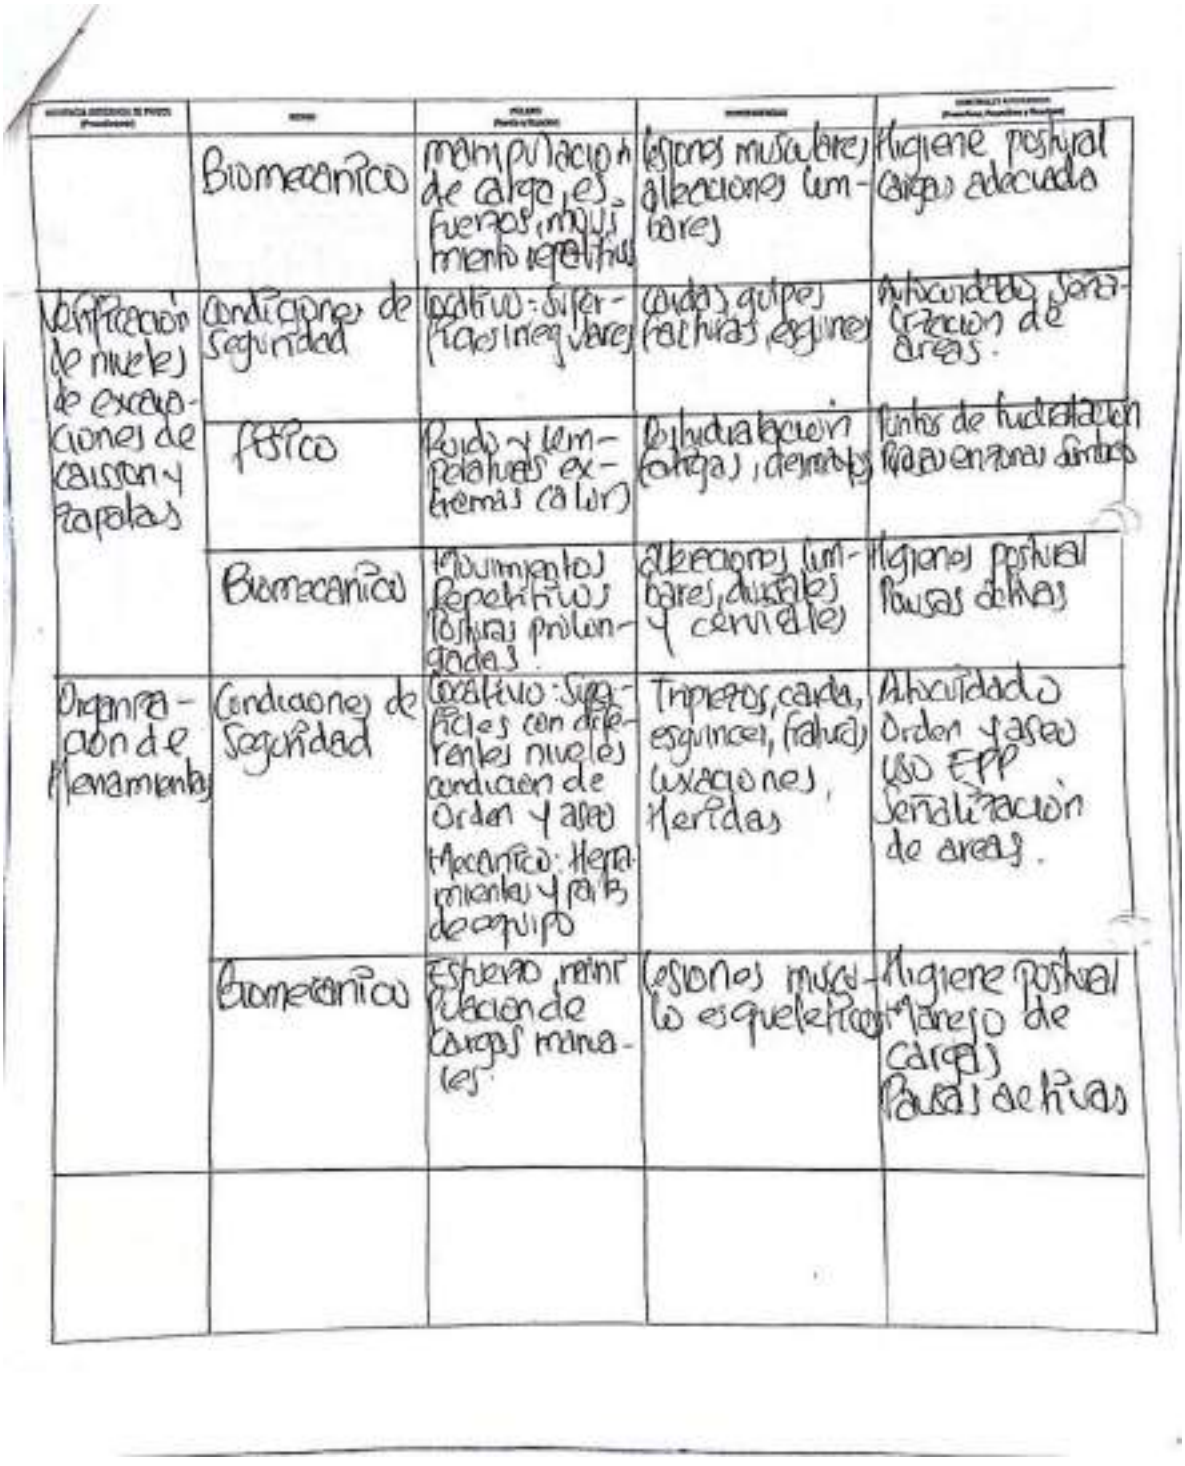


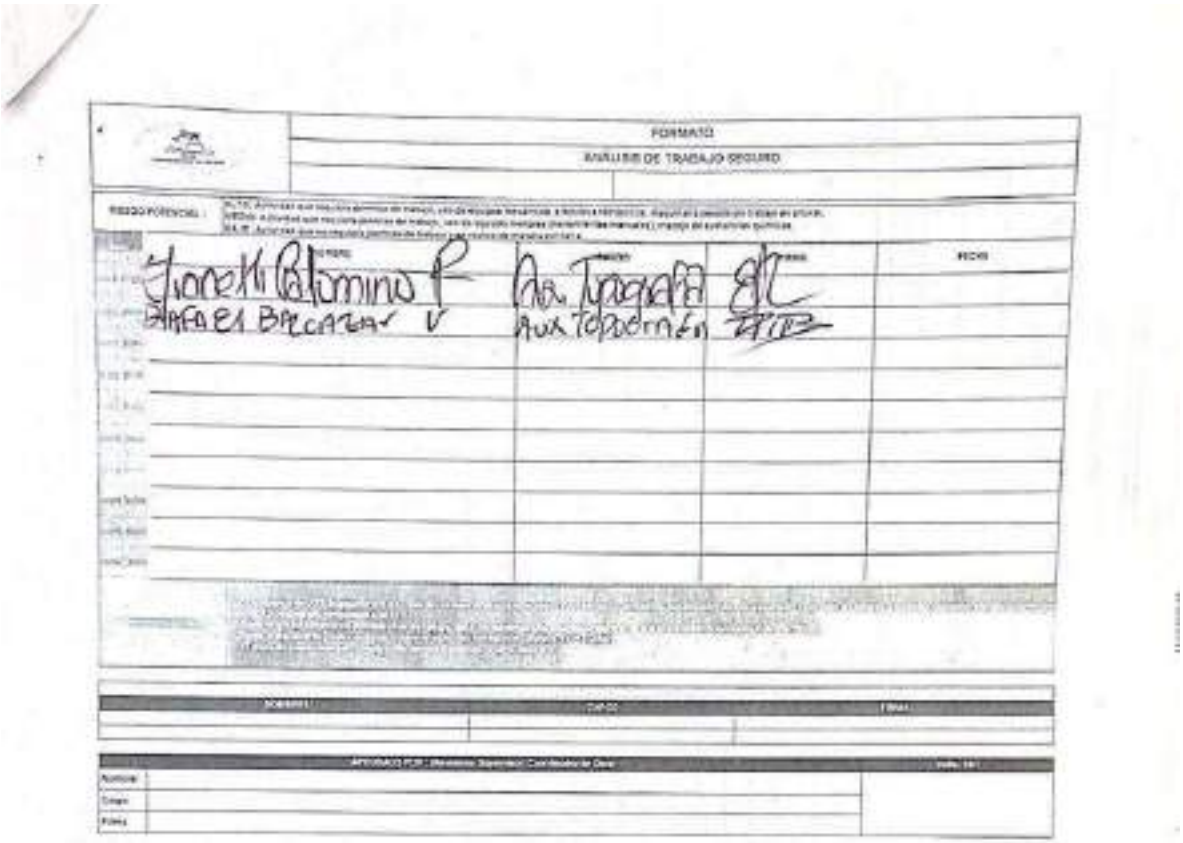

FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

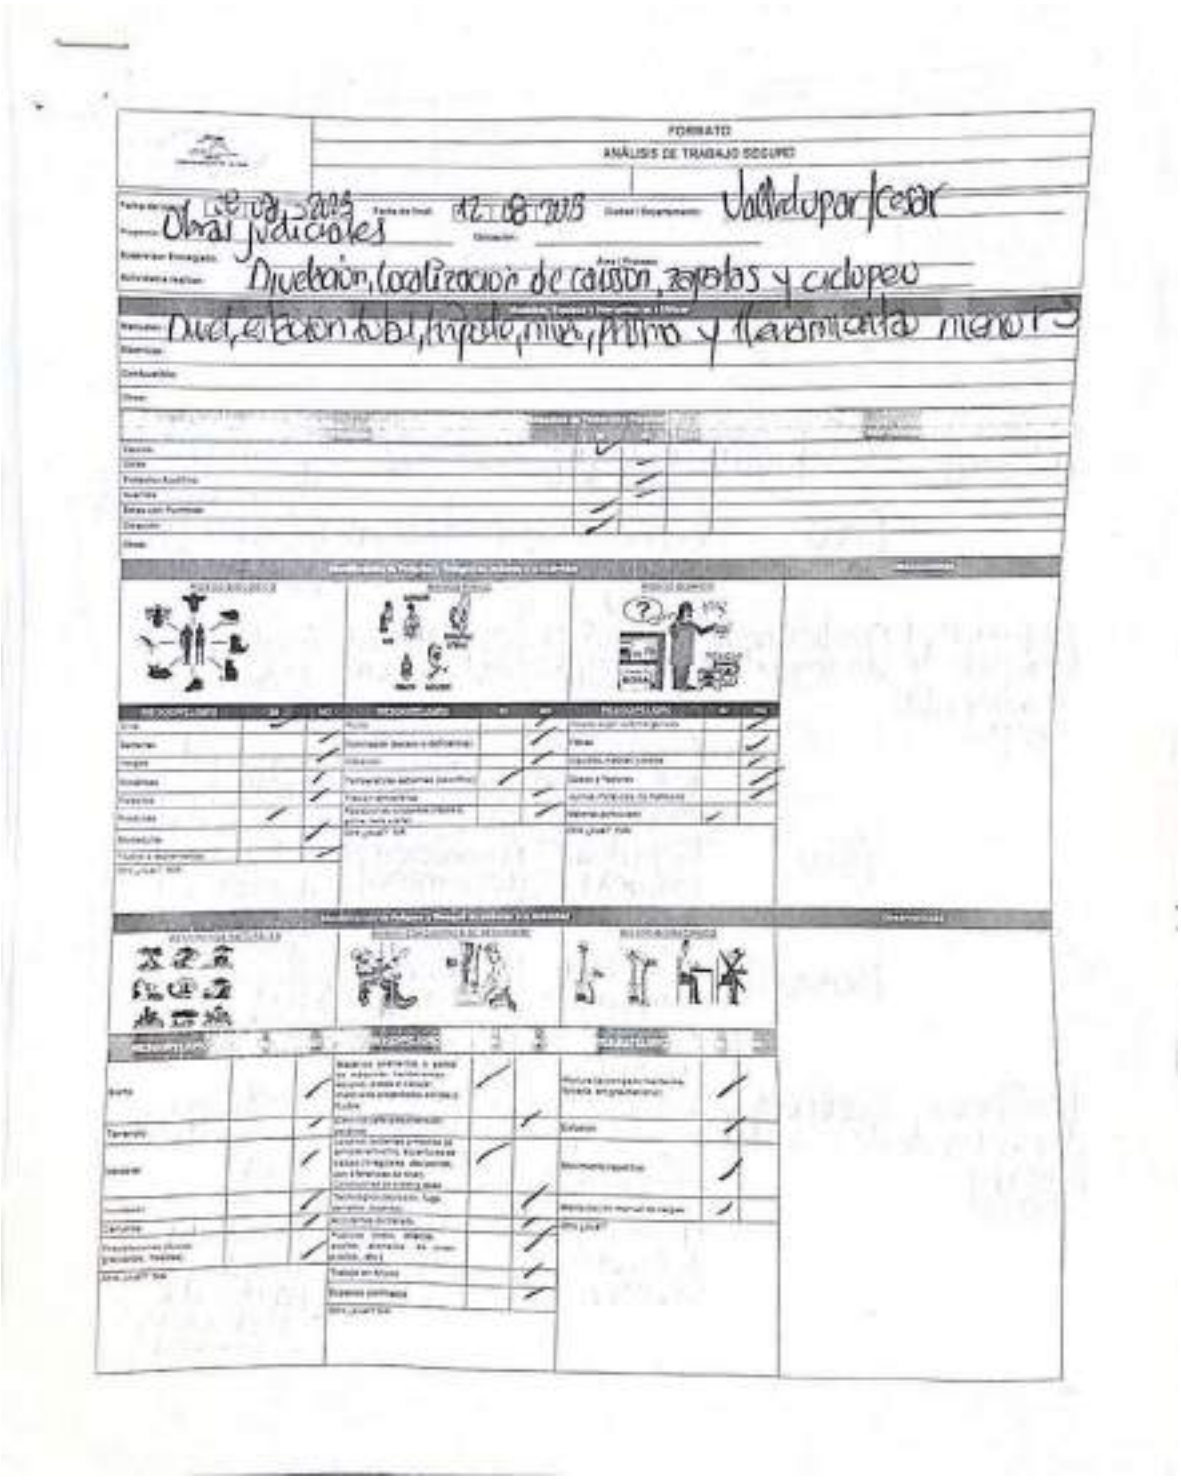
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Obras Judiciales
Valledupar/Cesar
Excavación, localización de cajón, zapatas y ciclopeo

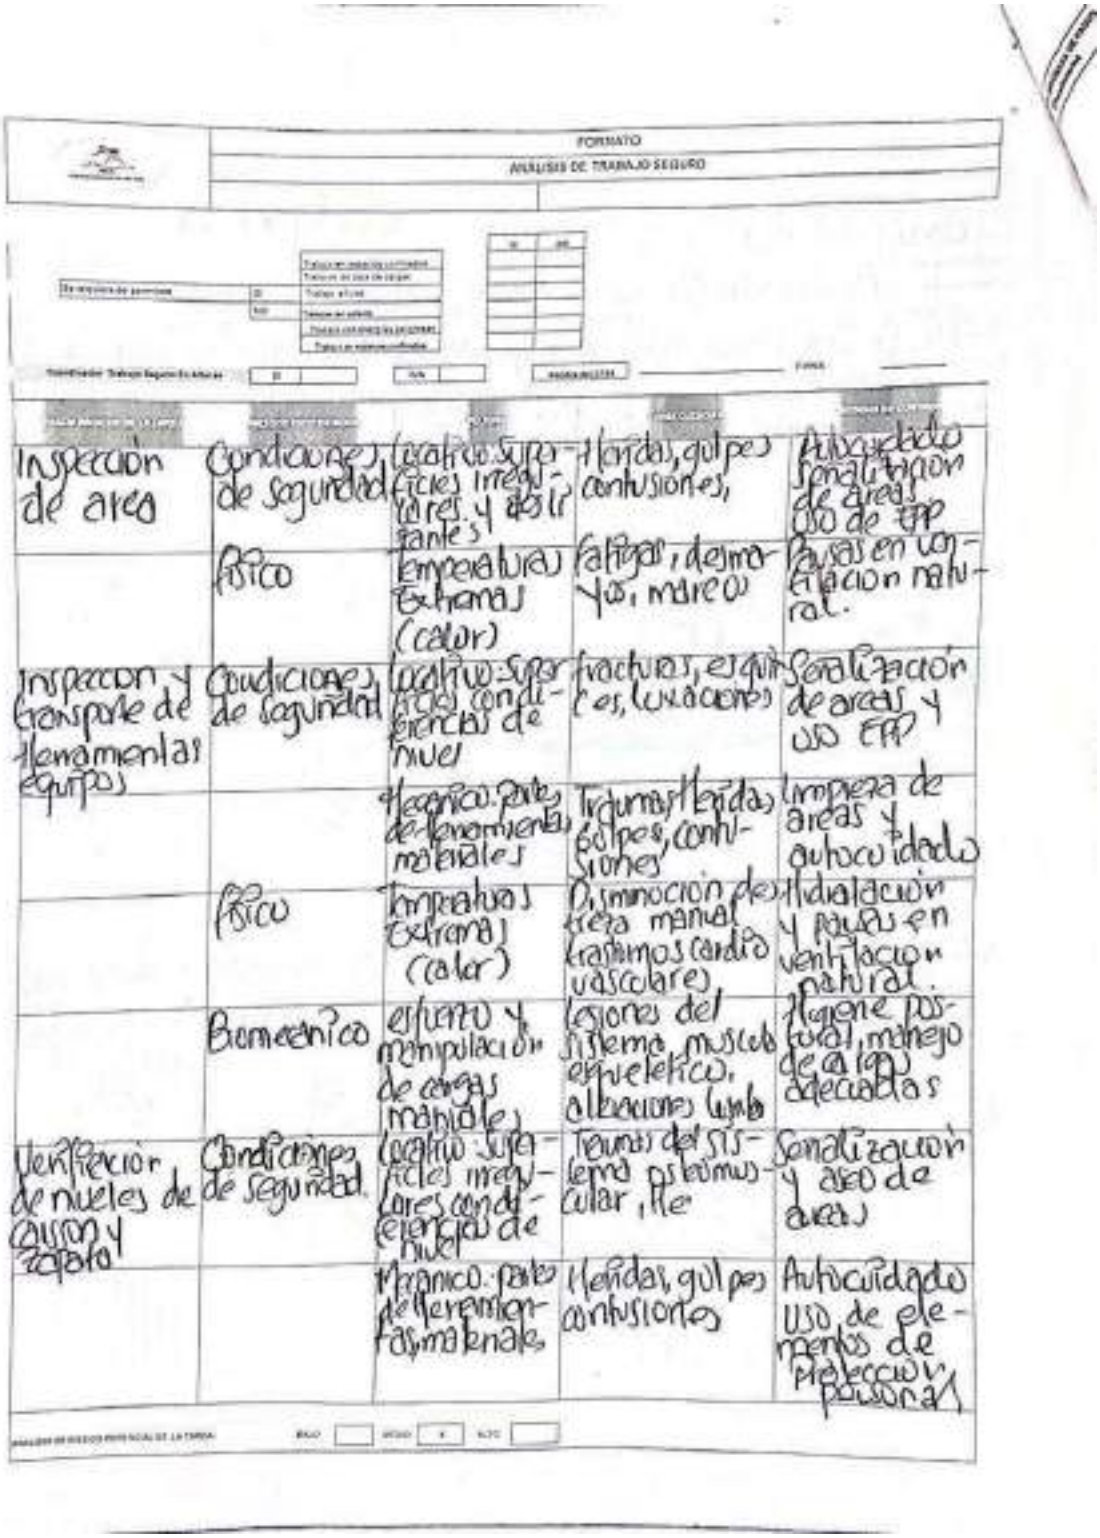



FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares y deslizantes	Heridas, golpes contusiones,	Autocuidado señalización de áreas uso de EPP
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Fatigas, desmayos, mareo	Pausas en ventilación natural.
Inspección y transporte de herramientas equipos	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies condiferencias de nivel	fracturas, esguinces, luxaciones	Señalización de areas y uso EPP
		Mecánico: parte de herramientas materiales	Traumas/Lesiones golpes, contusiones	Limpieza de areas y autocuidado
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Disminución de fuerza manual trastornos cardiovasculares)	Hidratación y pausas en ventilación natural.
	Biomecánico	esfuerzo y manipulación de cargas manipulables	lesiones del sistema, musculo esqueletico, alteraciones lumbo	Higiene postural, manejo de cargas adecuadas
Verificación de niveles de aceite y agua	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares condiferencias de nivel	Traumas del sistema osteomuscular, lle	Señalización y aseo de areas
		Mecanico: parte de herramientas manuales	Heridas, golpes contusiones	Autocuidado uso de elementos de protección personal

ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LA TAREA BAJO [ ] MEDIO [X] ALTO [ ]

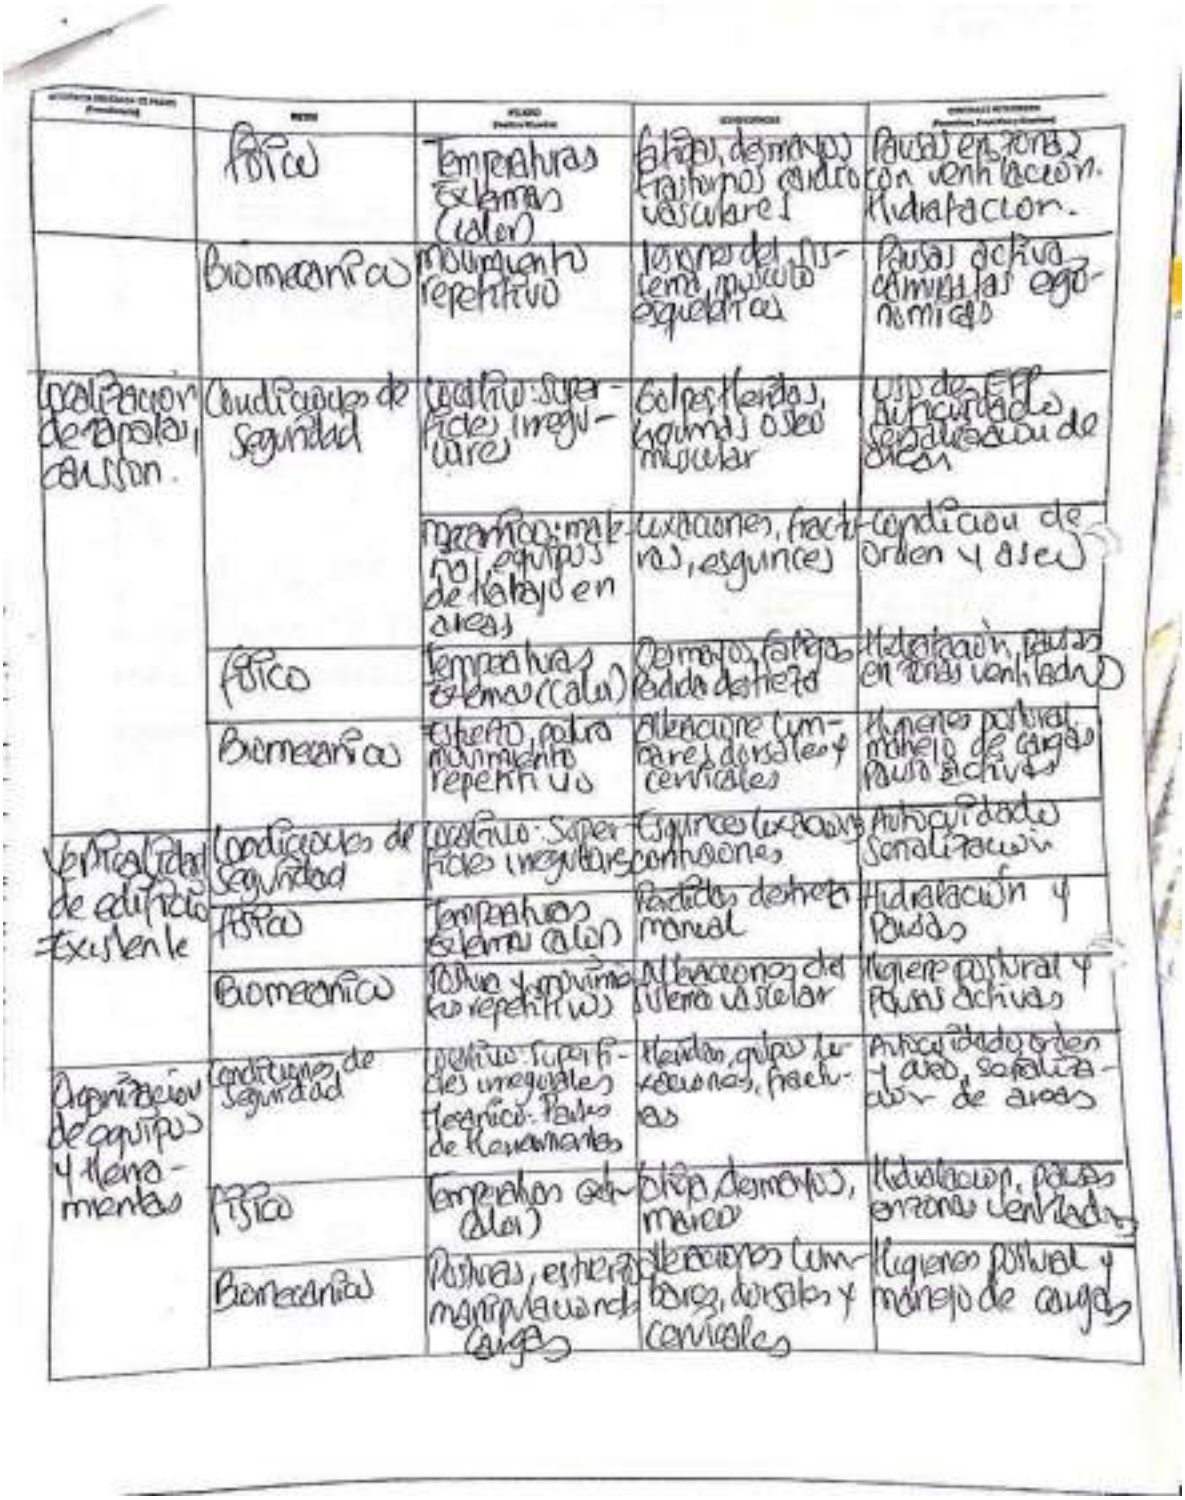

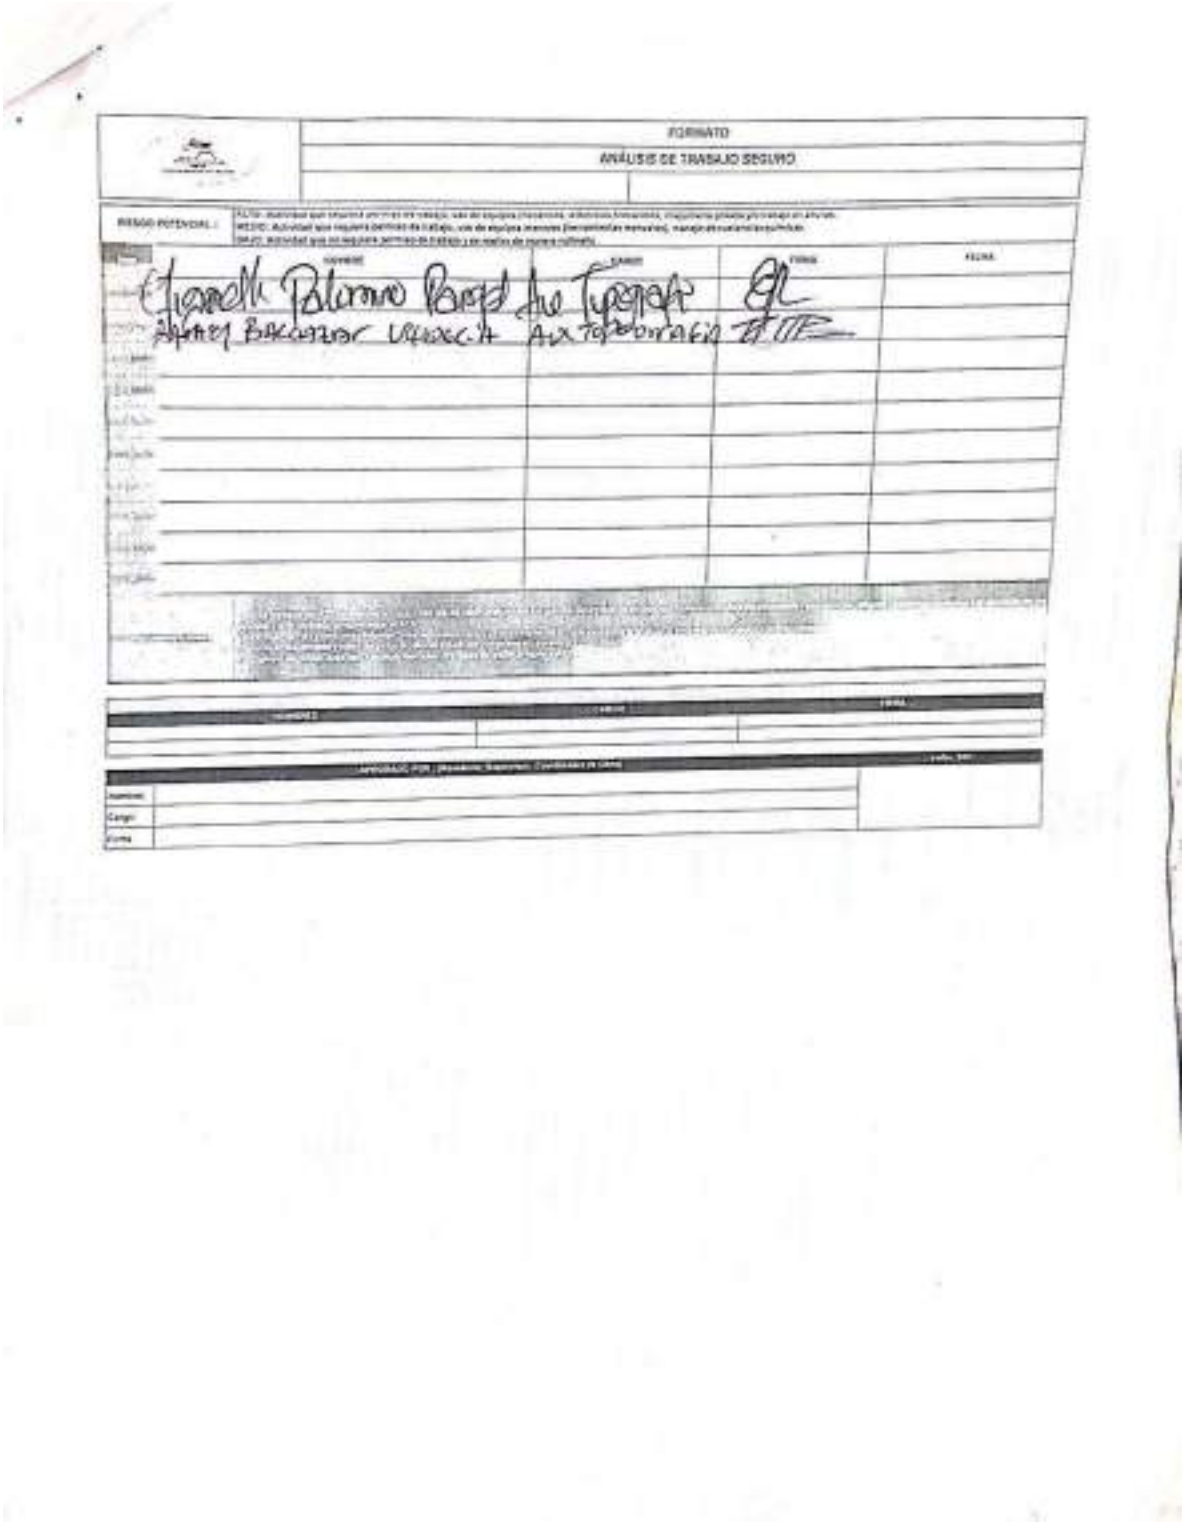
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

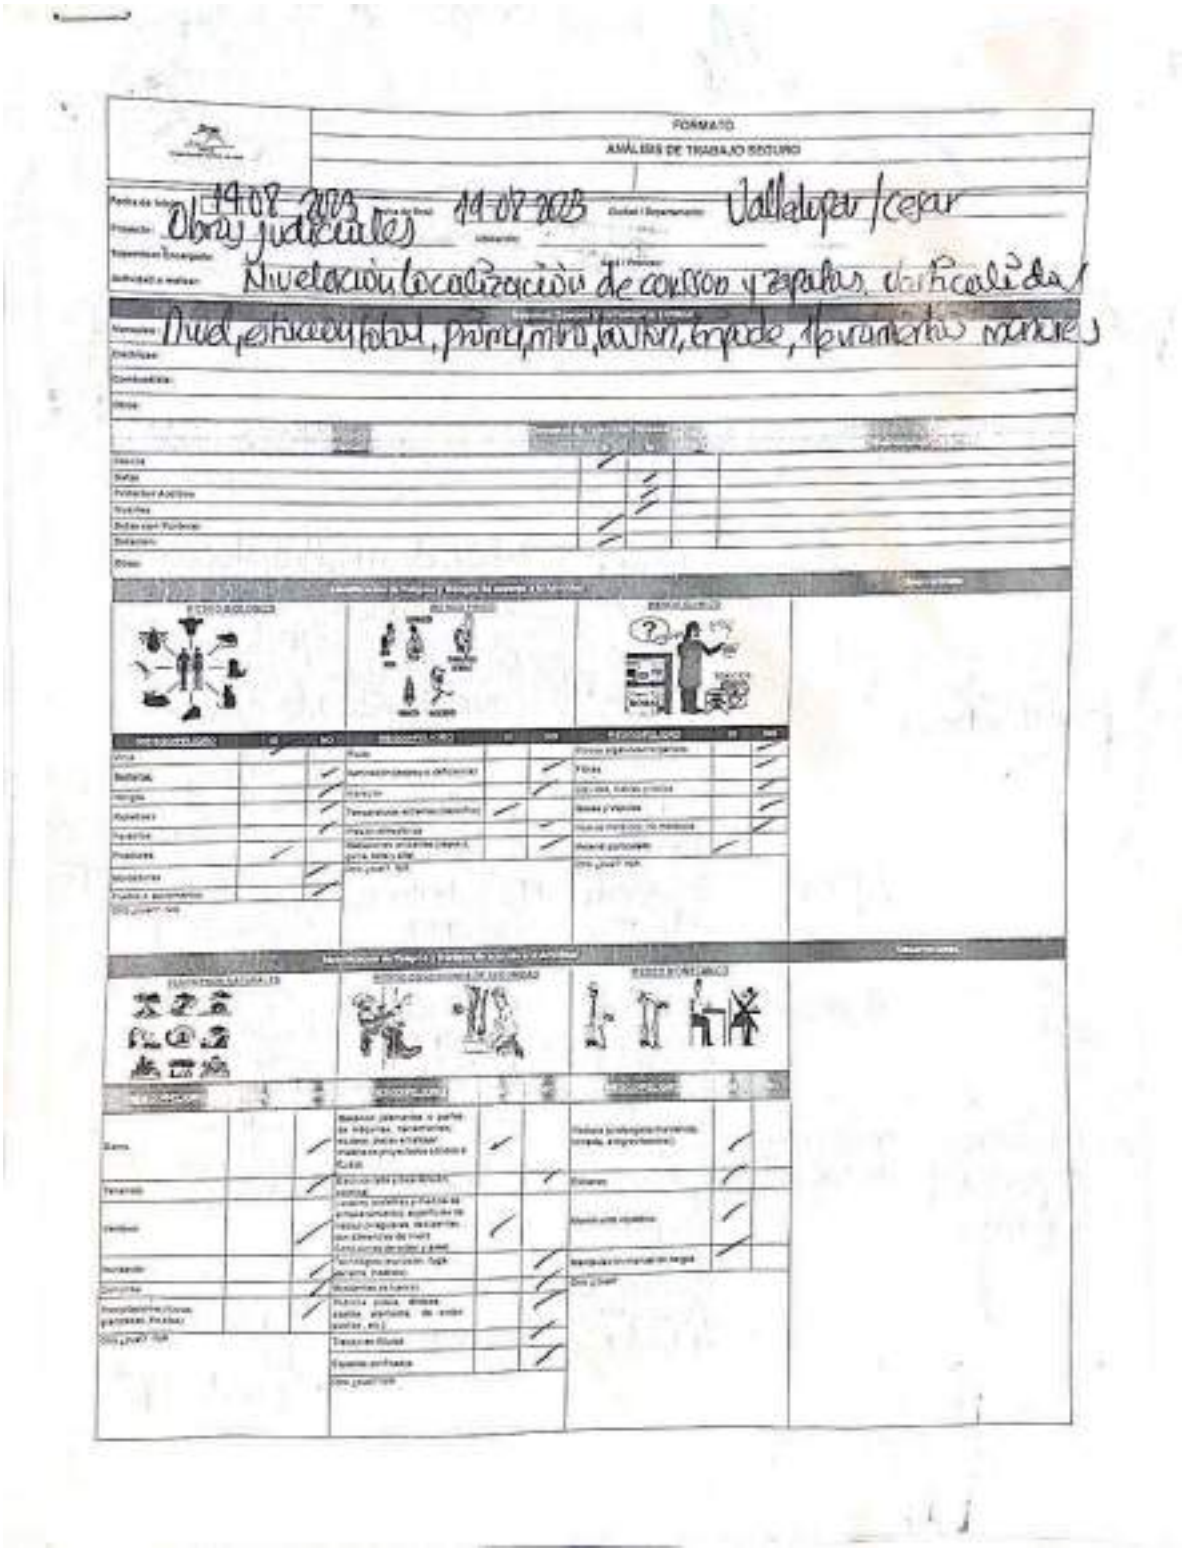
FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
19-07-2023
Obras judiciales
11-07-2023
Valledupar/Cesar
Nivelación localización de cerros y zapatas, excavación
Ruido, estrés, calor, polvo, mico, gripe, lluvia, herramientas manuales

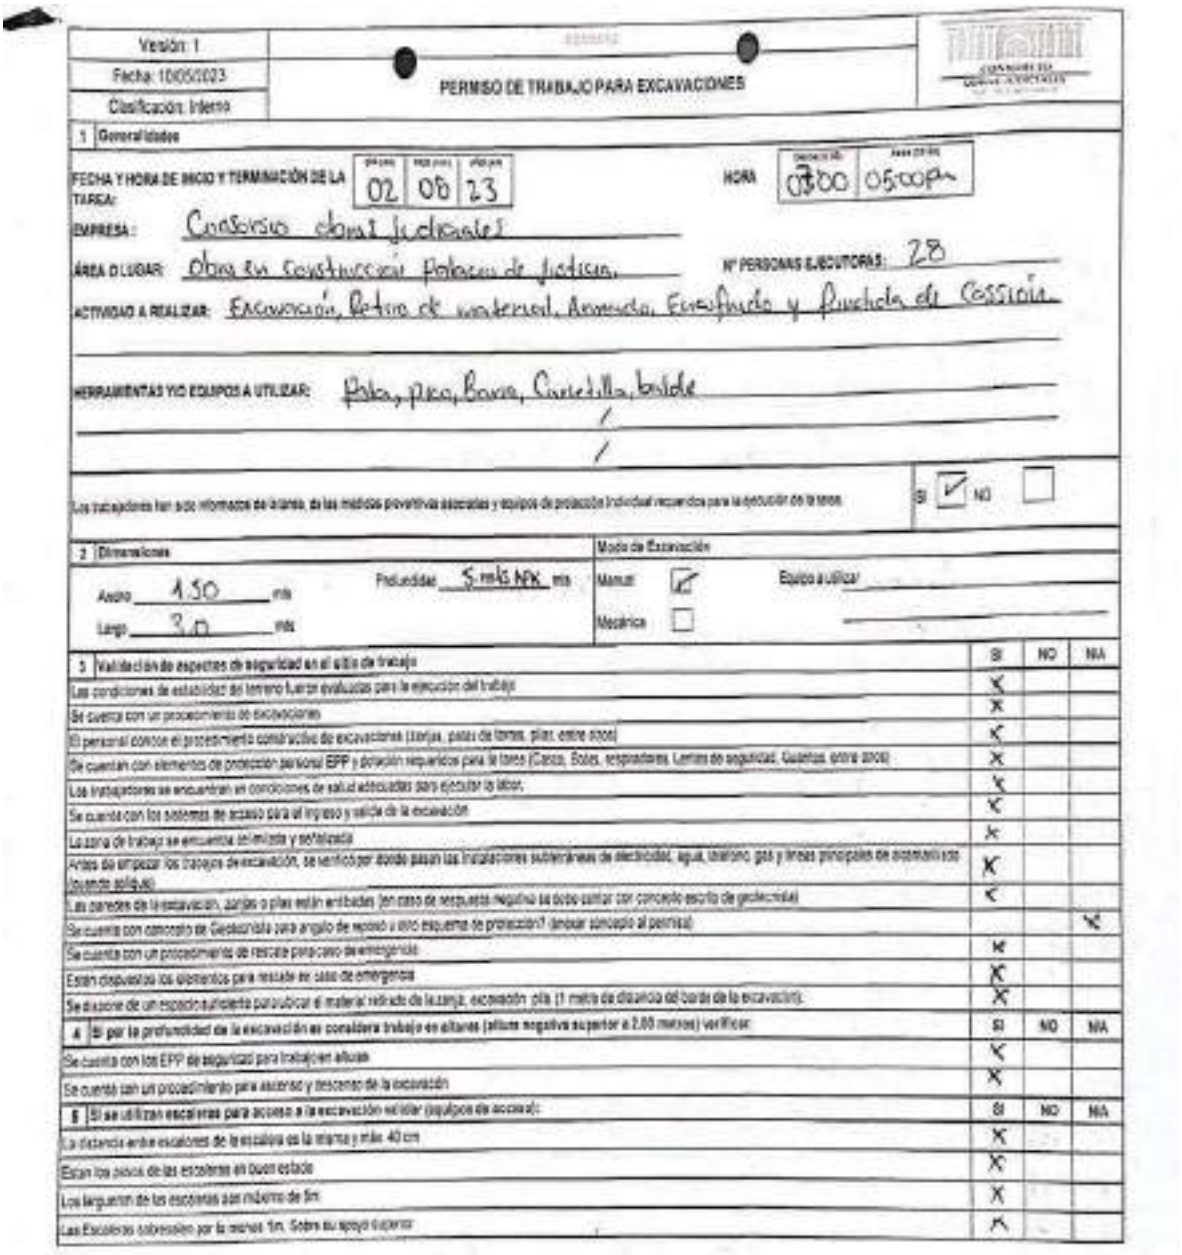

Versión: 1	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES
Fecha: 10/05/2023	
Clasificación: Interno	

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 02 06 23 HORA 08:00 05:00pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de justicia. Nº PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armada, Fundida y Fundida de cassión

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de riesgos, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5 mts APK mts

Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de torres, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y aislada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuenta aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)	X		
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila (1 metro de distancia del borde de la excavación).	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**NA**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**NA**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	X		
Están los pisos de las escaleras en buen estado	X		
Los larguero de las escaleras son mínimo de 5m	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

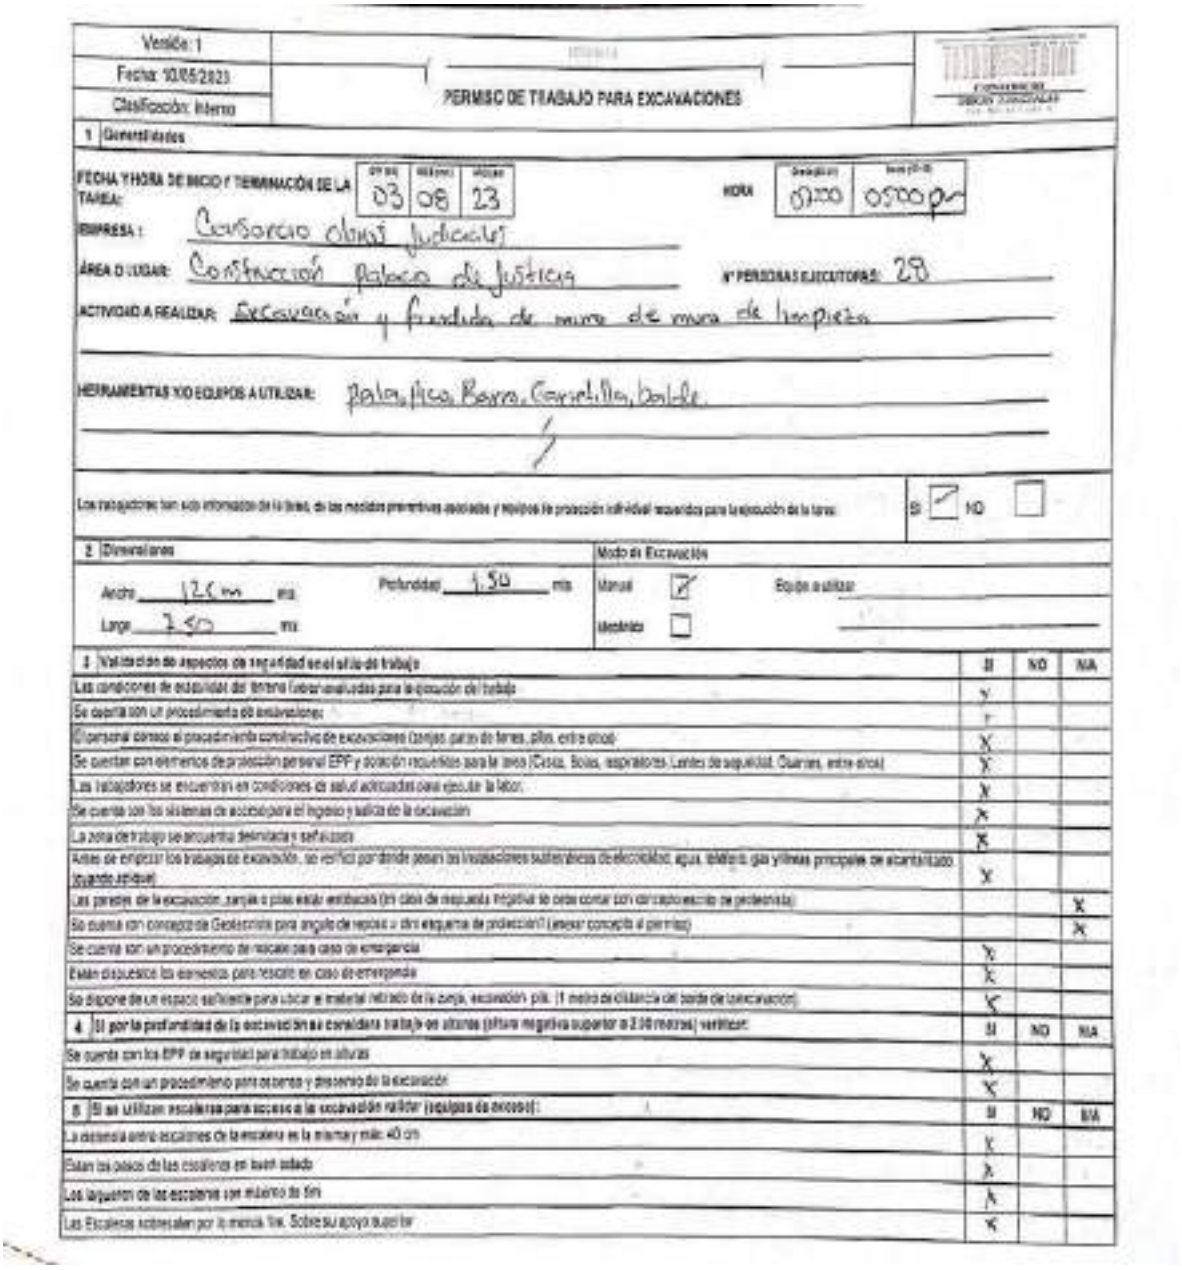

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 03 08 23 HORA 0800 0500 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de muro de muro de limpieza

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI [X] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.20 mts Profundidad 1.50 mts

Largo 7.50 mts

Modo de Excavación


Manual [X] Equipo a utilizar:

Mecánico [ ]

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de torres, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de acantarillado (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanja o pozo están entibadas (En caso de requerirlo negativo se debe contar con concepto escrito de profesional)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		

4 Si por la profundidad de la excavación se deberán realizar labores en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para descenso y ascenso de la excavación	X		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación realizar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más: 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los larguero de las escaleras son enteros de fin	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

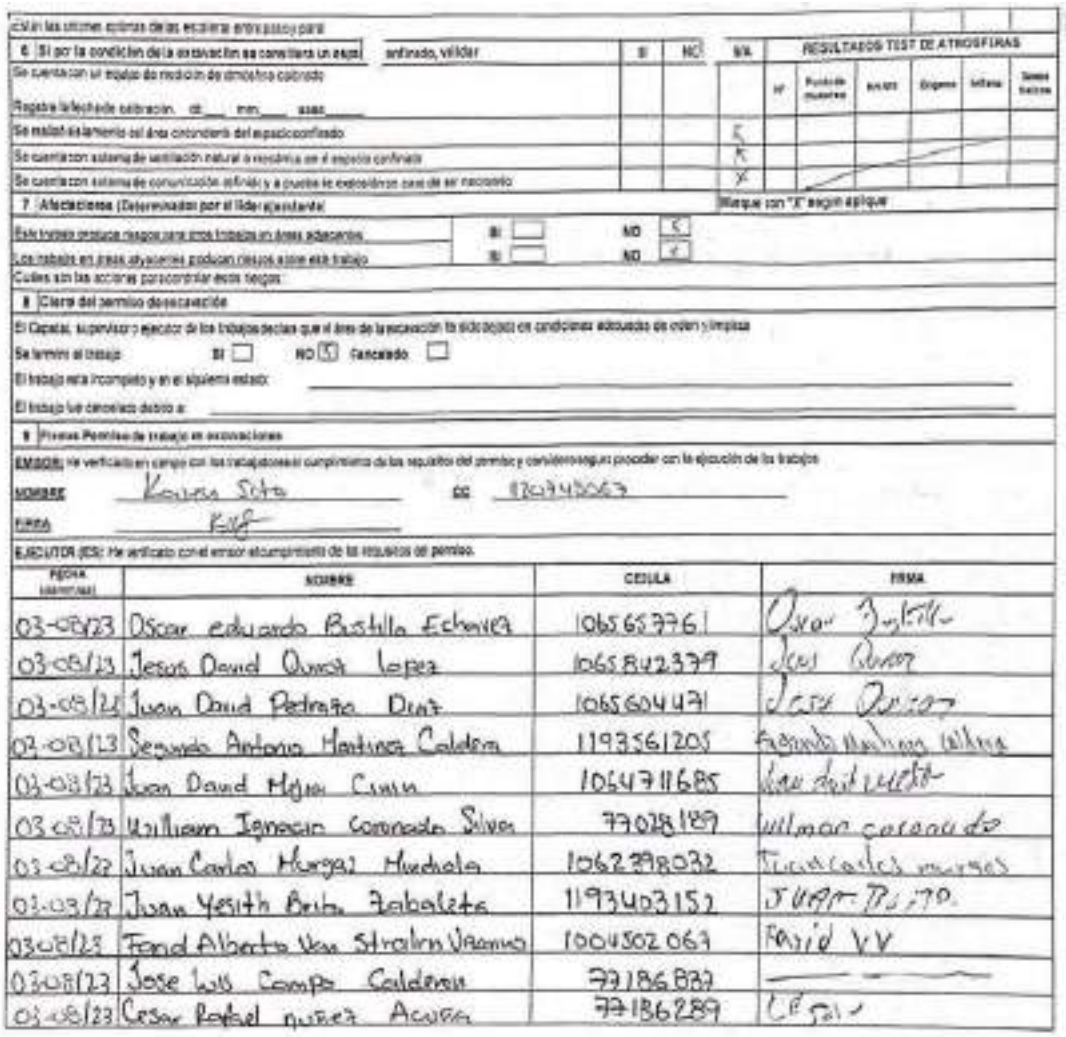

Cubrir las últimas cuatro de las escalera antes pasar para

6 Si por la condición de la excavación se considera un espa... confinado, validar — SI / NO / N/A

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS: %LEL, Oxigeno, Inflama, Sulfuro hidrog

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado
Registre la fecha de calibración: dd___ mm___ aaaa___ — N/A: X

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado — N/A: X

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado — N/A: X

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosiones caso de ser necesario — N/A: X

7 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes — SI: ___ NO: X

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI: ___ NO: X

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo: SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Kevin Soto — CC: 1024450667


FIRMA: [signature]

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
03-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	[signature]
03-08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	[signature]
03-08/23	Juan David Petrago Diaz	1065604471	[signature]
03-08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	[signature]
03-08/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	[signature]
03-08/23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	[signature]
03-08/23	Juan Carlos Murgas Machado	1062398032	[signature]
03-08/23	Juan Yesith Bello Zabaleta	1193403152	[signature]
03-08/23	Fond Alberto Vos Straten Vanegas	1004502069	[signature]
03-08/23	Jose Luis Campo Calderon	77186832	[signature]
03-08/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	[signature]

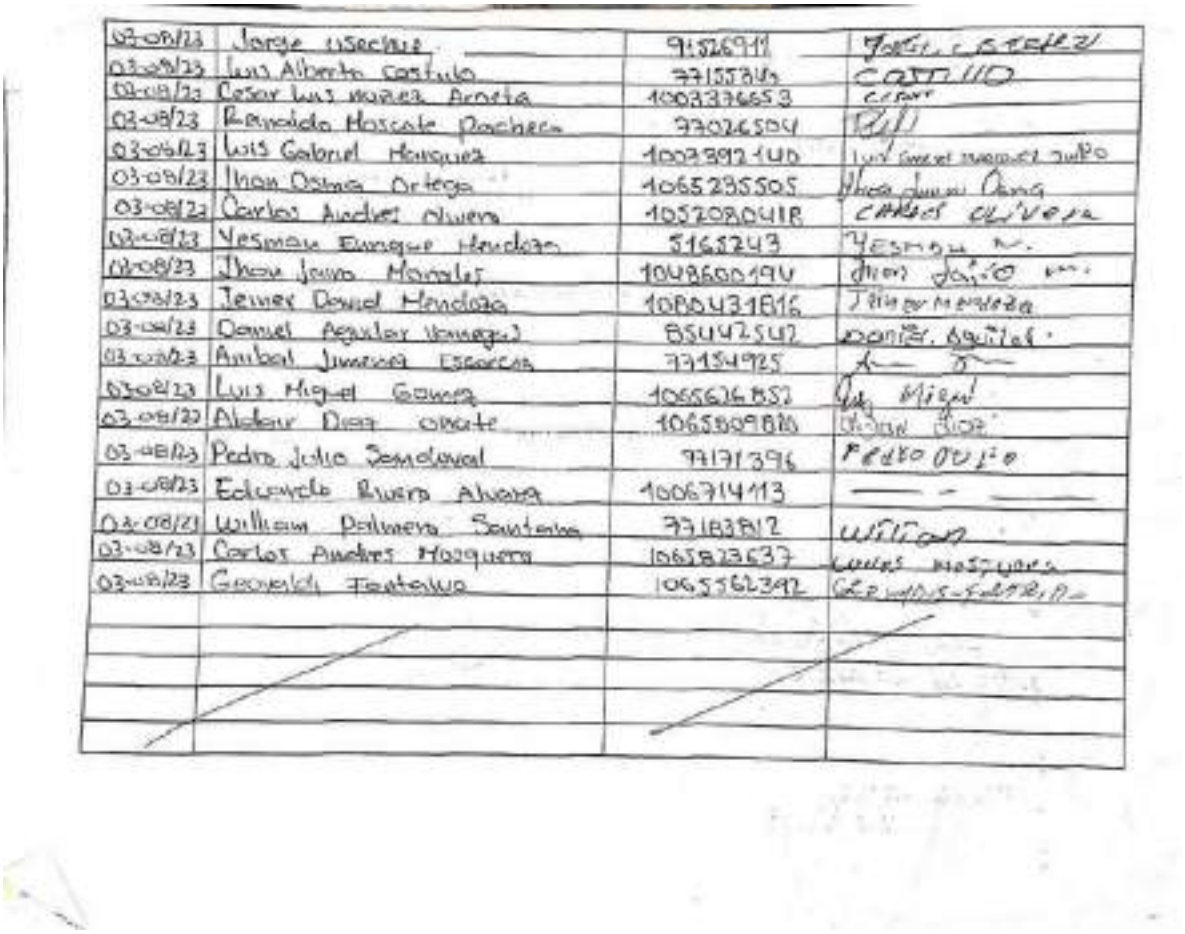

03-08/23	Jorge [illegible]	91526911	JORGE CASTILLO
03-08/23	Luis Alberto Castillo	77155345	CASTILLO
03-08/23	Cesar Luis Mateus Acosta	1003376653	CLM
03-08/23	Reinaldo Moscote Pacheco	93026504	[illegible]
03-08/23	Luis Gabriel Marquez	1003992140	LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO
03-08/23	Ihan Osmin Ortega	1065235505	Ihan Osmin Ortega
03-08/23	Carlos Andres Olivera	1057080418	CARLOS OLIVERA
03-08/23	Yesmen Enrique Mendoza	5163243	YESMEN M.
03-08/23	Jhon Jairo Morales	1048600194	JHON JAIRO M.
03-08/23	Jeiner Daniel Mendoza	1080431816	JEINER MENDOZA
03-08/23	Daniel Aguilar Venegas	85042542	DANIEL AGUILAR
03-08/23	Anibal Jimenez Estercas	77154925	[illegible]
03-08/23	Luis Miguel Gomez	1065626857	Luis Miguel
03-08/23	Aldair Diaz Conde	1065809816	[illegible]
03-08/23	Pedro Julio Semolaval	77171396	PEDRO JULIO
03-08/23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	[illegible]
03-08/23	William Palmera Santana	77183817	WILLIAM
03-08/23	Carlos Andres Mosquera	1065823637	CARLOS MOSQUERA
03-08/23	Gerardo Fontalvo	1065562392	GERARDO FONTALVO

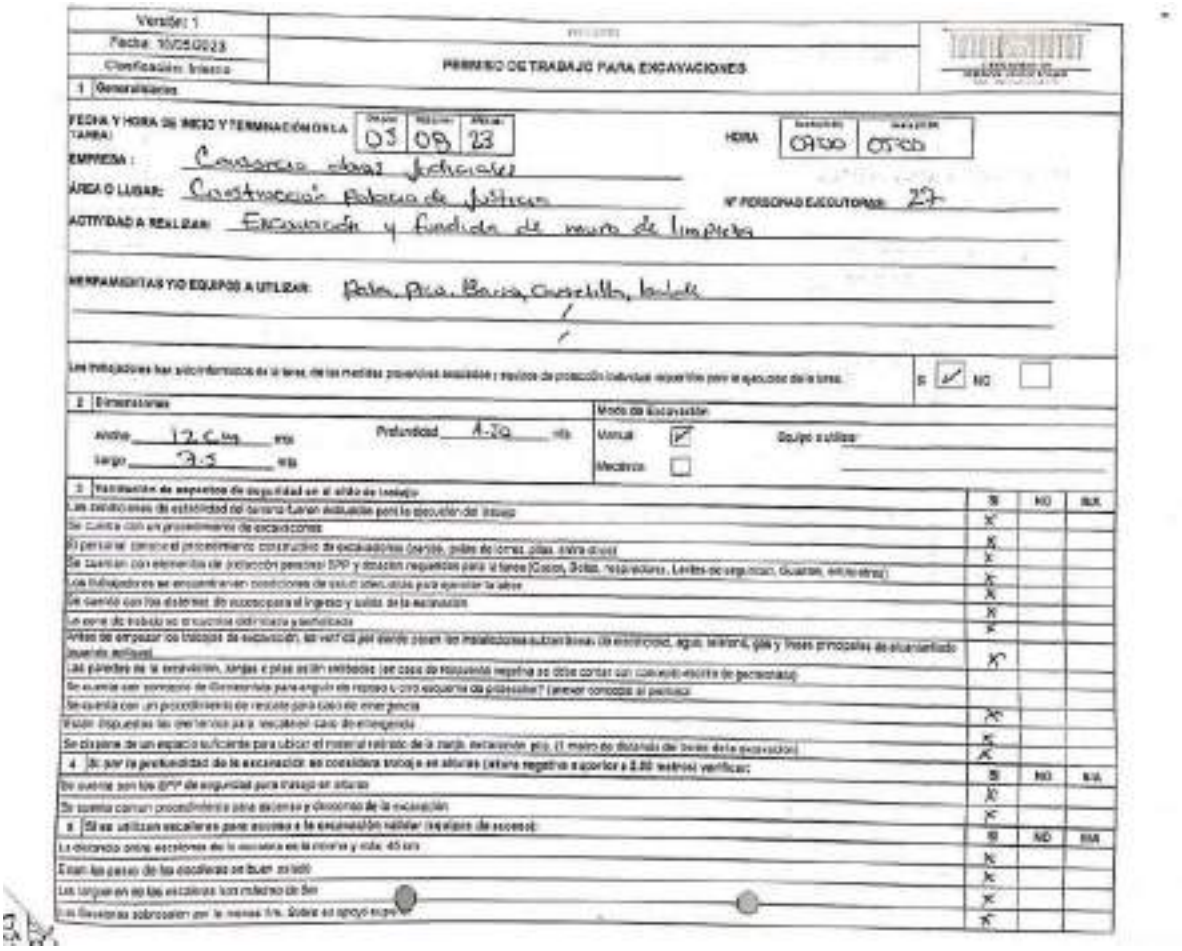

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 03 Mes 08 Año 23 HORA 0730 0500

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de muro de limpieza

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lampa

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y medios de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 12.5 mts Profundidad 4.20 mts

Largo 3.5 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ] Equipo a utilizar:

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo


	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas por la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cercha, pilas de cortes, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, Guantes, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con las distintas de accesos para el ingreso y salida de la excavación	X		
Un cerro de trabajo se encuentra debidamente señalizada	X		
Antes de empezar las labores de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas (de electricidad, agua, telefonía, gas y líneas principales de alcantarillado cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerirse registrar en obra contar con concepto escrito de personal)			
Se cuenta con personal de Coordinador para ángulo de reposo u otro equipo de protección? (anexar concepto al permiso)			
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para la vacatenar caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia de borde de la excavación)	X		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:


	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	X		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar requisitos de acceso:

	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la correcta y esta 45 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las largas en las escaleras son mayores de 5m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el apoyo superior	X		

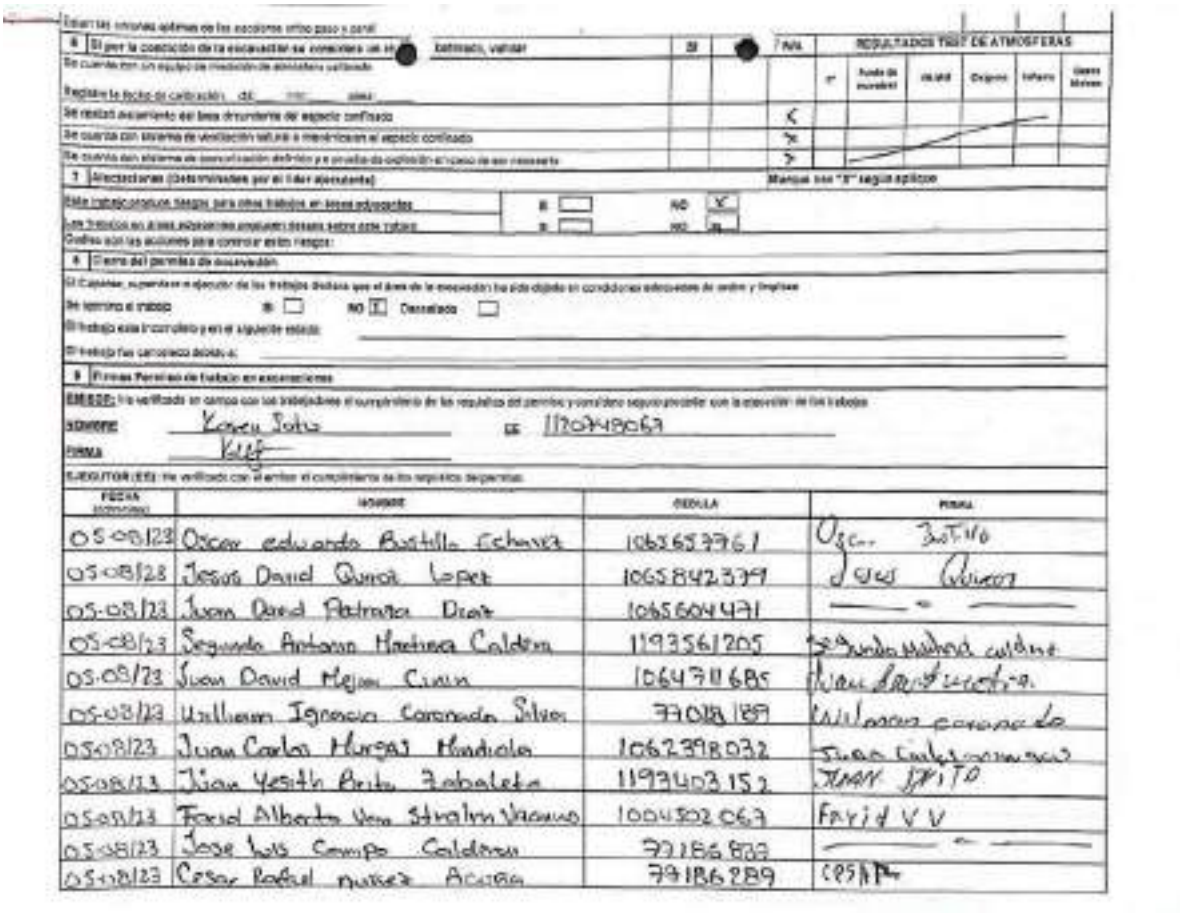

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
05-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echeverri	1063653796	
05-08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
05-08/23	Juan David Platmos Diaz	1065604471	
05-08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
05-08/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
05-08/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77018189	
05-08/23	Juan Carlos Murgas Mendiola	1062398032	
05-08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
05-08/23	Farid Alberto Vera Stralen Vanegas	1004302063	
05-08/23	Jose Luis Campo Calderon	77186833	
05-08/23	Cesar Rafael nuñez Acosta	77186289	

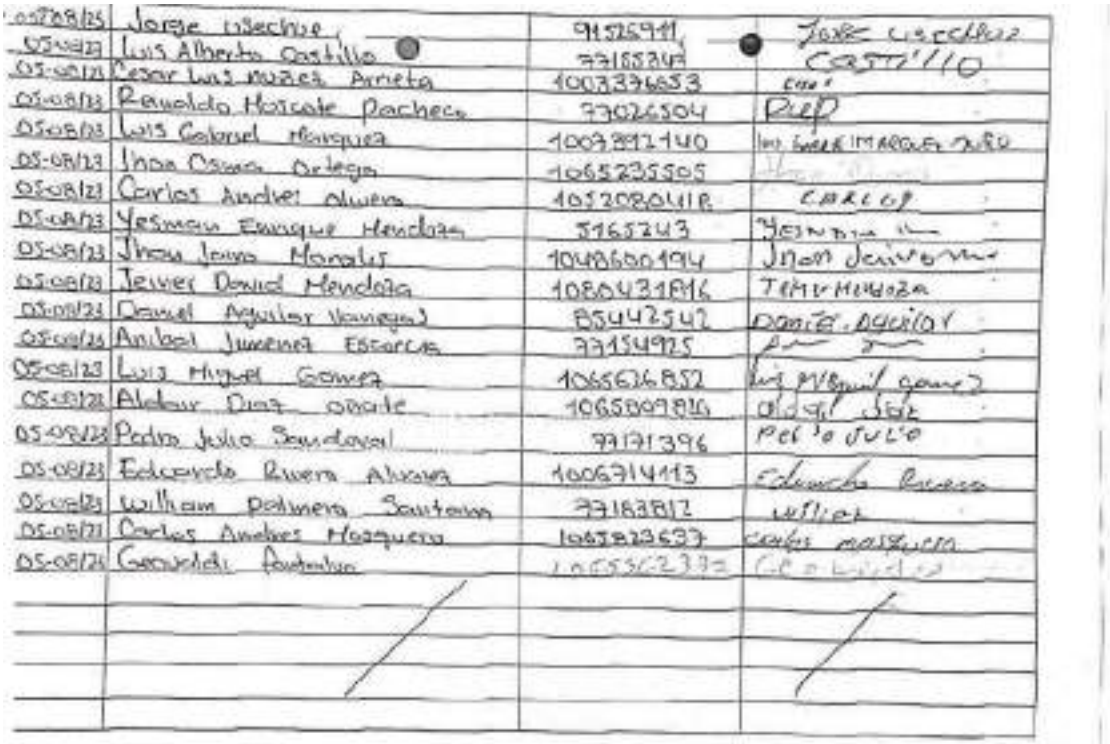

05/08/23	Jorge Sánchez	91525911	
05-08/23	Luis Alberto Castillo	77165249	
05-08/23	Cesar Luis Muñoz Arrieta	1003376653	
05-08/23	Reynaldo Horcasitas Pacheco	77026504	
05-08/23	Luis Gabriel Márquez	1003892140	
05-08/23	Jhon Osmar Ortega	1065235505	
05-08/23	Carlos Andres Olivera	1053080411	
05-08/23	Yesmaira Enrique Mendoza	51655243	
05-08/23	Jhon Jairo Morales	1048600194	
05-08/23	Jeiver David Mendoza	1080431816	
05-08/23	Daniel Aguilar Vanegas	85442542	
05-08/23	Anibal Jimenez Estarda	77154925	
05-08/23	Luis Miguel Gomez	1065636852	
05-08/23	Aledair Diaz Conde	1065809816	
05-08/23	Pedro Julio Sandoval	77171396	
05-08/23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	
05-08/23	William Palmera Santana	77163817	
05-08/23	Carlos Andres Mosquera	1065823637	
05-08/23	Gerardo Redondo	1065362372	



Versión: 1
Fecha: 10/05/2020
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACION DE LA TAREA: día 05 mes 08 año 23 — HORA: Inicio 09:00 Terminación 05:00

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material mecanico, Demolición, Conformación, Cortes de Cimentación

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Cuerda, Martillo

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 3.50 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas por la supervisión del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de cimentación, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con las señales de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar las labores de excavación, se verifica por donde pasan las excavaciones subterráneas: gas, electricidad, agua, telefonía, gas y todas principales de alcantarillado (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerirse) o se cuenta con concepto escrito de geotecnista)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o cómo esquema de protección? (talud, concepto de ingeniero)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponible los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la zanja, excavación (mín. 1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación señalar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La separación entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el apoyo superior	X		



FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
05-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
05-08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
05-08/23	Juan David Retmaz Diaz	1065604471	— o —
05-08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez Caldera
05-08/23	Juan David Mejia Cruz	1064711685	Juan David Mejia C.
05-08/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77018189	Williams Coronado S.
05-08/23	Juan Carlos Murgas Machado	1062398032	Juan Carlos Murgas
05-08/23	Juan Yosith Brito Jaboleta	1193403152	Juan Brito
05-08/23	Farid Albarto Vega Straborn Vaamonde	1004302069	Farid V V
05-08/23	Jose Luis Campos Calderon	77186839	— = —
05-08/23	Cesar Rafael Nuñez Arroyo	77186289	CESAR

05-08/23	Jorge Sánchez	91526911	Jorge Sánchez
05-08/23	Luis Alberto Castillo	97155364	Castillo
05-08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
05-08/23	Reinaldo Moscote Pacheco	77026504	Reinaldo
05-08/23	Luis Gabriel Marquez	1003892140	Luis Gabriel Marquez Julio
05-08/23	Ihan Osiris Ortega	1065235505	
05-08/23	Carlos Andres Olivera	1052080418	Carlos
05-08/23	Yesmaw Enrique Hendrix	51662643	Yesmaw E.
05-08/23	Ihan Jairo Morales	1048600194	Ihan Jairo M.
05-08/23	Jeiner David Mendoza	1080431816	Jeiner Mendoza
05-08/23	Daniel Aguilar Noriega	85142547	Daniel Aguilar N.
05-08/23	Anibal Jimenez Escorcia	77154925	
05-08/23	Luis Miguel Gomez	1065676852	Luis Miguel Gomez
05-08/23	Abdeur Diaz Olivate	1065809826	Abdeur Diaz
05-08/23	Pedro Julio Sandoval	91171396	Pedro J. Sandoval
05-08/23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
05-08/23	William Palmera Santana	77183817	William
05-08/23	Carlos Andres Marquez	1065823637	Carlos Marquez
05-08/23	Gonzalo Fontalvo	1065822792	Gonzalo F.



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1. Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 04 / 08 / 23 — HORA: 07:00 — 05:00

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA DE LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Demolición, excavación, Cortadas y almacenamiento de cascos.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Picas, Barras, Carretillas, Palas.


Los trabajadores han sido informados de los daños, de las medidas preventivas tomadas y equipos de protección individual requeridos para ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2. Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 5.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Maquina [ ] — Equipo a utilizar:


3. Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de seguridad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, pasos de tareas, otros, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, Protectores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por escrito que fueron localizadas redes aéreas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado, oleoductos, gaseoductos	X		
Las bordes de la excavación, zanjas o cualquier otra (en caso de encontrar material explosivo se debe contar con concepto escrito de autoridad)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulo de reposo o otro requerido de protección? (Anexar concepto si aplica)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están claramente los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zona excavación, min. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
4. Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajadores alturas (altura negativa superiora 1.50 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5. Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar aspectos de acceso:	SI	NO	NA
La escalera está en posición de la escalera es la indicada y está en el sitio	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las largueros de las escaleras son mínimo de 5m	X		
Las escaleras están sujetas por la menos 1m. Sobre la altura superior	X		

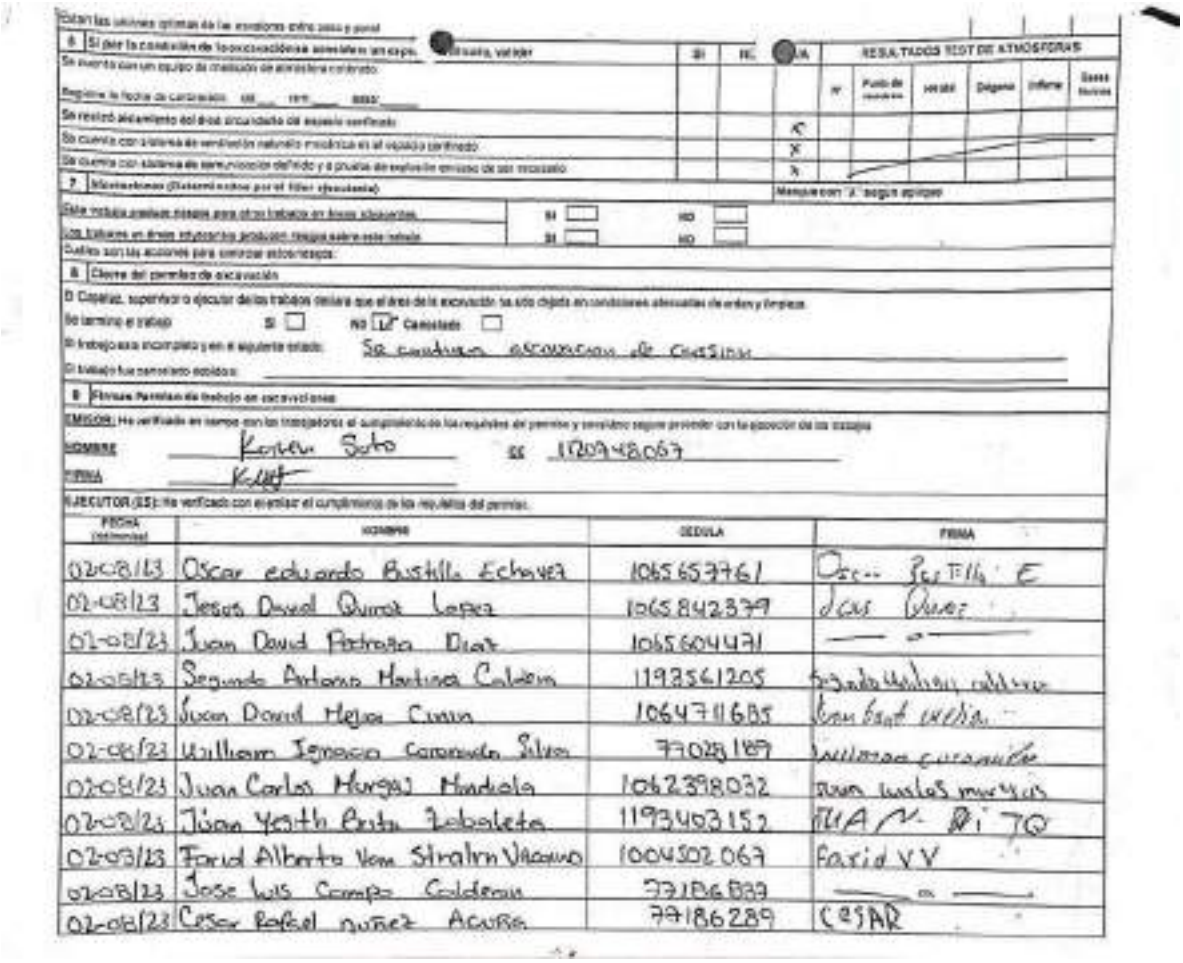

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
02-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Osc... Bustillo E
02-08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
02-08/23	Juan David Pertuz Diaz	1065604471	— " —
02-08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1192561205	Segundo Martinez calderon
02-08/23	Juan David Mejia Cuello	1064711685	Juan David mejia
02-08/23	Williams Ignacio Caraballo Silva	77025189	Williams caraballo
02-08/23	Juan Carlos Murgas Mendiola	1062398032	Juan Carlos murgas
02-08/23	Juan Yeith Pinto Zabaleta	1193403152	JUAN DIAZ
02-08/23	Farid Alberto Von Stralm Vasquez	1004502067	Farid VV
02-08/23	Jose Luis Campo Calderon	73186889	— " —
02-08/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	CESAR



FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
CM-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065653961	
4-08-2023	Jesus David Quiroz Lopez	1065842539	
14-08-2023	Juan David Petrino Diaz	1065604431	
14-08-2023	Segundo Pantaleon Martinez Caldera	1192561205	
09-08-2023	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
CM-08/23	Guillermo Ignacio Coronado Silva	79078189	
CM-08/2023	Juan Carlos Hoyos Hudaka	1062398032	
CM-08/2023	Juan Yesith Pinto Fontaleta	1193403152	
CM-08/23	Farid Alberto Vega Stratton Vasmo	1004502067	
CM-08/23	Jose Luis Campo Caballero	77186837	
CM-08/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	

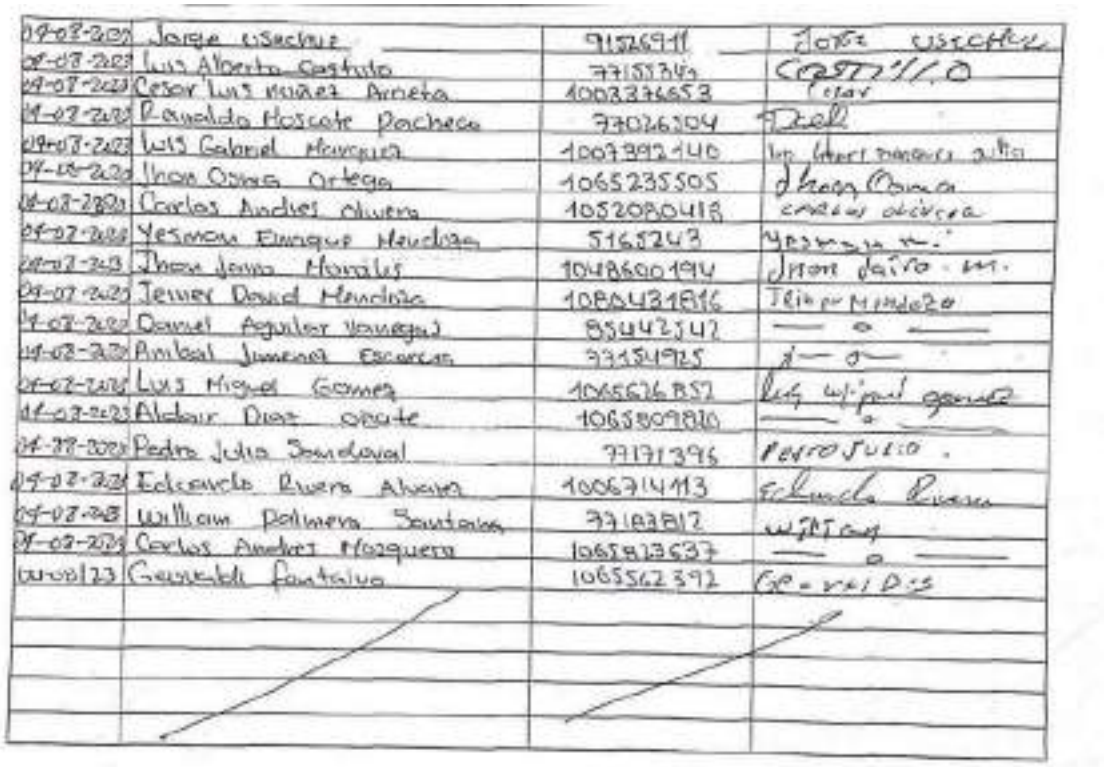

04-08-2023	Jorge Sánchez	91526911	Jorge Sánchez
04-08-2023	Luis Alberto Castaño	77151349	Castaño
04-08-2023	Cesar Luis Núñez Arneta	1003376653	Cesar
04-08-2023	Rogelio Hoscote Pacheco	77026204	Rogelio
04-08-2023	Luis Gabriel Marquez	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
04-08-2023	Ivan Ospino Ortega	1065235505	Ivan Ospino
04-08-2023	Carlos Andres Olivera	1052080418	Carlos Olivera
04-08-2023	Yesmon Enrique Mendoza	5165243	Yesmon E.
04-08-2023	Jhon Jairo Morales	1048600194	Jhon Jairo M.
04-08-2023	Jeiver David Mendoza	1084431816	Jeiver Mendoza
04-08-2023	Daniel Aguilar Venegas	85042347	— o —
04-08-2023	Anibal Jimenez Escorcia	93154925	— o —
04-08-2023	Luis Miguel Gomez	1065676857	Luis Miguel Gomez
04-08-2023	Aldair Diaz Ospino	1065809810	— o —
04-08-2023	Pedro Julio Sandoval	77171396	Pedro Julio
04-08-2023	Edelmelo Rivera Alvarez	1006714113	Edelmelo Rivera
04-08-2023	William Palmera Santana	77183817	William
04-08-2023	Carlos Andres Mosquera	1065823637	— o —
04/08/23	Gerardo Fontalvo	1065562392	Gerardo



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 04 08 23 HORA 07:00 05:00

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de justicia N° PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de muro de contención

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 2 Cm m Profundidad 1.50 m Largo 3.50 m

Modo de Excavación: Manual [x] Mecánica [ ] Equipo a utilizar:


3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones del terreno han sido evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargas, usos de forma, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para el tarea (Casco, botas, medidores, tapones de seguridad, guantes, entre otros	X		
Las trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con las escaleras de acceso personal seguras y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de otras facilidades (cuando aplique)	X		
Los pasillos de la excavación, rampas o pasarelas están protegidas con cinta de seguridad o barandas, se debe contar con protección contra caídas de personas			X
Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulo de reposo o talud seguro de excavación? (cuando aplique el permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zona, procurando que el mismo se encuentre a más de 1 metro del borde de la excavación.	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para prevenir y rescatar de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (opción de escalera):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm	X		
Estan en buen estado los escalones	X		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 3m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m sobre su punto superior	X		



FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
04-08-2022	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
04-08-2022	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
04-08-2022	Juan David Patrón Diaz	1065604431	—
04-08-2022	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	Segundo Martinez calderon
04-08-2022	Juan David Mejia Cuan	1064711685	—
04-08-2022	Williams Ignacio Coronado Silva	77031889	Williams coronado
04-08-2022	Juan Carlos Murgas Mendiola	1062398032	Juan carlos murgas
04-08-2022	Juan Yesith Barba Jabaleta	1193423152	Juan B. J.
04-08-2022	Farid Alberto Vega Stralen Vaamonde	1004502069	Farid VV
04-08-2022	Jose luis Campo Calderon	77186833	—
04-08-2022	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	CESAR



04-08-2020	Jorge Cisneros	91526911	Jorge Cisneros
04-08-2020	Luis Alberto Castillo	77155346	CASTILLO
04-08-2020	Cesar Luis Reyes Arreta	1003396053	
04-08-2020	Reinaldo Hoscote Pacheco	77026504	
04-08-2020	Luis Gabriel Marquez	1003892146	
04-08-2020	Jhon Ospina Ortega	1065235505	
04-08-2020	Carlos Andres Olivera	1052080418	
04-08-2020	Yesmar Enrique Mendoza	51652U3	
04-08-2020	Jhon Jairo Morales	1048600194	
04-08-2020	Jeiver Daniel Mendoza	1080431816	
04-08-2020	Daniel Aguilar Venegas	85042547	
04-08-2020	Anibal Jimenez Escorcia	77154925	
04-08-2020	Luis Miguel Gomez	1066626852	
04-08-2020	Aldair Diaz Obate	1065909816	
04-08-2020	Pedro Julio Saavedra	77171396	
04-08-2020	Edgardo Rivera Alvarez	1006714113	
04-08-2020	William Palmera Santana	77183512	
04-08-2020	Carlos Andres Mosquera	1065832637	
04-08-2020	Gonzalo Fontalvo	1065562392	

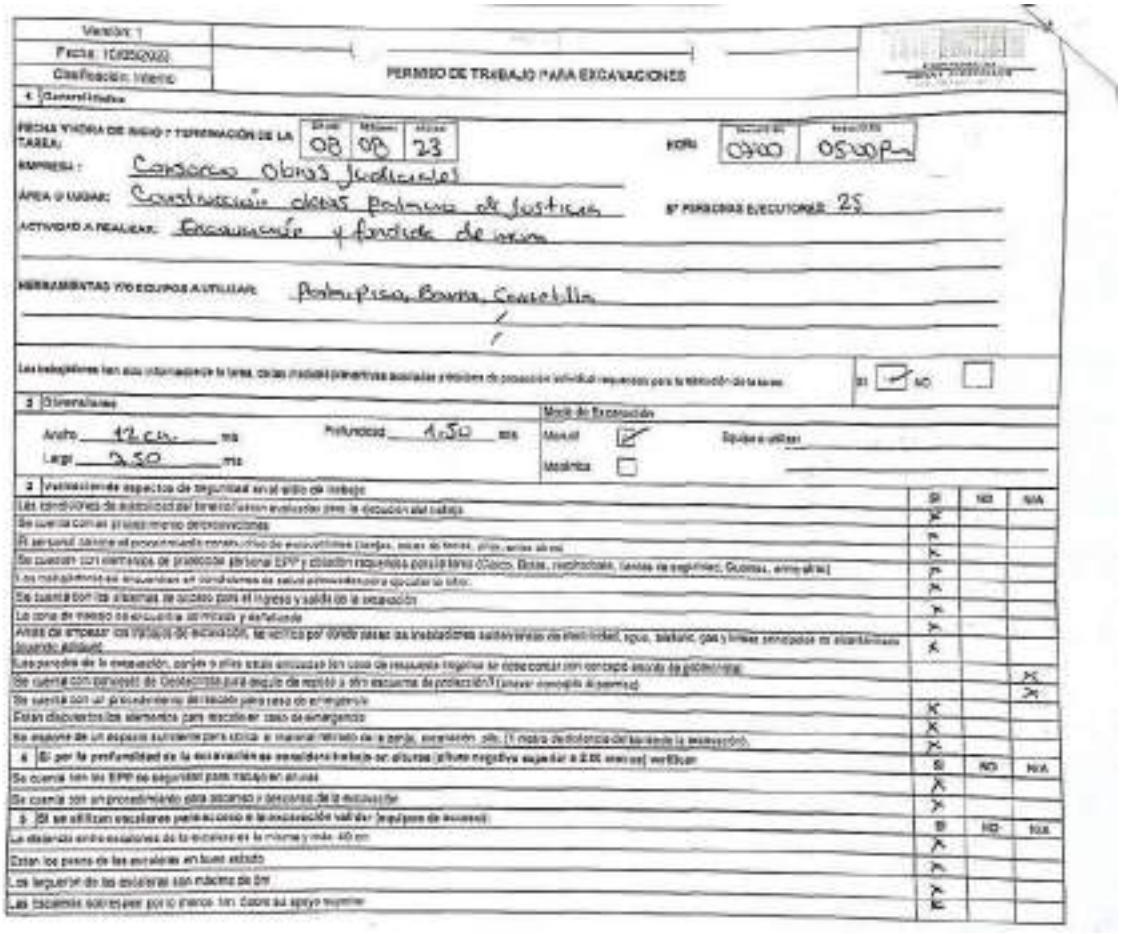

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 08 08 23 HORA: 0700 0500 PM

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción obras Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de viga

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los riesgos presentes asociados y medidas de protección individual requeridas para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]


3 Dimensiones

Ancho 1.2 cm. mts Profundidad 1.50 mts


Largo 2.50 mts

Modo de Excavación: Manual [x] Mecánica [ ] Equipo a utilizar

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un plan manejo de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, sitios de botes, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y elementos requeridos para la tarea (Casco, Botas, cachuchas, tapas de explosivos, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud apropiadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y delimitada	X		
Antes de empezar con trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y demás servicios en el predio/vía usando aplicativo	X		
Los pendientes de la excavación, paredes o pilas están entibadas (en caso de requerirse) Negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto si aplica)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescatar en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (Y nunca a distancia inferior a la profundidad de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se requiere trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 mts) se debe:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para el acceso a la excavación validar (equipos de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más de 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las longitud de las escaleras son máximo de 6m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

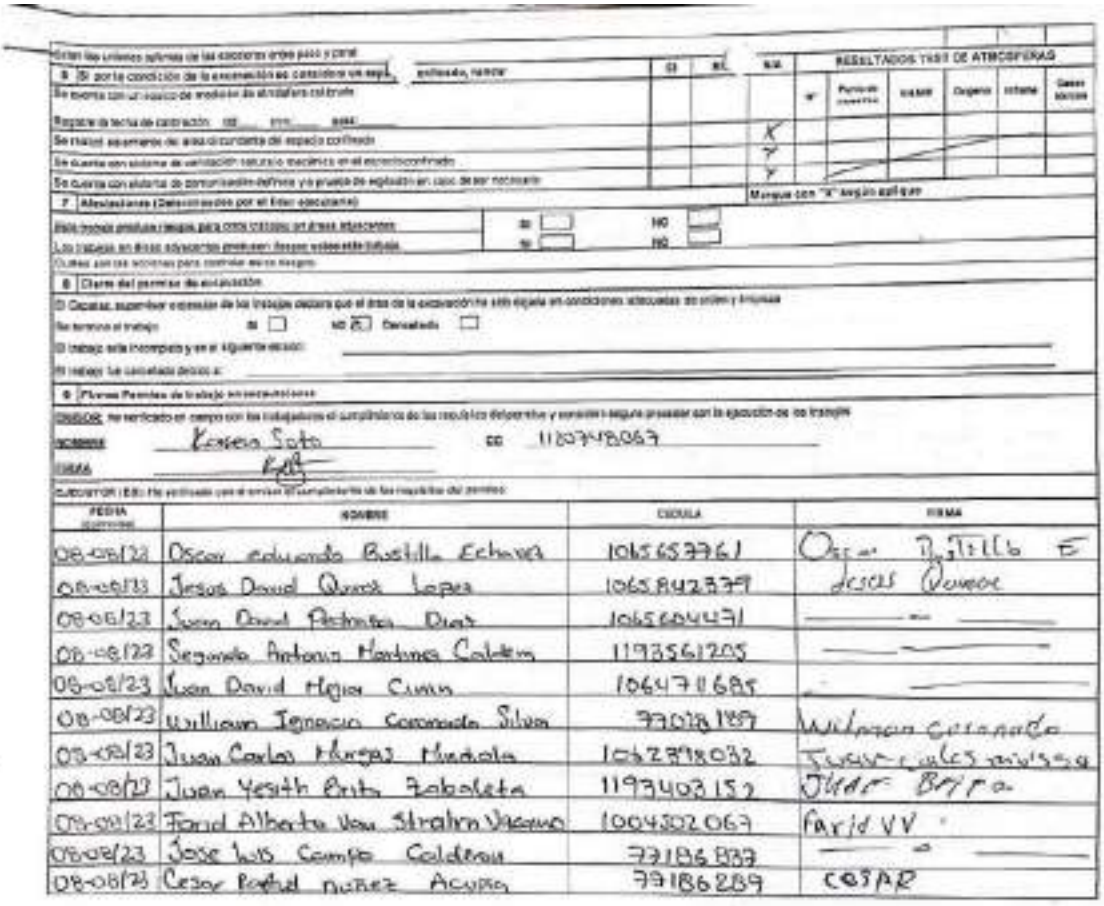

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
08-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065653761	Oscar Bustillo E
08-08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
08-08/23	Juan David Pestana Diaz	1065604431	—
08-08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	—
08-08/23	Juan David Mejia Cuan	1064716895	—
08-08/23	William Ignacio Coronado Silva	73038189	William Coronado
08-08/23	Juan Carlos Monsalve Medrano	1062898032	Juan Carlos Monsalve
08-08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	Juan Brito
08-08/23	Farid Alberto Vega Strahm Vasquez	1004302069	Farid VV
08-08/23	Jose Luis Campo Calderon	73186837	—
08-08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	73186289	CESAR

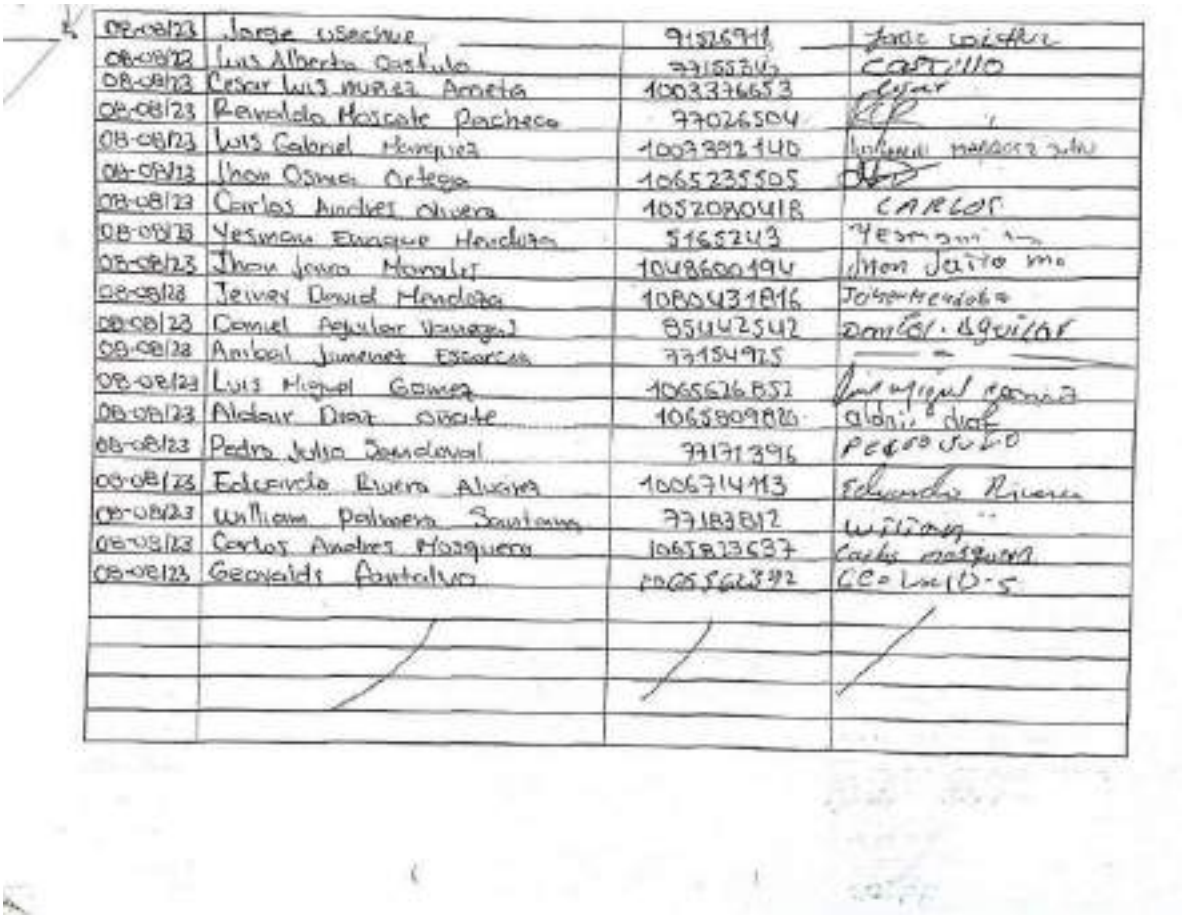

08-08/23	Jorge [illegible]	91816911	Jorge [illegible]
08-08/23	Luis Alberto Castillo	77155345	CASTILLO
08-08/23	Cesar Luis [illegible] Arrieta	1003376653	Cesar
08-08/23	Reynaldo Mascote Pacheco	77026504	
08-08/23	Luis Gabriel Henriquez	1003992140	[illegible]
08-08/23	Jhon Osmer Ortega	1065235505	
08-08/23	Carlos Andres Olivera	1052080418	CARLOS
08-08/23	Yesmon Enrique Hendrix	5165243	Yesmon
08-08/23	Jhon Jairo Morales	1048600194	Jhon Jairo Mo
08-08/23	Jeiver Daniel Hendrix	1080431816	Jeiver Hendrix
08-08/23	Daniel Aguilar Vanegas	85114254?	Daniel Aguilar
08-08/23	Anibal Jimenez Estarcos	77154925	
08-08/23	Luis Miguel Gomez	1065626851	Luis miguel gomez
08-08/23	Aldair Diaz Ocaste	1065809806	aldair diaz
08-08/23	Pedro Julio Sandoval	77171396	Pedro Julio
08-08/23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
08-08/23	William Polanco Santana	77183812	William
08-08/23	Carlos Andres Mosquera	1065833537	Carlos mosquera
08-08/23	Geovaldis Arrieta	1065562892	CC Lm 10-5



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 05 08 23 HORA 6:00 AM 03:00 PM

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación mecanica, Retiro de material, Armada, encofrado, fundida y descimbrada de cortina

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla, Balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual necesarios para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5.0 mts


Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánico [ ] Equipo a utilizar:


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de excavación del terreno fueron evaluadas (antes de iniciación del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cortes, retiro de tierras, picas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y detallen requeridos (casco, botas, reflectivos, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y otras (principales de diámetro alto). Describir aplicado.	X		
Las paredes de la excavación, tanto a poca como profundidad (en caso de respuesta negativa se debe contar con soporte escrito de geotecnista)			X
Se cuenta con personal de Vigilancia para ingreso de equipo y/o alguna maquinaria? (anexar carnet de operario)			X
Se cuenta con un procedimiento de trabajo seguro de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio adecuado para ubicar el material retirado de la zanja excavación, (A metro de distancia de borde de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ingreso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceder a la excavación verificar (aplica para de derrame):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la mitad y más 40 cm	X		
Están las patas de las escaleras en buen estado	X		
Las siguieron de las escaleras son mayor de 6m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		




FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
08-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echeverry	1065637761	Oscar Bustillo E
08-08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
08-08/23	Juan David Patiño Diaz	1065604471	
08-08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
08-08/23	Juan David Mejia Cuvin	1064706685	
08-08/23	Williams Ignacio Coronado Silva	73078189	Williams Coronado
08-08/23	Juan Carlos Hurtado Hurtado	1062398032	Juan Carlos Hurtado
08-08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	Juan Brito
08-08/23	Farid Alberto Vega Stratton Vanegas	1004502063	Farid V V
08-08/23	Jose Luis Campo Calderon	77186889	
08-08/23	Cesar Rafael nuñez Acosta	77186289	C Nuñez

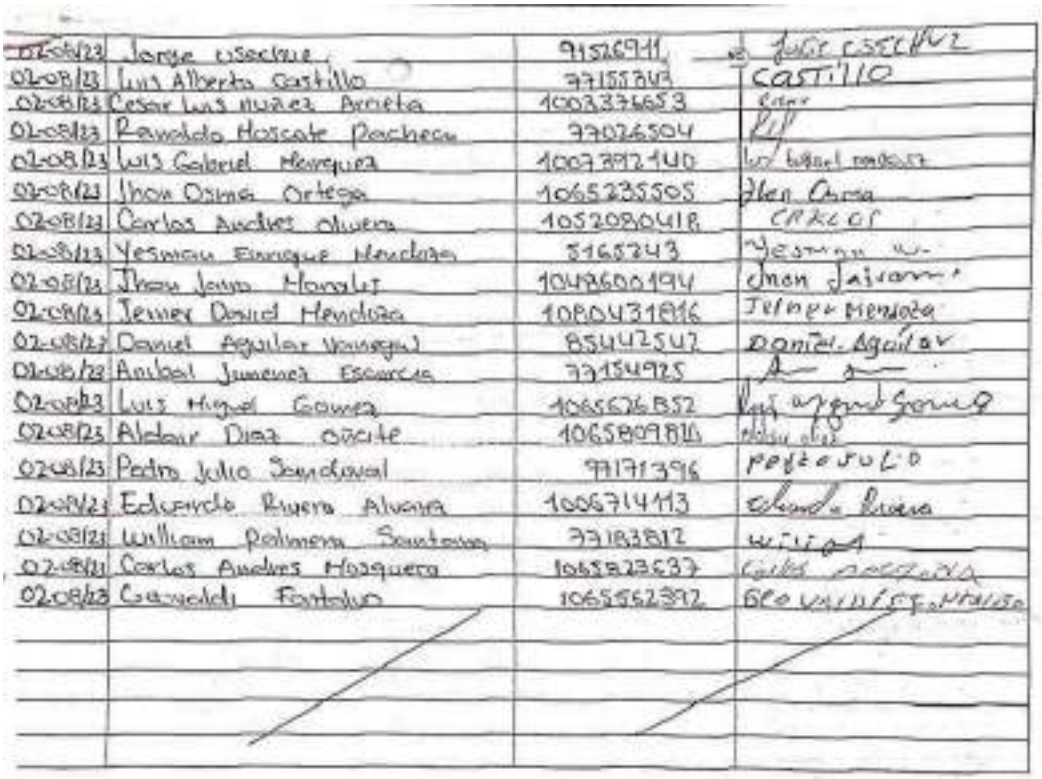

02/08/23	Jorge Useche	91526911	Jorge Useche
02/08/23	Luis Alberto Castillo	97155343	CASTILLO
02/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	Cesar
02/08/23	Reynaldo Hascote Pacheco	970726504	
02/08/23	Luis Gabriel Mesquita	1007392140	
02/08/23	Jhon Osma Ortega	1065235505	Jhon Osma
02/08/23	Carlos Andres Olivera	1052080418	
02/08/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman
02/08/23	Jhon Jairo Morales	1048600194	Jhon Jairo
02/08/23	Jerwer Daniel Mendoza	1080431816	Jerwer Mendoza
02/08/23	Daniel Aguilar Vanegas	85442547	Daniel Aguilar
02/08/23	Anibal Jimenez Escorcia	73154925	
02/08/23	Luis Miguel Gomez	1065626852	
02/08/23	Aledair Diaz Ochoa	1065809816	
02/08/23	Pedro Julio Sandoval	91171396	
02/08/23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	
02/08/23	William Palmera Santana	73183817	
02/08/23	Carlos Andres Mesquita	1065823637	
02/08/23	Gabriel Fontalvo	1065552397	

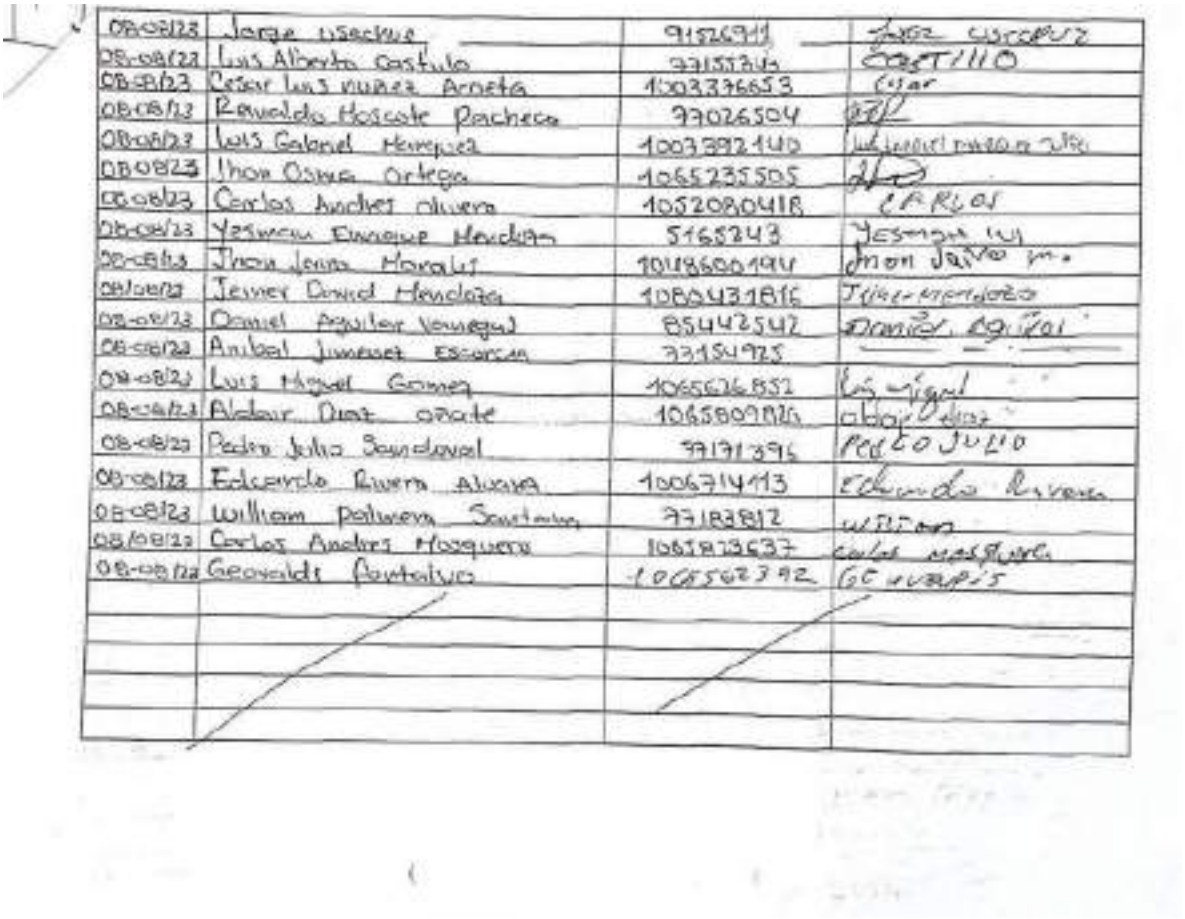

08-08/23	Jorge Usecheve	91526911	Jorge Usecheve
08-08/23	Luis Alberto Castulo	931553245	CASTULO
08-08/23	Cesar Luis nuñez Arneta	1303376653	Cesar
08-08/23	Reynaldo Hoscote Pacheco	970026504	
08-08/23	Luis Gabriel Henquez	1007392140	
08-08/23	Jhon Osma Ortega	1065235505	
08-08/23	Carlos Andres olivera	1052080418	CARLOS
08-08/23	Yesmen Enrique Hendrix	5165243	Yesmen
08-08/23	Jhon Jairo Morales	1014860194	Jhon Jairo M.
08-08/23	Jesner Daniel Hendrix	1084431816	
08-08/23	Daniel Aguilar Venegas	85442542	Daniel Aguilar
08-08/23	Anibal Jimenez Escorcia	931549725	
08-08/23	Luis Miguel Gomez	1065626852	Luis Miguel
08-08/23	Aldair Diaz ayarte	1065809826	aldair
08-08/23	Pedro Julio Sepulveda	91913896	Pedro Julio
08-08/23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
08-08/23	William pallares Santander	971838812	William
08-08/23	Carlos Andres Mosquera	1061873637	carlos mosquera
08-08/23	Geovaldis Fontalvo	1065623792	GEOVALDIS

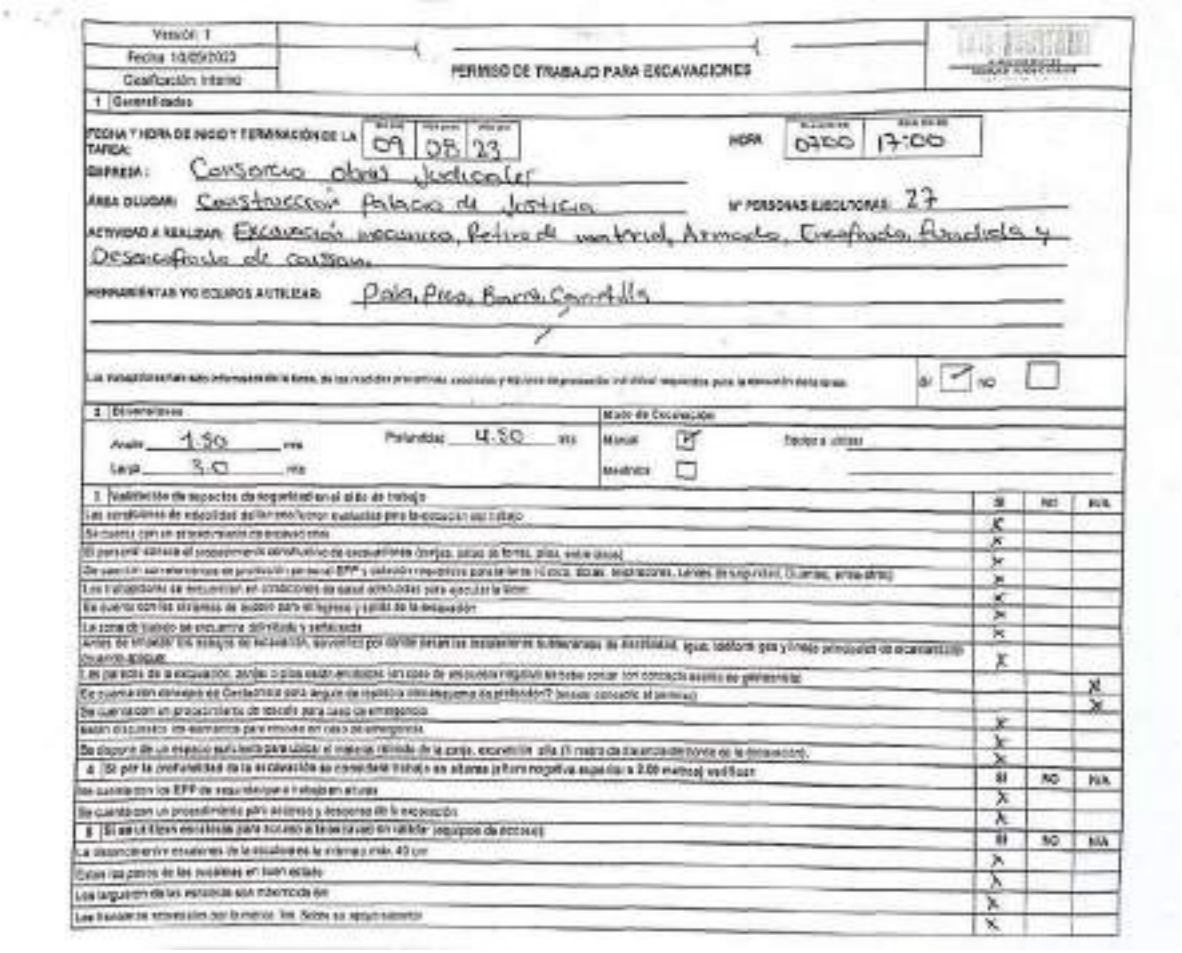

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 09 / 05 / 23 — HORA 07:00 / 17:00

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA OLUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material, Armado, Encofrado, Fundida y Desencofrado de cortina.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS AUTILIAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas colectivas y del uso de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 4.50 mts — Largo: 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánico [ ] Equipo a utilizar:

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno han sido evaluadas para la excavación del talud	X		
Se cuenta con un apuntalamiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cortes, taludes, formas, pilas, entre otros)	X		
Se cuenta con los elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (casco, botas, botas antideslizantes, botas dieléctricas, guantes, arnés, otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con las señales de tránsito para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de iniciar los trabajos de excavación, advierta por donde pasan las canalizaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y drenaje principalmente en el sector donde ubique	X		
En las zonas de la excavación, donde existan personas cerca de la excavación ¿existe algún riesgo de caída de personas u objetos? (cercas, cerramiento, etc.)			X
¿Se cuenta con elementos de Contención para alguna de nuestra colindancias de propiedad? (cercas, cerramiento, etc.)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia	X		
Están ubicados los números para emitirse en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la carga, excavación alla (1 metro de separación como mínimo de la excavación).	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera talud, es ademas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para el trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan estructuras para soporte o bracing (uso de tablas, equipos de acceso)	SI	NO	N/A
La separación entre codales de la estructura es la indicada (máx. 40 cm)	X		
Están las patas de los puntales en buen estado	X		
Las longitudes de las estacas son adecuadas (m)	X		
Las tablas de entibación son la mínima. Las fallas se apuntalamiento	X		

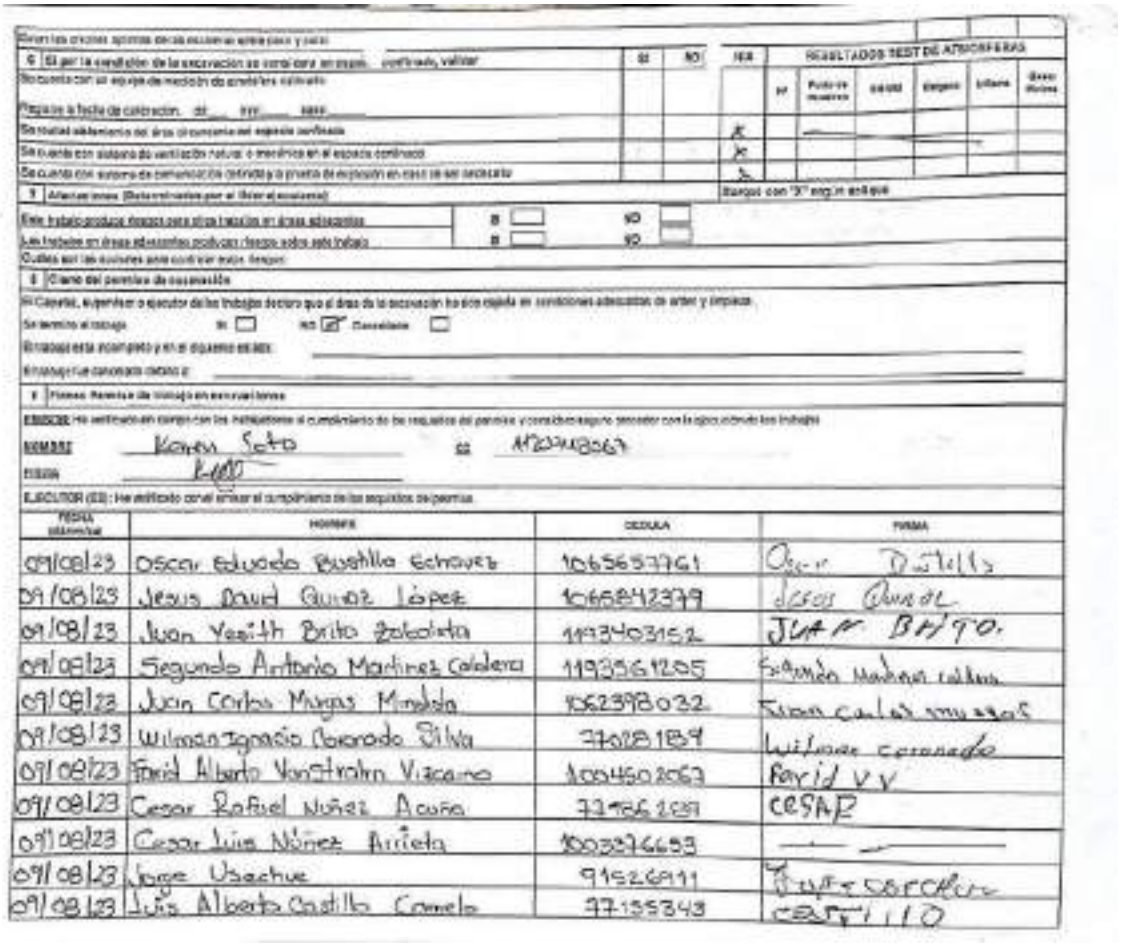

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
09/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065637761	
09/08/23	Jesus David Guiraz López	1066842379	
09/08/23	Juan Yesith Brito Zalaeta	1193403152	
09/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
09/08/23	Juan Carlos Mugas Maestre	1062398032	
09/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
09/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1065450263	
09/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77166209	
09/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376693	
09/08/23	Jorge Usechue	91526911	
09/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

07	08	23	Reinaldo Miranda Pacheco	77026504
07	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140
08	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065295505
08	08	23	Carlos Andres Oliveros Franco	1052084418
09	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	9165243
07	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194
07	08	23	Juan David Mejia Cano	1064911625
09	08	23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816
09	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vargas	85442542
07	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154825
09	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852
09	08	23	Didair Luis Diaz Oiste	1065859820
09	08	23	Pedro Luis Sandoval Vargas	77171896
09	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113
09	08	23	Geswaldi Enrique Tostaino Mabe	1065562239
09	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065829637
09	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 09 / 08 / 23 HORA: 09:00A 5:00 pm.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS A INTERVENIR: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de muro de limpieza.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lavida

Los trabajadores han sido informados de la tarea que van a realizar y los riesgos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho: 1.2 mts Profundidad: 3.0 mts Largo: 7.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ] Equipo a utilizar: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lavida

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de orden y aseo del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (riesgos, caída de tierra, cual, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores son sometidos a exámenes de salud ocupacional para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los puntos de anclaje para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de ejecutar los trabajos de excavación, se verificó con planos posibles interferencias (redes eléctricas, agua, telefonía, gas y demás) para la ejecución de excavaciones (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, antes o al ser subterráneas son visualmente seguras se cree conveniente estado de conservación			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnia o para seguir de repisa u otra seguridad de protección? anexar concepto al permiso			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja excavación, p/e. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 2.00 metros verificar)	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para entrada y salida de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para ingreso a la excavación señale (incluye de acceso)	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las tapaderas de las escaleras son mínimo 60 SP	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el nivel superior	✓		



Enlistar las 5 ordenes optimas de los accidentes entre pico y pala

6 | Si por la condición de la excavación se considera un espa... derrumbe, vuelco

	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de atmosferas tóxicas. Registre la hora de calibración: Hr: ___ min: ___ seg: ___			
Se realiza monitoreo del área circundante del espacio confinado		X	
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado		X	
Se cuenta con sistema de comunicación efectivo y/o prueba de explosivos en caso de ser necesario		X	

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

	Hr	Punto de muestreo	oxigeno	Inflamable	Gases tóxicos

7 | Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Esta trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz Supervisor ejecutor de los trabajos declara que el sitio de la excavación ha sido dejado en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo: SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Se continua con la excavación y Evitado del muro de limpieza

El trabajo fue terminado/cerrado a: ___

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Duncan Salcedo CC: 4098023

FIRMA: [signature]

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA INSPECCIÓN	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
08/08/23	Oscar Eduardo Castillo Echavez	1065657761	[signature]
08/08/23	Jesus David Guiaz Lopez	1066942379	[signature]
08/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	[signature]
08/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	[signature]
08/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062998232	[signature]
08/08/23	Wilmer Ignacio Coronado Silva	77018189	[signature]
08/08/23	Farid Alberto Vanstralen Villamil	1004502067	[signature]
08/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	[signature]
08/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376637	[signature]
08/08/23	Jorge Usechue	91126911	[signature]
08/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	[signature]

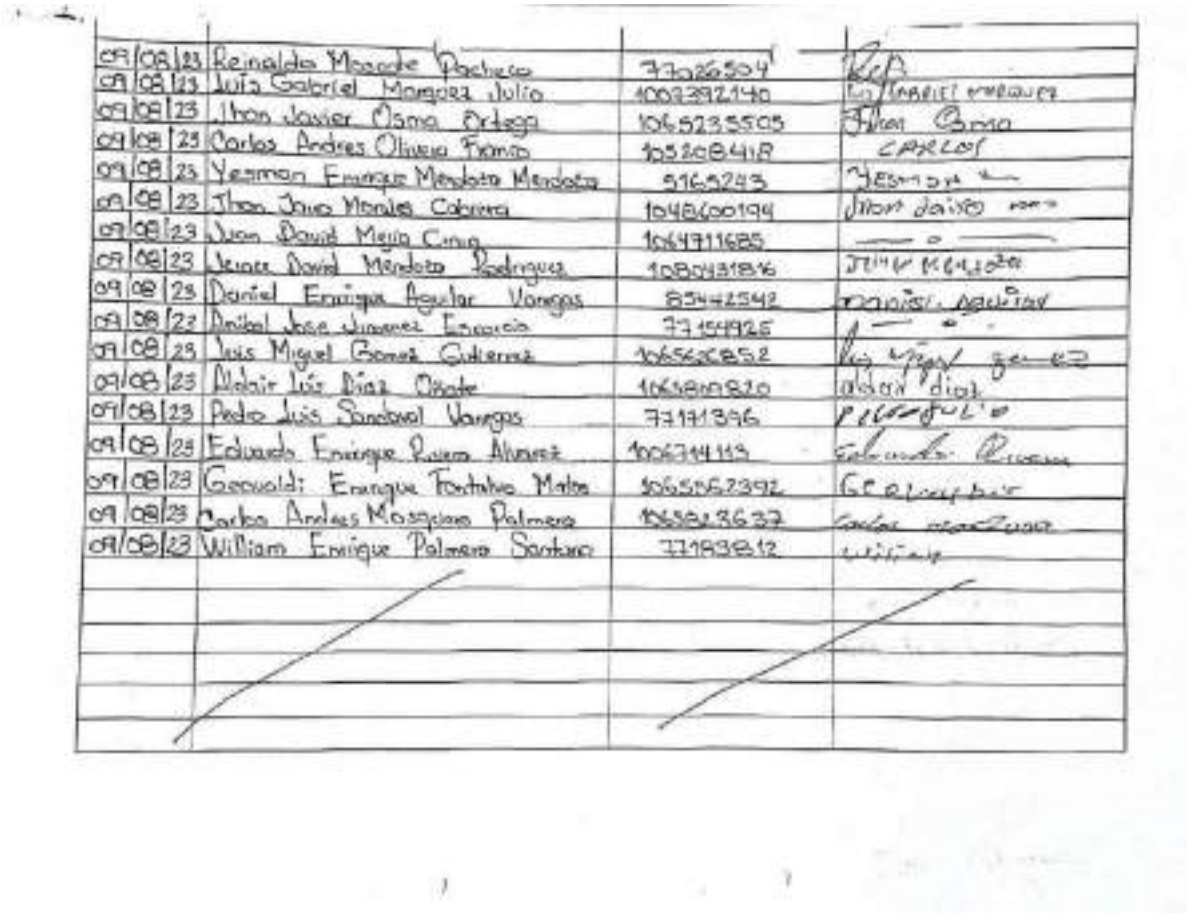

09/08/23	Reinaldo Maceda Pacheco	77026504	
09/08/23	Luis Gabriel Moreno Julio	1003392140	
09/08/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
09/08/23	Carlos Andres Oliveira Franco	1052084118	
09/08/23	Yeyman Enrique Mendoza Mendoza	91652243	
09/08/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
09/08/23	Juan David Mejia Cano	1064911685	
09/08/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
09/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
09/08/23	Anibal Jose Jimenez Estrada	77154926	
09/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
09/08/23	Alcair Luis Diaz Conde	1065809820	
09/08/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
09/08/23	Eduardo Enrique Pinto Alvarez	1006714113	
09/08/23	Gerald Enrique Fontalvo Mateo	1065862392	
09/08/23	Carlos Andres Mazzino Palmera	1065836637	
09/08/23	William Enrique Palmera Santana	77189812	



PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 11 08 23 HORA 0800 0500 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de viga de limpieza

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de todos los riesgos a los cuales estarán expuestos y medidas preventivas individuales necesarias para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

1 Dimensiones

Ancho: 1m mts Profundidad: 3.0 mts Largo: 7.5 mts


Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ Equipo a utilizar:

2 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cargo, pesos de tierra, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación adecuados para labores (Casco, botas, reflectividad, tapones de oído, guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con las señales de aviso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y aislada con	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y si son principales de abastecimiento	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de presentar la negativa se debe contar con concepto escrito de profesional)			X
Se cuenta con concepto de geotecnista para alguno de ellos y/o un esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de alguna pérdida			
Están ubicados los números para reporte de caso de emergencia	X		
Se dispone de un vehículo suficiente para evacuar al trabajador en caso de accidente. (Tiempo de distancia del lugar de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se requiere trabajo en altura (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar requisitos de acceso:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y está igual	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son de una sola pieza	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el nivel superior	X		

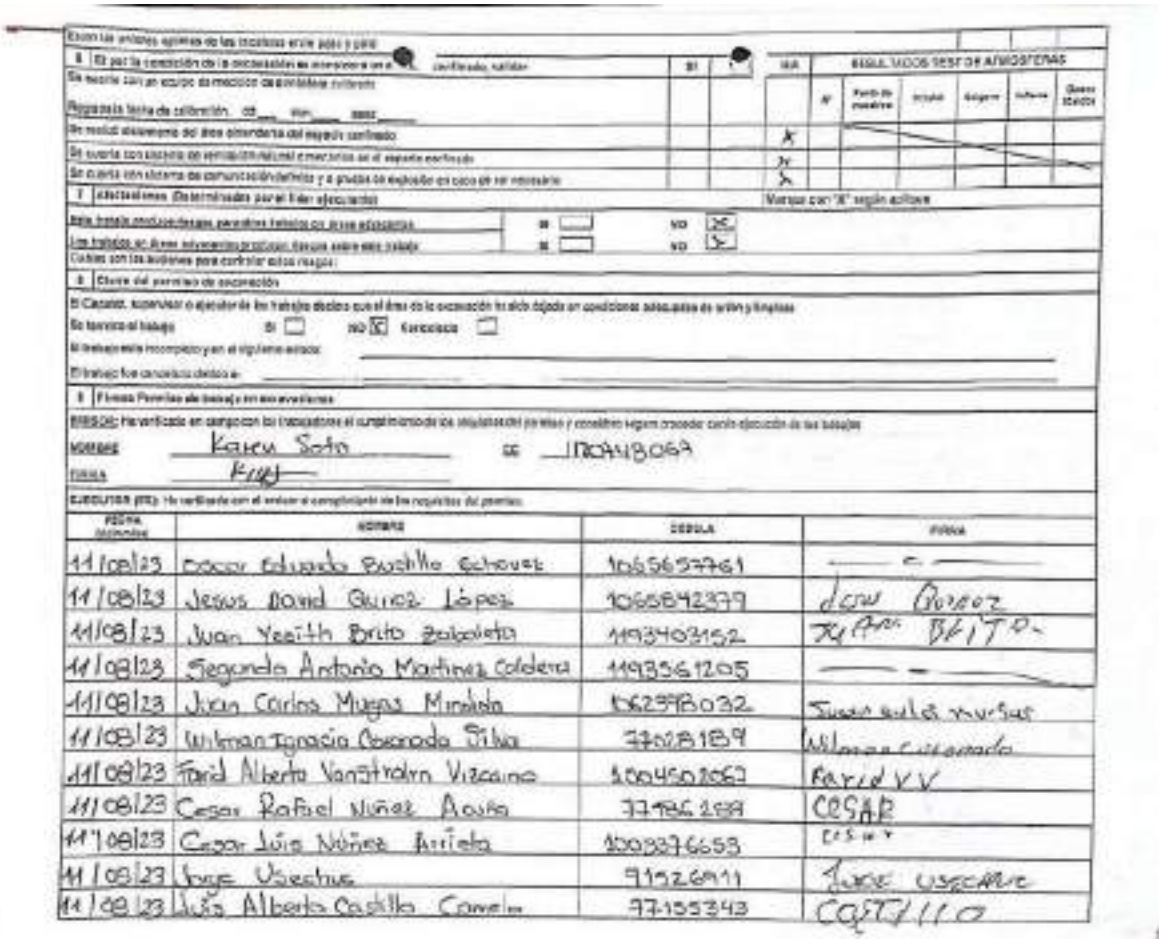


Karen Soto — CC 1104418069

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
11/08/23	Cesar Eduardo Portillo Echeverr	1065637761	
11/08/23	Jesus David Gomez Lopez	1065842379	
11/08/23	Juan Yesith Brito Zalgedo	1193403152	
11/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
11/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1063980032	
11/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	3702181B9	
11/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1064502062	
11/08/23	Cesar Rafael Nuñez Rosa	77966199	
11/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
11/08/23	Jorge Useche	91926911	
11/08/23	Luis Alberto Castillo Correa	77155343	

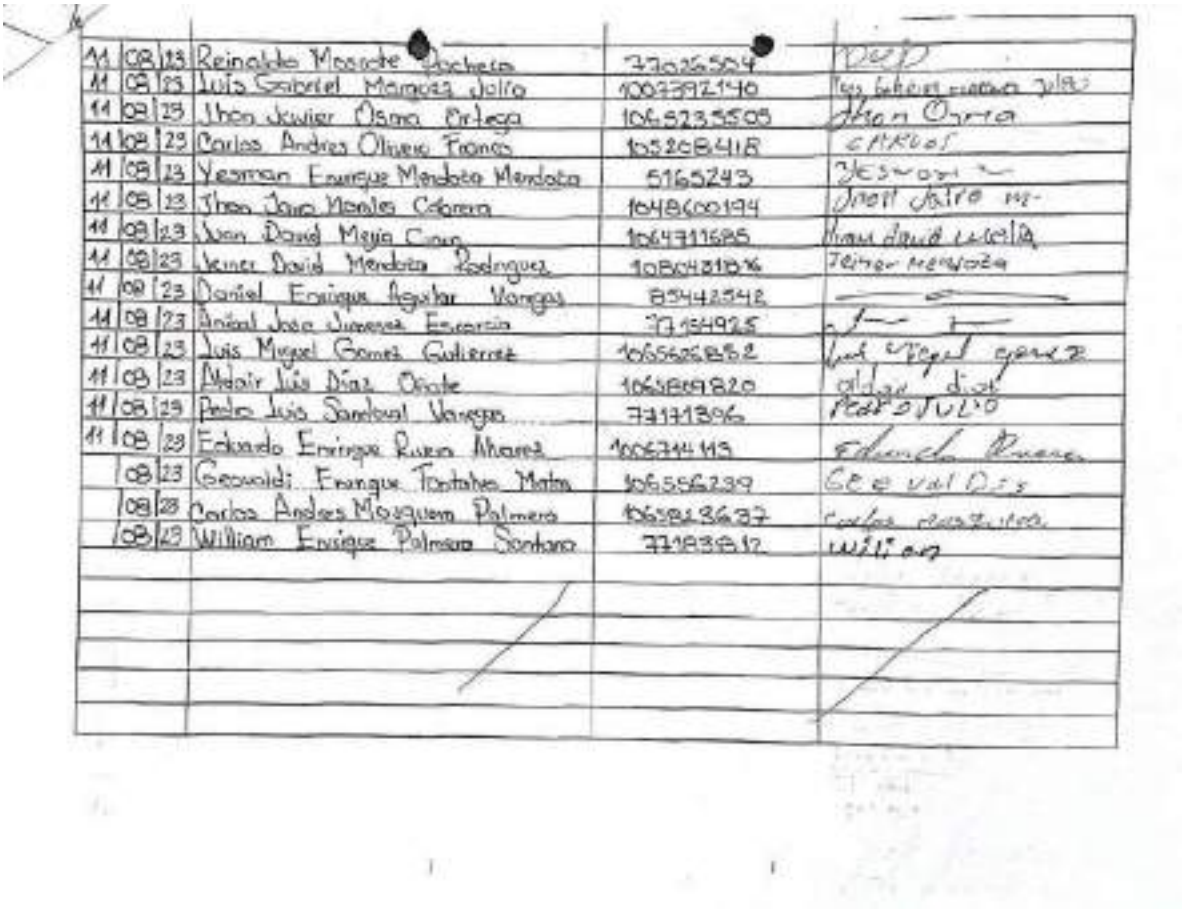

11	08	23	Reinaldo Mesache Pacheco	77026504	
11	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003992140	
11	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
11	08	23	Carlos Andres Oliveo Franco	1052084118	
11	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243	
11	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048000194	
11	08	23	Juan David Mejia Cano	1064711685	
11	08	23	Jaiver David Mendoza Rodriguez	1080431076	
11	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442548	
11	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
11	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
11	08	23	Alexis Luis Diaz Oyola	1065869820	
11	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171306	
11	08	23	Eduardo Enrique Ruiz Alvarez	1066744119	
	08	23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mateo	1065562239	
	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065813637	
	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812	

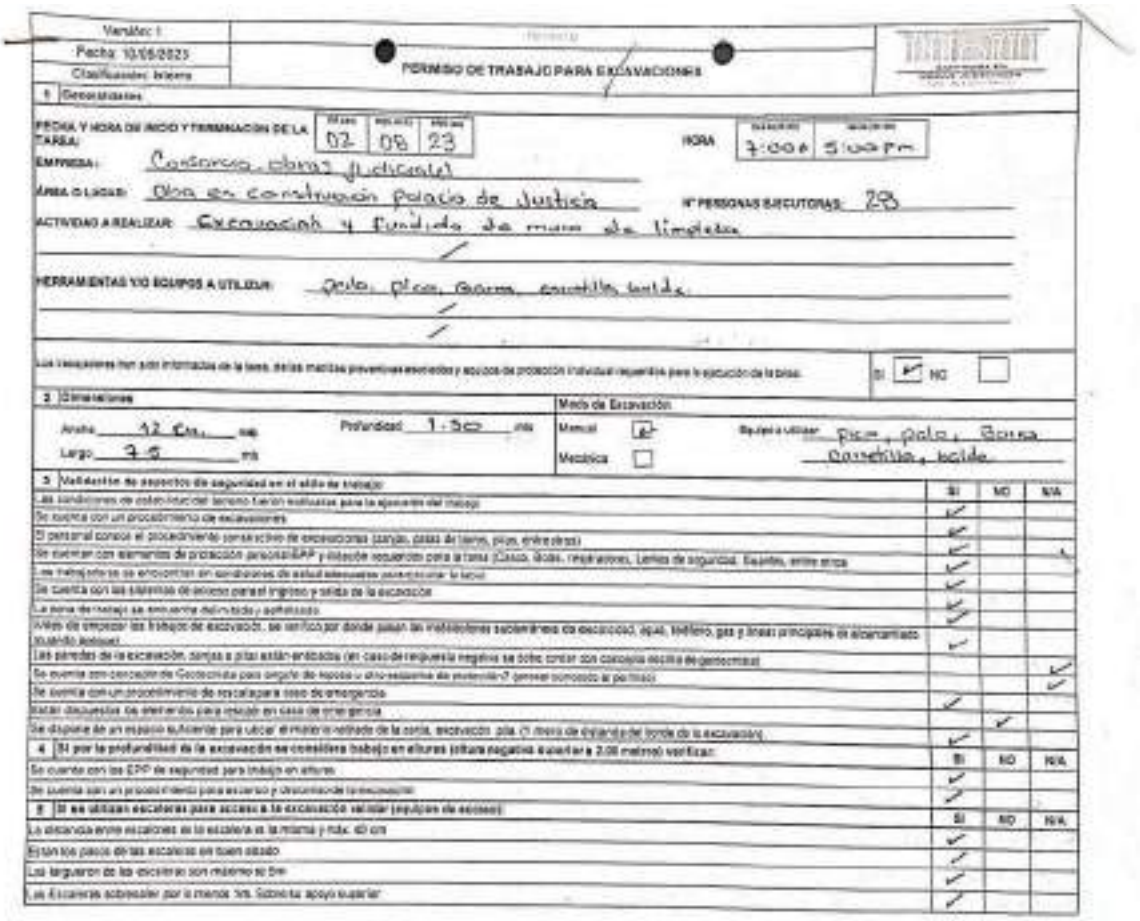

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 02 Mes 08 Año 23 — HORA 7:00 a 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y Fundida de muro de limpieza

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, cuerdita, cal.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 12 Cm. mts — Profundidad 1.50 mts — Largo 7.5 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: Pica, pala, Barra, Cuerdita, cal.

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de tierra, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con elementos de protección personal EPP y botiquín requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con las alternativas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (usando detector)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro sistema de contención? (anexar concepto si aplica)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de una emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
El ancho de los escalones es igual o mayor a 50 cm	✓		
Las largueros de las escaleras son mayores a 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobrepasa apoyo superior	✓		



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 10 / 08 / 23 — HORA: 7:00 a.m. — 5:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de muro de limpieza

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pica, pala, Barra, cuerilla, balde.

Los trabajadores han sido informados de los tipos, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 1.2 Cm. mts — Profundidad: 3.0 mts — Largo: 3.0 mts


Modo de Excavación: Manual ☑ — Maquina ☐ — Equipo a utilizar: pala, pica, Barra cuerilla

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución de tareas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce ampliamente como actúa de excavaciones (zanja, pozo de brinel, pilas, otros cuales)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y colectiva (señales para la obra (Cinta, Bolas, reflectivos, Tarabo de seguridad, Guardas, extintores)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con las escalinas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado cuando aplique	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de encontrar material negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnia o para ángulo de reposo y sin entibado? (anexar concepto o permiso)			✓
Se cuenta con el procedimiento de rescate para casos de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio auxiliado para colocar el material retirado de la zanja, excavación a/a. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 2.00 metros verticales)	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de almacen)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es uniforme y max. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los terminan de las escalinas son mayor de 2m	✓		
Las escaleras sobresalen por la menos 1m. Sirve de apoyo superior	✓		



FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
10/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	
10/08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
10/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
10/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderin	1193561205	
10/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062886032	
10/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	7702B189	
10/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502662	
10/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77196289	
10/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003976653	
10/08/23	Jorge Ubeche	91526911	
10/08/23	Luis Alberto Castillo Correa	77155343	

10	08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	7702620
10	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140
10	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1069235505
10	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418
10	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243
10	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194
10	08	23	Juan David Mejia Cano	1047911685
10	08	23	Jaiver David Mendoza Rodriguez	1080431816
10	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	83442342
10	08	23	Anibal Jose Juarez Escorcia	7715492
10	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852
10	08	23	Nelvir Luis Diaz Conde	1065809820
10	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	7371172996
10	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113
10	08	23	Gerardo Enrique Fontalvo Mateo	1065562397
10	08	23	Carlos Andres Manjarres Palmera	1063836837
10	08	23	William Enrique Palmera Sanchez	7718395

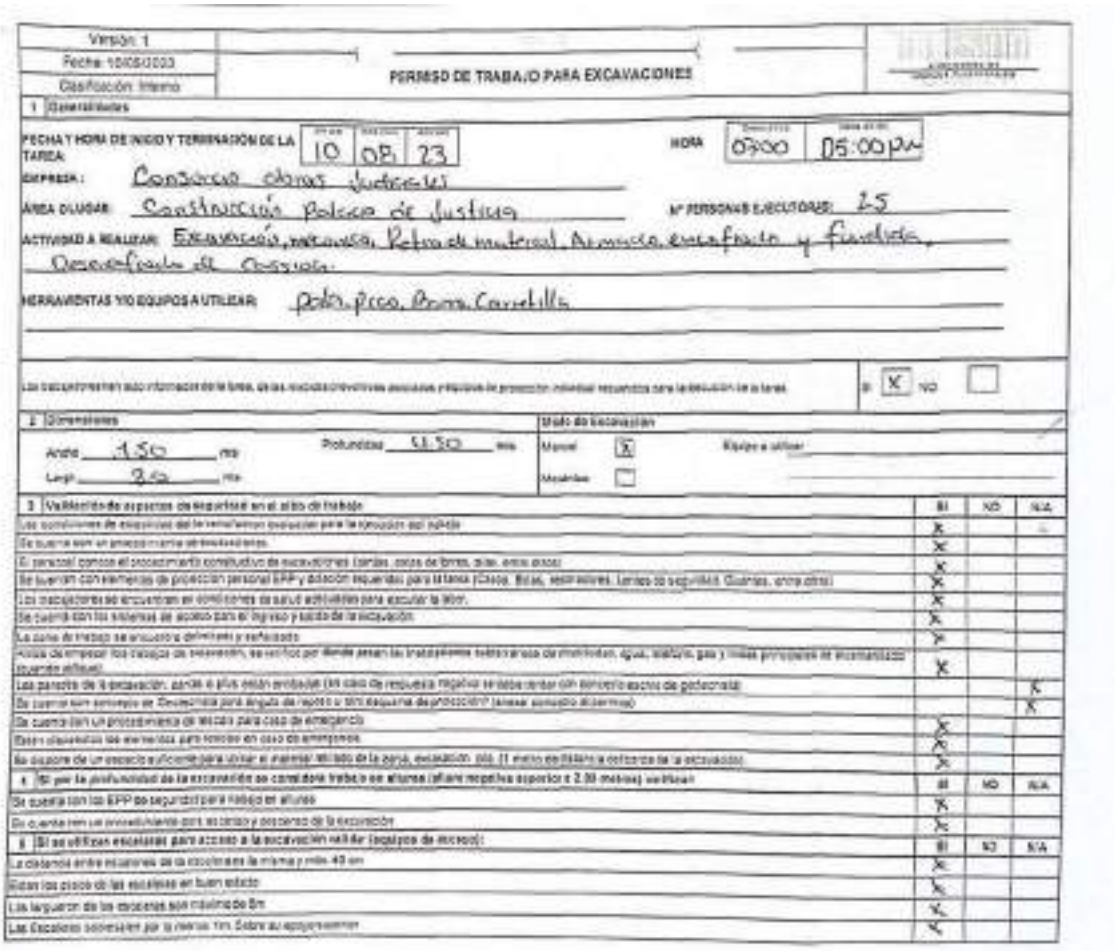

Versión: 1
Fecha: 10/08/2020
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACION DE LA TAREA: 10 | 08 | 23 — HORA 07:00 — 05:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

AREA DE LABOR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro, Retiro de material, Armado, encofrado y fundida. Desencofrado de concreto.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y medidas de protección colectiva requeridas para la ejecución de la tarea. SI [X] NO [ ]

2 Dimensiones


Ancho 1.50 mts — Profundidad 1.50 mts — Largo 2.40 mts

Modo de excavación: Manual [X] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar:

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de excavación del terreno/tipo excavación para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constitutivo de excavaciones (zanjas, pozos de brres, silos, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, gafas, guantes, Cuerdas, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con las escaleras de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifico por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y redes principales de alcantarillado (cuando aplique)	X		
Los paredes de la excavación, zanjas o pilas están protegidas (En caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de profesional)			X
Se cuenta con servicios de Ambulancia para ángulo de riesgo o con esquema de prevención? (anexar concepto de ambos)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles las escaleras para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para evitar el material retirado de la zanja, excavación, (al menos 1 metro de distancia a partir de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura respectiva superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm	X		
Están los pisos de las escaleras en buen estado	X		
La longitud de las escaleras son máximo de 6m	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

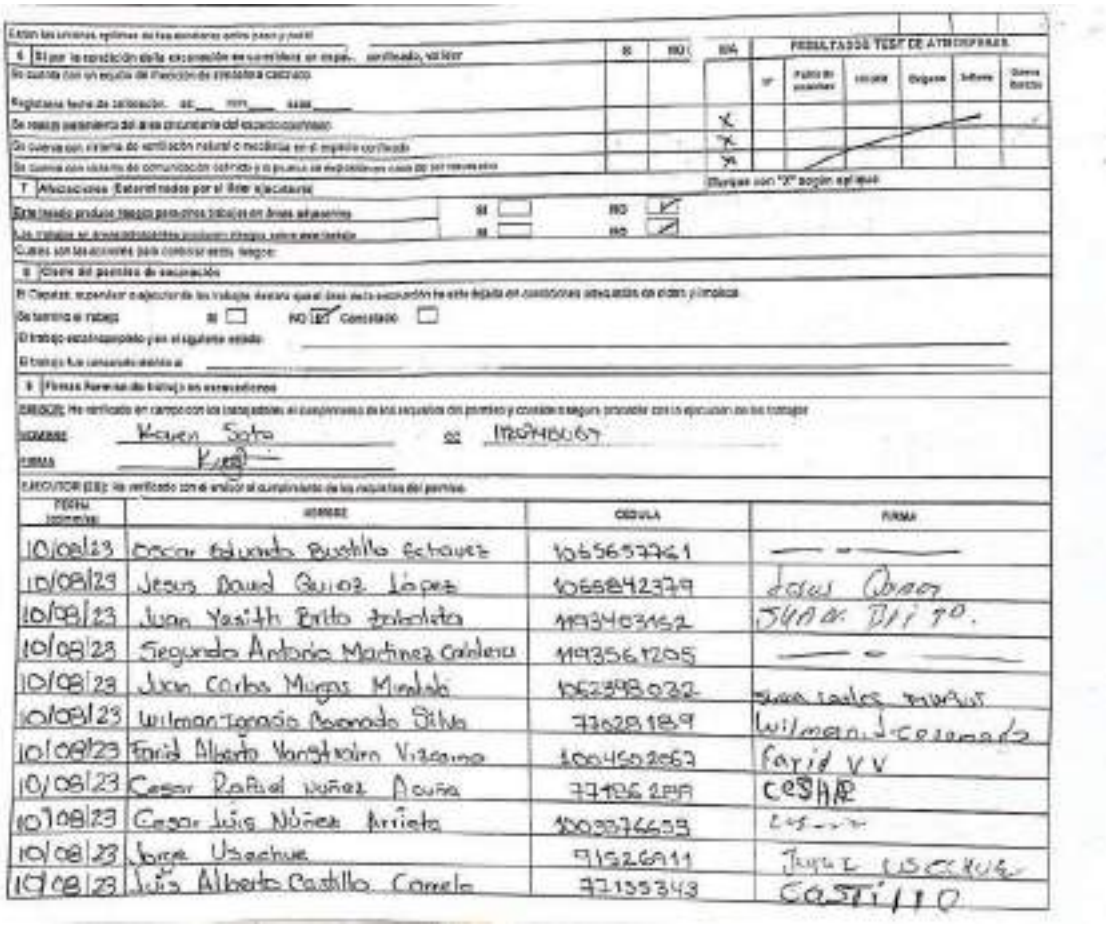

FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
10/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echaves	1065637761	
10/08/23	Jesus David Ortiz López	1066842379	
10/08/23	Juan Yesith Pitto Estrada	1193403452	
10/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193567205	
10/08/23	Juan Carlos Murgas Montaño	1052398032	
10/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
10/08/23	Farid Alberto Vanegas Vizcaino	1064502063	
10/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77196289	
10/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003776639	
10/08/23	Jorge Usechue	91526911	
10/08/23	Luis Alberto Castillo Correa	77135343	

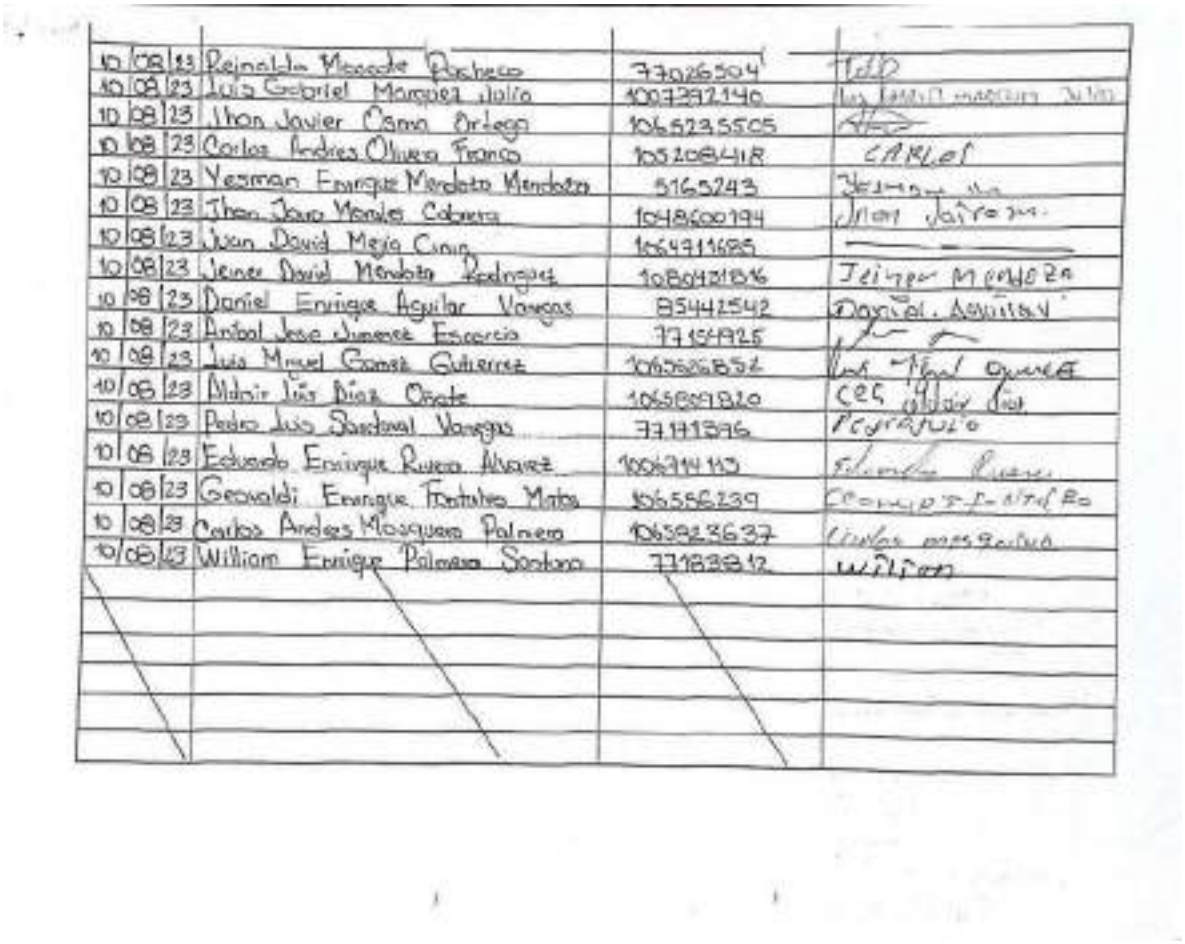

10	08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026504	
10	08	23	Luis Gabriel Marquez Avila	1007392140	
10	08	23	Jhon Javier Cama Ortega	1065235505	
10	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418	
10	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243	
10	08	23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1048600194	
10	08	23	Juan David Mejia Cama	1064911685	
10	08	23	Jaiver David Mendoza Rodriguez	1080421846	
10	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
10	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
10	08	23	Luis Miguel Gamez Gutierrez	1065626852	
10	08	23	Nilsair Luis Diaz Conde	1065859820	
10	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
10	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1004744113	
10	08	23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mora	1065556239	
10	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1063923637	
10	08	23	William Enrique Palmera Santana	77182812	



PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 11 Mes 08 Año 23 — HORA: 07:00 — 05:00

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales Valledupar

UNIDAD FUNCIONAL: Construcción Palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTANTES: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (carga con balde) Encofrado, Anclados, Descapote de Cerramiento

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Pico, Barra, Carretilla, Balde


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los riesgos preventivos asociados y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones


Ancho 1.50 mts — Profundidad 4.50 mts — Largo 5.0 mts

Modo de Excavación: Manual [x] Mecánico [ ] — Escalas a utilizar:


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tanques de almacenamiento, pilas, entre otros)	X		
Se cuenta con elementos de protección personal, EPP y protección respiratoria para la tarea (Casco, Botas, cauchera, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con las escalas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar las labores de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, tanto o pilas están entibadas (en caso de requerir) o tienen un concepto técnico de estabilidad			X
Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulo de reposo o con esquema de protección (taludes, concreto lanzado)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espejo auxiliar para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (Altura superior a 1.80 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para ingresar a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La escalera sobresale de la excavación a lo menos 1 m	X		
Están las patas de las escaleras en buen estado	X		
Las amarras de escaleras son adecuadas	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

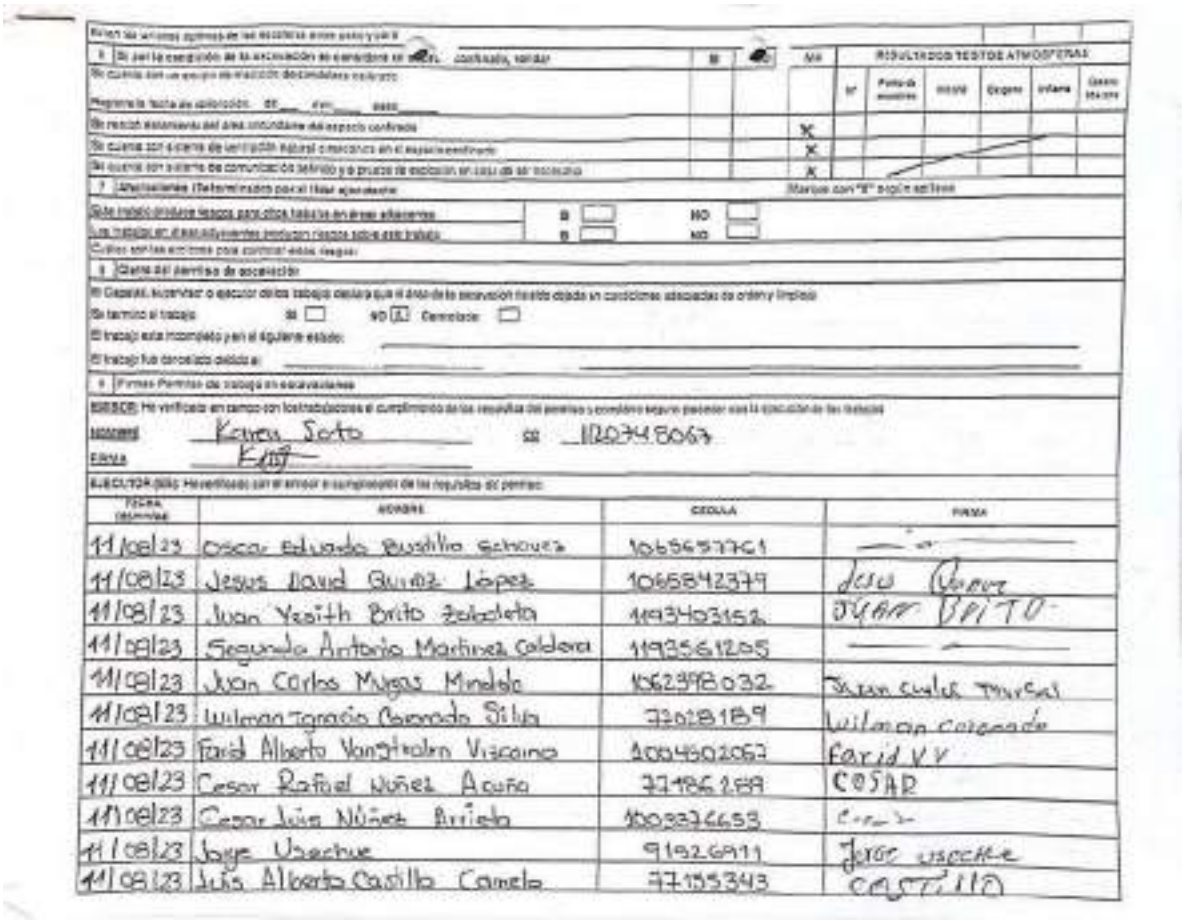

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
11/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	
11/08/23	Jesus David Guerra López	1066842379	
11/08/23	Juan Yesith Brito Zalaeta	1193403152	
11/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
11/08/23	Juan Carlos Mugas Mindeb	1062398032	
11/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	32028189	
11/08/23	Farid Alberto Vanstralen Visconi	1004602067	
11/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186169	
11/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
11/08/23	Jorge Usechue	91926911	
11/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

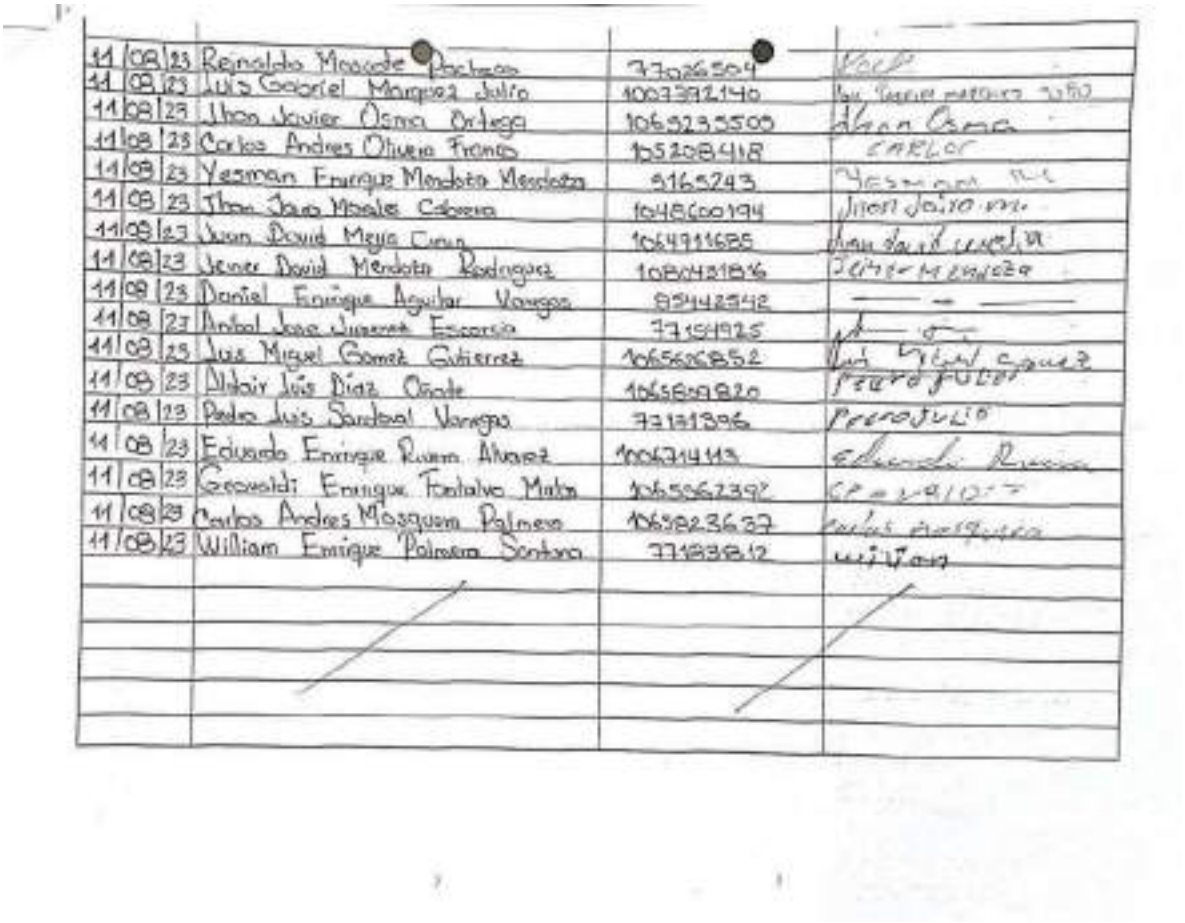

11	08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026504
11	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003392140
11	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235509
11	08	23	Carlos Andres Oliveo Franco	1052084118
11	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	9165243
11	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194
11	08	23	Juan David Mejia Cuna	1064911685
11	08	23	Jaimer David Mendoza Rodriguez	1084431836
11	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	93442542
11	08	23	Anibal Jose Juarez Escorcia	77154925
11	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852
11	08	23	Alnair Luis Diaz Conde	1065609820
11	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	73131396
11	08	23	Eduardo Enrique Ruan Alvarez	1004714113
11	08	23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mieles	1065562392
11	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637
11	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812

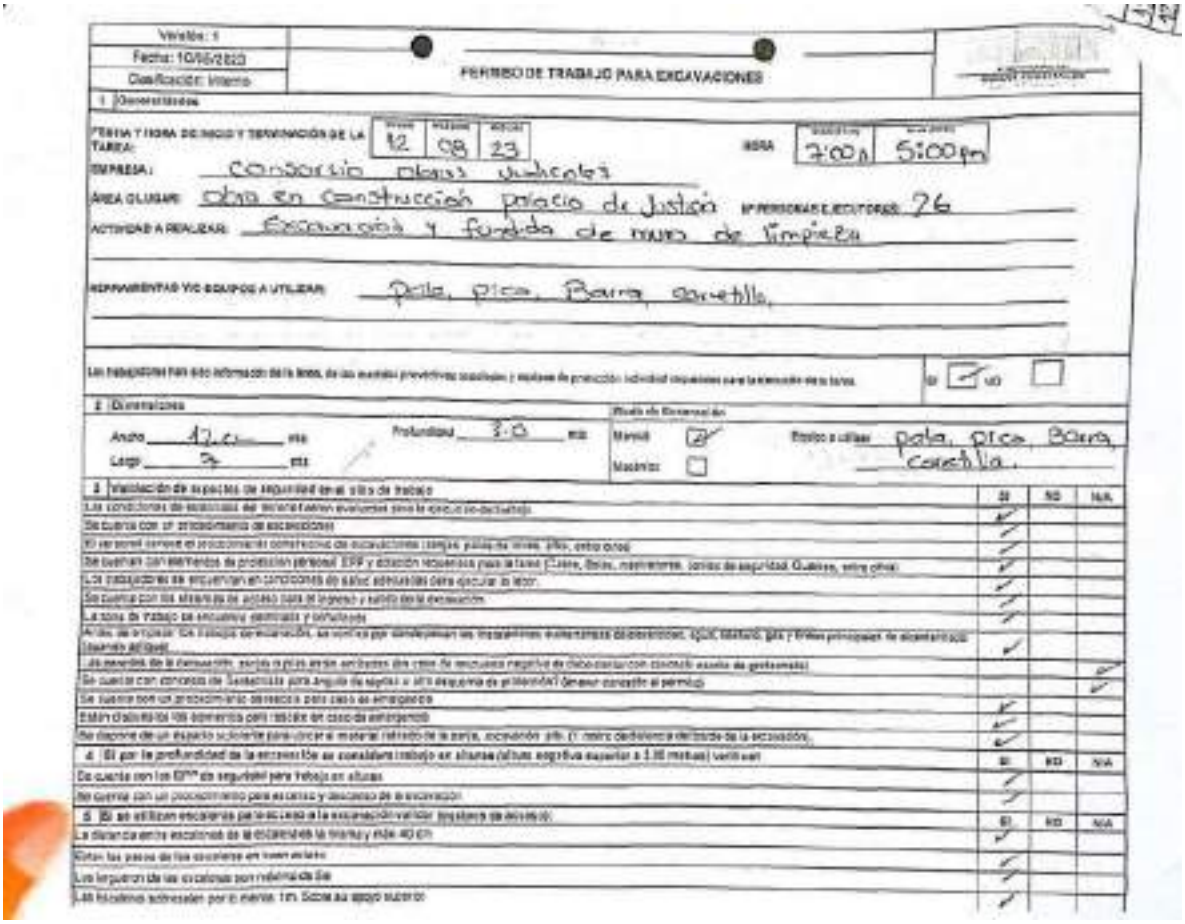

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 12 / 08 / 23 — HORA: 7:00 a 5:00 pm

EMPRESA: consorcio obras judiciales

AREA O LUGAR: obra en construcción palacio de justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación y fundida de muro de limpieza

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, Barra, carretilla.


Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y medidas de protección individual requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 | Dimensiones

Ancho 1.2 mts — Profundidad 3.0 mts — Largo 3 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: pala, pica, Barra, carretilla.

3 | Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas antes de ejecutar la actividad	✓		
Se cuenta con el procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tablaestacado, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y señalización requeridos para la tarea (Casco, Botas, reflectivos, chaleco de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y delimitada	✓		
Antes de iniciar las labores de excavación, se verifica por identificación las instalaciones subterráneas de servicios, (gas, telefonía, agua y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique))	✓		
En caso de que la excavación supere los 1.5 metros de profundidad se cuenta con el permiso respectivo de trabajo seguro con controles escritos de gerenciamiento			✓
Se cuenta con concepto de Sostenibilidad para ángulo de talud o otro esquema de estabilidad (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia	✓		
Están capacitados los trabajadores para el rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la pared, excavación, pila. (1 metro alrededor del borde de la excavación)	✓		
4 | Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajos en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para el acceso y descenso de la excavación	✓		
5 | Si se utilizan escaleras para el acceso de la excavación verificar lo siguiente de acuerdo a:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y esta 40 cm	✓		
Estan las patas de las escaleras en buen estado	✓		
Las longitudes de las escaleras son referencia de 6m	✓		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

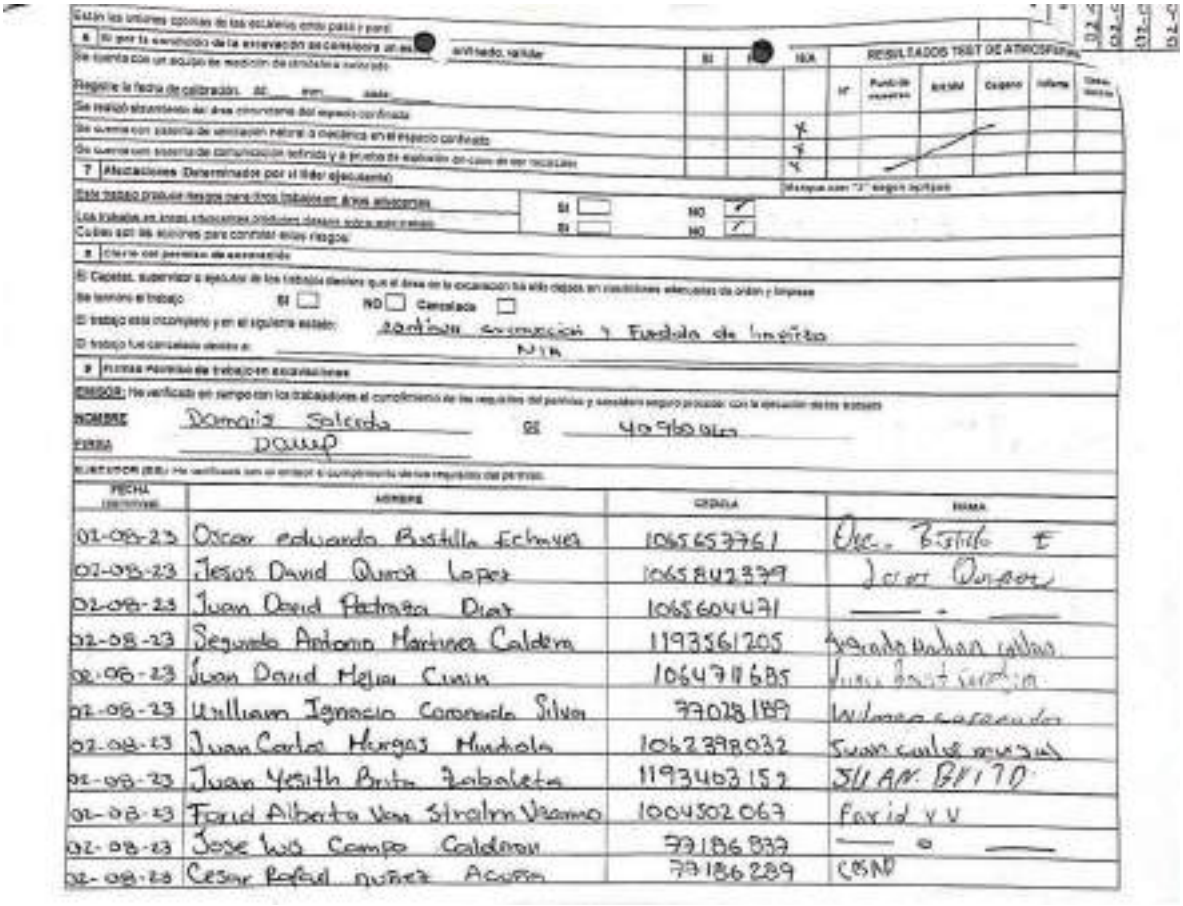

Están las anteriores opciones de las actividades antes pasar a pare:

6	Si por la naturaleza de la excavación se requiere un es...	actividad, señalar	SI	NO	N/A	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERA					
	Se cuenta con un equipo de medición de gases a realizar										
	Registre la fecha de calibración: dd mm aaaa										
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado										
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado				X						
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y la prueba de evaluación en caso de ser necesario				X						
7	Afectaciones Determinados por el líder ejecutante										

Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI		NO	X
Los trabajos en estas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI		NO	X

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8	Cierre con permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo: SI ☐ NO ☐ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Apertura excavación y Fundida de Concreto

El trabajo fue cancelado debido a: N/A

9	Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


ENTIDAD: He verificado en compañía con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de las labores

NOMBRE: Domaris Salcedo CC 40960965

FIRMA: Domaris

SUPERVISOR (ES): He verificado con mi equipo el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
01-08-23	Oscar eduardo Bastilla Echeverria	1065637761	Osc. Bastilla E
02-08-23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842339	Jesus Quiroz
02-08-23	Juan David Patroza Diaz	1065604431	—
02-08-23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez Caldera
02-08-23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	Juan David Mejia
02-08-23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	William Coronado
02-08-23	Juan Carlos Vargas Mendoza	1062398032	Juan Carlos Vargas
02-08-23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193463152	JUAN BRITO
02-08-23	Farid Alberto Vega Stralma Vasmo	1004302067	Farid V V
02-08-23	Jose Luis Campo Calderon	77186839	—
02-08-23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	CRN

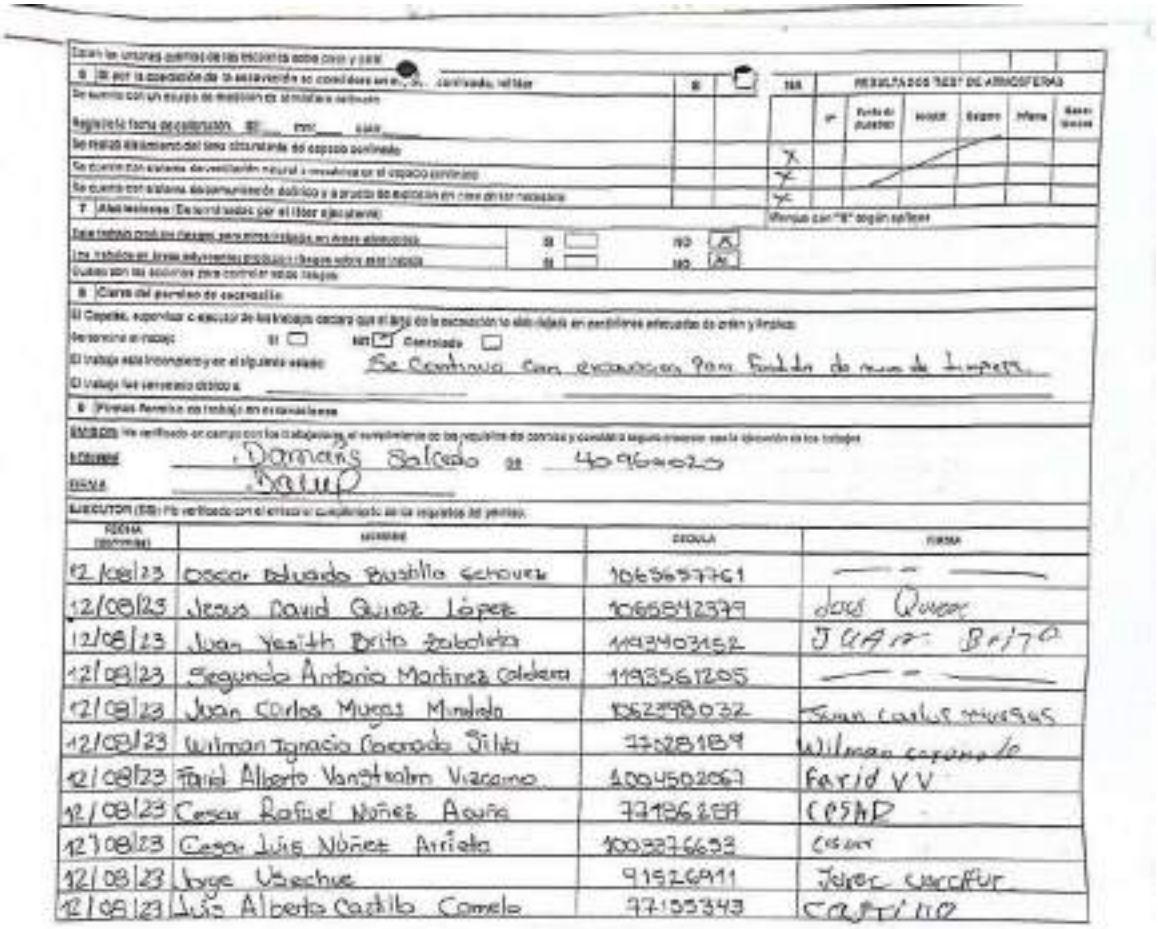

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
12/08/23	Oscar Eduardo Portilla Echeverri	1063697761	
12/08/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
12/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
12/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
12/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062980032	
12/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
12/08/23	Farid Alberto Vanstralen Viacamo	1004502067	
12/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77196288	
12/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003276693	
12/08/23	Jorge Usechue	91526911	
12/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	



12/08/23	Reinaldo Mosquera Pacheco	77026504	
12/08/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	
12/08/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
12/08/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052088418	
12/08/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	9165243	
12/08/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
12/08/23	Juan David Meza Cuna	1064911685	
12/08/23	Jaime David Mendoza Rodriguez	1080431836	
12/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	93442542	
12/08/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77159925	
12/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065268852	
12/08/23	Nibair Luis Diaz Olate	1065809820	
12/08/23	Pedro Luis Sanchez Vanegas	77171896	
12/08/23	Eduardo Enrique Ruiz Alvarez	1006714113	
12/08/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mata	1065862239	
12/08/23	Carlos Andres Mosquera Palomeque	1065829637	
12/08/23	William Enrique Palmera Santana	77193812	



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 12 08 23 — HORA 09:00 05:00 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA DE LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material, Armado, Encofrados, Andamios y desencofrado de columna

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Palas, Picas, Barras, Carretilla, Balde

Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas/correctivas y equipos de protección individual relacionados para la ejecución de la tarea: SI [✓] NO [ ]


1. Dimensiones

Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 4.50 mts — Largo: 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] — Mecánico [ ] — Equipo a utilizar:

2. Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavación	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tablas, estacas, tablones, pilas, entre otras)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y colectiva requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Cinturón de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar con la excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (nuevos enfoque)	X		
Los parados de la excavación, zanja o pila están entibados en caso de requerir y requiere de esta cerca con concepto escrito de ingeniería			X
Se cuenta con permiso de Secretaría para ocupación de espacio u otro requerido de propiedad? (anexar copia/foto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
4. Si por la profundidad de la excavación se consideran trabajos en alturas (altura superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para escalar y descenso de la excavación	X		
5. Si se utilizan escaleras como acceso a la excavación verificar (requisitos de escalera):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más de 40 cm	X		
Están los pasos de los escalones en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son metálicos de tipo	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

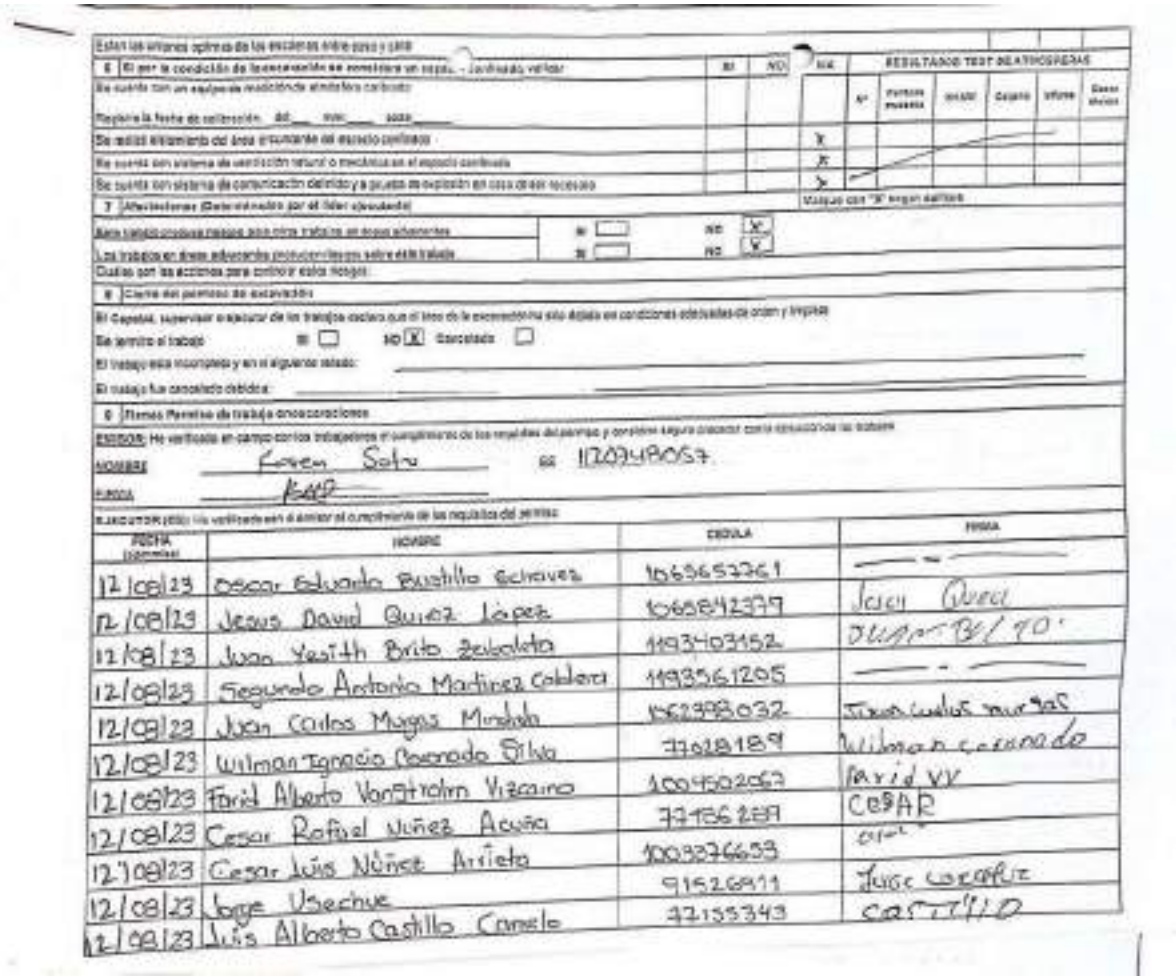

Estan las alturas optimas de las escalas entre zona y zona

6 El por la condición de la excavación se requiere un equipo. - Indicado, verificar

	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de gases tóxicos o oxigeno			
Registre la fecha de calibración dd mm aaaa			
Se realizó el aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADO TEST METEOROLOGICO

N°	Hora inicio	Hora fin	Oxigeno	Inflam.	Gases tóxicos

Marque con "X" según aplique

7 Alturas/zanjas (Determinado por el líder ejecutante)

Hay riesgos criticos nuevos para otra tarea en esas alturas/zanjas	SI	NO X
Los trabajos en dicha altura/zanja requieren de otro soporte	SI	NO X

Cuales son las acciones para control estos riesgos

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el lote de la excavación ha sido dejado en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO X Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


FIRMAS: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de la tarea

NOMBRE Kareem Soto CC 1120949057


FIRMA

EJECUTOR(ES): He verificado en el sitio el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA (ddmmaa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
12/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1069653761	
12/08/23	Jesus David Suarez Lopez	1068642379	
12/08/23	Juan Yesith Brito Zeballeta	1193403152	
12/08/23	Segundo Antonio Martinez Caballero	1193561205	
12/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062998032	
12/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	7702818?	
12/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502057	
12/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
12/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
12/08/23	Jorge Usechue	91526911	
12/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	72155343	

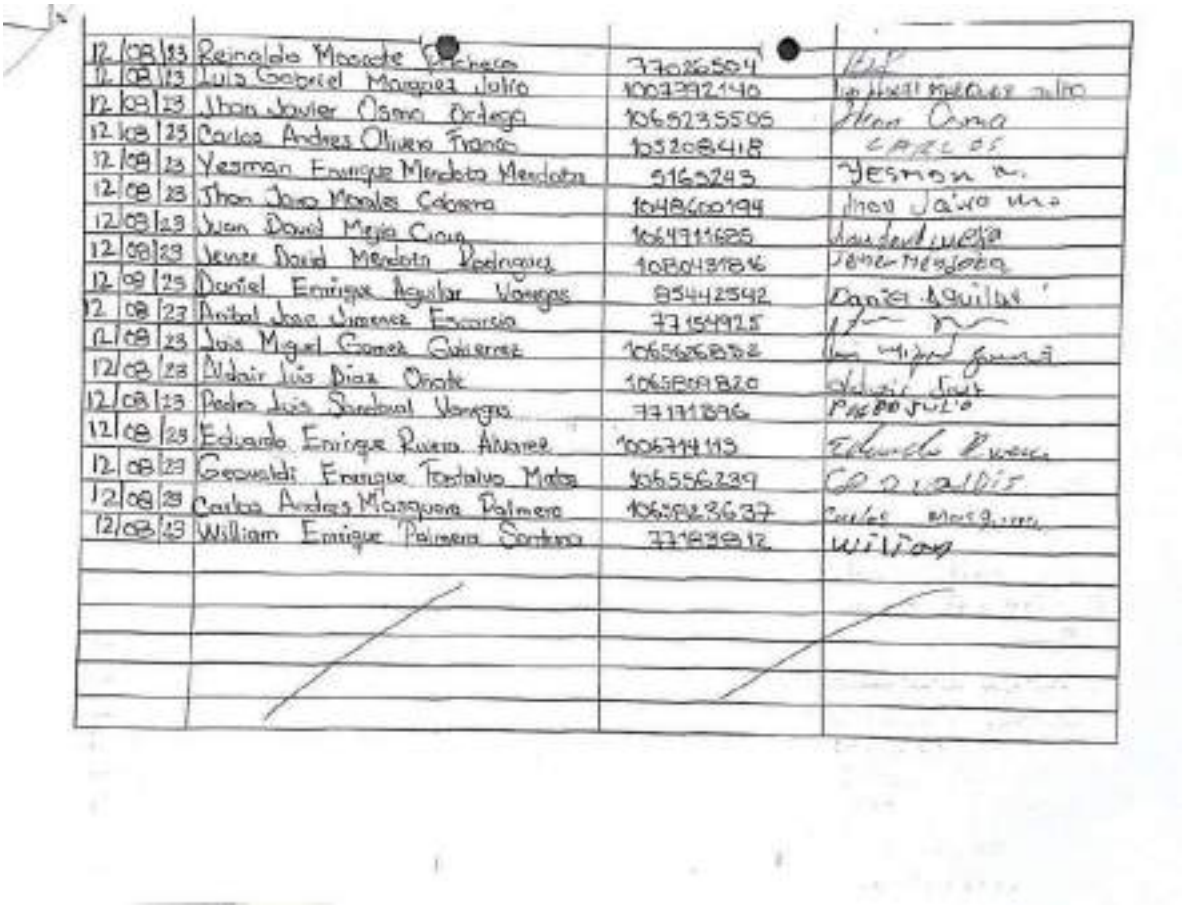

12/08/23	Reinaldo Mercado Pacheco	7706265 04	
12/08/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003792140	
12/08/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235595	
12/08/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418	
12/08/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	9165243	
12/08/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
12/08/23	Juan David Mejia Cano	1064911685	
12/08/23	Jemer David Mendoza Rodriguez	1080481846	
12/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vargas	85442542	
12/08/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	7715492.5	
12/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065268582	
12/08/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065809820	
12/08/23	Pedro Luis Sandoval Vargas	73191896	
12/08/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006744113	
12/08/23	Geovaldi Enrique Tordoya Mota	1065562.39	
12/08/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
12/08/23	William Enrique Palmera Santana	7716329.12	

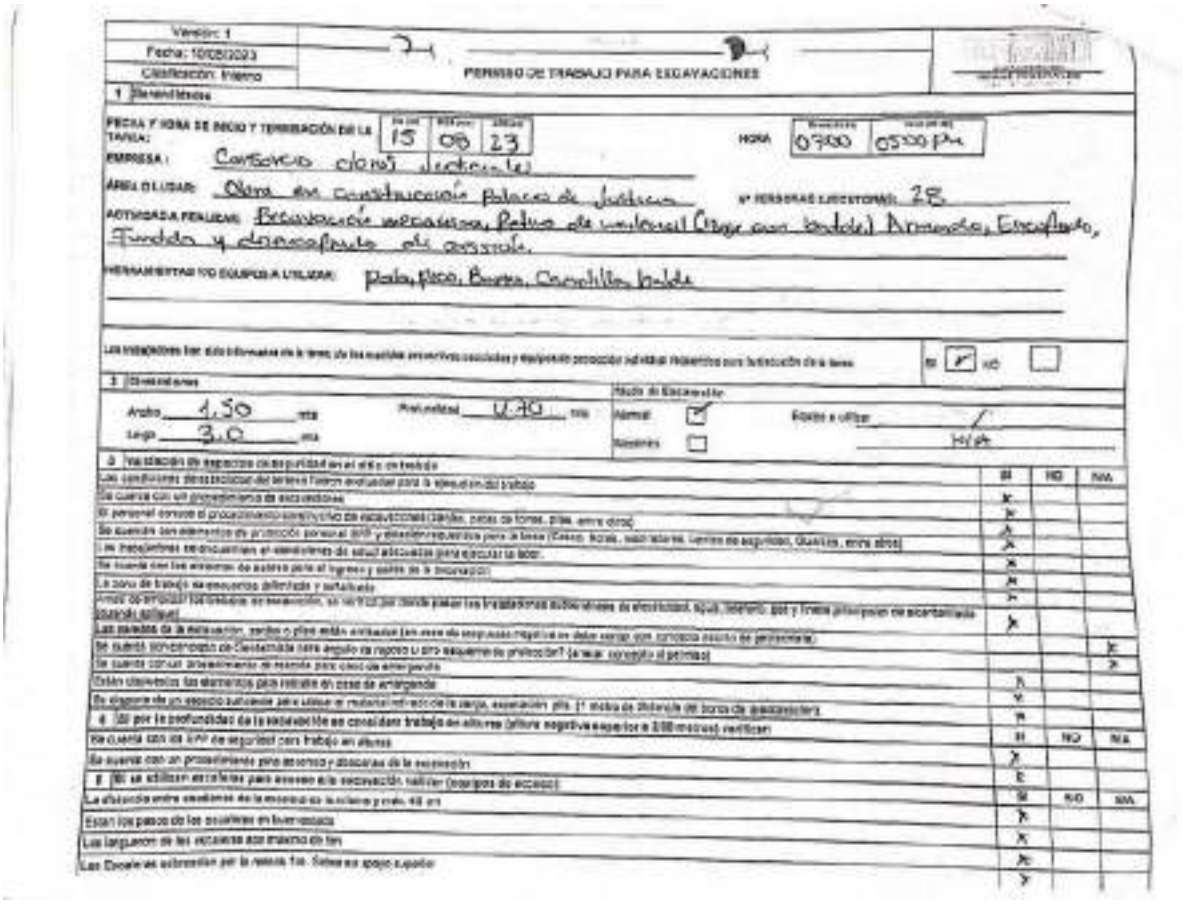

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interno

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 15 / 08 / 23 — HORA: 07:00 — 05:00 PM

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (Carga con balde) Armado, Encofrado, Fundido y desencofrado de cimiento.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde


Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y dispondrán protección individual adecuada para ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1,50 mts — Profundidad 0,40 mts — Largo 3,0 mts

Nivel de Excavación: Alcanzó ☑ — No alcanzó ☐ — Retiro a utilizar: H/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones geotécnicas del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (pilas, pilas de torres, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y elementos requeridos para la tarea (Casco, botas, reflectivos, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores están calificados en exámenes de salud ocupacional para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con las entradas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos se inspeccionó, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y fueron plenamente identificadas (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, taludes o pilas están entibadas (en caso de ser requerido se debe contar con concepto escrito de personería)			X
Se cuenta con un plan de contingencia para caso de rescate por caída (a nivel, con equipo o al primero)			X
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la pala, excavación, etc. (1 metro de distancia del borde de excavación)	X		
4 ¿Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 1,50 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con un PVP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para rescate y atención de la excavación	X		
5 ¿Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación, indicar (requisitos de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la ideal y mide 40 cm	X		
Están los pasos de los escalones en buen estado	X		
Las barandas de las escaleras son mínimo de 1m	X		
Las Escaleras sobresalen por la rasante 1m. Tiene un apoyo superior	X		

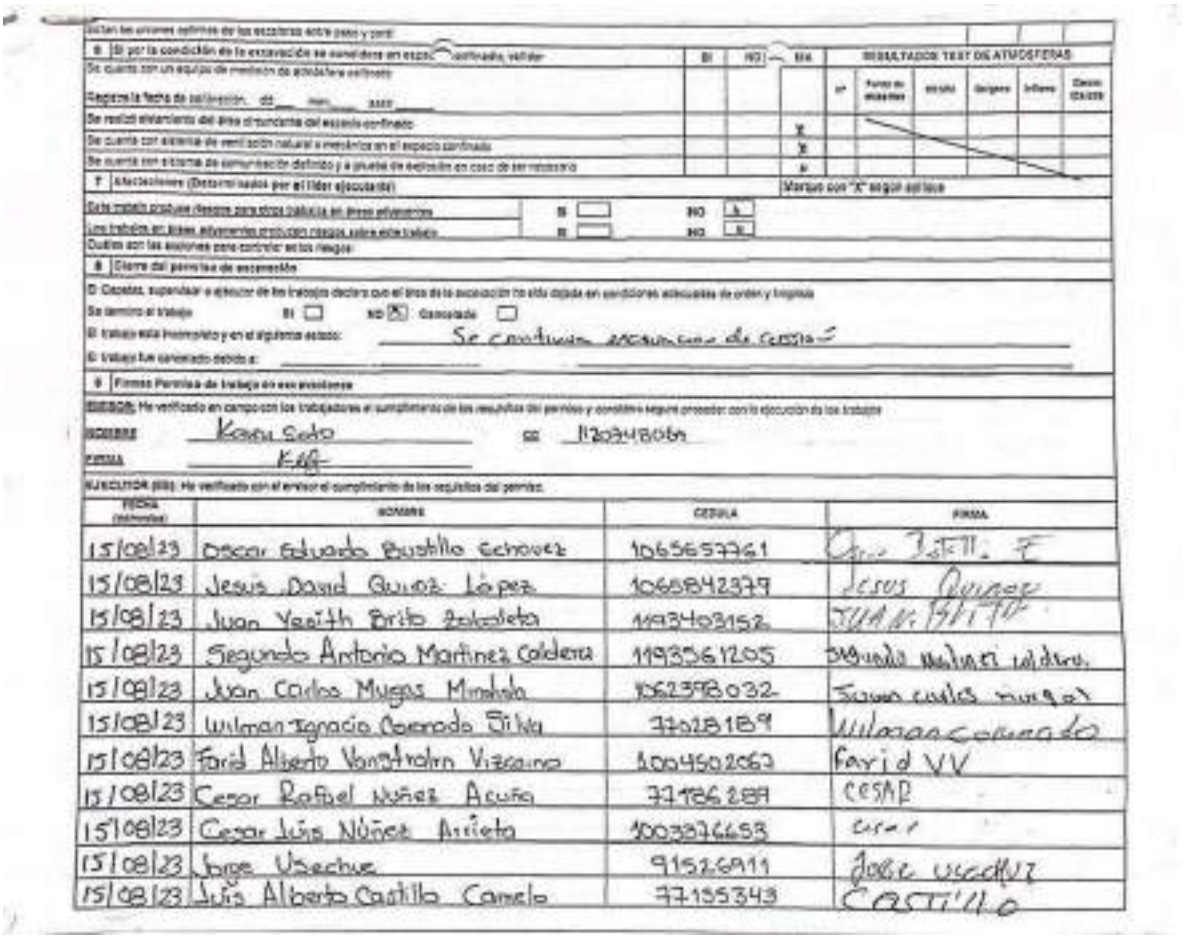

Indicar las unidades optimas de los escenarios entre pares y cero

		SI	NO	N/A	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS					
6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar:									
	Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera confinada									
	Registre la fecha de calibración: dd mm aaaa									
	Se realizó alistamiento del área circundante del espacio confinado				X					
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado				X					
	Se cuenta con sistema de comunicación distinto y a prueba de explosión en caso de ser necesario				X					
7	Alertadores (Determinados por el líder ejecutante)				Marque con "X" según aplique					
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes		SI		NO	X					
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo		SI		NO	X					

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8	Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Se continua excavacion de cepas

El trabajo fue cancelado debido a:

9	Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EJECUTOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Kevin Soto CC 1120348086


FIRMA

SUPERVISOR (SST): He verificado con el ejecutor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
15/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
15/08/23	Jesus David Guioza Lopez	1060842379	
15/08/23	Juan Yesith Brito Zakzuleta	1193403152	
15/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
15/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062398032	
15/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77018189	
15/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502062	
15/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
15/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003876653	
15/08/23	Jorge Usechue	91526911	
15/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	



15	08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026504	
15	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1001392140	
15	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
15	08	23	Carlos Andres Oliveira Franco	1052084118	
15	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5163243	
15	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
15	08	23	Juan David Mejia Cuna	1064911695	
15	08	23	Yeiner David Mendoza Rodriguez	1082431846	
15	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
15	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
15	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
15	08	23	Alduir Luis Diaz Oyuela	1063809820	
15	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77191396	
15	08	23	Eduardo Enrique Ruiz Alvarez	1006714113	
15	08	23	Gennaldi Enrique Fontalvo Mota	1065586299	
15	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1063823637	
15	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183912	

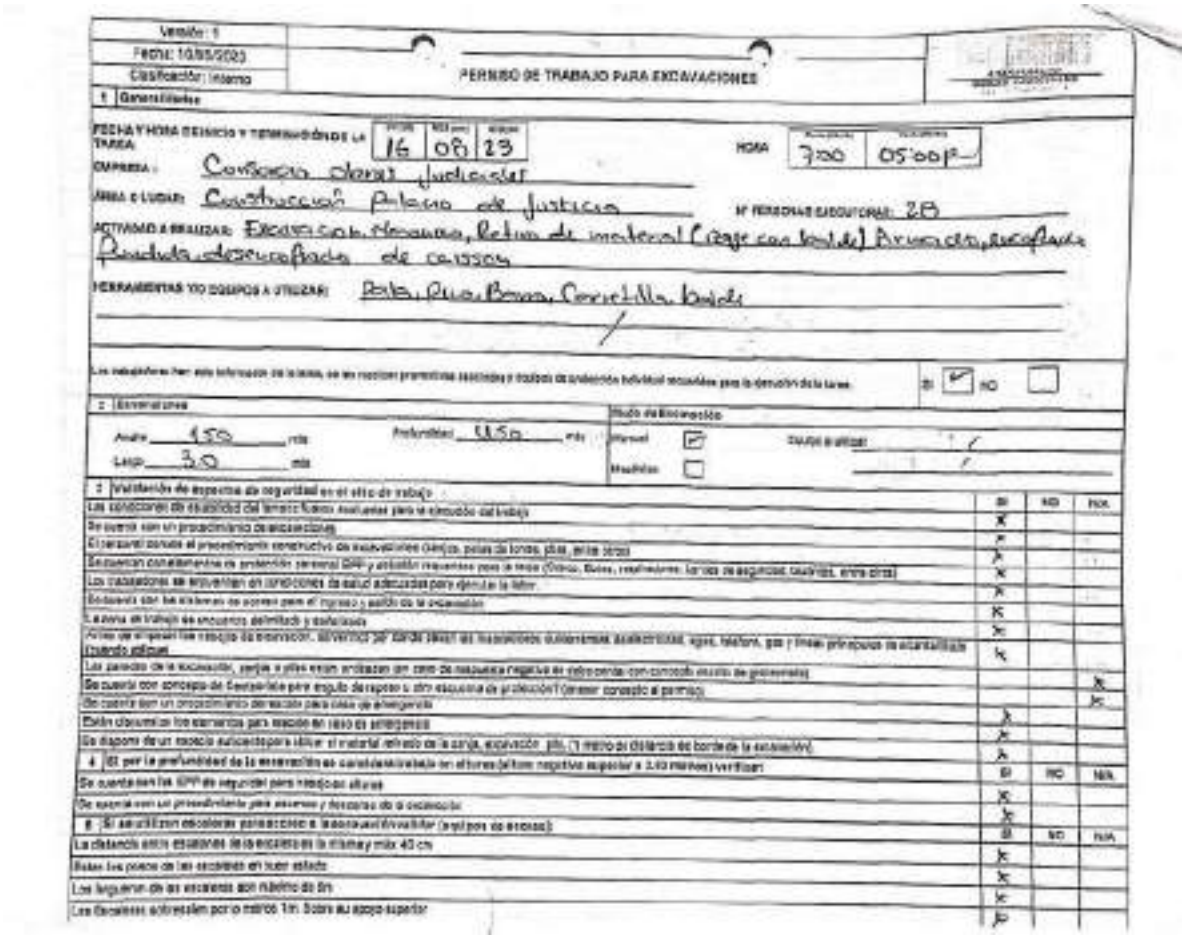

Versión: 1
Fecha: 10/05/2020
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 16 | 08 | 19 — HORA: 7:00 — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (Cargue con bobcat) Armado, fundida Pendula descriptiva de columna

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Bobcat

Los trabajadores han sido informados de los, de las medidas preventivas asociadas y medios de protección individual necesarios para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2 Características

Ancho 150 cm — Profundidad 1.50 m — Largo 3.0 m

Modo de excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: /

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron revisadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (anclas, pilas de bordo, pilas, entre otras)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y protección requeridos para la tarea (Cascos, Botas, cinturones, líneas de seguridad, cauchos, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con los sistemas de apoyo para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de ingresar los riesgos de excavación, adversos se tienen claros las instalaciones subterráneas (electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado cuando aplique)	X		
Los paredes de la excavación, zanjas o pilas están protegidas con cero de resistencia requerida en relación con concreto mínimo de (proyectado)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnia para ángulo de reposo o otro esquema de protección? (anexar concepto si aplica)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia	X		
Están claramente los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un medio autosostenible para izar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia de borde de la excavación)	X		
4 El por la profundidad de la excavación se considera mayor a 1.50 metros (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación (explicar)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 6m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

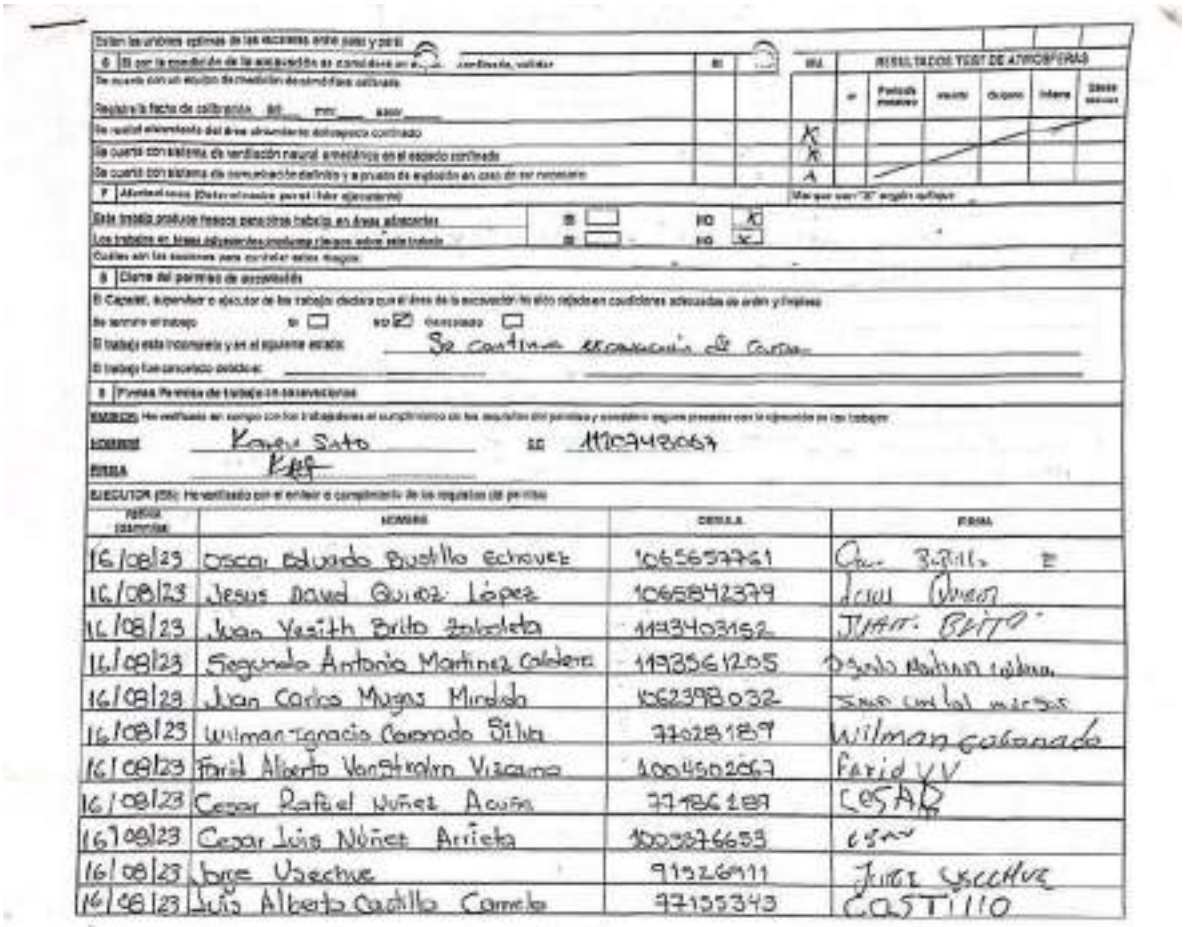

Se cuenta con sistema de ventilación natural artificial en el espacio confinado — SI X

Se cuenta con sistema de comunicación definido y apoyo de evacuación en caso de ser necesario — SI X

Este trabajo produce riesgos para otros trabajo en áreas adyacentes — NO X

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — NO X

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

9 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajo declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo: SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Se continua excavación de Cuneta.

El trabajo fue cancelado debido a:

8 Firmas Personas de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en compo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Kenyi Sato CC 1102948067

FIRMA:


EJECUTOR (Es): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA DIA/MES/AÑO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
16/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065637761	
16/08/23	Jesus David Guioz López	1066842379	
16/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
16/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
16/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062398032	
16/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
16/08/23	Farid Alberto VanStralen Vizcaino	1004502067	
16/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186189	
16/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003876653	
16/08/23	Jorge Ustecho	91926911	
16/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	



01-08-23	Jorge Sisecique	91552691	Jorge Sisecique
02-08-23	Luis Alberto Castillo	79151264	CASTILLO
02-08-23	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	[illegible]
02-08-23	Reveldo Hoscote Pacheco	79026504	[illegible]
02-08-23	Luis Gabriel Henriquez	1007992140	[illegible]
01-08-23	Ilnar Osma Ortega	1065235505	[illegible]
01-08-23	Carlos Andres Olivera	1052080418	CARLOS
02-08-23	Yesmen Enrique Hendrix	5165243	YESMEN M.
02-08-23	Ihon Jairo Morales	1048600194	IHON JAIRO M.
01-08-23	Jenner Daniel Mendoza	1006431816	[illegible]
02-08-23	Daniel Aguilar Venegas	85147542	[illegible]
02-08-23	Anibal Jimenez Escorcia	79154925	[illegible]
02-08-23	Luis Migel Gomez	1065636852	[illegible]
02-08-23	Aldair Diaz Ojeda	1065809826	[illegible]
02-08-23	Pedro Julio Sandoval	79171396	[illegible]
02-08-23	Eduardo Rivera Alvarez	1006714113	[illegible]
01-08-23	William Palmera Santana	79183812	[illegible]
02-08-23	Carlos Andres Mosquera	1065823637	[illegible]
02-08-23	Gerardo Fontalvo	1065562892	[illegible]

16/08/23	Reinaldo Maestre Pacheco	77026504	
16/08/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1001397140	
16/08/23	Jhon Javier Osma Ardoya	1065235505	
16/08/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418	
16/08/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243	
16/08/23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1042600194	
16/08/23	Juan David Mejia Cano	1064911685	
16/08/23	Jaimes David Mendoza Rodriguez	1080431846	
16/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
16/08/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
16/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
16/08/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065809820	
16/08/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
16/08/23	Eduardo Enrique Ruiz Alvarez	1006714113	
16/08/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mena	1065556239	
16/08/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
16/08/23	William Enrique Palmera Santana	77183812	

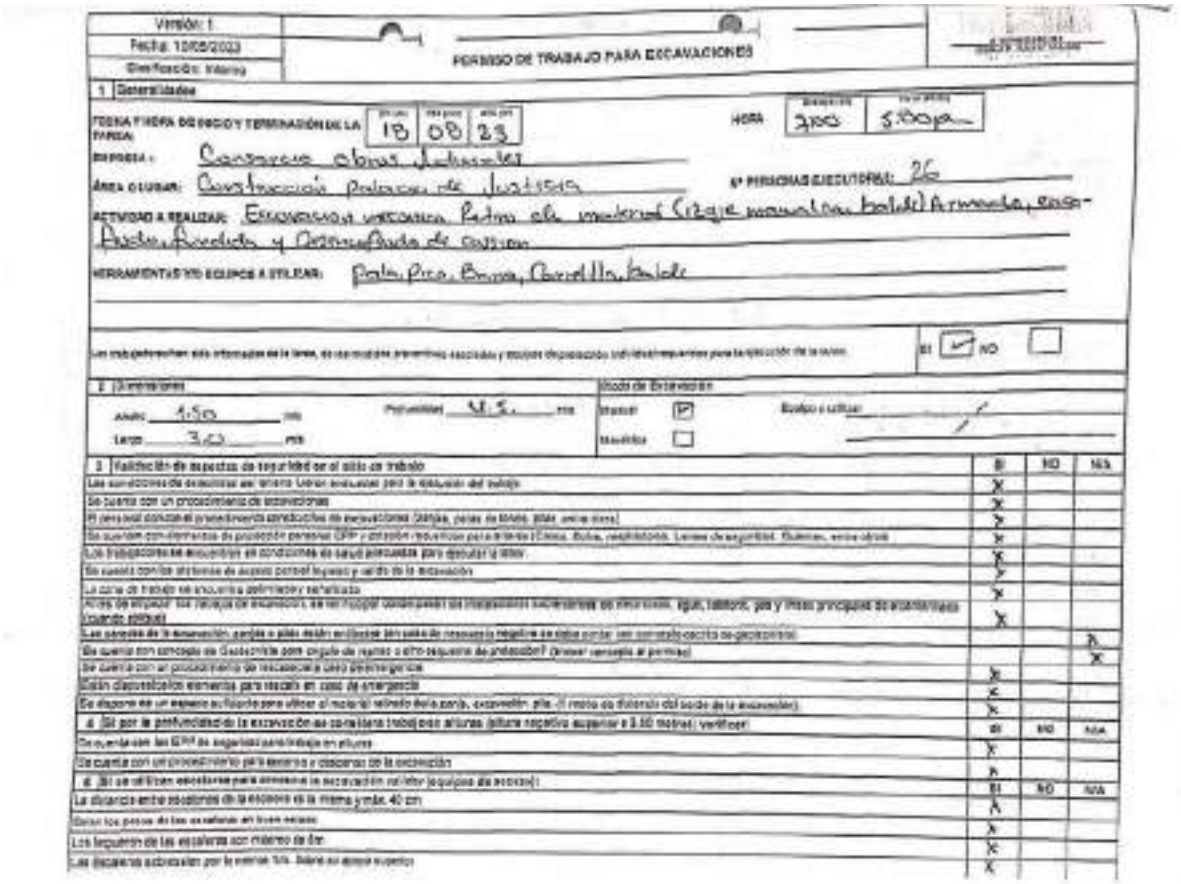

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 18 | 08 | 23 — HORA: 2:00 — 5:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual Retiro de material Cargue manual con balde Armando, cargue Bultos, Bandeja y Cortamaquina de concreto

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde


Las medidas preventivas descritas en este documento son las mínimas requeridas y deben implementarse para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones


Ancho: 1.50 mts — Profundidad: N.S. mts — Largo: 3.00 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: /


3 Ratificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de excavación son tenidas en cuenta para la elaboración del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de visita, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y protección requeridos para el trabajo (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso (escalera) seguro y cerca de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y delimitada	X		
Antes de iniciar las labores de excavación, se ha revisado cuidadosamente las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfonos, gas y otros principales de existir alguno (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerirse) o existe un concepto escrito de geotecnista			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro requerido de protección? (Anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	X		
Están disponibles los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para utilizar el material retirado (zanja, excavación, pila, el resto en distancia del borde de la excavación)	X		
a. Si por la profundidad de la excavación se considera trabajos en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
d. Si se utilizan escaleras para ascenso a la excavación (diferente equipos de excavación):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más de 40 cm	X		
Sobre los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los larguero de las escaleras son material de 6in	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. sobre el borde superior	X		

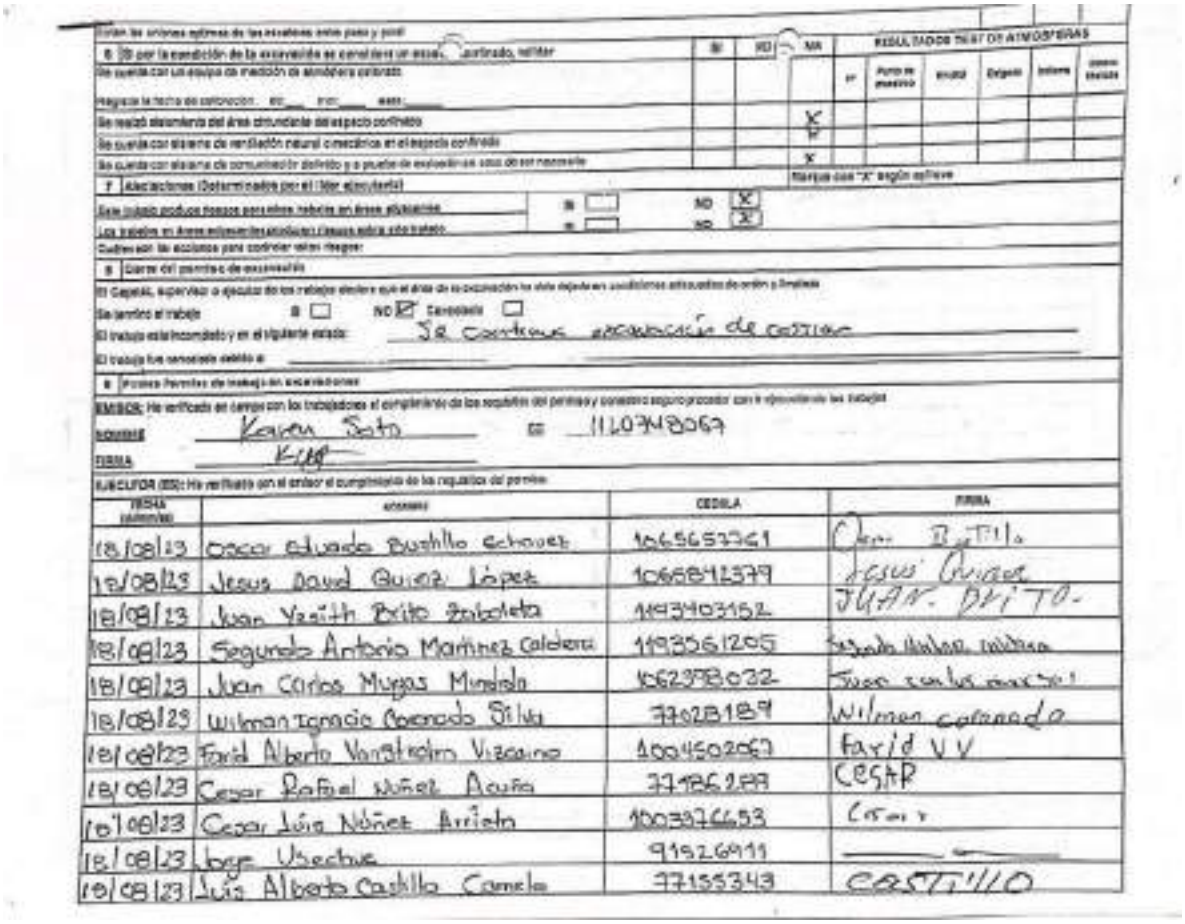

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
18/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657361	
18/08/23	Jesus David Guiraz López	1065842379	
18/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403162	
18/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
18/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062778032	
18/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	7702B189	
18/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502067	
18/08/23	Cesar Rafael Muñoz Acuña	37186289	
18/08/23	Cesar Luis Muñoz Arrieta	1003976653	
18/08/23	Jorge Usechue	91926911	
18/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

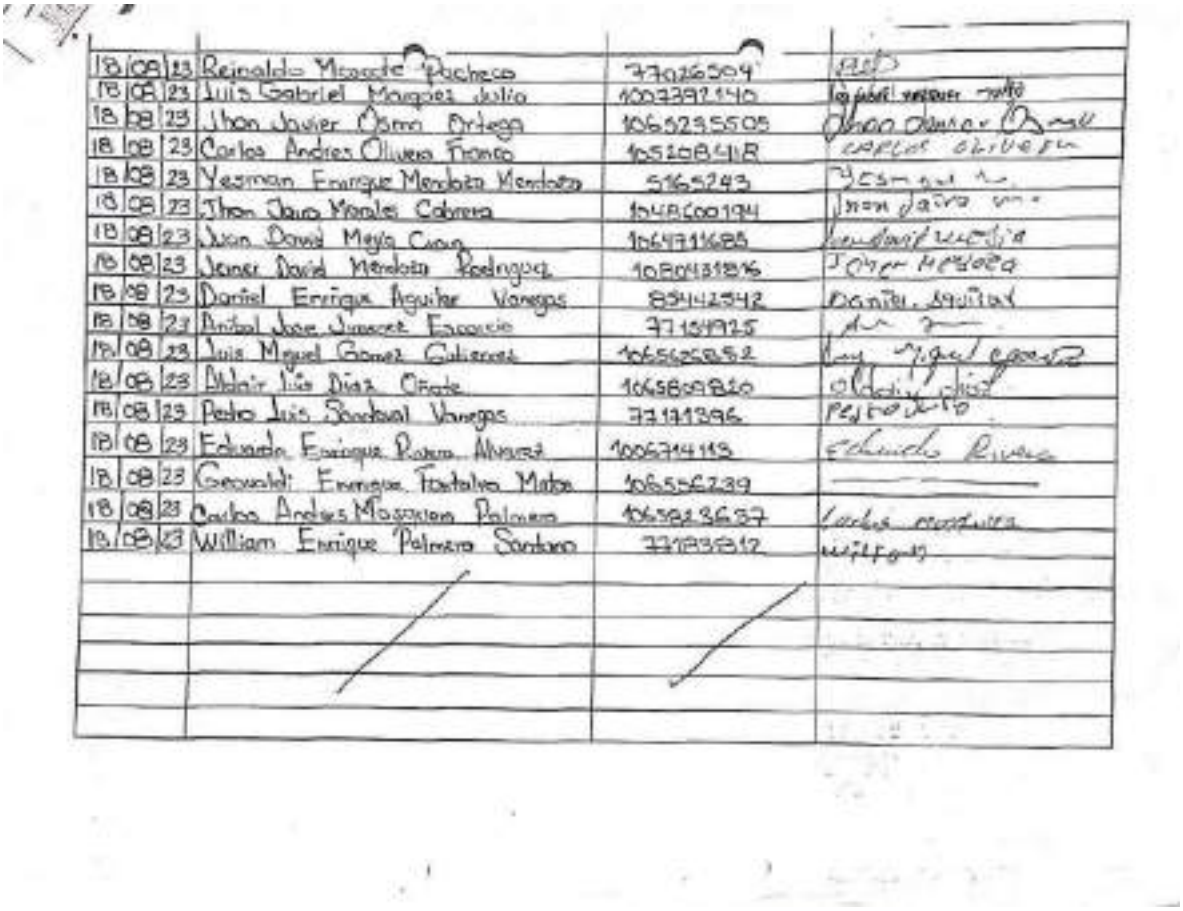

18	08	23	Reinaldo Ricardo Pacheco	77026504	
18	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003397140	
18	08	23	Jhon Javier Osorio Ortega	1065235505	
18	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1051084118	
18	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165293	
18	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
18	08	23	Juan David Mejia Cuao	1064911685	
18	08	23	Jaiser David Mendoza Rodriguez	1080431816	
18	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	83142342	
18	08	23	Anibal Jose Juncos Escorcia	77151925	
18	08	23	Luis Miguel Gomez Calderon	1065625852	
18	08	23	Didier Luis Diaz Conde	1065809820	
18	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77111396	
18	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714119	
18	08	23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mateo	1065562389	
18	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
18	08	23	William Enrique Palmera Sandoval	77123512	

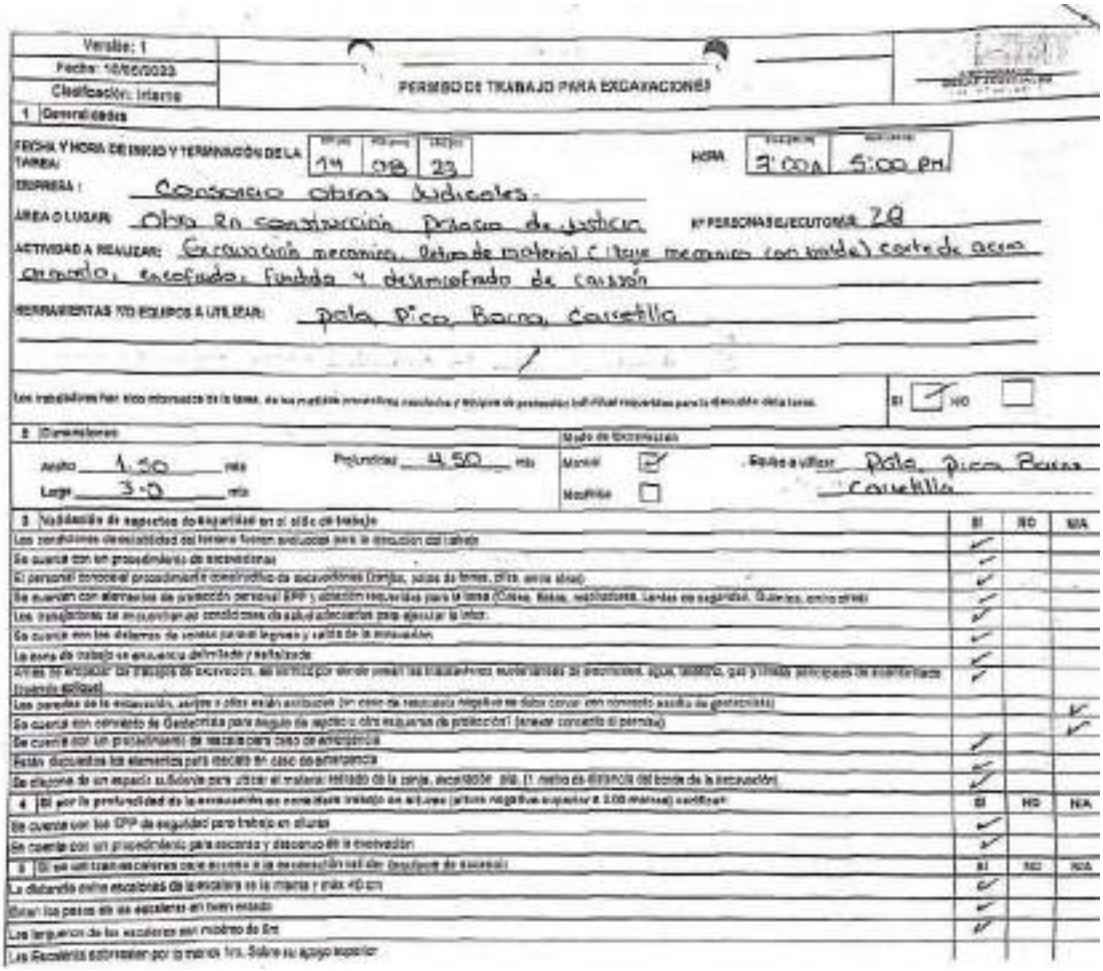

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 14 08 23 HORA 8:00 A 5:00 PM

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra Rp construcción Palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 20

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación mecanica, Retiro de material (Hoyo mecanico con taladro) cortes de acero armado, encofrado, fundida y desencofrado de cassón

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, Pico, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los posibles peligros asociados y medidas de protección individual requeridas para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 4.50 mts Largo 3.0 mts

Modo de excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: Pala, Pico, Barra, Carretilla


3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (rampa, pozos de bombeo, otros, cuales)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y señalización requeridos para la tarea (Cascos, Botas, reflectivos, Gafas de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de control (señal luminosa y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar las labores de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones eléctricas, de telefonía, agua, alcantarillado, gas y demás servicios públicos subterráneos (marcarlos en el terreno)	✓		
Los paredes de la excavación, apoyos y otros están protegidos (en caso de resultado negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de apoyo o otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación (Mín. 1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) continuar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para escalas y descanso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación (en lugar de rampas)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	✓		
Todos los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 8m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior			

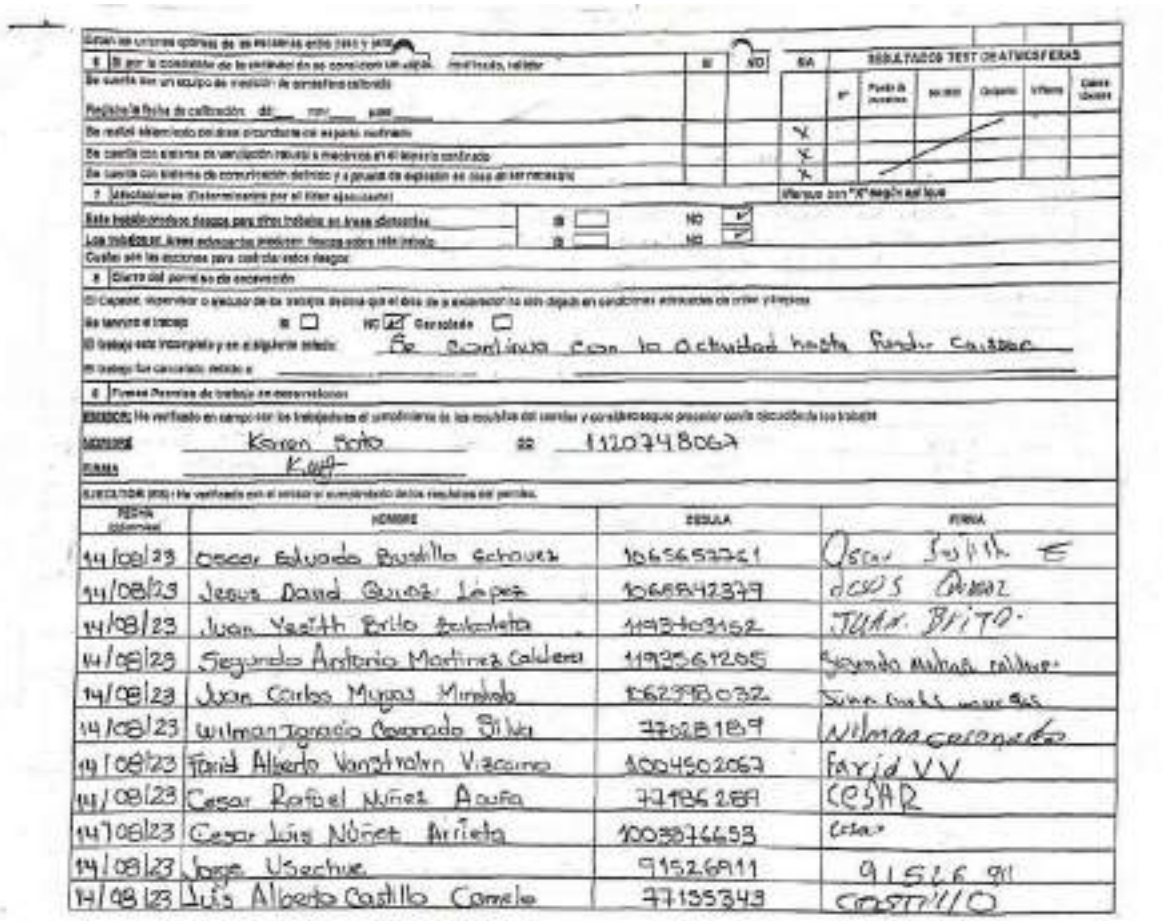

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
14/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
14/08/23	Jesus David Gomez Lopez	1068842379	dGJS
14/08/23	Juan Yaeith Brito Saladeta	1193463152	JUAN. BRITO.
14/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	Segundo Martinez Calderon
14/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062980032	Juan Carlos mugas
14/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	7702B189	Wilman coronado
14/08/23	Farid Alberto Vanstralen Viasmus	1004502067	FARID VV
14/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	CESAR
14/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003876653	Cesar
14/08/23	Jorge Usechue	91526911	91526 911
14/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77135343	CASTILLO



14/08/23	Reinaldo Moscote Pacheco	77026504	
14/08/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	
14/08/23	Jhon Javier Osma Ordoga	1065235505	
14/08/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052984418	
14/08/23	Yesmon Enrique Mendoza Mendoza	5163243	
14/08/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
14/08/23	Juan David Mejia Cano	1064911585	
14/08/23	Jesus David Mendoza Rodriguez	1080431816	
14/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85441542	
14/08/23	Anibal Jose Jimenez Estrada	77154925	
14/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
14/08/23	Nelair Luis Diaz Chole	1065869820	
14/08/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
14/08/23	Eduardo Enrique Ruano Alvarez	1006714113	
14/08/23	Gerardo Enrique Fontalvo Mota	1065556239	
14/08/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1067823637	
14/08/23	William Enrique Polo Santana	77183912	

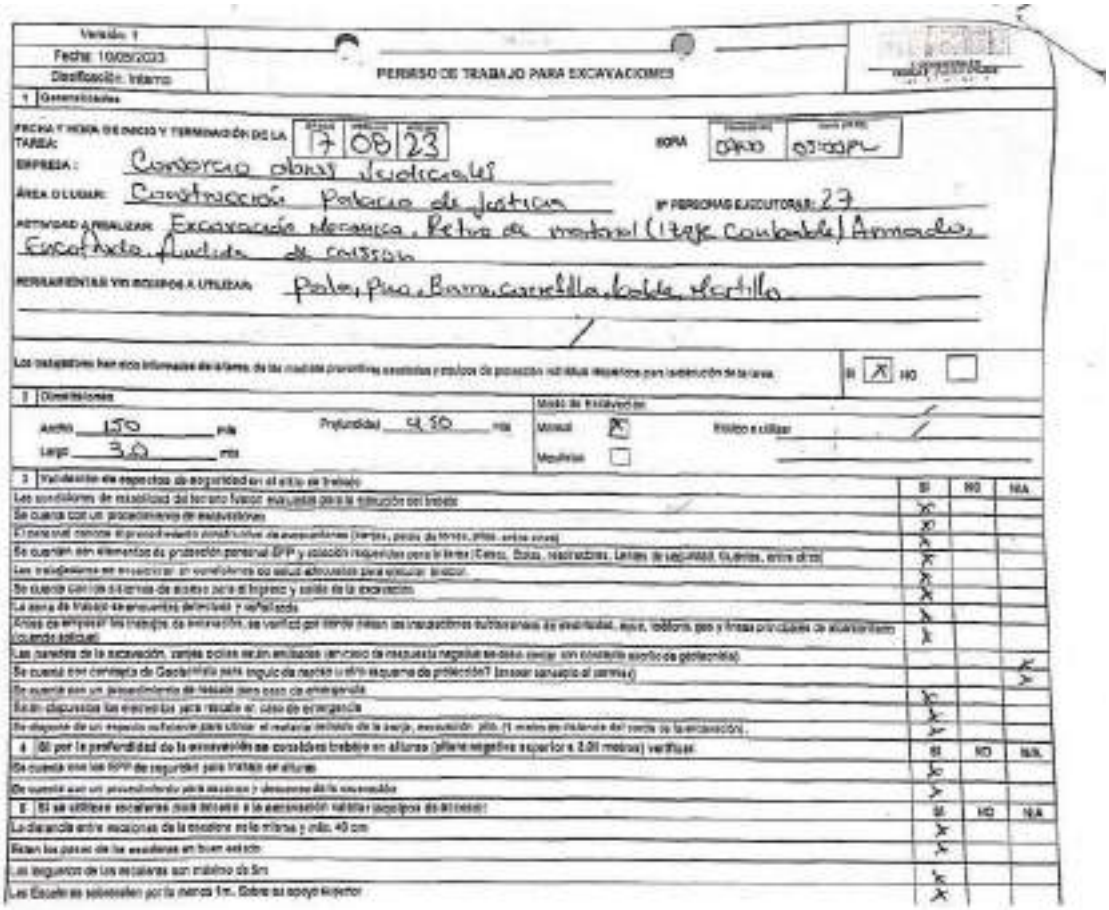

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 7 | 08 | 23 — HORA: 0900 — 03:00PM

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Manual, Retiro de material (Viaje Cumbiado) Armado, Excavación, Fundida de cimiento

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, carretilla, Lobo, Martillo


Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas existentes y medios de protección individuales requeridos para realización de la tarea. SI [X] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 4.50 mts — Largo: 3.00 mts

Modo de excavación: Manual [X] — Mecánica [ ] — Equipo a utilizar: /

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, pasos de trabajo, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y colectiva requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con rutas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por medio de inspecciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado cuando aplicara	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas serán entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			X
Se cuenta con cerramiento de Geotextil o alguna medida o algún esquema de protección? (Instalar cerramiento al terminar)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para utilizar el material retirado de la zanja, excavación, pilas. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se requieren trabajos en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verifique:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para rescates y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para ingresar a la excavación verifique aspectos de interés:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más de 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los seguros de las escaleras son mínimo de 5m	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

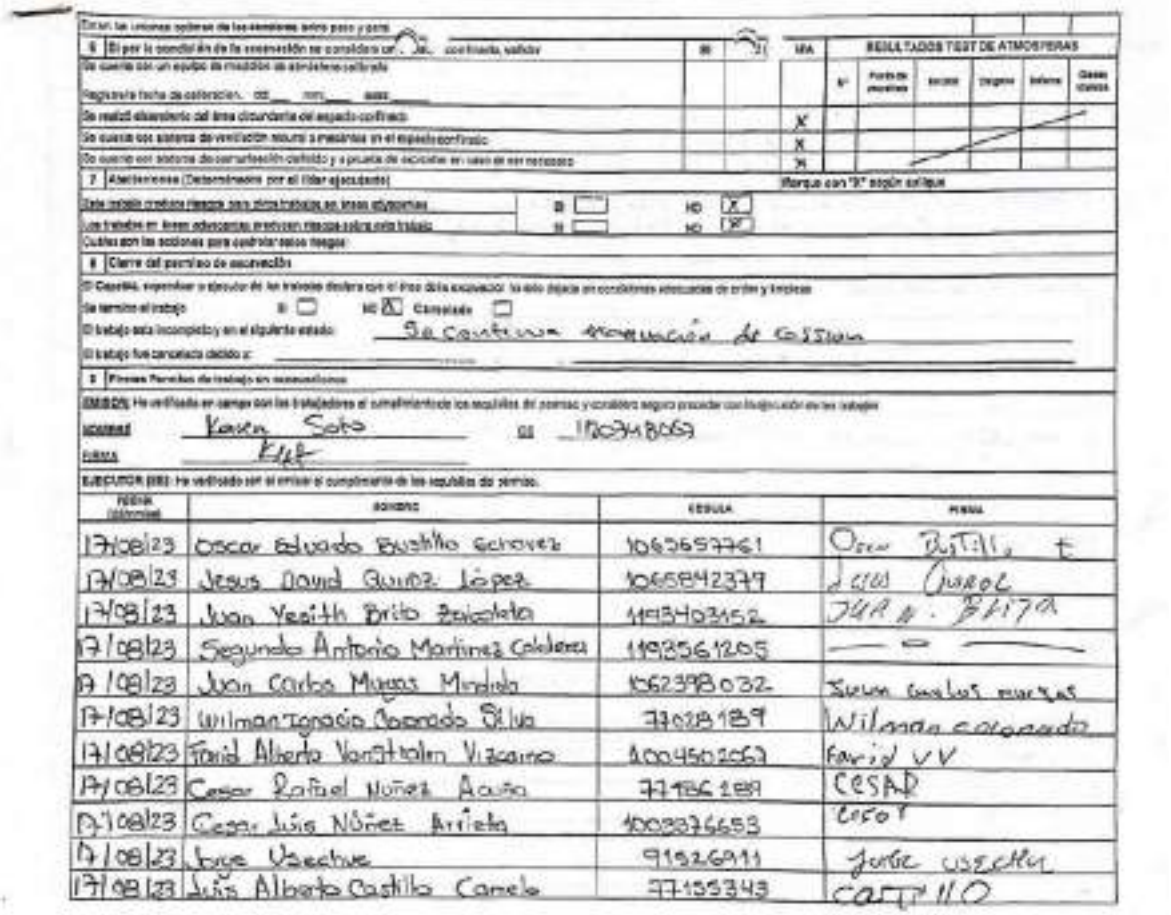

Se continua socialización de Gestion

Karen Soto

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
17/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Chavez	1063697761	
17/08/23	Jesus David Suarez Lopez	1065842379	
17/08/23	Juan Yesith Brito Baicheto	1193403152	
17/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
17/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062398032	
17/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77038189	
17/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502063	
17/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
17/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003876653	
17/08/23	Jorge Usechue	91526911	
17/08/23	Luis Alberto Castillo Canelo	77155343	

17	08	23	Reinaldo Mogollon Pacheco	77026504
17	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140
17	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505
17	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084118
17	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5163293
17	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194
17	08	23	Juan David Mejia Cuao	1064711685
17	08	23	Yeiner David Mendoza Rodriguez	1080491846
17	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542
17	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77164925
17	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852
17	08	23	Nelair Luis Diaz Ofiate	1065869820
17	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77131896
17	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113
17	08	23	Geovaldi Enrique Tordoya Mota	1065556239
17	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637
17	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183912



Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 03 08 23 HORA 07:00 05:00

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Retiro de material sobrante, Encofrados, fundidos y Descapote de cortes

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de los riesgos, daños, medidas preventivas esenciales y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts Profundidad: 5.0 mts


Largo: 3.0 mts

MODO DE EXCAVACIÓN

Manual: [✓] Equipo a utilizar:

Mecánica: [ ]

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo:	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (cunas, pilas de lonas, pica, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con las salidas de escape (entrada ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de comunicación (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación tienen o presentan entibado (en caso de resultado negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			N/A
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o alma soportante de protección? (anexar concepto al permiso)			N/A
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un acceso suficiente para dotar almacenamiento de la pared excavación (de 1 metro de distancia del borde de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para ascenso a la excavación validar requisitos de escalas:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	X		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las largueros de las escaleras son enteros de 5m	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

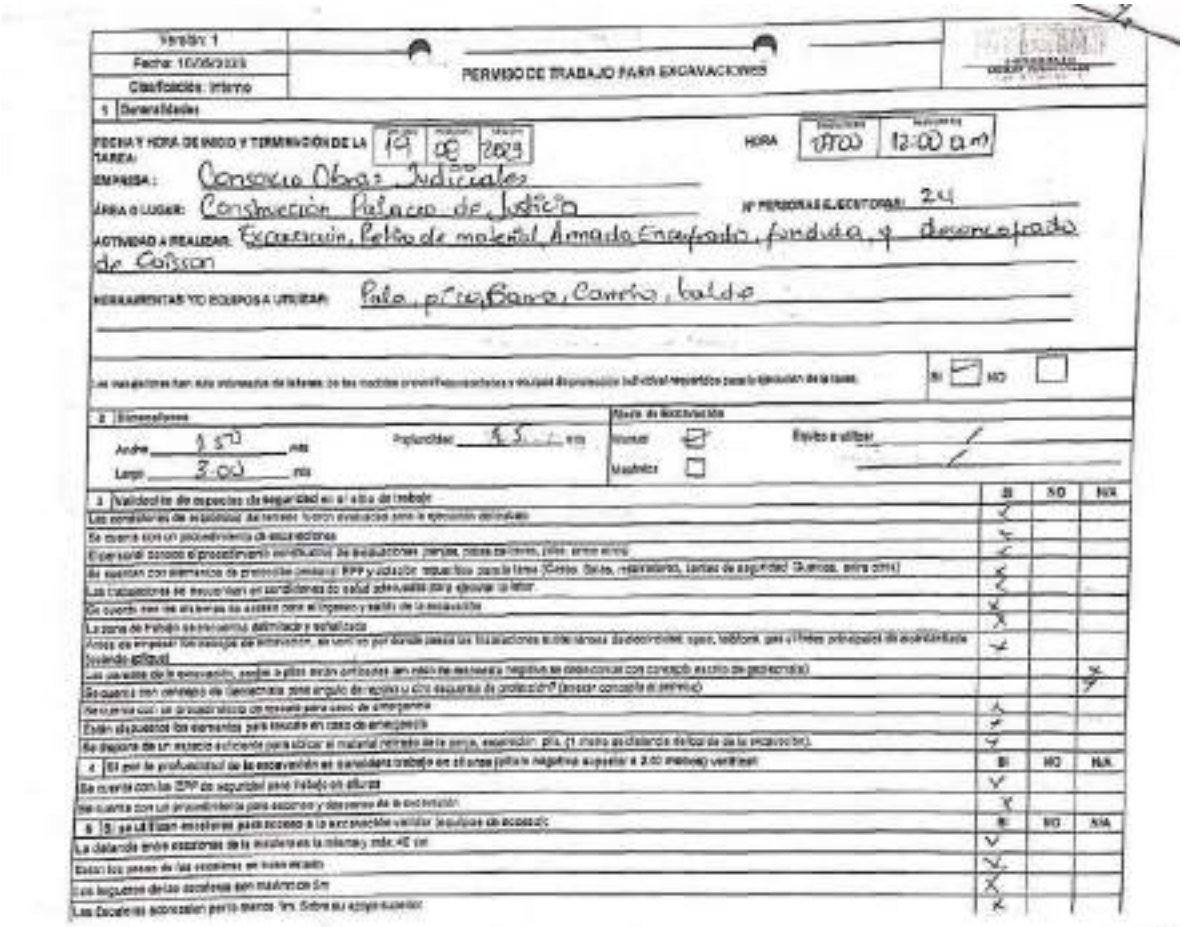

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 19 08 2023 HORA 07:00 12:00 a.m

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 24

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Pedido de material, Armado Encofrado, fundida y desencofrado de Caisson

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de forma [illegible] SI ☒ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 9.5 mts

Largo 3.00 mts

Hoja de Excavación


Manual ☐ Equipo a utilizar: /

Mecánico ☐

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de inspección, pilotes, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal: EPP y vestidos especiales para la tarea (Casco, Gafas, respiradores, cartas de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Las excavaciones se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se sabe en por donde pasan las instalaciones subterráneas (telecomunicaciones, agua, teléfono, gas y líneas principales de acueducto) (vivienda afiliada)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están confinadas con malla de seguridad o cualquier otra que impida el paso de personas?			X
Se cuenta con cerramiento de demarcación para evitar caída de objetos u otro elemento de protección? (Instalar cerramiento provisional)			X
Se cuenta con un botiquín básico de primeros auxilios para casos de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia de borde de la excavación).	X		

4 El por la profundidad de la excavación se consideran trabajos en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para escalera y dispositivos de excavación	X		


5 Si se han instalado escaleras para acceso a la excavación validar requisitos de acceso:	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y mide 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son mayores de 5m	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el apoyo superior	X		

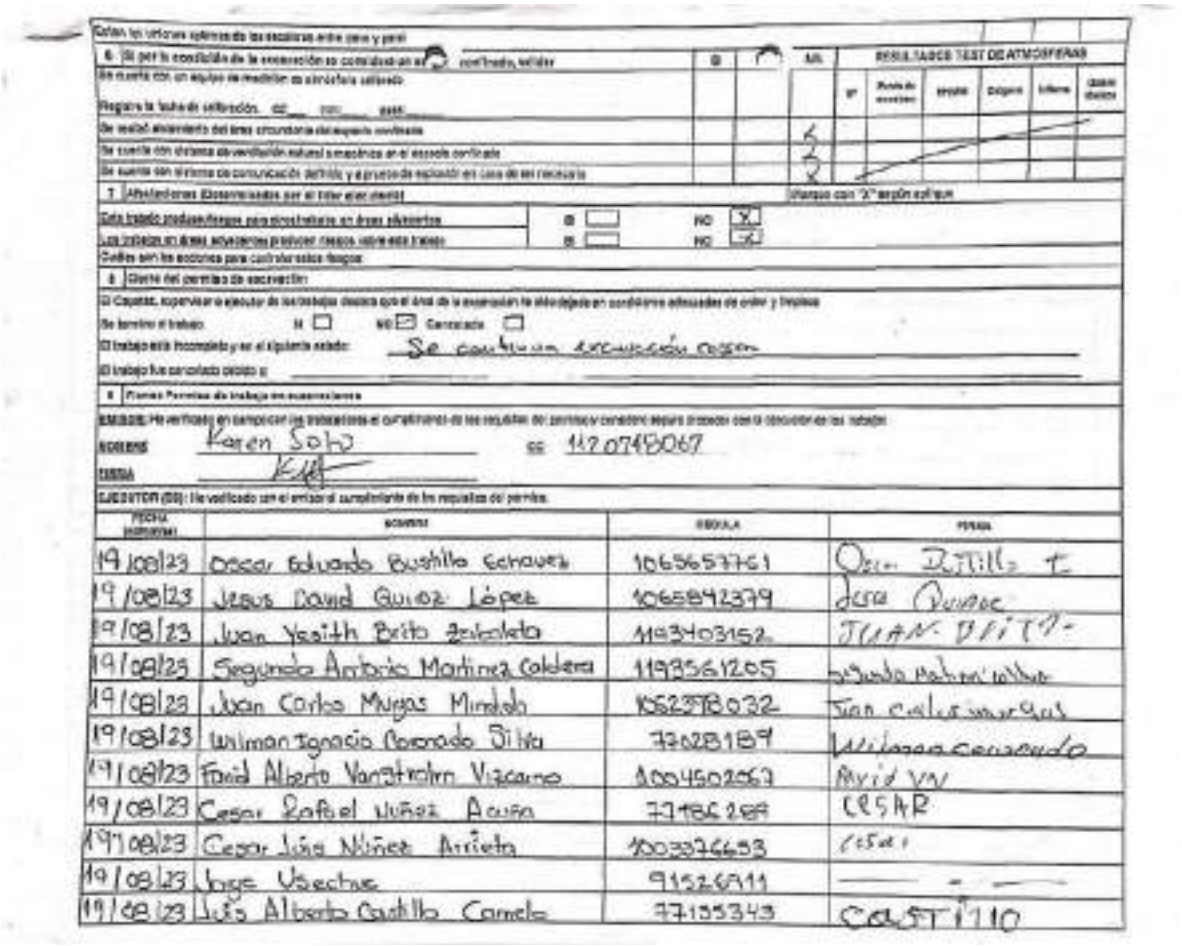


Se continua excavación manual

Karen Soto CC 1120748067

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
19/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E.
19/08/23	Jesus David Guioz López	1065842379	Jesus Quiroz
19/08/23	Juan Yseith Brito Zeleleta	1193403152	JUAN BRITO
19/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez
19/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062378032	Juan Carlos Mugas
19/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	72028189	Wilman Coronado
19/08/23	David Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502563	David VV
19/08/23	Cesar Rafael Muñoz Acuña	77186289	CESAR
19/08/23	Cesar Luis Muñoz Arrieta	1003976653	Cesar
19/08/23	Jorge Usechas	91526911	—
19/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO

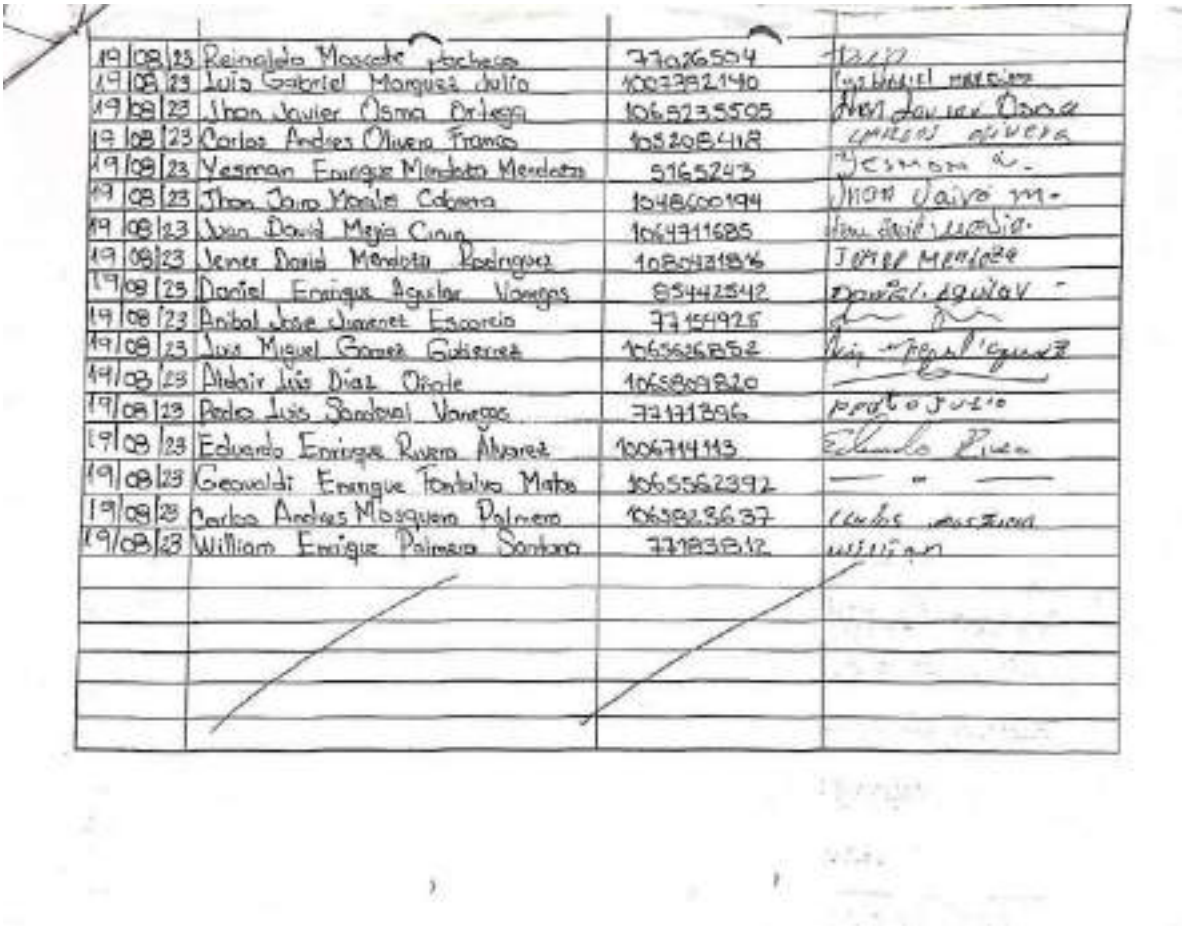

19	08	23	Reinaldo Mascote Barbosa	77026504	
19	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003982140	
19	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235595	
19	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1052085418	
19	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	91652423	
19	08	23	Jhon Jairo Varela Cabrera	1048600194	
19	08	23	Juan David Mejia Cano	1064711685	
19	08	23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1082931896	
19	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
19	08	23	Anibal Jose Jaramet Escorcia	77154925	
19	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
19	08	23	Aldair Luis Diaz Oirde	1065809820	
19	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
19	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
19	08	23	Gecvaldi Enrique Fontalvo Mate	1065562392	
19	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065826637	
19	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812	

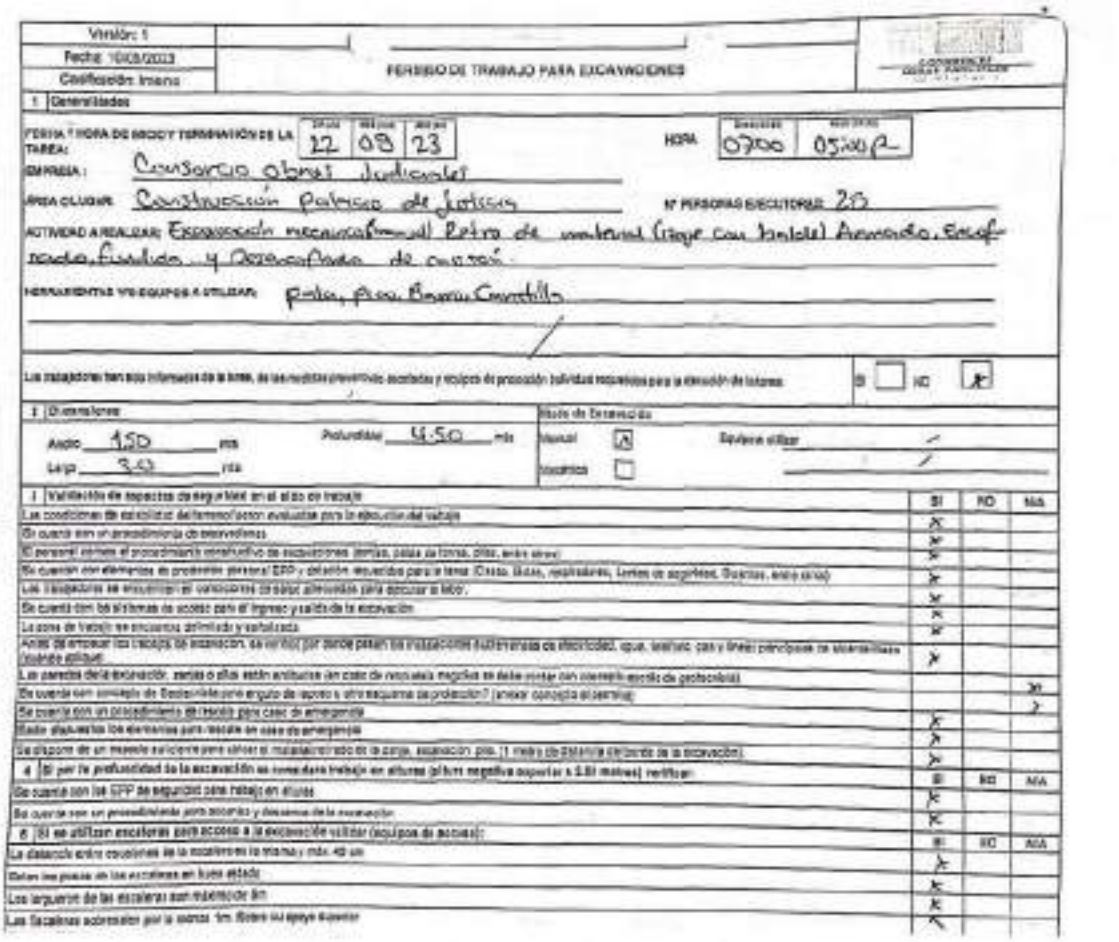

Versión: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: día 22 mes 08 año 23

HORA: 07:00 05:00 P

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 20

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación mecanica manual Retiro de material (Viaje con bobcat) Armado. Encofrados. Fundida y Descofrados de cuneta

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, picas, Barra, Canastilla

Los trabajadores han sido informados de la forma, de las medidas preventivas, controles y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de labores: SI ☐ NO ☒

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts

Profundidad: 4.50 mts


Largo: 3.43 mts

Modo de Excavación

Manual ☒ Equipos utilizar: /


Mecánico ☐ /

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, pasos de tareas, otros, entre otros)	X		
Se cuenta con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar las labores de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas en caso de necesidad negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de apoyo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento definido para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un manejo adecuado para retirar el material producto de la carga, excavación (mín. 1 metro de distancia al borde de la excavación)	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se requiere trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.80 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		
6 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son extensión 3m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

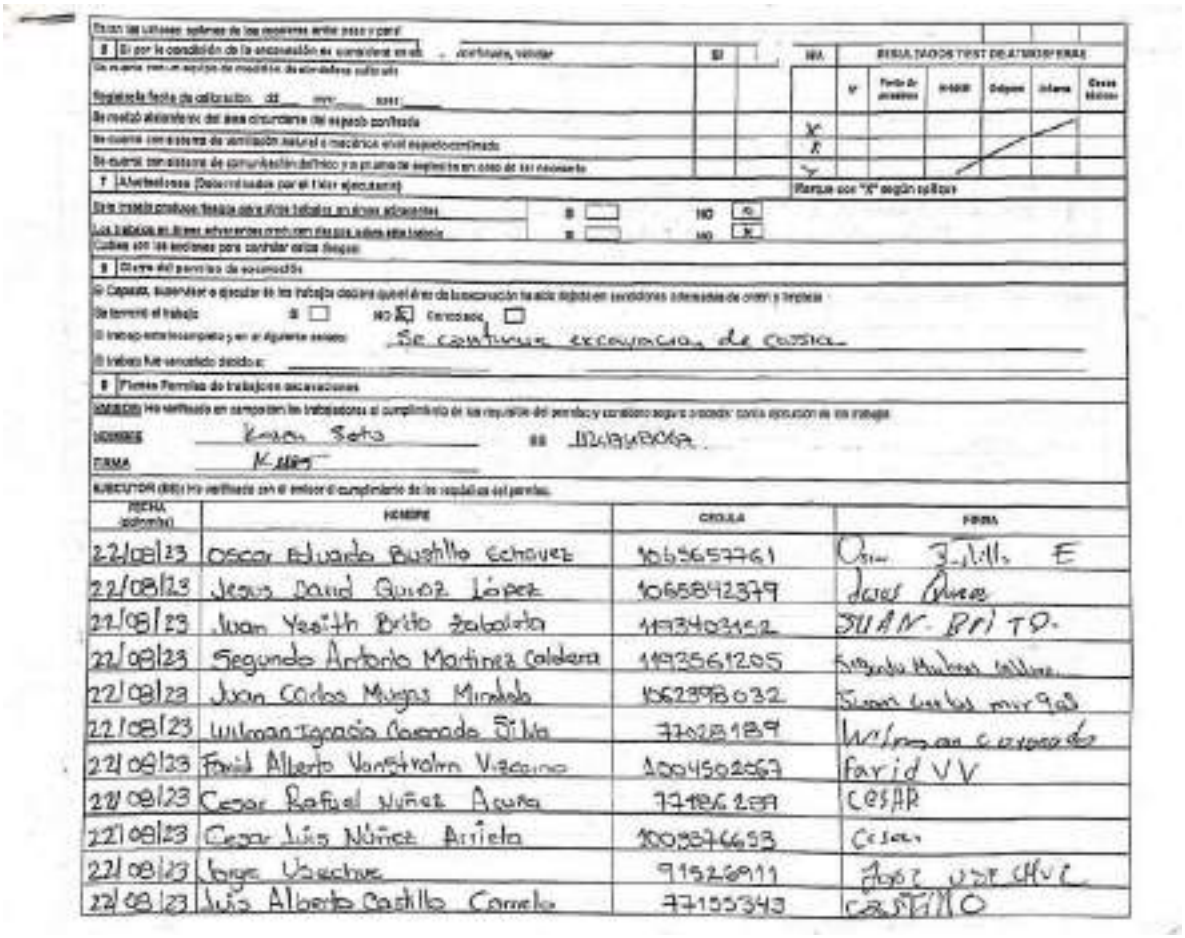


Se continua excavacion de cuneta

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
22/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
22/08/23	Jesus David Guioz López	1065842379	
22/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
22/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
22/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062398032	
22/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
22/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502567	Farid VV
22/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186299	CESAR
22/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003746653	Cesar
22/08/23	Jorge Ustariz	91526911	
22/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO

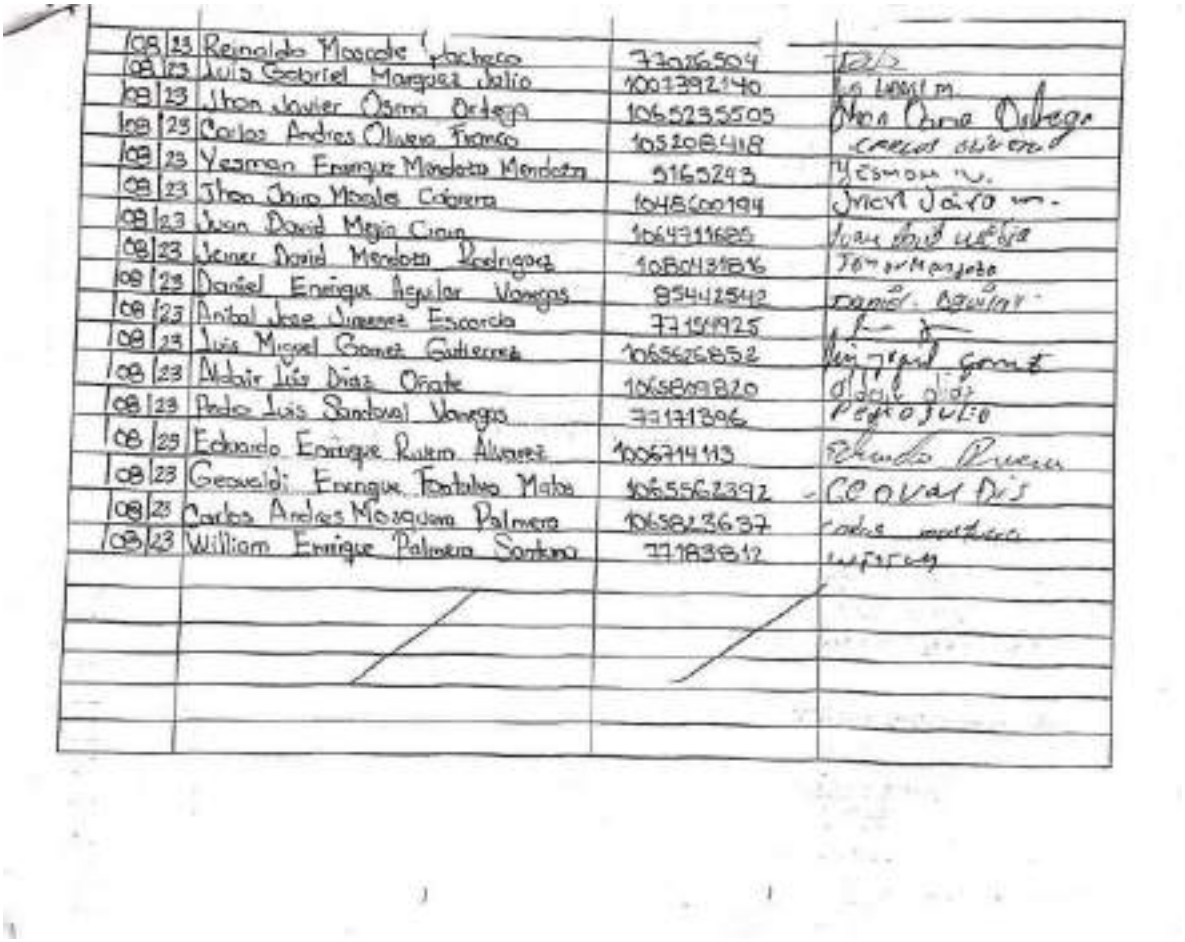

08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	73026504	
08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1001392140	
08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
08	25	Carlos Andres Olivera Franco	1052084118	
08	23	Yesmon Enrique Mendoza Mendoza	9165293	
08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
08	23	Juan David Mejia Cano	1064311685	
08	23	Jaimer David Mendoza Rodriguez	1080431836	
08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	7719/1925	
08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
08	23	Melvin Luis Diaz Oriate	1065809820	
08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	73171396	
08	25	Eduardo Enrique Ruiz Alvarez	1006714113	
08	23	Gesualdi Enrique Fontalvo Mata	1065562392	
08	25	Carlos Andres Mosquera Palmera	1063823637	
08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812	

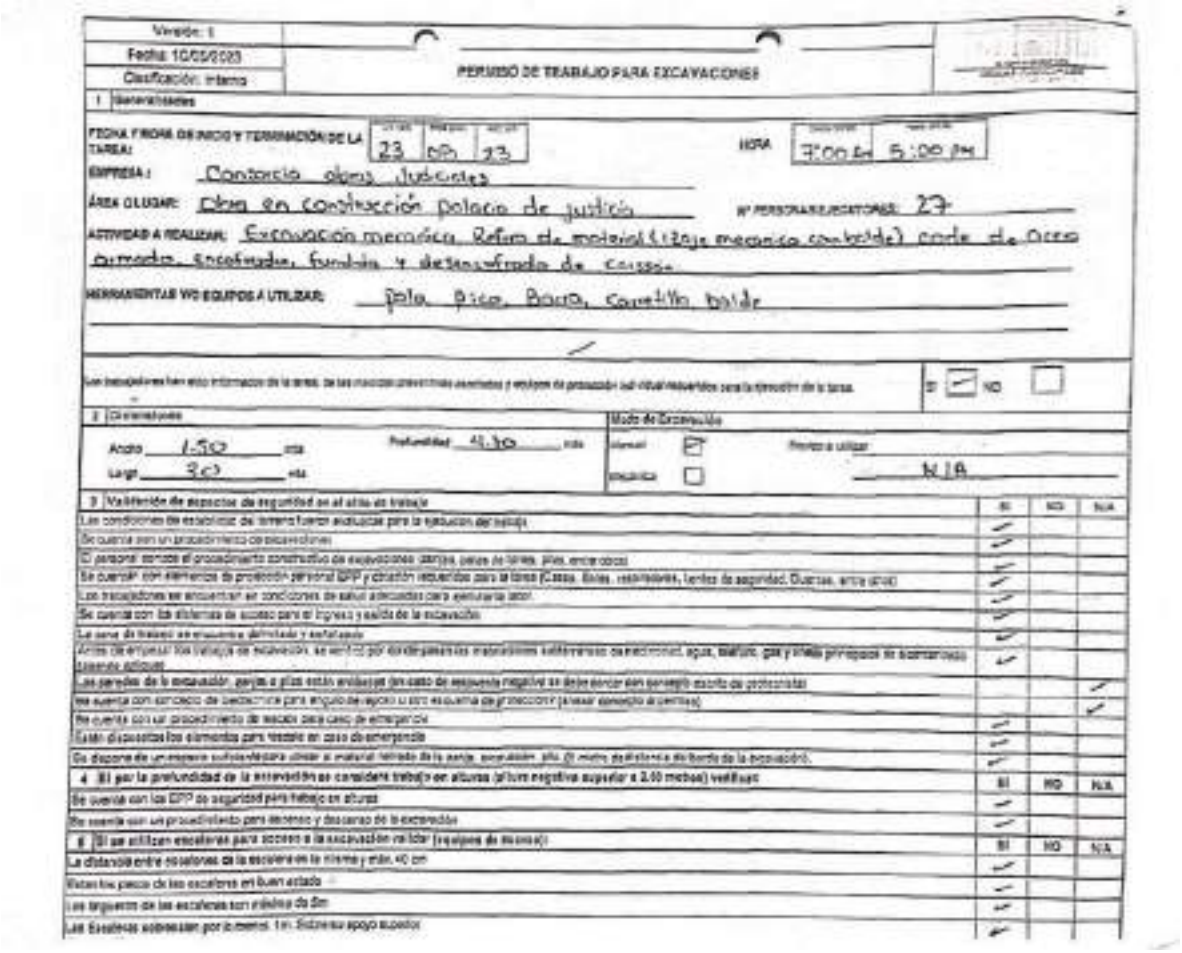

Versión: 1
Fecha: 10/03/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 23 mes 23 año — HORA 7:00 AM 5:00 PM

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación mecánica. Retiro de material (cargue mecanico con bobcat) corte de acero armado, encofrados, fundida y desencofrado de cassos.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, barra, carretilla bobcat


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los riesgos identificados asociados y medidas de prevención y control necesarios para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Características


Ancho 1.50 mts — Profundidad 4.30 mts — Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N/A

Largo 3.0 mts


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tablas, pasos de tablas, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (Casco, botas, reflectivos, lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con las sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por cada uno de los servicios subterráneos (eléctricidad, agua, teléfono, gas y otros) principales la ubicación aproximada	✓		
Las paredes de la excavación (tablas o pilas) están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de profesional)			✓
Se cuenta con sistema de electricidad para ingreso de equipo u otro esquema de protección (anexar concepto si permite)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila (2 metros de distancia de borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para descenso y descanso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar (equipos de manera):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y esta: 40 cm	✓		
Todos los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son metálicos de 3m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sistema apoyo superior	✓		

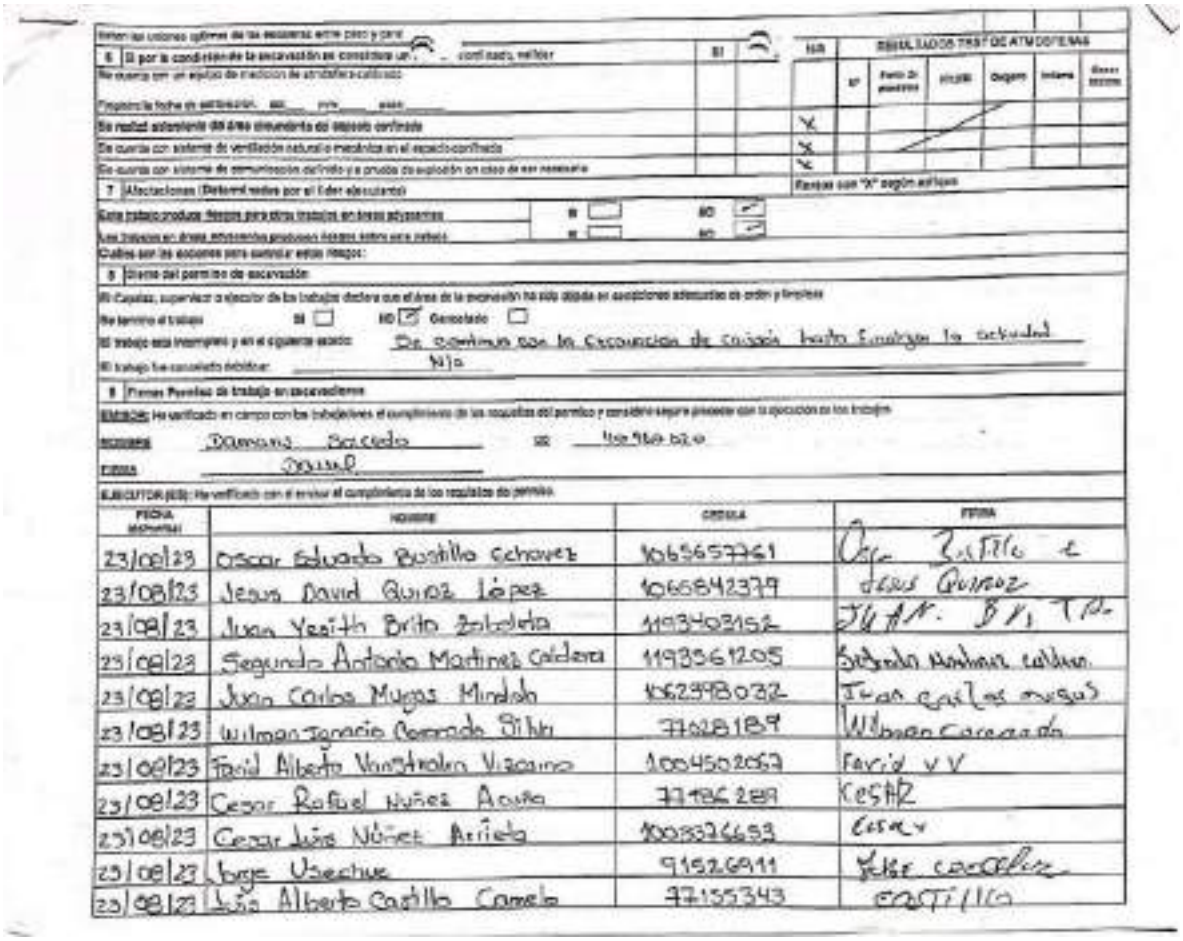

FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
23/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
23/08/23	Jesus David Guiraz López	1066842379	
23/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193493152	
23/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
23/08/23	Juan Carlos Mugas Mindoza	1062398032	
23/08/23	Wilman Ignacio Coronado Pitta	77028189	
23/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502067	
23/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
23/08/23	Cesar Julio Nuñez Arrieta	1003326693	
23/08/23	Jorge Usechue	91526911	
23/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

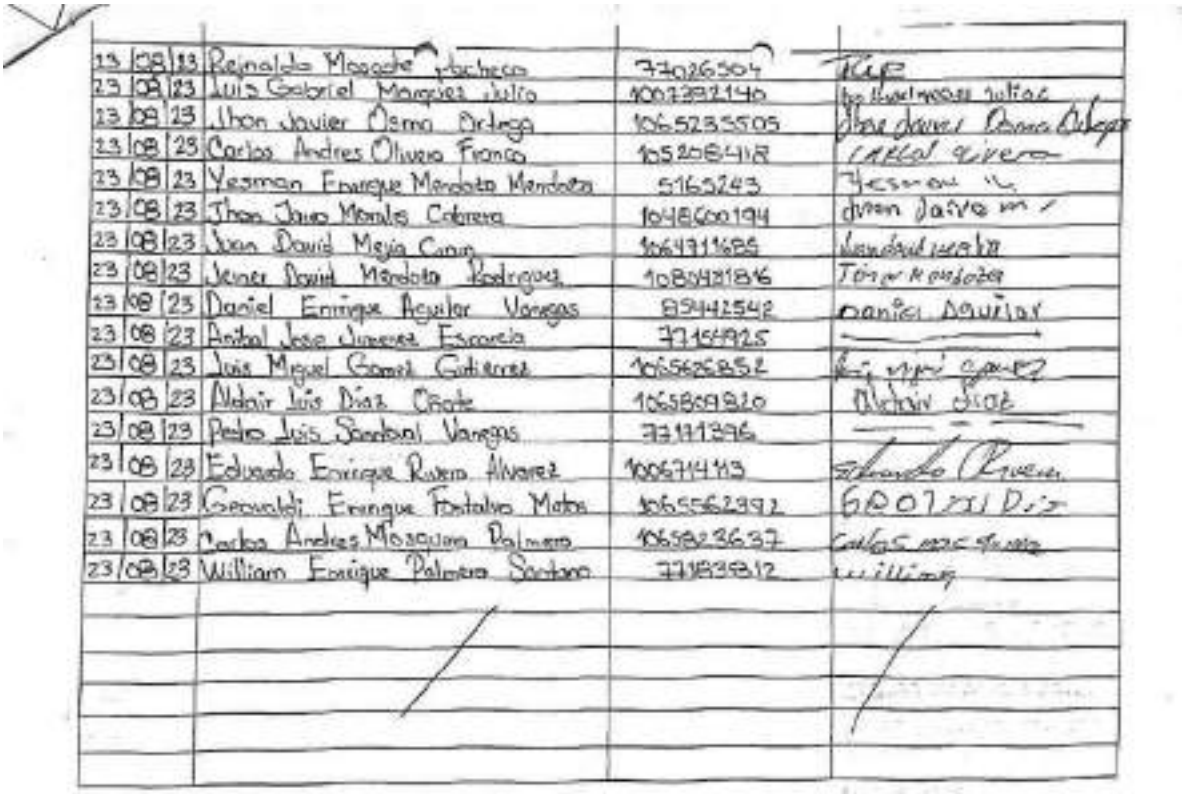

23	08	23	Reinaldo Mosquera Pacheco	77026504	
23	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1067732140	
23	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
23	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084118	
23	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5163243	
23	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
23	08	23	Juan David Mejia Cano	1064711685	
23	08	23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080421846	
23	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85142542	
23	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77156925	
23	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065625852	
23	08	23	Alexair Luis Diaz Conde	1065869820	
23	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	73171396	
23	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
23	08	23	Gerardo Enrique Fontalvo Mota	1065562392	
23	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
23	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183912	

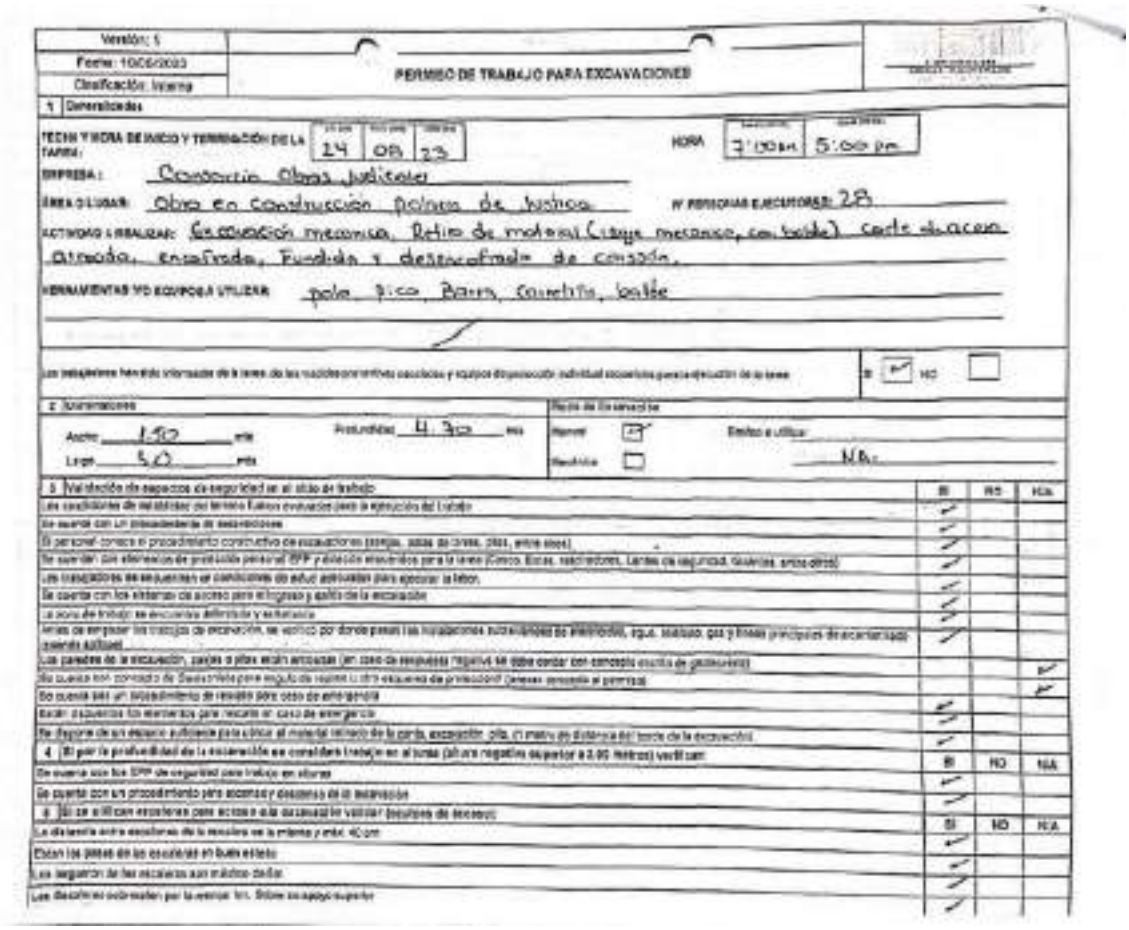

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 24 08 23 HORA 7:00 a.m. 5:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

OBRA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia N° PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación mecanica, Retiro de material (cargue manual, con balde) corte de acero. Armado, encofrado, Fundida y desencofrado de columna.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pico, Barra, canastilla, balde

Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas colectivas y equipos de protección individual necesarios para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts Profundidad: 4.30 mts


Largo: 5.0 mts

Fecha de excavación: Normal ☑ Reubicada ☐ Retiro a utilizar: N.A.

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un cronograma de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (entrega, aisla de cintas, zeta, entre otros)	✓		
Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y colectiva requeridos para la tarea (Conos, Cintas, señalizaciones, Lamina de seguridad, Guardas, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los elementos de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, eq.e. teléfono, gas y líneas principales de acueducto y cuenta activas	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para seguir de realizar otro esquema de protección (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 En caso de que la profundidad de la excavación se considere trabajo en altura (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar con:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 En caso de utilizar escaleras para acceso a la excavación verificar (escalera de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la prima y está: 40 cm	✓		
Están los pines de las escaleras en buen estado	✓		
La seguridad de las escaleras son metálicos dadas	✓		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre el apoyo superior	✓		

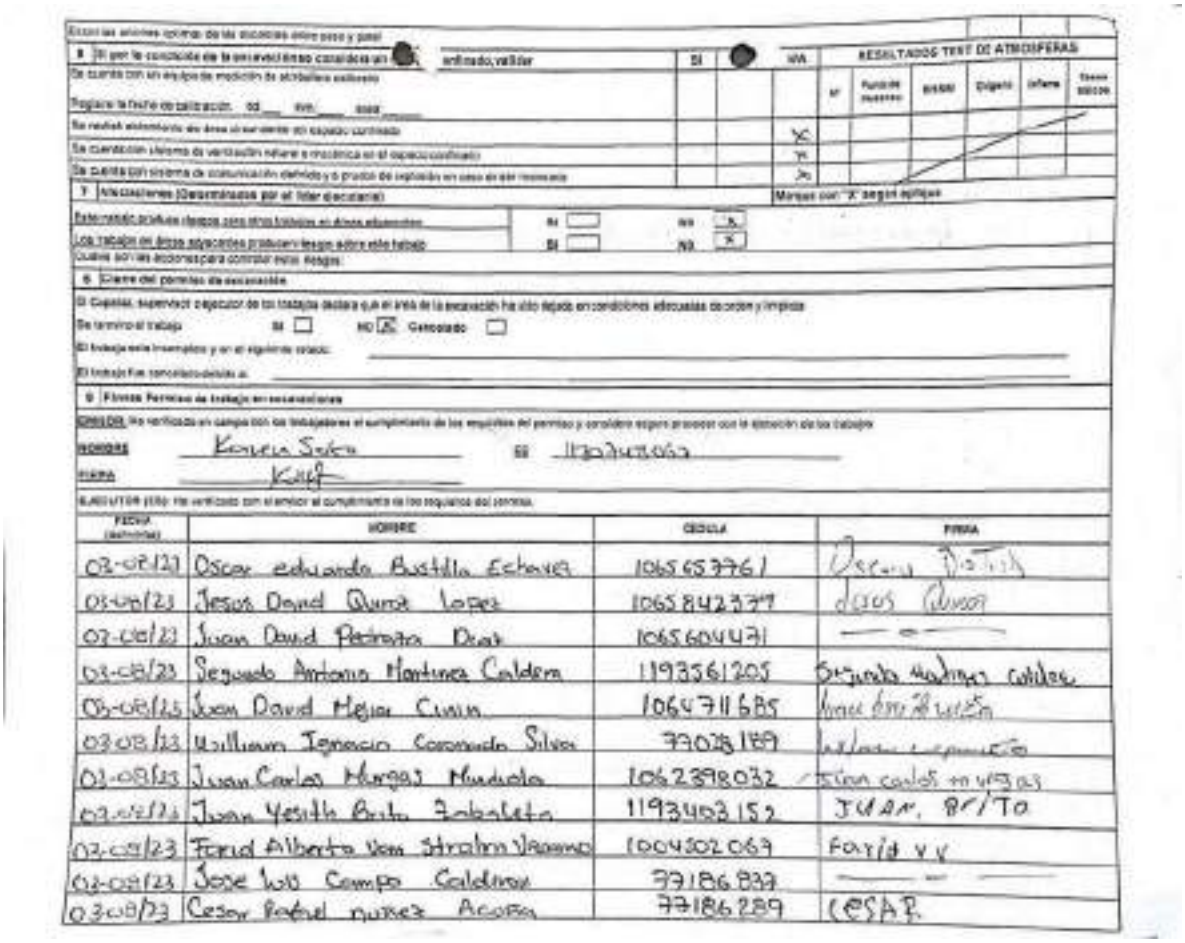

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
02-08/23	Oscar eduardo Bustillo Echeverri	1065653761	
03-08/23	Jesus David Quintero Lopez	1065842377	
02-08/23	Juan David Pedroza Diaz	1065604471	
03-08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
03-08/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	
03-08/23	William Ignacio Coronado Silva	79038189	
03-08/23	Juan Carlos Murgas Maduro	1062398032	
03-08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193453152	
03-08/23	Farid Alberto Vega Straboni Vasquez	1004302069	
03-08/23	Jose Luis Campo Calderon	77186839	
03-08/23	Cesar Rafael nuñez Acosta	77186289	

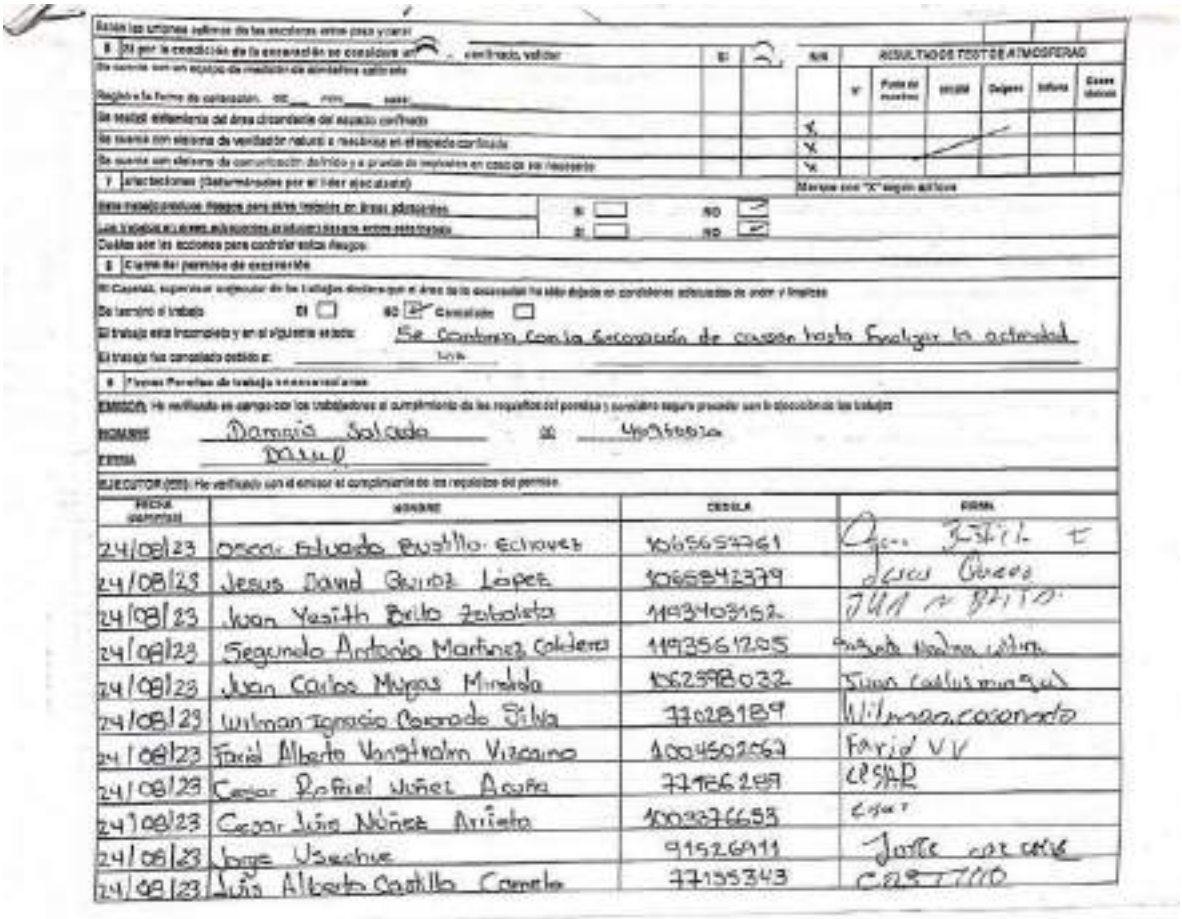


Se Continua con la Excavación de cuneta hasta finalizar la actividad

FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
24/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echeverz	1065657761	
24/08/23	Jesus David Garcia Lopez	1065842379	
24/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
24/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
24/08/23	Juan Carlos Mojica Miranda	1062998032	
24/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
24/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502062	
24/08/23	Cesar Rafael Juñez Acuña	77166289	
24/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003276653	
24/08/23	Jorge Usechue	91526911	
24/08/23	Luis Alberto Castilla Camelo	77155343	



24/08/23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026564	
24/08/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	
24/08/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235595	
24/08/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052084418	
24/08/23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	9165743	
24/08/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
24/08/23	Juan David Mejia Cuan	1064911486	
24/08/23	Jaiver David Mendoza Rodriguez	1080431816	
24/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	87441542	
24/08/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77101925	
24/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065625852	
24/08/23	Nelair Luis Diaz Olgate	1065609820	
24/08/23	Pedro Luis Sanchez Vanegas	77111896	
24/08/23	Eduardo Enrique Ruiz Alvarez	1006714113	
24/08/23	Gerardi Enrique Fontalvo Mejia	1065262392	
24/08/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
24/08/23	William Enrique Palmera Santana	77183617	

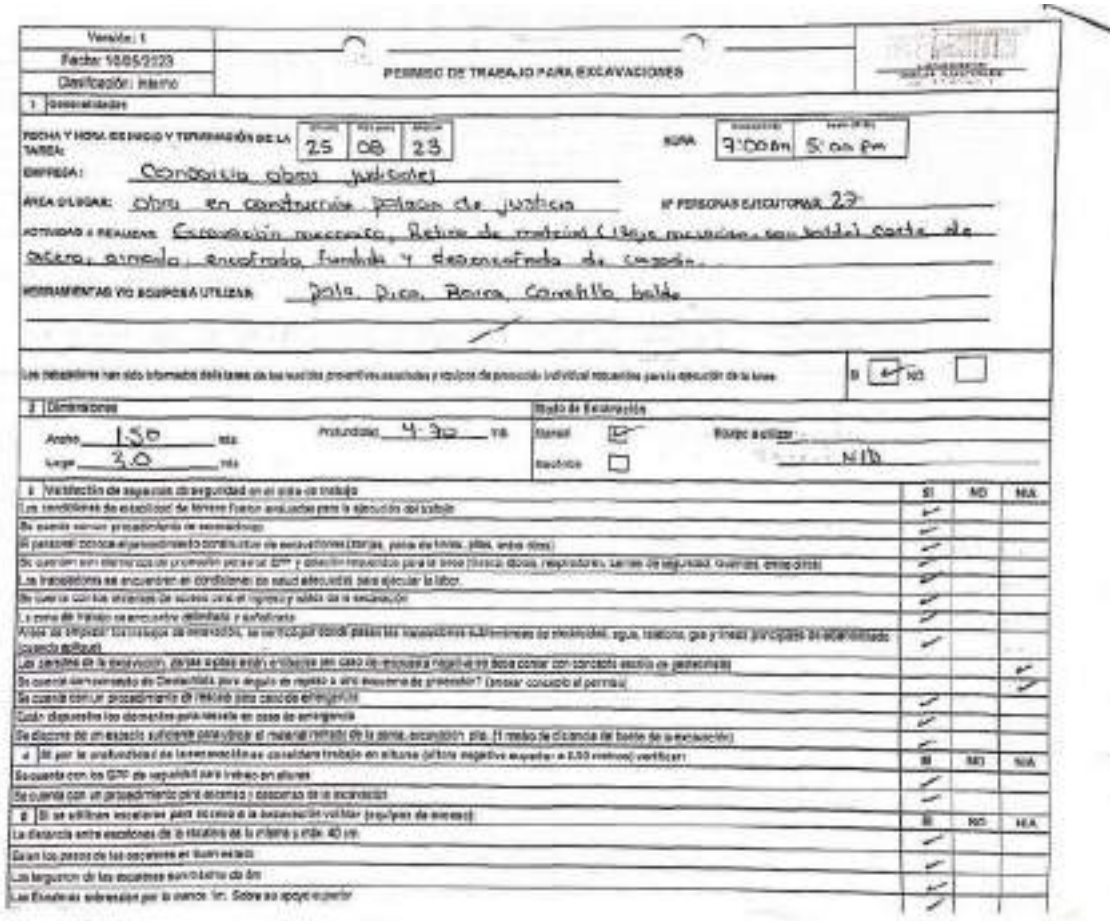

Versión: 1
Fecha: 16/05/2023
Clasificación: interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 25 / 08 / 23 — HORA: 9:00 Am — 5 pm Pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: obra en construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 22

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (tierra, escombros, concreto) carta de talud, armado, encofrado, fundida y desencofrado de cimiento.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, Pica, Barra, Carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de las tareas de los sucesos preventivos asociados y medios de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 4.30 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ — Mecánico ☐ — Equipo a utilizar: N/A

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de señalización	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, pasos de trabajo, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (botas dieléctricas, respiradores, cascos de seguridad, guantes, entre otros)	✓		
Las instalaciones se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con las entradas de suelos para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de iniciar excavación de interiores, se ha ubicado donde pasan las canalizaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y redes principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las cercanías de la excavación, dentro radios entre 0 y 5 metros del área de excavación hay algún árbol cerca (determinar)			✓
Se cuenta con concepto técnico de Geotecnia para seguir de rigidez a otro escenario de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en altura (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para ascenso a la excavación verificar (requisitos de escalas)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera de la interna y entre 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las longitudes de las escaleras sobrepasan 1m	✓		
Las Escaleras sobresalen por la menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

Unan las uniones optimas de las escaleras entre piso y piso

6 Si por la condición de la excavación se considera un ... confinado, validar — SI

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado

Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__

Se realiza aislamiento del área circundante del espacio confinado

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

	X					
	X					
	X					

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes — SI ☐ NO ☑

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI ☐ NO ☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termina el trabajo SI ☐ NO ☒ Concluido ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Se continúa con la Excavación de canaleta hasta completar la actividad

El trabajo fue cancelado debido a: N/A

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de las labores

NOMBRE: Damaris Salcedo CC 40960220


FIRMA: Damaris

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA dd/mm/aa	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
25/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	O. Bustillo E
25/08/23	Jesus David Guioz López	1065842379	Jesus Guioz
25/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN. BRITO.
25/08/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez Caldera
25/08/23	Juan Carlos Murgas Miranda	1062398032	Juan Carlos Murgas
25/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	Wilman Coronado
25/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502057	Farid V V
25/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	CESAR
25/08/23	Cesar Luis Núñez Arrieta	1003876653	Cesar
25/08/23	Jorge Usechue	91526911	Jorge Usechue
25/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO

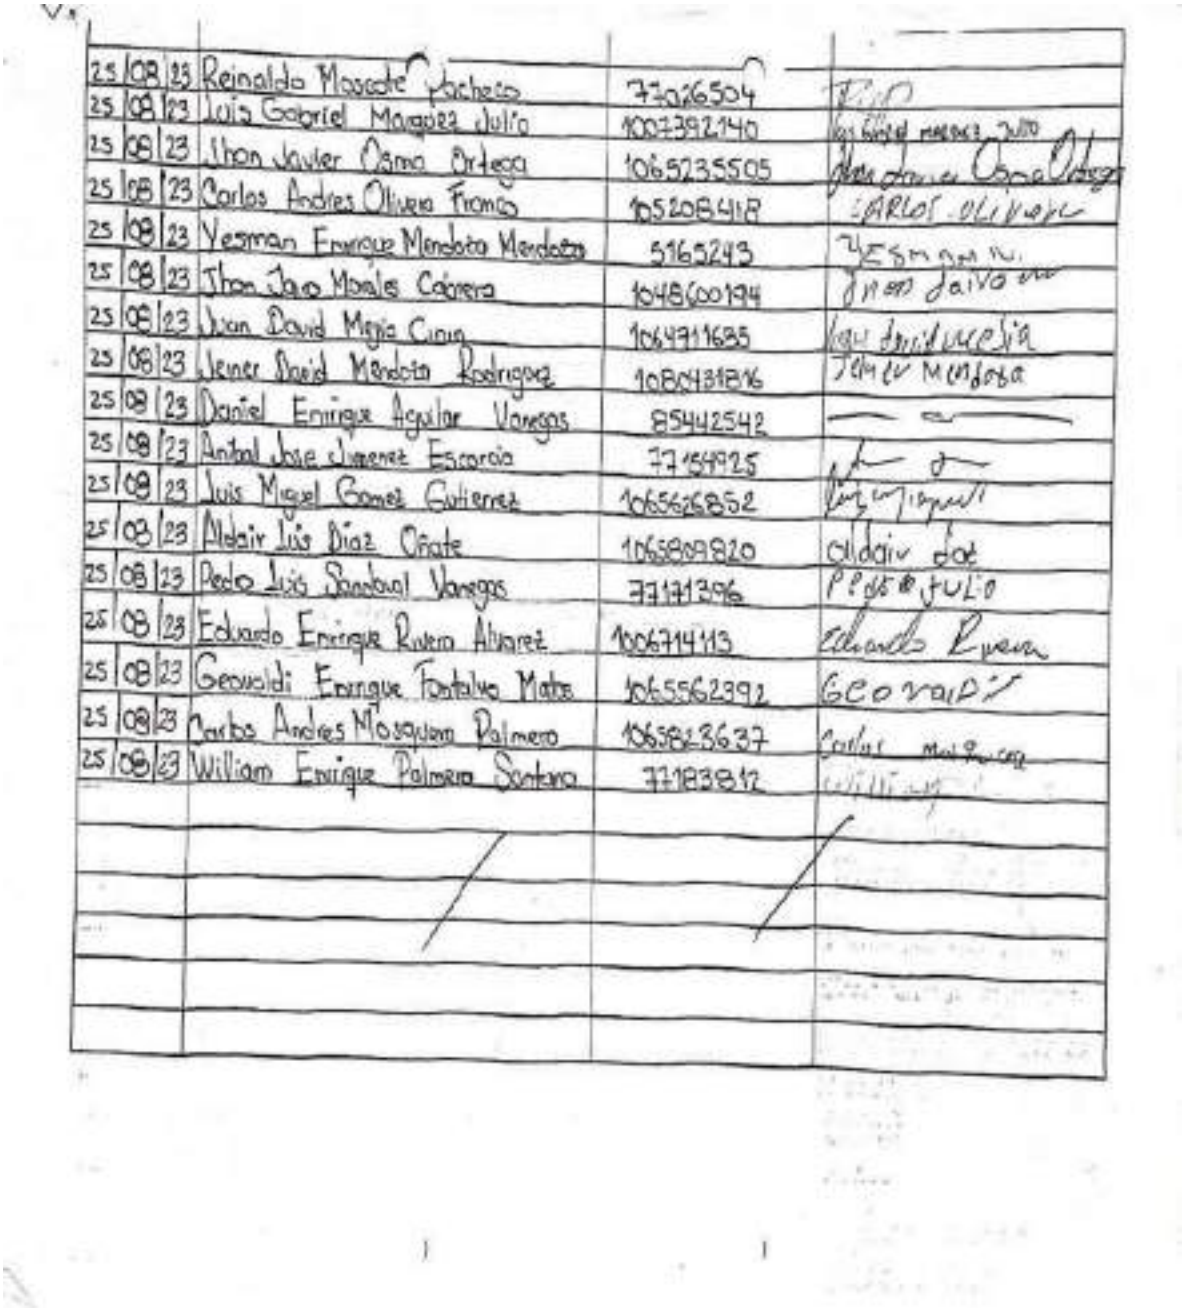

25	08	23	Reinaldo Mosquera Pacheco	77026504
25	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140
25	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505
25	08	23	Carlos Andres Oliveros Franco	1052084118
25	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243
25	08	23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194
25	08	23	Juan David Mejia Cuna	1064911685
25	08	23	Jemer Saeid Mendoza Rodriguez	1082431816
25	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542
25	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925
25	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852
25	08	23	Aldair Luis Diaz Conte	1065809820
25	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396
25	08	23	Eduardo Enrique Rueda Alvarez	1006714113
25	08	23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mata	1065562392
25	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637
25	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812

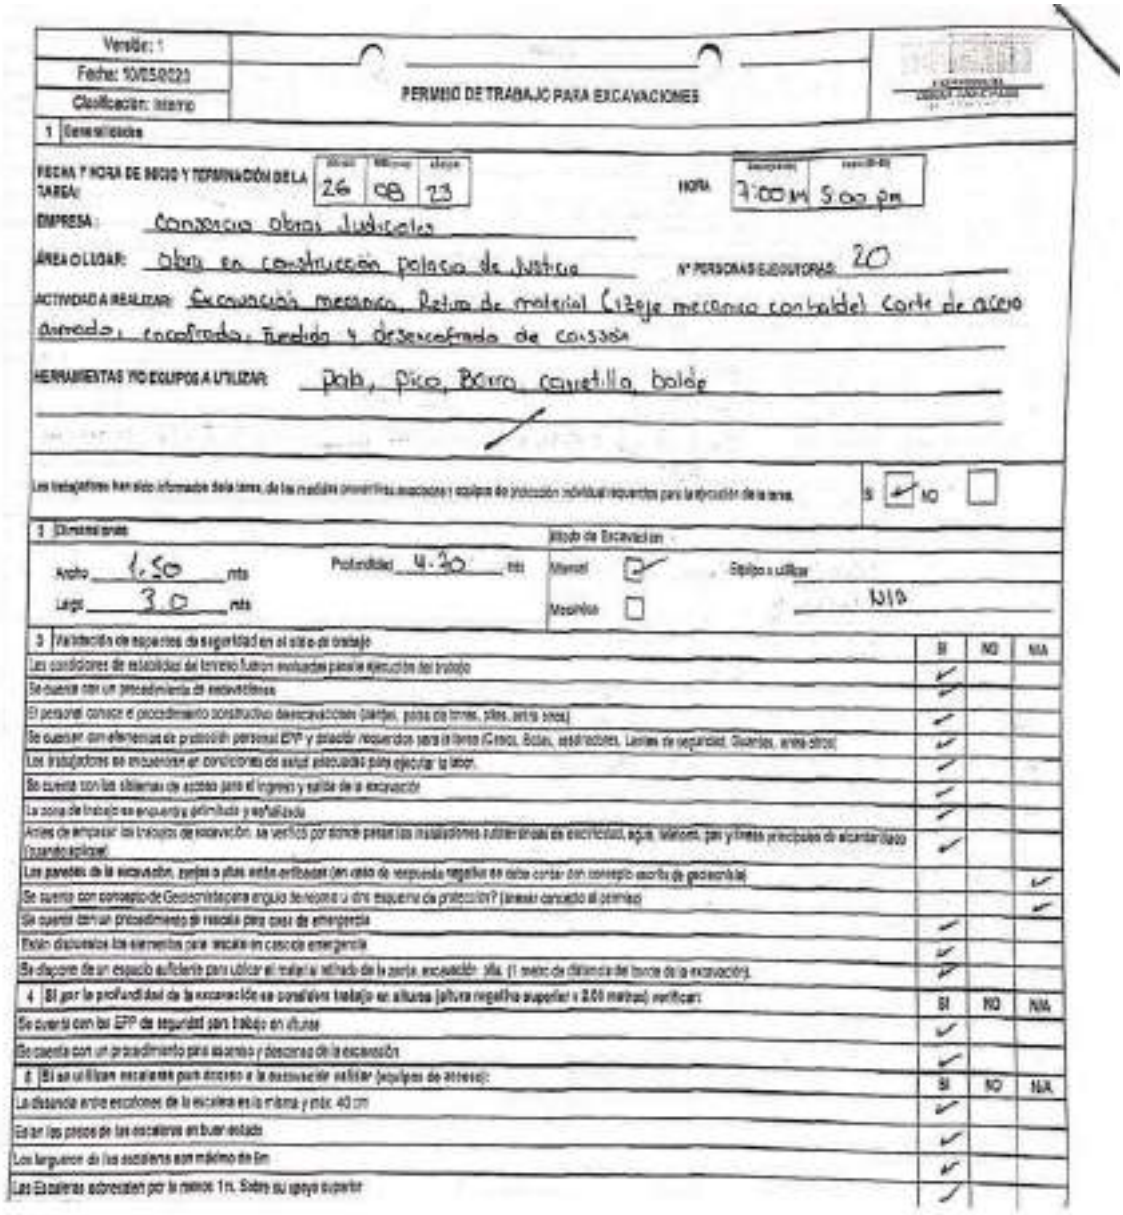

Versión: 1
Fecha: 10/05/2021
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: día 26 mes 08 año 23 — HORA 7:00 AM 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de Justicia — N° PERSONAS EJECUTORAS: 20

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación mecanica, Retiro de material Cizaje mecanico con balde) Corte de acero demolido, recalzado, Fundido y desencofrado de columna

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, cuerdilla, balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas, avaladas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones


Ancho 1.50 mts — Profundidad 4.20 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ✓ Equipos a utilizar: Ninguno — Mecánico ☐

3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de torres, sitios, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y planeta requeridos para el tipo (Cascos, Botas, guantes, Gafas de seguridad, Chalecos, arnés entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con las señales de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Los paredes de la excavación, zanjas o pozos están entibados (en caso de respuesta negativa en esta pregunta debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para el uso de taludes u otro esquema de protección? (anexar concepto al informe)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para casos de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación señalar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

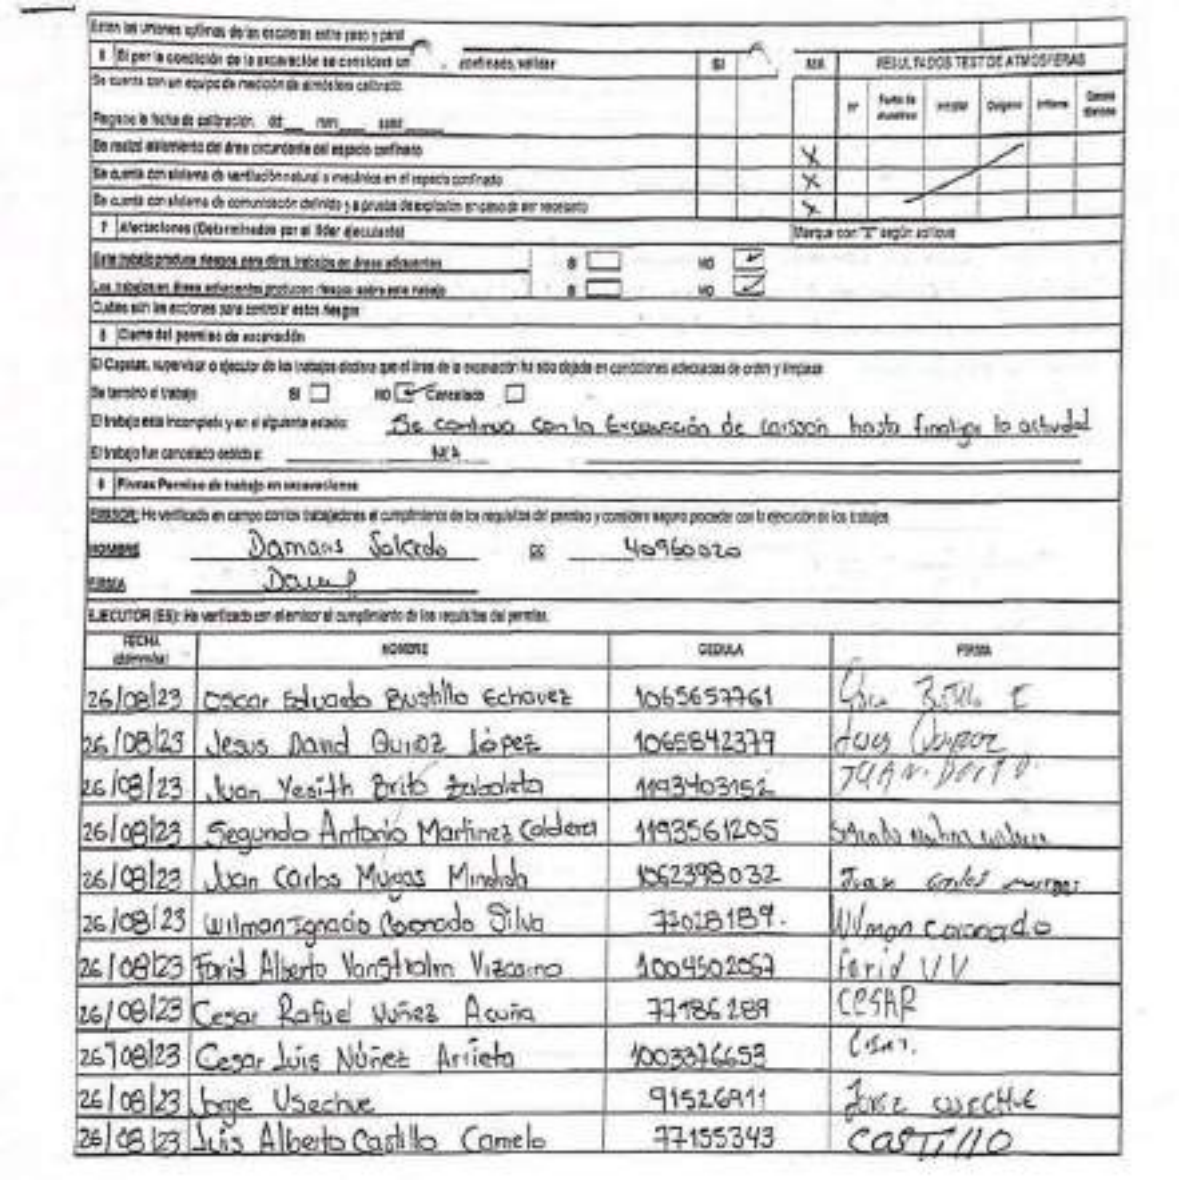

Entre las uniones soldadas de las escaleras entre piso y piso

8 | El pre la ejecución de la excavación se consideró un ... definidos, señalar | SI | NO

Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado. Registre la fecha de calibración: dd mm aaaa — NO

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado — NO

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánico en el espacio confinado — NO

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario — NO

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS: Hr | Punto de rocío | oxígeno | Oxígeno | Inflama | Gases tóxicos

7 | Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes — SI ☐ NO ☑

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI ☐ NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos

9 | Diario del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo: SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Se continua con la Excavación de canaleta hasta finalizar la actividad

El trabajo fue cancelado debido a: N/A

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


RESPOR: He verificado en campo contra trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Damaris Salcedo CC 40960220


FIRMA: Damaris

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA dd/mm/aa	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
26/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
26/08/23	Jesus David Ruiz López	1065842379	
26/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
26/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
26/08/23	Juan Carlos Mujas Mindiola	1062398032	
26/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	72028189	
26/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502067	
26/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
26/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
26/08/23	Jorge Usechue	91526911	
26/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

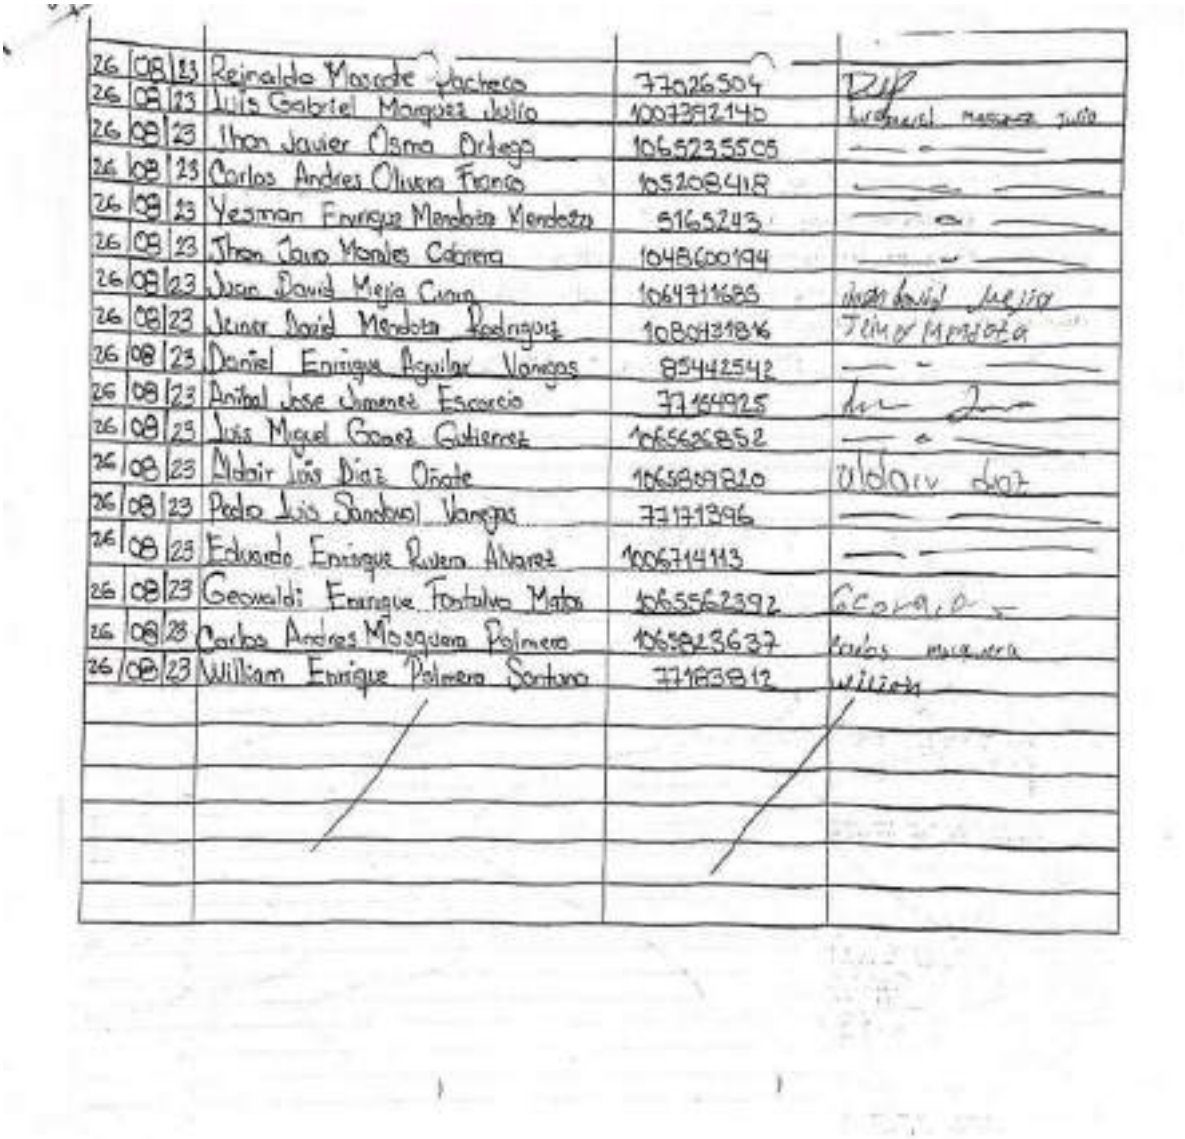

26	08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026504	
26	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003912140	
26	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
26	08	23	Carlos Andres Oliveros Franco	1052084118	
26	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243	
26	08	23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1048600194	
26	08	23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
26	08	23	Jenier David Mendoza Rodriguez	1080431836	
26	08	23	Daniel Enrique Aguilar Noriega	85442542	
26	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77164925	
26	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
26	08	23	Alnair Luis Diaz Oñate	1065809820	
26	08	23	Pedro Luis Sandoval Noriega	77171396	
26	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
26	08	23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mata	1065562392	
26	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
26	08	23	William Enrique Palmera Santana	77183812	

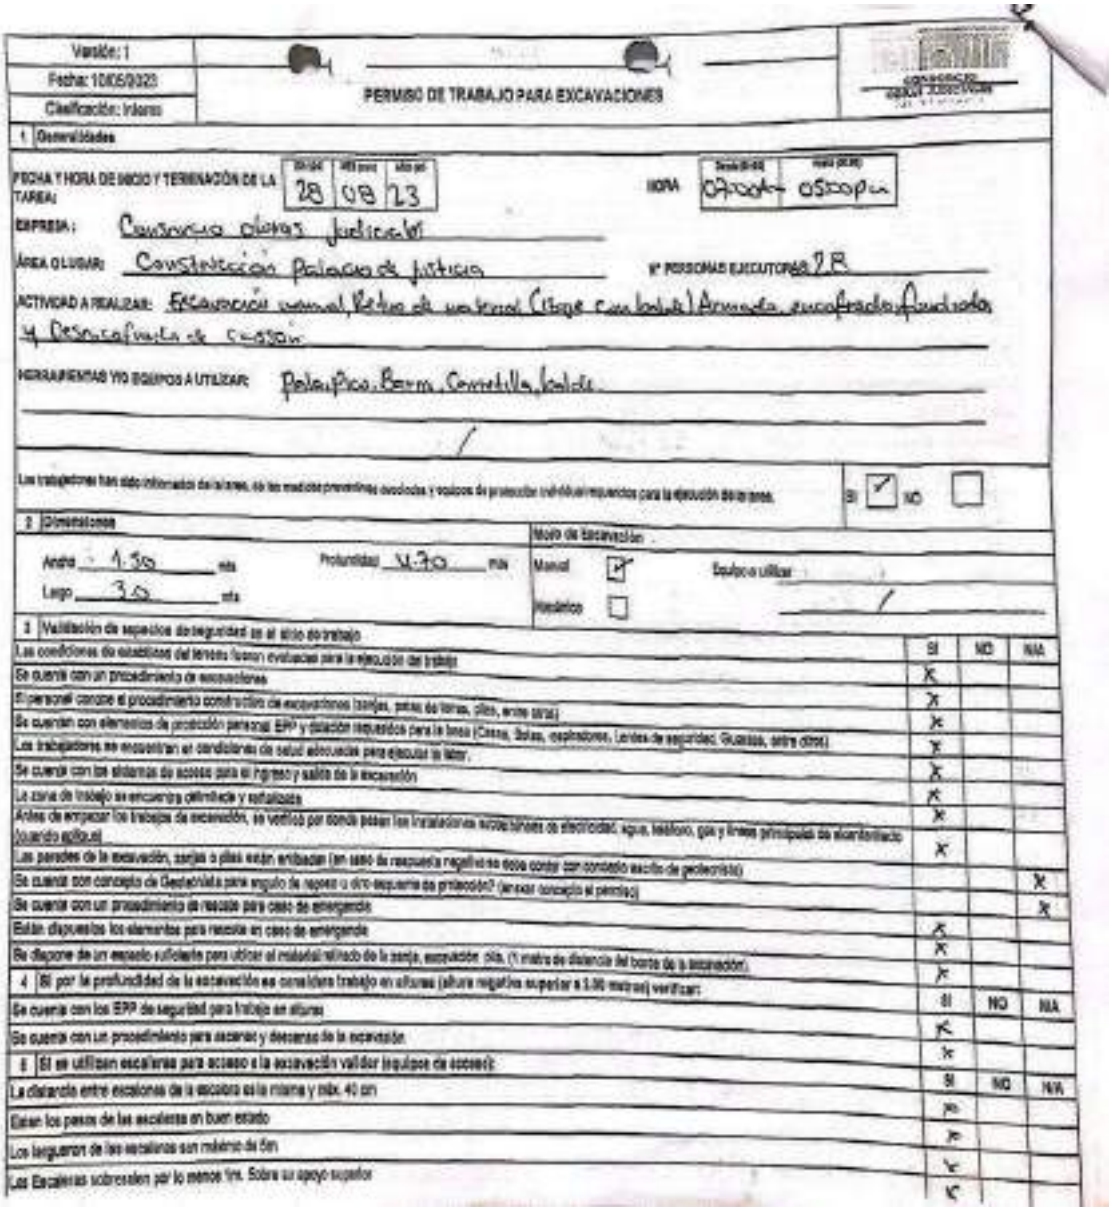

Versión: 1
Fecha: 10/05/2020
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 28 / 08 / 23 — HORA: 07:00 a.m. — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2 R

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, Retiro de material (Cargue con bota) Armado encofrado fundida y Desencofrado de cimiento

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, Bota

Los trabajadores han sido informados de los pares, de los medios preventivos asociados y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 4.70 mts — Largo 30 mts

Modo de excavación: Manual [x] — Mecánico [ ] — Equipo a utilizar: /

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo


	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de torres, pilas, entre otras)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para seguir de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para utilizar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	X		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:

	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	X		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):

	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	X		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 6in	X		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

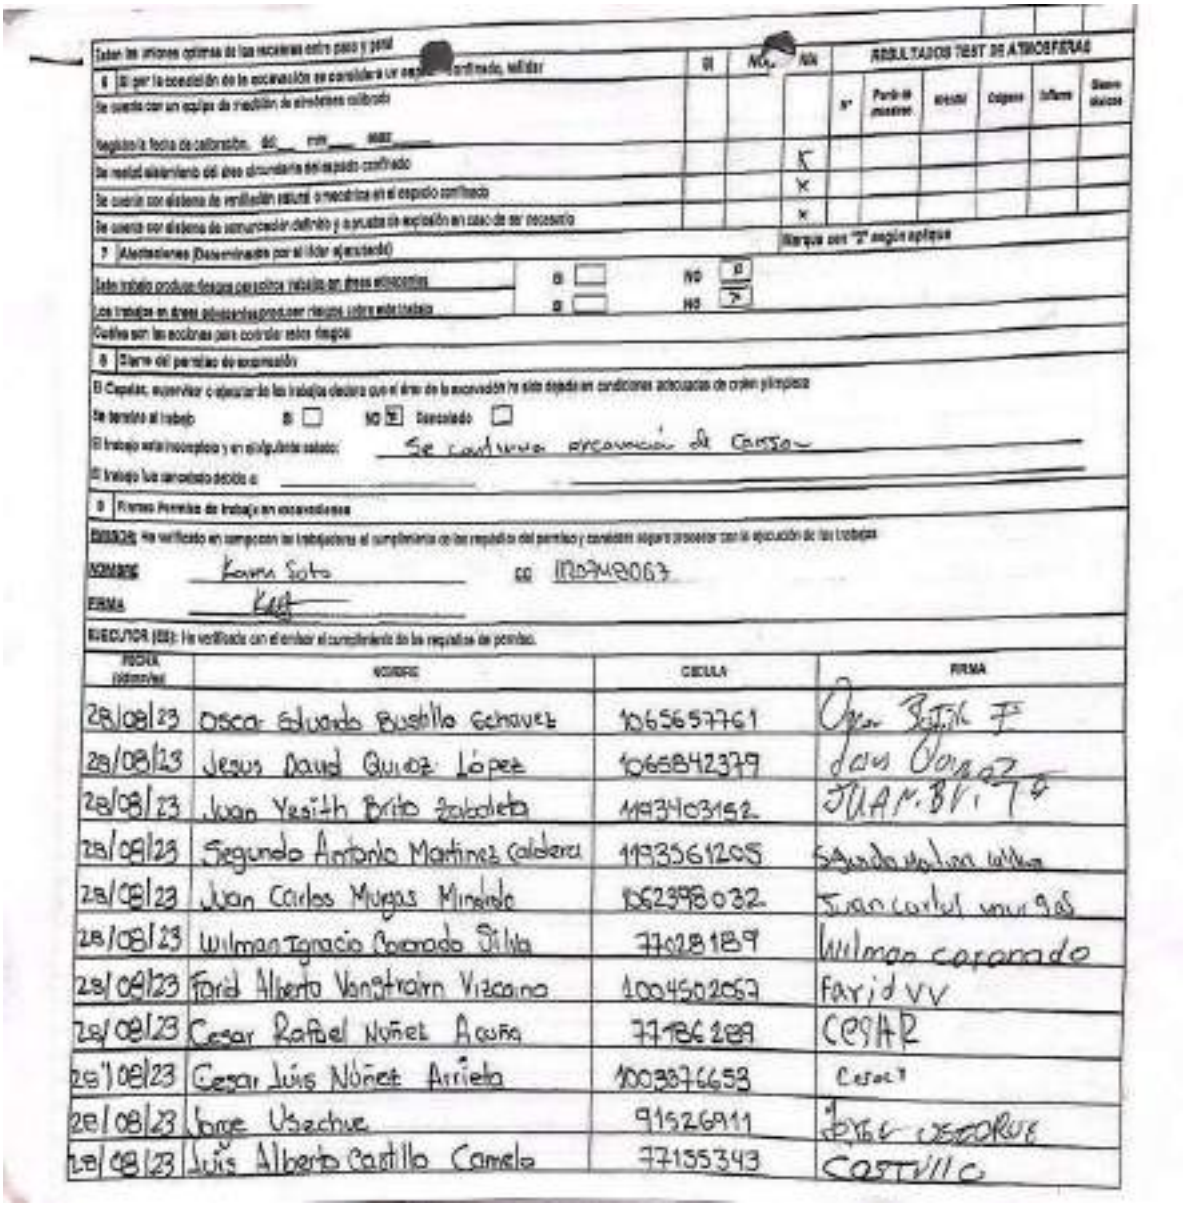

Todas las uniones ópticas de las escaleras entre pisos y piso

6 El por la excavación de la excavación se considera un espacio confinado, validar

	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de atmósferas calibrado			
Registrar la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__			
Se realizó el monitoreo del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y apropiado de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Resultado	Diagnóstico	Informe	Sistema utilizado

7 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Todo trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	X
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	X

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos

8 Diario del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en siguiente estado: Se continua excavación de Cerca

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

RESPONSABLE: He verificado en compañía de los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos


NOMBRE: Kevin Soto CC 1067908063

FIRMA: Kevin


EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
28/08/23	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
28/08/23	Jesus David Guioz López	1065842379	
28/08/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
28/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
28/08/23	Juan Carlos Mugas Mendoza	1062398032	
28/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	77028189	
28/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502052	
28/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
28/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003876653	
28/08/23	Jorge Usechue	91526911	
28/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	

03-08/23	Jorge Usechue	91526911	
03-08/23	Luis Alberto Castillo	77155347	CASTILLO
03-08/23	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	
03-08/23	Reinaldo Hoscote Pacheco	77026504	
03-08/23	Luis Gabriel Mosquera	1003992140	
03-08/23	Jhon Osma Ortega	1065235505	
03-08/23	Carlos Andres Olivera	1052080418	CARLS
03-08/23	Yesmen Enrique Mendoza	5165243	
03-08/23	Jhon Jairo Morales	1048600194	
03-08/23	Jeiner Daniel Mendoza	1080431816	
03-08/23	Daniel Aguilar Venegas	85442542	
03-08/23	Anibal Jimenez Escorcia	77154925	
03-08/23	Luis Miguel Gomez	1065676857	
03-08/23	Aldair Diaz Ocate	1065809805	
03-08/23	Pedro Julio Sandoval	77171396	
03-08/23	Edgardo Rivera Alvino	1006714113	
03-08/23	William Palmera Santana	77183812	
03-08/23	Carlos Andres Mosquera	1065823537	
03-08/23	Gerardo Fontalvo	1065562392	

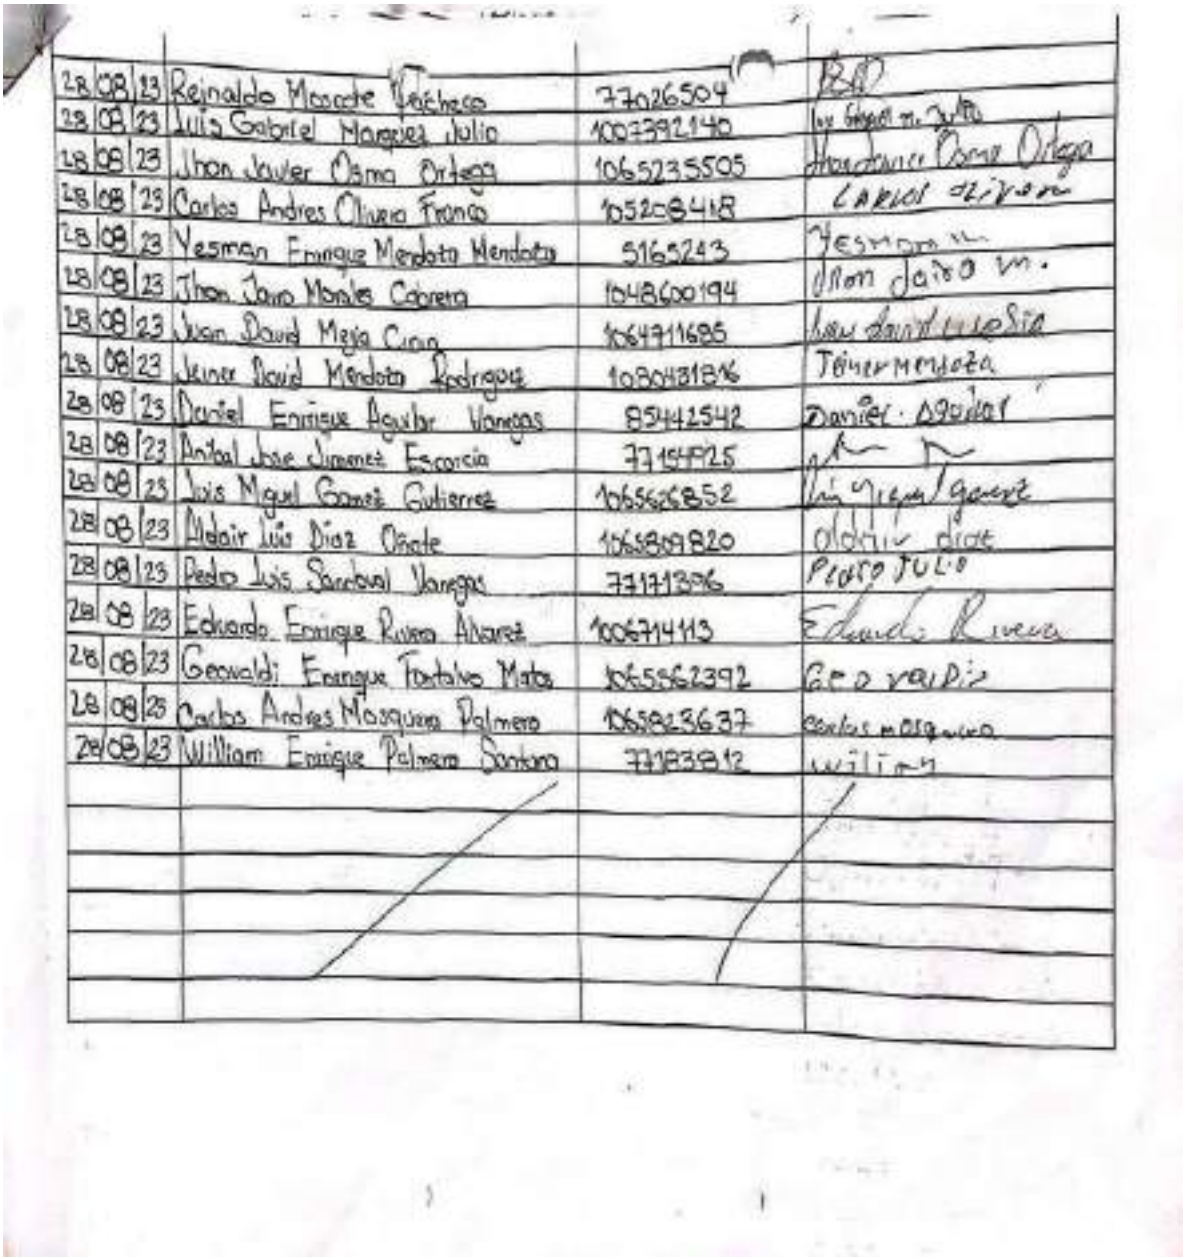

28/08/23	Reinaldo Mosquera Pacheco	77026504	
28/08/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	
28/08/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
28/08/23	Carlos Andres Oliveros Franco	1052088418	
28/08/23	Yesmen Enrique Mendoza Mendoza	5165243	
28/08/23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1048600194	
28/08/23	Juan David Mejia Cuao	1067711685	
28/08/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080481876	
28/08/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	
28/08/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	7715425	
28/08/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065625852	
28/08/23	Aldair Luis Diaz Conde	1065809820	
28/08/23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	77171396	
28/08/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
28/08/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mota	1065562392	
28/08/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065823637	
28/08/23	William Enrique Palmera Santana	77183812	

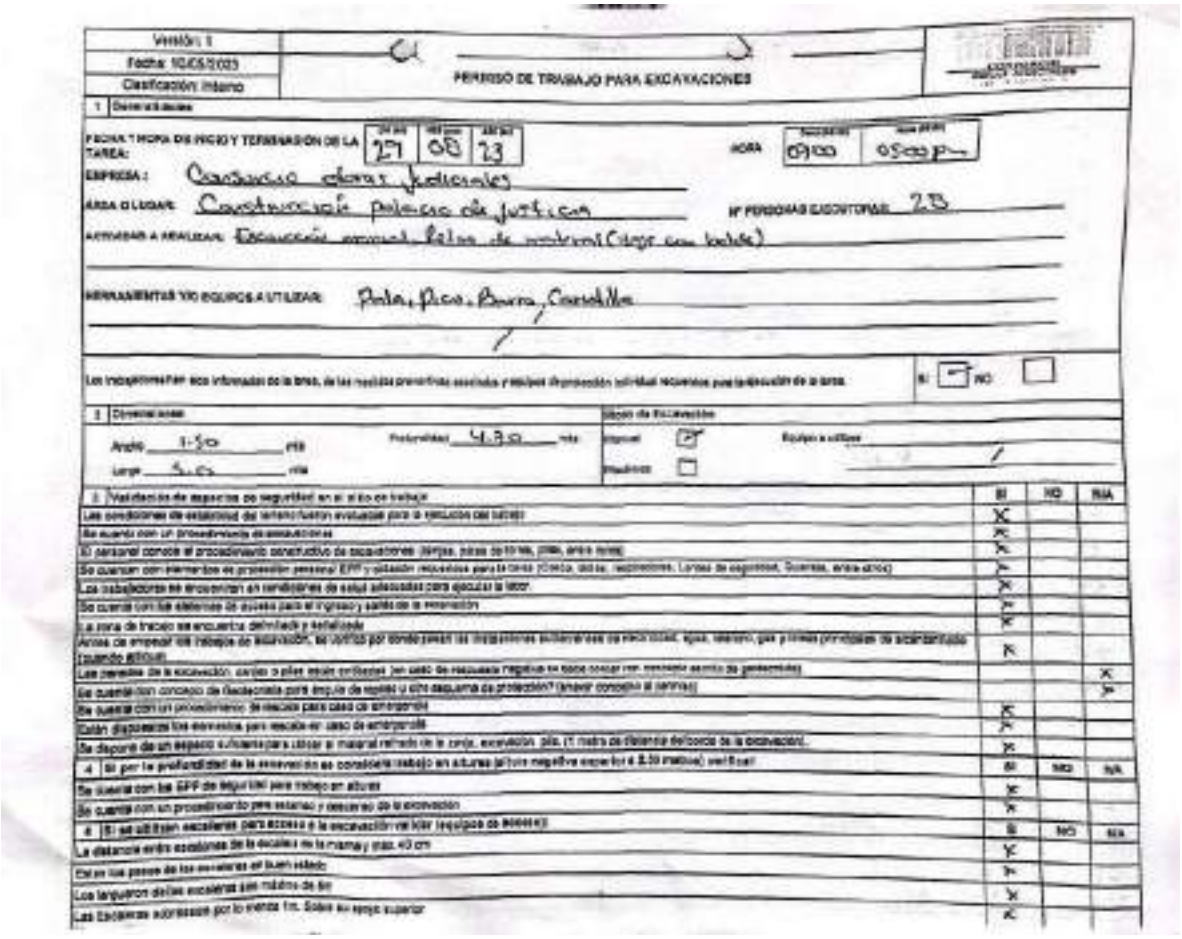

Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 27 | 08 | 23 — HORA: 09:00 — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS ENCONTRADAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, falsa de cimentación (viga con bolsa)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de los riesgos, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☐ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 4.30 mts — Largo: 5.05 mts

Clase de Excavación: Manual ☐ Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: /


3 Verificación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para el ejercicio del talud	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (tiempo, pasos de trabajo, orden, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP y señalización requeridos para la tarea (Casco, botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	X		
Se cuenta con las distancias de ayuda para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se tomaron las precauciones adicionales de seguridad (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación: cortes o pilas están entibadas (en caso de requerirse negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			X
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de talud u otro esquema de protección? (Anexar concepto al permiso)			X
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestas las escaleras para escape en caso de emergencia	X		
Se dispone de un espacio suficiente para colocar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	X		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	X		
Se cuenta con un procedimiento para estudio y descenso de la excavación	X		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar (equipos de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera no la mano y esta 40 cm	X		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	X		
Las longitudes de las escaleras son mayores de 6m	X		
Las escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	X		

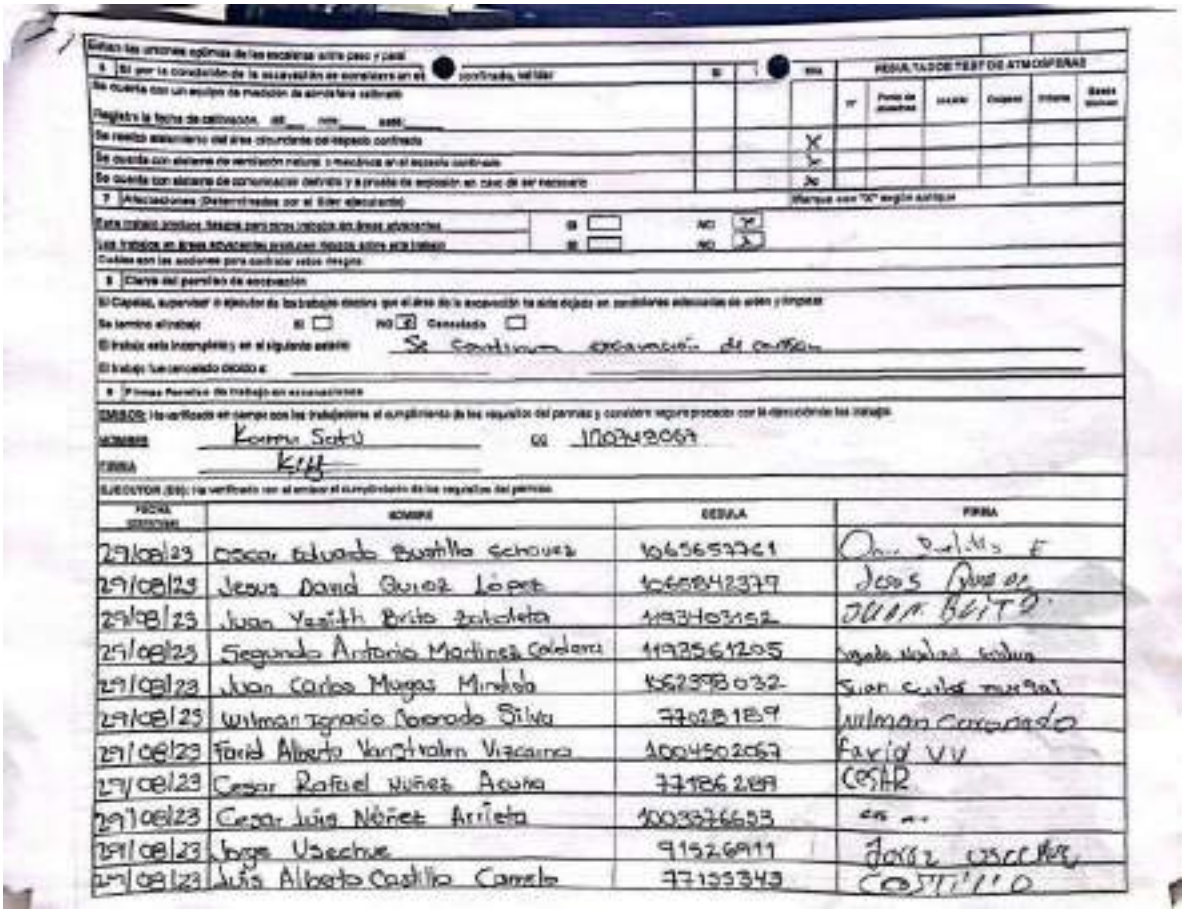



FECHA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
29/08/23	Cesar Eduardo Bustillo Echeverz	1065657761	
29/08/23	Jesus David Guiez Lopez	1065842379	
29/08/23	Juan Yesith Brito Bolaleta	1193403152	
29/08/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1192561205	
29/08/23	Juan Carlos Mugas Mindiola	1562398032	
29/08/23	Wilman Ignacio Coronado Silva	7702818?	
29/08/23	Farid Alberto Vanstralen Vizcaino	1004502067	
29/08/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	
29/08/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003776633	
29/08/23	Jorge Usechue	91526911	
29/08/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77133343	



29	08	23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026504
27	08	23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003782140
27	08	23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505
27	08	23	Carlos Andres Olivera Franco	1052088418
27	08	23	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5165243
27	08	23	Jhon Jairo Montes Cabrera	1048000194
29	08	23	Juan David Mejia Cuao	1064711685
29	08	23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080481816
29	08	23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85142542
29	08	23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	7715492S
29	08	23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626506
29	08	23	Nelair Luis Diaz Obate	1065869820
29	08	23	Pedro Luis Sandoval Vanegas	7711113096
29	08	23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113
29	08	23	Gerardi Enrique Fontalvo Mata	1065562392
29	08	23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1063823637
29	08	23	William Enrique Palmera Santana	77189812

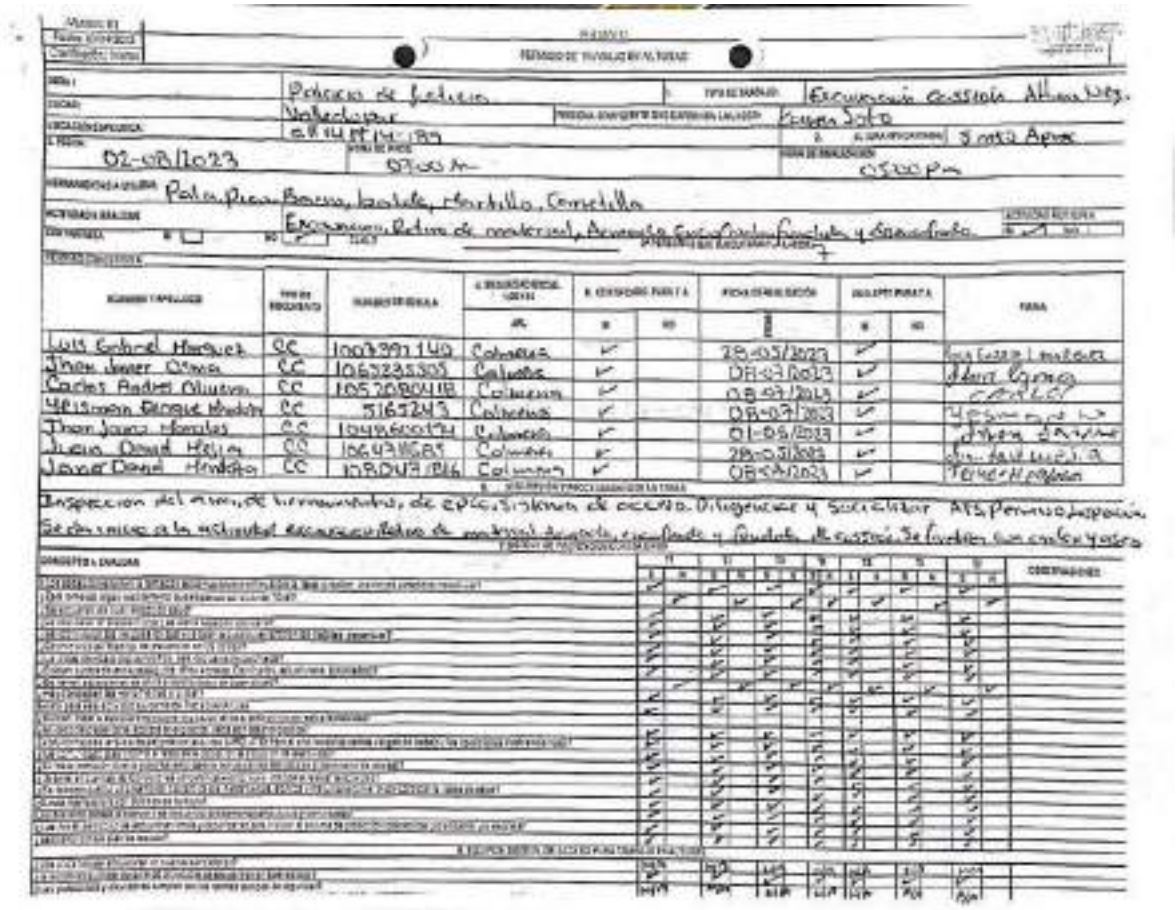

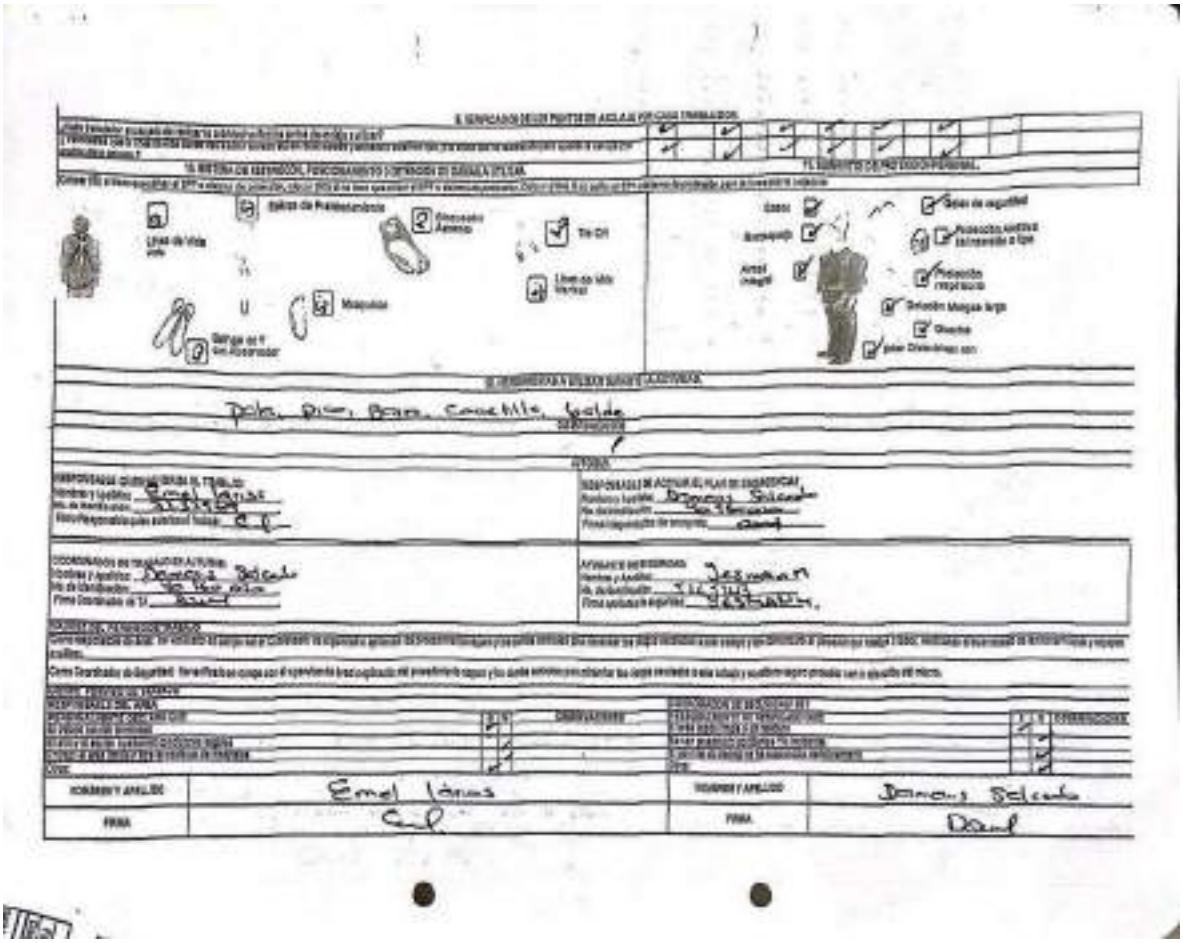
Emel Idrus
Jeimmy Salcedo

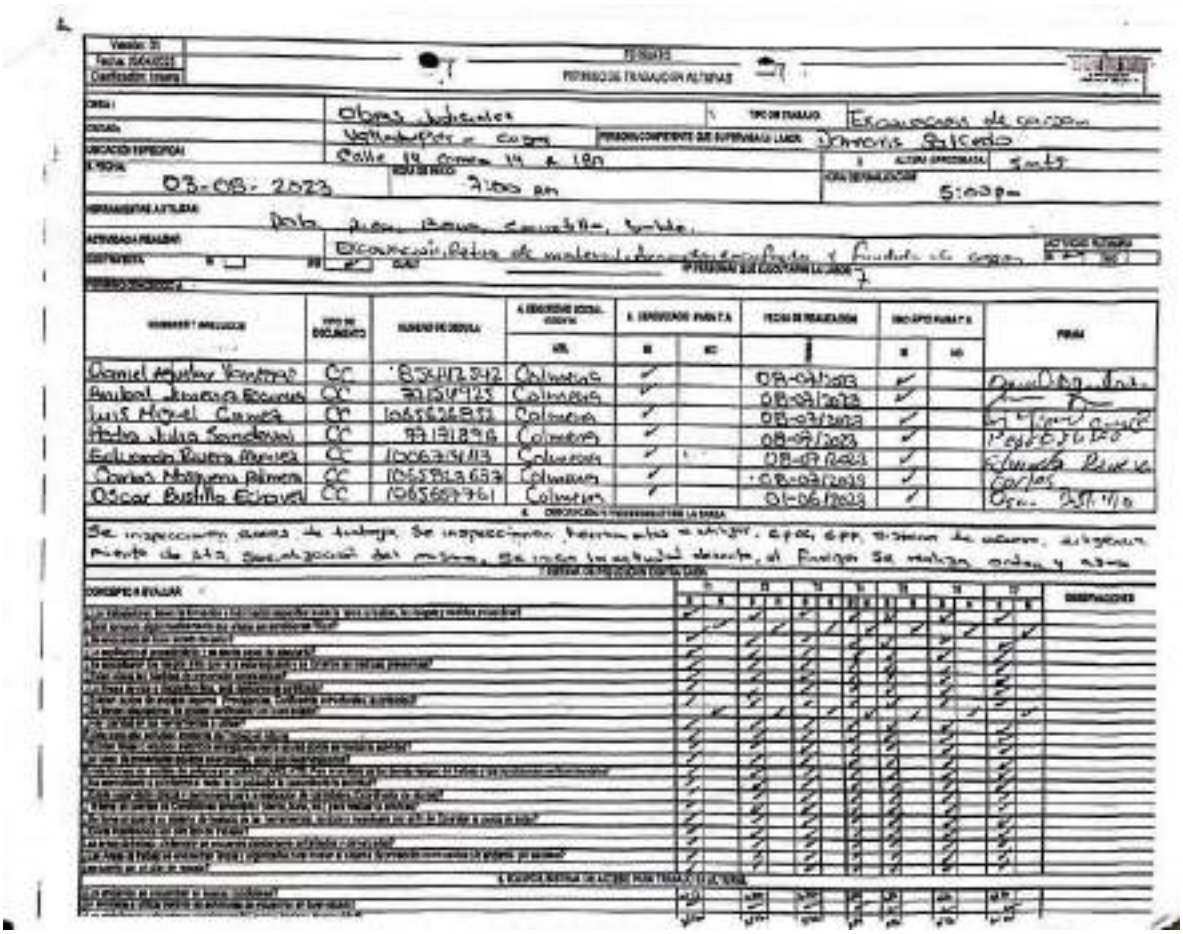

Obras Judiciales

03-08-2023

7:00 am

5:00 pm

Daniel Alfonso Vanegas CC 1.034.112.342 Colombia 08-08-2023

Anibal Jimenez Rocha CC 79.154.925 Colombia 08-08-2023


Luis Miguel Cuervo CC 1.065.628.832 Colombia 08-08-2023


Hoda Julia Sandoval CC 99.191.896 Colombia 08-08-2023

Eduardo Ruiz Ramirez CC 1.006.315.113 Colombia 08-08-2023

Carlos Mahecha Palma CC 1.065.813.657 Colombia 08-08-2023

Oscar Bustillo Elcavel CC 1.065.607.961 Colombia 01-06-2023

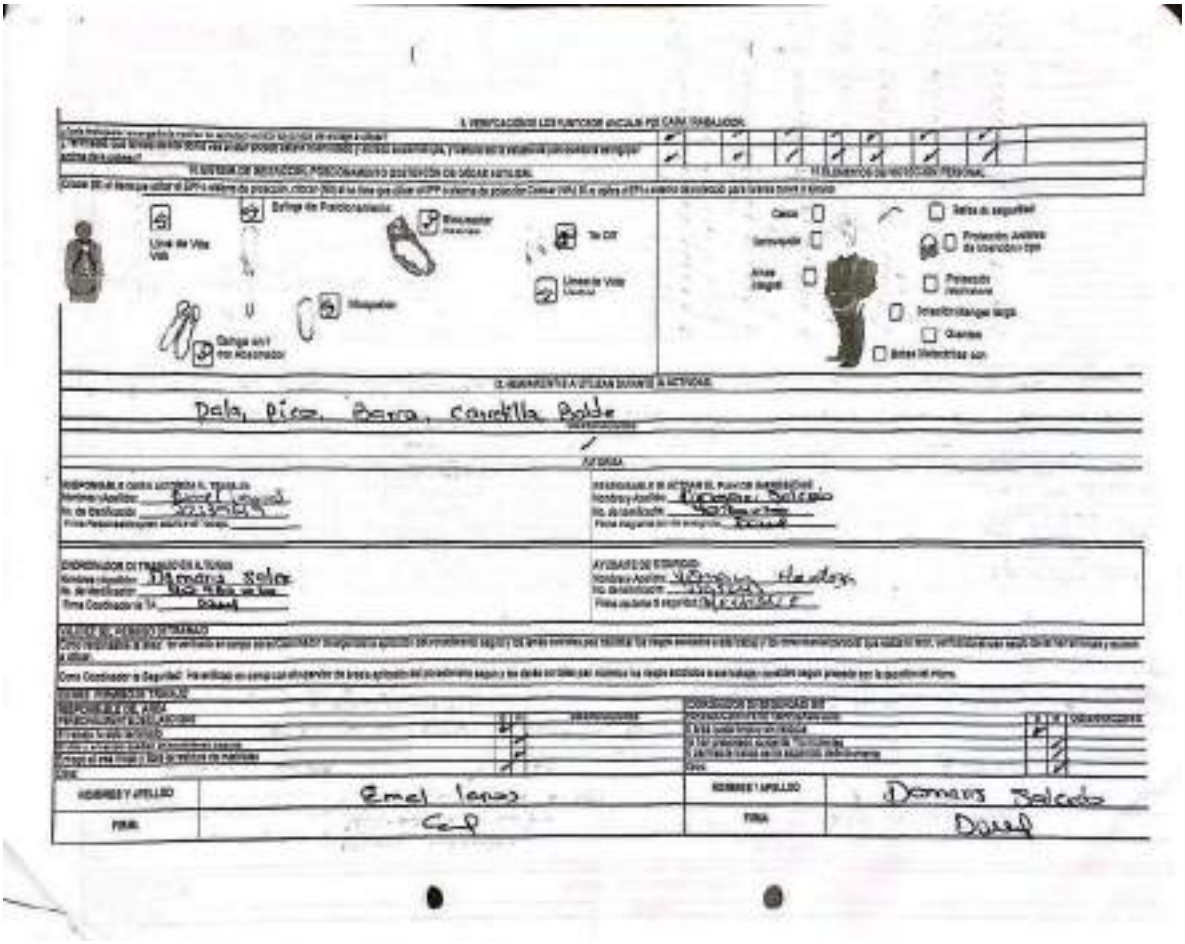

Pala, Pica, Barra, cuerda, Polea
Emel Iguas
Damaris Salcedo

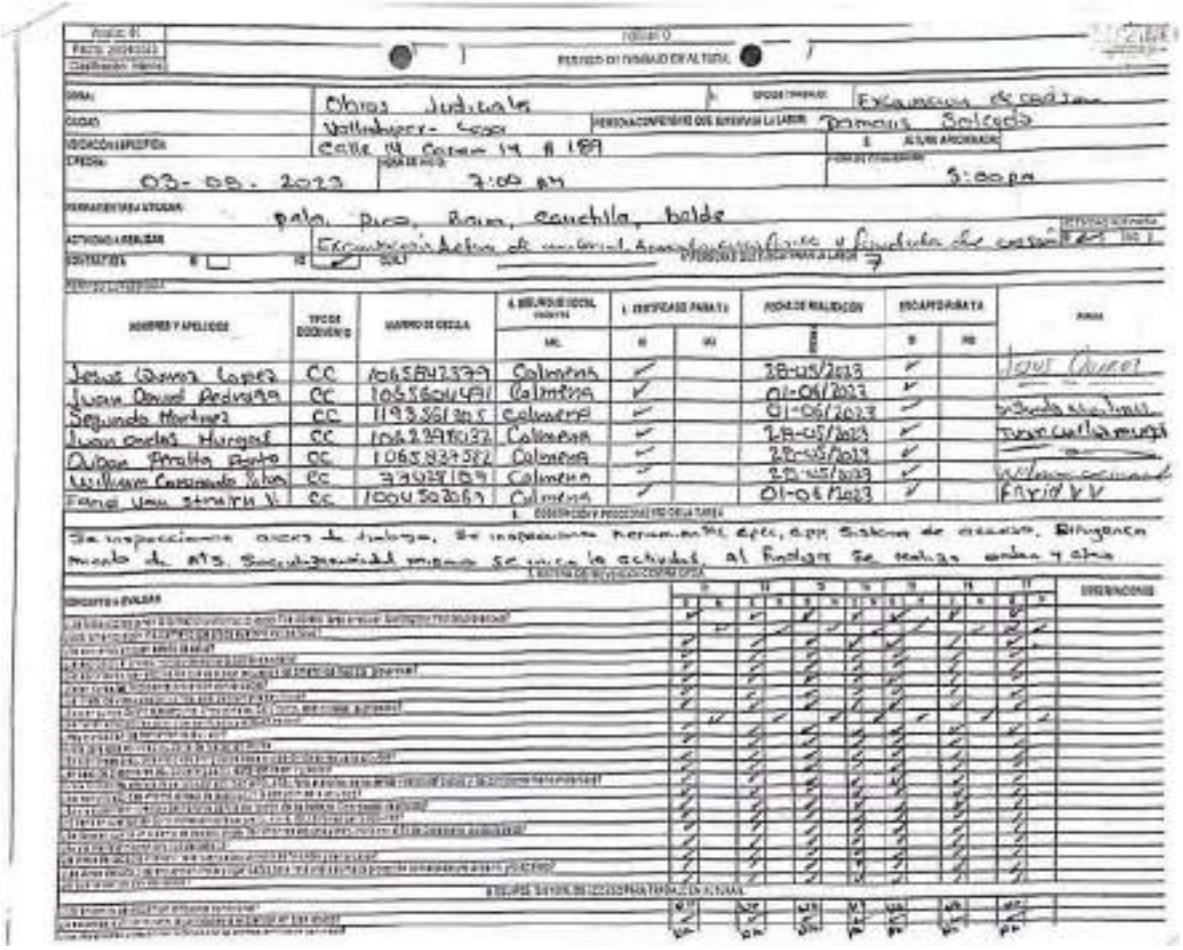



Obras Judiciales
Valledupar - Cesar
Calle 14 Carrera 14 A 189
03-08-2023
7:00 am
5:00 pm
pala, Pica, Rasa, Cuchilla, balde
Excavación Acta de vecindad Apuntalamiento Cimientos y Finalizar de excavar


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	EPS	ARL	ALTURAS SI	ALTURAS NO	FECHA DE REALIZACION	ESCAPE RAPIDO SI	ESCAPE RAPIDO NO	FIRMA
Jesus David Lopez	CC	1065847399	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Juan David Arevalo	CC	1065604491	Colmena		✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561315	Colmena		✓		01-06/2023	✓		
Juan carlos Hurgue	CC	1065839032	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Duban Pinilla Ayala	CC	1065839582	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	3202591089	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Fanol Jose Sierra V.	CC	1004502063	Colmena		✓		01-06/2023	✓		


Se inspecciona antes de labor, se implementa herramienta apta, apta Sistema de elevación. Ninguno uso de mts Seguridad mismo se inicia la actividad al finalizar se realiza orden y aseo

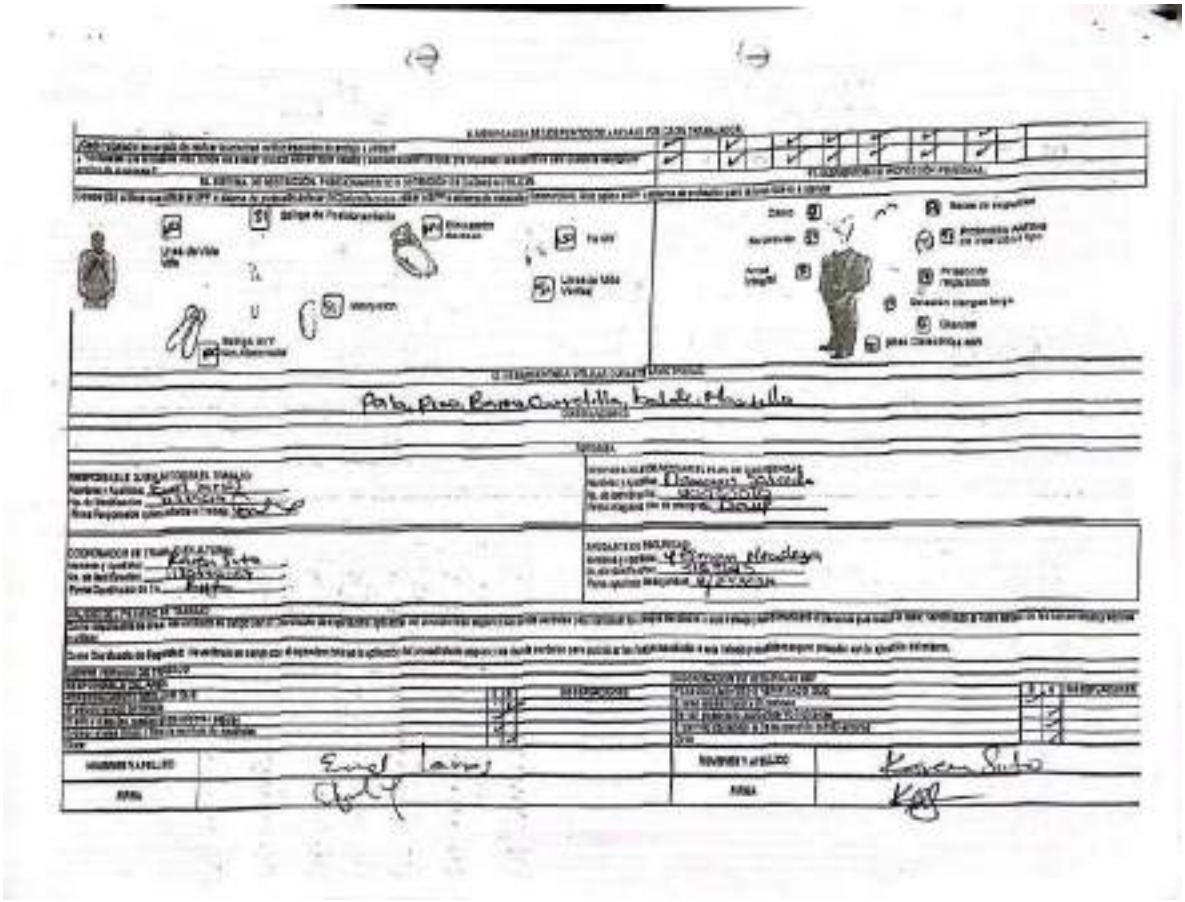


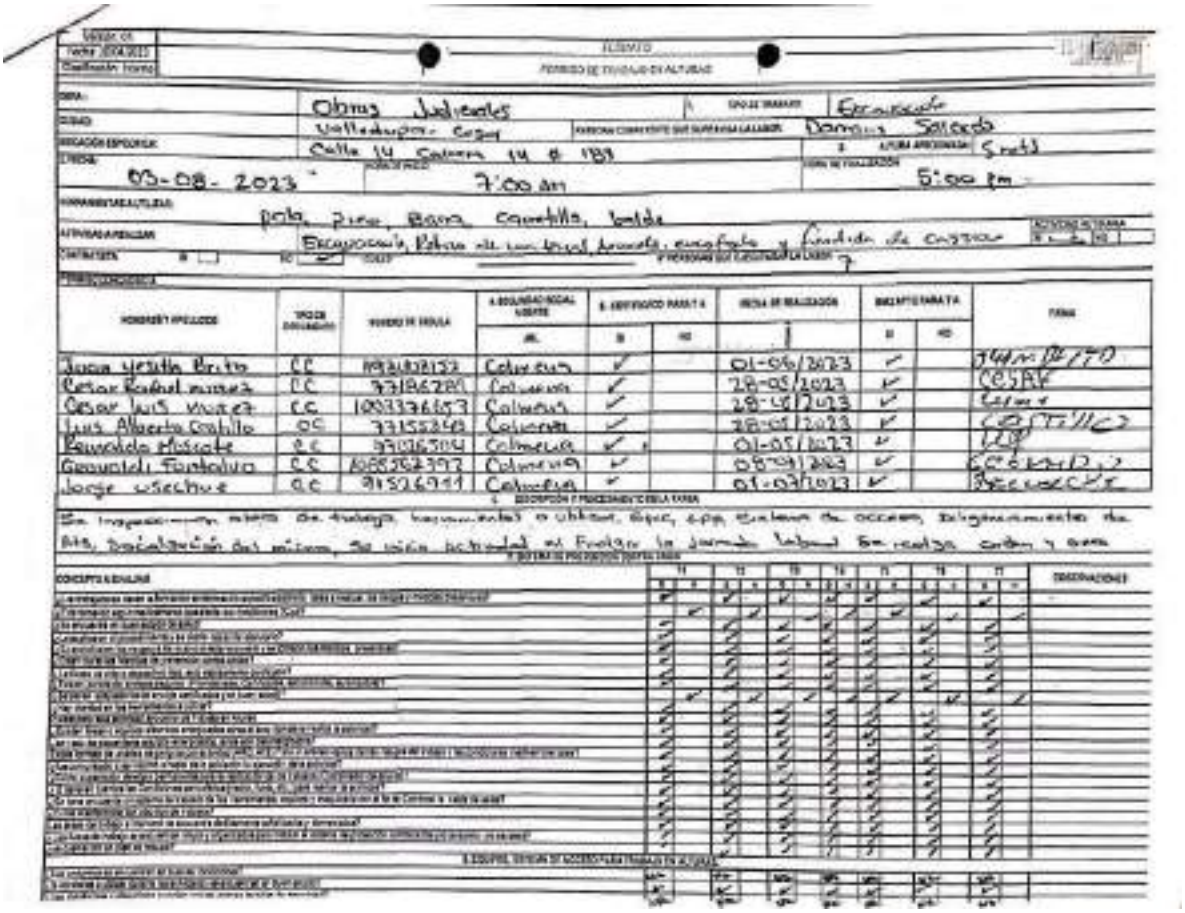

Obras Judiciales
Valledupar - Cesar
Calle 14 Carrera 14 # 183
03-08-2023
7:00 am
5:00 pm
Excavación, Retiro de concreto, escombro y limpieza de cuneta
Jesus Yesith Brito
Cesar Rafael Mateus
Cesar Luis Mateus
Luis Alberto Cohilo
Reynaldo Mojarte
Geovanni Fontalvo
Jorge Usechue

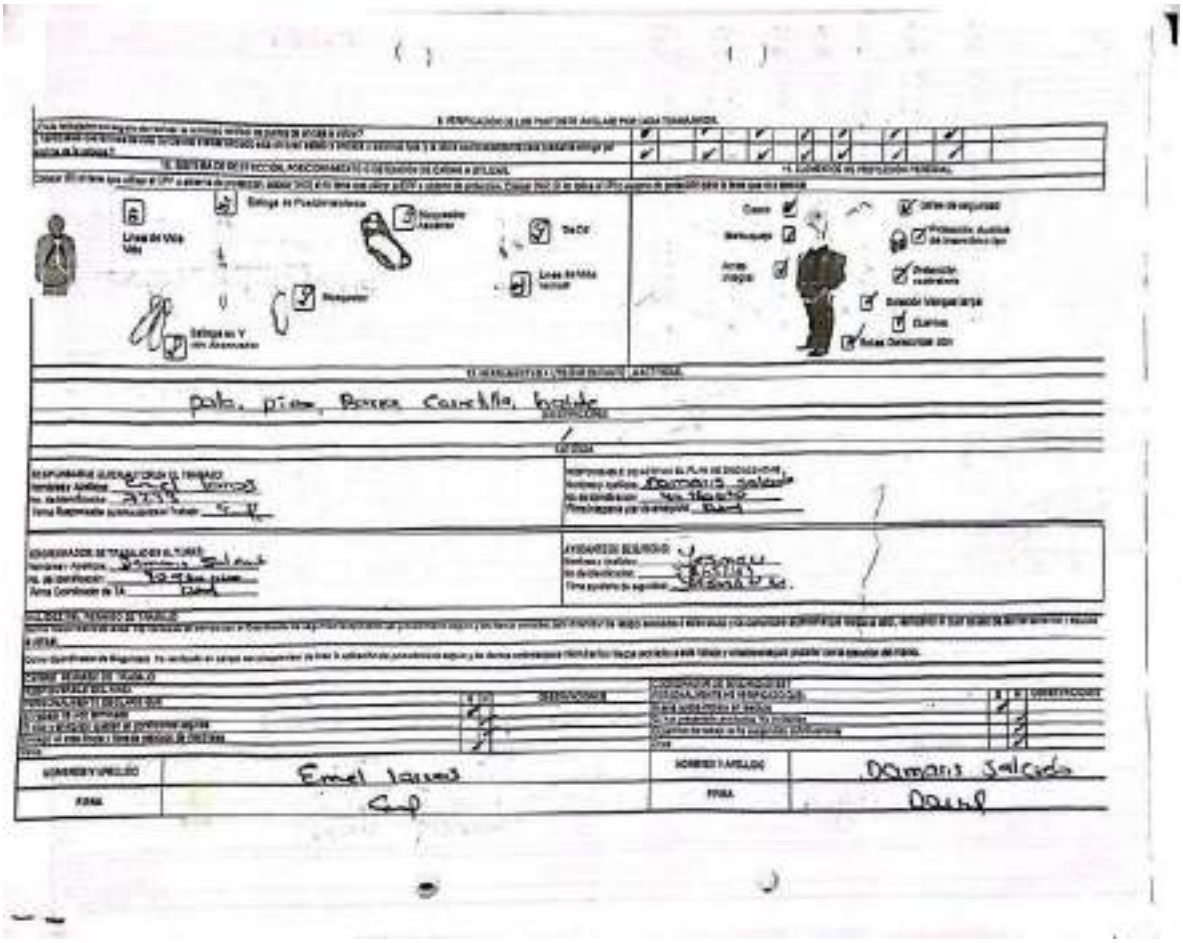


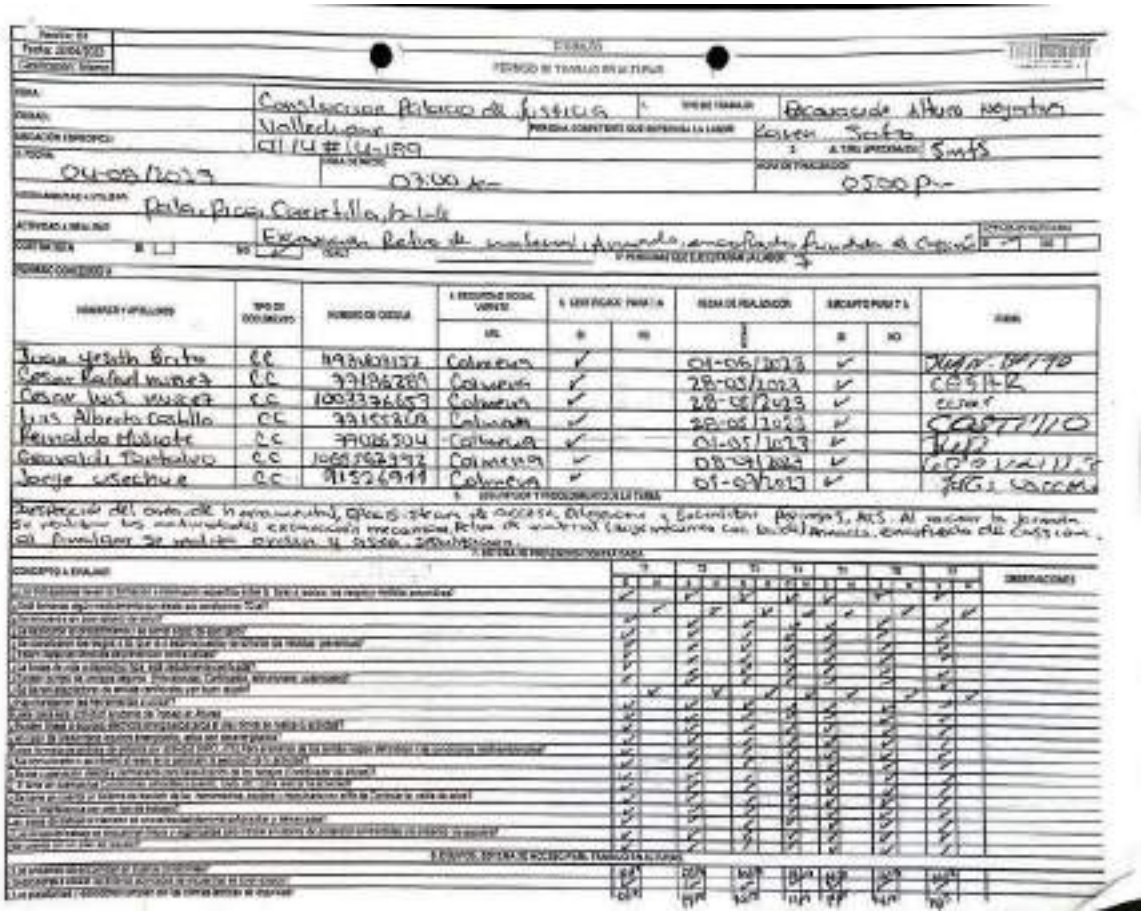


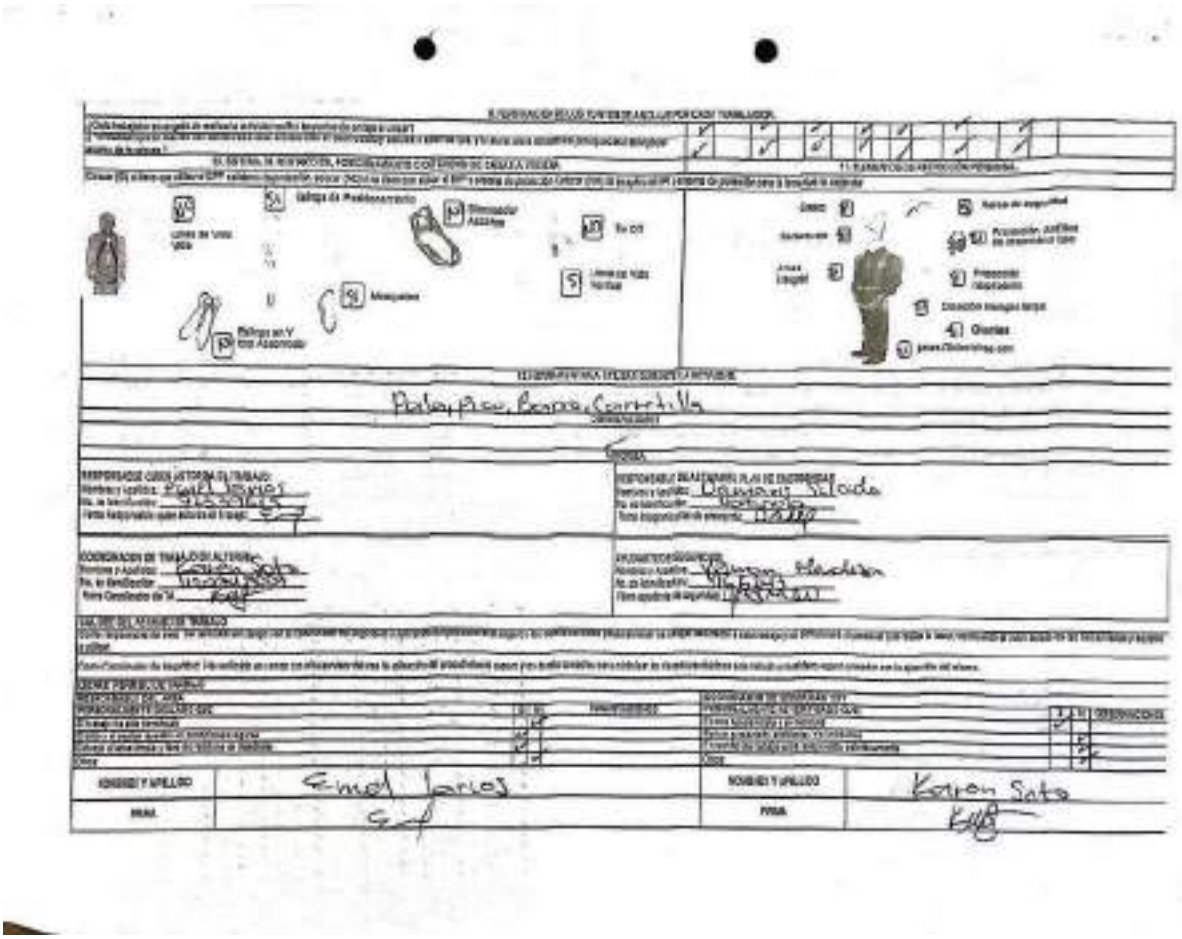


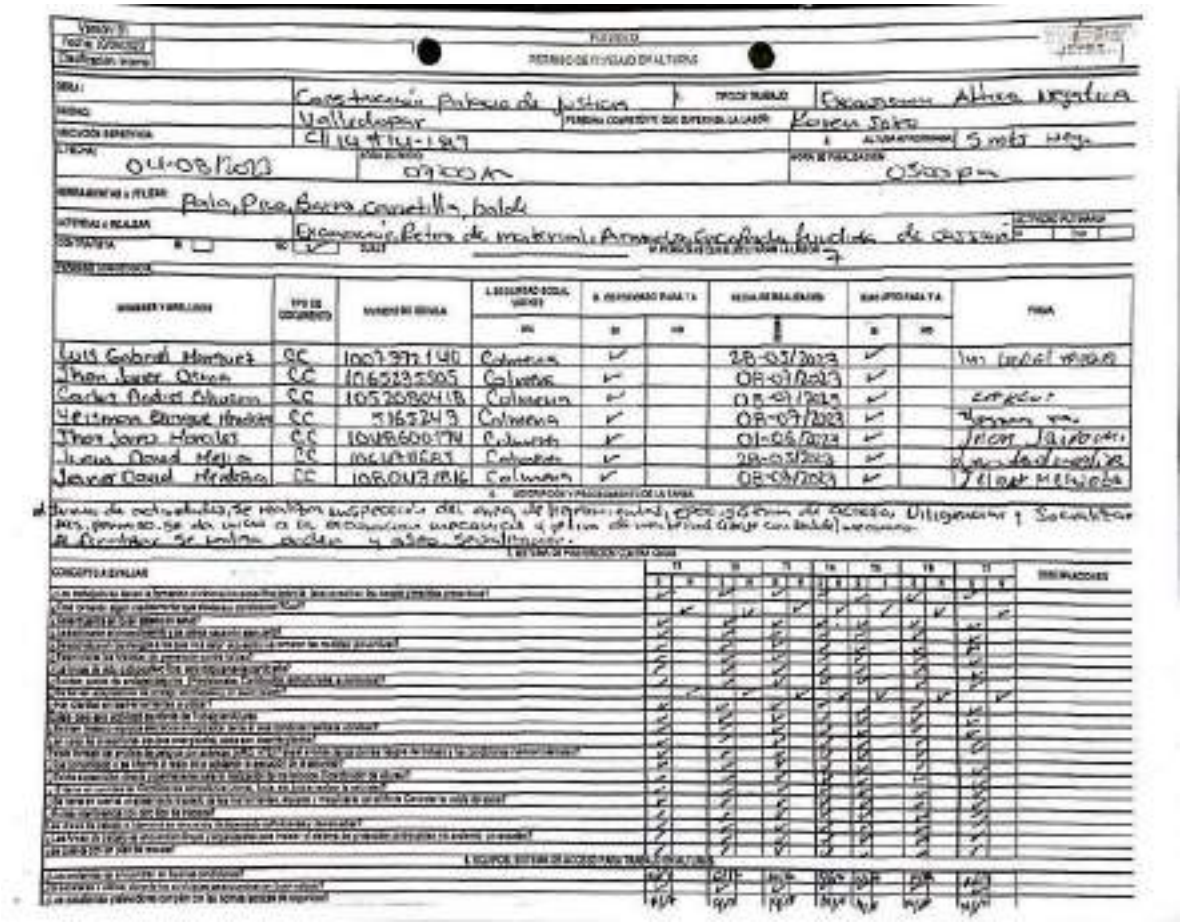


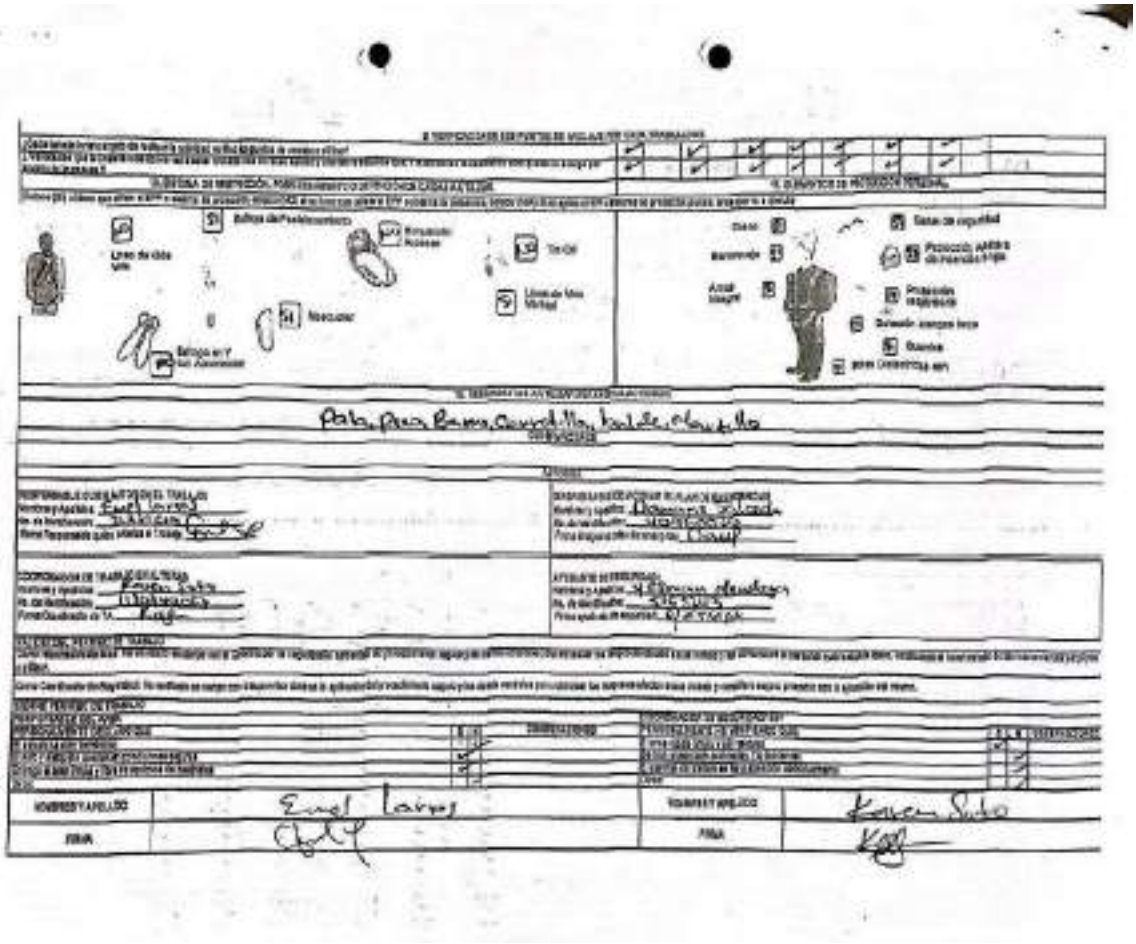

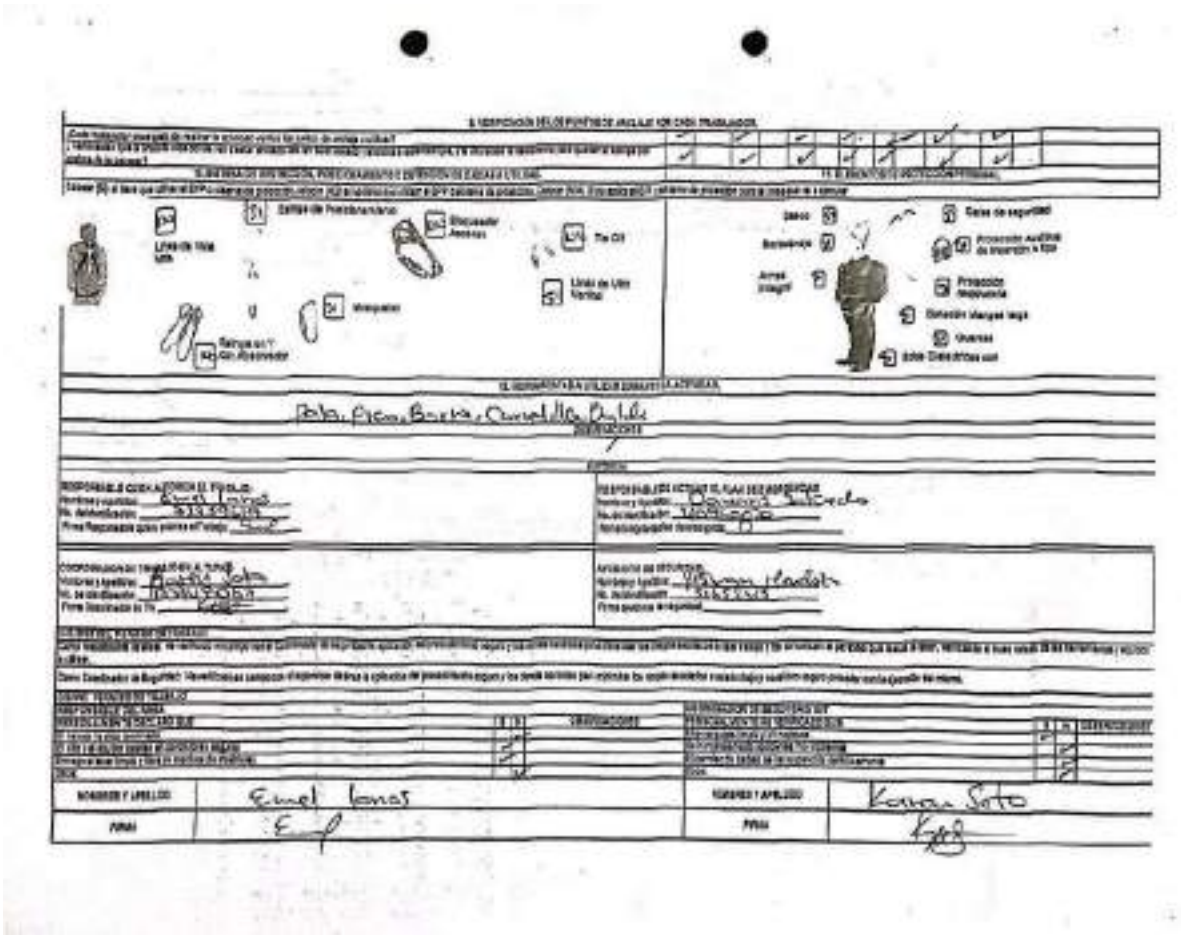

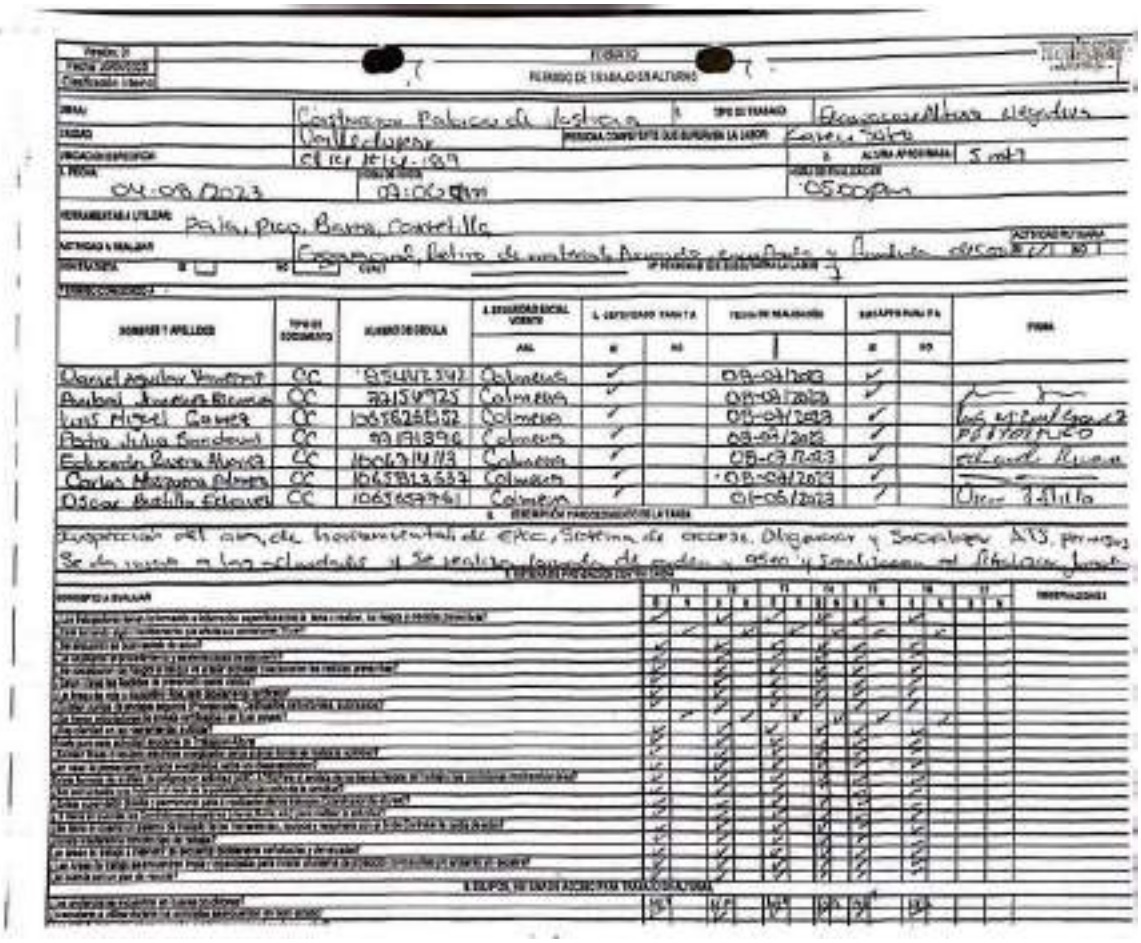

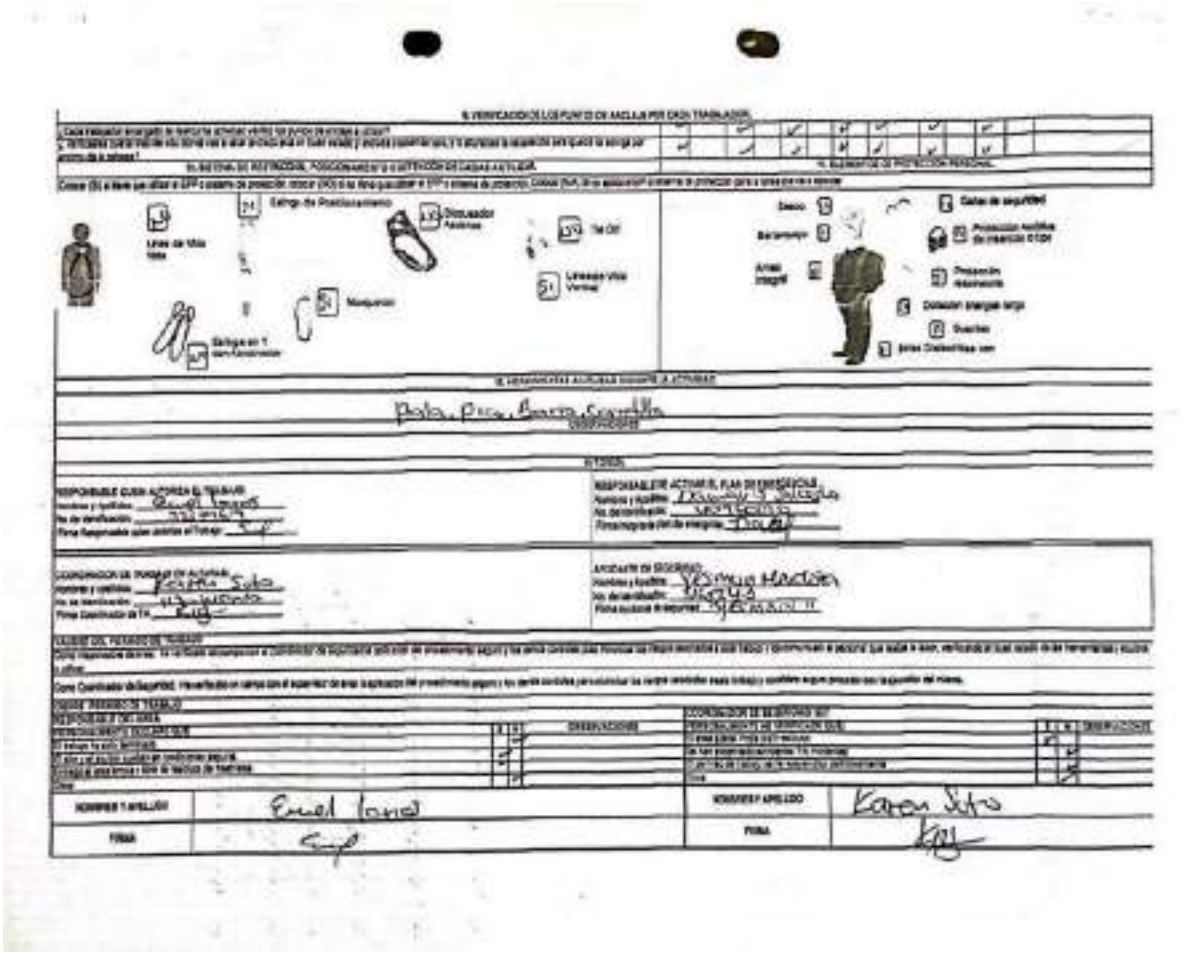

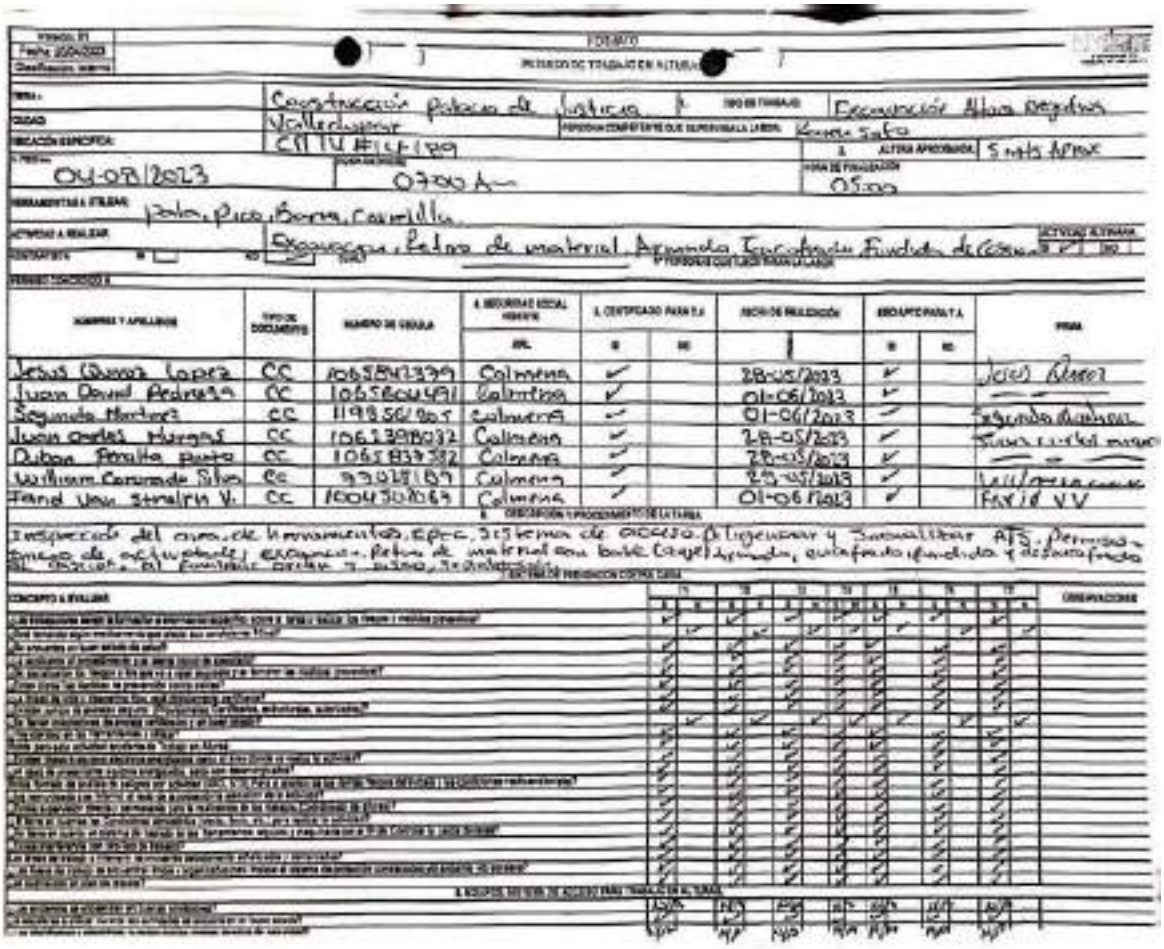

FORMATO

Fecha: 30/04/2020

Clasificación: Interna

Obra: Construcción Palacio de Justicia

Ciudad: Valledupar

Ubicación específica: Cll 14 #14-189

Fecha: 04-08-2023

Hora de inicio: 07:00 A.M.

Tipo de trabajo: Excavación Alturas Regulares

Persona competente que supervisa la labor: Kevin Soto

Altura aprobada: 5 mts Aprox

Hora de finalización: 05:00

Herramientas a utilizar: Pala, Pica, Barra, Carretilla.


Actividad a realizar: Excavación, Retiro de material, Apuntalamiento Excavación Fundida de Concreto


Nombres y apellidos	Tipo de documento	Número de cédula	Seguridad social (EPS)	Certificado para T.A.		Fecha de realización	Examen para T.A.		Firma
				SI	NO		SI	NO	
Jesus Blanco Lopez	CC	1065847339	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Juan David Andrade	CC	1065804491	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1198566905	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Juan Carlos Murgas	CC	1063398032	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065833382	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
William Coronado Silva	CC	92068187	Colmena	✓		25-05-2023	✓		
Farid Jose Stralen V.	CC	1004308069	Colmena	✓		01-06-2023	✓		


Observación y procedimiento de la tarea: Inspección del uso de herramientas, Epcc, Sistema de acceso. Delimitar y señalizar ATS, Permiso trabajo de alturas, Examen, Retiro de material con balde (Segundo), apuntalado fundida y desapuntalado. Al finalizar orden y aseo, Señalización.


Condiciones de realización costos caso

Concepto a evaluar	T1		T2		T3		T4		T5		T6		Observaciones
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
1. La información sobre el peligro y recomendaciones acerca como evitar o salir de la misma ¿resulta comprensible?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Sabe exactamente lo que debe hacer en caso de emergencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2. ¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. ¿Se encuentra los riesgos a los que está expuesto y se tienen en cuenta medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene usted las condiciones de protección contra incendios?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. ¿Sabe usted cómo y dónde debe actuar en caso de incendio?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. ¿Existe señalización de equipos contra incendios, salidas, evacuación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. ¿Tiene conocimiento de primeros auxilios y en caso dado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Conoce cómo se activa la alarma?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce cómo se activa la alarma?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha recibido información sobre los riesgos a los que está expuesto en su trabajo

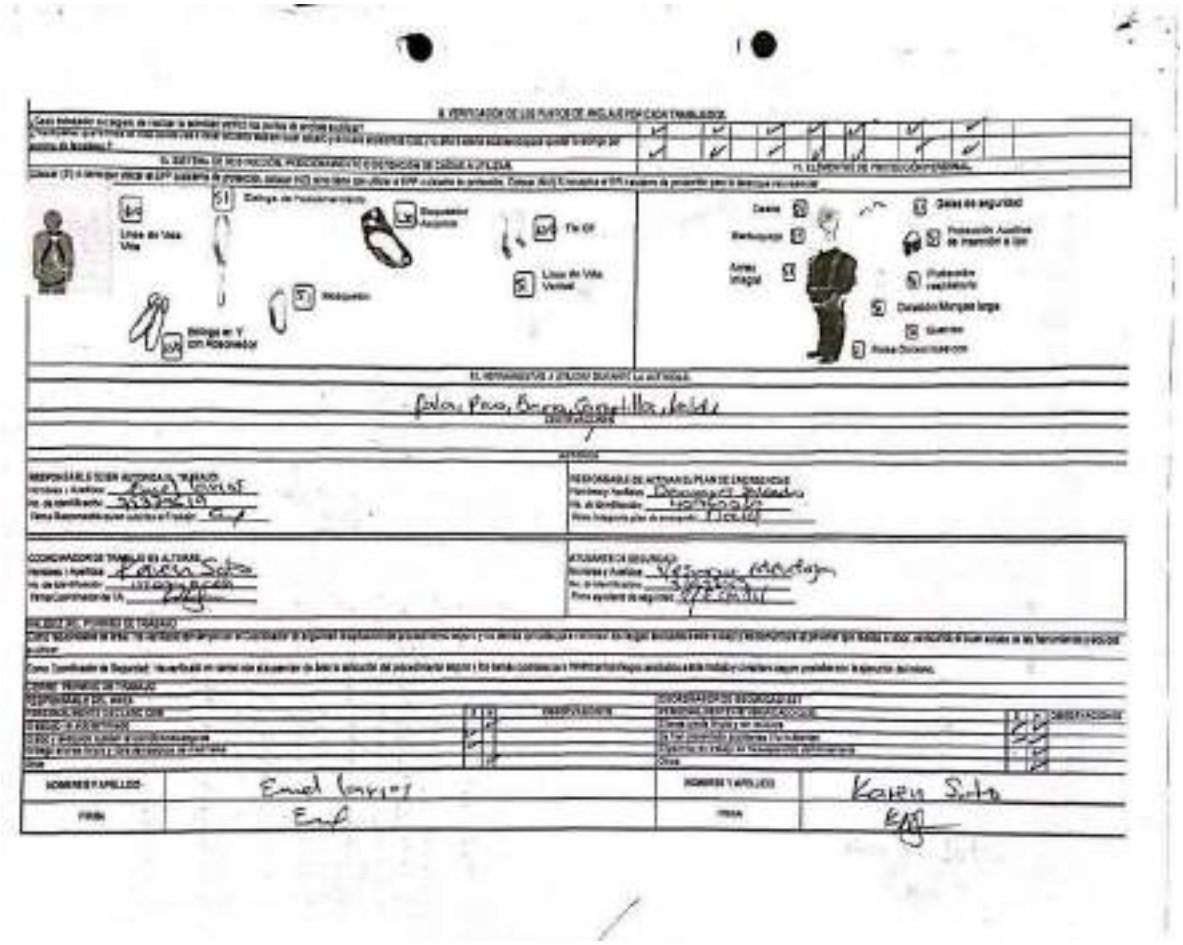


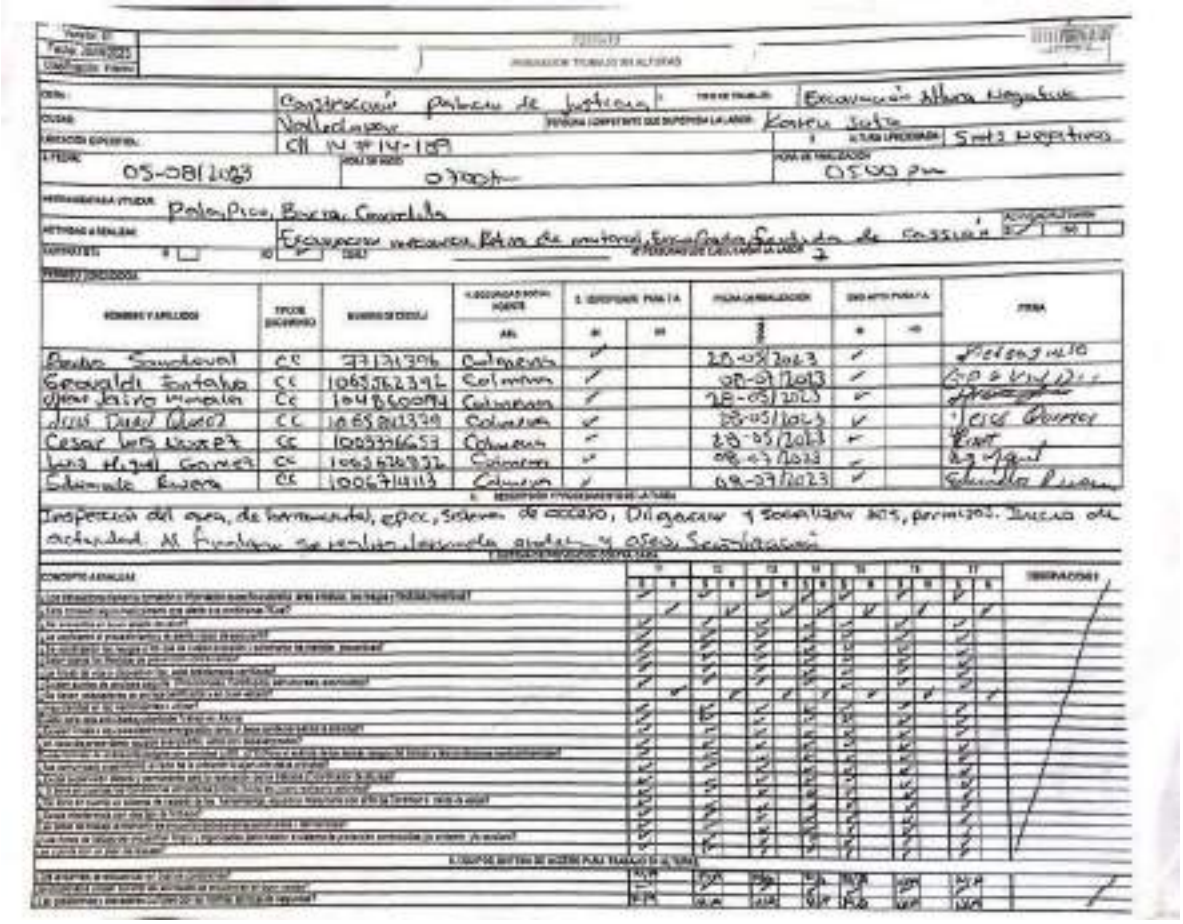


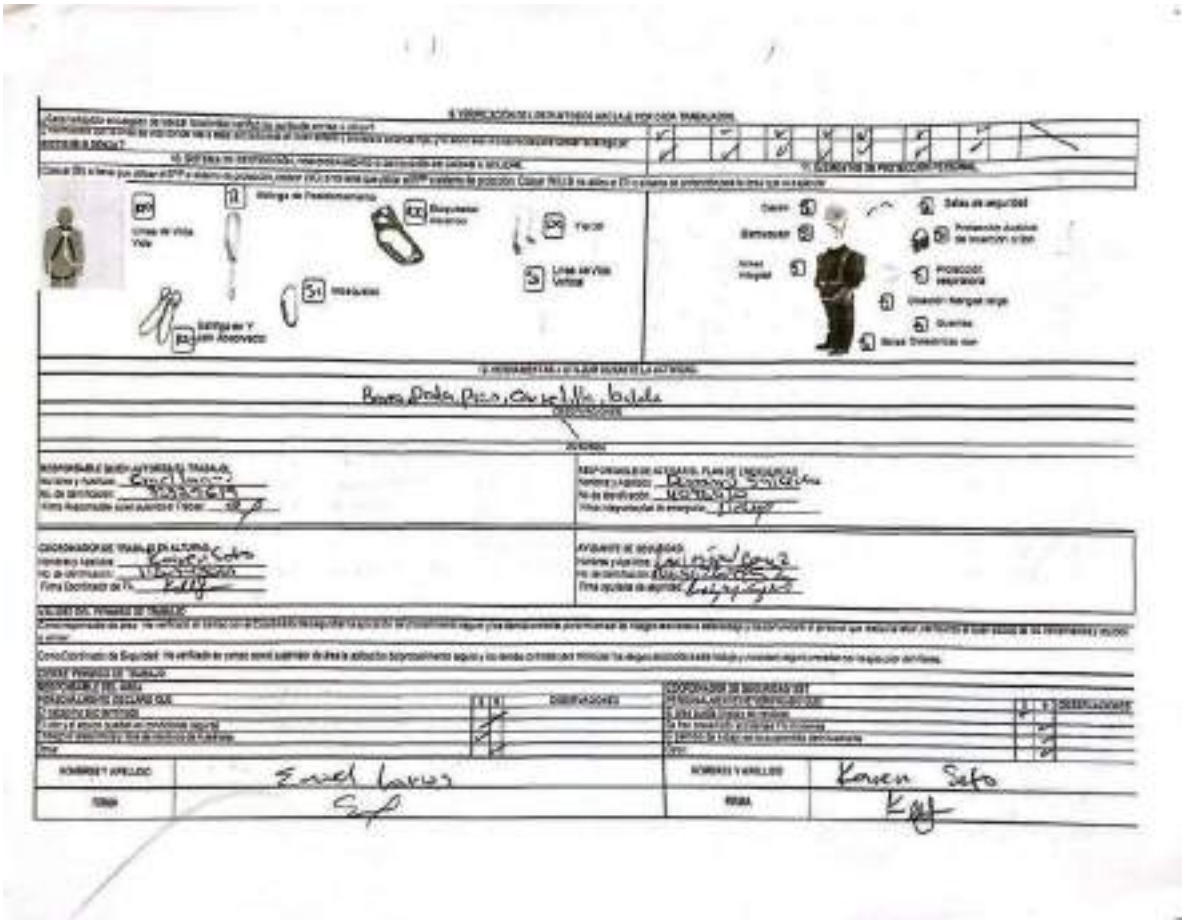

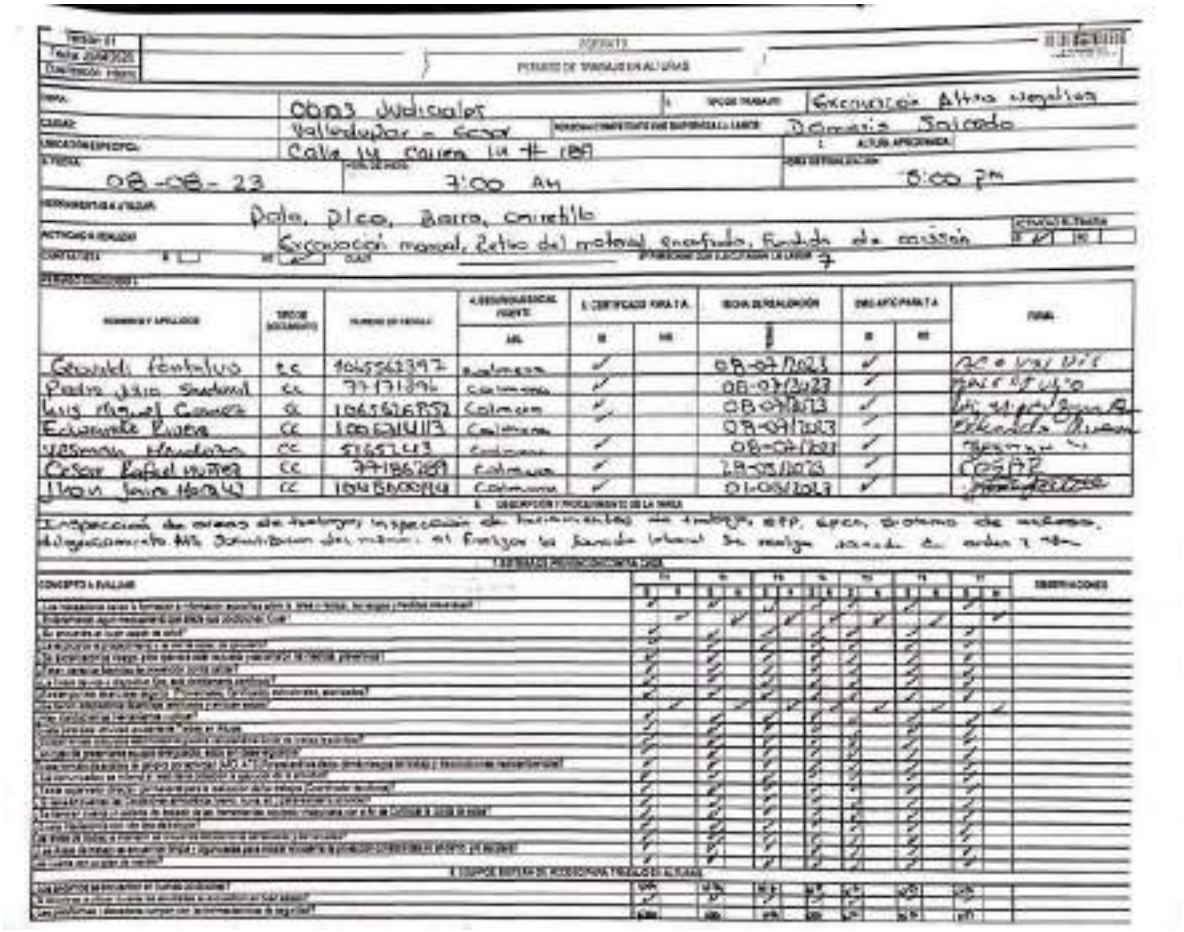

Obra Judiciales
Valledupar - Cesar
Calle 14 Carrera 14 # 18A
08-08-23
7:00 AM
5:00 pm
Excavación Altura regulares
Domicilio Soiedo
Pala, Pico, Barra, Carretilla
Excavación manual, Retiro del material excavado, Fundida de cimentación
Inspección de areas de trabajo; inspección de herramientas de trabajo; EPP, Epcs, Orden de aseo, Diligenciamiento ATS, Socialización del mismo; el Horizon la Jornada laboral se maneja acorde a ordenes y Rh

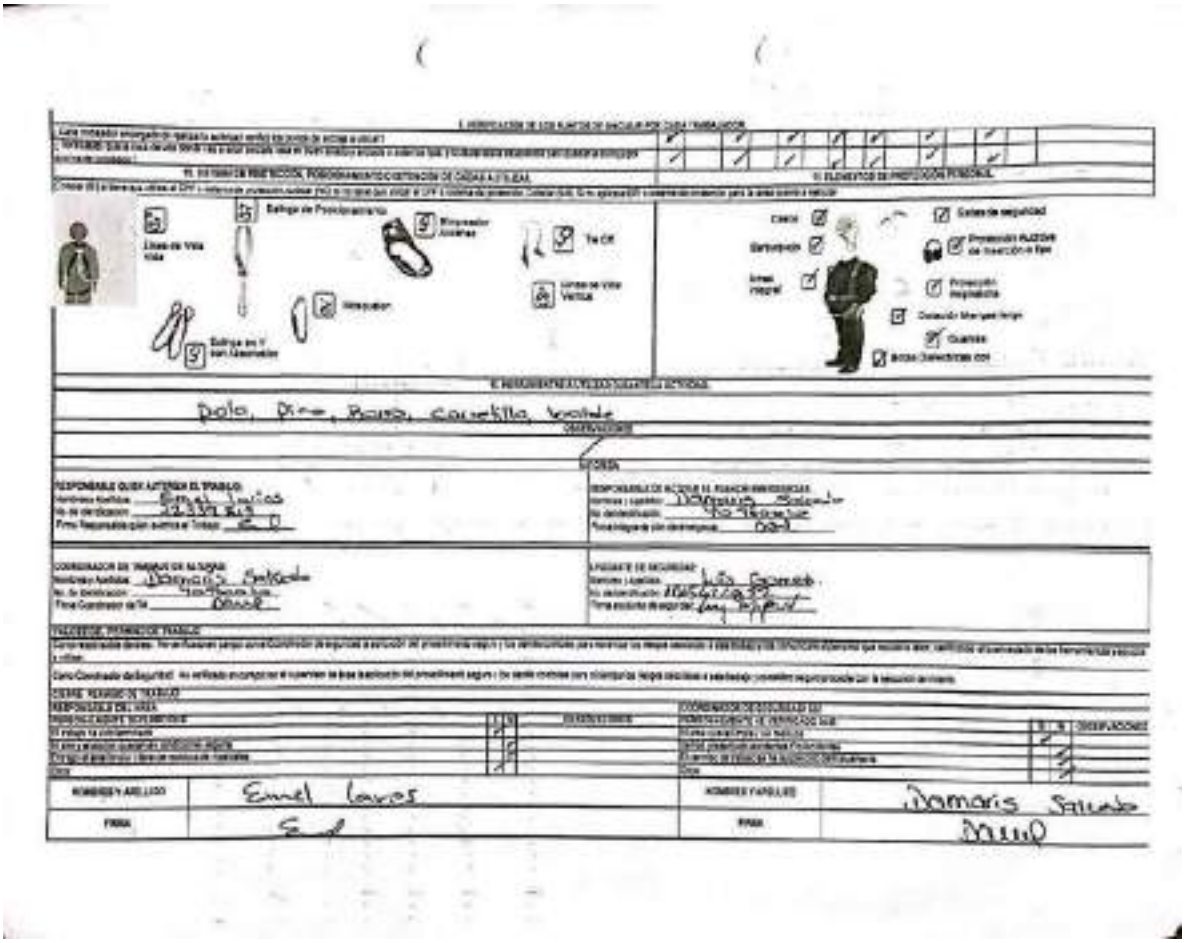
Polo, Pito, Pausa, Cornetta, Vocales
Emel Lavos
Damaris Salcedo

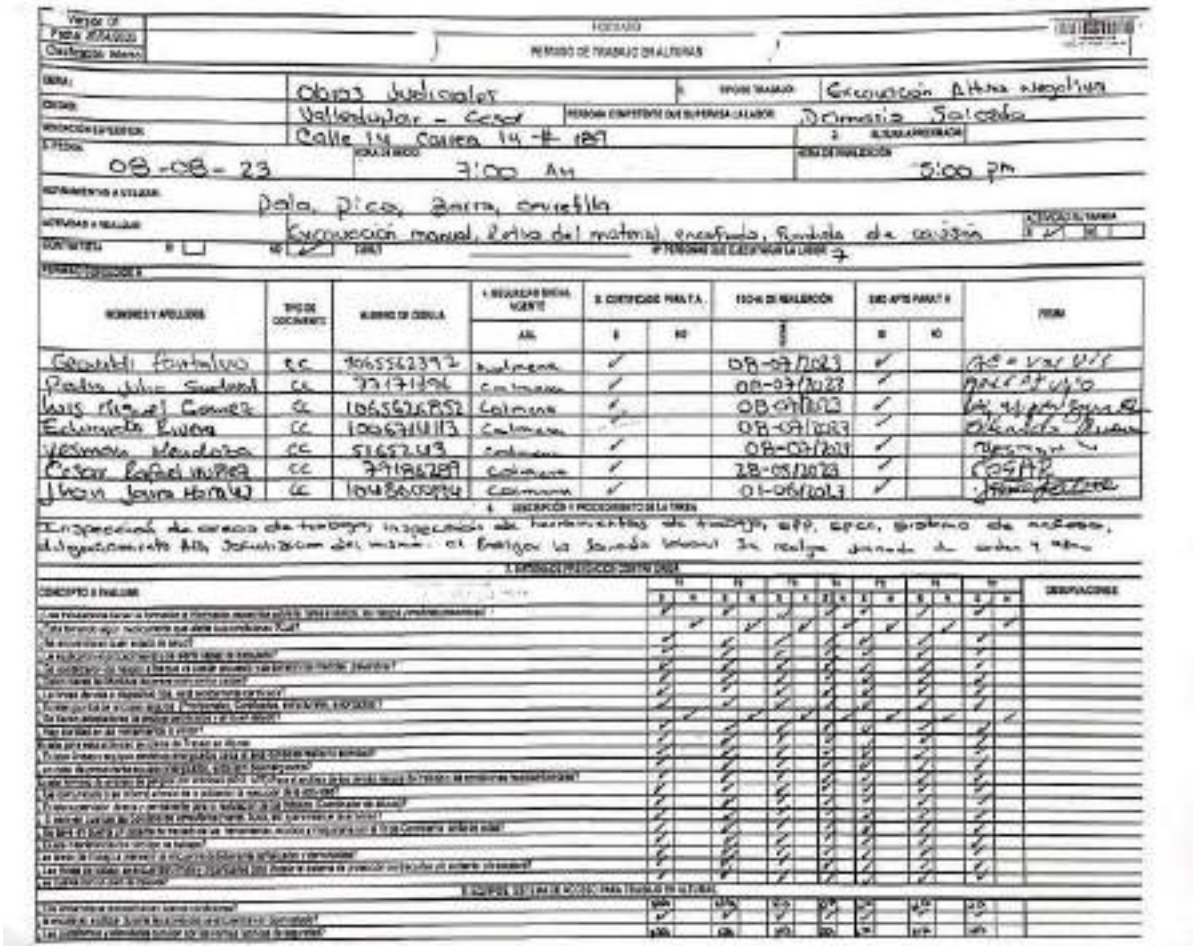

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura Negativa

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Dominga Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189

FECHA: 08-08-23 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 PM

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pica, barra, cuerdilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual, retiro del material excavado, fundida de cimiento

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

ACTIVIDAD DE RIESGO: SI ☑ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	EL SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	EL CERTIFICADO PARA T.A.: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EMO APTO PARA T.A: SI	NO	FIRMA
Gerardo Fontalvo	cc	1065562392	Sulmena	✓		08-07/2023	✓		
Pedro Julio Suarez	cc	77171896	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	cc	1065626852	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Eduardo Rivera	cc	1066741113	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yesmar Mendoza	cc	51657143	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Cesar Rafael Nuñez	cc	79186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Jhon Jairo Hernandez	cc	1064866984	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de arnes de trabajo, inspección de herramientas de trabajo, EPP, Epcc, sistema de anclaje, diligenciamiento del formato del mismo. El trabajo la jornada de 8am a 4pm


EXAMENES PREVIOS DEL TRABAJO


CONCEPTO A EVALUAR	11		12		13		14		15		16		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
1. Las trabajadores tienen la formación e información requerida para la labor a ejecutar, así como procedimientos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Todos tienen algún medicamento que alerte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3. Se encuentran bien desde el punto de vista?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Se encuentran en condiciones de realizar la labor sin ningún inconveniente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Se encuentran bajo efectos de alcohol o alguna sustancia psicoactiva?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Tienen todos los trabajadores los elementos de protección personal requeridos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Las vías de acceso a la obra se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Tienen todos los trabajadores los elementos de protección personal requeridos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Se tienen señalizadas las áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Hay un botiquín en el vehículo y en el sitio de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11. Se cuenta con un vehículo para el traslado de los trabajadores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12. Todos los trabajadores cuentan con el carnet de vacunación al día?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13. Se cuenta con un extintor en el vehículo y en el sitio de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		


EQUIPOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS


	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Los arnes tienen el mantenimiento requerido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Se realizó la inspección de los arnes antes de iniciar la labor?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Los trabajadores cuentan con el entrenamiento requerido para trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

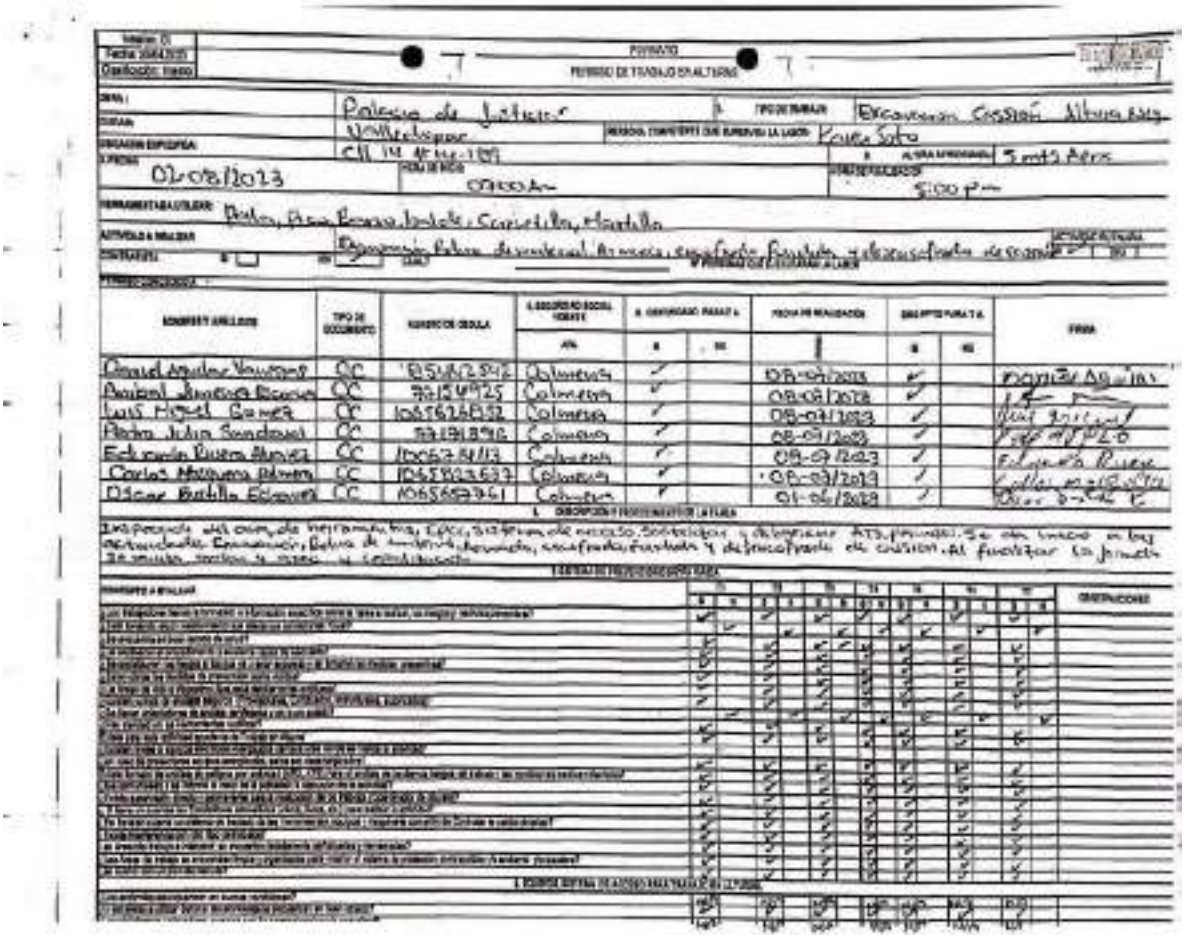


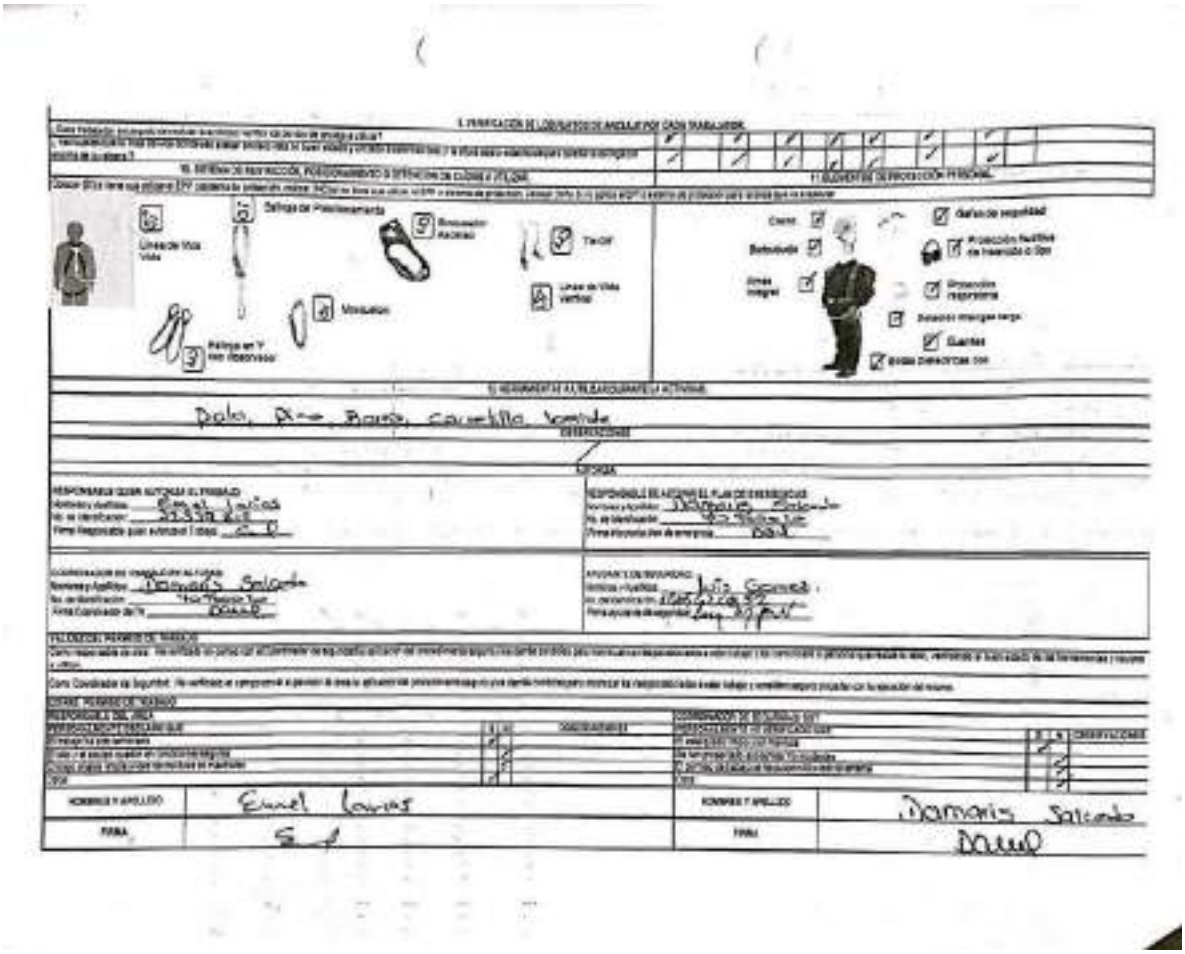

Eimel Lanes
Damaris Salcedo

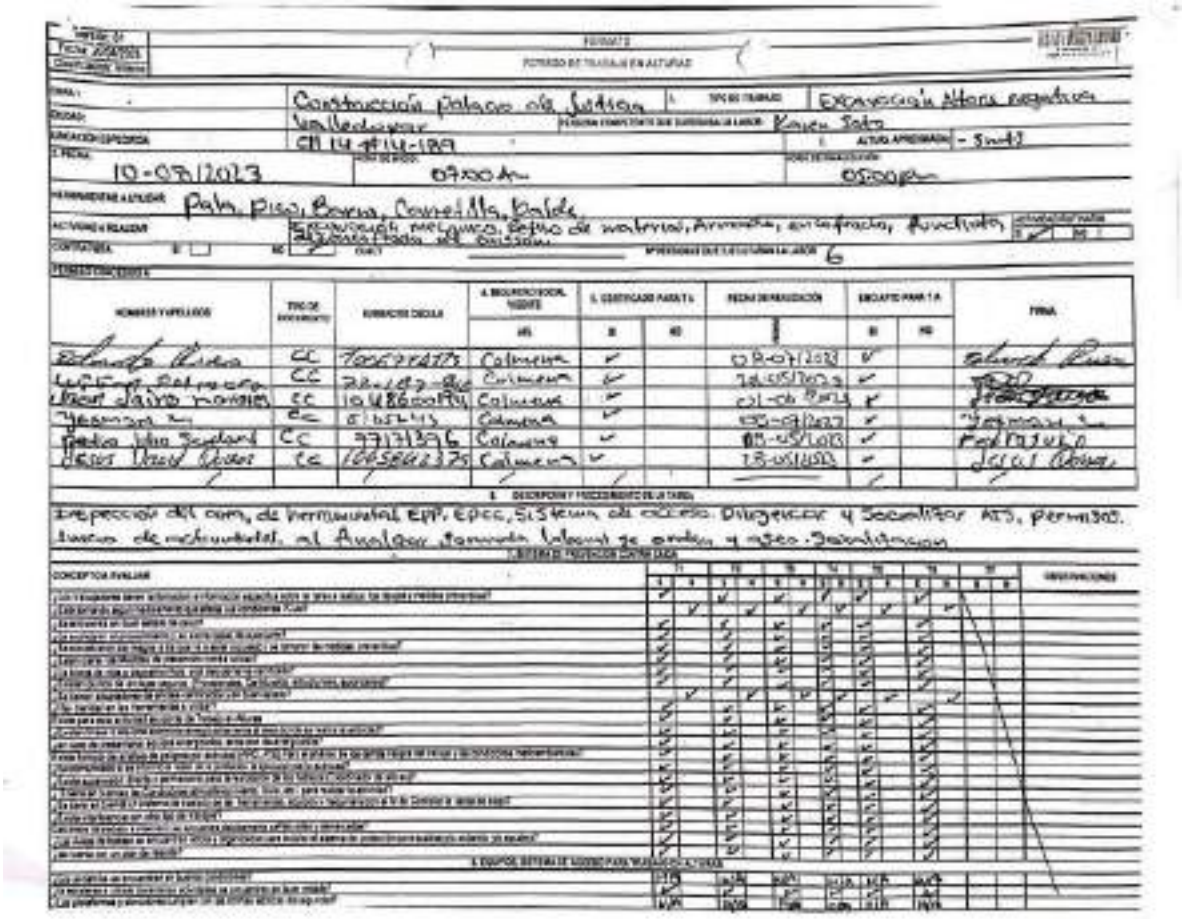


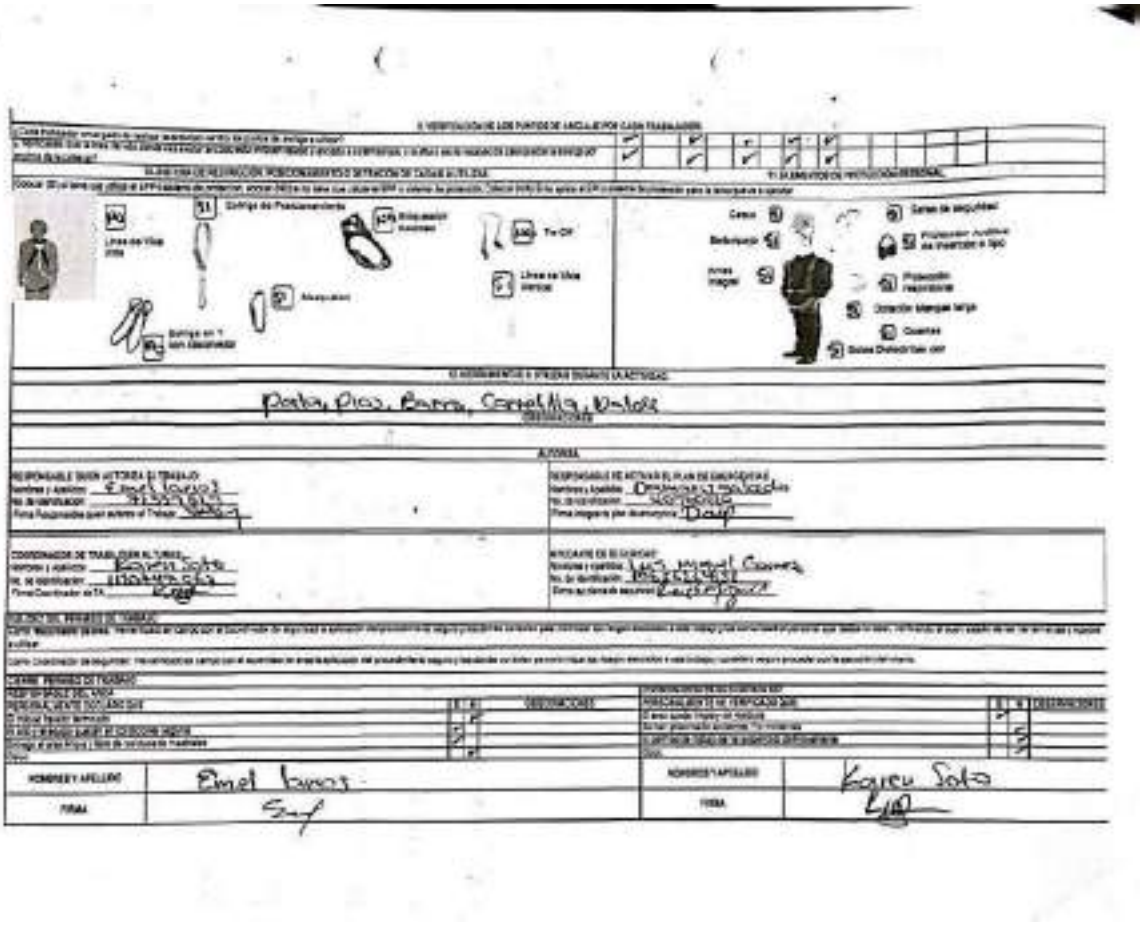


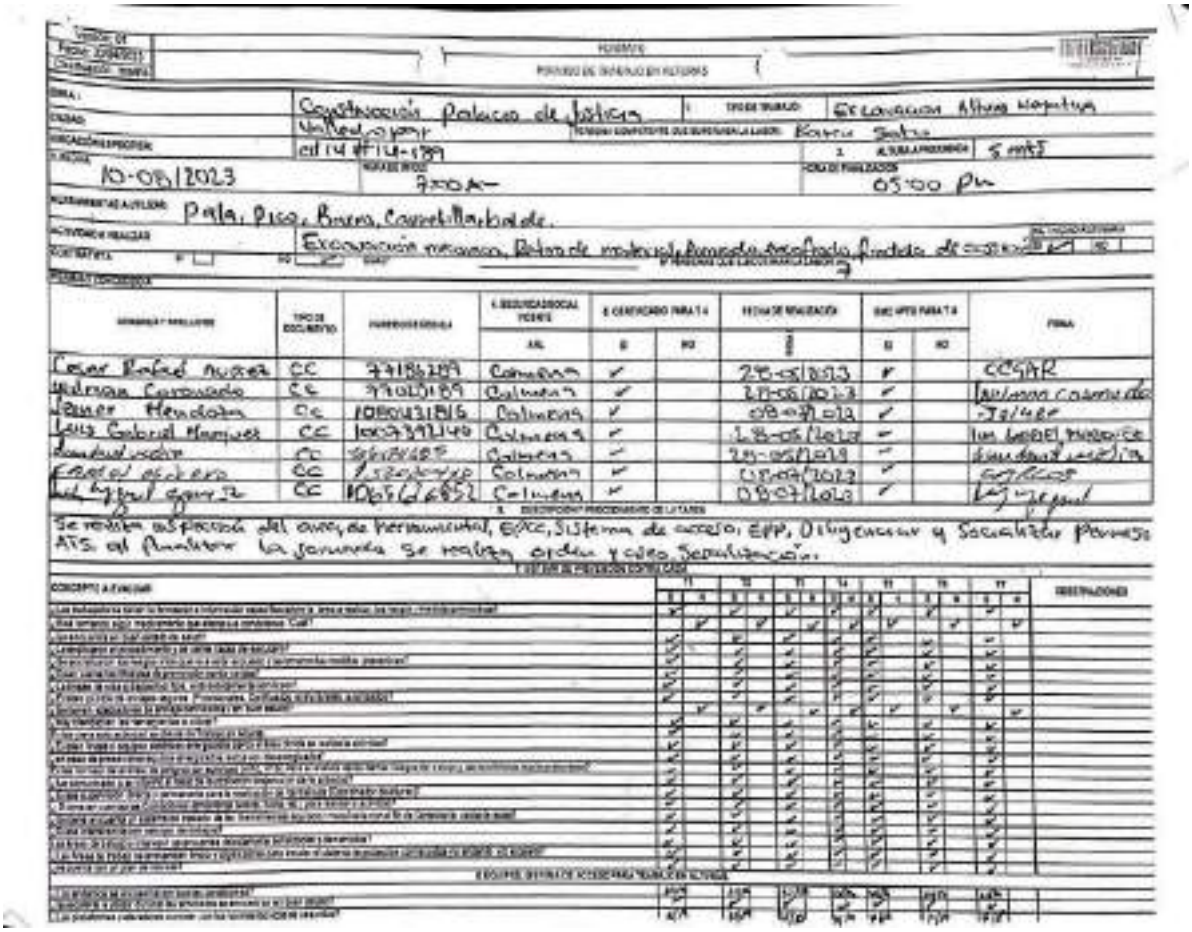

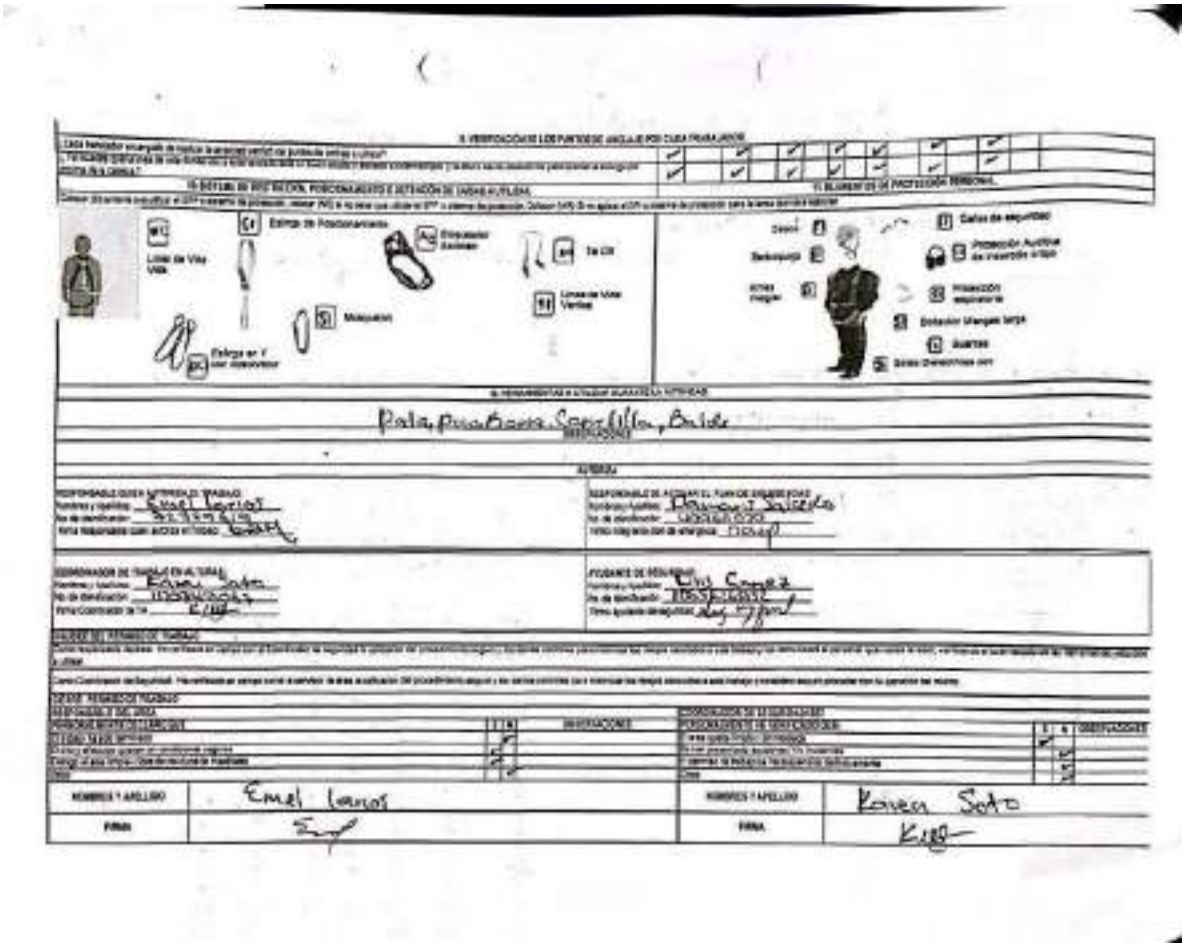
Emel Lamos
Kenia Soto

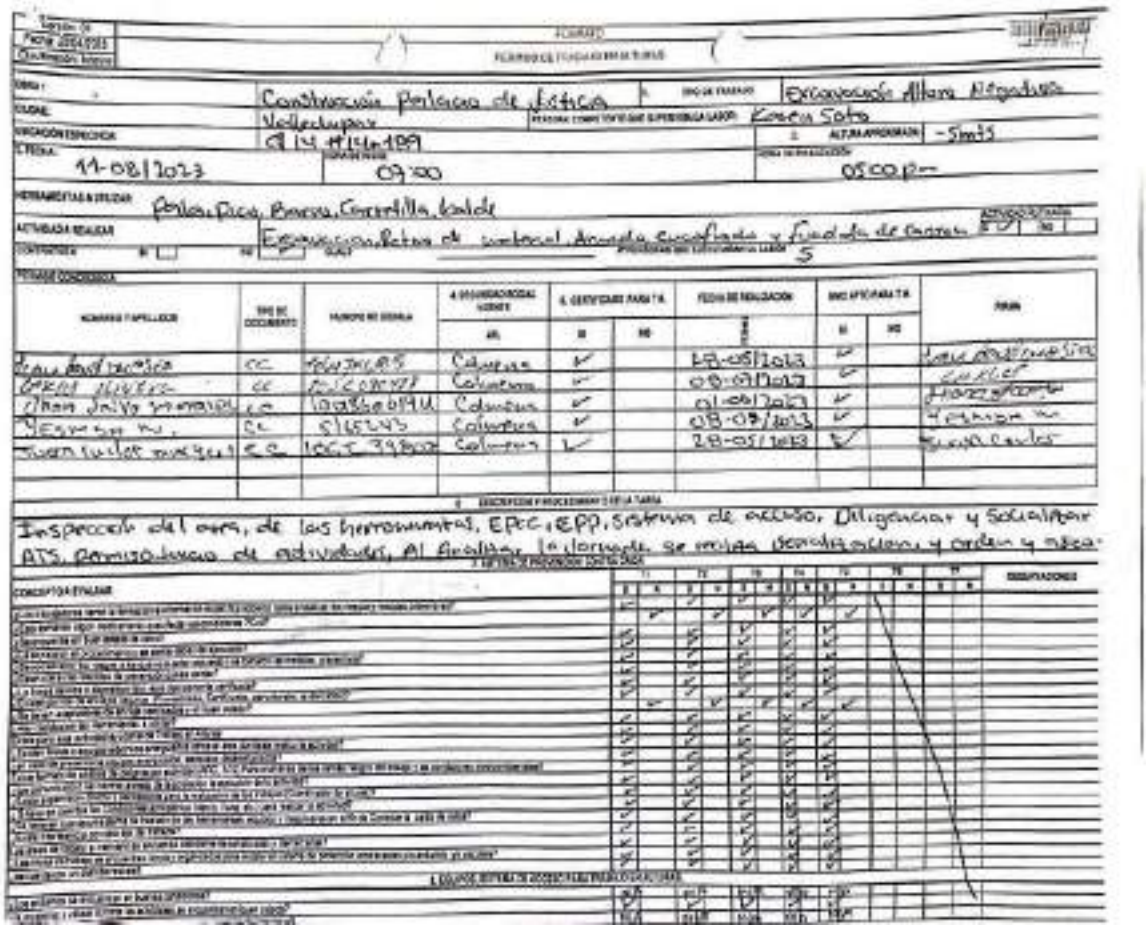
Construcción Parlacen de Fatica
Excavación Altura Adyacentes
Valledupar
Karen Soto
11-08-2023
09:00
05:00 p.m.
Palas, Picos, Barreno, Carretilla, Balde
Excavación Retiro de material Acopio escombros y limpieza de Canaleta
Inspección del area, de las herramientas, EPCC, EPP, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar ATS, Permiso trabajo de actividades, Al finalizar la jornada se miran observaciones y orden y aseo

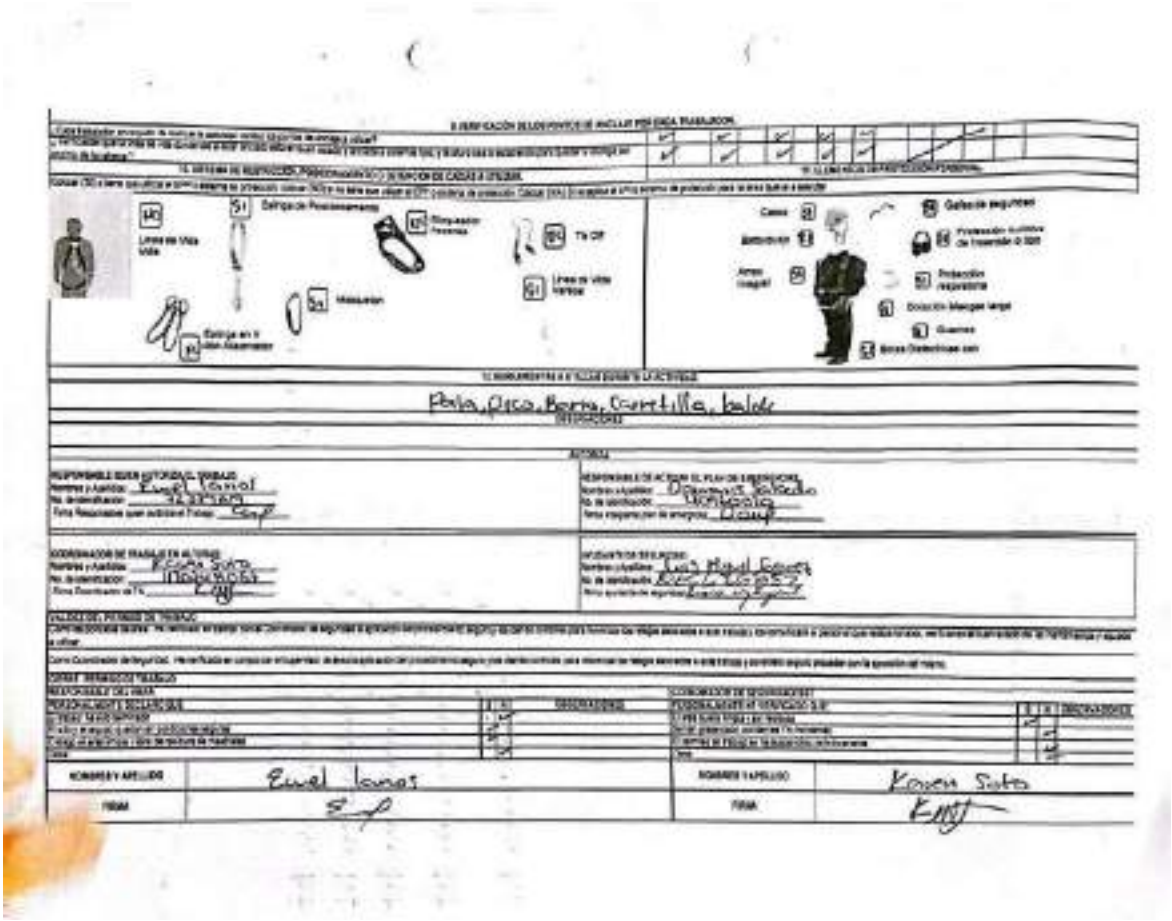
Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde
Ewel Ivanol
Karen Sista
Ewel Ivanol
Karen Sista

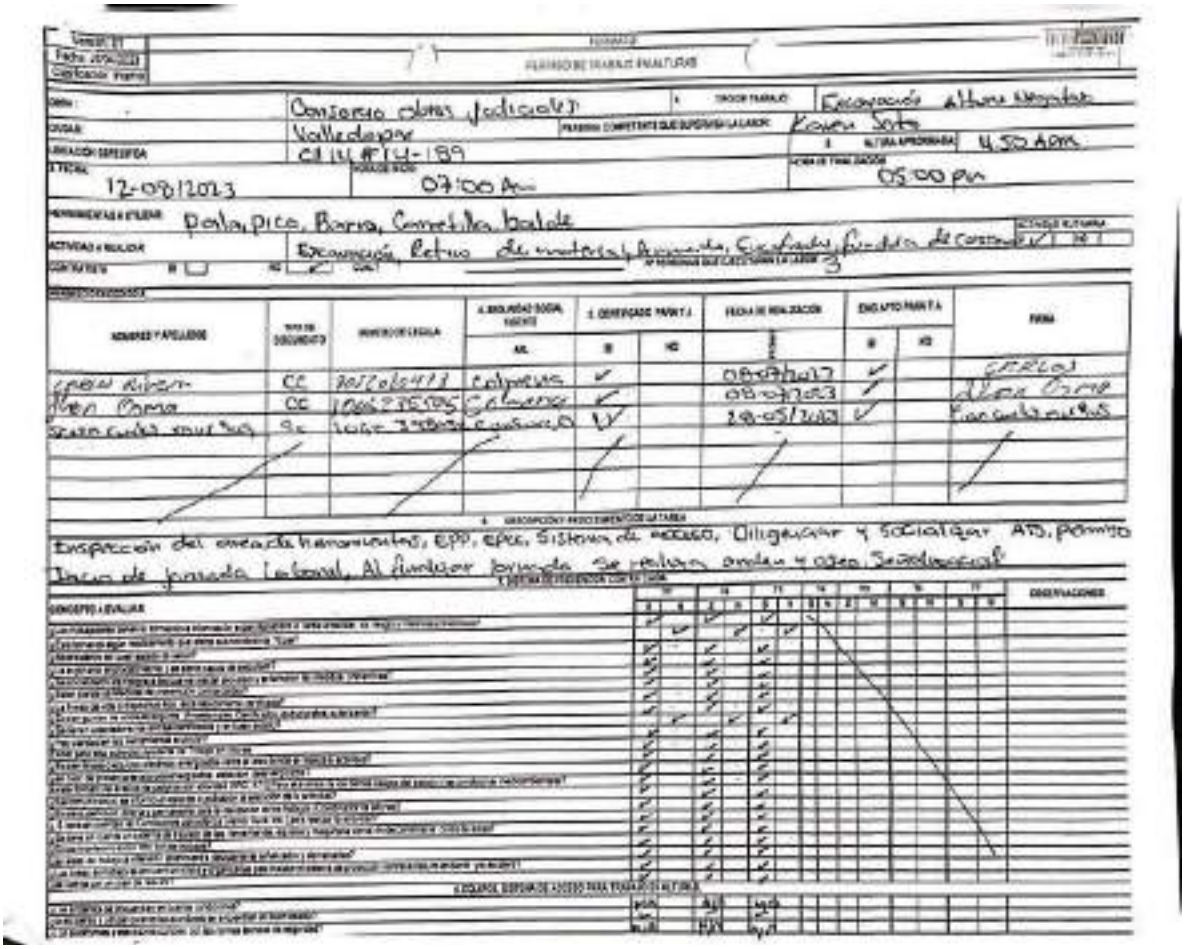



Consorcio Obras Judiciales VJ — Excavación Altura Máxima
Valledupar — Karen Soto — 4:30 AM
CR 14 # 14-189
12-08-2023 — 07:00 AM — 05:00 PM
Pala, pico, Barra, Carretilla, balde
Excavación, Retiro de material, Acordada, Cimentación, Fundida de Concreto


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL (ACTIVO)	B. CERTIFICADO PARA EL		FECHA DE REALIZACION	ENCARGADO PARA EL		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Carlos Rivera	CC	1077062478	Colpensiones	✓		08-08-2023	✓		
Alex Pena	CC	1066218595	Colpensiones	✓		08-08-2023	✓		
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	✓		29-05-2023	✓		


Inspección del area de herramientas, EPP, epcc, Sistema de acceso, Diligenciar y socializar ATS, permiso Inicio de jornada Laboral, Al finalizar jornada se realizan orden y aseo Socialización


CONCEPTO A EVALUAR	10		11		12		13		14		15		16		17		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
	✓				✓		✓								

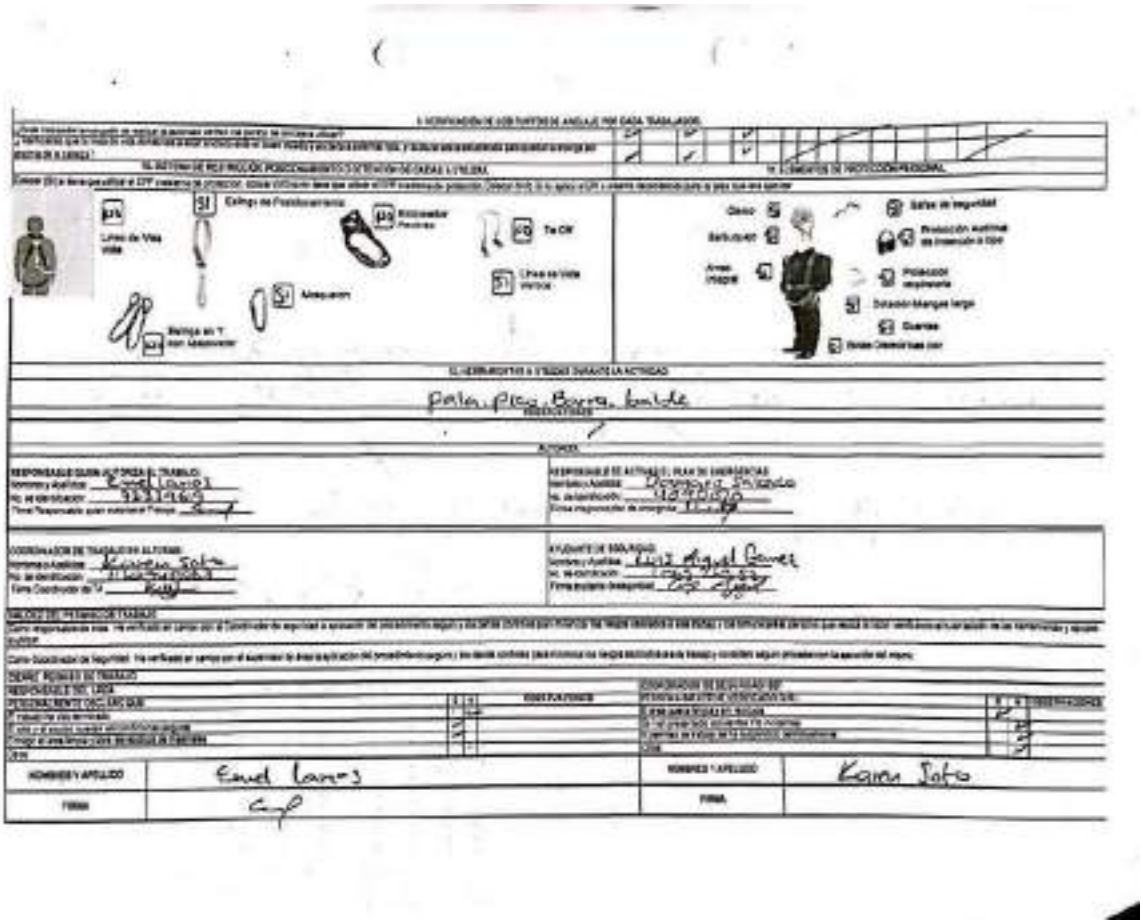

Eduel Lamos
Kamu Soto

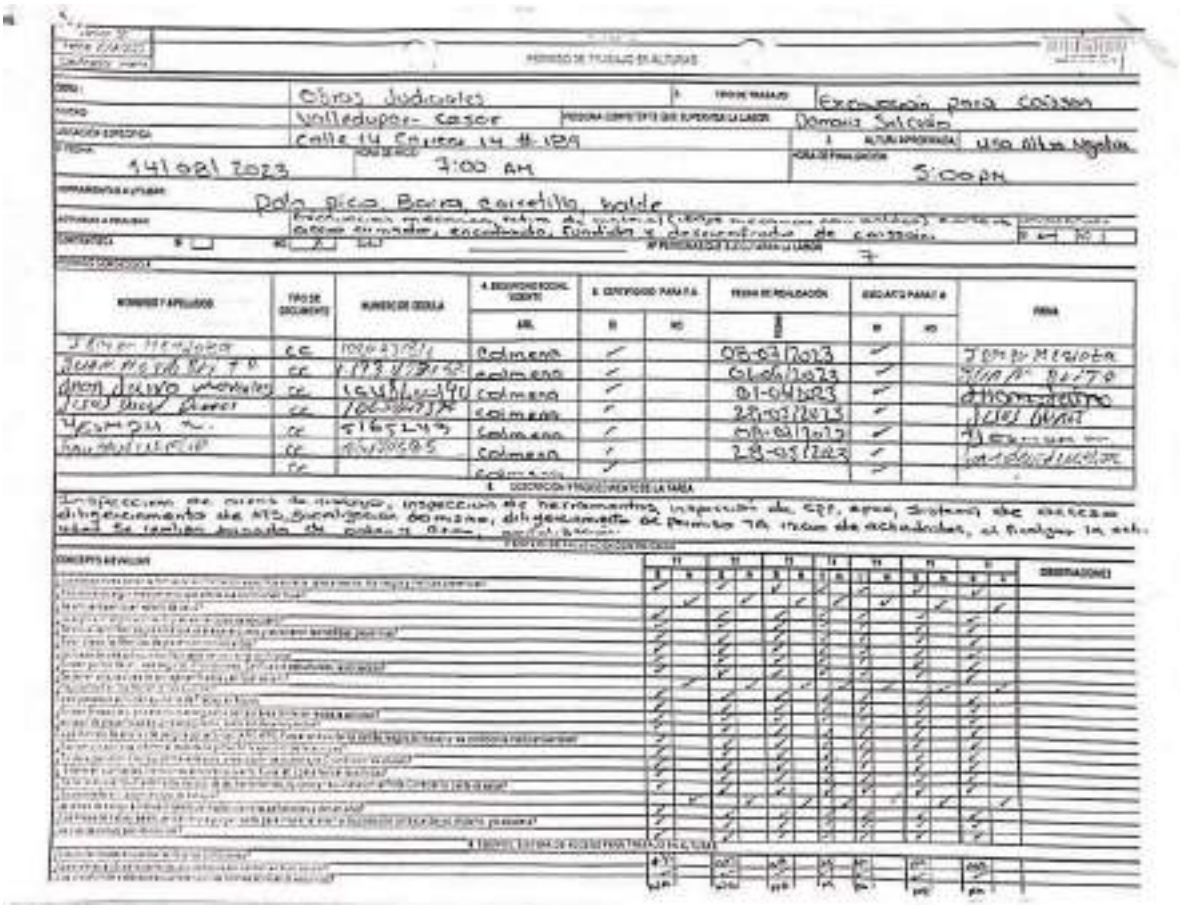


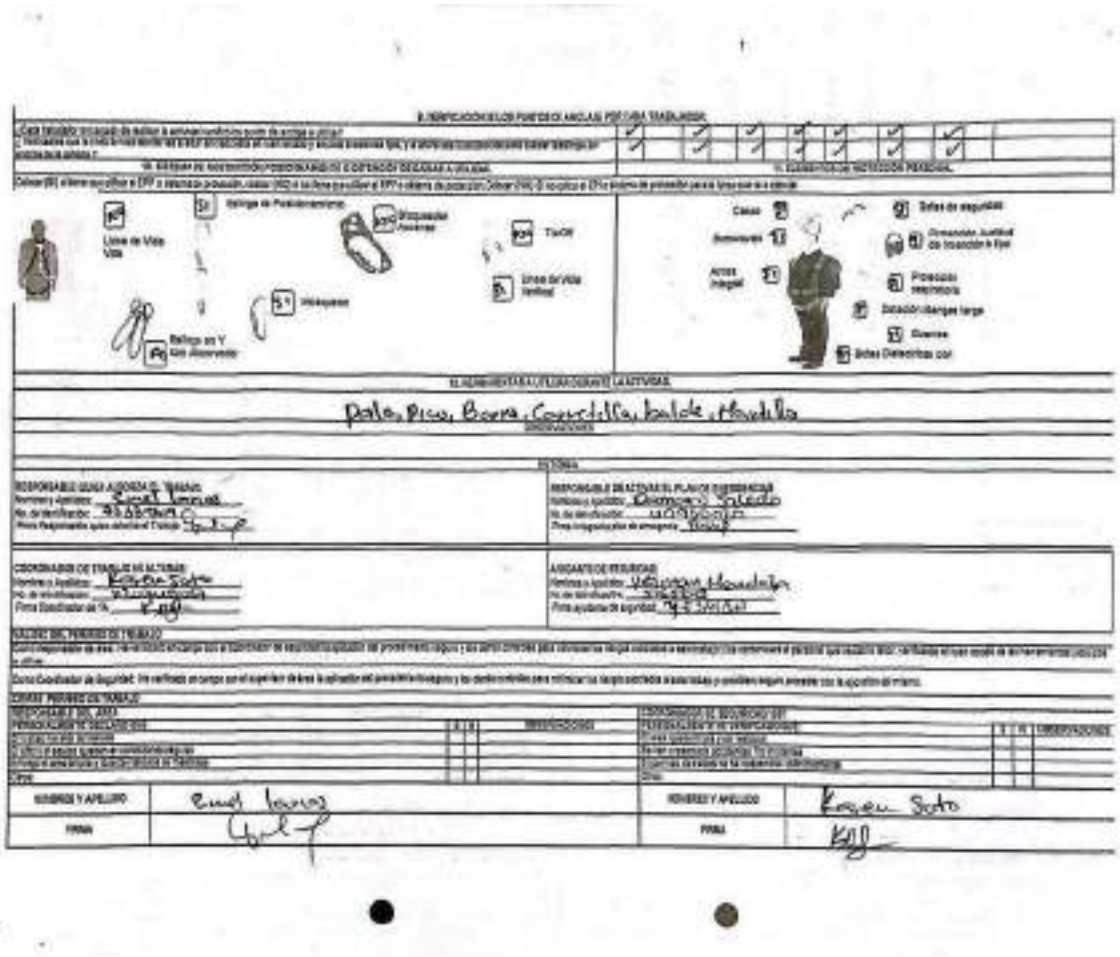

Palo, Pico, Barra, Carretilla, Balde, Martillo
Ruben Soto

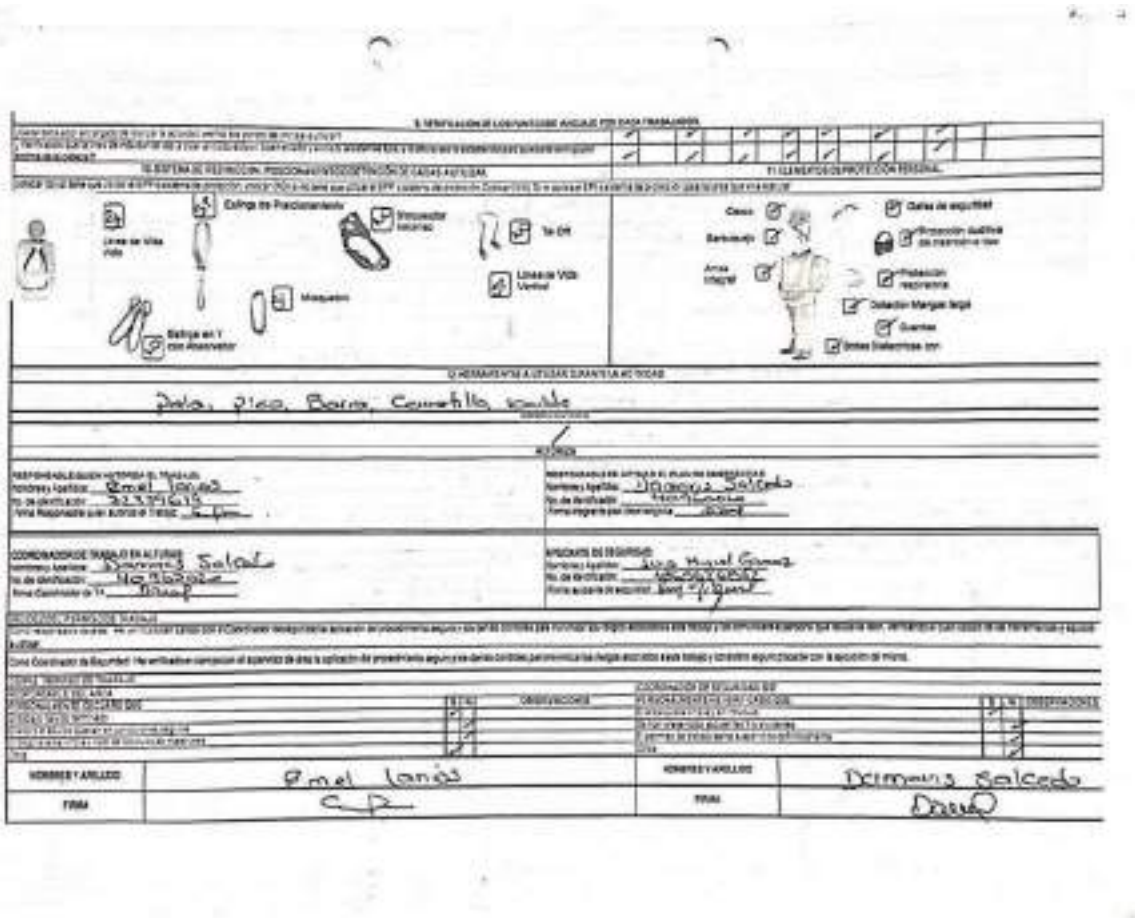

Arnes de cuerpo completo
Eslinga en Y con Absorvedor
Eslinga de Posicionamiento
Mosqueton
Arnes integral
Gafas de seguridad
Protección auditiva de inserción en oído
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas sin
Polo, pico, Barra, Cinchito, cuadr
Omar Lanos
Dimmys Salcedo
Omar Lanos
Dimmys Salcedo

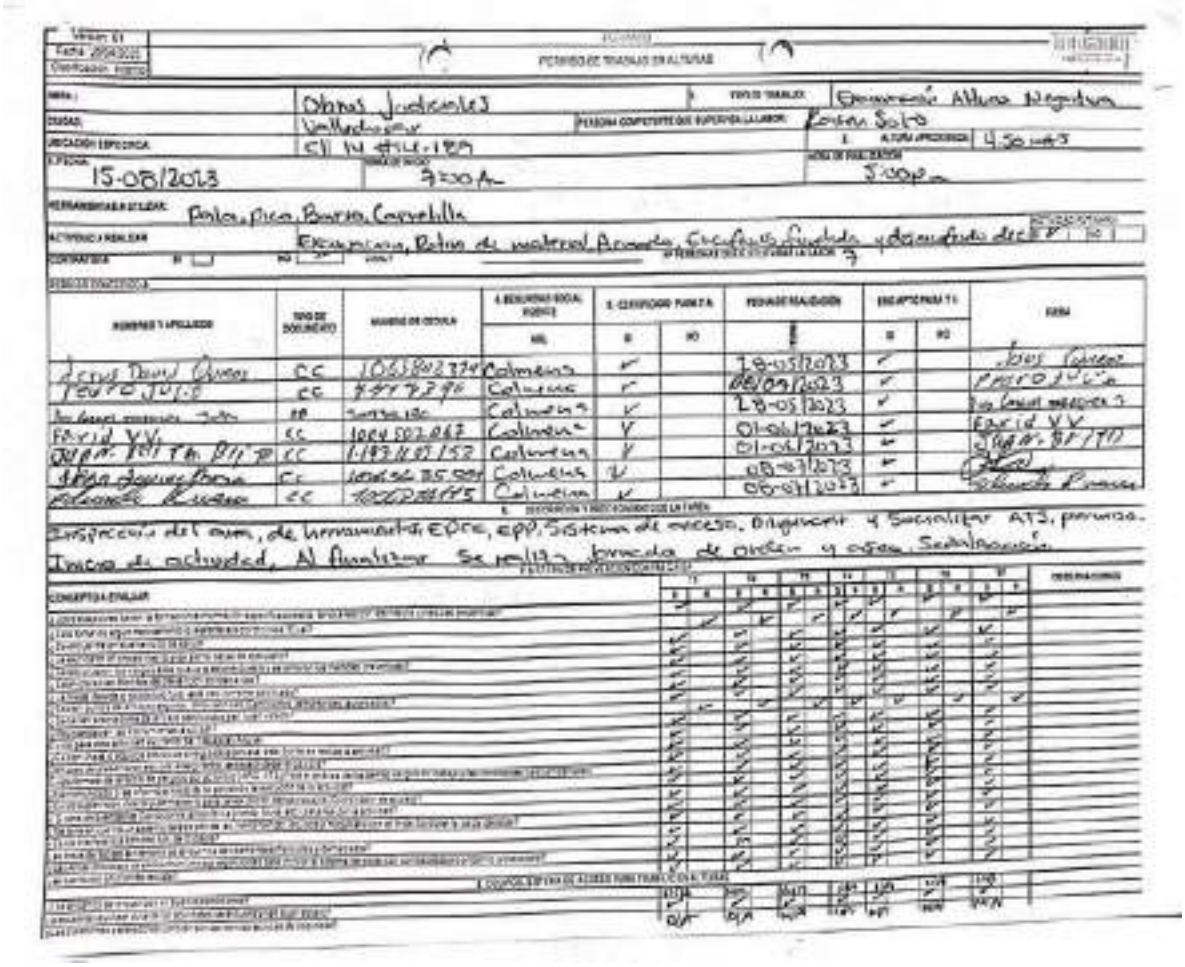
Obras Judiciales
15-08/2023
Inspección del arm, de herramienta, EPCC, EPP, Sistema de acceso, Diligencia y Socializar ATS, permisos.
Inicio de actividad, Al finalizar se realiza jornada de orden y aseo, Socialización.

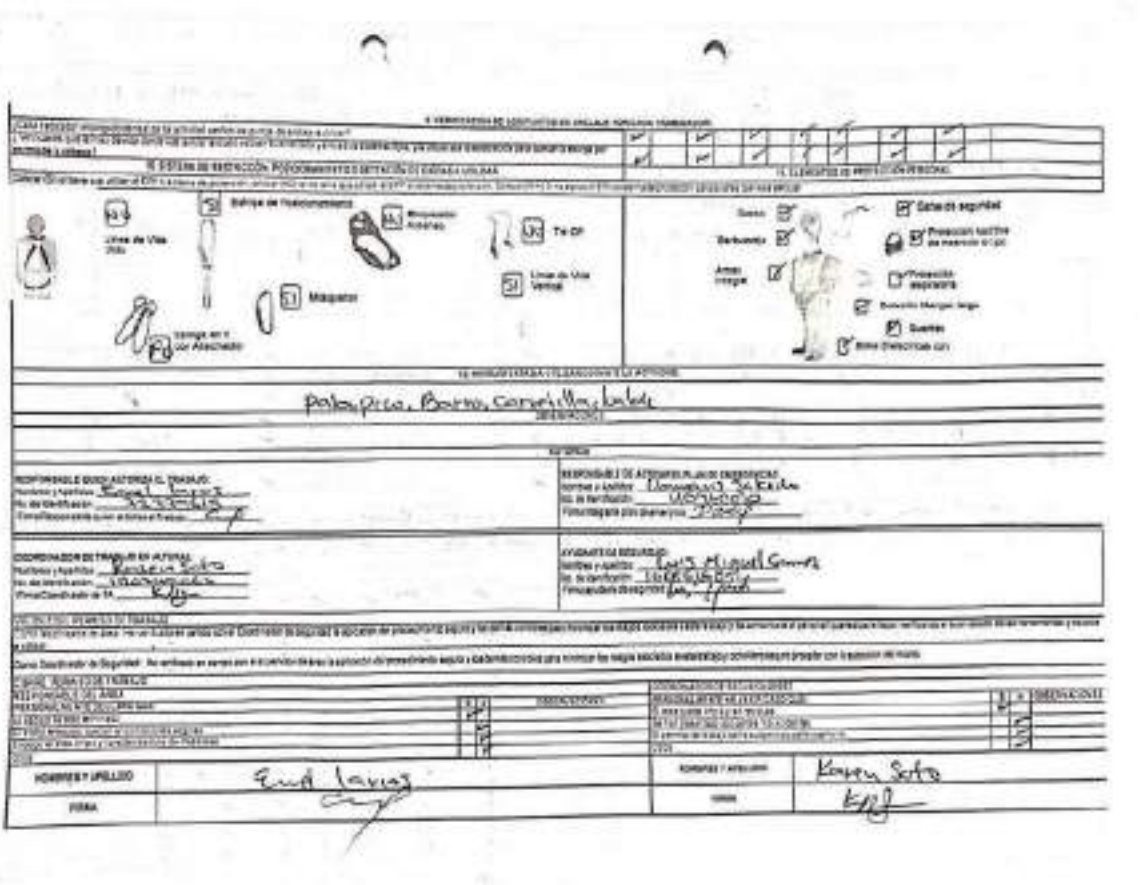

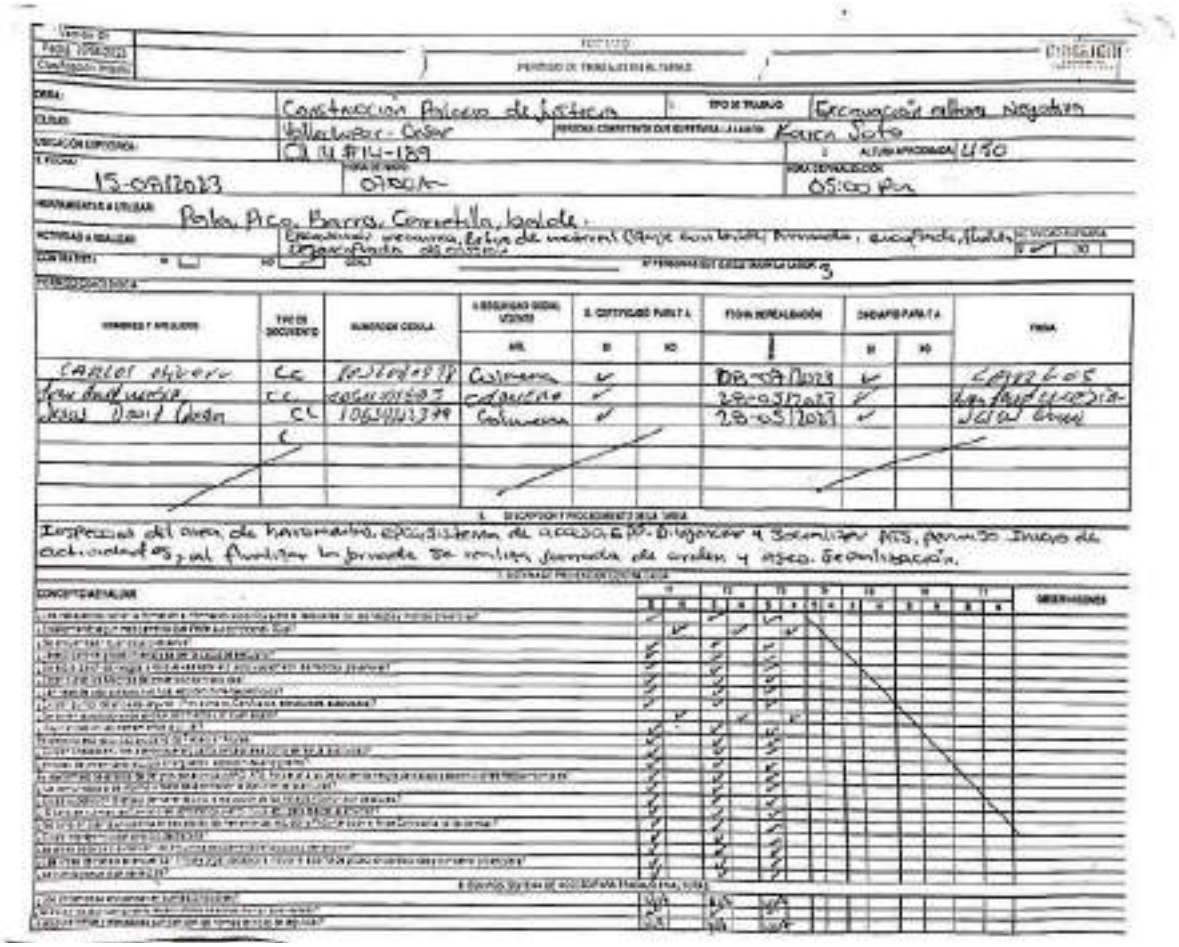

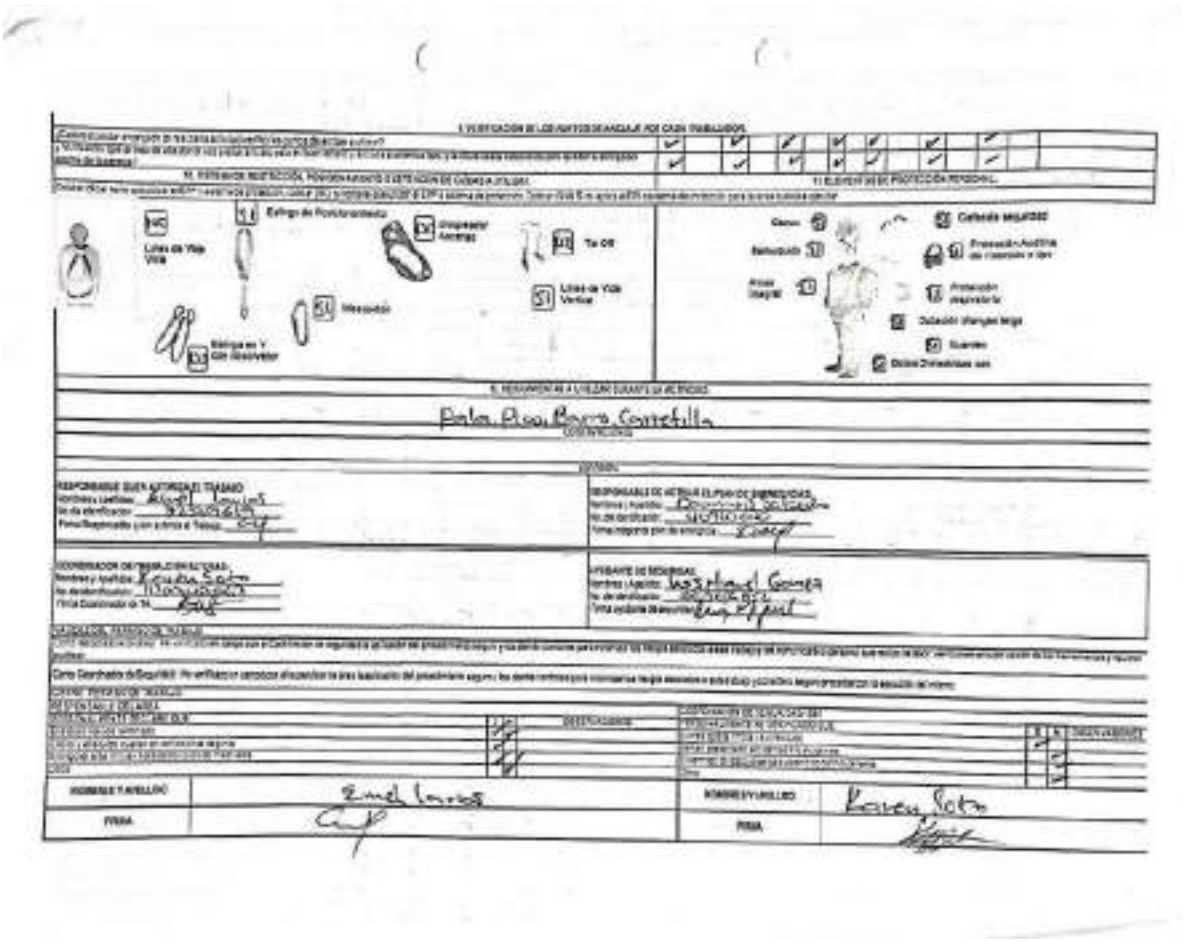

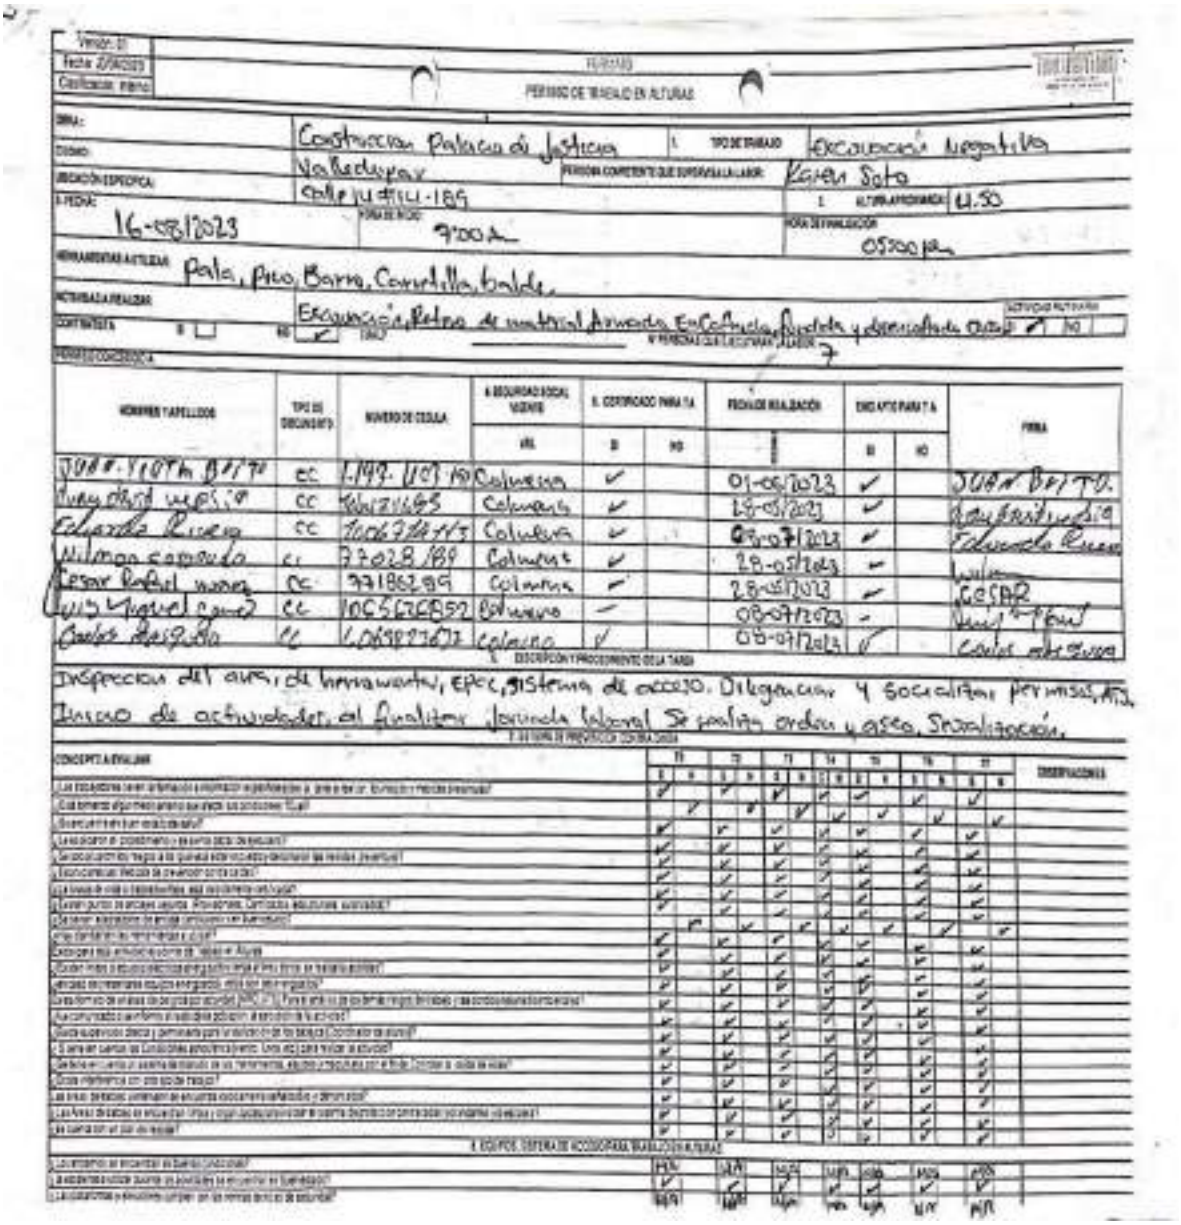

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Construccion Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavacion Negativa

DISEÑO: Valledupar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 #14-189 — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto — ALTURA APROXIMADA: 4.50

FECHA: 16-08-2023 — HORA DE INICIO: 9:00 A.M. — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico Barra, Carretilla, Taladro.

ACTIVIDADES A REALIZAR: Excavacion Retiro de material Armado En Concreto, fundida y desencofrada

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ TIPO: ____ — ACTIVIDAD ALTURAS: SI ✓ NO ☐

N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LABOR: 7

NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN APTO PARA TA SI	EXAMEN APTO PARA TA NO	FIRMA
Juan Diaz Tovar	cc	1.192.101.190	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Juan Diaz Tovar
Jonathan Lopez	cc	1065711693	Colmena	✓		29-05-2023	✓		Jonathan Lopez
Eduardo Rueda	cc	1006784475	Colmena	✓		09-07-2023	✓		Eduardo Rueda
Wilmer Coronado	cc	77028189	Colmena	✓		28-05-2023	✓		Wilmer
Cesar Rafael Mora	cc	77186299	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CESAR
Luis Miguel Cano	cc	1065626892	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Luis Miguel Cano
Carlos Arregoces	cc	1.069827673	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Carlos Arregoces


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion del area, de herramienta, Epcc, sistema de acceso. Diligencian y socializan permisos, ATS, Ingreso de actividades al finalizar jornada laboral se realiza orden y aseo, Socializacion.

CONCEPTO A EVALUAR	11 SI	11 NO	12 SI	12 NO	13 SI	13 NO	14 SI	14 NO	15 SI	15 NO	16 SI	16 NO	17 SI	17 NO	OBSERVACIONES
Los trabajadores tienen certificado o constancia de aptitud medica para trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cada trabajador dispone de medio anclaje que evite caidas superiores a 1,5 m?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Disponen de arnes tipo vaquero?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Los equipos de posicionamiento y de arnes estan certificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentran los trabajos a mas de 1,5 metros sobre un nivel inferior donde existan riesgos de caidas graves?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Esta controlado el acceso de personal no autorizado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La zona de trabajo esta libre de obstaculos que puedan causar caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen puntos de anclaje seguros (Estructural, Certificados, adecuados, suficientes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tienen autorizados los trabajos realizados con herramientas?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estan identificadas las herramientas y EPP?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe plan de rescate en caso de caidas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con todos los elementos requeridos para el rescate en caso de caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Personal capacitado en rescate en caso de caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentra en el sitio de trabajo personal capacitado (SVCA) en Trabajo seguro en alturas y que acredite reentrenamiento anual?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentra capacitado en primeros auxilios para atender una victima en caso de caida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con vigia o persona para verificar el cumplimiento de las tareas y Coordinar la salida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta las Condiciones ambientales del sitio. Lluvia, etc para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta el estado de salud de los trabajadores, equipos y herramientas, antes de iniciar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con iluminacion en sitio de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las areas de trabajo estan limpias de escombros, materiales y demas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las Areas de trabajo se encuentran libres y con condiciones seguras de caminos peatonales para evitar caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con un plan de rescate	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS DISPONIBLES DE ACCESO PARA REALIZACIÓN EN ALTURAS

Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
La estructura a escalar cuenta con puntos de anclaje para el ascenso y descenso?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Las estructuras a escalar cumplen con las normas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

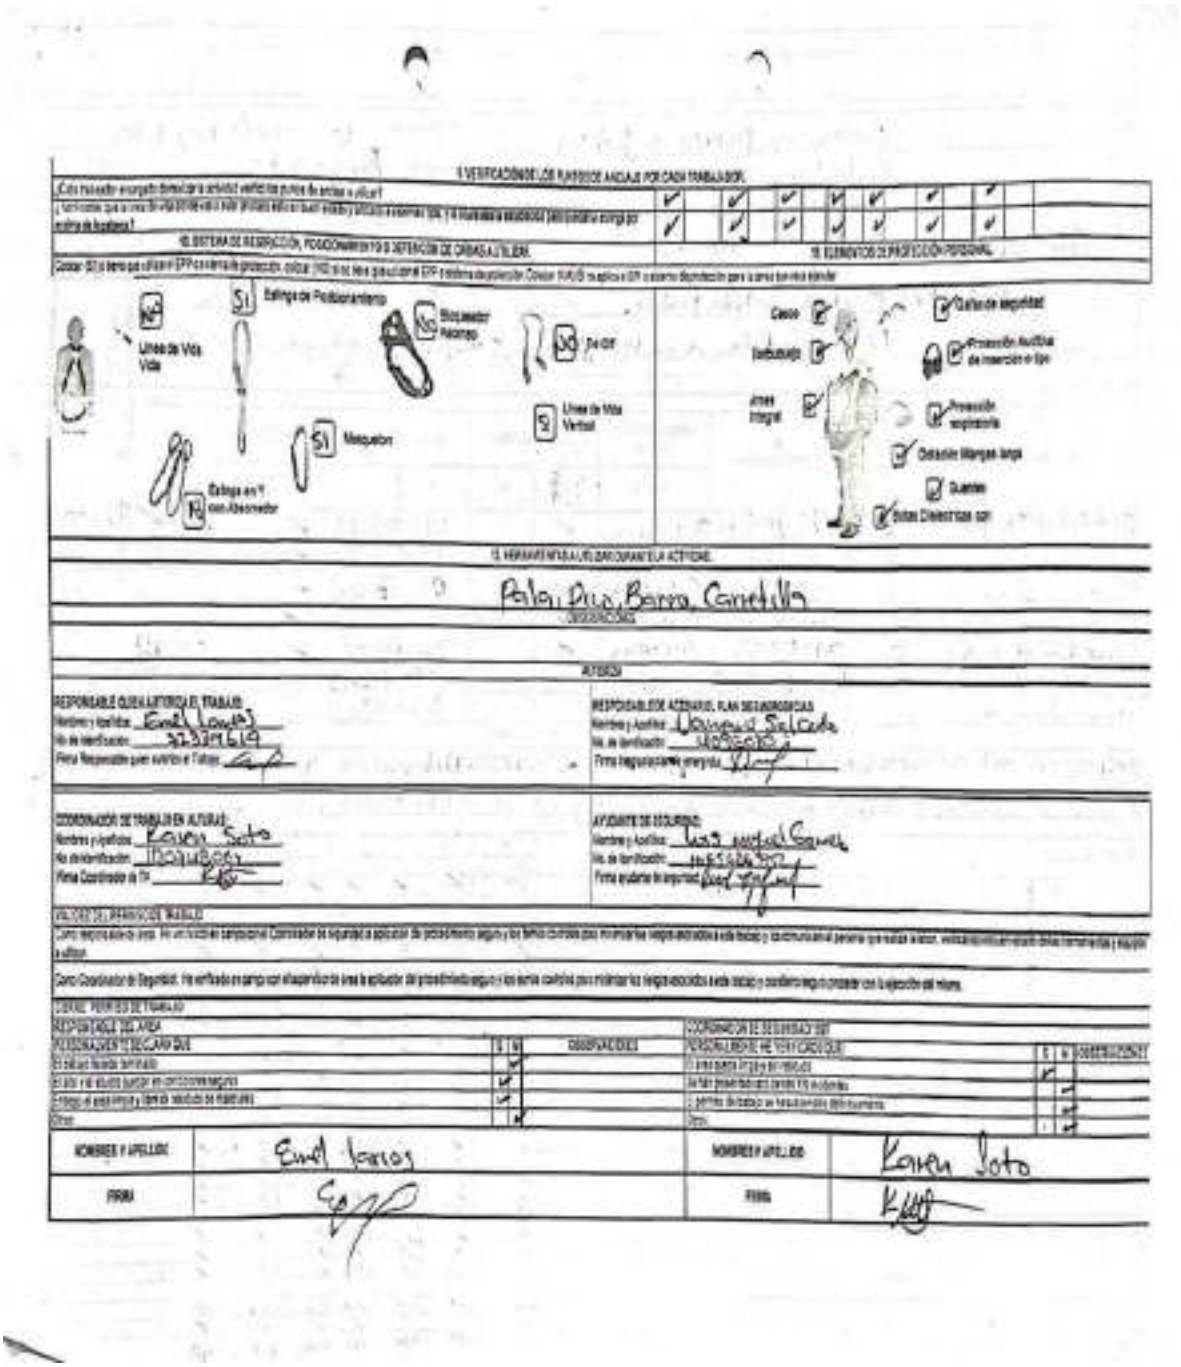

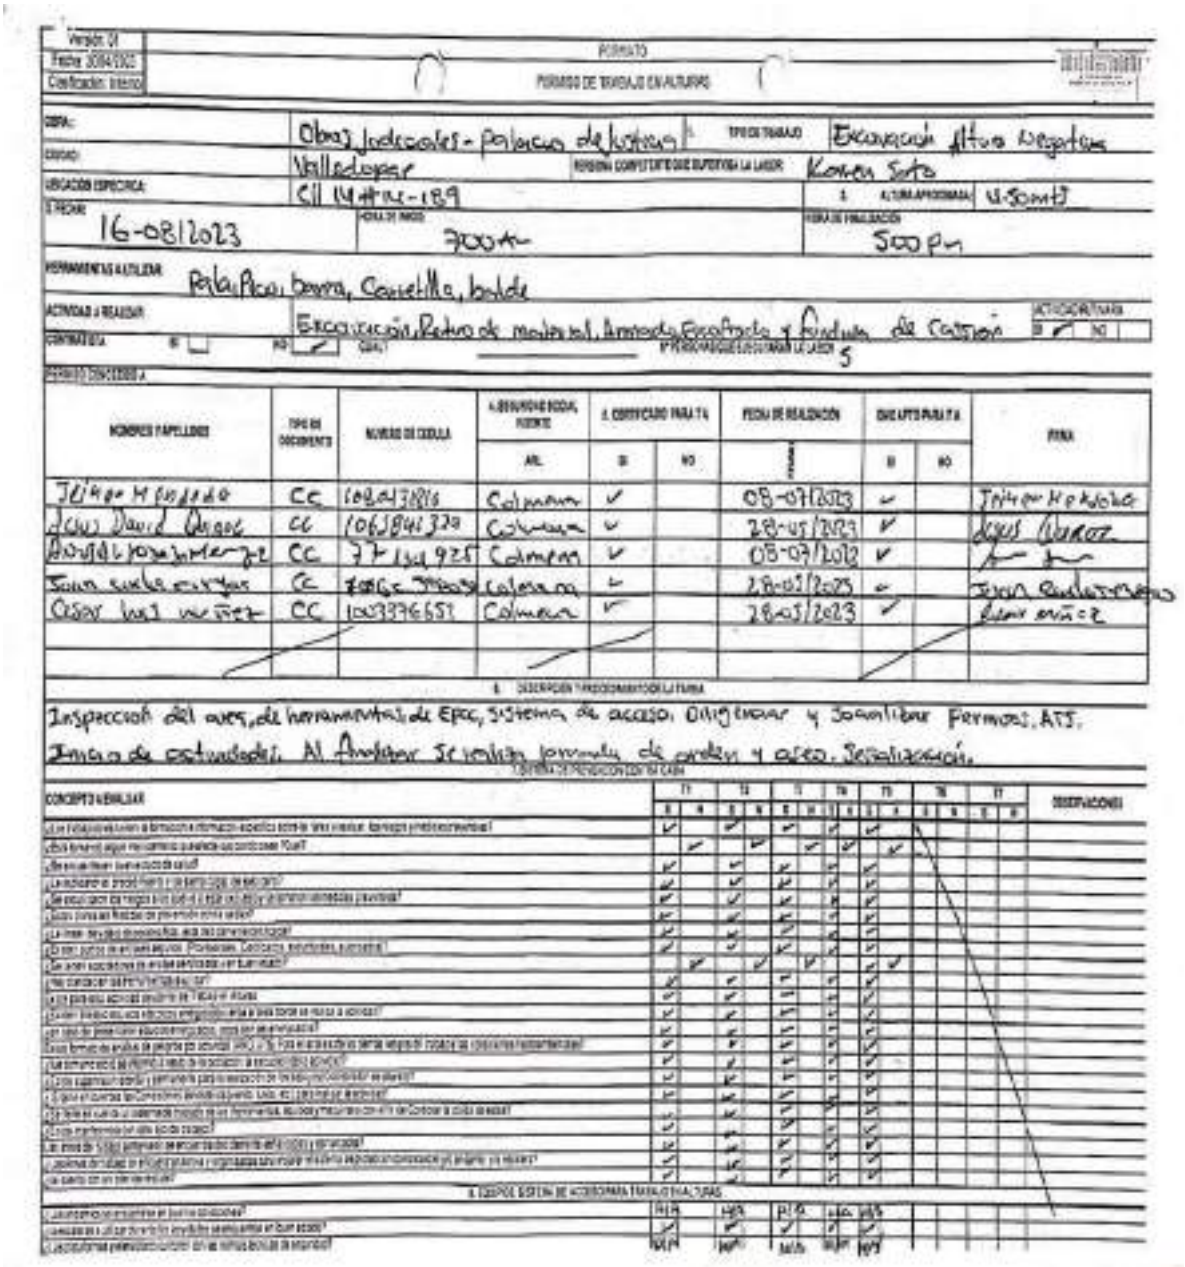

Versión: 01
Fecha: 30/04/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales - Palacio de Justicia | TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura Negativa
CIUDAD: Valledupar | PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kamen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #12-189 | # ALTURA APROXIMADA: 4.50mts
PERSONAL: 16-08/2023 | HORA DE INICIO: 7:00 a.m | HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 p.m
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado y Fundida de Cortina
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? ____ # PERSONAS QUE LES TOCARA LA LABOR: 5
ACTIVIDAD RUTINA: SI ☑ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	# SEGURIDAD SOCIAL ACTIVO ARL	# CERTIFICADO PARA T.A SI	# CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	CURSO ALTURAS PARA T.A SI	CURSO ALTURAS PARA T.A NO	FIRMA
Jairo Hoyos	CC	1082[illegible]815	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Jairo Hoyos
Jose David Ochoa	CC	1065[illegible]329	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Jose Ochoa
[illegible]	CC	77[illegible]925	Colmena	✓		08-07/2023	✓		[illegible]
Juan [illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		28-02/2023	✓		Juan [illegible]
Cesar [illegible]	CC	1003396651	Colmena	✓		28-03/2023	✓		Cesar [illegible]

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area, de herramientas de Epcc, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar Permiso, ATS, Inicio de actividades, Al finalizar se realiza formato de orden y aseo, Socialización.


CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA TAREA

CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la información y formación específica sobre la labor a realizar, los equipos y medios de protección?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Está firmado algún documento que indique que los trabajadores son competentes para realizar trabajo en alturas?		✓		✓		✓		
¿Se encuentran bien los certificados de salud?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Los trabajadores tienen el carné vigente de trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se realizó una identificación de peligros y valoración de riesgos?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Están todas las medidas de prevención antes de iniciar?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿La zona de trabajo delimitada, señalizada y demarcada?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿El área cuenta con señalización preventiva? (Peligro, Restricción, Obligación, Información)	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo eléctrico?		✓		✓	✓			
¿Los trabajadores tienen el EPP básico?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Los trabajadores tienen el EPP para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se realizó charla de seguridad antes de iniciar la actividad?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Existe algún tipo de riesgo ambiental? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo químico? ¿Se tiene una hoja de seguridad?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo biológico? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo público? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo psicosocial? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo ergonómico? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo de seguridad vial? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo de seguridad de la información? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo de seguridad de la información? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo de seguridad de la información? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Se tiene algún tipo de riesgo de seguridad de la información? ¿Se tiene un plan de contingencia?	✓	✓	✓	✓	✓			

ESPACIO SISTEMA DE ACCESO PARA LOS TRABAJADORES

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores se encuentran en buen estado físico?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Los trabajadores cuentan con la capacitación para el uso del sistema de acceso?	✓	✓	✓	✓	✓			
¿Los trabajadores tienen el certificado de trabajo en alturas?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

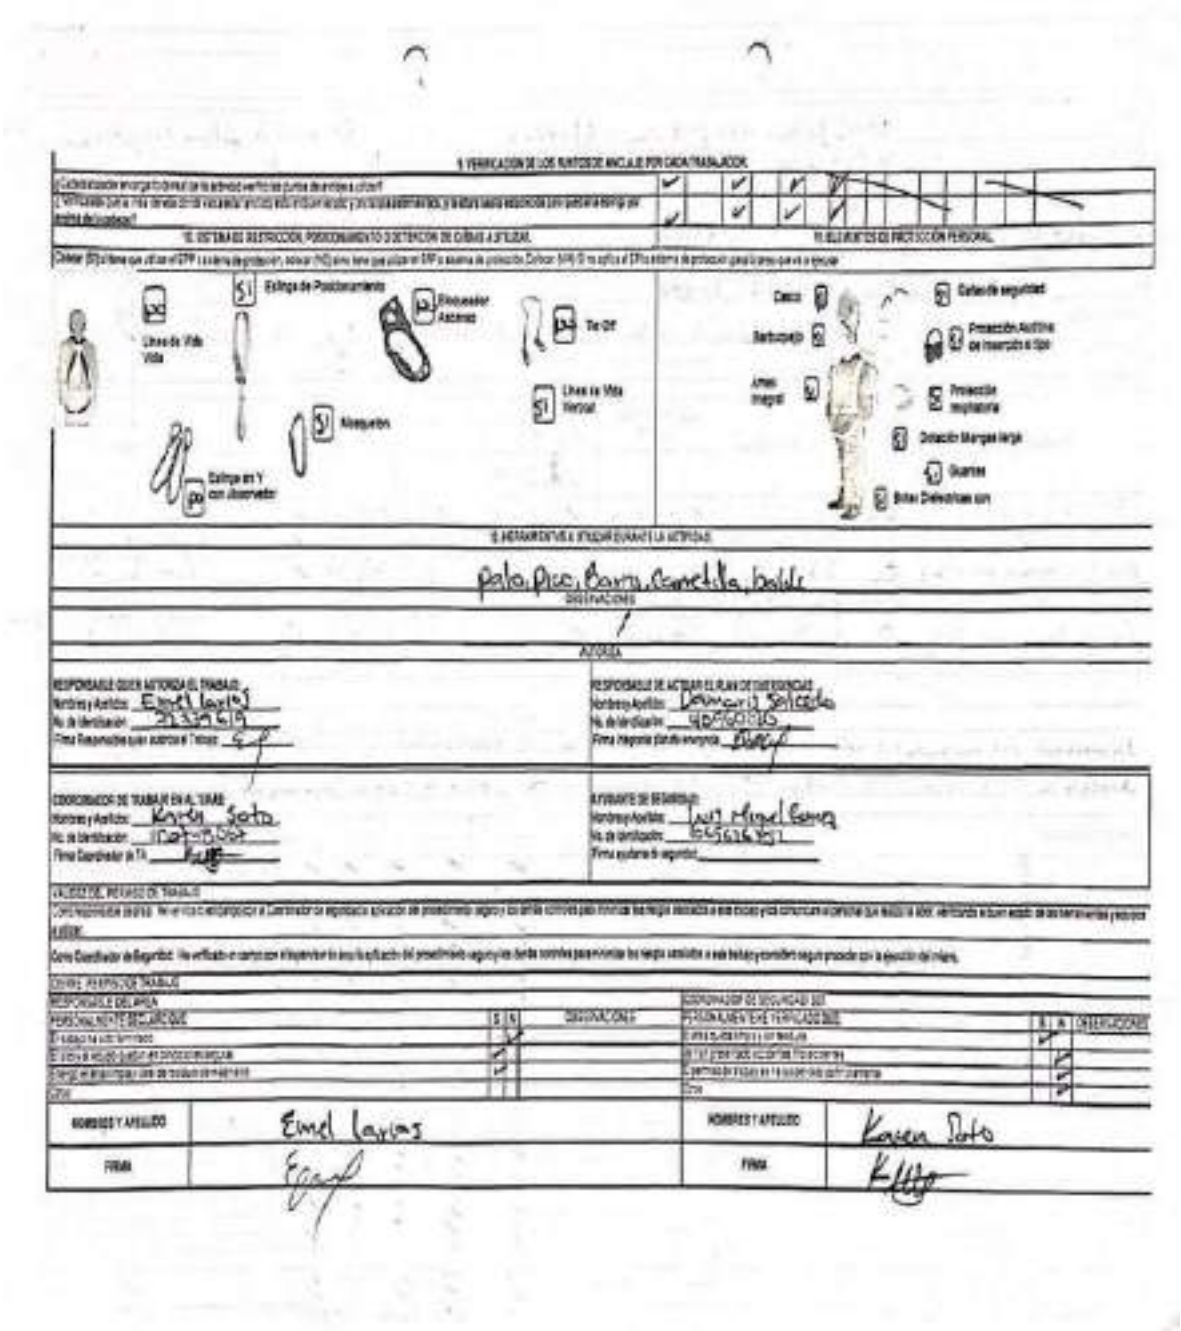
Eslinga de Posicionamiento
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Protección respiratoria
Guantes
Emel Lavias
Karen Soto

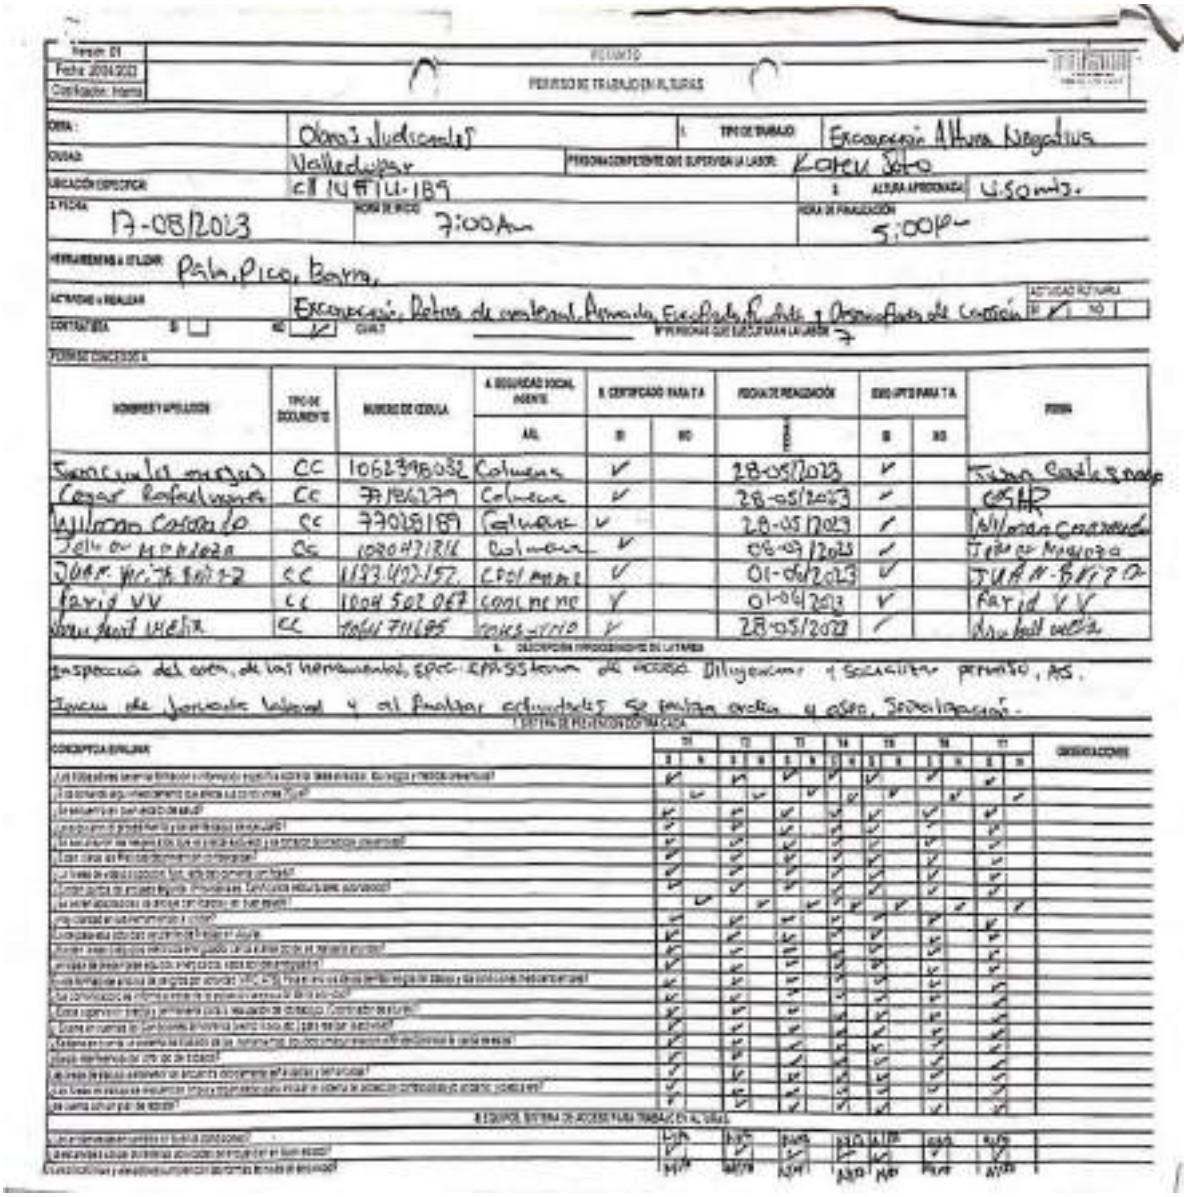

Versión: 01
Fecha: 2019/2023
Clasificación: Interna

REGISTRO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura Negativa
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
LOCALIZACIÓN ESPECIFICA: cll 16 # 14-189 — ALTURA APROXIMADA: 1.50 mts.
FECHA: 17-08/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 Pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra,
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado, Fundida y Desencofrado de cimentación — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI [X] NO [ ]
CONTRATISTA: SI [ ] NO [X] CUAL? — No PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A:


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL ACTIVA	B. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Samuel [illegible]	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		[illegible]
Cesar Rafael [illegible]	CC	77186279	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Wilmar Cordero	CC	77015189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Wilmar Cordero
Jeiver Mendoza	CC	1080421816	Colmena	✓		06-09/2023	✓		Jeiver Mendoza
Juan [illegible]	CC	1193.492.157	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN [illegible]
Yavid VV	CC	1004 502 067	COLMENA	✓		01-06/2023	✓		Yavid VV
[illegible]	CC	[illegible] 711695	COLMENA	✓		28-05/2023	✓		[illegible]


B. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area, de las herramientas, EPCC. EPP-SS toma de riesgos Diligenciar y solicitar permiso, ATS. Inicio de jornada laboral y al finalizar actividades se realiza orden y aseo, Socialización.


C. LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA


CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la información requerida sobre los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el mantenimiento preventivo de la herramienta?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se cuenta con [illegible] de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se [illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿La [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se

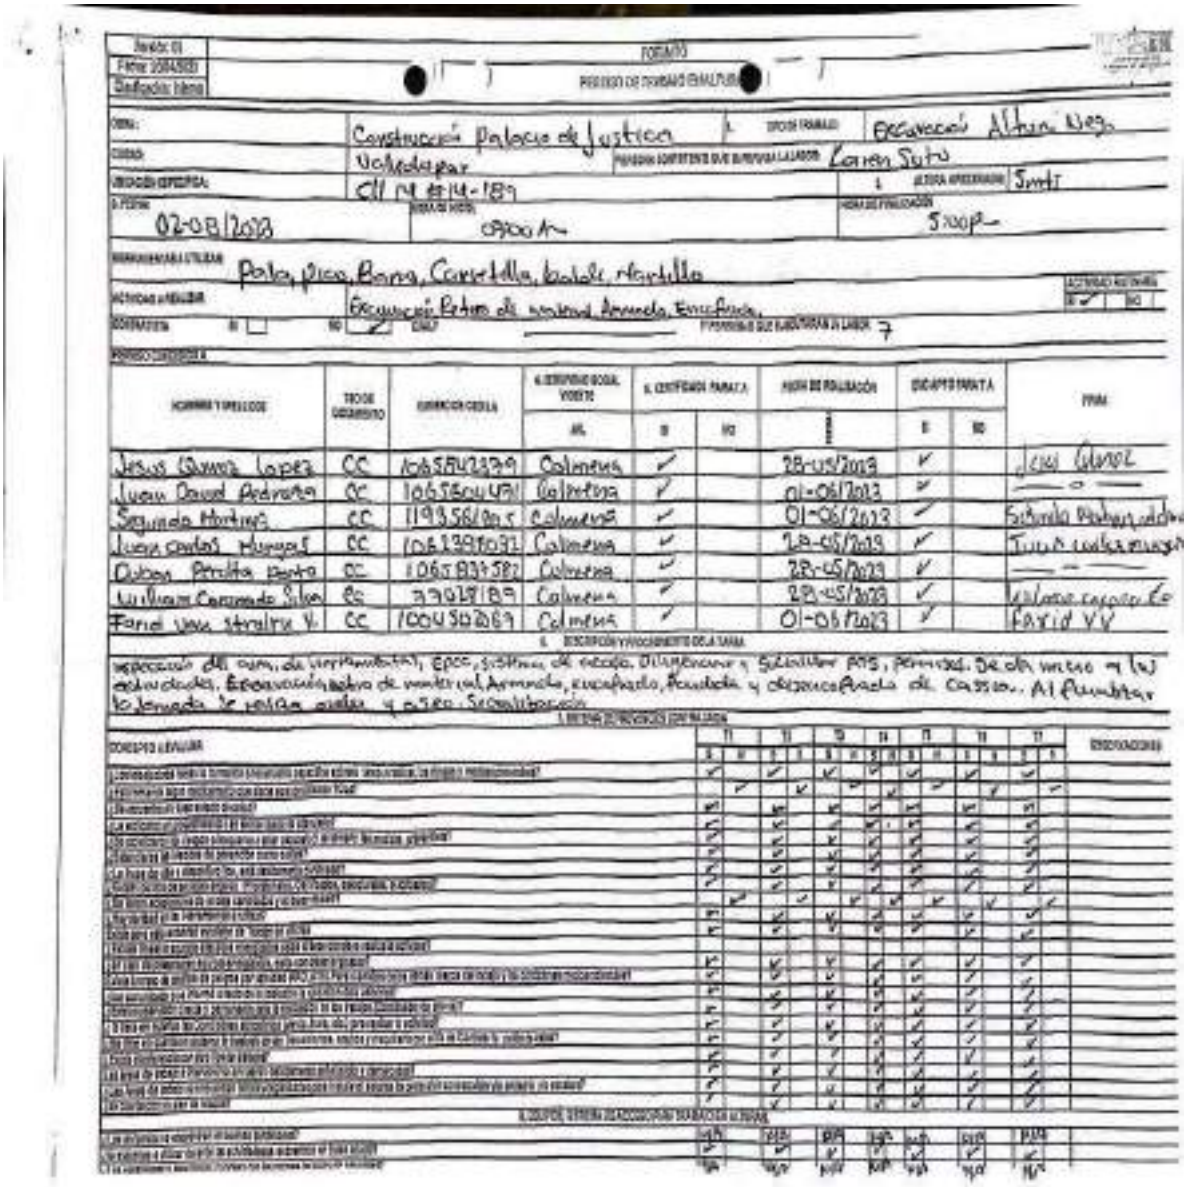


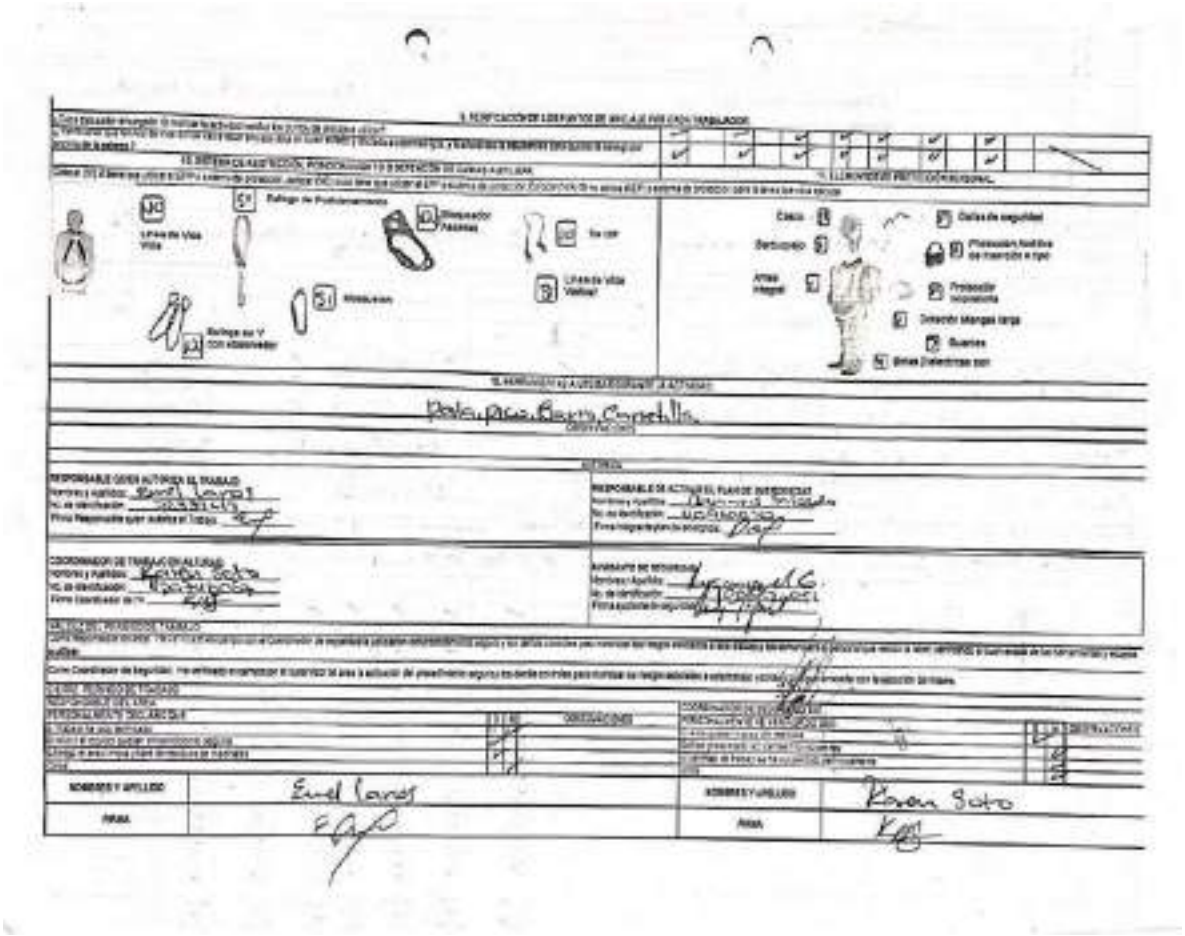


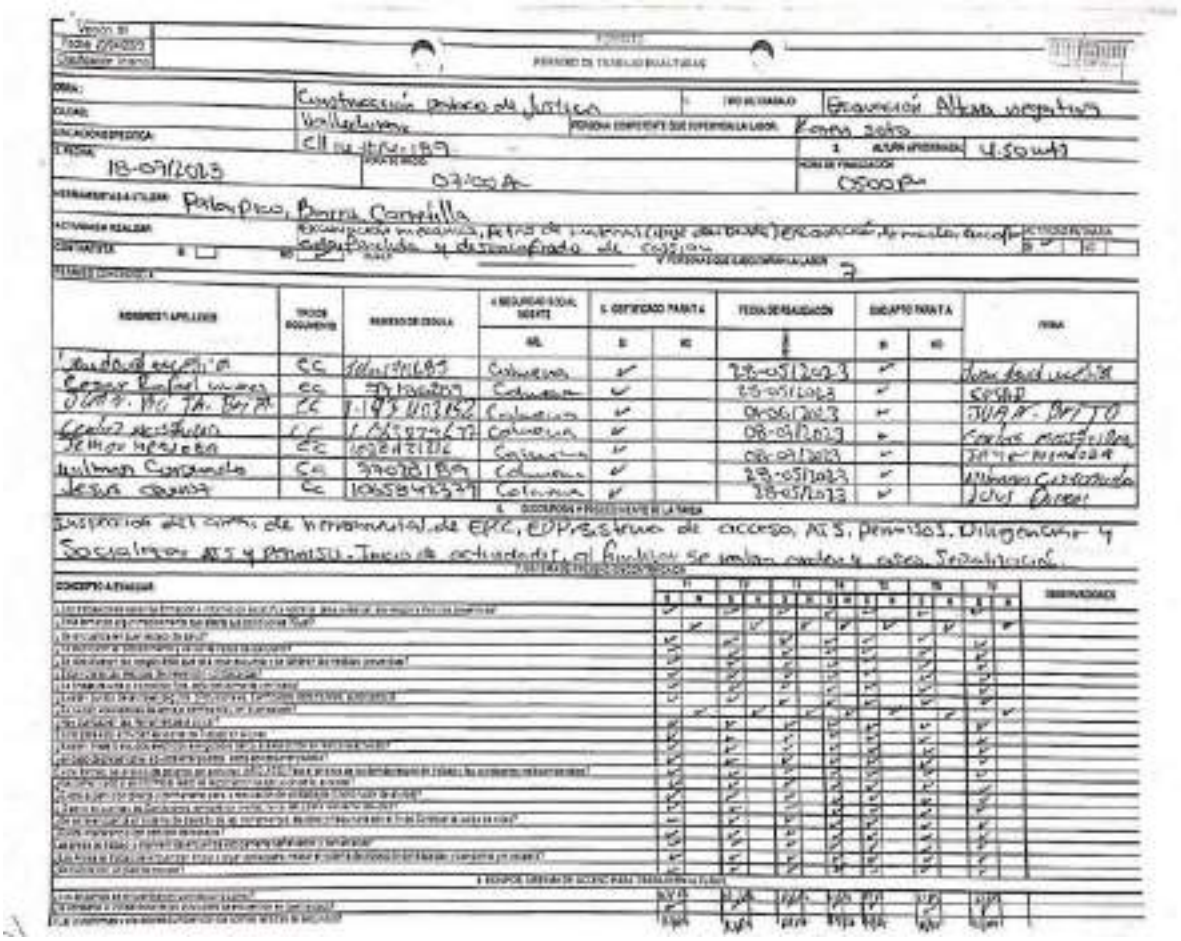


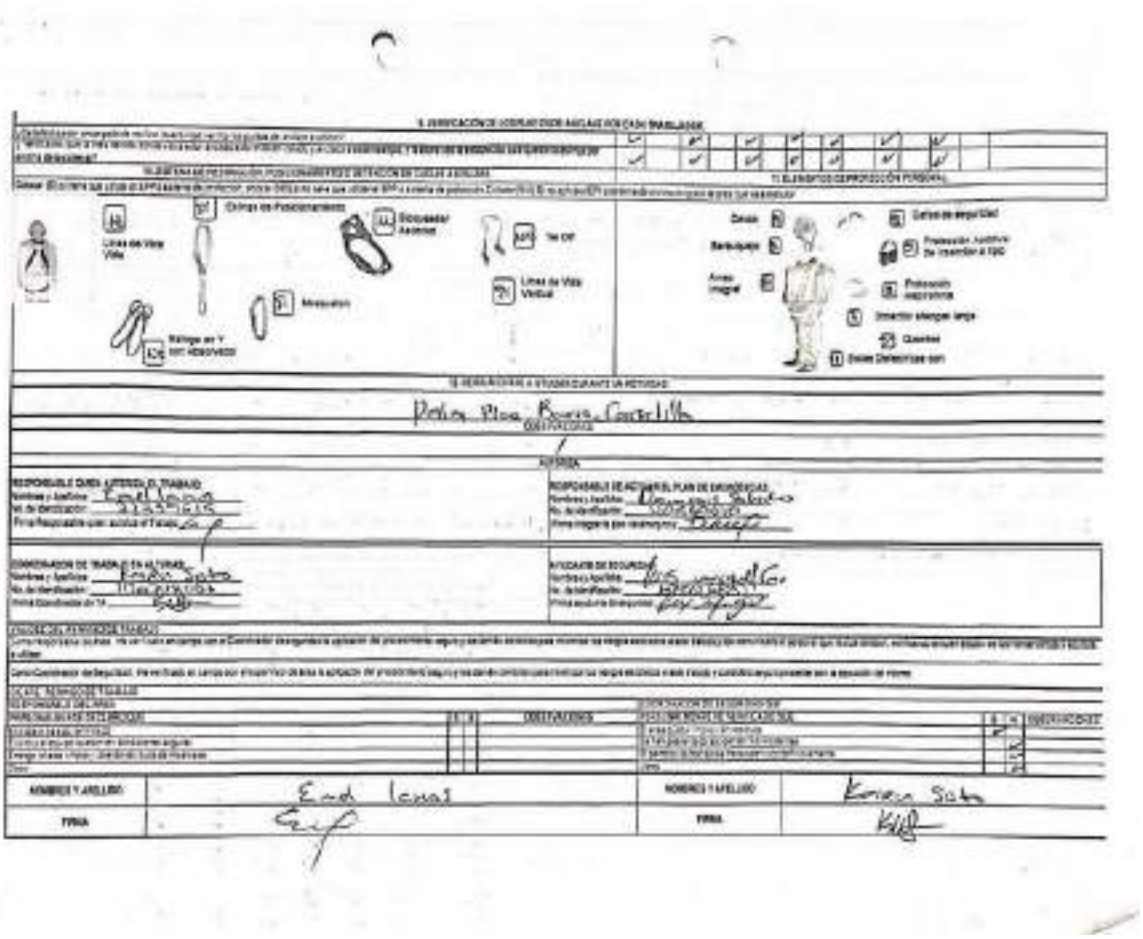


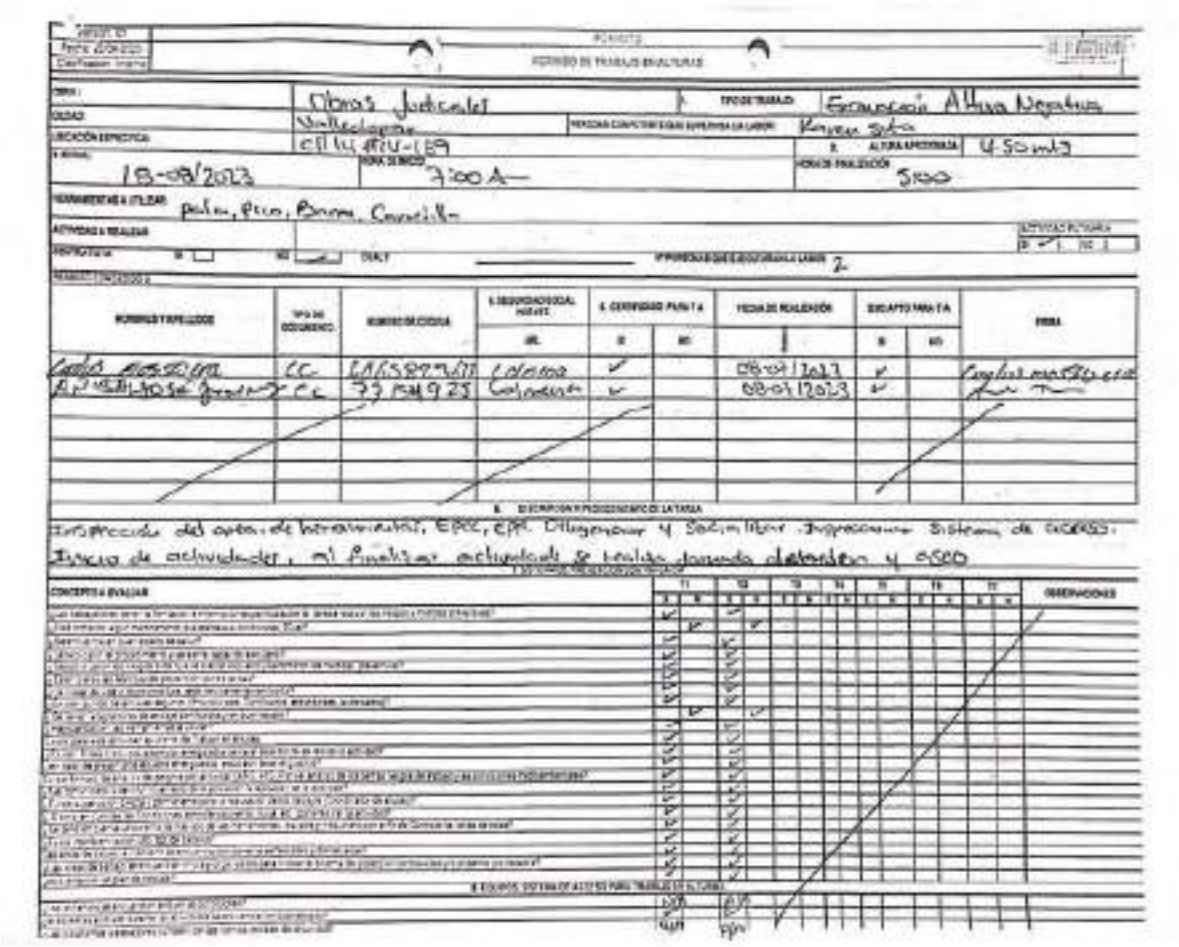

Obras Judiciales
Villavicencio
18-08/2023
7:00 A
Palin, Pico, Barra, Cuerda
Inspección del cumplimiento, EPCC, EPP. Diligenciar y socializar Inspecciones Sistema de acceso.
Inicio de actividades, al finalizar actividad se realiza jornada elaboración y aseo

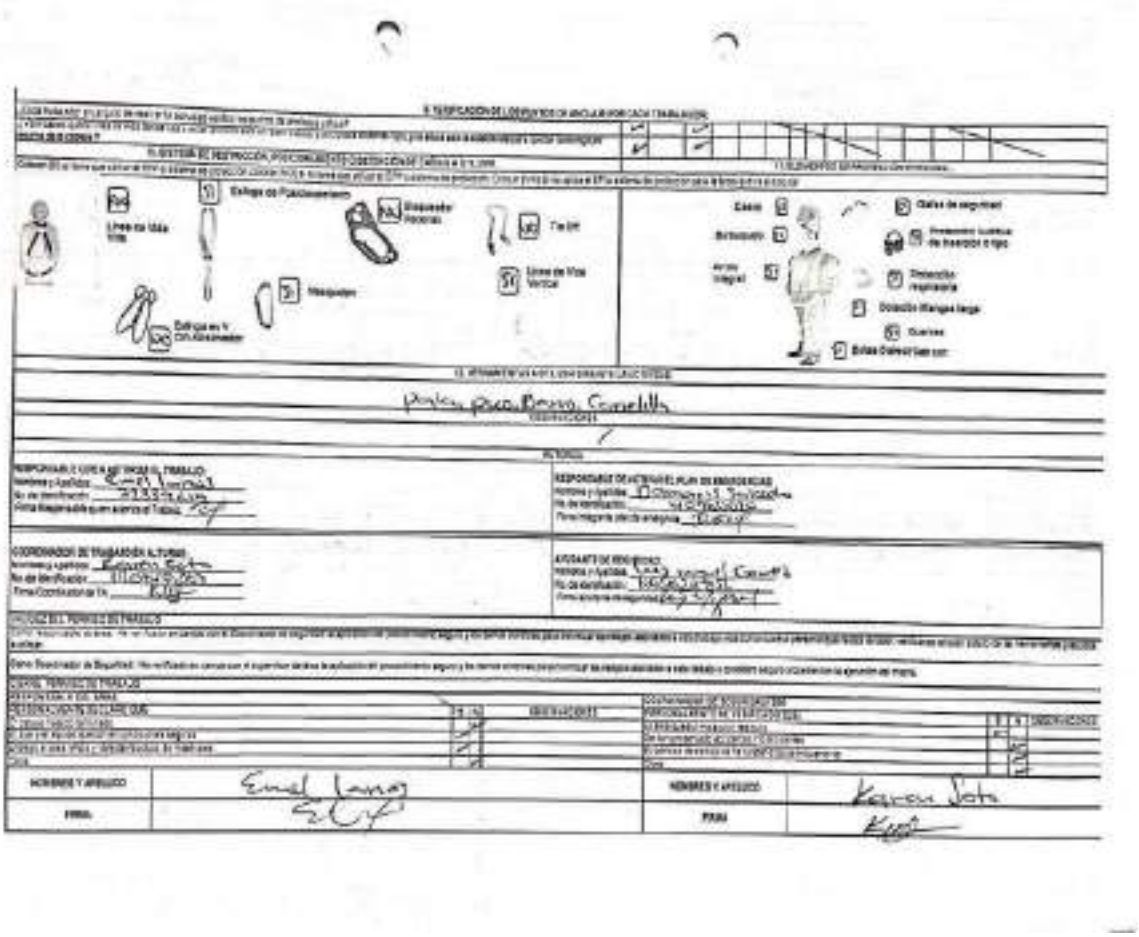


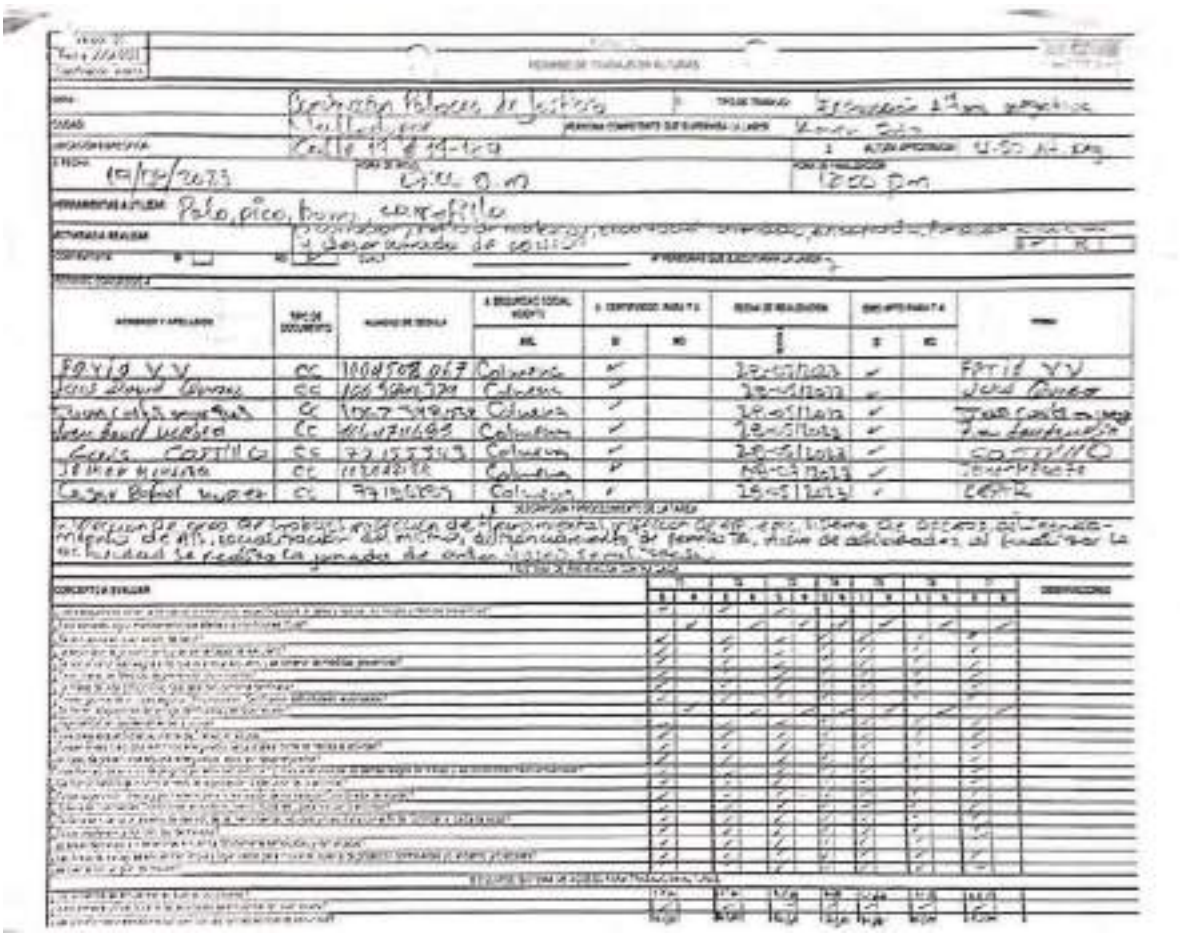


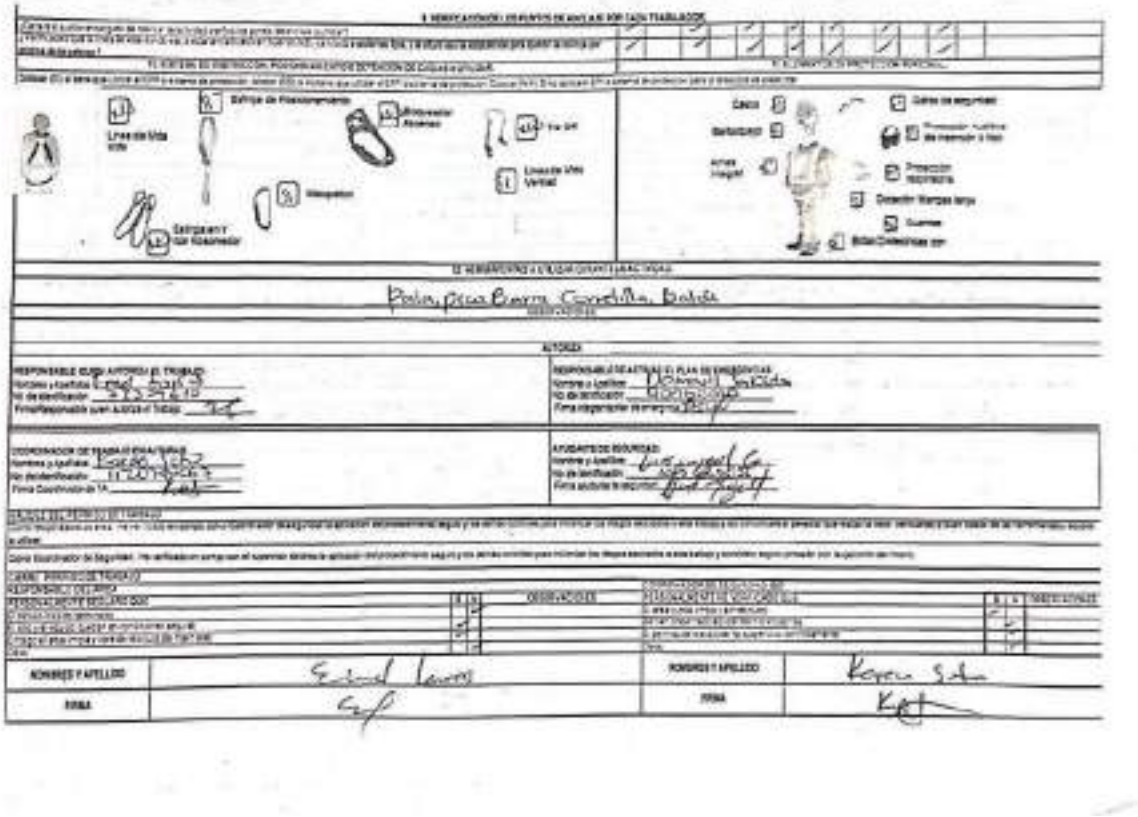


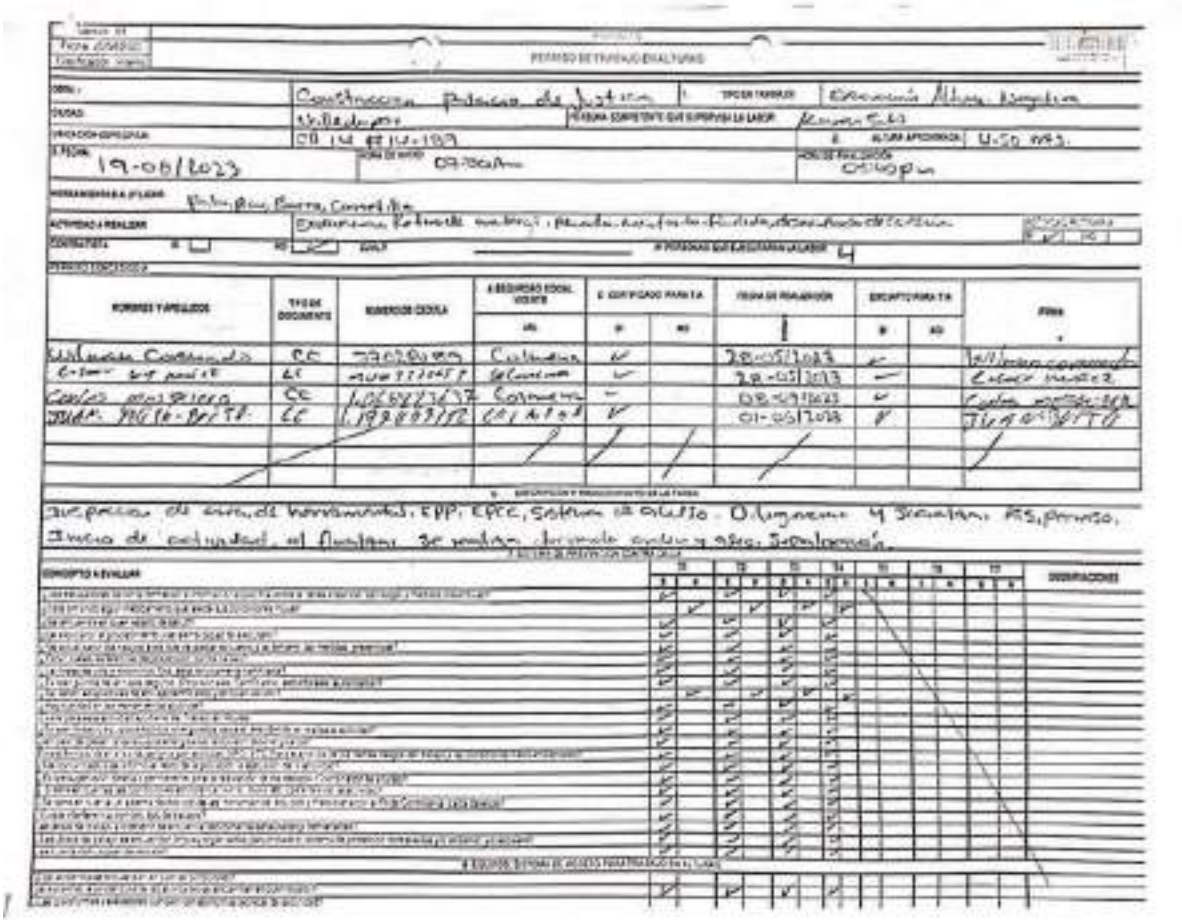


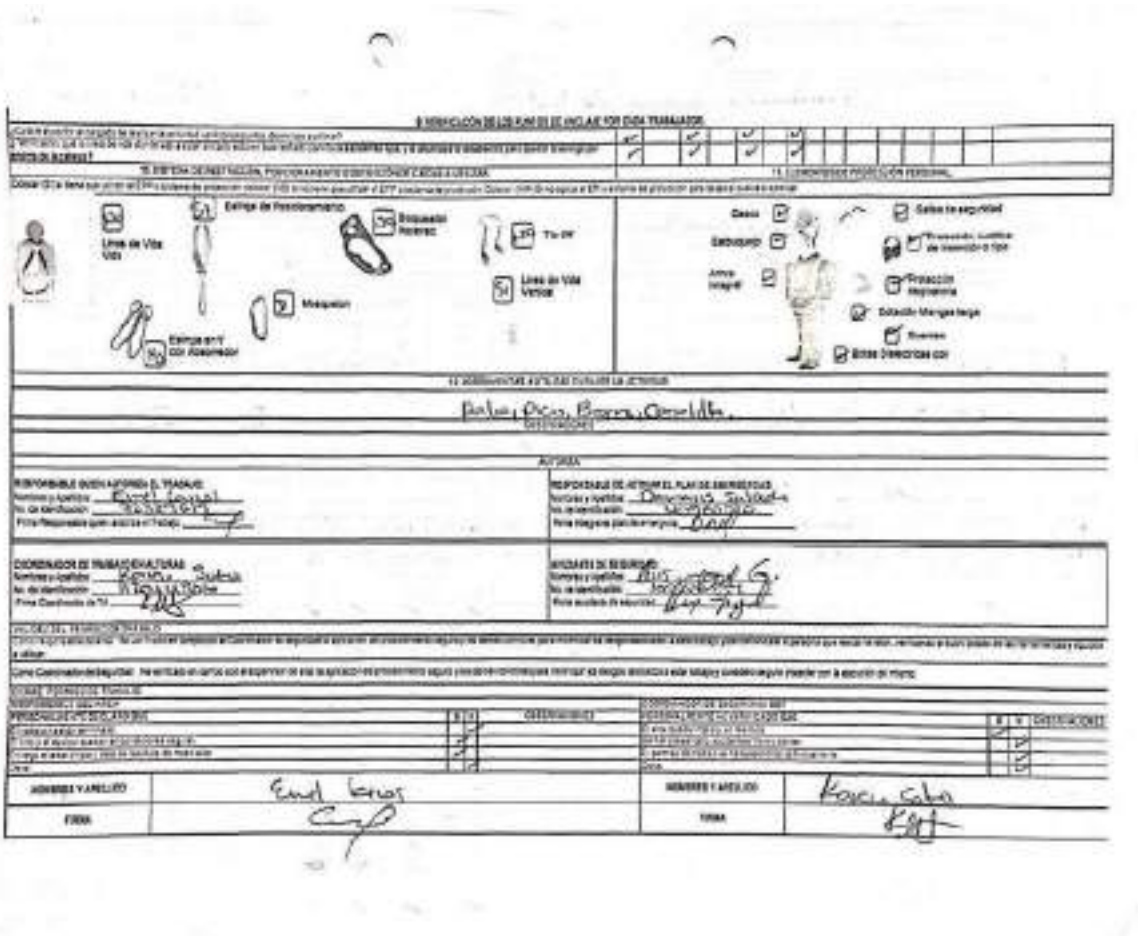


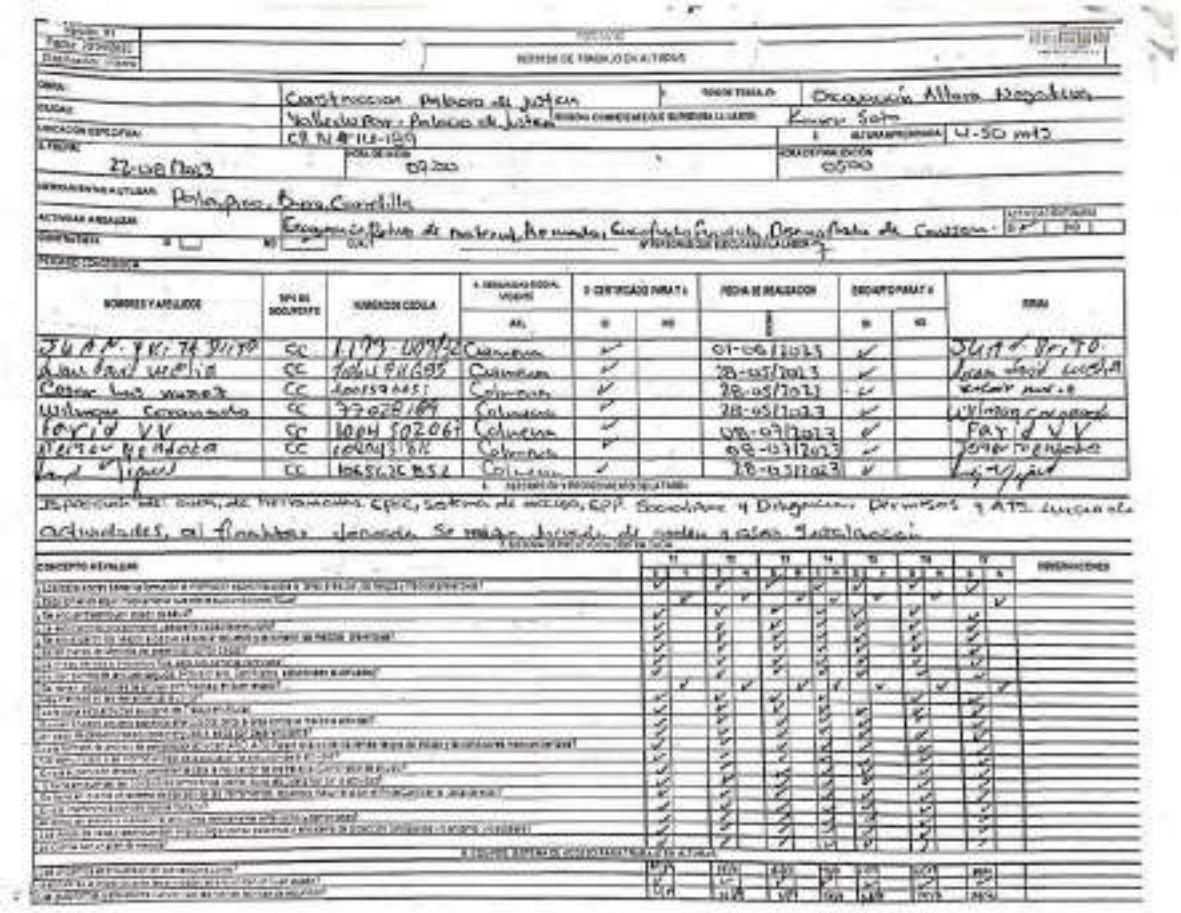


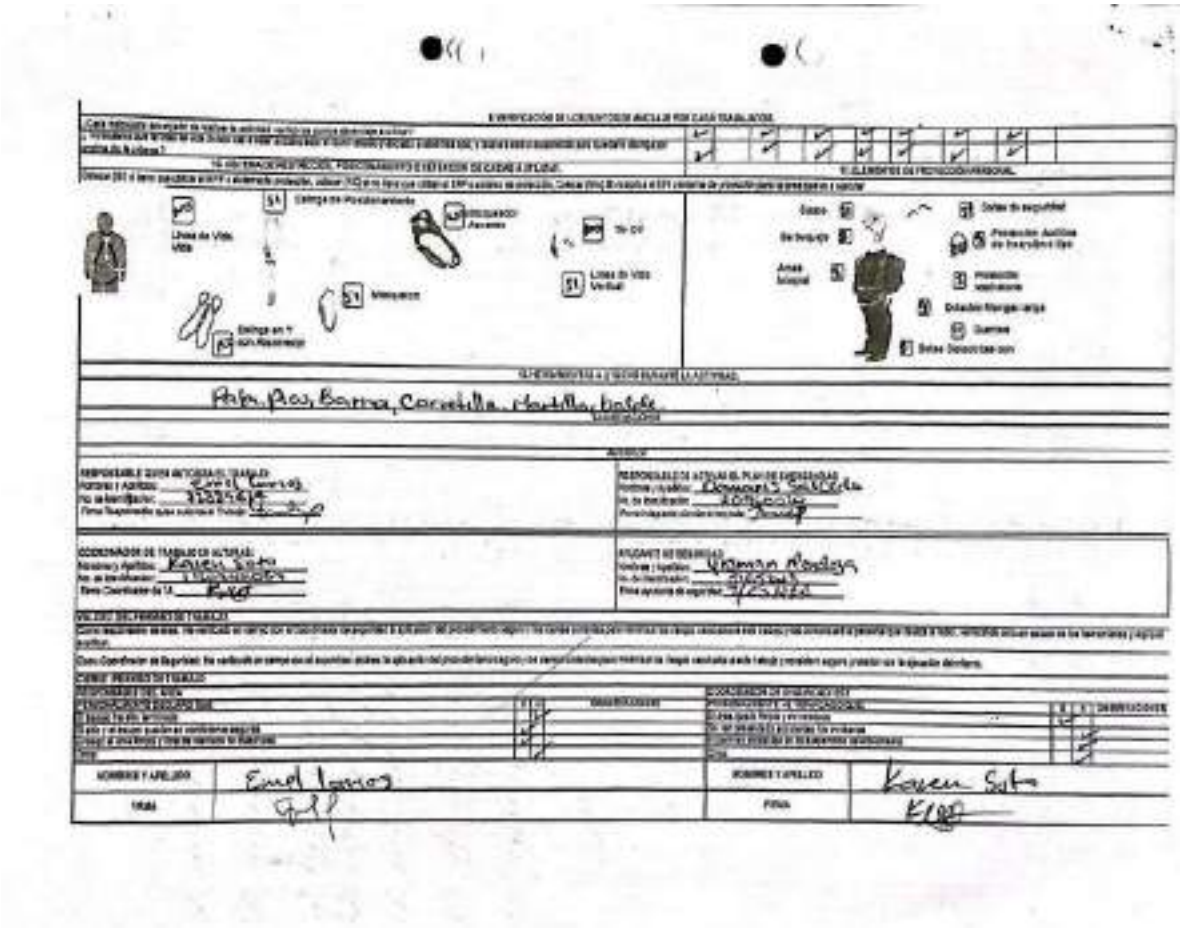


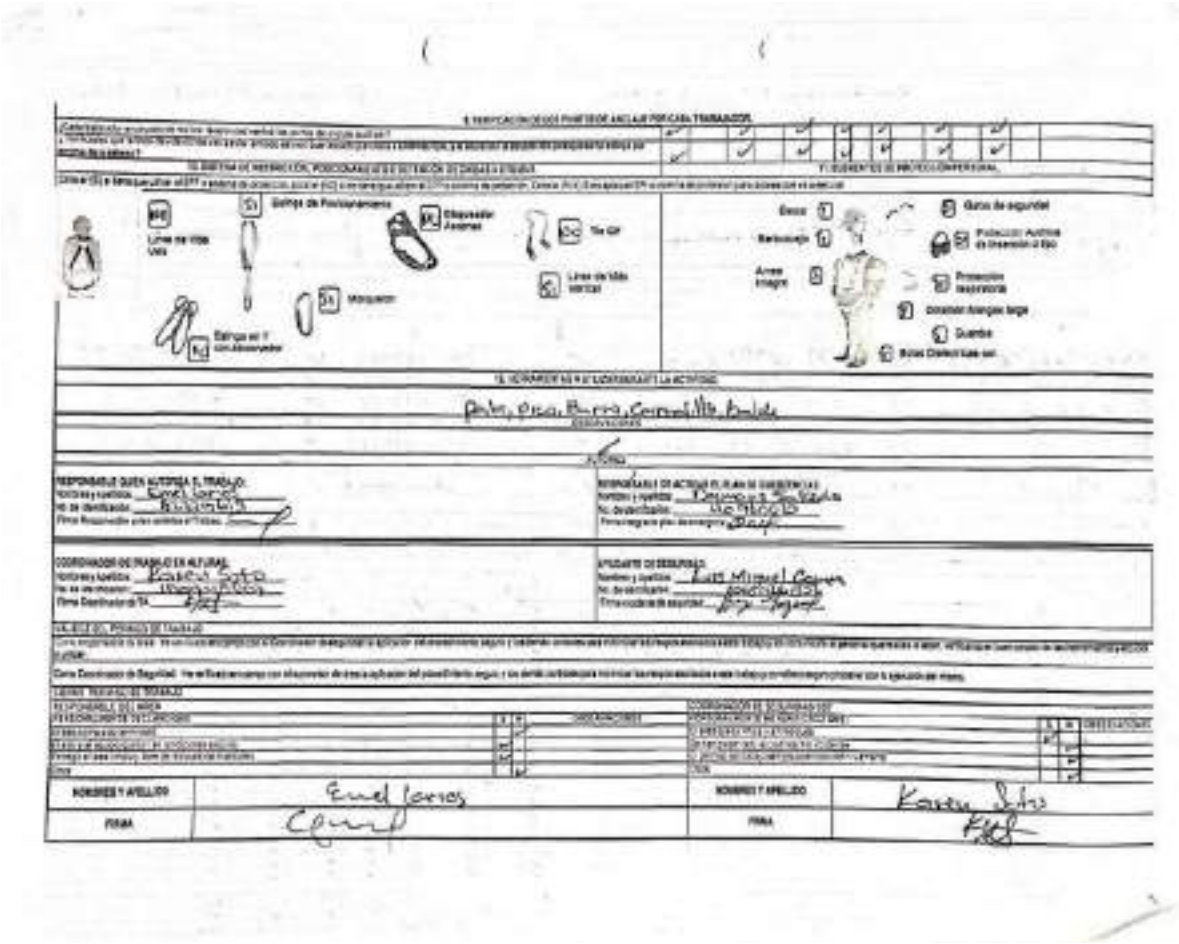


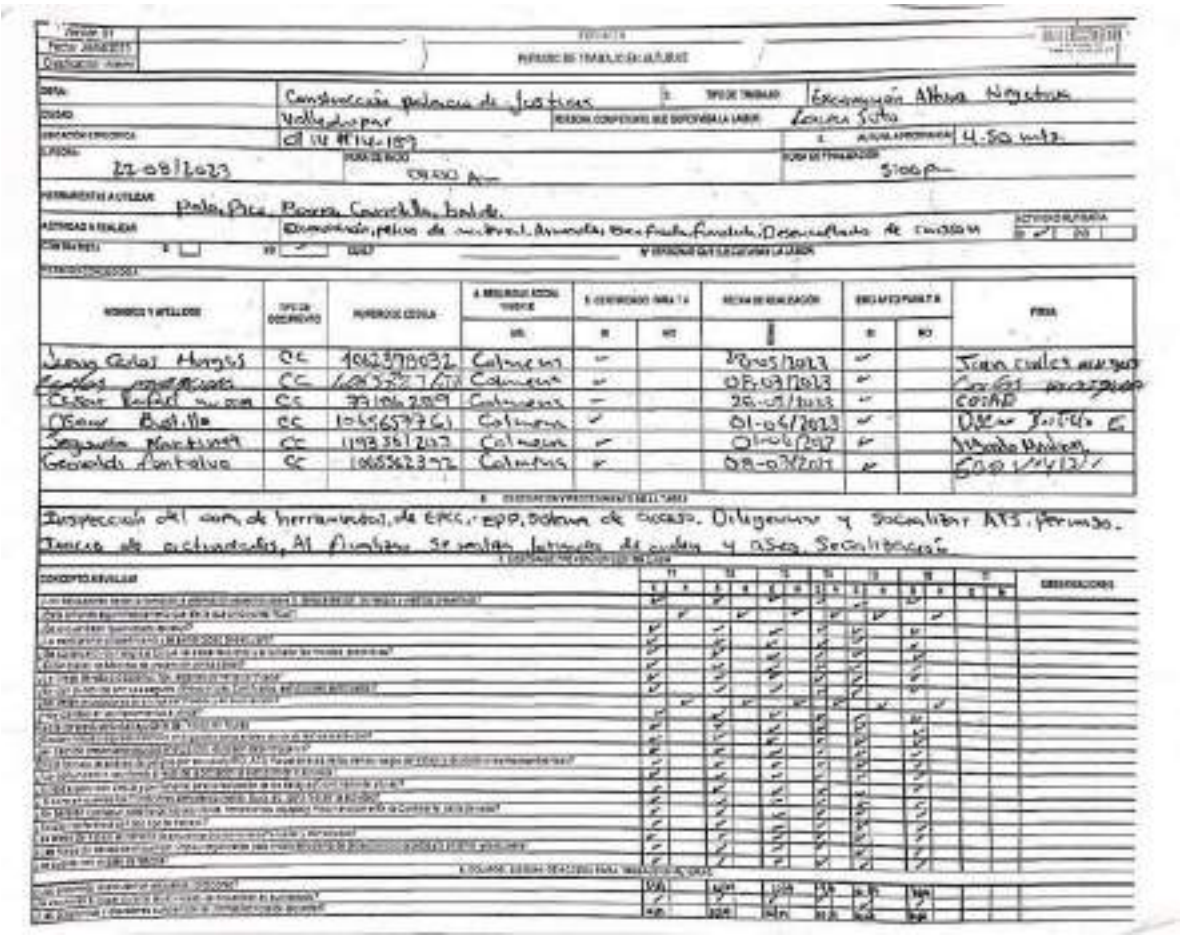


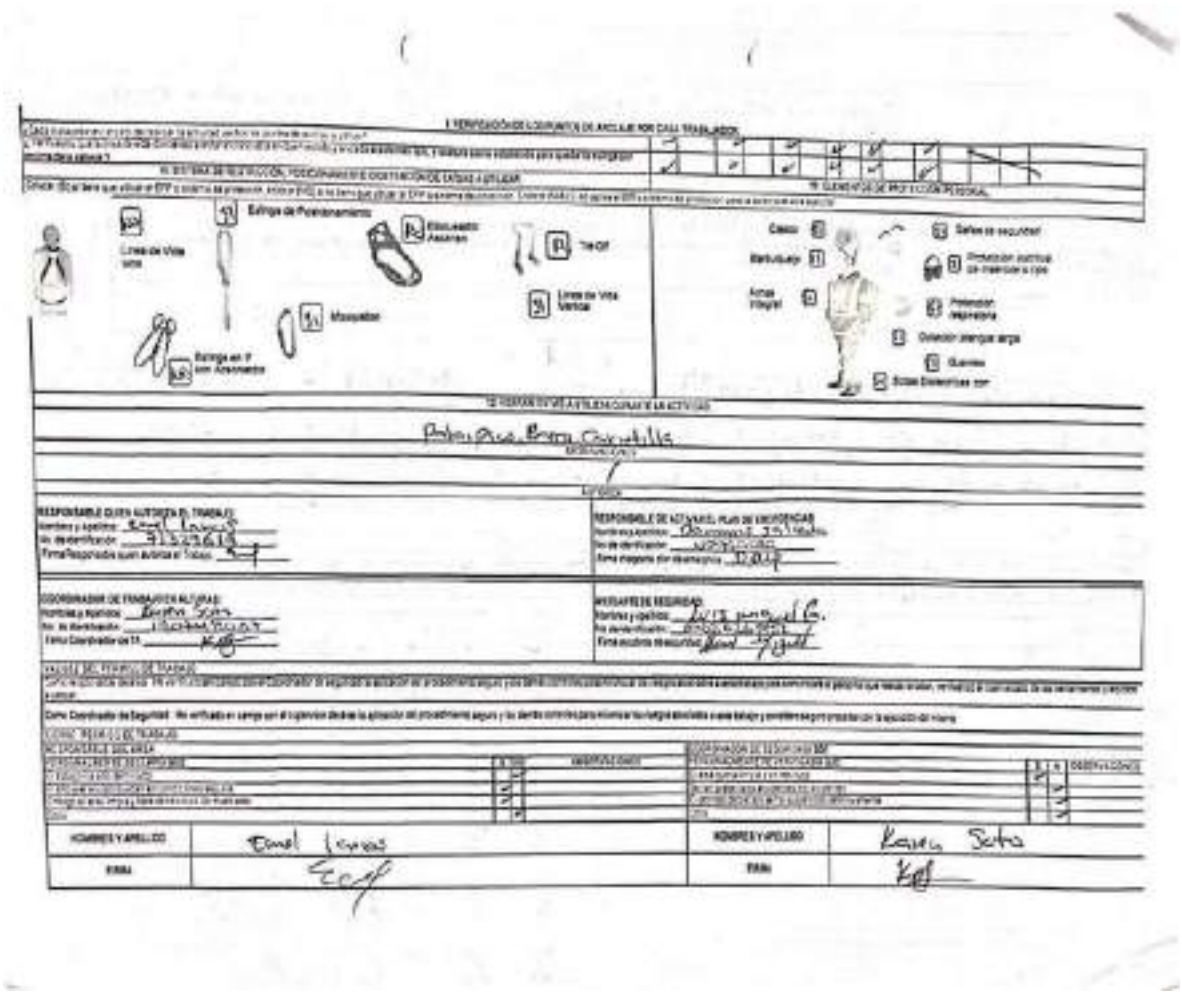


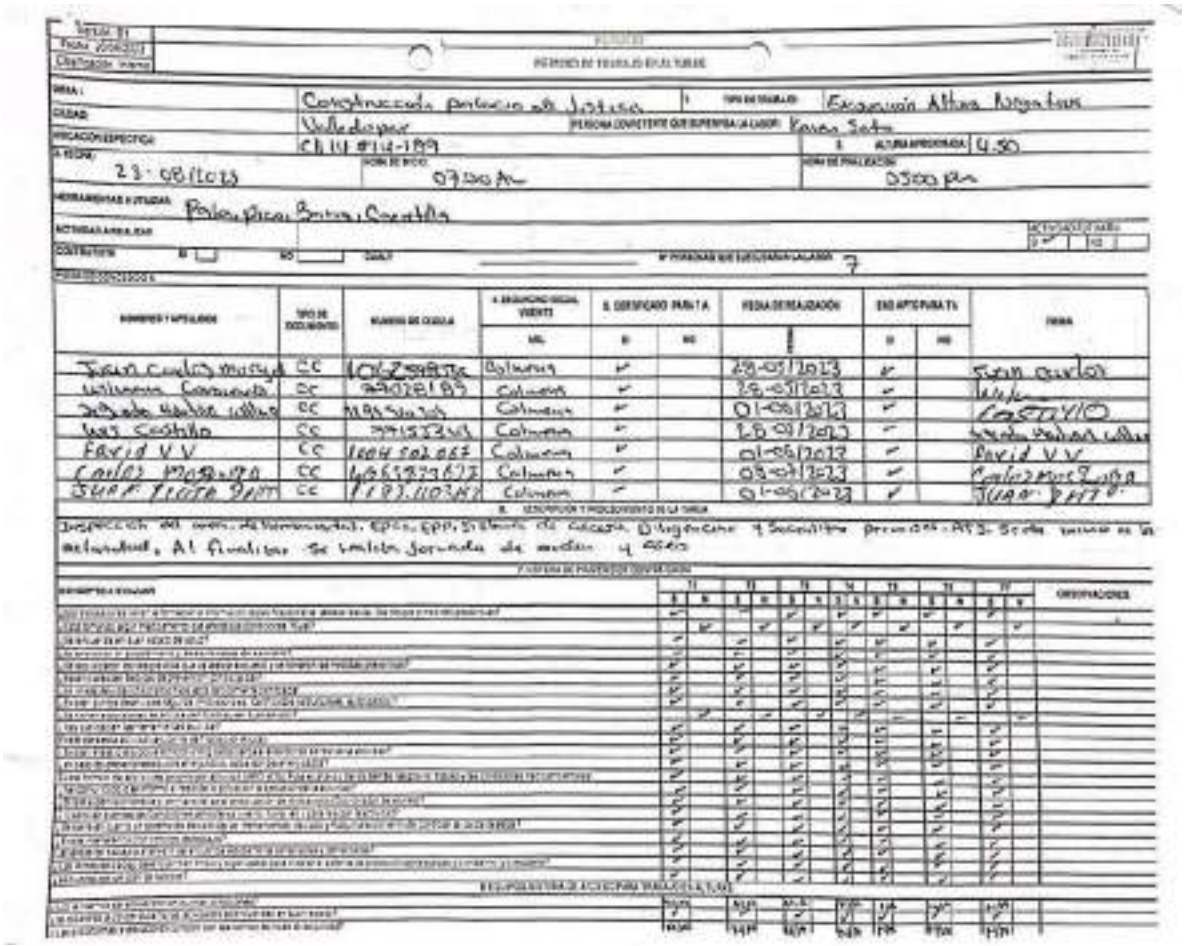


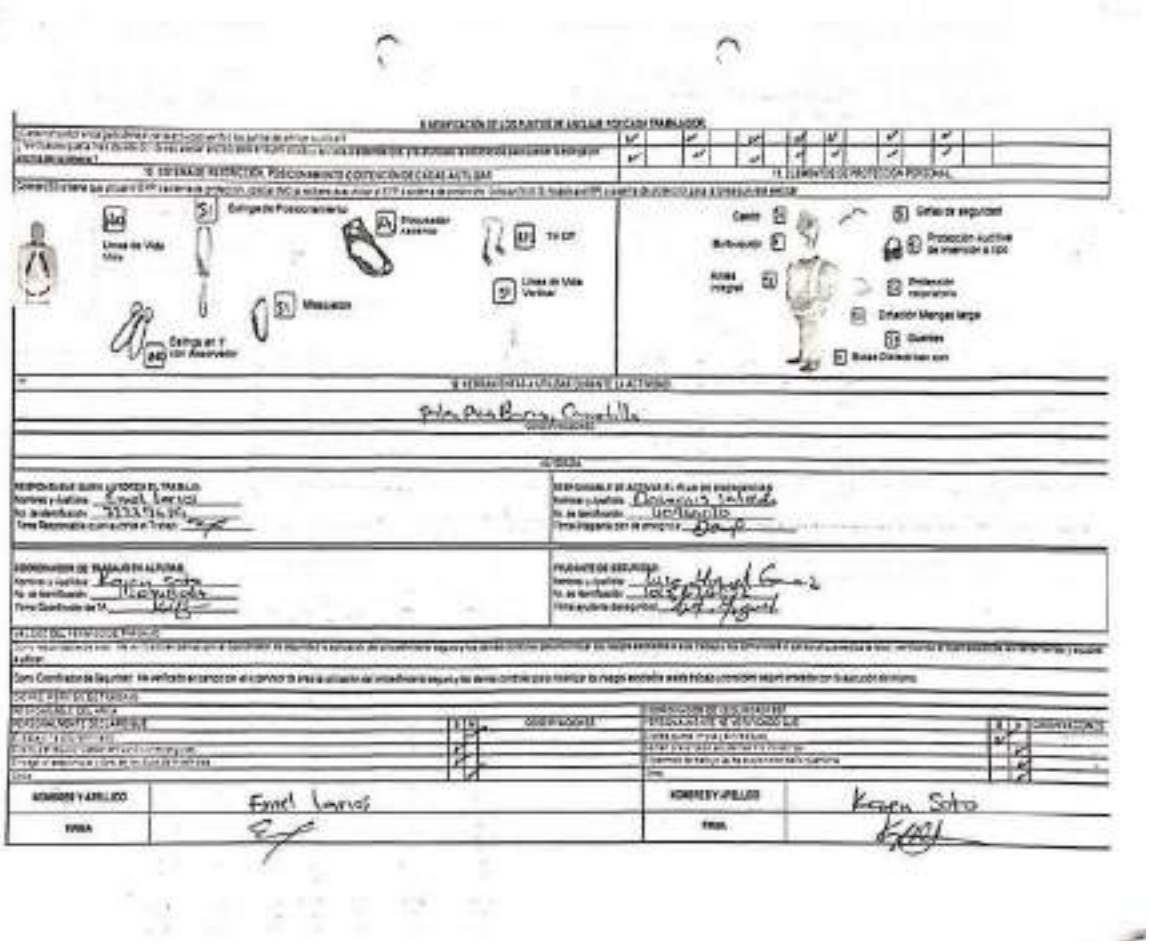

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Horizontal
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Botas de seguridad
Protección auditiva de inserción a ODO
Protección respiratoria
Overol Manga larga
Guantes
Ángel Barrios Castrillo
Ángel Barrios
Karen Soto
Karen Soto

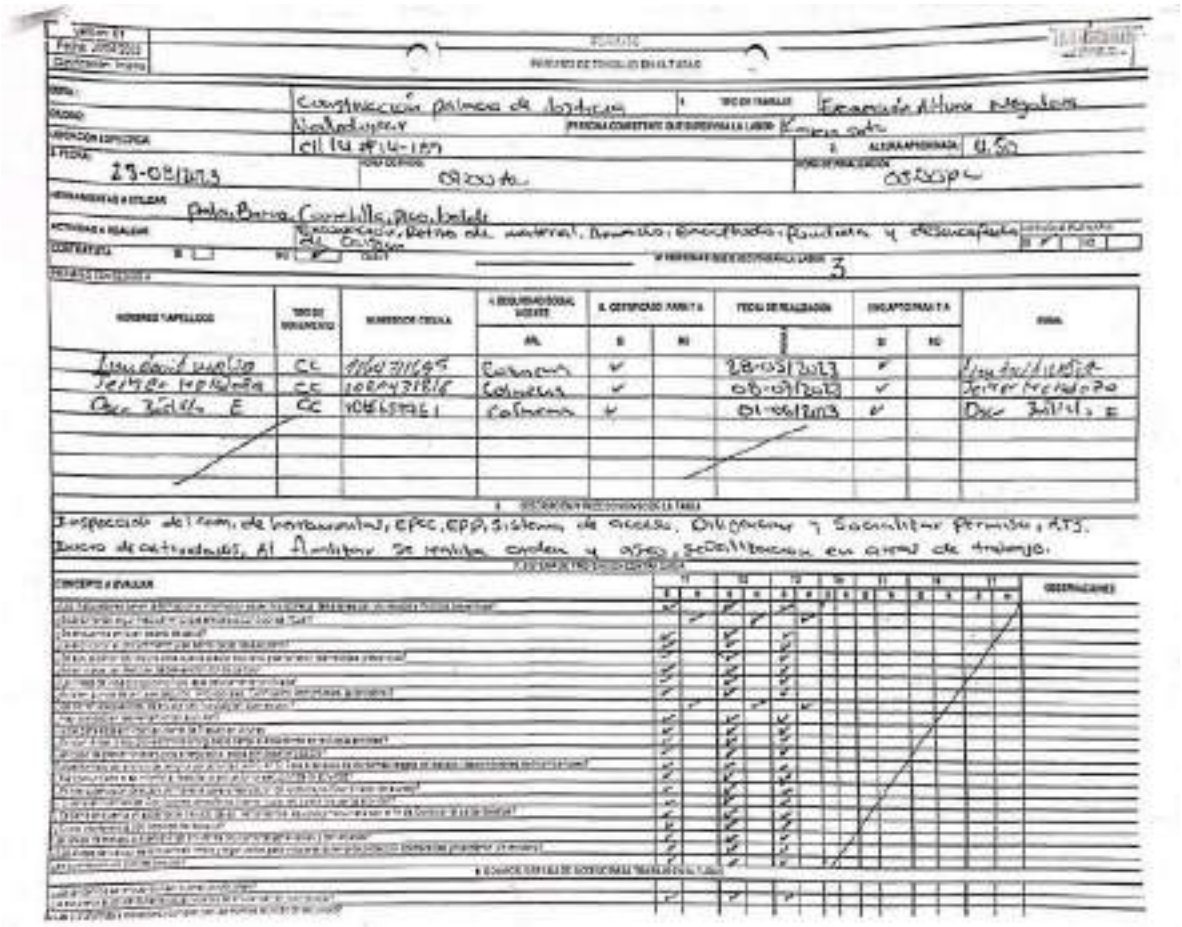


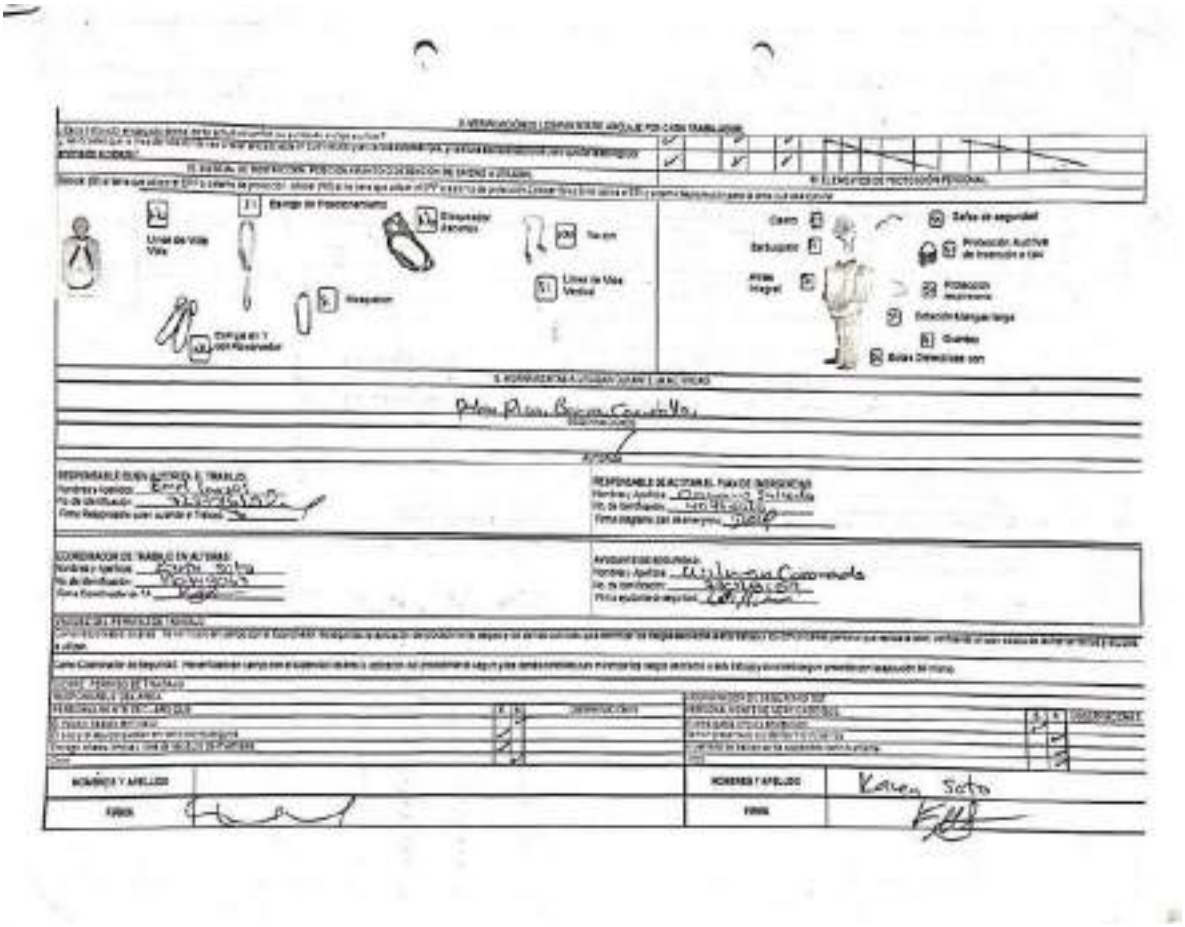

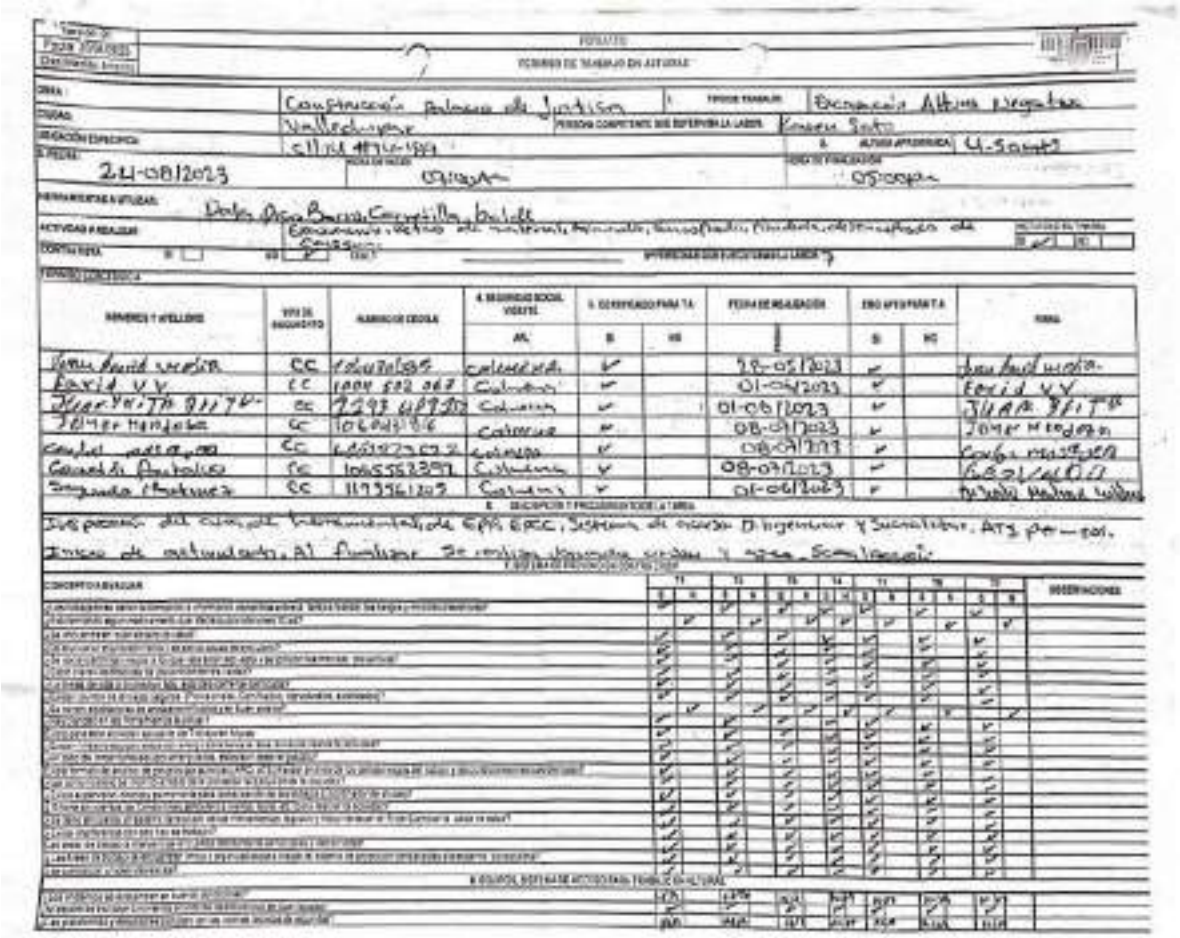

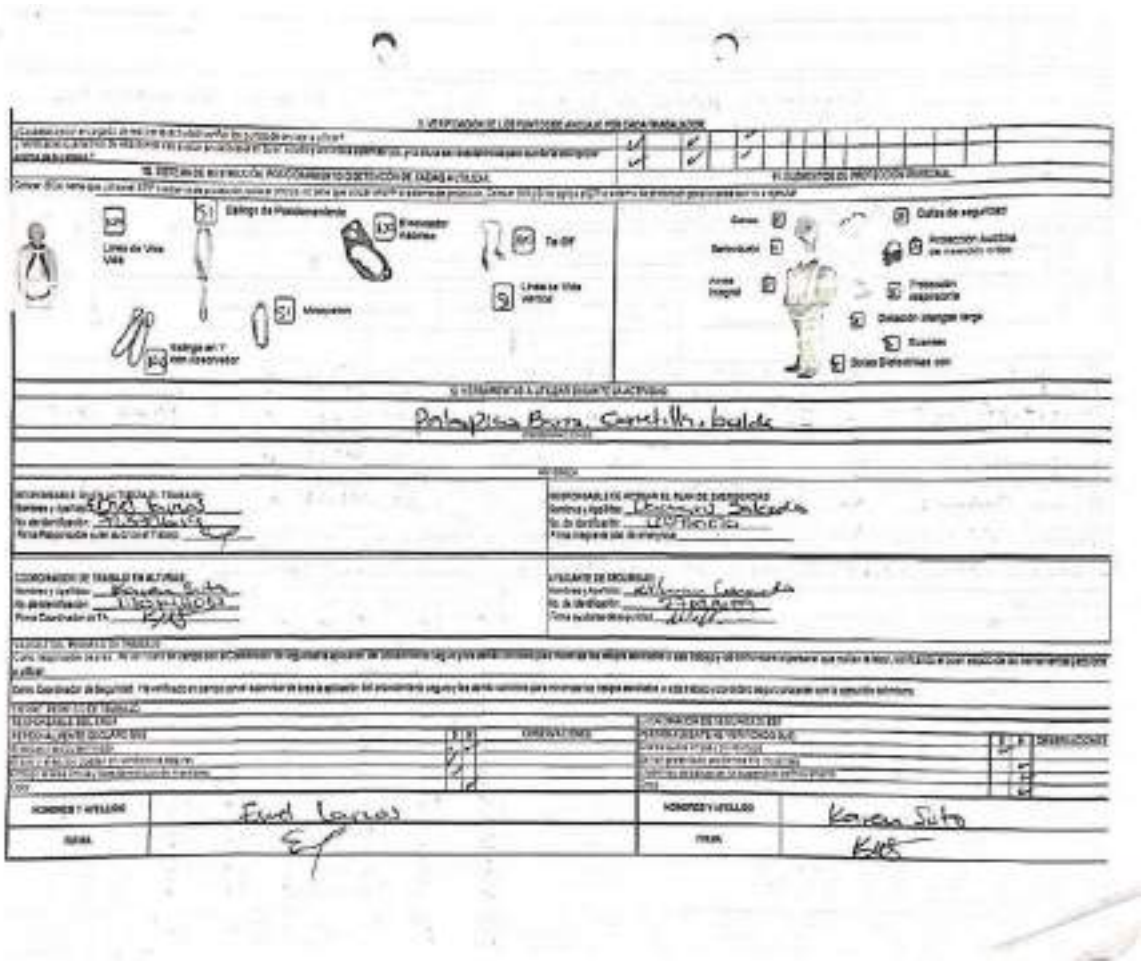

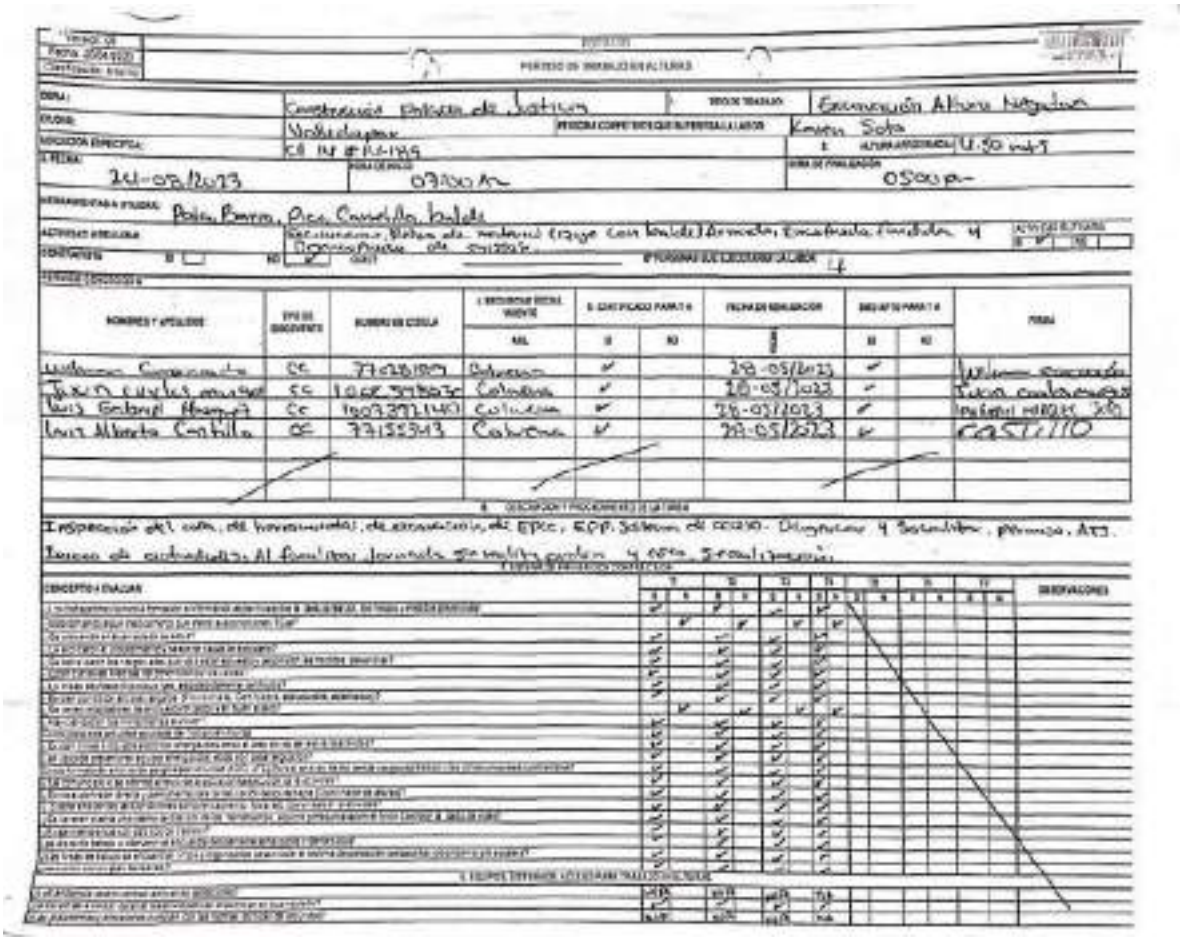

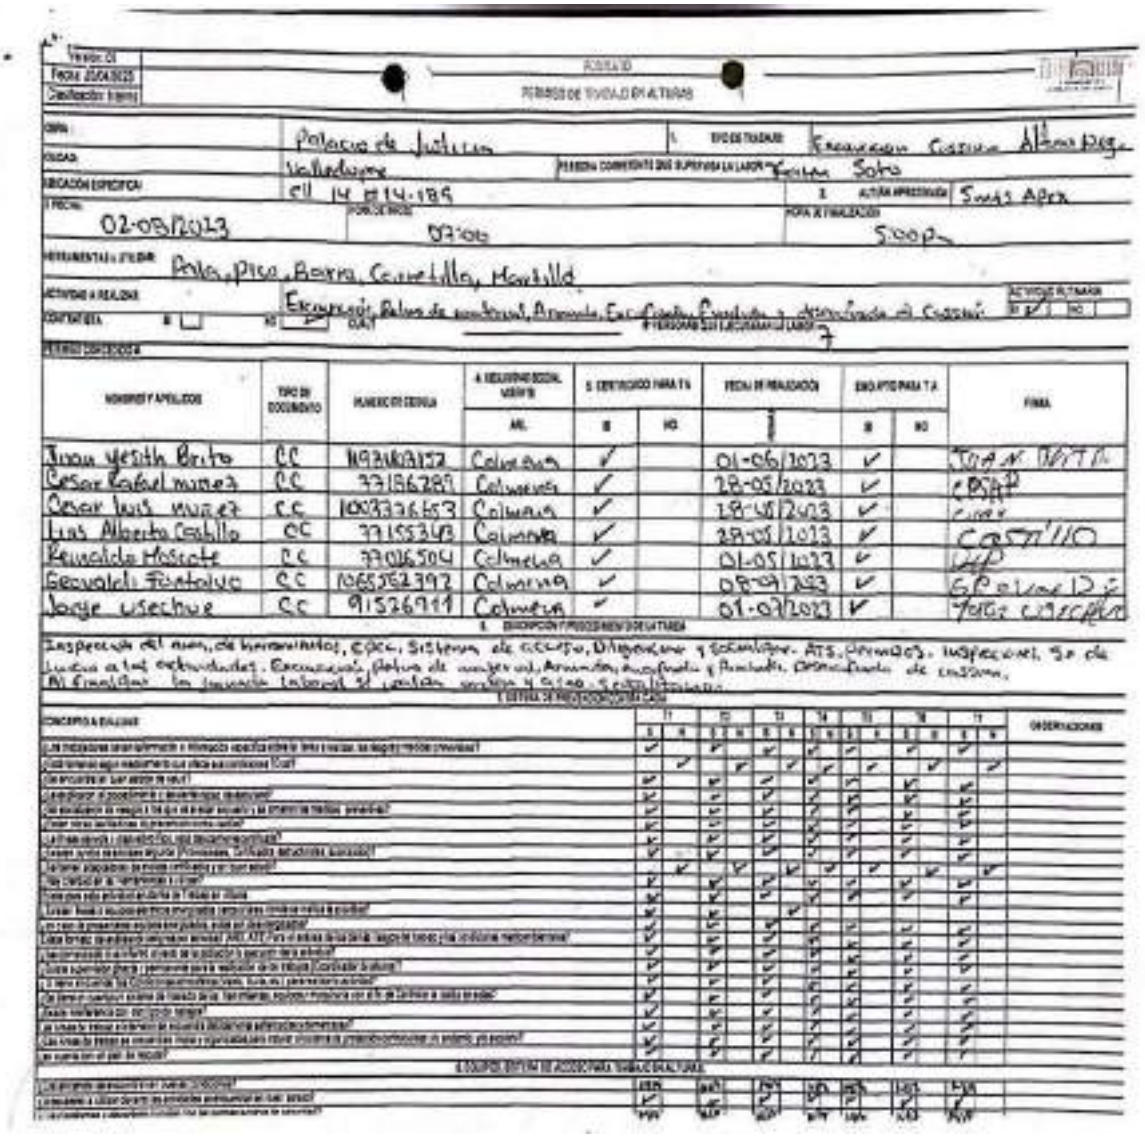

Versión: 01
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

REPORTE DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Palacio de Justicia
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189
FECHA: 02-05-2023
HORA DE INICIO: 07:00
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00p.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Polea, Pisa, Barra, Cuerdilla, Mosquetón
ACTIVIDAD A REALIZAR: Encerramiento, Retiro de escombros, Armando, Enrejado, Pintando y desarmando el Cerramiento
ESPACIO CERRADO: SI [ ] NO [X]
CUAL:
EMPRESA CONTRATISTA: Swiss Aplex
ACTIVIDAD ALTAMAR: SI [X] NO [ ]
PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO: 7


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	ENTRENADO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1193463177	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN BRITO
Cesar Rafael munoz	CC	77156289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CRSAP
Cesar luis muñoz	CC	1003336453	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CLMR
Luis Alberto Cebillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Hoyos	CC	77016504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		HHP
Gerardo Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		02-05/2023	✓		GFontalvo
Jorge Useche	CC	91526911	Colmena	✓		01-07/2023	✓		JORGE USECHE


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección del area, de herramientas, EPCC, Sistema de acceso, Diligencian y socializan ATS, Permisos, Inspeccionar, Se da Inicio a las actividades. Encerramiento, Retiro de escombros, Armando, Enrejado y Pintando, Desarmando de cerramiento. Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo. Se retiran todos


LISTA DE VERIFICACIÓN


CONCEPTOS A EVALUAR	1		2		3		4		5		6		7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Las indicaciones son claras y precisas para la ejecución de la tarea?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el equipo de protección personal requerido para la tarea?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

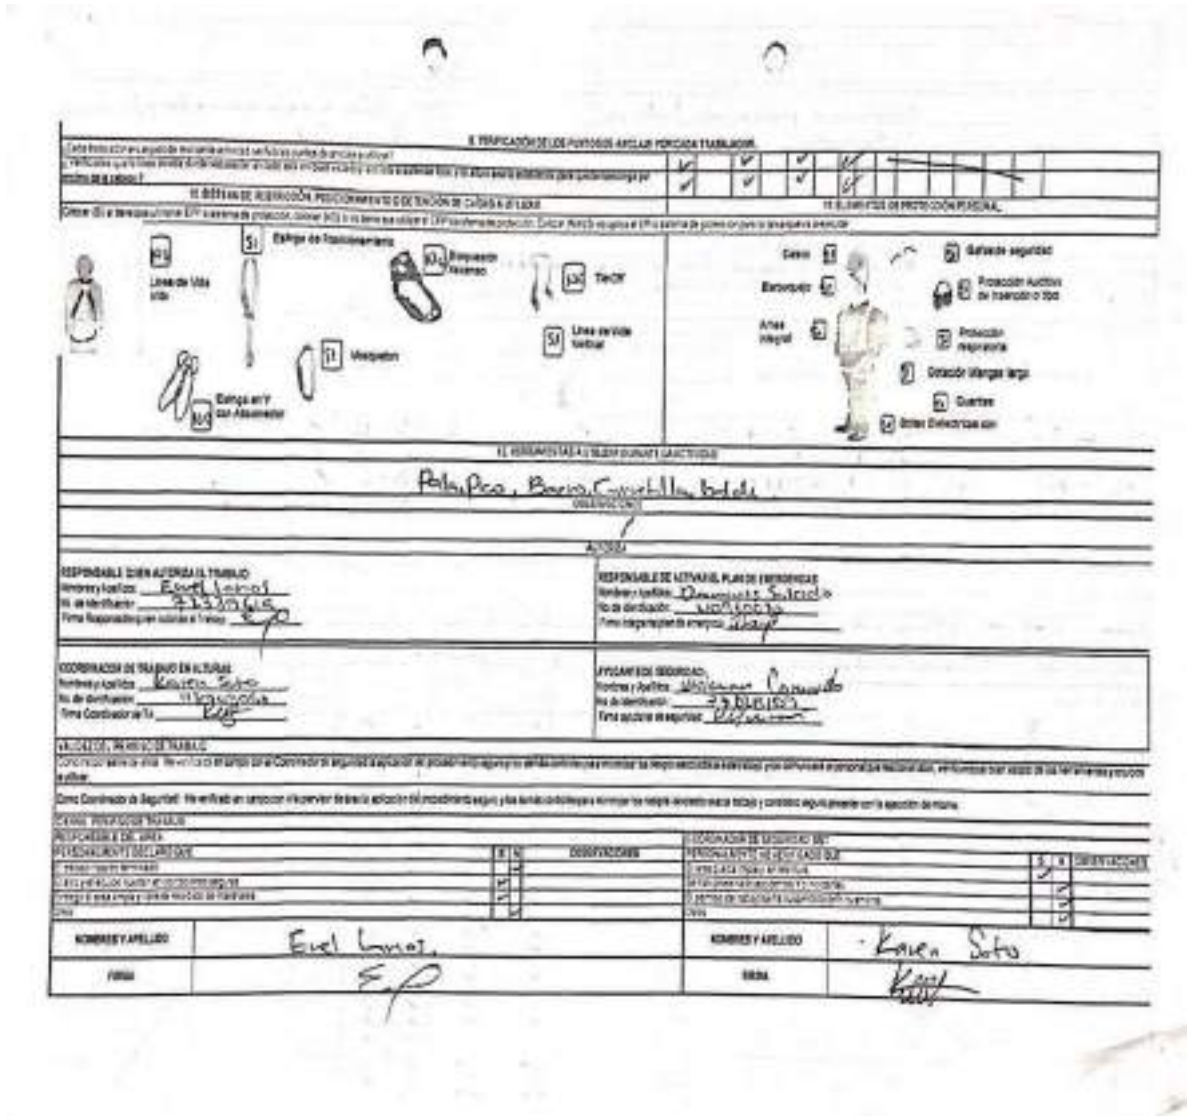


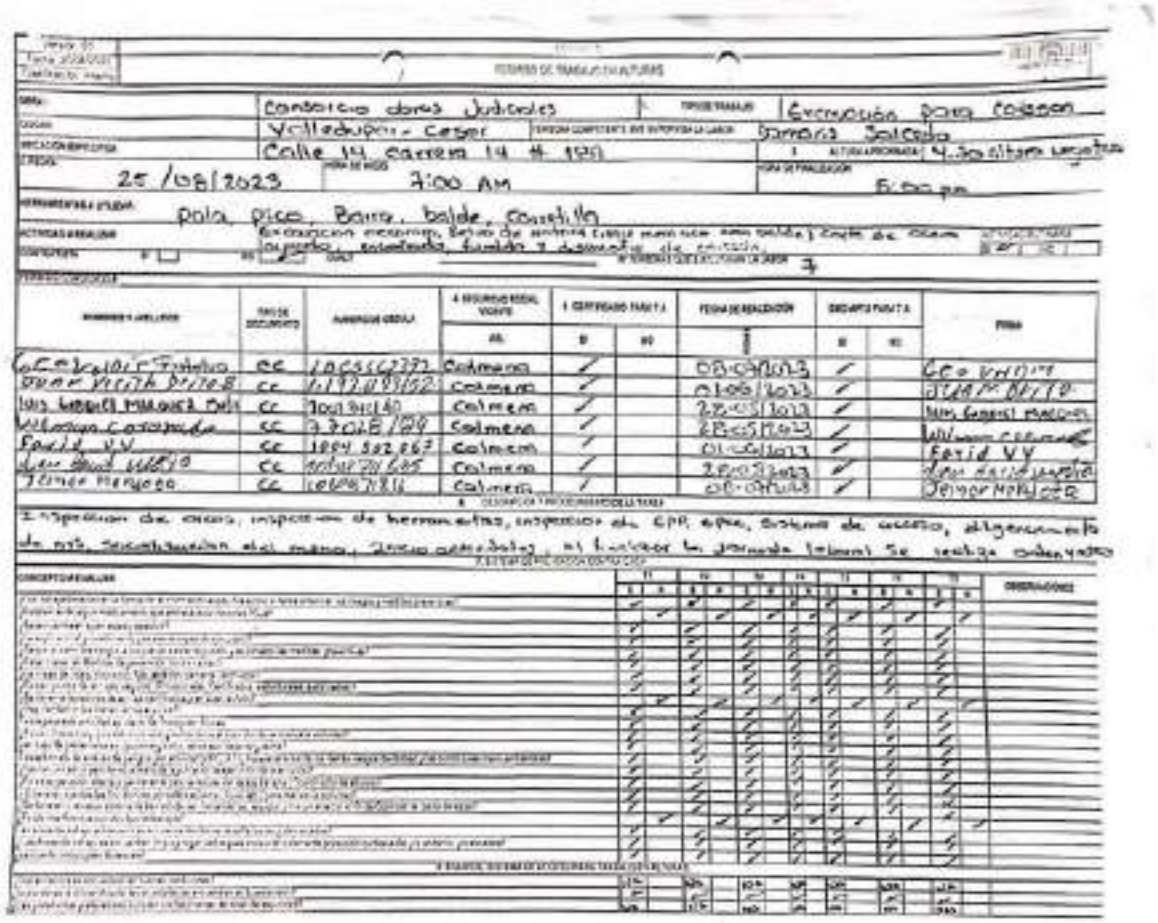

Consorcio obras Judiciales — Ejecución para reclusión
Villeduque - Cesar — Semana Solicita
Calle 14 carrera 14 # 19A
25/08/2023 — 7:00 AM — 5:00 pm
pala, pico, Barra, balde, carretilla

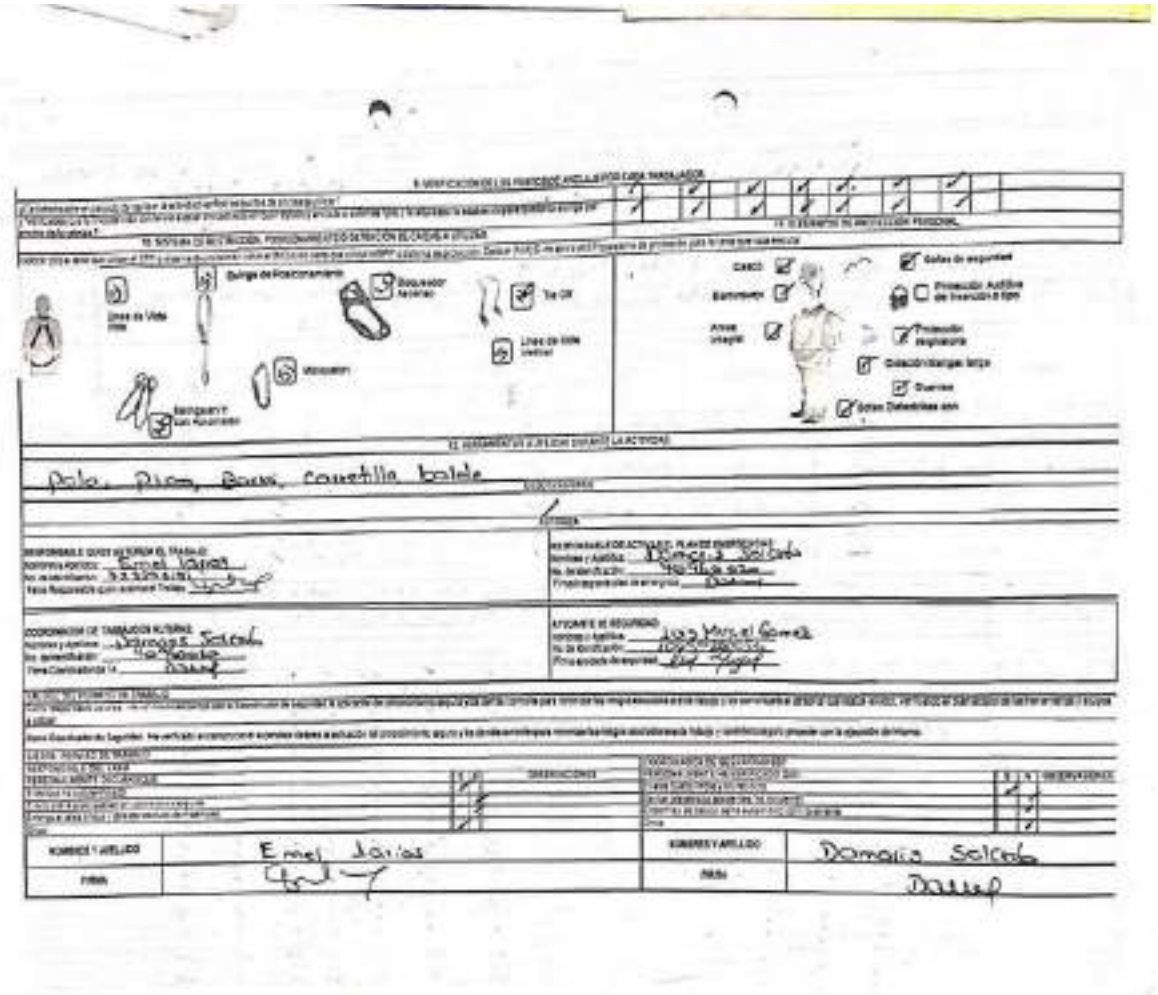
Eduar Rios, Bairo, Castillo Valdes
Emel Jaimes
Domaica Salcedo

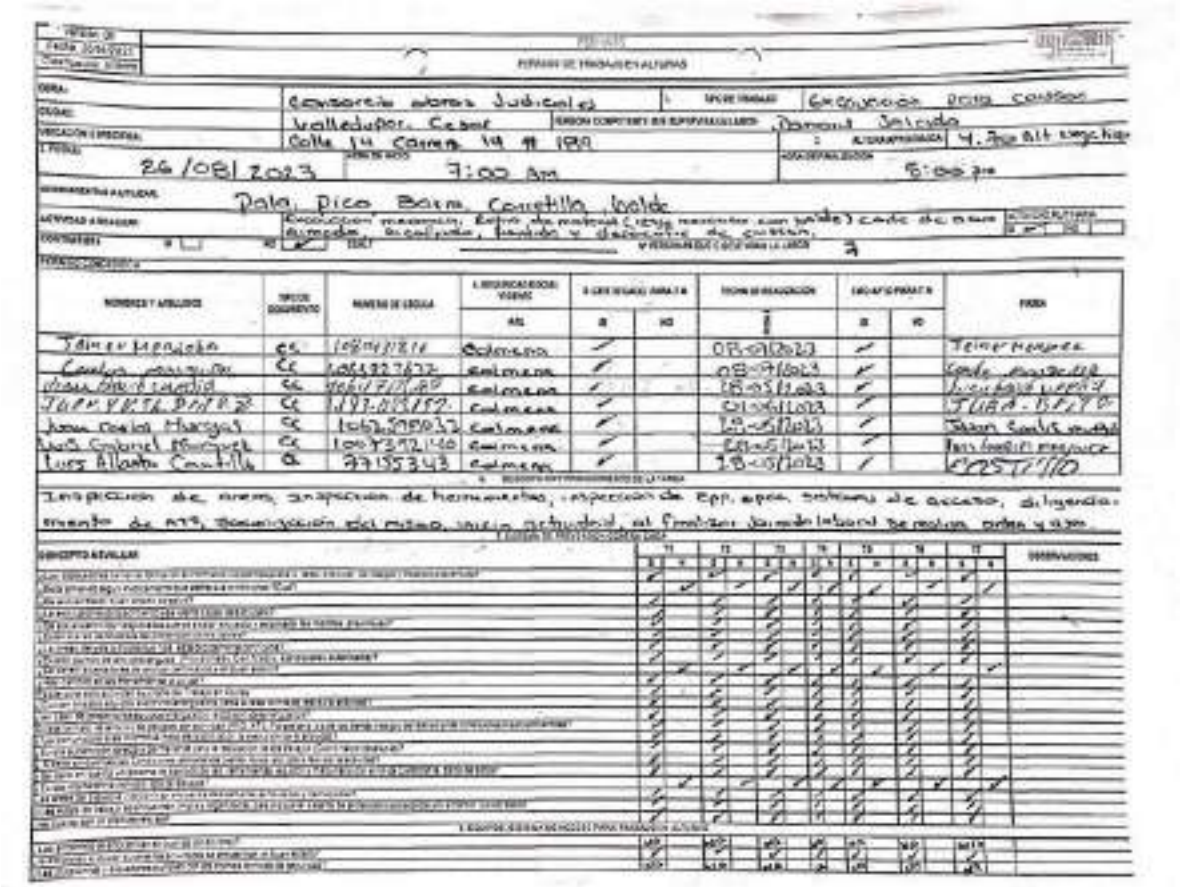


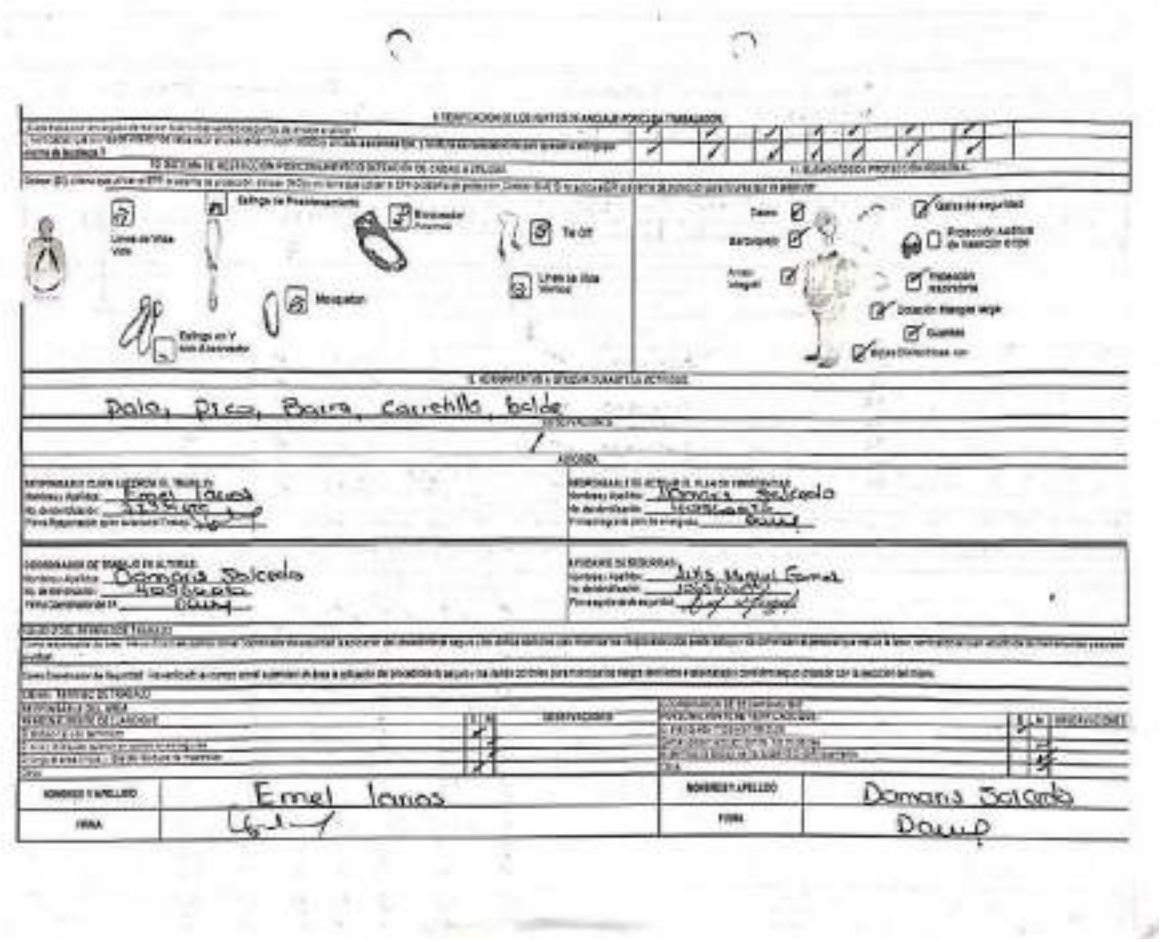



Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde


Emel Ianos

Damaris Salcedo

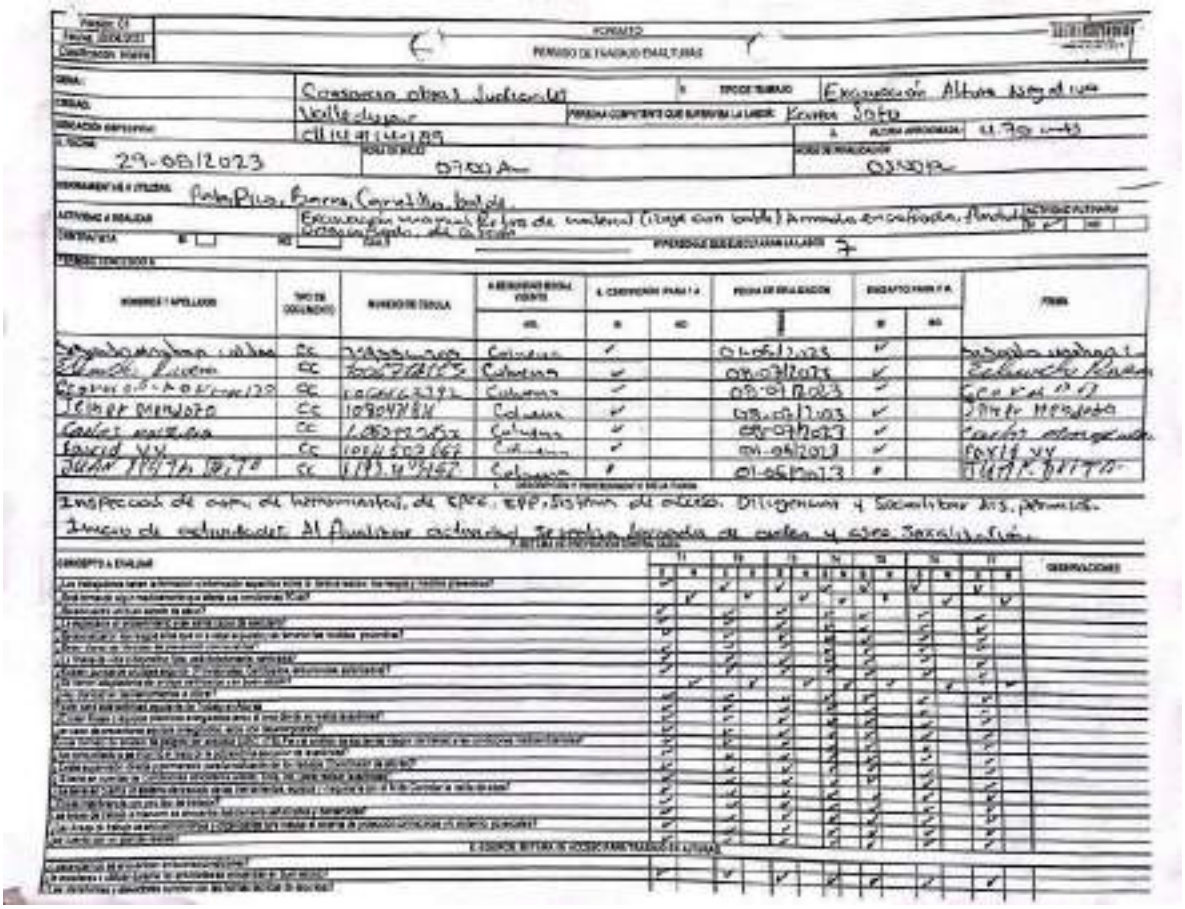

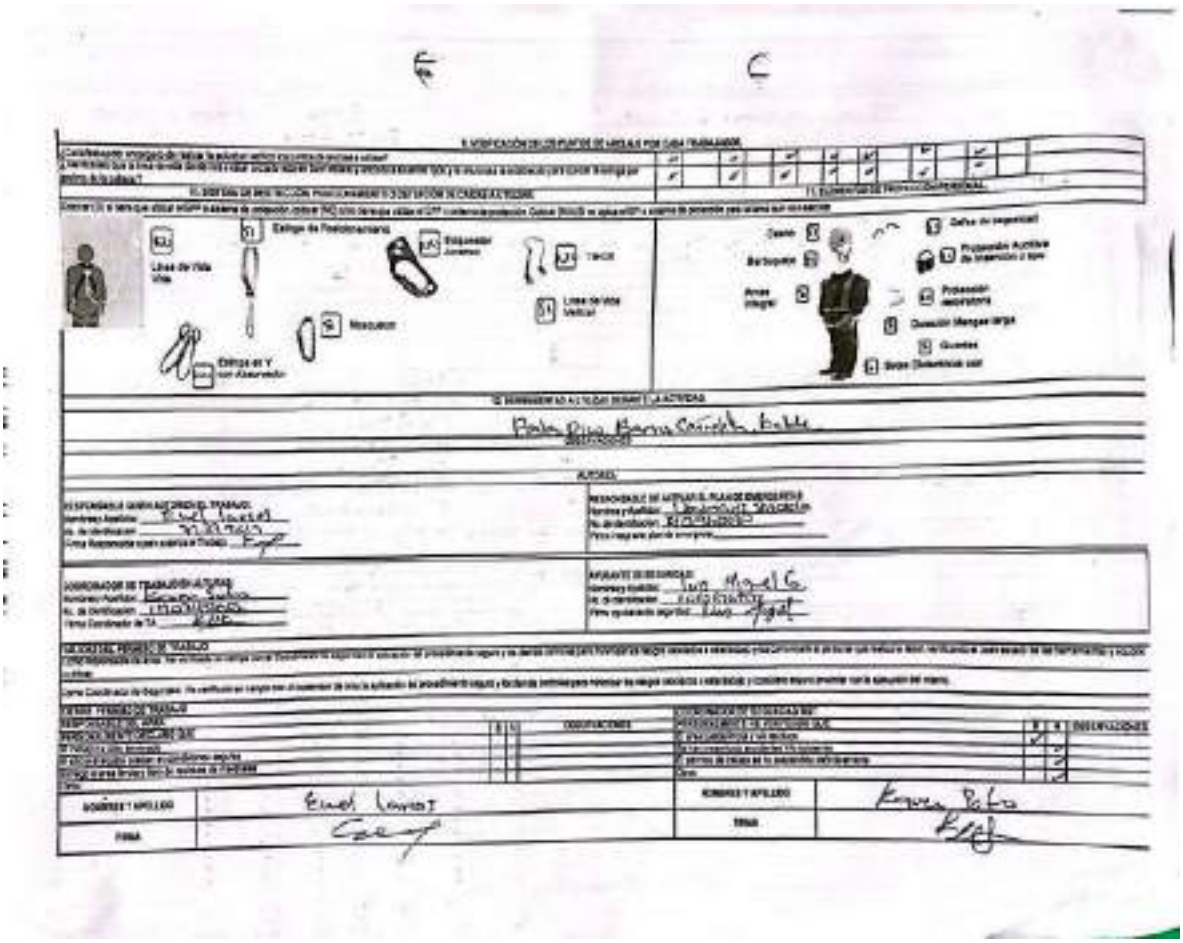

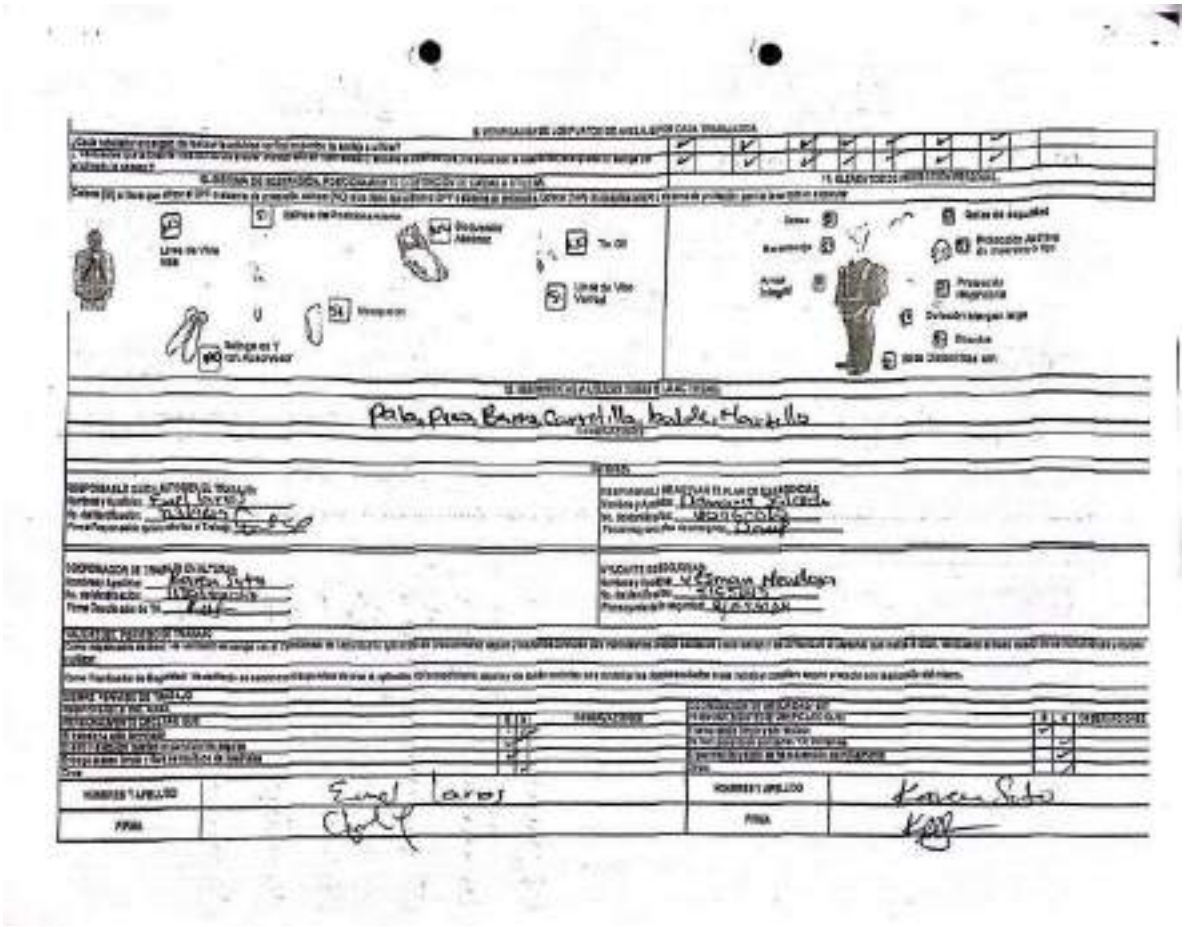


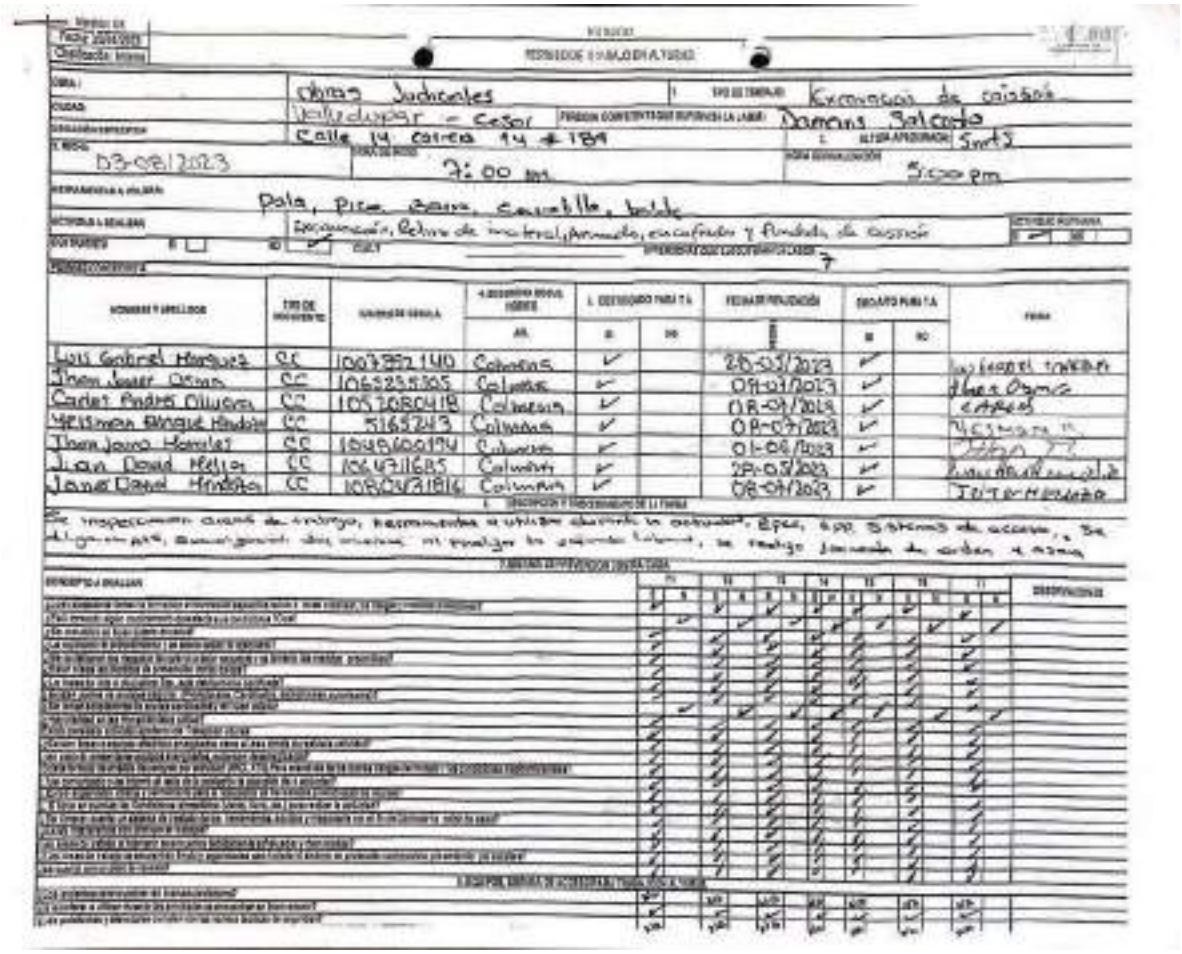

Obras Judiciales — Valledupar – Cesar — Excavación de cimiento
Calle 14 carrera 14 # 189 — Damaris Salcedo
03-08-2023 — 7:00 am — 5:00 pm
Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde
Excavación, Retiro de material, Armado, encofrado y Fundida de cimentación

NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	EQUIPO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	ENTREGO PARA T.A		FIRMA
				SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1003892140	Colaborador	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Ospino	CC	1065235305	Colaborador	✓		01-03/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1053080418	Colaborador	✓		01-03/2023	✓		
Yeisimen Enrique Hinojosa	CC	51652413	Colaborador	✓		01-03/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1064960194	Colaborador	✓		01-03/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064911685	Colaborador	✓		28-03/2023	✓		
Jaime David Hinojosa	CC	1065243816	Colaborador	✓		08-03/2023	✓		

Se inspeccionan cuando de trabajo, recomendado a utilizar elementos de protección: Epps, epp, Sistema de acceso, se Algunos epp, Buena gestión del riesgo, se realizo los exámenes laborales, se realizo jornada de orden y aseo

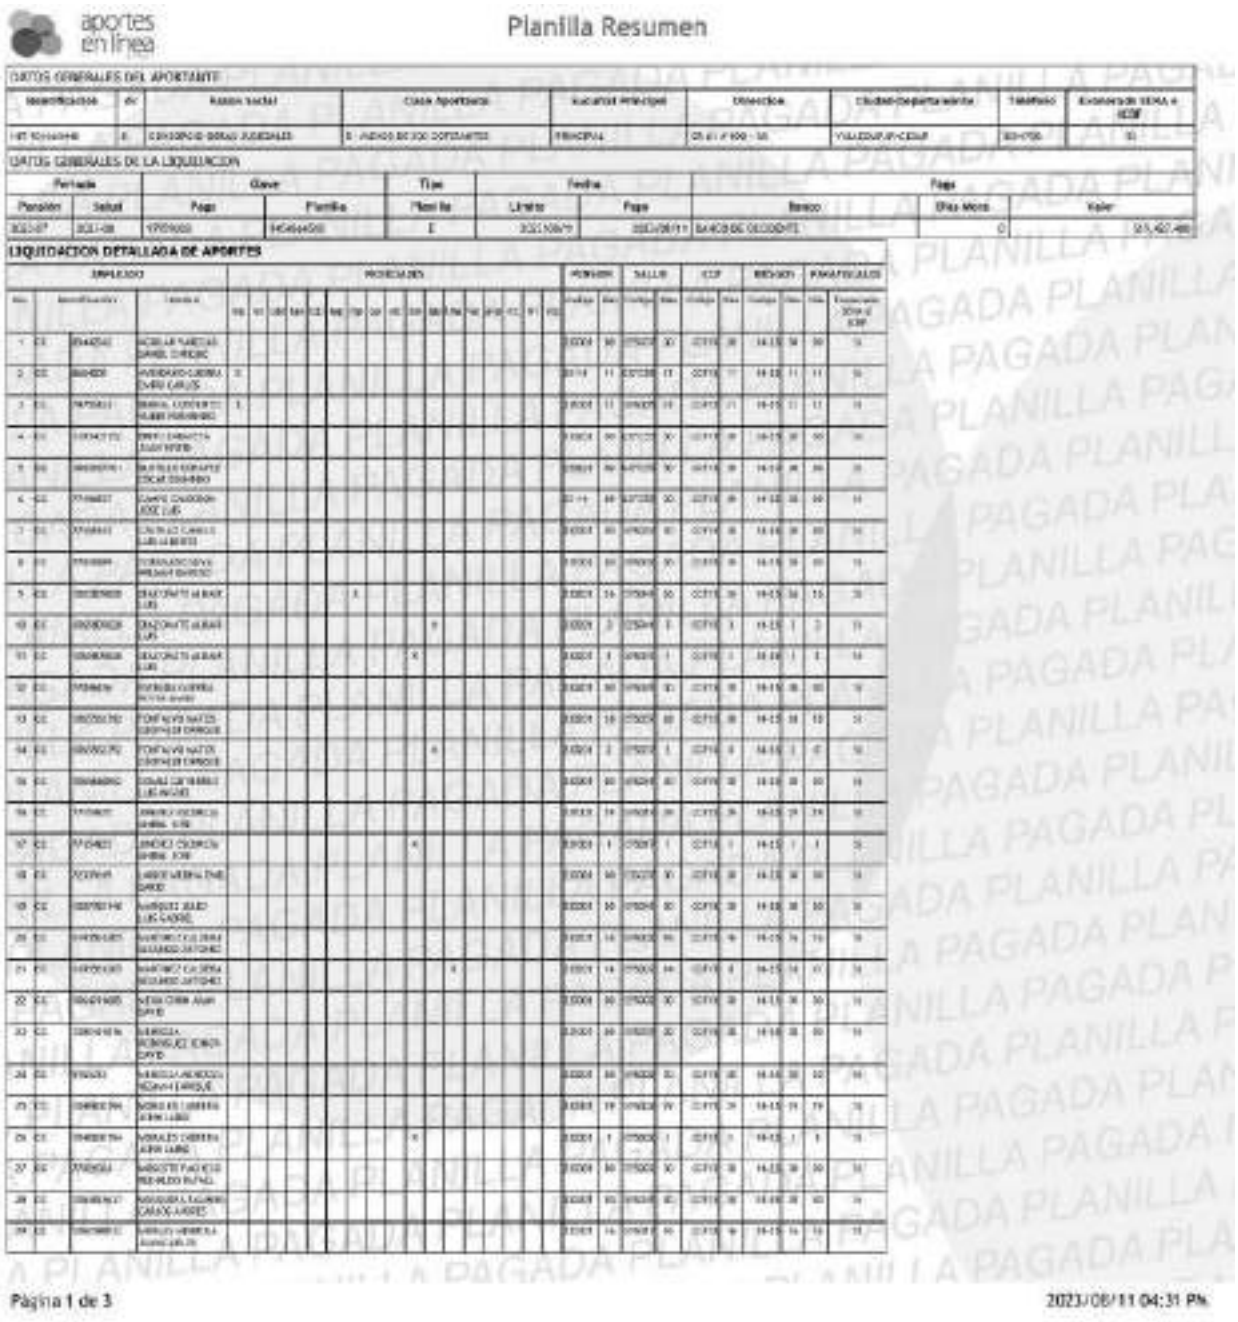

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665448	8	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	3 - APORTES DE 500 DEPENDIENTES	PRINCIPAL	CR 61 # 80 - 51	VALLEDUPAR-CESAR	5894706	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	1970-01-01	945644500	E	2023/08/11	2023/08/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,407,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION		SALUD		ICBF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LR	PRN	VAC	VTE	VTS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LR	PRN	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Días	Valor Aportes SENA e ICBF
1	CC	1144...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
2	CC	8640...	3																								0.0114	11	07020	11	02210	11	14-15	11	11	16
3	CC	7975...	1																								0.0004	11	07020	11	02210	11	14-15	11	11	16
4	CC	1193...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
5	CC	1065...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
6	CC	7916...																									0.0114	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
7	CC	7916...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
8	CC	7916...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
9	CC	1065...																									0.0004	16	07020	16	02210	16	14-15	16	15	16
10	CC	1065...																									0.0004	3	07020	3	02210	3	14-15	3	3	16
11	CC	1065...																									0.0004	1	07020	1	02210	1	14-15	1	1	16
12	CC	7916...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
13	CC	1065...																									0.0004	16	07020	16	02210	16	14-15	16	15	16
14	CC	1065...																									0.0004	2	07020	1	02210	1	14-15	1	0	16
15	CC	1064...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
16	CC	7916...																									0.0114	19	07020	19	02210	19	14-15	19	19	16
17	CC	7916...																									0.0004	1	07020	1	02210	1	14-15	1	1	16
18	CC	7916...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
19	CC	1065...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
20	CC	1065...																									0.0004	14	07020	14	02210	14	14-15	14	14	16
21	CC	1065...																									0.0004	14	07020	14	02210	14	14-15	14	11	16
22	CC	1064...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
23	CC	1065...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
24	CC	7916...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
25	CC	1065...																									0.0004	19	07020	19	02210	19	14-15	19	19	16
26	CC	1065...																									0.0004	1	07020	1	02210	1	14-15	1	1	16
27	CC	7916...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
28	CC	1065...																									0.0004	30	07020	30	02210	30	14-15	30	30	16
29	CC	1065...																									0.0004	14	07020	14	02210	14	14-15	14	14	16


Página 1 de 3

2023/08/11 04:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	1062398832	[illegible]											X						30/01/1	14	EPS017	14	CCF50	0	14-15	14	0	30
31	CC	1003178653	[illegible]																	30/01/1	29	EPS034	29	CCF50	29	14-15	29	29	30
32	CC	1003178653	[illegible]										X							30/01/1	1	EPS034	1	CCF50	1	14-15	1	1	30
33	CC	7718039	[illegible]																	23/01/1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
34	CC	1052080418	[illegible]																	30/01/1	30	EPS001	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
35	CC	1065335505	[illegible]																	30/01/1	30	EPS037	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
36	CC	7718882	[illegible]							X										30/01/1	30	ESS624	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
37	CC	1065604401	[illegible]																	30/01/1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
38	CC	1065817982	[illegible]											X						30/01/1	30	EPS034	30	CCF50	0	14-15	30	0	30
39	CC	1065842379	[illegible]																	30/01/1	28	EPS001	28	CCF50	28	14-15	28	28	30
40	CC	1065842379	[illegible]										X							30/01/1	1	EPS001	2	CCF50	2	14-15	2	2	30
41	CC	1065809341	[illegible]																	30/01/1	30	EPS001	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
42	CC	1065852968	[illegible]																	30/01/1	30	EPS001	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
43	CC	1006714113	[illegible]																	30/01/1	30	EPS001	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
44	CC	1094[illegible]	[illegible]																	30/01/1	30	ARS001	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
45	CC	7717198	[illegible]																	30/01/1	30	EPS034	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
46	CC	1121148867	[illegible]	X																30/01/1	24	EPS001	24	CCF50	24	14-15	24	24	30
47	CC	71354131	[illegible]		X															30/01/1	23	EPS001	23	CCF50	23	14-15	23	23	30
48	CC	9152911	[illegible]																	23/01/1	23	ESS024	23	CCF50	23	14-15	23	23	30
49	CC	9152911	[illegible]											X						23/01/1	7	ESS024	7	CCF50	0	14-15	7	0	30
50	CC	1004532067	[illegible]																	30/01/1	30	EPS034	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
51	CC	1032449361	[illegible]																	30/01/1	30	EPS017	30	CCF50	30	14-15	30	30	30
Total		**Afiliados(41)**																											

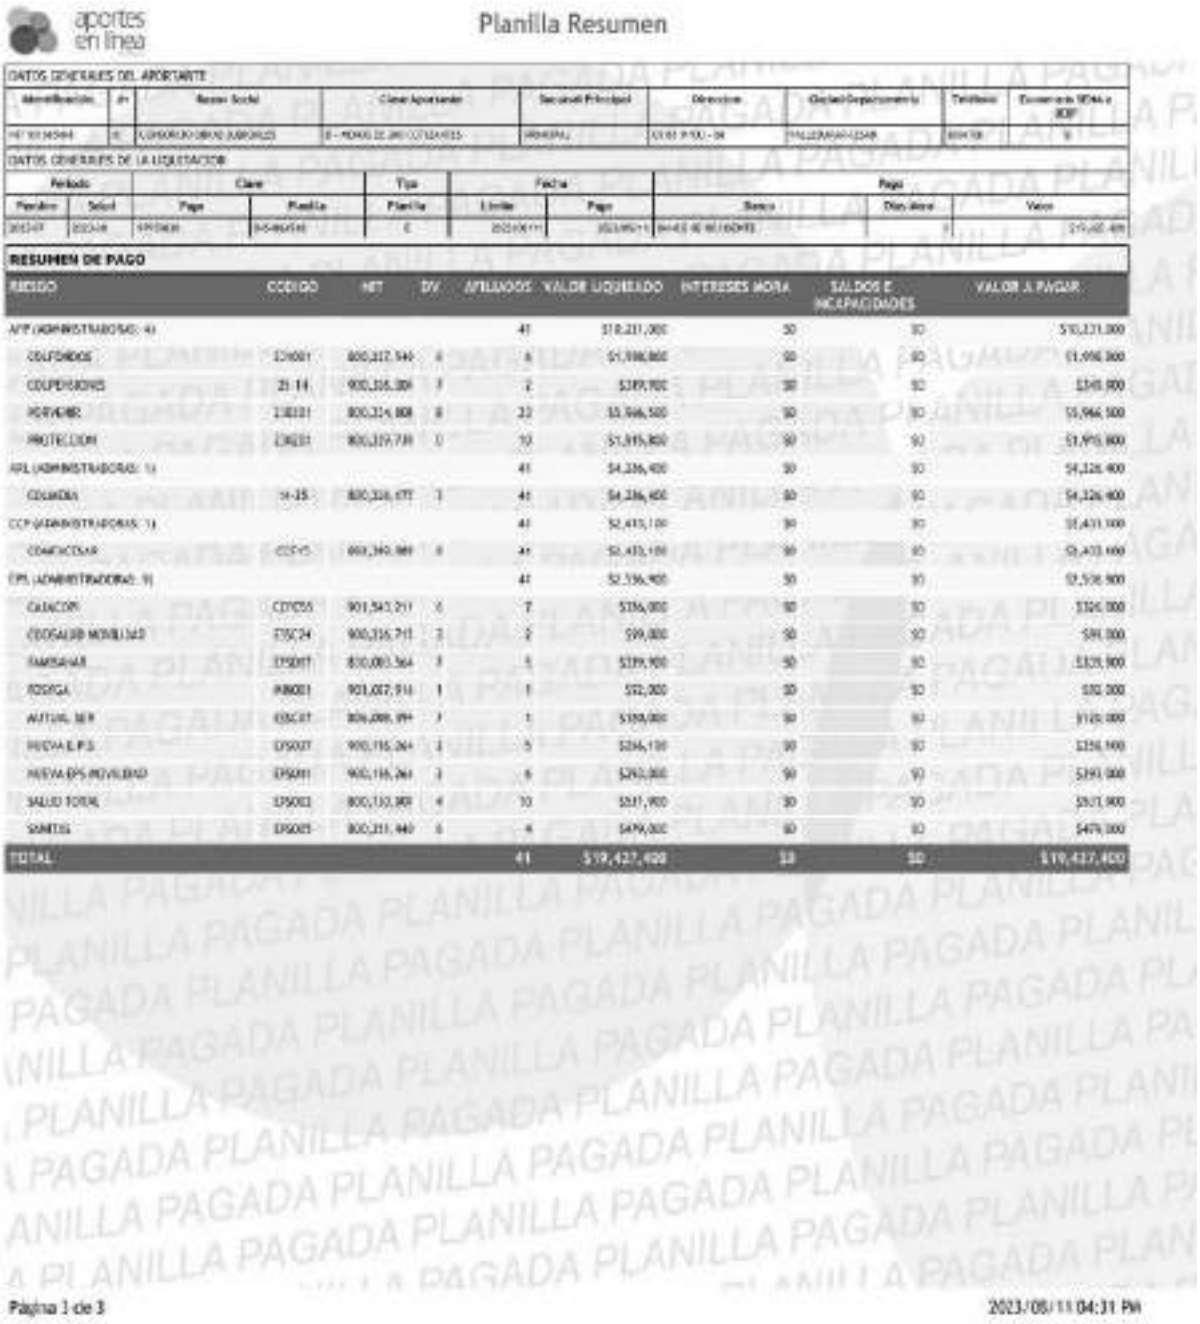

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$10,231,000	$0	$0	$10,231,000
COLFONDOS	230601	800,227,940	4	6	$1,996,800	$0	$0	$1,996,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$399,900	$0	$0	$399,900
PORVENIR	230201	800,224,808	8	22	$5,966,500	$0	$0	$5,966,500
PROTECCION	230201	800,209,778	0	10	$1,995,800	$0	$0	$1,995,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$4,226,400	$0	$0	$4,226,400
COLMENA	14-15	800,226,175	3	41	$4,226,400	$0	$0	$4,226,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,433,100	$0	$0	$2,433,100
COMFACESAR	CCF15	800,240,388	8	41	$2,433,100	$0	$0	$2,433,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				41	$2,536,900	$0	$0	$2,536,900
CAJACOPI	CCF055	901,543,291	6	7	$336,000	$0	$0	$336,000
COOSALUD MOVILIZA	CCF24	900,226,715	3	2	$99,800	$0	$0	$99,800
FAMISANAR	CCF007	830,003,564	7	5	$339,900	$0	$0	$339,900
FOSYGA	420001	900,087,916	1	1	$92,200	$0	$0	$92,200
MUTUAL SER	CCF07	806,008,394	4	1	$199,800	$0	$0	$199,800
NUEVA E.P.S.	CCF007	900,156,264	2	5	$266,100	$0	$0	$266,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	CCF001	900,156,264	2	6	$293,800	$0	$0	$293,800
SALUD TOTAL	CCF002	800,130,907	4	10	$517,900	$0	$0	$517,900
SANITAS	CCF005	800,251,440	6	4	$479,800	$0	$0	$479,800
TOTAL				41	$19,427,400	$0	$0	$19,427,400

Página 1 de 3


2023/05/11 04:31 PM





enlace
SuAporte |
PAGADO 15/08/2023





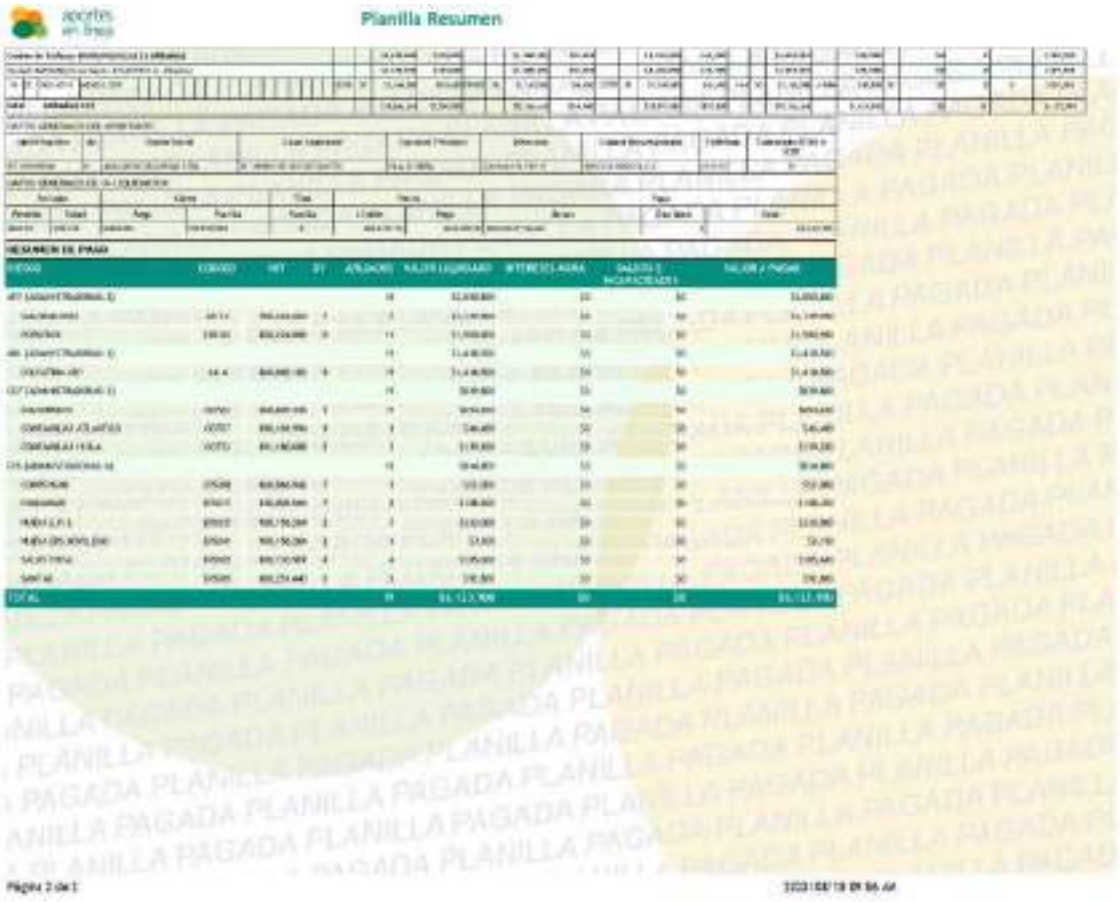

Planilla Resumen

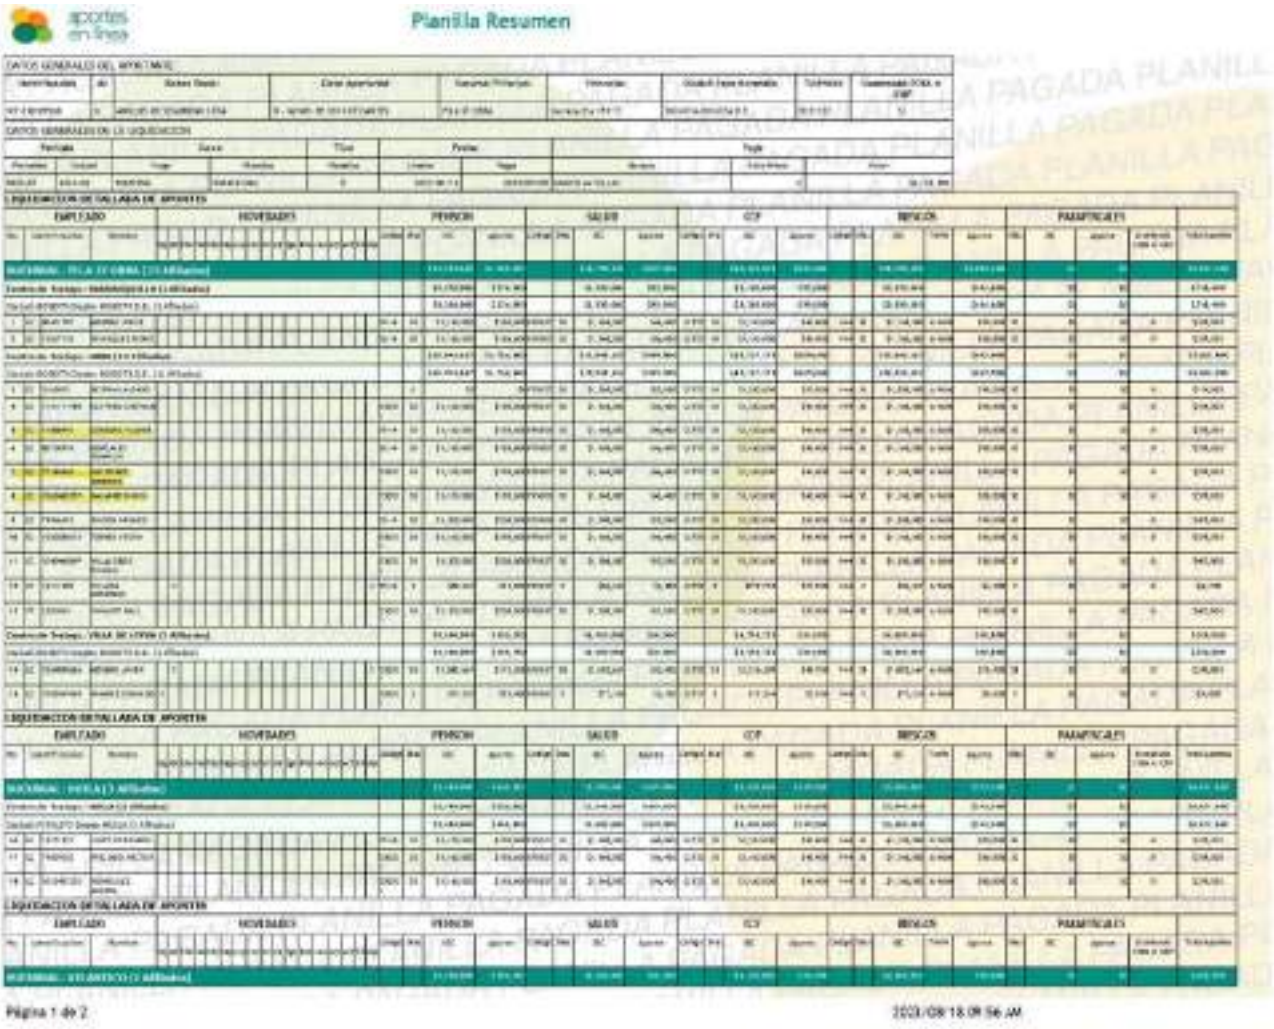

Planilla Resumen

Versión: 01	FORMATO
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Condiciones Inseguras				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	15 Minutos	
FECHA:	01-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1006714773	Consorcio	Eduardo Rivera
2	daniel Aguilar	85-442542	consorcio	daniel Aguilar
3	Reinaldo Moscote	77026504	1 1 1	Rey
4	Gregorio Diaz	1065626392	Consorcio	Gregorio Diaz
5	Luis Miguel Ramirez	1065626857	Consorcio	Luis Miguel
6	Segundo Medina cabrera	1193561201	consorcio	Segundo Medina cabrera
7	Pedro julio	77747396	consorcio	Pedro julio
8	Jose I. Campo	77186837	Consorcio	Jose I. Campo
9	CARLOS olivera	1052070473	consorcio	CARLOS
10	Oscar Bautista	1065657701	Consorcio	Oscar B.
11	CESAR	77186289		CESAR
12	Freddi SOSA	12619288	OPERADOR	Freddi
13	Wilman coronado	77078189	consorcio	Wilman
14	JUAN. PEGITH. BRITO	1.193.107.152	consorcio	JUAN BRITO
15	Luis CASTILLO	77155343	consorcio	CASTILLO
16	ANIBAL [illegible]	77154925	consorcio	[illegible]
17	Eduardo [illegible]	8664000	Consorcio	[illegible]
18	Jhon Jairo M.	1047860194	consorcio	Jhon Jairo M.
19	YESMON M.	5165243	Consorcio	YESMON M.
20	Juan David [illegible]	1064710685	consorcio	Juan David [illegible]
21	JORGE USECHE	91526911	CONSORCIO	JORGE USECHE
22	Jaimer Mendoza	1080431814	CONSORCIO	Jaimer Mendoza

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales- Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Protección de la flora y la fauna				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	15 Minutos	
FECHA:	05-08-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	[illegible]	706[illegible]685	consorcio	[illegible]
24	Jhon Jaiver M-	10[illegible]86c0194	consorcio	Jhon Jaiver
25	Carlos Mosquera	1.065893637	consorcio	Carlos Mosquera
26	Jeiver Medina	1080931816	consorcio	Jeiver Medina
27	Cesar Luis Muñoz	1003376851	consorcio	[illegible]
28	Juan Carlos Moreno	1062 548035	consorcio	Juan Carlos Moreno
29	[illegible]	1.003.240.689	consorcio	[illegible]
30	[illegible]	1065809391	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	1065815762	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	1065659761	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

32

Powered by CamScanner

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2020	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Socialización ATS - Riesgos y medidas de Control.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	15 minutos	
FECHA:	02-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Cesar Luis Navarro	1002776651	Consorcio	Cesar
2	Pedro Julio	77197396	Consorcio	Pedro Julio
3	Reinaldo Mascote	77026504	Consorcio	Reinaldo
4	Daniel Aguilar	85.442542	Consorcio	Daniel A.
5	Jose Cesar	91516911	Consorcio	Jose Cesar
6	Luis Miguel Javier	1065626852	Consorcio	Luis Miguel
7	Leonardo	1065623732	Consorcio	Leonardo
8	Eduardo Rivera	1065744185	Consorcio	Eduardo Rivera
9	Carlos Oliveira	1052080777	Consorcio	Carlos
10	Luis Arnedo	8'644000	Consorcio	Luis
11	Cesar	77186289		Cesar
12	Luis Castillo	77155343	Consorcio	Castillo
13	Wilson Romero	99.183.812	Consorcio	Wilson
14	Farid VV	1004502067	Consorcio	Farid VV
15	Wilman Coronado	77028189	Consorcio	Wilman
16	Jose Luis Campo	77186832	Consorcio	Jose Luis
17	Jhon Jairo Ospino	1065233505	Consorcio	Jhon Ospino
18	Edwar Velasquez	1.193.106.152	Consorcio	Edwar
19	Oscar Bustos E	1065657761	Consorcio	Oscar
20	Luis Diaz	1065890820	Consorcio	Luis Diaz
21	Jhon Jairo Morales	1003600194	Consorcio	Jhon Jairo
22	Carlos Mosquera	1065827677	Consorcio	Carlos Mosquera

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Socialización ATS, Riesgos y medidas de control.			
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN ✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	15 minutos
FECHA:	08-ago-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Yesenia [illegible]	51652[illegible]	Consorcio	Yesenia [illegible]
24	[illegible]	1073[illegible]140	Consorcio	[illegible]
25	[illegible]	1065815782	Jef	[illegible]
26	Juan Carlos Mesa S	1062 598 032	Consorcio	Juan Carlos Mesa S
27	Jeiry Mendoza	1080431816	Consorcio	Jeiry Mendoza
28	[illegible]	1.005 578 907	JCRI	[illegible]
29	Haiwin Ramirez	1062 4[illegible]397	Anillos	Haiwin Ramirez
30	Jesus David Ramos	1065 8[illegible]379	Consorcio	Jesus David Ramos

OBSERVACIONES

Versión 01 Fecha 19/04/2023 Clasificación Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales. valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Ahorro de recursos hídricos			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	12 Minutos
FECHA:	09-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Pedro Julio	88177346	consorcio	Pedro Julio
2	[illegible]	77067504	[illegible]	[illegible]
3	Enrique Fonseca	8'664000	Consorcio	[illegible]
4	Eduardo Luna	7x6774773	Consorcio	[illegible]
5	Daniel Aguilar	85.442542	consorcio	Daniel Aguilar
6	[illegible]	1193561705	consorcio	[illegible]
7	GCOVH D.C.	1065562392	Consorcio	GCOVH D.C.
8	Jorge Ussecche	91516911	consorcio	Jorge Ussecche
9	Farid V V	100H 502 067	consorcio	Farid V V
10	Luis castillo	77 155 311'3	consorcio	[illegible]
11	[illegible]	1065626852	Consorcio	[illegible]
12	carlos oliveros	1052020478	consorcio	carlos
13	Wilmar [illegible]	77028189	consorcio	[illegible]
14	[illegible]	77 154 975		
15	wilfran palmera	77-183-812	consorcio	wilfran
16	[illegible]	1065657936	consorcio	[illegible]
17	[illegible]	1064711695	consorcio	[illegible]
18	JUAN VICENTE PITO	1193403152	consorcio	JUAN PITO
19	Jose Luis Campo	77186837	Consorcio	Jose Luis Campo
20	[illegible]	51652413	consorcio	[illegible]
21	CESAR	77186289		CESAR
22	carlos mesquita	1065823637	consorcio	carlos mesquita

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Version: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Ahorro de Recursos hidricos				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	12 Minutos	
FECHA:	09-08/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jhon Jairo morales	1061800194	consorcio	
24	Jhon Darian Osma	1065635505	Consorcio	
25	Jeiner Mendoza	1080431816	consorcio	Jeiner Mendoza
26	Juan Gabriel marquez	1047347140	consorcio	Juan Gabriel Marquez
27	Yaneth Mesa A	1068818[illegible]	JF	
28	Jesus David Correa	1055842374	Consorcio	Jesus David
29	aldair diaz	1065[illegible]220	Consorcio	aldair diaz
30	Juan carlos mugas	1062348037	consorcio	Juan carlos mugas
31	Yhonti Quintero	[illegible]391	(10)	Yhonti Quintero
32	Rafael Rodriguez	1065[illegible]807	JCR	
33	Hawin Navarro	1062[illegible]393	Anillos	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2020	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Conflicto en lugar de Trabajo.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Kenny Soto			DURACIÓN:	30 minutos
FECHA:	10-08-2023.		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1066[illegible]	Consorcio	Eduardo Rivera
2	Pedro Julio	77191396	consorcio	Pedro Julio
3	Reinaldo Moscote	7702[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Danilo Aguilar	85-442542.	Consorcio	Danilo Aguilar
5	Jorge Sepulveda	41 526 911	CONSORCIO	Jorge Sepulveda
6	Luis Castillo	77 155 319	CONSORCIO	Castillo
7	Carlos Olivera	1052030[illegible]	consorcio	Carlos
8	Edwin Andrade	8'664000	Consorcio	[illegible]
9	[illegible]	1065562392	Consorcio	[illegible]
10	Farid VV	1004 502 067	consorcio	Farid VV
11	[illegible]	1065 676 852	Consorcio	[illegible]
12	Jose Conrado	77186837	Consorcio	[illegible]
13	Wilman Coronado	77028184	Consorcio	Wilman Coronado
14	[illegible]	1065235905	Consorcio	[illegible]
15	Wilman Palmera	22 183 - 812	consorcio	Wilman
16	Cesar	77186289		Cesar
17	Juan Pinto	1193.403.152.	consorcio	Juan Pinto
18	Anibal [illegible]	77 154 925	Consorcio	[illegible]
19	Yesmon M.	5165243	Consorcio	Yesmon M.
20	Carlos Maldonado	1065 373 237	consorcio	Carlos Maldonado
21	Jeiner Mendoza	1080431816	consorcio	Jeiner Mendoza
22	Luis Gabriel Barcha	7007 307 140	Consorcio	Luis Gabriel Barcha

OBSERVACIONES

Se realiza Socialización de conflicto en lugar de trabajo por mala Comunicación en obra. En compañía de el equipo Administrativo. y el Comité de Convivencia laboral, en apoyo con Director de obra, Residente Administrativo, Ingeniero Residente.

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Conflicto en el lugar de Trabajo.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	30 minutos
FECHA:	10-08/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jesus David Ramos	1065842379	Consorcio	
24	Marcela Patricia	1065815857	JER	
25		1008001391	CCO	
26	Jhon Jairo	1049600190	consorcio	
27		1065518867	JER	
28	Nayarne Hawin.	1063400397	Anillos.	
29	Aldair Diaz	1067277820	Consorcio Conjuez	Aldair Diaz
30	Evar [illegible]	1003776453		
31	Juan Carlos Murgas	1067378032	consorcio	Juan Carlos Murgas

OBSERVACIONES

Version: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Cambios climaticos			
TIPO DE ACTIVIDAD:	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN ✓	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	12 minutos
FECHA:	11-08/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1065614113	consorcio	Eduardo Rivera
2	Valledupar Escala	9702 6504	" "	Vale
3	Pedro Julio	77777396	consorcio	Pedro JULIO
4	Jorge Useche	91 526 911	CONSORCIO	Jorge Useche
5	CARLOS OLIVERA	1020830413	CONSORCIO	CARLOS
6	Omar Fundeño	8'664000	Consorcio	
7	[illegible]	1065562392	Consorcio	
8	Luis Castillo	77155 343	consorcio	Castillo
9	Wilson Barrera	77.183-812	Consorcio	Wilson
10	Farid V V	1004 502 067	consorcio	Farid V V
11	Luis Miguel Gomez	1065626852	Consorcio	Luis Miguel
12	Yinder M Pitalúa	1061811927	CP	CP
13	Yesmon [illegible]	5'165 413	consorcio	Yesmon [illegible]
14	Jose J Campy	77186837	Consorcio	Jose
15	Jhon Oma Ortega	1065735505	Consorcio	
16	Juan Avendaño	1064711685	consorcio	Juan Avendaño
17	JUAN. V.G TH.	1-192-483-152	consorcio	JUAN BAUTISTA
18	Jhon Jairo M	1064860194	consorcio	Jhon Jairo M
19	Carlos Rodriguez	1.065223.137	Consorcio	Carlos Rodriguez
20	Jeimer Mendoza	1080431816	consorcio	Jeimer Mendoza
21	CESAR	77186289	consorcio	CESAR
22	Luis Enrique Mancera	1007347140	Consorcio	Luis Enrique Mancera

22

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Cambios climaticos				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN /	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	12 minutos
FECHA:	27-08-2023		LUGAR:	palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jesus David Ovalle	1065842374	Consorcio	Jesus Ovalle
24	Adrian Diaz	1065809820	Consorcio	Adrian Diaz
25	Juan carlos burgos	1062398052	CONSORCIO	Juan carlos burgos
26	Luis Luis Nuñez	1065376618	Consorcio	Luis
27	RAFAEL BALCAZAR	1.065357681	JER	
28	ANIBAL Jose Jimenez Ferrer	77154925	consorcio	
29				
30				

OBSERVACIONES

28

Powered by CamScanner

Versión: 01	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales - Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	El Respeto						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	15 minutos	
FECHA:	12-09-2023		LUGAR:	palacio de justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Reinaldo Fascetto			
2	Eduardo Rivera	1006244443	Consorcio	Eduardo Rivera
3	Daniela Aguilar	85.442.542	consorcio	Daniela Aguilar
4	CARLOS OLIVERA	1052026416	CONSORCIO	CARLOS
5	JORGE VELASQUEZ	91.526.914	CONSORCIO	JORGE VELASQUEZ
6	PEDRO JULIO	77797396	CONSORCIO	PEDRO JULIO
7	EDWARD Arevalo	8'664000	Consorcio	
8	Jhon Miguel Yanez	1065676852	Consorcio	
9	Luis CASTILLO	77 155 303	consorcio	CASTILLO
10	GEOVANNYS	1065562392	Consorcio	GEOVANNYS
11	Jose L Cuadro	77186837	Consorcio	Jose L Cuadro
12	wilson polanco	77-182-812	consorcio	wilson
13	Jhon Andrade	1064274685	consorcio	Jhon Andrade
14	[illegible]	1065 85582	JEP	
15	CESAR	77186289		CESAR
16	Jhon Javier M.	1043600946	consorcio	Jhon Javier M.
17	Farid VV	1004 602 067	consorcio	Farid VV
18	Wilman coronado	77028189	consorcio	Wilman coronado
19	[illegible]	1065 [illegible]	JEP	
20	Juan Yoiner Gil K	1493403452	consorcio	Juan B 4/7 S
21	Jhon Osma	1065235505	Consorcio	
22	Jesus David Quiroz	1065946374	Consorcio	Jesus Quiroz

OBSERVACIONES

Version: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	condiciones Inseguras				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Solo		DURACIÓN:	15 Minutos	
FECHA:	01-08/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jesus David Rojas	1065842370	Consorcio	Jesus Rojas
24	Farid VV	1009502067	consorcio	Farid VV
25	Carlos mosquera	1.065822637	consorcio	Carlos mosquera
26	wilson pajaro	77-183-812	consorcio	wilson
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	Juan carlos mugas	1062 34 80 38	consorcio	Juan carlos mugas
29	Alexander Ospino	1065235505	Consorcio	Alex Ospino
30	Rafael [illegible]	1.065578853	JER	[illegible]
31	Cesar Luis [illegible]	1003776053	Consorcio	[illegible]
32	aldair diaz	1065809820	Consorcio	aldair diaz
33	[illegible]	1065[illegible]341	CO	[illegible]
34	HAWIN MENDOZA	1062[illegible]397	ANILLOS	HAWIN M
35	[illegible]	1068815[illegible]52	JER	[illegible]

OBSERVACIONES: Socialización con el personal las Condiciones inseguras presentadas el dia anterior (31-7/2023) la maquina no cuenta con pito de reversa, Se solicita al personal estar pendiente a los movimientos. Desnivel de terreno y exceso de material sobrante que obstaculiza el paso.

Versión: 01	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales – Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	El Respeto						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	15 minutos	
FECHA:	12/08/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Carlos marquez	1065827637	Consorcio	Carlos marquez
24	Cesar luis ariza	72137755	Consorcio	Cesar
25	Jorge Hernandez	1082431814	Consorcio	Jorge Hernandez
26	Wladis Diaz	1065809820	Consorcio	Wladis Diaz
27	Oliverio Quintero	1065800391	(C)	Oliverio Quintero
28	Anibal [illegible]	77154925	Consorcio	
29	Juan Carlos murgas	1062549032	Consorcio	Juan Carlos murgas

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo integral de residuos Solidos, domesticos y Peligro						
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓	SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:			
FECHA:	14-08-2023		LUGAR:	palacio de justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Raimundo Nuñez	77076501	consorcio	
2	Carlos Ochoa	1052836418	consorcio	Carlos
3	Jorge Useche	91526 911	consorcio	Jorge Useche
4	Luis castillo	92155 343	consorcio	castillo
5	Eduardo Rincon	1006244113	Consorcio	Eduardo Rincon
6	Pedro julio	44747396	Consorcio	Pedro julio
7	Daniel Aguilar	88.442.647	consorcio	Daniel Aguilar
8	Segundo Martinez cuadros	1102961701	Consorcio	Segundo Martinez Cuadros
9	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
10	Luis Miguel gomez	1065625852	Consorcio	Luis Miguel
11	Wilman coronado	77028189	consorcio	Wilman coronado
12	Tirso Arevalo	8'668000	Consorcio	
13	Adolfo Jose Jimenez Campo	77154925	Consorcio	
14	Wilton palmera	77-187-812	consorcio	Wilton
15	Jose I Campo	77186832	Consorcio	Jose I Campo
16	Juan David Lucia	1061711695	Consorcio	Juan David Lucia
17	Alvaro Cesar Cano	1065225501	Consorcio	
18	Edwar Diaz	1065562392	Consorcio	Edwar Diaz
19	Jhon Jairo m	1048600194	consorcio	Jhon Jairo m
20	CESAR	77186289		CESAR
21	Carlos mosquera	1065827637	consorcio	Carlos mosquera
22	Yesmon [illegible]	5165211?	consorcio	Yesmon

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Version: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificacion: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	consorcio obras judiciales						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo integral de residuos solidos, domesticos y peligr						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:			
FECHA:	14-08-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jimper Mendoza	1080431816	consc	Jimper Mendoza
24	HAWIN NAVARRO	1062400347	ANILLOS	
25	[illegible]	1008801391	CO	[illegible]
26	Jesus David Quiroz	1065842374	Consorcio	Jesus Quiroz
27	Juan carlos murgas	1062398032	consorcio	Juan carlos murgas
28	luis GABRIEL MARQUEZ	1007341190	consorcio	luis GABRIEL MARQUEZ
29	aldair diaz	1065804820	consorcio	aldair diaz
30	[illegible]	1.065575803	JER	
31	Cesar luis muñoz	1005776653	consorcio	Cesar
32	[illegible]	1005653746	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	1065915762	JER	
34	JOAN [illegible]	1193.103152	consorcio	JOAN. B. LITO

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de productos Quimicos utilizados durante actividades en obra.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Luis Lopez (ARL Colmena)			DURACIÓN:	2 Horas
FECHA:	15-08-2023			LUGAR:	palacio de justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Yesmon N.	5165243	Consorcio	Yesmon N.
2	General Dis	1065562392	Consorcio	General Dis
3	Reinaldo Mosca	77026504	" "	DRP
4	Pedro Julio	77177396	Consorcio	Pedro Julio
5	CARLOS Rivera	7052080473	Consorcio	CARLOS
6	Eduardo Rivera	1006744773	Consorcio	Eduardo Rivera
7	Jose Usecher	91526 91	Consorcio	Jose Usecher
8	Jairo Arevalo	8'664000	Consorcio	Jairo
9	Norberto Jimenez	77154925	Consorcio	
10	Daniel. Aguilar.	85-442542.	consorcio.	Daniel Aguilar.
11	Oscar Bonilla	1065657761	Consorcio	Oscar B.
12	William coronado	77028189	consorcio	William
13	Luis CASTILLO	77 155 343	consorcio	CASTILLO
14	Farid VV	1004 502067	consorcio	Farid VV
15	Jhon Javier Osma	1065775505	Consorcio	Jhon Osma
16	Jose Luis Campo	77186857	Consorcio	Jose Campo
17	Juan David Urueta	1064741695	Consorcio	Juan David Urueta
18	Wilian Palmera	77-183-812	consorcio	Wilian
19	Luis Alfonso	1065626852	Consorcio	Luis Alfonso
20	CESAR	7786280		CESAR
21	Jeiner Mendoza	1080431816	consorcio	Jeiner Mendoza
22	JOAO. VELITH B.	1.193.403152	consorcio	JOAO. BRITO.

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 08/08/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales. Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de productos químicos utilizados durante actividades				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Luis Lopez (ARL Colmena)			DURACIÓN:	2 Horas
FECHA:	15-08/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Rafael Bocanegra V	1065578862	JEP	
24	Juan Carlos Noriega	1067398032	Consorcio	Juan Carlos Noriega
25	Yuvelis Palacios	1065785762	JEP	
26	Orlando Alvarez Lopez	1065809341	CO	Orlando Alvarez
27	Cargil Luis Pinto	1065776151	Consorcio	
28	Aldair Diaz	1065809920	Consorcio	aldair diaz
29	Segundo Maximiliano Valdez	91493961701	Consorcio	Segundo Maximiliano Valdez
30	Luis Gabriel Marquez	7007347140	Consorcio	Luis Gabriel Marquez
31	Jesus David Lopez	1065841379	Consorcio	Jesus Lopez
32	Damaris Salcedo	49960020	Consorcio	Damaris
33	Karen Soto	1120718067	Consorcio	

OBSERVACIONES

Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 15/04/2020	
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Consorcio obras judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Como prevenir accidentes en una excavación				
TIPO DE ACTIVIDAD	CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Luis Lopez (ARL Colmena)		DURACIÓN:	2 Horas	
FECHA:	15.08.2023		LUGAR:	palacio de justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Yesmon [illegible]	5165243	Consorcio	Yesmon [illegible]
2	General Díaz	1065[illegible]3892	Consorcio	[illegible]
3	Reinaldo Maestre	9702[illegible]5[illegible]4	[illegible]	[illegible]
4	Pedro julio	77177396	consorcio	Pedro julio
5	CARLOS alvarez	7052080472	consorcio	CARLOS
6	Eduardo Rivera	1006274113	consorcio	Eduardo Rivera
7	Jose useche	91526 94	consorcio	Jose useche
8	Jairo [illegible]	8'664000	Consorcio	Jairo
9	[illegible]	[illegible]72154925	en consorcio	[illegible]
10	Daniel Aguilar	85.442542	consorcio	Daniel Aguilar
11	[illegible]	1065[illegible]9761	consorcio	[illegible]
12	Wilmar [illegible]	77028189	consorcio	[illegible]
13	Luis castillo	77 155 343	consorcio	castillo
14	Farid VV	1009 502 067	consorcio	Farid VV
15	Juan Jose Ospino	1[illegible]6[illegible]5[illegible]5	Consorcio	Juan Jose
16	Jose luis Campo	77186837	Consorcio	Jose luis Campo
17	Juan [illegible]	[illegible]1675	Consorcio	Juan [illegible]
18	[illegible]	77-[illegible]-812	Consorcio	[illegible]
19	[illegible]	1065[illegible]6852	Consorcio	[illegible]
20	CESAR	7786280		CESAR
21	Jeiver Mendoza	1080431811	consorcio	Jeiver Mendoza
22	Jose [illegible]	1.193.403.153	consorcio	Jose [illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 19/04/2023	
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales - Unidad para				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Como prevenir accidentes en una excavación.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Luis Lopez ARL Colmena			DURACIÓN:	2 Horas
FECHA:	15-08-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	RAFAEL Palencia V.	1065599863	JER	
24	Juan Carlos Suarez	1063396032	Consorcio	
25	Yhon Alexander Palacios	1061815852	JER	
26	Yhardy Alexis Hoyos	1065809491	CO	
27	Edgar Luis Pinto	1004137615	Consorcio	
28	Alfredo Diaz	1063809920	Consorcio	
29	Segundo Mariano Valdez	9997516161	Consorcio	
30	Luis Gabriel Marquez	7007341140	Consorcio	
31	Jesus David Lopez	1065802379	Consorcio	
32	Damaris Salcedo	49960010	consorcio	
33	Karen Soto	1124498089	Consorcio	

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de los recursos solidos, convencionales, RESPEL RAEE, Y RCD				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	15 Minutos	
FECHA:	16-08/23	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Pedro Julio	77171396	consorcio	Pedro julio
2	Luis castillo	77155343	consorcio	CASTILLO
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Jorge useche	91526911	consorcio	Jorge useche
5	Carlos olivera	1037080478	consorcio	Carlos
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	1065626857	consorcio	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Wilman coronado	77028184	consorcio.	[illegible]
12	daniel aguilera	85.142.542	consorcio	[illegible]
13	[illegible]	8664000	consorcio	[illegible]
14	Farid V V	1004 502067	consorcio	Farid VV
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	wilian palmera	77-183-812	consorcio	wilian
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	CESAR	77186989		CESAR
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	1048600194	consorcio	[illegible]

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de los residuos Solidos, convencionales, Respel. RAEE, y RCD.						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	15 Minutos		
FECHA:	16/08/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Carlos Mosquera	1.065.323.137	Consorcio	Carlos Mosquera
24	Jeiver Mendoza	1083431816	Consorcio	Jeiver Mendoza
25	Oldan Diaz	1065809810	Consorcio	Oldan Diaz
26	Jesus David Ochoa	1065842379	Consorcio	Jesus Ochoa
27	Juan Carlos Mojras	1062398032	Consorcio	Juan Carlos Mojras
28	Alberto Quintero	1065833341	(C)	Alberto Quintero
29	Daniela Rodriguez	1065817967	FR	DR
30	Cornel Balcazar V.	1.005578867	JCB	
31	JUAN. VELITA. BRITO	1193 1103. 152	AYUDANTE	JUAN. BRITO

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Consorcio obras judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Orden y aseo. Señalización en obra				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	12 minutos
FECHA:	17-08-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Pedro Julio	77173796	Consorcio	Pedro Julio
2	Reinaldo Mosquera	77026504	" "	Reinaldo
3	Jorge Escobar	91526911	Consorcio	Jorge Escobar
4	Eduardo Rivera	1065714713	Consorcio	Eduardo Rivera
5	CARLOS OLIVERA	7052030497	CONSORCIO	CARLOS
6	Gerson Arevalo	8264000	Consorcio	Gerson
7	Luis CASTILLO	77155343	CONSORCIO	LUIS CASTILLO
8	Omar Ortiz	1065613730	Consorcio	Omar
9	Daniel Davila	88.142.542	CONSORCIO	Daniel Davila
10	Luis Ojeda Gomez	1065676852	CONSORCIO	Luis Ojeda
11	Anibal Jose Diaz	77154725	Consorcio	Anibal
12	Wilman Coronado	77028189	Consorcio	Wilman Coronado
13	Farid VV	1004502067	CONSORCIO	Farid VV
14	Jose L Campo	77186832	Consorcio	Jose Luis Campo
15	Juan David Avila	1064711685	Consorcio	Juan David Avila
16	Jhon Jairo M	1049600194	CONSORCIO	Jhon Jairo M
17	Wilson Palmera	77.183.812	Consorcio	Wilson
18	Giovanni Valbuena	1065815762	Consorcio	
19	Geovany Diaz	1065662392	Consorcio	Geovany Diaz
20	CESAR	77196289		
21	JUAN JOSE TABARES	1193.109.157	CONSORCIO	JUAN JOSE
22	Carlos Mosquera	1065823674	Consorcio	Carlos Mosquera

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Riesgo Psicosocial			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	15 minutos
FECHA:	02-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1065[illegible]	Consorcio	Eduardo Rivera
2	Jordi SOSA	12619288	OPERADOR	Jordi
3	Reinaldo Ospino	77026504	17	Rey
4	Daniel Aguilar	85.442.542	consorcio	Daniel Aguilar
5	Luis CASTILLO	77 155 343	consorcio	CASTILLO
6	CARLOS Oliveira	7032 ORC 172	CONSORCIO	CARLOS
7	WARNERG HAVIN	1062900397	CASTILLO	
8	Eduardo Mahecha Caldas	1193 561 705	Consorcio	Eduardo Mahecha Caldas
9	GERVASIO FONTALVO	1065562392	Consorcio	GFONTALVO
10	Luis Miguel Gomez	1065626852	Consorcio	Luis Miguel
11	Oscar [illegible]	1065657761	Consorcio	Oscar
12	CESAR	77186289	COJ	CESAR
13	Wilmar Cacerado	77029189	COJ	Wilmar
14	[illegible]	8664000	Consorcio	[illegible]
15	Jose A Campo	77186837	Consorcio	Jose A Campo
16	JUAN V. VELITA B	1.199.403152	Consorcio	Juan Velita
17	Wilson Pedroza	77-187-812	consorcio	Wilson
18	ANIBAL Jose Mejia	77154925	Consorcio	[illegible]
19	JEIMER MENDOZA	1088921816	Consorcio	Jeimer Mendoza
20	Carlos Mosquera	1.065823637	CONSORCIO	Carlos Mosquera
21	Jhon Jairo M.	1065[illegible]	CONSORCIO	Jhon Jairo M.
22	Juan David LUCIO	1065711695	CONSORCIO	Juan David Lucio

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Consorcio obras judiciales Villavicencio						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Orden y aseo. Señalización en obra.						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	12 minutos		
FECHA:	17-08-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Yesmon M.	5165243	Consorcio	Yesmon M.
24	Cesar Luis Muñoz	1003776653	Constructora	
25	Jesus David Ramos	1065802374	Consorcio	Jesus Ramos
26	Jeiner Mendoza	1080931876	Consorcio	Jeiner Mendoza
27	Jhon Javier Ochoa	1065235505	Consorcio	Jhon Ochoa
28	Oldair Diaz	1065809916	Consorcio	Oldair Diaz
29	Jonathan Cortes Burgos	1062398052	Consorcio	Jonathan Cortes Burgos
30	[illegible]	1065800134	CO	[illegible]
31	Rafael Barbosa V	1065798807	JCR	

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de los residuos liquidos o vertimentos, permiso y obligaciones al respeto.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	8 Minutos
FECHA:	18-08-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia.	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1065	Consorcio	
2	Reinaldo Escobar	77026504		
3	Carlos Rivera	1065030473	Consorcio	
4	Luis CASTILLO	77 155 343	consordo	CASTILLO
5	Eduardo Manuel Cuadra	1193503178	Consorcio	
6	Pedro Julio	77177396	consordio	Pedro Julio
7	Oscar Daza	1065657	Cons	Oscar D.
8	Daniel Aguilar	85.442.542	consorcio	Daniel Aguilar
9	Yesmina M.	51655213	Consorcio	Yesmina M.
10	Eduardo Fernandez	8[illegible]	Contratista	Eduardo
11	JUAN [illegible]	1193.403.152	consorcio	JUAN BRITO
12	CESAR	77196289		CESAR
13	[illegible]	1065711685	Consorcio	[illegible]
14	Wilman colonado	77028189	consorcio	Wilman
15	Jose I Campo	77186837	Consorcio	Jose Luis Campo
16	[illegible]	1065626852	Consorcio	[illegible]
17	[illegible]	1.065576663	JCR	
18	[illegible]	77151925	consorcio	
19	Farid V V	1004502067	consorcio	Farid V V
20	[illegible]	1065	JCR	
21	[illegible]	1018	Consorcio	[illegible]
22	[illegible]	1065235505	consorcio	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interna	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de los residuos liquidos o Vertimentos Permisos y obligaciones al respecto						
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓	SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	8 Minutos		
FECHA:	18-05-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Wilian Palmera	77-183-812	consorcio	wilian
24	Cesar Luis Nuñez	1005776658	Consorcio	Cesar
25	Carlos Mastrodi	1065839363	Consorcio	Carlos Mastrodi
26	Jeiner Mendoza	1070931816	Consorcio	Jeiner Mendoza
27	Jesus David Gomez	1065842379	Consorcio	Jesus David
28	Luis Gabriel Marquez	1007336140	consorcio	Luis Gabriel Marquez
29	Aldair Diaz	1065809820	Consorcio	aldair diaz
30	Juan carlos murgas	1065 [illegible]	consorcio	Juan carlos murgas
31	Wendy Mendoza	1065 [illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Palacio de justicia - obras judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Actos inseguros. Socialización llamado de atención. por Comite de Convivencia.				
TIPO DE ACTIVIDAD:	-	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	30 minutos
FECHA:	19-08-2023		LUGAR:	palacio de justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Pedro Ujiba	1477396	consorcio	PEDRO JULIO
2	Reinaldo Moscote	77026504	" "	Reinaldo
3	CASTILLO	77155813	consorcio	CASTILLO
4	Oscar Castillo E	1065877701	Consorcio	Oscar
5	ANIBAL José Jurado	77154925		
6	carlos olivera	7052080471	consorcio	CARLOS
7	Eduardo Linero	1065 [illegible]	consorcio	Eduardo Linero
8	daniel aguilar	8[illegible]42	consorcio	Daniel A.
9	JUAN [illegible]	1903403192	consorcio	JUAN B.
10	CESAR	77186289		CESAR
11	Segundo Molina Ulloa	77935[illegible]	consorcio	Segundo Molina Ulloa
12	Wilfran Granado	77028189	consorcio	[illegible]
13	Dario Jaimes	1069000	Consorcio	[illegible]
14	Jose L Campo	7718[illegible]837	Consorcio	[illegible]
15	[illegible]	1065[illegible]	consorcio	[illegible]
16	[illegible]	1065626852	consorcio	[illegible]
17	faridVV	1004502067	consorcio	faridVV
18	Juan Javier Ospa	1065238505	Consorcio	Juan Ospa
19	Yesmyo [illegible]	5165243	consorcio	Yesmyo M.
20	Eusebio Luis Muñoz	9007276053	consorcio	[illegible]
21	Carlos mosquera	1065827637	consorcio	Carlos mosquera
22	Jaime Mendoza	1080931816	consorcio	Jaime Mendoza

OBSERVACIONES: El trabajador realiza Socialización por acto inseguro, el cual cuando realizaba una actividad fue sorprendido realizando acto inseguro. (Actualmente se encuentra en estructura para izaje).
Se realiza llamado de atención por inconvenientes presentados entre Compañeros. Se Procede a llamado de atención grupal para mejorar ambiente laboral.

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	asesoria obras judiciales - Villadupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Actos inseguros			
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	CAPACITACIÓN: ✓	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	30 minutos
FECHA:	19-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jesus David Gomez	1065942379	Consorcio	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

Versión 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 19/04/2023	
Clasificación: Interna	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Protección de los recursos hídricos, Prohibiciones, Permisos y obligaciones al respecto				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN ✓	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	8 minutos
FECHA:	22-08-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	1065623332	Consorcio	[illegible]
3	[illegible]	77026504	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	77177796	Consorcio	[illegible]
5	[illegible]	1065676852	Consorcio	[illegible]
6	[illegible]	1052086478	consorcio	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
8	[illegible]	05462502	consorcio	[illegible]
9	[illegible]	1065701695	consorcio	[illegible]
10	[illegible]	77028189	Consorcio	[illegible]
11	[illegible]	1065677361	Cons-	[illegible]
12	[illegible]	77155 3213	Consorcio	[illegible]
13	[illegible]	1045600019	consorcio	[illegible]
14	[illegible]	1004 502067	consorcio	[illegible]
15	[illegible]	1065235505	Consorcio	[illegible]
16	[illegible]	77186289		[illegible]
17	[illegible]	1.065823637	consorcio	[illegible]
18	[illegible]	77186837	Consorcio	[illegible]
19	[illegible]	1193.1107.152	consorcio	[illegible]
20	[illegible]	77-183-912	Consorcio	[illegible]
21	[illegible]	1669000	Consorcio	[illegible]
22	[illegible]	1065842374	consorcio	[illegible]

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 19/04/2023	
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Protección del recurso hídrico, Prohibiciones, Permisos y obligaciones al respecto.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	8 Minutos	
FECHA:	22-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jorge Ustariz	9 526 911	Consorcio	Jorge Ustariz
24	Edgar Luis Muñoz	1003776053	Consorcio	
25	[illegible]	77 134925	Consorcio	
26	[illegible]	5 165243	Consorcio	
27	[illegible]	[illegible]	CC	[illegible]
28	Oldair Diaz	1065 [illegible]	Consorcio	Oldair Diaz
29	Juan Carlos Murgas	1062 [illegible]	Consorcio	Juan Carlos Murgas
30	[illegible]	1065 81962	Consorcio JER	
31	Luis Gabriel Fragoso	1007307110	Consorcio	Luis Gabriel Fragoso
32	Rafael Balcazar V	1.065578067	JER	
33	Jeiner Mendoza	1082431[illegible]	Consorcio	Jeiner Mendoza

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Fecha: 08/08/2023		
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Uso eficiente del Agua				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	23-08-2023			LUGAR:	Palacio de Justicias

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	CARLOS OLIVERA	7052030 478	Consorcio	CARLOS
2	Reinaldo Bozcate	77026504	[illegible]	R.B
3	JUAN. YP G Th. B. TOZ	1.193.103.152	Consorcio	JUAN. B. T.
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	PEDRO JULIO	77741396	Consorcio	Pedro julio
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Luis CASTILLO	77 155 343	CONSORCIO	CASTILLO
9	[illegible]	9 326 911	CONSORCIO	[illegible]
10	CESAR	17186289	Consorcio	CESAR
11	[illegible]	8664000	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	85.442502	consorcio	[illegible]
13	William Palmera	92.183.812	consorcio	[illegible]
14	Wilmar Colorado	77028189	consorcio	Wilmar Colorado
15	[illegible]	1065657701	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	1065620852	Contratista	[illegible]
17	[illegible]	77154925	[illegible]	[illegible]
18	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
19	Jose L. Campo	77.186.837	Consorcio	[illegible]
20	[illegible]	1065233305	Consorcio	[illegible]
21	[illegible]	1.065.822.137	consorcio	[illegible]
22	[illegible]	1082431816	CONSORCIO	[illegible]

OBSERVACIONES: Se realizo capacitación del uso eficiente del Agua. y se realizo evaluación del tema.

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Versión: 01 Fecha: 13/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales.				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Uso eficiente del agua.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora.
FECHA:	23-08-23			LUGAR:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Luis Gabriel [illegible]	7007347140	Consorcio	Luis Gabriel [illegible]
24	Jesus David Ortiz	1065802379	Consorcio	Jesus Ortiz
25	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
26	Yesmina [illegible]	5165213	Consorcio	Yesmina [illegible]
27	Aldair Diaz	1065809810	Consorcio	Aldair Diaz
28	Cesar Luis [illegible]	1007137[illegible]	Consorcio	Cesar
29	Juan Carlos [illegible]	1062398032	consorcio	Juan Carlos [illegible]
30	[illegible]	1065809341	CO	[illegible]
31	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	1065815762	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Consorcio obra Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de sustancias peligrosas, aspectos ambientales relacionados.			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo	DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	24-08-2023	LUGAR:	palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1065944173	consorcio	Eduardo Rivera
2	Yeimi Alexander Moscote	77026504	Consorcio	
3	CARLOS OLIVERA	1065080478	CONSORCIO	CARLOS
4	PEDRO JULIO	1047197396	CONSORCIO	PEDRO JULIO
5	Orlando Molina Calderon	1143336105	Consorcio	Orlando Molina Calderon
6	GERMAN	1065562392	CONSORCIO	GERMAN
7	DANIEL AGUILAR	85-442542	CONSORCIO	
8	JUAN PABLO PUPO	1193.083.152	CONSORCIO	JUAN PABLO
9	Wilmer Coronado	77028189	CONSORCIO	Wilmer Coronado
10	Oscar Bustillo	1065657761	Consorcio	Oscar B.
11	Ernesto Fundora	8'664000	Consorcio	
12	Willian Palmera	77-183-812	CONSORCIO	Willian
13	LUIS CASTILLO	77155343	CONSORCIO	LUIS CASTILLO
14	Jhon Darwin Osorio	1065235505	CONSORCIO	Jhon Osorio
15	[illegible]	77134925		
16	FARID VV	1004502067	CONSORCIO	FARID VV
17	LUIS MIGUEL GOMEZ	1065676852	CONSORCIO	LUIS MIGUEL GOMEZ
18	JUAN DAVID LUCESIA	1064711685	CONSORCIO	JUAN DAVID LUCESIA
19	JOSE L CAMPO	71186837	CONSORCIO	JOSE LUIS CAMPO
20	YESMAN [illegible]	51654[illegible]	CONSORCIO	YESMAN
21	CESAR LUIS MARIA	1003376055	CONSORCIO	CESAR
22	JHON JAIRO [illegible]	1045800194	CONSORCIO	JHON JAIRO

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Riesgo Psicosocial						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	15 minutos	
FECHA:	02-08/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Farid V V	1004 502 067	Consorcio	Farid·V V
24	Jhon Javier Ospina	1065235505	Consorcio	Jhon Ospina
25	YESMDH	5168243	Consorcio	YESMDH
26	Cesar Luis Martinez	1007376657	Consorcio	Cesar
27	Jorge Usecha	91 526 911	consorcio	Jorge Usecha
28	Luis Gabriel Marquez	1007342140	Consorcio	Luis Gabriel M
29	Jesus David Daniello	1065842379	Consorcio	Jesus Daniel
30	Juan Carlos Moreno	1062348032	consorcio	Juan Carlos Moreno
31	Yuranelly Pulido P	1065815462	JCR	
32	Adolfo Jiménez	1065809820	Consorcio	Adolfo Jiménez
33	Orlando Quintero	1065809341	CO	Orlando Quintero
34	Rafael Balcazar	1065518867	JCR	
35				
7				

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	consorcio obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de Sustancias Peligrosas, aspectos ambientales relacionados.				
TIPO DE ACTIVIDAD	/	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	24-08-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Carlos Mosquera	1065899637	1065899637	Carlos Mosquera
24	Jeimer Mendoza	1080431816	Consorcio	Jeimer Mendoza
25	Jesus Ussecha	91 526 911	Consorcio	Jesus Ussecha
26	Luis Gabriel Marquez	7007 341140	Consorcio	Luis Gabriel Marquez
27	Jesus David Alvarez	1065812379	Consorcio	Jesus Alvarez
28	Aldair Diaz	1065819820	Consorcio	Aldair Diaz
29	Marlon Valbuena	1065815762	JER	
30	Fabian Betancur	1065578862	JER	
31	Juan Carlos Moreno	1062 396037	Consorcio	Juan Carlos Moreno
32	Wendy Perez Ayala	1065820134	CCJ	Wendy Perez Ayala
33	CESAR	77196289		CESAR

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna


FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Golpe de Calor. (Mantenerse hidratado)						
TIPO DE ACTIVIDAD:	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	8 minutos	
FECHA:	25-08/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	Jorge Useche	91 544 911	Consorcio	Jorge Useche
	Pedro Julio	77177396	Consorcio	Pedro Julio
	Charles el. Veve	1002070978	Consorcio	Charles
	oldair diaz	1065809820	Consorcio	oldair diaz
	Juan Ramon Ortiz	1127.483.152	Consorcio	Juan Ramon
	Cesar	77186289	Consorcio	Cesar
	Eduardo Rivera	1065774775	Consorcio	Eduardo Rivera
	Luis David Cueva	1065842379	Consorcio	
	Castillo	22 155 3413	Consorcio	Castillo
	[illegible]	77154 925	Consorcio	
	Yesmon M.	5165243	Consorcio	Yesmon M.
	Gregory Diaz	1065562392	Consorcio	Gregory Diaz
	[illegible]	1144276704	Consorcio	[illegible]
	Wilmar Coronado	77028189	Consorcio	Wilmar Coronado
	[illegible]	1065676852	Consorcio	[illegible]
	[illegible]	1065236505	Consorcio	[illegible]
	Farid VV	1004502067	Consorcio	Farid VV
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Luis Gabriel [illegible]	7002 341140	Consorcio	Luis Gabriel
	Jose I. Campo	77.186837	Consorcio	Jose I. Campo
	Juan Carlos Morgan	1067 348 032	Consorcio	Juan Carlos Morgan

OBSERVACIONES

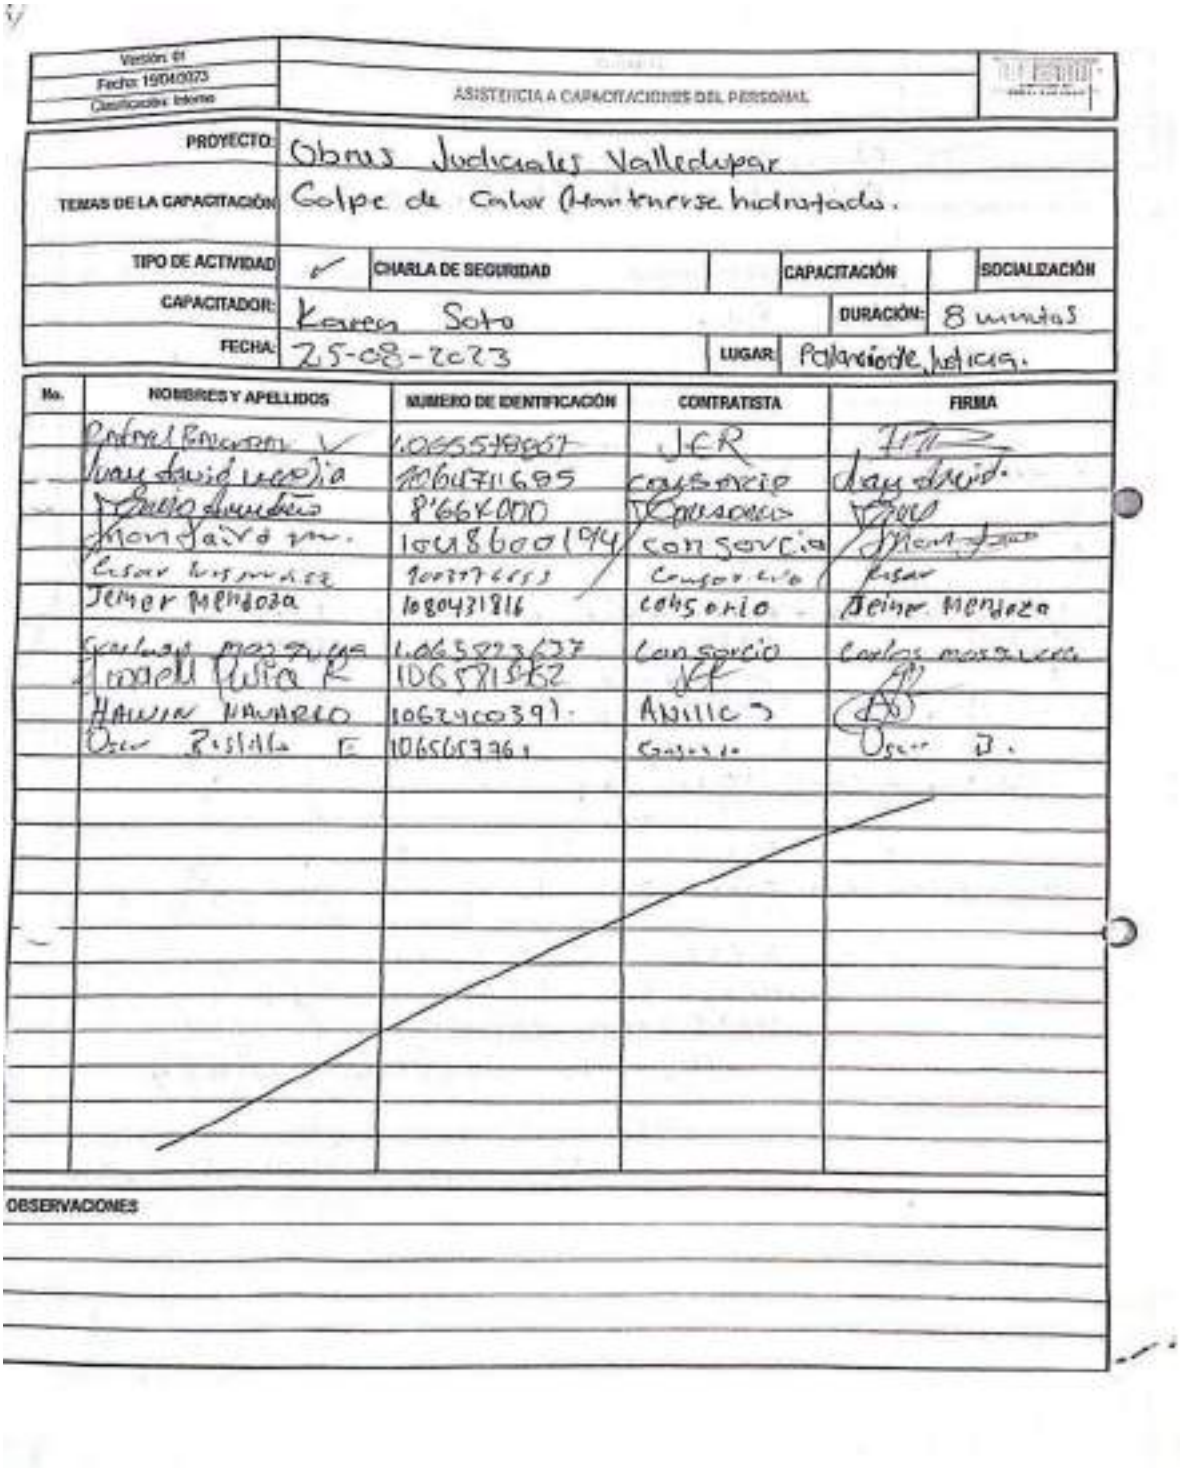

Versión: 01
Fecha: 15/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales Valledupar

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Golpe de Calor (Mantenerse hidratados.

TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Karen Soto | DURACIÓN: 8 minutos

FECHA: 25-08-2023 | LUGAR: Palacio de Justicia.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	Gabriel Barrera V	1.065548867	JCR	
	Juan david urrejia	1064711685	consorcio	Juan david.
	Pablo Arevalo	8'664000	Consorcio	
	Ramiro M.	1082800194	consorcio	
	Cesar [illegible]	1007776553	Consorcio	Cesar
	Jeiner Mendoza	1080431816	consorcio	Jeiner Mendoza
	Carlos [illegible]	1.065823627	Consorcio	Carlos [illegible]
	[illegible] Ruiz R	1065791582	JCR	
	Hamin Navarro	1062460391	Anillos	
	Oscar Rosales E	1065657961	[illegible]	Oscar R.

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	consorcio obras judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Responsabilidad social de un adecuado manejo ambiental en obra.				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	26/08/2023			LUGAR:	Palacio de justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	1065552312	consorcio	[illegible]
2	[illegible]	77155343	consorcio	[illegible]
3	[illegible]	1193547205	consorcio	[illegible]
4	Reinaldo Moscote	77026504	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	1065657761	consorcio	[illegible]
6	[illegible]	8664000	consorcio	[illegible]
7	Wilian Palmera	77-183-812	consorcio	Wilian
8	CESAR	77186289		CESAR
9	Willman coronado	77028169	consorcio	Will
10	Farid V V	1004 502 067	Consorcio	Farid V V
11	Jose L Campo	77.186.832	Consorcio	[illegible]
12	[illegible]	1065611485	Consorcio	[illegible]
13	[illegible]	1002776558	Consorcio	[illegible]
14	Jorge Useche	91528911	consorcio	Jorge Useche
15	[illegible]	1065842374	Consorcio	[illegible]
16	Jemer Mendoza	1080432816	consorcio	Jemer Mendoza
17	[illegible]	1.193.103.652	consorcio	[illegible]
18	[illegible]	1065809520	consorcio	[illegible]
19	Carlos Mosquera	1.065823637	consorcio	Carlos Mosquera
20	[illegible]	1065 [illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	1065 [illegible]	consorcio	[illegible]
22	[illegible]	5658 [illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Version: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Responsabilidad Social de un adecuado manejo ambiental en obra.						
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:			
FECHA:	26/08/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	RAFAEL [illegible]	1.C655[illegible]	JCR	
24	HAWIN MUHRAC A	1062410397	ANILLOS	
25	Karen Soto	1120748067	Consorcio	
26	YESMAN M.	5165243	consorcio	Yesman M.
27	ANABI [illegible]	72154925	Consorcio	
28	Jhon Jairo M	104 86 00294	Consorcio	Jhon Jairo M
29	Luis Angel Yamez	10 65626852	Consorcio	Luis Angel Yamez
29	Jhon Javier Osma	1065 23 5508	Consorcio	Jhon Osma
31	pedro dulce	77141396	consorcio	Pedro dulce
32				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pausas Activas.						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Sota			DURACIÓN:	10 minutos		
FECHA:	28-08/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Reinaldo Moscote	77026504	1111	
2	PENAGOJULIO	77747396	CONSORCIO	PENAGOJULIO
3	Eduardo Rivera	1065621115	Consorcio	Eduardo Rivera
4	Eduardo Maldonado	4493500101	Consorcio	
5	CARLOS RIVERA	1065620428	CONSORCIO	CARLOS
6	[illegible]	1065562392	CONSORCIO	CONSORCIO
7	[illegible]	8669000	[illegible]	
8	[illegible]	1065653361	[illegible]	
9	LUIS CASTILLO	77155743	CONSORCIO	CASTILLO
10	DANIEL AGUILAR	85.442.542	CONSORCIO	DANIEL A.
11	Wilman Coronado	77078189	Consorcio	Wilman Coronado
12	[illegible]	1065233505	Consorcio	
13	[illegible]	1065626852	CONSORCIO	
14	[illegible]	77-162-917	Consorcio	[illegible]
15	Jose Campo	77156837	Consorcio	Jose
16	Farid VV	1004 502 067	CONSORCIO	Farid VV
17	[illegible]	77154925	Consorcio	
18	CESAR	17106209	Consorcio	CESAR
19	[illegible]	1007776538	Consorcio	[illegible]
20	[illegible]	91 516 911	CONSORCIO	[illegible]
21	[illegible]	1.192.407.157	CONSORCIO	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales					
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pausas Activas					
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	10 minutos	
FECHA:	28-08/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	Jose David Cuervo	1065942379	Consorcio	Jose Cuervo
	Carlos Mosquera	1.085823637	consorcio	Carlos Mosquera
	Juan Carlos Noreña	1062 398032	Consorcio	Juan Carlos Noreña
	Yesmar M.	8165243	Consorcio	Yesmar M.
	Jaiver Mendoza	1030431816	consorcio	Jaiver Mendoza
	Oldany Diaz	1067809820	Consorcio	Oldany Diaz
	Marleth Palomino	1067815762	JER	
	Jean David Arteaga	1064211685	Consorcio	
	Charles Cuervo Arteaga	1065812341	CCJ	
	Jan Frederi Mendoza	1003734190	Consorcio	
	Rafael Bracho V	1.065578862	JER	
	Jhon Jairo Mu	1067800196	consorcio	


OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Charla Tema Social: Cooperacion entre compañeros de trabajo.				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	29.08.23	LUGAR:	Palacio de Justicia.		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1006714115	Consorcio	Eduardo Rivera
2	Reinaldo Mosca	77.076.584	"	Reinaldo
3	Carlos Olivera	7052020477	consorcio	Carlos
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Edwin Quintero	8664000	Consorcio	Edwin
6	[illegible]	1065562392	consorcio	[illegible]
7	Jorge Cerchar	91526 911	consorcio	Jorge Cerchar
8	Pedro Ortiz	91747396	consorcio	Pedro de J. O.
9	[illegible]	77154925	consorcio	[illegible]
10	[illegible]	1065626852	Consorcio	[illegible]
11	Yhon Daniel Osma	1065235505	Consorcio	[illegible]
12	Wilmar Coronado	77028189	consorcio	Wilmar Coronado
13	[illegible]	1065624261	Consorcio	[illegible]
14	wilian palomeque	77-183-812	consorcio	wilian
15	Farid VV	1004 502 067	consorcio	Farid VV
16	CASTILLO	77153393	consorcio	CASTILLO
17	Yesmon [illegible]	5166443	consorcio	Yesmon
18	Daniel Aguilar	85.142542	consorcio	Daniel Aguilar
19	CESAR	77086289		CESAR
20	Cesar luis muñoz	1003726651	consorcio	Cesar
21	Juan David Urrego	1061711685	consorcio	Juan David Urrego
22	Jeiner Mendoza	1082043186	consorcio	Jeiner Mendoza

OBSERVACIONES

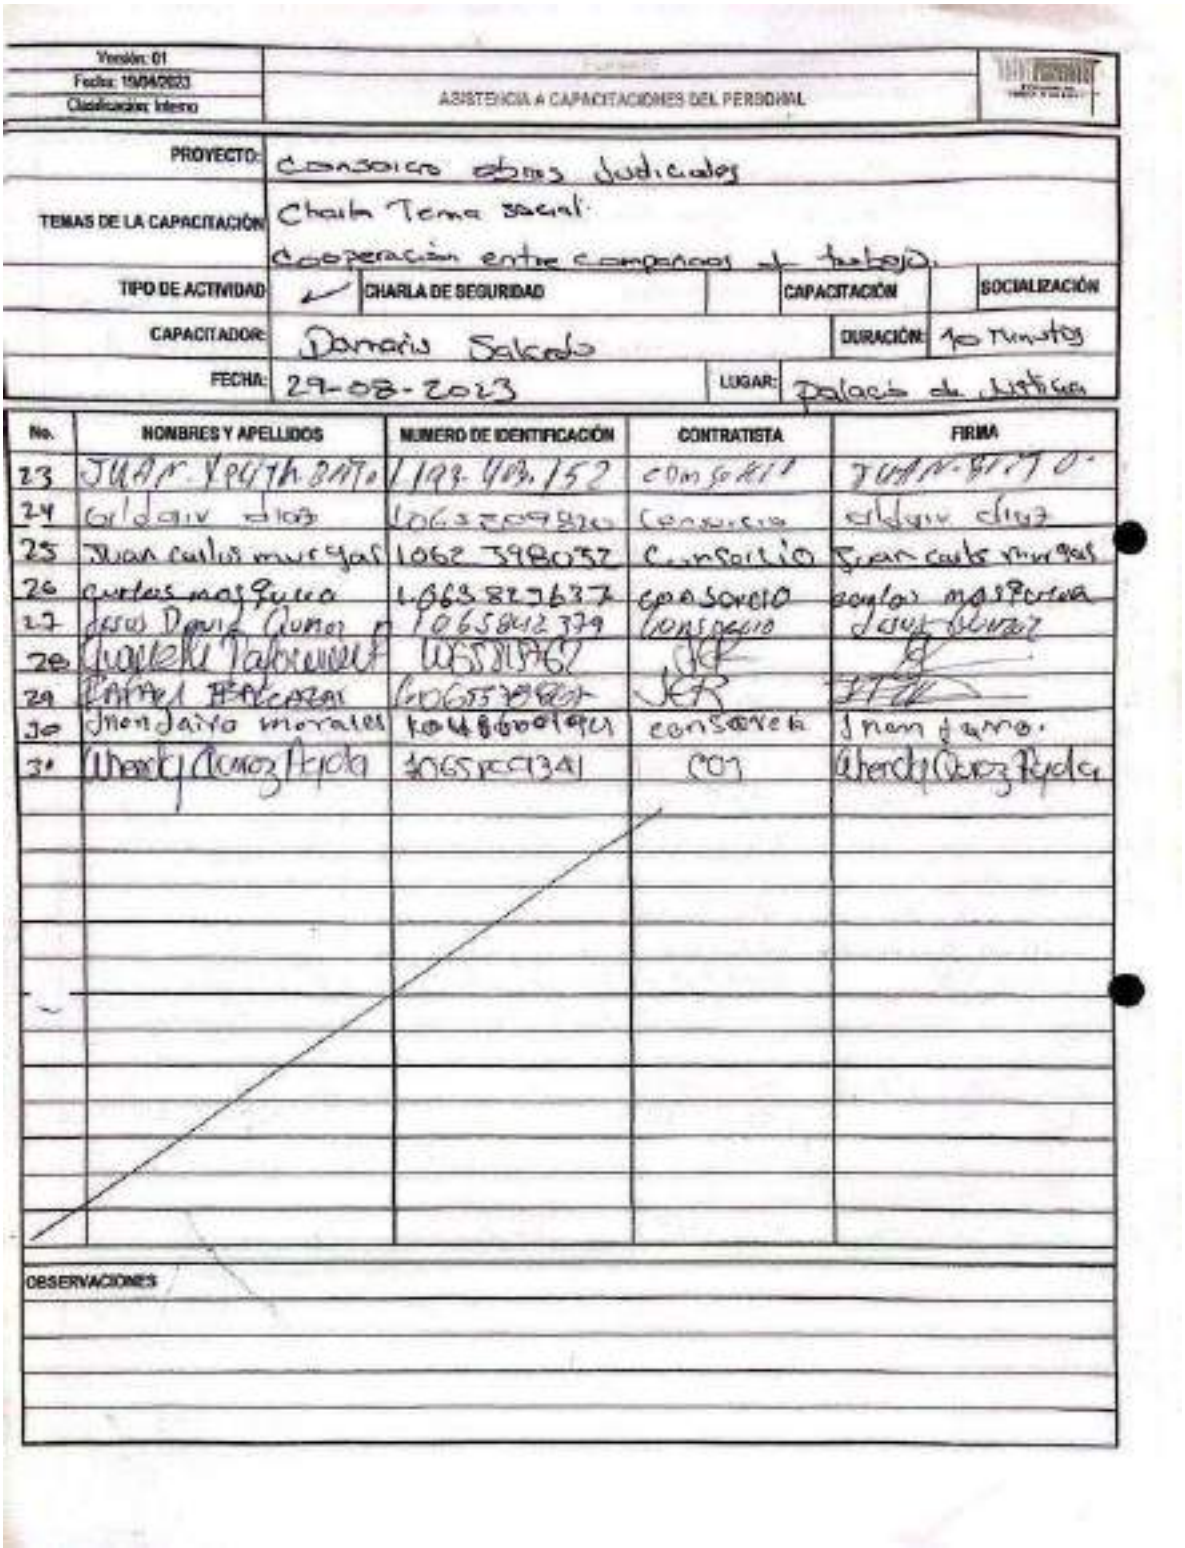

Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Consorcio obras Judiciales

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Charla Tema social: Cooperación entre compañeros de trabajo.

TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Damaris Salcedo | DURACIÓN: 10 Minutos

FECHA: 29-08-2023 | LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	JUAN YEITH BAÑO	1193 403 152	CONSORCIO	JUAN BAÑO
24	Gildaiv [illegible]	1063209820	Consorcio	[illegible]
25	Juan carlos murgas	1062 398032	Consorcio	Juan carlos murgas
26	carlos mayorga	1.063 827637	consorcio	carlos mayorga
27	Jesus David Gomez	1065812379	Consorcio	Jesus Gomez
28	Anabella Valverde	1055819467	JER	[illegible]
29	Rafael Palencia	1065579807	JER	[illegible]
30	Jhonjairo morales	1064000191	consorcio	Jhonjairo.
31	Wendy Gomez Ayola	1065 [illegible] 341	CON	Wendy Gomez Ayola

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2020	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Riesgo Biomecanico				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	10 minutos
FECHA:	03/08/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Pedro Julio	1047477396	consorcio	Pedro Julio
2	Daniel Aguilar	85.462.542	consorcio	Daniel Aguilar
3	Luis [illegible]	77155343	consorcio	[illegible]
4	Reinaldo Mos cote	77016504	Consorcio	
5	Eduardo Rueda	1006714113	Consorcio	Eduardo Rueda
6	[illegible]	1065552372	Consorcio	[illegible]
7	[illegible]	1093566703	[illegible]	[illegible]
8	Carla Olivera	1052070422	consorcio	CARLOS
9	[illegible]	1065057211	Consorcio	[illegible]
10	[illegible]	77.183.812	consorcio	[illegible]
11	Juan Velitta Brito	1.199.403.452	Consorcio	Juan Velitta
12	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
13	[illegible]	1065071105	consorcio	[illegible]
14	Jorge [illegible]	91526 911	consorcio	Jorge [illegible]
15	Luis Miguel [illegible]	1063626857	Consorcio	Luis Miguel [illegible]
16	Jhon Jairo M	1048600194	consorcio	Jhon Jairo M
17	Farid V V	1004 502 067	consorcio	Farid V V
18	Yesmar [illegible]	5165243	Consorcio	Yesmar [illegible]
19	Wilmar [illegible]	77028189	consorcio	Wilmar [illegible]
20	Jhon Jairo Ospina	1065235505	Consorcio	Jhon Ospina
21	[illegible]	1007392140	consorcio	[illegible]
22	Jesus David Ruiz	1065812379	Consorcio	Jesus David

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Riesgo Biomecanico			
TIPO DE ACTIVIDAD:	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	10 minutos
FECHA:	03-08/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	[illegible]	77 154 925	consorcio	
24	Carlos Mastrera	1.065.822.637	Consorcio	
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	Jeiver Hernandez	1080131816	consorcio	Jeiver Hernandez
27	[illegible]	8664000	Consorcio	
28	[illegible]	1062 34980 [illegible]	Consorcio	[illegible]
29	[illegible]	1063 [illegible] 341	CO	
30	[illegible]	1065 [illegible]	JRC	
31	Aldair diaz	1065809820	Consorcio	aldair diaz
32	Jose I Campo	79186831	Consorcio	Jose I Campo

OBSERVACIONES


Version 01 Fecha 14/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Riesgo Biologico			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	10 Minutos
FECHA:	04.08.2023		LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	PEDRO JULIO	77171796	Consorcio	PEDRO JULIO
2	CARLOS OLIVERA	7051080473	CONSORCIO	CARLOS
3	JOSE USECHE	91526911	CONSORCIO	JOSE USECHE
4	Eduardo Rueda	1006714773	Consorcio	Eduardo Rueda
5	Reinaldo Fosca	1093537	Consorcio	RF
6	Wilman Caicedo	77028189	Consorcio	Wilman Caicedo
7	[illegible]	1065562392	Consorcio	[illegible]
8	Ennio Andrade	8'664000	Consorcio	[illegible]
9	Luis Castillo	77155343	Consorcio	Castillo
10	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
11	Segundo Manuel Cuadrado	11935466	Consorcio	Segundo Manuel Cuadrado
12	JUAN DIEGO BUITRAGO	1.193.403.157	CONSORCIO	[illegible]
13	Luis Miguel Arce	1066268572	Consorcio	Luis Miguel
14	Jose I Campo	77-186837	Consorcio	Jose I Campo
15	[illegible]	77154925	Consorcio	[illegible]
16	WILTON PALACIO	77-183-872	Consorcio	WILTON
17	Jeiner Mendoza	1080431816	Consorcio	Jeiner Mendoza
18	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
19	Jhon Mario Ossa	1065235505	Consorcio	Jhon Ossa
20	[illegible]	1064711695	Consorcio	[illegible]
21	[illegible]	1065815[illegible]	JCR	[illegible]
22	Jhon Jairo M.	1082800194	Consorcio	Jhon Jairo

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

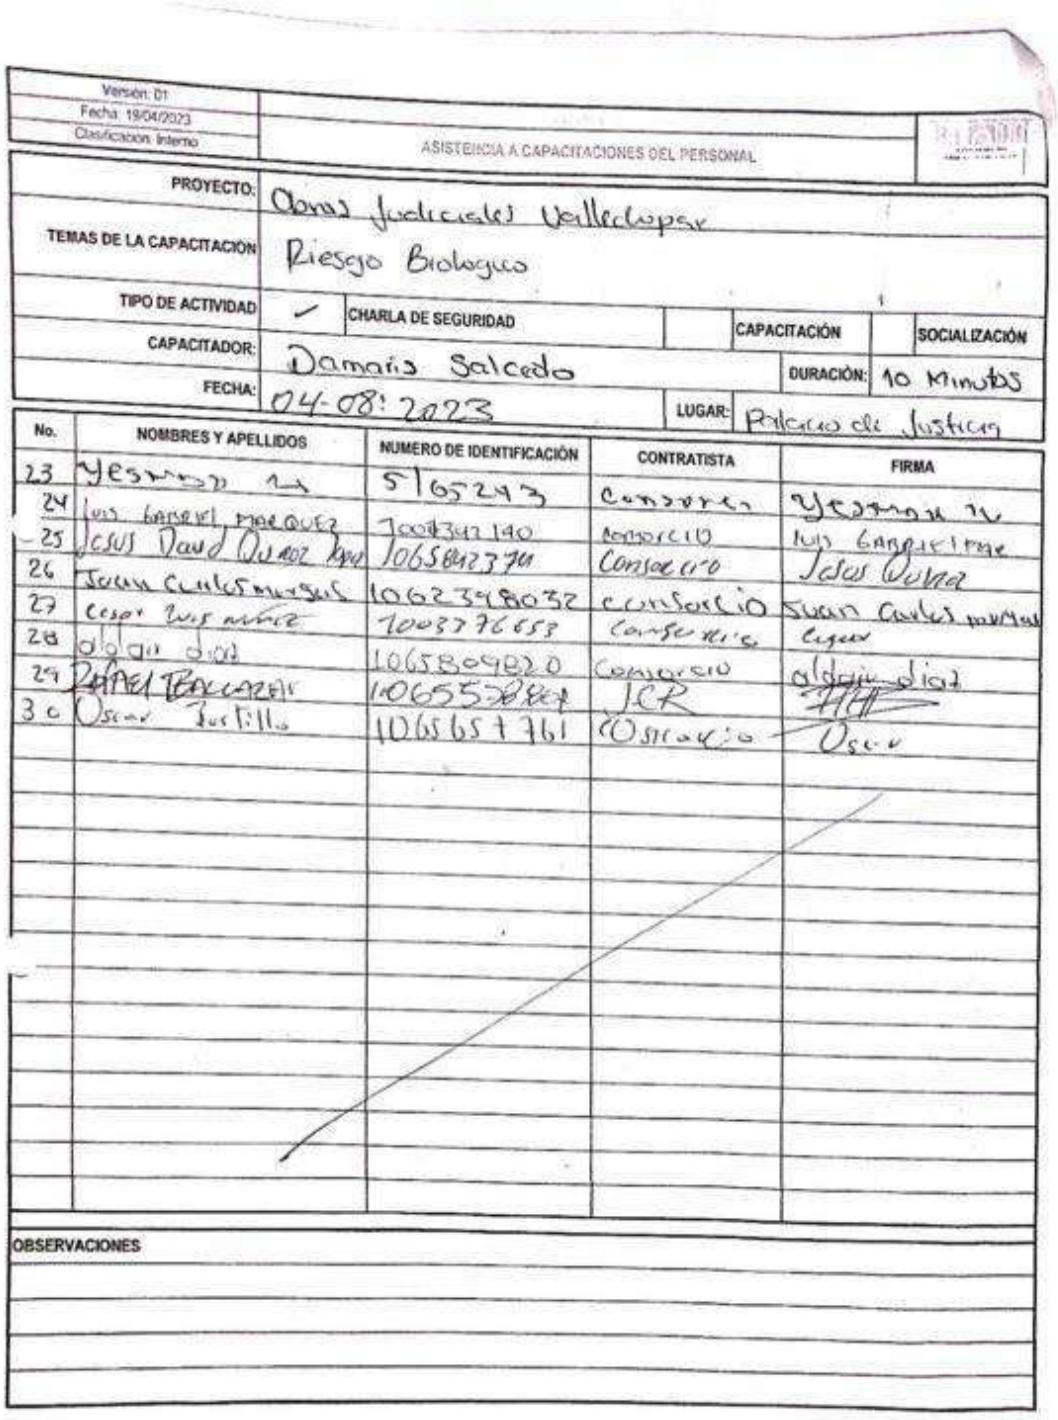

Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales Villavicencio

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Riesgo Biologico

TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Damaris Salcedo — DURACIÓN: 10 Minutos

FECHA: 04-08-2023 — LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Yesmon [illegible]	5[illegible]65243	Consorcio	Yesmon [illegible]
24	Luis Gabriel Marquez	1[illegible]3[illegible]140	Consorcio	Luis Gabriel Mar
25	Jesus David Ojeda Lopez	1065[illegible]3701	Consorcio	Jesus Ojeda
26	Juan Carlos Marquez	1062[illegible]8032	consorcio	Juan Carlos Marquez
27	Cesar Luis Muñoz	1[illegible]776[illegible]	Consorcio	Cesar
28	olgado diaz	1065[illegible]820	Consorcio	olgado diaz
29	Rafael [illegible]	1065[illegible]	JCR	[illegible]
30	Oscar Bustillo	1065[illegible]761	Consorcio	Oscar

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Protección de la flora y la fauna				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓ SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	15 Minutos
FECHA:	05-08-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Daniel Aguilar.	85442542.	consorcio	Daniel Aguilar
2	Reinaldo Jose	77026504	1111	
3	Jorge Usechue	91 526 911	consorcio	Jorge Usechue
4	Eduardo Rivera	1067744143	consorcio	Eduardo Rivera
5	Carlos Olivera	1065080488	consorcio	Carlos
6	Pedro Julio	77171396	consorcio	Pedro Julio
7	Wilian Palmera	77.187.812	consorcio	Wilian
8	[illegible]	77 194 925	consorcio	
9	CESAR	77186289	—	CESAR
10	Farid VV	1064 502 067	consorcio	Farid VV
11	Wilman coronado	77028184	consorcio	Wilman
12	Luis CASTILLO	77155343	consorcio	CASTILLO
13	Duvan Ambrosio	8664000	Consorcio	
14	Segundo Marlyan Caldera	1193561760	consorcio	Segundo Marlyan Caldera
15	JUAN [illegible]	1193 [illegible]	consorcio	JUAN [illegible]
16	[illegible]	1065562372	consorcio	[illegible]
17	Yesmon [illegible]	3165[illegible]	[illegible]	Yesmon [illegible]
18	Wismichel [illegible]	1065676852	consorcio	[illegible]
19	Jesus David Arias	1065841379	Consorcio	Jesus Arias
20	[illegible]	1007302740	consorcio	[illegible]
21				
22	Jose I Campo	77186832	Consorcio	

22

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Fecha: 10/08/2023		
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Uso eficiente del Agua				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	23-08-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	CARLOS OLIVERA	7951080478	Consorcio	CARLOS
2	Reinaldo Fuentes	77026504	[illegible]	R.F
3	JUAN VICENTE BUITRAGO	1.193.403152	Consorcio	JUAN V. B.
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	1065582396	Consorcio	[illegible]
6	PEDRO ULLO	77147346	Consorcio	Pedro Ullo
7	Eduardo Rivera	1065844115	Consorcio	Eduardo Rivera
8	LUIS CASTILLO	77 155 343	CONSORCIO	CASTILLO
9	JORGE USECHE	91 326 911	CONSORCIO	JORGE USECHE
10	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
11	[illegible]	8664000	Consorcio	[illegible]
12	RONALD AGUILAR	85-942502	CONSORCIO	[illegible]
13	WILLIAM PALMERA	77-183-812	CONSORCIO	WILLIAM
14	WILMAN COLONEDO	77028189	CONSORCIO	WILMAN COLONEDO
15	[illegible]	1065657201	Consorcio	
16	[illegible]	1065628852	Consorcio	[illegible]
17	[illegible]	77154925	Consorcio	[illegible]
18	FARID VV	1004502067	CONSORCIO	FARID VV
19	JOSE L. CAMPO	77.186.837	CONSORCIO	JOSE LUIS CAMPO
20	[illegible]	1065233505	Consorcio	[illegible]
21	[illegible]	1.065827137	CONSORCIO	[illegible]
22	[illegible]	1080431816	CONSORCIO	[illegible]

OBSERVACIONES: Se realiza Capacitación del uso eficiente del Agua. y se realiza evaluación del tema.

Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nota: 100

Nombres y Apellidos 1. ANIBAL JOSÉ SANCHEZ EJ CORSO **Fecha:** 23/08/23

2. Luis castilla

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. [illegible] Fecha: 03-23-23 Nota: 100

2. CARLOS OLIVERA

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21042023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. Sandra Milena Cobos Fecha: 17-08-23 Nota: 100

2. Dra. Jessica Echeverz.

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. Carlos Mosquera **Fecha:** 23/8/23

2. Eduardo Rivera

Nota: 100

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que salo de la llave (F)

2. **Encierra en un círculo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
X) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rolar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nota: 90

Nombres y Apellidos 1. Jcer David Quiroz Lopez **Fecha** 27-08-2023

2. Rafael Bracamonte Urueta

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V) ✓

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F) ✓

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V) ✓

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F) X

2. **Encierra en un círculo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar. ✓
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. Jair Mendoza 1080425816 **Fecha:** 23/08/23 **Nota:** 100

2. [illegible]

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Enciera en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA

Nombres y Apellidos 1. Yesmou E Mendoza **Fecha** 13-08/23 **Nota:** 100

2. Jacqueline Polanco R

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un círculo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nota: 90

Nombres y Apellidos 1. [illegible] **Fecha:** 28/2023

2. _____

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (V)

2. **Encierra en un círculo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales.				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Uso eficiente del agua.				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora.
FECHA:	23-08-23			LUGAR:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Luis Gabriel Pitre Ortiz.	1007321140	Consorcio	Luis Gabriel Pitre
24	Jesus David Duran	1065912379	Consorcio	Jesus Duran
25	Juan david rincon	1066706855	Consorcio	Juan david rincon
26	Yesmaira [illegible]	51652115	Consorcio	Yesmaira [illegible]
27	Aldair Diaz	1065809820	Consorcio	Aldair Diaz
28	Cesar Luis Nuñez	1003376013	Consorcio	Cesar
29	Juan carlos muñoz	1062348032	consorcio	Juan carlos muñoz
30	Marcel Alexis Arteta	1055809391	CO	Marcel Alexis Arteta
31	Rafael Fernandez	1065576867	SAR	
32	Gabriela Peñaloza	1065815762	SST	

OBSERVACIONES

Versión: 1-1	Formato	
Fecha: 21/04/2020	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nota: 10

Nombres y Apellidos 1 Juan javier Osma **Fecha:** 23-9-23

2 Juan David Ngaiza

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de pérdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (V) X

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar. V
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2020	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. JUAN YOSTH. BITOZ **Fecha:** 23/08/23 **Nota:** 100

2. Faluid VV

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V) ✓

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F) ✓

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V) ✓

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F) ✓

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar. ✓
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nota: 100

Nombres y Apellidos 1. Cesar Rafael muñoz **Fecha:** 23/6/2025

2. Cesar Luis muñoz

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**


El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Botar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. aldair diaz Fecha: 23-06-23

2 Pedro Jurado

Nota: 96

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de pérdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Botar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. Jhon Jaramorales Fecha: 23-08-23 Nota: 90

2. Luis Gabriel Marquez Soto

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de pérdida de este recurso (V)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA.

Nombres y Apellidos 1. Reinaldo Mercado Pacheco **Fecha:** 23/8/23 **Nota:** 100

2. Luis Diaz Romero

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (F)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (F)

2. **Encierra en un círculo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 1.0	Formato	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN USO EFICIENTE DEL AGUA

Nombres y Apellidos 1. Luis Miguel Gomez B Fecha: 8-23-2023 Nota: 90

2. Daniel Aguilar

1. **Indique si es Falso (F) o Verdadero (V)**

El uso eficiente del agua es cualquier medida que reduzca la cantidad de agua que se utiliza para una actividad (V)

Hacer un uso eficiente del agua es dejar la llave abierta (F)

El uso eficiente del agua se define como la reducción o prevención de perdida de este recurso (√)

El agua en ningún caso se puede reutilizar después de que sale de la llave (√)

2. **Encierra en un circulo como usas el agua de manera eficiente.**



3. **Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de las 3 R que nos ayuda a hacer un uso eficiente del agua?**

a) Reducir, contaminar, botar.
b) Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c) Reciclar, Rotar y Revisar.



Versión: 01	ACTA	
Fecha: 03/04/2023	REUNIÓN	
Clasificación: Interna		

Asunto: Reunión Comité Paritario de seguridad y Salud en Trabajo.

Hora de inicio: 09:00 am

Fecha: 24/08/2023

Hora de finalización: 09:30 am

Temas Tratados	
N.°	Ítem
1	Revisar los compromisos anteriores, notificación de la asignación de nuevos miembro del COPASST.
2	Revisar entrega de EPP, actos y condiciones inseguras en obra.

Desarrollo de la reunión

Se tomó registro de los asistentes.

El Comité se reúne y se lleva a cabo la revisión del acta anterior, la asignación de los nuevos miembros, donde se sustituye a Sandra Luque y Alejandro Torres.

Se revisa la entrega de EPP y las condiciones, dentro de los cumplimientos se sugieren incentivar a los trabajadores sobre el buen uso y cuidado de los EPP.

Se manifiesta la preocupación de los actos y condiciones inseguras presentadas en obras, los cuales persisten en el área de trabajo.

Compromisos			
N.°	Asunto	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Seguimiento y apoyo a los actos y condiciones inseguras.	Residentes SST Residente de obra Miembros del COPASST	21/09/2023
2	Reunión para seguimiento de los temas tratados	Miembros del COPASST	25/09/2023

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	Juan Cifuentes	Residente Social
2	Ismael Lanos Medina	Residente de obra
3	Anibal Pinzón	Oficial de obra
4	Carlos Olivera	Ayudante de obra
5	Oberdy Alvarez	Residente Administrativo
6	Damaris Soto	Residente SST
7	Abe Bernal	Apoyo Técnico
8	Karen Soto	Residente SST

LLAMADO DE ATENCIÓN

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8

Valledupar – Cesar, 23 de agosto de 2023

Señores
Colaboradores de obra civil

ASUNTO: **Llamado de Atención por convivencia laboral.**

Señores colaboradores de obra civil, por medio de la presente, dando respuesta al proceso disciplinario que se ha venido adelantando en su contra, la empresa identifica completa responsabilidad en la Mala convivencia que se viene presentando en el entorno laboral faltando de esta manera al *Reglamento Interno de Trabajo Capitulo XIV Articulo 44 inciso 20 "Utilizar lenguaje soez en contra de sus compañeros, superiores jerárquicos, o sus familias, así como personal de clientes, o cualquier clase de contratantes de la empresa"* y a las *"Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores. Cap. 15 Articulo 46 Inciso i Escala de faltas y sanciones disciplinarias. No respetar el conducto regular, implica por primera vez, memorando o llamado de atención, o suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días, dependiendo la gravedad de la falta y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses"*

Vale la pena resaltar que el comité de convivencia laboral se reunió con el personal colaborador, donde se les socializó el tema de convivencia laboral, con base a las situaciones que se venían presentando últimamente, razón por la que el comité de convivencia laboral se ve en la necesidad de realizar el siguiente llamado de atención grupal debido a los inconvenientes presentados en obra con los malos tratos, comentarios ofensivos y agresivo entre los compañeros.

Por consiguiente, debemos tener en cuenta que el trabajo debe realizarse en un ambiente ameno, sano y en total armonía, con el fin de crear un entorno de trabajo positivo y mejorar el bienestar y satisfacción laboral de los empleados solicitamos optar una mejor conducta de su parte.

Lo invitamos a que reflexione sobre la falta incurrida y las consecuencias que pudo desencadenar.

Cordialmente,

Ing. Fernando Bernal
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LLAMADO DE ATENCIÓN

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8

Colaboradores De Obra Civil			
No.	Nombres Y Apellidos	Cedula	Firma
7	Oscar Eduardo Bustillo Echavez	1.065.657.761	Oscar Bustillo Echavez.
8	Jesus David Quiroz Lopez	1.065.842.379	Jesus Quiroz
10	Juan Yesith Brito Zabaleta	1.193.403.152	JUAN BRITO-
11	Segundo Antonio Martinez Caldera	1.193.561.205	Segundo Martinez caldera
12	Juan Carlos Murgas Mindiola	1.052.398.032	Juan carlos murgas mindiola
14	Wilman Ignacio Coronado Silva	77.023.189	Wilman coronado silva
15	Farid Alberto Van Stralen Vizcaino	1.004.502.067	Farid V V
16	Jose Luis Campo Calderón	77.186.837	Jose L. Campo
17	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77.186.289	CESAR
18	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1.003.376.653	Cesar luis
23	Jorge Usechue	91.525.911	Jorge USECHUC
25	Luis Alberto Castillo Camelo	77.155.341	CASTILLO
26	Reinaldo Moscote Pachecho	77.026.504	RLP
27	Luis Gabriel Marquez Julio	1.007.392.140	Luis Gabriel M
28	Jhon Javier Osma Ortega	1.065.235.505	
29	Carlos Andres Olivera Franco	1.052.080.418	CARLOS OLIVERA
30	Yesman Enrique Mendoza Mendoza	5.165.243	Yesman. M.
31	Jhon Jairo Morales Cabrera	1.048.600.194	Jhon Jairo morales.


LLAMADO DE ATENCIÓN


32	Juan David Mejia Cinin	1.064.711.685	Juan David Mejia
33	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1.080.431.816	Jeiner mendoza
34	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85.442.542	Daniel Aguilar
37	Anibal José Jiménez Escorcia	77.154.925	
38	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1.065.626.852	Luis Miguel Gomez
39	Aldair Luis Diaz Criate	1.065.809.820	aldair diaz
42	Pedro Julio Vanegas Sandoval	77.171.396	Pedro Julio
48	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1.006.714.113	Eduardo Rivera
49	Geovaldi Enrique Fontalvo Matos	1.065.562.392	Geovaldis Fontalvo
50	Carlos Andres Mosquera Palmera	1.065.823.637	Carlos mosquera
54	Wilian Enrique Palmera Santana	77.183.812	wilian palmera


Cordialmente,

JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA
Comité De Convivencia Laboral
Presidente

WHENDY QUIROZ AYOLA
Comité De Convivencia Laboral
Secretaria

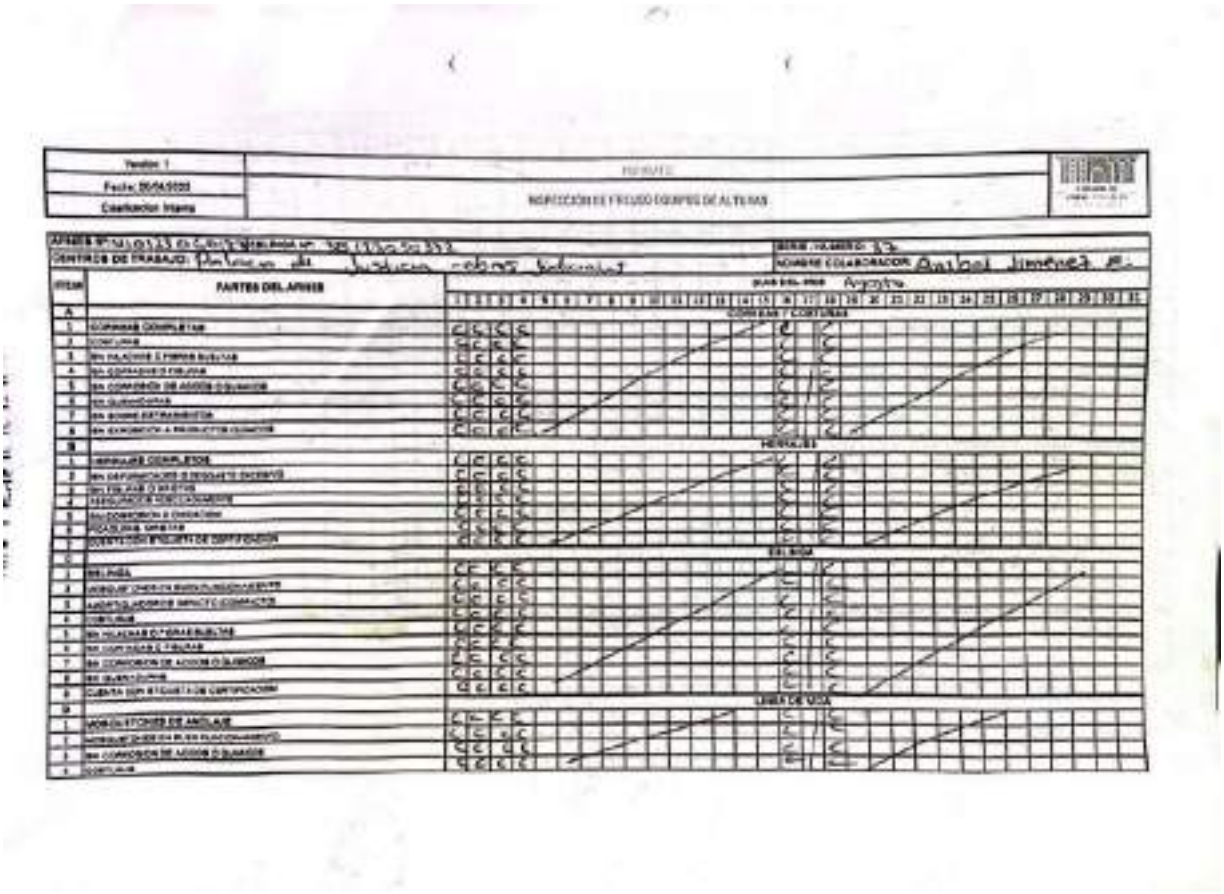

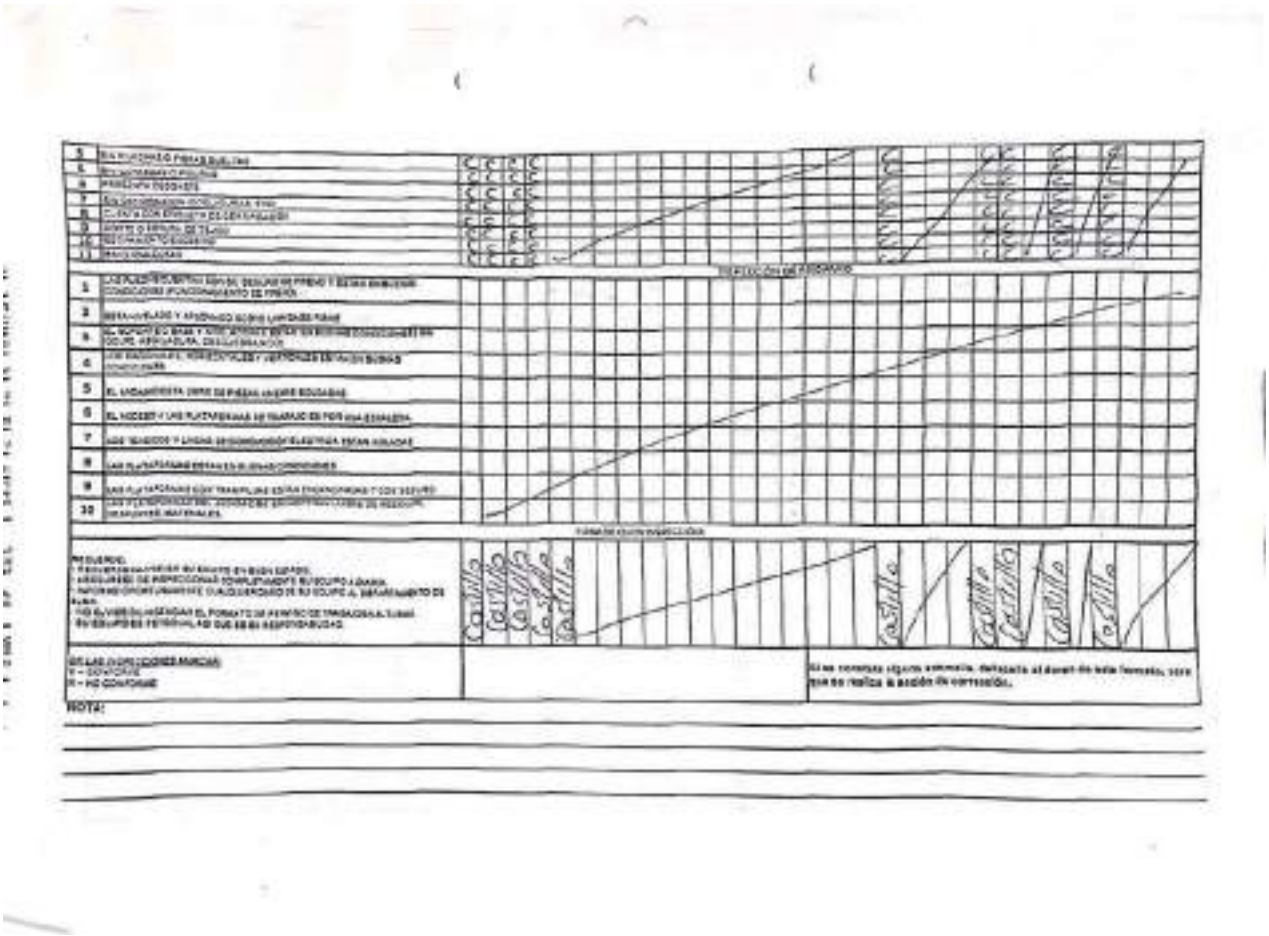

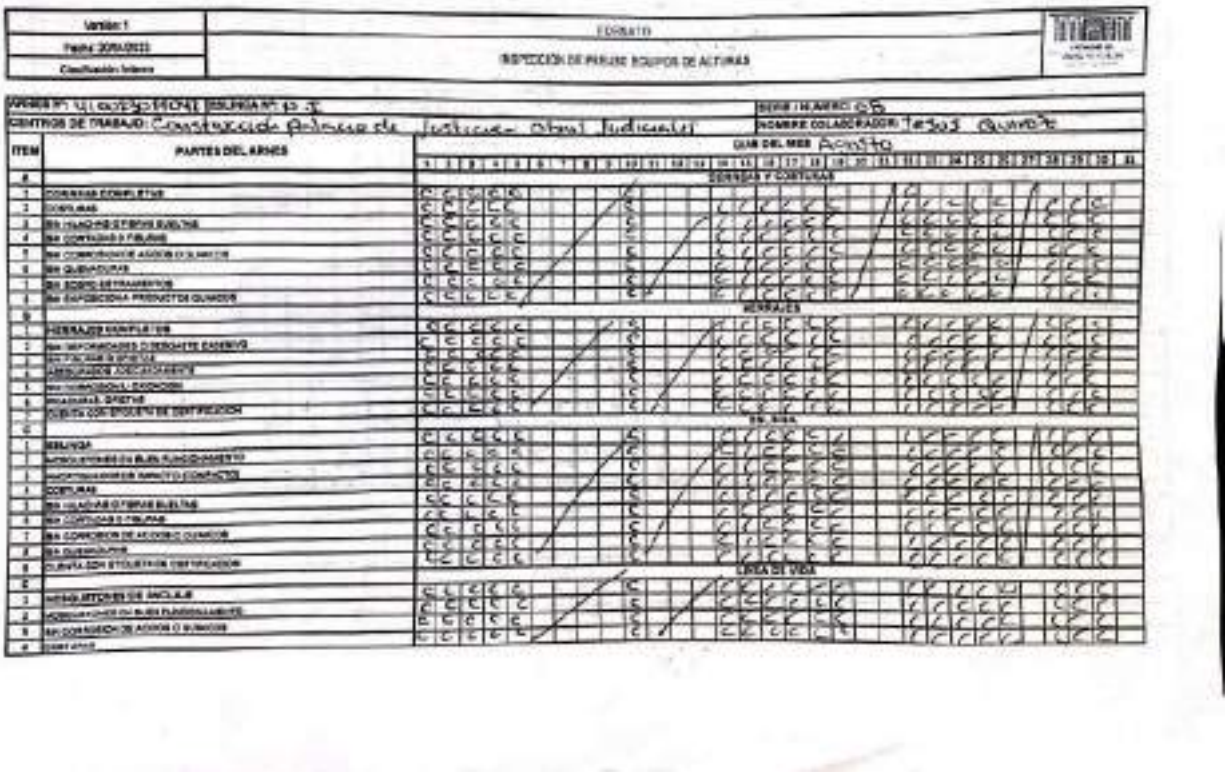


Versión 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2021	INSPECCIÓN DE PARTES, EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		


CENTROS DE TRABAJO: Construcción Palacio de Justicia - Obras Judiciales


NOMBRE COLABORADOR: Jesus Quintero


MES DEL MES: Agosto


ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y CORTEZAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
2	CORTEZAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
3	EN HUECOS O TIRAS SUELTAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
4	EN CORTEZAS O PALAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
5	EN CORROSIÓN DE ACERO O QUIMICOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
6	EN QUEMADURAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
7	EN SOBRE ESTIRAMIENTOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
8	EN EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUIMICOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES HABILITADOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
2	EN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
3	EN FISURAS O GRIETAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
4	ABRAZADERAS ADECUADAMENTE	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
5	EN CORROSIÓN O EXCESO	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
6	ENGANCHES, GANCHOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
7	CUENTA CON SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
C	EN SOGA																															
1	SOGA	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
2	EN DESGASTE O MAL FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
3	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
4	CORREAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
5	EN HUECOS O TIRAS SUELTAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
6	EN CORTEZAS O PALAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
7	EN CORROSIÓN DE ACERO O QUIMICOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
8	EN QUEMADURAS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
9	CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
D	LINEA DE VIDA																															
1	HERRAJES DE ANCLAJE	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
2	HOMOLOGACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
3	EN CORROSIÓN DE ACERO O QUIMICOS	C	C	C	C	C					C						C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		
4	CORREAS																															

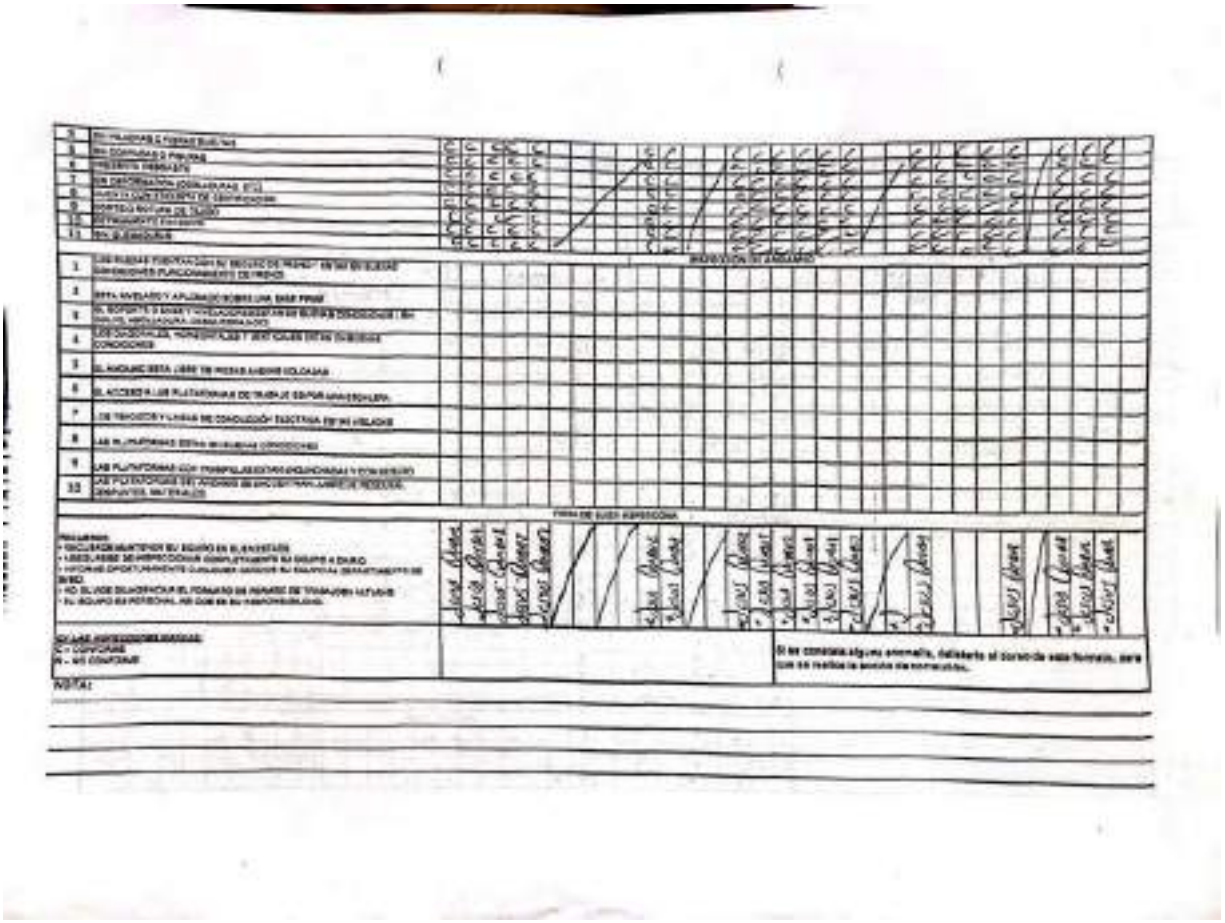


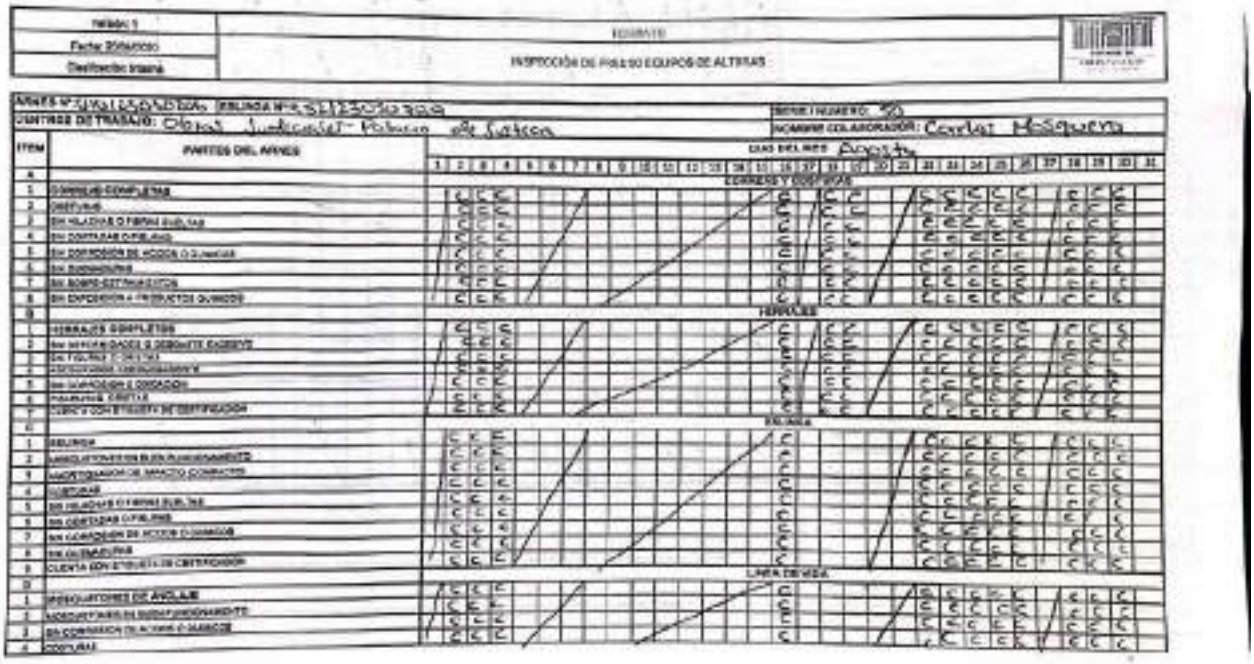

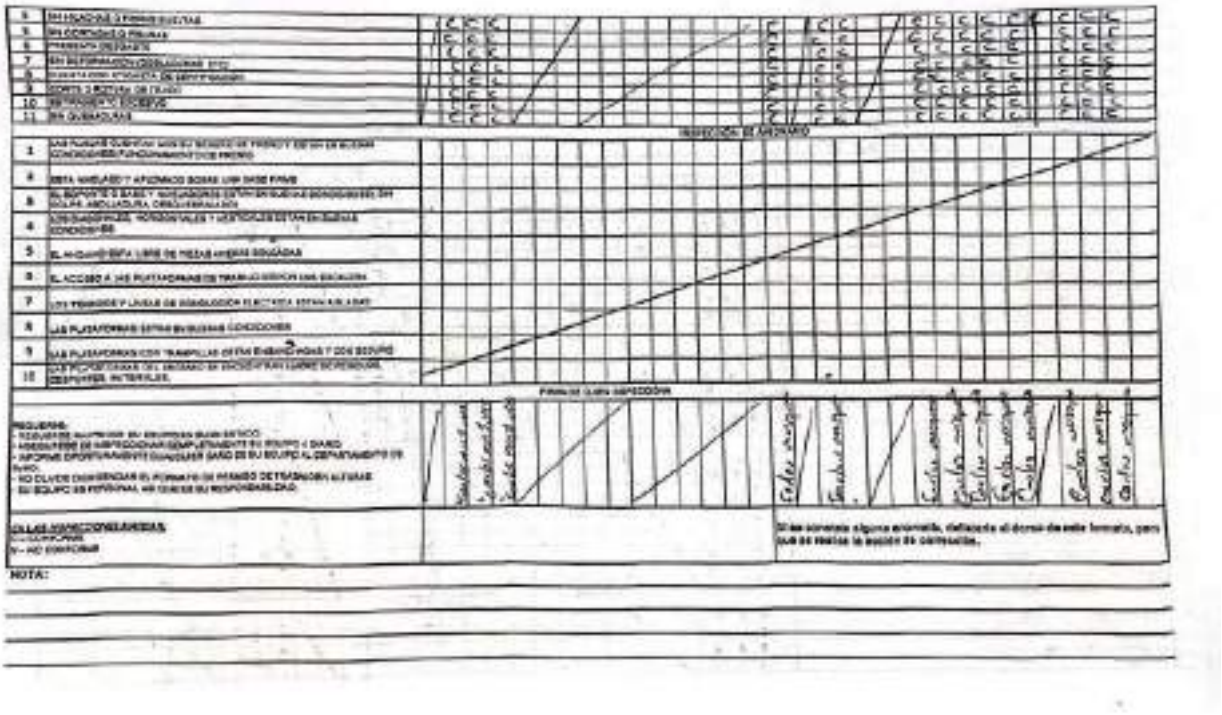

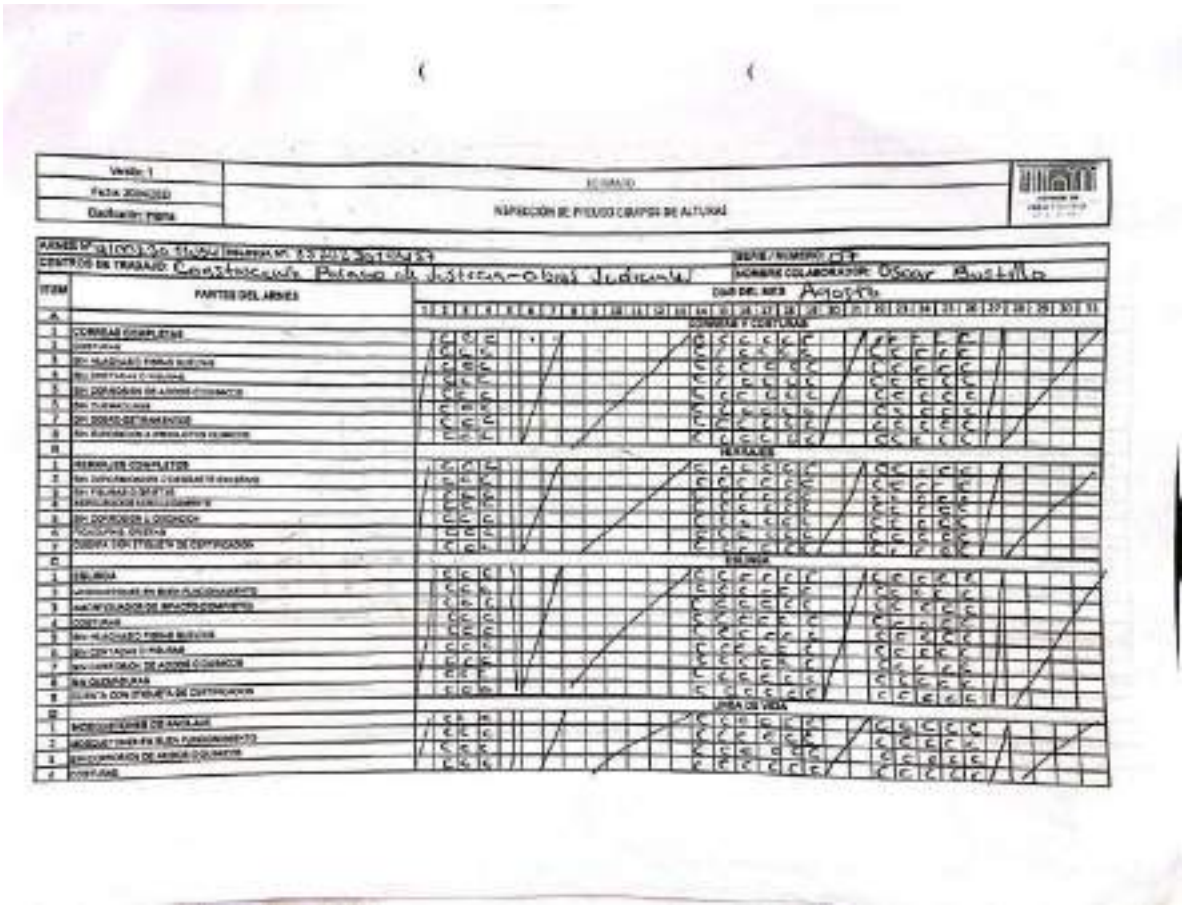

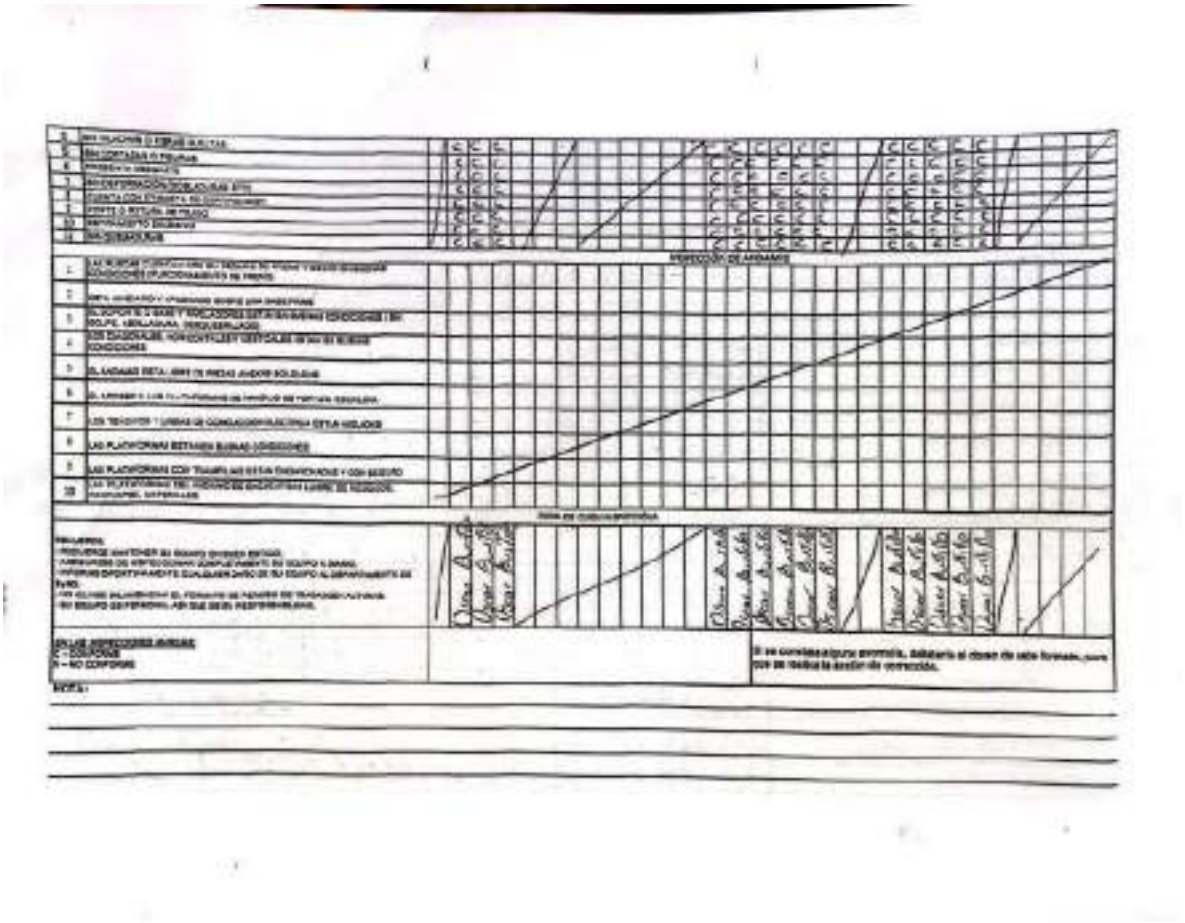

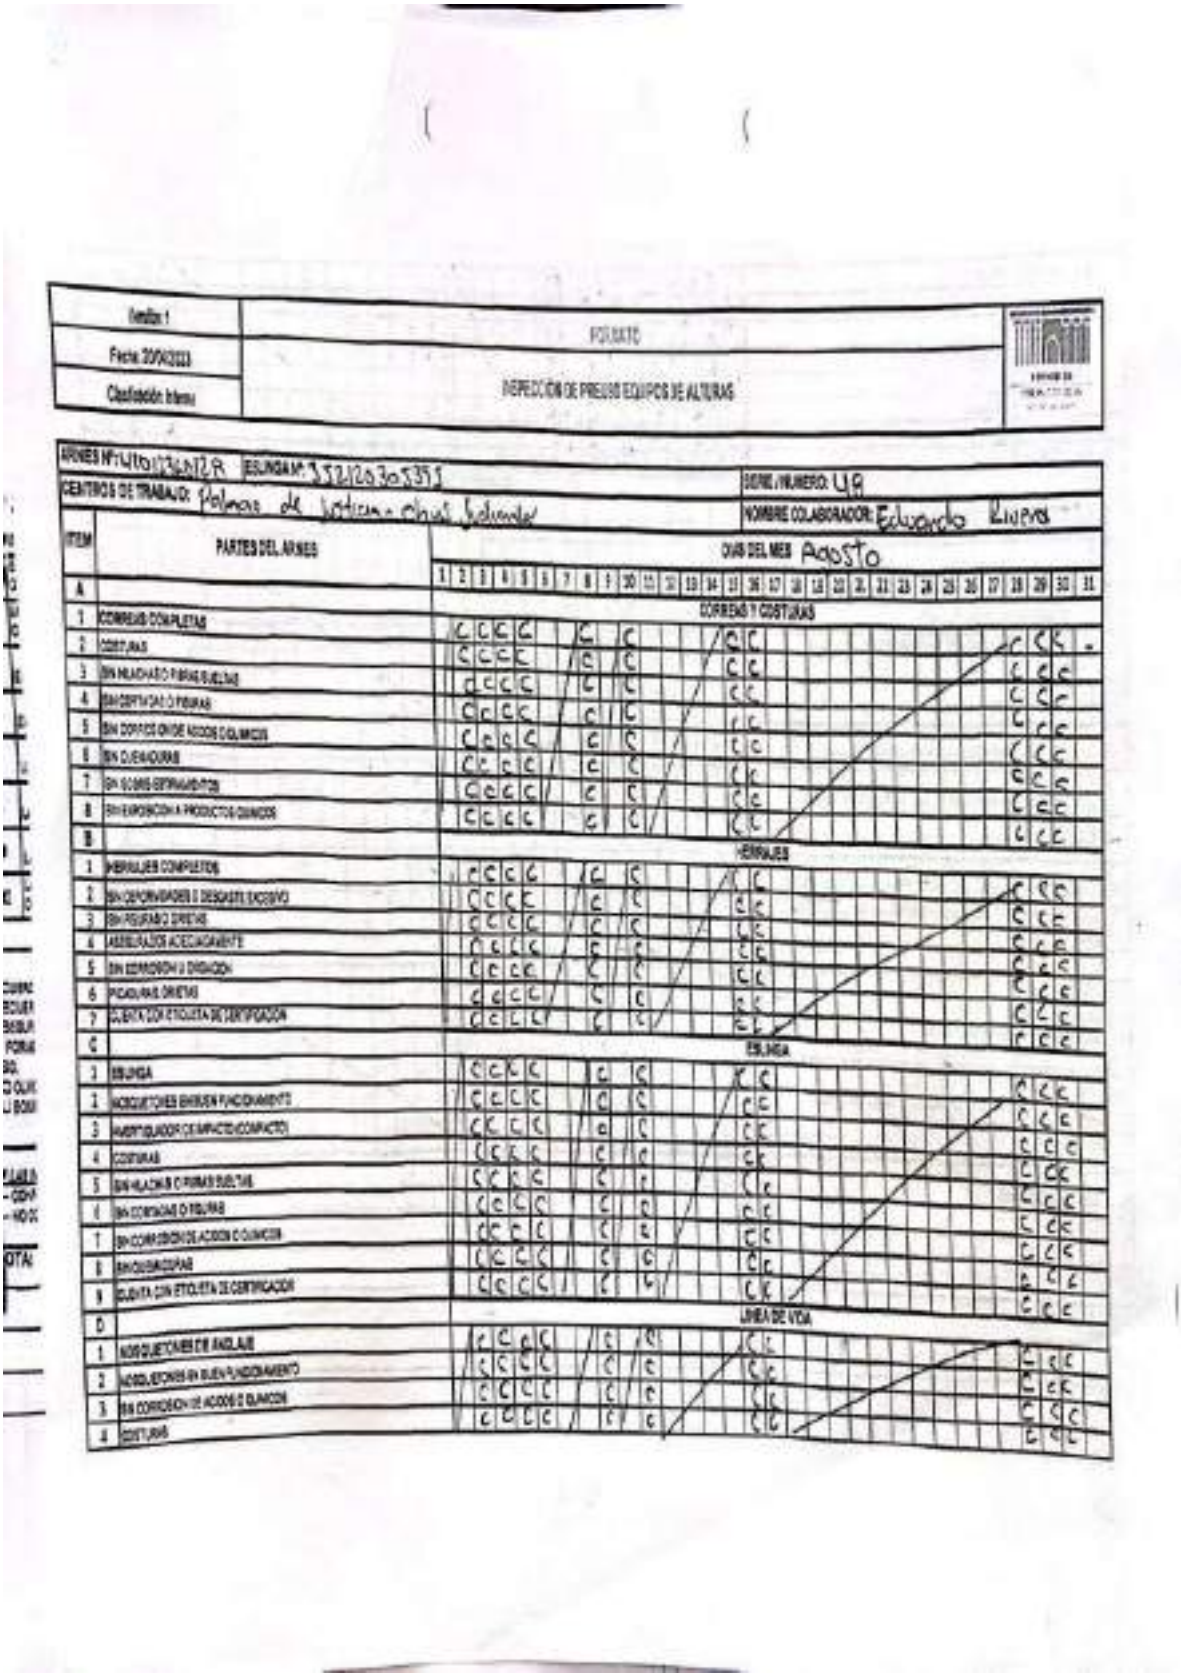

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2013	INSPECCIÓN DE PRELISTA EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		

ARNES Nº: [illegible] ESLINGA Nº: [illegible]


CENTROS DE TRABAJO: Palmas de Bucaramanga Ciudad Bolivar


TORRE / NUMERO: UG


NOMBRE COLABORADOR: Eduardo Lopez


DIAS DEL MES: Agosto


ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
2	COSTURAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
3	SIN HUMEDAD O PINTURA SOBRE LAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
4	SIN CERTIFICADO O PINTURA	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
5	SIN DOBLECES O ROSE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
6	SIN QUEMADURAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
7	SIN SOLDADURA O DERRAMIENTOS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
5	SIN CORROSION O DECOLORACION	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
6	PICADURAS O GRIETAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO EN COMPACTO	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
4	COSTURAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
5	SIN HUMEDAD O PINTURA SOBRE LAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
6	SIN CORROSION O ESLINGA	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
8	SIN QUEMADURAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	
4	COSTURAS	C	C	C	C		C		C			C	C								C	C	C							C	C	

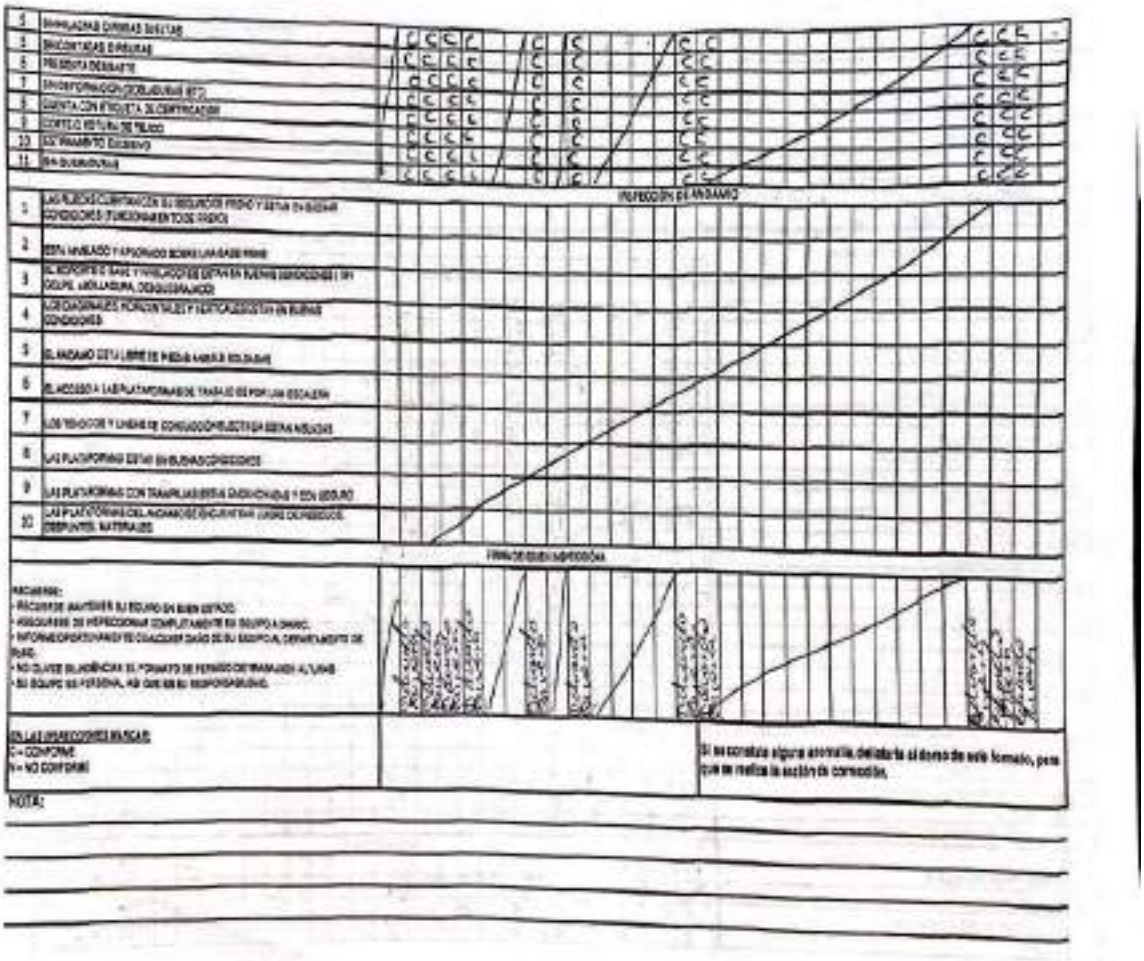


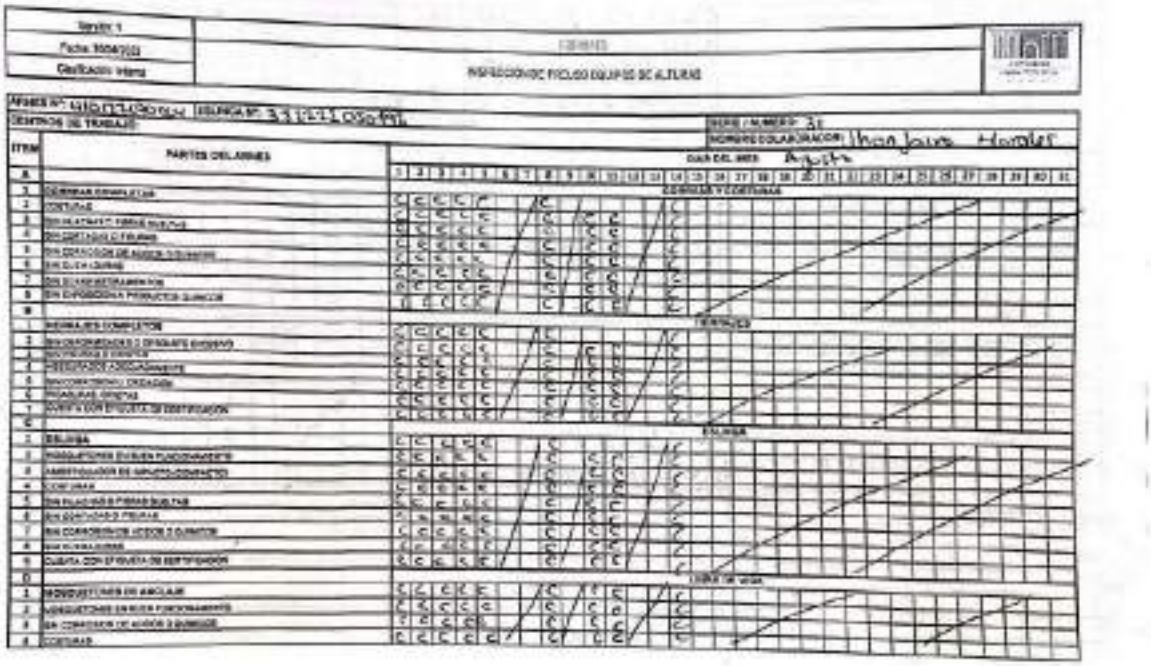


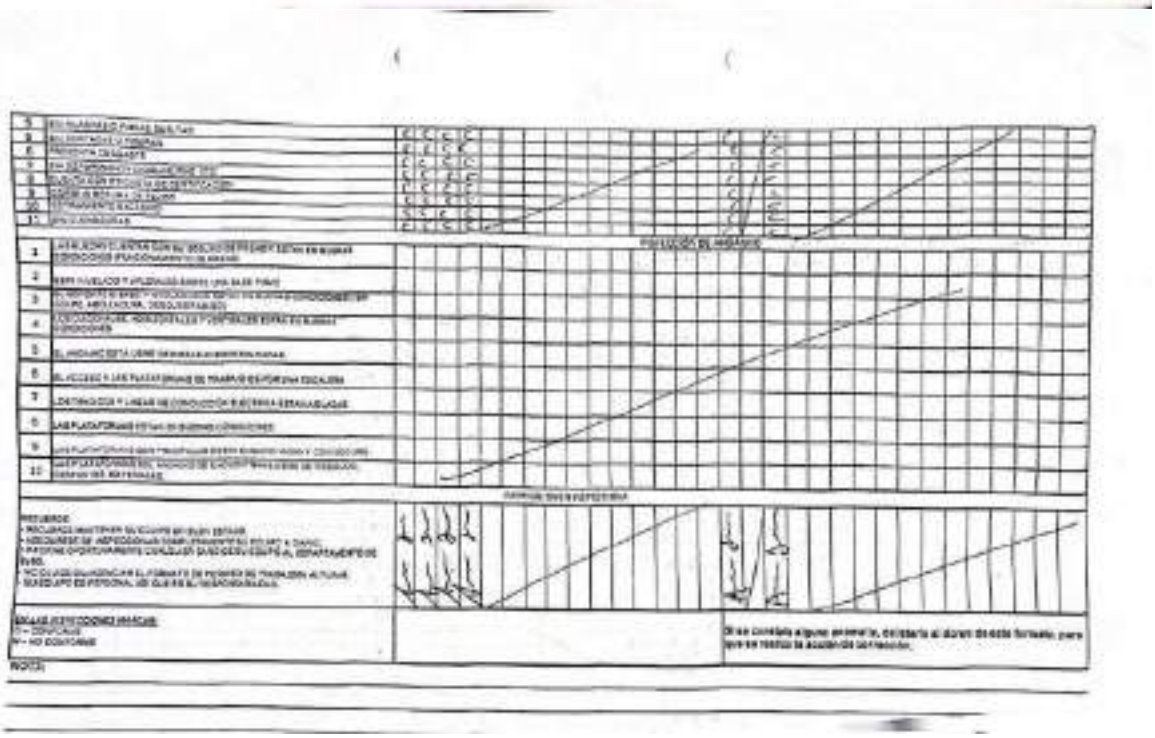


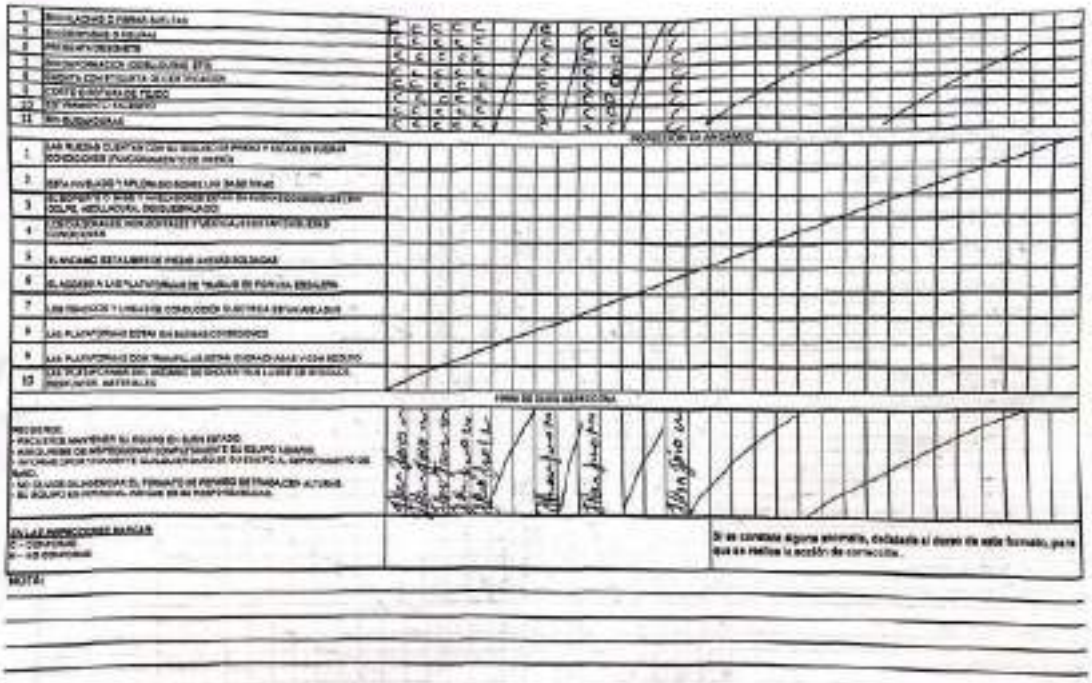


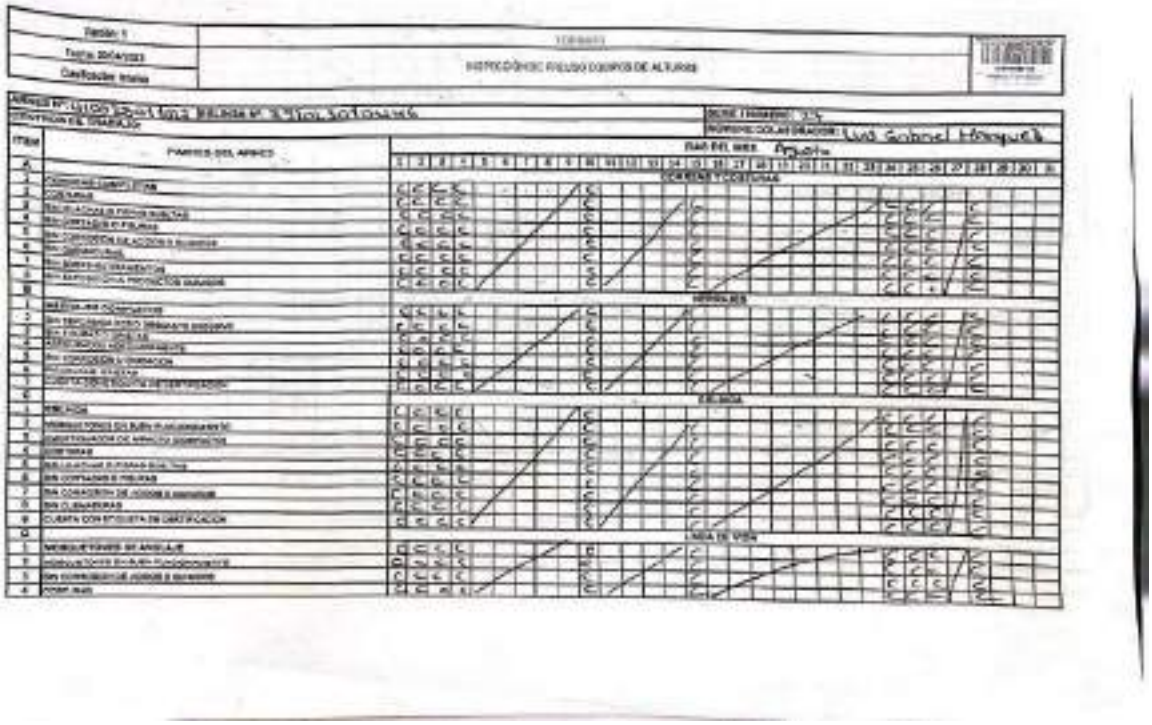


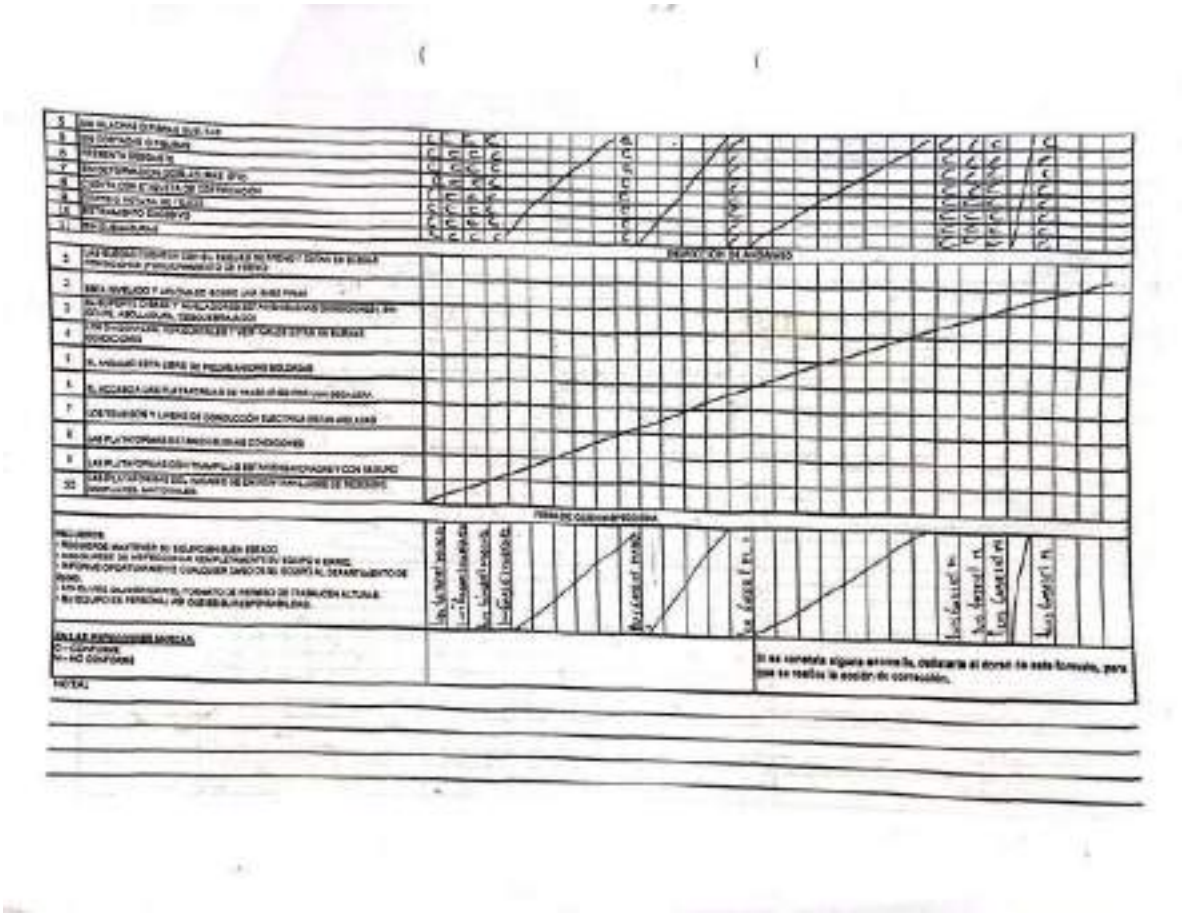


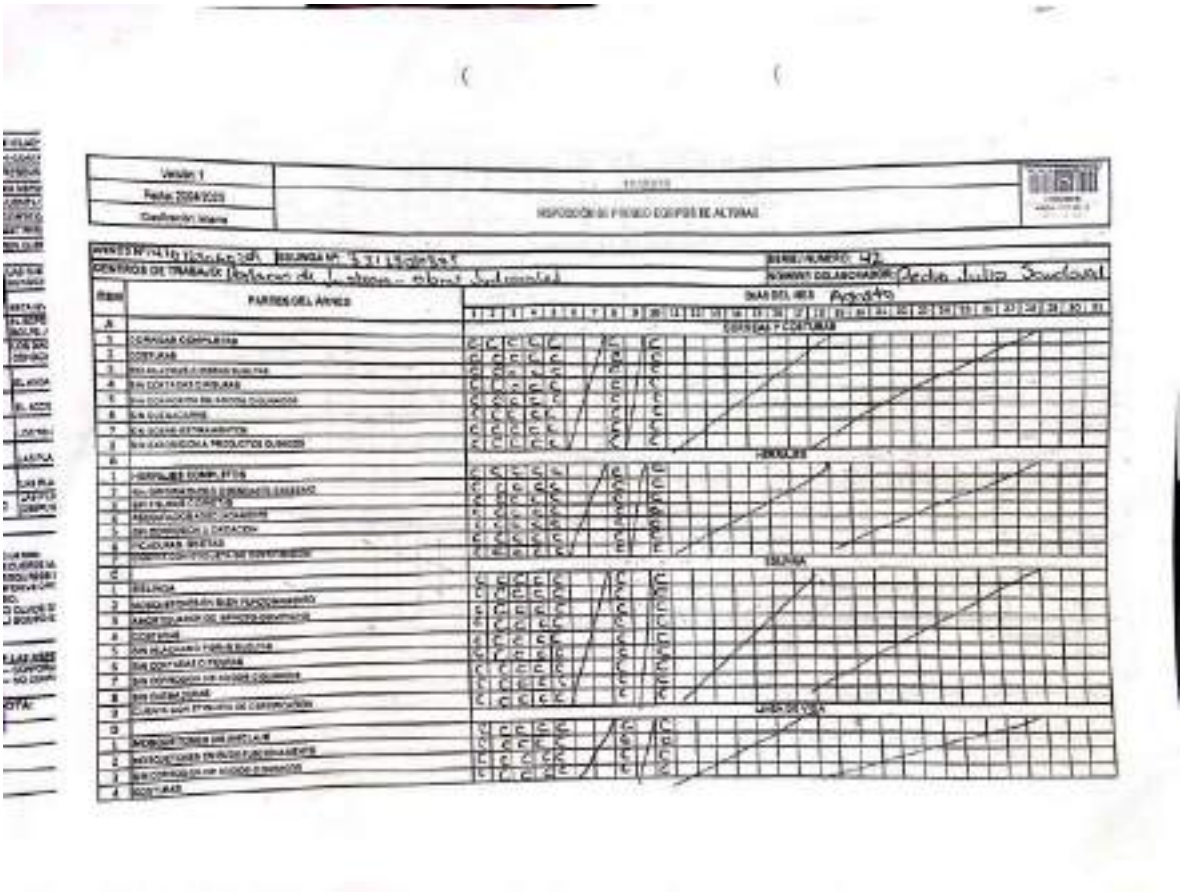


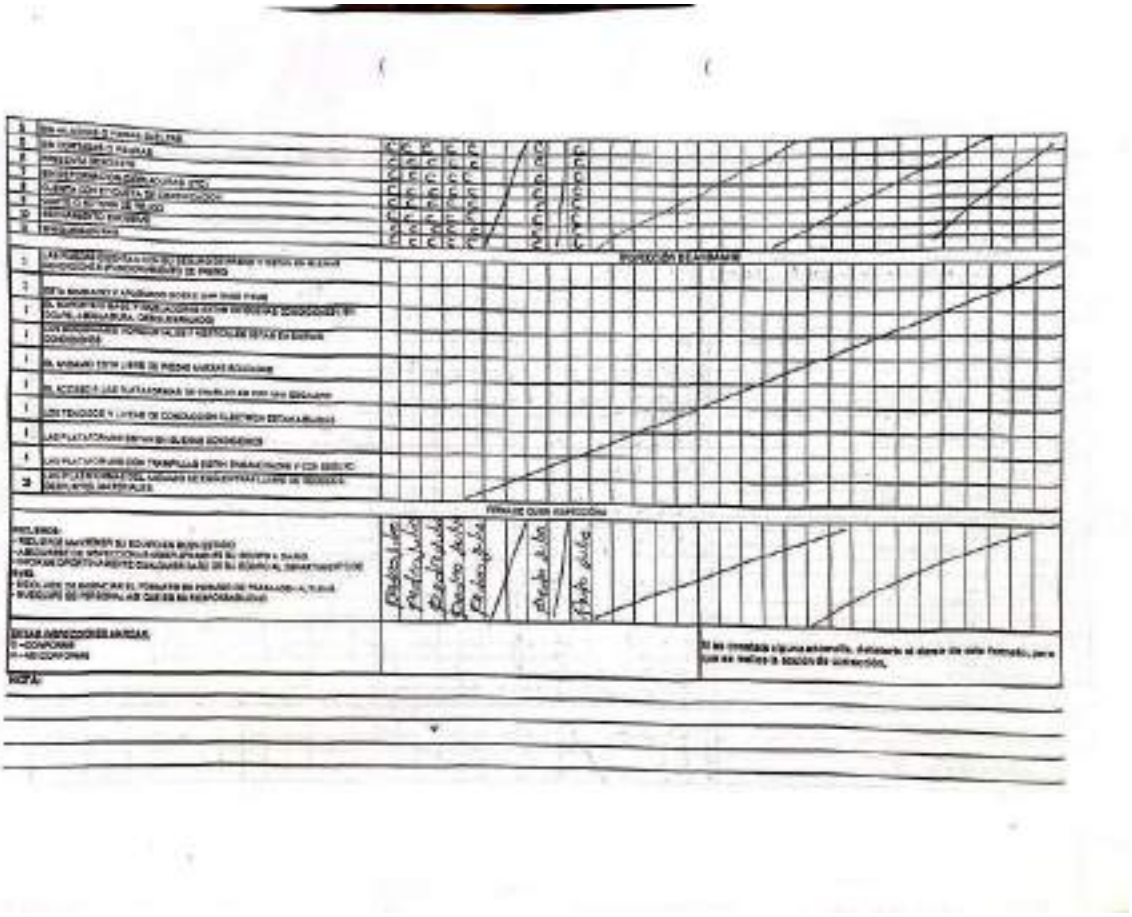


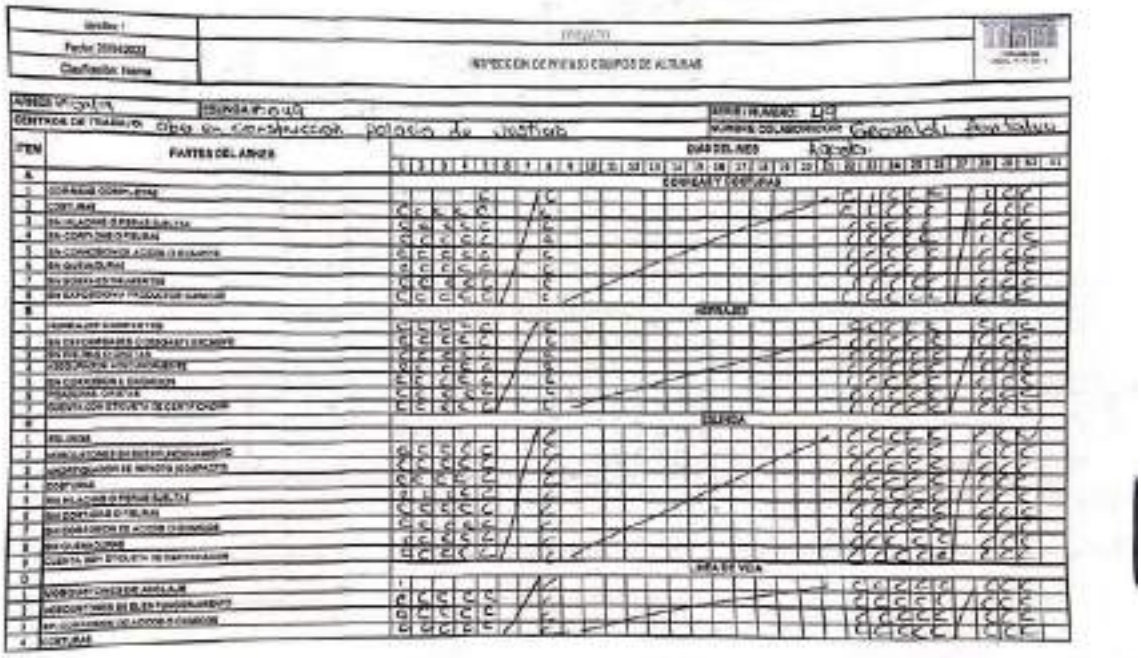


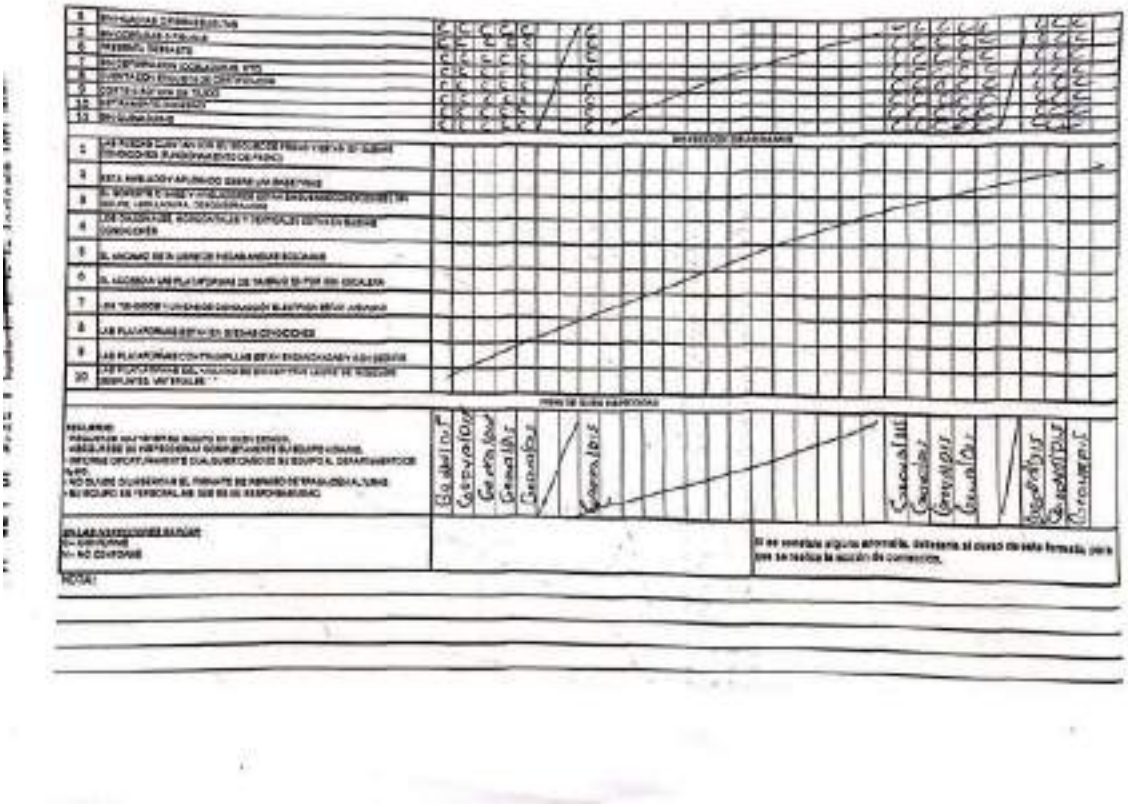


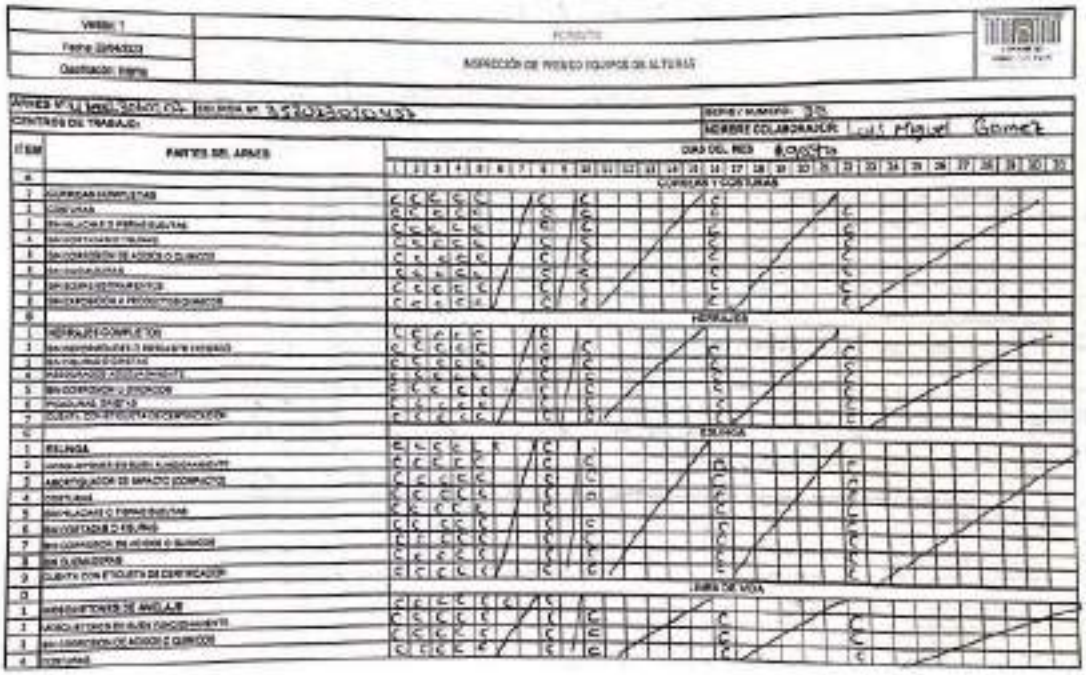


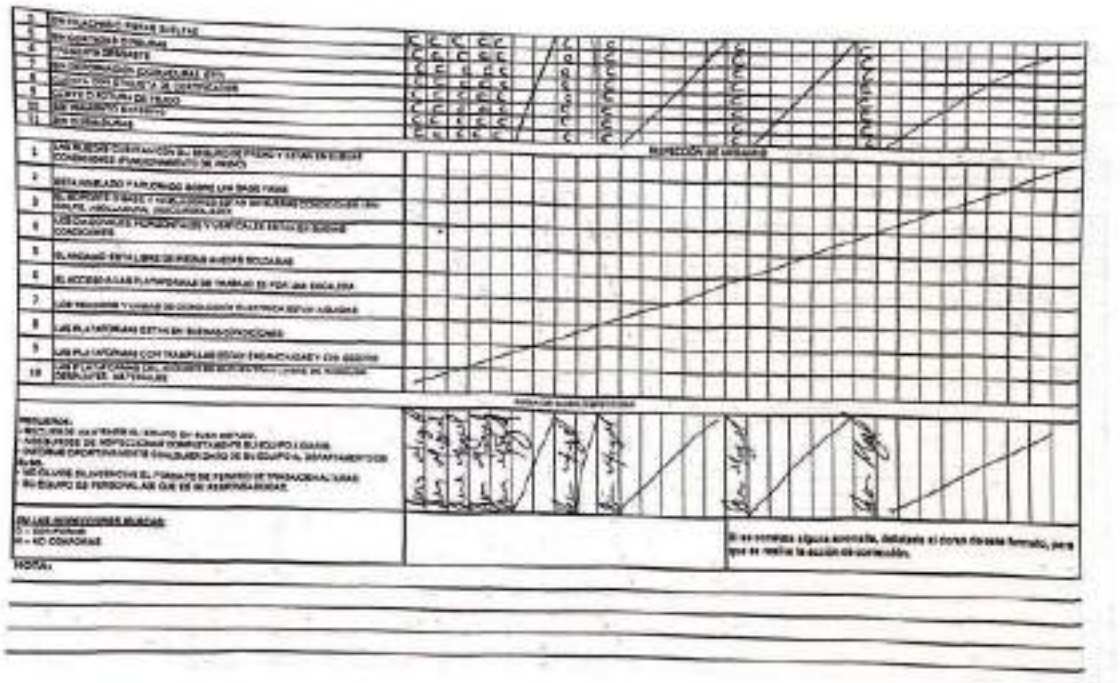


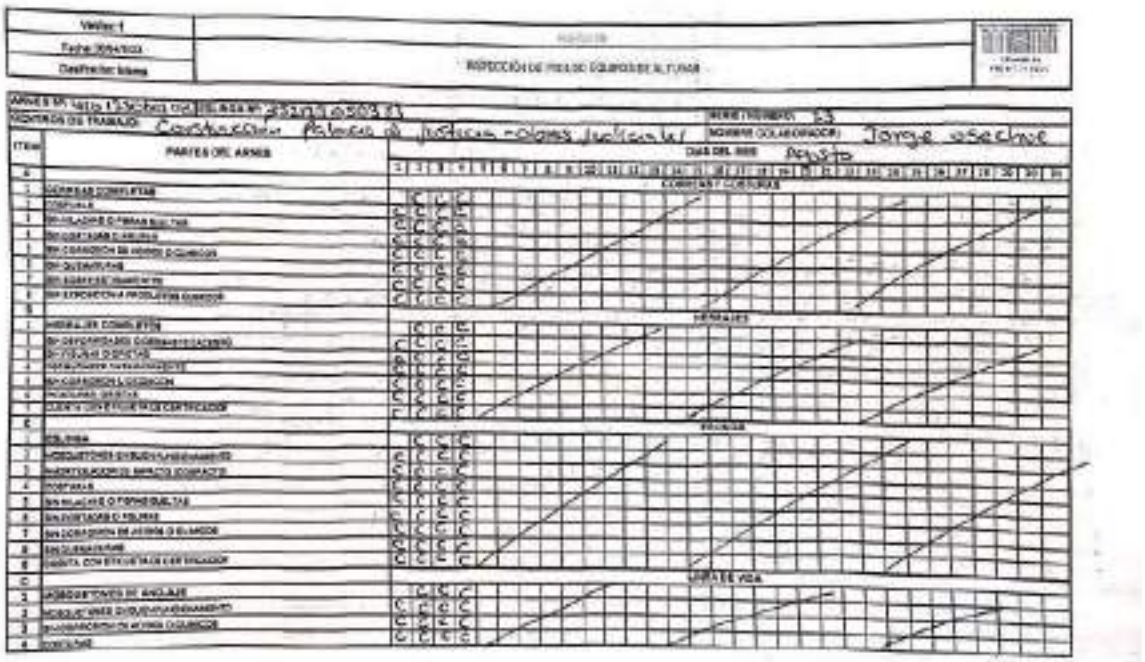


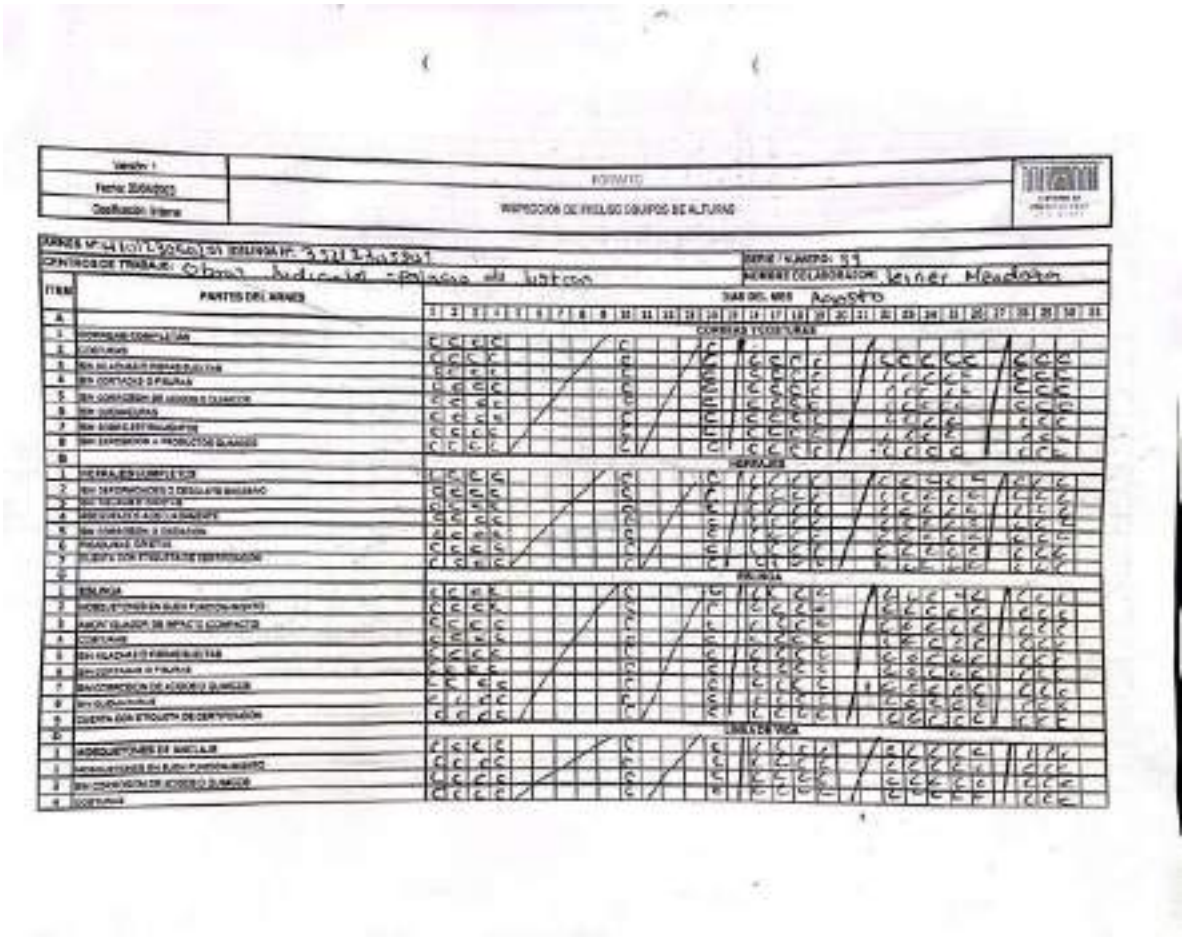


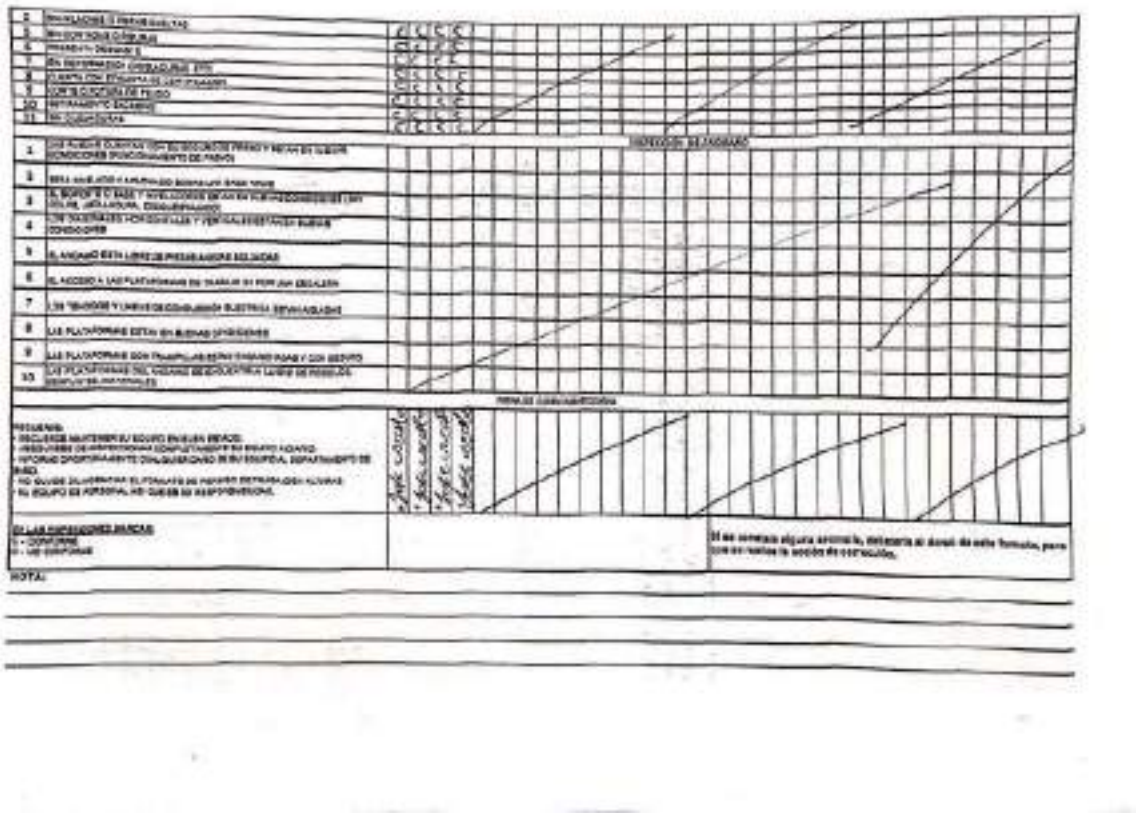


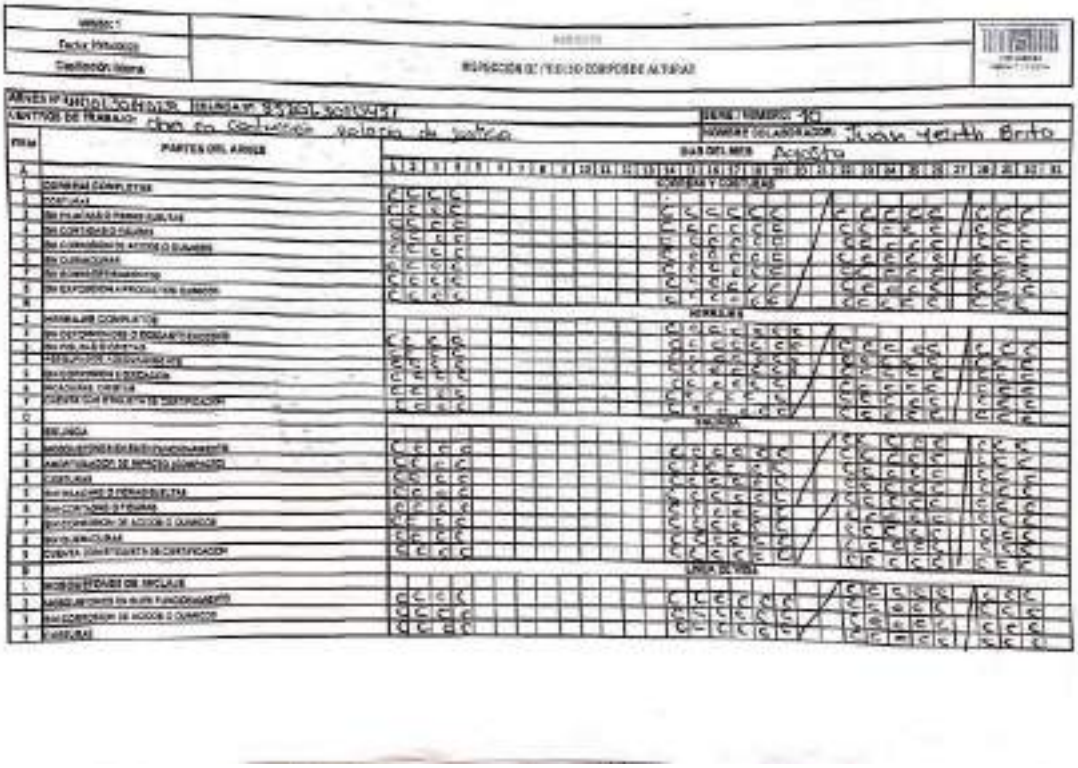


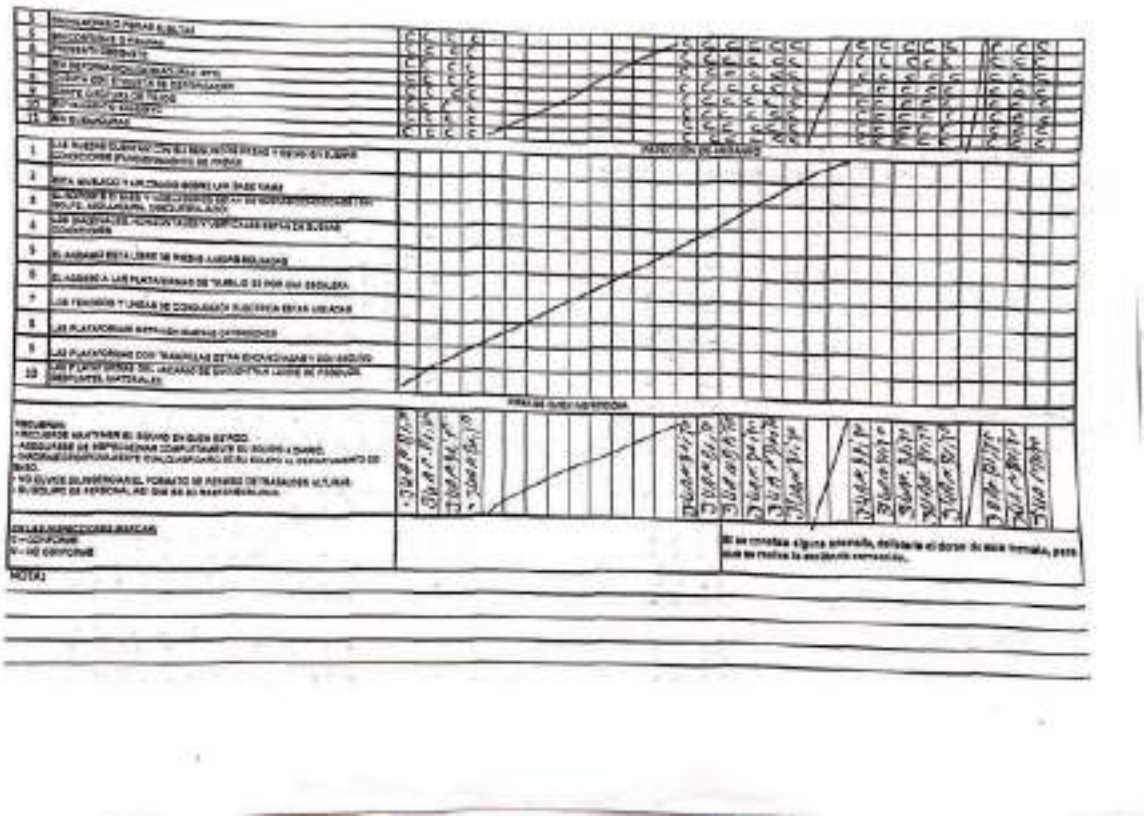


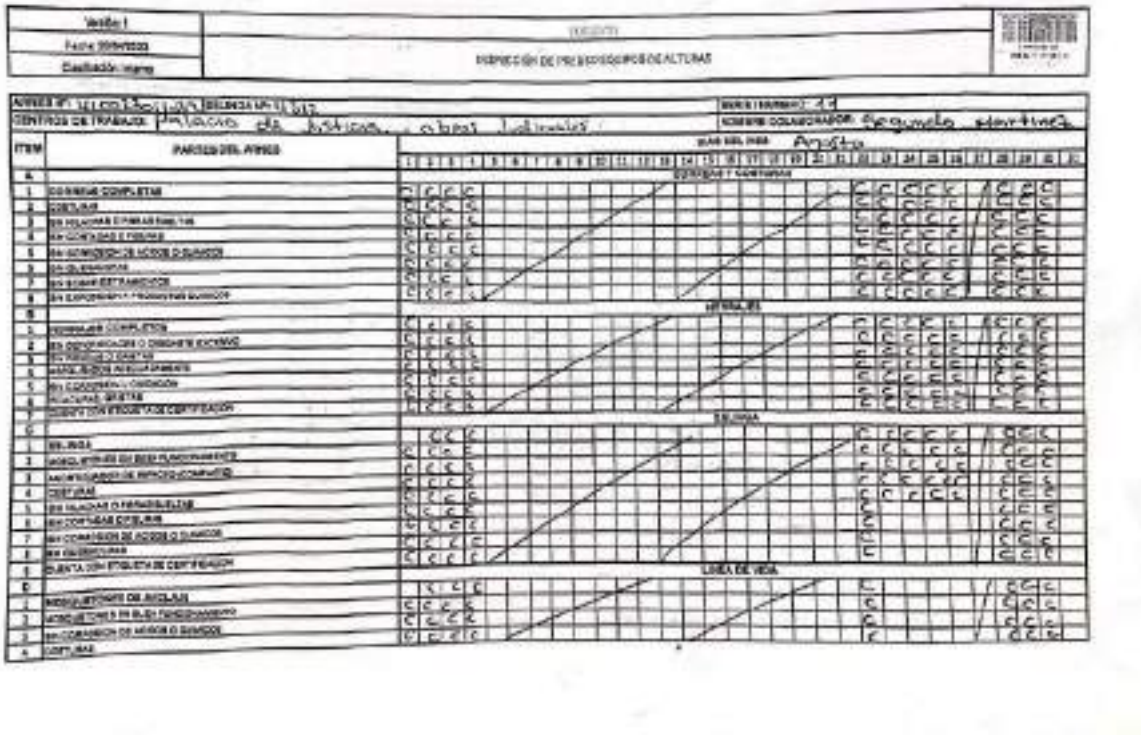


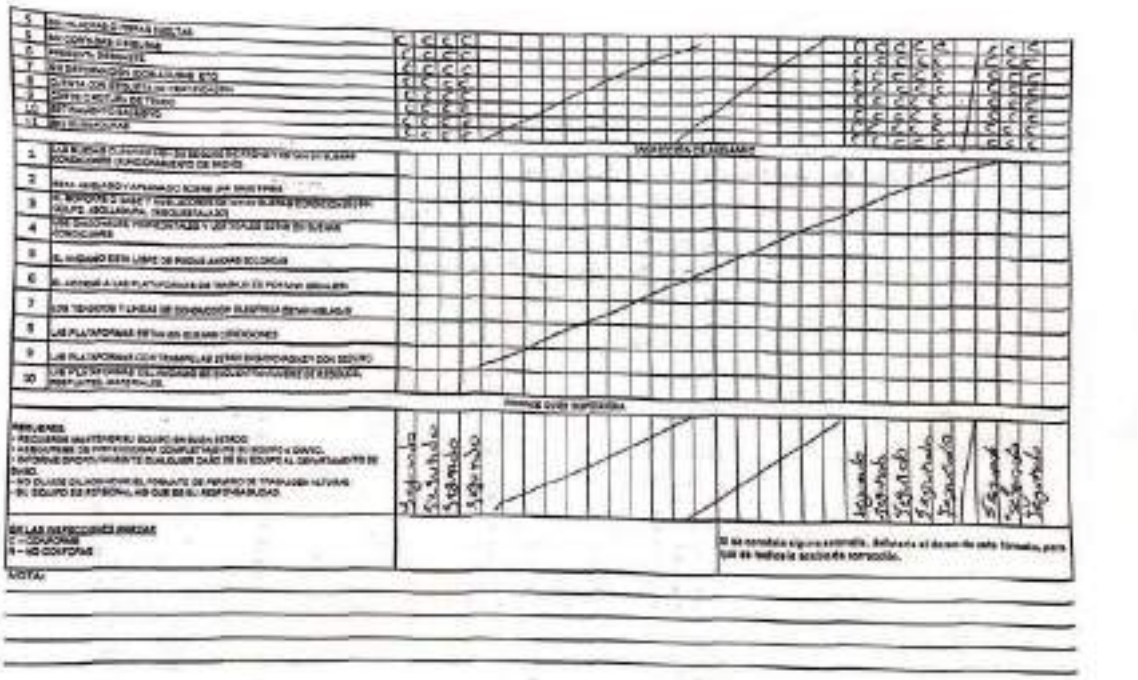


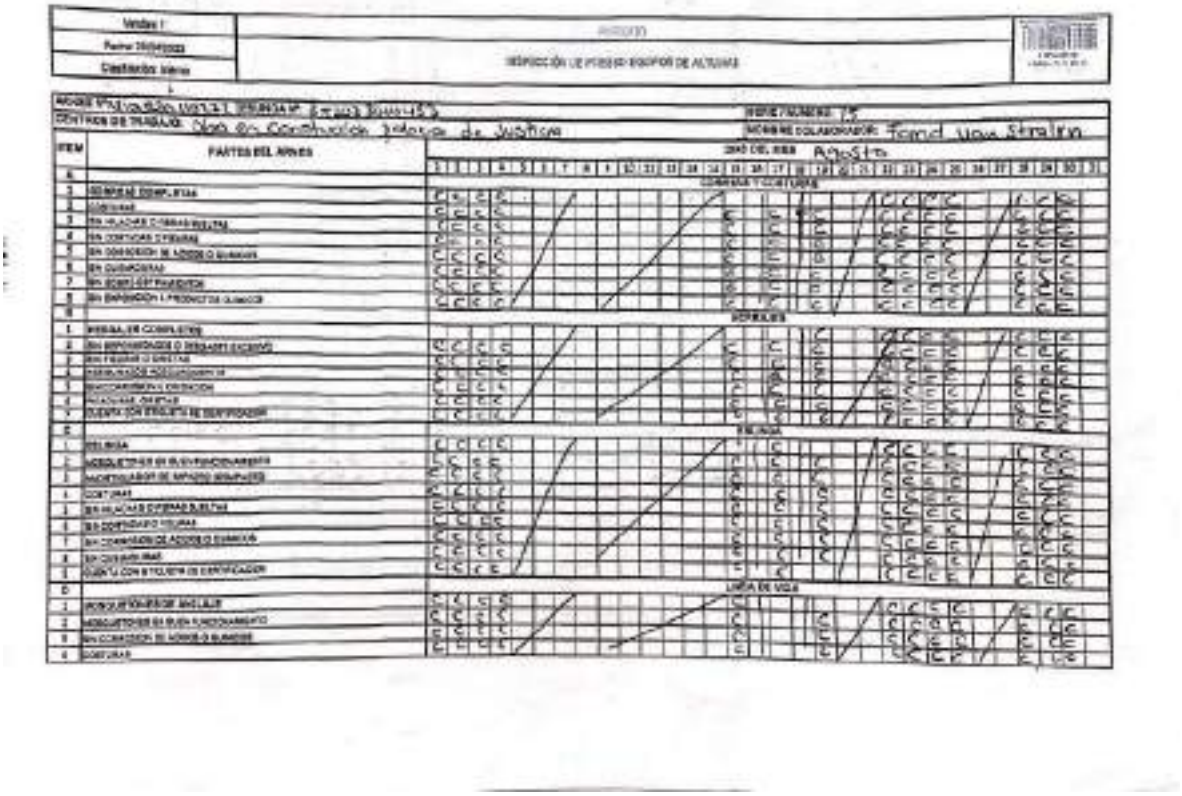


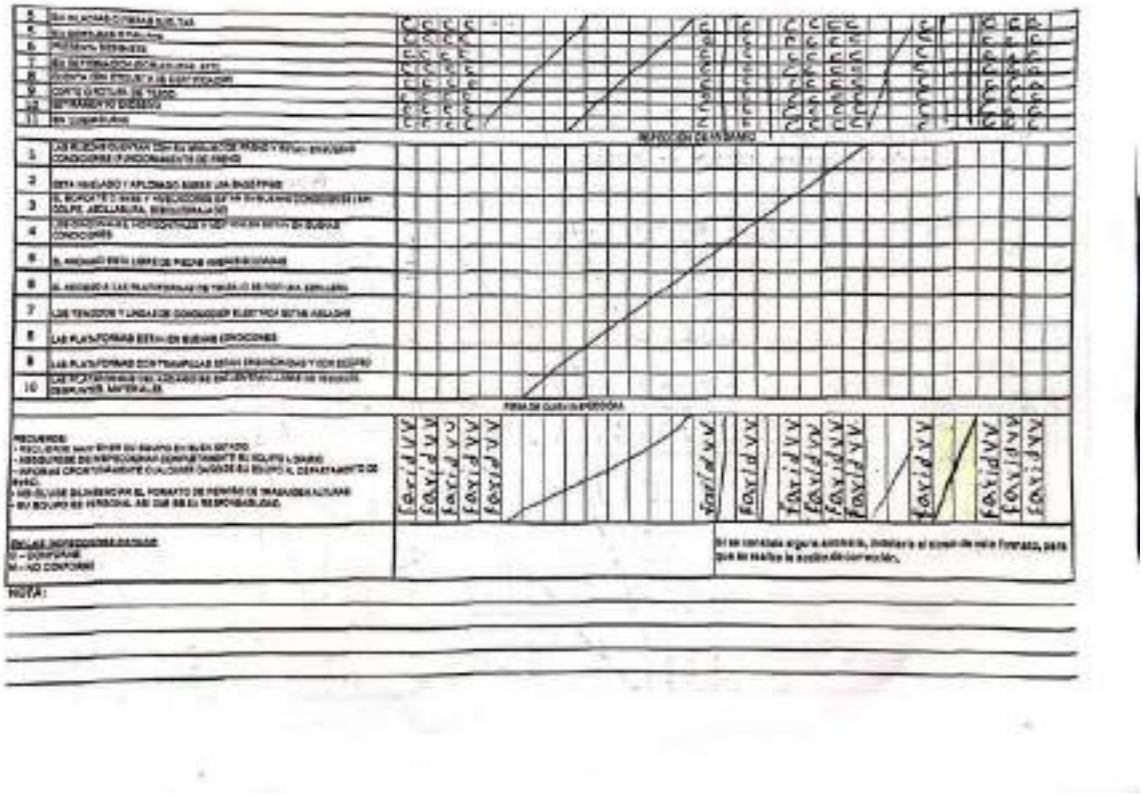


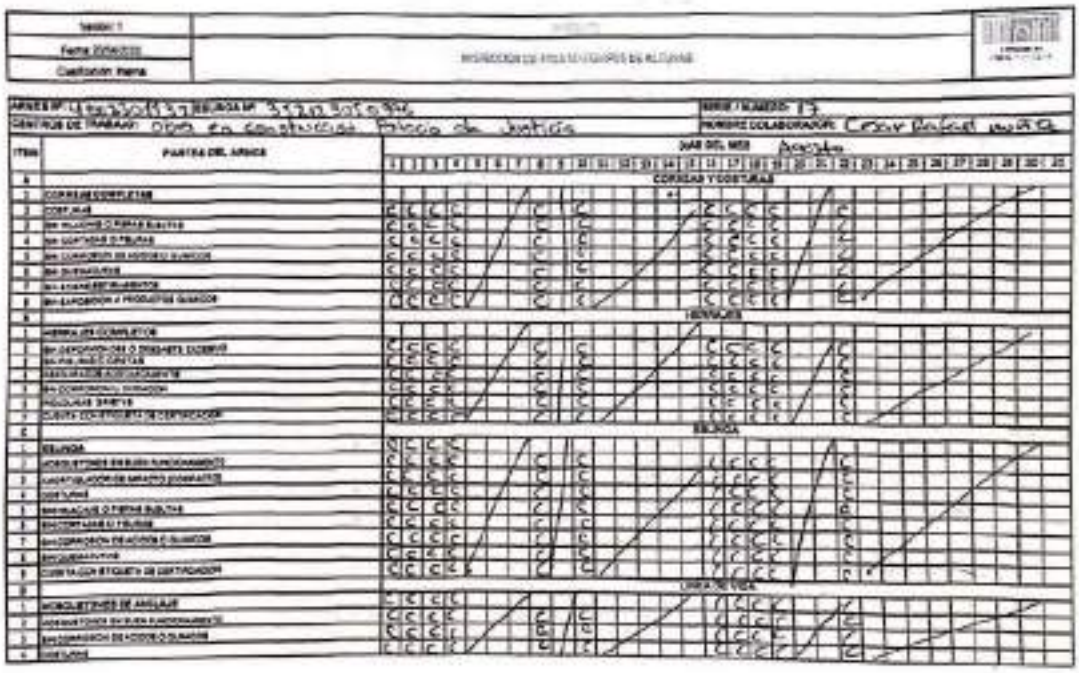


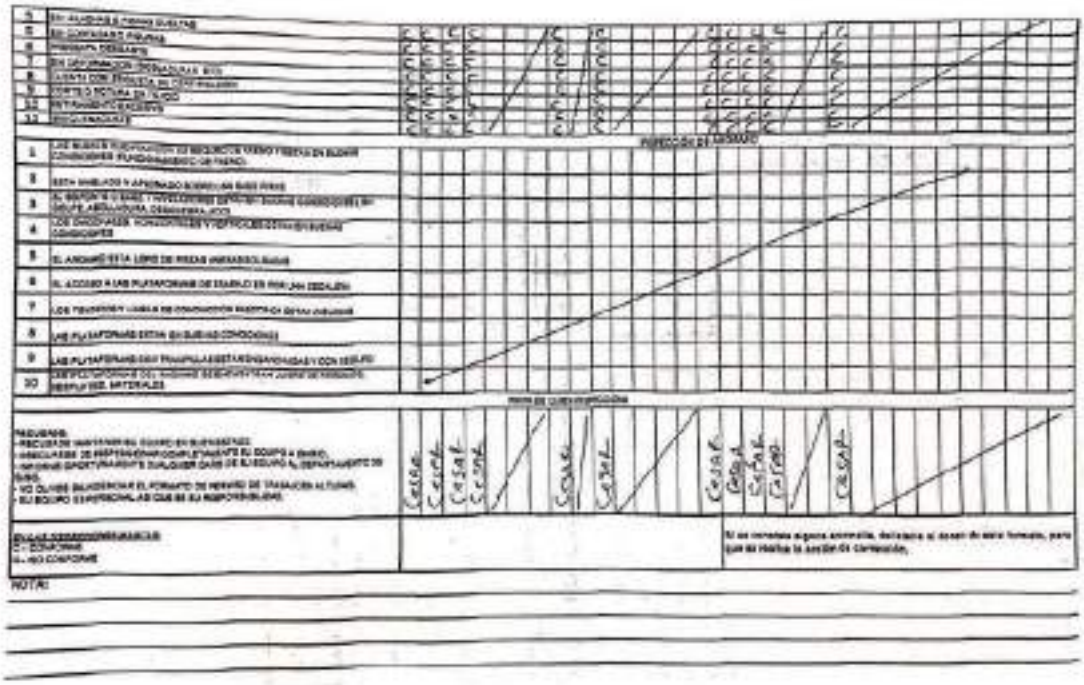


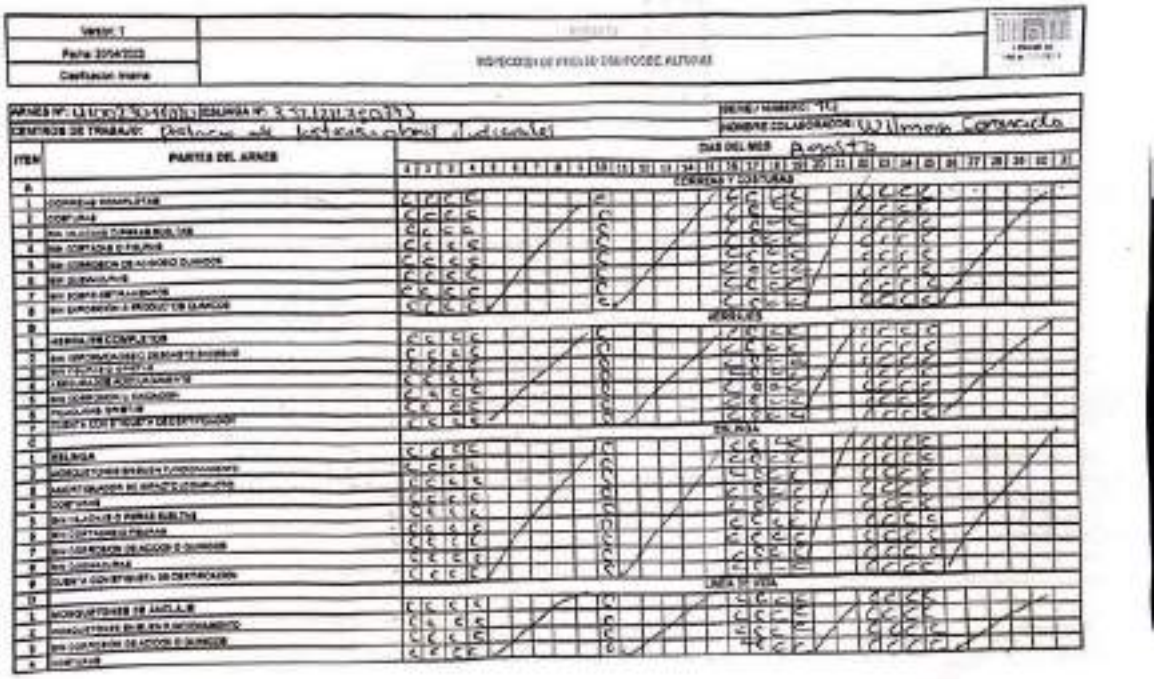


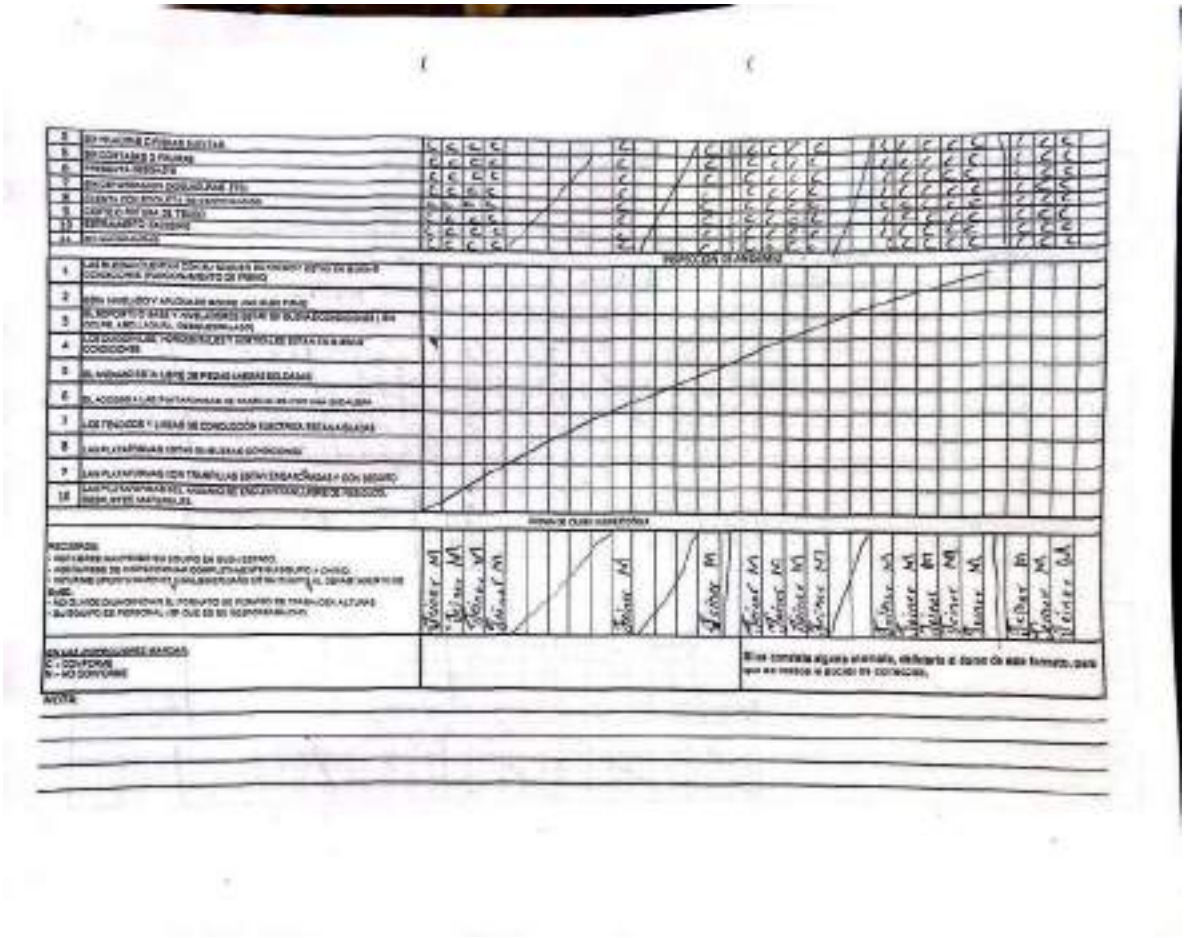


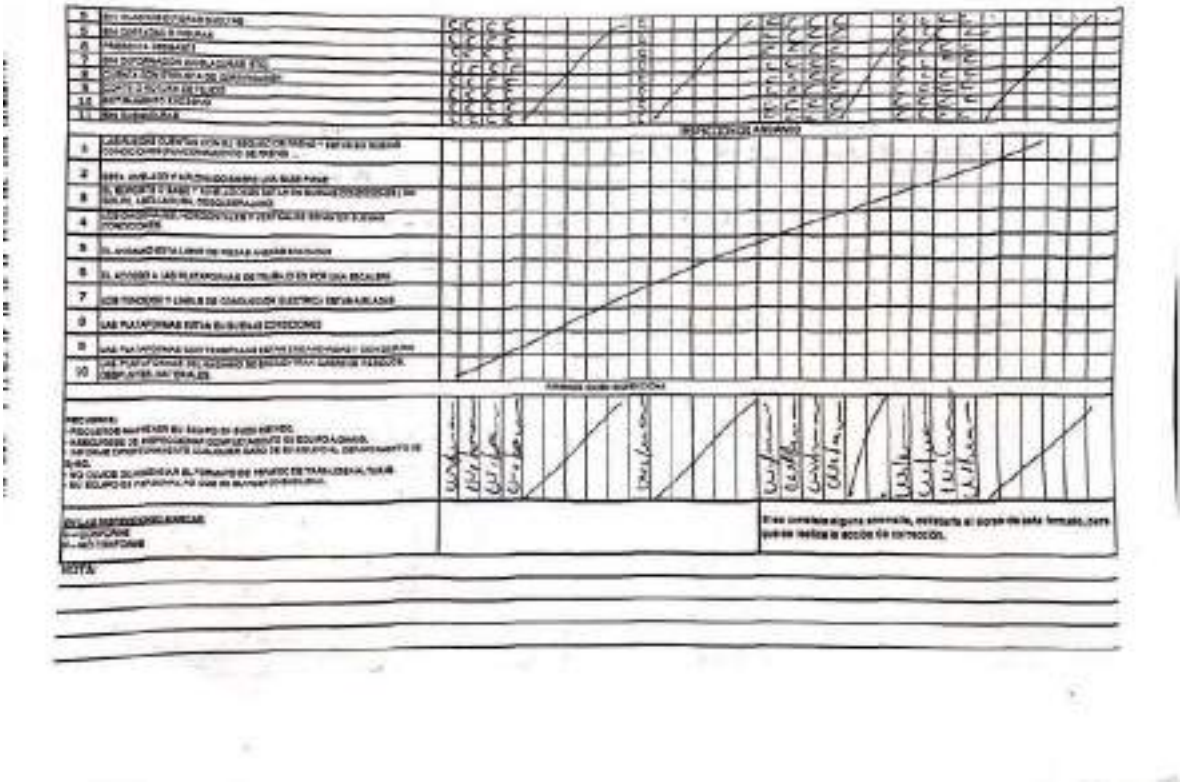


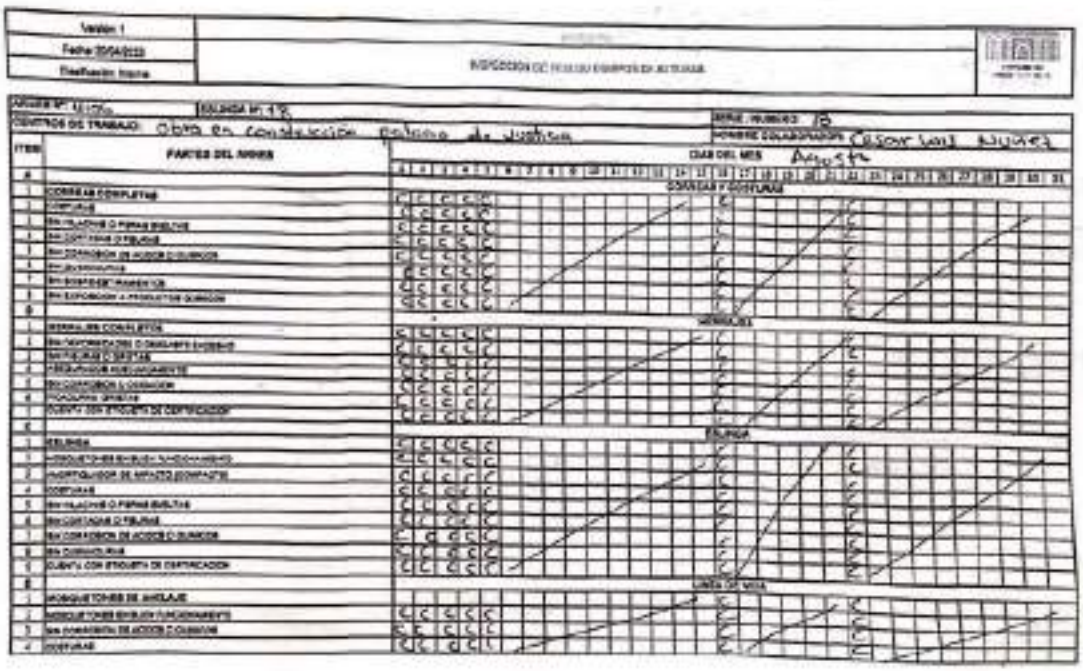


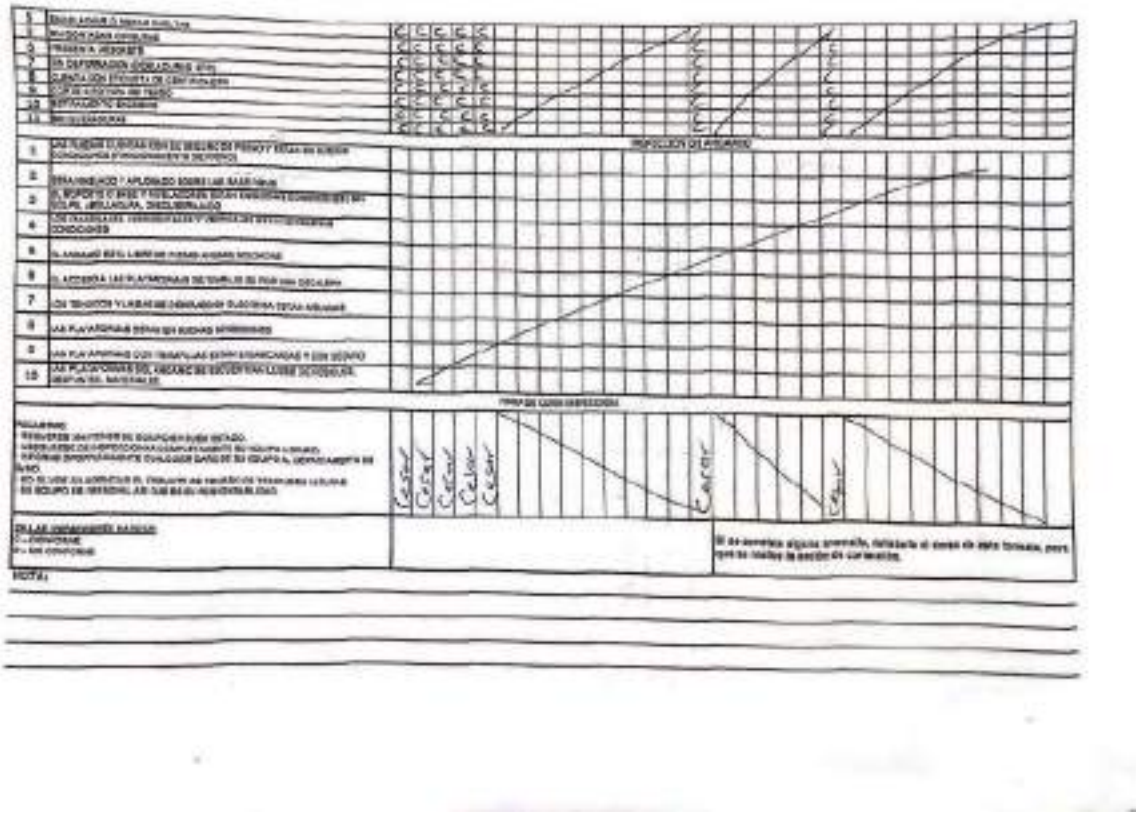


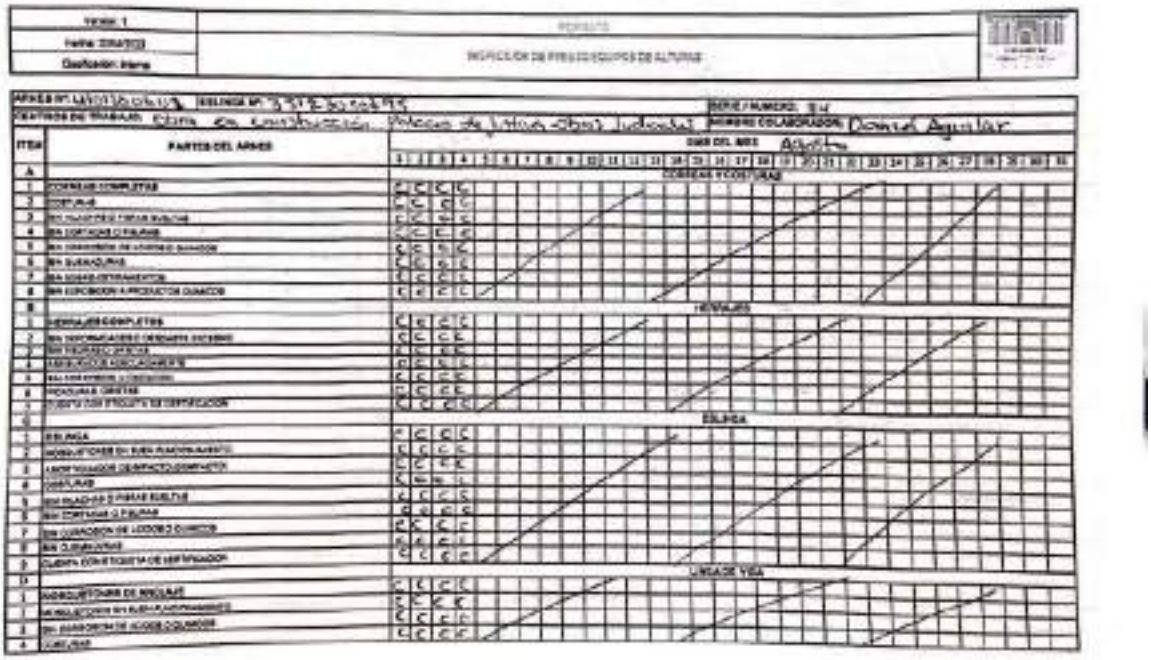


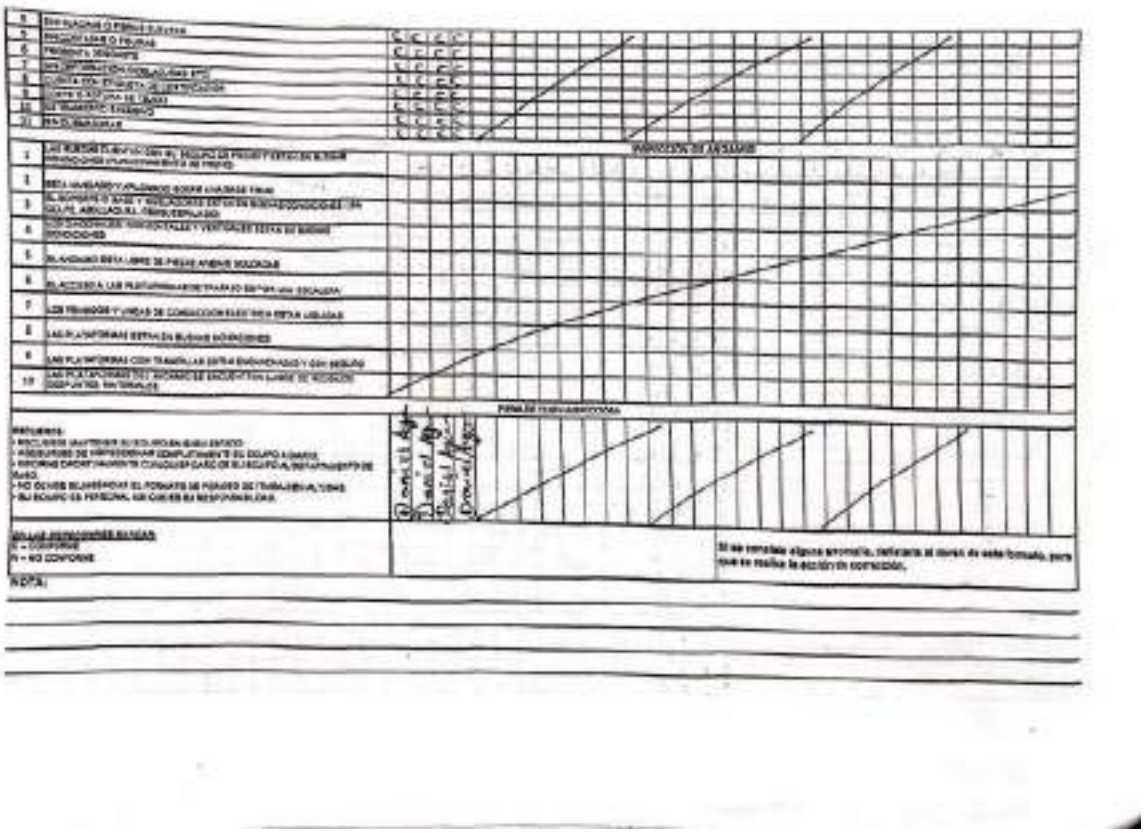

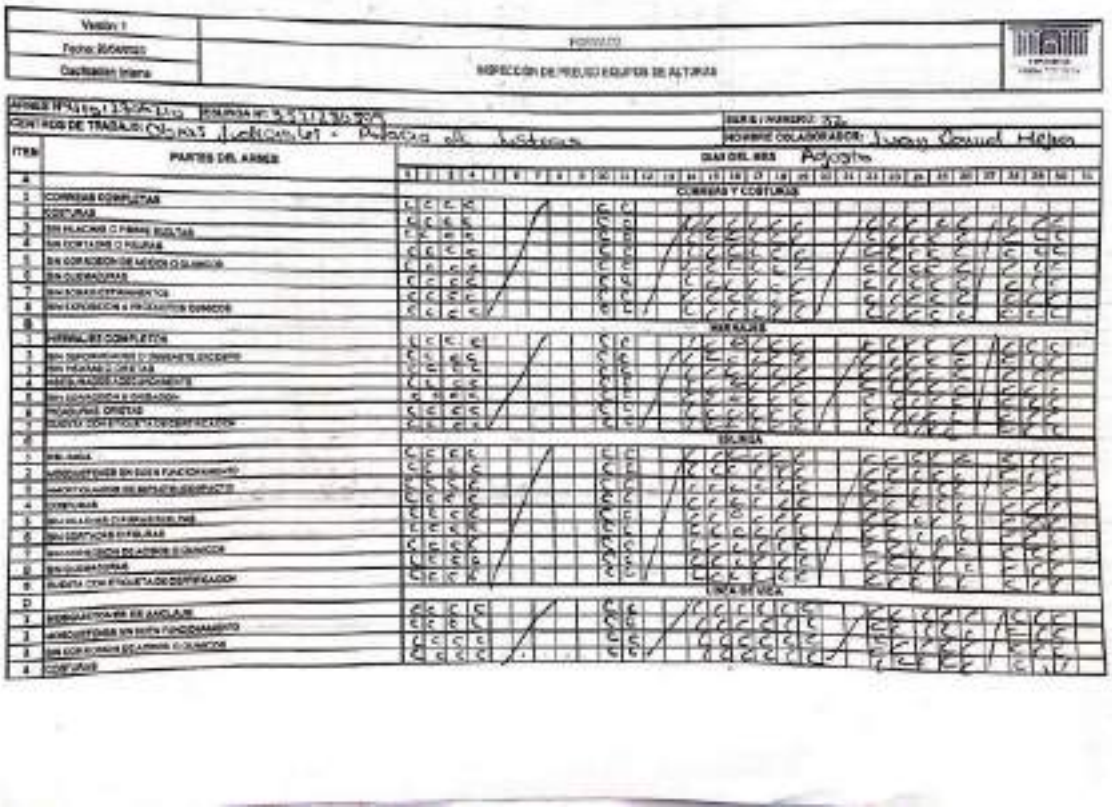


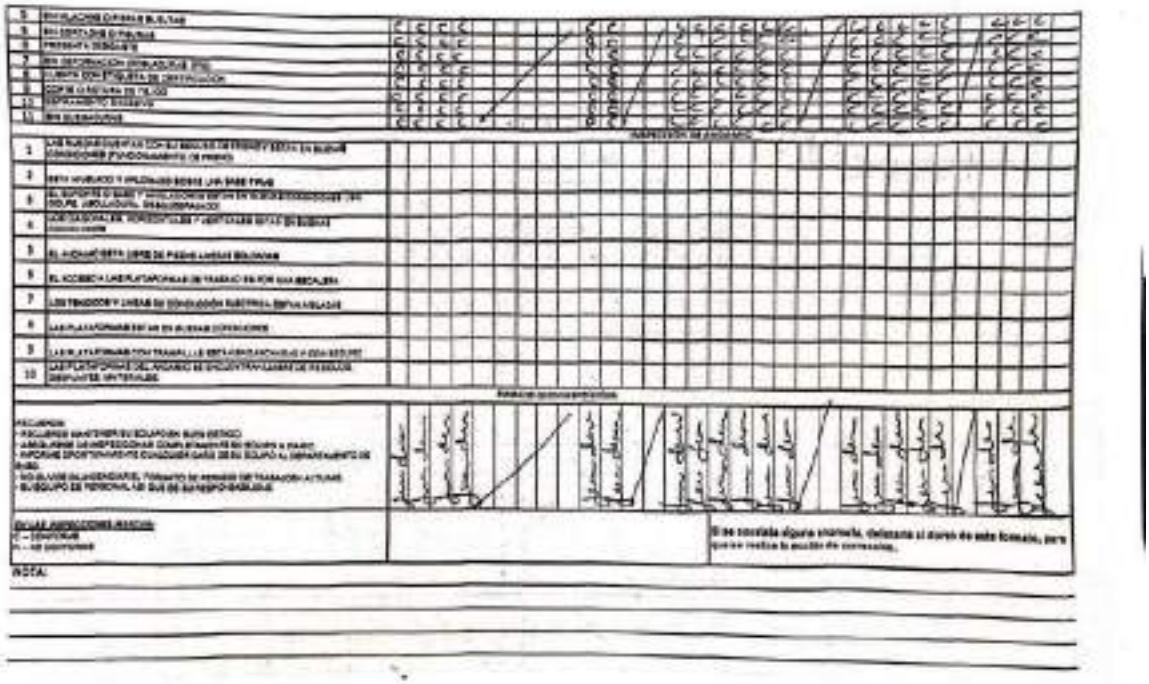


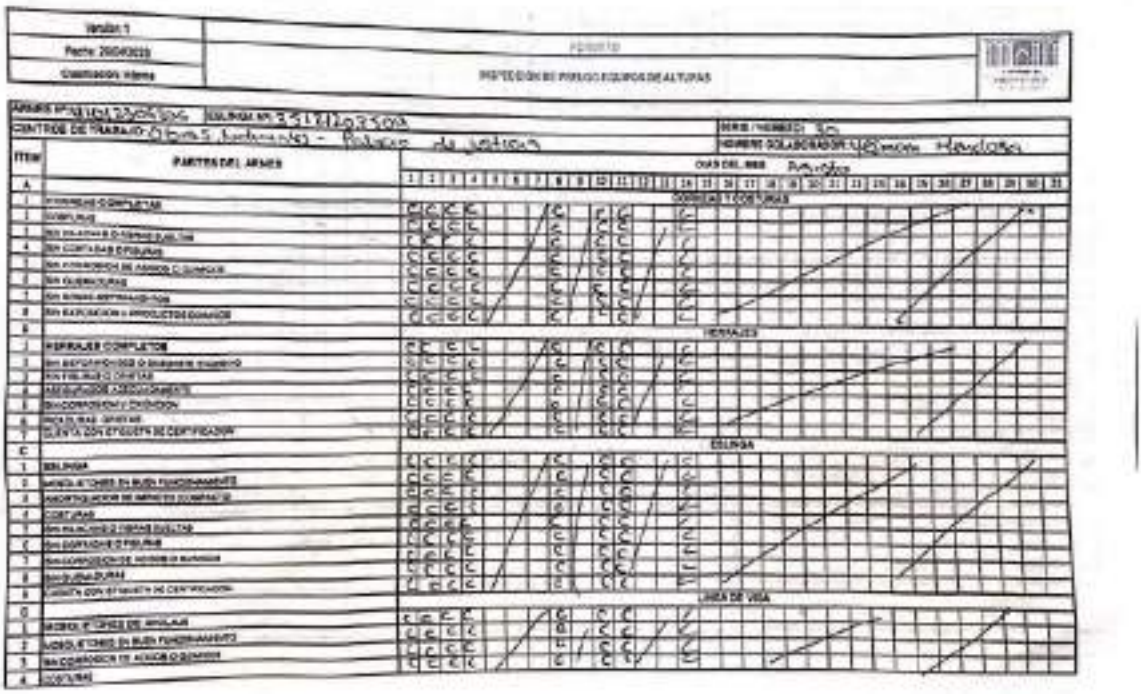

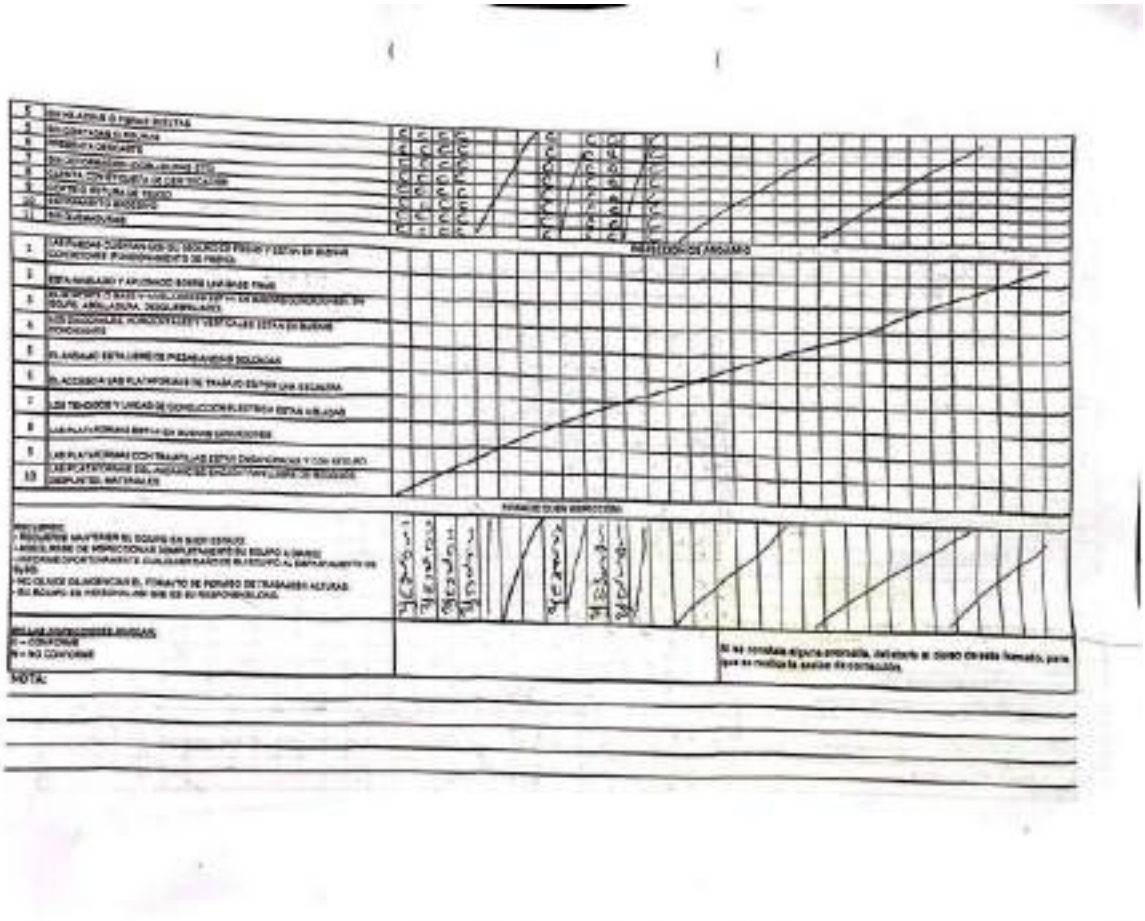





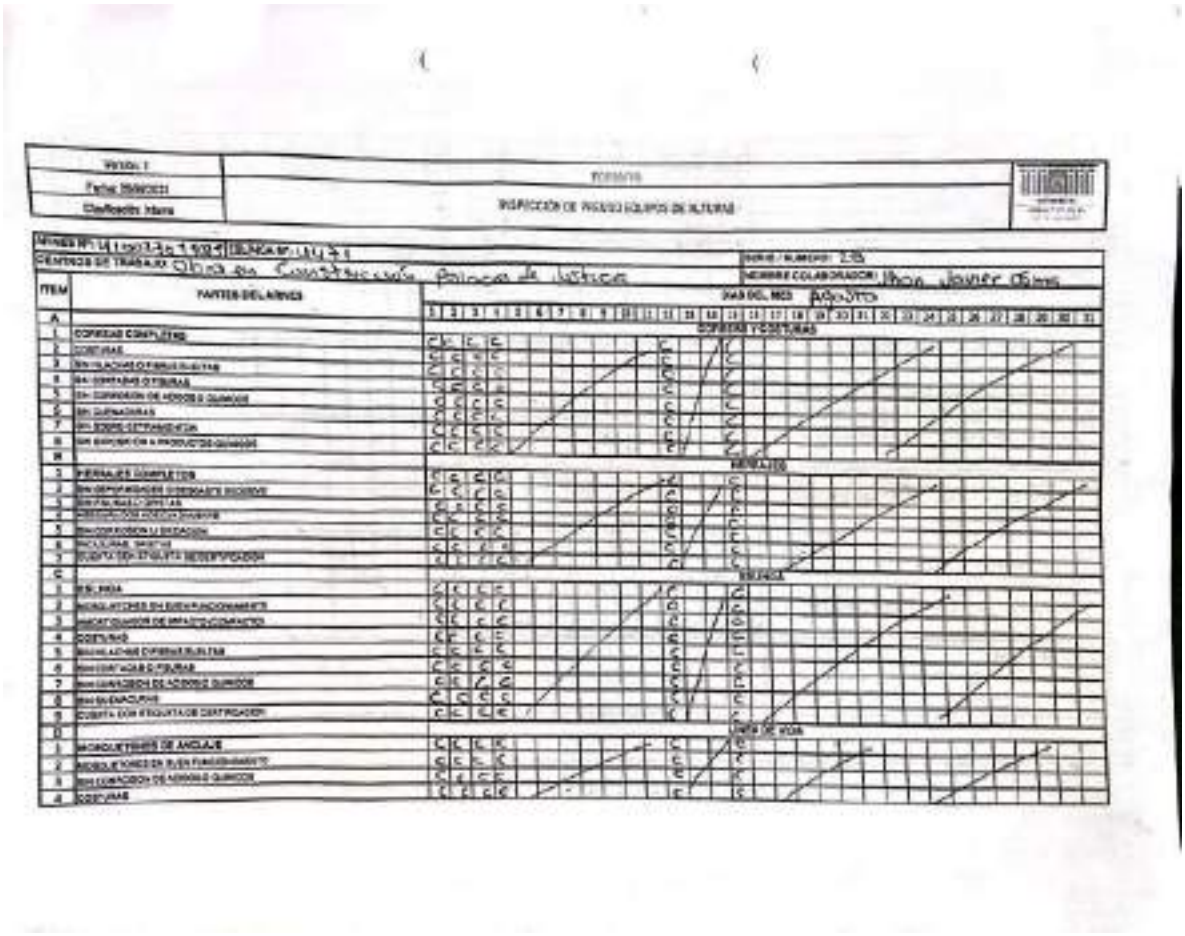


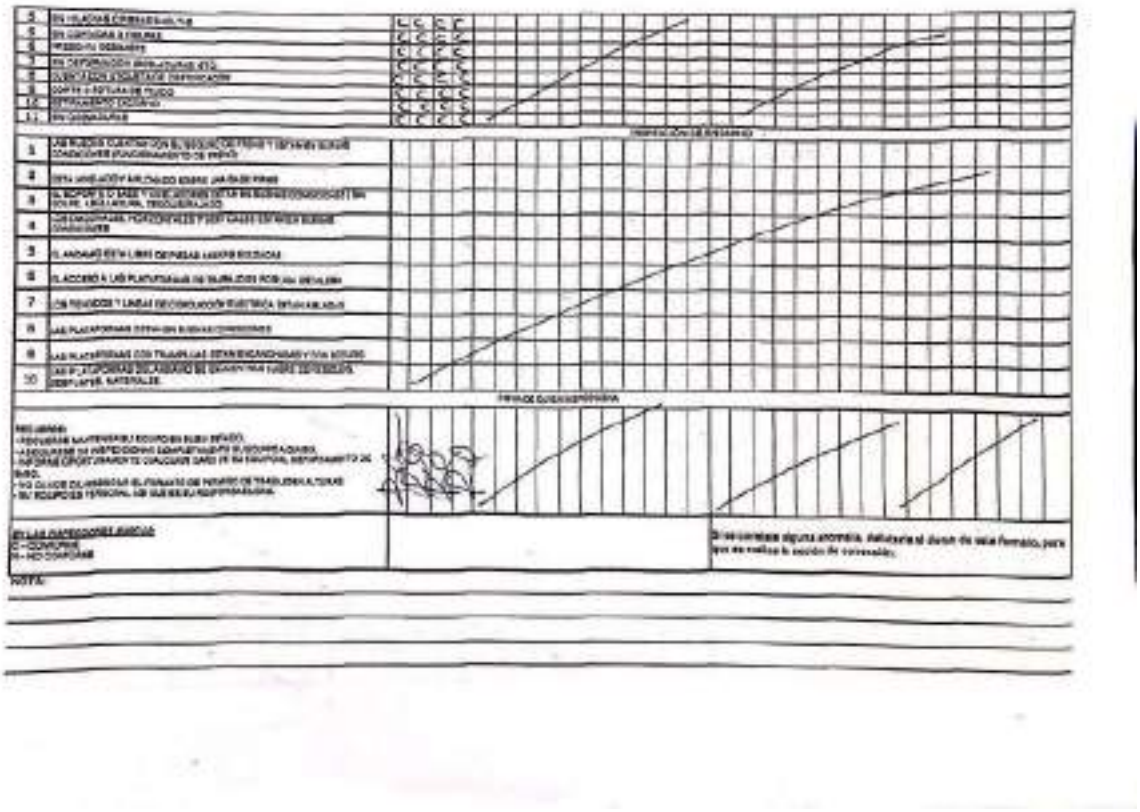





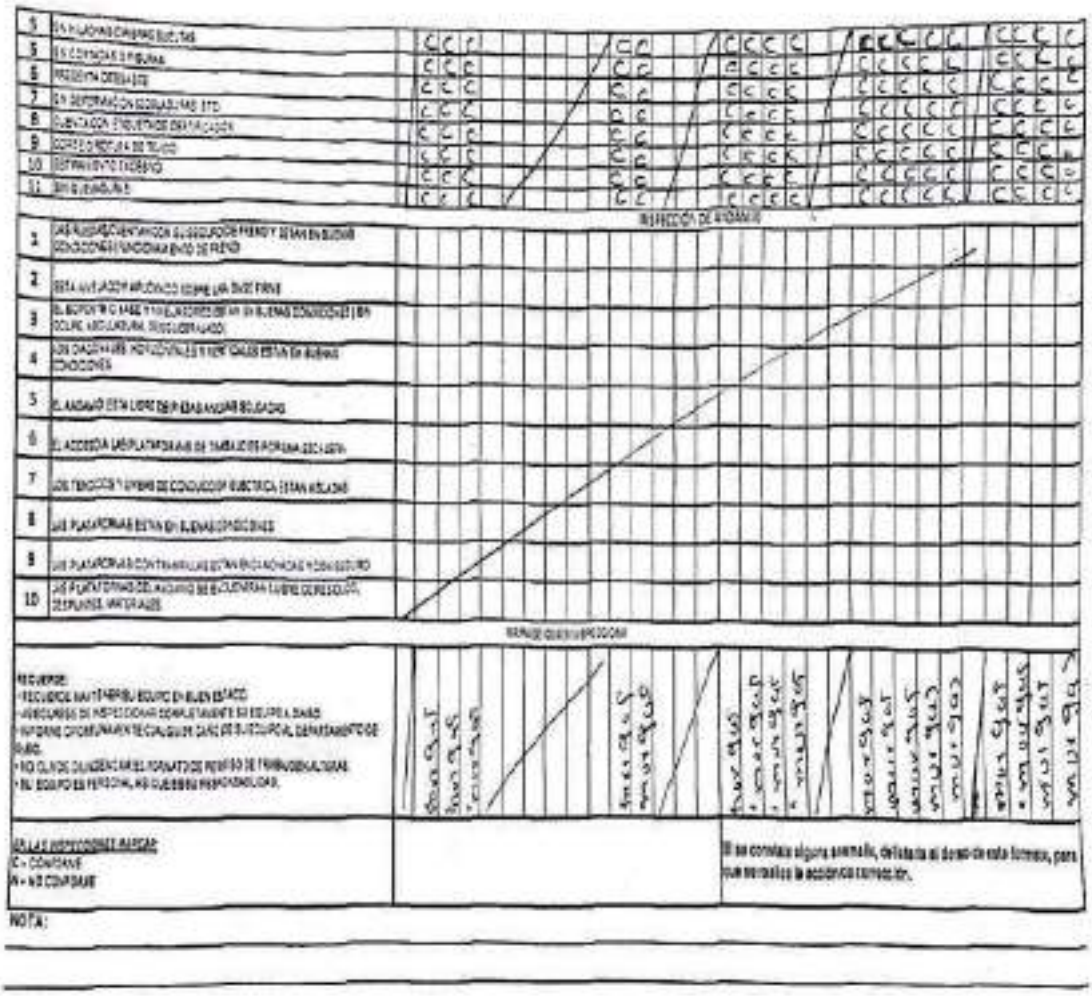

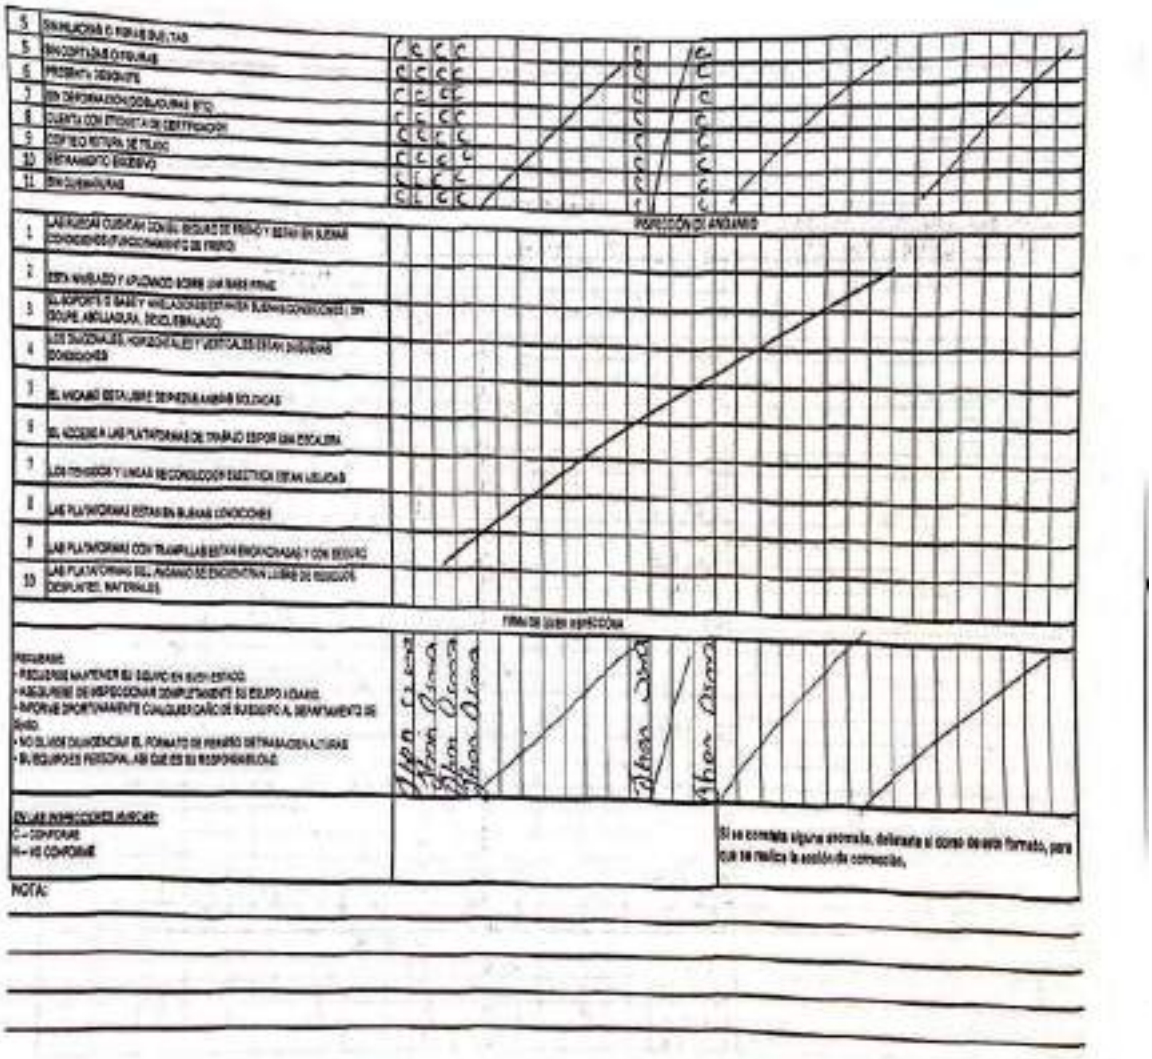

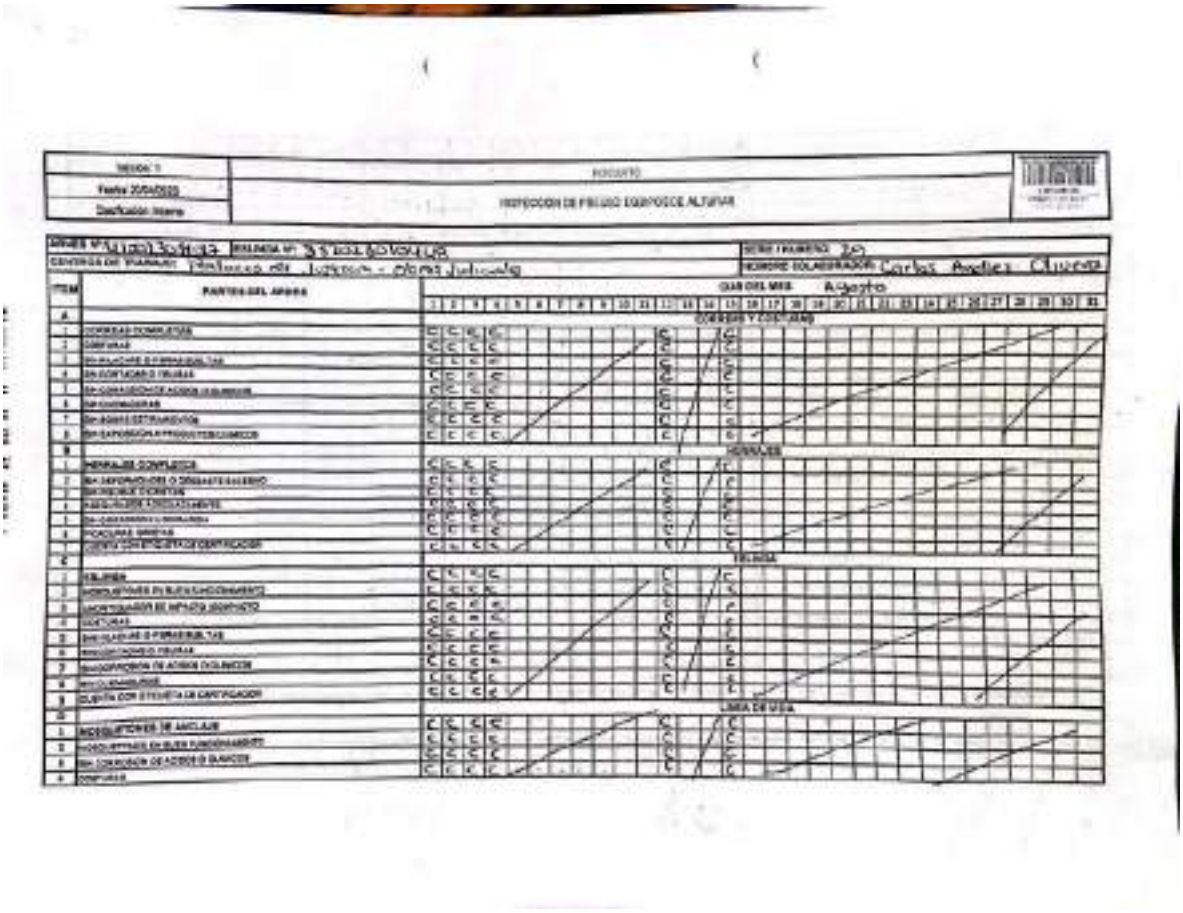

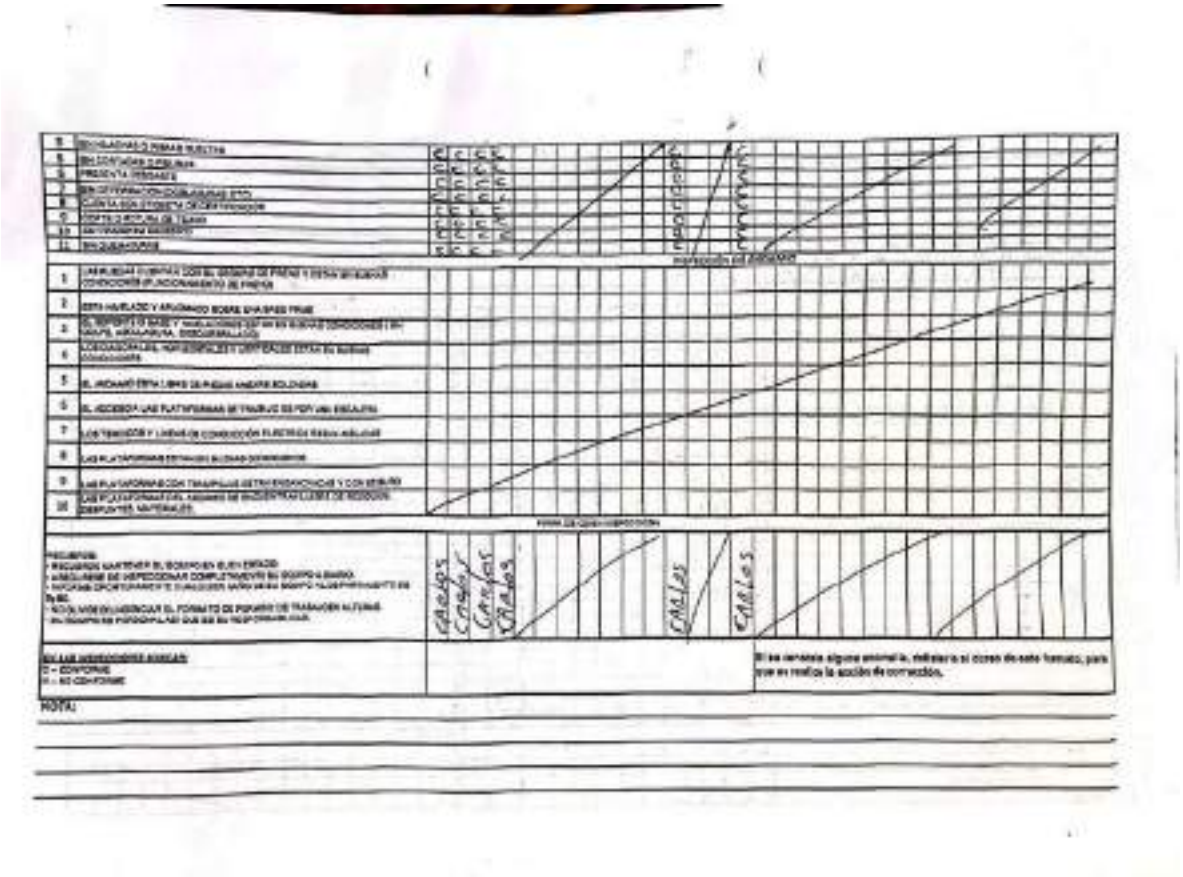

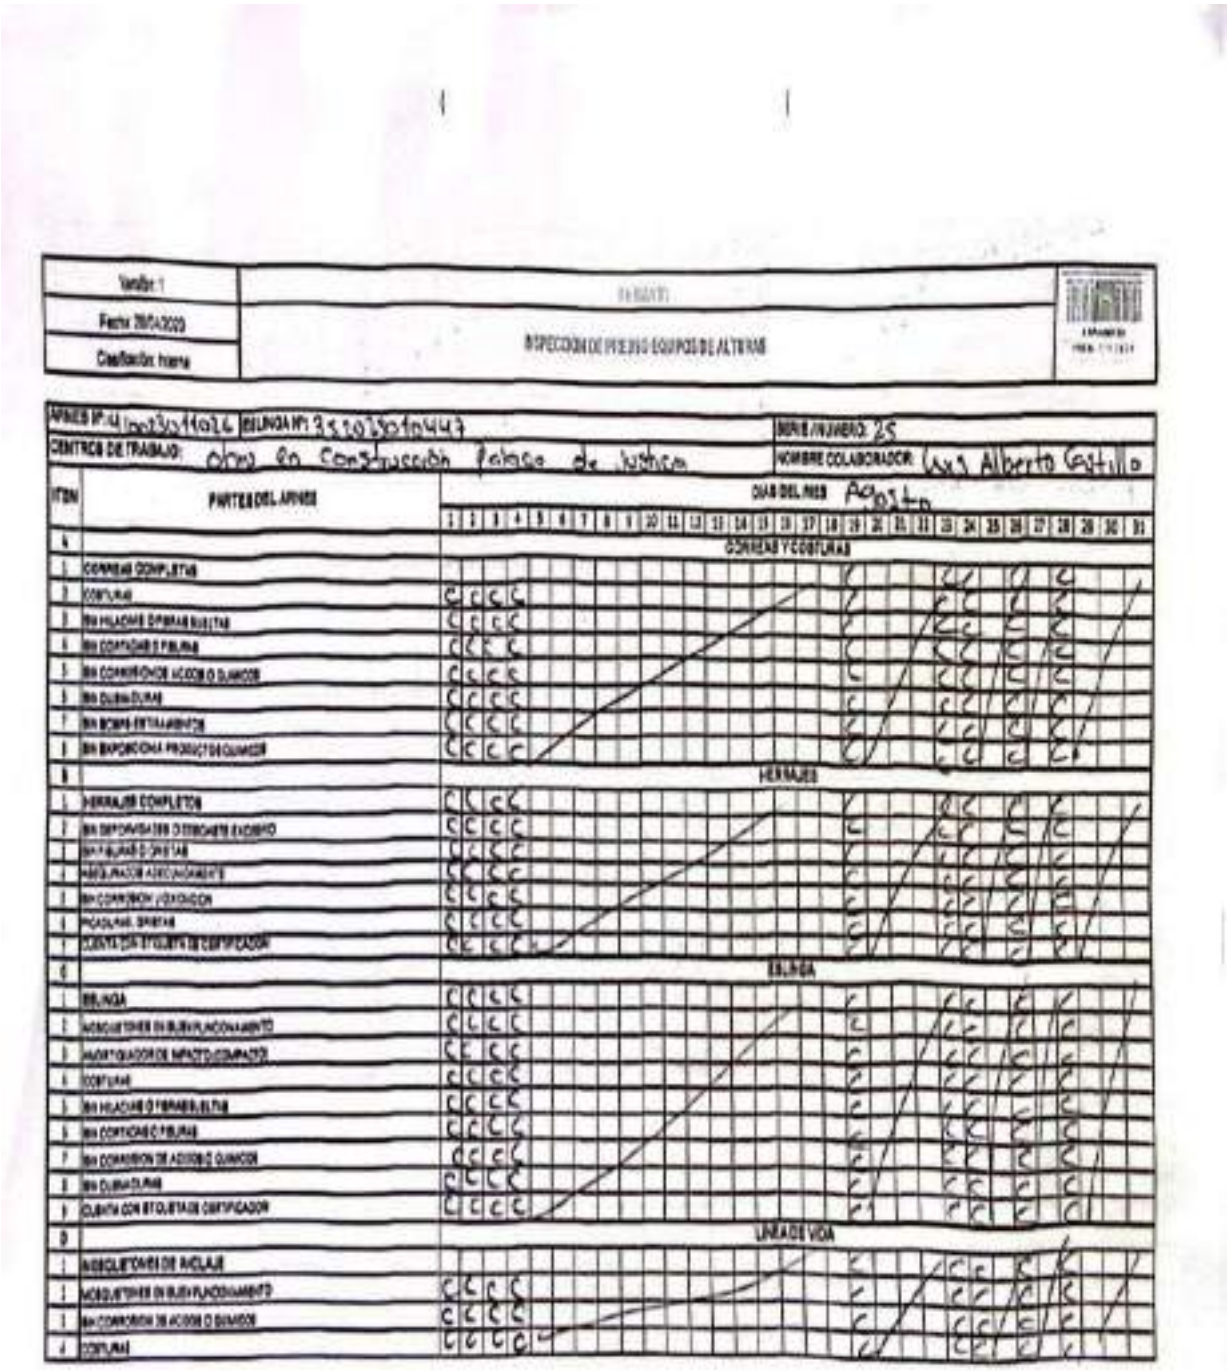


07




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

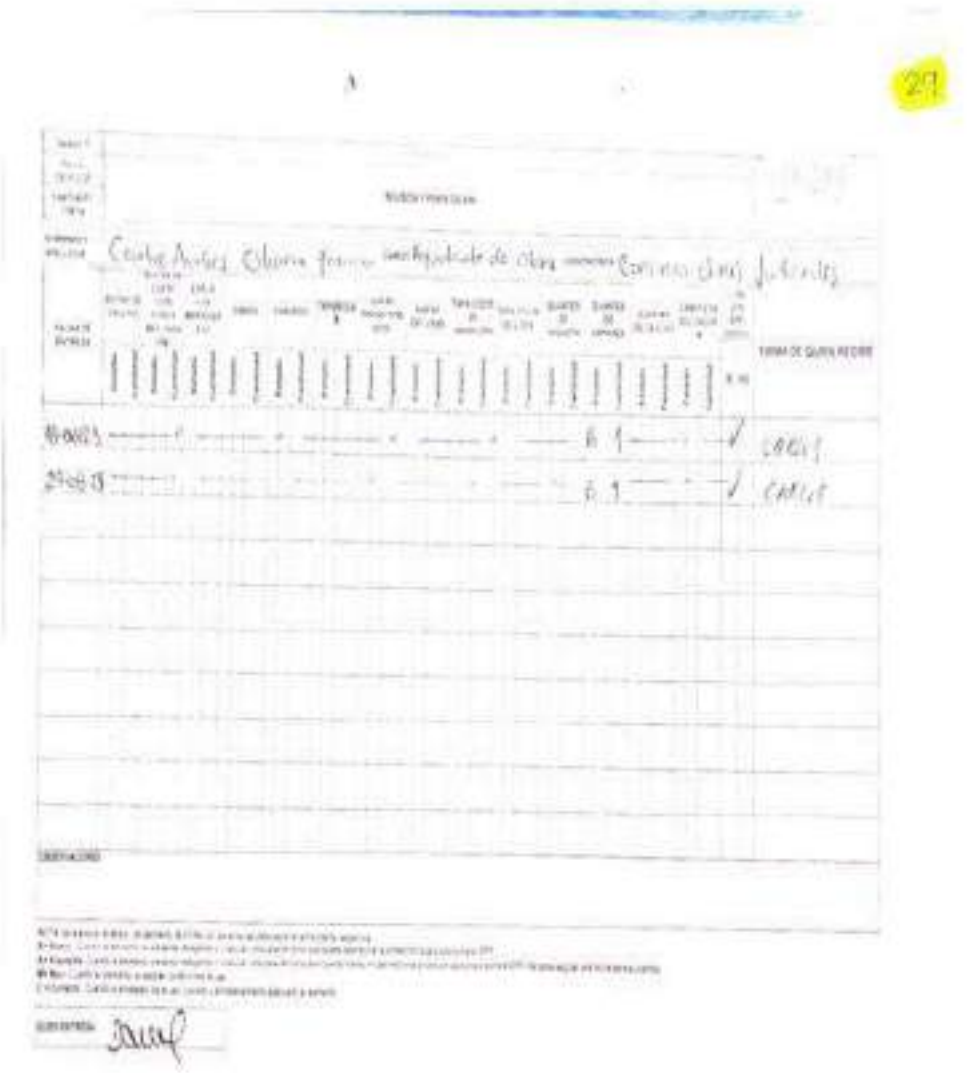

Powered by CamScanner

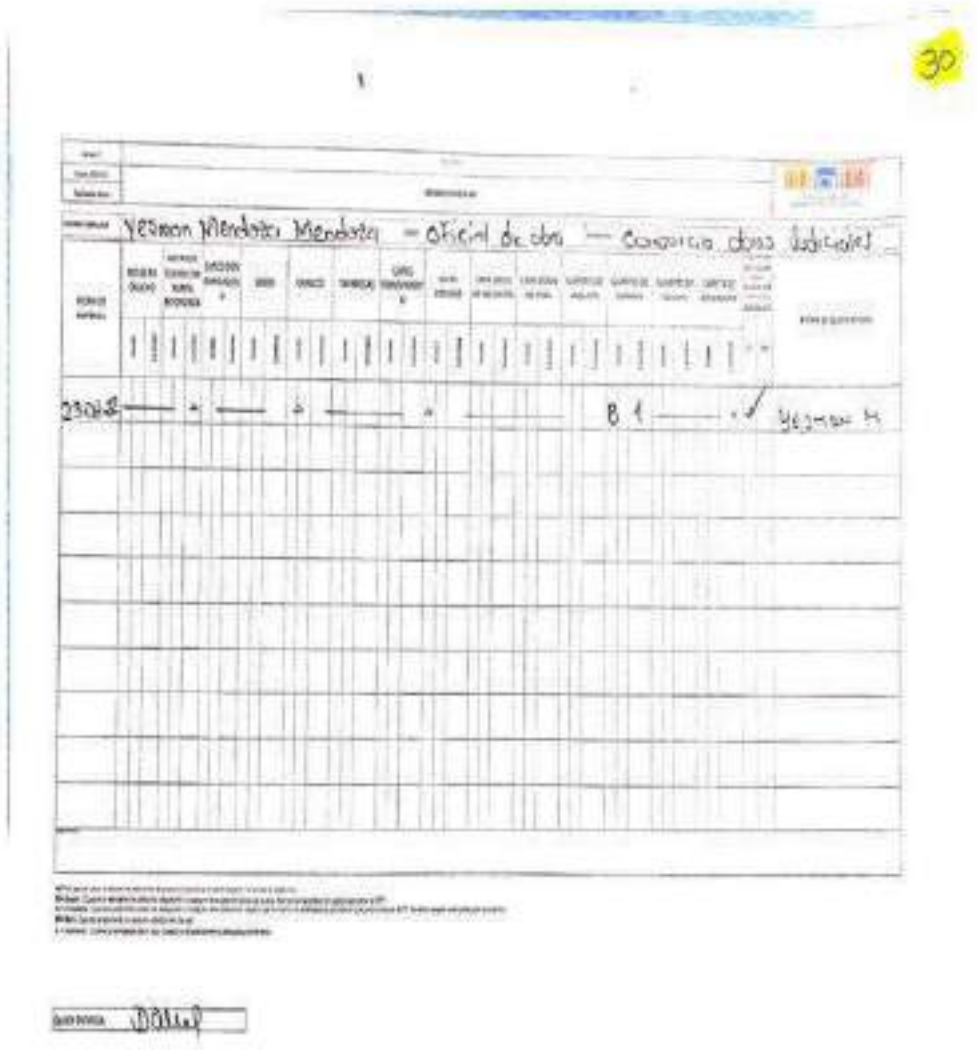


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


33

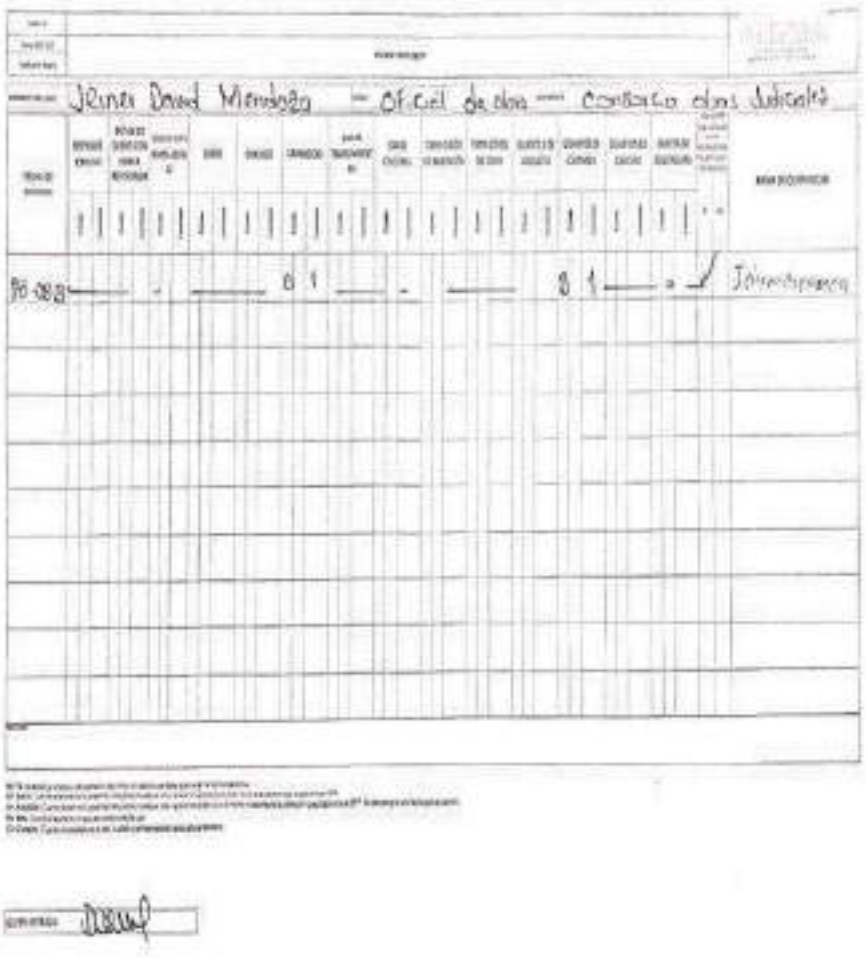


Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

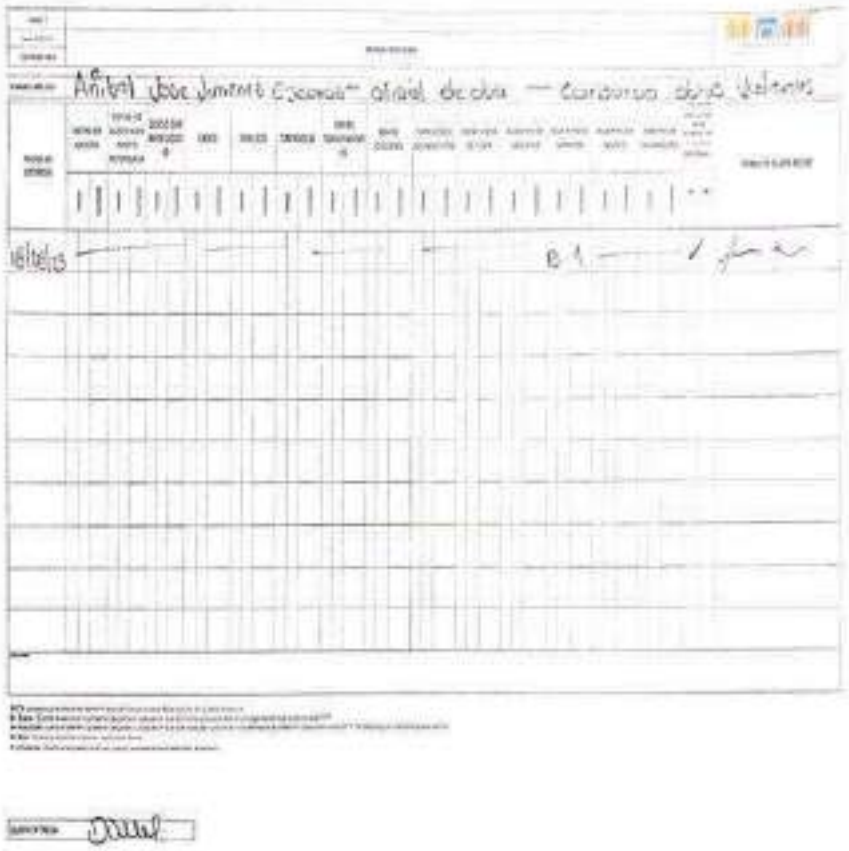

Powered by CamScanner

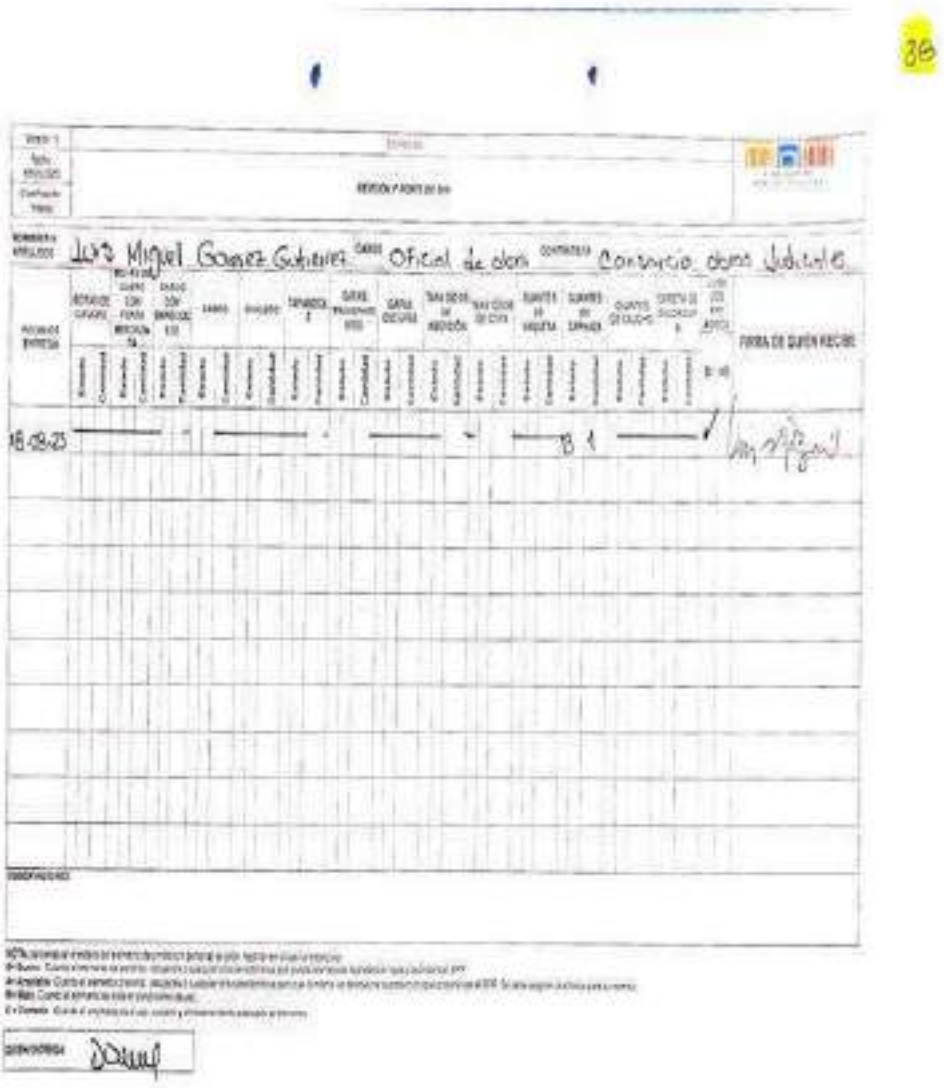


Powered by CamScanner

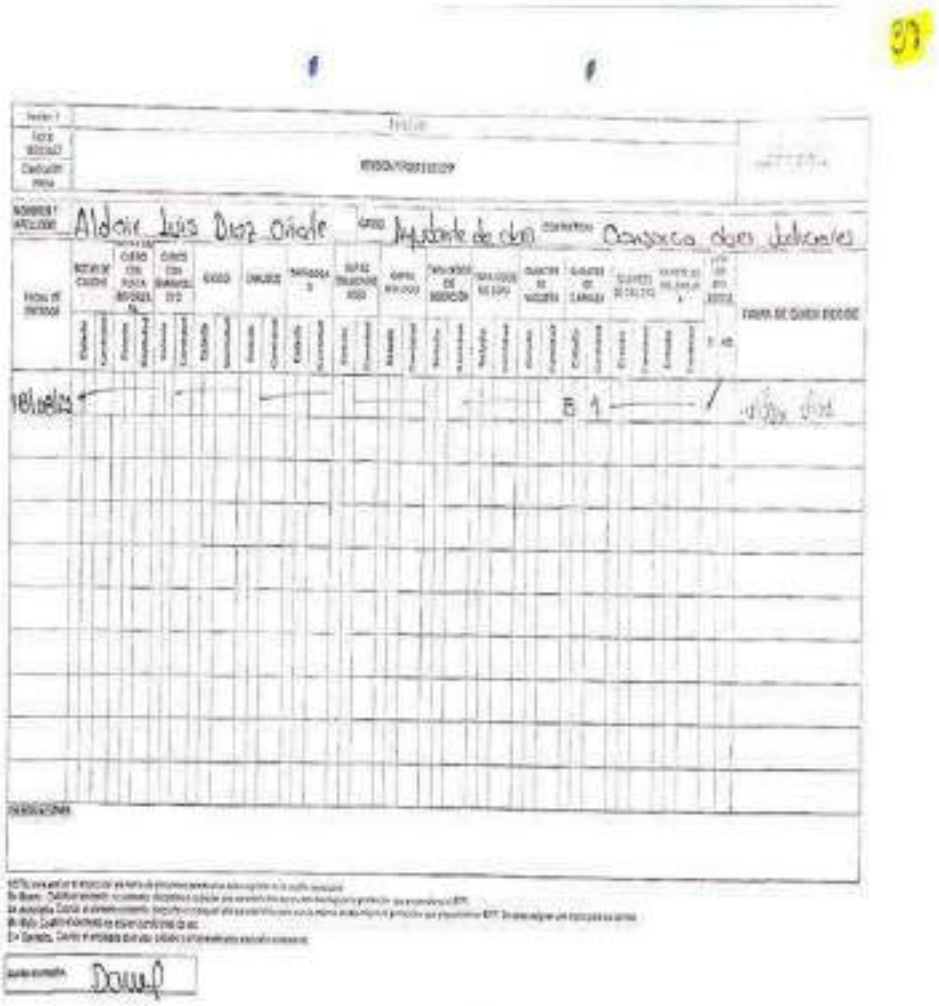


Powered by CamScanner

42

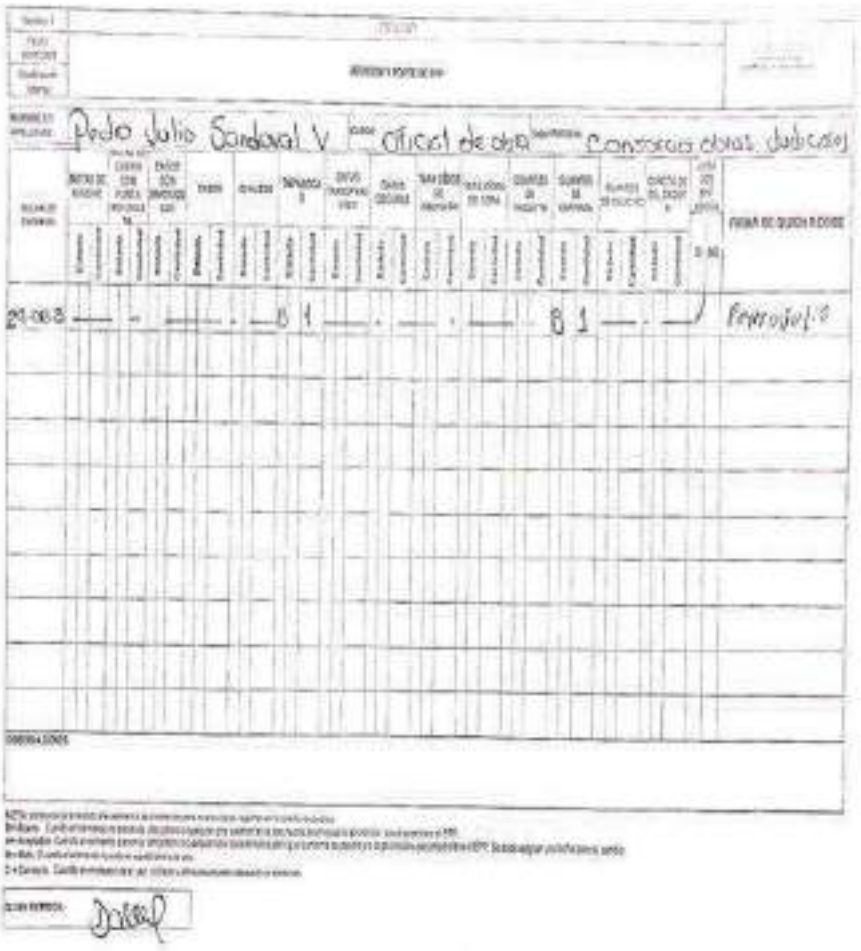

Powered by CamScanner

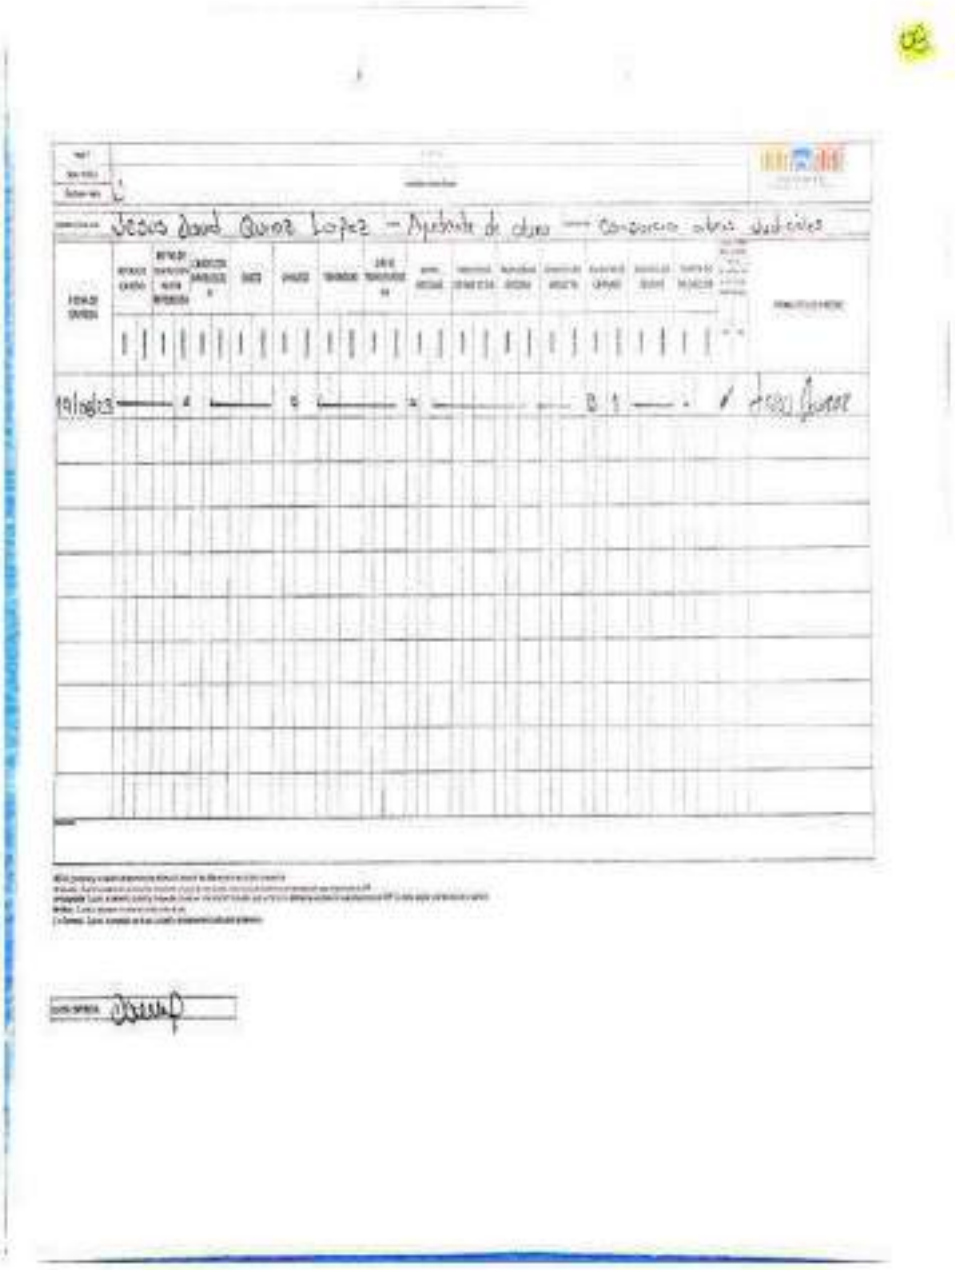

Powered by CamScanner

42

Pedro Julio Sandoval V. Oficial de obra Consorcio obras Judiciales

29-08-20 — — — B 1 — — — B 1 — — — Ferrojet-0


Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

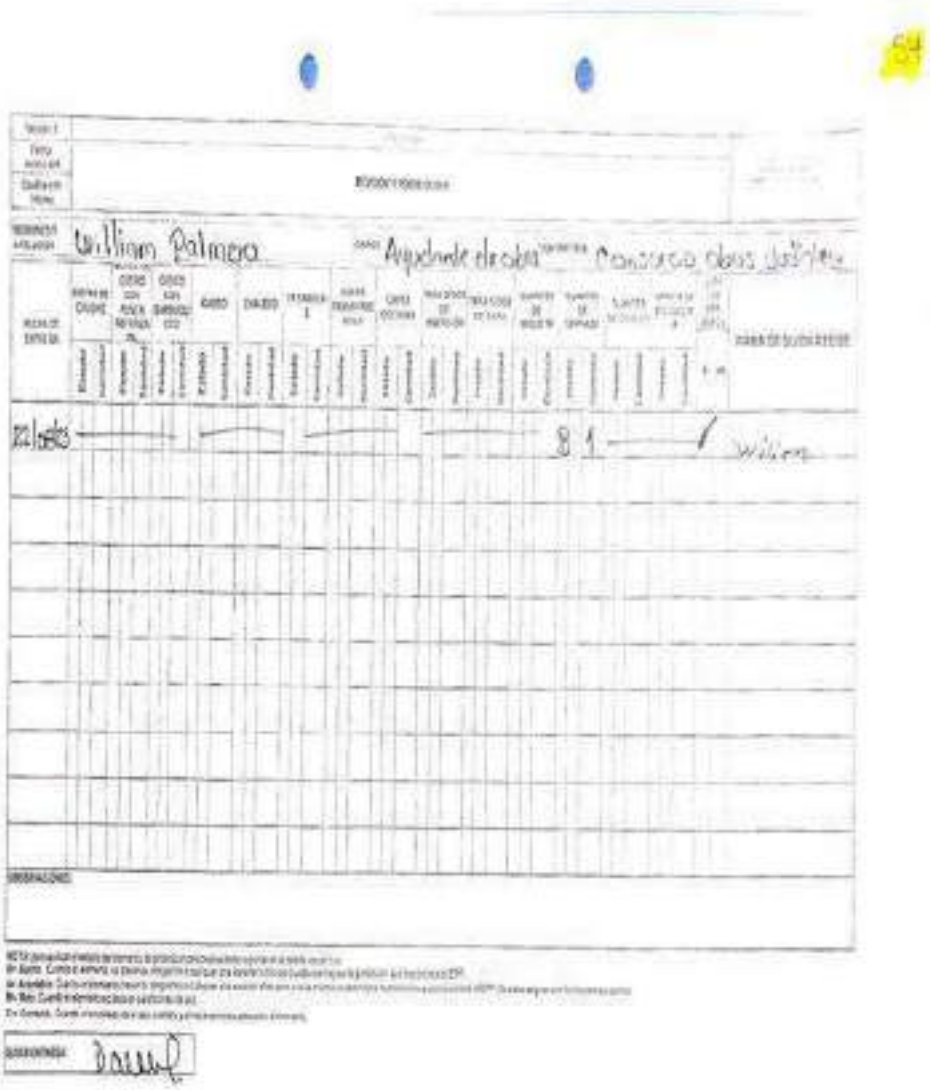


Powered by CamScanner

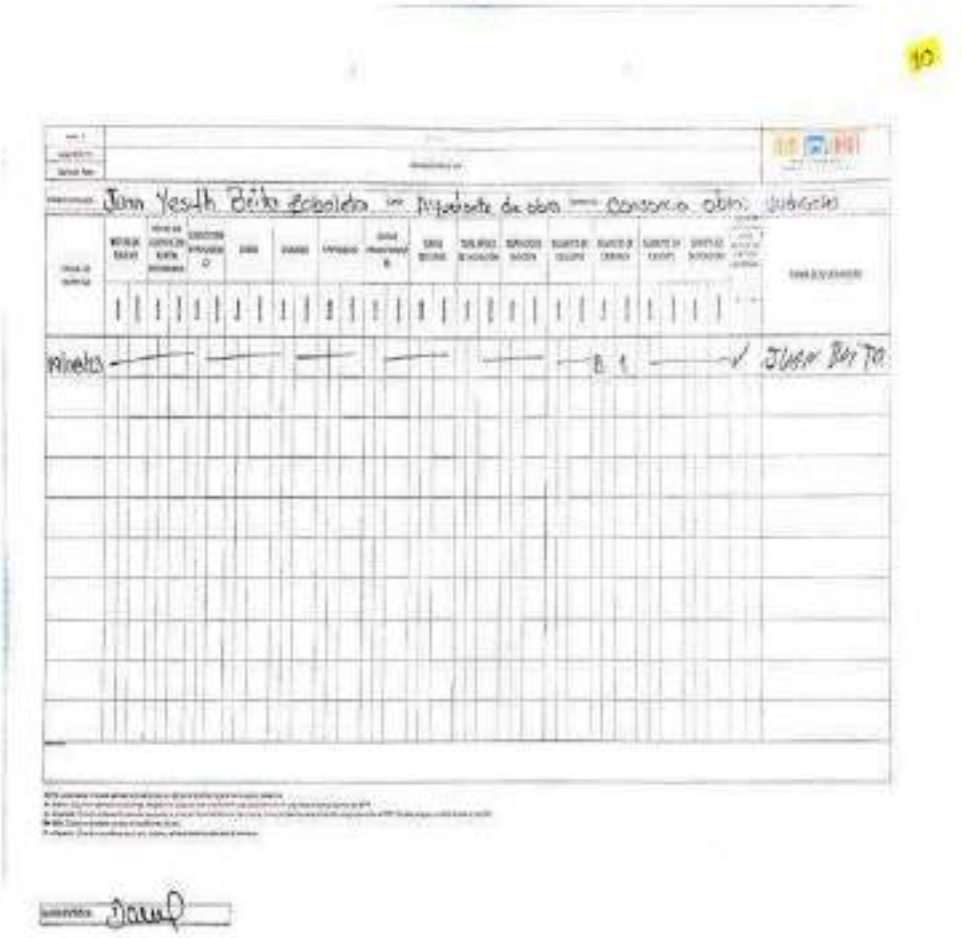


Powered by CamScanner


11

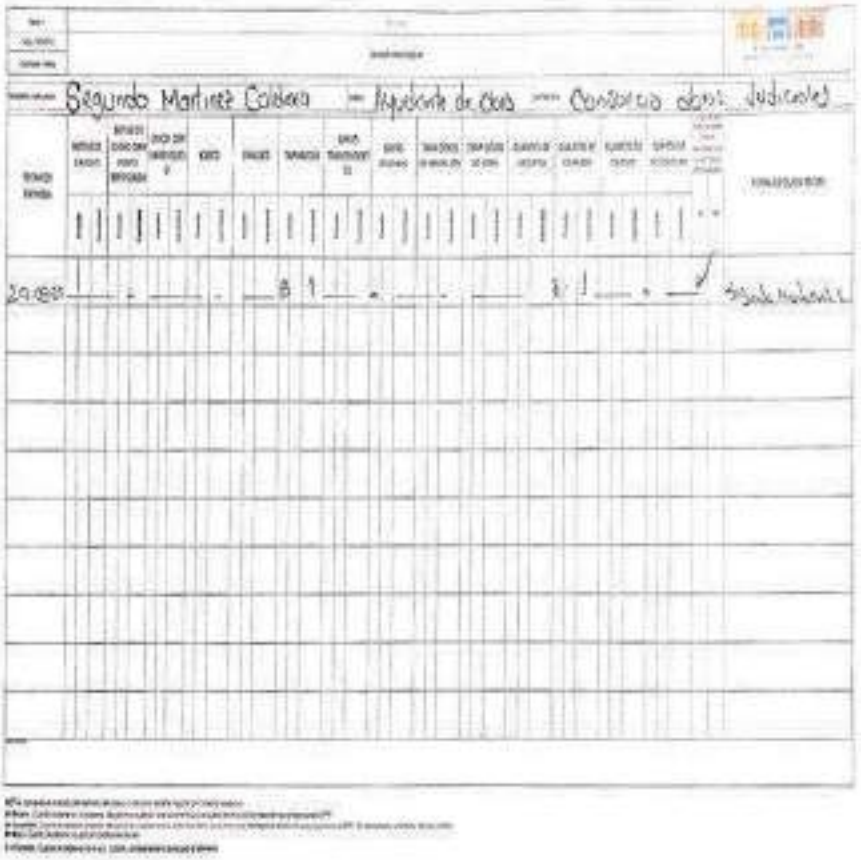

Powered by CamScanner

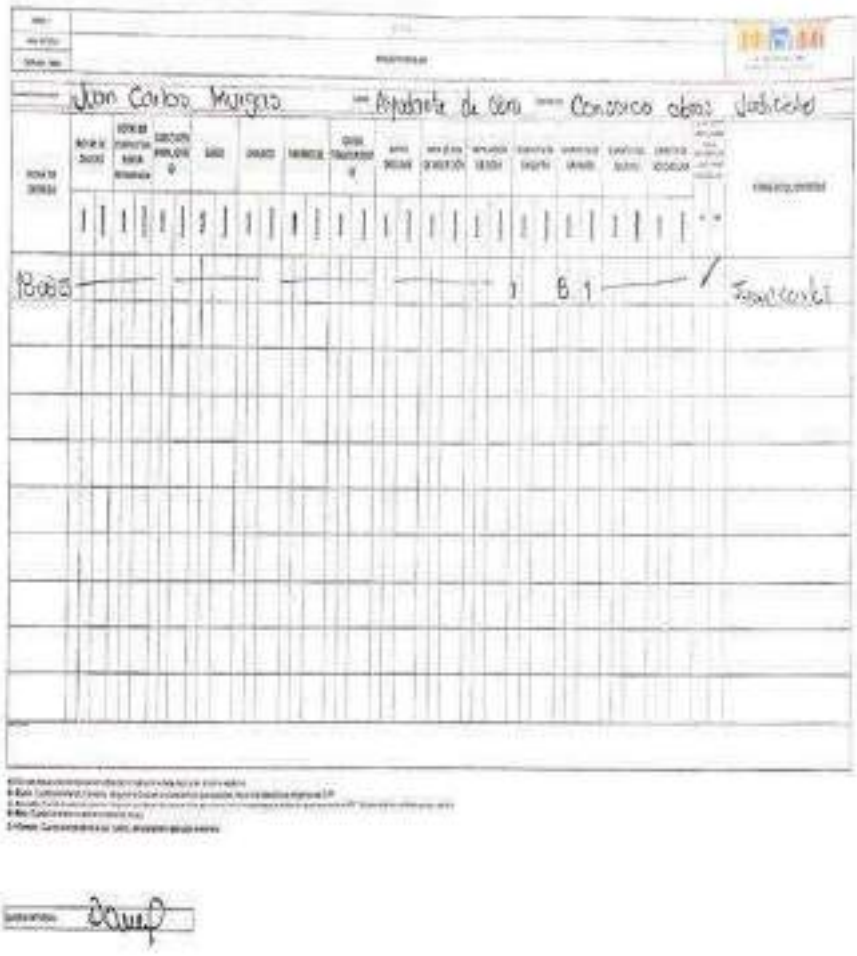


Powered by CamScanner

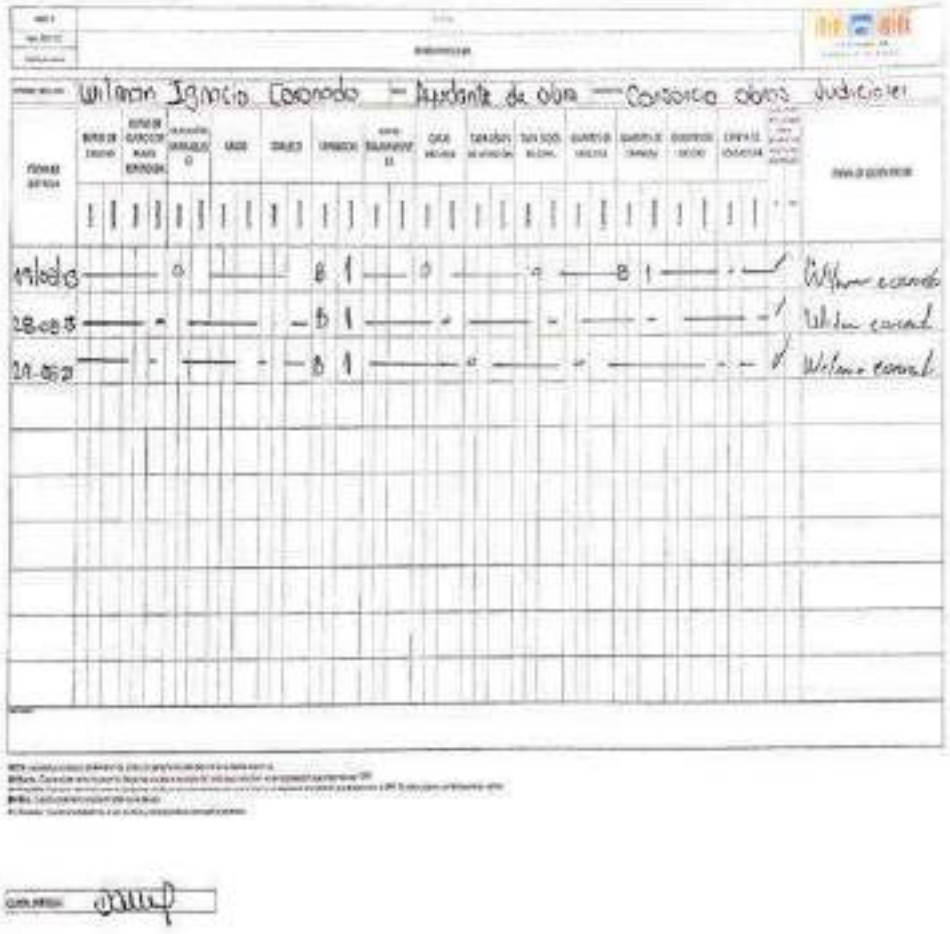

Wilmer Ignacio Coronado — Ayudante de obra — Consorcio obras Judiciales

Powered by CamScanner

18

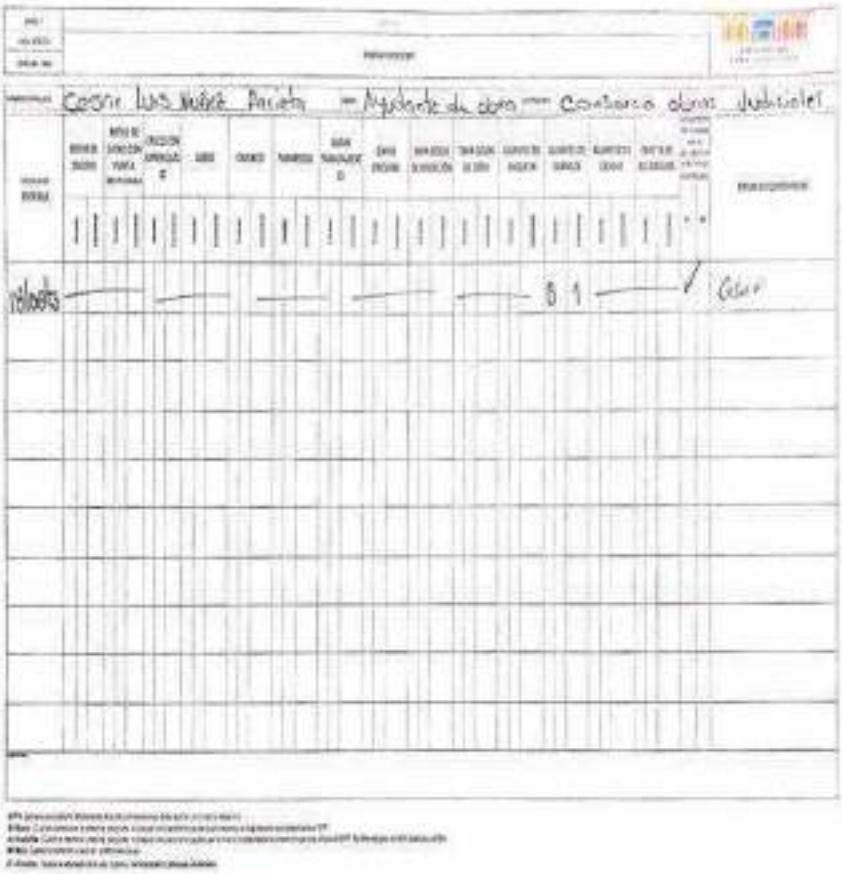


Powered by CamScanner

25



Powered by CamScanner

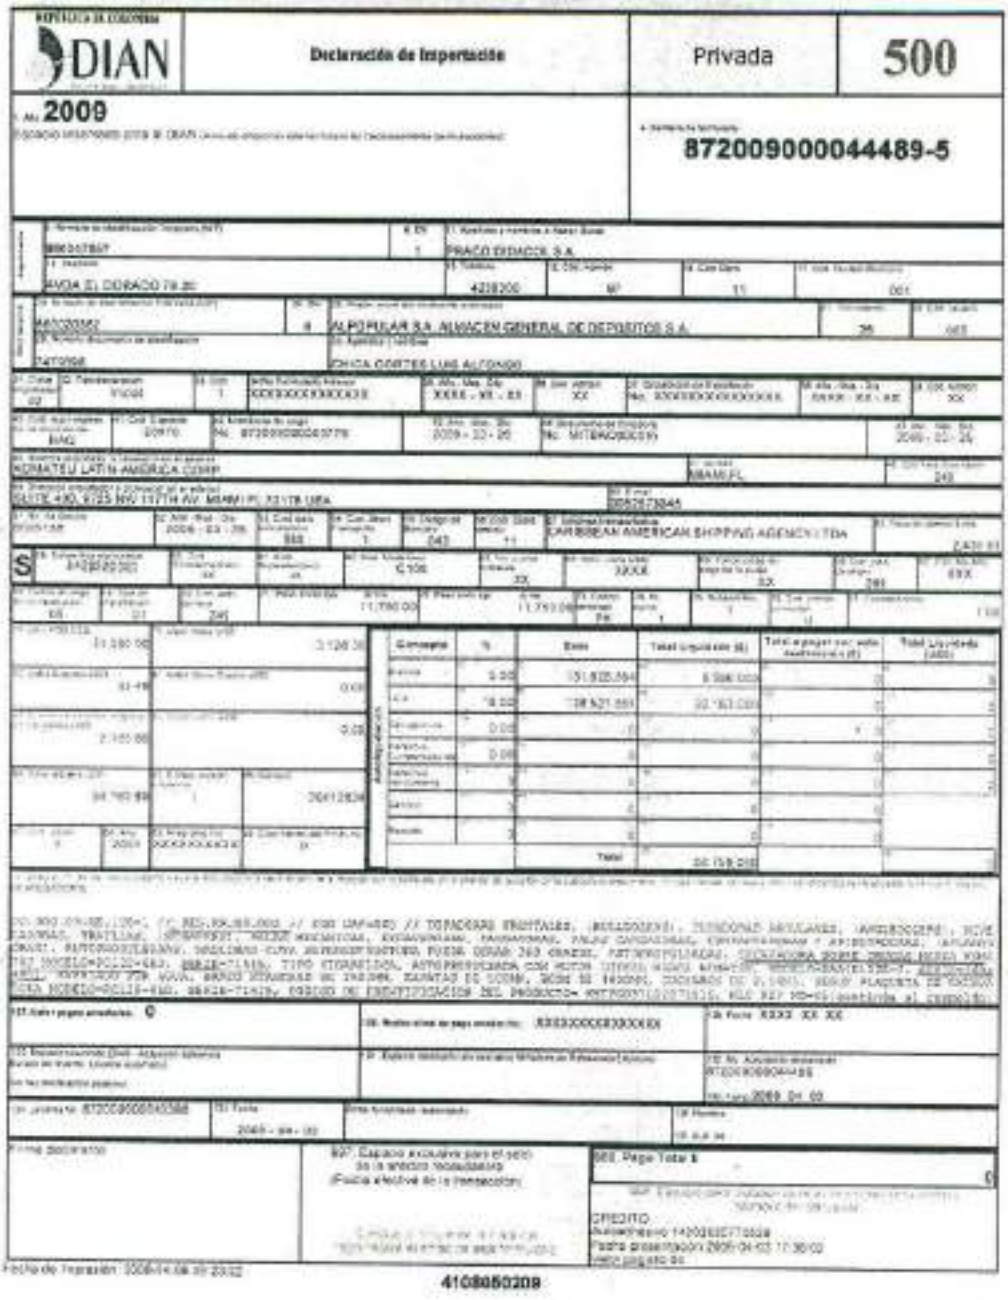

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2009

872009000044489-5

PRADO VIVIACS S.A.

CRA 9 CL 70 BIS

ALPOPULAR S.A. ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A.

ZONA FRANCA CORTES LUIS ALFONSO


KOMATSU LATIN AMERICA CORP

CARIBBEAN AMERICAN SHOPPING AGENCY LTDA

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con este formulario ($)	Total Liquidado (USD)
Total					

CREDITO

4108050209


DIAN
MUISCA
Declaración de Importación
Página 1 de 1

KR-09-002


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
No. 45849
MCG79654
MARCA KOMATSU
LINEA PC120-6E0
AÑO MODELO 2004
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION
CLASE EXCAVADORA
No. SERIE KMTPC037J02071515
COLOR(ES) AMARILLO
No. MOTOR 26348931
RODAJE ORUGAS
PESO 12030 Kg
ALTO 2715 mm
ANCHO 2480 mm
LARGO 7560 mm
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES / IDENTIFICACIÓN
INGECONSTRUCTORES S.A.S
NIT 900.230.160


LOCATARIO: APELLIDOS Y NOMBRES / IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO
FECHA REGISTRO 31-05-2018
FECHA EXPEDICION 31-05-2018
FECHA VENCIMIENTO
ORIGEN IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACION 672000000044400
FECHA DE LEVANTE 03/04/2009
TM03000031794

Orden de Trabajo Nro.: 2802

Vehículo: MC078654

KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC — Talleres: 31 (MARVIN)

Datos de la Orden

Fecha Orden: 22/may/2023 08:34 a.m. — No Orden: -- No Definido -- — Horómetro Orden: -- No Definido -- — Conductor: RONALD TRUJILLO

Creada Por: RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ — Afecta Disponibilidad: SI — Tiempo No Disponibilidad: 00:15m

Estados: Cerrada — Tipo de Orden: PREVENTIVO — Etiquetas: -- No Definidas --

Proveedor: KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC — Ciudad Orden: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS — C.Costos Orden: -- No Definido --

En una hoja: SI

Fecha Cierre Técnico: 22/may/2023 08:30 a.m. — Cierre Técnico Por: LEONARDO ORTIZ LEMUS

Fecha Cierre Final: 22/may/2023 08:30 a.m. — LEONARDO ORTIZ LEMUS

Datos del Vehículo

Vehículo: MC078654 — Marca: KOMATSU — Linea: PC-120-6EO — Tipo: EXCAVADORA — Modelo: 2004

Ciudad Actual: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS — C.Costos Actual: -- No Definido -- — Propietario: MERCA LOGISTICS S.A.S

Auditoría de creación y cierres Modelo

Trabajos

Trabajo	Tipo Mtto.	Costo Unitario	Cant.	Descto. Unitario	Impuesto	Total Trabajos	Total Repuestos	Gran Total	Proveedor
Ajuste tuerca rueda eje	Correctivo	$0,00	1	0% [$0,00]	16%	$0,00	$596.603,74	$596.603,74	KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
cambio de aceite motor	Preventivo	$0,00	1	0% [$0,00]	16%	$0,00	$0,00	$0,00	KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
cambio filtro de aceite motor	Preventivo	$0,00	1	0% [$0,00]	16%	$0,00	$0,00	$0,00	KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
TOTALES						$0,00	$596.603,74	$596.603,74	

Cantidad de Trabajos: 3

Repuestos

Trabajo	Repuesto	Código Repuesto	Costo Unitario	Cant.	Unidad	Descto. Unitario	Impuesto	Total	Proveedor
Ajuste tuerca rueda eje	Tuerca	Pza x Talleres Mega (Ref:Pza. 3000x xx (KOMATSU 9X3A))	9X3A 12345	$80.000,00	10	Talleres	0% [$0,00]	0%	$596.603,74	KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
TOTALES									$596.603,74	

Cantidad de Repuestos: 1

Resumen de Costos

Total Trabajos	$0,00
Total Repuestos	$596.603,74
Total Orden de Trabajo	$596.603,74

28/8/23, 18:29 Informe de la Orden ... cloudFleet

Orden de Trabajo Nro.: 1431

Vehículo: MC078654

Total Trabajos $0,00
Total Repuestos $4.135.358,58
Total Orden de Trabajo $4.135.358,58

Informe de Seguimiento


Fecha: 13/feb./2023 Creada por: ELIER JOVANNY MARTINEZ MARTINEZ
Descripción: CHEQUEO

Imágenes





https://fleet.cloudfleet.com/#/app/Seguimiento/InformeOrdenTrabajo.aspx?Ordenid=20241&idFdt=6%3d 2/2

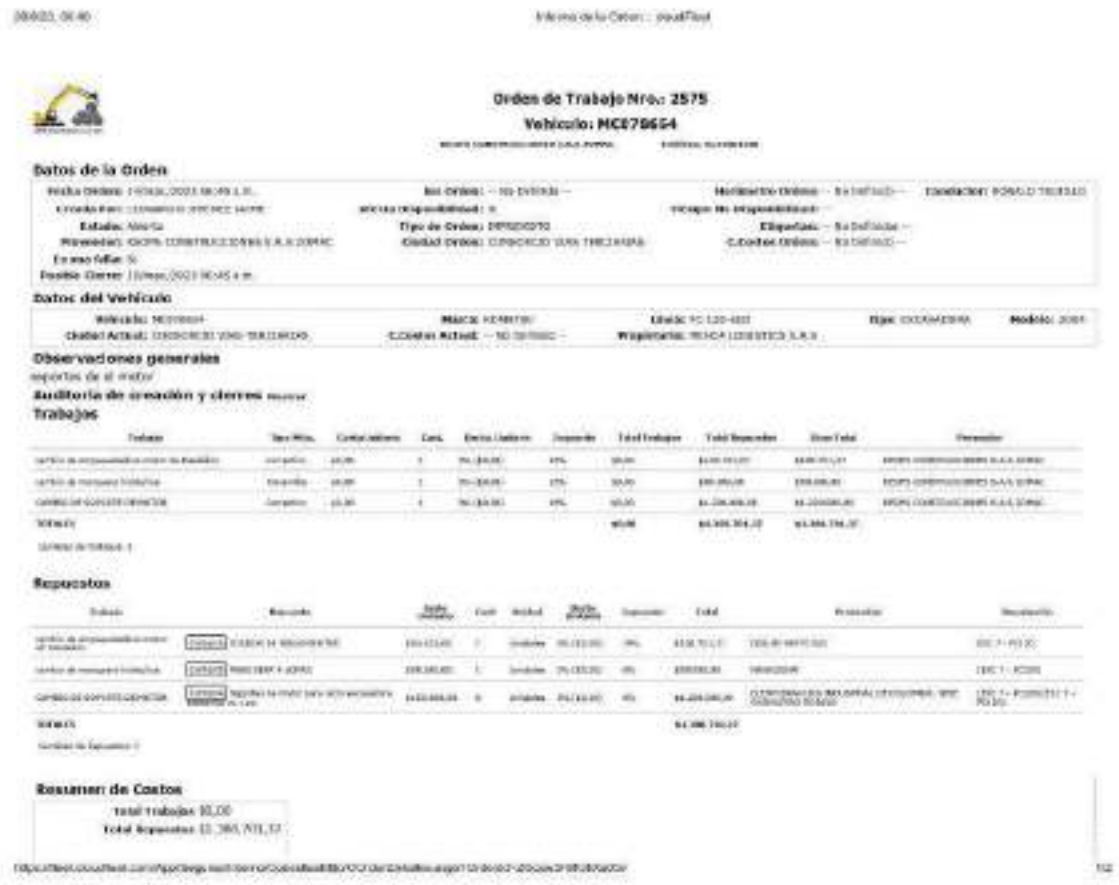

Orden de Trabajo Nro: 2575

Vehículo: MCE786G4

Datos de la Orden

Datos del Vehículo

Observaciones generales

Auditoria de creación y cierres

Trabajos

Repuestos


Resumen de Costos

Total Trabajos $0,00



Orden de Trabajo Nro.: 2575

Vehículo: MCE78654

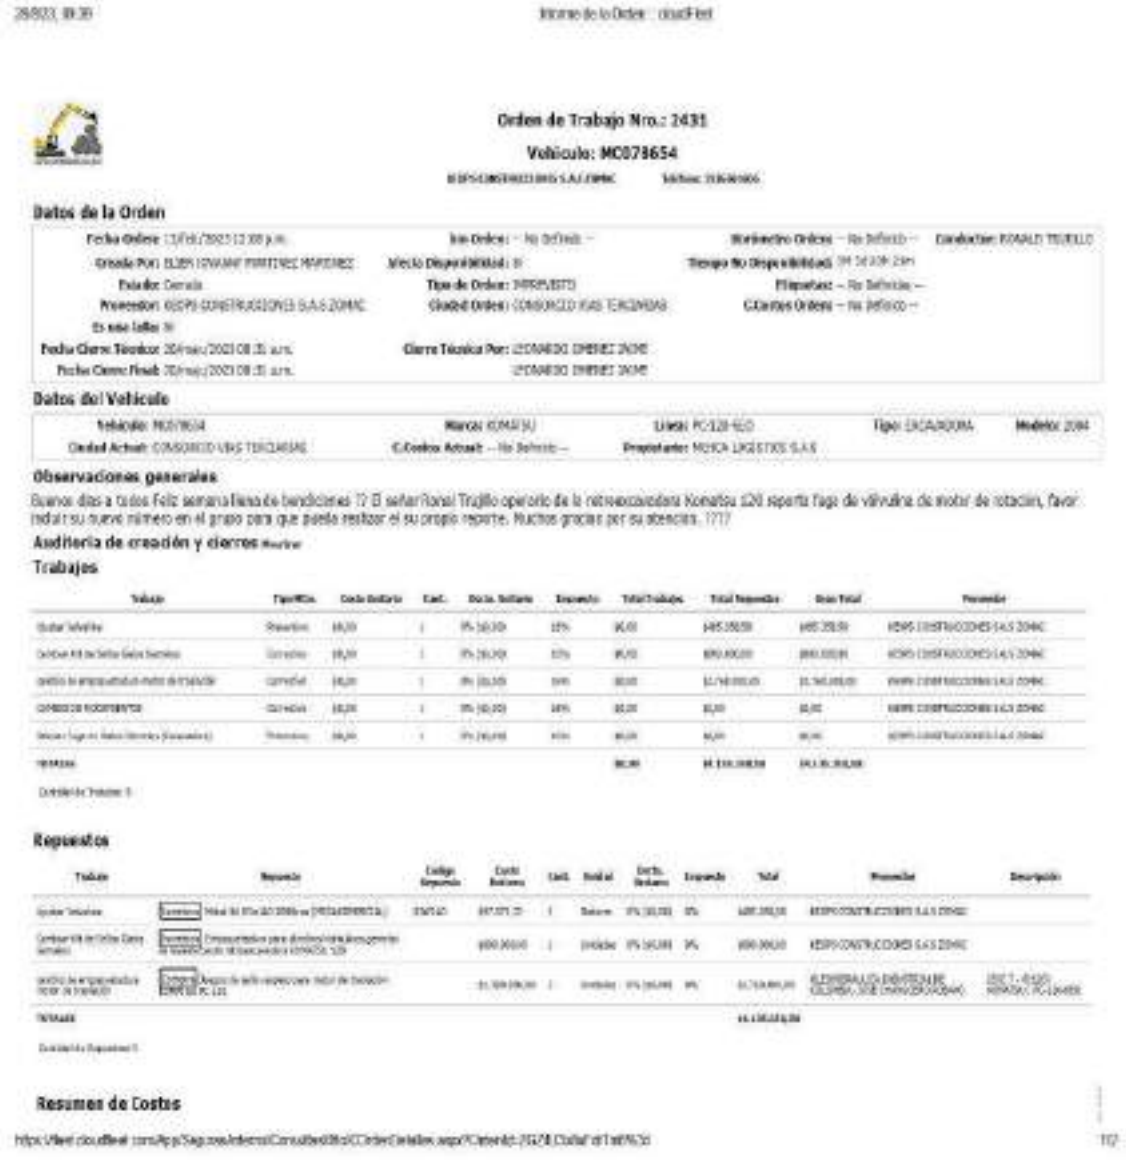

28/8/23, 10:39 Informe de la Orden - cloudFleet

Orden de Trabajo Nro.: 2431

Vehículo: MC078654

Datos de la Orden

Datos del Vehículo

Observaciones generales

Buenos días a todos Feliz semana llena de bendiciones !! El señor Ronal Trujillo operario de la retroexcavadora Komatsu 220 reporta fuga de válvulina de motor de rotación, favor radicar su nuevo número en el grupo para que pueda realizar el su propio reporte. Muchas gracias por su atención. !!!!

Auditoría de creación y cierres

Trabajos

Repuestos

Resumen de Costos

https://fleet.cloudfleet.com/App/Sag.oea.Web/es/Consultas/Ots/COrdenDetalles.aspx?Clave=pt:7574;Ciudad:dTotal%3d 1/2



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

otorga

Certificado de Competencia Laboral a

OLBER DONADO VILLAFAÑE

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1045699870

Quien demostró su Competencia Laboral en la


Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Excavadora hidráulica - NIVEL AVANZADO

Código: 270101120 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en MOSQUERA. A los veintidós (22) días del mes de Junio de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por




1077122 - 22/06/2023
No. Y FECHA REGISTRO

NELSON OCTAVIO GÓMEZ SUTTERO
Subdirector CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
REGIONAL CUNDINAMARCA

Vigencia:
hasta el 22 de Junio de 2028

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 96200570101202311154662987BC.

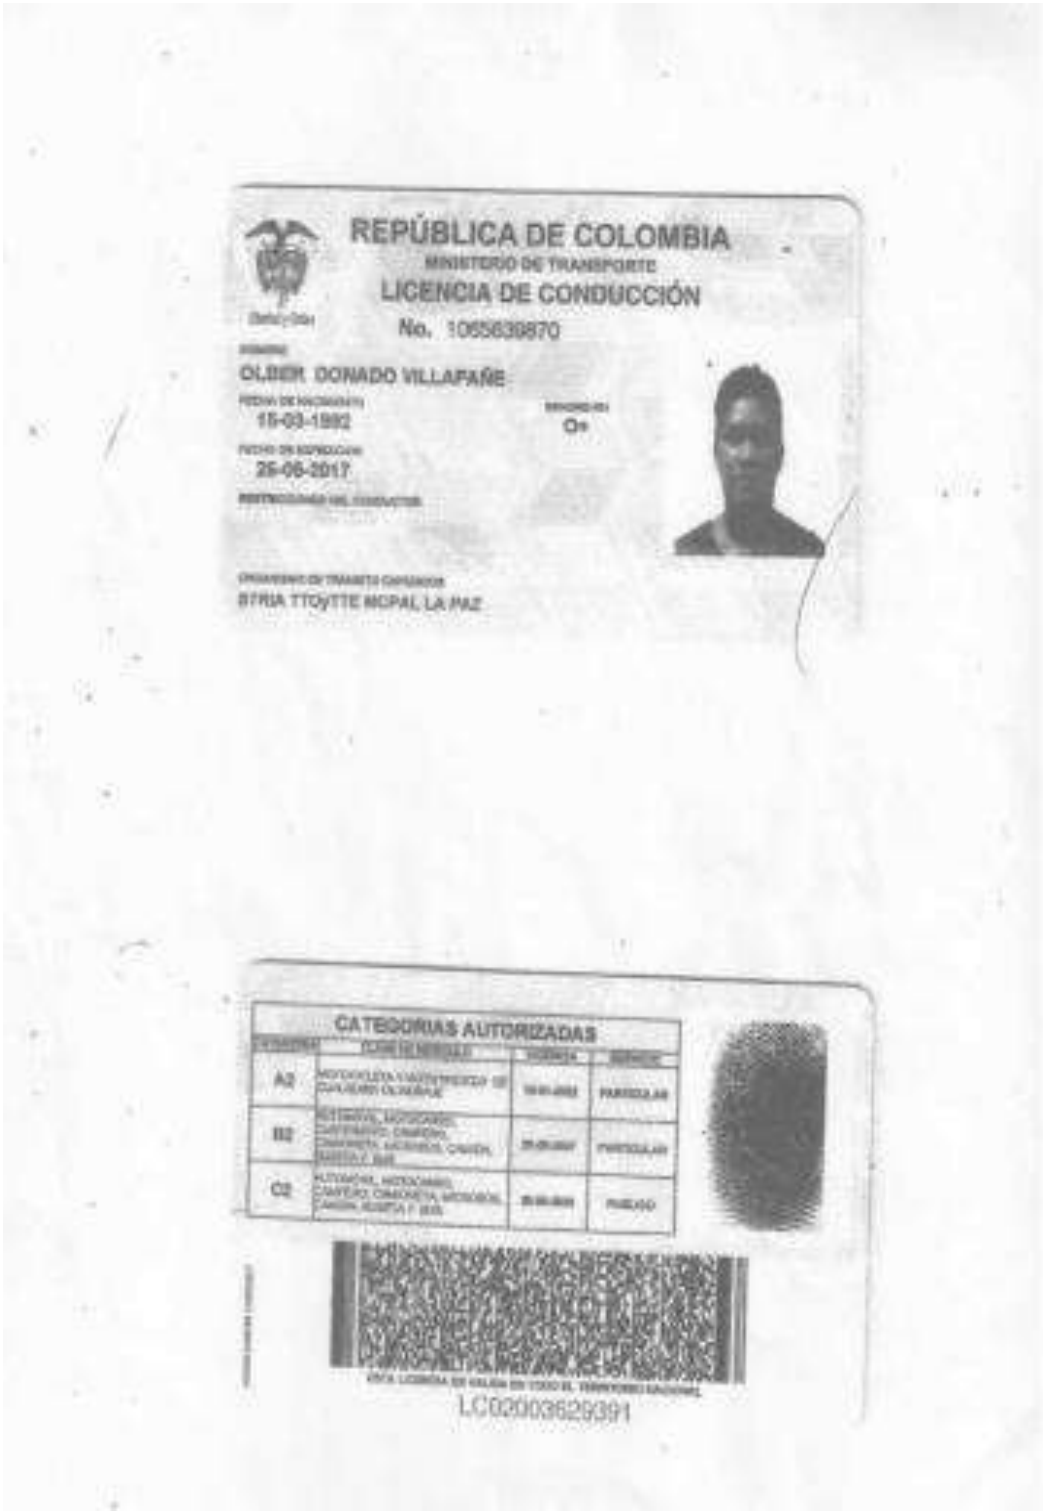
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1065639870
OLBER DONADO VILLAFAÑE
15-03-1992
O+
25-06-2017
CATEGORIAS AUTORIZADAS
A2
B2
C2
LC0000362391

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: Interno		

CUIDAD Y FECHA: VALLEDUPAR, 11/08/2023 **PROYECTO: Construcción Palacio de justicia**

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN: Área operativa

SE REPORTA A: Karen Soto **CARGO:** Residente SST

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE		CONDICIÓN INSEGURA	X	ACTO INSEGURO	

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Condición insegura: Se evidencia condición insegura por extensión sin tomacorrientes (con los cables sueltos).

ACCIONES REALIZADAS

Se corrige la condición insegura instalando tomacorrientesen caucho.

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Juan Yesid Brito	Ayudante	JUAN. BRITO.

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: Interno		

CUIDAD Y FECHA: VALLEDUPAR 17/08/ 2023 **PROYECTO: Construcción Palacio de justicia**

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN: Área operativa

SE REPORTA A: Damaris salcedo **CARGO: Residente SST**

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE		CONDICIÓN INSEGURA	X	ACTO INSEGURO	

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Condición insegura: Se evidencia sendero peatonal inestable por terrenos irregulares y deslizantes.

ACCIONES REALIZADAS

Se solicita la colaboración de dos trabajadores y se corrige la condicion insegura, realizando escalone para mejorar las condiciones del sendero.

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Jhon Jairo Morales	Ayudante	Jhon Jairo M.

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: Interno		

CUIDAD Y FECHA: Valledupar, 18/08/2023 **PROYECTO:** Construcción palacio

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN: Área operativa

SE REPORTA A: Karen Soto – Damaris Salcedo **CARGO:** Residente SST

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE		CONDICIÓN INSEGURA		ACTO INSEGURO	X

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Acto inseguro: Se evidencia trabajador realizando actividad de amarre de acero en un andamio en la baranda y realizando movimientos inapropiados para la actividad.

ACCIONES REALIZADAS

Se realiza charla de socializacion del actos inseguros por el trabaador para ue sirva como ejemplo prevenir sobre las consecuencias de realizar actos inseguros.

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Yesman Mendoza	Oficial	Yesman M.

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: Interno		

CUIDAD Y FECHA: Valledupar, 22/08/2023 **PROYECTO:** Construcción palacio

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN: Área operativa

SE REPORTA A: Karen Soto **CARGO:** Residente SST

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE		CONDICIÓN INSEGURA	X	ACTO INSEGURO	

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Condición Insegura: Se evidencia trabajadores con dificultad para transitar por terreno irregular.

ACCIONES REALIZADAS

Se comge condicion insegura replanteando el terreno al cual posteriormente se le realiza una adecuandon con cemento.

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Carlos Olivera Franco	Ayudante	CARLOS OLIVERA

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2

1.1 LOCALIZACIÓN..... .2

1.2 Características Técnicas del proyecto……...…5

2. OBJETIVO GENERAL…… 5

3. METODOLOGIA 6

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO..... 6

5 OBLIGACIONES DE PERMISOS 7

5.1. GENERALIDADES..... 7

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMA DEL PGAS 7

6.1. Programa y Proyecto de PGAS..... 7

61.1. Gestión Ambiental del proyecto 7

1.1. Grupo de Gestión Ambiental y social……...8

1.2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales……....8

1.3 Capacitación Ambiental y Social……..……..**8**

2 Componente Abiótico……...8

2.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos……...…8

2.2 Manejo del Recurso Hídrico……8

2.3. Control de las Excavaciones y Demoliciones……8

2.4. Residuos Sólidos Generados……..8

2.5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas…………**8**

2.6. Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento……..**8**

2.7. Manejo de la Maquinaria y Equipos……..……**8**

2.8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones……**8**

3. Componente Biótico……..…**8**

3.1. 1. Manejo de la Fauna Silvestre……..……**8**

63.2. Manejo de la Vegetación en Obra……..……..……**8**

3.3. Protección vegetal del suelo**……..……8**

4 Gestión Social……..……..……..……8

4.1 Atención a la Comunidad y Autoridades…….…….**8**

4.2. Información y Participación de la Comunidad……..……..**8**

4.3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos……..…..……**8**

4.4. Gestión de la Mano de Obra……..…**8**

7. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL... ¡Error! Marcador no definido.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS..... 9

9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..... ¡Error! Marcador no definido.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

Para el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas, el Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, en el continuo ejercicio de sus funciones, robusteciendo las edificaciones propias, con calidad en la construcción, garantizando la vida útil de los inmuebles y asegurando los niveles de bienestar, calidad de vida, eficiencia, productividad y ante todo la seguridad física de sus ocupantes.

De esta manera, cumpliendo con la anterior directriz, para la ciudad de Valledupar (Cesar) se creará una nueva torre para el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que se tiene un área libre para la implantación de un nuevo edificio que proporcione todas las garantías de seguridad, permanencia y bienestar tanto para funcionarios, empleados y usuarios.

Este nuevo bloque albergará las diferentes corporaciones, tales como: El Tribunal Superior de Valledupar, El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, El Consejo de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, los cuales se encuentran dispersos en diferentes inmuebles de la ciudad, lo cual permitirá reunir estas Corporaciones ofreciéndoles a los usuarios un correcto acceso a la justicia y una óptima prestación del servicio, digno para funcionarios, empleados y habitantes de la ciudad de Valledupar.

1.1. LOCALIZACIÓN

La construcción se desarrollará dentro de un predio de propiedad de la Rama Judicial de un área de 4.525,00 m², predio donde actualmente funciona el Palacio de Justicia de la ciudad de Valledupar y que está destinado como área de parqueadero descubierto.

El Palacio de Justicia existente consta de un bloque de 8 pisos y cuenta con las siguientes áreas generales:

- Área bruta total predio: 4.525.00 m²
- Área total edificio ocho pisos: 7.758.21 M²
- Área total neta del uso edificio ocho pisos: 5.386.83 M²
- Ocupación edificio ocho pisos: 1.063,61 m²

El predio se encuentra ubicado geográficamente, dentro de la COMUNA 1, barrio catastral 01-01-0468- denominado “ALFONSO LOPEZ”, cuya ubicación geográfica responde a las siguientes coordenadas:

- 10°28'27.4"N ,73°15'07.6"W.

Los datos del inmueble son los siguientes:

- Nomenclatura: Calle 14 No. 12-189
- Matrícula Inmobiliaria No: 190-33450 predio total
- Código Único Catastral: 01-01-0468-0002-000

- Escritura Pública: No. 2105 del 10 de agosto de 1984



Figura No. 1 Localización del proyecto.

Fuente: *Estudios previos del proyecto*

Linderos:

- Norte: 67.50 m
- Este: 84.65m
- Sur: 77 m
- Oeste: 49.45 m



Edificio actual del Palacio de Justicia



Zona en donde se ejecutará el proyecto, parqueadero actual del Palacio de Justicia.

Las principales vías de acceso a los frentes de obra son; Carrera 14 y la calle 14.

Debido al poco espacio en la obra se instalará un campamento, pero la oficina administrativa se ubicará fuera del proyecto, lo más cercano posible al frente de obra.

Tabla 1. Información del proyecto.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Razón social:	Consorcio Obras Judiciales.
Nit:	901665448-8
Objeto del proyecto	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).
Ciudad: Dirección:	Bogotá Carrera 61 # 100-68
Celular:	3004708 / Cel: 3014683375
Representante legal	Víctor Anderson Valbuena Quiroga
Duración del Proyecto:	35 meses

1.2. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla un recorrido vertical en 11 niveles y 2 sótanos. Un acceso de funcionarios y zona de archivo se ubican en el primer piso, en los tres siguientes niveles se localizan servicios netamente públicos con acceso diferenciado. El acceso de usuarios se encuentra en el piso 1 el cual distribuye a los pisos superiores rematando en el piso 10. Es importante resaltar que por funcionamiento de la entidad y su nivel de seguridad se plantean dos puntos fijos diferenciados para la atención del público y otro para el transporte de los funcionarios con circulaciones que no contemplan contacto son los usuarios.



Plano TOP Valledupar

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la ejecución del proyecto "Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar", en el departamento del Cesar, con el fin de ofrecerle a los usuarios y a los equipos de trabajo un espacio con mejor infraestructura el área de estudio y la zona de influencia, reconocer los posibles impactos ambientales, las medidas y acciones de manejo ambiental que se deben implementar durante la intervención en los frentes de obra.

Objetivos específicos

Recolectar información para establecer la demanda de recursos naturales, al igual que los permisos por su uso y aprovechamiento, que se requieran tramitar ante las autoridades ambientales y que son parte integral de PGAS, es decir, los requerimientos y obligaciones que de ellos se emanen.

Respetar el entorno donde se desarrollarán las obras; la eliminación, el control, la prevención y la compensación ante posibles impactos ambientales y sociales negativos, a través de la implementación del PGAS y cada uno de sus programas y proyectos, que se determinen de acuerdo con el proyecto a ejecutar y el estudio previo según el alcance de la obra proyectada.

Conocer y establecer comunicación con las autoridades ambientales y en general, instituciones, operadores de servicios públicos, comunidad y todas las entidades que puedan estar involucradas en el proceso constructivo, el establecimiento de buenas relaciones, así como también la atención y solución de quejas, peticiones o reclamos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto.

- Determinar los indicadores de gestión, según los programas y proyectos identificados, que pueden desarrollarse en cada Contrato para conformar el seguimiento y el nivel de cumplimiento ambiental.

El principal responsable del diseño e implementación y seguimiento del PGAS es el director de proyecto, quien provee los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo del PGAS de acuerdo con el análisis de las diferentes actividades de obra y no solo interviene el Residente ambiental.

En pago del PGAS está inmerso en el presupuesto de obra y el pago no se realiza por separado de las actividades ambientales y sociales.

3. METODOLOGIA

La metodología para implementar para la realización del Plan de Gestión Ambiental y Social es en primera instancia la Guía PGAS DEAJ, la recolección y análisis de información, los estudios previos, pliego de condiciones, información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, CORPOCESAR, entre otras.

De acuerdo con la información recolectada se elaborará un diagnóstico de la situación actual para el área de influencia directa e indirecta.

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Localización, trazado y replanteo para ubicación y marcado en el terreno de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.
Excavación mecánica en material común para elemento - incluye la conformación de taludes y trincheras del proceso constructivo. Esta actividad se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en el estudio de suelos, las recomendaciones estructurales y las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. - incluye retiro y disposición final
CAISSON
Excavación manual caissón constructivos
Suministro e instalación de anillos de caissón en concreto tipo_1 3000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento)
suministro y manejo de acero 60.000 psi/420 mpa.
Fundición de solado de limpieza en concreto
bases en concreto ciclópeo tipo_1 3000 psi - 60% rajón 40% concreto
zapatas en concreto tipo_1 5000 psi
suministro e instalación de pañete de taludes según estudio de suelos
Aseo general.

5. OBLIGACIONES DE PERMISOS DE TALA

5.1. GENEREALIDADES

De acuerdo a las obligaciones dadas por CORPOCESAR se están atendiendo las obligaciones impuestas en la Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023.

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL PGAS

A continuación, se describirán todas las actividades, con las respectivas metas de los programas establecidos para la ejecución del proyecto y describir las medidas desarrolladas durante el periodo de este informe.

1. Programa y proyecto del PGAS

De acuerdo con lo establecido en el plan de manejo ambiental, el proyecto se desarrollará desde el proceso ambiental de acuerdo a los programas establecidos durante la ejecución del proyecto:

ítem	Programas	Proyectos	Código
1	Gestión Ambiental del Proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP
		2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales	1.2-GAP
		3. Capacitación Ambiental y Social	1.3-GAP
2	Componente Abiótico	1.Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos	2.1-MCA
		2. Manejo del Recurso Hídrico	2.2-MCA
		3. Control de las Excavaciones y Demoliciones	2.3-MCA
		4. Residuos Sólidos Generados	2.4-MCA
		5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas	2.5-MCA
		6.Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento	2.6-MCA
		7. Manejo de la Maquinaria y Equipos	2.7-MCA
		8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones	2.8 MCA
3	Componente Biótico	1. Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB
		2. Manejo de la Vegetación en Obra	3.2-MCB
		2. Protección vegetal del suelo	No aplica
4	Gestión Social	1. Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1-GSP
		2. Información y Participación de la Comunidad	4.2-GSP
		3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos	4.3-GSP
		4. Gestión de la Mano de Obra	4.4-GSP
		5. Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural	No aplica

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Cumplir, monitorear y vigilar los planes PGAS, SG-SST, socio ambiental, en la fase de construcción.	Garantizar la estructura de profesionales idóneos, con la preparación y experiencia para cumplir con la gestión legal
El grupo de gestión ambiental y social debe elaborar todos los estudios previos para la elaboración del PGAS e implementarlo y cumplir con la gestión tanto preventiva, como la de control, mitigación y compensación en los casos que se requiera.	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA

Control	**x**	**Prevención**	**x**	**Mitigación**	**x**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

En el mes de agosto de 2023 ingresa al grupo de profesionales encargados de dar cumplimiento a la gestión ambiental en obra el Ing Ferney Peña Rojas director del proyecto.

Dando cumplimiento a la ficha ambiental a continuación se relaciona el personal miembro del grupo ambiental.

Cargo	Nombre y Apellido	Dedicación	# de contacto
Director de Proyecto	Ferney Peña Rojas	100%	3102981094
Ing. Residente de Obra	Emel Larios	100%	3014683375
Residente Ambiental	Mabely Toncel	50%	301 4683375
Administrativa	Wendy Quiroz	100%	311 8884207
Residente SST	Luz Damaris Salcedo	100%	312 4598360


- **Reuniones y comités de seguimiento**

En este periodo se incluye el Ing. Ferney Peña Rojas actual Director del proyecto, continuando así, la conformación

del equipo ambiental de la obra y seguimos con los comités internos del proyecto para seguir implementando y monitoreando las diferentes actividades ambientales.

Durante el mes de agosto se realizaron charlas, socialización y capacitación de temas ambiental con el fin de recordar al personal en obra, las medidas de manejo y protección del medio ambiente. Las actividades mencionadas se evidencian en el siguiente informe.

De igual forma se evidencia reunión realizada con el equipo ambiental donde se trataron temas como:
Solicitud realizada a la entidad de Corpocesar mediante oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-343 Reiteración de la solicitud de proveedores gestora de residuos peligrosos, residuos aprovechables. oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-344 Tratamiento y disposición de aguas subterráneas, Oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-346 Siembra de individuos arbóreos (Resolución 0017 del 28 de febrero de 2023, Oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-363 Solicitud ampliación resolución 0017 del 28 de febrero del 2023.
Oficios recibidos con radicado número 07910, 0901,07900, 08352).

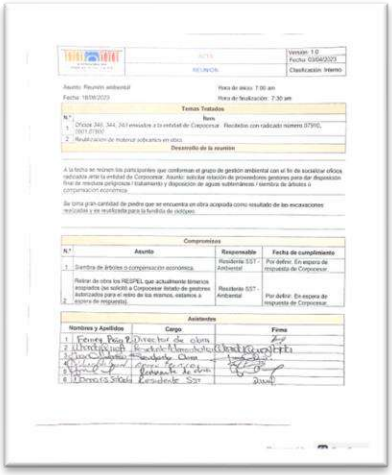	
Fotografía No. 1	Fotografía No. 2

FECHA	TEMA	OBJETIVO
05/08/2023	Protección de la flora y de la fauna.	**Socialización:** Se realiza charla con el tema mencionado, debido a la necesidad de concienciar al personal sobre la importancia y responsabilidad que témenos con la flora y la fauna.
09/08/2023	Ahorro del recurso hídrico.	**Charla:** Sensibilizar al personal Sobre la protección de unos de los recursos naturales más valiosos y a la vez

		más amenazados del planeta.
11/08/2023	Cambios climáticos	**Socialización:** Se tratan temas sobre los cambios de temperatura a los que estamos expuestos. Las causas de estos cambios climáticos y las medidas que debemos tomar para prevenir lesiones por las temperaturas extremas (calor) que se presentando.
14/08/2023	Manejo de residuos sólidos, domésticos y peligrosos.	**Socialización:** Con esta se busca lograr un manejo ambientalmente adecuado de los residuos solidos generados en obra.
16/08/2023	Manejo de los recursos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEC, y RCD.	**Charla:** El objetivo de esta capacitación es socializar las medidas a tomar para el manejo de los recursos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEC, y RCD.
18/08/2023	Manejo de los residuos líquidos a vertimientos, permisos y obligaciones al respecto.	**Charla:** Se realiza charla al Personal con el objetivo de prepararlos para que se maneje con efectividad los residuos líquidos, o de vertimientos generados en obra
22/08/2023	Protección de los recursos hídricos, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto.	**Socialización:** Al socializar el siguiente tema se busca dar un buen manejo al agua y así ayudar a a proteger los recursos hídricos en el proyecto.
24/08/2023	Manejo de sustancias peligrosas, aspectos ambientales relacionados.	**Charla:** Sensibilizar al personal Sobre Las medidas a tener en cuenta al momento de manipular sustancias peligros, su punto de acopio y el manejo de disposición final que se le da.
26/08/2023	Responsabilidad social de un adecuado manejo ambiental en obra.	**Capacitación:** Se realiza la capacitación con el objetivo de concienciar al personal

		la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en obra con el cuidado y manejo ambiental en obra.
29/08/2023	Cooperación entre compañeros de trabajo.	**Charla:** Se realiza la siguiente charla con el fin de alimentar al personal en obra el valor de la solidaridad, la cooperación entre compañeros, apoyarse en cualquier actividad cuando se requiera.
31/0872023	Manejo de material sobrantes y material de construcción.	**Charla:** El objetivo de esta charla es socializar las medidas a tomar para el manejo y y disposición final de los materiales sobrantes en la contracción.

	
Fotografía No. 3	Fotografía No. 4
	

Fotografía No. 5	Fotografía No. 6

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Número de profesionales que componen el grupo de gestión ambiental	No. de profesionales contratados / No. profesionales propuestos	Mensual	5 / 5	Positivo

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

Anexo 1.

- Soporte Asistencia a charlas, Socialización y capacitación ambiental realizadas al personal durante el mes de agosto 2023.





Fotografía No. 7	Fotografía No. 8


	
Fotografía No. 9	Fotografía No. 10
	
Fotografía No. 11	Fotografía No. 12

	
Fotografía No. 13	Fotografía No. 14
	
Fotografía No. 15	Fotografía No. 16

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente hasta terminar el contrato.

- **Reuniones y comités de seguimiento**

Se informa en el periodo del 01 al 31 de agosto del 2023 la realización de la reunión del grupo ambiental (anexo acta) del proyecto en donde se reitera al equipo el PGAS, al igual que los comités internos del proyecto para implementar y monitorear las diferentes actividades ambientales.

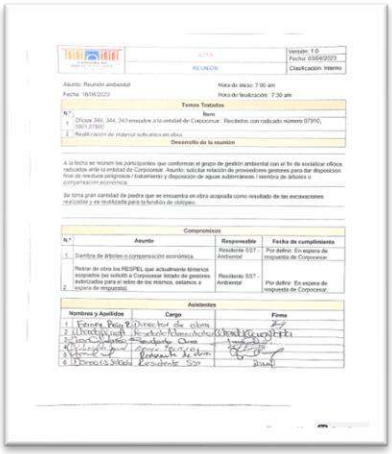	
Fotografía No. 17	Fotografía No. 18


Por otra parte, se tiene comité con interventoría donde se trataron los siguientes temas ambientales en el periodo comprendido en el informe: Siembra de individuos arbóreos o compensación económica, Ampliación de la resolución0017 del 28 de febrero del 2023, solicitud relación de proveedores gestores de residuos peligrosos, residuos aprovechables, tratamiento y disposición de aguas subterráneas (solicitud realizada a Corpocesar)

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA/RECIBIDA	DESTINATARIO
11/08/2023	343	Reiteración de la solicitud de proveedores gestora de residuos peligrosos, residuos aprovechables	enviado	Corpocesar
11/08/2023	344	Tratamiento y disposición de aguas subterráneas	enviado	Corpocesar
11/08/2023	346	Siembra de individuos arbóreos	enviado	Corpocesar
24/08/2023	363	Solicitud ampliación Resolución 0017 del 28 de febrero del 2023.	enviado	Corpocesar
14/08/2023	07906	Radicado del 11 de agosto de 2023, para conocimiento y	recibido	Corpocesar

		fines pertinentes.		
14/08/2023	07907	Radicado del 11 de agosto de 2023, para conocimiento y fines pertinentes.	recibido	Corpocesar
14/08/2023	07908	Radicado del 11 de agosto de 2023, para conocimiento y fines pertinentes.	recibido	Corpocesar
24/08/2023	08352	Radicado oficio N°363	recibido	Corpocesar

- **Anexos:**

Oficios enviados y recibidos sobre temas ambientales

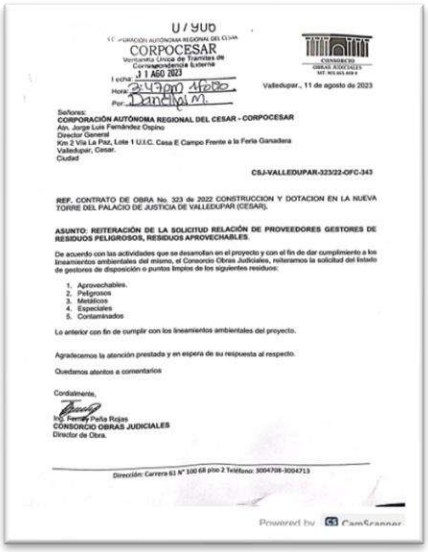
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Trámites de Correspondencia Externa
Fecha: 31 AGO 2023
Hora: 3:49pm 16216
Por: Daniela M.

Valledupar., 11 de agosto de 2023

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Atn. Jorge Luis Fernández Ospino
Director General
Km 2 Vía La Paz, Lote 1 U.I.C. Casa E Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar.
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-343

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO: REITERACIÓN DE LA SOLICITUD RELACIÓN DE PROVEEDORES GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS APROVECHABLES.

De acuerdo con las actividades que se desarrollan en el proyecto y con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos ambientales del mismo, el Consorcio Obras Judiciales, reiteramos la solicitud del listado de gestores de disposición o puntos limpios de los siguientes residuos:

1. Aprovechables.
2. Peligrosos
3. Metálicos
4. Especiales
5. Contaminados

Lo anterior con fin de cumplir con los lineamientos ambientales del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y en espera de su respuesta al respecto.

Quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,

Ing. Fernando Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra.

Dirección: Carrera 61 N° 100 68 piso 2 Teléfono: 3004708-3004713

Powered by CamScanner

Fotografía No. 19	Fotografía No. 20


07907
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Trámites de Correspondencia Externa
Fecha: 11 AGO 2023
Hora: 3:49pm 16216
Por: Daniela M.

Valledupar., 11 de agosto de 2023

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Atn. Jorge Luis Fernández Ospino
Director General
Km 2 Vía La Paz, Lote 1 U.I.C. Casa E Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar.
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-344

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO: TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA SUBTERRANEA

Una vez se ha evaluado en conjunto con la interventoria del proyecto de la referencia, y las actividades constructivas del sub sótano y sótano, los cuales actualmente se esta realizando la excavación a más de 5.00 mts, el Consorcio obras Judiciales he encontrado el nivel freático a 3.00 mts y como es de su conocimiento Valledupar no cuenta en esta zona con alcantarillado pluvial, se hace necesario realizar la disposición de estas aguas en carrotanque, por lo que solicitamos a CORPOCESAR nos indique cual debe ser procedimiento a seguir y en que lugar se puede hacer disposición del agua subterránea, la cual esta generando atrasos en el proceso constructivo del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y en espera de su respuesta al respecto.

Quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,

Ing. Fernando Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Dirección: Carrera 61 N° 100 68 piso 2 Teléfono: 3004708-3004713

Powered by CamScanner



CORPOCESAR
Ventanilla Única de Trámites de Correspondencia Externa
11 AGO 2023
Hora: 3:50pm 26fls
Por: Daniella M

Valledupar., 11 de agosto de 2023

Señores:
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Atn. Jorge Luis Fernández Osorio
Director General
Km 2 Vía La Paz, Lote 1 U.I.C. Casa E Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar.
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-346

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO: SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS RESOLUCIÓN 0017 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023. EXPEDIENTE CG-RNEEAP 012-2023.

Respetado Doctor Fernández,

Dando alcance al comunicado **CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC 304** enviado el día 11 de julio del 2023 con numero de radicación 09650, y teniendo en cuenta el comunicado enviado por CORPOCESAR el día 26 de junio del 2023 con el número de consecutivo SGAGA-CGITGRN- No. 702 en donde se da respuesta a las inquietudes presentadas por el Consorcio Obras Judiciales, sobre la siembra de los individuos arbóreos, en donde la entidad aclara:

"en cuanto al punto numero 4 la reposición deberá hacerse en la misma área de influencia donde se fincan a caba la actividad forestal es decir, en la calle 14 No. 12-189 Palacio de justicia de la ciudad de Valledupar, conforme al # 11 del Artículo tercera de la Resolución supralíticha cuando el área de influencia (Calle 14 No. 12-189 Palacio de justicia) sea insuficiente debido a la densidad de la siembra, Corpocesar podrá recomendar áreas de siembra"

El Consorcio reitera que al realizar la inspección visual del área de influencia, no se encuentran espacios disponibles para la siembra, lo cual nos impide ejecutar dicha actividad, por tal motivo solicitamos de manera atenta que CORPOCESAR nos permita hacer la compensación económica de los mismos, o nos permitan donar los veinticinco (25) individuos arbóreos a CORPOCESAR, si alguna de estas dos opciones no es posible solicitamos de manera atenta, CORPOCESAR nos indique en donde se debe realizar la siembra del material vegetal.

Sin otro particular quedamos a la espera de su respuesta para los fines pertinentes.

Dirección: Carrera 61 N° 100 68 piso 2 Teléfono: 3004708-3004713

Fotografía No. 21



Agradecemos la atención prestada y en espera de su respuesta al respecto.

Quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,

Ing. Fernando Peña Rojas
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Dirección: Carrera 61 N° 100 68 piso 2 Teléfono: 3004708-3004713

Activar
Ve a Conf
Powered by CamScanner

Fotografía No. 22



Valledupar., 24 de agosto de 2023

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
Atn. Jorge Luis Fernández Osorio
Director General
Km 2 Vía La Paz, Lote 1 U.I.C. Casa E Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar.
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-363

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN RESOLUCIÓN 0017 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

El día 28 de febrero del 2023, la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, mediante la resolución No.0017 otorgo al CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la intervención de cinco (5) arboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural en terreno privado, en la calle 14 No. 12-189 (Palacio de Justicia), zona rural del Municipio de Valledupar – Cesar, la cual tiene en sus obligaciones la siembra de veinticinco (25) arboles a reponer con un tamaño mínimo de un metro, en dicha resolución se establecen dos lugares de siembra, las cuales por su ambigüedad en las direcciones y la lejanía al proyecto, el Consorcio Obras Judiciales, solicito aclaración en el comunicado Oficio N°304 con fecha 11 de junio de 2023 el cual tuvo respuesta por CORPOCESAR en el comunicado SGAGA-CGITGRN- No. 702 el día 26 de junio de 2023, en donde la Corporación aclara que se establezca por parte del Consorcio un lugar de siembra en la zona de influencia del proyecto; pero al hacer la revisión ante este requerimiento el Consorcio Obras Judiciales ha enmarcado siguientes comunicados: oficio N°232 y Oficio 346, donde manifiesta que en la zona no se cuenta con lugares disponibles para siembra y por tal motivo se solicito que la compensación de los individuos arbóreos se puede realizar de forma económica o en su defecto hacer la donación de los veinticinco individuos arbóreos a CORPOCESAR, pero a la fecha, el Consorcio Obras Judiciales no ha recibido respuesta alguna de las cartas radicadas ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos de manera atenta, que la resolución 0017 del 28 de febrero del 2023 sea ampliada hasta que la CORPOCESAR defina los lugares de siembra o la compensación económica o la donación de los individuos arbóreos, ya que dicha resolución tiene fecha de vencimiento el día 28 de agosto del 2023.

Agradecemos la atención prestada y en espera de su respuesta al respecto.

Quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,

Ing. Fernando Peña Rojas
Director de Obra
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

08352
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Trámites de Correspondencia Externa
24 AGO 2023
Hora: 02:18pm Folios
Por: Jazz M

Dirección: Carrera 61 N° 100 68 piso 2 Teléfono: 3004708-3004713

Powered by CamScanner

Fotografía No. 23

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Ambiental del proyecto	2. Tramite y cumplimiento de requisitos legales	1.2.-GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Garantizar el cumplimento de las obligaciones del Consorcio de identificar, tramitar y/u obtener todos los permisos de acuerdo con la legislación colombiana y el cumplimiento de las normas locales de la ciudad de Valledupar	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación
Cumplir con los requisitos adquiridos derivados de los permisos que se deban generar para la ejecución del proyecto	Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Del proyecto del Consorcio Obras Judiciales seguimos identificando todos los requisitos legales y permisos a tramitar, cambios y novedades normativas.

Los permisos identificados son los siguientes:

- **Seguimiento de la licencia o permisos**

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses
Radicación del PG-RCD	Corpocesar	Fecha de radiado 02/03/2023	Duración del proyecto
solicitud vertimientos de Aguas Residuales	Corpocesar	Abril 27 del 2023	Duración del proyecto

- **Permisos ambientales de proveedores**

Agregados

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m³	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CESIÓN DE DERECHOS	RUCOM
Arena	32 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230
Gravilla	40 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230

Concretos

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m3	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
Concretos plástico asent.6"+/-1" 3000 psi 3/4"	640	Argos	Se ha desarrollado la construcción de los caissón en concreto de 3000 psi. Se realiza fundida de zapata en concreto 5000 psi.	
concretos plástico asent.6"+/-1" 4000 psi 3/4	5500	Argos		
concretos plástico asent.6"+/-1" 5000 psi 3/4"	1540	Argos		
concretos plástico asent.6"+/-1" 6000 psi 1"	640	Argos		

Disposición de RCD pétreos y no pétreos

TIPO DE RDC	VOLUMEN PROYECTADO m³	SITIO DE DISPOSICIÓN	PERMISO AMBIENTAL
RCD	108,28 m3	AGREGADOS DEL CESAR	Auto 432-09-10-2019 RCD
Excavación de material común	0		
Excavación en roca	86,28 m3		
RESPEL	3 kl.	A la fecha se tienen acopiados en obra en espera de aprobación de la empresa gestora de residuos peligrosos.	

Para los materiales de construcción y sitios de disposición de escombros el Consorcio Obras Judiciales adjuntará en cada informe la certificación del titular del permiso o licencia, manifestando la prestación del servicio o venta de materiales, en donde se indica el objeto del contrato

En el periodo de este informe no se evidencian hallazgos arqueológicos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Obligaciones y requerimientos de las autoridades ambientales	No. de requerimientos de autoridades	Anual	2	50 % (Compra y Siembra de árboles)
Permisos, autorizaciones o concesiones	No. Permisos otorgados por la autoridad / No. Permisos identificados en el proyecto	Mensual	1	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Licencias ambientales de las canteras y demás proveedores - resolución de tala (hacer listado y en una sola carpeta)

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Ambiental del Proyecto	Capacitación Ambiental y Social	1.3 - GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto, en lo relacionado con los temas de carácter ambiental, social y técnico de la obra	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.
Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación	

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Quejas y reclamos de la comunidad
Vandalismo	

TIPO DE MEDIDA							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales estable en el anexo 2, el cronograma de charlas, Socialización y capacitación ambiental y social.

Tema de capacitación	Fecha
Protección de la flora y de la fauna.	05/08/2023
Ahorro del recurso hídrico.	09/08/2023
Cambios climáticos	11/08/2023
Manejo de residuos sólidos, domésticos y peligrosos.	14/08/2023
Manejo de los recursos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEC, y RCD.	16/08/2023
Manejo de los residuos líquidos a vertimientos, permisos y obligaciones al respecto.	18/08/2023
Protección de los recursos hídricos, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto.	22/08/2023
Manejo de sustancias peligrosas, aspectos ambientales relacionados.	24/08/2023
Responsabilidad social de un adecuado manejo ambiental en obra	26/08/2023
Cooperación entre compañeros de trabajo.	29/08/2023
Manejo de material sobrantes y material de construcción.	31/0872023

Para el cumplimiento de esta ficha ambiental todas las capacitaciones son de carácter obligatorio para los colaboradores del proyecto y el director de obra garantiza y autoriza la ejecución de las mismas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Capacitaciones	No. Capacitaciones realizadas /	Mensual	11 / 11	100%

cumplidas	No. Capacitaciones programadas			
Personal Capacitado	No. Personal Capacitado / No. de personal laborando	Mensual	39	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Durante el mes de agosto se realizaron 5 charlas Ambientales 1 charla social 1 capacitación, 4 socialización al personal en obra con el fin de retroalimentar temas ambientales y social.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Manejo Integral de materiales de construcción, Mobiliario y Equipos	2.1 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer las medidas de control, prevención y mitigación de impactos que puedan generar el manejo integral de los materiales de construcción en obra.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente	

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)
Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Riesgo de Accidentalidad	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra):

- el Consorcio Obras Judiciales, está realizando la compra de materiales pétreos solo en canteras que cuentan con permisos ambientales, licencias ambientales y mineros, teniendo especial cuidado en que estén vigentes los permisos y que no se encuentren vencidos, cancelados o suspendidos.

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:



Fotografía No 24. Suministro de gravilla



Fotografía No 25. Suministro de arena

En el frente de obra se tienen los siguientes materiales pétreos: Se cuenta con material en obra.

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
Arena	32 M3	Cantera	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI
Gravilla	40 M3	Cantera	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI

Anexo No. 01. Resolución Licencia Ambiental

- En caso de lluvias, disturbios o por exigencias legales, el material de construcción que se encuentre en la obra que no se utilice, se acordonará (como mínimo con señalizadores tubulares y cinta de señalización) y protegerá de la acción de las precipitaciones o el viento cubriéndolos con lonas o plástico, delimitándolos con barreras de contención como ladrillos y alejados de los drenajes

superficiales de agua, o sumideros.

- En cada frente de obra y según el programa de inspecciones planeadas, se realizarán inspecciones a los acopios temporales de materiales de construcción, identificando condiciones de señalización y cubrimiento del material.

TIPO DE MATERIAL INSPECCIONADO	FECHA
Arena	02/08/2023 - 10/08/2023 - 15/08/2023 -22/06/2023 -
Gravilla	01/08/2023- 03/08/2023- 10/08/203 14/08/2023 - 16/08/2023 -

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Fuentes de materiales con permisos vigentes	No. Fuentes con permisos vigentes / No. Fuentes de materiales presentadas	Mensual	1/1	Cumplido 100 %
Volumen de material en obra (por cada tipo de materiales)	Volumen certificado por fuentes autorizadas / Volumen de materiales ingresado a la obra	Mensual	300 / 300	Cumplido 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra)

- Arena
- Gravilla ¾”



Fotografía No. 26. Certificado cantidad de material pétreos ingresados a obra – agosto 23

Concretos

- Se ha realizado concretos en obra de 3000 psi para la construcción de anillos para caissón



Fotografía No. 27 para el mes de agosto ingresaron a obra 300 bolsas de cemento marca Argos.

Prefabricados

- Certificados de calidad.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Manejo del Recurso Hídrico	2.2 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer la demanda del recurso hídrico en el proyecto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR), y determinar las medidas de manejo de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo controles de protección y prevención de impactos.
Prevenir, minimizar y controlar los impactos en el recurso hídrico con el fin de llevar a cabo acciones de seguimiento y control para prevenir posibles modificaciones a las características fisicoquímicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto, por actividades derivadas de la ejecución del contrato.
Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sólidos para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación por escorrentía superficial	Contaminación del suelo
Incremento en la demanda de bienes o servicios	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA

Control		**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio ha identificado que el agua que se utiliza en el proyecto se hará a través de un contador independiente del Palacio de Justicia de Valledupar para el desarrollo del proyecto, que el agua será con acometida la cual se ha solicitado directamente por el proyecto a EMDUPAR con solicitud número: CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-006 y se hará el pago de servicio de manera independiente del Palacio de Justicia.

Para el mes de agosto Emdupar hace la entrega de la factura de consumo del agua gastada en obra.

	
Fotografía No 28 Factura de Consumo de agua a la fecha 31/08/2023	Fotografía No 29 Pago Factura Consumo de agua a la fecha 31/08/2023

Uso eficiente del recurso agua

- No se tienen cuerpos de agua cerca al proyecto, los sumideros aledaños al proyecto serán protegido con poli sombra con el fin de evitar el arrastre de material o sedimentos que puedan llegar a obstruir o contaminar los cuerpos de agua.
- No se presenta ni desviación ni canalización de cauces de ríos o cuerpos de agua cercanos al proyecto.
- Se puede reutilizar las aguas lluvias para su reutilización como aguas grises (uso y arrastre en aparatos sanitarios y para riego).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Control de la calidad del agua	No. parámetros que cumplen norma de referencia / No. parámetros medidos de calidad del agua	No aplica para el proyecto	0 / 0	100%
Obras para el control de sedimentos	No. obras de control de sedimentos construidas / No. obras de control de sedimentos planeadas	Mensual	0 / 0	No hay fracturado para controlar 100%
Consumo de agua en obra	Vol. Agua certificada para consumo en obra / Vol. Agua consumida durante el en obra	Mensual	000062	Se evidencia en la factura emitida por Endupar. 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

El soporte de seguimiento de esta ficha se realizará a través de:

- Cumplimiento de indicadores formato de la entidad.
- Registro fotográfico.
- F-EVSG-19 Control Consumo Agua formato de la entidad.



Fotografía No 30. Consumo de agua en obra a la fecha. 31//08/2023

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Control de la excavación y demoliciones	2.3 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Realizar el control de las demoliciones y excavaciones, cumpliendo con la normatividad legal vigente ambiental, Implementando las medidas de control y mitigación en la ejecución de las actividades de obra, transporte y disposición o su reutilización	Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se utilizarán en la conformación de rellenos, bases con el objetivo de prevenir los impactos.
Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas. Cumplir con la normatividad legal vigente.	Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del

	proyecto
Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y vehículos.	Disponer todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal fin
IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Generación y aporte de sólidos por escorrentía en redes de alcantarillado
Alteración de la calidad visual	Afectación de la cotidianidad
Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.).	Riesgo de Accidentalidad

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

En el proyecto no se podrá hacer limpieza manual de la vegetación de la zona de obra ya que en la actualidad se tiene una placa de concreto lo cual impide tener suelo orgánico en caso de que se encuentre solo se extrae el suelo orgánico con un espesor de 0,1 metros a 0,5 metros, según las especificaciones y la interventoría del proyecto se indicará la cantidad de material a utilizar con los equipos apropiados, en donde se pueda prevenir daños a las estructuras aledañas.

El área a excavar no presenta potencial arqueológico, pero en el momento que se presente se tomaran las medidas establecidas en la ficha Protección del patrimonio arqueológico y cultural, la cual será incluida en el presente documento.

Excavaciones

A la fecha se han realizado actividades de excavación

Actividad	Cantidad m³
Excavación	0
Demolición	0
Excavación en roca	86,28

- Una vez se tengan identificadas las estructuras que deben ser demolidas, los residuos resultantes y que no puedan ser reutilizados serán dispuestos en los siguientes sitios de disposición:

EXPEDIENTE	SITIO DE DISPOSICIÓN	ACTIVIDAD QUE REALIZA	LOCALIZACIÓN
Auto No. 432	Agregados del Cesar E. U	Gestor de RCD de puntos limpios y plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final	Sede Operaria: Km 3 Vía a La Mesa – Valledupar – Cesar

El auto No. 432 del 10 de octubre del 2019 Corpocesar emitió el respectivo permiso de este gestor

Transporte

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

Anexo: 2 Soporte Soat, Licencia de conducir, Tecno mecánica.

PLACA VOLQUETA	SOAT	LICENCIA DE CONDUCIR	TECNOMECANICA VIGENTE
PKB 173	X	X	x
UZA 362	X	X	x
SZM 219	X	X	x

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Sitios de disposición de escombros y excavaciones	No. Sitios de disposición autorizados / No. Sitios de disposición de escombros necesarios	Mensual	1/1	Agregados del Cesar E. U 100%
Material dispuesto en sitio de disposición autorizado	Volumen de materiales dispuestos en sitio autorizados / Volumen de material para disposición final	Mensual	108, 28 / 108, 28	Agregados del Cesar E. U 100%
Material reutilizable	Volumen reutilizado en obra o por terceros / Volumen de material reutilizable.	Mensual	0	N/A
Reutilización de descapote	Volumen descapote reutilizado en el proyecto/ Volumen descapote obtenido y almacenado	Mensual	0	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO



Fotografía No 31. Certificado Recepción material RCD



Fotografía No 32. Material Reutilizable en obra



Fotografía No 33. Fundida de ciclópeo con material reutilizable en obra

Excavaciones

- Registro Fotográfico

	
Fotografía. No. 34 excavación y fundida de caissón anillo 3	Fotografía No.35. Excavaciones y fundida para caissón anillo 3.

Transporte

- Registro Fotográfico

	
Fotografía No 36. Transporte de arena de Rio.	Fotografía No 37. Transporte de gravilla

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**
PROGRAMA	**PROYECTO**		**IDENTIFICACION**

Componente Abiótico	Residuos sólidos generados	2.4 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aplicar por parte del Consorcio Obras Judiciales las políticas ambientales en cuanto a la disminución en la generación de residuos sólidos.

El Consorcio Obras Judiciales cumple para la ejecución del proyecto las condiciones legales desde la clasificación, almacenamiento, presentación y disposición final de los residuos sólidos con el gestor autorizado.

Implementar medidas para el manejo de los residuos sólidos, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de este tipo de residuos.

Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales este encargado de gestionar los residuos en la obra, de acuerdo con las normas ambientales en Colombia.

En el proyecto se establece un sitio, el cual tenga sea de fácil acceso, el cual tiene como objeto al destinado al almacenamiento de RCD's, esta zona debe tener la señalización de acuerdo al tipo de residuo que se dispone, y debe estar el residuo confinado y el suelo debe contar con recubrimiento en polietileno de alta densidad, La estructura no debe encontrarse cerca de cuerpos de agua artificiales o naturales, los sumideros del área de influencia del proyecto deben estar cubiertos y realizarse manteniendo frecuente.

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	SITIO DE DISPOSICIÓN
Material vegetal y suelo orgánico	0	N/A
Chatarra y llantas.	0	N/A
Empaques, envases y embalajes.	0	N/A
Papel blanco oficinas.	25	Se están reutilizando en oficina.
Residuos especiales y/o peligrosos	3 kilos	Punto de acopio
Residuos Orgánicos.	15	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.
Basura	2	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.

Ubicación de recipientes de recolección de residuos sólidos / Residuos no aprovechables

Ubicar de manera estratégica y visible, recipientes adecuados para la separación en la fuente de los residuos.
Residuos orgánicos: serán entregados a las empresas dedicadas al aprovechamiento de este tipo de residuos que se encuentran en el área de influencia del proyecto o a personas que puedan hacer aprovechamiento de estos residuos en actividades agropecuarias.
Residuos no aprovechables – basuras: estos residuos serán almacenados hasta su recolección por las empresas prestadoras de este servicio para su disposición en el relleno sanitario que se encuentre debidamente autorizados para realzar este manejo.

Caneca color verde: Se deposita residuos orgánicos aprovechables
Caneca color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel, cartón.
Caneca color negro: Para depositar residuos no aprovechables.

Lo anteriormente mencionado es tomado de la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

Separación de residuos solidos

En los campamentos, instalaciones temporales y áreas de trabajo se realizará la separación de residuos en contendores debidamente marcados según tipo de residuo.

	
Fotografía No 38. Punto ecológico ubicación ingreso a obra.	Fotografía No 39. Punto ecológico sendero peatonal en obra.

Vertimiento de aguas producto de la excavación en obra

Debido a que el proceso constructivo del proyecto presenta un nivel freático alto, es necesario instalar sedimentadores para reducir la turbulencia, velocidad y decantar las aguas productos de las excavaciones por la cimentación del proyecto, la baja velocidad del flujo de agua permite que las partículas sedimentables se hundan, mientras los componentes que pesan menos que agua floten hacia la superficie, lo que permite el vertimiento de estos residuos líquidos que no son contaminados ya que no tendrán ningún tipo de sustancia química serán reutilizada para humectación, lavado de baños y lavado de llantas (en caso de requerirse) reincorporando en el proceso constructivo este tipo de residuo.

Se han realizado excavaciones a 4.80 metros para los caissón, encontrando inconvenientes con filtraciones de agua, los cuales se está realizando la medición de nivel freático del proyecto.

	
Fotografía No 40. Medición nivel freático	Fotografía No 41. Medición nivel freático

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Residuos sólidos convencionales dispuestos en relleno sanitario	RSI dispuesto en relleno sanitario / RSI generados en la obra	Mensual	0/0	No se generó residuos sólidos en obra. 100%
Residuos sólidos reutilizados por gestores construidos	RSR +RSO reutilizados por gestores autorizados / RSR + RSO generados en obra	Mensual	0/0	No se generan residuos sólidos para ser reutilizados por gestores. 100%
Residuos peligrosos manejados por operador autorizado	RSP entregados a gestor autorizado /RSP generados en obra	Mensual	3 kilos	El único RSP generado en obra son Bolsa de cemento se encuentran almacenadas en punto de acopio en espera de aprobación del gestor a quien va hacer entregado

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Construcción centro de recolección residuos solidos

- Centro de acopio debidamente señalizado.



Fotografía No. 42. Acopio de Residuos



Fotografía No. 43. Acopio de Residuos

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Residuos líquidos y sustancias peligrosas	2.5 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
El objetivo de esta ficha ambiental es definir las soluciones y herramientas técnicas para el adecuado manejo, control y aplicación de las contingencias, para el manejo de los residuos líquidos y sustancias peligrosas del proyecto.	Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sustancias peligrosas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto	
IMPACTOS POTENCIALES	

Contaminación del agua	Contaminación del suelo
Contaminación del aire	Alteración calidad visual
Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Manejo de Aguas residuales domesticas

- La obra tiene cobertura del sistema de alcantarillado, se dispondrá en la obra de baños fijos para los trabajadores los cuales se establece uno para mujeres y tres para hombres, en caso de contingencias, se dispondrán baños portátiles, los cuales contarán con el certificado de manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.

- Los baños cuentan con sanitario y lavamanos, en relación de una unidad sanitaria por cada quince trabajadores, separados por sexo y dotados con jabón desinfectante, papel higiénico, toallas y recipientes para basura.



Fotografía No. 44. Baños



Fotografía No 45. Lavamanos

Residuos Líquidos Industriales

- En el proyecto no se tiene permitido lavar vehículos o maquinaria de obra.
- En el proyecto no se establece la necesidad de tener un contenedor de residuos para este tipo de residuos líquidos industriales, en el caso que por las actividades generadas se requiera y este, se colmate se realiza su limpieza y mantenimiento respectivo.
- No se hará, por ningún motivo, disposición de residuos en los cuerpos de agua superficiales ni en la vía pública, con lo cual se asegura que no se verán afectados como consecuencia de las actividades

constructivas.

Residuos de aceite y/o combustibles

En el proyecto no se ha implementado esta actividad debido a que esta actividad no se realiza en obra.

Manejo de Sustancias Peligrosas

- Si se presentan derrames accidentales de aceites, aditivos de concreto, solventes, pinturas no acrílicas, agua-cemento, lubricantes u otras sustancias peligrosas, se debe realizar el procedimiento estipulado en el plan de contingencias y emergencias ambientales y utilizar el kit de derrames del proyecto.

- El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, debe ser conforme a las indicaciones de la hoja de seguridad del producto y tener a todo el personal entrenado en su manejo en caso de algún incidente.

- En el lugar de almacenamiento se tiene en cuenta la señalización del sitio.

- Para un apropiado almacenamiento, el Consorcio tiene en cuenta:

a. El volumen máximo de almacenamiento.
b. Volumen máximo de almacenamiento por clase.
c. Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de sustancias.
d. Cantidad almacenada según sustancias y clases de sustancias.
e. Se tendrá un registro de recepción, despacho e inspección.
f. No se deben mezclar sustancias peligrosas que sean incompatibles para esto se publica la matriz de sustancias químicas.
g. El acopio de recipientes de sustancias combustibles, tóxicas u oxidantes no podrá ser superior a la recomendada según el tipo de recipientes.
h. En el proyecto se implementa un Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales por derrame de sustancias peligrosas, socializado a todo el personal que haga parte del proyecto. Este plan se entregará junto con el PGAS
i. En el periodo de realización de este informe no se presentaron derrames o emergencias ambientales
En el proyecto se dispondrá un cuarto de sustancias químicas el cual estará en zona dura y cuenta con un dique de confinamiento en caso de derrames y tendrá una capacidad calculada en 110% del volumen almacenado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Permiso de vertimientos	No. permisos de vertimientos obtenidos / No. permisos de vertimientos identificados	Mensual	0 / 0	No se tienen baños portátiles en obra 100%
Disposición de	Volumen de residuos líquidos			

residuos líquidos	entregados a un gestor autorizado / Volumen de residuos líquidos generados	Mensual	0 / 0	No se generan residuos líquidos. 100%
Manejo de sustancias peligrosas	Volumen sustancias químicas almacenadas correctamente / Volumen sustancias químicas almacenadas.	Mensual	300 /300 (ingresa cemento a obra)	Al ingresar a obra se acopian en el almacén. 100%
Atenciones incidentes y accidentes ambientales	No. de emergencias atendidas correctamente / No. de emergencias con sustancias peligrosas	Mensual	0/0	No se presentan emergencia con sustancias peligrosas 100%
SOPORTES DE SEGUIMIENTO				
Residuos líquidos				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Instalación, Funcionamiento y retiro de campamentos	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento en caso de ser necesario construirlo.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Restaurar ambientalmente las áreas donde se han llevado a cabo desmantelamientos de instalaciones útiles en el momento de la construcción de obras.	

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de la calidad paisajística	Alteración de la estabilidad del terreno
Alteración de las características del suelo	Alteración de la calidad de agua por arrastre de sedimentos.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación



Fotografía No 46 campamento de obra



Fotografía No 47. Orden y aseo campamento de obra



Fotografía No 48. Dotación campamento de obra

- En el proyecto se cuenta con una franja de aproximadamente cuatro metros, el cual se dispone para campamentos de obra, cuenta con cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Funcionamiento del Campamento

- En el campamento están ubicados los profesionales del pliego de condiciones, el cual están dotado de equipos de cómputo, escritorios y demás insumos necesarios para la ejecución administrativa del proyecto.

- Se tiene asignado un trabajador para orden y aseo de las instalaciones temporales el cual debe cumplir con la establecido en la ficha ambiental 2.5 MCA Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas.
- Se instalará un punto de emergencia que está dotado de extintor, camilla y botiquín.
- La señalización es indispensable, por ende, se cuenta con esta, instalada en todos los sitios de almacenamiento y acopio de material incluyendo las señales informativas y de advertencia de acuerdo con el producto que se tenga.
- Con el propósito de implementar el uso eficiente al agua, se podrán implementar sistemas de recolección de aguas lluvias y recirculación, que pueda emplearse para usos específicos.
- No se instalarán plantas de producción de concreto en obra, el concreto será suministrado por una planta de concretos.

Desmantelamiento de instalaciones

- El desmantelamiento de instalaciones se realiza inmediatamente después de terminadas las obras, y así se dará por terminada la obra.
- Este desmantelamiento será de toda la infraestructura que se utilizó para la construcción del proyecto, así como los equipos, la acometida temporal que suministra el agua potable, luz y demás servicios públicos que se utilizaron el a etapa constructivo del proyecto.
- Del área de construcción se retiran todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.
- Como parte del cierre ambiental del PGAS, el Consorcio Obras Judiciales entregará una paz y salvo de propietario del predio de las instalaciones temporales, de lo contrario no podrá ser liquidado su contrato.

Esta parte de la ficha se implementa al finalizar el proyecto.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Medidas de Manejo ambiental en campamentos (se realiza inspección donde se evidencia que se encuentra limpio y ordenado.	Medidas de manejo ambiental aplicadas en el campamento e instalaciones / Medidas de manejo ambiental necesarias	Mensual	N/A	N/A
Calidad del aire	No. Quejas atendidas y cerradas de aire o ruido / No. quejas por mala calidad del aire o ruido	Mensual	100%	No se presentan quejas de la comunidad durante el mes de Agosto. 100 %

Calidad del agua	No. Quejas resueltas calidad del agua / No. Quejas por la mala calidad del agua	Mensual	100 %	No se presentan quejas por la calidad del agua 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de seguimiento de esta ficha ambiental se establecen:

- Lista de chequeo de medidas de manejo ambiental en campamentos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la maquinaria y equipo	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como objetivo de esta ficha es la prevención de los potenciales impactos negativos que se pueden producir por el uso de maquinaria y equipos en el proyecto.

Establecer los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo para que todos los equipos, vehículos y maquinaria para la ejecución del proyecto, el cual debe permanecer en óptimas condiciones, cumpliendo las normas ambientales y su operación se realice en seguridad y protección del medio ambiente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros	Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites
Contaminación del suelo	Emisiones de gases de combustión
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Maquinaria y Equipos

- Para este periodo continua en obras el siguiente equipo.

EQUIPO O MAQUIRIA	FECHA DE INGRESO
TROMPO	10/06/2023

- Anexo a este informe se entrega a la Interventoría los documentos de la maquinaria, equipos y vehículos que estarán al servicio de la obra, en donde se adjuntan:

  a. Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
  b. Revisión técnico-mecánica (N.A)
  c. Seguridad Social del operador.
  d. Preoperacional.



Foto No 49 Inspección visual 01 al 31 de agosto de 2023

- En el momento que se requiera programas y ejecutar actividades de obra en horario nocturno, se solicitará el respectivo permiso ante la alcandía si así se requiere.

- Este apartado se entrega en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El mantenimiento y lavado se realiza en centros especializados y autorizados ambientalmente para tal fin. Y están prohibido este tipo de prácticas en el proyecto.

- En la actualidad se encuentra en el proyecto mezcladoras portátiles, el lavado del trompo de mezcladora de concreto se realiza en un lugar con las medidas de manejo ambiental, que garantizando la protección de los recursos naturales
- El Consorcio no ejecutara mantenimientos preventivos ni correctivos en el proyecto de ninguno de la maquinaria o equipos del proyecto, solo en casos de extrema urgencia y con previa autorización de la interventoría y siguiendo los lineamientos de este documento.
- Para la permanente entrada y salida de vehículos se debe realizar mantenimiento periódico de los sedimentadores presentes en el área de intervención, para evitar su colmatación. El material seco será manejado como material de excavaciones, previo proceso de secado, realizado en lechos de secado por evaporación, tal como se explicó en la ficha ambiental 2.3 MCA CONTROL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, de este documento.

- Se instalará en la puerta de ingreso un desarenador con su respectiva rejilla para el lavado de llantas de las volquetas, con el objetivo de mantener el espacio público limpio y evitar aumento del material particulado afectando la calidad del aire, aporte de sedimentos al alcantarillado y aumentar el riesgo de accidente en las vías aledañas al proyecto; a la fecha de presentación de este informe aún no se ha instalado este tipo de estructura debido a que no se ha tenido la necesidad de este tipo

- Se restringe la velocidad de acuerdo con el PMT de circulación de los vehículos y maquinaria, dentro y alrededor de la obra. Vale la pena resaltar que este fue aprobado para el mes de mayo.

- El proyecto cuenta con un cerramiento en zinc para evitar cualquier tipo de incidente con la comunidad.
- Los trabajos del proyecto no ocuparán el espacio público, para los cortes de acero o ladrillo se dispondrán de barreras acústicas en icopor. En lo posible se utilizarán martillos de goma y cortadoras con reductores de ruido incorporados; para disminuir la emisión de ruido.



Fotografía No 50 Cerramiento de la zona de obra



Fotografía No 51 Cerramiento de la zona de obra

MANEJO DEL MATERIAL PARTICULADO

- El material agregado que se tenga en el proyecto deberá permanecer cubiertos en todo momento con el fin de evitar la fuga de partículas al proyecto.
- Se instala poli sombra para aislar la zona de construcción de la zona del Palacio de Justicia.
- Durante los días más calurosos se hará dispersión o humedecimiento de la zona de trabajo, pero sin formar charcos de agua o humectación excesiva.
- Minimizar el flujo de vehículos dentro y sobre los lugares de acopio del material pétreo.

- Se garantiza el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado.
- En el momento de barrer zonas de obra se hará humectación del sitio de limpieza para garantizar que el material particulado no este suspendido en el aire.
- Para la cortadora de ladrillo se dispondrá un lugar aislado dentro del proyecto en donde se realiza un cerramiento perimetral, aislado por polisombra e icopor, para minimizar el ruido que genera la operación del equipo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica	No. Vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica / No. Vehículos y maquinaria en el proyecto	Mensual	3 / 3	Todos los documentos al día 100 %
Accidentes registrados	No. eventos atendidos correctamente / No. Accidentes ocurridos por manejo de vehículos y maquinaria	Mensual	0 /0	No se ha presentado accidente y/o incidentes en obra 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de esta ficha ambiental son:

- Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
- Seguridad Social del operador
- Revisión Tecno mecánica de vehículos (No aplica)
- Ultimo mantenimiento
- Preoperacionales de maquinaria y equipos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Control de la calidad del aire y las emisiones	2.7 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar y plantear las medidas que debe realizar el Consorcio Obras Judiciales, con el fin de no alterar la calidad del aire y el ruido ambiental en el entorno donde se desarrolla la obra civil

Mitigar los posibles efectos negativos que se presentan, principalmente sobre el componente atmosférico durante la etapa de construcción y operación del proyecto

IMPACTOS POTENCIALES	
Deterioro de la calidad del aire, por el aumento en las concentraciones de material particulado y gases contaminantes	Deterioro de las zonas verdes y en general del paisaje por acumulación de polvo.
Molestias a la comunidad y los trabajadores, por la presencia de polvo, gases y ruido.	

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO

Calidad del Aire

- El proyecto tendrá un cerramiento en teja de zinc y si se requiere se protegerá con malla ecológica o polisombra para el control del material particulado.
- El control en la fuente se realiza cubriendo los materiales con plástico negro de construcción para evitar el efecto del viento que dispersa el material fino en el aire.
- Se hace control estricto del PMT del proyecto para evitar posibles accidentes con la comunidad.
- En el proyecto no hay perdida de cobertura en el área de intervención, pero se aplicarán medidas de disminución del material particulado que produce la circulación de maquinaria, vehículos, el personal de obra y la acción del viento.
- Se prohíbe el riego de aceite quemado como medida para este aspecto ambiental y cualquier mantenimiento en la zona del proyecto.
- Se debe cumplir con las medidas de manejo establecidas en la ficha 2.7 MCA MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS, especialmente en lo relacionado con las emisiones de los vehículos, equipos y maquinaria; además de las establecidas en la legislación colombiana sobre emisiones de ruido, ruido ambiental, emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, así como de la calidad del aire.

MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO

Las actividades de esta ficha se están implementando este mes, y así mismo dando cumplimiento al proceso constructivo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad
N. A	N. A	N. A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Revisión tecno mecánica
- Documentos volquetas

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Biótico	Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proteger la fauna presente en el área de influencia directa del proyecto.	Capacitar al personal sobre el componente ambiental.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración al paisaje.	Minimizar el impacto en la avifauna que pueda estar en el proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Esta ficha ambiental será aplicada en el proyecto en el caso que se detecte fauna en el proyecto o los permisos emitidos por CORPOCESAR lo requieran y se hará de la siguiente manera:
- En el caso de tener fauna en el proyecto se escogerán los lugares de relocalización, contando con el apoyo de las autoridades y entidades ambientales especializadas según las especies, para garantizar su conservación.
- El personal de la obra será capacitado según el cronograma de capacitaciones anexo al PGAS.
- Se informa al personal que está prohibida la caza de cualquier especie de fauna silvestre.
- Cuando se requiera de rescate de fauna, se debe concertar los sitios de captura y de liberación, así como gestionar los permisos para esta actividad.
- Todas las actividades de estudio, rescate y relocalización de la fauna hallada, se cumplirán antes de la intervención a la vegetación del área de influencia directa del proyecto.
- Cuando se encuentren animales heridos o enfermos, deben ser entregados a la autoridad ambiental, elaborar un acta de la entrega, especificando el sitio, la especia, su estado, funcionario y entidad que recibe.
- Se debe llevar un registro fotográfico, georreferenciar todos los procedimientos que se realicen, nombre científico y común de la especie rescatada y liberada.
- En caso de necesitarlo, el Consorcio Obras Judiciales debe llevar un formato de registro de fauna, donde se debe reportar todos los procedimientos realizados. Como mínimo debe contener el nombre científico y común de la especie, sexo, cantidad, ubicación, si está dentro de alguna clasificación de conservación o protección, su estado de salud, el sitio de la liberación y registro fotográfico.

Rescate de Avifauna

- En el caso de rescate de nidos con huevos o neonatos se hará a través de un biólogo quien está capacitado para ejercer esta labor.

- Se tendrá especial cuidado en la etapa de tala, con el fin de garantizar que en el momento de la ejecución de esta actividad los individuos no cuenten con nidos activos, para esperar que los huevos o neonatos se desarrollen hasta la formación de plumas.

Para el mes de junio se realizó la tala de un árbol, el cual se verificó con anterioridad que no se viera afectada la avifauna. Para este periodo de agosto no se realiza tala de arboles.

Rescate de Mamíferos

- En el caso de tener que realizar el procedimiento para el rescate de mamíferos se hará con un biólogo, quien tendrá en cuenta las características de las jaulas y tener un espacio mínimo dos veces el tamaño del animal, tener ventilación y recubierta con material poroso como la tela.
- Cuando se empleen anestésicos o sedantes, solo se podrá hacer cuando se haga bajo la supervisión de un veterinario experto.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate de Reptiles

- Cuando se identifique una de especies en el proyecto se procederá al ahuyenta miento de la misma y su rescate se hará con ayuda de personal especializado para este fin. En el proyecto no se tendrá disponible suero antiofídico.
- El procedimiento de captura se debe realizar preferiblemente en días soleados entre 10:00 y 13:00 horas del día o entre las 17:00 hasta máximo 18:00 horas del día.
- Se deben transportar en bolsas de tela gruesa y cuando sean serpientes venenosas, se tienen que utilizar recipientes rígidos, que la tapa se pueda cerrar de manera segura y que reciba ventilación suficiente.

No se pueden poner especies distintas en un mismo contenedor.
Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate, Traslado y Reubicación de Enjambre Silvestre

- En caso de identificarse este tipo de rescate se tendrá el apoyo de personal especializado ya que en obra no se cuenta con este tipo de expertos y se seguirán los siguientes pasos:

a. Hacer reconocimiento del sitio específico donde está el enjambre, verificar las condiciones del tiempo, para no actuar en condiciones de lluvia ni de extremo calor.
b. Con el equipo de trabajo se planificar esta intervención.
c. La intervención se hará mínimo tres (3) personas.
d. Usar siempre el traje de protección enterizo, guantes y botas.
e. En el área sólo debe permanecer el equipo que hará el procedimiento, instalar señales y personal que controle el paso por el sitio, habrá un responsable de la seguridad.
f. Es importante contar con personal médico dentro del equipo de trabajo.
g. Tener permanente comunicación y contacto visual con sus compañeros.
h. El procedimiento termina cuando la colmena se haya trasladado

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Preparación: Capacitación en manejo de abejas y primeros auxilios; identificación y compra de equipos de protección, equipos y accesorios; identificar e informar a organismos de respuesta como Bomberos, Defensa Civil y

Cruz Roja.

Acercamiento al Sitio: Establecer las condiciones, rutas que se van a manejar, duración del procedimiento y verificar si existen algunas condiciones especiales de las abejas o avispas, agresividad de la colonia, o si hay personas heridas.

Operación: Asegurar la zona, colocar una unidad generadora de humo a fin de neutralizar la capacidad de ataque de las abejas y transcurrido un tiempo prudente, retirar las abejas.

Reporte de la Actividad: En el mismo formato de rescate de fauna, se hará un reporte de la actividad con todas las características de la especie y el registro fotográfico. Informar a la autoridad ambiental, cuando así lo requiera.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Protección de la fauna existente	No. Fauna silvestre rescatada y reubicada / No. No. Fauna silvestre encontrada en el AID	Mensual	0 / 0	Para este periodo no se realiza tala de Árbol. 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Para el mes de agosto 2023, No se realizó tala de árbol.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la vegetación en obra	3.2 - MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definir los requisitos para la intervención de la vegetación y las actividades apropiadas en el manejo de la flora, para disminuir y compensar el impacto negativo que genera su afectación, en el proyecto.

Identificar la vegetación que se intervendrá, por la ejecución de las obras dentro del área de influencia directa; los trámites que sean necesarios ante CORPOCESAR y llevar a cabo las actividades como tala, poda radicular, poda aérea, bloqueo y traslado, mantenimiento, establecimiento, fertilización y control sanitario.

IMPACTOS POTENCIALES

Afectación a la capa vegetal						Alteración al paisaje.		
Migración de la fauna silvestre						Generación de ruido y material particulado		
TIPO DE MEDIDA								
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	**X**	
MEDIDAS DE MANEJO/ACTIVIDADES EJECUTADAS								

Inventario Forestal y Plan de Manejo Forestal

- Para este mes de agosto se continua con el riego de los árboles que fueron intervenidos en la raíz y los arboles que se encuentran dentro del proyecto.



Fotografía No 52. Riego de árbol



Fotografía No 53. Riego de Árbol

En pro de mantener los procesos de mejora continua, para la ejecución de dicha poda, se realiza el riego de los árboles intervenidos con el fin de evitar la deshidratación de los mismos.
Vale la pena mencionar que dicho proceso se evidencia en el informe forestal enviado al área de interventoría el día 18 de mayo de 2023 con radicado No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 210

Permisos para la Ejecución de la Intervención

- En el momento que se cuente con el inventario forestal, se inicia el trámite de permisos y autorizaciones por parte de CORPOCESAR, según el caso.

- En la actualidad se cuenta con el permiso ambiental de tala el cual se relaciona a continuación

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses

Manejo de la Vegetación: Podas, Talas y Traslados

En este periodo No se realizó tala de árbol.

Se anexa la siguiente documentación al presente informe:

La Interventoría aprobó el documento PGAS, a la fecha se ha venido realizando seguimiento a todos los compromisos y a lo que la ley refiere. el Consorcio entrego a la Interventoría, el acto administrativo mediante el cual se le otorga el permiso para el manejo de la vegetación y deberá cumplir con los requerimientos que establezca la autoridad ambiental,

Manejo de la Vegetación Para Permanecer:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Vegetación con veda nacional o regional	No. individuos con permisos de levantamiento de veda otorgado por autoridad ambiental competente / No. individuos inventariados identificados con veda	N/A	0/0	No Se realiza tala de árbol para este mes 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO
• Certificados de disposición vegetal
• Permisos ambientales /forestales

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1 GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto asume el manejo de las obligaciones ante la comunidad directa de influencia del proyecto la cual son

los funcionarios y visitantes al Palacio de Justicia de Valledupar, autoridades municipales, Juntas de Acción Comunal – JAC, líderes, directivas de instituciones, empresas de servicios públicos de la ciudad de Valledupar, los cuales presenten inquietudes, quejas, reclamos y consultas relacionadas con el proyecto.

El proyecto debe implementar mecanismos para recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las PQRS que las partes interesadas presenten al proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES

Minimizar impactos ambientales que puedan generarse desde el personal del proyecto.	Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Instalación y Funcionamiento del CAC

- El Consorcio Obras Judiciales en el ingreso del proyecto instala un espacio de atención a la ciudadanía, la cual tendrá atención a las partes interesadas en la etapa de inicio de las actividades constructivas, y se desarrollan las siguientes actividades:

a. Actas de vecindad: Ya fueron realizadas las de actas de Inicio

b. Gestión de mano de obra local: Se está contratando personal de la localidad

Este espacio estará abierto y disponible durante todo el proyecto, en los horarios 10:00 a.m. a 12:00, los lunes, miércoles y viernes, en dónde se tendrán los documentos técnicos del contrato, estos horarios serán divulgados a la comunicada comunidad en la reunión de inicio, adicional se publicarán los horarios de atención.

- Debe registrarse en el formato, el estado en el que queda la visita del ciudadano:

Cerrada: Cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y las partes interesadas o quien presento la queja este satisfecha con la respuesta o acción desarrollada por parte del Consorcio Obras Judiciales.

Abierta: cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en proceso de trámite.

En los informes mensuales del Consorcio Obras Judiciales se presentará al Interventor un consolidado de todas las solicitudes de los ciudadanos, entregando los siguientes valores y porcentajes:

a. Total, de manifestaciones en el periodo y acumuladas.
b. Total, de manifestaciones por tipo en el periodo y acumuladas.
c. Total, de casos cerrados en el periodo y acumulados.
d. Total, de casos abiertos en el periodo y acumulados.
e. Para el cierre ambiental y social del proyecto, el Contratista debe tener paz y salvo de todos los eventos registrados de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad.

En esta oficina deben permanecer las Actas de Vecindad que se realizaron en el periodo previo a las actividades constructivas y documentos en general que sean de consulta por la comunidad y las autoridades.

En Este periodo no se han presentado quejas y se ha presentado público.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Quejas y reclamos durante el proyecto	No. manifestaciones cerradas / No. manifestaciones de la comunidad	Mensual	0 / 0	A la fecha No se presentan quejas por la comunidad 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Formato de PQRS
- Reunión de inicio
- Actas de vecindad (del cliente)
- Gestión de mano de obra local

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Información y Participación de la Comunidad	4.2 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Que el consorcio Obras Judiciales proporcione información que oportuna, suficiente, clara y necesaria para todas las partes interesadas del proyecto.

El Consorcio Obras Judiciales debe darle un buen manejo a la información relativa al proyecto, con las autoridades locales, la comunidad del área de influencia directa

IMPACTOS POTENCIALES

Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

La comunidad aledaña al proyecto puede tener dudas sobre el proyecto las cuales pueden influir en el desarrollo del proyecto

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades de Comunicaciones y Publicidad

Son las actividades para distribuir elementos de comunicación para citar reuniones y divulgar información relevante relacionada con el proyecto.

Comunicaciones Personalizadas: Cuando es necesaria la elaboración de una comunicación formal dirigía a una persona, funcionario o entidad en particular, donde se entregue información o invitación a alguna reunión. Deberán estar revisadas por la Interventoría antes de su envío.

Volantes de Información: Cuando se distribuya información a través de volantes informativos en el área de influencia del proyecto, se tomará el recibido de los ciudadanos que lo recibieron dentro de un formato con la fecha, identificación completa de la persona que recibió la información y firma o huella.
En caso de que se requiera intervención de redes de servicios públicos que genere su suspensión temporal, la restricción de tráfico y cierre de vías, entre otras, se deberá dar aviso oportuno a la población afectada, mediante volantes y reuniones con la Junta de Acción Comunal, entre otras formas organizativas, con mínimo 5 días de anticipación; también deberá contar con los permisos respectivos para realizar este tipo de cierres y suspensiones.

Información por Medios Locales: A través de medios como la televisión local, radio comunitaria o perifoneo autorizado, se podrá hacer divulgación de reuniones programadas para la invitación a la comunidad en general.

Manejo del Flujo Peatonal



Fotografía No. 54. sendero peatonal dentro de obra



Fotografía No. 55. Señales de transito

- El Plan de Manejo de Tráfico – PMT Con fecha de aprobación 17 de mayo del 2023 y radicado a interventoría el día 18 de mayo de 2023 con oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-212, debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad de la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, como también el malestar a terceros dentro del

área de influencia.

- De igual forma se implementa la señalización de seguridad adecuada. Todos los elementos de señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función.
- Cuando el PMT aprobado por la oficina de tránsito o Alcaldía correspondiente, contemple los controladores viales, se deberá disponer del personal necesario, sin que esto implique costos adicionales a la DEAJ.
- En el caso de requerir senderos externos para uso peatonal con un ancho suficiente, para que el tráfico peatonal normal no sufra congestiones.
- Los senderos peatonales no podrán ser ocupados por la obra, como por equipos, vehículos, ni por el cargue y descargue, ni por el acopio temporal de materiales.
- Las obras en espacio público deben realizar cerramientos, buscando el bienestar y la seguridad de los transeúntes.
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán mantenerse bien señalizados, de tal forma que sean claramente visibles, identificables y que permitan una fácil orientación a los peatones.
- Se deben ubicar los factores generadores de ruido alejados del perímetro que limita la obra con el espacio público; aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Reuniones de apertura, seguimiento y cierre	o. de reuniones desarrolladas / No. Reuniones programadas	Mensuales	N/A	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Cronograma de reuniones de avance
- Informe general del avance del proyecto.
- Resultados de la gestión social y ambiental del Contratista.
- Reunión de finalización
- Comunicaciones personalizadas
- Volantes de información
- Plan de Manejo de Tráfico

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**
PROGRAMA	**PROYECTO**		**IDENTIFICACION**

Gestión Social	Manejo de Infraestructura Privada, Publica, de Servicios Públicos, Redes y Activos.	4.3 – GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta ficha es la elaboración del estado físico de la infraestructura pública y privada, así como de las redes de servicios públicos cercanos al área de influencia directa del proyecto, generar espacios y relaciones con propietarios y empresas administradoras u operadores; con el propósito de prevenir conflictos con las comunidades y las entidades correspondientes.

IMPACTOS POTENCIALES

Impactos derivados de la construcción del proyecto que puede generar daños a la infraestructura pública al igual que las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para la atención a los ciudadanos o partes interesadas del proyecto se tiene designado el siguiente horario de atención de la comunidad:

Martes, jueves y sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. lugar donde se decepcionará y aclararán todas las inquietudes presentadas por las partes interesadas o a través del correo electrónico: atencionpqrscoj@hotmail.com



Fotografía No. 56. Sitio de atención a las partes interesadas



Fotografía No 57. Sitio de atención a las partes interesadas

Actas de Vecindad de Predios

Corresponde al registro del estado de la construcción y de toda la infraestructura vecina a las actividades de obra y en los sitios que el contratista requiere de manera temporal para el desarrollo de la obra, empleando el Formato del Acta de Vecindad del Anexo 8.3 de la guía para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social.

Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles, vallas, redes de acueductos, de distribución de energía, redes de tecnología de la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

- Esta será una actividad que debe liderar el profesional social del contratista, con el acompañamiento del Residente de Obra, quien será la persona entendida en los aspectos técnicos del acta de vecindad en el momento de realizarla.

- La Interventoría también debe acompañar las actas de vecindad, con el fin de verificar que se cumpla con el procedimiento y apoyar técnicamente las observaciones.

- Cuando existan posibles interferencias de la obra con redes u infraestructura existente, que no está contemplado en el diseño, el Contratista debe informar formalmente a la Interventoría para que se realicen las gestiones y ajustes oportunos para la buena ejecución de la obra.

- Se debe informar a la comunidad sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del responsable o del propietario del predio.

- Antes de iniciar, el equipo social del Contratista establecerá contacto con el propietario, administrador o directiva de las construcciones. En el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de interés religioso o cultural) se debe realizar contacto con el Director del Palacio de Justicia de Valledupar para informarle sobre el levantamiento del Acta de Vecindad en esa área.

- Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- El Consorcio Obras Judiciales recibe y resolver las quejas y reclamos que la comunidad o entidades puedan presentar por afectación a la infraestructura vecina a la obra.
- El Formato del Acta de Vecindad será el que se encuentra en el Anexo 8.3 de la guía para el Plan de Gestión Ambiental y Social.
- En el proyecto no se tiene proximidad con actividades agrícolas, por eso no se hará registro del estado de cultivos, pasto, cercas, fuentes de agua.
- El Consorcio Obras Judiciales entregara al propietario o responsable del predio, la copia física del Acta de Vecindad, dentro de los 15 días calendario, posterior a la fecha de la diligencia.
- El archivo magnético deberá estar almacenado en la oficina de Centro de Atención Ciudadana CAC, para

ser consultado en el momento que sea necesario.
El Profesional Social al finalizar la obra, se llevarán a cabo las Actas de Vecindad de Cierre en las mismas construcciones y predios donde se levantó el Acta de Vecindad de Inicio; dicha acta consiste en la verificación final del estado físico en que quedaron, una vez terminadas las actividades constructivas y con la aceptación del dueño o responsable.

Manejo de las Quejas de Actas de Vecindad

Cuando en el CAC se reciba alguna queja por daños a la infraestructura, donde se adjudique dicho daño a las actividades constructivas, el Consorcio Obras Judiciales deberá tomar las siguientes acciones para atención a este evento:

- El Profesional Social del Consorcio Obras Judiciales deberá tomar nota en el formato de Atención al Ciudadano, diligenciando toda la información, en este caso de la queja por la posible afectación del predio.

- Se recomienda mantener una relación amable y diligente con el ciudadano que manifiesta una afectación.

- Se debe programar en el formato de Atención al Ciudadano una fecha y hora de visita, en un plazo no mayor a 24 horas, para determinar y cotejar la situación que expone el quejoso, frente a las condiciones en las cuales estaba el bien, previo al inicio de obra.

- Se deberá tener el acompañamiento de un garante como la Personería, lo cual se solicitará con el fin de ofrecer garantías al ciudadano.

- Habrá que establecer la responsabilidad de los daños provocados y el origen de los mismos, a fin de que no continúen tal secuela o en su defecto, aclarar que no corresponden a la ejecución del proyecto.

- Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.

- En todos los casos de un proceso de restauración de las condiciones del predio deben quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano, sobre el acuerdo en el cual firmen las partes y como mínimo indicando la siguiente información:

  - Fecha en que se instauró la queja en el CAC
  - Fecha en la que se hizo la diligencia de la visita para verificar el daño y sus causas
  - Registro fotográfico del espacio afectado
  - Concepto técnico del equipo profesional del Contratista
  - Registro fotográfico del archivo del acta de vecindad
  - Descripción del estado inicial, es decir, el que se encuentra en el acta de vecindad
  - Se debe señalar el tipo de arreglo que debe producirse: reparación, reposición o compensación. En cada caso debe explicarse la forma en que se cumplirá la acción.

Tendrá el seguimiento de las actividades programadas para la restauración, incluyendo:

- Registro fotográfico finalizado o cumplido el acuerdo
- Un recibido a satisfacción del ciudadano que formalizó la queja, firmada por el ciudadano

Fecha del cierre de la manifestación ciudadana

- Todo el proceso deberá ser informado a la Interventoría, quien podrá aportar su concepto y recomendaciones en la medida que lo considere pertinente.
- Cuando se presenten discrepancias entre la Interventoría y el Contratista sobre la responsabilidad en los daños presentados, se acudirá al Coordinador asignado por la DEAJUIF del Contrato de Obra o al funcionario que esta designe para dar solución a las diferencias presentadas.
- Si la DEAJ establece que la responsabilidad del daño es del Contratista, este deberá proceder a reparar los daños ocasionados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las reparaciones por razones imputables al Contratista no serán objeto de pago por el Contrato. En el caso que el contratista no repare los daños dentro del plazo previsto, será considerado como un incumplimiento del contrato

Medidas de Manejo de Infraestructura de Servicios Públicos

Se deberán tener en cuenta las siguientes actividades previas y durante las actividades de obra, para evitar la afectación de los servicios públicos:

- Antes de las actividades de descapote y excavaciones se debe comprobar la existencia de redes de servicios públicos en el área a intervenir.
- Se debe establecer comunicación formal con las entidades dueñas de redes y activos, operadores o administradores.
- Las redes deben ser localizadas junto con el operador con un plano de catastro de red actualizado, para determinar su posición y especificaciones.
- Para cuando se deban intervenir redes de servicios públicos. se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda desarrollar por falta de alguna autorización.
- No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos.
- Cuando se esté interviniendo una red subterránea, se recomienda que se efectúe por tramos y sin que permanezca abierta la excavación por un tiempo mayor de 12 horas, por lo que para este tipo de trabajos debe programarse iniciar temprano en la mañana, para tener instalado y cubierto al finalizar la jornada.
- En caso de ser necesario cortes de los servicios públicos, se debe informar anticipadamente a la comunidad cuya cobertura será afectada y adicionalmente tener preparado el Plan de Contingencia, que hará parte del PGAS, en el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio interrumpido.
- En el CAC y en otros puntos del campamento, deberá permanecer publicados todos los números telefónicos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, en caso de cualquier emergencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultados	Análisis
Levantamiento actas de vecindad (predios,	No. de actas de vecindad diligenciadas / No. de actas	Mensual	6 / 6	100%

redes y activos de servicios públicos, infraestructura	de vecindad identificadas			
Cierre actas de vecindad	No. de actas de vecindad cerradas / de actas de vecindad diligenciadas	Mensual	6 / 6	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Actas de vecindad

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Social	Gestión de la Mano de Obra	4.4 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar el manejo de contratación de mano de obra donde se considera que es trascendental priorizar la mano de obra local e impedir la migración de trabajadores al Área de Influencia Directa – AID del proyecto; toda vez que el incremento de población foránea puede generar escenarios negativos

Generar ingresos en los habitantes y comunidad del AID del proyecto, mejoramiento de su calidad de vida, previniendo la migración de trabajadores foráneos y la gestación de conflictos con la comunidad establecida.

IMPACTOS POTENCIALES

Desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes o conflictos de aspecto socioeconómico y cultural.	Causar un impacto positivo general en la comunidad de influencia

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO / ACTIVIDADES EJECUTADAS

Medidas de manejo

El Contratista tendrá que contratar un porcentaje de personal no profesional para la obra y dentro de ese total se establece que mínimo el 50% deben pertenecer al AID del proyecto. La Interventoría tendrá la obligación de hacer el seguimiento sobre el cumplimiento de este requisito o el que se establezca en los documentos técnicos del Contrato, cuando así ocurra.

- El equipo mínimo de profesionales del Consorcio Obras Judiciales será personal de su confianza, por lo tanto, este personal podrá ser foráneo en la medida y autonomía administrativa que tiene el Consorcio, sin embargo, preferiblemente podrá optar por personal de la zona donde se realizar la obra.
- Todo el personal deberá ser aprobado por la Interventoría de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto.

- Se debe conformar una línea base del componente socioeconómico y cultural, la cual debe indicar la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales presentes en el área y a fin de conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el Contratista establecerá la mano de obra a contratar para el desarrollo de su obra.
- El Contratista podrá solicitar apoyo de entidades públicas de gestión de empleo como del SENA u otras como, las Cajas de Compensación Familiar de la región y la Unidad de Servicio Público de Empleo: http://serviciodeempleo.gov.co/
- A través de las Alcaldías apoyadas en las Juntas de Acción Comunal – JAC, podrá certificar la residencia en el AID, en algunos lugares conocido como "Certificado de Territorialidad".
- En los informes mensuales del Contratista a la Interventoría, presentará toda la información correspondiente, soportes y los indicadores de la mano de obra contratada.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Generación de empleado en el área de influencia directa AID	No. personal contratado y vinculado al proyecto No. profesional del AID / No. Personal contratado y vinculado no profesional	Mensual	32	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Contratación de personal
- Cumplimiento del indicador
- Informe Mensual

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

El periodo objeto de este informe no se presentaron incidentes que deban ser reportados.
