ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL – HUILA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.

INTERVENTOR: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA.

INFORME DE INTERVENTORIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 149 DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 142 de 2023

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No.	Contrato No.149 de 2023
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Valor Inicial	$52.335.346,00
Plazo	La interventoría CONTRATADA deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza la interventoría, tres (03).
Anticipo	$0
Contratista	SOCIEDAD TÉCNCA SOTA LTDA
Representante Legal	ING. JAVIER BARRERO MOSSOS.
Supervisor	ING. SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Contratante	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL – HUILA. SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.
Fecha de Inicio	05 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación	04 de diciembre de 2023
OTRO SI No 1	N/A
Acta de suspensión	N/A
Fecha de Reiniciación No.01	N/A
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL

RELACION DE POLIZAS DE INTERVENTORÍA

Estado de las Pólizas – ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza Legalización del Contrato FECHA EXP23/AGO/2023 - FECHA DE APROBACION:24/AGO/2023				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Cumplimiento	CHU-100001080_0	11/08/2023	11/03/2024	$10.467.069,20
Anticipo	CHU-100001080_0	11/08/2023	11/03/2024	$15.700.604,00
Prestaciones Sociales	CHU-100001080_0	11/08/2023	11/11/2026	$10.467.069,20
Calidad del Servicio	CHU-100001080_0	11/11/2023	11/11/2028	$10.467.069,20

Amparo	No. Póliza	Desde	Hasta	Vlr. Asegurado
Responsabilidad Civil Extracontractual	CHU-100001080	11/08/2023	11/11/2023	$232.000.000,00

ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE INTERVENTORÍA POR ACTA DE INICIO

FECHA EXP: 13/SEP/2023 - FECHA DE APROBACION: Pendiente				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Cumplimiento	CHU-100005536	05/09/2023	05/04/2024	$10.467.069,20
Anticipo	CHU-100005536	05/09/2023	05/04/2024	$15.700.604,00
Prestaciones Sociales	CHU-100005536	05/09/2023	06/12/2026	$10.467.069,20
Calidad del Servicio	CHU-100005536	06/12/2023	06/12/2028	$10.467.069,20

FECHA EXP: 13/SEP/2023 - FECHA DE APROBACION: Pendiente				
Amparo	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**	**Vlr. Asegurado**
Responsabilidad Civil Extracontractual	CHU-100001080	05/09/2023	6/12/2023	$232.000.000,00

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra No.	Contrato No. 142 de 2023
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA.
Valor inicial	$ 715.214.130,00
Plazo	Tres (03) meses a partir de Acta de Inicio
Anticipo	$ 0
Contratista	GRUPO MSG S.A.S.
Representante Legal	ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Supervisor	Aguas del Huila – Ing. Yesid Rojas Peña
Fecha de inicio	05 de septiembre de 2023.
Fecha de Terminación	04 de diciembre de 2023.
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de suspensión No.01	N/A
Fecha de Reiniciación No.01	N/A
Valor Pagado a la fecha	$ 0
Estado del Contrato	En Ejecución

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

El equipo de la Interventoría realizo una labor de supervisión y seguimiento en los procesos constructivos en el sitio de la obra lo cual nos ha permitido estar en pleno contacto con el Contratista, la Alcaldía municipal y la comunidad de las veredas a intervenir de Paicol, para que la obra se desarrolle en los más altos estándares de calidad, y sea la misma comunidad beneficiaria, la que pueda estar mejorando su "Calidad de Vida".

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

El contrato en mención tiene un avance de 29.97%

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Durante este mes se ejecutaron obras en los siete (7) frentes:

Vereda Peña Negra Alta. Tramo 1:
*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación posibles sobreanchos. Con una cuadrilla integrada por un topógrafo, un maestro de obra, un (1) ayudantes de obra .
Vereda Peña Negra Baja. Tramo 2:
*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación alcantarilla, posibles sobreanchos. Con una cuadrilla integrada por un (1) topógrafo, un (1) maestro de obra, un (1) ayudantes de obra.
Vereda La Mesa (El Chaparro). Tramo 3:
*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación alcantarilla, posibles sobreanchos.
*2.1 Excavación Mecánica conformación banca.
*2.3 Conformación sub base granular.
*2.4 Figurado, arme y colocación aceros de refuerzos (varillas #2, #3 y #4).
*2.5 Fundición de concretos 3000psi.
*2.6 Fundición de concretos ciclópeos 40%piedra y 60%concreto 3000psi.
Con una cuadrilla integrada por un (1) topógrafo, un (1) maestro de obra, un (5) ayudantes de obra.
Vereda La Laja. Tramo 4:

*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación alcantarilla, posibles sobreanchos.
*2.1 Excavación Mecánica conformación banca.
*2.3 Conformación sub base granular.
*2.4 Figurado, arme y colocación aceros de refuerzos (varillas #2, #3 y #4).
*2.5 Fundición de concretos 3000psi.
*2.6 Fundición de concretos ciclópeos 40%piedra y 60%concreto 3000psi.
Con una cuadrilla integrada por un (1) topógrafo, un (1) maestro de obra, un (4) ayudantes de obra.

Vereda Alto Granadillo. Tramo 5:
*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación alcantarilla, posibles sobreanchos. Con una cuadrilla integrada por un (1) topógrafo, un (1) maestro de obra, un (1) ayudantes de obra.

Vereda La Reforma. Tramo 6:
*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación alcantarilla, posibles sobreanchos.
*2.1 Excavación Mecánica conformación banca.
*2.3 Conformación sub base granular.
*2.4 Figurado, arme y colocación aceros de refuerzos (varillas #2, #3 y #4).
*2.5 Fundición de concretos 3000psi.
*2.6 Fundición de concretos ciclópeos 40%piedra y 60%concreto 3000psi.
Con una cuadrilla integrada por un (1) topógrafo, un (1) maestro de obra, un (6) ayudantes de obra.

Vereda La Cumbre. Tramo 7:
*1.1 Localización y replanteo, Verificación de anchos bancas y ubicación alcantarilla, posibles sobreanchos. Con una cuadrilla integrada por un (1) topógrafo, un (1) maestro de obra, un (1) ayudantes de obra.

RELACIÓN DE LAS OBRAS.

CONTRADAS:

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOL MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localizacion y replanteo	ML	510	$ 4.096,89	$ 2.089.413,14
	SUBTOTAL				$ 2.089.413,14
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA				
2.1	Excavacion mecanica (Explaneacion) ESP 210-13 INVIAS. Incluye retiro de material proveniente de la excavacion a disposicion final del mismo.	m3	228	$ 57.671,00	$ 13.148.987,07
2.2	Excavacion manual en seco (Incluye transporte al sitio autorizado)	m3	58	$ 67.027,39	$ 3.887.588,65
2.3	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de subbase granular CBR>=40% . ESP. 320-13 INVIAS	m3	324	$ 157.983,10	$ 51.186.523,01
2.4	Acero de refuerzo 4200kg/cm2 (60000psi) ESP. 640-13INVIAS Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones.	kg	21838	$ 9.099,20	$ 198.708.410,40
2.5	Suministro e instalacion de concreto normal clase D. (F'c=210kg/cm2) o (3000 psi) para dentellones, placas , riostras, cunetas y bordillos.	m3	385	$ 752.466,00	$ 289.699.409,08
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	m3	93	$ 501.375,97	$ 46.627.965,37
	SUBTOTAL				$ 603.258.883,57
3	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (6)				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F (F'C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE.	m3	18	$ 586.891,47	$ 10.564.046,42
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES. MUROS. ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	m3	51	$ 752.466,00	$ 38.375.765,88
3.3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	30	$ 520.716,92	$ 15.621.507,50
3.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	Kg	3473	$ 9.099,20	$ 31.601.534,45
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	m3	3	$ 192.990,70	$ 578.972,09
3.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	m3	42	$ 102.004,40	$ 4.284.184,67
	SUBTOTAL				$ 101.026.011,07
	SUBTOTAL DE OBRAS				$ 706.374.307,77
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 3.264.000,00
	PAGA				$ 5.575.822,00
	VALOR TOTAL DIRECTOS				$ 715.214.129,77

EJECUTADAS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

ACTA DE CORTE No. 1 — **FECHA** 27/09/2023

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. MUNICIPIO DE ACEVEDO								
PRELIMINARES								
1	1,1		1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	270,00	$ 3.151	$ 850.892
Subtotal								**$ 850.892**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACA HUELLA								
2	2,1	ESP. 210-13 INV.		EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	334,57	$ 44.362	$ 14.842.438
3	2,2		2P	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	m3	0,00	$ 51.560	$ 0
4	2,3	ESP. 320-13 INV.		SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	m3	125,45	$ 121.525	$ 15.245.770
5	2,4	ESP.640-13 INV.		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	kg	7.176,90	$ 6.999	$ 50.233.904
6	2,5	ART. 630 INV		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES PLACAS RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	m3	116,65	$ 578.820	$ 67.521.007
7	2,6	ESP. 630-13 INV.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS.	m3	48,60	$ 385.674	$ 18.743.748
Subtotal								**$ 166.586.866**
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (6)								
8	3,1	ESP. 630-13 INV.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F-(F´C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE.	m3	0,00	$ 451.455	$ 0
9	3,2	ART. 630 INV		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	m3	0,00	$ 578.820	$ 0
10	3,3	ESP. 661-13 INV.		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	0,00	$ 400.551	$ 0
11	3,4	ESP.640-13 INV.		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA, BOX, MUROS, INCLUYE TRANSPORTE	Kg	0,00	$ 6.999	$ 0
12	3,5	ESP. 673-13 INV.		SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	m3	0,00	$ 148.454	$ 0
13	3.6	ESP. 220.1-13 INV.		TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.	m3	0,00	$ 78.465	$ 0
Subtotal								**$ 0**
COSTO DIRECTO								**$ 167.437.758**
						ADMINISTRACION	23%	**$ 38.510.684**
						IMPREVISTO	2%	
						UTILIDAD	5%	**$ 8.371.888**
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 0
				PAGA				$ 0
				VALOR TOTAL				**$ 214.320.330**

1.1.1 Estado de las Pólizas – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza Legalización del Contrato				**Anexo 1**
Fecha de expedición: 01/agosto/2023			**Fecha de Aprobación: N/A**	
No. Póliza	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	25/julio/2023	25/marzo/2024
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	25/julio/2023	25/octubre/2026
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	25/octubre/2023	25/octubre/2028
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$232,000,000.00	25/julio/2023	25/octubre/2023

Actualización Póliza Acta de Inicio				**Anexo 2**
Fecha de Expedición: N/A		**- Fecha de Aprobación: N/A**		
No. Póliza	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Desde**
33-44-101240822	Cumplimiento del Contrato	$143,042,826.00	**N/A**	**N/A**
33-44-101240822	Salarios y Prestaciones Sociales	$35,760,707.00	**N/A**	**N/A**
33-44-101240822	Estabilidad de la Obra	$143,042,826.00	**N/A**	**N/A**
33-40-101075700	Responsabilidad civil extracontractual	$232,000,000.00	**N/A**	**N/A**

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Contrato de Obra

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	05/09/2023	25		N/A
Suspensión No. 1	N/A			
Reiniciación No 1	N/A			
Terminación	04/12/2023			

Historial Cronológico del Contrato de Interventoría				
ACTIVIDAD	**FECHA**	**DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
Iniciación	05/09/2023	25		N/A
Terminación	04/12/2023			

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	05 de septiembre del 2023

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Acta de Inicio de Interventoría	1	05 de septiembre de 2023

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto Obra (Describir)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... $ 715.214.130,00

VALOR DEL ANTICIPO.....$ 00,00

PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 0%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual.....**29.97 %**

Avance Físico Acumulado.....**29.97%**

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA
De acuerdo a la programación inicialmente presentada, el avance físico a la fecha debería ser del **24.10%**

PORCENTAJE DE AVANCE O ATRASO SEGÚN CRONOGRAMA

Se presenta un avance (adelanto) del **5.87%**
El contratista ha concentrado la ejecutado en los tramos; N°3 (Vereda La Mesa-Chaparro), N°4 (Vereda La Laja) y N°6 (Vereda La Reforma).

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total de Obra.....91 días

Tiempo Total Transcurrido .....25 días

Tiempo Total que les queda.....66 días

Avance Porcentual según plazo inicial.....27.47%

AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada..... **$ 715.214.130,00**

Inversión Ejecutada en el Periodo.....**$ 214.320.330,00**

Porcentaje Ejecutado en el Periodo.....29.97%

Inversión Total Ejecutada.....$ 214.320.330,00

Porcentaje Total Ejecutado.....29.97%

1.3.1 Estado y Avance Presupuestal del Proyecto INTERVENTORIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO..... **$ 52.335.346,00**

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO..... $ 00.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO.....**$ 52.335.346,00**

VALOR DEL ANTICIPO..... $ 00.00

PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 0%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual.....29.97%

Avance Físico Acumulado..... 24.10%

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Se recomienda continuar señalizando a lo largo y durante la ejecución del contrato.

Se recomienda crear dos nuevas cuadrillas para avanzar en otros tramos del trayecto y cumplir con el plazo y cronograma de obra.

Se recomienda continuar con el control de calidad (toma de muestras de laboratorio) de las estructuras conformadas en obra, como son la preparación del concreto 3000psi y conformación de la sub base granular.

1.5. Estado de Cronograma de obra

El cronograma de obra entregado por el contratista cumple con los requerimientos de la entidad contratante, el cual permitirá realizar un buen seguimiento durante el desarrollo de la obra. Según el cronograma de obra presentado por el contratista de obra se debería haber ejecutado obras por valor de:

El % de avance programado es de 24.10% = $ 172.389.486,00
El % de avance ejecutado es de 29.97% = $ 214.320.330,00
El avance (adelanto) es de 5.87% = $ 41.930.844,00

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcia No. 1	28/09/2023	$ 214.320.330,00	$ 00	TRAMITE
TOTALES		**$ 214.320.330,00**	**$ 00**	TRAMITE
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 715.214.130,00		$ 715.214.130,00	$ 214.320.330,00	$ 500.893.800

2.1.1. Estado Financiero del Contrato de Interventoría

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcia No. 1	28/09/2023	$ 15.679.670	$ 00	TRAMITE
TOTALES		**$ 0**	**$ 0**	TRAMITE
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**

$ 52.335.346	$ 0.00	$ 52.335.346	$ 15.679.670	$ 36.655.676

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Personal Administrativo:

1. Diego Segura (director Obra)
2. Nelson Aldana (Residente obra)
3. Catalina Guasca (Especilista Pavimentos)
4. Lina Peralta (Residente SISOMA)
5. Ana Gonzalez (Topofraga)
6. Hector Argumero (Cadenero)

Personal de operativo:

Ayudante

1. Alavarado perdomo
2. Cerquera menza sergio
3. Contreras Meza Isidro
4. Diaz Marco Marco Aurelio (Maestro)
5. Diaz Martinez Jhon edixon
6. Illera Menza Juan Sebastian
7. Medina Almanza Alex
8. Medina Medina Eladio Andres (Maestro)
9. Mendez Cerquera Maria Lizeth
10. Quintero Vargas Jonathan David
11. Ramos Quintero Giovanny
12. Saenz Garces Jose Wilmer
13. Semeco Belys Antonio
14. Semeco Vrga Gregory Antonio (Maestro)
15. Son Cuenca Camilo Eduado

Equipo:

Una (1) Moto niveladora.
Una (1) retro cargador llantas.
Una (1) Volquetas.
Tres (3) Mezcladora de concreto.
Un (1) Vibro compactador 8 Ton.
Un (1) Equipos topográficos completos

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

MAYORES ANCHOS: Debido a que las bancas no cumplían el ancho diseños propuestos por la entidad, el contratista propuso e interventoría avalo ampliar las bancas para las condiciones de disenos.

No.	DESCRIPCION (VEREDA) / Ancho diseño.	Localización (Coordenadas)	Long. Tramo (Km) / Ancho encontrado
A	Municipio de Paicol		
1	Vereda Peña Negra Tramo 1 / 5.0m	2°23'0.34"N 75°48'20.53"W	40 / 4.1m
2	Vereda Peña Negra Tramo 2 / 5.0m	2°22'54.51"N 75°48'23.42"W	40 / 4.1m
3	Vereda La Mesa (El Chaparro) / 5.0m	2°24'56.53"N 75°44'21.63"W	90 / 3.7m
4	Vereda La Laja / 5.0m	2°23'55.55"N 75°45'21.69"W	80 / 4.1m
5	Vereda Alto Granadillo / 5.0m	2°21'40.05"N 75°45'2.65"W	80 / 5.0m
6	Vereda La Reforma / 5.0m	2°26'50.95"N 75°42'6.32"W	100 / 4.1m
7	Vereda La Cumbre / 5.0m	2°23'16.60"N 75°47'16.20"W	80 / 4.1m
	SUB TOTAL		510

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Solicitud por parte de la comunidad la opción en determinados tramos darle más inclinación a los bordillos para que las cunetas adopten los diseños que se vienen adoptando. R// Se socializo con la parte técnica de la alcaldía, concertó con la interventoría y contratista se puede dar una transición, pero continuar con el diseño original hasta que la entidad presente un diseño definido e interventoría apruebe.

3.3. Cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones

Las actividades adelantadas cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y los pliegos de condiciones.
La obra se lleva a cabo con el personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos.

El personal presente en obra cuenta su respectiva afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

- Compresión simple al concreto
- Ensayo porcentajes de compactación, conformación sub base.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Compresión simple al concreto: Anexos
Ensayo de compactación: Anexos

4.3. Comentarios y Conclusiones

1.El contratista realiza los respectivos controles en la preparación de concreto 3000psi in-situ, tomando asentamientos cono abrams y muestras frescas para compresión.
2. El contratista toma respectivos densidades de campo para verificar el porcentaje de compactación en la conformación de la sub base.

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
27-09-2023	Oficina de Planeación Municipal	Se reúnen el director de obra, director interventoría, residente de interventoría, supervisora alcaldía y el alcalde quien se aclara los tiempos para pagos de actas parciales y evaluar el avance en obra.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

Se cumple con todas las normas ambientales, sin presentar perjuicio alguno

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se presentan ningún tipo de daño y/o perjuicio a terceros al cierre del presente informe.

5.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

El contratista cumplió con todas las normas y requisitos exigidos para la seguridad industrial y salud ocupacional del personal.


6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Cumplimiento de las normas de seguridad Industrial

Esta Interventoría solicita al contratista de obra, adoptar las medidas necesarias para que todo el personal de obra utilice los elementos de seguridad y protección personal antes de iniciar y durante la ejecución de las actividades, según lo establecido en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional. Al cierre de cada jornada se coloca la cinta de señalización en toda el área afectada.
6.2. Pagos de la Seguridad Integral y Otros
El contratista viene presentando dentro de los plazos establecidos, las planillas, mensuales de pago de la seguridad social de sus trabajadores. Al personal de obra y proveedores se vienen haciendo los pagos puntualmente.

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal SOTA LTDA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

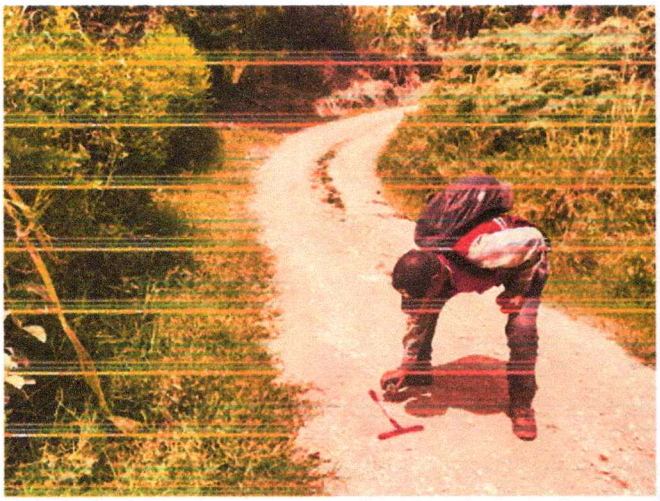


Ubicación y Replanteo tramo #4. Vereda La Laja.




Ubicación y Replanteo tramo #2. Vereda Peña Negra.




Ubicación y Replanteo tramo #3. Vereda La Mesa.

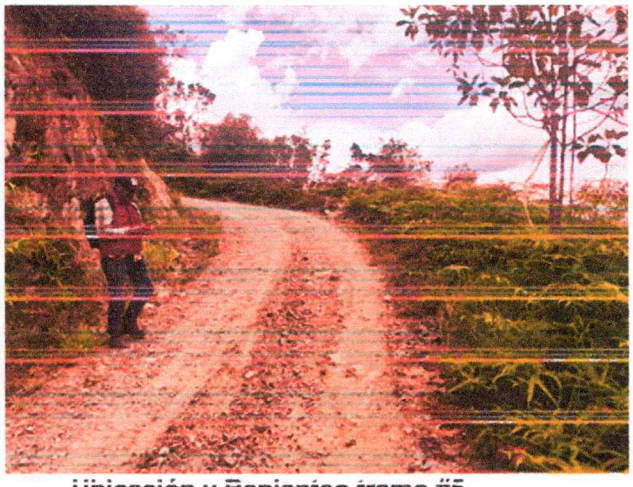


Ubicación y Replanteo tramo #5.
Vereda Alto Granadillo.

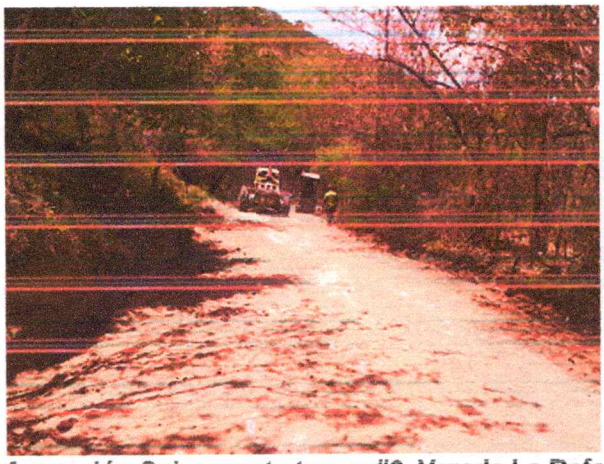

Conformación Sub rasante tramo #6. Vereda La Reforma.

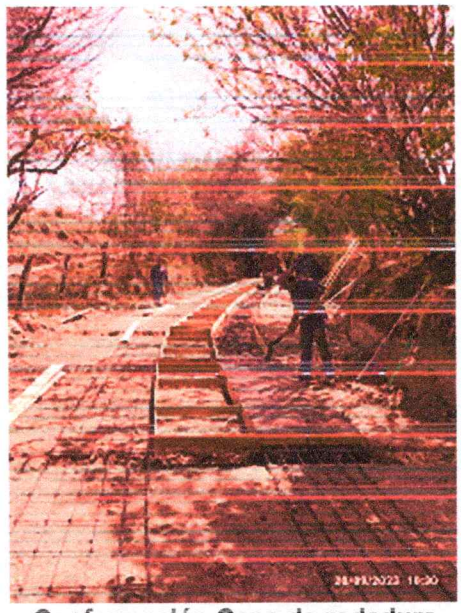

Conformación Capa de rodadura
Tramo #6. Vereda La Reforma.

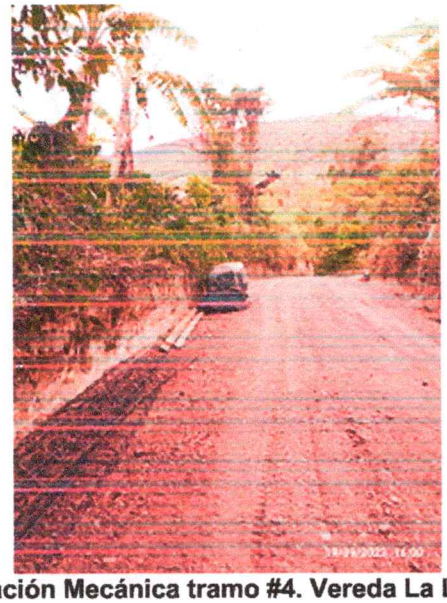

Excavación Mecánica tramo #4. Vereda La Laja.



Charlas HSEQ tramo #4. Vereda La Laja.

CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA
INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

ANALISIS GRANULOMETRICO

PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD DE LA SUBBASE
INTERESADO: GRUPO MSG SAS
LOCALIZACION: VIA PAICOL
FECHA: SEPTIEMBRE 5 DE 2023
(Muestra de septiembre 2023)


SUBBASE CANTERAS

Peso seco inicial (g) : ***7318,5***
Peso final fracciones (g): 6648,5 ***** La muestra se lavó por el tamiz 200***

Tamiz		Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
Pulgadas	Milimetros				
2 1/2"	62,500	0,0	0,0	0,0	100,0
2"	50,000	0,0	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	37,500	229,4	3,1	3,1	96,9
1"	25,000	845,3	11,6	14,7	85,3
1/2"	12,500	1637,1	22,4	37,1	62,9
3/8"	9,500	532,2	7,3	44,3	55,7
No. 4	4,750	900,7	12,3	56,6	**43,4**
No.10	2,000	965,3	13,2	69,8	30,2
No. 40	0,425	895,2	12,2	82,1	17,9
No. 200	0,075	643,4	8,8	90,8	**9,2**
Pasa Tamiz 200		670,0	9,2	100,0	0,0

D_{60} 11,0
D_{30} 2,00
D_{10} 0,080
Cu 137,5
Cc 4,5

Clasif. SUCS
GP-GM

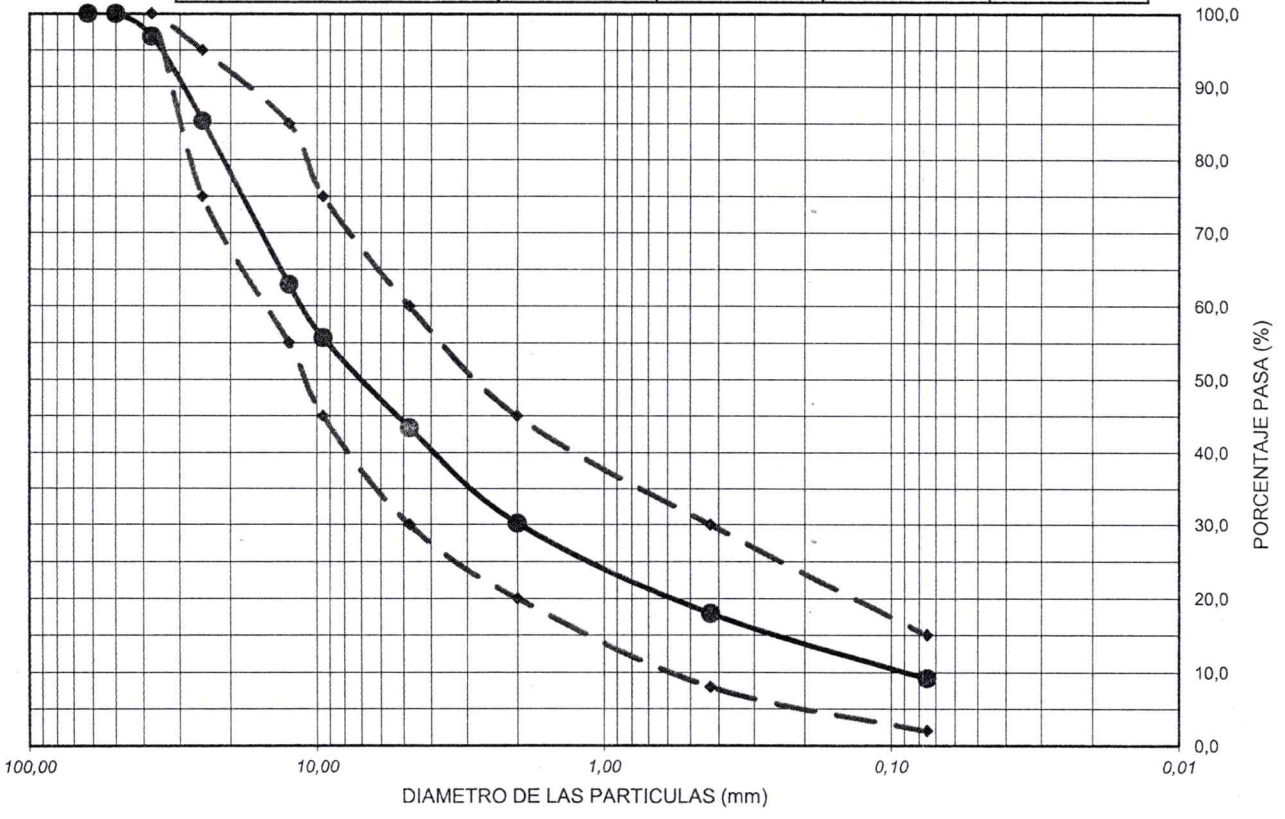


CARTERA COORDENADAS TRAMO ALTO GRANADILLO				
PUNTO	NORTE	ESTE	ALTURA	OBSERVACION
1008	752943	813861	1638	D
1010	755931	809734	1423	D
1011	755947,911	809780,976	1427,934	D
179	755947,138	809780,845	1427,653	BV
180	755944,648	809781,795	1427,669	BV
181	755943,702	809782,597	1427,53	PT
182	755941,512	809775,783	1426,524	PT
183	755941,923	809775,48	1426,72	BV
184	755944,409	809774,248	1426,598	BV
185	755945,0801	809773,6468	1426,99	TN
186	755942,009	809760,2998	1427,41	TN
187	755939,231	809758,905	1425,212	BV
188	755936,056	809759,601	1425,459	BV
189	755935,011	809759,843	1425,448	PT
190	755933,9596	809760,7174	1429,6	TN
191	755932,162	809751,766	1424,478	PT
192	755932,851	809751,261	1424,421	BV
193	755936,163	809749,85	1424,38	BV
194	755939,1798	809751,2362	1426,1	TN
195	755934,705	809744,406	1423,58	BV
196	755930,62	809745,021	1423,575	BV
197	755929,554	809745,151	1423,765	PT
198	755929,5693	809748,6521	1427,41	TN
199	755927,922	809740,8394	1426,34	TN
200	755928,591	809739,209	1423,271	PT
201	755929,826	809739,478	1423,108	BV
202	755933,376	809740,727	1422,917	BV
203	755936,023	809739,547	1421,797	BV
204	755936,776	809735,284	1421,988	BV
205	755937,368	809733,845	1422,331	CER
206	755943,3455	809740,7848	1420,77	CER
207	755943,177	809740,788	1419,999	BV
208	755940,551	809743,267	1419,93	PT
209	755950,642	809747,765	1417,145	BV
210	755947,645	809749,977	1417,436	BV
211	755946,3857	809752,7164	1427,1	TN
212	755958,339	809753,197	1415,079	BV
213	755955,693	809756,044	1415,223	BV
214	755962,4254	809755,8899	1415,12	CER
215	755962,422	809756,013	1414,129	BV
216	755959,611	809758,951	1414,373	BV
217	755957,9852	809760,81	1422,5	TN


TRAMO VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 1
LONGITUD: 40 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°23'0.34"N 75°48'20.53"W





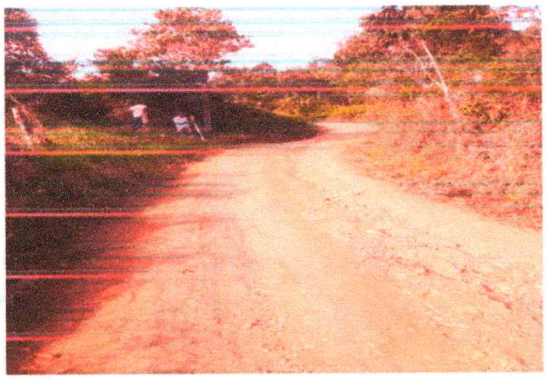





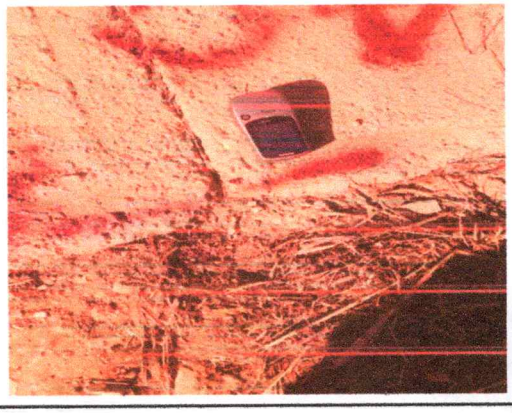




TRAMO VEREDA PEÑA NEGRA TRAMO 2
LONGITUD: 40 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°22'54.51"N 75°48'23.42"W

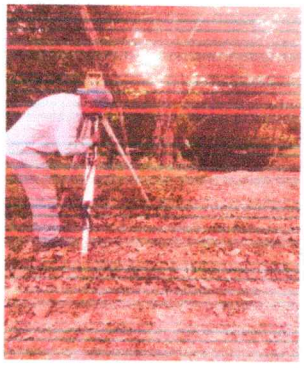

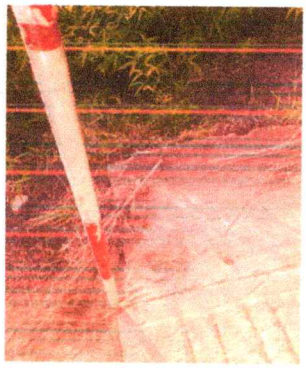

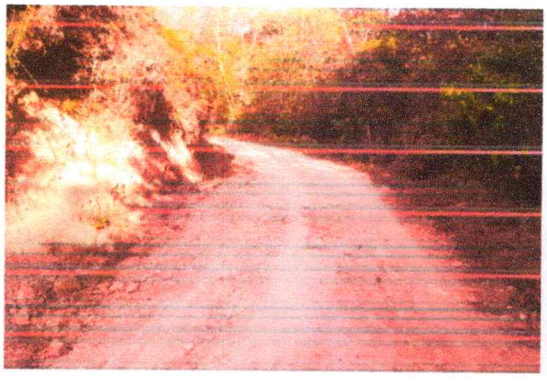








TRAMO VEREDA LA MESA (EL CHAPARRO)
LONGITUD: 90 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°24'56.53"N 75°44'21.63"W



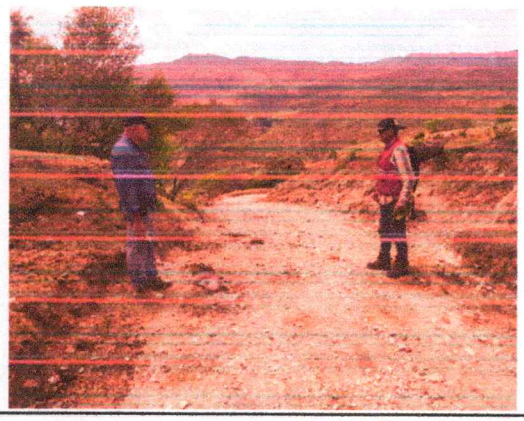


TRAMO VEREDA LA LAJA
LONGITUD: 80 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°23'55.55"N 75°45'21.69"W









TRAMO VEREDA ALTO GRANADILLO
LONGITUD: 80 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°21'40.05"N 75°45'2.65"W

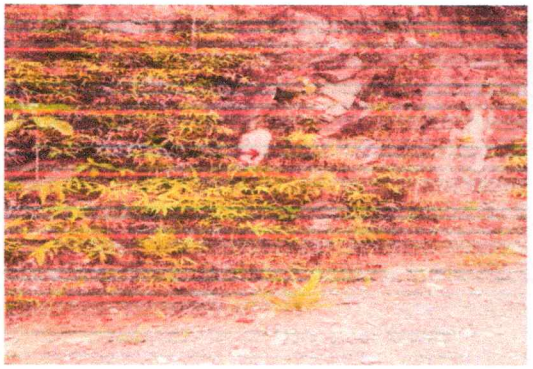



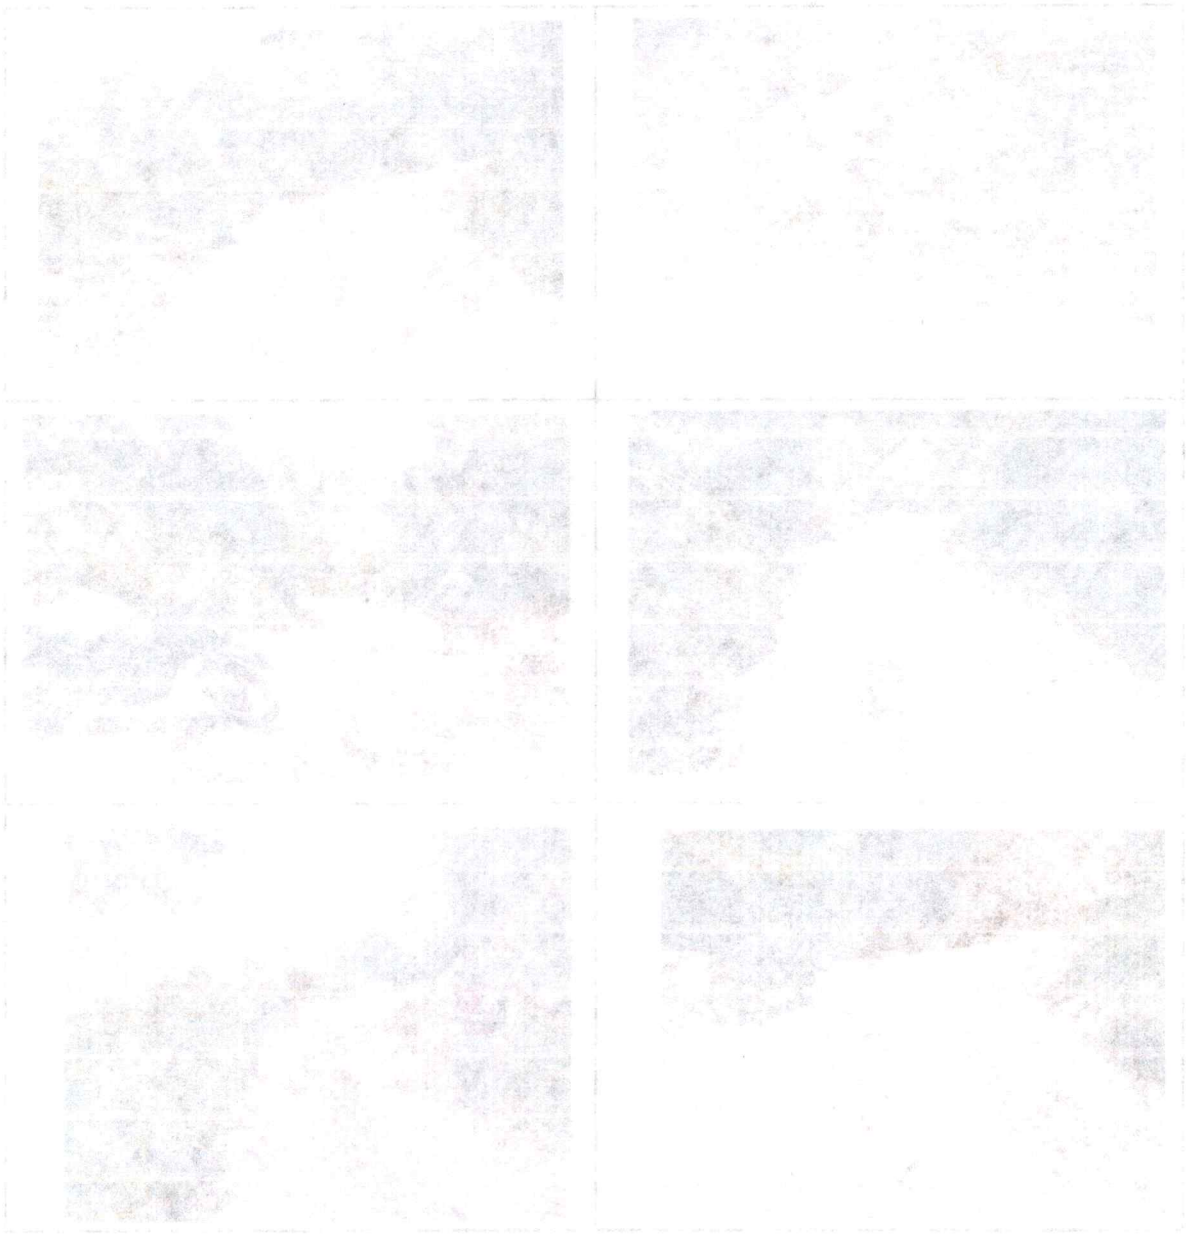

TRAMO VEREDA LA REFORMA
LONGITUD: 100 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°26'50.95"N 75°42'6.32"W










TRAMO VEREDA LA CUMBRE
LONGITUD: 80 METROS
COORDENADAS PROYECTO: 2°23'16.60"N 75°47'16.20"W





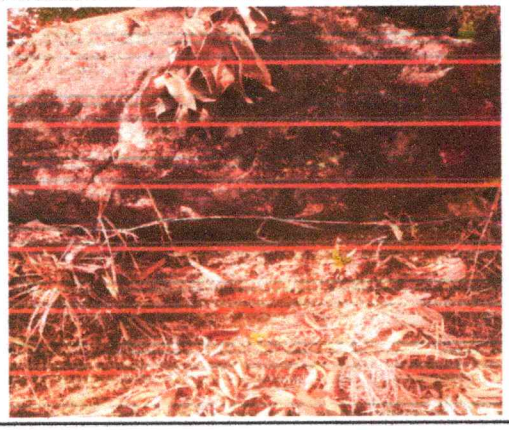


ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

SEPTIEMBRE DE 2023

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO **UNIDAD** **ML**

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	LONGITUD (mL)	OBSERVACION
La Reforma	k0+000	k0+100	100,00	
La Mesa	k0+000	k0+090	90,00	
La Laja	k0+000	k0+080	80,00	
TOTAL:			**270,00**	



REGISTRO FOTOGRAFICO

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:25:27 -05'00'

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos


	ACTA. 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	UNIDAD	M3

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
LA REFORMA	k0+000	k0+005		5,00	0,25	1,26		
	k0+005	k0+010	5,00	5,00	0,30	1,49	6,87	
	k0+010	k0+015	5,00	5,00	0,27	1,37	7,13	
	k0+015	k0+020	5,00	5,00	0,23	1,14	6,25	
	k0+020	k0+025	5,00	5,00	0,21	1,04	5,44	
	k0+025	k0+030	5,00	5,00	0,21	1,06	5,26	
	k0+030	k0+035	5,00	5,00	0,20	1,02	5,20	
	k0+035	k0+040	5,00	5,00	0,31	1,57	6,46	
	k0+040	k0+045	5,00	5,00	0,18	0,92	6,22	
	k0+045	k0+050	5,00	5,00	0,16	0,81	4,32	
	k0+050	k0+055	5,00	5,00	0,07	0,37	2,93	
	k0+055	k0+060	5,00	5,00	0,10	0,52	2,21	
	k0+060	k0+065	5,00	5,00	0,17	0,85	3,43	
	k0+065	k0+070	5,00	5,00	0,16	0,82	4,18	
TOTAL EJECUTADO:							65,91	
COBRADO A LA FECHA:							0,00	
PRESENTE ACTA:							65,91	

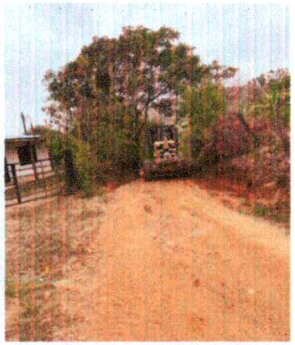

REGISTRO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:25:50 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos

	ACTA. 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2,1 EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	UNIDAD	M3

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
LA MESA	k0+000	k0+005		5,00	0,12	0,58		
	k0+005	k0+010	5,00	5,00	0,27	1,37	4,87	
	k0+010	k0+015	5,00	5,00	0,26	1,30	6,68	
	k0+015	k0+020	5,00	5,00	0,20	0,99	5,73	
	k0+020	k0+025	5,00	5,00	0,34	1,72	6,76	
	k0+025	k0+030	5,00	5,00	0,40	2,00	9,30	
	k0+030	k0+035	5,00	5,00	0,36	1,79	9,49	
	k0+035	k0+040	5,00	5,00	0,55	2,73	11,30	
	k0+040	k0+045	5,00	5,00	0,64	3,18	14,77	
	k0+045	k0+050	5,00	5,00	0,79	3,94	17,79	
	k0+050	k0+055	5,00	5,00	0,53	2,63	16,43	
	k0+055	k0+060	5,00	5,00	0,50	2,52	12,88	
TOTAL EJECUTADO:							116,00	
COBRADO A LA FECHA:							0,00	
PRESENTE ACTA:							116,00	



REGISTRO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:26:15 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos

	ACTA. 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2,1 EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	UNIDAD	M3

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
LA LAJA	k0+000	k0+005		5,00	0,42	2,12		
	k0+005	k0+010	5,00	5,00	0,55	2,73	12,13	
	k0+010	k0+015	5,00	5,00	0,33	1,63	10,91	
	k0+015	k0+020	5,00	5,00	0,15	0,73	5,90	
	k0+020	k0+025	5,00	5,00	0,10	0,52	3,13	
	k0+025	k0+030	5,00	5,00	0,26	1,32	4,60	
	k0+030	k0+035	5,00	5,00	0,37	1,87	7,96	
	k0+035	k0+040	5,00	5,00	0,96	4,78	16,62	
	k0+040	k0+045	5,00	5,00	0,79	3,96	21,84	
	k0+045	k0+050	5,00	5,00	1,20	5,98	24,83	
	k0+050	k0+055	5,00	5,00	1,01	5,04	27,54	
	k0+055	k0+060	5,00	5,00	0,37	1,84	17,21	
TOTAL EJECUTADO:							152,67	
COBRADO A LA FECHA:							0,00	
PRESENTE ACTA:							152,67	



REGISTRO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:26:35 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos




	ACTA 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2.3 SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-13 INV.	UNIDAD	M3

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
La Reforma	k0+000	k0+100	70,00	5,00	0,15	350,00	42,95	
La Mesa	k0+000	k0+090	60,00	5,00	0,15	300,00	45,00	
La Laja	k0+000	k0+080	50,00	5,00	0,15	250,00	37,50	
TOTAL EJECUTADO:							125,45	
COBRADO A LA FECHA:							0,00	
PRESENTE ACTA:							125,45	

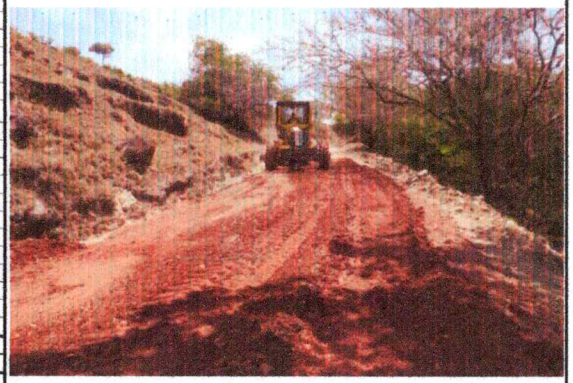

REGISTRO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:26:54 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos

	ACTA 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2.4 ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES	UNIDAD	KG

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	cantidad	longitud (m)	diametro (in)	Longitud total	Peso nominal	Peso (Kg)	OBSERVACION
La Reforma	k0+000	k0+080	108,00	5,60	4	604,80	1,00	604,80	viga riostra
	k0+000	k0+080	891,00	1,00	2	891,00	0,25	222,80	
	k0+000	k0+080	140,00	6,00	4	840,00	1,00	840,00	cuneta y bordillo
	k0+000	k0+080	532,00	0,70	2	372,40	0,25	93,10	
	k0+000	k0+080	1066,00	0,45	3	479,70	0,56	268,60	
	k0+000	k0+080	168,00	6,00	4	1008,00	1,00	1008,00	huellas
	k0+000	k0+080	534,00	0,90	2	480,60	0,25	120,20	
	k0+000	k0+080		5,00	4	0,00	1,00	0,00	rampa
				1,20	4	0,00	1,00	0,00	
La Mesa	k0+000	k0+050	68,00	5,60	4	380,80	1,00	380,80	viga riostra
	k0+000	k0+050	561,00	1,00	2	561,00	0,25	140,30	
	k0+000	k0+050	90,00	6,00	4	540,00	1,00	540,00	cuneta y bordillo
	k0+000	k0+050	332,00	0,70	2	232,40	0,25	58,10	
	k0+000	k0+050	666,00	0,45	3	299,70	0,56	167,80	
	k0+000	k0+050	108,00	6,00	4	648,00	1,00	648,00	huellas
	k0+000	k0+050	332,00	0,90	2	298,80	0,25	74,70	
	k0+000	k0+050		5,00	4	0,00	1,00	0,00	rampa
	k0+000	k0+050		1,20	4	0,00	1,00	0,00	
La Laja	k0+000	k0+050	68,00	5,60	4	380,80	1,00	380,80	viga riostra
	k0+000	k0+050	561,00	1,00	2	561,00	0,25	140,30	
	k0+000	k0+050	90,00	6,00	4	540,00	1,00	540,00	cuneta y bordillo
	k0+000	k0+050	332,00	0,70	2	232,40	0,25	58,10	
	k0+000	k0+050	666,00	0,45	3	299,70	0,56	167,80	
	k0+000	k0+050	108,00	6,00	4	648,00	1,00	648,00	huellas
	k0+000	k0+050	332,00	0,90	2	298,80	0,25	74,70	
	k0+000	k0+050		5,00	4	0,00	1,00	0,00	rampa
	k0+000	k0+050		1,20	4	0,00	1,00	0,00	
TOTAL:								7.176,90	



REGISTRO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.19 07:27:13 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos

	ACTA 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	UNIDAD	M3

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
La Reforma	k0+000	k0+070							
	k0+000	k0+070	1	70		0,45	0,16	11,27	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+070	1	70		0,45	0,16	11,27	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+070	2	70	1,8	0,15	0,27	18,9	Placas
	k0+000	k0+070	26	70	0,2	0,15	0,03	3,90	Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
La Mesa	k0+000	k0+060		60					
	k0+000	k0+060	1	60		0,45	0,16	9,66	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+060	1	60		0,45	0,16	9,66	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+060		60	1,8	0,15	0,27	16,20	Placas
	k0+000	k0+060	22	60	0,2	0,15	0,03	3,36	Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
La Laja	k0+000	k0+050		50					
	k0+000	k0+050	1	50		0,45	0,16	8,05	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+050	1	50		0,45	0,16	8,05	Bordillo y Cuneta Costado Derecho
	k0+000	k0+050		50	1,8	0,15	0,27	13,50	Placas
	k0+000	k0+050	19	50	0,2	0,15	0,03	2,83	Riostras (Atura0.15_ Ancho0.2_Largo5
TOTAL EJECUTADO:								116,65	
COBRADO A LA FECHA:								0,00	
TOTAL:								116,65	



REGISTRO FOTOGRAFICO

ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:27:40 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos

	ACTA 01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13 INV. PARA HUELLAS. — **UNIDAD: M3**

SEPTIEMBRE DE 2023

TRAMO	ABSC. INICIAL	ABSC. FINAL	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	H Prom. (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
La Reforma	k0+000	k0+070							
	k0+000	k0+070	2	70	1,8	0,15	0,27	18,90	Placas Ciclopeo
La Mesa	k0+000	k0+060							
	k0+000	k0+060	2	60	1,8	0,15	0,27	16,20	Placas Ciclopeo
La Laja	k0+000	k0+050							
	k0+000	k0+050	2	50	1,8	0,15	0,27	13,50	Placas Ciclopeo
TOTAL EJECUTADO:								**48,60**	
COBRADO A LA FECHA:								**0,00**	
TOTAL:								**48,60**	



ING. DIEGO SEGURA
DIRECTOR
GRUPO MSG SAS

Javier Barrero Mossos
Firmado digitalmente por Javier Barrero Mossos
Fecha: 2023.09.29 07:27:57 -05'00'

Aprobó:
RL interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Ing. Javier Barrero Mossos

PERSONERIA MUNICIPAL DE PAICOL
GRUPO MSG
RECIBIDO
Día 28 Mes 09 Año 2023
Quien Entrega Diego Segura
Quien Recibe Jesaldn Silva C.
Radicado No 087-23

Paicol 8 de sept. de 23

Doctor:
LEANDRO ALBERTO CORTES HERMOSA
Personero – Paicol
Paicol.

ASUNTO: Solicitud inscripción veeduría ciudadana

Cordial saludo,

Por medio de la presente yo ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 83.256.009 solicito ante su despecho la inscripción de la veeduría ciudadanía que se denominará "veeduría proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA y tendrá como objeto la vigilancia y seguimiento en la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y tendrá una duración del tiempo de ejecución del proyecto que corresponde a 3 meses a partir del 5 de septiembre de 2023 hasta el 4 de diciembre de 2023.

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C. 1.019.015.582 de Bogotá

ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIA CIUDADANA

En el Municipio de Paicol el día 08 de septiembre de 2023, se reunió una asamblea compuesta por las personas que se beneficiaran del proceso de contratación 142-2023 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Con el objeto de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 de Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo publico y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores(as) a los (las) siguientes ciudadanos(as), según el articulo 3 de la Ley 850 de 2003.

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LEIDY BIBIANA ROJAS RIOS	1.004.082.099
MARCO AURELIO DIAZ LIZARAZO	4.247.301

SEGUNDO: La veeduría se denominará "veeduría proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y tendrá como objeto la vigilancia y seguimiento en la ejecución del proyecto de proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y tendrá una duración del tiempo de ejecución del proyecto que corresponde a 3 meses a partir del 5 de septiembre de 2023 hasta el 4 de diciembre de 2023.

La asamblea aprueba esta designación y la lista de asistencia a esta jornada la promoción obra como aval de esta acta, debido a que fue en el acto de este ejercicio que se conformó la veeduría.

TERCERO: El grupo de veedores(as) elige democráticamente como su coordinador(a) o presidente(a) a Leidy Bibiana Rojas Ríos y como secretario(a) Marco Aurelio Diaz Lizarazo.

CUARTO: los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

Dada en el municipio de Paicol a los 8 días del mes de septiembre de 2023.

GRUPO MSG	**FORMATO**	Versión:1
	REUNIONES	FECHA EDICIÓN Septiembre de 2023

TEMA: Socialización proyecto de "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Dependencia Responsable: Área social GRUPO MSG S.A.S

Objetivo de la Reunión: Convocar a la ciudadanía a conocer el proyecto de mejoramiento, conocer al contratista y convocar las veedurías que participaran en el presente proyecto

Lugar: Paicol - Huila Fecha (08/06/2023): Hora Inicio: 09:00 AM Hora Aprox. Terminación: 11:30 AM

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA	E-MAIL	FIRMA
Leydy Patricia Rojas Ruiz.	Coordinadora de Junta	Alcaldia	leidyvivi1702@hotmail.com	
Marco Aurelio Diaz	Secretaria veeduria	Junta Accion comunal	Pg3409855@gmail.com	Marco Diaz.

Nombre Responsable Reunión: Diego Joya Director obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	99074157	9456238404	E	2023/09/13	2023/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,281,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$8,910,000	$1,425,600			$8,910,000	$356,400			$8,910,000	$356,400			$8,910,000	$143,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (6 Afiliados)						$7,410,000	$1,185,600			$7,410,000	$296,400			$7,410,000	$296,400			$7,410,000	$39,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$7,410,000	$1,185,600			$7,410,000	$296,400			$7,410,000	$296,400			$7,410,000	$39,100		$0	$0
1	CC	83167965	ALDANA NELSON	230201	20	$1,000,000	$160,000	EPS017	20	$1,000,000	$40,000	CCF22	20	$1,000,000	$40,000	14-4	20	$1,000,000	$5,300	20	$0	$0
2	CC	1019015582	GONZALEZ ANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
3	CC	80414387	GONZALEZ MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1061743747	OROZCO YENI	230301	17	$850,000	$136,000	EPS005	17	$850,000	$34,000	CCF22	17	$850,000	$34,000	14-4	17	$850,000	$4,500	17	$0	$0
5	CC	1012349671	ROJAS EDUARDO	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
6	CC	1018515205	VANEGAS VALERY	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$104,400		$0	$0
7	CC	1019059198	SEGURA DIEGO	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$8,910,000	$1,425,600			$8,910,000	$356,400			$8,910,000	$356,400			$8,910,000	$143,500		$0	$0

2023/09/13 01:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901110550	1	GRUPO MSG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 171 #55B-05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6454103	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	99074157	9456238404	E	2023/09/13	2023/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,281,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,425,600	$0	$0	$1,425,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$425,600	$0	$0	$425,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$136,000	$0	$0	$136,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$143,500	$0	$0	$143,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$143,500	$0	$0	$143,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$356,400	$0	$0	$356,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$356,400	$0	$0	$356,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$356,400	$0	$0	$356,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$94,000	$0	$0	$94,000
TOTAL				**7**	**$2,281,900**	**$0**	**$0**	**$2,281,900**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/09/13 01:08 PM

GRUPO MSG

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

YULY PAOLA MONDRAGÓN SEGURA, identificado con **C.C. No. 1.020.714.520 de Bogotá**, y con tarjeta profesional No. **TP 220934-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **GRUPO MSG SAS** identificado con NIT **901.110.550-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* serán pagados por la compañia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2023

YULYPAOLA MONDRAGON SEGURA
C.C. No. 1.020.714.520 de Bogotá
TP 220934-T

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1079412593	ALVARADO PERDOMO SANTIAGO	25/09/2023		22318326	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1079411654	CERQUERA MENZA SERGIO ANDRES	25/09/2023		24319144	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C13349988	CONTRERAS MEZA ISIDRO	25/09/2023		j1415722	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C4247301	DIAZ MARCO MARCO AURELIO	25/09/2023		20222042	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1127913162	DIAZ MARTINEZ JHON EDIXON	25/09/2023		189131J9	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1079509579	ILLERA MENZA JUAN SEBASTIAN	25/09/2023		Sx251636	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C12278710	MEDINA ALMANZA ALEX	25/09/2023		19219213	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1079508015	MEDINA MEDINA ELADIO ANDRES	25/09/2023		61129151	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1079508709	MENDEZ CERQUERA MARIA LIZETH	25/09/2023		91693523	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1007490170	QUINTERO VARGAS JONATHAN DAVID	25/09/2023		34b61R61	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C7700745	RAMOS QUINTERO GIOVANNY	25/09/2023		32141170	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1079408017	SAENZ GARCES JOSE WILMER	25/09/2023		12146281	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
X6348663	SEMECO	BELYS ANTONIO	25/09/2023		²x58e217	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
X6318078	SEMECO VRGA GREGORY ANTONIO	25/09/2023		9tG32293	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SENEL CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - PAICOL - HUILA, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1004081926	SON CUENCA CAMILO EDUARDO	25/09/2023		23619232	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C831679652326983707

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.90.100.61, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
