Liliana 956

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2019-88242
Fecha: 09-10-2019 - 10:38
Folios: 1 Anexos: 44 FOLIOS UN CD
Radicador: ANTONIO ORLANDO MORALES AFRICANO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el codigo de verificación: DPGM2

Bogotá D.C., octubre 9 de 2019

MEMORANDO

PARA: Coordinador De Planeación Control Y Estadística.

DE: **ANTONIO ORLANDO MORALES A.**
Dirección de Construcción y Conservación Establecimientos Educativos.

Asunto: Remisión primera factura contrato de Obra. 958234 - 2019.

Cordial Saludo

Por medio de la presente y para los fines pertinentes, remito los documentos relacionados a continuación como parte integral de la Primera factura del contrato de obra 958234 de 2019 suscrito con LA FIRMA CONSTRUCTORA M Y S.

1. Acta parcial 001
2. Memorias corte 001
3. Certificado paz y salvo, aportes parafiscales.
4. Furc
5. Rut.
6. Factura 00464 correspondiente acta parcial No 001.
7. Resolución facturación.
8. Certificación Bancaria.

Y revisado de acuerdo a lo solicitado.

Atentamente,

09 OCT 2019
Edith

ANTONIO ORLANDO MORALES A.
Arquitecto.
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Apoyo a la Supervisión

(41 folios) + 1 CD

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-JUANLOZANO-083-2019

Bogotá, 07 de Octubre de 2019

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Atn: Arq. Antonio Orlando Morales
Profesional de Apoyo DCCEE-SED
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.938211 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE AMPLIACIO DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED"

ASUNTO: ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

Cordial saludo,

Por medio del presente, hacemos entrega del Acta Parcial de Obra No. 1 correspondiente al periodo entre el 17 de julio de 2019 y el 18 de septiembre de 2019 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR958234 de 2019, con los documentos requeridos para su trámite, por lo tanto se remiten la siguiente documentación:

1. Acta Parcial de Obra No. 1
2. Memoria de cantidades Acta No.1
3. Anexo 1 – Acta final No 20
6. Factura de venta
7. FURC
8. Certificación Bancaria
9. RUT - Resolución de Facturación
11. Certificación de aportes
12. Certificación Revisor Fiscal
13. Informe Mensual de obra No. 1 (del 17 de julio de 2019 al 18 septiembre 2019)

Radicado Nº **E-2019-159313**
Fecha: 07-10-2019 - 15:58
Folios: 246 Anexos: 2CDS
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **06WS9**

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES
Representante legal

SE ANEXA LO ENUNCAIDO EN (44 FOLIOS+ CD) + I TOMO INFORME MENSUAL No. 1 (202 FOLIOS + CD)

C.C
- ARQ. ANTONIO ORLANDO MORALES - PROFESIONAL DE APOYO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
- ARCHIVO

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO: 956 OC 22079 19

RADICADO SDF: 18 OCT 2019

Hora | Fecha | Folios

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	958234	Fecha:	24	5	2019		
Contratista	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S.			NIT	X	C.C.		No.	900.361.854-6		
Dirección :	CRA.12 No.13-24 (NEIVA-HUILA)			Teléfonos	3168771311						
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	8	5	6	0	0	0	2	6	0							Banco	BANCO BBVA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4390
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Otro		Cual?								
Beneficiario									NIT		C.C.		No.						
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El contratista debera presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas pagara maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobacion por parte de la interventoria. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelara dentro de los treinta (30) dias habils, siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidacion del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital del Hacienda para tal fin.

Fecha Acta de Inicio	17	07	2019	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 4.047.764.888,00			Valor adición(es)										Valor total compromiso	$ 4.047.764.888,00	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo:	De	Fecha	17	07	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales							
							A:	Fecha	18	09	2019								
Recibo a Satisfacción No	958234/1	→	Fecha	18	09	2019	Anticipo			% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											
Otros		→	Cual:																

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
3289	365-REC. B/CE ATENCIO 1a. INFANCIA	331150107104601005 - Compra de lotes, diseño, construcción e interventoria de estudios y/o [illegible]	$ 87.957.528,17	$ 21.989.382,04	$ 65.968.146,13
		AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			-$ 0,13
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/L			Valor a Pagar	$ 65.968.146,00

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS

Declaración:Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA		Firma del Directivo responsable del Area fincional-SED ó Responsable de la UEL:
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.		
Elaborado por:	LILIANA VARELA HERNANDEZ	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED		
Fecha elaboración	17 10 2019 Ext: 3142		Fecha aprobación: 17 10 19

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

V.2016-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION		PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 4:00 PM	Vo.Bo.	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
				MIN. 12.5% DEL 40%	MIN. 16% DEL 40%	MIN. 0.522% DEL 40%	$ 0,00

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 01

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Del 17 de julio a 15 de agosto y el 18 de septiembre de 2019.

RADICACION No.

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR958234 DE 2019

CONTRATISTA : Constructora M y S S.A.S

DIRECCION : Carrera 12 No. 13 - 24 Santas Librada, Neiva - Huila

C.C. ó NIT : 900.361.854-6

TELEFONO : (8) 864 1141, Celular (321) 304 6412

INTERVENTOR : ETA Elsa Torres Arenales

DIRECCION : Carrera 49 A No 94 -76 Oficina 601, Bogotá D.C.

C.C. ó NIT : 63323375-2

TELEFONO : (1) 7446234, Celular: 3134204794

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

ESTABLECIMIENTOS : SED

LOCALIZACION : Bogotá D.C.

VR. INICIAL : $ 4,047,764,888.00

ANTICIPO 20% $ 809,552,977.00

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 4,047,764,888.00

PLAZO INICIAL : Seis (6) meses

FECHA INICIACION : 17 de Julio de 2019

FECHA TERMINAC.INICIAL : 16 de Enero de 2020

PLAZO ADICIONAL : N.A.

TIEMPO SUSPENDIDO : 32 dias

PLAZO TOTAL : Siete (7) meses

FECHA FINAL : 18 de Febrero de 2020

VALOR TOTAL A PAGAR $ **65,968,146.00** SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAS	NUEVO SALDO REG.
1509	13-feb-19	3289	21-may-19	$ 4,047,764,888.00	$ 3,238,211,911.00	$ 65,968,146.00	$ 3,172,243,765.00
				$ 4,047,764,888.00	$ 3,238,211,911.00	$ 65,968,146.00	$ 3,172,243,765.00

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] **RESOLUCION Nº** _____

GRAN CONTIBUYENTE [ ] **RESOLUCION Nº** _____

ICA [X] **CODIGO** 4290

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA **SUCURSAL** NEIVA - HUILA **CUENTA CORRIENTE** [X] **CUENTA DE AHORROS** [ ] **CTA. Nº** 0856-000260

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
01	PRELIMINARES											
01-01	OBRAS PRELIMINARES											
01-01-030	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	M3	377.66	$ 37,174.00	$ 14,046,567.64	377.66	$ 14,046,567.64			377.66	$ 14,046,567.64	100.0%
01-01-100	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	1,425.23	$ 2,880.00	$ 4,104,662.40	1,425.23	$ 4,104,662.40			1,425.23	$ 4,104,662.40	100.0%
01-01-110	LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	919.06	$ 2,240.00	$ 2,058,694.40	919.06	$ 2,058,694.40			919.06	$ 2,058,694.40	100.0%
01-02	INSTALACION DE SERVICIOS PROVISIONALES											
01-03	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
01-03-010	TALA ARBOLES CLASE I - H<5.00 M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	U	7.00	$ 217,299.00	$ 1,521,793.00	6.00	$ 1,304,394.00			6.00	$ 1,304,394.00	
01-03-020	TALA ARBOLES CLASE II - H<10.00 M. - H>5.00 M. - INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	U	2.00	$ 347,401.00	$ 694,802.00	2.00	$ 694,802.00			2.00	$ 694,802.00	100.0%
01-03-030	TALA ARBOLES CLASE III - H<20.00 M. - H>10.00 M. - INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	U	2.00	$ 624,479.00	$ 1,248,958.00	2.00	$ 1,248,958.00			2.00	$ 1,248,958.00	100.0%
02	CIMENTACION											
02-01	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
02-01-005	EXCAVACION MECANICA, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M3	1,365.20	$ 34,220.00	$ 46,717,144.00	1,250.00	$ 42,775,000.00			1,250.00	$ 42,775,000.00	91.6%
02-01-010	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M3	306.24	$ 55,695.00	$ 17,000,341.80							
02-01-100	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	1,836.19	$ 2,833.00	$ 5,201,926.27							
02-01-120	REEMPLAZO CON RECEBO ARENOSO COMPACTADO 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. VER RECOMENDACIONES ESTUDIO DE SUELOS	M3	550.86	$ 48,596.00	$ 26,769,592.56							
02-02	CONCRETOS DE CIMENTACION											
02-02-010	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C 14.5 MPA. - E: 0.05 M.	M2	1,456.04	$ 20,580.00	$ 29,970,913.92							

02-02-060	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F'C 21 MPA.	M3	197.84	$ 633,585.00	$ 125,308,888.40
02-02-065	LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C 21 MPA - E: 0.10 M.	M2	3,929.71	$ 64,538.00	$ 253,615,623.98
02-02-100	LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 21 MPA PARA TANQUE DE AGUA E: 0.20 M. INCLUYE FONDO FOCETAS, CINTA DE PVC TIPO SIKA H: 0.22 M. Y SELLANTE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1 A DE SIKA O EQUIVALENTE	M2	25.88	$ 174,559.00	$ 4,517,586.92
02-02-200	MUROS EN CONCRETO F'C 21 MPA PARA TANQUE DE AGUA E: 0.30 M. INCLUYE PASAMUROS	M3	26.91	$ 694,990.00	$ 18,702,180.90
02-03	**ACEROS DE REFUERZO**				
02-03-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1,161.77	$ 3,020.00	$ 3,508,545.40
02-03-020	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR FY 493 MPA	KG	8,709.46	$ 3,295.00	$ 28,697,736.60
02-04	**VARIOS - CIMENTACIONES**				
02-04-010	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA EN MEMBRANA TIPO SIKAPLAN 12 NTR DE SIKA O EQUIVALENTE, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON SIKAFERROGUARD-903 Y SIKA TOP ARMATEC - 108 DE SIKA O EQUIVALENTE	M2	109.22	$ 112,394.00	$ 12,275,672.68

03	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				
03-03	**DESAGUES AGUAS NEGRAS POR TERRENO**				
03-03-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4"	ML	94.00	$ 27,204.00	$ 2,557,176.00
03-03-020	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	56.00	$ 26,342.00	$ 1,475,152.00
03-03-030	SUMINISTRO Y EXTENDIDA CAMA EN ARENA	M3	5.00	$ 73,693.00	$ 368,465.00
03-03-040	SUMINISTRO Y COMPACTADO RELLENO RECEBO	M3	23.00	$ 28,190.00	$ 648,370.00
03-03-050	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	32.00	$ 11,318.00	$ 362,176.00
03-03-060	RETIRO DE SOBRANTES	M3	31.00	$ 33,140.00	$ 1,027,340.00
03-06	**DESAGUES AGUAS LLUVIAS POR TERRENO**				
03-06-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	57.00	$ 69,614.00	$ 3,967,998.00
03-06-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	79.00	$ 53,372.00	$ 4,216,388.00
03-06-030	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	82.00	$ 26,342.00	$ 2,160,044.00
03-06-040	SUMINISTRO Y EXTENDIDA CAMA EN ARENA	M3	7.00	$ 73,693.00	$ 515,851.00
03-06-050	SUMINISTRO Y COMPACTADO RELLENO RECEBO	M3	34.00	$ 28,190.00	$ 958,460.00
03-06-060	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	31.00	$ 11,318.00	$ 350,858.00
03-06-070	RETIRO DE SOBRANTES	M3	66.00	$ 33,140.00	$ 2,187,240.00

04	**ESTRUCTURAS**				
04-01	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**				
04-01-010	MUROS ESTRUCTURALES EN CONCRETO GRIS CLARO A LA VISTA F'C 21 MPA, E: 0.12 M. FORMALETA LISA.	M3	264.30	$ 736,227.00	$ 194,584,796.10
04-03	**LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO**				
04-03-010	LOSA DE CUBIERTA MACIZA INCLINADA EN CONCRETO GRIS CLARO VISTO F'C 21 MPA H: 0.10 M. INCLUYE VIGAS PERIMETRALES A: 0.25 M. X H: 0.25 M.	M2	1,455.02	$ 77,648.00	$ 112,979,392.96
04-05	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**				
04-05-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38,173.46	$ 3,020.00	$ 115,283,849.20
04-05-020	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR FY 493 MPA	KG	14,254.83	$ 3,295.00	$ 46,969,664.85
04-06	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
04-06-010	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, COLUMNAS CIRCULARES + PERFILES EN "I" PARA SOPORTE LOSA DE CUBIERTA, INCLUYE PLATINAS, PERNOS, ANCLAJES, SOLDADURAS Y PINTURA DE ACABADO.	KG	11,290.41	$ 9,280.00	$ 104,791,772.00

05	**MAMPOSTERIA - NO APLICA**				

06	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**				
04-01	**ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO**				
06-01-100	TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO L: 0.60 M. INCLUYE ANCLAJES A PISO Y PINTURA TIPO TRAFICO	U	4.00	$ 86,889.00	$ 347,556.00
04-02	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIOS**				
06-02-010	BANCA + MURETE EN CONCRETO VISTO GRIS CLARO F'C 21 MPA. BANCA A: 0.70 M. - E: 0.10 M. Y MURETE E: 0.12 M. - H: 0.30 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, COMEDOR	M	30.92	$ 248,776.00	$ 7,692,153.92
06-02-020	BANCA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. EMPOTRADA A MURO, A: 0.40 M. - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, VESTIER	M	1.20	$ 150,922.00	$ 181,106.40
06-02-030	LOSETA DINTEL EN CONCRETO VISTO GRIS CLARO F'C 21 MPA, A: 0.42 M. - E: 0.10 M. SOBRE PUERTAS CORREDIZAS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, AULAS	M	77.44	$ 90,028.00	$ 6,971,768.32
06-02-040	LOSETA DINTEL EN CONCRETO GRIS CLARO F'C 21 MPA. SOBRE PUERTAS DE ACCESO - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESOS PRINCIPAL, AULAS Y COCINA	M2	23.25	$ 151,423.00	$ 3,520,584.75
06-02-050	LOSETAS SILLAR Y DINTEL EN CONCRETO GRIS CLARO F'C 21 MPA SOBRE VENTANAS, A: 0.62 M. - E: 0.12 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, AULAS	M	75.60	$ 112,317.00	$ 8,491,165.20
06-02-060	LOSETAS BASE NICHOS EN CONCRETO VISTO GRIS CLARO F'C 21 MPA, A: 0.20 M. - E: 0.12 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, AULAS	M	37.80	$ 61,475.00	$ 2,323,755.00
06-02-070	LAVAESCOBAS POCETA EN CONCRETO F'C 21 MPA + FORRO EN GRANITO PULIDO BLANCO - 0.60 M. x 0.60 M. - H: 0.35 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	U	8.00	$ 143,358.00	$ 1,146,864.00

07	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS**				
07-15	**ACOMETIDA**				
07-15-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO GALV. SCH 40 ROSCAR 3/4"	ML	3.00	$ 24,338.00	$ 73,014.00
07-15-020	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO ROSCAR 3/4"	UN	9.00	$ 9,761.00	$ 87,849.00
07-15-030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 3/4"	ML	32.00	$ 9,338.00	$ 298,816.00
07-15-040	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3/4"	UN	25.00	$ 2,637.00	$ 65,925.00

07-15-050	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 3/4"	UN	1.00	$ 66,828.00	$ 66,828.00
07-15-060	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA 3/4"	UN	6.00	$ 39,897.00	$ 239,382.00
07-15-070	SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL H.G. 3/4"	UN	9.00	$ 13,632.00	$ 122,688.00
07-15-080	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D TIPO CORTINA 3/4"	UN	2.00	$ 66,828.00	$ 133,656.00
07-15-090	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO ROSCAR Ø3/4"	UN	2.00	$ 55,740.00	$ 111,480.00
07-15-100	MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4" (SEGÚN TRAMITE ANTE EAAB)	UN	1.00	$ 378,939.00	$ 378,939.00
07-15-110	CONEXIÓN MEDIDOR 3/4"	UN	1.00	$ 62,066.00	$ 62,066.00
07-15-120	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4" MAMPOSTERIA	UN	1.00	$ 493,475.00	$ 493,475.00
07-15-130	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	2.00	$ 26,342.00	$ 52,684.00
07-15-140	SUMINISTRO Y COMPACTADO RELLENO RECEBO	M3	1.00	$ 28,190.00	$ 28,190.00
07-15-150	SUMINISTRO Y EXTENDIDA CAMA EN GRAVILLA	M3	1.00	$ 103,170.00	$ 103,170.00
07-15-160	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	1.00	$ 11,318.00	$ 11,318.00
07-15-170	RETIRO DE SOBRANTES	M3	2.00	$ 33,140.00	$ 66,280.00
07-18	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**				
07-18-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE 2.1/2"	ML	12.00	$ 173,660.00	$ 2,086,320.00
07-18-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO GLAVANIZADO 1.1/2"	ML	6.00	$ 38,738.00	$ 232,428.00
07-18-030	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE RANURADOS 2.1/2"	UN	10.00	$ 126,689.00	$ 1,266,890.00
07-18-040	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO GLAVANIZADO ROSCADOS 1.1/2"	UN	18.00	$ 10,475.00	$ 188,550.00
07-18-050	SUMINISTRO E INSTALACION CUPLING RANURADO 2.1/2"	UN	16.00	$ 10,839.00	$ 173,424.00
07-18-060	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO ROSCADO 2.1/2"	UN	1.00	$ 348,552.00	$ 348,552.00
07-18-070	SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2"	UN	3.00	$ 173,301.00	$ 519,903.00
07-18-080	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE 2.1/2"	UN	2.00	$ 210,002.00	$ 420,004.00
07-18-090	SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA 2.1/2" x 1.1/4"	UN	2.00	$ 133,645.00	$ 267,290.00
07-18-100	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO 0-200 PSI	UN	1.00	$ 30,459.00	$ 30,459.00
07-18-110	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D TIPO CORTINA 2"	UN	1.00	$ 261,766.00	$ 261,766.00
07-18-120	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D TIPO CORTINA 2.1/2"	UN	3.00	$ 454,178.00	$ 1,362,534.00
07-18-130	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D TIPO CORTINA 1.1/2"	UN	2.00	$ 165,253.00	$ 330,506.00
07-18-140	SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO- ALARMA SONORA-Ø3/4"	UN	1.00	$ 192,412.00	$ 192,412.00
07-18-150	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA ACERO (INOXI. CON TORNILLOS TUERCAS Y EMPAQUE) 2.1/2"	UN	12.00	$ 113,891.00	$ 1,366,692.00
07-18-160	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2.1/2"	UN	2.00	$ 398,956.00	$ 797,912.00
07-18-170	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2"	UN	1.00	$ 256,093.00	$ 256,093.00
07-18-180	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1.1/2"	UN	2.00	$ 191,144.00	$ 382,288.00
07-18-190	SUMINISTRO E INSTALACION COLA MARRANO	UN	1.00	$ 14,578.00	$ 14,578.00
07-18-200	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2.1/2"	UN	8.00	$ 8,175.00	$ 65,400.00
07-18-210	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1.1/2"	UN	6.00	$ 7,098.00	$ 42,588.00
07-18-220	SUMINISTRO E INSTALACION BASTONES DE VENTILACION HG24"	UN	2.00	$ 301,911.00	$ 603,822.00
07-21	**RED INTERIOR AGUA FRIA Y CALIENTE PRESION**				
07-21-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 PVC-P 2.1/2"	ML	21.00	$ 42,631.00	$ 895,251.00
07-21-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 PVC-P 2"	ML	28.00	$ 27,066.00	$ 757,624.00
07-21-030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 PVC-P 1.1/2"	ML	42.00	$ 18,857.00	$ 791,994.00
07-21-040	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 PVC-P 1.1/4"	ML	44.00	$ 15,189.00	$ 668,316.00
07-21-050	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 13.5 PVC-P 1"	ML	23.00	$ 11,855.00	$ 272,665.00
07-21-060	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 11 PVC-P 3/4"	ML	116.00	$ 9,338.00	$ 1,083,208.00
07-21-070	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 9 PVC-P 1/2"	ML	300.00	$ 7,525.00	$ 2,257,500.00
07-21-080	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPV-C 1/2"	ML	9.00	$ 11,665.00	$ 104,985.00
07-21-090	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 2.1/2"	UN	11.00	$ 47,403.00	$ 521,433.00
07-21-100	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 2"	UN	11.00	$ 19,390.00	$ 213,290.00
07-21-110	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/2"	UN	11.00	$ 12,438.00	$ 136,818.00
07-21-120	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/4"	UN	32.00	$ 8,676.00	$ 277,632.00
07-21-130	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1"	UN	30.00	$ 4,326.00	$ 129,780.00
07-21-140	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3/4"	UN	205.00	$ 2,637.00	$ 540,585.00
07-21-150	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1/2"	UN	224.00	$ 1,827.00	$ 409,248.00
07-21-160	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS CPV-C 1/2"	UN	13.00	$ 9,847.00	$ 128,011.00
07-21-170	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS EXPULSORA DE AIRE 1/2"	UN	1.00	$ 553,685.00	$ 553,685.00
07-21-180	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1/2"	UN	37.00	$ 28,344.00	$ 1,048,728.00
07-21-190	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D TIPO CORTINA 3/4"	UN	19.00	$ 66,828.00	$ 1,269,732.00
07-21-200	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D TIPO CORTINA 1.1/4"	UN	1.00	$ 123,615.00	$ 123,615.00
07-21-210	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE Ø1/2"	UN	3.00	$ 53,353.00	$ 160,059.00
07-24	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA**				
07-24-010	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS DE TANQUE Ø1/2"	UN	17.00	$ 42,033.00	$ 714,561.00
07-24-020	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS Ø1/2"	UN	20.00	$ 42,033.00	$ 840,660.00
07-24-030	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO DUCHAS Ø1/2"	UN	3.00	$ 42,033.00	$ 126,099.00
07-24-040	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO LLAVE MANGUERA Ø1/2"	UN	3.00	$ 42,033.00	$ 126,099.00
07-24-050	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO ORINAL FLUXOMETRO Ø3/4"	UN	3.00	$ 49,712.00	$ 149,136.00

07-24-060	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO SANITARIO FLUXOMETRO Ø1.1/4"	UN	1.00	$ 111,973.00	$ 111,973.00
07-24-070	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO LAVAPLATOS Ø1/2"	UN	28.00	$ 42,033.00	$ 1,176,924.00
07-24-080	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO POCETA	UN	12.00	$ 42,033.00	$ 504,396.00
07-24-090	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO MARMITA Ø1/2"	UN	1.00	$ 42,033.00	$ 42,033.00
07-24-100	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO BAÑO DE MARIA Ø3/4"	UN	1.00	$ 51,120.00	$ 51,120.00
07-24-110	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO CALENTADOR ELECTRICO	UN	3.00	$ 42,033.00	$ 126,099.00
07-27	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**				
07-27-010	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO DUCHAS	UN	3.00	$ 57,146.00	$ 171,438.00
07-27-020	INSTALACION Y PRUEBA PUNTO HIDRAULICO CALENTADOR ELECTRICO	UN	3.00	$ 57,146.00	$ 171,438.00
07-27-030	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1/2"	UN	3.00	$ 28,344.00	$ 85,032.00
07-30	**SALIDAS SANITARIAS**				
07-30-010	INSTALACION SALIDA SANITARIOS DE TANQUE Y FLUXOMETRO	UN	18.00	$ 58,282.00	$ 1,049,076.00
07-30-020	INSTALACION SALIDA LAVAMANOS	UN	20.00	$ 58,282.00	$ 1,165,640.00
07-30-030	INSTALACION SALIDA DUCHAS	UN	3.00	$ 58,282.00	$ 174,846.00
07-30-040	INSTALACION SALIDA ORINAL	UN	3.00	$ 58,282.00	$ 174,846.00
07-30-050	INSTALACION SALIDA POCETA 3"	UN	3.00	$ 40,515.00	$ 121,545.00
07-30-060	INSTALACION SALIDA LAVALATOS	UN	28.00	$ 58,282.00	$ 1,631,896.00
07-30-070	INSTALACION SALIDA SIFON DE PISO 2"	UN	27.00	$ 21,407.00	$ 577,989.00
07-30-080	INSTALACION SALIDA SIFON DE PISO 3"	UN	11.00	$ 40,515.00	$ 445,665.00
07-30-090	INSALACION SALIDA SIFON DE PISO 2" POLIPROPILENO	UN	1.00	$ 80,265.00	$ 80,265.00
07-36	**BAJANTES Y RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**				
07-36-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S 4"	ML	174.00	$ 38,766.00	$ 6,748,764.00
07-36-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S 3"	ML	34.00	$ 28,665.00	$ 982,090.00
07-36-030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S 2"	ML	150.00	$ 19,672.00	$ 2,950,800.00
07-36-040	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC L 2"	ML	94.00	$ 14,017.00	$ 1,317,598.00
07-36-050	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC S 4"	UN	177.00	$ 29,635.00	$ 5,068,395.00
07-36-060	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC S 2"	UN	418.00	$ 9,845.00	$ 4,115,210.00
07-36-070	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC S 3"	UN	66.00	$ 16,745.00	$ 1,105,170.00
07-36-080	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIETILENO Ø2" PARA DESAGUES FN 20	ML	8.00	$ 39,689.00	$ 317,512.00
07-36-090	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO Ø2" PARA DESAGUES FN 20	UN	7.00	$ 41,831.00	$ 292,817.00
07-36-100	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2"	UN	23.00	$ 7,098.00	$ 163,254.00
07-36-110	SUMINISTRO E INSTALACION PASE EN VIGA Ø 4" L=0.60m	UN	39.00	$ 23,369.00	$ 911,391.00
07-39	**BAJANTES Y RAMALES DE AGUAS LLUVIAS**				
07-39-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S 6"	ML	86.00	$ 75,143.00	$ 6,462,298.00
07-39-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S 4"	ML	44.00	$ 38,766.00	$ 1,706,584.00
07-39-030	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC S 6"	UN	59.00	$ 175,790.00	$ 10,371,610.00
07-39-040	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC S 4"	UN	11.00	$ 28,635.00	$ 314,985.00
07-39-050	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 6"	UN	18.00	$ 13,065.00	$ 235,170.00
07-39-060	SUMINISTRO E INSTALACION PASE EN VIGA Ø 4" L=0.60m	UN	17.00	$ 22,697.00	$ 385,849.00
07-42	**MONTAJE EQUIPOS**				
07-42-010	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA AGUA POTABLE (2 BOMBAS+ HIDRO)	UN	1.00	$ 1,695,131.00	$ 1,695,131.00
07-42-020	MONTAJE BOMBA EYECTORA (2 BOMBAS)	UN	1.00	$ 637,416.00	$ 637,416.00
07-42-030	MONTAJE BOMBA LIDER INCENDIO	UN	1.00	$ 1,526,347.00	$ 1,526,347.00
07-42-040	MONTAJE BOMBA JOCKEY INCENDIO	UN	1.00	$ 513,641.00	$ 513,641.00
07-45	**TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				
07-45-010	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC S 4"	UN	20.00	$ 6,069.00	$ 121,380.00
07-45-020	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC S 3"	UN	15.00	$ 3,733.00	$ 55,995.00
07-45-030	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC S 2"	UN	75.00	$ 2,895.00	$ 217,125.00
07-45-040	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC P 1/2"	UN	83.00	$ 1,081.00	$ 89,723.00
07-45-050	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC P 3/4"	UN	4.00	$ 1,619.00	$ 6,476.00
07-45-060	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC P 1.1/4"	UN	1.00	$ 4,708.00	$ 4,708.00
07-48	**DESCARGA POZO EYECTOR A.LL., A.RES Y CUARTO BOMBAS**				
07-48-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 3"	ML	27.00	$ 56,095.00	$ 1,514,565.00
07-48-020	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3"	UN	13.00	$ 67,572.00	$ 878,436.00
07-48-030	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE BOLA 3"	UN	2.00	$ 619,861.00	$ 1,239,722.00
07-48-040	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO CORTINA 3"	UN	2.00	$ 629,871.00	$ 1,259,742.00
07-48-050	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DRESSER 3"	UN	2.00	$ 85,528.00	$ 171,056.00
07-48-060	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA 3"	UN	4.00	$ 8,175.00	$ 32,700.00
07-51	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				
07-51-010	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION CAJA INSPECCION 0.60 x 0.60 (PVC, BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	9.00	$ 568,409.00	$ 5,115,681.00
07-51-020	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION CAJA INSPECCION 0.80 x 0.80 (PVC, BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	7.00	$ 646,832.00	$ 4,527,824.00

07-51-030	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION POZO EN MAMPOSTERIA	UN	2.00	$ 2.328.420.00	$ 4,656,840.00
07-51-040	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION POZO TIPO ACUEDUCTO H:2.00 m	UN	1.00	$ 3.830.137.00	$ 3,830,137.00
07-51-050	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION SUMIDERO	UN	1.00	$ 691.535.00	$ 691,535.00
07-51-060	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS	UN	1.00	$ 511.608.00	$ 511,608.00
07-54	**SUMINISTRO EQUIPOS (VER ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS)**				
07-54-010	EQUIPO PRESIÓN AGUA POTABLE (2 BOMBAS+ HIDRO). ES UN SISTEMA DE PRESIÓN MEDIANTE TANQUE HIDROACUMULADOR QUE GARANTIZA EL PRENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA CUANDO EXISTE DEMANDA O LA DEMANDA SEA NULA. LAS CARACTERÍSTICAS SON LAS SIGUIENTES. CAUDAL TOTAL : 5.07 LTS/SEG., CABEZA DINÁMICA TOTAL : 34.00 M.C.A., PRESIÓN EN LA DESCARGA : 32.00 M.C.A., BOMBA NO. 1 Y 2: CAUDAL TOTAL : 3.01 LTS/SEG., CABEZA DINÁMICA TOTAL : 35.00M.C.A., PRESIÓN EN LA DESCARGA : 33.90 M.C.A., POTENCIA DE DISEÑO : 3.00 H.P., SUCCIÓN : 2.1/2". FLAUTA DE DESCARGA : 2.1/2". SE INSTALARAN (2) BOMBAS CADA UNA PARA EL 60% DEL CAUDAL TOTAL. TANQUE HIDROACUMULADOR : UN (1) TANQUE DE 300 LITROS. INCLUYE MANÓMETRO PARA MEDICIÓN HASTA 200 PSI.	UN	1.00	$ 14.500.000.00	$ 14,500,000.00
07-54-020	BOMBA EYECTORA. CUARTO BOMBAS (2 BOMBAS) SERÁ UN SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO OPERADO MEDIANTE INTERRUPTORES DE FLOTADOR Y TIPO AMPOLLETA DE MERCURIO. SE UTILIZARÁ PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE CUARTO DE EQUIPOS. CAUDAL TOTAL = 3.50 LTS/SEG., CABEZA DINÁMICA TOTAL = 5.0 MCA., POTENCIA DE DISEÑO = 0.5 H.P. VOLUMEN DEL POZO DE BOMBEO = 1.00 M3. SE INSTALARÁN DOS (2) BOMBAS EN POZO EYECTOR, CADA UNA PARA EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS DADAS.	UN	1.00	$ 5.900.000.00	$ 5,900,000.00
07-54-030	EQUIPO CONTRA INCENDIO (1 LÍDER 1 JOCKEY) INCLUIR FLUJOMETRO, VALVULA DE ALIVIO, TOMA PARA PRUEBAS. LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NFPA 20. LA BOMBA LÍDER DEBE SER DE CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE SUCCIÓN, LISTADA UL APROBADA FM PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIO, DE CUERPO EN HIERRO FUNDIDO, CAPAZ DE SUMINISTRAR UN 150% DEL FLUJO CON UN 65% DE LA ALTURA DE IMPULSIÓN NOMINAL, CON MOTOR ELÉCTRICO UL/FM DIMENSIONADO PARA NO SOBREPASAR EN NINGÚN PUNTO LA CURVA HIDRÁULICA DE LA BOMBA, QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: CAUDAL TOTAL : 100 GPM, CABEZA DINÁMICA TOTAL : 84 PSI, SUCCIÓN : 2", POTENCIA DE DISEÑO : 10.00 H.P., BOMBA JOCKEY INCENDIO: CAUDAL TOTAL : 2 GPM, CABEZA DINÁMICA TOTAL : 98 PSI, SUCCIÓN : 1.1/2", POTENCIA DE DISEÑO : 0.5 H.P.	UN	1.00	$ 47.800.000.00	$ 47,800,000.00
07-57	**CONEXIONES DOMICILIARIAS (LA PROPUESTA PUEDE CAMBIAR SEGÚN REVISION DE EAAB)**				
07-57-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	13.00	$ 72,911.00	$ 947,843.00
07-57-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	8.00	$ 53.646.00	$ 429,168.00
07-57-030	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	21.00	$ 26.342.00	$ 553,182.00
07-57-040	SUMINISTRO Y EXTENDIDA CAMA EN ARENA	M3	2.00	$ 73.693.00	$ 147,386.00
07-57-050	SUMINISTRO Y COMPACTADO RELLENO RECEBO	M3	9.00	$ 28.190.00	$ 253,710.00
07-57-060	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	7.00	$ 11.318.00	$ 79,226.00
07-57-070	RETIRO DE SOBRANTES	M3	18.00	$ 33.140.00	$ 596,520.00
07-57-080	ROTURA DE ANDEN	M2	19.00	$ 35.637.00	$ 677,103.00
07-57-090	ROTURA DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO)	M2	80.00	$ 43.558.00	$ 3,484,640.00
07-57-100	REPOSICION DE ANDEN e=0.12m	M2	19.00	$ 69.519.00	$ 1,320,861.00
07-57-110	REPOSICION DE PAVIMENTO e=0.12m	M2	80.00	$ 105.959.00	$ 8,476,720.00
07-60	**TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS**				
07-63	**DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				
07-63-010	DESINFECCIÓN DEL SISTEMA SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UN	1.00	$ 241.209.00	$ 241,209.00
07-66	**ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**				
07-69	**ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD**				
07-72	**RED DE FILTRO**				
07-72-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC FILTRO Ø4"	ML	336.00	$ 31.661.00	$ 10,638,096.00
07-72-020	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	168.00	$ 26.342.00	$ 4,425,456.00
07-72-030	SUMINISTRO Y EXTENDIDA GRAVILLA REDONDA LIBRE DE FINOS 3/4" a 1"	M3	67.00	$ 103.170.00	$ 6,912,390.00
07-72-040	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600	M2	672.00	$ 10.046.00	$ 6,750,912.00
07-78	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**				
07-78-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 2"	ML	16.00	$ 45.260.00	$ 724,160.00
07-78-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/2"	ML	7.00	$ 36.062.00	$ 252,434.00
07-78-030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 Ø2.1/2"	ML	8.00	$ 64.646.00	$ 517,168.00
07-78-040	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 2"	UN	8.00	$ 21.208.00	$ 169,664.00
07-78-050	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 2.1/2"	UN	6.00	$ 41.644.00	$ 249,864.00
07-78-060	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ROSCADOS 1.1/2"	UN	6.00	$ 12.563.00	$ 75,378.00
07-78-070	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLIN 2.1/2"	UN	11.00	$ 10.839.00	$ 119,229.00
07-78-080	SUMINISTRO E INSTALACION CUPLING RANURADO 2"	UN	15.00	$ 9.805.00	$ 147,075.00
07-78-090	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE ALIVIO Ø3/4"	UN	1.00	$ 721.735.00	$ 721,735.00
07-78-100	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ANTIVORTICE 0.60 x 0.60	UN	2.00	$ 474.649.00	$ 949,298.00
07-78-110	SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA 2x1.1/2	UN	1.00	$ 81.283.00	$ 81,283.00
07-78-120	SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA 1.1/2x1	UN	1.00	$ 62.672.00	$ 62,672.00

07-78-130	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VASTAGO ASCENDENTE BRIDADA 2"	UN	2.00	$ 621.290.00	$ 1,242,580.00
07-78-140	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VASTAGO ASCENDENTE BRIDADA 1.1/2"	UN	1.00	$ 391.544.00	$ 391,544.00
07-78-150	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA Ø2"	UN	1.00	$ 179.847.00	$ 179,847.00
07-78-160	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBA Ø3"Ø2.1/2"	UN	1.00	$ 1.456.795.00	$ 1,456,795.00
07-78-170	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA EN ACERO (INDIVIDUAL) Ø2"	UN	16.00	$ 83.859.00	$ 1,341,744.00
07-78-180	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 2"	UN	3.00	$ 256.093.00	$ 768,279.00
07-78-190	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 1.1/2"	UN	1.00	$ 191.144.00	$ 191,144.00
07-78-200	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2"	UN	16.00	$ 7.098.00	$ 113,568.00
07-78-210	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1.1/2"	UN	7.00	$ 7.098.00	$ 49,686.00
07-78-220	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ESPECIAL PARA TUBERIA SUCCION	UN	2.00	$ 67.138.00	$ 134,276.00
07-78-230	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO CORTINA Ø2"	UN	1.00	$ 261.766.00	$ 261,766.00
07-78-240	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO 2"	UN	1.00	$ 613.069.00	$ 613,069.00
07-78-250	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE FLEXIBLE METALICA 2"	UN	4.00	$ 26.796.00	$ 107,184.00
07-78-260	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO 0-200 PSI	UN	1.00	$ 30.459.00	$ 30,459.00
07-78-270	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO P/D PESADO TIPO CORTINA 3/4"	UN	1.00	$ 66.828.00	$ 66,828.00
07-78-280	SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO 3/4"- ALARMA SONORA	UN	1.00	$ 192.412.00	$ 192,412.00
07-78-290	SUMINISTRO E INSTALACION CICLA MARRANO	UN	1.00	$ 14.578.00	$ 14,578.00
07-78-300	MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4" (SEGÚN TRAMITE ANTE EAAB)	UN	1.00	$ 378.939.00	$ 378,939.00
07-78-310	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 3/4"	UN	1.00	$ 66.828.00	$ 66,828.00
07-78-320	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA 3/4"	UN	1.00	$ 39.897.00	$ 39,897.00
07-78-330	CONEXIÓN MEDIDOR 3/4"	UN	1.00	$ 62.066.00	$ 62,066.00
07-78-340	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR 3/4"	UN	1.00	$ 94.445.00	$ 94,445.00
07-78-350	SUMINISTRO E INSTALACION BASTONES DE VENTILACION HG24"	UN	2.00	$ 331.311.00	$ 662,622.00
07-81	**RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIO Y GABINETES**				
07-81-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 Ø3"	ML	51.00	$ 77.024.00	$ 3,928,224.00
07-81-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 Ø2.1/2"	ML	34.00	$ 64.646.00	$ 2,197,964.00
07-81-030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO Ø1.1/2" SHC 40	ML	3.00	$ 36.062.00	$ 108,186.00
07-81-040	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 3"	UN	22.00	$ 65.248.00	$ 1,435,456.00
07-81-050	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 2.1/2"	UN	22.00	$ 41.644.00	$ 916,168.00
07-81-060	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ROSCADOS 1.1/2"	UN	9.00	$ 12.563.00	$ 113,067.00
07-81-070	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLIN 3"	UN	25.00	$ 13.357.00	$ 333,925.00
07-81-080	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLIN 2.1/2"	UN	17.00	$ 10.839.00	$ 184,263.00
07-81-090	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2.1/2"/3"	UN	40.00	$ 8.175.00	$ 327,000.00
07-81-100	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ANTISISMICAS 2 VIAS 3"	UN	7.00	$ 150.643.00	$ 1,054,501.00
07-81-110	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE III (incluye vidrio de seguridad , montaje y martillo)	UN	2.00	$ 1.721.234.00	$ 3,442,468.00
07-81-120	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO 3"	UN	1.00	$ 821.119.00	$ 821,119.00
07-81-130	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 3" x 2.1/2" x 2.1/2"	UN	1.00	$ 1.326.907.00	$ 1,326,907.00
07-81-140	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UN	1.00	$ 335.990.00	$ 335,990.00
07-81-150	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1"	UN	1.00	$ 56.447.00	$ 56,447.00
07-87	**RED DE GAS BAJA PRESION**				
07-87-010	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA COBRE TIPO L 1.1/4"	ML	13.00	$ 66.612.00	$ 865,956.00
07-87-020	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA COBRE TIPO L 1"	ML	27.00	$ 50.197.00	$ 1,355,319.00
07-87-030	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	ML	19.00	$ 32.802.00	$ 623,238.00
07-87-040	SUMINISTRO E INSTALACION CORAZA PVC PARA PROYECCION TUBERIA	ML	11.00	$ 15.499.00	$ 170,489.00
07-87-060	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE TIPO L 1.1/4"	UN	11.00	$ 17.670.00	$ 194,370.00
07-87-060	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE TIPO L 1"	UN	40.00	$ 13.729.00	$ 549,160.00
07-87-070	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE TIPO L 3/4"	UN	22.00	$ 5.818.00	$ 127,996.00
07-87-080	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1"	UN	27.00	$ 5.201.00	$ 140,427.00
07-87-090	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 3/4"	UN	19.00	$ 5.201.00	$ 98,819.00
07-87-100	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1.1/4"	UN	1.00	$ 115.644.00	$ 115,644.00
07-87-110	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1"	UN	3.00	$ 56.447.00	$ 169,341.00
07-87-120	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 3/4"	UN	2.00	$ 39.897.00	$ 79,794.00
07-87-130	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ESTUFA ENANA 1"	UN	1.00	$ 224.196.00	$ 224,196.00
07-87-140	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ESTUFA INDUSTRIAL 1"	UN	1.00	$ 163.697.00	$ 163,697.00
07-87-150	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO PLANCHA DOBLE 1"	UN	1.00	$ 163.697.00	$ 163,697.00
07-87-160	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO MARMITA 1"	UN	1.00	$ 163.697.00	$ 163,697.00
07-87-170	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO BAÑO DE MARIA 3/4"	UN	1.00	$ 96.385.00	$ 96,385.00
07-87-180	SUMINISTRO REGULADOR UNICA 20m3/h (P60 PSI - PS: 23mbar)	UN	1.00	$ 462.465.00	$ 462,465.00
07-87-190	NICHO MAMPOSTERIA DE REGULACION Y MEDICION	UN	1.00	$ 571.848.00	$ 571,848.00
08	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.**				
08-10	**ALIMENTADORES 208V**				
08-10-00	DESDE GABINETE DE TRANSFERENCIA				

08-10-010	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO4/0 + 1 Nº 2/0 + 1 NO 6 AWG-CU-LSZH POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA.	ML	16.00	$ 206,515.00	$ 3,304,240.00
08-10-020	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO2+ 1 Nº 4 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO ELÉCTRICO PORTERÍA, TE-PORTERÍA.	ML	70.00	$ 79,454.00	$ 5,561,780.00
08-10-030	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO4+ 1 Nº 6 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA HASTA TE-COCINA.	ML	31.00	$ 58,745.00	$ 1,821,095.00
08-10-040	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO4+ 1 Nº 6 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA HASTA TE-SERVIDOR.	ML	12.00	$ 58,745.00	$ 704,940.00
08-10-050	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO4+ 1 Nº 6 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA HASTA TE-BOMBAS	ML	65.00	$ 58,745.00	$ 3,818,425.00
08-10-050a	DESDE GABINETE DE TGA ML				
08-10-060	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO2+ 1 Nº 4 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO TGA HASTA TE-1	ML	12.00	$ 79,454.00	$ 953,448.00
08-10-070	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO2+ 1 Nº 4 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO ML HASTA TE-CALF	ML	13.00	$ 79,454.00	$ 1,032,902.00
08-10-080	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO6+ 1 Nº 8 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR DUCTO EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDEÑO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL HASTA TE-OFICINAS	ML	70.00	$ 42,300.00	$ 2,961,000.00
08-10-090	ALIMENTADOR ELÉCTRICO BIFÁSICO EN 2 NO6+ 1 Nº 8 + 1 NO 8 AWG-CU-LSHZ POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE TABLERO ELÉCTRICO SERVIDOR TE-SERVIDOR HASTA ALIMENTACIÓN DE UPS SE INCLUYE ADEMÁS ALIMENTACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO REGULADO, DESDE SALIDA UPS HASTA TABLERO REGULADO.	ML	7.00	$ 26,315.00	$ 184,205.00
08-10-090a	DESDE PLANTA DE EMERGENCIA				
08-10-100	ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN 3 NO6+ 1 Nº 10 AWG-CU-LSZH POR TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBA JOCKEY.	ML	70.00	$ 284,662.00	$ 19,926,340.00
08-15	**APANTALLAMIENTO**				
08-15-010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO.	ML	399.00	$ 7,061.00	$ 2,825,319.00
08-15-020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO ANILLO MARCA CBO TIPO CLIC REF. 177/30 SE INCLUYE BASE PARA SOPORTE Y FIJACIÓN, INSTALACIÓN CADA 80 CMS.	UN	498.75	$ 14,760.00	$ 7,361,550.00
08-15-030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO. 1/0 AWG, CABLEADO CLASE B, INSTALADO ENTERRADO EN TERRENO NATURAL A 0.5M, (CILÍNDRICO), COMPACTADO, CONCÉNTRICO, TRENZADO, FORMADO CON ALAMBRE CILÍNDRICO SIN REVESTIMIENTO, CONSTRUIDO CON UN NÚCLEO CENTRAL RODEADO POR MÁS CAPAS DE HILOS COMPACTADOS, CABLEADOS HELICOIDALMENTE, NORMA B-8 DE LA ASTM, INCLUYE LA EXCAVACIÓN Y EL LLENO.	UN	105.00	$ 31,910.00	$ 3,350,550.00
08-15-040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 5/8" Y LONGITUD DE 2.4 METROS COBRIZADA , CONSTRUIDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE ELECTROLÍTICO DE POR LO MENOS 200UM DE ESPESOR, NORMA ASTM B - 187 SIN SULFATACIÓN NI OXIDACIÓN POR EFECTO CATÓDICO, INCLUYE LAS VARILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	6.00	$ 225,317.00	$ 1,351,902.00
08-15-050	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA POR REACCIÓN EXOTÉRMICA DE 90GR, INCLUYE CARGA, MOLDE, PINZAS DE SUJECIÓN DEL MOLDE Y DEL CABLE, CHISPERO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	7.00	$ 83,535.00	$ 584,745.00
08-15-060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO PARA CABLES CALIBRE 1/0 TIPO CBO REFERENCIA 247ZV.	UN	7.00	$ 51,340.00	$ 359,380.00
08-15-070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TERMINAL ELECTROPLATEADA BIMETALICA DOBLE OJO PARA CABLE 1/0 AWG. (PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA)	UN	7.00	$ 30,916.00	$ 216,412.00
08-15-080	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE 3 METROS EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO PESADA DE 3/4", INCLUYE BOQUILLAS, GRAPAS DOBLE ALA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO.	UN	12.00	$ 62,576.00	$ 750,912.00
08-15-090	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTOR ALUMINIO - ALUMINIO PARA ANILLO SUPERIOR TIPO CBO REFERENCIA 249ALU.	ML	34.00	$ 25,494.00	$ 866,796.00
08-15-100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE 3 METROS EN TUBERÍA PVC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO.	UN	12.00	$ 9,521.00	$ 114,252.00
08-20	**PUESTA A TIERRA**				
08-20-010	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA POR REACCIÓN EXOTÉRMICA DE 120GR, INCLUYE CARGA, MOLDE, PINZAS DE SUJECIÓN DEL MOLDE Y DEL CABLE, CHISPERO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	18.00	$ 137,669.00	$ 2,482,002.00

08-20-020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO. 4/0 AWG, CABLEADO CLASE B, INSTALADO ENTERRADO EN TERRENO NATURAL A 0.5M. CILÍNDRICO, COMPACTADO, CONCÉNTRICO, TRENZADO, FORMADO CON ALAMBRE CILÍNDRICO SIN REVESTIMIENTO, CONSTRUIDO CON UN NÚCLEO CENTRAL ROCEADO POR MÁS CAPAS DE HILOS COMPACTADOS, CABLEADOS HELICOIDALMENTE, NORMA B-8 DE LA ASTM, INCLUYE LA EXCAVACIÓN Y EL LLENO.	ML	54.00	$ 61,615.00	$ 3,336,010.00
08-20-030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 5/8" Y LONGITUD DE 2.4 METROS COBRIZADA , CONSTRUIDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE ELECTROLÍTICO DE POR LO MENOS 200UM DE ESPESOR, NORMA ASTM B - 187 SIN SULFATACIÓN NI OXIDACIÓN POR EFECTO CATÓDICO, INCLUYE LAS VARILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 225,317.00	$ 1,126,585.00
08-20-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE FISO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 CMS	UN	1.00	$ 102,384.00	$ 102,384.00
08-25	**GABINETES, TABLEROS Y CAJAS**				
08-25-010	TABLERO DE TRANSFERENCIA, GABINETE TRANSFERENCIA, METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD POLLED CALIBRE 16 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO, CON ACABADO FINAL EN COLOR RAL 7030, IP=3X USO INTERIOR, DIMENSIONES: ANCHO = 1.20 M. ALTO = 2.00 M Y PROF. = 0.40 M.	UN	1.00	$ 21,500,000.00	$ 21,500,000.00
08-25-010a	DIMENSIONES: ANCHO = 1.20 M. ALTO = 2.00 M Y PROF. = 0.40 M.				
08-25-010b	TENDRÁ DIAGRAMA MÍMICO INDICATIVO, CELOSÍA EN LOS COSTADOS, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA VENTILACIÓN DE LOS EQUIPOS.				
08-25-010c	ESTE TABLERO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:				
08-25-010d	INTERRUPTOR TOTALIZADOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3X150 A. 240 VAC 35 K A O SIMILAR				
08-25-010e	DOS (2) TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS, TIPO LOVATO O SIMILAR, COMPUESTA POR DOS CONTACTORES EN AC3 DE 200 AMPERIOS, CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO Y CABLEADO A BORNES.				
08-25-010f	EL CIRCUITO DE CONTROL SERÁ COMANDADO EN FORMA REMOTA DESDE UN ÚNICO RELÉ DE CONTROL PLANTA-RED.				
08-25-010g	UN (1) CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO DE 15(100) AMPERIOS DE MEDIDA DIRECTA 220/127 VOLTIOS CALIBRADO, (PARA RESTAURANTE)				
08-25-010h	DOS (2) LÁMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA, UNA (1) UNIDAD DE LLAVE SELECTORA DE POSICIÓN NORMAL, AUTOMÁTICO Y PLANTA, CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES.				
08-25-010i	UN BARRAJE PARA 323A, COMPUESTO POR 3 BARRAS PARA LAS FASES, 1 BARRA PARA NEUTRO Y PARA TIERRA SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600V, CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES ADECUADOS QUE SE DERIVEN SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR.				
08-25-010j	CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN REQUERIDOS DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR:				
08-25-010k	UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3X40 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-010l	UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3X50 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-010m	UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3X75 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-010n	UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3X80 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-010o	TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR LA SIC ; LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.				
08-25-020	CAJA PARA PROTECCIÓN DE BOMBA DE INCENDIO SE INCLUYE INTERRUPTOR SOLO MAGNETICO MAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL REGULABLE DE REGULACIÓN MAGNÉTICA DE 200 A 1000 A, AJUSTADO EN 205 AMPERIOS ICU 360 I A A 220V/240 V PROTECCIÓN MOTOR MAGNÉTICO REGULABLE DE 2 A 10 IN.	UN	1.00	$ 875,961.00	$ 875,961.00
08-25-030	TABLERO TE-COCINA TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 585,433.00	$ 585,433.00
08-25-040	TABLERO TE-SERVIDOR TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 452,887.00	$ 452,887.00
08-25-050	TABLERO TE-PORTERÍA TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 545,665.00	$ 545,665.00
08-25-060	TABLERO TE-1 TABLERO TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 753,391.00	$ 753,391.00
08-25-070	TABLERO TE-OFICINAS TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 354,601.00	$ 354,601.00
08-25-080	TABLERO TE-CAJF TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 394,458.00	$ 394,458.00
08-25-090	TABLERO TE-BOMBAS TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 394,458.00	$ 394,458.00
08-25-100	TABLERO TE-REGULADO TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, CORRIENTE NOMINAL DEL BARRAJE 200 A, PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA (ENTRADA PREFERFORADA PARA INSTALACIÓN).	UN	1.00	$ 394,458.00	$ 394,458.00
08-25-110	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO, CON ACABADO FINAL EN COLOR RAL 7030, IP=3X USO INTERIOR, DIMENSIONES: ANCHO = 1.80 M. ALTO = 2.00 M Y PROF. = 0.40 M.	UN	1.00	$ 19,700,000.00	$ 19,700,000.00
08-25-110a	DIMENSIONES: ANCHO = 1.80 M. ALTO = 2.00 M Y PROF. = 0.40 M.				
08-25-110b	TENDRÁ DIAGRAMA MÍMICO INDICATIVO, CELOSÍA EN LOS COSTADOS, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA VENTILACIÓN DE LOS EQUIPOS.				

08-25-110c	ESTE TABLERO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:				
08-25-110d	INTERRUPTOR TOTALIZADOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL TIPO DPXO LEGRAN REGULABLE DE 320 A 400 AJUSTADO EN 3x320A, 240 VAC 50 KA O SIMILAR.				
08-25-110e	UN BARRAJE PARA 323A, COMPUESTO POR 3 BARRAS PARA LAS FASES, 1 BARRA PARA NEUTRO Y PARA TIERRA SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600V, CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS. CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES ADECUADOS QUE SE DERIVEN SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR.				
08-25-110f	(1) UNA UNIDAD DE DPS EN BAJA TENSIÓN MCOV VAC 150 IMAX KA 60 IN(8/20) KA 30 VOLTAJE PROTECCIÓN KV 0.9 TRES FASES Y NEUTRO MÓDULOS INTERCAMBIABLES Y UNA BASE FIJA. INDICADOR VISUAL DE FALLA MEDIANTE MARCA ROJA EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN.				
08-25-110g	UN (1) ANALIZADOR DE REDES SIN MÓDULO DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, REF. PM 810 ENTES.				
08-25-110h	TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RELACIÓN 300/5A CLASE DE EXACTITUD 0.5, TENSIÓN DE AISLAMIENTO PARA 600 VOLTS. TENDRÁN PLATINAS DE CONEXIÓN.				
08-25-110j	CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN REQUERIDOS DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR.				
08-25-110k	DOS (2) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3x40 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-110l	UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3x80 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-110m	UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MARCO INDUSTRIAL DE 3x100 A 240 VAC 35 KA.				
08-25-110n	TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR LA SIC., LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.				
08-25-120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 20-50 AMP, TIPO QUICK-LAG, THQL O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE ,SELLADO Y CONTRAMARCADO.	UN	119.00	$ 21,224.00	$ 2,525,656.00
08-25-130	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 20-50 AMP, TIPO QUICK-LAG, THQL O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE ,SELLADO Y CONTRAMARCADO.	UN	7.00	$ 62,194.00	$ 435,358.00
08-25-140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR DIFERENCIAL TIPO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 20-50 AMP, TIPO QUICK-LAG, THQL O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE ,SELLADO Y CONTRAMARCADO.	UN	4.00	$ 88,702.00	$ 354,808.00
08-25-150	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TIPO ENCHUFABLE (BREAKER) DE 20-50 AMP, TIPO QUICK-LAG, THQL O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE ,SELLADO Y CONTRAMARCADO.	UN	5.00	$ 104,342.00	$ 521,710.00
08-30	**SALIDAS ELÉCTRICAS**				
08-30-05	TODA SALIDA SE INSTALARÁ A LA VISTA EN TUBERÍA EMT CON SOPORTERÍA UNISTRUT Y CONDUCTOR DE CABLE # 12 AWG LSZH/USHZN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. LAS CAJAS DE SALIDAS SERÁN EN LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA METÁLICA GALVANIZADA Y HUECO DE Ø½". LA DERIVACIÓN DE LOS CONDUCTORES SE HARÁ MEDIANTE TOMA TIPO LEVITON QUE PERMITAN VERIFICAR LAS CONEXIONES SIN SOLTAR LOS CONDUCTORES.				
08-30-010	SALIDA DE PLAFÓN TIPO LOSA, POR TUBERÍA EMT, CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 14 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	30.00	$ 86,214.00	$ 2,586,420.00
08-30-020	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R DE CAJA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA TIPO GFCI, POR TUBERÍA EMT, CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	16.00	$ 171,239.00	$ 2,739,824.00
08-30-030	SALIDA PARA SECADOR DE MANOS 110 V, POR TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS METÁLICAS, LOS CONDUCTORES ESTÁN EN LOS ALIMENTADORES. OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	11.00	$ 77,261.00	$ 849,871.00
08-30-040	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE CAJA NEMA 5-15R LEVITON STANDARD COLOR BLANCO O SIMILAR, POR TUBERÍA EMT, CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	120.00	$ 103,908.00	$ 12,468,960.00
08-30-050	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON 5-15R IG T00 VAC ISOLATED GROUND LEVITON STANDARD COLOR NARANJA O SIMILAR, POR TUBERÍA EMT, CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	28.00	$ 131,477.00	$ 3,681,356.00
08-30-060	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NEMA 6-20R 220 V O SIMILAR, POR TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	11.00	$ 169,974.00	$ 1,869,714.00
08-30-070	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICO 4X60AMPERIOS 220 VA O SIMILAR, POR TUBERÍA EMT 1", CAJAS METÁLICA 20X20X15, CONDUCTORES 10 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	5.00	$ 326,678.00	$ 1,634,390.00
08-30-080	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO A 120 VAC TIPO SIDE WIRED, QUIET SWITCH 15 A, TIPO TOGGLE SWITCH COLOR BLANCO CON TAPA CERTIFICADO PARA USO COMERCIAL MARCA LEVITON O SIMILAR. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	21.00	$ 104,969.00	$ 2,204,349.00
08-30-090	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE A 120 VAC TIPO SIDE WIRED, QUIET SWITCH 15 A, TIPO TOGGLE SWITCH COLOR BLANCO CON TAPA CERTIFICADO PARA USO COMERCIAL MARCA LEVITON O SIMILAR. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	5.00	$ 107,620.00	$ 538,100.00
08-30-100	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE A 120 VAC TIPO SIDE WIRED, QUIET SWITCH 15 A, TIPO TOGGLE SWITCH COLOR BLANCO CON TAPA CERTIFICADO PARA USO COMERCIAL MARCA LEVITON O SIMILAR. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	13.00	$ 112,921.00	$ 1,467,973.00
08-30-110	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE A 120 VAC TIPO SIDE WIRED, QUIET SWITCH 15 A, TIPO TOGGLE SWITCH COLOR BLANCO CON TAPA CERTIFICADO PARA USO COMERCIAL MARCA LEVITON O SIMILAR. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	4.00	$ 108,946.00	$ 435,784.00
08-30-120	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE A 120 VAC TIPO SIDE WIRED, QUIET SWITCH 15 A, TIPO TOGGLE SWITCH COLOR BLANCO CON TAPA CERTIFICADO PARA USO COMERCIAL MARCA LEVITON O SIMILAR. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	2.00	$ 115,573.00	$ 231,146.00

08-30-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLA CON SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUIDO EN LA MISMA BOMBILLA PARA LOS BAÑOS A 120 VAC .	UN	24.00	$ 61,462.00	$ 1,475,088.00
08-30-130a	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:				
08-30-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA POWER PACK.	UN	12.00	$ 151,427.00	$ 1,817,124.00
08-30-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR INFRARROJO EN TECHO OSCOS-II LEVITON A 120 VAC MEDIANTE CAJA METÁLICA.	UN	2.00	$ 177,936.00	$ 355,872.00
08-30-160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN ULTRASÓNICO OSC20-UDW LEVITON PARA 24 VDC AJUSTABLE DESDE 8 A 30 MIN, ÁNGULO DE VISIÓN 360ºO EQUIVALENTE. (SALONES DE CLASE)	UN	10.00	$ 493,184.00	$ 4,931,840.00
08-30-160a	ALIMENTADORES DE CIRCUITO				
08-30-160b	SE CONSIDERAN LOS MATERIALES A PARTIR DE LOS GABINETES DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y/O TABLERO DE ALUMBRADO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE ILUMINACIÓN, LA TUBERÍA SERÁ SOBREPUESTA CON PERFIL UNISTRUT 1.1/4", ANCLAS TIPO PL DE Ø3/8", VARILLA ROSCADA Ø3/8" Y ABRAZADERAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA.				
08-30-170	TUBERÍA EMT DE Ø3/4" CON CABLE 1#12F+1#12N+1#12T, INCLUYENDO LA SOPORTERÍA.	ML	876.00	$ 19,222.00	$ 16,819,250.00
08-30-180	TUBERÍA EMT DE Ø3/4" CON CABLE 2#12F+1#12N+1#12T, INCLUYENDO LA SOPORTERÍA.	ML	325.00	$ 21,276.00	$ 6,914,700.00
08-30-190	TUBERÍA EMT DE Ø1" CON CABLE 4#10F+2#12N+1#12T, INCLUYENDO LA SOPORTERÍA.	ML	60.00	$ 77,632.00	$ 4,657,920.00
08-30-200	TUBERÍA EMT DE Ø1" CON CABLE 1#12F+1#12N+1#12T, INCLUYENDO LA SOPORTERÍA.	ML	63.00	$ 63,893.00	$ 4,025,259.00
08-30-210	TUBERÍA EMT DE Ø3/4" CON CABLE 1#10F+1#10N+1#12T, INCLUYENDO LA SOPORTERÍA.	ML	140.00	$ 37,834.00	$ 5,296,760.00
08-30-220	TUBERÍA EMT DE Ø1" CON CABLE 1#8F+1#8N+1#12T, INCLUYENDO LA SOPORTERÍA.	ML	49.00	$ 79,469.00	$ 3,893,981.00
08-30-230a	ALIMENTADORES DE CIRCUITO EN DUCTO PORTACABLES				
08-30-230b	LOS CABLES INSTALADOS EN EL DUCTO DEBERÁN ESTAR ORGANIZADOS E IDENTIFICADOS DE ACUERDO A LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTAN, SEPARADOS CON VELCRO EN MAZOS DE CABLEADO SEGÚN LOS REQUISITOS DEL CEC 3x2-5.				
08-30-230	CABLE DE COBRE AISLADO LSZH/LSHZN # 12 AWG	ML	2,266.00	$ 3,788.00	$ 8,583,608.00
08-30-240	CABLE DE COBRE AISLADO LSZH/LSHZN # 10 AWG	ML	967.00	$ 5,113.00	$ 4,944,271.00
08-30-250	CABLE DE COBRE AISLADO LSZH/LSHZN # 8 AWG	ML	792.00	$ 6,213.00	$ 4,920,696.00
08-30-260	SALIDA PARA SENSOR DE LAVAMANOS 110 V, POR TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	15.00	$ 108,077.00	$ 1,621,155.00
08-35	CANALIZACIONES				
08-35-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 40X40 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES.	UN	2.00	$ 71,903.00	$ 143,806.00
08-35-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 30X30 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES.	UN	4.00	$ 53,917.00	$ 215,668.00
08-35-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 20X20 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES.	UN	2.00	$ 47,290.00	$ 94,580.00
08-35-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 15X15 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES.	UN	14.00	$ 42,917.00	$ 600,838.00
08-35-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 10X10 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES.	UN	18.00	$ 38,942.00	$ 700,956.00
08-35-060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA 40X8, SE INCLUYE CURVAS, TEE, REDUCCIONES Y ACCESORIOS DE GIRO, TIPO TORNILLO, 5 BARROTES, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 Y 16 (PERFILERÍA Y TAPAS RESPECTIVAMENTE), Y ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y LA SOLDADURA REALIZADA BAJO EL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN AWS D1.3 DE ACUERDO A NORMA ASTM A 123 Y/O ICONTEC 2076.	ML	8.00	$ 163,743.00	$ 1,309,944.00
08-35-070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO 40X10, SE INCLUYE CURVAS, TEE, REDUCCIONES Y ACCESORIOS DE GIRO, TIPO TORNILLO, 5 BARROTES, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 Y 16 (PERFILERÍA Y TAPAS RESPECTIVAMENTE), Y ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y LA SOLDADURA REALIZADA BAJO EL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN AWS D1.3 DE ACUERDO A NORMA ASTM A 123 Y/O ICONTEC 2076.	ML	7.20	$ 146,513.00	$ 1,054,893.60
08-35-080	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA 20X8 PESADA CON TRAVESAÑOS SEPARADOS NO MÁS DE 15 CM, GALVANIZADA DE ACUERDO A NORMA NEMA VE-1 Y LA SOLDADURA REALIZADA BAJO EL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN AWS D1.3 POR PROCESO MIG, GALVANIZADO EN CALIENTE DE ACUERDO A NORMA ASTM A 123 Y/O ICO.	ML	4.00	$ 151,339.00	$ 605,356.00
08-35-090	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO 20X10, SE INCLUYE CURVAS, TEE, REDUCCIONES Y ACCESORIOS DE GIRO, TIPO TORNILLO, 5 BARROTES, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 Y 16 (PERFILERÍA Y TAPAS RESPECTIVAMENTE), Y ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y LA SOLDADURA REALIZADA BAJO EL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN AWS D1.3 DE ACUERDO A NORMA ASTM A 123 Y/O ICONTEC 2076.	ML	71.00	$ 81,499.00	$ 5,786,429.00
08-35-100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO 10X10, SE INCLUYE CURVAS, TEE, REDUCCIONES Y ACCESORIOS DE GIRO, TIPO TORNILLO, 5 BARROTES, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 Y 16 (PERFILERÍA Y TAPAS RESPECTIVAMENTE), Y ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y LA SOLDADURA REALIZADA BAJO EL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN AWS D1.3 DE ACUERDO A NORMA ASTM A 123 Y/O ICONTEC 2076.	ML	168.00	$ 73,544.00	$ 12,355,728.00
08-35-110	TUBERÍA EMT DE 3/4" DEBE INCLUIR ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA.	ML	156.00	$ 15,603.00	$ 2,434,068.00
08-35-120	TUBERÍA PVC DE 3X120" POR PISO DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TOTALIZADOR DE BOMBA CONTRA INCENDIO Y JOCKEY, DEBE INCLUIR ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	70.00	$ 66,420.00	$ 4,649,400.00

08-35-130	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO 10X4, PARA INSTALACIÓN EN PAREDES SE INCLUYE CURVAS, TEE, REDUCCIONES Y ACCESORIOS DE GIRO, TIPO TORNILLO, 5 BARROTES. EN LÁMINA GOLD POLLED CALIBRE 20 (FERRLERIA Y TAPAS RESPECTIVAMENTE). Y ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y LA SOLDADURA REALIZADA BAJO EL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN AWS D1.3 DE ACUERDO A NORMA ASTM A 123 Y/O ICONTEC 2076.	ML	20.16	$ 41,598.00	$ 838,615.68
08-40	**REDES DE SEGURIDAD CCTV**				
08-40-00	EQUIPOS ACTIVOS Y DETECTORES DEL SISTEMA DE INCENDIO				
08-40-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE E INTELIGENTE CON UN RADIO DE CUBRIMIENTO DE 4.8M, CON SENSIBILIDAD VARIABLE SEGÚN ACTIVIDAD ATMOSFÉRICA DEL ÁREA. ESTE SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE DETECTAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO POR SUCIEDAD.	UN	3.00	$ 226,989.00	$ 680,967.00
08-40-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO Y TÉRMICO DE DOBLE TECNOLOGÍA DIRECCIONABLE E INTELIGENTE, CON UNA BASE ESTÁNDAR FIJA Y CABEZA REMOVIBLE. SENSOR TÉRMICO CON SET POINT VARIABLE DE TEMPERATURA DESDE EL PANEL DE CONTROL. LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR DEBE PODER VARIAR ENTRE 2% AL 3% DE OBSCURIDAD POR CADA PIE. DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE LA NFPA 72 Y UL268.	UN	5.00	$ 276,334.00	$ 1,381,670.00
08-40-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE, Y CON TESTIGO INTERNO. DEBE INCLUIR PROTECTOR TIPO STOPPER CON SEÑALIZACIÓN QUE INDICA PRESIONAR SOLO EN CASO DE EMERGENCIA.	UN	11.00	$ 169,400.00	$ 1,863,400.00
08-40-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE MONITOREO DIRECCIONABLE CONECTADO AL CIRCUITO DE INCENDIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SENSORES DE FLUJO, VÁLVULAS DE VÁSTAGO ASCENDENTE DE LA RED DE ROCIADORES CONTRA INCENDIO, TELÉFONOS DE EMERGENCIA, DETECTORES DE APERTURA EN LAS PUERTAS DE EVACUACIÓN ENTRE OTROS (EL SENSOR Y LA VÁLVULA LO SUMINISTRARÁ EL CONTRATISTA DE LA RED DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS).	UN	2.00	$ 385,441.00	$ 770,882.00
08-40-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS QUE SOPORTE COMO MÍNIMO 1 LAZO CLASE A O 2 LAZOS CLASE B PARA 250 DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES, CON TECLADO DE PROGRAMACIÓN DE TENER INTERFACE DE COMUNICACIÓN RJ45. DEBE INCLUIR GABINETE DE MONTAJE, FUENTE(S) DE ALIMENTACIÓN PARA ELEMENTOS INTERNOS Y DETECTORES-NOTIFICADORES EXTERNOS, BATERÍAS DE RESPALDO, ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE EL PANEL CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES.	UN	1.00	$ 2,075,410.00	$ 2,075,410.00
08-40-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE EXPANSOR DE POTENCIA PARA CIRCUITO NAC 12 A 24 DC – 6A. DEBE INCLUIR GABINETE DE MONTAJE COLOR ROJO IDENTIFICADO, CIRCUITO CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍAS DE RESPALDO, ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE EL PANEL CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES. INSTALADOS EN EL CUARTO DE SERVIDOR PISO 2.	UN	1.00	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00
08-40-060a	SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE ALARMA DE INCENDIO				
08-40-060b	EQUIPOS ACTIVOS NOTIFICADORES DEL SISTEMA				
08-40-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN CON SIRENA, ESTROBO Y SINCRONISMO DE OPERACIÓN, ESTROBO DE XENÓN CON 15CD ULI 971, OPERACIÓN DE LA SIRENA SEGÚN LA NORMA UL 464.	UN	11.00	$ 272,119.00	$ 2,993,309.00
08-40-070a	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN – CABLEADO DE NOTIFICACIÓN				
08-40-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR, DE DOS CONDUCTORES SÓLIDOS DE 16 AWG, CHAQUETA ROJA, PARA EL CABLEADO DE DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCENDIOS, MÓDULOS DE MONITOREO Y CONTROL, ETC... DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES UL.	ML	560.00	$ 4,219.00	$ 2,362,640.00
08-40-090	TUBERÍA EMT DE 3/4" DEBE INCLUIR ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA.	UN	187.00	$ 56,287.00	$ 10,525,669.00
08-40-090a	PRUEBAS, ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES				
08-40-100	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LAS PRUEBAS, ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES, PLANOS RECORD, MANUALES, INFORMES DE LOS ENSAYOS, DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.	UN	1.00	$ 3,721,850.00	$ 3,721,850.00
08-40-100a	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV				
08-40-100b	SISTEMA DE CCTV				
08-40-110	TUBERÍA EMT DE 3/4" DEBE INCLUIR ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA.	UN	87.00	$ 56,287.00	$ 4,896,969.00
08-40-120	SALIDA PARA CCTV PARA FIJACIÓN AL CIELO O APLIQUE, INCLUYENDO CAJA DE TERMINACIÓN Y TAPA CIEGA PARA CAJA.	UN	17.00	$ 39,981.00	$ 679,677.00
08-45	**REDES DE SONIDO**				
08-45-010	TUBERÍA EMT DE 3/4" DEBE INCLUIR ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA.	ML	125.00	$ 13,702.00	$ 1,712,750.00
08-45-020	SALIDA PARA SONIDO PARA FIJACIÓN AL CIELO O APLIQUE, INCLUYENDO CAJA DE TERMINACIÓN Y APARATO DE SONIDO PARA CAJA.	UN	33.00	$ 39,816.00	$ 1,313,928.00
08-45-030	CABLEADO DE SONIDO POLARIZADO. EN 2X18 AWG. (NO INCLUYE EL APARATO).	ML	625.00	$ 1,238.00	$ 773,750.00
08-45-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 40X40 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES.	UN	2.00	$ 71,903.00	$ 143,806.00
08-45-040a	SISTEMA DE SONIDO COLEGIO AULAS Y CORREDORES				
08-45-140	CABLEADO DE SONIDO BLINDADO. EN 3X16 AWG. (NO INCLUYE EL APARATO).	UN	76.00	$ 4,564.00	$ 346,864.00
08-45-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA (CONEXIÓN DE BOTONERA CON MATRIZ DE AUDIO).	UN	152.00	$ 4,391.00	$ 667,432.00

08-50	REDES DE TELECOMUNICACIONES				
08-50-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	30.00	$ 8.227,00	$ 246,810.00
08-50-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45 CAT 6A, QUE SOPORTE 10GB/S . (PARA INSERTAR EN FACE PLATE). PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS.	UN	30.00	$ 33.116,00	$ 993,480.00
08-50-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE	UN	30.00	$ 859,00	$ 25,770.00
08-50-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	1.440.00	$ 4.391,00	$ 6,323,040.00
08-50-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS UTP CAT 6A RJ45-RJ45 DE 3 M. QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. PARA CONECTAR EN LOS PC DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EN LOS SALONES.	UN	30.00	$ 31.999,00	$ 959,970.00
08-50-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS UTP CAT 6A RJ45-RJ45 DE 1 M. QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES.	UN	30.00	$ 26.168,00	$ 785,040.00
08-50-070	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA JACK EN LAS SALIDAS DE VOZ Y DATOS.	UN	30.00	$ 2.199,00	$ 65,970.00
08-50-080	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA JACK DE FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	30.00	$ 2.199,00	$ 65,970.00
08-50-080a	CENTRO DE CABLEADO PARA CUARTO SERVIDOR				
08-50-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 1.8M DE ALTO 0.72M ANCHO Y 0.8M DE PROFUNDIDAD. (CAPACIDAD DE 40 UNIDADES DE RACK). DEBERÁ TENER PUERTA FRONTAL Y PUERTA POSTERIOR, FABRICADO EN COLD ROLLED, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D, DEBE INCLUIR:	UN	1.00	$ 2.700.000,00	$ 2,700,000.00
08-50-090a	- 1 MULTITOMA VERTICAL CON 10 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG				
08-50-090b	- BARRAJE DE TIERRA PARA SISTEMA DE TIERRA DEL RACK DE COMUNICACIONES Y EL TGB DEL CUARTO TÉCNICO.				
08-50-090c	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RMS CON MÍNIMO 5" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA				
08-50-090d	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 1 RMS CON MÍNIMO 5" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA				
08-50-100a	BACKBONE DE DATOS EN FIBRA ÓPTICA				
08-50-100b	ESTE MATERIAL CORRESPONDE A LAS TRONCALES EN FIBRA ÓPTICA ENTRE EL RACK DE INTEGRACIÓN DEL CUARTO DE SERVIDOR DE PISO 2 Y EL CUARTO TÉCNICO DE CADA NIVEL. EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LA LONGITUD DEL ENLACE EN EL TERRENO ANTES DE SOLICITAR EL MATERIAL.				
08-50-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 DE 6H EXTERIOR CON ARMADURA.	ML	210.00	$ 16.925,00	$ 3,554,250.00
08-50-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC DÚPLEX PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 50/125UM. INCLUYE CONSUMIBLES DE INSTALACIÓN.	UN	6.00	$ 206.194,00	$ 1,237,164.00
08-50-130	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA DE 12 PUERTOS DÚPLEX DE CONECTORES LC MULTIMODO OM3 QUE SOPORTE 10GB/S, UBICADA EN EL RACK NO 1 DEL CUARTO DE SERVIDOR. DEBE INCLUIR MARCACIÓN DE CADA CONECTOR Y ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA FIBRA.	UN	1.00	$ 1.117.650,00	$ 1,117,650.00
08-50-140	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 50/125UM CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS (LONGITUD 2M).	UN	2.00	$ 129.558,00	$ 259,116.00
08-50-150	MARCADOR PARA MULTICONDUCTOR UBICADO EN EL RECORRIDO DEL CABLE DENTRO DE LAS CANALIZACIONES QUE IDENTIFIQUEN CADA CABLE DEL BACKBONE	UN	20.00	$ 1.754,00	$ 35,080.00
08-50-160	SALIDA HDMI DESDE CAJA A 1.80 M, HASTA SALIDA DE TELEVISOR PARA AULAS SALIDA PROMEDIO A 4.50 M SE INCLUYE DOS TOMAS HDMI PARA CAJA, TUBERÍA EMT DE 3/4, CAJAS, Y CABLEADO HDMI.	UN	13.00	$ 343.025,00	$ 4,459,325.00
08-50-170	SALIDA HDMI DESDE CAJA A 1.80 M DE PISO HASTA SALIDA DE PROYECTOR EN CIELO PARA AULAS, SALIDA PROMEDIO A 9.50 M SE INCLUYE DOS TOMAS HDMI PARA CAJA, TUBERÍA EMT DE 3/4, CAJAS, Y CABLEADO HDMI.	UN	2.00	$ 367.015,00	$ 734,030.00
08-50-170a	DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN				
08-50-170b	CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA – VOZ Y DATOS				
08-50-200	CERTIFICACIÓN DE PUNTO CATEGORÍA 6A A 10GBPS.	UN	30.00	$ 23.982,00	$ 719,460.00
08-50-210	CERTIFICACIÓN DE HILO DE FIBRA ÓPTICA OM3.	UN	6.00	$ 30.344,00	$ 182,064.00
08-50-220	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS EN FORMATO CAD Y DOCUMENTACIÓN.	UN	1.00	$ 1.267.418,00	$ 1,267,418.00
08-55	**SUBESTACIÓN**				
08-55-00	SUBESTACIÓN CAPSULADA CODENSA S.A ESP				
08-55-00	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA SUBESTACIÓN CAPSULADA, SEGÚN NORMAS VIGENTES DE CODENSA, S.A. SEGÚN LOS PLANOS DEL PROYECTO.				
08-55-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, TRES BISAGRAS Y DOS (2) CIERRES TIPO BRÍSTOL CON AVISO DE SEÑAL DE PELIGRO ALTA TENSIÓN, PARA AISLAR EL COMPARTIMENTO DE LLEGADA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN, DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:	UN	1.00	$ 432.737,00	$ 432,737.00
08-55-010a	DIMENSIONES : ANCHO = 1.00M., ALTO = 2.00M., PROF.= 1.30M				
08-55-060	CELDA TRIPLEX ENTRADA + SALIDA + PROTECCIÓN	UN	1.00	$ 16.418.665,00	$ 16,418,665.00

08-55-050a	DIMENSIONES : ANCHO = 1.30M., ALTO = 2.00M., PROF.= 1.30M.				
08-55-050b	GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE CODENSA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON DESENGRASANTE, FOSFATIZADO Y ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE RAL 7032.				
08-55-050c	CELDA DE MEDIA TENSIÓN COMPACTA DUPLEX ALTERNATIVA 2 CON SECCIONADORES VERTICALES SEGÚN NORMA CTS-503-2 EQUIPADA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :				
08-55-050d	CUBÍCULO SUPERIOR – VERTICAL				
08-55-050e	- UN (1) SECCIONADOR DÚPLEX DE ENTRADA Y SALIDA PARA OPERACIÓN BAJO CARGA, TIPO USO INTERIOR, PARA 600 A, 15 KV MONTADO SOBRE SOPORTES DE ACERO, MANDOS DE ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTES PARA LA ENTRADA Y SALIDA.				
08-55-050f	- JUEGO DE CABLES Nº2 CU., AISLAMIENTO 15 KV., INCLUYENDO 2 JUEGOS DE CONOS DE ALIVIO O TRATAMIENTO DE PUNTAS PARA INTERCONEXIÓN DE LOS SECCIONADORES DÚPLEX Y DE PROTECCIÓN.				
08-55-050g	CUBÍCULO INFERIOR – VERTICAL				
08-55-050h	- UN (1) SECCIONADOR TRIPOLAR PARA OPERACIÓN BAJO CARGA, USO INTERIOR, CAPACIDAD DE CONEXIÓN 400 A., MECANISMO DE ACCIONAMIENTO EXTERIOR MEDIANTE PALANCA. APERTURA TRIPOLAR POR FUSIÓN DE CUALQUIERA DE LOS FUSIBLES.				
08-55-050i	- TRES (3) FUSIBLES DE CORRIENTE DE 50A.				
08-55-050j	TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR HOMOLOGADOS POR CODENSA S. A. Y SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.				
08-55-060	INTERCONEXIÓN ENTRE CELDA TRIPLEX Y EL TRANSFORMADOR EN TRES (3) CABLES # 2 AWG CU XLPE 15 KV	UN	1.00	$ 4.062.373,00	$ 4,062,373.00
08-55-070	CELDA Y TRANSFORMADOR PARA 112.5 KVA	UN	1.00	$ 36.000.000,00	$ 36,000,000.00
08-55-070a	GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CODENSA S.A. CTS-518-2 Y EQUIPADO CON UN TRANSFORMADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:				
08-55-070b	- TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN : NORMA ICONTEC 818-819 4ª REVISIÓN				
08-55-070c	- REFRIGERACIÓN : SECO AISLAMIENTO CLASE H				
08-55-070d	POTENCIA : 112.5 K.V.A.				
08-55-070e	- VOLTAJE PRIMARIO : 11.400 VOLTIOS				
08-55-070f	- VOLTAJE SECUNDARIO : 208/120 VOLTIOS				
08-55-070g	- CONEXIÓN : DY5				
08-55-070h	- TAPS : +1, -3X2.5% ACCIONAMIENTO EXTERIOR				
08-55-070i	- BORNES APROPIADOS PARA LA CONEXIÓN A TIERRA				
08-55-070j	- ARGOLLAS DE IZAMIENTO Y BASE DE SOPORTE				
08-55-070k	- DOS (2) CANALES DE 3" EN ACERO ANCLADOS AL PISO CON FRENOS PARA SOPORTE DE LAS RUEDAS DEL TRANSFORMADOR.				
08-55-070l	TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR HOMOLOGADOS POR CODENSA S. A. Y SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE				
08-55-070m	SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SIN RETIRO DE SOBRANTES DE LOS SIGUIENTES DUCTOS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN ANDEN, SE INCLUYEN MARCOS Y TAPAS.				
08-55-080	SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN BANCO DE 4(2x1" PVC SUBTERRÁNEOS (ZONA DURA).	ML	25.00	$ 155.403,00	$ 3,885,075.00
08-55-090	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE EN MAMPOSTERÍA CTS-276 SEGÚN CODENSA ESP	UN	1.00	$ 2.041.645,00	$ 2,041,645.00
08-55-100	BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA GALVANIZADA DE 47/8CM CON 10 M DE LARGO CON CODOS, SOPORTES UNISTRUT AL MURO PARA BAJAR LOS CABLES DE MT. AL PISO DE LA SUBESTACIÓN.	UN	1.00	$ 266.057,00	$ 266,057.00
08-55-100a	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL CON DERIVACIÓN SUBTERRÁNEA SEGÚN LA-226 DE CODENSA S.A. ESP				
08-55-110	CONECTOR TIPO CUÑA SEGÚN NORMA ET-356 CODENSA S.A. ESP	UN	3.00	$ 126.245,00	$ 378,735.00
08-55-120	CONECTOR TIPO VÁSTAGO EN L PARA CABLE DE AL 15 K.V XLPE	UN	3.00	$ 196.293,00	$ 588,879.00
08-55-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS TIPO ZNO 9 K.V. + ACCESORIOS SEGÚN ET-500 CODENSA	UN	3.00	$ 164.814,00	$ 494,442.00
08-55-140	BAJANTE 1(2&1" (AC X 6 M DE LONGITUD ADOSADA AL POSTE MEDIANTE AMARRES EN CINTA BANDIT 4)	UN	1.00	$ 2.857.843,00	$ 2,857,843.00
08-55-150	RED DE 3X4/0 AWG AL XLPE, 15 K.V. PANTALLA EN HILOS	ML	39.00	$ 164.820,00	$ 6,427,980.00
08-55-160	TERMINAL USO EXTERIOR 15 K.V (3x JUEGO)	JG	1.00	$ 749.981,00	$ 749,981.00

08-55-170	TERMINAL USO INTERIOR GT3 15 KV (3X JUEGO)	JG	2.00	$ 882,523.00	$ 1,765,046.00
08-80	**TRAMITES Y ACTUALIZACIÓN DE PLANOS**				
08-80-010	SUMINISTRO DE PLANOS RECORD FINALES DE OBRA CON EL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y LAS SALIDAS FINALMENTE INSTALADAS.	UN	1.00	$ 1,656,759.00	$ 1,656,759.00
08-80-020	HORAS INGENIERO: TRAMITES Y DILIGENCIAS ANTE CODENSA S.A PARA LA OBTENCIÓN DE SERVICIOS DEFINITIVOS (ESTIMAR 60 HORAS)	UN	1.00	$ 1,789,299.00	$ 1,789,299.00
08-80-030	HORAS DIBUJANTE EN ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANOS FORMATO CAD, TAL COMO FUE EJECUTADA LA OBRA (ESTIMAR 150 HORAS)	UN	1.00	$ 1,855,570.00	$ 1,855,570.00
08-80-040	INFORMES, EMPASTES, FOTOCOPIAS Y COPIAS HELIOGRÁFICAS DE PLANOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INFORMES FINALES, CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS Y PLANOS PARA LA ADMINISTRACIÓN.	UN	1.00	$ 994,055.00	$ 994,055.00
08-80-050	ELABORACIÓN DE CUADRO CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO DE PROTECCIÓN CON LOS PLANOS DE DIAGRAMAS UNIFILARES EN EL CUARTO DE TABLEROS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS.	UN	1.00	$ 231,946.00	$ 231,946.00
08-80-060	CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00
08-80-070	CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1.00	$ 5,900,000.00	$ 5,900,000.00
09	**PAÑETES**				
09-01	**PAÑETES SOBRE MUROS**				
09-01-020	PAÑETE LISO SOBRE MUROS EN CONCRETO, INCLUYE FAJAS, FILOS Y RANURAS Y ADHERENTE	M2	296.46	$ 20,818.00	$ 6,171,704.28
10	**PISOS**				
10-01	**BASES Y ANFINADOS**				
10-01-010	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE - E: 0.05 M.	M2	188.64	$ 20,911.00	$ 3,944,651.04
10-02	**ACABADOS PISOS**				
10-02-020	PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.05 M. ENDURECIDO CON SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O EQUIVALENTE COLOR NEUTRO. INCLUYE JUNTAS ACORDE CON LA RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL	M2	1,061.66	$ 46,364.00	$ 49,222,804.24
10-02-040	PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO ECOELASTIC MIX E: 20 MM. COLOR 50/50, O EQUIVALENTE SOBRE TRITURADO E PROMEDIO: 0.25 M. INCLUYE CONFORMACION DE MONTICULOS EN TRIPLEX 18 MM ACORDE CON LOS DETALLES DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA	M2	40.00	$ 299,766.00	$ 11,990,640.00
10-02-050	PISO EN CERAMICA TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE FORMATO 33.8X33.8 COLOR BLANCO, INCLUYE PEGANTE TIPO LATEX	M2	188.64	$ 56,415.00	$ 10,642,125.60
10-03	**GUARDAESCOBAS**				
10-03-010	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE - R: 0.10 M.	M	221.88	$ 19,282.00	$ 4,278,290.16
10-03-020	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO VACIADO Y FUNDIDO COLOR BLANCO GRANO MARMOL BLANCO DANTA #1., INCLUYE DILATACIONES EN ALUMINIO. - R: 0.10 M.	M	232.59	$ 38,368.00	$ 8,928,664.92
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
11-01	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**				
11-01-040	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON EL SISTEMA DE MEMBRANAS PVC DE SIKA O EQUIVALENTE PARA CUBIERTA RESISTENTE A RAYOS UV, SISTEMA COMPUESTO POR SARNAFIL S327-12L GEOTEXTIL FP-1600, SIKAFLAN 12D, METALSHEET Y SIKAFLEX.	M2	1,340.24	$ 69,476.00	$ 93,114,514.24
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12-01	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**				
12-01-001	VENTANA VT-01 (2.64x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	1.00	$ 1,406,936.00	$ 1,406,936.00
12-01-003	VENTANA VT-02 (4.20x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	9.00	$ 2,253,094.00	$ 20,277,846.00
12-01-005	VENTANA VT-03 (0.90x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	11.00	$ 639,743.00	$ 7,037,173.00
12-01-007	VENTANA VT-04 (4.00x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	2.00	$ 2,164,842.00	$ 4,329,684.00
12-01-009	VENTANA VT-05 (2.00x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	1.00	$ 681,437.00	$ 681,437.00
12-01-011	VENTANA VT-06 (2.00x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	2.00	$ 1,123,695.00	$ 2,247,390.00
12-01-013	VENTANA VT-07 (1.80x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM + CELOSIA INFERIOR. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	3.00	$ 857,938.00	$ 2,573,814.00
12-01-015	VENTANA VT-08 (1.00x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.	U	1.00	$ 635,135.00	$ 635,135.00
12-01-017	VENTANA VT-09 (2.16x1.60). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS VERTICALES.	U	1.00	$ 2,273,981.00	$ 2,273,981.00
12-01-019	VENTANA VT-10 (1.20x1.60). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS VERTICALES.	U	1.00	$ 1,346,835.00	$ 1,346,835.00

12-01-021	VENTANA VT-11 (1.38x1.00). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS VERTICALES.	U	1.00	$ 849,352.00	$ 849,352.00
12-01-023	VENTANA VT-12 (11.40x2.22-3.96). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS VERTICALES.	U	1.00	$ 23,561,705.00	$ 23,561,705.00
12-01-025	VENTANA VT-13 (7.65x3.54-3.96). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS VERTICALES.	U	1.00	$ 16,949,730.00	$ 16,949,730.00
12-01-027	PUERTA VENTANA PV-01 (3.96x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y DOBLE VIDRIO TEMPLADO 4 MM. CON CAMARA DE AIRE. CUERPOS CORREDIZOS.	U	13.00	$ 8,212,321.00	$ 106,760,173.00
12-01-029	PUERTA VENTANA PV-02 (4.90x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y DOBLE VIDRIO TEMPLADO 4 MM. CON CAMARA DE AIRE. CUERPOS CORREDIZOS.	U	1.00	$ 10,159,914.00	$ 10,159,914.00
12-01-031	PUERTA VENTANA PV-03 (2.04x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO Y DOBLE VIDRIO TEMPLADO 4 MM. CON CAMARA DE AIRE. CUERPOS CORREDIZOS.	U	11.00	$ 4,234,258.00	$ 46,576,838.00
12-02	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
12-02-001	PUERTA P-01 (3.00x2.40). ALAS CON MARCOS LATERALES EN LAMINA METALICA. VIDRIO TEMPLADO CON PLATINAS FERMETRALES. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO.	U	1.00	$ 3,360,194.00	$ 3,360,194.00
12-02-003	PUERTA P-02 (0.80x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO MATE. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	7.00	$ 856,678.00	$ 5,996,746.00
12-02-005	PUERTA P-03 (1.10x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA DE ACABADO BLANCA MATE. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	1.00	$ 1,117,500.00	$ 1,117,500.00
12-02-007	PUERTA P-04 (0.90x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO MATE. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	13.00	$ 943,619.00	$ 12,267,047.00
12-02-009	PUERTA P-05 (1.60x2.40). ALAS CON MARCOS LATERALES EN LAMINA METALICA. VIDRIO TEMPLADO CON PLATINAS FERMETRALES. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO.	U	12.00	$ 1,877,016.00	$ 22,524,192.00
12-02-011	PUERTA P-06 (1.00x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN LAMINA CR CAL 18 + CELOSIA EN LAMINA SEGÚN DETALLE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO MATE. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	9.00	$ 1,241,871.00	$ 11,176,839.00
12-02-013	PUERTA P-07 (1.20x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO MATE. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	3.00	$ 1,204,442.00	$ 3,613,326.00
12-02-015	PUERTA P-08 (1.40x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALAS EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO MATE. CERRADURA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	2.00	$ 1,415,211.00	$ 2,830,422.00
12-02-017	PUERTA REJA PR-01 (2.00x2.40). BASTIDOR EN TUBULARES METALICOS 2" + ALA EN MALLA EXPANDIDA (MT-20 LECHON HOT ROLLED CAL 2.5 MM. DE COLMALLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA DE ACABADO. CERROJO DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	9.00	$ 696,575.00	$ 6,269,175.00
12-02-019	PUERTA REJA PR-02 (2.00x2.40). BASTIDOR EN TUBULARES METALICOS 2" + ALA EN MALLA EXPANDIDA (MT-20 LECHON HOT ROLLED CAL 2.5 MM. DE COLMALLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA DE ACABADO. CERROJO DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	2.00	$ 696,575.00	$ 1,393,150.00
12-02-021	PUERTA REJA PR-03 (3.00x2.40). BASTIDOR EN TUBULARES METALICOS 2" + ALA EN MALLA EXPANDIDA (MT-20 LECHON HOT ROLLED CAL 2.5 MM. DE COLMALLAS O EQUIVALENTE. PUERTA CORREDIZA CON RIEL SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA DE ACABADO. CERROJO DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	1.00	$ 1,326,593.00	$ 1,326,593.00
12-02-023	PUERTA REJA PR-04 (3.00x2.40). BASTIDOR EN TUBULARES METALICOS 2" + ALA EN MALLA EXPANDIDA (MT-20 LECHON HOT ROLLED CAL 2.5 MM. DE COLMALLAS O EQUIVALENTE. PUERTA CORREDIZA CON RIEL SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE ANTICORROSIVO. PINTURA DE ACABADO. CERROJO DE SEGURIDAD Y MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE.	U	1.00	$ 1,326,593.00	$ 1,326,593.00
12-04	**OTROS ELEMENTOS METALICOS**				
12-04-010	SISTEMA DE FACHADA EN MALLA EXPANDIDA REF. (MT-20 LECHON HOTROLLED CAL 2.5 MM. DE COLMALLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, PERNOS, ANGULO INFERIOR DE SOPORTE, PERFIL EN C DE REMATE SUPERIOR Y ALFAÍZA DE CUBIERTA EN LAMINA.	M2	589.55	$ 168,039.00	$ 99,067,392.45
12-04-020	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE PEJAS EN ACCESOS A PATIOS. PERFILES TUBULARES, INCLUYE PLATINAS, PERNOS, ANCLAJES, SOLDADURAS Y PINTURA DE ACABADO.	KG	658.23	$ 9,218.00	$ 6,067,564.14
13	**CARPINTERIA DE MADERA**				
13-03	**MUEBLES**				
13-03-010	MUEBLE NICHO LLOKCI AULAS. (4.20x0.40). REPISAS EN DIVISIONES DE AGLOMERADO MELAMINICO RH CON CANTO RIGIDO 2 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A MUROS.	U	9.00	$ 1,663,595.00	$ 14,972,355.00
13-03-020	MUEBLE ESTANTERIA AULAS. (0.68x2.40). REPISAS EN DIVISIONES DE AGLOMERADO MELAMINICO RH CON CANTO RIGIDO 2 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A MUROS.	U	8.00	$ 674,336.00	$ 5,394,688.00
13-03-030	MUEBLE ESTANTERIA AULAS. (6.12x2.40). REPISAS EN DIVISIONES DE AGLOMERADO MELAMINICO RH CON CANTO RIGIDO 2 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A MUROS.	U	1.00	$ 3,976,065.00	$ 3,976,065.00
14	**ENCHAPES**				
14-01	**ENCHAPES SOBRE MUROS**				

14-01-010	ENCHAPE EN CERAMICA COLOR BLANCO MATE FORMATO 20.3 x 30.5 REF. 225000771 DE ALFA O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGA TIPO SIKA CERAM B.A. DE SIKA O EQUIVALENTE + EMBOQUILLADO.	M2	253.17	$ 42,592.00	$ 10,783,016.64
14-02	**IMPERMEABILIZACIONES Y LAVADAS DE MUROS**				
14-02-010	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS CON HIDROFUGO CON SIKA TRANSPARENTE 10 DE SIKA O EQUIVALENTE	M2	3,761.67	$ 6,892.00	$ 25,925,429.64
14-02-020	LAVADA DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO CON AGUA A PRESION	M2	3,761.67	$ 4,542.00	$ 17,085,505.14
15	**ILUMINACION**				
15-10	**REDES DE ILUMINACIÓN**				
15-10-010	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TOMA DOBLE DE CAJA NEMA 5-15R LEVITON STANDARD COLOR BLANCO O SIMILAR EN PISO, POR TUBERÍA EMT, CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWG-CU-LSZH, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA PROMEDIO A 5 METROS.	UN	242.00	$ 104,969.00	$ 25,402,498.00
15-10-010a	SUMINISTRO DE LUMINARIAS INCLUYENDO BOMBILLOS Y ACCESORIOS. INCLUYE 2 METROS DE CABLE ENCAUCHADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y ANCLAJES EN GUAYA DE Ø1/16" CON PERROS DE FIJACIÓN Y ANCLAS RL-38.				
15-10-020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTIHUMEDAD HERMÉTICA 4X9W A VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, CON ALTO FACTOR DE POTENCIA, PANTALLA EN POLICARBONATO ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	27.00	$ 208,760.00	$ 5,636,520.00
15-10-030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER CON ACRÍLICO TUBO CORRIDO LED 4X9W CON DRIVER A VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, PANTALLA EN ACRÍLICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	116.00	$ 216,625.00	$ 25,128,500.00
15-10-040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER CON ACRÍLICO TUBO CORRIDO LED 4X9W CON MODULO DE EMERGENCIA VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, PANTALLA EN ACRÍLICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	2.00	$ 459,851.00	$ 919,702.00
15-10-050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE WALL PACK LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150 W 208 V TIPO PRA HERMÉTICO DE MONTAJE ESCUALIZABLE DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO NA 150W TUBULAR CLARO, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADAS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	20.00	$ 479,375.00	$ 9,587,500.00
15-10-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE SEÑAL DE SALIDA CON AUTONOMÍA MÍNIMO MEDIA HORA O EQUIVALENTE.	UN	11.00	$ 101,724.00	$ 1,118,964.00
15-10-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO ANTORCHA SLIM EN LED DE 2 METROS DE ALTURA Y DIÁMETRO DE 11 CMS CON BASE DE PERNOS, TIPO: ELÉCTRICO POTENCIA: 4x9W TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120 – 240V 12V FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ	UN	17.00	$ 487,618.00	$ 8,289,506.00
15-10-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBRE PONER TIPO CILINDER PARA CORREDORES. POTENCIA: 18W - 2000 LMS TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120 – 240V 12V FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ	UN	49.00	$ 112,713.00	$ 5,522,937.00
15-10-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE CON AUTONOMÍA MÍNIMO MEDIA HORA O EQUIVALENTE.	UN	10.00	$ 114,979.00	$ 1,149,790.00
15-10-100	PANEL DE CONTROL # 1 - TE PORTERIA	UN	1.00	$ 1,870,000.00	$ 1,870,000.00
15-10-110a	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DE 40X40X25 CM, PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN ZONAS COMUNES, ANEXO AL TABLERO TE ILUMINACION EMERGENCIA, CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 18, CON DOBLE PUERTA DE METAL PARA LOS SELECTORES Y DE VIDRIO AHUMADO CON CERRADURA MAESTRA DE LLAVE TIPO BOMBÍN DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :				
15-10-110b	• UN (1). INTERRUPTOR DE 2X6 A TIPO RIEL DIN CURVA C PARA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL.				
15-10-110c	• CUATRO (4) TELERRUPTOR DE 16A 120 VAC MONOPOLARES				
15-10-110d	• SEIS (6) TELERRUPTOR DE 16A 220 VAC BIPOLARES				
15-10-110e	• CUATRO (4) AUXILIARES ADAPTABLES PARA TELERRUPTOR PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN EN MANDO CENTRALIZADO				
15-10-110f	• CUATRO (4) CONMUTADORES DE MULETILLA CONTACTO MOMENTÁNEO 2 POSICIONES. ON-OFF, BORNERAS, CANALETAS DE CABLEADO Y TERMINALES DE IDENTIFICACIÓN.				
15-10-110g	- CANALETA RANURADA CON TAPA, FRENOS, PANTALLAS LATERALES - 15 BORNERAS EN RIEL DIN 27 A, PARA SALIDA DE FUERZA - 15 BORNERAS EN RIEL DIN 27 A, PARA SALIDAS DE CONTROL				
15-10-110h	TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN ENSAMBLADOS Y CABLEADOS DE FÁBRICA SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGAS Y DETALLES MOSTRADOS EN PLANOS.				
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
16-01	**APARATOS SANITARIOS**				
16-01-020	SANITARIO INSTITUCIONAL DE TANQUE REF. CYCLONE ULTRA DE CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA Y ASIENTO INSTITUCIONAL	U	6.00	$ 941,007.00	$ 5,646,042.00
16-01-030	SANITARIO INFANTIL REF. KIDDY DE CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO / BICOLOR. INCLUYE GRIFERIA COMPLETA Y ASIENTO INFANTIL.	U	15.00	$ 520,934.00	$ 7,814,010.00
16-01-050	LAVAMANOS DE PEDESTAL CORTO REF. FREE DE CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA MESA REF. PUSH MAX MX10.000 DE CORONA O EQUIVALENTE.	U	6.00	$ 504,764.00	$ 3,028,584.00

16-01-220	ORINAL INSTITUCIONAL FLUXOMETRO REF. GOTA EP DE CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH Y GRAPAS.	U	4.00	$ 921.090,00	$ 3,684,360.00
16-02	**ACCESORIOS**				
16-02-010	BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE Ø2" REF. 706550001 DE CORONA O EQUIVALENTE	U	1.00	$ 141.995,00	$ 141,995.00
16-02-020	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE REF. 210799 DE SOCODA O EQUIVALENTE	U	21.00	$ 120.213,00	$ 2,524,473.00
16-02-030	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 210797 DE SOCODA O EQUIVALENTE	U	16.00	$ 120.213,00	$ 1,923,408.00
16-02-040	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE REF. 210806 DE SOCODA O EQUIVALENTE	U	16.00	$ 425.522,00	$ 6,808,352.00
16-02-050	REJILLA DE PISO CUADRADA CON SOSCO 3" X 2" EN ALUMINIO Y BRONCE TIPO COLREJILLAS O EQUIVALENTE	U	25.00	$ 13.236,00	$ 304,428.00
16-03	**GRIFERIAS**				
16-03-010	GRIFERIA PARA LAVAMANOS Y LAVAPINCELES ANTIVANDALICA PUSH DE PARED REF. 94711000 DE CORONA O EQUIVALENTE	U	36.00	$ 265.033,00	$ 9,541,188.00
16-03-020	DUCHA INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA CON REGADERA EMPOTRADA . DE CORONA O EQUIVALENTE	U	4.00	$ 476.982,00	$ 1,907,928.00
16-03-030	GRIFERIA PARA LAVAMANOS QUIRURGICO CUELLO DE GANSO REF. TLA-13 + VALVULA DE PEDAL REF. TLF-12 DE TXG O EQUIVALENTE.	U	1.00	$ 445.132,00	$ 445,132.00
16-03-040	LLAVE PARA RIEGO REF. JARDIN PESADA CROMADA PARA EXTERIORES DE CORONA O EQUIVALENTE.	U	8.00	$ 52.447,00	$ 419,576.00
16-04	**MUEBLES**				
16-04-010	MESON DE LAVAMANOS A: 0,55 M. DE QUASAR O EQUIVALENTE COLOR AZUL #6. SALPICADEROS H: 0.10 M. + FALDON FRONTAL H: 0,16 M. CON 3 LAVAMANOS INTEGRADOS Ø 0,30 M. Y H: 0,11 M. AULAS SENCILLAS - L: 2,10 M. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	U	3.00	$ 2.109.491,00	$ 6,328,473.00
16-04-020	MESON DE LAVAMANOS A: 0,55 M. DE QUASAR O EQUIVALENTE COLOR AZUL #6. SALPICADEROS H: 0.10 M. + FALDON FRONTAL H: 0,16 M. CON 2 LAVAMANOS INTEGRADOS Ø 0,30 M. Y H: 0,11 M. AULAS DOBLES - L: 1,50 M. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	U	6.00	$ 1.410.937,00	$ 8,465,622.00
16-04-030	MESON DE LAVAMANOS A: 0,55 M. DE QUASAR O EQUIVALENTE COLOR AZUL #6. SALPICADEROS H: 0.10 M. + FALDON FRONTAL H: 0,16 M. CON 3 LAVAMANOS INTEGRADOS Ø 0,30 M. Y H: 0,11 M. COMEDOR - L: 2,50 M. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.	U	1.00	$ 2.456.066,00	$ 2,456,066.00
16-04-040	LAVAPINCELES CORRIDO A: 0,50 M. DE QUASAR O EQUIVALENTE COLOR AZUL #6. SALPICADEROS H: 0.10 M. + FALDON FRONTAL H: 0,20 M. AULAS - L: 1,40 M. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS	U	9.00	$ 1.317.884,00	$ 11,860,956.00
16-04-050	LAVAMANOS QUIRURGICO REF. 238427 LG DE SOCODA O EQUIVALENTE, INCLUYE REJILLA DESAGUE Y ANCLAJE A MUROS	U	1.00	$ 1.952.873,00	$ 1,952,873.00
16-04-900	MUEBLE COCINETA PROFESORES: MESON EN ACERO INOXIDABLE + SALPICADERO Y POZUELOS - MUEBLE BAJO Y ALTO EN MADECOR RH ACABADO MADERA SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTONICOS.	M	1.80	$ 847.141,00	$ 1,528,453.80
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**				
17-01	**CIELOS RASOS**				
17-01-010	CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO, INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.	M2	165.24	$ 43.061,00	$ 7,115,399.64
17-02	**DIVISIONES**				
17-02-010	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA O EQUIVALENTE, PARALES, DIVISIONES, PUERTAS Y ACCESORIOS	M2	25.86	$ 543.068,00	$ 14,043,738.48
18	**PINTURAS**				
18-01	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
18-01-010	PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN CONCRETO TIPO EPOXIPOLIAMIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	296.46	$ 14.660,00	$ 4,346,103.60
18-01-100	ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUFA ACRILICO DE SIKA O EQUIVALENTE SOBRE MUROS	M2	296.46	$ 15.766,00	$ 4,673,988.36
18-05	**PINTURA SOBRE CIELOS**				
18-05-010	PINTURA EPOXICA SOBRE CIELOS EN ESTUCO TIPO EPOXIPOLIAMIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	76.29	$ 15.859,00	$ 1,209,883.11
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**				
19-03	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				
19-03-010	ESPEJOS EN BAÑOS DE 5 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO CALIDAD FELCAR O EQUIVALENTE, INCLUYE ANCLAJES A MUROS.	M2	31.01	$ 169.220,00	$ 5,247,512.20
20	**OBRAS EXTERIORES**				
20-02	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**				
20-02-010	PISO VEHICULAR EN ADOQUIN DE CONCRETO HEXAGONAL 20x17x8. PREFABRICADOS O EQUIVALENTE, INCLUYE CAMA DE ARENA E: 0.04 M.	M2	340.41	$ 81.659,00	$ 27,797,540.19
20-02-030	PISO EN PATIOS DE RECREACION EXTERIOR, COMBINACION ADOQUIN DE CONCRETO HEXAGONAL 20x17x8 DE EL CONDOR PREFABRICADOS O EQUIVALENTE Y GRAMA ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES DEL ASESOR DE PAISAJISMO, INCLUYE CAMA DE ARENA E: 0.04 M.	M2	13.83	$ 96.601,00	$ 1,335,991.83

20-02-040	PISO EN ZONAS DE JUEGO INTERIOR, COMBINACION DE TRONCOS DE MADERA + APENERO, TRONCOS DIAMETRO VARIABLE - H: 0.30 M. + APENERO H: 0.15 M.	M2	63.14	$ 29,297.00	$ 1,849,812.58
20-02-060	DECK EN MADERA TECNOLOGICA REF. WOODPECKER COLOR GRIS GALERAS ACABADO ACANALADO O EQUIVALENTE, INCLUYE CARGUERAS DE SOPORTE	M2	26.35	$ 166,266.00	$ 4,433,809.10
20-02-070	PISO EN CAUCHO RECICLADO TIPO ECOELASTIC MIX E: 20 MM. COLOR 50/50. O EQUIVALENTE SOBRE TRITURADO E: 0.07 M.	M2	103.00	$ 233,332.00	$ 24,033,196.00
20-02-500	ZAPATAS PARA FUNDIACIONES DE ELEMENTOS URBANOS EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	27.78	$ 456,619.00	$ 12,684,875.82
20-02-600	BORDILLO EN CONCRETO F'C 21 MPA - H: 0.65 M. - E: 0.12 M. PARA CONFORMACION DEPRIMIDOS IRREGULARES, INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y MORTERO POBRE PARA CONTRAFUERTES Y BASE	M	35.61	$ 55,111.00	$ 1,962,502.71
20-02-602	BORDILLO EN CONCRETO F'C 21 MPA - H: 0.20 M. - E: 0.10 M. PARA CONFORMACION DEPRIMIDOS RECREATIVOS CUBIERTOS, INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y MORTERO POBRE PARA CONTRAFUERTES Y BASE	M	26.82	$ 30,076.00	$ 806,638.32
20-02-604	BORDILLO EN CONCRETO F'C 21 MPA - H: 0.40 M. - E: 0.10 M. PARA CONFORMACION DEPRIMIDOS RECREATIVOS CUBIERTOS, INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y MORTERO POBRE PARA CONTRAFUERTES Y BASE	M	5.32	$ 43,356.00	$ 230,648.60
20-02-610	MURETE EN CONCRETO F'C 21 MPA - H: 0.62 M. - E: 0.15 M. PARA HUERTA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	8.63	$ 76,652.00	$ 661,508.76
20-02-620	BORDILLO PREFABRICADO FICHA A-10 DE LA CARTILLA DE ANDENES DEL IDU, INCLUYE EXCAVACION Y MORTERO DE BASE Y JUNTAS	M	253.53	$ 77,183.00	$ 19,568,205.99
20-03	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**				
20-03-000	BANCA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA, A: 0.40 M. x L: 2.00 M. SOPORTE EN PLATINAS Y ANGULOS METALICOS SEGÚN DETALLES DE ARQUITECURA, INCLUYE ANCLAJES A ZAPATA DE FUNDACION	U	10.00	$ 166,912.00	$ 1,669,120.00
20-03-200	CICLOPA PIQUEADERO TIPO 2 FICHA M-101, INCLUYE ANCLAJES A FUNDIACION	U	1.00	$ 568,560.00	$ 568,560.00
20-03-500	MURETE DE CERRAMIENTO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA, A: 0.30 M. x H: 0.90 M. PARA CERRAMIENTO	M	102.89	$ 164,152.00	$ 16,889,599.28
20-03-510	MALLA DE CERRAMIENTO TIPO SED, SISTEMA DE PARALES + MALLA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, INCLUYE ANCLAJES A MURO DE CERRAMIENTO	M	102.89	$ 357,196.00	$ 36,751,896.44
20-03-800	MODULO 1 - AREA RECREATIVA CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA EN TUBULARES 2"X2" + RECUBRIMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO FORMALETA 19mm + ACABADO DE PISO EN CAUCHO RECICLADO TPO ECOLASTIC MIX E. 20 MM COLOR 50/50 O EQUIVALENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA	U	1.00	$ 6,549,957.00	$ 6,549,957.00
20-03-810	MODULO 2 - AREA RECREATIVA CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA EN TUBULARES 2"X2" + RECUBRIMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO FORMALETA 19mm + ACABADO DE PISO EN CAUCHO RECICLADO TPO ECOLASTIC MIX E. 20 MM COLOR 50/50 O EQUIVALENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA	U	1.00	$ 4,066,232.00	$ 4,066,232.00
20-03-820	MODULO 3 - AREA RECREATIVA CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA EN TUBULARES 2"X2" + RECUBRIMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO FORMALETA 19mm + ACABADO DE PISO EN CAUCHO RECICLADO TPO ECOLASTIC MIX E. 20 MM COLOR 50/50 O EQUIVALENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA	U	1.00	$ 4,895,574.00	$ 4,895,574.00
20-03-830	MODULO 4 - AREA RECREATIVA CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA EN TUBULARES 2"X2" + RECUBRIMIENTO EN TABLERO AGLOMERADO FORMALETA 19mm + ACABADO DE PISO EN CAUCHO RECICLADO TPO ECOLASTIC MIX E. 20 MM COLOR 50/50 O EQUIVALENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA	U	1.00	$ 6,159,953.00	$ 6,159,953.00
20-05	**OTROS - ZONAS EXTERIORES**				
20-05-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	5,278.26	$ 3,020.00	$ 15,940,345.20

26	**EQUIPOS ESPECIALES**				
26-03	**DOTACION COCINA**				
26-03-000	MESON CON POCETA 2.20x0.60x0.90 M. ACERO INOX CAL 16 REF. 304 - 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS, SALPICADERO H: 0.15 M. + 1 POCETA 60x40x30 + ENTREPAÑO BAJO CAL 18 Y PATAS TUBULARES 1 1/2" DE FPOACEROS O EQUIVALENTE, INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF. CAMBRIA MONOCONTROL C85000001 DE CORONA O EQUIVALENTE.	U	1.00	$ 3,375,147.00	$ 3,375,147.00
26-03-065	MESON CON DOBLE POCETA 4.60x0.70x0.90 M. ACERO INOX CAL 16 REF. 304 - 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS, SALPICADERO H: 0.15 M. + 2 POCETAS 60x50x30 + ENTREPAÑO BAJO CAL 18 Y PATAS TUBULARES 1 1/2" , INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF. CAMBRIA MONOCONTROL C85000001 DE CORONA O EQUIVALENTE.	U	1.00	$ 7,253,401.00	$ 7,253,401.00
26-03-110	POCETA LAVAOLLAS 0.80x0.80x0.90 M. ACERO INOX CAL 16 REF. 304 - 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS, SALPICADERO H: 0.15 M. + 1 POCETA 70x70x30 + ENTREPAÑO BAJO CAL 18 Y PATAS TUBULARES 1 1/2" , INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF. CAMBRIA MONOCONTROL C85000001 DE CORONA O EQUIVALENTE.	U	1.00	$ 2,045,423.00	$ 2,045,423.00
26-03-170	MESON EN L CON TRIPLE POCETA Y SHUTE PARA BASURAS 6.38x0.70x0.90 M. ACERO INOX CAL 16 REF. 304 - 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICOS, SALPICADERO H: 0.15 M. + 3 POCETAS 60x50x30 + ENTREPAÑO BAJO CAL 18 Y PATAS TUBULARES 1 1/2" DE FPOACEROS O EQUIVALENTE, INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF. CAMBRIA MONOCONTROL C85000001 DE CORONA O EQUIVALENTE.	U	1.00	$ 10,325,285.00	$ 10,325,285.00
26-03-420	VENTANA DE PASO 1.20x0.50x0.60 M. MARCO A1 MURO CON 2 ENTREPAÑOS A: 0.35 M. EN ACERO INOX CAL. 18 REF. 304-2B DE .	U	1.00	$ 1,550,703.00	$ 1,550,703.00
26-03-520	ESTANTERIA PARA DEPOSITO 1.45x0.50x1.80 M. ACERO INOX CAL 18, REF. 304-2B ANTIACIDO Y MAGNETICO CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y PARALES EN ANGULO 5x5 CAL. 16	U	1.00	$ 1,912,007.00	$ 1,912,007.00
26-03-530	ESTANTERIA PARA DEPOSITO 1.15x0.50x1.80 M. ACERO INOX CAL 18, REF. 304-2B ANTIACIDO Y MAGNETICO CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y PARALES EN ANGULO 5x5 CAL. 16	U	2.00	$ 1,516,419.00	$ 3,032,838.00
26-03-600	CARCAMO COCINA 1.10x0.20x0.07 M. ACERO INOX CAL 20 REF. 304, DOBLADA, REJILLA EN ANGULO Y PLATINAS 1"x1/8" + TUBO DE SALIDA DE 1 1/2"	U	2.00	$ 1,228,191.00	$ 2,456,382.00
26-03-610	CARCAMO COCINA 1.00x0.20x0.07 M. ACERO INOX CAL 20 REF. 304, DOBLADA, REJILLA EN ANGULO Y PLATINAS 1"x1/8" + TUBO DE SALIDA 1 1/2"	U	6.00	$ 1,036,440.00	$ 6,218,640.00

26-03-620	CARCAMO COCINA 1.20x0.20x0.07 M. ACERO INOX CAL 20 REF. 304. DOBLADA. REJILLA EN ANGULO Y PLATINAS 1"x1/8" + TUBO DE SALIDA 1 1/2"	U	4.00	$ 1.243.728.00	$ 4,974,912.00								
26-03-630	CARCAMO COCINA 0.90x0.20x0.07 M. ACERO INOX CAL 20 REF. 304. DOBLADA. REJILLA EN ANGULO Y PLATINAS 1"x1/8" + TUBO DE SALIDA 1 1/2"	U	2.00	$ 1.036.440.00	$ 2,072,880.00								
26-03-640	CARCAMO COCINA 1.27x0.20x0.07 M. ACERO INOX CAL 20 REF. 304. DOBLADA. REJILLA EN ANGULO Y PLATINAS 1"x1/8" + TUBO DE SALIDA - 1 1/2"	U	1.00	$ 1.316.278.00	$ 1,316,278.00								
26-03-650	CARCAMO COCINA 1.40x0.20x0.07 M. ACERO INOX CAL 20 REF. 304. DOBLADA. REJILLA EN ANGULO Y PLATINAS 1"x1/8" + TUBO DE SALIDA 1 1/2"	U	1.00	$ 1.451.016.00	$ 1,451,016.00								
26-03-730	CAMPANA EXTRACTORA A PARED 5.00x1.20x0.60 M. ACERO INOX CAL 20 ACABADO 2B ANTIACIDOS Y MAGNETICO, FILTRO REJILLA Y CAJAS RECOLECTORAS DE GRASAS, INCLUYE ANCLAJES A MURO.	U	1.00	$ 9,401,802.00	$ 9,401,802.00								
26-03-800	EXTRACTOR TIPO HONGO MODELO 240	U	2.00	$ 8.053.297.00	$ 16,106,594.00								
26-03-810	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	M	29.00	$ 428,930.00	$ 8,578,800.00								
26-03-820	PROTECTOR DE MOTOR PARA EXTRACTOR 6-8 AMP	U	2.00	$ 1.017.225.00	$ 2,034,450.00								
26-03-900	TRAMPA DE GRASA 0.55x0.45x0.30 M. EN ACERO INOX CAL 16 REF. 304-2B CON TANQUE DE DEPOSITO Y SEPARADORES INTERNOS.	U	1.00	$ 1.229.066.00	$ 1,229,066.00								
	DIFERENCIA PROPUESTA VS CONTRATO				$ 0.35								
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 3,048,015,729.00**		**$ 66,233,078.44**				**$ 66,233,078.44**	**2.2%**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO			$ 3,048,015,729.00		$ 66,233,078.44				$ 66,233,078.44	2.17%			
A. I. U.	(	32.80%)	$ 999,749,159.00		$ 21,724,449.73				$ 21,724,449.73	2.17%			
VALOR TOTAL			$ 4,047,764,888.00		$ 87,957,528.17				$ 87,957,528.17	2.17%			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(	25.00%)	$ 809,552,977.00		$ 21,989,382.04				$ 21,989,382.04	2.72%			
VALOR A PAGAR					$ 65,968,146.13				$ 65,968,146.13				
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA					$ 0.13				-$ 0.13				
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO					$ 65,968,146.00				$ 65,968,146.00				

SALDO DEL CONTRATO	**$ 3,172,243,765.00**	SALDO POR AMORTIZAR	$787,563,594.96	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C.C.

CONSTRUCTORA M Y S S.A.S
900.361.854-6
CESAR RAUL GONZALEZ ERAZO
98.385.998 DE PASTO

NOMBRE DE INTERVENTORA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C.C.

ETA ELSA TORRES ARENALES
63.323.375-2
ELSA TORRES ARENALES
63.323.375 DE BUCARAMANGA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA (CONTRATOS PRECIO UNITARIO FIJO)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MyS Constructora NIT. 900.361.854-6	MEMORIAS DE CORTE DE OBRA N° 1
PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.			


CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO	2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON							
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ETA-ELSA TORRES ARENALES	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR958234 DE 2019					
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR938211 DE 2019					

HOJA # 1

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	01
ITEM:	OBRAS PRELIMINARES			REF.	01-01
ITEM:	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	UND.	M3	REF.	01-01-030

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS				DESC. VACIOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
			LARGO (Ml.)	ANCHO (Ml.)	AREA (M2)	ALTO		L	a	h		
LOCALIZACION Y REPLANTEO												
Presenta Acta		piso 1 lote	68,31	33,52	2 290,06	0,17					377,86	377,86
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00
SUB TOTAL												377,86
SUB TOTAL GENERAL												377,86
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA												377,86
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR												0,00
TOTAL												377,86

CROQUIS

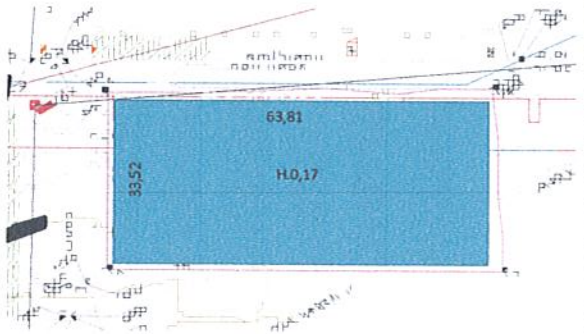

Nota: se cobra el 100 % del descapote

CANTIDAD CONTRACTUAL	377,86
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	377,86
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria. Para el caso de [illegible] como es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVETORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA						
PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	NIT. 900.361.854-6	MEMORIAS DE CORTE DE OBRA N° 1			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO	2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON							
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ETA-ELSA TORRES ARENALES	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR956234 DE 2019					
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR938211 DE 2019					

HOJA # 1

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	01
ITEM:	OBRAS PRELIMINARES			REF.	01-01
ITEM:	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	UND.	M2	REF.	01.01.100

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS				DESC. VACIOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
			LARGO (ML)	ANCHO (ML)	AREA (M2)	ALTO		L	a	h		
LOCALIZACION Y REPLANTEO												
Presenta Acta		piso 1 lote	60,00	23,75	1.425,23	-					1.425,23	1.425,23
					-						-	0,00
											-	
											-	
												0,00
					-						-	0,00
												0,00
					-						-	0,00
											-	0,00
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00
		1425,23										
SUB TOTAL												1.425,23
SUB TOTAL GENERAL												1.425,23
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA												1.425,23
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR												0,00
TOTAL												1425,23

CROQUIS



Nota:	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.425,23
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	1425,23
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. Para el caso de despiece de hierros, como es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ. NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVETORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA (CONTRATOS PRECIO UNITARIO FIJO)		MEMORIAS DE CORTE DE OBRA N° 1
PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MyS Constructora NIT. 900.361.854-6


CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO 2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON						
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ETA-ELSA TORRES ARENALES	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR958234 DE 2019				
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR938211 DE 2019				

HOJA # 1

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	01
ITEM:	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			REF.	01-03
ITEM:	TALA ARBOLES CLASE I - H<5.00 M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	UND.	UN	REF.	01-03-010

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD	ANCHO (ML)	AREA (M2)	ALTO	DESC. VACIOS	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO												
Presenta Acta		LOTE COLEGIO PRIMER INFANCIA	6,00								6,00	6,00
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00
SUB TOTAL												6,00
SUB TOTAL GENERAL												6,00
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA												6,00
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR												0,00
TOTAL												6,00

CROQUIS

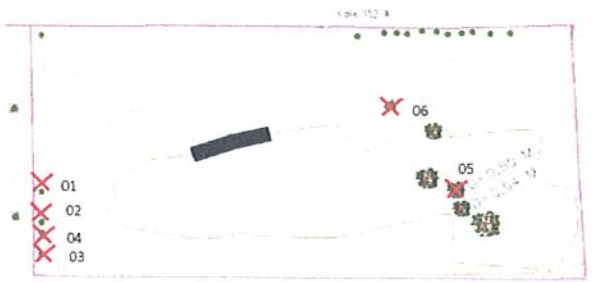

Nota:	
CANTIDAD CONTRACTUAL	7,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	6,00
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. Para el caso de [illegible] como es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ. NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVETORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA (CONTRATOS PRECIO UNITARIO FIJO)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MyS Constructora NIT. 900.361.854-6	MEMORIAS DE CORTE DE OBRA Nº 1
PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.			


CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO	2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON							
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ETA-ELSA TORRES ARENALES	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCONTR958234 DE 2019					
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCONTR938211 DE 2019					

HOJA # 1

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	01
ITEM:	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			REF.	01-03
ITEM:	TALA ARBOLES CLASE II - H<10.00 M. - H>5.00 M. - INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	UND.	UN	REF.	01-03-020

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS				DESC. VACIOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
			CANTIDAD	ANCHO (ML)	AREA (M2)	ALTO		L	a	h		
LOCALIZACION Y REPLANTEO												
Presenta Acta		LOTE COLEGIO PRIMER INFANCIA	2,00								2,00	2,00
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00
SUB TOTAL												2,00
SUB TOTAL GENERAL												2,00
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA												2,00
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR												0,00
TOTAL												2,00

CROQUIS

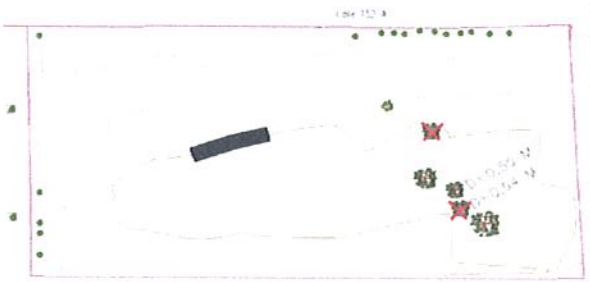

Nota:	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	2,00
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del metodo de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. Para el caso de despiece de hierros, copia es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ. NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo Bo. INTERVENTORIA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
(CONTRATOS PRECIO UNITARIO FIJO)

PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MyS Constructora
NIT. 900.361.854-6

MEMORIAS DE CORTE DE OBRA Nº 1


CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO	2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR958234 DE 2019					
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ETA-ELSA TORRES ARENALES							
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR938211 DE 2019					

HOJA # 1

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	01
ITEM:	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			REF.	01-03
ITEM:	TALA ARBOLES CLASE III - H<20.00 M. - H>10.00 M. - INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	UND.	UN	REF.	01-03-030

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS				DESC. VACIOS	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
			CANTIDAD	ANCHO (ML)	AREA (M2)	ALTO		L	a	h		
LOCALIZACION Y REPLANTEO												
Presenta Acta		LOTE COLEGIO PRIMER INFANCIA	2,00								2,00	2,00
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00
SUB TOTAL												2,00
SUB TOTAL GENERAL												2,00
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA												2,00
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR												0,00
TOTAL												2,00

CROQUIS

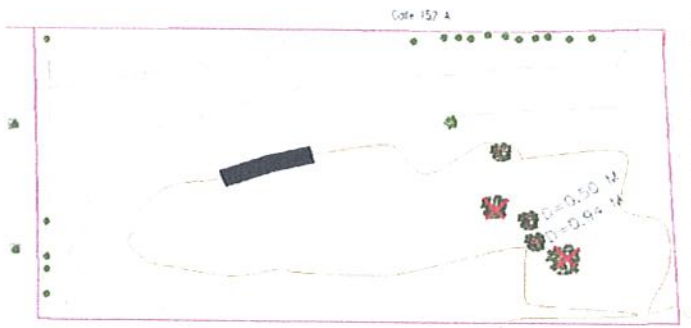

Nota:	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	2,00
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excel del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. Para el caso de despiece de hierros, como es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ. NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVETORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA (CONTRATOS PRECIO UNITARIO FIJO)			MEMORIAS DE CORTE DE OBRA Nº 1
PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	M y S Constructora NIT. 900.361.854-6	


CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO	2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON							
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ETA-ELSA TORRES ARENALES	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCONTR958234 DE 2019					
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCONTR938211 DE 2019					

HOJA # 1

CAPITULO	CIMENTACION			REF.	02
ITEM:	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			REF.	02-01
ITEM:	EXCAVACION MECANICA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	UND.	M3	REF.	02-01-005

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS LARGO (ML)	ANCHO (ML)	AREA (M2)	ALTO	DESC. VACIOS	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO												
Presenta Acta		piso 1 lote	28,10	22,60	635,06	1,63					1.035,15	1035,15
			29,60	4,80	142,08	1,51					214,85	214,85
											-	
											-	
												0,00
					-						-	0,00
												0,00
					-						-	0,00
											-	0,00
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00

CROQUIS

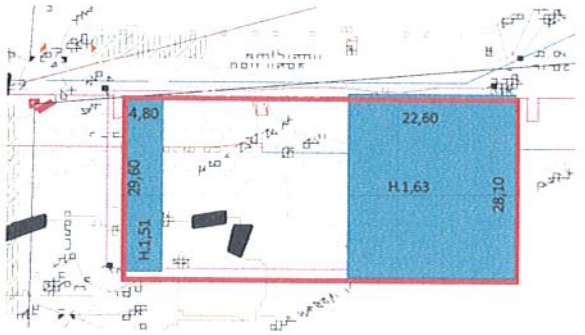

SUB TOTAL	1250,00
SUB TOTAL GENERAL	1250,00
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	1250,00
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR	0,00
TOTAL	1250,00

Nota:

CANTIDAD CONTRACTUAL	1.365,20
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	1250,00
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria. Para el caso de despiece de hierros, como es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ. NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVETORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA			
PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	NIT. 900.361.854-6	MEMORIAS DE CORTE DE OBRA Nº 1


CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA MyS	FECHA	DIA	17	MES	9	AÑO	2019
DIRECTOR TECNICO	ARQ. CARLOS PINZON	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR958234 DE 2019					
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ETA-ELSA TORRES ARENALES							
RESIDENTE INTERVENTORIA	ARQ. DAVID ROZO	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR938211 DE 2019					

HOJA # 1

CAPITULO	PRELIMINARES			REF.	01
ITEM:	OBRAS PRELIMINARES			REF.	01-01
ITEM:	LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	UND.	m2	REF.	01-01-110

PERIODO	EXTERIORES	AREA DE EJECUCION	ELEMENTOS LLENOS LARGO (ML)	ANCHO (ML)	AREA (M2)	ALTO	DESC. VACIOS	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO												
Presenta Acta		URBANISMO	68,00	34,47	2.344,29						919,06	919,06
			60,00	23,75	1.425,23							
					919,06							
VIENEN DE ACTA ANTERIOR												0,00
SUB TOTAL												919,06
SUB TOTAL GENERAL												919,06
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA												919,06
DESCUENTO CANTIDAD MAYOR												0,00
TOTAL												919,060

CROQUIS

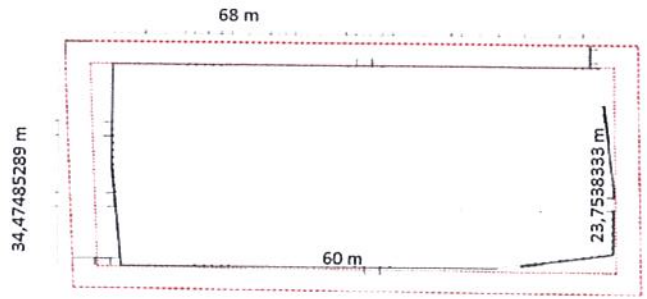

Nota:

CANTIDAD CONTRACTUAL	919,06
ACUMULADO ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	919,06
CANTIDAD MAYOR PRESENTE ACTA	0,00

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes, a seguir:

Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

El croquis es una copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. Para el caso de despiece de hierro, como es de su conocimiento, se realizará por medio del software de Codiacero

Elaboró: CONTRATISTA
ARQ. NELSON BOLIVAR
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA MyS

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ARQ. DAVID ROZO
RESIDENTE DE INTERVETORIA
ETA-ELSA TORRES ARENALES

FACTURA DE VENTA

CONSTRUCTORA MYS SAS
NIT 900361854-6
CARRERA 12 N. 13-24 NEIVA
Tel: 8641141 **Fax :** 8641141

Número: FV-00000466
Fecha: 16/10/2019

IVA REGIMEN COMUN

Tercero: 899999061-9 SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección: AVENIDA EL DORADO No 66-63 BOGOTA D.C.
Moneda : COP
Tipo Cliente : CLIENTES NACIONALES
Cond. de pago C30 CREDITO 30 DIAS
Fecha Vcto. : 16/11/2019
Notas : ACTA PARCIAL DE OBRA 1 CONTRATO CO1.PCCNTR958234 EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, PERIODO 17/07/2019 AL 15/08/2019 Y EL 18 DE SEPTIEMBRE

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
VS000000	SERVICIO CONTRATO DE OBRA CIVIL	1,0000	$66.233.078,44	$0,00	$0,00	$66.233.078,44
VS000000	ADMINISTRACION 25.80%	1,0000	$17.088.134,24	$0,00	$0,00	$17.088.134,24
VS000000	IMPREVISTOS 2%	1,0000	$1.324.661,57	$0,00	$0,00	$1.324.661,57
VS000000	UTILIDAD 5%	1,0000	$3.311.653,92	$0,00	$0,00	$3.311.653,92
VS000000	DESCUENTOS Y/O AJUSTE AL PESO	1,0000	$0,13	$0,00	$0,00	$0,13

Resolución facturacion No.18762012101006 de 2019-01-02 desde: FV-00000343 hasta: FV-00000500
Factura impresa con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Colombia

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Retenciones	Valor Documento
$87.957.528,17	$0,00	$0,00	$87.957.528,17	$0,00	$65.968.146,00

COSTO DIRECTO CORTE DE OBRA	1	$66.233.078,44
A.I.U 32,80% CORTE DE OBRA No.	1	$21.724.449,73
TOTAL CORTE DE OBRA No.	1	$87.957.528,17
AMORTIZACIÓN DEL 25% AL CORTE DE OBRA No.	1	$21.989.382,04
DESCUENTOS Y/O AJUSTE AL PESO		$0,13
VALOR A PAGAR DEL CORTE DE OBRA No.	1	$65.968.146,00

Valor letras: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

yloaiza	yloaiza	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C
Secretaria
DUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA		Otro, Cuál?			No.	958234	Fecha:	20	5	2019								
Contratista	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S.					NIT	X	C.C.		No.	900.361.854								
Dirección :	CRA.12 No.13-24					Teléfonos	3168771311												
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente									NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte					Donde realiza el aporte a Pensión						NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.													Banco						

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero	X	Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Otro		Cual?														
Beneficiario	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S.								NIT	X	C.C.		No.	900.361.854-6											
Cuenta Bancaria	0	8	5	6	0	0	0	2	6	0						Banco	BANCO BBVA			Ahorros		Corriente	X		

Fecha	4	10	2019

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14634241744

(415)7707212489984(8020) 000001463424174 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900361854	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSTRUCTORA M Y S S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
	M Y S S.A.S

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 12 13 24 BRR SANTA LIBRADA

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad@constructoramys.com	0	8641141	3168771311

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	20100604	4330	20100604		41124321		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
digo:	5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 7 61. Fecha: 2019 07 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS GARCIA CARLOS ERNESTO
985. Cargo: Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14634241744

(415)7707212489984(8020) 000001463424174 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900361854	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	13

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	04	01
72. Número:		11
73. Fecha:	20100527	20170314
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro:	20171130	20171130
77. No. Matrícula mercantil:	305744	49339
78. Departamento:	41	41
79. Ciudad/Municipio:	23	23

Vigencia:

80. Desde:	20100527
81. Hasta:	20300527

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	100 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	80	20171130	
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14634241744

(415)7707212489984(8020) 000001463424174 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900361854	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	13

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 18	2019 06 22

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadaní 13	98385998		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ONZALEZ	ERAZO	CESAR	RAUL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL SUPL 19	2019 06 06

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 13	77091883	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHON	CHARRY	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14634241744

(415)7707212489984(8020) 000001463424174 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900361854	6	Impuestos y Aduanas de Neiva (13)	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126.DV	127. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía (13)	76998800		96943

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
QUINTERO	MORA	HERNANDO	

Revisor Fiscal Suplente

2. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:

135. Fecha de nombramiento
20171130

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía (13)	77187655		156532

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CUMBE	LOSADA	DANIEL	ALFONSO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:

159. Fecha de nombramiento
20151101

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MYS
Constructora

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CONSTRUCTORA MYS S.A.S

CERTIFICA

EL PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Que la CONSTRUCTORA MYS S.A.S de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 3033 de 2013, durante la ejecución del Contrato de Obra CO1.PCCNTR958234, ha cancelado oportunamente los aportes por Sistema General de Seguridad Social Integral a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), elegidas por los empleados, cada una con los porcentajes establecidos en la Ley para el cumplimiento de las obligaciones patronales.

El presente certificado se expide en Neiva a los (04) días del mes de Octubre del año 2019 de conformidad a los documentos contables que están a disposición.

HERNANDO QUINTERO MORA
T.P. 96.943-T
REVISOR FISCAL

Cra 12 No. 13-24 Tel. 8641141 Cel. 316 877 13 11 Neiva – Huila
E-mail: constructoramyssas@gmail.com

MYS
Constructora

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CONSTRUCTORA MYS S.A.S.

CERTIFICA

Que la sociedad CONSTRUCTORA MYS S.A.S, de conformidad con la Ley 1819 de 2016 que señaló en su Artículo 65, la exoneración de pago de Aportes Parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes Declarantes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE ; por tanto la CONSTRUCTORA MYS S.A.S es sujeto pasivo de este impuesto y mensualmente se viene presentando y pagando los respectivos aportes correspondientes a los últimos 6 meses, se encuentra al día conforme a esta obligación, y realizando acorde a su responsabilidad el pago por los empleados vinculados a esta sociedad mediante contrato laboral correspondiente al cuatro por ciento (4%) para caja de Compensación Familiar en la respectiva planilla de pago de seguridad social mensualmente.

El presente certificado se expide en Neiva a los (04) días del mes de Octubre del año 2019 de conformidad a los documentos contables que están a disposición.

HERNANDO QUINTERO MORA
T.P. 96.943-T
REVISOR FISCAL

Cra 12 No. 13-24 Tel. 8641141 Cel. 316 877 13 11 Neiva – Huila
E-mail: constructoramyssas@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.699.880
QUINTERO MORA
APELLIDOS
HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1975
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00143810-M-0007699880-20081228
00090 12196A 1
6660028398



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96943-T

HERNANDO
QUINTERO MORA
C.C. 7699880
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

106739

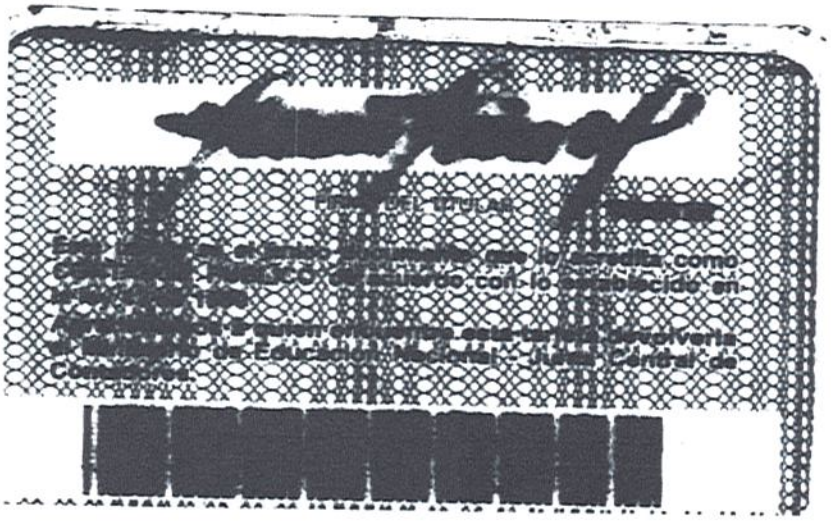

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CAB0041154420820

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CONSTRUCTORA MYS SAS

Que el contador público **HERNANDO QUINTERO MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7699880 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 96943-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.385.998**

GONZALEZ ERAZO
APELLIDOS

CESAR RAUL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-1973**
MADRID
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1991 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2300100-53140971-M-0098385998-20051228 0314905361C 02 190138476

NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTEN PETICIONES EN TRÁMITE, LO QUE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA M Y S S.A.S
SIGLA: M & S S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900361854-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : NEIVA
DOMICILIO : NEIVA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 305744
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 30 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 12,650,047,018.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 12 NO. 13-24
BARRIO : SANTA LIBRADA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 41001 - NEIVA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8641141
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3168771311
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidad@constructoramys.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 12 NO. 13-24
MUNICIPIO : 41001 - NEIVA
BARRIO : SANTA LIBRADA
TELÉFONO 1 : 8641141
TELÉFONO 2 : 3168771311
CORREO ELECTRÓNICO : contabilidad@constructoramys.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4330 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : F4321 - INSTALACIONES ELECTRICAS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO sin num DEL 27 DE MAYO DE 2010 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49339 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCTORA M Y S S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 21 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49339 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE NEIVA. Y ACTA ACLARATORIA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ORIGEN)

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-21	20171101	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-49339	20171130
AC-06-01	20141216	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	NEIVA	RM09-49339	20171130
CE-sin num	20141217	CONTADOR PUBLICO	NEIVA	RM09-49339	20171130
AC-19	20160722	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	NEIVA	RM09-49339	20171130
AC-11	20170314	ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-49339	20171130

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA M Y S S.A.S. CON NIT NO. 9003618546 ESTUVO MATRICULADA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA BAJO LA MATRICULA MERCANTIL NO. 208629 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2010, MEDIANTE ACTA DE CONSTITUCION DE FECHA 27 DE MAYO DE 2010.

QUE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA M Y S S.A.S. CON NIT NO. 9003618546 ESTUVO MATRICULADA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA BAJO LA MATRICULA MERCANTIL NO. 2845479 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2017, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2010.

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 27 DE MAYO DE 2030

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. 1) LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DIRECTA E INDIRECTA DE LA ARQUITECTURA, INGENIERIA, REFORMAS Y TODO TIPO DE CONSTRUCCION, ASESORIAS, INTERVENTORIAS, AVALUOS, YA SEA EN LA CIUDAD DE NEIVA U OTROS MUNICIPIOS DEL HUILA U OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, 2) OFRECER SUS SERVICIOS EN PROMOCION INMOBILIARIA, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REFORMAS EN GENERAL. 3) CONSTRUCCION DE CLINICA, HOSPITALES, CENTRO DE SALUD, CASA DE INTERES SOCIAL, APARTAMENTOS, CASAS, UNIDADES CAMPESTRES. 4) PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCION CIVIL Y DE MONTAJE DE NUEVAS OBRAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES. 5) OFRECER SERVICIOS DE DEMOLICION, DESMONTAJE, RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICACIONES, INSTALACIONES O OTROS OBJETIVOS EXISTENTES. 6) BRINDAR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO. 7) REALIZAR DISEÑO, PROYECCION

E INGENIERIA DE DETALLE O EJECUTIVA DE OBRAS. 8) REALIZAR ENSAMBLAJE DE COMPONENTES DE CONSTRUCCION. 9) DISEÑAR EQUIPOS, MEDIOS Y DEMAS ARTICULOS VINCULADOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 10) PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER DE APARTAMENTOS, CASAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y COMPLEMENTARIO. 11) BRINDAR SERVICIOS TECNICOS DE ASESORIA, INGENIERIA DE ORGANIZACION DE OBRAS, CONSULTORIAS Y ESTIMACION ECONOMICA EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, MONTAJE Y PRODUCCION, INCLUIDOS EN SU OBJETO EMPRESARIAL. 12) CULTIVAR Y COMERCIALIZAR DE FORMA MAYORISTA, PLANTAS ORNAMENTALES VINCULADAS AL PROCESO INVERSIONISTA. 13) OFRECER SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE CARGAS A TERCEROS CUANDO EXISTAN CAPACIDADES DISPONIBLES Y CUMPLIENDO CON LAS REGULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 14) COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, ESTOS SERVICIOS SERAN PRESTADOS YA SEA EN LA CIUDAD DE NEIVA U OTROS MUNICIPIOS DEL HUILA U OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. 15) Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES CONEXAS CON LA NATURALEZA DE LA CONSTRUCCION. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL ASI DETERMINADO LA SOCIEDAD PODRA: ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR, CONSTITUIR Y ENAJENAR INMUEBLES Y MUEBLES, MAQUINARIAS TANTO VEHICULARES COMO ESTACIONARIA E INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CONCURSOS, CONVOCATORIAS, COTIZACIONES O PROPUESTAS PUBLICAS Y PRIVADAS, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS EN EL OBJETO PRINCIPAL, RECIBIR O DAR EN HIPOTECA O PRENDA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD COMO GARANTIA DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE, ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO, GIRAR CONTRA ELLAS, CANCELAR, NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, OTORGARLOS, ENAJENARLOS, PAGARLOS, ETC. Y EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES COMERCIALES, FINANCIERAS DE SEGUROS Y NEGOCIOS JURIDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD PODRA SER SOCIA O ACCIONISTA DE CUALQUIER SOCIEDAD COMERCIAL O CIVIL.- OFRECER SUS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO SOCIAL AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO O MIXTO, DE LA ECONOMIA COLOMBIANA A TRAVES DE SUS MISMOS ACCIONISTAS O EMPLEADOS Y DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CONTRATADAS. PARAGRAFO: ES CONTRARIO AL OBJETO SOCIAL GARANTIZAR, RESPALDAR, FIAR O AVALAR DEUDAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, DISTINTAS DE AQUELLAS PERSONA JURIDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA O ESTE VINCULADA ECONOMICAMENTE O EN LAS QUE SEA PROPIETARIA DE ACCIONES O CUOTAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 06 DE JUNIO DE 2019 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 54124 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	GONZALEZ ERAZO CESAR RAUL	CC 98,385,998

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 06 DE JUNIO DE 2019 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 54124 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	PACHON CHARRY JUAN DIEGO	CC 7,709,183

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DE CODIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY. 12. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/ O CONSORCIOS PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL NO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER OPERACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL EN CUANTÍA INDETERMINADA.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 07 DEL 30 DE ENERO DE 2015 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 49339 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	QUINTERO MORA HERNANDO	CC 7,699,880	96943-T

CERTIFICA

ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRA LOS SIGUIENTES ORGANOS: 1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 2. GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.

DEL REPRESENTANTE LEGAL: ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL GERENTE GENERAL SERA REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES,

OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN ACTUARA CON LAS MISMAS FACULTADES QUE AQUEL, PERO CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS. LOS REPRESENTANTES LEGALES TENDRAN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES MUNICIPALES

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE NEIVA Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $5,800

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siineiva.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 7jy4A2HTGT

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****
