CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
SERVICIO AL CIUDADANO
FC
Radicación E-2019-61733
Fecha 03-04-19-16:42
Recibido por Nestor López
Dep: 4300

Bogotá D.C, 3 de abril de 2019

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Atn. ANTONIO ORLANDO MORALES AFRICANO
Supervisor contrato No CO1.PCCNTR.695946
Bogotá D.C

CVN-BP-596946-062

Ref.: Contralo de Interventoria No. CO1.PCCNTR.695946. .INIERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AIIIPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED".

Asunto: Remisión de informe mensual No.1 documentación para pago de contratista

Respetada Arquitecto:

Anexo al presente remitimos el informe mensual No1 que comprende el dia 15 de febrero del 2019 al 25 de marzo del 2019 junto con la respectiva documentación para el pago los cuales son:

1. **Gestión financiera**
   - Acta Parcial No.01 (20 folios)
   - Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutada (5 folios)
   - Cartera topográfica excavación y relleno (2 folios)
   - Certificado Paz y Salvo aportes parafiscales (2 folios)
   - FURC (1 folio)
   - Factura No. FV-00000383 Correspondiente a l Acta Parcial No.01 (1 Folio)
   - Resolución Facturación (2 folios)
   - Certificado bancario

2. Gestión documental
- Certificado de pago de las obligaciones de seguridad social
- Informe mensual técnico, jurídico, administrativo, legal y financiero
- Informe mensual ambiental y SG-SST interventoría y contratista

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR

Dirección: Carrera 56 # 153-15 Interior 1 Ofic. 302, Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 3007441, Celular: 317 3740811
E – mail: cvnporvenirbosa@gmail.com

2019

INFORME DE EJECUCION DE OBRA
JARDIN PORVENIR BOSA

INFORME MENSUAL No. 01

PERIODO DE 26/02/2019 AL 25/03/2019

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.699128

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.



MyS Constructora

CONSTRUCTORA M y S S.A.S
Nit: 900.361.854-6

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 Localización General del Proyecto 4

3. INFORMACIÓN GENERAL 5

3.1 Información del Contrato 5

3.2 Personal Obra 5

3.3 Horarios de Trabajo 5

4. EJECUCIÓN OBRA CIVIL 6

4.1 Porcentajes de Incidencia y Avance 6

4.2 Resumen Actividades Ejecutadas por Semanas 7

4.3 Avance Actividades por Capítulos 23

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 37

5.1 Señalización Obra 37

5.2 Aseo Obra y Exteriores 37

ANEXOS

Anexo 1: Registro Fotográfico Semanas 19 – 22

Anexo 2: Listado de Personal

Anexo 3: Pago de Seguridad Social y Aportes

Anexo 4: Cuadro de Lluvias

Anexo 5: Relación de Maquinaria y/o Equipos en Obra

Anexo 6: Certificados de Calidad Materiales

Anexo 7: Copia de Bitácora

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo corresponde al primer periodo de ejecución de la obra, que va desde su fecha de inicio el 26 de febrero de 2019 al 25 de marzo de 2019, y cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED".

Esta información contempla datos correspondientes a avances de actividades, registro fotográfico y documentación previa y necesaria para llevar a cabalidad el desarrollo de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización General del Proyecto: El Proyecto se encuentra ubicado en Bosa, localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia. Se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad.

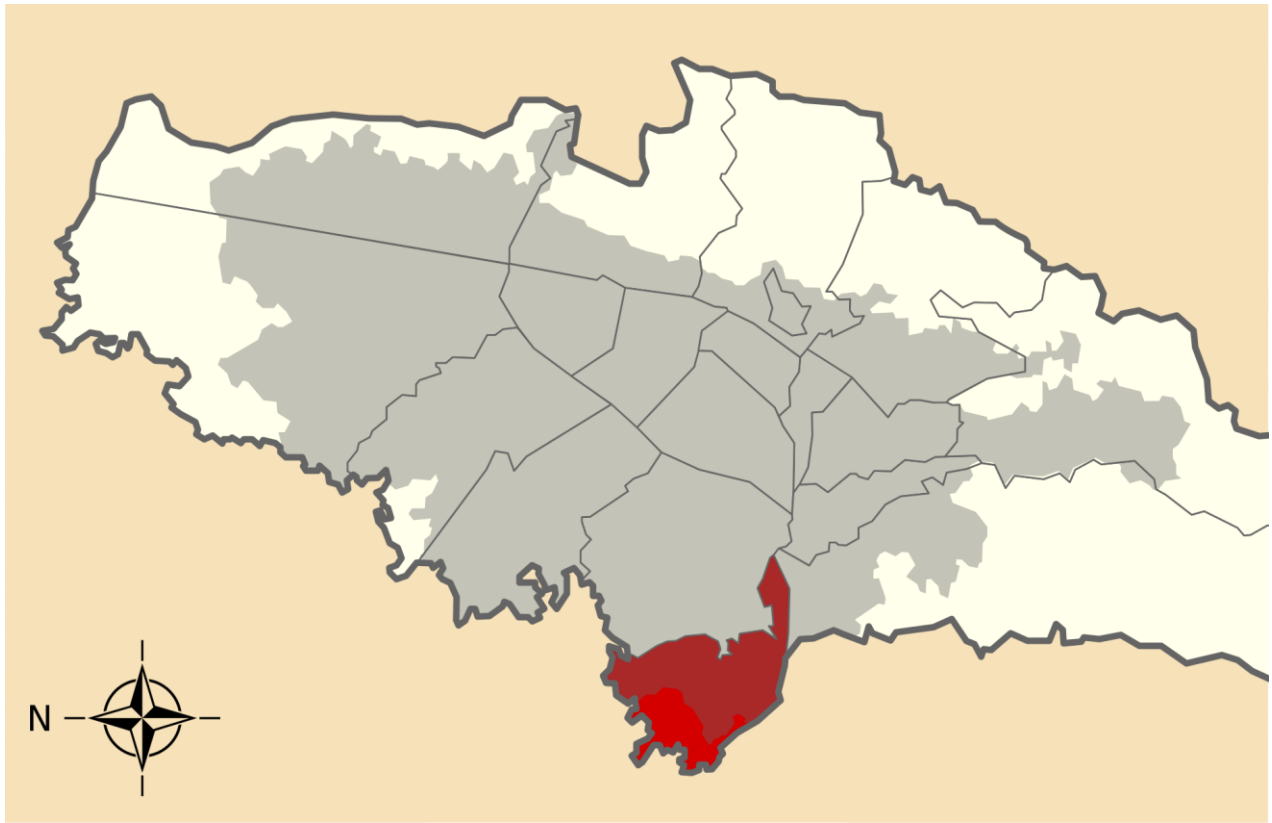


Grafico No. 01: Localización General del Proyecto.

3. INFORMACION GENERAL

3.1 Información del Contrato

En el siguiente cuadro se resume la información relacionada con el Contrato suscrito con LA Secretaria de Educación del Distrito – SED y la Constructora M y S S.A.S

NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.699128
OBJETO	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED".
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M y s S.A.S
FECHA DE ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL	$4.516.124.444,000
VALOR ANTICIPO	**$903.224.888,00**
INTERVENTOR	CVN INGENIERIA & ARQUITECTURA

Cuadro No. 01: Información Contrato

3.2 Personal

A corte del presente documento la Constructora M y S S.A.S, doce (12) trabajadores, entre personal administrativo y subcontratista

3.3 Horario de trabajo

Actualmente estamos trabajando en el siguiente horario:

DÍA DE LA SEMANA	HORARIO
Turno de Lunes a Viernes	7:00 a.m. a 12:00 m - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Turno de Sábados	7:00 a.m. a 12:00 m.

Cuadro No. 02: Horario de Trabajo

4. EJECUCIÓN OBRA CIVIL

4.1 Porcentaje de Incidencia por Capítulos

A continuación, se muestra el cuadro con todos los capítulos que componen el contrato de obra civil, y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos dentro del contrato, para un mayor control de los avances de ejecución de cada actividad respecto a la programación de obra.

ITEM	CAPITULO	% INCIDENCIA
1	PRELIMINARES	1.65%
2	CIMIENTOS	9.41%
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.67%
4	ESTRUCTURAS	20.58%
5	MAMPOSTERIA	1.65%
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	1.41%
7	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS	8.00%
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.	12.00%
9	PAÑETES	0.92%
10	PISOS	6.66%
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	2.58%
12	CARPINTERIA METALICA	16.64%
13	CARPINTERIA DE MADERA	1.88%
14	ENCHAPES	0.54%
15	ILUMINACIÓN	4.24%
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	2.54%
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0.74%
18	PINTURAS	1.87%
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0.04%
20	OBRAS EXTERIORES	0.99%
26	EQUIPOS ESPECIALES	4.98%
TOTAL PORCENTAJE INCIDENCIA POR CAPITULOS		**100%**

Cuadro No. 03: Porcentaje de Incidencia Contrato por Capítulos

4.2 Resumen de Actividades Ejecutadas a la fecha

Durante el periodo del presente documento se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	CAPITULO	% INCIDENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	PRELIMINARES	1.65%	1.65%	1.55%
2	CIMIENTOS	9.41%	2.60%	0.85%
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.67%	0.00%	0.00%
4	ESTRUCTURAS	20.58%	0.00%	0.00%
5	MAMPOSTERIA	1.65%	0.00%	0.00%
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	1.41%	0.00%	0.00%
7	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS	8.00%	0.00%	0.00%
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.	12.00%	0.00%	0.00%
9	PAÑETES	0.92%	0.00%	0.00%
10	PISOS	6.66%	0.00%	0.00%
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	2.58%	0.00%	0.00%
12	CARPINTERIA METALICA	16.64%	0.00%	0.00%
13	CARPINTERIA DE MADERA	1.88%	0.00%	0.00%
14	ENCHAPES	0.54%	0.00%	0.00%
15	ILUMINACIÓN	4.24%	0.00%	0.00%
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	2.54%	0.00%	0.00%
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0.74%	0.00%	0.00%
18	PINTURAS	1.87%	0.00%	0.00%
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0.04%	0.00%	0.00%
20	OBRAS EXTERIORES	0.99%	0.00%	0.00%
26	EQUIPOS ESPECIALES	4.98%	0.00%	0.00%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE A LA FECHA		**100.00%**	**4.30%**	**2.39%**

Total, avance a la fecha del presente informe**:** **2.39%**

A continuación, describiremos el proceso constructivo de las mismas y evidenciaremos el avance general de obra por semanas, de acuerdo al último balance de obra aprobado:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 01 del 26-02-19 al 03-03-19
PRELIMINARES ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Campamento de obra Baños Portátiles Cerramiento Vigilancia Privada	Llegan dos (2) Contenedores Tipo Oficina, para el Contratista y la Interventoría, y un Tercer Contenedor Tipo Bodega para el Almacén	
	Llegan dos (2) Baños Portátiles, uno queda para el personal Administrativo de la Obra (Contratista e Interventoría) y el otro para el personal Operativo.	
	Se Inicia con el Cerramiento Provisional en Lámina de Zinc y Postes de Madera Rolliza cada 3.00 m. Inicia el Servicio de Vigilancia.	

	Continúan Actividades de Hincado de Postes e Instalación de Lámina Galvanizada para el Cerramiento	
PRELIMINARES ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Campamento de obra Baños Portátiles Cerramiento Vigilancia Privada	Continúan Actividades de Hincado de Postes e Instalación de Lámina Galvanizada para el Cerramiento	
	Continúan Actividades de Hincado de Postes e Instalación de Lámina Galvanizada para el Cerramiento	

1. PRELIMINARES **1.1 OBRAS PRELIMINARES** 01-01-100 LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION) 01-01-110 LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION) Se Inicia la Actividad.	Se Verifican los Puntos de Amarre GPS-1 y GPS-2 para Replantear los Mojones (M-1, M-2, M-3 y M-4)	
	Se Inicia con el Replanteo de vértices del Lote del Proyecto (Mojones), y Perímetro del Edificio	
	Se Realiza el Levantamiento Topográfico de la Superficie del Terreno Natural, mediante Secciones Transversales cada 5.00 x 3.00 mts Se Localizan los Ejes del Proyecto	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 02 del 04-03-19 al 10-03-19
PRELIMINARES ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Cerramiento Provisional en Lámina de Zinc Verificación Colas Tuberías de Redes de Alcantarillado	Continúan Actividades de Cerramiento Provisional	
	Verificación Colas Salida Aguas Lluvias Lote Proyecto.	
	Verificación Colas Salida Aguas Residuales Lote Proyecto	

PRELIMINARES ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Cerramiento Provisional en Lámina de Zinc	Continúan Actividades de Cerramiento Provisional	
	Se Termina el Cerramiento en Lámina de Zinc a una Altura de 2.20 m	
	Se hacen las Puertas de Acceso a la Obra (Vehicular y Peatonal)	

PRELIMINARES ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Instalación Valla Licencia de Construcción, Señalización y Nomenclatura Obra.	El Personal de Bomberos Atiende la Emergencia y Controla la Fuga de Gas.	
	El personal de Gas Natural, Realiza la Reparación de la Tubería (cola) de Gas Natural que llega al Lote.	
	Se Instala la Valla de la Licencia de Construcción y la Nomenclatura con la Dirección del Predio	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 03 del 11-03-19 al 17-03-19
	Llegan a la Obra la Retroexcavadora y Volquetas Dobletroque para dar Inicio a la Actividad de Excavación Mecánica.	
2. PRELIMINARES **1.1 OBRAS PRELIMINARES** 01-01-030 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES – MECANICO Se Inicia la Actividad Equipo: Retroexcavadora Volquetas Dobletroque	Se Inicia la Actividad de Excavación una vez Delimitada con Cal el Área de la Caja	
	Se Separa del Material de Excavación las Basuras (Plásticos.	

	Se Revisan los Niveles con los Equipos de Topografía para hacer las Carteras de Excavación y Relleno.	
1. PRELIMINARES **1.1 OBRAS PRELIMINARES** 01-01-030 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES – MECANICO Continúan las Actividades Equipo: Retroexcavadora Volquetas Dobletroque Otros: Topografía	Se Realiza Control de Excavación con Topografía	
	Se Verifican Niveles de Excavación.	

01. PRELIMINARES **01.01 OBRAS PRELIMINARES** 01-01-030 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES – MECANICO Se Termina la Caja para la Cimentación, Comprendida entre los Ejes 1-A1; 1-D : Ejes 11-A1; 11-D, queda Pendiente el Área de Parqueaderos (6.20 x 15.50m) Actividad Final: Perfilada del Terreno Equipo: Minicargador (Perfilada) **02. CIMENTACIÓN** **02.01 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** 02-01-100 COMPACTACION DE SUBRASANTE 02-01-120 REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS COMPACTADO 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. VER RECOMENDACIONES ESTUDIO DE SUELOS Llegan los Equipos para Iniciar la Compactación de la Subrasante, Extendida y Compactación del Material de Relleno. Equipos: Minicargador Vibrocompactador 3 Tn.	Llega la Maquinaria para Perfilar y Compactar la Subrasante y el Material de Relleno. (Minicargador y Vibrocompactador)	
	SE Inicia a Perfilar la Caja Previamente Excavada, quitando el material suelto del Terreno.	
	Se Termina de Perfilar el Terreno y se Acopia el Material para Cargarlo y Realizar su Disposición Final en Botadero. Inicia Compactación de la Subrasante.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 04 del 18-03-19 al 25-03-18
	Se Realizan Actividades de Evacuación de las Aguas Lluvias que cayeron en la noche y en la madrugada.	
02. CIMENTACIÓN **02.01 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** 02-01-100 COMPACTACION DE SUBRASANTE 02-01-120 REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS COMPACTADO 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. VER RECOMENDACIONES ESTUDIO DE SUELOS Se da Inicio a estas Actividades Equipos: Minicargador Vibrocompactador 3 Tn. Volquetas Dobletroque	Continúan Trabajos de Extendida y Compactación del Recebo Tipo Invias	
	Secado y Seriado de la Capa Afectada por las lluvias.	

	Compactación de la Primera Capa E= 15 cms del Material de Relleno Recebo Tipo Invias.	
02. CIMENTACIÓN **02.01 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** 02-01-100 COMPACTACION DE SUBRASANTE 02-01-120 REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS COMPACTADO 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. VER RECOMENDACIONES ESTUDIO DE SUELOS Se Continua con estas Actividades Equipos: Minicargador Miniexcavadora Vibrocompactador 3 Tn. Volquetas Dobletroque	Se Realiza Acopio de Material de Relleno, Previniendo cierres de las Canteras por Temporada de Lluvias y/o Alerta Ambiental.	
	Actividades de Acopio de Material y Evacuación de Aguas Estancadas.	

	Debido a las Fuertes e Intensas Lluvias durante la Noche y parte de la Madrugada la Caja Excavada Amanece Inundada.	
02. CIMENTACIÓN **02.01 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** 02-01-100 COMPACTACION DE SUBRASANTE 02-01-120 REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS COMPACTADO 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. VER RECOMENDACIONES ESTUDIO DE SUELOS Se da Inicio a estas Actividades Equipos: Minicargador Miniexcavadora Vibrocompactador 3 Tn. Volquetas Dobletroque **Otros:** Actividades de Topografía.	Se Realiza Acopio de Material de Relleno, Previniendo cierres de las Canteras por Temporada de Lluvias y/o Alerta Ambiental.	
	Se Realiza con Topografía el Levantamiento de las Redes de Alcantarillado para hacer una Propuesta de Reubicación de la Red de A.LL que atraviesa el lote por la parte de los Tanques Subterráneos. Continúan Trabajos de Secado del Material de Relleno	


*4.*3 Control de Programación

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA			
EJECUCIÓN	**OBSERVADO**	**ESPERADO**	**DIFERENCIA**
Anterior	0.00%	0.00%	0.00%
Durante el periodo	2.39%	4.30%	-1.91%
Acumulado Actual	2.39%	4.30%	-1.91%

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN			
ATRASO	**Días**	**Fecha Inicio**	26 de Febrero/19
Anterior	0.00	**Fecha Terminación**	25 de Septiembre/19
Actual	**4.04**		

PLAZOS			
Cantidad Días	**Total**	**Transcurrido**	**Faltante**
Contractual	212.00	30.00	182.00
Proyección	0.00	0.00	0.00

AVANCE GRÁFICO DE OBRA

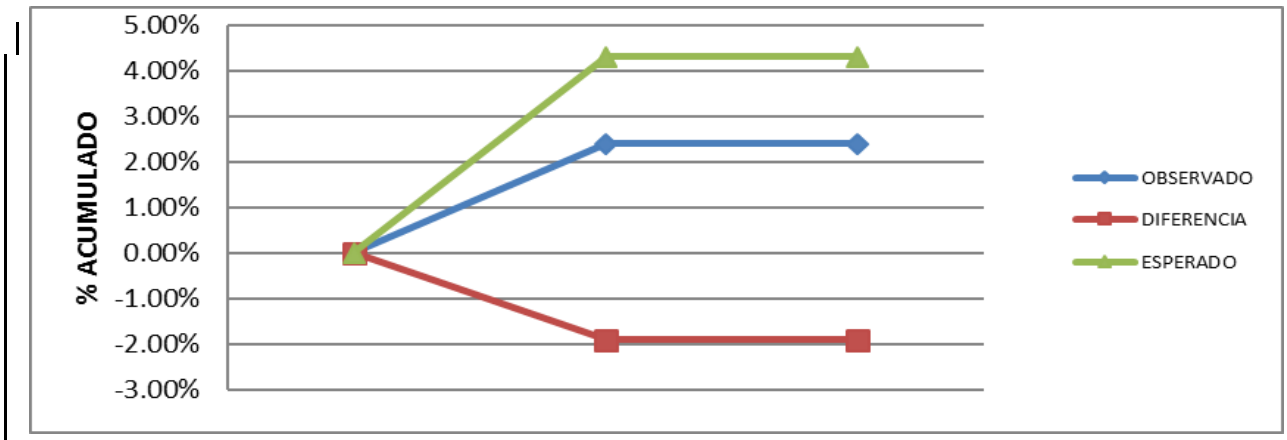

Cuadro No. 05: Avance General de Obra

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

5.1 Señalización

la obra se encuentra debidamente señalizada tal como lo indican las leyes colombianas, se tiene demarcadas las zonas de trabajo, rutas de evacuación, puntos de encuentro, se indican medidas básicas como uso de cascos, entre otras.

5.2 Aseo de Obra

Se realizan las siguientes actividades de Aseo y Limpieza:

- Aseo exterior: Zonas verdes y vías aledañas a la obra
- Aseo Interior obra

ANEXOS

Anexo 4:
Cuadro de Lluvias

CUADRO DE LLUVIAS PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2018		
FECHA	**DURACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
19-03-20119	4 Horas Aprox	Fuertes Lluvias en la Noche
20-03-2019	4 Horas Aprox	Fuertes Lluvias en la Madrugada
21-03-2019	4 Horas Aprox	Fuertes Lluvias en la Noche
22-03-2019	4 Horas Aprox	Fuertes Lluvias en la Madrugada

Anexo 5:
Relación de Maquinaria y/o Equipos en Obra

RELACIÓN MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA		
1	Retroexcavadora 330	1
2	Vibrocompactador 3 Toneladas	1
3	Minicargador	1
4	Miniexcavadora	1
5	Volquetas Dobletroque	5

Anexo 6:
Ensayos de Laboratorio Materiales Granulares

Anexo 7:
Copia Libro de Obra - Bitácora

CONSTRUCTORA M Y S.A.S

INFORME DE GESTION MENSUAL SSTA

CLM-F70 - v1

Vigente a partir del 2 -ENE-19

1 de 3

FECHA INICIO PROYECTO	26		2		2019		**Version: 1**	
FECHA INCIAL DEL INFORME	26		2		2019			
FECHA FINAL DEL INFORME	25		3		2019			
NUMERO DE TRABAJADORES	DIRECTOS	10	INDIRECTOS (CONTRATISTAS)			11		

0. REGISTRO FOTOGRAFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION





INDICADORES ACCIDENTALIDAD
CONSTRUCTORA M Y S EN EL MES MARZO 2019


N.	SEDE	MES	N. TRABAJADORES	AT 2019	AT MORTAL 2019	TASA AT	HHT	DIAS DE INCAPACIDAD	IS	IF	ILI	MORTALIDAD
1					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
2					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
3					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
4					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
5					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
6					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
7					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
8					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
9					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
10			0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
11			0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
12	PORVENIR	MARZO	21	0	0	0,0	4368	0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL INDICADORES ACCIDENTALIDAD			**7**	**0**	**0**	**0,0**	**364**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

1.2. INDICADORES DE GESTIÓN HSEQ

INDICADORES			DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
Actividades Realizadas en el periodo	7	88%	INSPECCIÓN DE LAS AREAS DE TRABAJO
Actividades Programadas en el proyecto	8	100%	INPECCION DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Porcentaje restante de cumplimiento		13%	CHARLAS DE SEGURIDAD
			COORDINAR ACTIVIDADES DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
			RADICAR ANTE LA INTERVENTORIA EL INFORME SST DE DE LA CONSTRUCTORA M Y S
			REALIZAR ISPECCION DE EPPS POR TODOS LOS TRABAJADORES
			INSPECCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
INSPECCIONES REALIZADAS			
Inspecciones Realizadas	5	75%	INSPECCIÓN DE CAMILLAS
			INSPECCIÓN DE BOTIQUIN
Inspecciones Programadas en el proyecto	6	100%	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO DIARIO
			INSPECCION DE EPPS
Porcentaje restante de cumplimiento		25%	INSPECCION DE EXTINTOR
CHARLAS DE SEGURIDAD			
Tiempo utilizado en charlas de seguridad	3:30 MIN		SE DICTO CARLAS DE SEGURIDAD EN TEMAS DE:
Charlas Realizadas	7	88%	INDUCCION EN TEMAS DE SST A TODO PERSONAL NUEVO.
			CUIDADO DE MANOS Y PAUSAS ACTIVAS.
Charlas Programadas en el proyecto	8	100%	CARGUE SEGURO DE VOLQUETAS PAUSAS ACTIVAS.
			ORDEN Y ASEO Y PAUSAS ACTIVAS.
			NOTIFICACION DE CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL AL PERSONAL
			PROTECCION SOLAR
Porcentaje restante de cumplimiento		13%	AUTOCUIDADO
INDUCCION DE ERSONAL NUEVO			
			INDUCCIONES AL PERSONAL NUEVO EN SST MEDIO AMBIENTE DE LOS SIGUIENTES SUBCONTRATISTAS:
Inducciones Realizadas	11	11%	CONSTRUCTORA MYS, BAU INGENIERIA SAS.
Personal nuevo de ingreso	100	100%	
Porcentaje restante de cumplimiento		89%	

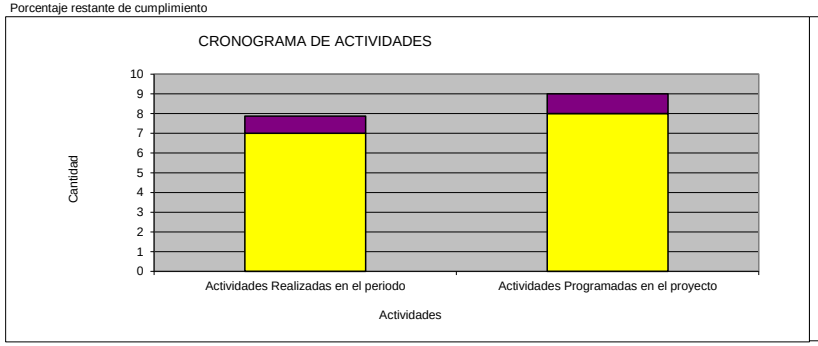

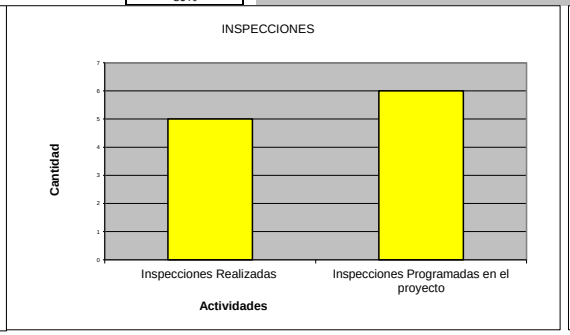

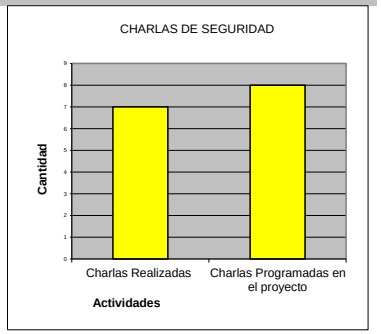

ACTIVIDADES DIARIAS DE HSE

1	Inspeciòn de obra
2	Revisiòn de formatos para permisos de trabajo de acuerdo a la actividad a realizar
3	Acompaamiento a las Charlas de seguridad
4	Actividades de orden y aseo en las areas de trabajo

2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Documentación elaborada:

	PERMISOS DE TRABAJO		ORDENES DE ACTIVIDADES		INSPECCIONES	5

(Alturas, inspecciones de: taladro demoledor,pulidoras, taladro percutor electrico)

Descripción detallada de documentos

OBSERVACIONES

2.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.4.1 LISTADO DE PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN EL MES MARZO 2019 EN EL PROYECTO JARDIN EL PORVENIR

Contratista	Nombre	Apellido	C.C.	Cargo	ARL	EPS	AFP
CONSTRUCTORA M Y S	MAURICIO RODRIGUEZ		79.580.675	ING. RESIDENTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
	CARLOS ALBERTO MEDINA		51.782.687	DIR. OBRA	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR
	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA		52.849.792	RESIDENTE SST	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	COLPENSIONES
	SANDRO FLORES		14.322.513	MAESTRO	SEGUROS BOLIVAR	SURA	PROTECCION
	MOISES GUERRERO		14.218.623	ALMACENISTA	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR
	JHON FERNANDO PAEZ		19.234.191	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
	PABLO LOMBANA		4.372.552	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
	KAREN AVILA		1.033.710.071	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR
	VICTOR MANUEL ROJAS		1.032.410.033	ING. AMBIENTAL	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
	MARGARITA ROMERO		52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PROTECCION
MAQUINARIA							
BAU INGENIERIA SAS	JOSE MEJIA		1.118.825.975	ING. SUBCONTRATISTA	SURA	SURA	PORVENIR
	JORGE SOTO		1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	SURA	COOMEVA	PROTECCION
	JUAN CAMARGO		74.302.390	OPERADOR	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES
	LUIS CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		1.030.559.254	OPERADOR	COLMENA	MEDIMAS	PORVENIR
	ANDRES BARRAGAN PACHON		79.867.764	ING. SUBCONTRATISTA	COLMENA	SANITAS	PROTECCION
	CLAUDIA ALVAREZ		11.207.474.281	INSPECTOR SST	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
	BREUDYS JOHINER POLO GUERRA		1.067.862.250	MAESTRO	SURA	SALUD TOTAL	POVENIR
	RONAL BARRERA		1.020.737.288	OPERADOR	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES
SEGURIDAD ROHEN LIMITADA	JOSE EFRAIN RINCON ZAMUDIO		19.406.580	VIGILANTE	COLPATRIA	FAMISANAR	COLPENSIONES
	YAHIR ESTEBAN VALERO RUBIO		1.022.975.808	VIGILANTE	COLPATRIA	SANITAS	PROTECCION
	JEISSON DAVID ARCE HENAO		1.022.393.510	VIGILANTE	COLPATRIA	CAPITAL SALUD	PORVENIR

RESIDENTE SST ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

ORDEN Y ASEO DE LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO , LIMPIEZA DE VIAS., PUNTO ECOLOGICO, PUNTO DE MATERIALES INFLAMABLES

ZAMUDIO



SEÑALIZACION INSPECCIONES BOTIQUIN, CAMILLA,EXTINTOR, CARNETIZACION DEL PERSONAL, SUPERVISION Y DESCARGUE DE MAQUINARIA





OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

MYS CONSTRUCTORA

ELABORO: **S. JANNETH RODRIGUEZ .S**	**REVISO:** **ARQ. CARLOS MEDINA**	**APROBO:** **T.S. ALEX ALVAREZ**
Firma	**Firma**	**Firma**
CARGO: Residente SST Contratista	**CARGO** Director de obra	**CARGO:** Residente SST Interventoría

BOGOTA D.C. MARZO 25 DE 2019

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
3. ALCANCE
4. OBJETIVO
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
5.1. ACTIVIDADES DE OBRA
5.2. LISTADO DE PERSONAL, INDUCCIONES DE INGRESO, CERTIFICACIONAFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP, PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.
5.3. SE REALIZA INDUCCION O REINDUCCION A TODO PERSONAL QUE INGRESE Y AL FINAL DEBE LLENAR EL REGISTRO DE INDUCCION Y CONTESTAR SU RESPECTIVA EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE SST.
5.4. CAPACITACIONES SST
5.5. INDICADORES DE GESTION
5.6. PLAN DE EMERGENCIA
5.7. SEÑALIZACION
5.8. SERVICIOS DE HIGIENE
5.9. COPASST

Listado de Anexos

Anexo.1. LISTADO DE PERSONAL INDUCCIONES DE INGRESO Y EL REGISTRO DE INDUCCION Y SUS RESPECTIVA EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE SST CON AFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO,
REGISTRO ENTREGA DE EPP PLANILLAS PAGOS SEGURIDAD SOCIAL.

Anexo.2. REGISTRÓ CAPACITACIONES Y CHARLAS SST

Anexo. 3. INDICADORES DE GESTIÓN

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades ejecutadas desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato de Obra ° 114-3-18, período comprendido del 26 de Febrero de 2019 al 25 de Marzo de 2019, en el cual, el CONSTRUCTORA M Y S.A.S, busca mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores a partir de una política de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la satisfacción de los trabajadores.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto del Contrato	Contratista: MYS CONSTRUCTORA "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"
Número del Contrato Contratista	CO1.PCCNTR.699128
Duración Del Contrato:	Siete (7) meses Fecha inicio: febrero 26 de 2019 Fecha finalización: septiembre 25 de 2019
Objeto De Contrato de La Interventoría	***5.1 Interventoría: Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura*** ***5.2 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.***
Numero de Contrato	***5.3 Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.695946***
	Generación de empleo, mejoramiento del entorno, mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento de la calidad de vida para

Beneficio del Proyecto	los niños y niñas en ciclo vital de primera infancia.
Ubicación del Proyecto	Zona VII de Porvenir sector CPF 760, de la UPZ 86, Lote ubicado en la Calle 55 sur No. 103 – 98, localidad de Bosa.

3. ALCANCE:

Evidenciar las acciones adelantadas en obra frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. OBJETIVO:

Verificar el grado de cumplimiento de los parámetros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las diferentes actividades ejecutadas por los trabajadores y contratistas de la CONSTRUCTORA M Y S.A.S.

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo que apliquen a la constructora.

- Reforzar la formación del personal con el fin de generar conciencia en el trabajo seguro y fomentar el autocuidado.

- Cumplir los controles establecidos para minimizar la ocurrencia de accidentes de Laborales.

- Implementar medidas para evitar la aparición de enfermedades de carácter laboral y minimizar el ausentismo laboral en la CONSTRUCTORA M Y S. A S.

5. ETAPAS DE LA INDUCCION

El contenido a brindar en el proceso de la inducción a los trabajadores de la Constructora M Y S.A.S, subcontratistas se compone de la siguiente estructura:

- Bienvenida al proyecto
- Reseña histórica de la empresa
- Objetivo de la Inducción
- Misión
- Visión
- Valores
- Políticas
- Objetivos
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Notificación de Riesgos
- Ley 1010 de Acoso laboral Comité Convivencia
- Comité Copasst
- SG-SST
- Exámenes Médicos Ocupacionales
- Accidente de Trabajo
- Procedimiento para atención de Incidente y accidente de trabajo
- Cubrimiento de at y Enfermedad Común
- Soporte de Ausentismo
- Enfermedad Laboral
- Reporte de actos y condiciones inseguras
- Condiciones Inseguras
- Definición Riesgo y Peligro
- Responsabilidad SST Trabajadores

Uso adecuado de EPPS

- Responsabilidad del Contratista
- Responsabilidades de los trabajadores
- Evaluación de conocimiento SST
- Identificación de Peligros escritos
- Notificación Condiciones de salud
  - Cartelización a todo el personal
  - Al final de la inducción realizamos el registro de inducción o reinducción y su respectiva evaluación de conocimientos en temas de SST.

5.1. EVALUACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL SST Y NOTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

Al finalizar la inducción al igual que la notificación de peligros y riesgos, se entrega a cada uno de los participantes la evaluación de la inducción de selección múltiple para ser diligenciada individualmente y poder evidenciar el conocimiento de los trabajadores en cuanto los temas recibidos.

6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

6.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Se desarrollaron diversas actividades del área de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron charlas de seguridad a todo el personal, inspecciones de trabajo, se realiza socialización del sistema de riesgos laborales, divulgación del buen mantenimiento de los EPP, se realiza socialización de la importancia del autocuidado, se verifica con inspecciones el buen uso de EPP y el manejo de las herramientas, se hace acompañamiento a las actividades de ejecución de obra, se realiza orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, también se sensibiliza al personal de la importancia de las pausas activas en el trascurso de la jornada laboral.

7. COMPONENTE SG-SST

Se implementaron las actividades definidas en el seguridad y salud en el trabajo las cuales buscan mejorar las condiciones de salud y seguridad del personal de obra, en el ejercicio de sus funciones, partiendo que es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores quienes con su compromiso de auto-cuidado en salud y el firme apoyo de la empresa posibilitan la prevención del riesgo laborales, es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral. De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud del trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos e instalaciones.

7.1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Nombre: CONSTRUCTORA MYS
NIT: 900361854-6
Dirección: CRA 12 # 13 - 24
Teléfono: 8641141

8. INGRESO PERSONAL

Tabla 1 INGRESO PERSONAL EN EL MES DE MARZO

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO
CARLOS ALBERTO MEDINA	ARQ. DIRECTOR OBRA	26/02/2019
ANDRES RAMIREZ	ING. RESIDENTE	26/02/2019
JANNETH RODRIGUEZ	PROFESIONAL SST	26/02/2019
SANDRO FLORES	MAESTRO	26/02/2019
JHON FERNANDO PAEZ	AYUDANTE	26/02/2019
PABLO LOMBANA	AYUDANTE	26/02/2019
MARGARITA ROMERO	PROFESIOONAL SOCIAL	26/02/2019
VICTOR MANUEL ROJAS	ING. AMBIENTAL	26/02/2019
JOSE EFRAIN RINCON ZAMUDIO	VIGILANCIA	27/02/2019
YAHIR ESTEBAN VALERO RUBIO	VIGILANCIA	27/02/2019
JEISSON DAVID ARCE HENAO	VIGILANCIA	27/02/2019
JOSE MEJIA	ING. SUBCONTRATISTA	04/02/2019
MAURICIO RODRIGUEZ	ING. RESIDENTE	09/03/2019
KAREN AVILA	AYUDANTE	09/03/2019
JUAN CAMARGO	OPERADOR	11/03/2019
JORGE SOTO	ING. SUBCONTRATISTA	11/03/2019
JOSE MEJIA	ING. SUBCONTRATISTA	11/03/2019
RONAL BARRERA	OPERADOR	23/03/2019
LUIS CARLOS ALVAREZ	OPERADOR	21/03/2019
CLAUDIA ALVAREZ	INSPECTOR SST	26/03/2019
MOISES GUERRERO	ALMACENISTA	27/03/2019
BREUDYS JOHNER POLO	MAESTRO	29/03/2019

8.1 RETIRO DEL PERSONAL

Tabla 2 Retiros DEL PERSONAL EN EL MES DE MARZO.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO
ANDRES RAMIREZ	ING. RESIDENTE	06/03/2019

9. SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo se presenta el pago de la seguridad social del contratista y Subcontratistas: CONSTRUCTORA M Y S.A. S, BAU, EMPRESA DE SEGURIDAD.

Tabla 3 SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Contratista/Subcontratista	Anexos	Folios
Constructora M Y S.A.S	*Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS*	3 folios
BAU	*Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS*	2 folios
Seguridad Privada	*Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA **FOLIOS***	3 folios

10. **ANEXOS**

Anexo # 1 LISTADOS DEL PERSONAL DE INGRESO DIARIO.
Anexo # 2 CERTIFICACIONAFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP.
Anexo # 3 PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL .
Anexo # 4 CAPACITACIONES SST.
Anexo # 5 INDICADORES DE GESTION.
Anexo # 6 RECOMENDACIONES OCUPACIONALES .
Anexo # 7 SEÑALIZACION.
Anexo # 8 COPASST.
Anexo # 9 CONVIVENCIA LABORAL
Anexo # 10 INSPECCIONES Y PERMISOS DE TRABAJO.
Anexo # 11 CONFORMACION DE BRIGADA DE EMERGENCIA.

Anexo # 1 LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE INGRESO DIARIO.

Anexo # 2
CERTIFICACIONAFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP.

Anexo # 3 PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Anexo # 4 CAPACITACIONES SST.

Anexo # 5 INDICADORES DE GESTION.

Anexo # 6 RECOMENDACIONES MEDICAS OCUPACIIONALES.

Anexo # 7 SEÑALIZACION.

Anexo # 8 COPASST.

Anexo # 9 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

Anexo # 10 INSPECCIONES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Anexo # 11 CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA.



OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

MYS CONSTRUCTORA

ELABORO: **T.S. MARGARITA ROMERO VARGAS**	**REVISO:** **ARQ. CARLOS MEDINA**	**APROBO:** **T.S. CAROLINA TRIVIÑO**
Firma	**Firma**	**Firma**
CARGO: Residente Social Contratista	**CARGO** Director de obra	**CARGO:** Residente Social Interventoría

BOGOTA D.C. MARZO 25 DE 2019

Versión 01

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 5
Interventoría: Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura 5
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED. 5
Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.695946 5
3. RESPONSABLES DEL PROYECTO 6
3.1. ÁREA SOCIAL 6
4. OBJETIVO GENERAL 7
4.1. Objetivos Específicos 7
5. CRONOGRAMA ÁREA SOCIAL 8
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 10
7. FASE ETAPA DE OBRA INFORMACION MENSUAL 12
Gráfico 01 12
8. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 13
8.1. Objetivo General 13
8.2. Objetivos Específicos 13
8.3. Actividades Desarrolladas 13
8.4. Objetivo General de Divulgación de la Información 16
8.5. Objetivos Específicos 16
8.6. Actividades Desarrolladas 17
9. PROGRAMA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA 18
9.2. Metodología 18
9.3. Actividad a Desarrollar 18
10. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO 20

10.1. Objetivo General 20

Brindar información a la comunidad AID-AII interesada en la construcción del Módulo de Primera Infancia del contrato CO1.PCCNTR.699128 en forma oportuna, clara y veraz. 20

10.2. Metodología 20

11. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES- ACTAS DE VECINDAD 22

11.1. Objetivo General 22

12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO CONTRATACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 26

12.1. Objetivo General 26

12.2. Metodología 26

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 27

13.1. Objetivo General 27

13.2. Metodología 27

14. CONCLUSIONES 28

15. ANEXOS 29

Tablas

Tabla 01 Características Generales del Proyecto

Tabal 02 Responsables del Proyecto

Tabla 03 Área Social

Tabla 04 Cronograma de Actividades

Tabla 05 Comité de Participación Ciudadana

Tabla 06 Inventario de Predios

Tabla 07 Anexos

1. INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente informe pretende evidenciar las actividades desarrolladas en los periodos del 22 de enero al 25 de febrero de 2019, antes de iniciar con las actividades constructivas de obra y del 26 de febrero al 25 de marzo de 2019 previo al inicio de obra, del contrato CO1.PCCNTR.699128 CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1". Proyecto que se desarrollará durante un periodo de SIETE MESES, (7).

En este informe se representa la trazabilidad de las actividades desarrolladas en el área social, las cuales tuvieron como fundamento los programas de: (información, divulgación, organización social y participación ciudadana, atención al ciudadano, y sostenibilidad). Cada una de las actividades que se describirán a continuación fueron previamente revisadas y avaladas por la Interventoría del área social, las cuales a su vez cumplieron con los protocolos establecidos en el Plan de Gestión Social, que direcciona el contrato en mención.

Cada una de las acciones que se programaron y llevaron a cabo, se realizaron con el objetivo de mitigar los posibles impactos que pueda generar el contrato CO1.PCCNTR.699128, a la comunidad aferente a la obra en construcción.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto del Contrato	Contratista: MYS CONSTRUCTORA "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"
Número del Contrato Contratista	CO1.PCCNTR.699128
Duración Del Contrato:	Siete (7) meses Fecha inicio: febrero 26 de 2019 Fecha finalización: septiembre 25 de 2019
Objeto De Contrato de La Interventoría	Interventoría: Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.
Numero de Contrato	Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.695946
Beneficio del Proyecto	Generación de empleo, mejoramiento del entorno, mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento de la calidad de vida para los niños y niñas en ciclo vital de primera infancia.
Ubicación del Proyecto	Zona VII de Porvenir sector CPF 760, de la UPZ 86, Lote ubicado en la Calle 55 sur No. 103 – 98, localidad de Bosa.

Tabla 01.

3. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Supervisión del Contrato SECRETARIA DE EDUCACION	UBICACIÓN AV. El Dorado No. 66-63
Firma Interventora Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura	UBICACIÓN Dirección: Calle 159 No 54-69, Torre 1ofic.302
Firma Contratista MYS CONSTRUCTORA	UBICACIÓN Carrera 12 No. 13-24 Neiva Huila

Tabla 02.

3.1. ÁREA SOCIAL

Supervisión	Sociólogo Felipe Correal
Interventoría	Trabajadora Social Carolina Triviño
Contratista	Trabajadora Social Margarita Romero Vargas

Tabla 03.

4. OBJETIVO GENERAL

Presentar de forma clara y detallada las actividades sociales que se desarrollaron durante el periodo comprendido del 22 de enero al 25 de marzo de 2019, en el contrato CO1.PCCNTR.699128.

4.1. Objetivos Específicos

- ✓ Informar a través de piezas comunicativas las actividades ejecutadas desde el programa de divulgación de la información, que se desarrollaron con la comunidad aferente al contrato CO1.PCCNTR.699128.

- ✓ Relacionar las dos reuniones que se sostuvieron con la comunidad interesada en la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.699128, con el fin de dar cumplimiento al programa de información a la comunidad.

- ✓ Conformar el comité de participación ciudadana, según lo establecido en la ley 850 de 2013.

- ✓ Ejecutar las Actas de vecindad de inicio del contrato CO1.PCCNTR.699128, según indicaciones técnicas.

- ✓ Implementar estrategias que permitan la instauración de los Puntos Satélites y el Punto de Atención a la comunidad-PAC.

- ✓ Suministrar a través de informes y demás documentos la información requerida por la interventoría del área Social.

5. CRONOGRAMA ÁREA SOCIAL

Fecha	Descripción de la Actividad
24/01/2019	Reunión en sitio de obra, reconocimiento de la Zona.
24/01/2019	Contacto con los líderes de la zona para invitación a socialización del 01/02/2019.
26/01/2019	Ejecución de la presentación para la reunión del 01/02/2019.
27/02/2019	Organización de los formatos enviados por interventoría para la ejecución de las actividades sociales.
28-29/01/2019	Contacto vía telefónica a líderes y lideresas de la zona para la reunión del 01/02/2019.
30/01/2019	Preparación logística para la reunión de 01/02/2019 con líderes y lideresas de la zona.
31/02/2019	Organización de piezas e instrumentos del área social, envió a la interventoría para la aprobación.
01/02/2019	Ejecución reunión con los líderes y lideresas de la zona.
03/02/2019	Envió de piezas comunicativas- Volantes de invitación a socialización y actas de vecindad de inicio.
03/02/2019	Envió de presentación efectuada a los líderes y lideresas al sr. Jorge Pinto líder de la zona.
04/02/2019	Convocatoria para la reunión de inicio con la comunidad de la Zona y entrega de volante de la 1 visita de Actas de Vecindad
06/02/2019	Ejecución de las actas de vecindad de Inicio Entrega de Volantes de Ejecución de Actas de Vecindad 1° y 2° visita.
08/02/2019	Ejecución de las actas de vecindad de Inicio Entrega de Volantes de Ejecución de Actas de Vecindad 1° y 2° visita.
08/02/2019	Ejecución de la Socialización de Inicio de obra, con la comunidad. Entrega de Volantes de ejecución de Actas de Vecindad 1° y 2° visita.

12/02/2019	Ejecución de las actas de vecindad de Inicio Entrega de Volantes de Ejecución de Actas de Vecindad 2° y 3° visita.
14/02/2019	Ejecución de Actas de Vecindad de Inicio Tercera y última visita
18 al 20 /02/2019	Organización de los registros de las Actas de Vecindad de Inicio
19/02/209	Reunión de área social en la SED
24 al 27 /02/2019	Organización de los registros de las Actas de Vecindad de Inicio
28/02/2019	Entrega de Actas de Vecindad a la interventoría para revisión
05/03//2019	Atención de observaciones realizadas por la interventoría, a las Actas de Vecindad de Inicio.
05/03//2019	Envió de Plan de Gestión Social a Interventoría versión 01
06/03/2019	Contactos con líderes de la comunidad, para ubicación de los tres puntos satélites y atención PAC.
08 al 11 /03/2019	Se subsanan las observaciones de las Actas de Vecindad realizadas por la interventoría por tercera vez
09/03/2019	Se reciben observaciones del Plan de Gestión Social, por parte de la interventoría y la supervisión del contrato
12/03/2019	Atención a PAC
13/02/2019	Envió de Plano Topográfico con convenciones para soporte de Actas de Vecindad
15/02/2019	Se envía arte para avisos de puntos satélites y PAC
17/02/2019	Se envía segunda versión del P.G.S. con observaciones subsanadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de Interventoría y Supervisión.
18/03/2019	Se obtiene aprobación del arte para avisos por parte de la interventoría.
19/03/2019	Atención a PAC
21/03/2019	Se realiza entrega del Arte aprobado a la dirección del proyecto para la impresión de los avisos, de puntos satélites y PAC
22/03/2019	Recepción de PQRS a través de correo PAC

Tabla 04.

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Bosa [2]UPZ 86 SITIO DE OBRA CLL. 55 SUR No. 103-96



Imagen 01

Fotografía Panorámica sitio de obra

Localidad de Bosa Ciudadela Porvenir Adoptado.

"El Plan Parcial Ciudadela El Porvenir, ubicado en la Localidad de Bosa, fue adoptado a través del Decreto 395 del 16 de septiembre de 2002. Este plan parcial presenta las siguientes modificaciones.

Primera Modificación de Ciudadela El Porvenir 2006: Fue adoptado a través del Decreto 366 del 12 de septiembre de 2006, por el cual se modifica el Decreto Distrital 395 de 2002

Segunda Modificación de Ciudadela El Porvenir 2007: Fue adoptado a través del Decreto 604 del 28 de diciembre de 2007, por el cual se modifica el Decreto Distrital 366 de 2006.

Tercera Modificación de Ciudadela El Porvenir 2014: Fue adoptado a través del Decreto del 355 del 28 de agosto de 2014, por el cual se modifica el Decreto Distrital 604 de 2007.

Cuarta Modificación de Ciudadela El Porvenir 2017: Fue adoptado a través del Decreto del 406 de 2017, por el cual se modifica el Decreto Distrital 355 de 2014"

Citado por el estudio de insuficiencia Educativa de Bogotá para el 2019. SED-octubre de 2018 "*Al comparar la oferta frente a la demanda efectiva se observan las siguientes UPZ con déficits estimados superiores a 2.000 cupos: Suba, El Rincón, Tibabuyes, Patio Bonito,* ***Bosa Occidental, Bosa Central*** *y Tintal Sur. UPZ con déficits estimados superiores a 1.000 cupos como: Ismael Perdomo, Bolivia, Gran Britalia, San Francisco, Diana Turbay, Ciudad Jardín, Calandaima, Jerusalén, Apogeo y el Porvenir. En el mapa se observa que las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar son las que concentran la mayor cantidad de UPZ deficitarias.*

Este indicador da cuenta de los cupos disponibles dentro de cada una de las UPZ, una vez establecida la matrícula. En su análisis se observan las siguientes UPZ en las cuales se concentran cupos superiores a 2.000: Lucero, Kennedy Central, Los Libertadores, Comuneros, Quiroga, 20 de Julio, y Las Ferias. Los cupos disponibles que se presentan en algunas zonas se deben a la falta de demanda o interés que tiene la población que reside en esa zona por estudiar en colegios distritales".

[2]https://www.google.com/maps/place/UPZ+86+EVENTOS/@4.6433165,74.2521048,12.38z/data=!4m12!1m61s0x8e3f9df1498af7f1¡:0xcc0cef17c0d27661!2sUPZ+86

7. FASE ETAPA DE OBRA INFORMACION MENSUAL

Esquema de los programas contemplados para la etapa de obra del CO1.PCCNTR.699128-Modulos de Primera Infancia.

A través de ejecución de actividades o programas sociales en los anexos técnicos del contrato firmados entre el Contratista MYS y la Secretaria de Educación, frente al componente social atendiendo oportunamente las necesidades de la Población Área de Influencia Directa-AID y Área de Influencia Indirecta-AII. En el presente informe se relacionarán las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 22 de enero al 25 de marzo de 2019. A través de la ejecución de los programas sociales que contempla el P.G. S. se busca hacer partícipe a la comunidad aferente al proyecto, así como responder con las solicitudes realizadas por la interventoría y la supervisión del contrato.



Gráfico 01

8. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

8.1. Objetivo General

Brindar información clara frente al contrato de obra CO1.PCCNTR.699128 a la comunidad, a través de las reuniones de inicio, avance y finalización, planteadas en el presente programa, posibilitando a la comunidad estar informados de los avances de las obras constructivas.

8.2. Objetivos Específicos

Relacionar las reuniones efectuadas con la comunidad, según direccionamientos de la interventoría y la supervisión del contrato.

8.3. Actividades Desarrolladas

Para este periodo se ejecutan las siguientes reuniones con la Comunidad:

1. Socialización con Líderes y Lideresas de la zona

Objetivo:

Establecer un primer contacto con los líderes y lideresas del sector circundante al CONTRATO CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1 con el fin de crear canales de comunicación e informar generalidades del contrato en mención.

Lugar: Caminos de Porvenir 5

Fecha: viernes 01 de febrero de 2019

Hora: 4:00 p.m**.**

Se contó con la participación de tres líderes comunitarios de los diez invitados, se socializaron temas generales del contrato y de las diferentes áreas a intervenir. Se realizó una presentación, previamente revisada y avalada por la interventoría. ***(Ver Anexo 01)***.

De esta reunión se generaron los siguientes compromisos:

- ✓ Realizar la Socialización de Inicio, con la comunidad aferente al proyecto.
- ✓ Generar lazos de comunicación efectiva, con el objetivo de permanecer en contacto y trasmitir información de interés general de la comunidad frente a los avances del contrato.
- ✓ Los líderes y lideresas se comprometen a ser canal de comunicación, con el resto de población aferente para que participen en la reunión de inicio.

Para efectos de ampliar la información en el primer encuentro con los líderes y lideresas de la zona, se adjunta al este informe acta de la de dicho encuentro, con el respectivo soporte fotográfico y de asistencia ***(Ver Anexo 02).***

2. Socialización de Inicio con la Comunidad

Lugar: Conjunto Residencial Bicentenario etapa 2
Dirección: Calle 55 sur No. 103-49
Fecha: viernes 08 de febrero de 2019
Hora: 11.00 a.m**.**

Objetivo:

Informar a la comunidad del área de Influencia directa del sector que circunda la obra de CONSTRUCCIÓN - COLEGIO DE PRIMERA INFANCIA PORVENIR VII. con el fin de establecer canales de comunicación, dar a conocer las generalidades del proyecto desde cada una de las áreas de intervención y presentar el grupo de profesionales a cargo del proyecto desde la SED, Interventoría y Contratista**.**

Con la participación aproximada de 54 asistentes a la reunión, se conformó el Comité de Participación Ciudadana, se socializa desde cada una de las áreas del Contratista (Técnico, Ambiental, SST y Social) los programas a desarrollar antes durante y hasta finalizar las obras constructivas. Desde las entidades se presentó la profesional Social de la Interventoría y el profesional Social de la Supervisión, por parte del contratista asistieron los profesionales de las áreas Ambiental, SST, Residente de obra, director de obra y Profesional Social.

Se aclararon dudas de la comunidad y se informó la ejecución de actas de vecindad de inicio de las viviendas aledañas al predio en construcción y las vías y zonas comunes.

Se anexa para ampliar la información de la reunión de inicio, la presentación socializada este día, el registro fotográfico y de asistencia y el acta de la reunión. **(Ver Anexo 03).**

8.4. Objetivo General de Divulgación de la Información

Establecer canales de información, comunicación por medio del proceso de divulgación que permitan a los residentes del área de influencia poseer la información sobre las actividades de obra que se ejecutaran durante el desarrollo del proyecto y afecten la cotidianidad de los residentes y/o comerciantes del sector.

8.5. Objetivos Específicos

- ✓ Establecer contacto telefónico con líderes y lideresas de la zona de influencia, para hacerlas participes de la primera reunión, antes del inicio de obra.

- ✓ Convocar a la comunidad para que participe en las reuniones programadas por el contratista acerca del inicio de obra sobre las labores que se ejecutan durante el desarrollo del proyecto.

- ✓ Distribuir los volantes y comunicados a la comunidad aferente a la obra, la cual fue determinada por el área técnica para la ejecución de las actas de vecindad de inicio, con la información pertinente y oportuna de la actividad.

8.6. Actividades Desarrolladas

Pertinencia: El contratista realizará convocatorias o Volanteos con el fin de mitigar los posibles impactos que se puedan generar en el proyecto, con el fin de que la información sea clara, veraz y oportuna con la comunidad en general.

Para el presente periodo fueron divulgadas las siguientes piezas comunicativas:

Volantes:

- ✓ Se realizó la entrega de 87 volantes de invitación el día 04 de febrero de 2019 en la zona de influencia del proyecto, para que la comunidad participé en la socialización de Inicio de obra la cual fue ejecutada el día 08/02/2019. **(Ver Anexo 04)** Planillas de volantes entregados, registros fotográficos y volante emitido.

- ✓ Se realiza la entrega de volantes informativos para la ejecución de Actas de Vecindad de 1°-2°-3° Visita a los predios que el área técnica determinó inspeccionar ***(Ver Anexo 05)*** Planillas de volantes entregados, registros fotográficos y volantes emitidos.

9. PROGRAMA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA

9.1. Objetivo General

Conformar el Comité de participación Ciudadana para efectuar el control social del contrato CO1.PCCNTR.699128 según lineamientos de la Ley 850-2003.

9.2. Metodología

Conformación del comité de participación ciudadana en la reunión de inicio de obra, luego que los participantes voluntariamente se inscribieron como representantes del comité de participación ciudadana, se llevaran a cabo reuniones con este grupo mes a mes con el fin de que obtengan información del contrato CO1.PCCNTR.699128 y de esta manera puedan ser multiplicadores de la información suministrada en estos encuentros con el resto de comunidad.

9.3. Actividad a Desarrollar

Conformación del comité de participación ciudadana, se conformó este comité el día 08 de febrero de 2019 en la Socialización de Inicio con la comunidad, para este fin se inscribieron 11 miembros de la comunidad.

A continuación, se relaciona los miembros de la comunidad que por iniciativa propia se inscriben en la reunión mencionada, con este comité el contratista MYS Constructora, efectuarán encuentros mensuales, para proporcionar información desde las diferentes áreas a intervenir en el contrato CO1.PCCNTR.699128.

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELEFONICOS
Diana Carolina Villamil	3046738602
Sonia Castro	3112967390
María Bertha Morales	3176827859
Jorge Pinto	3208236182
Lucero Campos	3105062424
María Libia Betancourt	3105901901
María Isabel Cárdenas	3214239572
German Acevedo	3112523436
Ana Elvia Pinzón	3143143637
María Mery Silva	3132129206
Martha Galindo	3202790096

Tabla 05.

Se anexa para el presente informe la planilla de inscripción al comité de participación ciudadana, que realizo la comunidad el pasado 08 de febrero de 2019 ***(Ver Anexo 06)***

10. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

10.1. Objetivo General

Brindar información a la comunidad AID-AII interesada en la construcción del Módulo de Primera Infancia del contrato CO1.PCCNTR.699128 en forma oportuna, clara y veraz.

10.2. Metodología

- ✓ Este periodo se instaló un Punto PAC móvil, el cual funcionará durante toda la etapa de obra; contará con su respectiva línea telefónica, (3183484944-3172149201) correo electrónico (atencioncomunidad.porvenir@gmail.com) para la atención a los ciudadanos.
- ✓ El contratista MYS Constructora, a su vez instauro el PAC, en el Salón Comunal de Bicentenario II, el cual fue atendido los días martes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. para la ubicación de la información se instalará en el sitio de obra un pendón con la información del PAC- Horarios, Dirección de la oficina de atención al ciudadano Correo electrónico y línea telefónica
- ✓ Se ubicará 3 puntos Satélites los cuales contaran con un aviso que tendrá la Información del PAC- Horarios, Dirección de la oficina de atención al ciudadano Correo electrónico y línea telefónica.

- ✓ Los puntos satélites se ubicaron en los siguientes conjuntos residenciales: --
  -Calle 54c sur No. 100-24 Torres del Porvenir

  -Calle 54f sur No. 103-50 Emmerital

  -Cra. 100 No. 56f – 15 sur Torres del Porvenir V.

El día 15 de marzo de 2019 el área social del contratista envía el arte de los avisos para para los puntos satélites y PAC, los mismos fueron aprobados luego de revisión por parte de la interventoría el día 17 de marzo de 2019, los cuales serán ubicados en cada uno de los puntos ya mencionados. ***(Ver Anexo 07)*** Arte de avisos que serán instalados. Nota aclaratoria: A la fecha el área social se encuentra a la espera, frente a la impresión del arte de los avisos, para los puntos satélites y PAC.

El día 22 de marzo de 2019 se atiende a través del PAC móvil, una solicitud ciudadana por parte del señor Edgar Hernando Rodríguez, solicitando información del porque las volquetas que están ingresando a la obra deben transportarse hasta el fondo de la bahía la cual queda situada en frente de la portería del conjunto Alameda de Porvenir, a lo cual se respondió que se debía a una situación particular ya que este día el área técnica estaba recibiendo maquinaria y material para abastecerse y poder adelantar tareas técnicas, que esta situación no se iba a presentar todos los días, sino que serían situaciones de días específicos, según las dinámicas de la obra. No obstante, el señor en mención, envía una carta a través de correo electrónico, mencionando o preguntando que si el paso de las volquetas puede afectar 64 apartamentos que están ubicados en las torres 1-2-3 y 22, y que no fueron inspeccionadas por acta de vecindad, carta que fue trasladada al área técnica y la cual será respondida dentro de los tiempos estipulados para la respuesta de los PQRS ***(Ver Anexo 08)*** Carta envía por ciudadano, se aclara que la carta fue enviada el día 18 de marzo del año en curso, atreves de correo electrónico y la cual viene fechada mes de agosto de 2018.

11. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES- ACTAS DE VECINDAD

11.1. Objetivo General

Ejecución de Actas de Vecindad, según determinación técnica a los predios y/o áreas comunes que posiblemente pueden verse afectados, por las obras constructivas al contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.

11.2. Metodología

Procedimiento actividad levantamiento actas de vecindad

La actividad levantamiento actas de vecindad se realizó con el objetivo de determinar el estado actual de los predios, vías, espacio público, etc., de la zona a intervenir y de influencia directa del Contrato CO1.PCCNTR.699128 antes del inicio de las obras.

En su ejecución se realizó descripción técnica apoyada en registros fotográficos de cada zona a involucrar. Esta labor estuvo a cargo de los profesionales del área técnica y social del contratista.

Los pasos que se siguieron para esta actividad fueron los siguientes:

1. Se realizó inventario de predios vías espacio público y zonas a involucrar en la actividad, el cual debe corresponder a las zonas identificadas en visita técnica conjunta realizada previamente entre interventoría y contratista, el día 22 de enero de 2019.

2. Antes del inicio de la actividad se entregó volante y/o comunicado informativo a la comunidad involucrada, con información tal como: el objetivo de la actividad, la fecha de inicio y los responsables de la misma.

3. Se llevó a cabo por predio tres (3) comunicados informativos y tres (3) visitas con el fin de realizar el respectivo levantamiento del acta de vecindad, no obstante, en las visitas que no se logró comunicación efectiva con el propietario, persona responsable del predio o zona a involucrar en la actividad, se hizo entrega de un tercer volante informativo, el cual indico el día en que se llevó a cabo el levantamiento de acta de vecindad de fachada, sin firma que el contratista MYS se pueda hacer cargo en caso de futuras reclamaciones.

4. El profesional Social para esta actividad, realizo su labor como facilitador comunitario con los involucrados de la zona de influencia en actividades de convocatoria, acompañamiento y seguimiento del procedimiento, por lo anterior quién fue el responsable de la descripción de las viviendas, vías, predios y espacios públicos entre otros fue el profesional técnico (Residente de obra).

5. Por lo anterior según indicaciones técnicas, se realizó el siguiente inventario a predios, el cual sirvió como base para la ejecución de las actas de vecindad de inicio y que a su vez han sido entregadas para la revisión y firma de la interventoría, a la fecha se encuentran en proceso de revisión, dado a los ajustes que se tuvieron que realizar.

INVENTARIO DE PREDIOS

No. ACTA	NOMBRE DEL CONJUNTO	TORRE	APARTAMENTO
1	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	603
2	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	503
3	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	403
4	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	303
5	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	203
6	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	103
7	ALAMEDA DE PORVENIR 1	5	ZONAS COMUNES
8	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4Y5	ZONAS COMUNES
9	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	603
10	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	602
11	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	503
12	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	502
13	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	403
14	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	402
15	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	303
16	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	302
17	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	203
18	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	202
19	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	103
20	ALAMEDA DE PORVENIR 1	4	102
21	CONJUNTO BICENTENARIO	NO APLICA	SHUT DE BASURAS
22	CONJUNTO BICENTENARIO	NO APLICA	PAPELERIA
23	CONJUNTO BICENTENARIO	NO APLICA	SALON COMUNAL
24	CONJUNTO BICENTENARIO	NO APLICA	PANADERIA

25	CONJUNTO BICENTENARIO	CASA	2
26	CONJUNTO BICENTENARIO	CASA	38
27	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F02
28	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F04
29	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F06
30	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F08
31	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F10
32	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F12
33	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F14
34	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F16
35	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F18
36	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F20
37	CAMINOS DE PORVENIR II	CASA	F22
38	ESPACIO PUBLICO	VIA PUBLICA	CRA 103 CON CALLE 55 SUR
39	ESPACIO PUBLICO	SENDERO PEATONAL	COSTADO SUR
40	ESPACIO PUBLICO	VIA PUBLICA0	AV. CRA 103
41	ESPACIO PUBLICO	VIA PUBLICA	CALLE 55 SUR
42	ESPACIO PUBLICO	PARQUE INFANTIL	
43	ESPACIO PUBLICO	SENDERO PEATONAL	COSTADO OCCIDENTAL
44	ESPACIO PUBLICO	AREA A INTERVENIR	
45	ESPACIO PUBLICO	CANCHA MULTIPLE	

Tabla 06.

12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO CONTRATACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE

12.1. Objetivo General

Realizar el proceso de vinculación del 30% de personal Mano de Obra No Calificada (MONC) con el propósito de brindar oportunidades laborales incluyentes a personas en condición de vulnerabilidad brindando oportunidad de trabajo y así contribuir a mejorar sus ingresos económicos y calidad de vida de los habitantes del sector.

13.2. Metodología

Determinar los mecanismos de convocatoria para la contratación de personal de acuerdo a las necesidades de la obra, los lineamientos de contratación de mano de obra local los determinara el área técnica los cuales irán vinculadas a las necesidades de la misma obra.

En la reunión de inicio el día 08 de febrero de 2019 a la población asistente a esta reunión, la Constructora MYS les informo que a través de la dinámica de la obra del contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018, se iniciara la contratación de trabajadores del sector, para desarrollar labores como: Paleteros, ayudantes de obra, personal de servicios de generales, entre otros que clasifican en MONC- Es de aclarar que dicha contratación se realizara dependiendo las necesidades y programación de obra, a medida que el contrato este avanzando. A la fecha se han recibido (5) cinco Hojas de Vida de residentes del sector, las cuales se tendrán en cuenta según perfiles cuando el desarrollo de las obras constructivas lo requieran.

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

13.1. Objetivo General

Generar procesos de pertenencia en el ciudadano a través de su vinculación con el proceso de diseño y construcción para disfrute, de la comunidad en el acatamiento de normas de convivencia y paz, aceptación de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en el contexto; utilización y apropiación de lo público como un bien común que se cuida y protege.

13.2. Metodología

- Se realizará un taller pedagógico con los ciudadanos interesados en la construcción de los módulos de primera infancia , cuando la obra esté en el 60% de la ejecución, implementado temas orientados a la apropiación, buen uso, mantenimiento y cuidado de la obra en mención, para el desarrollo de este taller pedagógico el contratista tendrá en cuenta el protocolo de convocatoria a la comunidad interesada en la ejecución de la obra, con previa aprobación por parte de la interventoría y supervisión del contrato de la pieza comunicativa a divulgar para la invitación de dicha actividad, de igual manera se entregara con tres (3) días de anticipación el material a utilizar para el taller.

14. CONCLUSIONES

1. El Contratista MYS Constructora desde el área social cumple en este periodo con la ejecución de la reunión de Inicio de obra y la reunión con líderes y lideresas de la zona, del contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018, bajo lineamientos del P.G.S. e indicaciones de la Interventoría.

2. Se llevó a cabo la conformación del Comité de participación Ciudadana según lineamientos de la Ley 850 de 2003.

3. Se ejecutaron las Actas de vecindad de inicio, previo al inventario de predios y zonas comunes teniendo en cuenta la determinación e indicaciones técnicas, de las áreas a inspeccionar, para un total de 45 actas de vecindad realizadas.

4. Se instauro y atendió el Punto de Atencional a la Comunidad, teniendo como resultado una consulta ciudadana la cual a la fecha se encuentra en proceso, para darle el respectivo alcance y responder al ciudadano que instaura la solicitud.

5. Se efectúa con el protocolo designado el programa de información a la comunidad, entregando volantes informativos, para la ejecución de las actas de vecindad de inicio y la socialización de inicio de obra.

15. ANEXOS

Descripción de Anexo	No. De Anexo
Presentación de reunión con líderes y lideresas	01
Acta, registro de asistencia y fotográfico de reunión con líderes y lideresas	02
Presentación, acta, registro de asistencia y fotográfico de reunión de Inicio con la comunidad.	03
Convocatoria de Reunión de Inicio	04
Divulgación de la Información, zona de influencia para ejecución de actas de vecindad de inicio	05
Inscripción al Comité de participación Ciudadana	06
Arte de avisos para puntos satélites y PAC	07
Carta de solicitud ciudadana	08

Tabla 07.

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

MxS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Versión 0
Fecha Emisión
24-Feb-2017

ACTA DE REUNIÓN

Inicio	3:30 pm	Fin	4:30 pm	Lugar	Campos de Porvenir 05
Proyecto	CONTRATO CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1			Contrato No.	699128-2018
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia	Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	01/02/2019	Elaborado por	Margarita Romero	Próxima Reunión	

Se da inicio a reunión con lideres de la Comunidad del sector Porvenir Profesional Social del Contratista Margarita Romero da Bienvenida a los asistentes y agradecimientos por la asistencia. A continuación se da lectura a la agenda del dia, Presentación de los asistentes, objetivo de la reunión, generalidades del Contrato: Valor, duración del contrato, Area de Intervención, Licencia de Construcción, población beneficiada. Desde el componente tecnico el ingeniero Andres Ramirez realiza la explicación de la ubicación del proyecto el cúal contara con 2 pisos, aclara que la cimentación a realizar es superficial, los espacios con el que contara el proyecto (Aulas, zona de descanso, cocina, Parqueadero, comedor, baños, deposito, Judoteca aclara que el andén de 3mts se conservara.
Desde el componente Ambiental el ingeniero Victor M. Rojas aclará que ambientalmente el impacto es minimo, Dentro de la obra maneja 2 Programas que son Plan de manejo Ambiental.
Desde el componente SST la ingeniera Janeth Rodriguez, este esta enfocado al cuidado de cada uno de los trabajadores brindarles seguridad en el trabajo, reposicion de EPP.
Profesional Social Margarita Romero manifiesta que este proyecto esta diseñado para beneficio de la Comunidad, por tanto dentro de este proceso los programas a desarrollar existen las siguientes Actividades: Conformación de un comité de participación para lograr un canal de informacion asertiva, Divulgación de la información, Contratación de MONC. El programa de información tendra socralización de Inicio de Obra, avance de obra, Socialización de puesta en servicio. Informa a las asistentes que dentro de las actividades a ejecutar es el levantamiento de actos de vecindad (vias, predios, mobiliario) inicial antes de iniciar Obra donde se registra el estado de el predio, etc, actas de Seguimiento y actos de Cierre. Otro programa es la Atención al ciudadano donde se tiene una linea telefónica, correo electronico.
El ingeniero Andres manifiesta el fin del cerramiento que tendrá la obra, este se realizará en polisombra, la obra contará con seguridad, no se permitirá

Scanned by CamScanner

MyS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RAP62
Versión 0
Fecha Emisión
24-Feb-2017

ACTA DE REUNIÓN

Inicio	3:30 pm.	**Fin**	4:30 pm	**Lugar**	Caminos Porvenir 5
Proyecto	CONTRATO CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1			**Contrato No.**	699128-2018
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia	**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	01/02/2019	**Elaborado por**	Margarita Romero	**Próxima Reunión**	

el ingreso de personas ajenas a la obra.
Profesional Social interviene para aclarar sobre el programa de contratación de Mano de Obra no Calificada la cual tendrá en cuenta personal de la localidad que cumplan con los requisitos exigidos por la constructora.
Integrante a reunión pregunta si despues de ejecutada la obra las personas del sector podrán aspirar a algun trabajo. Profesional Social de SED Felipe manifiesta que en temas de contratación se deben cumplir requisitos que pide la SED.
Profesional Social Margarita pide a los lideres que opinan del proyecto. Los cuales manifiestan agrado por el proyecto ya que beneficia mucho al sector. ya que contará con todas las garantias para los niños.
Se programa reunion de socialización de Inicio el dia 08 de febrero de 2019 a las 11:00 am en el salón Social de Conjunto Bicentenario 2.

Scanned by CamScanner

MyS Construcción

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Acercamiento Líderes			Proceso:	SOCIAL
Área Responsable:	Social	Fecha:	1 FEB 2019	Lugar:	CAMINOS DEL PORVENIR S
Contratista responsable:	MyS CONSTRUCTORA			Hora:	3:30 pm

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Cardina Triviño	Residente social	INTERVENTORÍA	3168315748	ictrimor.93@gmail.com	
2	Marcela Penoso	presidenta	caminos V	3115965580	Marcerey Rock Gmail	
3	Adriana Canchón	Secretaria.	Caminos VI	3205316395	adrianacanchoncruz@gmail.com	
4	Jorge H. Pinto T.	Aduxon.	Bicentenario 2.	3208236182	Pintomoraj@Yahoo.com	
5	Jannetth Rodriguez S	Profesional SST	Contratista.	3118049724	Residentesst@Gmail.com	
6	Victor Manuel Rojas	Ing Ambiental	Contratista	32[illegible]4935	Ambiental2zonadcaminos@gmail.com	
7	Carlos L. Medina	Director O.	Contratista	3214692680	DIR.OBRAYSALDIN.MYS@GMAIL.COM	
8	Andres Ramirez	Residente	Contratista	3043493526	residenteporvenir@gmail.com	
9	Felipe Correal Diaz	Social-SED	DCCEE-SED	3177821827	fcorrealpedraria@gmail.com	
10						
11						
12						
13						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
01/02/2019	REUNION LIDERES SOCIALES PORVENIR SECTOR VII	

REGISTRO REUNION LIDERES SOCIALES









PORVENIR SECTOR VII

SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON LA COMUNIDAD



CONSTRUCCIÓN - COLEGIO DE PRIMERA INFANCIA PORVENIR VII SECTOR CPF760 DE LA LOCALIDAD DE BOSA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

AGENDA DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019

- ❑Presentación de los asistentes.
- ❑Objeto de la Reunión.
- ❑Generalidades del Proyecto.
- ❑Componentes del Proyecto.
- ❑Cerramiento de Obra.
- ❑Intervención de la Comunidad.
- ❑Compromisos.

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES

MyS Constructora

Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018

Contratista

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

Contrato COP1.PCCNTR.695946 de 2018

Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Entidad Contratante

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Informar a la comunidad del área de Influencia directa del sector que circunda la obra de CONSTRUCCIÓN - COLEGIO DE PRIMERA INFANCIA PORVENIR VII. con el fin de establecer canales de comunicación, dar a conocer las generalidades del proyecto desde cada una de las áreas de intervención y presentar el grupo de profesionales a cargo del proyecto desde la SED, Interventoría y Contratista.

.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

GENERALIDADES DEL PROYECTO


No. de Contrato de obra	CO1.PCCNTR.699128
Valor del Contrato	$4.516.124.444 (Cuatro mil quinientos dieciséis millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/).
Duración del Contrato	7 meses aproximadamente
Área de Intervención	Primer piso: 973,82 m2 Segundo piso: 678,50 m2 Total construido 1652,32 m2
Licencia de Construcción	LC 17-2-0788

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Calle 55 Sur No. 103-98

COMPONENTES DEL PROYECTO

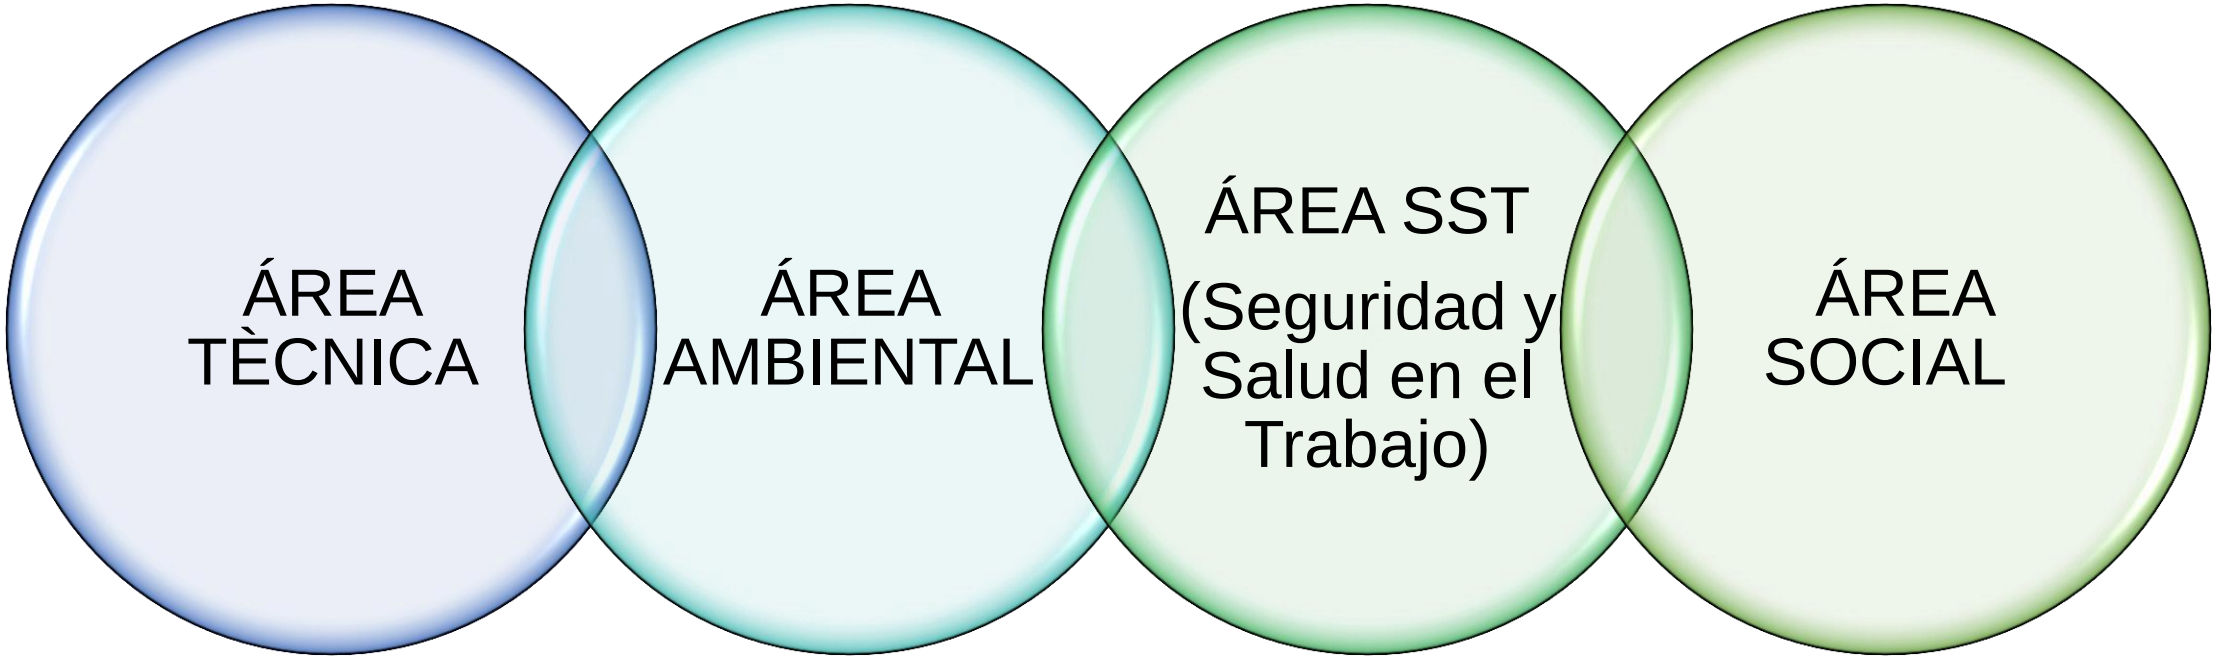

POBLACIÓN BENEFICIADA

220 Niñas y Niños de Primera Infancia

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ESPACIO	CANTIDAD
Aulas	9
Zona de Descanso o Dormitorio para los tres ambientes de aprendizaje de preescolar.	3
Área de almacenamiento de material didáctico y colchonetas.	9
Extensiones para los ambientes de aprendizaje.	1
Ludoteca	1
Baños	3
Deposito	2
Parque infantil y zonas de recreación	1
Oficina de coordinación, dirección, secretaria, sala de profesores, baños, estar y cafetería y ayudas pedagógicas	1

ESPACIO	CANTIDAD
Aula – Comedor	1
Cocina	1
Tienda escolar	1
Primeros auxilios	1
Bodega - Taller – Almacén	1
Equipos – Bombas	1
Basuras	1
Personal	1
Portería	1
Vestíbulo	1
Subestación eléctrica	1

ÁREA TÉCNICA




ÁREA TÉCNICA




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


PLANTA PRIMER PISO

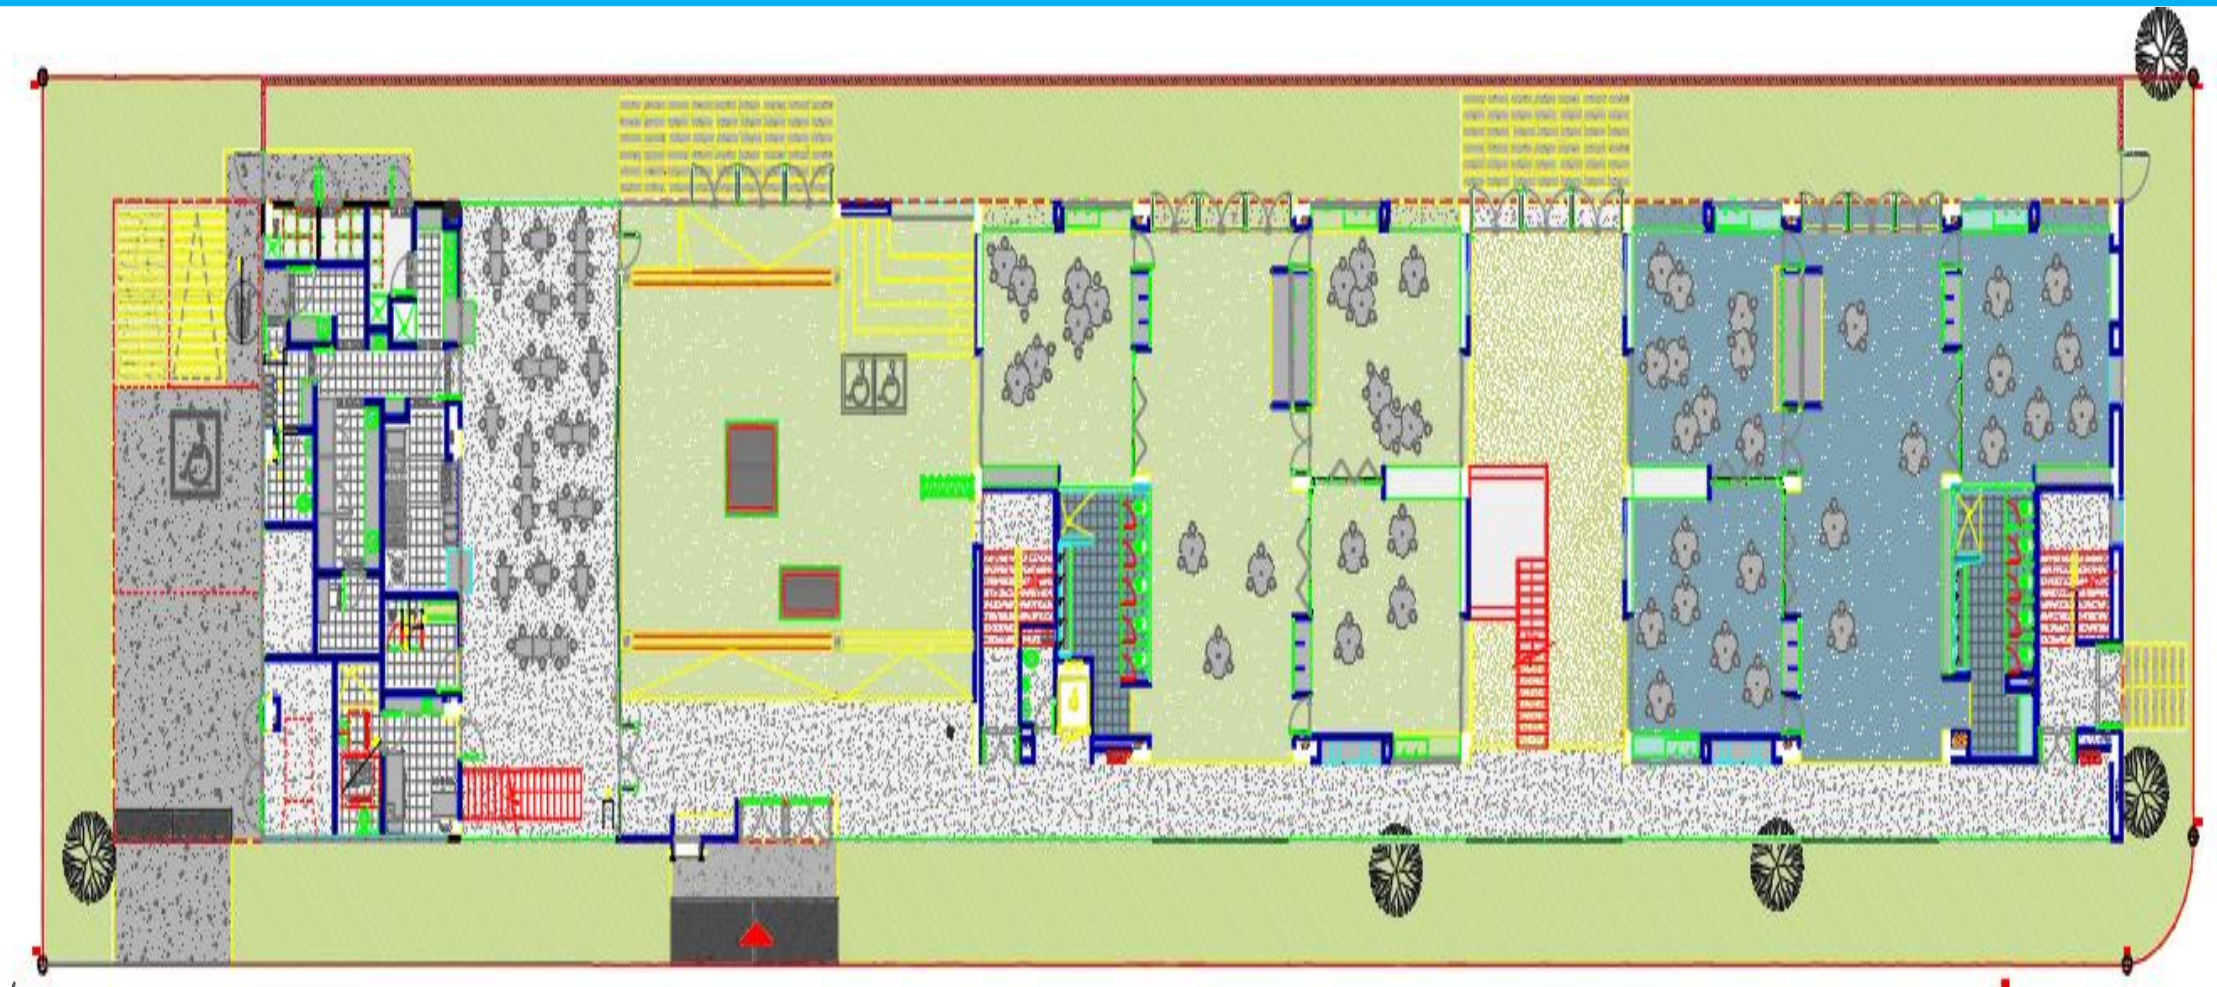

PLANTA SEGUNDO PISO

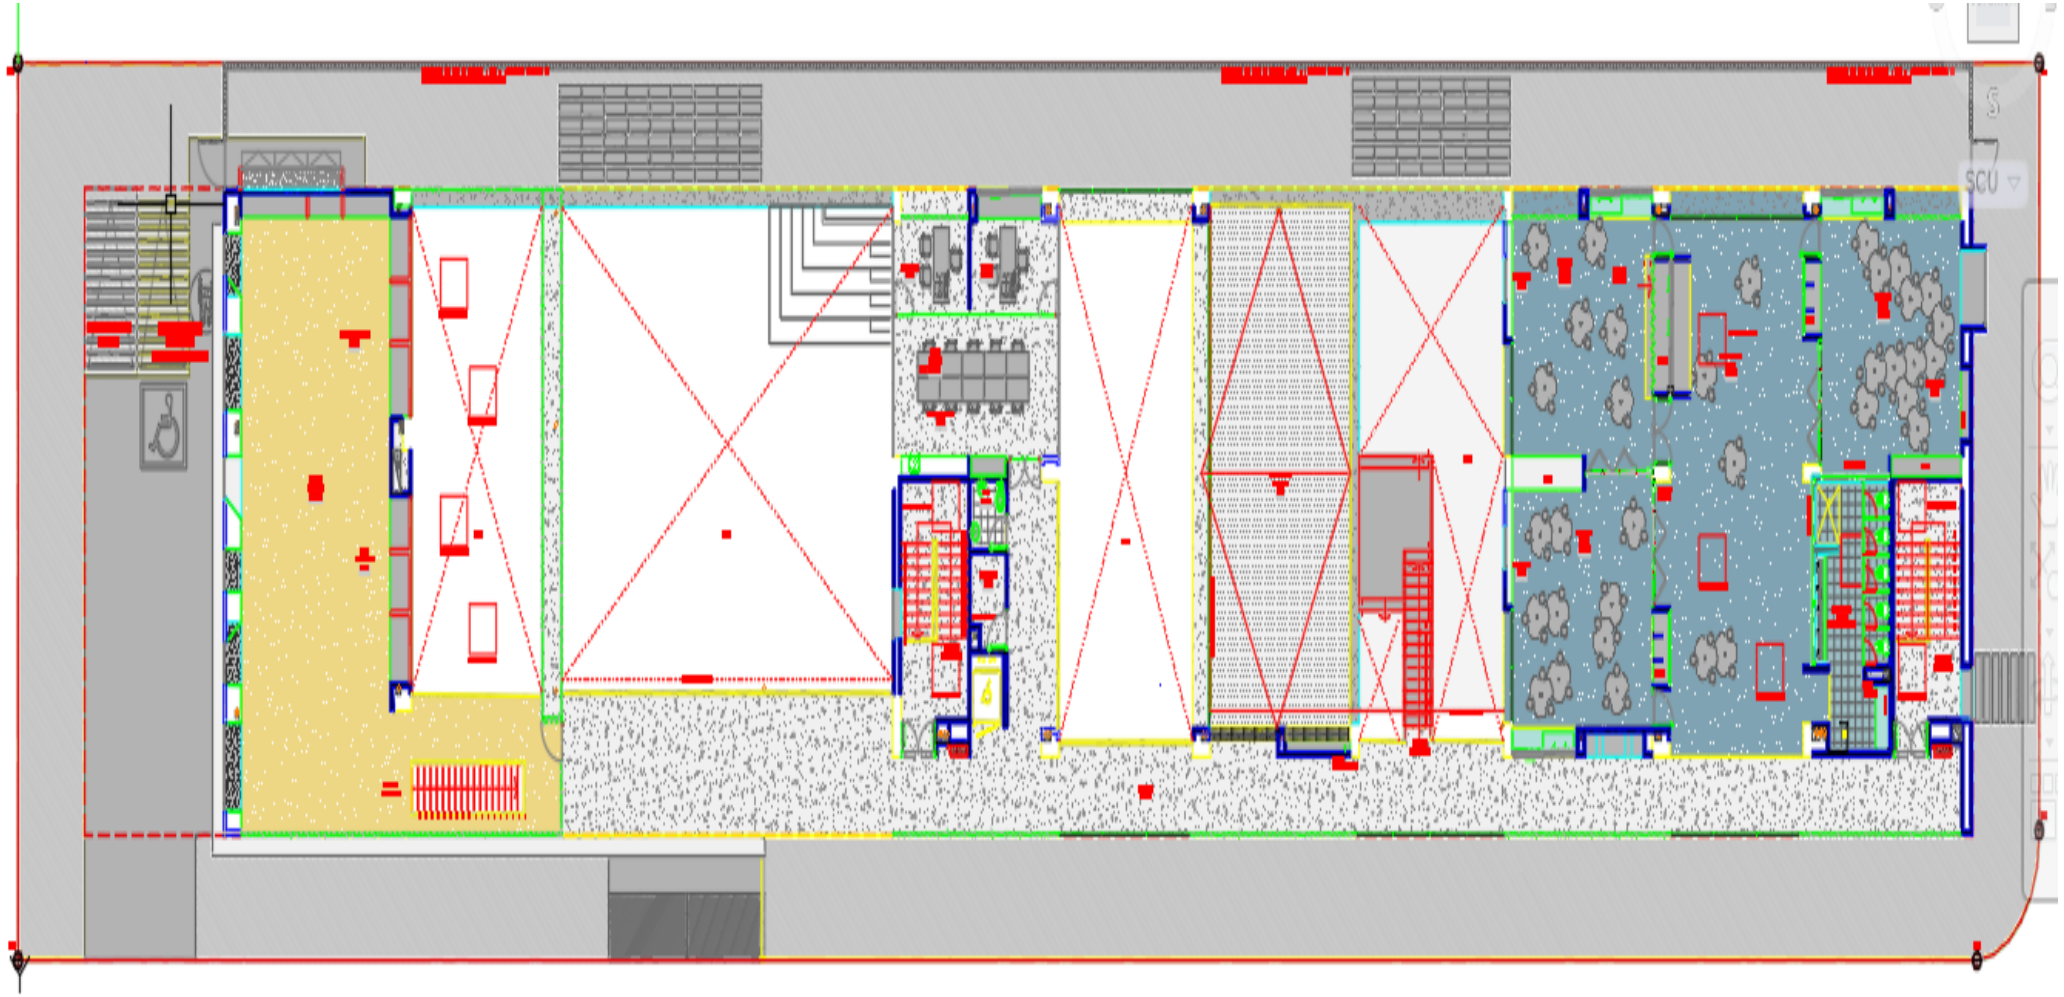

ÁREA AMBIENTAL

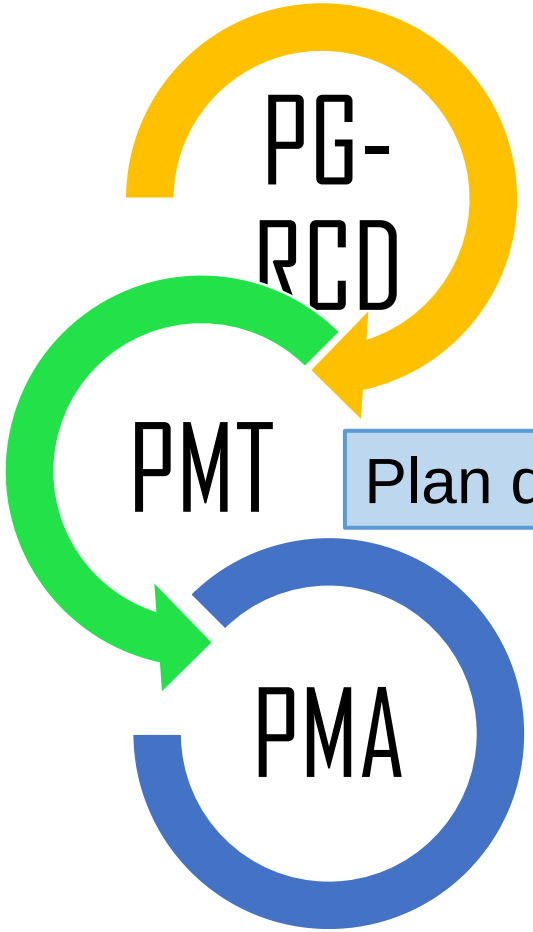


Programa Residuos de Construcción y demolición

Plan de Manejo de Trafico

Plan de Manejo Ambiental

ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

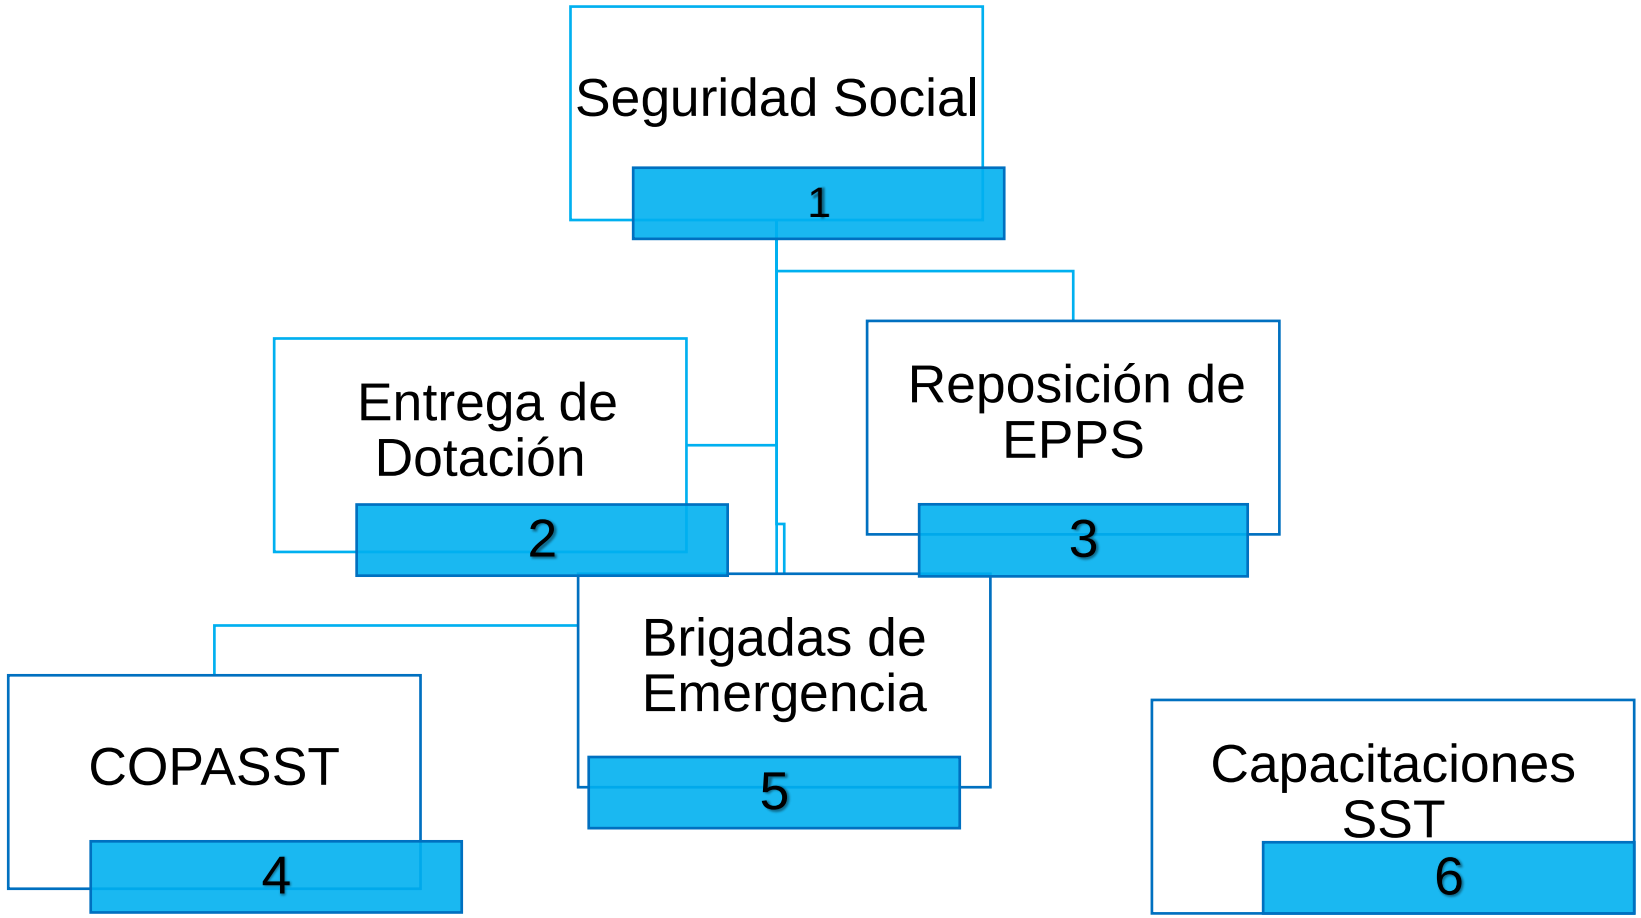

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


ÁREA SOCIAL


Comunidad Educativa
Actores del territorio
Otros Actores
Secretaria Educación Distrital
Comunidad del entorno
Actores del proceso


PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

- Programa de Divulgación de la Información
- Programa de Organización Social y Participación Ciudadana
- Programa de Atención al Ciudadano
- Programa de Generación de empleo
- Programa de Sostenibilidad

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

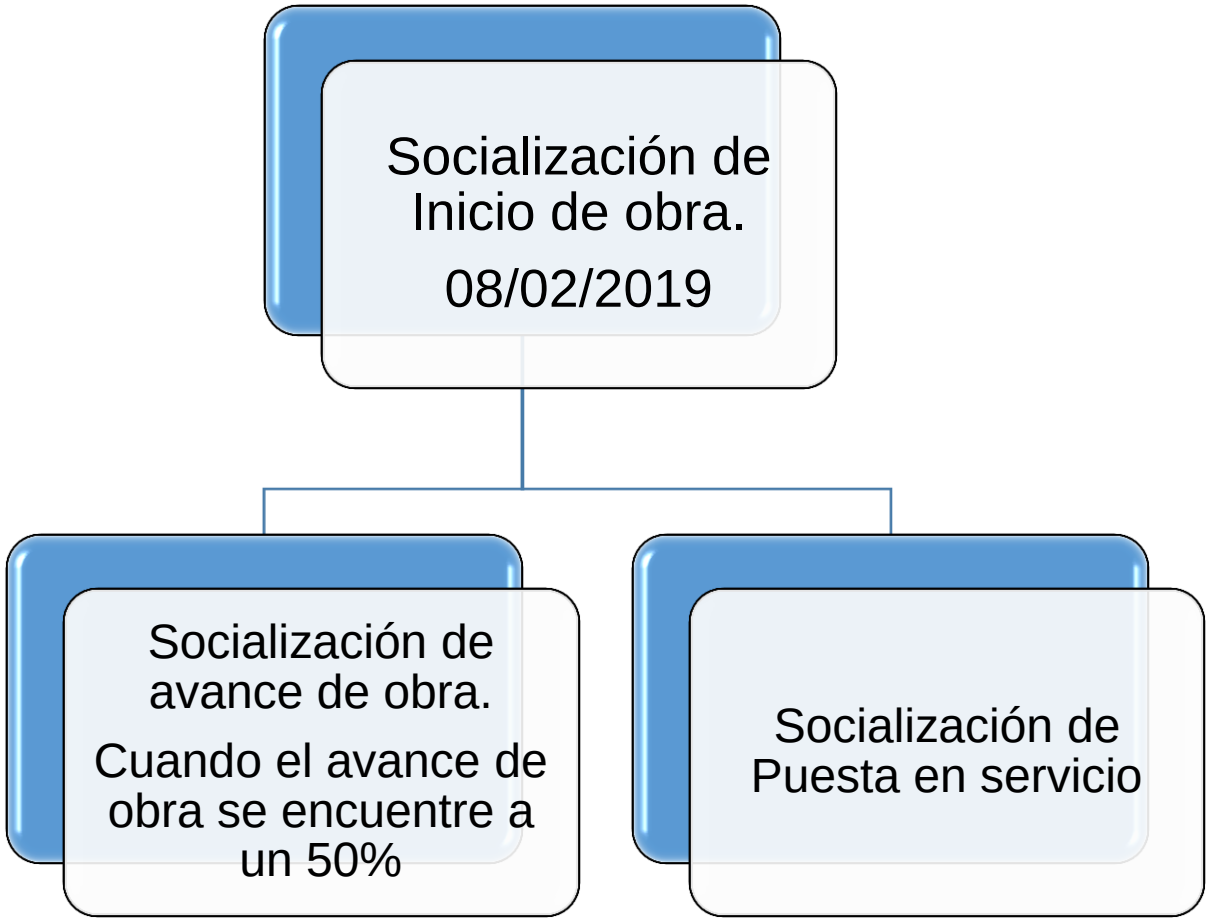

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

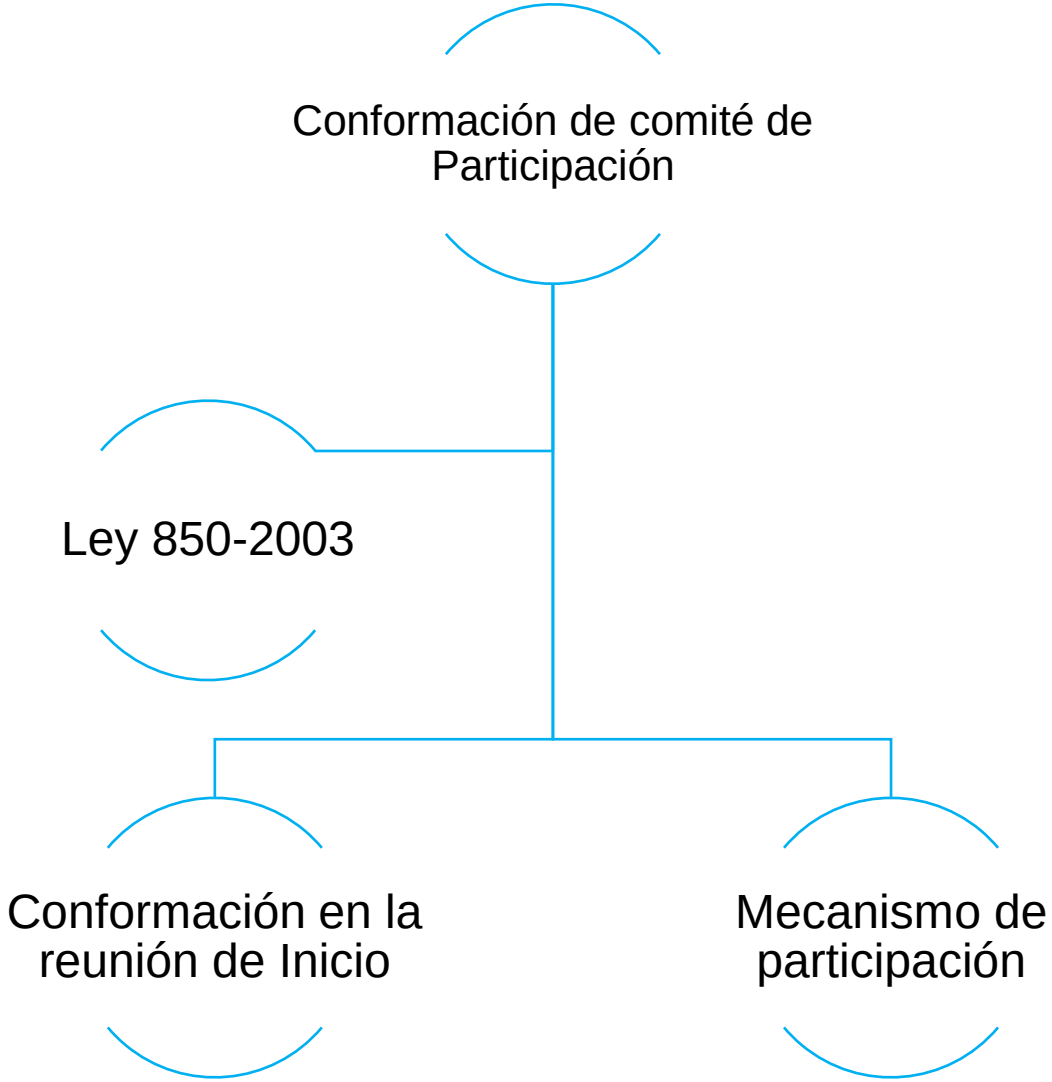

- Para conformación del Comité de Participación Ciudadana, como lo decreta la Ley 850-2003 solo es necesario Inscribirse en la socialización de Inicio, participar activamente de los encuentros mensuales , ser canal de comunicación de los temas tratados con el resto de la comunidad de influencia del proyecto y tener disposición de tiempo para las reuniones que se programaran.

PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA



Correo electrónico

atencioncomunidad.porvenir@gmail.com



Líneas de Atención

3172149201 / 3183484944

Equipo Social

T.S. MARGARITA ROMERO VARGAS - NUBIA HORTUA

Atención a cualquier Petición, Queja, Reclamo o Solicitud, por parte de la Comunidad en general.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO


CONTRATACIÓN DE MONC
Estratos socioeconómicos 1-2-3

LOCALIDAD DE BOSA

PERFILES REQUERIDOS:

*PALETEROS
*AYUDANTES DE OBRA

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

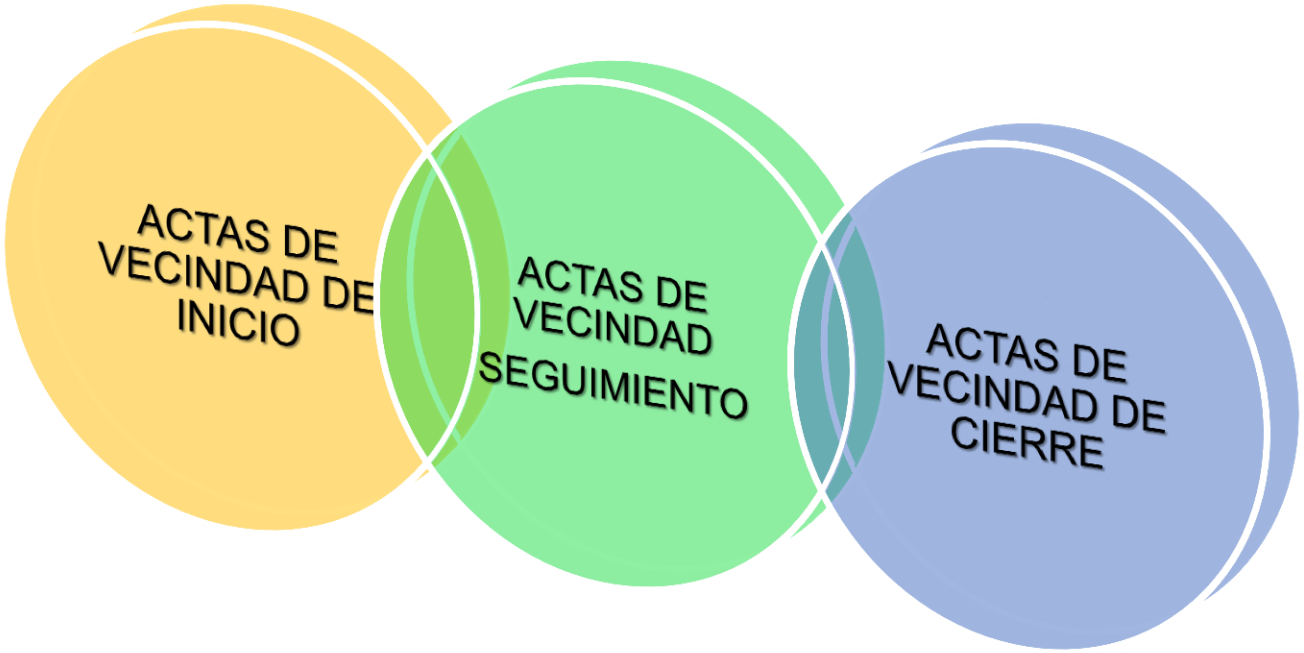

Las actas de Vecindad de son un documento que se construye a través de registro escrito, fotográfico y fílmico en el área de influencia directa del proyecto (unidades residenciales y espacio publico). Este documento será firmado por los propietarios de los predios y/o encargados de los mismos, el Contratista y la interventoría. Este documento permitirá garantizar que las zonas mencionadas, se conserven en el estado que se encuentran antes de iniciar la obra.

CERRAMIENTO DE OBRA



Se proyecta iniciar con el cerramiento de obra y las mediciones topográficas el día 11/02/2019.

Con el fin de evitar:

- ❑ Cualquier tipo de accidente o incidente con la comunidad que transite o viva cerca a la obra. (Es importante que la comunidad no traspase el cerramiento o lo destruya).

Es importante tener en cuenta que:

- ❑ No será permitido el ingreso a la obra de personal no autorizado, puesto que el contratista no podrá responder por personas o situaciones ajenas a las que laboran en el presente contrato.

?

- INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS PACTADOS EN LA REUNIÓN

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MyS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura

ACTA DE REUNIÓN

RAP62
Versión 0
Fecha Emisión
24-Feb-2017

Inicio	11:00 am	**Fin**	12:20 am	**Lugar**	Bicentenario 2.
Proyecto	CONTRATO CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1			**Contrato No.**	CO1.PCCNTR 699128-2018
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia	**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	08 Febrero 2019	**Elaborado por**		**Próxima Reunión**	

Se da inicio a reunión Socialización de inicio Profesional Social Margarita Romero da bienvenida a los asistentes y explica el objetivo de esta reunion, a continuación informa la agenda a desarrollar: Presentación de las entidades participantes y profesionales asistentes. Generalidades del contrato: Numero, valor del contrato, Duración, area de intervencion, Licencia de construcción. A continuación da lectura a los componentes que tiene este proyecto como son: área técnica, ambiental, SST, y social. la población beneficiada son 230 niños y niñas Aprox. Desde el área tecnica el ingeniero Andres realiza explicación de la planta Arquitectonica del proyecto las cuales tiene todas las normas que se deben cumplir en su totalidad. 9 areas, zona de descanso, Ludoteca, Baños, depositos, area donde tendra planta.
Esta compuesto de 2 plantas. Desde el área ambiental el ingeniero Victor Rojas informa que este proyecto tiene una normatividad desde medio ambiente como es el manejo de residuos, el PMT, PMA son todos los programas que sirven para mitigar los impactos que ambientalmente genere este tipo de intervenciones. Desde el area de SST la ingeniera Janeth Rodriguez, explica que debe cuidar a todos los trabajadores, capacitarlos, ofrecer los elementos necesarios para este tipo de trabajos (salud, guantes, overoles). Desde el área Social profesional Margarita Romero explica los programas como son: Divulgacion de la información. el cual cuenta con la ejecución de 3 reuniones (Inicio, avance, Puesta en Servicio) donde se dara información del estado del contrato. Programa de organizacion social y participacion Ciudadana: conformación comite de participacion Ciudadana el cual se reunira mensualmente Programa de atención Ciudadana - canal de comunicación telefonica y por correo. Programa de generación de empleo: estratos socio-economicos 1-2,3 que residan en la localidad de Bosa y perfiles requeridos - *Ayudantes de Obra - Paleteros. Programa de Sostenibilidad donde se tiene contemplado ejecución de actos de Vecindad de inicio - seguimiento y cierre. Informa que se tiene proyectado realizar el cerramiento el dia 18 febrero de 2019.
A continuación se da la palabra a la comunidad con las inquietudes

Scanned by CamScanner

MYS CONSTRUCCIÓN | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | CARLOS VERGARA HIGUERA Ingeniería & Arquitectura

ACTA DE REUNIÓN

RAP62
Versión 0
Fecha Emisión
24-Feb-2017

Inicio	11:00 am	**Fin**	12:20 pm	**Lugar**	Bicentenario 2
Proyecto	CONTRATO CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1			**Contrato No.**	CO1 PCCNTR 699128- 2018
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia	**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	08/Febrero/2019	**Elaborado por**		**Próxima Reunión**	

La Señora Carolina pregunta cual sera el área de construcción. Pta Solo se interviene un área especifica dejando zona de niños sin intervenir. Manifiesta que esperan que esta construcción quede completamente dotado. Pide que el contratista cumpla con el porcentaje de MONC. Pide que el PMT tenga en cuenta las vias y se tenga registro del estado ~~de~~ actual. Profesional Social de Secretaria de Educación: manifiesta que la dotación estará ~~el~~ instalado en su totalidad para entrega a la comunidad. El registro fotografico se esta llevando a cabo. Comunidad en general manifiesta -que solicitan sean tenidos en cuenta para que los niños del sector sean los beneficiados. Profesional Social de SED informa que estos procesos serán informados a la comunidad. Madre comunitario manifiesta que esta localidad necesita espacios para niños pequeños ya que esta localidad no cuenta con estos espacios adecuados para este tipo de Población.
Profesional Social del Contratista a formar parte del comite de participación Ciudadana explica que este comité se reunirá mensualmente y conocerá los avances tecnicos ambientales, SST y Sociales que tenga la obra.
Integrante de la Comunidad Solicita que para proximas reuniones hagar presencia funcionarios de la alcaldia local. Profesional Social del contratista manifiesta que esta solicitud será tenida en cuenta.

Scanned by CamScanner

MyS Constructores

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Reunión Socialización Inicio			**Proceso:**	**SOCIAL**
Área Responsable:	Social.	**Fecha:**	08-Febrero-2019.	**Lugar:**	Salón Comunal Bicentenario
Contratista responsable:	**CONSORCIO SAN PABLO**			**Hora:**	11:00 a.m.

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maria Tobar			3103282260		Maria L Tobar
2	Filomena Ramirez			7344031		Filomena Ramirez
3	LuzMarina Sandoval			7344031		LuzMarina Sandoval
4	Bertha Bermudez			3004277658		Bertha Bermudez
5	Maria Inés Tombana			3108258088		Maria Tombana
6	Lucas Campos S.			31050624 24		
7	Adolfo PEÑA			3134956668		Adolfo PEÑA
8	JHON Quintero			3004451175		
9	Alfonso Camacho	presidente comunal		3143885888		
10	Elsa Arevalo			3223194071		Elsa Arevalo
11	Karen Murcia			3215876348		
12	Enriqueta Mantilla			3105886948		Enriqueta Mantilla
13	William Lozano Garzón			3185764248		William Lozano

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | CARLOS VERGARA HERRERA Ingeniería & Arquitectura

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Reunión Socialización Intao.			**Proceso:**	**SOCIAL**
Área Responsable:	Social	**Fecha:**	08 febrero /2019	**Lugar:**	Bicentenario 2
Contratista responsable:	CONSORCIO SAN PABLO			**Hora:**	11:20 am.

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ana Eluia Pinzón			5764517		
2	Victor Rosas	Ing. Ambiental y Contratista		3219349355	ambiental.tundra.ing@gmail.com	
3	Jannetth Rodriguez	Profesional SST Contratista.		3118049724	residentesstporvenir@gmail.com	
4	ANDRES RAMIREZ	RESIDENTE	CONTRATISTA	3043493526	residenteporvenir@gmail.com	
5	Carlos L. Medina h.	DIRECTOR	CONTRATISTA	3214692680	DIRCOBEL1@EDIN.MEDELLIN.GOV.CO	
6	Cristian Camilo Muñoz	Residente.	Interventoria.	3166998103.	cvnporvenir.bca@gmail.com.	
7	Carolina Triviño	Res. Social	INTERVENTORÍA	3168315748	ctrivar.93@gmail.com	
8	Jorge Pinto Jara	Administrador	Bicentenario 2.	3208236182	Pintomaraj@yahoo.com	
9	Felipe Campos Diaz	Soc. SEDCE	SED - DCCEE	3179818624	farcadeaneari@gmail.com	
10						
11						
12						
13						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS VERGARA MEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Reunión Socialización Inicio			**Proceso:**	**SOCIAL**
Área Responsable:	Social	**Fecha:**	08-febrero/2019	**Lugar:**	Bicentenario 2
Contratista responsable:	CONSORCIO SAN PABLO			**Hora:**	11:00 a.m

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ana Bertilde T		5160776	7116916		
2	Elvia Buitrago			3122182153		Elvia Buitrago
3	María Yeny Silva C	Líder		3132129206	yenyelenigsr@gmail.com	
4	Lilia Muñoz G			3103042730		Lilia Muñoz
5	Andrea Aragón			3183010610	andreamaricamargal.com	
6	Mª Emilcis Cepeda	Líder		3118261824	emilcis56@hotmail.com	
7	Adera Sindy			3214328[illegible]2		
8	Diancis Escalante			3103374886		
9	María Alicia Sevia			3124174[illegible]2		
10	Emilia Jiménez			7337308		
11	Diana Carolina Villamil			3046738602	D5283532@Gmail.com	Diana Villamil
12	Mariam cabeza R			320-7296209		Mariam cabeza
13	SORANY AGUIRRE R			3123699427		SORANY AGUIRRE

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS Consultorías | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Reunión Socialización Inicio			**Proceso:**	**SOCIAL**
Área Responsable:	Social	**Fecha:**	08-febrero/2019	**Lugar:**	Bicentenario 2
Contratista responsable:	CONSORCIO SAN PABLO			**Hora:**	11:00 am.

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ricaurte Rodríguez		3702421663			
2	Robinson Diaz		3223686369			Robinson Diaz
3	Yaisa Antonia C		3223126114			
4	Adriana Pinzon		3184455315			
5	Samuel Mendoza		3165567923			
6	Martha t. Galindo A.		23753117.			Martha t. Galindo A.
7	Yoselin Beltran Toledo		3176827855			
8	Nohora Isabel Cardenas		3214234572.			
9	Maria Alarcon		52537469			Maria Alarcon
10	No lleva placa		51658390			Pedro Ruiz
11	José Hernando Sandoval		17305301			
12	Ruben Ordoñez		3549108			Ruben Ordoñez
13	Miguel Antonio Lopez		2300772			

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS Arquitectura

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS VERGARA MEGRETE Ingeniería & Arquitectura

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Reunion Socialización Inicio			**Proceso:**	**SOCIAL**
Área Responsable:	Social	**Fecha:**	08-febrero/2019	**Lugar:**	Bicentenario 2
Contratista responsable:	CONSORCIO SAN PABLO			**Hora:**	11:00 a.m

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Miguel Gonzalez P.			3002861493		
2	M Libia Betancur			310 5901901		
3	Claudia Carrion				mana-311@yahoo.es	
4	LuisGabriel82			3102341431		
5	EnvicePinzon			3125677682		
6	Sonia Castro			3112969730	soniaycastro1973@gmail.com	
7	carlos Andres Cuño			3112410476		
8	gladys tovar			3203190239		
9	Sandi castro			3043947714		
10	Salomon Policia			7384497		
11	GERMAN MUEDOS.			80053763		
12	Maia			28'626938 13		
13	Flor prado			3155060965		

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

GRUPO COMITE PARTICIPACION CIUDADANA
PORVENIR.

MyS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARLOS VERGARA MEMBRETE Ingeniería & Arquitectura	RAP63 Versión 0 Fecha Emisión 24-Feb-17			

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Conformación Comite Participación Ciudadana			**Proceso:**	**SOCIAL**
Área Responsable:	Social	**Fecha:**	08-febrero/2019	**Lugar:**	Bicentenario 2
Contratista responsable:	CONSORCIO SAN PABLO			**Hora:**	11:00 am

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Carolina Villamil			3046739602	D52831532@Gmail.Com	Diana Villamil
2	Sonia Casbo			3112967390	soniaycasbo.1973@gmail.com	
3	Yuma Bertha Morales			3176827859	leonardomaria2015@gmail.com	
4	Jorge H. Pinto Mon			3208236182	Pintomarija@Yahoo.Com	
5	Lucero Campos S.		8025213 luceroCampos23	3105062424	Alba. lucero	
6	Maria Libia Betancur.			3105901901		Libia Betancur
7	NOHORA ISABEL OREJUELA			3219239572	mischiquis19@gmail.com	
8	GERMAN ACEVEDO			3112523436	germandavinci@gmail.com	
9	Ana Elvia Pinzón		3143143637	5764517		
10	Maria Mery Silva			3132129206		
11	Martha Galindo			3202790096		
12						
13						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
08/02/2019	REUNION SOCIALIZACION DE INICIO	

REUNION DE INICIO









PORVENIR SECTOR VII

MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
08/02/2019	REUNION SOCIALIZACION DE INICIO	

REUNION DE INICIO









PORVENIR SECTOR VII

Comunicado No. 02

Fecha: 04/Febrero/2019
Sector: Porvenir VII
Contrato: No. CO1.PCCNTR.699128 de 2018.
Contratista: MYS CONSTRUCTORA

INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN DE INICIO

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y la Firma MYS CONSTRUCTORA, le invitan a participar en la Socialización de inicio del Contrato No. CO1.PCCNTR.699128 de 2018. la "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

Para la Secretaría de Educación, EL contratista MYS CONSTRUCTORA; y la Interventoría Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura, es de vital importancia su presencia en la reunión; ya que, se informaran las actividades adelantadas en las áreas Técnica y Social.

- **Lugar:** **Conjunto Residencial Bicentenario etapa 2**
- **Dirección:** **Calle 55 sur No. 103-49**
- **Fecha:** **Viernes 08 de Febrero de 2019**
- **Hora:** **11.00 a.m.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atención a la comunidad :
T.S. Margarita Romero –Nubia Hortua
Teléfono Móvil: 3172149201/3183484944
Correo electrónico:
atencioncomunidad.porvenir@gmail.com

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.699128
Hoja 1 de 1	

04	02	2019.
DD	MM	AA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

RAP59
Versión 0
Fecha emisión: 24-feb.-17

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES 1° COMUNICADO SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA CON LA COMUNIDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Jose Eliecer Trivino	Cra 100 #56A - 15	Camino Porve VI	8054621		10. Volantes
2	Reinaldo Polo	Cra 100 #56F 15	Caminos Porve 5			8. Volantes
3	Guillermo Duarte.	Cra 99 #54D-18Sur	Camino Porv. 1	(378) 7387710		8. Volantes
4	Ricardo Moreno	Clle 55sur #100-06	Caminos Porve II	3929337		9. Volantes
5	Albert Perez	Clle 55sur # 102A-08	Camino Porve III	7710884	ALBERT PEREZ	8. Volantes
6	Marcela Mejia		Bicentenario 3	3124298837		15. Volantes
7	Jorge Pinto.	Clle 55sur # 103--49	Bicentenario 2	3205236182		7. Volantes
8	Jhon Vega	calle 55 Sur # 104-49	Alameda Porve 2	2809531		7. Volantes
9		Clle 55sur # 104-48.	Alameda Porve 1			8 Volantes
10	Jose David Tamgarife			3194765608		
11	Jaime Cardenas			3194765608		
12	Jhon Castro	Clle 54F #103-30.	Emmental	4605300		
13	Luis Jimenez	Clle 54C sur #102-25	Villa de Paveni 2	4602377		
14	Juan Chaverra	calle 54C sur #100-75	Villas Porvenir 1	4672729		
15	Marlon Valbuena.	calle 54 Sur # 100-24	Torres del Porvenir	3082627	Marlon Valbuena	
16	Carlos Rodriguez		Estación CAI	7859260		

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría


Scanned by CamScanner

MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
04/02/2019	CONVOCATORIA SOCIALIZACION DE INICIO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA



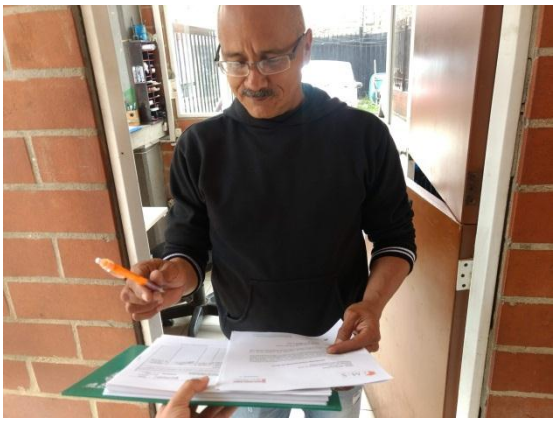







PORVENIR SECTOR VII

MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
04/02/2019	CONVOCATORIA SOCIALIZACION DE INICIO	

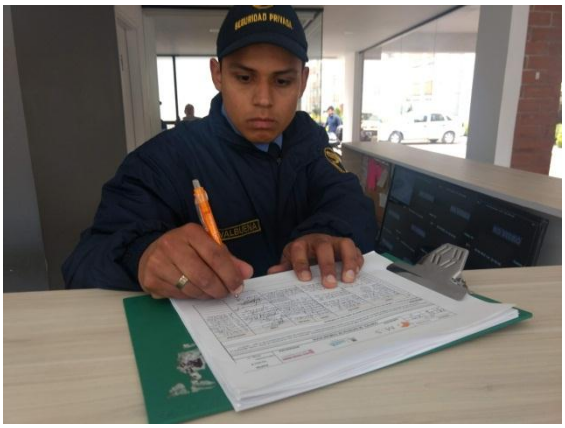



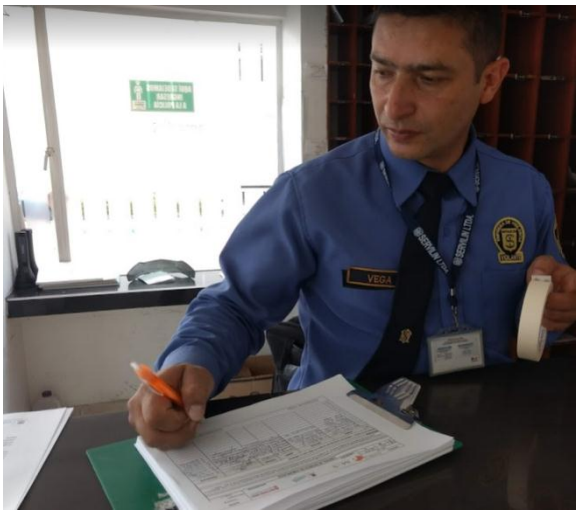



PORVENIR SECTOR VII

INFORMACIÓN DE INTERES PARA LA COMUNIDAD
PRIMERA VISITA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA: PROYECTO PORVENIR VII SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CONTRATISTA GYM CONSTRUCTORA
No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.

INTERVENTORIA
Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura No. Contrato COP1.PCCNTR.69594 6 de 2018.

Atención a la Comunidad:
Margarita Romero Vargas
Nubia Hortúa
Tel: 317 2149201
Correo electrónico:
atencioncomunidad.porvenir@gmail.com



(Visita N.1) **Comunicado 01**

Señor(as) Propietario(as) de las unidades residenciales vecinos al proyecto PORVENIR VII, **La Firma Contratista MYS CONSTRUCTORA** informan que en el desarrollo del **Contrato CO1.PCCNTR.699128** cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1". Realizara una visita a su predio para hacer el levantamiento de un acta de vecindad de inicio previo a la construcción de las obras concernientes a los módulos de primera infancia en el sector de Porvenir VII en la localidad de Bosa.

Esta actividad consiste en la verificación del estado actual de los predios adyacentes al lugar donde se hará la construcción del Jardín infantil, con el fin de contar con un soporte fotográfico y escrito de cada inmueble, en caso de que exista alguna afectación y/o reclamación durante o posterior a las actividades de obra. Por tal razón, se requiere la presencia de los propietarios y/o encargados.

El Levantamiento de las Actas de Vecindad se iniciara a partir del día miércoles 06 de febrero de 2019 a las 8:00 a.m.

A continuación, relacionamos las personas autorizadas para el desarrollo de la actividad:

CONTRATISTA
Profesionales sociales:
Margarita Romero Vargas . C.C.52827506
Nubia Janeth Hortua. C.C. 20485497
Ing. Andrés Ramírez C.C. 1.073.682.188

En caso de no obtener respuesta en tres (3) oportunidades, Se deja constancia que ya formalizadas las visitas referenciadas y en atención a que no fueron atendidas las visitas realizadas por el Contratista, GYM CONSTRUCTORA no tendrá responsabilidad alguna ante futuras reclamaciones por parte del propietario.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.699128
Hoja 1 de 1	
04 (DD)	02 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

RAP59
Versión 0
Fecha emisión: 24-feb.-17

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES 1 COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Bajo Puerta	TS Apto 102				
2	Bajo Puerta	TS Apto 103				
3	Bajo Puerta	TS Apto 203				
4	Bajo Puerta	TS. Apto 303				
5	Bajo Puerta	Ts Apto 403.				
6	Alejandro Lopez	TS Apto 503	Alameda Porvenir 1	4635476	Alejandro Lopez	
7	Bajo Puerta	TS. Apto 603				
8	Bajo Puerta	T4 Apto 102				
9	Jhon Bolivar	T4. 103		3141448421		
10	Mery Pineda.	T4 202		3219604860	M. Mery Pineda.	
11	Bajo Puerta	T4 203				
12	Sandi Betancur	T4 302		3153909343		
13	Andrea Holguin	T4 303		3132914186		
14	Pada Jara.	T4 407		3128562284	Cina Pada	
15	Bajo Puerta	T4 403				
16	Bajo Puerta	T4 502				

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.699128			MyS Constructora	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura	RAP59
Hoja 1 de 1						Versión 0
04	02	2019				Fecha emisión:
DD	MM	AA	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	24-feb.-17

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES 1 COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Bajo Puerto	T4 - 503				
2	Bajo Puerto	T4 602				
3	Bajo Puerto	T4 603				
4	Claudia P. Jancero3	Bicentenario 2. Casa 384		3202435834	Claudia P.	
5	Gustavo Lopez	Bicentenario 2. Casa 184		3205173028.	Gustavo Lopez	
6	Angela Caballero	Bicentenario 2 local		6614477.	Angela Caballero	
7	Hector Huertos	Bicentenario 2. local Panaderia.		3108105951		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.699128			CONTRATISTA	INTERVENTORIA	RAP59
Hoja 1 de 1			MyS Constructora	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Versión 0
08	02	2019.		CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura	Fecha emisión: 24-feb.-17
DD	MM	AA			

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES 1 COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Por debajo Puerta F02.	Caminos de Porvenir 4.				
2	Nohora Isabel Cardenas	Cll 55 Sur # 102 A 08 casa F 4.		3214234572		
3	por debajo Puerta F06	Caminos de Porvenir F 6				
4	Por debajo puerta F08	Caminos de Porveni F 8				
5	Por debajo Puerta F10	Caminos de Porvenir F 10.				
6	Diomedes Escalante	Cll 55 Sur # 102 A 08 F 12.		3103374886		
7	Bajo puerta F 14.	Caminos de Porvenir F 14				
8	Milena Ramos	Cll 55 Sur # 102A-08 F 16.		2099048	Milena Ramos R.	
9	Bajo Puerta	Caminos de Porvenir F 18				
10	Iver Pineda	Cll 55 Sur # 102 A 08 F 20		3118226654		
11	Ana Pintor	Cll 55 Sur # 102A-08 F 22		5764517		
12	Bajo Puerta	Calle 55 Sur # 102A-08 F 24				
13	Harlen Castaneda	Calle 55 Sur # 102A-08 F 26.		3172181033		
14						
15						
16						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

MYS Constructora

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

(Visita N.2) **Comunicado No.** 03

INFORMACIÓN DE INTERES PARA LA COMUNIDAD

SEGUNDA VISITA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA

Señor(as) Propietario(as) de las unidades residenciales vecinos al proyecto PORVENIR VII, **La Firma Contratista MYS CONSTRUCTORA** informan que en el desarrollo del **Contrato CO1.PCCNTR.699128** cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1". El día _____ se realizó primera visita, con el objeto de adelantar el levantamiento del acta de vecindad de inicio del predio; sin embargo, el Contratista no fue atendido y/o no tuvo aprobación por ninguna persona encargada y/o dueña del predio para el desarrollo de la actividad.

Por tal razón, se realizará segunda visita el próximo _____.

Esperamos contar con su presencia y/o autorización para el desarrollo de la actividad, de no ser entendida la 2° visita, se procederá al levantamiento del acta de vecindad de fachada y en este caso el Contratista no asumirá ningún tipo de responsabilidad si existiese alguna queja o reclamo por afectación interna en el predio.

CONTRATISTA

Profesionales sociales:

Margarita Romero Vargas . C.C.52827506

Nubia Janeth Hortua. C.C. 20485497

Ing. Andrés Ramírez C.C. 1.073.682.188

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atención a la Comunidad:
Margarita Romero Vargas-Nubia Hortúa
Tel: 317 2149201
Correo electrónico: atencioncomunidad.porvenir@gmail.com

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.699128			CONTRATISTA: MyS Constructora	INTERVENTORIA: Carlos Vergara Negrete Ingeniería & Arquitectura	RAP59
Hoja 1 de 1			Bogotá Mejor para Todos – Secretaría de Educación		Versión 0
06	02	2019.			Fecha emisión: 24-feb.-17
DD	MM	AA			

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES (2) SEGUNDO COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto Alameda P1	T4. Apto 103				
2	Conjunto Alameda P 1	T4. Apto 203				
3	Conjunto Alameda P1	T4. Apto 302				
4	Conjunto Alameda P1	T4 Apto 403				
5	Conjunto Alameda P1	T4. Ap. 503				
6	Conjunto Alameda P1	T4 Apto 602				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.699128			CONTRATISTA		INTERVENTORIA	RAP59
Hoja 1 de 1			MyS Constructora	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura	Versión 0
8 DD	01 MM	2019. AA				Fecha emisión: 24-feb.-17

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES (2) SEGUNDO COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto Alameda P1	T5 Apto 103			CONJ. RES. ALAMEDA DEL PORVENIR I Etapa	
2	Conjunto Alameda P1	T5 Apto 303			Correspondencia Recibida	
3	Conjunto Alameda P1	T5 Ap. 603			Hora:	
4	Conjunto Alameda P1	T4 Apto 503			Remitente:	
5	Conjunto Alameda P1	T4 Apto 403			Destinatario:	
6					Recibido por:	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.699128			CONTRATISTA	INTERVENTORIA	RAP59
Hoja 1 de 1					Versión 0
12	02	2019.			Fecha emisión: 24-feb.-17
DD	MM	AA			

MyS Construcciones

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES (2) SEGUNDO COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Por debajo Puerta	Caminos de Porvenir F104		—	—	—
2	Por debajo Puerta	Caminos de Porvenir F116		—	—	—
3	Por debajo Puerta	Caminos de Porvenir F118		—	—	—
4	Por debajo Puerta.	Caminos de Porvenir F102		—	—	—
5	Por debajo Puerta.	Caminos de Porvenir F114		—	—	—
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

MYS Constructora

CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura

(Visita N.3)

Comunicado No. 04

INFORMACIÓN DE INTERES PARA LA COMUNIDAD

TERCERA VISITA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA

Señor(as) Propietario(as) de las unidades residenciales vecinos al proyecto PORVENIR VII, **La Firma Contratista MYS CONSTRUCTORA** informan que en el desarrollo del **Contrato CO1.PCCNTR.699128** cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1". El día _____ se realizó primera visita, con el objeto de adelantar el levantamiento del acta de vecindad de inicio del predio; sin embargo, el Contratista no fue atendido y/o no tuvo aprobación por ninguna persona encargada y/o dueña del predio para el desarrollo de la actividad.

La visita 1 se realizó el día _____ a las _____ y fue informada a través del comunicado dejado _____

La visita 2 se realizó el día _____ a las _____ y fue informada a través del comunicado dejado _____

La Visita 3 se realizo el día _____ a las _____

Ante la imposibilidad de ubicar al propietario y /o responsable del inmueble, damos a conocer las implicaciones del no levantamiento del acta de vecindad.

Se deja constancia que ya formalizadas las visitas referenciadas y en atención a que no fueron atendidas, el Consorcio MYS CONSTRUCTORA, no tendrá frente a futuras reclamaciones, por tanto el Acta se vecindad se realizó por fachada, con firmas de interventoría y Contratista.

CONTRATISTA

Profesionales sociales:

Margarita Romero Vargas . C.C.52827506

Nubia Janeth Hortua. C.C. 20485497

Ing. Andrés Ramírez C.C. 1.073.682.188

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.699128			MyS Constructora	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura	RAP59
Hoja 1 de 1						Versión 0
12	02	2019	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	Fecha emisión: 24-feb.-17
DD	MM	AA				

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES (3) TERCER COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Portería Conjunto Alameda P. 1	T5 Apto 103			CONJ. RES. ALAMEDA DEL PORVENIR I Etapa	
2	Portería Conjunto Alameda P1	T5 Apto 303			Correspondencia Recibida	
3	Portería Conjunto Alameda P1	T9 Apto 603			Hora:	
4	Portería Conjunto Alameda P1	T4. Apto 503			Remitente:	
5	Portería Conjunto Alameda P1	T4. Apto 103			Destinatario:	
6	Portería conjunto Alameda P1	T4 Apto 302 X			Recibido por:	
7	Portería Conjunto Alameda P1	T4 Apto 403			Placa No:	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.699128
Hoja 1 de 1	

14	02	2019
DD	MM	AA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

RAP59

Versión 0

Fecha emisión: 24-feb.-17

CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICADOS

Contrato CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

TIPO DE PIEZA

ENTREGA DE VOLANTES (3) TERCER COMUNICADO ACTAS DE VECINDAD

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Por debajo Puerta	Camino de Porvenir	F02			
2	Por debajo Puerta	Camino de Porvenir	F14			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						


Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social – Interventoría

Scanned by CamScanner

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
04/02/2019	CONVOCATORIA LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD	

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA

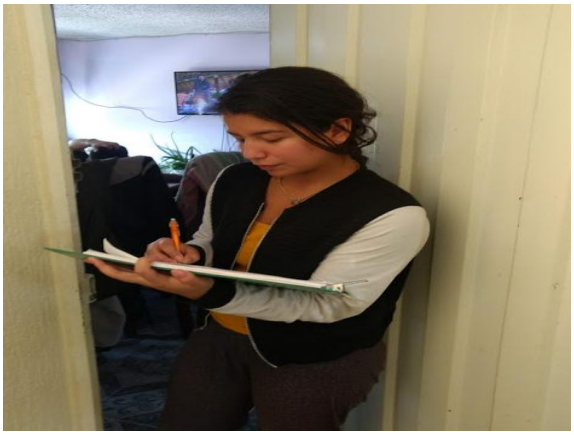








MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
08/02/2019	ENTREGA VOLANTES ACTAS DE VECINDAD	

CONVOCATORIA ACTAS DE VECINDAD





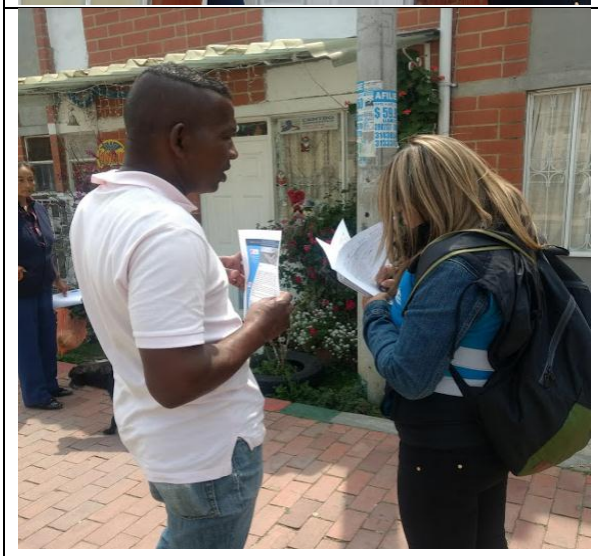



PORVENIR SECTOR VII

MyS Constructora	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
		VERSIÓN 01

FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	C.O. P 221-2017
14/02/2019	CONVOCATORIA LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD TERCERA VISITA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA





GRUPO COMITE PARTICIPACION CIUDADANA
PORVENIR

M S	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	CARLOS VERGARA HENRIETTE Ingeniería y Arquitectura	RAP63 Versión 0 Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Conformación Comite Participación Ciudadana			**Proceso:**	SOCIAL
Área Responsable:	Social	**Fecha:**	08-febrero/2019	**Lugar:**	Bicentenario 2
Contratista responsable:	CONSORCIO SAN PABLO			**Hora:**	11:00 am

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Carolina Villamil			3046738502	D52831532@Gmail.Com	Diana Villamil
2	Sonia Casbo			3112967390	soniaycasbo1973@gmail.com	
3	Yolanda Beatriz Morales			3176827859	yolandamora2015@ymail.com	
4	Jorge H. Pinto Mora			3208236852	Pintomoraja@Yahoo.Com	
5	Lucero Campos S.		8025213 LuceroCampos23	3105062424	Alba. lucero	
6	Maria Libia Betancur			3105901901		Libia Betancur
7	NOHORA ISABEL OREJUELA			3214239572	MISCHIQUIS19@gmail.com	
8	GERMAN ACEVEDO			3112523436	germandavinci@gmail.com	
9	Ana Elvia Pinzón		3143143637	5764517		
10	Maria Mery Silva			3132129206		
11	Martha Galindo			3202790096		
12						
13						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018



Correo electrónico

atencioncomunidad.porvenir@gmail.com

Líneas de Atención

3172149201 / 3183484944

Dirección del PAC

Salón Comunal Conjunto Residencial Bicentena

Horario de Atención

Martes de 8:00 a.m. a 11: 00 a.m.

Equipo Social T.S. MARGARITA ROMERO VARGAS-NUE
HORTUA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGC ME. PARA

SECRETARÍA DE EDUCAC

Scanned by CamScanner

solicitud
Recibidos

Adm Diseñarte

vie., 22 mar. 12:44
(hace 4 días)

para mí

Señora Margarita buen dia de acuerdo a lo dialogado via telefonica envío el siguiente
cordial Edgar Rodríguez

Tele-Fax (571) 8050665 Cel: (315)2114224 WhatsApp (321)4386398
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

ventasadmdisenarte@gmail.com

AVISO IMPORTANTE:

*Este correo es únicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener información privilegiada y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) deberá borrarlo inmediatamente. Queda notificado que el mal uso, divulgación no autorizada, alteración y/o modificación malintencionada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y pueden ser legalmente sancionados. **-ADM Diseñarte-** no asume ninguna responsabilidad por estas circunstancias-**La protección de los derechos de autor está regulada por la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, y sus decretos**

Zona de los archivos adjuntos

Scanned by CamScanner

Alameda del Porvenir

"Solos podemos hacer muy poco;
Unidos podemos hacer mucho"

Bogotá, D.C. agosto 06 de 2018

Señores:

Equipo Social

T.S. MARGARITA ROMERO VARGAS - NUBIA HORTUA

De acuerdo a comunicación vía whatsapp y vía telefónica, en informe sobre el paso de las volquetas con material para la obra del jardín infantil el Porvenir, dado que están llegando hasta el fondo de la bahía frente al conjunto, los residentes de las torres 1, 2, 3 y 22, al paso de dichos vehículos se cimbronéa la totalidad de esas torres, y estas no entraron en el acta de visita para revisión estructural, en caso de presentarse avería en las mismas, la señora Margaríta muy amablemente me contactó informándome que es por el momento del ingreso de la cantidad de material, y no va a presentarse anomalía ante este movimiento.

Solicito me confirme vía escrita para poder tranquilizar a los propietarios de los 64 apartamentos

Quedo agradecido por su colaboración

Cordial,

Edgar Hernando Rodriguez

Presidente de delegados

3152114224







Scanned by CamScanner

OPCION 1

ESTADO DE CUENTA CRISTIAN MUÑOZ.

OPCION # 1 = Valores adeudados

1.) salario julio (15) días ⟶ $ 1.500.000=

2.) saldo ferretería la Estrella ⟶ $ 1.399.004=

3.) cuenta cobro - julio alcides Gaviria ⟶ $ 576.000=

TOTAL $ 3.475.004=

4.) SALDO hotel sanpablo ⟶ $ 1.000.000=

TOTAL ⟶ $ 4.475.004=-

B-) Henry abono en bogotá
A ULTIMO salario de julio/18 ⟶ - $ 1.000.000=

V/R ADEUDADO ⟶ $ 3.475.004=
A CRISTIAN MUÑOZ.

NOTA: este sería el valor adeudado considerando lo que el ing. cristian Muñoz informo de lo que debía en sanpablo y que fue de conocimiento de luis FOO TAMAYO y que de igual forma se acepto su pago para reembolsar despues.

NOTA: la entrega de la obra fue el 11 de julio. sin embargo se cancela hasta el 15 de julio/18 —

OPCION 2

ESTADO DE CUENTA CRISTIAN MUÑOZ.

OPCION 2

NOTA: elaborando el estado de cuenta considerando todo lo consignado desde la fecha de la relacion de gastos entregada, es decir, desde Febrero 28/18 — se tiene el siguiente analisis:

- Valor total consignado, incluyendo el ultimo giro de 5 millones ——→ $ 68.180.000=
- V/r entregado en efectivo ——→ $ 5.500.000=

V/r total girado → $ 73.680.000=

- V/r de relacion de gastos presentados → $ 64.436.717=
- salarios consignados desde Feb hasta Julio.2018. → $ 16.500.000=

V/r total gastos en el periodo incluyendo los salarios → $ 80.936.717=

NOTA: se incluye el v/r basico del salario ya que los gastos de hotel y alimentacion ya estan en la relacion —

DESCUENTOS y/o correcciones a la relacion de gastos y/o costo menor presentada x CRISTIAN MUÑOZ —

- Arriendo mes Feb-Marzo ——→ − 1.200.000= v/rs repetidos
- pago Hrs extras a Trabajadores. → − 727.344= (Todas las Hrs extras se pagaron directamente a Traves de Giros a J.C. Muñoz)
- Felipe palencia ——→ − 1.000.000= pago directo - ultimo y - se consigna a cta del proveedor.
- Monica calderon — pago directo a cta del proveedor — 1.900.000.
- pagos a Bersaidey anaya ——→ − 3.842.000= pago directo al proveedor.

Σ $ 8.669.344=

OPCION 2

CONTINUA — opción 2

- el v/2 de gastos presentados y quedaría así:

- v/2 total gastos → $ 80.936.717.
- v/2 Δ descontar → - $ 8.669.344.

v/2 real de relación de gastos → $ 72.267.373 =

→ POR ESTA opción 2, la cuenta quedaría así =

→ v/2 total girado → $ 73.680.000 =

→ v/2 total de gastos relacionados y → - $ 72.267.373 =

Diferencia a favor de LFTP → $ 1.412.627 =

·Conclusión

→ realizadas las cuentas de (2) maneras, se concluye que de acuerdo a lo girado, incluidos los últimos 5 millones girados recientemente, NO se estaría debiendo nada, por el contrario se ha girado más de lo reportado, quedando un saldo a favor de Luis Fdo Tonnayo P.

Atj

UTH

CONSTRUCTORA M Y S.A.S

INFORME DE GESTION MENSUAL SSTA

CLM-F70 - v1

Vigente a partir del 2 -ENE-19

1 de 3

FECHA INICIO PROYECTO	26		2		2019		**Version: 1**	
FECHA INCIAL DEL INFORME	26		2		2019			
FECHA FINAL DEL INFORME	25		3		2019			
NUMERO DE TRABAJADORES	DIRECTOS	10	INDIRECTOS (CONTRATISTAS)			11		

0. REGISTRO FOTOGRAFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION





INDICADORES ACCIDENTALIDAD
CONSTRUCTORA M Y S EN EL MES MARZO 2019


N.	SEDE	MES	N. TRABAJADORES	AT 2019	AT MORTAL 2019	TASA AT	HHT	DIAS DE INCAPACIDAD	IS	IF	ILI	MORTALIDAD
1					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
2					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
3					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
4					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
5					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
6					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
7					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
8					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
9					0	#¡DIV/0!	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
10			0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
11			0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
12	PORVENIR	MARZO	21	0	0	0,0	4368	0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL INDICADORES ACCIDENTALIDAD			**7**	**0**	**0**	**0,0**	**364**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

1.2. INDICADORES DE GESTIÓN HSEQ

INDICADORES			DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
Actividades Realizadas en el periodo	7	88%	INSPECCIÓN DE LAS AREAS DE TRABAJO
Actividades Programadas en el proyecto	8	100%	INPECCION DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Porcentaje restante de cumplimiento		13%	CHARLAS DE SEGURIDAD
			COORDINAR ACTIVIDADES DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
			RADICAR ANTE LA INTERVENTORIA EL INFORME SST DE DE LA CONSTRUCTORA M Y S
			REALIZAR ISPECCION DE EPPS POR TODOS LOS TRABAJADORES
			INSPECCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
INSPECCIONES REALIZADAS			
Inspecciones Realizadas	5	75%	INSPECCIÓN DE CAMILLAS
			INSPECCIÓN DE BOTIQUIN
Inspecciones Programadas en el proyecto	6	100%	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO DIARIO
			INSPECCION DE EPPS
Porcentaje restante de cumplimiento		25%	INSPECCION DE EXTINTOR
CHARLAS DE SEGURIDAD			
Tiempo utilizado en charlas de seguridad	3:30 MIN		SE DICTO CARLAS DE SEGURIDAD EN TEMAS DE:
Charlas Realizadas	7	88%	INDUCCION EN TEMAS DE SST A TODO PERSONAL NUEVO.
			CUIDADO DE MANOS Y PAUSAS ACTIVAS.
Charlas Programadas en el proyecto	8	100%	CARGUE SEGURO DE VOLQUETAS PAUSAS ACTIVAS.
			ORDEN Y ASEO Y PAUSAS ACTIVAS.
			NOTIFICACION DE CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL AL PERSONAL
			PROTECCION SOLAR
Porcentaje restante de cumplimiento		13%	AUTOCUIDADO
INDUCCION DE ERSONAL NUEVO			
			INDUCCIONES AL PERSONAL NUEVO EN SST MEDIO AMBIENTE DE LOS SIGUIENTES SUBCONTRATISTAS:
Inducciones Realizadas	11	11%	CONSTRUCTORA MYS, BAU INGENIERIA SAS.
Personal nuevo de ingreso	100	100%	
Porcentaje restante de cumplimiento		89%	

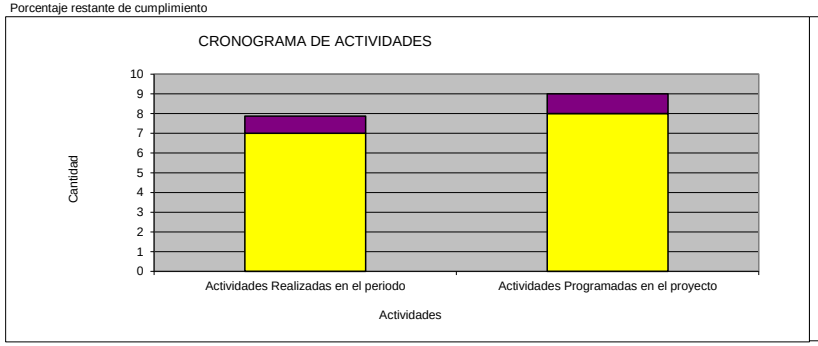

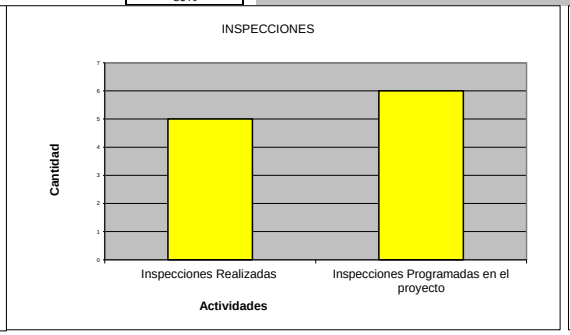

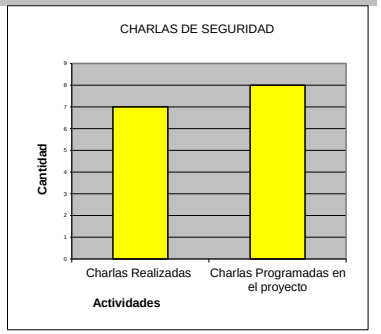

ACTIVIDADES DIARIAS DE HSE

1	Inspeciòn de obra
2	Revisiòn de formatos para permisos de trabajo de acuerdo a la actividad a realizar
3	Acompaamiento a las Charlas de seguridad
4	Actividades de orden y aseo en las areas de trabajo

2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Documentación elaborada:

	PERMISOS DE TRABAJO		ORDENES DE ACTIVIDADES		INSPECCIONES	5

(Alturas, inspecciones de: taladro demoledor,pulidoras, taladro percutor electrico)

Descripción detallada de documentos

OBSERVACIONES

2.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.4.1 LISTADO DE PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN EL MES MARZO 2019 EN EL PROYECTO JARDIN EL PORVENIR

Contratista	Nombre	Apellido	C.C.	Cargo	ARL	EPS	AFP
CONSTRUCTORA M Y S	MAURICIO RODRIGUEZ		79.580.675	ING. RESIDENTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
	CARLOS ALBERTO MEDINA		51.782.687	DIR. OBRA	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR
	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA		52.849.792	RESIDENTE SST	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	COLPENSIONES
	SANDRO FLORES		14.322.513	MAESTRO	SEGUROS BOLIVAR	SURA	PROTECCION
	MOISES GUERRERO		14.218.623	ALMACENISTA	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR
	JHON FERNANDO PAEZ		19.234.191	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
	PABLO LOMBANA		4.372.552	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
	KAREN AVILA		1.033.710.071	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR
	VICTOR MANUEL ROJAS		1.032.410.033	ING. AMBIENTAL	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
	MARGARITA ROMERO		52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PROTECCION
MAQUINARIA							
BAU INGENIERIA SAS	JOSE MEJIA		1.118.825.975	ING. SUBCONTRATISTA	SURA	SURA	PORVENIR
	JORGE SOTO		1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	SURA	COOMEVA	PROTECCION
	JUAN CAMARGO		74.302.390	OPERADOR	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES
	LUIS CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		1.030.559.254	OPERADOR	COLMENA	MEDIMAS	PORVENIR
	ANDRES BARRAGAN PACHON		79.867.764	ING. SUBCONTRATISTA	COLMENA	SANITAS	PROTECCION
	CLAUDIA ALVAREZ		11.207.474.281	INSPECTOR SST	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
	BREUDYS JOHINER POLO GUERRA		1.067.862.250	MAESTRO	SURA	SALUD TOTAL	POVENIR
	RONAL BARRERA		1.020.737.288	OPERADOR	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES
SEGURIDAD ROHEN LIMITADA	JOSE EFRAIN RINCON ZAMUDIO		19.406.580	VIGILANTE	COLPATRIA	FAMISANAR	COLPENSIONES
	YAHIR ESTEBAN VALERO RUBIO		1.022.975.808	VIGILANTE	COLPATRIA	SANITAS	PROTECCION
	JEISSON DAVID ARCE HENAO		1.022.393.510	VIGILANTE	COLPATRIA	CAPITAL SALUD	PORVENIR

RESIDENTE SST ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

ORDEN Y ASEO DE LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO , LIMPIEZA DE VIAS., PUNTO ECOLOGICO, PUNTO DE MATERIALES INFLAMABLES

ZAMUDIO



SEÑALIZACION INSPECCIONES BOTIQUIN, CAMILLA,EXTINTOR, CARNETIZACION DEL PERSONAL, SUPERVISION Y DESCARGUE DE MAQUINARIA





OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

MYS CONSTRUCTORA

ELABORO: **S. JANNETH RODRIGUEZ .S**	**REVISO:** **ARQ. CARLOS MEDINA**	**APROBO:** **T.S. ALEX ALVAREZ**
Firma	**Firma**	**Firma**
CARGO: Residente SST Contratista	**CARGO** Director de obra	**CARGO:** Residente SST Interventoría

BOGOTA D.C. MARZO 25 DE 2019

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
3. ALCANCE
4. OBJETIVO
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
5.1. ACTIVIDADES DE OBRA
5.2. LISTADO DE PERSONAL, INDUCCIONES DE INGRESO, CERTIFICACIONAFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP, PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.
5.3. SE REALIZA INDUCCION O REINDUCCION A TODO PERSONAL QUE INGRESE Y AL FINAL DEBE LLENAR EL REGISTRO DE INDUCCION Y CONTESTAR SU RESPECTIVA EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE SST.
5.4. CAPACITACIONES SST
5.5. INDICADORES DE GESTION
5.6. PLAN DE EMERGENCIA
5.7. SEÑALIZACION
5.8. SERVICIOS DE HIGIENE
5.9. COPASST

Listado de Anexos

Anexo.1. LISTADO DE PERSONAL INDUCCIONES DE INGRESO Y EL REGISTRO DE INDUCCION Y SUS RESPECTIVA EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE SST CON AFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO,
REGISTRO ENTREGA DE EPP PLANILLAS PAGOS SEGURIDAD SOCIAL.

Anexo.2. REGISTRÓ CAPACITACIONES Y CHARLAS SST

Anexo. 3. INDICADORES DE GESTIÓN

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades ejecutadas desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato de Obra ° 114-3-18, período comprendido del 26 de Febrero de 2019 al 25 de Marzo de 2019, en el cual, el CONSTRUCTORA M Y S.A.S, busca mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores a partir de una política de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la satisfacción de los trabajadores.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto del Contrato	Contratista: MYS CONSTRUCTORA "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"
Número del Contrato Contratista	CO1.PCCNTR.699128
Duración Del Contrato:	Siete (7) meses Fecha inicio: febrero 26 de 2019 Fecha finalización: septiembre 25 de 2019
Objeto De Contrato de La Interventoría	***5.1 Interventoría: Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura*** ***5.2 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.***
Numero de Contrato	***5.3 Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.695946***
	Generación de empleo, mejoramiento del entorno, mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento de la calidad de vida para

Beneficio del Proyecto	los niños y niñas en ciclo vital de primera infancia.
Ubicación del Proyecto	Zona VII de Porvenir sector CPF 760, de la UPZ 86, Lote ubicado en la Calle 55 sur No. 103 – 98, localidad de Bosa.

3. ALCANCE:

Evidenciar las acciones adelantadas en obra frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. OBJETIVO:

Verificar el grado de cumplimiento de los parámetros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las diferentes actividades ejecutadas por los trabajadores y contratistas de la CONSTRUCTORA M Y S.A.S.

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo que apliquen a la constructora.

- Reforzar la formación del personal con el fin de generar conciencia en el trabajo seguro y fomentar el autocuidado.

- Cumplir los controles establecidos para minimizar la ocurrencia de accidentes de Laborales.

- Implementar medidas para evitar la aparición de enfermedades de carácter laboral y minimizar el ausentismo laboral en la CONSTRUCTORA M Y S. A S.

5. ETAPAS DE LA INDUCCION

El contenido a brindar en el proceso de la inducción a los trabajadores de la Constructora M Y S.A.S, subcontratistas se compone de la siguiente estructura:

- Bienvenida al proyecto
- Reseña histórica de la empresa
- Objetivo de la Inducción
- Misión
- Visión
- Valores
- Políticas
- Objetivos
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Notificación de Riesgos
- Ley 1010 de Acoso laboral Comité Convivencia
- Comité Copasst
- SG-SST
- Exámenes Médicos Ocupacionales
- Accidente de Trabajo
- Procedimiento para atención de Incidente y accidente de trabajo
- Cubrimiento de at y Enfermedad Común
- Soporte de Ausentismo
- Enfermedad Laboral
- Reporte de actos y condiciones inseguras
- Condiciones Inseguras
- Definición Riesgo y Peligro
- Responsabilidad SST Trabajadores

Uso adecuado de EPPS

- Responsabilidad del Contratista
- Responsabilidades de los trabajadores
- Evaluación de conocimiento SST
- Identificación de Peligros escritos
- Notificación Condiciones de salud
  - Cartelización a todo el personal
  - Al final de la inducción realizamos el registro de inducción o reinducción y su respectiva evaluación de conocimientos en temas de SST.

5.1. EVALUACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL SST Y NOTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

Al finalizar la inducción al igual que la notificación de peligros y riesgos, se entrega a cada uno de los participantes la evaluación de la inducción de selección múltiple para ser diligenciada individualmente y poder evidenciar el conocimiento de los trabajadores en cuanto los temas recibidos.

6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

6.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Se desarrollaron diversas actividades del área de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron charlas de seguridad a todo el personal, inspecciones de trabajo, se realiza socialización del sistema de riesgos laborales, divulgación del buen mantenimiento de los EPP, se realiza socialización de la importancia del autocuidado, se verifica con inspecciones el buen uso de EPP y el manejo de las herramientas, se hace acompañamiento a las actividades de ejecución de obra, se realiza orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, también se sensibiliza al personal de la importancia de las pausas activas en el trascurso de la jornada laboral.

7. COMPONENTE SG-SST

Se implementaron las actividades definidas en el seguridad y salud en el trabajo las cuales buscan mejorar las condiciones de salud y seguridad del personal de obra, en el ejercicio de sus funciones, partiendo que es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores quienes con su compromiso de auto-cuidado en salud y el firme apoyo de la empresa posibilitan la prevención del riesgo laborales, es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral. De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud del trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos e instalaciones.

7.1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Nombre: CONSTRUCTORA MYS
NIT: 900361854-6
Dirección: CRA 12 # 13 - 24
Teléfono: 8641141

8. INGRESO PERSONAL

Tabla 1 INGRESO PERSONAL EN EL MES DE MARZO

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO
CARLOS ALBERTO MEDINA	ARQ. DIRECTOR OBRA	26/02/2019
ANDRES RAMIREZ	ING. RESIDENTE	26/02/2019
JANNETH RODRIGUEZ	PROFESIONAL SST	26/02/2019
SANDRO FLORES	MAESTRO	26/02/2019
JHON FERNANDO PAEZ	AYUDANTE	26/02/2019
PABLO LOMBANA	AYUDANTE	26/02/2019
MARGARITA ROMERO	PROFESIOONAL SOCIAL	26/02/2019
VICTOR MANUEL ROJAS	ING. AMBIENTAL	26/02/2019
JOSE EFRAIN RINCON ZAMUDIO	VIGILANCIA	27/02/2019
YAHIR ESTEBAN VALERO RUBIO	VIGILANCIA	27/02/2019
JEISSON DAVID ARCE HENAO	VIGILANCIA	27/02/2019
JOSE MEJIA	ING. SUBCONTRATISTA	04/02/2019
MAURICIO RODRIGUEZ	ING. RESIDENTE	09/03/2019
KAREN AVILA	AYUDANTE	09/03/2019
JUAN CAMARGO	OPERADOR	11/03/2019
JORGE SOTO	ING. SUBCONTRATISTA	11/03/2019
JOSE MEJIA	ING. SUBCONTRATISTA	11/03/2019
RONAL BARRERA	OPERADOR	23/03/2019
LUIS CARLOS ALVAREZ	OPERADOR	21/03/2019
CLAUDIA ALVAREZ	INSPECTOR SST	26/03/2019
MOISES GUERRERO	ALMACENISTA	27/03/2019
BREUDYS JOHNER POLO	MAESTRO	29/03/2019

8.1 RETIRO DEL PERSONAL

Tabla 2 Retiros DEL PERSONAL EN EL MES DE MARZO.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO
ANDRES RAMIREZ	ING. RESIDENTE	06/03/2019

9. SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo se presenta el pago de la seguridad social del contratista y Subcontratistas: CONSTRUCTORA M Y S.A. S, BAU, EMPRESA DE SEGURIDAD.

Tabla 3 SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Contratista/Subcontratista	Anexos	Folios
Constructora M Y S.A.S	*Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS*	3 folios
BAU	*Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS*	2 folios
Seguridad Privada	*Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA **FOLIOS***	3 folios

10. **ANEXOS**

Anexo # 1 LISTADOS DEL PERSONAL DE INGRESO DIARIO.
Anexo # 2 CERTIFICACIONAFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP.
Anexo # 3 PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL .
Anexo # 4 CAPACITACIONES SST.
Anexo # 5 INDICADORES DE GESTION.
Anexo # 6 RECOMENDACIONES OCUPACIONALES .
Anexo # 7 SEÑALIZACION.
Anexo # 8 COPASST.
Anexo # 9 CONVIVENCIA LABORAL
Anexo # 10 INSPECCIONES Y PERMISOS DE TRABAJO.
Anexo # 11 CONFORMACION DE BRIGADA DE EMERGENCIA.

Anexo # 1 LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE INGRESO DIARIO.

Anexo # 2
CERTIFICACIONAFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP.

Anexo # 3 PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Anexo # 4 CAPACITACIONES SST.

Anexo # 5 INDICADORES DE GESTION.

Anexo # 6 RECOMENDACIONES MEDICAS OCUPACIIONALES.

Anexo # 7 SEÑALIZACION.

Anexo # 8 COPASST.

Anexo # 9 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

Anexo # 10 INSPECCIONES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Anexo # 11 CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA.
