	CONTRATO N ° IP 011-2023	edeso Empresa de Desarrollo Sostenible

INFORME TECNICO MENSUAL 1.



Julio a diciembre 2023.

"CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LASDIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 5
4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 6
5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA. 7
6. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS Y PRESUPUESTO GENERAL. 7
7. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 14
8. ASPECTOS TÉCNICOS 15
9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 15
10. EQUIPO EN OBRA Y MATERIALES. 16
11. CONTROL E INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 16
12. DIFICULTADES Y TEMAS VARIOS. 17
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 18

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

1. INTRODUCCIÓN.

La administración Municipal de Rionegro en el marco del desarrollo del convenio interadministrativo entre El Municipio, La Gobernación y La Empresa de Desarrollo Sostenible EDSO para la pavimentaciónde vías urbanas y rurales a través de la construcción de placa huellas, que permitan a todos los habitantes tener buenas vías de comunicación.

El convenio atiende la problemática de tránsito y de desarrollo de los distintos sectores del municipio de Rionegro en este busca garantizar el acceso a 41 tramos de vías en su mayoría rurales y poder mejorar las condiciones de acceso los habitantes.

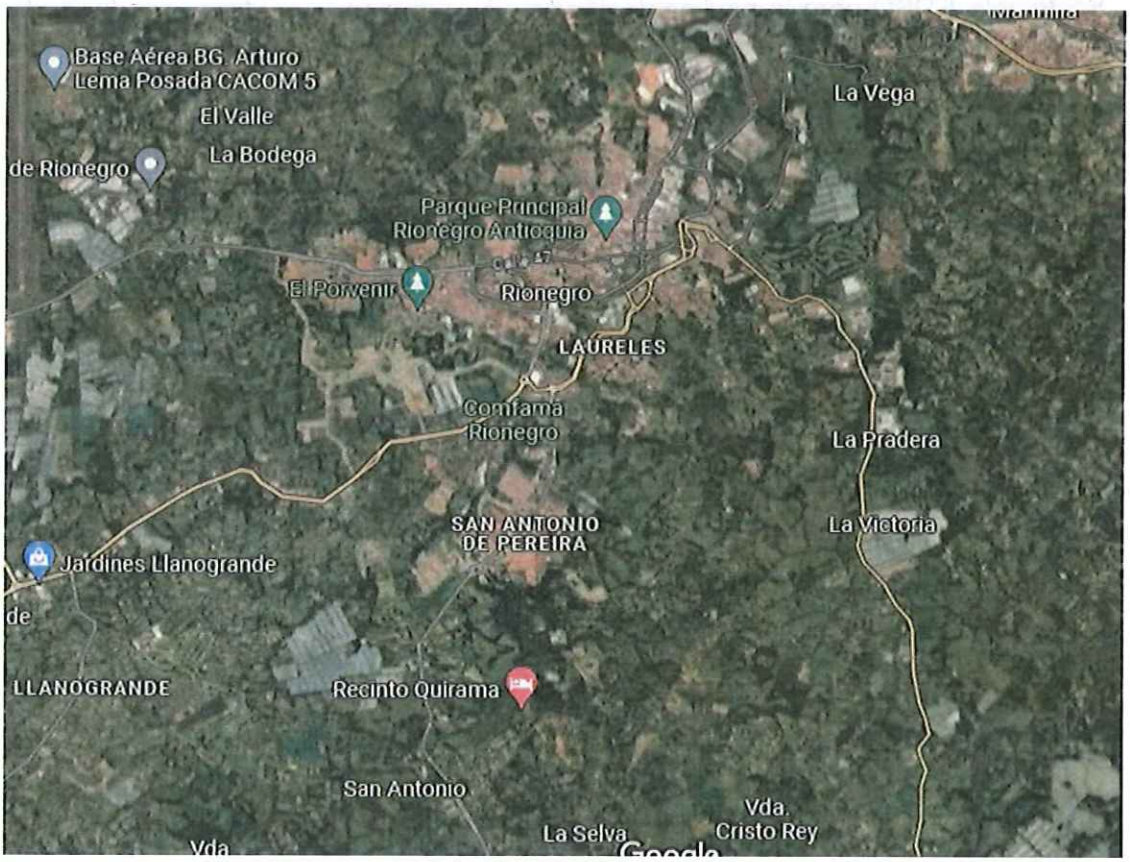
Se busca que el proyecto se realice garantizando la calidad de la obra a través de los estándares de las Normas Invia que se encuentran regidas hasta la fecha.

La construcción de alrededor de 3100 metros de placa huellas buscan aportar calidad de vida de los habitantes que se encuentran en 18 veredas y un barrio del municipio.,

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la Construcción de placa huellas en zonas urbanas y rurales en el Municipio de Rionegro Antioquia, donde se propone la mejora de caminos en sectores que aún no cuentan con accesos adecuados.



Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Número del Contrato Contratista	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IP 011-2023
Objeto del ContratoContratista	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELA CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LÑAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIODE RIONEGRO.
Nombre o RazónSocial del Contratista	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
Valor del Contrato.	CINCO MIL CIEN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($5.100.502.00) AU INCLUIDO.
Fecha de Inicio deEjecución del Contrato	25 de julio de 2023.
Plazo	Cinco (5) meses.
Fecha de Terminación del Contrato	15 de diciembre de 2023.

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Objeto del Contrato Contratista	INTERVENTORÍA TÉCNICA,FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONATRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Nombre o Razón Social del Contratista	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($473.294.932) IVA INCLUIDO.
Plazo	Cinco (5) meses.

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

5. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de Seguros
Responsabilidad Civil extracontractual.	48-40-101001009	$ 718, 160,00	Desde 25 de Julio de 2023 hasta el 21 de Diciembre de 2023	Seguros del estado S.A.
Cumplimiento	48-44-101006723	$40,310,950.00	Desde 25 de Julio de 2023 hasta el 21 de Diciembre de 2023	Seguros del estado S. A

Tabla No.1 Información Pólizas Contratista.

6. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS Y PRESUPUESTO GENERAL.

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V unitario	Valor total
1,1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografía)	día	30,00	$ 576.515	$ 17.295.450

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

1,3,1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2000 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	ml	138,00	$ 27.820	$ 3.839.160
3,1,13	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	1.231,00	$ 52.244	$ 64.312.364
3,1,1	Excavación mecánica de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., motobomba sumergible, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	55,16	$ 34.135	$ 1.882.873
2,1,3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	15,00	$ 202.915	$ 3.043.725
2,2,4	Retiro de tubería existente de 16", incluye cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiale o donde indique la interventoría, sin excavación.	ml	15,00	$ 24.053	$ 360.795
1,2,6	Descapote mecánico espesor variable e= 0.15 m - 0.20 m. Incluye: cargue, transporte, y disposición final del material resultante hasta el lugar indicado por la interventoría	m3	328,00	$ 37.041	$ 12.149.448

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

3,2,2	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte.	m3	1.202,00	$ 215.059	$ 258.500.918
5,1,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	71.707,00	$ 7.025	$ 503.741.675
8,1,1,7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construcción de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor. Incluye conformación y formalete ría, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	3.279,00	$ 116.111	$ 380.727.969
4,1,1,6	CONCRETO CLASE H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	m3	410,00	$ 526.325	$ 215.793.250
4,3,10,6	Suministro, transporte e instalación de concreto clase D ,3000 PSI para cunetas y bordillo, incluye formalete ría, mano de obra, vibrado, protección y curado. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	446,00	$ 757.618	$ 337.897.628
4,3,1,4	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundación (Llave de confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m cada 2,7 m.	m3	178,00	$ 724.428	$ 128.948.184
9,10,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 24". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ml	15,00	$ 612.272	$ 9.184.080
4,3,10,8	Suministro, transporte e instalación de CONCRETO de 28 MPa para estribos, aletas, muros y disipadores. incluye formalete ría, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas.	m3	15,00	$ 971.414	$ 14.571.210

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

4,1,1,2	Colocación de concreto de 2500 psi para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	18,00	$ 563.474	$ 10.142.532
6,2,15	Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	165,00	$ 145.870	$ 24.068.550
5,3,1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm diámetro 4.0mm (XX-084)	m2	165,00	$ 12.250	$ 2.021.250
9,10,9	Suministro, transporte y construcción de Caja de 0.80x0.80 de hasta 1 metro de profundidad en concreto de 21 MPa, incluye tapa y herrajes, Aditivo impermeabilizante y todo lo necesario para su adecuación.	un	12,00	$ 837.890	$ 10.054.680
12	escarificación, perfilación, nivelación y compactación de subrasante existente y retiro de sobre tamaños.	m2	8.016,43	$ 3.806	$ 30.510.537
	COSTOS DIRECTOS				$ 2.029.046.278
	ADMINISTRACIÓN (23,84%)				$ 483.724.632,00
	UTILIDAD (5%)				$ 101.452.314
	SUBTOTAL COSTO (C.D + A.U)				**$ 2.614.223.224**
	PMT				$ 13.902.200
	PMA				$ 7.743.965
	COSTO TOTAL				**$ 2.635.869.389**

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

Ítem	descripción	Unidad	Cantidad	V unitario	Valor total
1,1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (topografía)	día	30,00	$ 576.515	$ 17.295.450
1,3,1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2000 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	ml	138,00	$ 27.820	$ 3.839.160
3,1,13	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	1.140,00	$ 52.244	$ 59.558.160
3,1,1	Excavación mecánica de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., motobomba sumergible, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	55,16	$ 34.135	$ 1.882.873

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

2,1,3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	15,00	$ 202.915	$ 3.043.725
2,2,4	Retiro de tubería existente de 16", incluye cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiale o donde indique la interventoría, sin excavación.	ml	15,00	$ 24.053	$ 360.795
1,2,6	Descapote mecánico espesor variable e= 0.15 m - 0.20 m. Incluye: cargue, transporte, y disposición final del material resultante hasta el lugar indicado por la interventoría	m3	304,00	$ 37.041	$ 11.260.464
3,2,2	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte.	m3	1.113,00	$ 215.059	$ 239.360.667
5,1,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	66.538,00	$ 7.025	$ 467.429.450
8,1,1,7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construcción de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	3.037,00	$ 116.111	$ 352.629.107
4,1,1,6	CONCRETO CLASE H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa) Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	m3	380,00	$ 526.325	$ 200.003.500
4,3,10,6	Suministro, transporte e instalación de concreto clase D ,3000 PSI para cunetas y bordillo, incluye formalete ría, mano de obra, vibrado, protección y curado. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	413,00	$ 757.618	$ 312.896.234

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

4,3,1,4	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundación (Llave de confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m cada 2,7 m.	m3	165,00	$ 724.428	$ 119.530.620
9,10,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 24". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ml	15,00	$ 612.272	$ 9.184.080
4,3,10,8	Suministro, transporte e instalación de CONCRETO de 28 MPa para estribos, aletas, muros y disipadores. incluye formalete ría, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas.	m3	15,00	$ 971.414	$ 14.571.210
4,1,1,2	Colocación de concreto de 2500 psi para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m3	18,00	$ 563.474	$ 10.142.532
6,2,15	Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	165,00	$ 145.870	$ 24.068.550
5,3,1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm diámetro 4.0mm (XX-084)	m2	165,00	$ 12.250	$ 2.021.250
9,10,9	Suministro, transporte y construcción de Caja de 0.80x0.80 de hasta 1 metro de profundidad en concreto de 21 MPa, incluye tapa y herrajes, Aditivo impermeabilizante y todo lo necesario para su adecuación.	un	12,00	$ 837.890	$ 10.054.680
12	escarificación, perfilación, nivelación y compactación de subrasante existente y retiro de sobre tamaños.	m2	7.423,00	$ 3.806	$ 28.251.938
COSTOS DIRECTOS					$ 1.887.384.445
ADMINISTRACIÓN (24,42%)					$ 460.899.281
UTILIDAD (5%)					$ 94.369.222
COSTO TOTAL (C.D + A.U)					**$ 2.442.652.948**
PMT					$ 13.902.200
PMA					$ 7.743.965
COSTO TOTAL					**$ 2.464.299.113**

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

7. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

PERSONAL DEL CONTRATISTA.

CARGO	NOMBRE
Ingeniero Director	Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Residente	John Henry Gallego Rincón
Ingeniero Residente	Jaime Eduardo Gaviria Paniagua.
Auxiliar Residente	William Libardo Zuluaga Gaviria
Profesional Ambiental	Slenis Heliseth Ramírez Ramírez
Profesional Social	Gloria Haydé Gómez Loaiza.
Profesional SST	Carolina Oliveros Hernández

Tabla No.3 Relación Personal Contratista.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

CARGO	NOMBRE
Ingeniero director	John Jairo Vásquez Suarez
Ingeniero Residente	Leidy Diana Bonilla Castrellón
Ingeniero Residente	Ricardo Andrés Maya Londoño
Auxiliar Residente	Winder Arbey Parra Rios
Auxiliar Residente	Lida Cristian Cardona Botero
Profesional Socioambiental.	Edna del Carmen Arias Lozano
Profesional SST	Lina María Flórez Ramírez
Profesional SST	Karina Andrea Coronado Rojas

Tabla No.4 Relación Personal Interventoría.

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

8. ASPECTOS TÉCNICOS

A partir de la suscripción del acta de inicio, se procedió de inmediato la etapa de construcción y ejecución de las placas huellas, se realizaron las actas de vecindad y entorno correspondiente además de la socialización inicial con la comunidad de los frentes iniciales de obra.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Durante la etapa de ejecución de las obras se realizaron las siguientes actividades:

- Localización y replanteo topográfico.
- Escarificación, perfilación, nivelación y compactación de subrasante existente y retiro de sobre tamaños para nivelación de terreno
- Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad para la elaboración de cajeos o nivelación de terreno.
- suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo para los elementos que compone la placa huella (vigas, cunetas, rieles y placas de acceso.)
- Demolición de estructuras existentes para la perfilación o mejoramiento de zona s que ya estaban construidas como obras de drenaje, placas o vaciados a mejorar.
- Vaciado de cunetas, vigas, huellas y placas de concreto que cumplan con una resistencia mínima de 21 MPa según especificaciones técnicas.
- Concreto Clase H (Ciclopeo) con resistencia de 21 MPa para el vaciado de piso entre riel y sobreanchos.

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

10. EQUIPO EN OBRA Y MATERIALES.

EQUIPO EN OBRA.

Durante la construcción de la obra se contó con maquinaria y equipos que se relacionan a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD
Estación Topográfica	1
Canguro	1
Concretadora	3
Vibrador de aguja	3
Volqueta	3
Vibro compactador manual tipo rana	1
Compresor	1

Tabla No.5 Control de Equipos

MATERIALES.

MATERIAL	NOMBRE PROVEEDOR
Cemento	Argos
Arena de concreto	Cantera Argos e ingenieras.
Triturado	Cantera Argos e Ingetierras
Base granular	Cantera Argos e Ingetierras
Acero	Acería Celaya

Tabla No.6 Control de Materiales

11. CONTROL E INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

El contrato presento modalidad de pago por anticipado del 50% por un valor de dos mil quinientos cincuenta millones ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos M/L($2,550.084.251).

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

12. DIFICULTADES Y TEMAS VARIOS.

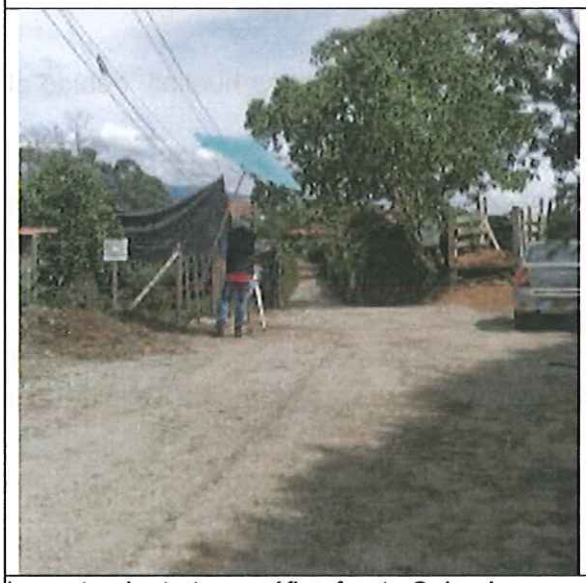
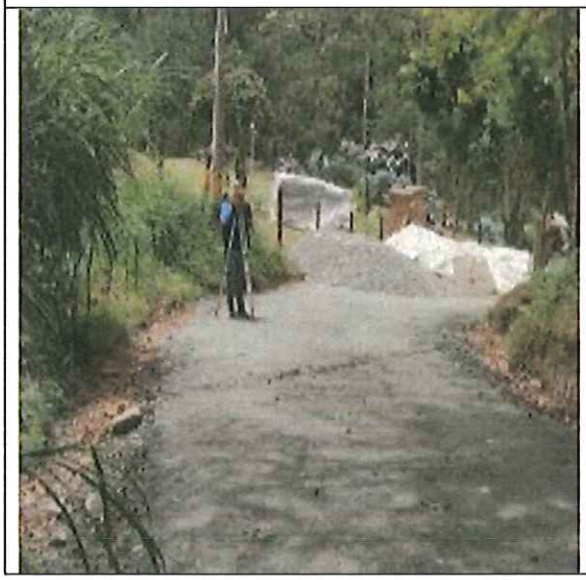
- Hasta la fecha el clima ha permitido la construcción de placa huellas, debido al verano que se está presentando.

- Se ha realizado en su totalidad la construcción de 50 metro de placa huellas en cada los frentes de los Montoya y la primavera perteneciente a la vereda de San Luis.





- En ejecución se encuentra los frentes del Anti-peaje, (La Quiebra) Salvador Rendon, (San Luis), Altos de La Pereira (la Pereira) y Campo alegre Taller Motos (Las Cuchillas).

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia



13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Levantamiento topográfico frente La Pereira	Levantamiento topográfico frente Anti-peaje La Quiebra.
	
Levantamiento topográfico frente Salvador Rendon, San Luis.	Levantamiento topográfico Los Montoya, San Luis.
	

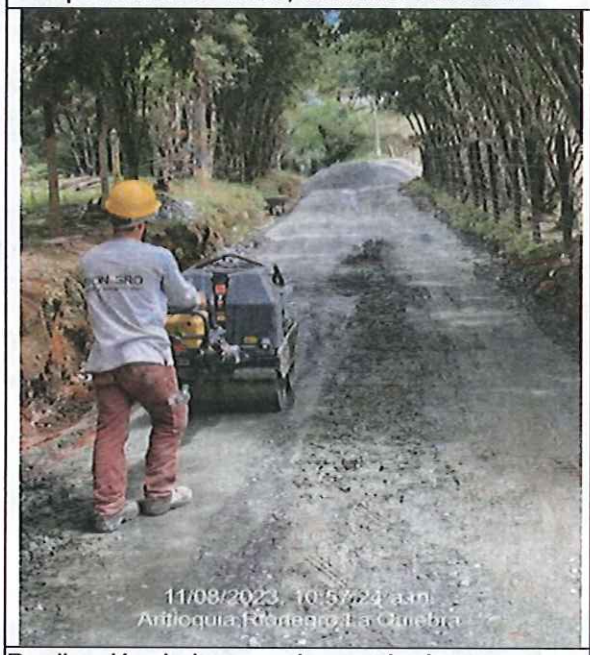
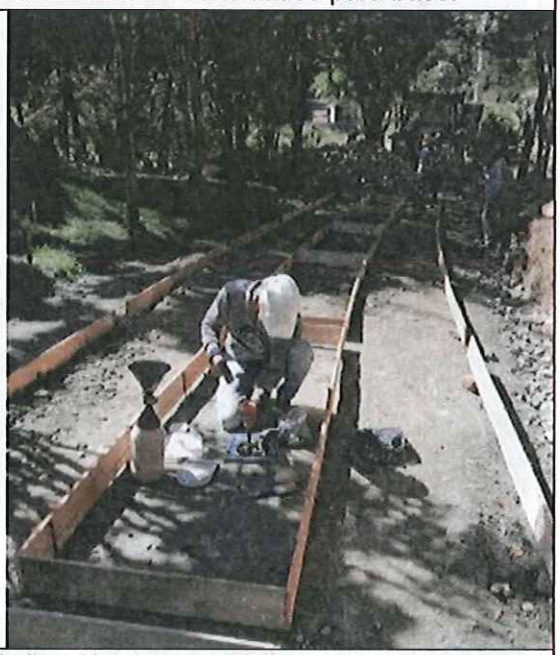
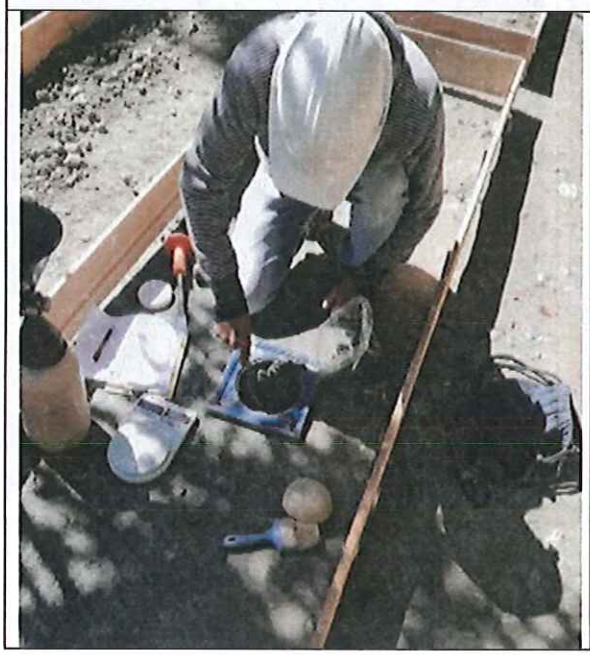
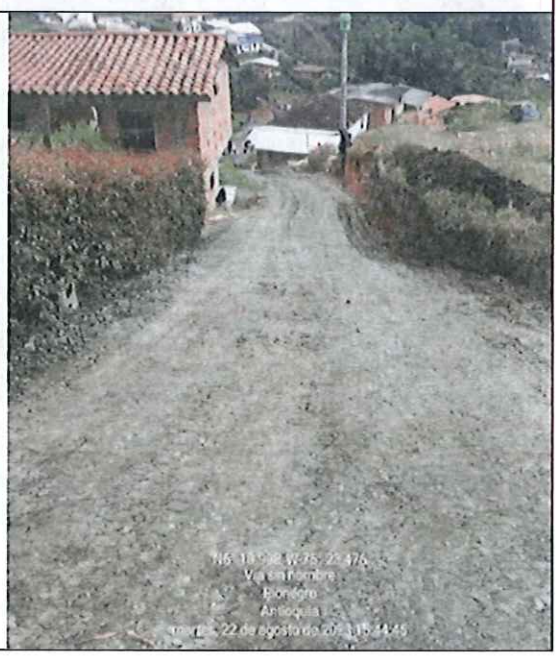
Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

Compactación de base, Salvador Rendon.	Realización de densidades para base.
	
Realización de base en la vereda de san Luis.	Aplicación de base en Las motos, Las cuchillas.
	

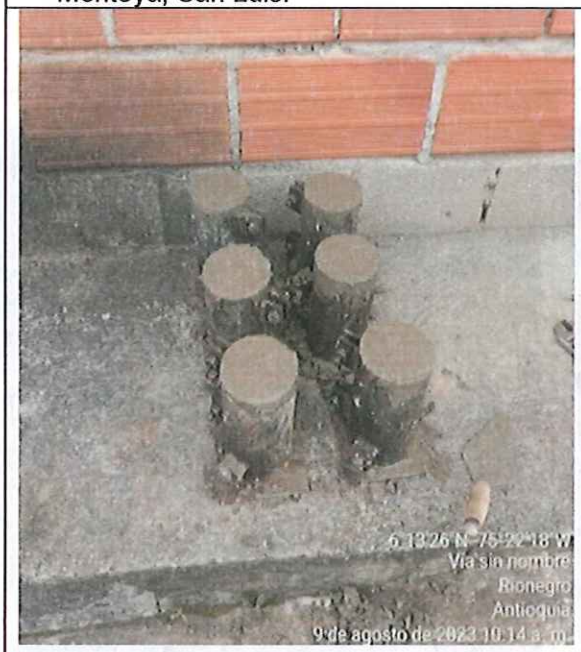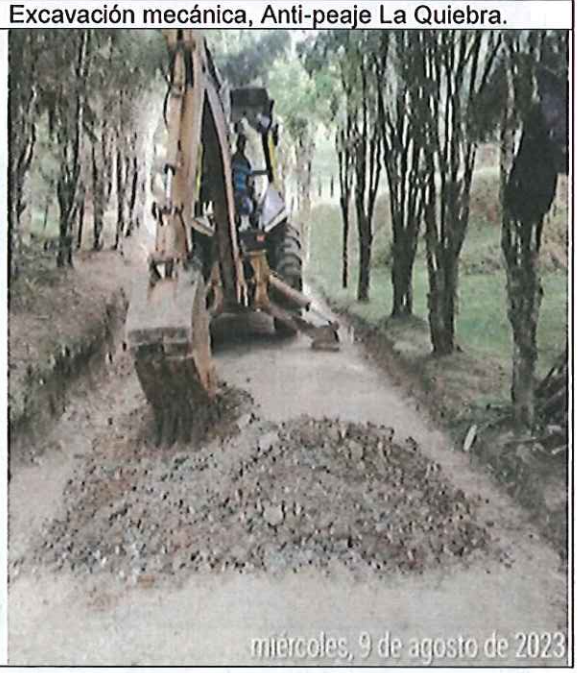Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia


Muestras de concretos para rieles Los. Montoya, San Luis.	Aplicación de base La primavera, San Luis.
	
Vaciado de concreto para rieles.	Excavación mecánica, Anti-peaje La Quiebra.
	

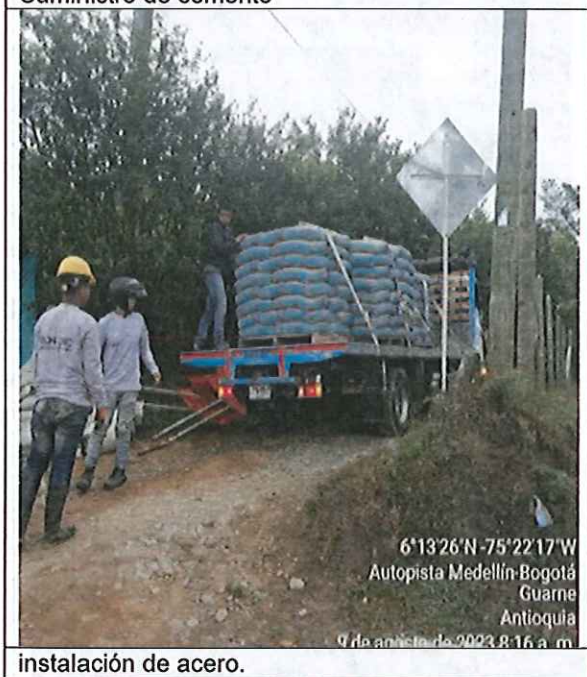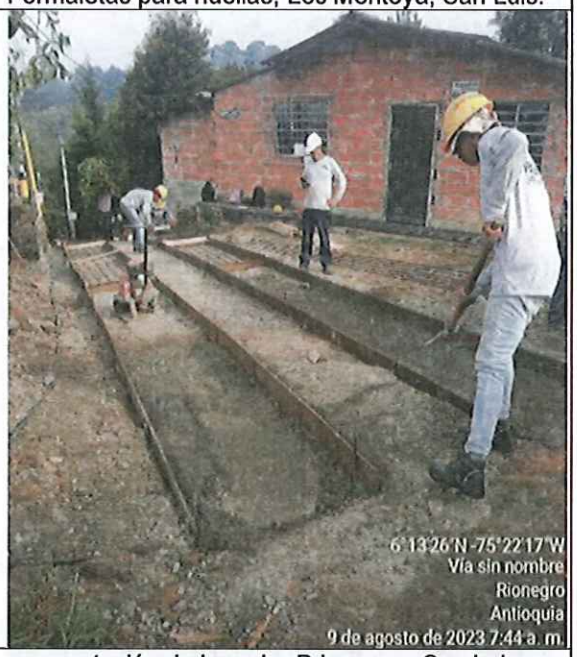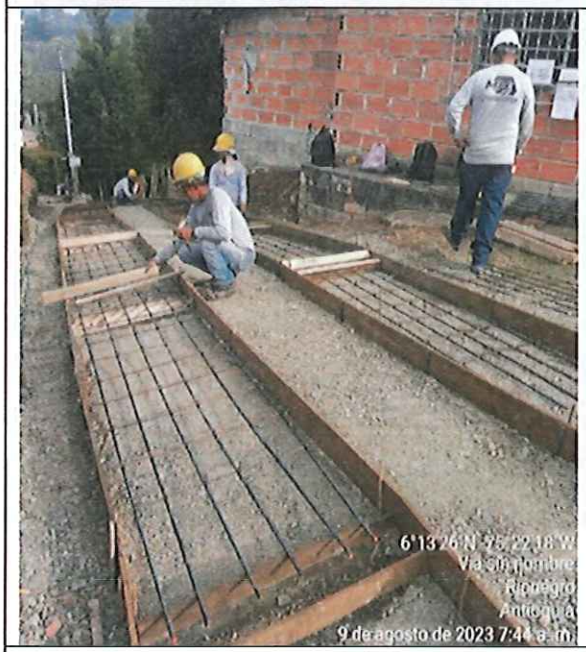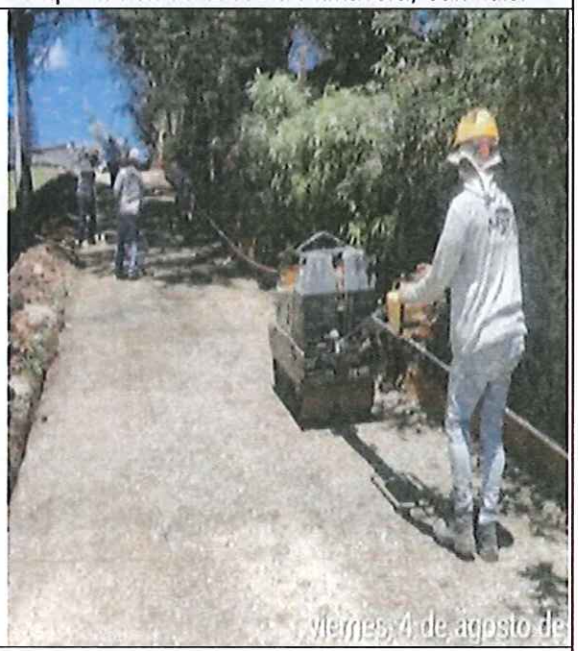Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

Suministro de cemento	Formaletas para huellas, Los Montoya, San Luis.
	
instalación de acero.	compactación de base La Primavera, San Luis.
	

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

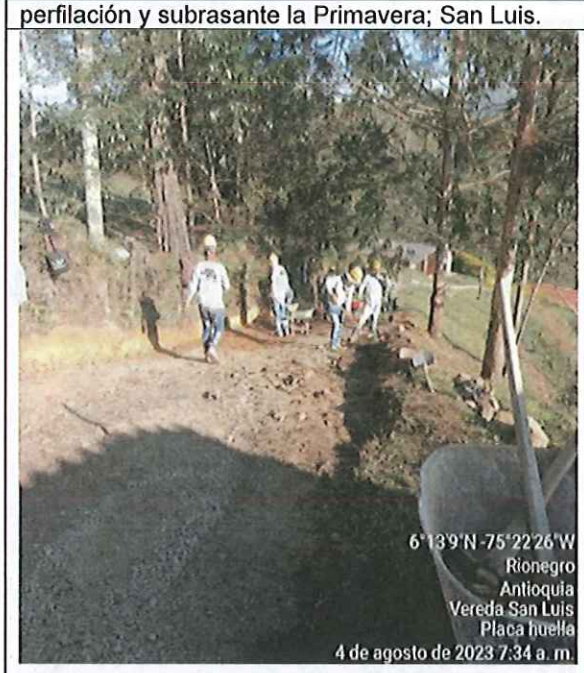perfilación y subrasante la Primavera; San Luis.








Vaciado de rieles altos de la Pereira.





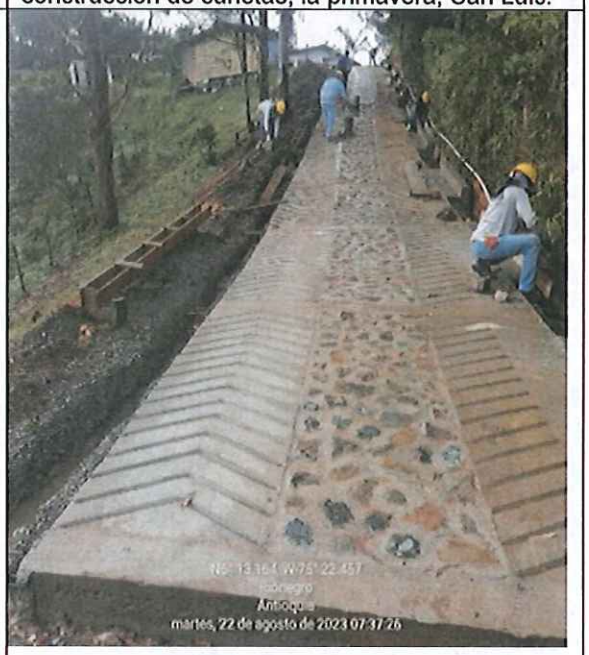
construcción de cunetas, la primavera, San Luis.




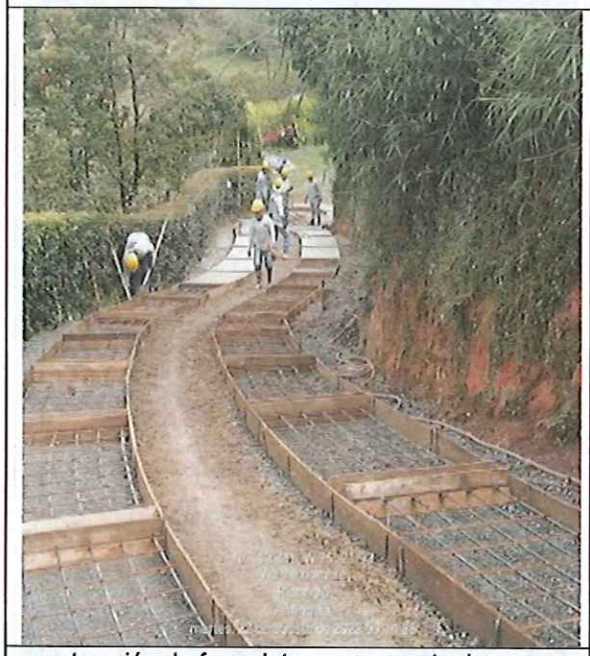
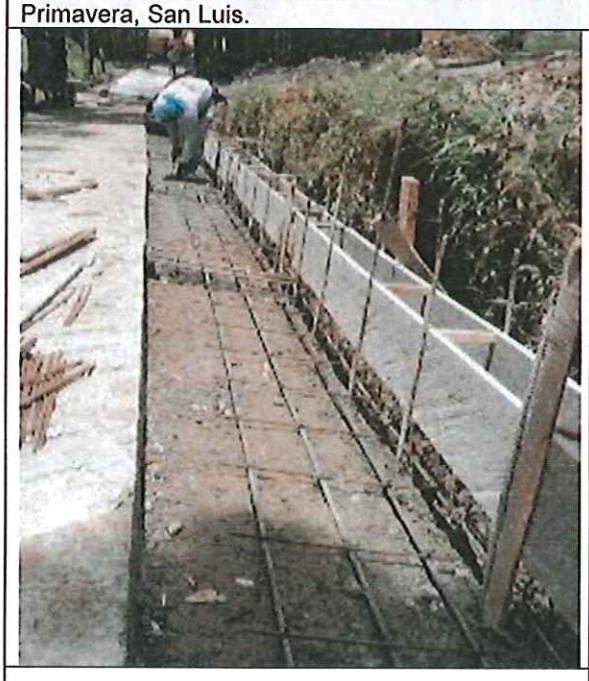
Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

Vaciado de rieles Salvador Rendon, San Luis.	Construcción de acero para rieles, La Primavera
	
construcción de formaletas para cuneta, La Primavera, San Luis.	instalación de ciclópeo.
	

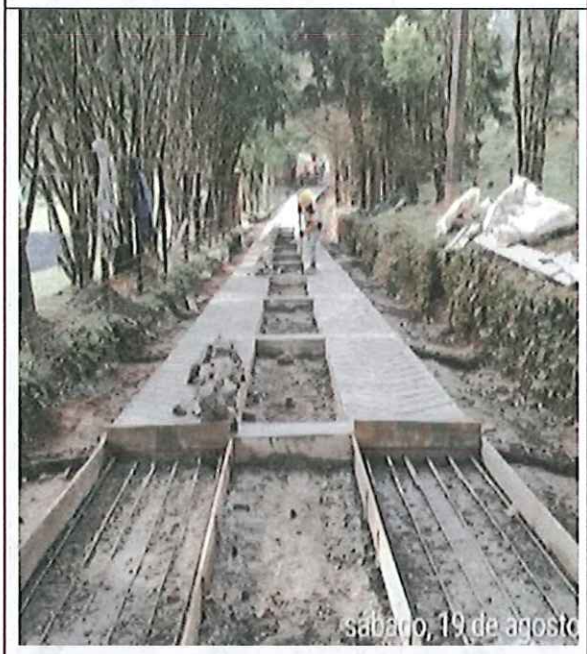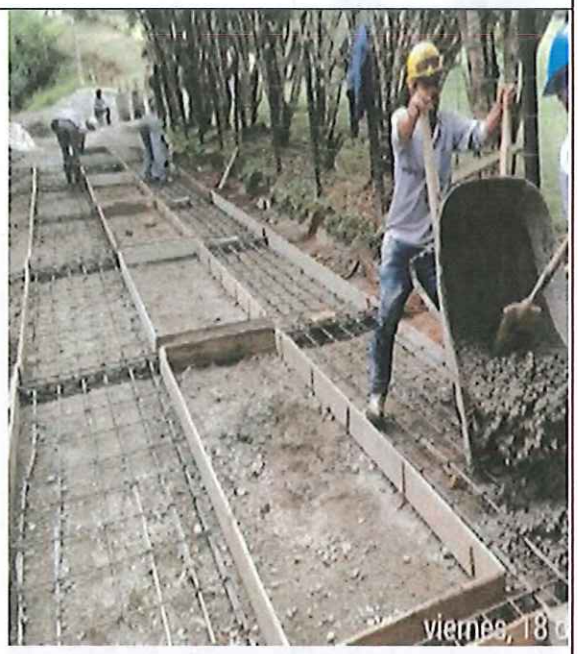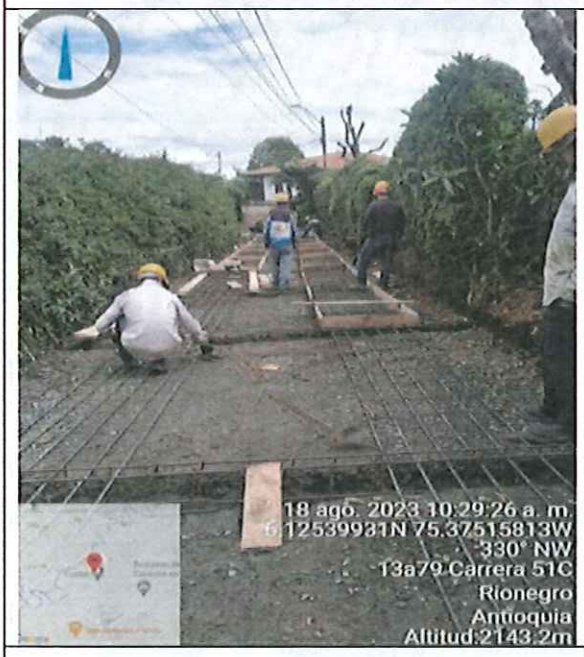Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

	Vaciado de Rieles en la Quiebra, Anti-peaje.
	
instalación de acero de refuerzo La Pereira	instalación de formaleta y acero para riel en Salvador Rendón
	

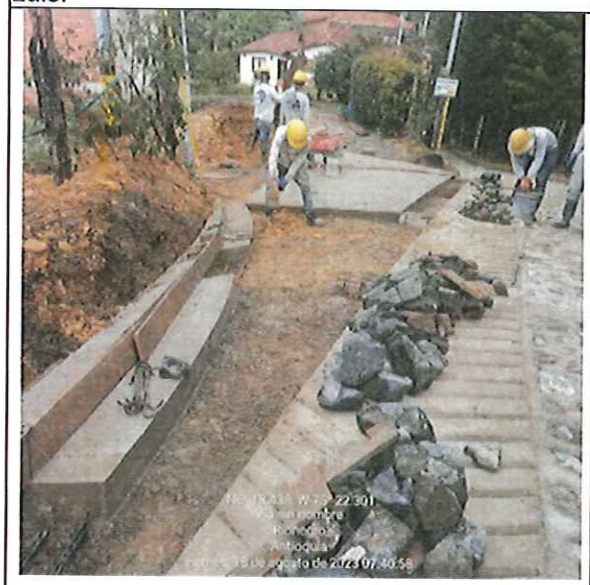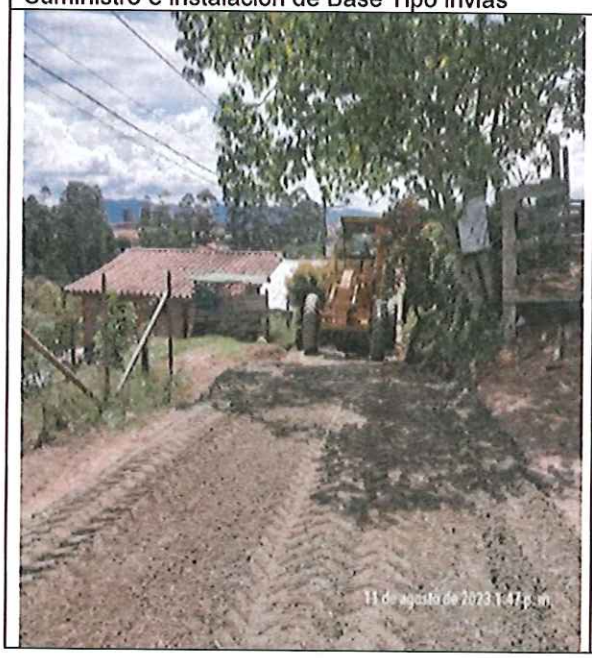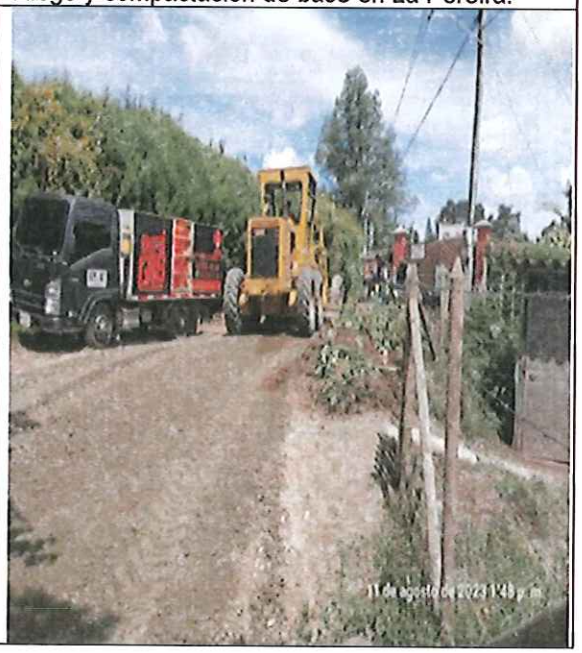Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia

Construcción de ciclópeo Los Montoya, San Luis.	Vaciado de riel, La Quiebra, Anti-peaje.
	
Suministro e instalación de Base Tipo invias	Riego y compactación de base en La Pereira.
	

Calle 25 B No. 53 a 53 Tel: 614 77 49 Móvil 3113895005 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Rionegro – Antioquia



edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

PIA Ingenierías & Arquitectura

ACTA DE OBRA N° 1

CONTRATO No IP 011 - 2023 - IP 011-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

VALOR CONTRATO INICIAL	$	5.100.168.502,00
PORCENTAJE ANTICIPO	50%	
VALOR ANTICIPO	$	2.550.084.251,00

CÓDIGO: FO-ESI-30	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 17/08/2018	
ACTA DE OBRA	
ACTA No.1	
MUNICIPIO: RIONEGRO	
FECHA DEL ACTA:	28 de Agosto de 2023
PERÍODO DE EJECUCIÓN	Julio 25 al 28 de 28 de 2023

ACTA N° 1

				GOBERNACION		MUNICIPIO		ACTA 1 GOBERNACION		ACTA 1 MUNICIPIO		ACUMULADA	
Item	Actividad	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad8	Valor Parcial2	Cantidad5	Valor2		Valor8	Cantidad4	Valor3
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografia)	dia	$ 576.515	30,00	$ 17.295.450	30,00	$ 17.295.450	2,00	1.153.030	3,00	1.729.545	5,00	$ 2.882.575
1.3.1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera comun para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2000 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	ml	$ 27.820	138,00	$ 3.839.160	138,00	$ 3.839.160		-		-	0,00	$ -
1.1.13	EXCAVACION MANUAL de material heterogeneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio.	m3	$ 52.244	1.231,00	$ 64.312.364	1.140,00	$ 59.558.160	0,00	-	55,39	2.893.795	55,39	$ 2.893.795
1.1.1	Excavacion Mecanica de material heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., motobomba sumergible, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio.	m3	$ 34.135	55,16	$ 1.882.873	55,16	$ 1.882.873		-		-	0,00	$ -
2.1.2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.	m3	$ 202.915	15,00	$ 3.043.725	15,00	$ 3.043.725		-	0,95	192.769	0,95	$ 192.769
2.2.4	Retiro de Tuberia existente de 16", incluye cargue,transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiale o donde indique la interventoria, sin excavación .	ml	$ 24.053	15,00	$ 360.795	15,00	$ 360.795		-		-	0,00	$ -
3.2.6	Descapote mecanico espeser variable == 0.15 m - 0.20 m. incluye: cargue, transporte, y disposición final del material resultante hasta el lugar indicado por la interventoria	m3	$ 37.041	328,00	$ 12.149.448	304,00	$ 11.260.464		-		-	0,00	$ -
3.2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del próctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. incluye transporte	m3	$ 215.059	1.202,00	$ 258.500.918	1.113,00	$ 239.360.667	531,23	114.245.793	296,08	63.674.669	827,31	$ 177.920.461
5.1.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	$ 7.025	71.707,00	$ 503.741.675	66.538,00	$ 467.429.450	13775,92	96.775.838	8.245,50	57.924.638	22021,42	$ 154.700.476
8.1.1.7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construccion de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 116.111	3.279,00	$ 380.727.969	3.037,00	$ 352.629.107	1471,68	170.878.236	846,29	98.263.578	2317,97	$ 269.141.815

4.3.1.6	CONCRETO CLASE H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diametro entre 4" y 10". Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demas para el correcto proceso constructivo.	m3	$ 526.325	410,00	$ 215.793.250	380,00	$ 200.003.500	114,05	60.027.366	64,99	34.205.862	179,04	$ 94.233.228
4.3.10.6	Suministro, transporte e instalación de concreto clase D ,3000 PSI para cunetas y bordillo, incluye formaleteria, mano de obra, vibrado, protección y curado. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demas elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	$ 757.618	446,00	$ 337.897.628	413,00	$ 312.896.234		-	37,34	28.289.456	37,34	$ 28.289.456
4.3.1.4	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundacion (Llave de confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m r.a/a 2.7 m.	m3	$ 724.428	178,00	$ 128.948.184	165,00	$ 119.530.620	15,05	10.902.641	15,76	11.416.985	30,81	$ 22.319.627
9.10.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 24". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La estavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su item respectivo.	ml	$ 612.272	15,00	$ 9.184.080	15,00	$ 9.184.080		-	-	-	0,00	$ -
4.3.10.8	Suministro, transporte e instalación de CONCRETO de 28 MPa para estribos , aletas,muros y disipadores. incluye formaleteria, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas.	m3	$ 971.434	15,00	$ 14.571.210	15,00	$ 14.571.210		-	-	-	0,00	$ -
4.1.1.2	Colocación de concreto de 2500 psi para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demas elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	$ 563.474	18,00	$ 10.142.532	18,00	$ 10.142.532		-	-	-	0,00	$ -
6.2.15	Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	$ 145.870	165,00	$ 24.068.550	165,00	$ 24.068.550		-	18,20	2.654.834	18,20	$ 2.654.834
5.3.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diametro 4.0mm (QX-084)	m2	$ 12.250	165,00	$ 2.021.250	165,00	$ 2.021.250		-	-	-	0,00	$ -
9.10.9	Suministro, transporte y construcción de Caja de 0.80x0.80 de hasta 1 metro de profundidad en concreto de 21 MPa, incluye tapa y herrajes, Aditivo impermeabilizante y todo lo necesario para su adecuacion.	und	$ 837.890	12,00	$ 10.054.680	12,00	$ 10.054.680		-	-	-	0,00	$ -
12	Escarificacion, perfilacion, nivelacion y compactacion de subrasante existente y retiro de sobretamaños	m2	$ 3.806	8.016,43	$ 30.510.537	7.421,00	$ 28.251.938	3346,50	12.736.779	1.973,84	7.512.435	5320,34	$ 20.249.214
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CONTRACTUAL				$ 2.029.046.278		$ 1.887.384.445		$ 466.719.684		$ 308.758.566		$ 775.478.250
	ADMINISTRACION			23,84%	$ 483.724.632	24,42%	$ 460.899.280		$ 111.265.973		$ 75.398.842		$ 186.664.815
	UTILIDAD			5,00%	$ 101.452.314	5,00%	$ 94.369.222		$ 23.335.984		$ 15.437.928		$ 38.773.912
	SUBTOTAL COSTO				$ 2.614.223.224		$ 2.442.652.948		$ 601.321.641		$ 399.595.336		$ 1.000.916.977
	PMT				$ 13.902.200		$ 13.902.200		$ 2.000.000		$ 2.383.960		$ 4.383.960
	PMA				$ 7.743.965		$ 7.743.965		$ 0		$ 0		$ 0
	COSTO TOTAL				$ 2.635.869.389		$ 2.464.299.113		$ 603.321.641		$ 401.979.296		$ 1.005.300.937
	CONSOLIDADO GOBERNACION Y MUNICIPIO								$ 1.005.300.937				
	AMORTIZACION ANTICIPO 50%								$ 502.650.469				
	VALOR TOTAL ACTAS								$ 502.650.468				

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen:

Contratista

Interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

PIA Ingeniería & Arquitectura

CODIGO: FO-ESI-29	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 17/08/2018	

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografía)	UNID.	dia	RIONEGRO





Descripción / localización	cantida	TOTAL
Acta de obra No. 1		
vereda san luis, callejon los montoya	1	1,00
vereda san luis, callejon la primavera	1	1,00
altos de la pereira	1	1,00
SUBTOTAL		3,00
menos pagado actas anteriores		0,00
TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA Ingeniería & Arquitectura	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografía)	UNID.	dia	RIONEGRO





Descripción / localización				cantida	TOTAL
Acta de obra No. 1					
vereda san luis, callejon los montoya				1	1,00
vereda san luis, callejon la primavera				1	1,00
alto de la pereira				1	1,00
SUBTOTAL					3,00
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					3,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible		**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

							Consecutivo	1	HOJA	
FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		3.3.13	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	UNID.	m3	RIONEGRO





Descripción / localización	DIMENSIONES			TOTAL
	L	B	H	
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				
lateral derecha	44	0,5	0,2	4,40
central	12	0,6	0,1	0,72
izquierda	50	0,45	0,2	4,50
lado derecho ampliacion seccion	17,5	0,45	0,34	2,68
lado izquierdo ampliacion seccion	7,5	0,3	0,48	1,08
lado izquierdo ampliacion seccion	8,8	0,3	0,15	0,40
inicio placa huella	3,3	3,5	0,2	2,31
fin placa huella	3,3	3,5	0,2	2,31
acceso finca 285	6,6	2,7	0,3	5,35
excavacion para cuneta	83,4	0,15	0,3	3,75
excavacion para ciclopeo	1,415	5,5	0,1	0,78
vigas	63,12	0,2	0,15	1,89
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				30,16

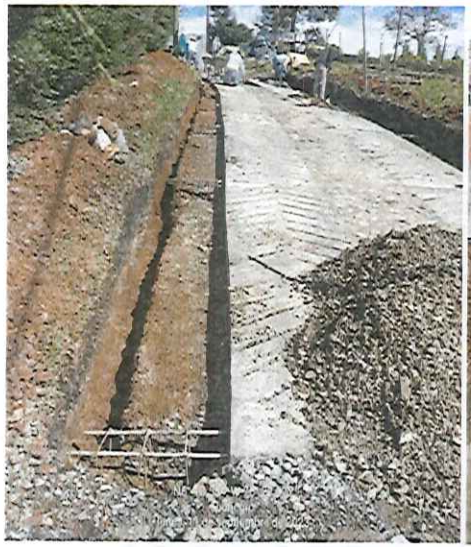



VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				
lado izquierdo ampliacion seccion	43	0,25	0,4	4,30
lado derecho	5	0,5	0,4	1,00
lado derecho	30	0,5	0,15	2,25
cajeo inicio	5	3,5	0,25	4,38
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				11,93
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				
lado derecho ampliacion seccion	27,7	0,8	0,6	13,30
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				13,30

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	55,39
menos pagado actas anteriores	0,00
TOTAL	55,39

Residente de obra

Residente de interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

PIA Ingeniería & Arquitectura

CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023		

		ÍTEM				
		2.1.3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	UNID.	m3	RIONEGRO





Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				
riel central	19	0,5	0,1	0,95
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				0,95
SUBTOTAL				0,95
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				0,95

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		3.2.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del próctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte.	UNID.	m3	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B1	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				
base granular	51,4	3,51	0,15	27,06
base granular entrada	6,5	2,80	0,15	2,73
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				29,79
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				
base granular	60,35	3,5	0,15	31,68
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				31,68
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				
base granular	100	4,1	0,15	61,50
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				61,50



ALTOS DE LA PEREIRA (3)				
base granular	120	4,15	0,15	74,70
TOTAL ALTOS DE LA PEREIRA (3)				74,70
ABREO CALLEJON DE NOE				
base granular	82	3	0,15	36,90
TOTAL ABREO CALLEJON DE NOE				36,90
CARMIN LOS GILES				
base granular	100	4,1	0,15	61,50
TOTAL ABREO CALLEJON DE NOE				61,50
SUBTOTAL				296,08
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				296,08

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

GOBERNACION

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA Ingeniería & Arquitectura	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		3.2.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del próctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte.	UNID.	m3	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B1	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)				
base granular	83	3,50	0,15	43,58
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)				43,58
VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)				
base granular	150	4	0,15	90,00
TOTAL VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)				90,00
VEREDA ABREO EL MANZANO				
base granular	80	3,5	0,15	42,00
TOTAL VEREDA ABREO EL MANZANO				42,00
VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE				
base granular	100	4,1	0,15	61,50
TOTAL VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE				61,50
VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA GUADALUPANA				
base granular	80	3,5	0,15	42,00
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA GUADALUPANA				42,00



VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS - LOS ROJAS				
base granular	124	4,5	0,15	83,70
TOTAL VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS				83,70
VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES				
base granular	130	4,1	0,15	79,95
TOTAL VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES				79,95
VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO				
base granular	60	4	0,15	36,00
TOTAL VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO				36,00
VEREDA EL CARMIN CALLEJON LOS FELICIOS				
base granular	100	3,5	0,15	52,50
TOTAL VEREDA EL CARMIN CALLEJON LOS FELICIOS				52,50
SUBTOTAL				531,23
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				531,23

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		5.1.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	KG	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ml	Cantidad Varillas/ml	ø	Peso por ml	
Acta de obra No. 1					
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)					
Huellas, longitudinal	102,80	6,00	1/2	0,99	613,10
Huellas,traslapos	10,20	6,00	1/2	0,99	60,83
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	343,00	1/4	0,25	68,60
Cuneta longitudinal.	83,40	4,00	1/2	0,99	331,60
Cuneta traslapos	8,34	4,00	1/2	0,99	33,16
Cuneta transversal @ 0,30	0,30	278,00	1/4	0,25	20,85
Cuneta transversal bordillo @ 0,15	0,60	556,00	3/8	0,56	186,82
Vigas	61,32	4,00	1/2	0,99	243,81
Estribos Vigas @ 0,15	1,00	409,00	1/4	0,25	102,25
	m2/entradas	Und/m2	ø	Peso por ml	
Entradas a fincas longitudinal @. 0,15	18,20	6,67	1/2	0,99	120,61
Entradas a fincas Transversal @. 0,30	18,20	3,33	1/4	0,25	15,17
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)					1796,79











VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)					
Huellas, longitudinal	120,70	6,00	1/2	0,99	719,85
Huellas,traslapos	12,00	6,00	1/2	0,99	71,57
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	402,00	1/4	0,25	80,40
Vigas	71,40	4,00	1/2	0,99	283,89
Estribos Vigas @ 0,15	1,00	476,00	1/4	0,25	119,00
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)					**1274,71**

	ml	**Cantidad Varillas/ml**	**ø**	**Peso por ml**	
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)					
Huellas, longitudinal	199,00	6,00	1/2	0,99	1186,84
Huellas,traslapos	19,80	6,00	1/2	0,99	118,09
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	663,00	1/4	0,25	132,60
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)					**1437,52**
ALTOS DE LA PEREIRA (3)					
Huellas, longitudinal	240,00	6,00	1/2	0,99	1431,36
Huellas,traslapos	24,00	6,00	1/2	0,99	143,14
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	800,00	1/4	0,25	160,00
TOTAL ALTOS DE LA PEREIRA (3)					**1734,50**
ABREO CALLEJON DON NOE					
Huellas, longitudinal	164,00	5,00	1/2	0,99	815,08
Huellas,traslapos	16,20	5,00	1/2	0,99	80,51
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 5 longitudinales)	0,70	547,00	1/4	0,25	95,73

TOTAL ABREO CALLEJON DON NOE						**991,32**
CARMIN LOS GILES						
Huellas, longitudinal	140,00	6,00	1/2	0,99	834,96
Huellas,traslapos	13,80	6,00	1/2	0,99	82,30
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	467,00	1/4	0,25	93,40
TOTAL CARMIN LOS GILES					**1010,66**
SUBTOTAL					8.245,50
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					**8.245,50**

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

GOBERNACION


edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

							Consecutivo	1	HOJA
FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA. — NIT O C.C. 15434553-9 — CONTRATO N° IP 011 - 2023

		ÍTEM				
		5.1.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	KG	RIONEGRO











Descripción / localización	DIMENSIONES ml	Cantidad Varillas/ml	ø	Peso por ml	TOTAL
Acta de obra No. 1					
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)					
Huellas, longitudinal	166,00	6,00	1/2	0,99	990,02
Huellas,traslapos	16,80	6,00	1/2	0,99	100,20
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	553,00	1/4	0,25	110,60
TOTAL "VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)					1200,82
VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)					
Huellas, longitudinal	300,00	6,00	1/2	0,99	1789,20
Huellas,traslapos	30,00	6,00	1/2	0,99	178,92
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	1000,00	1/4	0,25	200,00
TOTAL VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)					2168,12

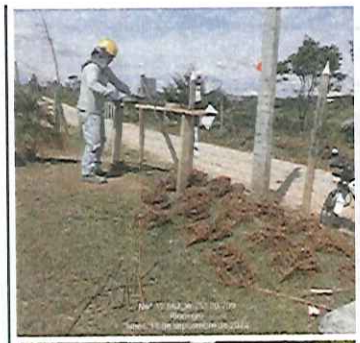



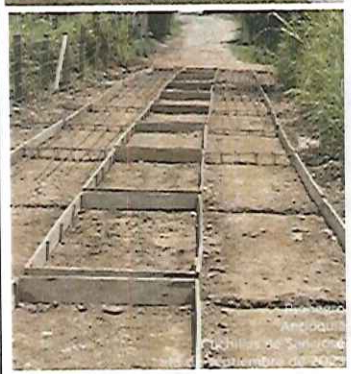



VEREDA ABREO EL MANZANO					
Huellas, longitudinal	160,00	6,00	1/2	0,99	954,24
Huellas,traslapos	16,20	6,00	1/2	0,99	96,62
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	533,00	1/4	0,25	106,60
TOTAL VEREDA VEREDA ABREO EL MANZANO					**1157,46**

VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE					
Huellas, longitudinal	140,00	6,00	1/2	0,99	834,96
Huellas,traslapos	13,80	6,00	1/2	0,99	82,30
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	467,00	1/4	0,25	93,40
TOTAL MAMPUESTO TANQUE DE LECHE					**1010,66**

VEREDA EL CARMIN SECTOR LOS FELICIOS					
Huellas, longitudinal	600,00	6,00	1/2	0,99	3578,40
Huellas,traslapos	60,00	6,00	1/2	0,99	357,84
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	2000,00	1/4	0,25	400,00
TOTAL VEREDA EL CARMIN SECTOR LOS FELICIOS					**4336,24**

VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA					
Huellas, longitudinal	100,00	6,00	1/2	0,99	596,40
Huellas,traslapos	10,20	6,00	1/2	0,99	60,83
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	333,00	1/4	0,25	66,60
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA					**723,83**





VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS - LOS ROJAS					
Huellas, longitudinal	60,00	6,00	1/2	0,99	357,84
Huellas,traslapos	6,00	6,00	1/2	0,99	35,78
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	200,00	1/4	0,25	40,00
TOTAL VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS					**433,62**

VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES					
Huellas, longitudinal	260,00	6,00	1/2	0,99	1550,64
Huellas,traslapos	25,80	6,00	1/2	0,99	153,87
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	867,00	1/4	0,25	173,40
TOTAL VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES					**1877,91**

VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO					
Huellas, longitudinal	120,00	6,00	1/2	0,99	715,68
Huellas,traslapos	12,00	6,00	1/2	0,99	71,57
Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	400,00	1/4	0,25	80,00
TOTAL VEREDA VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO					**867,25**

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.775,92
menos pagado actas anteriores	0,00
TOTAL	**13.775,92**

Residente de obra

Residente de interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	MEMORIAS DE CÁLCULO	PIA	CODIGO: FO-FSI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.						
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023		

		ÍTEM				
		6.1.1.7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construcción de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m2	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	Cantida	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				
Riel	102,8	0,9		92,52
Decuento vigas	-0,2	0,9	36,00	-6,48
TOTAL 'VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				86,04
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				
Riel	120,7	0,9		108,63
Decuento vigas	-0,2	0,9	42,00	-7,56
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				101,07
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				
Riel	200	0,9		180,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	68,00	-12,24
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				167,76
ALTOS DE LA PEREIRA (3)				
Riel	240	0,9		216,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	81,00	-14,58
TOTAL ALTOS DE LA PEREIRA (3)				201,42
VEREDA ABREO CALLEJON DON NOE				
Riel	164	0,8		131,20
Decuento vigas	-0,2	0,8	56,00	-8,96
TOTAL 'VEREDA ABREO CALLEJON DON NOE				122,24
VEREDA CARMIN LOS GILES				
Riel	200	0,9		180,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	68,00	-12,24
TOTAL 'VEREDA CARMIN LOS GILES				167,76
SUBTOTAL				846,29
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				846,29

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

GOBERNACION

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA Ingeniería & Arquitectura	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

							Consecutivo	1	HOJA	
FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		8.1.1.7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construcción de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m2	RIONEGRO





Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	Cantida	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)				
Riel	166	0,9		149,40
Decuento vigas	-0,2	0,9	56,00	-10,08
TOTAL "VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON				139,32









VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)				
Riel	300	0,9		270,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	101,00	-18,18
TOTAL VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)				**251,82**
VEREDA ABREO EL MANZANO				
Riel	160	0,9		144,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	54,00	-9,72
TOTAL VEREDA ABREO EL MANZANO				**134,28**
VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE				
Riel	200	0,9		180,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	68,00	-12,24
TOTAL 'VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE				**167,76**





VEREDA EL CARMIN CALLEJON LOS FELICIOS				
Riel	200	0,9		180,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	68,00	-12,24
TOTAL VEREDA EL CARMIN CALLEJON LOS FELICIOS				**167,76**
VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA				
Riel	100	0,9		90,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	34,00	-6,12
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA				**83,88**





VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS - LOS ROJAS				
Riel	248	0,9		223,20
Decuento vigas	-0,2	0,9	84,00	-15,12
TOTAL VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS				208,08
VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES				
Riel	260	0,9		234,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	88,00	-15,84
TOTAL VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES				218,16





VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO				
Riel	120	0,9		108,00
Decuento vigas	-0,2	0,9	41,00	-7,38
TOTAL VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO				100,62

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.471,68
menos pagado actas anteriores	0,00
TOTAL	1.471,68

Residente de obra

Residente de interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

							Consecutivo	1		HOJA	
FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	CORTE N°	1		ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		4.1.1.6	CONCRETO CLASE H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	UNID.	m3	RIONEGRO









Descripción / localización	Cantidad	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1					
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)					
Entreriel.	1	51,4	0,9	0,15	6,94
Descuento vigas.	18,00	-0,2	0,9	0,15	-0,49
ciclopeos laterales.	1	5,7	0,43	0,15	0,37
ciclopeos laterales.	1	1,415	5,50	0,15	1,17
TOTAL 'VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)					7,99
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)					
Entreriel.	1	60,35	0,9	0,15	8,15
Descuento vigas.	21,00	-0,2	0,9	0,15	-0,57
TOTAL 'VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)					7,58
VEREDA ABREO CALLEJON DON NOE					
Entreriel.	1	82	0,8	0,15	9,84
Descuento vigas.	28,00	-0,2	0,8	0,15	-0,67
TOTAL VEREDA ABREO CALLEJON DON NOE					9,17
ALTOS DE LA PEREIRA					
Entreriel.	1	120	0,9	0,15	16,20
Descuento vigas.	41,00	-0,2	0,9	0,15	-1,11
ALTOS DE LA PEREIRA					15,09

VEREDA EL CARMIN LOS GILES					
Entreriel.	1	100	0,9	0,15	13,50
Descuento vigas.	34,00	-0,2	0,9	0,15	-0,92
TOTAL VEREDA EL CARMIN LOS GILES					12,58
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE					
Entreriel.	1	100	0,9	0,15	13,50
Descuento vigas.	34,00	-0,2	0,9	0,15	-0,92
TOTAL VEREDA VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE					12,58
SUBTOTAL					64,99
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					64,99

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

GOBERNACION

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	MEMORIAS DE CÁLCULO	PIA Ingeniería & Arquitectura	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 1

							Consecutivo	1	HOJA	
FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		4.1.1.6	CONCRETO CLASE H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	UNID.	m3	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES Cantidad	L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1					
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)					
Entreriel.	1	83	0,9	0,15	11,21
Descuento vigas.	29	-0,2	0,9	0,15	-0,78
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)					10,42
VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)					
Entreriel.	1	150	0,9	0,15	20,25
Descuento vigas.	51	-0,2	0,9	0,15	-1,38
TOTAL VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)					18,87
VEREDA ABREO EL MANZANO					
Entreriel.	1	80	0,9	0,15	10,80
Descuento vigas.	28	-0,2	0,9	0,15	-0,76
TOTAL VEREDA ABREO EL MANZANO					10,04
VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE					
Entreriel.	1	100	0,9	0,15	13,50
Descuento vigas.	34	-0,2	0,9	0,15	-0,92
TOTAL VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE					12,58
VEREDA EL CARMIN SECTOR LOS FELICIOS					
Entreriel.	1	100	0,9	0,15	13,50
Descuento vigas.	34	-0,2	0,9	0,15	-0,92
TOTAL VEREDA EL CARMIN SECTOR LOS FELICIOS					12,58





VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA					
Entreriel.	1	80	0,9	0,15	10,80
Descuento vigas.	28	-0,2	0,9	0,15	-0,76
TOTAL ' VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA					10,04
VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS - ROJAS					
Entreriel.	1	124	0,9	0,15	16,74
Descuento vigas.	42	-0,2	0,9	0,15	-1,13
TOTAL VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS					15,61
VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES					
Entreriel.	1	130	0,9	0,15	17,55
Descuento vigas.	44	-0,2	0,9	0,15	-1,19
TOTAL VEREDA A LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES					16,36
VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO					
Entreriel.	1	60	0,9	0,15	8,10
Descuento vigas.	21	-0,2	0,9	0,15	-0,57
TOTAL VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO					7,53
SUBTOTAL					114,05
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					114,05

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoria


MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	
		ÍTEM	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundación (Llave de confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m cada 2,7 m.	UNID.	m3	RIONEGRO
		4,3,1,4				

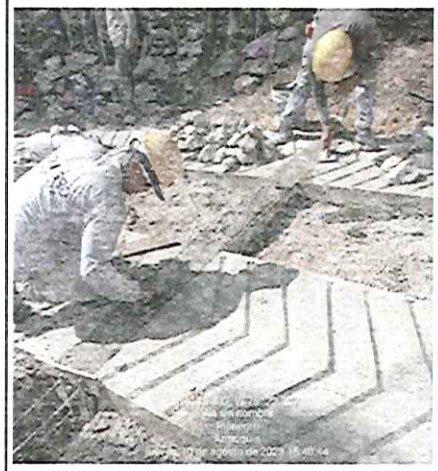



Descripción / localización	DIMENSIONES Cantidad	L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1					
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)					
Vigas	1,00	48,72	0,2	0,3	2,92
Vigas, longitud por debajo de cunetas	1,00	9,00	0,20	0,15	0,27
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)					3,19
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)					
Vigas	21,00	2,70	0,2	0,3	3,40
Vigas, longitud por debajo de cunetas	21,00	0,50	0,20	0,15	0,32
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)					3,72



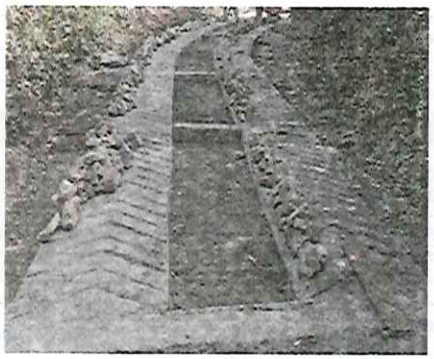

VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE (MOTOS)					
Vigas	30,00	2,70	0,2	0,3	4,86
Vigas, longitud por debajo de cunetas	30,00	0,50	0,20	0,15	0,45
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE (MOTOS)					5,31
ALTOS DE LA PEREIRA					
Vigas	20,00	2,70	0,2	0,3	3,24
Vigas, longitud por debajo de cunetas	20,00	0,50	0,20	0,15	0,30
ALTOS DE LA PEREIRA					3,54
SUBTOTAL					15,76
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					15,76

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

GOBERNACION

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

PIA

CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/06/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

	ÍTEM	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundación (Llave de confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m cada 2,7 m.	UNID.	m3	RIONEGRO	
	4.3.1.4					







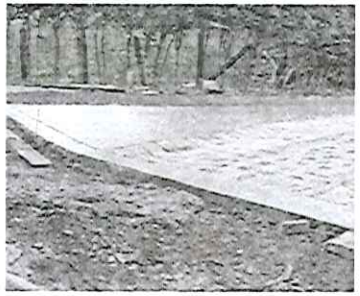

Descripción / localización	DIMENSIONES Cantidad	L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1					
VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA					
Vigas	15,00	2,70	0,2	0,3	2,43
Vigas, longitud por debajo de cunetas	15,00	0,50	0,20	0,15	0,23
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA LA GUADALUPANA					2,66
VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE					
Vigas	40,00	2,70	0,2	0,3	6,48
Vigas, longitud por debajo de cunetas	40,00	0,50	0,20	0,15	0,60
TOTAL VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE					7,08
VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES					
Vigas	30,00	2,70	0,2	0,3	4,86
Vigas, longitud por debajo de cunetas	30,00	0,50	0,20	0,15	0,45
TOTAL VEREDA LOS PINOS CALLEJÓN BERNARDO FUENTES					5,31
SUBTOTAL					15,05
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					15,05

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA ingeniería & arquitectura	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA. — NIT O C.C. 15434553-9 — CONTRATO N° IP 011 - 2023

		ÍTEM				
		4.3.10.6	Suministro, transporte e instalación de concreto clase D ,3000 PSI para cunetas y bordillo, incluye formaleteria, mano de obra, vibrado, protección y curado. Incluye conformación y formaleteria, suministro, transporte y colocación del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m3	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				
cuneta derecha (inicia en 0 y termina en 0,50)	13,1	0,25	0,15	0,49
cuneta derecha (inicia el 0,25 y termina en 0,50)	6	0,375	0,15	0,34
cunetas costado derecho e izquierdo	64,3	0,25	0,15	2,41
	Longitud	**m3/ml**		
Bordillo de la cuneta	83,4	0,01		0,83
TOTAL "VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				4,07
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				
cuneta lateral dercha e izquierda	90,2	0,25	0,15	3,38
	Longitud	**m3/ml**		
Bordillo de la cuneta	90,2	0,01		0,90
TOTAL "VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				4,28
ALTOS DE LA PEREIRA				
	Longitud	**m3/ml**		
cuneta margen izquierda	40	0,163		6,52
cuneta margen derecha	40	0,1165		4,66





TOTAL 'ALTOS DE LA PEREIRA				11,18
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE (MOTOS)				
	Longitud	m3/ml		
cuneta	100	0,178		17,80
TOTAL 'VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				17,80
SUBTOTAL				37,34
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				37,34

Residente de obra

Residente de interventoria

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

PIA Ingeniería & Arquitectura

CODIGO: FO-ESI-29	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 17/08/2018	

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM	Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	UNID.	m2	RIONEGRO
		6.2.15				





Descripción / localización	DIMENSIONES L	DIMENSIONES B	TOTAL
Acta de obra No. 1			
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)			
entrada a finca 285	6,5	2,8	18,20
TOTAL 'VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)			18,20
SUBTOTAL			18,20
menos pagado actas anteriores			0.00
TOTAL			18,20

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoría

MUNICIPIO

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1


FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		12	Escarificacion, perfilacion, nivelacion y compactacion de subrasante existente y retiro de sobretamaños.	UNID.	m2	RIONEGRO





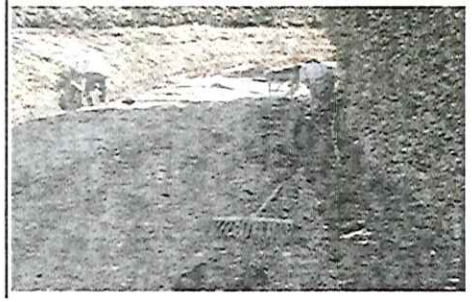



Descripción / localización	DIMENSIONES L	A		TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				
conformacion	51,4	3,51		180,41
conformacion	6,5	2,80		18,20
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LOS MONTOYA(13)				198,61
VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				
conformacion	60,35	3,5		211,23
TOTAL VEREDA SAN LUIS CALLEJON LA PRIMAVERA (14)				211,23
VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER DE MOTOS (8)				
conformacion	100	4,1		410,00
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS SECTOR CAMPO ALEGRE TALLER				410,00
ALTOS DE LA PEREIRA (3)				
conformacion	120	4,15		498,00
TOTAL ALTOS DE LA PEREIRA (3)				498,00





VEREDA ABREO CALLEJON DE NOE				
conformacion	82	3		246,00
TOTAL VEREDA ABREO CALLEJON DE NOE				246,00
VEREDA EL CARMIN LOS GILES				
conformacion	100	4,1		410,00
TOTAL VEREDA ABREO CALLEJON GILES				410,00
SUBTOTAL				1.973,84
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				1.973,84

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoria

GOBERNACION

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	PIA	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	28	MM	8	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA
							CORTE N°	1	ELABORÓ: Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 011 - 2023	

		ÍTEM				
		12	Escarificacion, perfilacion, nivelacion y compactacion de subrasante existente y retiro de sobretamaños.	UNID.	m2	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B1	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)				
conformacion	80	3,60		288,00
VEREDA SAN LUIS CALLEJON SALVADOR RENDON (18)				288,00
VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)				
conformacion	150	4,15		622,50
TOTAL VEREDA LA QUIEBRA ANTIPEAJE (8)				622,50
VEREDA ABREO EL MANZANO				
conformacion	80	3,5		280,00
TOTAL VEREDA ABREO EL MANZANO				280,00
VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE				
conformacion	100	4,5		450,00
TOTAL VEREDA MAMPUESTO TANQUE DE LECHE				450,00
VEREDA EL CARMIN CALLEJON LOS FELICIOS				
conformacion	100	4,1		410,00
TOTAL VEREDA EL CARMIN CALLEJON LOS FELICIOS				410,00





VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA GUADALUPANA				
conformacion	80	3,5		280,00
TOTAL VEREDA LAS CUCHILLAS CAPILLA GUADALUPANA				280,00
VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS - LOS ROJAS				
conformacion	54	4,5		243,00
TOTAL VEREDA LA MOSQUITA CALLEJON DON LUIS				243,00
VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES				
conformacion	130	4,1		533,00
TOTAL VEREDA LOS PINOS CALLEJON BERNARDO FUENTES				533,00
VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO				
conformacion	60	4		240,00
TOTAL VEREDA SAN LUIS PARROQUIA PADRE EMILIO				240,00
SUBTOTAL				3.346,50
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				3.346,50

OBSERVACIONES:

Residente de obra

Residente de interventoria

Serviseñales Ltda
NIT 811 043 299-1

Todo lo relacionado con Señalización Vial e Industrial

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 132

Resolución de Facturación DIAN No. 18764019324939 del 10/10/2021
Facturación por Computador Desde la FVE No. 001 Hasta la FVE No. 700 Vence el 10/10/2022

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4329 10000.00 X 1000

CLIENTE	ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	**15.434.553-9**		**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	FACTURA DE VENTA
SAN ANTONIO DE PEREIRA	**RIONEGRO**	6147749	Obra: Suministro de Señales Temporales de Obra

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2023	N/A	JORGE ENRIQUE VELASQUEZ HIGUITA	CONTADO

item	Código	Descripción	U Medida	Cant.	V. Unit.	IVA	V. IVA	Total
1	133	Tablero señal temporal de obra SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA de 75X75 cm adhesivo tipo IV en lamina galvanizada cal 20 según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	121.200	19%	23.028	1.212.000
2	134	Adhesivo señal temporal de obra SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA de 75X75 cm adhesivo tipo IV según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	85.200	19%	16.188	852.000
3	132	Tablero Corbatin (a 100mt) para señal temporal de obra SPO-01 de 90X30 cm en adhesivo tipo IV en lámina galvanizada cal 20 según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	96.000	19%	18.240	960.000
4	131	Adhesivo Corbatin (a 100mt) para señal temporal de obra SPO-01 de 90X30 cm en adhesivo tipo IV según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	66.000	19%	12.540	660.000

Total Items 4

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.684.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**699.960**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.383.960**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.383.960**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 29/08/2023 18:39:35

CALLE 49 a 58 42 Teléfono 3113181848 Copacabana
Correo Electrónico servisenales@hotmail.com

CUFE: a698c17b8b6403a5a0cac67f1505404f122642777b4faaac4a0dfca0e82ceddba39db9e5dc6119364943a3da4113438d--Expedición:29/08/2023 07:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Serviseñales Ltda
NIT 811 043 299-1

Todo lo relacionado con Señalización Vial e Industrial

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 132

Resolución de Facturación DIAN No. 18764019324939 del 10/10/2021
Facturación por Computador Desde la FVE No. 001 Hasta la FVE No. 700 Vence el 10/10/2022

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4329 10000.00 X 1000

CLIENTE	ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	15.434.553-9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
SAN ANTONIO DE PEREIRA	RIONEGRO	6147749	FACTURA DE VENTA Obra: Suministro de Señales Temporales de Obra

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2023	N/A	JORGE ENRIQUE VELASQUEZ HIGUITA	CONTADO

item	Código	Descripción	U Medida	Cant.	V. Unit.	IVA	V. IVA	Total
1	133	Tablero señal temporal de obra SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA de 75X75 cm adhesivo tipo IV en lamina galvanizada cal 20 según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	121.200	19%	23.028	1.212.000
2	134	Adhesivo señal temporal de obra SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA de 75X75 cm adhesivo tipo IV según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	85.200	19%	16.188	852.000
3	132	Tablero Corbatin (a 100mt) para señal temporal de obra SPO-01 de 90X30 cm en adhesivo tipo IV en lámina galvanizada cal 20 según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	96.000	19%	18.240	960.000
4	131	Adhesivo Corbatin (a 100mt) para señal temporal de obra SPO-01 de 90X30 cm en adhesivo tipo IV según especificaciones del manual INVIAS 2015.	Und.	10	66.000	19%	12.540	660.000

Total Items 4

SUBTOTAL	3.684.000
DESCUENTO	0
IVA	699.960
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.383.960
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.383.960

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/08/2023 18:39:35

CALLE 49 a 58 42 Teléfono 3113181848 Copacabana

Correo Electrónico servisenales@hotmail.com

CUFE: a698c17b8b6403a5a0cac67f1505404f122642777b4faaac4a0dfca0e82ceddba39db9e5dc6119364943a3da4113438d--Expedición:29/08/2023 07:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro, 02 de octubre de 2023

Señores:

EDESO

Referencia-. Contrato N° IP 011 – 2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Asunto: Certificación de cumplimiento con el pago de la seguridad social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Con la presente certifico que el Ingeniero LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA identificado con Nit: 15.434.553-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemasde Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP correspondiente a la nómina de losúltimos seis (6) meses.

FIRMA: _____
NOMBRE: Luis Alfonso Valencia Posada
CEDULA: 15.434.553

Carrera 25b N° 53ª - 53 Tel: 614 77 49 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com

Rionegro – Antioquia – Colombia

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro, 02 de octubre de 2023

Señores:

EDESO

Referencia-. Contrato N° IP 011 – 2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Asunto: Certificación IBC de seguridad social, persona natural

Yo LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA en mi calidad de persona natural identificado con Nit: 15.434.553-9, certifico que el pago de aportes a la seguridad social para el mes de Agosto se viene realizando sobre un IBC de 4.200.000 .

Adjunto planilla de pago de seguridad social

FIRMA: _____
NOMBRE: Luis Alfonso Valencia Posada
CEDULA: 15.434.553

Carrera 25b N° 53ª - 53 Tel: 614 77 49 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com

Rionegro – Antioquia – Colombia

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

LISTADO DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Nombre	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Cargo	CORDINADOR DE OBRA
Salario	4.200.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	JAIME EDUARDO GAVIRIA PANIAGUA
Cargo	RESIDENTE DE OBRA
Salario	3.200.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	JOHN HENRY GALLEGO RINCON
Cargo	RESIDENTE DE OBRA
Salario	3.200.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	WILLIAM LIBARDO ZULUAGA GARCIA
Cargo	TECNOLOGO AUXILIAR
Salario	2.500.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	SLENIS ELISETH RAMIREZ RAMIREZ
Cargo	PROFESIONAL AMBIENTAL
Salario	3.000.000 (50%)
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	GLORIA HAYDE GOMEZ LOAIZA
Cargo	PROFESIONAL SOCIAL
Salario	3.000.000 (50%)
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	CAROLINA OLIVEROS HERNANDEZ
Cargo	PROFESIONAL SST
Salario	3.000.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Ingeniero Civil
Contratista

Calle 25 b # 53 a 53 Barrio Santa Fe / San Antonio de Pereira
Rionegro – Antioquia – Colombia
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Tel: 614 77 49 / 311 389 50 05

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434853
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 35 B # 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		75859097359	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		105828731

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 672.000	$ 1.000	$ 673.000
SUBTOTALES:										$ 672.000	$ 1.000	$ 673.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DEDCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 525.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 525.000	$ 1.200	$ 0	$ 525.200
SUBTOTALES:													$ 525.000	$ 1.200	$ 0	$ 525.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DEDCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 292.400	$ 292.400	$ 700	$ 0	$ 293.100
SUBTOTALES:									$ 292.400	$ 700	$ 0	$ 293.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 65 A 63	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7892786889	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DIAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		104203725

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	28	$ 5.407.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 5.407.800	$ 6.100	$ 5.413.900
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 559.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 559.800	$ 700	$ 557.500
230201	230201- PROTECCION	29	$ 6.391.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 6.391.500	$ 7.200	$ 6.398.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	12	$ 2.786.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 2.786.400	$ 3.200	$ 2.791.600
SUBTOTALES:										$ 15.144.500	$ 17.200	$ 15.161.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS006	EPS006-COMFENDAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	21		$ 0		$ 0		$ 0	$ 907.600	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 907.600	$ 1.100	$ 0	$ 908.900
EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	33		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.309.400	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 2.309.400	$ 2.300	$ 0	$ 2.311.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 360.200	$ 0	$ 500	$ 0	$ 360.200	$ 500	$ 0	$ 360.800
EPS024	EPS024-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 86.700	$ 100	$ 0	$ 86.800
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 376.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 376.900	$ 500	$ 0	$ 376.500
SUBTOTALES:													$ 3.799.600	$ 4.600	$ 0	$ 3.791.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	72		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.516.800	$ 5.516.800	$ 7.400	$ 0	$ 5.524.200
SUBTOTALES:									$ 5.516.800	$ 7.400	$ 0	$ 5.524.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	72	$ 3.786.500	$ 4.300	$ 3.790.900
SUBTOTALES:			$ 3.786.500	$ 4.300	$ 3.790.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16434853
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 D 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7892786589		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		104200726

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434053
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 53 A 63	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78927868829	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2023
DIAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	104203726

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7892766889	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOG
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	104203725

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 53 A 63	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7892786889	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		104203725

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	95792237	124755108	28/08/2023

Número de Identificación
15434553

Primer Nombre ó Razón Social
LUIS

Primer Apellido (si es Persona natural)
VALENCIA

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona
Cédula de Ciudadania

Naturaleza Juridica
03

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CALLE25B # 53A 53

Ciudad de Domicilio
RIONEGRO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 3895005

Correo electrónico
ingenierialuisvalencia@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
011-2023

Nombre Obra
placa huellas rionegro 5.100

Fecha Inicio Obra
25/07/2023

Fecha Terminación Obra
24/12/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
rionegro

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
5100168502.00

Costo Total Mano de Obra
1020033700.00

Número de Trabajadores en el Periodo
50

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1450000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1450000.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	95792237	124755108	28/08/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15434553**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.55.15.83**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 1,450,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,450,000.00	COP$ 1,450,000.00

ecollect
Seguro para ti

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro, 02 de Octubre de 2023

Señores:

EDESO

Referencia-. Contrato N° IP 011 – 2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA, como persona natural, certifico que: SI me encuentro exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMMLV, de acuerdo con lo estipulado en el art 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano.

Atentamente,

FIRMA: _____
NOMBRE: Luis Alfonso Valencia Posada
CEDULA: 15.434.553

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764049866898

(415)7707212489934(8020) 001876404986689 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 5 4 3 4 5 5 3	9	VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 25 B 53 A 53

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Rionegro

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el articulo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-06-01 / 03:12:02 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 15434553 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación
1006. Organización: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2023-06-01 15:12:02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764049866898

(415)7707212469984(8020) 001876404986689 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 5 4 3 4 5 5 3	9	VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO CL 25 B 53 A 53	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	37	500	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro, 28 de agosto de 2023

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESO
Rionegro – Antioquia

ASUNTO: Certificación inversión Anticipo

Con la presente certifico que los recursos recibidos como anticipo han sido según el plan de inversión presentado

Ítem	Descripción	Valor	%	Afectación Planilla 1	Saldo
1	Materiales	$ 1.816.935.029	75,00%	600.000.461	1.216.934.568
2	Alquiler Equipo	$ 121.129.002	5,00%	-	121.129.002
3	Mano de obra	$ 484.516.008	20,00%	100.000.000	384.516.008
Total, 50% de anticipo		$ 2.422.580.038	100%		

Luis Alfonso Valencia Posada
15.434.553
Contratista

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Soportes de los gastos efectuados con el recurso del anticipo durante el periodo a cobrar Planilla N° 1

Calle 25 b # 53 a 53 Barrio Santa Fe / San Antonio de Pereira
Rionegro – Antioquia – Colombia
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Tel: 614 77 49 / 311 389 50 05

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925441468

(415)7707212469984(8020) 000001492544146 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 7 1 9 8 5	1	Impuestos de Medellín 1	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVITRANSPORTADORA S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal
D G 48 A 43 A 24

42. Correo electrónico servitransportadora@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 0 4 0	6 0 4 5 7 9 4 1 5 6	3 1 0 3 7 4 5 1 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 6 0 5 1 3	2 3 9 5	2 0 1 6 0 5 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 1 6 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 07 - 11 / 10 : 19: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HINCAPIE HENAO SANDRA LILIANA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-07-2023 10:20:01AM

DOCUMENTO GENERADO EN SIIF NACIÓN

TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL

NIT: 900.971.985-1

Diagonal 48a No. 43a 34 Rionegro-Antioquia

3103745189

CUENTA DE COBRO No.
1382

FECHA	28 de Julio de 2023		
SEÑOR(ES)	ALFONSO VALENCIA		
NIT		**TELEFONO**	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1,00	TRANSPORTE DE MATERIAL.	$ 150.000.000	$ 150.000.000
			$ 0
			$ 0
			$ 0
VALOR EN LETRAS:		**SUBTOTAL**	$ 150.000.000
		DESCUENTO	
		TOTAL	$ 150.000.000

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA CLIENTE**

NUEVA CUENTA DE COBRO

GUARDAR CUENTA DE COBRO

PDF

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14855689422

(415)7707212489984(8020) 000001485568942 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 8 7 2 0	9	Impuestos de Medellín (1 1)	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES FORTHY S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

41. Dirección principal
CR 31 43 29

42. Correo electrónico inversionesforthy@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 3 3 2 8 0	3 2 0 7 2 6 2 3 4 2	3 1 4 8 9 0 2 8 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 0 0 1 0 1	6 8 1 0	2 0 1 1 0 9 1 0	4 9 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 27 / 15 : 44: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 27-08-2022 03:45:00PM

DOCUMENTO GENERADO CON FINES INFORMATIVOS

INVERSIONES FORTHY S.A.S.
nit: 900.468.720-9

CUENTA DE COBRO # 037

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA

CC: 15.434.553

DEBE A:

INVERSIONES FORTHY S.A.S

NIT: 900.468.720-9

Por concepto de pago cemento

Valor total con Iva: $150.000.000= (ciento cincuenta millones de pesos m/l)

Este dinero debe ser consignado a la cuenta corriente Bancolombia

55675125847 a nombre de Inversiones Forthy s.a.s

STEVEN LLANO OCAMPO
C.C 1.036.404.057
Representante Legal

inversionesforthy@gmail.com
Cr 31 # 43 29
Tel: 543 32 80
Cel: 314 890 28 80

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894884350

(415)7707212489984(8020) 000001489488435 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 3 0 4 2 6	3	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
G Y J FERRETERIAS S A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 62 12 78 LC 1 CC PUENTE ARANDA

42. Correo electrónico impuestos@gyj.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 6 1 1	2 6 0 0 7 8 3	2 9 0 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	1 9 9 3 1 2 2 9	4 7 5 2	2 0 2 0 0 5 1 4					5 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 9	4 2	4 8	5 2	5 5												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
65 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 02 - 10 / 09 : 20: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CALLE 22 No. 51 - 225 Barrio Belen,Marinilla
Tel: 5314051 Fax: 5317689

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

COTIZACIÓN VENTAS No. 291307
Fecha Elaboración: 28 de Julio de 2023
Estado: APROBADO Fecha Estado: 28-07-2023
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

CLIENTE: VALENCIA ALFONSO
NIT: 15434553
Dirección: CR 63 40 11
Ciudad-Depto: Rionegro-Antioquia
Telefono: 5620545 3122894261
Contacto:VALENCIA ALFONSO

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: VALENCIA ALFONSO
NIT: 15434553
Dirección: CR 63 40 11
Ciudad-Depto: Rionegro-Antioquia
Telefono: 5620545 3122894261
Contacto: VALENCIA ALFONSO

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0000843	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	2,000.00	12,000.00	21,130.25	19%	42,260,500
0000809	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	2,500.00	8,400.00	11,946.21	19%	29,865,525
0000783	BARRA CORRUGADA 1/4" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	2,084.00	3,126.00	5,714.00	19%	11,907,976
			TOTALES	**23,526.00**		**Subtotal**	**84,034,001**
						I.V.A.	15,966,460
						Total	100,000,461

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (C08) CREDITO 30 DIAS
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** 3 DIAS
- **TRANSPORTE:** POR HORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER OFRECIDO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS COMERCIALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SIMILES DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCOLOMBIA CT AHORROS No 41200043110

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asesores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

obras

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: YENIFER CRISTINA OSORIO RIOS

Celular:

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901138476

(415)7707212489984(8020) 000001490113847 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 0 6 7 7 9	8	Impuestos de Medellín 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal
KM 2 VIA TRANVIA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidad@ingetierrasdecolombia.com		6 0 4 5 6 2 5 6 0 0	3 2 0 7 2 6 0 3 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 4 0 3	0 8 1 1	2 0 0 2 0 4 0 3		4 2 1 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 2 2 2 3	55. Forma 2 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 07 / 11 : 52: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MAYOR RIOS JULIAN ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-03-2023 08.09.51AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

INGETIERRAS
Calidad y Progreso

Rionegro, Julio 29 de 2023

CUENTA DE COBRO N°087 de 2023

CONSORCIO VIAL CL 2022
NIT: 901569635

DEBE A

INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.

NIT: 811.006.779-8

La suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000)** por concepto de pago anticipado para suministro, transporte y aplicación de base granular NT-2 Norma INVIAS para el tramo vial Cabeceras La lucha Ubicado en el Municipio de Rionegro Antioquia.

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 64792332861 de Bancolombia

Atentamente,

Brayan Ordoñez Quintana
Coordinador Comercial
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14888591309

(415)7707212489984(8020) 000001488859130 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 4 3 4 5 5 3	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	15434553	1 9 8 9 1 0 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal: CL 25 B 53 A 53

42. Correo electrónico: ingenierialuisvalencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 4 7 7 4 9	3 1 1 3 8 9 5 0 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 4 0 6 1 8	4 1 1 2	2 0 0 4 0 6 1 8	7 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 1 4 | 2 2 | 4 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 01 - 16 / 14 : 45: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-01-2023 02:46:04PM

DOCUMENTO CLASIFICADO COMO NO CONFIDENCIAL

Rionegro, 07 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT: 15.434.553-9
Calle 25b Nº 53ª – 53
614 77 49

DEBE A:

MAICOL ESTIVEN HENAO CARDONA
NIT: 1.038.417.481-1
Vereda San Luis
Rionegro

LA SUMA DE:

CUARENTA MILLONES DE PESOS

($40.000.000)

POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA

Atentamente

Maicol E. Henao

MAICOL ESTIVEN HENAO CARDONA
1.038.417.481-1

Rionegro,07 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT 15434553-9

DEBE A

ALFREDO DE JESUS MARIN HERRERA
NIT 71003362-3

LA SUMA DE

VEINTE MILLONES DE PESOS

($ 20.000.000)

- Por concepto de mano de obra

Alfredo Marin VH
ALFREDO DE JESUS MARIN HERRERA
NIT 71003362-3

Rionegro,07 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT 15434553-9

DEBE A

FRANCISCO EMILIO GARCIA GARCIA
NIT 15427616-5

LA SUMA DE

VEINTE MILLONES DE PESOS

($ 20.000.000)

- Por concepto de mano de obra

FRANCISCO EMILIO GARCIA GARCIA
NIT 15427616-5

Rionegro,07 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT 15434553-9

DEBE A

JOHN FREDY GARCIA GARZON
NIT 15442494-6

LA SUMA DE

VEINTE MILLONES DE PESOS

($ 20.000.000)

- Por concepto de mano de obra

JOHN FREDY GARCIA GARZON
NIT 15442494-6

Certificado
Bancario

Miércoles, 21 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA identificado(a) con CC 15434553, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10527023624	2004/06/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14888591309

(415)7707212469984(8020) 000001488859130 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 4 3 4 5 5 3	9	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 4 3 4 5 5 3	1 9 8 9 1 0 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal: CL 25 B 53 A 53

42. Correo electrónico: ingenierialuisvalencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 4 7 7 4 9	3 1 1 3 8 9 5 0 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 4 0 6 1 8	4 1 1 2	2 0 0 4 0 6 1 8	7 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 01 - 16 / 14 : 45: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-01-2023 02:46:04PM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888591309

(415)7707212489984(8020) 000001488859130 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 4 3 4 5 5 3	9	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO
