	MUNICIPIO DE SARDINATA	
	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

VALOR APORTE FONSECON	$ 4.746.387.467,00	CUENTA (AHORROS) No.	**83200003693**	DEL BANCO:	**BANCOLOMBIA**
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 527.376.385,00				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 5.273.763.852,00**				

VALOR GIRADO FONSECON

VALOR GIRADO POR FONSECON	FECHA	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	10/2/2023	$ 1.898.554.987,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		$ 0,00
QUINTO DESEMBOLSO		$ 0,00
TOTAL GIRADO		**$ 1.898.554.987,00**

CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VR CONTRATO INICIAL	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR CONTRATO
LP-001-155-2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	$ 4.746.387.467,00	APORTE FONSECON	$ 4.746.387.467,00
LP-001-155-2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	$ 197.137.465,00	APORTE MUNICIPIO	$ 197.137.465,00
CM-003-150-2023	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	$ 330.238.920,00	APORTE MUNICIPIO	$ 330.238.920,00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 5.273.763.852,00**

INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No. LP-001-155-2023		**CONTRATO No. CM-003-150-2023**	
CONTRATISTA	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	**CONTRATISTA**	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
NIT No.	900.808.866-5	**NIT. No.**	60.373.700-6
REP. LEGAL	RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**REP. LEGAL**	NO APLICA
DOC. IDENTID	88.269.550	**DOC. IDENTID**	60.373.700
EMAIL	proyectos@netkoln.com	**EMAIL**	
TELEFONO	3138727052	**TELEFONO**	3203435946
DIRECCIÓN	Calle 3 # 11E-38 B. Quinta Oriental - Cúcuta	**DIRECCIÓN**	AV DEMETRIO MENDOZA, CENTRO COMERCIAL BOLIVAR BLOQUE A, OFICINA A10
DISPONIBLIDA	CDP-0223002 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023	**DISPONIBLIDAD**	CDP-0223003 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO	No LP-001-155-2023	**CONTRATO**	No. CM-003-150-2023
REGISTRO PPT	RP-0420008 DEL 20 DE ABRIL DE 2023	**REGISTRO PPT**	RP-0413011 DEL 13 DE ABRIL DE 2023
POLIZAS	DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 49-44-101030358 - SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZAS**	DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 21-44-101410191 - SEGUROS DEL ESTADO
APROB POLIZ	27 DE ABRIL DE 2023	**APROB POLIZ**	27 DE ABRIL DE 2023
ACTA INICIO	28 DE ABRIL DE 2023	**ACTA INICIO**	28 DE ABRIL DE 2023

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

EJECUCIÓN DE LOS CONSTRATOS DERIVADOS

1. SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DERIVADO LP-001-155-2023



Fotografía No. 01



Fotografía No. 02



Fotografía No. 03

Las Fotografías No. 01, 02 y 03 muestran la participación de la comunidad en la socialización del contrato LP-001-155-

2. EJECUCIÓN EN TIEMPO CONTRATOS DERIVADOS



Gráfica No. 01. La gráfica muestra el % de avance en tiempo del Convenio Interadministrativo versus el contrato derivado LP-003-155-2023 con corte al 31 de mayo de 2023.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023

El Contratista presenta el Plan de Manejo de Tránsito. (Ver Anexo No. 02)

Se anexa formato de actas de vecindad levantadas en el casco urbano del municipio de Sardinata, tal como se puede observar en el Anexo No. 03

Se presenta el levantamiento de los puntos de cámaras ver Anexo No. 04

MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	CUENTA BANCARIA	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO FINAL	PAGOS SEGÚN ACTA	VALOR DEL PAGO			OBSERVACIONES
							CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	MUNICIPIO	
LP-001-155-2023										NO SE HAN GENERADO PAGOS AÚN
CM-003-150-2023										NO SE HAN GENERADO PAGOS AÚN

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
31/12/2022	$ 0,00	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/12/22
31/1/2023	$ 0,11	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/01/23
20/2/2023	$ 640.516,91	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 28/02/23
31/3/2023	$ 1.045.517,69	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/03/23
30/4/2023	$ 1.012.339,33	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 30/04/23
31/5/2023	$ 1.046.649,66	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/05/23
TOTAL	**$ 3.745.023,70**	

MUNICIPIO DE SARDINATA	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

RESUMEN BALANCE FINANCIERO

TOTAL DESEMBOLSO REALIZADO FONSECON	**$ 1.898.554.987,00**
TOTAL ABONO GENERADO POR EL MUNICIPIO DE SARDINATA	**$ 10.000,00**
(1) VALOR EJECUTADO CON RECURSOS DE FONSECON	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 3.745.023,70
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0,00
COMISIONES Y ABONOS	-$ 8.437,00
(2) SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 3.745.023,70**
(3) RECURSOS DE FONSECON NO EJECUTADOS	**$ 1.898.554.987,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 0,00**
SALDO EN CUENTA CON CORTE AL 31/05/2023	**$ 1.902.301.573,70**

OBSERVACIONES:

SE ANEXA EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
AUNQUE EN EL EXTRACTO BANCARIO APARECE UNA TRANSFERENCIA POR VALOR DE $78.854.985,80, ESTE VALOR VUELVE Y RETORNA A LA CUENTA.
SE CREO UNA FILA NUEVA DENOMINADA COMISIONES Y ABONOS, DONDE SE DEBITA DE LA CUENTA LA SUMA DE $8.437 POR CONCETP DE COMISIÓN PAGO A OTROS BANCOS Y COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS.

Ing. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
SUPERVISOR DESIGNADO
MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 01. EXTRACTO BANCARIO MES MAYO DE 2023

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 02

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS
NIT: 900.808.866-5

1. OBJETIVO

Mitigar el impacto generado por las obras que se van a desarrollar, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, todo bajo el cumplimiento de las normas establecidas.

2. ALCANCE

No.	NOMBRE DE CÁMARA	DIRECCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
			N	W
	P.C.1	Barrio Poblado: Entrada municipio Sardinata, sector patinódromo	8° 5'33.06"N	72°48'0.35"O
	P.C.2	Barrio Poblado: cll 16 con cra 6ta. EDS. Sardinata	8° 5'25.39"N	72°47'59.91"O
	P.C.3	Barrio Llano: av. 6ta B #13-5	8° 5'21.04"N	72°48'3.11"O
	P.C.4	Barrio Llano: Cra 7ma cll 10, morgue	8° 5'12.82"N	72°48'4.40"O
	P.C.5	Barrio Llano: cll 10 cra 6ta, cementerio	8° 5'12.35"N	72°48'0.58"O
	P.C.6	Barrio el centro: Cra 6 Calle 8 Esquina	8° 5'5.83"N	72°48'3.99"O
	P.C.7	Barrio el baho: Cra 2 calle 5 sur	8° 5'7.05"N	72°48'6.33"O
	P.C.8	Barrio el centro: Cra 7 cll 7	8° 5'4.47"N	72°48'7.51"O
	P.C.9	Barrio el centro: Cra 7 Cll 6	8° 5'1.83"N	72°48'8.52"O
	P.C.10	Barrio El Centro: Cra 6 cll 6	8° 5'0.84"N	72°48'6.12"O
	P.C.11	Barrio el Centro: Cra 6 cll 7	8° 5'3.36"N	72°48'5.01"O
	P.C.12	Barrio el Centro: Cra 0 Cll 6	8° 4'59.13"N	72°48'9.84"O
	P.C.13	Barrio san Rafael: estadio san Rafael	8° 4'56.40"N	72°48'14.39"O
	P.C.14	Barrio pueblo nuevo: Cra 6 cll 3-12	8° 4'52.76"N	72°48'9.33"O
	P.C.15	Barrio el Baho: Cra 3 cll 2 sur	8° 4'55.35"N	72°48'8.43"O
	P.C.16	Barrio el centro: Cra 6 cll 5, gym	8° 4'58.02"N	72°48'7.28"O
	P.C.17	Barrio tamarindo: Cra 5 cll 4-75	8° 4'56.80"N	72°48'4.36"O
	P.C.18	Barrio san Martín: Cra 4 #4-02	8° 4'53.24"N	72°48'2.98"O
	P.C.19	Barrio san Martín: Cra 4 cll 2, escuela CERES	8° 4'48.31"N	72°48'5.08"O
	P.C.20	Barrio el vado: Cra 4 CDI Gotitas de amor	8° 4'39.70"N	72°48'6.40"O
	P.C.21	Barrio el baho: Cra 4 KDX 4-01	8° 4'33.54"N	72°48'9.65"O
	P.C.22	Barrio el Baho: Cra 4 final el baho	8° 4'27.04"N	72°48'13.37"O
	P.C.23	Barrio el Baho: Cra 3 KDX 6 AF13	8° 4'26.65"N	72°48'10.13"O
	P.C.24	Barrio Chicaro: Cll 1 #3-10	8° 4'43.98"N	72°48'3.61"O
	P.C.25	Barrio San Martín: Cra 4 Cll 3	8° 4'49.07"N	72°48'1.45"O
	P.C.26	Barrio Tamarindo: Cancha Botello Gómez	8° 4'48.54"N	72°47'57.08"O
	P.C.27	Barrio Botello Gómez: Tanques	8° 4'45.92"N	72°47'51.14"O
	P.C.28	Barrio Betania: Cll 4 cra 0	8° 4'48.32"N	72°47'50.83"O
	P.C.29	Barrio Botello Duran: Cra 0 cll 1	8° 4'42.80"N	72°47'56.00"O
	P.C.30	Barrio Betania: Cll 5 Cra 1-51	8° 4'52.44"N	72°47'55.20"O
	P.C.31	Barrio Tamarindo: Cra 3 cll 5 comedor	8° 4'54.43"N	72°47'59.20"O
	P.C.32	Barrio Tamarindo: cra 4 Cll 4-07	8° 4'58.36"N	72°48'0.62"O
	P.C.33	Barrio San Francisco: Cll 7 Cra 2-93	8° 4'59.19"N	72°47'56.72"O

	P.C.34	Barrio San Francisco: Cll 6 Cra 4-07	8° 5'4.88"N	72°48'1.16"O
	P.C.35	Barrio San Francisco: Cll 8 Cra 2-28	8° 5'1.15"N	72°47'52.72"O
	P.C.36	Barrio Coliseo CIC: Cll 9 Cra 0	8° 5'0.72"N	72°47'44.66"O
	P.C.37	Barrio San Francisco: Cll 9 Cra 3-18	8° 5'4.78"N	72°47'54.14"O
	P.C.38	Barrio Vista Hermosa: Cll 1 Lote 14 Mz6 Lt12	8° 5'9.84"N	72°47'51.60"O
	P.C.39	Barrio Lote Los Jaimes	8° 5'9.36"N	72°47'47.96"O
	P.C.40	Barrio Centenario: Cll 11 #6-02	8° 5'16.16"N	72°47'52.79"O
	P.C.41	Barrio Centenario: Cra 5 Cll 11	8° 5'13.50"N	72°47'56.32"O
	P.C.42	Barrio Centenario: Cra 5a Cll 11a	8° 5'15.62"N	72°47'57.85"O

3. DEFINICIONES.

- *ACERA O ANDÉN:* Parte de la vía dedicada al tránsito de peatones.

- *BAHÍA:* Zona de transición entre la calzada y andén, destinada al estacionamiento provisional de vehículos

- *BANDERERO:* Persona que se ubica temporalmente al lado de la vía para dar paso en ambos sentidos, cuando se ejecutan obras viales.

- *BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN***:** Es el grupo de personas que se encargan en forma permanente de mantener en el sitio adecuado y en buen estado toda la señalización de la obra, incluyendo los aislamientos y canalizaciones realizadas.

- *CALZADA:* Zona de la vía destinada a la circulación de los vehículos.

- *CARRIL:* Parte de la calzada que puede acomodar una sola fila de vehículos de cuatro o más ruedas.

- *CONO DE TRANSITO:* Dispositivo en forma de cono truncado que se usa en serie para desviar o encauzar el tránsito. Suele ser de material flexible y resistente a golpes, con el fin de que no se deteriore fácilmente ni cause daño a los vehículos.

- *DEMARCACIÓN:* Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea mediante color, textura o cambio de material.

- *DEMARCACIÓN DE PASO PEATONAL A NIVEL:* Señalización aplicada a la calzada para indicar la trayectoria que deben seguir los peatones al travesar la misma (incluye la cebra).

- *EMPALME:* Conexión de una vía con otras, acondicionada para el tránsito vehicular.

- *ESTACIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO:* Parada de un vehículo en la parte lateral de la vía o de un sitio destinado para tal fin, que implique apagar el motor.

- *GLORIETA:* Intersección en donde no hay cruces a nivel directos, sino maniobras dentro de cruces y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central.

- *INTERSECCIÓN:* Área general donde dos o más vías se unen o crucen, ya sea a nivel o desnivel o que comprende toda la superficie necesaria para facilitar todos los movimientos de los vehículos que se cruzan por ellos.

- *PASO PEATONAL A NIVEL:* Zona de la calzada delimitada por dispositivos y áreas especiales con destino al cruce de peatones

- *PARQUEADERO:* Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

- *PEATÓN:* Persona que transita a pie por una vía.

- *PERSONAL DE APOYO (BANDEREROS):* Corresponde al grupo de personas que prestan apoyo en la obra para el manejo de peatones y del tráfico en donde se considere necesario.

- *SEÑAL DE TRÁNSITO:* Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos.

- *SEPARADOR:* Espacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de una franja o línea pintada, situado longitudinalmente entre dos calzadas, para separar el tránsito de la misma o distinta dirección, dispuesto de tal forma que intimide o impida el paso de vehículos

- TRÁNSITO: Acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías.

- *TRANSPORTE:* Es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico.


- *VEHÍCULO:* Artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, animales o cosas.

- *VÍA:* Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de público, personas y/o animales

- *VELOCIDAD DE OPERACIÓN:* Velocidad promedio que desarrollan el 85% de los usuarios en un tramo determinado de una vía.

- *ZONA DE CONFLICTO*: área de intersección entre dos flujos de transito

FLUJOGRAMA

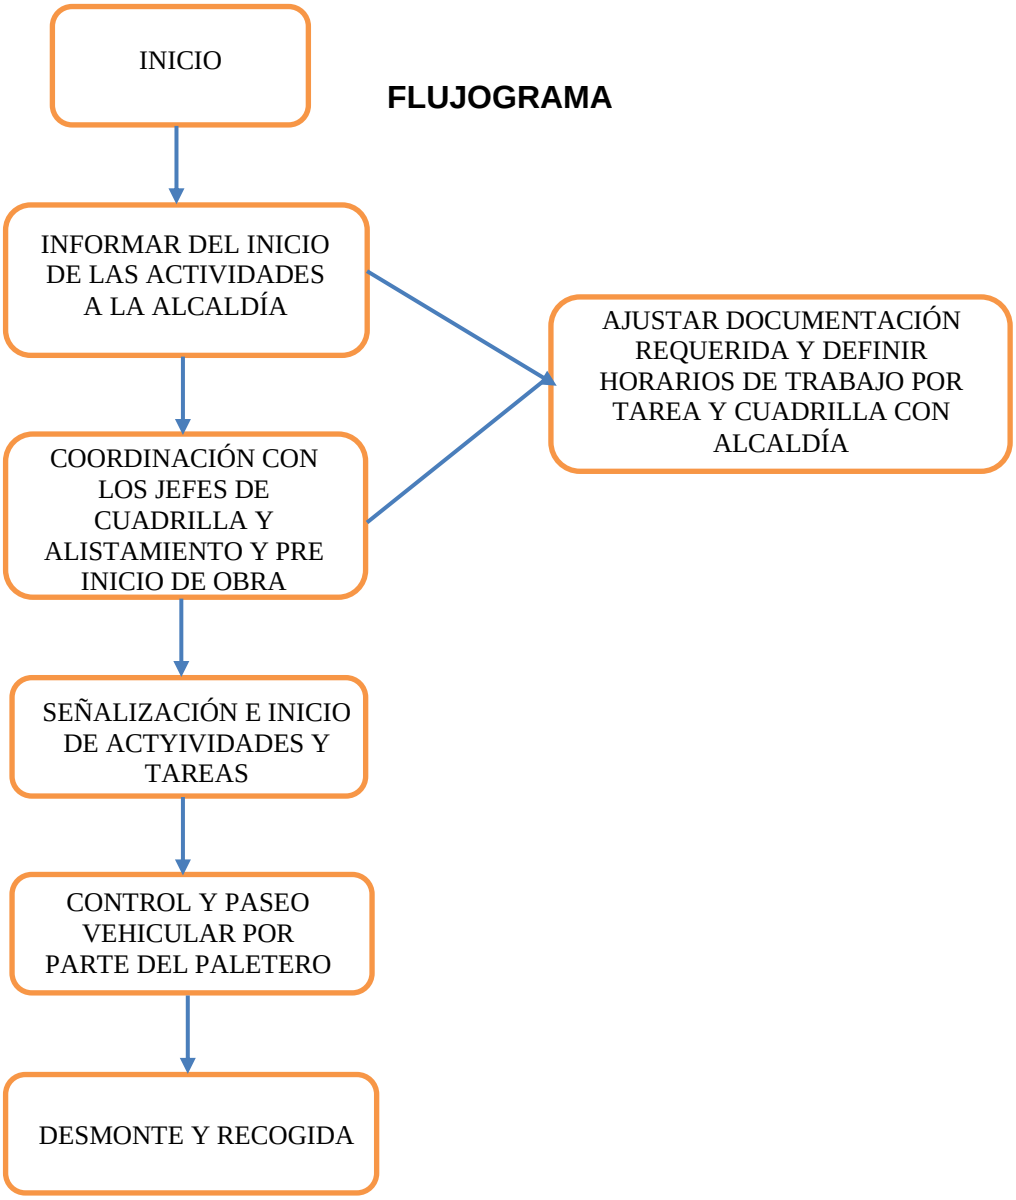
INICIO
INFORMAR DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES A LA ALCALDÍA
AJUSTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y DEFINIR HORARIOS DE TRABAJO POR TAREA Y CUADRILLA CON ALCALDÍA
COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE CUADRILLA Y ALISTAMIENTO Y PRE INICIO DE OBRA
SEÑALIZACIÓN E INICIO DE ACTYIVIDADES Y TAREAS
CONTROL Y PASEO VEHICULAR POR PARTE DEL PALETERO
DESMONTE Y RECOGIDA

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

En la gráfica siguiente, se muestra la localización de los tramos que conforman el proyecto enunciado anteriormente.



Grafica N°1 Localización de los tramos a intervenir

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:

Teniendo en cuenta la descripción de los elementos anteriormente relacionados, a continuación, formulamos el plan de ejecución adoptado para el proyecto, donde se conjugan las actividades secuenciales a ejecutar entre tramos.

El presente documento contiene el esquema general del Plan de Manejo de Tránsito, que se requiere implementar para minimizar el posible impacto que se pueda generar con los trabajos anteriormente enunciados y desarrollo de espacio público.

Cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o actividades relacionadas con desarrollos urbanísticos y servicios públicos en una determinada vía, o en zona adyacente a la misma, se presentan condiciones

especiales que afectan la circulación de vehículos y personas. Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía.

METODOLOGÍA


La metodología general empleada en la formulación del Plan de Manejo de Tránsito que se requiere implementar para minimizar el posible impacto que se pueda generar con los trabajos a realizar, se fundamenta en la interacción permanente con los agentes de tránsito del Municipio.

Para desarrollar la Formulación del Plan de Manejo del Tránsito, se tendrá en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: las características de tipo de obra a realizar, su localización con respecto a las áreas disponibles en el espacio público, los diferentes tipos de usuarios que diariamente pasan por las zonas a intervenir.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO.


El proyecto se desarrollará en el Municipio de Sardinata Norte de Santander, a continuación, se relacionan los diferentes puntos en los cuales se realizará intervención con cruces de calles

PUNTO DE CÁMARA 3

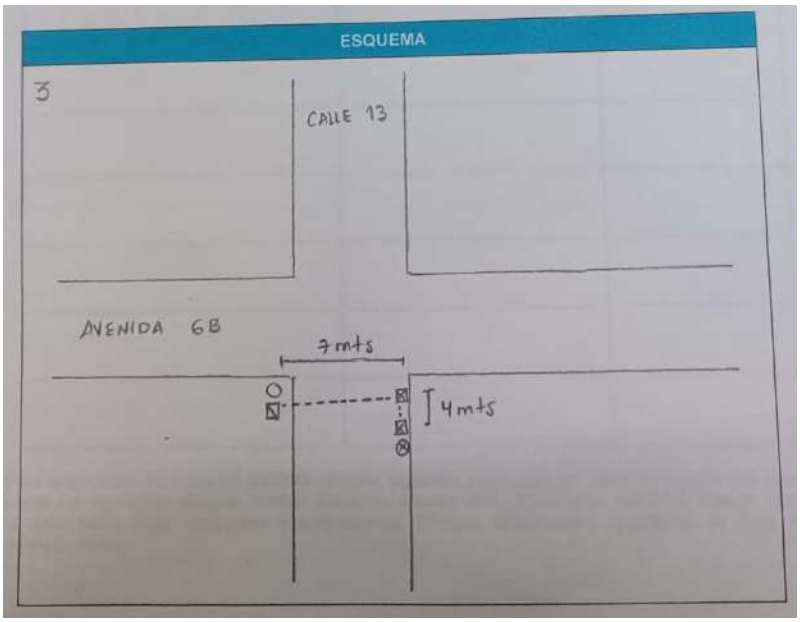




PUNTO DE CÁMARA 6

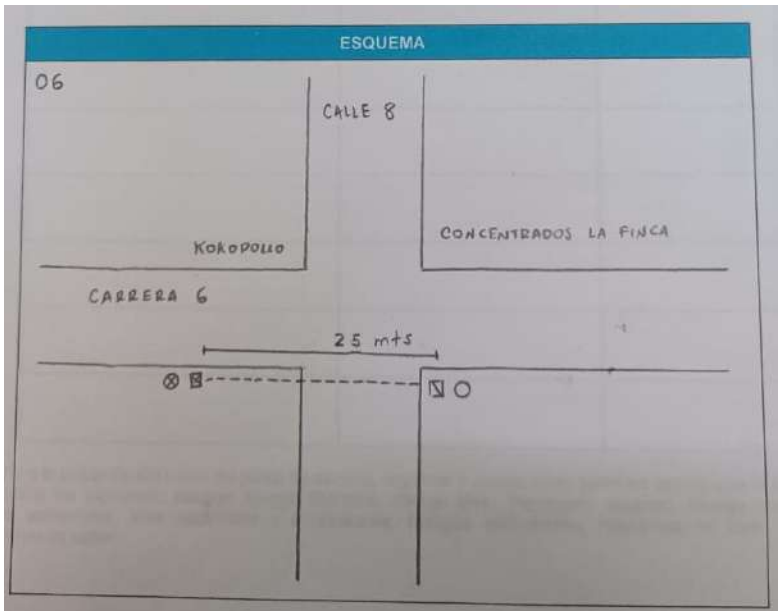




PUNTO DE CÁMARA 7

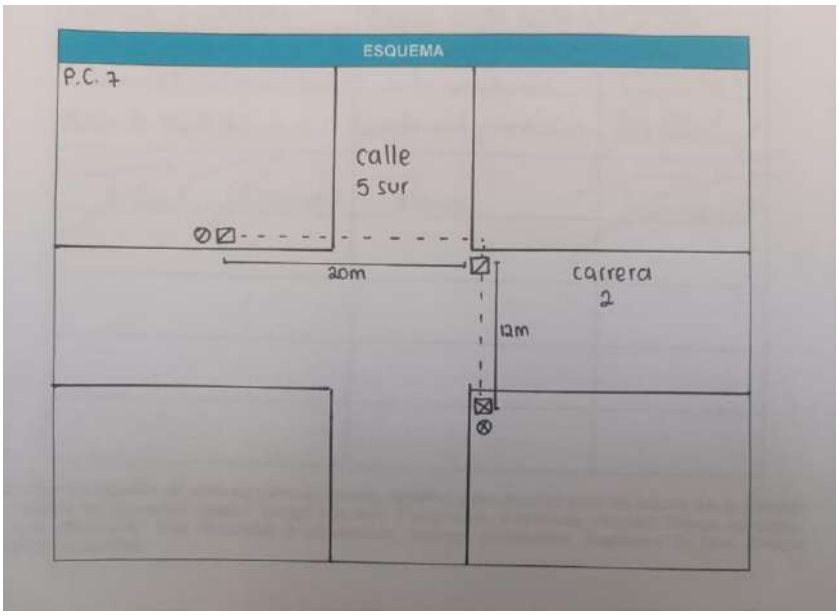




PUNTO DE CÁMARA 16

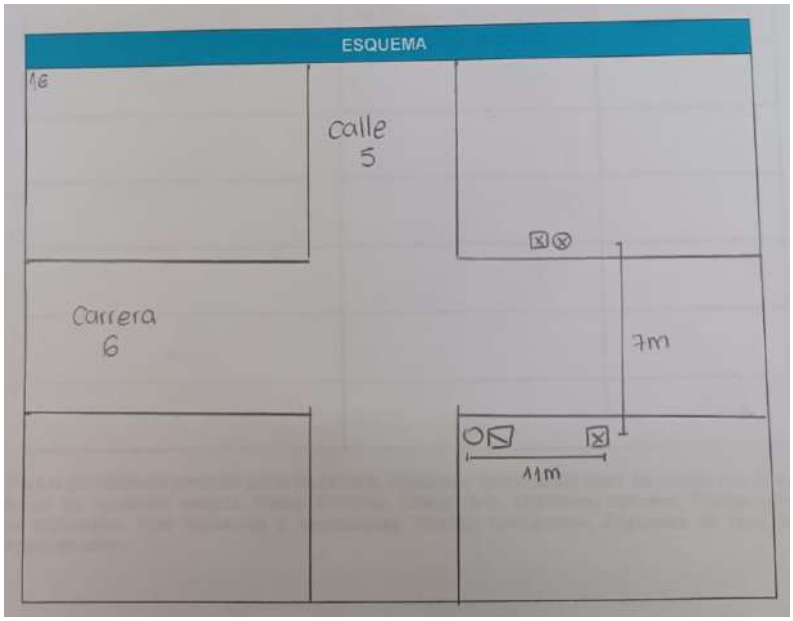




PUNTO DE CÁMARA 19

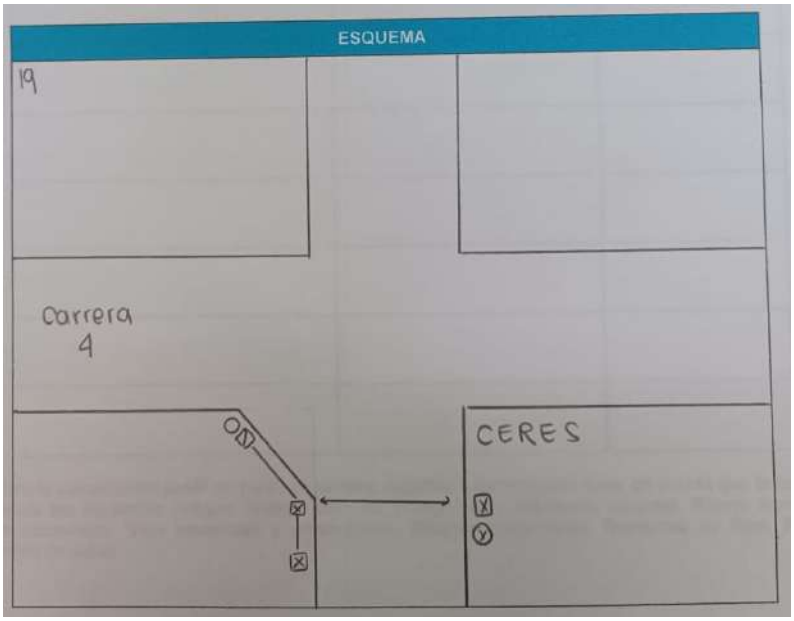




PUNTO DE CÁMARA 20

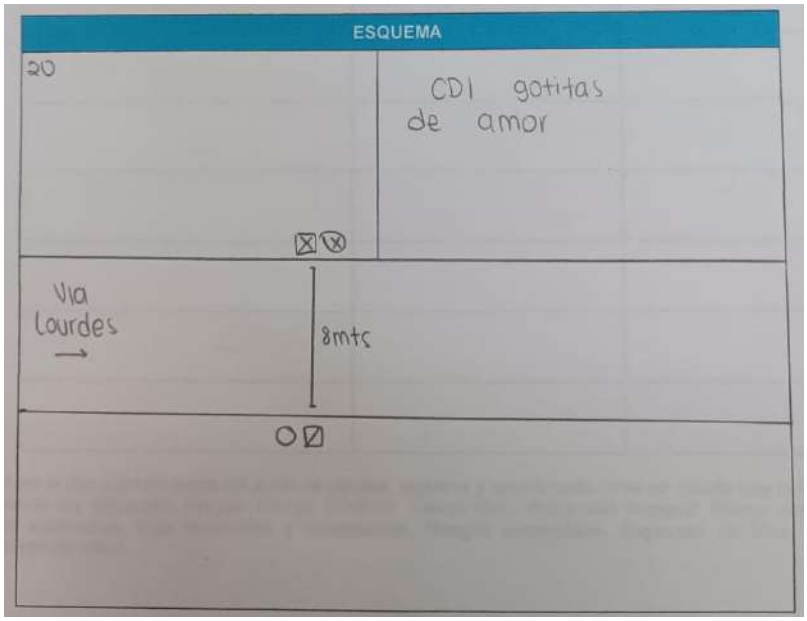




PUNTO DE CÁMARA 21

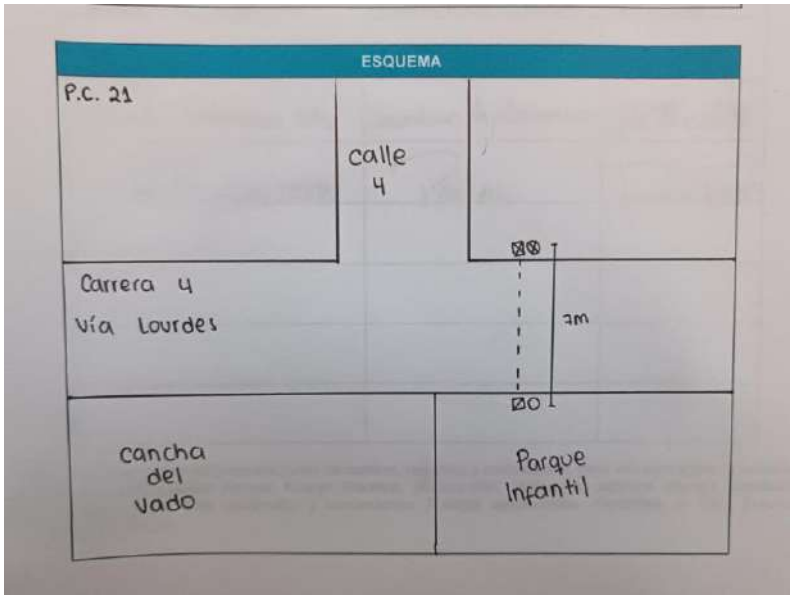




PUNTO DE CÁMARA 22

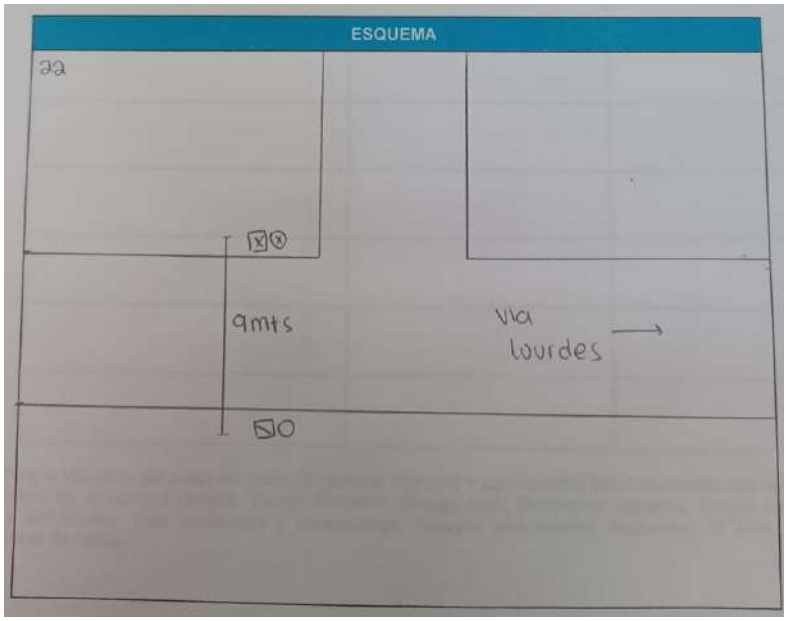




PUNTO DE CÁMARA 23

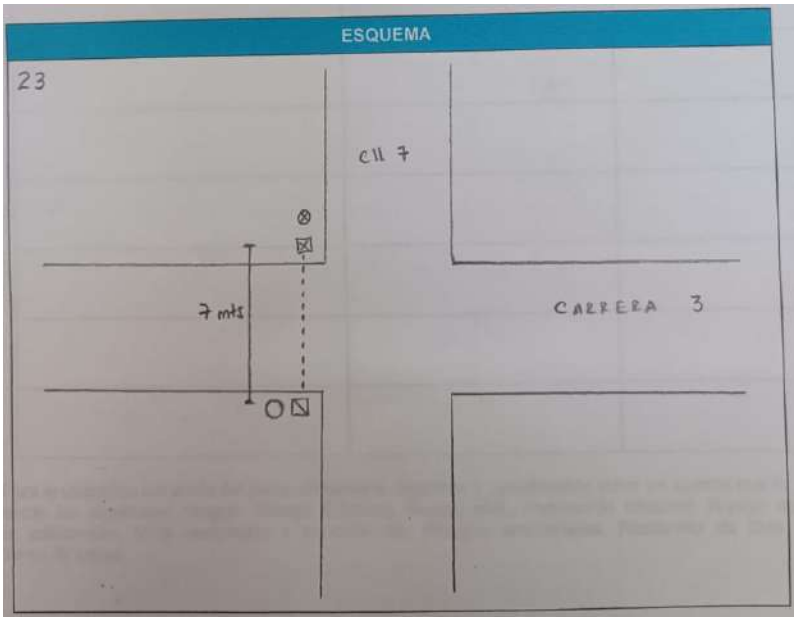




PUNTO DE CÁMARA 24

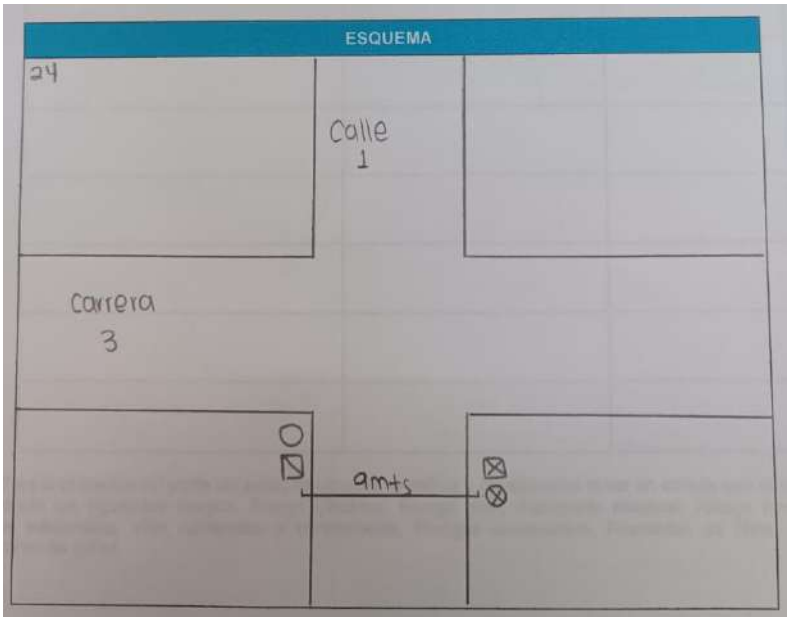




PUNTO DE CÁMARA 29

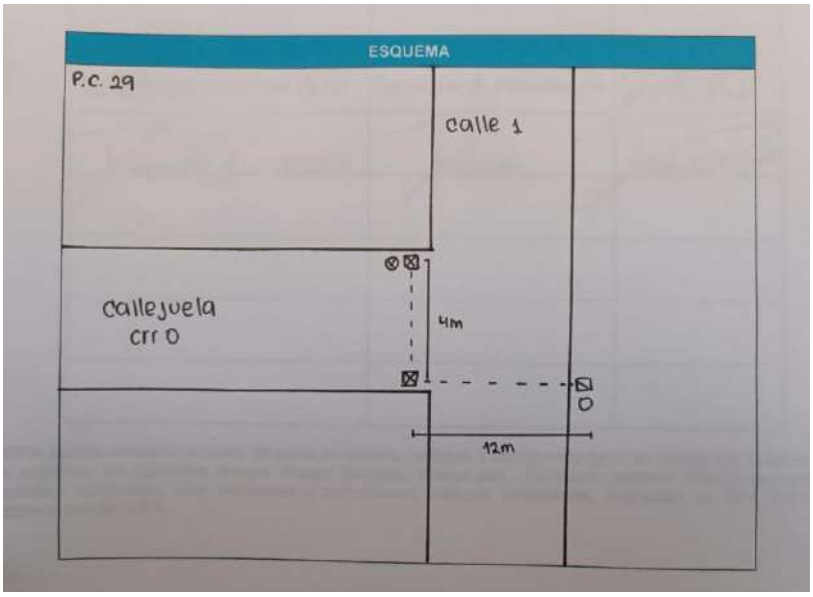




PUNTO DE CÁMARA 35

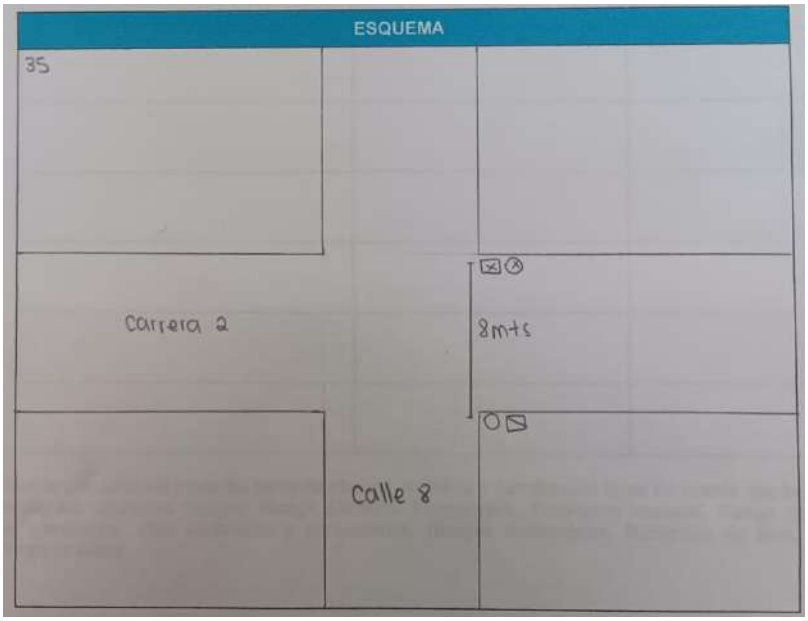




PUNTO DE CÁMARA 37

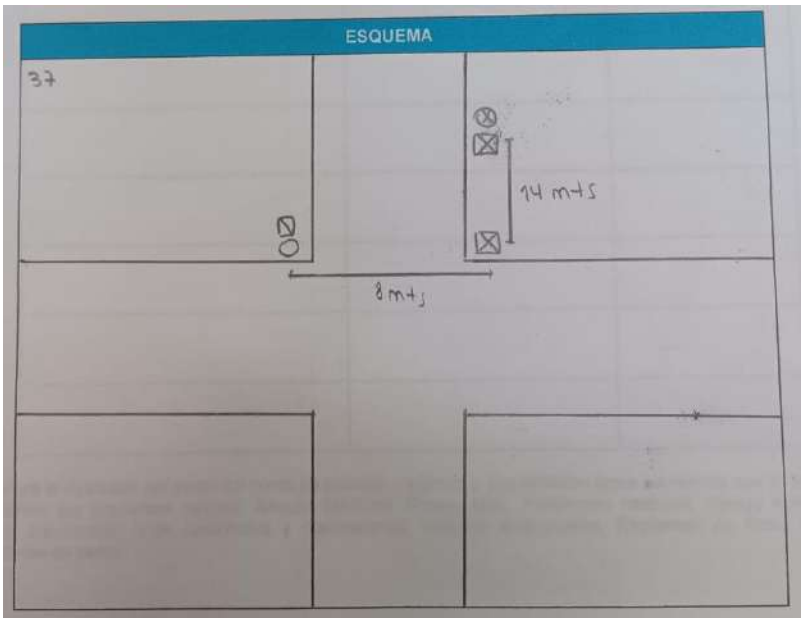




PUNTO DE CÁMARA 38

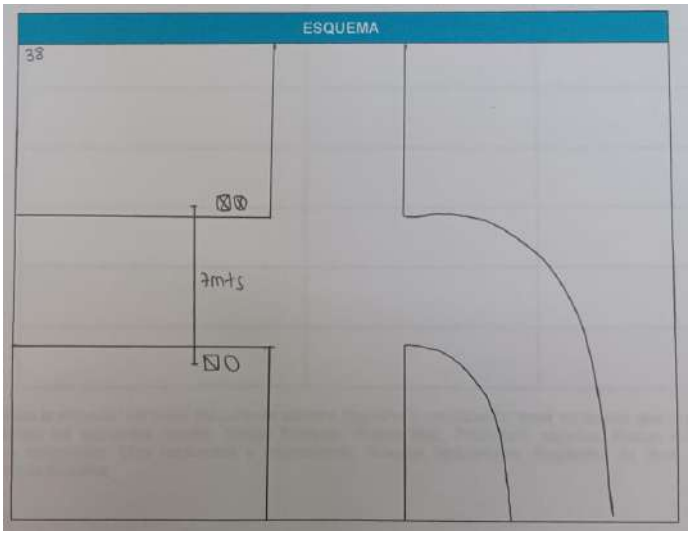




PUNTO DE CÁMARA 39

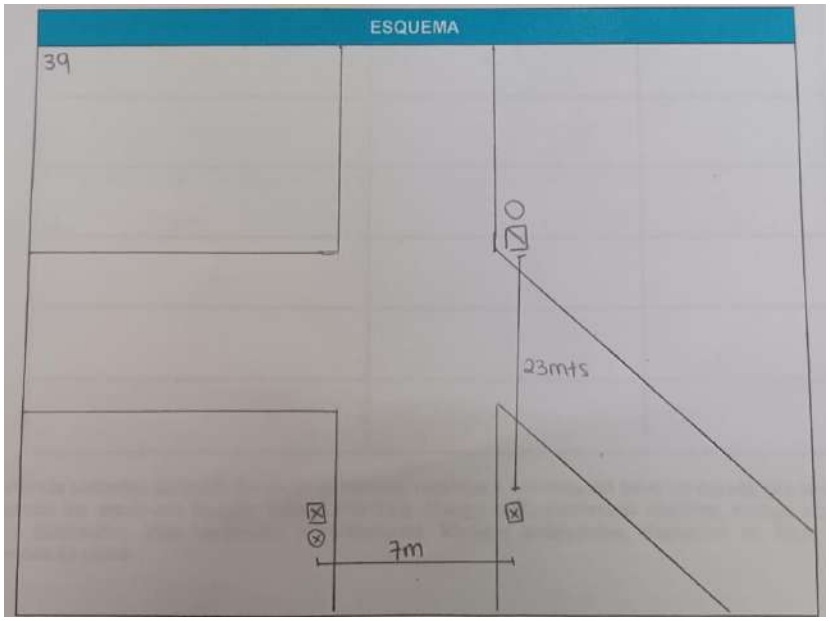



PUNTO DE CÁMARA 42

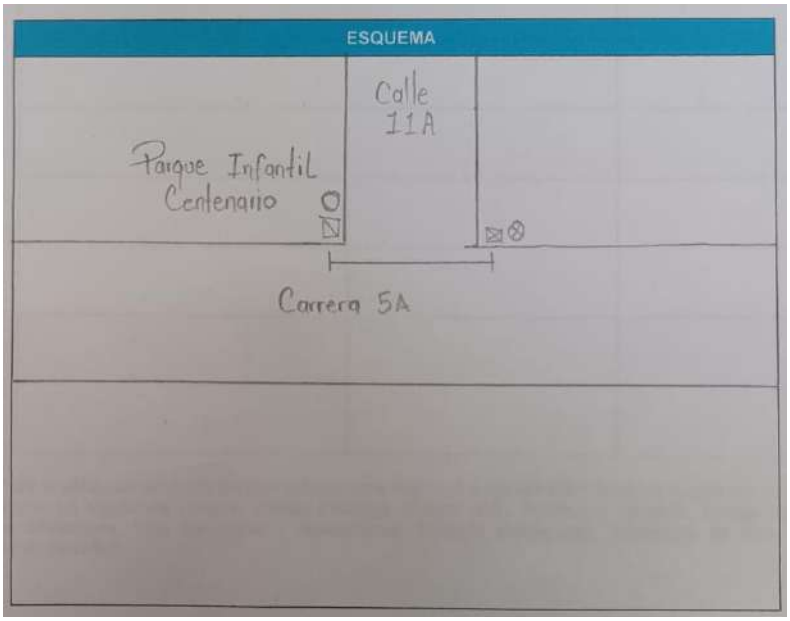
ESQUEMA
Calle 11A
Parque Infantil Centenario
Carrera 5A



Características físicas y operativas en el área del proyecto.

El proyecto consta de 3 etapas:

- Apertura de Hueco: Se intervendrá el andén en el punto de ubicación del poste, para realizar un hueco de aproximadamente 1,5 m de profundidad. La labor se realizará sin ocupación de calzada y tendrá una duración por punto de aproximadamente una hora. En caso de que estos huecos permanezcan más de una jornada se dejaran cubiertos con material rígido (madera-Metal) debidamente delimitados y con letreros de advertencia.

- Hincado de poste: El poste se ubicará y asentará en el hueco previamente realizado, y se verificará su correcta instalación. Para esta labor se hará uso de una grúa, que ocupará la calzada por un tiempo aproximado de una hora. Esta actividad contará con su debido aseguramiento y sistema de permiso de trabajo.

- Instalación de equipos: Se instalarán los equipos del sistema CCTV en el poste previamente instalado, (Cámara, Brazo de Cámara, Gabinete de equipos, entre otros). La labor se realizará con un carro-canasta que ocupará la calzada por un tiempo aproximado de una hora. Esta actividad contará con su debido aseguramiento y sistema de permiso de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO.

El tránsito en Sardinata Norte de Santander es bastante variable dependiendo de la zona y a la hora en la que se esté trabajando. Para las labores que impliquen ocupación de vías arteriales, se programará horario nocturno entre las 22:00 y las 05:00 hrs.

CARACTERÍSTICA GENERAL DE LA OBRA.

El principal objetivo es establecer mecanismos de control y seguridad, a través de los cuales se puedan realizar las intervenciones previstas en calles de los municipios sin ocasionar traumatismos en el tránsito y flujo vehicular. Este Plan de Manejo de Tráfico se implementará en cada uno de los lugares definidos como calles y carreras, cada uno de ellos con tráfico bidireccional o unidireccional. La ejecución de la labor se dividirá en las tres etapas mencionadas anteriormente de la siguiente manera: Apertura de hueco, Hincado de poste e Instalación de cámaras y equipos.



GRÚA



CARRO CANASTA

La jornada laboral será asignada a cada trabajador en cualquiera de los dos turnos de trabajo aceptados por la ley.

- Jornada Nocturna Ocasional Según Avance.

Las intervenciones nocturnas serán acordadas con la Alcaldía Municipal, con horarios de 22:00 a 05:00 horas.
22:00: Inicio de Jornada (Ingreso de las cuadrillas al sitio).
01:00: Refrigerio (receso de las cuadrillas de trabajo durante 20 minutos)
02:30: Refrigerio (receso de las cuadrillas de trabajo durante 20 minutos)
05:00: Fin de la jornada (Salida de las cuadrillas del sitio)

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

A continuación, un resumen del tráfico promedio diario en los meses del año inmediatamente anterior correspondientes al plazo de ejecución. Se tiene previsto intervenir los puntos de ubicación a del acta de inicio y avances de obra que especifique objeto del contrato.

La realización de los trabajos se efectuará de lunes a sábado en jornada continua. Las fechas establecidas para las intervenciones de vía se realizarán de la siguiente manera:

- A partir de la fecha de aprobación del PMT, se realizarán intervenciones de acuerdo con las jornadas laborales especificadas.

- En cuanto al horario establecido, el CIERRE EFECTIVO DE LA VÍA ES DE UNA HORA POR PUNTO DE TRABAJO, y se han proyectado 2 puntos en el día por frente, acordados previamente en un cronograma de avance.

- Las actividades programarán sus jornadas de trabajo

- Puesto que las vías son bidireccionales con disponibilidad de un carril por sentido o unidireccionales, es necesario alternar el tráfico por el carril opuesto al que se esté interviniendo, lo que involucra la detención total de uno de los flujos por tiempos cortos.

- Se realizarán pasos alternos con cambio de sentido cada dos minutos.

El Plan de Manejo de Tráfico se divide en dos partes:

1. ENTRADA EN LA VÍA: Se realizará la delimitación del área de trabajo con el fin de identificar la señalización a usar. Se prosigue con el montaje de señalización reglamentaria y preventiva previo al arranque, mediante la cual se dará información a los usuarios de los trabajos que se están realizando en el lugar. Se ubicará un auxiliar de manejo de tráfico quien indicará a los usuarios en qué momento pueden avanzar y cuando deben detenerse. La comunicación se realizará vía celular entre el grupo de trabajo y Policía si se requiere. Se realizará una reunión, socialización o capacitación para establecer los protocolos de comunicación.

2. INICIO DE TRABAJO: Se realizará la señalización a través de colombinas cada 10 m en ambos costados del área de trabajo, los cuales tendrán un rutilante en su parte superior. Adicionalmente se dispondrán señales de reducción de velocidad y barricadas en los dos extremos de la zona de intervención.

Además, para la regulación del tránsito alternado se utilizarán uno (1) o dos (2) auxiliares de manejo de tráfico, dependiendo del análisis y planeación del trabajo, protegiendo el acceso de los postes. La comunicación se realizará bajo las indicaciones dadas por la Policía, quienes realizarán una reunión, socialización o capacitación para establecer los protocolos de comunicación. Contarán con paletas (PARE/SIGA), casco, chaleco reflectivo y demás elementos de protección necesarios.

Descripción	Criterio	Cantidad
Colombina	Cada 10 Metros	65 aproximadamente
Barricadas	En cada costado de área a	4 aproximadamente
Bastones Luminosos	Para cada Paletero	4 aproximadamente
Paleta SIGA / PARE	Para cada Paletero	4 aproximadamente
Chaleco	Para cada Paletero	4 aproximadamente
Casco	Para cada Paletero	4 aproximadamente
Pito	Para cada Paletero	4 aproximadamente
Elementos protección	Para cada Paletero	4 aproximadamente

Una vez terminada la jornada laboral se realizará el levantamiento de los elementos utilizados para la señalización y escombros, de tal manera que la zona esté nuevamente en las condiciones que se encontró o en mejores condiciones.

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

- **Materiales**

El almacén principal para el abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución del contrato estará ubicado en Sardinata Norte de Santander, allí agruparemos la totalidad de elementos.

A partir de lo anterior, y con una periodicidad que dependerá de los avances de obra, se le entregará a cada frente de trabajo el material necesario para las instalaciones programadas. Este material se carga en los furgones que cada cuadrilla de trabajo tendrá a su disposición para la realización de las actividades en el sitio.

Una vez los furgones se ubiquen dentro del frente que van a intervenir, podrán disponer del material a medida que lo vayan necesitando, evitando obstaculizar el paso.

La programación de las instalaciones se coordinará de tal manera que los frentes de trabajo solo se tengan que reabastecer diariamente, para no interrumpir el flujo vehicular.

MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR

Durante las actividades de ejecución del proyecto se dispondrá de la siguiente maquinaria y equipos:

1. Teléfonos celulares.
2. Kit de herramientas.
3. Equipos de señalización de vías.
4. Camión canasta.
5. Escaleras.
6. Grúa Hidráulica tipo brazo articulado.
7. Camioneta.
8. Vehículo para transporte de equipos mecánicos y material.
9. Pinza amperimétrica.
10. Telurómetro.
11. Analizador de red.
12. Multímetro.
13. Luxómetro.
14. Computadores Portátiles.

Terminada la jornada laboral se retiran todos los materiales y elementos (en nuestro vehículo o los vehículos de nuestros contratistas) para ser nuevamente transportados a los centros de acopio, dejando el sitio de obra en prefectas condiciones y completamente limpio.


COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y PASO DE CARGAS EXTRADIMENSIONADAS

- Se supervisará antes de iniciar la intervención de vía que se cuenta con la señalización completa y equipos de radio comunicaciones debidamente operativos.
- Al finalizar la actividad se retirará toda señalización puesta, de tal forma que la vía queda libre de obstrucciones u elementos que la puedan afectar.
- En caso de presentarse tránsito de cargas extra-dimensionadas o extra-pesadas debidamente autorizadas, se realizará el levantamiento temporal de la señalización de la obra para dar paso a este tipo de vehículos.
- En caso de presentarse un incidente, accidente grave, incendio o cualquier otra incidencia que pueda poner en riesgo el personal de obra y usuarios de la vía, se coordinará mediante radiocomunicación el levantamiento temporal de la señalización de la obra para dar paso adecuado a los vehículos de rescate, emergencia, y particulares que evacuan la zona de obra que se está señalizando.


Manejo del tránsito particular

Para el manejo de tránsito particular en el punto que se va a intervenir se tienen dos escenarios identificados, para los cuales se tienen previstos los siguientes planes de manejo:

1. Vía bidireccional: para este escenario se usarán delineadores tubulares, señalización en la vía para vehículos y de obreros en la vía, Bandereros los cuales a alternarán el flujo de tráfico en los dos sentidos (Cada dos minutos cambio de sentido, esto sujeto a cambios por flujo del tráfico de cada sentido). se dispondrá de un área libre de circulación para los vehículos de mínimo 3 m.

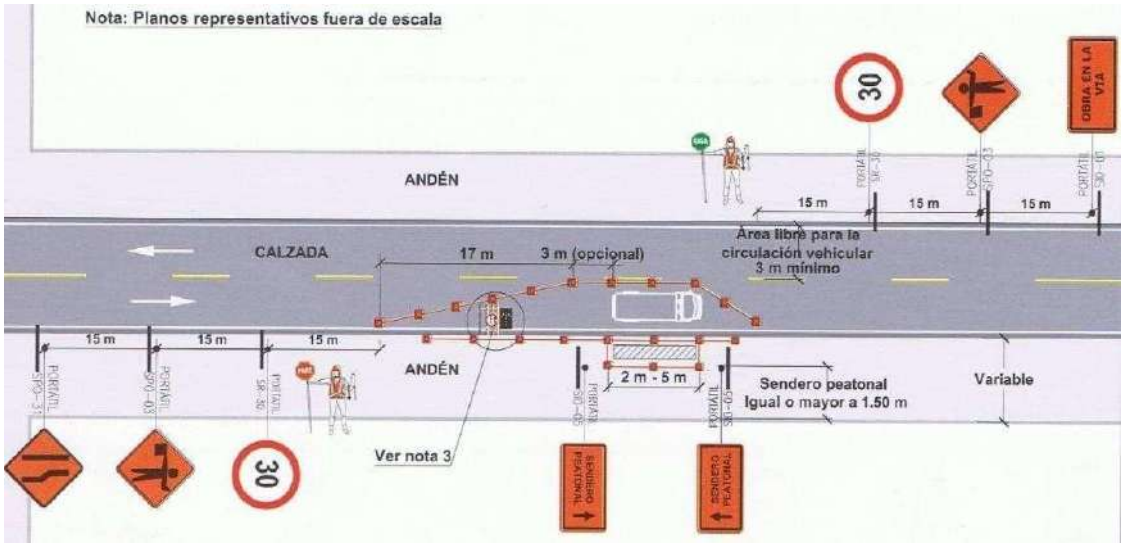

2. Vía un solo sentido: para este escenario se usarán delineadores tubulares, señalización en la vía para vehículos y de obreros en la vía, se dispondrá de un área libre de circulación para los vehículos de mínimo 3 m.

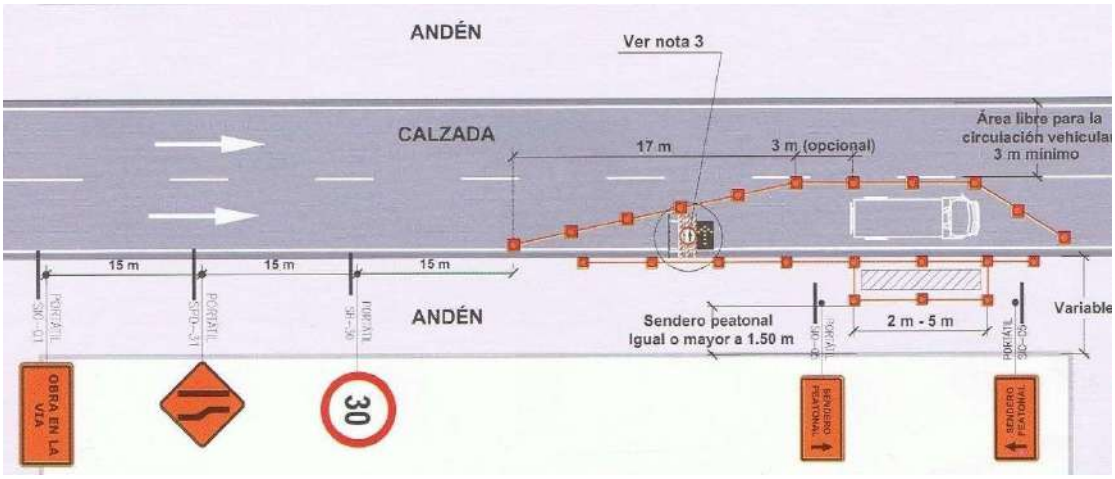

- Manejo de transporte público

Para el plan de manejo de transporte público se dispondrá de la misma logística del transporte particular, tanto para vías en un solo sentido como para vías bidireccionales.


- Manejo de vehículos de carga

Para el plan de manejo de transporte de carga se dispondrá de la misma logística del transporte particular, tanto para vías en un solo sentido como para vías bidireccionales. Los Bandereros apoyarán el tránsito de estos vehículos de acuerdo al espacio necesario para que ellos transiten.


- Manejo de peatones y bici-usuarios

Para el tránsito de peatones y bici-usuarios se tiene identificados dos escenarios:

1. Sendero peatonal dentro del mismo andén a intervenir: en este escenario se garantiza para el peatón o ciclo usuario un área libre para transitar de 1.5 metros dentro del mismo andén, esta área se delimitará con delineadores tubulares y señalización de sendero peatonal. Ver siguiente imagen:



2. Traslado de peatón a la acera de enfrente: en este escenario se garantiza el cruce del peatón a la acera de enfrente por las esquinas por medio de señalización, esto debido a que el área a intervenir en el andén no permite garantizar un área libre superior a 1.5 metros para que transite el peatón o el bici-usuario, esta área se delimitará con delineadores tubulares y señalización de transite por la acera de enfrente. Ver siguiente imagen:

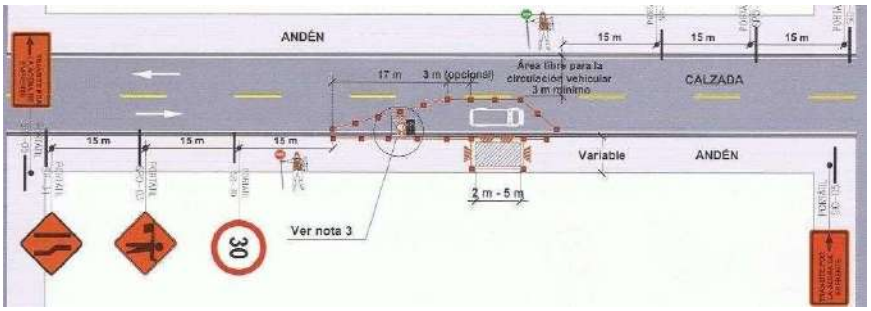

- Zonas de cargue y descargue de materiales

El cargue y descargue de equipos y materiales necesarios para realizar la obra, se realizará dentro de la bodega que establezca la Alcaldía, ubicada en la Sardinata Norte de Santander. En calle se realizará en la misma zona de trabajo delimitada, sin afectar el tráfico que tengamos en la zona.

- Implementación de desvíos

NO APLICA

- Entrada y salida de vehículos de carga

Esto se realizará apoyado en el personal de seguridad de la Alcaldía, quienes coordinarán y garantizarán que se cumplan todas las medidas de seguridad necesaria para el ingreso y la salida de estos vehículos de la bodega.

- Vehículos utilizados en la labor:

Grúa para hincado de postes y carro canasta, los dos de un solo troque para trasporte de carga, La frecuencia de llegada al área de injerencia será una vez al día con una duración de aproximadamente una hora.

Definición de dispositivos de control y apoyo en la gestión del tránsito durante la ejecución de la obra.

- Señalización y dispositivos del control del transito

El proceso de señalización se realizará de la siguiente manera:

✓ Señalización en el sitio de obra

El tipo, número de señales, ubicación y demás elementos necesarios para la señalización de las obras se determinó de acuerdo al manual de señalización Vial 2004 de INVIAS, a través del cual se pudo definir que para el proyecto se van a utilizar 4 tipos de señalización:

- ✓ Señales Preventivas
- ✓ Señales Reglamentarias
- ✓ Señales Informativas
- ✓ Señales para el manejo de tráfico

Señales Preventivas: Estas indican que puede existir riesgo o peligro; Algunas de las señales que se utilizarán son:



Señales Reglamentarias: Estas señales indican lo que está permitido o las prohibiciones en la vía, algunas de las señales que se utilizarán son:



Señales Informativas: Están señales indican al usuario información sobre distancia, prestación de servicios, sitios especiales, etc. Algunas de las señales que utilizarán son:







SEÑALES PARA MANEJO DE TRÁFICO

Para la regulación del tránsito alternado se utilizarán dos (2) auxiliares de manejo de tráfico, se dispondrá de un radio para comunicación, adicionalmente tendrán bastones luminosos y paletas PARE/SIGA.

Los bastones luminosos son con luz tipo led fija e intermitente, además el auxiliar de manejo de tráfico tendrá casco, chaleco reflectivo y demás elementos de protección necesarios.




Dentro de las funciones del auxiliar de manejo de tráfico se encuentran:

- Alertar y reducir la velocidad del tránsito



- Detener el tráfico

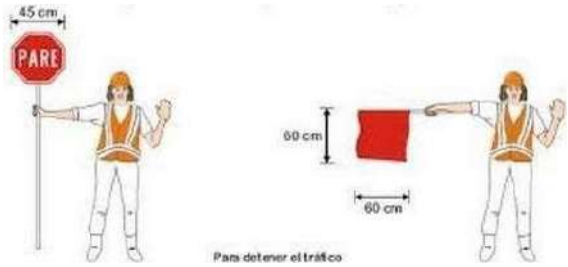



- Permitir que el tráfico avance




EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA SEÑALIZACIÓN

- Colombina: Son elementos con forma tubular que sirven para la señalización vial y representan un elemento de seguridad para los frentes de trabajo y los conductores, sirven para indicar desvíos, obras en caminos y carreteras.

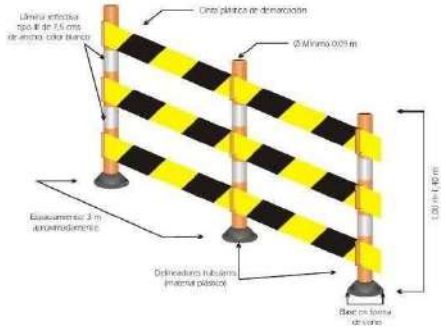



- Barricadas: Especialmente indicadas para trabajos de vías para proteger el área de trabajo. Son indispensables en el manejo de las obras y construcciones viales. Sirven como complemento para los conos.

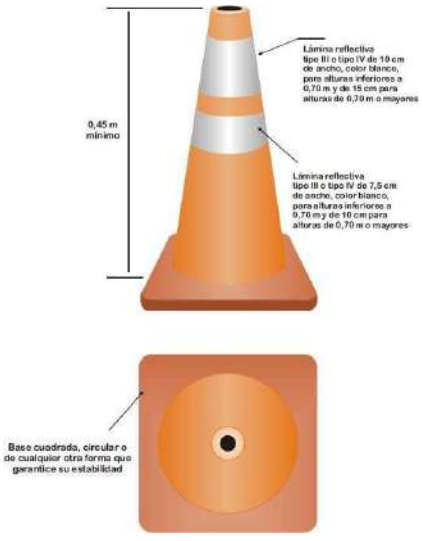

Información y divulgación

Para la divulgación de la labor ante la comunidad expuesta se utilizarán volantes e información directa los cuales se repartirán durante la actividad.

Proceso para la puesta en marcha


Para la implementación del PMT en el proyecto mencionado no se requiere del acompañamiento de la policía, la manera en la que se plantea la implementación está dividido en tres fases que son apertura de hueco, hincado de poste, e instalación de equipos durante los cuales se mantendrá el área siempre señalizada y delimitada al paso de peatones y de vehículos y si se requiere trabajar en horario nocturno se debe señalizar con Balizas, para el seguimiento de este PMT se realizara un seguimiento semanal por parte de la SMD.

Este PMT es una guía estándar que deberá ser ajustada de acuerdo a las características puntuales. Las acciones a tomar también podrán ser tenidas en cuenta en los controles establecidos en los análisis de trabajo seguro.


Se debe especificar y suministrar los datos de contacto de la persona o grupo responsable en campo.

REGISTROS A GENERAR:

- Listas de asistencia
- Inspecciones
- Registro fotográfico
- Planos y documentos puntales



RESPONSABLE SG-SST



GERENTE GENERAL

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 03

NETKLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 | 05 | 23

No. ACTA: 1

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO

CONTRATISTA: NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS

CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/días

INTEVENTORÍA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: ENTRADA MUNICIPIO SARDINATA

BARRIO: POBLADO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: VIA PÚBLICA

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA		X

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE INGRESO AL PUEBLO PC1, UBICADO SOBRE VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 01

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: BARRIO POBLADO: ENTRADA MUNICIPIO SARDINATA, SECTOR PATINÓDROMO

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste y caja 60*60 en espacio público, terreno blando





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23 | No. ACTA: 2

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: CALLE 16 CON CRA 6TA ESQ

BARRIO: POBLADO | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO SOBRE VIA PUBLICA, CANALIZACION EN VIA PUBLICA. PC2.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 02

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: BARRIO POBLADO: CLL 16 CON CRA 6TA. EDS. SARDINATA

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Vía Pública, instalación posteria y caja en terreno mixto (blando tierra y partes duro hormigón con grietas)







NETKLN DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23

No. ACTA: 3.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: AV GTAB #13-5

BARRIO: LLANO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMBIO UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION SOBRE TERRENO BLANDO EN VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

Gatila S
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 03

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Llano: Cra 6ta B #14-5

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Vía Pública, instalación posteria y canalización en terreno blando





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23 | No. ACTA: 4

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/días
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: CRA 7 CALLE 10

BARRIO: LLANO | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	X	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MORGUE

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	x	PORCHE BALDOSA BLANCA
CONCRETO		
OTRO		ADOQUIN DE CEMENTO

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO	X			
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN V/A PUBLICA, PUNTO DE CAMARA EN PARQUE PUBLICO, PUNTO UBICADO EN ENTORNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 04

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: BARRIO LLANO: CRA 7MA CLL 10, MORGUE


H.REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripción: Punto ubicado en entidad perteneciente al Municipio (morgue)



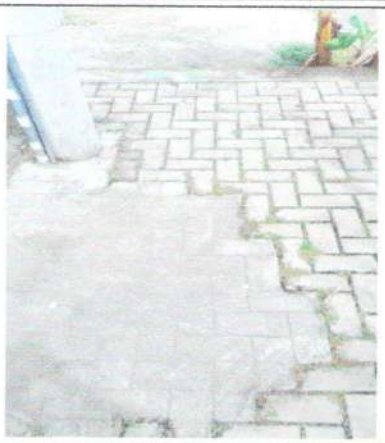

Descripción: Piso de anden en adoquín con deterioro propio, parches por adecuaciones anteriores





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23 | No. ACTA: 5

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: CALLE 10 CARRERA 5.

BARRIO: CENTENARIO. | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL	X	MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EL PUNTO DE LA LONGANIZA

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JAVIER OBREGON

NÚMERO DE CÉDULA: 19494387

TELÉFONO CELULAR: 3105884061

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			2	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	ROJA
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO	X			
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23.

JAVIER OBREGÓN.
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 05

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: JAVIER OBREGON

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CLL 10 CRA 5, CENTENARIO. PLAZA DE TOROS

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Punto ubicado en local comercial, instalación de caja 30*30 al pie de posteria existente, piso en tableta roja





Descripción: Canalización en vía pública en hormigón con grietas existentes actualmente





Descripción: Incado de poste y caja en terreno blando

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 | 05 | 2023 — No. ACTA: 06.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CARRERA 6 #8-35

BARRIO: CENTRO — ESTRATO: 1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	X	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE		PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ANCIANATO DE SARDINATA

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Centro Gerontologico Ntra Sra del Carmen - Sara Sandoval

NÚMERO DE CÉDULA: 900170821-3 - 27836687

TELÉFONO CELULAR: 3126864216.

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	BALDOSA ROJA
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO	X			
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23.

Sara Amelia Sandoval.
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 06

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: SARA SANDOVAL

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el centro: Cra 6 Calle 8 Esquina

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Canalización por vía pública a postería existente, vía en hormigón con desgaste natural





Descripción: Se soporta registro de anden local, piso en granito natural con grietas en todo el borde del andén, instalación de caja 30*30 en andén tableta roja





Descripción: Instalación de poste en andén tableta roja, canalización cruce de calle vía pública en hormigón con grietas

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23

No. ACTA: 07

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO: 5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO						
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS						
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO: 6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO						

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CR 2 CLL 5 SUR

BARRIO: EL VADO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION EN VIA PUBLICA, EN MATERIAL DE RELLENO Y CONCRETO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 07

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el Baho. Carrera 2 Calle 5 Sur

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y canalización en vía pública, pavimento en hormigón con grietas







NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 08

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO: 5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO						
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS						
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO: 6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO						

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CARRERA 7 CALLE 7

BARRIO: CENTRO — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL	X	MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TIENDA LA ESPERANZA

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	ROTA.
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION SOBRE VIA PUBLICA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23.

Patricia

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.

NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.

NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 08

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el centro: Cra 7 cll 7

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y canalización en vía pública, pavimento en hormigón con grietas





Descripción: Se soporta registro fotográfico de anden existente tableta roja, punto esquinero





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23

No. ACTA: 9

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 7 CALLE 6.

BARRIO: CENTRO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN VARIAS VISITAS A PREDIO, PERO NO SE TIENE COMUNICACION. CON PROPIETARIO DE PREDIO, SE ASIGNA AUTORIZACION POR PLANEACION MUNICIPAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 01 | 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 09

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el centro: Cra 7 Cll 6

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y canalización en andén, en concreto con tableta





Descripción: Se soporta registro fotográfico de anden existente con grietas y parches de reparación anteriores, punto esquinero

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23 No. ACTA: 10

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD DIRECCIÓN CARRERA 6 CALLE 6.

BARRIO CENTRO. ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA PUBLICA, PUNTO DE CAMARA UBICADO EN ANDEN.
SE ASIGNA PUNTO POR AUTORIZACION DE PLANEACION MUNICIPAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 01 | 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 10

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO:

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio El Centro: Cra 6 cll 6

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y canalización en andén, tableta cerámica







NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23

No. ACTA: 11

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: Carrera 6 calle 7

BARRIO: Centro

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN VARIAS VISITAS SIN ENCONTRAR AL PROPIETARIO DEL PREDIO, SE ASIGNA PUNTO POR AUTORIZACION DE PLANEACION MUNICIPAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 11

1. FECHA ELABORACIÓN: | 31 | 5 | 23 |

2. NOMBRE PROPIETARIO:


3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el Centro: Cra 6 cll 7

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y canalización en andén, tableta roja

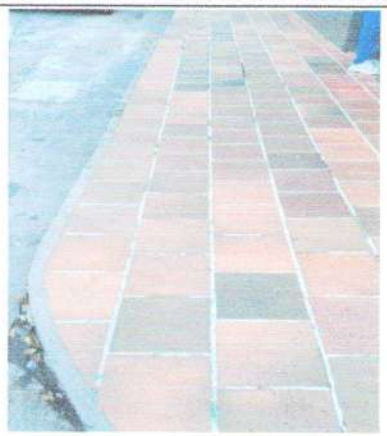





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23

No. ACTA: 12

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CALLE 7 MZ D LOTE 2

BARRIO: BRISAS.

ESTRATO: 1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Alba Nel Sanabria

NÚMERO DE CÉDULA: 1004805221

TELÉFONO CELULAR: 3158490583

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X	ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC	X	CIELO RASO		
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1 DIMENSIONES APROXIMADAS:

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

Alba Nena Sanchez
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 12

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: ALBAB SANCHEZ

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio san francisco: Cra 0 Cll 6

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y caja en andén, concreto







NETKLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 13.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: ESTADIO SAN RAFAEL.

BARRIO: SAN RAFAEL. — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	X

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA		X

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO		X
RECOLECCIÓN DE BASURA		X
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		ZONA BLANDA

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION EN TERRENO BLANDO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 13


1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio san Rafael: cancha san Rafael, via antigua la san juana

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO



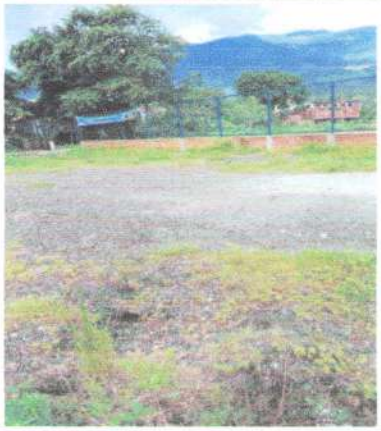

Descripción: Incado de poste y canalización en vía pública, terreno blando







NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 14

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CALLE 3 # 5-70

BARRIO: PUEBLO NUEVO — ESTRATO: 1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: LUZ MARINA MORANTES.

NÚMERO DE CÉDULA: 37195833

TELÉFONO CELULAR: 3224674914

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			2	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	BALDOSA ROJA
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO	X			
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS 1 DIMENSIONES APROXIMADAS

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

Luz Morante Perez
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar C.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 14

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: LUZ MARINA MORANTES

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio pueblo nuevo: Cra 6 cll 3-12

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Canalización y cajas en anden, tableta roja





Descripción: Incado de poste en anden





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23 | No. ACTA: 15

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: FOX 79-2. Cr 3 Cll 2 Sur

BARRIO: El Baho | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			4	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	DETERIORO
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZARON VARIAS VISITAS AL SITIO SIN ENCONTRAR AL PROPIETARIO DE PREDIO, SE ASIGNA PUNTO POR AUTORIZACION DE PLANEACION MUNICIPAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA


NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 15

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO:

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el Baho: carrera 3 calle 2 sur

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO

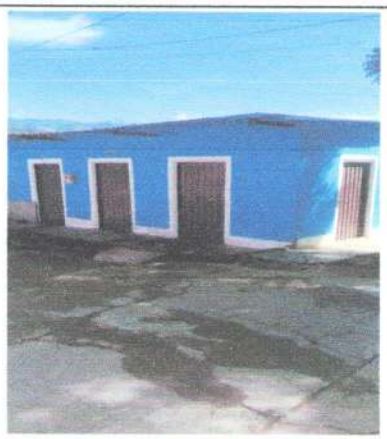



Descripción: Incado de postes y canalización en anden





Descripción: Anden en concreto con deterioro visible





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23

No. ACTA: 16

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 6 CALLE 5

BARRIO: CENTRO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL	X	MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X	ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		BALDOSA ROJA.
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA PUBLICA, PUNTO DE CAMARA EN VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 01 | 23

Jatiels

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.

NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.

NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 16


1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el Centro: Cra 6 Cll 5 GYM

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO



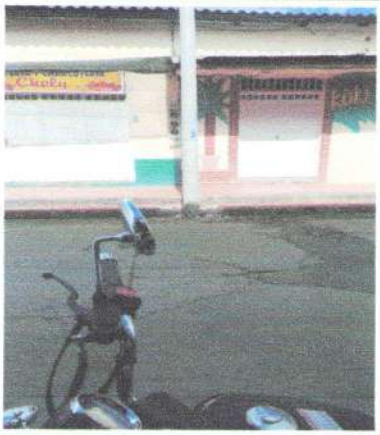

Descripción: Canalización en vía pública





Descripción: Vía pública en hormigón con deterioro visible, tiene reparcheo realizado con anterioridad





Descripción: Incado de poste en anden, tableta roja con deterioro visible, carpa existente que se debe retirar para el paso del poste

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23

No. ACTA: 17

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO: 5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO						
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS						
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO: 6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO						

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 5 #4-75

BARRIO: TAMARINDO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO	X	CONCRETO	
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	
BLOQUE		PREFABRICADOS	
LADRILLO		OTRO	CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARLENE METO.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	ROJA
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO	X			
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE SOCIALIZA CON LA DUEÑA DEL PREDIO QUIEN MANIFIESTA NEGACION A AUTORIZAR EL PUNTO DE CAMARA EN SU UBICACION, SE ASIENA AUTORIZACION A PLANEACION MUNICIPAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 17

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MARLENE MEZA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio tamarindo: Cra 5 cll 5 #4-75

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y Canalización en anden, tableta roja antigua con deterioro visible







NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 / 05 / 23

No. ACTA: 18

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 4 #4-02

BARRIO: SAN MARTIN.

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO EN ZONA PUBLICA, CANALIZACION EN VIA PUBLICA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23

Jatiel S

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J CONTRERAS.

NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar

NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 18

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio san Martín: Cra 4 Cll 4 #4-02

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y Canalización en vía pública, en hormigón con grietas y deterioro visible





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 19

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CARRERA 9 CALLE 2. CERES.

BARRIO: SAN MARTIN. — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA EN ESPACIO PUBLICO, SE CANALIZARA EN ANDEN EN ZONA PUBLICA CRUCE DE VIA Y CANALIZACION EN CONCRETO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 01 | 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge H. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 19

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio san Martín: Cra 4 cll 2, escuela CERES

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y Canalización en vía pública, en hormigón con grietas y deterioro visible









NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 20.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CARRERA 4 CO)

BARRIO: El baho — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: GOTITAS DE AMOR.

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA		X

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA UBICADO EN ESPACIO PUBLICO, CANALIZACION CRUCE DE CALLE EN CONCRETO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 20

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el Baho: Cra 4 CDI Gotitas de amor

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste y Canalización en vía pública, terreno blando









NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23 | No. ACTA: 21

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: CARRERA 4 KDX 401 CANCHA.

BARRIO: El baho | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA INSTALADO EN PARQUE PUBLICO, CANALIZACION EN CONCRETO EN VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23

Natalia S
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 21

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el baho: Cra 4 KDX 4-01

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste, terreno blando





Descripción: Canalización en vía pública, en hormigón con grietas y deterioro visible





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en terreno blando

NETKLN DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 22.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CARRERA 4. Calle 9.

BARRIO: El baño. — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X	ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA		X			

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CONSULTACION. EN VIA PUBLICA PUNTO DE CAMARA EN VIA PUBLICA
VIA EN MATERIAL DE RELLENO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA


NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 22

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el baho: CARRERA 4 CALLE 9

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO

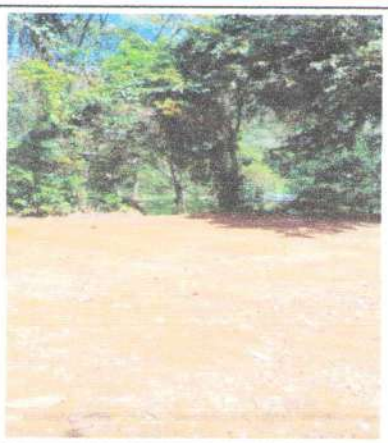



Descripción: Incado de poste, terreno blando





Descripción: Canalización en vía pública, terreno blando





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en terreno blando

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN:	31 05 23	No. ACTA:	23.
NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:		DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO:	MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD		DIRECCIÓN	KRA 14B-1 LT 506.
BARRIO	El baños.	ESTRATO	

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:	MUNICIPIO DE SARDINATA
NÚMERO DE CÉDULA:	
TELÉFONO CELULAR:	

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO	
NÚMERO DE CÉDULA:	
TELÉFONO CELULAR:	

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA PUBLICA, PUNTO DE CAMARA EN VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 23

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio el baho: CARRERA 3 CALLE 8 sur KDX 6 AF13

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste, en vía pública en terreno blando





Descripción: Canalización en vía pública, terreno blando





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en terreno blando

NETKLN DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23

No. ACTA: 24

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN: CALLE 1 #3-10

BARRIO: CHICAROS.

ESTRATO: 1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Gloria Galavis Velazo

NÚMERO DE CÉDULA: 37197624 57

TELÉFONO CELULAR: 3104802233

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO: MARGARITA MANJARRES.

NÚMERO DE CÉDULA: 37197930

TELÉFONO CELULAR: 3208250872.

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		GRIETAS Y HUMEDAD
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	BALDOSA CERAMICA EN ANDEN
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

Gloria Galavis V.
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 24

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: GLORIA GALAVIS VELOZA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Chicaro: Cll 1 #3-10

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste, vía pública en hormigon con grietas y deterioro visible





Descripción: Canalización en vía pública



Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en vía pública

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23. No. ACTA: 25.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: DIRECCIÓN: CARRERA 4 CALLE 3.

BARRIO: SAN MARTIN. ESTRATO:

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA UBICADO EN ESPACIO PUBLICO, CANALIZACION EN VIA PUBLICA EN CONCRETO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 25

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio San Martín: Cra 3 Cll 3

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Incado de poste, en vía pública en hormigon con deterioro visible





Descripción: Canalización en vía pública





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en vía pública

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 26.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CANCHA BOTELLO GOMEZ.

BARRIO: TAMARINDO. — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X	ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA		X			

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO EN PARQUE PUBLICO, CANALIZACION EN CONCRETO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 26

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Tamarindo: Cancha Botello Gomez

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Postería y caja en piso de concreto, espacio público





Descripción: anden en concreto con desgaste natural



Descripción:

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 | No. ACTA: 27

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: BARRIO BOTELLO GOMEZ TANQUE

BARRIO: BOTELLO GOMEZ | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION EN ZONA BLANDA DE VIA PUBLICA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 27

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Botello Gómez: cll 3 cra 1e , Tanques

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Posteria en terreno blando, vía pública





Descripción: Canalización y caja en terreno blando



Descripción: vía sin pavimentación

NETKLN DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23

No. ACTA: 28

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/días
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CALLE 4 CARRERA 0

BARRIO: BETANIA.

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION EN VIA PUBLICA. ZONA BLANDA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 28


1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Betania: Cll 4 cra 0

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO



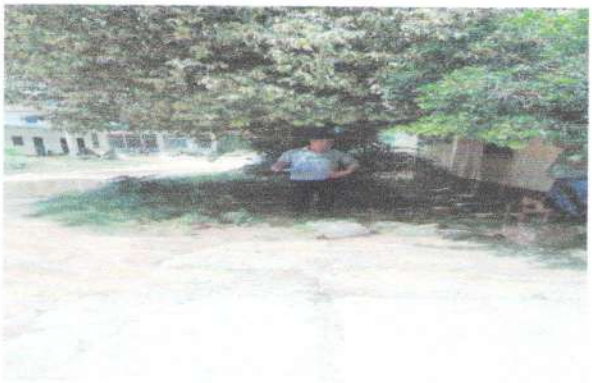

Descripción: Posteria y canalización en terreno blando





Descripción: Punto en vía pública



Descripción:

NETKLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 — No. ACTA: 29

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD — DIRECCIÓN: CARRERA 9 CALLE 1

BARRIO: BOTELLO DURAN. — ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	DESGASTE NATURAL.
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA PUBLICA. TERRENO BLANDO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 29

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Botello Duran: Cra 0 cll 1

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste en anden de concreto con desgaste natural





Descripción: Canalización en vía pública hormigón y terreno blando





Descripción: Caja de 30*30 en terreno blando

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23 | No. ACTA: 30

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: CALLE 5 #1-51.

BARRIO: BETANIA. | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO DE CAMARA UBICADO EN VIA PUBLICA, CANALIZACION EN VIA PUBLICA. EN CONCRETO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 05 | 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 30

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Betania: Cll 5 Cra 1-51

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Postería y canalización en vía pública, en hormigón con desgaste natural





Descripción: Caja de 60*60 y 30*30 en vía pública, terreno en hormigón



Descripción:

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 | 05 | 23.

No. ACTA: 31.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 3 CALLE 5 COMEDOR.

BARRIO: TAMARINDO.

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	X	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COMEDOR INFANTIL.

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	ANDEN EN CONCRETO, CON DETERIORO
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO EN ESPACIO PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 05 23.

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jose M. Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 31

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CARRERA 3 CALLE 5 TAMARINDO (COMEDOR)

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Posteria y Canalización en anden de concreto con desgaste (grietas existentes)





Descripción: Terreno para adecuación con gran deterioro visible



Descripción:

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 31 05 23. No. ACTA: 32

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: DIRECCIÓN: CALLE 6 #4-07

BARRIO: Tamarindo ESTRATO:

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: VERANIA BACCA

NÚMERO DE CÉDULA: 27834777

TELÉFONO CELULAR: 3145578549

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			2	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	TABLETA ROJA.
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO	X			
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1 DIMENSIONES APROXIMADAS:

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 31 | 01 | 23.

Veronica Bacca

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.

NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar

NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 32

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: VERANIA BACCA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CARRERA 4 CALLE 6 TAMARINDO

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Postería y canalización en anden con tableta roja existente









NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23

No. ACTA: 33.

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CII 7 CRA 2-93

BARRIO: SAN FRANCISCO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

PUNTO UBICADO SOBRE VIA PUBLICA, CANALIZACION EN VIA PUBLICA EN CONCRETO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

Jatil S
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 33

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CARRERA 3 CALLE 7 SAN FRANCISCO

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Posteria y canalización en vía pública en hormigón con reparcheo anterior





Descripción: Desgaste natural de la vía





NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23

No. ACTA: 34

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO: 5 MESES	Meses/días
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO						
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS						
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO: 6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO						

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: Cll 8 CRA 5 #5-02

BARRIO: SAN FRANCISCO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE	X	PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO		CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			2	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	CON GRIETAS.
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO	X			
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1 DIMENSIONES APROXIMADAS:

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN VARIAS VISITAS SIN ENCONTRAR A PROPIETARIO DEL PUERTO PREDIO, SE AVANZA PUNTO POR AUTORIZACION DE PLANEACION MUNICIPAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge A. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 34

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO:

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CALLE 8 CARRERA 5 # 5-02 SAN FRANCISCO

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Postería y Canalización en anden de concreto con evidente desgaste









NETKLN DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 | 05 | 23

No. ACTA: 35

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO

CONTRATISTA: NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS

CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias

INTEVENTORÍA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CL 8 CRA 2 -28

BARRIO: SAN FRANCISCO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION SOBRE VIA PUBLICA, EN MATERIAL DE RELLENO. PUNTO DE CAMARA UBICADO EN VIA PUBLICA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 35

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CARRERA 2 CALLE 8 SAN FRANCISCO

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Postería y Canalización en vía pública, terreno blando





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en terreno blando, vía pública



NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 | 05 | 23

No. ACTA: 36

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO

CONTRATISTA: NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS

CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias

INTEVENTORÍA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: Cll 9 Cra 0. coliseo

BARRIO: San Francisco

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	X

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO	
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	
BLOQUE		PREFABRICADOS	
LADRILLO		OTRO	CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO	X	MATERIAL DE RELLENO

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA PUBLICA, VIAS CON MATERIAL DE RELLENO, PUNTO DE CAMARA EN LOTE VALDIO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 36

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CALLE 9 CARRERA 0 SAN FRANCISCO

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste y Canalización en vía pública, terreno blando





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en terreno blanco, vía pública



NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23 | No. ACTA: 37

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD | DIRECCIÓN: CLL 9 CRA 3-18

BARRIO: SAN FRANCISCO | ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	X

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO	
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	
BLOQUE		PREFABRICADOS	
LADRILLO		OTRO	CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA -

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	✓		ALCANTARILLADO	✓	
ELECTRICIDAD	✓		RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELÉFONO FIJO		✓	TELEVISIÓN POR CABLE		✓
AGUA	✓				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN CONCRETO SOBRE VIA PUBLICA, PUNTO DE CAMARA EN LOTE VALDIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 37

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Cll 9 Cra 3-18

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste en terreno sin construir y Canalización en vía pública en hormigón con desgaste natural







NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23

No. ACTA: 38

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO

CONTRATISTA: NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS

CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias

INTEVENTORÍA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: Calle 11 cra3 ?

BARRIO: Vista hermosa

ESTRATO: 1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ROSALINA BASTOS.

NÚMERO DE CÉDULA: 26952383.

TELÉFONO CELULAR: 3105623378

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	x	DESGASTE POR TIEMPO.
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [x] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1. DIMENSIONES APROXIMADAS:

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 2023

Rosalina Bastos
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS.
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 38

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: ROSALINA BASTOS

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Cll 11 Cra 3 VISTA HERMOSA

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste en terreno blando





Descripción: Canalización y caja de 60*60 en vía pública en hormigón





Descripción: Caja de 60*60 en terreno blando

NETKLN DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23

No. ACTA: 39

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/días
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: LOTE LOS JAIMES

BARRIO: Vista hermosa Alt alta

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	X

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE		PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO			ALCANTARILLADO		
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA		
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE		
AGUA					

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

CANALIZACION EN VIA MATERIAL DE RELLENO, UBICACION DE CAMARA Y CAJAS EN LOTES SIN EDIFICAR.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS -
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 39

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Calle 11a Carrera 2

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste y canalización en vía pública en terreno blando lotes sin construccion





Descripción: Caja 60*60 y 30*30 en terreno blando



NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 05 23.

No. ACTA: 40

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO: 5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO						
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS						
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO: 6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO						

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CARRERA 3 CLL. 12 #6-02

BARRIO: CENTENARIO PARTE ALTA

ESTRATO: 1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	X	PREFABRICADOS			
LADRILLO		OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: LUZ MARINA TOLOZA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR: 3204935868

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN	X		GRIETAS POR DESGASTE NATURAL.
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			1	
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	AGRIETADO
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC	X			
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1 DIMENSIONES APROXIMADAS:

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZARON VARIAS VISITAS A SITIO SIN ENCONTRAR A PROPIETARIO DEL PREDIO, SE ASIGNA PUNTO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 40

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: LUZ MARINA VELAZQUEZ

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Barrio Centenario: Cll 12 Cra. 3 #6-02

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste y canalización en vía pública en hormigón con desgaste natural







NETKLON DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN:	30	05	2023	No. ACTA:	41

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:		DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO:	MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/dias
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/dias
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD		DIRECCIÓN	CARRERA 5 CALLE 11
BARRIO	CENTENARIO	ESTRATO	1

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO	
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	
BLOQUE		PREFABRICADOS	
LADRILLO	X	OTRO	CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:	TERESA QUINTERO
NÚMERO DE CÉDULA:	
TELÉFONO CELULAR:	

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO	LUISA FERNANDA DELGADO
NÚMERO DE CÉDULA:	1091804726
TELÉFONO CELULAR:	3143474564

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X	
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN		X	

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)			2	X
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	ROJO, CON DETERIORO
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC	X			
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 1 DIMENSIONES APROXIMADAS:

G. OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 2023.

Luis Fernando Delgado Ascanio
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar.
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 41

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: TERESA QUINTERO

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: Cra 5 Cll 11

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste y caja 60*60 en anden tableta roja





Descripción: Deterioro visible en tableta existente





Descripción: Espacios en anden que no tienen existencia de tableta

NETKLON DIGITAL SOLUTIONS

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Contrato: LP-001-155-2023

FECHA ELABORACIÓN: 30 | 05 | 23

No. ACTA: 42

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO:

DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: MUNICIPIO DE SARDINATA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LP 001-155-2023	FECHA CONTRATO:	28	4	2023	PLAZO:	5 MESES	Meses/días
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO							
CONTRATISTA:	NETKLON DIGITAL SOLUTIONS SAS							
CONTRATO INTEVENTORÍA No:	CM-003-150-2023	FECHA CONTRATO:	13	4	2023	PLAZO:	6 MESES	Meses/días
INTEVENTORÍA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO							

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD

DIRECCIÓN: CRA 5A CIL 11A

BARRIO: CENTENARIO

ESTRATO

TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO	
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE	
BLOQUE		PREFABRICADOS	
LADRILLO		OTRO	CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN			
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN			
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN			

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA		
CONCRETO	X	CANALIZACION EN CALLE
OTRO		ADOQUIN EN CEMENTO

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA				
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

SE CANALIZA EN VIA PUBLICA, POSTERIA EN PARQUE PC 42.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Sardinata., a los 30 05 23

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

ANDERSON J. CONTRERAS
NOMBRE CONTRATISTA

Jorge M. Villamizar
NOMBRE INTERVENTORIA

NETKSLN DIGITAL SOLUTIONS	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Contrato: LP-001-155-2023
		ACTA N 42

1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 5 | 23

2. NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE SARDINATA

3. DIRECCIÓN PREDIO VISITADO: CARRERA 5A CALLE 11A Centenario

H.REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: Poste en anden de adoquín en parque público





Descripción: Cajas y Canalización en vía publica de hormigón con deterioro visible y reparcheo anterior



INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 04


LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CAMARA

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Barrio Poblado: entrada municipio, sector Patinodromo.

OBSERVACION
• Conexión a alumbrado público. • 2m. de canalización Terreno blando.

ESQUEMA

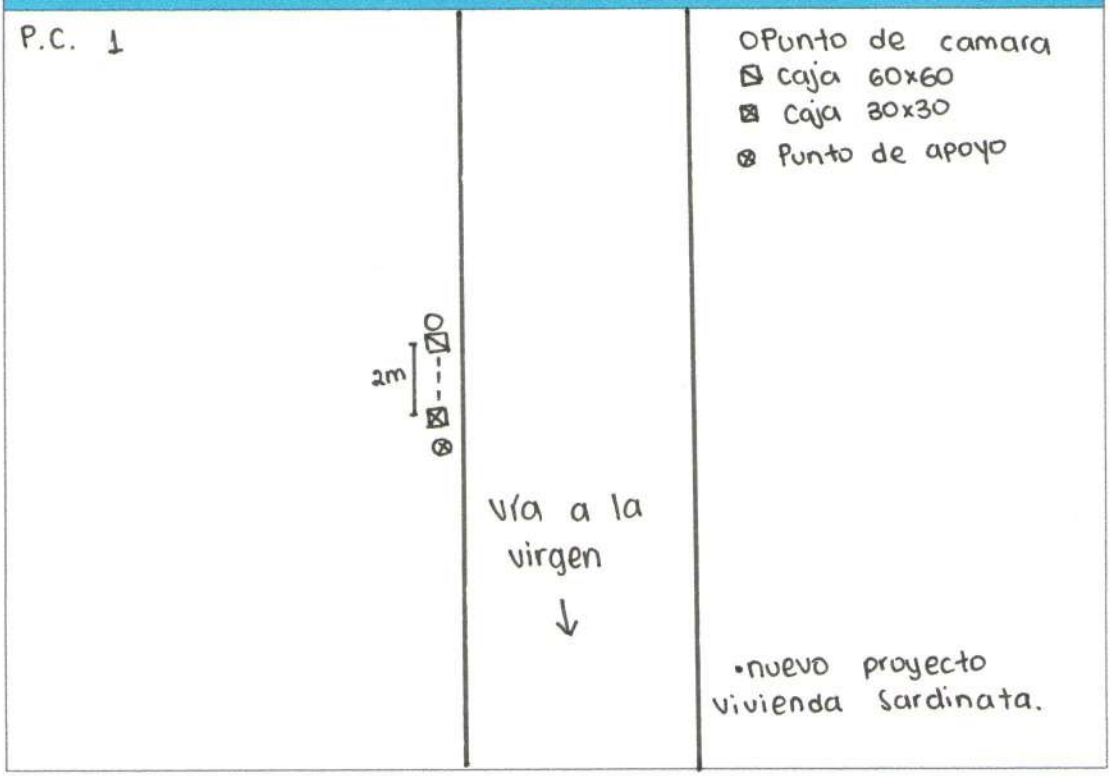

No Cámara	1
Sector / Barrio	Entrada, Patinodromo
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 27 Fibra 52
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 2 Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'33.06"N Longitud: 72°48'0.35" W
Infraestructura	Existente: __ Nueva: __

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M Villamizar.	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos	Secretario planeacion	
JANICE RESTREPO	PONAL	JANICE


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Barrio Poblado: Cll 16 Crr 6 - EDS Sardinata

OBSERVACION
• se debe podar arbol • solo caja 60x60 • Frente EDS Terpel • Canalizaúon N/A • Terreno blando / relleno.

ESQUEMA

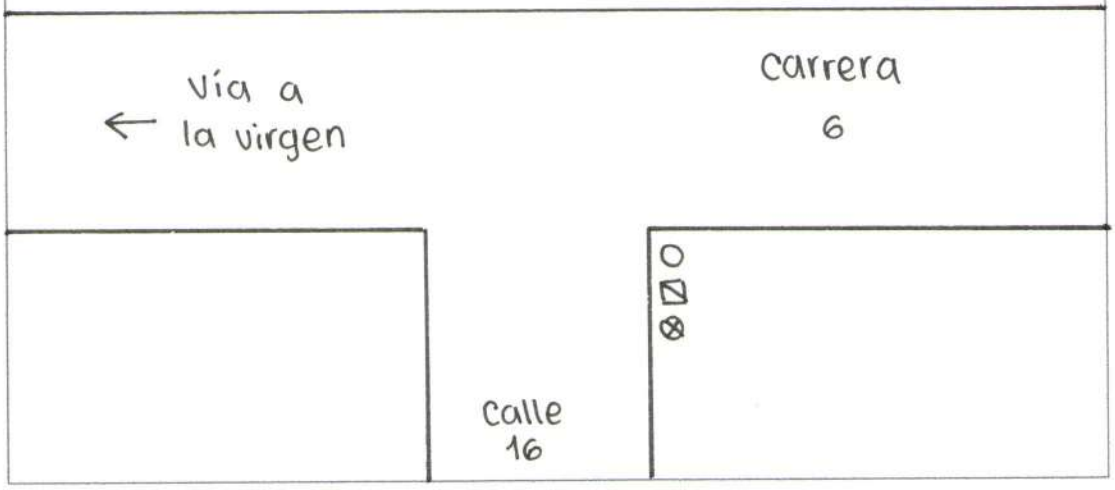

No Cámara	2
Sector / Barrio	El Poblado
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 23 Fibra 44
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 1 Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'25.39"N Longitud: 72°47'59.91"O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON JHOAN CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoría	Jorge M.
Roberto Castellanos C.	Secretaro planeación	
JAVIER RESTREPO	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo/ 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 6B cll14-5. Barrio el llano

OBSERVACION
• Cruce de calle relleno 11m. relleno • 2 cajas 30x30 • Poste de camara sobre terreno blando • Verificar con servicios publicos, gases del oriente

ESQUEMA

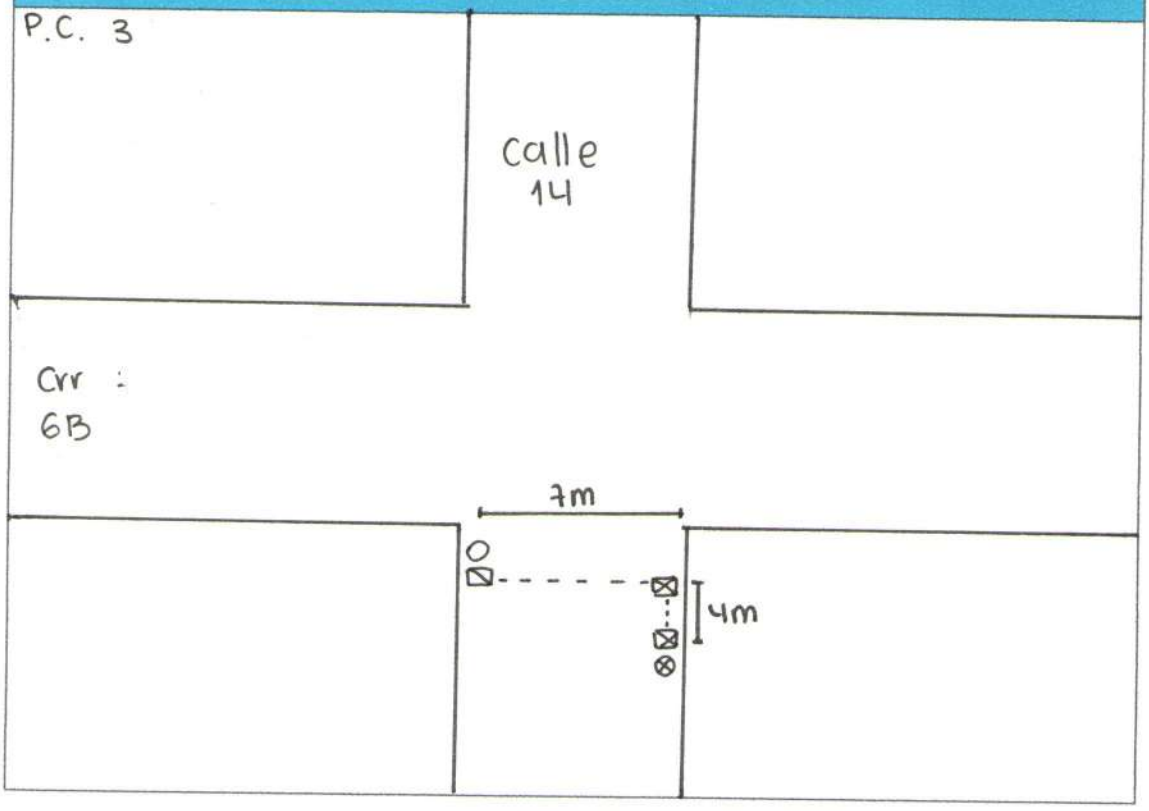

No Cámara	3
Sector / Barrio	El llano
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 34 Fibra 54
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 11 Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'21.04" N Longitud: 72°48'3,11" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos C.	Sec. planeación	
JANIER RESTREPO	PONAL	JANIER RP


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	calle 10 crr 7, Morgue

OBSERVACION
• Reconstruir adoquin de cemento • se ubica en la esquina de la morgue por canal de la vía.

ESQUEMA

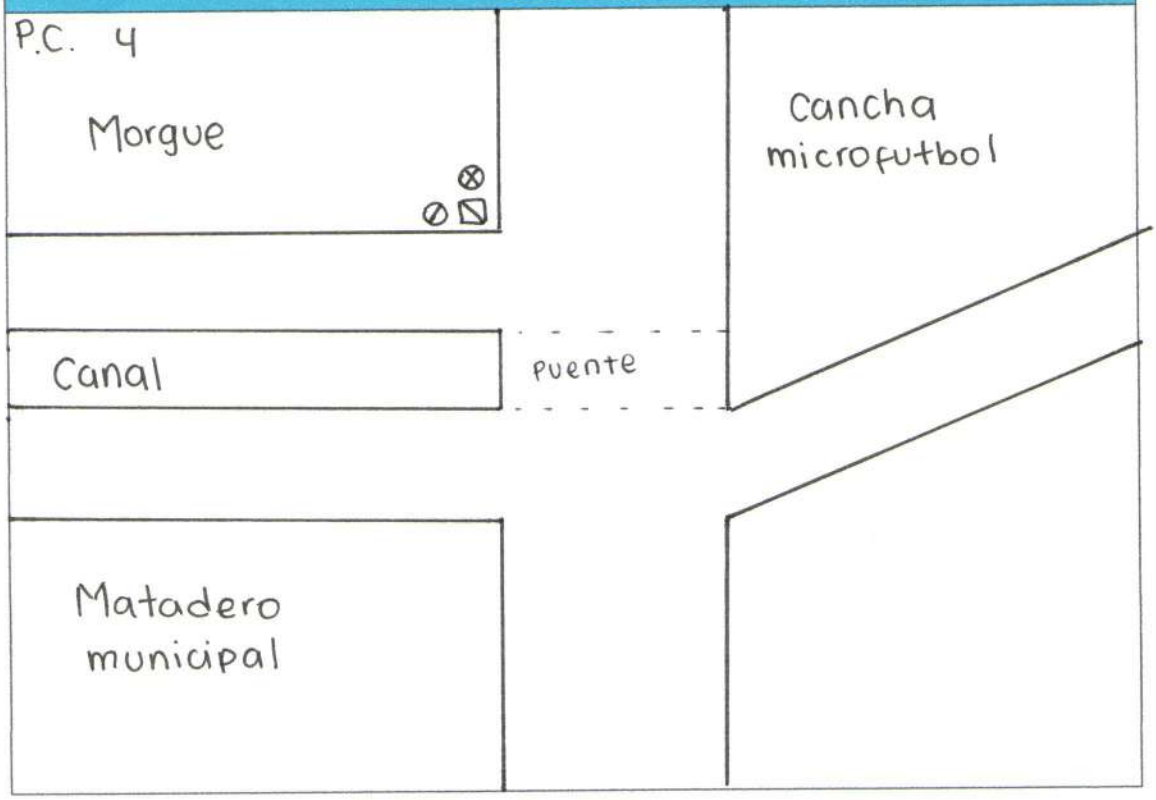

No Cámara	4
Sector / Barrio	El llano
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 24 Fibra 45
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 1
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra 1 Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'12,82"N Longitud: 72°48'4,40"O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Sec. planeación	
JAVIER ESTRADA	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	sardinata
Dirección	Plaza de Toros. cll 10 crr 5, centenario

OBSERVACION
• Doble cruce de vía • Revisar con servicios publicos • Linea de media tensión en poste de apoyo. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se translada 10cm por encontrarse lineas y/o ducteria de gas y agua.

ESQUEMA

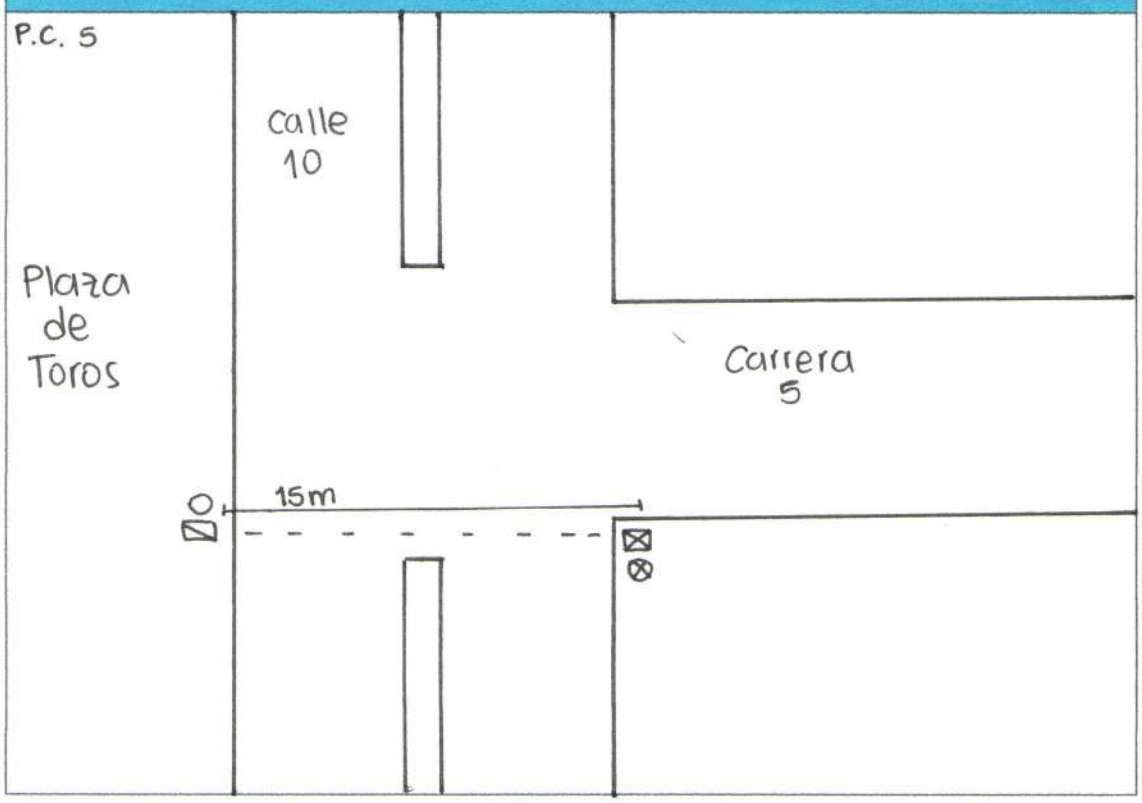

No Cámara	5
Sector / Barrio	Plaza de toros
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 36 m. Fibra 57 m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 15 m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace___
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°05'11,13" N Longitud: 72° 47' 58,30" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos C.	Secretario de planeación	
JAVIER ESTRADA	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	28 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 6 Cll 8, el centro

OBSERVACION
• Cruce de calle 7m • Caja elevada • Canalización en calle y anden granito, tableta roja. • Revisar con servicios publicos y gases del oriente

ESQUEMA

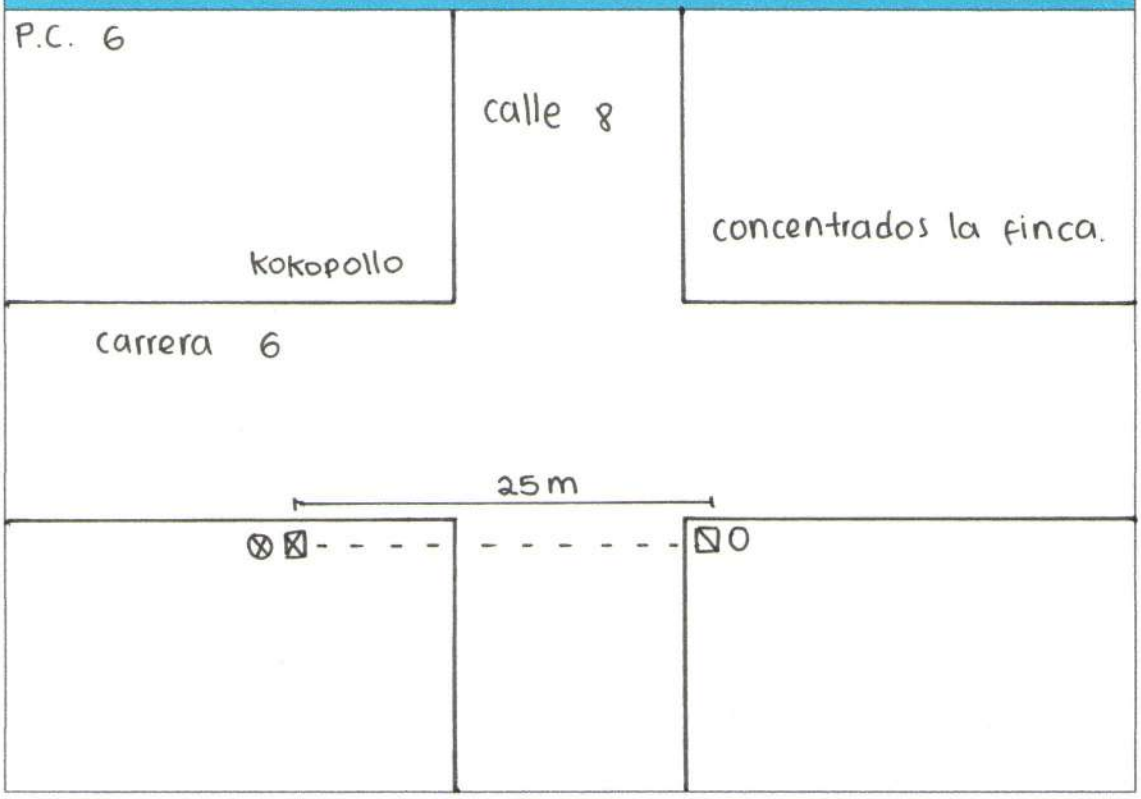

No Cámara	6
Sector / Barrio	El centro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 47m Fibra 67m
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 15m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace___
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'5,83"N Longitud: 72° 48' 3,991" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos C.	Sec. planeación	
JANCER RESTREPO	PONAL	JANCER RESTREPO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 7 Cll 7 #7-02, barrio el centro

OBSERVACION
• Reconstrucción 6m. tableta roja. • Revisar con gases del oriente • canalización y punto de camara en vía publica

ESQUEMA

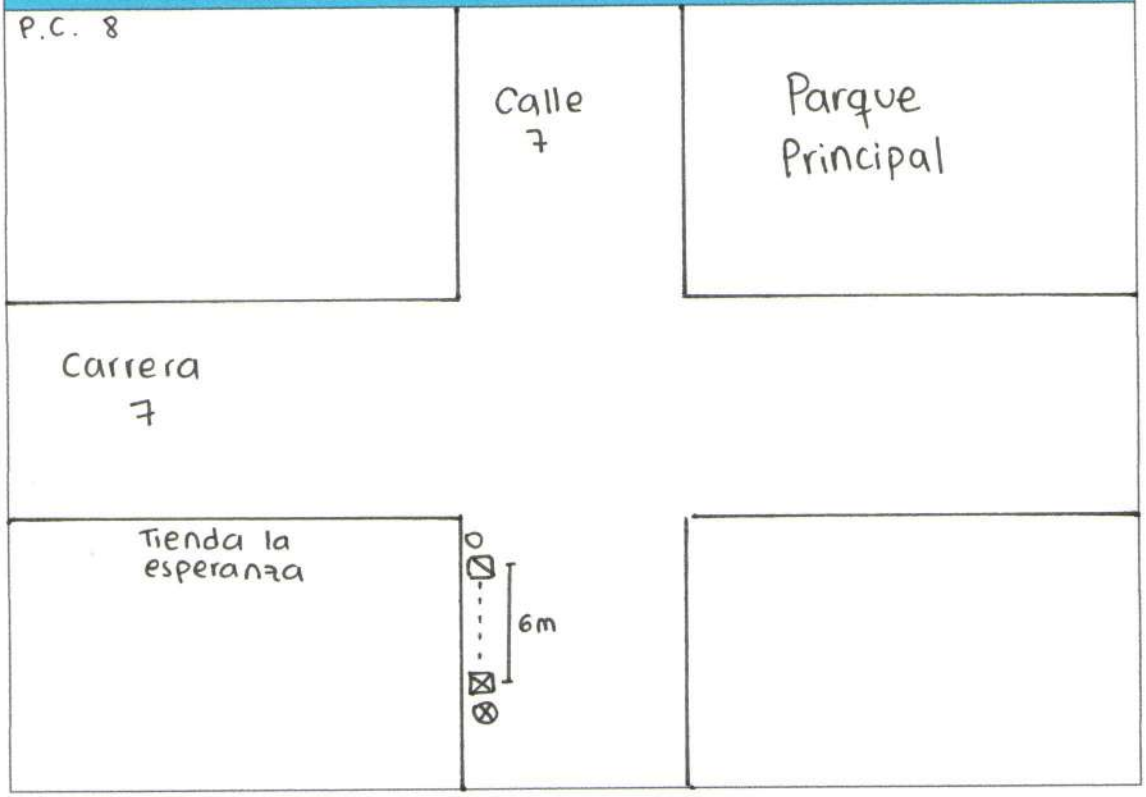

No Cámara	8
Sector / Barrio	El centro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 30 Fibra 48
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín 6m Cemento
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'4,47"N Longitud: 72°48'7,51"O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANGELICA J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cll 6 Crr 7, centro

OBSERVACION
• Canalización 12 m. en concreto • Anden 50cm altura.

ESQUEMA

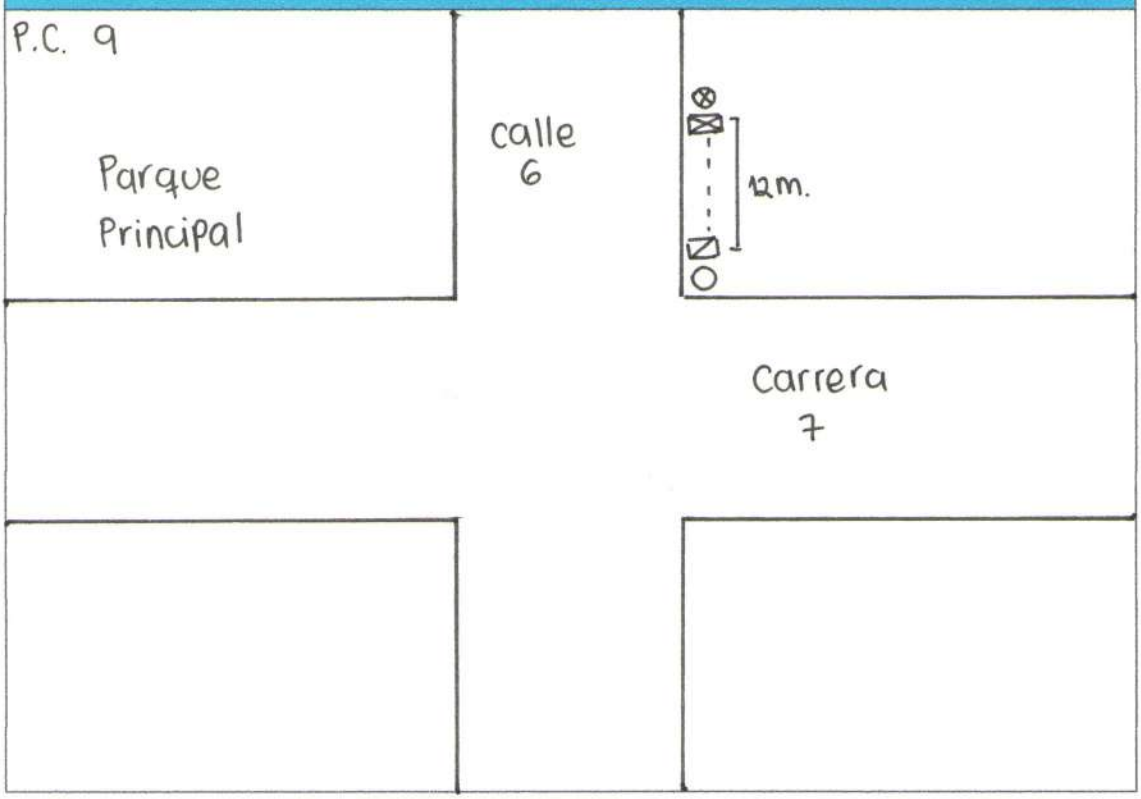

No Cámara	9
Sector / Barrio	Drogueria San Rafael - centro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 33 Fibra 54
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 12
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'1,83"N Longitud: 72°48'8.52"O
Infraestructura	Existente:__ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON JHON CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 Imayo 12023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 6 Cll 6 #6-03, centro

OBSERVACION
• Canalización por calle • Cajas sobre el anden • Construcción de dado para altura y continuidad de anden existente • Incado de poste sobre vía-esquina

ESQUEMA

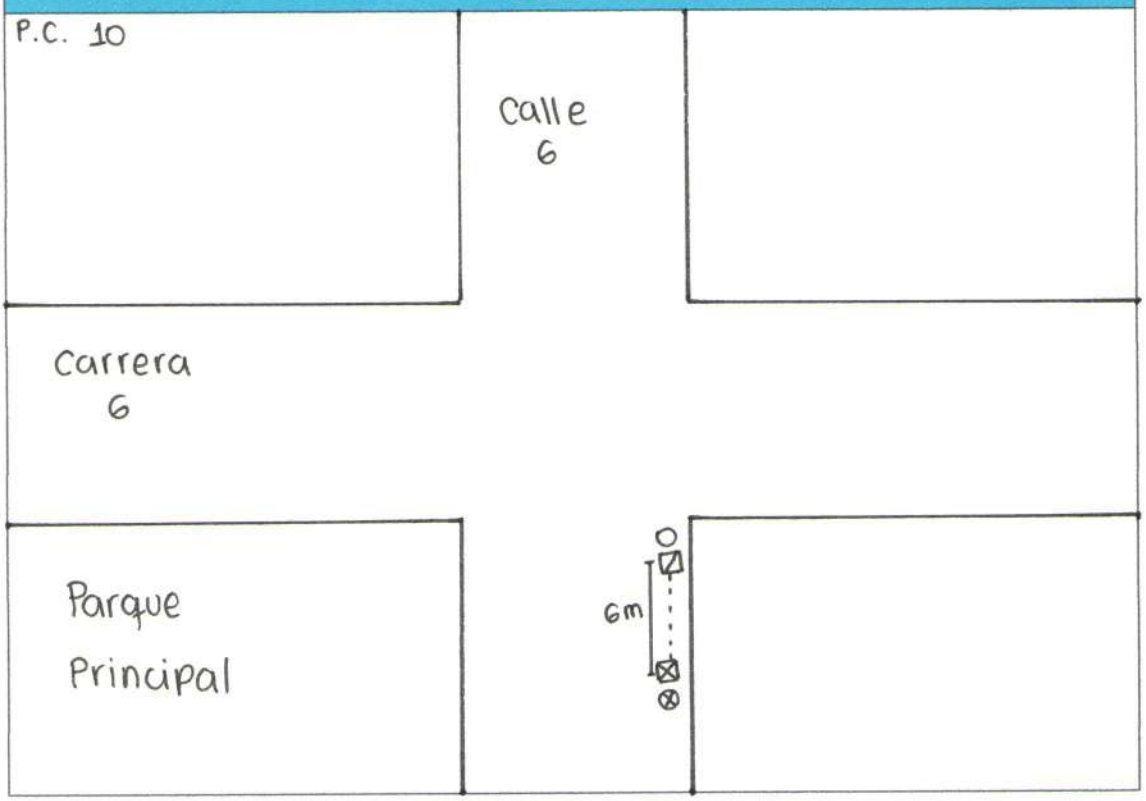

No Cámara	10
Sector / Barrio	el centro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 28 m Fibra 48 m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 6m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'0,84"N Longitud: 72°48'6,12"O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: __

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	DANIEL


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cir 6 cll 7, casa wral. Barrio el centro

OBSERVACION
•Reconstruir piso en tableta 10m. •Esquina de casa wral

ESQUEMA

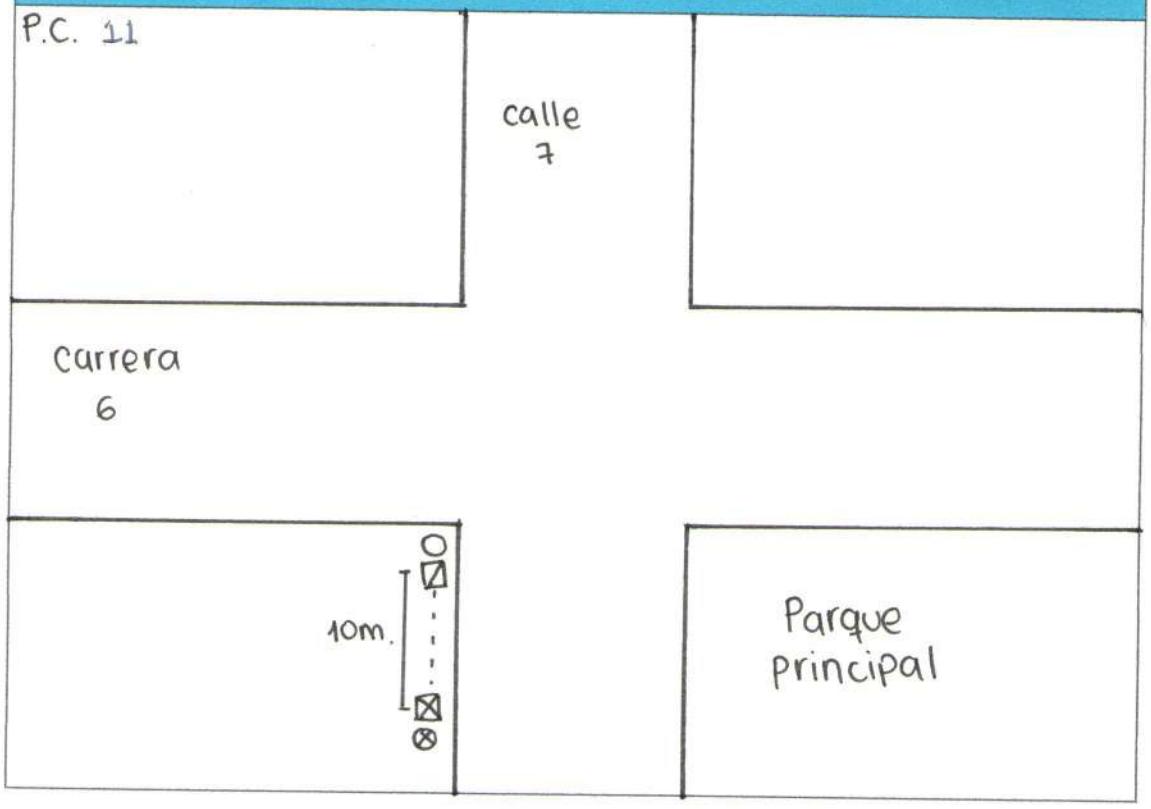

No Cámara	11
Sector / Barrio	El centro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 33m Fibra 52m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín 10m Cemento
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'3,36" N Longitud: 72° 45' 5,01" O
Infraestructura	Existente:__ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. planeación	
JANICER ESTRADO	TONAL	JANICER PAO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	cancha barrio San Rafael, Vía antigua la San Juana

OBSERVACION
• Antigua vía la sanjuana • Terreno blando / Relleno • Estadio San Rafael • Tecnicamente no pue posible realizar la conexión, se translado 200m para garantizar la seguridad del miniestadio

ESQUEMA

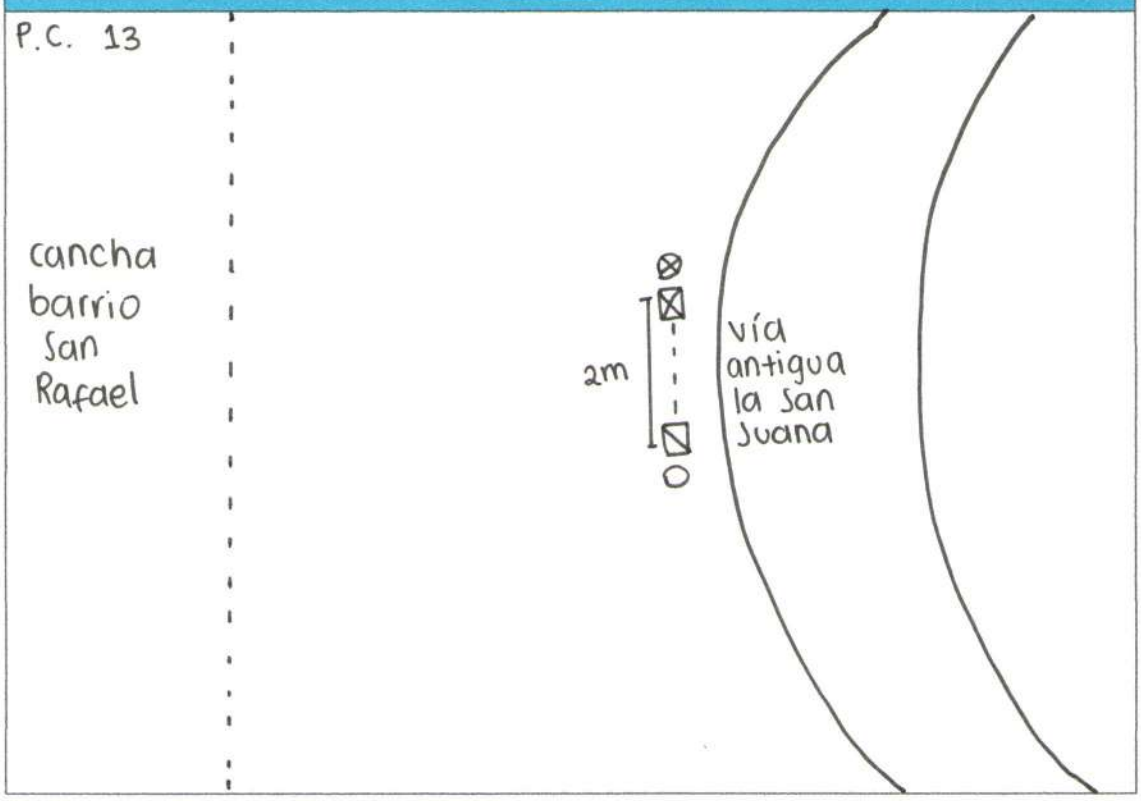

No Cámara	13
Sector / Barrio	San Rafael
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 23m Fibra 45m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 2 Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 __ 60x80 __ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra __ Radio enlace X
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'56,40" N Longitud: 72°48'14,39" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
JUSTIN J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Sec. de planeación	
JAVIER ESTRADO	PONAL	JAVIER


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 6 cll 3. Pueblo nuevo

OBSERVACION
• Canalización 9m sobre anden en tableta roja.

ESQUEMA

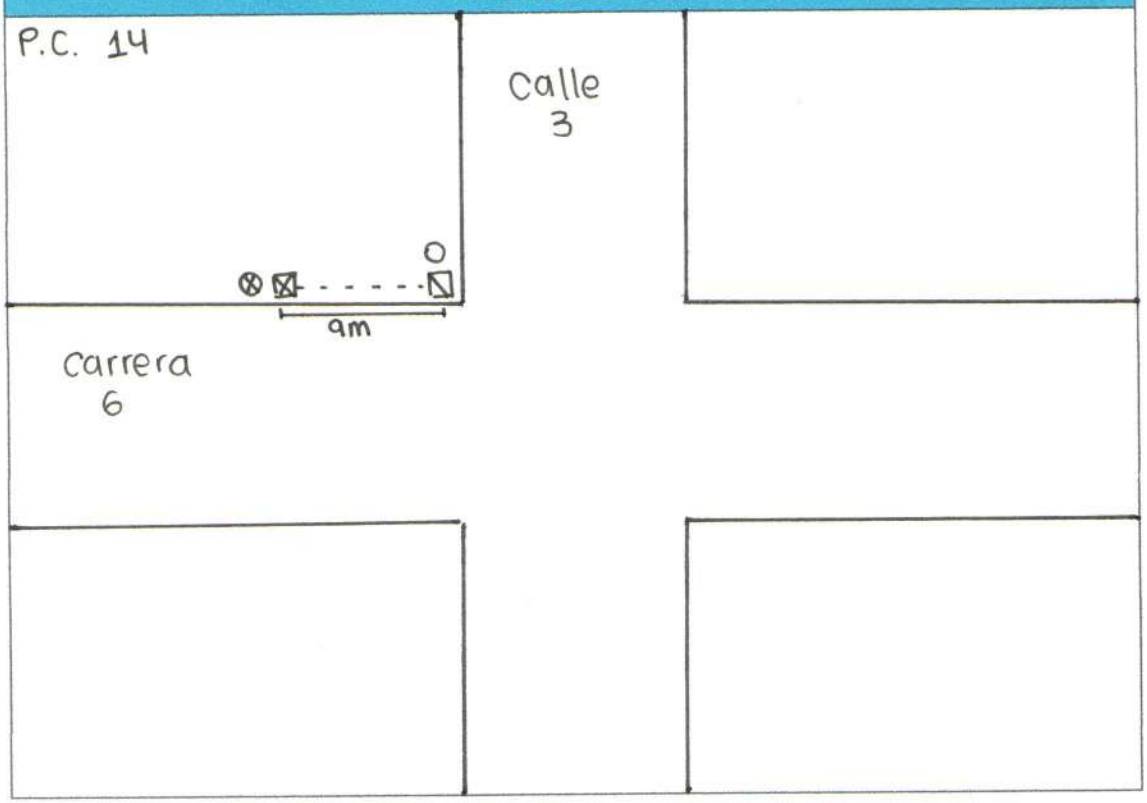

No Cámara	14
Sector / Barrio	Pueblo Nuevo
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 32m Fibra 52m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín 9m Cemento
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'52,76" N Longitud: 72°48'9,33" O
Infraestructura	Existente:__ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. de planeación	
JANICA RESTREPO	PONAL	JANICA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo /2023
Municipio	Sardinata
Dirección	cll 5 cra 6, Gimnasio

OBSERVACION
• cruce de calle • Revisar con servicios publicos y gases del oriente • una carpa impide la incada del poste. socializar con el Propietario • canalización en calle

ESQUEMA

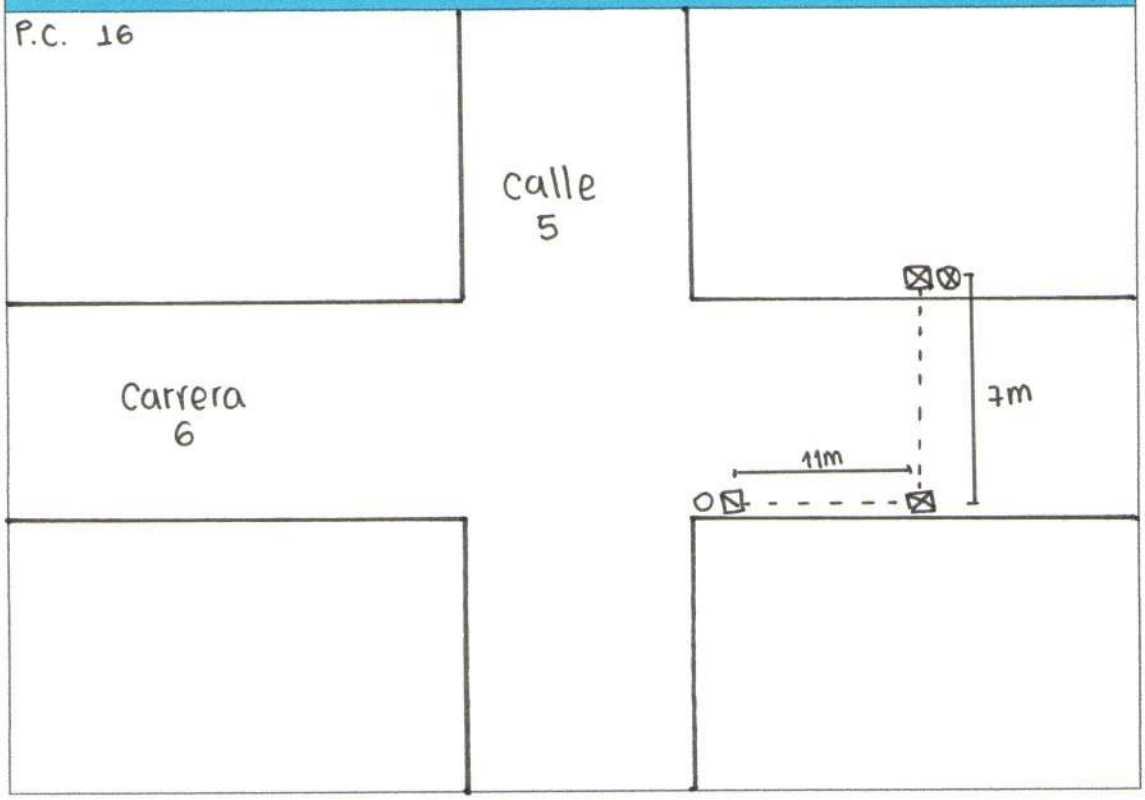

No Cámara	16
Sector / Barrio	El centro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 40m Fibra 61m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín 11m Cemento 7m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'58,2" N Longitud: 72°48' 7,28" O
Infraestructura	Existente:__ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos C.	Sec. de planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	DANIEL


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	sardinata
Dirección	Barrio Tamarindo. Cra 5 cll 5 #4-75

OBSERVACION
•Reconstroir anden en adoquin rojo 2m • Anden alto a 25cm.

ESQUEMA

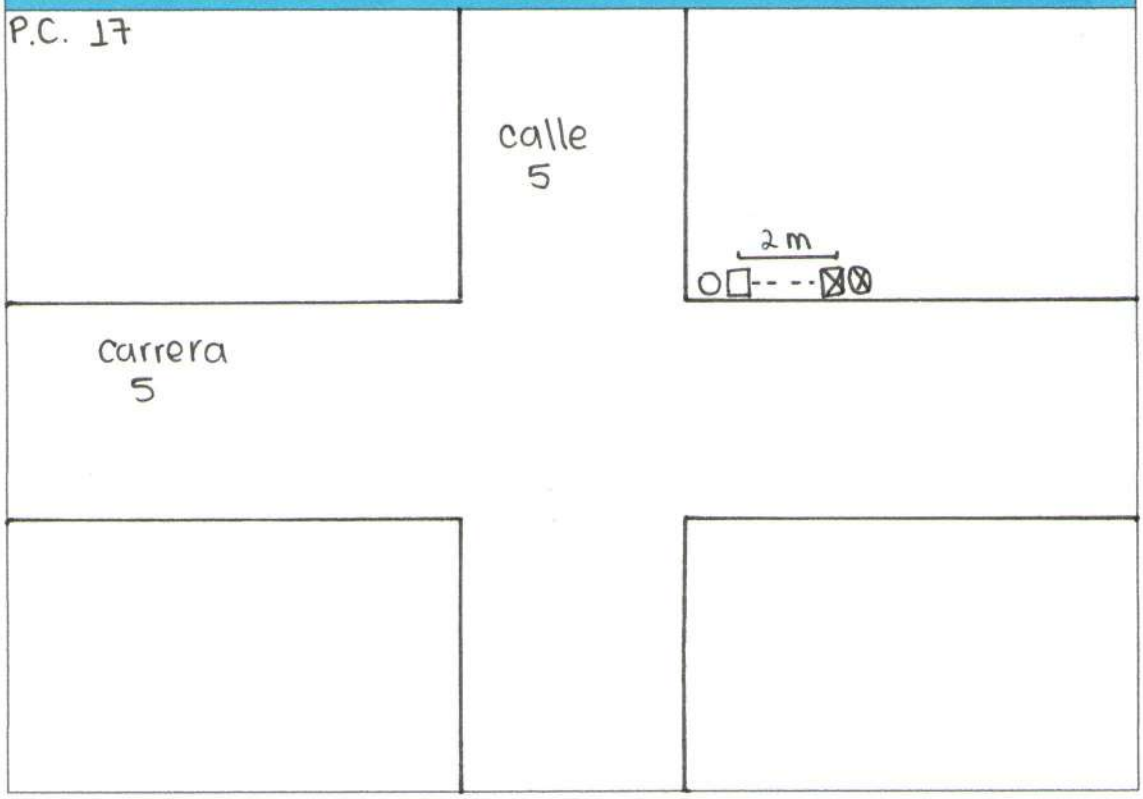

No Cámara	17
Sector / Barrio	Barrio San Martin - Tamarindo
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 25m Fibra 40m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín 2m Cemento
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'56,80" N Longitud: 72°48'4,36" O
Infraestructura	Existente:__ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
DANIEL ESTRADA PONTE		DANIEL ESTRADA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cra 4 Cll 4 #4-02, san martin

OBSERVACION
• Canalización por fuera del anden 7m • Punto de georeferenciación - Hospital • Revisar con servicios publicos, gases del oriente • Se debe canalizar por via publica.

ESQUEMA

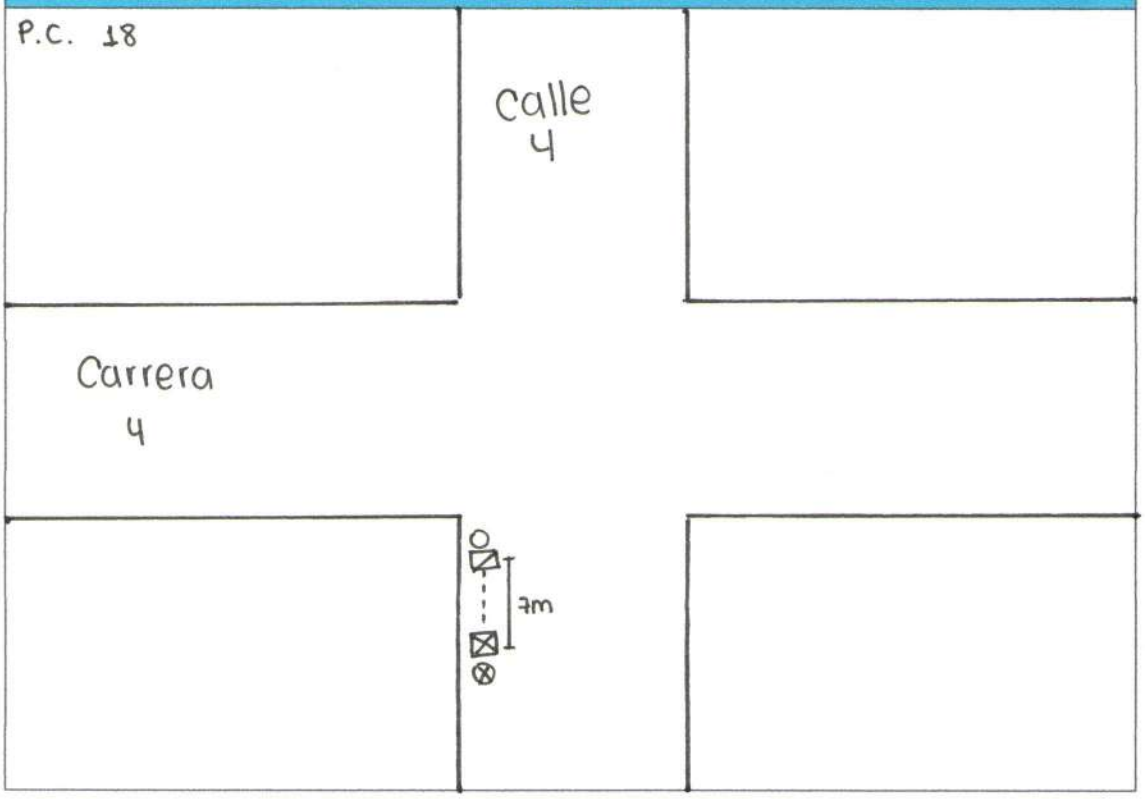

No Cámara	18
Sector / Barrio	San Martin
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 29 Fibra 50
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 7m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'53,24" N Longitud: 72°48'2,98" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Sec. de planeación	
FANIER PESTRENO	PONAL	FANIER PP


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Carrera 4a12 CERES. Barrio san martin

OBSERVACION
• 3 cajas 30x30 • caja de fibra se debe instalar en segundo poste por transformador a 22m de poste de apoyo • Cruce de vía - Revisar con servicios publicos y gases del oriente • Canalización 20m en concreto. • Canalización por vía publica.

ESQUEMA

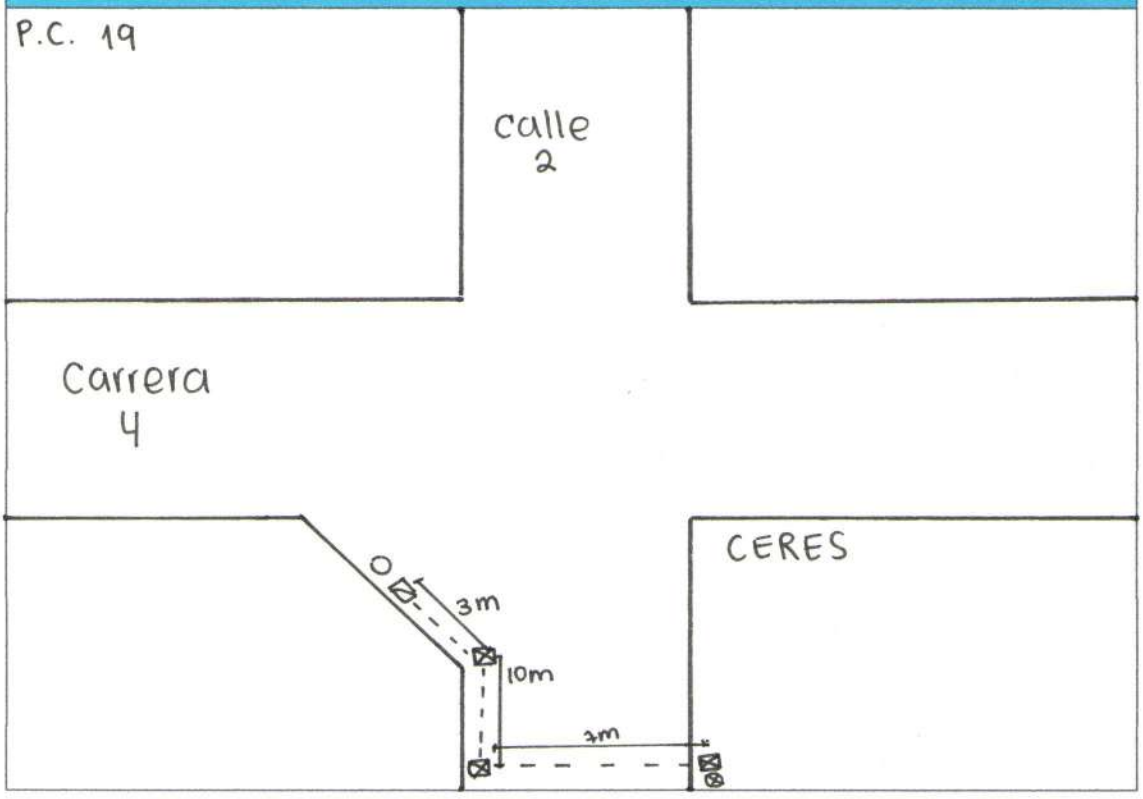

No Cámara	19
Sector / Barrio	CERES - Escuela CERES
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 41m Fibra 76m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 20m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 3
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'48,31" N Longitud: 72° 48' 5,08" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria.	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Sec de planeacion	
JANIER PESTRANO	PONAL	JANIER PO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	sardinata
Dirección	Crr 4, CDI. 6otitas de amor. Barrio el bahio

OBSERVACION
• Cruce de vía 8m. Reconstruir en concreto • Revisar con servicios publicos y gases del oriente • Via principal al baho • Tecnicamente no fue posible realizar la conexio'n, se translado 100m para garantizar la seguridaa del centro infantil "6otitas de amor"

ESQUEMA

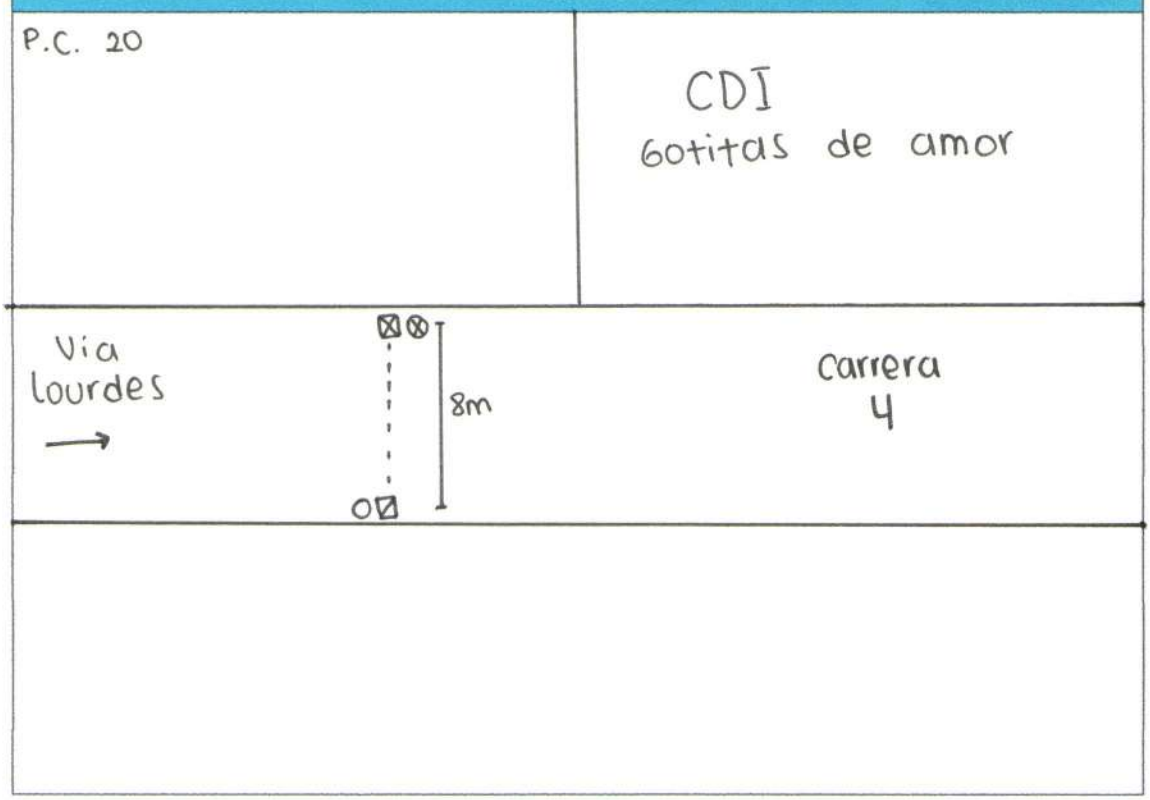

No Cámara	20
Sector / Barrio	El baho
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 31m Fibra 51m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 8m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'39,70"N Longitud: 72°48'6,40"O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M Villamizar.	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
JANCOL ESTUDIO	JONAL	JANCOL LTDA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo/ 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cir 4 KDX #4-01

OBSERVACION
• Canalización 18m. reconstruir anden en concreto. • Revisar con servicios publicos y gases del oriente. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se trasladó 100m para garantizar la seguridad del Parque infantil y la cancha de futbol "Baho"

ESQUEMA

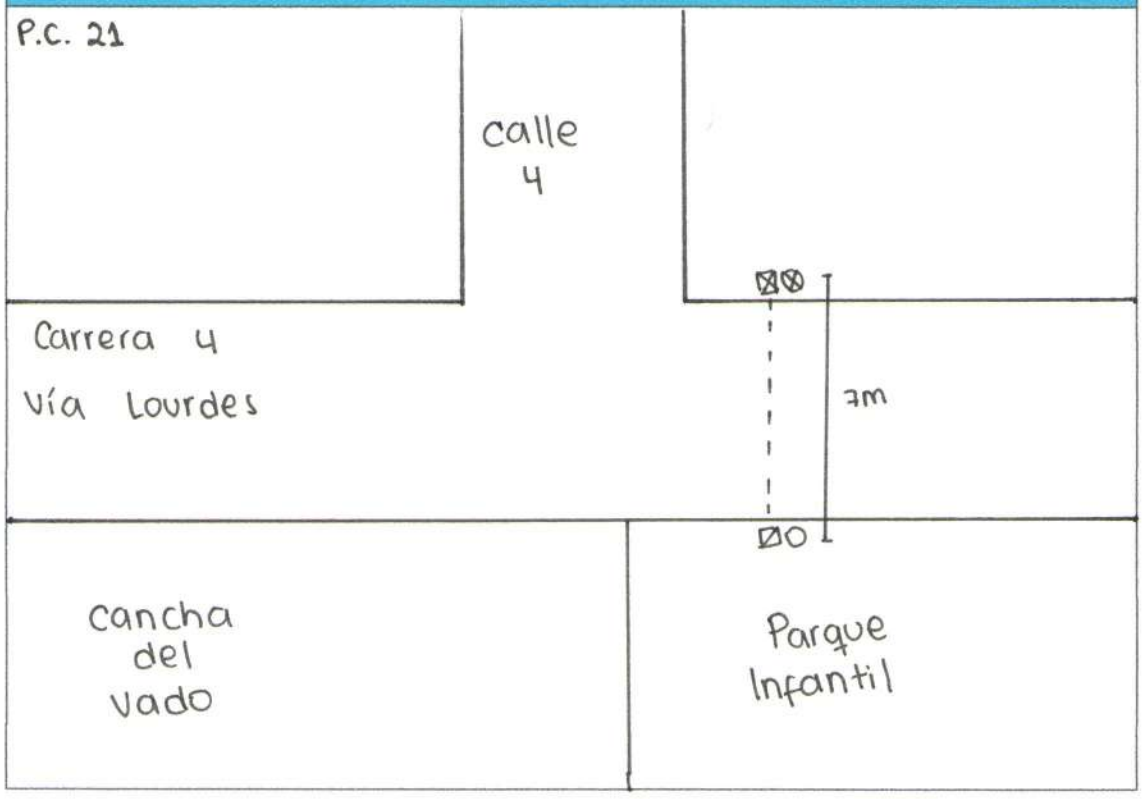

No Cámara	21
Sector / Barrio	El baho
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 28m Fibra 49m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 7m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 08°04'32,13''N Longitud: 72°48'10,62'' O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
JANICA ESTRADO	RONAL	JANICA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 mayo 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Barrio el baho, crr 4 final el baho

OBSERVACION
• Canalización en relleno. • Cruce de calle 9m, relleno. • Verificar servicios publicos y gases del oriente. • Canalización y punto de camara en via publica. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se translado 100m para garantizar la seguridad a la salida al municipio de Lourdes y zona periferica

ESQUEMA

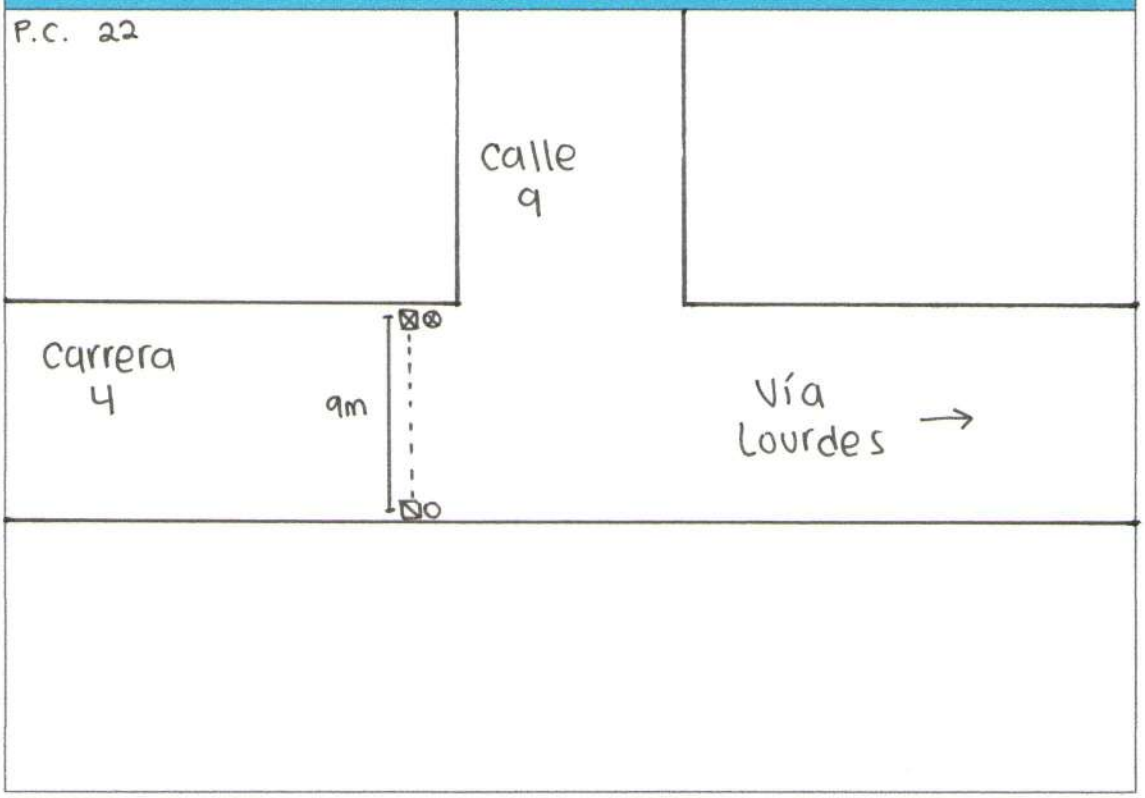

No Cámara	22
Sector / Barrio	El baño
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 32m Fibra 52m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 9m Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'27,04" N Longitud: 72°48'13,37" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria.	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
DANIEL ESTRADA	PONTAL	DANIEL ESTRADA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	El baño KDX 6 AF13, Cll 3 Cll 8 sur.

OBSERVACION
• Canalización en relleno / terreno blando • Canalización cruce de vía 7m. reconstruir. • Revisar con servicios publicos • Canalización y punto de camara en vía publica • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se translado 50m por no contar con linea electrica.

ESQUEMA

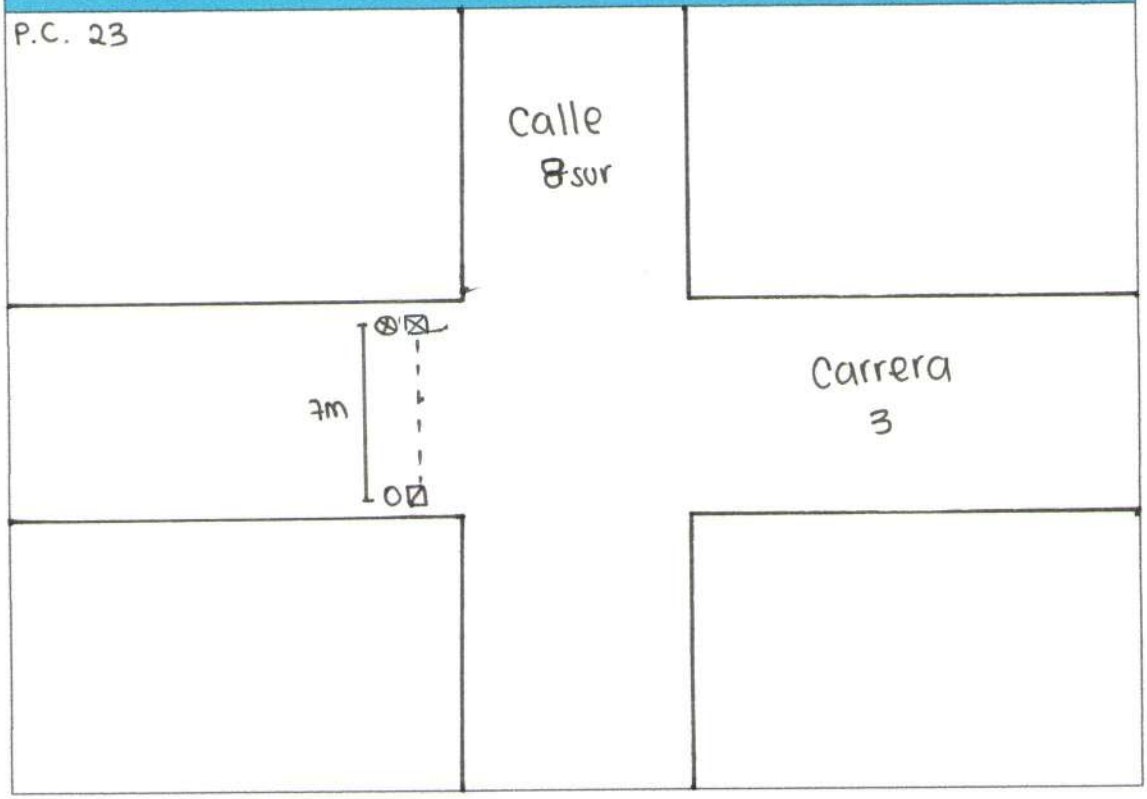

No Cámara	23
Sector / Barrio	El baho
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 30m Fibra 50m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 7m Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'26,65" N Longitud: 72°48'10,13" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. de planeación	
JANICE RESTREPO	PONAL	JANICE REPO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo /2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Calle 1 #3-10, Barrio Chicaro

OBSERVACION
• Cruce de calle 9m, reconstruir concreto. • Revisar con servicios publicos y gases del oriente. • Punto de camara en via publica. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión se translado 200m para garantizar la seguridad del colegio

ESQUEMA

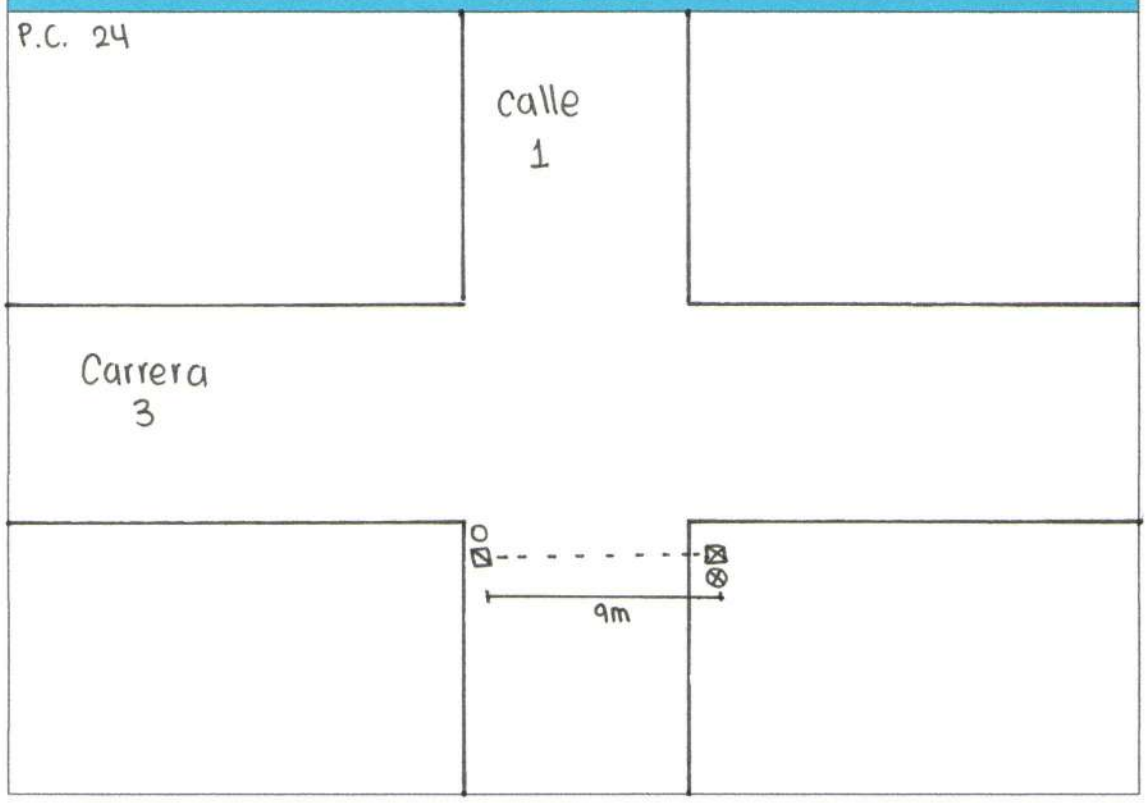

No Cámara	24
Sector / Barrio	El chicaro
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 32m Fibra 51m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 9m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8° 4'43,98" N Longitud: 72° 48' 8,61" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M Villamizar	Interventoria.	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
JONLER ESTREPO	JONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo/ 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Carrera 3 calle 3, Barrio San Martin.

OBSERVACION
• Canalización por calle en concreto de 12m. • Revisar con gases del oriente. • Canalización y punto de Camara en vía publica.

ESQUEMA

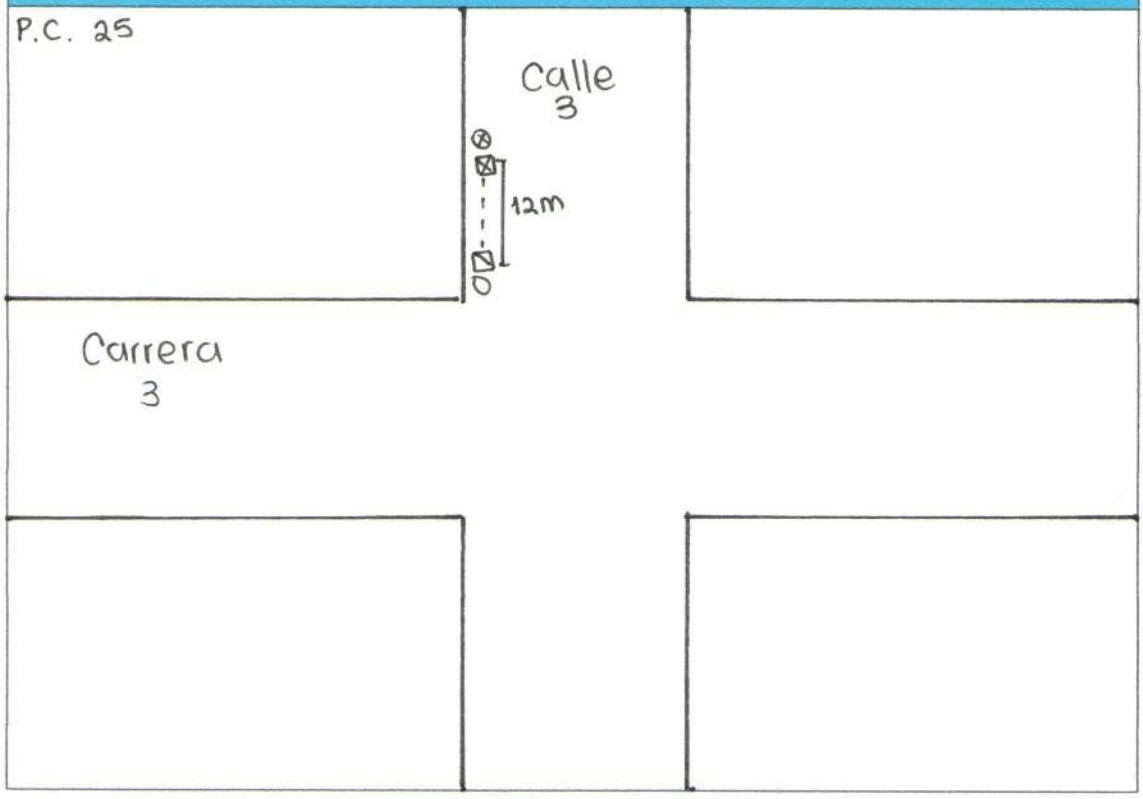

No Cámara	25
Sector / Barrio	San Martin
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 34m Fibra 54m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 12m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'49,7" N Longitud: 72°48'1,45" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeacion	
YANICA ESTRADO	PONAL	YANICA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	181 mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 1 Cll 3, Tamarindo. Cancha Botello Gomez

OBSERVACION
• Sin canalización, solo cajas • Cancha Botello Gomez • Punto de camara en via publica

ESQUEMA

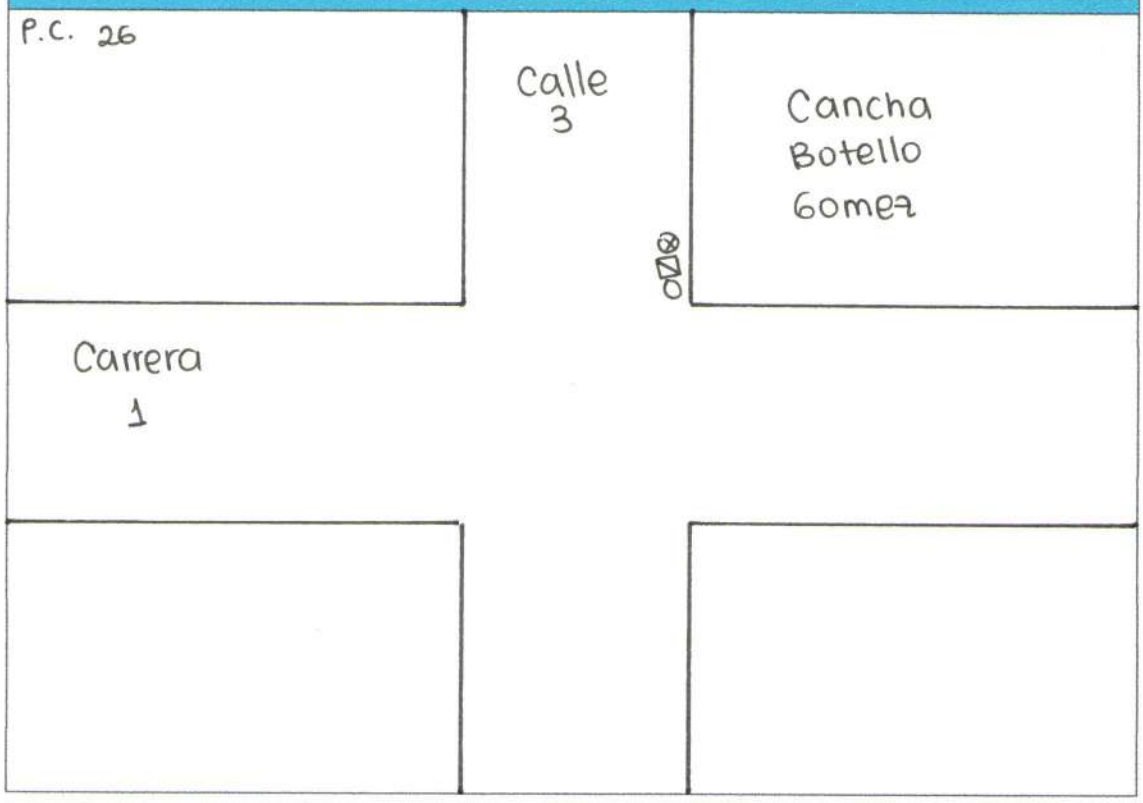

No Cámara	26
Sector / Barrio	Tamarindo
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 24 Fibra 45
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 2m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'48,54"N Longitud: 72°47'57,08"O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
[illegible] J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Seatasa de planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	DANIEL RP

NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.


LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo / 2023
Municipio	sardinata
Dirección	Cll3 Carr, Botello Gomez #1E-45

OBSERVACION

- Sin canalización
- Urbanización Botello Gomez
- Tecnicamente no fue posible realizar la conexion, se translado 100m por linea electrica abierta

ESQUEMA

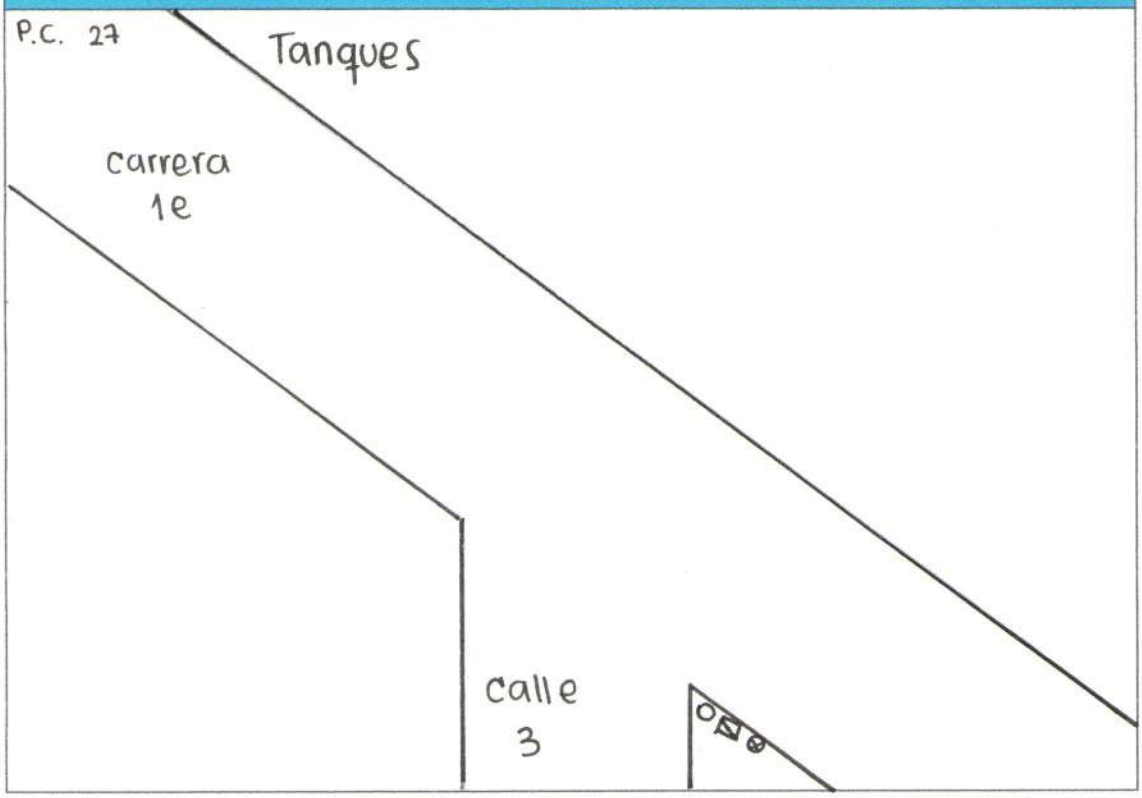

No Cámara	27
Sector / Barrio	Botello Gomez
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 32 Fibra 44m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 1m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'45,92"N Longitud: 72° 47' 51,14" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. de planeacion	
JANCA ESTRADO	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr Ø Cll 4a, Betania

OBSERVACION
•Revisar con gases del oriente • Cruce de vía en zona blanda • se debe podar arbol para punto de camara. • Verificar con servicios publicos y gases del oriente. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se Translado 100m por linea electrica abierta.

ESQUEMA

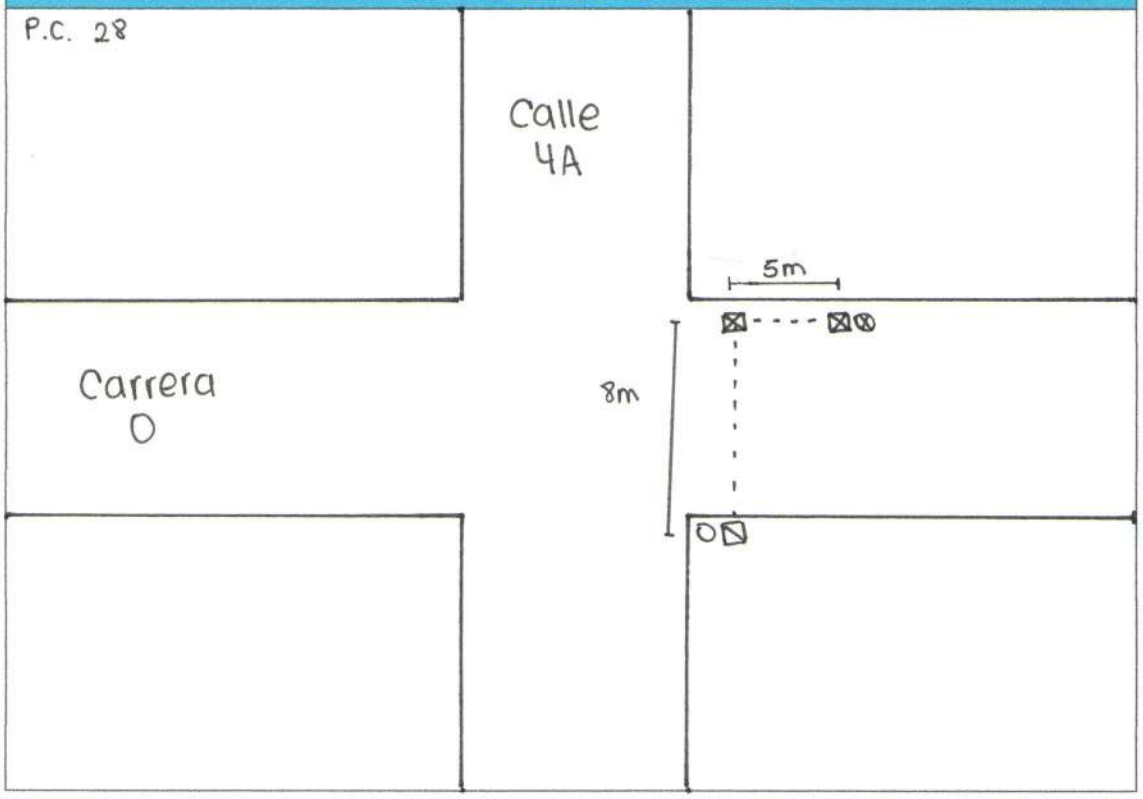

No Cámara	28
Sector / Barrio	Betania
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 34 m Fibra 55 m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 13m Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 3° 4' 48,47" N Longitud: 72° 47' 50,86" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Peña	Sec de planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	DANIEL


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 0 Cll 1 , Botello Gomez

OBSERVACION
• Se requiere canalización con cruce de vía 16m. • Reconstruir canalización en la vía. • de cruce de vía. • Verificar con servicios publicos y gases del oriente. • Reubicación estratégica, mitigación de la problematica en el Punto anterior. Translado por registrar el aumento del indice delincuencial.

ESQUEMA

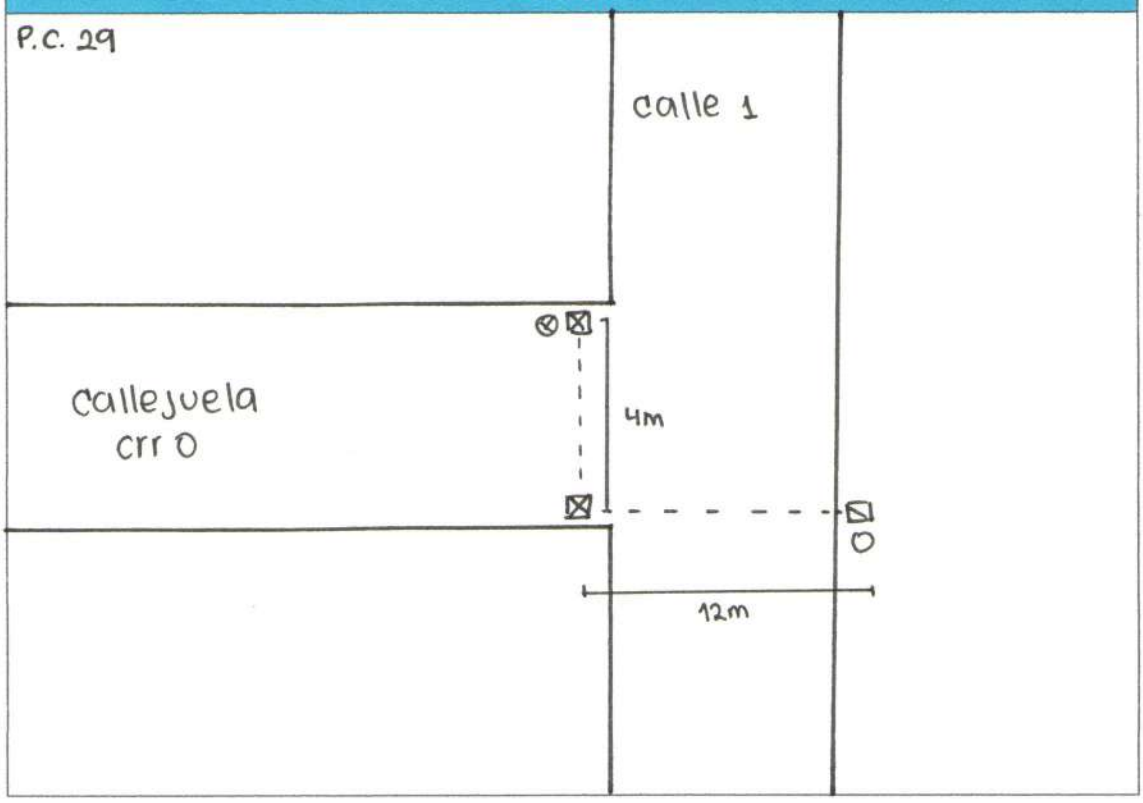

No Cámara	29
Sector / Barrio	Botello Gomez
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 37m Fibra 58m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 16m Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'42,43"N Longitud: 72°47'54,20"O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOLN DIGITAL SOLUTION	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeacion	
JANICA RESTREPO	PONAL	JANICA RP


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 I mayo I 2023
Municipio	sardinata
Dirección	Cll 5 Crr 1, Betania

OBSERVACION
• Cajas de registro sobre la vía • Canalización sobre calle 6m en cemento. • Punto de camara ubicado sobre la vía • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión. se translado 200m por no contar con espacio para instalación del punto.

ESQUEMA

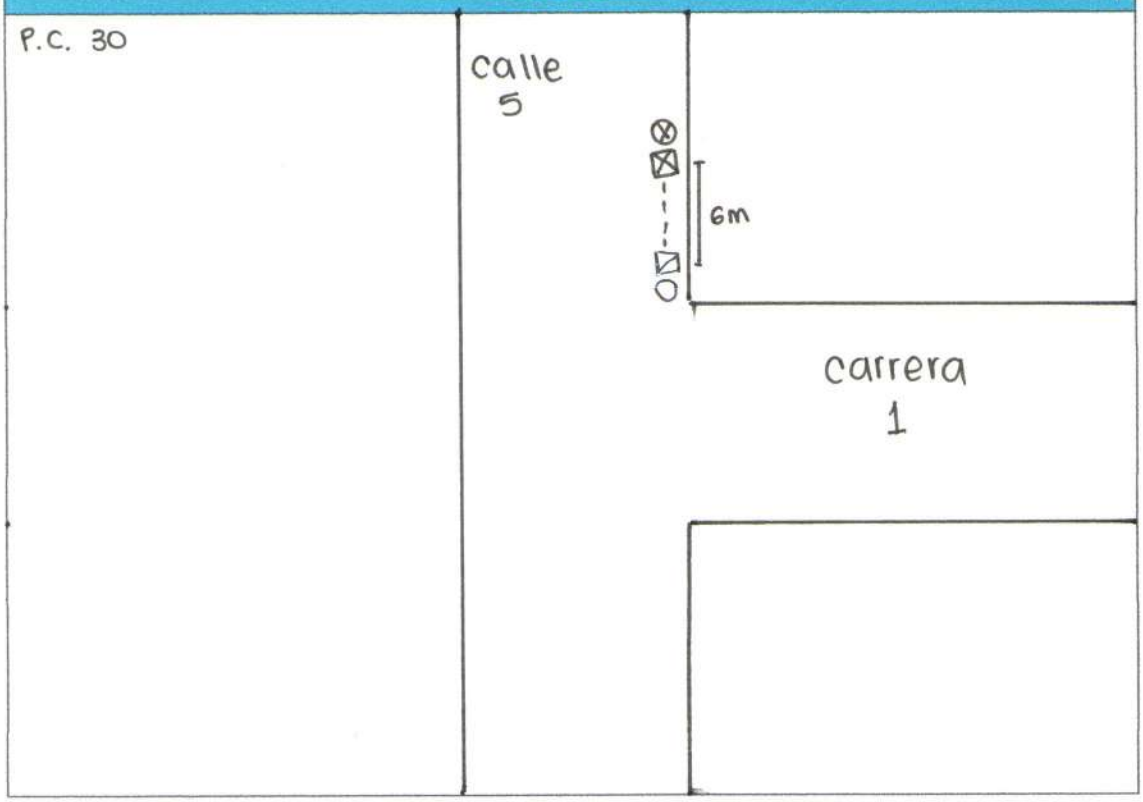

No Cámara	P.C. 30
Sector / Barrio	Betania
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida _____ Fibra_____
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 6m
Registros	60x60_1__ 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra__x__ Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'52.44" N Longitud: 72°47'55.20" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: __x__

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
JAVIER RESTREPO	PONAL	JAVIER RESTREPO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo /2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 3 Cll 5, comedor. Barrio Tamarindo

OBSERVACION
• Punto de camara sobre el anden • Reconstruir anden en concreto • canalización 10m concreto • Reubicación estrategica, mitigación de la problematica en el punto anterior. Tránslado por registrar el aumento del indice delincuencial.

ESQUEMA

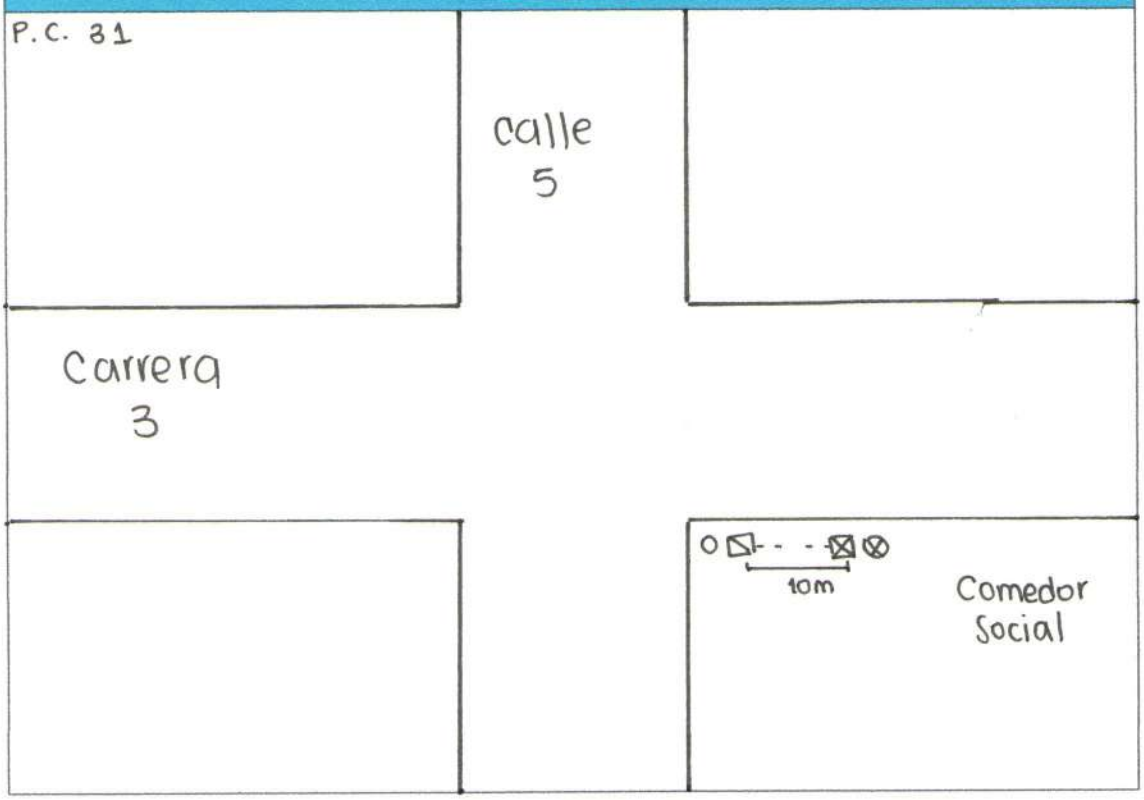

No Cámara	31
Sector / Barrio	Tamarindo
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 33m Fibra 52 m
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 10 m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace___
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'54,43"N Longitud: 72°47'59,20" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	DANIEL RP


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/mayo/2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cll 6 #4-07. Barrio Tamarindo

OBSERVACION
·Canalización tableta roja 9m ·Punto de verificación GPS ·Altura anden 40cm ·Punto de georeferenciación → Precaución ·Ubicar poste sin obstruir la entrada

ESQUEMA

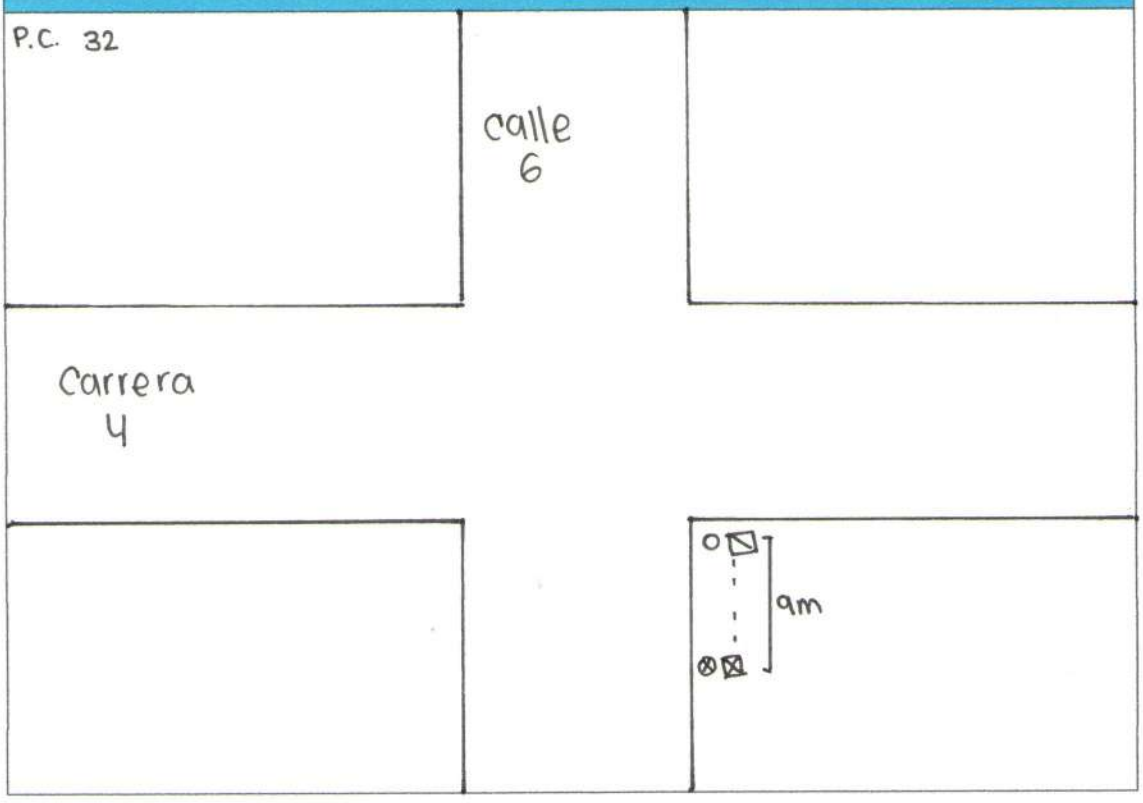

No Cámara	32
Sector / Barrio	
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 31m Fibra 51m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín9m Cemento
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'58,36" N Longitud: 72°48'0,62" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOW DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Secretaria de planeación	
JAVIER RESTREPO	PONAL	JAVIER RAO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Crr 3 cll 7, San Francisco

OBSERVACION
• Canalizacion en calle / Nivel del suelo • Reconstruir en concreto la calle 6m • Energía: Biometrico

ESQUEMA

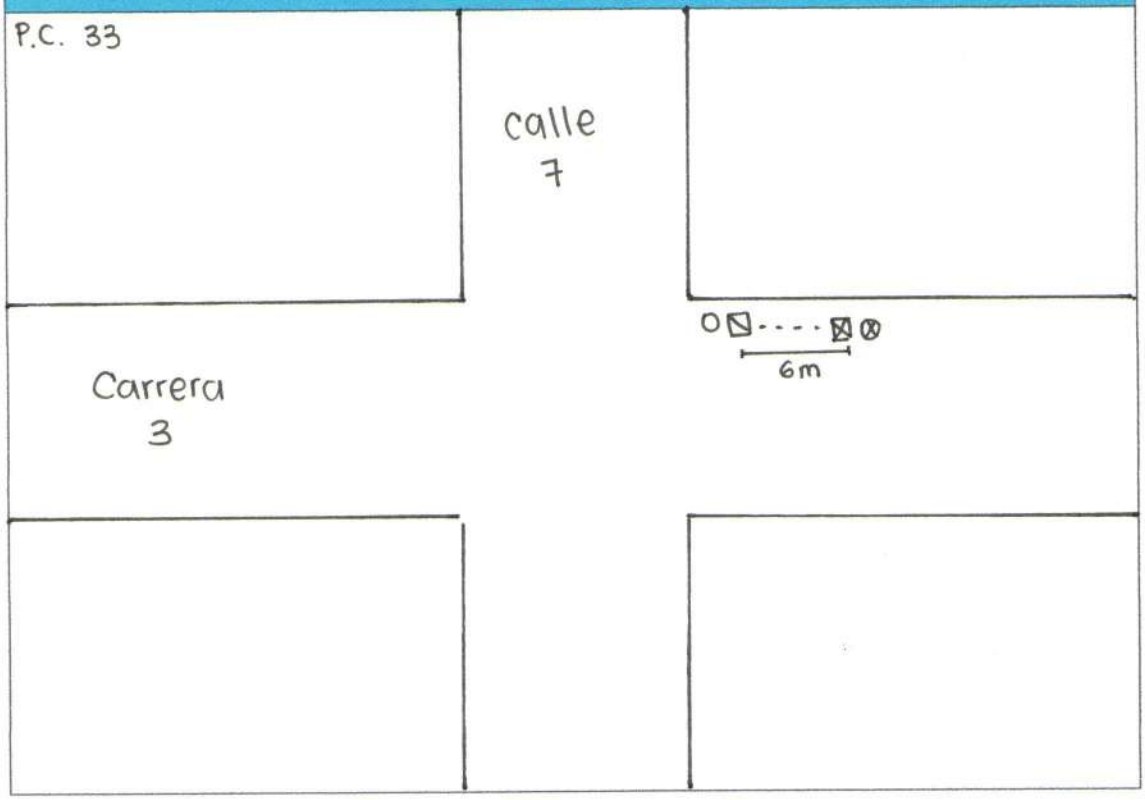

No Cámara	33
Sector / Barrio	San Francisco
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 28m Fibra 48m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 6m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°4'59,19" N Longitud: 72°47'56,72" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoría	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretaro de planeación	
PANCHO RESTREPO	PONAL	


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cll 8 Crr 5 #5-02. Barrio San Francisco

OBSERVACION
• Reconstruir anden en cemento 5m (Arbol en poste de apoyo) • canalización por Anden

ESQUEMA

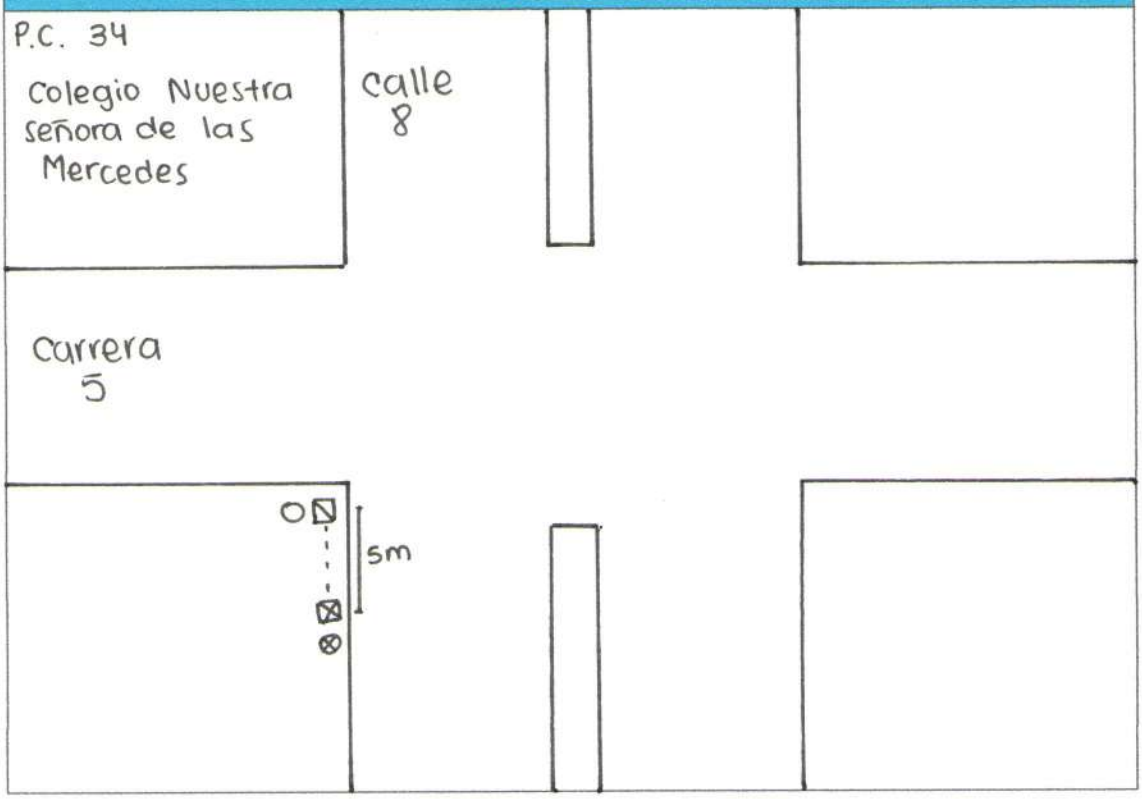

No Cámara	34
Sector / Barrio	San Francisco
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 28m Fibra 48m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 5m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace___
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'4,88" N Longitud: 72°48'1,16" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretaria de planeación	
JANICA RESTREPO	PONAL	JANICA RP


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18/ mayo /2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cll 8 Crr 2-28. San Francisco

OBSERVACION
• Cruce de calle • se debe instalar sobre calle por construcción aledaña y lineas de media tensión • Canalización en relleno 8m. • Revisar con servicios publicos y gases del oriente. • poste, canalización y vía publica

ESQUEMA

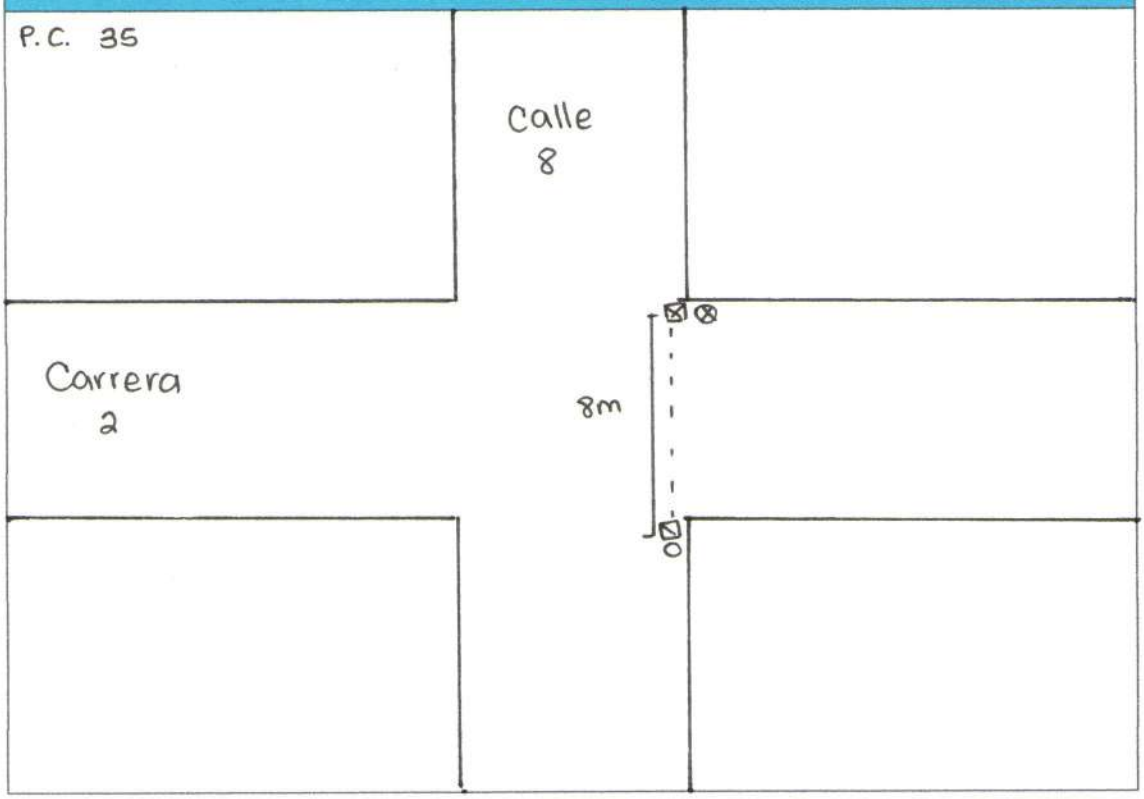

No Cámara	35
Sector / Barrio	San Francisco
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 31m Fibra 51m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 8 Asfalto __ Adoquín__ Cemento
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'1,15" N Longitud: 72°47'44,66"O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretaria de planeación	
JANIER RESTREPO	PONAL	JANIER


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Coliseo CIC, Crr 0 Cll 9

OBSERVACION
• Anden en relleno • Reubicación por lineas de medida • Canalización 7m. Terreno blando • Camara en lote no construido. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se translado 100m por encontrarse lineas de media tensión

ESQUEMA

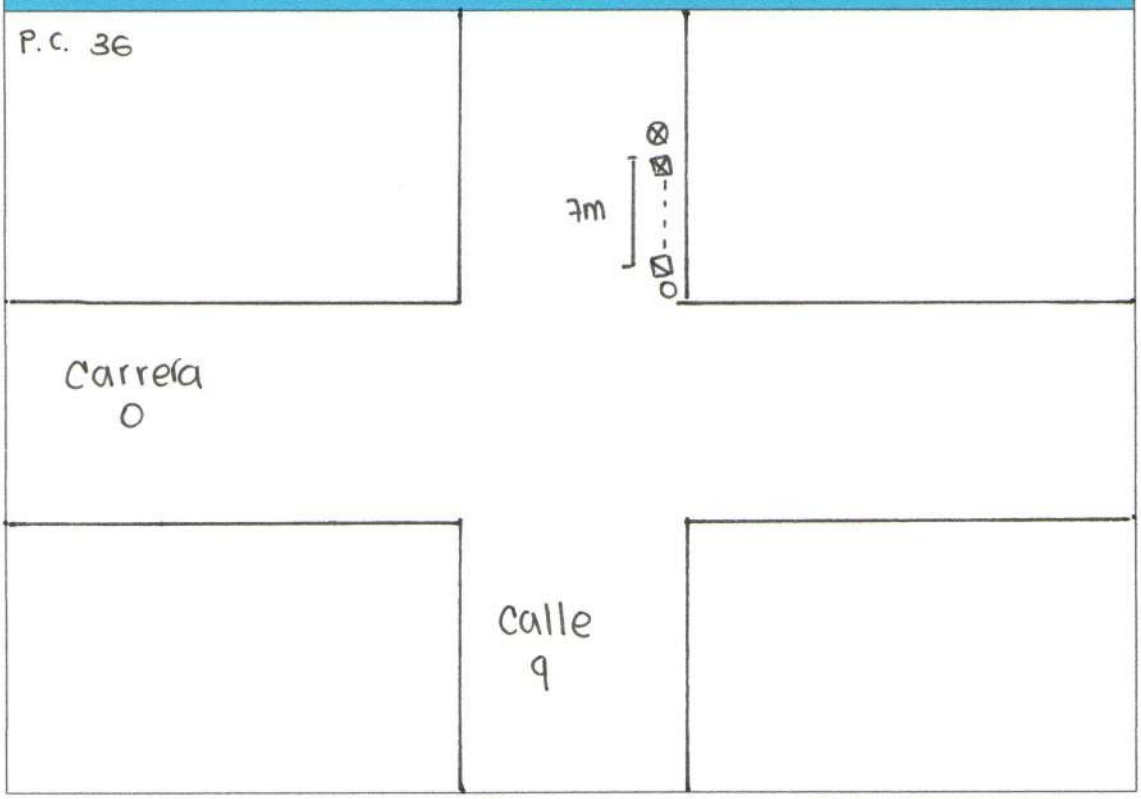

No Cámara	36
Sector / Barrio	coliseo CIC
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 29m Fibra 50m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado 3m Asfalto __ Adoquín__ Cemento
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace___
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'0,72" N Longitud: 72° 47' 44,66" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTION.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretaria de planeación	
PANCHO RESTREPO	PONAL	PANCHO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Calle 9 cra 3. San Francisco

OBSERVACION
•Canalización cruce de calle, canalización borde de anden en via publica. • se cambio de esquina por construcción de edificación • Revisar con servicios publicos y gases del oriente. • Tecnicamente no fue posible realizar la conexión, se translado 200m por no contar espacio para instalación del punto.

ESQUEMA

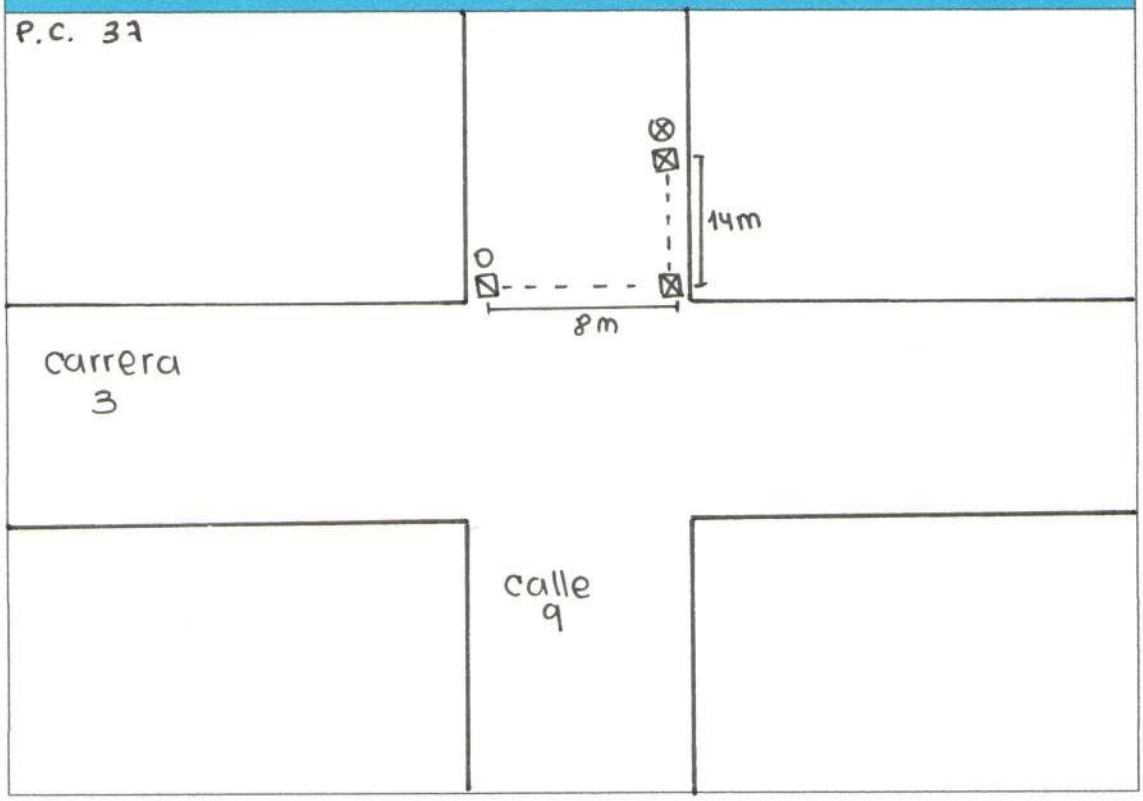

No Cámara	37
Sector / Barrio	San Francisco
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 44m Fibra 64 m
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 22m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'4,78" N Longitud: 72°47'54,14" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON JHON CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoría.	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Secretaría de planeación	
YANICE RESTREPO	PONAL	YANICE


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	sardinata
Dirección	Vista hermosa, cll 11 crr 3 ct14

OBSERVACION
• contemplar entrada a la casa planeación • conexión a poste de media, conexión en baja tensión • Cruce de calle concreto • Revisar con servicios publicos y gases del oriente

ESQUEMA

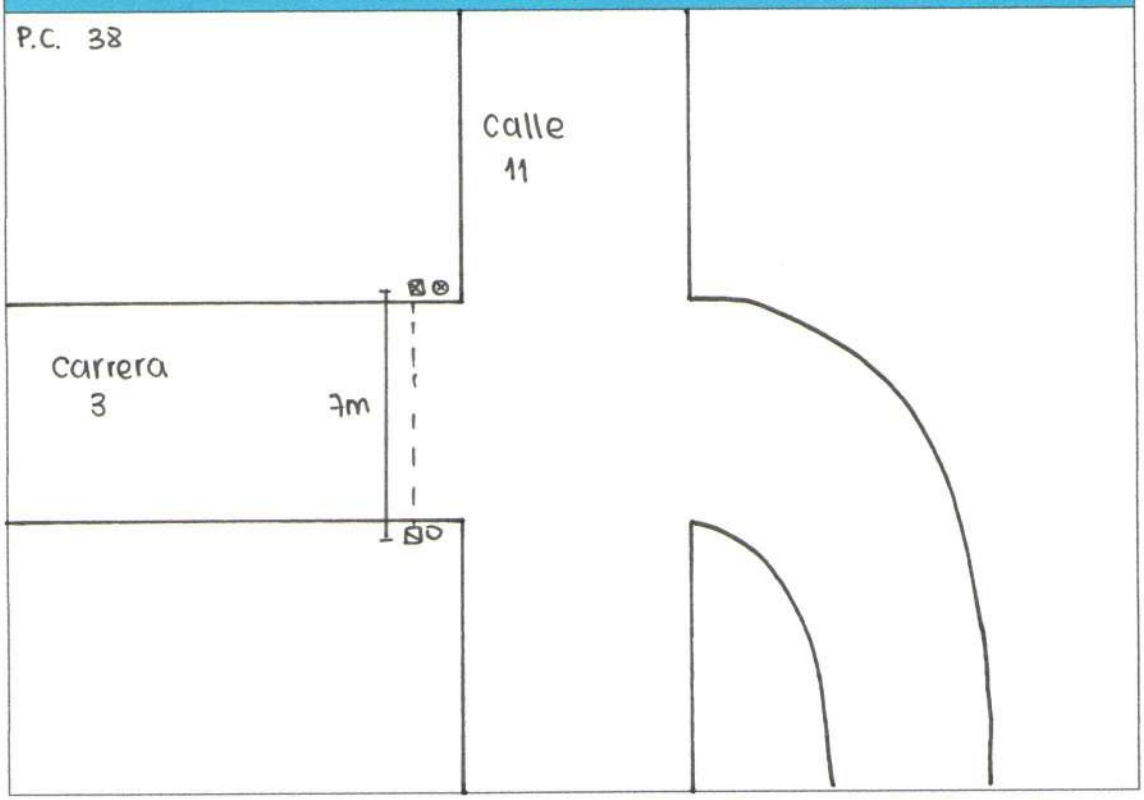

No Cámara	38
Sector / Barrio	Vista hermosa
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 28m Fibra 50m
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto__ Adoquín__ Cemento 7m
Registros	60x60 1 60x80__ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace__
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'9,84" N Longitud: 72°47'51,60" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS.	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar.	Interventoria.	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Secretario de planeación	
FANIOR RESTREPO	FONTEL	FANIOR


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	sardinata
Dirección	Crr 2 Cll 11a, lotes los Jaimes

OBSERVACION
• No se puede determinar lotes • No se puede determinar calles • 2 cruces de calle terreno blando / Relleno • Revisar con servicios publicos y gases del oriente • Punto ubicado en lotes valdios, casas en lotes valdios

ESQUEMA

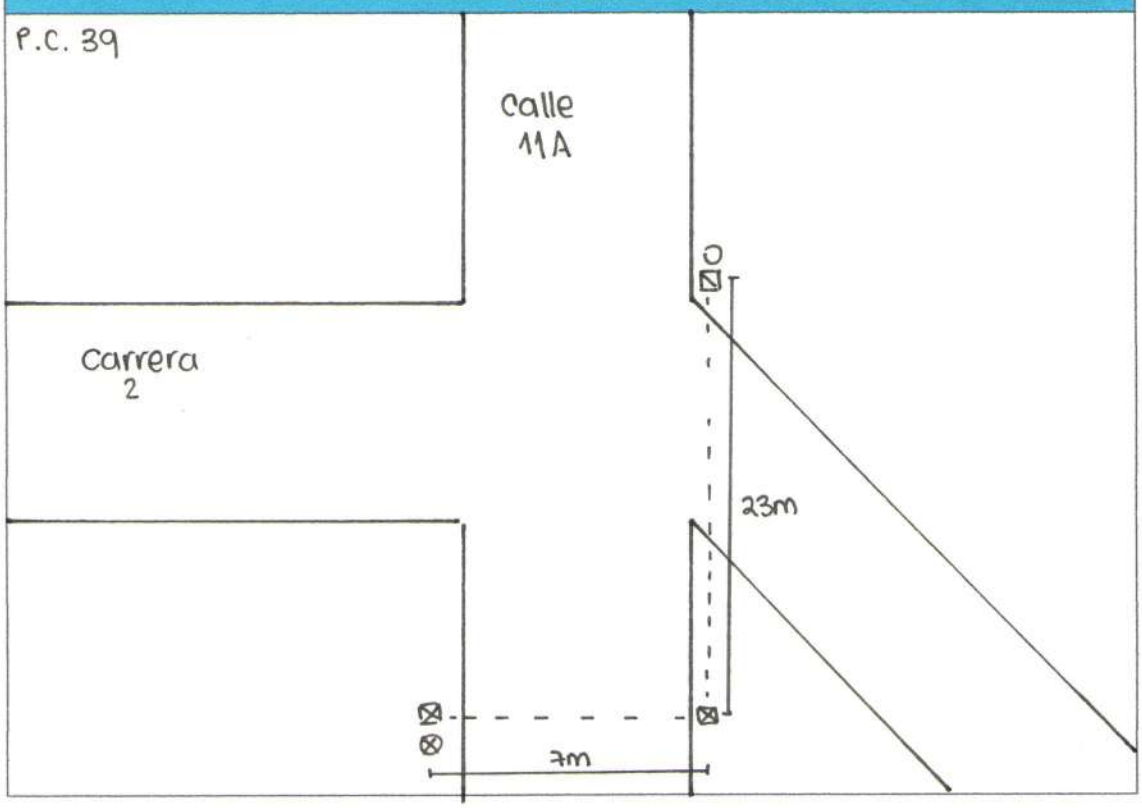

No Cámara	39
Sector / Barrio	lote Flia Jaimes
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 53m Fibra 72m
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado 30 Asfalto __ Adoquín __ Cemento
Registros	60x60 1 60x80 __ 30x30 2
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace __
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'9,36" N Longitud: 72°47'47,96" O
Infraestructura	Existente: __ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDRES J CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS.	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos Celis	Secretaria de planeación	
DANIEL RESTREPO	PONAL	DANIELRES


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	#11-62, Cll 12 KR 13. Barrio Centenario

OBSERVACION
• Canalización en calle, concreto 6m • Reconstruir calle concreto, canalización en la vía • Precausión gases del oriente • Revisar con servicios publicos

ESQUEMA

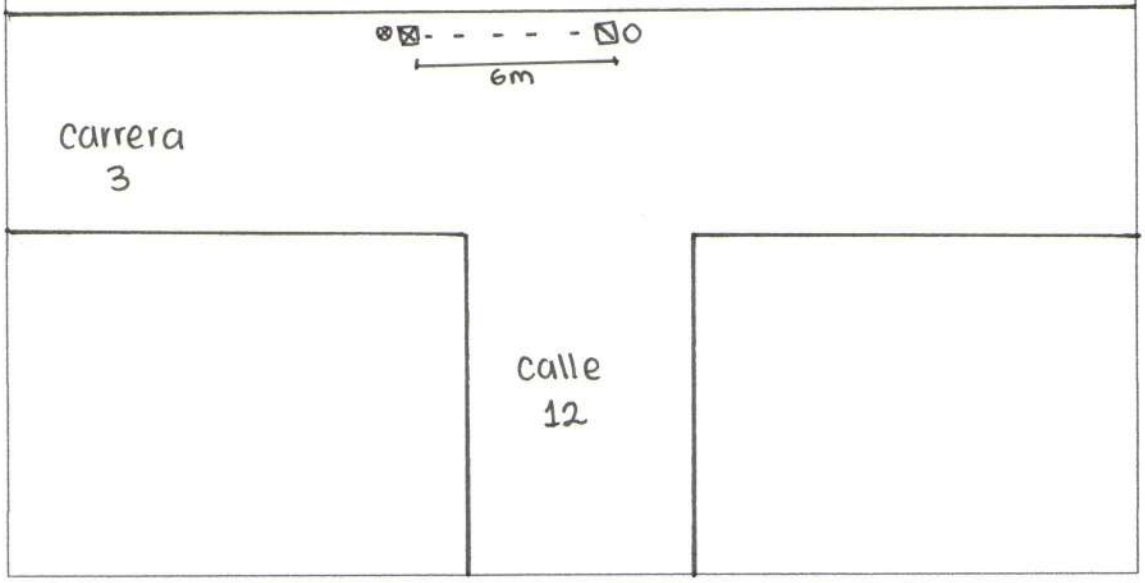

No Cámara	40
Sector / Barrio	centenario
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 29m Fibra 51m
Cantidades Cámaras fijas	2
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 6m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra X Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'16,16" N Longitud: 72°47'52,79" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M
Roberto Castellanos C.	Sec. de planeación	
VANIA CESTRODO	PONAL	VANIA


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	Sardinata
Dirección	Cra 5 Cll 11, Centenario

OBSERVACION
• Se reubica punto por fachada y lineas electricas • Instalación en anden alto junto al poste de apoyo

ESQUEMA

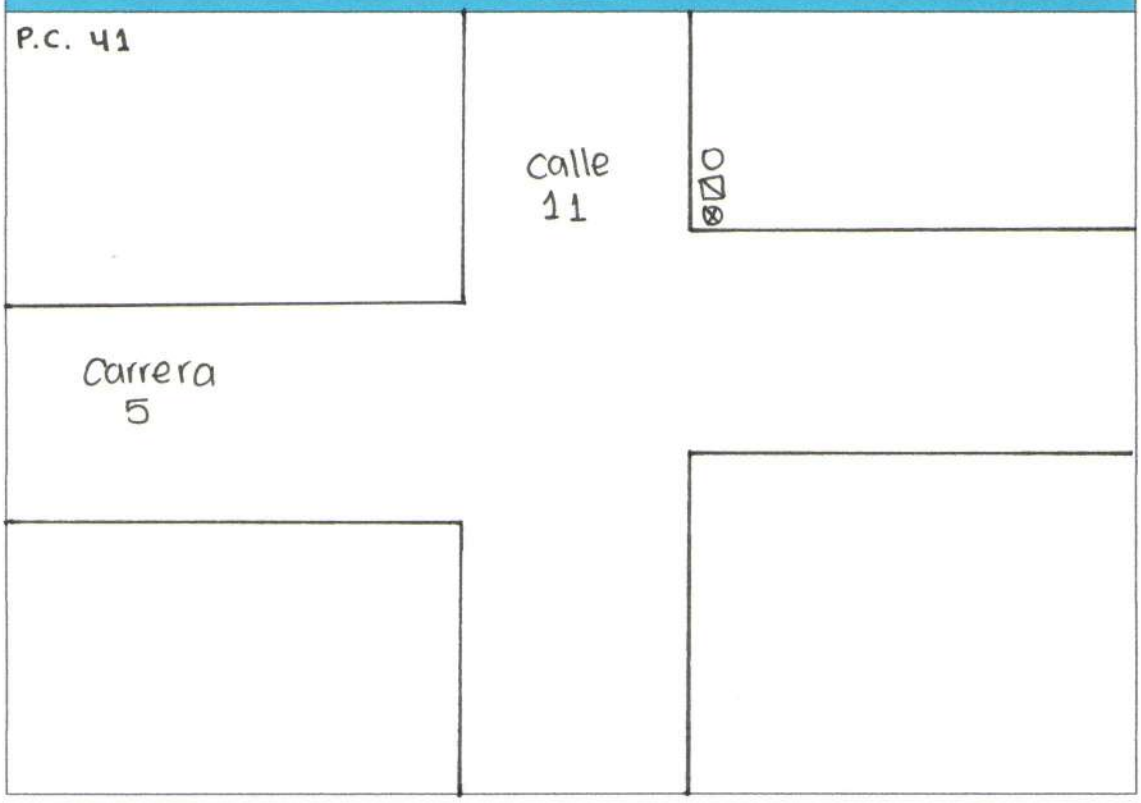

No Cámara	41
Sector / Barrio	centenario
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 22 Fibra 44
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 3m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'13,50" N Longitud: 72°47'56,32" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: x

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos Celis	Sec. de planeación	
JANICA RESTREPO	PONAL	JANICA RESTREPO


NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.

LEVANTAMIENTO PUNTOS DE CÁMARA

Fecha	18 / mayo / 2023
Municipio	sardinata
Dirección	Crr 5a Cll 11a, centenario

OBSERVACION
• Punto camara 42 • Poste apoyo en anden alto, se debe canalizar en vía y caja ubicada en vía publica. • canalización cruce de calle 7m • Verificación con servicios publicos y gases del oriente. • Punto de camara en espacio Publico • Reponer adoquin cemento de parque.

ESQUEMA

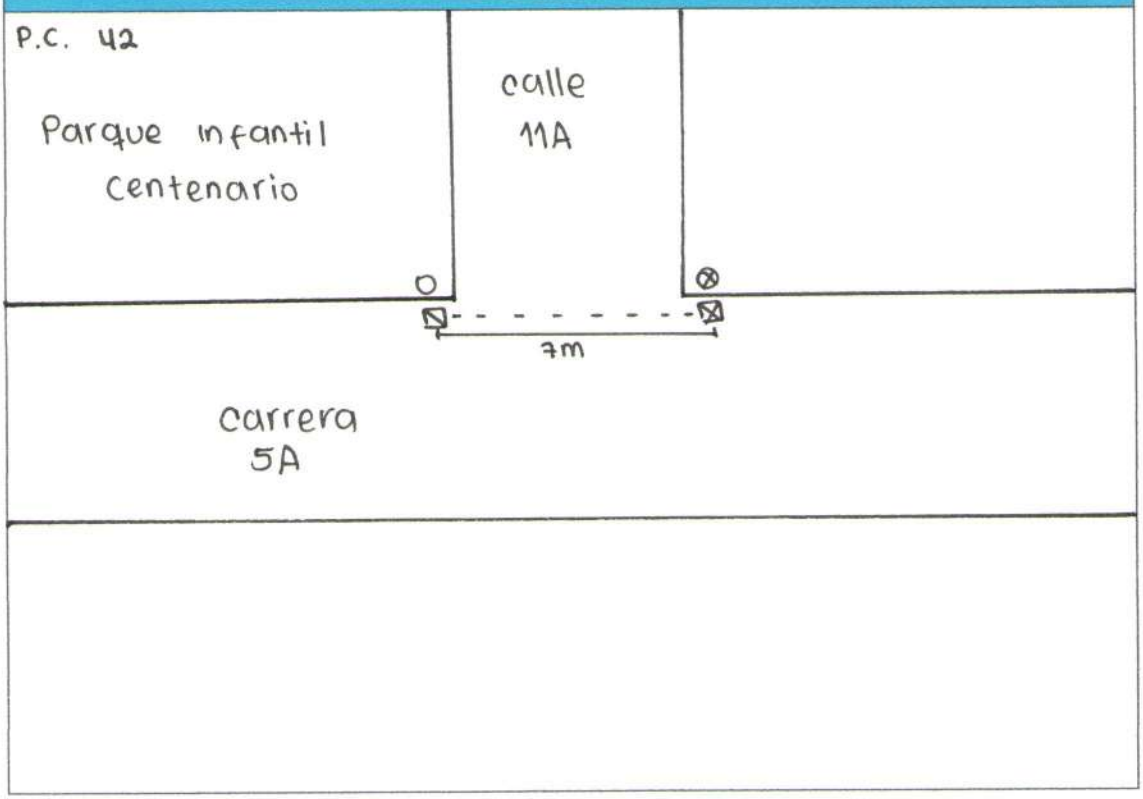

No Cámara	PC. 42
Sector / Barrio	Centenario
Acometida Eléctrica y Fibra armada (M/L)	Acometida 29m Fibra 50m
Cantidades Cámaras fijas	
Canalización (M/L)	Prado__ Asfalto __ Adoquín__ Cemento 7m
Registros	60x60 1 60x80___ 30x30 1
Tipo de Conectividad	Fibra x Radio enlace____
Punto de Repetición	
Coordenadas Geográficas	Latitud 8°5'15,62" N Longitud: 72°47'57,85" O
Infraestructura	Existente: ___ Nueva: X

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ANDERSON J. CONTRERAS	NETKOM DIGITAL SOLUTIONS	
Jorge M. Villamizar	Interventoria	Jorge M.
Roberto Castellanos C.	Sec. de planeación	
PANIA RESTREPO	PONAL	PANIAGUA

NOTA: Para la ubicación del poste del punto de cámara, registros y canalización tener en cuenta que la locación no evidencie los siguientes riesgos: Riesgo Eléctrico, Riesgo civil., Patrimonio nacional, Riesgo normativo, Permisos adicionales, Vías nacionales y concesiones, Riesgos ambientales, Replanteo de fibra, Futuras ampliaciones de calles.
