MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

VALOR APORTE FONSECON	$ 4.746.387.467,00	CUENTA (AHORROS) No.	**83200003693**	DEL BANCO:	**BANCOLOMBIA**
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 527.376.385,00				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 5.273.763.852,00**				

GIROS REALIZADOS POR FONSECON - MUNICIPIO CUENTA CUENTA DE AHORROS DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO - FONSECON	10/2/2023	$ 1.898.554.987,00
TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SARDINATA - PAGO INTERV	7/7/2023	$ 135.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		$ 0,00
QUINTO DESEMBOLSO		$ 0,00
TOTAL GIRADO		**$ 2.033.554.987,00**

CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VR CONTRATO INICIAL	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR CONTRATO
LP-001-155-2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	$ 4.746.387.467,00	APORTE FONSECON	$ 4.746.387.467,00
LP-001-155-2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	$ 197.137.465,00	APORTE MUNICIPIO	$ 197.137.465,00
CM-003-150-2023	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	$ 330.238.920,00	APORTE MUNICIPIO	$ 330.238.920,00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 5.273.763.852,00**

INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No. LP-001-155-2023		**CONTRATO No. CM-003-150-2023**	
CONTRATISTA	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	**CONTRATISTA**	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
NIT No.	900.808.866-5	**NIT. No.**	60.373.700-6
REP. LEGAL	RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**REP. LEGAL**	NO APLICA
DOC. IDENTID	88.269.550	**DOC. IDENTID**	60.373.700
EMAIL	proyectos@netkoln.com	**EMAIL**	interventoriacamarasseguridads@gmail.com
TELEFONO	3138727052	**TELEFONO**	3203435946
DIRECCIÓN	Calle 3 # 11E-38 B. Quinta Oriental - Cúcuta	**DIRECCIÓN**	AV DEMETRIO MENDOZA, CENTRO COMERCIAL BOLIVAR BLOQUE A, OFICINA A10
DISPONIBLIDA	CDP-0223002 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023	**DISPONIBLIDAD**	CDP-0223003 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO	No LP-001-155-2023	**CONTRATO**	No. CM-003-150-2023
REGISTRO PPT	RP-0420008 DEL 20 DE ABRIL DE 2023	**REGISTRO PPT**	RP-0413011 DEL 13 DE ABRIL DE 2023
POLIZAS	DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 49-44-101030358 - SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZAS**	DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 21-44-101410191 - SEGUROS DEL ESTADO
APROB POLIZ	27 DE ABRIL DE 2023	**APROB POLIZ**	27 DE ABRIL DE 2023
ACTA INICIO	28 DE ABRIL DE 2023	**ACTA INICIO**	28 DE ABRIL DE 2023

MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

EJECUCIÓN DE LOS CONSTRATOS DERIVADOS

1. REALIZACIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON TRES COMITES TÉCNICOS DURANTE LOS DÍAS 6 y 13 DE JULIO DE 2023.

2. EJECUCIÓN EN TIEMPO CONTRATOS DERIVADOS

CON CORTE A LA FECHA EL CONTRATISTA LLEVA UN AVANCE DEL 40%.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023

LA INTERVENTORIA APROBÓ EN SU TOTALIDAD LA LISTA DE ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO SIES CCTV - FASE I.

EL MUNICIPIO DE SARDINATA, ENTREGO EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO SIES CCTV - FASE I AL MINISTERIO DEL INTERIOR.

EL 31 DE JULIO DE 2023, SE REALIZÓ ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 2318-2022, CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE SARDINATA, ESTA REUNIÓN SE DIO COMO MEDIDA DE ALERTA POR INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO.

EL MUNICIPIO REALIZO MESA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA EXTERNA A FIN DE REVISAR CRONOGRAMA DE CHOQUE PARA PRESENTAR AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMO MEDIDA PREVENTIVA, SE HABLÓ DE PRESENTAR UNA PRÓRROGA AL CONVENIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	CUENTA BANCARIA	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO FINAL	PAGOS SEGÚN ACTA	VALOR DEL PAGO			OBSERVACIONES
							CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	APORTE RECURSOS	
LP-001-155-2023	ANTICIPO	CE 001327 - 09-06-23				$ 960.000.000,00	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	9/6/2023	FONSECON	
		CE 001328 - 09-06-23				$ 938.554.987,00		9/6/2023	FONSECON	
CM-003-150-2023	PARCIAL 1	CE 001627 - 07-07-23				$ 103.258.268,00	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	7/7/2023	MUNICIPIO	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
31/12/2022	$ 0,00	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/12/22
31/1/2023	$ 0,11	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/01/23
20/2/2023	$ 640.516,91	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 28/02/23
31/3/2023	$ 1.045.517,69	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/03/23
30/4/2023	$ 1.012.339,33	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 30/04/23
31/5/2023	$ 1.046.649,66	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/05/23
30/6/2023	$ 181.880,81	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 30/06/23
31/7/2023	$ 2.473,82	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/07/23
TOTAL	**$ 3.929.378,33**	

MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

RESUMEN BALANCE FINANCIERO

TOTAL SALDO ANTERIOR	**$ 3.911.593,51**
(1) VALOR EJECUTADO CON RECURSOS DE FONSECON	
(2) VALOR EJECUTADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO	**-$ 103.258.268,00**
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 2.473,82
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0,00
COMISIONES Y ABONOS	$ 134.995.991,85
(3) SALDO EN LA CUENTA CON CORTE AL MES	**$ 35.651.791,18**

OBSERVACIONES:

EN EL ANEXO No. 1 SE ADJUNTA EL EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Ing. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
SUPERVISOR DESIGNADO
MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 01. EXTRACTO BANCARIO MES JULIO DE 2023

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83200003693

SUCURSAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SEGURIDAD CIUDADANA-CAMARAS DE SEGURIDAD

CL 6 6 55

SARDINATA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,911,593.51	*SALDO PROMEDIO*	$	29,506,637
TOTAL ABONOS	$	135,002,473.82	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	103,262,276.15	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,473.82
SALDO ACTUAL	$	35,651,791.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			32.10	3,911,625.61
7/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			135,000,000.00	138,911,625.61
7/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,368.19	138,908,257.42
7/07	PAGO A PROVE ZULAY YADIRA VA			-103,258,268.00	35,649,989.42
7/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-639.96	35,649,349.46
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,441.72	35,651,791.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 02. INFORME DEL MES DE JULIO DE 2023 DE INTERVENTORÍA.

INFORME DE INTERVENTORIA MENSUAL No. 03

PERIODO: DEL (01) DE (JULIO) DE (2023) AL (31) DE (JULIO) DE (2023)

CONTRATO No. LP 001-155-2023

CONTRATISTA: NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-003-150-2023

CONTRATISTA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

OBJETO: En cumplimiento de las funciones adquiridas en el contrato de interventoría N° CM-003-150-2023, **INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.**

SUPERVISOR: ING. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS

SARDINATA, (JULIO) DEL 2023

CONTENIDO

INTRODUCCION.....3

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES.....6

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN.....6
1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO.....6

2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO.....7

2.1 DESCRIPCION GENERAL.....7
2.2 LOCALIZACION.....7
2.3 ALCANCE.....9
2.4 REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO.....9

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....10

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....10
3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA.....10
3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO.....11
3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN.....11
3.2.2 AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS.....12
3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES.....13
3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS.....13
3.4.1 MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO.....**¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.4.2 COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.....**¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS.....11
3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....14
3.7 BITACORA DIARIA DE OBRA.....17
3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA.....17
3.8.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.....17

3.8.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA 18
3.8.3 ACTAS Y REUNIONES SUSCRITAS POR LA VEEDURÍA CIUDADANA..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 18
3.9.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 18
3.9.2 PERSONAL OPERATIVO 18
3.9.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 19
3.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL..... 19
3.10.1 DOTACIÓN DEL PERSONAL..... 20
3.10.2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA..... 20
3.10.3 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA..... 20
3.10.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 20
3.11 PERMISOS Y LICENCIAS..... 21
3.11.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN U OTRO TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA..... 21
3.11.2 LICENCIA O PERMISOS AMBIENTALES 21
3.11.3 LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 21
3.11.4 OTROS PERMISOS REQUERIDOS..... 21
3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA..... 21
3.13 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y/O DE SEÑALIZACION23

4 ASPECTOS TECNICOS 23

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES..... 23
4.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA..... 25
4.3 AVANCE DE LA OBRA 25
4.3.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL..... 26
4.4 PROGRAMACION DE LA OBRA 27
4.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA..... 28
4.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 28
4.7 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 32

5 ASPECTOS FINANCIEROS 32

5.1 MANEJO DEL ANTICIPO 32
5.1.1 APERTURA DE CUENTA BANCARIA O ENCARGO FIDUCIARIO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5.1.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
5.1.3 CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
5.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

6 ASPECTOS AMBIENTALES 33

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 33
6.2 SEGUIMIENTO AL PMA O PAGA ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

7 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 33

8 CONCLUSIONES 33

9 ANEXOS 34

INTRODUCCION

El contrato N° LP 001-155-2023 cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.

El contrato N° CM-150-2023, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ ejecuta el CONTRATO N° CM-150-2023, el cual ha venido desarrollando actividades de Interventoría en el área técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato.

En el presente informe se detalla el seguimiento técnico, administrativo, financiera, ambiental, jurídica y de seguridad y salud en el trabajo realizado por la interventoría externa a la ejecución del contrato **No. LP 001-155-2023**, destacando el avance logrado a la fecha e identificando las fortalezas y debilidades observadas en la ejecución del proyecto.

En este documento, se encontrará información general, se describen las actividades ejecutadas dentro del marco contractual del contrato en mención, firmado y legalizado con pólizas que amparan la ejecución de los trabajos, avance de actividades entre el 01 de Julio y el 31 de julio del 2023, durante el periodo se realizaron actividades relacionadas con REVISION, AJUSTES Y ENTREGA A ESTUDIOS Y DISEÑOS, en el cual se trabajó con el equipo técnico requerido en los pliegos del contrato y de interventoría, realizando visita a terreno.

Se realizó un avance físico del 40%, periodo del 01/07/2023 AL 31/07/2023.

Se tiene un avance en acumulado del 40%, obteniéndose un avance financiero acumulado de $1.977.409.973 según anticipo.

1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

La alcaldia del municipio de sardinata adelanto el proceso de contratación No. LP 001-2023, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO", de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, art. 13 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 18 de la ley 80 de 1993 y demás normatividad concordante, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité estructurador y verificador (componente Jurídico-Técnico y Financiero). Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S representante Legal RAFAEL PABON LOPEZ, mediante ACEPTACION de la invitación del diecinueve (19) de abril de 2023.

1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación *(No.001 del 19/abril/2023),* se procedió a la suscripción del contrato **No. LP 001-155-2023** entre el señor Municipio de Sardinata y la firma contratista NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S representada por RAFAEL PABON LOPEZ, el cual tiene por objeto "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO"*),* con un plazo de ejecución de *5 meses* y un valor de $ *4.943.524.932.*

2. ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

En el municipio de Sardinata con la implementación del circuito cerrado de televisión se busca disminuir los índices de violencia e inseguridad que son los que dieron sustento para poder considerar la implementación de este proyecto de gran envergadura que será de apoyo para la policía en los diferentes puntos del municipio donde serán instaladas las cámaras de vigilancia.

Para lo cual se presenta la alternativa de "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO".

2.2 LOCALIZACION

El Municipio de Sardinata, se ubica al norte del departamento Norte de Santander aproximadamente a 70 Kms de la capital de San José de Cúcuta, geográficamente está ubicado sobre la cordillera oriental del país, en las coordinadas: longitud oeste de Greenwich 72°48'17" y latitud norte 8° 5' 09, con una superficie de 1.451,17 km2.

Sardinata limita al norte con los municipios de Hacarí y Tibú, al sur con los municipios de El Zulia, gramalote y Lourdes; al oriente con los municipios de El Zulia y Tibú y al occidente con los municipios de Abrego, Bucarasica y Hacarí.

Este municipio está conformado por cinco corregimientos: Luis Veros, La Mercedes, San Martin de loba, La victoria, El Carmen y la zona centro que ampara 22 veredas aledañas al casco urbano, la altura promedio es de 300 metros sobre nivel del mar con una temperatura promedio de 28 grados Celsius.



Figura 1. Localización general del Municipio de Sardinata. Fuente Google Earth



Figura 2. Localización Puntos de Camaras del Municipio de Sardinata. Fuente Google Earth

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolívar Bloque A Oficina A10
Telf.: 5956455 Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

SCAN ME

2.3 ALCANCE

El alcance del objeto consiste en la instalación de cuarenta y dos (42) cámara PTZ y 84 Cámaras Fijas de seguridad con analítica de reconocimiento facial los cuales serán instalados dentro del casco urbano del Municipio de Sardinata, conectadas a un Centro de Control y Monitoreo (CCM) con fibra óptica y operadas directamente por la Policía Nacional, Sistema que contara con todo el soporte eléctrico acompañado de una planta eléctrica de 20 KVA.

2.4 REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO

Una vez iniciado el contrato con fecha del 28 de abril de 2023, se realizó la revisión del proyecto entregado por la entidad, iniciando la etapa de ajuste a estudios y diseños, por parte del contratista y posterior entrega de documentos, planos, memorias de cálculo, A.P.U y el presupuesto definitivo, determinando el alcance definitivo del proyecto.

Una vez iniciada la etapa de diseños y estudios el contratista hace entrega parcial No. 1 el día 15 junio de 2023. Se recibió una segunda entrega parcial 26 junio de 2023 y Entrega final el día 12 de julio de 2023, Sujeta a observaciones.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE SARDINATA
INTERVENTOR EXTERNO:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
SUPERVISOR:	ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
CONTRATO No:	CM-003-150-2023 de fecha 13 DE ABRIL DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.
CONTRATISTA:	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S
NIT. No:	900.808.866-5
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL PABON LOPEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. No. 88.269.550
VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.943.524.932
PLAZO CONTRACTUAL:	CINCO (05) MESES
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 1.977.409.972,8
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. CD 0223002 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. RP 0420008 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023
FECHA INICIO:	28/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/09/2023
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
DIAS TRANSCURRIDOS:	94 DIAS

3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES en el Contrato No. LP 001-155-2023, se suscribe con la compañía de seguros el estado S.A, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA DECIMA del Contrato así:

3.2.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 26/04/2023 por la aseguradora seguros el estado S.A, tomadas por NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS y como beneficiario MUNICIPIO DE SARDINATA y MINISTERIO DEL INTERIOR. Dichas pólizas fueron aprobadas por el alcalde Municipal HERMIDES MONCADA OSORIO y el secretario de Planeación ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS, mediante certificación firmada por la el 27/04/2023.

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de servicios y suministros No. LP 001-155-2023

CUMPLIMIENTO.								
Anexo	**FECHA EXPEDICION**	**NOMBRE / TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	**OBSERVACIONES**
0	26/04/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101030358	$494.352.493.20	20-04/2023	20/01/2024	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 27/04/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 1.977.409.972.80	20/04/2023	20/09/2023	
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			$ 988.704.986.40	SI AMPARA	2 AÑOS	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 1.731.245.803,50	23/12/2021	23/02/2023	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.								
Anexo	**FECHA EXPEDICION**	**NOMBRE / TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	**OBSERVACIONES**

CUMPLIMIENTO.								
Anexo	**FECHA EXPEDICION**	**NOMBRE / TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	**OBSERVACIONES**
0	26/04/2023	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	49-40-101009669	$ 988.704.986,40	20/04/2023	20/09/2023	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 27/04/2023

3.2.2 Ampliaciones a las pólizas

Sin modificaciones al presente informe.

3.2.3 Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 28/04/2023 por la aseguradora seguros el estado S.A.

Tabla 2. Pólizas Inicio del contrato No. LP 001-155-2023, ampliadas según acta de inicio de fecha 28/04/2023.

CUMPLIMIENTO.								
Anexo	**FECHA EXPEDICION**	**NOMBRE / TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	**OBSERVACIONES**
0	30/05/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101030358	$494.352.493.20	28/04/2023	28/01/2024	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 27/04/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 1.977.409.972.80	28/04/2023	28/09/2023	
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			$ 988.704.986.40	SI AMPARA	2 AÑOS	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 1.731.245.803,50	28/04/2023	28/09/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.								
Anexo	**FECHA EXPEDICION**	**NOMBRE / TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	**OBSERVACIONES**

CUMPLIMIENTO.								
Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	30/05/2023	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	49-40-101009669	$ 988.704.986,40	28/04/2023	28/09/2023	

3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe no se han impuesto multas o sanciones al contratista.

3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 3. Actos Administrativos contrato de obra No. LP 001-155-2023

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
28/04/2023	Acta de inicio	*Una vez se realizó la legalización del contrato se procedió a realizar acta de inicio.*	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S. R/L RAFAEL PABON* *ROBERTO A CASTELLANOS CELIS* *SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL* *SUPERVISOR DESIGNADO* *ING.ZULAY VASQUEZ PINO* *INTERVENTORIA EXTERNA*

ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités técnicos desarrollados entre las partes:

Tabla 4. Relación de Comité Técnicos del Contrato de Obra No. **LP 001-155-2023**

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
08/06/2023	1	Avance de estudios y diseños	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS
15/06/2023	2	Compromisos de reunión anterior Y avances de estudios y diseños Entrega de información en drive	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS
29/06/2023	3	Entrega de información de estudios y diseños en el drive compartido por el contratista	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR
06/07/2023	4	Revisión de Estudios y diseños Cierre de CENS Cronograma de Actividades	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS
13/07/2023	5	Observaciones Estudios y diseños Contratista envía documentación del personal Se recuerda reunión el día 28/07/2023 en Bogotá.	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS

En el **ANEXO 1** se presenta copia de actas de comité para el periodo del acta parcial.

3.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS

Tabla 5. Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato No. LP 001-155-2023

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
05/05/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*SOLICITUD DOCUMENTACION INICIO DE LABORALES DEL CONTRATO LP-001-2023*
19/05/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*OBSERVACIONES AL DOCUMENTO ENTREGADO EL 18/05/2023*
26/05/20231	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*OBSERVACIONES AL PLAN DE INVERSION CONTRATO LP-001-155-2023*
06/06/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*DESIGNACION DE PERSONAL AUTORIZADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA*
20/06/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*SOLICITUD DE DOCUMENTACION INICIO DE LABORES DEL CONTRATO LP-001-155-2023*
22/06/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*SOLICITUD DE DOCUMENTACION INICIO DE LABORES DEL CONTRATO LP-001-155-2023*
04/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*SOLICITUD DE FACTURACION DE PROFORMAS*
04/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.*
10/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS*
11/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE MAYO*
14/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*Respuesta a informe del mes de mayo.*
18/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS*
19/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*SOLICITUD DE SOPORTES LEGALES DE ANTICIPO*
21/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*RELACIÓN DEL PERSONAL PARA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.*

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
25/07/2023	INTERVENTORIA EXTERNA	*NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS*	*PERSONAL PARA INICIO DE ACTIVIDADES.*

Tabla 6. Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato **LP 001-155-2023**

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
18/05/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA 05/05/2023*
05/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIO PLANEACION COMANDANTE DEPARTAMENTEO	*CORREO DESIGNADO PARA SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES.*
06/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*SOLICITUD DESIGNACION DE PERSONAL PARA AUTORIZACION – URGENTE*
14/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*RESPUESTA OFICIO No. INT-ZV-CCTV-SARDI-004-2023*
15/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*ACCESO A DRIVE – ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS*
16/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	SECRETARIO DE PLANEACION	*REITERACION SOLICITUDES*
21/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*RESPUESTA OFICIO No. INT-ZV-CCTV-SARDI-002-2023 y INT-ZV-CCTV-SARDI-006-2023*
22/06/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE REUNION SEMANAL*
04/07/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*ENTREGA INFORME DE GESTIÓN DEL MES DE MAYO.*

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
04/07/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*RESPUESTA OFICIO No.INT-ZV-CCTV SARDI-012-2023.*
07/07/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*POLIZAS ACTUALIZADAS*
21/07/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	ROBERTO A CASTELLANOS CELIS	*Estado suscripción contrato de arrendamiento y permiso de uso de infraestructura con CENS.*
25/07/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*Respuesta Oficio No. INT-ZV-CCTV SARDI-019-2023 – Observaciones atendidas.*
29/09/2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	INTERVENTORIA EXTERNA	*Aclaración proforma No. 332440 - 3025*

En el **ANEXO 2** se presenta copia de la correspondencia para el periodo del acta parcial.

3.6 BITACORA DIARIA DE OBRA

A la fecha del presente informe se presenta las actividades realizadas en el tiempo que va de ejecución.

En el **ANEXO 3** se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra para el periodo del acta parcial.

3.7 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.7.1 Socialización del proyecto

Se realizo la socialización con representantes de la Alcaldía de Sardinata, policía, contratista e interventoría del proyecto a quienes se les dio a conocer el alcance y funcionamiento de CCTV que será instala en la cabecera municipal y el plazo de ejecución del mismo.

3.7.2 Conformación de la veeduría ciudadana

A la fecha del presente informe no se conformado ninguna veeduría.

3.8 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución del ajuste a estudios y diseños de acuerdo al alcance del contrato, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificara las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista

Nota: *El personal laboral debe contar con examen ocupacional del año en curso o vigente, se verifica que los empleados cuentan con el examen ocupacional de ingreso.*

3.8.1 Personal Administrativo

Se le requirió al contratista dar aclaración de cuál es el personal técnico del contrato LP-001-155-2023 según propuesta. Relacionado en AIU. Se le solicita descripción del AIU.

Tabla 7. Personal administrativo del contrato **LP 001-155-2023** en el mes de JULIO de 2023

MES: JULIO DE 2023											
DATOS GENERALES									AFILIADO A		
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABOR	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	BOLENA MEZA	ANA	37.273.128	ARQUITECTA		16/03/2023					
2	VILLAMIZAR PABON	ROLANDO RAMIRO	1.094.271.057	INGENIERO ELECTRONICO		16/03/2023					
3				ABOGADA							

3.8.2 Personal Operativo

A la fecha del presente informe el contratista no posee personal operativo.

Tabla 8. Personal de servicios y suministro del contrato **LP 001-155-2023** en el mes de JULIO 2023.

MES: JULIO DE 2023	
DATOS GENERALES	AFILIADO A

	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	CONTRERAS	ANDERSON	13.279.288	RESIDENTE DE OBRA	$1.500.000	28/04/2023		30	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA
2.	MURILLO ORTEGA	EDIXON	1.090.392.473	TECNICO		20/04/2023					
3.	TOLOZA PORTILLA	JESUS HERNANDO	1.093.798.862	TECNICO		16/03/2023					
4.	OSPINA	EMMANUEL	10.030.485	DIRECTOR PROYECTO	$5.800.000	28/04/2023		30	S.O.S. S.A.	COLPENSIONES	POSTIVIA
5.	PABON	RAFAEL	88.269.550	CONTRATISTA/COORDINADOR	$1.500.000	28/04/2023		30	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA
8.	MIZTAJI DAGAN	NOAM	1.090.375.054	TECNICO	$1.600.000	25/04/2023		30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

Tabla 9. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- Contrato de servicios y suministro del contrato d **LP 001-155-2023**

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES JULIO				
	SI	NO	SI		
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X		X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.		N.A			
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

3.8.3 Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe; así mismo llevó a cabo la liquidación y pago al personal retirado de acuerdo a los requisitos de Ley.

3.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.9.1 Dotación del personal

Se realizo la entrega de dotación. Y se realiza exámenes médicos para el personal administrativo

Tabla 10. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato **LP 001-155-2023**

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros,
GUANTES	X		X			Ingenieros,
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros,
BOTAS DE CAUCHO						Ingenieros,
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros,
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros,
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros,
MASCARA	X		X			Ingenieros,

Señalización de la obra

Para la ejecución de los diseños y estudios no es necesaria la señalización.

3.9.2 Accidentalidad en la obra

De acuerdo al cronograma de actividades el contratista todavía está en ejecución de estudios y diseños y no se han presentado accidentes laborales.

3.9.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "*consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la*

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales."

3.10 PERMISOS Y LICENCIAS

3.10.1 Licencia de construcción u otro tipo de licencia urbanística

No aplica

3.10.2 Licencia o permisos ambientales

Para el presente proyecto el contratista debe solicitar ante la entidad ambiental CORPONOR la licencia correspondiente de ser necesaria.

3.10.3 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción

NO APLICA

3.10.4 Otros Permisos requeridos

(De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la Interventoría debe relacionar en este informe otros permisos que son necesarios tramitar para el normal desarrollo de los trabajos como es el caso de permisos de servidumbres, permisos para cierre temporal de vías públicas, entre otros. En este aparte se deben relacionar todos estos permisos tramitados, ante quien se tramitaron y su fecha de expedición. Para el caso del cierre e intervención de vías de orden secundario o vías urbanas se debe presentar el Plan de Manejo de Transito ante al Instituto de Transito Departamental o Municipal para su respectiva aprobación, o ante el Inspector Municipal, según corresponda.)

3.11 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

TIPO:	CONCRETO	
MARCA:	ITC	
REFERENCIA:	14MTS 750	

ESTADO:	NUEVO
TIPO:	CONCRETO
MARCA:	ITC
REFERENCIA:	14MTS 750
ESTADO:	NUEVO



TIPO:	UPS
MARCA:	AMERICAN POWER
REFERENCIA:	2 KVA MONOFASICA ON LINE
ESTADO:	NUEVO



TIPO:	GANIETE DE POSTE
MARCA:	DIMINEL GROUP
REFERENCIA:	GABINETE EXTERIOR
ESTADO:	NUEVO



TIPO:	CORONA Y BRAZO
MARCA:	DIMINEL GROUP

REFERENCIA:	N/A	
ESTADO:	NUEVO	

3.12 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y/O DE SEÑALIZACION

(Para proyectos que de acuerdo a la naturaleza de las actividades a ejecutar requieran PMT y/o Plan de señalización, en el informe la interventoría debe señalar el seguimiento que ha realizado a la implementación de estos planes e indicar el cumplimiento por parte del contratista; de no requerirse alguno o ninguno de ellos debe señalarlo igualmente.)

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN LABORES DE OBRA.

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato suscrito entre el La LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA y la firma contratista NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 5 (cinco) meses.

Tabla 12. Condiciones contractuales iniciales del Contrato **LP 001-155-2023**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SISTEMA VIGILANCIA			
	EQUIPOS			
1	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	42	$ 14.926.947,00	$ 626.931.774,00
2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	84	$ 5.235.288,00	$ 439.764.192,00
3	Equipo de Transmisión y Recepción de Microondas (Video y Control	7	$ 11.392.806,00	$ 79.749.642,00
4	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS (VIDEO Y CONTROL) DE BACK BONE	3	$ 43.598.210,00	$ 130.794.630,00
5	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	8570,20	$ 32.064,00	$ 274.794.892,80
6	SWITCH TIPO 6	2	$ 31.631.151,00	$ 63.262.302,00
7	SWITCH TIPO 1	42	$ 4.392.925,00	$ 184.502.850,00
8	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN TIPO RACK DESLIZANTE	1	$ 17.106.909,00	$ 17.106.909,00
9	SWITCH KVM	1	$ 6.356.018,00	$ 6.356.018,00
10	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	1	$ 75.419.281,00	$ 75.419.281,00
11	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	6	$ 21.997.309,00	$ 131.983.854,00
12	MONITOR OPERADOR CCTV	6	$ 2.531.236,00	$ 15.187.416,00
13	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	3	$ 27.623.531,00	$ 82.870.593,00
14	SILLAS ERGONÓMICAS	3	$ 1.268.685,00	$ 3.806.055,00
15	JOYSTICK DE OPERACIÓN	3	$ 5.391.650,00	$ 16.174.950,00
16	UPS 2KVA	42	$ 4.611.940,00	$ 193.701.480,00
17	SERVIDOR	1	$ 88.322.061,00	$ 88.322.061,00
18	SERVIDOR DE ARCHIVOS	1	$ 96.824.086,00	$ 96.824.086,00
19	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	126	$ 9.152.112,00	$ 1.153.166.112,00
20	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	1	$ 42.934.840,00	$ 42.934.840,00
21	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION VARIABLE SPLIT 36000 BTU	1	$ 40.366.860,00	$ 40.366.860,00
22	PLANTA ELÉCTRICA DE 15 KVA Y TRANSFERENCIA	1	$ 78.889.405,00	$ 78.889.405,00
23	Impresora Multifuncional	1	$ 9.415.824,00	$ 9.415.824,00
24	UPS 10 kVA	1	$ 30.751.076,00	$ 30.751.076,00
	ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA			
25	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	42	$ 4.531.519,00	$ 190.323.798,00
26	GABINETES DE POSTE/FACHADA	42	$ 3.249.856,00	$ 136.493.952,00
27	CORONAS ANTIESCALATORIAS	42	$ 365.793,00	$ 15.363.306,00
28	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	42	$ 493.175,00	$ 20.713.350,00
29	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	3	$ 1.131.493,00	$ 3.394.479,00
30	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	3	$ 1.177.012,00	$ 3.531.036,00
31	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	3	$ 1.272.037,00	$ 3.816.111,00

32	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 3	43	$ 4.739.620,00	$ 203.803.660,00
33	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	3	$ 5.138.399,00	$ 15.415.197,00
34	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, ESTACIÓN MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCÓPICA Y CONTROL DE ACCESO	1	$ 27.575.538,00	$ 27.575.538,00
35	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	1	$ 16.224.418,00	$ 16.224.418,00
36	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	1	$ 3.510.170,00	$ 3.510.170,00
37	LOCKER METÁLICO DE DOBLE COMPARTIMENTO	1	$ 1.445.371,00	$ 1.445.371,00
	OBRA CIVIL			
38	ADAPTACIÓN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	1	$ 39.807.293,00	$ 39.807.293,00
39	SISTEMA DE APERTURA	1	$ 5.785.740,00	$ 5.785.740,00
40	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	43	$ 3.234.772,00	$ 139.095.196,00
41	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	1	$ 62.316.246,00	$ 62.316.246,00
				$ 4.771.691.964,00

Nota: • El valor de la propuesta incluye todos los impuestos de ley
• Todos los ítems que den lugar a cobros, gastos o descuentos como IVA, AIU O EXCLUSIONES, serán determinados en la etapa de Estudios y Diseños

Ítem	Descripción	total
1	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 171.832.968,00
2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA	$ 4.771.691.964,00
	TOTAL	**$ 4.943.524.932,00**

4.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe no se ha iniciado la ejecución del proyecto se realizó la entrega de los estudios y diseños y compra de los equipos proyectados en el plan de inversión.

4.3 AVANCE DEL PROYECTO

4.3.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

De acuerdo al periodo del presente informe, se presenta un avance de ejecución del 40% y un avance de obra acumulado del 40%, haciendo falta por ejecutar un 60% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.

Se realizo la respectiva entrega de los Estudios y Diseños el día 28 de julio del 2023, en las instalaciones del MINISTERIO DEL INTERIOR en la ciudad de Bogotá, en acompañamiento del ING. ROBERTO CASTELLANOS CELIS, supervisor por parte de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS, Contratista de Servicios y Suministros y la Ing. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, Interventoría.

Presente una gráfica comparando el 40% de obra ejecutado vs él 60% de obra por ejecutar.



Grafico 1. Avance Físico del contrato No. **LP 001-155-2023**

4.3.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los cinco meses establecidos en la minuta del contrato, ha transcurrido un (01) mes desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 20% del total del plazo contractual, restando cuatro (04) meses para finalizar las actividades del contrato y proceder a entregar.

Durante el tiempo que ha transcurrido del contrato de obra No. **LP 001-155-2023**

A la fecha del presente informe no se han presentado suspensiones. Ni ha tenido adición en tempo.

En cuanto al estado del tiempo para el periodo del presente informe No se ha iniciado obras en terreno.


PLAZO CONTRACTUAL	*cinco (05) MESES*
TIEMPO SUSPENDIDO	*cero (00) DIAS*
PLAZO ADICIONADO	*N.A*

PLAZO EJECUTADO	*dos (02) MESES*
PLAZO POR EJECUTAR	*tres (03) MESES*
% PLAZO EJECUTADO	*40%*

4.4 PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los 40% de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

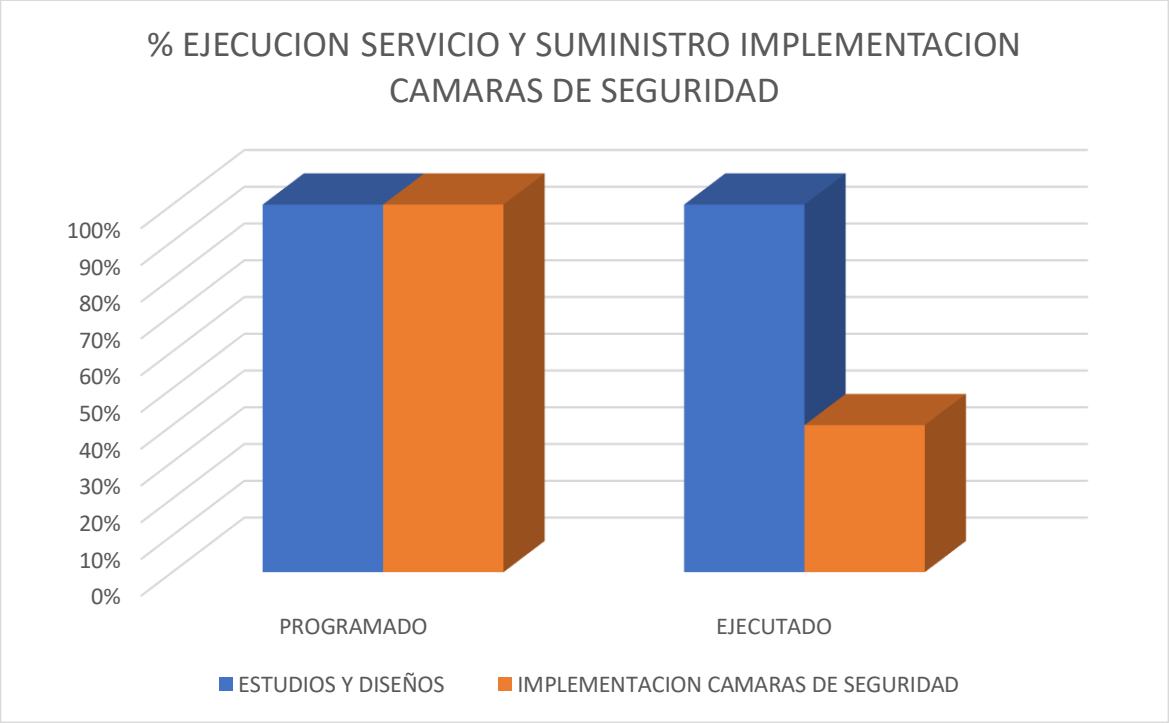

SERVICIOS Y SUMINISTROS	PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%	100%
IMPLEMENTACION CAMARAS DE SEGURIDAD	100%	40%

Tabla 13. Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No **LP 001-155-2023**

4.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

A la fecha del presente informe no se han presentado imprevistos en la ejecución de la etapa de estudios y diseños del contrato.

4.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2023, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

4.6.1 MESA TÉCNICA.

Se realizaron observaciones a la documentación de estudios y diseños en la mesa técnica del 06 de julio de 2023 en las instalaciones de Netkoln Digital Solutions con el fin de socializar los requerimientos solicitados

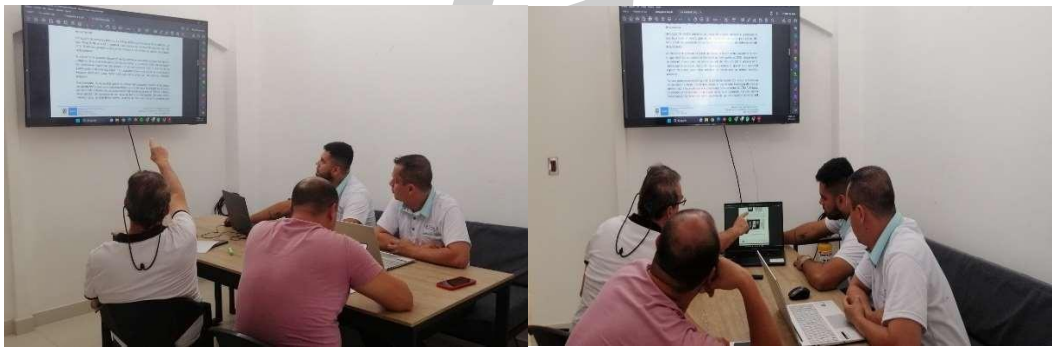


Ilustración 1. Mesa Técnica

4.6.2 APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Después de atendidas todas las observaciones realizadas del 24 de julio de 2023 se dio aprobación a la totalidad de ítems de los estudios y diseños. (Anexo 3. Aprobación Estudios y diseños)



ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
ESP.GERENCIA DE PROYECTOS.
ESP.GERENCIA RIESGOS LABORALES S.S.T.
NIT: 60.373.700-6 / REGIMEN: COMUN.

INT-ZV-CCTV SARDI-022-2023

San José de Cúcuta, 24 de julio de 2023

Supervisor
ING. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE SARDINATA

Señores
NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S
R/L RAFAEL PABON LOPEZ
Contratista CCTV.

REFERENCIA: CONTRATO: CONTRATO N° LP 001- 155 – 2023 OBJETO: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEUN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE SARDINATA VALOR:

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$171.832.968
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA	$ 4.771.691.964
TOTAL	$ 4.943.524.932

REGISTRO PRESUPUESTAL No.: RP0420008

CONTRATISTA: NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S

PLAZO: 5 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INTERVENTORIA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SARDINATA

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolivar Bloque A Oficina A10
Telf.: 6075965954. Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

Ilustración 2. Aprobación Estudios y Diseños

4.6.3 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANTE MINISTERIO DEL INTERIOR

Los días 27 y 28 de julio de 2023, se hizo presencia con el contratista (Netkoln Digital Solutions) y el secretario de Planeación (Supervisor designado) a las oficinas del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá con el fin de realizar la entrega formal de los estudios y diseños (Fase I) del Contrato LP-001-155-2023.



Ilustración 3. Entrega estudios y diseños

ITEM

1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	$ 171.832.968	40%

Informacion de los estudios y diseños

Reuniones de comité técnico semanal

06/07/2023	1	Revisión de Estudios y diseños Cierre de CENS Cronograma de Actividades	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS
13/07/2023	2	Observaciones Estudios y diseños Contratista envía documentación del personal Se recuerda reunión el día 28/07/2023 en Bogotá.	RAFEL PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS
28/0//2023	3	Entrega de estudios y diseños en las instalaciones del Ministerio del Interior	ANA BOLENA MEZA ROLANDO VILLAMIZAR PABON ANDERSON CONTRERAS HAVID NUMA ZULAY VASQUEZ JORGE VILLAMIZAR ROBERTO CASTELLANOS CELIS

4.7 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 MANEJO DEL ANTICIPO

A la fecha del presente informe se ha manejado el siguiente valor de anticipo:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA No LP-002-278-2020			
PAGO ANTICIPADO	**FECHA DEL PAGO ANTICIPADO**	**VALOR PAGADO**	**% EJECUADO**
PARCIAL No. 01	05 DE JUNIO DE 2023	$ 1.977.409.973	40%

6. ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

No aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La interventoría recomienda al contratista realizar la entrega de los estudios y diseños dentro del tiempo establecido para no tener atrasos en la ejecución del proyecto.

8. CONCLUSIONES

- Se realizo satisfactoriamente la entrega de estudios y diseños en las instalaciones de ministerio de interior con presencia de contratista, supervisor de la alcaldía de sardinata y supervisores del ministerio de interior.
- El contratista realizo la entrega del cronograma de actividades ajustándolo para iniciar labores de ejecución a partir del 1 de agosto del 2023.

9. ANEXOS

ANEXO 1. Comités realizados.
ANEXO 2. Correspondencia.
ANEXO 3. Bitácora
ANEXO 4. Cronograma

Aprobación del Informe:	
Elaboró:	Aprobó:
JORGE MARIO VILLAMIZAR MENESES	**ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO**
M.P. N° NS290-98275	M.P N° 54202-106086 NTS
Residente de la Interventoría	Director de la Interventoría

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO SEMANAL No. 4

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
ESP.GERENCIA DE PROYECTOS.
ESP.GERENCIA RIESGOS LABORALES S.S.T.
NIT: 60.373.700-6 / REGIMEN: COMUN.

ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA DE SARDINATA	FECHA	6	7	2023
FIRMA INTERVENTORIA	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	CONTRATO No.	CM-003-150-2023		
FIRMA CONTRATISTA	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	CONTRATO No.	LP-001-155-2023		

OBJETO DE CONTRATO:

OBJETO: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEUN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Zulay Vasquez	
Jorge Mario Villamizar	
Havid Numa	
Rafael Pabón	
Anderson Contreras	
Roberto A. Castellanos Celis	

II. OBJETO

REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Compartir con el Mininterior a los correos mencionados en la presente acta, el link del Drive para inicio por parte del mininterior de la verificación de los entregables - Compromiso de Secretarío de Planeación

V. TEMAS TRATADOS

1. Confirmación de cumplimiento de compromisos
2. Socialización avance de entregables Mínimos de Estudios y diseños.
3. Estado de permiso ante centrales electricas de Norte de Santander - CENS
4. enviar actas de comité para firma

VI. DESARROLLO TEMAS

1.Interviene el Ing. Havid Numa del Min. Interior y confirma que el secretario de planeación, en representación del municipio de Sardinata, envío el acceso a la carpeta drive donde se encuentran todos los ítems correspondientes a los entregables mínimos de estudios y diseños.

2. Se informa por parte del Ing. Jorge Mario Villamizar de la interventoría, que ya se efectuó la primera revisión y se realizaron observaciones a algunos ítems de los entregables.

El ing. Anderson Contreras de la empresa contratista confirma que ya se atendieron las observaciones realizadas y se espera una nueva revisión por parte de la interventoría.

3. El ing. Anderson Contreras de la empresa contratista manifiesta que aun no se ha suscrito el contrato de arrendamiento con la empresa Centrales Electricas de Norte de Santander y por lo tanto, no se cuenta aun con la factibilidad para el uso de la infraestructura electrica.

El Ing. Roberto Castellanos manifiesta que solo esta a la espera del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Sardinata para proceder a la radicación de la documentación y suscripción del contrato.

4. El Ing. Havid Numa del Min. Interior, solicita se le envien las actas de las anteriores reuniones realizadas para proceder a la firma de las mismas. Así mismo, solicita se realice el cronograma de actividades de implementación.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
1. Envíar actas de las anteriores reuniones para suscripción de firma por Mininterior	Interventoría

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 13 (DIA) 7 (MES) 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los

_____ (días del mes de _____ de _____
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO SEMANAL No. 5

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
ESP.GERENCIA DE PROYECTOS.
ESP.GERENCIA RIESGOS LABORALES S.S.T.
NIT: 60.373.700-6 / REGIMEN: COMUN.

ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA DE SARDINATA	FECHA	13	7	2023
FIRMA INTERVENTORIA	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	CONTRATO No.	CM-003-150-2023		
FIRMA CONTRATISTA	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS	CONTRATO No.	LP-001-155-2023		

OBJETO DE CONTRATO:

OBJETO: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEUN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Zulay Vasquez	
Jorge Mario Villamizar	
Havid Numa	
Rafael Pabón	
Anderson Contreras	
Roberto A. Castellanos Celis	

II. OBJETO

REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1. Socialización avance de entregables Mínimos de Estudios y diseños
2. Recomendaciones para la entrega de estudios y diseños
3. Personal para inicio de implementación

VI. DESARROLLO TEMAS

1.Se informa por parte del Ing. Jorge Mario Villamizar de la interventoría, que se realizaron nuevas observaciones a algunos ítems de los entregables y que ya fueron atendidas por el contratista, por lo que nuevamente se están revisando las correcciones realizadas por los mismos.

El ing. Rafael Pabón de la empresa contratista, manifiesta que se está a la espera de la revisión y posterior aprobación por parte de la interventoría de los entregables, o las nuevas correcciones que se requieran.

2. El Ing. Havid Numa del Min. Interior, realiza sugerencias para la entrega de los estudios y diseños, tales como presentación de las carpetas, rotulados y demás que se deben tener en cuenta para la reunión del 27 y 28 de julio de 2023 en Bogotá.

3. El ing. Rafael Pabón de la empresa contratista informa que se está reuniendo toda la documentación correspondiente del personal que iniciará labores de implementación en el municipio de Sardinata para la aprobación por parte de la interventoría.

El Ing. Havid Numa del Min. Interior, solicita se le informe el nombre y número de cedula de las personas que asistirán tanto por la interventoría, como por el contratista y el Municipio de Sardinata, para informar el ingreso a las oficinas del Ministerio.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
1. Envíar información del personal que asitirá a reunión de entrega de estudios y diseños.	Interventoría, planeación, contratista.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 17 (DIA) 7 (MES) 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los

_____ (días del mes de _____ de _____
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor
