INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA
PARA TRÁMITE DE ACTA DE COBRO No. 003

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4316864	DE 08 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	Consorcio Conexiones Viales Santander	
Nit o C.C. No.	901.669.825-1	
OBJETO:	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA	

VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)	
VALOR ADICIONAL:	No Aplica	
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00	
ANTICIPO INICIAL:	No Aplica	
ANTICIPO ADICIONAL:	No Aplica	
ANTICIPO TOTAL:	No Aplica	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	No Aplica	No Aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	No Aplica	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	2,66%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica	
PLAZO TOTAL:	No Aplica	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC R/L CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.577.958-5**	
SUPERVISOR:	**PAOLA ANDREA AGULERA SANTAMARIA**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	**08 febrero 2023**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	26/02/2028

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	SI	X	NO	

VALOR A PAGAR:	1,490,086,947.98

Periodo de Pago:	Desde:	01/08/2023	Hasta:	31/08/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA
No. SSEPI	**20220680000060**
No. BPIN	**2022004680068**
Valor total del Proyecto	$88.323.779.414,00
Alcance	SE PLANTEA LA PAVIMENTACIÓN DE 31 KM DE LA VÍA QUE VA A BENEFICIAR A LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES, ONZAGA Y SAN JOAQUÍN

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.4316864 DE 08 DE FEBRERO DE 2023

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4316864	DE 08 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	Consorcio Conexiones Viales Santander	
Nit o C.C. No.	901.669.825-1	
OBJETO:	LOTE No 2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA	

VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($88.323.779.414,00 COP)

VALOR ADICIONAL:	No Aplica	
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00	
ANTICIPO INICIAL:	No Aplica	
ANTICIPO ADICIONAL:	No Aplica	
ANTICIPO TOTAL:	No Aplica	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	No Aplica	No Aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	No Aplica	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	2,66%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica	
PLAZO TOTAL:	No Aplica	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022	CONTRATO INVIAS 1057 DE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC R/L CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.577.958-5**	
SUPERVISOR:	**PAOLA ANDREA AGULERA SANTAMARIA**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	**08 febrero 2023**	

FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Infraestructura**	Secretaria de XXXXX
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/02/2028	

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	27/02/2023	Se da inicio a las actividades de obra e interventoría.
APROBACIÓN DE POLIZAS	24/02/2023	Se firma el acta de aprobación de pólizas
ACTA PARCIAL No 1	21/09/2023	acta parcial No 1
ACTA PARCIAL No 2	28/09/2023	acta parcial No 2

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Relación en orden cronológico de las actas de modificación de cantidades y precios no previstos y/o adicionales.

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:


2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA No. 3	CANTIDAD ACUMULADA
210.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	478,249.00	0	14,813.76
220.1	TERRAPLENES	M3	28,500.80	0	14,813.76
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	270.50	20.98	113.07
320.1	SUB BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	36,049.87	2321.79	2290.5
330.1	BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	36,936.50	2114.90	2114.90
610.5	Material Granular Filtrante (incluye suministro, transporte e instalacio)	M3	215.20	820.40	820.40
640.1	Acero de refuerzo de Fy=420MPa (incluye suministro, transporte e instalación)	KG	34,881.50	3922.13	4.286.35
661.2.01	Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 MM de Diámetro Interior (Tipo II)	M	672.30	0	8.00
320.1	SUB BASE GRANULAR CLASE A (incluye suministro, transporte e instalación)	M3	672.10	101.59	122.07
600.1.1.A	Excavaciones sin clasificar a Maquina	M3	1,582.60	0	1,574.06
630.6	CONCRETO CLASE F 140 kg/cm2=2000PSI=14MPa concreto de limpieza	M3	11.00	0	14.96
630.3.7	CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=400PSI=28MPa	M3	2,259.10	33.04	73.93
630.7	CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa G (CICLOPEO)	M3	129.50	16.14	44.82
673.1.6	Geotextil Tipo NT-2000 o Similar no Tejido (incluye Suministro, Transporte e Instalación)	M2	1,129.80	3984.80	3984.80
663.1	Tuberia Perforada 4" (Incluye suministro, Transporte e Instalacion)	M	75.60	1172.00	1172.00

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se adjunta el programa de trabajo entregado a la interventoría una vez se dio apertura al acta de inicio del contrato

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		VÍA SAN GIL - MOGOTES - SAN JOAQUÍN	307 días?	mar 22/02/22	dom 31/12/23	$1.667.943.6...
2		TRAMO VIA K253+100-K257+400	0 días?	jue 16/11/23	jue 16/11/23	$1.400.100.0...
3		PRELIMINARES	307 días	mar 22/02/22	dom 31/12/23	$0
4		REVISION Y AJUSTES	60 días	mar 28/02/23	vie 28/04/23	$0
5		TOPOGRAFÍA	300 días	mar 7/03/23	dom 31/12/23	$0
6		CONFORMACIÓN DE VÍA	288 días	vie 14/04/23	lun 30/10/23	$1.617.298.562
7		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	200 días	vie 14/04/23	lun 30/10/23	$1.354.103.148
8		TERRAPLENES	170 días	sáb 29/04/23	dom 15/10/23	$263.680.413
9		PAVIMENTOS	256 días?	lun 24/04/23	vie 15/12/23	$1.851.4.778.5...
10		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES DE CORTES	180 días	dom 14/05/23	jue 9/11/23	$34.429.190
11		SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, transporte e instalacion)	180 días	vie 19/05/23	mar 14/11/23	$3.884.628.447
12		BASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, Transporte e Instalacion)	180 días	mié 24/05/23	dom 19/11/23	$2.956.875.185
13		RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-O	183 días	mar 13/06/23	mar 12/12/23	$242.987.800
14		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 (Incluye suministro, Transporte e Instalacion)	183 días	jue 15/06/23	jue 14/12/23	$3.365.849.884
15		SEÑALIZACION	79 días	vie 15/10/23	sáb 30/12/23	$267.454.752
16		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (90x90) cm	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$46.873.266
17		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO INFORMATIVA (SI-05 y/o SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$858.045
18		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA (SCH SP - REFLECTIVO TIPO IV (75x60)cm	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$30.406.012
19		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-01 (poste de referencia) REFLECTIVO TIPO IV(1.25x0.45)cm	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$4.753.756
20		LINEA DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$26.202.372
21		TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLASTICO	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$16.600.104
22		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (20 cm x 20cm)	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$1.088.015
23		DEFENSA METALICA DOBLE ONDA	70 días	vie 13/10/23	jue 21/12/23	$139.499.672
24		SECCION FINAL	5 días	mar 26/12/23	sáb 30/12/23	$1.372.520
25		ALCANTARILLAS	198 días?	vie 14/04/23	vie 29/12/23	$438.782.782
26		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	150 días	vie 14/04/23	dom 10/09/23	$15.824.524
27		CONCRETO CLASE C 280kg/cm2=4000PSI=28MPa	162 días?	vie 12/05/23	vie 20/10/23	$204.509.777
28		ACERO DE REFUERZOS DE Fy=420MPa (Incluye suministro, transporte e instalacion)	159 días	sáb 6/05/23	mié 11/10/23	$123.765.896
29		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 21 Mpa DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR (Tipo III)	150 días	jue 4/05/23	sáb 30/09/23	$92.507.846
30		SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, transporte e instalacion)	150 días	dom 23/04/23	mar 19/09/23	$30.195.711
31		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	150 días	vie 21/04/23	dom 17/09/23	$9.247.442
32		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (Incluye Suministro, Transporte e instalacion)	150 días	dom 23/04/23	mar 19/09/23	$6.344.954
33		GEOTEXTIL TIPO NT-2000 SIMILAR NO TEJIDO (Incluye suministro, transporte e instalacion)	150 días?	dom 23/04/23	mar 19/09/23	$6.076.168
34		TUBERIA PERFORADA 4" (Incluye suministro, transporte e instalacion)	157 días?	lun 24/04/23	mié 27/09/23	$4.516.386
35		CUNETAS Y FILTROS	155 días	mar 18/07/23	mar 19/12/23	$1.898.685.728
36		CUNETA EN CONCRETO VACIADO IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, CONCRETO CLASE C 280 KG/CM2=4000psi=28MPa	120 días	mar 22/08/23	mar 19/12/23	$630.879.804
37		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (Incluye Suministro, Transporte e instalacion)	120 días	mar 18/07/23	mar 14/11/23	$344.233.938
38		GEOTEXTIL TIPO NT-2000 SIMILAR NO TEJIDO (Incluye suministro, transporte e instalacion)	120 días	mar 18/07/23	mar 14/11/23	$338.572.516
39		TUBERIA PERFORADA 8" (Incluye suministro, transporte e instalacion)	120 días	mar 18/07/23	mar 14/11/23	$776.917.450
40		OBRAS AMBIENTALES	150 días	mié 28/06/23	vie 24/11/23	$18.702.824
41		PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUE DE CESPED	150 días	mié 28/06/23	vie 24/11/23	$18.702.824
42		TRAMO VIA K256+200-K259+470	253 días?	jue 29/04/23	jue 28/12/23	$1.805.288.616
43		PRELIMINARES	251 días	jue 29/04/23	mié 6/12/23	$56.939.887
44		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	90 días	jue 29/04/23	mar 18/07/23	$29.431.479
45		TERRAPLENES	60 días	dom 8/10/23	mié 6/12/23	$26.908.323
46		PAVIMENTOS	59 días	lun 9/10/23	mié 6/12/23	$487.134.717
47		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES DE CORTES	15 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	$2.762.002
48		SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Incluye suministro, transporte e instalacion)	30 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	$13.761.599
49		RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-O	3 días	jue 23/11/23	sáb 25/11/23	$11.193.820
50		MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 (Incluye suministro, Transporte e Instalacion)	18 días	lun 27/11/23	mié 6/12/23	$219.405.258
51		CUNETAS Y FILTROS	18 días?	jue 7/12/23	sáb 16/12/23	$297.136.481
52		CUNETA EN CONCRETO VACIADO IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, CONCRETO CLASE C 280 KG/CM2=4000psi=28MPa	1 día?	sáb 16/12/23	sáb 16/12/23	$19.282.003
53		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (Incluye Suministro, Transporte e instalacion)	9 días?	jue 7/12/23	vie 15/12/23	$60.507.404
54		GEOTEXTIL TIPO NT-2000 SIMILAR NO TEJIDO (Incluye suministro, transporte e instalacion)	9 días?	jue 7/12/23	vie 15/12/23	$21.544.156
55		TUBERIA PERFORADA DE 8"(Incluye suministro, transporte e instalacion)	9 días?	jue 7/12/23	vie 15/12/23	$136.807.920
56		SEÑALIZACION	19 días?	sáb 16/12/23	jue 28/12/23	$29.488.859
57		SEÑAL VERTICAL TIPO 1 LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (90x90) cm	12 días?	dom 17/12/23	jue 28/12/23	$6.681.608
58		SEÑAL VERTICAL TIPO 4 (60CH)	12 días?	dom 17/12/23	jue 28/12/23	$1.062.194
59		LINEA DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA	8 días?	sáb 16/12/23	sáb 23/12/23	$599.760
60		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (20 cm x 20cm)	4 días?	dom 24/12/23	mié 27/12/23	$662.808
61		DEFENSA METALICA DOBLE ONDA	10 días?	lun 18/12/23	mié 27/12/23	$21.189.816
62		SECCION FINAL	1 día?	jue 28/12/23	jue 28/12/23	$312.672
63		MUROS REFORZADOS	111 días	lun 19/06/23	sáb 7/10/23	$1.899.175.912
64		CONCRETO CLASE C 280 KG/CM2=4000PSI=28MPa	60 días	mar 1/08/23	vie 29/09/23	$126.159.232
65		ACERO DE REFUERZOS DE Fy=420MPa (Incluye suministro, transporte e instalacion)	60 días	lun 19/06/23	jue 17/08/23	$258.114.056
66		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa G (Ciclopeo)	30 días	dom 23/07/23	lun 21/08/23	$6.319.174
67		TUBERIA PERFORADA 4" (Incluye suministro, transporte e instalacion)	30 días	vie 8/09/23	sáb 7/10/23	$2.694.884
68		GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR TEJIDO (Incluye suministro, Transporte e Instalacion)	30 días	vie 8/09/23	sáb 7/10/23	$9.510.404
69		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (Incluye Suministro, Transporte e instalacion)	30 días	jue 7/09/23	vie 6/10/23	$28.311.302
70		PILOTE EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO =1.2 FC 28 Mpa- NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	70 días	mié 19/07/23	mar 26/09/23	$590.014.260
71		MUROS EN GAVIONES	78 días	jue 1/06/23	mié 9/08/23	$1.25.817.448
72		GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (Galvanizado)	70 días	jue 1/06/23	mié 9/08/23	$1.23.017.440

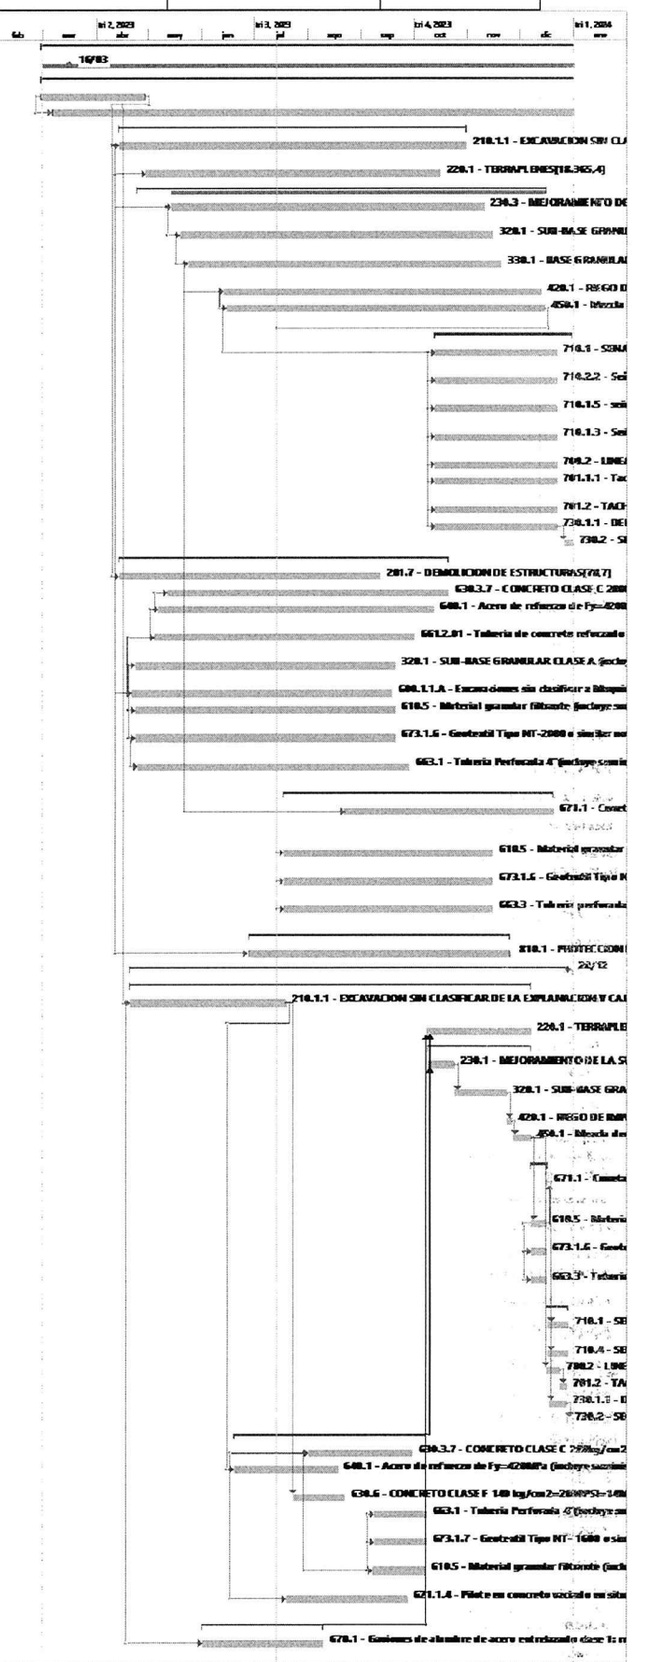

1.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Se anexa el reporte diario de estado general del tiempo

FECHA	DIA	DESCRIPCIÓN	HORA
01/08/2023	MARTES	SOLEADO	
02/08/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
03/08/2023	JUEVES	SOLEADO	

04/08/2023	VIERNES	LLUVIAS	3:00 PM adelante
05/08/2023	SABADO	SOLEADO	
06/08/2023	DOMINGO	SOLEADO	
07/08/2023	LUNES	SOLEADO	
08/08/2023	MARTES	SOLEADO	
09/08/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
10/08/2023	JUEVES	SOLEADO	
11/08/2023	VIERNES	SOLEADO	
12/08/2023	SABADO	SOLEADO	
13/08/2023	DOMINGO	SOLEADO	
14/08/2023	LUNES	SOLEADO	
15/08/2023	MARTES	LLUVIAS	3:45 PM adelante
16/08/2023	MIERCOLES	LLUVIAS	4:00 PM adelante
17/08/2023	JUEVES	LLUVIAS	3:39 PM adelante
18/08/2023	VIERNES	SOLEADO	
19/08/2023	SABADO	SOLEADO	
20/08/2023	DOMINGO	SOLEADO	
21/08/2023	LUNES	SOLEADO	
22/08/2023	MARTES	LLUVIAS	4:00 PM adelante
23/08/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
24/08/2023	JUEVES	SOLEADO	
25/08/2023	VIERNES	SOLEADO	
26/08/2023	SABADO	SOLEADO	
27/08/2023	DOMINGO	SOLEADO	
28/08/2023	LUNES	SOLEADO	
29/08/2023	MARTES	SOLEADO	
30/08/2023	MIERCOLES	SOLEADO	
31/08/2023	JUEVES	SOLEADO	

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Entrega de informes SST y ambientales del proyecto	Ver Anexos en el informe
realización de la inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a los trabajadores dependientes, cooperadores, en misión y contratistas.	Ver Anexos en el informe.
Diligenciamiento de la bitácora de obra	Ver Anexos en el informe.
Seguimiento a la programación	Ver Anexos en el informe.
Trámite de permisos	Ver Anexos en el informe.
Comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad	Ver Anexos en el informe.
realización de la inducción y reinducción a los trabajadores en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a los trabajadores dependientes, cooperadores, en misión y contratistas.	Ver Anexos en el informe.
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	Ver Anexos en el informe.
Se gestiona la disposición del material de excavación del proyecto, para él un punto autorizado y certificado.	Ver Anexos en el informe.
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Ver Anexos en el informe.

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Director de obra	1
Ingeniero Residente de obra	1
Especialista en pavimentos	1
Especialista en estructuras	1
Especialista ambiental	1
Especialista hidráulico	1
Auxiliar de residente	1
Inspectores	0
Topógrafo	1
Cadeneros	1
Contador	0
ayudantes	5
Oficiales	1
Controladores viales	2
TOTAL	**17**

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

AGOSTO

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER
NIT: 901669825-1
CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023 FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: LOTE No 2. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL, SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA- SANTANDER, BOYACÁ - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES- SAN JOAQUÍN -ONZAGA.

PERIODO FACTURADO: AGOSTO

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
Ayinson Javier Gonzales Pelaez	17975755	Especialista estructural	Independiente	2.300.000	70%	18/03/2023	N/A	30	Agosto	2.300.000	7890943952	2.300.000	287.500	368.000	12.100	667.600
Javier Caballero Esteban	91509767	Especialista Geotecnia	Independiente	1.160.000	60%	18/03/2023	N/A	30	Agosto	1.160.000	9455645262	1.160.000	145.000	185.600	12.200	342.800
Jesus Giovanny Inciarte Lizarazo	1122810440	Asesor legal	Independiente	1.160.000	100%	18/03/2023	N/A	30	Agosto	1.160.000	9455357123	1.160.000	145.000	185.600	80.800	411.400
Erika Paola Dotor Zambrano	1095911854	Profesional HSQ	Independiente	1.160.000	100%	18/03/2023	N/A	30	Agosto	1.160.000	9455464515	1.160.000	145.000	185.600	80.800	411.400
William Javier Vanegas Barrios	1121333761	hidraulico e hidrologia	Independiente	3.102.800	60%	26/04/2023	N/A	30	Agosto	3.102.000	9455543144	3.102.000	496.500	387.900	216.000	1.100.400
Jhon Edinson Sarmiento Gutierrez	1098613176	Especialista vias	Independiente	1.160.000	60%	26/04/2023	N/A	30	Agosto	1.160.000	9455701221	1.160.000	145.000	185.600	80.800	411.400
Andres Ricardo Lopez Saurith	1121332718	Residente de obra	Empleado	4.000.000	100%	14/03/2023	N/A	30	Agosto	4.000.000	9456078385	4.000.000	160.000	640.000	278.400	1.078.000
Doris Adriana Arguello Pinto	1005411432	Auxiliar administrativa	Empleado	1.160.000	100%	21/04/2023	N/A	30	Agosto	1.160.000	9456078385	1.160.000	46.400	185.600	80.800	312.800
Luis Manuel Cely Botia	3055620	Director de obra	Empleado	4.500.000	100%	4/05/2023	N/A	30	Agosto	4.500.000	9456078385	4.500.000	180.000	720.000	313.200	1.213.200

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400046559	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/02/2023	30/06/2028
400046559	PAGO DE SALARIOS	08/02/2023	31/12/2030
400046559	ESTABILIDAD	31/12/2027	31/12/2032
400046558	RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL	08/02/2023	31/12/2027

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

A continuación, se relacionan los municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor:

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
MOGOTES	RETEICA	2.5%	

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de acta de recibo 003	Anexo No, 001 Relacione la Evidencia

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$88.323.779.414,00
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	$88.323.779.414,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	00,00%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
23000804	14/02/2023	$9.500.000.000,00	23001949	15/02/2023	$7.823.779.414,00		
23000805	14/02/2023	$7.500.000.000,00	23001950	15/02/2023	$7.500.000.000,00		

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	**NO APLICA**
PARCIAL No 1	05/06/2023	$ 444.606.614,00	$00.000.00
PARCIAL No 2	05/08/2023	$ 417.326.967,78	$00.000.00
PRESENTE ACTA	**05/09/2023**	**$1,490,086,947.98**	$00.000.00
TOTAL		**$2.352.020.529,76**	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	$00.000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	$00.000.00
REINTEGROS:	Indicar valor, concepto y fecha.
FIDUCIARIA:	XXXXX
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	XXXXX
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	Correo electrónico y teléfono de la persona encargada.

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
➢ Visitas de evaluación ambiental por parte de la corporación autónoma regional de Santander- CAS en el marco del permiso de aprovechamiento forestal ➢ Ajuste del PAGA de conformidad a las recomendaciones solicitadas por la interventoría. ➢ Revisión y ajuste del marco legal y metodología. ➢ Revisión del capítulo de la definición del área de influencia y la línea base. ➢ Revisión cartográfica del área de influencia. ➢ Revisión de las fichas de manejo ambiental y sus indicadores. ➢ Elaboración de informe de cumplimiento ambiental.	Anexos adjuntos al informe.

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Se verifica que todos los materiales tengan el certificado de calidad (anexo se presenta).	Anexos adjuntos al informe
Se realiza la toma de muestras de materiales granulares en diversas canteras autorizadas en la región, para posteriormente realizarse los ensayos correspondientes.	Anexos adjuntos al informe
Se hace la revisión e inspección de los equipos, con el fin de cumplir con los buenos usos de los mismos, de que su estado sea el adecuado.	Anexos adjuntos al informe

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio de la firma PI SAS LABORATORIO DE INGENIERIA SAS

* Ensayos de procedencia para subbase granular clase A según norma INVIAS.
* Toma de densidades para el relleno compactado de los box culvert mencionados en las actividades del mes
* Toma de cilindros de concreto de la fundida de la estructura de los box culvert mencionados en las actividades en el mes.

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	REFERENCIA
Retroexcavadora	Doossan 225 LCA
Retrocargador	JCB C3X
Motoniveladora	Caterpillar 120GC
Vibrocompactador	Caterpillar CS10GC
Cargador	Volvo L70F

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

1/08/2023	OFI-CONEX-292	Respuesta a comunicado INV-VIAS CONEXION AC-397 Incumplimiento requerido guía de manejo ambiental del proyecto
1/08/2023	OFI-CONEX-293	Informe SST mes de abril
2/08/2023	OFI-CONEX-294	Acta de reunión 27 de julio de 2023
2/08/2023	OFI-CONEX-295	Acta de reunión 27 de julio de 2023
2/08/2023	OFI-CONEX-296	Acta de reunión 27 de julio de 2023
2/08/2023	OFI-CONEX-297	Acta de reunión socialización extraordinaria 01 de agosto de 2023
2/08/2023	OFI-CONEX-298	Acta de reunión gremio de volqueteros 01 de agosto de 2023
3/08/2023	OFI-CONEX-299	Subsanacion correciiones informe junio
4/08/2023	OFI-CONEX-300	Respuesta comunicado AC-285 Solicitud de actividades en desarrollo a la atencion de emergencia
5/08/2023	OFI-CONEX-301	Estudios y Diseños ZODME
8/08/2023	OFI-CONEX-302	ARCHIVOS ANEXOS SOLICITUD INVENTARIOS FORESTAL
8/08/2023	OFI-CONEX-303	Respuesta oficio INV-VIAS AC-404-2023 Solicitud implementacion jornada laboral dias festivos
8/08/2023	OFI-CONEX-304	Respuesta Oficio INV-VIAS CONEXION AC-354-2023 Diseño Geometrico completo PR33+350 a PR38+350
8/08/2023	OFI-CONEX-305	Respuesta Oficio INV-VIAS CONEXION AC-400-2023 Solicitud (Gestion Predial) por Parte de Interventoria
8/08/2023	OFI-CONEX-306	Respuesta comunicado AC-415-2023 del 05 de agosto de 2023

8/08/2023	OFI-CONEX-307	Documentos de personal nuevo del Consorcio Conexiones Viales Santander
8/08/2023	OFI-CONEX-308	Accidente de trabajo el 05 de agosto 2023
8/08/2023	OFI-CONEX-309	Entrega de documentos de personal nuevo del subcontratista CONSTRUYENDO SOLUCIONES G&G SAS.
9/08/2023	OFI-CONEX-310	Diseño hidráulico e hidrológico revisado PR 26
9/08/2023	OFI-CONEX-311	Información y divulgación de los próximos puntos a intervenir
9/08/2023	OFI-CONEX-312	Información y divulgación de los próximos puntos a intervenir
9/08/2023	OFI-CONEX-313	Información y divulgación de los próximos puntos a intervenir
9/08/2023	OFI-CONEX-314	Información y divulgación de los próximos puntos a intervenir
10/08/2023	OFI-CONEX-315	Piezas informativas cuñas radiales
10/08/2023	OFI-CONEX-316	Informacion y divulgacion de los proximos puntos a intervenir
10/08/2023	OFI-CONEX-317	Acta parcial de obra no. 2 - Consolidacion y aprobacion
10/08/2023	OFI-CONEX-318	Informe Gestion Social N.4 Julio
10/08/2023	OFI-CONEX-319	Acta de vencidad Centro Geriatricoo y Vida Luisa Maria
11/08/2023	OFI-CONEX-320	Diseño Geotecnico obras de contencion PR26
11/08/2023	OFI-CONEX-321	Entrega de documentacion de camioneta y conductor
11/08/2023	OFI-CONEX-322	Entrega documentacion de maquinaria amarilla (retroexcavadora) subcontratista
14/08/2023	OFI-CONEX-323	Informacion y divulgacion de los proximos puntos a intervenir
14/08/2023	OFI-CONEX-324	Informacion y divulgacion de los proximos puntos a intervenir
15/08/2023	OFI-CONEX-325	Reunion extraordinaria municipio de San Joaquin
15/08/2023	OFI-CONEX-326	Reunion extraordinaria municipio de San Joaquin

15/08/2023	OFI-CONEX-327	Reunion extraordinaria municipio de San Joaquin
15/08/2023	OFI-CONEX-328	Reunion extraordinaria municipio de San Joaquin
15/08/2023	OFI-CONEX-329	Reunion extraordinaria municipio de San Joaquin
15/08/2023	OFI-CONEX-330	Entrega de seguridad social de profesionales ambientales
15/08/2023	OFI-CONEX-331	Solicitud de resolución de la concesión de agua del acueducto
16/08/2023	OFI-CONEX-332	RESPUESTA OFICIO INV-VIAS CONEXIÓN AC-409-2023 Apremio por Incumplimiento - Diseños definitivos falla de la banca en el PR 76+040
17/08/2023	OFI-CONEX-333	PQRS del dia 17 de agosto de 2023
17/08/2023	OFI-CONEX-334	Respuesta comunicado ESPD-2023-077 ESPAMOGOTES
17/08/2023	OFI-CONEX-335	Solicitud de Permisos Ambientales.
17/08/2023	OFI-CONEX-336	Relacion de documentos de volquetas
18/08/2023	OFI-CONEX-337	Documentos de personal nuevo del Consorcio Conexiones Viales Santander
19/08/2023	OFI-CONEX-338	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-421-2023 - Respuesra oficio OFI-CONEX-260 Informe SST mes de marzo
19/08/2023	OFI-CONEX-339	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-424-2023 - Respuesra oficio OFI-CONEX-293 Informe SST mes de abril
19/08/2023	OFI-CONEX-341	Programacion de jornada laboral lunes 21 de agosto 2023
22/08/2023	OFI-CONEX-342	Solicitud de informacion
22/08/2023	OFI-CONEX-343	Documentacion de personal nuevos del Consorcio Conexiones Viales Santander
22/08/2023	OFI-CONEX-344	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-454-2023 - Respuesta oficio OFI-CONEX-192 - Entrega de documentacion personal nuevo del Consorcio Conexiones Viales
22/08/2023	OFI-CONEX-345	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-423-2023 - Respuesta oficio OFI-CONEX-287 - Entrega de documentacion personal nuevo CESAR ESTUPIÑAN CORZO Y ELMER JOSE QUIÑONES ROMERO.
22/08/2023	OFI-CONEX-346	RESPUESTA OFICIO INV-VIASCONEXIÓN AC-371 OBSERVACIONES A LOS INFORMES AMBIENTALES

22/08/2023	OFI-CONEX-347	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-366-2023 - Respuesta oficio OFI-CONEX-254 - Documentación de director de obra
23/08/2023	OFI-CONEX-348	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-457-2023 - Respuesta oficio OFI-CONEX-307 Documentos de personal nuevo del consorcio Conexiones Viales Santander
23/08/2023	OFI-CONEX-349	Respuesta a su comunicado INV-VIAS CONEXIÓN AC-455-2023 - Respuesta oficio OFI-CONEX-321 Entrega de documentación de camioneta y conductor
23/08/2023	OFI-CONEX-350	Informe SST mes de mayo
23/08/2023	OFI-CONEX-351	Acta de reunión ESPAMOGOTES 22 de agosto de 2023
23/08/2023	OFI-CONEX-352	Acta de reunión ESPAMOGOTES 22 de agosto de 2023
23/08/2023	OFI-CONEX-353	Estudio Hidrológico e hidráulico y Diseño Estructural Muro PR 26
23/08/2023	OFI-CONEX-354	Revisión tecnico-mecanica de la camioneta Chevrolet placa SON 239
24/08/2023	OFI-CONEX-355	Señalización Quebrada La Leona, municipio de San Joaquín
24/08/2023	OFI-CONEX-356	Señalización Quebrada La Leona, municipio de San Joaquín
28/08/2023	OFI-CONEX-357	Respuesta a comunicado
30/08/2023	OFI-CONEX-358	Entrega de topografía Familia Ortega y Centro Geriátrico y Vida Luisa Marcelina
30/08/2023	OFI-CONEX-359	Entrega de topografía Familia Ortega y Centro Geriátrico y Vida Luisa Marcelina
31/08/2023	OFI-CONEX-360	Informe SST Junio y Julio
31/08/2023	OFI-CONEX-361	Respuesta comunicado AC-430
31/08/2023	OFI-CONEX-362	Documentos traslado de redes de acueducto y alcantarillado
31/08/2023	OFI-CONEX-363	NOTIFICACION DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO EN EL PR 26+215-PR 26+500 PARA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
31/08/2023	OFI-CONEX-364	Ingreso de personal 01 de septiembre 2023.

Durante el replanteo se realizaron reuniones con la comunidad, presidentes de junta de acción comunal y líderes comunitarios de las zonas con el fin de identificar las variaciones del proyecto frente a las necesidades de cada una de las zonas en mención.

Reuniones constantes entre el contratista e Interventoría para la revisión de las mejores alternativas técnicas y económicas en las variaciones presentadas para el proyecto haciendo necesario la creación de nuevas actividades y pactación de sus precios de acuerdo a un meticuloso estudio del mercado.

3. RECOMENDACIONES

A. Se observa gran interés y entusiasmo por parte de la comunidad frente al desarrollo de la obra.

4. ANEXOS

A. Memoria de cantidades.
B. Registro fotográfico.
C. Bitácora de obra.
D. Programación de obra.
E. Actas de vecindad.
F. Actas de reuniones.
G. Planilla de dotación de implementos de seguridad industrial.
H. Planillas de capacitaciones.
I. Plan de Manejo de Tráfico.
J. Informes del clima.
K. Documentos equipo del contratista de obra.
L. Pólizas del contrato de obra.
M. Planillas de seguridad social del contratista de obra.
N. Ensayos de laboratorio del contratista de obra.
O. Comunicaciones.
