	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**6**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de agosto de 2023 – 29 de septiembre de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Ximena Carmona Giraldo**

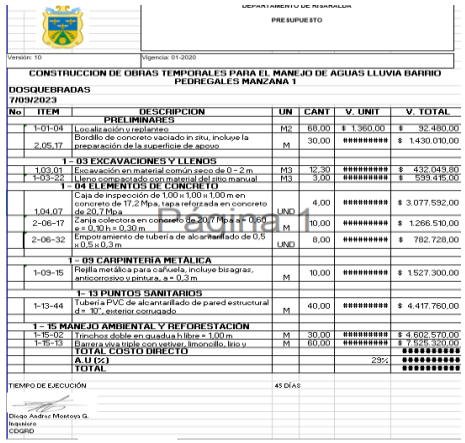
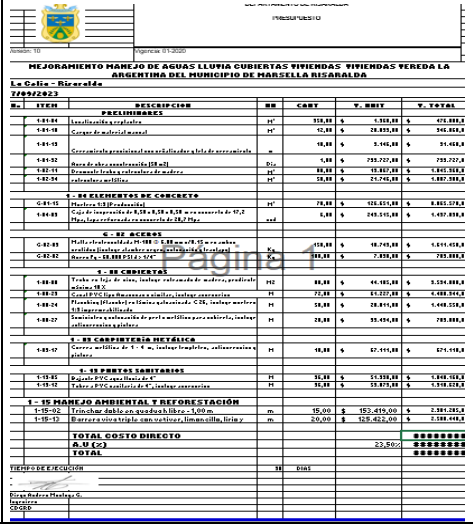
	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 31 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Pueblo Rico:** -**Visita técnica No. 1**, Inspección técnica en bocatoma del acueducto, se verifica optimización de rejilla, la cual presentaba obstrucción constante. **El día 04 de septiembre de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Mistrató:** -**Visita técnica No. 1,** vereda el Naranjo municipio de Mistrató, presenta deterioro avanzado en los elementos que componen la vivienda, sin embargo, se encuentra construida en una zona estable.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya. Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, David Ortega.

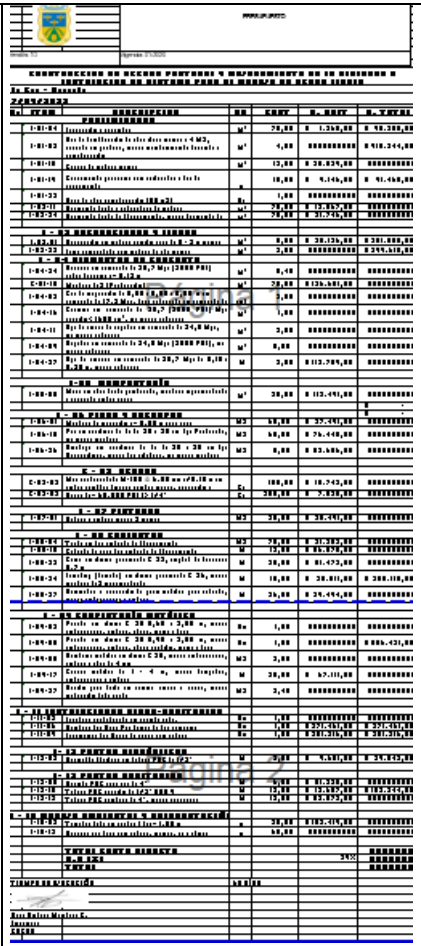
	-**Visita técnica No. 2,** Visita a la ladera Buenos Aires en el casco urbano de Mistrató, con el fin de verificar el avance de la obra que se viene desarrollando en el sector. **El día 07 de septiembre de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Dosquebradas:** -**Visita técnica No. 1,** Vivienda MZ 1 casa 32 barrio Pedregales, Dosquebradas, deslizamiento en la ladera a 6 metros de las viviendas.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, David Ortega. Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango.

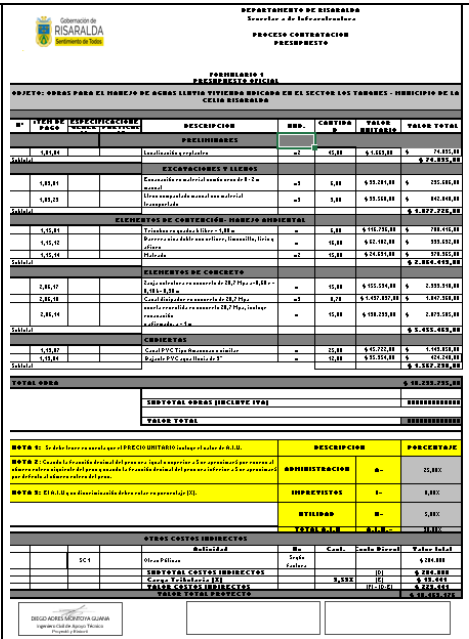
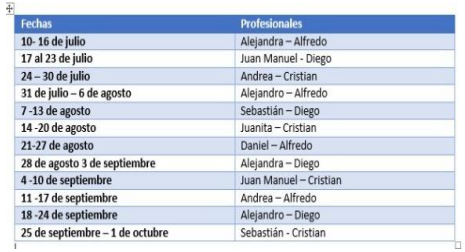
	El día 29 de septiembre de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Marsella: -**Visita técnica No. 1,** Inspección visual del estado actual del área de urgencias del Hospital San José de Marsella Risaralda.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, José Alfredo Quintero.
	-**Visita técnica No. 2,** Inspección de vivienda de la señora Amparo Gallo, deterioro avanzado de los elementos que la componen.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, José Alfredo Quintero.
2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	El día 30 de agosto de 2023 se realiza mesa de trabajo, seguimiento problemática Puentes La Esneda del Municipio de Dosquebradas.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya

3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que le sea requerido por el supervisor.	presupuesto construcción de obras temporales para el manejo de aguas lluvia barrio pedregales manzana 1 Presupuesto manejo de aguas cubiertas viviendas vereda La Argentina, municipio de Marsella Risaralda.	 DEPARTAMENTO DE RISARALDA PRESUPUESTO Versión: 10 Vigencia: 01-2020 CONSTRUCCION DE OBRAS TEMPORALES PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIA BARRIO PEDREGALES MANZANA 1 DOSQUEBRADAS 7/09/2023 No. ITEM DESCRIPCION UN CANT V. UNIT V. TOTAL PRELIMINARES 1-01-04 Localización y replanteo M2 68,00 $ 1.360,00 $ 92.480,00 2.05.17 Bordillo de concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo M 30,00 ########## $ 1.430.010,00 1 - 03 EXCAVACIONES Y LLENOS 1.03.01 Excavación en material común seco de 0 - 2 m. M3 12,30 ########## $ 432.049,80 1-03-22 Llenos compactado con material del sitio manual M3 3,00 ########## $ 593.415,00 1 - 04 ELEMENTOS DE CONCRETO 1.04.07 Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa UND 4,00 ########## $ 3.077.592,00 2-06-17 Zanja colectora en concreto de 20,7 Mpa a = 0,60 a = 0,10 h = 0,30 m M 10,00 ########## $ 1.266.510,00 2-06-32 Empotramiento de tubería de alcantarillado de 0,5 x 0,5 x 0,3 m UND 8,00 ########## $ 782.728,00 1 - 09 CARPINTERIA METALICA 1-09-15 Reilla metálica para cañuela, incluye bisagras, anticorrosivo y pintura, a = 0,3 m M 10,00 ########## $ 1.527.300,00 1- 13 PUNTOS SANITARIOS 1-13-44 Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado M 40,00 ########## $ 4.417.760,00 1 - 15 MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACION 1-15-06 Trinchos doble en guadua h libre = 1,00 m M 30,00 ########## $ 4.602.570,00 1-15-13 Barrera viva triple con vetiver, limoncillo, lirio y M 60,00 ########## $ 7.525.320,00 TOTAL COSTO DIRECTO ########## A.U (x) 29% ########## TOTAL ########## TIEMPO DE EJECUCIÓN 45 DÍAS Diego Andrez Montoya G. Ingeniero CQGRD Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  PRESUPUESTO Versión: 10 Vigencia: 01-2020 MEJORAMIENTO MANEJO DE AGUAS LLUVIA CUBIERTAS VIVIENDAS VIVIENDAS VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA La Celia - Risaralda 7/09/2023 No. ITEM DESCRIPCION UN CANT V. UNIT V. TOTAL PRELIMINARES 1-01-04 Localización y replanteo M² 118,00 $ 1.360,00 $ 160.480,0 1-01-18 Cargue de material sueltos M³ 12,00 $ 28.833,00 $ 345.996,0 1-01-15 Cerramiento provisional con cancha lámina de zinc ondulado h=2m M 10,00 $ 3.145,00 $ 31.450,0 1-01-02 Aseo de obra con remoción (60 m2) Día 1,00 $ 793.727,00 $ 793.727,0 1-02-11 Desmonte todos y retiradas de madera M² 80,00 $ 12.867,00 $ 1.029.360,0 1-02-24 retiradas metálicas M² 10,00 $ 24.746,00 $ 247.460,0 2 - 06 ELEMENTOS DE CONCRETO C-01-15 Placa en 3.5 (F'c reforzada) M³ 70,00 $ 126.611,00 $ 8.862.770,0 1-04-03 Caja de inspección de 0,70 x 0,70 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa und 6,00 $ 249.511,00 $ 1.497.066,0 C - 02 ACEROS C-02-03 Malla electrosoldada M-188 @ 0,20 mca/0,15 m en ambas sentidos (incluye alambre negro amarrar y traslapo) Kg 150,00 $ 10.763,00 $ 1.614.450,0 C-02-02 Acero fy = 60.000 PSI d = 1/2" Kg 300,00 $ 2.626,00 $ 787.800,0 3 - 05 CUBIERTAS 1-08-08 Teja en fibra de vino, incluye suministro de madera, gradicula y clavo, 18 K M2 80,00 $ 44.185,00 $ 3.534.800,0 1-08-23 Canal PVC tipo Rapacanoa y similar, incluye accesorios M 72,00 $ 61.227,00 $ 4.408.344,0 1-08-24 Flashing (Flanche) en lámina galvanizada C-26, incluye material fijación y impermeabilizante M 50,00 $ 28.811,00 $ 1.440.550,0 1-08-27 Suministro, instalación de perfil metálico para cubierta, incluye soldaduras y pintura M 20,00 $ 39.434,00 $ 788.680,0 4 - 03 CARPINTERIA METÁLICA 1-03-17 Correa metálica de 1 - 4 m, incluye tornillos, soldaduras y pintura M 10,00 $ 67.111,00 $ 671.110,0 5 - 13 PUNTOS SANITARIOS 1-13-45 Bajante PVC para lluvia de 4" M 30,00 $ 51.338,00 $ 1.540.140,0 1-13-12 Tubos PVC sanitaria de 4", incluye accesorios M 50,00 $ 33.875,00 $ 1.693.750,0 1 - 15 MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN 1-15-02 Trinchos doble en guadua h libre - 1,00 m m 15,00 $ 153.419,00 $ 2.301.285,0 1-15-13 Barrera viva triple con vetiver, limoncillo, lirio y m 20,00 $ 125.422,00 $ 2.508.440,0 TOTAL COSTO DIRECTO ########## A.U (x) 23,50% ########## TOTAL ########## TIEMPO DE EJECUCIÓN 90 DIAS Diego Andrez Montoya G. Ingeniero CQGRD	

Página 1

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	
Versión: 0	Vigencia 09-2012	

	Presupuesto mejoramiento de vivienda La Celia Sector Los tanques, propiedad de la Señora Teres Mejía.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	

	Presupuesto manejo de aguas lluvia y reforestación Vivienda sector los tanques.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	
4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se	Se estuvo atento por disponibilidad los días 18 de a 24 de septiembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	No se tienen observaciones.

Fechas	Profesionales
10- 16 de julio	Alejandra – Alfredo
17 al 23 de julio	Juan Manuel - Diego
24 – 30 de julio	Andrea – Cristian
31 de julio – 6 de agosto	Alejandro – Alfredo
7 -13 de agosto	Sebastián – Diego
14 -20 de agosto	Juanita – Cristian
21-27 de agosto	Daniel – Alfredo
28 de agosto 3 de septiembre	Alejandra – Diego
4 -10 de septiembre	Juan Manuel – Cristian
11 -17 de septiembre	Andrea – Alfredo
18 -24 de septiembre	Alejandro – Diego
25 de septiembre – 1 de octubre	Sebastián - Cristian

requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Evaluación técnica en el Barrio Futuro Bajo, Pereira Risaralda el día 14 de septiembre de 2023. El día 16 de septiembre de 2023 se da apoyo a al cargue de ayudas para ser entregadas en el Barrio Futuro Bajo de Pereira Risaralda.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.  Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	Atención a solicitud por emergencia por fuertes lluvias en el sector Futuro bajo

	El día 16 de septiembre de 2023 se da apoyo a la entrega de mercados en el barrio Futuro Bajo de Pereira Risaralda.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	
5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Reunión Equipo técnico el día 12 de septiembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

	Capacitación de digitación del RUD el día 12 de septiembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	
	Reunión Equipo técnico el día 19 de septiembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

	Capacitación liderada por Secretaria De Salud, Evaluación de Riesgos en Edificaciones, hospitales, Realizada el día 19 de septiembre d e2023	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	
6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS
