FLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

INFORME SST

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Corporación Académica Ambiental

EL HOMBRE POR NATURALEZA
Cornare

INFORME DE CONTRATISTAS SST - EJECUCIÓN

1. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

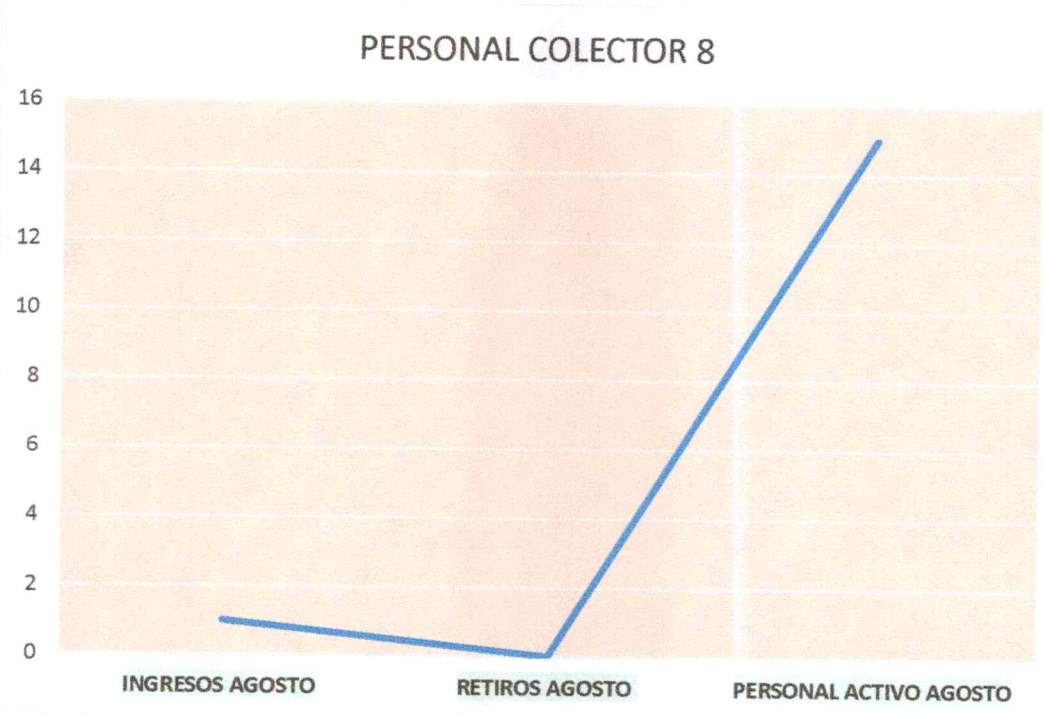
1.1 REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Tabla. Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones.

#	CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EPS	ARL		AFP
						NOMBRE	NOMBRE	FECHA DE AFILIACION	NOMBRE
1	FEXOCOM	811.013.821-9	ELKIN JESÚS LANDAZURI PASTRANA	1067986134	MAESTRO	MUTUAL SER	SURA	4/07/23	PORVENIR
2	FEXOCOM	811.013.821-9	DELVIS ANDRÉS SOLAR URANGO	1003401791	AYUDANTE DE OBRA	CAJACOPI	SURA	5/07/23	PORVENIR
3	FEXOCOM	811.013.821-9	NICOLAS SANTIAGO CAUSIL SUAREZ	10776117	OFICIAL DE OBRA	MUTUALSER	SURA	6/07/23	PORVENIR
4	FEXOCOM	811.013.821-9	RUBEN DARÍO POLO PÉREZ	1133844633	AYUDANTE DE OBRA	SAVIA SALUD	SURA	7/07/23	PORVENIR
5	FEXOCOM	811.013.821-9	SERGIO ANDRES MARIN AGUDELO	15448288	OP RETROEXCAVADORA	NUEVA EPS	SURA	7/07/23	PORVENIR
6	SUBCONTRATISTA	901662540	NEYS ANTONIO PERALTA SOTO	78298471	OP MINICARGADOR	SURA	SURA	5/07/23	PORVENIR
7	SUBCONTRATISTA	900167771-2	LUIS ALFONSO DORIA PEREZ	1124017896	OP DE EXCAVADORA	NUEVA EPS	POSITIVA	22/06/23	PORVENIR
8	FEXOCOM	811.013.821-9	CARLOS ALBERTO TORRES VALENZUELA	1234988421	AYUDANTE DE OBRA	SURA	SURA	19/07/23	PORVENIR
9	FEXOCOM	811.013.821-9	JANNER ALBERTO ÑEZCO ARGUMEDO	1066725750	DIRECTOR DE OBRA	SURA	SURA	1/06/23	PORVENIR
10	FEXOCOM	811.013.821-9	DAVID FELIPE GIL VERGARA	1066752563	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	1/06/23	COLPENSIONES
11	FEXOCOM	811.013.821-9	CARO GALOFRE ANDREA DEL PILAR	30688235	INGENIERA AMBIENTAL	SURA	SURA	1/06/23	PORVENIR
12	FEXOCOM	811.013.821-9	HOIBER ALFONSO BENITEZ ZAPATA	1035282060	ENCARGADO DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	5/07/23	PROTECCION
13	FEXOCOM	811.013.821-9	BAYRON DE JESUS RUIZ RUIZ	1066753209	ALMACENISTA	COOLSALUD	SURA	5/07/23	PORVENIR
14	FEXOCOM	811.013.821-9	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON	1098753002	RESIDENTE SST	NUEVA EPS	SURA	28/07/23	PORVENIR
15	MULTIMODAL	901313949-6	DERVIS JOSE ROMERO FERNANDEZ	PPT 7002131	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	17/08/23	PROTECCION

1.1.1 NOVEDADES EN SU PERSONAL INGRESOS - RETIROS DEL PERSONAL DE OBRA.

Figura x. Grafica de novedades del personal en el mes de Agosto



INGRESOS AGOSTO	RETIROS AGOSTO	PERSONAL ACTIVO AGOSTO
1	0	15

1.1.2 Ausentismo por (enfermedad general)

En el mes de Agosto no se presento ausentimismo por enfermedad.

1.1.3 Ausentismo por accidentes laborales

En el mes de Agosto se presento un accidente de trabajo el dia 26 del mes en el cual se vieron involucrados dos trabajadores.

Ver informe accidente de trabajo

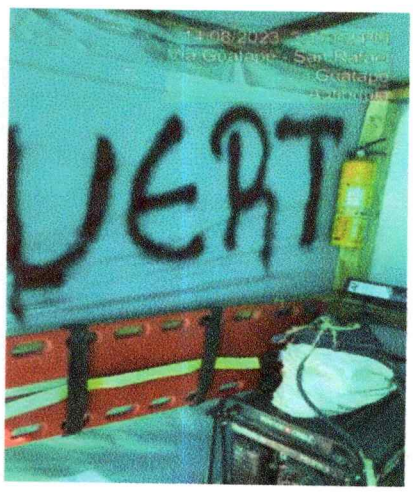
1.1.4 Ausentismo por incidentes:

En el mes de Agosto no se presento incidentes laborales.

1.2 REGISTROS

1.2.1 Registro fotográfico.

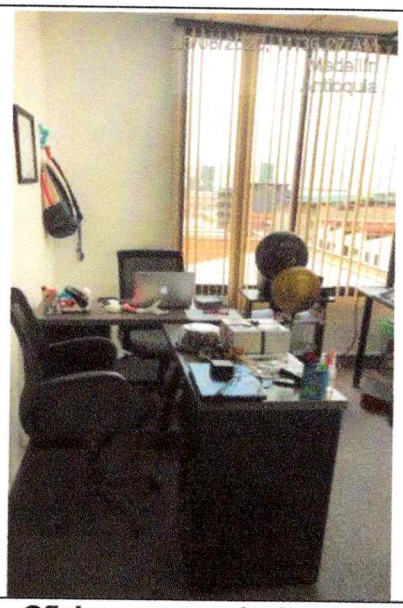
1.2.2 Primeros auxilios

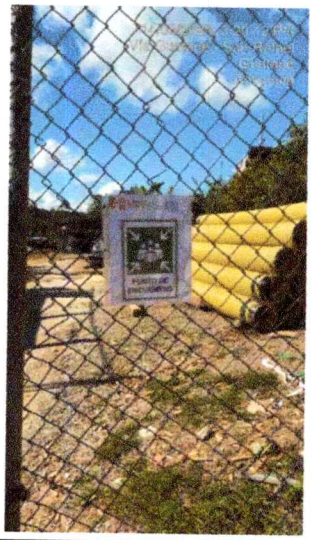
	
Botiquin primeros auxilios	**Camilla y extintor**

1.2.3 Saneamiento básico

1.2.3.1 Oficinas y campamentos.

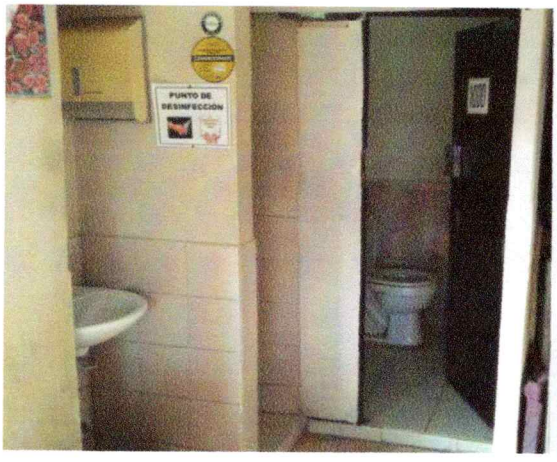
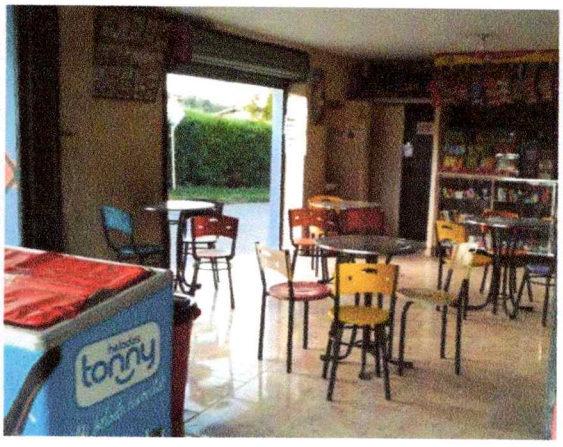
Registro fotográfico.

	
Oficinas personal administrativo	**Oficinas personal administrativo**

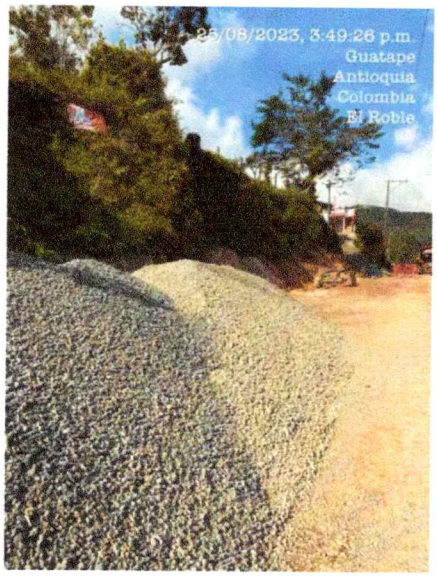
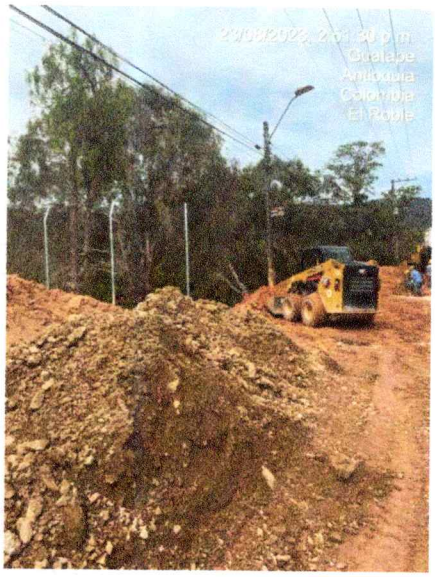
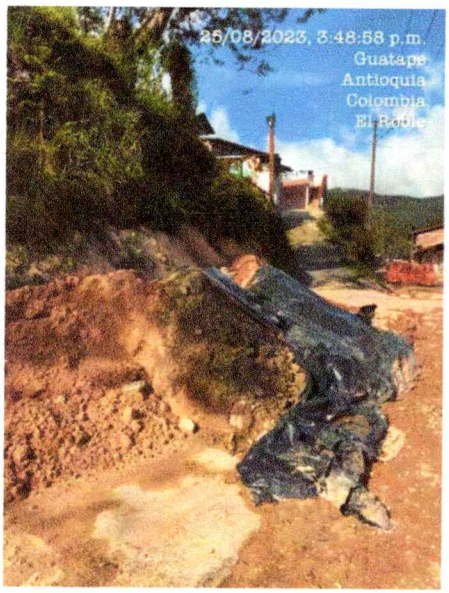
	
Campamento en obra	**Bodega de Obra**

1.2.3.2 Unidades sanitarias para personal de obra y personal administrativo

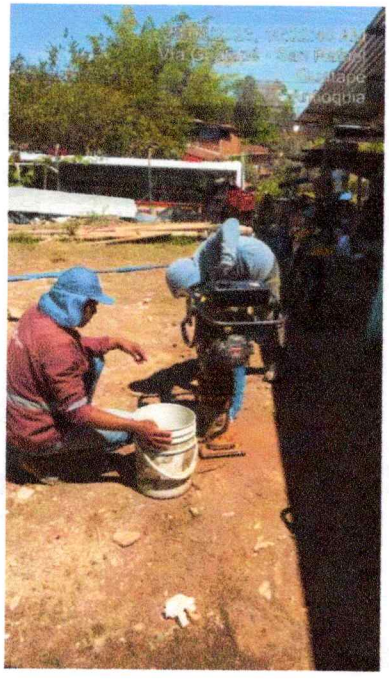
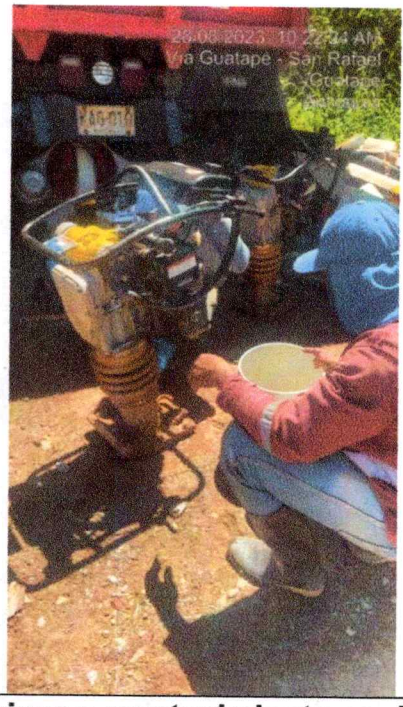
	
Baño personal operativo	**Baño personal administrativo**
	
Baño personal administrativo	**Baño personal administrativo**

	
Baño personal operativo -Obra	**Baño personal operativo -Obra**

1.2.4 Puntos de acopio

	
Acopio de material en obra	**Acopio de material en obra**
	
Acopio de material en obra	**Acopio de material en obra**

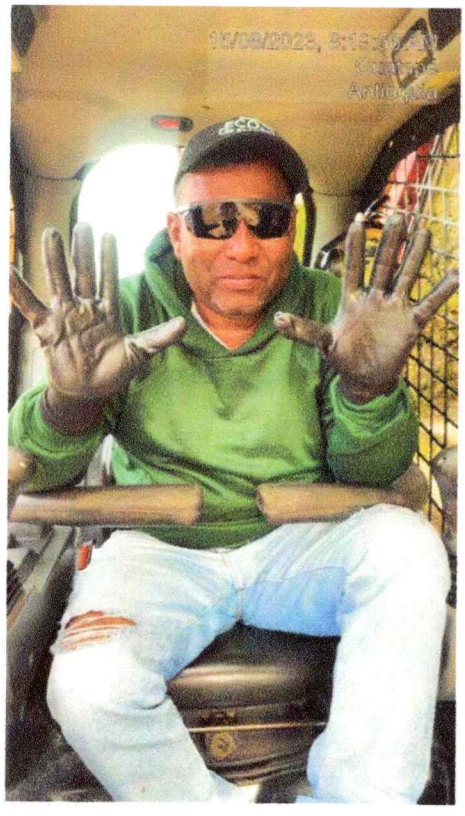
1.2.5 Inspección de maquinaria y equipos

	
Limpieza y mantenimiento equipos	**Limpieza y mantenimiento equipos**

Ver anexo inspección herramientas y equipos

1.3 MEDIDAS DE CONTROL

1.3.1 Entrega de elementos de protección personal

	
Entrega de EPP	**Soporte entrega de EPP**

Ver anexo entrega de Elementos de protección personal EPP.

1.3.2 SG- SST Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

1.3.3 Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros)

- En el desarrollo de las actividades se obra se evidencio que la demarcacion y señalizacion que se tenia en obra para el peaton no cumplia el objetivo de brindar una barrera la cual proteja al peaton del posible contacto con algun tipo de material que se genera en operación y evitar el paso de este cerca de la excavacion. Por esta razon se implemento una barrera contruida con malla zaran la cual restringa el paso del peaton y contenga cualqui tipo de material que se genere en obra.

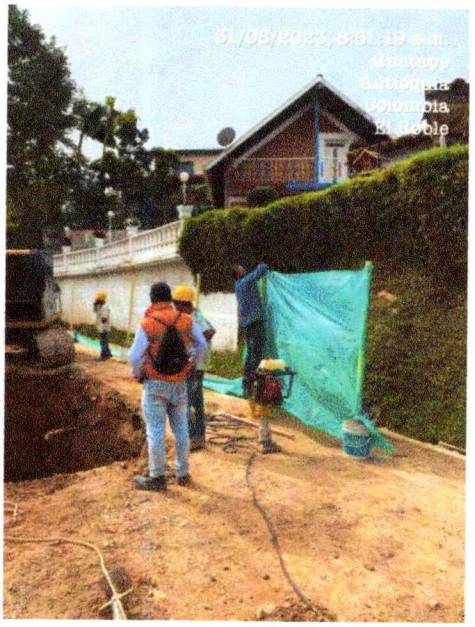


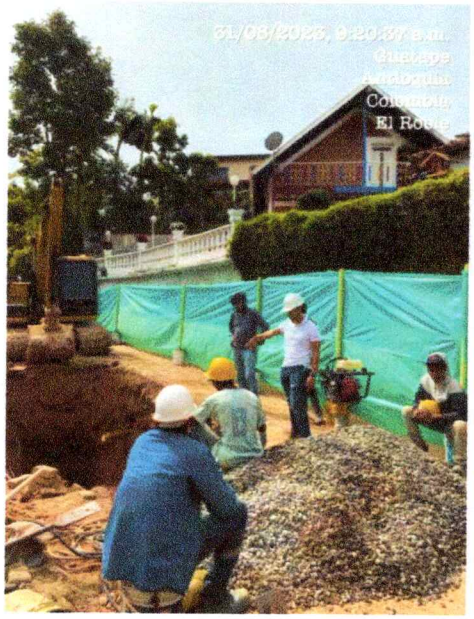
Demarcacion y señalizacion con balizas y cinta peligro para paso peatonal (ANTES)

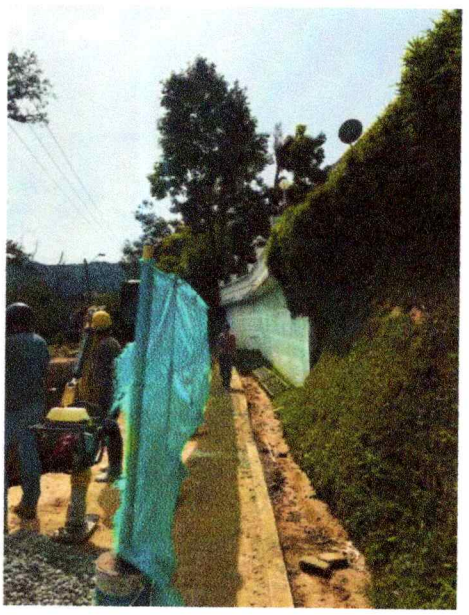
Proceso constructivo nueva barrare paso peatonal

Proceso constructivo





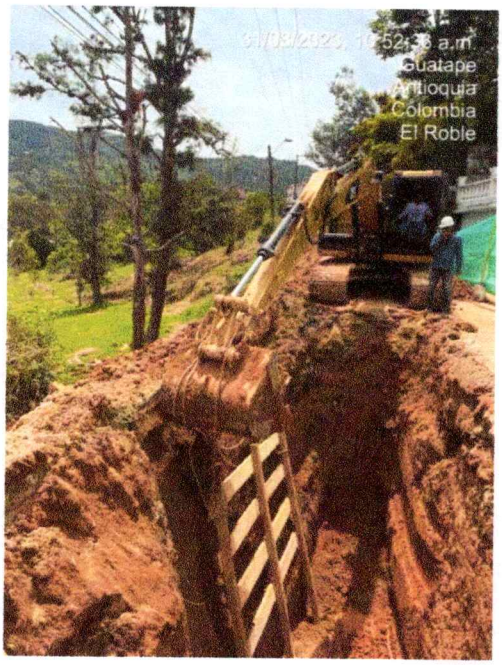


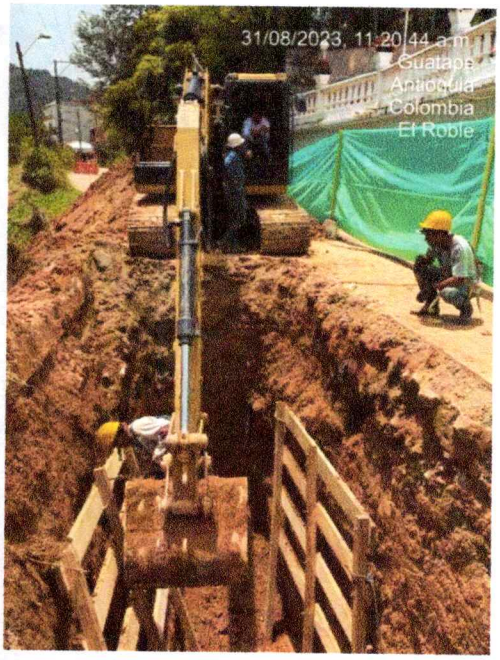


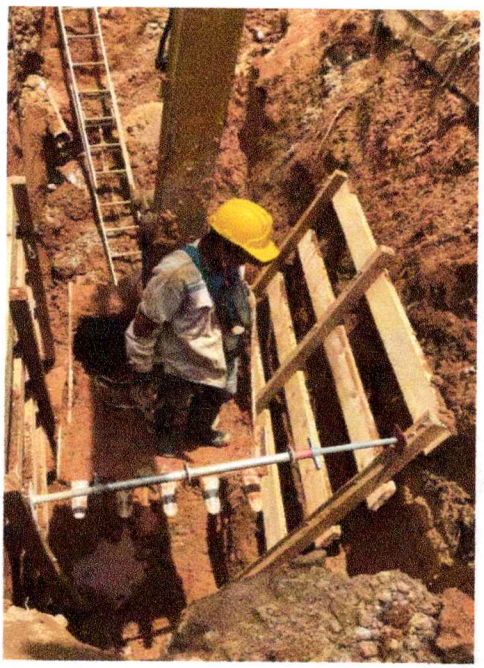
- Se presento en obra un accidene de trabajo el cual involucro a dos trabajdores que se encontraban en la puesta del entibado cuando el talud se desplomo. Despues de realizr la respectiva investigacion y socilizacion con los trabajadores la empresa decidi cambiar el metodo de contecion que se tenia por uno el cual cumpla la misma funcion pero se instale desde la superficie con ayuda de la retroexcavadora, evitando el ingreso de trabajadores a la brecha sin antes estar debidamente protegidos en caso tal que el talud se derrumbe.

Proceso constructivo nuevo metodo de contencion




Guatapé
Antioquia
Colombia
El Roble


31/08/2023, 11:20:44 a.m.
Guatapé
Antioquia
Colombia
El Roble

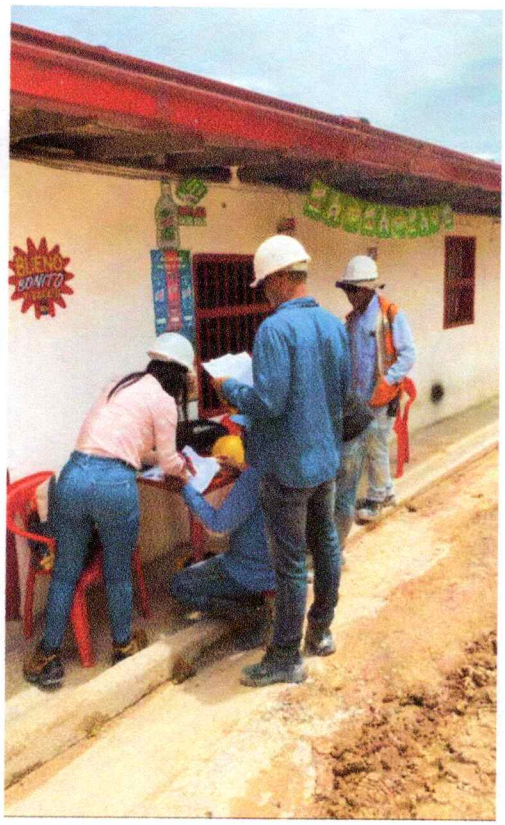
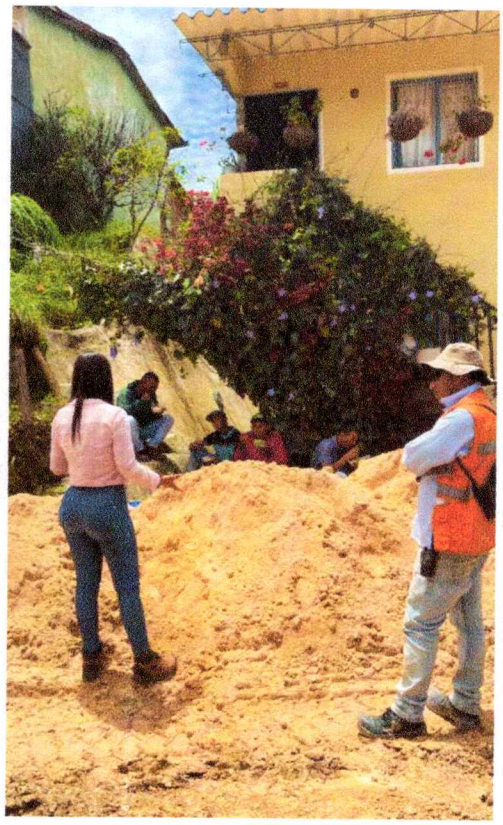


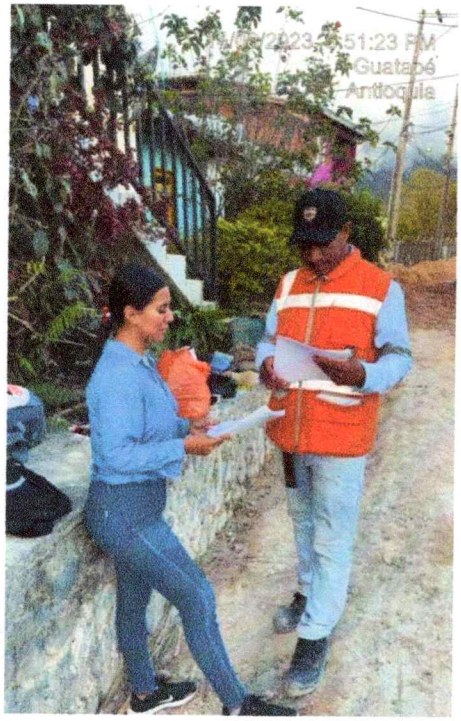
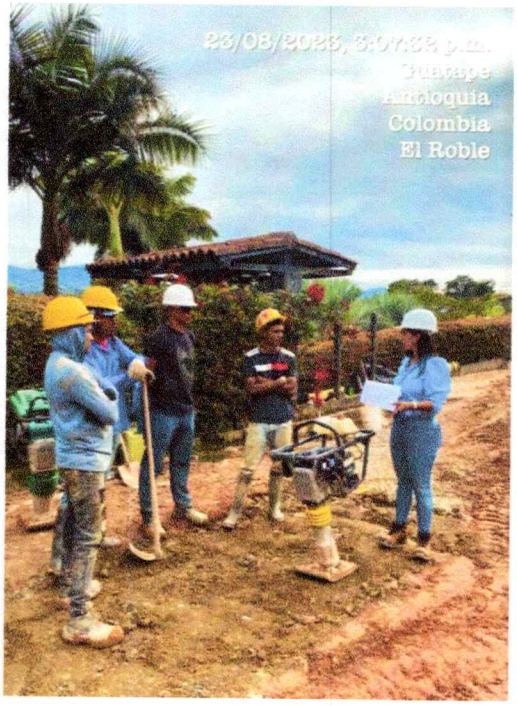
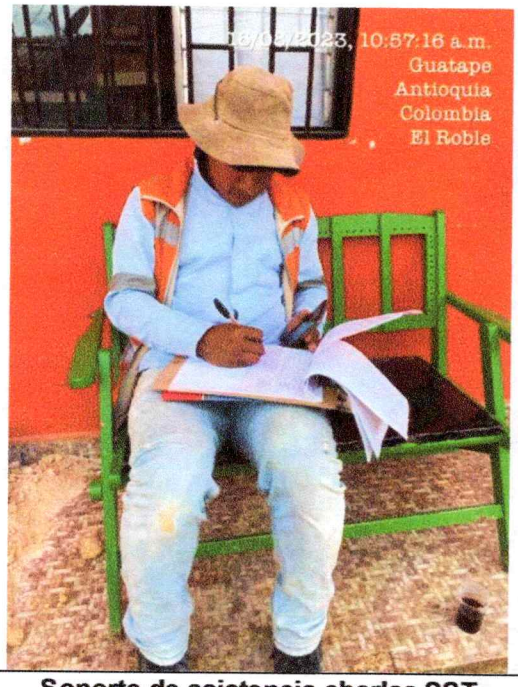
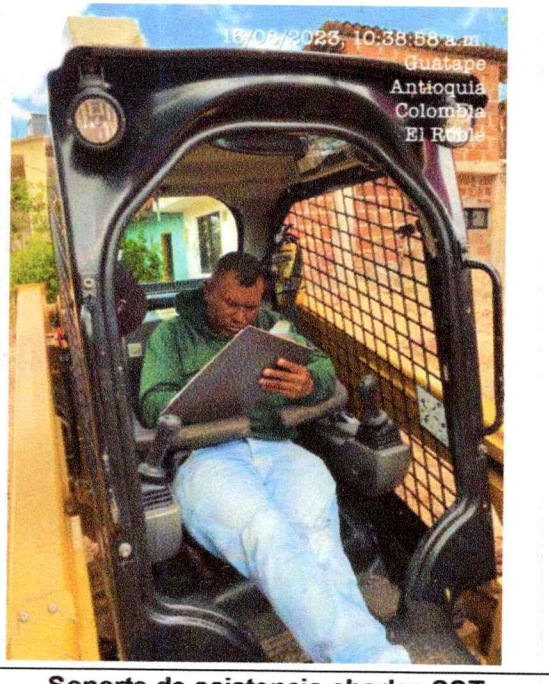


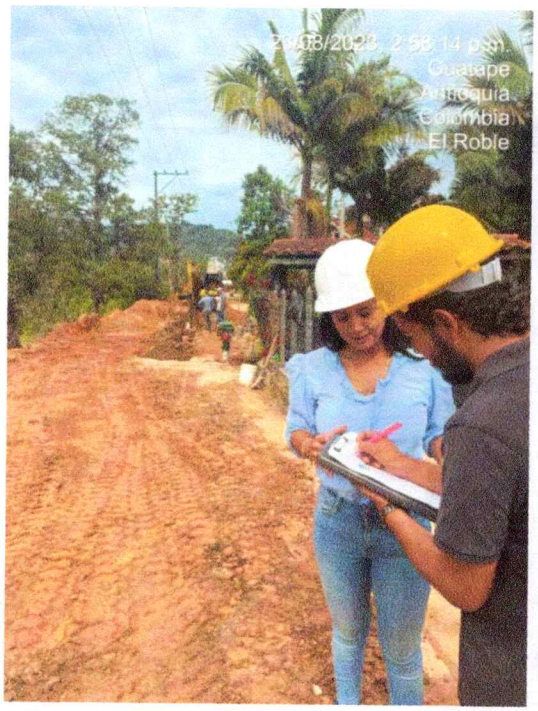
1.3.4 Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción.

1.3.4.1 Programa de inducción y capacitación

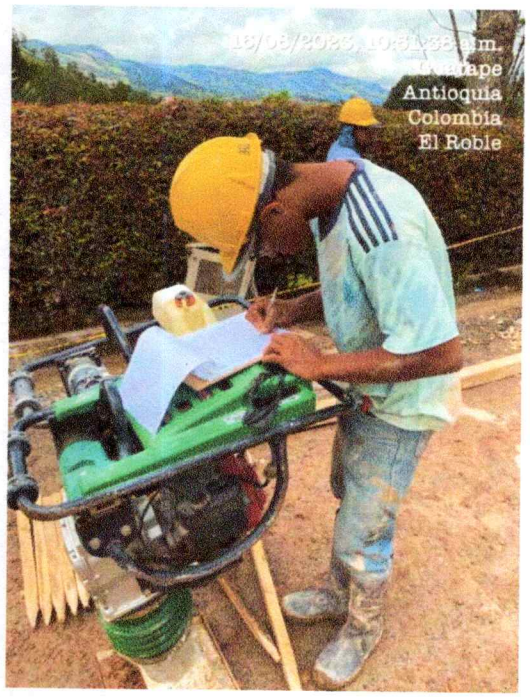
1.3.4.2 Inducciones y capacitaciones.

	
Charlas del plan anual de capacitaciones	Charlas del plan anual de capacitaciones

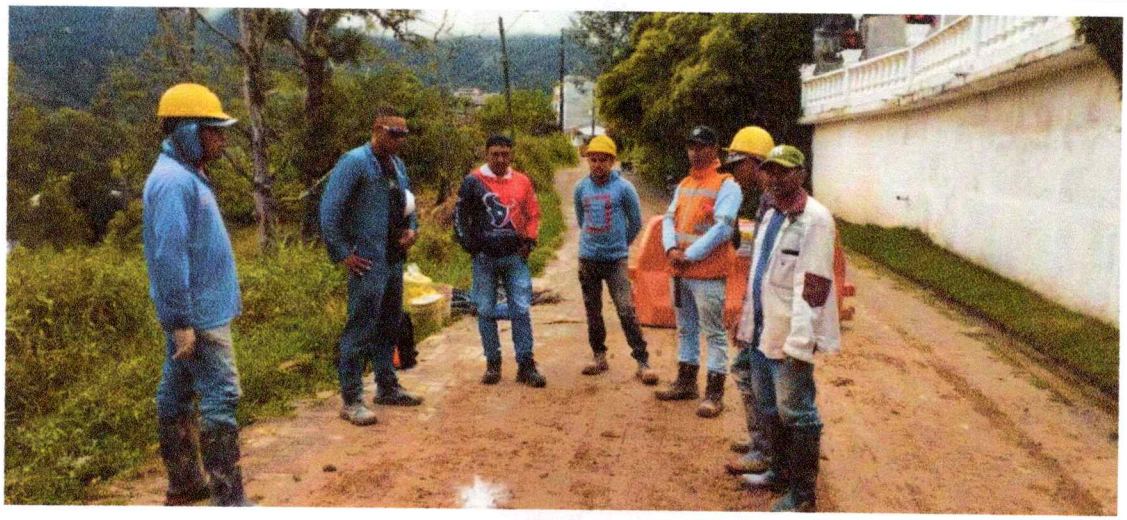
	
Charlas del plan anual de capacitaciones	**Charlas del plan anual de capacitaciones**
	
Soporte de asistencia charlas SST	**Soporte de asistencia charlas SST**



Soporte de asistencia charlas SST



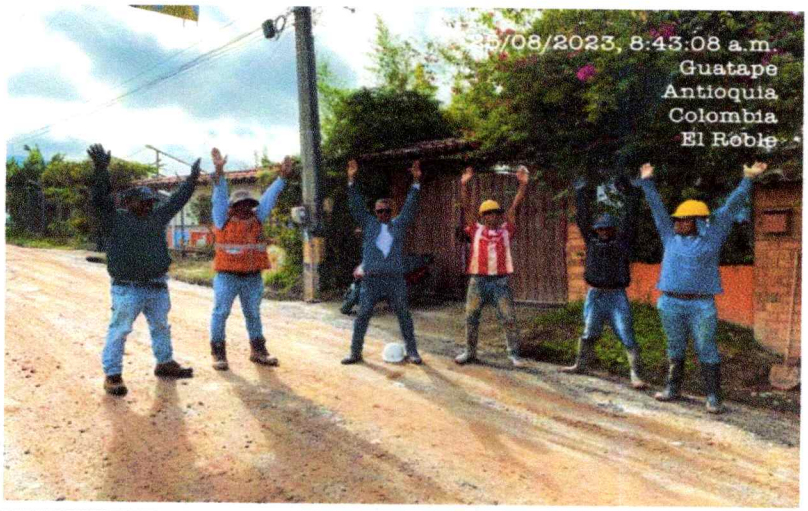
Soporte de asistencia charlas SST



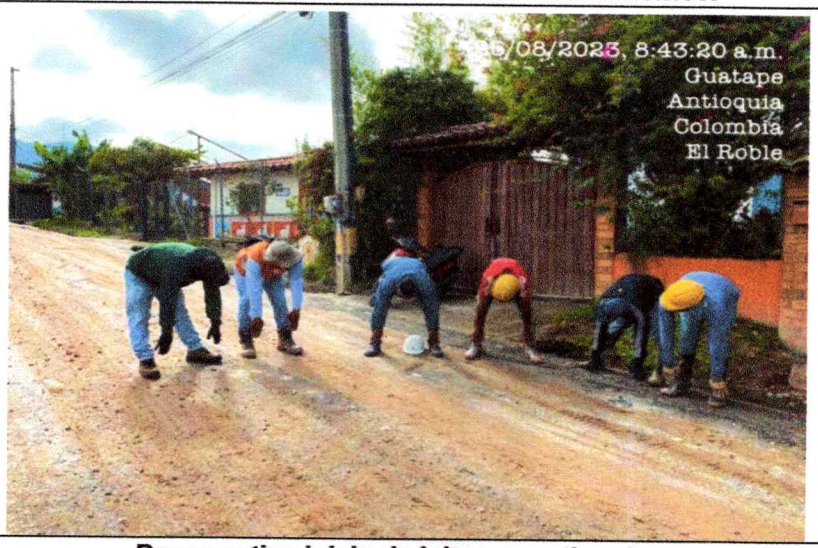
Capaitacion incio de labores

Ver anexo charlas SST

1.3.4.3 Pausas activas.



Pausa activa inicio de labores- estiramientos.



Pausa activa inicio de labores- estiramientos.

1.3.5 Señalización y demarcación

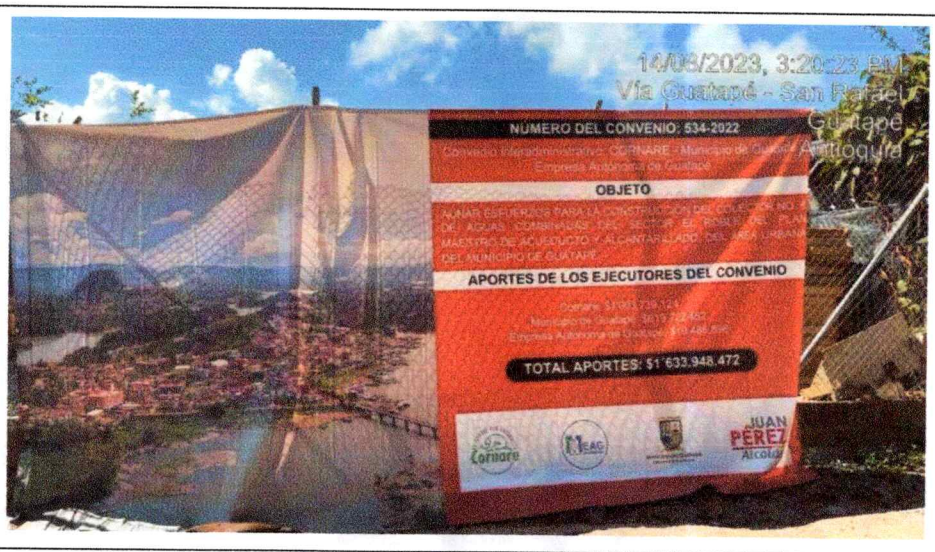
	
Paso peatonal con señalización informando sobre las actividades que se ejecutan	**Barreras al incio y fin de obra con señalización informativa de actividades de obra y aso restringido**



Paleta de pare y siga para uso en obra



Señalzacioin punto de encuentro en caso de emergencia



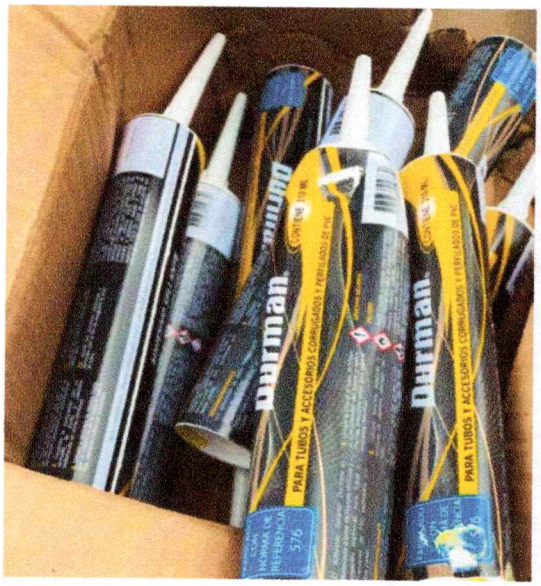
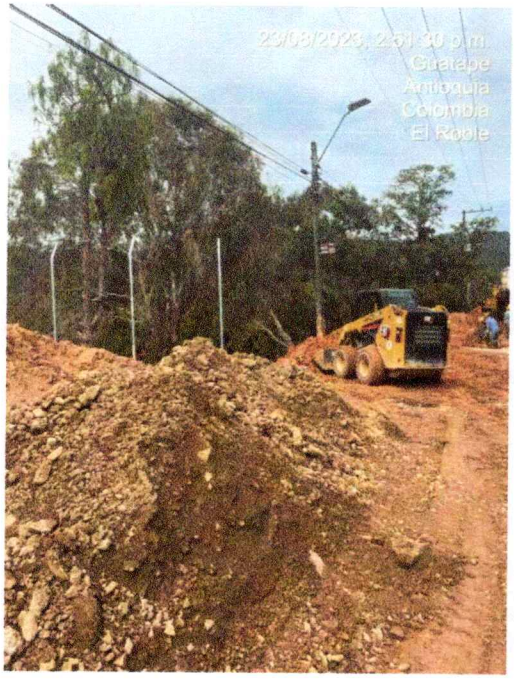
Valla informativa sobre proyecto colector # 8

1.3.6 Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

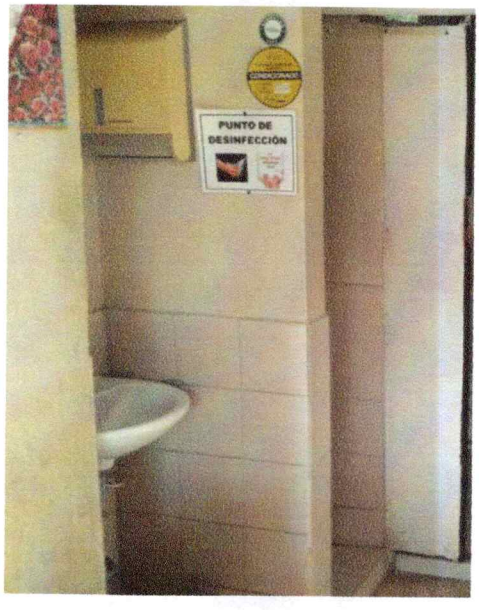
Proceso	Materiales	Equipos	Herramientas	Sustancias quimicas
Demolicion de pavimento con maquinaria pesada	Triturado, Lino afirmado	Retroexcavadora	Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo.	
Excavacion manual y mecanica de tierra	Triturado, Lino afirmado	Retroexcavadora	Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo.	
Puesta de Tuberia- colector	Tuberia PVC , accesorios		Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo	Limpiador PVC
Lleno de excavaciones para cubrir tuberia	Triturado, Lino afirmado	Retroexcavadora	Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo.	

- En la ejecuccion de las atividades se cuenta con herramientas menores. Maquinaria pesada, material de lleno y algunas sustancias quimicas como lo son el limpiador PVC, acontinuacion se deja registro fotografico reportado en la tabla.

Ver anexo ficha de seguridad Limpiador PVC.

	
Limpiador para PVC	**Retroexcavadora**
	
Minicargador y material	**Rana Compactadora.**

1.3.7 Lavado de manos y desinfección




Area de lavado de manos obra

1.3.8 Zona de hidratación



Areas de hidratacion obra



Angie Milena Sequeda Cordon

Residente SST

Ingeniera ambiental Esp, SST

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Corporación Académica Ambiental

EL HOMBRE POR NATURALEZA
Cornare

	RESOLUCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-89
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/05/2017
		PÁGINA	1 de 1

RESOLUCIÓN NÚMERO [redacted] 19998 **DE**

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 04502 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON, identificado (a) con la cédula de Ciudadanía No. 1098753002, ha solicitado licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo ante la Secretaria de Salud Departamental de Santander.

Que de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012, el peticionario ha presentado la documentación requerida para la expedición de la Licencia en Salud Ocupacional para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo.

Que por lo antes expuesto, el Secretario de Salud Departamental.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otórguese LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A: ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON. INGENIERO AMBIENTAL - ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No. 1098753002, en las áreas de Ingeniería Ambiental en Seguridad y Salud en el trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Investigación en área técnica, Investigación del accidente de trabajo, Educación, Capacitación, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 2: La licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de Diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: Cuando se modifique las condiciones por la cual se otorgó esta licencia, en el término máximo de un mes se debe informar a la Secretaria de Salud de Santander para la modificación de la misma.

ARTÍCULO 4: Esta licencia es válida en todo el Territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución procede los recursos legales.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,
Dado en Bucaramanga a los 12 SEP 2022

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Secretario de Salud Departamental

VoBo: Luis Felipe Tarazona V.- Director Desarrollo Vigilancia y Control
Revisó: Yelitza Hernández G. – Coordinador Grupo de Acreditación en Salud y SOGC
Proyectó: Helena Gordillo O. - Grupo de Acreditación en salud S.O.G.C.

Scanned with CamScanner

FLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO AGOSTO

IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

INFORME DE INVESTIGACION INCIDENTES / ACCIDENTES DE TRABAJO

SEÑALE CON UNA X EL TIPO DE EVENTO A INVESTIGAR.					
	Incidente		**Accidente de Trabajo**	X	

DATOS BASICOS DE LA OBRA			
Obra	COLECTOR # 8	**Teléfono**	3505665329
Municipio	GUATAPE	**Departamento**	ANTIOQUIA

DATOS BASICOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR			
Encargado de Salud Ocupacional	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON	**Identificación**	1098753002
Ingeniero residente	DAVID FELIPE GIL VERGARA	**Identificación**	1.066.752.563

IDENTIFICACION DEL EMPLEADO.							
Nombres y apellidos	NICOLAS SANTIAGO CAUSIL SUAREZ	**Cedula**	10.776.117			**Edad**	48 AÑOS
Oficio	OFICIAL DE CONSTRUCCION	**Antigüedad en la empresa**	2 MESES		**Antigüedad en el oficio**	15 AÑOS	
Sección		**Turno de trabajo**	DIURNA	**Horas trabajadas (Previa al AT)**	**2**	**Dias de incapacidad**	3 DIAS

IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

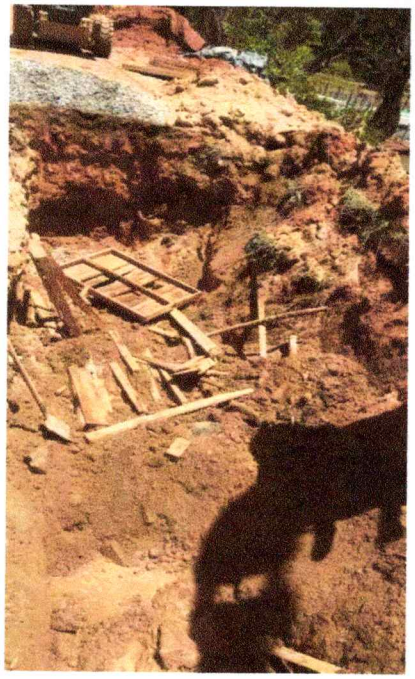
IDENTIFICACION DEL EMPLEADO.							
Nombres y apellidos	DEIVIS ANDRES SOLAR URANGO	**Cedula**	1003401791		**Edad**	21 AÑOS	
Oficio	AYUDANTE DE OBRA	**Antigüedad en la empresa**	2 MESES	**Antigüedad en el oficio**	5 AÑOS		
Sección		**Turno de trabajo**	DIURNA	**Horas trabajadas (Previa al AT)**	**2**	**Días de incapacidad**	3 DIAS

DATOS DEL SUCESO					
Fecha de la investigación	28/08/23	**Fecha de ocurrencia**	26/08/23	**Hora**	10: 30 AM
Lugar donde ocurrió el accidente	LA OBRA – COLECTOR 8, GUATAPE , ANTIOQUIA				
Parte del Cuerpo Afectada	MIEMBROS INFERIORES	**OBJETO, EQUIPO O SUSTANCIA QUE CAUSO EL DAÑO**	MATERIAL (TIERRA)		
Naturaleza de la lesión	TRAUMATISMO ,APLASTAMIENTO-CONTUNSION EN PIERNAS	**Tipo de accidente**	DERRUMBE(CAIDA DE MASAS, TIERRA, ROCAS)		
Hubo daños a las instalaciones, equipos?, Cuáles?	NO				
Testigos del accidente	TRABAJADORES Y COMUNIDAD	**Mecanismo o forma del accidente**	ATRAPAMIENTO EN BRECHA		

IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

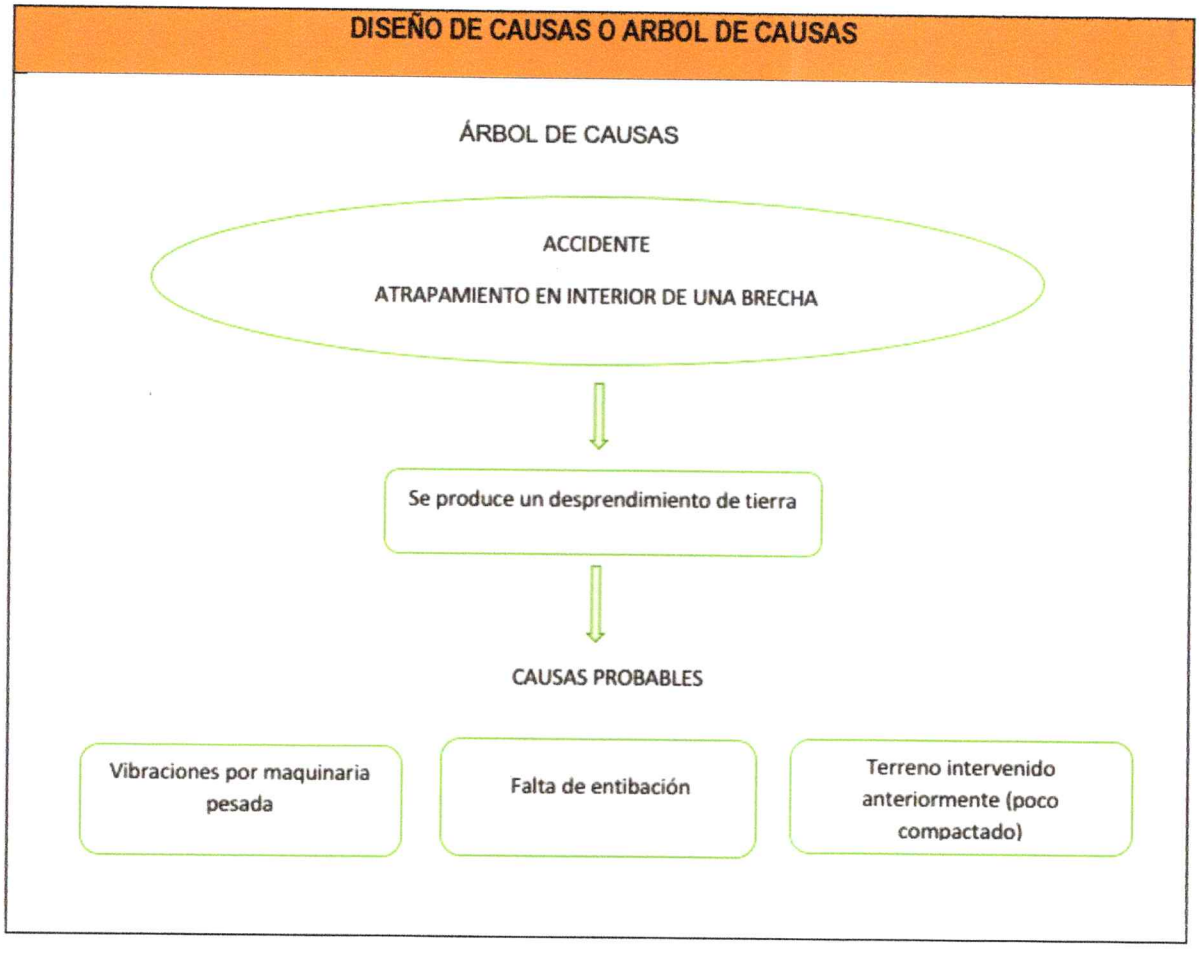
DATOS DEL SUCESO	
Describa detalladamente lo que ocurrió, sea breve y claro.	Los trabajadores, un Oficial de 48 años y un ayudante de 21 años pertenecientes a una empresa dedicada a la construcción. Realizaban una obra de conexiones de abastecimiento y saneamiento. En ese momento, junto con otros compañeros y el maquinista de una retroexcavadora perteneciente a una subcontrata, estaba ejecutando una brecha para la instalación de un tubo colector de unos 6 m de longitud. La instalación del colector se hacía por tramos. Para evitar el riesgo de derrumbe o desprendimiento de talud, el procedimiento normal era la utilización de un entibado como método de contención Siendo las 11:00 am del día 26 de Agosto, hora donde el trabajador se encontraba dentro de una brecha con una profundidad alrededor de 4 metros, excavación procedente a una de las actividades de obra, en la cual se empezaba a realizar la puesta del entibado como método de contención del talud. Para ese preciso momento el talud se viene abajo con el trabajador dentro de ella, ocasionando un atrapamiento con material de aproximadamente 2 metros de profundidad, dejando al trabajador completamente cubierto e inmóvil, causando lesiones de traumatismos por aplastamiento en regiones múltiples de los miembros inferiores.

IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

DIBUJO O FOTOS
 

IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

DISEÑO DE CAUSAS O ARBOL DE CAUSAS



IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS								
Controles a implementar según lista priorizada de causas	**Tipo de control**			**Fecha AA/MM/DD**		**Efectividad de la medida**		**Área o persona Responsable**
	F	**M**	**P**	**Ejecución**	**Verificación**	**SI**	**No**	
Implementación nuevo método de contención desde la parte superior.		x		30/08/2023	31/08/2023	x		Ing. residente – Ing. SST
Uso de elementos protección personal.			x	28/08/2023	28/08/2023	x		Ing residente – Ing. SST
Inspección locativa antes de inicio de actividades.			x	28/08/2023	28/08/2023	x		Ing.residente – Ing.SST-trabajadores
Socialización metodología cinco por que?			x	29/08/2023	29/08/2023	x		Ing. SST

ANÁLISIS CAUSAL		
Causas inmediatas (actos o condiciones)	Actos inseguros	No inspeccionar el área de trabajo.
	Condiciones peligrosas	Talud inestable.
Causas básicas (razones de lo sucedido)	Factores personales	exceso de confianza.
	Factores trabajo	Ausencia de supervisión.

IFLEXOCOM S.A.S
NIT 811.013.821
flexocomsas@gmail.com
Carrera 51 # 41-222 Oficina 502
3205256696

F: Fuente **M:** Medio **P:** Persona

FIRMA DE EQUIPO INVESTIGADOR	
Jefe inmediato	Janner Ñezco
Ingeniero residente	David Felipe gil
Residente SST	Angie Milena Sequeda

ELABORACION Y REVISION			
Nombres y apellidos	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON	**Cedula**	1098753002
Firma	
