	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. MCSP-SP-LP-005-2022 **Contratista:** MARTHA YENNY MENA
Contrato de Obra No. SAMC-009-2022 **Contratista:** SERVICIOS INTEGRALES CONTEMPORANEOS
Contrato de Obra No. 1050-15-103-2022-073 **Contratista:** INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S
Contrato de Obra No. MLSJ-LPN-009-2022 **Contratista:** UNION TEMPORAL LITORAL
Contrato de Obra No. 154-2022 **Contratista:** CAMPO ELIAS PALOMEQUE
Contrato de Interventoría No. 1101-2022 **Interventoría:** CONSORCIO INCOL-URBA

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOBIA RURAL" LOTE 15.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** jul-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2-4-6-8
1	**INTRODUCCIÓN**		10
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		11
2.1	Localización		12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		21
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		25
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		26
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		31
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	34-52-79
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	45-54-72
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	46-55-73
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	82
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	47-74
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	48-75
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	49-76-81
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		NA
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	42-58
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	58
	• Seguimiento Programa de Obra		70
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	70
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	70
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	69
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		83
5.1	Información general del contrato		83
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		85
5.3	Informes especialistas y profesionales		85
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		86
5.5	Informe matriz de riesgos.		NA
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		NA
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		86
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	96
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	97
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	NA
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	98
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	NA
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		99
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	99
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	99
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	NA
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	NA
7	**Conclusiones y recomendaciones**		100
8	**Anexos**		102
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		125
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		103-124
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		103-124
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		NA

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3388 de fecha 12 SEPTIEMBRE 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** 7

CONTRATO DE OBRA No.: 005 DE 2022

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/01/23
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/05/23
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 3.345.499.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 3.345.499.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URABA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	ANTIDAD ME	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	3.306.106.905,00	39.392.095,00	3.345.499.000,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	197.484.800,00	0,00	197.484.800,00	197.484.800,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 3.345.499.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 502.603.846,40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 15,02%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Lleno con material seleccionado y compactado del mismo y extracción de material de cantera.







Transporte de material, lleno con material seleccionado y compactado del mismo y chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Miguel rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** 4

CONTRATO DE OBRA No.: 154 DEL 2022

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 14/04/23
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/07/23
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 260.000.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 260.000.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URABA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	220.607.905,00	39.392.095,00	260.000.000,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	257.809.829,66	0,00	257.809.829,66	257.809.829,66
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 260.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 260.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/07/23 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.







Actividades de mantenimiento, conformación de calzada, y reparación de fisura en losa de concreto.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Miguel rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **PERIODO MES:** 7

CONTRATO DE OBRA No.: 1050-15-103-2022- 073

OBJETO: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 22/12/22
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/04/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 10/05/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/09/23
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 938.878.144,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 157.534.995,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.096.413.139,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 281.663.443,20
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCON-URBA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	298
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes	UNIDAD	1
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	50	240
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes	UNIDAD	0	0
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.093.233.131,00	3.180.008,00	1.096.413.139,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1.096.413.139,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	187.253.809,00	0,00	187.253.809,00	445.398.705,90
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				445.398.705,90

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 535.946.836,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 445.398.705,90
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 40,62%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA CI¿ONSTRUIDA UN SOLO CARRIL



PRELIMINARES CONSTRUCCION DEL PUENTE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN (DOCORDÓ) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** julio

CONTRATO DE OBRA No.: MLSJ-LPN-009 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL LITORAL DEL SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIÓN

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LITORAL

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 2/02/23
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/03/23
FECHA DE REANUDACIÓN: 10/04/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2/06/23
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 920.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL-URBA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	350	
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarillas	3	
	Box Culvert 2X2	2	
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarillas	UND		
	Box Culvert 2X2	UND		
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 920.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 920.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Indicar la localización y actividad.




Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520278504CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	CONSORCIO INCOL-URBA **NIT 901609799-1**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUB DIRECCIÓN RED TERCIARIA



Vía Tanela - Titumate, MUNICIPIO DE UNGUÍA – CHOCÓ.

INFORME MENSUAL N°07

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por CONSORCIO INCOL-URBA. contiene el **Informe Mensual No 07** de la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".**

El presente informe contiene una descripción general de las actividades realizadas durante el período comprendido del 1 al 31 de julio de 2023 correspondiente a la etapa de Construcción del proyecto por parte de los Contratistas que han sido seleccionados a la fecha por cada uno de los municipios, los cuales son: MARTHA YENNY MENA MONRROY para el Municipios de El Cantón de San Pablo (vía La Yesita-Managrú), INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S. para el Municipio de Unguía (vía Tanela- Titumate), INTEGRALES CONTEMPORANEOS S.A.S. para el Municipios de Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó), CAMPO ELIAS PALOMEQUE para el Municipio de El Carmen de Atrato (Vía La Arboleda) y UNION TEMPORAL LITORAL para el Municipio Litoral de San Juan (Vía Cementerio), así como por el Interventor CONSORCIO INCOL – URBA a través de actividades de control de la programación de obra, control de calidad, personal y equipo, puesto a disposición a cada uno de los frentes del proyecto, aspectos financieros y avance de las obras.

El Contrato de Interventoría considera la ejecución de las actividades enmarcadas en el objeto contractual y prevé la realización de seguimiento y control de las actividades previas y la ejecución de las obras a ejecutar por parte de los Contratista seleccionados, el recibo parcial y final de las obras por parte de la interventoría y la liquidación. Lo anterior, conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones exigidas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de acuerdo con los alcances propuestos en el pliego de condiciones, y demás normas vigentes en una forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recurso humano y demás apoyo propuesto y en concordancia con lo requerido en el pliego de condiciones de la licitación pública.

2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del programa Colombia Rural “lote 15” del Gobierno Nacional que busca mantener y mejorar la transitabilidad de la red vial terciaria del país, buscando una movilidad más segura y eficiente, impulsando la reactivación de las economías locales al facilitar la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos, la promoción de los destinos turísticos y el acceso a bienes y servicios.


Para el Departamento del Chocó fueron elegidos seis (06) dentro de este mismo programa, los cuales corresponden a los municipios de Cantón de San Pablo, Atrato, Unguía, El Carmen de Atrato, San José del Palmar y Litoral del San Juan que se muestran en el siguiente cuadro y en el que se definen los tramos de vías y longitudes a intervenir:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (KM)
CHOCÓ	CANTÓN DE SAN PABLO	LA YESITA - MANAGRÚ	1,90
	ATRATO	YUTO – RAMAL SAMURINDÓ	0.152
	UNGUÍA	TANELA- TITUMATE	0.298
	EL CARMEN DE ATRATO	VEREDA LA ARBOLEDA – VÍA RELLENO SANITARIO	0.167
	LITORAL DEL SAN JUAN	VÍA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.350

Es importante mencionar que en lo que respecta al Municipio de San José del Palmar el Gestor Técnico del contrato nos ha informado que no se ejecutara proyecto a cargo de esta interventoría, ya que las intervenciones proyectadas se realizaron mediante la ejecución de otro contrato.

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Tal como se informó en el punto anterior, las obras a construir se encuentran ubicadas en los municipios de El Cantón del San Pablo, Atrato, Unguía, El Carmen de Atrato, Litoral del San Juan y San José del Palmar en el Departamento del Chocó. A continuación, se presenta el mapa de localización de las obras:

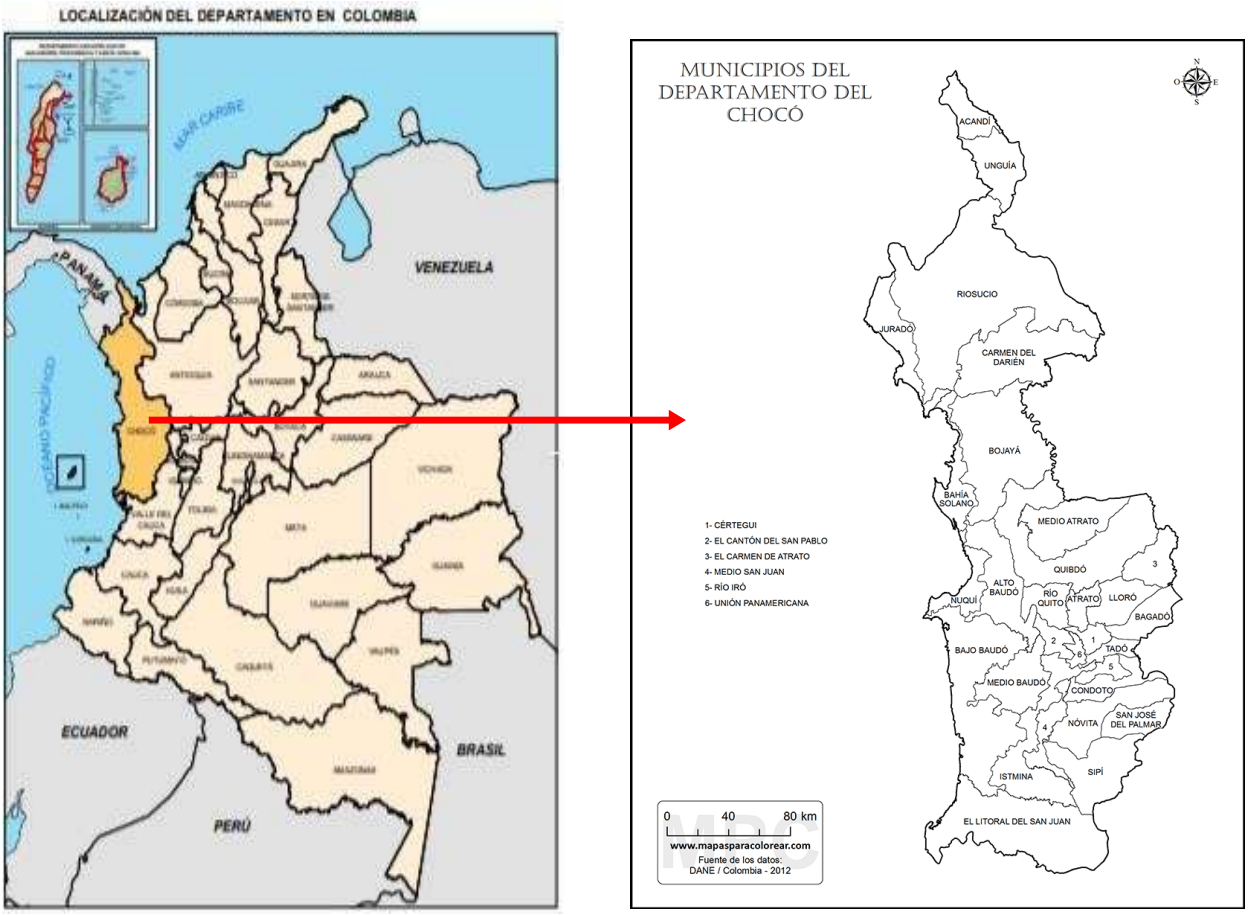

Fuente: Anexo Técnico Contrato de Interventoría.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS.

A la fecha del presente informe se ha adelantado la contratación de las obras por parte de los municipios de El Cantón de San pablo (vía La Yesita-Managrú), Unguía (vía Tanela- Titumate) y Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó), quedando pendiente aún por definir por parte de los respectivos municipios los contratistas para la ejecución de obras en los municipios de El Carmen de Atrato (vereda la Arboleda – vía relleno sanitario), Litoral del San juan (vía al cementerio).

2.2.1 Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo)

El tramo de vía a intervenir corresponde al camino vehicular que inicia desde la vía principal que conduce de Quibdó a Istmina con la cabecera municipal de Lloró, en una longitud total de 11.3 km, de los cuales 7.8 km ya se encuentran pavimentados en concreto hidráulico. De los 11.3 km hace falta por pavimentar una longitud de 3.5 km contados desde la intersección con la vía principal donde se ubica la abscisa K0+000 hacia la cabecera del municipio de lloró.

El Tramo de vía a mejorar presenta problemas de drenaje superficial de aguas e inestabilidad de algunos sitios de la banca, para lo cual se prevé realizar obras de construcción de Cinco (05) alcantarillas de Ø36”, la construcción de dos (02) box Culvert, construcción de dos (02) muros de contención, conformación de la calzada existente en sitios críticos y el mantenimiento rutinario mediante la actividad de limpieza de las alcantarillas existentes en todo el tramo de la vía. Así mismo, el proyecto considera para el mejoramiento del tramo de vía faltante la construcción de pavimento rígido en una longitud estimada en 450 ml.

2.2.2 Vía Yuto – Ramal Samurindó (Municipio de Atrato)

El tramo de vía a intervenir corresponde al camino vehicular que inicia desde la vía principal que conduce de Quibdó a Istmina con el centro poblado de Samurindó, en una

longitud de 2.9 km, de los cuales aproximadamente 50 metros lineales ya se encuentran pavimentados con placa huella. En el resto del tramo predomina la capa de rodadura en material de afirmado.

El Tramo de vía a mejorar presenta problemas de hundimientos y deformaciones en la capa de rodadura principalmente en los sectores con pendiente longitudinal superior al 7% para lo cual se prevé ejecutar obras de construcción de pavimento en los sitios críticos, en una longitud estimada de 150 metros lineales, cuneta de evacuación de escorrentías y obras de mantenimiento periódico consistente en la conformación de la calzada de todo el tramo de vía.

2.2.3 Vía Tanela- Titumate (Municipio de Unguía)

Las obras a ejecutar se encuentran localizada aproximadamente a 42 Km de la cabecera municipal, específicamente en la vía que comunica a los corregimientos de Tanela - Titumate del Municipio de Unguía.

El Estado actual de la vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma.

Actual mente el tramo vial a intervenir se encuentra en pésimo estado debido al tipo material que conforman la subrasante natural de la calzada existente y a la fuerte ola invernal que azota la región, por lo que esta se vuelve prácticamente intransitable para los habitantes de estos dos corregimientos y veredas aledañas que transitan por este corredor vial.

Con la intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de un Puente en concreto reforzado de 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Rio Capitán en el sector de Penagos.

2.2.4 Vía Vereda La Arboleda – Vía relleno sanitario (Municipio de EL Carmen de Atrato)

La zona de los trabajos se encuentra ubicada aproximadamente a 5 kilómetros de la zona urbana del Municipio, 20 minutos parque principal, la cual es una zona carreteable.

Las obras de construcción son en pavimento rígido en los sitios críticos, en una longitud estimada de 180 metros lineales, cuneta de evacuación de escorrentías y obras de mantenimiento periódico consistente en la conformación de la calzada de todo el tramo de vía.

2.2.5 Vía Cementerio (Municipio de Litoral de San Juan)

Este proyecto está localizado en Santa Genoveva de Docordó cabecera municipal del Litoral del San Juan, especifica mente en la “VIA CEMENTERIO” que busca comunicar a la cabecera municipal con el Cementerio (zona norte) en una extensión aproximada de 2 kilómetros.

El Estado actual de la vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso

de la misma, en una longitud aproximada de 350 metros. Así mismo se construirán 3 alcantarillas de 36", y dos Box Culvert de 2X2.


2.3 CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto está concebido para desarrollarse en las vías terciarias del Departamento del Chocó pertenecientes a los municipios de El Cantón del San Pablo, Atrato, Unguía, El Carmen de Atrato y Litoral del San Juan, en las cuales se hace necesario realizar su inversión para su mejoramiento con el fin de facilitar el tránsito de vehículos e impulsar el comercio la reactivación económica.

Para el mejoramiento de las vías se consideran principalmente actividades destinadas a mejorar el estado actual de la superficie de rodadura mediante su conformación y el manejo adecuado de las aguas lluvias de escorrentía y nacimientos de agua existentes a los lados de la vía con la construcción de obras de drenaje como son Alcantarillas de Ø36", construcción de estructuras en concreto tipo Box Culvert, evitando así la afectación del agua en la subrasante y las capas superiores de la estructura de pavimento o capa de afirmado existente.

Así mismo, el proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad mediante la construcción de pavimento rígido o la conformación y compactación de la capa de rodadura, en los sitios que se establezcan por la Interventoría como críticos, así como la construcción de muros de contención en concreto reforzado en los sitios en los que se prevé un deslizamiento o la pérdida de la banca.

Para la ejecución de estas actividades en el proyecto se ha establecido la aplicación de los diseños descritos en la cartilla técnica del Instituto Nacional de Vías, en la cual se establecen todos los parámetros técnicos en relación con las cuantías de refuerzo, resistencia a la compresión de los concretos, espesores del pavimento, características del material de afirmado y dimensionamiento de las estructuras y obras a construir.

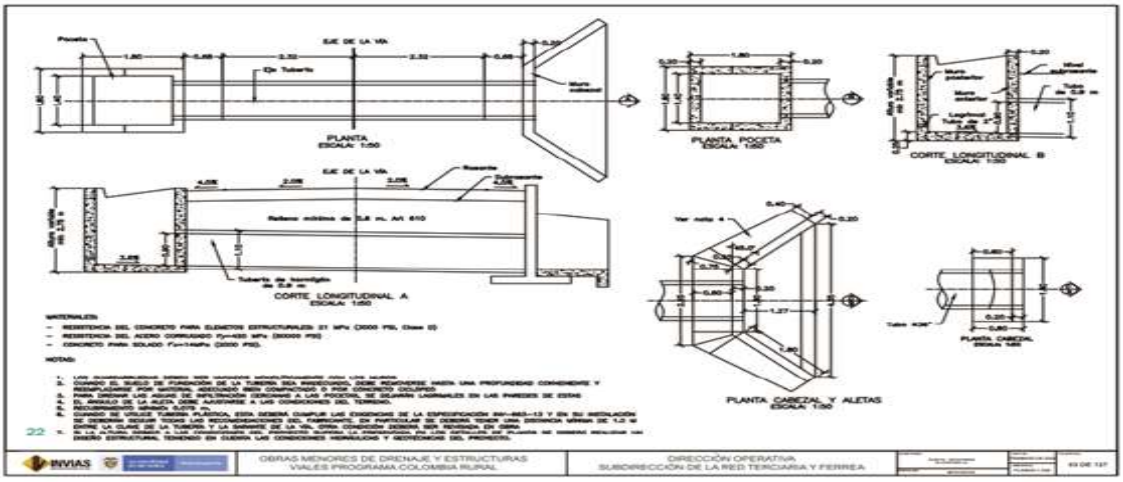

3 INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS.

3.1.1 Información General Contrato Municipio de El Cantón del San pablo.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO
CONTRATO DE OBRA No.	005-2022
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY – CC. No. 35.545.208
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS ($3.345.499.000). M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIO:	16 DE ENERO DE 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA No.1	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE JULIO 2023

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
	Responsabilidad Civil Patronal	Seguros del estado	$ 200.000.000	55-40-101033683	16/01/2023	16/06/2024
	Cumplimiento	Seguros del estado	$ 869.003.503	55-40-101033683	16/01/2023	16/07/2024
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Seguros del estado	$ 869.003.503	55-40-101033683	16/01//2023	15/03/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	Seguros del estado	$ 869.003.503	55-40-101033683	5 Años a partir de la firma Acta de Recibo Final de Obra.	
	Buen manejo del anticipo	Seguros del estado	$ 4.345.017.515	55-40-101033683	16/01/2023	16/07/2024

3.1.2 Información General Contrato Municipio de Atrato

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE ATRATO					
CONTRATO DE OBRA No.	SAMC – 009 DE 2022					
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL					
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES CONTEMPORANEOS S.A.S – NIT. 901.377.526-9					
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DOS CIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 260.000. 000.oo) M/CTE.					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES					
FECHA INICIO:	14 DE DICIEMBRE de 2022					
PRORROGA No.1	DOS (2) MESES					
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE ABRIL DE 2023 – YA FINALIZADO					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A.	10% del valor de la perdida	55-40-101033521	09/09/2022	09/11/2022
	Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	$ 26.000.000	55-44-101073513	09/09/2022	09/11/2022
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Seguros del Estado S.A.	$ 13.000.000	55-44-101073513	09/09/2022	09/11/2025
	Estabilidad y Calidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	$ 26.000.000	55-44-101073513	09/11/2022	09/11/2025

3.1.3 Información General Contrato Municipio de Unguía.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE UNGUIA					
CONTRATO DE OBRA No.	1050-15-103-2022-073					
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL					
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S NIT: 900.740.660-0					
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 938.878. 144.oo) M/CTE.					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES.					
FECHA INICIO:	DICIEMBRE 22 de 2022					
PRORROGA No.1	TRES (3) MESES					
SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL DE 2023					
FECHA DE FINALIZACIÓN	AGOSTO 04 DE 2023					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	$ 300.000.000	M- 100034815 Anexo 2	22/12/2022	24/04/2023
	Cumplimiento	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	$ 93.887.814,4	M- 10017063 Anexo 2	22//12/2022	22/08/2023
	Buen Manejo del Anticipo	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	$ 281.663.443,2	M- 10017063 Anexo 2	22//12/2022	22/08/2023
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	$ 46.943.907,4	M- 10017063 Anexo 2	22//12/2022	24/04/2026
	Estabilidad y Calidad de la obra	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	$ 93.887.814	M- 10017063 Anexo 2	5 Años a partir de la firma Acta de Recibo Final de Obra.	
					24/04/2023	23/04/2028
	Calidad y Correcto Funcionamiento	Compañía Mundial de Seguros s.a.s	$ 4.556.523	M- 10017063 Anexo 2	22/12/2022	23/04/2028

3.1.4 Información general Contrato Municipio de Litoral de San Juan

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN
CONTRATO DE OBRA No.	MLSJ-LPN-009-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL LITORAL DEL SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACION
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LITORAL
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 920.000. 000.oo) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES.
FECHA INICIO:	FEBRERO 02 de 2023
SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL 2023
SUSPENSIÓN No.2	30 DE JUNIO 2023

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN					
PRORROGA No.1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS					
FECHA DE FINALIZACIÓN	AGOSTO 14 DE 2023					
PÓLIZAS DEL CONTRATO:	Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Numero póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
	Predios, laborales y operacionales	Seguros del estado	$ 200.000.000	1744101204630	15/12/2022	30/07/2023
	Cumplimiento	Seguros del estado	$ 92.000.000	1744101204630	15/12/2022	30/09/2023
	Pago Salarios y Prest. Sociales	Seguros del estado	$ 46.000.000	1744101204630	15/12/2022	30/07/2023
	Estabilidad y Calidad de la obra	Seguros del estado	$ 92.000.000	1744101204630	5 Años a partir de la firma Acta de Recibo Final de Obra.	

3.1.5 Información general Contrato Municipio El Carmen de Atrato

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO
CONTRATO DE OBRA No.	154
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA:	CAMPO ELIAS PALOMEQUE SERNA
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 260.000. 000.oo) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES.
FECHA INICIO:	14 DE ABRIL 2023
SUSPENSIÓN No.1	27 DE ABRIL 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	28 DE JULIO 2023 – YA FINALIZADO

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1 Actividades Ejecutadas Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 16 de enero de 2023, cuyo contrato tiene un plazo de cuatro (04) meses para una fecha de finalización del día 16 de mayo del 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de Obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, Con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 28 de mayo de 2023, Con tramite prorroga hasta el 30 de julio de 2023. En este proyecto se realizó durante el presente mes las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron llenos compactados con material seleccionado.
- ✓ Se realizaron actividades de tipo administrativo con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos del contrato de obra.
- ✓ Se realizo chequeo topográfico para corroborar las cantidades de obra en los cajeos realizados y por consiguiente el chequeo de este por parte de la Interventoría.

Este contrato se encuentra tramitando una prórroga del contrato de obra, el cual ya fue conceptuado por la interventoría favorablemente y la cual iría hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.

3.2.2 Actividades Ejecutadas Vía Yuto-Ramal Samurindó (Municipio de Atrato).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 14 de diciembre de 2022, cuyo contrato tenía un plazo inicial de dos (02) meses y se realizó adición en tiempo mediante Otrosí No.01 del 13 de febrero de 2023 de (02) meses, para un plazo total acumulado de (04) meses; Este proyecto finalizó actividades constructivas el pasado 14 de abril de 2023 y se encuentra en proceso de liquidación final. Ya se tramito el pago del 90% del contrato y el mismo ya fue desembolsado.

3.2.3 Actividades Ejecutadas Vía Tanela - Titumate (Municipio de Unguía).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 22 de diciembre de 2022 y tiene un plazo establecido de cuatro (04) meses. Que por medio del acto administrativo otro si número dos (02) modifico la cláusula séptima del contrato de obra aumenta en tres (03) meses más el tiempo del contrato, quedando con una nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de Obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, Con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 5 de agosto de 2023. Actualmente se encuentra en trámite la prórroga número 2 la cual fue solicitada por el contratista y aprobada por la interventoría en un plazo de tres meses más a partir de la fecha de terminación actual, con lo cual el contrato iría hasta el 5 de noviembre de 2023.

En este proyecto se ejecutaron en el presente mes las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron actividades de tipo administrativo con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos estipulados contractualmente, para este periodo se aprobó la prórroga número 2 la cual tiene una duración de tres meses.
- ✓ Fundición de concreto ciclópeo en el carril faltante, las sesiones utilizadas fueron de 0.45 m
- ✓ Se realizaron actividades de construcción placa huella en Concreto Resistencia 21MPa (D) y Concreto Resistencia 14 MPa (F) en el carril faltante
- ✓ Se trabajó el carril complementario tomando 0.90m de huella, 0.45m de concreto ciclópeo y 0.70 de cuneta, para un ancho total de 2.05m trabajado en longitud de 250 ml
- ✓ Se realizaron actividades de corte de Acero de Refuerzo Fy 420 MPa., figurado y amarre del mismo de vigas riostra y bordillos
- ✓ Se realizó lleno de espaldar como protección de la placa huella en cuanto a la socavación

3.2.4 Actividades Ejecutadas Vía Cementerio (Municipio. de Litoral del San Juan).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del jueves 2 de febrero de 2023 y tiene un plazo establecido de cuatro (04) meses, para una fecha de finalización del día 2 de junio del 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de Obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 15 de junio de 2023. Se tramito una prórroga del contrato por 45 días con lo cual el contrato de obra iría hasta el 30 de julio de 2023. Sin embargo, posteriormente se tramito por parte del contratista una segunda suspensión por temas de orden público entre el 30 de junio al 15 de Julio de 2023, con lo cual el contrato de obra tendría fecha de terminación el 14 de agosto de 2023.

3.2.5 Actividades Ejecutadas en la vereda la arboleda – vía relleno sanitario. (Municipio de El Carmen de Atrato Chocó).

Para este proyecto se firmó el acta de inicio a partir del día 14 de abril de 2023 y tiene un plazo establecido de tres (03) meses para una fecha de finalización del día 14 de julio del 2023. El día 27 de abril del 2023 los contratos de Interventoría y de obra presentaron suspensión de actividades reiniciado desde el 10 de mayo de 2023, con dicha suspensión la fecha de finalización del proyecto se amplió hasta el 28 de julio de 2023. En este proyecto se ejecutaron en el presente mes las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron actividades de conformación de calzada.
- ✓ Se realizaron actividades de tipo administrativo con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos del contrato de obra.

3.3 SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS.

A la fecha el contratista del Municipio de Atrato remitió para aprobación los siguientes ítems no previstos, que no se encontraban dentro de la propuesta inicial y que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto.

Ítem de Pago	Especificación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% Incidencia sobre el Valor Total de la Obra.	Acta de Modificación No De Fecha.
231,1	231,13	Geotextil para separación de suelos	M2	132	$15.488	$ 20.537.088		
230,1	P1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Material seleccionado para relleno)	M3	429,0	$79.080	$ 33.925.320		
		Rellenos con Material Filtrante	M3	66,60	$114.158,19	$ 7.602.935		
		Tubería de Plástico Tipo sanitaria de pvc Norma NTC de Diámetro 102 mm Incluye accesorios	Ml	59,99	$34.245,06	$ 2.054.231		
		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	4,74	$842.572,05	$ 3.990.421		

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	[X] OBRA PROGRAMADA [X] ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	[X] EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	X Programada / $ Valor programado / X Ejecutada / $ Valor Ejecutado	1 16 enero - 16 febrero 2023	2 16 febrero - 16 marzo 2023	3 16 marzo - 16 abril 2023	4 16 abril - 16 mayo 2023	5 Indicar mes y año	6 Indicar m
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L - 7 m, D-36" (900 mm.)	$118.794.300	3,55%		%P	1,18%	1,18%	1,18%			
				$P	$39.598.100	$39.598.100	$39.598.100			
				$E						
				%E						
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	$3.169.267.605	94,74%		%P		31,58%	31,58%	31,58%		
				$P		$1.056.422.535	$1.056.422.535	$1.056.422.535		
				$E						
				%E						
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$18.045.000	0,54%		%P				0,54%		
				$P				$18.045.000		
				$E						
				%E						
CARACTERIZACIÓN VIAL	$1.520.000	0,05%		%P	0,05%					
				$P	$1.520.000					
				$E						
				%E						
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$4.497.251,72	0,13%		%P	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
				$P	$1.124.313	$1.124.313	$1.124.313	$1.124.313		
				$E						
				%E						
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$33.086.078,70	0,99%		%P			0,49%	0,49%		
				$P			$16.543.039	$16.543.039		
				$E						
				%E						
GPP7				%P						
				$P						
				$E						
				%E						
GPP8				%P						
				$P						
				$E						
				%E						
TOTAL OTROS ITEMS				%P						
				$P						
				$E						
				%E						
VALOR BÁSICO DE OBRA [A]	$ 3.345.210.235,42	100%								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO [A']										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES				%	1,26%	32,80%	33,29%	32,65%		
				VALOR (Miles de Pesos)	$42.242.413	$1.097.144.948	$1.113.687.987	$1.092.134.887		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA				%	1,26%	34,06%	67,35%	100,00%		
				VALOR (Miles de Pesos)	$42.242.413	$1.139.387.361	$2.253.075.348	$3.345.210.235		

Página 1

Para este proyecto se establece que de acuerdo al contrato de obra suscrito por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 15.02%

De acuerdo a los porcentajes de avance del proyecto inicial a la fecha tiene un atraso del (94,1%). De acuerdo con esto y a la realidad del proyecto el contratista de obra ha solicitado realizar una prórroga del contrato de obra, exponiendo los siguientes motivos:

La causa del atraso, es porque de acuerdo a la revisión en la ejecución de los diseños, fue necesario realizar unos cajeos para la ampliación del terraplén, en algunos casos superiores a 1.5 metros; lo anterior ocasiono que inicialmente el contratista hiciera una

solicitud de prorroga con lo cual el contrato llega actualmente hasta el 30 de Julio de 2023. Sin embargo y como se puede evidenciar en lo ejecutado el contrato aún está lejos de lograr terminar.

De acuerdo con lo anterior y con base en la ejecución actual las actividades de ejecución de obra se iniciaron en forma en el mes de abril, después de revisados los estudios y diseños entregados por el contratista y aprobada la actualización de presupuesto con las cantidades ajustadas. Se inicio el trámite de una prórroga del contrato de obra ya que con el tiempo actual no se lograría ejecutar el contrato.

Actualmente el contrato de obra terminaría el 30 de julio de 2023, plazo que evidentemente no es suficiente para lograr la ejecución de los recursos; por lo que el contratista realizo una solicitud de prórroga del contrato de obra por cinco (5) meses contados a partir del próximo 30 de Julio y que iría hasta el próximo 31 de Diciembre de 2023. La solicitud realizada esta basada en temas climáticos, cierres viales en la vía panamericana y orden público en la zona.

Debido a lo anterior se realizara una reprogramación de obra acorde a la solicitud de prórroga, que permita aumentar los rendimientos y superar el atraso presentado a la fecha e incrementar los frentes de trabajo correspondiente a la realización de alcantarillas, cajeos, llenos, instalación de base y por consiguiente la aplicación de pavimento rígido, para así superar el atraso presentado a la fecha.

3.4.2 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Yuto-Ramal Samurindó (Municipio de Atrato).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	PROGRAMADA Miles de pesos	PROGRAMADA	OBRA PROGRAMADA	$ Valor programado			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	15 DICIEMBRE 2022 - 14 ENERO 2023	15 ENERO 2023 - 14 FEBRERO 2023	15 FEBRERO - 15 MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDDO ITEM(1,2,3,4,5,6 Y 7)	$200.637.563	77,49%		%P	0,00%	0,00%	38,74%
				$P	$0	$0	$100.318.782
				$E			
				%E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ITEM(2 Y 3)	$5.624.468	2,17%		%P	0,00%	0,00%	2,17%
				$P	$0	$0	$5.624.468
				$E			
				%E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS ITEM (4)	$1.000.000	0,39%		%P	0,00%	0,00%	0,19%
				$P	$0	$0	$500.000
				$E			
				%E			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ITEM(1)	$10.000.000	3,86%		%P	0,00%	0,00%	1,93%
				$P	$0	$0	$5.000.000
				$E			
				%E			
TOTAL OTROS ITEMS IP1 y IP2	$41.669.320	16,09%		%P	0,00%	0,00%	8,05%
				$P	$0	$0	$20.834.660
				$E			
				%E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 258.931.351,00	100%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	51,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$132.277.310
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	51,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0,00	$132.277.310,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			
	VALOR (Miles de Pesos)			


Para este proyecto se establece que el contratista realizó actualización de programación de obra de conformidad a la adición en tiempo hecha al contrato y sujeto a dicha programación y de acuerdo al contrato de obra suscrito por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance:

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

De acuerdo a los porcentajes de avance del proyecto a la fecha se ejecutó en su totalidad, para lo cual este proyecto se encuentra en fase de cierre y/o liquidación.

3.4.3 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Tanela- Titumate (Municipio de Unguía)

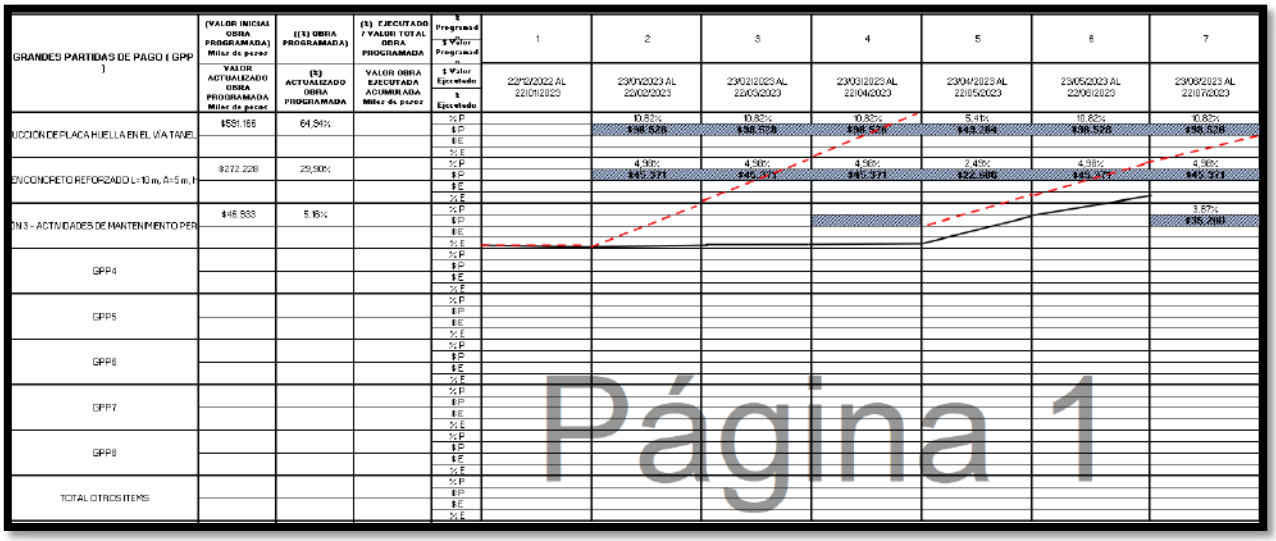

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((3) OBRA PROGRAMADA)	((5) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	$ Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(3) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / $ Ejecutado	22/12/2022 AL 22/01/2023	23/01/2023 AL 22/02/2023	23/02/2023 AL 22/03/2023	23/03/2023 AL 22/04/2023	23/04/2023 AL 22/05/2023	23/05/2023 AL 22/06/2023	23/06/2023 AL 22/07/2023
UCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL VIA TANEL	$591.166	64,94%		% P		10,83%	10,83%	10,83%	5,41%	10,83%	10,83%
				$ P		$98.528	$98.528	$98.528	$49.264	$98.528	$98.528
				$ E							
EN CONCRETO REFORZADO L=10 m, A=5 m, H	9272.228	29,90%		% P		4,98%	4,98%	4,98%	2,49%	4,98%	4,98%
				$ P		$45.371	$45.371	$45.371	$22.686	$45.371	$45.371
				$ E							
ON 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PER	$46.883	5,16%		% P							3,87%
				$ P							$35.200
				$ E							
GPP4				% P							
				$ P							
				$ E							
GPP5				% P							
				$ P							
				$ E							
GPP6				% P							
				$ P							
				$ E							
GPP7				% P							
				$ P							
				$ E							
GPP8				% P							
				$ P							
				$ E							
TOTAL OTROS ITEMS				% P							
				$ P							
				$ E							

Página 1

Para este proyecto se requiere que el contratista realice un plan de contingencia de obra, de igual manera una nueva reprogramación de acuerdo a la prórroga número dos del contrato, esta prórroga aumenta en tres meses más la duración del contrato

PROGRAMADO: 90.81%

EJECUTADO: 42.5%

De acuerdo a los porcentajes de avance del proyecto a la fecha tiene un atraso de 48.31%, para lo cual la Interventoría ha dado aprobación a la prórroga con el fin de que el contratista pueda realizar las actividades contractuales del puente las cuales no se han iniciado a ejecutar por los motivos expuestos en el acta de solicitud de prórroga, de esta forma con la prórroga se debe presentar una reprogramación de obras y así poder culminar las obras contempladas en el contrato.

3.4.4 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Cementerio (Municipio de Litoral del San Juan).

Para este proyecto se establece que de acuerdo a la programación de obra entregada por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance:

PROGRAMADO: 100%
EJECUTADO: 92,77%

De acuerdo a los porcentajes de avance de la programación se establece que el proyecto a la fecha tiene un atraso del 7,23%, debido lo anterior a la necesidad de suspender el contrato entre el 1 al 15 de julio, debido a temas de orden público, sin embargo la Interventoría le solicitá al contratista abrir más frentes de trabajo y realizar los suministros de materiales de manera oportuna en obra con el fin de ponerse al día con la programación de obra e igualmente construir un plan de trabajo que garantice la ejecución de la obra dentro de los plazos contractuales.

Estos controles de avance a la programación de obra se realizarán semanalmente estableciendo si existe atraso o adelanto.

3.4.5 Estado de Avance y Acciones a Seguir Vía Relleno Sanitario en la Vereda la Arboleda (Municipio de El Carmen de Atrato Chocó).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 14 abril - 14 mayo 2023	2 14 mayo - 14 junio 2023	3 14 junio - 14 julio 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	$241.092.097	93,10%		% P		50,00%	50,00%
				$ P		$120.546.049	$120.546.048
				$ E			
				% E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$3.350.000	1,29%		% P	100,00%		
				$ P	$3.350.000		
				$ E			
				% E			
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$2.109.649	0,81%		% P	33,33%	33,33%	33,33%
				$ P	$703.216	$703.216	$703.216
				$ E			
				% E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$2.410.921	0,93%		% P		50,00%	50,00%
				$ P		$1.205.461	$1.205.461
				$ E			
				% E			
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$10.000.000,00	3,86%		% P	0,97%	0,97%	0,97%
				$ P	$3.333.333	$3.333.333	$3.333.333
				$ E			
				% E			
GPP%				% P			
				$ P			
				$ E			
				% E			
TOTAL OTROS ITEMS				% P			
				$ P			
				$ E			
				% E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	258.962,667	100%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%			2,85%	48,57%	48,57%
		VALOR (Miles de Pesos)			$7.386.550	$125.788.059	$125.788.059
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%			2,85%	51,43%	100,00%
		VALOR (Miles de Pesos)			$7.386.550	$133.174.608	$259.962.667

Para este proyecto se establece que de acuerdo a la programación de obra entregada por el Contratista se tienen los siguientes porcentajes de avance:

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

De acuerdo a los porcentajes de avance de la programación se establece que el proyecto a la fecha tiene un avance ejecutado del 100% significativo para lo programado del 100%, cumpliendo así con el objeto contractual.

Estos controles de avance a la programación de obra se realizarán semanalmente estableciendo si existe atraso o adelanto.

3.5 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Se anexan los siguientes formatos diligenciados para los contratos de obra No. 005 - 2022 (Municipio de El Cantón de San pablo), No. SAMC – 009 - 2022 (Municipio de Atrato), No 1050-15-103-2022-073 (Municipio de Unguía), No MLSJ-LPN-009-2022 (Municipio Litoral de San Juan) y No 154 – 2022 (Municipio de El Carmen de Atrato):

1. MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUALI OBRA.
2. MEPI-MNT-IN-2-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA.
3. MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV.
4. MEPI-MIN1-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES.
5. MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA.
6. MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION.
7. MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY.
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.
9. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.
10. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA.
11. MEPI-MINI-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
12. MEPI-MIN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO.
13. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA.
14. MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - (VÍA YESITA – MANAGRÚ)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/07/23 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ SEMANA No.: 24 del 3/07/23 al 9/07/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,90 KM

Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita –Managrú mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La via objeto del proyecto se construira en concrerto rígido y adicionalemnte se construiran cuatro (4) obras de drenaje tip alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	MCSP-SP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 3.345.499.000,00
FECHA DE INICIO:	16/01/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 3.345.499.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/05/23		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL-URBA		
INTEGRANTES:	R. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	2/12/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.345.210.235,42	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 260.590.600,00	7,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-92,2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 260.590.600,00	7,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-92,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.105.800,00	1,89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.003.563.070,63
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,0%
Meta Física Ejecutada % 7,79%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm)	UN	4			Prog		4,00		$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,60		$ 17.164.800,00	15%
* CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML	1432,92			Prog		1.432,92		$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
* CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			-
* ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		1
Volqueta		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL DOCUMENTO P.A.G.A

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO P.A.G.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos y la preparación de concretos.
2. El contratista realizó excavaciones y lleno con material seleccionando.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Acopio de material de cantera para llenos y la preparación de concretos.
2. El contratista continuara con las excavaciones del cajeo y lleno con material seleccionando.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.
2, La interventoría esta en proceso de realización de estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 17/07/23 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ SEMANA No.: 25 del 10/07/23 al 16/07/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,90 KM

Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita –Managrú mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La via objeto del proyecto se construira en concrerto rígido y adicionalemnte se construiran cuatro (4) obras de drenaje tip alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY			INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL-URBA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO No.	MCSP-SP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 3.345.499.000,00	CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	16/01/23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/12/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 3.345.499.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/05/23		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.345.210.235,42	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 297.799.700,00	8,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-91,1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 297.799.700,00	8,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-91,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.209.100,00	1,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.003.563.070,63
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,0%
Meta Física Ejecutada %: 8,90%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm)	UN	4			Prog		4,00		$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,60		$ 17.164.800,00	15%
* CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML	1432,92			Prog		1.432,92		$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
* CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			-
* ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		1
Volqueta		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL DOCUMENTO P.A.G.A

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO P.A.G.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos.
2. El contratista realizó lleno con material seleccionando.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Acopio de material de cantera para llenos y lleno con material seleccionando.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.
2, La interventoría esta en proceso de realización de estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 24/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ SEMANA No.: 26 del 17/07/23 al 23/07/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,90 KM

Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita –Managrú mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La via objeto del proyecto se construira en concrerto rígido y adicionalemnte se construiran cuatro (4) obras de drenaje tip alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY			INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL-URBA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO No.	MCSP-SP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 3.345.499.000,00	CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	16/01/23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/12/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 3.345.499.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/05/23		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.345.210.235,42	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 297.799.700,00	8,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-91,1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 297.799.700,00	8,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-91,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.209.100,00	1,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.003.563.070,63
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,0%
Meta Física Ejecutada % 8,90%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm)	UN	4			Prog		4,00		$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,60		$ 17.164.800,00	15%
* CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML	1432,92			Prog		1.432,92		$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
* CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			-
* ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		1
Volqueta		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL DOCUMENTO P.A.G.A

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO P.A.G.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Acopio de material de cantera para llenos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Acopio de material de cantera para llenos y lleno con material seleccionando.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Señalizacion preventiva.



Señalizacion preventiva.



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.
2, La interventoría esta en proceso de realización de estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 27 del 24/07/23 al 30/07/23 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1,90 KM

Mejoramiento de 1.900 metros lineales de la vía la yesita –Managrú mediante la pavimentación en concreto regido en zona rural del municipio el cantón del san pablo-chocó

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La via objeto del proyecto se construira en concrerto rígido y adicionalemnte se construiran cuatro (4) obras de drenaje tip alcantarilla.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	MCSP-SP-LP-005-2022	VALOR INICIAL:	$ 3.345.499.000,00
FECHA DE INICIO:	16/01/23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 3.345.499.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/05/23		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL-URBA		
INTEGRANTES:	R. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	2/12/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.345.499.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.345.210.235,42	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 502.603.846,40	15,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-85,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.345.210.235,42	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 502.603.846,40	15,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-85,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 204.804.146,40	6,12%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.003.563.070,63
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,0%
Meta Física Ejecutada %: 15,02%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm)	UN	4			Prog		4,00		$ 118.794.300	100,0%
					Ejec		0,60		$ 17.164.800,00	15%
* CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML	1432,92			Prog		1.432,92		$ 2.509.003.521	79,2%
					Ejec		-			-
* CARACTERIZACIÓN VIAL	UN	1			Prog		1			100,0%
					Ejec		-			-
* ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN	0,84			Prog		0,84		$ 3.794.556,14	84,4%
					Ejec					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN	0,68			Prog		0,68		$ 3.091.860,56	68,8%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora		1
Volqueta		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL DOCUMENTO P.A.G.A

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO P.A.G.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos.
2. El contratista realizó lleno con material seleccionando.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. El contratista realizó acopio de material de cantera para llenos.
2. El contratista realizó lleno con material seleccionando.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Chequeo topografico a los cajeos por la interventoria.



Chequeo topografico a los cajeos por la interventoria y lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.
2, La interventoría esta en proceso de realización de estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS TERCIARIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. CD-0042-OP-UM (Indicar número y año) **CONTRATISTA:**

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LA POBLACION DE MANAGRU MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL-URBA (REP. LEGAL: EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Compra de materiales, herramientas e insumos	$ 270.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	**$ 620.000.000,00**	62%
2	Pago de mano de obra, salarios y prestaciones	$ 75.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 32.000.000,00	$ 38.000.000,00	**$ 180.000.000,00**	18%
3	Transporte y compra de maquinaria	$ 53.000.000,00	$ 29.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ 14.000.000,00	**$ 120.000.000,00**	12%
4	Gravamen movimientos financieros	$ 22.000.000,00	$ 26.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 17.649.700,00	**$ 83.649.700,00**	8%
TOTAL						**$ 1.003.649.700,00**	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **MARTHA YENNY MENA MONRROY**
Representante Legal o su Apoderado MARTHA YENNY MENA MONRROY
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-144528 ANT

Firma:
Nombre: **CONSORCIO INCOL URBA**
Representante Legal suplente HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 — MES: JULIO — INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐

CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15655 DE 20/09/2022 — ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 53600007167 BANCO BANCOLOMBIA S.A — SUCURSAL: QUIBDÓ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.003.649.700,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.

CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA MONRROY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Facturas			MARTHA YENNY MENA MONRROY	$ 297.698.231,93	1	Compra de Materiales Herramientas e Insumos
Cuentas de cobro			MARTHA YENNY MENA MONRROY	$ 139.490.000,00	2	Pago de Mano de obra, Salarios y Prestaciones
Factura	BOTO154269	23-mar-23	MARTHA YENNY MENA MONRROY	$ 120.000.000,00	3	Transporte, Compra y Alquiler de Maquinaria y Equipos
Cuentas de cobro			MARTHA YENNY MENA MONRROY	$ 30.000.000,00	4	Gastos Administrativos (Oficina, Campamento y Servicios Públicos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra de Materiales Herramientas e Insumos	$ 620.000.000,00		$ 297.698.231,93	$ 297.698.231,93	$ 322.101.768,07
2	Pago de Mano de obra, Salarios y Prestaciones	$ 180.000.000,00		$ 139.490.000,00	$ 139.490.000,00	$ 40.510.000,00
3	Transporte, Compra y Alquiler de Maquinaria y Equipos	$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ -
4	Gastos Administrativos (Oficina, Campamento y Servicios Públicos	$ 83.649.700,00		$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 53.649.700,00
	TOTALES	$ 1.003.649.700,00		$ 587.388.231,93		$ 416.261.468,07

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: Martha Yenny Mena Monroy
Nombre:
MARTHA YENNY MENA MONRROY
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-144528 ANT

Firma:
Nombre:
HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $

1 de 1

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 005 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA MONRROY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/23 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.345.499.000 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.345.499.000

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/05/23 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 16 enero - 16 febrero 2023	2 16 febrero - 16 marzo 2023	3 16 marzo - 16 abril 2023	4 16 abril - 16 mayo 2023	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L = 7 m, D=36" (900 mm)	$118.794.300	3,55%		% P	33,33%	33,33%	33,33%								
	$118.794.300	3,55%		$ P	$39.598.100	$39.598.100	$39.598.100								
				$ E											
				% E											
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	$3.169.267.605	94,74%		% P		33,33%	33,33%	33,33%							
	$3.169.267.605	94,74%		$ P		$1.056.422.535	$1.056.422.535	$1.056.422.535							
				$ E											
				% E											
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$18.045.000	0,54%		% P				100,00%							
	$18.045.000	0,54%		$ P				$18.045.000							
				$ E											
				% E											
CARACTERIZACIÓN VIAL	$1.520.000	0,05%		% P	100,00%										
	$1.520.000	0,05%		$ P	$1.520.000										
				$ E											
				% E											
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$4.497.252	0,13%		% P	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
	$4.497.252	0,13%		$ P	$1.124.313	$1.124.313	$1.124.313	$1.124.313							
				$ E											
				% E											
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$33.086.079	0,99%		% P			50,00%	50,00%							
	$33.086.079	0,99%		$ P			$16.543.039	$16.543.039							
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 3.345.210.235,42														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 3.345.210.235,42**														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,26%**	**32,80%**	**33,29%**	**32,65%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.242.413**	**$1.097.144.948**	**$1.113.687.987**	**$1.092.134.887**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**1,26%**	**34,06%**	**67,35%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.242.413**	**$1.139.387.361**	**$2.253.075.348**	**$3.345.210.235**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	- / -	$ -	%
	- / -	$ -	%
	- / -	$ -	%
	- / -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

$ 865.101.123,88 $ 590.814.886,90 $ 1.696.231.354,50
26% 17,7% 50,7%

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
SE ESTA REALIZANDO UNA REPROGRAMACIÓN DE OBRA LA CUAL SE PRESENTARA PARA EL PRÓXIMO INFORME DE ACUERDO AL TRAMITE DE PRORROGA QUE SE ESTA REALIZANDO

Aprueba Firma:
Nombre: Martha Yenny Mena Monrroy
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Edwin Andres Chaves Ochoa
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202133796 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

CONTRATO No. 005 DE 2022 **CONTRATISTA:** MARTHA YENNY MENA MONRROY

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INCOL - URBA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
MOTONIVELADORA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOCKA				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
VIBRO COMPACTADOR				A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	10				10	10	10	10		10		10	10	10	10		10		10		10	10		10		10	10	10	10		10
			TOTAL ACTIVO	10				10	10	10	10		10		10	10	10	10		10		10		10	10		10		10	10	10	10		10
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Onel Emilson Chalá Lemus
Nombre: Onel Emilson Chalá Lemus
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: Edwin A. Moreno
Nombre: Edwin Ariel Moreno
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202178259ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/23 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 005 DE 2022 **CONTRATISTA:** MARTHA YENNY MENA MONRROY

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Carlos Ariel Valoyes Urrutia		Operador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
2	Franclin Londoño	11.811.630	Operador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
3	Wilian Alberto Sepulveda Gallo	91.001.799	Operador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
4	Onny Mendoza	12.020.601	Operador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
5	Yeferson Torres		Operador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
6	Merlis Antonio Aguilar Perea				X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
7	José Francisco Sánchez		Operador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
8	Anyeline Mosquera		Paletera		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Martha Yenny Mena Monrroy
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Miguel Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 005 DE 2022 **CONTRATISTA:** MARTA YENNY MENA MONRROY

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24		22	16	24	24	24	24		22	20	24	24	24	24		24	24	24	20	22	24		24	23	24	24	24	24		0	576,5
Lluvias moderadas			2	3						2	4										2				1							14
Lluvias intensas				5																4,5												9,5
Total horas	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma: ONEL EMILSON CHALÁ LEMUS
Nombre: Onel Emilson Chalá Lemus
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: Edwin A. Moreno
Nombre: Edwin Ariel Moreno
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202178259ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No.: 005 DE 2022 **CONTRATISTA:** MARTHA YENNY MENA MONRROY

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1101 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		DURANTE EL PERIODO EN MENSIÓN, NO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIO							
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
		DURANTE EL PERIODO EN MENSIÓN, SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO							
1	12/05/23	CBR	INVIAS E - 410	SUBRASANTE	1	1,6		NO	Necesita mejoramiento
2	12/05/23	CBR	INVIAS E - 410	SUBRASANTE	1	2,0		NO	Necesita mejoramiento
3	12/05/23	CBR	INVIAS E - 410	SUBRASANTE	1	2,2		NO	Necesita mejoramiento

OBSERVACIONES:

Se realizan apiques y ensayod de CBR con el fin de obtenber la capacidad portante de la subrasante y saber si es necesario realizar mejoramiento.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Martha Yenny Mena Monrroy
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Miguel Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202785504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2022 **CONTRATISTA:** MARTHA YENNY MENA MONRROY

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DEL SAN PABLO-CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

FECHA DE INICIO: 16/01/23

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/05/23
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.345.499.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.345.499.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: Miguel Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA

MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ SEMANA No.: 11 del 3/07/23 al 9/07/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 100 Ml
Mejoramiento de 100 metros lineales de la vereda la arboleda – vía relleno sanitario.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La via objeto del proyecto se construira en concrerto rígido.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS F.D.C. S.A.S.			INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL-URBA		
INTEGRANTES:	R. LEGAL ING. CAMPO ELIAS PALOMEQUE SERNA			INTEGRANTES:	R. LEGAL: EDWIN ANDRÉS CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO No.	0154 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 260.000.000,00	CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	14/04/23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/12/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 260.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/07/23		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 30 ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 260.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 260.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 260.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 260.000.000,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	100,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 260.000.000,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	100,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.190.170,34	0,84%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: SIN RADICADO
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 78.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada % 100,00%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	ML				Prog					
					Ejec					
* REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN				Prog					
					Ejec					
* ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UN				Prog					
					Ejec					
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UN				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Pajarita		1
Volqueta		1
Rana Compactadora		1
Rotomartillo		1
Planta Eléctrica		1
Fiori		1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL DOCUMENTO P.A.G.A

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DEL DOCUMENTO P.A.G.A

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Reparación de fisura en losa de concreto.
2. Acatividades de mantenimiento, conformación de calzada.
3. Retiro de material sobrante y limpieza.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Iniciar procesos de liquidación.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se solicita al contratista presentar plan de contingencia para superar atraso de obra.
2, La interventoría esta en proceso de realización de estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.

CONTRATO No. 154 DEL 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS F.D.C S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INCOL - URBA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROTOMARTILLO	MAQUITA						X	X	X	X	X																						
PLANTE ELECTROCA							X	X	X	X	X																						
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR						X	X	X	X	X																						
VOLQUETA							X	X	X	X	X																						
RETROCARGADOR	CATERPILLAR						X	X	X	X	X																						
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Zabulón Palomeque Serna
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-375071 ANT

Firma
Nombre: Edwin Ariel Moreno
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-178259 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 154 DEL 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS F.D.C.S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA 'COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Zabulo Palomeque Serna	12.021.954	Ing. residente	$ 4.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Zabulon P	1E+06	$ -		Sanitas	1055544154	$ 145.000	Protección	1055544154	$ 185.600	$ 23.200			
3	Cristian Rentería Perea	11.801.339	Ayudante	$ 1.400.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	ConstruObras	1E+06	$ 80.800	1	Comfachocó	63973643	$ 46.400	Colpensiones	63973643	$ 185.600	$ 46.400			
4	Robinson Rodriguez Mosquera	11.808.261	Oficial	$ 3.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	ConstruObras	1E+06	$ 80.800	1	Comfachocó	63973643	$ 46.400	Colpensiones	63973643	$ 185.600	$ 46.400			
5	Guillermo Enrique Vasquez	12.279.683	Ayudante	$ 1.400.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	ConstruObras	6E+05	$ 43.100	1	Nueva Eps	63973643	$ 24.800	Porvenir	63973643	$ 99.000	$ 24.800			
6	Gustavo Hernandez Calle Arias	4.829.222	Oficial	$ 3.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	ConstruObras	6E+05	$ 43.100	1	Nueva Eps	63973643	$ 24.800	Protección	63973643	$ 99.000	$ 24.800			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Campo Elías Palomeque Sema
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-181096ANT

Firma
Nombre: Miguel Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 154 DEL 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS F.D.C S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1101 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24		24	24	24	24	24	24																								168
Lluvias moderadas	0		0	0	0	0	0	0																								0
Lluvias intensas	0		0	0	0	0	0	0																								0
Total horas	24	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Zabulon Palomeque Serna
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-375071 ANT

Firma
Nombre: Edwin Ariel Moreno
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-178259 ANT.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA

MUNICIPIO DE UNGUÍA

(VÍA TANELA- TITUMATE)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

1 de 1

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** MARZO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1050-15-103-2022-073 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15750 **DE** 26/10/22 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 95900002458 **BANCO** BANCOLOMBIA S.A SUCURSAL: MEDELLIN
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 232.988.835,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Factura	FEC4767	24-mar-23	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.	$ 49.655.849,00	4	Compra de Materiales y Accesorios
Factura Preforma	297	29-mar-23	SURTIZORA S.A.S	$ 76.015.862,00	4	Compra de Materiales y Accesorios

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de Salarios y Jornales	$ 48.927.655,35		$ -	$ -	$ 48.927.655,35
2	Compra de accesorios y repuestos de equipos	$ 34.948.325,25		$ -	$ -	$ 34.948.325,25
3	Transporte	$ 23.298.883,50		$ -	$ -	$ 23.298.883,50
4	Compra de Materiales y Accesorios	$ 125.813.970,90		$ 125.671.711,00	$ 125.671.711,00	$ 142.259,90
	TOTALES	$ 232.988.835,00				$ 107.317.124,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
HERMES CORDOBA CORDOBA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-221506 ANT

Firma:
Nombre:
HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | SEMANA No.: 26 del 3 al 9 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Rio Capitán en el sector de Penagos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metalicas el cual requiere ser reemplazado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.		
INTEGRANTES:	HERMES CORDOBA CORDOBA		
CONTRATO No.	1050-15-103-2022- 073	VALOR INICIAL:	$ 938.878.144,00
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 938.878.144,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 DE AGOSTO 2023	$ -	
		$ -	
		$ -	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCON-URBA		
INTEGRANTES:	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA		
CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ - -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 938.878.144		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 938.878.144,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 525.200.996,67	75,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 254.914.911,80	28,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 270.285.984,87	47,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35.820	3,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.958	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: se realizo la instalacion de material de subase en los tramos de la placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	281663443
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: el contratista instalo concreto clase D de 21 Mpa
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: NO SE TIENEN OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____ NO ____	N/A	

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVASE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTOCIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO REQUIERE

OBSERVACIONES: NO HAY GESTIÓN PREDIAL POR DESARROLLAR

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo de tiempo se realizo la constrccion de bordillos y el llono de espaldares

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

el contratista debe iniciar con la instalacion de placa huella en el otro carril que comprende la huella de 0,9 m, ciclopeo de 0,45m

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE FORMALETAS PARA BORDILLO



INSTALACION DE CONCRETO PARA BORDILLO



ACABADO DE BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construcion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el rio capitan

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA

Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — SEMANA No.: 27 del 10 al 16 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Rio Capitán en el sector de Penagos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metalicas el cual requiere ser reemplazado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.		
INTEGRANTES:	HERMES CORDOBA CORDOBA		
CONTRATO No.	1050-15-103-2022- 073	VALOR INICIAL:	$ 938.878.144,00
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 938.878.144,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 DE AGOSTO 2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCON-URBA		
INTEGRANTES:	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA		
CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ - -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 938.878.144		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 938.878.144,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 529.792.476,67	82,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 266.166.416,37	28,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 262.616.460,29	54,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35.820	3,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.252	1,24%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: se realizo la instalacion de material de subase en los tramos de la placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	281663443
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: el contratista instalo concreto clase D de 21 Mpa
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: NO SE TIENEN OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVASE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTOCIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO REQUIERE

OBSERVACIONES: NO HAY GESTIÓN PREDIAL POR DESARROLLAR

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo de tiempo se realizo la constrccion de bordillos y el llono de espaldares, se inicio a formaletear para el concreto ciclopeo en el tramocritico uno

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

el contratista debe iniciar con la instalacion de placa huella en el otro carril que comprende la huella de 0,9 m, ciclopeo de 0,45m

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE CONCRETO PARA BORDILLO



ACABADO DE BORDILLO TRAMO DOS



ACABADO DE BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construcion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el rio capitan

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA

Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | SEMANA No.: 28 del 17 al 23 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Rio Capitán en el sector de Penagos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metalicas el cual requiere ser reemplazado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.		
INTEGRANTES:	HERMES CORDOBA CORDOBA		
CONTRATO No.	1090-15-103-2022- 073	VALOR INICIAL:	$ 936.878.144,00
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 157.534.995,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.413.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 DE AGOSTO 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCON-URBA		
INTEGRANTES:	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA		
CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ - -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.096.413.139		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.096.413.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 532.364.956,80	86,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 253.077.601,40	31,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 249.287.255,20	23,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35.820	3,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.911	1,86%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: se realizo la instalacion de material de subase en los tramos de la placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	328923942
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: el contratista instalo concreto clase D de 21 Mpa
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: NO SE TIENEN OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____ NO ____	N/A	

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVASE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTOCIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO REQUIERE

OBSERVACIONES: NO HAY GESTIÓN PREDIAL POR DESARROLLAR

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo de tiempo se realizo la instalacion de concrto ciclopeo en los tres tramos donde se esta construyendo la placa huella, se realizo por madulos de 0,45 m * 3 m y se inicio la figuracion de acero de vigas riostras

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

el contratista debe instalar concreto de 21 Mpa en la hulla, vigas y cuneta para completar el carril completo de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO



ACABADO DE CICLOPEO



VACIADO DE CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construcion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el rio capitan	FIRMA NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — SEMANA No.: 29 del 24 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JONATHAN PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

intervención de la vía de un ancho de calzada de 5 metros lineales sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate, los cuales incluye la conformación y compactación. El mejoramiento de la vía mediante la construcción de 298 metros lineales de Placa Huella con un ancho aproximado de 5 metros lineales incluido bordillos y cunetas sobre el tramo vial entre Tanela y Titumate. La construcción de Pte 10 ml de largo y 5 ml de ancho, sobre el Rio Capitán en el sector de Penagos.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía a intervenir se encuentra en terreno natural, sin ninguna conformación estructural, por lo que dentro de las actividades a ejecutar se contempla dicha estructura de soporte con subbase granular, colocación de acero de refuerzo y Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA, resistencia acorde al uso de la misma. Respecto al paso sobre el Río Capitán actualmente se tiene un puente con losa en madera y vigas metalicas el cual requiere ser reemplazado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.		
INTEGRANTES:	HERMES CORDOBA CORDOBA		
CONTRATO No.	1090-15-103-2022- 073	VALOR INICIAL:	$ 936.878.144,00
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 157.534.995,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.413.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 DE AGOSTO 2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INCON-URBA		
INTEGRANTES:	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA		
CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA EL 30 DE ABRIL 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ - -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.096.413.139		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.096.413.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 535.946.506,80	90,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 386.919.799,30	42,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 149.027.037,30	48,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35.820	3,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 103.642	11,41%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: se realizo la instalacion de material de subase en los tramos de la placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	328923942
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	130,023,496
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: el contratista instalo concreto clase D de 21 Mpa
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibrocompactador		1
minibumper		1
minicargador		1
mitser		1
vibrador de concreto		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		

OBSERVACIONES: NO SE TIENEN OBSERVACIONES A LA FECHA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: NO SE TIENE OBSERVACIONES A LA FECHA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se encuentra en revision el documento aportado por el contratista

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVASE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTOCIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO REQUIERE

OBSERVACIONES: NO HAY GESTIÓN PREDIAL POR DESARROLLAR

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este periodo de tiempo se realizo la instalacion de concrto de 21 Mpa para la huella, cuneta y vigas riostras se alcanzo una longitud de 40 ml para asi obtener el totol del ancho en la placa huella, ademas se realizo la instalacion del hierro tanto en la huella como cuneta y vigas riostras

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

el contratista debe continuar con la instalacion de concreto de 21 Mpa en la hulla, vigas y cuneta de los tramos 2 y tres se beda iniciar con las excavaciones del las pilas del puente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE ACERO HUELLA CUNETA VIGAS



INSTALACION DE CONCRETO



TERMINADO PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
la interventoria realizara control y seguimiento al contrato en mencion donde se realizara la construcion de placa huella en tres tramos criticos y la construccion de un puente sobre el rio capitan	FIRMA NOMBRE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1050-15-103-2022-073 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15750 **DE** 26/10/22 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 95900002458 **BANCO** BANCOLOMBIA S.A SUCURSAL: MEDELLIN
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 232.988.835,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Factura	FEC4767	24-mar-23	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.	$ 49.655.849,00	4	Compra de Materiales y Accesorios
Factura Preforma	297	29-mar-23	SURTIZORA S.A.S	$ 76.015.862,00	4	Compra de Materiales y Accesorios
Factura	RTMZ 11	19-abr-23	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.	$ 23.298.883,50	3	Transporte
Cuentas de Cobros	1, 1, 20230303, 20230330, 1	31-mar-23	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.	$ 25.427.585,00	1	Pago de Salarios y Jornales
Factura	FESD-45	11-ene-23	INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.	$ 32.519.472,00	2	Compra de maquinaria, accesorios y repuestos de equipos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de Salarios y Jornales	$ 48.927.655,35		$ 25.427.585,00	$ 25.427.585,00	$ 23.500.070,35
2	Compra de accesorios y repuestos de equipos	$ 34.948.325,25		$ 32.519.472,00	$ 32.519.472,00	$ 2.428.853,25
3	Transporte	$ 23.298.883,50		$ 23.298.883,50	$ 23.298.883,50	$ -
4	Compra de Materiales y Accesorios	###############		$ 125.671.711,00	$ 125.671.711,00	$ 142.259,90
	TOTALES	############				$ 26.071.183,50

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (Marzo) : $ 2.214,39
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 72.877,02
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 44.744,26		MARZO	11-abr-23	$ 44.744,26
2	$ 25.918,37		ABRIL	4-may-23	$ 70.662,63
3	$ 2.214,39		MAYO	5-jun-23	$ 72.877,02

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
HERMES CORDOBA CORDOBA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-221506 ANT

Firma:
Nombre: **HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ**
Delegado
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ..... **DE** ..... (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ .....

1 de 1

SEGUIMIENTO No. .....
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1050-15-103-2022- 073

OBJETO:
EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCON-URBA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/22 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/07/23 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/04/23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 10/05/23 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 938.878.144,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 157.534.995,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.096.413.139,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 22/12/2022 AL 22/01/2023	2 23/01/2023 AL 22/02/2023	3 23/02/2023 AL 22/03/2023	4 23/03/2023 AL 22/04/2023	5 23/04/2023 AL 22/05/2023	6 23/05/2023 AL 22/06/2023	7 23/06/2023 AL 22/07/2023	8 23/07/2023 AL 05/08/2023	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
RUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL VÍA TANELA-	$591.166	64,94%		% P		10,82%	10,82%	10,82%	5,41%	10,82%	10,82%	5,41%			
				$ P		$64.024	$64.024	$64.024	$32.012	$64.024	$64.024	$32.012			
				$ E											
				% E											
TE EN CONCRETO REFORZADO L=10 m, A=5 m, H=4	$272.228	29,90%		% P		4,98%	4,98%	4,98%	2,49%	4,98%	4,98%	2,49%			
				$ P		$29.474	$29.474	$29.474	$14.737	$29.474	$29.474	$14.737			
				$ E											
				% E											
IÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIOD	$46.933	5,16%		% P							3,87%	1,29%			
				$ P				$22.918			$22.918	$7.639			
				$ E											
				% E											
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 910.327,31	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	15,81%	15,81%	15,81%	7,90%	15,81%	19,67%	9,19%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$143.899	$143.899	$143.899	$71.950	$143.899	$179.099	$83.683		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	15,81%	31,61%	47,42%	55,33%	71,13%	90,81%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$143.899	$287.798	$431.697	$503.647	$647.546	$826.645	$910.327		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	6,08%	22,28%	20,57%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$15.188	$0	$55.317	$162.829	$187.254			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	7,68%	29,96%	50,53%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$15.188	$15.188	$70.505	$233.334	$420.588			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	$ 28.550,84	$ 15.188,41	53%
	$ -		
	$ -		%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 28.550,84	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 938.878,14**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HERMES CORDOBA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202153647 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/23
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 1050-15-103-2022- 073
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCON-URBA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En el comité anterior se establecieron los siguientes compromisos:
ensayos de laboratorio, medicion de la resistencia del concreto de la placa huella

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

tiempos contractuales del contrato de obra
inicio de la construccion del puente

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

R.I. Carlos mosquera: dando cumplimiento a los tiempos establecidos contractualmente donde el 22 de diciembre de 2022 se dio acta de inicio con una duracion del contrato de 4 meses, debido a los inconvenientes presentados en el transcurso del proyecto se adicionaron tres meses mas, el dia 27 de abril se suspendio el contrato y se reanudo el dia 10 de mayo. dentro del transcurso de la ejecucion del contrato tenemos avances en la construccion de la placa huella, teniendo en cuenta que se presenta un avance significativo y se puede cumplir con el alcance en los tiempos estipulados, en cuanto a la construccion del puente se entiende que los tiempos contractuales no alcanzan para realizar todas las actividades constructivas que se requieren por lo tanto se necesita buscar una alternativa para dar cumplimiento al alcance del contrato

R.L.contratista Hermes Cordoba: en atencion a la preocupacion que manifiesta la interventoria con respecto al tiempo contratual, es de conococimiento que la placa huella se estara terminando en los tiempos establecidos, para la construccion del puente solicitare una prorroga por tres meses que me permita llevar a cabalidad la terminacion del puente, la solicitud de la prorroga esta basada en los retrasos administrativos como el aumento de de presupuesto que se dio atraves de los cambios en la cimentacion del puente por estos y otros motivos se vio retrasado el inicio de las actividades del puente

R.I. Carlos Mosquera, por parte de la interventoria se le recomienda realizar la solicitud de prorroga con los argumentos que justifiquen la prorroga de igual forma la interventoria estara presta para dar tramite a su solicitud,

R.L.contratista Hermes Cordoba: como compromiso tengo terminar la placa huella los primeros 10 dias del mes de agosto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/23
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
terminacion de construccion de placa huella en titumate	10/08/23	contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 15/08/23
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carlos Andres Mosquera	residente de interventoria	incon urba	
Hermes Cordoba	director de obra	inverconstrucciones s.a.s	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATO No. 1050-15-103-2022- 073 **CONTRATISTA:** INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INCON-URBA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MINICARGADOR	SL800/2019	700 KG	TITUMATE	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	A	A	A	A	I	R	A	A	A	A	A	I	A
VIBRO COMPACTADOR	ST 1200	3,5 TON	TITUMATE	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A		A		A	A		A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I
MINI DUMPER	TOPALL/2009	3 TON	TITUMATE	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
AUTO HORMIGONERA	DUMAK/2019	1,2 M3	TITUMATE	A	I	A	A	R	R	A	R	I	R	R	A	R	A	A	I	A	A	A	R	R	R	I	A	A	A	R	R	R	I	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En el presente periodo de informacion se realizaron mantenimientos rutinarios a las maqinarias

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ERIK YEINER LOZANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5202298933 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 1050-15-103-2022- 073 **CONTRATISTA:** INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCON-URBA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Romario martinez	1074716182	ayudante	$ 1.200.000	x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	38667	$ 2.700	5	SURA	9454929379	$ 1.600	porvenir	9454929379	$ 6.200				
2	Edwin Romaña	1003758039	ayudante	$ 1.200.000	x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	38667	$ 2.700	5	SURA	9454929379	$ 1.600	porvenir	9454929379	$ 6.200				
3	Hemes Cordoba	1077424990	ingeniero	$ 3.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	966667	$ 67.300	5	sura	94549297226	$ 120.900	porvenir	94549297226	$ 154.700				
4	Policarpo Mora	71970370	oficial	$ 2.400.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	541334	$ 37.700	5	nueva eps	94549297226	$ 67.700	colpensiones	94549297226	$ 86.700				
5	Deiner Morales	16233607	maestro	$ 2.400.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	966667	$ 67.300	5	nueva eps	94549297226	$ 120.900	porvenir	94549297226	$ 154.700				
6	Victor Cuadrado	1148204780	ayudante	$ 1.200.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	850667	$ 59.300	5	comfachoco	9454929379	34100	porvenir	9454929379	$ 136.200				
7	Eugenio Gomez	1193558104	ayudante	$ 1.200.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	889334	$ 59.300	5	nueva eps	9454929379	35600	porvenir	9454929379	$ 142.300				
8	Yeison Perez	1067288748	ayudante	$ 1.200.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	966667	$ 67.300	5	nueva eps	9454929379	$ 38.700	colpensiones	9454929379	$ 154.700				
9	Norberto Amaranto	1043446938	operador	$ 1.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	889334	$ 368.800	5	nueva eps	9454929226	$ 111.200	porvenir	9454929226	$ 142.300				
10	Ariel Cogollo	1074714577	operador	$ 1.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	966667	$ 67.300	5	nueva eps	9454929226	$ 120.900	porvenir	9454929226	$ 154.700				
11	Yimy Nisperusa	98599567	oficial	$ 2.400.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.	966667	$ 67.300	5	savia salud	94549297226	$ 120.900	colpensiones	94549297226	$ 154.700				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HERMES CORDOBA CORDOBA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL RODIGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 1050-15-103-2022- 073 **CONTRATISTA:** INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: EBRERO DE 202 **PROYECTO:** "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCON-URBA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	X	31
Lluvias moderadas																								X		X						
Lluvias intensas																						X										
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ERIK YEINER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MOSQUERA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202298933

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No.: 1050-15-103-2022- 073 **CONTRATISTA:** INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** "EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCON-URBA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	17/06/23	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	INVIAS E - 410	PLACA HUELLA TITUMATE	1	45%-100%	98%	SI	
2	20/06/23	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	INVIAS E - 410	PLACA HUELLA TITUMATE	1	45%-100%	99%	SI	
3	24/06/23	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	INVIAS E - 410	PLACA HUELLA TITUMATE	1	45%-100%	86%	SI	
4	25/06/23	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	INVIAS E - 410	PLACA HUELLA TITUMATE	1	45%-100%	84%	SI	
5	26/06/23	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	INVIAS E - 410	PLACA HUELLA TITUMATE	1	45%-100%	76%	SI	
6	27/06/23	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	INVIAS E - 410	PLACA HUELLA TITUMATE	1	45%-100%	78%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HERMES CORDOBA CORDOBA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 1050-15-103-2022- 073 **CONTRATISTA:** INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

"EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE UNGUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 22/12/22

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/04/22 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 938.878.144,00

VALOR ACUMULADO: $ 938.878.144,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 15.188.410,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 15.188.410,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCON-URBA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 93.887.814,40	5	7	2022	5/03/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 281.663.443,20	5	7	2022	5/03/23		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 46.943.907,40	5	7	2022	5	11	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30% DEL ITEM	$ 4.556.523,00	5	7	2022	5	11	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10	$ 93.887.814,00	5	7	2022	5	11	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M- 10017063

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros s.a.s

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 300.000.000,00	5	7	2022	5	11	2020
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M- 100034815 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros s.a.s

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 93.887.814,40	22	12	2022	22	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 281.663.443,20	22	12	2022	22	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 46.943.907,40	22	12	2022	24	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30% DEL ITEM	$ 4.556.523,00	22	12	2022	23	4	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10	$ 93.887.814,00	24	4	2023	23	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100172063

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros s.a.s

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 300.000.000,00	22	12	2022	24	4	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100034815 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros s.a.s

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....


OBSERVACIONES:

Se realizo actulizacion de polizas conforme al acta de inicio, se actualizaron las fechas de los amparos de acuerdo al acta de inicio del contrato

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA

MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN

(VÍA AL CEMENTERIO)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/23 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL LITORAL DEL SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ SEMANA No.: 22 del 3/07/23 al 9/07/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JANNIER SALAS QUEJADA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL LITORAL DEL SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIÓN

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejorar las condiciones de la vía al cementerio mediante la construcción de tres (3) alcantarillas en tubería de concreto reforzado con un diámetro de 36" (900mm), la construcción de dos (2) box culvert 2 x 2 y la (l = 6 m) construcción de trescientos cincuenta (350) de placa huella en concreto.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la actualidad la vía al cementerio se encuentra recuperada por la vegetación y/o terreno natural, por ello la alcaldía a través de convenio logra aunar esfuerzos con el Invias para Mejorar las condiciones de la vía, mediante la construcción de una placa huella en concreto con sus obras complementarias y así reducir los riesgos que se corren en cada sepelio que se lleva a cabo por en el rio San Juan.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LITORAL			INTERVENTOR:	CONSORCIO INCOL-URBA		
INTEGRANTES:	R. LEGAL YEFERSON JAVIER MARTÍNEZ LEUDO			INTEGRANTES:	R. LEGAL EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA		
CONTRATO No.	MLSJ-LPN-009 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 920.000.000,00	CONTRATO No.	1101 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 773.639.801,00
FECHA DE INICIO:	2/02/23	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/12/22	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	04 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 920.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	04 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 773.639.801,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/06/23		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/23	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	-	$ 920.000.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 920.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 920.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 853.490.619,87	92,77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (66.509.380,13)	-7,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 920.000.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 853.490.619,87	92,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.509.380,13)	-7,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.508.000,00	0,5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.534.500,00	0,4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 773.639.801,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NO SE REQUIERE
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NO SE REQUIERE
AVALÚOS APROBADOS: NO SE REQUIERE
PREDIOS ADQUIRIDOS: NO SE REQUIERE

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Por anuncio de para armado en la zona del San Juan se vio obligado el contratista en pedir suspensión de Obra, hasta que se de orden por estos de reactivar cualquier tipo de actividad y en especial la movilidad fluvial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción placa huella.



Construcción placa huella.



Construcción placa huella.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MANTILLA

Matrícula Profesional No.: 2520278504 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2023
	DIA	MES	AÑO

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. MLSJ-LPN-009 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL LITORAL

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL LITORAL DEL SAM JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACION.

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: JUNIO 02 DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 920.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 359.957.743,10
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL-URBA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 92.000.000,00	12	12	2022	16	8	2023
Pago Salarios y Prest. Sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 46.000.000,00	12	12	2022	16	4	2026
Estabilidad y Calidad de la obra	10,00%	$ 92.000.000,00	SÍ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.			SÍ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS.		
Amparos Predios labores y operaciones.	21,74%	$ 200.000.000,00	15	12	2020	30	4	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Nº 17-44-101204630

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/22

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2023
	DIA	MES	AÑO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10%	$ 200.000.000,00	15	12	2022	30/04/23		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Nº 17-40-101026903

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/22

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MANTILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
LICITACIÓN PÚBLICA	CMA-DTE-SEP-197-2021
CONTRATO No:	1101 DE 2022.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-URBA
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($773.639.801), IVA incluido
ADICIONAL 1	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN No.1	ABRIL 27 DE 2023
PRORROGA No.1	TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN	JULIO 30 DE 2023

PÓLIZAS DEL CONTRATO:

Tipo	Aseguradora	Valor asegurado	Número de póliza	Vigencia desde	Vigencia Fin
Cumplimiento	Seguros del Estado	$ 82.363.980	65-44-101213919	25/07/2022	30/01/2024
Calidad del servicio	Seguros del Estado	$ 247.091.940	65-44-101213919	30/04/2023	30/08/2028
Salarios y prestaciones sociales.	Seguros del Estado	$ 164.727.960	65-44-101213919	25/07/2022	30/07/2026
Buen Manejo de Anticipo	Seguros del Estado	$ 130.023.496	65-44-101213919	25/07/2022	30/01/2024

La Interventoría solicito al Instituto una prórroga de su contrato de interventoría por cinco (5) meses, basados en los siguientes argumentos:

Los contratos de obra que no alcanzaran a desarrollar toda su ejecución en el plazo establecido son los contratos con los Municipios de Cantón de San Pablo y el contrato de Unguía. Los cuales se encuentran en trámite de realizar prorrogas en tiempo ya que no alcanzarán a terminar sus actividades de obra en los tiempos establecidos del contrato de Interventoría.

Es importante mencionar que el contrato inicial de interventoría fue adjudicado por Resolución Número 1715 del 24 de mayo del 2022 y asumía una fecha de terminación del contrato hasta el 30 de abril de 2023; Con la adición y prorroga No.1 realizada al contrato de interventoría, se aseguraron los recursos y el tiempo de la interventoría hasta el próximo 30 de julio de 2023, sin embargo y como se puede evidenciar por distintas problemáticas, los plazos establecidos no son suficientes para que los contratista terminen sus obras. Es importante tener en cuenta la dinámica de estos contratos regionales, los cuales se encuentran en zonas alejadas del departamento del Choco y alejados de los cascos urbanos, lo que dificulta el aprovisionamiento de materiales y el transporte de estos a las zonas de las obras. Esto ha conllevado a las solicitudes actuales de más tiempo de ejecución, pero también causa incertidumbre en que los plazos estimados de los mismos, los cuales ya han sido mencionados anteriormente, sean insuficientes.

Con el fin de garantizar que estos contratos estén cubiertos por la interventoría de acuerdo con lo pactado en los convenios interadministrativos, los cuales están vigentes hasta el mes de diciembre de 2023 y de acuerdo con lo expuesto en este oficio, consideramos necesario realizar una prórroga del contrato de interventoría, dejando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023. Esta prórroga requiere la adición de recursos adicionales por un valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000,00), teniendo en cuenta los costos derivados del tiempo adicional de interventoría, entre el mes de agosto y el mes de Diciembre de 2023, por lo cual ponemos a su consideración esta solicitud.

Se observa que a pesar de los esfuerzos realizados no es factible ejecutar el 100% de las obras programadas en el plazo contractual, por lo que es necesario continuar con la ejecución del contrato de obra e interventora para culminar con las metas inicialmente contempladas para los proyectos.

Por lo anterior se solicita a la entidad una prórroga al plazo al contrato de interventoría, con una nueva fecha de finalización del 31 de diciembre de 2023 y una adición del valor por cincuenta millones de pesos ($50.000.000), con el propósito de continuar con la evaluación, seguimiento y supervisión de los dos (2) proyectos activos hasta la entrega a satisfacción, con el fin de garantizar la inversión total de los recursos y el cumplimiento de las metas físicas.

5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

La Interventoría dentro de su proceso de verificación y control del proyecto realizo en el periodo de este informe las siguientes actividades:

- ✓ Actividades de campo conjuntamente con los contratistas de obra, realizando recorridos de los tramos a intervenir para verificar las cantidades reales de las obras construidas y a construir.
- ✓ La Interventoría hizo control con topografía a las excavaciones, llenos y compactado como el retiro y disposición final del material sobrante.
- ✓ La Interventoría estuvo atenta a que los contratistas cumplieran con todas las especificaciones técnicas en las actividades desarrolladas en el presente mes, acorde con lo estipulado en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito por él y la Alcaldía e Invias.
- ✓ Se atendió a los llamados de los contratistas para aclarar algunas dudas referentes a los trabajos que se llevan acabó en las diferentes obras y las posibles soluciones del cambio y replanteo de las misma con fines de mejorar y garantizar un buen funcionamiento de las obras de Arte.

5.3 INFORME DE ESPECIALISTAS.

A la fecha no ha surgido la necesidad de su utilización en los diferentes proyectos iniciados.

5.4 INFORME PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

Frente a los municipios de **Cantón del San Pablo (Vía La Yesita – Managrú), Municipio de Atrato (Vía Yuto-Ramal Samurindó), Municipio del Litoral del San Juan (Vía al Cementerio) y el Carmen de Atrato Chocó**, de acuerdo con el flujo de fondos de inversión y programación de obra se presentó el siguiente avance, los cuales presentamos a continuación:

1.4.1. PAC - Vía La Yesita – Managrú (Municipio del Cantón del San Pablo).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	[X] OBRA PROGRAMADA / [X] ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	[X] EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	[X] Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / [X] Ejecutado	1 16 enero - 16 febrero 2023	2 16 febrero - 16 marzo 2023	3 16 marzo - 16 abril 2023	4 16 abril - 16 mayo 2023	5 Indicar mes y año	6 Indicar m
CONSTRUCCIÓN DE (4) ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (L - 7 m, D-36" (900 mm.)	$118.794.300	3,55%		%P	1,18%	1,18%	1,18%			
				$P	$39.598.100	$39.598.100	$39.598.100			
				$E						
				%E						
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Longitud: (1810) ml	$3.169.267.605	94,74%		%P		31,58%	31,58%	31,58%		
				$P		$1.056.422.535	$1.056.422.535	$1.056.422.535		
				$E						
				%E						
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$18.045.000	0,54%		%P				0,54%		
				$P				$18.045.000		
				$E						
				%E						
CARACTERIZACIÓN VIAL	$1.520.000	0,05%		%P	0,05%					
				$P	$1.520.000					
				$E						
				%E						
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$4.497.251,72	0,13%		%P	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
				$P	$1.124.313	$1.124.313	$1.124.313	$1.124.313		
				$E						
				%E						
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$33.086.078,70	0,99%		%P			0,49%	0,49%		
				$P			$16.543.039	$16.543.039		
				$E						
				%E						
GPP7				%P						
				$P						
				$E						
				%E						
GPP8				%P						
				$P						
				$E						
				%E						
TOTAL OTROS ITEMS				%P						
				$P						
				$E						
				%E						
VALOR BÁSICO DE OBRA [A]	$ 3.345.210.235,42	100%								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO [A']										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES				%	1,26%	32,80%	33,29%	32,65%		
				VALOR (Miles de Pesos)	$42.242.413	$1.097.144.948	$1.113.687.987	$1.092.134.887		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA				%	1,26%	34,06%	67,35%	100,00%		
				VALOR (Miles de Pesos)	$42.242.413	$1.139.387.361	$2.253.075.348	$3.345.210.235		

Página 1

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 15.02%

1.4.2. 3.4.2. PAC - Vía Yuto-Ramal Samurindó (Municipio de Atrato).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	PROGRAMADA Miles de pesos	PROGRAMADA	OBRA PROGRAMADA	$ Valor programado			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	15 DICIEMBRE 2022 - 14 ENERO 2023	15 ENERO 2023 - 14 FEBRERO 2023	15 FEBRERO - 15 MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDDO ITEM(1,2,3,4,5,6 Y 7)	$200.637.563	77,49%		% P	0,00%	0,00%	38,74%
				$ P	$0	$0	$100.318.782
				$ E			
				% E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ITEM(2 Y 3)	$5.624.468	2,17%		% P	0,00%	0,00%	2,17%
				$ P	$0	$0	$5.624.468
				$ E			
				% E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS ITEM (4)	$1.000.000	0,39%		% P	0,00%	0,00%	0,19%
				$ P	$0	$0	$500.000
				$ E			
				% E			
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ITEM(1)	$10.000.000	3,86%		% P	0,00%	0,00%	1,93%
				$ P	$0	$0	$5.000.000
				$ E			
				% E			
TOTAL OTROS ITEMS IP1 y IP2	$41.669.320	16,09%		% P	0,00%	0,00%	8,05%
				$ P	$0	$0	$20.834.660
				$ E			
				% E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 258.931.351,00	100%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	51,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$132.277.910
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	51,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0,00	$132.277.910,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			
	VALOR (Miles de Pesos)			

Página

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%


1.4.3. 3.4.2. PAC - Vía al Cementerio (Municipio de Litoral del San Juan).

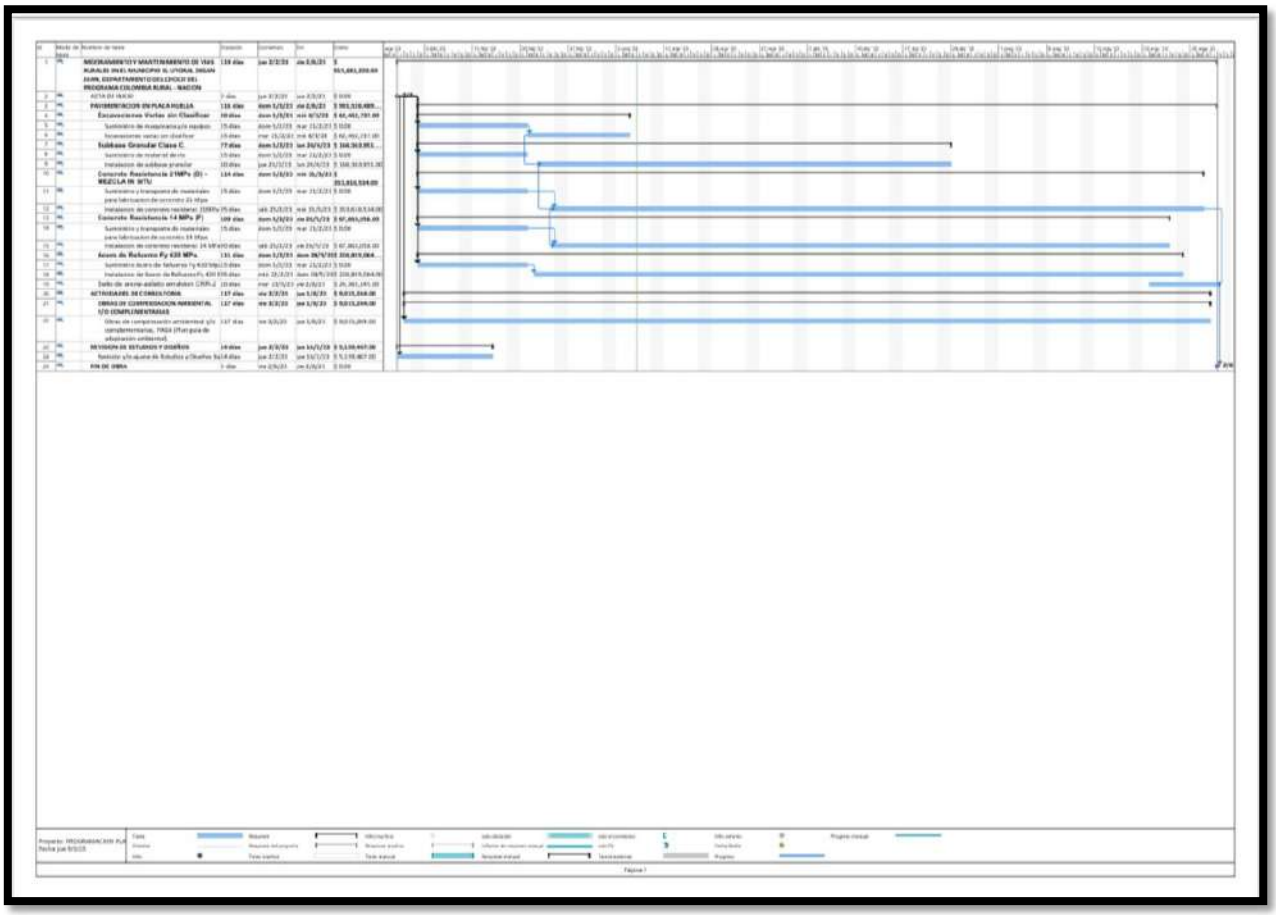

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 92,77%

1.4.1. 3.4.2. PAC - Vía Tanela - Titumate (Municipio de Unguía).

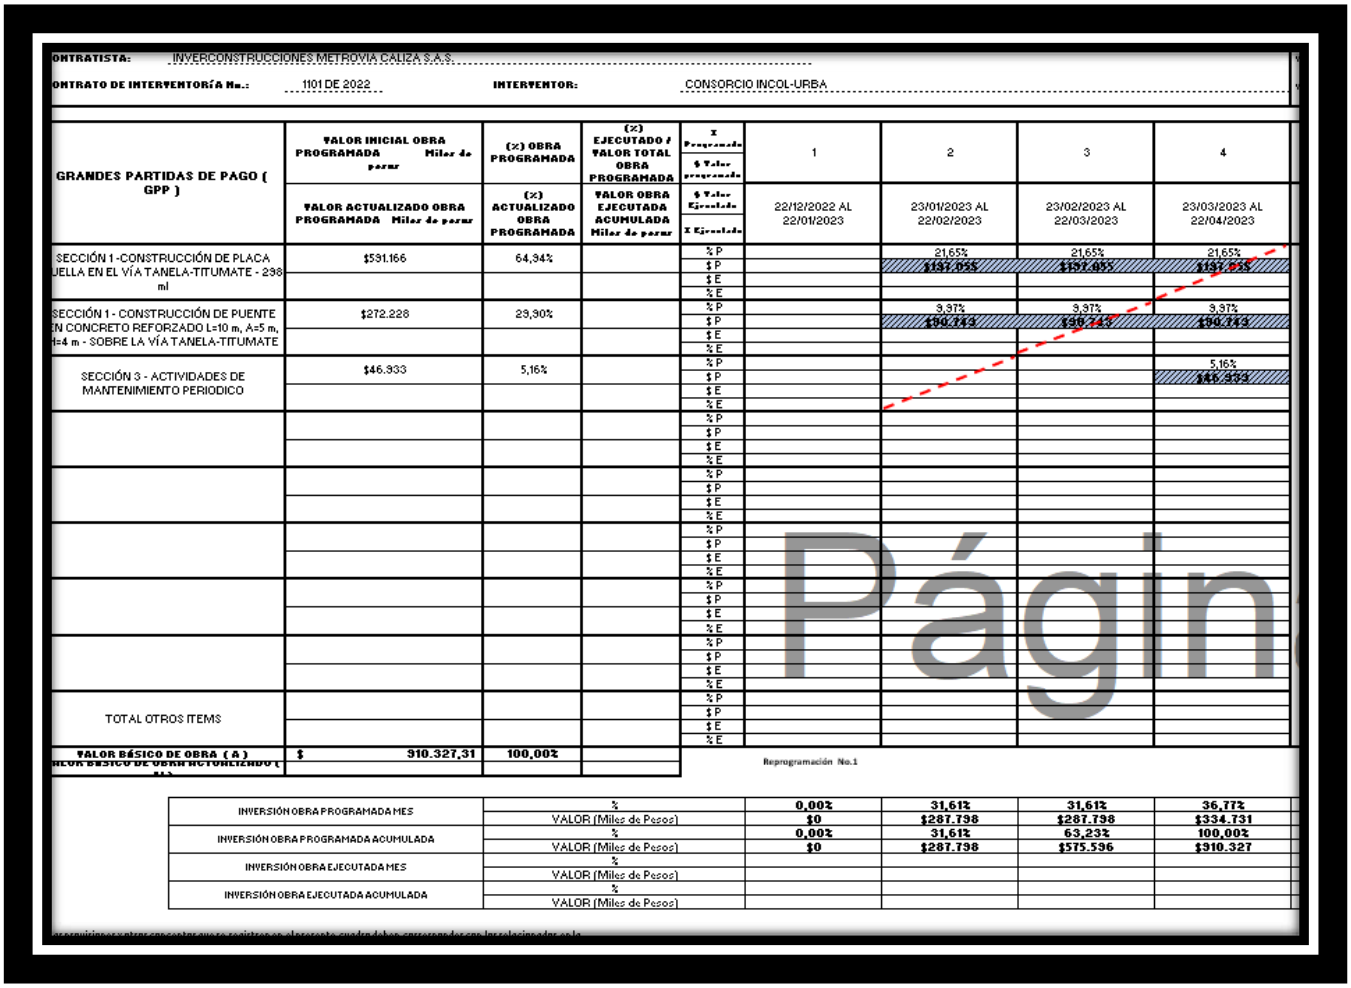

CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1101 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL-URBA

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 22/12/2022 AL 22/01/2023	2 23/01/2023 AL 22/02/2023	3 23/02/2023 AL 22/03/2023	4 23/03/2023 AL 22/04/2023
SECCIÓN 1 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL VÍA TANELA-TITUMATE - 238 ml	$531.166	64,94%		% P		21,65%	21,65%	21,65%
				$ P		$197.055	$197.055	$197.055
				$ E				
				% E				
SECCIÓN 1 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO REFORZADO L=10 m, A=5 m, H=4 m - SOBRE LA VÍA TANELA-TITUMATE	$272.228	29,90%		% P		9,97%	9,97%	9,97%
				$ P		$90.743	$90.743	$90.743
				$ E				
				% E				
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	$46.333	5,16%		% P				5,16%
				$ P				$46.333
				$ E				
				% E				
				% P				
				$ P				
				$ E				
				% E				
				% P				
				$ P				
				$ E				
				% E				
				% P				
				$ P				
				$ E				
				% E				
				% P				
				$ P				
				$ E				
				% E				
				% P				
				$ P				
				$ E				
				% E				
TOTAL OTROS ITEMS				% P				
				$ P				
				$ E				
				% E				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 310.327,31	100,00%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A1)								


Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	31,61%	31,61%	36,77%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$287.798	$287.798	$334.731
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	31,61%	63,23%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$287.798	$575.596	$910.327
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%				
	VALOR (Miles de Pesos)				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%				
	VALOR (Miles de Pesos)				

PROGRAMADO: 90.81%

EJECUTADO: 42.5%

1.4.1. 3.4.2. PAC - Vía Relleno Sanitario en la Vereda la Arboleda (Municipio de El Carmen de Atrato Chocó).

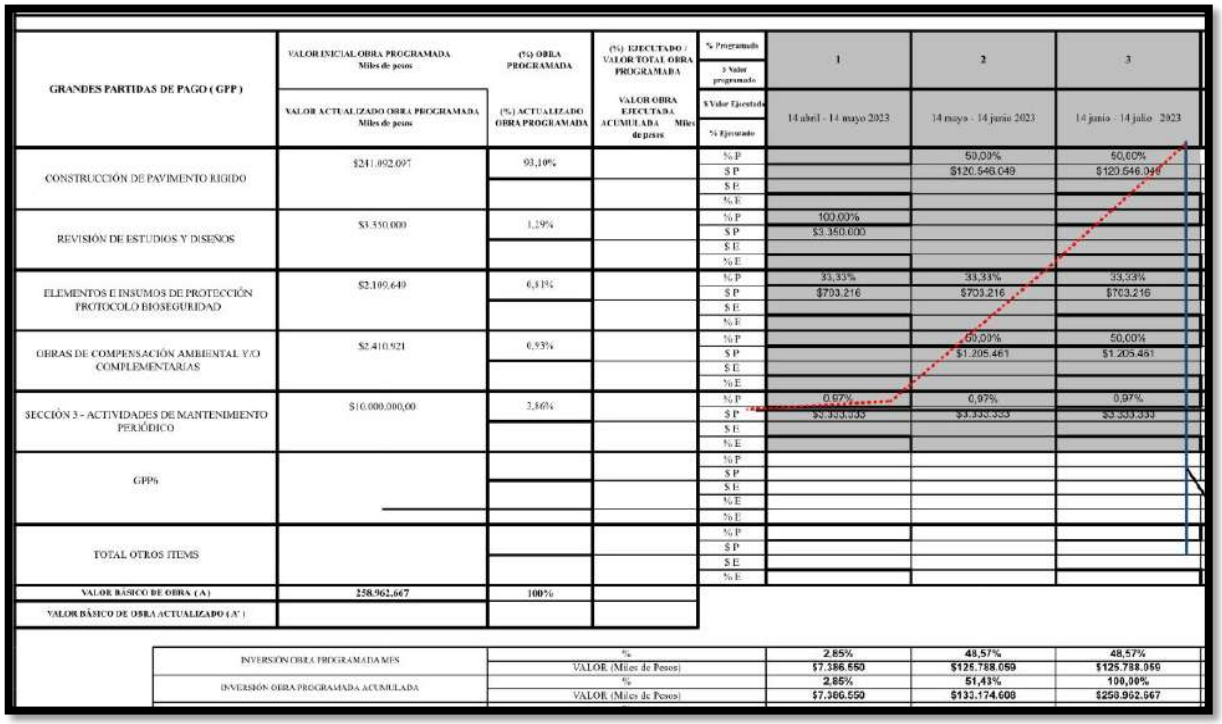

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 14 abril - 14 mayo 2023	2 14 mayo - 14 junio 2023	3 14 junio - 14 julio 2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	$241.092.097	93,10%		% P		50,00%	50,00%
				$ P		$120.546.049	$120.546.048
				$ E			
				% E			
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$3.350.000	1,29%		% P	100,00%		
				$ P	$3.350.000		
				$ E			
				% E			
ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$2.109.649	0,81%		% P	33,33%	33,33%	33,33%
				$ P	$703.216	$703.216	$703.216
				$ E			
				% E			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$2.410.921	0,93%		% P		50,00%	50,00%
				$ P		$1.205.461	$1.205.461
				$ E			
				% E			
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$10.000.000,00	3,86%		% P	0,67%	0,97%	0,97%
				$ P	$3.333.333	$3.333.333	$3.333.333
				$ E			
				% E			
GPP%				% P			
				$ P			
				$ E			
				% E			
				% P			
TOTAL OTROS ITEMS				$ P			
				$ E			
				% E			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	258.962.667	100%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,85%	48,57%	48,57%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.386.550	$125.788.050	$125.788.050
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,85%	51,43%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.386.550	$133.174.600	$259.962.667

PROGRAMADO: 100%

EJECUTADO: 100%

6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El personal de interventoría que laboró para este periodo fue el siguiente:

Cargo	Nombre	Fecha de vinculación
Director de Interventoría	Miguel Ángel Rodríguez Mantilla	07/12/2022
Residente de interventoría 1	Carlos Andrés Mosquera	25/01/2023
Residente de interventoría 2	Edwin Ariel Moreno	24/01/2023
Inspector de obra	Luis Nolberto Rentería Palacios	01/06/2023

Se anexan los siguientes formatos diligenciados por el personal de la Interventoría para el Contrato No 1101 de 2022:

1. MEPI-MN1-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICI MENSUALI INT.
2. MEPI-MINI-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT.
3. MEPI-MN1-IN-15-FR-1 LISTA CHEQUEO INFORME MENSUAL INT.
4. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.
5. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVEN.
6. MEPI-MN1-IN- 15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT.
7. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT.
8. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD INT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INCOL - URBA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15

CONTRATO DE OBRA No. MCSP-SP-LP-005-2022
(Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: MARTHA YENNY MENA

CONTRATO DE OBRA No. SAMC-009-2022
(Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: CONTEMPORANEOS

CONTRATO DE OBRA No. 1050-15-103-2022-073
(Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. MLSJ-LPN-009-2022
(Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LITORAL

CONTRATO DE OBRA No. 154-2022
(Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: CAMPO ELIAS PALOMEQUE

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 2/12/2022
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 773.639.801,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 30/04/2023
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

La Interventoría CONSORCIO INCOL-URBA en comunicación de fecha 26 de abril de 2023, solicitó una suspensión al Contrato de Interventoría No. 1101-2022 desde el 27 de abril hasta el 09 de mayo de 2023, debido a las siguientes justificaciones de cada uno de los contratos objeto de Interventoría:

Municipio de Unguía. Por los escases en el suministro de materiales a la zona por efectos del mar de leva que se ha presentado en las últimas semanas, lo que ocasiona el no acceso de embarcaciones de carga al Municipio.

Municipio de Litoral de San Juan. Se han presentado inconvenientes de acceso a la zona por temas de Orden Público; lo anterior a generado retrasos para el ingreso de materiales a la zona (Cemento) indispensable para la ejecución del proyecto.

Municipio de Carmen de Atrato. Es necesario suspender el contrato debido al no acceso de maquinaria y equipo a la zona de ejecución de la obra, por causas no imputables al contratista.

Municipio de Cantón de San Pablo. A pesar de contar con los equipos disponibles para el desarrollo de las obras, no es posible continuar su ejecución, debido a que es necesario efectuar algunos ajustes a los diseños que no estaban contemplados dentro del contrato inicial y que harían extender el plazo contractual vigente a la fecha.

Debido a las situaciones anteriormente mencionadas en estos municipios del Departamento de Chocó, es una causa de fuerza mayor, que impide desarrollar normalmente las actividades contratadas, por tal consideración da viabilidad, para que el contrato No. 1101-2022, se suspenda desde el 27 de Abril de 2023 hasta el 09 de Mayo de 2021.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El supervisor del contrato de interventoría, una vez recibidos y analizados los argumentos expuestos en la solicitud de suspensión del contrato de interventoría No. 1101-2022, recomienda la suspensión desde el veintisiete (27) de abril de 2023, hasta el nueve (9) de mayo de 2023, con fecha de reanudación del contrato el diez (10) de mayo de 2023, sustentándola en diversas circunstancias presentadas en las zonas donde se adelanta el objeto contractual. A su vez el Interventor considero que dicha causa es considerada de fuerza mayor, dando viabilidad a la suspensión.

El Representante Legal de la firma Interventora, presento solicitud al Instituto Nacional de Vías, mediante comunicación de fecha 26 de abril de 2023 para la suspensión del contrato de Interventoría 1101-2022.

En base a las anteriores consideraciones, se permite avalar la Suspensión del contrato 1101-2022, desde el 27 de abril hasta el 09 de mayo de 2023.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 27 (Día) de ABRIL (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 10 (Día) de MAYO (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 13 (Día) de MAYO (Mes) de 2023 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE: DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

Nombre: **EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA**
Representante legal o su Apoderado
Interventor: **CONSORCIO INCOL-URBA**

Nombre: **RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO**
Subdirector de Vias Regionales
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma

Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.:05202181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INCOL - URBA

Santiago de Cali, 26 de abril de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Atn ING. RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
Subdirector Vías Regionales
Bogotá.

REF.: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15**.**

ASUNTO: Solicitud de suspensión del Contrato de Interventoría 1101 de 2022.

Respetado Ingeniero:

Nos remitimos a Usted con el fin de solicitar la suspensión del contrato de interventoría desde el 27 de abril hasta el 9 de mayo de 2023, debido a las siguientes justificaciones de cada uno de los contratos objeto de interventoría:

Municipio de Unguía. El contrato de obra debe ser suspendido por la escases en el suministro de materiales a la zona por efectos del mar de leva que se ha presentado en las últimas semanas, lo que ocasiona el no acceso de embarcaciones de carga al Municipio.


Municipio de Litoral de San Juan. Se han presentado inconvenientes de acceso a la zona por temas de orden público; lo anterior retraso el ingreso de materiales a la zona (cemento) indispensable para la ejecución del proyecto.

Municipio de Carmen de Atrato. Es necesario suspender el contrato debido al no acceso de maquinaria y equipo a la zona de ejecución de la obra, por causas no imputables al contratista.

Municipio de Cantón de San Pablo. A pesar de contar con los equipos disponibles para el desarrollo de las obras, no es posible continuar su ejecución, debido a que es necesario efectuar algunos ajustes a los diseños que no estaban contemplados dentro del contrato inicial y que harían extender el plazo contractual vigente a la fecha.

Dado las circunstancias expuestas por el Contratista, solicitamos que se efectué la suspensión del Contrato No1101 de 2022 desde el 27 de abril de 2023 hasta el 9 de mayo de 2023.

Cordialmen



MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ MANTILLA
CONSORCIO INCOL - URBA
Archivo inv_024
Copia: Ing, Jonathan Parra – Gestor Proyecto – Invias. japarra@invias.gov.co
Adjunto: 1 Archivo PDF

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/08/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOBIA RURAL" LOTE 15.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1101-2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INCOL - URBA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta	Platon 4X4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Camioneta	Duster Renault	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520278504

Firma
Nombre: JANNIER SALAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/08/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1101-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL - URBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOBIA RURAL" LOTE 15.

CONTRATO DE OBRA No.: MCSP-SP-LP-005-2022 SAMC-009-2022 154-2022 1050-15-103-2022-073 MLSJ-LPN-009-2022 **CONTRATISTA:** MARTHA YENNY MENA SERVICIOS INTEGRALES CONTEMPORANEOS CAMPO ELIAS PALOMEQUE INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S UNION TEMPORAL LITORAL

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MANTILLA	79741329	DIRECTOR	$ 3.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	CONSORCIO INCOL URBA	3250000	$ 226.200		SALUD TOTAL	9450122472	$ 406.300	PORVENIR	9450122472	$ 520.000				
2	LUIS NORBERTO RENTERIA PALACIOS	4813952	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0	CONSORCIO INCOL URBA	1900000	$ 129.993		COOSALUD	9450122471	$ 74.687	PROTECCIÓN	9450122471	$298.633	$ 74.687			
3	CARLOS MOSQUERA	82260505	RESIDENTE	$ 5.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INCOL URBA	5500000	$ 382.800		SURA	9450122471	$220.000	PORVENIR	9450122471	$935.000	$220.000			
4	EDWIN MORENO	11706731	RESIDENTE	$ 5.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INCOL URBA	5500000	$ 382.800		NUEVA EPS	9450122471	$220.000	PROTECCIÓN	9450122471	$935.000	$220.000			
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
9																																																		
10																																																		
N																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO 1

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL-URBA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

JUSTIFICACIÓN:

N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL	$ 32.240.000,0	$ 32.240.000,0	$ 29.919.496,0		$ 94.399.496,00	72,60%
2	PERSONAL TÉCNICO	$ 4.836.000,0	$ 4.836.000,0	$ 0,0		$ 9.672.000,00	7,44%
3	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.426.000,0	$ 1.426.000,0	$ 0,0		$ 2.852.000,00	2,19%
4	VIÁTICOS	$ 2.000.000,0	$ 2.000.000,0	$ 0,0		$ 4.000.000,00	3,08%
5	COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA	$ 11.000.000,0	$ 1.300.000,0	$ 0,0		$ 12.300.000,00	9,46%
6	OTROS COSTOS	$ 3.400.000,0	$ 3.400.000,0	$ 0,0		$ 6.800.000,00	5,23%
TOTAL						**$ 130.023.496,00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
(Nombre) EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO INCOL.URBA
Matricula No.: 4.613.801.

Firma:
(Nombre) JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.:05202181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO 1

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1101 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INCOL-URBA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

JUSTIFICACIÓN:

N.A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL	$ 32.240.000,0	$ 32.240.000,0	$ 29.919.496,0		$ 94.399.496,00	72,60%
2	PERSONAL TÉCNICO	$ 4.836.000,0	$ 4.836.000,0	$ 0,0		$ 9.672.000,00	7,44%
3	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.426.000,0	$ 1.426.000,0	$ 0,0		$ 2.852.000,00	2,19%
4	VIÁTICOS	$ 2.000.000,0	$ 2.000.000,0	$ 0,0		$ 4.000.000,00	3,08%
5	COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA	$ 11.000.000,0	$ 1.300.000,0	$ 0,0		$ 12.300.000,00	9,46%
6	OTROS COSTOS	$ 3.400.000,0	$ 3.400.000,0	$ 0,0		$ 6.800.000,00	5,23%
TOTAL						**$ 130.023.496,00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
(Nombre) EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO INCOL.URBA
Matricula No.: 4.613.801.


Firma:
(Nombre) JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.:05202181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El proyecto de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15 se encuentra previsto para la ejecución de obra en cinco (05) Municipios correspondiendo a Municipio de El Cantón de San Pablo (vía La Yesita-Managrú), Municipio de Unguía (vía Tanela- Titumate), Municipios de Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó), Municipio de El Carmen de Atrato (Vía La Arboleda) Municipio Litoral de San Juan (Vía Cementerio), todos cinco (5) tienen acta de inicio tales como: El Cantón de San pablo (vía La Yesita-Managrú) a partir del 16 de enero de 2023, Unguía (vía Tanela- Titumate) a partir del 22 de diciembre de 2022, Atrato (vía Yuto-Ramal Samurindó) a partir del 14 de diciembre de 2022, Litoral de San Juan (Vía Cementerio) a partir del 02 de febrero de 2023 y El Carmen de Atrato (Vía La Arboleda) a partir del 14 de abril de 2023.
- ✓ El proyecto en la Vía la Yesita – Managrú, Municipio de Cantón de San Pablo en las actividades lleno vibrado con material seleccionado para los cajeos laterales en la vía donde se requiere la ampliación.
- ✓ El frente de mejoramiento de la vía que conduce desde el Municipio de Yuto – Ramal Samurindo completo las obras programadas para el proyecto como las actividades y observaciones realizadas por la interventoría. Este proyecto se encuentra en proceso de liquidación final.
- ✓ El contrato del municipio de Unguia presenta un avance de 80% en la construcción de la placa huella
- ✓ Para la placa huella en el municipio de Unguía en el tramo vial Titumate-Tanela se priorizaron tres puntos críticos de los cuales ya se construyo en un carril en todos los tamos, en el tramo 1 ya se completaron los dos carriles para el tramo 2 y 3 se instaló el acero y el concreto ciclópeo solo falta el concreto para huella, vigas y cuneta

- ✓ Para la construcción del puente sobre el rio capitán en el municipio de Unguia se realizó la adecuación de la vía que servirá como desvió del tránsito, para iniciar trabajos de excavación del puente.
- ✓ El proyecto del Municipio de El Carmen de Atrato completo las obras programadas para el proyecto como las actividades y observaciones realizadas por la interventoría. Este proyecto inicia su proceso de liquidación final.



Miguel Angel Rodríguez Mantilla
Director de Interventoría
Consorcio Incol - Urba

8 ANEXOS



Foto No. 29. Extracción de material de cantera para llenos y acopio en sitio.



Foto No. 30. Extracción de material de cantera para llenos y acopio en sitio.



Foto No. 25. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 26. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 27. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 28. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 21. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 22. Extracción de material de cantera para llenos y acopio en sitio.



Foto No. 23. Extracción de material de cantera para llenos y acopio en sitio.



Foto No. 24. Transporte de material de cantera para llenos y acopio en sitio.



Foto No. 17. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 18. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 19. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 20. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 13. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 14. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 15. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 16. Chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 9. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 10. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.

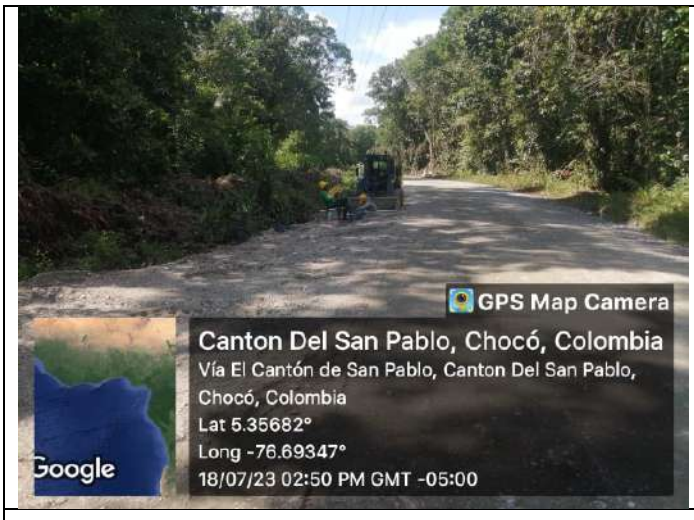


Foto No. 11. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 12. Instalación de equipos para realizar el chequeo topográfico a los cajeos por la interventoría.



Foto No. 5. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 6 Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 7. Señalización preventiva.



Foto No. 8. Señalización preventiva.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO CANTÓN DE SAN PABLO	**CONSORCIO INCOL-URBA** **NIT 901609799-1**
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	MARTHA YENNY MENA MONRROY
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022



Foto No. 1 Medicion manual con cinta metrica del cajeo.



Foto No. 2 Medicion manual con cinta metrica del cajeo.



Foto No. 3 Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.



Foto No. 4. Lleno con material seleccionado y compactado del mismo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No.33. placa huella



Foto No. 34. Placa huella



Foto No. 35. Placa huella



Foto No. 36. Acabado de placa huella

	
Foto No. 29. Instalación de concreto para huella cuneta y vigas	Foto No. 30. Concreto de 21Mpa
	
Foto No.31. concreto huella vigas y cuneta	Foto No.32. placa huella

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 25. Instalación de acero



Foto No.26. instalación de acero



Foto No. 27. Excavación de cunetas



Foto No. 28. Excavación de vigas y cunetas



Foto No. 21. Concreto ciclópeo tramo 3



Foto No. 22. Concreto ciclópeo punto crítico 3



Foto No.23. acero para vigas, huella cunetas



Foto No. 24. Acero para huella cunetas vigas

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 17. Concreto ciclópeo punto crítico 1



Foto No. 18. Concreto ciclópeo punto crítico 1



Foto No. 19. Concreto ciclópeo punto crítico 2



Foto No. 20. Concreto ciclópeo punto crítico 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 13. Instalación de formaletas tramo 2



Foto No. 14. Instalación de piedra para ciclópeo



Foto No. 15. Compactación



Foto No. 16. Instalación de formaletas tramo 3

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 9. Instalación de formaleta para ciclópeo tramo 1



Foto No. 10. Instalación de formaleta para ciclópeo tramo 1



Foto No. 11. Instalación de piedra para ciclópeo



Foto No. 12. Nivelación y compactación

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 5. Lleno de espaldares



Foto No. 6. Lleno de espaldares



Foto No. 7. Compactación llena de espaldares



Foto No. 8. Lleno de espaldares

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 15".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA:	INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 1. Fomaletas para bordillos



Foto No. 2. Formaleta para bordillo



Foto No. 3. Instalación de bordillo



Foto No. 4. Bordillo



Foto No. 17 Reparación de fisura en losa de concreto.



Foto No. 18 Reparación de fisura en losa de concreto.



Foto No. 13 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 14 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 15 Reparación de fisura en losa de concreto.



Foto No. 16 Reparación de fisura en losa de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS F.D.C. S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.



Foto No. 9 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 10 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 11 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 12 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 5 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 6 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 7 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.



Foto No. 8 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCÓ	**CONSORCIO INCOL-URBA** **NIT 901609799-1**
NOMBRE DEL PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS F.D.C. S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1101 DE 2022.

	
Foto No. 1 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.	Foto No. 2 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.
	
Foto No. 3 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.	Foto No. 4 Actividades de mantenimiento, conformación de calzada.

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

8.1.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
CSIU-INV-046	Solicitud de adición y prorroga interventoría	07 de julio de 2023
CSIU-INV-047	Respuesta su oficio SVR 35291 Rechazo del anexo 05 de la póliza 65-44-101213919	11 de julio de 2023
CSIU-INV-048	Entrega informe mensual No.5	17 de julio de 2023
CSIU-INV-049	Respuesta solicitud prorroga Cantón	21 de julio de 2023
CSIU-INV-050	Respuesta solicitud prorroga Unguia	07 de julio de 2023
