GCS
Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S
NIT 900.653.937-2
GCS-MAD-CO-543-058

Bogotá, 29 de Septiembre de 2023

Señores

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO
UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
Representante Legal.
Centro Comercial Bolivar OF. A10
Cucuta – Norte de Santander

ASUNTO: GCS-MAD-CO-543-045, INFORME MENSUAL No. 9 – MARZO, INFORME MENSUAL No. 10 – ABRIL, INFORME MENSUAL No. 11 – MAYO

REFERENCIA: CONTRATO No 543 de 2022, "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite el informe de obra mensual No.9,10 y 11 correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo para su respectiva revisión y aval, el cual contiene el informe de obra, SST con sus respectivos anexos

Agradezco la atención prestada, quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
C. C. No. 1.126.001.358 de Londres (ING)
Tarjeta Profesional No.25202-252504 CND
NIT: 900.653.937-2

Recibí

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

INFORME TECNICO No. 11

01 – 31 MAYO 2023

MADRID, CUNDINAMARCA

2023


Powered by CamScanner

MADRID – CUNDINAMARCA

INFORME TECNICO No. 11

PERIODO: MAYO 01 DE 2023 – MAYO 31 DE 2023

"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"

Elaboró: DIANA MARIA OLAYA ORTIZ	**Revisó:** DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	**Revisó y aprobó:** JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Cargo: Ing. Auxiliar	**Cargo:** Ing. Residente	**Cargo:** Representante Legal
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Fecha: 9/06/23	**Fecha:** 20/06/23	**Fecha:** 26/06/23

Powered by CamScanner

GCS
Construcciones S.A.S

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. LOCALIZACIÓN 5
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA 6
5. INFORME TECNICO 6
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
5.1.1. Valor de Actividades por Frentes 8
5.1.2. Porcentaje por Frentes 9
5.2. REGISTRO PERSONAL 9
5.2.1. PERSONAL 11
5.3. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO 12
5.4. DISEÑOS 13
5.5. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 13
5.6. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA 13
5.7. REPORTE MULTAS Y SANCIONES 13
5.8. POLIZAS DEL CONTRATISTA 13
5.9. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO 13
5.10. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 14
5.11. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 14
5.12. AFECTACIONES 14
5.12.1. CONDICIONES CLIMATICAS 14
5.12.2. VANDALISMO 14
6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS 15
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 15
7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN 19
7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS 25
7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA 27
7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS 27
8. CONCLUSIÓN 27

Powered by CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Madrid - Cundinamarca, concluyo contratar a GCS CONTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato No 543 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**

El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos y contractuales.

2. OBJETIVO

Generar un informe de rendición de cuentas del contrato de obra No. 543 de 2022, dando cumplimiento a las condiciones generales establecidas en el contrato según los requerimientos y observaciones realizadas por parte de la Interventoría y Supervisión.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**



Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

Powered by CamScanner

4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.contrucciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.1	30 DICIEMBRE 2022
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.1	30 ENERO 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1	02 MARZO 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.2	21 FEBRERO 2023
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.2	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.2	21 MARZO 2023

Powered by CamScanner

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.2	30 MARZO 2023
PLAZO PRORROGA No.1	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1	30 MAYO 2023
PLAZO PRORROGA No.2	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2	30 JUNIO 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
VALOR ADICIÓN No.1 POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$331.046.236 TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

5. INFORME TECNICO

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el transcurso del mes de febrero se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo a los diferentes frentes de trabajo:

A. Frente polideportivo del barrio Escallón:

Inicio de actividades: **16 de junio 2022**

- Adoquín en concreto
- Celosía tubular para el cerramiento del polideportivo

Powered by CamScanner

B. Frente polideportivo del barrio San Luis:

Inicio de actividades: **22 de junio 2022**

- Placa base en concreto
- Malla electrosoldada
- Celosía tubular para estructura cubierta polideportivo

C. Frente polideportivo del barrio La Magnolia:

Inicio de actividades: **20 Julio 2022**

- Celosía tubular para cerramiento polideportivo

D. Frente polideportivo barrio San Carlos.

Inicio de actividades: **12 agosto 2022**

- No se registran actividades para este frente en el transcurso del mes de MAYO 2023

5.1.1. Valor de Actividades por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 806.875.792,00
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.428.004.293,00
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.398.078.270,00
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 771.963.787,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 4.404.922.142,00**

5.1.1.1. Valor de Actividades Ejecutadas por frente en el periodo del presente informe

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 0
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 160.169.191,99
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 199.876.325,19
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 106.104.006,74

Powered by CamScanner

5.1.1.2. Valor de Actividades Ejecutadas por frente acumulado

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 908.012.028,03
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.232.488.300,30
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.168.883.578,77
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 436.109.276,48

5.1.1.3. Valor de Actividades Ejecutadas General del proyecto

VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	**$ 466.149.523,92**
VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	**$ 3.745.493.183,59**

5.1.2. Porcentaje por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	18,32%
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	32,42%
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	31,74%
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	17,53%
	% TOTAL DEL PROYECTO	**100%**

5.1.2.1. Porcentaje Ejecución por Frentes en el periodo del presente informe

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	0%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	11,22%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	14,30%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	13,74%

Powered by CamScanner

5.1.2.2. Porcentaje Ejecución por Frentes acumulado

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	112,53%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	86,31%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	83,61%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	56,49%

5.1.2.3. Porcentaje Ejecución General del Proyecto

PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	10,58%
PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	85,03%

5.2. REGISTRO PERSONAL

El personal vinculado a la obra contó con la entrega de los elementos de protección de seguridad industrial, además contaron con la afiliación, pagos de seguridad social y parafiscales, salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensión (AFP), caja de compensación, SENA e ICBF.

5.2.1. PERSONAL

El personal del contratista – GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, en obra en el periodo del presente informe, está compuesto por:

- Director de Obra: Javier Antonio González Arenas
- Ingeniero Residente de Obra: Daniel Camilo Prada Millán
- Asesor eléctrico: Carlos Julio Acevedo Ferreiro
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo: Daniel Mauricio Oler Restrepo
- Topógrafo: Leonel Eduardo López Duran
- Coordinador de Obra: José Lamus Rodríguez
- Asesor Estructural: Nicolas Alfonso Correa Duarte

Powered by CamScanner

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**ESTADO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	21/03/2023		
MAESTROS DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Maestro	Derlen Fabian Becerra	1.102.717.527	21/03/2023	15/05/2023	Retirado
OFICIALES DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Oficial	Jose Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	1/04/2023		
Oficial	Eduar Alberto García Cosme	1.051.737.892	21/03/2023	18/05/2023	Retirado
Oficial	Carlos Santana O.	1.051.737.892	21/03/2023	9/05/2023	Retirado
Oficial	Dagoberto Mora Tellez	9.167.984	21/03/2023		
Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	21/03/2023	6/05/2023	Retirado
AYUDANTES DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Ayudante	Daniel Enrique Arias Figueroa	1.081.797.879	21/03/2023		
Ayudante	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	21/03/2023		
Ayudante	Ricardo Rodriguez Tellez	1.002.423.643	21/03/2023	9/05/2023	Retirado
Ayudante	Pedro Arturo Fuenmayor Andradez	1.006.888.646	5/05/2023	5/05/2023	Retirado
Ayudante	Gilberto Pana	1.124.486.994	5/05/2023		
Ayudante	Gonzalo Epinayu Epinayu	1.192.768.738	5/05/2023	4/05/2023	Retirado
Ayudante	Juan David Guzman Berrio	1.065.586.229	2/05/2023	30/05/2023	Retirado

Powered by CamScanner

SOLDADORES					
Soldador	Jorge Alberto Espejo Beleño	8.055.676	21/03/2023	2/05/2023	Retirado
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	21/03/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	21/03/2023		
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	21/03/2023		
Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	21/03/2023	2/05/2023	Retirado
Soldador	Omar Fernando Rueda Herrera	1.102.723.680	21/03/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	21/03/2023		

Nota: En el transcurso del periodo de tiempo relacionado en el presente informe, se presentó la incorporación de personal, así como el retiro de varios empleados. En la tabla anterior se relaciona el estado actual del personal.

5.3. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación, se encuentra el listado de maquinaria y equipo empleado que se encuentran en obra y en los diferentes frentes a desarrollar:

Cantidad	Descripción
10	Pulidora
4	Barra
4	Picas
8	Pala
10	Andamio (sección)
1	Vibro compactador (canguro)
1	Vibro compactador (rana)
1	Vibrador concreto
2	Tronzadora

Powered by CamScanner

5.4. DISEÑOS

Las modificaciones en los diseños de los polideportivos presentados a interventoría y supervisión:

Frente polideportivo Escallón:

- Ubicación de las graderías: A borde con las columnas de la cubierta
- Ubicación de la placa de piso: Centrada con relación a la cubierta
- Acceso al polideportivo: dos (2) entradas
    - Entrada principal
    - Entrada de mayor dimensión al respaldo del arco de la parte frontal

Frente polideportivo San Luis:

- Niveles de la tarima: Nivel 0 = -0,4m por temas de seguridad con relación a la altura.
- Diseño de la cubierta del polideportivo

Frente polideportivo La Magnolia:

- Accesos al polideportivo
    - Calle 8°: puerta principal para ingresar al polideportivo
    - Cruce entre calle 8° y 9°: ingreso parque infantil
    - Acceso polideportivo por la carrera 4
- Diseño cimentación muro de cerramiento
- Baños al costado de las graderías

Frente polideportivo San Carlos:

- Dimensiones cerramiento: Lateral colindante con el predio de la iglesia

Powered by CamScanner

5.5. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos realizados, así como los resultados de estos mismos, fueron anexados en las cuentas de cobro 1 y 2 (11/11/2022 y 20/02/2023). Los ensayos realizados después de esta fecha, serán anexadas en la siguiente cuenta de cobro.

5.6. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra durante el periodo de ejecución del presente informe. (ANEXO No. 1)

5.7. REPORTE MULTAS Y SANCIONES

No se reportaron multas ni se adelantaron procesos de sanciones durante el periodo del presente informe.

5.8. POLIZAS DEL CONTRATISTA

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP

5.9. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO

- El contratista cuenta con una oficina en el barrio Escallón (Carrera 10° # 15-29), de igual manera se está almacenando el material, herramientas de construcción y demás elementos en bodega, que se encuentra ubicada en el mismo barrio, en el predio colindante (parqueadero). Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.
- En el polideportivo del barrio San Luis se cuenta con el alquiler del salón comunal del barrio San Luis para el almacenamiento de materiaes.
- En el polideportivo San Carlos, el contratista cuenta con el alquiler de dos (2) bodegas ubicadas en el frente del polideportivo (Carrera 21 6B Sur), para el almacenamiento de equipo y herramientas.

5.10. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

En el periodo del presente informe no se reportan residuos provenientes de demoliciones. Los desechos que se generan en obra, como las lonas del cemento, son recolectadas en bolsas de basura para posteriormente ser retiradas por el camión de la basura.

Powered by CamScanner

5.11. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

Frente polideportivo Escallón:

Se evidencia la presencia de un cuerpo de agua colindante con el cerramiento del polideportivo por la parte posterior y a la medianía con el predio correspondiente con el parqueadero, el cual, en el periodo del presente informe, no causo inconvenientes en la obra.

Frente polideportivo San Luis:

En el área de influencia de este frente, no se presenta ningún cuerpo de agua.

Frente polideportivo La Magnolia:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

Frente polideportivo San Carlos:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

5.12. AFECTACIONES

5.12.1. CONDICIONES CLIMATICAS

En el mes de mayo no se presentaron afectaciones por las condiciones climáticas en el desarrollo de las actividades del proyecto (Anexo No. 2)

5.12.2. VANDALISMO

En el periodo del presente informe no se reporta el hurto de material y herramientas en los diferentes frentes de trabajo.

6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS

En el periodo del presente informe No se registran inspecciones de obra en los diferentes frentes de trabajo.

Powered by CamScanner

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

- Adoquín en concreto




Powered by CamScanner







- Celosía tubular para el cerramiento del polideportivo

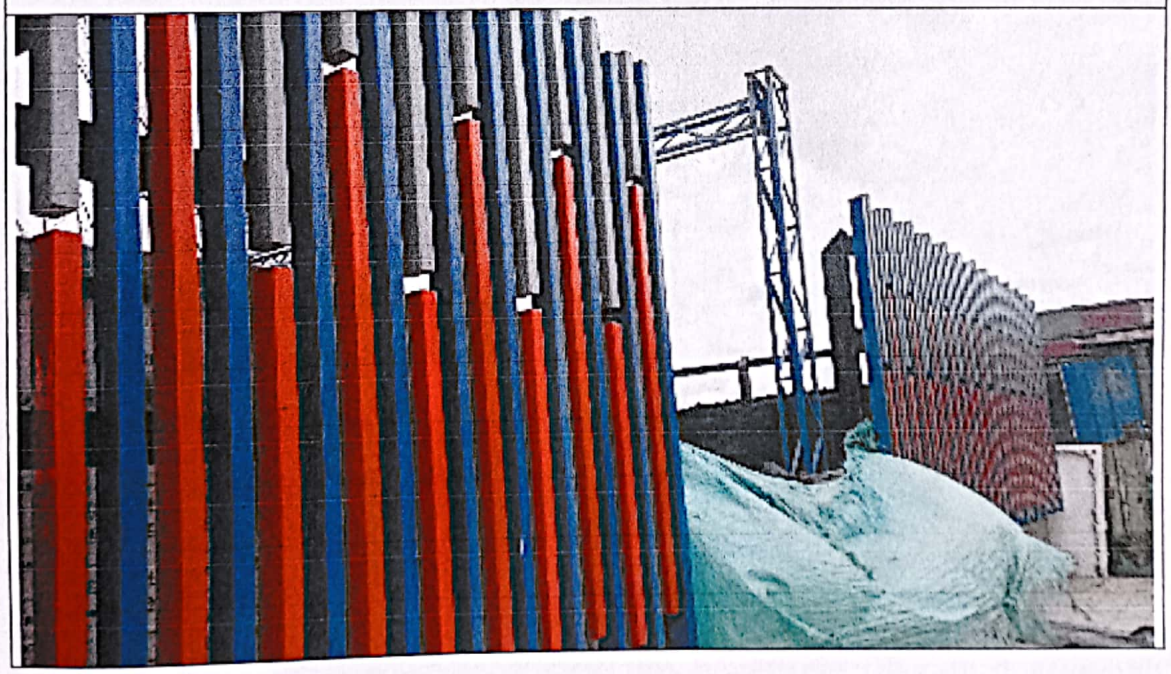

Powered by CamScanner



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner






Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS

- Placa base en concreto

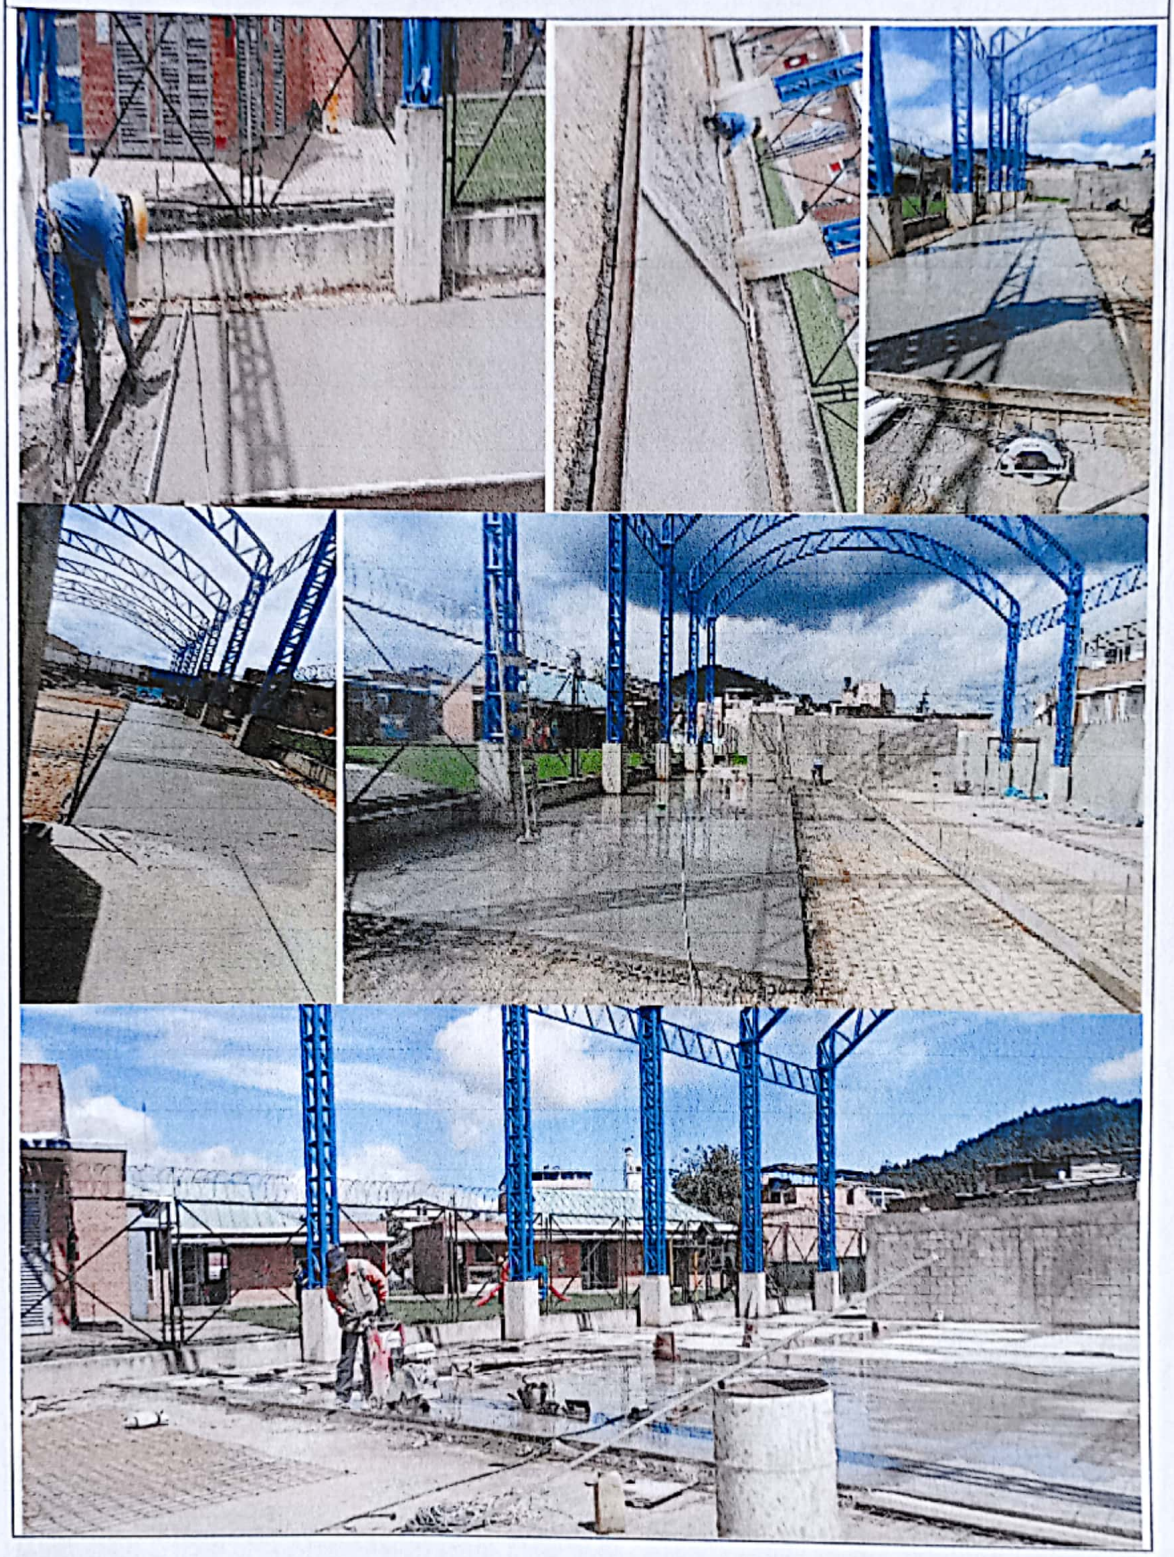

Powered by CamScanner



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com


Powered by CamScanner




Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

- Malla electrosoldada

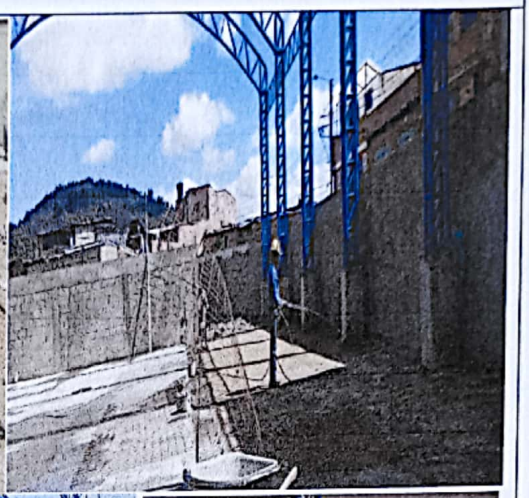

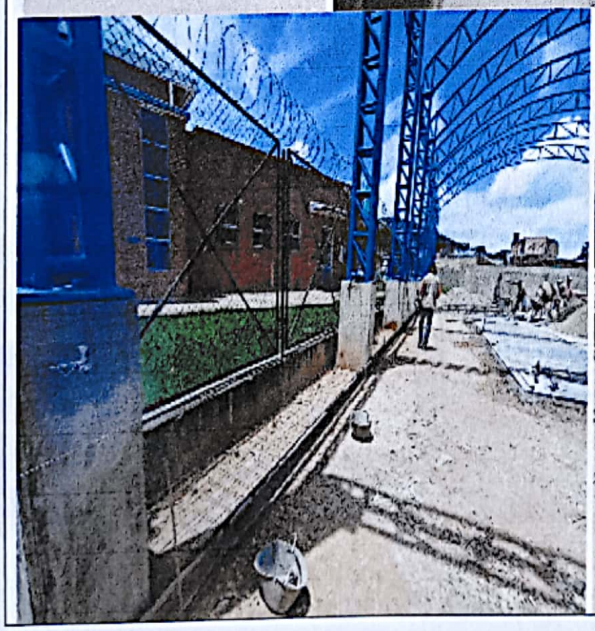



Powered by CamScanner

- Celosía tubular para estructura cubierta polideportivo



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

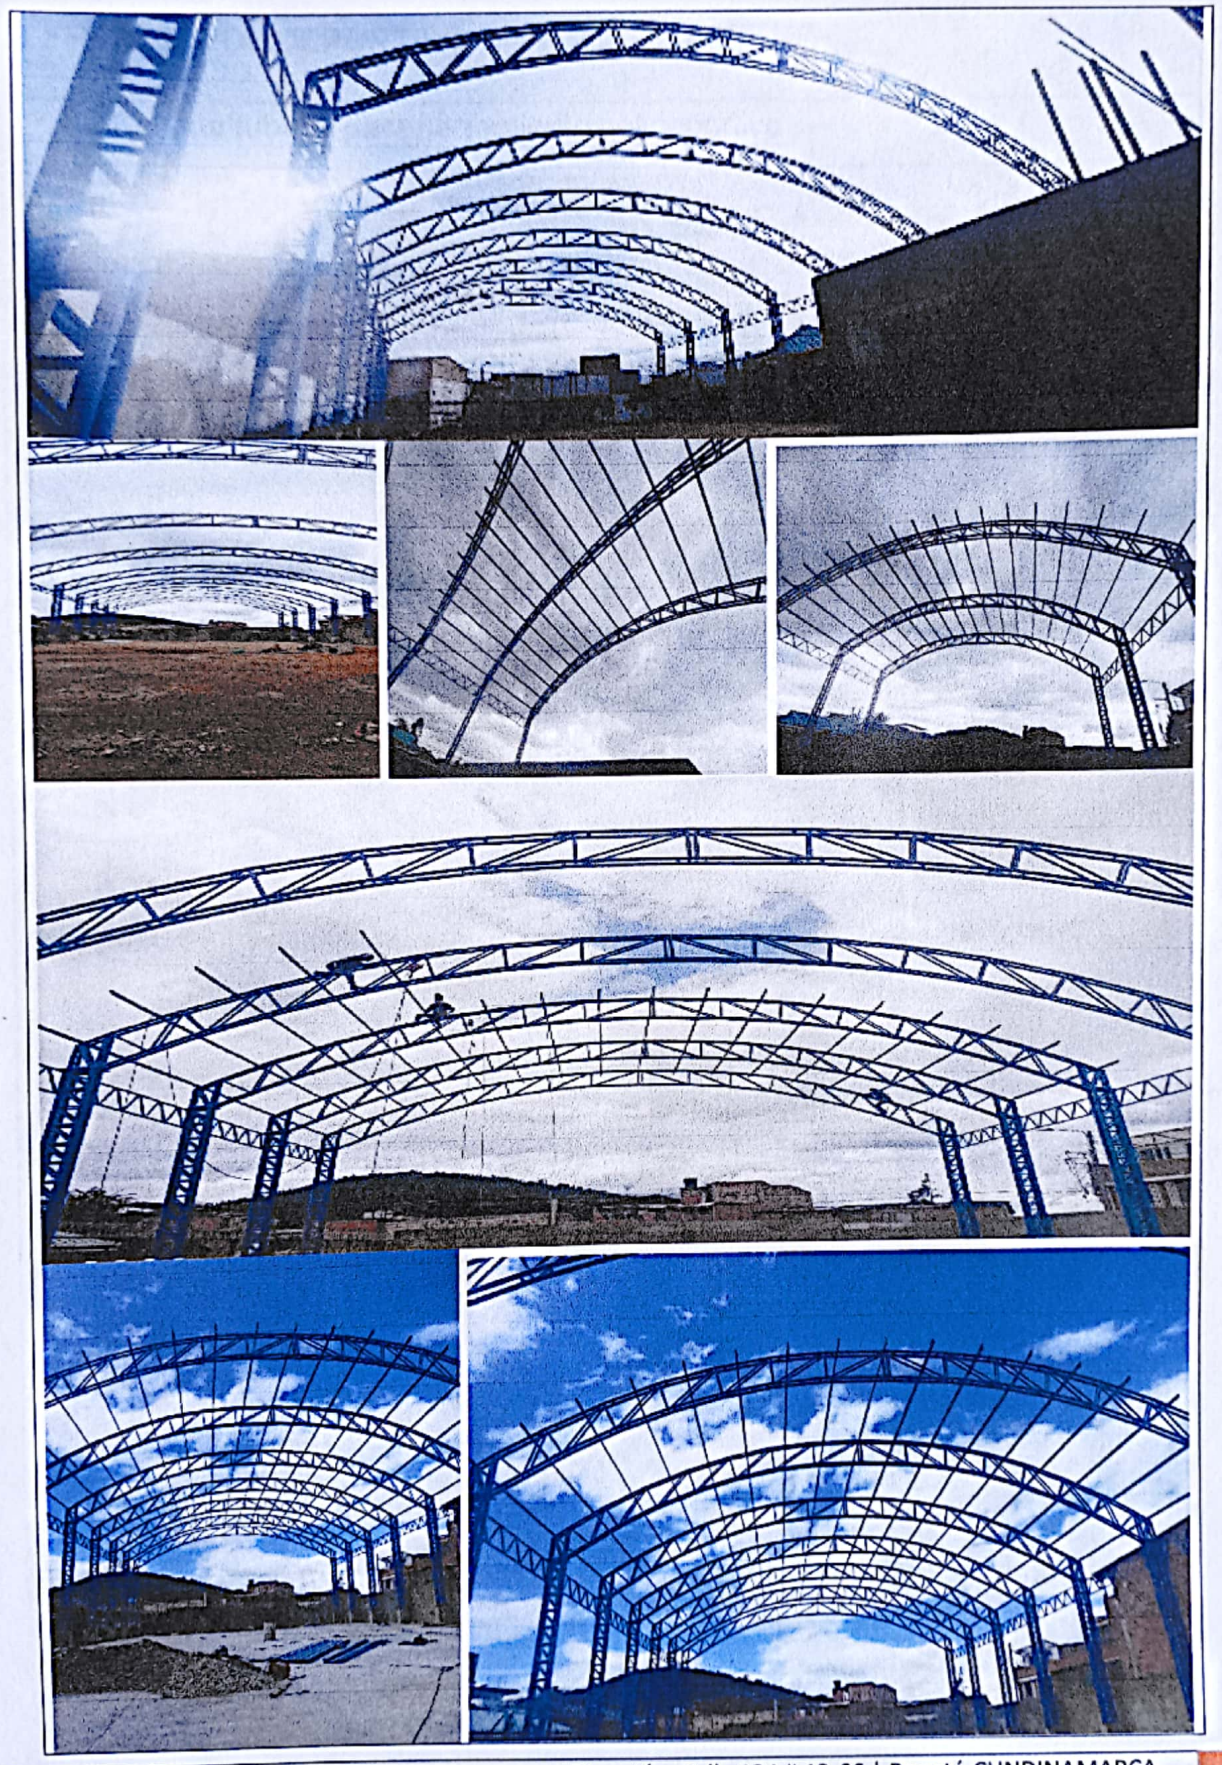

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

- Celosía tubular para cerramiento polideportivo



Powered by CamScanner



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

No se registran actividades para este frente en el transcurso del mes de mayo 2023

8. CONCLUSIÓN

Se concluye que el proyecto referente al contrato de obra No. 543 de 2022 que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".** suscrito entre la Alcaldía de Madrid (CUNDINAMARCA) y GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, presento el avance de ejecución de las actividades contratadas respecto al mes de mayo y las obras que a su vez fueron ejecutadas de conformidad con la interventoría y la supervisión por parte del municipio.

GCS CONSTRUCIONES SAS aún se encuentra a la espera de la viabilidad presupuestal por parte del ICCU para las actividades no previstas del contrato 543-2022.

Powered by CamScanner

ANEXO 1.
BITACORA

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO.

TECNICO:

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLÓN

FECHA INICIO:

16 JUN 2022

Powered by CamScanner

Estado del clima
Soleado

02 Mayo 2023
Personal en obra
Residente de obra - interventoria
Soldadores (5)
Maestro de obra
Ayudantes de Soldadura (2)
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Equipos Soldadura.
Actividades de obra.
1. Adoquin en concreto
2. Corte tapas para perfileria de color cerramiento.
3. Corte perfileria color cerramiento.
4. Soldar y pulir tapas.
5. instalacion perfileria de color.

Dmf

03 Mayo 2023
Estado del clima.
Soleado
Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores (5)
Oficial de obra.
Ayudantes de Soldadura (2)
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Equipos Soldadura
Actividades de obra.
1. Adoquin en concreto
2. Corte perfileria y tapas.
3. Soldar y pulir tapas para perfileria de color.
4. anticorrosivo y esmalte para perfileria color.

Dmf

Powered by CamScanner

04 Mayo 2023

Estado del clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- Soldadores (5)
- Ayudantes de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Equipos Soldadura.

Actividades de obra
1. Adoquin en concreto
2. Corte tapas y perfileria.
3. Soldar y pulir tapas para perfileria de color.
4. anticorrosivo y esmalte.
5. instalacion perfileria de color de cerramientos

05 Mayo 2023

Estado del clima: soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria.
- Soldadores (5).
- oficial de obra.
- Ayudantes de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Equipos Soldadura.

Actividades de obra.
1. Adoquin en concreto
2. Corte de tapas y perfiles del cerramiento
3. Soldar y pulir tapas perfileria de color.
4. anticorrosivo y esmalte perfileria de color.
5. instalacion perfileria de color.

Powered by CamScanner

06 Mayo 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Soldadores (5)
- Ayudantes de de soldadura (2)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor — Equipos Soldadura.

Actividades de obra:
1. Adoquin en concreto.
2. Corte tapas y perfileria cerramiento.
3. Soldar y polir tapas perfileria cerramiento.
4. anticorrosivo para perfileria cerramiento

D mf

08 Mayo 2023 — Estado del Clima: Soleado Tarde lluviosa.

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria.
- Maestro de obra.
- Soldadores: (3)
- Ayudantes de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor — Equipos Soldadura.

Actividades de obra
1. Adoquin en concreto
2. Esmalte para perfileria de color del cerramiento.
3. Cortar tapas y perfiles.
4. Soldar y polir tapas para perfileria de color.

D mf

Powered by CamScanner

09 Mayo 2023 Estado del clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
Soldadores. (3)
Ayudantes de soldadura (2)

Maquinaria y Equipos:
Herramienta menor Equipos Soldadura.

Actividades de obra
1. Dados en concreto
2. Corte de tapas y perfiles de colores del cerramiento
3. Soldar y pulir tapas.
4. anticorrosivo y esmalte para perfileria de color.
5. instalacion perfiles del cerramiento de colores

DM

10 Mayo 2023 Estado del clima
Soleado
Tarde lluviosa

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores. (3)
Ayudante de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipos Soldadura.

Actividades de obra.
1. Soldar y pulir tapas para perfileria de color del cerramiento.
2. anticorosivo y esmalte para perfiles de colores
3. instalacion perfiles cerramiento de colores

DM

Powered by CamScanner

Estado del clima
Soleado

11 Mayo 2023.

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores. (3)
Ayudante de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipos Soldadura

Actividades de obra.
1. Soldar y pulir tapas.
2. anticorosivo y esmalte perfiles colores.
3. instalacion perfileria de color.

DM

Estado del clima
Soleado

12 Mayo 2023.

Personal en obra.
Director de obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores. (3)
Ayudante de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor — Equipos Soldadura

Actividades de obra.
1. Soldar y pulir perfileria de cabi y tapas
2. anticorosivo y esmalte.
3. instalar perfileria de colores del cerramiento.

DM

Powered by CamScanner

13 Mayo 2023.

Estado del clima
Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores. (3)
Ayudante de Soldadura (2)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipos Soldadura.

Actividades de obra:
1. Instalar perfileria de cobres del Cerramiento.

Powered by CamScanner
Powered by CamS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

543 - 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

OBRA:
CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO LA MAGNOLIA

FECHA INICIO:
30 JUL 2022

Powered by CamScanner

01 Abril 2023 — 30 Abril 2023
No se registran actividades de obra para este frente en el transcurso del mes de abril

Estado del Clima
Soleado

02 Mayo 2023
Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo soldadura
Actividades de obra
1. Medicion separacion de cada una de la barras de acero de las columnas.

Estado del Clima
Soleado

03 Mayo 2023
Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra.
1. Esquema y corte de platinas para cerramient.

estado del Clima
Soleado

04 Mayo 2023
Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores.
Maquinaria y Equipo
1.

Powered by CamScanner

... Actividades de obra:
1. Corte de platinas para cerramiento
2. Corte de acero para instalacion platinas.

D M

05 Mayo 2023 Estado del clima: Soleado
Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo soldadura
Actividades de obra.
1. Corte e instalacion de platinas del cerramiento

D M

06 Mayo 2023 Estado del clima: Soleado
Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Equipo Soldadura.
Actividades de obra.
1. Corte de acero para instalacion de platinas de cerramiento
2. instalacion (Soldar) Platinas del cerramiento.

D M

D M

08 Mayo 2023 — Soleado / Tarde Nublada con lluvia

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria.
Soldadores (2)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Equipo Soldadura.
Actividades de obra:
1. Corte de tapas y perfileria principal para cerramiento

09 Mayo 2023 — Estado del clima: Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Equipo Soldadura.
Actividades de obra.
1. Corte de tapas y soldadura para perfileria principal del cerramiento.

10 Mayo 2023 — Estado del clima: Soleado / Tarde Nublada con lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
soldadores (3)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadura.
Actividades de obra.
1. Corte tapas + Soldar tapas.
2. Corte perfiles principales cerramiento.

Powered by CamScanner

11 Mayo 2023 — Estado del clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores (3)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Equipo Soldadora

Actividades de obra:
1. instalacion perfiles principales cerramiento

D M

12 Mayo 2023 — Estado del clima: Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores (3)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Equipo Soldadora.

Actividades de obra:
1. instalacion perfiles principales cerramiento

D M

13 Mayo 2023 — Estado del clima: Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores (3)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Equipo Soldadura.

Actividades de obra:
1. Soldar tapas para perfiles principales, transversales y de colores del cerramiento.
2. instalacion perfiles principales.

D M

Powered by CamScanner

15 Mayo 2023
Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de intreventoria.
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura.
Actividades de obra:
1. anticorrosivo y esmalte para perfileria instalada.
Dmf

Estado del Clima
Nublado con presencia de lluvia
Tarde soleada

16 Mayo 2023
Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo soldadura.
Actividades de obra:
1. anticorrosivo y esmalte para perfileria transversal
Dmf

Estado del Clima.
Soleado
Tarde con abundante lluvia

17 Mayo 2023
Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura.
Actividades de obra
1. instalacion perfileria transversal
2. anticorrosivo y esmalte
Dmf

Estado del Clima.
Nublado con lluvia
Tarde soleada.

Powered by CamScanner

18 Mayo 2023 Estado del clima soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo soldadura.
Actividades de obra:
1. instalacion perfileria transversal

DMF

19 Mayo 2023 Estado del clima soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra:
1. instalacion perfileria transversal

DMF

20 Mayo 2023 Estado del clima: soleado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Soldadores (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra:
1. instalacion perfileria transversal
2. anticorrosivo y esmalte.

DMF

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

512 - 2022.

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCION: OBRA NUEVA- ADECUACION- CERRAMIENTO

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN CARLOS

FECHA INICIO

12 AGO 2022

Powered by CamScanner

Estado del clima
Soleado
Tarde Nublado.

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoría
Maestro de obra.
Ayudante de obra
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor.
Actividades de obra.
1 Plagin en concreto
2 instalación perfilería cerramiento policarbonato

DMP

01 Mayo - 31 Mayo 2023
No se reportan actividades de obra en el transcurso de este mes, se espera viabilidad presupuestal para la ejecución de actividades No previstas.

DMP

Powered by CamScanner

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACION - CERRAMIENTO

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS

FECHA INICIO:

22 JUN 2022

Powered by CamScanner

29 Abril 2023

Estado del clima
Soleado
Tarde Nublada

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadora

Actividades de obra
1. Subbase debidamente compactada.
2. Malla electrosoldada y fundicion placa base concreto secciones aledañas rotonda parque infantil.
3. Celosia tubular para estructura cubierta: Union entre Secciones cerchas.

Dmf

02 Mayo. 2023.

Estado del Clima
Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra.
Ayudantes de obra. (3)

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora compactador E. Soldadura

Actividades de obra:
1. Subbase granular debidamente compactada
2. Celosia tubular para estructura cubierta (resoldar cerchas de la cubierta)

Dmf

Powered by CamScanner

03 Mayo 2023 Estado del clima.
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)
Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Compactador Mezcladora E. Soldadora

Actividades de obra
1. Subbase granular
2. Celosia tubular para estructura cubierta del polideportivo
3. Malla electrosoldada y encofrado

Dmf

04 Mayo 2023. Estado del Clima.
Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. Mezcladora Compactador.

Actividades de obra:
1. Subbase granular debidamente compactada
2. Fundicion Placa base en concreto

Dmf

Powered by CamScanner

05 Mayo 2023 Estado del clima. Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra. (3)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor, Compactador Mezcladora.

Actividades de obra.
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Encofrar y fundir Placa base en concreto

D M

06 Mayo 2023. Estado del clima. Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora Compactador

Actividades de obra:
1. Subbase granular
2. Malla electrosoldada.
3. Encofrar y fundir Placa base en concreto.

D M

Powered by CamScanner

08 Mayo 2023

Estado del clima
Soleado
Tarde Nublada con lluvia

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra. (3)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Mezcladora compactador.

Actividades de obra
1. Sub base granular.
2. Malla electrosoldada
3. Encofrar y fundir placa base en concreto

09 Mayo 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora compactador.

Actividades de obra
1. Sub base granular
2. Malla electrosoldada.
3. Encofrar y fundir placa base en concreto.

Powered by CamScanner

10 Mayo 2023

Estado del clima
Soleado
Tarde Nublada con lluvia.

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y equipo.
Herramienta menor Mezcladora Compactador.

Actividades de obra
1. Sub base granular debidamente compacta
2. Refuerzo malla electrosoldada.
3. Fundicion concreto para placa base cancha.

11 Mayo 2023.

Estado del clima
Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y equipo
Herramienta menor Mezcladora Compactador

Actividades de obra
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto.

Powered by CamScanner

12 Mayo 2023 Estado del clima Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- oficial de obra
- Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Mezcladora Compactador

Actividades de obra
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada
3. Placa base en concreto

13 Mayo 2023 Estado del clima Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- oficial de obra
- Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Mezcladora compactador

Actividades de obra
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada
3. Placa base en concreto.

Powered by CamScanner

15 Mayo 2023

Estado del clima
Nublado con presencia de lluvia
Tarde soleado.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora compactador.

Actividades de obra.
1. Subbase debidamente compactada.
2. Refuerzo malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto para cancha polideportiva

16 Mayo 2023

Estado del clima
Soleado
Tarde Nublada con lluvia.

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Mezcladora compactador.

Actividades de obra.
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto.

Powered by CamScanner

17 Mayo 2023.

Estado del clima
Nublado con lluvia
Tarde soleado

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudantes de obra. (3)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Mezcladora Compactador.

Actividades de obra.
1. Subbase granular
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto.

Dmf

18 Mayo 2023

Estado del Clima.
Soleado

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Oficial de obra.
- Ayudantes de obra. (3)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Mezcladora Compactador

Actividades de obra.
1. Subbase granular
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto

Dmf

Powered by CamScanner

19 Mayo 2023

Estado del clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Compactador.
Actividades de obra.
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Placa de concreto.

D m/

20 Mayo 2023

Estado del clima.
Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Mezcladora Compactador.
Actividades de obra
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto.

D m/

Powered by CamScanner

23 Mayo 2023

Estado del clima
Soleado
Tarde Nublada con Lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora compactador

Actividades de obra
1. Subbase y granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto

D mf

24 Mayo 2023

Estado del clima
Nublado
Tarde Lluviosa.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)
Soldadores (2)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Compactadora Equipo Soldadura

Actividades de obra.
1. Subbase granular
2. Malla electrosoldada
3. Placa base en concreto
4. anticorrosivo y esmalte para correas de la cubierta

D mf

SS

25 Mayo 2023

Estado del clima.
Nublado con
lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadora

Actividades de obra.
1. anticorrosivo y esmalte para correas
2. instalacion correas de la cubierta.
3. Subbase granular.
4. Malla electrosoldada
5. Placa base en concreto.

DMF

26 Mayo 2023

Estado del clima.
Nublado
Tarde lluviosa

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra. (3)

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora Compactador E. Soldadora
Actividades de obra:
1. anticorrosivo y esmalte para correas.
2. instalacion correas de la cubierta.
3. Subbase granular.
4. Malla electrosoldada
5. Placa base en concreto.

DMF

27 Mayo 2023

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Estado del clima
Nublado con lluvia

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Compactador.

Actividades de obra
1. Subbase granular
2. Malla electrosoldada
3. placa base en concreto.

29 Mayo 2023

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Estado del clima.
soleado
Tarde poco lluviosa.

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora Compactador Equipos Soldadores

Actividades de obra
1. esmalte y anticorrosivo para correas
2. instalación correas de la cubierta
3. Subbase granular
4. Malla electrosoldada
5. placa base en concreto

Powered by CamScanner

114

Estado del clima
Nublado
Tarde poca lluvia.

30 Mayo 2023
Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
Oficial de obra.
Ayudantes de obra. (3)
Soldadores (6)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor, Compactador, Mezcladora, E. Soldadora
Actividades de obra:
1. Instalacion correas de la cobertera.
2. Subbase granular.
3. Malla electrosoldada.
4. Placa base en concreto

Estado del clima
Nublado

31 Mayo 2023
Personal en obra:
Residente de obra. / Residente de interventoria
Oficial de obra / Maestro de obra.
Ayudantes de obra. (3)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor, Mezcladora, Compactador.
Actividades de obra:
1. Subbase granular.
2. Malla electrosoldada.
3. Placa base en concreto


Powered by CamScanner

ANEXO 2.
REPORTE DE LLUVIAS

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Tiempo observado en mayo de 2023 en Madrid

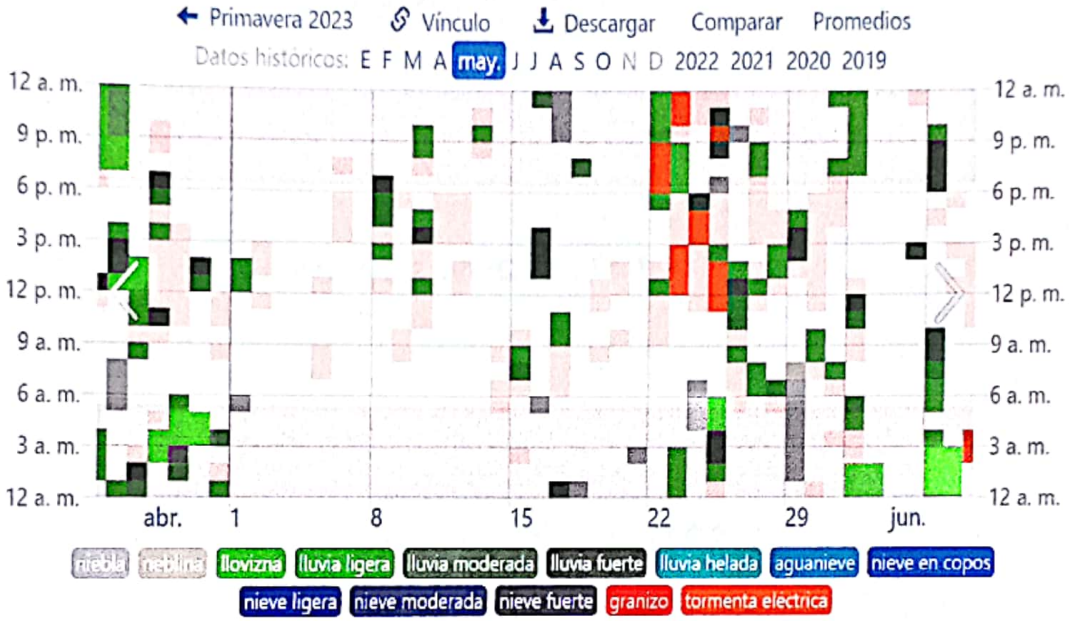

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

© WeatherSpark.com

Powered by CamScanner

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PERIODO 01 DE MAYO – 31 DE MAYO 2023

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

Powered by CamScanner

DATOS DE ENTRADA

OBJETO: CONTRADO 543 .2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra.

Powered by CamScanner

CONTENIDO

ALCANCE 2
OBJETIVOS 2
1. DEFINICIONES 2
2. MANEJO DE HERRAMIENTAS 4
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 5
3.1. Protección de la cabeza 5
3.2. Protección de los pies 5
3.3. Protección de las manos y piel 6
3.4. Protección de la vista 6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA 7
5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL 9
6. INDUCCIÓN 9
7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 9
3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 13
3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES 13
5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES 14
4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 14
6. CONCLUSIONES 16

Powered by CamScanner

1. DEFINICIONES

Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

COVID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida Colombia.

Emergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Derrumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y su desplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

Espacio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el espacio adecuado para permitir las labores por el personal.

Excavación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente con el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde con lo establecido a la normativa.

Sistema de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o niveles escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de materiales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras colindantes.

Suelo: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades y clases de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

Zanja, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la profundidad es superior al ancho de esta.

Trabajo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se desarrollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de

Powered by CamScanner

protección tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar. La ejecución del proyecto requiere del funcionamiento de una serie de maquinaria y equipos que de no ser direccionadas las indicaciones al personal que se va a hacer a cargo, pueden derivar en lesiones para el personal de trabajo:

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara algún tipo de protección personal EPP, como lo son cascos, protección de la vista y los oídos, botas y guantes, sin embargo el uso de EPP tiene sus desventajas tales como; algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo, se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen lo elementos de protección.

3.1. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, las izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en las obras de construcción, una herramienta pequeña o un perno que cae a 10 o 20 metros de altura puede causar lesiones graves o incluso la muerte, las heridas en la cabeza se producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado hacia adelante, cuando endereza el cuerpo después de haberse inclinado.

Los cascos de seguridad resguardan la cabeza efectivamente contra la mayoría de esos riesgos y es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde se está realizando el trabajo más arriba.

3.2. Protección de los pies

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales; las causadas por la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamientos del pie por caída de herramientas o materiales. Ambas pueden minimizarse usando calzado protector, la clase de zapatos o de botas protectoras dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua

Powered by CamScanner

subterránea en la obra) pero todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de acero.

3.3. Protección de las manos y piel

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, con el uso de protección adecuada como guantes o manoplas.

3.4. Protección de la vista

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiación son causas de muchas lesiones de la vista en las siguientes tareas:

- El picado, corte, perforación, labrado o afirmado de piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o automáticas.
- El corte y soldadura de metales

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire o un mejor diseño de tareas. En muchos casos, como por ejemplo el labrado y corte de piedra, la protección personal (anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección.

Powered by CamScanner

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**ESTADO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	21/03/2023		
MAESTROS DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Maestro	Derlen Fabian Becerra	1.102.717.527	21/03/2023	15/05/2023	Retirado
OFICIALES DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Oficial	Jose Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	1/04/2023		
Oficial	Eduar Alberto García Cosme	1.051.737.892	21/03/2023	18/05/2023	Retirado
Oficial	Carlos Santana O.	1.051.737.892	21/03/2023	9/05/2023	Retirado
Oficial	Dagoberto Mora Tellez	9.167.984	21/03/2023		
Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	21/03/2023	6/05/2023	Retirado
AYUDANTES DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Ayudante	Daniel Enrique	1.081.797.879	21/03/2023		

Powered by CamScanner

	Arias Figueroa				
Ayudante	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	21/03/2023		
Ayudante	Ricardo Rodriguez Tellez	1.002.423.643	21/03/2023	9/05/2023	Retirado
Ayudante	Pedro Arturo Fuenmayor Andradez	1.006.888.646	5/05/2023	5/05/2023	Retirado
Ayudante	Gilberto Pana	1.124.486.994	5/05/2023		
Ayudante	Gonzalo Epinayu Epinayu	1.192.768.738	5/05/2023	4/05/2023	Retirado
Ayudante	Juan David Guzman Berrio	1.065.586.229	2/05/2023	30/05/2023	Retirado
SOLDADORES					
Soldador	Jorge Alberto Espejo Beleño	8.055.676	21/03/2023	2/05/2023	Retirado
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	21/03/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	21/03/2023		
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	21/03/2023		
Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	21/03/2023	2/05/2023	Retirado
Soldador	Omar Fernando Rueda Herrera	1.102.723.680	21/03/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	21/03/2023		

En la anterior tabla, se relaciona el personal del contratista del mes de mayo; se incluye a las personas que se contrataron, y por diversos motivos se desvincularon

Powered by CamScanner

en el transcurso del mismo mes, motivos los cuales también se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones".

Anexo 1. Planillas de seguridad social

5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

6. INDUCCIÓN

El maestro de obra realizo inducción, acerca del manejo de equipos, maquinaria y herramientas con acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando las actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de las pulidoras
- Manejo de demoledor manual
- Manejo Tronzadora
- Manejo Mezcladoras
- Manejo de sierra circular
- Manejo de pistón compactador

7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de diciembre se realizaron actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallón, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

- Manejo manual de cargas.
- Lesiones pequeñas.
- La seguridad responsabilidad de todos.
- Manejo de extintores.
- Uso de EPP.
- Peligro mecánico.
- Peligro locativo.

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner



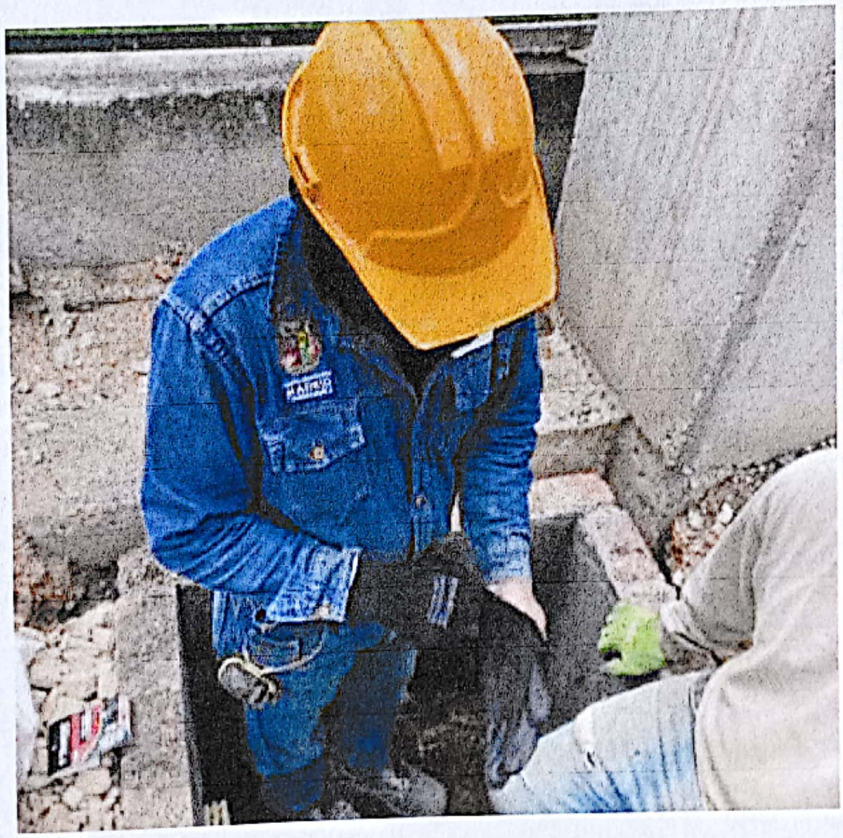

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner

3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de diciembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal:

- Guantes: se entregaron guantes de seguridad
- Gafas de seguridad

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Kevin Rodriguez
- Faber Morales
- Rugero Sotelo
- Eduar García

Sierra

- Faber Morales

Mezcladora

- Donis Carbono

Demoledor y tronzadora

No se emplearon

El personal restante, solo empleo herramienta menor.

3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que, por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso de estos y el cumplimiento de este.

Powered by CamScanner

5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

POYECTO: **CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022** "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausento ya sea por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en los frentes de los polideportivos activos: Escallón, San Luis y La Magnolia. Por otro lado, algunos de los trabajadores se ausentaban constantemente y no presentaron incapacidad o excusa valida.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE DICIEMBRE						
NOMBRE	Ausencia por causa de salud	No. Horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. de horas de ausencia citas médicas	No. de horas diligencias personales	No. total de horas ausentismo
Diana María Olaya Ortiz	0	0	0	0	0	0
Derlen Fabian Becerra	0	0	0	0	0	0
Raul Ortega Ortega	0	0	0	0	0	0
Eduar Alberto García Cosme	0	0	0	0	0	0
Carlos Santana Obregon	0	0	0	0	0	0
Dagoberto Mora Tellez	0	0	0	0	0	0
Faber Augusto Morales Chica	0	0	0	0	0	0
Rugero Segundo Sotelo Vides	0	0	0	0	0	0
Pablo Emiro Bermon Rojas	0	0	0	0	0	0
Samuel Rocha Villalba	0	0	0	0	0	0
Jose de la Cruz Gil Macias	0	0	0	0	0	0
Clemente Rocha Villalba	0	0	0	0	0	0

Powered by CamScanner

Daniel Enrique Arias Figueroa	0	0	0	4	4	8
Donis David Carbono Bastidas	0	0	0	0	0	0
Kevin David Rodriguez Gil	0	0	0	0	0	0
Ricardo Rodriguez Tellez	0	0	0	0	0	0
Jhon Jairo Chavez Rodriguez	0	0	0	0	0	0
Gabriel de Jesús Schmalbach Quezada	0	0	0	0	0	0
Oscar Daniel Torres Vanegas	0	0	0	0	0	0

Trabajadores que solicitaron permiso para atender diligencias personales:

- Daniel Arias

Powered by CamScanner

6. CONCLUSIONES

Se informo al personal los peligros que se pueden generar en obra y la importancia del uso de los EPP para el resguardo de su salud y bienestar.

Hasta la fecha de finalización del periodo del presente informe, no se han reportado ni accidentes ni incidentes laborales o ausencias por enfermedad laboral.

Al finalizar las labores diarias, se realiza el almacenamiento de herramientas y equipos en bodega, dejando organizado el espacio donde se desarrollan las labores de obra.

DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	88574473	$51.903.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	1.600	0		0		0	5	100	0	1.700	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S A	830113831-0	174.400	0		0		0	5	1.100	0	175.500	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	463.500	0		0		0	5	2.300	0	465.800	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	502.300	0		0		0	5	3.000	0	505.300	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	328.000	0		0		0	5	2.000	0	330.000	7
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	46.400	0		0		0	5	300	0	46.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	730.100	0		0		0	5	4.300	0	734.400	25
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.692.500	0		0		0	5	9.900	0	1.702.400	42
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	48.000	0		0		0	5	300	0	48.300	2
EPS041	NUEVA E P S S A MOV	900156264-2	637.500	0		0		0	5	4.200	0	641.700	18
EPS048	EPS-S Mutual Ser	805008394-7	46.400	0		0		0	5	300	0	46.700	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	4.800	0		0		0	5	100	0	4.900	3
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	147.000	0		0		0	5	900	0	147.900	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805008394-7	1.600	0		0		0	5	100	0	1.700	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	922.600	0		0		0	5	5.400	0	928.000	27
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	937.600	0		0		0	5	5.500	0	943.100	28
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	46.400	0		0		0	5	300	0	46.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.063.500	0	0	0	0	5	17.900	0	3.081.500	21
230301	Porvenir	800224808-8	18.208.300	0	0	0	0	5	104.400	0	18.312.700	131
231001	Colfondos	800227940-6	1.200.300	0	0	0	0	5	7.000	0	1.207.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.583.300	0	0	0	0	5	28.400	0	4.611.700	30

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.786.300				10.786.300	5	62.900	10.849.200			107.883	10.849.200	190

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	68574473	$51 603 300	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.835.900	5	16.600	2.852.500	89
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	2.357.200	5	13.800	2.371.000	64
CCF39	Cajasan	890200106-1	1.537.600	5	9.000	1.546.600	37

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	17	6.730.700	6.770.800
Pensión	4	27.055.500	27.213.200
Riesgos Laborales	1	10.786.300	10.849.200
CCF	3	6.730.700	6.770.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	25	51.303.200	51 603 300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	58574473	$61 603 300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003842728	HERNANDEZ HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S		X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
2	CC	1007429324	MARMOLEJO VELEZ JERSY ARLEY	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1010015584	BARBOSA ALFONSO GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS017	600.000	24.000	14-11	600.000	5	41.800	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010015584	BARBOSA ALFONSO GUSTAVO ADOLFO	1	0			S										X						230301	1.200.000	144.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	0	14-11	1.200.000	5	0	CCF24	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1012459723	OSPINA LADINO INGRY DAYANA	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS009	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	8.150	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1018502585	MORENO SALAZAR SERGIO ANDRES	1	0			S																230101	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1032462720	GOYES RODRIGUEZ EVER DANILO	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF35	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	1088730436	ESPINOSA MELO DARIO FERNANDO	1	0			S	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS005	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF35	232.000	9.300	0	0	0	0	0
9	CC	1088735933	DIAZ DEL CASTILLO VILLOTA WILMER FERNANDO	1	0			S	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	ESSC18	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
10	CC	1088831824	TRUJILLO DE LA CRUZ IVAN DARIO	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
11	CC	1087120705	GUANGA RODRIGUEZ GUILLERMO ARTURO	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
12	CC	87455975	MORALES PANTOJA JHON JAIRO	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC18	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
13	CC	1088793250	ESPINOSA MELO JHON ALEXANDER	1	0			S	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF35	580.000	23.200	0	0	0	0	0
14	CC	1088737784	ORREGO DELGADO JEFERSON STIVEN	1	0			S	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	ESSC18	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF35	580.000	23.200	0	0	0	0	0
15	CC	13963642	RASCOS VELASQUEZ GERMAN BOLIVAR	1	0			S	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF35	580.000	23.200	0	0	0	0	0
16	CC	71187586	MADRID BEDOYA WALTER	1	0			S	X															231001	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS041	502.667	20.200	14-11	502.667	5	35.000	CCF24	502.667	20.200	0	0	0	0	0
17	CC	1007012214	AREVALO MUÑOZ ELVIS DANIEL	1	0			S	X															230201	232.000	37.200	0	0	0	0	ESSC18	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
18	CC	1088729963	MELO NOGUERA RUBEN ALEXANDER	1	0			S	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	ESSC18	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF35	232.000	9.300	0	0	0	0	0
19	CC	1071551906	RODRIGUEZ MORA JOAN HERNANDO	1	0			S	X															25-14	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS017	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF24	850.667	34.100	0	0	0	0	0
20	CC	87452327	YELA SANTANDER JOSE	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC18	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF35	850.667	34.100	0	0	0	0	0
21	CC	87455145	ORTEGA VILLOTA TITO FERNEY	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC18	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF35	850.667	34.100	0	0	0	0	0
22	CC	1007736492	GETIAL GETIAL MARCO TULIO	1	0			S	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPSIC5	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF35	580.000	23.200	0	0	0	0	0
23	CC	1088018787	OROZCO CARVAJAL GIOVANNI	1	0			S	X															230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS002	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF35	580.000	23.200	0	0	0	0	0
24	CC	1088726332	MORALES CASTRO WILMER JAVIER	1	0			S	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF35	580.000	23.200	0	0	0	0	0
25	CC	80430676	BALLEN GONZALEZ MAURICIO	1	0			S	X	X														230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
26	CC	1088722423	CADENA ARTEAGA RUBEN DARIO	1	0			S	X															230301	889.334	142.300	0	0	0	0	ESSC18	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF35	889.334	35.600	0	0	0	0	0
27	CC	1088030097	ANDRADE LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			S	X															230301	889.334	142.300	0	0	0	0	ESSC18	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF35	889.334	35.600	0	0	0	0	0
28	CC	1088286728	RODRIGUEZ CANTICUS GERARDO ARMANDO	1	0			S	X															230301	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS037	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF35	889.334	35.600	0	0	0	0	0
29	CC	16262251	PORTILLA JURADO JOSE ISAAC	1	0			S	X															230301	889.334	142.300	0	0	0	0	EPSIC5	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF35	889.334	35.600	0	0	0	0	0
30	CC	1061755643	HERNANDEZ IBARRA ANDERSON DANILO	1	0			S	X	X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
31	PT	1010014	RICAURTE FIGRES AURELIS ALEJANDRA	1	0			S	X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPSIC5	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF24	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
32	CC	1006686646	FUENMAYOR ANDRADEZ PEDRO ARTURO	1	0			S	X	X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSIC1	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
33	CC	1065586229	GUZMAN BERRIO JUAN DAVID	1	0			S	X															230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS002	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	5	70.000	CCF24	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
34	CC	1089041599	SORASO TERAN DIEGO ESTEBAN	1	0			S	X															230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	ESSC18	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF35	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
35	CC	1102724050	MONSALVE MORA ALVARO JAVIER	1	0			S	X	X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.500	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
36	CC	1124456994	PAVA GILBERTO	1	0			S	X															230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS037	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	5	70.000	CCF24	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
37	CC	1003614182	BEJARANO SABOGAL BRAYAN ESTIVEN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
38	CC	1065303178	RAMIREZ CORAL MARLON DAVID	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				190	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	58574473	$51 603 300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			PIESGOS LABOPALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	2965934	ARIAS GUAVITA WILSON ALBERTO	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
40	CC	18112776	JARAMILLO RODRIGUEZ WILSON ORLANDO	1	0			S	X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC18	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF35	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
41	CC	87523648	ILVIRA VALENCIA LIBARDO APOLINAR	1	0			S	X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC18	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF35	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
42	CC	87453648	HERNANDEZ JURADO ALVARO FIDEL	1	0			S	X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC18	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF35	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
43	CC	2965675	AYALA PEDRAZA RUBEN EDUARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
44	CC	1005563082	FIGUEROA PINTO HECTOR HERNANDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
45	CC	1102715117	SINJCO ZARATE SERGIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
46	CC	1102720236	CALA LEON ANDERSON JESUS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
47	CC	1102725247	ARAQUE MARTINEZ ALEX DAYAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	PT	5880940	MONTEROLA BATATIN JESUS EDUARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
49	CC	1096240185	BAEZ DELGADILLO JAYDHER JHAIR	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
50	CC	1102721147	ROMERO VILLALBA CRISTIAN FAVIAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
51	CC	3059194	PEÑA GARZON JAIRO ENRIQUE	1	0			S		X														230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
52	CC	80430607	HORTUA DIAZ NELSON ENRIQUE	1	0			S		X														230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
53	PT	1396885	SALAZAR RODRIGUEZ GREGORI DAVID	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
54	CC	2965551	SANABRIA MAYORGA EUDES VIANEY	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
55	CC	87552762	TAIGUS GUANGA FAUSTINO JOVITO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
56	CC	91042557	DIAZ MARTINEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
57	CC	91046693	ALFONSO SARMIENTO JOSELIN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
58	CC	88346828	BRAVO CASTRO RAMIRO GERMAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC62	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
59	PT	6256859	ALFONZO AGUILERA LUIS ALBERTO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
60	PT	6919900	BRITO ROJAS WILIKER JOSE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
61	CC	1022420856	RICAURTE HERNANDEZ JUAN DAVID	1	0			S																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
62	CC	1004236527	MIRANDA MELO JUAN DIEGO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
63	CC	1004595977	ARTEAGA AYALA EDWIN JAVIER	1	0			S																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC18	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
64	CC	1086104028	CHAMORRO ACOSTA RICARDO ALEXANDER	1	0			S																230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS037	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	5	201.900	CCF35	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
65	CC	1102725646	SANCHEZ CARREÑO EDWIN ARLEY	1	0			S																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
66	CC	5342305	JURADO GETIAL CARLOS ALFREDO	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
67	CC	1088728090	BASTIDAS DIAZ VICTOR ALFONSO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
68	CC	1088737282	VILLOTA DIAZ JHONATAN ESMITH	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
69	CC	1088737756	BASTIDAS ERAZO JOHN ALEXANDER	1	0			S																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
70	CC	87451951	PANTOJA PORTILLO SEGUNDO ENRIQUE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
71	CC	87454159	TORO RIASCOS JOSE WILLIAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
72	PT	6163701	VELASQUEZ LANDAETA JOSE ALEJANDRO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
73	CC	1005757405	ARIAS ACOSTA WILMAR EDUARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
74	CC	1080186799	PATIÑO TORRES ELMER YOVANY	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
75	CC	1080187393	PATIÑO TORRES VICTOR ALFONSO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
76	CC	1052104196	PISMAG MUÑOZ JOSE MEDARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
77	CC	1065912561	LARA CHAMORRO LUIS ALFONSO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
78	CC	1065549951	PINCHAO CABRERA DIANA ANDREA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
79	CC	1088735636	DIAZ VARGAS JOSE LUIS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	88574473	161 600 300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cotiza en otro país	Ingreso	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
80	CC	1102717910	MORALES SARMIENTO JHOAN FERNEY	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
81	CC	106565875	CARBONO ORTIZ FAIDER ENRIQUE	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
82	CC	71664413	OLIER RESTREPO DANIEL MAURICIO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
83	CC	1004190437	MARTINEZ PANTOJA JAIDER ALEXANDER	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
84	CC	1004697504	MORALES HERNADEZ JHON ARMANDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
85	CC	1024466281	CABUYA CHAPARRO EDWIN GUILLERMO	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
86	CC	1121202503	VILLALOBOS SAAVEDRA IVAN	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
87	CC	2965417	GUERRERO DIAZ JOSE JOADUIN	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	CCFC33	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
88	CC	1004505456	FLORIAN OJEVEDO LUIS ANGEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
89	CC	1007282068	ALVEAR SANTANDER DANIELA ROCIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
90	CC	1086982633	YELA JURADO YENNY FRANCIA	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
91	CC	1016111781	REDONDO VANEGAS ALGEMIRO ALBERTO	1	0			S																230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
92	CC	1073237718	GARCIA COSME EDUAR ALBERTO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
93	CC	1124060566	RAMIREZ IPUANA YOEL ESTEBAN	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
94	CC	1148439871	PEREZ BARRIOS ANIBAL RAFAEL	1	0			S	X															231001	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC07	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
95	CC	12625286	ORTEGA ORTEGA SAUL	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF39	38.667	1.600	0	0	0	0	0
96	CC	91453860	HERRERA RENGIFO ROBINSON	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
97	CC	1071551132	MORA TORRES ELKIN ARNOBIS	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
98	CC	1073558557	BARRERA MANCERA MICHAEL ANDRES	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
99	CC	1130223106	FORERO JIMENEZ ARLEHIM ALEXANDER	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
100	CC	1102716695	PEREZ LOPEZ SERGIO ANDRES	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
101	CC	1102722825	MONTAÑEZ LOPEZ ALEXANDER	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
102	CC	91040878	NOVA JORGE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
103	CC	2964991	MORA FRESNEDA JESUS MIGUEL	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
104	CC	1010074577	MOLANO ORDUZ ADRIANA LUCIA	1	0			S																25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	9.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
105	CC	88202926	NIÑO LANDINEZ LUIS ALEJANDRO	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
106	CC	1069582418	PALACIOS IBAÑEZ JOAN SEBASTIAN	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
107	CC	3963789	CONTERAS PRIETO WLADIMIR	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
108	CC	80354169	CAMPOS RAMOS MARCO AURELIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
109	CC	93081911	QUINTERO GUTIERREZ ROQUE JACINTO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
110	CC	1124497938	URARIYU LUCAS	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSIC1	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
111	CC	1124497941	URARIYU DAVID	1	0			S	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSIC1	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
112	CC	2963658	MORA DIAZ PEDRO PABLO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
113	PT	1075254	OLIVAR BARRIOS JOSE RAFAEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Dirección: Calle 13A # 13
Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	68574473	$51.903.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estancia	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
114	CC	1070963782	GONZALEZ JUAN CARLOS	1	0			S		x														25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
115	CC	1051738151	SANTANA OBREGON DELIA	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
116	CC	1096247138	BAUTISTA VARGAS MARIO ANDRES	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
117	CC	1102718418	SILVA CORTES ANDERSON EDUARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
118	CC	1102723660	RUEDA HERRERA OMAR FERNANDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
119	CC	91517667	SILVA CORTES ELKIN FABIAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
120	CC	9167964	MORA TELLEZ DAGOBERTO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
121	CC	1051737692	SANTANA OBREGON CARLOS	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
122	CC	1073176552	OLAYA ORTIZ DIANA MARIA	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
123	CC	1061787879	ARIAS FIGUEROA DANIEL ENRIQUE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
124	CC	7572127	CARBONO BASTIDAS DONIS DAVID	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
125	CC	8056676	ESPEJO BELEÑO JORGE ALBERTO	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
126	CC	86010568	MORALES CHICA FABER AUGUSTO	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
127	CC	1063484703	LIMA PALOMINO ANGEL MIGUEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
128	CC	1064115331	PALOMINO PERTUZ LUIS ALFREDO	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
129	CC	1066929621	GARNICA ALDANA EDGAR ARTURO	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
130	CC	11511369	GUTIERREZ RODRIGUEZ NELSON MIGUEL	1	0			S		x														230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
131	CC	74329159	SANCHEZ MARTINEZ MISAEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
132	CC	80356051	GUARIN DAZA JUAN CARLOS	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
133	CC	80774210	GUAQUETA BARRAGAN NESTOR ANDRES	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
134	CC	1002423643	RODRIGUEZ TELLEZ RICARDO	1	0			S		x														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
135	CC	19715029	PEDROZO ROBLES VICTOR MANUEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
136	CC	6954463	GONZALEZ FEDERICO JOSE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS046	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
137	CC	7151759	LIMA PALOMINO OMAR	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
138	CC	1124371654	EPIEYU EPINAYU MIGUEL	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
139	CC	11387578	ZAPATA TORRES OSCAR ORLANDO	1	0			S																25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
140	CC	1005564399	CASTRO ACUÑA WILLIAN ARLEY	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	68574473	$61 903 000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sustitu	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
141	CC	1007392515	FUENTES AVILA LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
142	CC	1102720388	PRADA GOMEZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS037	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	5	121.800	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
143	CC	1102725714	LUNA BECERRA LEIDER GONZALO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
144	CC	13644780	ARAQUE RAMIREZ NELSON HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
145	CC	91041587	GARCIA TRUJILLO JOSE VICENTE	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
146	CC	91043825	VARGAS REYES HUGO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
147	CC	91045850	DOMINGUEZ AGUILAR ROBINSON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
148	CC	91046945	CARREÑO GOMEZ WILSON	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
149	CC	91102237	ACOSTA GUALTERO LIBARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
150	CC	91286206	ESPINDOLA RODRIGUEZ HENDER	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
151	CC	1102718459	ARENIZ ARENIZ ALBEIRO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
152	CC	1102718712	NOVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
153	CC	1096651957	PRADA MILLAN DANIEL CAMILO	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
154	CC	13642103	PEÑA AMADOR CARLOS JESUS	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF39	38.667	1.600	0	0	0	0	0
155	CC	13642678	NOVA GOMEZ JOSEFITO	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF39	38.667	1.600	0	0	0	0	0
156	CC	13643320	ARAQUE RAMIREZ JOSE EXPEDITO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
157	CC	1030650580	QUINTERO ZIPACON PAULA STEFANNY	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
158	CC	1005595122	QUINTERO LOPEZ BUDWEISER DAYAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
159	CC	1096804060	QUINTERO GARCIA CARLOS ALBERTO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF39	38.667	1.600	0	0	0	0	0
160	CC	1102716643	PRADA BECERRA OSCAR IVAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
161	CC	1102717223	HERNANDEZ MORALES GERMAN DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
162	CC	1102718754	NOVA JIMENEZ JOSE ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
163	CC	9773973	PANTOJA BENAVIDES HECTOR FABIO	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS005	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF35	232.000	9.300	0	0	0	0	0
164	PT	5020797	CHIRINOS COLINA OSCAR RAMON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
165	PT	5657661	CHOURIO SULBARAN ELISAUL DE JESUS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
166	PT	6232333	MEDINA CALLEJA OSCAR EDUARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS040	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
167	CC	3221110	GOMEZ RINCON WILSON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs construcciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					190	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	88574473	$51.903.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
168	CC	13644813	RODRIGUEZ PORRAS JOSE BERNARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
169	CC	87453481	TORO RICARDO LIBARDO	1	0			S	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS041	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF35	232.000	9.300	0	0	0	0	0
170	CC	87454230	VALLEJOS MORILLO SERVIO TULIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
171	CC	91043642	SANCHEZ PLATA NELSON	1	0			S		K														25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS040	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
172	CC	91045560	LUQUE DURAN CESAR ENRIQUE	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
173	CC	91046208	MARMOLEJO GIRALDO RIGOBERTO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
174	CC	84062213	MEDINA CASTRO FABIO NELSON	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS005	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF35	850.667	34.100	0	0	0	0	0
175	CC	13642134	QUINTERO JORGE	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
176	CC	256093	CHISICA ZAPATA JOSE ALBEIRO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
177	CC	5786590	SANTAMARIA TELLEZ JOSE BERNABE	1	0			S	X															25-14	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-11	502.667	5	35.000	CCF24	502.667	20.200	0	0	0	0	0
178	CC	5761189	RUBIO CHIVATA JOSE GUILLERMO	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
179	CC	87453004	SOLARTE JULIO CESAR	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
180	CC	1088738475	ZAMUDIO RODRIGUEZ JUAN ANDRES	1	0			S	X	X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC18	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
181	CC	1102717189	DAVILA VELEZ ROBINSON	1	0			S		X														25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
182	CC	1102717527	BECERRA AGREDO DERLEN FABIAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
183	CC	1120216107	PERENGUEZ ESTRADA HELMAR ALVEIRO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS012	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
184	CC	1123761151	LUNA RINCON RAFAEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
185	CC	1192768736	EPINAYU EPINAYU GONZALO	1	0			S	X	X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
186	CC	1053866171	GUERRON BASTIDAS DOOVERNEY	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
187	CC	1069052635	ALDANA CASTRO EDUARDO CAMILO	1	0			S		X														230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
188	CC	1071548012	BARRETO HERRERA HECTOR ALEXANDER	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
189	CC	1071549553	MORA TORRES JINSON FERLEY	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
190	CC	1071628764	HERNANDEZ CRUZ DIEGO ARMANDO	1	0			S		X														25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
191	CC	1085281808	ZAMBRANO ERASO ANDERSON GIOVANNI	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		CLL 41 A B 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	15/06/2023	58621086	$425.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	83.600				83.600	0	0	83.600			83	83.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	83.600	83.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	425.600	425.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	15/06/2023	58621086	$425.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estacionalidad	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1126001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	59	0			N																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	5	83.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS		CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	09/08/2023	88491543	$1.077.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1
230301	Porvenir	800224808-6	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	242.400				242.400	0	0	242.400			2.424	242.400	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	139.200	0	0	139.200	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139.200	139.200
Pensión	3	556.800	556.800
Riesgos Laborales	1	242.400	242.400
CCF	1	139.200	139.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.077.600	1.077.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	09/06/2023	68491543	$1.077.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colbene	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547987	CUNTERO GUALDRON OSCAR GIOVANY	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1102723325	CARREÑO ACEVEDO FABIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	91043063	ACEVEDO FERREIRA CARLOS JULIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102721369		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7152055	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2073539136	9450795369	I	2023/06/09	2023/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA D.C Depto: BOGOTA D.C (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	1102721369	LOPEZ LEONEL	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,200,000	$192,900			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102721369		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2073539136	9450795369	I	2023/06/09	2023/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				**1**	**$348,300**	**$0**	**$0**	**$348,300**

2023/06/09 03:57 PM

Dirección: Calle 134 # 13-66 I Bogotá

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900702893	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135967413	9453356489	E	2023/06/09	2023/06/06	BANCO DE OCCIDENTE		$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTECOR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1020776092	LAMUS JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900702893	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135967413	9453356489	E	2023/06/09	2023/06/06	BANCO DE OCCIDENTE		$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$284,500

2023/06/07 10:08 AM

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-05
Período Salud : 2023-06

Se certifica que en la fecha 2023-06-06 la empresa INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 901043519 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CORREA DUARTE NICOLAS ALFONSO identificado con CC-1090425817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901043519	INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
26626362	E	2023-06-06	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30

93

2023

Powered by CamScanner
