ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO02
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 10/06/2022
		Página 1 de 2

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA								
Fecha:	06/09/2023	Acta de Corte N°	4	Periodo Ejecución:		15/08/2023	al	28/08/2023
Persona natural:		Persona jurídica:	X	Modalidad contratación:		LICITACION PUBLICA		
Numero cedula:		NIT:	901.590.186-1	N° contrato:		SIOP 0082 - 2022		
Nombre contratista:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA							
Correo electrónico:	jcurielcon@hotmail.com			Numero de contacto:		3007658674		
Nombre y cargo del supervisor:	MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS							

OBJETO DE CONTRATO:

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND).

2. BALANCE FINANCIERO		
Valor Inicial del Contrato:	$	27.029.500.000,00
Anticipo 40% Contrato Inicial	$	-
Adicion No. 01 (SI APLICA):	$	-
Valor Total del Contrato:	$	27.029.500.000,00
Acta de corte (01):	$	1.445.063.750,00
Acta de corte (02):	$	557.101.500,00
Acta de corte (03):	$	369.439.375,00
Acta de corte (04):	$	**3.662.337.807,97**
Acta de corte (05):	$	-
Valor Total Ejecutado:	$	6.033.942.432,97
Saldo por ejecutar:	$	20.995.557.567,03

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA	
Plazo Inicial del Contrato:	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de Suscripción del Contrato	13 DE JULIO DE 2022
Fecha de Acta de Inicio:	02 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Terminación Inicial del Contrato:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
Suspensión No. 01:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	N/A
Otro Si Modificatorio No. 01	CESIÓN PARTICIPACIÓN DISPOSICIONES- 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nueva Fecha de Terminación del Contrato:	16 DE ENERO DE 2024

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Acta Parcial de Obra No. 04	12	X		El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
Cuenta de cobro y/o factura:	2	X		
Certificación Bancaria	1	X		
Registro Unico Tributario	12	X		
Informe y Certificado de Interventoría	20	X		
Informe Técnico y/o de actividades:	59	X		
Pólizas de Garantía y Anexos	12	X		
Modificatorio Unión Temporal	29	X		
Relación Personal, Planillas de seguridad social y otros	8	X		
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:	2	X		
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:	2	X		
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:	2	X		
Otros (especificar): Documentos contractuales: Acta de inicio - Suspensión y Reinicio	20	X		
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS:			x	

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

FASE 3: OBRA - ACTA PARCIAL 1

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

UT CULTURAL EN COTA - NIT: 901.590.186-1
JERSON MENDOZA OCHOA CC 1.118.844.495 DE RIOHACHA -
Representante Legal - **CONTRATISTA**

UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
NIT: 901.611.855-0.
RAUL BOHORQUEZ ZEA C.C. 79.052.252 de Bogotá
Representante Legal INTERVENTORIA

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS - SUPERVISOR CON FACULTADES DE ORDENADOR DEL GASTO

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	SARA PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ	ING. MIGUEL ALFREDO CERMEÑO ING. CAROLINA GOMEZ CRUZ	MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO S.I.O.P - CONTRATISTA O.P.S.	PROFESIONALES S.I.O.P. - CONTRATISTAS O.P.S. APOYO A LA SUPERVISION	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA			
FECHA:	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes

	FASE 3- ACTA DE OBRA No. 1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082-2022	Fecha de corte: Del 15 de agosto de 2023 al 28 de agosto de 2023	OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)
	FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2022			
	FECHA DE SUPENSIÓN No. 1: 24 DE OCTUBRE DE 2022	PLAZO DE EJECUCIÓN: 16 MESES	contratista: UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	
	FECHA DE REINICIO 1: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022			
	FECHA DE SUPENSIÓN No. 2: 3 DE ABRIL DE 2023		Interventor: UNION TEMPORAL INTERCULTURAL	
	FECHA DE REINICIO 2: 30 DE JUNIO DE 2023			
	ACTA DE INICIO FASE 3: 15 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:11 DE ABRIL DE 2024		

ITEM	COD.GOB CUND ICCU / EPC	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL DE CONTRATO	PERIODO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		CUENTAS PRESENTADAS		SALDO PENDIENTE	
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		ADECUACION CASA OFICINAS												
1.001	ICCU-1.11	DEMOLICION PISOS	M2	71.25	13,015	927,318.75	-	-	71.25	927,318.75	71.25	927,319	-	-
1.002	ICCU-1.12	DEMOLICION ENCHAPES	M2	12.89	9,943	128,185.16	-	-	12.89	128,185.16	12.89	128,185	-	-
1.003	ICCU-2.6	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJON	M3	10.62	98,264	1,043,563.68	-	-	10.62	1,043,563.68	10.62	1,043,564	-	-
1.004	ICCU-16.8	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	5.56	89,878	499,631.80	-	-	5.56	499,631.80	5.56	499,632	-	-
1.005	ICCU-1.38	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	6.00	18,338	110,028.00	-	-	6.00	110,028.00	6.00	110,028	-	-
1.006	ICCU-1.39	DESMONTE VENTANAS	UN	6.00	15,911	95,466.00	-	-	6.00	95,466.00	6.00	95,466	-	-
1.007	ICCU-13.4	AFINADO DE PISOS	UN	64.00	36,507	2,336,448.00	-	-	64.00	2,336,448.00	64.00	2,336,448	-	-
1.008	ICCU-6.17	PAÑETE MUROS	M2	169.67	24,443	4,147,268.25	-	-	169.67	4,147,268.25	169.67	4,147,268	-	-
1.009	ICCU-1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	23.00	15,927	366,321.00	-	-	23.00	366,321.00	23.00	366,321	-	-
1.010	ICCU-7.23	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	46.00	46,820	2,153,720.00	-	-	46.00	2,153,720.00	46.00	2,153,720	-	-
1.011	ICCU-11.20	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3.00	112,973	338,919.00	-	-	3.00	338,919.00	3.00	338,919	-	-
1.012	ICCU-12.2	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	28.00	73,071	2,045,988.00	-	-	28.00	2,045,988.00	28.00	2,045,988	-	-
1.013	ICCU-14.1	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	64.00	74,851	4,790,464.00	-	-	64.00	4,790,464.00	64.00	4,790,464	-	-
1.014	ICCU-9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TABLA CHAPA 0.15M	UN	6.00	304,192	1,825,152.00	-	-	6.00	1,825,152.00	6.00	1,825,152	-	-
1.015	ICCU-10.19	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7.97	343,808	2,740,149.76	-	-	7.97	2,740,149.76	7.97	2,740,150	-	-
1.016	ICCU-18.23	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	169.67	9,820	1,666,169.22	-	-	169.67	1,666,169.22	169.67	1,666,169	-	-
1.017	ICCU-17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	1.00	379,937	379,937.00	-	-	1.00	379,937.00	1.00	379,937	-	-
1.018	ICCU-17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	233,770	233,770.00	-	-	1.00	233,770.00	1.00	233,770	-	-
1.019	ICCU-15.5	CIELO RASO DRYWALL	M2	64.00	67,172	4,299,008.00	-	-	64.00	4,299,008.00	64.00	4,299,008	-	-
		ADECUACION CASA ALMACEN		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.020	ICCU-6.17	PAÑETE MUROS	M2	113.87	24,443	2,783,397.74	-	-	-	-	-	-	113.87	2,783,398
1.021	ICCU-1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	15.50	15,927	246,868.50	-	-	-	-	-	-	15.50	246,869
1.022	ICCU-7.23	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	31.00	46,820	1,451,420.00	-	-	-	-	-	-	31.00	1,451,420
1.023	ICCU-10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	5.00	196,065	980,325.00	-	-	-	-	-	-	5.00	980,325
1.024	ICCU-10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	5.00	272,559	1,362,795.00	-	-	-	-	-	-	5.00	1,362,795
1.025	ICCU-18.23	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	96.60	9,820	948,612.00	-	-	-	-	-	-	96.60	948,612
1.026	ICCU-11.20	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3.00	112,973	338,919.00	-	-	-	-	-	-	3.00	338,919
1.027	ICCU-11.16	PUNTOS HIDRAULICOS (PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2")	UN	3.00	87,224	261,672.00	-	-	-	-	-	-	3.00	261,672
1.028	ICCU-17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00	379,937	759,874.00	-	-	-	-	-	-	2.00	759,874
1.029	ICCU-17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	233,770	233,770.00	-	-	-	-	-	-	1.00	233,770
1.030	ICCU-5.17	MAMPOSTERIA CUARTO ALMACEN (MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M)	M2	48.30	53,570	2,587,431.00	-	-	-	-	-	-	48.30	2,587,431
1.031	ICCU-6.17	PAÑETE CUARTO ALMACEN	M2	48.30	24,443	1,180,596.90	-	-	-	-	-	-	48.30	1,180,597
1.032	ICCU-7.21	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26)	M2	67.88	54,417	3,693,880.38	-	-	-	-	-	-	67.88	3,693,880
1.033	ICCU-12.2	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	6.00	73,071	438,426.00	-	-	-	-	-	-	6.00	438,426
1.034	ICCU-10.27	PUERTAS EN LAMINA METALICA 1.20 (CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS)	M2	2.64	194,380	513,163.20	-	-	-	-	-	-	2.64	513,163
1.035	ICCU-10.19	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	2.00	343,808	687,616.00	-	-	-	-	-	-	2.00	687,616
1.036	ICCU-16.8	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	18.51	89,878	1,663,911.41	-	-	-	-	-	-	18.51	1,663,911

1.037	ICCU-13.13	PLACA DE CONTRAPISO ESPESOR 10CMS (PLACA BASE CONCRETO 0,10 2500 PSI)	M2	61.71	70,989	4,380,731.19	-	-	-	-	-	-	61.71	4,380,731
1.038	ICCU-1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H: 1.80 M	ml	310.00	58,510	18,138,100.00	-	-	-	-	-	-	310.00	18,139,100
1.039	ICCU-1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	un	1.00	3,338,472	3,338,472.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3,338,472
1.040	ICCU-11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4 5M	un	8.00	354,430	2,835,440.00	-	-	-	-	-	-	8.00	2,835,440
1.041	ICCU-1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	m^2	1,760.85	12,445	21,913,778.25	-	-	1,760.85	21,913,778.25	1,760.85	21,913,778	-	-
1.042	ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m^2	7,134.00	8,407	59,976,538.00	-	-	7,134.00	59,976,538.00	7,134.00	59,975,538	-	-
1.043	ICCU-1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M	m^2	1,760.85	1,859	3,273,420.15	-	-	1,760.85	3,273,420.15	1,760.85	3,273,420	-	-
1.044	ICCU-16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m^3	2,619.70	20,198	52,912,700.60	-	-	-	-	-	-	2,619.70	52,912,701
1.045	ICCU-16.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	m^3	2,095.00	89,878	188,294,410.00	-	-	-	-	-	-	2,095.00	188,294,410
1.046	ICCU-1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	880.43	11,076	9,751,642.68	-	-	-	-	-	-	880.43	9,751,643
		SUB TOTAL PRELIMINARES				**415,074,418.62**		-	-	**115,290,244.02**		**115,290,244.02**		**299,784,174.60**
		BLOQUE No. 2 MUSICA												
2.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**CIMENTACION**	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
2.001	APU-2.1	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	51.00	86,588	4,415,988.00	-	-	51.00	4,415,988.00	51.00	4,415,988	-	-
2.002	APU-2.2	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	128.00	504,356	64,557,568.00	-	-	128.00	64,557,568.00	128.00	64,557,568	-	-
2.003	APU-2.3	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	560.00	634,716	355,440,960.00	-	-	560.00	355,440,960.00	560.00	355,440,960	-	-
2.004	APU-2.4	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	384.00	949,782	364,716,288.00	-	-	384.00	364,716,288.00	384.00	364,716,288	-	-
2.005	ICCU-4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1,500PSI	m^3	15.59	410,402	6,397,941.46	-	-	-	-	-	-	15.59	6,397,941
2.006	ICCU-2.16	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147.20	741,244	109,107,410.58	-	-	-	-	-	-	147.20	109,107,411
2.007	ICCU-2.3	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	9.00	412,215	3,709,935.00	-	-	-	-	-	-	9.00	3,709,935
2.008	ICCU-2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m^3	46.88	814,928	38,203,824.64	-	-	-	-	-	-	46.88	38,203,825
2.009	ICCU-4.20	PLACA FLOTANTE 0,9 ESTRUCTURAS 3500 PSI FOSO ASCENSOR	m2	4.90	350,570	1,717,793.00	-	-	-	-	-	-	4.90	1,717,793
2.010	ICCU-4.17	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0,15 mts	m^2	792.00	129,056	102,212,352.00	-	-	-	-	-	-	792.00	102,212,352
2.011	ICCU-4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	40,005.00	7,163	286,555,815.00	-	-	113,000.00	93,119,000.00	13,000.00	93,119,000	27,005.00	193,436,815
		SUB TOTAL CIMENTACIÓN				**1,337,035,875.68**		-		**882,249,804.00**		**882,249,804.00**		**454,786,071.68**
3.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**ESTRUCTURA**	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
3.001	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	140,643.27	23,099	3,248,718,823.05	-	-	21,096.49	487,307,823.46	21,096.49	487,307,823	119,546.78	2,761,411,000
3.002	ICCU-4.18	MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, PUNTO FIJO ASCENSORES E: 20 CM	M3	13.29	911,759	12,116,183.00	-	-	-	-	-	-	13.29	12,116,183
3.003	APU-3.1	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m^3	10.09	867,322	8,751,278.98	-	-	-	-	-	-	10.09	8,751,279
3.004	APU-3.2	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluya conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m^2	755.22	187,119	141,316,011.18	-	-	-	-	-	-	755.22	141,316,011
3.005	ICCU-4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m^2	792.00	168,699	133,609,608.00	-	-	-	-	-	-	792.00	133,609,608
3.006	APU-3.3	GROUTING DE NIVELACION	KG	428	39,052	16,714,256.00	-	-	-	-	-	-	428.00	16,714,256
3.007	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	2,765.56	23,099	63,881,670.44	-	-	-	-	-	-	2,765.56	63,881,670
		SUB TOTAL ESTRUCTURA				**3,625,107,630.65**		-		**487,307,823.46**		**487,307,823.46**		**3,137,800,007.19**
4.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**MAMPOSTERIA (No acústica)**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
4.001	ICCU-5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	1,022.40	114,594	117,160,905.60	-	-	-	-	-	-	1,022.40	117,160,906
4.002	ICCU-5.41	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m^2	954.48	126,537	120,777,035.76	-	-	-	-	-	-	954.48	120,777,036

4.003	ICCU-5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	71.08	64,753	4,602,643.24	-	-	-	-	-	-	71.08	4,602,643
4.004	ICCU-5.8	MESONES EN CONCRETO 2,500 PSI E: 10CM	M2	7.88	129,567	1,020,987.96	-	-	-	-	-	-	7.88	1,020,988
		SUB TOTAL MANPOSTERIA (No acústica)				**243,561,572.56**		-		-		-	-	**243,561,572.56**
5.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**CUBIERTA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
5.001	ICCU-7.1	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	752.20	36,751	27,644,102.20	-	-	-	-	-	-	752.20	27,644,102
5.002	ICCU-7.38	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m^2	752.20	56,526	42,518,775.34	-	-	-	-	-	-	752.20	42,518,775
5.003	ICCU-14.5	ADOQUIN GRES PEATONAL CIRCULCIONES EN TERRAZA	m^2	231.80	98,875	22,455,540.30	-	-	-	-	-	-	231.80	22,455,540
5.004	APU-5.1	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	163.00	72,686	11,847,764.75	-	-	-	-	-	-	163.00	11,847,765
5.005	ICCU-13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	163.00	37,721	6,148,545.62	-	-	-	-	-	-	163.00	6,148,546
		SUB TOTAL CUBIERTA				**110,614,728.41**		-		-		-		**110,614,728.41**
6.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**ELEMENTOS DE ACUSTICA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
		SALAS INSONORIZADAS-SALONES DE TEORIA-SALAS DE PIANO, PERCUSIONES, INCIACION MUSICAL Y AGRUPACIONES					-	-	-	-	-	-	-	-
		MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	-	-	-	-	-	-	-
6.001	APU-6.1	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B6 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B6 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m^2	2,820.00	185,000	521,700,416.57	-	-	-	-	-	-	2,820.00	521,700,417
		CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			-	-	-	-	-	-	-	-
6.002	APU-6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO STC 47 DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + PERFILERÍA + FRESCASA 2.5" INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m^2	698.31	185,000	129,186,629.58	-	-	-	-	-	-	698.31	129,186,630
6.003	APU-6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m^2	698.31	105,000	73,322,208.05	-	-	-	-	-	-	698.31	73,322,208
6.004	APU-6.4	PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE MUROS COMPUESTO POR LAMINA DE BLACK THEATER 2", MARCO INTERNO Y FORRADO EN PAÑO, SOBREPUESTO EN MURO POR MEDIO DE SISTEMA DE CUCHILLA. (modulacion de 1m x 1,80 m)	m^2	1,780.00	350,000	623,000,025	-	-	-	-	-	-	1,780.00	623,000,025
		CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	-	-	-	-	-	-	-
6.005	APU-6.5	SUMINISTRO DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO ACOUSTIC CONTROL FB PARA PISO. (1.2m x 1m) E=2,8CM FIBRA DE VIDRIO 1" + MEMBRANA ACÚSTICA DE 3MM. NO INCLUYE MANO DE OBRA, INCLUYE TRANSPORTE HASTA COTA.	M2	988.00	215,000	212,420,038.55	-	-	-	-	-	-	988.00	212,420,039
		SUB TOTAL ELEMENTOS DE ACÚSTICA				**1,559,629,317.89**		-		-		-		**1,559,629,317.89**
8.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
8.001	APU-8.1	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antirrobo 17mm (6+6+5) (656.22), con Protección P6B (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	M2	404.03	2,173,844	878,298,205.33	-	-	-	-	-	-	404.03	878,298,205
8.002	APU-8.2	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	305.76	1,520,517	464,913,308.50	-	-	-	-	-	-	305.76	464,913,308
		SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				**1,343,211,513.82**		-		-		-	-	**1,343,211,513.82**
9.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
9.001	ICCU-11.16	Punto hidraulico PVC Presion 1/2" (Lavamanos)	und	11.00	87,224	959,464.00	-	-	-	-	-	-	11.00	959,464
9.002	ICCU-11.18	Punto hidraulico PVC Presion 1 1/4" (Flexmetro sanitario)	und	10.00	116,050	1,160,500.00	-	-	-	-	-	-	10.00	1,160,500
9.003	ICCU-11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	und	2.00	92,635	185,270.00	-	-	-	-	-	-	2.00	185,270
9.004	APU-9.1	TUBERÍA PVC-C900 4"	ml	6.00	115,476	692,856.00	-	-	-	-	-	-	6.00	692,856
9.005	APU-9.2	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	3.00	740,065	2,220,195.00	-	-	-	-	-	-	3.00	2,220,195
9.006	ICCU-11.52	Tubería A.C. SCH - 40 4"	ml	12.10	196,296	2,375,181.60	-	-	-	-	-	-	12.10	2,375,182
9.007	ICCU-11.51	Tubería A.C. SCH - 40 3"	ml	5.00	132,656	663,280.00	-	-	-	-	-	-	5.00	663,280
9.008	ICCU-11.50	Tubería A.C. SCH - 40 2-1/2"	ml	10.00	112,729	1,127,290.00	-	-	-	-	-	-	10.00	1,127,290
9.009	ICCU-11.49	Tubería A.C. SCH - 40 2"	ml	33.00	87,503	2,887,599.00	-	-	-	-	-	-	33.00	2,887,599
9.010	ICCU-11.47	Tubería A.C. SCH - 40 1-1/2"	ml	100.00	59,551	5,955,100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	5,955,100

9.011	APU-9.3	Accesorios A.C. 4"	un	7.00	162,944	1,140,608.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00	1,140,608
9.012	APU-9.4	Unión flexible Ranurada 4"	un	2.00	53,323	106,646.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	106,646
9.013	APU-9.5	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	5.00	42,819	214,095.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00	214,095
		RED DE AGUAS LLUVIAS				-									
9.015	ICCU-11.34	TUBERÍA PVC-S 6"	ml	56.40	112,417	6,340,318.80	-	-	-	-	-	-	-	56.40	6,340,319
9.016	APU-9.6	ACCESORIOS PVC-S 6"	un	9.00	195,848	1,762,632.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	1,762,632
9.017	APU-9.7	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	18.00	52,461	944,298.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00	944,298
		SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**28,735,333.40**		-		-		-			**28,735,333.40**
10.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**un**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**		
10.001	APU-10.1	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TRANSFORMAOR A TABLERO TOTALIZADOR GENERAL, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	15.00	2,089,200	31,337,993.02	-	-	-	-	-	-	-	15.00	31,337,993
10.002	APU-10.2	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A PLANTA EMERGENCIA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	10.00	2,089,200	20,691,995.34	-	-	-	-	-	-	-	10.00	20,691,995
10.003	APU-10.3	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A TG1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	20.00	2,089,200	41,783,990.69	-	-	-	-	-	-	-	20.00	41,783,991
10.004	APU-10.4	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TG1 A TGA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	25.00	2,089,200	52,229,988.36	-	-	-	-	-	-	-	25.00	52,229,988
10.005	APU-10.5	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG1 A TD1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	114.00	106,387	12,128,139.61	-	-	-	-	-	-	-	114.00	12,128,140
10.006	APU-10.6	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.8+1No.8 DE TGR A TDR1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/4	ml	15.00	22,150	332,247.67	-	-	-	-	-	-	-	15.00	332,248
		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.007	ICCU-12.20	VARILLA DE 2,4 M X 5/8 CU CERTIFICADA RETIE	un	20.00	345,502	6,910,040.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00	6,910,040
10.008	APU-10.7	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG COBRE A VARILLA DE 5/8 (PUNTOS)	un	20.00	31,662	633,246.90	-	-	-	-	-	-	-	20.00	633,247
10.009	ICCU-3.4	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 40X40 CM	un	2.00	291,188	582,376.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	582,376
10.010	APU-10.8	CABLE 2/0 AWG CU, PARA MALLA TIERRA	ml	50.00	103,399	5,169,968.96	-	-	-	-	-	-	-	50.00	5,169,969
		SALIDAS DE ALUMBRADO		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.011	APU-10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	210.00	92,413	19,406,737.22	-	-	-	-	-	-	-	210.00	19,406,737
		SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.012	APU-10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	50.00	18,562	928,117.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	928,117

10.023	APU-10.21
10.024	APU-10.22
10.025	APU-10.23
10.026	APU-10.24
10.027	ICCU-21.14
10.028	ICCU-21.14
10.029	ICCU-21.14
10.030	ICCU-21.14
10.031	ICCU-21.14
10.032	ICCU-21.14
10.033	ICCU-21.14
10.034	APU-10.25
10.035	APU-10.26
10.036	APU-10.27
10.037	APU-10.28
10.038	APU-10.29
10.039	APU-10.30
10.040	APU-10.31
10.041	APU-10.32
10.042	APU-10.33
10.043	APU-10.34
10.044	APU-10.35
10.045	APU-10.36
10.046	APU-10.37
10.047	APU-10.38
10.048	APU-10.39
10.049	APU-10.40
10.050	APU-10.41
12.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**
12.001	ICCU-6.17
12.002	ICCU-6.15

10.013	APU-10.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	11.00	23,562.32	259,185.55	-	-	-	-	-	-	11.00	259,186
10.014	APU-10.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	19.00	46,562	884,684.55	-	-	-	-	-	-	19.00	884,685
		SALIDAS TOMACORRIENTES		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.015	APU-10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	2.00	107,763	215,526.69	-	-	-	-	-	-	2.00	215,527
10.016	APU-10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	56.00	117,588	6,584,929.93	-	-	-	-	-	-	56.00	6,584,930
10.017	APU-10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF	un	123.00	93,588	11,511,328.23	-	-	-	-	-	-	123.00	11,511,328
		TABLEROS Y PROTECCIONES		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.018	APU-10.16	TG4: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL . Segun diagrema unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados. CERTIFICADO RETIE	un	1.00	9,483,117	9,483,117.24	-	-	-	-	-	-	1.00	9,483,117
10.019	APU-10.17	TD4: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 4 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1.00	1,224,030	1,224,029.75	-	-	-	-	-	-	1.00	1,224,030
10.020	APU-10.18	TD5: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 5 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1.00	1,665,611	1,665,610.75	-	-	-	-	-	-	1.00	1,665,611
10.021	APU-10.19	TR3: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1.00	971,373	971,373.45	-	-	-	-	-	-	1.00	971,373
10.022	APU-10.20	TR4: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1.00	971,373	971,373.45	-	-	-	-	-	-	1.00	971,373
		CONDUCTORES PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSION		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

12.003	APU-12.1	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m^2	544.00	247,909	134,862,230.04	-	-	-	-	-	-	-	544.00	134,862,230
12.004	APU-12.2	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m^2	480.32	194,248	93,301,827.48	-	-	-	-	-	-	-	480.32	93,301,827
12.005	ICCU-7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	m^2	724.00	362,287	262,295,578.84	-	-	-	-	-	-	-	724.00	262,295,579
12.006	ICCU-18.6	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	480.32	81,419	39,107,377.63	-	-	-	-	-	-	-	480.32	39,107,378
		SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				**629,142,941.75**		-		-		-			**629,142,941.75**
		BLOQUE No. 3 TEATRO					**BLOQUE No. 3 TEATRO**								
2.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**CIMENTACION**	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
2.001		CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	52.00	86,568	4,502,576.00	-	-	52.00	4,502,576.00	52.00	4,502,576	-	-	
2.002	APU-2.2	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	360.00	504,356	181,568,160.00	-	-	360.00	181,568,160.00	360.00	181,568,160	-	-	
2.003	APU-2.3	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	126.00	634,716	79,974,216.00	-	-	126.00	79,974,216.00	126.00	79,974,216	-	-	
2.004	APU-2.4	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	564.00	949,782	535,677,048.00	-	-	564.00	535,677,048.00	564.00	535,677,048	-	-	
2.005	ICCU-4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	15.86	410,402	6,510,740.45	-	-	-	-	-	-	15.86	6,510,740	
2.006	ICCU-2.16	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147.60	741,244	109,557,345.69	-	-	-	-	-	-	147.60	109,557,346	
2.007	ICCU-2.3	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	9.66	412,215	3,981,998.90	-	-	-	-	-	-	9.66	3,981,997	
2.008	ICCU-2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	51.60	814,928	42,050,284.80	-	-	-	-	-	-	51.60	42,050,285	
2.009	ICCU-4.17	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m2	951.00	129,056	122,732,256.00	-	-	-	-	-	-	951.00	122,732,256	
2.010	ICCU-4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	45,602.00	7,163	326,647,126.00	-	-	-	-	-	-	45,602.00	326,647,126	
		SUB TOTAL - CIMENTACION				**1,413,201,749.84**		-		**801,722,000.00**		**801,722,000.00**		**611,479,749.84**	
3.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**ESTRUCTURA**	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
3.001	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	150,255.58	23,099	3,470,753,716.18	-	-	22,538.34	520,613,057.73	22,538.34	520,613,058	127,717.25	2,950,140,660	
3.002	APU-3.1	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m3	10.10	867,322	8,759,952.20	-	-	-	-	-	-	10.10	8,759,952	
3.003	APU-3.2	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m2	739.28	187,119	138,333,334.32	-	-	-	-	-	-	739.28	138,333,334	
3.004	ICCU-4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m2	956.00	168,699	161,276,244.00	-	-	-	-	-	-	956.00	161,276,244	
3.005	APU-3.3	GROUTING DE NIVELACION	KG	400.00	39,052	15,620,800.00	-	-	-	-	-	-	400.00	15,620,800	
3.006	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	1,554.00	23,099	35,895,846.00	-	-	-	-	-	-	1,554.00	35,895,846	
		SUB TOTAL - ESTRUCTURA				**3,830,639,694.70**	-	-	-	**520,613,057.73**	-	**520,613,057.73**	-	**3,310,026,836.98**	
4.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**MAMPOSTERIA (No acústica)**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
4.001	ICCU-5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	1,473.44	114,594	168,847,383.36	-	-	-	-	-	-	1,473.44	168,847,383	
4.002	ICCU-5.41	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m^2	128.56	126,537	16,267,596.72	-	-	-	-	-	-	128.56	16,267,597	
4.003	ICCU-5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	45.00	64,753	2,913,885.00	-	-	-	-	-	-	45.00	2,913,885	
4.004	ICCU-5.8	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E: 10CM	M2	9.90	129,567	1,282,713.30	-	-	-	-	-	-	9.90	1,282,713	
		SUB TOTAL MANPOSTERIA (No acústica)				**189,311,578.38**		-		-		-		**189,311,578.38**	
5.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**CUBIERTA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
5.001	ICCU-13.5	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	925.00	104,649	96,707,625.00	-	-	-	-	-	-	925.00	96,707,625	
5.002	ICCU-7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m^2	925.00	56,526	52,286,449.34	-	-	-	-	-	-	925.00	52,286,449	
5.003	ICCU-14.5	ADOQUIN GRES PEATONAL CIRCULCIONES EN TERRAZA	m^2	350.78	96,876	33,981,684.32	-	-	-	-	-	-	350.78	33,981,684	
5.004	ICCU-5.2	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	188.00	72,685	13,664,780.00	-	-	-	-	-	-	188.00	13,664,780	
5.005	ICCU-13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	168.00	37,721	6,337,161.52	-	-	-	-	-	-	168.00	6,337,162	
		SUB TOTAL CUBIERTA				**202,977,890.18**		-		-		-		**202,977,890.18**	

9.026	ICCU-11.19	SALIDA SANITARIA PVC
9.027	ICCU-11.19	SALIDA SANITARIA PVC
9.028	ICCU-14.32	SIFON CON SOSCO 4.5
		RED DE AGUAS LLUVIA
9.029	ICCU-11.34	RED SANITARIA TUBER
9.030	APU-9.6	ACCESORIOS PVC-S 6'
9.031	APU-9.7	ABRAZADERA TUBERÍA
		SUB TOTAL - INSTAL
10.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**INSTA**
		RED DE MEDIA TENSIO
10.001	APU-10.42	CAJA DE INSPECCIÓN EXCAVACIÓN Y RETIR
10.002	APU-10.43	CAJA DE INSPECCIÓN EXCAVACIÓN Y RETIR
		SALIDAS DE ALUMBRA
10.003	APU-10.9	SUMINISTRO E INSTAL INCLUYE TUBERIA MET CONDUCTORES,CAJAS NECESARIO PARA SU
		LUMINARIAS
		SALIDAS PARA CONTR
10.004	APU-10.10	SUMINISTRO E INSTAL SENCILLO, INCLUYE TU TUBERIA, ACCESORIO APARATOS, REGATA,R LSHF, HILO DE CONTIN CONECTORES, APARA OBRA Y TODO LO NEC
10.005	APU-10.11	SUMINISTRO E INSTAL INCLUYE TUBERIA CON ACCESORIOS, INTERR REGATA,RESANES, CO DE CONTINUIDAD, CAJ CONECTORES, APARA OBRA Y TODO LO NEC
10.006	APU-10.12	SUMINISTRO E INSTAL TUBERIA CONDUIT TIP INTERRUPTOR DE 15 A REGATA,RESANES, CO DE CONTINUIDAD, CAJ CONECTORES, APARA OBRA Y TODO LO NEC
		SALIDAS TOMACORRIE
10.007	APU-10.13	SUMINISTRO E INSTAL TOMACORRIENTES TO 12 LSHF APARATO O T
10.008	APU-10.14	SUMINISTRO E INSTAL TOMACORRIENTES RE POLO A TIERRA EN CA CONSUMIBLES
10.009	APU-10.15	SUMINISTRO E INSTAL TOMACORRIENTES NO LSHF
		TABLEROS Y PROTEC

6.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**ELEMENTOS DE ACUSTICA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
		MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	-	-	-	-	-	-	-
6.001	APU-6.1	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B6 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B6 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m^2	180.00	185,000	33,300,026.59	-	-	-	-	-	-	180.00	33,300,027
		CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	-	-	-	-	-	-	-
6.002	APU-6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m^2	770.00	105,000	80,850,138.37	-	-	-	-	-	-	770.00	80,850,138
		SUB TOTAL - ELEMENTOS DE ACUSTICA				**114,150,164.96**		-		-		-		**114,150,164.96**
8.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
8.001	APU-8.1	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antirrobo 17mm (6+6+5) (656.22), con Protección P6B (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	m2	692.62	2,173,844	1,506,082,624.10	-	-	-	-	-	-	692.62	1,506,082,624
8.002	APU-8.2	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	487.57	1,520,517	741,358,522.45	-	-	-	-	-	-	487.57	741,358,522
		SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				**2,247,441,146.54**		-		-		-		**2,247,441,146.54**
9.000	**COD.GOB CUND ICCU / EPC**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
		AGUA POTABLE					-	-	-	-	-	-	-	-
9.001	ICCU-11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ml	5.00	11,376	56,880.00	-	-	-	-	-	-	5.00	56,880
9.002	ICCU-11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ml	12.00	14,110	169,320.00	-	-	-	-	-	-	12.00	169,320
9.003	ICCU-11.18	PUNTO HIDRAULICO PVC-P PARA 1-1/4"	und	35.00	116,050	4,061,750.00	-	-	-	-	-	-	35.00	4,061,750
9.004	ICCU-11.38	REGISTO DE 1 1/2	un	2.00	229,918	459,836.00	-	-	-	-	-	-	2.00	459,836
9.005	APU-9.8	PUNTO A.F. SANITARIO FLUXOMETRO	un	5.00	94,007	470,035.00	-	-	-	-	-	-	5.00	470,035
9.006	ICCU-11.16	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" LAVAMANOS	un	4.00	87,224	348,896.00	-	-	-	-	-	-	4.00	348,896
9.007	APU-9.9	PUNTO A.F. DUCHAS	un	4.00	56,465	225,860.00	-	-	-	-	-	-	4.00	225,860
9.008	APU-9.10	PUNTO A.F. ORINAL FLUXOMETRO	un	2.00	72,075	144,150.00	-	-	-	-	-	-	2.00	144,150
		RED CONTRA INCENDIOS RCI					-	-	-	-	-	-	-	-
9.009	ICCU-11.52	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	16.00	196,296	3,140,736.00	-	-	-	-	-	-	16.00	3,140,736
9.010	APU-9.2	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	7.00	740,065	5,180,455.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5,180,455
9.011	ICCU-11.52	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	2.50	196,296	490,740.00	-	-	-	-	-	-	2.50	490,740
9.012	ICCU-11.50	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	39.00	112,729	4,396,431.00	-	-	-	-	-	-	39.00	4,396,431
9.013	ICCU-11.49	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	44.00	87,503	3,850,132.00	-	-	-	-	-	-	44.00	3,850,132
9.014	ICCU-11.47	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 1 1/ 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	51.00	59,551	3,037,101.00	-	-	-	-	-	-	51.00	3,037,101
9.015	APU-9.11	Tubería A.G. SCH - 40 1-1/4"	ml	67.00	50,949	3,413,583.00	-	-	-	-	-	-	67.00	3,413,583
9.016	APU-9.4	Unión flexible Ranurada 4"	un	2.00	53,323	106,646.00	-	-	-	-	-	-	2.00	106,646
9.017	APU-9.5	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	6.00	42,819	256,914.00	-	-	-	-	-	-	6.00	256,914
		RED DE AGUAS RESIDUALES					-	-	-	-	-	-	-	-
9.018	ICCU-11.31	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 2"	ml	14.00	33,372	467,208.00	-	-	-	-	-	-	14.00	467,208
9.019	ICCU-11.32	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 3"	ml	12.00	45,799	549,588.00	-	-	-	-	-	-	12.00	549,588
9.020	ICCU-11.33	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 4"	ml	15.00	62,017	930,255.00	-	-	-	-	-	-	15.00	930,255
9.021	ICCU-11.41	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 2"	ml	15.00	23,593	353,895.00	-	-	-	-	-	-	15.00	353,895
9.022	ICCU-11.42	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 3"	ml	9.50	29,612	281,314.00	-	-	-	-	-	-	9.50	281,314
9.023	APU-9.5	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	3.00	42,819	128,457.00	-	-	-	-	-	-	3.00	128,457
9.024	ICCU-11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" SANITARIO FLUXOMETRO	un	5.00	120,145	600,725.00	-	-	-	-	-	-	5.00	600,725
9.025	ICCU-11.16	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" LAVAMANOS	un	4.00	87,224	348,896.00	-	-	-	-	-	-	4.00	348,896

Id. 000011

000010

18.007	ICCU-4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	2,444.00	7,163	17,506,372.00	-	-	-	-	-	-	2,444.00	17,506,372
18.008	ICCU-5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	94.90	114,594	10,874,970.60	-	-	-	-	-	-	94.90	10,874,971
18.009	ICCU-5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	6.00	64,753	388,518.00	-	-	-	-	-	-	6.00	388,518
18.010	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	2,026.00	23,099	46,798,574.00	-	-	-	-	-	-	2,026.00	46,798,574
18.011	ICCU-6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	ml	190.00	24,443	4,644,170.00	-	-	-	-	-	-	190.00	4,644,170
18.012	ICCU-7.43	TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA A360	M2	71.60	80,055	5,731,938.00	-	-	-	-	-	-	71.60	5,731,938
		SUB TOTAL - PORTERIAS				**141,643,859.32**		-		-		-		**141,643,859.32**
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					-	-	-	-	-	-	-	-
19.001	APU-19.1	SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES	UN	2.00	5,000,000	10,000,000.00	-	-	2.00	10,000,000.00	2.00	10,000,000	-	-
19.002	APU-19.2	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	m3	1,945.73	15,711	30,569,364.03	-	-	-	-	-	-	1,945.73	30,569,364
19.003	ICCU-1.45	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	M3	2,362.42	11,076	26,166,151.60	-	-	-	-	-	-	2,362.42	26,166,152
		SUB TOTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**66,735,515.63**	-	-	-	**10,000,000.00**	-	**10,000,000.00**	0	**56,735,515.63**

RESUMEN	%								
PRELIMINARES		**415,074,416.62**		-		115,290,244		115,290,244		**299,784,175**
EDIFICIO 2 MÚSICA		**9,257,446,473.15**		-		**1,369,557,627**		**1,369,557,627**		**7,887,888,846**
EDIFICIO 3 TEATRO Y DANZA		**8,741,063,606.28**		-		**1,322,335,058**		**1,322,335,058**		**7,418,728,549**
URBANISMO		**299,679,986.32**		-		-		-		**299,679,986**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**66,735,515.63**		-		**10,000,000.000**		**10,000,000**		**56,735,516**
TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA		**18,780,000,000.00**		-		**2,817,182,929.21**		**2,817,182,929**		**15,962,817,071**
ADMINISTRACIÓN	18%	3,380,400,000.00		-		507,092,927.26		507,092,927		2,873,307,073
IMPREVISTOS	2%	375,600,000.00		-		56,343,658.58		56,343,659		319,256,341
UTILIDAD	10%	1,878,000,000.00		-		281,718,292.92		281,718,293		1,596,281,707
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**24,414,000,000.00**		-		**3,662,337,807.97**		**3,662,337,807.97**		**20,751,662,192.03**

JAIR ALFONSO MELO MARQUEZ
ARQUITECTO T.P A68542066-84088986
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT: 901590186-1

JERSON MENDOZA OCHOA
INGENIERO CIVIL TP 44202-343452
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT: 901590186-1

MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE COTA
SUPERVISOR

RAUL BOHORQUEZ ZEA
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901611855-0

h10000

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
901.590.186-1
CR 18 137 11 BRR CHICO
Bogotá - Colombia
(57) 3007568674
jcurielcon@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: UCE 12

Cliente: MUNICIPIO DE COTA
Nit: 899.999.705-3
Teléfono: (601) 3161800
Dirección: CRA 4 12 63
Correo: obras@alcaldiacota.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	28/08/2023, 15:18
Expedición	28/08/2023, 15:18
Vencimiento	28/08/2023
Vendedor	UNION TEMPORAL CULTURA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	102	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA	1.00	2,817,182,929.21	0.00	0 %	2,817,182,929.21
2	105	ADMINISTRACION	1.00	507,092,927.26	0.00	0 %	507,092,927.26
3	106	IMPREVISTOS	1.00	56,343,658.58	0.00	0 %	56,343,658.58
4	107	UTILIDAD	1.00	281,718,292.92	0.00	0 %	281,718,292.92

Total items: 4

Total Bruto	3,662,337,807.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,662,337,807.97

Valor en Letras:
Tres mil seiscientos sesenta y dos millones trescientos treinta y siete mil ochocientos siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-28 por $ 3,662,337,807.97

Observaciones:
FASE-3 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1_OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)

Elaborado por

Firma recibido

Acepto la cuenta cedida aplicable a la tasa de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización 18764033574001 aprobado en 20220922 prefijo UCE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

000015

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Riohacha, 21 de Septiembre de 2022

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA identificado con Nit No 901590186 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	526-000031-05	2022/09/21	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 8 N° 3 - 9 Oficina Bancolombia RIOHACHA Tel:7273575

Atentamente,

BANCOLOMBIA Riohacha
Asesor de servicios Nº 15
Aula Nº

KAYRA HERNANDEZ SIERRA
ASESOR INTEGRAL MIPYME
Sucursal Riohacha - 526

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

000022

Scanned with CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 137 11 BRR CHICO

42. Correo electrónico jcurielcon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 5 6 8 6 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 2 0 4 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 16 42 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 30 / 09 : 17: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

No. 000058

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-07-2023 05:46:26PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) **000001486846736 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 2 3 0 3 2 4	2 0 2 3 0 3 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 5 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

000059

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 1 8 8 4 4 4 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	OCHOA	JERSON	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

000060

Fecha generación documento PDF: 19-07-2023 05:46:26PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) **000001486846736 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 2 0 3 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 1 5 6 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ERINCO. S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 9 0 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

000061

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	IGV INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
C R 11 A 94 46 O F 602

42. Correo electrónico gerencia@igvinfraestructura.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 7 9 4 5 1 2	3 0 0 6 7 5 9 6 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 1 0	2 0 1 2 1 2 1 5	4 1 1 2	2 0 1 3 0 2 0 1	4 2 2 0	4 2 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	8	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 11 / 16 : 41: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ LOPEZ CAMILO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

000062

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 7 6	1 3
73. Fecha	1 9 9 7 0 5 2 6	2 0 1 8 0 5 2 9
74. Número de notaría	5 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 6 1 3	2 0 1 8 0 5 3 0
77. No. Matrícula mercantil	7 9 7 8 4 5	0 9 2 9 3 0 8 5 1 2
78. Departamento	1 1	1 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	9
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 5 2 6	
81. Hasta	2 1 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
			000083

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 0 1 0 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	LOPEZ	CAMILO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

000064

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 1 4 6 4		1 2 4 5 6 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	RODRIGUEZ	ZACARIAS	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 6 2 2

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

000065

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR BLASDELEZO MZ 23 LT 18 ET 4

42. Correo electrónico incoesas@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 6 1 7 4 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 4 1 2 2 2	4 1 1 2	2 0 1 4 1 2 2 2		4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 03 / 11 : 43: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRIOS REDONDO JAIME JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

000066

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		4
73. Fecha	2 0 1 4 1 2 2 2	2 0 1 6 1 2 2 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 2 2 2	2 0 1 6 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 3 8 9 8 9 1 2	0 9 3 3 8 9 8 9 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 2 2 2
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 7 0 1 1 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
			000067

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

000068

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

INCOE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena de indias, 28 de agosto de 2023

La suscrita, ***KATIA MILETH MERCADO ROHENES****, identificada con 1.047.391.806, y con la tarjeta profesional No. 189399-T De la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de* ***INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.****, identificada con el Nit. 900.803.956-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Katia Mileth Mercado Rohenes

KATIA MILETH MERCADO ROHENES
Revisora Fiscal
M.P. 189399-T
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.

000023

BARRIO MANGA CRA 22 # 29-55 APTO 401 EDF DUQUE DE ALBA
PBX 3165339306
Cartagena - Colombia
Email: incoesas@yahoo.com

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ZACARÍAS MORELO RODRÍGUEZ identificado con 7.921.464, y con tarjeta profesional 124569-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de la firma INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERIA SAS identificada con el NIT 830031937-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

ZACARÍAS MORELO RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
INVERSIONES GRANDES VÍAS SAS IGV

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
Celular: 318-2617442



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189399-T

KATIA MILEIN
MERCADO ROMERO
C.C. 1047391806
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

20D923

000025

000028

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

836D46DB3741086

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATIA MILETH MERCADO ROHENES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047391806 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 189399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

000024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3B0C50CAC0FB1594

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

000027

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase
				Desde	Hasta		
Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Erinco sas 40%	11-40-101048192 Anexo 0	RCE - Predios labores y operaciones	21/07/2022	13/07/2022	30/11/2023		
	11-44-101188992 Anexo 1	Cumplimiento	27/07/2022	15/07/2022	30/11/2027		Estudios
		Cumplimiento		15/07/2022	31/05/2023	523,100,000.00	Fase I - Estudios y diseños
		Salarios		15/07/2022	30/11/2025	261,550,000.00	
		Calidad del servicio		30/11/2023	30/11/2027	523,100,000.00	
	11-44-101188993 Anexo 0	Cumplimiento	21/07/2022	13/07/2022	30/11/2028		Construcción
		Cumplimiento		13/07/2022	31/05/2024	4,882,800,000.00	Fase III - Construcción de obras civiles
		Salarios		13/07/2022	30/11/2026	2,441,400,000.00	
	Estabilidad y calidad de la obra			30/11/2023	30/11/2028	4,882,800,000.00	

1 Contrato original

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase
				Desde	Hasta		
Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Erinco sas 40%	11-40-101048192 Anexo 2	RCE - Predios labores y operaciones	04/08/2022	02/08/2022	20/12/2023	1,351,475,000.00	I y III
	11-44-101188992 Anexo 3	Cumplimiento	04/08/2022	02/08/2022	18/12/2022		
		Cumplimiento		15/07/2022	31/05/2023	523,100,000.00	Fase I - Estudios y diseños
		Salarios		15/07/2022	30/11/2025	261,550,000.00	
		Calidad del servicio		30/11/2023	30/11/2027	523,100,000.00	

2 POLIZAS CUMPLIMIENTO Y RC SEGUN ACTA DE INICIO

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase
				Desde	Hasta		
	11-40-101049560 Anexo 0	RCE - Predios labores y operaciones	06/10/2022	05/09/2022	30/11/2023	1,351,475,000.00	

070000

Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Incoe sas 40% Cambia No. póliza por cesión	11-44-101192083 Anexo 0	Cumplimiento	06/10/2022	05/09/2022	30/11/2028		Estudios	3	Cesión
		Cumplimiento		05/09/2022	31/05/2024	523,100,000.00	Fase I - Estudios y diseños		
		Salarios		05/09/2022	30/11/2023	261,550,000.00			
		Calidad del servicio		30/11/2023	30/11/2028	523,100,000.00			
	11-44-101192082 Anexo 0	Cumplimiento	06/10/2022	05/09/2022	30/11/2028		Construcción		
		Cumplimiento		05/09/2022	31/05/2024	4,882,800,000.00	Fase III - Construcción de obras civiles		
		Salarios		05/09/2022	30/11/2026	2,441,400,000.00			
	Estabilidad y calidad de la obra			30/11/2023	30/11/2028	4,882,800,000.00			

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase		
				Desde	Hasta				
Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Incoe sas 40% Cambia No. póliza por cesión	11-40-101049560 Anexo 2	RCE - Predios labores y operaciones	06/10/2022	05/09/2022	30/11/2023	1,351,475,000.00	F1 y F2	4	SUSPENSION No. UNO (001), CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022. ACTA DE REINICIO No. UNO (001) CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.
	11-44-101192083 Anexo 3	Cumplimiento	15/12/2022	05/09/2022	31/01/2029		Estudios		
		Cumplimiento		05/09/2022	30/06/2024	523,100,000.00	Fase I - Estudios y diseños		
		Salarios		05/09/2022	31/12/2026	261,550,000.00			
		Calidad del servicio		30/11/2023	31/12/2028	523,100,000.00			

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase		
				Desde	Hasta				
Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Incoe sas 40% Cambia No. póliza por cesión	11-40-101049560 Anexo 3	RCE - Predios labores y operaciones	24/07/2023	05/09/2022	11/04/2024	1,351,475,000.00	F1 y F2	5	SUSPENSION N. DOS (002), CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2023. ACTA DE REINICIO N. DOS (002), CON FECHA 30 DE JUNIO DE
	11-44-101192083 Anexo 5	Cumplimiento	24/07/2023	05/09/2022	31/01/2029		Estudios		
		Cumplimiento		05/09/2022	11/10/2024	523,100,000.00	Fase I - Estudios y diseños		
		Salarios		05/09/2022	11/04/2027	261,550,000.00			
		Calidad del servicio		30/11/2023	31/12/2028	523,100,000.00			

2023. DEMAS TERMINOS

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase
				Desde	Hasta		
Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Incoe sas 40% Cambia No. póliza por cesión	11-40-101049560 Anexo 5	RCE - Predios labores y operaciones	24/08/2023	15/08/20223	21/03/2025	1,351,475,000.00	F3
	11-44-101192083 Anexo 2	Cumplimiento	24/08/2023	15/08/2023	15/08/2025		Estudios
		Cumplimiento		15/08/2023	11/05/2024	523,100,000.00	Fase I - Estudios y diseños
		Salarios		15/08/2023	09/11/2027	261,550,000.00	
		Calidad del servicio		08/11/2024	09/11/2029	523,100,000.00	

6

ACTA DE INICIO FASE III-15 AGOSTO-2023

270000 4

(1)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101188993	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	07	2022	13	07	2022	00:00	30	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.580.186-1
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	

DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3007568874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.705-3
MUNICIPIO DE COTA	

DIRECCION: CR 4 NRO. 12 - 63	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU01GB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. DIOP 0092 DE 2022 QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/07/2022	31/05/2024	$4,882,800,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/07/2022	30/11/2026	$2,441,400,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/11/2023	30/11/2028	$4,882,800,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
RTMED S.A.S	900561683-6	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *133,059,644.00	$ ******25,000.00	$ **25,286,082.00	$ *******158,370,726.00	$ ***12,207,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
GARGOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	132527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 95-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101188993

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

000073

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101168993	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	07	2022	13	07	2022	00:00	30	11	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT:	901.590.136-1
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE COTA		NIT:	899.999.705-3
DIRECCION: CR 4 NRO. 12 - 63	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELEFONO	8540993

ADICIONAL:

P GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SUPERMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida de Estado Cuenta Corriente 008465457

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida de Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **133,059,644.00	$ ******25,000.00	$ **25,286,082.00	$ ********158,370,726.00	$ ****12,207,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GARBOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	138527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180000 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1100062178775-2

(415)7709998022107(8020)1100062178775(3900)000158370726(96)20230720

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000074

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101188993, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de JULIO de 2022

11-44-101188993

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

000075

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	08	2023	15	08	2023	00:00	21	03	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAREL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENECOMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**15/08/2023**	**21/03/2025**	**$1,351,475,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO A EL ACTA DE INICIO FASE III, CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,487,080.00	$ ******26,000.00	$ ***1,237,485.00	$ *********7,750,565.00	$ ****1,351,475,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

000076

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	08	2023	15	08	2023	00:00	21	03	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DE LA POLIZA
(11-40-101048192 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

000077

MARISOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	08	2023	15	08	2023	00:00	21	03	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1	
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3	
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

000078

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	08	2023	15	08	2023	00:00	09	11	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DELAOBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA PLIZA (11-44-101188993 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/08/2023	10/05/2025	$4,882,800,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2023	09/11/2027	$2,441,400,000.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	09/11/2029	$4,882,800,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE RECIBE Y ACEPTA EL ACTA DE INICIO FASE III, CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *129,808,903.00	$ ******25,000.00	$ **24,668,441.00	$ ********154,502,345.00	$ ***12,207,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

000075

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MODIFICACION No 01 AL
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, **JAIME JOSE BARRIOS REDONDO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 73006077 de Cartagena, representante legal de la empresa **INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S.,** identificada con NIT. 830.031.937-1, **EMA DOLORES GUTIERREZ PACHECO,** identificada con cedula de ciudadanía No 49.786.203, representante legal de la empresa **ERINCO S.A.S.,** identificada con NIT 900561563-6, y **WILLIAM JAVIER VANEGAS BARROS,** varón mayor de edad, e identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.333.761 de Villanueva, La Guajira, Representante Legal de **INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S** identificada con **NIT. 900.803.956-7,** manifestamos que se hace necesario realizar modificación **DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA** previas las siguientes consideraciones:

a) Que entre las empresas **INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S** y **ERINCO S.A.S** se conformó la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, con la siguientes participación:

Compromiso (%) [2]	Nombre del integrante a cargo de la actividad
60%	INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S
40%	ERINCO S.A.S

b) Que **UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA,** fue adjudicataria del Contrato No. 0082 de 2022 suscrito con el Municipio de Cota
c) Que la empresa **ERINCO S.A.S.,** solicitó al Municipio de Cota, autorización, para la cesión de su participación del 40% dentro de la **UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA** a la empresa **INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S** identificada con NIT. 900.803.956-7.
d) Que el municipio impartió Autorización mediante Resolución No. 1452 del 05 de septiembre de 2022.
e) Por tanto se hace necesario modificar el Documento de Conformación de la **UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA,**

f) De la misma manera los miembros han decidido el cambio de representante legal de la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA,
g) Por tanto se modificaran el numeral la conformación de la Unión temporal por efectos de la cesión y la representación legal de la misma cual quedará así:

PRIMERO: La Unión Temporal UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA está integrada desde la fecha por:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato [1]	Compromiso (%) [2]	Nombre del integrante a cargo de la actividad
Elaboración de estudios y diseños, licenciamiento y	60%	INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S

MODIFICACION No 01 AL
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

construcción. Actividades de índole técnico.		
Coordinación de actividades, Compras, Contabilidad, actividades administrativas, Elaboración de estudios y diseños, licenciamiento y construcción. Actividades de índole técnico.	40%	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S
TOTAL	**100%**	

SEGUNDO: Que el señor **JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA,** será representante Legal de la Unión Temporal, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.844.495 Riohacha, La Guajira, quien está expresamente facultada para firmar y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

TERCERO: El presente Modificatorio requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. –

CUARTA: Las partes declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del Contrato que no son objeto de modificación con el presente Modificatorio, continúan vigentes y conservan el carácter vinculante para las partes en los términos convenidos en el Contrato modificado.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 05 días del mes de septiembre de dos mil veintidós 2022.

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
C.C. 73006077 de Cartagena
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S
Nit: 830.031.937-1
Miembro **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**

EMA DOLORES GUTIERREZ PACHECO
C.C. 49.786.203 de Valledupar
ERINCO S.A.S.
Nit : 900561563-6
Miembro saliente **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**

MODIFICACION No 01 AL
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

William Vanegas

WILLIAM JAVIER VANEGAS BARROS
C.C. .121.333.761 de Villanueva La Guajira
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S
NIT. 900.803.956-7
Nuevo Miembro **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**

JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha, La Guajira
Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA.**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
Sigla: IGV INFRAESTRUCTURA
Nit: 830031937 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03274063
Fecha de matrícula: 20 de agosto de 2020
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 24 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 11 A N° 94 - 46 Oficina 602
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@igvinfraestructura.com
Teléfono comercial 1: 3006794512
Teléfono comercial 2: 3006759629
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 11 A N° 94 - 46 Oficina 602
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@igvinfraestructura.com
Teléfono para notificación 1: 3006794512
Teléfono para notificación 2: 3006759629
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

000032

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 23 del 16 de junio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Julio de 2022, con el No. 00329519 del libro VI, se inscribió la Apertura de Sucursal denominada INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SUCURSAL PERU, en la ciudad de Piura (Perú).

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001676 del 26 de mayo de 1997 de Notaría 50 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 1997, con el No. 00588929 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 de la Junta de Socios, del 15 de septiembre de 2010, inscrita el 1 de octubre de 2010 bajo el número 01418503 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Por Acta No. 2 de la Asamblea de Accionistas, del 8 de julio de 2011, inscrita el 2 de septiembre de 2011 bajo el No. 01509376 del libro IX, consta el cambio de domicilio de la ciudad/municipio de Bogotá D.C. a la ciudad/municipio de Cartagena (Bolívar).

Por Acta No. 07 del 22 de junio de 2017 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020, con el No. 02607960 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S a INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S.

Por Acta No. 07 de la Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrito el 20 de Agosto de 2020 bajo el No. 02607960 del libro

000033

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IX, la sociedad de la referencia cambió su sigla de: IGV S.A.S., por: IGV INFRAESTRUCTURA.

Por Acta No. 16 de la Asamblea de Accionistas del 6 de agosto de 2020, inscrita el 20 de Agosto de 2020 bajo el número 02607960 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Comercio de Cartagena el 3 de noviembre de 2011 bajo el número 74.124 del libro IX, trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Cartagena (Bolívar) a la ciudad/municipio de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2100.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: A) La realización de obras de construcción de cualquier tipo casas, urbanizaciones, puentes, carreteras, túneles, distritos de riego, estructuras, presas, infraestructuras para centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, bodegas, edificios, centros comerciales y en general todo tipo de obras civiles relacionadas con el ejercicio de las profesiones de ingeniería en todas sus ramas y arquitectura, incluyendo obras vinculadas con la explotación, exploración y comercialización de minerales o de cualquier otro recurso natural. B) La prestación de servicios profesionales de Asesoría, consultoría, Interventoría, Diseño, Programación, Gerencia de Proyectos de construcción, Estudios de factibilidad de inversiones en obras públicas o privadas y cualquier otro servicio relacionado con las ramas de la ingeniería, la arquitectura y el diseño. C) La explotación de cualquier industria relacionada con el sector de la construcción. D) La administración de bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal o separada. E) La comercialización de toda clase de productos, elementos, maquinaria y equipo relacionados con la construcción y el diseño. F) La administración, corretaje, compraventa, arriendo, permuta, comodato o cualquier acto o contrato

000034

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

sobre bienes muebles e inmuebles. G) La adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como la pignoración e hipoteca de dichos bienes según el caso. H) La remodelación o restauración de construcciones. I) Organizar y financiar empresas de cualquier naturaleza, que tengan objetos similares o complementarios con los de la sociedad y llevar la representación de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, dedicadas a la construcción u obras civiles, lo mismo que con la maquinaria dedicada a dicha actividad. J) Contratar con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas en su propio nombre o de terceros la ejecución de obras civiles o asociarse con otras sociedades para la realización de las mismas, bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la ley comercial y administrativa sea bajo el esquema de contratos en participación, consorcios, uniones temporales y otras. K) La realización de operaciones de comercio exterior, tales como la importación y exportación de toda clase de bienes y servicios. L) La promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos, especialmente en los países del Grupo Andino, Mercosur y Unasur. M) Participar en todo tipo de licitaciones privadas o públicas. N) Todas las actividades relacionadas con el establecimiento, aislamiento, mantenimiento y conservación de plantaciones forestales protectoras, productoras y todas aquellas actividades necesarias para el manejo y control ambiental y forestal; así como consultoría y prestación de servicios en proyectos y actividades de: restauración ecológica, restauración y protección de ecosistemas, siembra, resiembra y mantenimiento de especies nativas e introducidas, establecimiento de plantaciones con fines protectores, productores y comerciales, mantenimiento de plantaciones con fines protectores, productores y comerciales, compensación de pérdida de biodiversidad, aprovechamiento forestal, forestales, silvicultura, elaboración de planes de restauración ecológica pasiva y activa, monitoreo de restauración, regeneración natural, restauración activa, restauración pasiva, establecimiento de viveros, trasplante de plántulas y semillas, cosecha de semillas o plántulas, re forestación con especies nativas, re forestación con especies introducidas, aislamiento en zonas de importancia ecológica, cercas vivas, bancos dendroenergéticos, estufas ecoeficiente, sistemas productivos agrícolas, sistemas productivos forestales, erradicación de especies invasoras, sistemas forestales, sistemas agro forestales, rehabilitación ecológica de ecosistemas, recuperación ecológica de ecosistemas, entre otras, al igual que ejecución. interventorías y asesorías a todo tipo de proyectos

000035

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ambientales y forestales y cualquier otro que sea útil para la actividad social. O) La producción, distribución, importación, exportación, compra, venta, instalación, arrendamiento y/o operación, concesión, mantenimiento y reparación de equipos y materiales de energía eléctrica, mecánica y/o térmica, incluyendo las fuentes de energía alternativas, entre las cuales se pueden considerar: baterías o acumuladores para radios de comunicaciones, alarmas, computadores, módulos solares fotovoltaicos, sistemas de rectificación y cargadores de baterías, tecnología SCRS, ferroresonante y PWM, sistemas ininterrumpidos de potencia U.P.S., equipos de conversión y transformación eléctrica y electrónica de energía voltaje y corriente, elementos semiconductores para la protección contra sobretensiones transitorias TVS. Sistemas de acondicionamiento ambiental, refrigeración y calefacción, pequeñas centrales hidroeléctricas, redes eléctricas en baja tensión y media tensión, motores diesel y motogeneradores diesel y/o eléctricos para uso en generación de energía eléctrica, además del suministro de materiales, accesorios y servicios de ingeniería para redes eléctricas HVDC, HVAC, AT, BT, y MT. P) Suministro, distribución e instalación de sistemas de iluminación de alumbrado público e interior, alumbrado de emergencia e iluminación de vías y escenarios. Q) Desarrollar programas de reducción de pérdidas consistentes en la verificación del funcionamiento, retiro e instalación de medidores de servicio de energía eléctrica, ejecutar el control de morosidad de los clientes de la empresa de servicio de energía consistente en la verificación de la suspensión, verificación de la suspensión, seguimiento de las suspensiones, reconexión de los servicios de energía en sus diferentes aspectos y modalidades. R) Diseño, interventoría, supervisión e inspección de redes eléctricas industriales, domiciliarias, comerciales o gubernamentales. S) Desarrollo, diseño e implementación de proyectos de automatización, gestión y control remoto de equipos de energía y complementarios, así como para sistemas de telecomunicaciones y equipos de control, accionamiento y supervisor. Diseño, suministro, construcción, concesión, instalación, remodelación, mantenimiento, reparación y/o adaptación de elementos y equipos de planta interna y de planta externa, bienes de planta externa, redes de energía y de telefonía alámbrica o inalámbrica, incluyendo el suministro e instalación de torres para comunicaciones, así como el estudio y la presentación de servicios de diseños, asesorías, interventorías, consultoría, construcción, operación de servicios de telecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, como socio o aliado estratégico en contratos de

000036

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

asociación y operador de redes y proveedor de equipos relacionados, fabricación de sistemas y equipos de codificación direccionables y servicios complementarios. T) Diseño, fabricación, suministro, instalación, concesión, interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de las redes, equipos y elementos para la expansión de la red de servicios de banda ancha. Obras civiles para redes de distribución aéreas y subterráneas, canalizaciones y enrutamiento, con el objeto de prestar servicios a poblaciones de clientes, usuarios, abonados o suscriptores y en general todo lo relacionado en concesiones de telecomunicaciones. También prestará el servicio público de telecomunicaciones a través de la explotación, contratación, distribución, concesión, operación, asesoría, auditoría, interventoría y asistencia técnica de los servicios de televisión abierta y por suscripción, radiodifundida, cableada, cerrada y satelital de señales tanto incidentales como codificadas, la prestación del servicio de valor agregado y/o telemático haciendo uso de la propia red y/o de las redes de telecomunicaciones del estado o privadas; en general la explotación y prestación de servicios de telecomunicaciones básicos, especiales y auxiliares de ayuda, walkout, producción de televisión e ingeniería en general tales como: cableado, diseño de redes, ductos, obras civiles y otros que conlleven o no la comercialización de equipos electrónicos, mantenimientos, transferencia de tecnología, sistemas de comunicación y obras complementarias en: centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, el diseño, selección, instalación, operación, concesión y mantenimiento de todo tipo de equipos electrónicos especializados, líneas y accesorios para comunicaciones, soluciones de vigilancia y seguridad privada, automatización de procesos y el diseño, suministro, integración, instalación, implementación, pruebas, puesta en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad y blindaje arquitectónico. U) Actividades de la ingeniería electromecánica tales como diseñar, seleccionar, instalar, operar, supervisar, dar mantenimiento de sistemas electromecánicos, electroneumáticos y electrohidráulicos, así como los sistemas de protección y control de equipo eléctrico y subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, redes y máquinas hidráulicas, maquinaria industrial y equipo. Seleccionar, instalar, controlar y operar motores de combustión interna, transmisiones mecánicas, turbogeneradores, generadores y turbinas de vapor, cambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y

000037

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

refrigeración y máquinas eléctricas y transformadores. Seleccionar, instalar y operar instrumentos de medición del área electromecánica y todas las labores y aspectos, incluyendo la automatización de servicios industriales, automatización de edificios, sistemas de transporte masivo, equipos de control y automatización de tráfico y transporte, señalización. Seguridad de instalaciones industriales. La sociedad podrá ser fiadora y garantizar con todo o parte de sus bienes, obligaciones de terceros y por lo tanto, tienen valor para ella las obligaciones que por este concepto lleguen a constituirse por cualquiera de los socios. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar actividades que tengan relación directa con el mismo tales como: a) Tomar o recibir dinero en mutuo con interés o sin él, con garantía o sin ella; b) Girar, otorgar, aceptar, endosar, avalar, y negociar toda clase de títulos valores; c) Celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias y bursátiles con las entidades del sector financiero público o privado, tales como bancos, corporaciones financieras, fondos fiduciarios, bolsas de valores, etc.; d) intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles y formar parte de personas jurídicas de derecho privado y economía mixta; e) Celebrar con personas jurídicas o naturales el negocio jurídico de cuentas en participación respecto a operaciones comerciales relacionadas con su objeto social; f) importar los bienes muebles y accesorios necesarios para la dotación de los inmuebles de la sociedad o construidos por ella para terceros; g) Celebrar contratos de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento y demás negocios que versen sobre muebles e inmuebles; h) obtener y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza, tales como patentes de invención, marcas de productos o servicios, lemas comerciales y cualquier otro tipo que sea útil para la actividad social. Ejecutar en condición de operador todas las actividades correspondientes al diseño, financiación, operación, gestión, construcción, ampliación, expansión, reposición, rehabilitación, mantenimiento, recuperación y administración de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, recolección y procesamiento de basuras, desechos y escombros y todas las actividades complementarias, afines o análogas acordes con el régimen jurídico vigente y aplicable, así como la ejecución de obras de ampliación y limpieza de cauces y cuerpos de agua. Estas actividades podrán desarrollarse en cualquier sitio o región geográfica de la República de Colombia y en cualquier país o república del mundo, por lo tanto la empresa podrá desarrollar todas sus actividades en el exterior, negociar internacionalmente,

000038

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecer sucursales en el extranjero, constituir y participar en consorcios y demás formas de asociación empresarial y comercial permitidas en el país correspondiente, participar en licitaciones públicas y privadas y en las demás formas de contratación estatal y privada legalmente definidas en el país respectivo, con sujeción a las leyes y normas de cada nación. En desarrollo del objeto social, la empresa podrá ofrecer además de las garantías comerciales legales a las que está obligada, las garantías adicionales o extendidas que considere, emitiendo y suscribiendo paro ello los documentos que sean necesarios.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $15.000.000.000,00
No. de acciones : 15.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $15.000.000.000,00
No. de acciones : 15.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $15.000.000.000,00
No. de acciones : 15.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente

000039

ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Se establece que todas las autorizaciones, documentos y poderes que suscriba u otorgue que comprometan a la Sociedad, sean autenticados con presentación personal, únicamente en las Notarías 4a. del Circulo de Cartagena, 22° del Círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas y conservando la limitación que todas las autorizaciones, documentos y poderes que suscriba u otorgue que comprometan a la sociedad, sean autenticados con presentación personal, únicamente en las Notarías 4a. del Circulo de Cartagena, 22° del Círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo: Como Representante Legal de la compañía judicial y extrajudicialmente, el Gerente y su suplente tiene las más amplias facultades para celebrar o ejecutar y para actuar en nombre de la sociedad en todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la compañía y los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El Gerente y su suplente con las limitaciones previstas en estos estatutos y en la ley con la condición de protocolizar únicamente en las Notarías 4a. del Circulo de Cartagena, 22° del Círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar, los documentos y poderes que otorgue, previstas en el artículo 29° de estos Estatutos, queda investidos de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios

000040

sociales; solicitar créditos, constituir hipotecas; constituir fideicomisos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso - administrativas en que la compañía tenga interés o debe intervenir e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme con la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga y constituir, para tales efectos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad y delegarles facultades; novar obligaciones o créditos; suscribir títulos valores de contenido crediticio a condición de que exista contraprestación cambiaria a favor de la compañía; dar o recibir bienes en pago; revocar mandatos y sustituciones. En cumplimiento de lo anterior el Gerente podrá: A) Ejecutar los decretos de la Asamblea de Accionistas; B) Nombrar trabajadores y velar por el cumplimiento de sus deberes, suspender a los de su dependencia cuando lo juzgue necesario y designar a quienes deban reemplazarlos; C) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para que, obrando bajo sus órdenes, representen a la compañía y determinar sus facultades; D) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales, sin limitación, Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad; E) Si hay lugar a ello, otorgar a los gerentes de las sucursales el poder de que trata el artículo 263 del Código de Comercio en el cual se fijarán las facultades de cada uno de ellos; F) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la seguridad debida; G) Asistir a las reuniones de la Asamblea de Accionistas, asociaciones (incluida la Cámara de Comercio) o comunidades en que la compañía tenga intereses, dar su voto en ellas en representación de ésta; H) Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias; I) Visitar las instalaciones, obras y dependencias de la compañía cuando lo estime conveniente; J) Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley y la naturaleza de su encargo. K) Ejercer la vigilancia control y evaluación del funcionamiento de las sucursales en el exterior que la sociedad haya decidido constituir, cumplir y hacer cumplir las leyes, exigencias y disposiciones de cada país en cuanto al funcionamiento de las respectivas sucursales la ejecución correcta y oportuna de los contratos que hayan sido adjudicadas, adoptar los correctivos que fueren necesarios si están dentro de sus atribuciones o informar de inmediato de la posible anomalía a la Asamblea de Accionistas.

000041

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 26-2023 del 10 de enero de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023 con el No. 02920849 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Camilo Andres Martinez Lopez	C.C. No. 9101062

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 07 del 22 de junio de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020 con el No. 02607960 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Zacarias Morelo Rodriguez	C.C. No. 7921464 T.P. No. 124569-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000538 del 31 de marzo de 2005 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	00984298 del 5 de abril de 2005 del Libro IX
Acta No. 0000004 del 20 de diciembre de 2006 de la Junta de Socios	01116680 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0008845 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116679 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX

000042

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 0008845 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116682 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002340 del 18 de septiembre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01159490 del 21 de septiembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002715 del 22 de octubre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01166276 del 23 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0001362 del 28 de diciembre de 2007 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01255563 del 12 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 8102 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01293142 del 28 de abril de 2009 del Libro IX
E. P. No. 8102 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01336646 del 27 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1803 del 1 de diciembre de 2009 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01344392 del 2 de diciembre de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 15 de septiembre de 2010 de la Junta de Socios	01418503 del 1 de octubre de 2010 del Libro IX
Acta No. 2 del 8 de julio de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01509376 del 2 de septiembre de 2011 del Libro IX
Acta No. 01 del 27 de agosto de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 10 del 17 de agosto de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 07 del 22 de junio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 11 del 10 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 13 del 29 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 16 del 6 de agosto de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 19 del 3 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02709827 del 27 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 25 del 15 de noviembre de 2022 de la Accionista Único	02901861 del 23 de noviembre de 2022 del Libro IX

000043

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 20 de diciembre de 2021 de Representante Legal, inscrito el 13 de enero de 2022 bajo el número 02781352 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- INVERSIONES TECNICAS Y GESTION PLUS S.A.S.
Domicilio: Cartagena (Bolívar)
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil, 9999 Actividad No Homologada CIIU v4, 0141 Cría de ganado bovino y bufalino
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2021-12-09

Por Documento Privado del 15 de diciembre de 2021 de Empresario, inscrito el 4 de enero de 2022 bajo el número 02779413 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- Karol Eugenia De Jesus Huertas Barrios
Domicilio: Cartagena (Bolívar)
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Ingeniero civil.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2021-12-09

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL
Se aclara la situación de control inscrita el 4 de Enero de 2022 bajo el No. 02779413 del libro IX, en el sentido de indicar que la persona natural Karol Eugenia de Jesus Huertas Barrios (matriz), comunica que configura situación de control indirecta sobre la sociedad INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S (subordinada), a través de la sociedad INVERSIONES TÉCNICAS Y GESTIÓN PLUS SAS (filial).

000044

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 20 de Agosto de 2020, fueron inscritos previamente por otra cámara de comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

000045

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 22.131.964.325
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 26 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

****

000046

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de agosto de 2023 Hora: 17:39:55
Recibo No. AB23613960
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23613960F8978

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

000047

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 28/08/2023 - 5:45:05 PM

Recibo No.: 0009040246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: njibhSWhpgHkbkvj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S
Sigla:	No reportó
Nit:	900803956-7
Domicilio principal:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	09-338989-12
Fecha de matrícula:	22 de Diciembre de 2014
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	29 de Marzo de 2023
Grupo NIIF:	GRUPO III. Microempresas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	BLAS DE LEZO MZ 23 LT 18 ETAPA 4
Municipio:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:	incoesas@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3165339306
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	BLAS DE LEZO MZ 23 LT 18 ETAPA 4
Municipio:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	incoesas@yahoo.com
Teléfono para notificación 1:	3165339306
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

000048

La persona jurídica INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

du

CONSTITUCION: Que por documento privado del 22 de Diciembre de 2014 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,268 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la realización de construcciones de Obras de Ingeniería Civil en general, ya sea por el sistema convencional de edificaciones individuales o por el sistema multifamiliar o el de propiedad horizontal o condominio, realizar obras de arquitectura o de ingeniería de cualquier género o naturaleza total o parcialmente, ya fuere para la sociedad o para terceros, así como subcontratar las mismas, remodelar, reconstruir toda clase de edificaciones antiguas o modernas; la sociedad podrá adquirir o arrendar, o dar en arriendo, bienes muebles y maquinaria o equipo y demás enseres propios de la actividad, la compraventa y arriendo de toda de bienes inmuebles urbanos o rurales ubicados en cualquier parte de la República, la sociedad podrá tener representación o esencia de otras firmas que produzcan materiales de construcción, la sociedad puede producir materiales de construcción, la sociedad puede contratar el suministro de materiales de construcción. La sociedad podrá recibir y dar hipotecas? como garantía de sus operaciones comerciales o civiles. La sociedad podrá formar parte de otras sociedades, estableciéndolas o fundándolas directamente, o adquiriendo parte del capital o acciones de compañías existentes; podrá tomar dinero en mutuo, liberar, girar, otorgar, emitir, aceptar, endosar, pagar, negociar, descargar y

público y privado. Los servicios podrán ser prestados tanto en el país como en el exterior. Podrá además la sociedad, en el ejercicio de su objeto social: 1) Adquirir a cualquier título oneroso la propiedad o cualquier otro derecho real sobre muebles o inmuebles. 2) Variar la forma de sus bienes muebles, enajenarlos a cualquier título, transigir sobre sus derechos de juicio o fuera de él y comprometerlos. 3)

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Gravarlos con prenda e hipoteca. 4) Adquirir el uso de cualquier título pecuniario de bienes muebles o inmuebles, así como ceder el uso de los propios a igual título. 5) Recibir créditos en dinero o en especie, con o sin intereses o garantías reales o personales. 6) Celebrar el contrato de cuentas corrientes o cualquier otra que usaren los bancos e instituciones financieras para formalizar sus operaciones. 7) Adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en cualquier clase de sociedad, transformar su forma Social, fusionarse con otra u otras sociedades, o incorporarse en sí a otra u otras: 8) Otorgar garantías. 9) Hacer, sea en su propio nombre o por cuenta de terceros; o en participación, organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría. pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina, con ello toda clase de operaciones que sean necesarias para el mejor logro del objeto social. 10) Realizar actividades de investigación, análisis, evaluación, planeación y control de mercados, estudios de mercados, asesoría en mercado y publicidad, consultorías empresariales en mercadeo y publicidad, creación, conceptualización y realización de todo tipo de campañas publicitaria, de comunicación, y/o divulgación, contratar o subcontratar consultores externos en el ramo de mercadeo, publicidad y comunicaciones, realizar el diseño, elaboración, ampliación, análisis e interpretación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, observaciones individuales o grupales, y en general todo tipo de metodologías relacionadas con el estudio, análisis y prospección de mercados, bases de datos, sea en medio escrito, magnético, computarizado o sistematizado, y realizar actividades de asesoría, consultoría, asistencia técnica, profesional y capacitación a todo tipo de empresas, personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, en aspectos administrativos, financieros, técnicos, comerciales, legales, logísticos y operacionales; administración y manejo de recurso humano, asesoría técnica y profesional en las áreas gerencial, organizacional, económica, administrativa, comercial, jurídica, psicológica, social. comunicaciones, comunicaciones, en general en todas las áreas empresariales; realizar, dictar o dirigir charlas, conferencias, seminarios, talleres, paneles, mesas redondas, simposios y todo tipo de actividades en campo de la capacitación no formal. 11) La sociedad podrá prestar el servicio de operación administración de grúas para el transporte de vehículos automotores. 12) Prestar el servicio integral de aseo y cafetería y operar y/o administrar parqueaderos abiertos al

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

público, de vehículos. 13) La sociedad podrá desarrollar todas las actividades de su objeto social en Colombia o en el exterior. Se adiciona la división de suministros, por medio de la cual la sociedad podrá comprar, vender y celebrar toda clase de contratos de suministros de muebles, maquinaria y equipos de oficina, incluyendo computadores y sus componentes, o partes y programas, insumos y materiales para equipos de oficina, papelería y útiles de oficina, uniformes y dotaciones para trabajadores, juguetería y artículos deportivos y otros similares. 14) Compra, venta, arrendamientos, explotación industrial y comercial de bienes raíces, explotación agrícola y de maquinaria para propósitos afines. 15) Realizar préstamos bajo cualquier modalidad. 16) Proveer a la industria y comercio de capital de trabajo para el desarrollo de sus actividades a través de la negociación de las facturas y contratos producto de sus ventas con recursos propios o provistos por nuestros inversionistas de sus necesidades financieras. 17) Prestar asesoría especializada a los inversionistas mediante análisis y evaluación de sus necesidades financieras, con presentación de alternativas para decisión e inversión con acompañamiento profesional permanente y apoyo jurídico, contable y tributario. 18) Constituir hipotecas. 19) Comercialización de equipos de cómputo y sus respectivas partes. 20) Comercialización de materiales para la construcción. 21) Comercialización de electrodomésticos. 22) Realizar obras civiles y mejoramiento de vivienda. 23) Llevar a babó labores de loteo y realizar mejoras a toda clase de obras. 24) Fabricación y comercialización de productos e insumos agropecuarios y agroindustriales. 25) Podrá igual mente desarrollar actividades agrícolas, cría, levante y engorde de ganado. 26) Importar y exportar maquinaria agrícola e industrial. 27) Comercializar al por mayor maquinaria industrial, equipos y herramientas para buceo deportivo, comercial y táctico-militar incluido suministros, repuestos, componentes, accesorios, instalación, mantenimiento y reparación. 28) Suministro de equipos tácticos y militares para operaciones especiales y rescate, incluidos: rebreathers, DPVs, trajes, cuerdas, ropa, maletines, botas, guantes, sistemas de visión nocturna, navegación, navajas, cuchillos, herramientas, GPS, brújulas, sistemas de orientación, luces y linternas, gafas, cascos y arneses, incluidos partes, repuestos, componentes y accesorios, e) Distribución de toda clase de equipos para deportes náuticos y subacuáticos incluido partes, repuestos, componentes y accesorios.

CAPITAL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$500.000.000,00	500.000	$1.000,00
SUSCRITO	$500.000.000,00	500.000	$1.000,00
PAGADO	$500.000.000,00	500.000	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para un término de un año por El socio único o la asamblea de accionistas en caso de que exista más de un socio, pudiendo ser nombrado nuevamente por periodos sucesivos.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo. Como Representante legal de la compañía judicial y extrajudicialmente, el Gerente tiene las más amplias facultades para celebrar o ejecutar y para actuar en nombre de la sociedad en todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la compañía y los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El Gerente, con las limitaciones previstas en estos estatutos y en la ley, queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; solicitar

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

créditos, constituir hipotecas; constituir fideicomisos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso-administrativas en que la compañía tenga interés o deba intervenir e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme con la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga y sustituir, para tales efectos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad y delegarles facultades; novar obligaciones o créditos; suscribir títulos valores de contenido crediticio a condición de que exista contraprestación cambiaria a favor de la compañía; dar o recibir bienes en pago; revocar mandatos y sustituciones. En cumplimiento de lo anterior el Gerente podrá: a) Ejecutar los decretos de la Asamblea de Accionistas. b) Nombrar trabajadores y velar por el cumplimiento de sus deberes, suspender a los de su dependencia cuando lo juzgue necesario y designar a quienes deban remplazarlos. c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para que, obrando bajo sus órdenes, representen a la compañía y determinar sus facultades. d) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales, sin limitación; Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad. e) Si hay lugar a ello, otorgar a los gerentes de las sucursales el poder de que trata el artículo 263 del Código de Comercio en el cual se fijarán las facultades de cada uno de ellos. f) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la seguridad debida. g) Asistir a las reuniones de la Asamblea de Accionistas, asociaciones (incluida la Cámara de Comercio) o comunidades en que la compañía tenga intereses, dar su voto en ellas en representación de ésta. h) Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias. h) Visitar las instalaciones, obras y dependencias de la compañía cuando lo estime conveniente. j) Las demás que le corresponden de acuerdo con la ley y la naturaleza de su encargo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 14 del 12 de diciembre de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2022 con el No. 186410 del Libro IX, se designó a:

000054

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO	C.C. 73.006.077

REVISORES FISCALES

Por Acta No 13 del 06 de mayo de 2022, de Asamblea de Accionista, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2022 con el No. 182041 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE		IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	KATIA MILETH MERCADO ROHENES	C.C. T.P.	1.047.391.806 189399-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No. 07 del 27/12/2016 Asamblea	128511 del 29/12/2016 del L.IX
Acta No. 09 del 05/06/2019 Asamblea	151050 del 07/06/2019 del L.IX
Acta No. 11 del 10/01/2020 Asamblea	156096 del 16/01/2020 del L.IX
Acta No. 13 del 06/05/2022 Asamblea	182841 del 11/08/2022 del L.IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

000055

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4210
Actividad secundaria código CIIU: 4112
Otras actividades código CIIU: 4220, 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es mediana.

Con anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $6,192,478,431.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4210

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Recibo No.: 0009040246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: njibhSWhpgHkbkvj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CESAR ALONSO ALVARADO BARRETO
DIRECTOR DE SERVICIOS REGISTRALES,
ARBITRAJE Y CONCILIACION

000057

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

ALCALDÍA MUNICIPAL COTA - CUNDINAMARCA

Cota, 28 de Agosto de 2023

FIII-CCO72/2023

Señores:
UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
Atn: JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
gerencia@moaingenieria.com
Carrera 18 No. 137-11
Bogotá D.C.

CC: Mario Alberto Fiquitiva Casallas
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Miguel Cermeño
Ingeniero adscrito a la SIOP

Ref. **CONTRATO No. SIOP-0083-2022** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA

ASUNTO: **APROBACIÓN PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. SIOP-0082-2022 "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"

Cordial saludo.

Dando respuesta al correo recibido el día 28 de agosto de 2023, en el cual, usted como contratista de obra presenta a esta interventoría las hojas de vida del director de obra, residente, especialista estructural, ingeniero hidrosanitario, ingeniero electricista, residente SISO y el inspector de obra (maestro de obra) y realizada la revisión que adelanto esta interventoría, me permito dar el concepto de aprobación a los siguientes profesionales:

1. En atención a lo establecido en los pliegos de condiciones, esta interventoría da por aprobado la hoja de vida de los profesionales relacionados a continuación:

Cantidad	Cargo a desempeñar	Nombre del profesional presentado al cargo
1	Director de obra	Jair Alfonso Melo Márquez
1	Residente de obra	Ewdin Javier Salamanca Manosalva
1	Especialista estructural	Freddy Humberto Olejua Castillo Barcasnegras
1	Ingeniero hidrosanitario	Eduardo Rafael Castilla

RELACION PERSONAL FASE III -CONTRATO SIOP-0082-2022

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESION
DIRECTOR DE OBRA	JAIR ALFONSO MELO MARQUEZ	84.088.986	ARQUICTECTO-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCION
RESIDENTE DE OBRA	EWDIN JAVIER SALAMANCA MONOSALVA	74.337.644	ARQUITECTO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	FREDDY HUMBERTO OLEJUA CASTILLO BARCASNEGRAS	13.510.402	INGENIERO CIVIL- MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL-ESTRUCTURAL
INGENIERO HIDROSANITARIO	EDUARDO RAFAEL CASTILLA	72.238.512	INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA EN SANIAMIENTO AMBIENTAL
INGENIERO ELECTRICISTA	MAURICIO JIMENEZ	75.072.691	INGENIERO ELECTRICISTA
RESIDENTE SISO	DERLY JASBREIDY ACOSTA CHITIVA	1.124.191.506	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
INSPECTOR DE OBRA(MAESTRO DE OBRA)	JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA	1.118.844.495	INGENIERO CIVIL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590186	1	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7289120	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	125671072	9455602358	E	2023/09/20	2023/08/28	BANCOLOMBIA	0	$8,698,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tep	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	94150494	LOZANO PLAZA JOHN WILMER	X																	23030 1	26	EPS017	26	CCF22	26	14-11	26	0.522%	26	No
2	CC	79618820	PIRAGAUTA ALARCON DINAEL MAURICIO	X																	23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	No
3	CC	1017275094	VILLAMIZAR ALARCON CRISTIAN DAVID	X																	23020 1	23	EPS010	23	CCF22	23	14-11	23	0.522%	23	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: FASE III OBRA (7 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: FASE III OBRA (7 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																																
4	CC	1124191506	ACOSTA CHITIVA DERLY JASBREIDY	X																	23020 1	16	EPS017	16	CCF22	16	14-11	16	0.522%	16	No
5	CC	72238512	CASTILLA BARCASNEGRAS EDUARDO RAFAEL	X																	23020 1	16	EPS005	16	CCF22	16	14-11	16	0.522%	16	No
6	CC	75072691	JIMENEZ MAURICIO	X																	23030 1	16	EPS010	16	CCF22	16	14-11	16	0.522%	16	No
7	CC	84088986	MELO MARQUEZ JAIR ALFONSO																		23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	No
8	CC	1118844495	MENDOZA OCHOA JERSON ESTEBAN	X																	23030 1	16	CCFC55	16	CCF22	16	14-11	16	0.522%	16	No
9	CC	13510402	OLEJUA CASTILLO FREDDY HUMBERTO	X																	25-14	16	EPS003	16	CCF22	16	14-11	16	0.522%	16	No
10	CC	74337644	SALAMANCA MANOSALVA EDWIN JAVIER																		23020 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	No
Total			**Afiliados(10)**																														

020000

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590186	1	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7289120	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	125671072	9455602358	E	2023/09/20	2023/08/28	BANCOLOMBIA	0	$8,698,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$4,385,900	$0	$0	$4,385,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$170,700	$0	$0	$170,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,531,600	$0	$0	$2,531,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,683,600	$0	$0	$1,683,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$102,600	$0	$0	$102,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$102,600	$0	$0	$102,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$783,300	$0	$0	$783,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$783,300	$0	$0	$783,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,447,400	$0	$0	$2,447,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$154,700	$0	$0	$154,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$1,175,200	$0	$0	$1,175,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$325,700	$0	$0	$325,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$791,800	$0	$0	$791,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$587,800	$0	$0	$587,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$587,800	$0	$0	$587,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$391,900	$0	$0	$391,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$391,900	$0	$0	$391,900
TOTAL				10	$8,698,900	$0	$0	$8,698,900

170000

2023/08/28 04:56 PM

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-14, 01:52:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65191671

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 14/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAICOL ESTIL CUELLAR OLIVEROS		
Documento	CC1019027256	**Dirección**	CL 40 SUR #23 D - 27
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134069469
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005179424	JOSE ALONSO CASTILLO MIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS917) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1005851116	DEIBY ALEJANDRO CUELLAR OLIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93452817	YIMMER CUELLAR OLIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 139.200	$ 242.400	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.600	$ 0	$ 1.077.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

115 Miguel Carmona

Cota, 28 de agosto de 2023 OFICIO No: 031-2023

Ingeniero
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ciudad

ALCALDIA DE COTA
29/08/2023 9:56:52 A. M.
RADICADO: CO-20987
OBRAS PUBLICAS

Ref.: ESTUDIO, DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022.

Estimado Ingeniero:

Dentro del desarrollo de la primera fase del proyecto en referencia le hacemos entrega de la primera cuenta con sus respectivos soportes que son:

1. Aval de cuenta No. 1 enviado por interventoría
2. Acta parcial No. 1 FASE III
3. Factura fiscal
4. Planilla integrada de seguridad social del personal aprobado para fase 3 obra.
5. Certificación bancaria
6. Certificación de Parafiscales de las empresas integrantes de la UT, que son IGV SA e INCOE SAS
7. Documento consorcial de cesión de contrato
8. Certificado de existencia y representación legal de IGV SA e INCOE SAS
9. Rut de la unión temporal cultura en cota
10. Rut de IGV SA e INCOE SAS
11. Pólizas del contrato
12. Acta de inicio de inicio y suspensión del contrato
13. Informe general de soporte del acta No. 1 FASE 3
14. Programación de obra

No. DE FOLIOS (241) **No. DE PLANO** (2)

Cordial saludo,

JERSON MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha
Representante Legal de la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA***

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá, email: jcurielcon@hotmail.com, celular: 3007658674

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 28 de Agosto de 2023 Oficio: FIII-CC073/2022

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
obras@alcaldiacota.gov.co
Cota-Cundinamarca

C.C. Miguel Cermeño- Ingeniero adscrito a la SIOP

REFERENCIA: Proceso de contratación No (SIOP-CM-0004-2022), en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SIOP-0083-2022

Asunto: REMISIÓN DE ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL No.1 FASE III DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082-2022 "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".

Respetados señores:

Por medio de la presente esta interventoría remite la documentación del Acta parcial de Obra No.1 FASE III del Contrato de Obra No. SIOP-0083-2022 del 02 de agosto de 2022 cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA". A continuación, se relaciona la documentación correspondiente a la ejecución del contratista de obra, la cual fue revisada y aprobada según los lineamientos contractuales:

Adjunto:

1. Acta parcial No1. Fase III, con sus respectivas memorias de cantidades firmadas por interventoría
2. Factura
3. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales

Carrera 3 11- 45 Local 101.
E:mail:jdar999@hotmail.com
Teléfono: 315 8904477
Cota-Cundinamarca

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

CONTRATO No SIOP-0082-2022
LICENCIA DE CONSTRUCCION N° 900.49.694
DEL 20 DE JUNIO DEL 2023



INFORME DE OBRA SOPORTE ACTA N° 01

INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL

PERIODO: 15 DE AGOSTO HASTA 28 DE AGOSTO DEL 2023

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION **6**
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO **7**
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 7
UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8
DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL PROYECTO 11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13
INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIOP-0082-2022.14
POLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACION DE LA POSICION CONTRACTTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO SIOP- 0082-2022. SEGÚN REINICIO DE LA SUSPENSION N°1 15
POLIZAS CON ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO SIOP-0082-2022 16
POLIZAS DE INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO SIOP- 0082-2022 16
MODIFICACIONES AL CONTRATO **17**
MODIFICATORIO 1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE LAUNION TEMPORAL 17
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO SIOP-0082-2022 ..... **17**
ENTREGABLES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS **18**
ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA NO. SIOP-0082-2022 24
AVANCE DE ACTIVIDADES – FASE III **25**
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CONTRATOS **30**
MEMORIAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO N° 1 30

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación del lote destinado para la implantación del proyecto 8
Ilustración 2 Ubicación general del proyecto.....9
Ilustración 3 Ubicación especifica del proyecto.....10
Ilustración 4 Avance del Presente Periodo 27
Ilustración 5 Avance de Ejecución Obra - Fase III 27
Ilustración 6 Memorias de Obra. 37

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: *jcurielcon@hotmail.com,*
Celular: *3007658674*

000104

INTRODUCCION

El Municipio de COTA Cundinamarca a través de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas mediante resolución 283 del 18 de Marzo de 2022 dio apertura al proceso de Licitación Publica número LPO-SIOP-0001-2022 publicada en la plataforma del Secop 2 el 24 de Febrero del 2022 donde al cierre del proceso mediante resolución No. 406 del 22 de Abril de 2022 se declaró habilitadoy se adjudicó el proceso a la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA por un valor de $27.029.500.000,00.

El día 13 de Julio de 2022 se celebró el contrato No. SIOP-0082-2022 entre la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Cota y la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA. Así mismo el día 2 de agosto de 2022 se suscribe el acta de inicio de la fase 1 correspondiente a la Elaboración de Estudios y Diseños del referido contrato.

El presente documento que constituye el Informe de Obra No. 6 soporte de acta No 01 de obra, detalla en forma resumidalas actividades adelantadas por la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 al 28 de agosto de 2023, de la fase III en el contrato de obra No. SIOP-0082-2022

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo a los estudios previos realizados por el municipio de Cota Cundinamarca, en cabeza dela administración municipal, evidenció la necesidad de fomentar espacios y escenarios tendientes al desarrollo de actividades de participación social en materia cultura, por lo que se desarrolló el proceso administrativo para el proyecto "*ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA".*

En coherencia con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento de sus políticas y objetivos, la Administración Municipal de Cota adelantó la adquisición del predio denominado El Futuro, destinado entre otros para la construcción del proyecto para el arte y la cultura, denominado ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE
COTA, cuya finalidad es garantizar a la comunidad los espacios e infraestructura construida técnicamente, para la realización de las actividades artísticas y culturales al mayor número de la población posible e incentivando particularmente la participación y organización de la juventud; dicho proyecto deberá contar con una Biblioteca idónea para las necesidades del municipio, auditorios, teatros, salas de conferencias, salones adecuados para la enseñanza musical, dramatúrgica, dancística, de las artes plásticas, visuales y literarias, espacios para el ensayo de las agrupaciones musicales y ensambles de gran formato, estudios de grabación y producción audiovisual, camerinos, alojamientos para artistas y delegaciones, parqueaderos, zonas de bodegaje de implementos para las actividades de los distintos programas artísticos y culturales, zonas para la comercialización de productos, área administrativa; una infraestructura que cuente con todos los recursos tecnológicos idóneos para el desarrollo de las actividades y que cumpla con la normatividad vigente en cuanto a estructuras, espacios arquitectónicos en edificios de ocupación especial, diseños eléctricos, normatividad para acceso de población diversamente hábil y las demás normas aplicables al uso de tipo de espacios

*Tomado del documento: estudios previos "*ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".*

Dado lo anterior, mediante la modalidad de selección: Licitación Pública, convocatoria Pública SIOP-LPO-0001-2022, cuyo objeto ***ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,***

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

030106

LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. Dicha oferta se adjudicó mediante contrato ***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022*** a la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA***, con NIT 901.590.186-1, por un valor de VENTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029.500.000,00) M/CTE.

UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Complejo Cultural se llevará a cabo en el casco urbano del Municipio de Cota en el Predio denominado "El Futuro" en la vereda Cetime del municipio de Cota Cundinamarca, identificado conla matrícula inmobiliaria 50N-20770808.

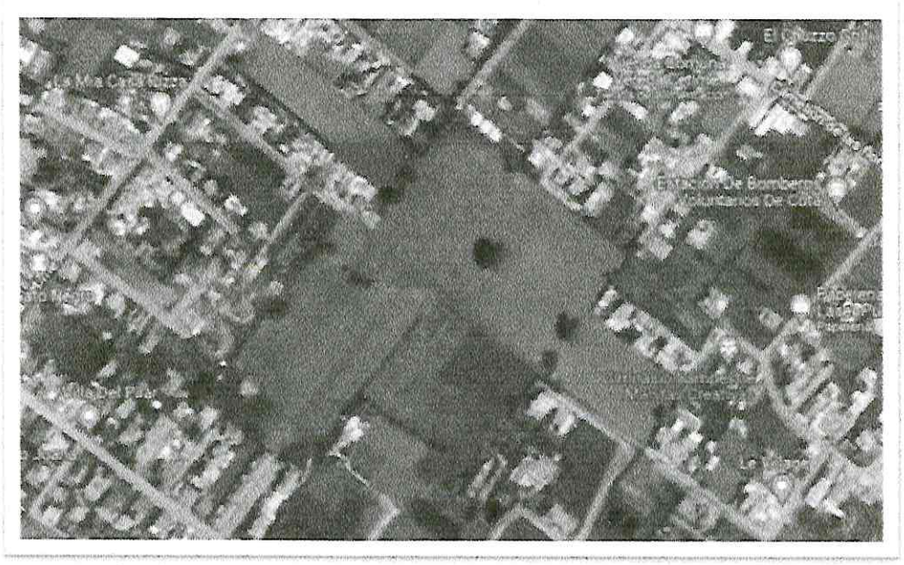


Ilustración 1 Ubicación del lote destinado para la implantación del proyecto

Cota es uno de los 116 municipios colombiano del departamento de Cundinamarca.3 Se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 6 km de Bogotá. Hace parte de la Región Metropolitanade Bogotá y del Altiplano Cundiboyacense. Su cabecera municipal se encuentra a 2.566 m s. n. m..3

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000107

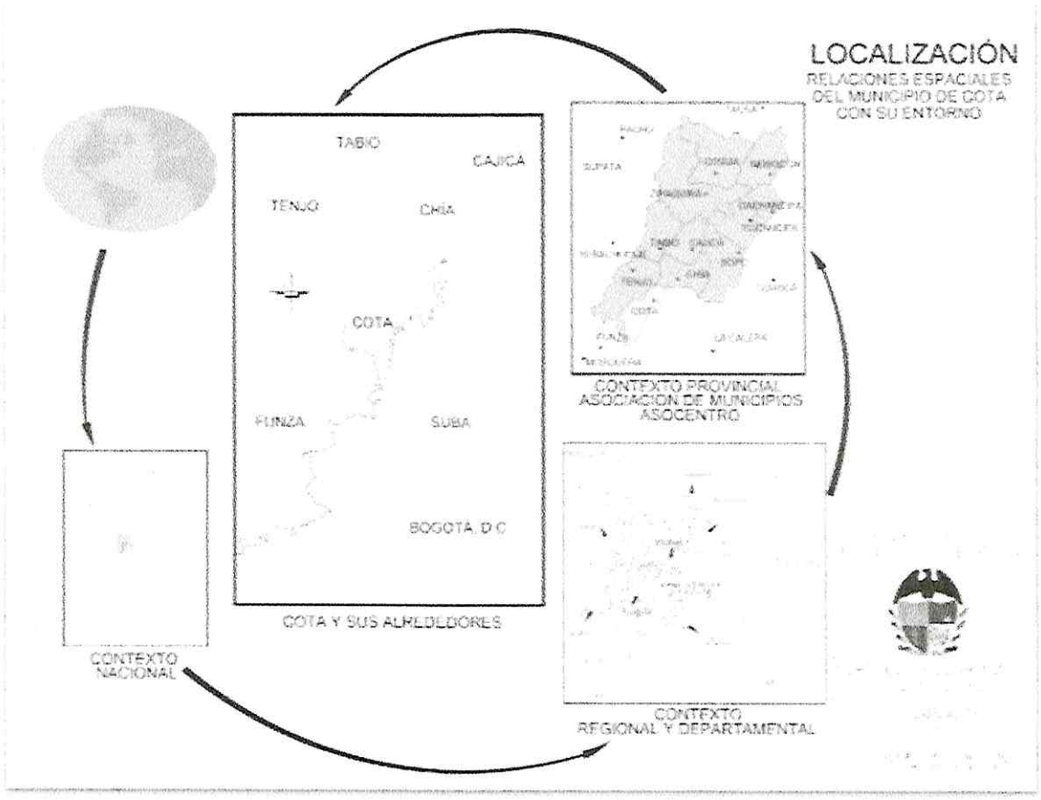


Ilustración 2 Ubicación general del proyecto Fuente: Galería de mapas Municipio de Cota Cundinamarca

El proyecto de **"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"** está ubicado en el predio denominado El Futuro en la vereda Cetime del municipio de Cota Cundinamarca, identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-20770808.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000108



Ilustración 3 Ubicación especifica del proyecto

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000109

DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL PROYECTO- CONDICIONES ORIGINALES

El contrato de "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO YCONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"
contempla las siguientes áreas de proyecto dividida en dependencias, de acuerdo a los estudiosprevios y al pliego de condiciones:

AREA	ALCANCE
ADMINISTRACIÓN:	Vestíbulo: recepción, hall espera. Administrador: director, secretaria. Sala de juntas. Archivo administración. Personal: coordinación auxiliar. Relaciones públicas: coordinación auxiliar. Contabilidad: contador auxiliar. Sanitarios: W.C. hombre-mujer. Aseo-cafetería: almacén.
ÁREA TÉCNICA:	Hall: recepción, vestíbulo hall. Sanitarios: W.C. hombre-mujer Dllo investigación: coordinador, sala juntas, bodega. Inventario: coordinador. Bodega: archivo. Curaduría/ restauración: curador, laboratorio.
ÁREA PÚBLICA:	Vestíbulo: hall interno, recepción, taquilla. Baños públicos: hombre-mujer. Foyer general: vestíbulo conexión. Museo: sala temporal (exp. Itinerantes), sala permanente, sala memoria. Biblioteca: acervo/estantes, coordinador, auxiliar, conservación /estampado cambio sala general, hall, sala infantil/ ludoteca, sonoteca/ videoteca. Biblioteca- servicios educativos: s. informática, s. talleres, sala clases, s. lectura, W.C. hombre - mujer. Auditorio (1200 personas) coliseo: vestíbulo, W.C. hombre-mujer, silletería, escenario, ingreso artistas, camerinos, bodega, ctrl sonido. Teatrino: área exterior.
ARTE:	- Administración: coordinador, s. profesores.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

AREA	ALCANCE
	Salones. especializados: arte infantil, pintura y dibujo, escultura, laboratorio de fotografía, robótica y nuevos medios, arte digital, centro de proyección audiovisual, estudio de fotografía y producción audiovisual. Talleres: telares, textiles y manualidades, maderas, cerámica, grabado, metales, duchas industriales, impresión 3D. Exposición: multisalón. Bodega general: materiales y herramientas, almacenaje decoración, bodega para obras de exposición o galería, audiovisuales y artes digitales.
DANZA:	Administración: coordinador, s. profesores. Multisalón: salón división. Salones especializados: e1: sala especializada "fuego", e 2: sala especializada "aire", e3: sala especializada "tierra". Sala de rehabilitación y fisioterapia: primeros auxilios. Camerino mujeres: batería de baños, duchas, vestier. Camerino hombres: batería de baños, duchas, vestier. Bodega general: estantes para vestuario y elementostécnicos para danza
TEATRO:	Administración: coordinador, profesores. Salón multifuncional: salón, teatro, estudio, cine y televisión. camerino. Salones especializados: salón de acrobacia, telas aéreas y gimnasia, salón de teatro de sala musical, salón de teatro sala 1, salón de teatro sala 2, salón de teatro sala3, salón de teatro sala 4. Cancha cubierta. Vestier/ duchas. Bodega general de 40 mts por 20 metros: bodega de escenografía, bodega de utilería, bodega de vestuario, bodega de maquinaria y equipos.
MÚSICA:	Administración: coordinador, s. profesores, atención apúblico. Salones especializados: iniciación musical, agrupaciones, ensamble mediano, pianos, salón de piano avanzado, sección de percusión.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

AREA	ALCANCE
	Cátedra: cabinas insonorizadas, salones para clases,salones para seccionales, salones de teoría. Bodega instrumentos: estantes. Bodega general: estantes
SERVICIOS GENERALES	Estacionamiento: motos, carros. Zona. carga/descarga: almacén. Vigilancia: vigilancia. Control/ seguridad: puesto control. Área mantenimiento: mantenimiento. Bodega general: estantes. S/E eléctrica: tableros. Cuarto máquinas: tanques almacén. Sanitarios empleados: W.C. hombre –mujer. Shut de basuras: disposición final residuos sólidos.
ZONA COMERCIAL:	Comercio/souvenir: local ventas. Circulación: hall. Café: mesas, preparación. Área mantenimiento: aseo/bodega. Restaurantes: mesas, preparación, W.C. hombre-mujer
ZONA PARQUEADERO:	Estacionamientos. Cajas. Zonas de traslado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra Pública: **No SIOP-0082-2022** que tiene por objeto la "**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA**", es ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, de acuerdo al pliego de condiciones y la oferta presentada.

El proyecto se compone de 3 fases:

FASE I: Elaboración de estudios y diseños (Plazo 3 meses).

FASE II: Licenciamiento (Plazo 1 mes).

FASE III: Construcción (Plazo 12 meses).

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000112

INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIOP-0082-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT	901590186-1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA No.	SIOP-0082-2022.
OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA (Nombrado mediante Modificatorio al Documento de Conformación Consorcial del 5 de Septiembre de 2022)
PLAZO INICIAL	DIECISÉIS (16) MESES
ADICIÓN FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS(902.219.533,57) CON PLAZO DE UN MES PARA LA FASE I
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	13 de Julio de 2022
FECHA ACTA DE INICIO FASE III	15 de agosto del 2023
FECHA DE TERMINACION	11 de abril del 2024
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cota Cundinamarca pagará al contratista el valor del Contrato de la siguiente manera: FASE III – CONSTRUCCIÓN COMPLEJO CULTURAL COTA CUNDINAMARCA. El 90% del valor de la Fase III del contrato se pagarámediante actas de corte parcial por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría del proyecto. Un pago final equivalente al 10% del valor de la FaseIII, una vez se suscriba el acta de terminación de obray suscrita el acta de recibo final de obra. Los cortes se efectuarán de conformidad con el avance deobra ejecutada, por el sistema de precios unitarios.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**COSTO DIRECTO** VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029'500.000.00)M/CTE
INTERVENTOR	**UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL-CONTRATO SIOP-0083-2022**
SUPERVISOR DE PROYECTO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	MARIO ALBERTO FIQUITIVA CASALLAS

POLIZAS ACTUALIZADAS CON ULTIMA NOVEDAD CONTRACTUAL, SEGÚN ACTA DE INICIO DE LA FASE III OBRA , DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-40-101049560	15/08/2022	30/06/2024	$523.100.000,00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	11-40-101049560	05/09/2022	31/12/2026	$261.550.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	11-40-101049560	30/11/2023	31/12/2028	$523.100.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101049560	05/09/2022	31/12/2023	$1.351.475.000,00

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. MODIFICATORIO 1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL

Mediante documento suscrito el día 5 de septiembre de 2022, la Unión Temporal Cultural en Cota se realizó la modificación del documento de Conformación de Unión Temporal Cultural en Cota dondela empresa ERINCO S.A.S. cede su participación del 40% dentro de la UT Cultural en Cota a la empresa INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S identificada con NIT.900.803.956-7, que mediante Resolución No. 1452 del 05 de septiembre de 2022 el Municipio de cota realizo autorización. Así mismo se da cambio de representación legal nombrando al señor JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.844.495 de Riohacha quien será representante legal de la Unión Temporal Cultural en Cota

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022

VALOR INICIAL	$ 27.029.500.000,00	100%
VALOR FASE 1 INICIAL	$ 2.615.500.000,00	9,68%
VALOR ADICION 1 FASE 1	$ 902.219.533,57	
VALOR ACTUALIZADO FASE1	3.517.719.533,57	
VALOR FASE 2	0,00	
VALOR FASE 3	$ 24.414.000.000,00	90,32%
VALOR ACTUALIZADO	**$ 27.931.719.533,57**	**100%**
VALOR ANTICIPO	**N/A**	**N/A**
VALOR EJECUTADO FASE 1	**$ 2.371.604.625,00**	
VALOR EJECUTADO FASE 3	**$ 3.662.337.807,97**	

El valor ejecutado a la fecha de la fase 3, se presenta anexa al presente informe para la respectiva acta de avance de obra No 1 y su respectivo pago. Por un valor de $3.662.337.807,97.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

5. ENTREGABLES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Para el desarrollo de los Estudios técnicos y Diseños del proyecto, se emplearon los procedimientosde diseño arquitectónico y ejecución de estudios técnicos, que permitan el logro de las metas propuestas, así como el cumplimiento del alcance en términos técnicos y de productosplanteados .

6. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022

Dentro del alcance del contrato de obra esta desarrollar los siguientes alcances

Ejecutar en la FASE I del contrato de obra No. SIOP-0082-2022, los Estudios y Diseños DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA dando estricto cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas para los diseños de estas edificaciones de ocupación especial. En esta fase se establecerán todos los diseños técnicos que comprende todos los Estudios y Diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos detallados, análisis de precios unitarios debidamente firmados por cada profesional de la especialidad y la consultoría, deben ser aprobados y aceptados por el municipio de Cota y la Interventoría.
Con los diseños, se establecerán las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuestofinal del proyecto. Los diseños serán aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio de Cota, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobación definitiva de la Interventoría y del municipio de Cota. Se tiene un plazo de tres (3) meses para desarrollar esta etapa.

Ejecutar en la FASE II del contrato de obra No. SIOP-0082-2022, el LICENCIAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA, con un plazo de un (1) mes. Es responsabilidad del contratista tramitar ante las autoridades competentes las licencias querequiera el proyecto para su adecuado desarrollo y garantizando la ejecución de forma completa del proyecto y disponibilidad completa de servicios públicos, entre otras cosas comprende las siguientes actividades obligatorias:

Facilitar a la Interventoría y/o el Supervisor por parte del municipio de Cota, la oportuna aprobación definitiva de los Estudios y Diseños en este periodo de tiempo.
Tramitar Licencia de Urbanismo con referencia a la ejecución de planosarquitectónicos, estructurales, eléctricos incluidos voz y datos, hidrosanitarios, red de incendios, gases, estudios de suelos, ambiental, PMT en caso de requerirse y los demás que sean necesarios para realizar la construcción del proyecto.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Licencia de Construcción Obra Nueva, referida a los diseños y planos arquitectónicos,estructurales y Estudios de Suelos.

Ejecutar en la FASE III del contrato de obra No. SIOP-0082-2022, la CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA en un plazo de doce (12) meses que comprende la ejecución de todas las actividades inherentes a la infraestructura diseñada, conforme a los planos y especificaciones previamente aprobados por la Interventoría y/o el Supervisor por parte del municipio de Cota y las respectivas Licencias otorgadas para el proyecto y el cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas para la construcción de edificaciones de ocupación especial.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000118

		FASE 3- ACTA DE OBRA No. 1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082-2022		
		FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2022			
		FECHA DE SUPENSIÓN No. 1: 24 DE OCTUBRE DE 2022	PLAZO DE EJECUCIÓN: 16 MESES		
		FECHA DE REINICIO 1: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022			
		FECHA DE SUPENSIÓN No. 2: 3 DE ABRIL DE 2023			
		FECHA DE REINICIO 2: 30 DE JUNIO DE 2023			
		ACTA DE INICIO FASE 3: 15 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:11 DE ABRIL DE 2024		
ITEM	COD.GOB CUND ICCU / EPC	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	% AVANCE
		ADECUACION CASA OFICINAS			
1.001	ICCU-1.11	DEMOLICION PISOS	M2	71.25	100.00
1.002	ICCU-1.12	DEMOLICION ENCHAPES	M2	12.89	100.00
1.003	ICCU-2.8	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJON	M3	10.62	100.00
1.004	ICCU-16.8	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	5.56	100.00
1.005	ICCU-1.38	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	6.00	100.00
1.006	ICCU-1.39	DESMONTE VENTANAS	UN	6.00	100.00
1.007	ICCU-13.4	AFINADO DE PISOS	UN	64.00	100.00
1.008	ICCU-6.17	PAÑETE MUROS	M2	169.67	100.00
1.009	ICCU-1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	23.00	100.00
1.010	ICCU-7.23	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	46.00	100.00
1.011	ICCU-11.20	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3.00	100.00
1.012	ICCU-12.2	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	28.00	100.00
1.013	ICCU-14.1	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	64.00	100.00
1.014	ICCU-9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TABLA CHAPA 0.15M	UN	6.00	100.00
1.015	ICCU-10.19	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7.97	100.00
1.016	ICCU-18.23	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	169.67	100.00
1.017	ICCU-17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	1.00	100.00
1.018	ICCU-17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	100.00
1.019	ICCU-15.5	CIELO RASO DRYWALL	M2	64.00	100.00
		ADECUACION CASA ALMACEN			
1.041	ICCU-1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	m^2	1,760.85	100.00
1.042	ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m^2	7,134.00	100.00
1.043	ICCU-1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M	m^2	1,760.85	100.00
		SUB TOTAL PRELIMINARES			
		BLOQUE No. 2 MUSICA			
2.000	COD.GOB CUND ICCU / EPC	CIMENTACION	UN	CANTIDAD TOTAL	
2.001	APU-2.1	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	51.00	100.00
2.002	APU-2.2	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	128.00	100.00
2.003	APU-2.3	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	560.00	100.00
2.004	APU-2.4	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	384.00	100.00
2.011	ICCU-4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	40,005.00	32.49
		SUB TOTAL CIMENTACIÓN			
3.000	COD.GOB CUND ICCU / EPC	ESTRUCTURA	UN	CANTIDAD TOTAL	
3.001	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	21,096.49	15.00
		BLOQUE No. 3 TEATRO			
2.000	COD.GOB CUND ICCU / EPC	CIMENTACION	UN	CANTIDAD TOTAL	
2.001		CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	52.00	100.00
2.002	APU-2.2	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	360.00	100.00
2.003	APU-2.3	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	126.00	100.00
2.004	APU-2.4	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	564.00	100.00
		SUB TOTAL - CIMENTACION			
3.000	COD.GOB CUND ICCU / EPC	ESTRUCTURA	UN	CANTIDAD TOTAL	
3.001	ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	150,255.58	15.00
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			
19.001	APU-19.1	SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES	UN	2.00	100.00
		SUB TOTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			

Ilustración 4. Avance del presente periodo

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

A continuación, se muestra el porcentaje acumulado de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe en el avance de obra:

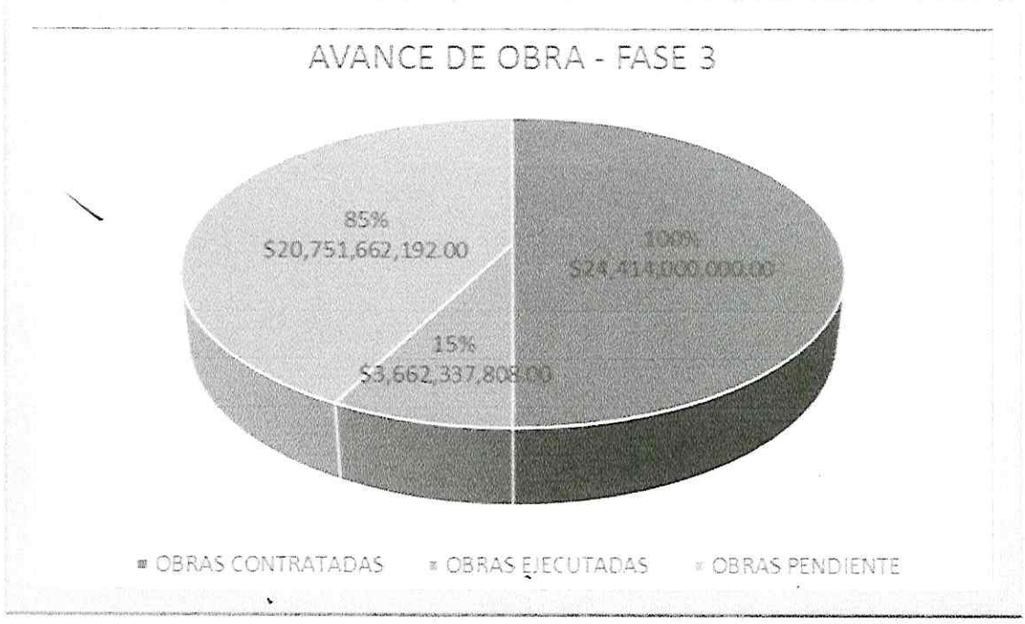


Ilustración 5. Avance de Obra.

Para el período del mes de agosto de 2023, teniendo en cuenta el reinicio de obra según el acta de fecha del 15 de agosto, se tuvo un avance de obra del 15% sobre el 100% de la obra, por un valor de $3.662.337,808.00 correspondiente a las obras ejecutadas en los capítulos preliminares, cimentación y estructuras, (trabajos en taller corte y ensamblé de perfilaría metálica), sobre el diseño arquitectónico y diseño estructural, diseños hidráulicos, sanitarios y otros fluidos, eléctricos, presupuesto de obra, programación de obra, coordinación de estudios técnicos y diseños.

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000120

8. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO.

En la Fase III de Construcción y ejecución de obra, se realizaron las siguientes actividades en el periodo del informe.

8.1. PRELIMINARES

Las Obras Preliminares son un conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante de una construcción para establecer, delimitar y proteger el terreno mismo y las construcciones colindantes, así como también facilitar y permitir el inicio de los trabajos de construcción

Teniendo en cuenta la conceptualización arquitectónica y lo acordado entre la interventoría y el municipio de cota, se consolido el proyecto arquitectónico con las siguientes actividades:


8.1.1 ADECUACION CASA A OFICINA

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTACUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022
INFORME DE AVANCE PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2023	
ADECUACIÓN CASA OFICINAS	
FECHA 15/08/2023	EDICIFIO CAMPAMENTO
DESCRIPCIÓN: Labores requeridas para lograr convertir el espacio en oficinas adecuadas dentro de la obra. Incluye: demolición de pisos y enchapes, retiro de marcos, ventanas y puertas, relleno del piso, instalación depuntos sanitarios y eléctricos, acabados de piso y paredes, instalación de ventanas, puertas, cielo raso e implementos de baño.	
REGISTRO	

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674


000121




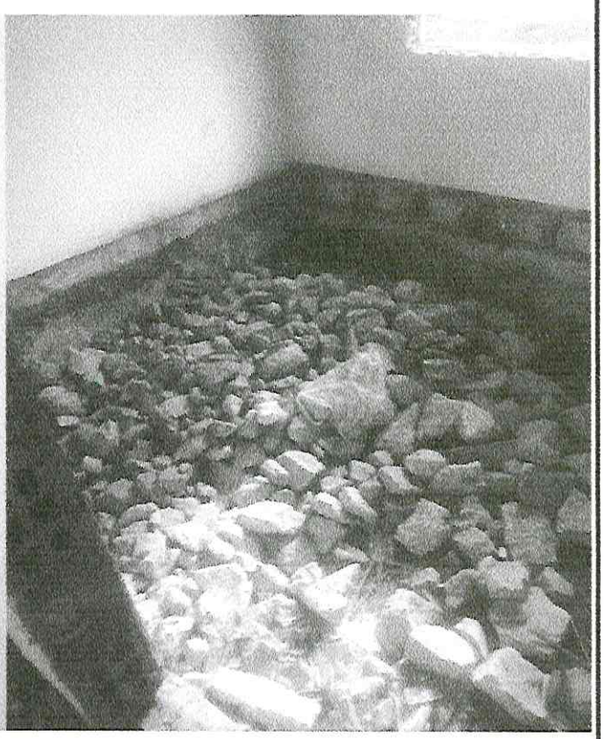

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000122

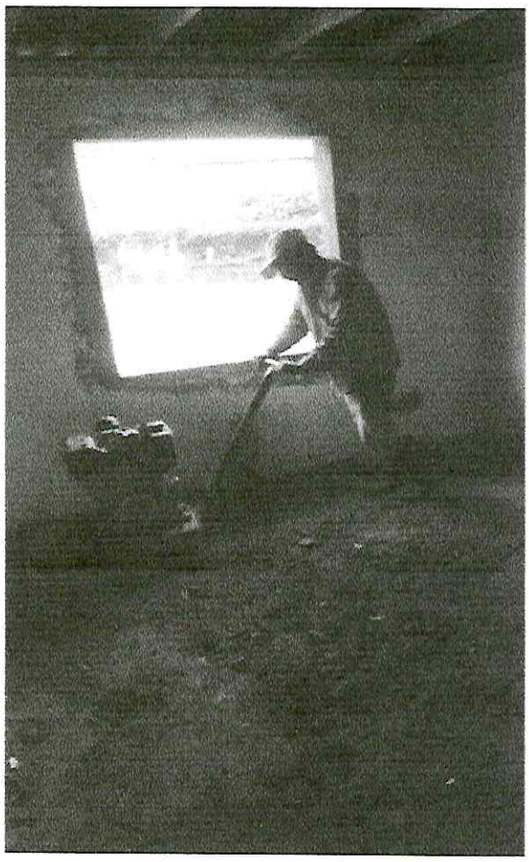

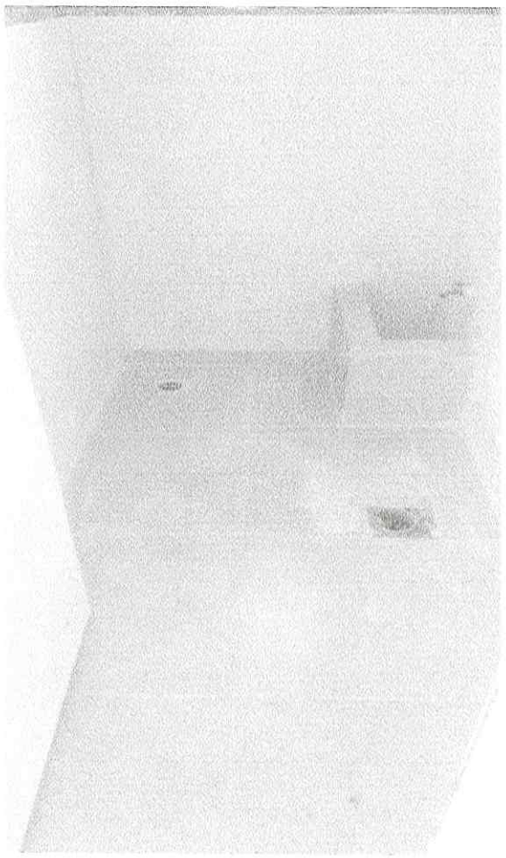



Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000123







OBSERVACIONES
Labores realizadas del 15 al 26 de agosto de 2023 con un valor de $30´127,507,621. Incluye del ítem 1.001 al 1.024

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000124

8.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA DICIEMBRE DEL 2022	UT CULTURA EN COTA

OBJETO CONTRATO: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA
CONTRATO No SIOP- 0052 - 2022

CAPITULO	PRELIMINARES	
ITEM	1.041	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION
UNIDAD		

LOCALIZACION	AREA	TOTAL	NOTAS
BLOQUE2 (MUSICA)	791.95		
BLOQUE3 (BIBLIOTECA)	969		
URBANISMO.	1760.95		








Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

030125


8.1.3 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M APILE A 15 M.


ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA MEJORAMIENTO DEL ANFITEATRO DEL COLEGIO VALIDEZ DEL 2022		UT CULTURA EN COTA
CONTRATO DE OBRA No. 1510-0084-2022			
CAPITULO		ITEM APROBADO	
ITEM	1.042	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M APILE A 15 M.	
UNIDAD			
LOCALIZACION	CANTIDAD	TOTAL	PARCIAL
	7.534	7.534	





ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA MEJORAMIENTO DEL ANFITEATRO DEL COLEGIO VALIDEZ DEL 2022		UT CULTURA EN COTA
CONTRATO DE OBRA No. 1510-0084-2022			
CAPITULO		ITEM APROBADO	
ITEM	1.043	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	
UNIDAD			
LOCALIZACION	CANTIDAD	TOTAL	PARCIAL
	7.534	7.534	
	1.883	1.883	

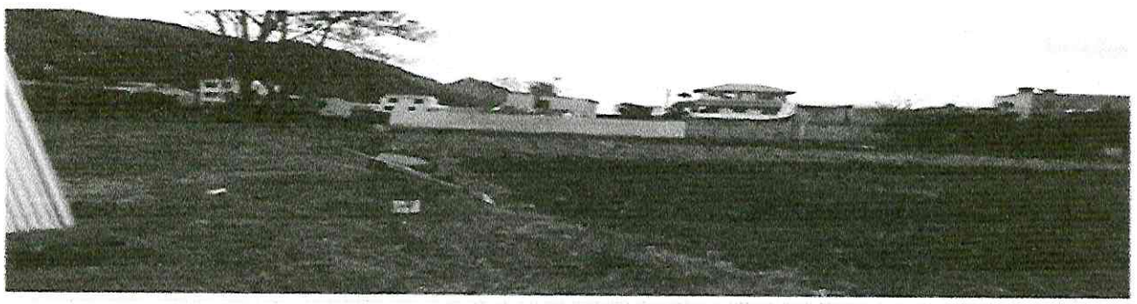

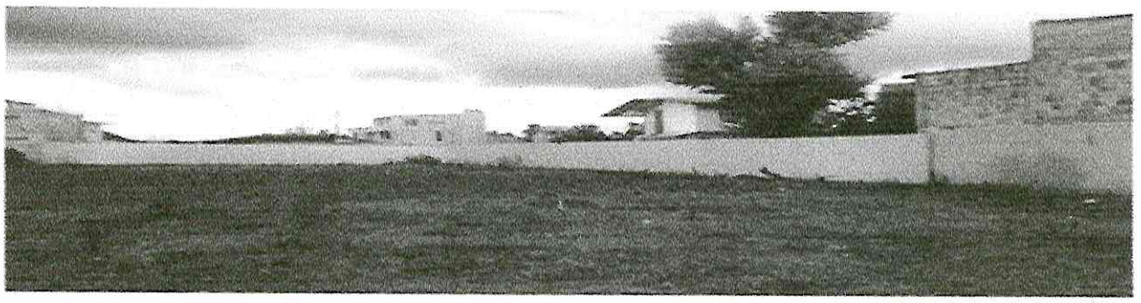

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674


000126

8.1.4 DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20 M.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA	
	CENTRO CULTURAL COTA	
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
	DICIEMBRE DEL 2022	UT CULTURA EN COTA

OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.
CONTRATO No SIOP-0082-2022

CAPITULO	PRELIMINARES		
ITEM	1.043	DESCAPOTE A MAQUINA E=20CMS	
UNIDAD	m2		
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	NOTAS
EDIFICIO 2	791.85	791.85	
EDIFICIO 3	969	969	

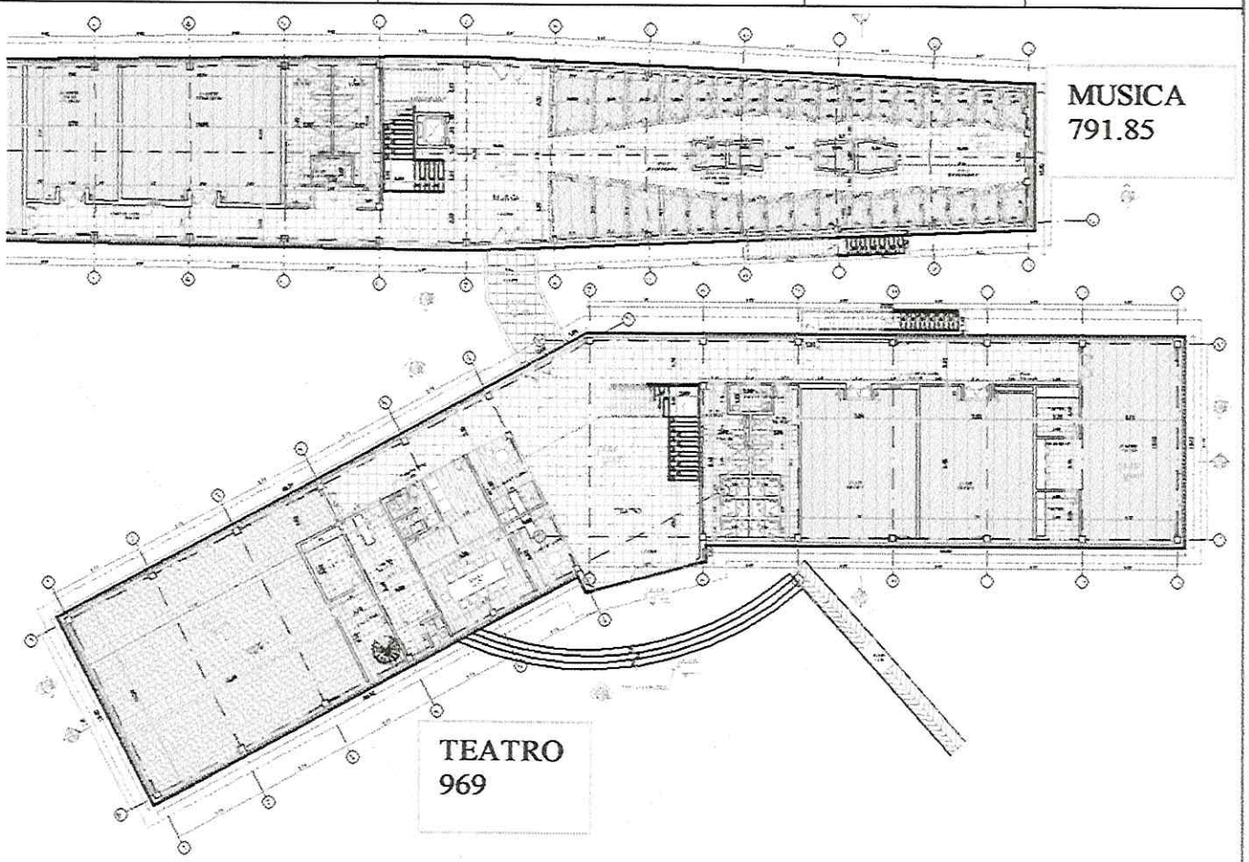

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000127

8.2. CIMENTACION.


Durante este periodo se adelantaron trabajo de cimentación general del proyecto (Tipo Pilotes),Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales.


8.2.1. CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO DE PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTS A O.80 MTS.

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022
INFORME DE AVANCE PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2023	
PILOTAJE	
FECHA 15/08/2023	EDICIFIO TEATRO Y MUSICA

DESCRIPCIÓN:
Incluye todas las actividades realizadas para la correcta construcción de los pilotes de ambas edificaciones. Se realizó excavación de prehuecos entre 50 y 80 centímetros, llenado con arena, excavaciones manuales.

REGISTRO



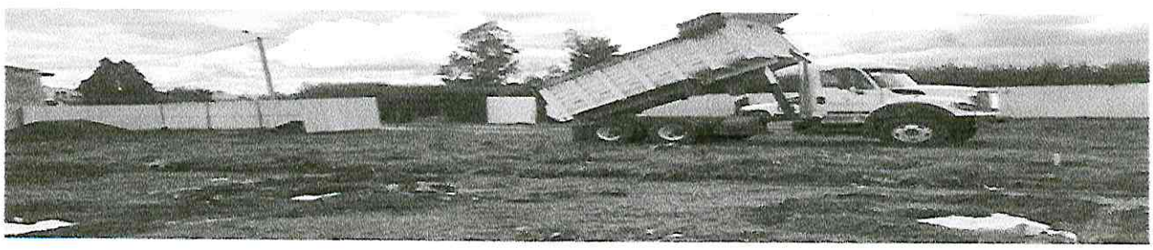

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: *jcurielcon@hotmail.com,*
Celular: *3007658674*

8.2.2. PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE ENTRE 0.50 MTS, 0.60 MTS Y .80 CM.

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022


INFORME DE AVANCE PERIODO DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DE 2023

PILOTAJE

FECHA	15/08/2023	EDICIFIO	TEATRO Y MUSICA

DESCRIPCIÓN:
Incluye todas las actividades realizadas para la correcta construcción de los pilotes de ambas edificaciones. Se realizó excavación de prehuecos entre 50 y 80 centímetros, llenado con arena, excavación con sistema de hélicecontinua (tornillo) entre 20 y 22 metros, prueba de asentamiento al concreto, toma de cilindros de prueba del concreto, fundido del pilote e instalación de la parrilla metálica.

REGISTRO

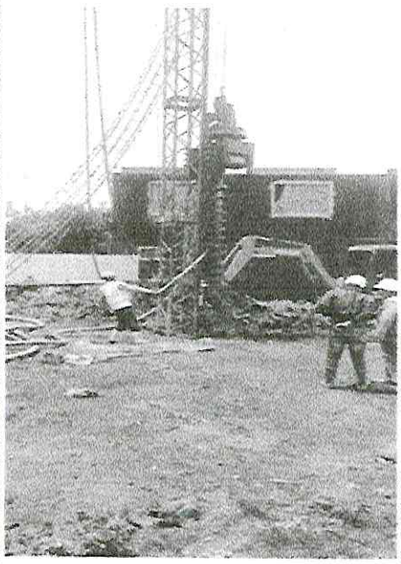





Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: *jcurielcon@hotmail.com,*
Celular: *3007658674*

000130








Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674



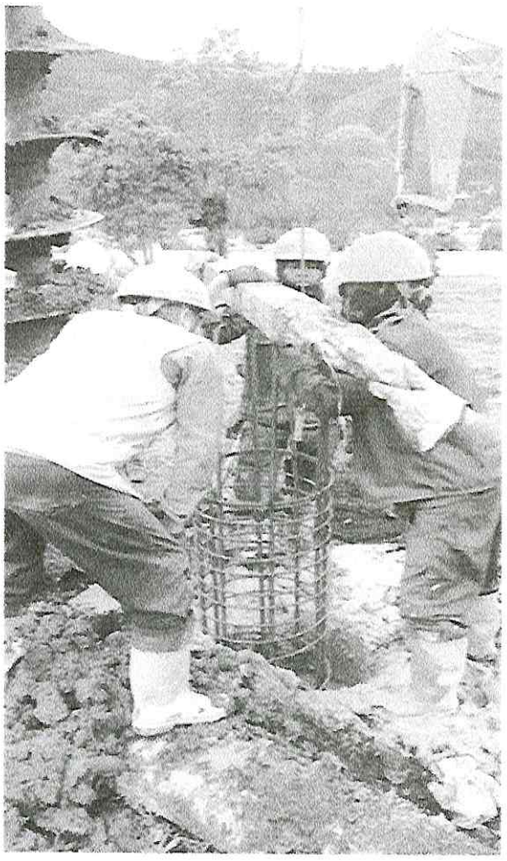



Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: *jcurielcon@hotmail.com,*
Celular: *3007658674*








Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: *jcurielcon@hotmail.com,*
Celular: 3007658674




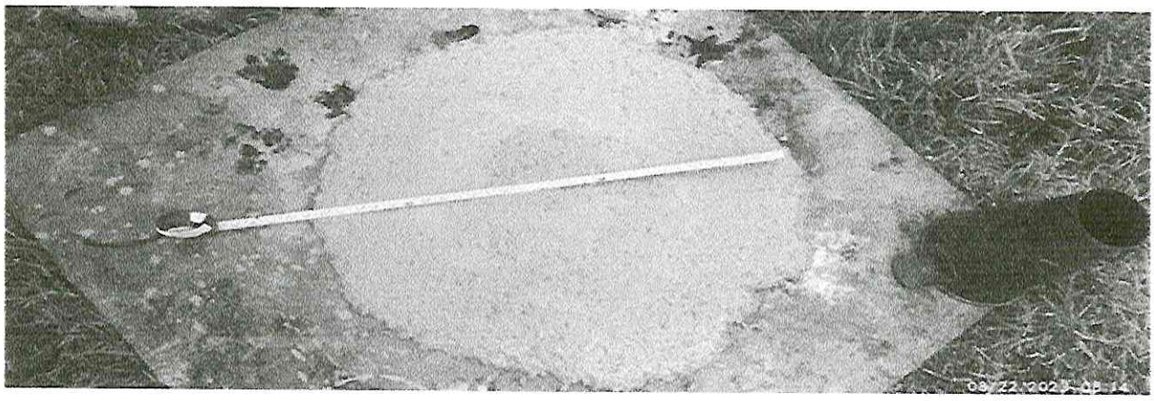




Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000134

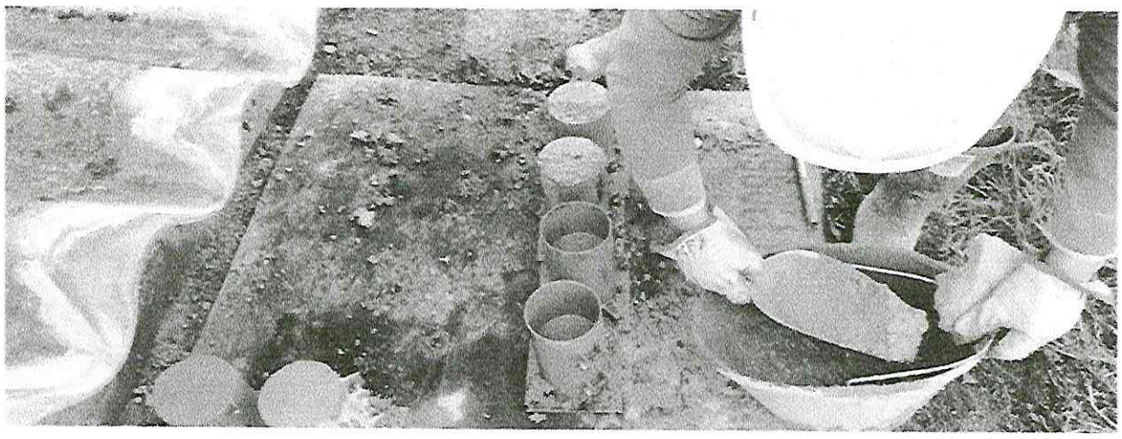

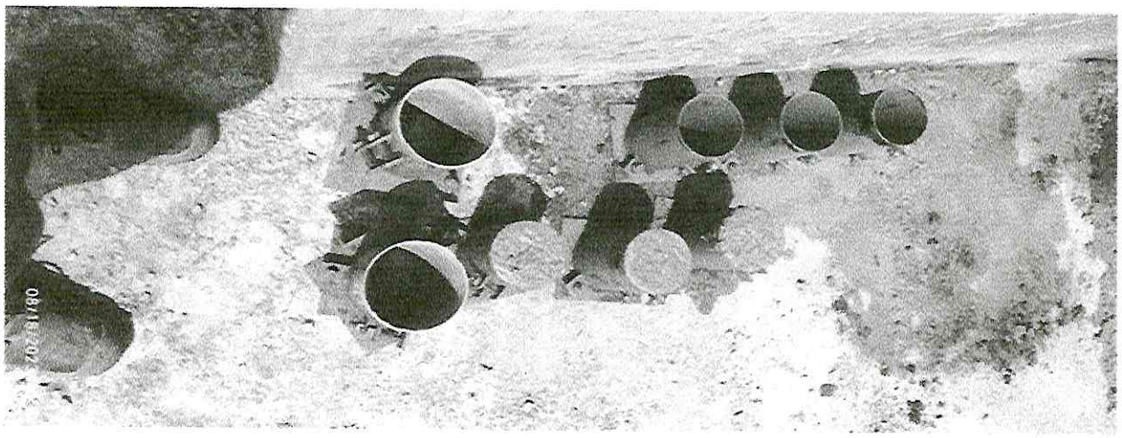

OBSERVACIONES
Labores realizadas del 15 y al 26 de agosto de 2023 con un valor de $1.590´852.804 Incluye 2.001 a 2.004 de teatro y música

789.130.804
801.722.000
1590.852.804 ✓


Carrera 18 No. 137-11 Bogotá,
Email: jcurielcon@hotmail.com,
Celular: 3007658674

000135

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	1	ID PILOTE	52
FECHA DE EXCAVACIÓN	15/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

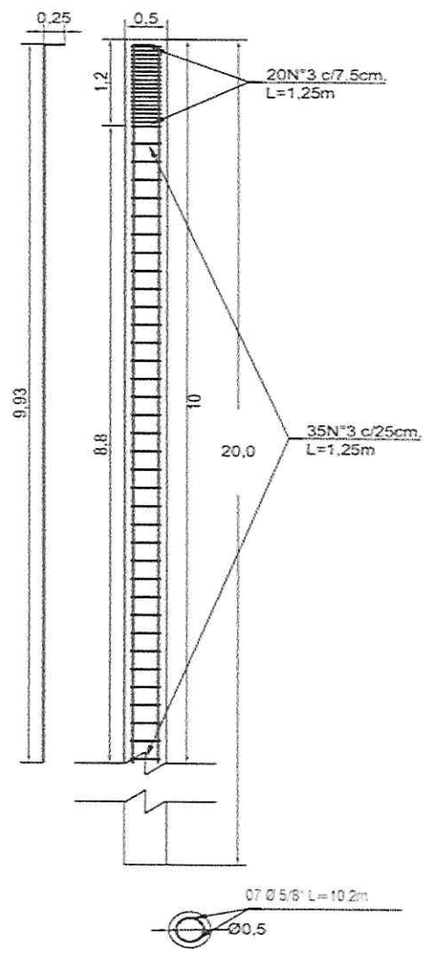

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	8:10
HORA FINAL EXCAVACIÓN	8:39
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:29
HORA INICIO FUNDIDO	8:39
HORA FINAL FUNDIDO	8:54
TIEMPO FUNDIDO	0:15
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	38%


OBSERVACIONES

000136

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	2	ID PILOTE	48
FECHA DE EXCAVACIÓN	15/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

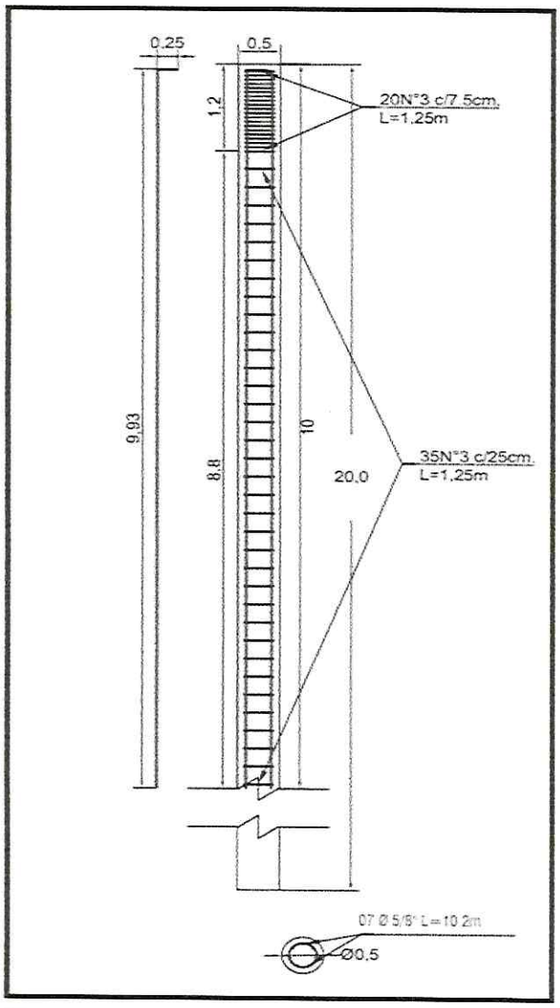


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	9:05
HORA FINAL EXCAVACIÓN	9:31
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:26
HORA INICIO FUNDIDO	9:37
HORA FINAL FUNDIDO	9:54
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	4.75
% EXPANSIÓN	20%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	3	ID PILOTE	44
FECHA DE EXCAVACIÓN	15/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

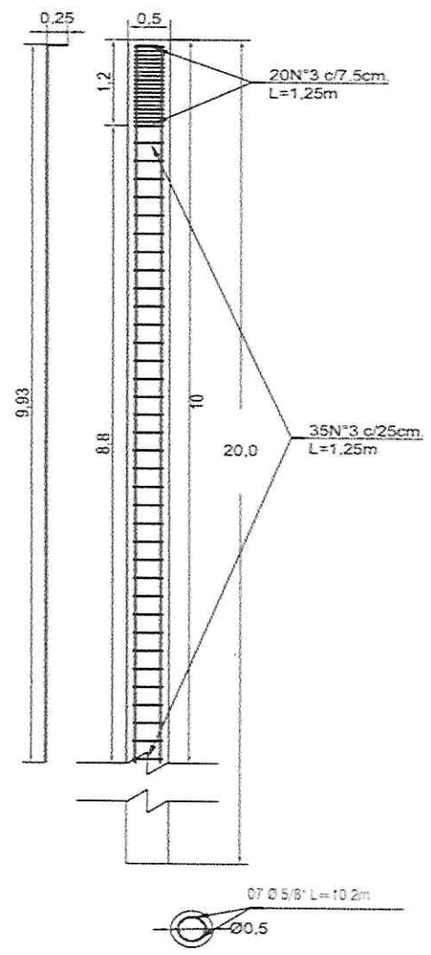


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	10:03
HORA FINAL EXCAVACIÓN	10:21
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:18
HORA INICIO FUNDIDO	10:34
HORA FINAL FUNDIDO	10:49
TIEMPO FUNDIDO	0:15
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.25
% EXPANSIÓN	32%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	4	ID PILOTE	41
FECHA DE EXCAVACIÓN	15/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

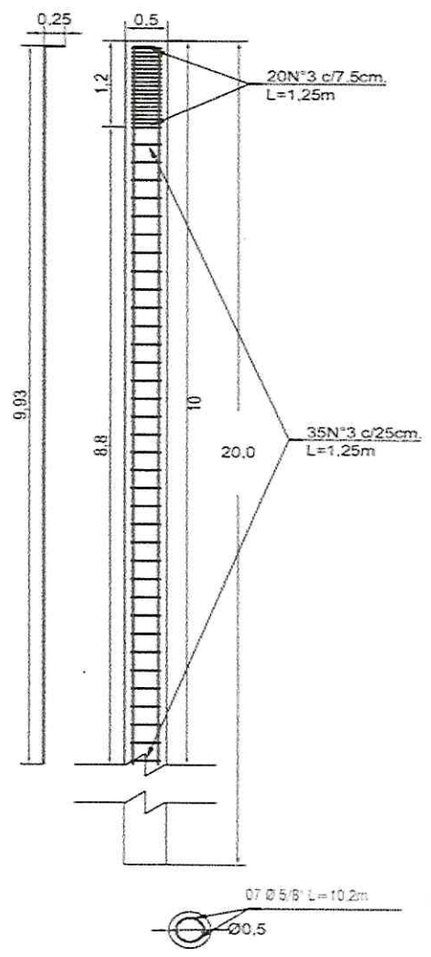


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	11:12
HORA FINAL EXCAVACIÓN	11:29
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:17
HORA INICIO FUNDIDO	11:29
HORA FINAL FUNDIDO	11:46
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	6.25
% EXPANSIÓN	57%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	5	ID PILOTE	45
FECHA DE EXCAVACIÓN	15/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

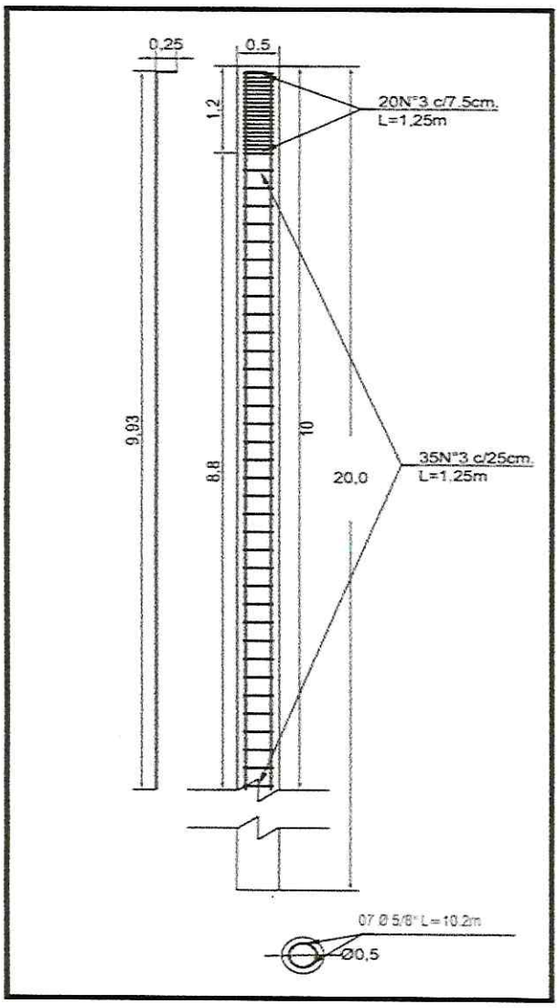


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	11:59
HORA FINAL EXCAVACIÓN	12:25
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:26
HORA INICIO FUNDIDO	12:40
HORA FINAL FUNDIDO	12:55
TIEMPO FUNDIDO	0:15
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.25
% EXPANSIÓN	32%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	6	ID PILOTE	49
FECHA DE EXCAVACIÓN	15/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

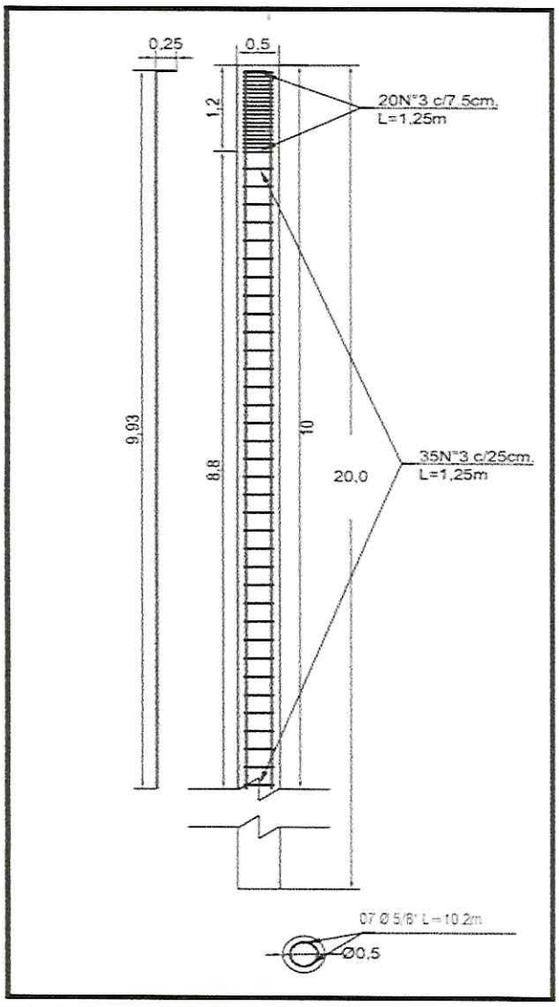

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	14:10
HORA FINAL EXCAVACIÓN	14:39
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:29
HORA INICIO FUNDIDO	14:39
HORA FINAL FUNDIDO	14:52
TIEMPO FUNDIDO	0:13
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.25
% EXPANSIÓN	32%


OBSERVACIONES

000141

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	7	ID PILOTE	51
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

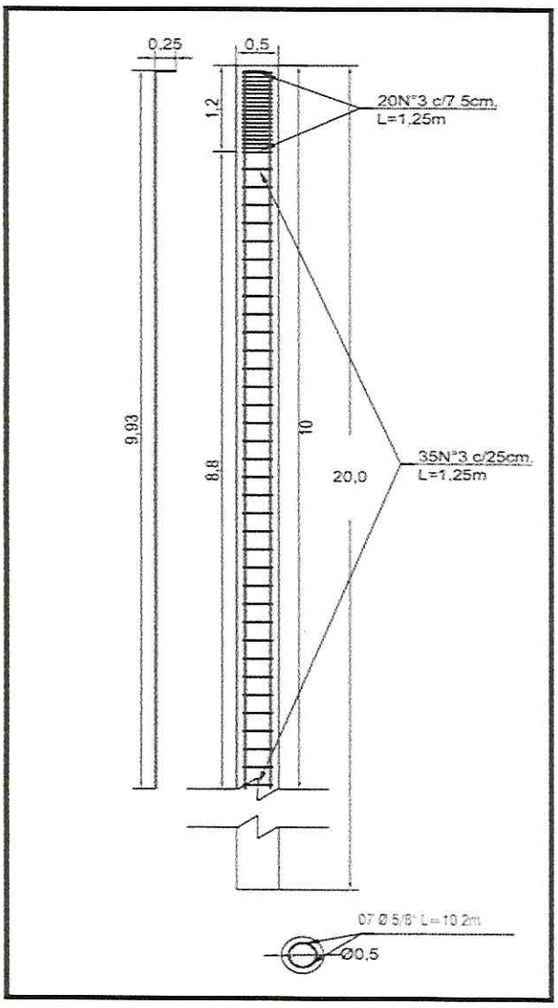


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	7:05
HORA FINAL EXCAVACIÓN	7:33
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:28
HORA INICIO FUNDIDO	7:33
HORA FINAL FUNDIDO	7:49
TIEMPO FUNDIDO	0:16
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	38%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	8	ID PILOTE	47
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

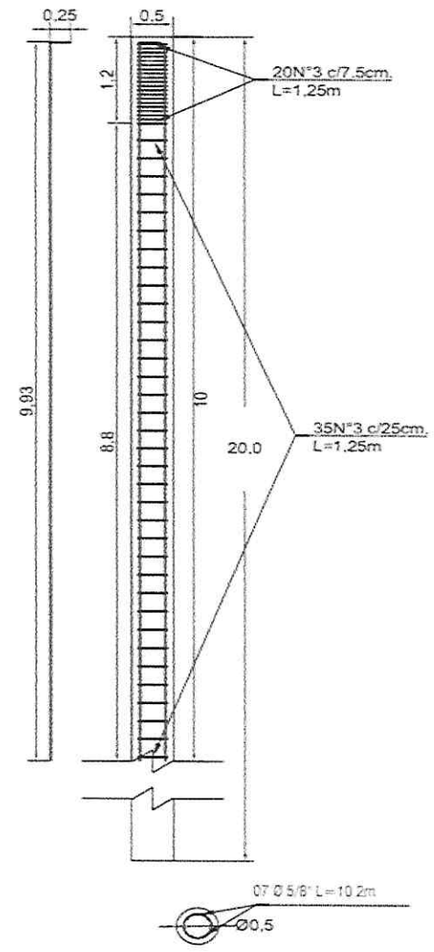


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	7:55
HORA FINAL EXCAVACIÓN	8:17
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:22
HORA INICIO FUNDIDO	8:32
HORA FINAL FUNDIDO	8:48
TIEMPO FUNDIDO	0:16
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.75
% EXPANSIÓN	45%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	9	ID PILOTE	43
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

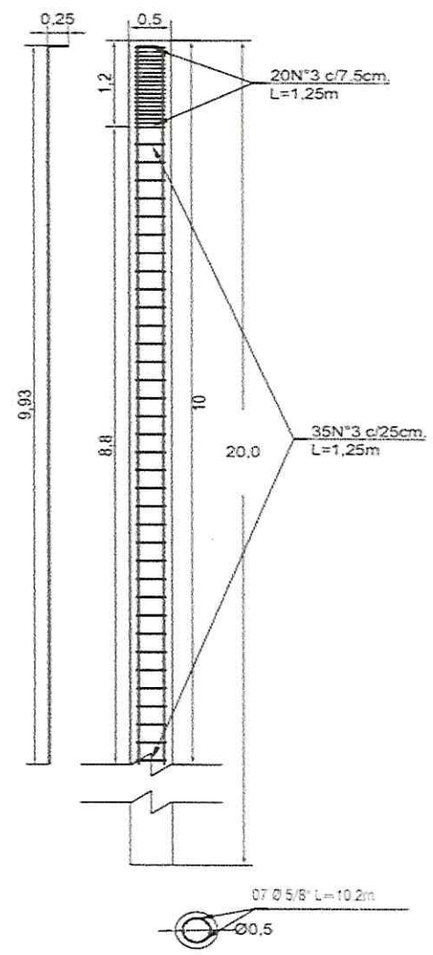


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	9:01
HORA FINAL EXCAVACIÓN	9:29
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:28
HORA INICIO FUNDIDO	9:29
HORA FINAL FUNDIDO	9:44
TIEMPO FUNDIDO	0:15
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	38%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	10	ID PILOTE	42
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

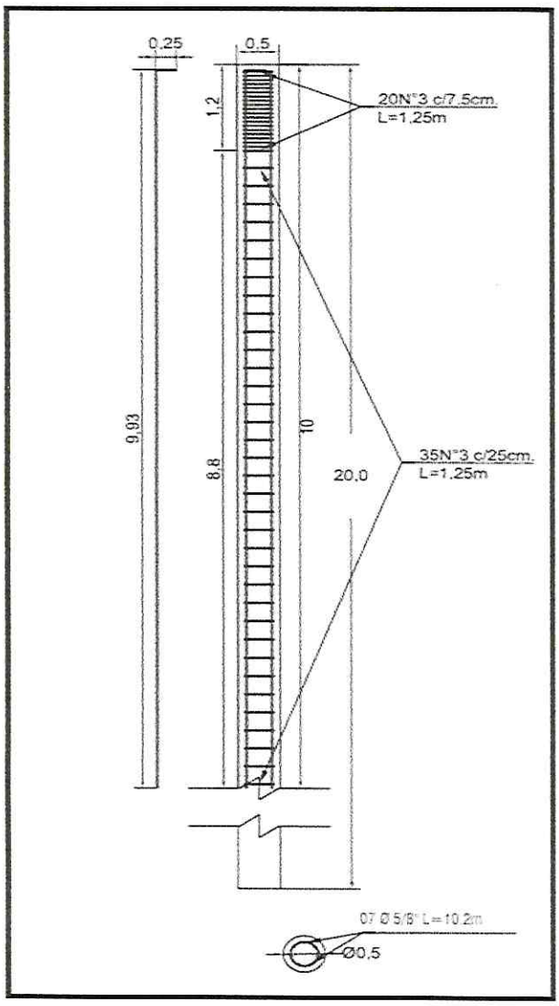


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	9:50
HORA FINAL EXCAVACIÓN	10:19
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:29
HORA INICIO FUNDIDO	10:28
HORA FINAL FUNDIDO	10:40
TIEMPO FUNDIDO	0:12
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	38%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	11	ID PILOTE	46
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

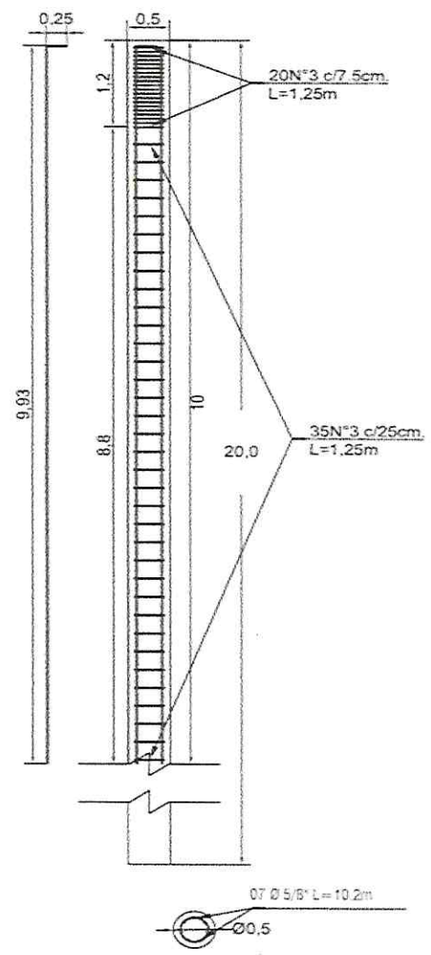

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	10:47
HORA FINAL EXCAVACIÓN	11:14
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:27
HORA INICIO FUNDIDO	11:14
HORA FINAL FUNDIDO	11:31
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5
% EXPANSIÓN	26%


OBSERVACIONES

000146

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	12	ID PILOTE	50
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

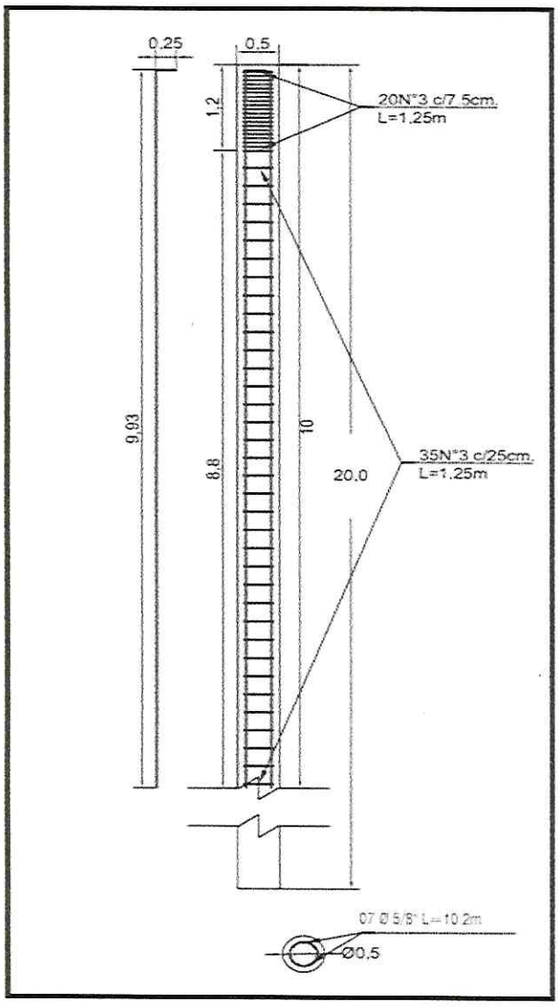


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	11:22
HORA FINAL EXCAVACIÓN	11:43
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:21
HORA INICIO FUNDIDO	11:43
HORA FINAL FUNDIDO	12:00
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	6
% EXPANSIÓN	51%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	13	ID PILOTE	29
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

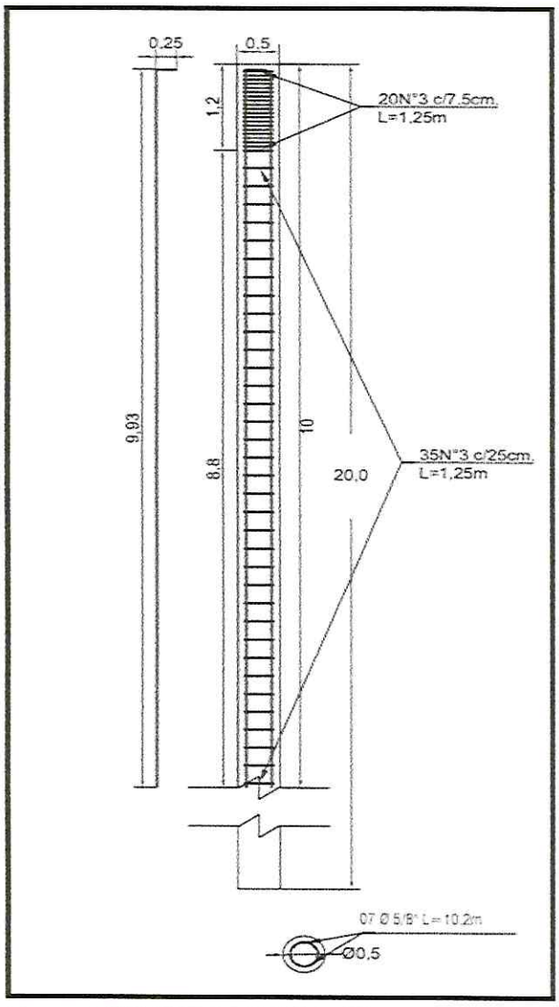


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	11:49
HORA FINAL EXCAVACIÓN	12:06
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:17
HORA INICIO FUNDIDO	12:06
HORA FINAL FUNDIDO	12:18
TIEMPO FUNDIDO	0:12
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.75
% EXPANSIÓN	45%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	14	ID PILOTE	27
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

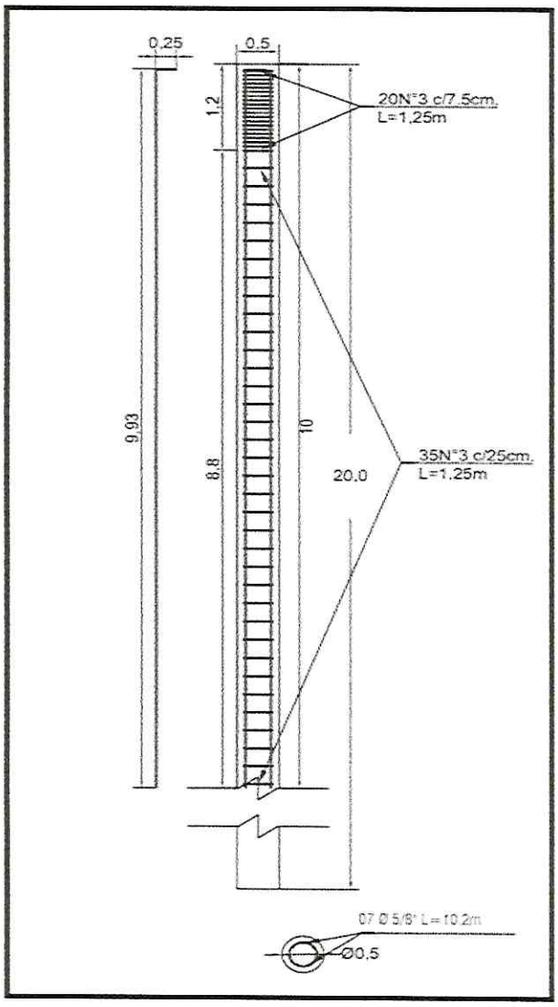


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	13:02
HORA FINAL EXCAVACIÓN	13:30
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:28
HORA INICIO FUNDIDO	13:30
HORA FINAL FUNDIDO	13:46
TIEMPO FUNDIDO	0:16
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	6
% EXPANSIÓN	51%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	15	ID PILOTE	19
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

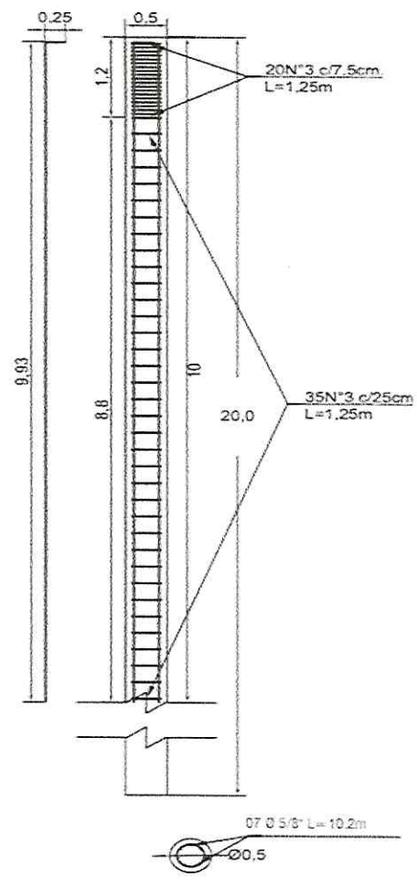

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	13:38
HORA FINAL EXCAVACIÓN	14:04
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:26
HORA INICIO FUNDIDO	14:15
HORA FINAL FUNDIDO	14:31
TIEMPO FUNDIDO	0:16
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.25
% EXPANSIÓN	32%


OBSERVACIONES

030150

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	16	ID PILOTE	20
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

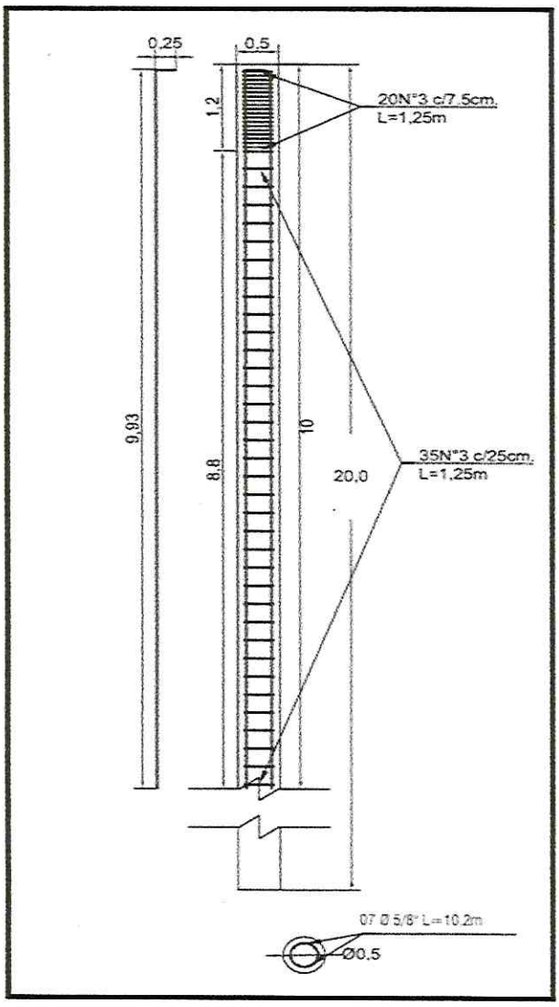


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	20
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	14:35
HORA FINAL EXCAVACIÓN	14:55
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:20
HORA INICIO FUNDIDO	14:55
HORA FINAL FUNDIDO	15:12
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.93
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	40%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	17	ID PILOTE	21 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-06

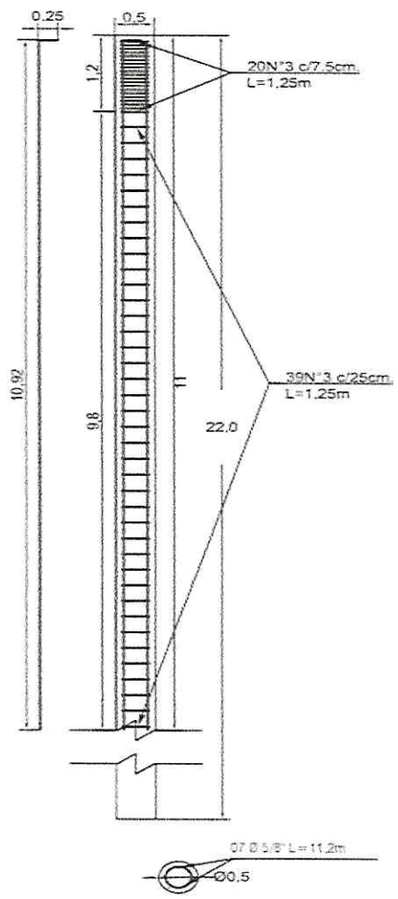

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	22
LONGITUD PARRILLA	11
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	22
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	15:05
HORA FINAL EXCAVACIÓN	15:30
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:25
HORA INICIO FUNDIDO	15:30
HORA FINAL FUNDIDO	15:47
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	4.32
VOLUMEN DE CONCRETO	5.75
% EXPANSIÓN	33%


OBSERVACIONES

000152

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	18	ID PILOTE	45 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	16/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-06

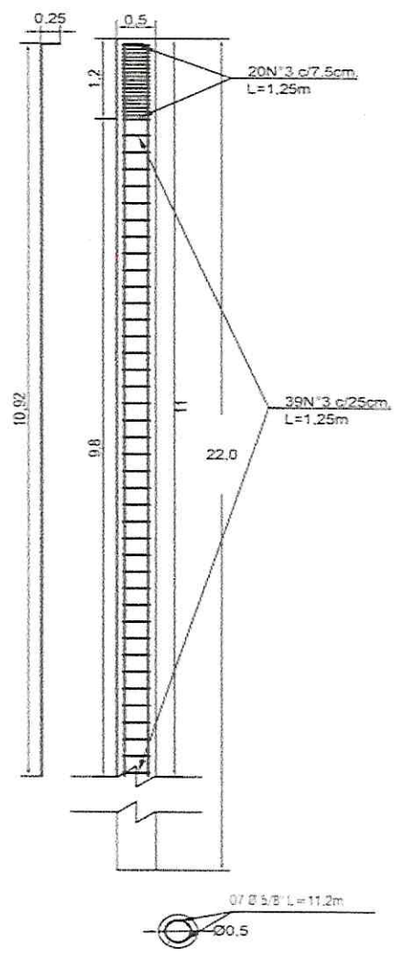

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	22
LONGITUD PARRILLA	11
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	22
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	15:52
HORA FINAL EXCAVACIÓN	16:20
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:28
HORA INICIO FUNDIDO	16:20
HORA FINAL FUNDIDO	16:34
TIEMPO FUNDIDO	0:14
VOLUMEN EXCAVADO	4.32
VOLUMEN DE CONCRETO	6.25
% EXPANSIÓN	45%


OBSERVACIONES

Error en el plano, indica PLT-07 DET 06 (detalle de PLT-06), debido a esto se opta por fundirlo como PLT-06 por seguridad.

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	19	ID PILOTE	21
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

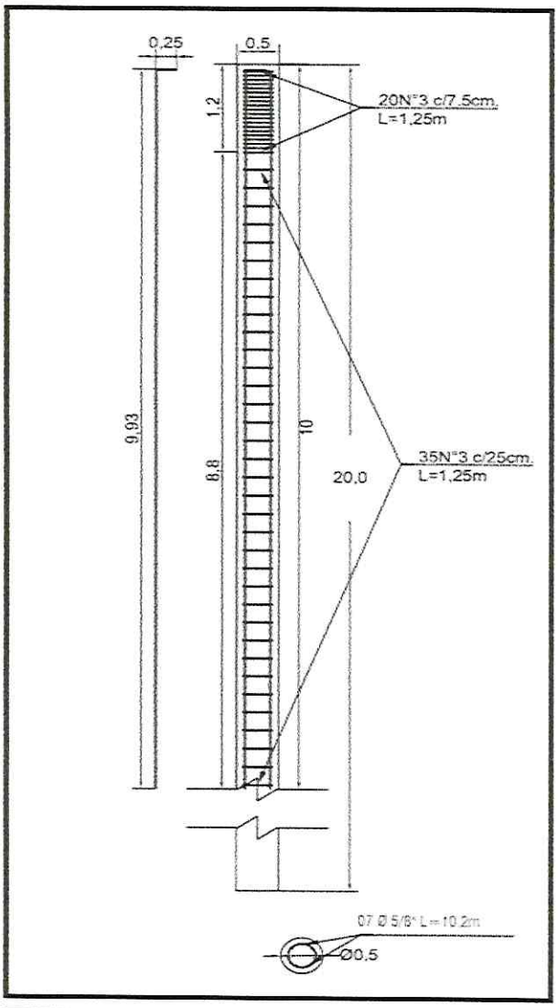


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	20.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	6:30
HORA FINAL EXCAVACIÓN	6:56
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:26
HORA INICIO FUNDIDO	7:00
HORA FINAL FUNDIDO	7:13
TIEMPO FUNDIDO	0:13
VOLUMEN EXCAVADO	3.97
VOLUMEN DE CONCRETO	5.75
% EXPANSIÓN	45%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	20	ID PILOTE	28
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

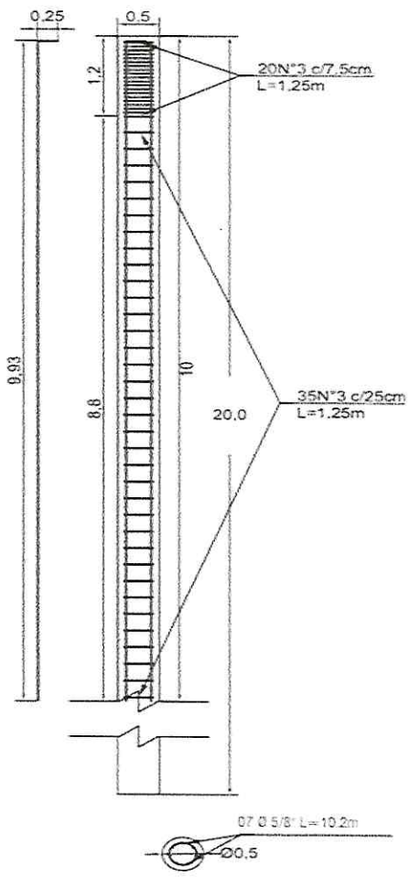

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	20
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	7:20
HORA FINAL EXCAVACIÓN	7:45
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:25
HORA INICIO FUNDIDO	8:41
HORA FINAL FUNDIDO	8:58
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.93
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	40%


OBSERVACIONES

009155

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	21	ID PILOTE	22 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-06

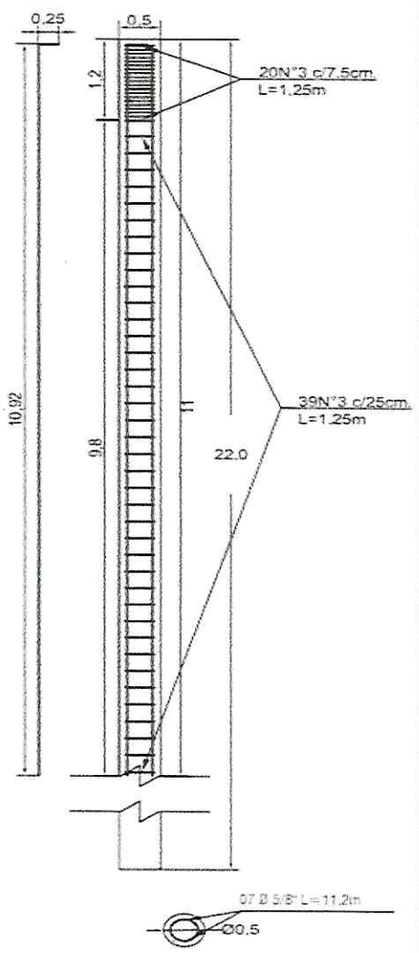


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	22
LONGITUD PARRILLA	11
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	22.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	8:16
HORA FINAL EXCAVACIÓN	8:43
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:27
HORA INICIO FUNDIDO	9:30
HORA FINAL FUNDIDO	9:46
TIEMPO FUNDIDO	0:16
VOLUMEN EXCAVADO	4.36
VOLUMEN DE CONCRETO	6.25
% EXPANSIÓN	43%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	22	ID PILOTE	44 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-06

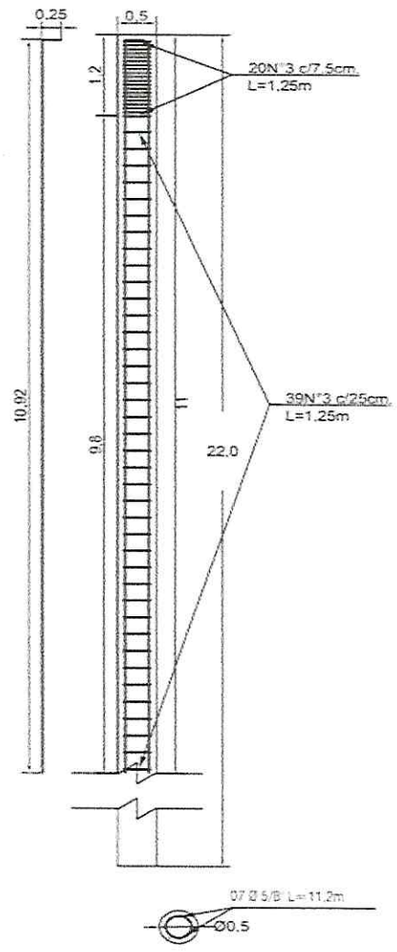

DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	22
LONGITUD PARRILLA	11
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	22
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	9:03
HORA FINAL EXCAVACIÓN	9:30
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:27
HORA INICIO FUNDIDO	10:31
HORA FINAL FUNDIDO	10:43
TIEMPO FUNDIDO	0:12
VOLUMEN EXCAVADO	4.32
VOLUMEN DE CONCRETO	6.25
% EXPANSIÓN	45%


OBSERVACIONES

000157

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	23	ID PILOTE	49 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

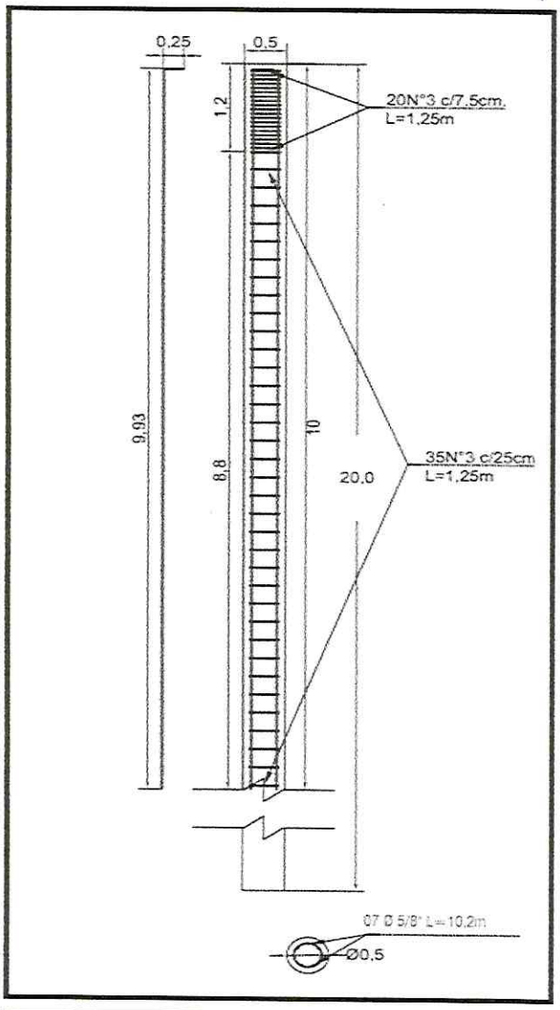


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	20
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	9:55
HORA FINAL EXCAVACIÓN	10:22
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:27
HORA INICIO FUNDIDO	11:23
HORA FINAL FUNDIDO	11:36
TIEMPO FUNDIDO	0:13
VOLUMEN EXCAVADO	3.93
VOLUMEN DE CONCRETO	5.5
% EXPANSIÓN	40%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	24	ID PILOTE	50 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-07

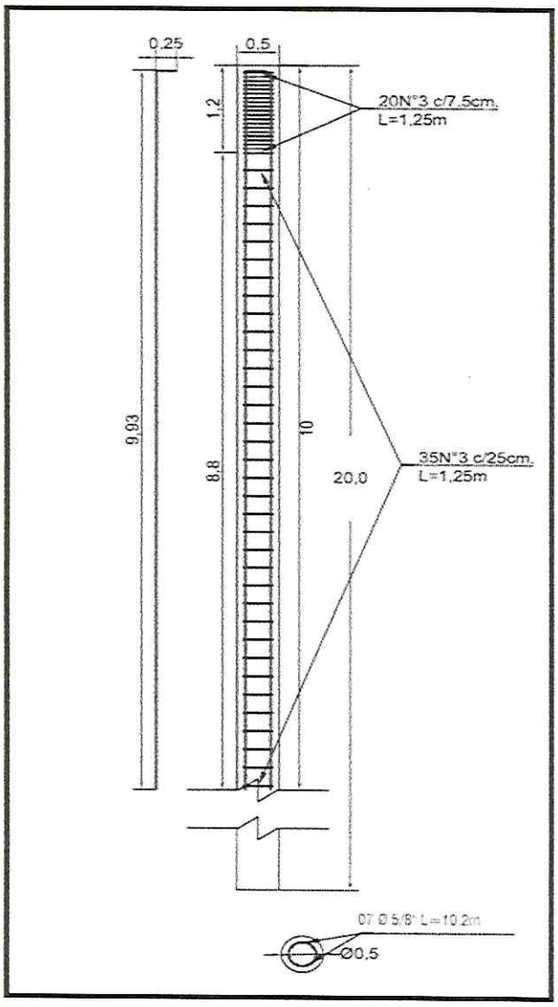


DIAMETRO	0.5
LONGITUD CONCRETO	20
LONGITUD PARRILLA	10
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	20
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	10:49
HORA FINAL EXCAVACIÓN	11:14
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:25
HORA INICIO FUNDIDO	12:08
HORA FINAL FUNDIDO	12:25
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	3.93
VOLUMEN DE CONCRETO	5.25
% EXPANSIÓN	34%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	25	ID PILOTE	47 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

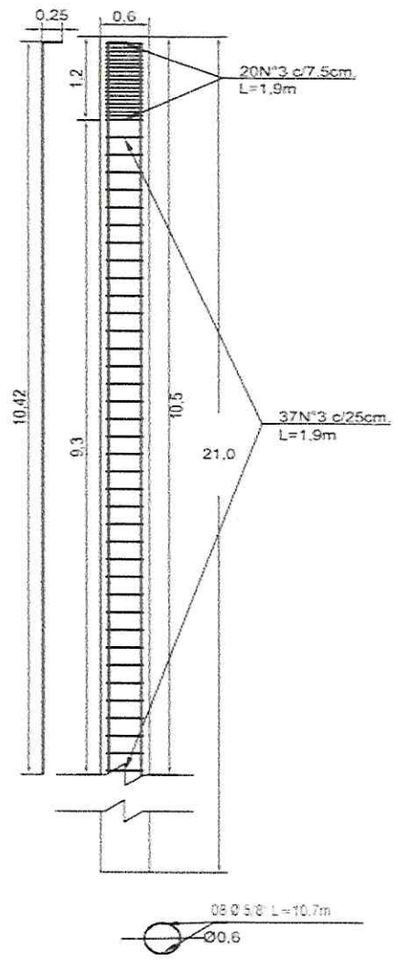

DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	21
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	13:05
HORA FINAL EXCAVACIÓN	13:24
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:19
HORA INICIO FUNDIDO	13:34
HORA FINAL FUNDIDO	13:46
TIEMPO FUNDIDO	0:12
VOLUMEN EXCAVADO	5.94
VOLUMEN DE CONCRETO	8
% EXPANSIÓN	35%


OBSERVACIONES

000160

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	26	ID PILOTE	43 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

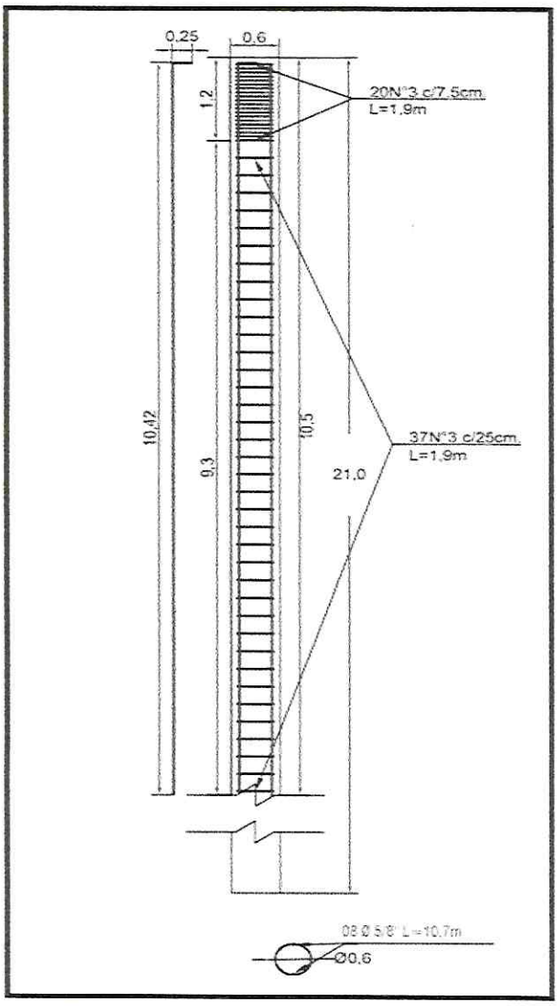


DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	21
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	13:55
HORA FINAL EXCAVACIÓN	14:16
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:21
HORA INICIO FUNDIDO	14:28
HORA FINAL FUNDIDO	14:44
TIEMPO FUNDIDO	0:16
VOLUMEN EXCAVADO	5.94
VOLUMEN DE CONCRETO	7.75
% EXPANSIÓN	31%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	27	ID PILOTE	40 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

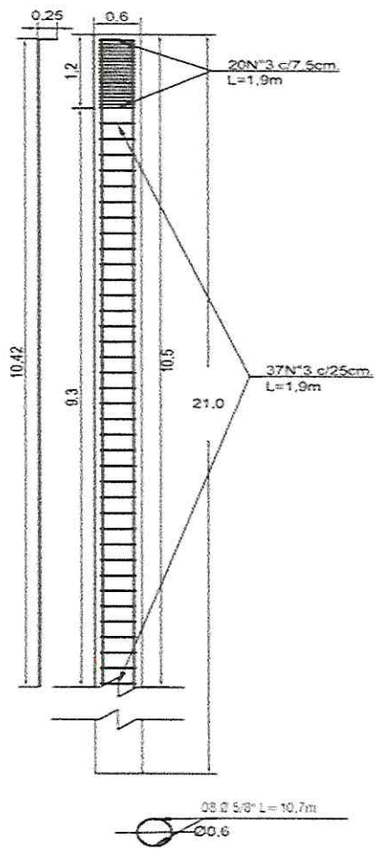


DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	21
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	14:34
HORA FINAL EXCAVACIÓN	14:56
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:22
HORA INICIO FUNDIDO	15:04
HORA FINAL FUNDIDO	15:19
TIEMPO FUNDIDO	0:15
VOLUMEN EXCAVADO	5.94
VOLUMEN DE CONCRETO	7.75
% EXPANSIÓN	31%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	28	ID PILOTE	22
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

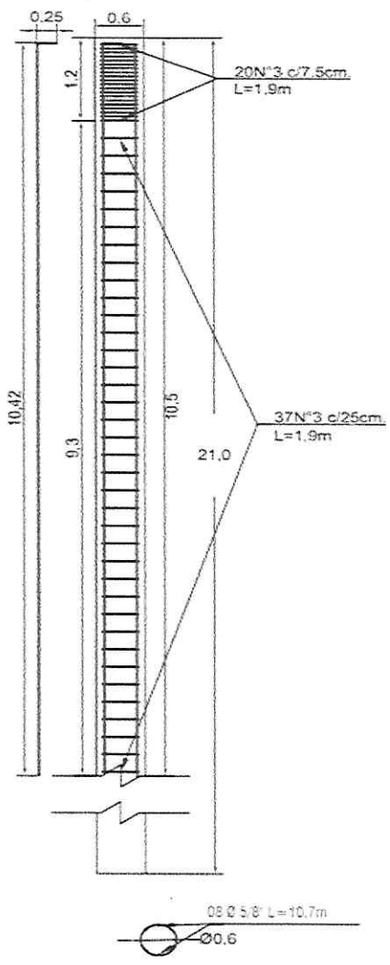

DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	21.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	15:27
HORA FINAL EXCAVACIÓN	15:46
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:19
HORA INICIO FUNDIDO	15:46
HORA FINAL FUNDIDO	16:00
TIEMPO FUNDIDO	0:14
VOLUMEN EXCAVADO	6.00
VOLUMEN DE CONCRETO	8.5
% EXPANSIÓN	42%


OBSERVACIONES

Se vaciaron dos mixer la primera de 7:40 a 7:55 con 5m3 y la segunda de7:52 a 7:55 con 3.25

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	29	ID PILOTE	31
FECHA DE EXCAVACIÓN	17/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

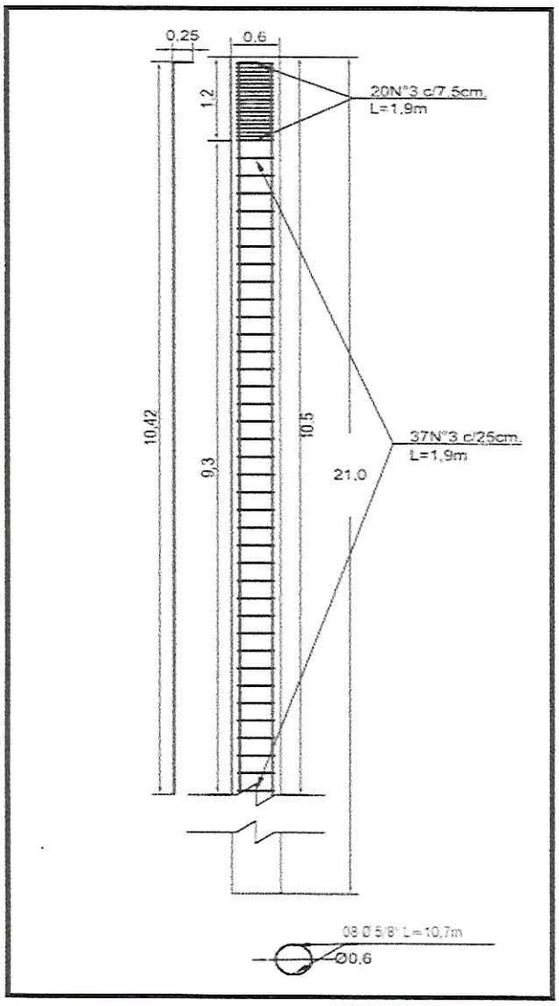


DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	21.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	15:59
HORA FINAL EXCAVACIÓN	16:28
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:29
HORA INICIO FUNDIDO	16:28
HORA FINAL FUNDIDO	16:45
TIEMPO FUNDIDO	0:17
VOLUMEN EXCAVADO	6.00
VOLUMEN DE CONCRETO	7.75
% EXPANSIÓN	29%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	30	ID PILOTE	24
FECHA DE EXCAVACIÓN	18/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

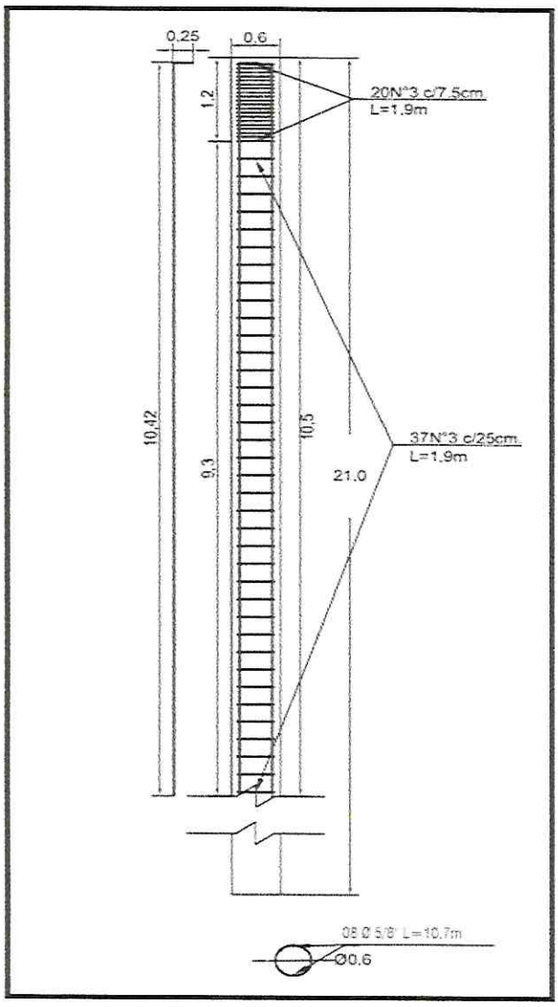


DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	21.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	8:56
HORA FINAL EXCAVACIÓN	9:19
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:23
HORA INICIO FUNDIDO	9:19
HORA FINAL FUNDIDO	9:34
TIEMPO FUNDIDO	0:15
VOLUMEN EXCAVADO	6.00
VOLUMEN DE CONCRETO	7.25
% EXPANSIÓN	21%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	31	ID PILOTE	32
FECHA DE EXCAVACIÓN	18/08/2023	EDIFICIO	Teatro
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

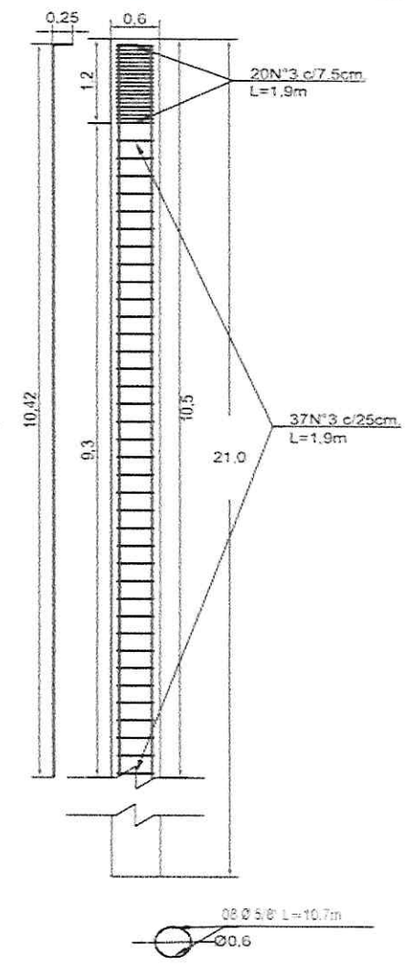


DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0.23
LONGITUD EXCAVACIÓN	21.23
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	9:40
HORA FINAL EXCAVACIÓN	10:01
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:21
HORA INICIO FUNDIDO	10:01
HORA FINAL FUNDIDO	10:15
TIEMPO FUNDIDO	0:14
VOLUMEN EXCAVADO	6.00
VOLUMEN DE CONCRETO	7.25
% EXPANSIÓN	21%

OBSERVACIONES

UT CULTURA EN COTA	OBJETO CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. CONTRATO No SIOP-0082-2022

HOJA DE VIDA PILOTES

PILOTAJE	32	ID PILOTE	46 Mu
FECHA DE EXCAVACIÓN	18/08/2023	EDIFICIO	Musica
		TIPO DE PILOTE	PLT-05

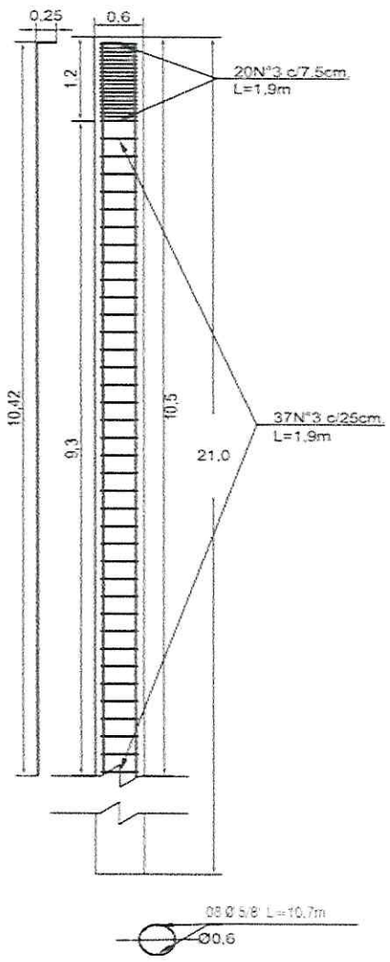

DIAMETRO	0.6
LONGITUD CONCRETO	21
LONGITUD PARRILLA	10.5
COTA TERRENO	0
LONGITUD EXCAVACIÓN	21
RESISTENCIA CONCRETO	24.5
HORA INICIO EXCAVACIÓN	10:20
HORA FINAL EXCAVACIÓN	10:44
TIEMPO EXCAVACIÓN	0:24
HORA INICIO FUNDIDO	10:44
HORA FINAL FUNDIDO	10:57
TIEMPO FUNDIDO	0:13
VOLUMEN EXCAVADO	5.94
VOLUMEN DE CONCRETO	8.5
% EXPANSIÓN	43%

OBSERVACIONES
