MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.503.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	01 - OBRAS PRELIMINARES			
Actividad:	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	20	5513	MES

Área para Dibujo o Fotografía







Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
Agosto de 2023						1,00	1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA **1,00**

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteveintor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	01 - OBRAS PRELIMINARES			
Actividad:	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	20	CM-01	MES

Área para Dibujo o Fotografía

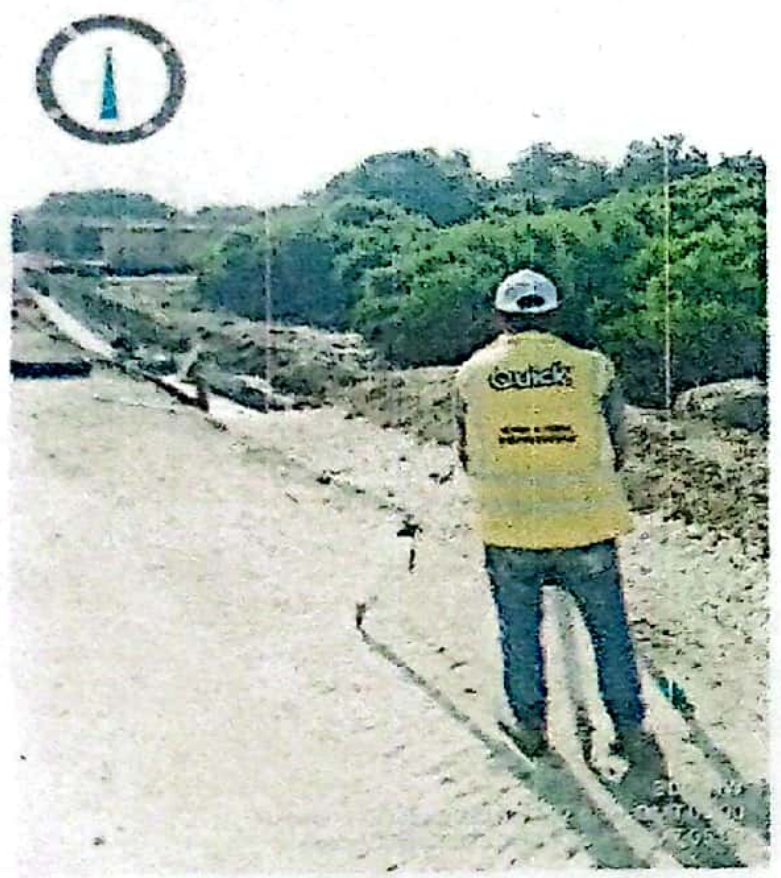

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
Agosto de 2023	Frente tierra 1					1,00	1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							1,00

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	02- MOVIMIENTOS DE TIERRA			
Actividad:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	20	5913	M3

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación Abs Inicial	Ubicación Abs final	Dimensiones A Longitud (m)	B Ancho (m)	C Alto (m)			A*B*C VOLUMEN
Desvio tuberia m006	780,3	753	27,3	4,56	1,79			222,83
	753	720	32,00	2,35	1,20			90,24
	720	692,12	40,00	2,2	1,61			141,68
	692,12	680	12,12	2,2	1,77			47,20
	680	667,7	12,30	2,2	1,9			51,41
	662,12	650	12,12	2,2	1,72			45,86
	650	640	10,00	2,2	1,26			27,72
	640	630	10,00	2,2	1,93			42,46
Muro 006	630	620	10,00	2,2	1,87			41,14
	620	610	10,00	2,2	1,25			27,50
	610	600	10,00	2,2	1,15			25,30
	600	590	10,00	2,2	1,2			26,40
	590	580	10,00	2,2	1,11			24,42
	580	570	10,00	2,2	1,53			33,66
	570	560	10,00	2,2	1,23			27,06
	560	550	10,00	2,2	0,98			21,56
	550	540	10,00	2,2	1,17			25,74
							CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**922,18**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	02- MOVIMIENTOS DE TIERRA			
Actividad:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	20	5913	M3

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación Abs inicial / Abs final	Dimensiones A Longitud (m)	B Ancho (m)	C Alto (m)			A*B*C VOLUMEN
Zona de placa de tanque PLACA		11,00	11	0,20			24,20
Zona de placa de tanque VIGAS		62,80	0,4	0,17			4,27
Cuarto electrico		35,28	0,3	0,2			2,12
Carcamos		5,95	0,7	0,2			0,83

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA — 31,42

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA — 953,60

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-3

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capitulo:	02- MOVIMIENTOS DE TIERRA			
Actividad:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	20	198	M3

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación / Absisas		Dimensiones						Volumen (m3) (A*B*C)
	Absisa inicial	Absisa final	A Longitud (m)	B (Ancho)	C (Alto)				
Muro 001			17,50	0,70	2,00				24,50
Porteccion			30,70	0,81	1,00				24,87
	850	840	10,00	4,60	2,10				96,60
	840	830	10,00	4,58	2,00				91,60
	830	820	10,00	4,55	2,00				91,00
	820	810	10,00	4,55	2,03				92,37
	810	800	10,00	4,52	2,08				94,02
	800	790	10,00	4,52	1,89				85,34
	790	780	10,00	4,55	1,90				86,45
	780	770	10,00	3,40	0,93				31,62
	770	760	10,00	3	0,93				30,69
	760	750	10,00	3	0,98				31,36

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA **780,41**

Powered by CamScanner


MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		**Fecha:**	31/08/2023
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	20	CM-04	ML

Área para Dibujo o Fotografía

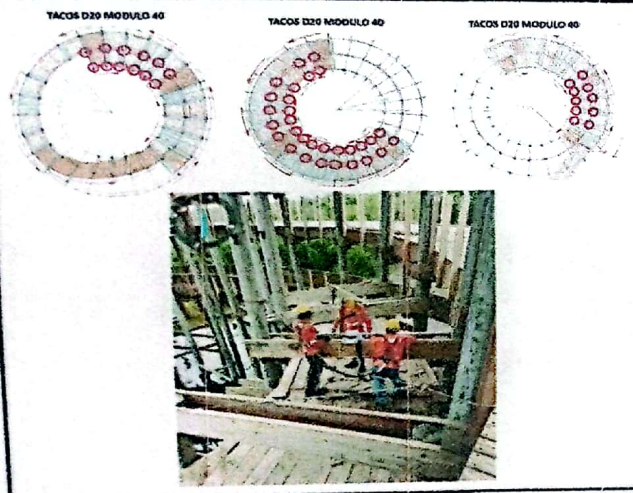

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad de tacos	Medida Total
			Longitud (m)				
tacos	Del eje 6'' al 7'''	40	0,5			52	26,00

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 26,00

TOTAL EJECUTADO 26,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR	MEMORIAS DE OBRA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN NIT: 901.501.279-2
	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Acta No.	Ítem No.	Unidad
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	20	CM-08	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
GRADERIAS DE CONTEMPLACION		36	56,56				56,56
GRADERIAS DE CONTEMPLACION		37	55,12				55,12
Cuarto almacenamiento		38	32,65				32,65

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	144,33
TOTAL EJECUTADO	144,33

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	20	CM-08	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)				

Quien entrega:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien recibe:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901 501 275-2

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	20	CM-09	ML

Área para Dibujo o Fotografía

VIGA LAMINADA 08X36 MODULO 40



VIGA LAMINADA 08X36 MODULO 40

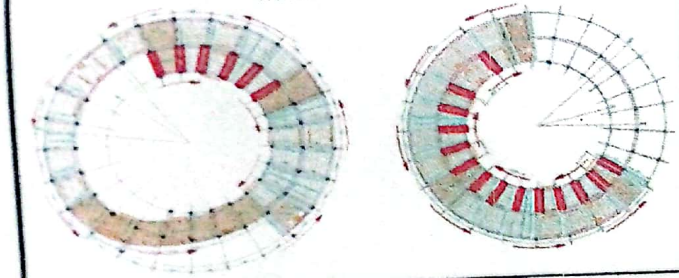

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
Eje 9' a 5'' lado interno y Del eje 6'' al 7'''		40	3,7			73	270,1

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	270,10
TOTAL EJECUTADO	270,10

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 68202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	20	CM-09	ML

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)				

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	20	CM-010	M2

Área para Dibujo o Fotografía

DECK CURVO MODULO 40

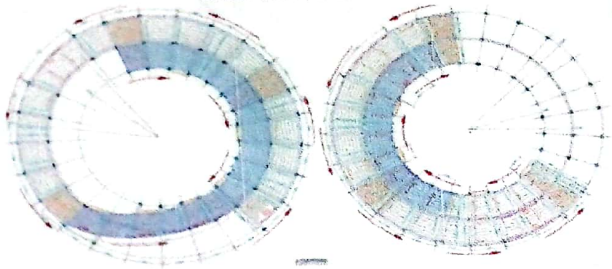

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		
Ejes 18' -21"		40	73,50	3	220,50		220,50
Ejes 1-9 (Se incluye tramo curvo que fue cobrado como recto en el acta 16)		40	25,07	3	75,21		75,21
mediclon precisa en campo y se hace el ajuste en la presente acta		45	-70,13		-70,13		-70,13

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 225,58

TOTAL EJECUTADO 225,58

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Thorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUMAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	20	CM-010	M2

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	-
TOTAL EJECUTADO	-

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	20	CM-011	M2

Área para Dibujo o Fotografía

DECK CURVO MODULO 45

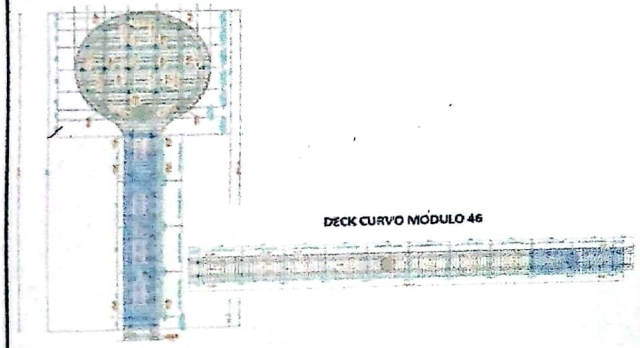

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		
Ejes 1-9 (Se cobro en acta 16 como tramo recto, se descuenta en la presente acta para ser incluida como tramo curvo)		40	-25,07	3	-75,21		-75,21
		45	20,54	3	61,61		61,61
Saldo pendiente por cobrar, se culmino modulo		46	10,1	3	30,30		30,30

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTAIDA 16,70

TOTAL EJECUTADO 16,70

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-12	ML

Área para Dibujo o Fotografía

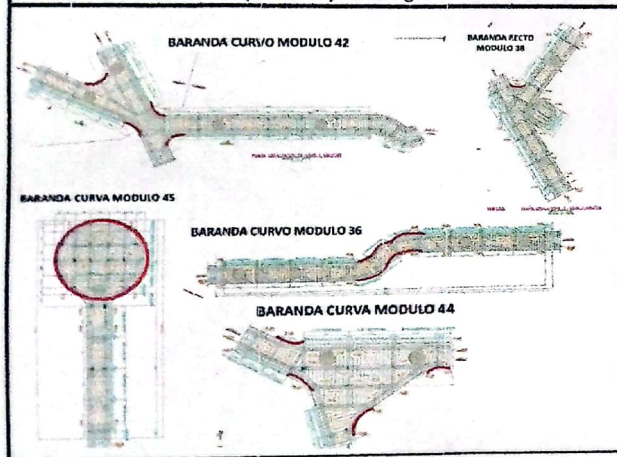

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		
		36	11,19				11,19
		38	1,65				1,65
hasta el p 31	Externo	40	108,67				108,67
del 22 hasta el 31	Interno	40	36,010				36,01
		42	11,04				11,04
		44	17,96				17,96
		45	40,01				40,01
		47	1,1				1,10
		48	12,39				12,39
		49	11,05				11,05

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 251,07

TOTAL EJECUTADO 251,07

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-12	ML

Área para Dibujo o Fotografía

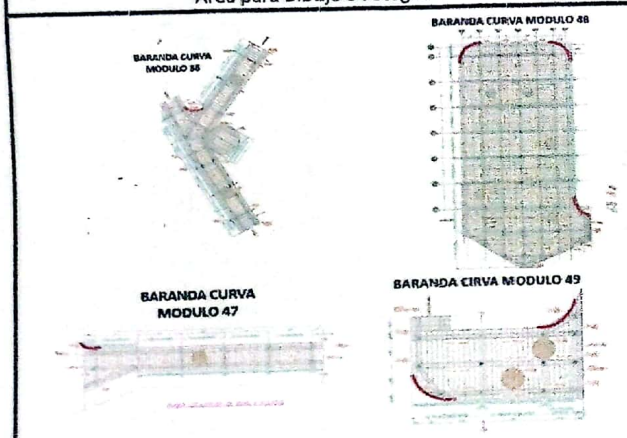

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		
							-
							-

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-12	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA -

TOTAL EJECUTADO -

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-13	ML

Área para Dibujo o Fotografía

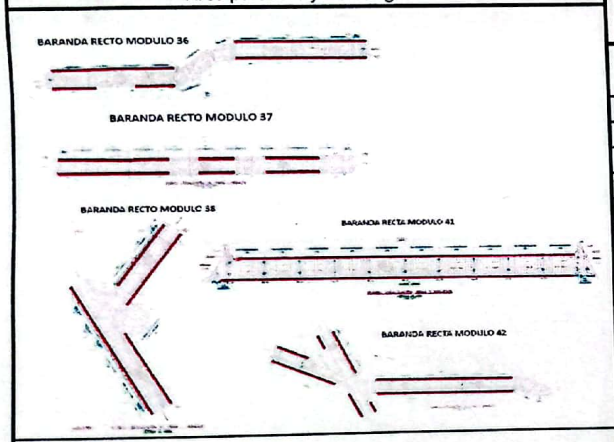

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		
		36	51,80				51,80
		38	60,22				60,22
		37	45,63				45,63
		41	100,94				100,94
		42	94,7				94,70
		44	33,9				33,90
		45	37,63				37,63
		47	51,22				51,22
		48	86,15				86,15
		49	18,68				18,68
		50	41				41,00

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 621,87

TOTAL EJECUTADO 621,87

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-13	ML

Área para Dibujo o Fotografía

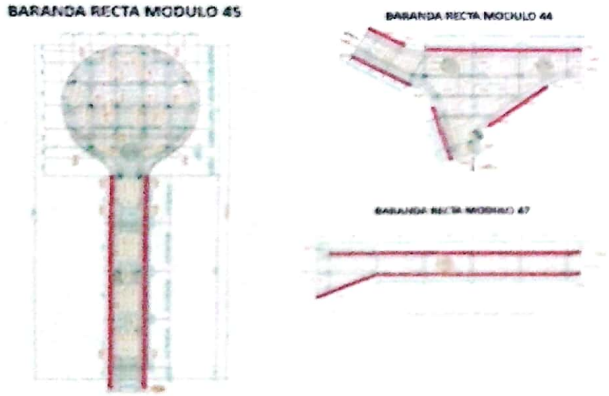

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA -

TOTAL EJECUTADO -

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Norvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 88202-267439 STD

Powered by CamScanner


MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Fecha:**	31/08/2023	
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-13	ML

Área para Dibujo o Fotografía

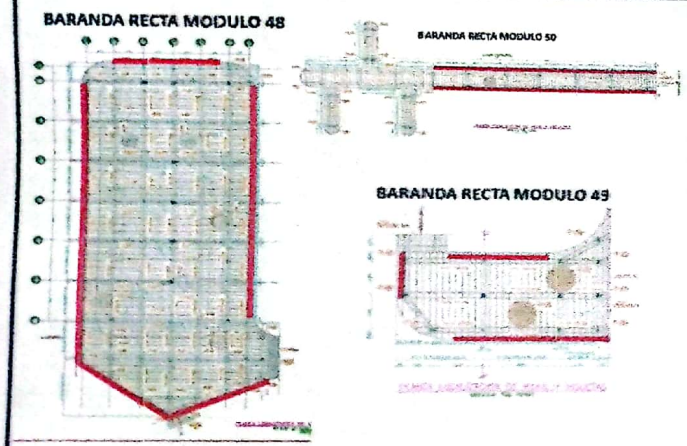

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA -

TOTAL EJECUTADO -

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	05- BARANDAS EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	20	CM-13	ML

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA -

TOTAL EJECUTADO -

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.273-2

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		**Fecha:**	31/08/2023
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	20	CM-16	M2

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones				Medida Total
			Area de cubierta (m2)				
Equipamiento deportivos		48	190,85				190,85

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. :# 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**190,85**
TOTAL EJECUTADO	**190,85**

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-4

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	20	CM-17	M2

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones (A) perimetrom uro (m)	(B) Altura de muro (m)	(C) Area Puertas	Area ventanas	(A*B)-(C) Medida Total
Equipamiento deportivos		48	70,16	3,11	22,49		195,70

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	195,70
TOTAL EJECUTADO	195,70

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2


Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR

Acta No.	Ítem No.	Unidad
20	CM-18	ML

Área para Dibujo o Fotografía

DINTELES INTERIORES MODULO 48

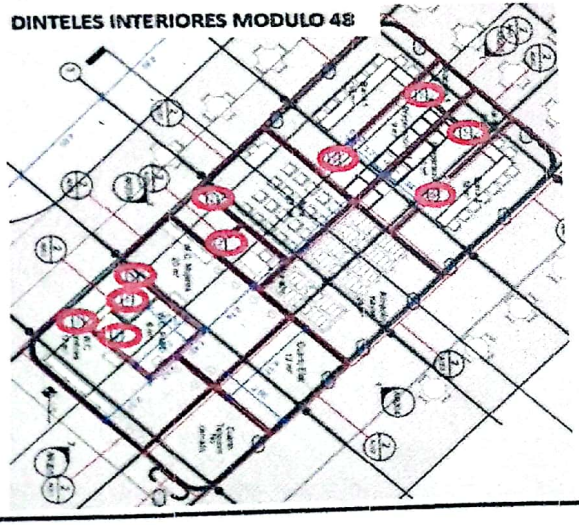

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
Equipamiento deportivo		48	11,41				11,41

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	11,41
TOTAL EJECUTADO	11,41

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	20	CM-18	ML

Área para Dibujo o Fotografía

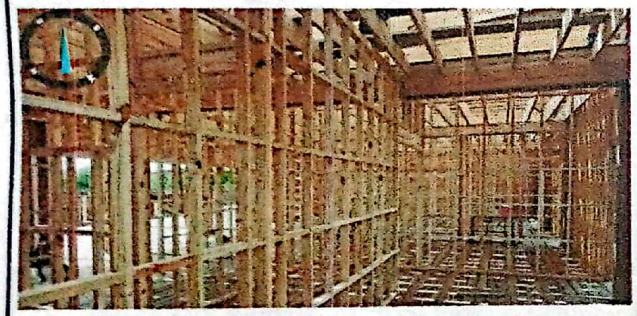

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)				

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA	20	CM-22	ML
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA			

Área para Dibujo o Fotografía

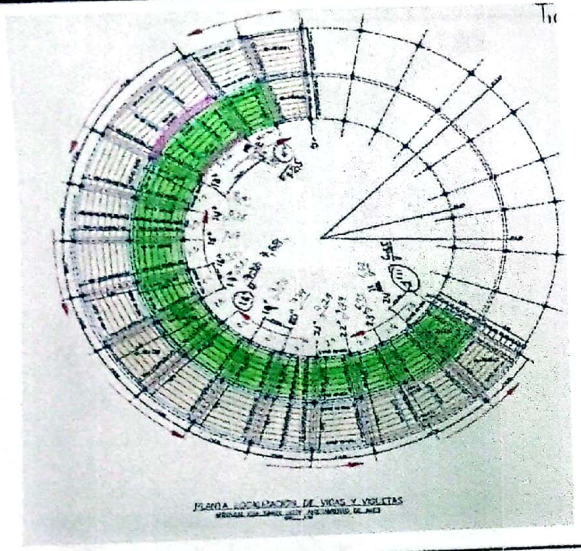

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
12" - 13"		40	10,14				10,14

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	10,14
TOTAL EJECUTADO	10,14

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	06 - EDIFICACIONES EN MADERA	20	CM-23	ML
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA			

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
		48	403,4				403,40

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	403,40
TOTAL EJECUTADO	403,40

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO
Actividad:	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS

Acta No.	Ítem No.	Unidad
20	1201	M3

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación		Dimensiones (A) Longitud (m)	(B) Ancho (m)	(C) Espesor (m)	Cantidad	A*B*C Medida Total Area (m3)
	SUBESTACION		62,8	0,4	0,05		1,26
	CARCAMOS SUBESTACION		5,95	0,7	0,05		0,21
	PLACA DE TANQUE		4,9	4,9	0,08	4,00	7,68
	VIGAS PLACA TANQUE		62,8	0,4	0,08		2,01
ABS 0+819 - 0+674,54	MURO 006		144,46	1,6	0,10		23,11

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	34,27
TOTAL EJECUTADO	34,27

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO			
Actividad:	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	20	7651	M3

Área para Dibujo o Fotografía

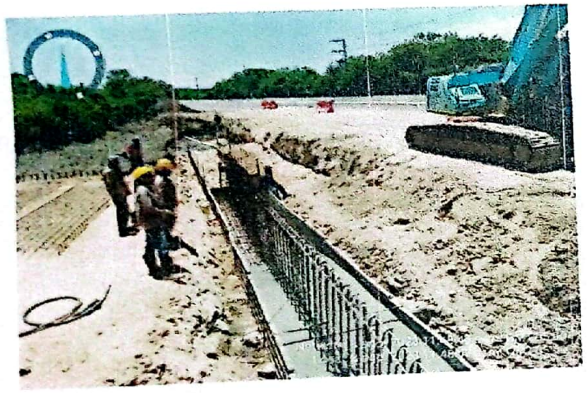

Detalle	Ubicación		Dimensiones			Cantidad	Medida Total Area (m3)
			Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		
ABS 0+819 - 0+674,54	MURO 006		144,46	1,6	0,35		80,90

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	80,90
TOTAL EJECUTADO	80,90

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO			
Actividad:	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	20	2219	M3

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación		Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad	Medida Total vol (m3)
	GARITA		28,26	1,38	0,30		11,70
	Rampa		8,75	1,78	0,30		4,67
	Muro 001		16,77	2,02	0,35		11,86
ABS 0+819 - 0+674,54	MURO 006		6,7	1,4	0,30		2,81
			58,4	1,58	0,30		27,68
			33,14	1,02	0,30		10,14
			46,22	1,62	0,3		22,46

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	91,33
TOTAL EJECUTADO	91,33

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-002612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO			
Actividad:	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F"C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	20	6020	M3

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación		Dimensiones (A) Longitud (m)	(B) Ancho (m)	(C) Espesor (m)	(D) Cantidad	(A*B*C) ó (A*B*C*D) segun aplique Medida Total vol (m3)
Placa cim tanques	PARQUEADERO		4,9	4,9	0,20	4,00	19,21
Vigas cim tanques			62,8	0,4	0,45		11,30

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	30,51
TOTAL EJECUTADO	30,51

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUMAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO			
Actividad:	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F"C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	20	6020	M3

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación		Dimensiones (A) Longitud (m)	Dimensiones (B) Ancho (m)	Dimensiones (C) Espesor (m)	(D) Cantidad	(A*B*C) ó (A*B*C*D) segun aplique Medida Total vol (m3)
Placa cim tanques	PARQUEADERO		4,9	4,9	0,20	4,00	19,21
Vigas cim tanques			62,8	0,4	0,45		11,30

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 30,51

TOTAL EJECUTADO 30,51

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO			
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	20	78	KG

Área para Dibujo o Fotografía



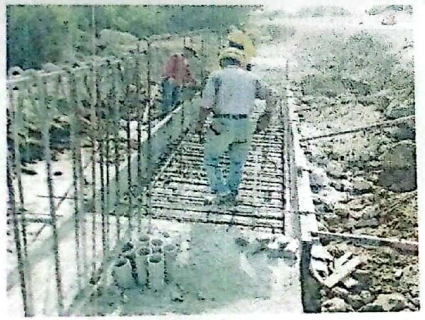

Detalle	Ubicación	Tipo de refuerzo	Diametro acero	Dimensiones (A) Longitud elemento (m)	Dimensiones (B) espaciamiento (m)	Dimensiones (C) Cantidad / ml	Dimensiones (D) kg/ml	(E) Longitud de muro con elementos de acero instalados (m)	CANTIDAD (A*C*D*E)
Parrilla inf 1/2" @0,15m	ACERO ZAPATA MURO 006	Transversal	1/2"	1,75	0,15	7	1,00	144,48	1769,88
		Longitudinal	1/2"	1	0,15	14	1,00	144,48	2022,72
Parrilla sup 1/2" @0,2m		Transversal	1/2"	1,75	0,2	5	1,00	144,48	1264,20
		Longitudinal	1/2"	1	0,2	11	1,00	144,48	1589,28
Gancho muro (1@0,2m)	ACERO MURO MURO 006 TRAMO 001 (L = 6,70m) (h = 1,4 m) rampa (abs 0+819 - 0+812,30)	Transversal	1/2"	2,00	0,2	5	1,00	6,70	67,00
Gancho muro (1@0,2m)		Transversal	5/8"	1,90	0,2	5	1,56	6,70	99,29
Muro		Longitudinal	1/2"	1,00		14	1,00	16,77	234,78
Gancho muro (1@0,2m)	ACERO MURO MURO 006 TRAMO 001 (L = 109,38 m) h= 1,58 (abs 0+812,3 - 0+753,90)	Transversal	1/2"	2,20	0,2	5	1,00	58,40	642,40
Gancho muro (1@0,2m)		Transversal	5/8"	2,10	0,2	5	1,56	58,40	956,59
Muro		Longitudinal	1/2"	1,00		16	1,00	58,40	934,40
Gancho muro (1@0,2m)	ACERO MURO MURO 006 TRAMO 001 (L = 34,14 m) h= 1,02(abs 0+753,90 - 0+720,76)	Transversal	1/2"	1,70	0,2	5	1,00	33,14	281,69
Gancho muro (1@0,2m)		Transversal	5/8"	1,80	0,2	5	1,56	33,14	465,29
Muro		Longitudinal	1/2"	1,00		10	1,00	33,14	331,40
Gancho muro (1@0,2m)	ACERO MURO MURO 006 TRAMO 001 (L = 46,22 m) h=1,62 (abs 0+720,76 - 0+674,54)	Transversal	1/2"	2,14	0,2	5	1,00	46,22	494,55
Gancho muro (1@0,2m)		Transversal	5/8"	2,24	0,2	5	1,56	46,22	807,56
Muro		Longitudinal	1/2"	1,00		16	1,00	46,22	739,52
Separador de parrilla en varilla 1/2" (2 @2,2m)		Longitudinal	1/2"	0,80	2,2	0,91	1,00	132,55	96,76
Separador de parrilla en varilla 1/2" (2 @2,2m)		Longitudinal	1/2"	0,80	1,5	1,33	1,00	11,91	12,62
								CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**12.809,94**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Fecha:	31/08/2023
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN		
Capítulo:	07 - ESTRUCTURAS EN CONCREO	Acta No.	Ítem No. / Unidad
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	20	78 / KG

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Diametro acero	Long elemento (m)		Dimensiones (A) Long elem (m)	(B) cant elementos a figurar	(C = A*B) Long de acero	(D) Kg ml	(C*D) KG
Placa cimiento de tanques	VIGAS / estribos	3/8"			1,5	330	495	0,56	277,20
	VIGAS / acero long.	5/8"			11	6	66	1,56	102,96
					11	6	66	1,56	102,96
					11	6	66	1,56	102,96
					11	6	66	1,56	102,96
					11	6	66	1,56	102,96
					11	6	66	1,56	102,96
					11	6	66	1,56	102,96
	Losa cimentacion refuerzo longitudinal superior	1/2"			11,2	56	627,2	1,00	627,20
	Losa cimentacion refuerzo transversal superior	1/2"			11,2	56	627,2	1,00	627,20
	Losa cimentacion refuerzo longitudinal inferior	1/2"			11,2	56	627,2	1,00	627,20
	Losa cimentacion refuerzo	1/2"			11,2	56	627,2	1,00	627,20
	separadores	1/2"			0,8	28	22,40	1,00	22,40

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	3.426,16
TOTAL EJECUTADO	16.236,10

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Capítulo:	14.5 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)
Actividad:	Suministro e instalación de unidad de conexión de gabinete en tubería ACERO SCH 10 2-1/2" (Incluye Accesorios)

Acta No.	Ítem No.	Unidad
20	14.5.2	UND

Área para Dibujo o Fotografía

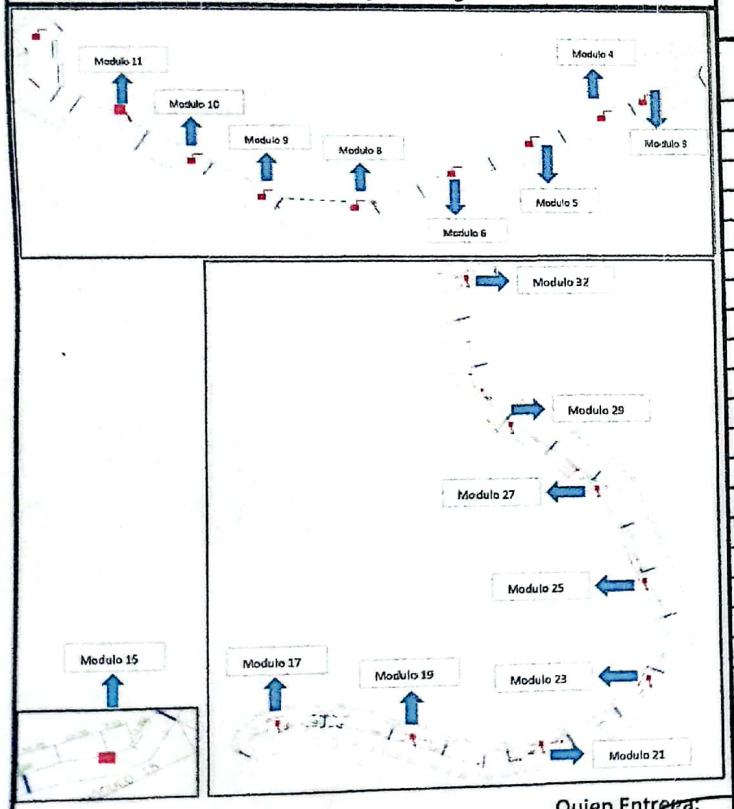

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Unidad			N° de lados	Medida Total
Eje Superior	Pasarela 6 m	3	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	4	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	5	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	6	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	8	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	9	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	10	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	11	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	15	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	17	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	19	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	21	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	23	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	25	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	27	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	29	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	32	1,00				1,00

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	17,00
TOTAL EJECUTADO	17,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-287439 STD

Powered by CamScanner


MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Fecha:**	31/08/2023	
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14.5 -- SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH 10 4" (Incluye Accesorios)	20	14.5.3	ML

Área para Dibujo o Fotografía

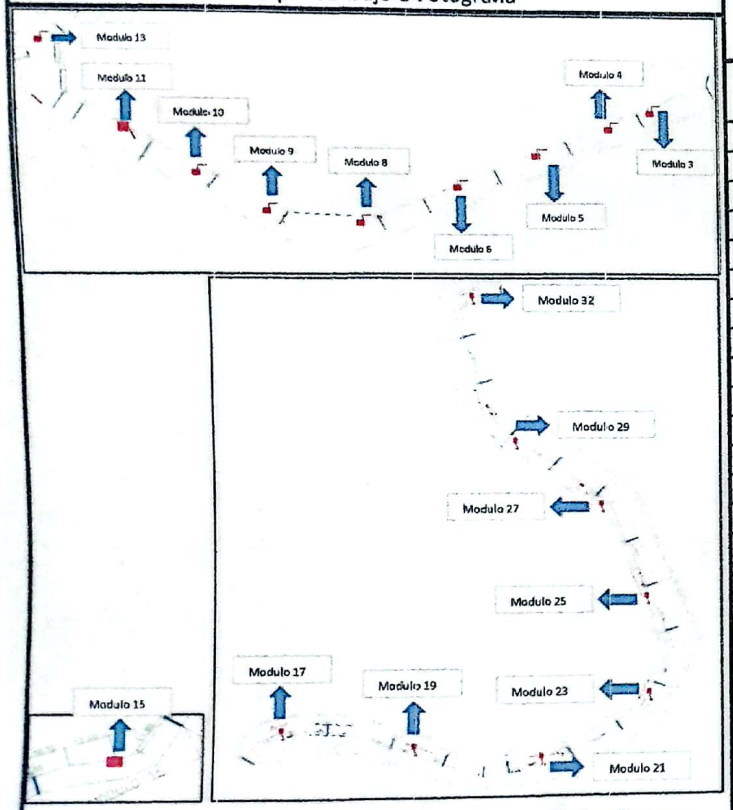

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)	Dimensiones und tubos		N° de lados	Medida Total
Eje inferior	Pasarela 6 m	3	1,85				1,85
Eje inferior	Pasarela 6 m	4	1,42				1,42
Eje inferior	Pasarela 6 m	5	1,41				1,41
Eje inferior	Pasarela 6 m	6	1,41				1,41
Eje inferior	Pasarela 6 m	8	5,32				5,32
Eje inferior	Pasarela 6 m	9	1,82				1,82
Eje inferior	Pasarela 6 m	10	1,43				1,43
Eje inferior	Pasarela 6 m	11	1,44				1,44
Eje inferior	Estación 3	13	6,84				6,84
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	15	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	17	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	19	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	21	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	23	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	25	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	27	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	29	0,42				0,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	32	0,42				0,42
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		26,72
					TOTAL EJECUTADO		26,72

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14.5 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)			
Actividad:	Suministro e instalación de tubería ACERO SCH 10 6" (Incluye Accesorios)	20	14.5.4	ML

Área para Dibujo o Fotografía

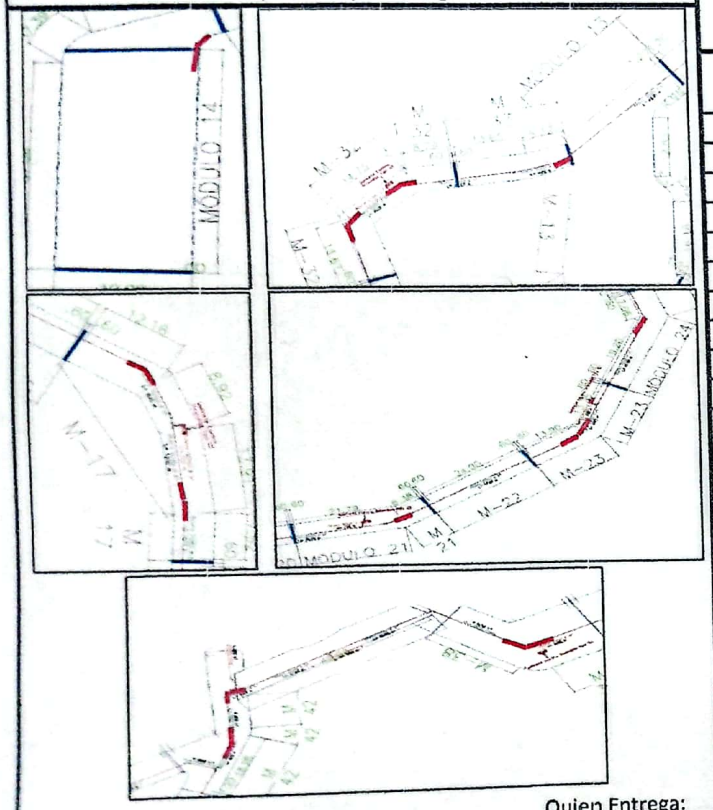

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones		Parcial	N° de lados	Medida Total
			Longitud (m)	und tubos	%		
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	13	1,79				1,79
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	14	5,39				5,39
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	17	11,42				11,42
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	21	3,70				3,70
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	23	5,65				5,65
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	24	0,90				0,90
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	32	8,85				8,85
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	38	4,325				4,33
Eje inferior	Pasarela 1,5 m	42	5,38				5,38

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 47,410

TOTAL EJECUTADO 47,410

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capitulo:	14.5 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)			
Actividad:	Bomba con motor Diesel Q=250 GPM, Hd=95 MCA y 1 Bomba Jockey Q=158 L/S, Hd= 104,50 MCA. Suministro e instalación Válvula de compuerta BRONCE 4" BxB Suministro e instalación cabezal de prueba 2-1/2" X 2-2/12" X 4" BxB	20	14.5.6	UND

Área para Dibujo o Fotografía



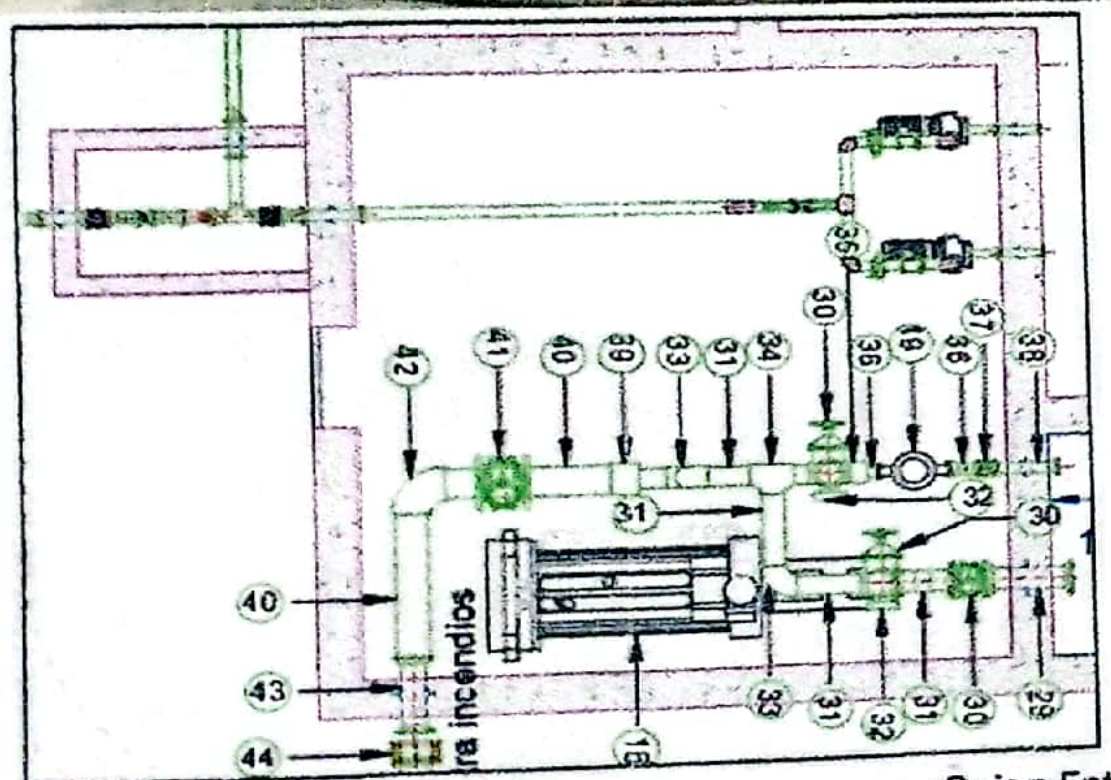

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones: Unidad			N° de lados	Medida Total
Bomba RCI	Tanque RCI	N.A	1,00				1,00

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	1,00
TOTAL EJECUTADO	1,00

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14.5 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS (UNIONES RANURADAS)			
Actividad:	Gabinete para equipo contra incendio 77x77x22 - Clase III	20	14.5.9	UNIDAD

Área para Dibujo o Fotografía

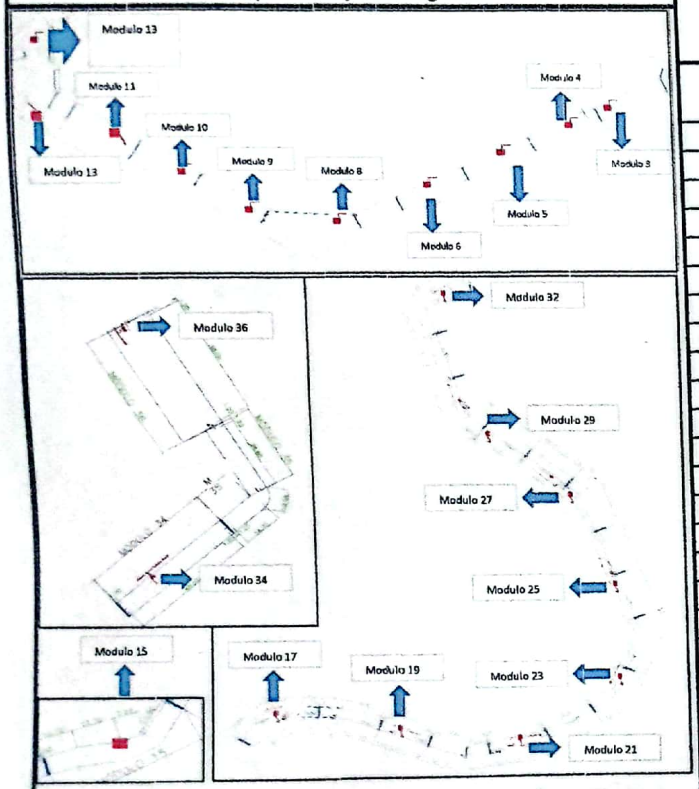

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones (A) Unidad		Parcial (B) %	N° de lados	(A*B) Medida Total
Eje Superior	Pasarela 6 m	3	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	4	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	5	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	6	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	8	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	9	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	10	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 6 m	11	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	13	2,00		70%		1,40
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	15	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	17	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	19	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	21	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	23	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	25	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	27	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	29	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	32	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	34	1,00		70%		0,70
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	36	1,00		70%		0,70

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	14,70
TOTAL EJECUTADO	14,70

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 08202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
Actividad:	Suministro e instalación de tuberia NOVAFORT 12" (Incluye Accesorios)	20	14.6.2	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
	SUMIDERO N° 2		6				6
	SUMIDERO N° 3		6				6

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**12,00**
TOTAL EJECUTADO	**12,00**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
Actividad:	Suministro e instalacion de canaleta en PRFV Plastico reforzado con fibra de vidrio 0,3x0,25 m	20	14.6.4	ML

Área para Dibujo o Fotografía





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Longitud (m)			Cantidad	Medida Total
	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	48	9,28			2	18,56

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	18,56
TOTAL EJECUTADO	18,56

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
Actividad:	Suministro e Instalacion de tanque industrial cilindrico vertical de 90 m3 para almacenamiento de agua potable	20	14.7.1	UND

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	ZONA PARQUEADERO					2	2

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	2,00
TOTAL EJECUTADO	2,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	14 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
Actividad:	Suministro e instalacion de tanque industrial cilindrico vertical de 30 m3 para almacenamiento de agua potable	20	14.7.2	UND

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	ZONA PARQUEADERO					1	1

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 1,00

TOTAL EJECUTADO 1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.501.275-2


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para iluminacion interior ubicada en cielo raso en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.1	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ILUMINACION ESTACION 3

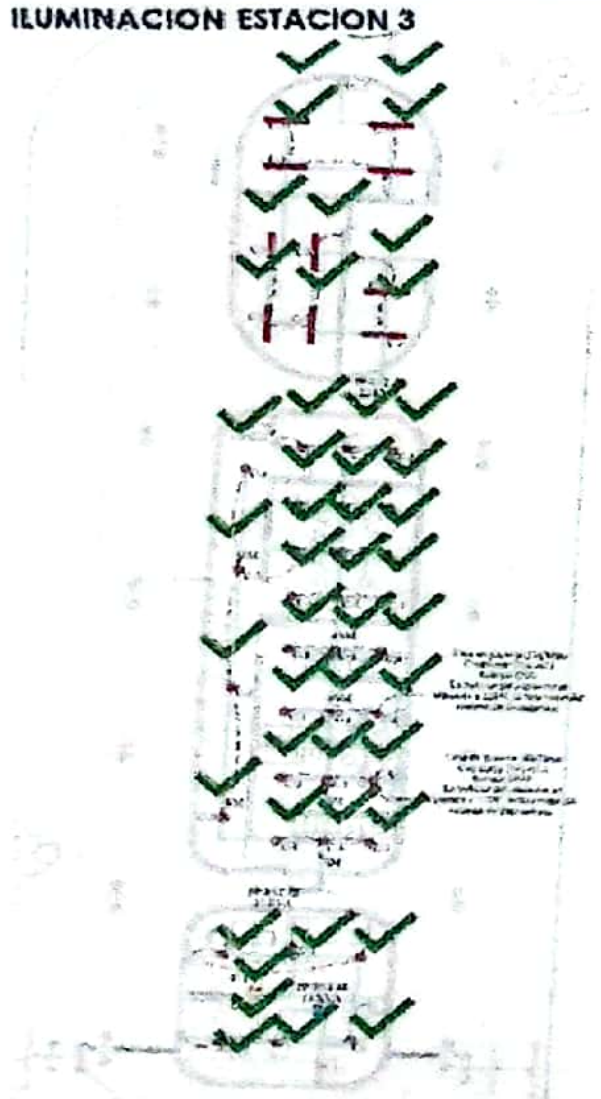

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	47,00	50%		23,5	23,50

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA: 23,5

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en fachada de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.2	UND

Área para Dibujo o Fotografía

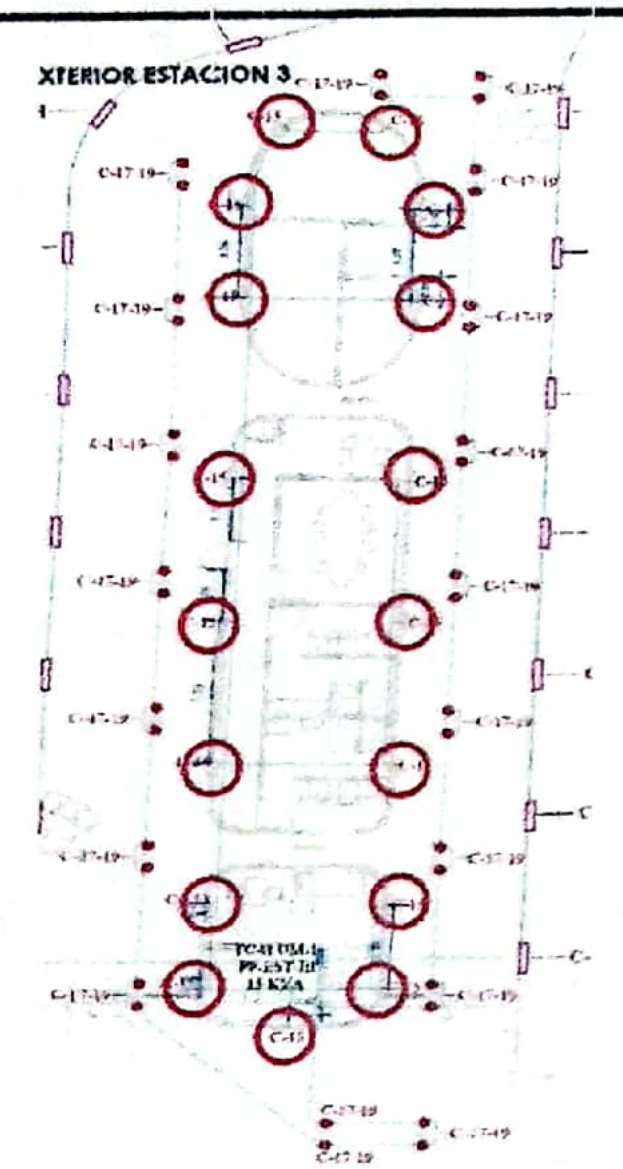

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	17,00	60%		10,2	10,20
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						10,20


Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR	MEMORIAS DE OBRA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN NIT: 901.501.279-2
	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.3	UND

Área para Dibujo o Fotografía

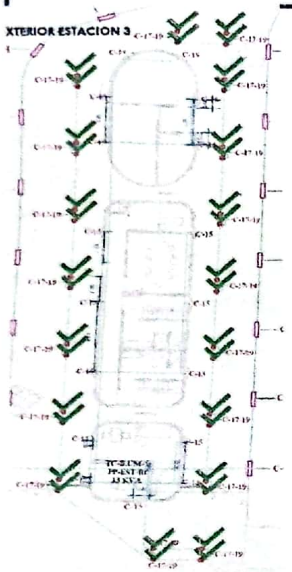

Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	14	36,00	60%		21,6	21,60
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						21,60

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capitulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel , curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.4	UND

Área para Dibujo o Fotografía





Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % Instalado		Cantidad	Medida Total
	1	4,00	35%		1,4	1,40
	2	18,00	35%		6,3	6,30
	8	9,00	35%		3,15	3,15
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						**10,85**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:


Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

JEDUBAR	**MEMORIAS DE OBRA** INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**		**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN				
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL				
Actividad:	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.5		ML

Área para Dibujo o Fotografía





Ubicación	Actividad	Modulo	Dimensiones (A) Longitud (m)	Dimensiones (B) Long de en caja para empalmes	Dimensiones (C) Total de cajas	D = (A)-(B*C) Cantidad	(E) % Instalado	(D*E) Medida Total
DERECHA	CABLEADO ELECTRICO	14	36,78	0,15	8	35,58	35%	12,45
		15	42,6	0,15	9	41,25	35%	14,44
		16	25,18	0,15	6	24,28	35%	8,50
		17	41,32	0,15	8	40,12	35%	14,04
		18	30,22	0,15	7	29,17	35%	10,21
		19	25,2	0,15	5	24,45	35%	8,56
		20	30,15	0,15	6	29,25	35%	10,24
		21	30,15	0,15	7	29,1	35%	10,19
		22	25,25	0,15	5	24,5	35%	8,58
		23	29,95	0,15	6	29,05	35%	10,17
IZQUIERDA		14	29,5	0,15	7	28,45	35%	9,96
		15	41,42	0,15	9	40,07	35%	14,02
		16	25,2	0,15	5	24,45	35%	8,56
		17	43,17	0,15	9	41,82	35%	14,64
		18	30,6	0,15	6	29,7	35%	10,40
		19	25,2	0,15	6	24,3	35%	8,51
		20	30,1	0,15	6	29,2	35%	10,22
		21	29,32	0,15	7	28,27	35%	9,89
		22	25,27	0,15	5	24,52	35%	8,58
		23	29,05	0,15	6	28,15	35%	9,85

Ubicación	Actividad	Modulo	Dimensiones Longitud (m)	Dimensiones Diametro de cajas 15x15	Dimensiones Total de cajas	Cantidad	% Instalado	Medida Total
TOTAL	TUBERIA CAJAS	13	71,8	0,15	8	70,6	65%	45,89
		CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						257,8780

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:


Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

ADMAR	**MEMORIAS DE OBRA** **INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA**	CONSORCIO JCO MALLORQUIN NIT 901 561 771-2 **Fecha:** 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.6	ML

Área para Dibujo o Fotografía





Ubicación	Modulo	Dimensiones (A) Longitud (m)	(B) Longitud de cajas 15x15	(C) Total de cajas	D= (A)-(B*C) cantidad	(E) % instalado (sin incluir cableado)	(D*E) Cantidad a cobrar	Medida Total = Cntidad a cobrar
TOTAL	2	71,62	0,15	18,00	68,92	65%	44,798	44,80
	8	51	0,15	9,00	49,65	65%	32,2725	32,27
	CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA							**77,0705**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Ingeniera Residene Interventoria
M.P. # 08202-092612 ATL

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para interrruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.9	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ILUMINACION ESTACION 3

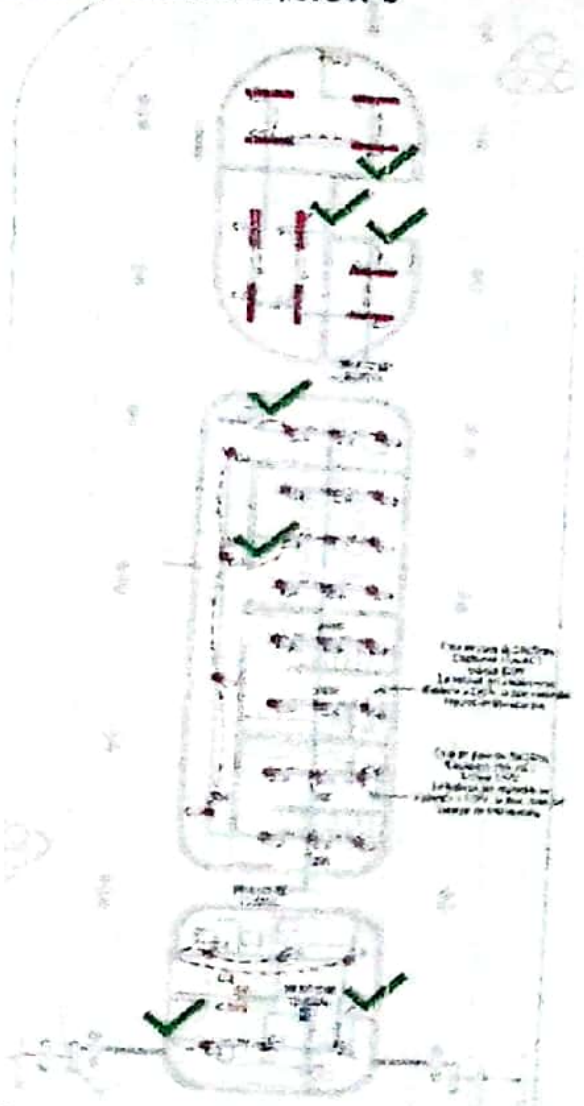

Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	**14**	7,00	60%		4,2	4,20

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA **4,20**

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUMAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUIN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para interrruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.10	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ILUMINACION ESTACION 3

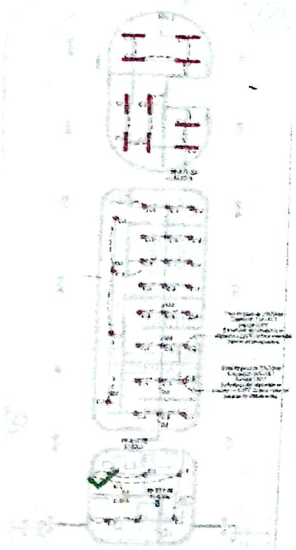

Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% Instalado			
ESTACION 3	14	1,00	100%		1	1,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						1,00

Quien Recibe:

Cyntidia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2023


Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e Instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", Incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.11	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ILUMINACION ESTACION 3

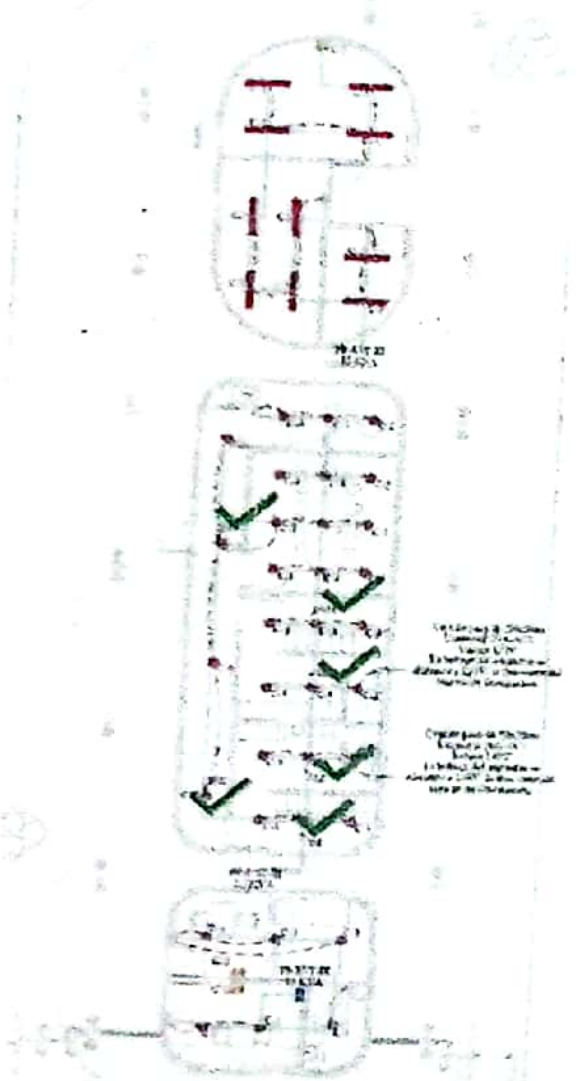

ILUMINACION GRADERIA PLAYA

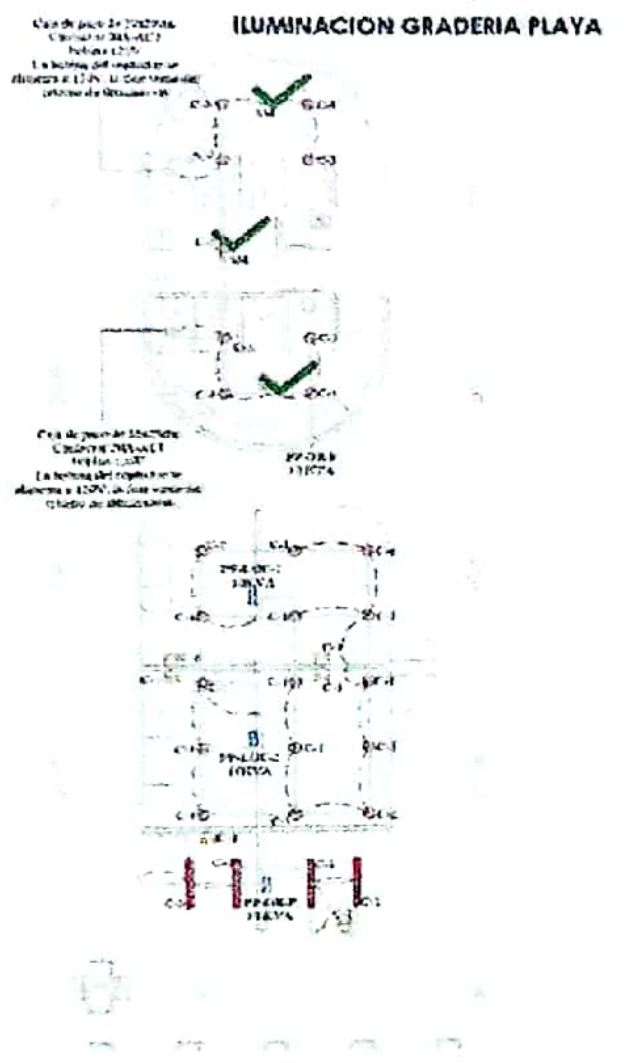

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	6,00	60%		3,6	3,60

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 3,60

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.12	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

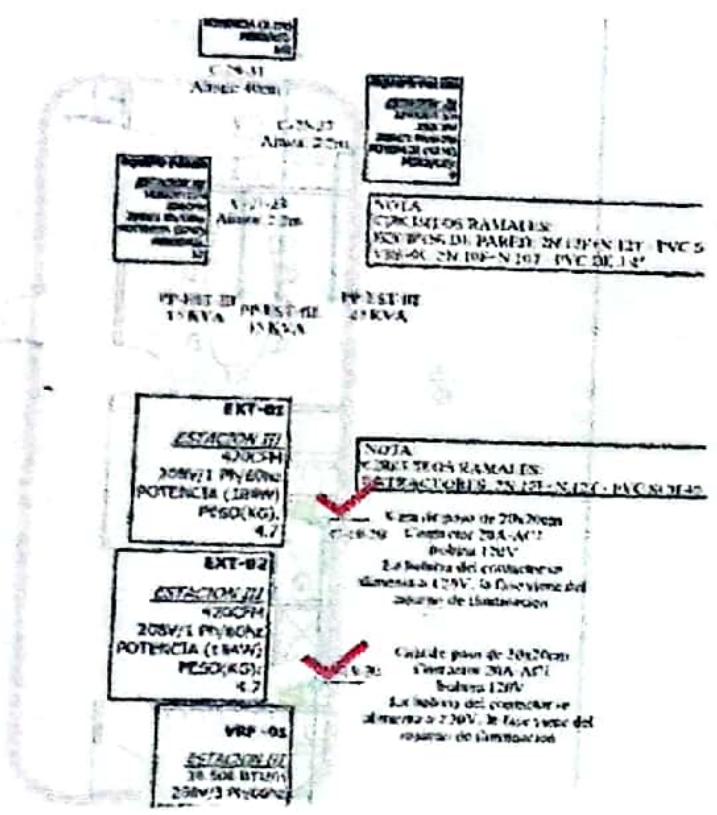

GRADERIA PLAYA

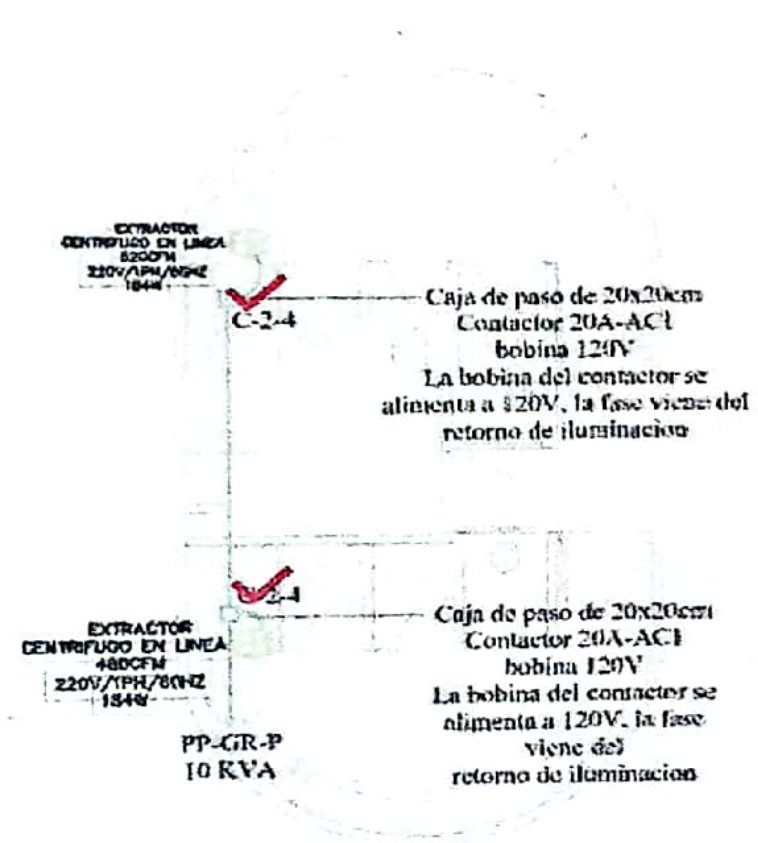

Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	2,00	60%		1,2	1,20

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	1,20

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	20	15.1.13	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

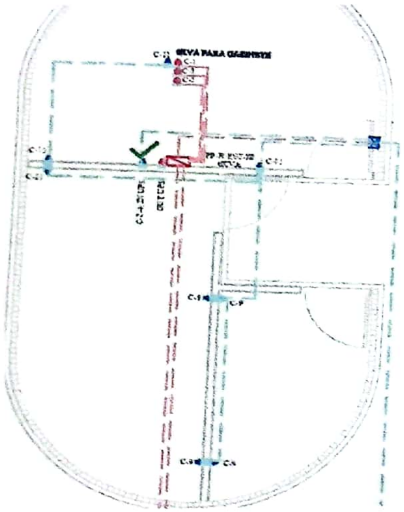

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	1,00	60%		0,6	0,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	0,60

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhonvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	20	15.1.14	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

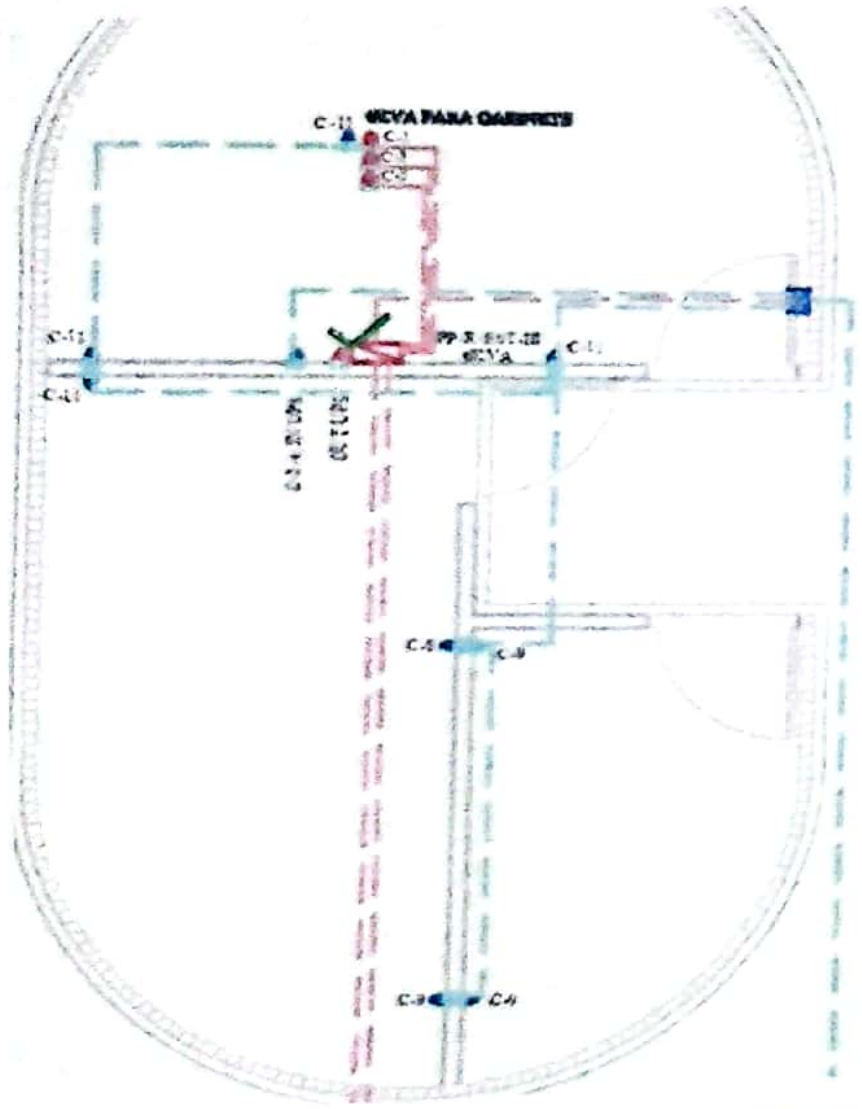

Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado	Dimensiones	Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	1,00	60%		0,6	0,60
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						0,60

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL.			
Actividad:	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.15	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado	Dimensiones	Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	42,00	100%		42	42,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						42,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092512 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.19	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

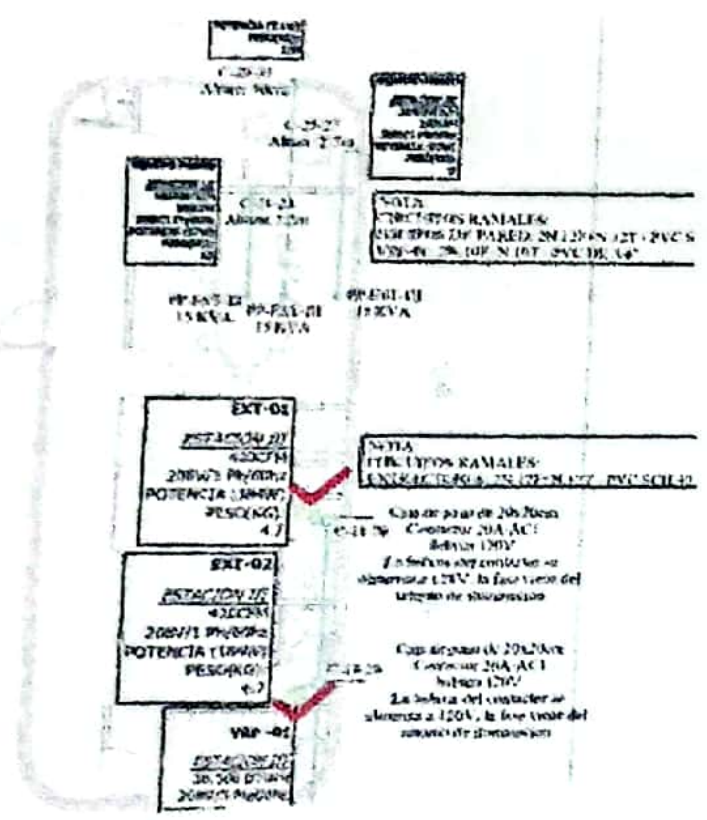

GRADERIA PLAYA

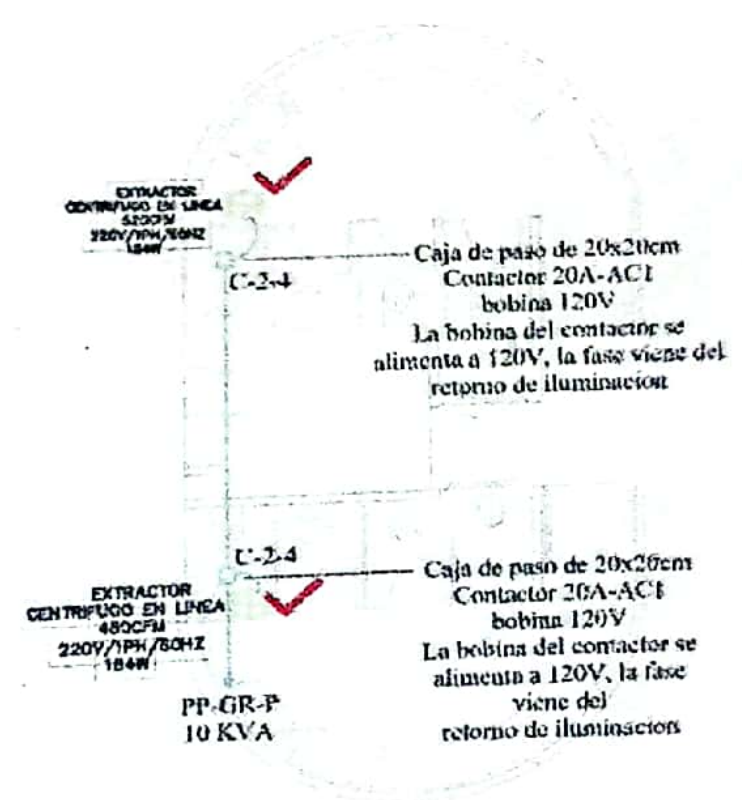

Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	2,00	100%		2	2,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						2,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Horvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por rnedio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.20	ML

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

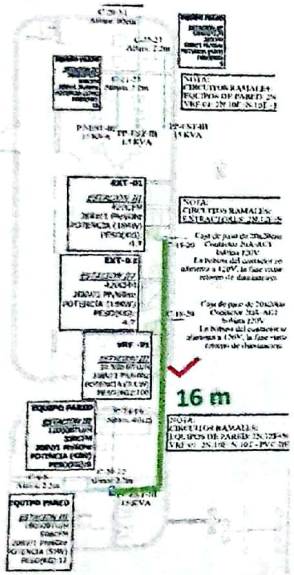

GRADERIA PLAYA



Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado	Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	20,00	100%	20	20,00
				CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	20,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUMAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.502.279-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.21	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	14	5,00	60%		3	3,00
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	3,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.22	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	**14**	1,00	60%		0,6	0,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**0,60**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jharvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.23	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	**14**	2,00	60%		1,2	1,20
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						**1,20**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhonvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Acta No.	Ítem No.	Unidad
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.24	ML

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	36,80	100%		36,8	36,80
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						36,80

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 63202-267439 STD

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Nit: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.25	ML

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	14	41,10	100%		41,1	41,10

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 41,10

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL			
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanell, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.28	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



GRADERIA PLAYA

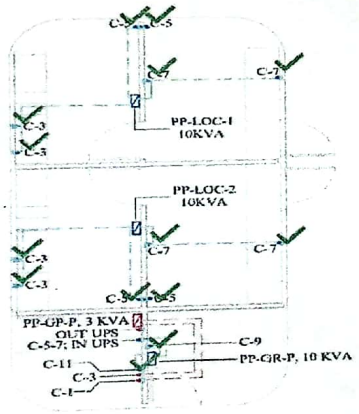

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado	Dimensiones	Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	3,00	100%		3	3,00
ESTACION 3	14	17,00	60%		10,2	10,20
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						**13,20**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2


Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		**Fecha:**	31/08/2023
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.1 SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", Incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por rnedio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	20	15.1.30	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



GRADERIA PLAYA

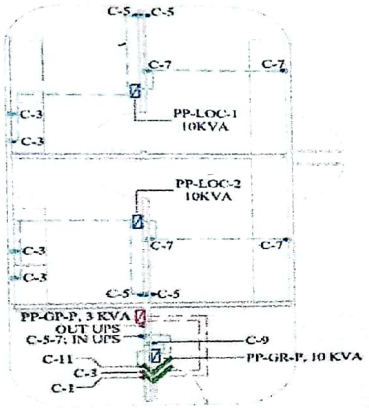

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado	Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	4,00	60%	2,4	2,40
ESTACION 3	14	3,00	100%	3	3,00
				CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**5,40**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES			
Actividad:	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.1	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



GRADERIA PLAYA

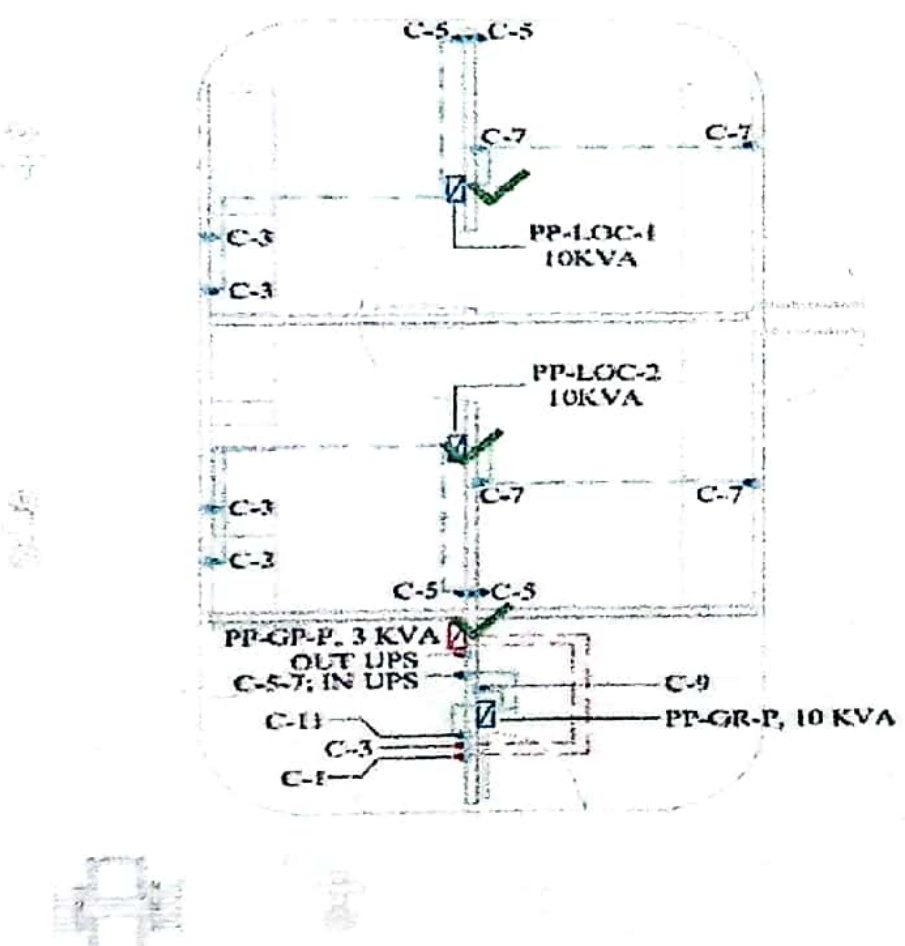

Ubicación	Modulo	Dimensiones cantidad	Dimensiones % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	1,00	20%		0,2	0,20

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 0,20

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-4


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2023


		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capitulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES			
Actividad:	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.2	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3



GRADERIA PLAYA

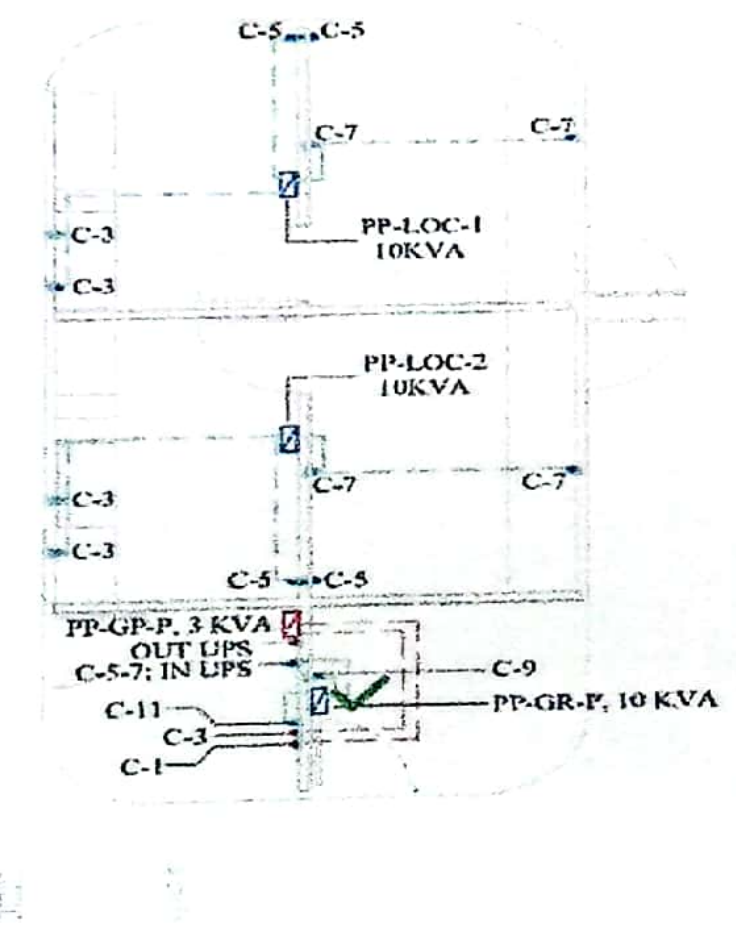

Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	1,00	20%		0,2	0,20
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						0,20

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES			
Actividad:	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.5	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

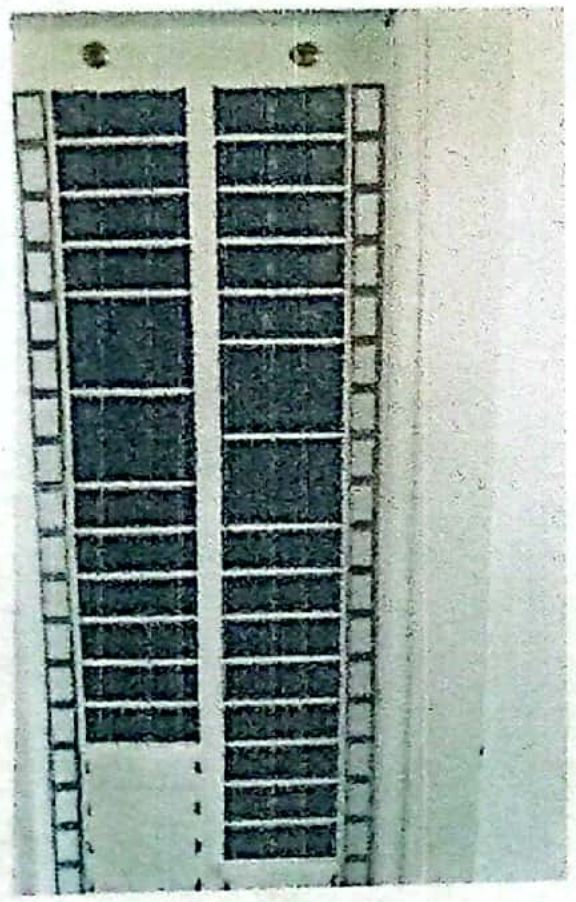

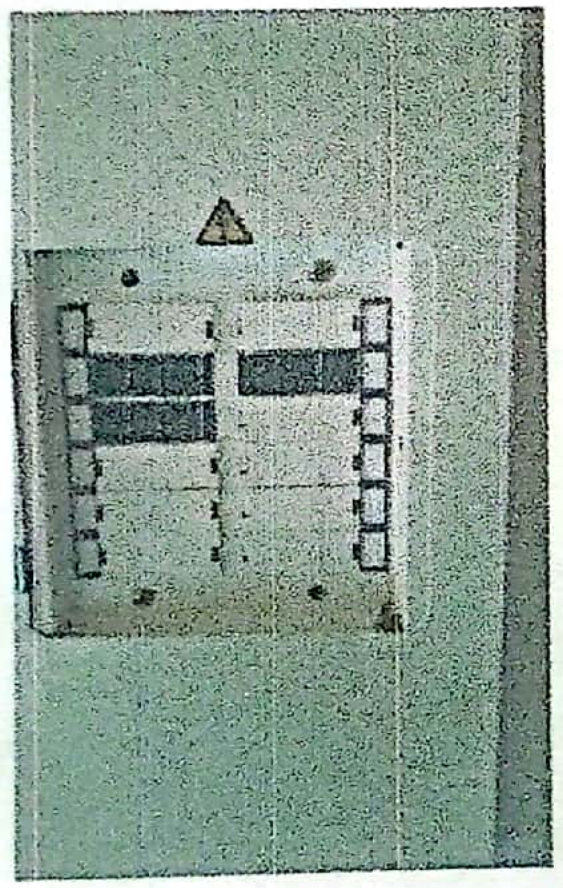

Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	9,00	100%		9	9,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						9,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

JHorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD


Powered by CamScanner

EDURBAN	MEMORIAS DE OBRA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.275-2
	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES			
Actividad:	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.7	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

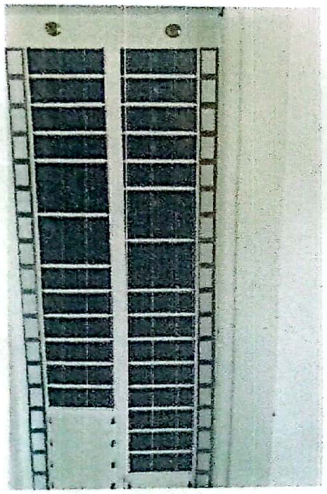



Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	14	2,00	100%		2	2,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						2,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES			
Actividad:	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.8	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

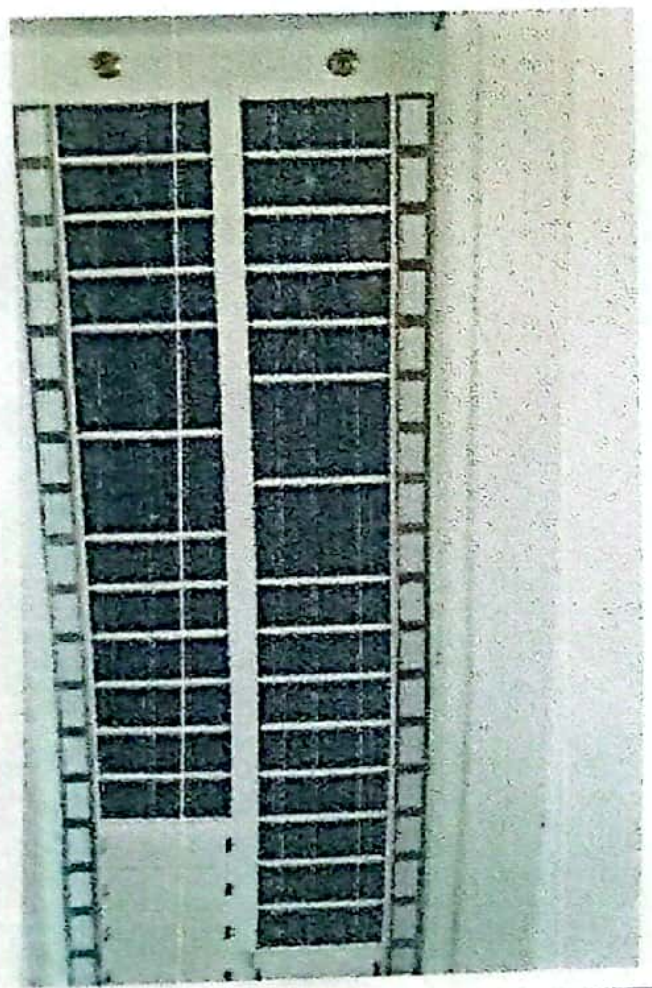


Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado		Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	2,00	100%		2	2,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						2,00

Quien Recibe:
Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:
Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2


Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES			
Actividad:	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.9	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

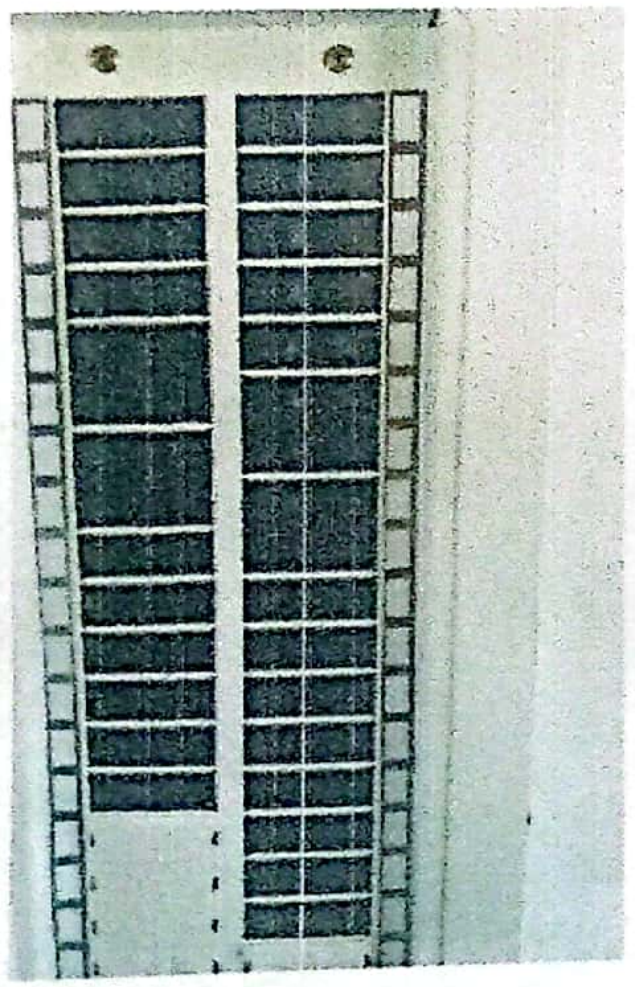

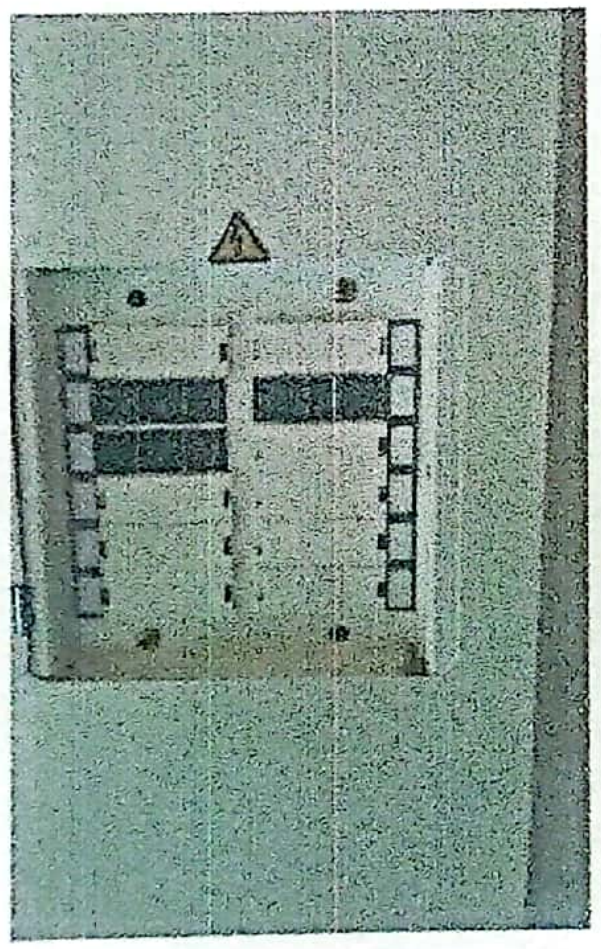

Ubicación	Modulo	Dimensiones: cantidad	Dimensiones: % instalado	Dimensiones	Cantidad	Medida Total
ESTACION 3	14	1,00	100%		1	1,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA						1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra


M.P. # 68202-267439 STD


EDUBAR	**MEMORIAS DE OBRA** INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN NIT: 901.501.273-2 Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	15.2 PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	20	15.2.11	UND

Área para Dibujo o Fotografía

ESTACION 3

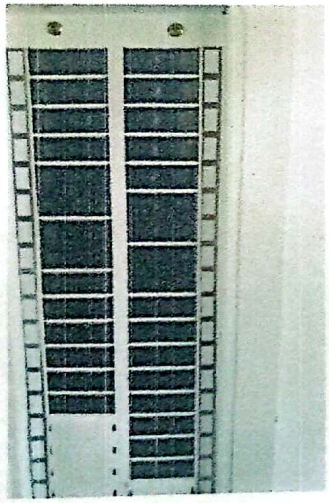

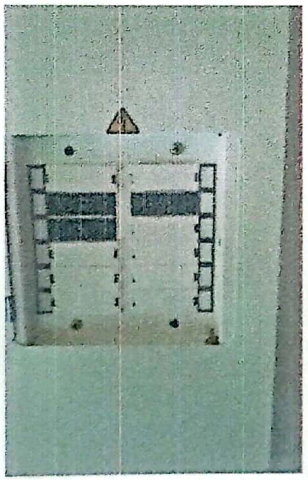

Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		cantidad	% instalado			
ESTACION 3	**14**	2,00	100%		2	2,00

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**2,00**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría

M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra

M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDMBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.379-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Inteventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Capitulo: 15.4 ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSIÓN
Actividad: Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", Incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.

Acta No.	Ítem No.	Unidad
20	15.4.23	ML

Área para Dibujo o Fotografía







Ubicación	Modulo	Dimensiones (A) Longitud (m)	(B) Long de cajas 1m x .60 m	(C) Total de cajas	(D) Numero total de tuberia (Banco de ductos)	E = (A*D)-(B*C) Cantidad	(F) % Instalado	(E*F) Medida Total
Derecha	37	56	1	2	2	110	100%	110,00
CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA								110,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		**Fecha:**	31/08/2023
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	19 PROVISIONES	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA PINO AMARILLO COLOR NATURAL CERRADURA COLOR NEGRO REF: P-02	20	19.05-2	UND

Área para Dibujo o Fotografía

PUERTAS P-02 MODULO 13

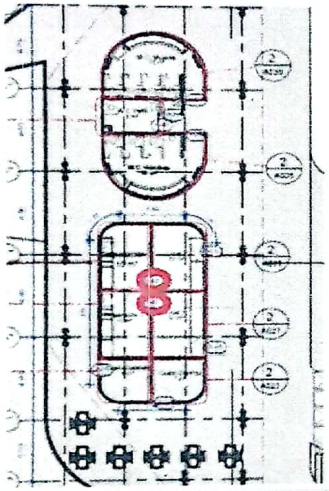

Detalle		Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
LA PLAYA		13				2,00	2,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATIL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA **2,00**

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capitulo:	20 - ITEMS NO PREVISTOS			
Actividad:	APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE ANGULO DECK	20	N.P 001	UND

Área para Dibujo o Fotografía

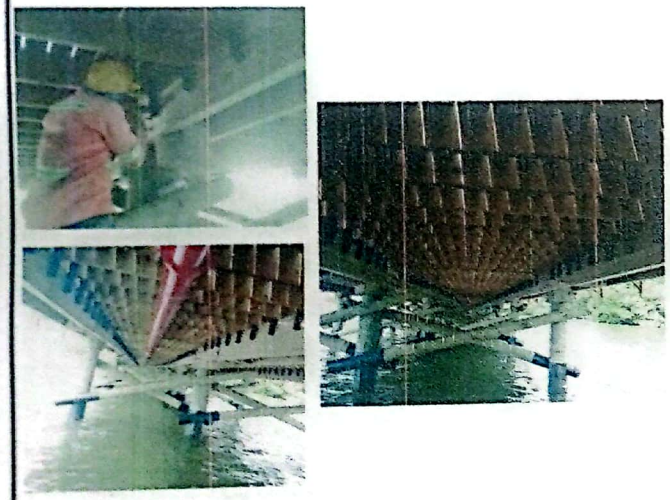

Detalle		Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
		1				705,00	705,00
		2				425,00	425,00
		3				689,00	689,00
		4				691,00	691,00
		5				689,00	689,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 3.199,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Powered by CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.373-2

Fecha: 31/08/2023

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Capítulo:	20 - ITEMS NO PREVISTOS			
Actividad:	DESMONTE DE BARRERA PARA CANALIZACION DE CANGREJOS	20	N.P 004	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	UBICACIÓN		Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	ABS INICIAL	ABS FINAL	Longitud (m)				
	710	550	160				160,00
	550	500	50				50,00
	500	450	50				50,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA **260,00**

Powered by CamScanner

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Inteventor: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Fecha: 31/08/2023

Capítulo: 20 - ITEMS NO PREVISTOS

Actividad: RELLENO EN MATERIAL DE PEDRAPLEN e= 0,5m

Acta No.	Ítem No.	Unidad
20	N.P 008	M3

Área para Dibujo o Fotografía







Detalle	Ubicación		Modulo	Dimensiones Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad	Medida Total
VER ANEXOS REMISIONES	MURO ESTACION 3						288,98	288,98
	630	570					189,60	189,60
	570	530					94,80	94,80

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 573,38

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 31/08/2023

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	20 - ITEMS NO PREVISTOS			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA GABINETE DE RCI EN MADERA PINO AMARILLO	20	N.P 010	UNIDAD

Área para Dibujo o Fotografía

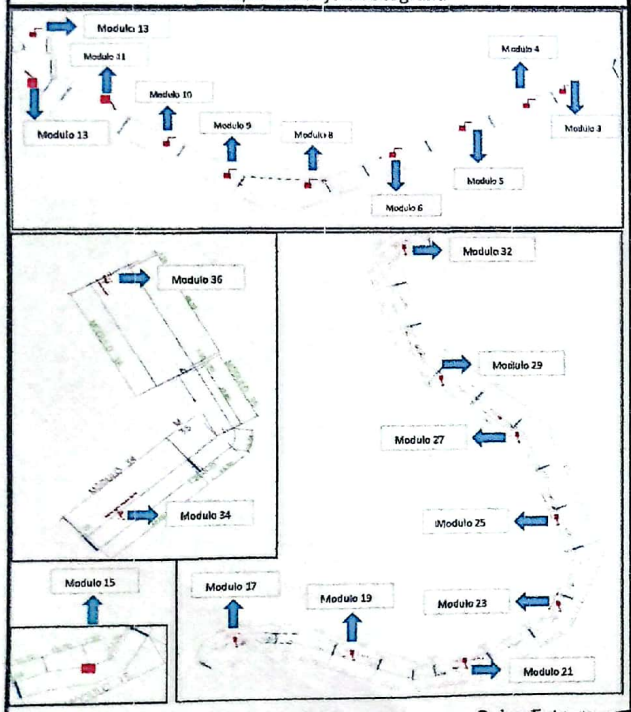

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones Unidad		Parcial %	N° de lados	Medida Total
Eje Superior	Pasarela 6 m	3	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	4	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	5	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	6	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	8	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	9	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	10	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 6 m	11	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	13	2,00				2,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	15	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	17	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	19	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	21	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	23	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	25	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	27	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	29	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	32	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	34	1,00				1,00
Eje Superior	Pasarela 1,5 m	36	1,00				1,00

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA 21,00

TOTAL EJECUTADO 21,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Ihorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-287439 STD

Powered by CamScanner
