INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 0032 DEL 2023 RELACIONADAS A LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DESIGNADAS.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Fecha de Elaboración del Informe:	**16 de agosto del 2023**
Informe de Supervisión:	**N° 02**
Periodo de Seguimiento:	**Del 16/07/2023 AL 15/08/2023**
Nombre del Supervisor:	**ALEXNAIDER BENJUMEA MURGAS**
Entidad del Supervisor:	**CORPOGUAJIRA**
Área del Supervisor:	**Subdirección de Gestión Ambiental**
Grupo del Supervisor:	**Administración Integral del recurso hídrico**
Cargo del Supervisor:	**Profesional Especializado Grado 15 (Con funciones de Coordinador)**
Designación Supervisor:	**Notificado Por correo los días 15 y 31 de mayo 2023**

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	**0032**	**FECHA**	**18/04/2023**	**Modalidad Contratación**	**SAMC - 005 DE 2023**	**Entidad Contratante**	**CORPOGUAJIRA**	
Contratista	**COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA**					**NIT**	**900539722-9**	
Representante Legal	**JOSE MARIO BOLAÑO SANCHEZ**					**CC**	**84.084.968**	
Objeto del Contrato	**REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA OPERADOS POR AEROBOMBAS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA PRODUCIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, BPIN 20223218000010.**			**Alcance del Contrato**	**El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC - 005 DE 2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.**			
Plazo Inicial del Contrato	**DOS (2) MESES**	**Acta de Inicio**	**Quince (15) de Junio de 2023**			**Valor Inicial Contratado**	**$ 335.816.574**	
Plazo Adicional del Contrato						**Valor Adicional**	**NAEP**	
Plazo Total del Contrato	**DOS (2) MESES**	**Fecha Terminación**	**Quince (15) de Agosto de 2023**			**Valor Total Contratado**	**$ 335.816.574**	
Tiempo Trascurrido del Contrato	**02 MES (100%)**	**Fecha Acta Final de Obra**	**Dieciséis (16) de Agosto de 2023**			**Valor del Anticipo**	**$ 167.908.287**	
Actas de Suspensión	**Numero**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Numero**	**Fecha**	
	NAEP					**NAEP**		
	NAEP					**NAEP**		

Porcentaje de Ejecución Física		**Porcentaje de Ejecución Financiera**		**Porcentaje de Retraso**	**Actas Parciales Suscritas**		
					No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**
Programado	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**		**1**	**140.626.552**	**70.313.276**	**70.313.276**
100%	**100%**	**100%**	**100**		**2**	**129.716.736**	**64.858.368**	**64.858.368**
					Final	**65.473.286**	**32.736.643**	**32.736.643**

3. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)


Este informe corresponde a las actividades desarrolladas en función a las tareas de supervisión del contrato de obra 0032 del 2023, del periodo comprendido del 16 de julio al 15 de Agosto del 2023. A continuación, se describen las labores principales de vigilancia y control realizadas en el periodo señalado en relación con las funciones de supervisor designada en la plataforma SECOP II, el día 18/04/2023 por el director general de CORPOGUAJIRA y notificada a través de los correos electrónicos contratacion@corpoguajira.gov.co los días 15 y 31 de mayo 2023.

Las funciones de vigilancia y control para el proyecto ("REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA OPERADOS POR AEROBOMBAS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA PRODUCIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, BPIN 20223218000010",) fueron divididas bajo las figuras de interventoría y supervisión en donde las funciones técnica, administrativa y financiera fuero delegadas para la interventoría (CONSORCIO MOLINOS MAICAO 2023, ALBERTO BRITO RONCANCIO), a través del contrato de contrato No. 0055 de 2023, y las demás al supervisor (yo), para tener mayor claridad sobre el tipo de seguimiento que debería de desempeñar el día 27 de junio del 2023 solicite a la oficina de jurídica de Corpoguajira mediante oficio con el asunto: *"Solicitud aclaración del alcance de rol de supervisor"*, del cual tuve respuesta de forma física por medio del oficio con fecha 03 de julio del 2023, en dónde la funcionaria encargada de dirigir la oficina jurídica, define el alcance de mis funciones como supervisor limitándola a la realización de actividades netamente administrativas enfocadas específicamente al manejo y cargue del expediente electrónico y verificación de requisitos o entregables en los tramites de pagos al contratista en la plataforma SECOP II.

4. ETAPA PREVIA

Después de culminado el cronograma del proceso selección abreviada de menor cuantía SAMC-005-2023, mediante resolución No. 0860 del 12 de abril de 2023, se adjudica dicho proceso a la persona jurídica COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA, representada legalmente por JOSE MARIO BOLAÑOS SANCHEZ, por cumplir todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, suscribiéndose el contrato de obra 0032 del 2023 el día 18 de abril del 2023, en esta misma fecha en la plataforma SECOP II, se me asigna las funciones como supervisor del contrato mencionado, la cual fue notificada vía correo electrónico los días 15 y 31 de mayo 2023. El día 2/06/2023 en la plataforma SECOP II, se me asigna como supervisor al contrato de interventoría 0055 de 2023, el cual tiene como objeto hacer seguimiento contrato de obra 0032 del 2023, ante la posibilidad de materializarse un posible conflicto de interés el día 7 de junio del 2023 mediante oficio con número de radiado 202306073500012423, solicite omitir la designación argumentando que como las funciones de la interventoría y el supervisor de obra no pueden ser concurrentes por razones ética y de conflicto de interés no podía ejercer las dos supervisiones. Mediante oficio del 15 de junio del 2023 con radicado 202306153300013063, se adjudica esta función de supervisor al señor subdirector de gestión ambiental amparados en la resolución 1527 del 14 de junio del 2023, en donde se realiza una modificación parcial del manual de contratación (resolución 1157 del 2022) en la forma de designación de los supervisores de contratos.

5. LOCALIZACION

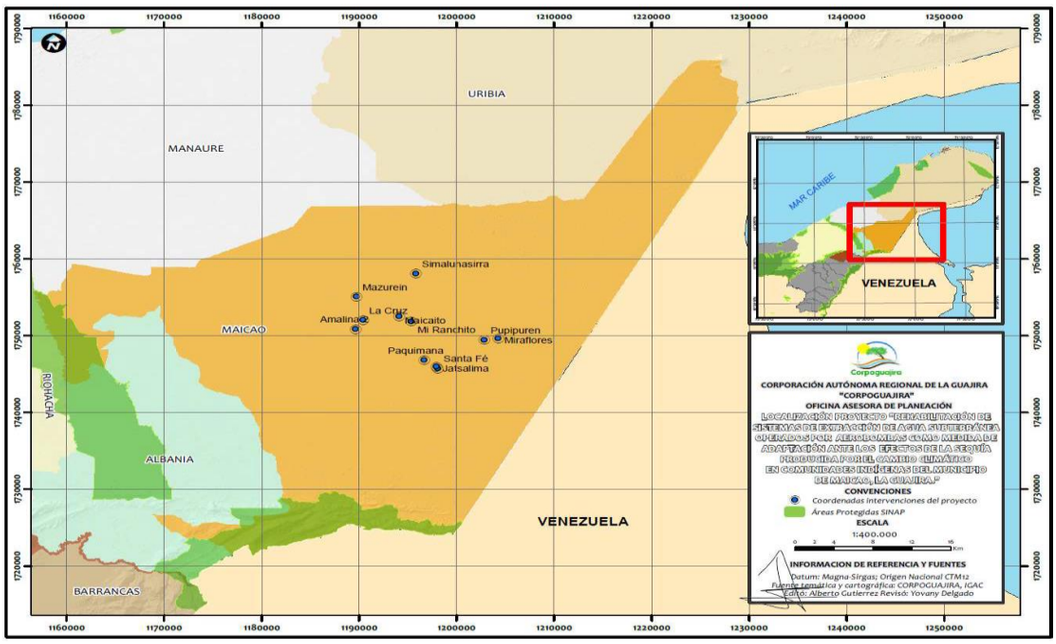

Las comunidades objeto del proyecto se localizan en la zona rural de los municipios de Maicao. El total de las comunidades pertenecen a la comunidad wayuu, la cual se encuentra asentada a lo largo y ancho del departamento de La Guajira. En la siguiente tabla se relacionan los nombres de las comunidades asociadas y las coordenadas para su ubicación, entre otros datos.

N°	Municipio	Comunidad	Autoridad y telefono	Población				Coordenadas	
				#Casas	#Personas	#Adultos	#Niños	N	W
1	Maicao	Miraflores	Silherio Pusahina 3106686679	24	215	92	123	11°22'05.8"	72°12'23,2"
2	Maicao	Pupipuren	Ramiro Paz 3106068909 3024477530	20	157	67	90	11°21'58.6"	72°13'09,9"
3	Maicao	Maicaoito	Ramn Cambar Maria del pilar Palmar 3144598240	48	538	231	307	11°23'41.3"	72°17'58,1"
4	Maicao	Santa Fé	Andres Palacio	16	94	40	54	11°20'00.4"	72°15'48,4"
5	Maicao	Jatsalima	Yanika Ipuana Maria Boscan 3003926405	20	235	101	134	11°20'08.2"	72°15'52,8"
6	Maicao	Paquimana	Betulia	15	172	74	98	11°20'36.0"	72°16'33,7"
7	Maicao	Mi Ranchito	Fransisco Ramirez Victor Ramirez 3005787601	11	127	55	72	11°23'19.4"	72°17'16,11"
8	Maicao	Mazurein	Caballero Montiel Ipuana 3212233962	28	190	82	108	11°25'05.7"	72°20'21,1"
9	Maicao	La Cruz	Angelina Gonzalez	25	253	109	144	11°23'26.1"	72°19'59,4"
10	Maicao	Amalina 2	Laudy Fernandez 3014586168	30	272	117	155	11°52'48.5"	72°30'25,6"
11	Maicao	Tuctus	Fenando Ipuana 3134356541	4	80	36	44	11°23,82.0N	72°20,71.3W

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Después de definido el alcance de mis funciones como supervisor por la oficina jurídica en el presente periodo esta supervisión desarrolla las siguientes actividades generales:

- Recopilación de información: se recopila los documentos soporte consignados en la plataforma SECOP, tanto del contrato de obra como el de la interventoría.

- Análisis de información: se realizan actividades tendientes a complementar la información aportada por la interventoría en relación con los verificables o soportes de estrega de productos.

- Se verifico en plataforma (SECOP II) el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta plataforma.

- Como el contrato de interventoría se pactó que su intervención en el seguimiento y vigilancia del contrato de obra (0032 del 2023) era de tipo integral sobre aspectos técnicos, administrativos y financieros, la injerencia de esta supervisión en estos temas se limitó a la realización de acciones administrativas de publicación y verificación en la plataforma SECOP II, por tal motivo se hace claridad que los aspectos de tipo técnico: es decir la verificación de la ejecución de las obligaciones propias del contrato, pactadas en el cuerpo de los mismos, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el contratista, fue realiza por la interventoría, de igual forma la vigilancia desde el punto de vista administrativo y financiero es decir el seguimiento a la ejecución de los recursos del contrato con relación a los pagos o desembolsos se efectúen en los términos y por las sumas pactadas en las cláusulas contractuales, por parte de la interventoría.

Se da continuidad a las consultas y revisión de documentos tales como cantidades de obra según datos suministrados o extraídos de los informes de la interventoría, se verifico la actualización de pólizas de garantía la cual tiene una aprobación por parte del jefe de la oficina asesora jurídica el 28/08/2023.

De igual forma se diseñó y se lleva un control de avance del contrato de obra, con el fin de detectar en la ejecución de este los posibles atrasos, necesidad de reprogramaciones, cuantificar los recursos invertidos y visualizar las actividades crítica, en la medida que se detecten atrasos en la obra, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para garantizar el total cumplimiento de la programación de la obra.

7. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Al finalizar la fecha de corte del presente informe se informa que la ejecución del contrato de obra se desarrolla sin contratiempos en donde según interventoría se han ejecutado todas las actividades de obras contratadas.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DETALLADO DE LO CONTRATADO.

En la siguiente tabla se podrá observar en detalle las condiciones técnicas y características generales del proyecto objeto de seguimiento.

CONDICIONES INICIALES DE CONTRATO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.				
1.1	Realizar jornadas de socialización en las comunidades indígenas objeto del proyecto.	UND	11.00	$ 1,305,000.00	$ 14,355,000.00
	SUBTOTAL				$ 14,355,000.00
2	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE.				
2.1	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Miraflores	Un	1.00	$ 11,455,451.00	$ 11,455,451.00
2.2	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Pupipuren	Un	1.00	$ 10,984,862.00	$ 10,984,862.00
2.3	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Maicaito	Un	1.00	$ 10,888,448.00	$ 10,888,448.00
2.4	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Santa Fé	Un	1.00	$ 12,425,742.00	$ 12,425,742.00
2.5	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Jatsalima	Un	1.00	$ 11,768,564.00	$ 11,768,564.00
2.6	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Mi Ranchito	Un	1.00	$ 11,463,956.00	$ 11,463,956.00
2.7	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Mazureim	Un	1.00	$ 12,144,923.00	$ 12,144,923.00
2.8	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de La Cruz	Un	1.00	$ 11,769,597.00	$ 11,769,597.00
2.9	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Amalina 2	Un	1.00	$ 12,711,461.00	$ 12,711,461.00
2.10	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de Tuctu	Un	1.00	$ 11,430,996.00	$ 11,430,996.00
2.11	Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua de la comunidad de paquimana	Un	1.00	$ 23,071,565.00	$ 23,071,565.00
	SUBTOTAL DE REAHABILITACION DE MOLINOS				$ 140,115,565.00
3	LIMPIEZA DE POZOS				
3.1	Limpieza de pozos profundos	UND	11.00	$ 7,113,700	$ 78,250,700.00
	SUBTOTAL				$ 78,250,700.00
4	Publicación y divulgación de información				
4.1	Realizar la Publicación y divulgación de información	Unidad	1.00	$ 10,047,600.00	$ 10,047,600.00
	SUBTOTAL				$ 10,047,600.00
5	Procesos de sensibilización y concienciación ambiental en comunidades indígenas				
5.1	Realizar talleres de sensibilización y concienciación en comunidades indígenas del municipio de Maicao, departamento de La Guajira	Unidad	11.00	$ 1,605,000.00	$ 17,655,000.00
	SUBTOTAL				$ 17,655,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 260,423,865.00
	ADMINISTRACIÓN			22.0%	$ 57,293,250.00
	IMPREVISTOS			1.0%	$ 2,604,239.00
	UTILIDAD			5.0%	$ 13,021,193.00
	IVA (S/UTILIDAD)			19.0%	$ 2,474,027.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			28%	$ 75,392,709.00
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				$ 335,816,574.00

9. RELACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y ADICIONALES:

En la actualidad al presente reporte no se ha identificado la necesidad de actividades adicionales.

10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

En concordancia al informe presentado por la interventoría, en este periodo, en el siguiente esquema se podrá apreciar el avance del cronograma.

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATADAS	TIEMPO							
				MES 1				MES 2			
1	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.	UND	11.0	11				0			
1.1	PROGRAMADO			2	3	3	3				
1.2	EJECUTADO			2	3	3	3				
2.3	ACTUALIZADO										
2	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE.	UND	11.0	8				3			
2.1	PROGRAMADO				2	2	1	2	2	2	
2.2	EJECUTADO				3	3	2		2		1
2.3	ACTUALIZADO										
3	LIMPIEZA DE POZOS	UND	11.0	0				11			
3.1	PROGRAMADO				2	2	1	2	2	2	
3.2	EJECUTADO							3	4	3	1
3.3	ACTUALIZADO										
4	Publicación y divulgación de información	UND	1.0	0				1.0			
4.1	PROGRAMADO			0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	
4.2	EJECUTADO							0.25	0.25	0.25	0.25
4.3	ACTUALIZADO										
5	Procesos de sensibilización y concienciación ambiental en comunidades indígenas	UND	11.0	0				11			
5.1	PROGRAMADO				2	2	1	2	2	2	
5.2	EJECUTADO							3	4	3	1
5.3	ACTUALIZADO										

Según análisis realizado al esquema en el presente periodo, la ejecución del proyecto se desarrolló sin ninguna dificultad, destacándose la terminación de actividades de obra como la ***"Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua existente".,*** de igual forma las actividades, de "***limpieza de pozos", "Publicación y divulgación de información", "Procesos de sensibilización y concienciación ambiental en comunidades indígenas",*** las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, según acta de recibo parcial 2 (31-07-2023) y acta de recibo final (15-08-2023).

11. RESUMEN GENERAL DE AVANCE

En la imagen que se sigue se muestra en detalle cual es el avance físico y financiero del contrato con relación a la información aportada por la interventoría.

REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA OPERADOS POR AEROBOMBAS COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA PRODUCIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, BPIN 20223218000010.

CONDICIONES DEL CONTRATO				RESUMEN GENERAL DE AVANCE MES 2								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDAD	POD	Cantidad ejecutada a/mes	Cantidad ejecutada acumulada anterior	Valor ejecutado/mes	Valor ejecutado/Anterior	Valor ejecutado acumulado	Cantidad ejecutada acumulada	% real ejecutado en el periodo	% real ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado General
1	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.	11.0	0.0551	0.0	11.0	0.0	14,355,000.0	14,355,000.0	11.0	0.0	100.0	0.0551
2	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE.	11.0	0.5380	3.0	8.0	45,415,464.0	94,700,101.0	140,115,565.0	11.0	27.3	100.0	0.5380
3	LIMPIEZA DE POZOS	11.0	0.3005	11.0	0.0	78,250,700.0	0.0	78,250,700.0	11.0	100.0	100.0	0.3005
4	Publicación y divulgación de información	1.0	0.0386	1.0	0.0	10,047,600.0	0.0	10,047,600.0	1.0	100.0	100.0	0.0386
5	Procesos de sensibilización y concienciación ambiental en comunidades indígenas	11.0	0.0678	11.0	0.0	17,655,000.0	0.0	17,655,000.0	11.0	100.0	100.0	0.0678
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		1.0			151,368,764.0	109,055,101.0	260,423,865.0				
	ADMINISTRACIÓN				22.0%	33,301,128.0	23,992,122.0	57,293,250.0				
	IMPREVISTOS				1.0%	1,513,688.0	1,090,551.0	2,604,239.0				
	UTILIDAD				5.0%	7,568,438.0	5,452,755.0	13,021,193.0				1.0
	IVA (S/UTILIDAD)				19.0%	1,438,003.0	1,036,023.0	2,474,027.0				
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				28%	43,821,257.0	31,571,451.0	75,392,709.0				
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU					195,190,021.0	140,626,552.0	335,816,574.0				
VALOR CONTRATADO		335,816,574.0				58.12 %	41.88 %	100.00 %	100.0 %			

Según análisis realizado a los informes de interventoría el avance físico de las cantidades de obras contratadas es equivalente al 100% y el avance financiero del 100%. la interventoría tramita cuenta de acta parcial 2 con fecha de suscripción del 31 de julio del 2023, con valor de $ 129,716,736.00, en donde se amortiza el 50% (64.858.368), de igual forma se suscribe el acta de recibo final entre el contratista y la interventoría por 65.473.286, se amortiza

32.736.643, para un avance financiero a la fecha del 100%. Se hace claridad que en virtud de las competencias integrales (técnicas, administrativa y financiera), conferidas a la interventoría esta fue la encargada de suscribir y tramitar la acta parcial 2 y el acta final.

12. Aspectos administrativos y financieros

12.1. Garantías: en el proceso de revisión y aprobación de garantías se constató según información aportada que en el periodo que se reporta las pólizas de cumplimiento y la de responsabilidad civil se encuentra acorde a las disposiciones consagradas en la minuta contractual, las cuales fueron aprobadas por la oficina jurídica el día 29 de agosto del 2023.

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	BQ-100069161	SEGUROS MUNDIAL	28/08/2023	$235.071.601,80
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**ESTABILIDAD DE LA OBRA**
VALOR ASEGURADO	$ 33.581.657,40	$167.908.287,00	$ 16.790.828,70	$ 16.790.828,70
VIGENCIA DESDE	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	15/08/2023
VIGENCIA HASTA	15/08/2024	14/02/2024	15/08/2026	15/08/2025

PÓLIZAS	Nos.	COMPAÑÍA		FECHA EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO TOTAL
	BQ-100018382	SEGUROS MUNDIAL		11/05/2023		232.000.000,00
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	VIGENCIA				
		DESDE			HASTA	
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Responsabilidad Civil Extracontractual.	232.000.000,00	18	04	2023	18	06	2023

VIGILANCIA TECNICA: Necesidades de cambio o ajuste: en el periodo que se reporta no se evidencio necesidades de cambio o ajuste.

Preparación de soportes o documentos para hacer efectivas las garantías: en las fechas que enmarca el presente reporte no se informó ni se evidencio la ocurrencia de hechos que ameriten la solitud de hacer efectiva las garantías de cumplimiento ni las de responsabilidad civil que amparan el contrato.

Avance de Ejecución Reportado: al analizar la información aportada se puede deducir que actualmente hay un avance de las actividades de obra del 100,0 % con un avance en tiempo de ejecución del 100.0% (2 mes).

VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE: Seguimiento a la gestión financiera: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujeta a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3923 del 30-01-2023, del Rubro de inversión No. 00AD-3206-0900-2022-321800-0010, expedido por el SPGR y el CDP 95 del 24-01-2023 expedido por el Profesional especializado del Presupuesto de Corpoguajira.

Revisión pagos al contratista: en el periodo que se reporta el contratista y la interventoría suscribieron y tramitaron el acta parcial 02, fechada el 31 de julio del 2023, por un valor total de $ 129,716,736.00, en donde se amortiza el 50% (64.858.368), y el acta de recibo final 65.473.286, se amortiza 32.736.643, para un avance financiero a la fecha del 100%.

Documentar pagos y ajustes: Actualmente se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general.

Balance después del acta parcial 2.

VALOR TOTAL CONTRATO:	335.816.574,00	
VALOR ANTICIPO		167.908.287,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		140.626.552,00
VALOR PRESENTE PAGO (ACTA PARCIAL 2)		129.716.736,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		64.858.368,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		64.858.368,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		65.473.286,00
SUMAS IGUALES	335.816.574,00	335.816.574,00

Balance después de acta recibo final.

VALOR TOTAL CONTRATO:	335.816.574,00	
VALOR ANTICIPO		167.908.287,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		270.343.288,00
VALOR PRESENTE PAGO (Acta recibo final)		65.473.286,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		32.736.643,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		32.736.643,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		0,00
SUMAS IGUALES	335.816.574,00	335.816.574,00

Verificación de entrega de anticipos y amortización: el contratista realizo solicitud del préstamo bajo la modalidad de anticipo, una vez verificados los requisitos mínimos para este propósito por parte de la interventoría.
Verificación de actividades adicionales: en la actualidad al presente reporte no se ha identificado la necesidad de actividades adicionales.
Coordinación del trámite de liquidación del contrato: en su momento se realizará la respectiva gestión para el trámite correspondiente a la liquidación del contrato.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de obra pública Nº 0032 de 2023, certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido del 15 de julio al 15 de agosto de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA
Contrato de obra pública No. 0032 de 2023
Factura Nº
Fecha de Seguimiento: 16 de agosto de 2023

CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	30%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	29%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, interventoría o para la prestación del servicio	**25%**	24%
• Personal idóneo	**10%**	10%
• Valor Agregado	**3%**	3%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**	2%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	**NO**
SUMATORIA CALIFICACIÓN:		98%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del contrato de obra Nº 0032 de 2023, manifiesto que teniendo en cuenta los datos de contabilidad de cantidades obtenidos del informe de interventoría del mismo periodo del presente informe, el avance físico general del contrato de obra equivale al 100%, con un avance en tiempo de ejecución del 100% (2 mes), se informa además que el contratista en este periodo presento cuenta de cobro correspondiente al acta de recibo parcial 2, y acta de recibo final, las cuales fueron tramitada por la interventoría en concordancia a las funciones de vigilancia y control integrales que esta ejerce sobre el contrato obra 0032 del 2023. En virtud de que el seguimiento y control del proyecto por su complejidad es compartido por las figuras de la interventoría y la supervisión el presente informe contiene información complementaria que enmarca los resultados del seguimiento del proyecto en concordancia a las funciones de cada figura de control y vigilancia, asignado al proyecto. Se manifiesta que después de revisar la documentación relacionada al tramite del acta de recibo final adjunta en la plataforma secop 2, está en términos generales es acorde con los soportes aportados es por este motivo que se procederá a dar aprobación al tramite en la plataforma secop 2, en concordancia a Las funciones administrativas de mi competencia.

Se firma este informe a los dieciséis (16) días del mes de julio del 2023.

ALEXNAIDER BENJUMEA MURGAS
Profesional Especializado –
CORPOGUAJIRA
Supervisor
