aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000376	9455552287	I	2023/08/13	2023/08/16	BANCO BOGOTA	3	$740,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
1	CC 73565045	DAVILA JAIRO	230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,080,000	$144,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000376	9455552287	I	2023/08/13	2023/08/16	BANCO BOGOTA	3	$740,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$1,100	$0	$333,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$332,800	$1,100	$0	$333,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,800	$500	$0	$145,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$144,800	$500	$0	$145,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$900	$0	$260,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,000	$900	$0	$260,900
TOTAL				1	$737,600	$2,500	$0	$740,100

Espacio para
Logo Corporativo

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
NIT 73.565.045-1
CR LAS FLORES CL11 13 40
Tel: (605) 7726810
San Martín De Loba - Colombia
jairodavila85@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJD 59

Señores	Gobernacion del Quindio		
NIT	890.001.639-1	**Teléfono**	(605) 7417700 - Ext. 000
Dirección	calle 20 # 13-22	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2023, 17:43
Expedición	08/08/2023, 17:43
Vencimiento	08/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	INTERVENTORIA RED SALUD	1.00	46,624,028.00	46,624,028.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones seiscientos veinticuatro mil veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 46,624,028.00

Total Bruto	46,624,028.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	46,624,028.00

Observaciones:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICAS (ZONA A) REDSALUD ARMENIA EN VIRTUD DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046070443 aprobado en 20230316 prefijo FEJD desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b8a1389b4efe94e097d565b287e917af40603720143e6144a6bedc4230cc44ad5c7e692b0f1790b19267f923a93b15a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA No. 001
CONVENIO/CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 008

INTERVENTOR: JAIRO ALFONSO DÁVILA GUERRA

SUPERVISOR: VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ORION

NIT: 901621988-4

OBJETO: **CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (ZONA A) RED SALUD ARMENIA, EN VIRTUD DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES PANDEMIA SARS COV-2 (COVID 19) EN ARMENIA QUINDÍO**

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	Licitación publico
No. Proceso	006 del 2022
Tipo de Contrato	Contrato de obra
Secretaría que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	Secretaria de aguas de infraestructuradel departamento del Quindío
Dependencia que genera elproceso	Infraestructura social del departamento del Quindío
No. Del contrato	010 del 2022
Fecha de suscripción del contrato	04 de noviembre 2022
Contratista	CONSORCIO ORION
NIT / CC	901621988-4

Valor Inicial del Contrato	$477.221.983,94
Forma de pago (ídem al contrato)	95% actas parciales y 5% liquidación
Plazo de ejecución	40 días calendario
Fecha de inicio	04 de Noviembre del 2022
Fecha de terminación inicial	13 de diciembre del 2022
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN N o. 001 DEL2022	12 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de terminación de suspensión no. 001del 2022	27 de diciembre del 2022
Prorroga suspensión no. 001 del2022	28 de diciembre del 2022
Terminación prorroga de suspensión no.001 del 2022	13 de enero del 2023
Prorroga de suspensión no. 001 de2023	15 de enero del 2023
Fecha de terminación de prórroga de suspensión no. 001 de 2023	18 de enero del 2023
Fecha de reinicio	19 de enero del 2023
Fecha de terminación	20 de enero de 2023
Plazo de ejecución a prorrogar	40 días
Fecha de terminación	01 de marzo de 2023
Fecha Inicio de suspensión 002	01 de marzo de 2023
Fecha de reinicio 2	08 de mayo de 2023
Fecha de terminación final	07 de junio de 2023
Supervisor por parte del Departamento	Vanessa Katherine Rincón Gaviria Jefe de infraestructura social del departamento

2. DATOS FINANCIEROS	
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2022	No. 1943 del 11/03/2022 por valor de $496.920.387
No. y valor Registro Presupuestal 2022	No. 6705 del 01/09/2022 por valor de $477.221.983,94
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2023	No. 36 del 01/01/2023 por valor de $477.221.983,94
No. y valor Registro Presupuestal 2023	No. 23 del 01/01/2023 por valor de $477.221.983,94
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2023	No. 2028 del 16/03/2023 por valor de $36.655.922
No. y valor Registro Presupuestal 2023	No. 1674 del 15/03/2023 por valor de $36.655.922
Adición (Modificatorio No. 002 de 2023	$ 36.655.922
Valor Total del Contrato	$513.877.905,94

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

- **ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA**

Se adelantan los trabajos de interventoría de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato 008 del 2020 y supervisado por el funcionario que la entidad GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, designo para tal fin:

ASPECTOS TÉCNICOS

Componente técnico:

Se verifico la ejecución del contrato de obra y de interventoría de acuerdo con las condiciones establecidas

Bitácora:


Se adelanto la bitácora día a día en obra, donde se consignan todas las actividades realizadas en obra.

En la bitácora se recopilo información diaria, de acuerdo con las actividades realizadas y donde se incluyeron las respectivas memorias de cálculo de las cantidades de obra para la verificación y posterior

realización del balance, además se dejó constancia y aprobación de materiales para la compra oportuna por parte del CONTRATISTA, como por ejemplo las siguientes:

Así mismo se realizó aprobación de trazado de planos:

- Localización de accesorios PMR.
- Instalación de láminas de cielo raso.

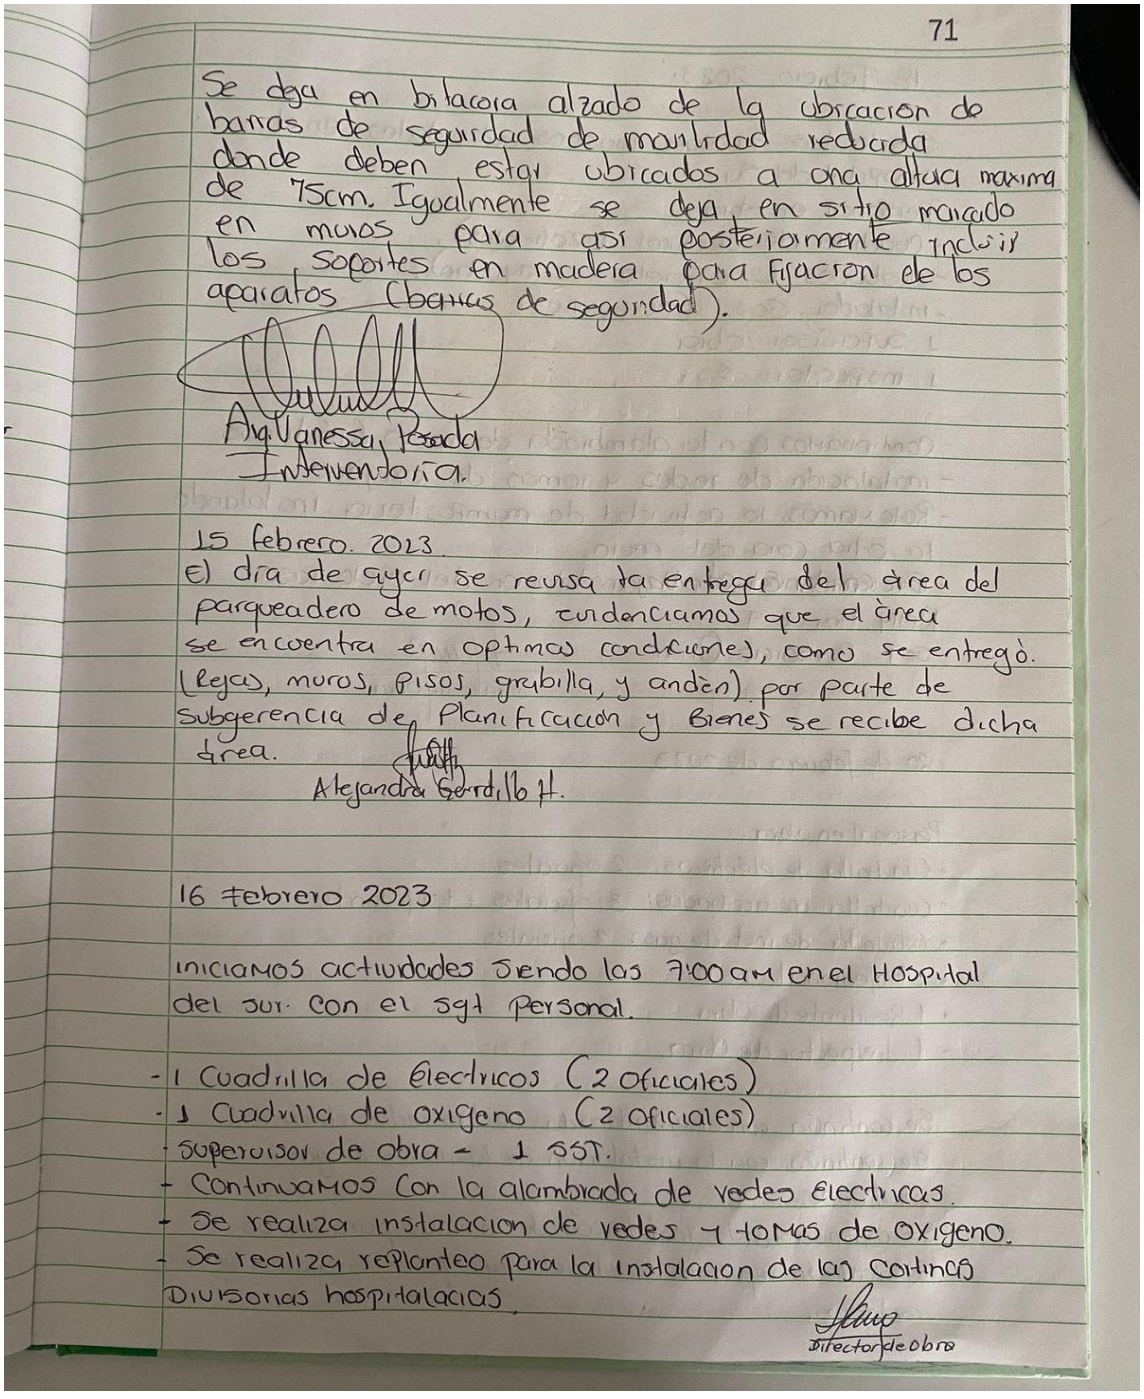

71

Se deja en bitacora alzado de la ubicacion de barras de seguridad de manilrdad reducida donde deben estar ubicados a una altura maxima de 75cm. Igualmente se deja en sitio marcado en muros para asi posteriormente incluir los soportes en madera para Fijacion de los aparatos (barras de seguridad).

Arq. Vanessa Posada
Interventoria.

15 febrero. 2023.
El dia de ayer se reunsa la entrega del area del parqueadero de motos, evidenciamos que el area se encuentra en optimas condiciones, como se entregó. (Rejas, muros, pisos, grabilla, y anden) por parte de subgerencia de Planificacion y Bienes se recibe dicha area.


Alejandra Gerdrlb H.

16 febrero 2023

Iniciamos actividades siendo las 7:00 am en el Hospital del sur. con el sgt Personal.

- 1 Cuadrilla de Electricos (2 oficiales)
- 1 Cuadrilla de oxigeno (2 oficiales)
- Supervisor de obra - 1 SST.
- Continuamos con la alambrada de redes electricas.
- Se realiza instalacion de redes y tomas de oxigeno.
- Se realiza replanteo para la instalacion de las cortinas Divisorias hospitalarias.

Director de Obra

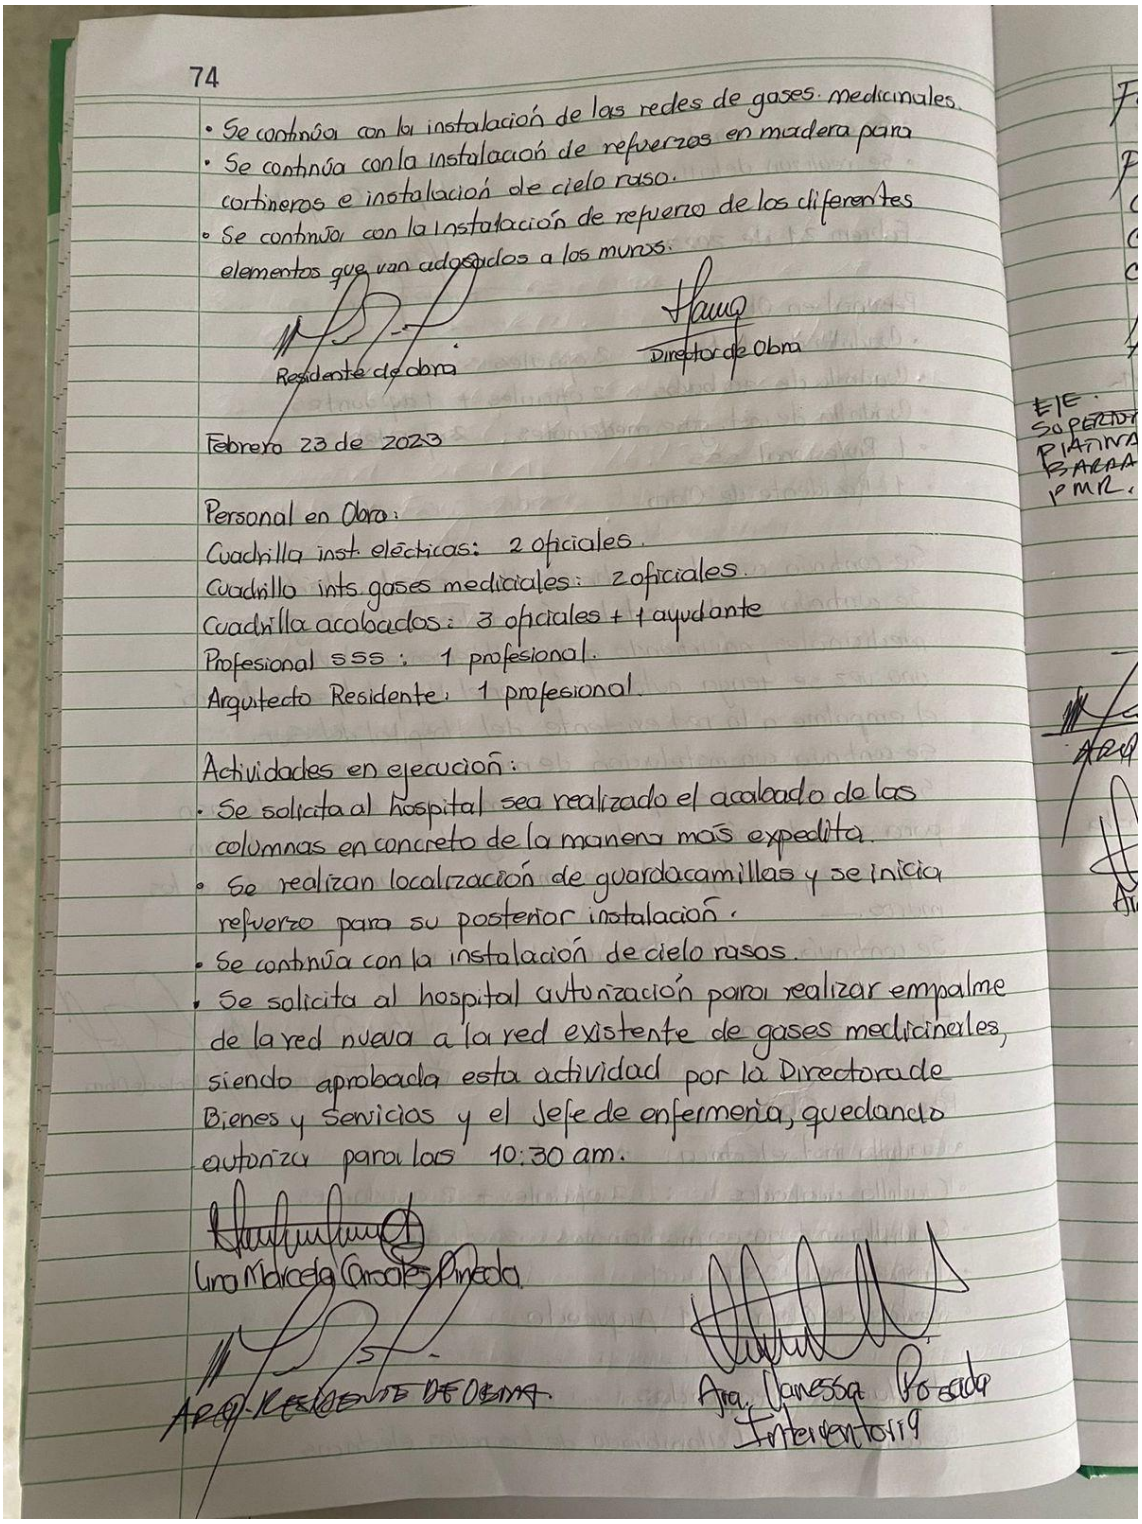

74

- Se continúa con la instalación de las redes de gases medicinales.
- Se continúa con la instalación de refuerzos en madera para cortineros e instalación de cielo raso.
- Se continúa con la instalación de refuerzo de los diferentes elementos que van adosados a los muros.

Residente de obra

Director de Obra

Febrero 23 de 2023


Personal en Obra:
Cuadrilla inst. eléctricas: 2 oficiales.
Cuadrilla ints. gases medicinales: 2 oficiales.
Cuadrilla acabados: 3 oficiales + 1 ayudante
Profesional sss: 1 profesional.
Arquitecto Residente: 1 profesional.

Actividades en ejecución:
- Se solicita al hospital sea realizado el acabado de las columnas en concreto de la manera más expedita.
- Se realizan localización de guardacamillas y se inicia refuerzo para su posterior instalación.
- Se continúa con la instalación de cielo rasos.
- Se solicita al hospital autorización para realizar empalme de la red nueva a la red existente de gases medicinales, siendo aprobada esta actividad por la Directora de Bienes y Servicios y el Jefe de enfermería, quedando autoriza para las 10:30 am.

Lina Marcela Arcos Pineda

ARQ. RESIDENTE DE OBRA

Arq. Vanessa Posada
Interventoría

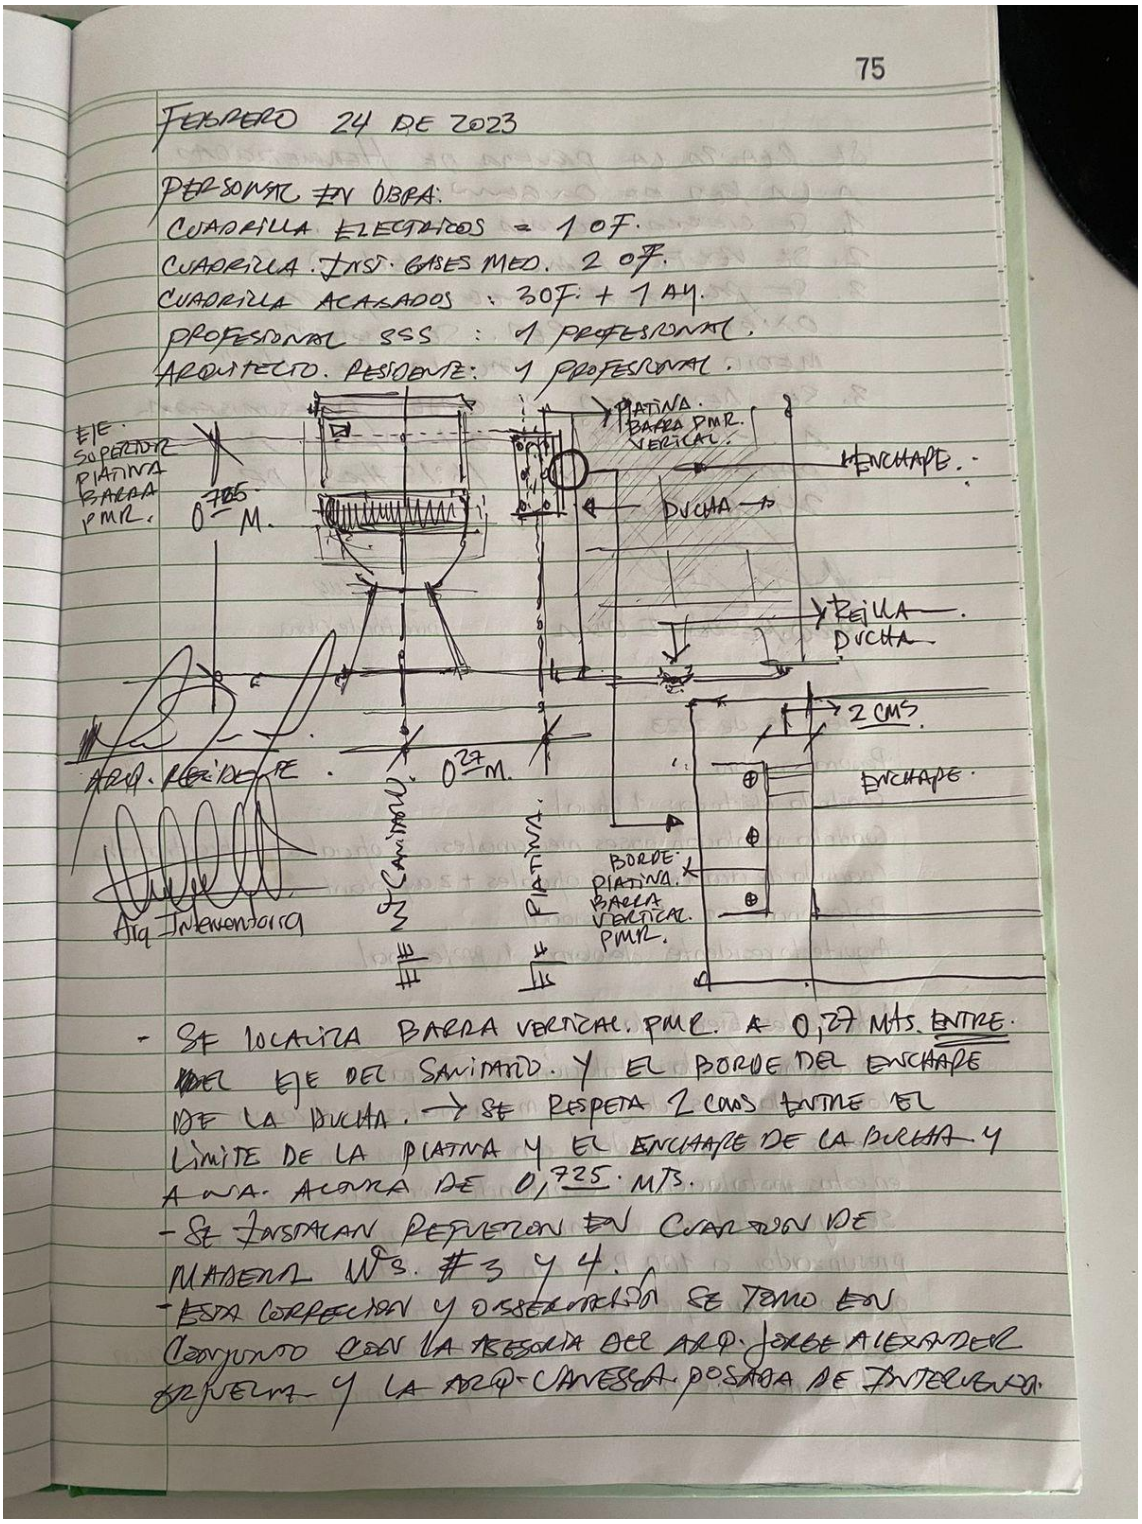


75

FEBRERO 24 DE 2023

PERSONAL EN OBRA:
CUADRILLA ELECTRICOS = 1 OF.
CUADRILLA. INST. GASES MED. 2 OF.
CUADRILLA ACABADOS : 3 OF. + 1 AY.
PROFESIONAL SSS : 1 PROFESIONAL.
ARQUITECTO. RESIDENTE: 1 PROFESIONAL.

- SE LOCALIZA BARRA VERTICAL. PMR. A 0,27 MTS. ENTRE EJE DEL SANITARIO. Y EL BORDE DEL ENCHAPE DE LA DUCHA. → SE RESPETA 2 CMS ENTRE EL LIMITE DE LA PLATINA Y EL ENCHAPE DE LA DUCHA Y ANCHO ALCANZA DE 0,725. MTS.
- SE INSTALAN REJILLAS EN CUADRON DE MADERA NOS. #3 Y 4.
- ESTA CORRECCION Y OBSERVACION SE TOMO EN CONJUNTO CON LA ASESORIA DEL ARQ. JORGE ALEXANDER ORJUELA Y LA ARQ. VANESSA POSADA DE INTERVENTORIA.

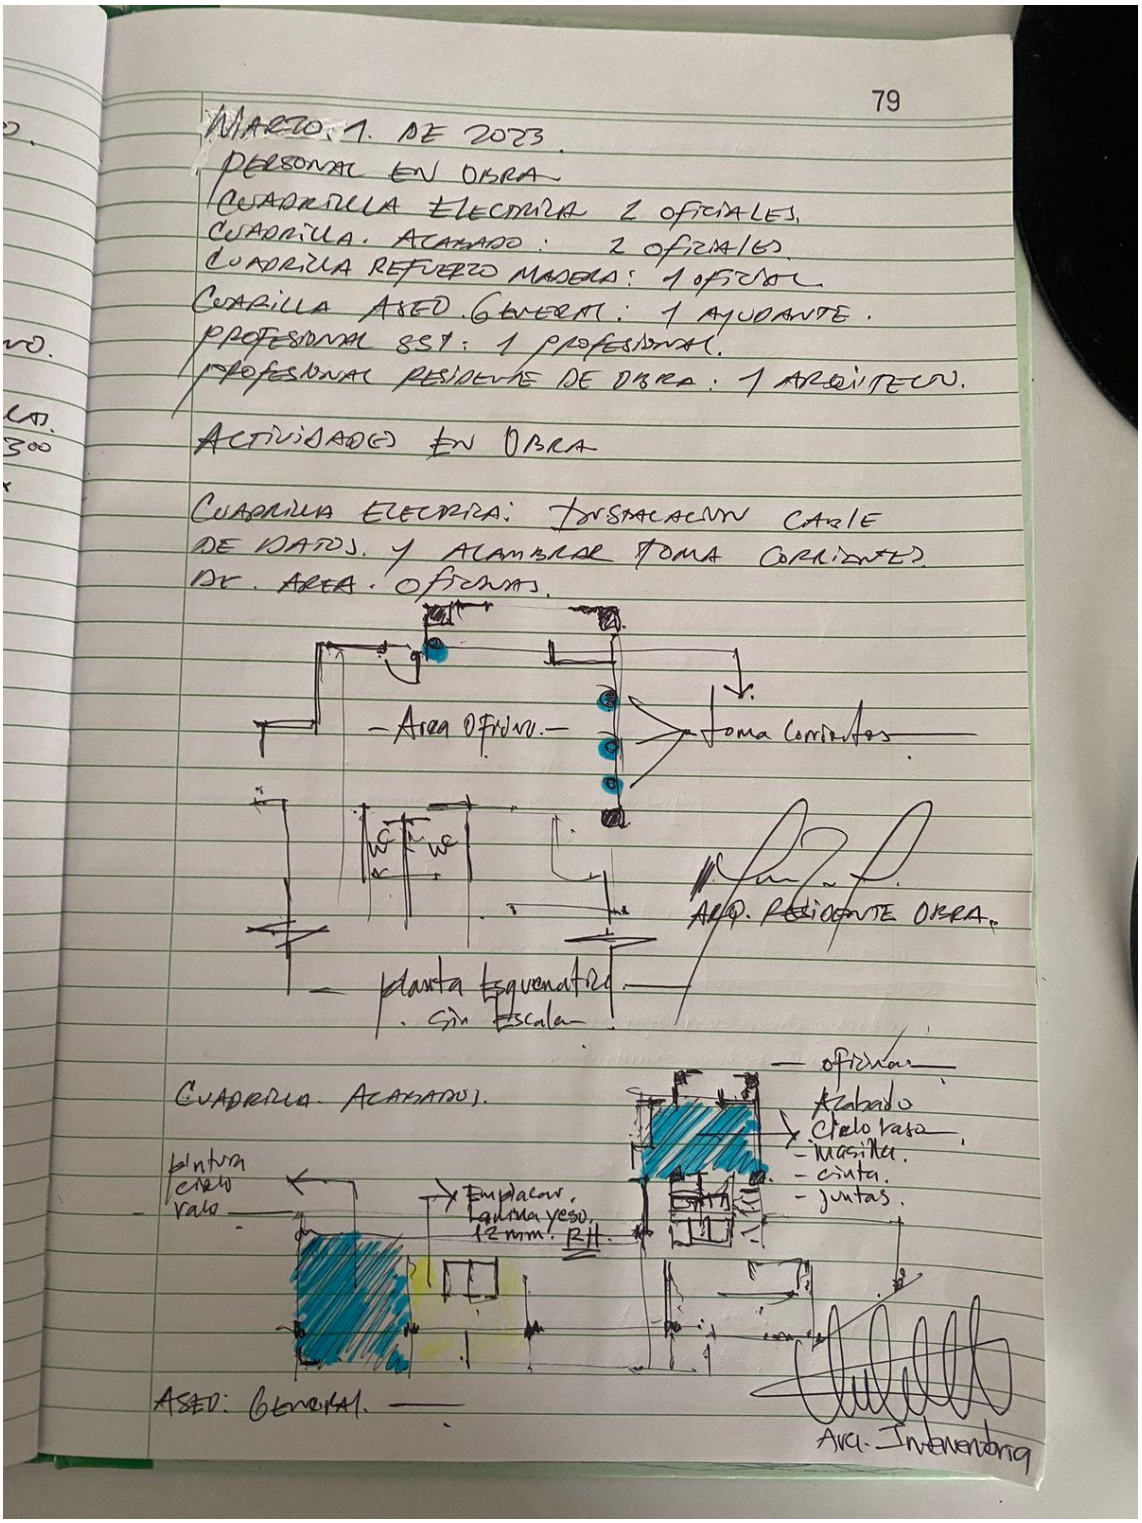

79

MARZO 1. DE 2023.

PERSONAL EN OBRA

CUADRILLA ELECTRICA 2 OFICIALES.
CUADRILLA. ACABADO: 2 OFICIALES.
CUADRILLA REFUERZO MADERA: 1 OFICIAL
CUARILLA ASEO GENERAL: 1 AYUDANTE.
PROFESIONAL SST: 1 PROFESIONAL.
PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA: 1 ARQUITECTO.

ACTIVIDADES EN OBRA

CUADRILLA ELECTRICA: INSTALACION CANALE DE DATOS. Y ALAMBRAR TOMA CORRIENTES DE AREA OFICINAS.

- Area Oficina.
- Toma Corrientes
- planta Esquematica. Sin Escala.

Arq. Residente Obra.

CUADRILLA ACABADOS.

- pintura cielo raso
- Empalcar, Laminas yeso, 12 mm. RH.
- oficinas
- Acabado Cielo raso
- Muestra.
- cinta.
- juntas.

ASEO GENERAL

Arq. Interventoria

Control de las cantidades de los materiales

Los trabajos desarrollados hasta la fecha por los contratistas "CONSORCIO ORION", han cumplido con el estipulado en los comités de obra en la realización de memorias de cálculo para la verificación del balance de obra.

Las cantidades ejecutadas por el contratista se resumen en el Anexo Cantidades de obra ejecutada.

Control de Equipo:

Los equipos empleados por el contratista "CONSORCIO ORION" son los siguientes: (se anexa informe de mantenimiento o pre operacionales de los equipos)

- Herramienta menor
- Taladro

Esta maquinaria se encontró en buenas condiciones para su operación

Control de Personal:

En el desarrollo de la obra, el personal contratado por el contratista es el siguiente: (se anexa informe de planillas de registro de personal – asistencia en el periodo)

- Ingenieros Civiles
- Residente de obra
- Personal Operario de la maquinaria (para el contrato de obra)
- Cuadrilla de Estructura de Cielo Raso
- Cuadrilla de instalación y acabado de muro

Control Técnico


Los contratistas de obra e interventoría cumplieron con los requisitos de Ley, en lo referente a la Afiliación a EPS, ARL Y PENSIÓN del personal empleado en esta obra. El personal que laboro en la obra cuenta con la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos respectivos.

Seguridad industrial y salud Ocupacional (se anexan planillas del periodo)

Por parte de interventoría se veló porque se cumplieran todas las normativas vigentes sobre seguridad industrial y se exigió al contratista el cumplimiento de estas con el personal a su cargo, durante el desarrollo de la obra. Se superviso la prevención de accidentes en cuanto a:

- Riesgo y prevención
- Utilización de elementos personales de seguridad: cascos, guantes, botas etc.
-

El tiempo para la ejecución de la obra se encuentra dentro de los términos estipulados en la minuta, el "CONSORCIO ORION", realizó entrega del cronograma de obra, compromiso que adquirió semanalmente para llevar el control de la obra.

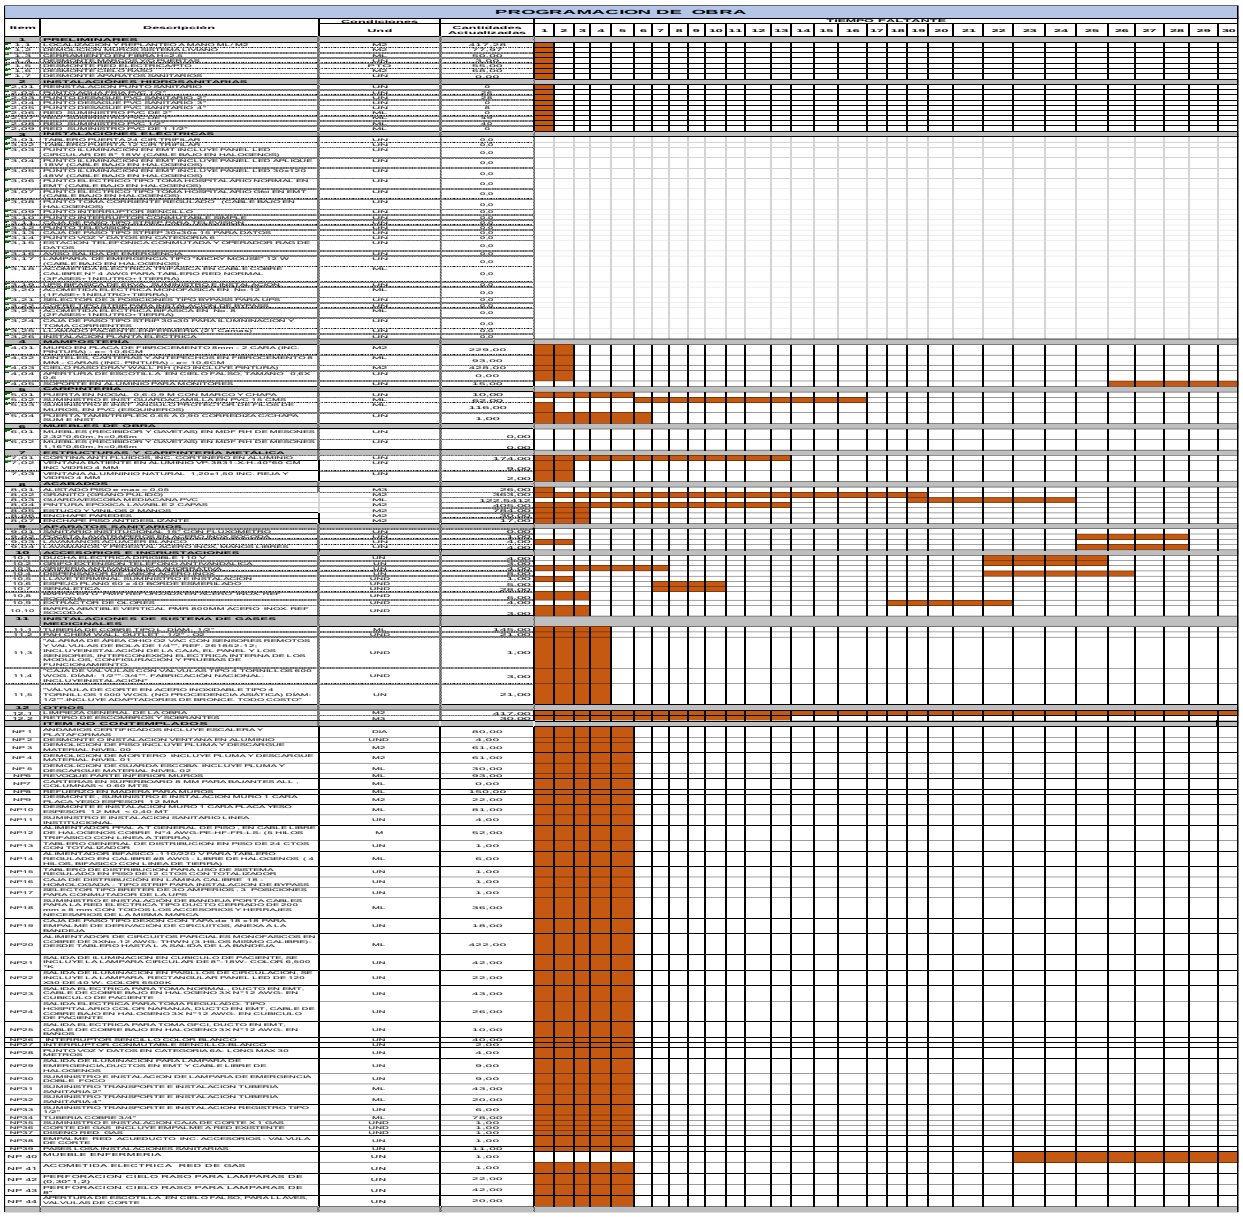

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para la ejecución de los trabajos de Interventoría se contó en obra con el siguiente personal:

- Director de interventoría: Ing. Jairo Dávila Guerra
- Residente de Interventoría: Arq. Vanessa Posada Posada

- **ACTIVIDADES DE OBRA**

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE OBRAS:

Durante la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato objeto de este informe, se ejecutaron las siguientes actividades:

Item	Descripción	Condiciones Iniciales		Actas anteriores	Acta N° 2	Total Ejecutado
		Und	Cantidad	Cantidad ejecutada	Cantidad ejecutada	Cantidad
1	**PRELIMINARES**					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO ML/ M2	M2	420,00	417,28	0,00	417,28
1,2	DEMOLICION MUROS SISTEMA LIVIANO	M2	64,00	64,00	13,97	77,97
1,3	CERRAMIENTO EN FIBRA H=2,5	ML	15,00	15,00	35,00	50,00
1,4	DESMONTE MARCOS Y/O PUERTAS	UN	3,00	3,00	0,00	3,00
1,5	DESMONTE RED ELECTRICA/PTO	PTO	30,00	30,00	25,00	55,00
1,6	DESMONTE CIELO RASO	M2	85,00	85,00	-17,00	68,00
2	**INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS**					
2,02	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	UN	22,00	22,00	4,00	26,00
2,03	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2"	UN	8,00	8,00	20,00	28,00
2,05	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4"	UN	4,00	4,00	4,00	8,00
2,07	RED SUMINISTRO PVC DE 1"	ML	13,00	13,00	36,00	49,00
2,08	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	37,00	37,00	3,00	40,00
4	**MAMPOSTERÍA**					
4,01	MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 8mm - 2 CARA (INC. PINTURA) - e= 10,6CM	M2	244,00	185,00	44,00	229,00
4,02	DINTELES, CARTERAS Y ANTEPECHOS EN FIBROCEMENTO 8 MM - CARAS (INC. PINTURA) - e= 10,6CM	ML	70,00	70,00	23,00	93,00
4,03	CIELO RASO DRAY WALL RH (NO INCLUYE PINTURA)	M2	420,00	250,98	177,02	428,00

5	**CARPINTERÍA**					
5,01	PUERTA EN NOGAL 0,6-0,9 M CON MARCO Y CHAPA	UN	10,00		5,00	5,00
5,02	SUMINISTRO E INST GUARDACAMILLA EN PVC 15 CMS	ML	160,00		62,00	62,00
5,03	SUMINISTRO E INST ANGULO PROTECTOR DE FILOS DE MUROS, EN PVC (ESQUINEROS)	ML	51,00		116,00	116,00
7	**ESTRUCTURAS Y CARPINTERÍA METÁLICA**					
7,01	CORTINA ANTI FLUIDOS, INC. CORTINERO EN ALUMINIO	UN	168,00		174,00	174,00
7,02	VENTANA BATIENTE EN ALUMINIO VP-3831-X-H-40*60 CM INC VIDRIO 4 MM	UN	13,00		9,00	9,00
7,03	VENTANA ALUMNINIO NATURAL 1,20x1,50 INC. REJA Y VIDRIO 4 MM	UN	2,00		2,00	2,00
8	**ACABADOS**					
8,01	ALISTADO PISO e max = 0,05	M3	14,60	14,60	11,40	26,00
8,02	GRANITO (GRANO PULIDO)	M2	291,00	260,00	77,25	337,25
8,04	PINTURA EPOXICA LAVABLE 2 CAPAS	M2	792,00	0,00	405,00	405,00
8,05	ESTUCO Y VINILOS 2 MANOS	M2	420,00	0,00	784,00	784,00
8,07	ENCHAPE PISO ANTIDESLIZANTE	M2	21,00	21,00	-4,00	17,00

9	**APARATOS SANITARIOS**					
9,03	LAVAMANOS ACUACER BLANCO	UN	4,00		4,00	4,00
10	**ACCESORIOS E INCRUSTACIONES**					
10,3	GRIFERIA ANTIVANDALICA AHORRATIVA	UN	4,00		4,00	4,00
10,4	DISPENSADOR DE JABON ACERO INOX	UN	10,00		0,00	0,00
10,5	LLAVE TERMINAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2,00		1,00	1,00
10,8	BARRA EN U PMR REFORZADA EN ACERO INOX. REF SOCODA	UND	6,00		6,00	6,00
10,10	BARRA ABATIBLE VERTICAL PMR 800MM ACERO INOX. REF SOCODA	UND	3,00		3,00	3,00
11	**INSTALACIONES DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES**					
11,1	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1/2"	ML	161,00		145,00	145,00
11,2	PAH CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2	UND	21,00		21,00	21,00
11,3	"ALARMA DE ÁREA OHIO O2 VAC CON SENSORES REMOTOS Y VALVULAS DE BOLA DE 1/4"", REF. 261852-12; INCLUYEINSTALACIÓN DE LA CAJA, EL PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELECTRICA INTERNA DE LOS MODULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00		1,00	1,00
11,4	"CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2""-3/4"". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYEINSTALACIÓN"	UND	1,00		3,00	3,00
11,5	"VÁLVULA DE CORTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 4 TORNILLOS 1000 WOG. (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1/2"".INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO"	UN	21,00		21,00	21,00
12	**OTROS**					
12,1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	420,00		276,00	276,00
12,2	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	30,00	21,00	0,00	21,00

	ITEM NO CONTEMPLADOS					
NP 1	ANDAMIOS CERTIFICADOS INCLUYE ESCALERA Y PLATAFORMAS	DIA			80,00	80,00
NP 2	DESMONTE O INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO	UND			4,00	4,00
NP 3	DEMOLICION DE PISO INCLUYE PLUMA Y DESCARGUE MATERIAL NIVEL 00	M2			61,00	61,00
NP 4	DEMOLICION DE MORTERO INCLUYE PLUMA Y DESCARGUE MATERIAL NIVEL 01	M2			61,00	61,00
NP 5	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA INCLUYE PLUMA Y DESCARGUE MATERIAL NIVEL 02	ML			30,00	30,00
NP6	REVOQUE PARTE INFERIOR MUROS	ML			93,00	93,00
NP7	CARTERAS EN SUPERBOARD 8 MM PARA BAJANTES ALL , COLUMNAS < 0.60 MTS	ML			0,00	0,00
NP8	REFUERZO EN MADERA PARA MUROS	ML			150,00	150,00
NP9	DESMONTE , SUMINISTRO E INSTALACION MURO 1 CARA PLACA YESO ESPESOR 12 MM	M2			22,00	22,00
NP10	DESMONTE E INSTALACION MURO 1 CARA PLACA YESO ESPESOR 12 MM < 0,40 MT	ML			81,00	81,00
NP11	SUMINSTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL	UN			4,00	4,00
NP12	ALIMENTADOR PPAL A T GENERAL DE PISO , EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS COBRE N°4 AWG-PE-HF-FR-LS- (5 HILOS TRIFASICO CON LINEA A TIERRA)	M			52,00	52,00
NP13	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN PISO DE 24 CTOS CON TOTALIZADOR	UN			1,00	1,00
NP14	ALIMENTADOR BIFASICO -110/220 V PARA TABLERO REGULADO EN CALIBRE #8 AWG - LIBRE DE HALOGENOS (4 HILOS, BIFASICO CON LINEA DE TIERRA)	ML			6,00	6,00
NP15	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA USO DE SISTEMA REGULADO EN PISO DE12 CTOS CON TOTALIZADOR	UN			1,00	1,00
NP16	CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN LÁMINA CALIBRE 18 - HOMOLOGADA - TIPO STRIP PARA INSTALACION DE BYPASS	UN			1,00	1,00
NP17	SELECTOR TIPO BRETER DE 3O AMPERIOS , 3 POSICIONES PARA CONMUTADOR DE LA UPS	UN			1,00	1,00

NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES PARA LA RED ELECTRICA TIPO DUCTO CERRADO DE 200 mm x 8 mm CON TODOS LOS ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS DE LA MISMA MARCA	ML			36,00	36,00
NP19	CAJA DE PASO TIPO DEXON CON TAPA de 18 x18 PARA EMPALME DE DERIVACIÓN DE CIRCUITOS, ANEXA A LA BANDEJA	UN			18,00	18,00
NP20	ALIMENTADOR DE CIRCUITOS PARCIALES MONOFASICOS EN COBRE DE 3XNo.12 AWG- THWN (3 HILOS MISMO CALIBRE)- DESDE TABLERO HASTA L A SALIDA DE LA BANDEJA	ML			422,00	422,00
NP21	SALIDA DE ILUMINACION EN CUBICULO DE PACIENTE, SE INCLUYE LA LAMPARA CIRCULAR DE 8"-18W- COLOR 6,500 °K	UN			42,00	42,00
NP22	SALIDA DE ILUMINACION EN PASILLOS DE CIRCULACION, SE INCLUYE LA LAMPARA RECTANGULAR PANEL LED DE 120 X30 DE 40 W- COLOR 6500K	UN			22,00	22,00
NP23	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NORMAL, DUCTO EN EMT, CABLE DE COBRE BAJO EN HALOGENO 3X N°12 AWG- EN CUBICULO DE PACIENTE	UN			43,00	43,00
NP24	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA REGULADO- TIPO HOSPITALARIO COLOR NARANJA, DUCTO EN EMT, CABLE DE COBRE BAJO EN HALOGENO 3X N°12 AWG- EN CUBICULO DE PACIENTE	UN			26,00	26,00
NP25	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI, DUCTO EN EMT, CABLE DE COBRE BAJO EN HALOGENO 3X N°12 AWG- EN BAÑOS	UN			10,00	10,00
NP26	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO	UN			40,00	40,00
NP27	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO-BLANCO	UN			2,00	2,00
NP28	PUNTO VOZ Y DATOS EN CATEGORIA 6A-LONG MAX 30 METROS	UN			4,00	4,00
NP29	SALIDA DE ILUMINACION PARA LAMPARA DE EMERGENCIA,DUCTOS EN EMT Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS	UN			9,00	9,00
NP30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA DOBLE FOCO	UN			9,00	9,00

NP31	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	ML			43,00	43,00
NP32	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML			20,00	20,00
NP33	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO 1/2"	UN			6,00	6,00
NP34	TUBERIA COBRE 3/4"	ML			78,00	78,00
NP35	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE X 1 GAS	UND			1,00	1,00
NP36	CORTE DE GAS INCLUYE EMPALME A RED EXISTENTE	UND			1,00	1,00
NP37	DISEÑO RED GAS	UND			1,00	1,00
NP38	EMPALME RED ACUEDUCTO INC. ACCESORIOS - VALVULA DE CORTE	UN			1,00	1,00
NP39	PASES LOSA INSTALACIONES SANITARIAS	UN			11,00	11,00
NP 40	MUEBLE ENFERMERIA	UN			0,00	0,00
NP 41	ACOMETIDA ELECTRICA RED DE GAS	UN			1,00	1,00
NP 42	PERFORACION CIELO RASO PARA LAMPARAS DE (0,30*1,2)	UN			22,00	22,00
NP 43	PERFORACION CIELO RASO PARA LAMPARAS DE 8"	UN			42,00	42,00
NP 44	APERTURA DE ESCOTILLA EN CIELO FALSO, PARA LLAVES, VALVULAS DE CORTE	UN			20,00	20,00
ITEMS	**ITEMS FUERA DE A.I.U**	**UND**	**CANT**			
16,01	PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD	UN	1		0,00	0,00
	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE HOSPITALARIO	M2	420		0,00	420,00
	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP HOSPITALARIO	M2	420		0,00	420,00
NP45	AJUSTE DISEÑO ELECTRICO	un	0		1,00	1,00

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contrato de Obra 010 de 2022, tiene Acta de inicio firmada del 04 de noviembre.

Una vez firmada el Acta de iniciación entre la firma Interventoría y la GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, el equipo de interventoría da inicio con las actividades propias de acuerdo con lo establecido en el contrato respectivo verificando el avance de obra.

- Con respecto al cuadro comparativo que se presenta anteriormente, las cantidades que se aprueban en los **ITEM NO PREVISTOS**, fueron consensuadas el día 26 de enero del presente año, mediante el comité de obra que se realizó en las instalaciones de Red Salud.

El día (21) de marzo de dos mil veintitrés, se recibe mediante medio magnético el balance de obra, donde se incluyen todas las actividades que se han realizado y que algunas de ellas han tenido cambios en sus cantidades en el transcurso de la ejecución de esta, estas cantidades se han justificado en su momento y se ha dejado constancia en bitácora. Igualmente se anexan a este oficio las Justificación técnicas de los ítems NO PREVISTOS que fueron suministradas por parte del CONTRATISTA y estas ya se analizaron por parte de la interventoría:

NP1 ANDAMIOS CERTIFICADOS: La justificación está sustentada en que no es posible acceder por la entrada principal del hospital, debido a lo solicitado por Red Salud, quedando como única alternativa el ingreso del personal a obra por la fachada del edificio a una altura de nueve (9) metros.

NP3 DEMOLICIÓN DE PISO: Actividad que se requiere ejecutar con la finalidad de poder realizar la instalación de piso en granito pulido.

NP4 DEMOLICIÓN DE MORTERO: Actividad indispensable ejecutar con la finalidad de realizar el alistado de piso.

NP5 DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA: Actividad indispensable ejecutar con la finalidad de realzar la instalación del piso en granito pulido.

NP6 - REVOQUE PARTE INFERIOR MUROS: conforme al proceso constructivo para la instalación del guarda escoba en PVC, esta actividad debe estar soportada y/o adherida a una superficie lisa y uniforme para garantizar la estabilidad del guarda escoba en PVC. Razón por la cual es necesario e indispensable realizar un revoque en la parte inferior de los muros que nos garantice la superficie adecuada para la actividad de instalación de guarda escoba en PVC.

NP7 - CARTERAS EN SUPERBOARD 8 MM PARA BAJANTES ALL, COLUMNAS < 0.60 MTS: este ítem no previsto en reunión del 26 de enero de 2023 no fue autorizado su ejecución por parte del consorcio Orión.

NP8 - REFUERZO EN MADERA PARA MUROS: con la finalidad de garantizar estabilidad los elementos que van adheridos a los muros, es necesario e indispensable instalar refuerzo en madera al interior de los muros ya sean

en super board o dry Wall. Razón por la cual se deben realizar los mencionados refuerzos.

NP9 - DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO 1 CARA PLACA YESO ESPESOR 12 MM: Las instalaciones eléctricas y red de gas domiciliario deben realizarse al interior de los muros, en vista que en sector de intervención existen muros ya construidos a los cuales se les debe retirar una cara del muro existente para poder dejar embebidas las instalaciones a construir tanto eléctricas como de gas medicinal. Razón por la cual se debe ejecutar esa actividad.

NP10 - DESMONTE E INSTALACIÓN MURO 1 CARA PLACA YESO ESPESOR 12 MM: como es necesario instalar refuerzo en madera al interior de los muros, en obra existen en dry Wall ya construidos. Es necesario realizar el desmonte e instalación de muros una cara por unidad de medida metro lineal, razón por la cual se debe ejecutar esta actividad.

NP31 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2": para poder realizar las instalaciones necesarias de la obra en construcción es necesario el suministro de transporte de instalación de tubería sanitaria 2" para los diferentes desagües. Razón por la cual se debe ejecutar esta actividad.

NP32 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4": para poder realizar las instalaciones necesarias de la obra en construcción es necesario el suministro de transporte de instalación de tubería sanitaria 4" para los diferentes desagües. Razón por la cual se debe ejecutar esta actividad.

NP33 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO 1/2" CON CAJA DE REGISTRO DE 15X15: con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones hidráulicas de la edificación es necesario el suministro transporte e instalación registro 1/2" con caja de registros de 15x15, con la finalidad de en un eventual daño hidráulico realizar cierres puntuales de las instalaciones y no tener que suspender la totalidad del servicio en el área construida.

NP34 - TUBERÍA COBRE 3/4": para poder realizar las instalaciones de la red de gas medicinal de la obra en construcción, es necesario el suministro de transporte de instalación de tubería cobre 3/4" para garantizar el adecuado y seguro suministro de gas medicinal. Razón por la cual se debe ejecutar esta actividad

NP35 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE X 1 GAS: para poder realizar las instalaciones de la red de gas medicinal de la obra en construcción, es necesario el suministro e instalación caja de corte x 1 gas" para garantizar el adecuado y seguro suministro de gas medicinal conforme al diseño de red de gas medicinal. Razón por la cual se debe ejecutar esta actividad

NP36 - CORTE DE GAS INCLUYE EMPALME A RED EXISTENTE: en el momento que se termine de construir la red de gas medicinal, es necesario realizar la actividad corte de gas incluye empalme a red existente con la finalidad de realizar las pruebas a la red construida y finalmente empalmarla con la red existente generando el uso continuo de la red, tanto de la red construida como la red existente en la edificación. Razón por la cual se debe ejecutar esta actividad.

NP37 - DISEÑO RED GAS: para realizar la construcción de la red de gas medicinal de la edificación en intervención, es necesario tener el diseño de la red de gas medicinal, donde se especifique longitudes, diámetros de tubería, ubicación de accesorios, entre otros. Razón por la cual es necesario e indispensable ejecutar esta actividad.

NP38 - EMPALME RED ACUEDUCTO INC. ACCESORIOS - VÁLVULA DE CORTE: para garantizar el servicio de acueducto del área intervenida por parte del contratista, es indispensable y necesario que las instalaciones hidráulicas construidas se empalmen a la red de acueducto existente en la edificación, motivo por el cual es de vital importancia realizar esta actividad.

NP39 - PASES LOSA INSTALACIONES SANITARIAS: como es de conocimiento de la interventoría y entidad contratante conforme a lo evidenciado en obra, las redes sanitarias se encuentran por debajo de la losa de piso del área intervenida, razón por la cual se deben realizar los pases a la losa para poder pasar la tubería de 2" y 4" sanitaria. Razón por la cual es indispensable realizar esta actividad.

NP40- MUEBLE ENFERMERÍA: conforme al comité de obra realizado el día 17 de m a r z o de 2023, y a la necesidad planteada por el hospital red salud de lo importante y funcional de incluir en la adición un mueble de enfermería en madera que permita el buen desarrollo, atención maniobrabilidad y control de las obras ejecutadas.

NP41- ACOMETIDA ELÉCTRICA RED DE GAS: Dentro del alcance inicial del contrato de obra, no se incluyó la acometida eléctrica para el sistema red de gas medicinal, actividad que debe ser ejecutada con la finalidad de dar en servicio el sistema de red de gas medicinal ejecutado y necesario para poder cumplir con los requisitos mínimos de funcionabilidad para una obra de este tipo que garanticen un buen servicio atención desde el componente de salud.

NP42- PERFORACIÓN CIELO RASO PARA LÁMPARAS DE (0,30*1,2): Dentro del alcance inicial del contrato de obra, no se incluyó está actividad, proceso constructivo necesario para la instalación de las lámparas y se requiere de su ejecución, consistente en cortar el espacio adecuado en el cielo raso y poder ubicar ahí las lámparas conforme a sus medidas.

NP43- PERFORACIÓN CIELO RASO PARA LÁMPARAS DE (8"): Dentro del alcance inicial del contrato de obra, no se incluyó está actividad, proceso constructivo necesario para la instalación de las lámparas y se requiere de su ejecución, consistente en cortar el espacio adecuado en el cielo raso y poder ubicar ahí las lámparas conforme a sus medidas.

NP44-APERTURADE ESCOTILLA EN CIELO FALSO, PARA LLAVES, VÁLVULAS DE CORTE: Dentro del alcance inicial del contrato de obra, no se incluyó está actividad, proceso constructivo necesario ya que las instalaciones de gas, eléctricas, se requiere de su ejecución, consistente en cortar el espacio adecuado en el cielo raso y poder ahí generar acceso a válvulas corte conforme a sus medidas.

BALANCE GENERAL MODIFICACIÓN

De acuerdo con la relación de obra a disminuir, a eliminar, a incrementar y a adicionar, existen algunas diferencias en los siguientes Ítems en cuanto a valores, se presenta el siguiente cuadro:

		BALANCE DE OBRA #2 (CONSORCIO ORION)		
		MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	CONDICIONES ACTUALIZADAS
VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 477.221.984,00	$ 200.095.326	$ 152.823.876,00	$ 525.266.135,00
ADICION QUE SE REQUIERE SEGÚN BALANCE		$ 48.044.151,00		

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 477.221.984,00	BALANCE DE OBRA #2 (INTERVENTORIA)		
		MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	CONDICIONES ACTUALIZADAS
		$ 183.900.014,00	$ 147.244.090,00	$ 513.877.906,00
ADICION QUE SE REQUIERE SEGÚN BALANCE		$ 36.655.922		

Una vez por parte de INTERVENTORIA se estudia y se analiza la solicitud presentada por el contratista de obra **CONSORCIO ORION** de adición al contrato de obra #010, por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS ($36.655.992,00 M/CTE) dicho esto se considerará viable, siempre y cuando el CONTRATISTA presente la justificación que incluya los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, presupuestales, otros que se requieran para hacer oficial esta solicitud.

CONDICIONES LABORALES

CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO

No se presentó problema con la ejecución de los trabajos, en lo referente a condiciones anormales de orden público.

CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Se ha presentado un buen manejo de materiales en conjunto contratista e interventoría.

RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

CONTRATO N°	NOMBRE	FECHA
CONTRATO DE OBRA 010 DE 2022	CONTRATODE OBRA CONSORCIO ORION	viernes, 4 de noviembre de 2022
	Acta de Inicio	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008 DE 2022	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Miércoles, 19 de octubre de 2022
	Acta de Inicio de Obra	lunes, 24 de octubre de 2022

BALANCE DE INVERSIÓN, CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

El contrato de obra se encuentra en un estado de avance del ochenta y ocho punto cincuenta y seis por ciento (88.56%), en lo referente al alcance de este.

Referenciar:

- $ 455.075.379,24 que corresponde al 88,56% de avance financiero (ejecutado y proyectado)
- 88,56% de avance de obra (ejecutado y proyectado)

➢ OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- La obra se encuentra en un estado de avance del ochenta y ocho punto cincuenta y seis por ciento (88,56%), en lo referente al alcance de este.
- El tiempo del contrato se encuentra con 80 días de ejecución.
- Se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el cronograma de actividades.
- La interventoría realiza un continuo seguimiento a los trabajos realizados y a la forma como se emplean los materiales dispuestos para cada actividad

REGISTRO FOTOGRAFICO

















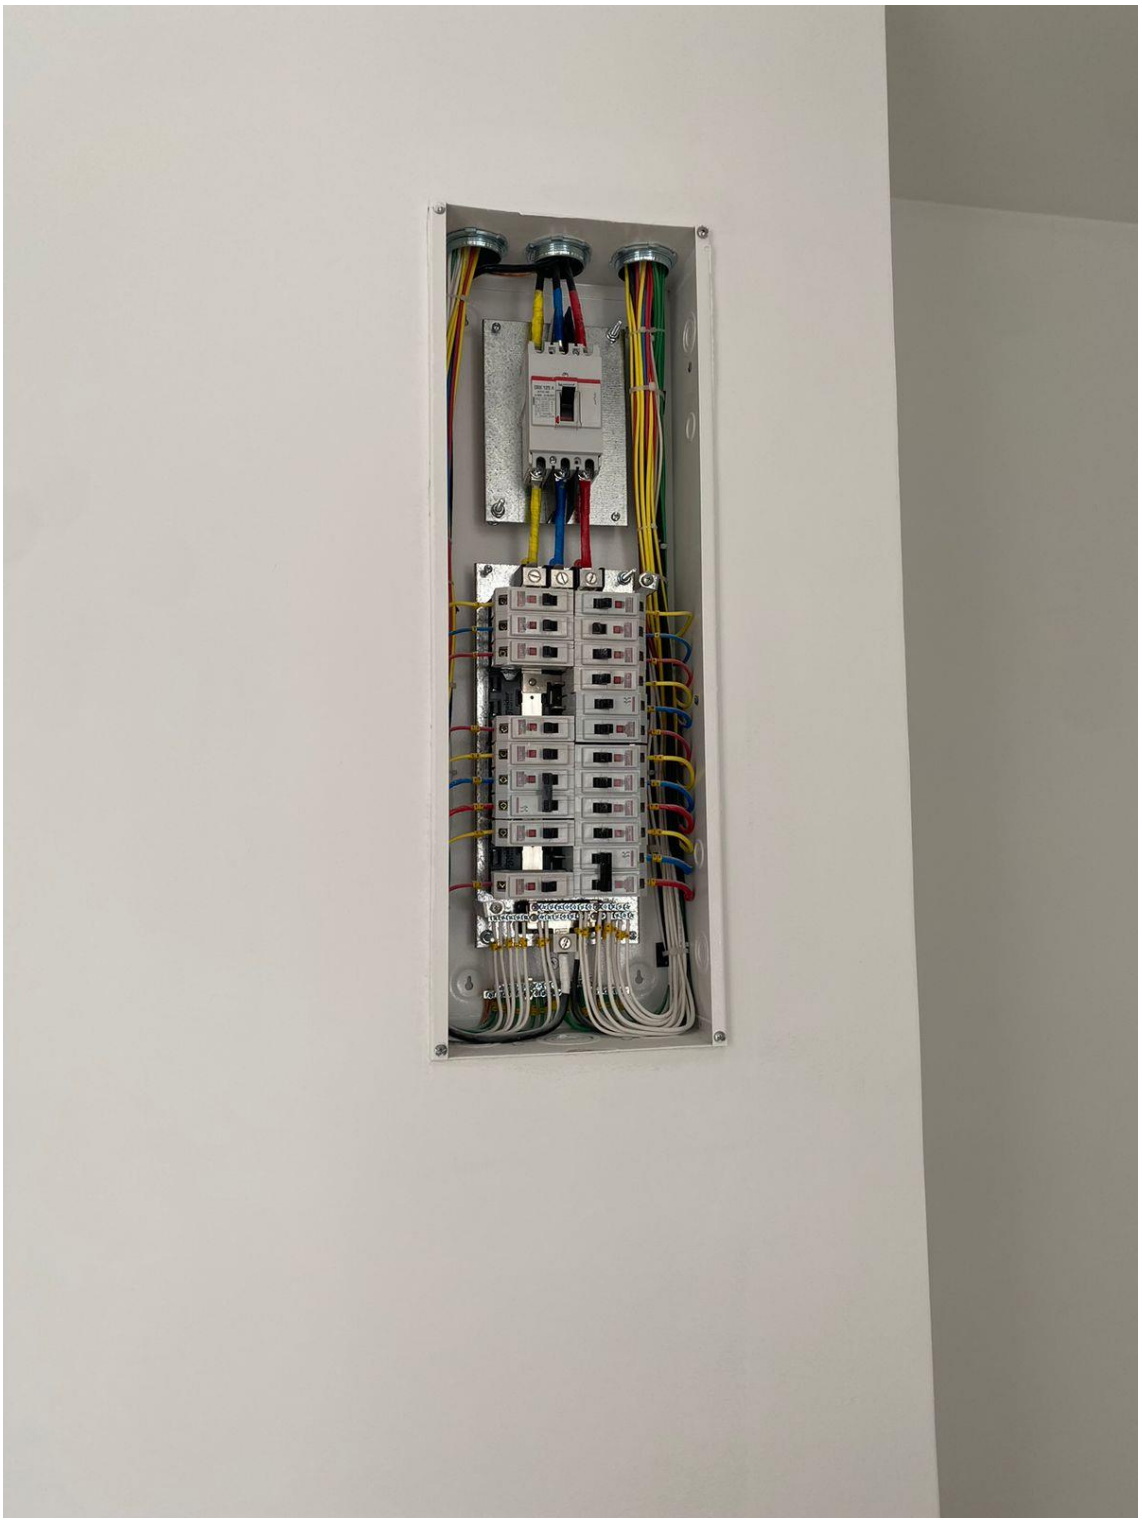





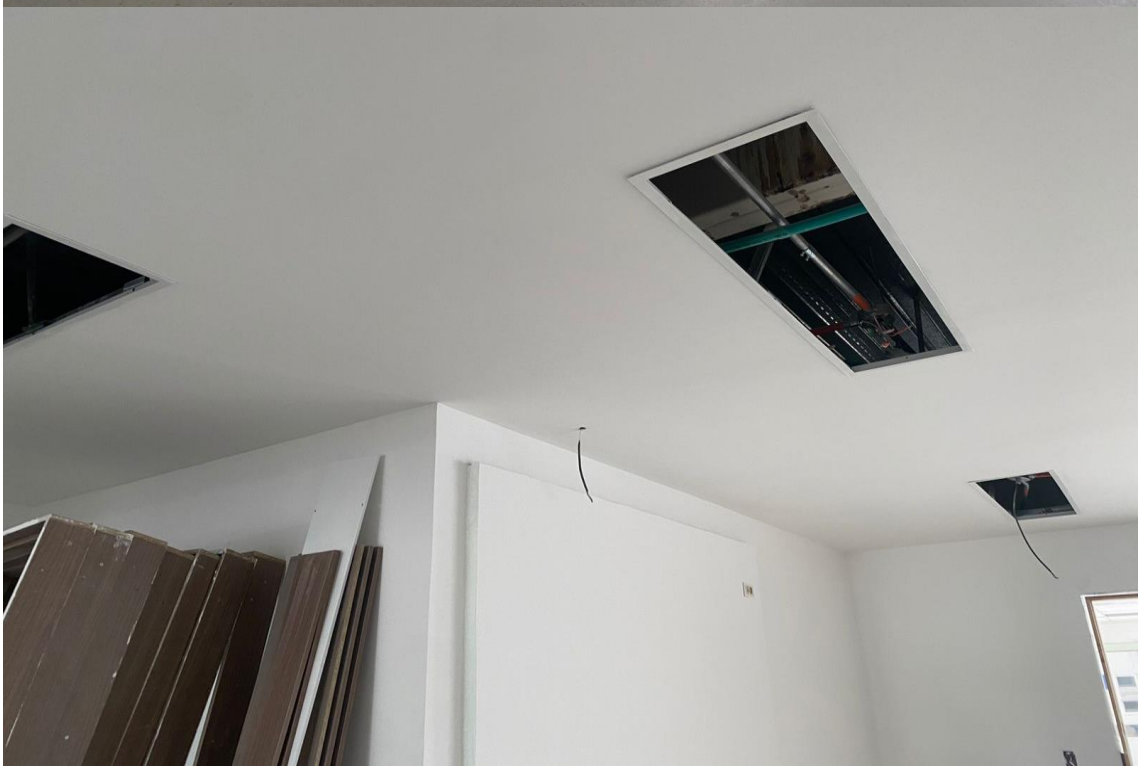



BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$477.221.983,94	-	$477.221.983,94
ADICION No. 1	$ 36.655.922	-	$ 36.655.922
ACTA No.1.	$477.221.983,94	$121.482.365,64	$355.739.618,30
ACTA No.2.	$513.877.905,94	$326.741.554,60	$65.653.985,70
TOTAL	$513.877.905,94	$326.741.554,60	$65.653.985,70
Valor a pagar del periodo febrero de 2023:		$326.741.554,60	

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **(profesional a cargo)**, en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre-Cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Hugo Rodolfo mejía - ingeniero	$ 16.000	$ 64.000	$ 27.900	25315231	diciembre
Jorge Alexander Orjuela - arquitecto	$ 16.000	$ 64.000	$ 27.900	25315231	diciembre
Nelly Henao franco - SST	$ 16.000	$ 64.000	$ 27.900	25315231	diciembre
Juan Carlos Gutiérrez H	$ 1.600	$ 6.200	$ 27 00	25445585	enero
Hugo Rodolfo mejía - ingeniero	$ 17.100	$ 68.100	$ 29 700	25445585	enero
Jorge Alexander Orjuela - arquitecto	$ 17.100	$ 68.100	$ 29 700	25445585	enero
Nelly Henao franco - SST	$ 17.100	$ 68.100	$ 29 700	25445585	enero
Nelson Alejandro Cifuentes	$ 1.600	$ 6.200	$ 2700	25445585	enero
Jhonatan Castaño	$ 1.600	$ 6.200	$ 2700	25445585	enero
Erbyn Restrepo López	$ 3.100	$ 12.400	$ 5.400	25822443	febrero

Juan Carlos Gutiérrez H	$ 7.800	$ 31.000	$ 13.500	25822443	febrero
Hugo Rodolfo mejía - ingeniero	$ 7.800	$ 31.000	$ 13.500	25822443	febrero
Jorge Alexander Orjuela - arquitecto	$ 46.400	$ 185.600	$ 80.800	25822443	febrero
Jhonatan Castaño	$ 7.800	$ 31.000	$ 13.500	25822443	febrero
Nelson Alejandro Cifuentes	$ 3.100	$ 12.400	$ 5.400	25822443	febrero
Nelly Henao franco - SST	$ 46.400	$ 185.600	$ 80.800	25822443	febrero
Jorge Alexander Orjuela - arquitecto	$ 1.600	$ 6.200	$ 2.700	25822491	marzo
Nelly Henao franco - SST	$ 1.600	$ 6.200	$ 2.700	25822491	marzo

INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN PROPUESTA.

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Vanessa Posada Posada	SURA	Colpensiones	Positiva	1051258695	Marzo

VALOR A PAGAR: El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin fórmula de reajuste, hasta llegar al cien por ciento (100%), en un único pago (contra entrega), a la terminación de la obra y previa presentación del acta firmada por el supervisor, donde certifique que todas las cantidades de obra contratadas fueron ejecutadas cumpliendo con las especificaciones técnicas, los cuales deben cumplir con lo establecido en cuanto a la calidad de los materiales.

El acta de recibo a satisfacción de la interventoría debe ir acompañada del documento que certifique el pago por parte del contratista, de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) y Aportes Parafiscales a que haya lugar (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

El acta de terminación de la obra deberá ser suscrita por el contratista y por el supervisor del contrato, debiendo además ir acompañada por los siguientes documentos:

- Memorias de cálculo de cantidades.
- Balance de la ejecución de actividades.
- Copia de bitácora de obra.
- Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.
- Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse).
- Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
- Para realizar el respectivo pago, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato.

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	$ 31.254.278	$ 31.254.278	0
ADICIONAL	$ 15.369.750	$ 15.369.750	0
TOTAL	$ 46.624.028	$ 46.624.028	0

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BBVA	CUENTA DE AHORROS	330-283-979	JAIRO ALONSO DÁVILA GUERRA



Nombre del interventor/supervisor.
Representante Legal: Jairo Alonso Dávila Guerra
NIT/Cédula: 73.565.045
Dirección: Cra 97 # 42-101 Cali Canto
Nro. Teléfono: 3017726810

Nombre del Supervisor.
Vanessa Katherine Rincón Gaviria
Jefe de infraestructura social del departamento
Gobernación del Quindío
Nro. Teléfono: 3208195243

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14725608739

(415)7707212489984(8020) 000001472560873 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 5 6 5 0 4 5	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 5 6 5 0 4 5	2 0 0 3 0 7 0 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Martín de Loba 6 6 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DAVILA	GUERRA	JAIRO	ALONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Martín de Loba 6 6 7

41. Dirección principal: CR LAS FLORES CL 11 13 40

42. Correo electrónico: jairodavila85@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 7 2 6 8 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9 0	2 0 1 1 0 7 1 2	7 1 1 2	2 0 1 1 0 7 1 2	4 6 4 9		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9 5 2

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02- 01 / 08 : 29: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica


Que nuestro(a) cliente JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 73,565,045 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 330283979 aperturada el 15 de abril de 2019 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 28 de septiembre de 2023.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0330283979
Cuenta de 16 dígitos:	0330000200283979
Cuenta de 20 dígitos:	00130330000200283979

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
