Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.,
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No. 06 – 6 - 10178 – 22
Fecha suscripción contrato:	27/09/2022
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
Lugar de ejecución de la obra:	Lote Trapichito Nuevo 3 – Kilometro 3 via al sur.
Constancia de recibo No.	8
Contratista:	CONSORCIO PONAL L Y M.
NIT del contratista:	901.635.603-5
Fecha del acta de inicio:	18/10/2022
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 20/12/2022, previa aprobación de la garantía única (fecha en al cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría). **Con prorroga N°1**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de obra PN DIRAF No.06-6-10178-22, por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el 19 de mayo de 2023. **Con prorroga N°2**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoría PN DIRAF No.06-6-10178-22, por ciento cuarenta (140) días calendario, es decir, hasta el 06 de octubre de 2023. **Con prorroga N°3**: Cláusula tercera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de obra PN DIRAF No.06-6-10178-22, en sesenta (60) días calendario contados a partir del 07 de octubre de 2023 hasta el 05 de diciembre de 2023.

Nombre del Interventor del contrato:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22 Analista de Seguimiento Proyectos DIRAF
Valor del contrato:	Contrato Principal: $ 6.974.591.904,74 Incluido AIU e IVA.
Adición No.	N/A
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Valor total del contrato:	$ 6.974.591.904,74 Incluido AIU e IVA.
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI _X_ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 24/07/2023 al 24/09/2023 — Acta de corte N°*: 8
Forma de Pago:	La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben Corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día

	veinticinco (25) de cada mes. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así: Acta de avance parcial. (Suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) • Factura de venta. • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC. • Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al Derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO PONAL LYM NIT. 901.635.603-5 ENTIDAD FINANCIERA: BBVA. NUMERO DE CUENTA: 0570011064 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2022).

Principal: RP 406222 del 29/09/2022

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA"	$ 2.011.906.131,95 (2022)	$ 2.011.906.131,95 (2022)	$0,00	$ 2.011.906.131,95 (2022)

Observaciones: N/A.

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 3.014.295.056,66 Avance parcial recibido: $ 2.011.906.131,95 Total, acumulado $ 5.026.201.188,61
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro. 8 radicada el 25/09/2023 Ingresada en SECOP II el 27/09/2023.
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra del 25/09/2023. Ingresada en SECOP II el 27/07/2023.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO__x_SI ___
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_x__ SI
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de avance parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría (SECOP II el 27/09/2023). • Factura de venta (SECOP II el 27/09/2023). •Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP II el 27/09/2023). • Certificación pagos FIC (SECOP II el 27/09/2023). • Memoria de cantidades ejecutadas (SECOP II el 27/09/2023)
Documento de entrada de bienes	N/A.

en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X__.	N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de obra No. 8	$ 2.011.906.131,95	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LYM11	25/09/2023	$ 2.011.906.131,95	$0,00	$2.011.906.131,95
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.011.906.131,95	$0,00	$ 2.011.906.131,95

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del Modificatorio No.1 del contrato en mención, toda vez que el Contratista de obra – CONSORCIO PONAL LYM, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA DE AVANCE PARCIAL No. 8, memorias de cantidades ejecutadas del 24/07/2023 hasta el 24/09/2023; el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por la firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor del contrato de obra, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

De acuerdo con la solicitud expresa del CONSORCIO PONAL LYM contratista de la obra, mediante documento CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10178-22, suscrita por LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ como representante legal del consorcio contratista y DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO como representante de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS, donde se requirió la cesión total de los derechos económicos a favor de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS, y fue aprobada por la Dirección Administrativa y Financiera, ahora Dirección Logística y Financiera, por lo tanto los

dineros provenientes del pago de la presente acta N°8 serán consignados a la cuenta del BANCO DE OCCIDENTE N° 512856295 a nombre de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NIT: 79.508.558 – 7
Interventor contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
Representante Legal obra
CONSORCIO PONAL L Y M.

Mayor **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor Contrato de interventoría PN DIRAF 06-3-10086-22.

CI-2022-OF-042
Neiva – Huila, 25 de septiembre 2023

Ingeniero
CARLOS VERGARA NEGRETE
Interventor del contrato de obra No 06-6-10178-22

Recibi
Sep 25/2023

Entidad contratante
Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

Referencia: Contrato De Obra No 06-6-10178-22

"Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste "

Asunto: Entrega de acta parcial No 8 del contrato de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta (Forma de pago), del contrato de obra en referencia, que tiene por objeto: "*Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste* "

Nos permitimos realizar la entrega formal de los documentos pertinentes para el cobro del acta parcial No 8 de obra.

1-Acta parcial de obra No 8
2-Memorias de cálculo
3-Informe ejecutivo de obra
4-Certificado de pagos parafiscales
5-Certificado de pago FIC
6-Autorización de facturación
7-Factura electrónica
8-Rut del consorcio
9-Certificación bancaria

Ing. Diego Medina Guerrero
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

CERTIFICADO DE PAGO FIC

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO PONAL LYM identificado con el NIT 901635603, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
0661017822	consorcio ponal lym	901635603	580,000	2023-08	18-AGO-2023	95433384
		Total	580,000			

Expedido por el SENA, a los dieciocho (18) dias del mes de Agosto de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-08-18

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1543118199 - 217407

SENA, MÁS TRABAJO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 580.000,00

Número de aprobación
00881493

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
18/08/2023

Referencia 1
181.235.177.228

Hora del pago
09:18 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1444

Referencia 3
900327235

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
109881493

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO PONAL LYM identificado con el NIT 901635603, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
06-6-10178-22	CONSORCIO PONAL LYM	901635603	580,000	2023-09	25-SEP-2023	97180450
		Total	580,000			

Expedido por el SENA, a los veinticinco (25) dias del mes de Septiembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-09-25

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 2775301 - 225273

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Comprobante

de pago en línea

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: MAURICIO ANDRES RENDON TORO

Nro. de factura: 97180450

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.235.161.158

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 901635603

Fecha y hora de la transacción: Lunes 25 de Septiembre de 2023 03:55:07 PM

Nro. de comprobante: 0000036214

Valor pagado: $ 580,000.00

Producto: *******3022

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

CONSORCIO PONAL LYM

NIT. 901.635.603-5

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DEL CONSORCIO PONAL LYM NIT 901.635.603-5

CERTIFICAMOS:

Que durante el periodo comprendido del 24 de julio al 25 de septiembre de 2023, el consorcio Ponal LyM, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior se expide la presente certificación en la ciudad de Neiva, a los (25) días del mes de septiembre del 2023.

Ing. Diego Medina Guerrero
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

ANA MILENA OSORIO RAMÍREZ
CC. 1.032.438.052 de Bogotá
CONTADOR PUBLICO
T.P 282674-T

PLANILLAS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					55	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	89821652	$15.388.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	64.700	0		0		0	0	0	0	64.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	254.300	0		0		0	0	0	0	254.300	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	328.300	0		0		0	0	0	0	328.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.145.300	0		0		0	0	0	0	1.145.300	27
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	137.900	0		0		0	0	0	0	137.900	7
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	106.800	0		0		0	0	0	0	106.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.514.300	0	0	0	0	0	0		2.514.300	16
230301	Porvenir	800224808-6	2.551.300	0	0	0	0	0	0		2.551.300	23
231001	Colfondos	800227940-6	1.056.800	0	0	0	0	0	0		1.056.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.022.500	0	0	30.000	30.000	0	0		2.082.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	899903790-5	3.110.800				3.110.800	0	0	3.110.800			31.108	3.110.800	55

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	280.300	0	0	280.300	2
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.755.400	0	0	1.755.400	53

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					55	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69821652	$15.388.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.037.300	2.037.300
Pensión	4	8.204.900	8.204.900
Riesgos Laborales	1	3.110.800	3.110.800
CCF	2	2.035.700	2.035.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15.388.700	15.388.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME	-		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					55	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69821652	$15.388.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiatura	Extranjero	Cotizante Exterior	Pensionado Exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003951149	ANDRADE ARBELAEZ JOHNS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.000	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1076501099	RAMIREZ ROJAS DUVAN STIVEN	1	0			S																	230201	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS005	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF32	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
3	CC	1076501099	RAMIREZ ROJAS DUVAN STIVEN	1	0			S											X						230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	0	CCF32	38.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1091160532	CACHAYA SILVA JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1220324	GUZMAN QUINTERO CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	16345285	MEDINA RODRIGUEZ JAIRO	1	0			S		X															230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-11	50.000	5	3.500	CCF32	50.000	2.000	0	0	0	0	0
7	CC	26430852	CORTES CERQUERA JOHANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF32	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	9846208	LOMZA CABRERA LEOMAR	1	0			S	X	X															231001	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF32	154.667	6.200	0	0	0	0	0
9	CC	1097459820	VASQUEZ GAVIRIA EDIER ANDRES	1	0			S	X																230201	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS037	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF32	696.000	27.900	0	0	0	0	0
10	CC	1193080593	CARTAGENA POLANCO JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS041	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF32	348.000	14.000	0	0	0	0	0
11	CC	1193107560	SALAMANCA ROJAS BRAYAN ESTIVEN	1	0			S	X																230201	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS037	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF32	232.000	9.300	0	0	0	0	0
12	CC	14251684	LOZANO SANCHEZ JHON JAIME	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	5059256	MONTIEL RUBIO HUMBERTO	1	0			S	X	X															25-14	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS037	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF32	696.000	27.900	0	0	0	0	0
14	CC	7728669	PLAZA HERNANDEZ YEISON	1	0			S	X	X															230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS005	270.667	10.900	14-11	270.667	5	18.900	CCF32	270.667	10.900	0	0	0	0	0
15	CC	1075221262	VAQUIRO GUARACA LUIS HERNANDO	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
16	CC	1075227035	POLO VEGA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X	X															231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
17	CC	1075253912	LOZANO DIAZ FABIO ERNESTO	1	0			S	X																231001	1.372.930	219.700	0	0	0	0	EPS037	1.372.930	55.000	14-11	1.372.930	5	95.800	CCF32	1.372.930	55.000	0	0	0	0	0
18	CC	1075790760	ROJAS LEA NICOLAS	1	0			S	X																25-14	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS041	464.000	18.600	14-11	464.000	5	32.300	CCF32	464.000	18.600	0	0	0	0	0
19	CC	1077721094	LOZANO GARCIA JHEFERSON ESTIVEN	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	CCFC55	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF32	116.000	4.700	0	0	0	0	0
20	CC	1081150391	MONTEALEGRE VARGAS JEFFERSON RAMIRO	1	0			S	X	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
21	CC	1093805621	GALINDO QUIROGA HECTOR DAMIAN	1	0			S	X																230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF32	154.667	6.200	0	0	0	0	0
22	CC	1093811235	DIAZ MONTANO LUIS SANTIAGO	1	0			S	X																230301	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS037	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF32	696.000	27.900	0	0	0	0	0
23	CC	1093813548	REY VARGAS JUAN CAMILO	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS005	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF32	232.000	9.300	0	0	0	0	0
24	CC	1012351830	BUSTOS MARTINEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S	X																230201	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS041	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF32	232.000	9.300	0	0	0	0	0
25	CC	1023039333	GONZALEZ RODRIGUEZ SANTIAGO	1	0			S	X	X															230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF32	348.000	14.000	0	0	0	0	0
26	CC	1075208256	LOPEZ LAVAO LUIS FERNANDO	1	0			S	X	X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS037	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF32	154.667	6.200	0	0	0	0	0
27	CC	7697133	RAYO QUIROGA RUBEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	79391286	MANRIQUE YOSA ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	6905252	ROJAS BARACALDO JUAN CARLOS	1	0			S		X															230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS037	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF32	386.667	15.500	0	0	0	0	0
30	CC	6905252	ROJAS BARACALDO JUAN CARLOS	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
31	CC	1075306840	PUERTAS ESQUIVEL RONAL	1	0			S		X															231001	348.000	55.700	0	0	0	0	EPSIC3	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF32	348.000	14.000	0	0	0	0	0
32	CC	1075284126	PERDOMO RUJANA DANIELA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF32	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
33	CC	1093801452	ASCENCIO CERQUERA OSCAR DAVID	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-11	464.000	5	32.300	CCF32	464.000	18.600	0	0	0	0	0
34	CC	1010023650	NAVIA DUSSAN JAVIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
35	CC	12139378	AYA SERRATO REINEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
36	CC	7691036	MONTANO PERDOMO JOSE YESID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
37	CC	12135392	LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
38	CC	1075320894	MANRIQUE LOZANO IVAN DARIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
39	CC	12139743	RIVAS VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	60.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					55	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	02/08/2023	69821652	$15.388.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Colombiano	Extranjero Cotizante	Cotizante Estudiante	Colombiano	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ING	RET	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1	0				S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
41	CC	1003930557	ARIAS GARCIA JHALMAR SMITH	1	0				S	X																	230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS005	502.667	20.200	14-11	502.667	5	35.000	CCF32	502.667	20.200	0	0	0	0	0
42	CC	1081159398	LOSADA GARCIA DAVID	1	0				S	X																	230201	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS037	928.000	37.200	14-11	928.000	5	64.600	CCF32	928.000	37.200	0	0	0	0	0
43	CC	1006517705	MEDINA LIZCANO DUBER FABIAN	1	0				S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
44	CC	1075313320	BARRERA CARRILLO ANDRES FELIPE	1	0				S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
45	CC	7724429	PUENTES ACEVEDO WILMAR ANDRES	1	0				S																		231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
46	CC	88041943	DIAZ GARCIA JOSE DAVID	1	0				S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
47	CC	1007165597	AYA PENAGOS BRAYAN STEVEN	1	0				S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	CC	2957450	SANCHEZ BERNAL MARCO JESUS	1	0				S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
49	CC	1003864749	RAIGOZA VARGAS JHOAN SEBASTIAN	1	0				S	X																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
50	CC	79415420	MONJE QUIROGA JUAN CARLOS	1	0				S	X																	231001	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-11	50.000	5	3.500	CCF32	50.000	2.000	0	0	0	0	0
51	CC	17588480	DIAZ GUADASMO ANTONIO OMAR	1	0				S																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	7696000	MORENO LOSADA UBARDO	1	0				S																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
53	CC	80059776	MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO	1	0				S																		25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS017	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
54	CC	80921330	GARCIA GOMEZ JAIRO RODOLFO	1	0				S	X																	230201	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS017	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	3	24.500	CCF24	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
55	CC	93256849	ROMERO SANCHEZ ARNOLDO	1	0				S																		230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
56	CC	1121658871	RENDON TORO MAURICIO ANDRES	1	0				S																		230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	CCFC55	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF32	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
57	CC	1075301493	ROA CAMPOS LUIS FELIPE	1	0				S																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764039561910

(415)7707212489984(8020) 001876403956191 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5				

11. Razón social: CONSORCIO PONAL LYM

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán — Cód. 1 7

24. Dirección: CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2022-11-15 / 11:23:56 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: PATIÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1061754434 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO PONAL LYM

997. Fecha formalización: 2022-11-15/11:23:56

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039561910

(415)7707212489984(8020) 001876403956191 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5				

11. Razón social
CONSORCIO PONAL LYM

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PONAL LYM CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LYM	1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2022 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028067757587

(415)7707212489984(8020) 001302806775758 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5				

11. Razón social: CONSORCIO PONAL LYM

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PONAL LYM CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LYM	1	50	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DIAN

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2022-11-15 / 11:21:36 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: PATIÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1061754434 1004. DV: 1
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO PONAL LYM

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento
992. Área
990. Lugar Admitivo.
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2022-11-15/11:21:36

FACTURA ELECTRÓNICA

CONSORCIO PONAL LYM
NIT 901.635.603-5
CL 5 9-37
Tel: (602) 3113407052
Popayán - Colombia
contador@estrategiaydefensa.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. LYM 11

Señores	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 5159000
Dirección	CR 59 26 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2023, 11:22
Expedición	25/09/2023, 11:28
Vencimiento	25/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cobro de acta parcial No 8, del contrato de obra No PN-DIRAF No. 06-6-10178-22 construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del Comando de Policía Metropolitana de Neiva y Departamento de Policía Huila	1.00	1,587,353,841.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos mil once millones novecientos seis mil ciento treinta y un pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-25 por $ 2,011,906,131.95

Total Bruto	1,572,415,890.54
Administración 21.00%	330,207,337.02
Imprevistos 1.00%	15,724,158.91
Utilidad 5.00%	78,620,794.52
IVA 19%	14,937,950.96
Total a Pagar	2,011,906,131.95

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-6-10178-22;gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 512856295 DE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039561910 aprobado en 20221115 prefijo LYM desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa

CUFE: e7bd05554ede6934636a226292e1e357e05f1dacf687f2e0c0868d75a1ac49ccd040b8384590d03f534a9a5a777dc73a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CI-2022-OF-043
Bogotá DC, 25 SEPTIEMBRE 2023

Señores
Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera
Mayor Gustavo Quiroz
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

Referencia: Contrato De Obra No 06-6-10178-22

"Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste "

Asunto: Anexo a la factura LYM-11.

Respetado Mayor,

En el marco del desarrollo del contrato, se ha adelantado el proceso de facturación de las actividades enmarcadas en los capítulos abajo listados ejecutadas de acuerdo al **acta parcial No. 8** suscrita el **Veinticinco (25) de septiembre** de 2023, conforme en la programación y valores unitarios contractuales.

ITEM	DESCRIPCIÓN
3.1.1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.
3.1.2	Relleno en Recebo común Compactado
3,2,1	Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI
3,2,5	Malla electrosoldada para losa contrapiso
3,2,10	Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI
NP 2	CONCRETO SOLADOS 2500 PSI
NP 4	MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CUBIERTA
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3"
NP 7	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA
NP 8	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI

NP 9	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA
NP 10	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 8 1/2" DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD (120 M) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMÁS TABLEROS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA, TUBERÍA, FILTROS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN A PTAP CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y BARCTERIOLÓGICO DEL AGUA
NP 12	PLASTICO POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO
NP 13	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 10¨´ PARA ACCESO PRINCIPAL
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA No 5
NP 15	CONCRETO CICLOPEO 20,7 MPA (3000 PSI) PARA SOBRE ANCHOS EN CIMENTACIÓN
NP 16	CASETON EN ICOPOR FORRADO EN POLIETILENO PARA ALIGERAMIENTO DE PLACAS DE CUBIERTA

Las actividades ejecutadas en este periodo se causaron por medio de la **factura de venta electrónica LYM-11**, Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos **$2,011,906,131.95**

DETALLE LYM-11	
COSTO DIRECTO	$ 1,572,415,890.54
ADMINISTRACIÓN 21%	$ 330,207,337.01
IMPREVISTOS 1%	$ 15,724,158.91
UTILIDADES 5%	$ 78,620,794.53
SUB TOTAL SIN DESCUENTOS	$ 1,996,968,180.99
IVA 19% sobre utilidad	$ 14,937,950.96
TOTAL	$ 2,011,906,131.95

Así las cosas, quedamos atentos de su amable gestión con el fin de obtener el pago oportuno de las actividades ejecutadas, las cuales cabe resaltar, fueron previamente aprobadas por parte de la Interventoría con el fin de generar el trámite pertinente.

Cordialmente,

Diego Medina Guerrero
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

RUT DEL CONSORCIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona juridica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PONAL LYM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA

42. Correo electrónico ponallym@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 4 0 7 0 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 2 0 8 3 1	4 3 3 0	2 0 2 2 0 8 3 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 14 / 11 : 04: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PATIÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria juridica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 8 3 1	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Defensa Nacional — 2 0

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 8 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 6 1 7 5 4 4 3 4	1	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PATIÑO	RAMIREZ	LUISA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 8 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 8 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	LEDEZMA	MANUEL	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 6 0 3	5	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 1 7 5 4 4 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PATIÑO	RAMIREZ	LUISA	FERNANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 2 0 2 2 0 8 3 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 8 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ	LEDEZMA	MANUEL	ANTONIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 5	2 0 2 2 0 8 3 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA

NIT 860.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS - ESTRATEGIA Y DEFENSA SA** identificada con el número de documento **9003272353** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 17 de febrero de 2020 con la Cuenta Corriente 512-856295 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 05 de enero de 2023.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

ESTRATEGIA & DEFENSA

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22

CONTRATANTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA - DIRAF
CEDENTE: CONSORCIO PONAL LYM – **NIT.** 901635603-5
CESIONARIO: ESTRATEGIA & DEFENSA SAS **NIT.** 900327235-3

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($6.974.591.904,74)**

VALOR A CEDER: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($6.974.591.904,74)**

LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.061.754.434 de Popayán, actuando en nombre y representación legal del **CONSORCIO PONAL LYM**, con Nit. 901635603-5, quién en adelante se denominará **EL CEDENTE y DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía No.80.058.776 de Bogotá, representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS** con Nit 900327235-3 quien en delante se denomina el **CESIONARIO**, en usos de sus facultades legales y estatutarias, se han convenido celebrar la presente cesión de los derechos económicos del contrato de la referencia, previa las siguientes consideraciones:

Que el día 27 de septiembre de 2022, se suscribió el contrato de obra **PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, celebrado entre el **LA POLICÍA NACIONAL Y EL CONSORCIO PONAL LYM**, cuyo objeto lo constituye la **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

a. Que dentro de la forma de pago LA POLICÍA NACIONAL realizará pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cálculo y que la interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día 25 de cada mes.

   Cuando elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las catas parciales y a su ejecución, deberá ser aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesarios) proyectado y avalo por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

   Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

   - Acta de recibo parcial. (Suscrita entre los contratistas de obra e interventoría)
   - Factura de venta.
   - Balance de cantidades ejecutadas.
   - Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
   - Certificación pagos FIC.
   - Memoria de cantidades ejecutadas.

Juan Carlos Vargas Sarmiento
Notaría 42

ESTRATEGIA & DEFENSA

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC)

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: Consorcio Ponal LYM
NIT: 901635603-5
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA
TIPO DECUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 0570011064

b. Que por solicitud expresa de **CONSORCIO PONAL LYM**, quien en el presente contrato tiene la calidad de contratista, se requiere la cesión total de los derechos económicos a favor de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**.

c. Que el presente acto modificatorio, se efectúa en el artículo 887 del código de comercio, el cual establece: " en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse constituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato..." y en especial en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 que reza"...los contratos estatales son intuito persona y en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse so previa autorización escrita de la entidad contratante.

d. Que de conformidad con el artículo 32 de la ley 80 de 1993, las entidades públicas pueden celebrasen todos los contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

e. Que en el artículo 13 de la misma ley, consagra que los contratos que celebren las entidades estatales se rigen por la disposiciones civiles y comerciales, salvo en las materias expresamente reguladas por la ley 80 de 1993.

En virtud de lo expuesto las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA CESIÓN. Ceder el 100% de los derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, suscrito entre **LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** y **CONSORCIO PONAL LYM** a favor de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, y en virtud del contrato señalado, reciba la suma de dinero que se deba pagar como consecuencia de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22.**

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
NIT: 9003272353
ENTIDAD FINANCIERA: OCCIDENTE
TIPO DECUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 512856295

Juan Carlos Vargas Jaramillo Notario 42

ESTRATEGIA & DEFENSA

CLAUSULA SEGUNDA – AUTORIZACION. LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, autoriza la cesión de derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, a **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS** en los términos del mismo y del presente documento.

CLAUSULA TERCERA- ACEPTACIÓN. EL CESIONARIO acepta la cesión de los derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22** y con suscripción de este documento. Adquiere todos los derechos y obligaciones que dé él se derivan.

CLAUSULA CUARTA. Las demás clausulas establecidas en el **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22** continúan vigentes y sin modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente contrato, siendo veinticuatro (24) de noviembre del año 2022, en tres (3) originales.

LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ
C.C 1.061.754.434 DE POPAYÁN
CONSORCIO PONAL LYM
CEDENTE

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
C.C. 80058776 DE BOGOTA
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
CESIONARIO

Dirección Oficina Principal: Calle 162 A No. 17 A - 60 Bogotá – Colombia
Teléfonos: (601) 8053770 – 3103841467
Email: contacto@estrategiaydefensa.com

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

14386527

En la ciudad de Popayán, Departamento de Cauca, República de Colombia, el primero (1) de diciembre de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Popayán, compareció: LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1061754434 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----

v3m30vqwkvmr
01/12/2022 - 14:21:32



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

FABIO ANDRES CASTRO BRAVO

Notario Segundo (2) del Círculo de Popayán, Departamento de Cauca - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: v3m30vqwkvmr

Juan Carlos Vargas Zapata
Notario

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON HUELLA

NOTARÍA CUARENTA Y DOS (42)
CÍRCULO DE BOGOTÁ - COLOMBIA

JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO,
NOTARIO TITULAR

CERTIFICA:

Que MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO

Se identificó con: C.C. 80058776

manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en él aparece es la suya. En constancia, firma nuevamente y estampa la huella de su dedo índice derecho.

(La certificación de huella causa derechos notariales según tarifa)

Bogotá D.C. 05/12/2022

tesr55\rfdcoeco

www.notariaenlinea.com
Q2FD0WQG8SWS82YC

YEMR

Juan Carlos Vargas Jaramillo
Notario

42 Notaría

Autenticación Biométrica
Decreto Ley 019 de 2012
Artículo 17
144508

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y EL CONSORCIO PONAL LYM, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Entre los suscritos, de una parte la **POLICÍA NACIONAL**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado para el caso que nos ocupa señor coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79'637.727** expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre de la **NACIÓN - POLICÍA NACIONAL**, en su calidad de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL (E)**, nombrado mediante Orden Administrativa de Personal No. 23-009 del 09/01/2023, debidamente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional, en adelante se denominará la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, con **NIT. 800.141.397-5,** y por la otra el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.058.776 expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal del **CONSORCIO PONAL LYM**, con **NIT** 901.635.603-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio No. 1, previos los siguientes considerandos: **a).** La Policía Nacional celebró con el consorcio PONAL LYM., el contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, el 27 de septiembre de 2022, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($6.974.591.904,74) incluido AIU e IVA., con plazo de ejecución hasta el 20/12/2022, previa aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría). **b).** Que el 29 de septiembre de 2022, la Jefe Grupo de Presupuesto General de la Dirección Administrativa y Financiera, expidió el Registro Presupuestal del Compromiso No. 406222, por un valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($6.974.591.904,74), recurso 11. **c).** Que el 18 de octubre de 2022, la Dirección Administrativa y Financiera, aprobó la garantía única del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, póliza No. 435-47-994000050931, anexo No. 1, expedida el 10 de octubre de 2022 y póliza No. 435-74-994000012439, anexo No. 1, expedida el 10 de octubre de 2022, por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. **d).** Que mediante oficio No. GS-2022-042127/DIRAF-ARCON-17.5 del 19 de diciembre de 2022, se suscribió la aceptación cesión de derechos económicos del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22. **e).** Que el 19 de diciembre de 2022, se suscribió la prórroga No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en la cual se prorrogó el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el día 19 de mayo de 2023. **f).** Que el 28 de diciembre de 2022, la Dirección Administrativa

y Financiera, aprobó la garantía única del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, póliza No. 435-47-994000050931, anexo No. 3, expedida el 26 de diciembre de 2022 y póliza No. 435-74-994000012439, anexo No. 2, expedida el 23 de diciembre de 2022, por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. g). Que mediante oficio sin número del 13 de enero de 2023, radicado en la ventanilla única de correspondencia y radicación de la Dirección General de la Policía Nacional, bajo el Nro. 001426 el 13 de enero de 2023, el señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, Representante Legal del CONSORCIO PONAL LYM., presentó a la Dirección Administrativa y Financiera, solicitud de modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, mediante acta de cambio y nombramiento representante legal y representante legal suplente del consorcio PONAL LYM, en los siguientes términos: *"(...)*

Adjunto encontrará:

- Acta de cambio y nombramiento representante legal y representante legal suplente consorcio PONAL LYM debidamente autenticada.
- Copia cédula de ciudadanía Diego Fernando Medina Guerrero.
- Copia cédula de ciudadanía Ana Milena Osorio Ramirez.

Nuestros datos de notificación son:

Dirección: Carrera 5 No 10 – 49
Oficina 301
Neiva – Huila

Celular: 3107841467

ACTA DE CAMBIO Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CONSORCIO PONAL LYM

NIT. 901635603-5

ACTA No. (01)

En la ciudad de Popayán, siendo las 10 40 am, del día 26 de noviembre de 2022 se reunen los integrantes del consorcio PONAL LYM, con el objeto de realizar el cambio y nuevos nombramientos de los representante legal y representante legal suplente del consorcio.

Estuvieron presentes los integrantes del consorcio, actuando como actual representante legal la señorita Luisa Fernanda Patiño Ramirez, identificada con cédula de ciudadanía 1.061.754.434 de Popayán y el Manuel Antonio Muñoz Ledezma identificado con cédula de ciudadanía 10.536.292 de Popayan como representante legal suplente. Con participación consorcial así:

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN CONSORCIO
LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ	5%
MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA	95%
TOTAL	100%

El 100% de los integrantes del consorcio aprueban el nombramiento de **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía numero **80.058.776** de Bogotá, como Representante legal, en reemplazo de **LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No **1.061.754.434** de Popayán y a **ANA MILENA OSORIO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.032.438.052** de Bogotá, como representante legal suplente, en reemplazo de **MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA**, identificado con cédula de ciudadanía No **10.538.292** de Popayán.

Los anteriores nombramientos son realizados de manera inamovible por los integrantes del consorcio, esto quiere decir que durante la ejecución y/o cesión del contrato, a no ser que alguno de los nuevos nombrados manifieste lo contrario, no se podrán efectuar cambios en la representación legal aquí y desde ahora establecida, salvo que con su actuar, los nuevos representantes legales principal y suplente, perjudiquen directamente y de manera lesiva a los consorciados.

Tanto la señorita **LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ** como el señor **MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA** declaran que no tienen ninguna limitación para realizar el cambio, y a su vez otorgan total libertad, sin limitación, a los nuevos representantes legales, **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO Y ANA MILENA OSORIO RAMIREZ** para realizar todos los trámites pertinentes, esto incluye cesiones totales o parciales y actuar de manera amplia y suficiente en nombre del consorcio **PONAL LYM – NIT. 901635603-5** para el **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, cuyo objeto es "construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1 - b del comando de policía metropolitana de Neiva y departamento de policía huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste" respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Aceptación de la Nueva Representación Legal Designada.

Una vez comunicada la designación para el cargo de representante legal al señor **Diego Fernando Medina Guerrero** y representante legal suplente a la señora **Ana Milena Osorio Ramirez** en el consorcio **PONAL LYM**, se manifiesta por ambas partes la aceptación del cargo y el compromiso a ejercer fielmente las funciones.

Como prueba de la aceptación de los nombramientos proceden a firmar al final de la presente acta.

Lectura y Aprobación del Acta.

Los integrantes del consorcio y la nueva representación legal del consorcio hacen lectura del acta y esta es aprobada.

LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ
1.061.754.434 de Popayán

MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
10.538.292 de Popayán.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
80.058.776 de Bogotá

ANA MILENA OSORIO RAMIREZ
1.032.438.052 de Bogotá

Imagen pegada del PDF (...)". h). Que mediante oficio Nro. GS-2023-001231/DIRAF del 17 de enero de 2023, el supervisor del contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22, señor Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO, presentó al señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ, Director Administrativo y Financiero (E), concepto de viabilidad para el modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en los siguientes términos: *"(...)*

> En atención al desarrollo del contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", y considerando el acta No.1 del consorcio PONAL LYM del 26/11/2022 donde la señorita Luisa Fernanda Patiño Ramirez representante legal del consorcio establece soporte escrito y legal (documento autenticado por Notaría). para que la entidad contratante efectúe los tramites administrativos para lograr el cambio de representante legal y representante legal suplente, respetuosamente informo a mi Coronel que luego de verificar los documentos anexos en el oficio GE-2022-001426-DIPON del 13/01/2023 y la necesidad establecida por el consocio, esta supervisión considera viable y necesario el trámite administrativo requerido por el contratista y así, avanzar en el desarrollo de las obras contratadas.

Imagen pegada del PDF (...)". i). Que es procedente la celebración del modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, conforme lo solicitado por el contratista y el supervisor, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: modificar parcialmente el ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en el cual quedará como representante legal del CONSORCIO PONAL LYM, el señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.058.776 expedida en Bogotá D.C. y como representante legal suplente la señora ANA MILENA OSORIO RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.438.052 de Bogotá D.C. **PARÁGRAFO:** El presente modificatorio No. 1 no genera costos adicionales para la Policía Nacional. **CLÁUSULA SEGUNDA – PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento del presente modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, se requiere de las firmas de las partes. **PARÁGRAFO:** la Policía Nacional se obliga a dar aviso de la suscripción del presente modificatorio No. 1 a la Compañía Aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que expidió el mecanismo de cobertura del riesgo, que respalda las obligaciones contractuales del contrato de obra PN-DIRAF No. 06-6-10178-22. **CLÁUSULA TERCERA:** las demás cláusulas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, continúan vigentes. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

LA POLICÍA NACIONAL

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional (E)

CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
Representante Legal del CONSORCIO PONAL LYM.

Elaboró	Revisó	Revisó	Revisó	Revisó
SI. German Eduardo Daza Chacón Analista Contractual y Seguimiento	MY José Ricardo Rodríguez Andrade Jefe Grupo Contractual y Seguimiento	MY Cindia Yuriet García Jefe Oficina Asuntos Jurídicos DIRAF	Mayor José [illegible] Jefe Área [illegible]	TC Andrés Ricardo Vaca Camacho Subdirector Administrativo y Financiero (E)

LABORATORIOS

CONSORCIO PONAL LYM

INFORME LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA. "

AGOSTO DE 2023

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA. "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 9 de marzo de 2022

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
24/02/2023	10/02/2023	1	LAB 1	15,00	30,00	729,1	163908	14	24/02/2023	5984	120%	5	5000	concreto cimentacion bloque A
	10/02/2023	2		15,00	30,00	705,4	158580	14	24/02/2023	5790	116%	6	5000	
	10/02/2023	3						28	10/03/2023				5000	
	10/02/2023	4						28	10/03/2023				5000	
24/02/2023	18/02/2023	5	LAB 2	15,00	30,00	565,9	127219	7	25/02/2023	4645	93%	4	5000	concreto cimentacion bloque A
	18/02/2023	6		15,00	30,00	549,0	123420	7	25/02/2023	4506	90%	2	5000	
	18/02/2023	7		15,00	30,00	605,5	136122	14	4/03/2023	4970	99%	6	5000	
	18/02/2023	8		15,00	30,00	549,8	123600	14	4/03/2023	4512	90%	6	5000	
24/02/2023	20/02/2023	9	LAB 3	15,00	30,00	500,1	112427	7	27/02/2023	4105	82%	4	5000	concreto bloque A
	20/02/2023	10		15,00	30,00	527,9	118677	7	27/02/2023	4333	87%	4	5000	
	20/02/2023	11		15,00	30,00	528,4	118789	14	6/03/2023	4337	87%	2	5000	
	20/02/2023	12		15,00	30,00	522,9	117553	14	6/03/2023	4292	86%	4	5000	
24/02/2023	22/02/2023	13	LAB 4	15,00	30,00	614,0	138033	7	1/03/2023	5039	101%	1	5000	concreto bloque A
	22/02/2023	14		15,00	30,00	618,7	139089	7	1/03/2023	5078	102%	5	5000	
	22/02/2023	15		15,00	30,00	709,3	159457	14	8/03/2023	5822	116%	5	5000	
	22/02/2023	16		15,00	30,00	711,8	160019	14	8/03/2023	5842	117%	4	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	jueves, 20 de abril de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificacion Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
24/02/2023	27/02/2023	17	LAB 5	15,00	30,00	443,6	99725	7	6/03/2023	3641	73%	2	5000	concreto cimentacion bloque A
	27/02/2023	18		15,00	30,00	467,9	105188	7	6/03/2023	3840	77%	3	5000	
	27/02/2023	19		15,00	30,00	468,9	105413	14	13/03/2023	3848	77%	3	5000	
	27/02/2023	20		15,00	30,00	451,2	101434	14	13/03/2023	3703	74%	4	5000	
24/02/2023	4/03/2023	21	LAB 6	15,00	30,00	498,8	112135	7	11/03/2023	4094	82%	5	5000	Zapatas B2, B3, Viga de Cimentacion Eje B entre ejes 4 a 7 Bloque A
	4/03/2023	22		15,00	30,00	491,2	110426	7	11/03/2023	4032	81%	6	5000	
	4/03/2023	23		15,00	30,00	590,1	132660	14	18/03/2023	4843	97%	5	5000	
	4/03/2023	24		15,00	30,00	641,2	144152	28	1/04/2023	5263	105%	4	5000	
24/02/2023	13/03/2023	25	LAB 7	15,00	30,00	429,8	96623	7	20/03/2023	3528	71%	4	5000	Pedestales a columnasA2, A3, A4, A5, A6 B7, ytramos de vigas próximas a B6,B5 y B4;y tramos de vigas entre B1, B2, B3 y B4 con sus tercios en dirección eje A y C, del bloque A
	13/03/2023	26		15,00	30,00	431,6	97023	7	20/03/2023	3542	71%	5	5000	
	13/03/2023	27		15,00	30,00	554,2	124589	14	27/03/2023	4549	91%	3	5000	
	13/03/2023	28		15,00	30,00	614,2	138078	28	10/04/2023	5041	101%		5000	
21/03/2023	18/03/2023	29	LAB 8	15,00	30,00	605,8	136189	14	1/04/2023	4972	99%	5	5000	cimentacion y vifgas Bloque A premezclado
	18/03/2023	30		15,00	30,00	603,5	135672	14	1/04/2023	4953	99%	5	5000	
	18/03/2023	31		15,00	30,00	641,2	144148	28	15/04/2023	5263	105%	4	5000	
	18/03/2023	32		15,00	30,00	645,5	145114	28	15/04/2023	5298	106%	4	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA. "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	martes, 2 de mayo de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
25/03/2023	22/03/2023	33	LAB 9	15,00	30,00	518,5	116563	7	29/03/2023	4256	85%	2	5000	concreto bloque A
	22/03/2023	34		15,00	30,00	526,5	118362	7	29/03/2023	4321	86%	3	5000	
	22/03/2023	35		15,00	30,00	624,8	140461	14	5/04/2023	5128	103%	4	5000	
	22/03/2023	36		15,00	30,00	618,5	139044	14	5/04/2023	5076	102%	3	5000	
27/03/2023	24/03/2023	37	LAB 10	15,00	30,00	579,8	130344	7	31/03/2023	4759	95%	2	5000	Zapatas C3, C4 y C5 del Bloque A
	24/03/2023	38		15,00	30,00	581,2	130659	7	31/03/2023	4770	95%	2	5000	
	24/03/2023	39		15,00	30,00	614,2	138078	14	7/04/2023	5041	101%	4	5000	
	24/03/2023	40		15,00	30,00	618,2	138977	14	7/04/2023	5074	101%	5	5000	
28/03/2023	25/03/2023	41	LAB 11	15,00	30,00	486,6	109392	7	1/04/2023	3994	80%	3	5000	Zapata C2 del Bloque A,. Zapata A6 del Bloque B
	25/03/2023	42		15,00	30,00	490,2	110201	7	1/04/2023	4023	80%	2	5000	
	25/03/2023	43		15,00	30,00	510,3	114720	14	8/04/2023	4188	84%	5	5000	
	25/03/2023	44		15,00	30,00	505,1	113551	14	8/04/2023	4146	83%	4	5000	
1/04/2023	29/03/2023	45	LAB 12	15,00	30,00	526,3	118317	14	12/04/2023	4320	86%	3	5000	Zapatas A4 y A5 del Bloque B y parcial de viga Eje C entre ejes 2 y 3 con sus tercios próximos.
	29/03/2023	46		15,00	30,00	542,4	121936	14	12/04/2023	4452	89%	4	5000	
	29/03/2023	47		15,00	30,00	687,2	154489	28	26/04/2023	5640	113%	3	5000	
	29/03/2023	48		15,00	30,00	702,2	157861	28	26/04/2023	5763	115%	4	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA."
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 ---1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 28 de junio de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
2/04/2023	30/03/2023	49	LAB 13	15,00	30,00	526,1	118272	14	13/04/2023	4318	86%	4	5000	Zapatas B6, B5, B4 Y B1 del Bloque B
	30/03/2023	50		15,00	30,00	557,9	125421	14	13/04/2023	4579	92%	3	5000	
	30/03/2023	51		15,00	30,00	624,5	140393	28	27/04/2023	5126	103%	5	5000	
	30/03/2023	52		15,00	30,00	628,6	141315	28	27/04/2023	5159	103%	3	5000	
4/04/2023	1/04/2023	53	LAB 14	15,00	30,00	670,8	150802	14	15/04/2023	5506	110%	3	5000	Zapatas B2, B3 del bloque A y Zapata C6 del Bloque B. POLINAL
	1/04/2023	54		15,00	30,00	628,2	141225	14	15/04/2023	5156	103%	3	5000	
	1/04/2023	55		15,00	30,00	692,8	155748	28	29/04/2023	5686	114%	4	5000	
	1/04/2023	56		15,00	30,00	708,0	159165	28	29/04/2023	5811	116%	5	5000	
8/04/2023	5/04/2023	57	LAB 15	15,00	30,00	690,7	155276	14	19/04/2023	5669	113%	5	5000	Vigas de cimentacion Eje 1 entre B/C/D y eje C entre ejes 1 y 2. Del Bloque A
	5/04/2023	58		15,00	30,00	623,1	140078	14	19/04/2023	5114	102%	4	5000	
	5/04/2023	59		15,00	30,00	655,4	147340	28	3/05/2023	5379	108%	4	5000	
	5/04/2023	60		15,00	30,00	653,5	146913	28	3/05/2023	5364	107%	4	5000	
16/04/2023	13/04/2023	61	LAB 16	15,00	30,00	663,4	149138	14	27/04/2023	5445	109%	4	5000	13 ABRIL VIGA EJE C ENTRE EJES 4-5-6 DEL BLOQUE A
	13/04/2023	62		15,00	30,00	665,1	149520	14	27/04/2023	5459	109%	3	5000	
	13/04/2023	63		15,00	30,00	687,2	154489	28	11/05/2023	5640	113%	4	5000	
	13/04/2023	64		15,00	30,00	690,2	155163	28	11/05/2023	5665	113%	4	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 28 de junio de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
18/04/2023	15/04/2023	65	LAB 17	15,00	30,00	550,3	123712	14	29/04/2023	4517	90%	3	5000	15 ABRIL PEDESTALES BLOQUE A D1,C1,C2,C3,C4,C5 Y ZAPATAS D6,D5,D4,D3,D2,D1, VIGA CIMENTACION EJE C 6-7
	15/04/2023	66		15,00	30,00	560,9	126095	14	29/04/2023	4604	92%	5	5000	
	15/04/2023	67		15,00	30,00	612,5	137696	28	13/05/2023	5027	101%	1	5000	
	15/04/2023	68		15,00	30,00	615,2	138302	28	13/05/2023	5049	101%	2	5000	
1/05/2023	28/04/2023	69	LAB 18	15,00	30,00	534,1	120070	14	12/05/2023	4384	88%	1	5000	Concreto Plástico 5000 PSI Viga Eje A entre 3/4/5/6 y los tercios de las vias de los ejes 6, 5, 4 entre ejes A y B del Bloque B
	28/04/2023	70		15,00	30,00	565,9	127219	14	12/05/2023	4645	93%	1	5000	
	28/04/2023	71		15,00	30,00	608,5	136796	28	26/05/2023	4994	100%	2	5000	
	28/04/2023	72		15,00	30,00	614,3	138089	28	26/05/2023	5041	101%	5	5000	
5/05/2023	2/05/2023	73	LAB 19	15,00	30,00	576,1	129512	14	16/05/2023	4728	95%	3	5000	Concreto Plástico, Bloque B: vigas de cimentación: EjeA entre 1/2/3, tercios de viejas ejes 1, 2 entre ejes A y B, eje 6 entre A/B/C, tercio de viga Eje C entre ejes 5 y 6
	2/05/2023	74		15,00	30,00	590,2	132682	14	16/05/2023	4844	97%	1	5000	
	2/05/2023	75		15,00	30,00	621,2	139651	28	30/05/2023	5098	102%	1	5000	
	2/05/2023	76		15,00	30,00	616,8	138662	28	30/05/2023	5062	101%	2	5000	
7/05/2023	4/05/2023	77	LAB 20	15,00	30,00	551,1	123892	14	18/05/2023	4523	90%	5	5000	Viga de Cimentación Eje B entre ejes 1/2/3 y tercios aledaños
	4/05/2023	78		15,00	30,00	561,2	126163	14	18/05/2023	4606	92%	4	5000	
	4/05/2023	79		15,00	30,00	611,4	137448	28	1/06/2023	5018	100%	3	5000	
	4/05/2023	80		15,00	30,00	630,4	141720	28	1/06/2023	5174	103%	3	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA."
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 — 1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 28 de junio de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
11/05/2023	8/05/2023	81	LAB 21	15,00	30,00	560,7	126050	14	22/05/2023	4602	92%	1	5000	viga de cimentación Eje B entre ejes 1/2/3 y tercios del bloque B
	8/05/2023	82		15,00	30,00	603,9	135782	14	22/05/2023	4956	99%	1	5000	
	8/05/2023	83		15,00	30,00	616,7	138640	28	5/06/2023	5062	101%	3	5000	
	8/05/2023	84		15,00	30,00	616,9	138685	28	5/06/2023	5063	101%	3	5000	
14/05/2023	11/05/2023	85	LAB 22	15,00	30,00	592,5	133199	14	25/05/2023	4863	97%	1	5000	columnas A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B7 del bloque A y viga de cimentacion eje B y tercios del bloque B
	11/05/2023	86		15,00	30,00	566,2	127287	14	25/05/2023	4647	93%	4	5000	
	11/05/2023	87		15,00	30,00	621,2	139651	28	8/06/2023	5098	102%	4	5000	
	11/05/2023	88		15,00	30,00	623,5	140168	28	8/06/2023	5117	102%	5	5000	
30/05/2023	22/02/2023	89	LAB 23	15,00	30,00	748,8	168337	56	19/04/2023	6146	123%	5	5000	TESTIGO
	22/02/2023	90		15,00	30,00	743,4	167123	56	19/04/2023	6101	122%	5	5000	
30/05/2023	27/02/2023	93	LAB 24	15,00	30,00	662,5	148936	56	24/04/2023	5437	109%	5	5000	TESTIGO

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA. "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 — 1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 28 de junio de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICIÓN DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
16/05/2023	13/05/2023	94	LAB 25	15,00	30,00	591,7	133019	14	27/05/2023	4856	97%	4	5000	viga cimentacion eje C entre 6/5/4 y tercios, viga eje 6 entre ejes c, viga eje D entre 6/7 y tercio al 5 del bloque B
	13/05/2023	95		15,00	30,00	613,7	137965	14	27/05/2023	5037	101%	5	5000	
	13/05/2023	96		15,00	30,00	607,1	136482	28	10/06/2023	4983	100%	3	5000	
	13/05/2023	97		15,00	30,00	608,4	136774	28	10/06/2023	4993	100%	3	5000	
22/05/2023	19/05/2023	98	LAB 26	15,00	30,00	636,8	143158	14	2/06/2023	5227	105%	4	5000	viga cimentacion eje C entre 5/4 y tercios, viga eje 6 entre ejes c, viga eje D entre 6/7 y tercio al 5 del bloque B
	19/05/2023	99		15,00	30,00	552,6	124229	14	2/06/2023	4535	91%	3	5000	
	19/05/2023	100		15,00	30,00	640,9	144080	28	16/06/2023	5260	105%	1	5000	
	19/05/2023	101		15,00	30,00	684,3	153837	28	16/06/2023	5616	112%	4	5000	
23/05/2023	20/05/2023	102	LAB 27	15,00	30,00	616,9	138685	14	3/06/2023	5063	101%	4	5000	Columnas del Bloque A, Pedestales bloque B, Zapatas Bloque C
	20/05/2023	103		15,00	30,00	363,0	81606	14	3/06/2023	2979	60%	4	5000	
	20/05/2023	104		15,00	30,00	674,6	151656	28	17/06/2023	5537	111%	4	5000	
	20/05/2023	105		15,00	30,00	614,1	138055	28	17/06/2023	5040	101%	5	5000	
2/06/2023	30/05/2023	106	LAB 28	15,00	30,00	547,5	123083	14	13/06/2023	4494	90%	4	5000	
	30/05/2023	107		15,00	30,00	595,2	133806	14	13/06/2023	4885	98%	5	5000	
	30/05/2023	108		15,00	30,00	632,5	142192	28	27/06/2023	5191	104%	3	5000	
	30/05/2023	109		15,00	30,00	638,8	143608	28	27/06/2023	5243	105%	4	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA."
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 ---1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	jueves, 6 de julio de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
3/06/2023	31/05/2023	110	LAB 29	15,00	30,00	612,3	137651	14	14/06/2023	5025	101%	4	5000	
	31/05/2023	111		15,00	30,00	614,0	138033	14	14/06/2023	5039	101%	4	5000	
	31/05/2023	112		15,00	30,00	641,2	144148	28	28/06/2023	5263	105%	3	5000	
	31/05/2023	113		15,00	30,00	654,2	147070	28	28/06/2023	5369	107%	2	5000	
5/06/2023	2/06/2023	114	LAB 30	15,00	30,00	543,5	122184	14	16/06/2023	4461	89%	5	5000	
	2/06/2023	115		15,00	30,00	530,8	119329	14	16/06/2023	4357	87%	1	5000	
	2/06/2023	116		15,00	30,00	674,0	151521	28	30/06/2023	5532	111%	4	5000	
	2/06/2023	117		15,00	30,00	645,4	145092	28	30/06/2023	5297	106%	3	5000	
5/06/2023	2/06/2023	118	LAB 31	15,00	30,00	614,1	138055	14	16/06/2023	5040	101%	4	5000	
	2/06/2023	119		15,00	30,00	639,2	143698	14	16/06/2023	5246	105%	3	5000	
	2/06/2023	120		15,00	30,00	653,6	146935	28	30/06/2023	5364	107%	5	5000	
	2/06/2023	121		15,00	30,00	696,6	156602	28	30/06/2023	5717	114%	4	5000	
9/06/2023	6/06/2023	122	LAB 32	15,00	30,00	600,4	134975	14	20/06/2023	4928	99%	4	5000	
	6/06/2023	123		15,00	30,00	635,0	142754	14	20/06/2023	5212	104%	5	5000	
	6/06/2023	124		15,00	30,00	671,1	150869	28	4/07/2023	5508	110%	4	5000	
	6/06/2023	125		15,00	30,00	647,2	145496	28	4/07/2023	5312	106%	2	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA. "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	martes, 8 de agosto de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN							
11/06/2023	8/06/2023	126	LAB 33	15,00	30,00	711,6	14	22/06/2023	5840	117%	4	5000	
	8/06/2023	127		15,00	30,00	728,4	14	22/06/2023	5978	120%	5	5000	
	8/06/2023	128		15,00	30,00	761,2	28	6/07/2023	6248	125%	2	5000	
	8/06/2023	129		15,00	30,00	753,2	28	6/07/2023	6182	124%	3	5000	
11/06/2023	8/06/2023	130	LAB 34	15,00	30,00	352,6	14	22/06/2023	2894	58%	5	5000	
	8/06/2023	131		15,00	30,00	331,8	14	22/06/2023	2723	54%	4	5000	
	8/06/2023	132		15,00	30,00	771,4	28	6/07/2023	6331	127%	3	5000	
	8/06/2023	133		15,00	30,00	774,8	28	6/07/2023	6359	127%	4	5000	
10/07/2023	26/06/2023	134	LAB 35	15,00	30,00	528,6	14	10/07/2023	4338	87%	2	5000	M1 / COLUMNA B.B
	26/06/2023	135		15,00	30,00	539,2	14	10/07/2023	4425	89%	5	5000	
	26/06/2023	136		15,00	30,00	613,5	28	24/07/2023	5035	101%	4	5000	
10/07/2023	26/06/2023	137	LAB 36	15,00	30,00	564,4	14	10/07/2023	4632	93%	5	5000	M2 / COLUMNA B.B
	26/06/2023	138		15,00	30,00	537,5	14	10/07/2023	4412	88%	5	5000	
	26/06/2023	139		15,00	30,00	623,2	28	24/07/2023	5115	102%	4	5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA."
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 16 de agosto de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN							
13/07/2023	10/07/2023	140	LAB 37	15,00	30,00	631,8	14	24/07/2023	5185	104%	3	5000	
	10/07/2023	141		15,00	30,00	634,6	14	24/07/2023	5208	104%	4	5000	
	10/07/2023	142		15,00	30,00	658,7	28	7/08/2023	5406	108%	5	5000	
	10/07/2023	143		15,00	30,00	664,2	28	7/08/2023	5451	109%	4	5000	
15/07/2023	13/07/2023	144	LAB 38	15,00	30,00	510,4	14	27/07/2023	4189	84%	3	5000	
	13/07/2023	145		15,00	30,00	590,3	28	10/08/2023	4845	97%	5	5000	
17/07/2023	15/07/2023	146	LAB 39	10,00	20,00	265,1	14	29/07/2023	4896	98%	4	5000	
	15/07/2023	147		10,00	20,00	286,2	28	12/08/2023	5285	106%	4	5000	
20/07/2023	18/07/2023	148	LAB 40	15,00	30,00	438,2	7	25/07/2023	3597	72%	3	5000	
	18/07/2023	149		15,00	30,00	648,5	28	15/08/2023	5323	106%	2	5000	
21/07/2023	19/07/2023	150	LAB 41	15,00	30,00	426,3	7	26/07/2023	3499	70%	3	5000	
	19/07/2023	151		15,00	30,00	684,2	28	16/08/2023	5616	112%	4	5000	
22/07/2023	20/07/2023	152	LAB 42	15,00	30,00	432,2	14	3/08/2023	3547	71%	5	5000	COLUMNA CIRCULAR B.L-A
	20/07/2023	153		15,00	30,00		28	17/08/2023	0	0%		5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA."
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 16 de agosto de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN							
26/07/2023	24/07/2023	154	LAB 43	15,00	30,00	670,7	7	31/07/2023	5505	110%	3	5000	BLOQUE A EJE 4,5 M.2
	24/07/2023	155		15,00	30,00		28	21/08/2023	0	0%		5000	
26/07/2023	24/07/2023	156	LAB 44	15,00	30,00	684,0	7	31/07/2023	5614	112%	4	5000	COLUMNAS BL. B
	24/07/2023	157		15,00	30,00		28	21/08/2023	0	0%		5000	
26/07/2023	24/07/2023	158	LAB 45	10,00	20,00	310,2	14	7/08/2023	5728	115%	5	5000	BLOQUE A
	24/07/2023	159		10,00	20,00	296,5	14	7/08/2023	5475	110%	4	5000	
	24/07/2023	160		10,00	20,00		28	21/08/2023	0	0%		5000	
28/07/2023	26/07/2023	161	LAB 46	15,00	30,00	456,5	14	9/08/2023	3747	75%	5	5000	BLOQUE B
	26/07/2023	162		15,00	30,00		28	23/08/2023	0	0%		5000	
29/07/2023	27/07/2023	163	LAB 47	15,00	30,00	222,6	14	10/08/2023	1827	37%	4	5000	COLUMNAS CIRCULAR BLOQUE B
	27/07/2023	164		15,00	30,00		28	24/08/2023	0	0%		5000	
30/07/2023	28/07/2023	165	LAB 48	10,00	20,00	183,3	14	11/08/2023	3385	68%	5	5000	CICLOPEO BLOQUE B, VIGAS
	28/07/2023	166		10,00	20,00		28	25/08/2023	0	0%		5000	

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	29-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA "
UBICACIÓN	LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS
FECHA EMISION INFORME:	miércoles, 16 de agosto de 2023

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN							
31/07/2023	29/07/2023	167	LAB 49	15,00	30,00	474,0	42	9/09/2023	3890	78%	4	5000	PLACA BLOQUE B-CONTRAPISO MEXER #1
	29/07/2023	168		15,00	30,00		56	23/09/2023	0	0%		5000	
31/07/2023	29/07/2023	169	LAB 50	15,00	30,00	468,2	70	7/10/2023	3843	77%	4	5000	PLACA CONTRAPISO BLOQUE B MIXER #2
	29/07/2023	170		15,00	30,00		84	21/10/2023	0	0%		5000	
31/07/2023	29/07/2023	171	LAB 51	15,00	30,00	183,1	98	4/11/2023	1503	30%	4	5000	PLACA CONTRAPISO BLOQUE B MIXER #3
	29/07/2023	172		15,00	30,00		112	18/11/2023	0	0%		5000	
31/07/2023	29/07/2023	173	LAB 52	15,00	30,00	443,0	126	2/12/2023	3636	73%	4	5000	PLACA CONTRAPISO BLOQUE B MIXER #4
	29/07/2023	174		15,00	30,00		140	16/12/2023	0	0%		5000	
31/07/2023	29/07/2023	175	LAB 53	15,00	30,00	510,7	154	30/12/2023	4192	84%	4	5000	PLACA CONTRAPISO BLOQUE B MIXER #5
	29/07/2023	176		15,00	30,00		168	13/01/2024	0	0%		5000	

TIPO DE FALLA






OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

REALIZO
FENER GONZALEZ
LABORATORISTA

CALCULO
ANDERSON URREA COLLAZOS
JEFE DE LABORATORIO

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

Registro fotografico

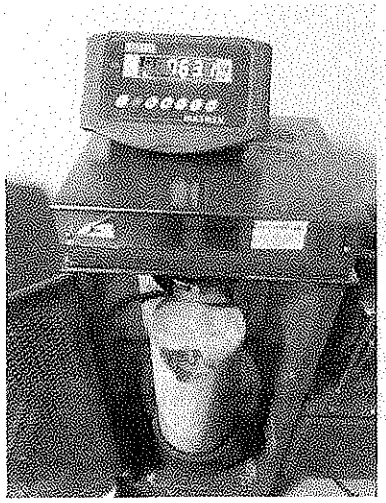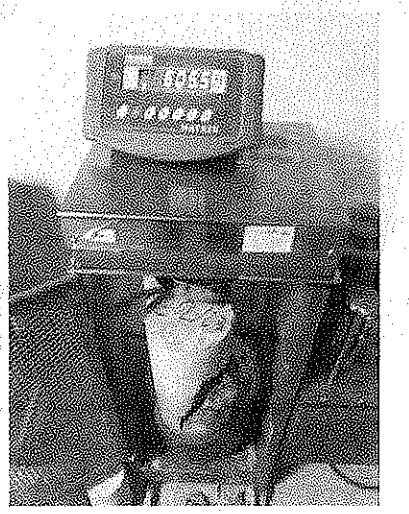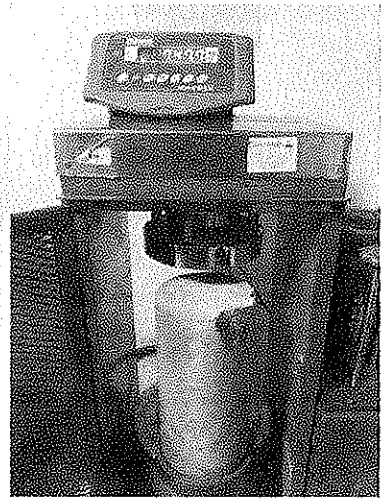
Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

ACTA PARCIAL DE OBRA No 8

POLICÍA NACIONAL	POLICIA NACION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
		CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM	VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74	PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
C.C. ó NIT	901.635.603-5	VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
TELÉFONO	3113407052	ANTICIPO	N/A	PLAZO ADICIONAL	360 DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	-
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95	FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
C.C. ó NIT	79.508.558-7	SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos			
TELÉFONO	310 654 1925				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES												
1.1	Replanteo y localización	M2	15,500.00	$ 6,987.70	$ 108,309,350.00	15,500.00	$ 108,309,350.00	0.00	$ -	15,450.19	$ 107,961,292.66	15,450.19	$ 107,961,292.66
1.2	Campamento de obra en unidades de contenedores para almacenamiento de herramientas y oficinas	GL	1.00	$ 26,163,097.72	$ 26,163,097.72	1.00	$ 26,163,097.72	0.00	$ -	1.00	$ 26,163,097.72	1.00	$ 26,163,097.72
				SUBTOTAL CAPITULO 1	$ 134,472,447.72		$ 134,472,447.72		$ -		$ 134,124,390.38		$ 134,124,390.38
	CIMENTACIÓN												
2.1	POZO PROFUNDO												
2,1,1	construcción de pozo de 8 1/2" de diámetro con profundidad recomendada en estudio de prospección geoelectrica (80 m) y obras complementarias. incluye equipo de bombeo con caudal de 6,00 l/s y altura dinámica total de 55,36 m, 7,86 hp además tuberia y accesorios de impulsión a ptap	UN	1.00	$ 351,161,363.52	$ 351,161,363.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 2	$ 351,161,363.52		$ -		$ -		$ -		$ -
	ESTRUCTURA												
3.1	RELLENOS Y EXCAVACIONES												
3.1.1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	m3	626.00	$ 51,143.72	$ 32,015,968.72	3,713.16	$ 189,904,815.36	840.00	$ 42,960,724.80	2,873.16	$ 146,944,090.56	3,713.16	$ 189,904,815.36
3.1.2	Relleno en Recebo común Compactado	m3	274.00	$ 102,496.05	$ 28,084,465.70	4,668.08	$ 478,469,097.24	520.00	$ 53,298,986.00	4,148.08	$ 425,168,061.28	4,668.08	$ 478,467,047.28
				SUBTOTAL CAPITULO 3.1	$ 60,100,434.42		$ 668,373,912.60		$ 96,259,710.80		$ 572,112,151.84		$ 668,371,862.64
3.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
3,2,1	Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI	kg	10,039.00	$ 5,652.48	$ 56,745,246.72	21,104.36	$ 119,291,972.81	717.78	$ 4,057,237.09	19,524.60	$ 110,362,411.01	20,242.38	$ 114,419,648.10
3,2,2	Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación fc=5000PSI	m3	200.00	$ 875,941.15	$ 175,188,230.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,3	Acero para Columnas fy=60000 PSI	kg	23,832.00	$ 5,652.48	$ 134,709,903.36	30,949.76	$ 174,942,899.49	0.00	$ -	29,232.10	$ 165,233,860.61	29,232.10	$ 165,233,860.61
3,2,4	Concreto para Columnas fc=5000PSI	m3	80.00	$ 1,305,949.01	$ 104,475,920.80	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,5	Malla electrosoldada para losa contrapiso	kg	7,972.00	$ 5,524.67	$ 44,042,669.24	7,972.00	$ 44,042,669.24	775.99	$ 4,287,088.67	5,187.72	$ 28,660,441.05	5,963.71	$ 32,947,529.72
3,2,6	Losa de contrapiso en concreto	m3	149.00	$ 584,874.41	$ 87,146,287.09	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,7	Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	30,834.00	$ 5,652.48	$ 174,288,568.32	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,8	Concreto para vigas aéreas y losa de entreplso segundo piso fc=5000PSI	m3	318.00	$ 919,401.32	$ 292,399,619.76	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,9	Concreto para vigas aéreas y losa de entrepiso tercer piso fc=5000PSI	m3	2.00	$ 919,401.32	$ 1,838,802.64	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,10	Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	727.00	$ 5,652.48	$ 4,109,352.96	38,335.29	$ 216,689,464.89	12,379.65	$ 69,976,859.50	25,955.44	$ 146,712,605.49	38,335.29	$ 216,689,464.99
3,2,11	Concreto para vigas aéreas y losa de Cubierta fc=5000PSI	m3	10.00	$ 919,401.32	$ 9,194,013.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3,2,12	Acero A-50 para cubierta metálica	kg	17,207.00	$ 13,183.74	$ 226,852,614.18	5,378.05	$ 70,902,786.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 3.2	$ 1,310,961,228.27		$ 625,899,793.18		$ 78,321,185.26		$ 450,969,318.16		$ 529,290,503.42
				SUBTOTAL CAPITULO 3	$ 1,371,061,662.69		$ 1,294,243,705.78		$ 174,580,896.06		$ 1,023,081,470.00		$ 1,197,662,366.06
	MAMPOSTERIA												
4.1	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 25 cm.	M2	1,724.46	$ 114,825.48	$ 198,012,045.99	0.00	$ -		$ -	0.00		0.00	$ -
4.2	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 20 cm.	M2	387.09	$ 92,370.53	$ 33,808,438.41	0.00	$ -		$ -	0.00		0.00	$ -
4.3	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 12 cm.	M2	228.05	$ 79,286.68	$ 18,081,468.66	0.00	$ -		$ -	0.00		0.00	$ -
4.4	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 30 cm.	M2	9.24	$ 123,111.25	$ 1,137,547.95	0.00	$ -		$ -	0.00		0.00	$ -
4.5	Suministro e instalación de Bordillo ventanas h. 0.15 mts, en concreto 2500 psi 25 cm	ML	21.20	$ 91,949.81	$ 1,949,335.97	80.05	$ 7,360,582.29		$ -	0.00		0.00	$ -
4.6	Suministro e instalación de Bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi,muro de 12 cm	ML	65.51	$ 87,817.55	$ 5,752,927.70	65.51	$ 5,752,927.70		$ -	0.00		0.00	$ -
4.7	Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm	ML	538.61	$ 91,949.81	$ 49,525,087.16	581.18	$ 53,439,390.58		$ -	0.00		0.00	$ -
4.8	Suministro e instalación de cañuela en concreto 2500 psi	ML	148.93	$ 83,607.51	$ 12,451,666.46	148.93	$ 12,451,666.46		$ -	0.00		0.00	$ -
4.9	Suministro e instalación de bordillo en concreto 2500 psi	ML	296.28	$ 88,072.06	$ 26,092,228.50	296.28	$ 26,092,228.50		$ -	0.00		0.00	$ -
4.10	Suministro e instalacion de pasos, en concreto 2500 psi e=08 cm, ancho 30 cm y largo de acuerdo a detalle de plano por cada	ML	9.00	$ 98,917.63	$ 890,258.67	15.00	$ 1,483,764.45		$ -	0.00		0.00	$ -
4.11	Suministro e instalación de tapas para ductos, en concreto 2500 psi e=8 cm, tapa sin angio, ver detalle de planos	M2	39.33	$ 147,025.46	$ 5,782,511.34	39.33	$ 5,782,511.34		$ -	0.00		0.00	$ -
4.12	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 12 cm	ML	2.65	$ 114,177.36	$ 302,570.00	2.65	$ 302,570.00		$ -	0.00		0.00	$ -
4.13	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 20 cm	ML	11.44	$ 116,400.01	$ 1,331,616.11	11.44	$ 1,331,616.11		$ -	0.00		0.00	$ -
4.14	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 25 cm	ML	88.48	$ 118,622.65	$ 10,495,732.07	89.55	$ 10,622,658.31		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 4	$ 365,713,370.99		$ 124,619,915.74		$ -				$ -
	MAMPOSTERIA MURO DE CONTENCION												

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	RADICACIÓN No.	8
		FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10065-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM	VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74		PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
C.C. ó NIT	901.635.603-5	VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74		FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
TELÉFONO	3113407052	ANTICIPO	N/A		PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	-
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.96		FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
C.C. ó NIT	79.508.558-7	SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos				
TELÉFONO	310 654 1925					

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5.0	Suministro e instalacion de Pañete impermeabilizado liso interiores 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	470.00	$ 42,683.44	$ 20,061,067.41	294.35	$ 12,563,871.01		$ -	0.00		0.00	$ -
5.1	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm, bordes de vanos	ML	401.92	$ 40,826.84	$ 16,409,123.53	1.00	$ 40,826.84		$ -	0.00		0.00	$ -
5.2	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm	M2	2,284.54	$ 41,809.13	$ 95,514,483.52	2,572.05	$ 107,535,172.82		$ -	0.00		0.00	$ -
5.3	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	1,330.37	$ 43,156.76	$ 57,414,458.80	1,493.70	$ 64,463,252.41		$ -	0.00		0.00	$ -
5.4	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm, bordes de vanos	ML	252.40	$ 44,479.10	$ 11,226,524.84	1.00	$ 44,479.10		$ -	0.00		0.00	$ -
5.5	Suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta	M2	2,792.88	$ 25,602.82	$ 71,505,045.35	3,050.27	$ 78,094,903.71		$ -	0.00		0.00	$ -
5.6	Suministro e instalación de mento Morter Plast al 60 para impermeabilización cubiertas	M2	1,674.70	$ 37,363.88	$ 62,573,289.84	1.00	$ 37,363.88		$ -	0.00		0.00	$ -
5.7	Suministro e instalación de aislamiento termico para muros y cubierta	M2	1,741.18	$ 70,615.14	$ 122,953,669.47	1.00	$ 70,615.14		$ -	0.00		0.00	$ -
			SUBTOTAL CAPITULO 5		$ 457,657,662.76		$ 262,859,484.91		$ -				$ -
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS												
6.1	RED DE SUMINISTRO												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	218.08	$ 36,633.00	$ 7,988,924.64	218.08	$ 7,988,924.64		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	19.65	$ 28,954.35	$ 568,952.98	19.65	$ 568,952.98		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	10.06	$ 20,609.60	$ 207,332.58	10.06	$ 207,332.58		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	56.37	$ 12,736.83	$ 717,975.11	56.37	$ 717,975.11		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	15.29	$ 13,108.89	$ 200,434.93	15.29	$ 200,434.93		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	57.09	$ 11,618.62	$ 663,307.02	57.09	$ 663,307.02		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA / LAVAMANOS 3/4"	UN	12.00	$ 27,319.96	$ 327,839.52	12.00	$ 327,839.52		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS / LAVAPLATOS / POCETA / ASEO 1/2"	UN	11.00	$ 23,713.49	$ 260,848.39	11.00	$ 260,848.39		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UN	6.00	$ 20,837.09	$ 125,022.54	6.00	$ 125,022.54		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4"	UN	11.00	$ 44,320.92	$ 487,530.12	11.00	$ 487,530.12		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 2"	UN	4.00	$ 518,138.58	$ 2,072,554.32	4.00	$ 2,072,554.32		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2"	UN	3.00	$ 349,801.88	$ 1,049,405.64	3.00	$ 1,049,405.64		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1/2"	UN	7.00	$ 86,930.76	$ 608,515.32	7.00	$ 608,515.32		$ -	0.00		0.00	$ -
6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PURGA 3/4"	UN	4.00	$ 135,854.18	$ 543,416.72	4.00	$ 543,416.72		$ -	0.00		0.00	$ -
			SUBTOTAL CAPITULO 6.1		$ 15,822,059.83		$ 15,822,059.83		$ -				$ -
6.2	RED AGUAS RESIDUALES												
6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	62.61	$ 59,432.04	$ 3,721,040.02	62.61	$ 3,721,040.02		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	14.30	$ 46,236.94	$ 661,173.94	14.30	$ 661,173.94		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	53.86	$ 36,689.48	$ 1,976,095.39	53.86	$ 1,976,095.39		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	30.70	$ 27,604.39	$ 847,454.77	30.70	$ 847,454.77		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UN	17.00	$ 60,248.74	$ 1,024,228.58	17.00	$ 1,024,228.58		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3"	UN	4.00	$ 40,719.48	$ 162,877.92	4.00	$ 162,877.92		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"	UN	14.00	$ 32,406.11	$ 453,685.54	14.00	$ 453,685.54		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	RADICACIÓN No.	8
		FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10085-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
DIRECCIÓN	Carrera 9ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301
C.C. ó NIT	901.635.803-5
TELÉFONO	3113407052
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba
C.C. ó NIT	79.508.558-7
TELÉFONO	310 654 1925

VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,606,131.95
SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos	

PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	-
PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

CANTIDADES INICIALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"	UN	14.00	$ 50,197.57	$ 702,765.98	14.00	$ 702,765.98		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3"	UN	4.00	$ 68,614.73	$ 274,458.92	4.00	$ 274,458.92		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110mm	ML	9.82	$ 48,784.09	$ 479,059.76	9.82	$ 479,059.76		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160mm	ML	33.40	$ 74,677.84	$ 2,494,243.20	33.40	$ 2,494,243.20		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 200mm	ML	28.03	$ 104,832.38	$ 2,938,451.61	28.03	$ 2,938,451.61		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.13	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm H. máx1.0m	UN	6.00	$ 509,764.75	$ 3,058,588.50	6.00	$ 3,058,588.50		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.14	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80cm H. máx1.5m	UN	6.00	$ 681,136.05	$ 4,086,816.30	6.00	$ 4,086,816.30		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.15	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR. INCLUYE TRASIEGO, REPALEO Y DISPOSICION FINAL	M3	39.62	$ 51,444.37	$ 2,038,225.94	39.62	$ 2,038,225.94		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.16	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. INCLUYE COMPACTACION	M3	19.81	$ 27,035.93	$ 535,581.77	19.81	$ 535,581.77		$ -	0.00		0.00	$ -
6.2.17	RELLENO CON ARENA PARA TAPAR TUBERIAS ENTERRADAS. INCLUYE COMPACTACION MANUAL	M3	19.81	$ 105,550.89	$ 2,090,963.13	19.81	$ 2,090,963.13		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 6.2	$ 27,545,711.27		$ 27,545,711.27		$ -				$ -
6.3	RED AGUAS LLUVIAS			$ -									
6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	304.34	$ 58,369.01	$ 17,764,024.50	304.34	$ 17,764,024.50		$ -	0.00		0.00	$ -
6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 4" (INCLUYE TRAGANTE TIPO CUPULA)	UN	23.00	$ 112,748.66	$ 2,593,219.18	23.00	$ 2,593,219.18		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 6.3	$ 20,357,243.68		$ 20,357,243.68		$ -				$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 6	$ 63,725,014.78		$ 63,725,014.78		$ -	0.00		0.00	$ -
7	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7.1	ALIMENTADORES BAJA TENSION Y CANALIZACION												
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC TDP Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	120.53	$ 120,846.57	$ 14,565,369.55	1.00	$ 120,846.57		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	290.00	$ 116,047.85	$ 33,653,876.50	1.00	$ 116,047.85		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	698.71	$ 36,053.99	$ 25,191,292.26	1.00	$ 36,053.99		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	233.60	$ 51,935.52	$ 12,132,137.47	1.00	$ 51,935.52		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	120.00	$ 65,462.44	$ 7,855,492.80	1.00	$ 65,462.44		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	113.30	$ 86,446.15	$ 9,794,348.80	1.00	$ 86,446.15		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	123.00	$ 142,343.38	$ 17,508,235.74	1.00	$ 142,343.38		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 cm, COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML	31.36	$ 46,618.67	$ 1,461,961.49	1.00	$ 46,618.67		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION (CAJA DE HALADO)	UN	15.00	$ 135,941.19	$ 2,039,117.85	1.00	$ 135,941.19		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE 60 X 10,5 CM FIJACION EN TECHO	ML	120.00	$ 236,803.28	$ 28,416,393.60	1.00	$ 236,803.28		$ -	0.00		0.00	$ -
7.1.11	ALIMENTADOR INICIO DE CIRCUITOS ILUMINACIÓN-TOMACORRIENTE EN 3#12 HFFRLS POR TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS	ML	2,535.00	$ 43,878.75	$ 111,232,631.25	1.00	$ 43,878.75		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 7.1	$ 293,850,857.31		$ 1,082,377.79		$ -				$ -
7.2	TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES												
7.2.1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	1.00	$ 472,731.84	$ 472,731.84	1.00	$ 472,731.84		$ -	0.00		0.00	$ -
7.2.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	7.00	$ 853,971.20	$ 5,977,798.40	1.00	$ 853,971.20		$ -	0.00		0.00	$ -
7.2.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	10.00	$ 926,480.19	$ 9,264,801.90	1.00	$ 926,480.19		$ -	0.00		0.00	$ -
7.2.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE TREINTA Y SEIS (36) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	1.00	$ 1,145,569.81	$ 1,145,569.81	1.00	$ 1,145,569.81		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	RADICACIÓN No.	8
			FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10176-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22		OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-8 DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM		
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301		
C.C. ó NIT	901.635.603-5		
TELÉFONO	3113407052		
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA		
DIRECCIÓN	Calle 52ª No. 14-17, Montería – Córdoba		
C.C. ó NIT	79.508.558-7		
TELÉFONO	310 654 1925		

VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95
SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos	

PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	-
PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7,2,5	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DE BARRAJE 400-500 A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	2.00	$ 5,194,769.91	$ 10,389,539.82	1.00	$ 5,194,769.91		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,6	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 1663 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	2.00	$ 14,924,592.95	$ 29,849,185.90	1.00	$ 14,924,592.95		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,7	PROTECCION TERMOMAGNETICA MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	198.00	$ 32,279.11	$ 6,391,263.78	1.00	$ 32,279.11		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,8	PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	6.00	$ 56,765.16	$ 340,590.96	1.00	$ 56,765.16		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,9	PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 40A /10KA	UN	10.00	$ 65,208.62	$ 652,086.20	1.00	$ 65,208.62		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,10	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	4.00	$ 108,326.59	$ 433,306.36	1.00	$ 108,326.59		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,11	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X50A /25KA	UN	2.00	$ 258,259.90	$ 516,519.80	1.00	$ 258,259.90		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,12	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X75A /25KA	UN	3.00	$ 274,021.04	$ 822,063.12	1.00	$ 274,021.04		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,13	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X125A /25KA	UN	3.00	$ 595,106.64	$ 1,785,319.92	1.00	$ 595,106.64		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,14	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(12,8-16)/25KA 240V	UN	12.00	$ 295,194.73	$ 3,542,336.76	1.00	$ 295,194.73		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,15	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(20-25)/25KA 240V	UN	4.00	$ 295,194.73	$ 1,180,778.92	1.00	$ 295,194.73		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,16	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(32-40)/25KA 240V	UN	3.00	$ 310,618.13	$ 931,854.39	1.00	$ 310,618.13		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,17	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(35-50)/25KA 240V	UN	2.00	$ 314,108.10	$ 628,216.20	1.00	$ 314,108.10		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,18	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(50,4-63)/25KA 240V	UN	3.00	$ 322,438.98	$ 967,316.94	1.00	$ 322,438.98		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,19	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(80-100)/25KA 240V	UN	6.00	$ 322,438.98	$ 1,934,633.88	1.00	$ 322,438.98		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,20	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(100-125)/25KA 240V	UN	6.00	$ 718,381.24	$ 4,310,287.44	1.00	$ 718,381.24		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,21	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(140-200)/40KA 240V	UN	1.00	$ 775,606.63	$ 775,606.63	1.00	$ 775,606.63		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,22	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(160-200)/40KA 240V	UN	2.00	$ 765,664.65	$ 1,531,329.30	1.00	$ 765,664.65		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,23	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(200-250)/40 KA 240V	UN	2.00	$ 869,610.55	$ 1,739,221.10	1.00	$ 869,610.55		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,24	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(256-320)/60 KA 240V	UN	1.00	$ 1,981,783.86	$ 1,981,783.86	1.00	$ 1,981,783.86		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,25	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(504-630)/65 KA 240V	UN	2.00	$ 3,548,190.53	$ 7,096,381.06	1.00	$ 3,548,190.53		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,26	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(500-1250)/65 KA 240V	UN	1.00	$ 4,807,730.46	$ 4,807,730.46	1.00	$ 4,807,730.46		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,27	DPS CLASE I+II	UN	1.00	$ 2,765,790.03	$ 2,765,790.03	1.00	$ 2,765,790.03		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,28	DPS CLASE III	UN	1.00	$ 431,705.52	$ 431,705.52	1.00	$ 431,705.52		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 550 A	UN	2.00	$ 17,002,145.17	$ 34,004,290.34	1.00	$ 17,002,145.17		$ -	0.00		0.00	$ -
7,2,30	TABLERO GENERAL RED REGULADA CON ELEMENTOS	UN	1.00	$ 5,095,194.86	$ 5,095,194.86	1.00	$ 5,095,194.86		$ -	0.00		0.00	$ -
			SUBTOTAL CAPITULO 7.2		$ 141,766,235.50		$ 65,529,880.11		$ -				$ -
7,3	SALIDAS ELÉCTRICAS			$									
7,3,1	SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	345.00	$ 222,639.01	$ 76,810,458.45	345.00	$ 76,810,458.45		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,2	SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	55.00	$ 153,420.98	$ 8,438,153.90	55.00	$ 8,438,153.90		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	341.00	$ 194,223.35	$ 66,230,162.35	341.00	$ 66,230,162.35		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,4	SALIDA PARA TERMOSTATO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	50.00	$ 127,623.94	$ 6,381,197.00	50.00	$ 6,381,197.00		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	189.00	$ 25,401.96	$ 4,800,970.44	189.00	$ 4,800,970.44		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	RADICACIÓN No.	8
		FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301
C.C. ó NIT	901.835.603-5
TELÉFONO	3113407052
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba
C.C. ó NIT	79.508.558-7
TELÉFONO	310 654 1925

VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95
SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos	

PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	-
PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

CANTIDADES INICIALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7,3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	15.00	$ 86,485.11	$ 1,297,276.65	15.00	$ 1,297,276.65		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED REGULADA), INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	137.00	$ 36,716.21	$ 5,030,120.77	137.00	$ 5,030,120.77		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,8	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x6 Cu + 1x10 T AA	ML	120.00	$ 62,822.89	$ 7,538,746.80	120.00	$ 7,538,746.80		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,9	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x4 Cu + 1x10 T AA	ML	17.00	$ 89,663.73	$ 1,524,283.41	17.00	$ 1,524,283.41		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,10	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x2 Cu + 1x8 T AA	ML	7.00	$ 112,693.89	$ 788,857.23	7.00	$ 788,857.23		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,11	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x1/0 Cu + 1x8 T AA	ML	55.00	$ 147,910.04	$ 8,135,052.20	55.00	$ 8,135,052.20		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,12	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x12 Cu + 1x12 T AA	ML	24.00	$ 34,953.62	$ 838,886.88	24.00	$ 838,886.88		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,13	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x10 Cu + 1x12 T AA	ML	239.90	$ 38,414.19	$ 9,215,564.18	239.90	$ 9,215,564.18		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,14	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x6 Cu + 1x10 TAA	ML	18.35	$ 55,177.27	$ 1,012,502.90	18.35	$ 1,012,502.90		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,15	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x1/0 Cu BLINDADO CONTROL AA	ML	1,020.00	$ 40,658.00	$ 41,471,160.00	1,020.00	$ 41,471,160.00		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,16	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 EXTRACTORES	ML	350.00	$ 40,027.15	$ 14,009,502.50	350.00	$ 14,009,502.50		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,17	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 DESHUMUFICADOR	ML	180.00	$ 40,027.37	$ 7,204,926.60	180.00	$ 7,204,926.60		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,18	SALIDA BIFASICA COMPLETA MANEJADORA	UN	48.00	$ 375,683.03	$ 18,032,785.44	48.00	$ 18,032,785.44		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,19	SALIDA COMPLETA MODULO CONTROL MANEJADORA-CONDENSADORA	UN	48.00	$ 403,577.43	$ 19,371,716.64	48.00	$ 19,371,716.64		$ -	0.00		0.00	$ -
7,3,20	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	19.00	$ 207,607.89	$ 3,944,549.91	19.00	$ 3,944,549.91		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 7.3	$ 302,076,874.25		$ 302,076,874.25		$ -				$ -
7,4	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN												
7,4,1	EXCAVACIÓN MECANICA DE MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE EMBIENTAL AUTORIZADO	M3	268.00	$ 90,526.68	$ 24,261,686.24	268.00	$ 24,261,686.24		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,2	RELLENO CON BASE GRANULAR COMPACTADO B600 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE CUERDO CON ESTUDIO DE SUELOS	M3	120.00	$ 119,009.33	$ 14,281,119.60	120.00	$ 14,281,119.60		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,3	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	M3	125.00	$ 210,540.76	$ 26,317,595.00	125.00	$ 26,317,595.00		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 4Φ4" EN BANCO DE DUCTOS	ML	170.00	$ 220,940.87	$ 37,559,947.90	34.77	$ 7,681,508.97		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 6Φ6" EN BANCO DE DUCTOS	ML	260.00	$ 360,917.41	$ 93,838,526.60	138.86	$ 50,118,222.13		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 2Φ3" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	155.00	$ 88,782.39	$ 13,761,270.45	1.00	$ 88,782.39		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,7	SUMINISTRO Y MARCACION CON CINTA CS 273	ML	585.00	$ 35,844.36	$ 20,969,950.60	1.00	$ 35,844.36		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,8	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS275.	UN	7.00	$ 1,382,424.70	$ 9,676,972.90	1.00	$ 1,382,424.70		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,9	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO DOBLE CS276	UN	6.00	$ 2,579,417.75	$ 15,476,506.50	1.00	$ 2,579,417.75		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES XLPE @15kV, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	280.00	$ 242,724.48	$ 67,962,854.40	1.00	$ 242,724.48		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,11	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.35m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm.	ML	25.00	$ 287,100.20	$ 7,177,505.00	1.00	$ 287,100.20		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10176-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301
C.C. ó NIT	901.635.603-5
TELÉFONO	3113407052
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba
C.C. ó NIT	79.508.558-7
TELÉFONO	310 654 1925

VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95
SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos	

PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	-
PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7,4,12	CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 1 SEGUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 8 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NO SE PERMITE NI SALES NI CARBÓN ACTIVADO NI LIMADURA DE HIERRO	UN	1.00	$ 10,917,125.89	$ 10,917,125.89	1.00	$ 10,917,125.89		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO H 300kVA, TAPS: +1 -3 X 2.5%, 13.2/0.208kV, INCLUYE DPS	UN	1.00	$ 41,241,378.02	$ 41,241,378.02	1.00	$ 41,241,378.02		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFORMADOR 300kVA, 15/0.6kV SEGUN CTS 516-2	UN	1.00	$ 8,634,028.67	$ 8,634,028.67	1.00	$ 8,634,028.67		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1.00	$ 33,046,772.19	$ 33,046,772.19	1.00	$ 33,046,772.19		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SALIDA, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	3.00	$ 25,160,345.21	$ 75,481,035.63	1.00	$ 25,160,345.21		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1.00	$ 24,428,578.18	$ 24,428,578.18	1.00	$ 24,428,578.18		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,18	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS274.	UN	5.00	$ 939,640.28	$ 4,698,201.40	1.00	$ 939,640.28		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA NORMALIZADA LOCAL SUBESTACIÓN	UN	3.00	$ 4,388,720.15	$ 13,160,160.45	1.00	$ 4,388,720.15		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,20	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 15kV USO EXTERIOR	UN	1.00	$ 858,482.30	$ 858,482.30	1.00	$ 858,482.30		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,21	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 15kV USO INTERIOR	UN	3.00	$ 860,423.32	$ 2,581,269.96	1.00	$ 860,423.32		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,22	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO DE MEDIDA NIVEL 2 CON MODEM TELEFONICO	UN	1.00	$ 6,651,217.97	$ 6,651,217.97	1.00	$ 6,651,217.97		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,23	ESTRUCTURA DE ARRANQUE	UN	1.00	$ 8,655,650.57	$ 8,655,650.57	1.00	$ 8,655,650.57		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,24	ESTRUCTURA DE AFLORAMIENTO	UN	1.00	$ 7,059,350.28	$ 7,059,350.28	1.00	$ 7,059,350.28		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,25	PRUEVA VLF	UN	1.00	$ 3,154,168.25	$ 3,154,168.25	1.00	$ 3,154,168.25		$ -	0.00		0.00	$ -
7,4,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDICIÓN, 13.2kV, INCLUYE 3PT´S Y 3 CT´S.	UN	1.00	$ 21,260,444.16	$ 21,260,444.16	1.00	$ 21,260,444.16		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 7,4	$ 593,110,799.11		$ 324,520,751.26		$ -				$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 7	$ 1,300,803,786.17		$ 693,219,883.41		$ -				$ -
	CARPINTERIA METALICA												
8.1	Suministro e instalación de Persiana para ventilacion natural antitormenta, modulo de 1 x 1 m , incluye perfil antitormenta en aluminio extruido cal 1/16 espaciado cada 60 cm color blanco mate, incuye elementos de instalacion y aflajia	M2	8.00	$ 273,934.08	$ 2,191,472.64	1.00	$ 273,934.08		$ -	0.00		0.00	$ -
8.2	Suministro e instalacion de P-4 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, mediads 75 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	4.00	$ 1,177,855.23	$ 4,711,420.92	1.00	$ 1,177,855.23		$ -	0.00		0.00	$ -
8.3	Suministro e instalacion de P-4A puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 60 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	2.00	$ 1,129,658.56	$ 2,259,317.12	1.00	$ 1,129,658.56		$ -	0.00		0.00	$ -
8.4	Suministro e instalacion de P-5 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 90 x 300, termocurado por definir kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	7.00	$ 1,227,233.00	$ 8,590,631.00	1.00	$ 1,227,233.00		$ -	0.00		0.00	$ -
8.5	Suministro e instalacion de P-6 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 100 x 300, termocurado por definir kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	1.00	$ 1,258,633.96	$ 1,258,633.96	1.00	$ 1,258,633.96		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-6-10176-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10096-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM	VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74	PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
C.C. ó NIT	901.635.603-5	VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
TELÉFONO	3113407662	ANTICIPO	N/A	PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	-
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA & ARQUITECTURA	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería -- Córdoba	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,905,131.95	FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
C.C. ó NIT	79.508.558-7	SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos			
TELÉFONO	310 854 1925				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
8.6	Suministro e instalacion de P-7 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 70 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	3.00	$ 1,162,819.06	$ 3,488,457.18	1.00	$ 1,162,819.06		$ -	0.00		0.00	$ -
8.7	Suministro e instalacion de P-8 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 80 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	1.00	$ 1,190,489.37	$ 1,190,489.37	1.00	$ 1,190,489.37		$ -	0.00		0.00	$ -
8.8	Suministro e instalacion de P-12 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zzra, medidas 100 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	3.00	$ 1,703,842.38	$ 5,111,527.14	1.00	$ 1,703,842.38		$ -	0.00		0.00	$ -
8.9	Suministro e instalacion de P-13 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 60 x 300 ,termocurado por definir,kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac zra	UN	4.00	$ 1,129,658.56	$ 4,518,634.24	1.00	$ 1,129,658.56		$ -	0.00		0.00	$ -
8.10	Suministro e instalacion de P-14 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio. Marco m120, ref zzra, medidas 138 x 300,termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac	UN	3.00	$ 2,028,189.87	$ 6,084,569.61	1.00	$ 2,028,189.87		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 8	$ 39,405,153.18		$ 12,282,314.07		$ -				$ -
9	PISOS												
9.1	Suministro e instalación de Baldosa de grano de marmol pulido Nº1 33x33 cm vibroprensada de espesor 15 mm, perlato claro fondo blanco granulada. Instalación con destroque y pulida juntas con boquilla con polvo del mismo grano, acabado brillante y sellado, diseño según planos de despiece en detalles de pisos.	M2	966.27	$ 93,460.13	$ 90,284,957.38	1.00	$ 93,460.13		$ -	0.00		0.00	$ -
9.2	Suministro e instalación de Guardaescobas recto prefabricado en grano de marmol pulido 10x 33 cm referencia color perlato claro fondo blanco , acabado brillante	ML	436.94	$ 71,043.19	$ 31,041,611.44	1.00	$ 71,043.19		$ -	0.00		0.00	$ -
9.3	Suministro e instalación de cerceamica Nature de Alfa, de 15 x 120 cm color Bizque.	M2	28.69	$ 156,374.15	$ 4,486,991.91	1.00	$ 156,374.15		$ -	0.00		0.00	$ -
9.4	Suministro e instalación de Piso Corona Mikonos Beige 33.8 x 33.8	M2	139.65	$ 72,618.66	$ 10,141,195.87	1.00	$ 72,618.66		$ -	0.00		0.00	$ -
9.5	Suministro e instalación de Boca puerta en grano de marmol No. 1, fundido, pulido y brillado, color beige, diseño según despiece de pisos.	ML	4.00	$ 44,674.77	$ 178,699.08	1.00	$ 44,674.77		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 9	$ 136,323,455.68		$ 438,160.90		$ -				$ -
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS												
10.1	Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro pettro 20 mm, apoyado sobre mueble de madera. Para baños	ML	3.60	$ 139,327.79	$ 501,580.04	1.00	$ 139,327.79		$ -	0.00		0.00	$ -
10.2	Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro pettro 20 mm, apoyado sobre mueble en estructura metalica. Para baños	ML	7.28	$ 148,490.41	$ 1,081,010.16	1.00	$ 148,490.41		$ -	0.00		0.00	$ -
10.3	Suministro e instación de Lavamanos de colgar en porcelana sanitaria, color blanco, dimensiones 47X36,5 cm, con agujeros insinuados, incluye juego de accesorios y elementos de fijación, no incluye griferia	UN	1.00	$ 122,265.59	$ 122,265.59	1.00	$ 122,265.59		$ -	0.00		0.00	$ -
10.4	Suministro e instalación de Orinal ADA en porcelana sanitaria color blanco de entrada posterior antivandálico con esmalte antibacterial, dimensiones 34 X 62 X 36,7 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación	UN	2.00	$ 245,218.73	$ 490,437.45	1.00	$ 245,218.73		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22		OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM	VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74		PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
C.C. ó NIT	901.635.603-5	VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74		FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
TELÉFONO	3113407052	ANTICIPO	N/A		PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	-
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,908,131.95		FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
C.C. ó NIT	79.508.558-7	SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos				
TELÉFONO	310 654 1925					

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
10.5	Suministro e instalación de Taza alongada ada en porcelana sanitario color blanco, dimensiones 39,7 x 73 x 47 cms para personas con movilidad reducida o adultos mayores de entrada posterior. Incluye fluxómetro.	UN	1.00	$ 520,003.49	$ 520,003.49	1.00	$ 520,003.49		$ -	0.00		0.00	$ -
10.6	Suministro e instalación de Sanitario alongado de una pieza en porcelana sanitaria color blanco de control azul y asiento de cierre suave, medidas 35,7 x x69,4 x x40,8 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	1.00	$ 477,728.87	$ 477,728.87	1.00	$ 477,728.87		$ -	0.00		0.00	$ -
10.7	Suministro e instalación de Taza alongada en porcelana sanitaria color blanco línea institucional 36,8 x 73 x 36,2 cms (altura tradicional). Incluye fluxómetro expuesto de palanca y asiento institucional . Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	4.00	$ 392,516.54	$ 1,570,066.16	1.00	$ 392,516.54		$ -	0.00		0.00	$ -
10.8	Suministro e instalación de Lavamanos de sobreponer en porcelana cerámica color blanco 51 x 45 con agujeros insinuados . Incluye accesorios y elementos de fijación, no incluye grifería	UN	5.00	$ 175,534.59	$ 877,672.95	1.00	$ 175,534.59		$ -	0.00		0.00	$ -
10.9	Suministro e instalación de Taza alongada color blanco línea institucional 36,8 x 73 x 36,2 cms (altura tradicional). Incluye válvula de push antibandalica y asiento institucional. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	10.00	$ 392,516.54	$ 3,925,165.40	1.00	$ 392,516.54		$ -	0.00		0.00	$ -
10.10	Suministro e instalacion de Llave terminal tipo jardin corriente de 1/2" salida de 3/4"acabado metalico cromado . Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion. Para patios y Zonas humedas	UN	5.00	$ 16,801.20	$ 84,005.99	1.00	$ 16,801.20		$ -	0.00		0.00	$ -
10.11	Suministro e instalacion de Ceramica para pared Almara beige 30 x 60	M2	356.63	$ 70,871.45	$ 25,275,061.82	1.00	$ 70,871.45		$ -	0.00		0.00	$ -
10.12	Suministro e instalacion de Griferia de push para pared, antivandálica, acabado metalico cromado, ref.701320001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, retenidos	UN	12.00	$ 229,903.60	$ 2,758,843.20	1.00	$ 229,903.60		$ -	0.00		0.00	$ -
10.13	Suministro e instalacion de Griferia de mesa para lavamanos monocontrol acabado metálico cromado, ref. Th1015551 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, apartamentos y casas fiscales	UN	6.00	$ 208,013.10	$ 1,248,078.60	1.00	$ 208,013.10		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 10	$ 38,931,919.72		$ 3,139,191.90		$ -				$ -
11	MUROS												
11.1	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos	ML	401.92	$ 22,386.45	$ 8,997,561.98	1.00	$ 22,386.45		$ -	0.00		0.00	$ -
11.2	Suministro e instalación de Koraza gris sobre muro de fachada 3 manos incluye filos,dilataciones y carteras vanos	M2	205.18	$ 33,142.29	$ 6,800,135.08	1.00	$ 33,142.29		$ -	0.00		0.00	$ -
11.3	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos	M2	1,094.57	$ 33,075.52	$ 36,203,471.93	1.00	$ 33,075.52		$ -	0.00		0.00	$ -
11.4	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre muro interior 3 manos Incluye filos, dilataciones y cartera vanos	M2	2,284.54	$ 23,825.57	$ 54,430,384.30	1.00	$ 23,825.57		$ -	0.00		0.00	$ -
11.5	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre vanos	ML	252.40	$ 19,340.97	$ 4,881,660.83	1.00	$ 19,340.97		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 11	$ 111,313,214.10		$ 131,770.60		$ -				$ -
12	VENTANERIA Y ESPEJOS												
	VENTANAS												
12.1	Suministro e instalacion de ventaneria fija dilatada de muros con cuerpo lateral deslizable según detalle. En perfileria de aluminio, acabado anonizado blanco mate, dimensiones ventana variable cristal con camara low-e 24mm composicion (6mm-knt sep 12mm+6m-nc) bordes pulidos mate (100*1000), incluye elementos de fijacion.	M2	10.48	$ 481,811.85	$ 5,049,388.19	1.00	$ 481,811.85		$ -	0.00		0.00	$ -
12.2	Suministro e instalacion de Espejo 4 mm borde liso y pulido. Incluye elementos de fijacion, en todos los baños	M2	5.53	$ 64,985.97	$ 359,656.25	1.00	$ 64,985.97		$ -	0.00		0.00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10078-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE I-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301
C.C. ó NIT	901.635.603-5
TELÉFONO	3113407052
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba
C.C. ó NIT	79.508.556-7
TELÉFONO	310 654 1925

VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,908,131.95
SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos	

PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	-
PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

CANTIDADES INICIALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
12.3	suministro e instalacion de divisiones para orinales en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos).	UN	2.00	$ 662,461.84	$ 1,324,923.68	1.00	$ 662,461.84		$ -	0.00		0.00	$ -
12.4	Suministro e instalacion de divisiones para sanitarios en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye puerta, accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos).	UN	10.00	$ 861,239.71	$ 8,612,397.10	1.00	$ 861,239.71		$ -	0.00		0.00	$ -
12.5	Suministro e instalacion de Puerta en vidrio templado de 10mm (doble), incluye sandofasting, herrajes, topes, chapa y elementos de fijación y anclaje.	M2	85.20	$ 955,982.61	$ 81,449,718.37	1.00	$ 955,982.61		$ -	0.00		0.00	$ -
12.6	Suministro e instalacion de Espejo inclinado 15 grados con marco en aluminio. Incluye elementos de fijacion para baño minusválidos	M2	0.52	$ 88,129.56	$ 45,474.85	1.00	$ 88,129.56		$ -	0.00		0.00	$ -
12.7	Suministro e instalacion de V-1A OAC ventana proyectante vp o- x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=1.0, vidrio 6- 12-6	UN	17.00	$ 1,433,897.85	$ 24,376,263.45	1.00	$ 1,433,897.85		$ -	0.00		0.00	$ -
12.8	Suministro e instalacion de V-1B OAC ventana proyectante vp o- x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.0, b=1.0, vidrio 6-12- 6	UN	20.00	$ 1,607,129.54	$ 32,142,590.80	1.00	$ 1,607,129.54		$ -	0.00		0.00	$ -
12.9	Suministro e instalacion de V-2 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=2.50, vidrio 6-12-6	UN	5.00	$ 2,787,747.79	$ 13,938,738.95	1.00	$ 2,787,747.79		$ -	0.00		0.00	$ -
12.10	Suministro e instalacion de V-3 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=2.70, vidrio 6-12-6	UN	9.00	$ 3,001,922.31	$ 27,017,300.79	1.00	$ 3,001,922.31		$ -	0.00		0.00	$ -
12.11	Suministro e instalacion de V-4 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.5, b=2.70, vidrio 6-12-6	UN	4.00	$ 3,301,009.14	$ 13,204,036.56	1.00	$ 3,301,009.14		$ -	0.00		0.00	$ -
12.12	Suministro e instalacion de V-5 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.0, b=2.35, vidrio 6-12-6	UN	3.00	$ 3,027,589.65	$ 9,082,768.95	1.00	$ 3,027,589.65		$ -	0.00		0.00	$ -
12.13	Suministro e instalacion de V-6 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=0.99, vidrio 6-12-6	UN	1.00	$ 1,073,756.13	$ 1,073,756.13	1.00	$ 1,073,756.13		$ -	0.00		0.00	$ -
12.14	Suministro e instalacion de V-7 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=3.35, vidrio 6-12-6	UN	1.00	$ 3,698,065.21	$ 3,698,065.21	1.00	$ 3,698,065.21		$ -	0.00		0.00	$ -
12.15	Suministro e instalacion de V-8 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.0, b=1.20, vidrio 6-12-6	UN	3.00	$ 1,601,018.48	$ 4,803,055.44	1.00	$ 1,601,018.48		$ -	0.00		0.00	$ -
12.16	Suministro e instalacion de V-9 OAC ventana corrediza xxo perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=2.0, b=3.0, vidrio 6- 12-6	UN	3.00	$ 4,141,702.69	$ 12,425,108.07	1.00	$ 4,141,702.69		$ -	0.00		0.00	$ -
12.17	Suministro e instalacion de V-10 OAC sejilla ventana proyectante alfajia koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.80, b=1.0, vidrio 6-12-6	UN	3.00	$ 589,339.87	$ 1,768,019.61	1.00	$ 589,339.87		$ -	0.00		0.00	$ -
12.18	Suministro e instalacion de V-11 OAC persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.50, b=1.20, vidrio 6- 12-6	UN	10.00	$ 180,363.96	$ 1,803,639.60	1.00	$ 180,363.96		$ -	0.00		0.00	$ -
12.19	Suministro e instalacion de V-12 OAC persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=1.0, b=0.50	UN	1.00	$ 165,636.54	$ 165,636.54	1.00	$ 165,636.54		$ -	0.00		0.00	$ -
12.20	Suministro e instalacion de V-13 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño	UN	3.00	$ 1,942,522.51	$ 5,827,567.53	1.00	$ 1,942,522.51		$ -	0.00		0.00	$ -
12.21	Suministro e instalacion de V-14 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño	M2	1.00	$ 3,043,179.83	$ 3,043,179.83	1.00	$ 3,043,179.83		$ -	0.00		0.00	$ -
12.22	Suministro e instalacion de V-15 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño	UN	1.00	$ 2,342,409.62	$ 2,342,409.62	1.00	$ 2,342,409.62		$ -	0.00		0.00	$ -
12.23	Suministro e instalacion de V-16 OAC Rejilla bioclimatica fijo o marco 0047 trat anodizado A3, según planos de diseño	UN	4.00	$ 525,412.96	$ 2,101,651.84	1.00	$ 525,412.96		$ -	0.00		0.00	$ -
12.24	Suministro e instalacion de V-17 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño	UN	12.00	$ 1,715,686.68	$ 20,588,240.16	1.00	$ 1,715,686.68		$ -	0.00		0.00	$ -
12.25	Suministro e instalacion de V-18 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño	UN	2.00	$ 2,971,168.70	$ 5,942,337.40	1.00	$ 2,971,168.70		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 12	$ 282,185,924.92		$ 42,264,171.00		$ -				$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10085-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301
C.C. ó NIT	901.635.603-5
TELÉFONO	3113407052
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba
C.C. ó NIT	79.500.558-7
TELÉFONO	310 654 1925

VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74
VR. ADICIONAL	
VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	
ANTICIPO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95
SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos	

PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	-
PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13	PRELIMINARES												
13.1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	m3	167.00	$ 51,143.72	$ 8,541,091.24	167.00	$ 8,541,091.24	0.00	$ -	83.50	$ 4,270,500.62	83.50	$ 4,270,500.62
13.2	Relleno en Recebo comun Compactado	m3	131.00	$ 102,498.05	$ 13,427,244.55	131.00	$ 13,427,244.55	0.00	$ -	68.00	$ 6,969,867.40	68.00	$ 6,969,867.40
				SUBTOTAL CAPITULO 13	$ 21,968,245.79		$ 21,968,245.79		$ -		$ 11,240,368.02		$ 11,240,368.02
14	ESTRUCTURA CIMENTACIONES												
14.1	Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI	kg	3,626.00	$ 5,652.48	$ 20,495,892.48	1.00	$ 5,652.48		$ -	0.00		0.00	$ -
14.2	Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación f'c=5000PSI	m3	34.00	$ 875,941.15	$ 29,781,999.10	1.00	$ 875,941.15		$ -	0.00		0.00	$ -
14.3	Acero para Columnas fy=60000 PSI	kg	6,268.00	$ 5,652.48	$ 35,429,744.64	1.00	$ 5,652.48		$ -	0.00		0.00	$ -
14.4	Concreto para Columnas f'c=5000PSI	m3	16.00	$ 1,305,949.01	$ 20,895,184.16	1.00	$ 1,305,949.01		$ -	0.00		0.00	$ -
14.5	Malla electrosoldada para losa contrapiso	kg	1,262.00	$ 5,524.67	$ 6,916,886.84	1.00	$ 5,524.67		$ -	0.00		0.00	$ -
14.6	Losa de contrapiso en concreto	m3	20.00	$ 584,874.41	$ 11,697,488.20	1.00	$ 584,874.41		$ -	0.00		0.00	$ -
14.7	Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetes fy=60000 PSI	kg	3,768.00	$ 5,652.48	$ 21,298,544.64	1.00	$ 5,652.48		$ -	0.00		0.00	$ -
14.8	Concreto para vigas aereas y losa de Cubierta f'c=5000PSI	m3	41.00	$ 919,401.32	$ 37,695,454.12	1.00	$ 919,401.32		$ -	0.00		0.00	$ -
14.9	Acero A-50 para cubierta metálica	kg	14,040.00	$ 13,183.74	$ 185,099,709.60	1.00	$ 13,183.74		$ -	0.00		0.00	$ -
14.10	Placa en concreto f'c=5000PSI para cubierta metálica	m3	204.00	$ 882,926.18	$ 178,036,940.72	1.00	$ 882,926.18		$ -				$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 14	$ 545,347,844.50		$ 4,584,757.92		$ -				$ -
15	MAMPOSTERIA												
15.1	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 25 cm.	M2	182.38	$ 114,825.48	$ 20,941,871.04	1.00	$ 114,825.48		$ -	0.00		0.00	$ -
15.2	Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm	ML	43.60	$ 91,949.81	$ 4,009,011.72	1.00	$ 91,949.81		$ -	0.00		0.00	$ -
15.3	Suministro e instalación de Poyos muebles h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, fondo 60 cm	ML	3.00	$ 118,791.93	$ 356,375.79	1.00	$ 118,791.93		$ -	0.00		0.00	$ -
15.4	Suministro e instalación de cañuela en concreto 2500 psi	ML	62.00	$ 83,607.51	$ 5,183,665.62	1.00	$ 83,607.51		$ -	0.00		0.00	$ -
15.5	Suministro e instalación de bordillo en concreto 2500 psi	ML	123.20	$ 88,072.06	$ 10,850,477.79	1.00	$ 88,072.06		$ -	0.00		0.00	$ -
15.6	Suministro e instalación de parapetos en concreto 2500 psi, altura y espesor de acuerdo al muro de cada edificio	ML	41.80	$ 184,925.20	$ 7,729,873.36	1.00	$ 184,925.20		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 15	$ 49,071,275.32		$ 682,171.99		$ -				$ -
16	ACABADOS ESTRUCTURALES												
16.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm	M2	251.60	$ 41,809.13	$ 10,519,177.11	1.00	$ 41,809.13		$ -	0.00		0.00	$ -
16.2	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	257.16	$ 43,156.76	$ 11,098,192.40	1.00	$ 43,156.76		$ -	0.00		0.00	$ -
16.3	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm, bordes de vanos	ML	37.70	$ 44,479.10	$ 1,676,862.07	1.00	$ 44,479.10		$ -	0.00		0.00	$ -
16.4	Suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta	M2	403.66	$ 25,602.62	$ 10,334,753.59	1.00	$ 25,602.62		$ -	0.00		0.00	$ -
16.5	Suministro e instalación de manto Morter Plast af 80 para impermeabilización cubiertas	M2	211.63	$ 37,363.88	$ 7,907,317.92	1.00	$ 37,363.88		$ -	0.00		0.00	$ -
16.6	Suministro e instalación de aislamiento termico para muros y cubierta	M2	194.69	$ 70,615.14	$ 13,748,061.61	1.00	$ 70,615.14		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 16	$ 55,284,364.70		$ 283,026.63		$ -				$ -
17	CARPINTERIA METALICA												
	PUERTAS												
17.1	Suministro e instalación de Persiana para ventilacion natural antitormenta, modulo de 1 x 1 m , incluye perfil antitormenta en aluminio extruido cal 1/16 espaciado cada 60 cm color blanco mate, incluye elementos de instalacion y afajia	M2	5.10	$ 273,934.08	$ 1,397,063.81	1.00	$ 273,934.08		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 17	$ 1,397,063.81		$ 273,934.08		$ -				$ -
18	PISOS												
18.1	Suministro e instalación de Piso esmaltado con endurecedor de cuarzo y allanado manual, directamente sobre placa, juntas de dilatación cortadas con discos de pulidor E= 3mm (modulacion según diseño), acabado brillante y sellado. Trafico mediano	M2	208.57	$ 245,961.99	$ 51,300,292.25	1.00	$ 245,961.99		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 18	$ 51,300,292.25		$ 245,961.99		$ -				$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-5-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No. 05-3-10086-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM	VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74	PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
C.C. ó NIT	901,635,603-5	VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
TELÉFONO	3113407052	ANTICIPO	N/A	PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	-
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
DIRECCIÓN	Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95	FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
C.C. ó NIT	79.508.558-7	SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos			
TELÉFONO	310 654 1925				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

			CANTIDADES INICIALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	CAPITULO 19												
19.1	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos	ML	19.00	$ 22,386.45	$ 425,342.55	1.00	$ 22,386.45		$ -	0.00		0.00	$ -
19.2	Suministro e instalación de Koraza gris sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos,dilataciones y carteras vanos	M2	3.60	$ 33,142.29	$ 119,312.24	1.00	$ 33,142.29		$ -	0.00		0.00	$ -
19.3	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos	M2	253.51	$ 33,075.52	$ 8,384,975.68	1.00	$ 33,075.52		$ -	0.00		0.00	$ -
19.4	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre muro interior 3 manos Incluye filos, dilataciones y cartera vanos	M2	251.60	$ 23,825.57	$ 5,994,513.41	1.00	$ 23,825.57		$ -	0.00		0.00	$ -
19.5	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre vanos	ML	18.70	$ 19,340.97	$ 361,676.14	1.00	$ 19,340.97		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 19	$ 15,285,819.42		$ 131,770.80		$ -		$ -		$ -
	CAPITULO 20												
	VENTANAS												
20.1	Suministro e instalacion de V-2 BODE persiana antitorm perfil konopt40 konopt50 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.50, vidrio 6- 12-6	UN	2.00	$ 789,461.88	$ 1,578,923.76	1.00	$ 789,461.88		$ -	0.00		0.00	$ -
				SUBTOTAL CAPITULO 20	$ 1,578,923.76		$ 789,461.88		$ -		$ -		$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	$ 15,430.00	$ -	10,780.00	$ 166,335,400.00	0.00	$ -	10,780.00	$ 166,335,400.00	10,780.00	$ 166,335,400.00
NP 2	CONCRETO SOLADOS 2500 PSI	M3	-	$ 575,270.00	$ -	29.83	$ 17,160,304.10	8.28	$ 4,763,235.60	21.55	$ 12,397,068.50	29.83	$ 17,160,304.10
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA ALAMBRE DE PUA 3 HILOS	ML	-	$ 30,400.00	$ -	150.00	$ 4,560,000.00	0.00	$ -	120.00	$ 3,648,000.00	120.00	$ 3,648,000.00
NP 4	MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CUBIERTA	KG	-	$ 10,420.00	$ -	11,018.24	$ 114,810,060.80	3,316.41	$ 34,557,011.47	7,573.18	$ 78,912,535.60	10,889.59	$ 113,469,547.07
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3"	M3	-	$ 140,000.00	$ -	1,052.50	$ 147,350,000.00	450.00	$ 63,000,000.00	332.50	$ 46,550,000.00	782.50	$ 109,550,000.00
NP 6	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI	M3	-	$ 1,146,827.87	$ -	281.88	$ 322,985,960.00	0.00	$ -	276.49	$ 316,809,947.78	276.49	$ 316,809,947.78
NP 7	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	M3	-	$ 1,402,771.18	$ -	112.40	$ 157,671,478.38	10.70	$ 15,009,651.41	101.70	$ 142,661,826.97	112.40	$ 157,671,478.38
NP 8	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI	M3	-	$ 936,087.61	$ -	167.00	$ 156,326,630.87	102.62	$ 96,061,310.54	59.32	$ 55,528,717.03	161.94	$ 151,590,027.57
NP 9	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	M3	-	$ 1,353,052.05	$ -	471.82	$ 638,397,018.23	222.30	$ 300,783,470.72	249.52	$ 337,613,547.51	471.82	$ 638,397,018.23
NP 10	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 8 1/2" DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD (120 M) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMÁS TABLEROS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA, TUBERÍA, FILTROS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN A PTAP CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y BARCTERIOLÓGICO DEL AGUA	UN		$ 516,824,981.43		1.00	516,824,981.43 $	1.00	516,824,981.43 $	0.00	- $	1.00	$ 516,824,981.43

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 08 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	8
	CORTE No 8 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	FECHA RADICACIÓN:	25 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10178-22 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22	OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-8 DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL LYM	VR. INICIAL	$ 6,974,591,904.74	PLAZO INICIAL	2 MESES Y 4 DIAS
DIRECCIÓN	Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3-301	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
C.C. ó NIT	901.635.603-5	VR. ACTUAL	$ 6,974,591,904.74	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2022
TELÉFONO	3113407052	ANTICIPO	N/A	PLAZO ADICIONAL	350 DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	-
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	13 MESES Y 18 DIAS
DIRECCIÓN	Calle 52ª No. 14-17, Montería – Córdoba	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 2,011,906,131.95	FECHA TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
C.C. ó NIT	79.508.558-7	SON: Dos mil once millones, novecientos seis mil, ciento treinta y un pesos, con noventa y cinco centavos			
TELÉFONO	310 654 1925				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 08

CANTIDADES INICIALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 11	SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO - BASES EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE - ACCESORIOS, CABLEADO, VARIADOR DE BOMBEO SOLAR	UN		$ 112,541,250.00		1.00	112,541,250.00 $	0.00	- $	0.00	- $	0.00	$ -
NP 12	PLASTICO POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO	M2		$ 4,832.00		1,421.23	6,867,383.36 $	1,421.23	6,867,383.36 $	0.00	- $	1,421.23	$ 6,867,383.36
NP 13	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 10'' PARA ACCESO PRINCIPAL	ML		$ 115,486.00		6.00	692,916.00 $	6.00	692,916.00 $	0.00	- $	6.00	$ 692,916.00
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA No 5	M2		$ 103,919.56		2,214.17	230,095,052.57 $	2,100.00	218,231,076.00 $	0.00	- $	2,100.00	$ 218,231,076.00
NP 15	CONCRETO CICLOPEO 20,7 MPA (3000 PSI) PARA SOBRE ANCHOS EN CIMENTACIÓN	M3		$ 839,185.11		19.55	16,406,068.90 $	19.55	16,406,068.90 $	0.00	- $	19.55	$ 16,406,068.90
NP 16	CASETON EN ICOPOR FORRADO EN POLIETILENO PARA ALIGERAMIENTO DE PLACAS DE CUBIERTA	M2		$ 84,747.90		1,470.69	124,637,889.05 $	1,470.69	124,637,889.05 $	0.00	- $	1,470.69	$ 124,637,889.05
				SUBTOTAL CAPITULO NO PREVISTOS	$ -		$ 2,733,682,393.69		$ 1,397,834,994.48		$ 1,160,457,043.39		$ 2,558,292,037.87
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 5,393,988,785.78		$ 6,393,988,785.78		$ 1,572,415,890.64		$ 2,328,903,271.79		$ 3,901,319,162.33
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION		21.00%		$ 1,132,737,645.01		$ 1,132,737,645.01		$ 330,207,337.01		$ 489,069,687.08		$ 819,277,024.09
	IMPREVISTOS		1.00%		$ 53,939,887.86		$ 53,939,887.86		$ 15,724,158.91		$ 23,289,032.72		$ 39,013,191.62
	UTILIDADES		5.00%		$ 269,699,439.00		$ 269,699,439.00		$ 78,620,794.53		$ 116,445,163.59		$ 195,065,958.12
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19.00%		$ 51,242,893.41		$ 51,242,893.41		$ 14,937,950.98		$ 22,124,581.08		$ 37,062,532.04
				SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 1,507,619,865.28		$ 1,507,619,865.28		$ 439,490,241.41		$ 650,928,464.47		$ 1,090,418,705.87
				SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL	$ 6,901,608,651.06		$ 6,901,608,651.06		$ 2,011,906,131.95		$ 2,979,831,736.26		$ 4,991,737,868.20
	INSTALACIONES PROVISIONALES												
21.1	INSPECTORIA RETIE Y RETILAP	UN	0.50	$ 22,127,383.68	$ 11,063,691.84		$ 11,063,691.84						
21.2	TRAMITE DE CONEXIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED	UN	1.00	$ 21,306,000.00	$ 21,306,000.00		$ 21,306,000.00						
21.3	PROVISIONAL ELECTRICA	UN	1.00	$ 28,960,773.44	$ 28,960,773.44		$ 28,960,773.44	-	$ -	1.00	$ 28,960,773.44	1.00	$ 28,960,773.44
				SUBTOTAL CAPITULO 21	$ 61,330,465.28		$ 61,330,465.28		$ -		$ 28,960,773.44		$ 28,960,773.44
	COSTOS EQUIPOS + TRÁMITE ANTES DE IVA				$ 61,330,465.28		$ 61,330,465.28		$ -		$ 28,960,773.44		$ 28,960,773.44
	IVA	19%			$ 11,652,788.40		$ 11,652,788.40		$ -		$ 5,502,546.95		$ 5,502,546.95
	TOTAL COSTOS EQUIPOS + TRÁMITE				$ 72,983,253.68		$ 72,983,253.68		$ -		$ 34,463,320.39		$ 34,463,320.39
				VALOR TOTAL PROYECTO	$ 6,974,591,904.74		$ 6,974,591,904.74		$ 2,011,906,131.95		$ 3,014,295,056.65		$ 5,026,201,188.59
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 6,974,591,904.74	100.00%	$ 6,974,591,904.74	28.85%	$ 2,011,906,131.95	43.22%	$ 3,014,295,056.65	72.06%	$ 5,026,201,188.59
	AMORTIZACION ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR NETO A PAGAR				$ 6,974,591,904.74		$ 6,974,591,904.74		$ 2,011,906,131.95		$ 3,014,295,056.65		$ 5,026,201,188.59

Para constancia se firma el documento por los participantes, a los Veinticinco (25) días del mes de Septiembre del 2023.

EL CONTRATISTA:

ING.DIEGO MEDINA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PONAL LYM
CONTRATISTA DE OBRA

EL INTERVENTOR

ING. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CVN
INTERVENTORÍA

EL CONTRATANTE:

MAYOR - GUSTAVO QUIROZ
SUPERVISOR DIRAF - PONAL

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	3- EDIFICIO OAC		

ITEM	3,1,1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	UNIDAD	M3

BLOQUE		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES				
				Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Espesor (m)	Volumen (m3)
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
OAC	VIA A PTAR	Excavación cajeo de via		300.00	6.00	0.40		720.00
	Plataforma PTAR	Excavación de nivelación plataforma		20.00	20.00	0.30		120.00
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								840.00
ACUMUDADO ACTAS ANTERIORES								2873.16
ACUMULADO TOTAL:								3713.16

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

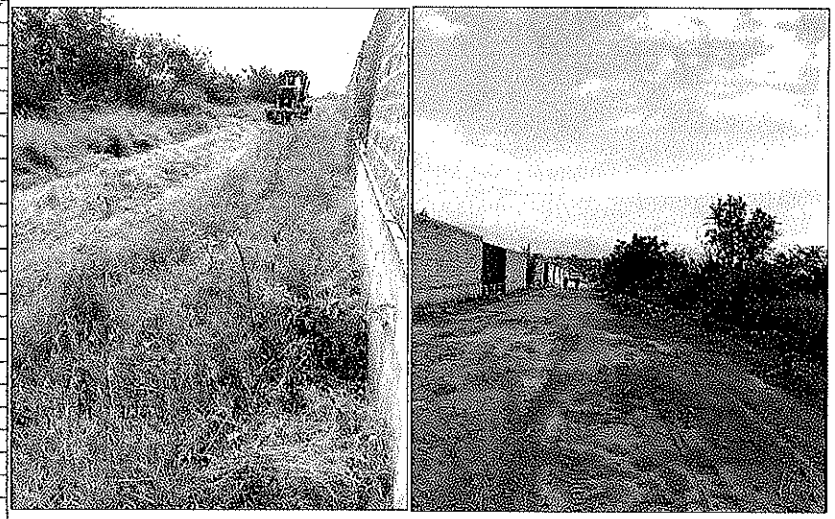

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	3713.16
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

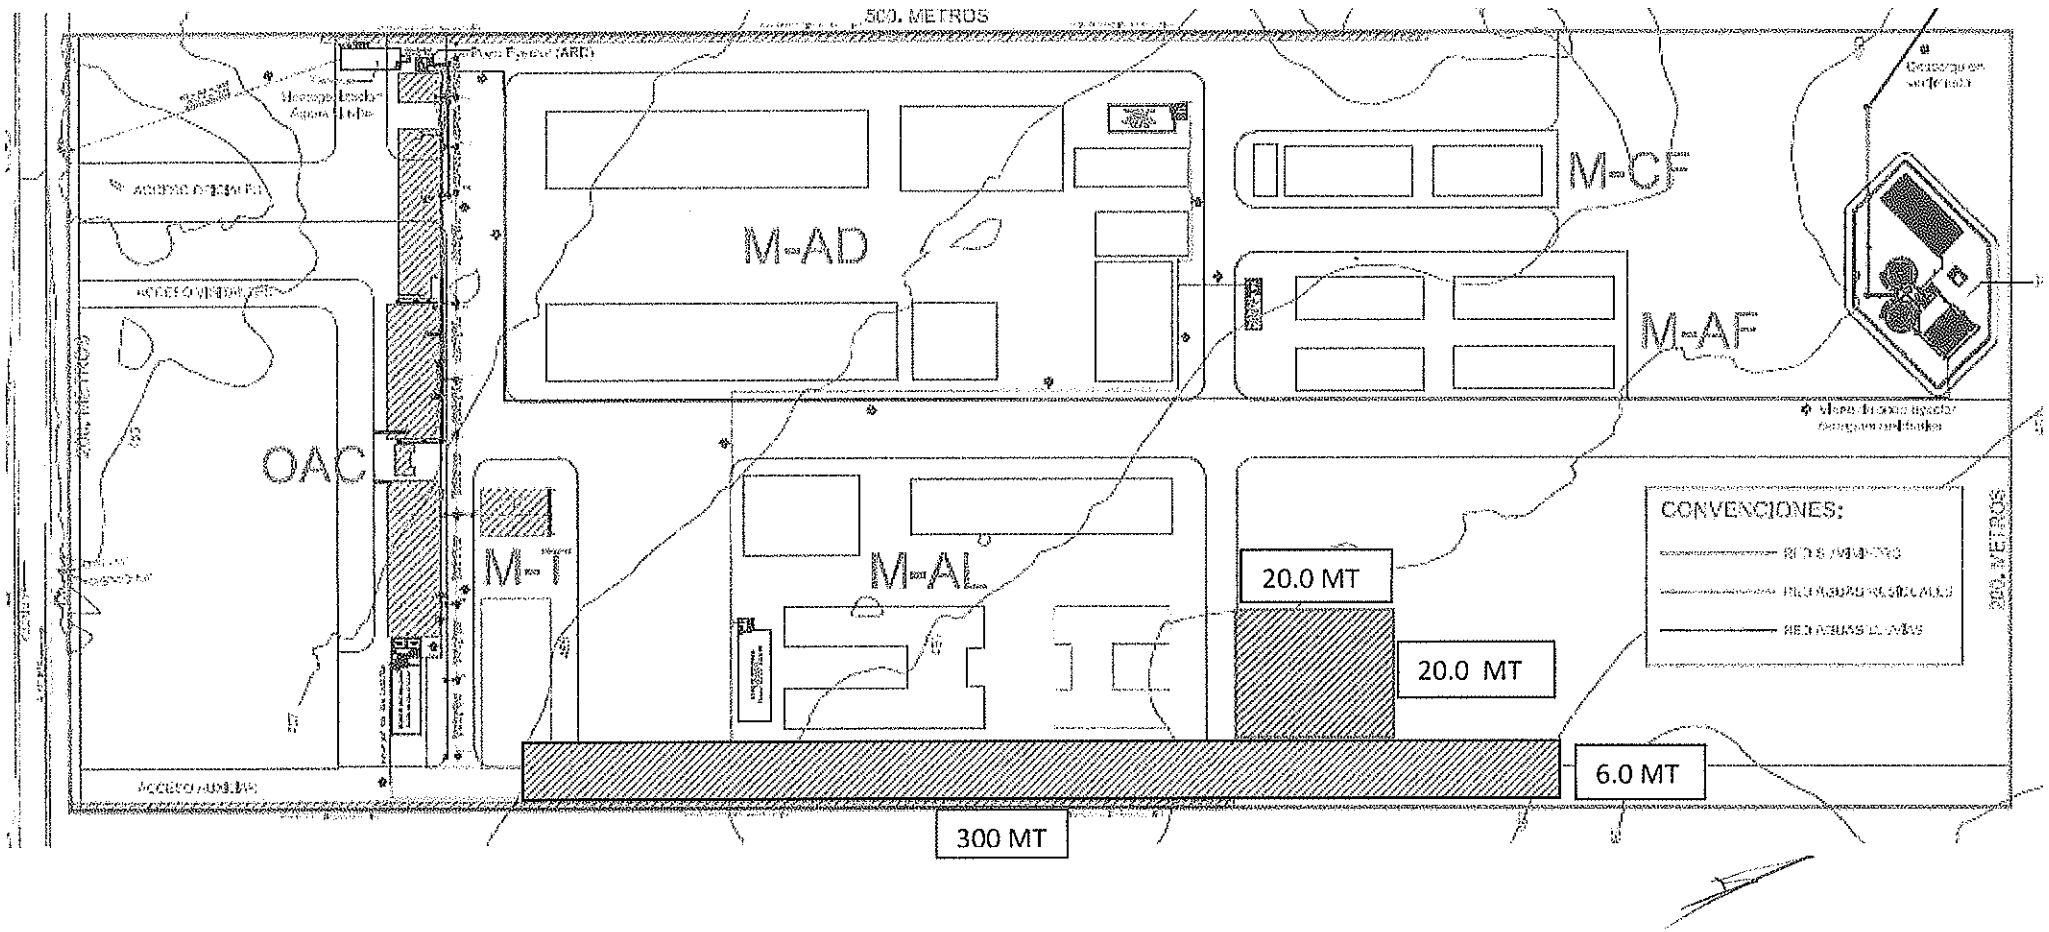
500. METROS
M-AD
M-CF
M-AF
OAC
M-T
M-AL
CONVENCIONES:
20.0 MT
20.0 MT
6.0 MT
300 MT

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	3- EDIFICIO OAC		

ITEM	3,1,2	Relleno en Recebo común Compactado	UNIDAD	M3

BLOQUE		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES				
				Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
VIA A PTAR		Relleno de vía		300.00	6.00	0.20		360.00
Plataforma PTAR		Relleno de nivelación plataforma		20.00	20.00	0.40		160.00
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								520.00
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES								4148.06
ACUMULADO TOTAL:								4668.06

ESQUEMA / FOTOGRAFIA



RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	4668.08
DIFERENCIA:	-0.02
PORCENTAJE:	0.00%

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

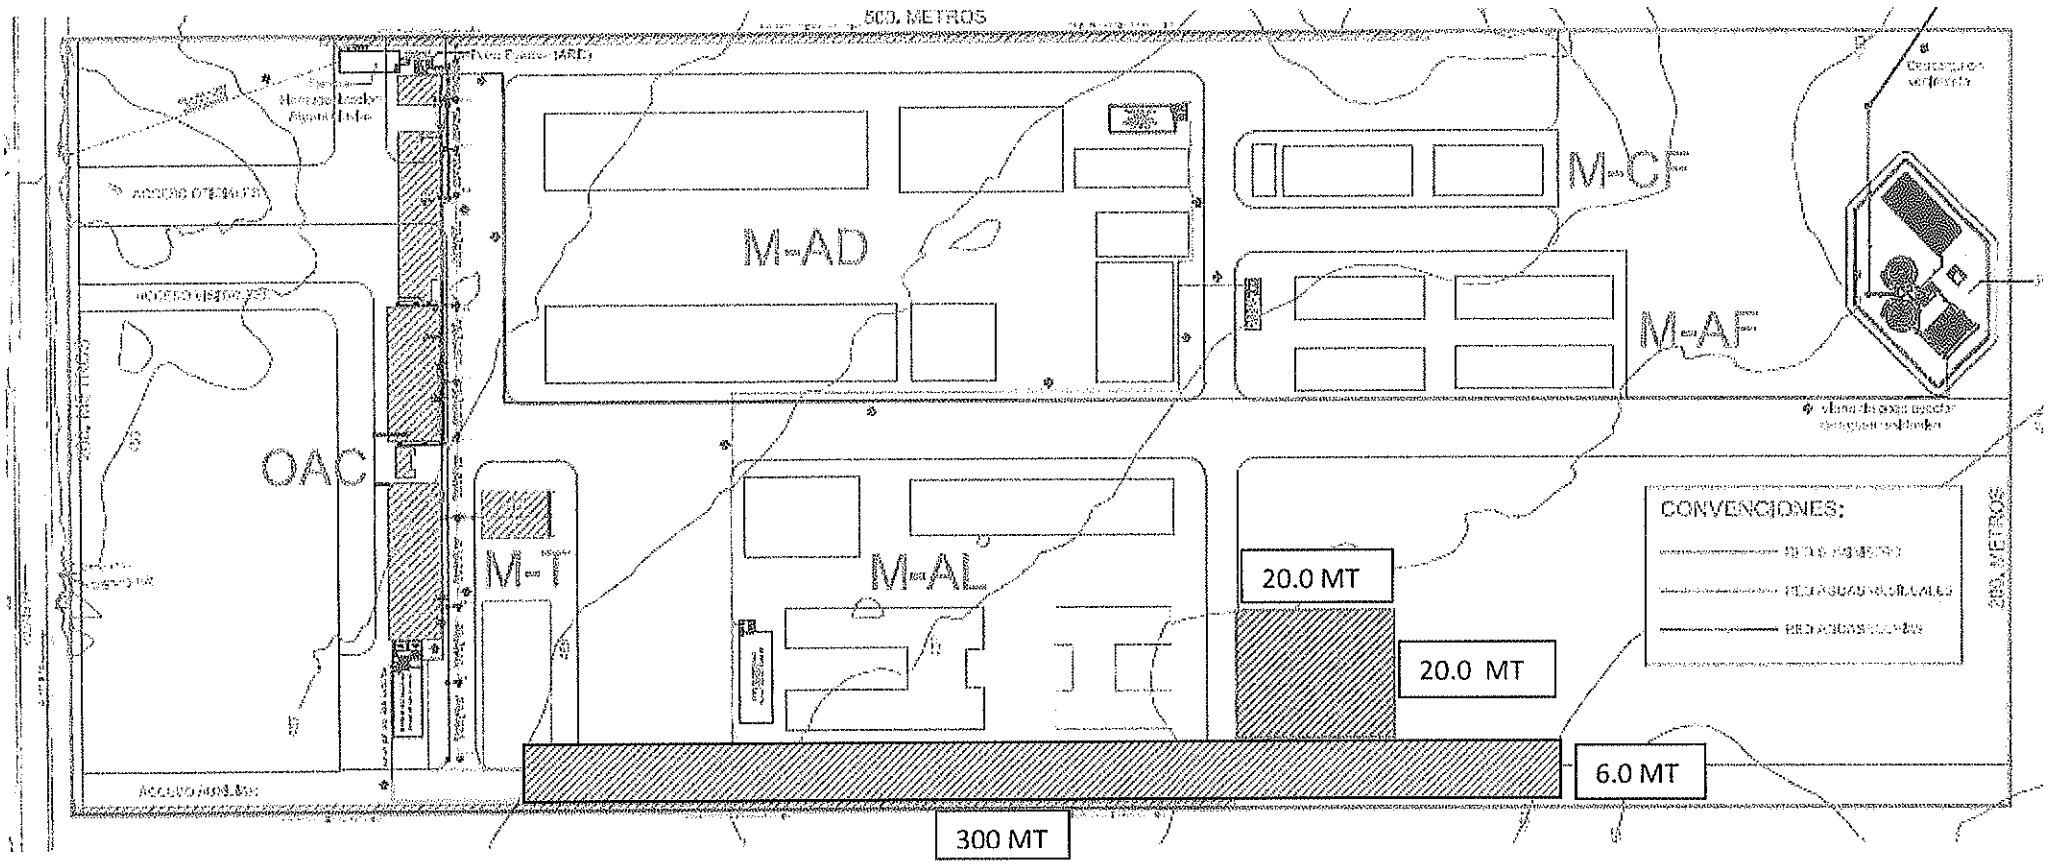
500. METROS
M-AD
M-CF
M-AF
OAC
M-T
M-AL
20.0 MT
20.0 MT
6.0 MT
300 MT
CONVENCIONES:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	3.2.1- Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI	ITEM: 3.2.1	UNIDAD: KG

CAPITULO: 3.00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES # De Varillas	DIMENSIONES # de Acero	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Repetición	Peso Kg
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
D		ACERO ZAPATAS BLOQUE D						
		ZAPATA TIPO 6	6.00					210.00
D		ACERO VIGAS CIMENTACIÓN D						
		VIGA 101 D	1.00					74.34
		VIGA 102 D	1.00					74.34
		VIGA 103 D	1.00					74.34
		VIGA 104 D	1.00					142.38
		VIGA 105 D						142.38
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								717.78
ACUMUDADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES								19524.60
ACUMULADO TOTAL:								20242.38

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

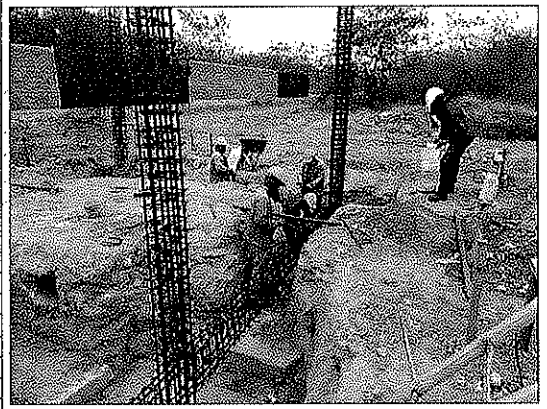

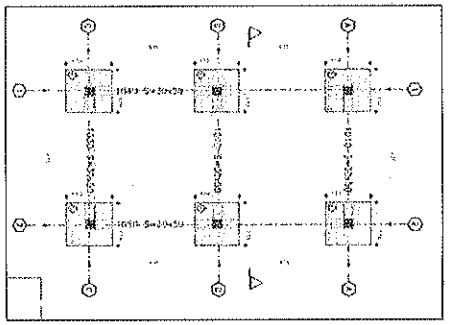

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	21104.36
DIFERENCIA:	861.98
PORCENTAJE:	4.08%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITE	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	Malla electrosoldada para losa contrapiso	ITEM: 3.2.5	UNIDAD: KG

CAPITULO: EDIFICIO OAC-ENTRUCTURAS EN CONCRETO

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	DIMENSIONES A	AREA	KG/M2			PESO TOTAL KG
BLOQUE A	MALLA LARGO 6.00 X 2.35 ANCHO	1	40.80	17.03	694.82	4.07			2827.59
BLOQUE B	MALLA LARGO 6.00 X 2.35 ANCHO	1	34.83	17.03	593.15	4.07			2413.85
AREA QUE RESTA COLUMNAS	COLUMNA								
BLOQUE A	COLUMNA RECTANGULAR	21	0.70	0.40	5.88	4.07			-23.93
	COLUMNA CIRCULAR AREA 0.19 M2	7			1.33	4.07			-5.41
AREA QUE RESTA COLUMNAS	COLUMNA								
BLOQUE B	COLUMNA RECTANGULAR	18.00	0.70	0.40	5.04	4.07			-20.51
	COLUMNA CIRCULAR AREA 0.19 M2	5.00			0.95	4.07			-3.87
	TOTAL SIN TRASLAPO				1287.98				
TRASLAPO LONGITUDINAL MALLA 0.50 X 6.00		1.50							
TRASLAPO TRANSVERSAL MALLA 0.50 X 2.35		0.59							
TOTAL AREA TRASLAPO POR MALLA DE 14.10 M2		2.09							
PAR 1.00 M2 DE MALLA EL TRASLAPO PROMEDIO ES DE		0.15							
TRASLAPO REQUERIDO PARA EL TOTAL DE MALLA					190.68	4.07			775.99
SUBTOTAL PRESENTE HOJA									775.99
ACUMUDADO ANTERIOR									0.00
ACUMUDADO PRESENTE ACTA									775.99
ACUMUDADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES									5187.72
ACUMULADO TOTAL:									5963.71
TOTALES:									5963.71
ACUMULADO:									5963.71

ESQUEMA / FOTOGRAFIA





RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	7972.00
DIFERENCIA:	2008.29
PORCENTAJE:	25.19%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	ITEM: 3,2,10	UNIDAD: KG

CAPITULO: 3.00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES # De Varillas	# de Acero	Longitud	Repetición	Peso Kg
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
C		ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE C						
NIVEL 2		VIGA 201 C	1.00					157.21
		VIGA 202 C	1.00					171.41
		VIGA 203 C	1.00					155.50
		VIGA 204 C	1.00					175.03
		VIGA 205 C	1.00					128.65
		VIGA 206 C	1.00					128.65
		VIGA 207 C	1.00					128.65
		VIGA 208 C	1.00					175.03
C		ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE C						
NIVEL 3		VIGA 301 B	1.00					57.69
		VIGA 302 B	1.00					341.89
		VIGA 303 B	1.00					645.24
		VIGA 304 B	1.00					770.32
		VIGA 305 B	1.00					181.14
		VIGA 306 B	1.00					144.29
		VIGA 307 B	1.00					134.43
		VIGA 308 B	1.00					131.36
		VIGA 309 B	1.00					140.33
		VIGA 310 B	1.00					176.70
		VIGA 311 B	1.00					176.70
		VIGA 312 B	1.00					139.69
		VIGA 313 B	1.00					139.69
		VIGA 314 B	1.00					130.03
		VIGA 315 B	1.00					139.69
		VIGA 316 B	1.00					227.39
		VIGA 317 B	1.00					38.74
		VIGA 318 B	1.00					38.74
		VIGA 319 B	1.00					68.75
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								5042.94
ACUMULADO ANTERIOR								0.00
ACUMULADO TOTAL:								5042.94

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

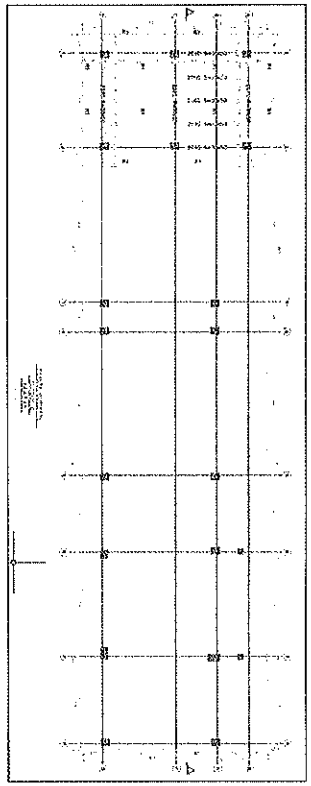

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	38335.29
DIFERENCIA:	33292.35
PORCENTAJE:	86.85%

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	ITEM: 3,2,10	UNIDAD: KG

CAPITULO: 3.00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES # De Varillas	# de Acero	Longitud	Repetición	Peso Kg
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
C		ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE C						
NIVEL 4		VIGA 401 C	1.00					70.80
		VIGA 402 C	1.00					96.83
		VIGA 403 C	1.00					331.37
		VIGA 404 C	1.00					93.88
		VIGA 405 C	1.00					116.67
		VIGA 406 C	1.00					273.26
		VIGA 407 C	1.00					101.61
		VIGA 408 C	1.00					101.61
		VIGA 409 C	1.00					173.26
C		ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE C						
NIVEL 5		VIGA 501 C	1.00					254.07
		VIGA 502 C	1.00					276.99
		VIGA 503 C	1.00					144.81
		VIGA 504 C	1.00					87.99
		VIGA 505 C	1.00					87.99
		VIGA 506 C	1.00					131.19
		VIGA 507 C	1.00					87.99
		VIGA 508 C	1.00					87.99
		VIGA 509 C	1.00					87.99
		VIGA 510 C	1.00					168.58
C		ACERO VIGAS RIOSTRAS BLOQUE C	1.00					1030.09
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								3804.97
ACUMUDADO ANTERIOR								5042.94
ACUMULADO TOTAL:								8847.91

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

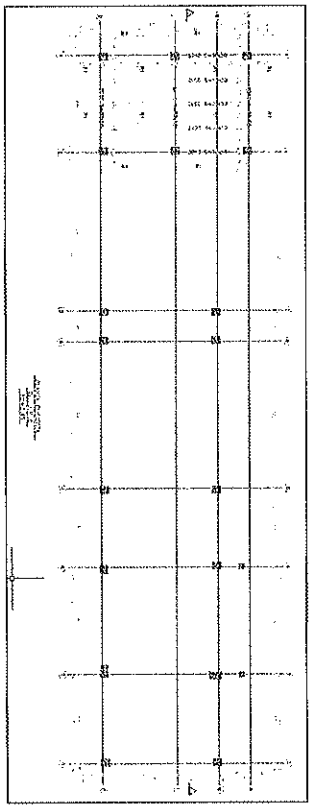

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	38335.29
DIFERENCIA:	29487.38
PORCENTAJE:	76.92%

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	ITEM: 3,2,10	UNIDAD: KG

CAPITULO: 3.00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES # De Varillas	# de Acero	Longitud	Repetición	Peso Kg
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
D		ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE D						
NIVEL 2		VIGA 201 D	1.00					106.11
		VIGA 202 D	1.00					111.44
		VIGA 203 D	1.00					106.11
		VIGA 204 D	1.00					177.60
		VIGA 205 D	1.00					177.60
		VIGA 206 D	1.00					130.21
		VIGA 207 D	1.00					177.60
D		ACERO VIGAS RIOSTRAS BLOQUE D	1.00					176.71
E		ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE E						
NIVEL 2		VIGA 201 E	1.00					68.37
		VIGA 202 E	1.00					121.54
		VIGA 203 E	1.00					122.47
		VIGA 204 E	1.00					80.55
		VIGA 205 E	1.00					108.88
		VIGA 206 E	1.00					124.68
		VIGA 207 E	1.00					93.05
		VIGA 208 E	1.00					108.88
		VIGA 209 E	1.00					88.83
E		ACERO VIGAS RIOSTRAS BLOQUE E	1.00					41.38
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								2122.01
ACUMUDADO ANTERIOR								8847.91
ACUMUDADO PRESENTE ACTA								10969.92

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

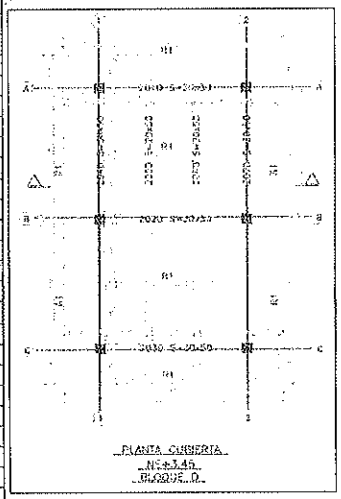

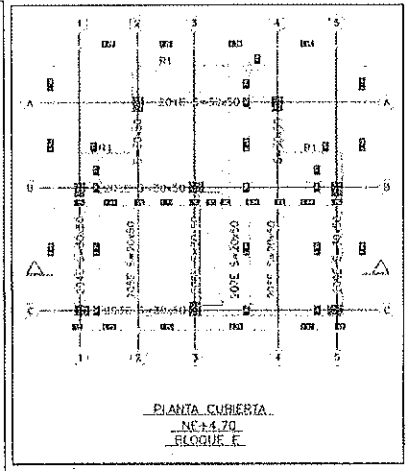

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	38335.29
DIFERENCIA:	27365.37
PORCENTAJE:	71.38%

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	ITEM:	3,2,10 / UNIDAD: KG

CAPITULO: 3.00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES # De Varillas	# de Acero	Longitud	Repetición	Peso Kg
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
A		ACERO SOBRE ANCHO EN VIGA AEREA						
NIVEL 2		EJE A DEL 1 AL 7	1.00	4.00	5.00	30.80		191.21
		EJE 7 DEL A AL C	1.00	4.00	5.00	8.45		52.46
		EJE C DEL 1 AL 7	1.00	4.00	5.00	21.09		130.93
		FLEJES	1.00	2.00	3.00	1.08	402.27	486.58
B		ACERO SOBRE ANCHO EN VIGA AEREA						
NIVEL 2		EJE A DEL 1 AL 6	1.00	4.00	5.00	23.71		147.19
		EJE C DEL 1 AL 6	1.00	4.00	5.00	14.74		91.51
		FLEJES	1.00	2.00	3.00	1.08	256.33	310.06
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								1409.93
ACUMUDADO ANTERIOR								10969.92
ACUMUDADO PRESENTE ACTA								12379.85
ACUMUDADO ACTAS PARCIALES								25955.44
ACUMULADO TOTAL:								38335.29

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

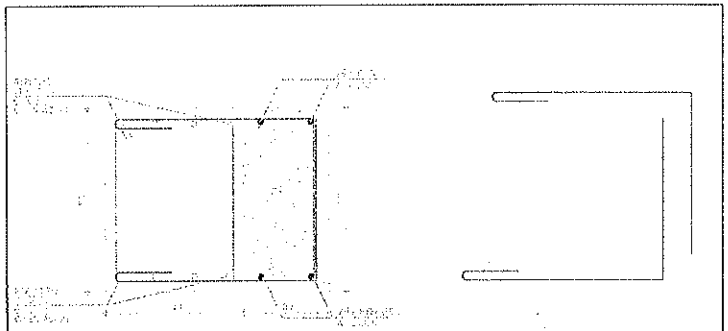

SOBRE ANCHO VIGA CIMENTACIÓN
ARRANQUE MURO DOBLE

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	38335.29
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:


DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:


DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACERO PARA PLACA DE CUBIERTA

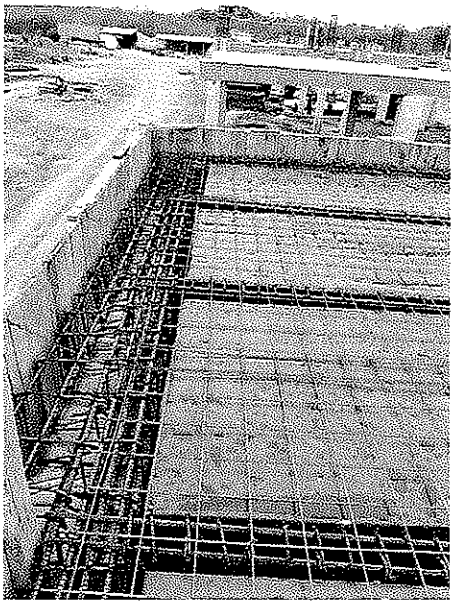




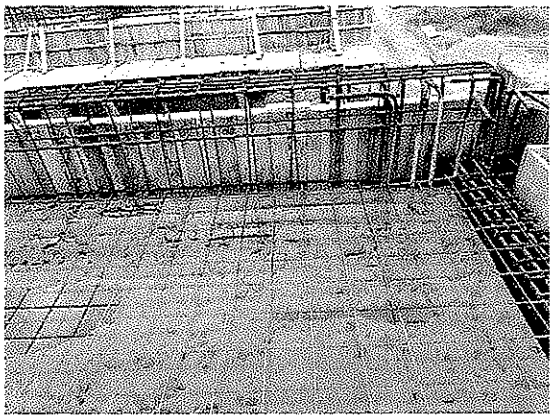





BLOQUE C

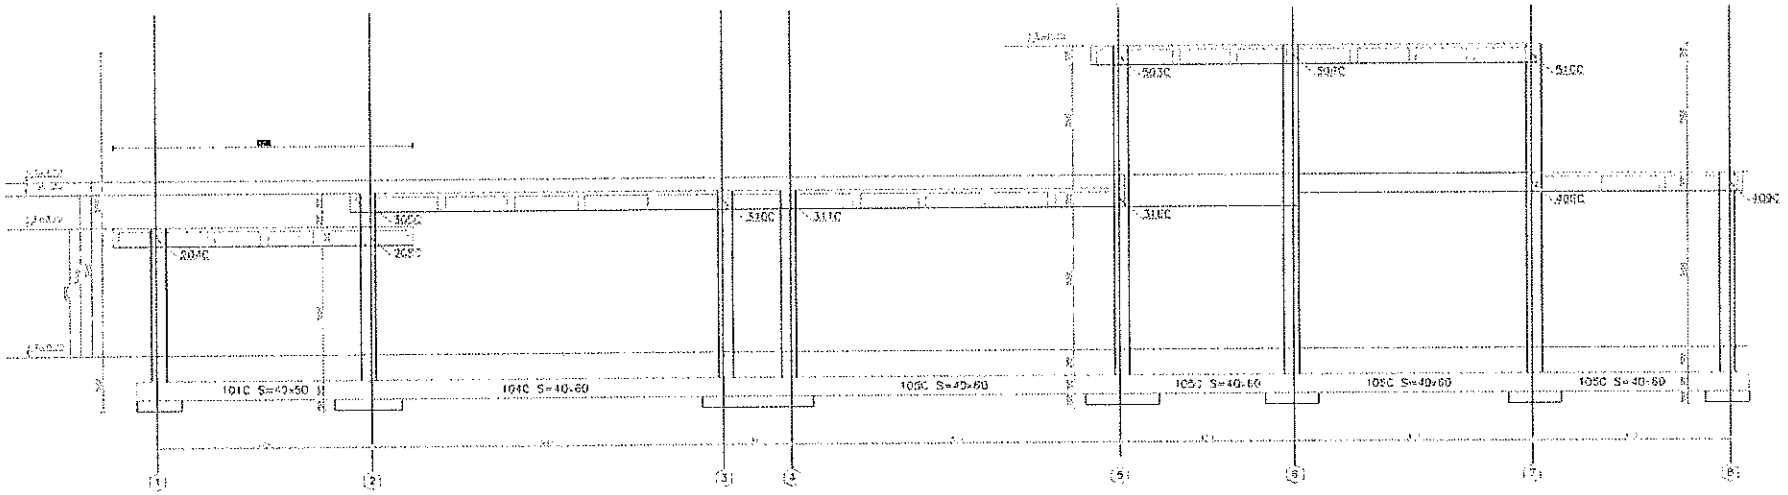


CORTE A-A

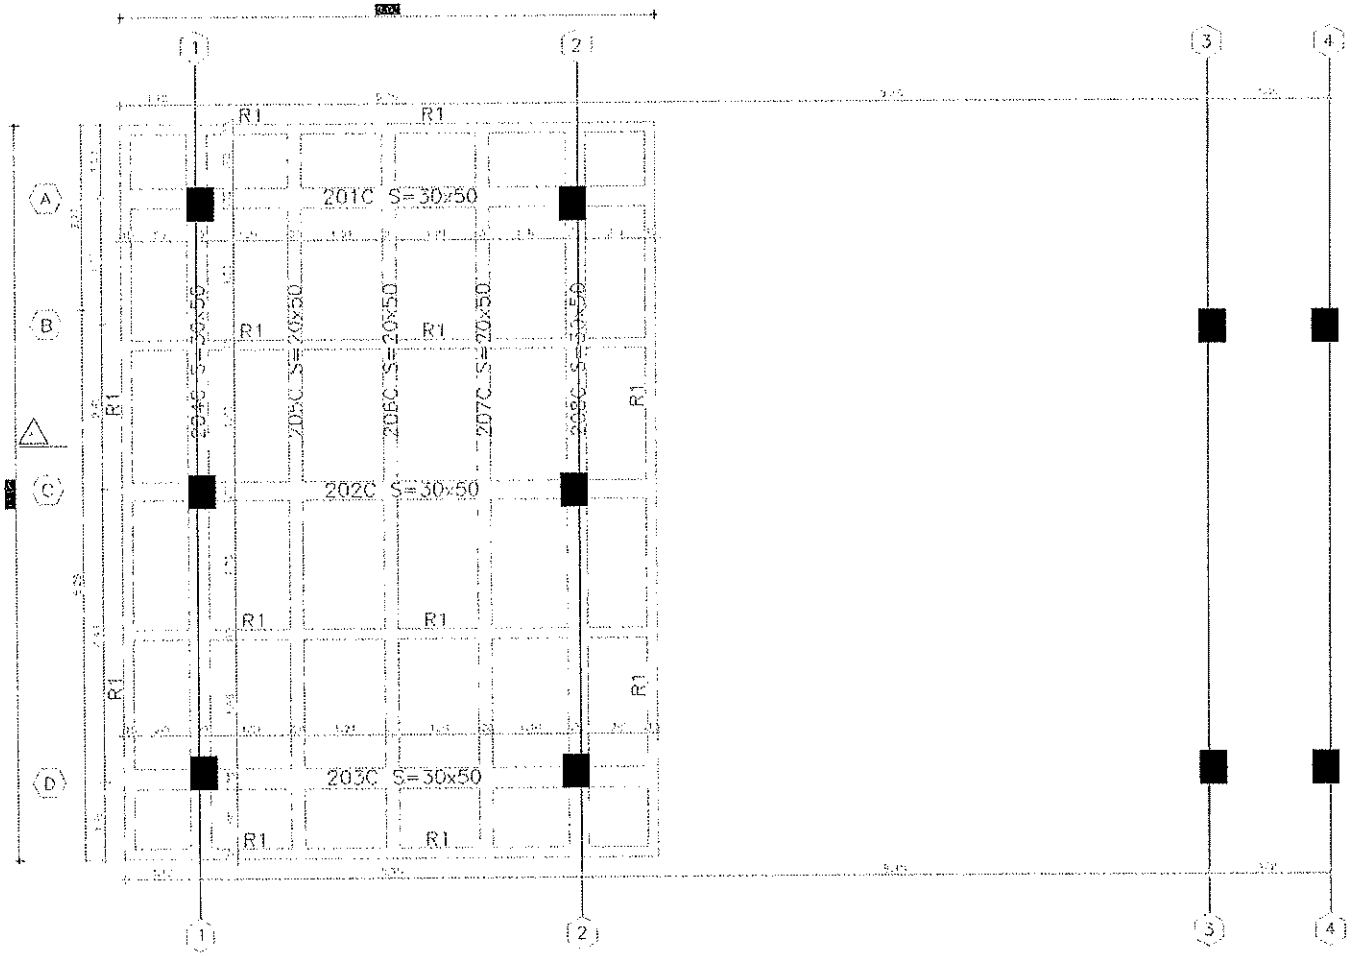


PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+3,45

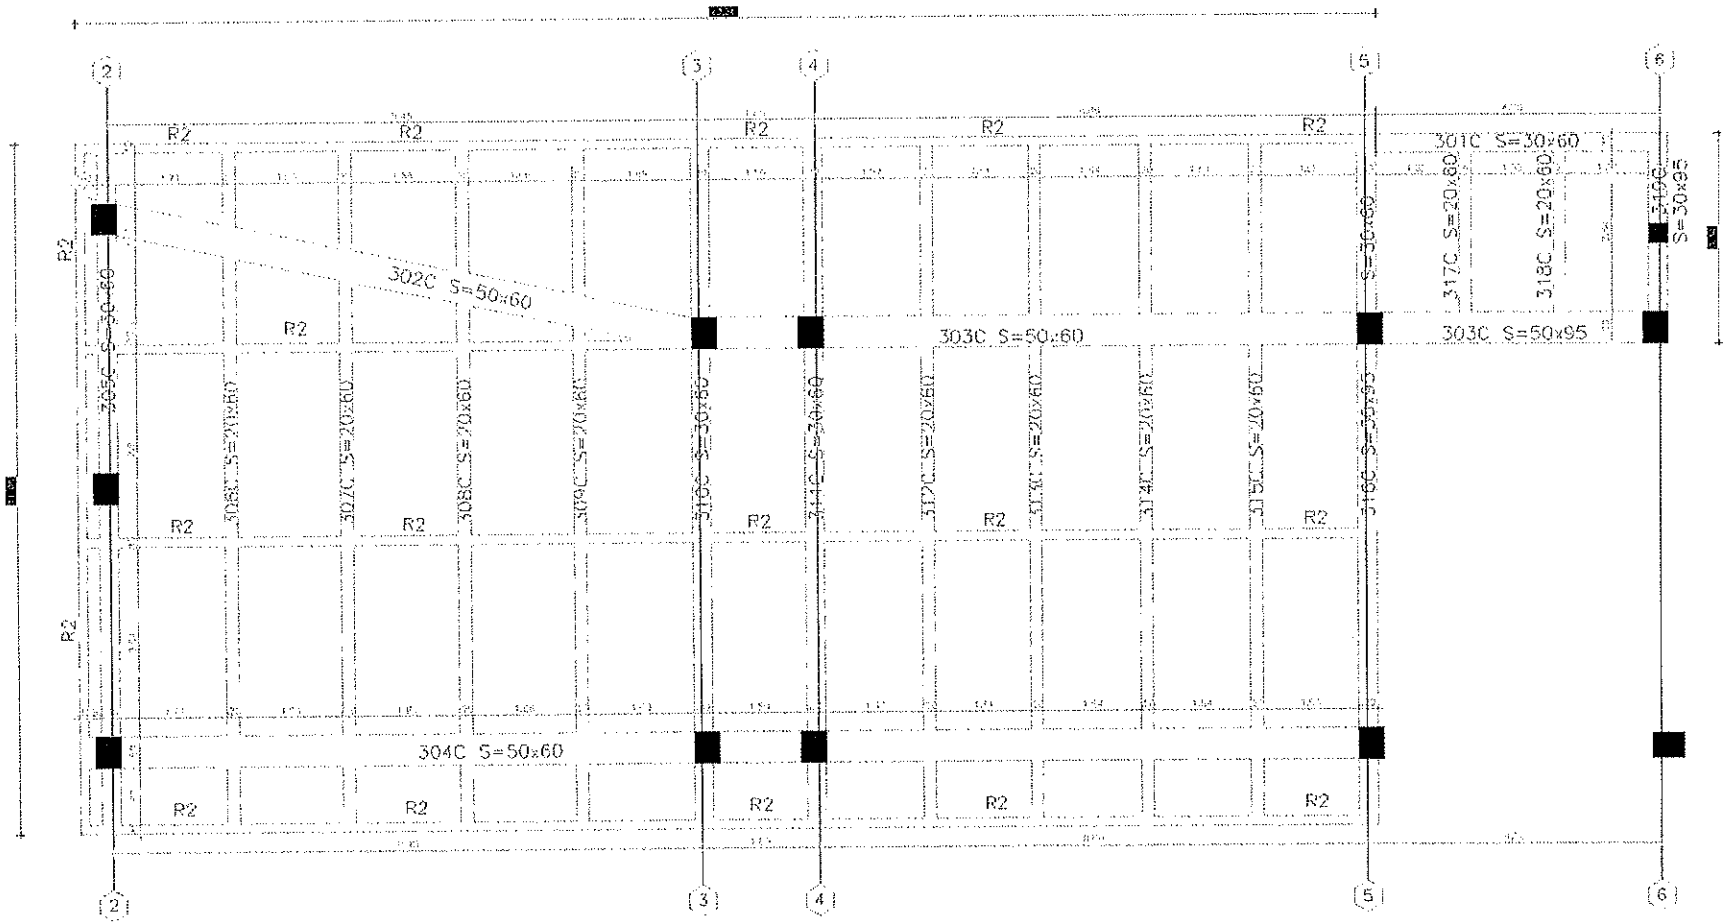

PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+4,35

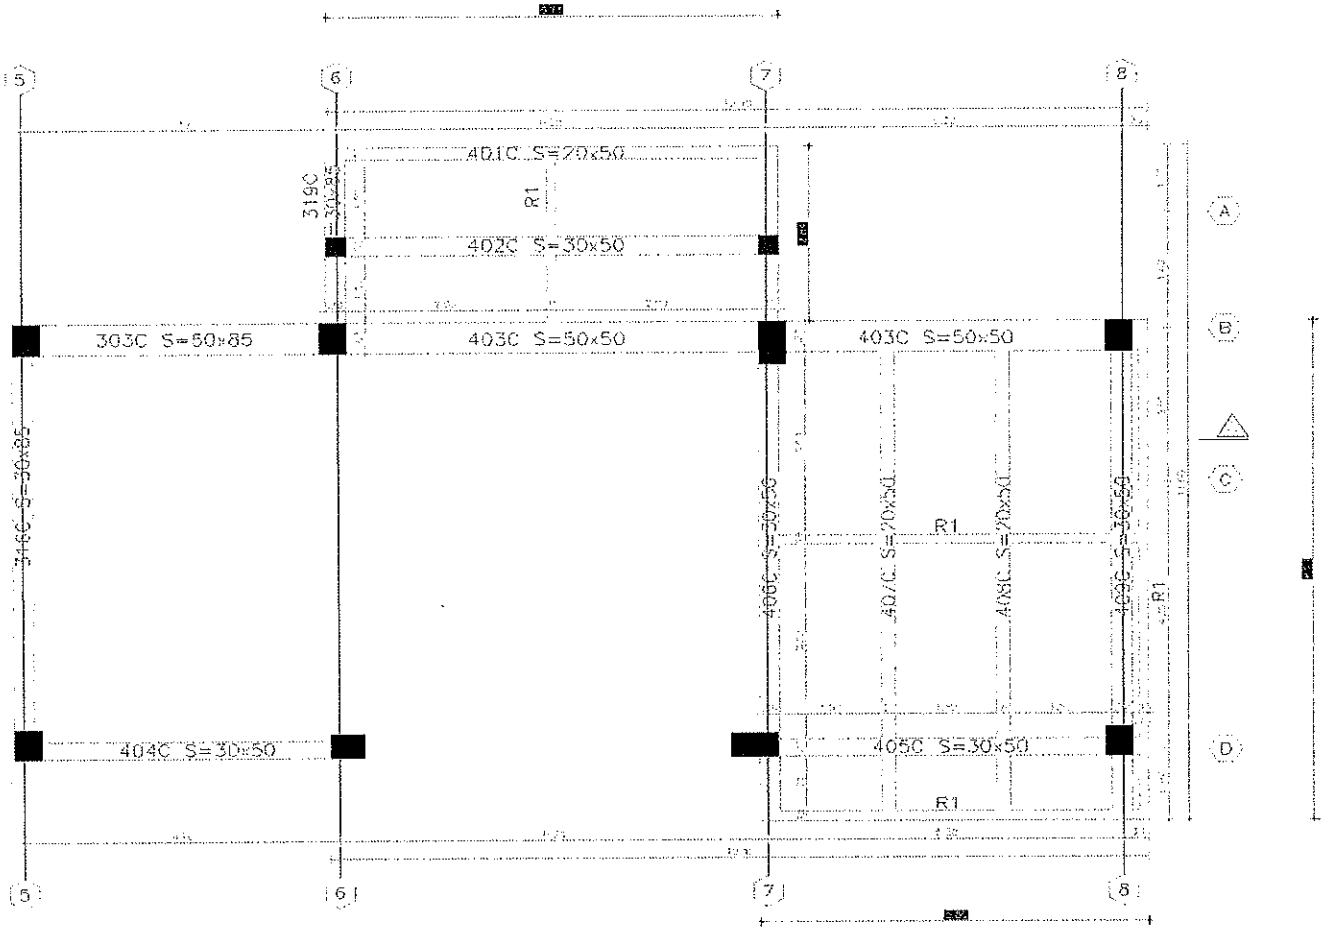


PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+4.70

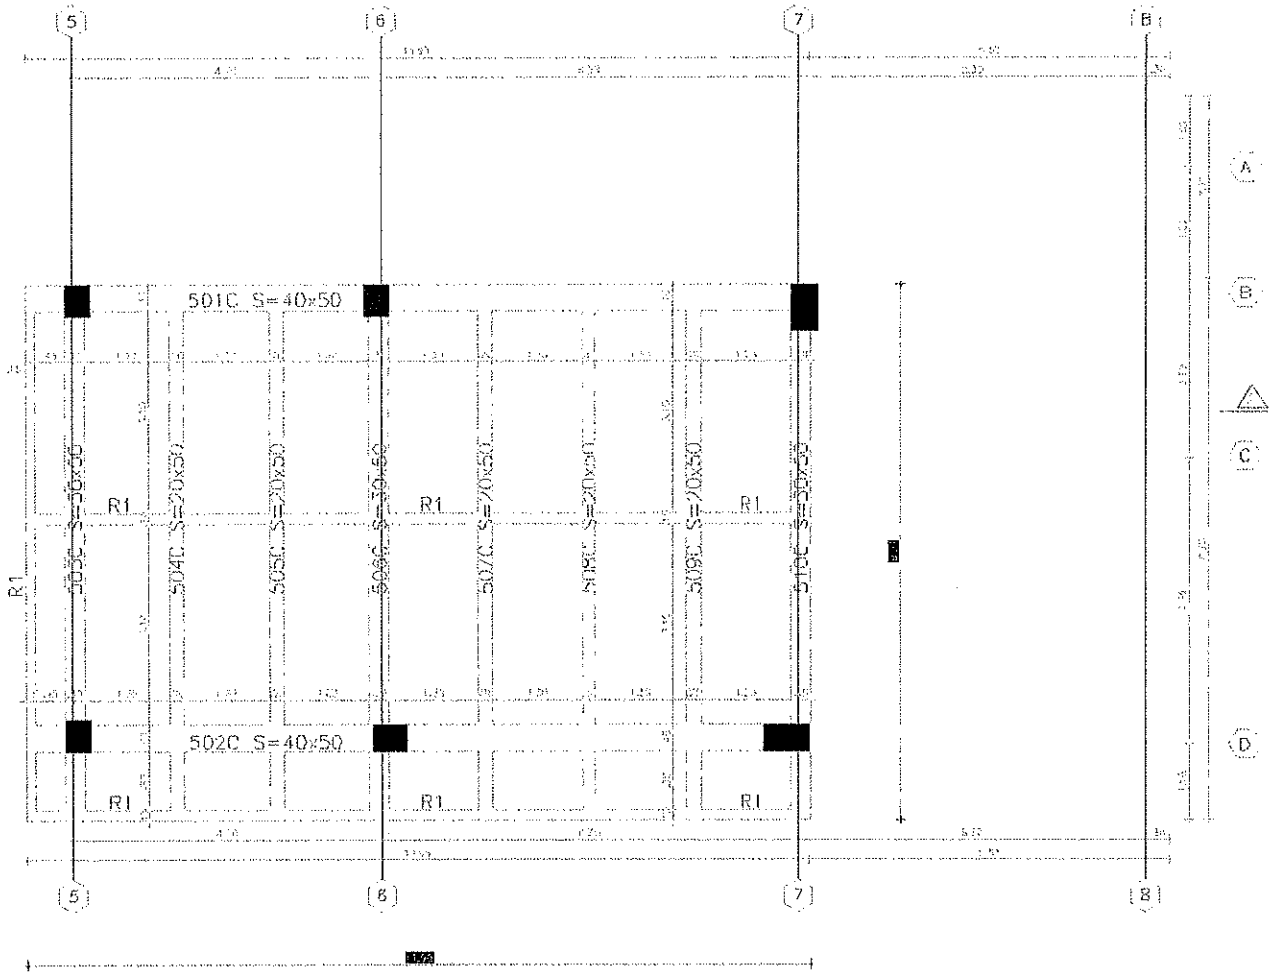


PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+8.15

BLOQUE D

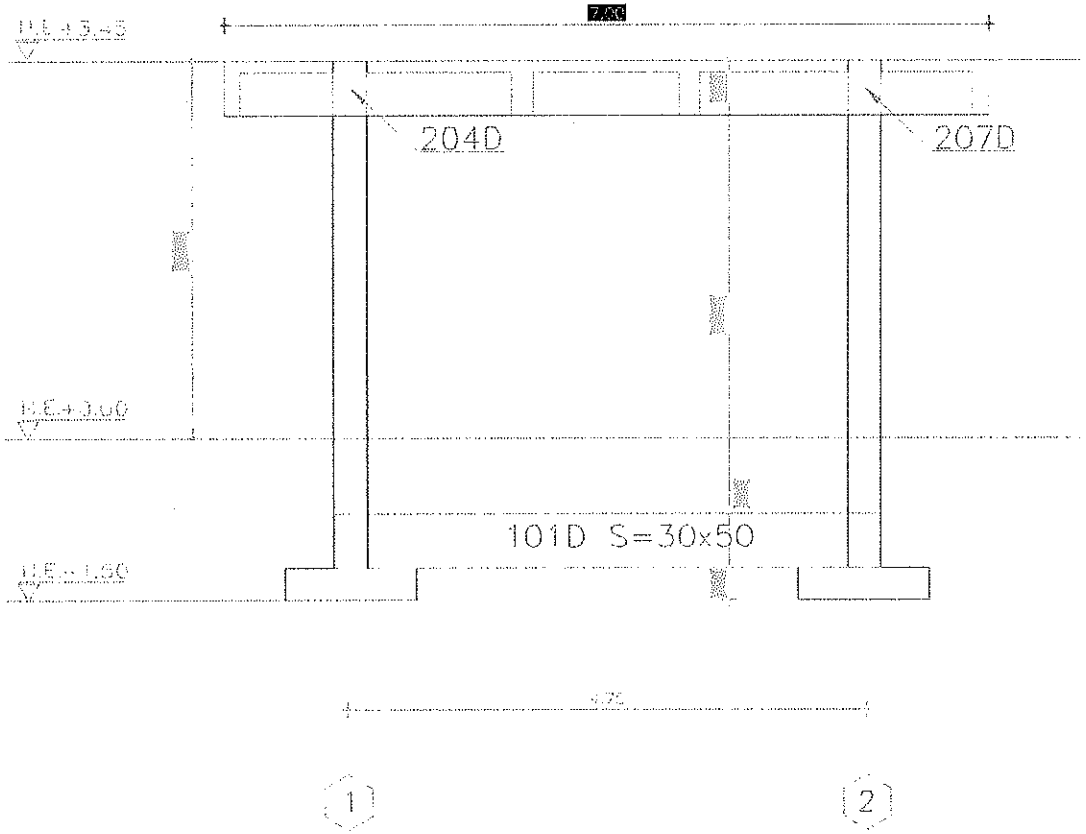

CORTE A–A

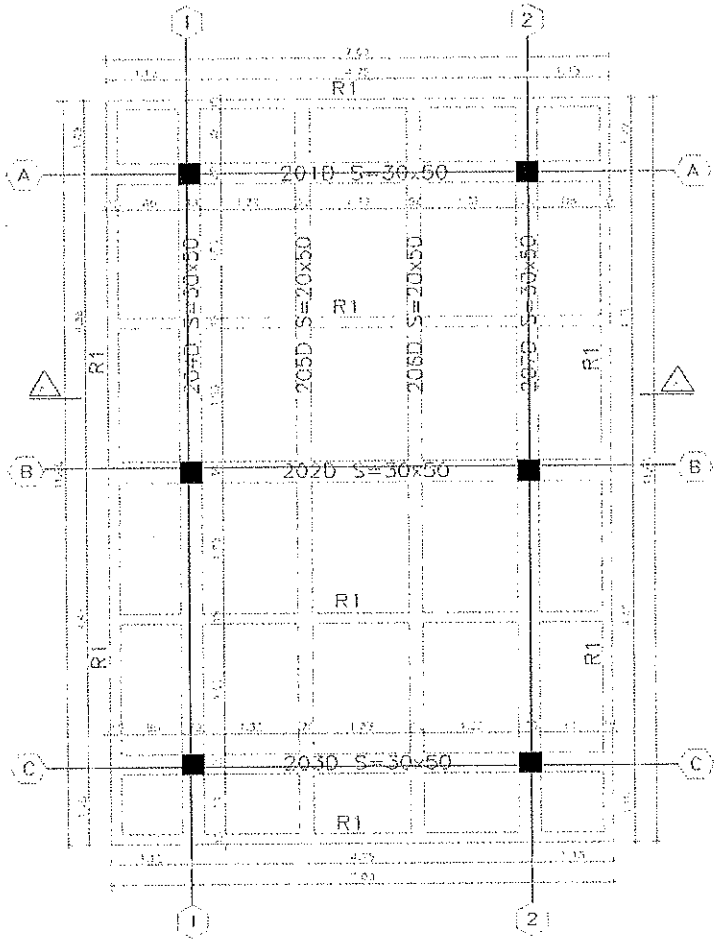


PLANTA CUBIERTA


NE+3.45

BLOQUE D

BLOQUE E

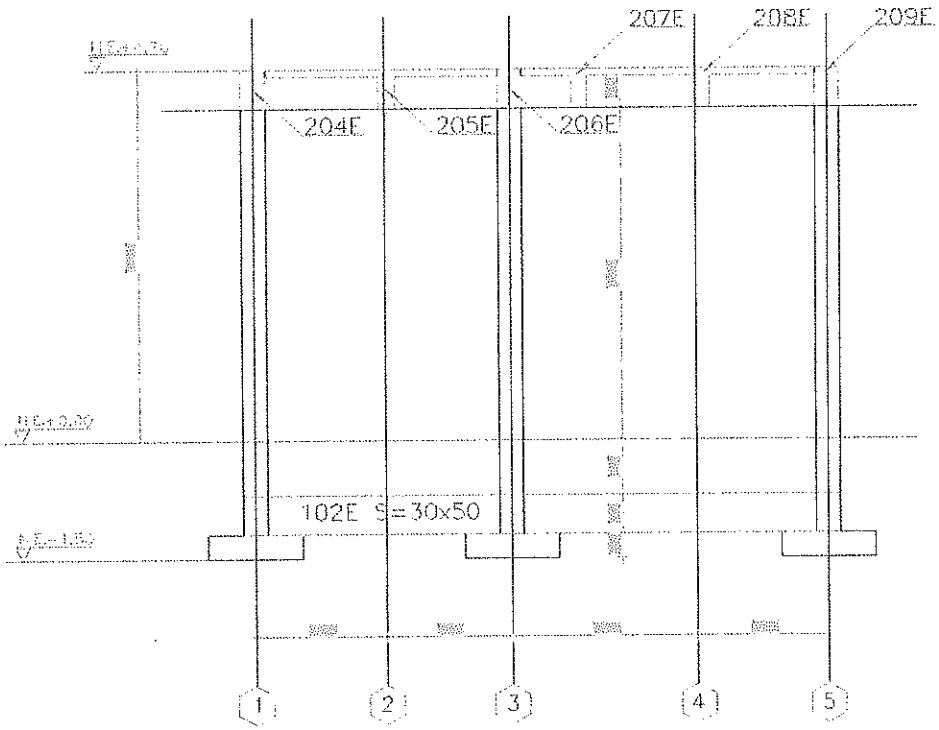

CORTE A–A

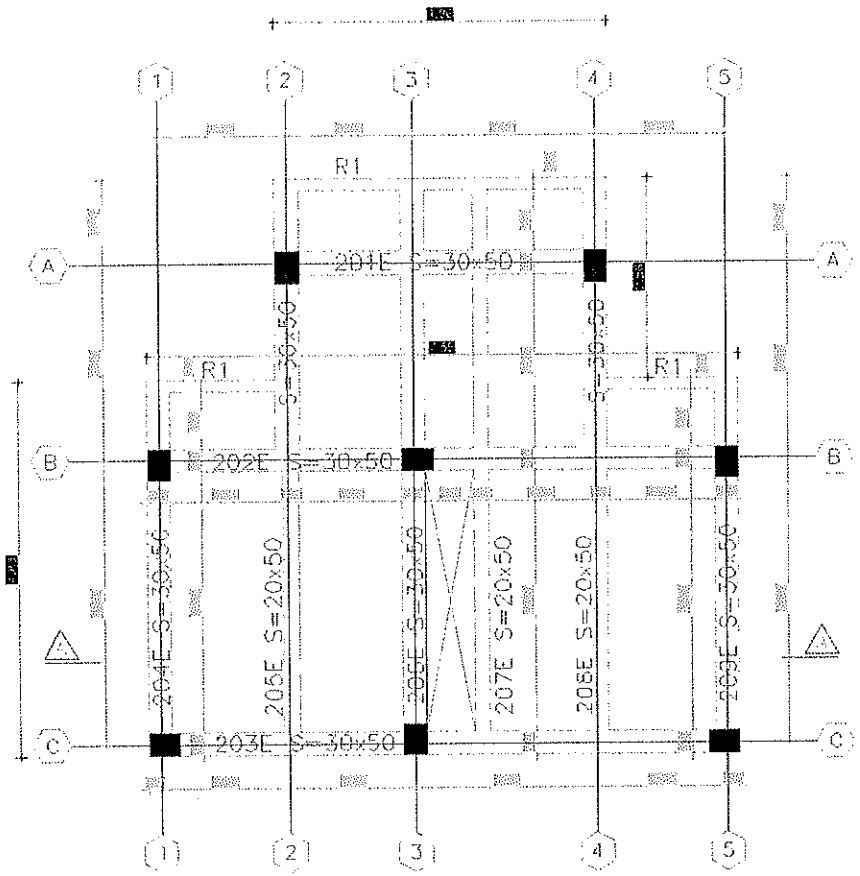

PLANTA CUBIERTA

NE+4.70

BLOQUE E

CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura	**MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS**	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE I-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**CONTRATO No.**	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**SUPERVISOR**	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	**REPRESENTANTE LEGAL**	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	**REPRESENTANTE LEGAL**	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO SOLADOS 2500 PSI	**ITEM:** NP 2	**UNIDAD** M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	**FECHA FINAL:** 06 DE OCTUBRE 2023

CAPITULO: NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
ZAPATAS BLOQUE A									
BLOQUE A OAC ZAPATAS T6	D7	1	1.50	1.50	0.05	0.11			0.11
BLOQUE A OAC ZAPATAS T5	A1, A7, D1, D3, D4, D5, D6	7	1.80	1.80	0.05	0.16			1.13
BLOQUE A OAC ZAPATAS T4	A2-A6, B1, B7, C1,C6,C7, D2	11	2.10	2.10	0.05	0.22			2.43
BLOQUE A OAC ZAPATAS T3	B6, C2-C5	5	2.30	2.30	0.05	0.26			1.32
BLOQUE A OAC ZAPATAS T2	B2-B5	4	2.40	2.40	0.05	0.29			1.15
ZAPATAS BLOQUE B									
BLOQUE B OAC ZAPATAS T6	A6, C6, D1, D5	4	1.50	1.50	0.05	0.11			0.45
BLOQUE B OAC ZAPATAS T5	A1, A5, B6, C1, D2-D4	7	1.80	1.80	0.05	0.16			1.13
BLOQUE B OAC ZAPATAS T4	A3,A4, B1, C5	4	2.10	2.10	0.05	0.22			0.88
BLOQUE B OAC ZAPATAS T3	A2, C3, C4	3	2.30	2.30	0.05	0.26			0.79
BLOQUE B OAC ZAPATAS T2	B4, B5, C2	3	2.40	2.40	0.05	0.29			0.86
BLOQUE B OAC ZAPATAS T1	B2, B3	2	2.50	2.50	0.05	0.31			0.63
ZAPATAS BLOQUE C									
BLOQUE C OAC ZAPATAS T7	B3Y4, C3Y4, AB6,AB7	4	2.7	2.7	0.05	0.36			1.46
BLOQUE C OAC ZAPATAS T6	A1, B8, C6, D6, D8	5	1.50	1.50	0.05	0.11			0.56
BLOQUE C OAC ZAPATAS T5	C2	1	1.80	1.80	0.05	0.16			0.16
BLOQUE C OAC ZAPATAS T4	D6, D7	2	2.10	2.10	0.05	0.22			0.44
BLOQUE C OAC ZAPATAS T3	A2, D2	2	2.30	2.30	0.05	0.26			0.53
BLOQUE C OAC ZAPATAS T2	B5, D5	2	2.40	2.40	0.05	0.29			0.58
ZAPATAS BLOQUE D									
BLOQUE D OAC ZAPATAS T6	A1, A2, B1, B2, C1, C2	6	1.50	1.50	0.05	0.11			0.68
VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE A									
BLOQUE A OAC S40X50	EJES A-D ENTRE EJES 1-7	4	40.55	0.40	0.05	0.81			3.24
BLOQUE A OAC S40X50	EJS 1-7 ENTRE EJES A-D	7	16.78	0.40	0.05	0.34			2.35
							0.28	21.00	-0.28
							0.196	7.00	-0.07
TOTALES:									20.53
ACUMULADO:									20.53

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	29.83
DIFERENCIA:	9.30
PORCENTAJE:	0.00%

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

TIPO	DIMENSIONES (m) A	B	H (m)	REFUERZO Sentido A	Sentido B	CANT
2	2.40	2.40	0.40	16 #4 L=2.65 c/.15	16 #4 L=2.65 c/.15	4
3	2.30	2.30	0.40	15 #4 L=2.55 c/.15	15 #4 L=2.55 c/.15	5
4	2.10	2.10	0.40	14 #4 L=2.35 c/.15	14 #4 L=2.35 c/.15	11
5	1.80	1.80	0.30	12 #4 L=2.05 c/.15	12 #4 L=2.05 c/.15	7
6	1.50	1.50	0.30	10 #4 L=1.75 c/.15	10 #4 L=1.75 c/.15	1

TIPO	DIMENSIONES (m) A	B	H (m)	REFUERZO Sentido A	Sentido B	CANT
1	2.50	2.50	0.40	16 #4 L=2.70 c/.16	16 #4 L=2.75 c/.16	2
2	2.40	2.40	0.40	16 #4 L=2.65 c/.15	16 #4 L=2.65 c/.15	3
3	2.30	2.30	0.40	15 #4 L=2.55 c/.15	15 #4 L=2.55 c/.15	3
4	2.10	2.10	0.40	14 #4 L=2.35 c/.15	14 #4 L=2.35 c/.15	4
5	1.80	1.80	0.30	12 #4 L=2.05 c/.15	12 #4 L=2.05 c/.15	7
6	1.50	1.50	0.30	10 #4 L=1.75 c/.15	10 #4 L=1.75 c/.15	9

TIPO	DIMENSIONES (m) A	B	H (m)	REFUERZO Sentido A	Sentido B	CANT
3	3.40	2.40	0.40	16 #4 L=2.65 c/.15	16 #4 L=2.65 c/.15	2
3	2.30	2.30	0.40	15 #4 L=2.55 c/.15	15 #4 L=2.55 c/.15	2
4	2.10	2.10	0.40	14 #4 L=2.35 c/.15	14 #4 L=2.35 c/.15	2
5	1.80	1.80	0.30	12 #4 L=2.05 c/.15	12 #4 L=2.05 c/.15	1
6	1.50	1.50	0.30	10 #4 L=1.75 c/.15	10 #4 L=1.75 c/.15	5
7	3.70	4.00	0.40	32 #4 L=3.95 c/.08	27 #4 L=4.15 c/.15	4

TIPO	DIMENSIONES (m) A	B	H (m)	REFUERZO Sentido A	Sentido B	CANT
6	1.50	1.50	0.30	10 #4 L=1.75 c/.15	10 #4 L=1.75 c/.15	6





Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma: _____ Firma: _____

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO SOLADOS 2500 PSI	ITEM: NP 2	UNIDAD: M3
CAPITULO: NO PREVISTOS		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 06 DE OCTUBRE 2023

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE B									
BLOQUE B OAC S40X50	EJES A-C ENTRE EJES 1-6	3	34.43	0.40	0.05	0.69	0.014	18.00	1.81
BLOQUE B OAC S40X50	EJE D ENTRE EJES 1-5	1	28.43	0.40	0.05	0.57	0.0098	5.00	0.52
BLOQUE B OAC S40X50	EJES 1-5 ENTRE EJES A-D	5	16.78	0.40	0.05	0.34			1.68
BLOQUE B OAC S40X50	EJE 6 ENTRE EJES A-C	1	12.96	0.40	0.05	0.26			0.26
VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE C									
BLOQUE C OAC S40X50	EJE A -D ENTRE 1 Y 2	3	6.00	0.40	0.05	0.12			0.36
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 1-2 ENTRE A Y D	2	9.05	0.40	0.05	0.18			0.36
BLOQUE C OAC S40X50	EJE A ENTRE 2 Y 3	1	9.39	0.40	0.05	0.19			0.19
BLOQUE C OAC S40X60	EJE D ENTRE 2 Y 3	1	9.20	0.40	0.05	0.18			0.18
BLOQUE C OAC S40X60	EJE A -D ENTRE 3 Y 4	2	2.10	0.40	0.05	0.04			0.08
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 3-4 ENTRE B Y D	2	7.15	0.40	0.05	0.14			0.29
BLOQUE C OAC S40X60	EJE A ENTRE 3 Y 4	1	8.55	0.40	0.05	0.17			0.17
BLOQUE C OAC S40X60	EJE D ENTRE 3 Y 4	1	8.55	0.40	0.05	0.17			0.17
BLOQUE C OAC S40X50	EJE A -D ENTRE 5 Y 8	2	16.63	0.40	0.05	0.33			0.67
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 5-8 ENTRE B Y D	4	7.15	0.40	0.05	0.14			0.57
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 5 ENTRE B Y A	1	0.86	0.40	0.05	0.02			0.02
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 6 ENTRE B Y A	1	1.42	0.40	0.05	0.03			0.03
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 7 ENTRE B Y A	1	1.42	0.40	0.05	0.03			0.03
BLOQUE C OAC S30X50	EJE A ENTRE 6 Y 7	1	6.81	0.30	0.05	0.10			0.10
BLOQUE C OAC S20X50	EJE A ENTRE 5 Y 6	1	4.55	0.20	0.05	0.05			0.05
BLOQUE C OAC S20X50	EJE D AL EXTERIOR	1	5.30	0.20	0.05	0.05			0.05
BLOQUE C OAC S40X50	EJE 7 - 8 AL EXTERIOR	2	1.21	0.40	0.05	0.02			0.05
COLUMNAS DE 40X50							0.01	16.00	-0.16
COLUMNAS DE 30X30							0.0045	2.00	-0.01
COLUMNAS DE 70X40							0.014	2.00	-0.03
TOTALES:									7.44
ACUMULADO ANTERIOR:									20.53
ACUMULADO TOTAL:									27.97

ESQUEMA / FOTOGRAFÍA

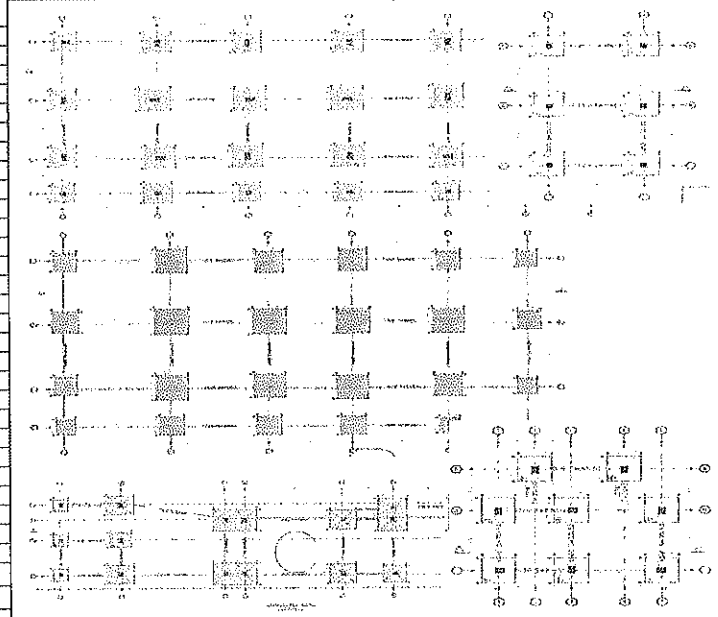

TIPO	DIMENSIONES (m) A	B	H (m)	REFUERZO Sentido A	Sentido B	CANT
6	1.50	1.50	0.30	10 #4 L=1.75 c/.15	10 #4 L=1.75 c/.15	8

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	29.83
DIFERENCIA:	1.86
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO SOLADOS 2500 PSI	ITEM: NP 2	UNIDAD M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 06 DE OCTUBRE 2023

CAPITULO: NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE D									
BLOQUE D OAC S30X50	EJES A, B Y C ENTRE 1-2	3	5.00	0.30	0.05	0.08			0.23
BLOQUE D OAC S30X50	EJES 1 Y 2 ENTRE A-C	2	9.06	0.30	0.05	0.14			0.27
COLUMNAS DE 30X30							0.0045	6.00	-0.03
ZAPATAS BLOQUE E									
BLOQUE D OAC ZAPATAS T6	A2, A4, B1, B3, B5, C1, C3, C5	8	1.50	1.50	0.05	0.11			0.90
VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE E									
BLOQUE E OAC S30X50	EJE A ENTRE 2 Y 4	1	4.26	0.30	0.05	0.06			0.06
BLOQUE E OAC S30X50	EJE B ENTRE 1 Y 5	1	7.55	0.30	0.05	0.11			0.11
BLOQUE E OAC S30X50	EJE C ENTRE 1 Y 5	1	7.55	0.30	0.05	0.11			0.11
BLOQUE E OAC S30X50	EJE 1,3,5 ENTRE B Y C	3	3.95	0.30	0.05	0.06			0.18
BLOQUE E OAC S30X50	EJE 2,4 ENTRE A Y B	2	2.52	0.30	0.05	0.04			0.08
COLUMNAS DE 30X40							0.006	8.00	-0.05
TOTALES:									1.87
ACUMULADO ANTERIOR:									27.97
ACUMULADO TOTAL:									29.83
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES:									-21.55
TOTAL PRESENTE ACTA:									8.28

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

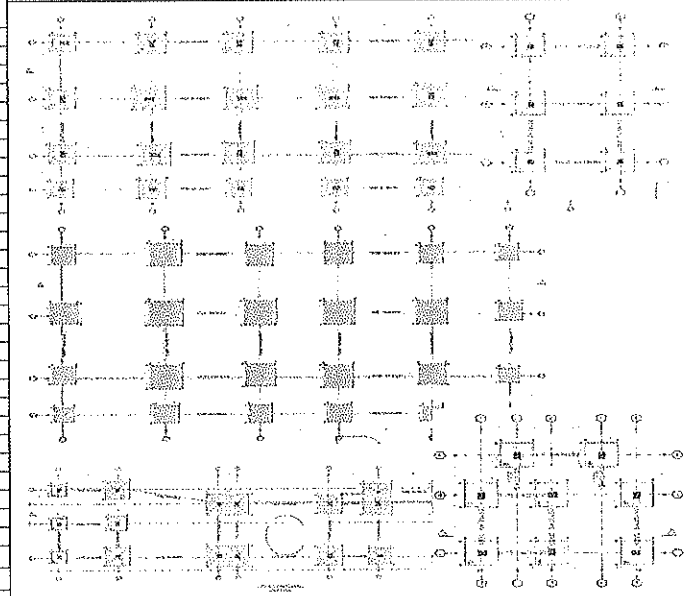

TIPO	DIMENSIONES (m) A	B	H (m)	REFUERZO Sentido A	Sentido B	CANT
6	1.50	1.50	0.30	10 #4 L=1.75 c/.15	10 #4 L=1.75 c/.15	8

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	29.83
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÒN	MALA ELECTROSOLDADA PARA PLACA CUBIERTA	ITEM: NP 4	UNIDAD: KG
CAPITULO: NO PREVISTOS		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 06 DE OCTUBRE 2023

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	AREA	KG/M2			PESO TOTAL KG
BLOQUE A	NIVEL 2 - EJES 1 - 2	1.0	17.17	7.53	129.29	4.07			526.33
	NIVEL 2 - EJES 4 - 5	1.0	17.17	7.80	133.93	4.07			545.20
	NIVEL 3 - EJES 2 - 3	1.0	17.17	8.06	138.39	4.07			563.38
	NIVEL 3 - EJES 5 - 7	1.0	17.17	12.39	212.74	4.07			866.03
	NIVEL 4 - EJES 3 - 4	1.0	17.17	8.06	138.39	4.07			563.38
					752.73				
	TRASLAPOS BLOQUE A								
	TRASLAPO LONGITUDINAL (0,50 X 6,00)	1.00	6.00	0.50	3.00				
	TRASLAPO TRANSVERSAL (0.50 X 2.35)	1.00	2.35	0.50	1.18				
	TOTAL AREA TRASLAPO POR MALLA (14,1 M2)				4.18				
	TRASLAPO POR 1 M2				0.30				
	TOTAL TRASLAPO BLOQUE A				222.86	4.07			907.34
TOTALES:									3971.66
ACUMULADO ANTERIOR:									0.00
ACUMULADO TOTAL:									3971.66

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

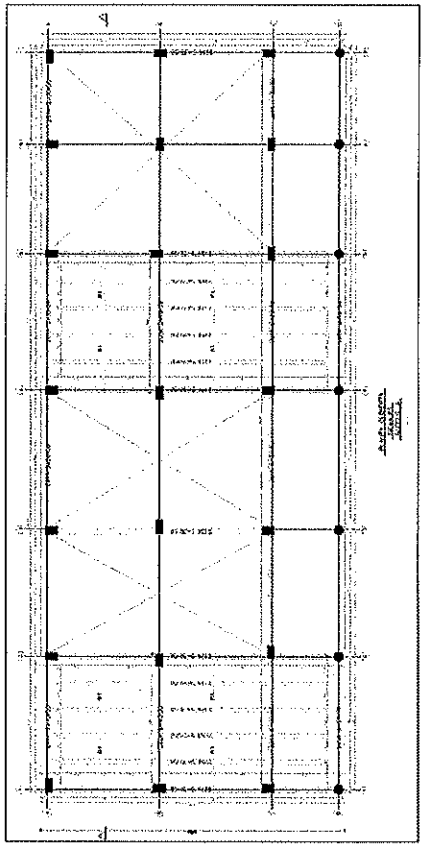

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	0.00
DIFERENCIA:	3971.66
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE I-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	MALA ELECTROSOLDADA PARA PLACA CUBIERTA	ITEM: NP 4	UNIDAD: KG
CAPITULO: NO PREVISTOS		FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 06 DE OCTUBRE 2023

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	DIMENSIONES A	AREA	KG/M2			PESO TOTAL KG
BLOQUE B	NIVEL 2 - EJES 3-4	1	17.17	7.23	124.14	4.07			505.36
	NIVEL 3 - EJES 5-6	1	14.13	6.30	89.02	4.07			362.39
	NIVEL 4 - EJES 2-3	1	17.17	8.30	142.51	4.07			580.15
	NIVEL 4 - EJES 4-5	1	17.17	9.12	156.59	4.07			637.47
	NIVEL 5 - EJES 1-2	1	17.17	10.18	174.79	4.07			711.56
					687.05				
	TRASLAPOS BLOQUE B								
	TRASLAPO LONGITUDINAL (0,50 X 6,00)	1.00	6.00	0.50	3.00				
	TRASLAPO TRANSVERSAL (0.50 X 2.35)	1.00	2.35	0.50	1.18				
	TOTAL AREA TRASLAPO POR MALLA (14,1 M2)				4.18				
	TRASLAPO POR 1 M2				0.30				
	TOTAL TRASLAPO BLOQUE B				203.44	4.07			828.17
TOTALES:									3625.10
ACUMULADO ANTERIOR:									3971.66
ACUMULADO TOTAL:									7596.75

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

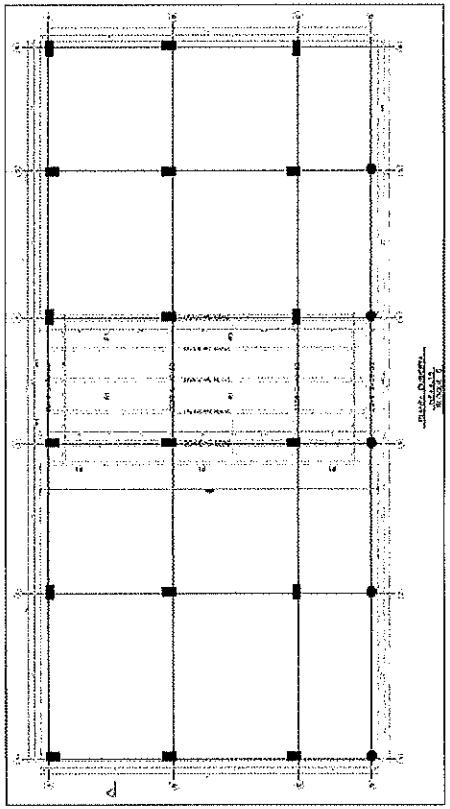

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	10420.00
DIFERENCIA:	2823.25
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	MALA ELECTROSOLDADA PARA PLACA CUBIERTA	ITEM:	NP 4 — UNIDAD: KG
CAPITULO:	NO PREVISTOS	FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DEL 2022 — FECHA FINAL: 19 DE MAYO DE 2023

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	DIMENSIONES A	AREA	KG/M2			PESO TOTAL KG
BLOQUE C	NIVEL 2 - EJES 1-2	1	11.05	8.03	88.73	4.07			361.22
	NIVEL 3 - EJES 2-5	1	11.05	20.80	229.84	4.07			935.66
	NIVEL 3 - EJES 5-6	1	4.70	3.34	15.70	4.07			63.91
	NIVEL 4 - EJES 6-7	1	6.73	2.84	19.11	4.07			77.81
	NIVEL 4 - EJES 7-8	1	8.21	5.80	47.62	4.07			193.85
	NIVEL 5 - EJES 5-7	1	8.21	11.98	98.36	4.07			400.40
					499.36				
	TRASLAPOS BLOQUE C								
	TRASLAPO LONGITUDINAL (0,50 X 6,00)	1.00	6.00	0.50	3.00				
	TRASLAPO TRANSVERSAL (0.50 X 2.35)	1.00	2.35	0.50	1.18				
	TOTAL AREA TRASLAPO POR MALLA (14,1 M2)				4.18				
	TRASLAPO POR 1 M2				0.30				
	TOTAL TRASLAPO BLOQUE C				147.86	4.07			601.92
TOTALES:									2634.76
ACUMULADO ANTERIOR:									7596.75
ACUMULADO TOTAL:									10231.52

ESQUEMA / FOTOGRAFIA



RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	0.00
DIFERENCIA:	10231.52
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	MALA ELECTROSOLDADA PARA PLACA CUBIERTA	ITEM: NP 4	UNIDAD: KG
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 19 DE MAYO DE 2023

CAPITULO: NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	DIMENSIONES A	AREA	KG/M2			PESO TOTAL KG
BLOQUE D	NIVEL 2 - EJES 1-2	1	11.05	7.00	77.35	4.07			314.89
BLOQUE E	NIVEL 2 - EJES 1-5 Y B-C	1	4.83	7.55	36.47	4.07			148.45
	NIVEL 2 - EJES 2-4 Y B-A	1	2.56	4.26	10.91	4.07			44.40
					124.72				
	TRASLAPOS BLOQUE D Y E								
	TRASLAPO LONGITUDINAL (0,50 X 6,00)	1.00	6.00	0.50	3.00				
	TRASLAPO TRANSVERSAL (0.50 X 2.35)	1.00	2.35	0.50	1.18				
	TOTAL AREA TRASLAPO POR MALLA (14,1 M2)				4.18				
	TRASLAPO POR 1 M2				0.30				
	TOTAL TRASLAPO BLOQUE D Y E				36.93	4.07			150.34
TOTALES PRESENTE HOJA:									658.07
ACUMULADO HOJA ANTERIOR:									10231.52
ACUMULADO TOTAL:									10889.59
COBRADO ACTAS ANTERIORES									7573.18
PRESENTE ACTA PARCIAL									3316.41

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

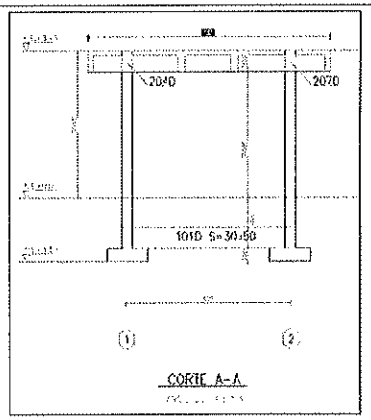

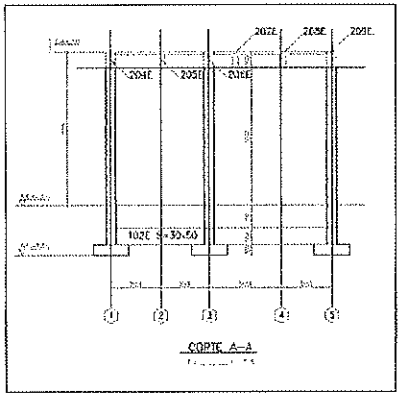

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	0.00
DIFERENCIA:	3316.41
PORCENTAJE:	0.00%


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA


Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


BLOQUE A

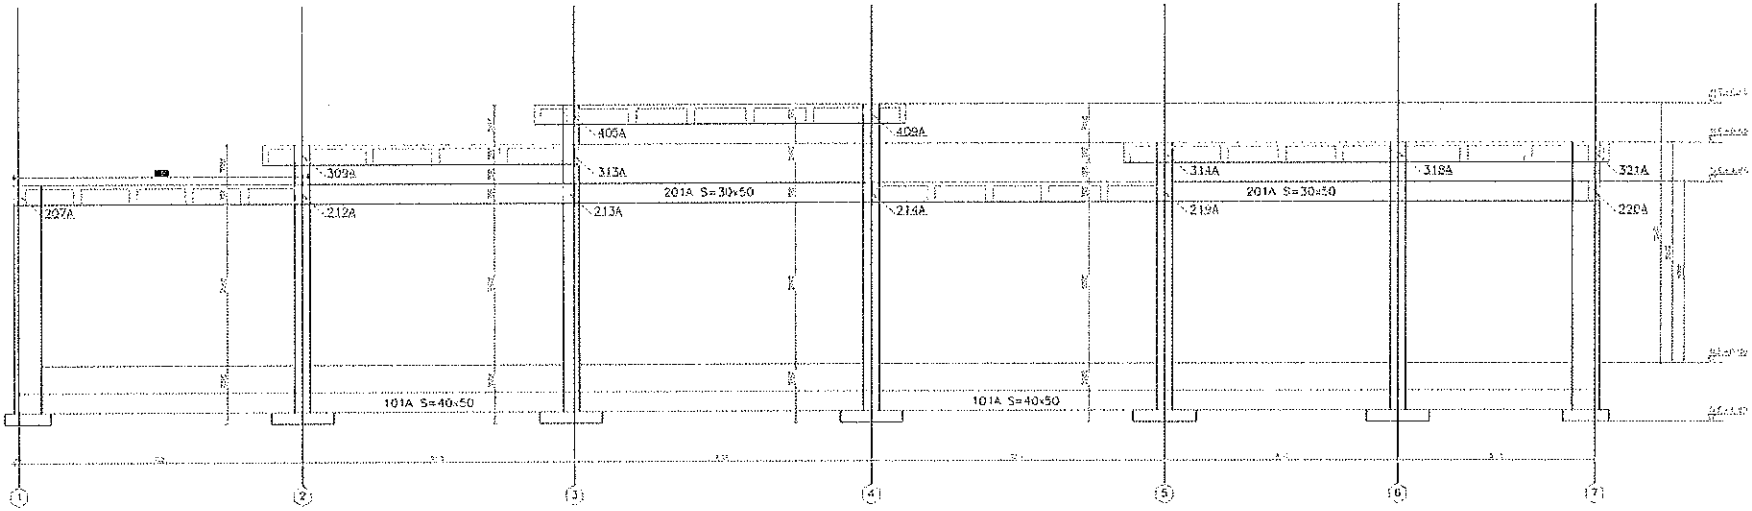


CORTE A-A

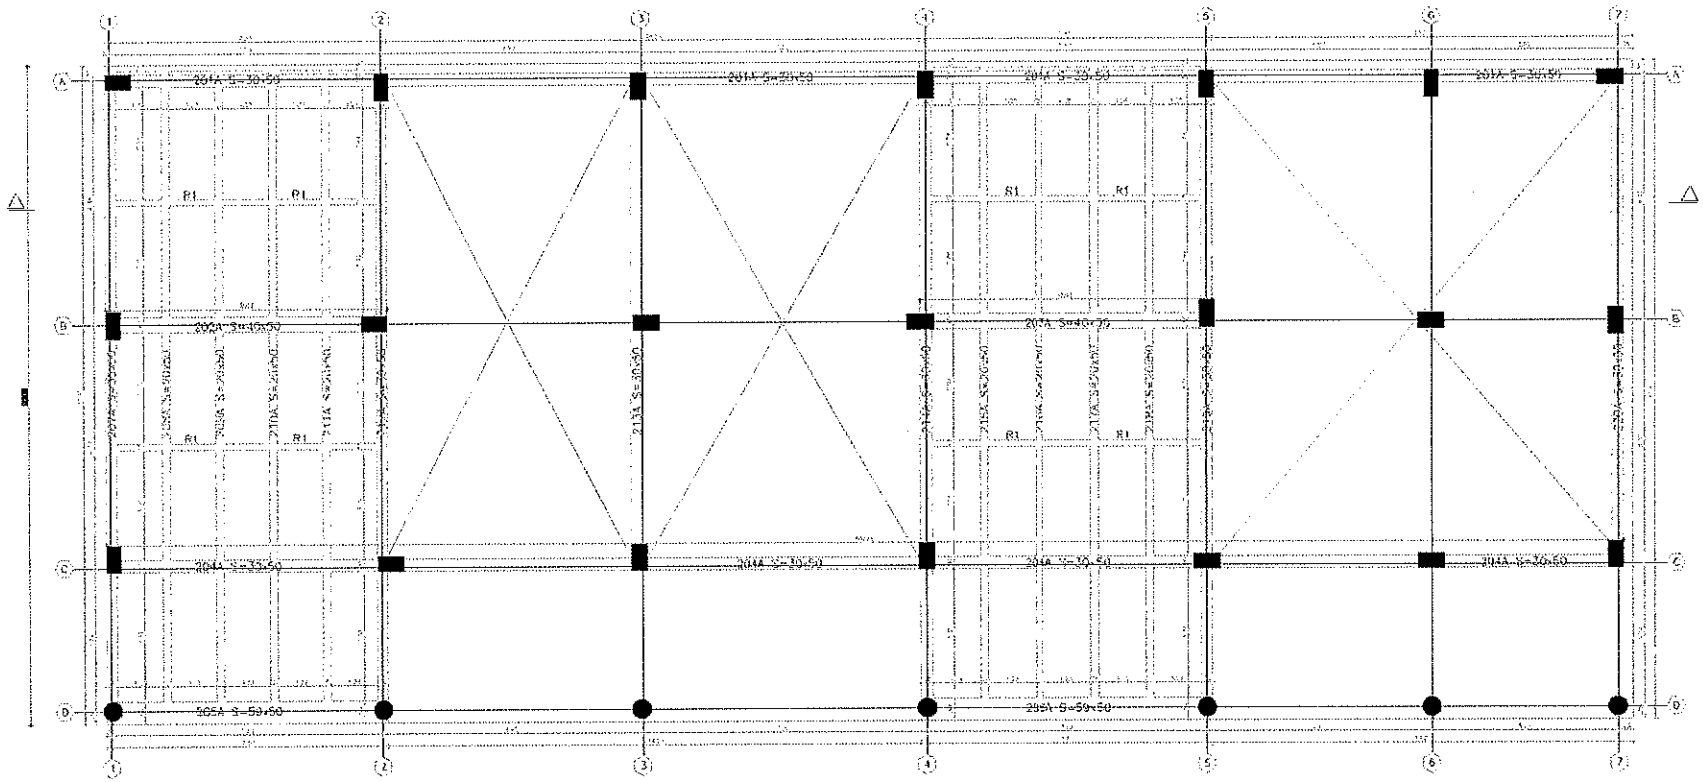

PLANTA CUBIERTA
NF+4.65
BLOQUE A

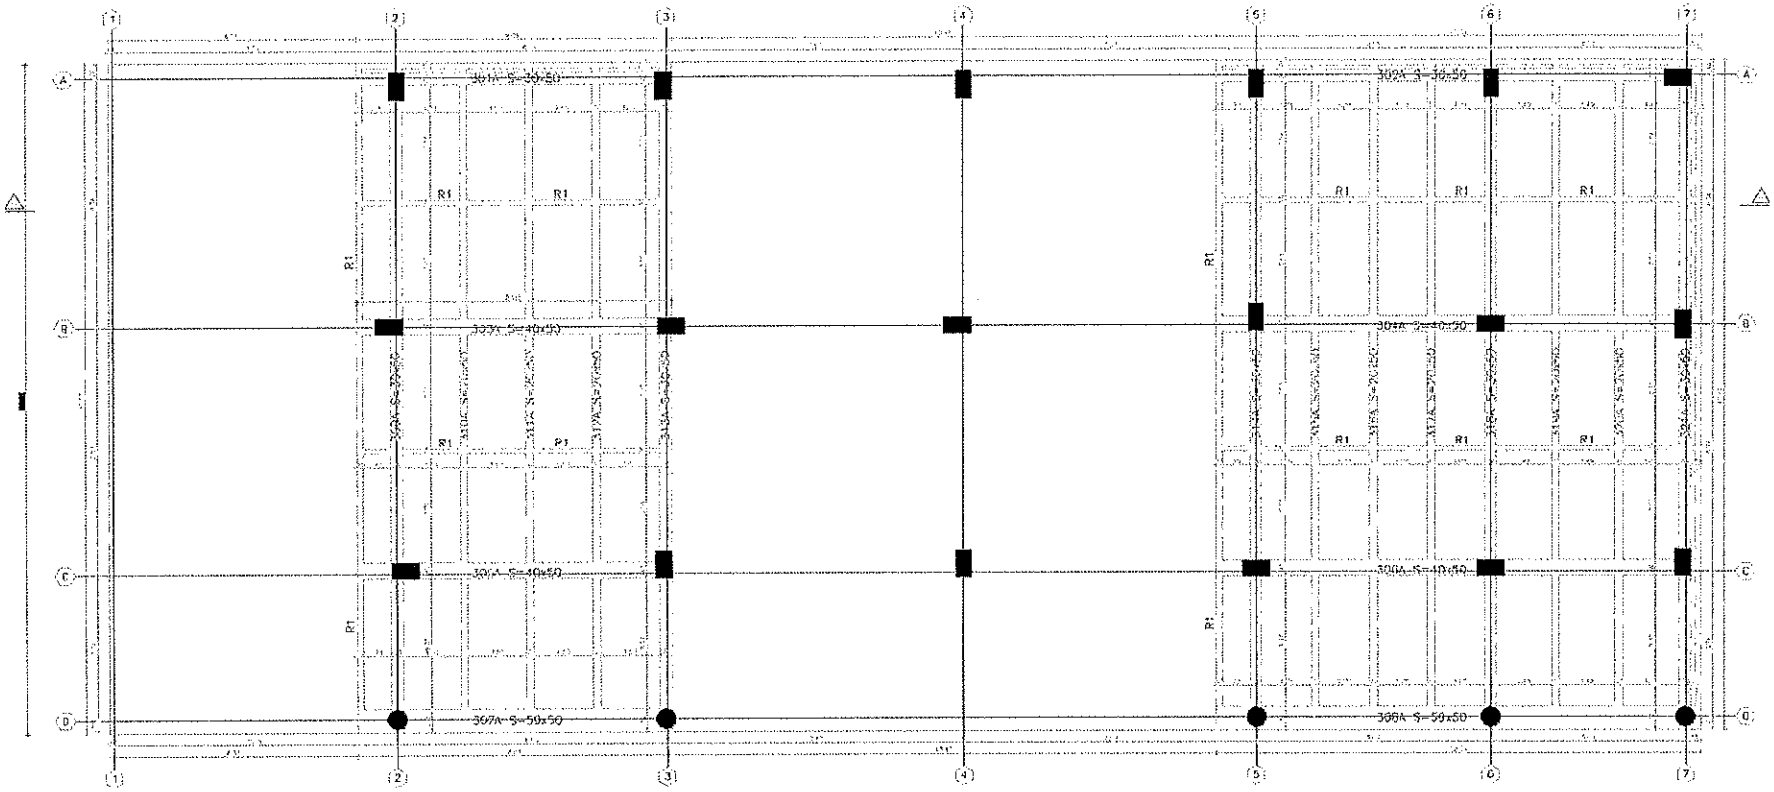


PLANTA CUBIERTA
NE+5.65
BLOQUE A

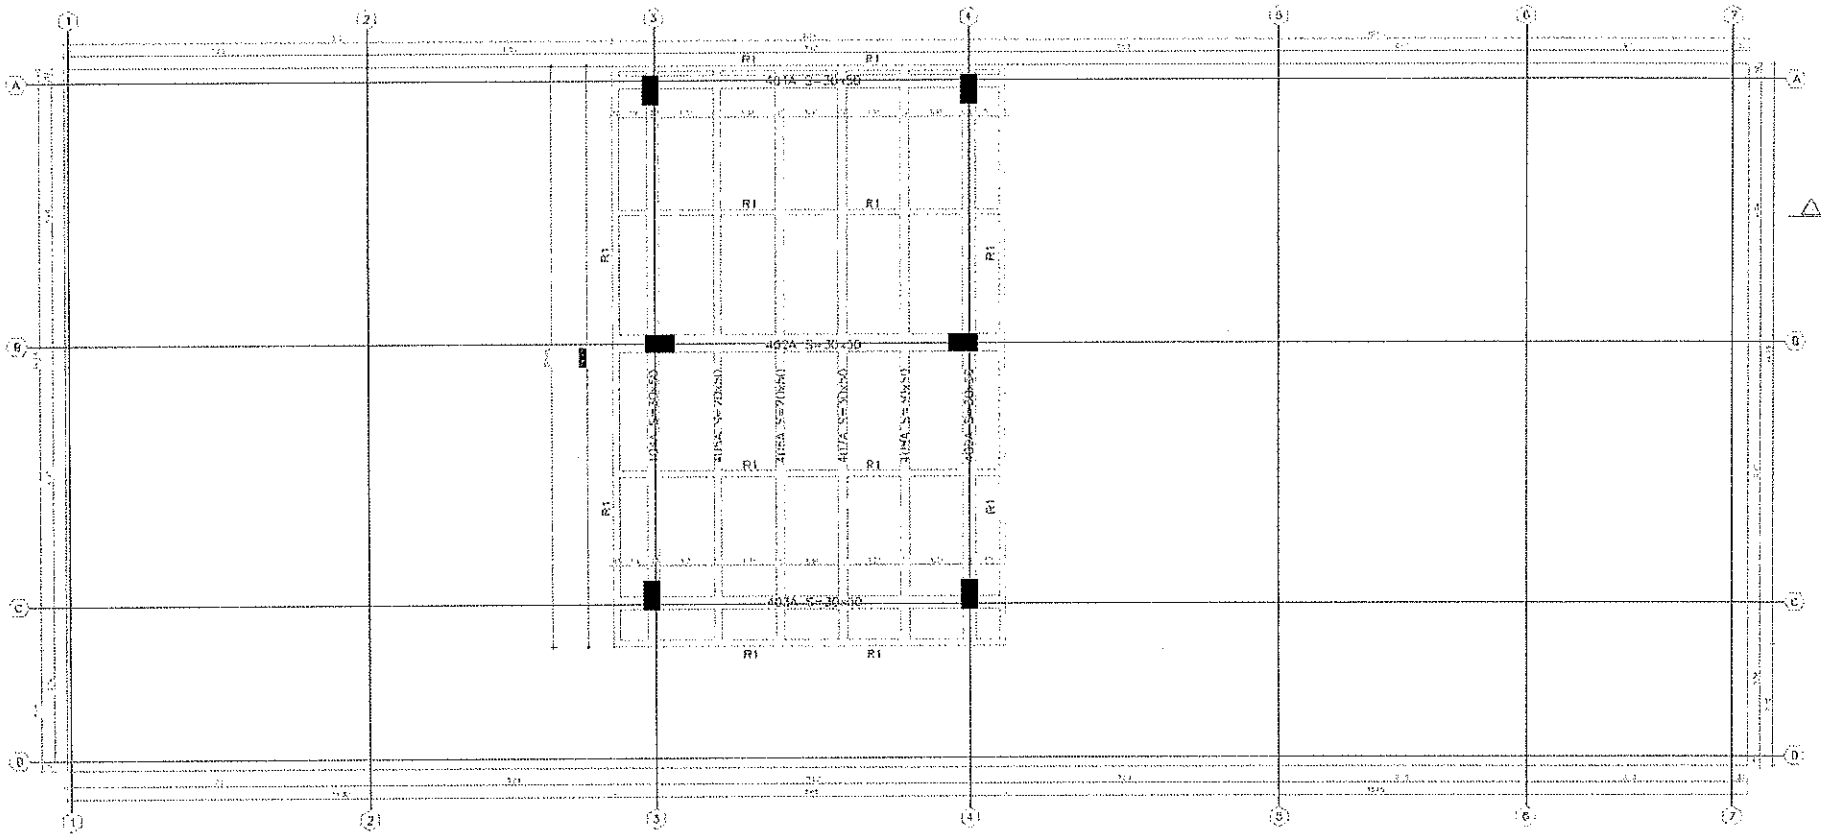


PLANTA CUBIERTA
NE+6.65
BLOQUE A


BLOQUE B

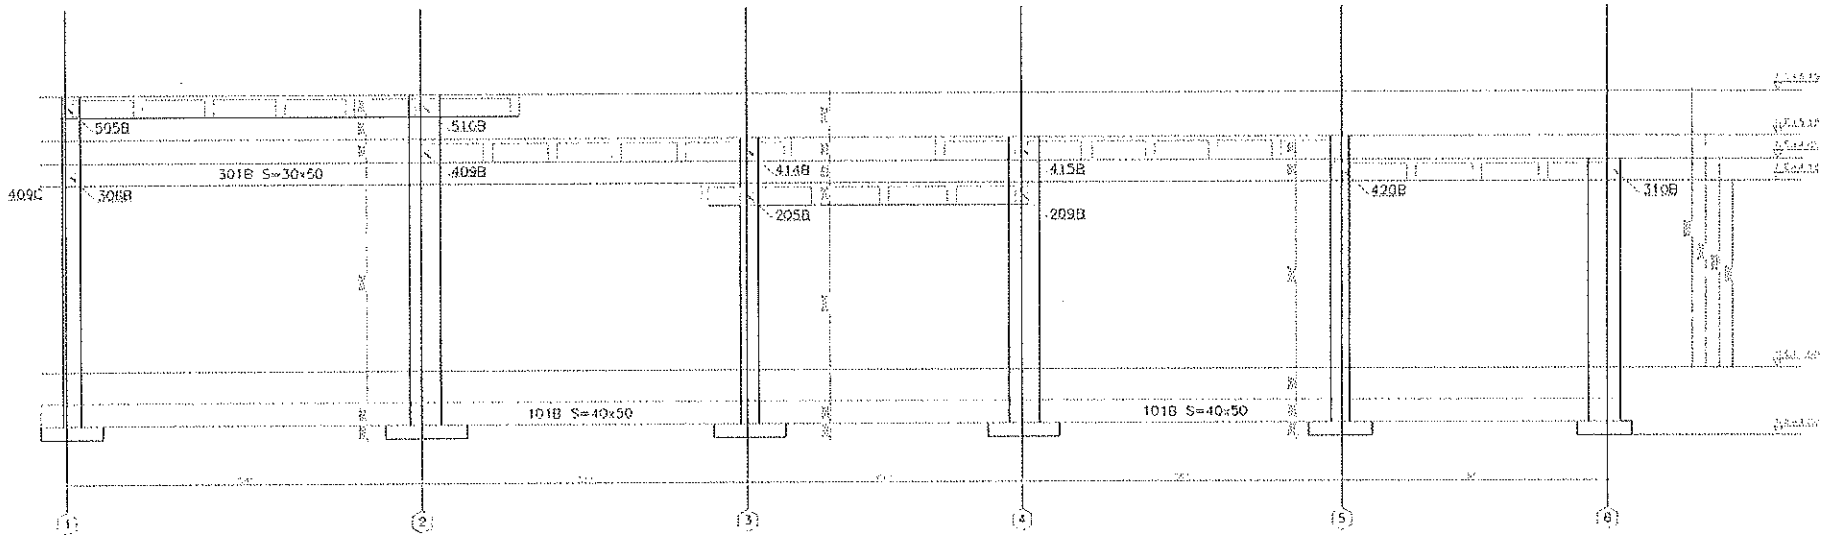


CORTE A–A

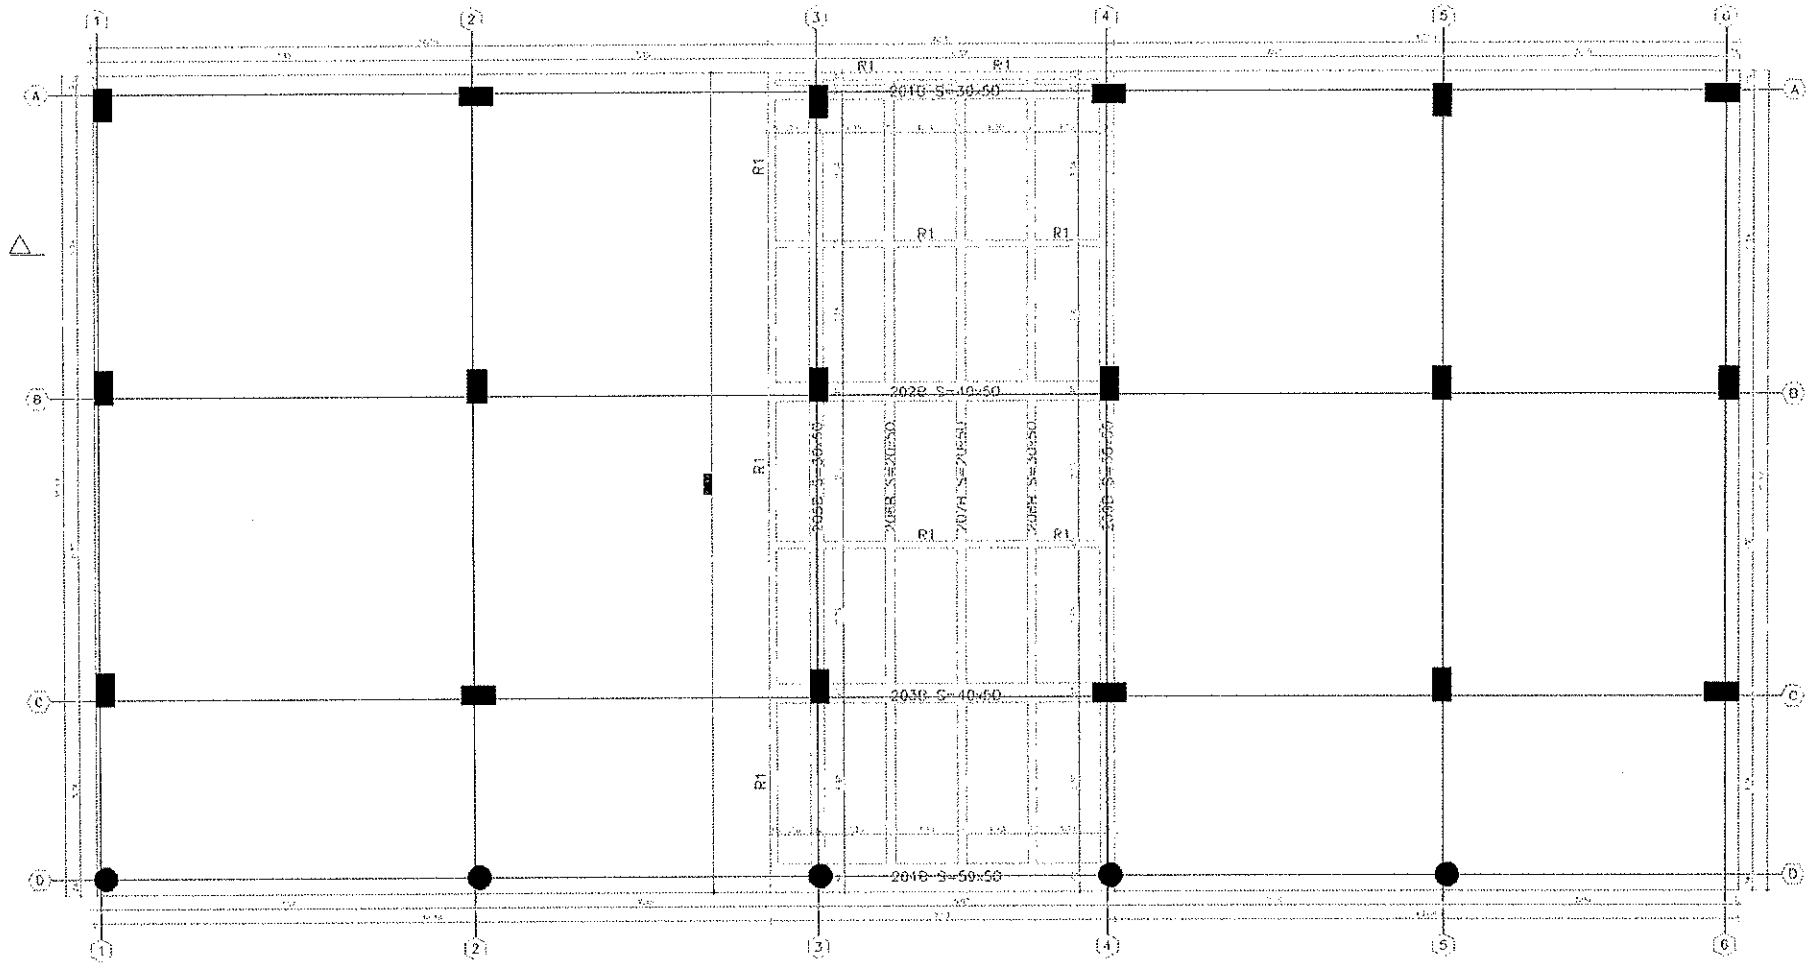


PLANTA CUBIERTA
NE+4.15
BLOQUE B

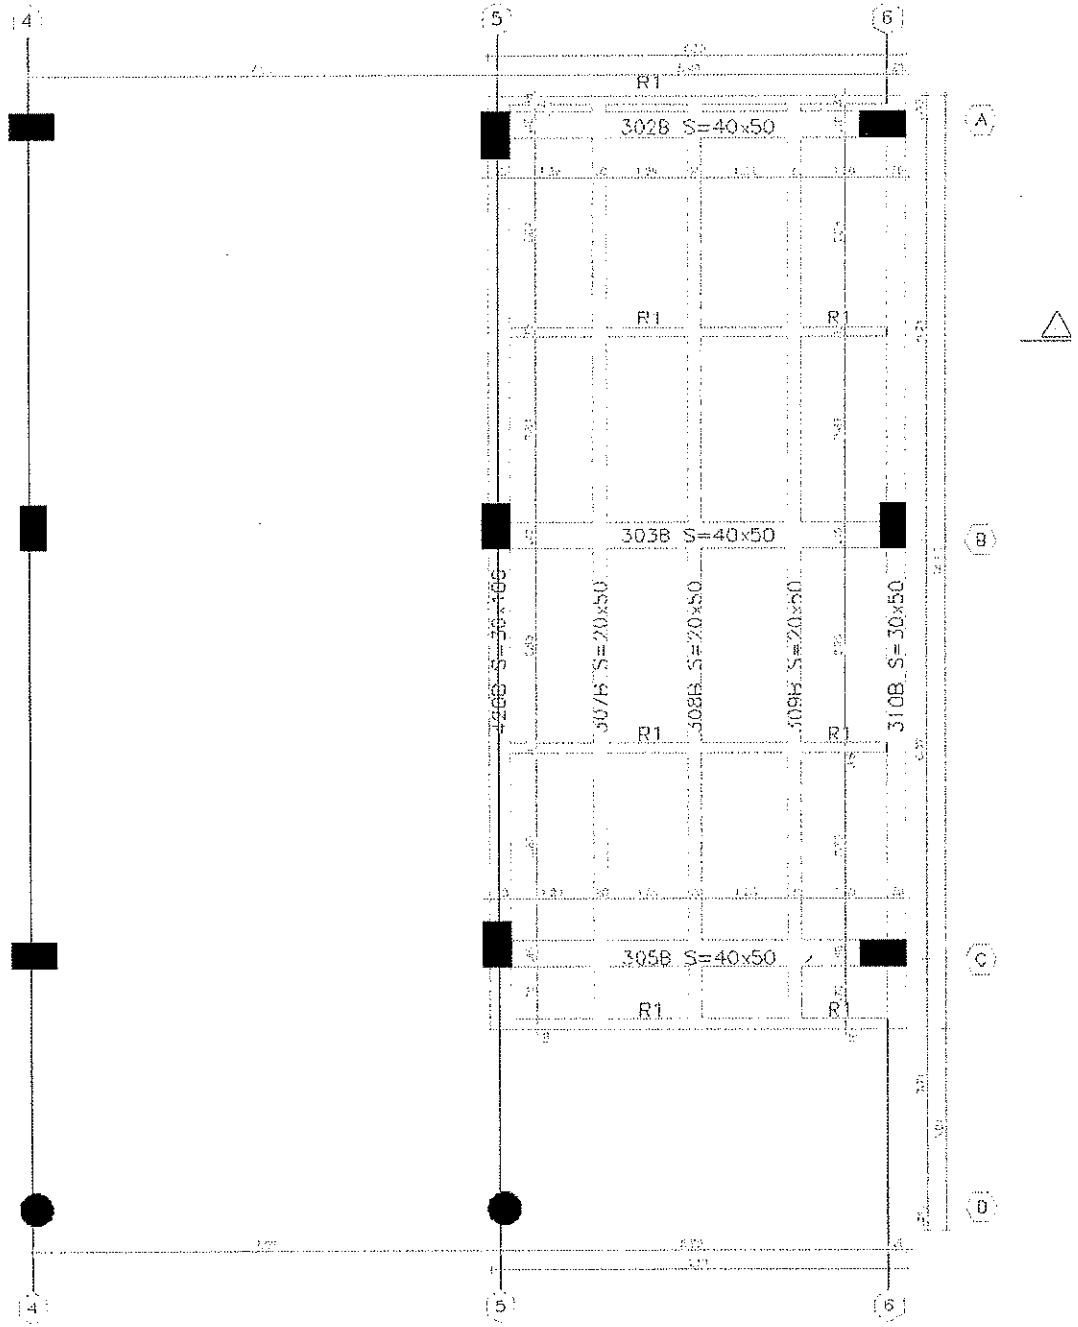
4
5
6
A
B
C
D
R1
302B S=40x50
303B S=40x50
305B S=40x50
310B S=30x50
306B S=20x50
308B S=20x50
309B S=20x50

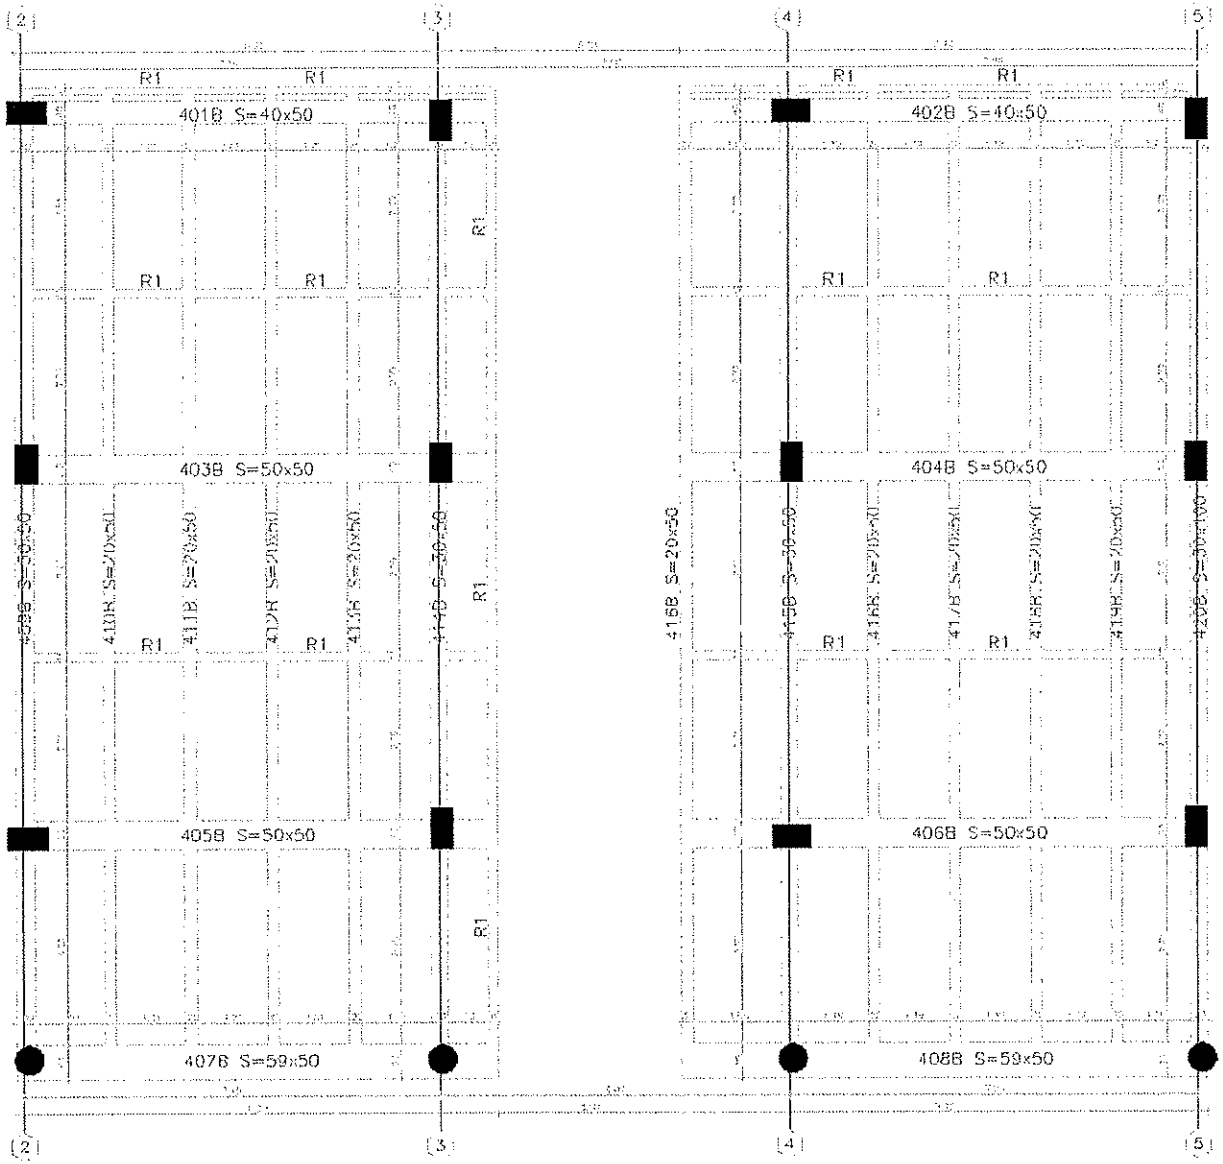


PLANTA CUBIERTA
NE+5.15
BLOQUE B

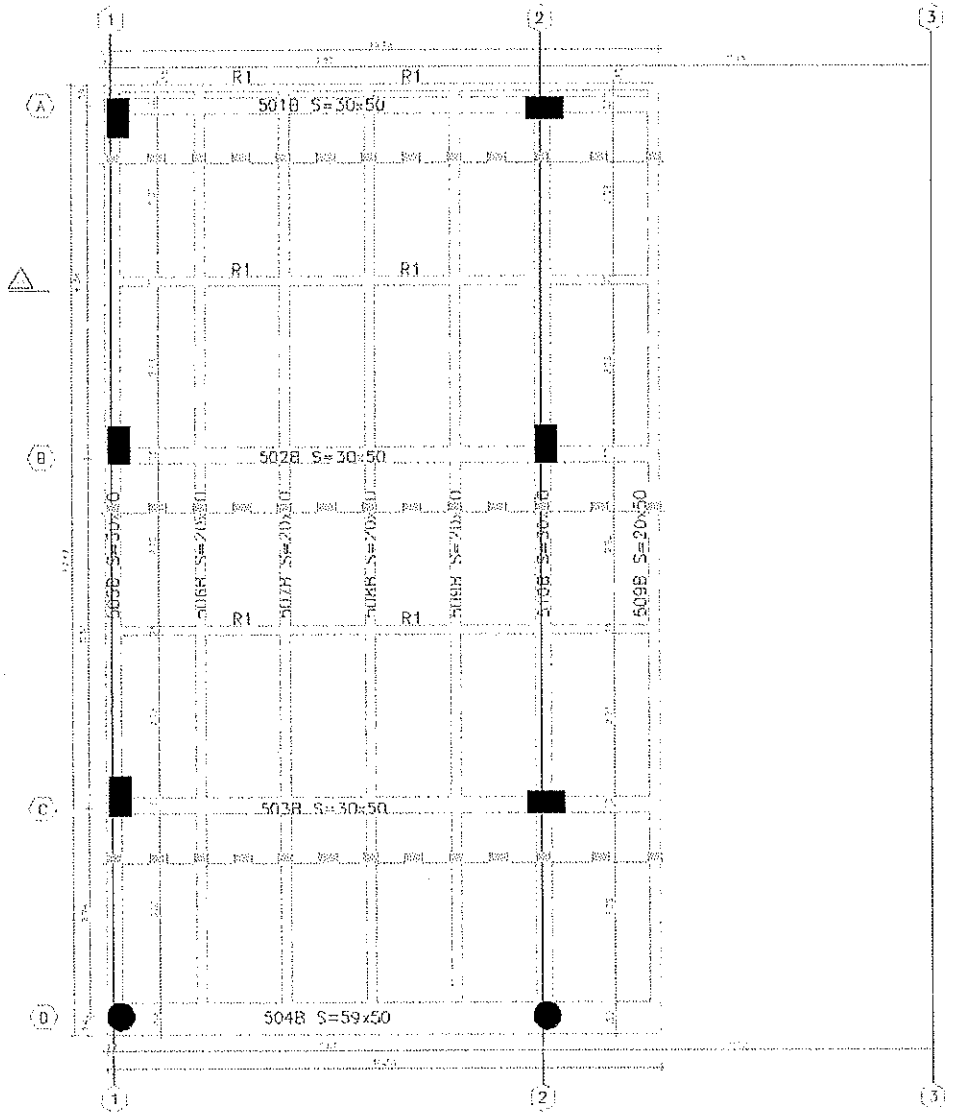


PLANTA CUBIERTA
NE+6.15
BLOQUE B


BLOQUE C

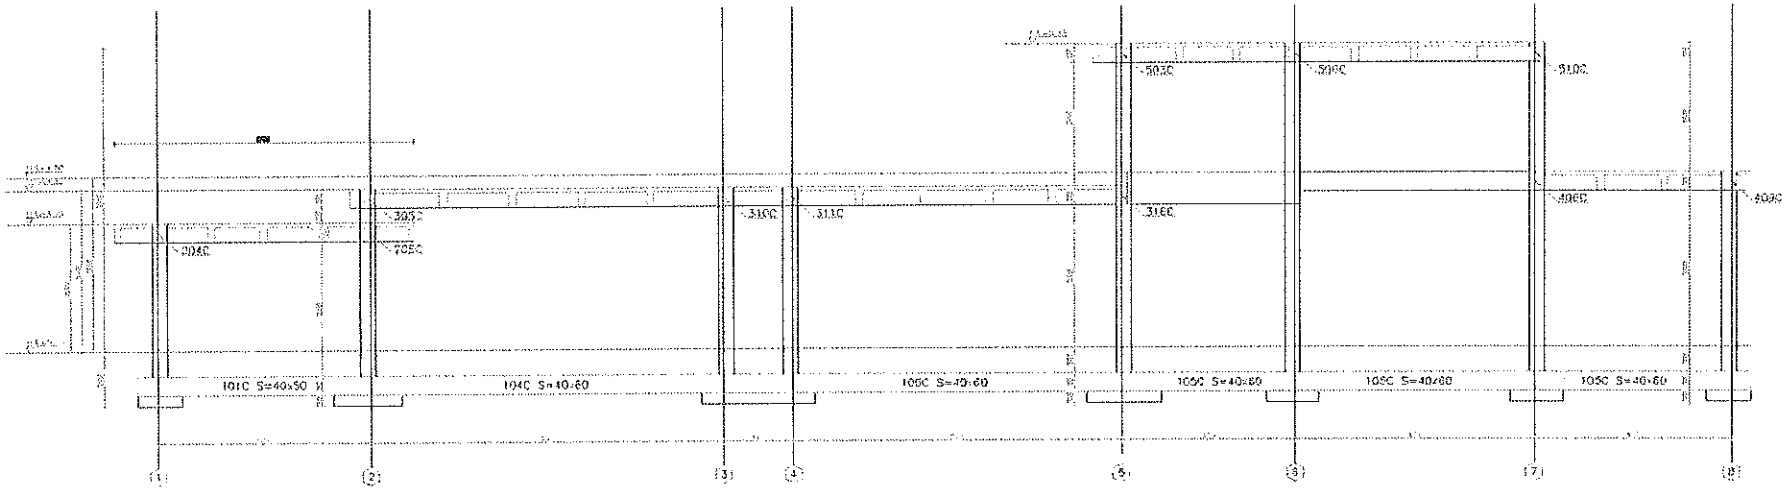


CORTE A-A

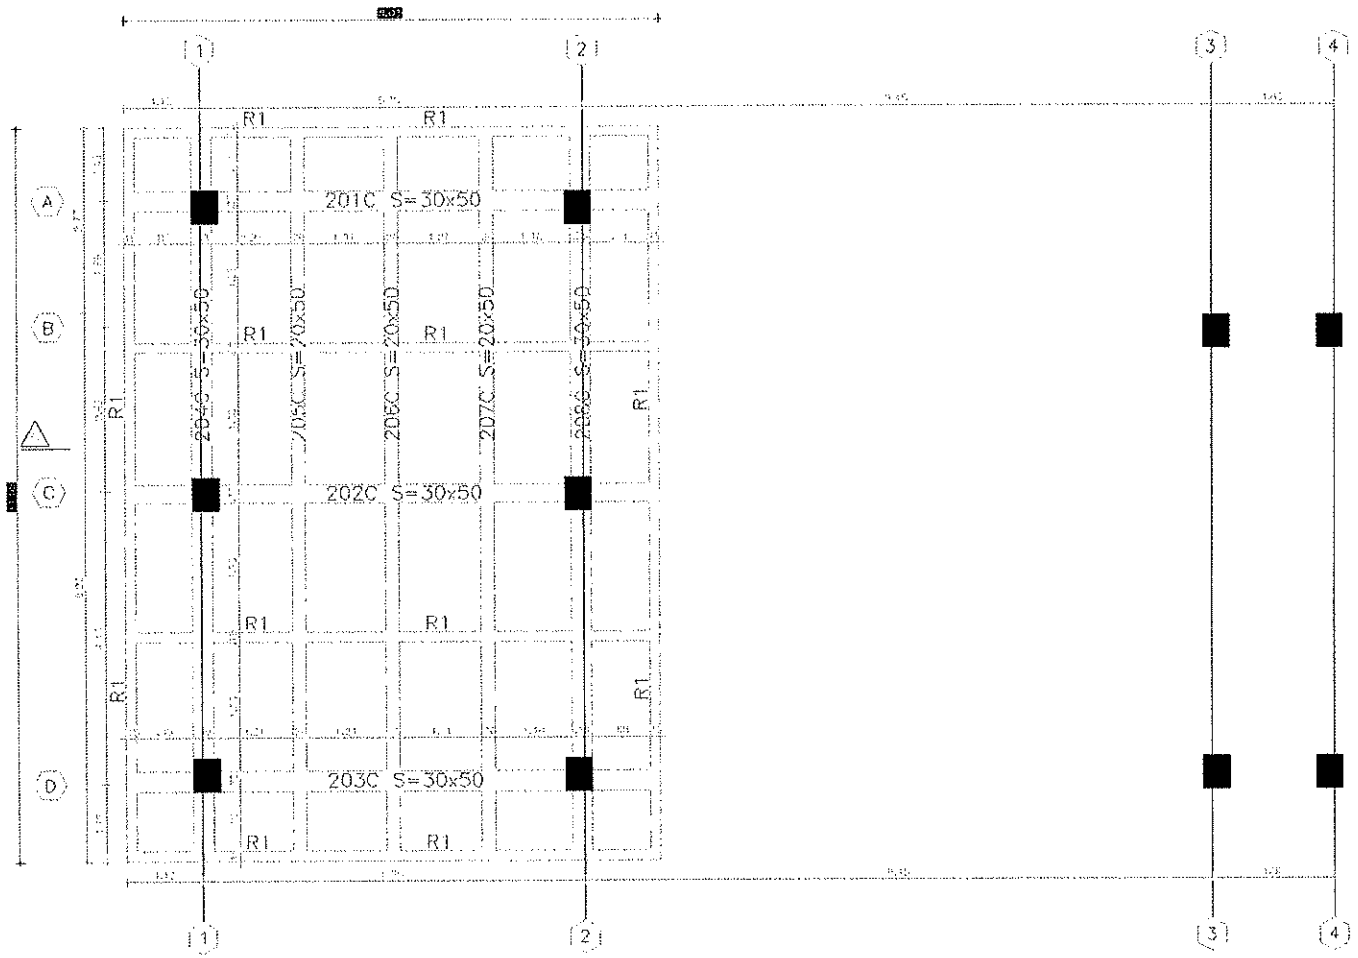


PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+3.45

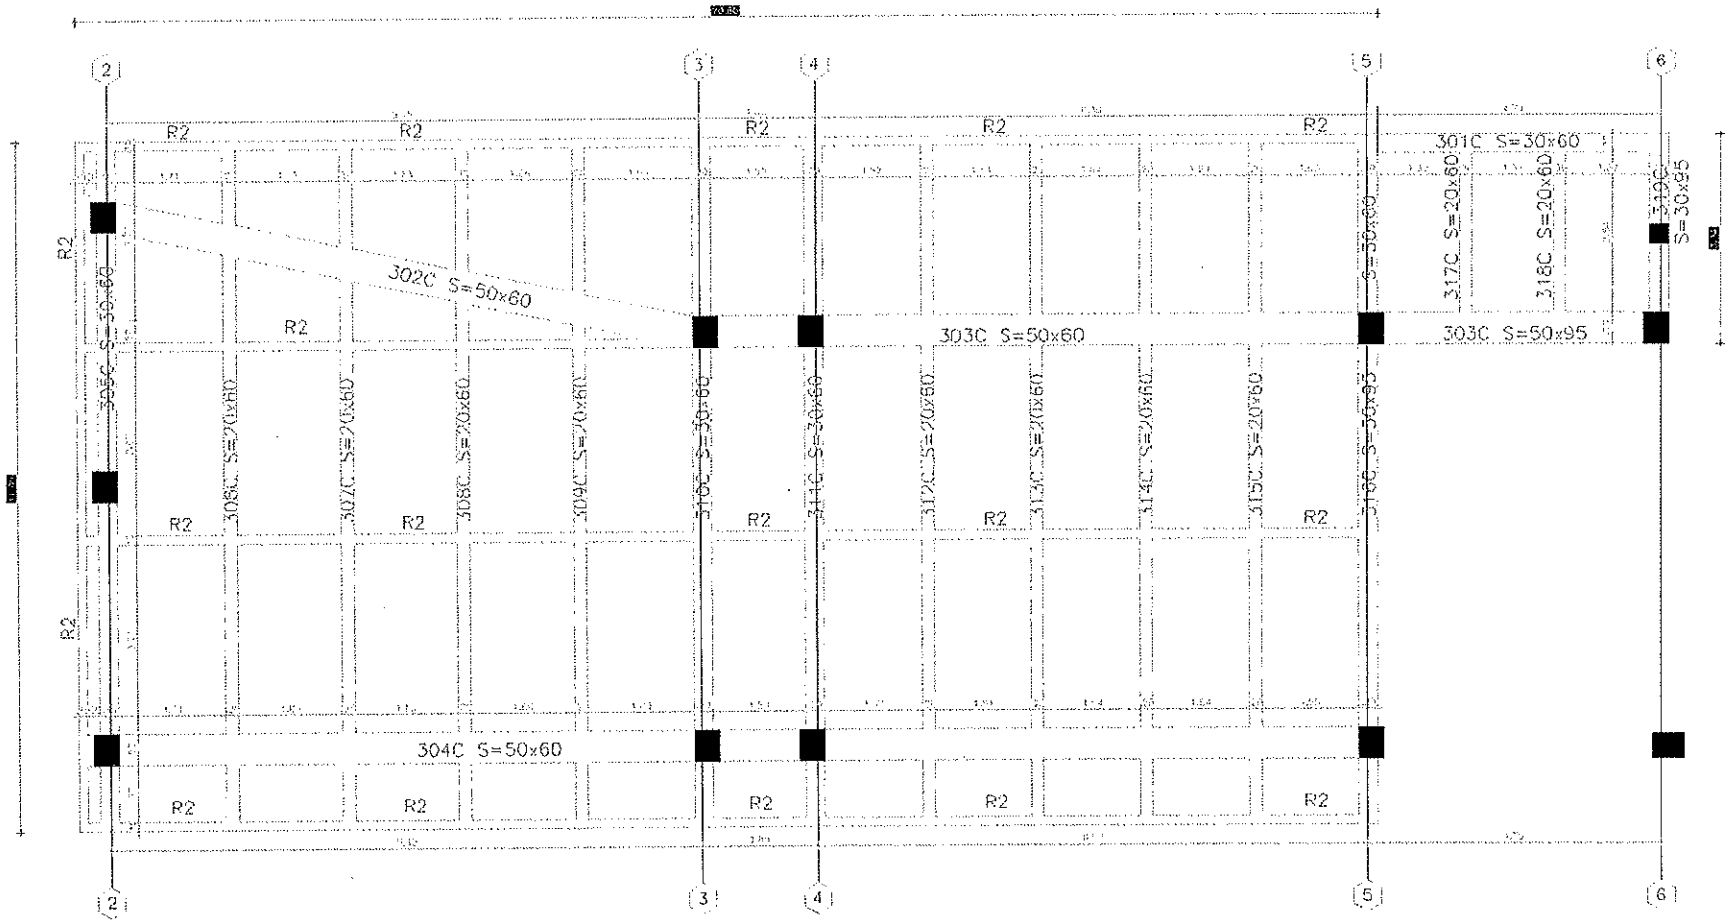

PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+4.35

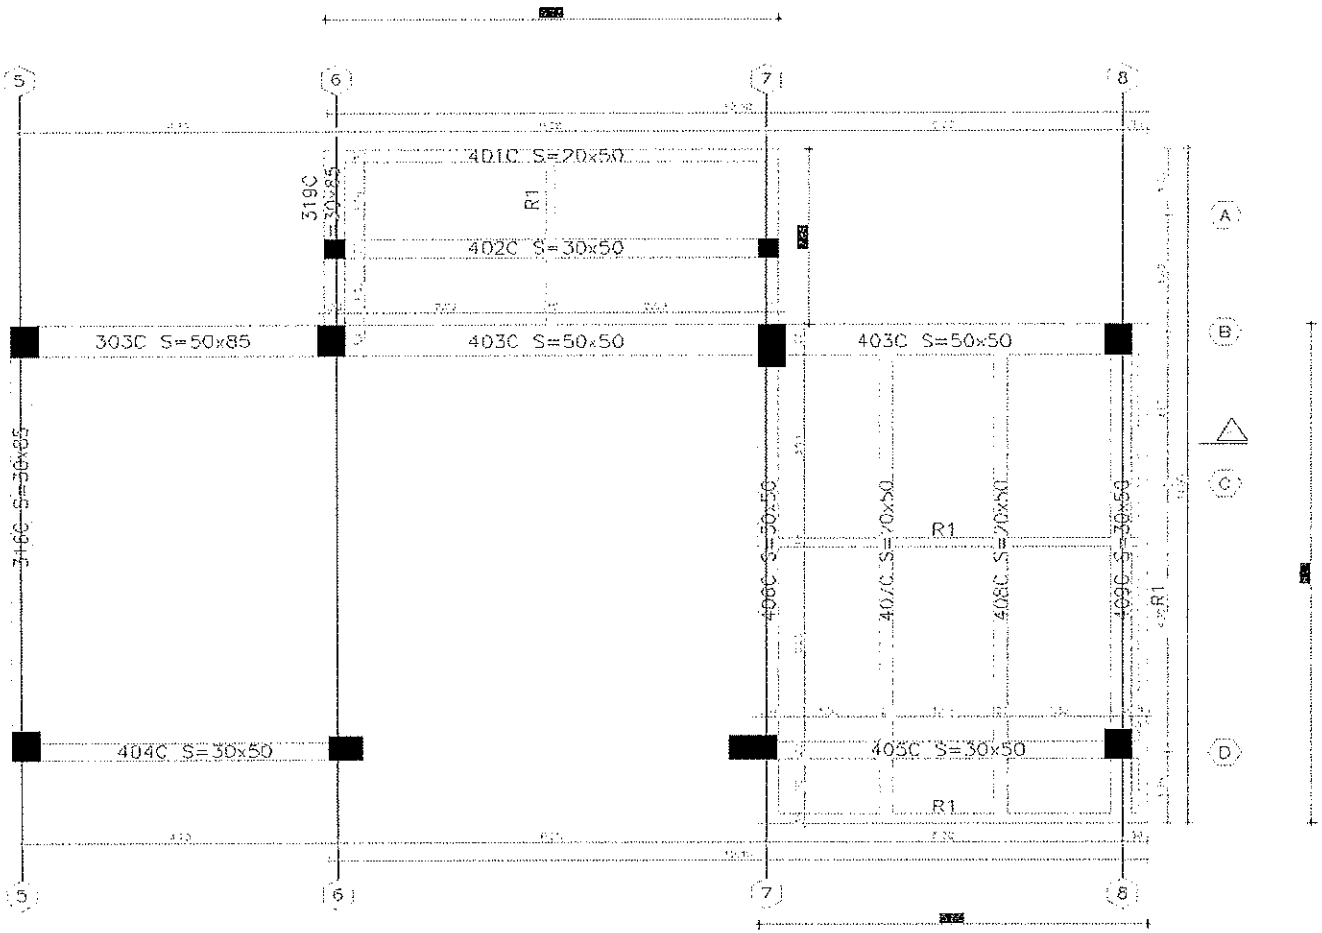


PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+4.70

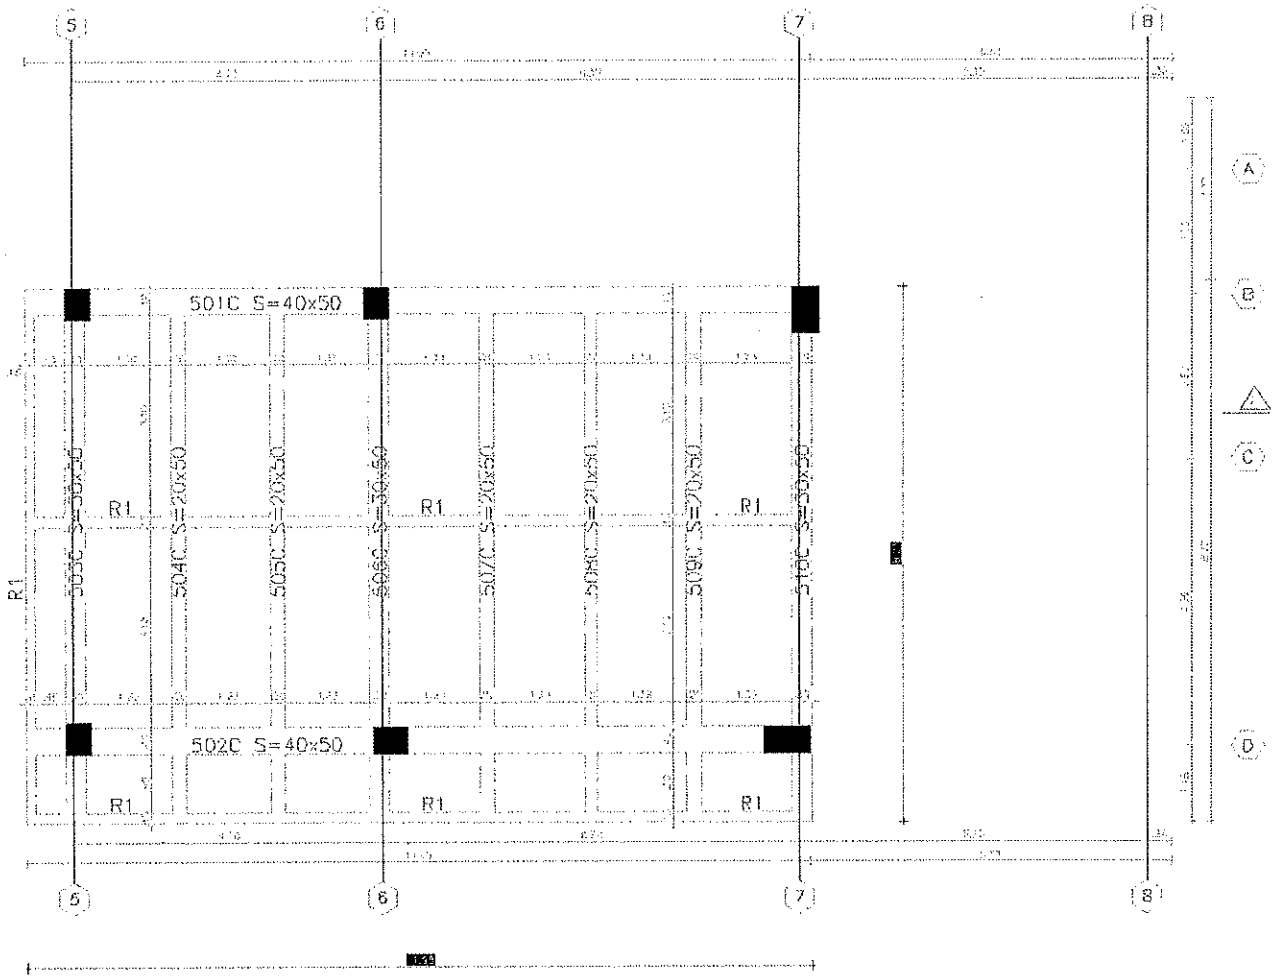


PLANTA CUBIERTA
BLOQUE C
NE+8.15

BLOQUE D

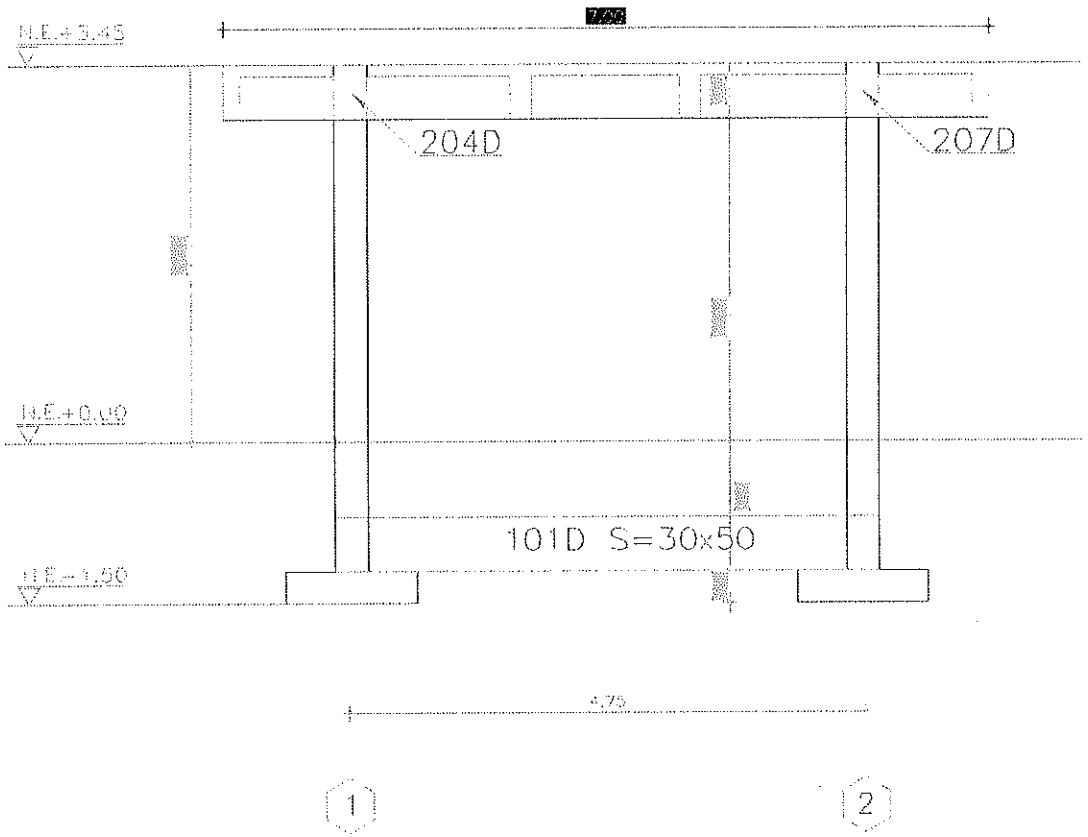


CORTE A—A

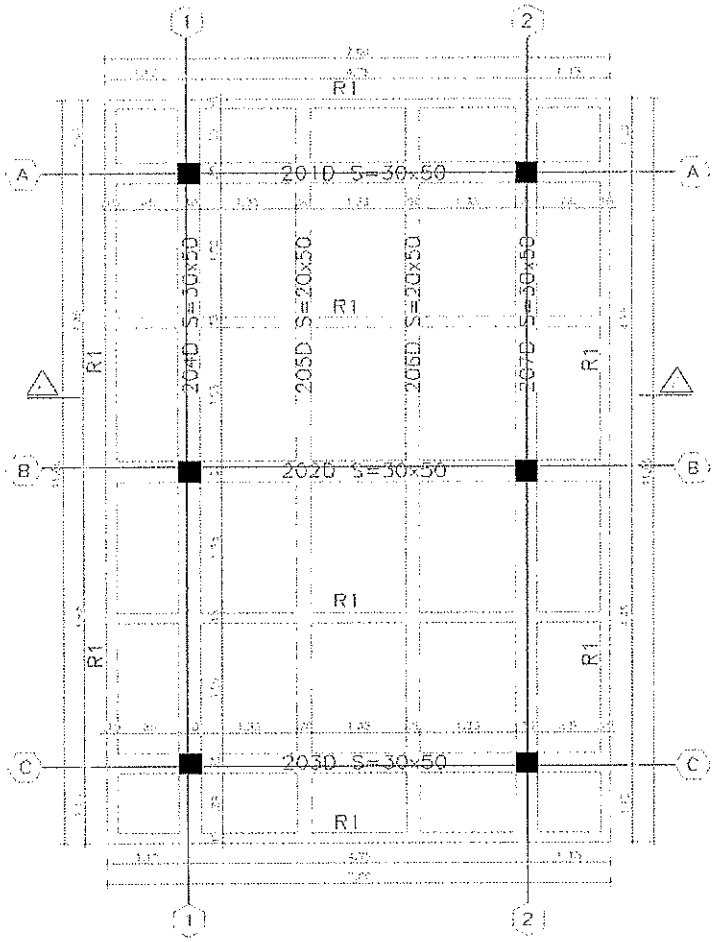


PLANTA CUBIERTA
NE+3.45
BLOQUE D

BLOQUE E

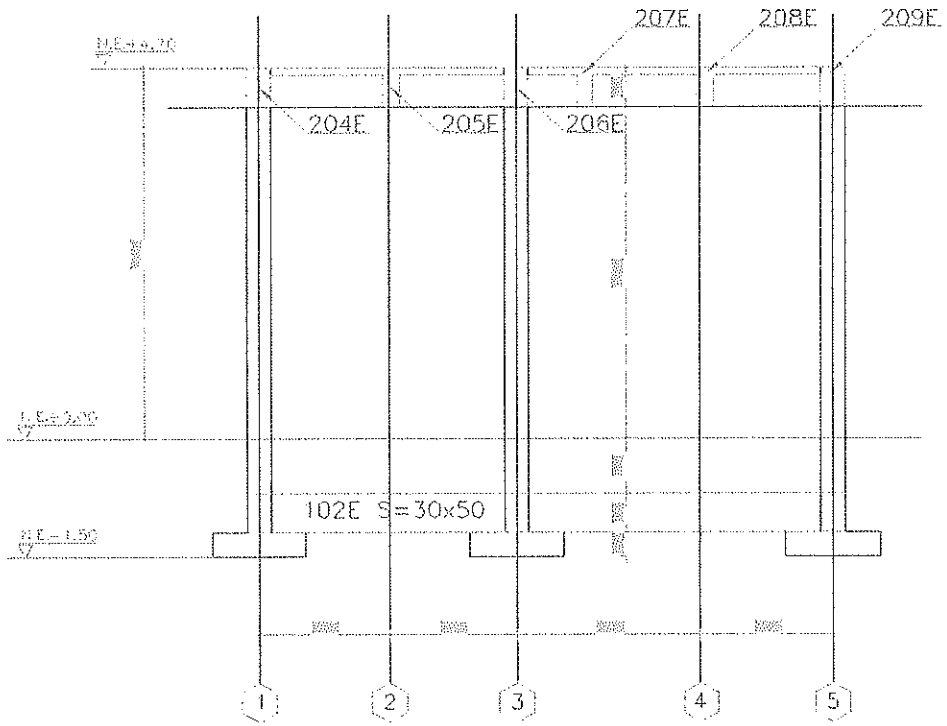

CORTE A–A

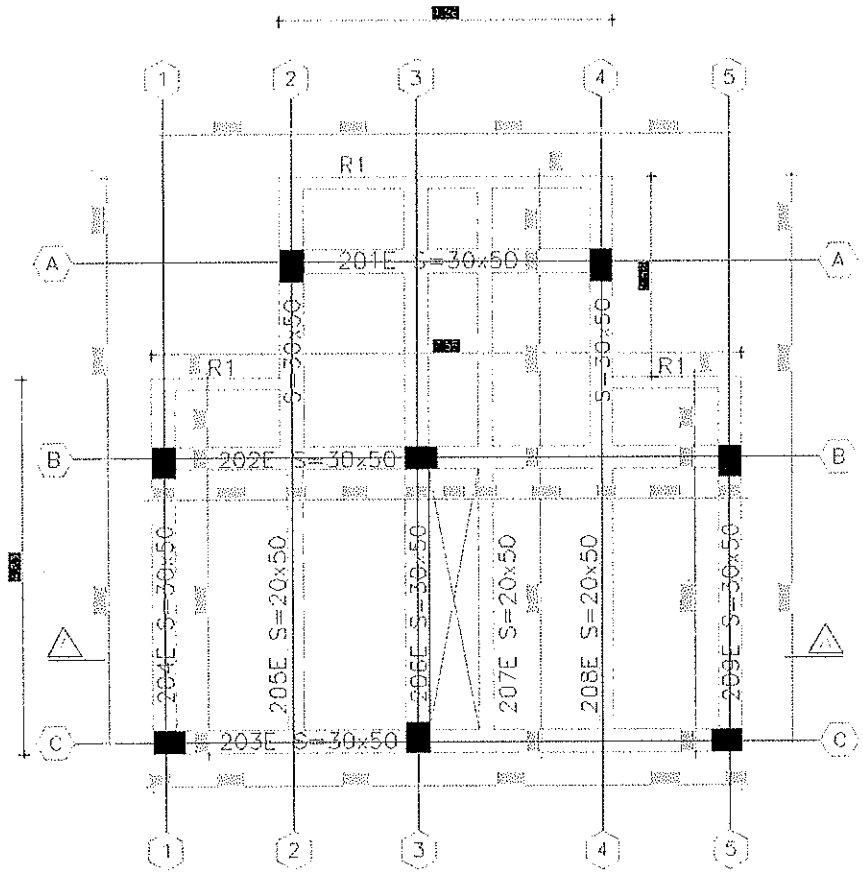

PLANTA CUBIERTA

NE+4.70

BLOQUE E

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE RELLENO MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3"	ITEM: NP 5	UNIDAD: M3

CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Espesor (m)	TOTAL ML
		EDIFICIO OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE						
OAC		VIA DE ACCESO A PTAR Y POZO PROFUNDO	1.00	300.00	6.00		0.25	450.00
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								450.00
ACUMUDADO ANTERIOR								332.50
ACUMULADO TOTAL:								782.50

ESQUEMA / FOTOGRAFIA





RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	1052.50
DIFERENCIA:	270.00
PORCENTAJE:	74.35%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 08-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI	ITEM: NP 6	UNIDAD: M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5/12/2023

CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN			VOLUMEN TOTAL
ZAPATAS BLOQUE C									
BLOQUE C OAC ZAPATAS T7	B3Y4, C3Y4, AB6,AB7	4	2.7	1.30	0.40	1.40			0.00
VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE D									
BLOQUE D OAC S30X50	EJES A, B Y C ENTRE 1-2	3	4.75	0.30	0.50	2.14			0.00
BLOQUE D OAC S30X50	EJES 1 Y 2 ENTRE A-C	2	9.05	0.30	0.50	2.72			5.43
DESCUENTO COLUMNAS		6	0.30	0.30	0.50	-0.27			-1.62
TOTALES PRESENTE ACTA:									3.81
ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES									276.49
ACUMULADO TOTAL:									280.30

ESQUEMA / FOTOGRAFIA





RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	281.88
DIFERENCIA:	1.58
PORCENTAJE:	0.56%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM: NP 7	UNIDAD M3
CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5/12/2023

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
COLUMNAS BLOQUE A									
BLOQUE A	EJE 1 ENTRE EJES A-C	3	0.70	0.40	5.85	1.64			0.00
BLOQUE A	EJE 2,5,6 Y 7 ENTRE EJES A-C	12	0.70	0.40	6.85	1.92			0.00
BLOQUE A	EJES 3 Y 4 ENTRE EJES A-C	6	0.70	0.40	7.85	2.20			0.00
COLUMNAS BLOQUE B									
BLOQUE B	EJE 1 Y 2 ENTRE EJES A-C	6	0.70	0.40	7.35	2.06			0.00
BLOQUE B	EJE 3, 4 Y 5 ENTRE EJES A-C	9	0.70	0.40	6.35	1.78			0.00
BLOQUE B	EJE 6 ENTRE EJES A-C	3	0.70	0.40	5.85	1.64			0.00
COLUMNAS BLOQUE C									
BLOQUE C	EJE 1A, 1C Y 1D	3	0.50	0.40	4.65	0.93			0.00
BLOQUE C	EJE 2A, 2C Y 2D	3	0.50	0.40	5.55	1.11			0.00
BLOQUE C	EJES 3B, 4B, 3D Y 3D	4	0.50	0.40	5.55	1.11			0.00
BLOQUE C	EJES 5B, 5D, 6B Y 6D	4	0.50	0.40	9.35	1.87			0.00
BLOQUE C	DDEJES 7B Y 7D	2	0.70	0.40	9.35	2.62			0.00
BLOQUE C	DDEJES 6A Y 7A	2	0.30	0.30	9.35	0.84			0.00
BLOQUE C	DDEJES 8B Y 8D	2	0.50	0.40	5.90	1.18			0.00
COLUMNAS BLOQUE D									
BLOQUE D	EJES 1 Y 2 ENTRE EJES A-C	6	0.30	0.30	4.65	0.42			2.51
COLUMNAS BLOQUE E									
BLOQUE E	EJES 1B, 1C, 2A, 3B, 3C, 4A, 5B Y 5C	8	0.40	0.30	5.90	0.71			5.66
BLOQUE E COLUMNETAS CONF	EJE 1	3	0.20	0.15	4.20	0.13			0.38
BLOQUE E COLUMNETAS CONF	EJE 2	4	0.20	0.15	4.20	0.13			0.50
BLOQUE E COLUMNETAS CONF	EJE 3	3	0.20	0.15	4.20	0.13			0.38
BLOQUE E COLUMNETAS CONF	ENTRE EJES 3 Y 4	3	0.20	0.15	4.20	0.13			0.38
BLOQUE E COLUMNETAS CONF	EJE 4	4	0.20	0.15	4.20	0.13			0.50
BLOQUE E COLUMNETAS CONF	EJE 5	3	0.20	0.15	4.20	0.13			0.38
TOTALES PRESENTE ACTA:									10.70
ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES									101.70
ACUMULADO TOTAL:									112.40

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

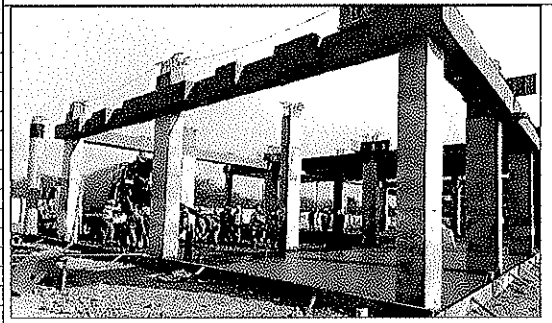



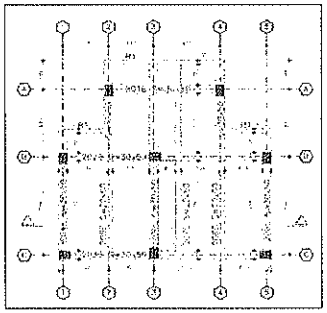

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	112.40
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	100.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma: _____ Firma: _____

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI	ITEM: NP 8	UNIDAD: M3
CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 05 DE DICIEMBRE 2023

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	AREA	ESPESOR			VOLUMEN
BLOQUE A		1	40.80	17.03	694.82	0.10			69.48
BLOQUE B		1	34.83	17.03	593.15	0.10			59.32
AREA QUE RESTA COLUMNAS	COLUMNA								
BLOQUE A	COLUMNA RECTANGULAR	21	0.70	0.40	5.88	0.10			-0.59
	COLUMNA CIRCULAR AREA 0.19 M2	7			1.33	0.10			-0.13
AREA QUE RESTA COLUMNAS	COLUMNA								
BLOQUE B	COLUMNA RECTANGULAR	18.00	0.70	0.40	5.04	0.10			-0.50
	COLUMNA CIRCULAR AREA 0.19 M2	5.00			0.95	0.10			-0.10
BLOQUE C		1	16.93	11.05	187.08	0.10			18.71
BLOQUE C		1	7.38	2.39	17.64	0.10			1.76
BLOQUE C		1	9.85	6.80	66.98	0.10			6.70
BLOQUE D		1	10.70	5.80	62.06	0.10			6.21
BLOQUE E		1	4.26	2.56	10.91	0.10			1.09
BLOQUE E		1	7.55	4.83	36.47	0.10			0.00
VOLUMEN COBRADO ACTA ANTERIOR BLOQUE B									-59.32
TOTALES PRESENTE ACTA:									102.62
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES:									59.32
ACUMULADO TOTAL:									161.94

ESQUEMA / FOTOGRAFIA





RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	167.00
DIFERENCIA:	5.06
PORCENTAJE:	3.03%


Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA


Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONCRETO PARA PLACA CONTRAPISO

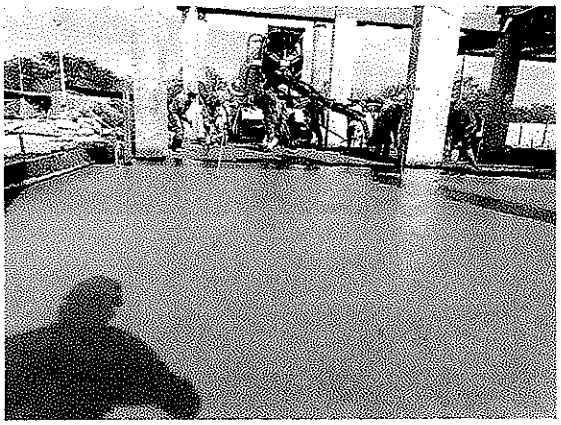

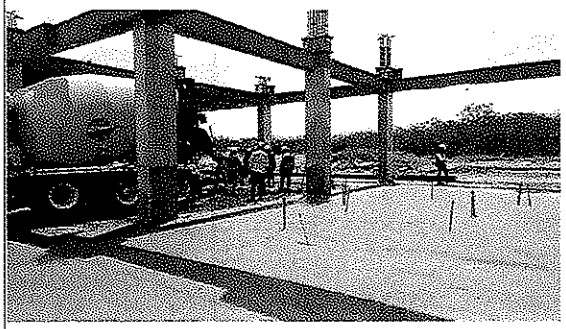

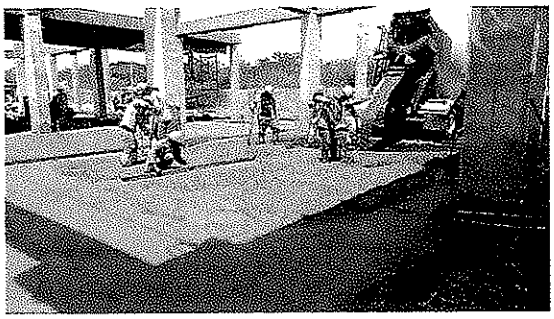

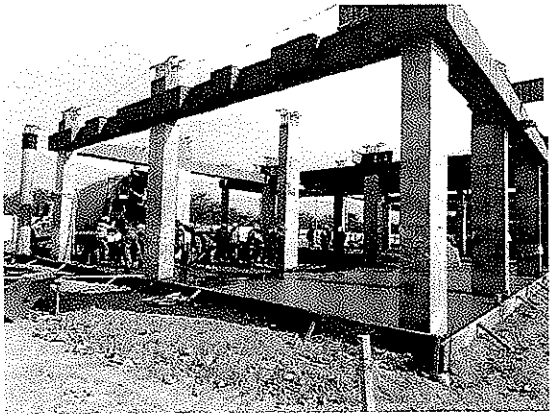

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM: NP 9	UNIDAD M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5-dic-23

CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
BLOQUE A NE+4.65 PLACA CUBIERTA EJE 1-2 ENTRE A-D		1	17.17	7.52	0.10	12.91	0.060	8	12.43
BLOQUE A NE+4.65 PLACA CUBIERTA EJE 4-5 ENTRE A-D		1	17.17	7.8	0.10	13.39	0.060	8	12.91
ANTES EJE A 1-2 R1		1	7.52	0.15	0.40	0.45	0.048	0	0.45
ANTES EJE A 4-5 R1		1	7.8	0.15	0.40	0.47	0.048	0	0.47
EJE A 1-7		1	40.54	0.3	0.40	4.86	0.048	7	4.53
ENTRE EJES A-B Y 1-2 R1		1	6.92	0.15	0.40	0.42	0.048	0	0.42
EJE B ENTRE 1-2		1	6.47	0.4	0.40	1.04	0.048	0	1.04
EJE B ENTRE 4-5		1	7.1	0.4	0.40	1.14	0.048	0	1.14
ENTRE EJES B-C Y 1-2 R1		1	6.92	0.15	0.40	0.42	0.048	0	0.42
EJE C ENTRE 1-7		1	40.54	0.3	0.40	4.86	0.048	7	4.53
EJE D ENTRE 1-2		1	7.52	0.59	0.40	1.77	0.048	0	1.77
EJE D ENTRE 4-5		1	7.8	0.59	0.40	1.84	0.048	0	1.84
VIGUETAS ENTRE EJES A-B Y 1-2		4	14.83	0.2	0.40	1.19	0.048	0	4.75
EJES 1 Y 2 ENTRE EJES A-D		2	16.92	0.3	0.40	2.03	0.048	8	3.68
EJE 3 Y 7 ENTRE A-C		2	11.56	0.3	0.40	1.39	0.048	2	2.68
EJES 4 Y 5 ENTRE EJES A-D		2	16.92	0.3	0.40	2.03	0.048	8	3.68
VIGUETAS ENTRE EJES A-B Y 4-5		4	14.83	0.2	0.40	1.19	0.048	0	4.75
ENTRE EJES A-B Y 4-5 R1		1	7.2	0.15	0.40	0.43	0.048	0	0.43
ENTRE EJES B-C Y 4-5 R1		1	7.2	0.15	0.40	0.43	0.048	0	0.43
BLOQUE A NE+5.65 PLACA CUBIERTA EJE 2-3 ENTRE A-D		1	17.17	8.05	0.10	13.82	0.060	8	13.34
BLOQUE A NE+5.65 PLACA CUBIERTA EJE 5-7 ENTRE A-D		1	17.17	12.4	0.10	21.29	0.060	12	20.57
ANTES EJE A 2-3 R1		1	8.05	0.15	0.40	0.48	0.048	0	0.48
ANTES EJE A 5-7 R1		1	12.4	0.15	0.40	0.74	0.048	0	0.74
EJE A ENTRE 2-3		1	8.05	0.3	0.40	0.97	0.048	2	0.87
EJE A ENTRE 5-7		1	12.4	0.3	0.40	1.49	0.048	3	1.34
ENTRE EJES A-B Y 2-3 R1		1	7.6	0.15	0.40	0.46	0.048	0	0.46
ENTRE EJES A-B 5-7 R1		1	12.1	0.15	0.40	0.73	0.048	0	0.73
TOTALES:									100.86
ACUMULADO:									100.86

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

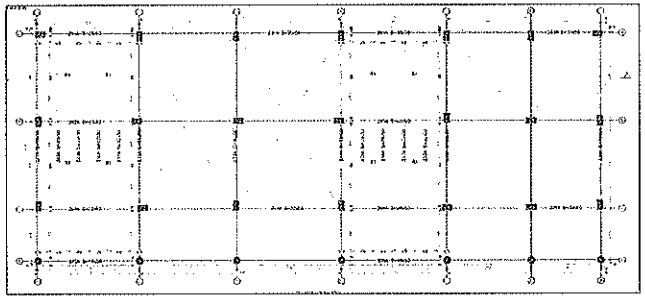

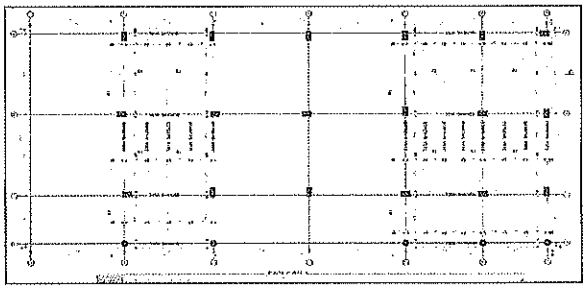

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	370.96
PORCENTAJE:	21.38%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM: NP 9	UNIDAD M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5-dic-23

CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
EJE B ENTRE 2-3		1	8.05	0.4	0.40	1.29	0.048	2	1.19
EJE B ENTRE 5-7		1	12.4	0.4	0.40	1.98	0.048	3	1.84
ENTRE EJES B-C Y 2-3		1	8.05	0.15	0.40	0.48	0.048	0	0.48
ENTRE EJES B-C Y 5-7		1	12.4	0.15	0.40	0.74	0.048	0	0.74
EJE C ENTRE 2-3		1	8.05	0.4	0.40	1.29	0.048	2	1.19
EJE C ENTRE 5-7		1	12.4	0.4	0.40	1.98	0.048	3	1.84
EJE D ENTRE 2-3		1	8.05	0.59	0.40	1.90	0.048	2	1.80
EJE D ENTRE 5-7		1	12.4	0.59	0.40	2.93	0.048	3	2.78
ANTES EJE 2 ENTRE A-D R1		1	16.43	0.15	0.40	0.99	0.048	0	0.99
EJE 2 ENTRE A-D		1	16.58	0.3	0.40	1.99	0.048	3	1.85
VIGUETAS ENTRE EJES 2-3 Y A-D		3	16.43	0.2	0.40	1.31	0.048	0	3.94
EJE 3 ENTRE A-D		1	16.58	0.3	0.40	1.99	0.048	3	1.85
ANTES EJE 5 ENTRE A-D R1		1	16.43	0.15	0.40	0.99	0.048	0	0.99
EJE 5 ENTRE A-D		1	16.58	0.3	0.40	1.99	0.048	3	1.85
VIGUETAS ENTRE EJES 5-6 Y A-D		3	16.43	0.2	0.40	1.31	0.048	0	3.94
EJE 6 ENTRE A-D		1	16.58	0.3	0.40	1.99	0.048	3	1.85
VIGUETAS ENTRE EJES 6-7 Y A-D		2	16.43	0.2	0.40	1.31	0.048	0	2.63
EJE 7 ENTRE A-D		1	16.58	0.3	0.40	1.99	0.048	3	1.85
DESPUES EJE 7 ENTRE A-D		1	16.43	0.15	0.40	0.99	0.048	0	0.99
BLOQUE A NE+6.65 EJES 3-4 ENTRE A-C		1	14.13	9.5	0.10	13.42	0.060	6	13.06
ANTES EJE A ENTRE 3-4 R1		1	9.49	0.15	0.40	0.57	0.048	0	0.57
EJE A, B Y C ENTRE 3-4		3	9.19	0.3	0.40	1.10	0.048	2	3.21
DESPUES EJE C ENTRE 3-4 R1		1	9.49	0.15	0.40	0.57	0.048	0	0.57
ANTES EJE 3 ENTRE A-C R1		1	14.13	0.15	0.40	0.85	0.048	0	0.85
EJE 3 Y 4 ENTRE A-C		2	14.13	0.3	0.40	1.70	0.048	6	3.10
ENTRE EJES 3-4 Y A-C		4	13.83	0.2	0.40	1.11	0.048	0	4.43
TOTALES:									60.37
ACUMULADO HOJA ANTERIOR									100.86
ACUMULADO TOTAL									161.23

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

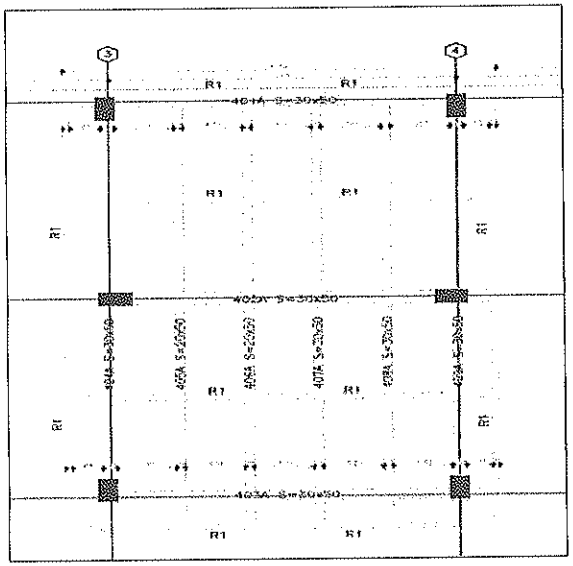

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	310.59
PORCENTAJE:	34.17%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÒN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM: NP 9	UNIDAD M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5-dic-23

CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
BLOQUE B NE+4.15 EJES 3-4 ENTRE A-D		1	17.17	7.23	0.10	12.41	0.060	8	11.93
ANTES EJE A ENTRE 3-4 R1		1	7.23	0.15	0.40	0.43	0.048	0	0.43
EJE A ENTRE 3-4		1	7.23	0.30	0.40	0.87	0.048	2	0.77
ENTRE EJES 3-4 Y A-B R1		1	7.23	0.15	0.40	0.43	0.048	0	0.43
EJE B ENTRE 3-4		1	7.23	0.40	0.40	1.16	0.048	2	1.06
ENTRE EJES 3-4 Y B-C R1		1	7.23	0.15	0.40	0.43	0.048	0	0.43
EJE C ENTRE 3-4		1	7.23	0.40	0.40	1.16	0.048	2	1.06
EJE C ENTRE 3-4		1	0.59	0.40	0.40	0.09	0.048	2	0.00
ANTES EJE 3 ENTRE A-D R1		1	17.17	0.15	0.40	1.03	0.048	0	1.03
EJE 3 Y 4 ENTRE EJES A-D		2	17.17	0.30	0.40	2.06	0.048	8	3.74
ENTRE EJES A-D Y 3-4		4	17.17	0.15	0.40	1.03	0.048	0	4.12
BLOQUE B NE+4.65 EJES 5-6 ENTRE A-C		1	14.14	6.30	0.10	8.91	0.060	6	8.55
EJE A Y C ENTRE 1-2		2	7.28	0.30	0.40	0.87	0.048	0	1.75
EJE 1 ENTRE A-C		1	11.55	0.30	0.40	1.39	0.048	1	1.34
ANTES EJE A ENTRE 5-6 R1		1	6.3	0.15	0.40	0.38	0.048	0	0.38
EJE A ENTRE 5-6		1	6.3	0.40	0.40	1.01	0.048	2	0.91
ENTRE EJES 5-6 Y A-B R1		1	6.3	0.15	0.40	0.38	0.048	0	0.38
EJE B ENTRE 5-6		1	5.6	0.40	0.40	0.90	0.048	0	0.90
ENTRE EJES 5-6 Y B-C R1		1	6.3	0.15	0.40	0.38	0.048	0	0.38
EJE C ENTRE 5-6		1	40	0.40	0.40	6.40	0.048	2	6.30
DESPUES EJE C ENTRE 5-6 R1		1	6.3	0.40	0.40	1.01	0.048	0	1.01
EJE 5 ENTRE A-C		1	14.13	0.30	0.90	3.82	0.048	0	3.82
EJE 6 ENTRE A-C		1	14.13	0.30	0.40	1.70	0.048	0	1.70
ENTRE EJES A-C Y 5-6		3	13.33	0.20	0.40	1.07	0.048	0	3.20
TOTALES:									55.61
ACUMULADO HOJA ANTERIOR									161.23
ACUMULADO TOTAL									216.84

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

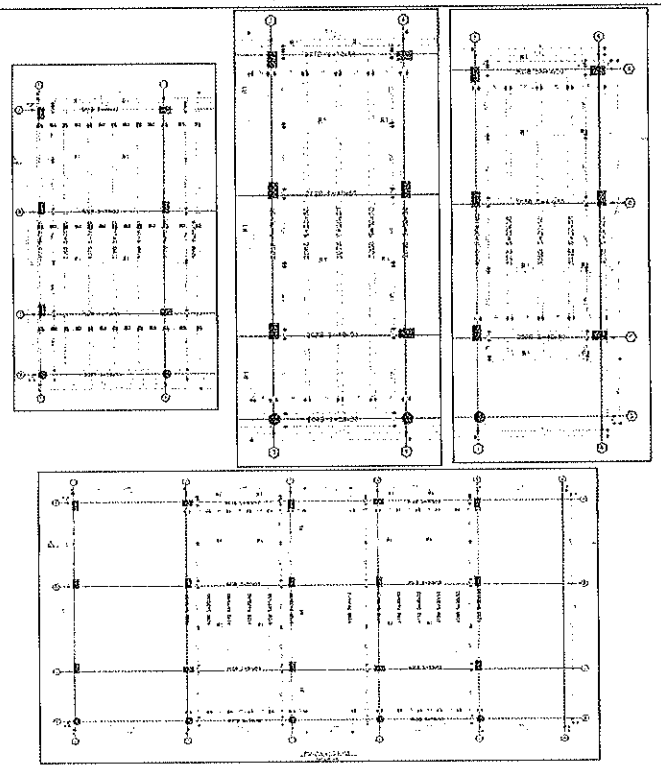

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	254.98
PORCENTAJE:	45.96%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM: NP 9	UNIDAD M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5-dic-23

CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
BLOQUE B NE+5.15 EJES 2-3 ENTRE A-D		1	17.17	8.30	0.10	14.25	0.060	8	13.77
ANTES EJE A ENTRE 2-3 R1		1	8.30	0.15	0.40	0.50	0.048	0	0.50
EJE A ENTRE 2-3		1	8.30	0.40	0.40	1.33	0.048	2	1.23
ENTRE EJES 2-3 Y A-B R1		1	8.30	0.15	0.40	0.50	0.048	0	0.50
EJE B ENTRE 2-3		1	8.30	0.50	0.40	1.66	0.048	2	1.56
ENTRE EJES 2-3Y B-C R1		1	8.30	0.15	0.40	0.50	0.048	0	0.50
EJE C ENTRE 2-3		1	8.30	0.50	0.40	1.66	0.048	2	1.56
EJE D ENTRE 2-3		1	8.30	0.59	0.40	1.96	0.048	2	1.86
EJE 2 Y 3 ENTRE A-D		2	17.17	0.30	0.40	2.06	0.048	8	3.74
ENTRE EJES A-D Y 2-3		4	16.43	0.20	0.40	1.31	0.048	0	5.26
DESPUES EJE 3 ENTRE A-D R1		1	17.17	0.15	0.40	1.03	0.048	0	1.03
BLOQUE B NE+5.15 EJES 2-3 ENTRE A-D		1	17.17	9.12	0.10	15.66	0.060	8	15.18
ANTES EJE A ENTRE 4-5 R1		1	9.12	0.15	0.40	0.55	0.048	0	0.55
EJE A ENTRE 4-5		1	9.12	0.40	0.40	1.46	0.048	1	1.41
ENTRE EJES 4-5 Y A-B R1		1	9.12	0.15	0.40	0.55	0.048	0	0.55
EJE B ENTRE 4-5		1	9.12	0.50	0.40	1.82	0.048	2	1.73
ENTRE EJES 4-5Y B-C R1		1	9.12	0.15	0.40	0.55	0.048	0	0.55
EJE C ENTRE 4-5		1	9.12	0.50	0.40	1.82	0.048	0	1.82
EJE D ENTRE 4-5		1	9.12	0.59	0.40	2.15	0.048	0	2.15
EJE 4 ENTRE A-D		1	17.17	0.30	0.40	2.06	0.048	2	1.96
EJE 5 ENTRE A-D		1	17.17	0.30	0.90	4.64	0.048	2	4.54
ENTRE EJES A-D Y 4-5		4	16.43	0.20	0.40	1.31	0.048	0	5.26
BLOQUE B NE+6.15 EJES 1-2 ENTRE A-D		1	17.17	10.18	0.10	17.48	0.060	8	17.00
ANTES EJE A ENTRE 1-2 R1		1	10.18	0.15	0.40	0.61	0.048	0	0.61
EJE A ENTRE 1-2		1	10.18	0.30	0.40	1.22	0.048	2	1.13
ENTRE EJES 1-2 Y A-B R1		1	10.18	0.15	0.40	0.61	0.048	0	0.61
EJE B ENTRE 1-2		1	10.18	0.30	0.40	1.22	0.048	2	1.13
ENTRE EJES 1-2 Y B-C R1		1	10.18	0.15	0.40	0.61	0.048	0	0.61
TOTALES:									88.29
ACUMULADO HOJA ANTERIOR									216.84
ACUMULADO TOTAL									305.14

ESQUEMA / FOTOGRAFÍA

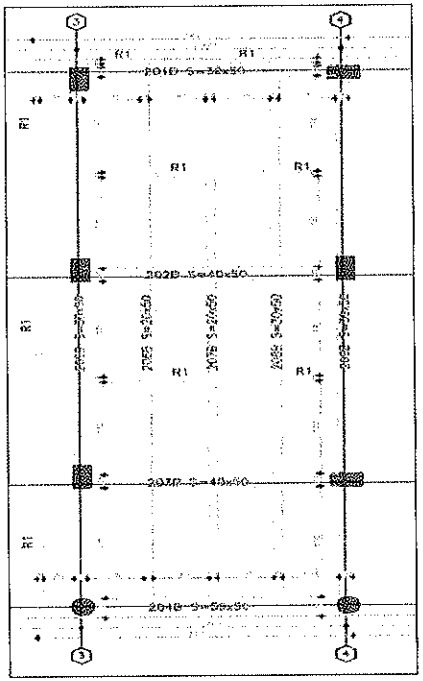

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	166.68
PORCENTAJE:	64.67%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM: NP 9	UNIDAD: M3
		FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA FINAL: 5-dic-23

CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
BLOQUE B NE+6.15 EJES 1-2 ENTRE A-D									
EJE C ENTRE 1-2		1	10.18	0.30	0.40	1.22	0.048	2	1.13
EJE D ENTRE 1-2		1	10.18	0.59	0.40	2.40	0.048	2	2.31
EJE 1 Y 2 ENTRE A-D		2	17.17	0.30	0.40	2.06	0.048	8	3.74
ENTRE EJES A-D Y 1-2		4	16.43	0.20	0.40	1.31	0.048	0	5.26
DESPUES EJE 2 ENTRE A-D		1	17.17	0.20	0.40	1.37	0.048	0	1.37
BLOQUE C NE+3.45 EJES 1-2 ENTRE A-D		1	11.04	8.02	0.10	8.85	0.060	6	8.49
ANTES EJE A ENTRE 1-2 R1		1	8.02	0.15	0.40	0.48	0.048	0	0.48
EJE A ENTRE 1-2		1	8.02	0.40	0.40	1.28	0.048	2	1.19
ENTRE EJES 1-2 Y B-C R1		1	8.02	0.15	0.40	0.48	0.048	0	0.48
EJE C ENTRE 1-2		1	8.02	0.30	0.40	0.96	0.048	2	0.87
ENTRE EJES 1-2YC-D R1		1	8.02	0.15	0.40	0.48	0.048	0	0.48
EJE D ENTRE 1-2		1	8.02	0.30	0.40	0.96	0.048	2	0.87
ANTES EJE 1 ENTRE A-D R1		1	11.04	0.15	0.40	0.66	0.048	0	0.66
EJE 1 Y 2 ENTRE A-D		2	11.04	0.30	0.40	1.32	0.048	6	2.36
ENTRE EJES A-D Y 1-2		3	10.74	0.20	0.90	1.93	0.048	0	5.80
DESPUES EJE 2 ENTRE A-D R1		1	11.04	0.15	0.40	0.66	0.048	0	0.66
BLOQUE C NE+3.45 EJES 2-5 ENTRE A-D		1	20.80	11.04	0.10	22.96	0.012	9	22.86
BLOQUE C NE+3.45 EJES5-6 ENTRE A-B		1	4.65	3.34	0.10	1.55	0.012	2	1.53
ANTES EJE A ENTRE 2-5 R2		1	20.50	0.15	0.50	1.54	0.10	0	1.54
ANTES EJE A ENTRE 5-6		1	4.65	0.30	0.50	0.70	0.10	0	0.70
ENTRE EJES A1-B3		1	9.90	0.50	0.50	2.48	0.10	1	2.38
EJE B ENTRE 2-3 R2		1	9.70	0.15	0.50	0.73	0.10	0	0.73
EJE B ENTRE 3-5		1	10.25	0.50	0.50	2.56	0.10	1	2.46
EJE B ENTRE 5-6		1	4.15	0.50	0.85	1.76	0.17	0	1.76
ENTRE EJES C-D Y 2-5 R2		1	20.35	0.15	0.50	1.53	0.10	0	1.53
EJE D ENTRE 2-5		1	20.35	0.50	0.50	5.09	0.10	3	4.79
DESPUES EJE D ENTRE 1-5 R2		1	20.35	0.15	0.50	1.53	0.10	0	1.53
TOTALES:									77.93
ACUMULADO HOJA ANTERIOR									305.14
ACUMULADO TOTAL									**383.07**

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

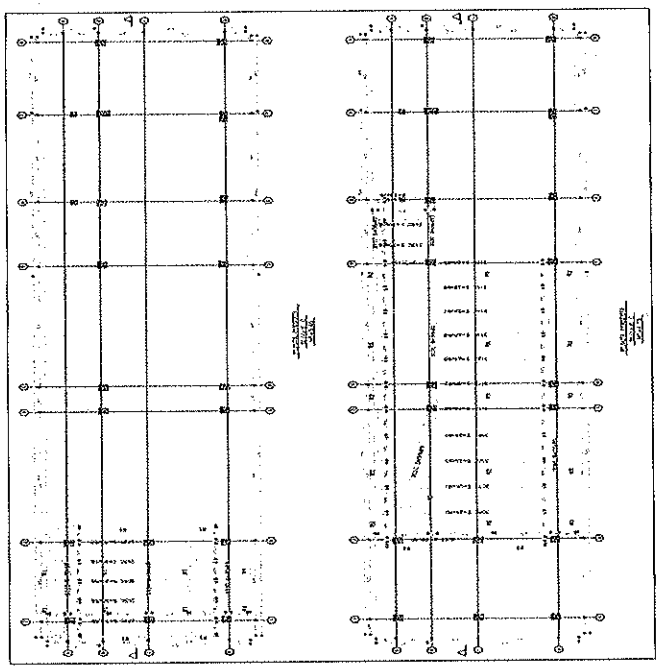

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	88.75
PORCENTAJE:	81.19%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM:	NP 9 / UNIDAD: M3
CAPITULO:	21 - NO PREVISTOS	FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DEL 2022 / FECHA FINAL: 5-dic-23

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
BLOQUE C NE+3.45 EJES 2-6 ENTRE A-B									
ANTES EJE 2 ENTRE A-D		1	11.05	0.15	0.50	0.83	0.10	0	0.83
EJE 2 ENTRE A-D		2	11.05	0.30	0.50	1.66	0.10	3	3.02
ENTRE EJES 2-3 Y A-D		4	10.75	0.20	0.50	1.08	0.10	0	4.30
EJES 3 Y 4 ENTRE A-D		2	10.75	0.30	0.50	1.61	0.10	4	2.83
ENTRE EJES 4-5 Y A-D		4	10.75	0.20	0.50	1.08	0.10	0	4.30
EJE 5 ENTRE A-B		1	2.70	0.30	0.50	0.41	0.10	0	0.41
EJE 5 ENTRE B-D		1	7.70	0.30	0.85	1.96	0.17	1	1.79
EJE 6 ENTRE A-B		1	2.84	0.30	0.85	0.72	0.08	1	0.65
BLOQUE C NE+4.70 EJES 6-7 ENTRE A-B		1	6.73	3.34	0.10	2.25	0.01	4	2.21
BLOQUE C NE+4.70 EJES7-8 ENTRE B-D		1	8.20	5.80	0.10	4.76	0.01	4	4.72
ANTES DE EJE A ENTRE 6-7		1	6.72	0.20	0.40	0.54	0.08	0	0.54
ENTRE EJES A-B Y 6-7		1	6.13	0.30	0.40	0.74	0.08	0	0.74
EJE B ENTRE 5-6		1	4.15	0.50	0.75	1.56	0.15	0	1.56
EJE B ENTRE 6-8		1	11.28	0.50	0.40	2.26	0.08	2	2.10
ENTRE EJES C-D Y 7-8 R1		1	4.95	0.15	0.40	0.30	0.08	0	0.30
EJE D ENTRE 5-6		1	4.30	0.30	0.40	0.52	0.08	0	0.52
EJE D ENTRE 7-8		1	5.35	0.30	0.40	0.64	0.08	1	0.56
DESPUES EJE D ENTRE 7-8 R1		1	5.80	0.15	0.40	0.35	0.08	0	0.35
EJE 5 ENTRE B-D		1	6.15	0.30	0.75	1.38	0.15	0	1.38
EJE 6 Y 7 ENTRE A-B		2	2.84	0.30	0.75	0.64	0.07	2	1.14
ENTRE EJES 6-7 Y A-B R1		1	2.64	0.15	0.40	0.16	0.08	0	0.16
EJE 7 Y 8 ENTRE B-D		2	7.50	0.30	0.40	0.90	0.08	4	1.46
ENTRE EJES 7-8 Y B-D		2	7.55	0.20	0.40	0.60	0.08	0	1.21
DESPUES EJE 8 R1		1	8.20	0.15	0.40	0.49	0.08	0	0.49
TOTALES:									37.56
ACUMULADO HOJA ANTERIOR									383.07
ACUMULADO TOTAL									420.63

ESQUEMA / FOTOGRAFÍA

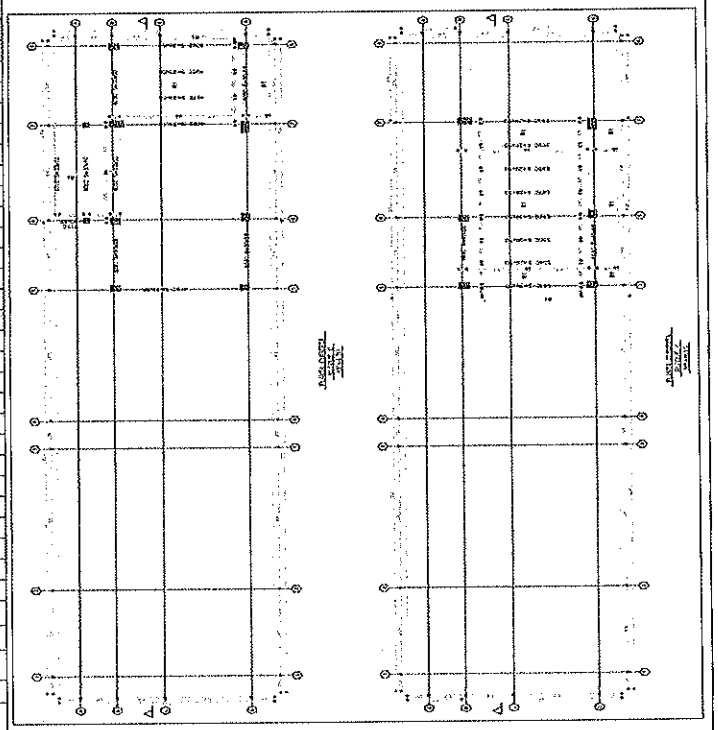

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	51.19
PORCENTAJE:	89.15%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE & CIA. LTDA.
Ingeniería & Arquitectura


MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA	ITEM:	NP 9 / UNIDAD: M3
CAPITULO:	21 - NO PREVISTOS	FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DEL 2022 / FECHA FINAL: 5-dic-23

LOCALIZACION	EJES	# ELEMENTOS	DIMENSIONES L	A	H	VOLUMEN	VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS	# COLUMNAS DECUENTO	VOLUMEN TOTAL
BLOQUE C NE+8.15 EJES 5-7 ENTRE B-D		1	12.07	8.20	0.10	9.90	0.02	6	9.78
EJE B Y D ENTRE 5-7		2	12.07	0.40	0.40	1.93	0.08	6	3.38
ENTRE EJES C-D Y 5-7 R1		1	12.07	0.50	0.40	2.41	0.10	0	2.41
DESPUES EJE D ENTRE 5-7 R1		1	12.07	0.50	0.40	2.41	0.10	0	2.41
ANTES EJE 5 ENTRE C-D R1		1	8.20	0.15	0.40	0.49	0.10	0	0.49
EJES 5, 6 Y 7 ENTRE C-D		3	7.65	0.30	0.40	0.92	0.08	3	2.51
ENTRE EJES 5-7 Y C-D		5	7.65	0.20	0.40	0.61	0.08	0	3.06
BLOQUE D NE+3.45 EJES 1-2 ENTRE A-C		1	11.05	7.00	0.10	7.74	0.01	6	7.68
ANTES EJE A Y DESPUES EJE D ENTRE 1-2 R1		2	7.00	0.15	0.40	0.42	0.04	0	0.84
ANTES EJE 1 Y DESPUES EJE 2 ENTRE A-D R1		2	10.75	0.15	0.40	0.65	0.04	0	1.29
EJE A, B Y C ENTRE 1-2		3	6.70	0.30	0.40	0.80	0.04	6	2.20
EJE 1 Y 2 ENTRE A-C		2	10.75	0.30	0.40	1.29	0.04	6	2.36
ENTRE EJES A-C Y 1-2 R1		2	6.70	0.15	0.40	0.40	0.04	0	0.80
ENTRE EJES 1-2 Y A-C R1		2	10.75	0.15	0.40	0.65	0.04	0	1.29
BLOQUE E NE+4.7 EJES 1-5 ENTRE A-C		1	4.25	2.56	0.10	1.09	0.01	2	1.06
BLOQUE E NE+4.7 EJES 1-5 ENTRE A-C		1	7.55	4.63	0.10	3.65	0.01	6	3.57
ANTES EJE A ENTRE 2-4 R1		1	3.65	0.15	0.40	0.22	0.05	0	0.22
EJE A ENTRE 2-4		1	3.65	0.30	0.40	0.44	0.05	0	0.44
ENTRE EJES A-B Y 1-2 Y 4-5 R1		2	1.65	0.15	0.40	0.10	0.04	0	0.20
EJE B ENTRE 1-5		1	6.95	0.30	0.40	0.83	0.04	1	0.80
EJE C ENTRE 1-5		1	6.95	0.30	0.40	0.83	0.04	1	0.80
EJE 1 ENTRE B-C Y EJE 5 ENTRE B-C		2	4.53	0.30	0.40	0.54	0.04	2	1.02
EJE 2 Y 4 ENTRE A-B		2	3.30	0.30	0.40	0.40	0.04	2	0.72
EJE 3 ENTRE A-C		1	6.84	0.30	0.40	0.82	0.04	1	0.78
ENTRE EJES 3-4 A-B		1	3.30	0.20	0.40	0.26	0.04	0	0.26
ENTRE EJES 2-4 Y B-C		3	3.35	0.20	0.40	0.27	0.04	0	0.80
TOTALES:									51.20
ACUMULADO HOJA ANTERIOR									420.63
ACUMULADO TOTAL									471.82
COBRADO EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES									249.52
CANTIDADES PRESENTE ACTA									222.30

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

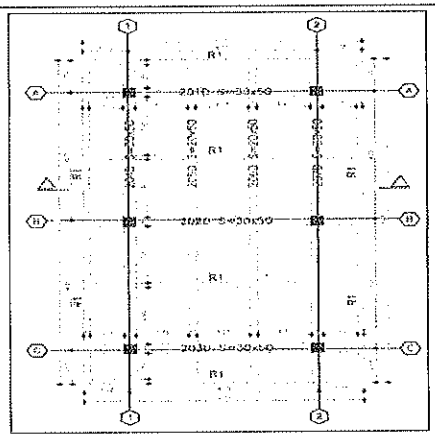

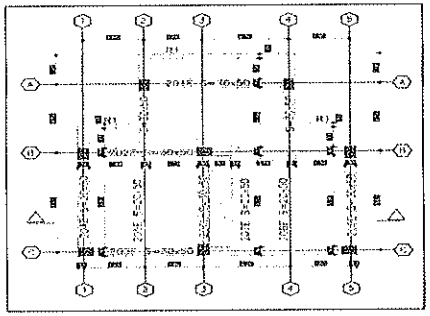

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	471.82
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	100.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:


DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA


Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONCRETO PARA PLACA CUBIERTA

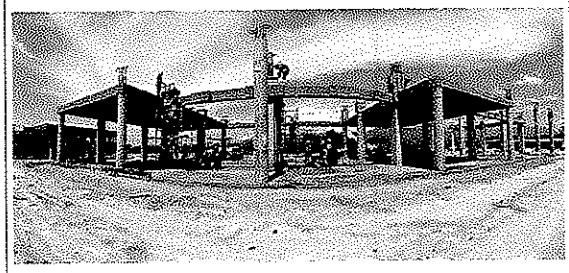


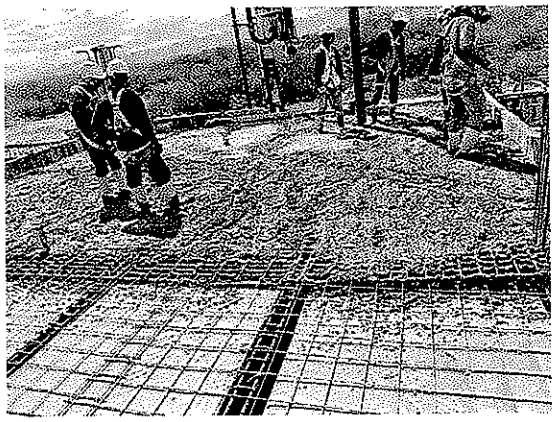






BLOQUE B

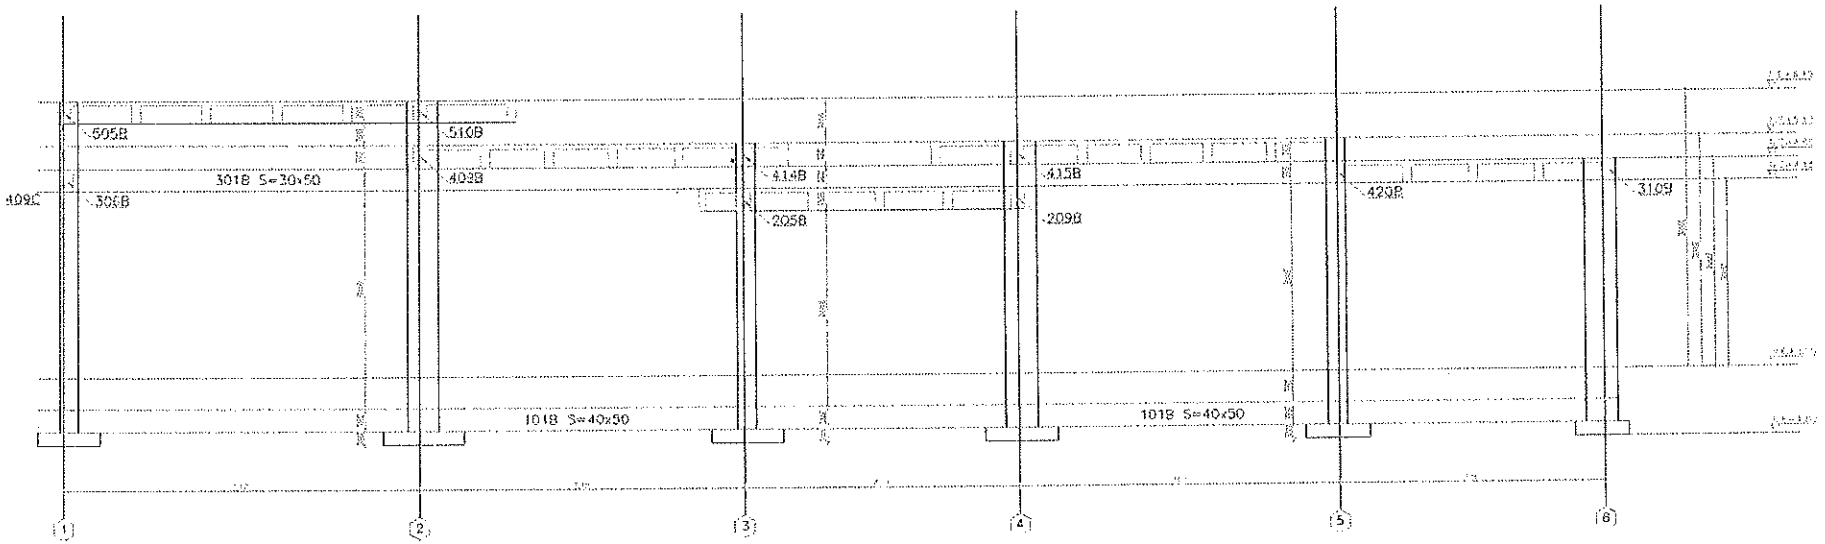


CORTE A-A

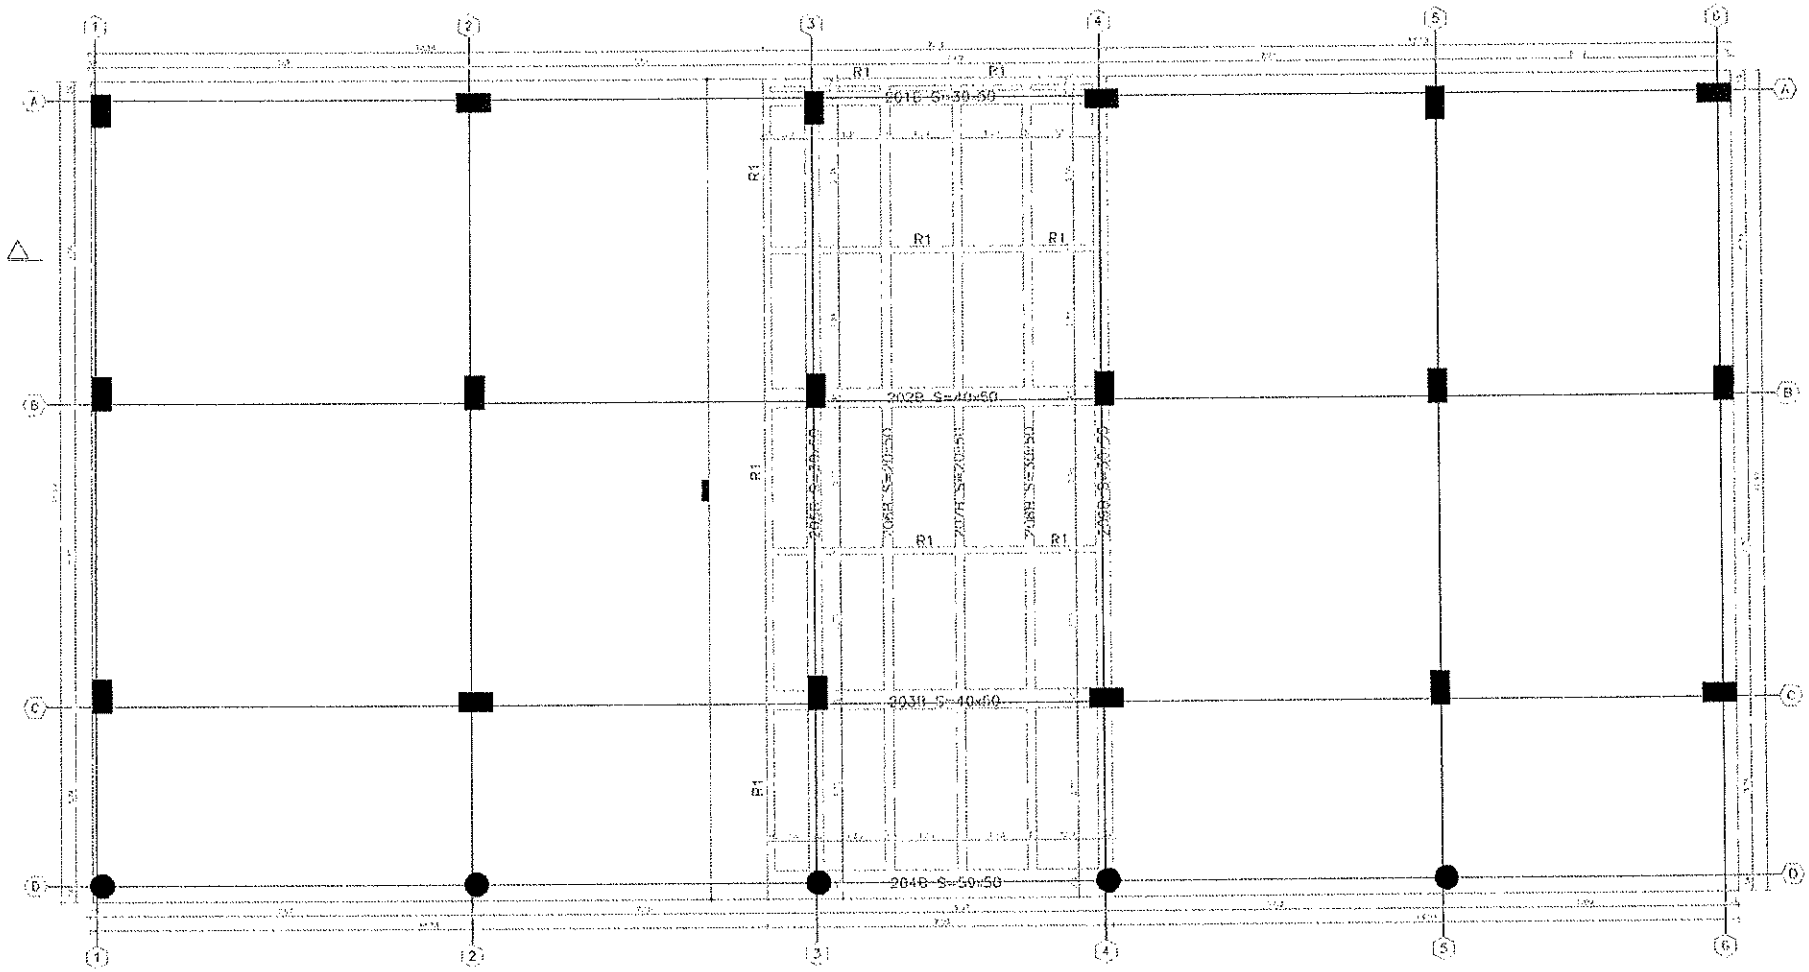


PLANTA CUBIERTA
NF+4.15
BLOQUE B

4
5
6
D
C
B
A
306B S=30x100
307B S=70x50
308B S=70x50
309B S=70x50
310B S=30x50
305B S=40x50
303B S=40x50
302B S=40x50
R1

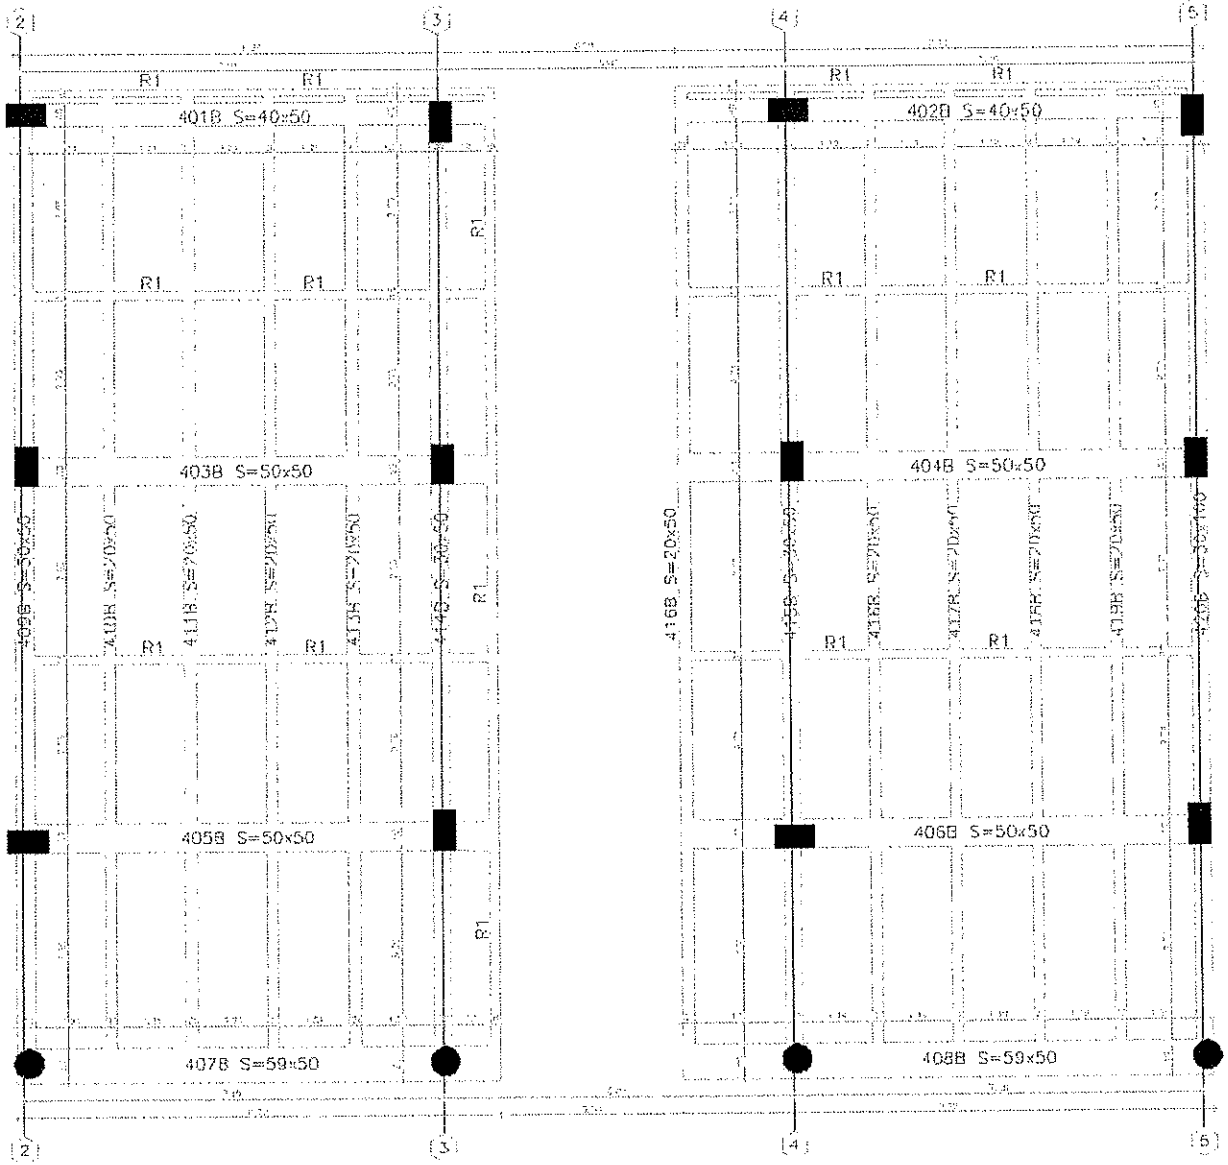

PLANTA CUBIERTA
NF+5.15
BLOQUE B

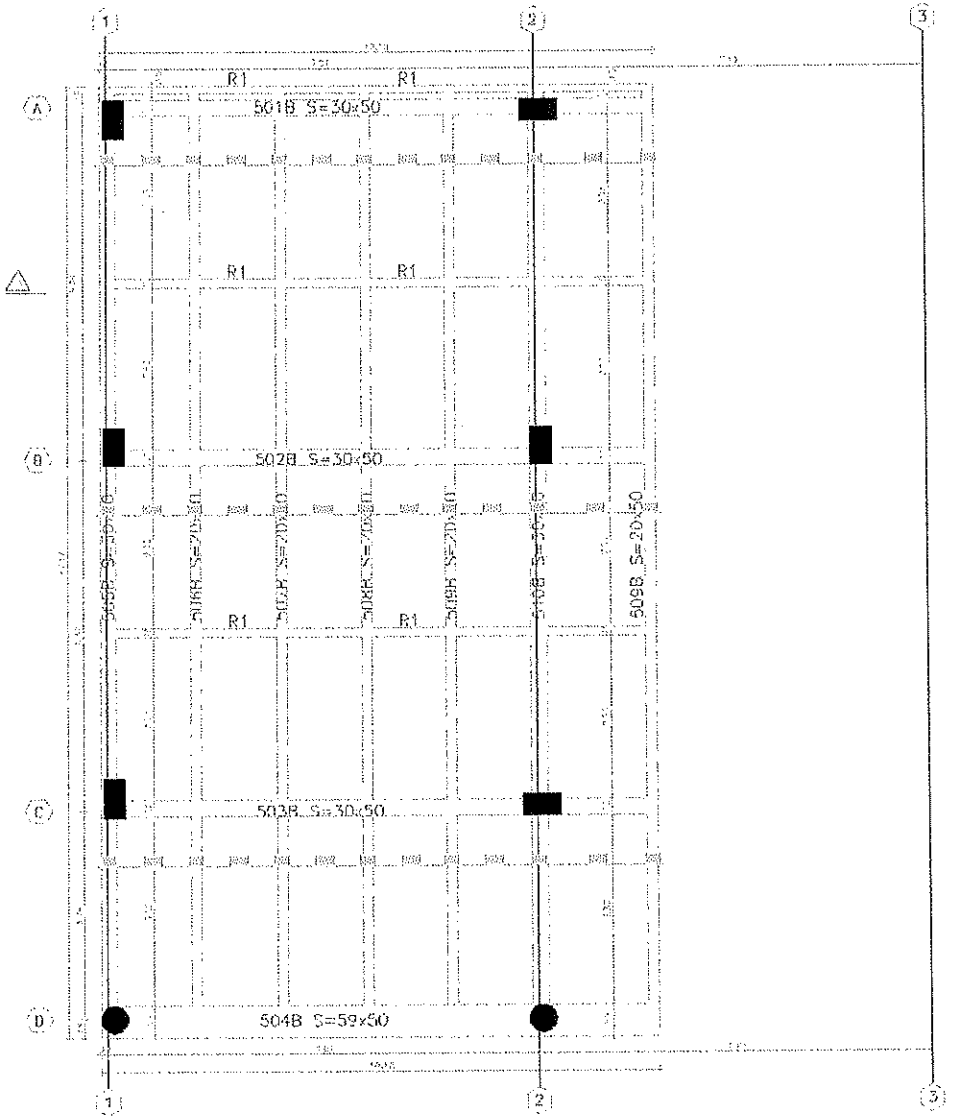

PLANTA CUBIERTA
NE+6.15
BLOQUE B

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 8 1/2" DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD (120 M) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMÁS TABLEROS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CONTROL. ARBOL DE FONTANERÍA, TUBERÍA, FILTROS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN A PTAP CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y BARCTERIOLÓGICO DEL AGUA	ITEM: NP 10	UNIDAD: UND

CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Espesor (m)	TOTAL
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
OAC		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	1.00					1.00
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								1.00
ACUMUDADO ANTERIOR								0.00
ACUMULADO TOTAL:								1.00

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

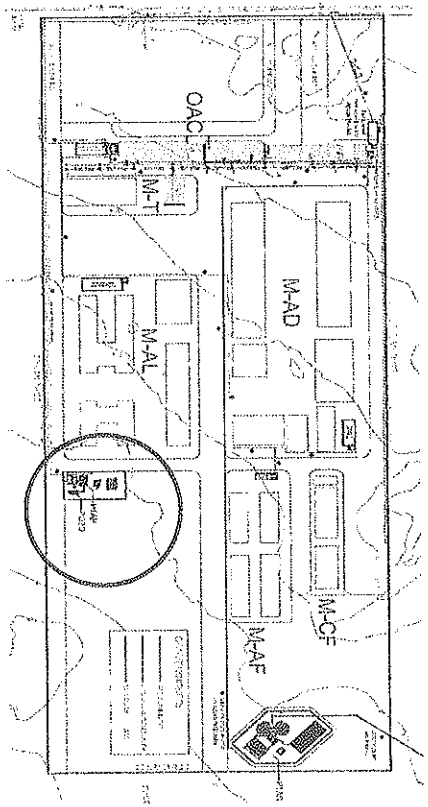

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	1.00
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA


Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO POZO PROFUNDO

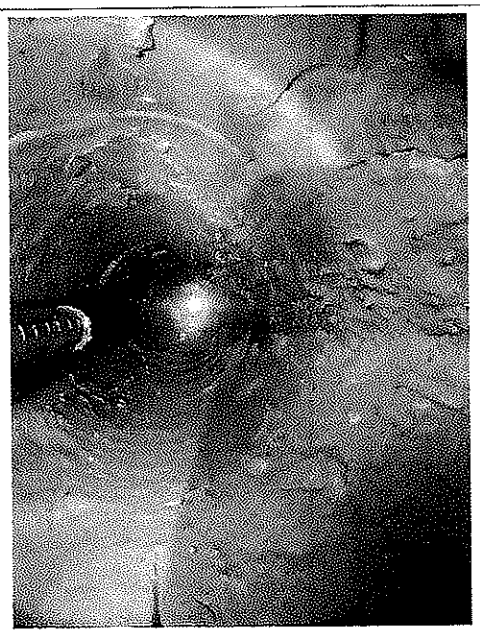

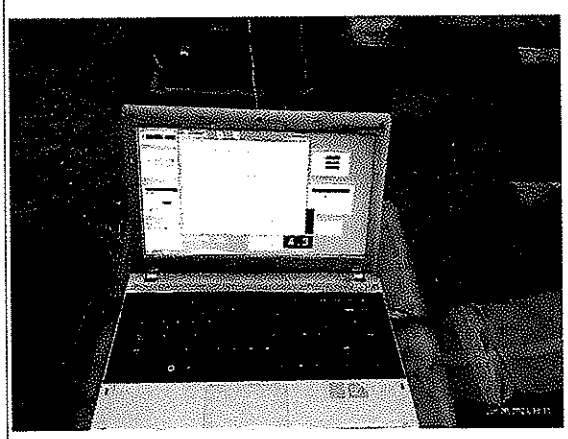

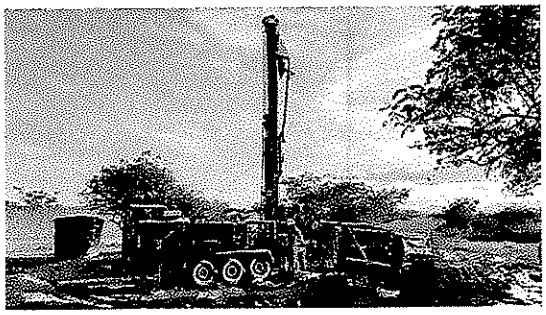

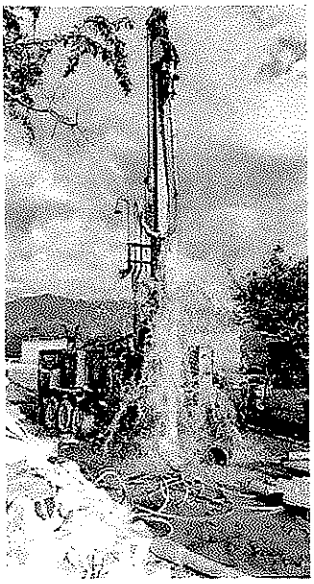

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	PLASTICO POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO	ITEM: NP 12	UNIDAD M2

CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Espesor (m)	TOTAL
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
OAC								
		AREA BLOQUE A				694.88		694.88
		AREA BLOQUE B				300.00		300.00
		AREA BLOQUE C				340.53		340.53
		AREA BLOQUE D				45.28		45.28
		AREA BLOQUE E				40.54		40.54
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								1421.23
ACUMUDADO ANTERIOR								0.00
ACUMULADO TOTAL:								1421.23

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

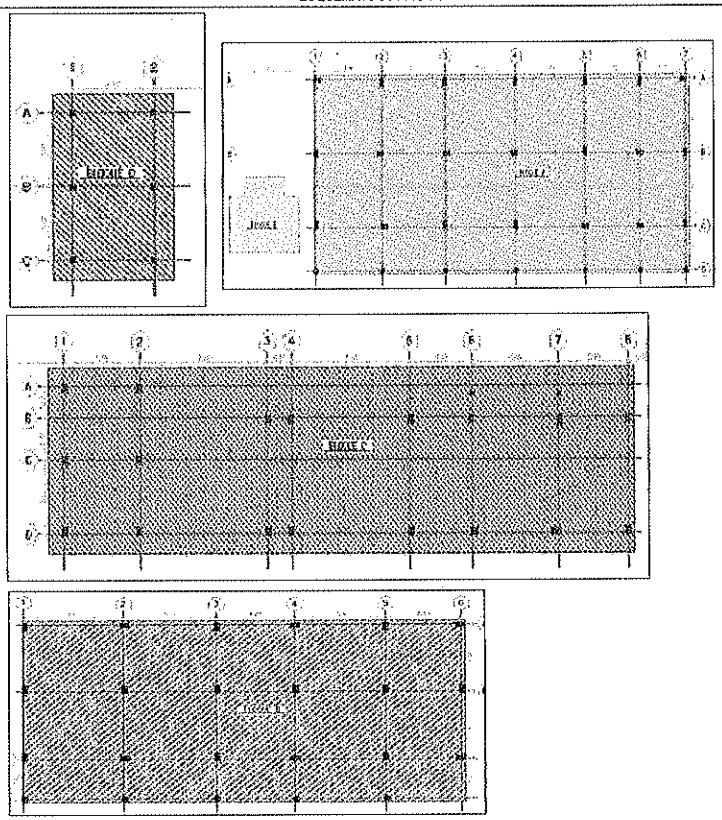

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	1421.23
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PLASTICO POLIETILENO



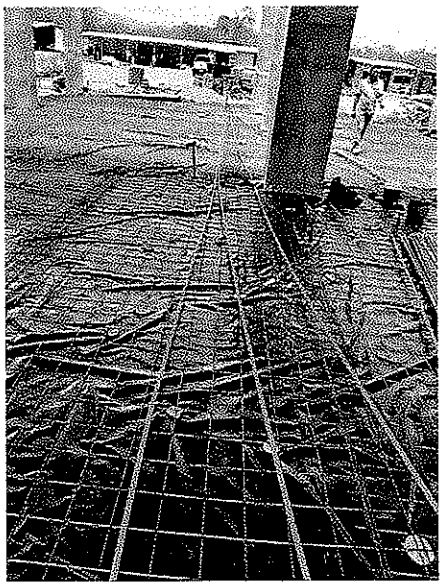



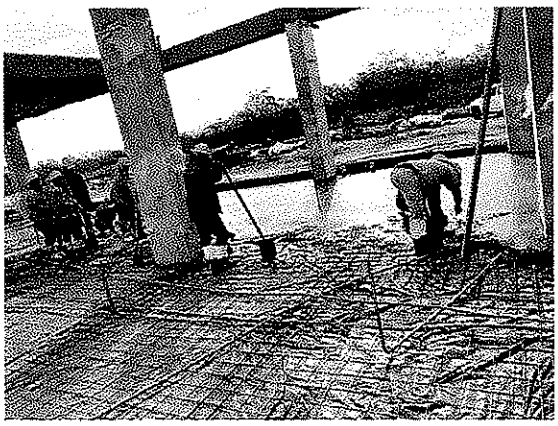

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 10" PARA ACCESO PRINCIPAL	ITEM:	NP 13 / UNIDAD: ML

CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Espesor (m)	TOTAL ML
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
OAC		ACCESSO PRINCIPAL						
		TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 10" PARA ACCESO PRINCIPAL	1.00	6.00				6.00
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								6.00
ACUMUDADO ANTERIOR								0.00
ACUMULADO TOTAL:								6.00

ESQUEMA / FOTOGRAFIA



RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	6.00
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CONCRETO CICLOPEO 20,7 MPA (3000 PSI) PARA SOBRE ANCHOS EN CIMENTACIÓN	ITEM: NP 15	UNIDAD M3

CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Espesor (m)	TOTAL ML
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
OAC								
		BLOQUE A						
		EJE A ENTRE 1 Y 7	1.00	40.55	0.30	0.40		4.87
		EJE 7 ENTRE A Y C	1.00	12.96	0.30	0.40		1.56
		EJE C ENTRE 1 Y 7	1.00	40.55	0.30	0.40		4.87
		BLOQUE B						
		EJE A ENTRE 1 Y 7	1.00	34.43	0.30	0.40		4.13
		EJE C ENTRE 1 Y 7	1.00	34.43	0.30	0.40		4.13
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								19.55
ACUMUDADO ANTERIOR								0.00
ACUMULADO TOTAL:								19.55

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

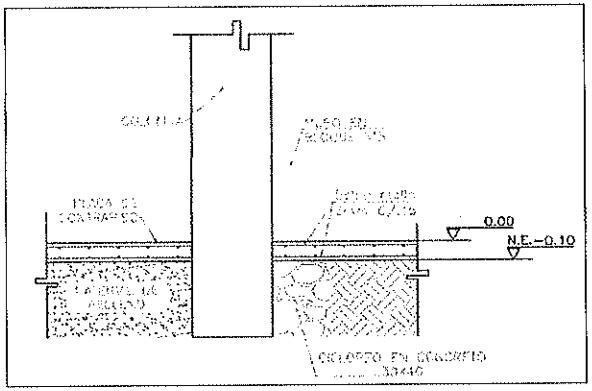



RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	19.55
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORÍA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E	CONTRATO No.	PN DIRAF N° 06-6-10178-22
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISOR	MAYOR GUSTAVO QUIROZ
CONTRATISTA	CONSORCIO PONAL L Y M	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DIEGO MEDINA GUERRERO
INTERVENTOR	CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS VERGARA NEGRETE
DESCRIPCIÓN	CASETÓN EN ICOPOR FORRADO EN POLIETILENO PARA ALIGERAMIENTO DE PLACA DE CUBIERTA	ITEM: NP 16	UNIDAD M2

CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

BLOQUE	REFERENCIA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (und)	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	AREA	TOTAL
		EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE						
OAC		BLOQUE A					537.42	537.42
		BLOQUE B					489.53	489.53
		BLOQUE C					357.65	357.65
		BLOQUE D					54.34	54.34
		BLOQUE D					31.75	31.75
SUBTOTAL PRESENTE ACTA								1470.69
ACUMUDADO ANTERIOR								0.00
ACUMULADO TOTAL:								1470.69

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

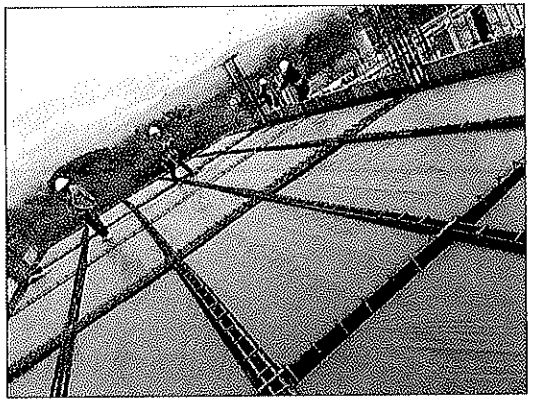

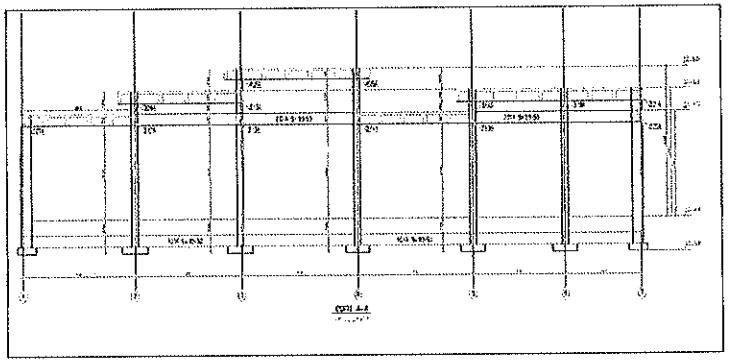

RESUMEN GENERAL	
CANT. PRESUP.:	1470.69
DIFERENCIA:	0.00
PORCENTAJE:	0.00%

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

BLOQUE A (PLACAS NIVEL 1 H= 4,65)

EJE 1 AL 2

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,23	2,95	18,14
5,00	1,23	2,90	17,84

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,23	2,92	17,96
5,00	1,23	2,91	17,90

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,23	3,37	20,73

EJE 4 AL 5

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,28	2,95	18,88
5,00	1,28	2,90	18,56

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,28	2,92	18,69
5,00	1,28	2,91	18,62

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,28	3,37	21,57

SUB TOTAL AREA 188,88

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE A (PLACAS NIVEL 2 H= 5,65)

EJE 2 AL 3

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,71	2,94	2,09
4,00	1,50	2,94	17,64
1,00	0,71	2,90	2,06
4,00	1,50	2,90	17,40

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,71	2,92	2,07
4,00	1,50	2,92	17,52
1,00	0,71	2,81	2,00
4,00	1,50	2,81	16,86

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,71	3,37	2,39
4,00	1,50	3,37	20,22

EJE 5 AL 7

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,72	2,94	2,12
4,00	1,28	2,94	15,05
3,00	1,43	2,94	12,61
1,00	0,72	2,90	2,09
4,00	1,28	2,90	14,85
3,00	1,43	2,90	12,44

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,72	2,92	2,10
4,00	1,28	2,92	14,95
3,00	1,43	2,92	12,53
1,00	0,72	2,81	2,02
4,00	1,28	2,81	14,39
3,00	1,43	2,81	12,05

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,72	3,37	2,43
4,00	1,28	3,37	17,25
3,00	1,43	3,37	14,46

SUB TOTAL AREA 251,59

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE A (PLACAS NIVEL 3 H= 6,65)

EJE 3 AL 4

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,68	2,94	2,00
5,00	1,31	2,94	19,26
1,00	0,57	2,94	1,68
1,00	0,68	2,89	1,97
5,00	1,31	2,89	18,93
1,00	0,57	2,89	1,65

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,68	2,92	1,99
5,00	1,31	2,92	19,13
1,00	0,57	2,92	1,66
1,00	0,68	2,91	1,98
5,00	1,31	2,91	19,06
1,00	0,57	2,91	1,66
1,00	0,68	0,77	0,52
5,00	1,31	0,77	5,04
1,00	0,57	0,77	0,44

SUB TOTAL AREA 96,95

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

TOTAL AREA DE BLOQUE A	537,42

BLOQUE B (PLACAS NIVEL 1 H= 4,15)

EJE 3 AL 4

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,70	2,94	2,06
4,00	1,30	2,94	15,29
1,00	0,70	2,81	1,97
4,00	1,30	2,81	14,61

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,70	2,95	2,07
4,00	1,30	2,95	15,34
1,00	0,70	2,85	2,00
4,00	1,30	2,85	14,82

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	0,70	3,38	2,37
4,00	1,30	3,38	17,58

SUB TOTAL AREA 88,09

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE B (PLACAS NIVEL 2 H= 4,65)

EJE 5 AL 6

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
4,00	1,28	2,84	14,54
4,00	1,28	2,81	14,39

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
4,00	1,28	2,95	15,10
4,00	1,28	2,85	14,59
4,00	1,28	0,78	3,99

SUB TOTAL AREA 62,62

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE B (PLACAS NIVEL 3 H= 5,45)

EJE 2 AL 3

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,21	2,83	17,12
1,00	0,70	2,83	1,98
5,00	1,21	2,73	16,52
1,00	0,70	2,73	1,91

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,21	2,95	17,85
1,00	0,70	2,95	2,07
5,00	1,21	2,75	16,64
1,00	0,70	2,75	1,93

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,21	3,38	20,45
1,00	0,70	3,38	2,37

EJE 4 AL 5

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	1,55	2,83	4,39
5,00	1,19	2,83	16,84
1,00	1,55	2,73	4,23
5,00	1,19	2,73	16,24

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	1,55	2,95	4,57
5,00	1,19	2,95	17,55
1,00	1,55	2,75	4,26
5,00	1,19	2,75	16,36

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1,00	1,55	3,38	5,24
5,00	1,19	3,38	20,11

SUB TOTAL AREA 208,62

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE B (PLACAS NIVEL 4 H= 6,15)

EJE 1 AL 2

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,36	2,93	19,92
1,00	1,80	2,93	5,27
5,00	1,36	2,93	19,92
1,00	1,80	2,93	5,27

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,36	2,95	20,06
1,00	1,80	2,95	5,31
5,00	1,36	2,95	20,06
1,00	1,80	2,95	5,31

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
5,00	1,36	3,38	22,98
1,00	1,80	3,38	6,08

SUB TOTAL AREA 130,20

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

TOTAL AREA DE BLOQUE B	489,53

BLOQUE C (PLACAS NIVEL 1 H= 3.45)

EJE 1 AL 2

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.85	0.80	0.68
3.00	1.21	0.80	2.90
1.00	1.16	0.80	0.93
1.00	0.88	0.80	0.70
1.00	0.85	1.98	1.68
3.00	1.21	1.98	7.19
1.00	1.16	1.98	2.30
1.00	0.88	1.98	1.74

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.85	1.98	1.68
3.00	1.21	1.98	7.19
1.00	1.16	1.98	2.30
1.00	0.88	1.98	1.74

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.85	1.95	1.66
3.00	1.21	1.95	7.08
1.00	1.16	1.95	2.26
1.00	0.88	1.95	1.72
1.00	0.85	1.95	1.66
3.00	1.21	1.95	7.08
1.00	1.16	1.95	2.26
1.00	0.88	1.95	1.72
1.00	0.85	0.90	0.77
3.00	1.21	0.90	3.27
1.00	1.16	0.90	1.04
1.00	0.88	0.90	0.79

SUB TOTAL AREA 62.33

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE 2 (PLACAS NIVEL 2 A -0.25)

EJE 2 AL 6

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.20	0.74	0.15
1.00	0.20	1.84	0.37
1.00	1.50	2.54	3.81
1.00	1.57	2.54	3.99
3.00	1.54	2.54	11.73
1.00	1.55	2.54	3.94
3.00	1.32	2.54	10.06

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.20	2.97	0.59
1.00	1.71	2.97	5.08
3.00	1.66	2.97	14.79
1.00	1.69	2.97	5.02
1.00	1.50	2.97	4.46
1.00	1.57	2.97	4.66
3.00	1.54	2.97	13.72
1.00	1.55	2.97	4.60

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.20	3.04	0.61
1.00	1.71	3.04	5.20
3.00	1.66	3.04	15.14
1.00	1.69	3.04	5.14
1.00	1.50	3.04	4.56
1.00	1.57	3.04	4.77
3.00	1.54	3.04	14.04
1.00	1.55	3.04	4.71
1.00	0.20	0.90	0.18
1.00	1.71	0.90	1.54
3.00	1.66	0.90	4.48
1.00	1.69	0.90	1.52
1.00	1.50	0.90	1.35
1.00	1.57	0.90	1.41
3.00	1.54	0.90	4.16
1.00	1.55	0.90	1.40

SUB TOTAL AREA **157.18**

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE C (PLACAS NIVEL 3 H= 4.70)

EJE 6 AL 7

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
2.00	2.99	1.25	7.48
2.00	2.99	1.09	6.52

EJE 7 AL 8

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
3.00	1.52	3.00	13.68

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
3.00	1.52	3.20	14.59
3.00	1.52	0.90	4.10

SUB TOTAL AREA 46.37

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

BLOQUE C PLACAS NIVEL 4 M- 2 E-1

EJE 5 AL 7

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.45	3.10	1.40
3.00	1.32	3.10	12.28
4.00	1.38	3.10	17.11

C-D

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	0.45	3.10	1.40
3.00	1.32	3.10	12.28
4.00	1.38	3.10	17.11
1.00	0.45	0.90	0.41
3.00	1.32	0.90	3.56
4.00	1.38	0.90	4.97

SUB TOTAL AREA 70.50


CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

SUB TOTAL AREA DE BLOQUE C	336.38
TOTAL AREA DE BLOQUE C TRAPECIOS	21.27
TOTAL AREA DE BLOQUE C	357.65

EJE 2 AL 3


A -3

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	0.80	1.15	1.71	1.75	1.66725




A -B

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	1.19	1.54	1.66	1.70	2.2659




A -B

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	1.58	1.92	1.66	1.70	2.905




A -3

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	1.96	2.30	1.66	1.70	3.5358




A -B

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	2.35	2.69	1.69	1.73	4.2588




A -3

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	1.38	1.73	1.71	1.75	2.65905




A -3

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	1.00	1.34	1.66	1.70	1.9422




A -B

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	0.61	0.96	1.66	1.70	1.3031




A -B

CANTIDAD	BASE MENOR	BASE MAYOR	LONGITUD LADO A	LONGITUD LADO B	AREA
1.00	0.21	0.57	1.66	1.70	0.6474



A -B

CANTIDAD	BASE	ALTURA	LONGITUD LADO A	AREA
1.00	0.90	0.19	0.93	0.0855



SUB TOTAL AREA BLOQUES TRAPECIO 21.27
CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

TOTAL AREA DE BLOQUE C TRAPECIOS	21.27

EJE 1 AL 2

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
2.00	0.85	0.80	1.36
3.00	1.33	0.80	3.19
4.00	0.85	1.98	6.73
6.00	1.33	1.98	15.80

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
4.00	0.85	1.95	6.63
6.00	1.33	1.95	15.56

C-VOLADIZO

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
2.00	0.85	0.89	1.51
3.00	1.33	0.89	3.55

SUB TOTAL AREA 54.34

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

TOTAL AREA DE BLOQUE B	54.34

BLOQUE E (PLACAS NIVEL 1 H= 4.70)

EJE 1 AL 4

A -B

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	1.30	0.78	1.01
1.00	0.63	0.78	0.49
1.00	1.23	0.78	0.96
2.00	1.35	0.73	1.97
1.00	1.30	2.22	2.89
1.00	0.63	2.22	1.40
1.00	1.23	2.22	2.73

B-C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
1.00	1.44	3.35	4.82
1.00	1.31	3.35	4.39
1.00	0.63	3.35	2.11
2.00	1.34	3.35	8.98

SUB TOTAL AREA 31.75

CASETÓN ICOPOR DE 40 CM DE ALTO

TOTAL AREA DE BLOQUE B	31.75

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.,
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No. 06 – 3 – 10086 - 22
Fecha suscripción contrato:	26/05/2022
Objeto del contrato:	"INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
Lugar de ejecución de la obra:	Lote Trapichito Nuevo 3 – Kilometro 3 via al sur.
Constancia de recibo No.	8
Contratista:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NIT del contratista:	79.508.558 – 7
Fecha del acta de inicio:	18/10/2022
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** El plazo de ejecución para la "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", se estima en 6.5 meses, previa aprobación de la garantía única. **Con prorroga N°1**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoría PN DIRAF No.06-3-10086-22, por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el 19 de mayo de 2023. **Con prorroga N°2**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoría PN DIRAF No.06-3-10086-22, por ciento cuarenta (140) días calendario, es decir, hasta el 06 de octubre de 2023. **Con prorroga N°3**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoria PN DIRAF No. 06-6-10186-22 en sesenta (60) días calendario contados a partir del 7 de octubre de 2023 hasta el 5 de diciembre de 2023.
Nombre del Interventor del contrato:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE Interventor contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22.
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22 Analista de Seguimiento Proyectos DIRAF

Valor del contrato:	Contrato Principal: $ 443.997.728,00 Incluido IVA.
Adición No.	N/A
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Valor total del contrato:	$ 443.997.728,00 Incluido IVA.
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI _X_ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 24/07/2023 al 24/09/2023 — Acta de corte *: N°8
Forma de Pago:	La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben Corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes. Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno a a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). • Factura de venta. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por Inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al Derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Los pagos se harán a la siguiente cuenta: Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizara bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría será siempre y cuando se realiza alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

	NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE NIT. 79.598.558 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA NUMERO DE CUENTA: 10543708998 TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2022).	Principal: R.P. 243422 del 27/05/2022

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DIRAF	11	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	$ 128.076.561,86	$ 128.076.561,86	$0	$ 128.076.561,86

Observaciones:	N/A.

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 191.887.952,01 Avance parcial recibido: $ 128.076.561,86 Total, Acumulado $ 319.964.513,87
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro. 8 radicada el 25/09/2023 (SECOP II el 27/09/2023).
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades del contrato de obra adjuntas al acta de obra Nro.8 del 25/09/2023 (SECOP II el 27/09/2023).
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	N/A
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	N/A.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Factura de venta (SECOP II el 27/09/2023) • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP II el 27/09/2023) Los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, ahora Dirección Logística y Financiera (SECOP II el 27/09/2023).

Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X__.	N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
pago por el control y supervisión de las actividades descritas en el corte de obra Nro. 8	$ 128.076.561,86	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CVN1-2058	25/09/2023	$ 128.076.561,86	$0,00	$ 128.076.561,86
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 128.076.561,86	$0,00	$ 128.076.561,86

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato en mención, toda vez que el Contratista de interventoría – CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 08 y las memorias de cantidades ejecutadas en el periodo de corte comprendido entre el 24/07/2023 al 24/09/2023; donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción y la interventoría efectuó el seguimiento y control adecuado, por lo anterior se considera viable continuar con el reconocimiento del corte 8, toda vez que el interventor cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA y con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

Lo anterior basado en el principio de eficiencia administrativa y optimización del talento humano.

NOTA 2: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Interventor

Mayor **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22

Bogotá D.C, 26 de septiembre de 2023

Señores:
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera
Dir. Carrera 59 No.26-21 Piso 2 CAM
Bogotá D.C., Colombi

CVN-06-3-10086-2022-98

Ref., Contrato de obra No. **06-6-10178-22 "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".** y Contrato de interventoría No. **06-3-10086-22 "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Presentación de corte de obra N°8 y corte de interventoría N°8 con soportes anexos.

Cordial Saludo.

Mediante el presente CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en calidad de interventor del contrato de obra en referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de interventoría también en referencia, hace entrega de los documentos del acta parcial N°8 según los requerimientos de la Supervisión de la DILOF, la cual corresponde al corte de obra que va desde el 24 de Julio de 2023 hasta el 24 de septiembre del 2023 con los respectivos anexos, la cual nos fue entregada por el contratista de la obra consorcio PONAL LYM mediante oficio N° CI-2022-OF-042 del 25 de septiembre de 2023, la documentación aquí presentada fue revisada y avalada por la interventoría, tal como se muestra en el acta de recibo a satisfacción anexa a la documentación soporte del acta de corte N°8.

La documentación entregada es la siguiente:

ACTA DE OBRA

- ACTA DE CORTE PARCIAL No8
- MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES PAGADAS
- INFORME EJECUTIVO DE OBRA
- CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATRO DE OBRA
- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
- CERTIFICADO A LA FACTURA
- AUTORIZACION DE FACTURACION
- CERTIFICACION BANCARIA
- NIT DEL CONTRATISTA
- COMPROBANTE DE PAGO FIC
- CERTIFICADO REVISOR FISCAL DE PAGO PARAFISCALES

ACTA DE INTERVENTORIA

- CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE INTERVENTORIA
- FACTURA ELECTRONICA
- CERTICADO A LA FACTURA
- AUTORIZACION DE FACTURACION
- CERTIFICADO REVISOR FISCAL DE PAGO PARAFISCALES
- PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES

Atentamente,

CARLOS VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
C. Copia GUSTAVO ADOLFO QUIROS
Supervisor.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CARLOS VERGARA NEGRETE

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 33a93b1a83da35ae2bda2d727d001cced43b89ecf7b81d5293664afb2462e1e0e21051db250e31cb42c4ac3051207511

Número de Factura: CVN1-2058
Fecha de Emisión: 25/09/2023
Fecha de Vencimiento: 25/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
Nombre Comercial: VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
Nit del Emisor: 79508558
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE
Teléfono / Móvil: 6047846589
Correo: CONTRATOSCVN@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: KR 59 26 - 21
Teléfono / Móvil: 6015159681
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	713100004	Servicios de consultoría en ingeniería y construcción	94	1,00	$ 107.627.362,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.449.198,95	19,00			$ 107.627.362,91

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia


Notas Finales

#$16-01-01-000;06-3-10086-22;gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co#$

Cobro de Acta Parcial No 8 del Contrato de Interventoría No. 06-3-10086-22 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-`9-25 09:57:39
ocumento generado el: 2023-09-25 09:57:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	107.627.362,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	107.627.362,91
IVA	20.449.198,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	20.449.198,95
Total neto factura (=)	128.076.561,86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 128.076.561,86

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048674078 Rango desde: 2046 Rango hasta: 2100 Vigencia: 2023-11-08

Bogotá D.C, 27 de septiembre de 2022

Señores
Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera
Mayor Gustavo Quiroz
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

Ref., **Contrato de interventoría No. 06-3-10086-22– ""INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**

Asunto: Anexo factura CVN1-2058

Cordial saludo,

Nos permitimos remitir aprobación de las siguientes actividades;

ITEM	DESCRIPCIÓN
3.1.1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.
3.1.2	Relleno en Recebo común Compactado
3,2,1	Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI
3,2,5	Malla electrosoldada para losa contrapiso
3,2,10	Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI
NP 2	CONCRETO SOLADOS 2500 PSI
NP 4	MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CUBIERTA
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3¨
NP 7	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA

NP 8	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI
NP 9	CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA
NP 10	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 8 1/2" DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD (120 M) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO DE BOMBA ELECTROSUMERGIBLE, CON CAPACIDAD DE 6LPS Y 7,86 HP ADEMÁS TABLEROS DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CONTROL. ARBOL DE FONTANERIA, TUBERÍA, FILTROS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN A PTAP CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y BARCTERIOLÓGICO DEL AGUA
NP 12	PLASTICO POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO
NP 13	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 10¨´ PARA ACCESO PRINCIPAL
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO FLEXA No 5
NP 15	CONCRETO CICLOPEO 20,7 MPA (3000 PSI) PARA SOBRE ANCHOS EN CIMENTACIÓN
NP 16	CASETON EN ICOPOR FORRADO EN POLIETILENO PARA ALIGERAMIENTO DE PLACAS DE CUBIERTA

De acuerdo al acta parcial No.8 de fecha (25) de septiembre de 2023 dichas actividades son facturadas a través de factura electrónica CVN1-2058 por un valor de ($128.076.561,86) CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y SEISMIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON COCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$	443.997.728,00
VALOR DEL PRESENTE CORTE	$	128.076.561,86
SUBTOTAL	$	107.627.362,91
IVA %	$	20.449.198,95
TOTAL	$	128.076.561,86

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048674078

(415)7707212489984(8020) 001876404867407 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 5 0 8 5 5 8	7	VERGARA	NEGRETE	CARLOS	ARTURO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CVN1	2,046	2,100	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

COPIA AUTORIZADA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048674078

(415)7707212489984(8020) 001876404867407 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 5 0 8 5 5 8	7	VERGARA	NEGRETE	CARLOS	ARTURO

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

Dirección
CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-05-08 / 09:38:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79508558 1004. DV 7
1005. Cod. Representación
1006. Organización VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO

997. Fecha formalización 2023-05-08/09:38:03

AUTORIZADO

Señores:
POLICIA NACIONAL
Dir. Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C., Colombia

Ref., **Contrato de interventoría No. 06-3-10086-2022 – "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

Yo, **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado (a) con C.C. No. **79.508.558** de Bogotá D.C., de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Nota 1: Siendo persona natural empleadora me encuentro exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF, por lo que mis empleados devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Nota 2: Actualmente no tengo acuerdos de pago con las entidades recaudadoras respecto a alguna de las obligaciones mencionadas.

Dado en **Montería** a los (27) **veintisiete** día del mes de **septiembre** de **2023.**

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

JAIRO ALBERTO ARGEL MARTINEZ
C.C. No.1.063.151.436 de Lorica
T.P. 246221-T
Contador Público

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 45561087
DESDE AGOSTO 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79505568
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 34 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Cocinar actividades de cafeterías no tradicionales
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45561087
APELLIDOS:	CONTRERAS SUAREZ	NOMBRES:	CATMEN CECILIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPENDIENTE	SUBTIPO COTIZANTE:	
COTIZANTE RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No: **78964063B1** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: septiembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 14/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
															PENSIÓN								SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.500.000																		230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	7950568	$ 1.954.695	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

PLANILLA No: **78927244B2** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: agosto - 2023 | FECHA DE PAGO: 13/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
															PENSIÓN								SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.500.000																		230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	7950568	$ 1.954.695	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79503558
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 DR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7845589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7897672083	(TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			85527605

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$ 0	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:									$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1067404725
DESDE AGOSTO 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		79506558
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 TEL MONTE VERDE TELÉFONO:		7845569
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE/ASIMILADO CLASE APORTANTE:		INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	9601X01 ACTIVIDAD ECONÓMICA:		Construcción de edificios no residenciales
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067404725
APELLIDOS:	CARDENAS BENITEZ NOMBRES:	INDIRA SCARLETH
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO	
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

PLANILLA No: **78984006381** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023 | PERIODO COTIZACION SALUD: septiembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 14/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: MICO

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES				
																PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.250.000																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79506558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 387.000

PLANILLA No: **78927244492** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2023 | PERIODO COTIZACION SALUD: agosto - 2023 | FECHA DE PAGO: 15/08/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: MICO

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES				
																PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.250.000																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79506558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 387.000

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 45561087
DESDE AGOSTO 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78568558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 62 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7865588
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de edificios no residenciales
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45561087
APELLIDOS:	CONTRERAS SUAREZ	NOMBRES:	CARMEN CECILIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND. SUBSID. COTIZANTE		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No: **7896406381** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023 | PERIODO COTIZACION SALUD: septiembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 14/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																PENSIÓN								SALUD						ARP				DCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1,500,000																		230301-PORVENIR	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,500,000	70560558	$ 104,400	30	$ 1,500,000	CCF19-COMFACOR	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

PLANILLA No: **7892724492** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: Julio - 2023 | PERIODO COTIZACION SALUD: agosto - 2023 | FECHA DE PAGO: 15/08/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																PENSIÓN								SALUD						ARP				DCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1,500,000																		230301-PORVENIR	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,500,000	70560558	$ 104,400	30	$ 1,500,000	CCF19-COMFACOR	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120516-4	DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA		carrera 7 # 156 - 78 Oficina 701	3108628385	clientes@disenosyestructuras.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	8 – menos de 200 o			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	24/08/2023	70312992	$426,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	20	1.600	0	69.600	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	20	6.200	0	278.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.900				8.900	20	300	9.200			89	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Comfenalco Cajo	860066942-7	68.000	20	1.600	69.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de (GE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	68.000	69.600
Pensión	1	272.000	278.200
Riesgos Laborales	1	8.900	9.200
CCF	1	68.000	69.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	416.900	426.600

Este documento está cla dado como PRIVADO por parte de Compensar Op dor de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
M	830120516-4	DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA	carrera 7 # 156 - 78 Oficina 701	3108026365	clientes@disenosyestructuras.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-08	2023-07	E	24/08/2023	70312392	TOTAL A PAGAR	
					$426.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Dependiente	IRP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Apo ME
1	CC	10428423	USECHE MACIAS JAIR	1	0			S																X	23030	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	1	8.000	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está cla[illegible]lado como PRIVADO por parte de Compensar O[illegible]dor de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5107680
DESDE AGOSTO 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7896406391
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERÍA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN: KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE TELÉFONO: 7840369
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Construcción de edificios no residenciales
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 5107680
APELLIDOS: PADILLA DE LA PEÑA NOMBRES: JOSE SEBASTIAN
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
TIPO COTIZANTE: DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: 00-NO COTIZANTE
COLOMBIANO/A RESIDENTE EN EL EXTERIOR: NO EXTRANJERO/A NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: NO
TIPO DE SALARIO: FIJO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

PLANILLA No: 78966406391 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION DIROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: septiembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 14/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
															PENSION								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COR	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.160.000	01																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS042 - SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	73560358	$ 80.850	30	$ 1.160.000	CCF06 - COMFABARRANQUILLA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 173.600**

planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7223489
DESDE SEPTIEMBRE 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900437751
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COVIDIAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CRA 7 NO. 30 A - 11 OF 106 1ER PISO		5402840
TIPO APORTANTE:	51-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-EMPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223489
APELLIDOS:	MARTINEZ CELY	NOMBRES:	JUAN CARLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	1-DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	0
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No: **7890410735** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO FORMACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: septiembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 13/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
															PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.650.000																	COLPENSIONES	30	$ 1.650.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Original	$ 256.000	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.650.000	$ 64.600	$ 0	$ 64.600	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.650.000		$ 111.400	30	$ 1.650.000	CCF21-CAFAM	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 495.400

Planilla Pagada

Planilla pagada

Entregado por:

Recibido por:

2023/09/13 9:34 AM USUARIO: SOI - CC 7223489

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 72175262
DESDE AGOSTO 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: 7
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 7890558
CIUDAD/MUNICIPIO: CARLOS ARTURO
DIRECCIÓN: CORDOBA
TIPO APORTANTE: 7845349
TIPO EMPRESA: INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES A SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): Consulta común de cuidados no contenciosos
SI

CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
MONTERIA DEPARTAMENTO:
KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE TELÉFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:
APELLIDOS:
CIUDAD/MUNICIPIO:
TIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:
TIPO DE SALARIO:
CO TIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 72175262
APELLIDOS: ARCELIO QUINTO
NOMBRES: CORDOBA
MONTERIA DEPARTAMENTO:
DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:
NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: NO
FIJO
SI

PLANILLA No: 78984065[illegible] | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: septiembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 14/09/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						SALUD										ARP						PARAFISCALES									
															PENSIÓN																																																		
																		FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.500.000															230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	7890558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF10-COMFICOR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

PLANILLA No: 7892724[illegible] | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: agosto - 2023 | FECHA DE PAGO: 15/08/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						SALUD										ARP						PARAFISCALES									
															PENSIÓN																																																	
																		FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.500.000															230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	7890558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF10-COMFICOR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

Entregado por:

Recibido por:

2023-09-27 2:35 PM USUARIO: SOI - CC72550560
