
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

ATENCION DE LESIONADOS

ALCANCE:	ALCANTARILLADO LA FLORIDA
ELABORACIÓN:	30/03/2023

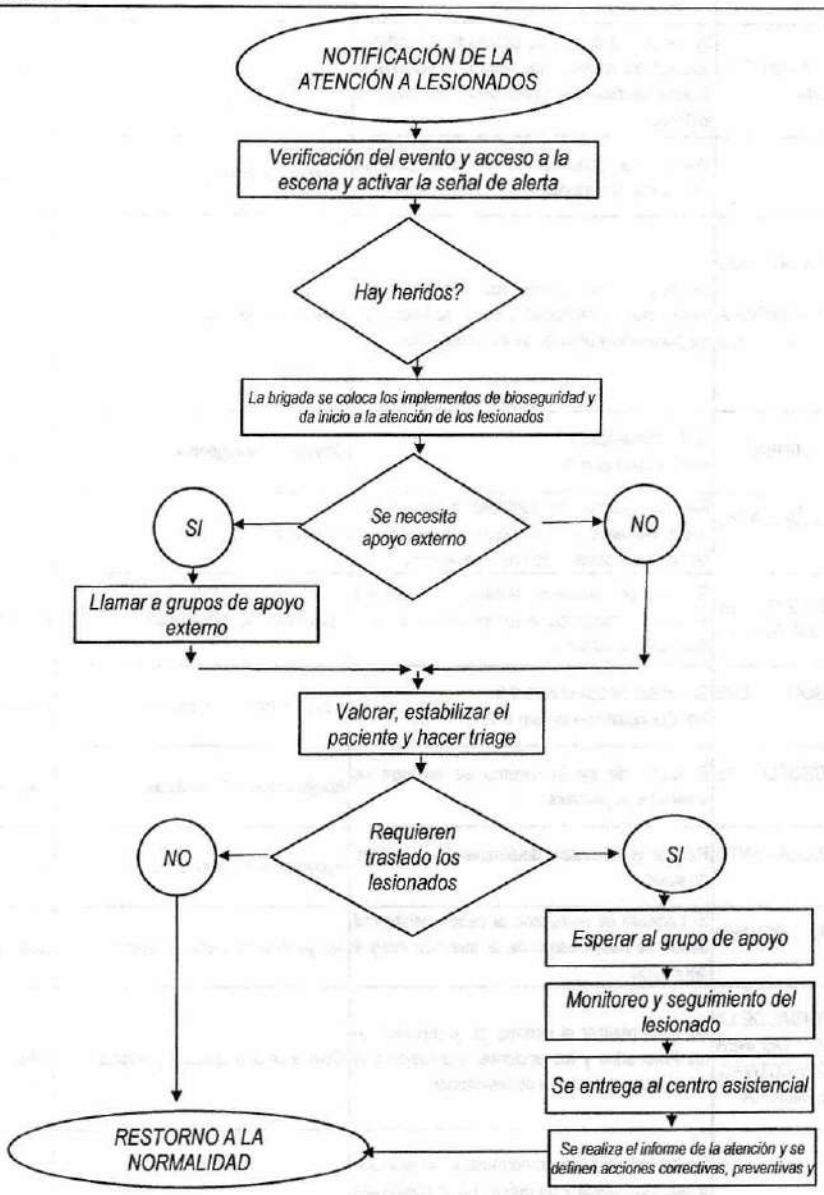

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM, REGISTROS Y EVIDENCIAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL / RECURSOS
01	NOTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LESIONADOS	Cualquier persona, que evidencie la presencia de una(s) persona(s) herida(s), debera notificar a las personas de la empresa con que se encuentre o al brigadista cercano.	Cualquier persona	Se debera inducir a los visitantes, contratistas y empleados en la forma de reporte de accidentes e incidentes de acuerdo a su funcion en la empresa.
02	VERIFICACIÓN DEL EVENTO Y ACCESO A LA ESCENA	Se determina el tipo de accidente o incidente ocurrido en el area, los riesgos asociados al evento, los recursos disponibles y las posibles victimas	Brigadistas	Inspecciones a la infraestructura y el area afectada.
03	¿HAY HERIDOS?	Verificar la cantidad de persona que se encuentran lesionados.	Personal de la brigada	Informe verbal al comité de Emergencias.
04	LA BRIGADA SE COLOCA LOS IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DA INICIO A LA ATENCIÓN DE LOS LESIONADOS	La brigada se coloca sus elementos de bioseguridad y proceden a hacer valoración de los pacientes y atender de acuerdo al triage.	Personal de la brigada	Botiquin, inmovilizadores
05	NECESITA APOYO EXTERNO	Si: Continue item # 6 No:Continua item # 7	Comité de emergencias	Informar el personal lesionado
06	LLAMAR A GRUPOS DE APOYO EXTERNOS	Realizar cadena de llamadas solicitando el apoyo requerido (Policia, bomberos) y teniendo en cuenta la cadena de llamadas interna.	Comité de emergencias	
07	VALORAR, ESTABILIZAR EL PACIENTE Y REALIZAR TRIAGE	Brindar los primeros auxilios al personal afectado controlando o estabilizando el daño que sufrio la persona	Apoyo externo, brigadistas	Informe de atencion de paciente
08	REQUIEREN TRASLADO LOS LESIONADOS	Si: Continuar con el item # 9 No: Continuar con el item # 12	Apoyo externo, brigadistas	Informe de atencion de paciente
09	ESPERAR AL GRUPO DE APOYO	El grupo de ayuda externo se encarga de estabilizar el paciente.	Apoyo externo, brigadistas	Informe de atencion de paciente
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL LESIONADO	Revisar el lesionado determinando su estado de salud	Apoyo externo, brigadistas	Informe de atencion de paciente
11	SE ENTREGA AL CENTRO ASISTENCIAL	El paciente es entregado al centro asistencial donde se hacen cargo de la atencion integral del mismo.	Apoyo externo, centro asistencial	Informe de atencion de paciente
12	SE REALIZA EL INFORME DE LA ATENCIÓN Y SE DEFINEN ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	Se debe realizar el informe de la atención de los lesionados y las acciones que mejoren el proceso de la atención de lesionados.	Comité de emergencias y brigada	Informe
13	RETORNO A LA NORMALIDAD	Se determina parte de normalidad, la atención a sido controlada y se determina la posibilidad de continuar las labores dentro de la organización de acuerdo com lo estipulado por el comité de emergecias y la alta dirección de la empresa	Comité de emergencias, Gerencia	Informe el evento. Investigacion de Accidente Laboral.


OTRAS CONSIDERACIONES	ACCION	RESPONSABLE (CARGO / FUNCION)	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	REGISTRO	RECURSOS
MANEJO AMBIENTAL	Manejo de residuos solidos: Manejo de escombros y generación de residuos estructurales	SST	Casco Zapatos de Seguridad	Certificados y licencias Verificación de vehículos y escombreras	Vehiculos de transporte de escombros y escombreras autorizadas

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

CONSIDERACIONES ESPECIALES	Manejo de herramientas y equipos	Almacen y SST	Cascos Guantes Proteccion Visual Zapato de Seguridad	Informe de resultados	Lo requerido del informe. Verificación de las hojas de seguridad, ficha tecnica.
	Manejo de sustancias quimicas	SST	De acuerdo a la ficha de seguridad de la sustancia quimica.	Informe de resultados	Lo requerido del informe. Verificación de las hojas de seguridad, ficha tecnica y activación del pon del manejo de sustancias quimicas en caso de que sea requerido
GLOSARIO / TERMINOS	**LESIÓN:** Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe, una enfermedad, etc				

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
INCENDIO

ALCANCE:	ALCANTARILLADO LA FLORIDA
ELABORACIÓN:	30/03/2023

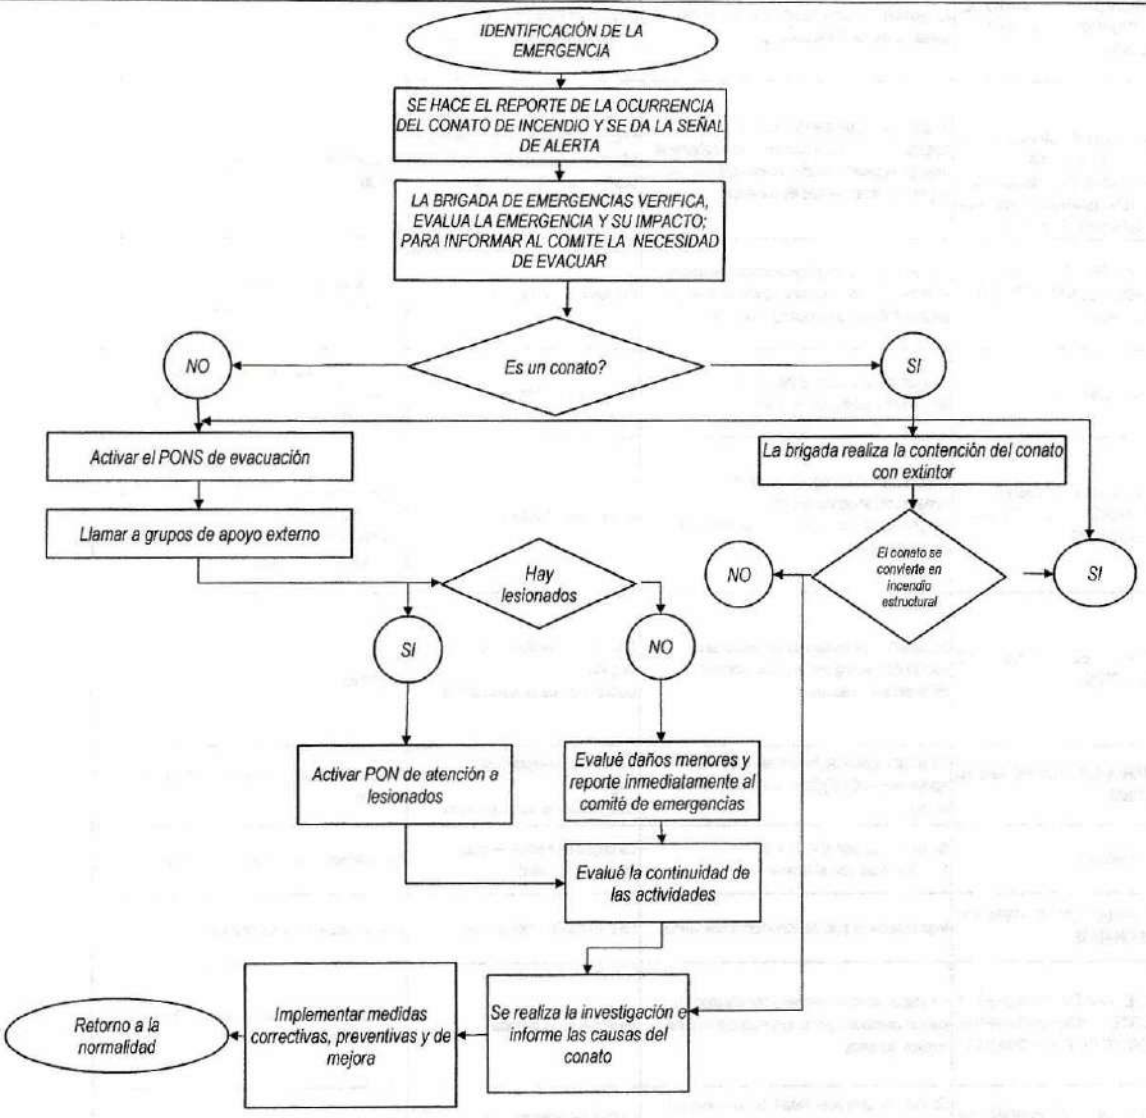

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM, REGISTROS Y EVIDENCIAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL / RECURSOS
01	IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA	Cualquier persona, que evidencie el hecho ocurrido, deberá notificar a las personas de la empresa con que se encuentre o al brigadista cercano.	Cualquier persona	Se deberá inducir a los visitantes, contratistas y empleados en la forma de notificación de la emergencia de acuerdo a su función en la empresa.
02	SE HACE EL REPORTE DE LA OCURRENCIA DEL CONATO DE INCENDIO Y SE DA LA SEÑAL DE ALERTA	Al reportar la ocurrencia del evento se da la señal de alerta (2 silbatazos)	Brigada de emergencias Coordinadores de evacuación	Silbatos
03	LA BRIGADA DE EMERGENCIAS VERIFICA, EVALUA LA EMERGENCIA Y SU IMPACTO; PARA INFORMAR AL COMITE LA NECESIDAD DE EVACUAR	Al dar la señal de alerta el comité activa a la brigada y da la orden que esta se desplace al área de impacto y evalue la emergencia, su impacto y la necesidad de evacuar.	El comité de emergencias activa al jefe de la brigada para que se desplace con su personal	Cascos de seguridad, guantes, gafas, tapabocas y calzado de seguridad. Silbato
04	IDENTIFICAR EL TIPO DE INCENDIO (CONATO, INCENDIO ESTRUCTURAL)	Observar la situación identificando el tipo de incendio que se esta generando en la empresa para definir como se puede intervenir	Personal de la brigada	Cascos de seguridad, guantes, gafas, tapabocas y calzado de seguridad
05	¿ES UN CONATO?	Si: Continuamos con el ítem # 6 No: Continuamos con el ítem # 7	Personal de la brigada	Cascos de seguridad, guantes, gafas, tapabocas y calzado de seguridad extintores con polvo químico seco.
06	LA BRIGADA REALIZA LA CONTENCIÓN DEL CONATO CON EXTINTOR	El personal de la brigada se hace cargo del conato utilizando los extintores (ABC, SOLKAFLAM) ubicados en diferentes puntos de la empresa	Brigada de emergencias	Cascos de seguridad, guantes, gafas, tapabocas y calzado de seguridad, extintores con polvo químico seco. Informar acerca de los extintores que fueron usados para continuar con una nueva recarga del mismo
07	ACTIVAR EL PONS DE EVACUACIÓN	Se activa la señal de alarma (Silbatazo continuo) y se siguen las indiciaciones del PON para la evacuación	Comité de emergencias Brigada Coordinadores de evacuación	Silbatos Distintivos
08	LLAMAR A GRUPOS DE APOYO EXTERNO	Realizar cadena de llamadas solicitando el apoyo requerido (Policía, bomberos, entre otros)	Comité de emergencias Brigada Coordinadores de evacuación	Directorio telefonico de grupos de apoyo externo
09	HAY LESIONADOS	Si: Continuar con el ítem # 9 No: Continuar con el ítem # 10	La brigada de emergencias (primeros auxilios)	informe verbal al jefe de emergencias
10	ACTIVAR EL PON DE ATENCIÓN A LESIONADOS	Implementar el pon de atención a lesionados	La brigada de emergencias	Pon de atención a lesionados
11	EVALUE DAÑOS MENORES Y REPORTE INMEDIATAMENTE AL COMITÉ DE EMERGENCIAS	Se inspecciona la empresa observando los puntos afectados por la emergencia evitando nuevos sucesos.	Personal de la brigada	Informe de lo sucedido al comité de emergencias
12	EVALUE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES	Se determina la posibilidad de continuar las actividades de acuerdo a los riesgos evidenciados y valorados por la emergencia.	Comité de emergencias Brigada	Informe verbal del comité de emergencias
13	EL CONATO SE CONVIERTE EN INCENDIO ESTRUCTURAL Al no realizar la contencion del conato de incendio, este se convierte en un incendio o conflagracion, y se limita la competencia de la brigada de la empresa.	Si: Continuar con el ítem # 7 No: Continuar con el ítem # 15	Brigada de Emergencia Cuerpo de Bomberos	Solicitud verbal de apoyo externo (Bomberos) Informe de Evento.
15	HAY LESIONADOS	Si: Continuar con el ítem # 14 No: Continuar con el ítem # 17	La brigada de emergencias	informe verbal al jefe de emergencias
16	ACTIVAR PON DE ATENCIÓN A LESIONADOS	Implementar el PON de atención a lesionados	La brigada de emergencias	PON de atención a lesionados
17	SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN E INFORME LAS CAUSAS DEL CONATO DE INCENDIO	Se analizan las causas del conato de incendio, evitando una nueva ignición	Personal de la brigada	Llenar el formato de investigación evidenciando los hechos

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

18	IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	Implementar el plan de acción propuesto después de realizar la investigación del evento	comité de emergencia	N/A
19	RETORNO A LA NORMALIDAD	Se determina parte de normalidad, la emergencia a sido controlada y se determina la posibilidad de continuar las labores dentro de la organización de acuerdo por lo estipulado por el comité de emergencias y la alta dirección de la empresa	Comité de emergencias y la gerencia	Informe el evento


OTRAS CONSIDERACIONES	ACCION	RESPONSABLE (CARGO / FUNCION)	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	REGISTRO	RECURSOS
MANEJO AMBIENTAL	Manejo de residuos solidos: Manejo de escombros y generación de residuos estructurales (cenizas y carbones, material solido de estructura)	SST	Casco Zapatos de Seguridad	Certificados y licencias Verificación de vehículos y escombreras	Vehículos de transporte de escombros y escombreras autorizadas
	Manejo de recurso agua	La empresa prestadora de servició públicos	N.A.	Informe de resultados	Lo requerido del informe Verificación del estado de la infraestructura y posibles fuentes de contaminación
CONSIDERACIONES ESPECIALES	Manejo de sustancias químicas	Área de seguridad y salud en el trabajo	De acuerdo a la ficha de seguridad de la Sustancia Quimcia	Informe de resultados	Lo requerido del informe Verificación de las hojas de seguridad, ficha técnica y activación del pon del manejo de sustancias químicas en caso de que sea requerido

GLOSARIO / TERMINOS	**Incendio estructural:** Un incendio estructural corresponde a aquel tipo de incendio que se produce en casas, edificios, locales comerciales, etc.
	Flashover o combustión súbita: Generalizada es un fenómeno que se observa en incendios confinados en los cuales de forma repentina todas las superficies combustibles, que hasta ese momento no estaban implicadas en el incendio
	Incendio: Es fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita, gradual e instantánea, requiriendo para su control y eliminación el uso de hidrantes, mangueras y extintores de carretilla. Los efectos resultantes del siniestro, abarcan hasta un 25 por ciento de la zona o inmueble afectado. Conflagración: Es el incendio que destruye parcial o totalmente un inmueble, abarcando de un 26 por ciento al 100por ciento de su estructura.
	Backdraft, llamado también explosión de gases de humo con efecto reverso: Es una situación que puede ocurrir cuando un fuego necesita oxígeno; por lo cual la combustión cesa pero sigue habiendo gases y humo combustible con temperatura alta.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

ORDEN PUBLICO

ALCANCE:	ALCANTARILLADO LA FLORIDA
ELABORACIÓN:	30/03/2023

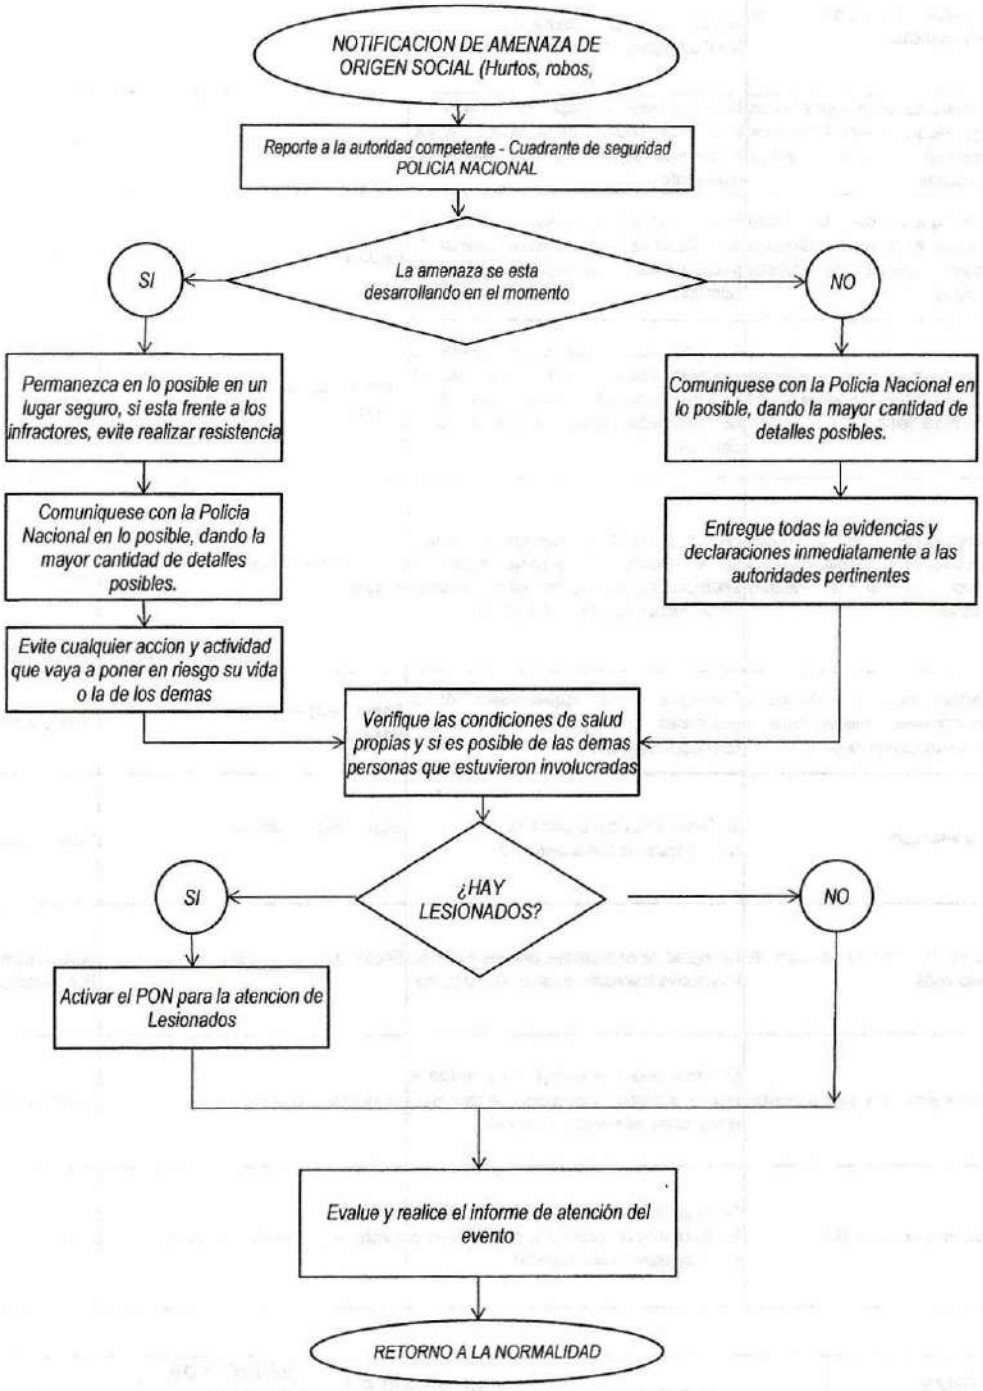

DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM, REGISTROS Y	RESPONSABLE	OBSERVACIONES / ELEMENTOS DE
01	Notificacion de Amenaza	Delincuencia realiza cualquiera de los siguientes delitos: Hurto, Robo, asonada, extorsión, atentados, entre otros.	Persona afectada	Son pocos minutos los cuales se desarrolla el delito.

02	Reporte a la autoridad competente - Cuadrante de seguridad POLICIA NACIONAL	Al identificar la emergencias se debe notificar a las autoridades de Policia para que ellos realicen una búsqueda y control en el área, hasta que se tenga la certeza de que no existe peligro. Solo se hace el reporte si es seguro en ese momento, sino espere a que los delicuentes se retiren para activar al cuadrante de policia.	Brigada de emergencia	Se debera dar la informacion con la mayor claridad posible a las autoridades, y apoyar con las evidencies y pruebas respectivas.
03	La amenaza se esta desarrollando en el momento	Si: Continuamos con el item # 4 No: Continuamos con el item # 7		N/A
04	Permanezca en lo posible en un lugar seguro, si esta frente a los infractores, evite realizar resistencia	No se enfrente ni haga resistencia a los delincuentes, si es posible ocultese o pongase en un lugar seguro, fuera del alcance del delincuente.	Personal	N/A
05	Comuniquese con la Policia Nacional en lo posible, dando la mayor cantidad de detalles posibles	Informe a las autoridades sobre la evidencia y el detalle de los hechos, y siga a cabalidad los procedimientos establecidos por las autoridades.	Personal	Telefono
06	Evite cualquier accion y actividad que vaya a poner en riesgo su vida o la de los demas.	No haga acciones que puedan afectar su integridad fisica o la de los demas. No sea implusivo de manera innecesaria y permita que las autoridades tomen el control de la situacion.	Grupos de apoyo externo Brigada	N/A
07	Comuniquese con la Policia Nacional en lo posible, dando la mayor cantidad de detalles posibles.	Permita que las autoridades tomen el control de la situacion, y exponga todas las evidencias, comentarios, hechos in situ que se desarrollaron o se estan desarrollando	Grupos de apoyo externo Brigada	Telefono
08	Entregue todas la evidencias y declaraciones inmediatamente a las autoridades pertinentes	Dispongase a los requerimientos de la autoridades y siga el procedimiento establecido por ellos.	Grupos de apoyo externo Brigada	Informe verbal
09	Hay lesionados	Si: Continuamos con el item # 10 No: Continuamos con el item # 12	Brigada de Emergencias	Botiquin e inmovilizadores
10	Active el PON de atención de lesionados	La brigada de emergencias procede a atender los posibles lesionados durante la emergencia	Brigada de Emergencias	Botiquin e inmovilizadores Pon de atención de lesionados
11	Evalue el evento y haga el informe	El comité evalua la emergencia y realiza el informe definiendo actividades que prevengan la ocurrencia del evento nuevamente	Comité de emergencias	Informe escrito
12	Retorno a la normalidad	Después de controlada la situación y atendido los lesionados el comité y la gerencia dan la orden de retorno a la normalidad	comité de emergencia y gerencia	N/A

OTRAS CONSIDERACIONES	ACCION	RESPONSABLE (CARGO / FUNCION)	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	REGISTRO	RECURSOS
	Manejo de residuos solidos: Manejo de escombros y generación de residuos estructurales (Cenizas, cupón)	SST	Verificación de vehículos y escombreras	Certificados y licencias	Vehiculos de transporte de escombros y escombreras autorizadas

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

MANEJO AMBIENTAL	Manejo de recurso agua	La empresa prestadora de servicio públicos	N.A.	Informe de resultados	Lo requerido del informe. Verificación del estado de la infraestructura y posibles fuentes de contaminación
CONSIDERACIONES ESPECIALES	Manejo de sustancias químicas	SST	N.A.	Informe de resultados	Lo requerido del informe. Verificación de las hojas de seguridad, ficha técnica y activación del pon del manejo de sustancias químicas en caso de que sea requerido
GLOSARIO / TERMINOS	**LAS TAREAS DE ALTO RIESGO**: son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.				
	ORDEN PUBLICO: Situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias.				

Anexo 3.3.3:Anexo 6:Matriz IPVR

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Matriz de Riesgo.
Registro SG-SST 022/version 2

MATRIZ DE PELIGRO

FECHA DE ACTUALIZACION: 08/02/2023

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDAD	TAREAS	RUTINARIA SI o NO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE INTERVENCION				
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NIVEL DE DE x NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCION	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVOS, ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS	ALCANTARILLADO LA FLORIDA	RECORRIDO DE OBRA, TRABAJO ADMINISTRATIVO	DESPLAZAMIENTOS A LAS OBRAS Y A ENTIDADES PUBLICAS	SI	Carga estática: posiciones prolongadas y rotativas	Ergonómico / Biomecánico	Lesiones osteomusculares, dolores lumbares, problemas vasculares.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	3	2	6	Bajo	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	Dotacion de Sillas ergonomicas	Realizar Pausas activas durante la jornada de trabajo Capacitacion en higiene postural y pausas activas Inspecciones ergonomicas a puestos de trabajo	NA
				SI	Movimientos repetitivos en las manos	Ergonómico / Biomecánico	Tendinitis, entumecimiento, Síndrome del túnel del carpo	psc reusa	NINGUNO	pausas activas en manos y brazos	2	2	4	Bajo	10	40	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	Ninguno	Realizar Pausas activas durante la jornada de trabajo Capacitacion en higiene postural y pausas activas Inspecciones ergonomicas a puestos de trabajo	NA
				SI	Diseño del puesto de trabajo (uso de computador)	Ergonómico / Biomecánico	Fatiga Visual, dolores lumbares, agotamiento físico	adecuacion del puesto de trabajo	ninguno	Pausas activas	2	2	4	Bajo	10	40	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	Adecuacion puesto de trabajo	Capacitacion en Higiene Postural	NA
				SI	Carga mental	Psicosocial	Disminución de la atención, inestabilidad emocional, alteraciones de sueño, alteraciones psicosomáticas (Alteraciones cardiacas, problemas digestivos)	ninguno	INTEGRACION DEL PERSONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES LUDICAS	Evaluacion factores de riesgo psicosocial	2	3	6	Medio	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Integraciones Laborales Programa para el Riesgo Psicosocial Programa de Estilos de Vida Saludable	NA
				SI	Caidas a nivel	Locativos	golpes,fracturas,hernias,muerte etc	ninguno	ninguno	precaucion al momento de transitar	2	3	6	Medio	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en prevencion de caidas a nivel Instalar Señalizacion en obras aledaña a la prevencion de caidas a nivel	Uso de Calzado con suela antideslizante
				SI	Golpes contra objetos inmóviles	Locativos	Traumas superficiales	ninguno	ninguno	Botas de seguridad	2	3	6	Medio	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en orden y aseo en oficinas	NA
				SI	Caidas de objeto	Locativos	Contusiones, heridas traumas, fracturas. Caidas a mismo nivel	Ninguno	señalizacion y demarcacion preventiva del riesgo	uso de elementos de proteccion personal	2	3	6	Medio	25	150	I Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60	No Aceptable	NA	NA	NA	Inspecciones de seguridad locativas periodicas en oficinas Capacitacion en orden y aseo en oficinas	NA
				SI	Cortes con objetos	de seguridad	Corte en manos por manipulacion de elementos de oficina como tijeras,papeleria,alas ganchos,sierras.	Ninguno	ninguno	precaucion al momento de manipular objetos	1	3	3	Bajo	10	30	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60	Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en autocuidado	NA
				SI	Contactos eléctricos, instalaciones eléctrica expuestas y en mal estado	electrico	Quemaduras, heridas, traumatismo, perdidas humanas y materiales	Ninguno	Plan de emergencia	capacitacion en procedimientos de emergencias	2	3	6	Medio	60	360	I Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Inspecciones de Seguridad señaladas en oficinas (Conexiones y equipos electricos) Plan de mantenimiento preventivo de redes y conexiones electricas en oficinas Autoreporte de condiciones inseguras de trabajo en oficinas	NA
				SI	Iluminación (por exceso o deficiencia)	Físico	agotamiento visual, desmotivacion	Mediciones ambientales	ninguno	Capacitacion o charlas sobre el reporte de condiciones inseguras	1	2	2	Bajo	10	20	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60	Aceptable	NA	NA	Cambio de luces por falta o recese de luminarias	Autoreporte de condiciones inseguras de trabajo en oficinas	NA
				SI	Virus, bacterias, parásitos, hongos	biologico	alergias, afectaciones gastro intestinales,lesiones cutaneas,dermatitis	ninguno	ninguno	charlas sobre el autocuidado y limpieza de las manos	2	2	4	Bajo	10	40	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Programa de Estilos de Vida Saludables Capacitacion en lavado de manos Limpieza y desinfeccion de superficies de trabajo	NA
				SI	contagio del covid 19	biologico	dificultades respiratoria, muerte	Ninguno	Limpieza de superficie y elementos	Capacitacion en autocuidado	3	4	12	MUY ALTO	10	120	I NVC	Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en autocuidado	NA
				SI	Accidentes de transito al desplazarse por vias publicas.	de seguridad	lesiones de gravedad, muerte etc	ninguno	ninguno	charlas de seguridad vial	6	2	12	Alto	10	120	I Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	charlas de seguridad vial	NA
				SI	Robos, atracos, disturbios publicos.	publico	lesiones de gravedad, muerte etc	ninguno	ninguno	charla de actuacion en caso de robos y manifestaciones publicas	2	4	8	Medio	10	80	I Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en prevencion del riesgo publico	NA
				SI	Exposición a virus, bacterias,animales, hongos o parasitos. Presencia en el ambiente de trabajo.	Biologicos	Infecciones o infestaciones agudas o crónicas. Reacciones alérgicas. Enfermedades infectocontagiosas	Ninguno	Aseo continuo en las instalaciones	Capacitacion en autocuidado estilos de vida saludable	3	3	9	Alto	10	90	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Programa de Estilos de Vida Saludables Capacitacion en lavado de manos	NA
				SI	Postura prolongada mantenida. Las actividades de procesamiento de información implican posición sedentaria prolongada	Biomecánicos	Dolor lumbar, incomodidad, malas posturas, cansancio	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	3	4	12	Muy Alto	10	120	I Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	Ninguno	Realizar Pausas activas durante la jornada de trabajo Capacitacion en higiene postural y pausas activas Inspecciones ergonomicas a puestos de trabajo	NA
				SI	Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de información implican digitación de información.	Biomecánicos	Síndrome del túnel carpiano, adormecimiento, calambres en extremidades superiores, desordenes de trauma acumulativo.	Ninguno	NINGUNO	Pausas Activas	2	2	4	Bajo	10	40	III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Realizar Pausas activas durante la jornada de trabajo Capacitacion en higiene postural y pausas activas Inspecciones ergonomicas a puestos de trabajo	NA
				SI	Relaciones interlaborales, organización, planeación del trabajo. Interacción con los demas funcionarios	Psicosocial	Alteración de la memoria, trastornos del sueño, irritabilidad	Ninguno	Integracion del personal por medio de actividades ludicas	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	Aceptable	NA	NA	NA	Integraciones Laborales Programa para el Riesgo Psicosocial Capacitacion en trabajo en equipo Programa de Estilos de Vida Saludable	NA

| | | |

PROYECTOS EN CASAO	CIVILMA	ADECUACIONES CALLE 70 CARRERA	Actividades de obra	5	Ruido Generar ruido molestias auditivas y exceder esta emisión sobre molestias propias	Físico	Generar ruido molestias auditivas y exceder esta emisión sobre molestias propias	Ninguno	Ninguno	Uso de protección auditiva	2	4	6	Medio	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	NA	NA	NA	capacitacion el uso adecuado de epp	Uso de protección auditiva
				6	Altas temperaturas Contacto con temperaturas altas o bajas		Exposición térmica ambiente fatiga, molestias	Ninguno	Ninguno	Uso de ropa para el frio	2	4	6	Medio	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	NA	NA	NA	Realizar pausas activas durante la jornada laboral Hidratacion Frecuente	NA
				7	Ocasionar y exponer a la vía a los transeuntes por cambio de comportamiento en conductores y peatones	Psicosocial	Estrés	Ninguno	Ninguno	Pausas activas	2	4	6	Medio	10	60	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	NA	NA	NA	Integraciones Laborales Programa para el Riesgo Psicosocial Programa de Estilos de Vida Saludable	NA
				8	Dolor Lumbar Levantamiento de cargas	Biomecanico	Lesiones músculo esqueléticas dolor lumbar	Ninguno	Ninguno	Rotación de actividades y levantamiento adecuado de cargas	2	4	8	Medio	10	80	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	Aceptable	NA	NA	NA	Realizar Pausas activas durante la jornada detrabajo Capacitacion en higiene postural, pausas activas y manejo de carga	NA
				9	Caida a nivel		Riesgo cardiovascular Dolor lumbar Dificultad de movilidad	Ninguno	Ninguno	Sensibilizacion y seguimiento a casos de esta patologia	2	3	6	Medio	25	150	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspende actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Programa de Estilos de Vida Saludable	NA
				10	Mecanico Atrapamiento en maquinas,equipos y vehiculos	Seguridad	Fracturas especialmente de las porciones terminales extremidades	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento de cinta de riesgos	2	4	8	Medio	60	480	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Plan de mantenimiento a los vehiculos y equipos Señalizacion de seguridad en areas Capacitación en normas de seguridad en obras	Uso de botas de seguridad, casco, gafas y guantes
				11	Locativo Infraestructura precaria en mal estado		Caidas al mismo nivel, golpes contusiones, heridas, fracturas, esguinces, golpes	Ninguno	Señalizacion de areas	Ninguno	2	3	6	Bajo	15	90	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en prevencion de caidas a nivel o desnivel Inspecciones de seguridad Autocontrole de condiciones de trabajo	Uso de botas de seguridad
				12	Locativo Orden y aseo Materiales dispersos en el area de trabajo Elementos inservibles		Tropezones Golpes, heridas, contusiones, esguinces	Ninguno	Clasificacion orden y limpieza	Ninguno	3	3	9	Medio	10	90	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	NA	Programa de Manejo de Residuos Programa de orden y aseo Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras en los proyectos	NA
				13	Accidentes de transito Desacato de señalizaciones y malas diligencias viales		Atropellamiento, choques con y contra vehículos, caídas de vía con diferentes severidades, vuelcos, golpes, contusiones, fracturas severas de riesgo, accidentes vehiculares con compromiso de la vida humana, colisiones con otros vehículos	Ninguno	Ninguno	Charlas de seguridad en seguridad Vial	3	5	15	Medio	20	300	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion de normas de seguridad vial Señalizacion de seguridad en areas de trabajo Inspeccion de seguridad periodica a vehiculos	NA
				14	Publicos (ruidos, silbidos, insultos, amenazas, etc) Por desplazamiento a pie/vias con diferentes niveles de orden público, por agresiones de invasión y entorno		Traumatismos de tejidos duros de varias clases severos. Shocks, hipovolemicos, lesiones psicologicas	Ninguno	Ninguno	Charlas de manejo de situaciones peligrosas y publicidad	3	4	8	Medio	25	200	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en prevencion del riesgo publico	NA
				15	Sismo Inundación Vientos fuertes derrame químicos Por fenómenos naturales Contratiempos, angustias y molestias en vías y viviendas.	Fenomenos naturales	Heridas, golpes, contusiones, lesiones severas	Ninguno	Ninguno	Promover el autocuidado	5	1	5	Medio	10	50	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Plan de emergencias Capacitacion en atencion y respuesta ante emergencias	Dotacion de impermeable
				16	Trabajo en alturas Exposición en actividades a más de 2 metros de altura o profundidad	Mecanicos	caidas de altura de diferentes niveles a diferentes alturas	Ninguno	Inspeccion de puntos de anclaje	Sistema de las eslingas de Yoyo	2	4	8	Medio	10	80	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	Infraestructura para la proteccion contra caidas: lineas de vida, andamios y escaleras certificadas	Programa de prevencion y proteccion contra caidas en trabajo en altura Entrenamiento en trabajo en altura Aplicacion de permisos de trabajo seguro en altura o lista de chequeo antes de realizar trabajo en altura	Dotacion y empleo de equipos contra caidas
				17	Atrapamiento Hundimiento en excavaciones profundas			Ninguno	Verificacion de taludes	Prohibir el ingreso al borde o alrededor de la excavacion	2	4	12	Alto	10	120	II Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	NA	NA	Entibado de paredes de excavacion	Diseñar procedimiento de trabajo seguro en excavaciones Capacitacion en normas de seguridad para trabajos en excavaciones	NA
				18	Caidas de mismo nivel	Biologico	Golpes contusiones, heridas, muerte	Identificacion de superficies	Identificacion de superficies irregulares	Uso de elementos para la prevencion	5	1	20	Muy Alto	10	200	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	NA	Capacitacion en autocuidado Autoreporte de condiciones de salud	NA
				19	Explosivos (pirotecnia) Ingreso a sitios de seguridad Explosivos, riesgo químicos	Seguridad Explosivos riesgo químicos	Golpes, lesiones severas, heridas, contusiones, fracturas, muerte	Ninguno	Inspeccion de cilindros	Uso de extintor en extincion personal	4	1	4	Medio	25	100	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No Aceptable	NA	NA	Sistema de ventilacion Medicion ambiental antes del ingreso a espacio confinado	Diseñar programa de trabajo seguro en espacios confinados Capacitacion en normas de seguridad en espacios confinados Realizacion de permiso de trabajo seguro o lista de chequeo en espacios confinados	Uso de EPP de acuerdo a riesgos identificados al interior del espacio confinado

899

Anexo 4.1-1: Certificado de seguridad social.

900

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Medellín, 04 de abril de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, y como Contadora pública del **CONSORCIO PITA 7,** identificado con **NIT 901.646.363 - 1**, me permito certificar que éste se encuentra a paz y salvo por todo concepto correspondiente a salarios y pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales.

Cordialmente,

MYRIAM MAHECHA ALZA
T.P 20747 –T
C.C. 41.721.695 de Bogotá.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.721.695
MAHECHA ALZA
APELLIDOS
MYRIAM
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1955
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

11-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00154484-F-0041721695-20090417 0010742785A 1 26786901



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

20747-T

MYRIAM
MANRIQUE ALZA
C.C. 41721685
RESOLUCION INSCRIPCION 1169 FECHA 19/05/88
UNIVERSIDAD CENTRAL

Huella

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003569

Transcriba Notaría Directoría del Círculo
Según documento que esta
COPIA conforme con su
original que he tenido a la vista
10 MAR. 2017
NOTARIA DECIMO OCTAVA
18 CIRCULO DE BOGOTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
Julia E. Galvis Ni
NOTARIA 18 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3C7A8ED0938438CE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MYRIAM MAHECHA ALZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41721695 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Anexo 4.4-1: Actas de reunión.

Cód. FO-GTIC-004

Versión 6

Formato
FO-GTIC Acta de Reunión General

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS GENERALES								
Número de acta		01.						
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de control y gestión territorial**						
Subsecretaría o Subdirección:		**Servicios públicos**						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Alcantarillado**						
Lugar:	**San Antonio de Prado**	**Fecha:**	02/03/23	**Hora Inicio:**	11:11	**Hora Finalización:**		
Actividad o tema:	RECORRIDO DE OBRA ALCANTARILLADO LA FLORIDA.			**Anexa listado de asistencia**				
				SI	V	**NO**		
Elaborado por:	GLORIA CRISTINA GARCIA RODRIGUEZ	**Convocada por:**		SUPERVISIÓN DE OBRA				
Objetivo de la reunión:	COMITE DE OBRA # 1.							

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1.	PRESENTACIÓN EQUIPO DE OBRA Y SUPERVISIÓN
2.	INFORMACIÓN DE ACTA DE INICIO.
3.	DEFINICIÓN DE PUNTOS DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA
4.	DEFINICIÓN DE FECHA Y HORA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

DESARROLLO TEMÁTICO

1 PRESENTACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.

2 INFORMACIÓN DE ACTA DE INICIO PARA CONTRATISTA E INTERVENTORÍA. PARA 01 MARZO DE 2023.

3 SE DEFINE COMO PUNTO DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA EN TRAMO 2 EN SECTOR LA FLORIDA EN LA Y ENTRE TRAMO 2 Y TRAMO 3, Y SE REALIZARA INSTALACIÓN EN.

INICIO DE RAMO 2. EN SECTOR LOMA DE LOS VARGAS.

4. SE DEFINE LA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA PARA EL DIA MARTES 07 DE MARZO DE 2023 A LAS 5:00pm. EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISIÓN, PROFESIONALES DE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

\

CONCLUSIONES	
1	\
2	
3	
4	
5	
6	
7	

DOCUMENTOS ANEXOS	
1	\
2	

3	
4	
5	
6	
7	
8	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
CITAR EPM A REUNION DE INICIO	INTERVENTORIA	MARTES 07 MARZO 5:PM.
RECORRIDO DE OBRA CON EPM	INTERVENTORIA	MIERCOLES 08 MARZO 10:AM.
REUNION DE INICIO DE OBRA	PERSONAL DE OBRA Y CONTRATO	MARTES 07 MARZO 5:PM.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	JUEVES 9 DE MARZO DE 2023 - 2:00 pm.

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Entidad**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Diana Hernández B	Contratista	3013393031	dianahdez573@gmail.com	
[illegible]	Interventoría	3005[illegible]829	La Florida.ecovias@gmail.com	
Carlos J. Pacheco S.	Interventoría	3117139465	Laflorida.ecovias@gmail.com	
Nini Johana R	Interventoría	3136566255	"	
Juan David Upegui E	"	3103718726	"	
Sara Hernández Pineda	Contratista	3205402685	alcantarilladopita7@gmail.com	
SANTIAGO TABORDA	CONTRATISTA	3206767612	"	
Sorany Guerra	Contratista	3203644942	" "	
Juan Carlos Montoya	Contratista	3105952902	" "	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Diego Alberto Ceballos	SG y CT / SSPP	3014546274	diego.ceballos@medellin.gov.co	Diego Ceballos P
José A. Montoya E	SG y CT / SSPP	3148561334	joa.montoya@medellin.gov.co	
Maritza Gil M.	SG y CT / SSPP	3007855578	maritza.gil@medellin.gov.co	Maritza Gil
Nancy S. Álvarez	SG y CT / SSPP	3014339690	nancyalvarez1@gmail.com	Nancy S.

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

DATOS GENERALES							
Número de acta		02					
Secretaría o Departamento Administrativo:		GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL.					
Subsecretaría o Subdirección:		SERVICIOS PUBLICOS.					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		EQUIPO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.					
Lugar:	CAMPAMENTO DE INTERVENTORÍA	**Fecha:**	09 MARZO	**Hora Inicio:**	2:00	**Hora Finalización:**	3:15
Actividad o tema:	COMITE DE OBRA.	**Anexa listado de asistencia**					
		SI	✓	**NO**			
Elaborado por:	Gloria Cristina García Rodríguez	**Convocada por:**	INTERVENTORIA – SUPERVISIÓN				
Objetivo de la reunión:	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO DE OBRA.
2.	INFORME DE RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑOS EN OBRA.
3.	INFORME DE AVANCE DE CADA COMPONENTE

DESARROLLO TEMÁTICO
PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN - VER LISTADO DE ASISTENCIA ANEXO. - SE NOTIFICA CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA. RICARDO GUERRA, SE ANEXARA DOCUMENTACIÓN A LA INTERVENTORIA PARA CAMBIO.

- SE ANALIZA TIEMPOS DE OBRA CON RELACION A TRAMO 1, 2 Y 3.
- EN RECORRIDO EL DIA MIERCOLES 8 DE MARZO CON EPM SE EVIDENCIO EN COMPAÑIA DE SUPERVISION TOBON Y SALVADOR. EL FALLO EXISTENTE EN TRAMO 1. LOS CAMBIOS QUE SE HAN GENERADO Y EPM REALIZA LA COORDINACION DE CAMBIO DE TUBERIA POR POLIETILENO Y REALIZAR DOS BROCALES UBICADOS EN.
  LA SUPERVISION INFORMA QUE LA ALCALDIA ESTA REALIZANDO ESTUDIOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LA INTERVENCION DE LOS DOS FALLOS EXISTENTES EN LA ZONA CON EL FIN DE PODER MINIMIZAR LOS COSTOS AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO.
- EL CONTRATISTA HABLA SOBRE LOS RIESGOS DE DEJAR LOS CAJAS PORQUE SE PODRIA DAR EL CASO DE CONEXION SIN PERMISOS. ASI MISMO SUGIERE LA COORDINACION DEL MURO EN LA FALLA DEL SECTOR EL AGUACATAL PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO SIN DEJAR PORCHE, SE COMPROMETE LA SUPERVISION EN REVISAR LA PROPUESTA.
- SE PROPONE REVISAR ESTUDIOS REALIZADOS A LA FALLA DE LA VIA EXISTENTE EN LOMA DE LOS VARGAS, PINA 7. SE COMPROMETE EN REVISAR CONEXION CON DISEÑO ANTERIOR Y CONTRAR MURO COLINDANTE A LA FALLA ANTERIOR.
- REVISION DE DISEÑO EN EL TRAMO 69, 71 Y 73.
- TRAMO 2. A PARTIR DEL MES DE FEBRERO SE INCREMENTA EL FALLO KM 1. Y EL PAVIMENTO TIENE PIEL DE COCODRILO TRAMO 95 A 97.
- SUPERVISION INFORMA QUE EL PLAN RURAL VIAL PRETENDE ORGANIZAR VARIAS VIAS, SE REVISARA EL TEMA

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

- ENTREGA DE BRECHAS = EPM. INFORMA QUE EL RECIBO QUEDA COMO SE HALLA PACTADO EN CONTRATO, SE REVISARA CON RELACIÓN SI SE ENTREGA EN PAVIMENTO O SUELO CEMENTO.
- LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE LO RECOMENDADO ES DEJAR PAVIMENTADO LA INTERVENCIÓN PARA EVITAR FUTURAS DIFICULTADES.
- SE DEBERA ESTABLECER LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TRAMO 2.
- CON RELACIÓN AL PASO POR LAS NOCHES EN CIERRE DE VÍA SE REALIZARA COMUNICADO FIJO EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN EL QUE SE INFORME A LA COMUNIDAD QUE LA OBRA NO SE HARA RESPONSABLE POR ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA VÍA, A DEMAS SE REALIZARA SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
- SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA REVISAR EL TRAMO 2. A LA ALTURA DE REPORTE DE PTAR PARA REVISAR. MURO EN GAVIÓN PARA INSTALACION DE NUBO EJE 49.
- REVISAR CON LA COMUNIDAD LA POSIBILIDAD DE CIERRE DE TRAMO 3. EN HORARIO DE 7 am A 2:00 pm. PARA PERMITIR LA CIRCULACIÓN DE LOS CONDUCTORES
- EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO LA FLORIDA SE CONSTRUYO ANTES DE QUE SUCEDIERA LA FALLA EN TRAMO 1.
- EL DIA 10 DE MARZO SE REALIZARON LOS APIQUES
- REVISAR EL TEMA DE PROTECCIÓN CON RELACION AL MATERIAL QUE SE UTILIZARA BIEN SEA DE EXCAVACIÓN O ARCILLA, MATERIALES A USAR Y CERTIFICACIONES.
- RELACION MATERIAL DE CIMENTACION TRITURADO Y ARCILLA.
- INCLUIRA SE CONTINUA DEL E11 EN ADELANTE.
- SE DEBERA SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD DESPUES DE REALIZAR CON LA CONDUCTA NECESARIA SOBRE LA CONEXIÓN EN LA ZONA DE LA TRINCHERA, Y SEGUN EPM SE PUEDE AUTORIZAR UNA CONEXIÓN NO CONVENCIONAL. Y PARA ESTO SE

REQUIERE RECOLECTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.
* COPIA CEDULA DE CIUDADANIA, COPIA FACTICA DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMATO DE SOLICITUD DE CONEXIÓN PARA ENTREGAR A EPM.
- LA INTERVENTORÍA SE REUNIRA CON EL ACUEDUCTO EL MANANTIAL PARA QUE SE REALICE LA REFERENCIACIÓN EN UTEARES. DONDE SE EVIDENCIEN EN CRUCES PRINCIPALES.
- SE REALIZARON CAMBIOS DE PROFESIONALES AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATISTA.
- SE INICIA LA EXCAVACIÓN EL DIA LUNES 13 DE MARZO DE 2023.
- LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE LOS TRABAJADORES ESTAN LABORANDO SIN EPP.
- EL CONTRATISTA SUGIERE REALIZAR RECOLECCIÓN DE BASURAS UN DIA ANTES DE QUE EL CARRO RECOLECTOR PASE EN SU HORARIO HABITUAL DE MARTES, JUEVES Y SABADO EN LA MAÑANA Y ASÍ PODER EVITAR CONTRATIEMPOS Y DIFICULTADES CON LA COMUNIDAD
- SUGIERE LA SUPERVISIÓN PUBLICAR EN SALON DE REUNIONES LOS PLANOS Y CRONOGRAMA DE OBRA.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS.	INTERVENTORIA.	10 MARZO 2023.

PRÓXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	16 DE MARZO 2023 - 2:00 pm.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Nancy S. Alvarez	SGyCT/SSPP	3014339690	nancyalvarez@gmail.com	
José A. Montoya	SGyCT/SSPP	3148561334	jose.montoya@medellin.gov.co	
Maritza Gil	SGyCT/SSPP	3007855578	maritza.gil@medellin.gov.co	
Diego Beato B	SGyCT/SSPP	3014546274	diego.beato@medellin.gov.co	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN

Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Gloria Cristina García R	Interventoría	3005458829	laflorida-ecovias@gmail.com	
Cindy Johana Guerrero V	Interventoría	3015766060	laflorida.ecovias@gmail.com	
Nini Johana Rodríguez	Interventora	3136566255	laflorida-ecovias@gmail.com	
Juan David Upegui C	Interventoría	310 3778726	laflorida.ecovias@gmail.com	
Alejandra Ginaldo Abate	Contratista	3206188859	alcantarilladoplan7@gmail.com	
Yeidis Castro Ramírez	Contratista.	3213884975	Yeidis.castro@hotmail.com.	
Diana Hernandez B	Contratista	3013893031	dianahelys73@gmail.com	
Juan Carlos Montoya	Contratista	3105952907	"	
[illegible]	CONTRATISTA	3154201347	"	
Dani Ricardo Acevedo	Interventoría	3212146410	laflorida.ecovias@gmail.com	
Carlos A. Preciado	Interventoría	3117139465	" "	
Sara Hernández Pineda	Contratista.	3205402685	Alcantarilladoplan7@gmail.com	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

DATOS GENERALES							
Número de acta		03					
Secretaría o Departamento Administrativo:		Gestión y control territorial					
Subsecretaría o Subdirección:		Servicios públicos					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Agua potable y saneamiento básico					
Lugar:	Campamento de interventoría	**Fecha:**	16-03-23	**Hora Inicio:**	2:00 pm	**Hora Finalización:**	3:00 pm
Actividad o tema:	Comité de Obra			**Anexa listada de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	Cindy Johana Quiceno Vasco	**Convocada por:**		Interventoría			
Objetivo de la reunión:	Seguimiento de la actividad de obra						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Compromiso entrega de pólizas
2	Presupuesto de reajustes

DESARROLLO TEMÁTICO

1. La interventoría habla del compromiso de la entrega de las pólizas por parte del contratista y de la interventoría, indicando que estas ya fueron enviadas y verificadas con ingeniero Diego Acosta Betancur.

2. El Ingeniero Diego acosta indica que se debe revisar el presupuesto, ya que la secretaría está limitada con recursos, por lo que se requiere definir el alcance sin afectar el presupuesto para reajustes de obra. Además, señala que se debe cubrir la proyección de los reajustes que presentó el contratista y la interventoría la semana pasada, y que existe incertidumbre, ya que estos pueden ser superiores, ya que se tiene la vía libre para realizar una modificación al contrato.

3. El ingeniero Diego acosta queda con el compromiso de hacer un recorrido con la secretaría de infraestructura, para revisar la vía principal y los fallos encontrados en ella, además de revisar el estado del pavimento.

La interventoría consulta respecto al procedimiento con EPM para los cambios a realizar en diseños y alineamientos, ya que el trámite de rediseño, revisión por una interventoría a diseños y aprobación final por EPM podría demorar el inicio de actividades en esos tramos con cambios. El Ingeniero Diego Acosta responde que de los proyectos que se están realizando de alcantarillado en San Antonio de Prado, este es el único proyecto que tiene planos sellados y aprobados por EPM, por lo que se deberá consultar a EPM sobre el procedimiento para modificaciones, y si éstas podrán realizarse sólo con firma y aprobación de los funcionarios de EPM.

La interventoría queda con el compromiso de hacer el recorrido con el diseñador Salvador Restrepo y consultarle al respecto

La supervisión solicita al contratista de obra consultar al diseñador del muro de la urgencia manifiesta atendida antes del presente contrato, sobre cuánto costaría un rediseño para atender el fallo encontrado en tramo 2.

CONCLUSIONES	
1	
2	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	
2	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
La interventoría queda como compromiso hacer un recorrido con el diseñador Salvador Restrepo	Carlos Alfonso preciado suaza	Marzo 22 / 2023
La supervisión queda pendiente de conversación y recorrido con infraestructura	Ingeniero Diego Acosta Betancur	Marzo 18 / 2023

PRÓXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Jueves, 23 de marzo del.2023

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Diego Alberto [illegible]	SGyCT/SSPP	3014546274	diego.cuesta@medellin.gov.co	[signature]
Maritza Gil	SGyCT/SSPP	3007855578	maritza.gil.medellin	[signature]
José A. Montoya	SGyCT/SSPP	3148561334	jose.montoya@medellin.gov.co	[signature]

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Entidad**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Juan David Upegui G.	Interventoría	3107778726	Laflorida.ecovias@gmail.com	
Carlos A. Preciados	Interventoría	3117139465	" "	
Juan Carlos Montoya	Contratista	3105952907		
[illegible]	CONTRATISTA	3154201342	[illegible]	
Dani Acevedo	Interventoría	3212146410	laflorida.ecovias@gmail.com	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

DATOS GENERALES								
Número de acta		04						
Secretaría o Departamento Administrativo:		Gestión y control territorial						
Subsecretaría o Subdirección:		Servicios públicos						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Agua potable y saneamiento básico						
Lugar:	Campamento de interventoría	**Fecha:**	23/03/23	**Hora Inicio:**	2:00 pm	**Hora Finalización:**	3:00 pm	
Actividad o tema:	Comité de obra			**Anexa listada de asistencia**				
				SI	X	**NO**		
Elaborado por:	Cindy Johana Quiceno Vasco	**Convocada por:**		Interventoría				
Objetivo de la reunión:	Seguimiento de obra							

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Compromiso interventoría.
2	Recorrido secretaria de Infraestructura Física SIF y personal de EPM.
3	Programación de obra por tramos.

DESARROLLO TEMÁTICO
Se realizó recorrido al proyecto en los tramos 1 y 2 en las zonas de los fallos, el día sábado 18 de marzo de 2023 en compañía de la Secretaría de Infraestructura Física (Subsecretario Adrián Correa) y los diseñadores Dany Michaels y Alejandro Ospina de la Alcaldía de Medellín; en este recorrido se solicita a la interventoría informar en el recorrido al personal de EPM que se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo de 2023 y se expondrán las siguientes recomendaciones: La secretaria de Infraestructura Física SIF sugiere al personal del contratista y la interventoría suspender actividades a la altura del talud en la parte superior de la loma del vergel, para no generar afectación en la estabilidad de la vía, mientras se determina la intervención necesaria y aprobada según lineamientos de EPM. Sin embargo, se informa sobre la posibilidad de instalar una tubería aérea y acercarla hasta el muro.

La interventoría del proyecto estuvo revisando la propuesta realizada por la SIF, a lo que el Ingeniero Dani Acevedo de la interventoría informa que no es necesario llevar la tubería hasta el muro ya que la parte del muro está estabilizada, esto con el fin de conservar el alineamiento, ya no serían los 120 metros propuestos si no que se reduciría a 92 metros. Se acordó hablar con la empresa SANEAR y revisar que propuesta sugiere.

La interventoría habla de una falla que hay en el tramo 1 en la margen derecha de la vía, esto lo revisaran en conjunto con la empresa SANEAR.

Informa la interventoría que enviara a EPM un correo electrónico para informar sobre localización IPID del hidratante, con el fin de programar lo más pronto posible visita marcación del trazado de tubería de impulsión y de esta manera, comunicar a la empresa SANEAR sobre la nueva ubicación.

El ingeniero Diego Acosta supervisor del proyecto, programó para el día martes 28 de marzo de 2023 de 9:00 a 9:30 am, un recorrido con José Antonio Montoya y Juan Sebastián Ruiz diseñador de la empresa SANEAR para verificar la información suministrada por EPM.

Informa la supervisión del proyecto que se programara reunión para la próxima semana con el subsecretario de servicios públicos Roger Jiménez para realizar el comité y hablar de los recorridos y analizar las alternativas a los planteamientos de los alineamientos de las tuberías en los tramos 1 y 2.

Se realiza por parte de la interventoría del proyecto, solicitud al contratista sobre la programación de cada tramo y se aclara que esta deberá estar detallada por cada tramo a desarrollar, ya que la actual programación se encuentra realizada de manera muy general; además se solicita que la programación contenga una parte financiera y otra parte de la programación física para realizar una revisión y medición por cada tramo ejecutado según lo programado. Se compromete el contratista de obra a generar dicha programación para el próximo comité de obra que tendrá lugar el jueves 30 de marzo de 2023 a las 3:00 pm en las oficinas de la Supervisión (Plaza de la Libertad)

La interventoría informa que elevo la consulta a personal de EPM sobre la entrega de la documentación para la realización de la solicitud de conexión al alcantarillado de la florida, a lo que informa EPM que la información se basará en la recolección del dato de ¿Cuáles viviendas se encuentran conectadas al acueducto del Manantial y cuales al acueducto del Vergel? esta labor la realizaran las gestoras sociales de la interventoría y del contratista, una vez obtenida dicha información se pasa a los ingenieros de EPM para ellos informar a la dirección social de EPM.

La supervisión del proyecto solicita a la interventoría un oficio dirigido a la subsecretaría de servicios públicos para análisis económico y técnico de las mezclas asfálticas MDC2 Y MDC19.

La interventoría del proyecto informa que el documento PASAO se encuentra en revisión y ajustes por parte del contratista en los componentes del equipo ambiental y SST.

Informa el contratista de obra que realizará instalación de buzón de sugerencias y cartelera informativa una vez sea entregada por el proveedor en cada cierre de tramo activo del proyecto.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

CONCLUSIONES	
1	N/A
2	
3	
4	
5	
6	
7	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	N/A
2	
3	
4	
5	
6	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Reunión con empresa SANEAR	Diego Alberto Acosta Betancur	Martes,28 de marzo 2023
Reunión con la SS PP	Interventoría	Jueves, 30 de marzo 2023
Programación de obra por tramo	Contratista de obra	Jueves,30 de marzo 2023
Buzón de sugerencia y cartelera informativa	Contratista de obra	Por definir

PRÓXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Jueves, 30 de marzo del 2023 a las 3:00 pm Subsecretaria de Servicios Públicos.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Mantja Gil	SGCT/SSP	3007855578	mantzagil@medellin.gov.co	
Alexandra Restrepol	SGCT/SSP	3144899867	alexandram.restrepo@medellin.gov.co	
José A. Montoya	SGCT/SSPP	3148561334	jose.montoya@medellin.gov.co	
Nancy S. Alvarez A.	SGyCT/SSPP.	3014339690	nancyalvarez21@gmail.com	
Diego [illegible]	SSyCT/SSPP	3014546234	diego.acosta@medellin.gov.co	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Entidad**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Dani Acevedo	Interventoría	3212146410	laflorida.ecovias@gmail.com	
Carlos Preciado	Interventoría	3117139465	" "	
Juan Carlos Montoya	Contratista	3002670332	alcantarilladopita@gmail.com	
Juan David Upegui C.	Interventoría	3103778726	laflorida.ecovias@gmail.com	
Cindy Johana Quiceno V.	Interventoría	3015766060	laflorida.ecovias@gmail.com	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

DATOS GENERALES							
Número de acta	01						
Secretaría o Departamento Administrativo:	Gestión y control territorial						
Subsecretaría o Subdirección:	Servicios públicos						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	Alcantarillado la florida						
Lugar:	San Antonio de Prado, Sector la Florida	**Fecha:**	08/03/23	**Hora Inicio:**	10:00 am	**Hora Finalización:**	1:00 pm
Actividad o tema:	Recorrido de obra EPM			**Anexa listada de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	Cindy Johana Quiceno Vasco	**Convocada por:**		Interventoría ECOVIAS SAS			
Objetivo de la reunión:	Recorrido de la obra con EPM para la verificación del alineamiento.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Documentación requerida para EPM de parte de los propietarios beneficiados por el alcantarillado de la florida.
2	Cambio de alineamiento en placa huellas.
3	Verificación de los fallos en tramo 1 y tramo 2

DESARROLLO TEMÁTICO

1. EPM solicita la recolección de la siguiente documentación para la realización de la solicitud de conexión, para esta tarea EPM suministrara los talonarios de suscripción a la interventoría:

- Copia de la cedula de ciudadanía del propietario del inmueble.
- Copia de la cuenta de servicios públicos del inmueble.
- Formato diligenciado de la solicitud de conexión.

2. Respecto al ramal ubicado en inmediaciones de la Truchera de Frank Vélez, el Ingeniero salvador Restrepo de EPM recomienda NO construir los tramos 1 y 2 entre los MH 7 y MH 9, y se dejara como arranque el MH 11, con el fin de no intervenir en el sector de la vía que ha perdido banca, toda vez que cualquier trabajo que se realice en este punto, terminaría de desconfinar la vía ocasionando una mayor pérdida de la banca de la

vía. En su lugar, recomienda extender la recolección mediante cajas a construir por la comunidad, junto al muro del predio contiguo a la vía.

Al frente de la finca el refugio donde empiezan las placas huellas en concreto se propone cambiar el alineamiento de la tubería del alcantarillado para pasarlo por todo el cordón cuneta y evitar dañar las placas huellas y la reposición de las mismas, para esto al frente de la finca el refugio se debe agregar un MH y trasladar el segundo MH que ya estaba propuesto en el lugar hacia el cordón cuneta, con esto se cambiaría el alineamiento.

Con respecto al resto del alineamiento, por debajo de las placas huellas, se definió que se harán apiques de exploración en el terreno para verificar el alineamiento de las redes de acueducto y alcantarillado, con el fin de definir la mejor forma de instalación de la tubería de alcantarillado. El funcionario de EPM recomendó verificar si es posible trasladar un poco las redes encontradas, con el fin de incidir lo menos posible en la eventual desestabilización de los taludes aledaños a la vía.

3. EPM a través de los ingenieros Zuleima Tobón y Salvador Restrepo manifiestan su preocupación durante el recorrido de los tramos 1 y 2 al ver que la secretaria de infraestructura no ha atendido los sitios críticos en mención, y solicita información de las acciones a tomar por parte de la secretaria de infraestructura toda vez que estos fallos tienen incidencia directa en el trazado de la red de alcantarillado a construir.

CONCLUSIONES	
1	Se definió que se harán apiques de exploración en el terreno para verificar el alineamiento de las redes de acueducto y alcantarillado.
2	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	
2	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Recolección de documentación	Tecnóloga social	Depende la fecha de iniciación de construcción del tramo
Hacer apiques de investigación	Contratista Pita 7	Miércoles 15 de marzo de 2023
Solicitar información en el comité con la supervisión acerca de las gestiones con la secretaria de infraestructura	Interventoría ECOVIAS	Jueves 9 de marzo de 2023

PRÓXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Por definir.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN

Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
[illegible]	INTERVIAL DRIA	3005458829	@gmail.com	
Diana Hernandez DB	Consorcio Pita 7	3013593031	dianthernandez@gual	
Sara Hernández Pineda	Consorcio Pita 7	3205402655	Alcantarilladopita7@gmail.com	
Juan Carlos Mon[illegible]	Consorcio Pita 7	3105952907		
Juan David Upegui Cano	Ecovias SAS	3103778726	[illegible]@gmail.com	
Carlos A. Preciado	ECOVIAS S.A.S	3117139465	" "	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
José A. Montoya	SCyCT SSP	3148561334	Josemontoya@medellin.gov.co	
Jesús S. Restrepo A.	EPM/Aguas	3028269550	jesus.restrepo@epm.com.co	
Yuleima Andrea Tobón G.	EPM/Aguas	3147860180	yuleima.tobon@epm.com.co	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

DATOS GENERALES							
Número de acta		**02**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Gestión y control territorial**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Servicios públicos**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Agua Potable y Saneamiento Básico**					
Lugar:	**San Antonio de Prado, Sector La Florida**	**Fecha:**	**22/03/2023**	**Hora Inicio:**	**2:00 PM**	**Hora Finalización:**	**3:00 PM**
Actividad o tema:	Recorrido de obra EPM			**Anexa listado de asistencia**			
				SI		**NO**	**X**
Elaborado por:	Juan David Upegui Escobar	**Convocada por:**		Interventoría ECOVÍAS S.A.S.			
Objetivo de la reunión:	Recorrido de la obra con EPM para la verificación de alineamiento, a partir de conclusiones de recorrido de la Secretaría de Infraestructura.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Contextualización y anotaciones de la SIF, en visita del 18 de marzo de 2023
2	Determinación de procedimiento en tramo 2, entre R69 y R77
3	Determinaciones de procedimiento en tramo 1, entre R119 y R135
4	Otros temas

DESARROLLO TEMÁTICO

1. Contextualización y anotaciones de la SIF, en visita del 18 de marzo de 2023:

El residente de interventoría contextualiza y pone en conocimiento a los funcionarios de EPM, sobre las conclusiones y anotaciones realizadas por el subsecretario de Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Física y su parte de su equipo de trabajo, en la visita realizada a la obra, el día 18 de marzo de 2023, en los siguientes términos:

La Subsecretario indicó que, en tramo 2, entre los R69 y R73, no se recomiendan iniciar excavaciones de la vía para la instalación de la tubería de alcantarillado, toda vez que la sección de la vía, es toda la banca de la que dispone el talud en donde se encuentra la falla evidenciada, por lo que cualquier desconfinamiento del material, reactivaría la falla, produciendo un movimiento en masa afectando la vía, los trabajos del alcantarillado y, eventualmente, las viviendas aledañas. Adicionalmente, el subsecretario indica que, para la contención de dicho talud, la SIF dispondrá de nuevos contratos de construcción que deberán pasar por todas las fases de diseños, licitación de obra y de interventoría, para iniciar las actividades de contención de dicho fallo. En este sentido, y

debido a que se avecinan elecciones regionales, y con ellas la Ley de Garantías, es probable que la ejecución de las obras de contención para este fallo no se materialice hasta el próximo año. Debido a lo anterior, la SIF recomienda cambiar el alineamiento proyectado para la tubería del alcantarillado, saliendo desde el R69 hacia afuera del talud, pasarla por encima del fallo con un sistema de alcantarillado aéreo expuesto (como lo han realizado en otros sectores de la ciudad), y posteriormente, reintegrarlo al trazado original.
Una situación similar ocurre en el tramo comprendido entre los R73 a R75, en donde, aunque la falla de este punto ya se encuentra estabilizada por un proyecto de urgencia manifiesta anterior, un desconfinamiento del la vía con excavaciones podría reactivar el fallo. Para esto, se recomienda continuar con el tramo de alcantarillado aéreo expuesto, desde el R69, hasta el R77 en donde se realizaría el reintegro al trazado inicial.

Por otro lado, para la falla reportada en tramo 1, entre R119 y R135, la SIF anota que las obras de contención para este fallo, dada su magnitud, no están proyectadas para ser ejecutadas pronto, por lo que recomiendan realizar un cambio de alineamiento a la berma-cuneta del costado derecho de la vía (sentido Occidente-Oriente), con el fin de alejar lo máximo posible la tubería del punto de estabilidad crítica en dicho tramo. Para esto, se requiere localizar la tubería de conducción del acueducto de EPM, que pasa por esta zona.

Para los cambios de diseños mencionados, la interventoría indica que, en conversaciones entre el diseñador (empresa SANEAR) y la Supervisión del contrato, se acordó que el primero podría hacer cambios en diseños, siempre que EPM, como receptor final de los trabajos, de su aval por escrito y reciba estas modificaciones.

2. Determinación de procedimiento en tramo 2, entre R69 y R77:

Una vez fueron contextualizados, los funcionarios de EPM anotan los siguientes procedimientos, relativos a la próxima ejecución de actividades en los sectores críticos de tramo 2:

- Para que EPM reciba los trabajos con los eventuales cambios a realizar, según las recomendaciones de la SIF con su propuesta de un tramo de alcantarillado aéreo, se deben entregar nuevos diseños hidráulicos para el alcantarillado, estructurales de los soportes del mismo, y la forma en que la tubería se fija a estos soportes. También recomiendan realizar este tramo en tubería de polietileno termo-fundida, aprovechando su flexibilidad, y que su tamaño (8"), le permite luces considerables entre apoyos.

3. Determinación de procedimiento en tramo 1, entre R119 y R135:

Con respecto al cambio de alineamiento hacia el otro costado de la vía, EPM solicita que la interventoría envíe un correo electrónico, en donde se especifique uno de los MH o un Hidrante que se encuentra en esta zona, con el fin de que se pueda ubicar geográficamente el tramo de necesidad, para que EPM envíe a realizar la marcación de la tubería de conducción que pasa por allí. Adicionalmente, una vez realizado el trazado de la tubería de conducción, los funcionarios de EPM recomiendan al contratista realizar nichos de inspección, al menos, cada 10 m, con el fin de localizar certeramente la tubería de alcantarillado a construir, sin interferencias con las existentes.

EPM aclara que los cambios de diseño podrán ser avalados por EPM, siempre que las condiciones hidráulicas no sean alteradas en los nuevos diseños.

Con respecto a los dos temas anteriores, la interventoría menciona que la instrucción desde la supervisión es llevar a cabo una reunión entre las partes (EPM, SSSP, Interventoría y contratista), con el fin de definir actividades y responsabilidades próximas, y dejar plasmadas voluntades y directrices para las obras relativas a estos dos tramos, afectados por fallas en el terreno.

4. Otros temas:

- El contratista de obra consulta a EPM sobre la ubicación de las conexiones para domiciliarias en las viviendas beneficiadas. EPM responde que recomienda realizarlas sólo en frente de las fachadas de cada predio.

- La interventoría consulta respecto a los formatos que entregaría EPM como documentación de requisito para conexión de domiciliarias. EPM responde que primero se deberá entregar a EPM, por parte del proyecto, la identificación de viviendas habilitadas (técnicamente) para ser conectadas, en donde se especifique de qué tipo de acueducto dispone cada una de las viviendas a conectar.

CONCLUSIONES	
DOCUMENTOS ANEXOS	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Enviar correo electrónico a EPM identificando MH o Hidrante cercano al tramo 1, en donde se pretende cambio de alineamiento	Interventoría	23/03/2023
Programar reunión entre SSSP, EPM, Contratista e Interventoría, en despacho de la SSSP.	Interventoría	Lo antes posible

PRÓXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Por definir

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Cód. FO-GTIC-004	Formato **FO-GTIC Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 6		

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Entidad**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
Juan David Upegui Gaviria	Interventoría Ecovías	3103778726	laflorida.ecovias@gmail.com	
Carlos Preciado	Interventoría	3117139465	" " "	
Juan Carlos Montoya	Contratista	3002670332	alcantarillapita70 gmail.com	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

922

Anexo 4.5-1: Correspondencia enviada.

ECOVIAS S.A.S.

198-1-001
Medellín, febrero 1 de 2023

Señor
Diego Alberto Acosta Betancur
diego.acosta@medellin.gov.co
Supervisor proyecto Secretaría de Servicios Públicos
Medellín

Asunto: Contrato 4600096200 DE 2022. INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Referencia: Entrega hojas de vida personal interventoría

Estimado Ingeniero

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, me permito presentar las hojas de vida del personal que integrará la Interventoría del proyecto, estas se relacionan a continuación.

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara
Residente de Interventoría	Ing. Carlos Alfonso Preciado Suaza
Residente Social	Zulima Alcaraz Silva
Residente Ambiental	Jefferson Harry López Moreno
Residente SST	Nini Johana Rodríguez
Tecnólogo de obras civiles	Juan David Upegui Escobar

No siendo mas el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. LUIGGI PUGLIESE MERCADO.
Representante Legal

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 9:52
Para: diego.acostabetancur@gmail.com

Buenas tardes

Atentamente remitimos nuestro oficio N° 198-1-001 junto con las hojas de vida del personal profesional de la Interventoría.

Cordialmente

Ing. Dani Acevedo
Director de Interventoría

HV SST COMPLILADA.pdf

6 adjuntos

- **Director DRAV.pdf** 5004K
- **Residente Carlos Preciado compilado.pdf** 6325K
- **Hoja de vida Residente Ambiental.pdf** 5909K
- **ZAS HV Dic 2022.pdf** 1016K
- **HV AUX ING COMPILADA.pdf** 5270K
- **198-1-001 HOJAS DE VIDA.pdf** 460K

23

ECOVIAS SAS

198-1-010

Medellín, febrero 23 de 2023

Ingeniera
Carmen Patricia Garcés Hemández
alcantarilladopita7@gmail.com
Directora de Obra
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Solicitud de Documentos Contractuales de Obra

Estimada Ingeniera Garcés

En consideración al inicio del contrato de la referencia el próximo 1 de marzo de 2023 y basados en los requerimientos contractuales, solicitamos el envío de los siguientes documentos de manera oficial:

- Hojas de vida de los profesionales administrativos y afiliación al sistema de seguridad social, con los salarios ofertados en su propuesta.
- Cronograma de obra a ejecutar para ser revisado y aprobado
- Planos y carta de aprobación del PMT.
- Recepción y revisión del PASAO (correcciones)
- Plan de Gerencia del Proyecto (corregida la programación)
- Documentación del personal con discapacidad, criterio que le dio puntaje en la evaluación de su oferta, esto para ser verificado su cumplimiento.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

CC. Ing. Diego Acosta. Supervisor del Contrato

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

oficio 198-1-0010 Solicitud documentos contractuales de obra

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 12:22
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniera
Carmen Patricia Garces
Directora de Obra
Alcantarillado Pita 7

Estimado ingeniera, adjunto encuentra el oficio 198-1-0010

198-1-010.pdf

de ECOVIAS donde hacemos la solicitud de los documentos contractuales de obra.

Cordials saludo.

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0011

Medellín, marzo 9 de 2023

Señores
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Atención de infraestructura sobre vías y taludes del proyecto

Estimado Ingeniero Acosta

En cumplimiento del numeral 10 de la Cláusula 9. *"Obligaciones Generales del Interventor."*, del contrato de interventoría de la referencia, nos permitimos poner en conocimiento de la Entidad la situación encontrada en obra el día de hoy martes 28 de febrero de 2023:

1. Asentamiento y potencial pérdida de banca:

En el desarrollo de sus funciones como interventores del proyecto, ECOVIAS S.A.S. Ha estado realizando recorridos a los puntos de intervención, previo al inicio de actividades y a la suscripción del acta de inicio. Particularmente, entre las visitas realizadas el 20 de enero y el 27 de febrero de 2023, se ha evidenciado una situación que amerita toda la atención y pronta intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura, toda vez que pone en riesgo la ejecución del proyecto, su entregable final y, principalmente, el tránsito y transporte por una de las vías de acceso principal al Corregimiento de San Antonio de Prado.

En la calle 56 Sur, entre la carrera 70 y la carrera 75, se ha venido presentando un asentamiento sostenido de la calzada derecha de la vía (sentido oriente-occidente, ver fotografías 1 a la 10), producto de una socavación presente en la quebrada contigua al talud inferior de la vía. Este asentamiento, que evidencia presencia de movimientos en masa hacia la quebrada aledaña al talud, ya desencadenó importantes deterioros tanto en la estructura de la vía, como en los andenes y talud en cuestión. Entre las visitas del 20 de enero y 27 de febrero de 2023, se ha evidenciado que la carpeta asfáltica de la calle 56 Sur, ha cedido en aproximadamente 67 cm. Adicionalmente, se evidencia que con eventos de precipitación como el del día domingo 26 de febrero de 2023, el terreno cedió considerablemente, poniendo en riesgo la circulación por el sector.

198-1-0011

Adicionalmente, en el recorrido del día 3 de marzo de 2023, se encontró que la Secretaría de Infraestructura, a través del contrato de *"Construcción y mantenimiento de la malla vial e infraestructura asociada"*, inició labores de nivelación de reparación, parcheo y nivelación de la carpeta asfáltica en el sector; para lo cual, esta interventoría también considera pertinente anotar, que se están adelantando tratamientos paliativos, que no representan una solución de fondo para la situación detallada; incluso, puede ser contraproducente incrementar la carga del talud con los trabajos mencionados, acelerando el movimiento del material inestable.

Esta situación amerita una intervención inmediata por parte de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, toda vez que representa un riesgo latente para la comunidad aledaña, los usuarios de la vía y para los trabajos que allí se proyectan como es la construcción del colector de alcantarillado que atañe a este contrato.

2. Activación de fallo, sobre calle 56 Sur:

En diferentes puntos entre las abscisas K1+250 y K1+350, se presentan hundimientos laterales de la banca de la vía producto de procesos de reptación en el talud inferior. Esta condición puede afectar la estabilidad de la red de alcantarillado proyectada (ver fotografías 11 a 16).

Adicionalmente, ponemos en conocimiento de la entidad que, sobre la calle 56 Sur, aproximadamente en el K1+017, se ha evidenciado la pérdida parcial del talud inferior de la vía producto de un fenómeno de remoción en masa (ver fotografías 17 a 22). Esta situación, que al igual que la detallada inicialmente se ha visto considerablemente afectada por la ola invernal, pone en riesgo las obras por ejecutar en el sector.

3. Desestabilización de terreno, sobre calle 56 Sur:

Finalmente, sobre la calle 56 Sur a la altura de la "Truchera Frank Vélez", se proyecta extender un ramal del alcantarillado en ejecución, para el cual se requiere intervenir una vía sin pavimentar. En este punto se encuentra una alcantarilla metálica que no tiene estructuras de protección o aletas, lo que ha derivado en afectaciones por efecto de la erosión de la quebrada que pueden generar la pérdida de la banca de la vía por el colapso de esta estructura de paso, aspecto que puede afectar a futuro la estabilidad del ramal del alcantarillado proyectado. (ver fotografías 23 y 28).

No siendo más el motivo de la presente, suscribimos cordialmente.

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

924

198-1-0011

Anexos:

Registro fotográfico de calle 56 Sur, entre carrera 70 y carrera 75:



Fotografía 1



Fotografía 2

198-1-0011



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6

198-1-0011



Fotografía 7



Fotografía 8




Fotografía 9



Fotografía 10

198-1-0011

Registro fotográfico de calle 56 Sur, entre carrera 14 y carrera 70:

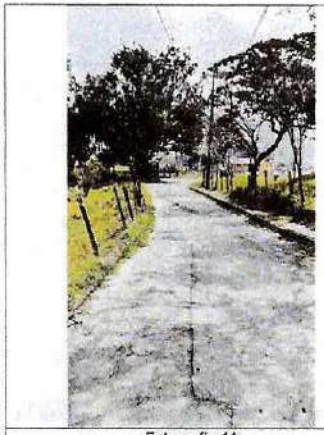


Fotografía 11



Fotografía 12



Fotografía 13

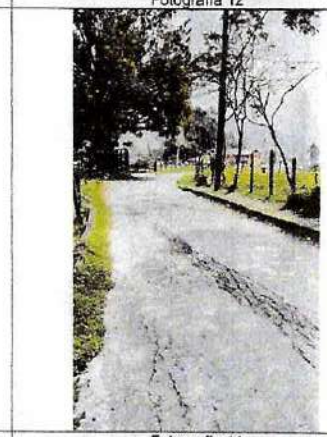

Fotografía 14



Fotografía 15



Fotografía 16



Fotografía 17

ECOVIAS SAS

198-1-0011



Fotografía 18




Fotografía 19



Fotografía 20

198-1-0011

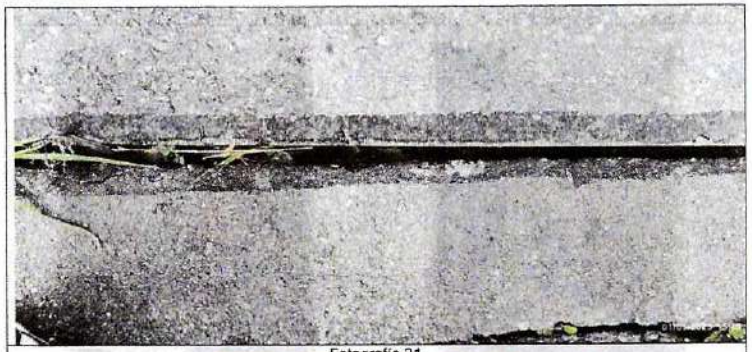


Fotografía 21



Fotografía 22

198-1-0011

Registro fotográfico de calle 56 Sur, a la altura de la "Truchera Frank Vélez":

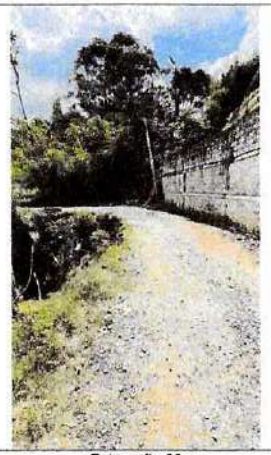

Fotografía 23




Fotografía 24

926

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0011

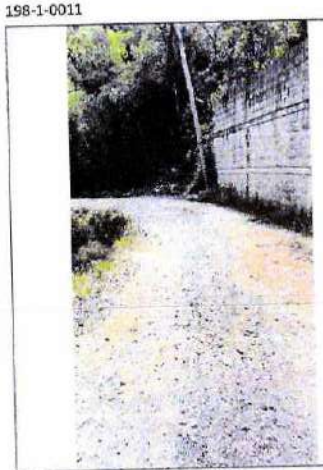

Fotografía 25



Fotografía 26



Fotografía 27



Fotografía 28

11

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficios 198-1-0011, 198-1-0015

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 9 de marzo de 2023, 17:52
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor Contrato

Nos permitimos adjuntar los comunicados 198-1-0011 Atención de Infraestructura sobre vías y taludes del proyecto, y el oficio 198-1-0015Novedad planta personal Contratista Pita 7.

Cordial saludo.

Carlos Preciado
Ing. Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0015.pdf

198-1-0011.pdf

ECOVIAS S.A.S

198-1-012

Medellin, marzo 3 de 2023

Señor
Diego Alberto Acosta Betancur
diego.acosta@medellin.gov.co
Supervisor proyecto, Sub-secretaria de Servicios Públicos
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovación. Medellin.

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Entrega Pólizas Actualizadas Contratista Alcantarillado Pita 7

Estimado Ingeniero Acosta

En cumplimiento del numeral 10 de la Cláusula 9. *"Obligaciones Generales del Interventor."*, del contrato de interventoria de la referencia, nos permitimos poner en conocimiento que el Consorcio Pita 7 nos allega la Póliza de Cumplimiento 520-47-994000045910-2 de la Aseguradora Solidaria de Colombia donde el asegurado y beneficiario es el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, dando cumplimientoa sus obligaciones de acuerdo al acta de inicio del contrato.

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoria

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Anexo: Póliza 520-47-994000045910-2

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

Polizas Actulizadas contratista Alacantarillado Pita 7

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 8:42
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com, jose.montoya@medellin.gov.co

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor Contrato

Atendiendo su solicitud, nos permitimos reenviar el oficio 198-1-0012 donde se encuentra adjunto la Póliza de Cumplimiento 520-47-994000045910-2 de la Aseguradora Solidaria de Colombia.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

520-47-994000045910-2.pdf

198-1-0012.pdf

422

ECOVIAS S.A.S.

198-1-013
Medellin, marzo 7 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA 7
Atención: Ingeniera Carmen Patricia Garcés Hernández
Directora de Obra
alcantarilladopita7@gmail.com
Medellin

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta al comunicado AM-004 solicitud cambio de profesional SST

Estimada Ingeniera Garcés

Mediante el presente comunicado nos permitimos informarle que una vez revisada la documentación (hoja de vida y experiencia) de la profesional SST Yeidis Paola Castro, presentada en reemplazo de la profesional Yurley Sorany Guerra, se indica que esta interventoria no tiene objeciones al respecto y considera viable su aprobación.

No siendo mas el motivo de la presente, suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

07/03/23

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoria

Elaboro: NJR
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

ECOVIAS S.A.S.

198-1-014
Medellin, marzo 7 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA 7
Atención: Ingeniera Carmen Patricia Garcés Hernández
Directora de Obra
alcantarilladopita7@gmail.com
Medellin

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta al comunicado AM-007 solicitud cambio de profesional Ambiental

Estimada Ingeniera Garcés

Mediante el presente comunicado nos permitimos informarle que una vez revisada la documentación (hoja de vida y experiencia) de la profesional ambiental Alejandra Giraldo, presentada en reemplazo de la profesional Katherine Valencia Valencia, se indica que esta interventoria no tiene objeciones al respecto y considera viable su aprobación.

No siendo más el motivo de la presente, suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

07/03/23

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoria

Elaboro: JHL
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0015

Medellín, marzo 8 de 2023

Señores
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Novedad Profesionales personal contratista ALCANTARILLADO PITA 7

Estimado Ingeniero

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, nos permitimos presentar las hojas de vida verificadas por esta interventoría de las nuevas Residentes SST y Ambiental del Contratista Pita 7 y por lo cual se da el concepto favorable al nuevo personal del contratista que integrará el equipo constructor del proyecto, estas se relacionan a continuación:

Residente Ambiental: ALEJANDRA GIRALDO ALZATE
Ingeniero Ambiental
MATRÍCULA PROFESIONAL 05238-342353

Residente SST: YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ
Tecnóloga en Salud Ocupacional
Resolución 0264 del 15 de MARZO DE 2015 SECCIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE BOLIVAR

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

Oficios 198-1-0011, 198-1-0015

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 9 de marzo de 2023, 17:52
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor Contrato

Nos permitimos adjuntar los comunicados 198-1-0011 Atención de Infraestructura sobre vías y taludes del proyecto, y el oficio 198-1-0015Novedad planta personal Contratista Pita 7.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing. Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0015.pdf

198-1-0011.pdf

198-1-0016

Medellín, marzo 8 de 2023

Señores
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Proyección reajustes

Estimado Ingeniero

En atención a su solicitud, elevada mediante correo electrónico del pasado 6 de marzo de 2023, la interventoría del contrato de la referencia se permite informar sobre el valor y el procedimiento realizado para la proyección de reajustes necesarios al contrato de obra.

Procedimiento:

Para el cálculo de la proyección de reajuste de precios al contrato de obra, se utilizó la fórmula de reajuste detallada en el numeral *5. "Forma de pago"*, del Anexo 1 - Anexo Técnico del contrato, la cual se compone de la siguiente forma:

$$AR = AS * \left[0.19\left(\frac{MASi}{MASo}\right) + 0.18\left(\frac{MOOPi}{MOOPo}\right) + 0.12\left(\frac{C30i}{C30o}\right) + 0.10\left(\frac{C40i}{C40o}\right) + 0.10\left(\frac{EQOi}{EQOo}\right) + 0.09\left(\frac{AFi}{AFo}\right) + 0.08\left(\frac{T}{T}\right)\right.$$

Dónde:

AR: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista.
AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios cotizados en la Licitación, luego de descontar la amortización del anticipo (En el evento de pactarse).
MAS: Mezcla asfáltica

198-1-0016

MOOP: Mano de obra de obras públicas
C30: Concreto premezclado de 3000
C40: Concreto premezclado de 4000
EQO: Equipo de obras públicas
AF: Afirmados - Base granular
TRA: Transporte
MG: Materiales galvanizados
HI: Hierro
PR: Prefabricados
Subíndice i: Mes de pago de reajustes
Subíndice o: Mes básico de presentación de la propuesta

Para el mes básico de presentación de la propuesta (subíndice o) se tomó el mes de septiembre de 2022, toda vez que la propuesta del Consorcio Pita 7, adjudicatario del contrato 4600095815 de 2022 como producto de la licitación de obra pública 70005051 de 2022; fue presentada en dicho mes.

Por otro lado, debido a que los reajustes se calculan con base en los índices de costos de la construcción de CAMACOL Antioquia, que son publicados mes vencido; fue necesario hacer una proyección del reajuste dado que, a la fecha, no se han generado los índices de los meses en que se causarán y cobrarán actas de obra. En este sentido, se utilizaron los índices del mes de enero de 2023 como referencia para el cálculo de los reajustes requeridos.

Partiendo de estos índices (septiembre de 2022 y enero de 2023), se aplicó la fórmula de reajuste detallada inicialmente, utilizando como valor de acta mensual (As) el valor total del presupuesto de obra incluyendo Administración y Utilidad; y excluyendo Imprevistos.

Resultado:

Una vez aplicada la fórmula de reajuste, partiendo de los parámetros y premisas detalladas anteriormente, se obtiene lo siguiente:

$$\$2,707,263,369 = \$2,508,230,104 * \left[0.19\left(\frac{7534.47}{6729.23}\right) + 0.18\left(\frac{3198.43}{2979.05}\right) + 0.12\left(\frac{3186.63}{2825.66}\right) + 0.10\left(\frac{3645.80}{3142.24}\right) + (\right.$$

Posteriormente, se calcula la diferencia entre el valor del presupuesto reajustado y el valor del presupuesto sin reajustar, para encontrar el valor de reajuste, así:

$$\$2,707,263,369 - \$2,508,230,104 = \$199,033,265$$

ECOVIAS SAS

198-1-0016

En este sentido, el reajuste proyectado para el contrato de obra 4600095815, partiendo de los índices de septiembre de 2022 y enero de 2023, se estima en $199,033,265, correspondiendo a un incremento de, aproximadamente, el 8% del presupuesto de obra (ver anexo: "Memorias de cálculo – Proyección de Reajuste").

Recomendaciones:

Teniendo en cuenta que la proyección de reajuste se realizó con los índices del mes de enero de 2023, y que las actas de obra serán cobradas a partir del mes de marzo y hasta el mes de diciembre de 2023 (según programación de obra), se puede esperar que los índices de costos de la construcción de CAMACOL Antioquia continúen incrementando, lo que resultaría en un déficit presupuestal para cubrir costos por reajuste de obra, si se mantiene una reserva del 8% para tal fin.

Según información recuperada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para el mes de febrero de 2023 se reportó una inflación del 13.28%.
En este sentido, podría estimarse un incremento similar para los costos de la construcción, por lo que la interventoría recomendaría dejar una reserva de, al menos, 13% del valor del presupuesto, previendo el incremento de los costos, por encima de la proyección realizada.

De esta forma, se debería mantener una reserva de, al menos, $ 330,786,726 para cubrir los costos de reajuste al contrato de obra.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el contrato actualmente cuenta con $ 119,867,766, se recomienda a la Entidad gestionar por lo menos $ 210,920,960 como recursos adicionales como destinación para pago de reajustes.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

CAPS/23

ING. CARLOS PRECIADO.
Residente de Interventoría

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

anexo: Memorias de cálculo – Proyección de Reajuste"

16/3/23, 9:54 Gmail - Oficio 198-1-0016 Proyeccion Reajustes

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-0016 Proyeccion Reajustes

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 8 de marzo de 2023, 17:47
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, diego.acostabetancur@gmail.com
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor Contrato

Atendiendo su solicitud del dia lunes 6 de marzo de 2023, nos permitimos entregar la proyeccion de reajustes a la obra alcantarillado la florida mediante el oficio 198-1-0016 Proyeccion Reajustes

Cordial saludo, y quedo atento

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S.

2 adjuntos

198-1-0016.pdf
699K

Memorias de cálculo - Proyección de Reajuste.xlsx
892K

ECOVIAS SAS

198-1-0017
Medellín, marzo 10 de 2023

Señoras
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Referencia: Contrato 4600096200 DE 2022. INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Asunto: Actualización póliza interventoría ECOVIAS S.A.S

Estimado Ingeniero Acosta

En cumplimiento del numeral 10 de la Cláusula 9. *"Obligaciones Generales del Interventor."*, del contrato de interventoría de la referencia, nos permitimos hacer entrega de la Póliza M-100186327 de SEGUROS MUNDIAL por Cumplimiento, prestaciones Sociales y Calidad del Servicio cuyo beneficiario es el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, dando así cumplimiento a las obligaciones de acuerdo al acta de inicio del contrato.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente,

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Anexo: Póliza M-100186327 SEGUROS MUNDIAL

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

Oficio 198-1-0017 Actulizacion polizas ECOVIAS

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 11 de marzo de 2023, 7:50
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato

Atendiendo a nuestras obligaciones nos permitimos adjuntar el comunicado 198-1-0017 donde hacemos entrega de la Póliza M-100186327 de SEGUROS MUNDIAL dando cumplimiento al contrato.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

02.1 Póliza Cumplimiento - Acta de Inicio.pdf

198-1-0017.pdf

ECOVIAS SAS

198-1-018

Medellín, marzo 11 de 2023

Ingeniera
Carmen Patricia Garcés Hernández
alcantarilladopita7@gmail.com
Directora de Obra
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Observaciones PASAO

Estimada Ingeniera Garcés

De acuerdo a la nueva revisión realizada el documento PASAO, se tiene las siguientes observaciones/ sugerencias

- Se debe eliminar del documento los profesionales que aparecen en la elaboración del PASAO (KATHERINE VALENCIA y SORANY GUERRA), ya que estos no hacen parte del proyecto por parte del contratista de obra.
- **Objetivo Especifico:** Eliminar los que se encuentran resaltados en color rojo.
- Lo que se resalta en color azul en el documento es como se sugiere que debe quedar.
- Lo que se resalta en color amarillo, es lo que se debe articular una vez se tenga estructurado el documento.
- Aterrizar el documento y formatos con el nombre del contratista PITA 7.
- Anexar los documentos faltantes como el SG-SST con sus respectivos anexos
- anexos faltantes (Plan de emergencias y contingencias, cronograma de capacitaciones, cronograma de inspecciones, permiso para trabajo en excavaciones, los permisos para TSA aterrizar a la resolución 4272 del 2021.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

Anexo PASAO

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: HLM
Revisó: CAPS
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Respuesta Oficios ECOVIAS a sus comunicados

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 15:29
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Consorcio Alcantarillado Pita 7

Buenas tardes, nos permitimos remitir los comunicados 198-1-0018 Observaciones al PASAO, 198-1-0019 Respuesta oficio AM-010, 198-1-0020 Solicitud entrega Plan de Inspección y Ensayos de Calidad, 198-1-0021 Respuesta oficio AM-015.

Quedamos prestos a sus solicitudes y/o inquietudes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0021.pdf

198-1-0020.pdf

198-1-0019.pdf

198-1-0018.pdf

ECOVIAS SAS

198-1-019

Medellín, marzo 13 de 2023

Ingeniera
Carmen Patricia Garcés Hernández
alcantarilladopita7@gmail.com
Directora de Obra
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Respuesta oficio AM-010 Documentación y afiliación del personal de obra

Estimada Ingeniera Garcés

De acuerdo a la revisión de la documentación del personal, YEISON DAVID RUIZ y JORGE HERNÁN TORO quedan aprobados para iniciar actividades con las siguientes observaciones:

- YEISON DAVID RUIZ debe anexar certificado para trabajos en alturas
- Si el personal va realizar trabajos en espacios confinados se deben realizar el examen médico con aptitud para laborar en espacios confinados y los respectivos certificados.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: NJR
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Respuesta Oficios ECOVIAS a sus comunicados

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 15:29
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Consorcio Alcantarillado Pita 7

Buenas tardes, nos permitimos remitir los comunicados 198-1-0018 Observaciones al PASAO, 198-1-0019 Respuesta oficio AM-010, 198-1-0020 Solicitud entrega Plan de Inspección y Ensayos de Calidad, 198-1-0021 Respuesta oficio AM-015.

Quedamos prestos a sus solicitudes y/o inquietudes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0021.pdf

198-1-0020.pdf

198-1-0019.pdf

198-1-0018.pdf

ECOVIAS SAS

198-1-002

Medellín, enero 31 de 2023

Señor
Diego Alberto Acosta Betancur
diego.acosta@medellin.gov.co
Supervisor proyecto Secretaría de Servicios Públicos
Medellín

Asunto: Contrato 4600096200 DE 2022. INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Referencia: Solicitud redistribución de recursos de interventoría para incluir el cargo de auxiliar administrativo de interventoria.

Estimado Ingeniero

La ejecución de las actividades de Interventoría del proyecto mencionado en el asunto se deben ejecutar de una manera ágil y eficiente por parte del equipo profesional y técnico dispuesto por ECOVIAS SAS, de tal manera que se propenda por la ágil ejecución de las obras contratadas, con este objetivo se ha revisado la organización de la Interventoría, encontrándose la necesidad de incorporar a la Interventoría un auxiliar administrativo que integre toda la información generada por las distintas áreas del proyecto, como informes semanales y mensuales, correspondencia emitida por los distintos actores del contrato, actas de reunión y de costos, y en general todos los documentos que se emitan en el desarrollo del contrato, de tal manera que tanto la Interventoría como la Entidad cuenten de manera oportuna y eficiente con la información que se requiera de las diferentes áreas del proyecto.

Por lo anterior solicitamos a la Secretaria de Servicios Públicos autorice el traslado interno de recursos de la Interventoría para contar con los fondos necesarios para la contratación del Auxiliar administrativo propuesto, quien tendría un salario mensual de $ 1.700.000,00 valor que con el factor multiplicador de 2,16 daría un total mensual de $ 3.672.000,00, para un total durante los 9,5 meses del proyecto de $ 34.884.000; este valor puede ser trasladado del ítem *"otro Auxilio Diseño y asesorías especializadas (el VALOR PARCIAL corresponde al 4% del costo del personal sin factor multiplicador)"*, ya que dadas las características del proyecto es posible que este ítem no sea utilizado en su totalidad.

No siendo mas el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. LUIGGI PUGLIESE MERCADO.
Representante Legal

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

Entrega oficio N° 198-1-002

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 11:25
Para: diego.acosta@medellin.gov.co

Ingeniero buenas tardes

Atentamente enviamos nuestro oficio N° 198-1-002 para su consideración y concepto.

No siendo más, suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS
ING DANI ACEVEDO
Director de Interventoría

198-1-002 PROP AUX AD.pdf
481K

ECOVIAS S.A.S.

198-1-020

Medellín, marzo 15 de 2023

Ingeniero
Ricardo Guerra Barrientos
alcantarilladopita7@gmail.com
Director de Obra - Consorcio Pita 7
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Solicitud de entrega de Plan de inspección y ensayos de calidad.

Estimada Ingeniero Guerra:,

En cumplimiento de los numerales 3, 4 y 26 de la cláusula 10. *"OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA"* del contrato de la referencia, se solicita al contratista de obra la entrega del plan de inspección y ensayos de calidad para el proyecto, con el fin de garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos que hacen parte del contrato de obra.

Adicionalmente, solicitamos la entrega de la caracterización de laboratorio de los materiales de acuerdo a las especificaciones del contrato a utilizar en la construcción de las obras, como es el caso de la arenilla y el triturado, así como también el diseño de la mezclas de concreto a utilizar.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente,

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Respuesta Oficios ECOVIAS a sus comunicados

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 15:29
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Consorcio Alcantarillado Pita 7

Buenas tardes, nos permitimos remitir los comunicados 198-1-0018 Observaciones al PASAO, 198-1-0019 Respuesta oficio AM-010, 198-1-0020 Solicitud entrega Plan de Inspección y Ensayos de Calidad, 198-1-0021 Respuesta oficio AM-015.

Quedamos prestos a sus solicitudes y/o inquietudes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0021.pdf

198-1-0020.pdf

198-1-0019.pdf

198-1-0018.pdf

ECOVIAS SAS

198-1-021

Medellín, marzo 16 de 2023

Ingeniero
Ricardo Guerra Barrientos
Alcantarilladopita7@gmail.com
Director de Obra
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta al oficio AM-015, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Estimado Ingeniero Guerra

Por medio de la presente, solicitamos la entrega del SG-SST de la Constructora Guinco con los respectivos registros que soporten la implementación, con el fin de garantizar la aplicación y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: NJR
Revisó: CAPS.
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Respuesta Oficios ECOVIAS a sus comunicados

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 15:29
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Consorcio Alcantarillado Pita 7

Buenas tardes, nos permitimos remitir los comunicados 198-1-0018 Observaciones al PASAO, 198-1-0019 Respuesta oficio AM-010, 198-1-0020 Solicitud entrega Plan de Inspección y Ensayos de Calidad, 198-1-0021 Respuesta oficio AM-015.

Quedamos prestos a sus solicitudes y/o inquietudes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-0021.pdf

198-1-0020.pdf

198-1-0019.pdf

198-1-0018.pdf

ECOVIAS SAS

198-1-0022

Medellín, marzo 17 de 2023

Señores
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atención: Ingeniero Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor del proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Novedad Profesionales personal contratista ALCANTARILLADO PITA 7

Estimado Ingeniero

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, nos permitimos presentar las hoja de vida verificada por esta interventoría de el nuevo Director de Obra por lo cual se da el concepto favorable al nuevo ingeniero civil del contratista que integrará el equipo constructor del proyecto,a partir del 15 de marzo de 2023, a continuacion se referencia el cambio:

Director de Obra (Entrante): RICARDO GUERRA BARRIENTOS
Ingeniero Civil
MATRÍCULA PROFESIONAL 05238-092561

DIRECTORA DE OBRA (saliente): CARMEN PATRICIA GARCÉS

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-0022, Novedad profesionales personal contratista ALCANTARILLADO PITA 7
1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 16:09
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato

Estimado ingeniero Acosta,

Adjunto le enviamos el oficio 198-1-0022 Novedad profesionales personal contratista Alcantarillado Pita 7, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS

198-1-0022.pdf
208K

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0023

Medellín, marzo 17 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta a oficio AM-012, Entrega de Programación de Obra.

Estimado Ingeniero Guerra,

Por medio de la presente, la interventoría del contrato de la referencia se permite dar respuesta al oficio del asunto observando, respecto a la programación entregada, que se realizaron correctamente los ajustes en cuanto a la reducción del rubro de "Imprevistos" en la misma, observación enviada mediante correo electrónico del 13 de marzo de 2023.

En este sentido, se aprueba y adopta la programación adjunta al oficio AM012 como hoja de ruta del proyecto, por medio de la cual se realizará el seguimiento físico y financiero del mismo.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

CC: Ingeniero Diego Alberto Acosta Betancur – Supervisor del proyecto.

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM 012 Programación de Obra

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 14:56
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenas tardes Ingeniero Carlos Preciado.
Se adjunta Oficio AM 012 Entrega programación de Obra, se adjunta programación de obra y se entrega en físico.

quedamos atentos a sus comentarios

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio PITA 7

2 adjuntos

OFICIO AM012.pdf
114K

Programacion Florida Ajuste.mpp
393K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 16:05
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: ingdrav@gmail.com, Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de obra.

Estimado ingeniero Guerra,

Adjunto enviamos el oficio 198-1-0023, como respuesta oficio AM-012, entrega de programación de obra.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

198-1-0023.pdf
211K

ECOVIAS SAS

198-1-0024

Medellín, marzo 17 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta al oficio AM-014, Fallas y problemáticas identificadas en diferentes del alcantarillado

Estimado Ingeniero Guerra

Por medio del oficio 198-1-0011 Atención a infraestructura en vías del Proyecto, se notificó a la Supervisión del contrato Ingeniero Diego Acosta acerca de la situaciones de los dos fallos que nos atañe en el corredor del proyecto Alcantarillado La Florida, y en el comité de obra # 3 realizado el día de ayer jueves 16 de marzo de 2023 la supervisión informó acerca de que la pasada semana hubo una reunión entre la Secretaría de Gestión y Control Territorial y la Secretaria de Infraestructura donde se trató el tema, y para el comité # 4 se nos informará acerca del resultado de dicha reunión y su recorrido, más sin embargo esta interventoría pondrá en conocimiento de la supervisión este comunicado.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

CC: Ingeniero Diego Acosta-Subsecretaria de Servicios Públicos

Elaboró: CAPS
Revisó: CAPS.
Aprobo: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM 014

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 9:02
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenos días, se comparte Oficio AM 014, Donde se identifican sectores críticos de los tramos del alcantarillado a construir.

Quedamos atentos a sus comentarios.

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio Pita 7

OFICIO AM014.pdf
1395K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 16:14
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra

Estimado ingeniero Guerra,

Adjunto le enviamos el oficio 198-1-0024 respuesta al oficio AM-014 Fallas y problemática identificadas en diferentes partes del alcantarillado, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS
[El texto citado está oculto]

198-1-0024.pdf
235K

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0025

Medellín, marzo 17 de 2023

Señores
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atención: Ingeniero Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor del proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Traslado de oficio AM-016, Cimentaciones de la tubería de alcantarillado; y concepto de interventoría.

Estimado Ingeniero Acosta,

Por medio de la presente, la interventoría del contrato de la referencia se permite dar traslado al oficio del asunto, y presentar su concepto y posición, en los siguientes términos:

Al igual que el contratista de obra, la interventoría realizó las estimaciones y cálculos de variación presupuestal, en caso de cambiarse las cimentaciones con Arenilla (E2) y mezcla de arenas y gravas (E1), por cimentaciones con triturado (E3). Para esto, considerando cimentaciones de 15cm y hasta medio tubo (10.16cm), se obtuvieron los volúmenes necesarios de cimentación para cada uno de los casos anteriores, así:

	Volumen [m3]
Cimentación E1	3.52
Cimentación E2	268.02
Cimentación E3	70.37
Cimentación E4	14.82
Total Cimentaciones	**356.74**

Posteriormente se estimó el costo proyectado para cada tipo de cimentación. Sin embargo, el ejercicio realizado por la interventoría, al contrario del del contratista de obra, considera la inclusión de AU dentro de los precios para las proyecciones presupuestales, así:

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0025

	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VOLUMEN REQUERIDO [M3]	VALOR UNITARIO (AU INCLUIDO)	COSTO TOTAL
Cimentación E1	MUN_3.3.1	Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	m3	3.52	$ 103,139	$ 363,236
Cimentación E2	MUN_3.3.1	Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	m3	268.02	$ 103,139	$ 27,643,704
Cimentación E3	MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	70.37	$ 163,123	$ 11,479,168
Cimentación E4	MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	14.82	$ 163,123	$ 2,417,795
TOTAL						**$ 41,903,902**

De esta forma se encuentra que, como se solicita en diseños, las cimentaciones para todo el trazado de la tubería tienen un costo proyectado aproximado de $41,903,902. Se debe tener en cuenta que este valor incrementaría en el eventual caso de aprobarse un pago extra por concepto de transporte de arenilla, toda vez que el ítem 3.3.1 no contempla el transporte.

Adicionalmente, realizando el ejercicio de trasladar la cantidad necesaria de volumen de cimentación en arenilla, a cimentación en triturado, se obtiene lo siguiente:

	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VOLUMEN REQUERIDO [M3]	VALOR UNITARIO (AU INCLUIDO)	COSTO TOTAL
Cimentación E1	MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	3.52	$ 163,123	$ 574,487
Cimentación E2	MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	268.02	$ 163,123	$ 43,720,761
Cimentación E3	MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	70.37	$ 163,123	$ 11,479,168
Cimentación E4	MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	14.82	$ 163,123	$ 2,417,795
TOTAL						**$ 58,192,210**

Sin embargo, al revisar las cantidades presupuestales para los ítems 3.3.1 y 3.3.4, se encuentra que se disponen de $45,753,509 como presupuesto contractual, como se presenta en la siguiente tabla:

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0025

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VOLUMEN REQUERIDO [M3]	VALOR UNITARIO (AU INCLUIDO)	COSTO TOTAL
MUN_3.3.1	Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	m3	15.00	$ 103,139	$ 1,547,091
MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	271.00	$ 163,123	$ 44,206,418
TOTAL					$ 45,753,509

Finalmente, se concluye que se requeriría una adición o cambio de obra, por valor de $12,438,701 en caso de aprobarse el cambio de material para las cimentaciones tipo E1 y E2 por grava.

Por otro lado es importante mencionar que, técnicamente, y a partir de la experiencia de esta interventoría, se recomienda realizar el cambio de material, toda vez que el triturado, utilizado como cimentación para alcantarillados, cumple las funciones adicionales de filtro, por lo que se evitarían socavaciones bajo la tubería, producto de aguas por nivel freático o fugas de la misma. De esta forma, se garantiza una mayor estabilidad y vida útil para el sistema de alcantarillado construido.

Sin embargo, está en manos de la entidad, como ordenador del gasto, la decisión final respecto a la necesidad y aprobación del cambio de material.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

Oficio AM16 Comparativo cimentaciones

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 12:02
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenas tardes Ingeniero Carlos Preciado, adjuntamos Oficio AM 016, Comparativo de cimentaciones.

quedamos atentos a sus comentarios

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio Pita 7

OFICIO AM016.pdf
172K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 16:23
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: asesoriasconstructivas@hotmail.com, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato

Estimado ingeniero Acosta,

Adjunto le enviamos el oficio 198-1-0025 Traslado oficio AM-016, cimentaciones de la tubería de alcantarillado; y concepto de interventoría, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

OFICIO AM016.pdf
172K

198-1-0025.pdf
969K

ECOVIAS S.A.S.

198-1-026

Medellin, marzo 21 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellin

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Reiteración, solicitud de entrega de documentos como requisito previo para actividades de obra.

Estimado Ingeniero Guerra

Por medio del presente comunicado, la interventoría se permite requerir nuevamente la remisión de los documentos de afiliación del personal operativo de maquinaria, como requisito previo al inicio de las actividades constructivas, el cual se relaciona a continuación:

- Jhon Fredy Restrepo: Cédula, licencia de conducción y examen médico.
- Maquina: Minicargador marca "Bobcat": ficha técnica, declaración de importación, hoja de mantenimiento.
- Davinson Arley Torres: cédula, licencia de conducción, examen médico y certificado de competencia como operador.
- Máquina: Excavadora marca Yanmar, historial de mantenimiento.

La interventoría se permite reiterar, que tanto los comprobantes de pago de seguridad social, como otros documentos relativos a la información y competencia del personal, o a las características operativas de la maquinaria y equipo de obra, son insumos indispensables para el inicio y desarrollo de actividades de campo, en este sentido, se otorga al contratista un plazo máximo de 48 horas (hasta el día jueves 23 de marzo de 2023), para remitir a la interventoría la información aquí solicitada; en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, se procederá a la suspensión temporal de las actividades de obra que se encuentran en ejecución en la cual tenga injerencia la maquinaria y personal detallado anteriormente.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor
Elaboró: NJR
Revisó: CAPS.
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Comunicados 198-1-0026 y 198-1-0027 Reiteración entrega información
1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 21:26
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Alcantarillado pita 7

Estimado ingeniero, nos permitimos entregar los oficios 198-1-0026 y 198-1-0027 quedamos pendiente de su pronta y positiva respuesta a los requerimientos.

Cordial saludo.

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S.

198-1-027.pdf

198-1-026.pdf

ECOVIAS SAS

198-1-027

Medellín, marzo 21 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Reiteración de nuestro comunicado No 198-1-0021 del 16 de marzo de 2023 en respuesta a su oficio AM015 del 16 de marzo de 2023.

Estimado Ingeniero Guerra.

Mediante el presente comunicado, la interventoría se permite reiterar la necesidad de remitir el documento denominado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, el cual fue solicitado mediante el comité socioambiental y SST el día 06 de marzo del 2023 y oficio No 198-1-0021 del 16 de marzo de 2023, y que a la fecha no se ha obtenido respuesta oportuna por parte del contratista de obra. Este requerimiento se fundamenta en cumplimiento de los numerales 9, 23, 26, 36,45, 46, 47, 50, 51, 61, 71 y 72 de la **CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** del contrato de obra No **4600095815 de 2022**

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: NJR
Revisó: CAPS.
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Comunicados 198-1-0026 y 198-1-0027 Reiteración entrega información

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 21:26
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Alcantarillado pita 7

Estimado ingeniero, nos permitimos entregar los oficios 198-1-0026 y 198-1-0027 quedamos pendiente de su pronta y positiva respuesta a los requerimientos.

Cordial saludo.

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S.

198-1-027.pdf

198-1-026.pdf

198-1-0028

Medellín, marzo 22 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA 7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Disposición de personal administrativo en obra.

Estimado Ingeniero Guerra,

En el ejercicio de las funciones de la interventoría del contrato de la referencia, se ha hecho seguimiento y verificación del cumplimiento de la totalidad de las responsabilidades del contratista, consignadas en la Cláusula 10. Obligaciones específicas del contratista" en donde, entre otras, se exponen las siguientes responsabilidades:

"32. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida podrán someterse a la aprobación de la supervisión del contrato de interventoría de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, previa revisión de la interventoría."

"34. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría, cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento."

"35. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y al avance del contrato."

198-1-0028

"64. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo laboral."

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría aclara que, si bien se ha verificado la vinculación y pago oportuno de seguridad social integral del personal relacionado en el componente de Administración del contrato de obra, no se ha evidenciado presencia constante del personal administrativo (especialmente el componente ambiental) en los frentes de trabajo, repercutiendo en el eficiente avance y desarrollo de las obras a ejecutar.

Debido a esto, la interventoría solicita mayor presencia en frentes de obra de todas y cada una de personas contratadas para los cargos relacionados en la siguiente tabla, obtenida del cálculo del AIU del contrato de obra:

Recurso Humano	Cantidad	Dedicación
Director de obra	1	20%
Residente de obra	1	100%
Tecnólogo en Obras Civiles	1	100%
Tecnólogo Ambiental	1	100%
Tecnólogo Social	1	100%
Tecnólogo residente en Seguridad y Salud en el trabajo – SST	1	100%

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

CC: Ingeniero Diego Alberto Acosta Betancur – Supervisor del proyecto.

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

936

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-0028, Disposición de personal administrativo en obra.

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 16:26
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, asesoriasconstructvas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra

Estimado ingeniero Guerra,

Adjunto le enviamos el oficio 198-1-0028 Disposición de personal administrativo en obra, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS

198-1-0028.pdf
570K

ECOVIAS SAS

198-1-0029

Medellín, marzo 22 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Presupuesto socioambiental para corrección por el contratista.

Estimado Ingeniero Guerra,

Conforme a la revisión que se realizó en la reunión el dia 22 de marzo del 2023, la interventoria se permite enviar el presupuesto para que se hagan las respectivas correcciones.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Anexo: Presupuesto socioambiental.

Elaboró: JHLM
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Presupuesto Socioambiental y SST

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 13:15
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Consorcio Alcantarillado Pita 7

Buenas tardes

Adjunto oficio-198-1-0029 donde se anexa el presupuesto socio-ambiental y SST para su respectiva corrección.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST- Interventoría

2 adjuntos

Oficio-198-1-0029.png
725K

Presupuesto socioambiental-SST (Pita).xlsx
49K

ECOVIAS S.A.S.

198-1-003

Medellín, febrero 1 de 2023

Señor
Diego Alberto Acosta Betancur
diego.acosta@medellin.gov.co
Supervisor proyecto Secretaría de Servicios Públicos
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Entrega Plan de Manejo de Tránsito PMT

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, me permito presentar el Plan de Manejo de Tránsito revisado y firmado con Vo.Bo. por parte de esta interventoría, y el radicado ante la secretaría de movilidad de Medellín para su conocimiento y fines pertinentes.

Solicitamos de sus buenos oficios ante el profesional encargado por parte de la secretaría de movilidad para que pueda dar su aval y aceptación a este plan de movilidad.

No siendo mas el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS S.A.S

ING. DANI RICARDO ACEVEDO
Director de Interventoría

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO 4600095815 de 2022

6 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 8:17
Para: diego.acosta@medellin.gov.co
Cc: ingdrav@gmail.com

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del contrato

Respetado ingeniero Acosta, atendiendo las funciones de esta interventoría nos permitimos hacer entrega del radicado del Plan de Manejo de Tránsito- PMT del contrato en mención revisado y con VoBo por parte de ECOVIAS S.A.S.

Es importante aclarar que este fue radicado por parte del Contratista Alcantarillado Pita 7 para su aval por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, el día lunes 30 de enero de 2023 a las 12:29 m

Atentamente,

Carlos Preciado
Residente de Interventoría
ECOVIAS S:A.S

15 adjuntos

WhatsApp Image 2023-01-30 at 12.19.00 PM radicado (4).jpeg
79K

TRAMO3_ETAPA1.pdf
1779K

TRAMO3_ETAPA2.pdf
1529K

TRAMO1_ETAPA6.pdf
1691K

TRAMO2_ETAPA3.pdf
1842K

TRAMO2_ETAPA1.pdf
2164K

TRAMO2_ETAPA2.pdf
2427K

TRAMO1_ETAPA4.pdf
1686K

TRAMO1_ETAPA3.pdf
1784K

TRAMO1_ETAPA5.pdf
1673K

TRAMO1_ETAPA7.pdf
1667K

TRAMO1_ETAPA8.pdf
2654K

TRAMO1_ETAPA2.pdf
1887K

TRAMO1_ETAPA1.pdf
1937K

198-1-003 .docx
88K

postmaster@medellin.gov.co <postmaster@medellin.gov.co> 1 de febrero de 2023, 8:19
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

diego.acosta@medellin.gov.co

El destinatario no podrá recibir este mensaje porque es demasiado grande.

El tamaño máximo de mensaje permitido es 11 MB. Este mensaje tiene 33 MB.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: MDECORREO01.medellin.gov.co

diego.acosta@medellin.gov.co
Remote Server returned '550 5.2.3 RESOLVER.RST.RecipSizeLimit; message too large for this recipient'

Encabezados de mensajes originales:

```
Received: from BARRACUDA.MEDELLIN.GOV.CO (192.168.200.4) by
 mdecorreo01.medellin.gov.co (10.1.230.138) with Microsoft SMTP Server id
 15.0.1497.38; Wed, 1 Feb 2023 08:19:35 -0500
X-ASG-Debug-ID: 1675257551-1f6e53578d58080001-XI0I62
Received: from outbound-ip122b.ess.barracuda.com (outbound-ip122b.ess.barracuda.com [209.222.82.143]) by
BARRACUDA.MEDELLIN.GOV.CO with ESMTP id IKIEnZT8nmjhdDYc (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-
GCM-SHA256 bits=128 verify=NO) for <diego.acosta@medellin.gov.co>; Wed, 01 Feb 2023 08:19:12 -0500 (-05)
X-Barracuda-Envelope-From: laflorida.ecovias@gmail.com
X-Barracuda-RBL-Trusted-Forwarder: 209.222.82.143
Received: from mail-pg1-f174.google.com (mail-pg1-f174.google.com [209.85.215.174]) by mx-inbound42-219.us-
east-2c.ess.aws.cudaops.com (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO); Wed,
01 Feb 2023 13:18:30 +0000
Received: by mail-pg1-f174.google.com with SMTP id z14so2038593pgs.10
        for <diego.acosta@medellin.gov.co>; Wed, 01 Feb 2023 05:18:30 -0800 (PST)
X-Barracuda-RBL-IP: 209.85.215.174
X-Barracuda-Effective-Source-IP: mail-pg1-f174.google.com[209.85.215.174]
```

```
X-Barracuda-Apparent-Source-IP: 209.85.215.174
X-Barracuda-BBL-IP: 209.85.215.174
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gmail.com; s=20210112;
        h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject
         :date:message-id:reply-to;
        bh=Z077+3Di1kb5pWTELfNMa4fbcCeBXBGzU8Gzy8vfS+s=;
        b=Jn245dHsw9EQreF1MBjQvwZu+jg5UCMHcyC5vNnbnK4GDghSfXM/OO+Jn9FMNLOeke
         rY8wFsNYKvLP4gWG6W4sRHgf45bH4bUoNjFSrpHBId2t/FLdxR9bxV2ytmJ4/UNkSBrE
         4cci0stVpboCOUOBY9+gucA1H7VJ3Eb6R4fzIJyDNvORwXvRm6mJDc24iisYjjUFmzzE
         CEw1NGzKBPPyiN5aW64aMmF1r2HO5drGEyLOMUS2JMgz35BZBmCq95agZ18n/qmexW/T
         0lmqWYVg9UBI3df4FvmsJOkZUsBCDXouE7Z1dgfkQYdZGEWlMLxSngRhevh/VOX7vI39
         JvIg==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20210112;
        h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state
         :from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;
        bh=Z077+3Di1kb5pWTELfNMa4fbcCeBXBGzU8Gzy8vfS+s=;
        b=ZCSD3fyd0AK7qMNNY7HMZFedRuisEUwcfRpxqpReNVMP3aNiby978dczBnjGIj4/Bq
         +I6C66WeEnsiR7SKWI+4ycea7CDa06vJOydlDsNUS5/c3UkEUoCMAu4JAQsyHT4bnvLU
         oporGcJCNjjNLfxQT4FhfcsTU3QCBmj688FcmKuKbirnDhzlrRjM7watSaATzjYWN3sK
         eOGJUZ2dFGwJV7J74YvtlxRzDVBG+QzQcZxNQgcgaYqZfY+397CaTLZcyNwOeGSOIMkc
         TR7EOyQL4kixWqO43AZemD48Ull9pxVvSGrpk40LIe6CHo8WQ9zAeDYbE6yfp4E3FFR1
         ogyA==
X-Gm-Message-State: AO0yUKURYJAr52Q9ez84MM6CAosA56Hw8hEvkqamz3qlPBg2p2oG/grQ
        bruuhVJSLnnWMNnVw7k6mxkZH1OM58jcH/yJgPyKtUQs8dQq8Q==
X-Google-Smtp-Source: AK7set8Q+oMtronXugOJT2ujxAkAQAiYxMm+GhNChomfDO+Sq/IyPN1l0Bjrf7fP0aM/
iq6LbN1VwDVS1XVpIS4o+bw=
X-Received: by 2002:a63:5255:0:b0:4de:7e96:17d0 with SMTP id
 s21-20020a635255000000b004de7e9617d0mr390147pgl.84.1675257502765; Wed, 01 Feb
 2023 05:18:22 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
From: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Date: Wed, 1 Feb 2023 08:17:39 -0500
Message-ID: <CAN6O14__RgWdgS6DWvyr0DT0U-fqurdJE_Wa7+YBF-CchO1kcg@mail.gmail.com>
Subject: Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO
 4600095815 de 2022
To: <diego.acosta@medellin.gov.co>
X-ASG-Orig-Subj: Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO
 4600095815 de 2022
CC: <ingdrav@gmail.com>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="0000000000005f4ecf05f3a3486f"
X-BESS-ID: 1675257510-110971-5469-4816-1
X-BESS-VER: 2019.1_20221214.2106
X-BESS-Apparent-Source-IP: 209.85.215.174
Received-SPF: pass (mx-inbound42-219.us-east-2c.ess.aws.cudaops.com: domain of laflorida.ecovias@gmail.com
designates 209.85.215.174 as permitted sender)
X-BESS-BRTS-Status: 1
X-Barracuda-Connect: outbound-ip122b.ess.barracuda.com[209.222.82.143]
X-Barracuda-Start-Time: 1675257551
X-Barracuda-Encrypted: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
X-Barracuda-URL: https://10.1.230.34:8443/cgi-mod/mark.cgi
X-Virus-Scanned: by bsmtpd at MEDELLIN.GOV.CO
X-Barracuda-Scan-Msg-Size: 2035
X-Barracuda-BRTS-Status: 1
X-Barracuda-Bayes: INNOCENT GLOBAL 0.4830 1.0000 0.0000
X-Barracuda-Spam-Score: 0.20
X-Barracuda-Spam-Status: No, SCORE=0.20 using per-user scores of TAG_LEVEL=3.5 QUARANTINE_LEVEL=1000.0
KILL_LEVEL=5.0 tests=HTML_MESSAGE, MIME_DOC_AO_NAME4
X-Barracuda-Spam-Report: Code version 3.2, rules version 3.2.3.104176
        Rule breakdown below
         pts rule name              description
        ---- --------------------- --------------------------------------------------
        0.00 HTML_MESSAGE          BODY: HTML included in message
        0.20 MIME_DOC_AO_NAME4     Custom Rule MIME_DOC_AO_NAME4
Return-Path: laflorida.ecovias@gmail.com
```


Original-Recipient: rfc822;diego.acosta@medellin.gov.co
Final-Recipient: rfc822;diego.acosta@medellin.gov.co

Action: failed
Status: 5.2.3
Diagnostic-Code: smtp;550 5.2.3 RESOLVER.RST.RecipSizeLimit; message too large for this recipient

noname
5K

postmaster@medellin.gov.co <postmaster@medellin.gov.co> 1 de febrero de 2023, 8:19
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

diego.acosta@medellin.gov.co

El destinatario no podrá recibir este mensaje porque es demasiado grande.

El tamaño máximo de mensaje permitido es 11 MB. Este mensaje tiene 33 MB.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: MDECORREO01.medellin.gov.co

diego.acosta@medellin.gov.co
Remote Server returned '550 5.2.3 RESOLVER.RST.RecipSizeLimit; message too large for this recipient'

Encabezados de mensajes originales:


```
Received: from BARRACUDA.MEDELLIN.GOV.CO (192.168.200.4) by
 mdecorreo01.medellin.gov.co (10.1.230.138) with Microsoft SMTP Server id
 15.0.1497.38; Wed, 1 Feb 2023 08:19:54 -0500
X-ASG-Debug-ID: 1675257551-1f6e53578e58080001-XI0I62
Received: from outbound-ip61b.ess.barracuda.com (outbound-ip61b.ess.barracuda.com [209.222.82.238]) by
BARRACUDA.MEDELLIN.GOV.CO with ESMTP id zSRBs1i1O20CrSmY (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-
GCM-SHA256 bits=128 verify=NO) for <diego.acosta@medellin.gov.co>; Wed, 01 Feb 2023 08:19:11 -0500 (-05)
X-Barracuda-Envelope-From: laflorida.ecovias@gmail.com
X-Barracuda-RBL-Trusted-Forwarder: 209.222.82.238
Received: from mail-wm1-f49.google.com (mail-wm1-f49.google.com [209.85.128.49]) by mx-inbound21-89.us-
east-2b.ess.aws.cudaops.com (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO); Wed,
01 Feb 2023 13:18:48 +0000
Received: by mail-wm1-f49.google.com with SMTP id n28-20020a05600c3b9c00b003ddca7a2bcbso1409722wms.3
        for <diego.acosta@medellin.gov.co>; Wed, 01 Feb 2023 05:18:48 -0800 (PST)
X-Barracuda-RBL-IP: 209.85.128.49
X-Barracuda-Effective-Source-IP: mail-wm1-f49.google.com[209.85.128.49]
X-Barracuda-Apparent-Source-IP: 209.85.128.49
X-Barracuda-BBL-IP: 209.85.128.49
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gmail.com; s=20210112;
        h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject
         :date:message-id:reply-to;
        bh=zMVwF0srGtW+m+GYCoLD9A9qplfq8XtI3rtpsptPc6o=;
        b=ASmMkWiyLgASkV9nYW29bhSqs953jBNDBsPDY7sylu7qv4aPIi5iva4qUF8MusitIe
         OqybRGczpqYG/jPBn0syv1ikS+MQmvMlgyCBrKfao7DBHtdHe8gTycoIFdP0AV+iug8W
         f8ueLunL1SmNkhBd4Yzk9GLQ+462XXgMsSWVshZ1RsHkddEcmAtps9EGwIdwrIKQRDEG
```

tMPRZDf8Y8ubuEQEJfrRZ59onSLYGyS2OnOrxzVAeggPkzLQlpfMFBk9/7eX1AyW283k
hcpCk9eTnWzBHJ2qz0YSf32WU08ZBXuSH2uVZQQfmlXKnQGxWSLiKidATwLVGupiapsY
rzrg==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20210112;
h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state
:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;
bh=zMVwF0srGtW+m+6YCoLD9A9qplfqBXtI3rtpsptPc6o=;
b=oMjBidvncHc3MyjA+opoCY7cF8wtL4Ww0t+06A2AtIQAJZMAgzgCZ9sl1JvbC7zRKl
HDKckfmR5EyVG3msCd6cKFpnJVuXn7W+ZfYoB4uOtzJ/qaz71SSRfUQ+Z0AVcilrALBV
dafppob6Q3NIzJcTIXYPyy9FEKZdw+gZOwrq8+N1dVs7EhrYN+zDCPxLaeApNgiTFI+5
hYXK3izg4ClyT8JtyJCJYu8L2Sg6HwAu2tUeXVDcd48w21a/EyZKuJl4j3rSOU9sSr5T
gNZGkwxNogBVXLUiCgcPgAlKGgM0uCilK83bzGS/hBIdZzLVHGoPcDqaemsg8jYXMZK3
5jcg==
X-Gm-Message-State: AO0yUKXli2ccepjoC1spYePzuVa0g1JEHSz2Td72CLJyzhxCkERq1Is1
lhrz6g4kYxkv81P4SqZVSzv5/CSkQ/FhSD2bacIC7sZUzrg1Fg==
X-Google-Smtp-Source: AK7set8N+fld8O4kfzrxIj7PG3Cpsmb+Z5/elPtlbJM9LHMn4MydOeYcClZsOiDgL
A34It2d++rJ+vAiVbL/Zr7gP0s=
X-Received: by 2002:a05:600c:22cc:b0:3d9:f3cf:7848 with SMTP id
12-20020a05600c22cc00b003d9f3cf7848mr117534wmg.53.1675257522889; Wed, 01 Feb
2023 05:18:42 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
From: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Date: Wed, 1 Feb 2023 08:17:39 -0500
Message-ID: <CAN6O14__RgWdgS50WvyrODT0U-fqurdJE_Wa7+YBF-CchO1kcg@mail.gmail.com>
Subject: Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO
4600095815 de 2022
To: <diego.acosta@medellin.gov.co>
X-ASG-Orig-Subj: Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO
4600095815 de 2022
CC: <ingdriv@gmail.com>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="0000000000000923d0705f3a349c5"
X-BESS-ID: 1675257527-105465-5384-7639-1
X-BESS-VER: 2019.1_20221214.2106
X-BESS-Apparent-Source-IP: 209.85.128.49
Received-SPF: pass (mx-inbound21-89.us-east-2b.ess.aws.cudaops.com: domain of laflorida.ecovias@gmail.com
designates 209.85.128.49 as permitted sender)
X-BESS-BRTS-Status: 1
X-Barracuda-Connect: outbound-ip61b.ess.barracuda.com[209.222.82.238]
X-Barracuda-Start-Time: 1675257551
X-Barracuda-Encrypted: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
X-Barracuda-URL: https://10.1.230.34:8443/cgi-mod/mark.cgi
X-Virus-Scanned: by bsmtpd at MEDELLIN.GOV.CO
X-Barracuda-Scan-Msg-Size: 2035
X-Barracuda-BRTS-Status: 1
X-Barracuda-Bayes: INNOCENT GLOBAL 0.4791 1.0000 0.0000
X-Barracuda-Spam-Score: 0.20
X-Barracuda-Spam-Status: No, SCORE=0.20 using per-user scores of TAG_LEVEL=3.5 QUARANTINE_LEVEL=1000.0
KILL_LEVEL=5.0 tests=HTML_MESSAGE, MIME_DOC_AO_NAME4
X-Barracuda-Spam-Report: Code version 3.2, rules version 3.2.3.104176
Rule breakdown below
pts rule name description
---- ---------- ----------
0.00 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
0.20 MIME_DOC_AO_NAME4 Custom Rule MIME_DOC_AO_NAME4
Return-Path: laflorida.ecovias@gmail.com

Original-Recipient: rfc822;diego.acosta@medellin.gov.co
Final-Recipient: rfc822;diego.acosta@medellin.gov.co
Action: failed
Status: 5.2.3
Diagnostic-Code: smtp;550 5.2.3 RESOLVER.RST.RecipSizeLimit; message too large for this recipient

noname
5K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 8:58
Para: diego.acostabetancurt@gmail.com

[El texto citado está oculto]

15 adjuntos

WhatsApp Image 2023-01-30 at 12.19.00 PM radicado (4).jpeg
79K

TRAMO3_ETAPA1.pdf
1779K

TRAMO3_ETAPA2.pdf
1529K

TRAMO1_ETAPA6.pdf
1691K

TRAMO2_ETAPA3.pdf
1842K

TRAMO2_ETAPA1.pdf
2164K

TRAMO2_ETAPA2.pdf
2427K

TRAMO1_ETAPA4.pdf
1686K

TRAMO1_ETAPA3.pdf
1784K

TRAMO1_ETAPA5.pdf
1673K

TRAMO1_ETAPA7.pdf
1667K

TRAMO1_ETAPA8.pdf
2654K

TRAMO1_ETAPA2.pdf
1887K

TRAMO1_ETAPA1.pdf
1937K

198-1-003 .docx
88K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 1 de febrero de 2023, 8:59
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **diego.acostabetancurt@gmail.com** porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

```
550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking
the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser fl22-20020a05600c0b9600b003db063463absor670715wmb.31 -
gsmtp
```

Final-Recipient: rfc822; diego.acostabetancurt@gmail.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser fl22-20020a05600c0b9600b003db063463
absor670715wmb.31 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Wed, 01 Feb 2023 05:59:32 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
To: diego.acostabetancurt@gmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 1 Feb 2023 08:58:52 -0500
Subject: Fwd: Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO 4600095815 de 2022
----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: laflorida.ecovias@gmail.com
1 de febrero de 2023, 8:59

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **diego.acostabetancurt@gmail.com** porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue:

```
550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking
the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser c189-20020a621cc6000000b0059395cc8ccdsor5391363pfc.75
- gsmtp
```

Final-Recipient: rfc822; diego.acostabetancurt@gmail.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser c189-20020a621cc6000000b0059395cc8c
cdsor5391363pfc.75 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Wed, 01 Feb 2023 05:59:55 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
To: diego.acostabetancurt@gmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 1 Feb 2023 08:58:52 -0500
Subject: Fwd: Oficio 198-1-003 Radicado PMT Alcantarillado la Florida CONTRATO 4600095815 de 2022
----- Message truncated -----

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0030

Medellín, marzo 28 de 2023

Señores
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atención: Abogado Roger Alejandro Jiménez Fernández
Subsecretario de Servicios Públicos
roger.jimenez@medellin.gov.co
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Concepto Técnico económico utilización mezcla asfáltica MDC-19 en lugar de MDC2.

Estimado Abogado Jiménez,

Por medio de la presente, la interventoría del contrato de la referencia se permite dar traslado al oficio del asunto, y presentar su concepto y posición, en los siguientes términos:

Con el ánimo de solucionar la controversia presentada al interior del proyecto en cuanto a los inconvenientes para la producción de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 y a los sobrecostos que supuestamente implica su cambio por mezcla asfáltica tipo MDC-19, a continuación, se hacen las siguientes claridades:

- Ante la alerta dada por el Contratista en cuanto a que las plantas de producción de asfalto de la zona no producen actualmente mezcla tipo MDC-2, se realizó por parte de la interventoría investigación en distintas plantas del valle de Aburrá encontrándose que las plantas MINCIVIL, ASFALTADORA COLOMBIA, Y PAVIMENTAR si están en disposición de producir este tipo de mezcla.

- De acuerdo a lo anterior no es necesaria la implementación del cambio de mezcla asfáltica tipo MDC-2 a MDC-19.

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0030

- Sin embargo, si el Contratista mantiene su propuesta de suministrar para el proyecto mezcla asfáltica tipo MDC-19 a cambio de MDC-2, se considera por parte de esta interventoría que este es un cambio viable dado que estos dos tipos de mezcla son similares y su diferencia en nombre obedece principalmente a la actualización de las especificaciones de Construcción de Carreteras del INVIAS de la versión 2007 a la versión 2012.

Para comprobar esto basta con comparar las dos versiones de las mencionadas especificaciones, en donde se observa que las dos mezclas tienen la misma granulometría (comparar tabla 450.2 de la versión 2007 con tabla 450-6 de la versión 2013), que se deben cumplir los mismos requisitos de calidad de los materiales pétreos y bituminosos (comparar tabla 400.1a de la versión 2007 con tabla 450-3 de la versión 2013) y que deben cumplir los mismos parámetros de diseño para el establecimiento de la fórmula de trabajo (comparar tablas siguientes), simplemente la especificación 2012 requiere de la evaluación de parámetros adicionales de control de calidad, por tanto la mezcla MDC-19 puede cumplir fácilmente los requisitos de diseño y calidad de la mezcla MDC-2.

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0030

- Con respecto a los presuntos sobrecostos que indica el Contratista implica el suministro de mezcla tipo MDC-19 frente al tipo MDC-2, es claro que dada su similitud no debe haber diferencia alguna en precio de fabricación de las dos mezclas, dado que son técnicamente iguales, este aspecto se puede corroborar a partir del comunicado presentado por la firma Sanear, diseñador del proyecto en donde el proveedor Asfaltadora Colombia SA indica el mismo costo para MDC-19 o MDC-2.

- Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir como primera medida que el Contratista puede suministrar al proyecto mezcla tipo MDC-2 o MDC-19, dado que esta es producida por las diferentes plantas de producción del valle de Aburrá, y como segunda que dado que la mezcla MDC-2 es técnicamente igual a la mezcla tipo MDC-19, no debe haber diferenciación en sus precios, por tanto no hay sobrecosto alguno al respecto.

Finalmente es importante resaltar que el Contratista presentó su propuesta hacia finales del 2022, en la cual se comprometió a suministrar mezcla tipo MDC-2, y desde la fecha de presentación de su propuesta a la fecha actual no han cambiado las condiciones del mercado a un nivel que impidan que el Contratista cumpla con el suministro del material asfáltico que ofertó, por tanto, se solicita al Contratista coordine sus actividades de colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-2 tal como lo indica en su propuesta, se aceptará la colocación de mezcla tipo MDC-19 siempre y cuando esto no signifique ningún sobrecosto al contrato de obra mencionado en la referencia.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Norma INVIAS 2012

Norma INVIAS 2007

198-1-0030

ECOVIAS SAS

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-0030 concepto Técnico económico mezcla asfáltica MDC-2

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 30 de marzo de 2023, 10:18
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: diego.acostabetancur@gmail.com, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, jose.montoya@medellin.gov.co

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud nos permitimos hacer entrega del oficio en mención, quedamos prestos a sus comentarios y/o inquietudes

Cordial saludo,

Carlos Preciado
ECOVIAS S.A.S

Oficio 098-1-0030.pdf

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0031

Medellín, marzo 30 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA 7
Atención: Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos
Director de obra
Alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Entrega de actas de vecindad y entorno con observaciones en respuesta de oficio AM-002 y AM-006

Estimado Ingeniero Guerra,

Por medio de la presente, la interventoría del contrato de la referencia se permite dar devolución de veinticinco (25) actas de vecindad y una (1) acta de entorno, con observaciones.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

30/03/2023

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: GCGR
Revisó: CAPS
Aprobó: DRAV

ECOVIAS S.A.S.

198-1-0032

Medellín, marzo 21 de 2023

Señores
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atención: Ingeniero Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor del proyecto
Diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Referencia: Contrato N° 4600096200 DE 2022 "INTERVENTORÍA INTEGRAL ALA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Solicitud reconocimiento reajuste de precios del contrato de interventoría.

Estimado Ingeniero

Teniendo en cuenta que los demás contratos de Interventoría de la construcción de obras de saneamiento básico que se encuentra ejecutando actualmente la Secretaria de Gestión y Control Territorial, consideran el reajuste de precios, a diferencia de nuestro contrato de la referencia, con el ánimo de ejecutar nuestras funciones en igualdad de condiciones que los otros Interventores activos de la entidad, atentamente solicitamos se considere el reajuste de precios en nuestro contrato, en los mismos términos de los otros proyectos, como sustento de lo mencionado anteriormente anexo a la presente entregamos el aparte de los pliegos de cada proyecto en el que se reglamenta este reajuste.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventor

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-0032, Solicitud reconocimiento reajuste de precios del contrato de interventoría.
1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 30 de marzo de 2023, 14:44
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, cpreciado0@gmail.com

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato

Cordial saludo

Por medio de la presente le enviamos el oficio 198-1-0032, para su conocimiento y fines pertinentes.
Adicionalmente, le adjuntamos los anexos completos de dicho oficio.

Quedamos prestos a sus solicitudes y/o comentarios

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

3 adjuntos

Oficio 198-1-0032.pdf
1831K

Pliego de Condiciones Definitivo Interventoria Montañita.pdf
1863K

Pliego de Condiciones Definitivo Interventoria La Verde.pdf
1809K

198-1-004

Medellín, febrero 1 de 2023

Señores
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Entrega hojas de vida personal contratista ALCANTARILLADO PITA 7

Estimado Ingeniero

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, me permito presentar las hojas de vida verificadas por esta interventoría y por lo cual se da el concepto favorable al personal del contratista que integrará el equipo constructor del proyecto, estas se relacionan a continuación:

Directora de Obra: CARMEN PATRICIA GARCES HERNANDEZ
Ingeniera Civil
MATRICULA PROFESIONAL 05202-122296

Residente de Obra: JUAN CARLOS MONTOYA GOMEZ
Ingeniero Civil
MATRICULA PROFESIONAL 05202-157645

Tecnóloga de Obra: DANIELA OCHOA TORRES
Tecnóloga de Obras Civiles
05502-035053 desde el 18 de junio de 2014

Residente Ambiental: LEYDY KATHERINE VALENCIA VALENCIA
Ingeniero Ambiental
MATRICULA PROFESIONAL 05238-336650

Residente Social: DIANA HERNANDEZ
Trabajadora Social

198-1-004

MATRICULA PROFESIONAL 296601009-1 CONSEJO NACIONAL TRABAJO SOCIAL

Residente SST: YURLEY SORANY GUERRA USUGA
Tecnóloga en Salud Ocupacional
Resolución 2017060103944 SECCION DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-004 Entrega HV Contratista Pita 7

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 13:04
Para: diego.acostabetancur@gmail.com, diego.acosta@medellin.gov.co, ingdrav@gmail.com

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del contrato

Respetado Ingeniero Acosta

Nos permitimos hacer entrega del oficio 198-1-004 que contiene el aval de ECOVIAS S.A.S de los profesionales para el proyecto Alcantarillado La Florida CONTRATO 4600095815 de 2022.

También se adjuntan en el drive las HV y los soportes validados por esta interventoría.

Atentamente,

Carlos Preciado
Residente de Interventoria
ECOVIAS S.A.S.

https://wetransfer.com/downloads/0b50851cc1ba6443fb8bddb73bf73ce420230201133215/8ea56de1e2554fbc2929d40fdaf82d6720230201133231/134edc

198-1-004 ENTREG HV CSTA.pdf
527K

ECOVIAS S.A.S

198-1-005
Medellín, febrero 8 de 2023

Señores
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Entrega acta de recorrido inicio EPM

Estimado Ingeniero

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, nos permitimos hacer entrega del acta de recorrido de inicio de acompañamiento con Empresas Públicas de Medellín EPM para los fines pertinentes entre la Subsecretaria de Servicios Públicos de la Alcaldía de Medellín y EPM.

No siendo más el motivo de la presente nos suscribimos cordialmente

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría
ECOVIAS SAS

Adjunto: Acta recorrido EPM 001.pdf

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Comunicado 198-1-005 Entrega acta recorrido EPM Alcantarillado La Florida

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 9 de febrero de 2023, 16:06
Para: diego.acosta@medellin.gov.co, diego.acostabetancur@gmail.com
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato

Respetado Ingeniero Acosta

Nos permitimos hacer entrega del oficio 198-1-005 que contiene el acta de recorrido realizado el dia jueves 2 de enero de 2023 entre la Subsecretaria de Servicios Publicos, Empresas Publicas de Medellin, el contratista Consorcio Pita 7 y ECOVIAS S.A.S para el proyecto Alcantarillado La Florida CONTRATO 4600095815 de 2022.

Atentamente,

Carlos Preciado
Residente de Interventoria
Ecovias S.A.S

2 adjuntos

198-1-005.pdf
135K

Acta 1 Recorrido - La Florida.pdf
316K

ECOVIAS SAS

198-1-005

Medellín, febrero 17 de 2023

Señores
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ingeniero: Diego Alberto Acosta Betancur
Supervisor proyecto
diego.acosta@medellin.gov.co
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Novedad en el personal de Interventoria (Residente Social)

Estimado Ingeniero Acosta

Nos permitimos informar que la Trabajadora Social Zulima Carvajal Silva quien integraba el pull de profesionales de esta interventoría se retiró del proyecto, por tal motivo nos permitimos presentar la Hoja de Vida de la Trabajadora Social Gloria Cristina García Rodríguez para su análisis y aprobación.

No siendo más el motivo de la presente nos suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Adjunto: Hoja de Vida TS. Gloria Cristina García Rodríguez (14 folios)
Certificaciones académicas y laborales (66 folios)

Elaboro: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio Ecovias 198-1-006 Novedades de Personal

3 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 17 de febrero de 2023, 15:45
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, diego.acostabetancur@gmail.com, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor del Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Estimado Ingeniero

Nos permitimos hacer entrega del oficio 198-1-006 de ECOVIAS donde anunciamos la novedad en nuestra planta de personal para su conocimiento y aval de nuestra nueva residente social.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing. Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-006.pdf

Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co> 17 de febrero de 2023, 15:58
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, "diego.acostabetancur@gmail.com" <diego.acostabetancur@gmail.com>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Buenas tardes:

Por favor adjuntar el oficio al que hacen referencia.

Cordial saludo,

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario
Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial
diego.acosta@medellin.gov.co
Teléfono: 3855555 Ext. 5286
Edificio Plaza Libertad, Piso 8 Torre A
Dirección Carrera 43 A N°42-161
Medellín - Colombia

De: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2023 15:45

ECOVIAS S.A.S.

198-1-007
Medellín, febrero 17 de 2023

Señores
CONSORCIO PITA 7
Ingeniera: Carmen Patricia Garcés Hernández
Directora de Obra
alcantarilladopita7@gmail.com
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Observaciones PASAO

Estimada Ingeniera Garcés

Una vez revisado el Plan de Acción Social Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo PASAO esta interventoría solicita atender las siguientes observaciones en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, corregirlas y enviar nuevamente para verificación de las mismas, las observaciones son las siguientes:

1. La Resolución **No 202000001839 del 11 de junio de 2020**, expedida por la Secretaría de Planeación del Municipio de Bellos, establece en su Artículo Primero: que se renueva y autoriza la misma por un término de **tres (3) años** para la operación del sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición-RCD de **CONASFALTOS,** así las cosas, y dado de que la misma fue expedida el 11 de junio de 2020, se hace necesario que el contratista inicie lo antes posible el proceso de renovación de la misma, ya que esta vence el 11 de junio de 2023.

2. **MINCIVIL**: Teniendo en cuenta, que la Alcaldía Municipal de Girardota concede y da trámite al PMA aprobado ambiental CORANTIOQUIA para los títulos mineros con No 456 y 525, localizados en los predios identificados con números catastrales 11-191 y 11-193 (ubicados entre la vía Girardota – Hatillo y el Río Aburrá), mediante la cual se autorizó a la empresa MINCIVIL el uso de los predios como ZODME; y que en su Parágrafo Primero (del permiso), establece que una vez cumplido los 18 meses de la presente prórroga la Sociedad MINCIVIL S.A, deberá solicitar nuevamente la prórroga. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario la renovación del permiso aquí descrito, toda vez que este fue concedido/notificado el día 15 de mayo de 2019.

3. Se hace necesario que se remita el REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM, de la empresa **CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A** con fecha reciente (año 2023), ya que la remitida tiene vigencia de hace tres (3) años.

ECOVIAS SAS

198-1-007

4. Se hace necesario que se remita el REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM, de la empresa **ARENAS Y TRITURADOS HELICONIA S.A.S** con fecha reciente (año 2023), ya que la remitida tiene vigencia del año 2021.

5. Referente a la volqueta de placas **TDZ 835**, el documento que se remite respecto al RUNT, según se observa en la información reportada, ya se venció el "CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES": Fecha de expedición: 2021/12/1 Fecha de vencimiento: 2022/12/11.

6. En el punto #6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA: se debe diligenciar la información de fecha de inicio y finalización contractual, incluir también los siguientes datos:

- Nombre de la empresa contratante.
- Departamento.
- Ciudad / Municipio.
- Nombre de la empresa interventora.
- Contrato de interventoría.
- Objeto del contrato de interventoría.
- Objeto del contrato de obra.
- Nombre de la empresa contratista.
- Contrato de obra.

7. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

8. El reporte de los resultados de la Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso.

9. Las obligaciones que suma en relación con el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, y el Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.

ECOVIAS SAS

198-1-007

NOTA: Respecto al PASAO, hasta el momento se ajusta a lo requerido; no obstante, si durante el desarrollo de las actividades de obra se observa la necesidad de incluir aspectos relevantes en alguna de las áreas, se deberán realizar.

No siendo más el motivo de la presente nos suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Copia: Ing. Diego Acosta-Supervisor Contrato. Subsecretaria de Servicios Públicos
Archivo

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-007 Observaciones PASAO

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorica.ecovias@gmail.com> 17 de febrero de 2023, 15:40
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniera
Carmen Patricia Garces
Directora de Obra
Consorcio Pita 7

Asunto: Oficio 198-1-007 Observaciones PASAO

Estimada ingeniera Garces, nos permitimos remitir el oficio 198-1-007 de esta interventoría donde se hacen unas observaciones al Plan de Manejo Socio Ambiental y SST PASAO para su atención y corrección.

Cordial saludo,

Carlos Preciado
Ing. Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-007.pdf
557K

ECOVIAS SAS

198-1-008

Medellín, febrero 23 de 2023

Ingeniero
Diego Alberto Acosta Betancur
diego.acosta@medellin.gov.co
Supervisor Proyecto Secretaría de Servicios Públicos
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Solicitud de Documentos Contractuales de Obra

Estimado Ingeniero Acosta

En consideración al inicio del contrato de la referencia y basados en las responsabilidades contractuales de la interventoría, respetuosamente solicitamos el envío de los siguientes documentos correspondientes al contrato de obra de la referencia, con el fin de documentarnos y ejercer la interventoría a cabalidad:

1. Propuesta técnica y económica que hizo parte del proceso, incluyendo el presupuesto del contrato de obra o servicios con sus respectivos APU´S.
2. Acta o Resolución de adjudicación
3. Contratos de obra debidamente suscritos.
4. Garantías que respaldan el contrato de obra.
5. Documentos para la legalización de los contratos suscritos.
6. Formatos de Acta de Entorno, Actas de Vecindad, Informe Semanal de Interventoría
7. Acta, resolución o registro de la entidad para la aprobación de pólizas que amparan el contrato de obra
8. Acta, resolución o registro de la entidad que indique nombre del supervisor delegado asignado por parte de Empresas Públicas de Medellín EPM.
9. Estudios, diseños y planos del proyecto debidamente firmados y aprobados
10. Evaluación del estado de las redes de los Servicios Públicos
11. Modelo o diseño de la valla a utilizar en el proyecto.
12. Manual de imagen corporativa del municipio de Medellín.
13. Fichas técnicas-requerimientos y especificaciones mínimas.
14. Registros presupuestales que respaldan el contrato de obra.
15. Link plataforma SECOP II, para verificación de la publicación y aprobación de los documentos contractuales

ECOVIAS SAS

198-1-008

Por otra parte, le informamos el correo electrónico asignado a la interventoría del proyecto es, laflorida.ecovias@gmail.com.

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó: DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio 198-1-008 Solicitud Documentos Contractuales de Obra

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 12:16
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, diego.acostabetancur@gmail.com
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor Contrato
Subsecretaria Servicios Publicos

Estimado ingeniero, adjunto encuentra el oficio 198-1-008 de ECOVIAS donde hacemos la solicitud de los documentos contractuales de obra.

Cordials saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

198-1-008.pdf

ECOVIAS S.A.S.

198-1-009

Medellin, febrero 23 de 2023

Ingeniero
Diego Alberto Acosta Betancur
diego.acosta@medellin.gov.co
Supervisor proyecto Secretaría de Servicios Públicos
Medellín

Asunto: Contrato N° 4600095815 DE 2022 " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Referencia: Entrega Plan de Manejo de Tránsito PMT

Estimado Ingeniero Acosta

Atendiendo las obligaciones del contrato en mención, nos permitimos hacer entrega del oficio de la Secretaría de Movilidad dando respuesta positiva al radicado N° 202310044322 del 11 de febrero de 2023.

Se cita textualmente del comunicado: "La Secretaría de Movilidad aprueba el Plan de Manejo de Tránsito presentado para la ejecución del Contrato 4600095815 DE 2022 – "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO".

Esta interventoría una vez dada el acta de inicio al contrato velará por el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito autorizado

No siendo más el motivo de la presente suscribimos cordialmente

ECOVIAS SAS

ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Elaboró: CAPS
Revisó: DRAV
Aprobó. DRAV

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

oficio 198-1-009 Entrega carta aprobacion PMT secretaria de Movilidad

1 mensaje

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 12:20
Para: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, diego.acostabetancur@gmail.com
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>

Ingeniero
Diego Acosta
Supervisor Contrato
Subsecretaria Servicios Publicos

Estimado ingeniero, adjunto encuentra el oficio 198-1-009 de ECOVIAS donde hacemos entrega de la carta de la secretaría

202330055676 APROBACIÓN PMT.pdf

198-1-009.pdf

de movilidada aprobando el PMT

Cordials saludo,

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 22 de febrero de 2023

Señor
LUIGGI PLUGLIESE MERCADO
Representante Legal
ECOVIAS S.A.S

Asunto: Aprobación de hojas de vida personal contrato 46000996200 de 2022, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILALDO EN LA VEREDA LA FLORIDA - SAN ANTONIO DE PRADO.

Respetado señor Plugliese Mercado:

En cumplimiento de las funciones asignadas como Supervisor del contrato del asunto, me permito informarle que de acuerdo a la información por usted aportada y verificando los requerimientos establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato, se aprueba el siguiente personal para laborar en desarrollo del precitado contrato:

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Dani Ricardo Acevedo Vergara
Ingeniero Residente de Interventoría	Carlos Alberto Preciado Suaza
Tecnólogo en Obras Civiles 1	Juan David Upegui Escobar
Tecnólogo Social	Gloria Cristina García Rodríguez
Tecnólogo Ambiental	Jefferson Harry López Moreno
Tecnólogo Residente en SST	Nini Johana Rodríguez Ortiz

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Se aclara además, que deberá presentar los respectivos certificados de afiliación a la seguridad social para poder iniciar el desarrollo del actividades, así mismo, en caso de que se requiera realizar el cambio de algún profesional, se deberá solicitar a la Supervisión, con los documentos que certifiquen el cumplimiento de requisitos del mismo.

Cordial saludo,

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario
Subsecretaría de Servicios Públicos
Supervisor Contrato 4600096200 de 2022

www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55. Medellín - Colombia
SGS

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES Y OTROS ASUNTOS CONTRATO 4600096200 DE 2022

1 mensaje

Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co> 22 de febrero de 2023, 10:46
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días:

Adjunto oficio con aprobación de las hojas de vida de los profesiones que realizarán las labores de interventoría, según el contrato del asunto.

De otra parte, se requiere que alleguen a la Supervisión los certificados de afiliación a la seguridad social con los salarios que ofertaron en su propuesta, para poder iniciar el desarrollo de actividades y la certificación de la vinculación de personal con discapacidad, criterio por el que obtuvo puntaje en la evaluación de su propuesta.

Así mismo, para poder dar inicio a las actividades del contrato de obra 4600095815, objeto de esta interventoría, ustedes deben verificar, entre otros, la siguiente información:

1. Revisión y aprobación de las hojas de vida de los profesionales administrativos del contratista de obra y afiliación al sistema de seguridad social, con los salarios que ofertó el proponente en su propuesta.
2. Cronograma aprobado de las obras a ejecutar.
3. Verificación de la aprobación del PMT.
4. Recepción y revisión del PASAO.
5. Verificar la implementación del programa de Gerencia de Proyectos del contratista, criterio que le dio puntaje en la evaluación de su oferta.
6. Verificación de la vinculación de personal con discapacidad, criterio que le dio puntaje en la evaluación de su oferta.

Agradezco la atención.

Cordial saludo,

Alcaldía de Medellín
Distrito
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario
Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial
diego.acosta@medellin.gov.co
Teléfono: 3855555 Ext. 5286
Edificio Plaza Libertad. Piso 8 Torre A
Dirección Carrera 43 A N°42-161
Medellín - Colombia

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA INT LA FLORIDA.pdf
154K

Medellín, 17 de febrero de 2023

Señor
DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario.
Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y control Territorial.
Municipio de Medellín.
Teléfono: 604 3855555 Ext: 5286
Cra. 43A # 42-161

20230130037263

Asunto: Solicitud de acompañamiento y supervisión técnica en la construcción de las redes del proyecto: "Construcción y la respectiva interventoría integral para la construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida - San Antonio de Prado".

Cordial saludo.

En atención a la solicitud realizada el 31 de enero de 2023, que ingresó a través del buzón de la Unidad Desarrollo de Intervenciones de Inversión, donde solicita el acompañamiento técnico y supervisión de los trabajos del asunto.

Se informa que la manera correcta de hacer la solicitud de supervisión para poder prestarles una mejor atención y más oportuna, es enviar la documentación inicial: planos aprobados vigentes (no superior a dos años) y carta de solicitud o formato; al Buzón corporativo dep01411027@epmco.onmicrosoft.com, esta información la debe ingresar el mismo ente territorial o municipio y no sus contratistas o Interventoría, pero en la solicitud si debe relacionar todos los datos del proyecto incluyendo ejecutor e Interventoría.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 380 8580
Medellín - Colombia



Información general

Fecha de solicitud: 31/01/2023 — Supervisión de acueducto — Supervisión de alcantarillado

Nombre del proyecto: Diseños finales, estudios y diseños para el suministro de agua potable y saneamiento básico en áreas

Veredas de los diferentes corregimientos del municipio de Medellín: contrato n° 4600068879 de 2021 — Vigencia futura numero: 95622

Dirección del proyecto: Calle 56 con No. 75- 149 — Municipio: Distrito de Medellín

Fecha de aceptación de diseños de acueducto — Fecha de aceptación de diseños de alcantarillado: 28/02/2022

Longitud total red de acueducto — Longitud total red de alcantarillado: 22.5km — Longitud construida de acueducto

Longitud total acometidas de alcantarillado: 5.6km — Numero de torres — Numero de apartamentos

Nombre del propietario del proyecto: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín — NIT/C.C. 890.905.211-1

Correo electrónico: diego.acosta@medellin.gov.co

Nombre del constructor del proyecto: Consorcio Pitalito, (Constructora Conconcreto S.A.S 50% - Solarca 50 %) — NIT/C.C. 901.676.464-2

Correo electrónico: Alcantarillado.Pitalito@epm.com.co

Nombre del responsable de la obra: Diego Alberto Acosta betancur

Correo electrónico del responsable de la obra: diego.acostam@medellin.gov.co — Teléfono: 3024526273

Nombre del interventor de la obra: CCDVIAS S.A.S

Correo electrónico del interventor de la obra: [illegible] — Teléfono: 3113179405

Numero del contrato del servicio temporal de acueducto y alcantarillado para la industria de la construcción de la obra

Nombre de quien radica el tramite: Diego Alberto Acosta Betancur

Firma del responsable de la obra: — Fecha de recibo:

Numero de solicitud de acueducto: — Numero de solicitud de alcantarillado:

(1) La solicitud podrá ser radicada a través del buzón de recepción digital para proyectos constructivos de la página WEB de EPM

(2) se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra y las fechas estimadas de entrega de apartamentos del proyecto

Para la supervisión de este proyecto se ha designado a los siguientes Profesionales:

- Jesús Salvador Restrepo Acosta (ingeniero de supervisión). Tel: 3028269550, y
- Zuleima Andrea Tobón Gutiérrez (auxiliar de campo). Tel: 3147860180.

Vale la pena resaltar que, si bien las Empresas realizan un acompañamiento durante la construcción de la obra, la responsabilidad técnica, administrativa y económica es del contratista, del dueño de la obra y de la interventoría como representante de este último.

No obstante, es relevante para las Empresas, el cumplimiento de su normatividad por parte del ejecutor de las obras, por lo que éstas se deben construir tal como aparecen en los planos aprobados por EPM y ceñirse a las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, de no tener los planos validados y sellados no se puede iniciar la construcción de ninguna obra que tenga que ver con los servicios propios de EPM.

Cualquier variación en los diseños, deben ser socializada con el ingeniero supervisor y la interventoría del proyecto, si la modificación es significativa esta deberá ser presentada por el ingeniero diseñador del proyecto para validación por parte de EPM, luego de la revisión y aprobación por parte de la interventoría de diseño contratada por el dueño del proyecto.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 380 8580
Medellín - Colombia

A continuación, relacionamos algunos aspectos importantes para tener en cuenta durante la construcción de las redes:

- El personal de la interventoría del proyecto debe cumplir con las exigencias del RAS.
- El proyecto tanto horizontal como verticalmente debe estar amarrado a la red geodésica, con coordenadas Magna Sirgas origen Medellín, y contar con el visto bueno de Planeación Municipal.
- La localización de las redes existentes de los servicios públicos debe ser investigada directamente en campo antes de comenzar la construcción de la obra. Se debe ejecutar el replanteo para verificar la factibilidad de construcción del mismo y hacer nichos de investigación de campo para comprobar los cruces con otras redes.
- Para iniciar la construcción de las redes de servicios, se requiere que la explanación de las vías esté ejecutada hasta el nivel de rasante definitiva, además que los ejes de vías y los bordes interiores de andenes estén localizados de acuerdo con los planos.
- Para los servicios temporales en la obra, el constructor deberá hacer el trámite de solicitud ante las Empresas, diligenciando el formulario de **"SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO"**, dispuesto para ello.
- De igual forma, cualquier cliente nuevo que requiera conectarse a los servicios de EPM, deberá hacerlo mediante el mismo formulario de **"SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO"**, señalando la casilla de servicio solicitado: Conexión Definitiva. Y se debe hacer el trámite a través de la Unidad Vinculación clientes. (así mismo funciona para el acueducto)
- El interventor designado por el dueño del proyecto hará cumplir las medidas necesarias con el fin de garantizar las máximas condiciones de seguridad e impacto ambiental, tales como colocación de avisos de peligro, entibado de zanjas, drenaje, etc. Para tal efecto debe cumplir con el decreto 673 de 2006, Guía o plan Socio Ambiental de Manejo para obras públicas del Municipio o en su defecto cumplir con las especificaciones 1300 y 1301 de las normas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Para la ejecución de empalmes de redes de acueducto se debe ceñir al estricto cumplimiento del procedimiento de EPM **"INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO", "AGU-DSE-EMI-001-38-00"**.
- La referenciación se debe hacer simultáneamente al desarrollo del proyecto, con entregas parciales mensuales de tramos terminados. La interventoría se encargará de revisar la referenciación como también los planos actualizados por construcción y deberán tener el visto bueno del equipo asesor de EPM previo a su entrega en las taquillas de EPM. Una vez referenciado, se debe televisar las redes de alcantarillado.
- Para el recibo de las obras, la interventoría debe coordinar con el ingeniero asesor de EPM, el recorrido físico de las obras de acueducto y alcantarillado.
- Posterior al recibo físico de las obras, con sus reparaciones en el caso de existir, se debe entregar a EPM póliza de estabilidad de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones del contrato que originó las obras.
- Igualmente es importante que tenga en cuenta que para el recibo de las redes se requiere, en caso de ser necesario, los permisos de ocupación de cauce o intervención de estructura hidráulica con las entidades competentes y en caso de que aplique las servidumbres debidamente gestionadas y legalizadas.
- **Si el proyecto tiene reconocimiento económico se debe celebrar un acta de ejecución entre las partes (EPM – ENTE TERRITORIAL) por un valor estimado a dicho reconocimiento, el cual se hace con base a la vida útil remanente.**

Atentamente,

JULIAN ANDRES MONTOYA CANO
Jefe de Unidad (E)
UNIDAD DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE INVERSIÓN
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Preparado por:
Cesar Alejandro Méndez Hernández

Copia:
Harol Alberto Tovar Orrego. Profesional Relaciones Externas. Harol.Tovar@epm.com
Gloria Lucia Muñoz. Profesional Relaciones Externas. gloria.munoz@epm.com
Municipio de Medellín. (Propietario Proyecto). diego.acosta@medellin.gov.co
Consorcio PITA7. (constructor). Alcantarilladopita7@gmail.com
ECOVIAS S.A.S (Interventor). Laflorida.ecovias@gmail.com

Por ti, estamos ahí
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador 604 3806830
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Solicitud de acompañamiento y supervisión técnica en la construcción de las redes del proyecto: "Construcción y la respectiva interventoría integral para la construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida - San Antonio de Prado".

1 mensaje

Unidad Desarrollo de Intervenciones de Inversion <uo1027@epm.com.co> 17 de febrero de 2023, 13:15
Para: "diego.acosta@medellin.gov.co" <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: "correo@certificado.4-72.com.co" <correo@certificado.4-72.com.co>, "Alcantarilladopita7@gmail.com" <Alcantarilladopita7@gmail.com>, "Laflorida.ecovias@gmail.com" <Laflorida.ecovias@gmail.com>, HAROLD ALBERTO TOVAR ORREGO <Harold.Tovar@epm.com.co>, GLORIA LUCIA MUNOZ URIBE <GLORIA.MUNOZ@epm.com.co>, JULIAN ANDRES MONTOYA CANO <JULIAN.MONTOYA.CANO@epm.com.co>, CESAR ALEJANDRO MENDEZ HERNANDEZ <CESAR.MENDEZ@epm.com.co>

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente, el uso indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM.

The contents of this document and/or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any retention, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your attention. Grupo Empresarial EPM.

20230130037263.pdf
169K

Señor:

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR

Profesional Universitario.

Subsecretaría de Servicios Públicos

Secretaría de Gestión y control Territorial.

Municipio de Medellín.

Teléfono: 604 3855555 Ext: 5286

Cra. 43A # 42-161

Respetado Señor;

De acuerdo con el asunto se adjunta oficio con radicado EPM N. 20230130037263.

Cordialmente;

epm

Teléfono: (+574) 380 4510

E-Mail: uo1027@epm.com.co

www.epm.com.co

948

Anexo 4.5-2: Correspondencia recibida.

Medellín, 1 de marzo de 2023

AM-002

CONSORCIO PITA 7

Señores,
ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría


Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"
Asunto: Entrega de actas de vecindad físicas.

Cordial saludo,
Por medio del presente oficio, me permito realizar la entrega de (25) actas de vecindad medio físico para revisión y aprobación del sector San Antonio de Prado.

Calle 56 sur 75-100
Calle 56 sur 75-110
Calle 56 sur 75-120
Calle 56 sur 75-403 (103)
Calle 56 sur 75-409
Calle 56 sur 75-415
Calle 56 sur 75-445
Calle 56 sur 75-451
Calle 56 sur 75-685
Calle 56 sur 75-767 (tienda)
Calle 56 sur 75-777
Calle 56 sur 75-777 (101)
Calle 56 sur 75-805
Calle 56 sur 75-791 (101)
Calle 56 sur 75-799 (110)
Calle 56 sur 75-799 (116)
Calle 56 sur 75-799 (118)
Calle 56 sur 75-799 (120)
Calle 56 sur 75-799 (224)
Calle 56 sur 75-132
Calle 56 sur 87-05
Calle 56 sur 87-20
Calle 56 sur 87-06
Carrera 87 56-05
Primera casa después de La Virgen La Colina

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

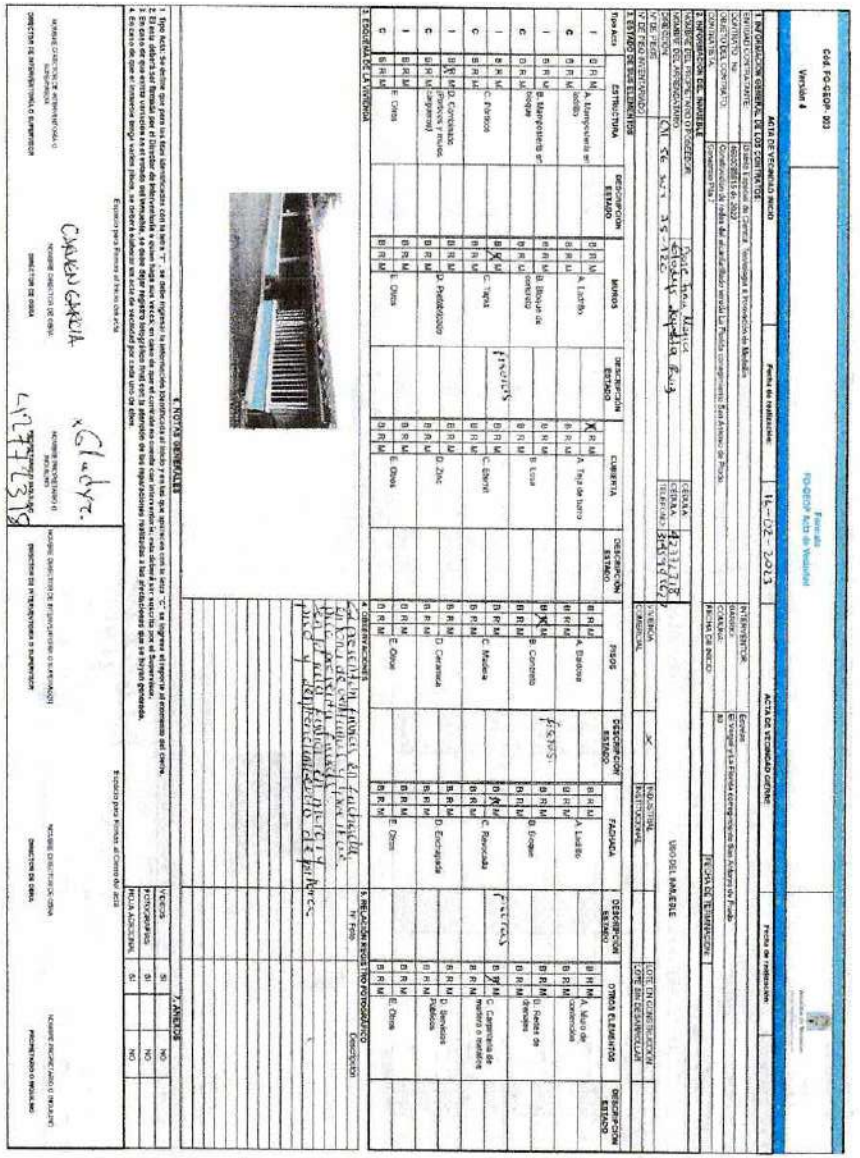

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO | Fecha de realización: 31-02-2023 | **ACTA DE VECINDAD CIERRE** | Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR	Ecovias
CONTRATO No	4600069415 de 2022	BARRIO	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA	80
CONTRATISTA	Consorcio Fita 2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	Rubiela Castrillon	CÉDULA	43802902
NOMBRE DEL ARRENDATARIO		CÉDULA	
DIRECCIÓN	Cll 56 Sur # 75-409	TELÉFONO	3192567757
Nº DE PISOS		VIVIENDA	X
Nº DE PISO INVENTARIADO		COMERCIAL	

USO DEL INMUEBLE: INDUSTRIAL | LOTE EN CONSTRUCCIÓN | INSTITUCIONAL | LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo		B X M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X B R M B. Losa		B X M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		X B R M C. Revocada		X B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		X B R M D. Servicios Públicos	Energía gas
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

4. OBSERVACIONES

Se presenta fisuras en zona de pisos y muros, en zona de cocina y zona de sopal fisuras en columnas

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARLOS GARCIA		Rubiela Castrillon 21412900
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO



Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO | Fecha de realización: 31/02/2023 | **ACTA DE VECINDAD CIERRE** | Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR	Ecovias
CONTRATO No	4600069415 de 2022	BARRIO	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA	80
CONTRATISTA	Consorcio Fita 2	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	Angela Nieves	CÉDULA	1037621640
NOMBRE DEL ARRENDATARIO	Jenifer Santos	CÉDULA	1036-2402
DIRECCIÓN	Cll 56 Sur # 75-403 (casa)	TELÉFONO	
Nº DE PISOS	Primer piso	VIVIENDA	X
Nº DE PISO INVENTARIADO	1	COMERCIAL	

USO DEL INMUEBLE: INDUSTRIAL | LOTE EN CONSTRUCCIÓN | INSTITUCIONAL | LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo		B X M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M X A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X B R M B. Losa		B X M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	FISURAS	X B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en muro y pisos en habitación 1
En correa muro habitación 2 se presenta fisuras en muro lateral derecho y piso en zona de cocina se presenta fisuras en muro y desprendimiento de revoque fisura en muro lateral derecho hasta zona de pisos en habitación 3 se presenta humedades y desprendimiento de pintura y revoque

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARLOS GARCIA		Jenifer Santos
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO



Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad .

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	03-02-2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Luz Deicira Sepulveda	CÉDULA:	43459938	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	Cll 56 sur #75-195	TELÉFONO:	3122960871		
N° DE PISOS:	Un piso	VIVIENDA	X	INDUSTRIAL	LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO:	Un piso	COMERCIAL		INSTITUCIONAL	LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X N M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo		R M A. Teja de barro		R M A. Baldosa		R M A. Ladrillo		R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa		B X M B. Concreto	Fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		X R M C. Revocada		X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

5. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presenta fisuras en el piso de la sala se presenta en cuarto y el dintel de la puerta

6. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFÍAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMEN GARCIA	Luz Damary	43459938
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	7/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Gloria María Ramírez	CÉDULA:	21346205	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	Calle 56 sur #75-915	TELÉFONO:	3006998		
N° DE PISOS:	2	VIVIENDA	X	INDUSTRIAL	LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO:	PRIMER PISO	COMERCIAL		INSTITUCIONAL	LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo		R M A. Teja de barro		R M A. Baldosa		R M A. Ladrillo		X R M A. Muro de contención	Fisuras.
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		X R M D. Cerámica		X R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	Energía. gas Agua
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

5. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presenta fisuras en dintel ventana cocina, en habitación 1 se presenta humedad, en habitación 2 se presenta humedad y fisuras en muro lateral izquierdo ventana y en baño lateral derecho presenta daño ocasionado; fisuras en muros de cocina y entre viga y muro lateral izquierdo en baño se presenta en baldosa en la entrada zona muro de contención se presentan fisuras y entorno a la viviendas.

6. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFÍAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	Gloria. D.J.M.79
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO 43757806

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	04-01-2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Eximia
CONTRATO No:	4600080615 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correg/interno San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA	Consorcio Pte 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Juan Felipe Lopez Hecho: 01-2023	CÉDULA:	S/N	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	70818475		
DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur 25-685	TELÉFONO:	2147615		
N° DE PISOS:	Plurales	VIVIENDA:	X	INDUSTRIAL:	LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO:		COMERCIAL:		INSTITUCIONAL:	LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Rodes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras	B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapado		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	Puertas de madera	B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

4. OBSERVACIONES

En la vivienda se presentan fisuras en columnas de concreto, pintura en mal estado, puertas en madera en buen estado

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



7. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta:** Se define con para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta debe ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con Interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

8. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	RAMON GARCIA	Hector Correa 70.484.913

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	04/01/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Eximia
CONTRATO No:	4600080615 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correg/interno San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA	Consorcio Pte 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Olga Lucia Cifuentes	CÉDULA:	42893450	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	N/A	CÉDULA:	N/A		
DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur 25-451	TELÉFONO:	3013947517		
N° DE PISOS:	Primer Piso	VIVIENDA:	X	INDUSTRIAL:	LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO:	Primer Piso	COMERCIAL:		INSTITUCIONAL:	LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo	Fisuras	B X M A. Ladrillo	Fisuras	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B X M B. Concreto	Fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Rodes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B X M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras	X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapado		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

4. OBSERVACIONES

En la sala se presentan fisuras en piso, muro lateral derecho y cielo raso, en el de habitación se presentan fisuras, la cubierta presenta fisuras en el machimbre, fisuras en alas lateral derecho, fisuras en piso en cocina, fisuras en pisos y muros, en baño de mixta y piso fisuras, fisuras en habitación 1 se presentan fisuras en muros y piso.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



7. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta:** Se define con para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta debe ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con Interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

8. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	RAMON GARCIA	Olga Cifuentes P 42.893.450

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 13/12/2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	60
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Marisol Bedoya Ruiz Gutierrez	CÉDULA:	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Juan Fernando Ruiz	CÉDULA:	1128.451.332
DIRECCIÓN:	Cll 56 6a - # 71-373	TELÉFONO:	3104499396
N° DE PISOS:	2 pisos		
N° DE PISO INVENTARIADO:			

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	A. Mampostería en ladrillo	X				A. Ladrillo	X				A. Teja de barro					A. Baldosa		X		Fisuras	A. Ladrillo					A. Muro de contención				
C																													
I	B. Mampostería en bloque					B. Bloque de concreto					B. Losa	X				B. Concreto					B. Bloque					B. Redes de drenajes				
C																													
I	C. Pórticos					C. Tapia					C. Eternit					C. Madera					C. Revocada					C. Carpintería de madera o metálica			X	Fisuras
C																													
I	D. Combinado (Pórticos y muros portantes)					D. Prefabricado					D. Zinc					D. Cerámica					D. Enchapada	X				D. Servicios Públicos				
C																													
I	E. Otros					E. Otros					E. Otros					E. Otros					E. Otros					E. Otros				
C																													

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se observan fisuras en muros y piso en el baño con fisuras en la fachada exterior se evidencia desprendimiento de pintura y pañete

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces, en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFÍAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMEN GARCIA		1128 450 376
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización:

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	60
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Maribel Ruiz	CÉDULA:	42.984.844		
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	Cll 56 6a1 D 15-76 (Tienda)	TELÉFONO:	318 5354620		
N° DE PISOS:	2 niveles				
N° DE PISO INVENTARIADO:					

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL	X	INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	B	R	M	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	A. Mampostería en ladrillo	X				A. Ladrillo		X			A. Teja de barro					A. Baldosa		X			A. Ladrillo			X		A. Muro de contención				
C																													
I	B. Mampostería en bloque					B. Bloque de concreto					B. Losa					B. Concreto		X		Fisuras	B. Bloque					B. Redes de drenajes				
C																													
I	C. Pórticos		X			C. Tapia					C. Eternit					C. Madera					C. Revocada					C. Carpintería de madera o metálica				
C																													
I	D. Combinado (Pórticos y muros portantes)					D. Prefabricado					D. Zinc					D. Cerámica					D. Enchapada					D. Servicios Públicos				Energía, agua
C																													
I	E. Otros					E. Otros					E. Otros					E. Otros					E. Otros			X	Fuera de servicio	F. Otros				
C																													

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se observa fisuras en muros de concreto y algunos pañetes con fracturas y faltas puertas de acceso a vivienda en mal estado Viven solamente con vivienda a la derecha del bloque y casi estable

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces, en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFÍAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMEN GARCIA		Maribel Ruiz
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO | Fecha de realización: | **ACTA DE VECINDAD CIERRE** | Fecha de realización:

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

ENTIDAD CONTRATANTE	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR	Ecovias
CONTRATO No	4600096515 de 2022	BARRIO	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA	50
CONTRATISTA	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORMACION DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	Abel Romero	CEDULA	70505508
NOMBRE DEL ARRENDATARIO	Abel Romero	CEDULA	70505508
DIRECCION	Cll 56 Cra 75-805	TELEFONO	3044296164
N° DE PISOS			
N° DE PISO INVENTARIADO			

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCION	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA				DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS				DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA				DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS				DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA				DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS				DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B	R	X M	A. Mamposteria en ladrillo		B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Teja de barro		B	R	M	A. Baldosa		B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Muro de contención	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	B. Mamposteria en bloque		B	R	M	B. Bloque de concreto		B	R	X M	B. Losa		B	R	M	B. Concreto		B	R	M	B. Bloque		B	R	M	B. Rieles de drenajes	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	C. Pórticos		B	R	M	C. Tapia		B	R	M	C. Eternit		B	R	M	C. Madera		B	R	X M	C. Revocada		B	R	X M	C. Carpintería de madera o metálica	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B	R	M	D. Prefabricado		B	R	M	D. Zinc		B	R	X M	D. Cerámica		B	R	M	D. Enchapada		B	R	X M	D. Servicios Públicos	ENERGIA EXCLS
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Cielo		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		

4. OBSERVACIONES

En el momento de la visita fallos en pisos, cielo y muros, se evidencia deterioro en el cielo, pisos y muros. Existe exposición de cableado eléctrico

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



7. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para los ítem identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMENGARCIA	Abel Romero	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

70505508

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO | Fecha de realización: 15-02-2023 | **ACTA DE VECINDAD CIERRE** | Fecha de realización:

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

ENTIDAD CONTRATANTE	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR	Ecovias
CONTRATO No	4600096515 de 2022	BARRIO	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA	50
CONTRATISTA	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORMACION DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	Delfis Rocio Ruiz	CEDULA	50
NOMBRE DEL ARRENDATARIO	Hector Leonardo Ibarra	CEDULA	1.035.913.281
DIRECCION	Cll 56 Cra 75-37 Casa 27 Vereda	TELEFONO	3104315523
N° DE PISOS	Dos (2)		
N° DE PISO INVENTARIADO	Uno (1)		

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCION	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA				DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS				DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA				DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS				DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA				DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS				DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B	X	M	A. Mamposteria en ladrillo	Avisos	B	R	M	A. Ladrillo	Avisos	B	R	M	A. Teja de barro		B	R	M	A. Baldosa		B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Muro de contención	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	B. Mamposteria en bloque		B	R	M	B. Bloque de concreto		B	R	X	M	B. Losa	Avisos	B	R	M	B. Concreto		B	R	M	B. Bloque		B	R	M	B. Rieles de drenajes	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M				B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	C. Pórticos		B	R	M	C. Tapia		B	R	M	C. Eternit		B	R	M	C. Madera		B	R	X	M	C. Revocada	Avisos	B	R	X	M	C. Carpintería de madera o metálica	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M				B	R	M		
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B	R	M	D. Prefabricado		B	R	M	D. Zinc		B	R	X	M	D. Cerámica		B	R	X	M	D. Enchapada		B	R	X	M	D. Servicios Públicos	Energía Exclusiva
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		

4. OBSERVACIONES

En el momento de la visita fallos en pisos, cielo y muros, se evidencia deterioro en el cielo, pisos y muros. Existe exposición de cableado eléctrico

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



7. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para los ítem identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMENGARCIA		Camilo Rico
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO 1000008384

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

952

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecoplex
CONTRATO No:	4600080515 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Miguel Carlos Bolivar	CÉDULA:	1035955824
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	CL 56 Sur # 35 - 149 (Dir)	TELÉFONO:	3117453819
N° DE PISOS:	Uno piso		
N° DE PISO INVENTARIADO:			

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA				DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS				DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA				DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS				DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA				DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS				DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X	R	M	A. Mampostería en ladrillo		X	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Teja de barro		B	X	M	A. Baldosa	Pisos	B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Muro de contención	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	B. Mampostería en bloque		B	R	M	B. Bloque de concreto		B	R	M	B. Losa		B	R	M	B. Concreto		B	R	M	B. Bloque		B	R	M	B. Rodes de drenajes	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	C. Pórticos		B	R	M	C. Tapia		B	R	M	C. Eternit		B	R	M	C. Madera		B	X	M	C. Revocada		B	X	M	C. Carpintería de madera o metálica	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B	R	M	D. Prefabricado		B	R	M	D. Zinc		B	R	M	D. Ceramica		B	R	M	D. Enchapada		B	X	M	D. Servicios Públicos	Energía, gas, agua
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

En ejecución, piscas en pared, pinta exterior y en zona inacabada

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para los ítem identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces, en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO
FOTOGRAFIAS	SI		NO
HOJA ADICIONAL	SI		NO

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	43935536

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización: 12/04/2022	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecoplex
CONTRATO No:	4600080515 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Alberto Carlos Bolivar Quintero	CÉDULA:	3224350		
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Luz Marina Herrera	CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	CL 56 Sur 35 - 149 (Dir)	TELÉFONO:	3152323		
N° DE PISOS:	Dos pisos		3217453819		
N° DE PISO INVENTARIADO:	Primer piso				

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL	X	INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA				DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS				DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA				DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS				DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA				DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS				DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X	R	M	A. Mampostería en ladrillo		X	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Teja de barro		B	X	M	A. Baldosa	Pisos	B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Muro de contención	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	B. Mampostería en bloque		B	R	M	B. Bloque de concreto		B	X	M	B. Losa		B	R	M	B. Concreto		B	R	M	B. Bloque		B	R	M	B. Rodes de drenajes	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	C. Pórticos		B	R	M	C. Tapia		B	R	M	C. Eternit		B	R	M	C. Madera		B	R	M	C. Revocada		B	X	M	C. Carpintería de madera o metálica	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B	R	M	D. Prefabricado		B	R	M	D. Zinc		B	R	M	D. Ceramica		B	R	M	D. Enchapada		B	X	M	D. Servicios Públicos	Energía, gas, agua
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

En ejecución, pendiente de pintura y terminar de fundir en bodega del patio. se presentan pisos

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para los ítem identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces, en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO
HOJA ADICIONAL	SI		NO

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	3224350

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Proceso
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO | Fecha de realización: | **ACTA DE VECINDAD CIERRE** | Fecha de realización:

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovas
CONTRATO No:	4600065815 de 2023	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	50
CONTRATISTA:	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACION DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Arteaga - Gloria Victoria	CEDULA:		USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Machado Hermenegildo	CEDULA:	1152461641		
DIRECCION:	Cll 56 Cra 35 - 3699 (196)	TELEFONO:	3217262191		
N° DE PISOS:				VIVIENDA: X	INDUSTRIAL:
N° DE PISO INVENTARIADO:				COMERCIAL:	INSTITUCIONAL:

LOTE EN CONSTRUCCIÓN | LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo	Fisuras	R M A. Teja de barro		R M A. Baldosa		R M A. Ladrillo		R M A. Muro de contención	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M B. Mampostería en bloque		R M B. Bloque de concreto		X M B. Losa	Asiento	R M B. Concreto		R M B. Bloque		R M B. Redes de drenajes	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M C. Fibrocs		R M C. Tapia		R M C. Eternit		R M C. Madera		X R C. Revocada	Fisuras	X R C. Carpintería de madera o metálica	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M D. Combinado (Fibrocs y muros largueros)		R M D. Prefabricado		R M D. Zinc		X R C. Ceramica		R M D. Enchapada		X R D. Servicios Públicos	Energía gas Agua
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	

5. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Las personas fisuras en losa, en sitio apariencia fisuras, habitantes inconformes en muros y muebles de la cocina en mal, se presenta humedad bajo escaleras y en muros patio trasero. En la vivienda se presentan humedades en algunos sectores de muros y en zona de cimentación. En cuanto a deficiencia de drenaje en el predio y vecinos en general.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se debe que para los ítem identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa al reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la ubicación de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO 1152461641

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Proceso
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO | Fecha de realización: | **ACTA DE VECINDAD CIERRE** | Fecha de realización:

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovas
CONTRATO No:	4600065815 de 2023	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	50
CONTRATISTA:	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACION DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Ospina Sanchez	CEDULA:	43466264	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Luz Elena Rondon	CEDULA:			
DIRECCION:	Cll 56 Cra 35 - 3699 (196)	TELEFONO:	3104229115		
N° DE PISOS:			4132410502	VIVIENDA: X	INDUSTRIAL:
N° DE PISO INVENTARIADO:				COMERCIAL:	INSTITUCIONAL:

LOTE EN CONSTRUCCIÓN | LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo		R M A. Teja de barro		X R M A. Baldosa		R M A. Ladrillo		R M A. Muro de contención	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M B. Mampostería en bloque		R M B. Bloque de concreto		X R B. Losa		R M B. Concreto		R M B. Bloque		R M B. Redes de drenajes	
C	R M		R M		R M		R M		R M		X R M	
I	R M C. Fibrocs		R M C. Tapia		R M C. Eternit		R M C. Madera		X R C. Revocada		X R C. Carpintería de madera o metálica	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M D. Combinado (Fibrocs y muros largueros)		R M D. Prefabricado		R M D. Zinc		R M D. Ceramica		X R D. Enchapada		X R D. Servicios Públicos	Energía gas Agua
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	
I	R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros		R M E. Otros	
C	R M		R M		R M		R M		R M		R M	

5. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

En la vivienda fracturas de baldosa en algunos sectores presenta fisuras en paredes y techos en algunos sectores. En cuanto a deficiencia de drenajes en el predio y vecinos en general.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se debe que para los ítem identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa al reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la ubicación de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO 21.406.744

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: — **ACTA DE VECINDAD CIERRE** — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias		
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado		
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80		
CONTRATISTA:	Consorcio Hte 7	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:		CÉDULA:		USO DEL INMUEBLE			
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Elvia Cecilia Restrepo	CÉDULA:	1.39.232.865				
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	316 [illegible] 627				
N° DE PISOS:	Cll 56 Sur 35-149 (Int 3)	VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
N° DE PISO INVENTARIADO		COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mamposteria en ladrillo		B X M A. Ladrillo	Fisuras	B R M A. Teja de barro		X B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M C. Pañitos	Fisuras	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras	X B R M C. Carpinteria de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pañitos y muros largueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Publicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

2. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en fachadas y losa, alrededor de predio se presenta poste superior inyectable se presenta fisura

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para los ítem identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

CARMEN GARCIA

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — NOMBRE DIRECTOR DE OBRA — NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — DIRECTOR DE OBRA — PROPIETARIO O INQUILINO

1334988654

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — NOMBRE DIRECTOR DE OBRA — NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — DIRECTOR DE OBRA — PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 19/02/2023 — **ACTA DE VECINDAD CIERRE** — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias		
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado		
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80		
CONTRATISTA:	Consorcio Hte 7	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	S/D	CÉDULA:	S/D	USO DEL INMUEBLE			
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Francisca Andrea Alvarez	CÉDULA:	1020[illegible]365				
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	3154[illegible]194				
N° DE PISOS:	Cll 56 Sur 35-149 (Int 3) Piso 2	VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
N° DE PISO INVENTARIADO	Piso 2	COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE EN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mamposteria en ladrillo	Fisuras	B X M A. Ladrillo	Fisuras	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B X M B. Losa	Fisuras	B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pañitos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras	X B X M C. Carpinteria de madera o metálica	Falta en marcos y puerta
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M D. Combinado (Pañitos y muros largueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M C. Enchapada		X B R M D. Servicios Publicos	Energia y agua.
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

2. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en muros pañitos frontales de patio y costado en muros de mayor altura se presenta desprendimiento de pintura y revoque con presencia de moho y hongos, en la fachada y pasos, en la fachada se presentan grietas en muros en la parte superior y falta de pintura. Fisuras en viga de cubierta de pasillo en [illegible] de piso [illegible]

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para los ítem identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

CARMEN GARCIA

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — NOMBRE DIRECTOR DE OBRA — NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — DIRECTOR DE OBRA — PROPIETARIO O INQUILINO

Francisca Andrea

1007102905

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — NOMBRE DIRECTOR DE OBRA — NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR — DIRECTOR DE OBRA — PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 02-02-2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecoinsi
CONTRATO No:	4600096815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	90
CONTRATISTA:	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	[illegible]	CEDULA:	15.371.792	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	[illegible]	CEDULA:	-		
DIRECCIÓN:	CR 56 6A1 35-55	TELEFONO:	3205612433		
N° DE PISOS:	Primer			VIVIENDA:	X
N° DE PISO INVENTARIADO:				COMERCIAL:	
				INDUSTRIAL:	
				INSTITUCIONAL:	
				LOTE EN CONSTRUCCIÓN:	
				LOTE SIN DESARROLLAR:	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mamposteria en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto	Fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Confinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

La casa [illegible] [illegible]

5. RELACION REGISTRO FOTOGRAFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	CARLOS GARCIA	[illegible] 1037587432

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 10-02-2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecoinsi
CONTRATO No:	4600096815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida correginiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	90
CONTRATISTA:	Consorcio Pila 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	[illegible]	CEDULA:	21406573	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CEDULA:			
DIRECCIÓN:	CR 56 6A1 35-55	TELEFONO:	3205612433		
N° DE PISOS:	Primer			VIVIENDA:	X
N° DE PISO INVENTARIADO:				COMERCIAL:	
				INDUSTRIAL:	
				INSTITUCIONAL:	
				LOTE EN CONSTRUCCIÓN:	
				LOTE SIN DESARROLLAR:	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mamposteria en ladrillo	Fisuras	B X M A. Ladrillo		X R M A. Teja de barro		B X M A. Baldosa	Fisuras	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada		B X M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Confinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Evidencia Fisuras en Estructura y desprendimiento de pintura

5. RELACION REGISTRO FOTOGRAFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	CARLOS GARCIA	[illegible] 21406573

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

954

Cód. FO-GEOP- 003	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	
Versión 4		

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600085815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	50
CONTRATISTA:	Consorcio Pda 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	[illegible]	CÉDULA:	50	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	[illegible]	CÉDULA:	[illegible]		
DIRECCION:	Cll 56 Sur 87-06	TELEFONO:	[illegible]		
N° DE PISOS:				VIVIENDA: X	INDUSTRIAL:
N° DE PISO INVENTARIADO:				COMERCIAL:	INSTITUCIONAL:

LOTE EN CONSTRUCCION:
LOTE SIN DESARROLLAR:

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo	Fisuras	B X M A. Ladrillo	Sanitarios	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B X M A. Ladrillo	Fisuras	B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M D. Bloque de concreto		X B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Rejas de drenajes	
C	B R M		D R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M C. Pórticos	Fisuras	B R M C. Teja		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		X B R M E. Otros	Inclinado	B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se evidencia en la vivienda [illegible] Se [illegible] Se [illegible] Se

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 16-02-2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR	Ecimes
CONTRATO No.	4600095815 de 2022	BARRIO	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de redes del acueducto veredal La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA	80
CONTRATISTA	Consorcio Pilo 7	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	Martha Ramírez	CÉDULA	3.355.186	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO	N.A	CÉDULA	N.A		
DIRECCIÓN	Cll 56 Sur 35-110	TELÉFONO	320 5999597		
N° DE PISOS	Primero			VIVIENDA: X	INDUSTRIAL: — LOTE EN CONSTRUCCIÓN: —
N° DE PISO INVENTARIADO	Primero			COMERCIAL: —	INSTITUCIONAL: — LOTE SIN DESARROLLAR: —

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B X M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B X M B. Concreto	Fisuras y deficiencias	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B X M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras	B X M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en el piso de ingreso a la vivienda.
Se evidencian grietas en viga sobre fisura sobre muro de cerramiento en la parte baja lateral derecha sobre muro de cerramiento colindante, en inspección se observa humedad sobre techos de pared y enlaces

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMEN GARCIA	X Martha Ramírez	3355186
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
Romero		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003

Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 28/02/2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR	Ecimes
CONTRATO No.	4600095815 de 2022	BARRIO	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción de redes del acueducto veredal La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA	80
CONTRATISTA	Consorcio Pilo 7	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	JAHER USUGA	CÉDULA	71.263.109	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO		CÉDULA			
DIRECCIÓN	Cll 57 #56-05	TELÉFONO	3105217991		
N° DE PISOS	Primero			VIVIENDA: X	INDUSTRIAL: — LOTE EN CONSTRUCCIÓN: —
N° DE PISO INVENTARIADO	Primero			COMERCIAL: —	INSTITUCIONAL: — LOTE SIN DESARROLLAR: —

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		X B M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa	Humedad	B X M B. Concreto	Fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M C. Pórticos	Fisuras elevadas	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada	Fisuras	X B M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	Energía
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

4. OBSERVACIONES

Se observan humedades, fisuras, grietas, en donde se presentan fisuras, entre otras, se evidencia la falta de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de aguas residuales y pluviales en la vivienda, de ventana verde hacia predios públicos.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CARMEN GARCIA		71.263.109
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 23/02/2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600080815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Gerardo Zapata	CÉDULA:	S/D	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Luciano Zapata	CÉDULA:	1128456845		
DIRECCIÓN:	Primera casa después de la Virgen	TELÉFONO:	3116073712		
N° DE PISOS:	Dos			VIVIENDA: X	INDUSTRIAL:
N° DE PISO INVENTARIADO:	Primero			COMERCIAL:	INSTITUCIONAL:

LOTE EN CONSTRUCCIÓN:
LOTE SIN DESARROLLAR:

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo	Fisuras	B R M A. Ladrillo	Fisuras	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa	Humedad filtración	B R M B. Concreto	Fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Rodes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos	Fisuras	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	Contiguo a vivienda
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M C. Otras		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en pisos en concreto, evidentemente en la estructura de la vivienda, con presencia de humedad, filtración y deterioro de pintura en la fachada, concreto agrietado en muro y humedad en cubierta, en sala se presenta humedad en techo, en habitación la madera presenta deterioro, baños con presencia de humedad y fisuras en pisos, presentan deterioro en acabados y pisos en mal estado, humedad en techo de habitación y fisuras en muros.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se debe que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFÍAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	Gerardo Zapata

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Cód. FO-GEOP- 003
Versión 4

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO — Fecha de realización: 16-02-2023

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600080815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Andrés Arbeláez	CÉDULA:	1128456845	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	S/D	CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur 35-235	TELÉFONO:	3196232854		
N° DE PISOS:	Uno			VIVIENDA: X	INDUSTRIAL:
N° DE PISO INVENTARIADO:	Uno			COMERCIAL:	INSTITUCIONAL:

LOTE EN CONSTRUCCIÓN:
LOTE SIN DESARROLLAR:

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Rodes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		X R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras	X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		X R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en fachadas

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se debe que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFÍAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	Andrés Arbeláez

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
1128456846		

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM002 entrega de actas de vecindad fisicas

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 1 de marzo de 2023, 15:32
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

Buenas tardes, adjuntamos oficio AM002 con la relación de las actas de vecindad entregadas de manera física para su revisión, aprobación y firma.

saludos,

Consorcio PITA 7

OFICIO AM002.pdf
523K

AM-003

CONSORCIO PITA7

Recibido: 2/03/2023 6:09 pm
Johana Lucero V.

Medellín, 02 de marzo de 2023

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentos y afiliación de personal de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio realizamos entrega de la siguiente información:

Afiliaciones y certificados de trabajo en alturas y espacios confinados de:

- JAIVER OVED VILLEGAS DUARTE
- CARLOS HUMBERTO ROVIRA
- ANGEL DAVID AGRESOTT CONTRERAS
- JONFER JOSE SANCHEZ GARCIA

Afiliaciones de auxiliares viales

- BIBIANA RUIZ
- LUISA FERNANDA RUIZ

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM003 Documentos y afiliación de personal de obra

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 2 de marzo de 2023, 18:10
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

DOCUMENTOS Y AFILIACIONES.rar

Buenas tardes,

Adjuntamos oficio AM003 y su respectivo anexo con la documentación y afiliaciones del personal de obra para su revisión.

Saludos,

Consorcio PITA 7

OFICIO AM003.pdf
325K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 3 de marzo de 2023, 13:25
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buenas tardes

1. De acuerdo a la revision de los documentos, solcito que por favor sean adjuntados en archivo pdf por trabajador y scaneados en una misma direccion.
2.Luisa Fernanda Ruiz en el examen medico tiene el cargo como operaria y en el oficio me especifican que es controlador vial.
3. Enviar perfil sociodemogrfico actualizado del personal.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
Residente SST- Interventoria

[El texto citado está oculto]

Medellín, 02 de marzo de 2023

AM-004 CONSORCIO PITA7

Recibido 2/03/2023 6:18 pm
Johana Quevedo V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Cambio de profesional SST.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio se solicita el cambio de la profesional SST YURLEY SORANY GUERRA USUGA por YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ, realizamos entrega de la siguiente información para su revisión y aprobación:

- Hoja de vida de la profesional YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ.
- Afiliación al sistema de seguridad.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM004 Cambio de profesional SST

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 2 de marzo de 2023, 20:18
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

Buenas noches,

Adjuntamos oficio AM004 y su respectivo anexo para el cambio de residente SST, quedamos atentos a su revisión y aprobación .

Saludos,

Consorcio PITA 7

3 adjuntos

- **OFICIO AM004.pdf** 324K
- **HV-YEIDIS CASTRO RAMIREZ.pdf** 2136K
- **YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ.pdf** 13414K

CONSORCIO PITA 7

AM-005

Recibido: 3/03/2023 2:51 pm
Juliana Quiceno V.

Medellín, 03 de marzo de 2023

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta al oficio 198-1-007 observaciones PASAO

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio se da respuesta a las observaciones realizadas en el oficio 198-1-007 y se anexa la información solicitada.

Componente ambiental

- Como se menciona en el oficio La Resolución No 202000001839 del 11 de junio de 2020, expedida por la Secretaría de Planeación del Municipio de Bello, establece en su Artículo Primero: que se renueva y autoriza la misma por un término de tres (3) años para la operación del sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición-RCD de CONASFALTOS, así las cosas, y dado de que la misma fue expedida el 11 de junio de 2020. Se solicitará la renovación a la empresa, estamos pendientes de la fecha ya que esta vence el 11 de junio de 2023.Una vez nos lo envíen renovado se les enviará.
- Se solicitó la prórroga de MINCIVIL, una vez nos la entreguen se les hará llegar.
- Se remite el REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM, de la empresa CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A con fecha reciente del año 2023.
- Se remite el REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM, de la empresa ARENAS Y TRITURADOS HELICONIA S.A.S con fecha reciente del año 2023.
- Se anexa el "CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES" de la volqueta con placa TDZ 835 actualizada.

Componente SST

- Por fallas internas de la página del ministerio esta quedo inhabilitada, por tal motivo no se han entregado los certificados, una vez se restablezca la página se procederá a enviarlos para su revisión.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

21/3/23, 12:27 Gmail - Oficio AM005 Respuesta al oficio 198-1-007 observaciones PASAO

Gmail **ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>**

Oficio AM005 Respuesta al oficio 198-1-007 observaciones PASAO

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 3 de marzo de 2023, 14:51
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

Buenas tardes,

Se adjunta respuesta a las observaciones del PASAO con sus respectivos anexos.

Saludos,

Consorcio PITA 7

2 adjuntos

OFICIO AM005.pdf
531K

Anexos Oficio 198-1-007.rar
700K

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 3 de marzo de 2023, 14:55
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

[El texto citado está oculto]

PASAO ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN.docx
17361K

952

Medellín, 07 de marzo de 2023

AM-006

CONSORCIO PITA 7

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"


Asunto: Entrega de acta de entorno

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio realizamos entrega del acta de entorno tramo 1, 2 y 3 y las respectivas observaciones para su revisión y aprobación.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

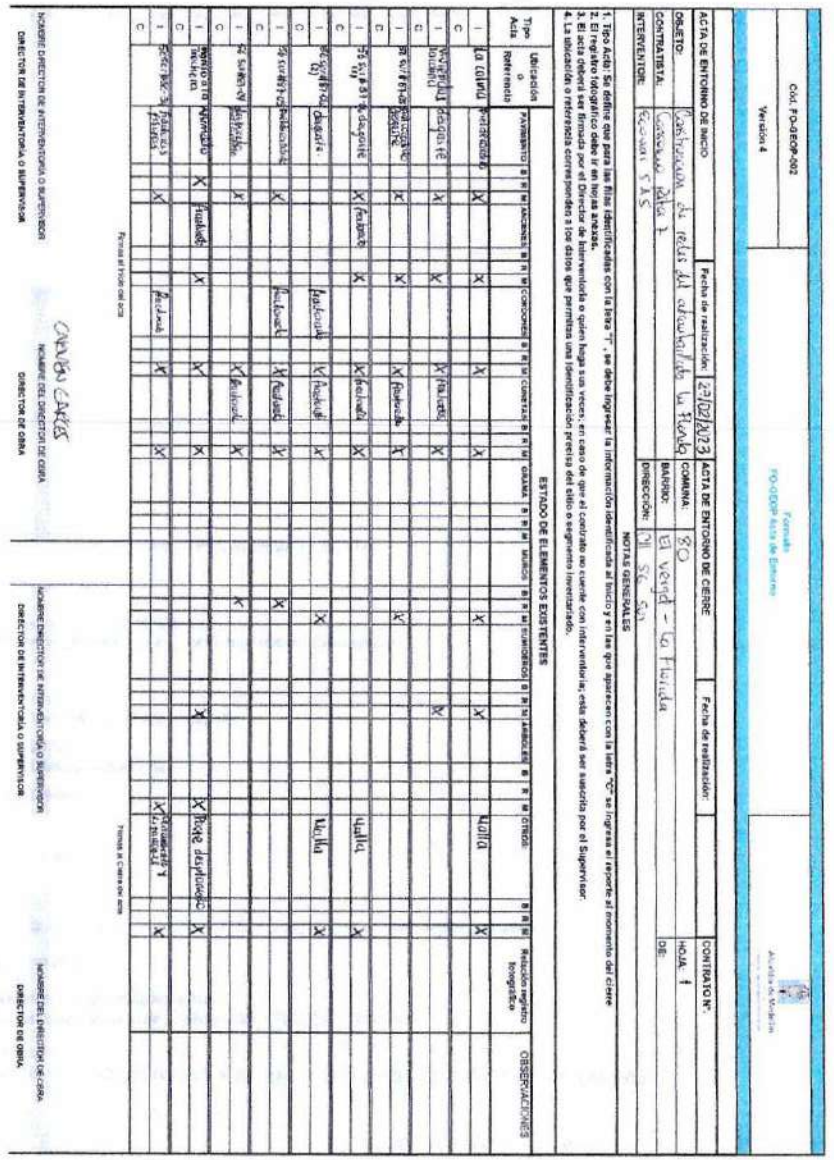
CXX FO-DEOP-002
Versión 4
Formato FO-DEOP Acta de Entorno
ACTA DE ENTORNO DE INICIO
Fecha de realización: 23/02/23
ACTA DE ENTORNO DE CIERRE
Fecha de realización:
CONTRATO N°:
OBJETO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:
COMUNA:
BARRIO:
DIRECCIÓN:
HOJA 1
DE:
NOTAS GENERALES
1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre
2. El registro fotográfico debe ir en hojas anexas.
3. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
4. La ubicación o referencia corresponden a los datos que permitan una identificación precisa del sitio o segmento inventariado.
ESTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES
Tipo Acta
Ubicación o Referencia
PAVIMENTO
ANDENES
CORDONES
CUNETAS
GRAMA
MUROS
SUMIDEROS
ARBOLES
OTROS
Relación registro fotográfico
OBSERVACIONES
NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
Firmas al Cierre del acta

Cód. FO-GEOP-002	Formato FO-GEOP Acta de Entorno	Alcaldía de Medellín
Versión 4		

ACTA DE ENTORNO DE INICIO	Fecha de realización: 27/02/2023	ACTA DE ENTORNO DE CIERRE	Fecha de realización:		CONTRATO N°.
OBJETO:	Construccion de redes de alcantarillado la Florida	COMUNA:	80		HOJA: 3
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	BARRIO:	El vergel - La Florida		DE:
INTERVENTOR:	Ecovias SAS	DIRECCIÓN:	Cll 56 sur		

NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre
2. El registro fotográfico debe ir en hojas anexas.
3. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
4. La ubicación o referencia corresponden a los datos que permitan una identificación precisa del sitio o segmento inventariado.

ESTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES

Tipo Acta	Ubicación o Referencia	PAVIMENTO	B	R	M	ANDENES	B	R	M	CORDONES	B	R	M	CUNETAS	B	R	M	GRAMA	B	R	M	MUROS	B	R	M	SUMIDEROS	B	R	M	ÁRBOLES	B	R	M	OTROS:	B	R	M	Relación registro fotográfico	OBSERVACIONES
I	Cll Sur 39 3W2 ANUAL	Pavimento			X	Andenes			X	Cordones			X				X							X														
C																																						
I	Cll Sur 39 4W2 Cll Sur 39 3W2	Retiro de escombros			X								X				X																	Sin novedades			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 4W2			X							X				X								X											Recolección y disposición de residuos			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 4W2 Cllr del Jesús			X						Fracturado			X																					Generación O			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Bordillo Pavimento asfaltico			X							X				X																							
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X	Andenes			X	Cordones			X	Cunetas			X																						
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X	Andenes			X	Cordones			X	Cunetas			X																						
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X	Andenes			X	Cordones			X	Cunetas			X																						
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X	Andenes			X	Cordones			X	Cunetas			X																						
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X	Andenes			X	Cordones			X	Cunetas			X																						
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X	Andenes			X	Cordones			X	Cunetas			X																						
C																																						

Firmas al Inicio del acta

CARMEN GARCES

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Cód. FO-GEOP-002	Formato FO-GEOP Acta de Entorno	Alcaldía de Medellín
Versión 4		

ACTA DE ENTORNO DE INICIO	Fecha de realización: 27/02/2023	ACTA DE ENTORNO DE CIERRE	Fecha de realización:		CONTRATO N°.
OBJETO:	Construccion de redes de alcantarillado la Florida	COMUNA:	80		HOJA: 2
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	BARRIO:	El vergel - La Florida		DE:
INTERVENTOR:	Ecovias SAS	DIRECCIÓN:	Calle 56 Sur		

NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre
2. El registro fotográfico debe ir en hojas anexas.
3. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
4. La ubicación o referencia corresponden a los datos que permitan una identificación precisa del sitio o segmento inventariado.

ESTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES

Tipo Acta	Ubicación o Referencia	PAVIMENTO	B	R	M	ANDENES	B	R	M	CORDONES	B	R	M	CUNETAS	B	R	M	GRAMA	B	R	M	MUROS	B	R	M	SUMIDEROS	B	R	M	ÁRBOLES	B	R	M	OTROS:	B	R	M	Relación registro fotográfico	OBSERVACIONES
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X								X	Fracturado			X														X							
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X					Fracturado			X				X																	Tapones cuneta			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X								X				X																						
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2 Cra 7	Pavimento asfaltico			X								X				X																	Fuga de agua			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2				X				X				X				X							X										Bache Fracturado			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2 Cra 7	Pavimento asfaltico deteriorado			X								X				X							X										Agua mezclada con aceite de motor			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico			X			X		Fracturado			X				X																	Tapones cuneta			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico deteriorado			X								X				X																	Agua mezclada con aceite de motor			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2 Cra 7	Pavimento asfaltico			X					Fracturado			X				X																	Tapones cuneta			X		
C																																						
I	Cll Sur 39 3W2	Pavimento asfaltico deteriorado			X								X				X																	Generación de residuos			X		
C																																						

Firmas al Inicio del acta

CARMEN GARCES

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

OBSERVACIONES

Punto de referencia 1 (La colina/arranque)

Pavimento en mal estado (piel de cocodrilo), cárcamo en mal estado, se realiza registro fotográfico hacia la derecha donde se puede utilizar como zona de reversa y se evidencia desgaste en la carpeta asfáltica, cerramiento en alambre y malla totalmente destruido, muro en bloque y malla eslabonada en mal estado.






(La collna hacia portería de vivienda 1)

Pavimento en mal estado (piel de cocodrilo muy marcado), se presenta desgaste en la carpeta asfáltica, cunetas fracturadas y en mal estado, los cordones no se alcanzan a apreciar por la presencia de maleza y en algunas zonas se evidencia desprendimiento de la losa de cuneta.




Zona vivienda calle 56 sur # 87-05

Cunetas fracturadas y en mal estado, muro en regular estado, los cordones no se logran apreciar por presencia de maleza, pavimento con piel de cocodrilo y desgaste de la carpeta asfáltica.




Zona vivienda calle 56 sur # 87-06 (1 derecha)

Anden en mal estado, cerramiento en malla en mal estado, cuneta fracturada y en mal estado.




Zona vivienda calle 56 sur # 87-06 (2)

Muro y malla en mal estado, cunetas fracturadas y en mal estado, pavimento desgastado.




Zona vivienda calle 56 sur # 87-05

Muro en regular estado, cunetas y bordillos fracturados y en mal estado.




Zona vivienda calle 56 sur # 87-04

Pavimento en mal estado totalmente destruido, con piel de cocodrilo, muro en regular estado, cunetas y cordón en mal estado.




Ingreso a la truchera

Zona de ingreso vaciado en concreto, fracturado y en mal estado, muro en bloque se evidencia en buen estado, se presenta poste desplomado, sobre borde de cauce de quebrada se presenta desprendimiento de la banca lo que puede generar desconfinamiento de la tubería, vía en afirmado en regular estado, sumidero en mal estado, árboles en mal estado.

Acopio de basura en zona ingreso a la truchera en buen estado, pavimento en mal estado con presencia de piel de cocodrilo, cunetas y cordones en mal estado con presencia de fracturas








Zona de vivienda calle 56 sur # 86-34

Ingreso en mal estado, fractura en zona de ingreso a vivienda y cordón existente, cerramiento en alambre, estacones y portón en mal estado, árboles en mal estado, pavimento con piel de cocodrilo y en mal estado, se presentan fracturas y fisuras en la carpeta asfáltica.




Zona de vivienda calle 56 sur # 86-89

Pavimento con de piel de cocodrilo, fisuras y hundimientos de la carpeta asfáltica, cordón cuneta en mal estado con presencia de fracturas.






Zona de vivienda calle 56 sur # 86-45

Se presentan desprendimientos, fracturas y piel de cocodrilo en el pavimento, se presenta hundimiento en la carpeta asfáltica, cordones en mal estado, cunetas fracturada, acceso a portón de vivienda aledaña en mal estado






Ramal cercano al tanque

Inicio de la vía en afirmado hasta la carrera 86 # 56 sur-39, inicia vía pavimentada la cual se encuentra en mal estado, puente aledaño en mal estado.









Vía principal cerca al tanque

Se presenta fuga de agua constante, pavimento con piel de cocodrilo



Caseta en la Y

Se evidencia fractura de las bancas en concreto, cordón y cunetas en mal estado.




Tramo 2

Cunetas en mal estado, deconfinamiento de pavimento, carpeta asfáltica en mal estado, con presencia de fracturas, muro en buen estado.

Se presenta derrumbe cerca al acopio de reciclaje, pavimento con piel de cocodrilo y con asentamientos.









Ramal antes de la tienda

Pavimento marcado en juntas red de gas y daños en cerámica viviendas de la zona.




Zona calle 56 sur # 75-777

Pavimento en mal estado, con piel de cocodrilo y hundimientos, cuneta y bordillo en mal estado cerramiento en alambre y estacones en mal estado, ingreso a parqueadero/acopio en mal estado, cuneta y bordillos en mal estado, malla eslabonada en mal estado.







Zona calle 56 sur 75-451

Carpeta de rodadura placas en concreto desgastada y con fracturas, bordillos y cordón en mal estado, algunos con fracturas, se presenta una roca de gran tamaño en la vía.












Zona Calle 56 sur 75-345 Ingreso ramal

Pavimento con fisuras, piel de cocodrilo y en mal estado, cuneta y cordón en regular estado, muro de contención en regular estado







Zona de calle 56 sur # 75-480 a calle 56 sur 75-442


En este tramo se evidencia una falla la cual está generando riesgo de colapso de cordón cuneta y pavimento

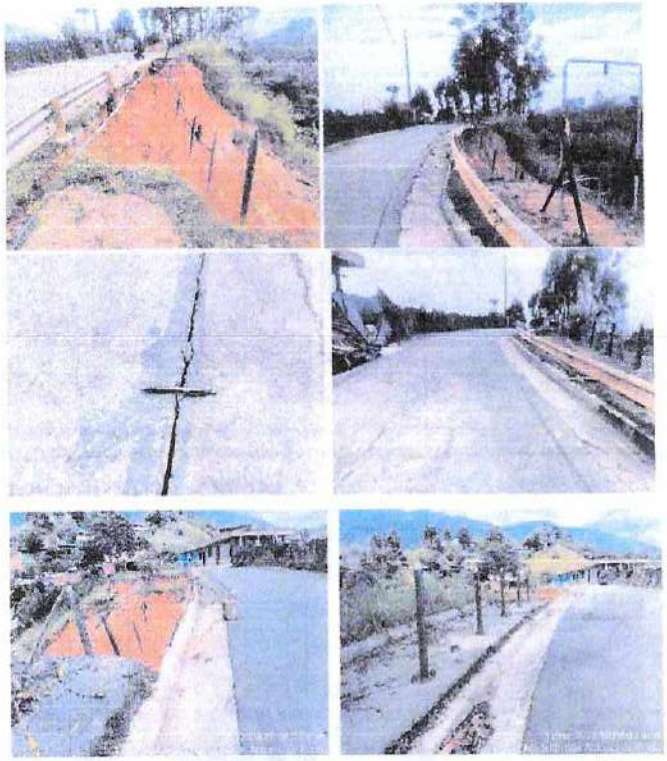

Zona calle 56 sur 75-442

Se evidencia daño en malla eslabonada, pasamanos en regular estado muro y pavimento en buen estado

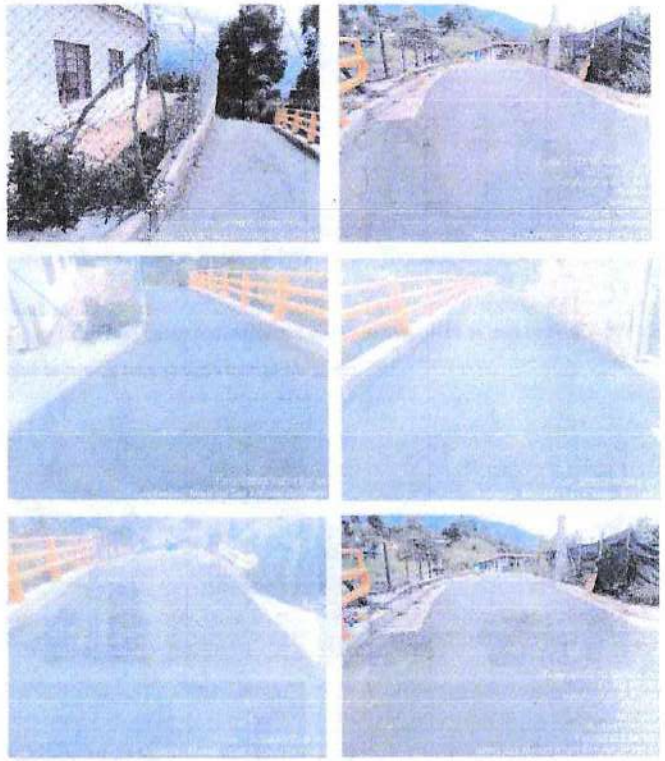

Se presenta demolición de cuneta, el pavimento y cordón cuneta se encuentra en buen estado, acceso a vivienda




Cordón cuneta en buen estado, pavimento con piel de cocodrilo




Pavimento con desgaste y fisuras, cordón cuneta en buen estado




Pavimento en regular estado con fisuras y hundimiento, bordillos fracturados y en mal estado, en una zona




Se identifica daño total en el sendero peatonal existente y cordón, en lateral derecho se presenta pérdida total de cordón cuneta.




Se presenta pavimento con piel de cocodrilo, fisura y hundimientos, cordones en mal estado


















Tramo 1

Se presenta desgaste en la carpeta asfáltica, fisuras y fallas en vía principal con riego de colapso, perdida de cordón y sendero peatonal (en esta zona se han estado realizando trabajos de pavimentación y reparcheo)

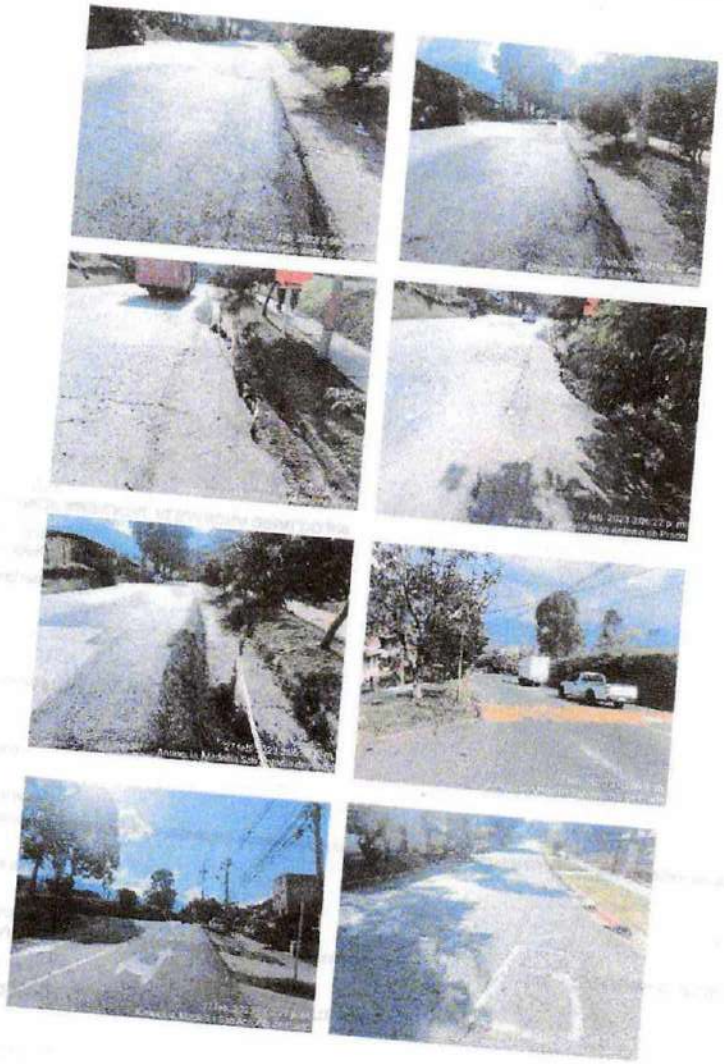

Medellín, 07 de marzo de 2023

AM-007 CONSORCIO PITA 7

Recibido 7/03/2023 11:31 am
Johana Quiceno V

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Cambio de profesional ambiental.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio se solicita el cambio de la profesional ambiental LEIDY KATHERINE VALENCIA VALENCIA por ALEJANDRA GIRALDO ALZATE realizamos entrega de la siguiente información para su revisión y aprobación:

- Hoja de vida de la profesional y certificados de ALEJANDRA GIRALDO ALZATE.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM007 Cambio de profesional ambiental

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 7 de marzo de 2023, 11:31
Para: laflorida.ecovias@gmail.com

Buenas tardes,

Adjuntamos oficio AM007 y su respectivo anexo para el cambio de residente ambiental, quedamos atentos a su revisión y aprobación .

Saludos,

Consorcio PITA 7

2 adjuntos

- **OFICIO AM007.pdf** 324K
- **PROF AMBIENTAL ALEJANDRA GIRALDO.pdf** 3781K

Medellín, 09 de marzo de 2023

AM-008 CONSORCIO PITA 7

Recibido 9/03/2023 12:45 am
Johana Guevara V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Perfil sociodemográfico y correcciones documentos de afiliaciones del personal de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio realizo entrega del perfil sociodemográfico y de los siguientes documentos corregidos y en el orden solicitado:

Afiliaciones, certificados de alturas y espacios confinados de:

- JAIVER OVED VILLEGAS DUARTE
- CARLOS HUMBERTO ROVIRA
- ANGEL DAVID AGRESOTH CONTRERAS
- JONFER JOSE SANCHEZ GARCIA

Auxiliares viales

- BIBIANA RUIZ
- LUISA RUIZ

Residente SST

- YEIDIS CASTRO

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

(sin asunto)

2 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 8 de marzo de 2023, 10:40
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buenos días, Paola

Solicito que se envie las correcciones realizadas con relación a la entrega de la documentación del personal.
1. escaneado por persona conservando un mismo orden para todos, adjuntando los certificados de afiliación de ARL donde se describa que el personal está Activo y no pendiente por iniciar y con las correcciones del cargo en los exámenes médicos.
3. perfil sociodemográfico de todo el personal actualizado.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
Interventoría- SST

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 9 de marzo de 2023, 12:45
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Documentacion del personal de obra.zip

Buenos días,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Adjunto comprimido con las correcciones solicitadas y perfil sociodemográfico.

Cordialmente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST
[El texto citado está oculto]

OFICIO AM008.pdf
116K

Medellín, 10 de marzo de 2023

AM-009 CONSORCIO PITA 7

Recibido: 10/03/2023 1:25 pm.
Johana Quiroz

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Certificados auxiliares viales.

Cordial saludo,

Por medio del presente hago envió de los certificados del curso de auxiliar de tránsito y seguridad vial de:

Auxiliares viales

- BIBIANA RUIZ
- LUISA RUIZ

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

964

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

CERTIFICADOS AUXILIARES VIALES

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 13:24
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Adjunto certificados de las auxiliares viales:

1. Bibiana Ruiz
2. Luisa Ruiz

Cordialmente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

CERTIFICADO AUX. VIALES.pdf
490K

OFICIO AM009.pdf
115K

Medellín, 13 de marzo de 2023

AM-010 CONSORCIO PITA 7

Recibido: 13/03/2023 11 36 am
Johana Quiceno Y.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentación y afiliaciones personal de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente hago envió de la documentación

Ayudantes de obra

- YEISON RUIZ
- JORGE TORO

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Documentación y afiliaciones personal de obra

6 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 11:36
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Hago envío de documentación y afiliaciones de personal ayudantes de obra para su revisión.

Cordialmente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

5 adjuntos

- **HV Yeison Ruiz (1).pdf** 703K
- **HV Jorge Toro (1).pdf** 991K
- **YEISON DAVID RUIZ.pdf** 12118K
- **Jorge Hernan Toro..pdf** 11532K
- **OFICIO AM010.pdf** 114K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 11:53
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen dia, Yeidis Paola

por favor me confirma si el colaborador Jorge Hernan Toro va realizar trabajo en alturas, no se evidencia el certificado para TSA.

Quedo atenta.

Nini Johana Rodriguez
SST- Interventoria
[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 11:57
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Yeidis

Corrijo información anterior, es Yeison David Ruiz el que no cuenta con certificado para TSA.
[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 12:27
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Hola Nini.

El señor Yeison Ruiz, tiene programado el curso de trabajador autorizado para dos fines de semana 18,19, 25 Y 26 de Marzo.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST
[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 16:39
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen dia, Yeidis

Adjunto oficio de respuesta al oficio AM-010 con las observaciones realizadas de la documentación y afiliaciones del personal.

quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST-Interventoria
[El texto citado está oculto]

Oficio-198-1-019.png
822K

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 22:33
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días.
Nini Johana Rodriguez.

De acuerdo a la solicitud realizada en el OFICIO 198-1-019. hago la salvedad que en estos momentos el señor YEISON RUIZ no está desempeñando actividades de alturas y tampoco de espacios confinados, el trabajador está actualmente desempeñando actividades a nivel de piso y el caso que se requiera para dichas actividades seria enviado a la realización de exámenes con enfasis en confinados y capacitado como trabajaor autorizado-ALTURAS y trabajador entrante-ESPACIOS CONFINADOS.

Es de mi conocimiento como tecnologa en seguridad y salud en el trabajo y residente SST del proyecto PITA7, que todo trabajador que se exponga a condiciones de seguridad alturas y confinados, debe contar con un concepto médico laboral que lo dictamine como apto para la labor y adicionalmente deberá contar con la competencia como trabajador autorizado-ALTURAS y como trabajador entrante- ESPACIOS CONFINADOS.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST
[El texto citado está oculto]

Medellín, 13 de marzo de 2023

AM-011

CONSORCIO PITA 7

Recibido. 13/03/2023 2:32 pm
Johana Echeverri V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Cambio de Profesional director de Obra

Cordial saludo,

Por medio del presente solicitamos el cambio de profesional del director de obra del proyecto. la Ingeniera Carmen Patricia Garces en reemplazo por el Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos, el cual desempeñara el cargo como director de Obra.

Se adjunta

- Hoja de vida del Ingeniero Ricardo Guerra Barrientos y sus certificados.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM011 Cambio profesional director de Obra

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 14:32
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenas tardes Ingeniero Carlos Preciado, se adjunta oficio AM 011, solicitud cambio profesional director de Obra

quedamos atentos a sus comentarios

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra

2 adjuntos

OFICIO AM011.pdf
113K

hvdirectordeobraricardoguerra.zip
4369K

Medellín, 13 de marzo de 2023

AM-012

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 13/03/2023 2:56 pm
Johana Quiceno V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato Nº 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Entrega Programación de Obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente hacemos entrega de la programación de obra del proyecto.

Adjunto

- Programación de Obra en físico y digital

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM 012 Programación de Obra

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 13 de marzo de 2023, 14:56
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenas tardes Ingeniero Carlos Preciado.
Se adjunta Oficio AM 012 Entrega programación de Obra, se adjunta programación de obra y se entrega en físico.

quedamos atentos a sus comentarios

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio PITA 7

2 adjuntos

OFICIO AM012.pdf
114K

Programacion Florida Ajuste.mpp
393K

AM-013 CONSORCIO PITA 7

Recibido: 14/03/2023 2:23 pm
Johana Durango V

Medellín, 14 de marzo de 2023

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato Nº 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Factura y certificados de calidad de la tubería TUBOSA.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio se adjunta la factura y los certificados de los lotes de la tubería a instalar para su verificación.

- Se adjunta factura, certificaciones, manual y Norma Técnica Colombiana de la tubería TUBOSA.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Factura y certificados de calidad de la tubería TUBOSA.

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 14 de marzo de 2023, 14:27
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,

Se adjunta Oficio AM013 correspondiente a la factura y certificaciones de la tubería TUBOSA para su verificación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

saludos,

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio PITA 7

12 adjuntos

- **OFICIO AM013.pdf** 324K
- **NTC-5055 tuc alca.pdf** 792K
- **Protocolos Tubería Alcantarillado 160 SN4 mm 53000005432.pdf** 135K
- **NTC-33632010 ducto corrugado.pdf** 782K
- **NTC-13412006 acc sant.pdf** 863K
- **Protocolos Tuberia Alcantarillado 200 mm SN4 53000005486.pdf** 136K
- **NTC-3822011 presion tub.pdf** 837K
- **TUBOSA-RES.-0501.pdf** 763K
- **TUBOSA-Resolucion-90708-Tuberia cond.pdf** 134K
- **FAC FLORIDA.pdf** 316K
- **NTC-3722-32012 tub drenaje.pdf** 864K
- **Manual_Tecnico_Tuberia_Alcantarillado_Corrugado.pdf** 3589K

Medellín, 14 de marzo de 2023

AM-013A

CONSORCIO PITA7

Recibido: 24/03/2023 4:51 pm

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentación personal de obra y maquinaria amarilla.

Cordial saludo,

Por medio del presente hago envió de la documentación

Topógrafo

- JUAN LAMPION

Operadores maquinarias

- DAVINSON TORRES
- JHON RESTREPO

Tarjeta de propiedad

- Retroexcavadora BH960
- Bobcat 525014670

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PITA 7

262

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Corrección numeración de oficios

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:51
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,

Se adjuntan oficios con su numeración corregida de la siguiente manera
Documentación personal de obra y maquinaria amarilla queda numerado como Oficio AM-013A
Documentación y afiliaciones personal de obra queda numerado como Oficio AM-016A

Saludos,

Ricardo Guerra Barrientos
Director
Consorcio Pita 7

2 adjuntos

OFICIO AM016A.pdf
81K

OFICIO AM013A.pdf
104K

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

DOCUMENTACIÓN TOPOGRAFO-OP Y MAQ. AMARILLA

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 14 de marzo de 2023, 16:23
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Hago envio de documentación:

1. Topógrafo
2. Davinson Torres
3. Jhon Restrepo

Maquinaria Amarilla

1. Bobcat
2. Retroexcavadora

Cordialmente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

Documentación personal de obra.zip
18299K

OFICIO AM013.pdf
118K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 15 de marzo de 2023, 9:12
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen día, Yeidis

De acuerdo a la revision de la documentación de los colaboradores y máquinas, solicitó que se anexen los siguientes documentos:

JhonFredy Restrepo: cédula, licencia de conducción y examen médico.
Maquina Bobcat: ficha técnica, declaración de importación, hoja de mantenimiento.

Davinson Arley Torres: cédula, licencia de conducción, examen médico y certificado de competencia como operador.
Máquina Retroexcavadora historial de mantenimiento.

Por favor garantizar que los documentos de los colaboradores, maquinaria y equipos estén completos para su respectiva revision y aprobación antes de iniciar actividades.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST-Interventoría

Medellín, 15 de marzo de 2023

AM-014

CONSORCIO PITA 7

Recibido 16/03/2023 9.03 am

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Fallas y problemáticas identificadas en diferentes tramos del alcantarillado.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio se quiere dar a conocer las dificultades que consideramos sean revisadas en los tramos 1, 2 y 3 del sistema de alcantarillado a construir. Dado que podría poner en riesgo la estabilidad de la obra. Las cuales se describen a continuación:


- Tramo 1 "entre abscisas K1 +553.33 a K1 + 662.66 vía principal a San Antonio de Prado

Antes del inicio de las actividades se realizaron recorridos para reconocimiento de la zona donde se estará iniciando la intervención, durante este se pudo identificar que en este tramo se está presentando asentamientos a la estructura del pavimento existente y en los senderos peatonales del mismo, debido a fallas posiblemente producidas por socavaciones que se presentan en cauce de la quebrada la limoná. Este se presenta entre las cámaras R123 a R131 con abscisas K1+553.33 a K1+662.66 según planos de construcción del alcantarillado de aguas residuales del proyecto, y cuyo alineamiento de la red esta sobre un eje de los carriles de la falla.

Cabe resaltar que debido al movimiento de la masa que se presenta en la vía principal, consideramos un riesgo muy alto, por lo descrito anteriormente.

CONSORCIO PITA 7

Foto.1 Falla presentada en la vía principal tramo 1 entre cámaras R123 a R131

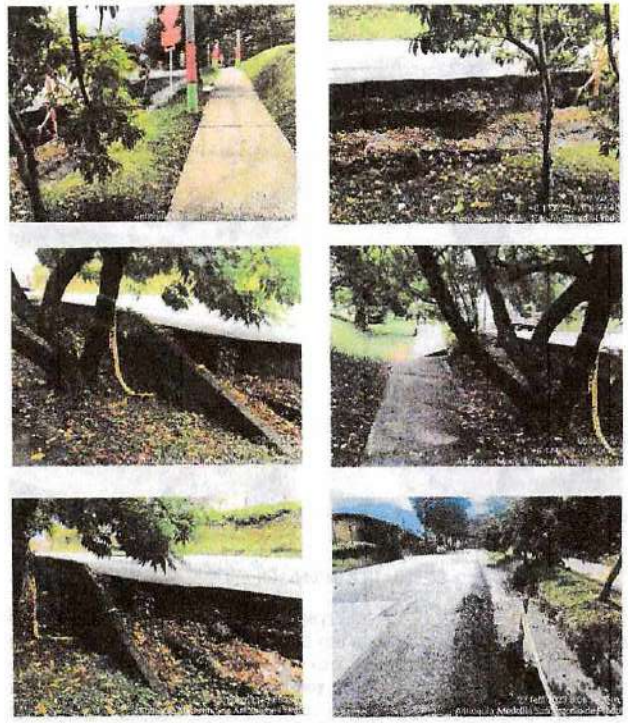

968

- Tramo 2 "entre abscisas K1+216.06 a K1+250.02"

En este tramo entre la cámara R95 y R99 con abscisas K1+216.06 y K1+250.02 se presenta desconfinamiento en la margen izquierda de la vía en sentido de las aguas. Donde por falta de contención en los laterales este puede seguir presentándose y llegar a presentar una falla en la estructura de la tubería a instalar.

Foto 2. Desplazamiento de la vía por falta de confinamiento de la estructura de pavimento lateral entre cámaras R95 a R99



- Tramo 2 k0+ 949.76 a k1+045.28

En el recorrido realizado inicialmente se identifica una falla entre las cámaras R69 a R75 con abscisas K0+949.76 y K1+045.28 entre la calle 56 sur # 75-480 y la calle 56 sur # 75-442 en donde se presenta desprendimiento de talud, donde se esta comprometida la estabilidad de la vía, la cual ya presenta fisuras en las juntas del pavimento por donde pasa la red del gas. Donde vemos que al realizar alguna excavación en este sector puedo comprometer aún más la estructura de la vía y posible riesgo de la misma tubería de alcantarillado Novafort a instalar. Dado que, de fallar la estructura de la vía en su totalidad, la tubería puede presentar una fractura e interrumpir su trayectoria del flujo del agua. Dado lo anterior solicitamos muy comedidamente nos informen que tipo de intervención se realizara en este tramo con el fin de no presentar ningún riesgo en la estructura a construir y la estabilidad de la misma.

Foto 3. Tramo colector principal K0+949.76 a K1+045.28



- Tramo 3 "entre cámaras R15 a R7 Sector truchera"

En el ramal la zona conocida como ingreso a la truchera entre la cámara R5 (inicio del ramal o cámara en vía principal), R15, R13, R11, R9 Y R7. donde el arranque de este tramo se evidencia despedimiento del talud, producto posiblemente por la socavación del cauce de la quebrada sobre la margen izquierda del cauce. Por lo que al realizar cualquier intervención sobre este tramo pondría en riesgo la estabilidad de la misma vía y la de la tubería a instalar.

Foto 4. Tramo 3. Sector truchera





Siendo así, es de suma importancia que se considere cada uno de los puntos expuestos anteriormente con el fin no presentar riesgos de la estabilidad de la tubería a construir y de las estructuras de las vías existentes que ya se encuentran muy afectadas.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM 014

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 9:02
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenos días, se comparte Oficio AM 014, Donde se identifican sectores críticos de los tramos del alcantarillado a construir.

Quedamos atentos a sus comentarios.

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio Pita 7

OFICIO AM014.pdf
1395K

Medellín, 16 de marzo de 2023

AM-015

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 16/03/2023 10:34 am

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Cordial saludo

Con la presente informamos que el Consorcio PITA 7 se acogerá al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Constructora Guinco S.A.S identificada con Nit 900.336.649-7, la cual es una de las empresas consorciadas, una vez el personal se encuentre afiliado por el Consorcio Pita 7 se contara con el sistema de gestión establecido para dicho Consorcio.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

SANDRA LILIANA SALAZAR
COORDINADORA SST
GRUPO EMPRESARIAL GUINCO

KELLEN ORTIZ GOMEZ
COORDINADORA SST
GRUPO EMPRESARIAL GUINCO

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO AM 015-Acogimiento SGSST GUINCO S.AS.

4 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 10:34
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
cordial saludo.

Por medio de la presente notificamos formalmente el acogimiento del SGSST de la empresa consorciada GUINCO SAS.

Quedo atenta.

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

OFICIO AM 015.pdf
281K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 13:12
Para: gestionsst@ecoviasas.com

Jonathan, reenvio oficio del contratista donde nos informan que se acogen al SG-SST de la empresa Guinco, unos de los socios del consorcio pita 7.

Adjunto oficio de respuesta para su revision
[El texto citado esta oculto]

2 adjuntos

OFICIO AM 015.pdf
281K

198-1-022.docx
119K

gestionsst@ecoviasas.com <gestionsst@ecoviasas.com> 16 de marzo de 2023, 14:13
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Es aceptable.

De igual manera debe enviar el SG-SST, ya que no se esperara al ingreso del personal.

Nos toca solicitar mediante comunicado lo siguiente:

Plan de emergencias o plan de gestion del riesgo según aplicación

Plan estratégico de seguridad vial

Matriz de peligro

Plan de capacitaciones y cronograma

Cordialmente,

Jonathan Santos P.

Coordinador Gestion SST y Vial Ecovias SAS

[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 16:33
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen dia, Yeidis

Adjunto Oficio de respuesta al oficio AM-015.

Quedo atenta

Nini Johna Rodriguez
SST- Interventoria
[El texto citado está oculto]

Oicio-198-1-021.png
661K

Medellín, 16 de marzo de 2023

AM-016

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 16/03/2023 12:02 am
Johana Durango V

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Cimentaciones de la tubería de alcantarillado

Luego de realizar la revisión de los tipos cimentaciones que encontramos en las tuberías ponemos en conocimiento las siguientes inquietudes.

- Contractualmente se tiene presupuestado un total en triturado de 271 metros cúbicos para las actividades que se requieran para las cimentaciones de la tubería de alcantarillado, y si lo comparamos para instalar este en la totalidad de la tubería se tendría un total de 368 metros cúbicos aproximadamente.

Imagen 1. Volumen de triturado contractual vs cimentación en triturado en su longitud.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m³	271	$ 118.034	$ 31.987.278
MUN_3.3.5	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m3	368,584	$ 118.034	$ 43.505.531
					$ 11.518.253

Siendo así que la diferencia que se tendría entre ambas es de **$11.518.253.**

- Ahora bien, realizando una revisión a los planos el detalle de cimentación E4 para altas pendientes. Se considera la cimentación en triturado. Pero revisando el detalle de cada unos de los cortes en algunos sectores no aplicaría este tipo de cimentación.

- Consideramos se realice una revisión a este tipo de cimentación ya que vemos que por las altas pendientes que se tienen en el sector el tipo de cimentación en toda la longitud de la tubería se realice en triturado, dado que esta funcionaria como un filtro y se evitaría posibles asentamientos en la red a construir. Ya que de realizarse en arenilla se pueden presentar lavado del material y saturación del mismo.

- Al realizar el comparativo de las cimentaciones que se tienen con base a los planos, vemos que los costos entre el triturado y la arenilla se estaría dando un valor de $43.943.484 contra $43.505.531. por lo que vemos que se puede realizar la estructura de cimentaciones en triturado

Foto 2. Comparativo de cimentaciones entre triturado y arenilla

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
MUN_3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m³	91,46596252	$ 118.034	$ 10.796.115
MUN_3.3.1	Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	m³	290,179608	$ 74.631	$ 21.656.257
	Trasnporte de materiall de prestamo	m3-km	6383,951376	$ 1.800	$ 11.491.112
Valor total					$ 43.943.484

Dado lo anterior consideramos que la cimentación de la tubería de alcantarillado se realice en triturado, teniendo en cuenta que al realizar el comparativo los costos entre ambos no representaría un desface entre las cimentaciones a realizar
Cordial saludo,

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM16 Comparativo cimentaciones
1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 16 de marzo de 2023, 12:02
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>, ingdrav@gmail.com

Buenas tardes Ingeniero Carlos Preciado, adjuntamos Oficio AM 016, Comparativo de cimentaciones.

quedamos atentos a sus comentarios

saludos

Ricardo Guerra Barrientos
Consorcio Pita 7

OFICIO AM016.pdf
172K

Medellín, 17 de marzo de 2023

AM-016A

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 21/03/2023 4:51 pm

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato Nº 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentación y afiliaciones personal de obra.

Cordial saludo

Por medio del presente envio documentación del señor Yairo Yance Seña ayudante de obra.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

97

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Corrección numeración de oficios

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:51
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,

Se adjuntan oficios con su numeración corregida de la siguiente manera
Documentación personal de obra y maquinaria amarilla queda numerado como Oficio AM-013A
Documentación y afiliaciones personal de obra queda numerado como Oficio AM-016A

Saludos,

Ricardo Guerra Barrientos
Director
Consorcio Pita 7

2 adjuntos

- **OFICIO AM016A.pdf** 81K
- **OFICIO AM013A.pdf** 104K

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Documentación y afiliaciones personal de obra OFICIO 016

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 10:59
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Hago envío de documentación del señor Yairo Yance ayudante de obra para su revisión.

Cordialmente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

- **OFICIO AM016.pdf** 106K
- **YAIRO LUIS YANCE SEÑA.pdf** 10295K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 17 de marzo de 2023, 12:00
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen dia, Yeidis

Revisado y aprobado para iniciar actividades.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST-Interventoria
[El texto citado está oculto]

Medellín, 18 de marzo de 2023

AM-017 CONSORCIO PITA 7

Recibido: 18/03/2023 3:06 pm
Johana Quiroz V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentación y afiliaciones personal de obra.

Cordial saludo

Por medio del presente envio documentación del señor Yeison Lobato Auxiliar de topografía.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Documentación y afiliaciones de personal de obra OFICIO-017

2 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 18 de marzo de 2023, 15:06
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Hago envío de documentación del señor Yeison Lobato auxiliar de topografía para su revisión.

Cordialmente.

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

3 adjuntos

- **HV YEISON LOBATO FLOREZ.pdf** 92K
- **AFI YEISON.pdf** 2945K
- **OFICIO AM018.pdf** 106K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 8:40
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buenos días, Yeidis

Revisado y aprobado para iniciar actividades.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST-Interventoria
[El texto citado está oculto]

Medellín, 18 de marzo de 2023

AM-018

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 18/03/2023 4:04 pm
Jehana Guerrero V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato Nº 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Informes semanales SST del 06 al 18 de marzo de 2023.

Cordial saludo

Por medio del presente envió informes semanales del 06 al 11 de marzo y del 13 al 18 de marzo, para su revisión

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

INFORMES SEMANALES 06 AL 18 DE MARZO -OFICIO 017

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 18 de marzo de 2023, 16:03
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,

Comparto informes semanales del 06 al 11 de marzo y del 13 al 18 de marzo, para su revisión.

Quedo atenta.

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

3 adjuntos

Informe Semanal SST- 06-03-23 Al 11-03-23.docx
896K

Informe Semanal SST- 13-03-23 Al 18-03-23.docx
809K

OFICIO AM018.pdf
105K

Medellín, 21 de marzo de 2023

AM-019

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 21/03/2023 4:23 pm
Johana Guevara V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Estándares mínimos SGSST ministerio del trabajo.

Cordial saludo,

Por medio del presente envió constancia de cumplimiento de estándares mínimos SGSST ministerio del trabajo.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Constancia cumplimiento de estandares minimos SGSST GUINCO SAS- OFICIO 019
1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 16:23
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Por medio del presente envio constancia del cumplimiento de estándares mínimos emitida por el ministerio del trabajo de la empresa GUINCO SAS.

Cordialmente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

Estandares Ministerio GUINCO.pdf
53K

OFICIO AM019.pdf
105K

Medellín, 21 de marzo de 2023

AM-020 CONSORCIO PITA 7
Recibido: 21/03/2023 11:45 am
Johana Quirono V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentación afiliaciones personal de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente envió afiliaciones del personal nuevo en obra.

Ayudantes de obra

- JEFERSSON VALLEJO
- CAMILO SOTO
- JOBANY PULAGRIN

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

DOCUMENTACIÓN PERSONAL NUEVO EN OBRA OFICIO 020

5 mensajes

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 17:31
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Documentación personal de obra.rar

Buenas tardes,

Aten. Nini Johana Rodriguez.

Envio documentos de afiliaciones del personal nuevo en obra para revisión.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

OFICIO AM020.pdf
113K

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 10:07
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Buen dia, Yeidis

Revisado y aprobado el personal para iniciar actividades en obra a nivel de piso, favor corregir el asunto en el oficio AM-020 ya que no corresponde a los archivos adjuntos.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST- Interventoría
[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 10:39
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,

Nini Johana.

Cómo así que el OFICIO 20 no corresponde a los archivos adjuntos??
[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 11:26
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>

Yeidis

El asunto del oficio dice que me relaciona los estándares mínimos, y me adjunta la documentación del personal.

Debes corregir el asunto del oficio.

Quedo atenta

Nini Johana Rodriguez
SST-Interventoría
[El texto citado está oculto]

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 11:45
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Envió OFICIO 020, corregido.
[El texto citado está oculto]

OFICIO AM020.pdf
87K

Medellín, 22 de marzo de 2023

AM-021

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 22/03/2023 11:38 am

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta OFICIO 021 del 06 de marzo de 2023.

Cordial saludo,

El Consorcio PITA 7 el día 16 de marzo emitió el OFICIO 015 dónde comunica a ECOVIAS S.AS. que se acogerá al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Constructora Guinco S.A.S identificada con Nit. 90.336.649-7, la cual es una de las empresas consorciadas y por la cual se está ingresando actualmente al personal de la obra, a partir de está fecha se tiene claro que formatos, procedimientos y demás documentos del SGSST serán implementados.

Por lo anterior solicito a la interventoría ser más específicos al momento de solicitar cualquier documento del SG-SST de la Constructora GUINCO S.A.S, y estimar los plazos prudentes para la entrega de lo solicitado.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

934

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Comunicados 198-1-0026 y 198-1-0027 Reiteración entrega información

2 mensajes

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com> 21 de marzo de 2023, 21:26
Para: ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com>
Cc: DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA <ingdrav@gmail.com>, Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>, asesoriasconstructivas@hotmail.com

Ingeniero
Ricardo Guerra
Director de Obra
Alcantarillado pita 7

Estimado ingeniero, nos permitimos entregar los oficios 198-1-0026 y 198-1-0027 quedamos pendiente de su pronta y positiva respuesta a los requerimientos.

Cordial saludo.

Carlos Preciado
Ing Civil Msc
ECOVIAS S.A.S.

198-1-027.pdf

198-1-026.pdf

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 11:38
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
Aten. Nini Jhoana Rodriguez.

Respuesta OFICIO 021.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

[El texto citado está oculto]

OFICIO AM021.pdf
108K

Medellín, 22 de marzo de 2023

AM-022

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 22/03/2022 2:58pm
Jhoana Rueno V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Respuesta OFICIO 026.

Por medio del presente se hace entrega de los siguientes documentos:

- Jhon Fredy Restrepo: Cédula y examen médico.
- Maquina: Minicargador marca "Bobcat": ficha técnica, la tarjeta de propiedad del bobcat reemplaza la declaración de importación y esta ya fue enviada.

- Davinson Arley Torres: cédula, ARL, EPS, AFP, CCF, examen médico ocupacional (El trabajador fue trasladado y afiliado a la empresa GUINCO SAS, se comparte afiliaciones) y certificado de competencia como operador.

- El historial de mantenimiento de las maquinarias ya fueron solicitadas a las áreas encargadas, quedan pendientes por entregar.

- Los operadores de las maquinas no cuentan con licencia de conducción, por lo tanto, nos acogemos al PMT del proyecto, para los operadores de maquinaria agrícola no es un requisito dentro de la obra ya que no se encuentran circulando en vía pública o privadas abiertas al público, garantizamos como único requisito la certificación de operario.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO 022- MAQ. AMARILLA Y DOC DE OPERARIOS

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 14:59
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,
Aten. NIni Jhoana Rodriguez.

Envio respuesta a OFICIO 026 de ECOVIAS.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

OFICIO AM022.pdf
109K

Operadores Maq. Amarilla.rar
21413K

Medellín, 22 de marzo de 2023

AM-023

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 22/03/2023 6:20 pm
Jhoana Rodriguez V

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: obras extras presentadas en el Proyecto

A continuación, presentamos las siguientes obras extras evidenciadas en el proyecto, para su respectiva revisión, cabe anotar que las obras extras presentadas de la OE 02 a OE 06 ya fueron ajustadas a el valor comercial.

Item	Descripción	Unidad	Valor unitario	Justificación
OE 01	Comisión de Topografía para alineamiento y nivelación de red de aguas alcantarillado. Incluye Topógrafo + 1 cadenero, Estación total, nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución	mes	$ 15.240.000	Se requiere comision permanente para marcacion de tuberia y cambios en alineamientos.
OE 02	Suministro y transporte de material de prestamo arenilla. Intuye volqueta y descarga hasta la obra.	m3-km	$ 1.810	debido a que dentro del apu de material de prestamo, no se cuentifico el transporte del material
OE 03	Instalacion de Herraje y tapa de 40 cm x 40 cm para cajas de domiciliarias.	un	$ 211.839	en el item contratual de las cajas para domiciliarias, no se presenta en este el herraje y la tapa.
OE 04	Pare y siga para control de vehiculos y peatones, según PMT. Incluye radios de comunicación.	mes/un	$ 1.935.848	Por Plan de Manejo de Transito se requiere la ubicación de 2 gestores viales, los cuales no se presupuestaron en la cantidades inicales
OE 05	Reparaciones de domiciliarias de 1/2" tuberia presion, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	$ 70.800	durante las excavaciones se han presentado daños, los cuales no se tenian presupuestados contractualmente.
OE 06	Construccion de cordon cuneta en concreto de 21 Mpa de desarrollo de 0,70 m a 0,8 metros de ancho variable. Espesor de 10 a 12 cm; incluye ajustes en concreto donde sea necesario. La	m	$ 150.785	por alineamientos de la tuberia, en algunos sectores se vio la necesidad de la intervencion de las cunetas de la via principal, por lo que dentro del presupuesto contractual no se presenta.

Adjunto.

Obras Extras No 1 a la 6

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Oficio AM No 023 Obras extras
1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 22 de marzo de 2023, 18:20
Para: ingdrav@gmail.com, ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes Ingeniero Carlos Preciado. se adjunta Oficio AM 023. Obras extras

quedamos atentos a sus comentarios

Ricardo Guerra Barrientos
Director de Obra

2 adjuntos

OFICIO AM 023.pdf
166K

OBRA EXTRA N° 1 al 6.xlsx
76K

Medellín, 23 de marzo de 2023

AM-024

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 23/03/2023 8:38am
Johana Durena V

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Entrega de Diseños de mezclas los materiales


Se hace entrega del diseño de mezclas de los concretos a utilizar en el proyecto que se hace referncia.

Adjunto.

Diseño de Mezclas

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

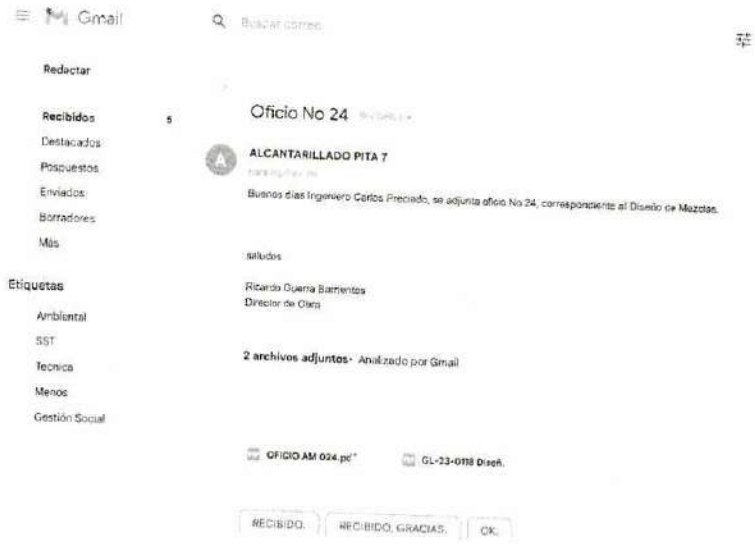

Medellín, 23 de marzo de 2023

AM-025

CONSORCIO PITA 7

Recibido. 23/03/2023 10:40am.
Johana Durango V

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Documentación maquinaria minicargador y operador.

Por medio del presente entrego los siguientes documentos:

- Cédula operador NEYS PERALTA
- Certificado operador NEYS PERALTA
- Examen ocupacional NEYS PERALTA
- Seguridad social NEYS PERALTA
- Ficha técnica minicargador
- Tarjeta de registro de maquinaria

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR- OFICIO 025

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 23 de marzo de 2023, 10:49
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días.
Aten. Nini Rodriguez.

Comparto documentos del operador Neys Peralta de la maquinaria minicargador nuevo en obra.

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

DOC. MINICARGADOR.rar
2119K

OFICIO AM025.pdf
116K

Medellín, 23 de marzo de 2023

AM-026 CONSORCIO PITA 7

Recibido: 23/03/2023 11:46am

Johana Guiceo

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: IF- SEMANAL SST del 21 al 25 de marzo de 2023 y perfil sociodemográfico actualizado a la fecha.

Por medio del presente entrego informe semanal SST del periodo relacionado en el asunto y perfil sociodemográfico actualizado.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO 026- IF- SEMANAL SST

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 23 de marzo de 2023, 11:46
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días.
Envio IF- SEMANAL.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

3 adjuntos

- **Informe Semanal SST- 21-03-23 Al 25-03-23.docx** 1090K
- **F-SST-023 Perfil sociodemografico con alturas.xlsx** 186K
- **OFICIO AM026.pdf** 106K

Medellín, 23 de marzo de 2023

AM-027

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 23/03/2023 1 29 pm
Juana Duque V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: Fichas técnicas y hojas de vida de equipos y maquinaria en obra.

Por medio del presente entrego:

- Ficha técnica apisonadora tipo canguro marca TOYAMA (Los dos compactadores tipo canguro disponibles en obra son de la misma marca)
- Hoja de vida compresor SPEEDAIR
- HV cortadora de pavimento HUSQVARNA
- Ficha técnica martillo demoledor MAC
- Ficha técnica sierra circular BOSCH
- Historial de mantenimiento retroexcavadora YANMAR

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO- 027 FICHAS TECNICAS Y HV EQUIPOS DE OBRA

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 23 de marzo de 2023, 13:28
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenas tardes,

Comparto fichas técnicas y hv de equipos y maquinaria en obra.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

2 adjuntos

HV EQUIPOS DE OBRA.rar
6244K

OFICIO AM027.pdf
116K

Medellín, 25 de marzo de 2023

AM-028

CONSORCIO PITA 7

Recibido 25/03/2023 2:16pm
Johana Echeverri V

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: INFORME SG-SST MENSUAL DE CONSTRATISTA Y ANEXOS.

Por medio del presente entrego informe SGSST mensual y anexos.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO 028- IF- MENSUAL SGSST Y ANEXOS.

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 25 de marzo de 2023, 14:16
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

IF-MENSUAL SGSST.rar

Buenas tardes,
Aten. Nini Johana Rodriguez

Por medio del presente envió informe mensual y anexos para su revisión.

Quedo atenta.

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST

OFICIO AM028.pdf
107K

028

Medellín, 29 de marzo de 2023

AM-029

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 29/03/2023 7:08 pm
Johana Moreno V.

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato Nº 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: INFORME SST SEMANAL DE CONSTRATISTA DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2023.

Por medio del presente entrego informe semanal SST, perfil sociodemográfico y anexo de registro fotográfico correspondiente a la semana.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO 029-IF-SEMANAL SST 27-03-23 AL 01-04-2023

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 29 de marzo de 2023, 19:08
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días,
Aten. Nini Johana Rodriguez.

Por medio del presente envio IF-SEMANAL SST.

Quedo atenta,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST
PITA 7

2 adjuntos

IF-SEMANAL 27-03-23 AL 01-04-23.rar
4459K

OFICIO AM029.pdf
107K

Medellín, 30 de marzo de 2023

AM-030

CONSORCIO PITA 7

Recibido: 30/03/2023 10:35am

Señores,

ECOVIAS SAS
ING. DANI RICARDO ACEVEDO.
Director de Interventoría

Referencia: Contrato N° 4600095815 DE 2022
Objeto: " CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Asunto: ENTREGA DE CORRECCIONES INFORME MENSUAL SGSST Y ANEXOS.

Por medio del presente entrego informe mensual SGSST y anexos atendiendo a las correcciones emitidas por la supervisión e interventoría.

Atentamente,

RICARDO GUERRA BARRIENTOS
C.C 71.337.270 de Medellín
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PITA 7

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

OFICIO 030- Entrega de correciones IF-MENSUAL SGSST

1 mensaje

ALCANTARILLADO PITA 7 <alcantarilladopita7@gmail.com> 30 de marzo de 2023, 10:35
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

IF-MENSUAL SGSST.rar

Buenos días,

Por medio del presente envío IF-MENSUAL y anexos atendiendo las correcciones emitidas.

Atentamente,

YEIDIS CASTRO
RESIDENTE SST
PITA 7

OFICIO AM030.pdf
106K

Medellín, 17 de febrero de 2023

20230130037263

Señor
DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario.
Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y control Territorial.
Municipio de Medellín.
Teléfono: 604 3855555 Ext: 5286
Cra. 43A # 42-161

Asunto: Solicitud de acompañamiento y supervisión técnica en la construcción de las redes del proyecto: "Construcción y la respectiva interventoría integral para la construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida - San Antonio de Prado".

Cordial saludo.

En atención a la solicitud realizada el 31 de enero de 2023, que ingresó a través del buzón de la Unidad Desarrollo de Intervenciones de Inversión, donde solicita el acompañamiento técnico y supervisión de los trabajos del asunto.

Se informa que la manera correcta de hacer la solicitud de supervisión para poder prestarles una mejor atención y más oportuna, es enviar la documentación inicial: planos aprobados vigentes (no superior a dos años) y carta de solicitud o formato; al Buzón corporativo dep01411027@epmco.onmicrosoft.com, esta información la debe ingresar el mismo ente territorial o municipio y no sus contratistas o Interventoría, pero en la solicitud si debe relacionar todos los datos del proyecto incluyendo ejecutor e Interventoría.



Información general

Fecha de solicitud: 31/01/2023 — Modalidad: Acueducto — Supervisión de alcantarillado: X

Nombre del proyecto: Diagnósticos, estudios y diseños para el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en algunas veredas de las diferentes corregimientos del municipio de Medellín, contrato nº 4600068379 de 2021 — Vereda/s número: Vereda

Dirección del proyecto: Calle 55 con No. 75 - 145 — Municipio: Distrito de Medellín

Fecha de aceptación de diseños de acueducto: — Fecha de aceptación de diseños de alcantarillado: 21/01/2022

Longitud total red de acueducto: — Longitud total red de alcantarillado: 2210m — Longitud acometida de acueducto:

Longitud total acometida alcantarillado: 1584m — Número de torres: — Número de apartamentos:

Nombre del proponente del proyecto:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Nit / C.C.: 890.905.211-1
Correo electrónico:	diego.acosta@medellin.gov.co	
Nombre del constructor del proyecto:	Consorcio PEIAT 01 conformado por Gyarco S.A.S 50% Solunco SA %	Nit / C.C.: 901.640.251-1
Correo electrónico:	Alcantarillados.peiat@gmail.com	
Nombre del responsable de la obra:	Diego Alberto Acosta Betancur	
Correo electrónico del responsable de la obra:	diego.acosta@medellin.gov.co	Teléfono: 3024526214
Nombre del interventor de la obra:	LCOVIAS S.A.S	
Correo electrónico del interventor de la obra:	Laflorida.lcovias@gmail.com	Teléfono: 3117139463

Número del contrato del servicio temporal de acueducto y alcantarillado para la industria de la construcción de la obra:

Nombre de quien realiza el trámite: Diego Alberto Acosta betancur

Firma del responsable de la obra: — Fecha de recibo:

Número de solicitud de acueducto: — Número de solicitud de alcantarillado:

(1) La solicitud podrá ser enviada a la taquilla de recibo digital para proyectos constructivos de la página WEB de EPM

(2) Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra y las fechas estimadas de entrega de apartamentos del proyecto.

Para la supervisión de este proyecto se ha designado a los siguientes Profesionales:

- Jesús Salvador Restrepo Acosta (ingeniero de supervisión). Tel: 3028269550, y
- Zuleima Andrea Tobón Gutiérrez (auxiliar de campo). Tel: 3147860180.

Vale la pena resaltar que, si bien las Empresas realizan un acompañamiento durante la construcción de la obra, la responsabilidad técnica, administrativa y económica es del contratista, del dueño de la obra y de la interventoría como representante de este último.

No obstante, es relevante para las Empresas, el cumplimiento de su normatividad por parte del ejecutor de las obras, por lo que éstas se deben construir tal como aparecen en los planos aprobados por EPM y ceñirse a las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, de no tener los planos validados y sellados no se puede iniciar la construcción de ninguna obra que tenga que ver con los servicios propios de EPM.

Cualquier variación en los diseños, deben ser socializada con el ingeniero supervisor y la interventoría del proyecto, si la modificación es significativa esta deberá ser presentada por el ingeniero diseñador del proyecto para validación por parte de EPM, luego de la revisión y aprobación por parte de la interventoría de diseño contratada por el dueño del proyecto.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 3808080
Medellín - Colombia

A continuación, relacionamos algunos aspectos importantes para tener en cuenta durante la construcción de las redes:

- El personal de la interventoría del proyecto debe cumplir con las exigencias del RAS.
- El proyecto tanto horizontal como verticalmente debe estar amarrado a la red geodésica, con coordenadas Magna Sirgas origen Medellín, y contar con el visto bueno de Planeación Municipal.
- La localización de las redes existentes de los servicios públicos debe ser investigada directamente en campo antes de comenzar la construcción de la obra. Se debe ejecutar el replanteo para verificar la factibilidad de construcción del mismo y hacer nichos de investigación de campo para comprobar los cruces con otras redes.
- Para iniciar la construcción de las redes de servicios, se requiere que la explanación de las vías esté ejecutada hasta el nivel de rasante definitiva, además que los ejes de vías y los bordes interiores de andenes estén localizados de acuerdo con los planos.
- Para los servicios temporales en la obra, el constructor deberá hacer el trámite de solicitud ante las Empresas, diligenciando el formulario de "**SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**", dispuesto para ello.
- De igual forma, cualquier cliente nuevo que requiera conectarse a los servicios de EPM, deberá hacerlo mediante el mismo formulario de "**SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**", señalando la casilla de servicio solicitado: Conexión Definitiva. Y se debe hacer el trámite a través de la Unidad Vinculación clientes. (así mismo funciona para el acueducto)
- El interventor designado por el dueño del proyecto hará cumplir las medidas necesarias con el fin de garantizar las máximas condiciones de seguridad e impacto ambiental, tales como colocación de avisos de peligro, entibado de zanjas, drenaje, etc. Para tal efecto debe cumplir con el decreto 673 de 2006, Guía o plan Socio Ambiental de Manejo para obras públicas del Municipio o en su defecto cumplir con las especificaciones 1300 y 1301 de las normas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Para la ejecución de empalmes de redes de acueducto se debe ceñir al estricto cumplimiento del procedimiento de EPM "**INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO**", "**AGU-DSE-EMI-001-38-00**".
- La referenciación se debe hacer simultáneamente al desarrollo del proyecto, con entregas parciales mensuales de tramos terminados. La interventoría se encargará de revisar la referenciación como también los planos actualizados por construcción y deberán tener el visto bueno del equipo asesor de EPM previo a su entrega en las taquillas de EPM. Una vez referenciado, se debe televisar las redes de alcantarillado.
- Para el recibo de las obras, la interventoría debe coordinar con el ingeniero asesor de EPM, el recorrido físico de las obras de acueducto y alcantarillado.
- Posterior al recibo físico de las obras, con sus reparaciones en el caso de existir, se debe entregar a EPM póliza de estabilidad de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones del contrato que originó las obras.
- Igualmente es importante que tenga en cuenta que para el recibo de las redes se requiere, en caso de ser necesario, los permisos de ocupación de cauce o intervención de estructura hidráulica con las entidades competentes y en caso de que aplique las servidumbres debidamente gestionadas y legalizadas.
- **Si el proyecto tiene reconocimiento económico se debe celebrar un acta de ejecución entre las partes (EPM – ENTE TERRITORIAL) por un valor estimado a dicho reconocimiento, el cual se hace con base a la vida útil remanente.**

Atentamente,

JULIAN ANDRES MONTOYA CANO
Jefe de Unidad (E)
UNIDAD DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE INVERSIÓN
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Preparado por:
Cesar Alejandro Méndez Hernández

Copia:
Harol Alberto Tovar Orrego. Profesional Relaciones Externas. Harol.Tovar@epm.com
Gloria Lucia Muñoz. Profesional Relaciones Externas. gloria.munoz@epm.com
Municipio de Medellín. (Propietario Proyecto). diego.acosta@medellin.gov.co
Consorcio PITA7. (constructor). Alcantarilladopita7@gmail.com
ECOVIAS S.A.S (Interventor). Laflorida.ecovias@gmail.com

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: (604) 380 8080
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Solicitud de acompañamiento y supervisión técnica en la construcción de las redes del proyecto: "Construcción y la respectiva interventoría integral para la construcción de redes de alcantarillado en la vereda La Florida - San Antonio de Prado".

1 mensaje

Unidad Desarrollo de Intervenciones de Inversion <uo1027@epm.com.co> 17 de febrero de 2023, 13:15
Para: "diego.acosta@medellin.gov.co" <diego.acosta@medellin.gov.co>
Cc: "correo@certificado.4-72.com.co" <correo@certificado.4-72.com.co>, "Alcantarilladopita7@gmail.com" <Alcantarilladopita7@gmail.com>, "Laflorida.ecovias@gmail.com" <Laflorida.ecovias@gmail.com>, HAROLD ALBERTO TOVAR ORREGO <Harold.Tovar@epm.com.co>, GLORIA LUCIA MUNOZ URIBE <GLORIA.MUNOZ@epm.com.co>, JULIAN ANDRES MONTOYA CANO <JULIAN.MONTOYA.CANO@epm.com.co>, CESAR ALEJANDRO MENDEZ HERNANDEZ <CESAR.MENDEZ@epm.com.co>

Señor:

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR

Profesional Universitario.

Subsecretaria de Servicios Públicos

Secretaría de Gestión y control Territorial.

Municipio de Medellín.

Teléfono: 604 3855555 Ext: 5286

Cra. 43A # 42-161

Respetado Señor;

De acuerdo con el asunto se adjunta oficio con radicado EPM N. 20230130037263.

Cordialmente;

Unidad Desarrollo de Intervenciones de Inversión

epm

Teléfono: (+574) 380 4510

E-Mail: uo1027@epm.com.co

www.epm.com.co

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente, el uso indebido, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM.

The contents of this document and/or its attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any retention, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your attention. Grupo Empresarial EPM.

20230130037263.pdf
169K

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 22 de febrero de 2023

Señor
LUIGGI PLUGLIESE MERCADO
Representante Legal
ECOVIAS S.A.S

Asunto: Aprobación de hojas de vida personal contrato 46000996200 de 2022, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILALDO EN LA VEREDA LA FLORIDA - SAN ANTONIO DE PRADO.

Respetado señor Plugliese Mercado:

En cumplimiento de las funciones asignadas como Supervisor del contrato del asunto, me permito informarle que de acuerdo a la información por usted aportada y verificando los requerimientos establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato, se aprueba el siguiente personal para laborar en desarrollo del precitado contrato:

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Dani Ricardo Acevedo Vergara
Ingeniero Residente de Interventoría	Carlos Alberto Preciado Suaza
Tecnólogo en Obras Civiles 1	Juan David Upegui Escobar
Tecnólogo Social	Gloria Cristina García Rodríguez
Tecnólogo Ambiental	Jefferson Harry López Moreno
Tecnólogo Residente en SST	Nini Johana Rodríguez Ortiz

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Se aclara además, que deberá presentar los respectivos certificados de afiliación a la seguridad social para poder iniciar el desarrollo del actividades, así mismo, en caso de que se requiera realizar el cambio de algún profesional, se deberá solicitar a la Supervisión, con los documentos que certifiquen el cumplimiento de requisitos del mismo.

Cordial saludo,

Diego Alberto Acosta B.

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario
Subsecretaría de Servicios Públicos
Supervisor Contrato 4600096200 de 2022

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55. Medellín - Colombia
www.medellin.gov.co
SGS

Gmail

ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES Y OTROS ASUNTOS CONTRATO 4600096200 DE 2022

1 mensaje

Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co> 22 de febrero de 2023, 10:46
Para: ALCANTARILLADO LA FLORIDA <laflorida.ecovias@gmail.com>

Buenos días:

Adjunto oficio con aprobación de las hojas de vida de los profesiones que realizarán las labores de interventoría, según el contrato del asunto.

De otra parte, se requiere que alleguen a la Supervisión los certificados de afiliación a la seguridad social con los salarios que ofertaron en su propuesta, para poder iniciar el desarrollo de actividades y la certificación de la vinculación de personal con discapacidad, criterio por el que obtuvo puntaje en la evaluación de su propuesta.

Así mismo, para poder dar inicio a las actividades del contrato de obra 4600095815, objeto de esta interventoría, ustedes deben verificar, entre otros, la siguiente información:

1. Revisión y aprobación de las hojas de vida de los profesionales administrativos del contratista de obra y afiliación al sistema de seguridad social, con los salarios que ofertó el proponente en su propuesta.
2. Cronograma aprobado de las obras a ejecutar.
3. Verificación de la aprobación del PMT.
4. Recepción y revisión del PASAO.
5. Verificar la implementación del programa de Gerencia de Proyectos del contratista, criterio que le dio puntaje en la evaluación de su oferta.
6. Verificación de la vinculación de personal con discapacidad, criterio que le dio puntaje en la evaluación de su oferta.

Agradezco la atención.

Cordial saludo,

Alcaldía de Medellín
Distrito
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Profesional Universitario
Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial
diego.acosta@medellin.gov.co
Teléfono: 3855555 Ext. 5286
Edificio Plaza Libertad. Piso 8 Torre A
Dirección Carrera 45 A N°42-161
Medellín - Colombia

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA INT LA FLORIDA.pdf
154K

983

Anexo 4.6-1: Bitácora de obra.

BITÁCORA DE OBRA.

Contrato de obra No. 4600095815 de 2022

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO".

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

NIT: 890.905.211-1

CONTRATISTA:

CONSORCIO PITA 7

NIT: 901.646.363-1

Representante legal: Ricardo Guerra Barrientos

C.C. No: 71.337.270

INTERVENTORÍA:

ECOVIAS SAS.

NIT: 890.104.625-1

Representante legal: Luiggi Alberto Pugliese Mercado

C.C. No: 8.739.219

FIRMAS AUTORIZADAS

Ricardo Guerra Baccientos
Director de obra

Dani Ricardo Acevedo Vergara
Director de Interventoría

Juan Carlos Montoya Gómez
Residente de obra

Carlos Alfonso Preciado Suaza
Residente de Interventoría

Daniela Ochoa Torres
Tecnólogo en obras civiles (obra)

Juan David Upegui Escobar
Tecnólogo en obras civiles (interventoría)

Diana Milena Hernández Berrío
Tecnólogo social (obra)

Gloria Cristina García Rodríguez
Tecnólogo social (interventoría)

Alejandra Giraldo Alzate
Tecnólogo Ambiental (obra)

Jefferson Harry López Moreno
Tecnólogo Ambiental (interventoría)

Yeidis Paola Castro Benítez
Tecnólogo SST (obra)

Nini Johana Rodríguez O.
Nini Johana Rodríguez Ortiz
Tecnólogo SST (interventoría)

985

Miércoles, 01 de Marzo de 2023:

- Horario de trabajo: 7:00 AM - 500PM
- Estado del tiempo: soleado
- Personal del Contratista: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 topógrafo, 2 cadeneros, 2 Ayudantes
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta Maquinaria y equipos: 1 Estación total y accesorios.
- Actividades de obra: • Se da inicio al contrato de obra 4600095815 de 2022 y de interventoría 4600096200 de 2022.
• Se realiza inicio de trazado y localización del proyecto.
• Se realizo recorrido de reconocimiento del proyecto
• Se verifican condiciones de estabilidad en algunos puntos del proyecto.
• El contratista de Obra enfatiza en que la Entidad debe revisar y atender los Problemas de estabilidad a lo largo del proyecto, evidenciados en el recorrido realizado, y en los recorridos previos. La interventoría especifica que los puntos con problema de estabilidad son los siguientes: ▲ En la calle 56 Sur, entre la carrera 70 y la carrera 75, se han presentado asentamientos en la vía, de más de 6Z cm, producto de socavaciones y movimientos en masa hacia la vertical del talud inferior de la vía. Este punto se ve agravado con la temporada de lluvias actual.
▲ En diferentes puntos entre las abscisas K1+250 y K1+350 se presentan hundimientos laterales en la banca de la vía producto de procesos de reptación en el talud inferior. Adicionalmente, sobre la calle 56 Sur (Aproximadamente en el K1+017) se encontró pérdida parcial del talud inferior de la vía producto de un fenómeno de remoción en masa.
▲ Sobre la calle 56 Sur, a la altura de la tercera de Frank Vélez, se proyecta extender un canal sobre una vía sin pavimento (vías RS y R1) En punto de este canal se evidencia pérdida de la banca de vía producto de procesos generados en el talud que la contiene.

Contratista de obra

Interventoría

Jueves, 02 de Marzo de 2023:
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en Obras civiles, 1 tecnólogo Ambiental, 1 tecnólogo Social, 1 tecnólogo SST, 1 topógrafo, 2 cadeneros, 2 Ayudantes, 2 Auxiliares de tránsito
- Personal de Interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civila, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo Social, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta, maquinaria, equipo: 1 Estación total y accesorios, Herramienta menor
- Actividades de obra: • Se continúa con la localización, trazado y replanteo de obra en el tramo 2.
• Se realiza comité de obra #1 con recorrido con participación de la supervisión, el contratista de obra y la interventoría.
• Se inician los cierres viales sobre la calle 56 sur, en el tramo 2
• Se realizan apiques de exploración en el tramo 2

Contratista de obra | Interventoría CMPS/23

Viernes, 03 de Marzo de 2023:
- Horario de trabajo: 7:00AM - 3:00PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo Social, 1 tecnólogo SST, 1 topógrafo, 2 cadeneros, 2 Ayudantes, 2 Auxiliares de tránsito.
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, maquinaria, equipo: 1 Estación total y accesorios, Herramienta menor.
- Actividades de obra: • Se realiza adecuación de acceso y descargue de material en parqueadero de la empresa Solobus
• Se continua con la localización trazado y replanteo de obra en el tramo 2.

Contratista de obra | Interventoría

Sábado, 04 de Marzo de 2023:
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00PM
- Estado del tiempo: Soleado

- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 Tecnólogo SST, 1 Oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de tránsito.
- Herramienta, maquinaria, equipo: Herramienta menor, Herramienta menor
- Actividades de obra: • Adecuación de acopio de material en parqueadero de Solobus.
• Se realizo instalación de pasacalles sobre la calle 56 sur y sobre la carrera 14.

Contratista de obra — Interventoría

Domingo, 05 de Marzo de 2023:
- Este día no se adelantaron actividades de obra.

contratista de obra — Interventoría

Lunes, 06 de Marzo de 2023:
- Horario de trabajo: 7:00Am - 5:00 pm
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 1 Topógrafo, 2 cadeneros, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 Auxiliares de tránsito, 1 tecnólogo social.
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, maquinaria, equipo: 1 Estación total y accesorios, 1 cortadora de pavimento, Herramienta manual.
- Actividades de obra: • Continua localización, trazado y replanteo de tramo 2.
• Se realiza ubicación y adecuación de puntos de acopio de material.
• Se inicia el corte de pavimento en tramo 2.

Contratista de obra — Interventoría

Martes, 07 de Marzo de 2023

- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 PM
- Estado del tiempo: Lluvia moderada entre 10:20 AM - 10:40 AM y entre 2:50 PM - 3:30 PM
- Personal contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 Tecnólogo social, 1 Tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 Ayudantes, 2 Auxiliares de tránsito, 1 Topógrafo, 2 cadeneros.
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo Social, 1 Tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta, maquinaria y equipo: Herramienta menor, 1 Estación total con accesorios, 1 cortadora de pavimento.
- Actividades de obra: • Continua localización, trazado y replanteo del Tramo 2.
• Se realiza adecuación de acopios de materiales.
• Continua corte de pavimento en tramo 2.
• Se realiza reunión de inicio con la comunidad.

Contratista de obra — Interventoría

Miércoles, 8 de Marzo de 2023

- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 pm
- Estado del tiempo: Lluvia moderada 1:00 pm - 3:30 PM
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares viales.
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta, maquinaria y equipo: Herramienta menor, cortadora de pavimento
- Actividades de obra: • Se descarga tubería en acopio del parqueadero.
• Continúa corte de pavimento para brecha
• Se realiza recorrido de verificación de alineamiento con funcionarios de EPM.

Contratista de obra — Interventoría

Jueves, 9 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00AM - 5:00PM
- Estado del tiempo: soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de Obra, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo social; 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 Auxiliares viales
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social
- Herramienta, Maquinaria y equipo: Herramienta menor, 1 cortadora de pavimento.
- Actividades de obra: • Continúa corte de pavimento para brecha en tramo 2.
• Se realiza descargue de tubería en acopio de porvenir
• Se realizo comité de obra #2 con participación de contratista, supervisión de interventoría.

Contratista de obra — Interventoría

Viernes, 10 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 3:00PM
- Estado del tiempo: lluvia moderada de 7:00AM - 8:30AM
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tránsito.
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, guadaña, cortadora de pav.
- Actividades de obra: • Se realiza recepción y recolección de residuos sólidos para adecuación de acopio en frente del campamento de obra. • Continua el corte de pavimento en tramo 2.
• Se realiza descargue de tubería en acopio del porvenir

Contratista de obra — Interventoría

Sábado, 11 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 12:00 M
- Estado del tiempo: lluvia moderada de 8:00am - 8:30 AM
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tránsito.
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta manual guadaña
- Actividades de obra: • continua rocería y adecuación de acopio a frente de campamento de obra
• Se realiza descargue de tubería

Contratista de obra

Interventoría

Domingo, 12 de Marzo de 2023
- Este día no se adelantaron actividades de obra

Contratista de obra

Interventoría

Lunes, 13 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 PM
- Estado del tiempo: lluvias moderadas entre 7:20Am - 9:50AM y 10:45AM - 12:05PM
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 auxiliares de tránsito.
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta manual, martillo hidráulico.
- Actividades de obra: • Descargue de tubería en acopio de parqueadero.
• Ampliación de acopio del parqueadero de subbase
• Adecuación de acopio en frente del campamento.
• Adecuación de acopio sobre cra 75 con calle 56 sur
• Descargue de triturado y base granular

- Inicia retiro de pavimento con martillo hidraulico
- Se hizo adecuación y limpieza de cunetas y vía

Contratista de obra

Interventoría

Martes, 14 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tránsito
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta manual, martillo hidráulico.
- Actividades de obra: • Descargue de tubería en acopio de perforadora
• Descargue de triturado en acopio
• continúa retiro de pavimento con martillo hidráulico en tramo 2
• llega mini excavadora a obra.


contratista de obra

Interventoría

Miércoles, 15 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00AM - 5:00PM
- Estado del tiempo: Lluvia leve de 2:00PM - 4:00PM
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo Social, 1 tecnólogo ambiental, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tránsito, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de excavadora, 1 operador de Bobcat
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST
- Herramienta y equipo y Maquinaria: Herramienta manual, 1 estación total con accesorios, 1 mini excavadora, 1 Bobcat.
- Actividades de obra: • Se inician las excavaciones y instalación de tubería

y llenado de brecha con el tramo entre los siguientes MH R67 y R69 del tramo 2.

- Se presenta rotura de tubo del acueducto el Manantial, junto al R67, ya que este no está sobre el alineamiento que fue compartido previamente por el acueducto. Se realiza la reparación en obra.
- Se acordó entre contratista e interventoría realizar cimentación del tramo R67 y R69 con triturado 3/4" hasta media tubo. Posteriormente se llenó con arcilla y se finalizó con base granular, estabilizada con cemento en su última capa para permitir tránsito y evitar erosión



NOTA: Se solicita al contratista entibar, así sea que el terreno se encuentre en buenas condiciones.

Contratista de obra

Interventoría

Jueves, 16 de Marzo de 2023

- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tránsito, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 operarios
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 Nivel de precisión, 1 mini excavadora, 1 Bobcat, 1 cunguo
- Actividades de obra: • Se realiza comité de obra #3
- Continúa la excavación mecánica en el tramo 2, entre los R67 y R69.
- Se realiza cimentación de tubería con triturado 3/4" hasta media tub

Se realizó llena la brecha con arcilla y base granular estabilizada con cemento en su última capa.
• Continúa encontrándose tubería del acueducto El Manantial en medio y de la brecha proyectada para el alcantarillado

Contratista de obra — Interventoría CMR/23

Viernes, 17 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 3:00 PM
- Estado del tiempo: 2:30 pm - 3:00 pm lluvia moderada
- Personal del Contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares de tránsito, 1 Topógrafo, 1 cadenero, 2 operarios
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 Tecnólogo social, 1 Tecnólogo SST
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 nivel de precisión 1 Estación total, 1 mini excavadora, 1 Bobcat, 1 cargador
- Actividades de obra: • Continúa excavación mecánica en el tramo 2, entre los RG7 y RG9.
• Se realiza instalación de tubería de 8" con relleno de 3/4 hasta medio tubo (25 cm).
• Se realizó llena de brecha con arcilla y base granular estabilizada con cemento en su última capa.
• Se excavó sobre-espesor de concreto asfáltico (15cm en total), en una longitud de 9m, entre RG7 y RG9. Se requirió martillo hidráulico para terminar la rotura

Contratista de obra — Interventoría CMR/23

Sábado, 18 de marzo de 2023
- Horarios de trabajo: 7:00 AM - 12:00 M
- Estado del tiempo: Lluvia leve 8:30 AM - 10:00 AM
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental

1 Tecnólogo SST, 20 Fiscales, 4 grudantes, 1 topógrafo, 1 cadenero
2, auxiliares de tránsito
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta manor, martillo demoledor, cortadora de pavimento.
- Actividades de obra: • Se presenta visita del subsecretario de construcción y mantenimiento de infraestructura física, y de funcionarios de la SIF, los cuales recomiendan suspender excavaciones entre R69 y R77, para analizar diferentes alternativas para el alineamiento del alcantarillado, toda vez que, si se excava la vía por donde está la marcación, podría generar reactivación de los fallos presentes en este tramo y provocaría pérdida de la banca de la vía.
• Se realizan cortes de pavimento en tramo 2.
• Se realiza rotura de pavimento con martillo hidráulico en tramo 2.
• Para el tramo 1, la SIF recomienda cambiar el alineamiento del alcantarillado a la cuneta que hay sobre la margen derecha de la vía (sentido occidente - oriente), con el fin de evitar aportar y empeorar las condiciones, producto de la falla encontrada en el talud de la quebrada.

Contratista de obra

Interventoría. CONSTRU

Domingo, 19 de Marzo de 2023
- Este día no se adelantaron actividades de obra

Contratista de obra

Interventoría CONSTRU

Lunes, 20 de Marzo de 2023
- Este día no se adelantaron actividades de obra por ser festivo

Contratista de obra

Interventoría CONSTRU

Martes, 21 de Marzo de 2023.
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo Ambiental, 1 Tecnólogo Social, 1 tecnólogo SST, 2 auxiliares de tránsito, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de mini excavadora, 1 operador de bobcat.
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 estación total, 1 mini excavadora, 1 bobcat, 1 canguro, 1 martillo hidráulico
- Actividades de obra: • Continúan excavaciones mecánicas entre RG7 y RG9 de tramo 2.
• Se encuentra, como estaba identificado en planos, el cruce de una obra transversal en el tramo en excavación. Sin embargo, es necesario realizar sobre excavación para demoler parte del estribo de esta obra, ya que este no permitía el paso de la tubería de alcantarillado. La sobre excavación, de 0.8m x 5m x 1m, fue llenada con arenilla.
• Justo antes de llegar, con la excavación, al RG9, se encontró una piedra de grandes dimensiones, que atraviesa la brecha. Esta piedra será demolida con cuña hidráulica, posteriormente.
• Se realiza instalación de tubería de 8", con cimentación de 25cm de triturado 3/4" (hasta medio tubo), y posterior llenado en arenilla y base.
• Entre los RG9 y RG71, se encontró trabajos hechos por la SIF el día 18 de Marzo, con los cuales desvían las aguas de la cuneta para evitar socavaciones en el pollo activado de esta zona.


Contratista de obra

Interventoría

Miércoles, 22 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00AM - 5:00PM
- Estado del tiempo: 4:30PM - 5:00PM Lluvia moderada
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Tecnólogo

1 Tecnólogo social, 1 Tecnólogo ambiental, 1 Tecnólogo SST, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 auxiliares de tránsito, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operario de Mini excavadora, 1 operario de bobcat

- Personal interventoría: 1 Directo de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 Tecnólogo Ambiental, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 Tecnólogo social, 1 Tecnólogo SST.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 nivel de precisión, 1 estación total, 1 cangrejo, 1 martillo hidráulico, 1 mini excavadora, 1 bob cat
- Actividades de obra: • Se inicia excavación mecánica entre R17, R19
• Se realiza instalación de tubería cimentada en triturado 3/4" y con llenos con material Selecto de la excavación y con base granular estabilizada con cemento en su último capa.
• Se realiza recorrido con funcionarios de EPM y supervisión, para evaluar observaciones de los SIF, en recorrido realizado el 18 de mayo, sobre los finalizajes de estabilidad de taludes
• El ingeniero Salvador Restrepo de EPM, recomienda que, cuando se vaya a utilizar material selecto de la excavación para hacer los llenos de brecha, se implemente una capa de 20cm + medio tubo (101.6cm) de arcilla, antes de llenar con el material de la excavación

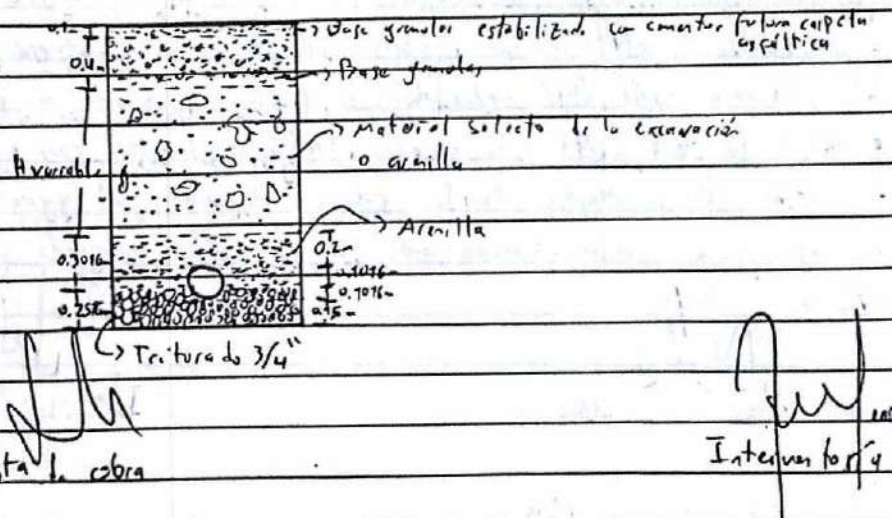

Jueves, 23 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 Am - 5:00 PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal Contratista de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo Social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 Operario de mini excavadora, 1 operador de bobcat
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 nivel de precisión, 1 estación total, 2 cunguros, 1 martillo hidráulico, 1 mini excavadora, 1 bobcat
- Actividades de obra: • Continúa excavación mecánica, instalación de tuberías de 8" sanitaria en tubería 3/4", con capa superior de arena. Llene con material selecto de la excavación y 30cm de ajuste a lleno en arcilla. 40cm de base granular, y 10cm de base granular estabilizada con cemento, ítem R19, R81.
• Desde el componente de comunicaciones del Distrito de Medellín se realizó entrevista a beneficiarios del proyecto.

Contratista de obra

Interventoría

Viernes, 24 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 3:00 PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal Contratista de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de mini excavadora, 1 operador
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST
- Herramientas, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 nivel de precisión, 2 cunguros, 1 mini excavadora, 1 bobcat.
- Actividades de obra: • Continua excavación mecánica, instalación

de tubería de 8" cimentada en triturado, con capa superior en arcilla, lleno con material selecto de la excavación, compactación con canguro, lleno con base granular, estabilizada en su última capa con cemento, afu R79 y R81.

Contratista de obra

Interventoría

Sábado, 25 de Marzo de 2023

-Horario de trabajo: 7:00 AM - 12:00M

-Estado del tiempo: lluvia moderada de 7:00 AM a 9:00 AM

-Personal contratista de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares viales, 2 operadores de maquinaria, 1 topógrafo, 1 cadenero

-Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo social.

-Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, 1 nivel de precisión, 2 canguros, 1 mini excavadora, 1 bobcat, 1 martillo hidráulico.

-Actividades de obra: se realiza rotura de pavimento entre R81 y R83 • Se realizan actividades de orden y aseo al final de la jornada

Contratista de obra

Interventoría

Domingo, 26 de Marzo de 2023

-Horario de trabajo: Este día no se adelantaron actividades de obra

Contratista de obra

Interventoría

Lunes, 27 de Marzo de 2023

-Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00pm

-Estado del tiempo: lluvia fuerte de 3:30 pm a 5:00 pm

-Personal Contratista de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 operario de mini excavadora, 1

operador de bobcat.
- Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, nivel de precisión, 1 mini excavadora, 1 bobcat
- Actividades de obra: • Se inicia excavación mecánica, instalación de tubería, entibado, lleno con arcilla, tritrado, material selecto de la excavación y base granular, compactado con rangers, entre RB1, RB3, en el tramo 2

Contratista de obra — Interventoría

Martes, 28 de Marzo de 2023
- Horario de trabajo: 7:00 AM - 5:00 pm
- Estado del tiempo: lluvia fuerte de 3:30 pm a 4:30 pm
- Personal Contratista de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 operador de excavadora, 1 operador de bobcat, 1 topógrafo, 1 cadenero.
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental
- Herramienta, equipo y Maquinaria: Herramienta menor, 1 nivel de precisión, 2 rangers, 1 mini excavadora, 1 bobcat,
- Actividades de obra: • Continua excavaciones mecánicas, instalación de tubería, lleno con tritrado, arcilla, material de la excavación y base granular, ala RB1 y RB3
• Se presenta rotura de tubería de acueducto veredal, de granulado de energía, por el movimiento del brazo de la excavadora,
• Se realiza visita en pareja de EPM, SANEAR y SSPD, para verificar las alternativas en los 2 puntos del Tramo 2, el tramo 1, dados los fallos encontrados y los placa huellas en tramo 2.

Contratista de obra — Interventoría

Miércoles, 29 de Marzo de 2023
-Horario de trabajo: 7:00AM - 5:00PM
-Estado del tiempo: lluvia fuerte de 3:30 pm - 4:45 PM
-Personal del Contratista de Obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo ambiental, 2 oficiales, 7 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de mini excavadora, 1 operador de bobcat
-Personal interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST
-Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, nivel de precisión, 2 conos, 1 mini excavadora, 1 bobcat
-Actividades de obra: • Se realiza excavación mecánica, instalación de tubería, entibado temporal, cimentación con triturado, lleno con arrillo, material selecto de la excavación y base granular estabilizada con cemento en su última capa, debidamente compactada, entre los MH R83 y R85, y R85 y R89
• Se realizan apiques de exploración en tramo 1, para localización de la tubería de impulsión de EPM, para evaluar traslado horizontal o alineamiento

Contratista de obra | Interventoría

Jueves, 30 de Marzo de 2023
-Horario de trabajo: 7:00AM - 5:00PM
-Estado del tiempo: lluvia moderada de 4:30 pm - 5:00PM
-Personal del contratista: 1 Director de Obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 7 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de mini excavadora, 1 operador de bobcat
-Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo Ambiental.
-Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, nivel de precisión, 2 conos, 1 mini excavadora, 1 Bobcat
-Actividades de obra: • Se realiza excavación mecánica, entibado temporal,

993

cimentación con tubo de 3/4", instalación de tubo novafort de 8". Llena con arenillo, material selecto de la excavación y base granular estabilizada con cemento en su última capa. • Se encuentra la vía del tramo 2 con importante contaminación por material de acopios, que fue arrastrado por lluvias en la noche y madrugada anterior. • Las intervenciones del día se hacen sobre R89, R91 • Se encuentra un pilote de concreto en una zona de excavación de brecha para tubería, bajo la carpeta asfáltica. • Se encuentra tubería de gas. • Se realiza comité de obra Nro 5 en las instalaciones de la SIF.

Contratista de obra

Interventoría

Viernes, 31 de Marzo de 2023

- Horario de trabajo: 7:00 AM - 3:00 PM
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo social, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo SST, 2 oficiales, 7 ayudantes, 2 auxiliares viales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de miniexcavadora, 1 operador de bobcat.
- Personal de interventoría: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 tecnólogo en obras civiles, 1 tecnólogo SST, 1 tecnólogo ambiental, 1 tecnólogo social.
- Herramienta, equipo y maquinaria: Herramienta menor, nivel de precisión, 2 cargas, 1 mini excavadora, 1 Bobcat.
- Actividades de obra: • Se encuentra la vía en deficientes condiciones debido al arrastre de material mal acopiado por las lluvias de la noche y madrugada anterior. Se solicitó al contratista limpieza y corrección inmediata de los acopios de material para evitar que vuelva a ocurrir. • Funcionarios de EPM realizan recorrido de socialización puerta a puerta con posibles futuros usuarios del alcantarillado. • Se realiza excavación mecánica, entibado temporal, cimentación con fraguado de 3/4", instalación de tubería de 8". Llena compactado con arenillo, base granular estabilizada con cemento en su última capa, en el R91

994

Anexo 7.1-1: Registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.





















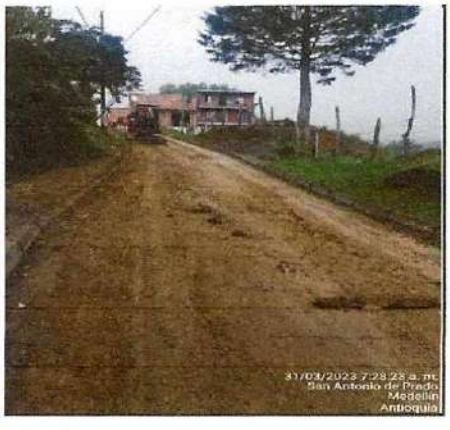







REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.

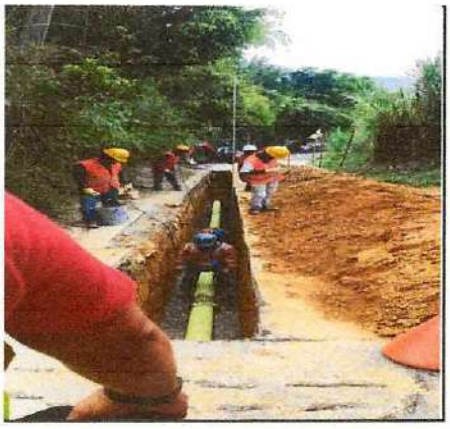







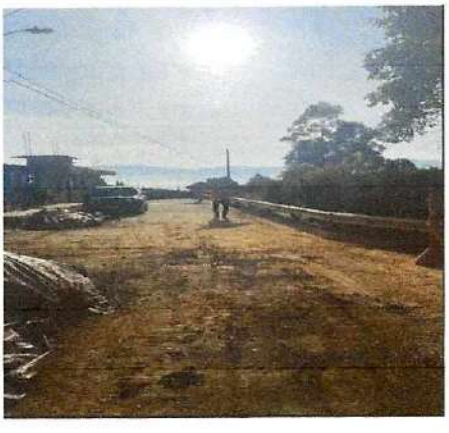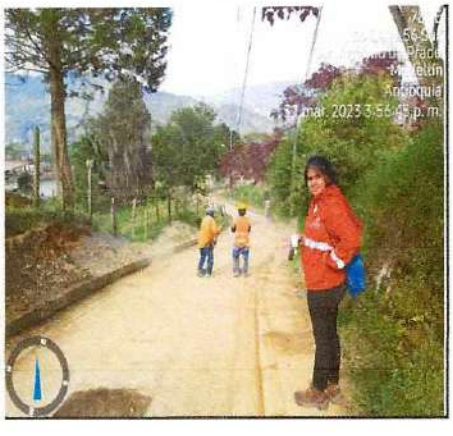

REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.

















REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.














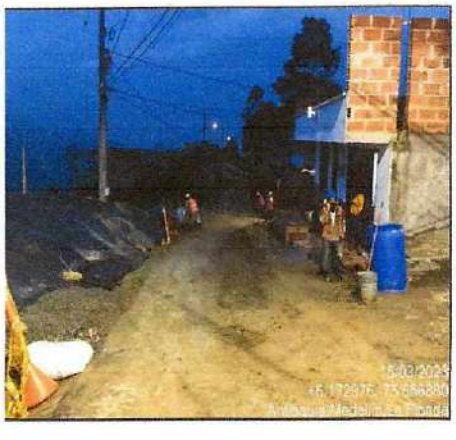

REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.

























1000

REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.
















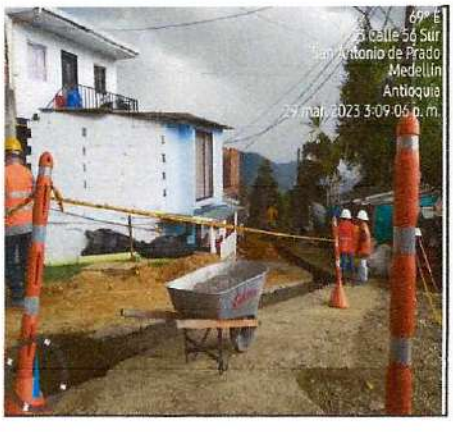



REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.


















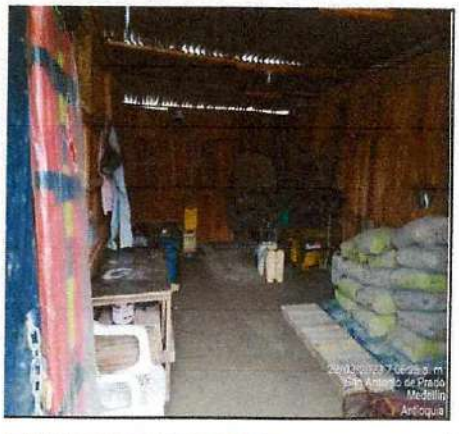







REGISTRO FOTOGRÁFICO MARZO 2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO.









