INFORME MENSUAL No. 15



CONTRATO DE OBRA No. 133 de 2022 - CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA – SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Bogotá agosto 31 de 2023

Contenido

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4

OBJETO 4

INFORMACIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL CONTRATO 4

ANTECEDENTES 4

LOCALIZACION DEL PROYECTO 6

DESCRIPCION DEL PROYECTO 6

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 6

CONTRATO DE OBRA 7

- CONTRATO DE OBRA No. 133 DE 2022 7
- OBJETO 7
- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 8
- PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 9
- RECURSOS DEL CONTRATISTA 9

2. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO 10

INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 10

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA. 10

REQUERIMIENTOS LEGALES, PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO 10

- **MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO.** 11

ACTIVIDAD DE ORDEN ADMINISTRATIVO 11

OBLIGACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO: 11

INFORMACION FINANCIERA 12

ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 12

Avance de cada una de las actividades programadas. 15

BALANCE PRESUPUESTAL QUE MUESTRE LO EJECUTADO, LO PROYECTADO PARA TERMINAR LAS OBRAS Y EL TOTAL, CONFORME NO EXCEDE DEL VALOR TOTAL CONTRACTUAL. 28

Gráfica "Curva S" con seguimiento a la programación mediante el avance físico de la obra. 89

Diagrama de Gantt con seguimiento a avance físico de la obra. 89

ATRASOS 91

FACTORES CLIMATOLOGICOS: 91

OCUPACION DEL COLEGIO 93
Registros fotográfico .....
Resultados de los ensayos 108
Calibración y control de equipos del proyecto. 108
Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra. 108
Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 108
Resumen de las actividades realizadas en el mes. 108
Provisionales de obra: 115
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 115
ANEXOS 117
ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO 118
ANEXO 2. SEGUIMIENTOS DE PARAMETROS DE CALIDAD 127
ANEXO 3. CERTIFICACIONES DE CALIDAD, ACEROS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 128
ANEXO 4. INFORME FINANCIERO 129
ANEXO 5. GESTION SOCIAL 130
ANEXO 6. INFORME SEGURIDAD Y SALUD 131
ANEXO 7. AMBIENTAL 132
ANEXO 8. CONTROL DE LLUVIA 133
ANEXO 9. COPIA BITACORA 134
ANEXO 10. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 135
ANEXO 11. INFORMES SEMANALES 136

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede la magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL CONTRATO

Para la ejecución del objeto del Contrato, se deberán desarrollar, entre otras, las actividades que se describen en las Especificaciones Técnicas, el presente documento y los demás anexos y documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. El alcance incluye, las siguientes actividades principales:

a) Demolición total de la edificación existente ubicada en el predio localizado en la dirección KR 94 8 C 49 (ACTUAL), área de demolición 1390,92 m2.
b) Construcción de dos edificaciones de tres (3) pisos de altura y un sótano (tanque de agua) destinada a una (1) edificación desarrollada en veinticuatro (24) unidades estructurales independientes para uso dotacional, equipamiento colectivo educativo de escala zonal con dos (2) estacionamientos privados, trece (13) estacionamientos de visitantes, cincuenta y un (51) bicicleteros y una (1) zona de cargue y descargue con dos (2) cupos, conforme con los estudios y diseños elaborados a través del contrato No. 1117603 de 2019 (Objeto: CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA – SEDE LA MAGDALENA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ;) y de acuerdo con la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva y Demolición Total para el Proyecto denominado COLEGIO LA MAGDALENA, en la Localidad 8 de Kennedy, en Bogotá D.C., expedida mediante Resolución No. 11001- 2-20-2061 de 17 de marzo de 2021 y ejecutoriada el 16 de abril.
c) Construcción de cerramiento perimetral definitivo.

ANTECEDENTES

1. Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital y en consecuencia la ejecución de los proyectos viabilizados, la SED, considerando la importancia de asegurar que las obras de infraestructura educativa a contratar cumplan con los principios y procedimientos establecidos en el estatuto de contratación estatal, optó por convocar como aliados a entidades públicas idóneas para desarrollarlos, y dando cumplimiento al principio de selección objetiva, envió invitación para presentar propuesta a cuatro (4) entidades públicas, concluyendo que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. – ERU, presentó la oferta más favorable para prestar el servicio de Gerencia Integral de Proyectos, suscribiéndose el Contrato Interadministrativo No.

CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021 entre la SED y la ERU con el objeto de "REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO", contemplado en su alcance la planeación, contratación de las obras y sus respectivas interventorías (2), la ejecución de actividades jurídico – contractuales, técnicas, financieras, sociales y económicas, necesarias para la entrega a la SED de la nueva infraestructura educativa de los siguientes proyectos: (i) Colegio La Magdalena e Interventoría Colegio La Magdalena (Localidad de Kennedy, Bogotá), y (ii) Colegio San Francisco de Asís e Interventoría Colegio San Francisco de Asís (Los Mártires, Bogotá).

2. Teniendo en cuenta lo anterior, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021, el 10 de diciembre de 2021 la ERU inició el proceso para selección No. ERU-IPRE-015-2021 para contratar la CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA – SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

3. Que el 2 de febrero de 2022 se dio apertura al proceso de selección ERU – IPRE –a 015 -2021, y en su desarrollo se presentaron las siguientes propuestas:

   - Consorcio Américas
   - Consorcio Colegio ERU 2022
   - Consorcio Construimos 2022
   - Consorcio Educación para Todos
   - Consorcio Educar
   - Consorcio Francisco de Asís
   - Consorcio Magdalena Mártires
   - Consorcio Megacolegio MYJ
   - CONTEIN

4. Que el 15 de marzo de 2022 se procedió a publicar el informe preliminar de las propuestas presentadas dentro del proceso ERU – IPRE – 015 – 2021.

5. Que, dentro del término establecido para dar contestación a las observaciones presentadas dentro del proceso, se publicaron las respuestas y la Empresa procedió a publicar el Informe definitivo de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección ERU – IPRE – 015 – 2021.

6. Que, de acuerdo con el cronograma del proceso de selección ERU - IPRE– 015 – 2021, el día 29 de marzo de 2022 se procedió a publicar la decisión de mejor oferta con la cual, la recomendación realizada por el Comité Evaluador del Proceso de Selección del proceso enunciado.

7. Que, teniendo en cuenta lo anterior, las partes han acordado suscribir el contrato de obra 133 de 2022,

8. Que el 23 de mayo se firmó el acta de inicio de obra.

LOCALIZACION DEL PROYECTO



Ilustración 1. Localización del proyecto

El proyecto se desarrollará en la localidad de Kennedy (8), exactamente en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ 78) Tintal Norte, la cual se localiza en el costado noroccidental de la localidad de Kennedy, tiene una extensión de 343,4 hectáreas, que equivalen al 8,9% del total de área de las UPZ de esta localidad, en la dirección Kra 94 No. 8c- 49 (actual) KR 94 8 C 49 (ACTUAL) - Chip AAA0179JYOE – Matrícula Inmobiliaria 50C1585666.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto para la actualización de la planta física del Colegio La Magdalena el cual se encuentra ubicado en la localidad No 8 Kennedy, en la UPZ No 78 Tintal Norte, de acuerdo con los estudios realizados al área de oportunidad y revisión teórica del mismo y desde el punto de vista social es pertinente la construcción de un nuevo colegio en el sector dado a que los resultados arrojados de insuficiencia y demanda construido por la SED pone de manifiesto la insuficiencia educativa en esta UPZ. El proyecto beneficiara a una población de 1.680 estudiantes en jornada única; la infraestructura educativa, está conformada por 6 bloques distribuidos en el predio logrando eficiencia lumínica y energética.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A este proceso de selección y a los contratos que de él se deriven, se regirán por las reglas previstas por las normas civiles y comerciales del derecho privado y por los principios de la función pública, así como las reglas previstas en el estudio previo y anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del proceso. Además, se aplicarán las normas propias del Distrito Capital y las reglamentaciones internas de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia acerca del desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de estas mismas, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 133 DE 2022.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA – SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.
CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – D.C.
CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 con NIT 901.581.473-0 Representante Ariel Alexander Roa Cortes, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.671.481 conformado por las sociedades CIVITARQ S.A.S. con NIT 900.283.279-6 (con una participación del 35%), CONSTRUCTORA CANAAN S.A. con NIT 800.007.447-2 (con una participación del 50%) y M&E CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.053.750-8 (con una participación del 15%).

VALOR: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($43.322.137.680), de acuerdo con la propuesta presentada.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es de diecisiete (17) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del Contrato.

Entre los suscritos a saber: (A) Por una parte: JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ GÓMEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 89.002.626 en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C., - en adelante LA ERU, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. quien realizó la convocatoria al Proceso de selección de Invitación Publica No. ERU – IPRE- 015 - 2021, y que en adelante se denominará el CONTRATANTE. (B) Por la otra parte: ARIEL ALEXANDER ROA CORTES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.671.481, en su calidad de Representante Principal, quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 de acuerdo con el documento de Conformación de Estructura Plural del 21 de febrero de 2022, presentado dentro de la propuesta, y que hace parte del presente contrato, identificado con NIT 901581473-0, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, y que declara bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna inhabilidad e incompatibilidad o de conflicto de interés, ya sea de carácter constitucional, o legal, juramento que se entiende prestado con la firma del contrato.

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA – SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU)
FIRMA INTERVENTORA	GNG Servicios de Ingeniería SAS
NUMERO DE CONTRATO	134 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto la construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
FIRMA CONTRATISTA	Consorcio Colegio ERU 2022
NÚMERO DE CONTRATO	133 de 2022
OBJETO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
LOCALIZACIÓN	Kennedy (8) UPZ Tintal Norte (78)
PLAZO	17 meses
FECHA DE INICIO	Mayo de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	Octubre de 2023
VALOR GLOBAL	$43.322.137.680

Tabla 1. Información general del contrato

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

N	CARGO	PROFESIONAL	CONTRATO	NUMERO DE PLANILLA
1	Director de obra	MAURICIO VARGAS GAITAN	PRESTACION DE SERVICIOS	1056489909
2	Residente de Obra	LEONARDO CARDENAS ROJAS	PRESTACION DE SERVICIOS	69004154
3	Residente de Obra	HENRY DAVID CARDENAS	PRESTACION DE SERVICIOS	9454629111
4	Residente de Obra	JEFFERSON MATEUS MALAGON	PRESTACION DE SERVICIOS	9454698871
5	Asesor estructural	NOHORA BEATRIZ GOMEZ GALINDO	PRESTACION DE SERVICIOS	7883660181
6	Especialista Instalaciones Eléctricas	EDGAR AUGUSTO LEIVA CASTIBLANCO	PRESTACION DE SERVICIOS	69358203
7	Especialista Redes Hidrosanitarias , Gas y Red Contra incendios	PAOLA ANDREA PACHON BRIÑEZ	PRESTACION DE SERVICIOS	69976781
8	Asesor Biólogo	LICINIO GARRIDO HOYOS	PRESTACION DE SERVICIOS	70009759
9	Asesor en Geotecnia	CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA	PRESTACION DE SERVICIOS	69976781
10	Asesor Ambiental	ADRIANA PAOLA SANDOVAL NIETO	PRESTACION DE SERVICIOS	69420467
11	Asesor Forestal	ALEJANDRO VARGAS MENDOZA	PRESTACION DE SERVICIOS	1056781343
12	Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL	PRESTACION DE SERVICIOS	70149206
13	Asesor en Bioclimática	MILTON DAVID PERICO AGUDELO	PRESTACION DE SERVICIOS	9454608274
14	Profesional Social	MAYERLY REYES VELASCO	PRESTACION DE SERVICIOS	70358309
15	Profesional Presupuestos	JORGE CARLOS MUÑOZ MONCALEANO	PRESTACION DE SERVICIOS	9455085436
16	Topografo	MIGUEL OVALLE	PRESTACION DE SERVICIOS	1057061940
17	Almacenista	LUIS OSWALDO HIBLA	OBRA O LABOR	9454975085
18	Maestro de obra	OMAR CRUZ	OBRA O LABOR	9454975085
19	Inspector de obra	JULIAN CAMILO ROMERO	OBRA O LABOR	9454975085
20	Inspector de obra	ANGELICA MATEUS	OBRA O LABOR	9454975085
21	Inspector de obra	JHON JAIMES RINCON	OBRA O LABOR	9454975085
22	Cadenero I	WILLIAM DELGADO	OBRA O LABOR	9454975085
23	Cadenero II	JHON CAMILO BERMUDEZ	OBRA O LABOR	9454975085
24	Técnico o Tecnólogo SST o HSE o HSEQ	SANDRA MILENA ZAMORA	OBRA O LABOR	9454975085
25	Técnico o Tecnólogo SST o HSE o HSEQ	LUCELE FONSECA	OBRA O LABOR	9454975085
26	Técnico o Tecnólogo SST o HSE o HSEQ	YENNY SILVA	OBRA O LABOR	INGRESO EL DIA 9 RETIRO DE 16 DE AGOSTO DE 2024
27	Mensajero	JESUS LEOTTAU	OBRA O LABOR	9454975085

Tabla 2. Personal involucrado en el proyecto

RECURSOS DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo correcto de la obra, CONSORCIO COLEGIO ERU 2022, cuenta con equipos de cómputo e instalaciones para el adecuado desarrollo del proyecto.

Cantidad	Equipo o Insumo
8	Computadores de Escritorio
4	Impresoras
2	Comunicaciones

Tabla 3. Recursos del contratista

Tabla 3. Relación de equipos

2. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A la fecha el contrato se encuentra suscrito por las partes y radicado en el SECOP desde el día 03 de mayo de 2022 por el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 y aprobado por la entidad contratante desde el 05 de mayo de 2022.

Se encuentra en tramite el documento de prorroga y adición del contrato de obra radicados desde el mes de mayo, al cual se le ha venido realizando seguimiento en comités y no se tiene una fecha verídica de suscripción del documento.

- Documento CCERU-22-704 SOLICITUD ANTICIPO ADICION 1 Y MODIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL ALCANCE DE LA ADMINISTRACIÓN (AIU) – 26 de mayo de 2023.
- Documento CCERU-22-740 ESTADO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) – 9 de julio de 2023.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.

ASEGURADORA	No. POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS	CBC-100035966	Cumplimiento del contrato	23/05/2022	23/04/2024	$8.664.427.536
		Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/05/2022	23/10/2026	$4.332.213.768
		Estabilidad y Calidad de la Obra	23/10/2023	23/10/2028	$10.830.534.420
		Buen manejo del Anticipo	23/05/2022	23/04/2024	$8.664.427.536
MUNDIAL DE SEGUROS	CBC-100005343	Responsabilidad Civil extracontractual	05/05/2022	23/10/2023	$2.166.106.884

Tabla 4. Pólizas del contrato

REQUERIMIENTOS LEGALES, PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO

Al requerimiento e Informe de Presunto Incumplimiento No. 4 remitido a la Entidad Contratante mediante radicado E2020008695 del 14 de diciembre de 2022 que adjunta el informe actualizado de acuerdo a las condiciones actuales en las que se encuentra el contrato de obra No. 133 de 2022, se le ha dado trámite de subsanación mediante el documento CCERU-22-382 de fecha 23 de diciembre de 2023 RESPUESTA A TRASLADO DE

INFORME DE INTERVENTORIA No. 1 VERSION No. 4 POR PRESUNTO INCUMPLIMENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 13 DE 2022 – PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO emitido por el contratista CONSOROCIO COLEGIO ERU 2022 argumentando y sustentando el incumpliendo del Plan de contingencia, exponiendo circunstancias de tiempo, modo y lugar de la Programación inicial y atrasos de obra del contrato No. 133 de 2022, radicado ante la ERU bajo consecutivo No. E2022008695.

La entidad contratante decidido mediante comunicado S2023003620 de fecha 04 de agosto de 2023 acta de declaratoria de incumplimiento y la respuesta al recurso de reconsideración, nuevamente y de manera reiterativa presentamos nuestra objeción frente a la decisión de la Entidad, soportada está en una evaluación presentada por la interventoría en la cual no es procedente la tasación de días y cuantificación de atrasos en cuestión, ante lo anterior reiteramos nuevamente nuestro análisis mediante comunicado CCERU-22-917 del presunto atraso en los cuales habría incurrido el Consorcio, los cuales por demás nuevamente manifestamos no son imputables al Consorcio Colegio ERU 2022.

MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo de inicio de actividades y fecha de acta de inicio no se presentaron modificaciones legales al contrato.

Se encuentra en trámite la solicitud de prorroga y adición al contrato

ACTIVIDAD DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Se firma acta de inicio con fecha del 23 de mayo de 2022, iniciando con actividades y productos a desarrollar de documentos iniciales del anexo técnico.

Se encuentra en trámite el documento de prorroga y adición del contrato de obra radicados desde el mes de mayo, al cual se le ha venido realizando seguimiento en comités y no se tiene una fecha verídica de suscripción del documento.

- Documento CCERU-22-704 SOLICITUD ANTICIPO ADICION 1 Y MODIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL ALCANCE DE LA ADMINISTRACIÓN (AIU) – 26 de mayo de 2023.
- Documento CCERU-22-740 ESTADO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) – 9 de julio de 2023.

-

OBLIGACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ACTIVIDAD	ESTADO
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA	
Alistamiento y logística	Culminado
Levantamiento Topográfico	A la fecha se ha realizado informes de asentamientos de topografía
Actas de vecindad	Culminado
Gestionar permisos	N/A
Hojas de vida	Culminado

Programación de obra	Culminado
Presupuesto	Culminado
Flujo de inversión contrato	Culminado
Flujo de inversión del anticipo	Culminado
Presentación del AIU	Culminado
Programas y planes complementarios	Culminado
Plan y aseguramiento de la calidad	Culminado
Cronograma de los trabajos	Culminado
Gestión Social	Culminado
Gestión Ambiental	Culminado
Acometidas provisionales	**Provisional hidráulica:** En funcionamiento de manera independiente al colegio. **Provisional eléctrica:** En funcionamiento, se instaló medidor en el colegio, realizando el pago de forma proporcional al consumo de obra.
Campamento de obra	Culminado

Tabla 5. Actividades administrativas

INFORMACION FINANCIERA

El día 24 de agosto del 2023 se radica el último informe de fiducia a interventoría. Se adjunta informe financiero (Ver anexo 4).

ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

Como es de conocimiento general de las partes el proyecto se dividió en dos etapas, toda vez que el lote se encuentra actualmente en uso, razón por la que se planteó la intervención de un área que contempla los módulos A, B, C, D, E, G, H, N, M, L y bloque I.

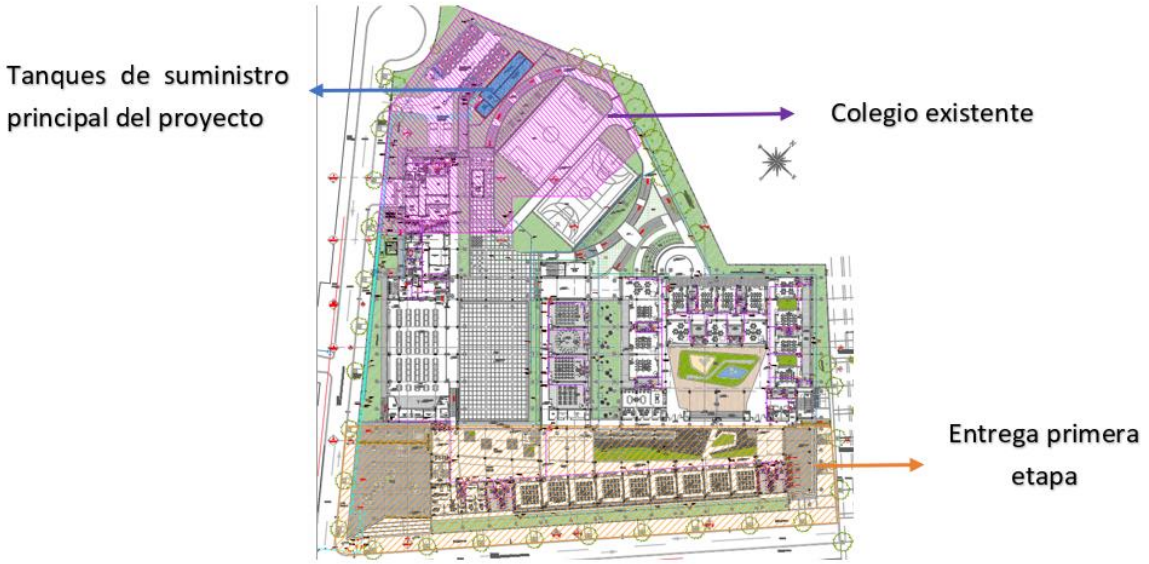


Ilustración 2. Diagrama de áreas no entregadas al consorcio para la ejecución del proyecto

A la fecha del 31 de agosto de 2023, aun el colegio tiene en custodia más del 30% del predio del lote, lo que impide desarrollar unos frentes de trabajo en simultaneo, como lo son el bloque J, Q, K zonas recreativas, tanques de agua y planta de emergencia entre otras, actividades que ya deberían estar en un 90%, lo anterior ha sido causal de un gran número de actividades no previstas y mayores cantidades de obra, como por ejemplo:

NP- 28.26	lavado para protección de mamposteria a la vista	m2	18472,46
NP- 28.27	Construccion de losa a la vista para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI, en situ - (Dimensiones de acuerdo a localización) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural.	m2	408,291
NP- 28.28	Suministro e instalacion e tuberia EMT 1.1/2¨ para acometida	ml	10
NP- 28.29	Suministro e instalacion de breaker industrial 3x150A incluye barraje	und	2
NP- 28.30	Suministro e instalacion de perfil 100 x 3 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural	ml	1789,29
NP- 28.31	Boca puerta en granito ancho hasta 10 cm incluye destroncado y pulida	ml	340,97
NP- 28.32	Junta perimetral de dilatación en piso continuo de concreto.	ml	4370,83
NP- 28.33	Suministro e instalación de dilatación plástica en color blanco para baldosa en granito.	ml	2741,51

NP- 28.34	Suministro e instalación de punto de 6" para salida de tragantes de 8 x 6¨	un	74
NP- 28.35	Construcción de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI con microfibra color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos, INCLUYE MOLDE	m2	1422
NP- 28.36	Suministro e instalación tanque horizontal de 10000 LTS	un	2
NP- 28.37	CONEXIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE, CON CHEQUE HIDRO4¨, CHEQUE HIDRO2¨, VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE 4¨, REGISTRO CORTINA DE 4¨, UNION FLEXIBLE BORRACHA 4¨, UNIVERSAL DE 2¨, COPA CONCENTRICA DE 4¨X2¨, COPA EXCENTRICA DE 4¨X2¨, SOPORTE TIPO PERA 4¨, CON TUBERIA DE PVC-P SCH -80 DE 4¨ Y DE 2¨.	un	1
NP- 28.38	Suministro e instalacion de cheque cortina nItrilo cuerpo en bronce roscado de 1 1/2¨con union universal 1 1/2¨ roscada	un	2
NP- 28.39	Lavado y desinfeccion de tanque 10000 Lt	un	2
NP- 28.40	Suministro e instalacion de equipos de presion diferencial	un	1
NP- 28.41	Suministro e instalacion de cubierta traslucida en poliester reforzado con fibra de vidrio trapezoidal, incluye accesoios de instalacion (fijacion y sellos)	m2	1361,6
NP- 28.42	Suministro e instalacion tuberia conduit PVC 3¨sobre cama de arena de peña, no incluye excavacion	ml	105
NP- 28.43	Suministro e instalacion de acometida 2(3X1/0F) + 2X1X1/0N + 2T, en alumino	ml	105
NP- 28.44	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F + 1X6N, EN ALUMINIO	ml	299
NP- 28.45	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x2f + 1x4n + 6t, EN ALUMINIO	ml	129
NP- 28.46	Suministro e instalacion de tuberia PVC 1.1/2¨ para acometida	ml	15
NP- 28.47	Suministro e instalacionpiso en baldosa en granito 33 x 33 cm, inlcuye destronque oulida y brillada	ml	
NP- 28.48	cerrojo al exterior con seguro al interior en mariposa yale o similar	und	239
NP- 28.49	suministro e instalacion de bandeja en lamina galvanizada para fachada flotante	m2	1471,06
NP- 28.50	Suministro e instalacion de borde contenedor de raiz A-70 (12X13.5)	ml	316,8

NP- 28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	m	1633,48
NP- 28.52	Suministro e instalacion de caneca barcelona grande tipo m-121, (incluye placa base en concreto y ele,entos de fijacion)	und	26
NP- 28.53	sumi nistro e instalacion de baranda	ml	196,81
NP- 28.54	suministro e instalacion de pasamanos	ml	1270,88

Por lo anterior se incurre en costos adicionales necesarios para el funcionamiento del colegio, que si se hubiese entregado el colegio completo estos costos asociados no serían necesarios.

Se acordó entre las partes realizar la entrega de los bloques A al E con el fin de que el colegio se pudiera trasladar, Sin embargo, al presentarse actividades no previstas, mayores y menores cantidades de obra el Consorcio Colegio ERU 2022 presentó balance de obra teniendo en cuenta que al evidenciarse actividades no previstas y mayores cantidades de obra es requerido un mayor tiempo de ejecución por lo cual adelantamos solicitud de adición y prorroga el cual se consolido en el balance tramitado radicado y aprobado por la interventoría, a la espera de respuesta oficial por parte de la entidad contratante.

Avance de cada una de las actividades programadas.

Las actividades adelantadas con corte al 31 de agosto del 2023, versus el balance ajustado a ceros, toda vez que aún no se ha definido la adición de recursos conforme con el balance presentado.

No	Ubicación de la actividad	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 65.112.733	68,05%
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	$ 1.237.434	28,15%
1.2.2	Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	$ 884.700	26,32%
1.2.3	Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	$ 536.360	35,71%
1.2.4	Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	$ 455.624	12,15%
1.2.7	Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	$ 2.982.250	42,74%
1.2.8	Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	$ 1.569.615	75,29%
1.2.9	Demolición de estructura de cimentación existente	$ 5.561.158	89,39%
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	$ 59.703.112	61,85%
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	$ 338.007.030	64,48%

1.3.3	Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	$ 35.201.716	97,48%
1.3.4	Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	$ 691.549.281	75,34%
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	$ 72.504.240	83,38%
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	$ 240.704.587	94,94%
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 643.654.093	69,08%
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 27.476.432	22,41%
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	$ 732.059.721	65,28%
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	$ 82.121.833	98,28%
2.2.1	Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 44.535.947	100,00%
2.2.3	Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	$ 84.976.724	98,78%
2.2.5	Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 25.865.740	100,00%
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	$ 1.547.441.628	78,59%
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	$ 307.386.119	95,37%
3.1.1	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	$ 10.298.417	100,00%
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	$ 8.559.892	52,75%
3.1.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	$ 2.081.097	16,26%
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	$ 3.086.016	54,42%
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	$ 2.832.571	30,49%
3.1.7	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	$ 1.286.872	53,45%
3.1.8	Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	$ 5.801.953	34,57%
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	$ 610.296.362	64,62%
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 1.304.440.831	83,58%
4.1.3	Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	$ 69.799.596	73,74%
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	$ 1.338.939.917	81,67%
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	$ 1.011.579.243	91,47%
4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	$ 213.357.806	98,70%

4.3.2	Construccion de Poyo para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI	$ 6.059.200	82,60%
4.3.4	Construccion de Alfajía ventanas aulas primer piso en concreto reforzado de 3000 PSI	$ 3.510.319	25,88%
4.3.5	Construccion de Alfajía ventanas aulas segundo y tercer piso en concreto reforzado de 3000 PSI	$ 11.590.721	54,80%
4.3.6	Construccion de Alfajía borde de placa segundo piso en concreto reforzado de 3000 PSI	$ 1.930.728	6,92%
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	$ 2.467.420.528	83,70%
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	$ 717.970.242	39,89%
5.1.2	Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	$ 37.407.653	100,00%
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	$ 489.040.464	86,46%
6.1.3.3	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	$ 1.099.629	52,39%
6.1.4.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 3.774.756	34,04%
6.1.5.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	$ 1.764.839	68,36%
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	$ 7.945.951	46,14%
6.1.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	$ 3.918.776	89,62%
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	$ 3.259.380	65,96%
6.1.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	$ 1.295.619	60,24%
6.1.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	$ 1.586.055	62,27%
6.1.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)	$ 1.969.754	69,31%
6.1.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	$ 1.415.928	81,04%
6.1.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	$ 2.371.277	83,25%
6.1.5.10	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 4"	$ 1.117.857	100,00%
6.1.5.11	Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 3"	$ 4.263.364	100,00%
6.1.6.1	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	$ 682.899	65,63%
6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.485.876	71,01%

6.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	$ 227.043	15,00%
6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	$ 946.390	30,40%
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	$ 439.929	20,39%
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	$ 804.454	22,56%
6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	$ 572.818	28,70%
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	$ 623.016	20,86%
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.011.010	6,75%
6.1.7.3	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2"	$ 9.022.536	90,00%
6.1.7.4	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/2"	$ 4.076.628	66,67%
6.1.7.5	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/4"	$ 1.898.806	38,89%
6.1.7.6	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1"	$ 810.472	22,22%
6.1.7.7	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3/4"	$ 3.980.450	58,14%
6.1.7.8	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1/2"	$ 1.608.720	23,08%
6.1.8.1	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavaojos	$ 11.109.336	90,32%
6.1.8.2	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría hidráulico 3/4" para orinales	$ 2.052.960	93,33%
6.1.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	$ 14.462.712	68,35%
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	$ 18.385.878	77,97%
6.2.1.2	Suministro e instalación de punto sanitario 3" para sifones de piso y duchas lavaojos	$ 163.379	50,00%
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	$ 18.456.942	75,35%
6.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	$ 20.246.423	85,29%
6.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	$ 1.620.900	37,22%
6.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	$ 3.155.159	71,22%
6.2.2.4	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	$ 498.858	100,00%
6.2.2.5	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 3" para bajantes	$ 231.744	75,00%

6.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	$ 4.011.621	19,91%
6.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	$ 2.586.277	16,71%
6.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	$ 279.987	3,87%
6.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	$ 1.617.103	51,75%
6.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	$ 2.113.600	18,45%
6.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	$ 8.889.282	100,00%
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	$ 8.069.397	58,33%
6.2.2.13	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	$ 5.144.932	100,00%
6.2.3.1	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	$ 2.376.202	22,60%
6.2.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	$ 2.563.268	64,97%
6.2.3.3	Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	$ 2.842.210	56,16%
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	$ 4.518.144	48,66%
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	$ 53.818.249	91,29%
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	$ 12.456.561	23,37%
6.2.4.8	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	$ 36.146.650	61,56%
6.2.4.9	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	$ 12.044.656	87,01%
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	$ 14.853.114	40,78%
6.2.4.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	$ 3.370.270	100,00%
6.2.4.12	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	$ 598.050	4,59%
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	$ 881.229	16,83%
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material;	$ 10.374.939	39,13%

	paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado		
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	$ 15.434.796	66,67%
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	$ 4.091.800	54,64%
6.2.5.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.170.684	16,59%
6.2.5.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	$ 394.212	15,85%
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.394.680	43,08%
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	$ 460.878	14,38%
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 10.458.748	21,44%
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 62.576.184	27,55%
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	$ 12.805.342	20,99%
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	$ 45.882.745	43,11%
7.1.2.2	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 19.767.693	78,57%
7.1.2.3	Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 6.607.944	80,00%
7.1.2.4	Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	$ 9.341.424	30,77%
7.1.2.5	Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	$ 2.382.355	33,33%
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	$ 653.872	9,47%
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	$ 2.052.568	25,44%
7.1.3.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	$ 731.414	42,19%
7.1.4.1	Suministro e instalación de toma siamesa en bronce 4" x 2.1/2" x 2.1/2" para cuerpo de bomberos, incluye válvula cheque ranurada de 4"	$ 1.519.187	100,00%

7.1.5.1	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	$ 12.759.171	45,37%
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	$ 37.718.842	49,87%
7.1.5.3	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	$ 4.963.909	24,16%
7.1.5.4	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	$ 15.273.511	61,06%
7.1.5.5	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	$ 9.635.011	76,58%
7.1.5.6	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	$ 43.565.323	41,85%
7.1.5.7	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	$ 4.344.000	32,26%
7.1.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	$ 5.065.710	100,00%
7.1.5.9	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	$ 346.020	66,67%
7.1.5.10	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"	$ 1.434.801	23,08%
7.1.5.11	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	$ 22.858.404	50,25%
7.1.5.12	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	$ 5.653.776	81,36%
7.1.5.13	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"	$ 4.950.454	29,50%
7.1.5.14	Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	$ 1.078.905	26,32%
7.1.5.15	Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	$ 6.489.144	57,14%
7.1.6.1	Suministro e instalación de válvula de angulo 1.1/4" para drenaje	$ 357.246	11,11%
7.1.6.2	Suministro e instalación de válvula de mariposa 2.1/2" listada UL	$ 1.589.241	33,33%
7.1.6.3	Suministro e instalación de cheque ranurado listado 2.1/2" listado UL	$ 1.003.374	33,33%
7.1.6.4	Suministro e instalación de Sensor de flujo 2.1/2" listado UL	$ 1.781.478	33,33%
7.1.6.5	Suministro e instalación de Manómetro + válvula 1/4"	$ 403.022	11,11%
7.1.7.1	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura ordinaria (K=5.6 y rango de temperatura 55-77 °C) para instalar en cielo raso	$ 27.404.624	32,20%
7.1.7.2	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura intermedia (K=5.6 y rango de temperatura 79-107°C) para instalar en cubierta traslucida	$ 23.617.688	54,02%
7.1.8.1	Suministro e instalación de soporte sísmico transversal 2.1/2" para red de rociadores	$ 2.781.116	43,33%
7.1.8.2	Suministro e instalación de soporte sísmico longitudinal 2.1/2" para red de rociadores	$ 1.761.480	46,67%
7.1.9.1	Suministro e instalación de salida de manguera de 2.1/2" con buje de 2.1/2" x 1.1/2"	$ 5.167.472	36,36%
7.1.10.1	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	$ 520.304	27,12%

7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	$ 6.735.609	58,30%
7.1.10.3	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.270.155	29,48%
7.1.10.4	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.822.563	36,71%
7.1.10.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	$ 1.326.262	51,26%
7.1.10.6	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	$ 9.756.384	51,46%
8.1.3.6	Suministro e instalación de alimentador tableros T6 y T8 en 3 # 1/0 fases + 1 # 1/0 neutro + 1 # 6 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø2" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 3.554.406	9,00%
8.1.3.10	Suministro e instalación de alimentador tableros T1, T3 y T7 en 3 # 6 fases + 1 # 6 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/4" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 13.700.483	74,23%
8.1.3.11	Suministro e instalación de alimentador de circuitos de iluminación en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" emt sobrepuesto en losa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	$ 13.265.693	81,92%
8.1.3.13	Suministro e instalación de alimentador de circuitos de tomacorrientes en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø1/2" PVC embebido en placa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	$ 713.440	6,53%
8.1.3.17	Suministro e instalación de paso para dilatación estructural con caja de paso metálica pintada, con puerta y chapa, 0,6x0,6x0,3m y coraza metálica flexible 2", incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 1.105.440	60,00%
8.1.3.20	Suministro e instalación tablero trifásico 30 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 63.879	5,00%
8.1.3.22	Suministro e instalación tablero trifásico 18 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 625.863	50,00%
8.1.3.23	Suministro e instalación tablero trifilar 12 circuitos, con puerta , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 529.367	25,00%
8.1.3.38	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación,	$ 14.883	33,33%

	elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.		
8.1.3.44	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	$ 14.883	0,59%
8.1.4.1	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml	$ 69.088.440	23,64%
8.1.4.3	Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4", descolgada en estructuras de cubierta, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4" RADWELL Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 12ml	$ 3.651.264	34,29%
8.1.4.5	Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	$ 5.621.175	41,18%
8.1.4.7	Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	$ 4.971.625	47,17%
8.1.4.11	Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	$ 5.925.300	34,29%
8.1.5.1	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	$ 19.776.924	71,30%
8.1.5.3	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion,	$ 9.406.098	82,11%

	incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml		
8.1.5.5	Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	$ 1.403.487	39,13%
8.1.5.11	Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	$ 2.263.065	81,67%
8.1.7.6	Suministro e instalación de anillo inferior en cable de cobre desnudo cal. # 1/0 awg, enterrado directamente a 0,5m de profundidad.(incluye colillas entre anillo y bajantes)	$ 1.331.080	8,00%
8.2.1.13	Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 2xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	$ 4.813.478	12,33%
8.2.1.14	Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 1xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	$ 2.217.804	58,00%
8.2.1.27	Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo rejilla, uso interior, zincada, 400x50mms, con todos los accesorios de soporte tipo columpio en riel, uniones, derivaciones de tuberias, y puesta a tierra en cable de cobre desnudo #8AWG con conectores.	$ 59.110.618	50,68%
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	$ 46.560.430	39,43%
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	$ 366.433.909	80,98%
12.1.10	Construcción de Piso concreto (rayado o escobeado) en concreto de 3000 PSI e=0.10M	$ 9.023.511	70,01%
12.1.13	Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M	$ 154.423.276	74,02%
12.2.1	Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	$ 55.496.876	48,31%
13.1.1	Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)	$ 294.647.220	30,18%

13.3.1	Afinado, pendientado e impermeabilizado de cubiertas planas en mortero 1:4 e=5 cm (incluye media caña)	$ 82.593.509	48,75%
14.1.6	Suministro e instalacion Sanitario institucional para discapacitados taza adriatica entrada posterior corona	$ 1.390.454	15,38%
14.1.7	Suministro e instalacion Sanitario Tipo Montecarlo advance Institucional de corona	$ 7.647.497	14,67%
14.1.9	Suministro e instalacion Ducha antivandálica para personas discapacitadas empotrada en pared cabezal en A.B.S. tipo Haws.	$ 615.850	10,00%
15.1.1	Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall	$ 58.707.594	62,72%
15.1.2	Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	$ 129.210.595	82,73%
15.2.2	Suministro e instalacion Muros cara sencilla en drywall 10 mm	$ 7.216.289	8,82%
15.2.4	Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)	$ 3.580.057	29,79%
16.1.1	Suministro y colocación de Estuco y pintura en vinilo tipo 1 (Incluye Filos y Dilataciones)	$ 9.478.575	13,76%
16.1.2	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Antibacterial a Base de Agua de Alta Resistencia	$ 9.715.229	10,75%
16.1.4	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	$ 9.743.803	47,79%
16.1.5	Lavado e impermeabilización con hidrófugo para protección de mamposteria a la vista	$ 8.464.827	24,14%
18.1.3	Puerta ventana PYV03 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	$ 5.339.103	3,28%
18.1.4	Puerta ventana PYV04 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	$ 103.657.937	30,44%
18.1.5	Puerta ventana PYV05 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	$ 18.584.926	54,27%
18.1.6	Puerta ventana PYV06 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	$ 222.242.220	29,15%

18.1.7	Puerta ventana PYV07 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	$ 1.289.319	13,07%
18.1.9	Ventana PYV09 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01,02,02P, V04P).	$ 231.494	3,48%
18.1.10	Ventana PYV10 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-02,04P,V04).	$ 371.188	16,46%
18.1.11	Ventana PYV11 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 02).	$ 15.747.323	65,19%
18.1.12	Ventana PYV12 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 03T, DP02).	$ 654.643	2,99%
18.1.14	Ventana PYV14 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-03A).	$ 762.333	66,32%
18.1.18	Puerta metálica PYV18 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver cartilla de colores).	$ 14.060.050	20,42%
18.1.22	Puerta metálica PYV22 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (Ver cartilla de colores)	$ 10.543.587	91,02%
18.1.23	Puerta metálica PYV23 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color (ver catilla de color), hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color (ver catilla de color), cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (ver catilla de color)	$ 41.425.550	81,85%

18.2.1	Suministro e instalación de división de baño, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)	$ 101.833.643	73,59%
18.2.3	Suministro e instalación puerta de baño, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)	$ 71.932.080	61,68%
21.1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	$ 1.427.039	7,64%
21.1.4	Suministro y colocacion Sub base granular b -400	$ 2.047.635	0,1
21.1.5	Suministro e instalacion de Geotextil tejido pavco ref. 2400	$ 14.955.641	83,92%
21.1.11	Suminstro e instalacion de Bordillo fundido en sitúo ó prefabricado 0.20x0.50xl (incluye refuerzo)	$ 17.361.917	81,86%
21.1.15	Suministro e instalacion Loseta tactil alerta 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	$ 181.492	31,22%
21.1.16	Suministro e instalacion Loseta tactil guia 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	$ 648.863	56,00%
21.1.17	Suministro e instalacion Loseta cuadratica 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	$ 45.673.568	67,03%
24.1.1	Construccion de meson en concreto Acabado en granito pulido fundido en sitio con formaleta metálica, con salpicadero y cortagotera. Pendiente 1%. Ver detalles de Elementos no Estructurales.	$ 6.190.251	71,78%
26,1	Aseo Permanente en Obra	$ 40.965.120	88,19%
26,2	Aseo Final	$ 838.350	2,30%
26,3	Retiro de Escombros y Sobrantes	$ 68.073.172	78,61%
28.1	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	$ 22.868.753	80,95%
28.2	Tratamiento de fallos	$ 293.401.965	85,32%
28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	$ 123.320.673	86,81%
28.4	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	$ 47.680.910	78,22%
28,5	Construcción de Placa aligerada en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) a la vista con casetón en icopor h= 0.49m y bocel,	$ 529.678.985	87,47%
28,6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	$ 178.241.047	73,07%
28.11	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación)	$ 14.828.780	16,97%
28.12	Guardaescobas baldosa vibroprensada biselado grano de marmol. Dim.: h= 10 x L= 30 cm Ref: Perlato claro grano 3 fondo crema.	$ 9.714.440	
28.14	Media caña en granito - 10*10*100 CM remate de piso con mediacaña en granito, referencia similar al piso blanco huila.	$ 28.002.578	52,20%
28.15	Suminstro y colocacion de Concreto bombeable para columnas de Rampa 3,000 PSI (28 Mpa)	$ 7.915.667	100,00%
28.16	Desmonte, desarme parque infantil grande y empaque en plastico- vinipel	$ 3.570.000	100,00%

28.17	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	$ 178.548.836	77,61%
28.18	Procedimiento de rescatar una colmena de abejas establecidas, incluye aplicación de productos que eliminen las feromonas logrando asi que no regresen las abejas	$ 300.000	100,00%
28.20	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	$ 68.420.661	74,66%
28.21	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.	$ 46.074.132	61,52%
28.22	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO III INCLUYE (VALVULA ANGULARES 1-1/2¨, VALVULA ANGULAR 2-1/2¨, TAPA CADENA 2-1/2¨, MANGUERA CHTA SENCILLA 150 PSI X 100 FT 1-1/2, BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO 1-1/2¨, HACHA PICO 4.5 IB, LLAVE SPANNER, EXTINTOR POLVO SECO ABC 10 LBS	$ 33.683.579	54,84%
28.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS (INCLUYE BRIDA SANITARIA)	$ 45.602.516	78,49%
28.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA ORINAL PUSH ENTRADA SUPERIOR EMPOTRADA	$ 14.992.608	88,89%
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	$ 316.463.003	96,00%
NP- 28.30	Suministro e instalación de perfil 100 X 100 X 30 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural	$ 140.787.418	80,30%

Tabla 7. Avance de cantidades ejecutadas


BALANCE PRESUPUESTAL QUE MUESTRE LO EJECUTADO, LO PROYECTADO PARA TERMINAR LAS OBRAS Y EL TOTAL, CONFORME NO EXCEDE DEL VALOR TOTAL CONTRACTUAL.

Se hizo entrega en el mes de abril el balance de obra, en el cual se determinan unas mayores y menores cantidades de obra, además de la presentación de las actividades no previstas en el presupuesto de obra, dando como resultado un mayor valor correspondiente a: nueve mil trecientos setenta y dos millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos M/CTE., $ 9.372.533.448, valor que motiva la necesidad de una adición presupuestal correspondiente a más del 21,63% del valor total del contrato, lo que a su vez requiere una prórroga al desarrollo del contrato para el desarrollo de las actividades no contempladas que corresponden a ítems no previstos y/o mayores cantidades de obra.

- **ANÁLISIS DE LA ADICIÓN 1:** A continuación, se hace un análisis resumido de las incidencias de las mayores cantidades del contrato y las actividades no revistas sobre el valor total del contrato:

ANALISIS ADICION 1		VALORES	INCIDENCIA
VR. CONTRATO	**$**	**43,322,137,680**	**100.00%**
VR. MAYORES	**$**	**5,763,028,450**	**13.30%**
VR. NO PREVISTOS	**$**	**3,609,504,999**	**8.33%**
VR. ADICION 1	$	9,372,533,448	**21.63%**
VR. CONTRATO + AD 1	**$**	**52,694,671,128**	**121.63%**

Ver ANEXO 01.

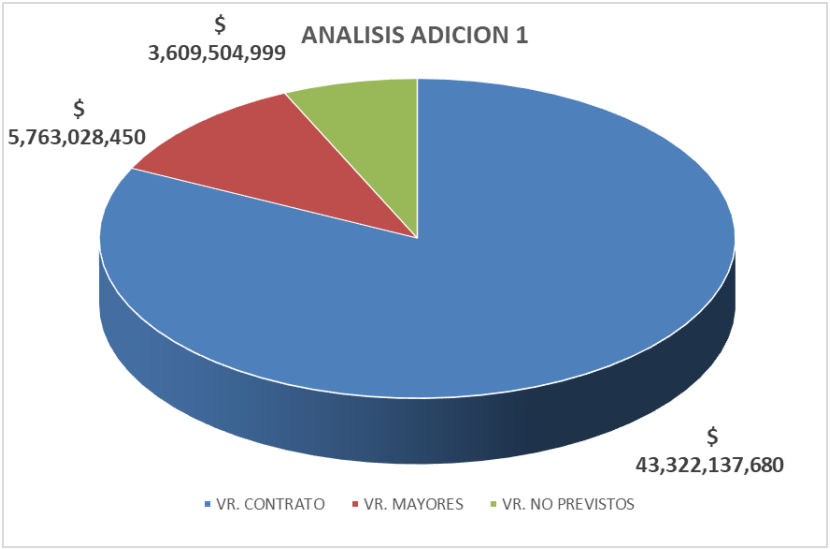

Grafica 1

En la gráfica 1, se puede analizar que el valor de la adición corresponde a dos factores:

- Balance de mayores y menores cantidades de obra a ejecutar con un valor de $ 5.763.028.450 con un porcentaje de incidencia del 13.30.%.

- Actividades no previstas en el presupuesto de obra a ejecutar con un valor de $ 3.609.504.999 con un porcentaje de incidencia del 8.33%.

El 26 de junio de 2023 se reciben observaciones a los APUS no previstos, los cuales son subsanados mediante correo electrónico el 6 de julio de 2023, por disponibilidad de la entidad fue posible la reunión hasta los días 8, 11 y 18 de agosto de 2023, en los cuales se emiten observaciones frente a rendimientos y se hace entrega de los ítems los días 15 y 23 de agosto de 2023 mediante consecutivos CCERU-22-925 y CCERU-22-936 quedando a la espera del acta de aprobación de los precios.

ITEM	NP	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR AVALADO	VALOR TOTAL
NP- 28.26	lavado para protección de mampostería a la vista	m2	18472,46	$ 15.424,00	$ 284.919.223,04
NP- 28.27	Construcción de losa a la vista para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI, en situ - (Dimensiones de acuerdo a localización) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural.	m2	408,291	$ 134.383,00	$ 54.867.369,45

NP- 28.30	Suministro e instalación de perfil 100 x 3 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural	ml	1789,29	$ 208.710,00	$	373.442.715,90
NP- 28.31	Boca puerta en granito ancho hasta 10 cm incluye destroncado y pulida	ml	340,97	$ 81.815,00	$	27.896.460,55
NP- 28.32	Junta perimetral de dilatación en piso continuo de concreto.	ml	4370,83	$ 6.816,00	$	29.791.577,28
NP- 28.33	Suministro e instalación de dilatación plástica en color blanco para baldosa en granito.	ml	2741,51	$ 10.762,00	$	29.504.130,62
NP- 28.34	Suministro e instalación de punto de 6" para salida de tragantes de 8 x 6¨	un	74	$ 276.088,00	$	20.430.512,00
NP- 28.35	Construcción de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI con microfibra color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos, INCLUYE MOLDE	m2	1422	$ 146.814,00	$	208.769.508,00
NP- 28.36	Suministro e instalación tanque horizontal de 10000 LTS	un	2	$ 17.857.444,00	$	35.714.888,00
NP- 28.37	CONEXIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE, CON CHEQUE HIDRO4¨, CHEQUE HIDRO2¨, VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE 4¨, REGISTRO CORTINA DE 4¨, UNION FLEXIBLE BORRACHA 4¨, UNIVERSAL DE 2¨, COPA CONCENTRICA DE 4¨X2¨, COPA EXCENTRICA DE 4¨X2¨, SOPORTE TIPO PERA 4¨, CON TUBERIA DE PVC-P SCH -80 DE 4¨ Y DE 2¨.	un	1	$ 28.691.335,00	$	28.691.335,00
NP- 28.38	Suministro e instalación de cheque cortina nitrilo cuerpo en bronce roscado de 1 1/2¨con unión universal 1 1/2¨ roscada	un	2	$ 893.515,00	$	1.787.030,00
NP- 28.39	Lavado y desinfección de tanque 10000 Lt	un	2	$ 714.000,00	$	1.428.000,00
NP- 28.40	Suministro e instalación de equipos de presión diferencial	un	1	$ 27.988.942,00	$	27.988.942,00
NP- 28.41	Suministro e instalación de cubierta traslucida en poliéster reforzado con fibra de vidrio trapezoidal, incluye accesorios de instalación (fijación y sellos)	m2	1361,6	$ 180.869,00	$	246.271.230,40

NP- 28.45	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x2f + 1x4n + 6t, EN ALUMINIO	ml	129	$ 60.674,00	$	7.826.946,00
NP- 28.48	cerrojo al exterior con seguro al interior en mariposa yale o similar	und	239	$ 151.617,00	$	36.236.463,00
NP- 28.49	suministro e instalación de bandeja en lámina galvanizada para fachada flotante	m2	1471,06	$ 252.000,00	$	370.707.120,00
NP- 28.50	Suministro e instalación de borde contenedor de raiz A-70 (12X13.5)	ml	316,8	$ 36.228,00	$	11.477.030,40
NP- 28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	m	1633,48	$ 72.755,00	$	118.843.837,40
NP- 28.53	suministro e instalación de baranda	ml	196,81	$ 540.000,00	$	106.277.400,00
NP- 28.54	suministro e instalación de pasamanos	ml	1270,88	$ 249.400,00	$	316.957.472,00
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 2.339.829.191,04**		
	AIU - 22,98%			**$ 537.692.748,10**		
	COSTO TOTAL			**$ 2.877.521.939,14**		
	INCIDENCIA CON EL CONTRATO ACTUAL			**6,64%**		

Tabla 8. Ítems No previstos en espera de suscripción de acta de aprobación

ITEM	NP	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR AVALADO	VALOR TOTAL
NP- 28.28	Suministro e instalación e tubería EMT 1.1/2¨ para acometida	ml	10	$ 37.072,00	$ 370.720,00
NP- 28.29	Suministro e instalación de breaker industrial 3x150A incluye barraje	und	2	$ 806.605,00	$ 1.613.210,00
NP- 28.42	Suministro e instalación tubería conduit PVC 3¨sobre cama de arena de peña, no incluye excavación	ml	105	$ 41.272,00	$ 4.333.560,00
NP- 28.43	Suministro e instalación de acometida 2(3X1/0F) + 2X1X1/0N + 2T, en aluminio	ml	105	$ 115.213,00	$ 12.097.365,00
NP- 28.44	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F + 1X6N, EN ALUMINIO	ml	299	$ 47.882,00	$ 14.316.718,00
NP- 28.46	Suministro e instalación de tubería PVC 1.1/2¨ para acometida	ml	15	$ 24.647,00	$ 369.705,00
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 33.101.278,00**	

	AIU - 22,98%	**$ 7.606.673,68**
	COSTO TOTAL	**$ 40.707.951,68**
	INCIDENCIA CON EL CONTRATO ACTUAL	**0,09%**

Ítems No previstos en espera de suscripción de acta de aprobación

					BALANCE		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL
1		PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO						
1.1.1		Localización y Replanteo de Obras generales.	M2	$ 6.174,00	15.498,63	95.688.541,62	10.546,28	$ 65.112.732,72
1,2		DEMOLICIONES Y DESMONTES						
1.2.1		Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	M3	$ 24.562,00	179,00	4.396.598,00	50,38	$ 1.237.433,56
1.2.2		Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	UND	$ 44.235,00	76,00	3.361.860,00	20,00	$ 884.700,00
1.2.3		Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	UND	$ 53.636,00	28,00	1.501.808,00	10,00	$ 536.360,00
1.2.4		Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	UND	$ 35.048,00	107,00	3.750.136,00	13,00	$ 455.624,00
1.2.5		Desmonte Tanques elevados (Incluye cargue y retiro)	UND	$ 126.961,00				$ -
1.2.6		Desmonte Bomba suministro de agua (Incluye dispocision)	UND	$ 138.242,00				$ -
1.2.7		Desmonte estructura metalica (Incluye dispocision)	KG	$ 1.975,00	3.533,00	6.977.675,00	1.510,00	$ 2.982.250,00
1.2.8		Desmonte cubierta (Incluye dispocision)	M2	$ 6.725,00	310,00	2.084.750,00	233,40	$ 1.569.615,00
1.2.9		Demolición de estructura de cimentación existente	M3	$ 61.599,00	101,00	6.221.499,00	90,28	$ 5.561.157,72
1,3		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.3.1		Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	M3	$ 36.101,00	2.673,95	96.532.268,95	1.653,78	$ 59.703.111,78
1.3.2		Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	M3	$ 38.095,00	$ 13.759,93	524.184.717,20	8.872,74	$ 338.007.030,30
1.3.3		Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	M3	$ 144.441,00	$ 250	36.110.250,00	243,71	$ 35.201.716,11
1.3.4		Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	M3	$ 164.696,00	$ 5.574	917.953.985,42	4.198,94	$ 691.549.281,02
2		CIMENTACION - RAMPA - ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO CIMENTACION						
2,1		CIMENTACION						

2.1.1		Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	M3	$ 381.943,00	227,66	86.953.142,62	189,83	$ 72.504.239,69
2.1.2		Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	M3	$ 497.114,00	510,00	253.528.140,00	474,69	$ 235.976.834,27
2.1.3		Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 710.584,00	1.311,30	931.788.799,20	837,07	$ 594.808.548,88
2.1.4		Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 706.335,00	173,62	122.633.882,70	38,90	$ 27.476.431,50
2.1.5		Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	M3	$ 706.335,00	1.587,75	1.121.483.031,68	1.036,42	$ 732.059.720,70
2.1.6		Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	M2	$ 8.535,00	9.789,97	83.557.393,95	9.621,77	$ 82.121.832,56
2,2		**RAMPA**						
2.2.1		Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 698.932,00	63,72	44.535.947,04	63,72	$ 44.535.947,04
2.2.2		Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 696.777,00				$ -
2.2.3		Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	M3	$ 702.926,00	122,38	86.024.083,88	120,89	$ 84.976.724,14
2.2.4		Suminstro y colocacion de Concreto para columnas de Rampa 4,000 PSI (28 Mpa)	M3	$ 775.268,00				$ -
2.2.5		Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 785.238,00	32,94	25.865.739,72	32,94	$ 25.865.739,72
2,3		**ACERO DE REFUERZO**						
2.3.1		Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	KG	$ 5.306,00	371.072,00	1.968.908.032,00	291.639,96	$ 1.547.441.618,21
2.3.2		Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	KG	$ 7.668,00	42.034,41	322.319.855,88	40.086,87	$ 307.386.119,16
3		**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**						
3,1		**TUBERIA Y ACCESORIOS**						
3.1.1		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	ML	$ 115.479,00	89,18	10.298.417,22	89,18	$ 10.298.417,22
3.1.2		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	ML	$ 34.633,00	468,54	16.226.945,82	247,16	$ 8.559.892,28
3.1.3		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	ML	$ 34.633,00	369,60	12.800.356,80	60,09	$ 2.081.096,97

3.1.4		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	ML	$ 33.094,00	171,34	5.670.325,96	93,25	$ 3.086.015,50
3.1.5		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	ML	$ 33.094,00	129,80	4.295.601,20		$ -
3.1.6		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	ML	$ 20.756,00	447,66	9.291.630,96	136,47	$ 2.832.571,32
3.1.7		Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	ML	$ 20.756,00	116,00	2.407.696,00	62,00	$ 1.286.872,00
3.1.8		Suministro e instalacion de Tubería PVC Novafort 160 mm (Bajo tierra)	ML	$ 48.137,00	348,70	16.785.371,90	120,53	$ 5.801.952,61
3,2		**CAJAS DE INSPECCION**						
3.2.1		Construcción de Cámaras de inspección para aguas residuales 0.80 m x 0.80 m	UND	$ 446.715,00	12,00	5.360.580,00		$ -
3.2.2		Construcción de Cámaras de inspección para aguas residuales D = 1.20 m	ML	$ 591.872,00	4,40	2.604.236,80		$ -
3.2.3		Suministro e instalacion de Tapa/Aro en HD para cámaras de inspección circulares	UND	$ 811.699,00	2,00	1.623.398,00		$ -
3.2.4		Suministro e instalacion o construccion de Base y cañuela para cámaras de inspección circulares	UND	$ 328.306,00	2,00	656.612,00		$ -
3.2.5		Suministro e instalcion filtro frances tuberia 4" perforando con grava 1/2"	ML	$ 133.852,00	64,00	8.566.528,00		$ -
4		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO - ESTRUCTURAS METALICAS - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**						
4,1		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						
4.1.1		Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	M3	$ 827.341,00	1.141,53	944.434.571,73	691,78	$ 572.337.956,98
4.1.2		Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 809.695,00	1.927,52	1.560.703.805,00	1.611,03	$ 1.304.440.830,64
4.1.3		Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 802.202,00	117,99	94.651.813,98	87,01	$ 69.799.596,02
4.1.4		Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	M3	$ 744.252,00				$ -
4.1.5		Suministro y colocacion de Concreto tanques 4,000 PSI (28 Mpa)	M3	$ 826.907,00	82,11	67.897.333,77		$ -
4,2		**ACERO DE REFUERZO**						
4.2.1		Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	KG	$ 5.306,00	308.995,19	1.639.528.478,14	252.344,50	$ 1.338.939.917,00
4.2.2		Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	KG	$ 5.306,00	208.422,93	1.105.892.066,58	190.648,18	$ 1.011.579.243,08
4.2.3		Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	KG	$ 7.668,00	28.190,78	216.166.901,04	27.824,44	$ 213.357.805,92
4.2.4		Suministro e instalacion de Acero refuerzo fy= 550 Mpa para tanques	KG	$ 5.306,00	21.386,30	113.475.707,80		$ -
4,3		**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**						

4.3.1		Construccion de Poyo arranque ventaneria fachada en baños en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 751.161,00	0,31	232.859,91		$ -
4.3.2		Construccion de Poyo para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 560.000,00	13,10	7.336.000,00	10,82	$ 6.059.200,00
4.3.3		Construccion de Poyo muebles en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 581.889,00	17,09	9.944.483,01		$ -
4.3.4		Construccion de Alfajía ventanas aulas primer piso en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 627.964,00	21,60	13.564.022,40	5,59	$ 3.510.318,76
4.3.5		Construccion de Alfajía ventanas aulas segundo y tercer piso en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 635.108,00	33,30	21.149.096,40	18,25	$ 11.590.721,00
4.3.6		Construccion de Alfajía borde de placa segundo piso en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 635.108,00	43,95	27.912.996,60	3,04	$ 1.930.728,32
4.3.7		Construccion de Dintel vanos muros en ladrillo a la vista en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 979.622,00	24,99	24.480.753,78		$ -
4.3.8		Construccion de Dintel puertas y vanos de servicios, vanos de atención cocina en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 927.977,00	1,81	1.679.638,37		$ -
4.3.9		Construccion de Borde arranque antepecho cubierta en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 870.647,00	3,15	2.742.538,05		$ -
4.3.10		Construccion de Soporte baranda en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 620.170,00	41,44	25.699.844,80		$ -
4.3.11		Construccion de Bordillo arranque muros escalera en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 677.168,00	2,17	1.469.454,56		$ -
4.3.12		Construccion de Placa de concreto banca ludoteca en concreto reforzado de 3000 PSI	M3	$ 572.264,00	1,25	715.330,00		$ -
4.3.13		Construccion de Lucernarios en concreto reforzado de 3000 PSI	UND	$ 1.697.771,00	12,00	20.373.252,00		$ -
4,4		**ESTRUCTURA METALICA - JUNTA DE CONSTRUCCION**						
4.4.1		Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	KG	$ 22.928,00	128.566,46	2.947.771.794,88	107.616,04	$ 2.467.420.527,98
4.4.2		Suministro e instalacion de Junta constructiva manto de poliestireno de alta densidad (unión entre edificaciones)	ML	$ 95.781,00	205,65	19.697.362,65		$ -
5		**MAMPOSTERIA**						
5,1		**MAMPOSTERIA**						
5.1.1		Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	M2	$ 131.066,00	13.731,51	1.799.733.536,36	5.477,93	$ 717.970.242,31
5.1.2		Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	M2	$ 221.190,00	169,12	37.407.652,80	169,12	$ 37.407.652,80

5.1.3		Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	UND	$ 30.657,00	18.450,00	565.621.650,00	15.952,00	$ 489.040.464,00
5.1.4		Muro en bloque de concreto con celdas rellenas de arena, grouting o vermiculita, Dimesiones 20cm , 20cm 40cm pañete a dos caras - auditorio	M2	$ 155.978,00	24,05	3.751.270,90		$ -
6		**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS**						
6,1		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
6.1.1		**ACOMETIDAS Y CONTADORES**						
6.1.1.1		Conexión a acometida existente que incluye la instalación de un medidor de agua totalizador 2" para la totalidad del proyecto (incluye caja para medidor)	UND	$ 4.222.629,00	1,00	4.222.629,00		$ -
6.1.1.2		Suministro e instalación de medidor de agua 2" para línea de llenado de tanque destinado a suministro de agua potable (incluye caja para medidor)	UND	$ 3.091.025,00	1,00	3.091.025,00		$ -
6.1.1.3		Suministro e instalación de medidor de agua 2" para línea de llenado de tanque destinado para red contra incendio (incluye caja para medidor)	UND	$ 3.091.025,00	1,00	3.091.025,00		$ -
6.1.2		**SISTEMA DE BOMBEO RED DE AGUA POTABLE**						
6.1.2.1		Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (3 bombas c/u con un caudal 93 GPM para un caudal total de 279 GPM y presión de servicio 65 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas necesarios para su instalación	UND	$ 65.162.152,00				$ -
6.1.3		**REDES DE AGUA A PRESION BAJO TIERRA**						
6.1.3.1		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 4" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	ML	$ 61.116,00	145,00	8.861.820,00		$ -
6.1.3.2		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2.1/2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	ML	$ 36.717,00	91,00	3.341.247,00		$ -
6.1.3.3		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	ML	$ 27.615,00	76,00	2.098.740,00	39,82	$ 1.099.629,30
6.1.3.4		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 21.724,00	36,00	782.064,00		$ -
6.1.3.5		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (Incluye accesorios)	ML	$ 15.821,00	300,00	4.746.300,00		$ -
6.1.3.6		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1" unión soldada RDE 13.5 (incluye accesorios)	ML	$ 12.581,00	12,00	150.972,00		$ -

6.1.3.7		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 3/4" unión soldada RDE 11 (Incluye accesorios)	ML	$ 10.525,00	154,00	1.620.850,00		$ -
6.1.3.8		Suministro e instalación de Tubería PVC presión 1/2" unión soldada RDE 9 (Incluye accesorios)	ML	$ 7.719,00	197,00	1.520.643,00		$ -
6.1.3.9		Suministro e instalación de codo 90° PVC unión mecánica 4"	UND	$ 154.524,00	5,00	772.620,00		$ -
6.1.3.10		Suministro e instalación codo 90° PVC unión mecánica 2.1/2"	UND	$ 105.226,00	5,00	526.130,00		$ -
6.1.3.11		Suministro e instalación codo 90° PVC unión mecánica 2"	UND	$ 91.482,00	3,00	274.446,00		$ -
6.1.3.12		Suministro e instalación codo 45° PVC unión mecánica 4"	UND	$ 147.337,00	1,00	147.337,00		$ -
6.1.3.13		Suministro e instalación codo 45° PVC unión mecánica 2.1/2"	UND	$ 106.776,00	1,00	106.776,00		$ -
6.1.3.14		Suministro e instalación codo 45° PVC unión mecánica 2"	UND	$ 87.687,00	1,00	87.687,00		$ -
6.1.3.15		Suministro e instalación de tee PVC unión mecánica 4"	UND	$ 210.580,00	4,00	842.320,00		$ -
6.1.3.16		Suministro e instalación de tee PVC unión mecánica 2.1/2"	UND	$ 78.237,00	1,00	78.237,00		$ -
6.1.3.17		Suministro e instalación de tee PVC unión mecánica 2"	UND	$ 75.353,00	1,00	75.353,00		$ -
6.1.3.18		Suministro e instalación de reducción PVC presión unión mecánica 4" x 2.1/2"	UND	$ 110.665,00	2,00	221.330,00		$ -
6.1.3.19		Suministro e instalación de reducción PVC presión unión mecánica 2.1/2" x 2"	UND	$ 63.327,00	2,00	126.654,00		$ -
6.1.4		**EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE**						
6.1.4.1		Excavación manual en material común de brecha para tubería	M3	$ 26.656,00	416,00	11.088.896,00	141,61	$ 3.774.756,16
6.1.4.2		Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	M3	$ 155.145,00	86,00	13.342.470,00		$ -
6.1.4.3		Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	M3	$ 20.480,00	333,00	6.819.840,00		$ -
6.1.4.4		Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	M3	$ 33.337,00	85,00	2.833.645,00		$ -
6.1.5		**REDES DE AGUA A PRESION DESCOLCADA Y POR DUCTOS**						
6.1.5.1		Suministro e instalación de tubería PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 117.343,00	22,00	2.581.546,00	15,04	$ 1.764.838,72
6.1.5.2		Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 67.804,00	254,00	17.222.216,00	117,19	$ 7.945.950,76
6.1.5.3		Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 52.056,00	84,00	4.372.704,00	75,28	$ 3.918.775,68
6.1.5.4		Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 32.943,00	150,00	4.941.450,00	98,94	$ 3.259.380,42
6.1.5.5		Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 21.724,00	99,00	2.150.676,00	59,64	$ 1.295.619,36
6.1.5.6		Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	ML	$ 15.821,00	161,00	2.547.181,00	100,25	$ 1.586.055,25
6.1.5.7		Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)	ML	$ 10.525,00	270,00	2.841.750,00	187,15	$ 1.969.753,75
6.1.5.8		Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	ML	$ 10.525,00	166,00	1.747.150,00	134,53	$ 1.415.928,25
6.1.5.9		Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	ML	$ 7.719,00	369,00	2.848.311,00	307,20	$ 2.371.276,80

6.1.5.10		Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 4"	UND	$ 1.117.857,00	1,00	1.117.857,00	1,00	$ 1.117.857,00
6.1.5.11		Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 3"	UND	$ 1.065.841,00	4,00	4.263.364,00	4,00	$ 4.263.364,00
6.1.5.12		Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2.1/2"	UND	$ 862.317,00	2,00	1.724.634,00		$ -
6.1.5.13		Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2"	UND	$ 665.834,00	1,00	665.834,00		$ -
6.1.5.14		Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 1.1/2"	UND	$ 500.925,00	1,00	500.925,00		$ -
6.1.5.15		Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 1.1/4"	UND	$ 423.923,00	1,00	423.923,00		$ -
6.1.6		**SOPORTERIA PARA TUBERIA DESCOLGADA Y POR DUCTOS PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE**						
6.1.6.1		Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 32.519,00	32,00	1.040.608,00	21,00	$ 682.899,00
6.1.6.2		Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 30.324,00	69,00	2.092.356,00	49,00	$ 1.485.876,00
6.1.6.3		Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 25.227,00	60,00	1.513.620,00	9,00	$ 227.043,00
6.1.6.4		Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 24.905,00	125,00	3.113.125,00	38,00	$ 946.390,00
6.1.6.5		Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 20.949,00	103,00	2.157.747,00	21,00	$ 439.929,00
6.1.6.6		Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 21.742,00	164,00	3.565.688,00	37,00	$ 804.454,00
6.1.6.7		Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 18.478,00	108,00	1.995.624,00	31,00	$ 572.818,00
6.1.6.8		Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 18.324,00	163,00	2.986.812,00	34,00	$ 623.016,00
6.1.6.9		Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 18.382,00	815,00	14.981.330,00	55,00	$ 1.011.010,00
6.1.7		**VALVULAS DE CIERRE Y CHEQUES**						
6.1.7.1		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 4"	UND	$ 2.512.504,00	1,00	2.512.504,00		$ -
6.1.7.2		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2.1/2"	UND	$ 841.712,00	1,00	841.712,00		$ -
6.1.7.3		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2"	UND	$ 501.252,00	20,00	10.025.040,00	18,00	$ 9.022.536,00
6.1.7.4		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/2"	UND	$ 339.719,00	18,00	6.114.942,00	12,00	$ 4.076.628,00
6.1.7.5		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/4"	UND	$ 271.258,00	18,00	4.882.644,00	7,00	$ 1.898.806,00
6.1.7.6		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1"	UND	$ 202.618,00	18,00	3.647.124,00	4,00	$ 810.472,00
6.1.7.7		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3/4"	UND	$ 159.218,00	43,00	6.846.374,00	25,00	$ 3.980.450,00
6.1.7.8		Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1/2"	UND	$ 134.060,00	52,00	6.971.120,00	12,00	$ 1.608.720,00
6.1.7.9		Suministro e instalación de cheque de cortina de bronce 1"	UND	$ 174.293,00	2,00	348.586,00		$ -
6.1.8		**PUNTOS HIDRAULICOS**						

6.1.8.1		Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavaojos	UND	$ 132.254,00	93,00	12.299.622,00	84,00	$ 11.109.336,00
6.1.8.2		Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría hidráulico 3/4" para orinales	UND	$ 73.320,00	30,00	2.199.600,00	28,00	$ 2.052.960,00
6.1.8.3		Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	UND	$ 66.957,00	316,00	21.158.412,00	216,00	$ 14.462.712,00
6.1.9		**MONTAJE APARATOS SANITARIOS**						
6.1.9.1		Montaje de sanitario de fluxómetro	UND	$ 45.802,00	91,00	4.167.982,00		$ -
6.1.9.2		Montaje de sanitario de tanque	UND	$ 45.802,00	36,00	1.648.872,00		$ -
6.1.9.3		Montaje de orinal	UND	$ 45.802,00	27,00	1.236.654,00		$ -
6.1.9.4		Montaje de lavamanos	UND	$ 45.802,00	192,00	8.793.984,00		$ -
6.1.9.5		Montaje de lavaplatos	UND	$ 45.802,00	27,00	1.236.654,00		$ -
6.1.9.6		Montaje de duchas	UND	$ 45.802,00	16,00	732.832,00		$ -
6.1.9.7		Montaje de bebedero	UND	$ 45.802,00	12,00	549.624,00		$ -
6.1.9.8		Montaje de ducha lavaojos	UND	$ 45.802,00	2,00	91.604,00		$ -
6,2		**SALIDAS SANITARIAS**						
6.2.1		**PUNTOS SANITARIOS**						
6.2.1.1		Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	UND	$ 133.231,00	177,00	23.581.887,00	138,00	$ 18.385.878,00
6.2.1.2		Suministro e instalación de punto sanitario 3" para sifones de piso y duchas lavaojos	UND	$ 163.379,00	2,00	326.758,00	1,00	$ 163.379,00
6.2.1.3		Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	UND	$ 69.387,00	353,00	24.493.611,00	266,00	$ 18.456.942,00
6.2.2		**REDES DE AGUAS RESIDUALES**						
6.2.2.1		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	ML	$ 155.145,00	153,00	23.737.185,00	130,50	$ 20.246.422,50
6.2.2.2		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	ML	$ 35.988,00	121,00	4.354.548,00	45,04	$ 1.620.899,52
6.2.2.3		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	ML	$ 23.318,00	190,00	4.430.420,00	135,31	$ 3.155.158,58
6.2.2.4		Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	UND	$ 83.143,00	6,00	498.858,00	6,00	$ 498.858,00
6.2.2.5		Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 3" para bajantes	UND	$ 77.248,00	4,00	308.992,00	3,00	$ 231.744,00
6.2.2.6		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	ML	$ 122.231,00	164,88	20.153.447,28	32,82	$ 4.011.621,42

6.2.2.7		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	ML	$ 38.492,00	402,00	15.473.784,00	67,19	$ 2.586.277,48
6.2.2.8		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	ML	$ 35.988,00	201,00	7.233.588,00	7,78	$ 279.986,64
6.2.2.9		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	ML	$ 23.318,00	134,00	3.124.612,00	69,35	$ 1.617.103,30
6.2.2.10		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 160 mm (Bajo tierra)	ML	$ 50.698,00	226,00	11.457.748,00	41,69	$ 2.113.599,62
6.2.2.11		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	ML	$ 77.656,00	114,47	8.889.282,32	114,47	$ 8.889.282,32
6.2.2.12		Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	UND	$ 1.152.771,00	12,00	13.833.252,00	7,00	$ 8.069.397,00
6.2.2.13		Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material	UND	$ 2.572.466,00	2,00	5.144.932,00	2,00	$ 5.144.932,00
6.2.2.14		Suministro e instalación de trampa de grasas 1.60 m x 0.65 m en concreto reforzado para aguas residuales provenientes de equipos de cocina (incluye tapa con marco y angulo, excavación y retiro de material)	UND	$ 2.212.575,00	1,00	2.212.575,00		
6.2.2.15		Suministro e instalación de trampa de grasas de grasas 1.20 m x 0.60 m en concreto reforzado para aguas residuales provenientes de laboratorios (incluye tapa con marco y angulo, excavación y retiro de material)	UND	$ 1.517.904,00	1,00	1.517.904,00		$ -
6.2.3		**REDES DE REVENTILACION PARA REDES DE AGUAS RESIDUALES**						
6.2.3.1		Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	UND	$ 30.740,00	342,00	10.513.080,00	77,30	$ 2.376.202,00
6.2.3.2		Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	UND	$ 20.231,00	195,00	3.945.045,00	126,70	$ 2.563.267,70
6.2.3.3		Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	UND	$ 16.592,00	305,00	5.060.560,00	171,30	$ 2.842.209,60
6.2.4		**REDES DE AGUAS LLUVIAS**						
6.2.4.1		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	ML	$ 25.440,00	365,00	9.285.600,00	177,60	$ 4.518.144,00
6.2.4.2		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	ML	$ 155.145,00	380,00	58.955.100,00	346,89	$ 53.818.249,05

6.2.4.3		Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 6" para bajantes	UND	$ 130.832,00	20,00	2.616.640,00		$ -
6.2.4.4		Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	UND	$ 83.143,00	31,00	2.577.433,00		$ -
6.2.4.5		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	ML	$ 122.231,00	436,00	53.292.716,00	101,91	$ 12.456.561,21
6.2.4.6		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	ML	$ 38.492,00	551,00	21.209.092,00		$ -
6.2.4.7		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 400 mm (Bajo tierra)	ML	$ 256.749,00	54,00	13.864.446,00		$ -
6.2.4.8		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	ML	$ 209.716,00	280,00	58.720.480,00	172,36	$ 36.146.649,76
6.2.4.9		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 315 mm (Bajo tierra)	ML	$ 145.502,00	95,14	13.843.060,28	82,78	$ 12.044.655,56
6.2.4.10		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	ML	$ 104.969,00	347,00	36.424.243,00	141,50	$ 14.853.113,50
6.2.4.11		Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 200 mm (Bajo tierra)	ML	$ 77.656,00	43,40	3.370.270,40	43,40	$ 3.370.270,40
6.2.4.12		Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	UND	$ 119.610,00	109,00	13.037.490,00	5,00	$ 598.050,00
6.2.4.13		Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	UND	$ 51.837,00	101,00	5.235.537,00	17,00	$ 881.229,00
6.2.4.14		Suministro e instalación de sumideros en zona de paqueaderos y zonas de carga y descarga	UND	$ 1.580.796,00	6,00	9.484.776,00		$ -
6.2.4.15		Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	UND	$ 1.152.771,00	23,00	26.513.733,00	9,00	$ 10.374.939,00
6.2.4.16		Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	UND	$ 2.572.466,00	9,00	23.152.194,00	6,00	$ 15.434.796,00
6.2.5		**SOPORTERIA PARA TUBERIA PVC SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES, REVENTILACION Y AGUAS LLUVIAS DESCOLGADA Y POR DUCTOS**						
6.2.5.1		Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 40.918,00	183,00	7.487.994,00	100,00	$ 4.091.800,00
6.2.5.2		Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 32.519,00	217,00	7.056.623,00	36,00	$ 1.170.684,00
6.2.5.3		Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 30.324,00	82,00	2.486.568,00	13,00	$ 394.212,00
6.2.5.4		Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 24.905,00	130,00	3.237.650,00	56,00	$ 1.394.680,00
6.2.5.5		Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 20.949,00	153,00	3.205.197,00	22,00	$ 460.878,00
6.2.6		**EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS PVC SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS**						
6.2.6.1		Excavación manual en material común de brecha para tubería	M3	$ 26.656,00	1.830,18	48.785.278,08	392,36	$ 10.458.748,16

6.2.6.2		Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	M3	$ 155.145,00	1.464,14	227.154.620,88	403,34	$ 62.576.184,30
6.2.6.3		Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	M3	$ 20.480,00	1.253,00	25.661.440,00		$ -
6.2.6.4		Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	M3	$ 33.337,00	1.830,18	61.012.710,66	384,12	$ 12.805.341,77
6.2.7		**EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE DE CUARTO DE BOMBAS**						
6.2.7.1		Suministro es instalación de equipo de bombeo sumergible para desagües de cuarto de bombas (2 bombas c/u con caudal de 85 GPM y presión de salida de 8 PSI) incluye válvulas, cheques, tuberías y todos los elementos necesarios para su instalación	UN D	$ 7.569.693,00				$ -
6.2.8		**EQUIPO DE BOMBEO PARA REUSO DE AGUAS LLUVIAS**						
6.2.8.1		Suministro e instalación de equipo de bombeo para reuso de aguas lluvias, que consta de dos bombas tipo lapicero c/u con caudal de 20 GPM y Presión de salida 60 PSI (incluye todos los accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 60 L y elementos necesarios para su instalación)	UN D	$ 18.883.884,00				$ -
6,3		**RED DE GAS**						
6.3.1		**COCINA**						
6.3.1.1		Acometida de gas con collarín de 2" y conexión a 1" en tubería dePolietileno de alta densidad, con elevador o transitoma y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1" alojada en caja de inspección prefabricada de polipropileno. El precio incluye la demolición y el levane del piso existente y la conexión con la red, incluye la excavación y el relleno principal.	UN D	$ 4.908.957,00				$ -
6.3.1.2		Suministro e Instalación Regulador 1ª Etapa Pe 60,00 Psi, Ps 5,00 Psi 3/4" 200,000 Btu	UN D	$ 355.076,00				$ -
6.3.1.3		Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rígido tipo "L" Ø 3/4" Cocina	UN D	$ 321.115,00				$ -
6.3.1.4		Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 5,00 Psi, Ps 23,00 mbar 3/4" 100,000 Btu. Cocina	UN D	$ 193.144,00				$ -
6.3.1.5		Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 5,00 Psi, Ps 23,00 mbar 3/4" 150,000 Btu. Cocina	UN D	$ 193.144,00				$ -
6.3.1.6		Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 3/4" . Cocina	UN D	$ 101.313,00				$ -
6.3.1.7		Abrazaderas tipo Pera Ø 3/4" . Cocina	UN D	$ 29.896,00				$ -
6.3.1.8		Suministro e instalacion de mangueras y accesorios para conexión a artefactos	UN D	$ 89.445,00				$ -
6.3.1.9		Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 5,00 Psi, Ps 23,00 mbar 3/4" 100,000 Btu. Cocina	UN D	$ 193.144,00				$ -

6.3.1.10		Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 5,00 Psi, Ps 23,00 mbar 3/4" 150,000 Btu. Cocina	UND	$ 193.144,00				$ -
6.3.1.11		Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 3/4" . Cocina	UND	$ 101.313,00				$ -
6.3.1.12		Abrazaderas tipo Pera Ø 3/4" . Cocina	UND	$ 29.896,00				$ -
6.3.1.13		Suministro e instalacion de mangueras y accesorios para conexión a artefactos	UND	$ 89.445,00				$ -
6.3.2		**LABORATORIOS**						
6.3.2.1		Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rígido tipo "L" Ø 1/2" . Laboratorios	ML	$ 1.220.860,00	1,00	1.220.860,00		$ -
6.3.2.2		Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1/2" . Laboratorios	UND	$ 58.467,00	4,00	233.868,00		$ -
6.3.2.3		Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 5,00 Psi, Ps 23,00 mbar 1/2" 50,000 Btu. Laboratorios	UND	$ 69.126,00	40,00	2.765.040,00		$ -
6.3.2.4		Abrazaderas tipo Pera Ø ½". Red de Distribución Laboratorios	UND	$ 28.045,00	35,00	981.575,00		$ -
6.3.2.5		Suministro e instalacion de mangueras y accesorios para instalacion de artefactos - mecheros bunsen	UND	$ 89.445,00	2,00	178.890,00		$ -
6.3.2.6		Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1/2"	UND	$ 58.467,00	24,00	1.403.208,00		$ -
6.3.2.7		Abrazaderas tipo Pera Ø ½". Red de Distribución Laboratorios	UND	$ 28.045,00	50,00	1.402.250,00		$ -
6.3.2.8		Instalación de Artefactos. Mecheros Bunsen, incluye manguera y accesorios	UND	$ 89.445,00	24,00	2.146.680,00		$ -
7		**INSTALACION RED CONTRAINCENDIOS**						
7,1		**RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS**						
7.1.1		**SISTEMA DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS**						
7.1.1.1		Suministro e instalación de equipo de bombeo listado UL y aprobado FM para suministro de agua a la red contra incendios (Caudal 250 GPM y Presión de salida 90 PSI) conformado por motor, tablero de control, accesorios, tuberías, válvulas, pasamuros, bomba jockey (Caudal 5 GPM y Presión 100 PSI) y los elementos necesarios para su instalación	UND	$ 123.016.898,00				$ -
7.1.1.2		Suministro e instalación de cabezal de prueba 4" con una válvula de 2.1/2" para equipo de bombeo contra incendios	UND	$ 1.642.892,00	1,00	1.642.892,00		$ -
7.1.2		**REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO TIERRA**						
7.1.2.1		Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	ML	$ 231.895,00	459,00	106.439.805,00	197,86	$ 45.882.744,70
7.1.2.2		Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	UND	$ 1.797.063,00	14,00	25.158.882,00	11,00	$ 19.767.693,00

7.1.2.3		Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	UND	$ 1.651.986,00	5,00	8.259.930,00	4,00	$ 6.607.944,00
7.1.2.4		Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	UND	$ 2.335.356,00	13,00	30.359.628,00	4,00	$ 9.341.424,00
7.1.2.5		Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	UND	$ 476.471,00	15,00	7.147.065,00	5,00	$ 2.382.355,00
7.1.3		**EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS**						
7.1.3.1		Excavación manual en material común de brecha para tubería	M3	$ 26.656,00	259,00	6.903.904,00	24,53	$ 653.871,68
7.1.3.2		Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	M3	$ 155.145,00	52,00	8.067.540,00	13,23	$ 2.052.568,35
7.1.3.3		Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	M3	$ 20.480,00	207,00	4.239.360,00		$ -
7.1.3.4		Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	M3	$ 33.337,00	52,00	1.733.524,00	21,94	$ 731.413,78
7.1.4		**TOMA FIJA PARA CUERPO DE BOMBEROS**						
7.1.4.1		Suministro e instalación de toma siamesa en bronce 4" x 2.1/2" x 2.1/2" para cuerpo de bomberos, incluye válvula cheque ranurada de 4"	UND	$ 1.519.187,00	1,00	1.519.187,00	1,00	$ 1.519.187,00
7.1.5		**REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DESCOLGADOS Y POR DUCTOS**						
7.1.5.1		Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	ML	$ 238.311,00	118,00	28.120.698,00	53,54	$ 12.759.170,94
7.1.5.2		Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	ML	$ 82.666,00	915,00	75.639.390,00	456,28	$ 37.718.842,48
7.1.5.3		Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	ML	$ 59.384,00	346,00	20.546.864,00	83,59	$ 4.963.908,56
7.1.5.4		Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	ML	$ 52.771,00	474,00	25.013.454,00	289,43	$ 15.273.510,53
7.1.5.5		Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	ML	$ 52.867,00	238,00	12.582.346,00	182,25	$ 9.635.010,75
7.1.5.6		Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	ML	$ 50.750,00	2.051,00	104.088.250,00	858,43	$ 43.565.322,50
7.1.5.7		Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	UND	$ 434.400,00	31,00	13.466.400,00	10,00	$ 4.344.000,00
7.1.5.8		Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	UND	$ 77.934,00	65,00	5.065.710,00	65,00	$ 5.065.710,00

7.1.5.9		Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	UND	$ 57.670,00	9,00	519.030,00	6,00	$ 346.020,00
7.1.5.10		Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"	UND	$ 478.267,00	13,00	6.217.471,00	3,00	$ 1.434.801,00
7.1.5.11		Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	UND	$ 112.051,00	406,00	45.492.706,00	204,00	$ 22.858.404,00
7.1.5.12		Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	UND	$ 117.787,00	59,00	6.949.433,00	48,00	$ 5.653.776,00
7.1.5.13		Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"	UND	$ 83.906,00	200,00	16.781.200,00	59,00	$ 4.950.454,00
7.1.5.14		Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	UND	$ 71.927,00	57,00	4.099.839,00	15,00	$ 1.078.905,00
7.1.5.15		Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	UND	$ 540.762,00	21,00	11.356.002,00	12,00	$ 6.489.144,00
7.1.6		**CENTROS DE CONTROL DE ROCIADORES**						
7.1.6.1		Suministro e instalación de válvula de angulo 1.1/4" para drenaje	UND	$ 357.246,00	9,00	3.215.214,00	1,00	$ 357.246,00
7.1.6.2		Suministro e instalación de válvula de mariposa 2.1/2" listada UL	UND	$ 529.747,00	9,00	4.767.723,00	3,00	$ 1.589.241,00
7.1.6.3		Suministro e instalación de cheque ranurado listado 2.1/2" listado UL	UND	$ 334.458,00	9,00	3.010.122,00	3,00	$ 1.003.374,00
7.1.6.4		Suministro e instalación de Sensor de flujo 2.1/2" listado UL	UND	$ 593.826,00	9,00	5.344.434,00	3,00	$ 1.781.478,00
7.1.6.5		Suministro e instalación de Manómetro + válvula 1/4"	UND	$ 201.511,00	18,00	3.627.198,00	2,00	$ 403.022,00
7.1.6.6		Suministro e instalación de tubería de drenaje PVC presión RDE 21 unión soldada 1.1/4" para centros de control de rociadores (incluye accesorios)	ML	$ 17.894,00	101,00	1.807.294,00		$ -
7.1.7		**ROCIADORES AUTOMATICOS**						
7.1.7.1		Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura ordinaria (K=5.6 y rango de temperatura 55-77 °C) para instalar en cielo raso	UND	$ 131.753,00	646,00	85.112.438,00	208,00	$ 27.404.624,00
7.1.7.2		Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura intermedia (K=5.6 y rango de temperatura 79-107°C) para instalar en cubierta traslucida	UND	$ 125.626,00	348,00	43.717.848,00	188,00	$ 23.617.688,00
7.1.8		**SOPORTES SISMICOS PARA RED DE ROCIADORES**						
7.1.8.1		Suministro e instalación de soporte sísmico transversal 2.1/2" para red de rociadores	UND	$ 106.966,00	60,00	6.417.960,00	26,00	$ 2.781.116,00
7.1.8.2		Suministro e instalación de soporte sísmico longitudinal 2.1/2" para red de rociadores	UND	$ 125.820,00	30,00	3.774.600,00	14,00	$ 1.761.480,00
7.1.9		**SALIDAS DE MANGUERA CONTRA INCENDIO**						
7.1.9.1		Suministro e instalación de salida de manguera de 2.1/2" con buje de 2.1/2" x 1.1/2"	UND	$ 645.934,00	22,00	14.210.548,00	8,00	$ 5.167.472,00
7.1.10		**SOPORTERIA PARA TUBERIA DESCOLGADA Y POR DUCTOS DESTINADAS A RED CONTRA INCENDIO**						

7.1.10.1		Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 32.519,00	59,00	1.918.621,00	16,00	$ 520.304,00
7.1.10.2		Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 25.227,00	458,00	11.553.966,00	267,00	$ 6.735.609,00
7.1.10.3		Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 24.905,00	173,00	4.308.565,00	51,00	$ 1.270.155,00
7.1.10.4		Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 20.949,00	237,00	4.964.913,00	87,00	$ 1.822.563,00
7.1.10.5		Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 21.742,00	119,00	2.587.298,00	61,00	$ 1.326.262,00
7.1.10.6		Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	UND	$ 18.478,00	1.026,00	18.958.428,00	528,00	$ 9.756.384,00
8		**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**						
8,1		**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
8.1.1		**RED DE MEDIA TENSION, SUBESTACION Y TRANSFORMADOR**						
8.1.1.1		Suministro e Instalación Afloramiento M.T. IMC 6" x 6m , norma CODENSA CS 400, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 3.610.757,00	2,00	7.221.514,00		$ -
8.1.1.2		Suministro e instalación Terminal premoldeado 15KV, tipo exterior 185mms2, juego tripolar, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	JGO	$ 900.739,00	1,00	900.739,00		$ -
8.1.1.3		Suministro e Instalación de cortacircuitos 15KV, 100A y DPS 12KV, 10KA en cruceta metálica centrada según apoyo LA 221 CODENSA, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	JGO	$ 2.987.155,00	1,00	2.987.155,00		$ -
8.1.1.4		Suministro e Instalación puesta a tierra para terminales premoldeados y DPS 12KV, 10KA en apoyo LA 221 CODENSA existente	UN	$ 502.355,00	1,00	502.355,00		$ -
8.1.1.5		Suministro e Instalación Red cable 3 hilos XLPE, #185mm2, 15KV, 133%, aluminio, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 196.410,00	58,00	11.391.780,00		$ -
8.1.1.6		Suministro e instalación tubería PVC, TDP, 4 vías x Ø6", incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 216.433,00	11,00	2.380.763,00		$ -
8.1.1.7		Suministro e instalación tubería PVC, TDP, 6 vías x Ø6" , incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 316.715,00	36,00	11.401.740,00		$ -

8.1.1.8		Suministro e instalación Terminal premoldeado 15KV, tipo interior 2-3/0, juego tripolar, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	JGO	$ 819.020,00	8,00	6.552.160,00		$ -
8.1.1.9		Construcción cámara de paso y halado ref.: CS276 Norma Enel CODENSA, pared doble, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 3.030.043,00	2,00	6.060.086,00		$ -
8.1.1.10		Suministro e instalación celda en media tensión con seccionadores en Sf6, para entrada y salida 17,5Kv, según norma CTS 508-2 Enel - CODENSA, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 53.430.219,00	1,00	53.430.219,00		$ -
8.1.1.11		Suministro e instalación celda de medida en media tensión, incluye medidor electrónico trifásico BIDIRECCIONAL, 3TC's 10/5A, 3TP11,4/120V y demás elementos, cableado y accesorios requeridos según norma AE 325 Enel - CODENSA, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 50.623.788,00	1,00	50.623.788,00		$ -
8.1.1.12		Suministro e instalación celda de protección con seccionador en SF6, 17,5KV, 630A, con fusibles tipo HH de 25A, 24KV, según norma Enel - CODENSA CTS503-1 CTS 503-3, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 25.837.601,00	1,00	25.837.601,00		$ -
8.1.1.13		Suministro e instalación celda para transformador seco hasta 300KV, según norma Enel - CODENSA CTS 518, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 11.089.157,00	1,00	11.089.157,00		$ -
8.1.1.14		Suministro e instalación transformador seco de 300KVA, clase F, 11400V/208-120V, incluye barraje de conexión a tierra, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 43.838.890,00	1,00	43.838.890,00		$ -
8.1.2		**GABINETES GENERALES DE BAJA TENSION Y TRANSFERENCIA**						
8.1.2.1		Suministro e instalación gabinete y transferencia en baja tensión, por interruptores motorizados de 3X200A, con enclavamiento eléctrico y mecánico y sistema de disparo por deslastre de cargas desde transferencia BCI, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 25.318.564,00	1,00	25.318.564,00		$ -
8.1.2.2		Suministro e instalación de tablero general de baja tensión principal, de acuerdo a diagrama unifilar, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 17.675.661,00	1,00	17.675.661,00		$ -

8.1.2.3		Suministro e instalación de tablero general de baja tensión satélite, de acuerdo a diagrama unifilar, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 17.155.974,00	1,00	17.155.974,00		$ -
8.1.2.4		Suministro e instalación de tablero de control para bomba Jockey de 2Hp, listado, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 2.688.991,00	1,00	2.688.991,00		$ -
8.1.2.5		Suministro e instalación de tablero de control y transferencia para bomba contra incendios de 30Hp, listado, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 37.319.874,00	1,00	37.319.874,00		$ -
8.1.3		**ALIMENTADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION**						
8.1.3.1		Suministro e instalación de alimentador, sin ducto, entre transformador y tablero general de baja tensión principal en 2 X (3 # 500 MCM fases + 1 # 4/0 MCM neutro + 1 # 2 tierra) Aluminio THWN SERIE 8000, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 300.032,00	20,00	6.000.640,00		$ -
8.1.3.2		Suministro e instalación de alimentador, sin ducto, entre planta de emergencia y transferencia en 3 # 4/0 fases + 1 # 4/0 neutro + 1 # 2 tierra AWG HFFRLS, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 317.055,00	15,00	4.755.825,00		$ -
8.1.3.3		Suministro e instalación de alimentador, sin ducto, entre tablero general de baja tensión y transferencia en 3 # 4/0 fases + 1 # 4/0 neutro + 1 # 2 tierra AWG HFFRLS, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 335.166,00	20,00	6.703.320,00		$ -
8.1.3.4		Suministro e instalación de alimentador, ducto EMT 4", entre tablero general de baja tensión principal y tablero general de baja tensión satélite en 2 X (3 # 500 MCM fases + 1 # 500 MCM neutro + 1 # 2 tierra) AWG HFFRLS, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 1.604.865,00	115,00	184.559.475,00		$ -
8.1.3.5		Suministro e instalación de alimentador, entre transformador y tablero T- BCI y entre planta de emergencia y tablero T-BCI en 3 # 1/0 fases + 1 # 1/0 neutro + 1 # 6 tierra AWG HFFRLS, en ducto Ø2"PVC DB enterrado, incluye elementos terminales de ponchar, de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 188.073,00	90,00	16.926.570,00		$ -
8.1.3.6		Suministro e instalación de alimentador tableros T6 y T8 en 3 # 1/0 fases + 1 # 1/0 neutro + 1 # 6 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø2" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 197.467,00	200,00	39.493.400,00	18,00	$ 3.554.406,00

8.1.3.7		Suministro e instalación de alimentador tableros T4, T10, T-CO y T-C3 en 3 # 2 fases + 1 # 2 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/2" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 152.774,00	286,00	43.693.364,00		$ -
8.1.3.8		Suministro e instalación de alimentador tableros T-BOM en 3 # 4 fases + 1 # 4 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/4" PVC DB enterrado, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 95.752,00	45,00	4.308.840,00		$ -
8.1.3.9		Suministro e instalación de alimentador tableros T2, T5, T9 y T-C2 en 3 # 4 fases + 1 # 4 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/4" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 109.056,00	284,00	30.971.904,00		$ -
8.1.3.10		Suministro e instalación de alimentador tableros T1, T3 y T7 en 3 # 6 fases + 1 # 6 neutro + 1 # 8 tierra, AWG HFFRLS, en ducto Ø11/4" EMT sobrepuesto en losa, incluye terminales de ponchar, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	ML	$ 83.134,00	222,00	18.455.748,00	164,80	$ 13.700.483,20
8.1.3.11		Suministro e instalación de alimentador de circuitos de iluminación en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" emt sobrepuesto en losa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	ML	$ 21.592,00	750,00	16.194.000,00	614,38	$ 13.265.692,96
8.1.3.12		Suministro e instalacion de alimentador de circuitos de iluminacion en 2x3#12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" EMT sobrepuesto en losa, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	ML	$ 33.360,00	750,00	25.020.000,00		$ -
8.1.3.13		Suministro e instalación de alimentador de circuitos de tomacorrientes en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø1/2" PVC embebido en placa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	ML	$ 14.560,00	750,00	10.920.000,00	49,00	$ 713.440,00
8.1.3.14		Suministro e instalación de alimentador de circuitos de tomacorrientes en 2 x 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" EMT en placa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente	ML	$ 33.360,00	750,00	25.020.000,00		$ -
8.1.3.15		Construcción cámara de paso y halado alumbrado publico y red de baja tensión, ref.: CS 274 norma Enel - CODENSA, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 1.481.997,00	3,00	4.445.991,00		$ -

8.1.3.16		Suministro e instalación de paso para dilatación estructural con caja de paso metálica pintada, con puerta y chapa, 1,0x0,8x0,3m, y coraza metálica flexible 4", incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 501.653,00	5,00	2.508.265,00		$ -
8.1.3.17		Suministro e instalación de paso para dilatación estructural con caja de paso metálica pintada, con puerta y chapa, 0,6x0,6x0,3m y coraza metálica flexible 2", incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 368.480,00	5,00	1.842.400,00	3,00	$ 1.105.440,00
8.1.3.18		Suministro e instalación tablero trifásico 42 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los elementos para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 229.254,00	6,00	1.375.524,00		$ -
8.1.3.19		Suministro e instalación tablero trifásico 36 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye s todos los elementos para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 115.071,00	10,00	1.150.710,00		$ -
8.1.3.20		Suministro e instalación tablero trifásico 30 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 63.879,00	20,00	1.277.580,00	1,00	$ 63.879,00
8.1.3.21		Suministro e instalación tablero trifásico 24 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 716.337,00	2,00	1.432.674,00		$ -
8.1.3.22		Suministro e instalación tablero trifásico 18 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 625.863,00	2,00	1.251.726,00	1,00	$ 625.863,00
8.1.3.23		Suministro e instalación tablero trifilar 12 circuitos, con puerta , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 529.367,00	4,00	2.117.468,00	1,00	$ 529.367,00
8.1.3.24		Suministro e instalación de tablero de control de iluminación por telerruptores TTR1, según diagrama en plano de detalles, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 487.445,00	3,00	1.462.335,00		$ -

8.1.3.25		Suministro e instalación de tablero de control de iluminación por telerruptores TTR2, según diagrama en plano de detalles, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 414.535,00	4,00	1.658.140,00		$ -
8.1.3.26		Suministro e instalación de tablero de control de iluminación por telerruptores TTR3, según diagrama en plano de detalles, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 685.598,00	1,00	685.598,00		$ -
8.1.3.27		Suministro e instalación de tablero de control de iluminación por telerruptores TTR4, según diagrama en plano de detalles, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 260.942,00	4,00	1.043.768,00		$ -
8.1.3.28		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x100A, 25KA , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 255.111,00	2,00	510.222,00		$ -
8.1.3.29		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x80A, 25KA ,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 1.373.137,00	1,00	1.373.137,00		$ -
8.1.3.30		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x70A, 25KA , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 712.818,00	1,00	712.818,00		$ -
8.1.3.31		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x60A, 25KA ,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 3.876.205,00	1,00	3.876.205,00		$ -
8.1.3.32		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x50A, 25KA , incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 3.968.654,00	1,00	3.968.654,00		$ -
8.1.3.33		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x40A, 25KA ,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 340.387,00	2,00	680.774,00		$ -
8.1.3.34		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 3x40A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 130.636,00	1,00	130.636,00		$ -
8.1.3.35		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 3x30A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 58.659,00	2,00	117.318,00		$ -
8.1.3.36		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 2x30A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 89.227,00	1,00	89.227,00		$ -
8.1.3.37		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 2x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 14.883,00	2,00	29.766,00		$ -
8.1.3.38		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 14.883,00	3,00	44.649,00	1,00	$ 14.883,00

8.1.3.39		Suministro e instalación interruptor termomagnético industrial 3x40A, 25KA ,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 340.387,00	2,00	680.774,00		$ -
8.1.3.40		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 3x40A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 130.636,00	4,00	522.544,00		$ -
8.1.3.41		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 3x30A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 58.659,00	4,00	234.636,00		$ -
8.1.3.42		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 2x30A, 10KA,incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 89.227,00	21,00	1.873.767,00		$ -
8.1.3.43		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 2x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 14.883,00	9,00	133.947,00		$ -
8.1.3.44		Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20A, 10KA, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, elementos de fijación, identificación, señalización y marcación.	UN	$ 14.883,00	169,00	2.515.227,00	1,00	$ 14.883,00
8.1.4		**SALIDAS DE ILUMINACION Y LUMINARIAS**						
8.1.4.1		Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml	UN	$ 158.824,00	1.840,00	292.236.160,00	435,00	$ 69.088.440,00
8.1.4.2		Suministro e instalacion salida de iluminacion exterior(no incluye luminaria) en tuberia conduit PVC DB enterrada, cable #12 AWG HFFRLS, y todos los elementos y accesorios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 15ml	UN	$ 249.262,00	53,00	13.210.886,00		$ -
8.1.4.3		Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4", descolgada en estructuras de cubierta, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4" RADWELL Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 12ml	UN	$ 304.272,00	35,00	10.649.520,00	12,00	$ 3.651.264,00
8.1.4.4		Suministro e instalacion salida de iluminacion exterior(no incluye luminaria) en tuberia conduit IMC Ø 3/4", sobrepuesta, cable #12 AWG HFFRLS, y todos los elementos y accesorios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 10ml	UN	$ 395.600,00	23,00	9.098.800,00		$ -

8.1.4.5		Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	UN	$ 160.605,00	85,00	13.651.425,00	35,00	$ 5.621.175,00
8.1.4.6		Suministro e instalacion de interruptor doble sin piloto, en tuberia EMT Ø3/4", empotrada en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	UN	$ 181.849,00	30,00	5.455.470,00		$ -
8.1.4.7		Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 198.865,00	53,00	10.539.845,00	25,00	$ 4.971.625,00
8.1.4.8		Suministro e instalacion de interruptor sencillo conmutable, sin piloto, en tuberia PVCØ1/2", empotrada en pared , caja 2x4metalica Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	UN	$ 183.081,00	10,00	1.830.810,00		$ -
8.1.4.9		Suministro e instalacion de interruptor doble, conmutable sin piloto, en tuberia PVCØ3/4" empotrada en pared , caja 2x4metalica Retie, cable 6#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	UN	$ 185.551,00	5,00	927.755,00		$ -
8.1.4.10		Suministro e instalacion de Dimmer electronico, con capacidad hasta 1.000W, en tuberia EMT Ø3/4" en pared , caja 4x4 RADWELL Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	UN	$ 310.119,00	4,00	1.240.476,00		$ -
8.1.4.11		Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml	UN	$ 493.775,00	35,00	17.282.125,00	12,00	$ 5.925.300,00

8.1.4.12		Suministro e instalacion reflector led tipo mini flood 200W, 20,000Lm, 30,000Hrs, CRI70, 120-277V, 6500°K, IK07, angulo abierto, fp 0,9, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 400.145,00	8,00	3.201.160,00		$ -
8.1.4.13		Suministro e instalacion reflector led tipo flood 150W, 15,000Lm, 30,000Hrs, CRI>70, 120-277V, 6500°K, IK07, angulo abierto, fp 0,9, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 390.460,00	56,00	21.865.760,00		$ -
8.1.4.14		Suministro e instalacion reflector led tipo 10W, 15,000Lm, 30,000Hrs, CRI>70, 120-277V, 4000°K, IK07, fp 0,9, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 78.836,00	31,00	2.443.916,00		$ -
8.1.4.15		Suministro e instalacion luminaria led, de colgar, 6,000Lm, 4100°K, 97W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 745.682,00	31,00	23.116.142,00		$ -
8.1.4.16		Suministro e instalacion luminaria led, de incrustar, 3,200Lm, 4100°K, 49W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 325.816,00	18,00	5.864.688,00		$ -
8.1.4.17		Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 3,200Lm, 4100°K, 49W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 278.496,00	69,00	19.216.224,00		$ -
8.1.4.18		Suministro e instalacion luminaria led, desobreponer, 2,100Lm, 4100°K, 2x18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 214.675,00	1.193,00	256.107.275,00		$ -
8.1.4.19		Suministro e instalacion luminaria led, de incrustar con marco, 2,100Lm, 4100°K, 2x18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 214.675,00	116,00	24.902.300,00		$ -
8.1.4.20		Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 1,100Lm, 4100°K, 2x10W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 159.469,00	77,00	12.279.113,00		$ -
8.1.4.21		Suministro e instalacion panel led, de incrustar, circular, 4000°K, 18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 40.945,00	75,00	3.070.875,00		$ -

8.1.4.22		Suministro e instalacion luminaria led, hermetica, de sobreponer, 2,100Lm, 4100°K, 2x18W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 192.642,00	56,00	10.787.952,00		$ -
8.1.4.23		Suministro e instalacion luminaria led, hermetica, de sobreponer, 1,1000Lm, 4100°K, 2x10W, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 192.432,00	6,00	1.154.592,00		$ -
8.1.4.24		Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 2,230Lm, 4100°K, 2x14W, dimerizable, 120/277V, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 307.156,00	29,00	8.907.524,00		$ -
8.1.4.25		Suministro e instalacion luminaria led, alumbrado exterior, reparto asimetrico, 74W, 8,000Lm, 4000°K, color negro, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 2.916.039,00	33,00	96.229.287,00		$ -
8.1.4.26		Suministro e instalacion luminaria led, alumbrado exterior, tipo bolardo, reparto simetrico, 5,5W, color negro, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 488.321,00	20,00	9.766.420,00		$ -
8.1.4.27		Suministro e instalacion luminaria led, alumbrado exterior, tipo reflector de piso, 7W, color negro, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 96.151,00	5,00	480.755,00		$ -
8.1.4.28		Suministro e instalacion de luminaria led de emergencia, de sobreponer, 4W, IP54, autonomia 1Hr, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 258.261,00	228,00	58.883.508,00		$ -
8.1.4.29		Suministro e instalacion Aviso de salida de emergencia, de sobreponer, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 89.976,00	38,00	3.419.088,00		$ -
8.1.4.30		Suministro e instalacion bateria de emergencia para luminaria led, incluye elementos de conexión, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 394.099,00	19,00	7.487.881,00		$ -
8.1.4.31		Suminsitro e instalacion base en concreto para luminaria decorativa,incluye elementos de puesta a tierra, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 246.670,00	33,00	8.140.110,00		$ -
8.1.4.32		Suministroe instalacion poste de concreto troncoconico de 11m x 510Kgs, incluye elementos de puesta a tierra, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 911.413,00	9,00	8.202.717,00		$ -

8.1.4.33		Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,2x0,2x0,15m, incluye elementos de puesta a tierra, fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 61.434,00	30,00	1.843.020,00		$ -
8.1.4.34		Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 49.207,00	30,00	1.476.210,00		$ -
8.1.4.35		Suministro e instalacion caja de paso 4x4 metalica Retie, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 7.237,00	100,00	723.700,00		$ -
8.1.4.36		Suministro e instalacion luminaria led, de sobreponer, 1,850Lm, 4100°K, 1x18W, 120/277V, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 203.175,00	97,00	19.707.975,00		$ -
8.1.5		**SALIDAS DE TOMACORRIENTES**						
8.1.5.1		Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	UN	$ 120.591,00	230,00	27.735.930,00	164,00	$ 19.776.924,00
8.1.5.2		Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en techo, en tuberia EMT, caja metalica 2x4" o 4x4" REDWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 15ml	UN	$ 371.243,00	35,00	12.993.505,00		$ -
8.1.5.3		Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	UN	$ 120.591,00	95,00	11.456.145,00	78,00	$ 9.406.098,00
8.1.5.4		Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en techo, red regulada color naranja, en tuberia EMT /4, caja REDWELL metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 15ml	UN	$ 369.981,00	20,00	7.399.620,00		$ -
8.1.5.5		Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml	UN	$ 155.943,00	23,00	3.586.689,00	9,00	$ 1.403.487,00

8.1.5.6		Suministro e instalacion tomacorriente bipolar polo a tierra, 120/208V, 30A, en pared, en tuberia PVC Ø 3/4", caja metalica 4x4" Retie, cable 4#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 10ml	UN	$ 259.666,00	12,00	3.115.992,00		$ -
8.1.5.7		Suministro e instalacion tomacorriente trifasica polo a tierra, 208V, 50A, en pared, en tuberia PVC DB Ø 1" en losa, caja metalica 10x10 profunda Retie, cable 3#8 Fases + 1#8Tierra, AWG HFFRLS yy todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. (Unidad Condensadora UCO-01 Aula Audiovisuales) prom: 22ml	UN	$ 785.993,00	1,00	785.993,00		$ -
8.1.5.8		Suministro e instalacion tomacorriente trifasica polo a tierra, 120/208V, 50A, en pared, en tuberia PVC Ø 1" Sch 40 en techo, caja metalica 10x10 profunda Retie, cable 3#10Fases+ 1#10Neutro+1#10Tierra, AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. . (Compresores mantenimiento)prom: 38ml	UN	$ 1.665.774,00	2,00	3.331.548,00		$ -
8.1.5.9		Suministro e instalacion tomacorriente trifasica polo a tierra, 120/208V, 50A, en pared, en tuberia PVC Ø 1" DB en losa, caja metalica 10x10 profunda Retie, cable 3#10Fases+ 1#10Neutro+1#10Tierra, AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. . (Lava vajillas cocina)prom: 16m	UN	$ 461.585,00	4,00	1.846.340,00		$ -
8.1.5.10		Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,2x0,2x0,15m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 57.654,00	20,00	1.153.080,00		$ -
8.1.5.11		Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 46.185,00	60,00	2.771.100,00	49,00	$ 2.263.065,00
8.1.5.12		Suministro e instalacion caja de paso 4x4 metalica Retie.. incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 7.141,00	50,00	357.050,00		$ -
8.1.6		**EQUIPOS PLANTA DE EMERGENCIA, UPS**						

8.1.6.1		Suministro e instalacion planta de emergencia 75KVA efectivos a la altura de Bogota, trifasica, 220/127V, incluye exhostos, cargador de baterias y todos los demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento en la ciudad de Bogota.	UN	$ 75.444.724,00	1,00	75.444.724,00		$ -
8.1.6.2		Suministro e instalacion de UPS trifasico de 20KVA, true on line, doble conversion, incluye puesta en marcha y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	$ 85.725.784,00	1,00	85.725.784,00		$ -
8.1.6.3		Suministro e instalacion de UPS trifasico de 15KVA, true on line, doble conversion, incluye puesta en marcha y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	$ 74.254.851,00	1,00	74.254.851,00		$ -
8.1.6.4		Suministro e instalacion de UPS trifasico de 10KVA, true on line, doble conversion, incluye puesta en marcha y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	$ 39.842.051,00	1,00	39.842.051,00		$ -
8.1.6.5		Suministro e instalacion de UPS trifilar de 8KVA, true on line, doble conversion, incluye puesta en marcha y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	$ 32.959.489,00	1,00	32.959.489,00		$ -
8.1.6.6		Suministro e instalacion de UPS trifilar de 6KVA, true on line, doble conversion, incluye puesta en marcha y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	$ 28.371.116,00	1,00	28.371.116,00		$ -
8.1.6.7		Suministro e instalacion de UPS trifilar de 3KVA, true on line, doble conversion, incluye puesta en marcha y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	$ 16.770.574,00	1,00	16.770.574,00		$ -
8.1.6.8		Suministro e instalacion de gabinete con baypass por llave selectora tripolar de 63A, 2 interruptores de sobreponer de 3x70A, con barraje trifasico de 125A, ,señalizacion y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	UN	$ 3.737.578,00	2,00	7.475.156,00		$ -
8.1.6.9		Suministro e instalacion de gabinete con baypass por llave selectora tripolar de 63A, 2 interruptores de sobreponer de 3x40A, con barraje trifasico de 125A, ,señalizacion y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	UN	$ 3.164.760,00	2,00	6.329.520,00		$ -

8.1.6.10		Suministro e instalacion de gabinete con baypass por llave selectora tripolar de 32A, 2 interruptores de sobreponer de 2x30A, con barraje trifilar de 125A, ,señalizacion y todos los demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	UN	$ 2.200.816,00	2,00	4.401.632,00		$ -
8.1.6.11		Suministro e instalacion de alimentador de entrada/salida de UPS trifasica 20KA, en cable de cobre 3#4+1#2+1#8 AWG HFFRLS, coraza metalica 11/2" con accesorios.	ML	$ 107.768,00	30,00	3.233.040,00		$ -
8.1.6.12		Suministro e instalacion de alimentador de entrada/salida de UPS trifasica 15KA/10KVA, en cable de cobre 3#8+1#6+1#8 AWG HFFRLS, coraza metalica 1" con accesorios.	ML	$ 55.493,00	30,00	1.664.790,00		$ -
8.1.6.13		Suministro e instalacion de alimentador de entrada/salida de UPS trifilar 8KVA, en cable de cobre 2#8+1#6+1#8 AWG HFFRLS, coraza metalica 1" con accesorios.	ML	$ 47.081,00	30,00	1.412.430,00		$ -
8.1.6.14		Suministro e instalacion de alimentador de entrada/salida de UPS trifilar 6KVA, en cable de cobre 2#10+1#8+1#10 AWG HFFRLS, coraza metalica 3/4" con accesorios.	ML	$ 34.566,00	30,00	1.036.980,00		$ -
8.1.6.15		Suministro e instalacion de alimentador de entrada/salida de UPS trifilar 3KVA, en cable de cobre 2#12+1#10+1#12 AWG HFFRLS, coraza metalica 3/4" con accesorios.	ML	$ 27.442,00	30,00	823.260,00		$ -
8.1.7		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA RAYOS**						
8.1.7.1		Suministro e instalacion puntas captadoras, de 50cms, aluminio, con base, incluye elemetos de soporte y fijacion.	UN	$ 142.408,00	60,00	8.544.480,00		$ -
8.1.7.2		Suministro e instalacion de alambron redondo de aluminio diametro 8mm , para anillo superior y bajantes, satisface las exigencias de vde 0185-305 (iec 62305) y retie 16.3.2., incluye elementos de soporte y fijacion.	UN	$ 14.419,00	800,00	11.535.200,00		$ -
8.1.7.3		Suministro e instalación de bajante en cable de cobre aislado #2. incluye tubo imc de ø 3/4" y conector bimetálico cobre- aluminio, incluye elementso de soporte, fijacion, marcacion y todos los demas elementso para una correcta y segura instalacion.	UN	$ 957.609,00	30,00	28.728.270,00		$ -
8.1.7.4		Construcción de cámara de inspección de 30cmx30cm con cierre hermético, incluye tapa, filtro y sellos de tuberias de reserva.	UN	$ 152.954,00	30,00	4.588.620,00		$ -
8.1.7.5		Suministro e instalación de electrodo de cobre 2.4mx 5/8". incluye soldadura exotérmica y todos los demas elementso y accesorios para una correcta y segura instalacion.	UN	$ 264.562,00	35,00	9.259.670,00		$ -

8.1.7.6		Suministro e instalación de anillo inferior en cable de cobre desnudo cal. # 1/0 awg, enterrado directamente a 0,5m de profundidad.(incluye colillas entre anillo y bajantes)	ML	$ 33.277,00	500,00	16.638.500,00	40,00	$ 1.331.080,00
8.1.7.7		Suministro e instalacion malla de puesta a tierra, con 4 electrodos de cobre de 5/8" x 2,4m, cable de cobre desnudo #2/0 AWG, uniones en soldadura exotermica. Incluye todos los accesorios y demas elementso necesarios para una correcta y segura instalacion. Incluye medicion de resistencia de puesta a tierra una vez instalada.	UN	$ 2.431.461,00	1,00	2.431.461,00		$ -
8,2		**INSTALACIONES COMUNICACIONES**						
8.2.1		**INSTALACIONES COMUNICACIONES**						
8.2.1.1		Construccion recamara para entrada de servicios, según norma ETB, 1,2x0,7x1,2m, bloque de 20x20x40cm, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta construccion.	UN	$ 1.555.683,00	1,00	1.555.683,00		$ -
8.2.1.2		Suministro e instalación de tubería PVC DB de 3 Vias x 3" para entrada de servicios, incluye todos los elementos de fijacion, marcacion y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 67.485,00	40,00	2.699.400,00		$ -
8.2.1.3		Suministro e instalacion de Gabinete telefonico de entrada 0,6x 0,4x0,2 mts, sobrepuesto en cuarto tecnico #2-1, incluye todos los elementos necesarios de fijacion, marcacion, identificacion y demas accesorios para una correcta instalacion.	UN	$ 1.037.586,00	1,00	1.037.586,00		$ -
8.2.1.4		Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 9.045,00	300,00	2.713.500,00		$ -
8.2.1.5		Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 de 1", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 13.950,00	300,00	4.185.000,00		$ -
8.2.1.6		Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 de 2", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 23.124,00	150,00	3.468.600,00		$ -
8.2.1.7		Suministro e instalacion canaleta metalica 12x5 cms, pintura electrostatica, cold rolled cal. 20. Incluye tapas troqueladas para tomas de uso final tanto electricos como de comunicaicones. Incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, marcacion, identificacion para una correcta instaladcion.	ML	$ 38.850,00	75,00	2.913.750,00		$ -
8.2.1.8		Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,2x0,2x0,15m, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 57.654,00	30,00	1.729.620,00		$ -

8.2.1.9		Suministro e instalacion de Caja de paso metalica pintada, con puerta y chapa, 0,15x0,15x0,10m, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 49.207,00	30,00	1.476.210,00		$ -
8.2.1.10		Suministro e instalacion caja de paso 4x4 metalica Retie, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.	UN	$ 7.237,00	50,00	361.850,00		$ -
8.2.1.11		Suministro e instalacion cable Cat 6a, utp 500mhz, 10g 4x2x23awg, carrete de 305 metros, LSZH, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	ML	$ 3.939,00	15.000,00	59.085.000,00		$ -
8.2.1.12		Suministro e instalación de cable de fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-3, tipo interior, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	ML	$ 32.769,00	350,00	11.469.150,00		$ -
8.2.1.13		Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 2xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	UN	$ 130.094,00	300,00	39.028.200,00	37,00	$ 4.813.478,00
8.2.1.14		Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 1xjacks Cat 6A, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	UN	$ 76.476,00	50,00	3.823.800,00	29,00	$ 2.217.804,00
8.2.1.15		Suministro, configuración e instalación de rack de 42 UR, incluye organizadores verticales, organizadores horizontales, bandejas, kit de ventilador. y todos las demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en operación, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	UN	$ 3.867.897,00	5,00	19.339.485,00		$ -
8.2.1.16		Suministro e instalación de multitoma de 6 salidas dobles, con supresor de picos, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	UN	$ 289.123,00	10,00	2.891.230,00		$ -
8.2.1.17		Suministro e instalacion de bandeja para fibra optica, incluye acopladores, conectores lc/lc, pigtails, bandeja para empalmes, conectorizacion, certificacion y accesorios hasta para 48 hilos multimodo, Rack A,, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	UN	$ 2.468.189,00	5,00	12.340.945,00		$ -

8.2.1.18		Suminsitro e instalacion de bandeja para fibra optica, incluye acopladores, conectores lc/lc, pigtails, bandeja para empalmes, conectorizacion, certificacion y accesorios hasta para 12 hilos multimodo, rakcs B,C, D E y F,, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	UN	$ 1.519.668,00	5,00	7.598.340,00		$ -
8.2.1.19		Suministro, instalación y configuracion de tranceivers de fibra optica y todos las demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en operación.	UN	$ 820.455,00	3,00	2.461.365,00		$ -
8.2.1.20		Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos sistema voz - datos, prearmado, cat. 6 A, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	UN	$ 1.066.906,00	6,00	6.401.436,00		$ -
8.2.1.21		Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos sistema cctv , prearmado, cat. 6 A, incluye todos los elementos y accesorios de fijacion, sujecion, marcacion y demas necesarios para su correcta instalacion y operación.	UN	$ 1.676.791,00	10,00	16.767.910,00		$ -
8.2.1.22		Suministro, instalación y configuracion de switche l3 tipo core incluye: licencia capa 3, fuentes hot swap, netcover, accesorios y todos las demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en operación.	UN	$ 5.996.959,00	1,00	5.996.959,00		$ -
8.2.1.23		Suministro, instalación y configuracion de switche administrable 10/100/1000, 48puertos RJ45, incluye accesorios y todos las demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en operación.	UN	$ 1.676.791,00	6,00	10.060.746,00		$ -
8.2.1.24		Suministro e instalacion de puntos de acceso inhalambricos ACCES POINTS 802,11ac, dual band.	UN	$ 3.510.413,00	25,00	87.760.325,00		$ -
8.2.1.25		Suministro e instalacion barraje equipotencial TMGB, en pared, cuarto tecnico #2-1	UN	$ 388.497,00	5,00	1.942.485,00		$ -
8.2.1.26		Suministro e instalacion cable equipotencial de tierras para racks, en cable de cobre desnudo #6 AWG.	ML	$ 12.608,00	5,00	63.040,00		$ -
8.2.1.27		Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo rejilla, uso interior, zincada, 400x50mms, con todos los accesorios de soporte tipo columpio en riel, uniones, derivaciones de tuberias, y puesta a tierra en cable de cobre desnudo #8AWG con conectores.	ML	$ 233.270,00	500,00	116.635.000,00	253,40	$ 59.110.618,00
8.2.1.28		Suministro e instalación de cable patch cord de 3 pies cat.6A	UN	$ 38.171,00	350,00	13.359.850,00		$ -
8.2.1.29		Suministro e instalación de cable patch cord de 7 pies cat.6A	UN	$ 45.170,00	350,00	15.809.500,00		$ -

8.2.1.30		Suministro e instalacion patch cord fibra optica multimodo OM3, x 3m, LC/LC	UN	$ 150.103,00	20,00	3.002.060,00		$ -
8.2.1.31		Suminstro e instalacion salida para television comercial, solo conduccion, tuberia PVC min 3/4" Sch 40, incluye tuberia pvc, caja y accesorios, no incluye cableado (NOTA: SOLO SALAS DE EXTENSION, LUDOTECA, CRI, TALLERES DE ARTES Y DANZAS	UN	$ 71.234,00	8,00	569.872,00		$ -
8.2.1.32		Suminstro e instalacion planta telefonica digital 8 troncales, 24 extensiones	UN	$ 8.078.815,00	1,00	8.078.815,00		$ -
8,3		**SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV**						
8.3.1		**SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV**						
8.3.1.1		Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 14.545,00	270,00	3.927.150,00		$ -
8.3.1.2		Suministro e instalación de tubería EMT de 1", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 22.420,00	36,00	807.120,00		$ -
8.3.1.3		Suministro e instalacion cable Cat 6, utp 500mhz, 10g 4x2x23awg, carrete de 305 metros, LSZH	ML	$ 3.342,00	3.162,00	10.567.404,00		$ -
8.3.1.4		Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 1xjacks Cat 6, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	UN	$ 91.960,00	23,00	2.115.080,00		$ -
8.3.1.5		Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 2xjacks Cat 6, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	UN	$ 57.228,00	15,00	858.420,00		$ -
8.3.1.6		Suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de almacenamiento de video (96t) 12 unidades para almacenamiento + 2 grabadores de failover - garantizar 45 días de almacenamiento. incluye pruebas funcionales, simulaciones de trafico, y todos los accesorios, modulos y actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio	UN	$ 8.075.326,00	1,00	8.075.326,00		$ -
8.3.1.7		Suministro, instalacion y configuracion de Switch PoE 24 puertos, gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps	UN	$ 5.128.986,00	5,00	25.644.930,00		$ -
8.3.1.8		Suministro, instalacion y configuracion de Switch PoE 5 puertos, gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps	UN	$ 3.683.070,00	5,00	18.415.350,00		$ -
8.3.1.9		Camara IP tipo Domo PoE, 3MP, funcionalidad dia/noche, conectividad ONVIF, IP66, Smart IR 98ft.incluye todos los accesorios y actividades complementarias, para garantizar el correcto funcionamiento y fijacion del equipo a cualquier altura	UN	$ 892.417,00	7,00	6.246.919,00		$ -

8.3.1.10		Camara IP tipo Bala PoE, 2MP, funcionalidad dia/noche, conectividad ONVIF, IP66, Smart IR 98 ft.incluye todos los accesorios y actividades complementarias, para garantizar el correcto funcionamiento y fijacion del equipo a cualquier altura	UN	$ 392.276,00	47,00	18.436.972,00		$ -
8.3.1.11		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de administrador del sistema (vms) (software y hardware) ; servidores para administracion del sistema, incluye balanceadores de carga, servidor ntp, pruebas funcionales, simulaciones de trafico, y todos los accesorios, modulos y actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en servicio	UN	$ 6.683.918,00	1,00	6.683.918,00		$ -
8.3.1.12		Suministro e instalacion Caja metalica 20x20x10cm	UN	$ 57.654,00	1,00	57.654,00		$ -
8.3.1.13		Suministro e instalacion de bandeja tipo malla 100x50, incluye accesorios de instalación y uniones y derivaciones para tuberias de 1" y 3/4"	ML	$ 136.243,00	70,00	9.537.010,00		$ -
8.3.1.14		Suminsitro e Instalacion monitor detipo industrial, funcionamiento continuo, 32" con soporte de pared	UN	$ 2.450.075,00	4,00	9.800.300,00		$ -
8,4		**SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS**						
8.4.1		**SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS**						
8.4.1.1		Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	ML	$ 14.545,00	2.340,00	34.035.300,00		$ -
8.4.1.2		suministro e instalación de cable de cobre calibre 2x18 fplr	ML	$ 8.141,00	730,00	5.942.930,00		$ -
8.4.1.3		suministro e instalación de cable de cobre calibre 2x16 fplr	ML	$ 11.697,00	2.617,00	30.611.049,00		$ -
8.4.1.4		suministro e instalación de cable de cobre calibre 2x14 fplr	ML	$ 12.844,00	63,00	809.172,00		$ -
8.4.1.5		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sensor de humo fotoelectrico direccionable para el sistema de detección de incendios, incluye base y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento.	UN	$ 274.943,00	290,00	79.733.470,00		$ -
8.4.1.6		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sensor de temperatura fotoelectrico direccionable para el sistema de detección de incendios, incluye base y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento.	UN	$ 380.475,00	3,00	1.141.425,00		$ -

8.4.1.7		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sensor multicriterio de temperatura y humo direccionable para el sistema de detección de incendios, incluye base y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento.	UN	$ 431.082,00	1,00	431.082,00		$ -
8.4.1.8		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de estación manual, incluye protector acrilico para el sistema de detección de incendios, incluye todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. incluye las referencias:	UN	$ 346.737,00	22,00	7.628.214,00		$ -
8.4.1.9		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sirena con luz estroboscopica para el sistema de detección de incendios, y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. 110cd	UN	$ 358.208,00	9,00	3.223.872,00		$ -
8.4.1.10		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sirena con luz estroboscopica para el sistema de detección de incendios, y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. 75cd	UN	$ 358.208,00	9,00	3.223.872,00		$ -
8.4.1.11		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de sirena con luz estroboscopica para el sistema de detección de incendios, y todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento. 15cd	UN	$ 300.950,00	3,00	902.850,00		$ -
8.4.1.12		suministro e instalación de módulo de monitoreo , incluye caja rawelt y accesorios de fijación.	UN	$ 975.711,00	4,00	3.902.844,00		$ -
8.4.1.13		suministro, instalación, y configuración de acuerdo a especificaciones técnicas de panel de incendios, gabinete, puerta, baterias, licencia de integración bacnet, todos los accesorios y actividades complementarias, para garantiar el correcto funcionamiento.	UN	$ 7.545.893,00	2,00	15.091.786,00		$ -
8,5		**SISTEMA DE AUDIO VOZ Y SONIDO**						
8.5.1		**EQUIPOS AUDIO VOZ Y SONIDO**						
8.5.1.1		Cuarto de sonido / EMISORA	UND	$ 36.123.966,00				$ -
8.5.1.2		Parlanteria remota	UND	$ 488.079,00				$ -
9		**RED DE AIRE ACONDICIONADO**						
9,1		**EQUIPOS**						

9.1.1		Suministro e instalacion Extractor heliccentrifugo de 560 CFM EXT-01, 03, 08, 10, 12 Y 14	UND	$ 1.200.629,00				$ -
9.1.2		Suministro e instalacion de Extractor heliccentrifugo de 640 CFM EXT-02, 04, 09, 11, 13 Y 15	UND	$ 1.602.053,00				$ -
9.1.3		Suministro e instalacion Extractor heliccentrifugo de 320 CFM EXT-05, 07 Y 19	UND	$ 810.189,00				$ -
9.1.4		Suministro e instalacion Extractor heliccentrifugo de 240 CFM EXT-06	UND	$ 815.425,00				$ -
9.1.5		Suministro e instalacion Extractor heliccentrifugo de 160 CFM EXT-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35	UND	$ 622.394,00				$ -
9,2		**CONDUCTOS**						
9.2.1		Construccion de Ductos en lamina galvanizada tdf, incluye (lamina, clips, esquineros, tornillo de carriaje, soporteria, mano de obra fabricacion e instalacion)	KG	$ 33.424,00				$ -
9.2.2		Suministro e instalacion de Aislamiento en fibra de vidrio duct wrap, incluye (aislamiento, cinta foil, pegante, soporteria, mano de obra fabricacion e instalacion)	M2	$ 60.056,00				$ -
9.2.3		Suministro e instalacion Acople flexible a equipos con lona	UND	$ 83.233,00				$ -
9,3		**TUBERIA DE REFRIGERACION**						
9.3.1		Suministro e instalacion Tuberia de cobre flexible de 1/2"incluye (tuberia, codo, union, soldadura, rubatex, soporteria y mano de obra de instalacion)	ML	$ 50.284,00				$ -
9.3.2		Suministro e instalacion Tuberia de cobre rigida de 1 1/8" tipo k, incluye (tuberia, codo, union, soldadura, rubatex, soporteria y mano de obra de instalacion)	ML	$ 97.690,00				$ -
9.3.3		Suministro e instalacion Accesorios de refrigeracion, incluye (filtro secador, indicador de liquido, valvulas, tuercas flare, termostato.. etc)	UND	$ 1.240.564,00				$ -
9.3.4		Gas refrigerante r-410a	LB	$ 23.765,00				$ -
9,4		**TUBERIA DE PVC**						
9.4.1		Suministro e instalacion Tuberia pvc sch 40 (rde21) de 4",incluye (tuberia, codo, union, tee, adaptador macho y hembra, union universal, soldadura, limpiador, cañuela preformada, soporteria y mano de obra de instalacion)	ML	$ 143.977,00				$ -
9,5		**CABLES DE CONTROL**						
9.5.1		Suministro e instalacion cable encauchetado 4x14 (no incluye tuberias)	ML	$ 8.959,00				$ -

9,6		**TUBERIA CABLEADA**						
9.6.1		Suministro e instalacion Tuberia electrica emt de 3/4", incluye accesorios, soporteria y mano de obra de instalacion	ML	$ 23.916,00				$ -
9.6.2		Suministro e instalacion Tuberia electrica imc de 3/4", incluye accesorios, soporteria y mano de obra de instalacion	ML	$ 44.027,00				$ -
9.6.3		Suministro e instalacion Coraza americana de 3/4", incluye accesorios, soporteria y mano de obra de instalacion	ML	$ 15.776,00				$ -
10		**INSTALACION ELECTRICA RED DE AIRE ACONDICIONADO**						
10,1		**TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA**						
10.1.1		Suministro e instalacion Tablero electrico de potencia RETIE 2013 para uma	UND	$ 2.712.209,00				$ -
10.1.2		Suministro e instalacion Star stop para cajas de venitilacion	UND	$ 831.077,00				$ -
10.1.3		Suministro e instalacion Star stop para extractores de cocina	UND	$ 1.163.762,00				$ -
10,2		**DIFUSORES**						
10.2.1		Suministro e instalacion Difusor de suminitro 4 vias de 14"X14"	UND	$ 187.792,00				$ -
10,3		**REJILLAS DE SUMINISTRO**						
10.3.1		Suministro e instalacion Rejilla de suminitro doble aleta de 20"X8"	UND	$ 147.889,00				$ -
10,4		**REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION**						
10.4.1		Suministro e instalacion Rejilla de retorno aleta fija de 6"X4" C.D.	UND	$ 52.750,00				$ -
10.4.2		Suministro e instalacion Rejilla de retorno aleta fija de 8"X4" C.D.	UND	$ 55.607,00				$ -
10.4.3		Suministro e instalacion Rejilla de retorno aleta fija de 8"X8" C.D.	UND	$ 70.805,00				$ -
10.4.4		Suministro e instalacion Rejilla de retorno aleta fija de 14"X8" C.D.	UND	$ 92.083,00				$ -
10.4.5		Suministro e instalacion Rejilla de retorno aleta fija de 18"X 8" C.D.	UND	$ 107.282,00				$ -
10.4.6		Suministro e instalacion Rejilla de reotno aleta fija de 72"X 14" C.D.	UND	$ 510.552,00				$ -
10,5		**REJILLAS TIPO LOUVER**						
10.5.1		Suministro e instalacion Rejilla tipo louver de 10"X6"C.D.	UND	$ 75.464,00				$ -
10.5.2		Suministro e instalacion Rejilla tipo louver de 12"X6"C.D.	UND	$ 83.620,00				$ -
10.5.3		Suministro e instalacion Rejilla tipo louver de 14"X8"C.D.	UND	$ 102.263,00				$ -
10.5.4		Suministro e instalacion Rejilla tipo louver de 18"X8"C.D.	UND	$ 119.740,00				$ -

10.5.5		Suministro e instalacion Rejilla tipo louver de 24"X22"C.D.	UND	$ 320.097,00				$ -
10.5.6		Suministro e instalacion Rejilla tipo louver de 28"X10"C.D.	UND	$ 196.643,00				$ -
10,6		**FILTROS DE AIRE**						
10.6.1		Suministro e instalacion Filtro para aire al 35%	UND	$ 268.619,00				$ -
11		**PAÑETES**						
11,1		**PAÑETES**						
11.1.1		Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	M2	$ 27.393,00	4.310,59	118.079.991,87	1.699,72	$ 46.560.429,96
11.1.2		Suministro y colocación de Pañete liso en mortero 1:3, incluye filos y dilataciones	M2	$ 21.495,00	517,59	11.125.597,05		$ -
12		**PISOS Y ENCHAPES**						
12,1		**PISOS**						
12.1.1		Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	M2	$ 100.796,00	4.489,05	452.478.283,80	3.635,40	$ 366.433.909,43
12.1.2		Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	M2	$ 92.154,00				$ -
12.1.3		Suministro e instalacion Piso en deck en madera, incluye estructura de apoyo, productos y elementos de fijación.	M2	$ 211.215,00	371,64	78.495.942,60		$ -
12.1.4		Suministro e instalacion Piso laminado en madera, incluye adhesivos y elementos de fijacion.	M2	$ 83.110,00	1.209,26	100.501.598,60		$ -
12.1.5		Suministro e instalacion Piso en alfombra argollada, incluye adhesivo y elementos de fijacion.	M2	$ 130.787,00	147,91	19.344.705,17		$ -
12.1.6		Construccion de Piso en concreto pulido 0.05-0.07 M de 3000 PSI allanado y afinado mecanicamente, con endurecedor de cuarzo color de acuerdo a plano de detalle de piso.	M2	$ 96.665,00	1.357,92	131.263.336,80		$ -
12.1.7		Suministro e instalacion Piso caucho linea infantil, diseño según planos de detalle de piso.	M2	$ 182.446,00	53,35	9.733.494,10		$ -
12.1.8		Suministro e instalacion Pisos con revestimientos epoxicos para alto trafico peatonal y zonas polideportivas, incluye productos imprimante y epoxico.	M2	$ 142.423,00	2.417,39	344.291.935,97		$ -

12.1.9		Suministro e instalación de grama de PAISAJISMO - Fibra: PP+PE - Rollo: Ancho 2.0M - Fibra polipropileno y backing en látex negro; en dos tonos de verde - REF: 30MM-1.822grs - Incluye mano de obra, adhesivo y transporte.	M2	$ 115.632,00	333,62	38.577.147,84		$ -
12.1.10		Construcción de Piso concreto (rayado o escobeado) en concreto de 3000 PSI e=0.10M	M2	$ 97.341,00	132,41	12.888.921,81	92,70	$ 9.023.510,70
12.1.11		Suministro e instalación de Piso VinilCaucho Importado en rollo - Heterogeneo - Formato Rollo: 2 m x 20 m - Espesor: 2,2 mm Tráfico Industrial - Tratamiento de doble capa PUR - Tecnología Easy Clean - Capa de fibra de vidrio que asegura estabilidad dimensional - Color: Por definir (el color elegido no cambia el precio de la cotización) - Abrasión: grupo T (mayor >P) - Químicamente inerte, Antibacterial, antimicrobiano. Retardante al fuego, auto extinguible - Suministro e instalación rinconera para media caña Tira de 3 - Suministro e instalación de cordon de soldadura.	M2	$ 178.816,00	721,14	128.951.370,24		$ -
12.1.12		Suministro e instalacion Piso en gramoquin prefacbricado 43X30X9 cm.	M2	$ 79.958,00	295,83	23.653.975,14		$ -
12.1.13		Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M	M2	$ 117.029,00	1.782,67	208.624.087,43	1.319,53	$ 154.423.276,37
12,2		**ENCHAPES**						
12.2.1		Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	M2	$ 72.737,00	1.579,34	114.876.453,58	762,98	$ 55.496.876,26
12.2.2		Suministro e instalacion de Poceta de aseo en granito pulido prefabricada	M2	$ 204.535,00	9,09	1.859.223,15		$ -
12.2.3		Suministro e instalacion de Poceta de ducha en granito pulido (incluye alistado y acabado granito pulido con dilataciones).	M2	$ 223.649,00	14,09	3.151.214,41		$ -
13		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**						
13,1		**CUBIERTAS**						
13.1.1		Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)	M2	$ 239.972,00	4.068,58	976.345.279,76	1.227,84	$ 294.647.220,48
13.1.2		Suministro e instalacion de cubierta plana en policarbonato alveolar 8mm traslucido (incluye accesorios de fijación)	M2	$ 82.281,00	1.315,35	108.228.313,35		$ -
13,2		**CANALES Y FLANCHES**						
13.2.1		Suministro e instalacion de Canal lamina galvanizada cal. 20 ds= 0.80m	ML	$ 169.039,00	216,91	36.666.249,49		$ -

13.2.2		Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada C 22	ML	$ 64.104,00	209,28	13.415.685,12		$ -
13,3		**IMPERMEABILIZACIONES**						
13.3.1		Afinado, pendientado e impermeabilizado de cubiertas planas en mortero 1:4 e=5 cm (incluye media caña)	M2	$ 47.829,00	3.542,36	169.427.536,44	1.726,85	$ 82.593.508,65
14		**APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS**						
14,1		**APARATOS SANITARIOS**						
14.1.1		Suministro e instalacion Lavamanos de colgar para discapacitados Tipo acuajet Institucional de corona	UND	$ 506.576,00	13,00	6.585.488,00		$ -
14.1.2		Suministro e instalacion Lavamanos redondo en acero inox 304 pulido 42Cm pando tipo corona	UND	$ 449.547,00	147,00	66.083.409,00		$ -
14.1.3		Suministro e instalacion Lavamanos de colgar porcelana tipo Milano blanco de corona	UND	$ 143.777,00	19,00	2.731.763,00		$ -
14.1.4		Suministro e instalacion Orinal Grande entrada superior de consumo de agua 3.8 lt por descarga tipo institucional de corona	UND	$ 341.363,00	27,00	9.216.801,00		$ -
14.1.5		Suministro e instalación sanitario de empotrar tipo institucional taza adriatica entrada posterior de corona	UND	$ 695.227,00	10,00	6.952.270,00		$ -
14.1.6		Suministro e instalacion Sanitario institucional para discapacitados taza adriatica entrada posterior corona	UND	$ 695.227,00	13,00	9.037.951,00	2,00	$ 1.390.454,00
14.1.7		Suministro e instalacion Sanitario Tipo Montecarlo advance Institucional de corona	UND	$ 695.227,00	75,00	52.142.025,00	11,00	$ 7.647.497,00
14.1.8		Suministro e instalacion Sanitario tipo kiddy infantil de corona	UND	$ 531.319,00	18,00	9.563.742,00		$ -
14.1.9		Suministro e instalacion Ducha antivandálica para personas discapacitadas empotrada en pared cabezal en A.B.S. tipo Haws.	UND	$ 615.850,00	10,00	6.158.500,00	1,00	$ 615.850,00
14,2		**GRIFERIAS Y ACCESORIOS**						
14.2.1		Suministro e instalacion de Grifería antivandalica para ducha	UND	$ 478.198,00	10,00	4.781.980,00		$ -
14.2.2		Suministro e instalacion de grifería antivandalica para lavamanos	UND	$ 443.096,00	147,00	65.135.112,00		$ -
14.2.3		Suministro e instalación de griferia tipo push para lavamanos	UND	$ 451.840,00	19,00	8.584.960,00		$ -
14.2.4		Suministro e instalacion de griferia especial para baños PMR	UND	$ 260.916,00	13,00	3.391.908,00		$ -
14.2.5		Suministro e instalacion de dispensador de jabon en acero inoxidable tipo institucional	UND	$ 207.760,00	89,00	18.490.640,00		$ -
14.2.6		Suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable tipo institucional	UND	$ 320.038,00	50,00	16.001.900,00		$ -
14.2.7		Suministro e instalacion de diapensador papel higienico en acero inoxidable tipo institucional	UND	$ 187.717,00	120,00	22.526.040,00		$ -
14.2.8		Kit de valvula de descargue para discapacitados	UND	$ 426.277,00	13,00	5.541.601,00		$ -
14.2.9		Kit de valvula de descargue	UND	$ 93.335,00	103,00	9.613.505,00		$ -

14.2.10		Kit de valvula de descargue para orinales	UND	$ 423.725,00	27,00	11.440.575,00		$ -
14.2.11		Suministro e instalacion Tapa registro 0.20 x 0.20	UND	$ 43.035,00	91,00	3.916.185,00		$ -
14.2.12		Suministro e instalacion Llave manguera 1/2" (suministro e instalación)	UND	$ 47.722,00	13,00	620.386,00		$ -
14.2.13		Suministro e instalacion barra en "L" de seguridad	UND	$ 433.869,00	13,00	5.640.297,00		$ -
15		**CIELO RASOS Y ESTRUCTURA LIVIANA**						
15,1		**CIELO RASO**						
15.1.1		Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall	M2	$ 126.495,00	740,00	93.606.300,00	464,11	$ 58.707.594,45
15.1.2		Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm	M2	$ 143.276,00	1.090,11	156.186.600,36	901,83	$ 129.210.595,08
15.1.3		Suministro e instalacion Cielo raso tipo tile natura de hunter douglas o similar (bandeja de madera laminada hr 100 de 16mm enchapado natural perfilería oculta)	M2	$ 194.337,00				$ -
15.1.4		Suministro e instalación de Cielorraso en panel de aluminio en alucobond	M2	$ 254.202,00				$ -
15,2		**ESTRUCTURA LIVIANA**						
15.2.1		Suministro e instalacion Panel de madera natura de Hunter Douglas o similar	M2	$ 135.782,00	100,14	13.597.209,48		$ -
15.2.2		Suministro e instalacion Muros cara sencilla en drywall 10 mm	M2	$ 143.351,00	570,86	81.833.351,86	50,34	$ 7.216.289,34
15.2.3		Suministro e instalacion Aislamientos acustifibra 1 1/2" o similar (muros y techos)	M2	$ 197.661,00	261,48	51.684.398,28		$ -
15.2.4		Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)	M2	$ 41.117,00	292,30	12.018.499,10	87,07	$ 3.580.057,19
16		**ESTUCO, PINTURA Y SEÑALIZACION**						
16,1		**ESTUCO Y PINTURA**						
16.1.1		Suministro y colocación de Estuco y pintura en vinilo tipo 1 (Incluye Filos y Dilataciones)	M2	$ 27.785,00	2.478,58	68.867.345,30	341,14	$ 9.478.574,90
16.1.2		Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Antibacterial a Base de Agua de Alta Resistencia	M2	$ 28.274,00	3.196,02	90.364.269,48	343,61	$ 9.715.229,14
16.1.3		Suministro y aplicación de Pintura Antibacterial media caña	ML	$ 26.725,00	914,31	24.434.934,75		$ -
16.1.4		Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	M2	$ 39.388,00	517,59	20.386.834,92	247,38	$ 9.743.803,44
16.1.5		Lavado e impermeabilización con hidrófugo para protección de mamposteria a la vista	M2	$ 18.462,00	1.899,28	35.064.507,36	458,50	$ 8.464.827,00
16,2		**SEÑALIZACION**						
16.2.1		Suministro y aplicación de Pintura líneal de demarcación parqueaderos, pintura a base de resinas acrilicas de secado rapido y resistencia a la abracion e intemperie debe cumplir con la norma NTC 1360, 7 mils.	ML	$ 24.610,00				$ -
16.2.2		Suministro y aplicación de Pintura m2 demarcación parqueaderos pintura a base de resinas acrilicas de secado rapido y resistencia a la abracion e intemperie debe cumplir con la norma NTC 1360, 7 mils.	M2	$ 37.772,00				$ -

17		**CARPINTERIA DE MADERA - MOBILIARIO**						
17,1		**MUEBLES FIJOS Y DIVISIONES EN MADERA**						
17.1.1		SILLA SKALA AUDITORIO (para fijar a concreto en perfil de sección oval de 40x80mm cal 12, asiento abatible por gravedad, bastidor del espaldar madera termolaminada, acojinamiento espuma inyecta de poliuretano densidad 50, tapicería en polipropileno o microfibra	UND	$ 933.614,00				$ -
17.1.2		Suministro e instalacion de muro en Division en lamina de madera y vidrio tipo G5 escoming o similar.	M2	$ 695.681,00				$ -
17,2		**MOBILIARIO INSTITUCIONAL**						
17.2.1		Suministro Kit de canecas grandes - Conjunto de tres canecas para separar papel, residuos orgánica, plástico y vidrio - zonas exteriores. Ver ficha tecnica SED.	UND	$ 682.889,00				$ -
17.2.2		Suministro Kit de canecas pequeñas - Conjunto de tres canecas para separar papel, basura orgánica, plástico y vidrio, ubicadas en las aulas. Ver ficha tecnica SED.	UND	$ 360.622,00				$ -
17.2.3		Suministro e instalación Puesto administrativo de recepcion y atencion a usuarios tipo counter - Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de cómputo, manejo de papelería, recepción y atención de usuarios - Ver ficha tecnica SED.	UND	$ 5.113.963,00				$ -
18		**CARPINTERIA METALICA**			1			
18,1		**CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO**						
18.1.1		Puerta ventana PYV01 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	202,73	111.702.405,43		$ -
18.1.2		Puerta ventana PYV02 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	503,49	277.418.458,59		$ -

18.1.3		Puerta ventana PYV03 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	295,51	162.823.350,41	9,69	$ 5.339.102,79
18.1.4		Puerta ventana PYV04 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	617,94	340.479.378,54	188,13	$ 103.657.936,83
18.1.5		Puerta ventana PYV05 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	62,15	34.244.090,65	33,73	$ 18.584.926,43
18.1.6		Puerta ventana PYV06 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	1.383,76	762.439.306,16	403,35	$ 222.242.219,85
18.1.7		Puerta ventana PYV07 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	17,90	9.862.738,90	2,34	$ 1.289.318,94
18.1.8		Puerta ventana PYV 08 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	M2	$ 550.991,00	26,85	14.794.108,35		$ -

18.1.9		Ventana PYV09 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01,02,02P, V04P).	M2	$ 399.127,00	16,68	6.657.438,36		$ -
18.1.10		Ventana PYV10 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-02,04P,V04).	M2	$ 399.127,00	5,65	2.255.067,55	0,93	$ 371.188,11
18.1.11		Ventana PYV11 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 02).	M2	$ 550.991,00	43,84	24.155.445,44	28,58	$ 15.747.322,78
18.1.12		Ventana PYV12 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 03T, DP02).	M2	$ 367.777,00	59,61	21.923.186,97	1,78	$ 654.643,06
18.1.13		Ventana PYV13 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-03T).	M2	$ 399.127,00	314,04	125.341.843,08		$ -
18.1.14		Ventana PYV14 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-03A).	M2	$ 399.127,00	2,88	1.149.485,76	1,91	$ 762.332,57
18.1.15		Cortina PYV15 enrollable, metálica tipo americano, rieles cold rolled cal 18, cuerpo en tubo de aluminio y varilla de acero. (Ver detalle arquitectónico planos DV 01B, 03T)	M2	$ 439.244,00	11,09	4.871.215,96		$ -
18.1.16		Ventana PYV16 en aluminio – perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – con ventanas fijas y proyectantes.	M2	$ 399.127,00	42,60	17.002.810,20		$ -
18.1.17		Puerta metálica PYV17 con marco en lámina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo, pintura de esmalte, resistente al fuego 120 minutos, nave en lámina metálica cal. 18 con núcleo de aislamiento en lana mineral de roca y sellamiento contra fuego, sistema de barra anti pánico y pintura de esmalte color, resistente al fuego. (Ver cartilla de colores)	M2	$ 1.503.140,00	24,20	36.375.988,00		$ -
18.1.18		Puerta metálica PYV18 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver cartilla de colores).	M2	$ 852.641,00	80,74	68.842.234,34	16,49	$ 14.060.050,09

18.1.19		Puerta metálica PYV19 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver cartilla de colores)	M2	$ 929.967,00	1,76	1.636.741,92		$ -
18.1.20		Puerta de reja de cerramiento con paral de tubo cuadrado de 50x50, tubo de 1/2" Y platinas de 2'X1/4	M2	$ 374.397,00	44,08	16.503.419,76		$ -
18.1.21		Puerta corrediza con marco en lámina cold rolled cal 18 con anticorrosivo color (ver cartilla de colores), nave corrediza entamborada en aglomerado tipo MDF con acabado laminado color (ver cartilla de colores), rejilla en madera, manija horizontal para halar largo de 60cm en aluminio, cerradura puerta corrediza	M2	$ 293.163,00	13,16	3.858.025,08		$ -
18.1.22		Puerta metálica PYV22 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (Ver cartilla de colores)	M2	$ 788.011,00	14,70	11.583.761,70	13,38	$ 10.543.587,18
18.1.23		Puerta metálica PYV23 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color (ver catilla de color), hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color (ver catilla de color), cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (ver catilla de color)	M2	$ 878.032,00	57,64	50.609.764,48	47,18	$ 41.425.549,76
18.1.24		Puerta metálica PYV24 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver cartilla de colores).	M2	$ 613.906,00	33,44	20.529.016,64		$ -
18.1.25		Puerta metálica PYV25 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (ver Planos detalle DP-01T, 02 y cartilla de colores)	M2	$ 774.163,00	60,00	46.449.780,00		$ -

18.1.26		Puerta metálica PYV26 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en marco de lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver plano detalle DP02B y cartilla de colores)	M2	$ 538.724,00	2,64	1.422.231,36		$ -
18.1.27		Puerta metálica PYV27 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (ver cartilla de colores)	M2	$ 974.885,00	1,20	1.169.862,00		$ -
18.1.28		Suministro e instalación de Pasamanos en tubo aguas negras de 2" e= 2.5mm soldado a paral principal, paral de apoyo para pasamanos de 1" x 3/8" soldada a paral principal, platina metalica horizontal de 2" x 3/4" soldada a paral principal, paral principal en platina metalica de 2" x 1/2" anclado a estructura, paral secundario en platina metalica de 2" x 3/8" soldado a platina horizontal.	ML	$ 139.047,00				$ -
18.1.29		Pasamanos en tubo aguas negras de 2" e= 2.5mm soldado a paral principal. paral de apoyo para pasamanos de 1" x 3/8" soldada a paral principal.	ML	$ 84.155,00				$ -
18,2		**ACERO INOXIDABLE**						
18.2.1		Suministro e instalación de división de baño, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)	M2	$ 642.808,00	215,26	138.370.850,08	158,42	$ 101.833.643,36
18.2.2		Suministro e instalación de faldón mesón lavamanos en acero inoxidable cal. 18 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304)	M2	$ 497.378,00	61,71	30.693.196,38		$ -
18.2.3		Suministro e instalación puerta de baño, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)	UND	$ 1.089.880,00	107,00	116.617.160,00	66,00	$ 71.932.080,00
18.2.4		Suministro e instalacion Parales en tubo de 1 1/2" en acero inoxidable	UND	$ 356.084,00	24,00	8.546.016,00		$ -
18.2.5		Suministro e instalación de división de baño infantil para preescolar, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)	M2	$ 657.035,00	62,51	41.071.257,85		$ -
19		**VIDRIOS TEMPLADOS Y ESPEJOS**						
19,1		**VIDRIOS TEMPLADOS**						

19.1.1		Suministro e instalacion vidrio templado 8 mm color (película intermedia pvb - proceso de autoclave - incluye elementos de instalación, perforaciones y bordes biselados)	M2	$ 165.478,00				$ -
19,2		**ESPEJOS**						
19.2.1		Suministro e instalacion de Lamina Espejo sin Moldura 4 mm, sin bicelar, con borde pulido. Fijado a la pared con cinta espumosa doble faz de alta adherencia, tipo 3M o similar.	M2	$ 131.822,00				$ -
19.2.2		Suministro e instalacion de Lamina Espejo baño PMR sin Moldura 4 mm, sin bicelar, con borde pulido. Fijado a la pared con cinta espumosa doble faz de alta adherencia, tipo 3M o similar.	M2	$ 131.822,00				$ -
20		**RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADAS**						
20,1		**FACHADAS**						
20.1.1		Recubrimiento de control solar para fachada Quadrobrise XLS de seccion 95 x 345 mm Tipo Hunter Douglas distancia perpendicular.	M2	$ 940.724,00	1.324,77	1.246.246.490,32		$ -
21		**OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO**						
21,1		**OBRAS EXTERIORES**						
21.1.1		Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	M3	$ 38.095,00	490,00	18.666.550,00	37,46	$ 1.427.038,70
21.1.2		Rellenos en material seleccionado proveniente de la excavación (no incluye material)	M3	$ 34.719,00				$ -
21.1.3		Suministro y colocacion Sub base granular b -600	M3	$ 112.875,00				$ -
21.1.4		Suministro y colocacion Sub base granular b -400	M3	$ 136.509,00	150,00	20.476.350,00	15,00	$ 2.047.635,00
21.1.5		Suministro e instalacion de Geotextil tejido pavco ref. 2400	M2	$ 8.609,00	2.070,00	17.820.630,00	1.737,21	$ 14.955.640,89
21.1.6		Cárcamo concreto 3000 PSI + rejilla prefabricada 0.40x 0.40m fibrit o similar (incluye refuerzo)	ML	$ 93.287,00	83,37	7.777.337,19		$ -
21.1.7		Construcción de Cunetas 3000 psi e = 0.10m	ML	$ 44.839,00	267,90	12.012.368,10		$ -
21.1.8		Construccion de Anden en concreto 3000 psi e = 0.10m	ML	$ 111.305,00	289,46	32.218.345,30		$ -
21.1.9		Construccion de Rampa en concreto 3000 PSI 0.10 - 0.12 m	M2	$ 102.095,00	24,49	2.500.306,55		$ -
21.1.10		Suminstro e instalacion de Sardinel prefabricado en concreto de 3000 PSI	ML	$ 133.589,00				$ -
21.1.11		Suminstro e instalacion de Bordillo fundido en sitúo ó prefabricado 0.20x0.50xl (incluye refuerzo)	ML	$ 62.029,00	341,93	21.209.575,97	279,90	$ 17.361.917,10
21.1.12		Suministro y colocacion de Concreto para escaleras de 3000 psi (21 mpa) sobre terreno	ML	$ 258.787,00	13,11	3.392.697,57		$ -

21.1.13		Cerramiento exterior tipo sed en malla eslabonada altura 2.4 (parales en tubo estructural 100x40x2 empotrado en dados de concreto cuerpos en ángulos de 2 1/2" - 1 1/4" x 3/16 -3/4 x 1/8", malla ondulada 2x2" 4mm, terminada con base imprimante epóxica y esmalte	ML	$ 1.042.751,00	295,87	308.513.683,34		$ -
21.1.14		Suministro e instalacion de Adoquines trafico peatonal 20x10x8 cm, incluye capa de arena suministro e instalacion	M2	$ 130.801,00				$ -
21.1.15		Suministro e instalacion Loseta tactil alerta 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	M2	$ 94.527,00	6,15	581.341,05	1,92	$ 181.491,84
21.1.16		Suministro e instalacion Loseta tactil guia 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	M2	$ 96.557,00	12,00	1.158.684,00	6,72	$ 648.863,04
21.1.17		Suministro e instalacion Loseta cuadratica 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena	M2	$ 99.299,00	686,23	68.141.952,77	459,96	$ 45.673.568,04
21.1.18		Construccion de bancas en concretos dados 50 x 50	M3	$ 270.770,00				$ -
21.1.19		Suministro e instalacion bicileteros tipo 1 IDU 1.40 x 0.50M de 6 puestos (Incluye elementos de instalcion y fijacion)	UND	$ 609.672,00				$ -
21.1.20		Malla textil en poliéster con sublimación en el total de la superficie y refuerzo externo en reata para tensar, y ojales en reata cada 75 cm.	M2	$ 61.258,00				$ -
21,2		**MOBILIARIO URBANO**						
21.2.1		Suministro e instalacion Protector de arbol - protector de arbol fabricado en tubo de 2" a.n , terminacion pintura en polvo de alta resisitenca a la intemperie.	UND	$ 204.575,00				$ -
21.2.2		Suministro e instalacion Contenedor de raices - Caja prefabricada en concreto 30x25x60cm; tipo Cartilla de andenes SED o similar.	UND	$ 109.140,00				$ -
21.2.3		Suministro e instalacion Tope llanta prefabricado en concreto - Tipo B 15X20X50 con herraje.	UND	$ 59.372,00				$ -
21,3		**PAISAJISMO**						
21.3.1		especie arborea chicala h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 205.335,00				$ -

21.3.2		especie arborea falso pimiento h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 236.551,00				$ -
21.3.3		especie arborealiquidambar h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 406.056,00				$ -
21.3.4		especie arborea ligustro h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 204.775,00				$ -
21.3.5		especie arborea eucalipto pomarroso h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 232.737,00				$ -
21.3.6		especie arborea palma fenix h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 406.062,00				$ -
21.3.7		especie arborea roble australiano h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 302.034,00				$ -
21.3.8		especie arborea jazmin dela china h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 204.774,00				$ -
21.3.9		especie arborea chicala rosado h= 1.5 m (incluye suministro, siembra, tierra negra 4.5.17 y tutor - transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado a 28 km)	UND	$ 232.737,00				$ -
21.3.10		taludes y zonas verdes ornamentales - pennisetum tipo 1 (pennisetum alopecuroides) h= 10 a 15 cm (incluye suministro, siembra, tierra negra y abono)	UND	$ 44.366,00				$ -
21.3.11		taludes y zonas verdes ornamentales - pasto kikuyo (penisetum clnadestinum h= 10 a 15 cm (incluye suministro, siembra, tierra negra y abono)	UND	$ 24.805,00				$ -
21.3.12		taludes y zonas verdes ornamentales lantanas h= 10 a 15 cm (incluye suministro, siembra, tierra negra y abono)	UND	$ 44.366,00				$ -
22		**SEÑALETICA**						
22,1		**IDENTIFICACION EXTERIOR**						

22.1.1		Suministro e instalacion Señal Identificación Institucional, todo el conjunto=1350x500x5 mm (L x h x e) o menos según se requiera, elaboradas en fundición de aluminio, en letras y caracteres individuales, pulidas hasta un acabado semimate, instaladas con pernos galvanizados, según lineamientos SED - (uso "El escudo de la Secretaría, el texto Secretaría de Educación y el texto Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá")	UND	$ 361.622,00				$ -
22,2		**INFORMATIVAS**						
22.2.1		Suministro e instalacion Señal Directorio, 600x1000 mm (a x h); base de lámina de aluminio, temple y aleación de grado alto, superficie externa fondeado en azul institucional por pintura electrostática; textos y escudo del Distrito estampados por serigrafía en tintas UV; los demás textos, pictogramas y flechas direccionales en vinilos autoadhesivos montados en la lámina de policarbonato de 3mm sobre su cara inversa; anclajes y tornillos bristol galvanizados; según lineamientos SED - (uso Directorio general y de cada piso)	UND	$ 201.001,00				$ -
22.2.2		Suministro e instalacion Cartelera General Tipo abierta, 600x1000 mm (a x h); base de lámina galvanizada, tapizado en base de corcho recubierta con paño de telar; lateral con lámina galvanizada recubierta en pintura electrostática blanco regio (porcelanizada) para escritura con fluomaster seco borrable; logosímbolo estampado por serigrafía; textos, pictogramas y flechas direccionales en vinilos autoadhesivos montados en remates de policarbonato 2mm sobre su cara inversa; perfiles doblados, acoples en acrílico pigmentado de fábrica (rojo); pernos y bujes de aluminio maquinados, con espaciadores; según lineamientos SED - (uso Cartelera de uso general)	UND	$ 145.333,00				$ -
22,3		**NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS**						
22.3.1		Suministro e instalacion Señal Avisos de Evacuación, 500x200mm (L x h); caja en lámina de aluminio, lámina deflectora en galvanizado cal.26 sin pintar; textos , pictogramas y flechas direccionales en vinilos translúcidos autoadhesivos montados sobre lámina de acrílico cristal mate 2mm por su cara inversa, iluminación interna fluorescente 2x32w; según lineamientos SED - (uso Fechas e Indicaciones para Salidas de Emergencia)	UND	$ 86.320,00				$ -
22,4		**IDENTIFICACIÓN INTERIOR**						

22.4.1		Suministro e instalacion Señal Identificación de Aulas Especificas, 300x150 mm (a x h); lámina de aluminio temple 6 cal.2mm, fondo en pintura epóxica electrostática horneable tonos de azul, amarillo, rojo, blanco y otros según corresponda el grado escolar; textos en serigrafía con tintas Ultra violeta; anclajes y tornillos bristol galvanizados; según lineamientos SED - (uso Preescolar, Primaria, Cuarto, etc.) Identificacion Aulas, Administracion y Dependencias	UND	$ 73.893,00				$ -
22.4.2		Suministro e instalacion Señal Identificación de Servicios Comunes, 120x155 mm (a x h); lámina de aluminio temple 6 cal.2mm, fondo en pintura epóxica electrostática horneable tonos de azul, amarillo, rojo, blanco y otros según corresponda el grado escolar; textos, pictogramas y flechas direccionales impresos por serigrafía en tintas Ultra violeta; anclajes y tornillos bristol galvanizados; según lineamientos SED - Baños generico, Escaleras, Enfermeria, Comedor, Cocina, Aseo, Basuras, Cuartos Tecnicos, etc	UND	$ 110.546,00				$ -
23		**EQUIPOS ESPECIALES**						
23,1		**EQUIPOS DE COCINA**						
23.1.1		Suministro e instalacion Extractor tipo hongo de 3000 CFM	UND	$ 5.155.109,00				$ -
23.1.2		Suministro e instalacion Extractor tipo hongo de 3500 CFM	UND	$ 8.337.333,00				$ -
23.1.3		Suministro e instalacion Extractor tipo hongo de 2400 CFM	UND	$ 4.767.478,00				$ -
23.1.4		Suministro e instalacion Caja de ventilacion de 1300 CFM	UND	$ 2.182.735,00				$ -
23.1.5		Suministro e instalacion Extractor tipo plafon de 80 CFM	UND	$ 214.912,00				$ -
23.1.6		Suministro e instalacion Unidad manejadora de 7.5 TR	UND	$ 10.223.473,00				$ -
23.1.7		Suministro e instalacion de UNIDAD CONDENSADORA DE 7.5 TR	UND	$ 13.379.266,00				$ -
24		**MUEBLES Y MESONES**						
24,1		**MESONES**						
24.1.1		Construccion de meson en concreto Acabado en granito pulido fundido en sitio con formaleta metálica, con salpicadero y cortagotera. Pendiente 1%. Ver detalles de Elementos no Estructurales.	M2	$ 139.088,00	62,00	8.623.456,00	44,51	$ 6.190.250,53

24.1.2		Suministro e instalacion de meson entamborado De madera. Grosor 23 mm, enchapado con triplex de 4mm (4mm + 72mm + 4mm), caras vistas en flormorado. Cantos vistos con marquete de madera maciza de flormorado de 23x10mm. Dilataciones de 5mm entre piezas. Acabado en sellador poro cerrado y laca semimate de base nitrocelulosa.	M2	$ 44.066,00				$ -
24.1.3		Construccion de meson en concreto reforzado de 3000 PSI fundido en sitio con formaleta metálica. VER DISEÑO ESTRUCTURAL.	M3	$ 561.015,00				$ -
24.1.4		Suministro e instalacion banca en madera maciza Flormorado Listones de 150mmx50mm. Ensamble tipo "cola de pato o milano" entre patas y banca.	M2	$ 763.037,00				$ -
24.1.5		Suministro e instalacion meson entamborado De madera. Grosor 80 mm, enchapado con triplex de 80mm (4mm+72mm+4mm),caras vistas en flormorado. Cantos vistos con marquete de madera maciza de flormorado de 80x10mm. Dilataciones de 5mm entre piezas. Acabado en sellador poro cerrado y laca semimate de base nitrocelulosa tipo Phillac. Todas las maderas deben cumplir con todas las normas NTC / SED / ICONTEC, en cuanto a niveles de humedad, estabilidad dimensional, control de plagas, procedencia y similares.	M2	$ 53.922,00				$ -
24,2		**MUEBLES**						
24.2.1		Suministro e instalacion pozuelo Solo y grifo con control de torrente automático en acero inoxidable para incrustar en bebedero de concreto. Rejilla de desagüe removible. Conexión de suministro. Marca Halsey Taylor AC-6000 o similar.	UN D	$ 684.700,00				$ -
24.2.2		Suministro e instalacion poyo en concreto Concreto reforzado de 3000 PSI para apoyo y soporte de perfiles en hierro fundido y listones en madera de mueble exterior.	M3	$ 570.950,00				$ -
24.2.3		Suministro e instalacion banca corrida Placa superior en concreto reforzado de 3000 PSI. A la vista. (Ver detalles de Elementos no Estructurales) y muros de soporte en ladrillo tolete tipo rejilla prensado liviano coral tipo Santa fé o similar.	M3	$ 1.371.536,00				$ -

24.2.4		Suministro e instalacion entrepaño entamborado De madera. Enchapado con triplex de 4mm (4mm + 72mm + 4mm), caras vistas en flormorado. Cantos vistos con marquete de madera maciza de flormorado de 23x10mm. Dilataciones de 5mm entre piezas. Acabado en sellador poro cerrado y laca semimate de base nitrocelulosa.	M2	$ 58.447,00				$ -
24.2.5		Suministro e instalacion de puertas mueble PUERTA ENTAMBORADA de madera. Grosor 23mm, enchapado con triplex de 4mm (4mm+15mm+4mm), en flormorado las caras vistas. Cantos vistos con marquete de madera maciza de flormorado de 23x10mm. Acabado en sellador poro cerrado y laca semimate de base nitrocelulosa tipo Phillac. Manija de madera maciza de flormorado de 20x200mm. Cerrojo. Pivotes en acero inoxidable. Todas las maderas deben cumplir con todas las normas NTC / SED / ICONTEC, en cuanto a niveles de humedad, estabilidad dimensional, control de plagas, procedencia y similares.	M2	$ 75.741,00				$ -
25		**ZONAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**						
25		**ZONAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**						
25,1		Suministro e instalacion de Dotacion polideportiva mobil (incluye arcos microfutbol, cestas baloncesto, parales voleybol y sus mallas)	UND	$ 4.700.398,00				$ -
25,2		Suministro e instalacion Parque infantil grande	UND	$ 28.449.540,00				$ -
25,3		Suministro e instalacion Parque infantil pequeño	UND	$ 18.716.730,00				$ -
25,4		Suministro e instalacion Parque infantil modulado	UND	$ 33.545.089,00				$ -
26		**ASEO**						
26		**ASEO**						
26,1		Aseo Permanente en Obra	Dia	$ 80.640,00	576,00	46.448.640,00	508,00	$ 40.965.120,00
26,2		Aseo Final	M2	$ 3.450,00	10.580,06	36.501.198,97	243,00	$ 838.350,00
26,3		Retiro de Escombros y Sobrantes	M3	$ 55.876,00	1.549,86	86.599.977,36	1.218,29	$ 68.073.172,04
27		**SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR**						
27		**SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR**						

27,1		Suministro e instalacion de Paneles Solares 475Wp, Eficiencia 21.16%, Garantía 12 Años- 92150 Wp, Incluye: Suministro e instalacion de Inversor 100Kwp Incluye Tarjeta De Monitoreo Wifi, 6 MPPT, 1000VDC, 400VAC, Garantía 5 Años - Suministro e instalacion Estructura En Aluminio Alurack Para fijación Paneles Solares, Incluye Tornilleria - Suministro e instalacion de Eclam y Mclam En Aluminio Alurack Para fijación De Paneles Solares - Transformador seco tipo H 100KVA , 400/208V - Acometida DC 1000V,6MMQ - Acometida Ac, Canalizaciónes, Protecciónes electrica, Cofres y accesorios en AC.	Kwp	$ 2.919.658,00				$ -
28		**NO PREVISTOS**						$ -
28,1	NP	Mejoramiento de terreno y deteccion de fallos	M2	$ 3.657,83	7.723,68	28.251.908,41	6.252,00	$ 22.868.753,16
28.2	NP	Tratamiento de fallos	M3	$ 137.549,15	2.500,00	343.872.875,00	2.133,07	$ 293.401.965,39
28.3	NP	Reemplazo de material organico por Recebo Común	M3	$ 88.233,04	1.610,00	142.055.194,40	1.397,67	$ 123.320.673,02
28.4	NP	Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m	ml	$ 117.227,00	520	60.958.040,00	406,74	$ 47.680.909,98
28.5	NP	Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.49 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	m3	$ 1.286.253,00	470,8	605.567.912,40	411,80	$ 529.678.985,40
28.6	NP	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting y acero de refuerzo)	ml	$ 10.170,00	23984,24	243.919.720,80	17.526,16	$ 178.241.047,20
28,7	NP	Suministro e instalación de piezometros de 10 ml de profundidad, incluye perforaciones.	ml	$ 10.597.007,00	2	21.194.014,00		$ -
28,8	NP	Lectura de piezometros de profundidad 10 ml. Incluye Informe de resultados	un	$ 665.223,00	48	31.930.704,00		$ -

28.9	NP	Junta de dilataccion mamposteria interior	m	$ 5.274,00	5711	30.119.814,00		$ -
28.10	NP	Junta de dilataccion mamposteria exterior	m	$ 6.079,00	8397	51.045.363,00		$ -
28.11	NP	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación)	m2	$ 115.877,00	754,22	87.396.750,94	127,97	$ 14.828.779,69
28.12	NP	Guardaescobas baldosa vibroprensada biselado grano de marmol. Dim.: h= 10 x L= 30 cm Ref: Perlato claro grano 3 fondo crema.	m	$ 31.154,00	2393,95	74.581.118,30	311,82	$ 9.714.440,28
28.13	NP	Guarda escobas Madera. Dim. H= 10 x L= 30cm. Para pisos en deck y laminados.	m	$ 26.105,00	712,27	18.593.808,35		$ -
28.14	NP	Media caña en granito - 10*10*100 CM remate de piso con mediacaña en granito, referencia similar al piso blanco huila.	m	$ 58.430,00	918,0888565	53.643.931,88	479,25	$ 28.002.577,50
28.15	NP	Suminstro y colocacion de Concreto bombeable para columnas de Rampa 3,000 PSI (28 Mpa)	m3	$ 753.873,00	10,5	7.915.666,50	10,50	$ 7.915.666,50
28.16	NP	Desmonte, desarme parque infantil grande y empaque en plastico- vinipel	un	$ 1.785.000,00	2	3.570.000,00	2,00	$ 3.570.000,00
28.17	NP	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	m2	$ 34.150,00	6736,84	230.063.086,00	5.228,37	$ 178.548.835,50
28.18	NP	Procedimiento de rescatar una colmena de abejas establecidas, incluye aplicación de productos que eliminen las feromonas logrando asi que no regresen las abejas	gl	$ 300.000,00	1	300.000,00	1,00	$ 300.000,00
28.19	NP	Suministro e instalación de resina impermeabilizante y membrana (incluye aditivos repelentes)	m2	$ 60.420,00	2523,28	152.456.577,60		$ -
28.20	NP	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	m	$ 58.086,00	1577,67	91.640.539,62	1.177,92	$ 68.420.661,12

28.21	NP	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.	m	$ 84.549,00	885,75	74.889.276,75	544,94	$ 46.074.132,06
28.22	NP	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO III INCLUYE (VALVULA ANGULARES 1-1/2", VALVULA ANGULAR 2-1/2", TAPA CADENA 2-1/2", MANGUERA CHTA SENCILLA 150 PSI X 100 FT 1-1/2, BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO 1-1/2", HACHA PICO 4.5 IB, LLAVE SPANNER, EXTINTOR POLVO SECO ABC 10 LBS	un	$ 1.981.387,00	31	61.422.997,00	17,00	$ 33.683.579,00
28.23	NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS (INCLUYE BRIDA SANITARIA)	un	$ 624.692,00	93	58.096.356,00	73,00	$ 45.602.516,00
28.24	NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA ORINAL PUSH ENTRADA SUPERIOR EMPOTRADA	un	$ 624.692,00	27	16.866.684,00	24,00	$ 14.992.608,00
28.25	NP	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	m	$ 83.516,00	3947,13	329.648.509,08	3.789,25	$ 316.463.003,00
28.30	NP	Suministro e instalación de perfil 100 X 100 X 30 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural	ML	$ 208.710,00	840	175.316.400,00	674,56	$ 140.787.417,60
28.36	NP	Suministro e instalación tanque horizontal de 10.000 LTS	UN	$ 17.811.824,00	2	35.623.648,00		$ -
28.49	NP	Suministro e instalacion de bandeja de lamina galvanizada calibre 18 para fachada flotante , de acuerdo a los diseños	M2	$ 252.000,00	686,88	173.093.760,00		
28.53	NP	Suministro e instalacion de Baranda con Pasamanos principal y secundario en tubos cold rolled de 2" calibre 16 soldado a paral principal en tubo cuadrado calibre 16 de 50x 50 mm, platina dilatadora de 1 1/2/ x 3/16" soldada a paral principal, estructura principal de baranda con marco en tubo cold rolled rectangular de 50 x 2 mm calibre 18 y tejido en tubo Cold Rolled, placa de anclaje 120x120x 1/4" pernos de anclaje de 1/2" x 3" expansivo (Segun muestra entregada en obra)	ML	$ 540.000,00	196,81	106.277.400,00		

28.54	NP	Suministro e instalacion de Pasamanos en tubo cold rolled de 2" calibre 16 soldado a paral principal en tubo cuadrado cal 16 soldado a paral principal en tubo cuadrado cal 16 50x50 mm, (tubo secuntario en cold rolled 1 1/2" calibre 18, platina dilatadora de 1 1/2" x 3/16" placa de anclaje 120x120x1/4", pemos de anclaje de 1/2x3" expansivo. (Segun muestra entregada en obra)	ML	$ 249.400,00	660	164.604.000,00			
		COSTO TOTAL				35.226.978.110,00	52,32%	$	18.431.384.275,00

Gráfica "Curva S" con seguimiento a la programación mediante el avance físico de la obra.

Actualmente se tiene un avance del 52.58% versus un ejecutado versus un programado del 97.09%.

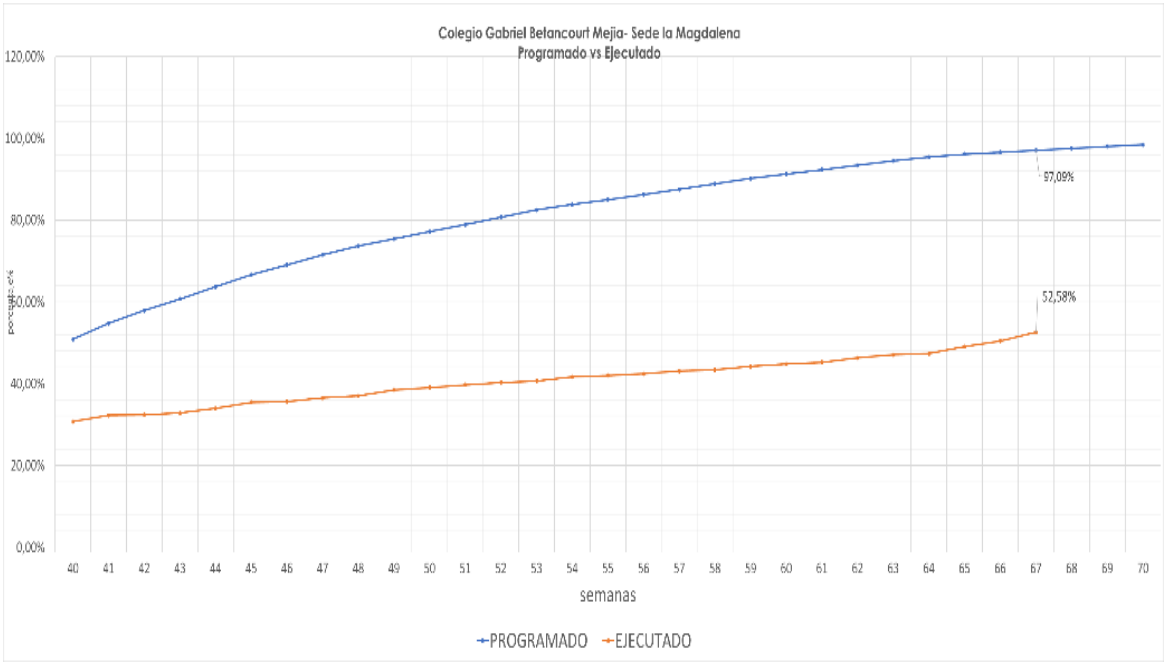


Diagrama de Gantt con seguimiento a avance físico de la obra.

Se realiza seguimiento a la programación presentada cuyo resultado es:

	Actividad			EJECUTADO		
	Valor	Total	PROGRAMADO	EJECUTADO		ATRASO
1	23-may-22	29-may-22	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
2	30-may-22	5-jun-22	0,00%	$ 191.377,08	0,00%	0,00%
3	6-jun-22	12-jun-22	0,01%	$ 382.754,17	0,00%	0,00%
4	13-jun-22	19-jun-22	0,01%	$ 574.131,25	0,00%	-0,01%
5	20-jun-22	26-jun-22	0,05%	$ 5.358.558,35	0,02%	-0,04%
6	27-jun-22	3-jul-22	0,34%	$ 5.435.109,18	0,02%	-0,33%
7	4-jul-22	10-jul-22	0,64%	$ 58.441.922,10	0,17%	-0,47%
8	11-jul-22	17-jul-22	0,89%	$ 59.962.677,97	0,17%	-0,72%
9	18-jul-22	24-jul-22	1,05%	$ 73.976.426,59	0,21%	-0,84%
10	25-jul-22	31-jul-22	1,38%	$ 93.507.674,07	0,27%	-1,12%
11	1-ago-22	7-ago-22	1,63%	$ 126.007.554,09	0,36%	-1,27%
12	8-ago-22	14-ago-22	1,79%	$ 175.421.649,91	0,50%	-1,30%
13	15-ago-22	21-ago-22	1,80%	$ 212.701.256,87	0,60%	-1,20%

14	22-ago-22	28-ago-22	1,80%	$	236.331.238,07	0,67%	-1,13%
15	29-ago-22	4-sep-22	1,81%	$	300.448.428,69	0,85%	-0,95%
16	5-sep-22	11-sep-22	2,09%	$	500.591.142,98	1,42%	-0,67%
17	12-sep-22	18-sep-22	3,01%	$	776.111.691	2,20%	-0,81%
18	19-sep-22	25-sep-22	4,26%	$	890.219.194	2,53%	-1,73%
19	26-sep-22	2-oct-22	5,81%	$	1.747.923.213,43	4,96%	-0,85%
20	3-oct-22	9-oct-22	7,83%	$	1.902.725.952,94	5,40%	-2,43%
21	10-oct-22	16-oct-22	9,28%	$	2.408.015.142	6,84%	-2,44%
22	17-oct-22	23-oct-22	10,55%	$	2.862.266.963	8,13%	-2,42%
23	24-oct-22	30-oct-22	12,15%	$	3.091.956.543,12	8,78%	-3,38%
24	31-oct-22	6-nov-22	14,07%	$	3.539.045.953,97	10,05%	-4,03%
25	7-nov-22	13-nov-22	15,65%	$	3.959.808.529,07	11,24%	-4,41%
26	14-nov-22	20-nov-22	17,26%	$	4.270.394.429	12,12%	-5,14%
27	21-nov-22	27-nov-22	18,67%	$	4.968.663.658	14,10%	-4,57%
28	28-nov-22	4-dic-22	20,11%	$	5.358.023.392,12	15,21%	-4,90%
29	5-dic-22	11-dic-22	21,22%	$	5.852.414.212,32	16,61%	-4,60%
30	12-dic-22	18-dic-22	22,42%	$	6.035.899.991,71	17,13%	-5,29%
31	19-dic-22	25-dic-22	23,65%	$	7.177.491.431	20,37%	-3,27%
32	26-dic-22	1-ene-23	25,22%	$	9.081.308.531	25,78%	0,56%
33	2-ene-23	8-ene-23	27,31%	$	9.628.762.123	27,33%	0,03%
34	9-ene-23	15-ene-23	29,97%	$	9.811.963.554	27,85%	-2,12%
35	16-ene-23	22-ene-23	32,71%	$	10.047.766.345	28,52%	-4,19%
36	23-ene-23	29-ene-23	35,74%	$	10.136.025.558	28,77%	-6,96%
37	30-ene-23	5-feb-23	39,54%	$	10.277.309.053	29,17%	-10,37%
38	6-feb-23	12-feb-23	43,21%	$	10.325.445.455	29,31%	-13,90%
39	13-feb-23	19-feb-23	46,98%	$	10.680.427.791	30,32%	-16,66%
40	20-feb-23	26-feb-23	50,87%	$	10.839.853.488	30,77%	-20,10%
41	27-feb-23	5-mar-23	54,77%	$	11.361.897.223	32,25%	-22,52%
42	6-mar-23	12-mar-23	57,91%	$	11.419.867.966	32,42%	-25,49%
43	13-mar-23	19-mar-23	60,70%	$	11.577.421.467	32,87%	-27,84%
44	20-mar-23	26-mar-23	63,69%	$	11.964.127.159	33,96%	-29,73%
45	27-mar-23	2-abr-23	66,66%	$	12.495.166.782	35,47%	-31,19%
46	3-abr-23	9-abr-23	69,05%	$	12.556.119.509	35,64%	-33,40%
47	10-abr-23	16-abr-23	71,52%	$	12.877.823.244	36,56%	-34,96%
48	17-abr-23	23-abr-23	73,66%	$	13.047.554.175	37,04%	-36,62%
49	24-abr-23	30-abr-23	75,42%	$	13.556.180.758	38,48%	-36,94%
50	1-may-23	7-may-23	77,17%	$	13.763.154.840	39,07%	-38,10%
51	8-may-23	14-may-23	78,91%	$	13.993.843.787	39,72%	-39,19%
52	15-may-23	21-may-23	80,73%	$	14.200.549.645	40,31%	-40,42%
53	22-may-23	28-may-23	82,49%	$	14.327.995.540	40,67%	-41,82%
54	29-may-23	31-may-23	83,81%	$	14.679.724.688	41,67%	-42,14%

55	5-jun-23	11-jun-23	85,04%	$ 14.802.683.685,08	42,02%	-43,02%
56	12-jun-23	18-jun-23	86,25%	$ 14.943.063.836,00	42,42%	-43,83%
57	19-jun-23	25-jun-23	87,55%	$ 15.174.744.303,57	43,08%	-44,47%
58	26-jun-23	2-jul-23	88,87%	$ 15.276.701.613	43,37%	-45,51%
59	3-jul-23	9-jul-23	90,19%	$ 15.590.991.520	44,26%	-45,93%
60	10-jul-23	16-jul-23	91,30%	$ 15.783.372.680	44,80%	-46,50%
61	17-jul-23	23-jul-23	92,33%	$ 15.926.610.976	45,21%	-47,12%
62	24-jul-23	30-jul-23	93,42%	$ 16.322.779.576	46,34%	-47,09%
63	31-jul-23	6-ago-23	94,51%	$ 16.586.342.665	47,08%	-47,42%
64	7-ago-23	13-ago-23	95,42%	$ 16.680.825.192	47,35%	-48,07%
65	14-ago-23	20-ago-23	96,12%	$ 17.292.120.616	49,09%	-47,03%
66	21-ago-23	27-ago-23	96,61%	$ 17.773.201.562	50,45%	-46,16%
67	28-ago-23	31-ago-23	97,09%	$ 18.523.147.480	52,58%	-44,51%

Tabla 8. Avance de valores programados vs ejecutado

ATRASOS


Este consorcio se encuentra ejecutando múltiples frentes de trabajo, e intervino varias actividades a medida que la obra lo permite, se tramito balance con solicitud de adición a lo cual no se ha recibido respuesta formal por parte de la ERU, si existe la posibilidad de adicionar los recursos o por si el contrario hay que definir el alcance del contrato.

Se tiene un atraso del 44.51% gran parte de los atrasos de obra se presentan por diferentes causales como lo son: afectaciones por factores climáticos, logísticos e inconvenientes generados por la ocupación del colegio, como se muestra a continuación:

FACTORES CLIMATOLOGICOS:

Durante el presente mes se presentaron lluvias en los 9 días de los 25 días laborales del mes, teniendo una afectación de 13 horas que equivale a 2 días de trabajo.

Dia	Horas de lluvia
1	0.5
2	1
3	1
9	4
10	2
15	1
17	1
18	0.5
19	2
Total	13

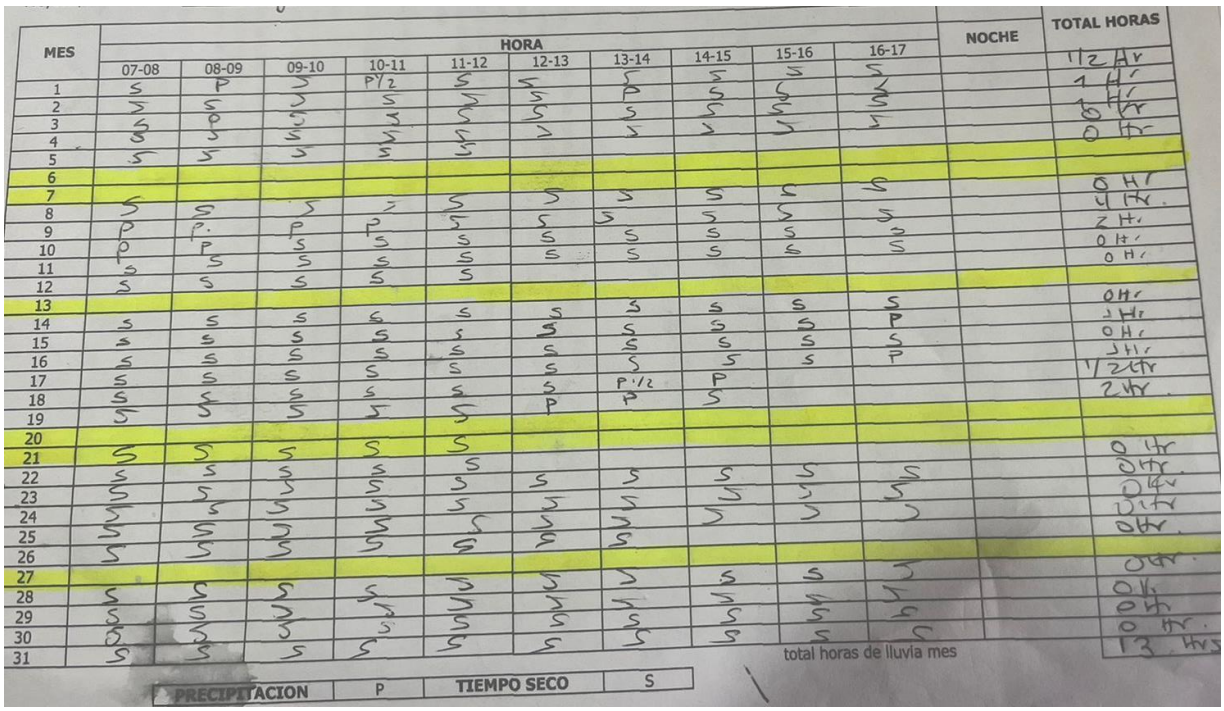

AFECTACIONES POR LLUVIAS:

Las lluvias impiden el desarrollo de actividades en altura, como son la ornamentación (instalación de estructura metálica de cubierta), todas las actividades de mampostería que requieren andamio, otra actividad es estructura (armado de acero), instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, RCI todas son aéreas y requieren el uso de andamio.

CONTINGENCIAS POR LLUVIAS:

Cuando se presentan lluvias el personal no debe seguir trabajando en actividades de alturas, razón por la que el personal procede a bajarse y a desarrollar actividades de piso, bien sea aseo y/o adelantar la actividad que se pueda.

Como medida de mitigación se trabaja en horarios extendidos, y/o los fines de semana

- Sábado 5 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 2:00 pm, personal de estructura. Para armado de placa bloque I actividades de estructura metálica.
- Lunes 14 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 6:00 pm, personal de estructura.
- Jueves 17 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 6:00 pm, personal de estructura.
- Sábado 19 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 3:00 pm, personal de estructura.
- Domingo 20 de Agosto: se labora en actividades hidrosanitarias y limpieza y lavado de mampostería
- Lunes 21 de agosto (festivo): se adelantan actividades hidrosanitarias, de limpieza y lavado de mampostería, instalación de

pisos y enchapes y estructura metálica.
- Viernes 25 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 7:45 pm, personal de estructura. Para fundida de concreto estampado y descimbre de placa de modulo O.
- Sábado 26 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 5:00 pm, actividades de instalación de cubierta, estructura metálica, impermeabilización.
- Domingo 27 de agosto: se labora en actividades de instalación de cubierta, estructura metálica
- Martes 30 de agosto: Se extiende la jornada laboral hasta las 6:00 pm, personal de estructura.

OCUPACION DEL COLEGIO

Actualmente se encuentra en funcionamiento el colegio Gabriel Betancourt Mejía, lo que impide el desarrollo de unas estructuras que ya debían haberse iniciado según programación, como lo son los bloques, J, K y Q y exteriores (zonas deportivas), esto a raíz de una condicionante de entrega por parte de la entidad que requiere la entrega de los bloques del A al E, para poder entregar la totalidad de las áreas, y que así el colegio siga en funcionamiento.

Esto también ocasiono que el acceso a la obra se haya tenido que mover en 4 oportunidades, cambiando la planeación del proyecto.

Se acordó entre las partes realizar la entrega de los bloques A al E con el fin de que el colegio se pudiera trasladar, Sin embargo, se han detectado contratiempos (demoras en la aprobación de item no previstos, atrasos por factores climáticos, dificultades con proveedores) lo que ha atrasado la entrega de estas zonas, Por actividades no previstas, mayores cantidades de obra de tal manera que nos encontramos a la espera de respuesta por parte de la entidad contratante sobre la solicitud de adición y prorroga al contrato para realizar la totalidad de las entregas de las actividades contratadas.

Se han remitido los siguientes comunicados.

- Documento CCERU-22-622 ANALISIS BALANCE DE OBRA, MAYORES, MENORES CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS. – 21 de abril de 2023.
- Documento CCERU-22-704 SOLICITUD ANTICIPO ADICION 1 Y MODIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL ALCANCE DE LA ADMINISTRACIÓN (AIU) – 26 de mayo de 2023.
- Documento CCERU-22-740 ESTADO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA (PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) – 9 de julio de 2023.
- Documento CCERU-22-816 RESPUESTA OFICIOS COMPLEMENTO PERSONAL DE OBRA - PROGRAMACION E HISTOGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA

A la fecha no se ha suscrito, documento de modificación y/o adición y/o prorroga al contrato de obra.

BALANCE

Se hizo entrega de un balance, del cual no se ha recibido respuesta formal frente la posibilidad de adición y prorroga al contrato, existen ítems que no se pueden desarrollar sin

la aprobación del balance.

Provisionales de agua y energía no contempladas en el presupuesto inicial.

La planeación del proyecto no contemplaba el proyecto por etapas, y estamos en desacuerdo con que la entrega de las zonas que están en uso por el colegio, dependa de una pre entrega, si bien es cierto que se está colaborando en el desarrollo del contrato por etapas, no es una obligación contractual, entre los documentos mas relevantes están:

FECHA DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOC (si aplica)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO / CONTENIDO
24/05/2022	**CCERU-005**	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE OBRA
3/06/2022	**CCERU-014**	PROPUESTA DE ADECUACION
13/06/2022	**CCERU-033**	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS
28/06/2022	**CCERU-043**	OBSERVACIONES DISEÑO CONSTRUCTIVO
23/06/2022	**CCERU-046**	OBSERVACIONES DISEÑO
6/07/2022	**CCERU-047**	SOLICITUD DE PRORROGA

Para lo cual se obtuvo respuesta negativa por parte de la entidad y se decidió trabajar el proyecto por etapas.

VALOR PROGRAMADO	ACUMULADO EJE.	ATRASO
$ 34.203.000.037,84	$ 18.523.147.480,21	-$ 15.679.852.557,63
97,09%	52,58%	-44,51%

El atraso de 44,51 % se presenta en las siguientes actividades que son de imposible ejecución:

Actividad	Valor Programado a la fecha	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
Localización y Replanteo de Obras generales.	$ 95.688.542	**-0,09%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programación.

DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ 130.170.739	**-0,33%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programación.
MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 1.328.667.761	**-0,58%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programación.
CIMENTACION	$ 3.115.332.915	**-3,74%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programación.
Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	$ 15.865.612	**-0,05%**	El ítem no se requiere
Suminstro y colocacion de Concreto para columnas de Rampa 4,000 PSI (28 Mpa)	$ 9.861.409	**-0,03%**	Se modificada al no tener consistencia con los planos, toda vez que la resistencia requerida es de 3000 psi, el ítem se presentó para aprobación de la entidad.
ACERO DE REFUERZO	$ 2.234.331.328	**-1,08%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programación, a excepción del bloque I el cual se inició el 14 de marzo de 2023. sumado a Atrasos generados por actividades predecesoras como lo son estructura, mampostería, ocasionados por las demoras en las aprobaciones de los ítems no previstos, adicionalmente factores logísticos ocasionados por la ocupación del colegio y factores climáticos (lluvias) lo que ha incidido en alrededor de 166 horas.
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	$ 61.084.892	**-0,08%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion, el item esta cuantificado doble vez.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO - ESTRUCTURAS METALICAS - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 9.571.652.969	**-5,07%**	Se elevo consulta a la entidad frente a la imposibilidad de conseguir los perfiles metalicos de columnas, ya que no son comerciales, presentando atraso en el item 4.4.1 De igual forma con los emplames de la estructura en policarbonato se elevo consulta a la entidad y no se ha dado respuesta. lo anterior es indispensable para el desarrollo de la actividad.
MAMPOSTERIA	$ 2.531.810.111	**-3,65%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Adicional a lo anterior, los proveedores del ladrillo nos informaron en el transcurso de la semana que el insumo se encuentra sin producción aplazando la entrega del mismo en la obra, quedando hasta la fecha sin suministro de ladrillo para la continuación de las respectivas actividades, dentro de la matriz de riesgo se indica " Posibilidad de encontrar dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos " con una probabilidad de ocurrencia Baja Sin embaego es un factor que dado el volvumen de obras que se encuentran en ejecucion a nivel colo,bia se encuentra excases de insumos, presentando dificultades y generando atrasos
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS	$ 924.401.325	**-1,34%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y la zona de las instalaciones de gas son en el bloque J donde no se a dado incio a este bloque dado que se tiene un problema con un poste eléctrico donde la acometida eléctrica esta muy cerca a nuestro proyecto, ya se están realizando los tramites para el movimiento de este

INSTALACION RED CONTRAINCENDIOS	$ 836.982.564	**-1,38%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 2.256.142.368	**-5,96%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
INSTALACIONES COMUNICACIONES	$ 449.974.625	**-1,09%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV	$ 116.849.342	**-0,33%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.

SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS	$ 180.016.062	**-0,51%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
RED DE AIRE ACONDICIONADO	$ 109.278.652	**-0,31%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
INSTALACION ELECTRICA RED DE AIRE ACONDICIONADO	$ 24.762.672	**-0,07%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.

PAÑETES	$ 129.205.589	**-0,23%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
PISOS Y ENCHAPES	$ 2.048.132.575	**-4,15%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 1.304.083.064	**-2,63%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos
APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	$ 312.801.019	**-0,86%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos
CIELO RASOS Y ESTRUCTURA LIVIANA	$ 557.917.706	**-1,02%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.

ESTUCO, PINTURA Y SEÑALIZACION	$ 233.897.756	**-0,56%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
CARPINTERIA DE MADERA - MOBILIARIO	$ 282.393.956	**-0,80%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
CARPINTERIA METALICA	$ 2.544.936.445	**-5,61%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
VIDRIOS TEMPLADOS Y ESPEJOS	$ 71.853.365	**-0,20%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADAS	$ 1.258.927.657	**-3,57%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	$ 731.439.870	**-1,89%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.
SEÑALETICA	$ 33.384.217	**-0,09%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias - Dentro de la matriz de riesgos no esta contemplado los factores climaticos
EQUIPOS ESPECIALES	$ 52.597.639	**-0,15%**	La actividad se desarrolla en el bloque J y K modulos ue no se pueden desarrollar por la ocupacion del colegio
MUEBLES Y MESONES	$ 29.528.124	**-0,07%**	Actividades que presentan un atraso acumulado por proceso constructivo al tener incidencia de lluvias, y demoras en las aprobaciones de los items no previstos. Ademas de esto se presentan muchas alzas en los precios y demoras con la llegada de material. Como por ejemplo las actividades de mejoramiento del terreno fueron aprobadas hasta el 1 de septiembre de 2022 cuando se informo desde el mes de junio, las actividades de rellenos son predecesoras de la estructura en general, por lo que no se podian ejecutar las actividades relacionadas en el capitulo.

ZONAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$ 116.237.809	**-0,33%**	La actividad se desarrolla en el bloque J y K modulos ue no se pueden desarrollar por la ocupacion del colegio
SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR	$ 269.046.485	**-0,76%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
Suministro e instalacion de Paneles Solares 475Wp, Eficiencia 21.16%, Garantía 12 Años-92150 Wp, Incluye: Suministro e instalacion de Inversor 100Kwp Incluye Tarjeta De Monitoreo Wifi, 6 MPPT, 1000VDC, 400VAC, Garantía 5 Años - Suministro e instalacion Estructura En Aluminio Alurack Para fijación Paneles Solares, Incluye Tornilleria - Suministro e instalacion de Eclam y Mclam En Aluminio Alurack Para fijación De Paneles Solares - Transformador seco tipo H 100KVA , 400/208V - Acometida DC 1000V,6MMQ - Acometida Ac, Canalizaciónes, Protecciónes electrica, Cofres y accesorios en AC.	$ 269.046.484,69	**-0,76%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programación.

Como medida de contingencia se remitió solicitud en que se plantea la entrega total de las áreas del lote, con el fin de ampliar el mayor número de frentes de trabajo, la interventoría indica que no es posible dicha solicitud, hasta que no se entregue la etapa 1, sin embargo, debe tenerse en cuenta que para la entrega de esa etapa se requiere la aprobación de unos ítems, que se encuentran en proceso de aprobación de la ERU, los ítems corresponden a:

	NP		**CANTIDAD**
NP- 28.26	lavado para protección de mamposteria a la vista	m2	18472,46

NP- 28.27	Construccion de losa a la vista para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI, en situ - (Dimensiones de acuerdo a localización) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural.	m2	408,291
NP- 28.28	Suministro e instalacion e tuberia EMT 1.1/2¨ para acometida	ml	10
NP- 28.29	Suministro e instalacion de breaker industrial 3x150A incluye barraje	und	2
NP- 28.30	Suministro e instalacion de perfil 100 x 3 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural	ml	1789,29
NP- 28.31	Boca puerta en granito ancho hasta 10 cm incluye destroncado y pulida	ml	340,97
NP- 28.32	Junta perimetral de dilatación en piso continuo de concreto.	ml	4370,83
NP- 28.33	Suministro e instalación de dilatación plástica en color blanco para baldosa en granito.	ml	2741,51
NP- 28.34	Suministro e instalación de punto de 6" para salida de tragantes de 8 x 6¨	un	74
NP- 28.35	Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI con microfibra color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos, INCLUYE MOLDE	m2	1422
NP- 28.36	Suministro e instalacion tanque horizontal de 10000 LTS	un	2
NP- 28.37	CONEXIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE, CON CHEQUE HIDRO4¨, CHEQUE HIDRO2¨, VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE 4¨, REGISTRO CORTINA DE 4¨, UNION FLEXIBLE BORRACHA 4¨, UNIVERSAL DE 2¨, COPA CONCENTRICA DE 4¨X2¨, COPA EXCENTRICA DE 4¨X2¨, SOPORTE TIPO PERA 4¨, CON TUBERIA DE PVC-P SCH - 80 DE 4¨ Y DE 2¨.	un	1
NP- 28.38	Suministro e instalacion de cheque cortina nltrilo cuerpo en bronce roscado de 1 1/2¨con union universal 1 1/2¨ roscada	un	2
NP- 28.39	Lavado y desinfeccion de tanque 10000 Lt	un	2
NP- 28.40	Suministro e instalacion de equipos de presion diferencial	un	1
NP- 28.41	Suministro e instalacion de cubierta traslucida en poliester reforzado con fibra de vidrio trapezoidal, incluye accesoios de instalacion (fijacion y sellos)	m2	1361,6
NP- 28.42	Suministro e instalacion tuberia conduit PVC 3¨sobre cama de arena de peña, no incluye excavacion	ml	105

NP- 28.43	Suministro e instalacion de acometida 2(3X1/0F) + 2X1X1/0N + 2T, en alumino	ml	105
NP- 28.44	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F + 1X6N, EN ALUMINIO	ml	299
NP- 28.45	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x2f + 1x4n + 6t, EN ALUMINIO	ml	129
NP- 28.46	Suministro e instalacion de tuberia PVC 1.1/2¨ para acometida	ml	15
NP- 28.48	cerrojo al exterior con seguro al interior en mariposa yale o similar	und	239
NP- 28.49	suministro e instalacion de bandeja en lamina galvanizada para fachada flotante	m2	1471,06
NP- 28.50	Suministro e instalacion de borde contenedor de raiz A-70 (12X13.5)	ml	316,8
NP- 28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	m	1633,48
NP- 28.52	Suministro e instalacion de caneca barcelona grande tipo m-121, (incluye placa base en concreto y ele,entos de fijacion)	und	26
NP- 28.53	sumi nistro e instalacion de baranda	ml	196,81
NP- 28.54	suministro e instalacion de pasamanos	ml	1270,88

Adicionalmente, se requiere informar el estado de aprobación de la prórroga y el balance, ya que de esta depende la terminación del proyecto.

A continuación, se adjunta cada una de las solicitudes y/o requerimientos realizados por este consorcio:

NUMERO RADICADO	ASUNTO	FECHA DE RADICADO	RESUMEN
CCERU-22-896	DOSSIER CALIDAD DE CONCRETO	1/08/2023	Se radica el dossier de estructura de concreto
CCERU-22-903	MEDIDAS CORRECTIVAS POR REQUERIMIENTO DEL STI - PEGA DE MAMOSTERIA	1/08/2023	Se reitera formato de asistencia y registro fotográfico del personal de mampostería para construcción de elementos de mampostería
CCERU-22-904	MUESTRA MANIJA PARA PUERTAS METALICAS	2/08/2023	Se remiten dos opciones de manija de puerta para su elección

CCERU-22-905	PROPUESTA VIGUETA PARA REFUERZO MAMPOSTERIA SOBRE PLACA	2/08/2023	Se presenta la propuesta de las vigas de reforzamiento en placas estructurales
CCERU-22-911	RESPUESTA AL COMUNICADO GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_600, GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_605 y GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_608 CON RESPECTO APU´S	5/08/2023	Se da respuesta al grupo número 5 de NP - aprobación de análisis de precios unitarios previstas y contractuales
CCERU-22-912	CERTIFICADOS DE TOPOGRAFIA	8/08/2023	Se envían los certificados de equipos de topografía actualizados
CCERU-22-913	PROPUESTA PARA EL DISEÑO D EPLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL (TOPOGRAFIA)	9/08/2023	Iniciación de actividad de urbanismo con 3 alternativas: 1. Cotas de diseño vs. reales 2. Modulación parte plana y reubicación del muro 3. Esquina sur oriental de la obra
CCERU-22-914	ACTAS NP NO PREVISTO	9/08/2023	Se solicita sean enviadas todas las actas de aprobación de los NP
CCERU-22-915	INFORME DE LECTURA DE CONSUMO DE ENERGIA EN OBRA	9/08/2023	Se radica el informe de lectura de los meses de junio y julio del 2023
CCERU-22-917	SOLICITUD ACLARACION SOBRE OFICIO S2023003620 QUE RESOLVIO EL RERUCRSO DE RECONSIDERACION SOBRE ACTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE GARANTIA PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION	10/08/2023	Se radica nuevamente el asunto mencionado solicitando nuestra objeción frente a la decisión de la entidad
CCERU-22-918	RESULTADOS PRUEBAS ESTRUCTURA METALICA Y CERTIFICACIONES DE EQUIPO	10/08/2023	Se radican los resultados de la cubierta metálica el día 26 de julio anexando así mismo los certificados de calibración de los equipos
CCERU-22-919	INFORMES SEMANALES	10/08/2023	Se radican los informes semanales 61 y 62
CCERU-22-920	SOLICITUD APROBACION NO PREVISTOS	12/08/2023	Solicitud de aprobación de os ítems mencionados en el oficio para proceder con la ejecución
CCERU-22-921	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 14	11/08/2023	Se radica el informe mensual de obra No. 14 del mes de julio

CCERU-22-922	INFORME DE ASENTAMIENTO	12/08/2023	Se radica el informe de asentamiento de topografía del mes de julio
CCERU-22-924	DEFINICION COLOR FACHADA EXTERIOR	12/08/2023	Se radica la ficha de colores para selección de color de fachadas
CCERU-22-925	SOLICITUD INFORMACION ESTADO DE APROBACION DE LOS ITEMS NO PREVISTOS	15/08/2023	Solicitud de estado de aprobación de los ítems mencionados en el asunto (NP)
CCERU-22-926	RESPUESTA AL COMUNICADO S2023003583 DE ASUNTO COMUNICACIÓN RADICADA EN ERU E202300543 COMPROMISOS PENDIENTES DEFINICION ENTREGA BLOQUES A AL E	15/08/2023	Se da respuesta al asunto mencionado con respecto a los análisis de precios unitarios, pendientes y aclaraciones y APU baranda
CCERU-22-927	RESPUESTA AL COMUNICADO S2023004338 DE ASUNTO COMUNICACIÓN RADICADA EN ERU E202304338 SOLICITUD ESPECIFICACION DE POLICARBONATO	15/08/2023	Se les informa sobre el precio consolidado con respecto a la reunión realizada el 8 de agosto del presente año
CCERU-22-929	RESPUESTA AL COMUNICADO S2023003580 DE ASUNTO COMUNICACIÓN RADICADA EN ERU E202304453 SOLICITUD ACLARACION ESPECIFICACION DE CERRAMIENTO	15/08/2023	Se envía el estado actual de la actividad conforme a la aprobación dada en procedimiento de actividades preliminares
CCERU-22-930	RESULTADOS DE INFORMES DE CONCRETO	16/08/2023	Se radica las pruebas de la muestra 240 correspondientes a la quinta fundida del bloque B
CCERU-22-931	RESULTADOS DE INFORMES DE CONCRETO	17/08/2023	Se radica las pruebas de la muestra 247 correspondientes todos columnas y 248-249 placa, vigas y viguetas del modulo I
CCERU-22-933	PRUEBAS TINTAS PENETRANTES Y PRUEBA DE ADHERENCIA	25/08/2023	Se radican las pruebas llevadas de la estructura metálica de la marquesina del bloque C
CCERU-22-934	PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE LA PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL	24/08/2023	Se realiza una adecuación con respecto al asunto mencionado con la propuesta de diseño
CCERU-22-935	INFORMES SEMANALES	23/08/2023	Se radica los informes semanales 63, 64 y 65

CCERU-22-936	SOLICITUD INFORMACION ESTADO DE APROBACION DE LOS ITEMS	23/08/2023	Solicitud de trámite y estado de aprobación de los ítems mencionados en el asunto con respecto a reunión el día 18 de agosto
CCERU-22-937	INFORME FINAL FIDUCIA	24/08/2023	Entrega de documentos al cierre de fiducia: INFORME FINAL - ACTA FINAL
CCERU-22-938	PROPUESTAS GRADAS ENTERRADAS Y MURO DE PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL	24/08/2023	De acuerdo a la reunión del 18 de agosto se presenta la propuesta de gradas enterradas del paso modulo A la plazoleta de banderas
CCERU-22-940	FICHAS TECNICAS DE CABLE UTP PARA SISTEMA DE DATOS	26/08/2023	Se radican las fichas técnicas para su debida instalación
CCERU-22-941	RESPUESTA AL COMUNICADO GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_624 ATENCION OBSERVACIONES	29/08/2023	Se da respuesta al oficio mencionado en asunto con respecto al acopia de la malla, valla informativa, maquinas roscadoras, anden, excavación abierta modulo G
CCERU-22-942	ALCANCE AL OFICIO CCERU-22-924-DEFINICION COLOR FACHADA EXTERIOR	29/08/2023	Se radica la ficha de colores para selección de color de fachadas
CCERU-22-943	RESPUESTA AL COMUNICADO GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_638 RESULTADO MR 45 PLAZOLETA COTADO SUR	29/08/2023	Se radica resultado de concreto a los 7 días
CCERU-22-944	ACTUALIZACION DE DISTRIBUCION DE RETICULA DE ESTRUCTURA SOPORTE CORTASOLES	30/08/2023	Se presenta la nueva distribución superior entre perfiles acerca de los cortasoles
CCERU-22-947	INFORME SEMANAL	31/08/2023	Se radican el informe semanal 66
CCERU-22-948	CERTIFICADOS TOPOGRAFIA	31/08/2023	Se radica el certificado de topografía con relación a equipo
CCERU-22-949	OTROSI DOCUMENTO CONSROCIAL - RECOMPOSICION PORCENTAJE DE PARTICIPACION	31/08/2023	Se solicita modificación de porcentaje de participación consorcial
CCERU-22-950	ALCANCE CCERU-22-944 ACTUALIZACIO DE DISTRIBUCION DE RETICULA DE ESTRUCTURA SOPORTE CORTASOLES	31/08/2023	Se radica los sobrecostos actualizados de distribución de retícula estructura metálica

Registros fotográficos

Se relaciona en el anexo 01.

Resultados de los ensayos

Se anexan al presente documento todo lo relacionado con resultados de ensayos de

- Acero de refuerzo: Ensayos de resistencia Acero.
- Base, sub base: Caracterización y ensayos de laboratorio.
- Resistencia concretos
- Toma de densidades
- Pruebas de tinta
- Certificados de calidad estructura metálica

En cuanto a los concretos se han realizado 3 campañas de núcleos cuyo estado a corte del presente informe es el siguiente el estado de los módulos en consecuencia con lo indicado por la interventoría en documento GNGSERV_BTA_ERU_16-2021_636:

- Bloque B: En proceso de demolición de las dos columnas pendientes.
- Bloque C. Avalado.
- Bloque D. Avalado.
- Bloque E. Avalado.
- Bloque G. Avalado.
- Bloque L. En análisis
- Bloque M. Avalado.
- Bloque N. Avalado.
- Bloque I. En análisis

Calibración y control de equipos del proyecto.

Para la actividad de Topografía, se evidencia la calibración de los equipos de nivel digital modelo SPRINTER 250M y estación marca HI-TARGET utilizados.
Para control de calidad de los siguientes materiales se anexa los respectivos certificados de calidad, caracterizaciones y fichas técnicas. (Ver anexo 2.)

Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra.

En el periodo del informe, se generaron los siguientes controles de calidad (Ver anexo 3.):
FT 190 (Liberación acero estructural)
FT 180 (Fundida de elementos en concreto)
FT 037 (Control de calidad pisos y enchapes)
FT 034 (Control de calidad mampostería y pañetes)

Fotocopia de la bitácora o libro de obra.

Se anexa al presente informe copia de la bitácora. (Ver anexo 9.)

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades, las cuales se encuentran a

nivel de detalle especificadas en el acta parcial.

- 1.2.1 Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)
- 1.2.9 Demolición de estructura de cimentación existente
- 1.3.3 Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina
- 1.3.4 Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS
- 2.1.2 Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)
- 2.1.4 Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)
- 2.3.1 Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa
- 2.3.2 Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa
- 4.1.1 Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)
- 4.1.3 Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)
- 4.4.1 Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)
- 5.1.1 Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.
- 5.1.3 Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)
- 6.1.3.3 Suministro e instalación de Tubería PVC presión 2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI
- 6.1.4.1 Excavación manual en material común de brecha para tubería
- 6.1.5.2 Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)
- 6.1.5.3 Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)
- 6.1.5.6 Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)
- 6.1.5.7 Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)
- 6.1.5.8 Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)
- 6.1.5.9 Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)
- 6.1.6.3 Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos
- 6.1.6.6 Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos

- 6.1.6.7 Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos
- 6.1.6.8 Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos
- 6.1.6.9 Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos
- 6.1.8.1 Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavaojos
- 6.1.8.3 Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)
- 6.2.1.1 Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque
- 6.2.2.13 Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material
- 6.2.3.3 Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)
- 6.2.4.2 Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)
- 7.1.2.1 Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo
- 7.1.2.2 Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio
- 7.1.2.3 Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio
- 7.1.2.4 Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio
- 7.1.2.5 Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada
- 7.1.3.1 Excavación manual en material común de brecha para tubería
- 7.1.3.2 Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)
- 7.1.4.1 Suministro e instalación de toma siamesa en bronce 4" x 2.1/2" x 2.1/2" para cuerpo de bomberos, incluye válvula cheque ranurada de 4"
- 7.1.5.1 Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"
- 7.1.5.2 Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"
- 7.1.5.3 Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"

- 7.1.5.4 Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)
- 7.1.5.5 Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)
- 7.1.5.6 Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)
- 7.1.5.7 Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"
- 7.1.5.8 Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"
- 7.1.5.9 Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"
- 7.1.5.10 Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"
- 7.1.5.11 Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"
- 7.1.5.13 Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"
- 7.1.5.14 Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "
- 7.1.6.2 Suministro e instalación de válvula de mariposa 2.1/2" listada UL
- 7.1.6.3 Suministro e instalación de cheque ranurado listado 2.1/2" listado UL
- 7.1.6.4 Suministro e instalación de Sensor de flujo 2.1/2" listado UL
- 7.1.6.5 Suministro e instalación de Manómetro + válvula 1/4"
- 7.1.7.1 Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura ordinaria (K=5.6 y rango de temperatura 55-77 °C) para instalar en cielo raso
- 7.1.7.2 Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura intermedia (K=5.6 y rango de temperatura 79-107°C) para instalar en cubierta traslucida
- 7.1.9.1 Suministro e instalación de salida de manguera de 2.1/2" con buje de 2.1/2" x 1.1/2"
- 7.1.10.2 Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos
- 7.1.10.3 Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos
- 7.1.10.4 Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos
- 7.1.10.5 Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos
- 7.1.10.6 Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos
- 8.1.3.11 Suministro e instalación de alimentador de circuitos de iluminación en 3 # 12 AWG HFFRLS, ducto Ø3/4" emt sobrepuesto en losa, incluye elementos de fijación, identificación, señalización y marcación. Va desde tablero de protecciones hasta primera salida de circuito ramal correspondiente

- 8.1.4.1 Suministro e instalacion salida de iluminacion interior(no incluye luminaria) en tuberia conduit EMT sobrepuesta Ø3/4" en losa, cable #12 AWG HFFRLS, caja metalica 2x4" o 4x4 Radwell Retie; tomacorriente doble polo a tierra y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion, elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 4ml
- 8.1.4.5 Suministro e instalacion de interruptor sencillo sin piloto, en tuberia EMT 3/4" en pared , caja 2x4 radwell Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml
- 8.1.4.7 Suministro e instalacion de interruptor triple sin piloto, en tuberia EMT 3/4", en pared , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 5#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion.
- 8.1.4.11 Suministro e instalacion de sensor de movimiento multitecnologia, 360°, en tuberia EMT Ø 3/4", sobrepuesto en cielo raso , caja 2x4 RADWELL Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 5ml
- 8.1.5.1 Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml
- 8.1.5.3 Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared, red regulada color naranja, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 2x4" o 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml
- 8.1.5.5 Suministro e instalacion tomacorriente doble polo a tierra en pared,con proteccion GFCI, en tuberia PVC Ø 1/2", caja metalica 4x4" Retie, cable 3#12 AWG HFFRLS y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye elementos de fijacion, identificacion, señalizacion y marcacion. prom: 6ml
- 8.1.7.6 Suministro e instalación de anillo inferior en cable de cobre desnudo cal. # 1/0 awg, enterrado directamente a 0,5m de profundidad.(incluye colillas entre anillo y bajantes)
- 11.1.1 Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)
- 12.1.1 Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado
- 12.1.10 Construcción de Piso concreto (rayado o escobeado) en concreto de 3000 PSI e=0.10M
- 12.1.13 Suministro e instalacion Pavimento en concreto reforzado MR-39 e=0.15M

- 12.2.1 Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)
- 13.1.1 Suministro e instalación cubierta tipo sándwich deck ancho 525 mm aislante en fibra de vidrio e = 3cm panel inferior y superior en aluzinc cal. 24 pintada a una cara (incluye remate lateral y elementos de fijación)
- 13.3.1 Afinado, pendientado e impermeabilizado de cubiertas planas en mortero 1:4 e=5 cm (incluye media caña)
- 14.1.6 Suministro e instalacion Sanitario institucional para discapacitados taza adriatica entrada posterior corona
- 14.1.7 Suministro e instalacion Sanitario Tipo Montecarlo advance Institucional de corona
- 14.1.9 Suministro e instalacion Ducha antivandálica para personas discapacitadas empotrada en pared cabezal en A.B.S. tipo Haws.
- 15.1.1 Suministro e instalación de Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de drywall
- 15.1.2 Suministro e instalacion Cielorraso o recubrimiento plano en lamina de superboard 10mm
- 15.2.4 Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)
- 16.1.2 Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Antibacterial a Base de Agua de Alta Resistencia
- 16.1.5 Lavado e impermeabilización con hidrófugo para protección de mamposteria a la vista
- 18.1.3 Puerta ventana PYV03 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.
- 18.1.4 Puerta ventana PYV04 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.
- 18.1.5 Puerta ventana PYV05 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.
- 18.1.6 Puerta ventana PYV06 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.
- 18.1.7 Puerta ventana PYV07 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.

- 18.1.10 Ventana PYV10 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-02,04P,V04).
- 18.1.11 Ventana PYV11 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 02).
- 18.1.12 Ventana PYV12 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-01, 03T, DP02).
- 18.1.14 Ventana PYV14 perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar, vidrio laminado templado 3+3 y/o 4+4mm incoloro, celosía (Ver detalle arquitectónico planos DV-03A).
- 18.1.18 Puerta metálica PYV18 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver cartilla de colores).
- 18.1.22 Puerta metálica PYV22 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (Ver cartilla de colores)
- 18.1.23 Puerta metálica PYV23 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color (ver catilla de color), hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color (ver catilla de color), cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (ver catilla de color)
- 18.2.1 Suministro e instalación de división de baño, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)
- 18.2.3 Suministro e instalación puerta de baño, en acero inoxidable cal. 20 (acabado satinado prelijado no 4. con sae 304. fabricado con estructura interna para dar rigidez y apoyar en cantiléver)
- 21.1.1 Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)
- 21.1.11 Suminstro e instalacion de Bordillo fundido en sitúo ó prefabricado 0.20x0.50xl (incluye refuerzo)
- 21.1.15 Suministro e instalacion Loseta tactil alerta 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena
- 21.1.16 Suministro e instalacion Loseta tactil guia 40 x 40 x 6

cm incluye capa de arena
- 21.1.17 Suministro e instalacion Loseta cuadratica 40 x 40 x 6 cm incluye capa de arena
- 24.1.1 Construccion de meson en concreto Acabado en granito pulido fundido en sitio con formaleta metálica, con salpicadero y cortagotera. Pendiente 1%. Ver detalles de Elementos no Estructurales.
- 26,1 Aseo Permanente en Obra
- 26,3 Retiro de Escombros y Sobrantes
- 28.4 NP Suministro e Instalacion de cerramiento en laminas de superboard de 6 mm, Altura 2.4m
- 28.6 NP Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting y acero de refuerzo)
- 28.11 NP Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación)
- 28.12 NP Guardaescobas baldosa vibroprensada biselado grano de marmol. Dim.: h= 10 x L= 30 cm Ref: Perlato claro grano 3 fondo crema.
- 28.14 NP "
- Media caña en granito - 10*10*100 CM remate de piso con mediacaña en granito, referencia similar al piso blanco huila."
- 28.17 NP Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm
- 28.20 NP Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral
- 28.21 NP Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.
- 28.22 NP SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO III INCLUYE (VALVULA ANGULARES 1-1/2¨, VALVULA ANGULAR 2-1/2¨, TAPA CADENA 2-1/2¨, MANGUERA CHTA SENCILLA 150 PSI X 100 FT 1-1/2, BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO 1-1/2¨, HACHA PICO 4.5 IB, LLAVE SPANNER, EXTINTOR POLVO SECO ABC 10 LBS
- 28.25 NP Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega
- 28.30 NP Suministro e instalación de perfil 100 X 100 X 30 mm, pintura anticorrosiva y acabado esmalte color aluminio natural

Provisionales de obra:

- Provisional hidráulica: En funcionamiento de manera independiente al colegio.

- Provisional eléctrica: En funcionamiento, se instaló medidor en el colegio, realizando el pago de forma proporcional al consumo de obra.

A la fecha no se ha dado respuesta alguna por parte de la entidad contratante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se ha venido realizando la subsanación de las observaciones de acabados de las estructuras, de acuerdo con el protocolo aprobado por interventoría.

- Se están interviniendo el mayor número de frentes posibles, con el fin de recuperar los atrasos, sin embargo, insistimos que existen frentes de imposible ejecución, toda vez que se encuentran en uso por el colegio.
- Se acordó entre las partes realizar la entrega de los bloques A al E con el fin de que el colegio se pudiera trasladar, Sin embargo, se han detectado contratiempos (demoras en las aprobaciones de los ítems no previstos, factores climáticos, dificultades de despacho con los proveedores, inconvenientes logísticos) lo que ha atrasado la entrega de estas zonas, cuyas mayores cantidades y actividades no previstas están en evaluación de una posible prorroga y adición, la cual se encuentra en trámite ante la ERU.
- Es indispensable se haga entrega de las zonas que están en uso por el colegio con el fin de cumplir con la programación y/o se dé respuesta a la solicitud de prorroga y adición al contrato.
- Se requiere de mayores recursos económicos (solicitud de adición por $9.372.533.448 al contrato de obra) para la ejecución del contrato como lo establecen los diseños, lo que incide directamente en mayores tiempos de ejecución, razón por la que se tramito solicitud de adición y prorroga y nos encontramos a la espera de respuesta de la respectiva modificación del contrato.
- A la espera de la respuesta de solicitud de prórroga y adición, con el fin de definir al alcance real del contrato.
- Se realizo modelación de los conjuntos de elementos en el que dio resultados satisfactorios evitando la demolición de algunos elementos
- Se vienen realizando mesas de trabajo en aras de suplir las inconsistencias encontradas en la planimetría versus el presupuesto, lo que ha generado ítems no previstos, de los cuales se encuentran en proceso de aprobación.
- Se requiere el acta de aprobación de ítems no previstos para proceder a su intervención.

ANEXOS

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO


DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.



Fotografía 1. Sub- base granular



Fotografía 2. Retiro de escombros

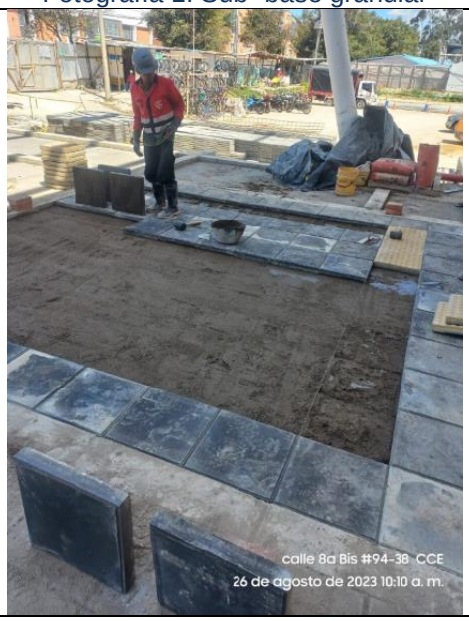

Fotografía 3. Instalación loseta táctil plazoleta principal



Fotografía 4. Aseo general de obra




Fotografía 5. Instalación de bordillo fundido plazoleta principal



Fotografía 6. Excavación mecánica plazoleta principal



Fotografía 7. Instalación de malla electrosoldada plazoleta principal

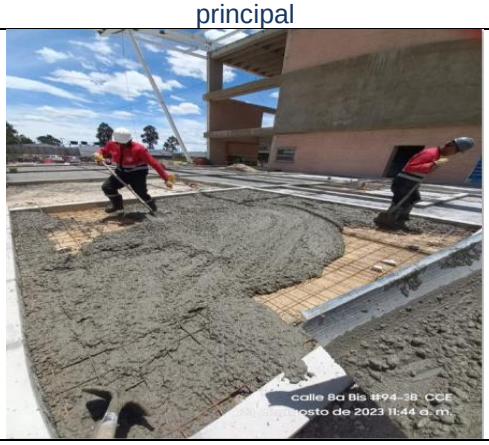

Fotografía 8. Pavimento en concreto reforzado MR-45 Plazoleta principal



Fotografía 9. Instalación de loseta cuadrática



Fotografía 10. Instalación de cerramiento



Fotografía 23. Lavado hidrofugado bloque E



Fotografía 24. Instalación de alimentador 3 # 12



Fotografía 25. Instalación de salida iluminación interior



Fotografía 26. Instalación de sensor de movimiento



Fotografía 27. Instalación de tomacorriente doble polo a tierra



Fotografía 28. Instalación de anillo inferior en cable de cobre del bloque A al E



Fotografía 29. Instalación de estructura metálica



Fotografía 30. Instalación de estructura metálica



Fotografía 31. Instalación de estructura metálica Bloque E




Fotografía 32. Instalación de estructura metálica Bloque A



Fotografía 33. Instalación de cubierta tipo sándwich



Fotografía 34. Instalación de cubierta tipo sándwich

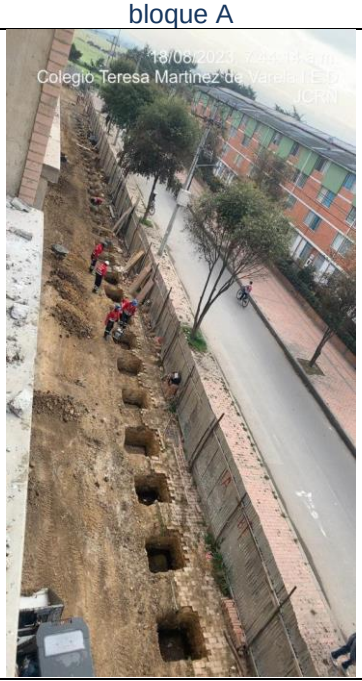
	
Fotografía 35. Instalación de cielo raso en lamina de drywall bloque A	Fotografía 36. Instalación de cielo raso en lamina de drywall bloque A
	
Fotografía 37. Suministro de estuco y pintura bloque A	Fotografía 38. Instalación de aislamientos frescasa bloque A
	
Fotografía 39. Demolición de estructura muros- adoquines del bloque A al E	Fotografía 40. Demolición de estructura cimentación existente



Fotografía 41. Suministro de concreto (solado) del bloque A al E



Fotografía 42. Suministro de concreto para zapatas del BLOQUE A al E

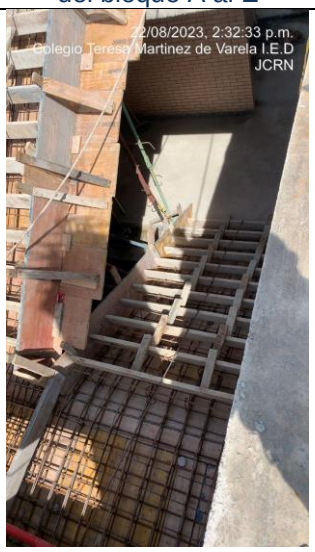

Fotografía 43. Instalación de acero de refuerzo




Fotografía 44. Suministro de concreto para columnas bloque G



Fotografía 45. Suministro de concreto para escaleras bloque G



Fotografía 46. Instalación de piso en concreto

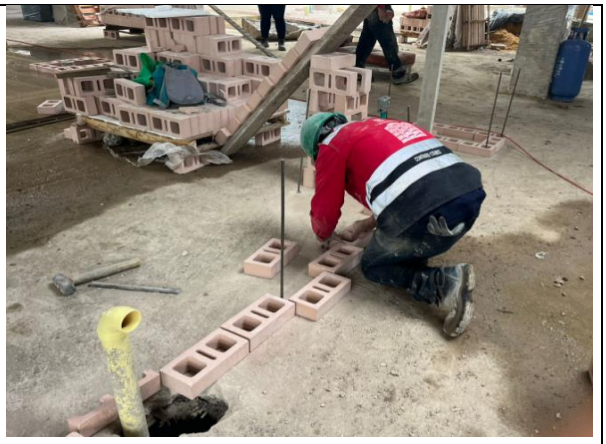
	
Fotografía 47. Instalación de muro en ladrillo bloque G	Fotografía 48. Instalación de anclaje reforzamiento bloque M
	
Fotografía 49. Pañete impermeabilizado Bloque A	Fotografía 50. Instalación de piso en baldosa de granito bloque A
	
Fotografía 51. Instalación de enchape de muros Bloque A	Fotografía 52. Impermeabilizado de cubiertas bloque B



Fotografía 53. Instalación de puerta ventana en aluminio Bloque A



Fotografía 54. Instalación de puerta ventana en aluminio Bloque A

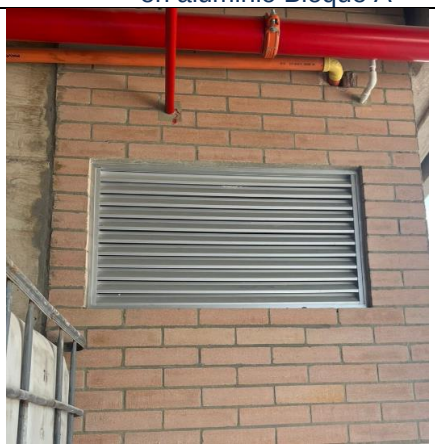

Fotografía 55. Instalación ventanearía perfilería en aluminio



Fotografía 56. Instalación de puerta ventana en aluminio Bloque A



Fotografía 57. Instalación de mesón en granito pulido



Fotografía 58. Instalación dovela en mampostería



Fotografía 59. Instalación de ladrillo prensado bloque G



Fotografía 60. Instalación de guardaescoba bloque C



Fotografía 61. Instalación de media caña bloque E



Fotografía 62. Instalación de alistado de piso plazoleta



Fotografía 63. Instalación de perfileria tubular del bloque A al E



Fotografía 64. Instalación de tubería pvc 2"" plazoleta de acceso
