SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2019-11-06-11:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2951819	Fecha Registro:	2019-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.769.494,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.769.494,00	Saldo x Ordenar:	28.769.494,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.654.033,00	Valor Neto:	27.115.461,00			Nro. Compromiso:	396419	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	87736

TERCERO

Identificacion:	812003389	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110310172283	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1883619	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	316	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	28.769.494,00	0,00	28.769.494,00	28.769.494,00

Objeto:	CON 819/2019 ACTA No. 06 MES OCT/2019 RADICADO 94328

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-11-13	Generada	28.769.494,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488.490,00	15,000 %	73.274,00	73.274,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	28.281.004,00	5,000 %	1.414.050,00	1.414.050,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.281.004,00	0,500 %	141.405,00	141.405,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	811.922,00	0,950 %	7.713,00	7.713,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	1.759.078,00	1,000 %	17.591,00	17.591,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 819 DE 2019

		%
ANTICIPO	[ ]	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	[X]	6	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
OTRO	[ ]	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 398419 del 8 de mayo de 2019

No. COMPROMISO 396419	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $28,769,494.00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA $28,769,494.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 BLV

COOTRACOL LTDA.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY
NIT. 812.003.389-9

FACTURA DE VENTA 316

SEÑORES: instituto nacional d. vias
NIT. 800215807-2
DIRECCIÓN: CLL 56 Nº 6-195
TELÉFONO: 7850062
CIUDAD: Monteria cord.

FECHA EXPEDICIÓN	DÍA	MES	AÑO
	05	11	2019

FECHA VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ACTA Nº 6		
Cuyo objeto: mantenimiento, Rutinario atraves de microamprasas A cargo de la territorial cordoba en una - Longitud de 38,22 Km, del contrato 819-2019		
Periodo del 1 al 31 de OCTubre 2019		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 94328 05/11/2019 10:45:13 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 17589		
	VALOR BÁSICO $	28.281.004
	IVA $	488.490
	TOTAL $	28.769.494

Son: Veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro ps

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Reinaldo A Guzmán A
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA VENDEDOR

Cel: 3137476855 - cootracolcta99@gmail.com
Cra. 3 Nº. 2-59 P. Corregimiento Colomboy
Barrio El Campo Tel: 758 52 78 - Sahagún - Córdoba

Supersolidaria

Resolución DIAN Nº. 18762008931O... acha 2018/06/28 Numerados desde 303 hasta 500 Habilitación

NUBIA ISABEL CASTILLA ALVAREZ NIT. 34.978.916-2 Graficas Medellín Tél: 792 0248

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: 28.281.004

PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Fernando Melo B		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	05	11	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA: Fernando Melo O.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE:		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE:		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 819 DE 2019 NIT. 812.003.380-9

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2014: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL" por valor de : $ 28'769.494,00 (VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE).
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. SEIS (6) del periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR ACARDY VILLEANO
Matrícula Mp. 13202-47438 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-063534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-063534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR---		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. 6 **PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CONTRATO No.	819 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	819 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR	COPEBA S.A.S.
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA
OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (6) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 172,616,964.00
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 172,616,964.00

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	$ 28,281,004.00
VALOR IVA 19%		$ 488,490.00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 28,769,494.00**

En Montería; a los CINCO (5) días del mes de NOVIEMBRE de 2019 se reunieron :

El Ingeniero: FERNANDO MELO BASTIDAS, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1233-2019), y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA E TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este período se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo a los cinco (5) días del mes de NOVIEMBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

(Firma)
FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No. 19202-61616 CAU

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 819 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta No. 6 **Valor básico:** $ 28,281,004.00 **Período:** DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Valor Incluido Iva $ 28,769,494.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2514	Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO			28,769,494.00	28,769,494.00
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**	**28,769,494.00**	**28,769,494.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN 1.757.078	19,684,088.00	19,349,863.00
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	9,085,406.00	8,931,141.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**28,769,494.00**	**28,281,004.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		-	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Remberto A Guzman A

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
Representante Legal

COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
M.P. No. 19202-61816 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 819 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

MES INFORME MENSUAL: oct-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA 2514: PLANETA RICA – SINCELEJO

SECTOR: VÍA 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	398419	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	Propios	819-2019	172,616,964.00
				TOTAL		172,616,964.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 172,616,964.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones
								$ 172,616,964.00						
1	Obra	Del 20 al 31 de mayo de 2019	$ 10,181,161.00	$ 175,856.00	$ 10,357,017.00			$ 162,259,947.00	$ 10,357,017.00	$ 162,259,947.00	45143 (06/06/2019)			RP No. 398419 (06/05/2019)
2	Obra	Del 1al 30 de junio de 2019	$ 28,281,004.00	$ 488,490.00	$ 28,769,494.00			$ 133,490,453.00	$ 39,126,511.00	$ 133,490,453.00				VIGENCIA 2019
3	Obra	Del 1al 31 de julio de 2019	$ 28,281,004.00	$ 488,490.00	$ 28,769,494.00			$ 104,720,959.00	$ 67,896,005.00	$ 104,720,959.00	63947 (05/08/2019)			VIGENCIA 2019
4	Obra	Del 1al 31 de agosto de 2019	$ 28,281,004.00	$ 488,490.00	$ 28,769,494.00			$ 75,951,465.00	$ 96,665,499.00	$ 75,951,465.00	73795 (04/09/2019)			VIGENCIA 2019
5	Obra	Del 1al 30 de septiembre de 2019	$ 28,281,004.00	$ 488,490.00	$ 28,769,494.00			$ 47,181,971.00	$ 125,434,993.00	$ 47,181,971.00	83265 (02/10/2019)			VIGENCIA 2019
6	Obra	Del 1al 31 de octubre de 2019	$ 28,281,004.00	$ 488,490.00	$ 28,769,494.00			$ 18,412,477.00	$ 154,204,487.00	$ 18,412,477.00				VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 151,586,181.00	$ 2,618,306.00	$ 154,204,487.00									

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 151,586,181.00	$ 2,618,306.00	$ 154,204,487.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 151,586,181.00	$ 2,618,306.00	$ 154,204,487.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

Firma
Nombre: FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S. - INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No. 19522-81616 CALI

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 55 No. 6-195
Montería.

Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de OCTUBRE de 2019.

Dado en Montería a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2019.

FIRMA
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)
Representante Legal

COPEBA S.A.S
Nit: 830.011.122-9

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 819 – 2019

CERTIFICA:

Que la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL" con NIT. 800.085.654-3 con Contrato No. 819 - 2019, cuyo Objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Esta certificación se expide en Planeta Rica a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2019.

FERNANDO MELO BASTIDAS
Ingeniero Residente
COPEBA S.A.S.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL CÓRDOBA
Interventor contrato No. 819 - 2019

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003189	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	513649263	8498441958	E	2019/11/25	2019/10/29	BANCO POPULAR	0	$2,191,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$530,000	$0	$0	$530,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$795,000	$0	$0	$795,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$202,000	$0	$0	$202,000
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	10	$202,000	$0	$0	$202,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$332,000	$0	$0	$332,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$332,000	$0	$0	$332,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$332,000	$0	$0	$332,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$332,000	$0	$0	$332,000
TOTAL				10	$2,191,000	$0	$0	$2,191,000

2019/10/29 11:25 AM

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 819 DE 2019

PERÍODO: OCTUBRE DE 2019

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR34+0200	PR37+0500	4	X	X	5	0,80	
PR31+0000	PR32+0600	2	X	X	2	1,00	
PR29+0400	PR30+0900	5	X	X	5	1,00	
PR28+0200	PR28+0800	4	X	X	2	2,00	
PR28+0100	PR29+0400	6	X	X	2	3,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó actividad de parcheo en toda la vía con el contrato de suministro de mezcla asfáltica (110 jornales).

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	20,8	45	0,46	80
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1869	19	98,37	92
3	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	700	8	87,50	95
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	21	16	1,31	95

OBSERVACIONES

En el mes de noviembre se realizará el recibo de las obras por vencimiento de contrato; por lo tanto, para dicha fecha deberán cumplir con los porcentajes mínimos de cumplimiento exigidos por INVIAS. Se debe priorizar la actividad de roceria y cumplir con el número mínimo de guadañas exigido.

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté
Representante Legal

INTERVENTOR
COPEBA S.A.S. / ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
Ing. FERNANDO MELO BASTIDAS
Ingeniero Residente

7. ANEXOS

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY
"COOTRACOL"
MÓDULO 7
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL Nº6
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA
"COOTRACOL"
CONTRATO 819 DE 2019

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

NOVIEMBRE DE 2019

[redacted]

2. OBJETIVOS

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"

El contrato 819 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VÍA 2514, PLANETA RICA - SINCELEJO PR14+0000 – PR52+0000, MÓDULO 7, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY. "COOTRACOL"

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACOL.

La microempresa COOTRACOL encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRACOL***
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, Sector Planeta Rica – La Ye, PR14+0000 – PR52+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRACOL.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente **A.M.V.**, tiene a su cargo a la microempresa "COOTRACOL", el cual se encarga de realizar las actividades de **Mantenimiento Vial Rutinario** en los sectores a cargo de la **Dirección Territorial Cordoba – INVÍAS.** Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de octubre de 2019 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRACOL (CONTRATO 819 DE 2019)***

Semana 1: Martes 01 – Domingo 06 de Octubre de 2019.

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR34+0500 hasta el PR36+0000, desde el PR33+0000 hasta el PR34+0500, desde el PR31+0000 hasta el PR33+0000 y desde el PR29+0000 hasta el PR31+0000 en ambos lados de la vía con 20 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR31+0500 hasta el PR32+0200 con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert) desde el PR34+0200 hasta el PR37+0500, desde el PR31+0000 hasta el PR32+0600 y desde el PR29+0400 hasta el PR30+0900con 12 jornales de trabajo

- Limpieza de barandas y defensas metálicas en el PR35+0000. hasta el PR37+0000
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

- ***Semana 2: Lunes 07 – Domingo 13 de Octubre de 2019.***

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0500 hasta el PR29+0000 en ambos lados de la vía con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0400 hasta el PR29+0300 en ambos lados de la vía con 3 jornales de trabajo
- Bacheo desde el PR26+0600, desde el PR15+0300 hasta el PR24+0000 con 30 jornales.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert) desde el PR28+0200 hasta el PR28+0800 con 2 jornales de trabajo
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Octubre de 2019.

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR43+0000 hasta el PR44+0000, desde el PR27+0500 hasta el PR29+0000 y desde PR26+0500 hasta PR27+0000 en ambos lados con 15 jornales.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert) desde el PR28+0100 hasta el PR29+0400 con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de cuneta desde el PR43+0000 hasta el PR43+0900 y desde el PR28+0400 hasta el PR29+0400 con 8 jornales de trabajo
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR26+0600 hasta el PR28+0000 en ambos lados de la vía con 3 jornales de trabajo
- Bacheo desde el PR18+0300 hasta el PR24+0000 en ambos lados de la vía con 10 jornales de trabajo
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 4: Lunes21 – Domingo 27 de Octubre de 2019.

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Se realizó actividad de bacheo desde el PR24+0000 hasta el PR37+0400 en ambos lados de la vía con 40 jornales de trabajo
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 5: Lunes28 – Jueves 31 de Octubre de 2019

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR25+0500 hasta el PR26+0700 en ambos lados de la vía con 5 jornales.
- Limpieza de cunetas desde el PR40+0300 hasta el PR43+0000 en ambos lados con 16 jornal de trabajo.
- Se realizó jornada de bacheo desde el PR37+0300 hasta el PR46+0800 en ambos lados de la vía con 30 jornales de trabajo
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el primero (01) de octubre de 2019 y el treinta y uno (31) de octubre de 2019, fueron ejecutadas al 100% por la Microempresa.

4.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la presente Administración Vial, se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas que realiza la Administración Vial, se corrobora que la Microempresa esté desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o

herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como el vestuario y los elementos de protección requeridos.

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY
"COOTRACOL"
MÓDULO 7
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA MICROEMPRESA

MICROEMPRESA	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Invias, Vías 2514 Planeta Rica – Sincelejo, PR14+0000 – PR52+0000, Módulo 7, a cargo de la dirección Territorial Córdoba.
CONTRATO	819 de 2019.
CONTRATO ADICIONAL	N/A.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES (ADICIONAL N° 1)	N/A.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de Mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 de Noviembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$172.616.964,00
VALOR TOTAL ADICIONALES (N° 1)	$N/A.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$172.616.964,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el periodo de Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la Microempresa en lo que respecta a sus labores de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras, cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL


ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S.
CARRETERA: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: 1 - 6 DE OCTUBRE DE 2019

MÓDULO 2
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS


ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2514; PR33+0000 - PR35+0500

ANTES

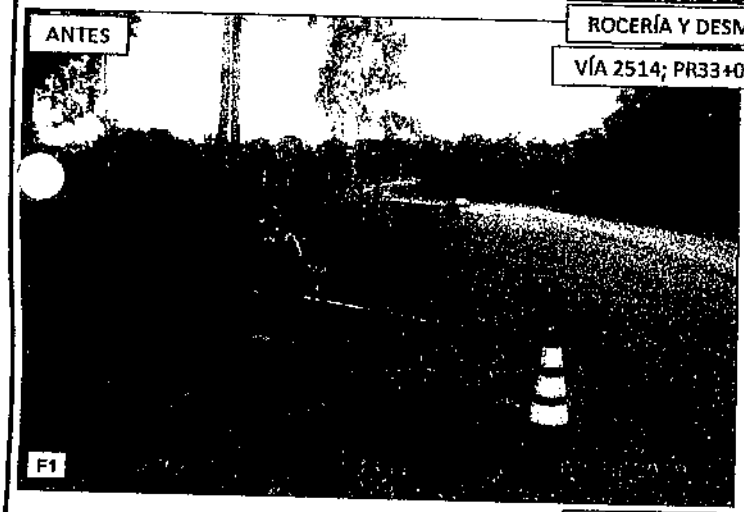

F1

DESPUÉS

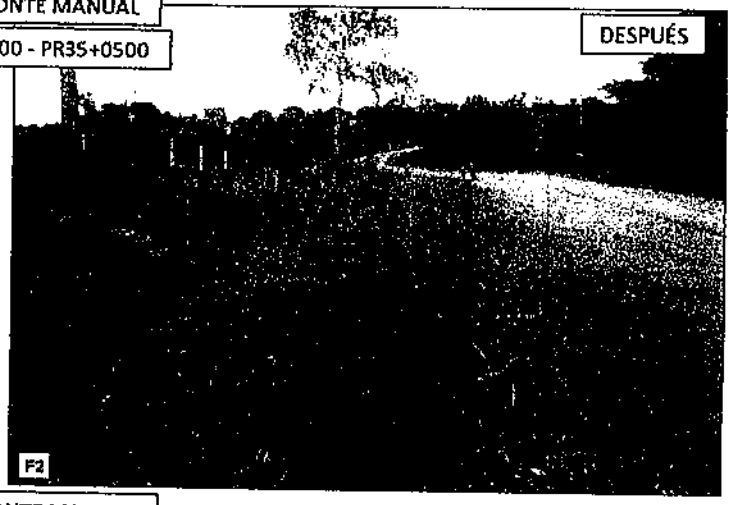

F2


ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2514; PR31+0000 - PR33+0000

ANTES



F3

DESPUÉS

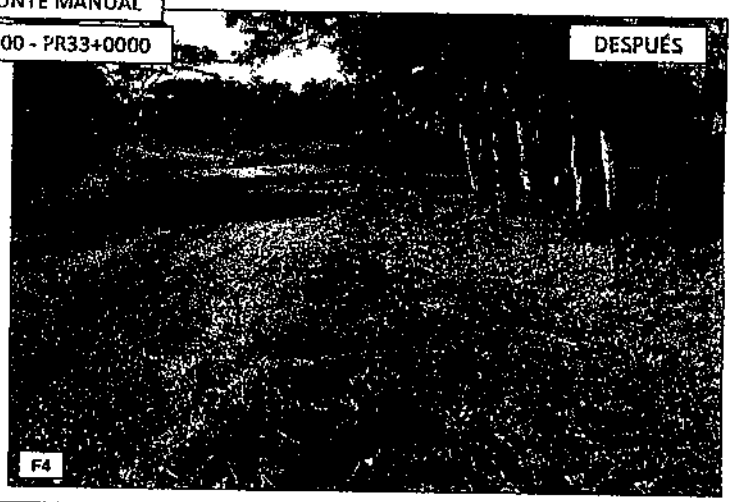


F4

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2514; PR29+0000 - PR31+0000

ANTES



DESPUÉS

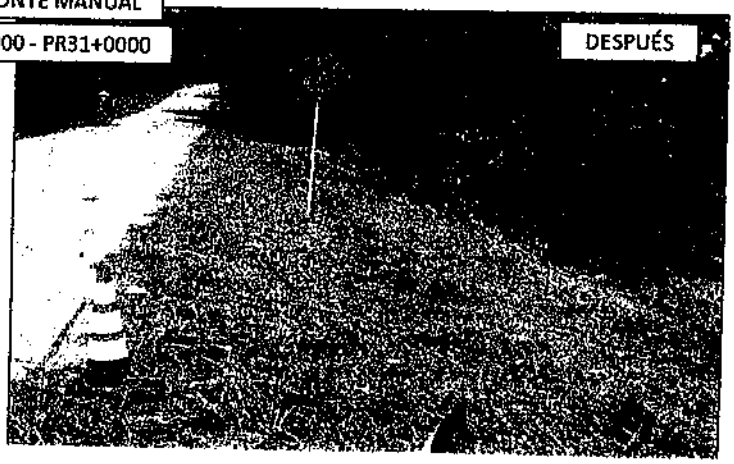

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL


ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S.		
CARRETERA:	PLANETA RICA - SINCELEJO	MÓDULO	2
FECHA:	7 - 13 DE OCTUBRE DE 2019	SECTOR:	PLANETA RICA - LA YE
		PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

VÍA 2514; PR26+0620

ANTES

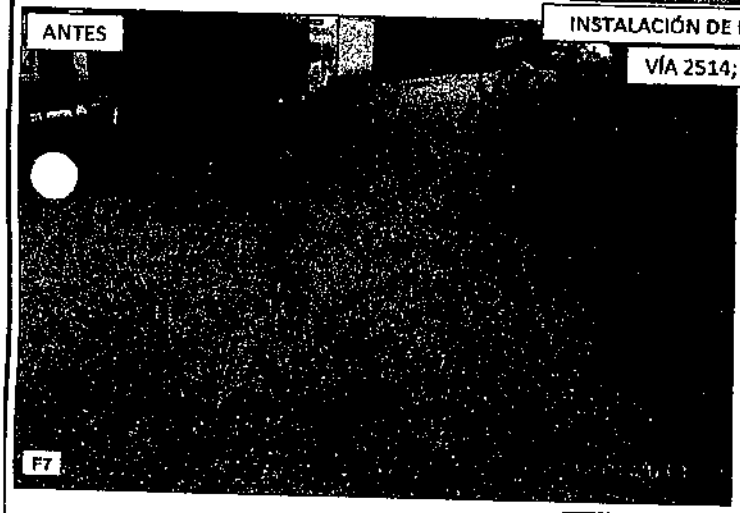

F7

DESPUÉS




F8

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL


VÍA 2514; PR30+0500

ANTES

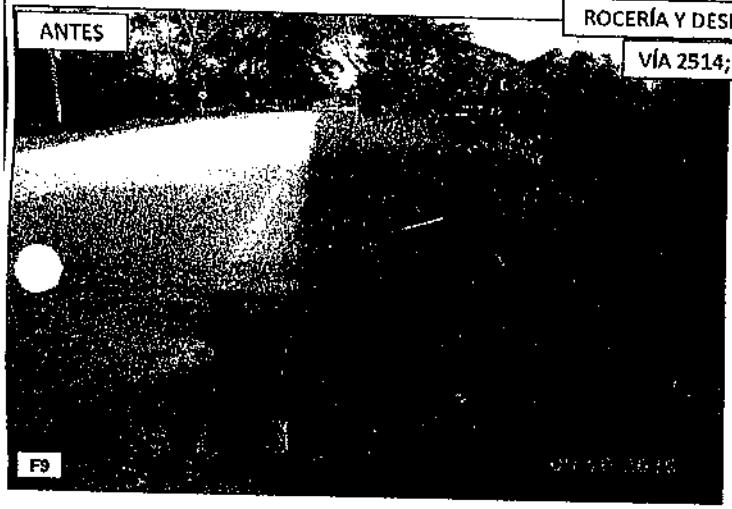

F9


DESPUÉS

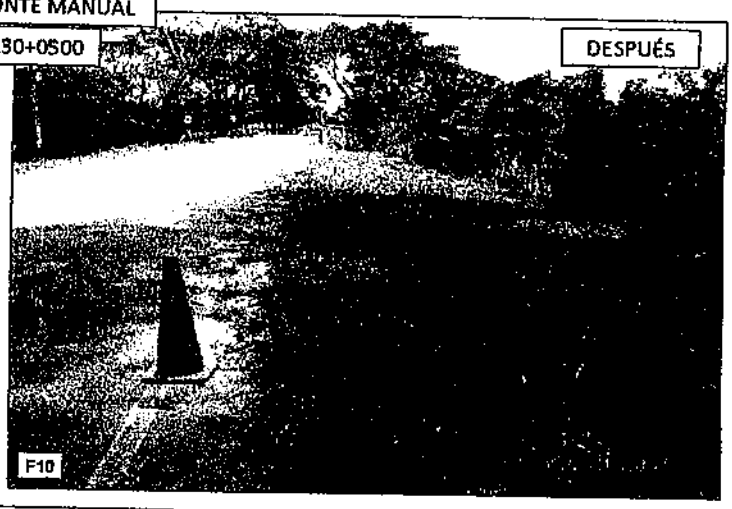

F10

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

VÍA 2514; PR18+0300

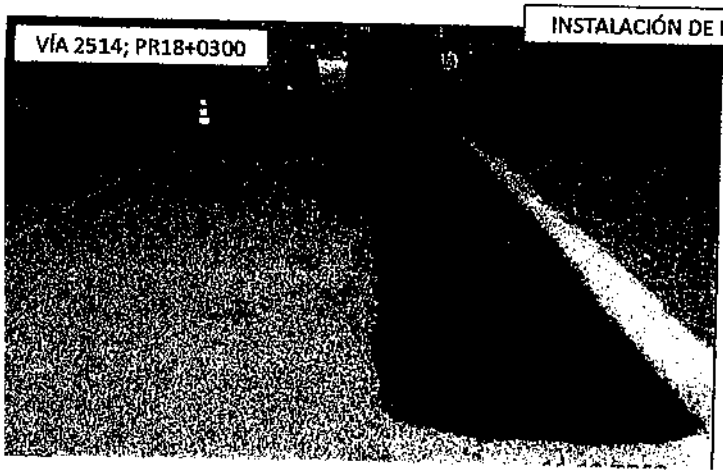

VÍA 2514; PR18+0370



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL


ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S.	MÓDULO	2
CARRETERA:	PLANETA RICA - SINCELEJO	SECTOR:	PLANETA RICA - LA YE
FECHA:	14 - 20 DE OCTUBRE DE 2019	PR's:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS


VIA PLANETA RICA - LA YE


INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
VÍA 2514; PR20+0200




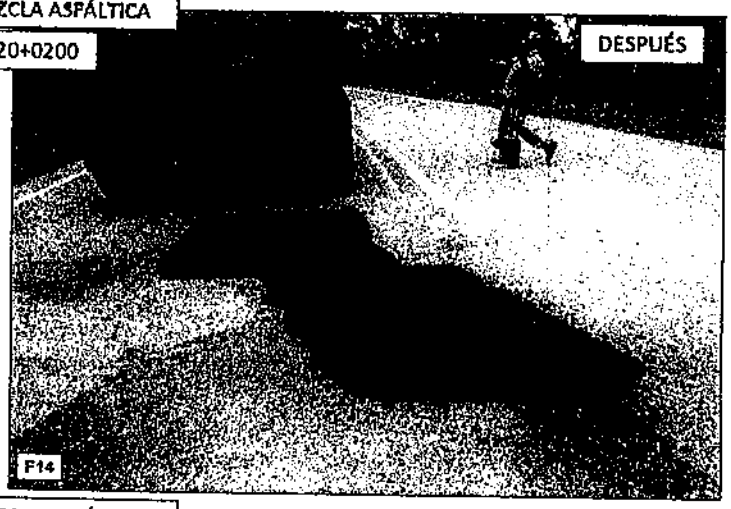

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
VÍA 2514; PR21+0150

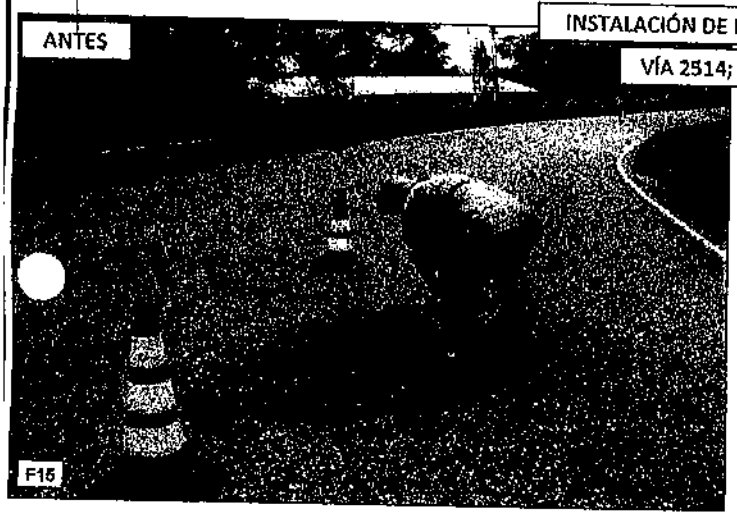

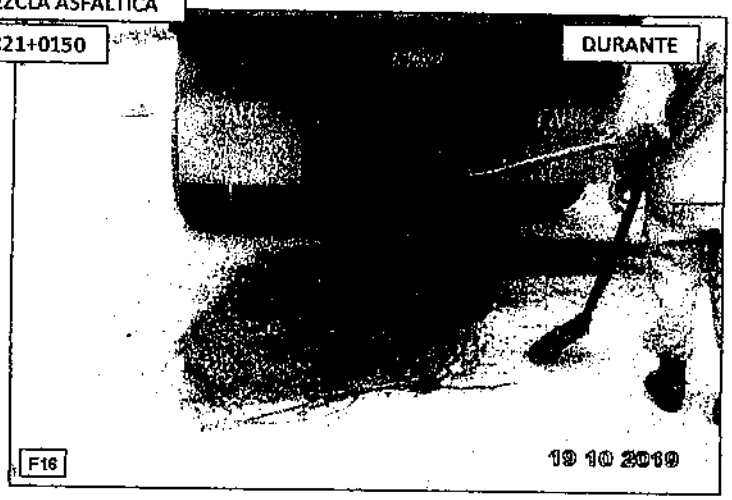

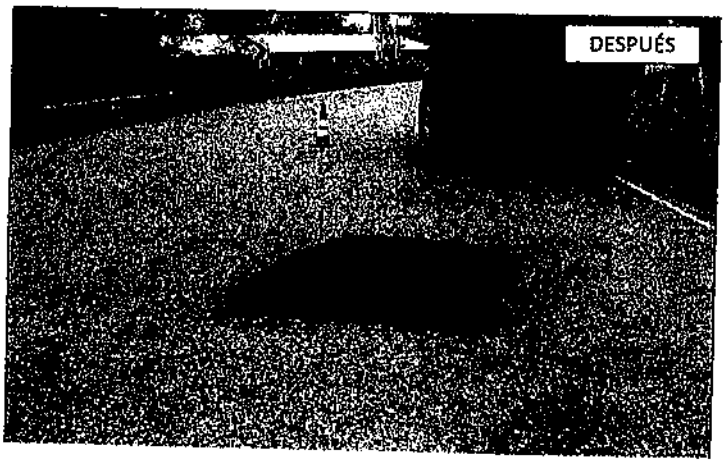

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: COPEBA S.A.S.
CARRETERA: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: 21 - 27 DE OCTUBRE DE 2019


MÓDULO 2
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VIA 2514 PLANETA RICA LA YE

ANTES

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
VÍA 2514; PR24+0250

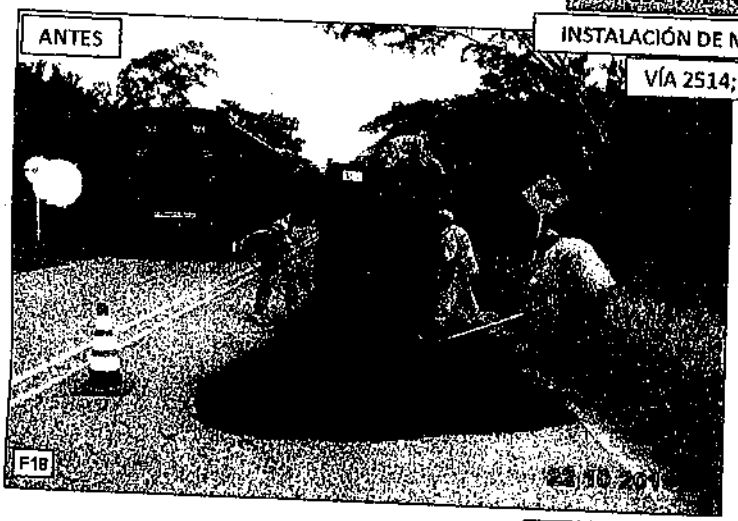


DESPUÉS



ANTES

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
VÍA 2514; PR25+0200

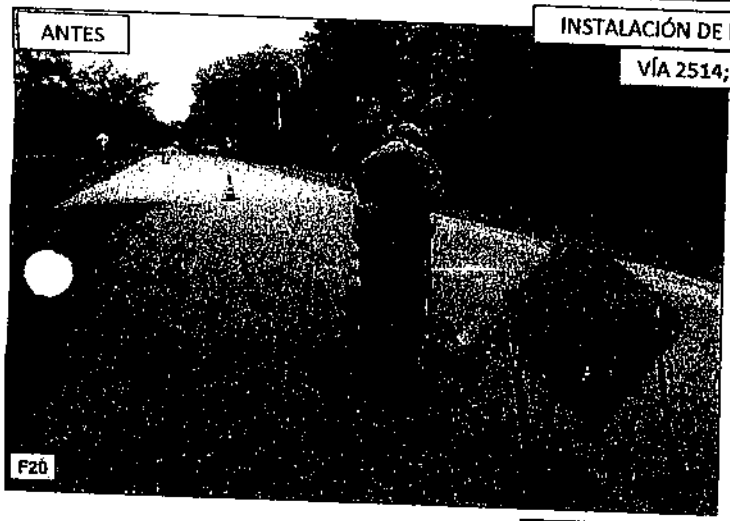

DESPUÉS



ANTES

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
VÍA 2514; PR38+0540



DESPUÉS

