SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL GUAVIARE

CONTRATO No. **026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INFORME SEPTIEMBRE

SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL GUAVIARE

, GUAVIARE

SEPTIEMBRE 2023

INTRODUCCION

En el presente informe se reportan las actividades ejecutadas, en el periodo comprendido entre los meses 01 de septiembre y 05 de octubre, del contrato **026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**, de acuerdo al diseño y planteamiento de las actividades de obra.

Se pueden evidenciar los lineamientos de carácter técnico desarrollados durante la ejecución del contrato de obra, cuyo objeto es: EJECUTAR LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBJETIVOS

GENERALES

El presente informe tiene como objeto reportar las actividades ejecutadas, dentro del periodo establecido en el contrato **026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**.

ESPECIFICOS

- Dar a conocer las actividades ejecutadas por el contratista, para reportar a el supervisor el estado obra a fecha de entrega.

- Dar a conocer las obligaciones técnicas que garanticen que las actividades de obra ejecutadas se encuentran conforme a la norma que rige este tipo de construcciones.

DATOS GENERALES

CONTRATO	**026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA
SUPERVISOR	TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
VALOR DEL CONTRATO	$ 179.990.342.66
PLAZO DE EJECUCIÓN	69 días
FECHA DE INICIO	01de septiembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de noviembre de 2023

1. ASPECTOS TÉCNICOS:

1.1 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES

Para el presente periodo de ejecución estuvieron a cargo de las actividades como residente de obra la javier esneider tovar amud quien estuvo a cargo del componente técnico general.

A su vez se cuenta con el siguiente personal fijo en la obra conformado así:

- 2 maestro, 2 oficiales
- 1 Técnico electricista
- 1 SISO
- 1 Ingeniero civil

Con lo referente a equipos usados tenemos los siguientes:

ítems	Equipos utilizados	Herramienta menor
1	Pulidora	martillo
2	taladro	cincel
3	hidrolavado	llana
4		espátula

5		segueta
6		
7		
8		

1.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.3 CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA $ 30.000.000,00				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRACTUALES**	**CANTIDADES EJECUTAS**
1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	84	
1.2	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES, INCLUYE RETIRO	Un	14	14
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	14	14
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	26.25	26.25
1.6	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO	UN	7	7
1.7	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE	M²	1	1
3	**ESTRUCTURA METALICA**			
3.3	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA PASARELA METÁLICA TORRE RADAR - ESTRUCTURA METALICA DE CONTENEDORES. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA	M²	79.4	79.4

	MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR			
4	**PINTURA**			
4.1	PINTURA ESMALTE	M2	586	586
5	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**			
5.1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA, PUERTAS CORREDIZAS EN ALUMINIO	M^2	15.9	15.9
SHELTERS 9				
1	**PRELIMINARES**			
1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M^2	70	70
1.8	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	ML	30	30
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M^3	3.6	3.6

3	**ESTRUCTURA METALICA**			
3.1	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 19", PERIL TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270). INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR	ML	5	5
4	**PINTURA**			
4.2	VINILO CORRIENTE TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	85	85
4.3	PINTURA PREMIUM PARA EXTERIORES BASE DE AGUA - TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	70	70

4.4	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES A DOS (2) MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	70	
4.5	ESMALTE POLIURETANO	M2	3.78	3.78
5	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**			
5.1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA, PUERTAS CORREDIZAS EN ALUMINIO	M²	1.716	1.716
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			

8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0,57 X 0,51 MEZCLADOR PRACTICO	Un	1	1
10	**CARPINTERIA EN MADERA**			
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE X 0.60 X 0.80M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORRADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, MESON EN GRANITO PULIDO CON SALPICADERO COLOR A ESCOGER POR EL SUPERVISOR, POCETAS, PUERTAS, CAJONERAS, ENTREPAÑOS, MANIJAS DE ACERO. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.	ML	1.8	1.8

10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO DE COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE 0,35 X 0,70 M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORRADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, PUERTAS, CAJONERAS, MANIJAS DE ACERO, INCLUYE LOCERO Y VAJILLERO PLASTIFICADO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.	ML	1.8	1.8
12	**VIDRIOS Y ESPEJOS**			
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M²	1	
13	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	1	1

13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	17	17
SHELTERS 5				
1	**PRELIMINARES**			
1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M²	70	70
1.8	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	ML	30	30
3	**ESTRUCTURA METALICA**			

3.1	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 19", PERIL TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270). INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR	ML	19	19
4	**PINTURA**			
4.2	VINILO CORRIENTE TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	85	85
4.3	PINTURA PREMIUM PARA EXTERIORES BASE DE AGUA - TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	70	70

4.4	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES A DOS (2) MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	70	70
4.5	ESMALTE POLIURETANO	M2	3.78	3.78
5	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**			
5.1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA, PUERTAS CORREDIZAS EN ALUMINIO	M²	1.716	1.716
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			

8.8	PRUEBA SANITARIA	Un	1	1
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0,57 X 0,51 MEZCLADOR PRACTICO	Un	1	1
10	**CARPINTERIA EN MADERA**			
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM SEGÚN DISEÑO	M²	3.6	3.6
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE X 0.60 X 0.80M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORRADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, MESON EN	ML	1.8	1.8

	GRANITO PULIDO CON SALPICADERO COLOR A ESCOGER POR EL SUPERVISOR, POCETAS, PUERTAS, CAJONERAS, ENTREPAÑOS, MANIJAS DE ACERO. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.			
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO DE COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE 0,35 X 0,70 M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORRADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, PUERTAS , CAJONERAS, MANIJAS DE ACERO, INCLUYE LOCERO Y VAJILLERO PLASTIFICADO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN.	ML	1.8	1.8
13	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Un	1	1

SHELTERS 8				
1	**PRELIMINARES**			
1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M²	70	70
3	**ESTRUCTURA METALICA**			
3.1	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 19", PERIL TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270). INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR	ML	8	8

4	**PINTURA**			
4.2	VINILO CORRIENTE TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	99	99
4.3	PINTURA PREMIUM PARA EXTERIORES BASE DE AGUA - TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	70	70
4.4	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES A DOS (2) MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	70	70
5	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**			

5.1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA, PUERTAS CORREDIZAS EN ALUMINIO	M²	2.2	2.2
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			
6.4	REFORZAMIENTO PISO EXISTENTE	M²	3	3
10	**CARPINTERIA EN MADERA**			
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM SEGÚN DISEÑO	M²	3.6	3.6

" MANTENIMIENTO TORRES RADAR $ 40.000.000,00"				
3.1	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 19", PERIL TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270). INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR	ML	384	384
3.2	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 DE BARANDA METÁLICA EXISTENTE COMPUESTA POR (PASAMANOS DE 5CM X 5 CM, Y BARANDAS 5 CM X 5 CM). INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR	ML	38	38
3.3	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA PASARELA METÁLICA TORRE RADAR - ESTRUCTURA METALICA DE CONTENEDORES. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE	M²	52	52

	EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR			

1.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Ítems	Materiales
1	Cemento
2	Estuco
3	Pintura
4	Enchape
5	Pega enchape
6	Concreto

2. ASPECTOS FINANCIEROS

Corte	Valor programado	Valor ejecutado	Fecha	Porcentaje ejecutado	Porcentaje ejecutado	Porcentaje retraso
1	$ 155,565,653.16	$143,992,274.1	01 de septiembre a 05 octubre 2023	80.00%	86.43%	6.43%

3. CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO DE A26 BRIL DE 2023 AL 26 DE MAYO DEL 2023

Anexo 01

4. AVANCE DE OBRA

Anexo 2

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1 REPORTE DETALLADO DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS.

En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades por el contratista:

a. Demoliciones.

b. Excavación de Cimentación.

5.2 GESTION REALIZADA POR EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.


Dentro de los compromisos establecidos por el contratista y la gestión realizada por el área de SST en este periodo se cumplió con las Inducciones de ingreso para el personal operativo con el fin de identificar cada uno de los riesgo a los que se va exponer cada trabajador y tomar las medidas de prevención y dar buen uso de dotación y elementos de protección personal. Antes de iniciar labores se procedió al registro del personal operativo en las respectivas planillas. Se realizaron tomas de temperatura corporal con termómetro digital diariamente antes de iniciar las actividades de obra y al finalizar labores diarias. El contratista en este mes ejecuto capacitaciones y charlas de seguridad con la participación del personal operativo de este frente de trabajo para mitigar la propagación y contagio de COVID 19 y de esta forma reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales.

Antes de iniciar labores se verifica el uso adecuado overol anti fluidos, cofia, guantes de seguridad y luego realizar.

Se solicitó a todo el personal operativo realizar el lavado frecuente de manos y desinfección con gel anti bacteria.

Afiliación al sistema de seguridad social
Todo el personal que trabaja para la obra ejecutada, cuenta con el respectivo pago de seguridad social: ARL y EPS. El personal y la respectiva planilla de pagos de seguridad se relacionan en el **(Anexo 3)**

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-MINISTRIO DE DEFENSA NACIONAL**	**88 días**
2		**MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA**	**88 días**
3		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACION**	**16 días**
4		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 300 PSI H=0,05 M	2 días
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA ANT-90351277L DEMARCA	2 días
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE PARED REF-75303B501 (INCLUYE RISANI DEL PAÑETE EXISTENTE Y PINTURA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS PILOS) (EN LOS	3 días
7		**CIELO RASO**	**2 días**
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPLEMENTOS PARA INSPECCIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU	2 días
9		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**9 días**
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE UNA PIEZA ARO ALARGADO ALTO TANQUE MATERIAL PORCELANA SANITARIA ANCHO 35 CM AHORRO DE AGUA TIPO DE DESCARGA DOBLE SISTEMA DE	2 días
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER OVALADO BLANCO 38X51,5X14 CM INCLUYE GRIFERIA	2 días
12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS	2 días
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 CM	1 día
14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLASTICA 100X2 S1 X 2	1 día
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE PORCELANA	1 día
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOALLERO METALICO	1 día
17		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**24 días**
18		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO 15A,125V,2Ø+N+PT) CON CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW-90 (GRIS) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",	2 días
19		INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUNTO ELECTRICO PARA PUNTOS ELECTRICO EN CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. (NO	3 días
20		INSTALACIÓN A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COZUM ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DISAÑO.	3 días
21		INSTALACIÓN A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COZUM ROJO , INCLUYE INSTALACIÓN Y DISAÑO.	3 días
22		INSTALACIÓN A TODO COSTO ALAMBRADO DE PUNTOS Y RED LIBRE DE ALUROGENOS # 12, CON RECUBRIMIENTO POR COZUM VERDE , INCLUYE INSTALACIÓN Y DISAÑO.	3 días
23		ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ARQUEA PRAMRADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA	1 día
24		INSTALACIÓN A TODO COSTO TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) LÍNEA ARQUEA PRAMRADA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS	2 días
25		INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PANEL LED INTEGRADO REDONDO DE INCRUSTAR 18W 2.5 CM, O IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA	1 día
26		SUPERVISION LUZ BLANCA Y/O AMARILLA, GESTIÓN INTERNA	1 día
27		SIPS BOMBILLO LED 8 AMPS	2 días
28		ESCUELA LINEA 5 MANAGER	2 días
29		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CONVENCIONAL (Interruptor sencillo 10 cm x 5 cm, 1 polo, 1 tiro, 1 operación) LUZ, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	2 días
30		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA ENCABLEADO (PE, NE, FE, LI), LIBRE DE HALOGENOS, CANALIZACIÓN, CAJA METALICA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, TUBERÍA	2 días
31		**CARPINTERIA EN MADERA**	**10 días**
32		PUERTA EN MADERA CON ACABADO EN MELAMINICO COLOR A DEFINIR, CON 2 DILATACIONES EN VINILO INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA Y TOPE	10 días
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE DE LAVAMANOS CON ENTREPAÑO EN MADECOR RH	3 días
34		**MAMPOSTERIA**	**2 días**
35		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 2.0 - 0 - 15 MM, INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES"	2 días
36		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**2 días**
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO 5 - 6 MM (FIJO7ADO EN MURO)	1 día
38		SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU	1 día
39		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**14 días**
40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	2 días
42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 2X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	2 días
43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	2 días
44		**MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA**	**21 días**
45		**PRELIMINARES**	**10 días**
46		REMOCIÓN DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	5 días
47		DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES, INCLUYE RETIRO	2 días
48		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	2 días
49		DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	1 día
50		DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE	1 día
51		ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PIS	1 día
52		**ESTRUCTURA METALICA**	**6 días**
53		LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA PASARELA METÁLICA TORRE RADAR - ESTRUCTURA METALICA DE CONTENEDORES. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA	6 días
54		**PINTURA**	**6 días**
55		PINTURA ESMALTE	6 días
56		**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**2 días**
57		MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA, PUERTAS COMERCIALES EN ALUMINIO	2 días
58		**SHELTERS 9**	**15 días**
59		**PRELIMINARES**	**3 días**
60		ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	2 días
61		DESMONTE TUBERIA HIDRÁULICA	1 día
62		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**2 días**
63		EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE	2 días
64		**ESTRUCTURA METALICA**	**1 día**
65		LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 14", PERF. TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270) INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA	1 día
66		**PINTURA**	**7 días**
67		VINILO CORRIENTE TIPO 2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	2 días
68		PINTURA PREMIUM PARA EXTERIORES BASE DE AGUA - TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	3 días
69		ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES A DOS (2) MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y TODAS LAS ACTIVIDADES	2 días
70		ESMALTE POLIURETANO	1 día
71		**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**1 día**
72		MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA, PUERTAS COMERCIALES EN ALUMINIO	1 día
73		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**2 días**
74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPATOS DE EMPOTRAR ELF 9 G11 MEZCLADOR PRACTICO.	2 días
75		**CARPINTERIA EN MADERA**	**8 días**
76		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE X 0.60 X 0.85M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORMADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA COLOR POR DEFINIR, MESON EN	8 días
77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO DE COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE 0.35 X 0.70 M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORMADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA	8 días
78		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**1 día**
79		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO 5 - 6 MM (FIJO7ADO EN MURO)	1 día
80		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**2 días**
81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día
82		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día
83		**SHELTERS 5**	**12 días**
84		**PRELIMINARES**	**3 días**
85		ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	2 días
86		DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA Ø1 8" Y Ø 6"	1 día
87		**ESTRUCTURA METALICA**	**2 días**
88		LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 14", PERF. TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270) INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIAN	2 días
89		**PINTURA**	**7 días**
90		VINILO CORRIENTE TIPO 2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	2 días
91		PINTURA PREMIUM PARA EXTERIORES BASE DE AGUA - TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	2 días
92		ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES A DOS (2) MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y TODAS LAS ACTIVIDADES. COMERCIAL INSTALACIÓN	2 días
93		ESMALTE POLIURETANO	1 día
94		**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**1 día**
95		MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA,	1 día
96		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**1 día**
97		PRUEBA SANITARIA	1 día
98		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPATOS DE EMPOTRAR ELF 9 G11 MEZCLADOR PRACTICO.	2 días
99		**CARPINTERIA EN MADERA**	**5 días**
100		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSETS EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM SEGÚN diseño	5 días
101		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE X 0.60 X 0.85M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORMADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA	8 días
102		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO DE COCINA 2.50 APROXIMADAMENTE 0.35 X 0.70 M ESTRUCTURA EN QUINTUPLEX Y CUERPO EN MADECOR RH DE 15 MM, FORMADO INTERNAMENTE EN FORMICA COLOR BLANCA Y EXTERNAMENTE EN FORMICA	8 días
103		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**1 día**
104		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día
105		**SHELTERS 8**	**12 días**
106		**PRELIMINARES**	**2 días**
107		ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	2 días
108		**ESTRUCTURA METALICA**	**2 días**
109		LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (TUBO DIAMETRO 7", 10" Y 14", PERF. TIPO C 15 CM X 5 CM, PERFIL TIPO L 8 CM X 8 CM, IPE DE 60 A 270) INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA	2 días
110		**PINTURA**	**7 días**
111		VINILO CORRIENTE TIPO 2, 3 MA	3 días
112		PINTURA PREMIUM PARA EXTERIORES BASE DE AGUA - TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	2 días
113		ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES A DOS (2) MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y TODAS LAS ACTIVIDADES.	2 días
114		**CARPINTERIA EN ALUMINIO**	**1 día**
115		MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VENTANERIA,	1 día
116		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACION**	**2 días**
117		REFORZAMIENTO PISO EXISTENT	2 días
118		**CARPINTERIA EN MADERA**	**5 días**
119		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSETS EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM SEGÚN diseño	5 días
120		**MANTENIMIENTO TORRES DEL RADAR**	**22 días**
121		**PRELIMINARES**	**22 días**
122		LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA PASARELA METÁLICA TORRE RADAR - ESTRUCTURA METALICA DE CONTENEDORES. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA	15 días
123		LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA PASARELA METÁLICA TORRE RADAR - ESTRUCTURA METALICA DE CONTENEDORES. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA	5 días

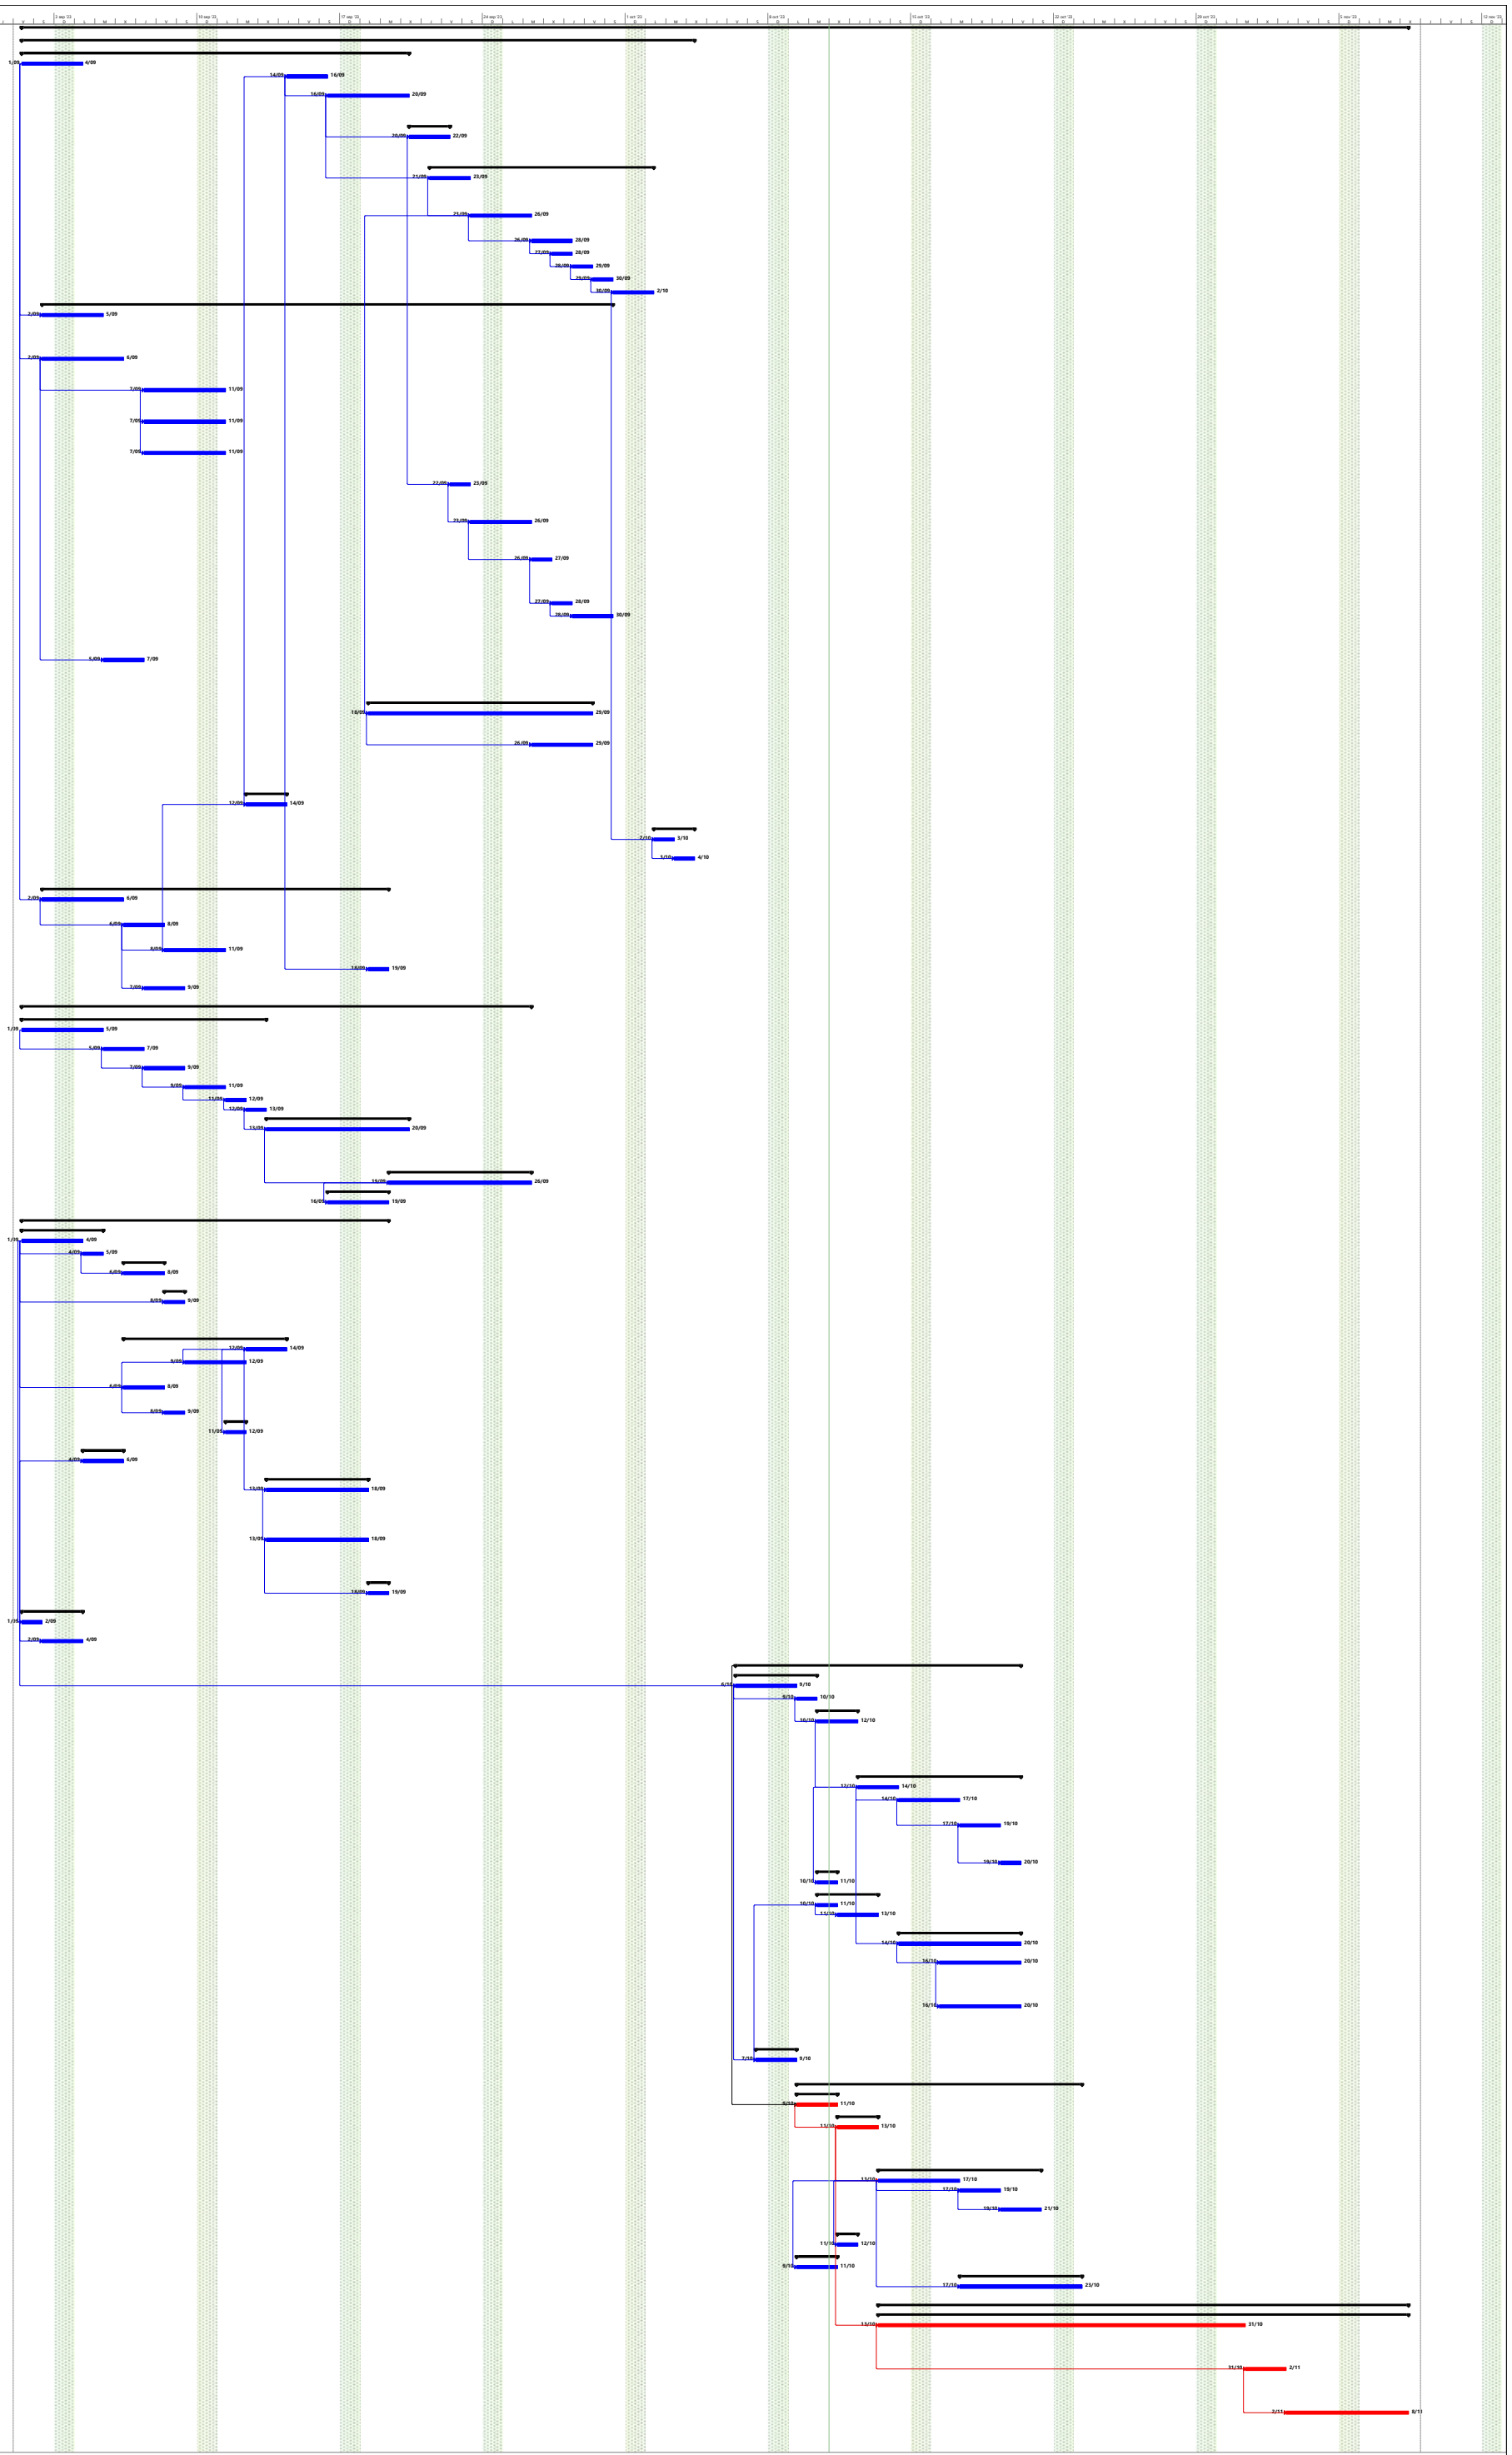

Proyecto: Programacion Fuerza
Fecha: mié 11/10/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Progreso

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/10/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/09/2023	**AL:**	5/10/2023
CONTRATO Nº	026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	CONSORCIO VENTURA		
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS				
FECHA DE INICIO	1/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	8/11/2023		
VALOR INICIAL	$ 179,990,342.66	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 179,990,342.66				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
PRUEBA SANITARIA	FAVORABLE	ENCHAPE POR M2	80	ANDAMIOS POR SECCIONES	4	JAVIER ESMEIDER TOVAR AMUD	1	**100.00%**	**100.00%**	SI	RESIDENTE DE OBRA
PRUEBA ELECTRICA DE CONTINUIDAD	FAVORABLE	TUBERIA SANITARIA 4 POR ML	42	ARNES	3	CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE	1	**100.00%**	**100.00%**	SI	SISO
		INVERCRYL	7	LINEA DE VIDA	3	HAENZZ GONZALEZ	1	**100.00%**	**10.00%**	SI	TECNICO ELECTRICISTA
		ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO	210	HIDROLAVADORA	1	NESTOR ENRIQUE AVILA RINCON	1	**100.00%**	**100.00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
		VINILO CORRIENTE TIPO-2 POR M2	255	PULIDORA POR UNIDA	2	SANTOS RAMIREZ FIGUEROA	1	**100.00%**	**100.00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
		EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA POR ML	384	TALADRO POR UNIDAD	1	RICARDO MORENO HURTADO	1	**100.00%**	**100.00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
		SUPERBOARD POR M2	164			LENARDO MORENO	1	**100.00%**	**50.00%**	SI	MAESTRO DE OBRA
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	80.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (SEPTIEMBRE)				
Semana 1	2.00%	**80.00%**	**86.43%**	**6.43%**
Semana 2	20.00%			
Semana 3	23.00%			
Semana 4	35.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA













































AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		86.43%
EJECUTADO		80.00%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

		GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
02-01-01-001-00210 REC 10			
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA			
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		0.00%
7. CIELO RASO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		0.00%
9. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
11. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		0.00%
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

02-02-02-005-004 REC 10			
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA $ 30.000.000,00			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL RADAR SAN JOSE $ 40.000.000,00"			
SHELTERS 9			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
12. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
SHELTERS 5			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100%**
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. PINTURA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
8. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**

SHELTERS 8			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
3. ESTRCTURA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. PINTURA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
" MANTENIMIENTO TORRES RADAR $ 40.000.000,00"			
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
N/A	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	69	35	34
Proyección	69	35	34

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

PEGAR FOTO ANTES Y DESPUES ACTIVIDAD RELEVANTE DENTRO DEL CONTRATO

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
35	0	8/11/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SEDE MACARENA

SE REALIZO DEMOLICION DE ACABADOS EN SHELTER OMEGA DE LA MACARENA, INSTALACION DE ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CIELO RASO.

SEDE SAN JOSE

REALIZANDO LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA TORRE DE CONTROL Y PINTURA DEL RADAR, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA DE MUROS, CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA, APLICACION DE ESTUCO IMPERMEABILIZADO EN JUNTAS Y DILATACIONES..

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	SI	X	NO	
CARPINTERIA EN MADERA	SI		NO	X
VIDRIOS Y ESPEJOS	SI	X	NO	
ESTRUCTURA METALICA	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: Una vez se realiza la medición completa de la torre del radar, esta resulta es superior a la contractual evento que es informado al supervisor para continuar o detener dicha actividad; inmediatamente el supervisor se prioriza la limpieza y aplicación de pintura del radar se detienen las actividades de carpintería en madera correspondiente a muebles altos y bajos de cocina.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 179,990,342.66	$ 179,990,342.66	$ 143,992,274.13	80.00%	$ 35,998,068.53	20%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 179,990,342.66	$ 179,990,342.66				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 179,990,342.66	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 179,990,342.66	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
FLUJO DE CAJA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


EL CONTRATISTA EJECUTA LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE OBRA.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE PRESENTAN LLUVIAS PERO NO AFECTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES


ELABORO:	REVISO:
TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma	JAVIER ESMEIDER TOVAR AMUD RESIDENTE DE OBRA Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO














ANTES











DESPUES







CONSORCIO VENTURA	**INFORME DE GESTIÓN SSTMA (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE)**	**MJHG -A- GSSTMA**
		Version 0.1
		Fecha 1/9/2023

INFORME

Mes reportado:	sep-23			
Contrato No. :	1			
Objeto del Contrato :	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUTAR SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Empresa Contratista:	CONSORCIO VENTURA			
Dirección :	BASE DE LA FUERZA AEREA, SAN JOSE DEL GUAVIARE			
Teléfono :	3184818340	**E-mail :**	consorcioventurafuerzaaerea@gmail.com	
Interventor del Contra		X	**Nombre :**	Tte. Bohorquez

Nó. De trabajadores	**ADMINISTRATIVOS**	5
	CONTRATISTAS	NA
	FORANEOS	NA
	TOTAL:	5

Actividades SST (Seguridad y salud en el trabajo)	Actividades MA (Medio ambiente)
Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Charlas de Medio Ambiente
Supervición de Actividades de trabajo en alturas	Orden y aseo de Resios Peligrosos (Pintura, catalizador, disolventes)
Pausas Activas	Capacitación manipulación y disposicion final de residuos peligrosos
Diligenciamento de formatos	
Actualización de SG-SST	

Señalizacion del area de trabajo	

ESTADISTICAS	Total días trabajados en el mes	24
	Total de horas hombres trabajadas al día	24
	Total de horas hombres trabajadas del mes	576
	Total de horas hombres capacitación	4
	Numero de accidentes con perdidas de tiempo	0
	Numero de accidentes sin perdidas de tiempo	0
	Total dias de inacapacidad	0
	Numero de incidentes ambientales con perdidas de tiempo	0
	Numero de incidentes ambientales sin perdidas de tiempo	0

Ítem	Capacitación y Entrenamiento		Duración
1	SEMANA 1	Inducción	1.00
2	SEMANA 2	Trabajo en alturas	1.00
3	SEMANA 3	Riesgo Quimico	1.00
4	SEMANA 4	Orden y Aseo	1.00
Total			**4 horas**

Carlos Cardona S.	
Residente SSTMA	**Vigia SST**

Elaboró: Luz Adriana Piñeros Vizcaya	**Revisó:** Maria Jose Herrera Guzman	**Aprobó:** Maria Jose Herrera Guzman



FOTOGRAFÍA No.	1
FECHA	2/9/2023
LUGAR	Torre Radar
OBSERVACIONES	
Supervición de actividades y uso de los elementos de protección contra caidas (Arnes, eslinga, casco con barbuquejo, gafas de protección, camisa manga larga)	



FOTOGRAFÍA No.	2
FECHA	4/9/2023
LUGAR	Torre Radar
OBSERVACIONES	
Supervición de actividades y uso de elementos de proteccion personas	



FOTOGRAFÍA No.	3
FECHA	7/9/2023
LUGAR	Torre Radar
OBSERVACIONES	
Supervición de actividades de trabajos en alturas	



FOTOGRAFÍA No.	4
FECHA	11/9/2023
LUGAR	Cabañas
OBSERVACIONES	
Charla de Seguridad y Salud en el Trabajo y capacitación	





FOTOGRAFÍA No.	5	**FOTOGRAFÍA No.**	6
FECHA	16/9/2023	**FECHA**	18/9/2023
LUGAR	Torre Radar	**LUGAR**	Torre Radar
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
Supervición de actividades, Charla de Seguridad, uso de EPP (casco, camisa manga larga, pantalon, botas puntas de acero, barbuquejo)		Encerramiento y señalización del area donde se realiza trabajos en alturas	



FOTOGRAFÍA No.	7
FECHA	22/9/2023
LUGAR	Torre Radar
OBSERVACIONES	
Supervición de actividades de trabajos en alturas	




FOTOGRAFÍA No.	8
FECHA	23/9/2023
LUGAR	
OBSERVACIONES	
Charla diaria y capacitación de orden y aseo en el area de trabajo	



FOTOGRAFÍA No.	9
FECHA	26/9/2023
LUGAR	Cabañas
OBSERVACIONES	
Actividades de orden y aseo de las areas de trabajo	



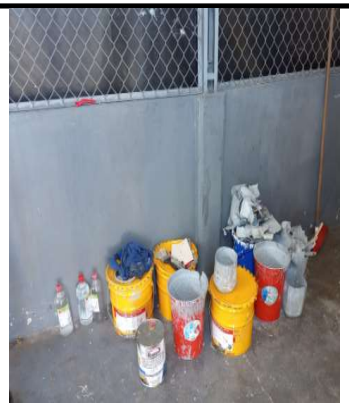

FOTOGRAFÍA No.	10
FECHA	29/9/2023
LUGAR	Cabañas y cuarto de quimicos
OBSERVACIONES	
Almacenamiento y disposión de residuos	


CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Maria Jose Herrera Guzman** , identificada con **NI 52452955** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **24/03/2023** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2022** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Resultados Evaluación por Ciclo



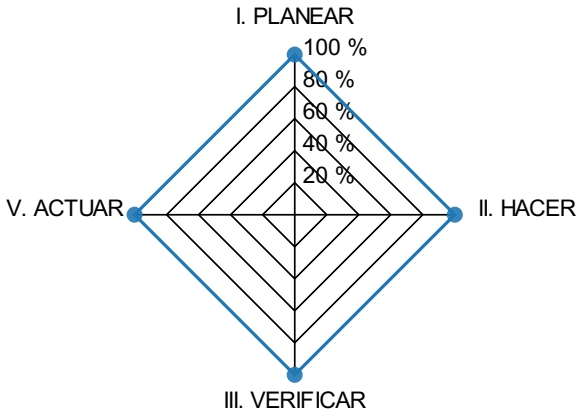

CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar

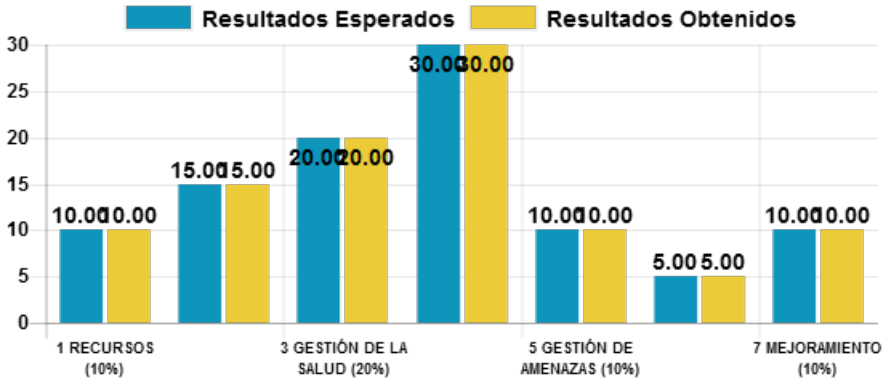

ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	**100,00%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **24 marzo 2023**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=Xl5IIUPWnZf5UmC29EoP0w==)

Para verificación de Positiva

CONSORCIO VENTURA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Fecha: 15/01/2017

Version: 0 1

Proyecto	Consorcio Ventura.	Tema	Trabajo en alturas.
Lugar	(5 - B) Fuerza Aerea	Aplicado a	Personal
Fecha	8 y 9 Septiembre.	Expositor	Carlos Cardenas.

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Ricardo moreno Hurtado	1,120583014	ayudante	3213[illegible]46		Ricardo moreno
2	Nestor enrique Avila A	1077520582	maestro	3229260691		Nestor Avila
3	Jose Edwin Juan Moreno	1.006.701.821	ayudante	3168844106		[illegible]
4	Carlos D Cardenas M.	1124037360	SST MA	3134818340		[illegible]
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Se realizo Capacitacion de media hora, el tema trabajo en alturas. esta relacionado con el mantenimiento de la torre radar, con el objetivo de que conozcan la importancia de los elementos de proteccion contra caidas.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VENTURA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND	
Fecha	15/01/2017
Version	0.1

Proyecto	Consorcio Ventura.	Tema	Orden y Aseo
Lugar	Batallon fuerza Aerea	Aplicado a	Personal
Fecha	14 y 23 septiembre.	Expositor	Carlos Cardenas

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	NESTOR SOLEDAD AVILA ERAZO	1077320560	MAESTRO	3229260699	✓	NESTOR AVILA
2	RICARDO MORENO HURTADO	1.120583014	AYUDANTE	3213424336		RICARDO MORENO
3	Jose Francisco Juan Moreno	1.006.701.821	ayudante	3168844106		
4	Carlos D. Cardenas M.	1126572360	SOLDADOR	3182481840		Carlos C.
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Se realizo capacitacion de media hora el tema Orden y Aseo esta relacionado a organizacion de las areas de trabajo donde se realizan actividades. como las cabinas y la torre Radar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VENTURA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Fecha: 15/01/2017

Version: 0.1

Proyecto	Consorcio Ventura	Tema	Riesgo Químico
Lugar	Fuerza Aerea – SJ Cúcuta	Aplicado a	Personal Op.
Fecha	11 y 16 Septiembre	Expositor	Carlos Cardenas

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Jose Fernando Leon Moreno	1.006.701.821	ayudante	3168844106	—	
2	RICARDO Moreno Murtado	1.120583094	ayudante	3213424336	—	Ricardo moreno
3	NESTOR enrique, Avila Rincon	1077320582	maestro	3[illegible]	—	NESTOR Avila
4	Carlos A. Cardenas CM	1120572360	ESTIMA	3184818340	—	Carlos C.
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Se realiza capacitacion de media hora, El tema Riesgo Quimico estal relacionado con la Clasificacion de residuos Peligrosos o quimicos con el objetivo de que conozcan la manipulacion adecuado al el almacenamiento. de la pintura que se utiliza para pintar la torre.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	12/10/2023	71582757	$1.397.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	77.400	0		0		0	9	800	0	78.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.100	0		0		0	9	1.400	0	146.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.100	0		0		0	9	1.400	0	146.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.900	0		0		0	9	100	0	5.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	82.300	0		0		0	9	800	0	83.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.400	0	0	0	0	9	2.600	0	275.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	309.400	0	0	0	0	9	2.900	0	312.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.600				19.600	9	200	19.800			196	19.800	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	145.800	9	1.400	147.200	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
73.000	9	700	73.700	8
ICBF				
109.400	9	1.100	110.500	8
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	454.800	459.300
Pensión	2	581.800	587.300
Riesgos Laborales	1	19.600	19.800
CCF	1	145.800	147.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	109.400	110.500
MEN	0	0	0
SENA	1	73.000	73.700
TOTALES	11	1.384.400	1.397.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	12/10/2023	71582757	$1.397.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N	X																230201	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS002	618.667	77.400	14-23	618.667	1	3.300	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
2	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	77.400	14-23	618.667	1	3.300	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
3	CC	1120572360	CARDENAS MANRIQUE CARLOS ANDRES	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS041	618.667	77.400	14-23	618.667	1	3.300	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
4	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS008	618.667	77.400	14-23	618.667	1	3.300	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
5	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N	X																230201	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	67.700	14-23	541.334	1	2.900	CCF24	541.334	21.700	541.334	10.900	16.300	0	0
6	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N	X																230201	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS008	541.334	67.700	14-23	541.334	1	2.900	CCF24	541.334	21.700	541.334	10.900	16.300	0	0
7	CC	1006701821	LEON MORENO JOSE LEONARDO	1	0			N	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
8	CC	1120583014	MORENO HURTADO RICARDO	1	0			N	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018455674		TOVAR AMUD JAVIER ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA23#17-35	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5840627	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	173600595	9455614951	I	2023/09/18	2023/09/21	BANCOLOMBIA		$338,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1018455674	TOVAR AMUD JAVIER ESNEIDER																		230201	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018455674		TOVAR AMUD JAVIER ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA23#17-35	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5840627	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	173600595	9455614951	I	2023/09/18	2023/09/21	BANCOLOMBIA		$338,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$186,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$186,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$145,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$145,500
TOTAL				1	$336,700	$0	$338,000
