"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			**1**		
1.2. Período del informe	**Del**	4/09/2023			
	Al	13/10/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RO-0021	**Fecha**	18/08/2023	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINIA/VAUPES Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS					
1.5. Nombre del contratista					
BERMORI GRANADA VALENCIA					
1.6. Cédula o NIT		**1.7. Correo electrónico**			
76.325.377		granvalingenieria@gmail.com			
1.8. Dirección		**1.9. Teléfono**			
CALLE 3 No. 6-80 Buenaventura (Valle del cauca)		315 - 497 - 0774			
1.10. Fecha de Inicio		31/08/2023			
1.11. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***					
☑ Acta de Inicio		☑ Registro Presupuestal			
☑ Aprobación de la Garantía		☑ Suscripción del Contrato			
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)		SI APLICA		N/A	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL	
2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO – ORINOQUIA – SECCION BIENES, SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO	**608 6611990 ext. 85019**
2.4. Correo electrónico	**orlando.fernandez@fiscalia.gov.co**
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
N/A	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A
2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 400.000.000	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A		
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
4723	2023-02-06

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
218833	2023-08-18

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/10/2023	$ 400.000.000,00	$ 0	$ 0	$ 400.000.000,00

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales N/A

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).N/A

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	0%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	10%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): N/A

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				X
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado				X
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Se presente formalmente el Ingeniero residente	

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

(01) 30940-0612 PERMISOS PROTECCION - GRANVAL MMTO SEDES
(02) ACTA DE REUNION 1 Mmto de sedes visitas

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(03) CRONOGRAMA DE TRABAJO
(04) FGN-RO-0021-2023 OF2023-001 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INGRESO PERSONAL OBRA
(05) FGN-RO-0021-2023 OF2023-002 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INGRESO PERSONAL OBRA
(06) 20231006 Balance CTO FGN-RO-0021-2023-V3
(07) FGN-RO-0021-2023 OF2023-002 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INGRESO PERSONAL OBRA
(08) GRANVAL-FGN-RO-0021-2023-OF003 REEMPLAZO RESIDENTE DE OBRA
(09) Hoja de vida -Ing Residente DANIEL LONDOÑO GOMEZ
(10) FGN-RO-0021-2023 OF2023-004 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INGRESO PERSONAL OBRA

Informes anexos	○ SI	◉ NO	○ N/A

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se realizan las siguientes actividades durante la ejecución del contrato.

1. **REUNIÓN CON CONTRATISTA - INTERVENTORIA**

Fecha: Lunes 04/09/2023
Participantes:
EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL - Supervisión
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ – Gerente del Contrato
Objetivo: reconocimiento sitios de intervención:
Se realiza visita en cada sitio detallando la necesidad de intervención.

El ingeniero Eddie Orlando Fernandez Gil, en calidad de supervisor del contrato FGN-RO-0021-2023, y la arquitecta EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ en representación del contratista se realizan seguimiento a los sitios a intervenir

No		
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Cambio piso de garaje, pintura punto fijo
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED
3	CAIVAS KR 37 34 108	Divisiones en vidrio en piso 2 y 3
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	Terminación de división Drywall y techo en PVC
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Implementación de recepción de recibo de documentos ventanilla única

Se realiza una medición para determinar las cantidades básicas a implementar.

Se hace levantamiento fotográfico de los sitios antes de intervención

Se realiza registro de grafico que permite hacer seguimiento a intervenciones.

Con los diseños arquitectónicos de la sede de CAIVAS se ajustan las necesidades y ubicación de divisiones.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha de entrega
1	Elaboración de presupuesto de sitios visitados	Contratista	2023-09-23
2	Elaboración de Cronograma de intervención sitios visitados	Contratista	2023-09-23
3	Realizar visita a los sitios de San José de Guaviare y Retorno en Guaviare	Contratista – Interventoría	2023-09-28

2. PRESENTACIÓN INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

El contratista presenta al Ing. Civil Daniel Londoño Gómez, con el perfil de Ingeniero Residente y la supervisión aprueba la propuesta.
Se anexa hoja de vida.

3. RECONOCIMIENTO SEDES DE SEDES EN VILLAVICENCIO

Fecha: 28/09/2023
Participantes:
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ – Gerente del Contrato
DANIEL LONDOÑO GÓMEZ: Ingeniero Residente
EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL - Supervisión

Objetivo: Reconocimiento sitios de intervención:
Se realiza visita en las sedes en villavicencio para precisar cada sitio de intervención.

El contratista realiza inspección en las sedes para detallar cantidades y costos de los ítems a consumir de los mantenimientos a realizar.

4. RECONOCIMIENTO SEDE SAN JOSÉ DE GUAVAIRE Y RETORNO

Fecha: 29/09/2023
Participantes:
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ – Gerente del Contrato
DANIEL LONDOÑO GÓMEZ: Ingeniero Residente
Objetivo: reconocimiento sitios de intervención:
Se realiza visita en la sede de interevión en Guaviare para precisar las necesidades de intervención.

5. REUNIÓN CON CONTRATISTA - INTERVENTORIA - SUBDIRECCIÓN

Fecha: 02/10/2023
Participantes:
EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL - Supervisión
SURY ANDREA SERRATO. Subdirectora Regional Orinoquia
DANIEL LONDOÑO GÓMEZ: Ingeniero Residente
Objetivo: Reconocimiento intervención en San José de Guavaire:
Se realiza visita en la sede de Bunker de la Selva detallando la necesidad de intervención.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

El contratista realiza inspección en las sedes y presenta el presupuesto detallando cantidades y costos de los ítems a consumir de los mantenimientos a realizar.

El contratista realiza un cronograma donde expone los tiempos en cada sede.

Se autoriza el ingreso de personal a las sedes para efectos de diagnostico inspección y levantamiento de información.

No se tramita para pago de los servicios**.**

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO	○ REGULAR	○ BUENO	◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

N/A

FIRMA RESPONSABLES



Interventor(es) / Supervisor (es)

Nombre	**Cédula**
Eddie Orlando Fernandez Gil	17.335.913

Ciudad	Villavicencio	**Fecha**	13/10/2023

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	**Eddie Orlando Fernandez Gil.**		**13/10/2023**
Revisó	**Eddie Orlando Fernandez Gil.**		**13/10/2023**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Oficio 30940-0612

Villavicencio, 25 de septiembre de 2023

Señor
ALFONSO MELO ERAZO
Responsable Grupo de Seguridad Infraestructuras y Personas
Dirección de Protección y Asistencia – Departamento de Seguridad
Regional Orinoquia.

ASUNTO: **PERMISOS ACCESO A LA SEDES**

Comedidamente solicito su valiosa colaboración en el sentido de autorizar a quien corresponda el acceso a las personas relacionadas a la sede de la Fiscalía General de la Nación de la Regional Orinoquia como aparece a continuación.

EMPRESA	GRAN VAL INGENIERIA
FECHAS	25/09/2023 Hasta 30/10/2023
ACTIVIDADES	OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO DE SEDES
SEDES	Entrerios, URI, Guatiquia, CAIVAS, Archivo en Villavicencio, San Martin, Inírida, San José de Guaviare y Retorno.

NOMBRE Y APELLIDO	**NO. DE IDENTIFICACIÓN**
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	CC 31.655.741
CARLOS ANDRÉS CUBIDES SANTOS	CC 86.050.461
JAVIER ESNEIDER TOVAR AMUD	CC 1.018.455.674
AUBIN LAMPREA GOMEZ	CC 4.082.932
JULIO ENRIQUE MORENO CRUZ	CC 17.130.720

Gracias por su atención
Atentamente,

EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL
Coordinador Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo (e)
Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía
Email: orlando.fernandez@fiscalia.gov.co.
Tel 3219559152

INFORMACIÓN BÁSICA					
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Fecha**	2023	09	04
Lugar	SITIOS DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEDES Y CL 34 41 73 VILLAVICENCIO				
Hora inicio	09:00 horas	**Hora fin**	17:02		
Tema de la reunión	Revisión, Verificación y detalle de sitios a intervenir contrato FGN-RO- 0021-2023				
Dependencia que convoca	Supervisión de contrato Sección de bienes, soporte y apoyo administrativo				
Secretario (quien transcribe)	Eddie Orlando Fernandez Gil	Profesional Especializado II (E)			

IMPORTANTE
1. Diligencie digitalmente (evite su impresión, atendiendo políticas de cero papel)*.
2. Si el acta no es aprobada al finalizar la reunión, el secretario la elabora y remite vía correo electrónico a los asistentes, indicando el tiempo estimado para observaciones. Una vez cumplido el plazo, y si no hay pronunciamiento, ésta se entenderá aprobada.
3. El acta aprobada se envía en formato PDF a los asistentes vía correo electrónico.

***** Esta actividad la realiza el Secretario de la reunión.

ASISTENTES**				
#	**Nombre**	**Cargo**	**Dependencia**	**Correo electrónico**
1	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	Supervisor contrato	Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia	orlando.fernandez@fiscalia.gov.co
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Gerente Proyecto	Granval Ingeniería	granvalingenieria@gmail.com
3				
4				
5				
6				

**Formato control de asistencia (opcional).

ORDEN DEL DÍA	
1	Determinación de sitios a intervenir
2	Visita a sitios y detalle de
3	
4	

DESARROLLO

El ingeniero Eddie Orlando Fernandez Gil, en calidad de supervisor del contrato FGN-RO-0021-2023, y la arquitecta EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ en representación del contratista se realizan seguimiento a los sitios a intervenir

No		
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Cambio piso de garaje, pintura punto fijo
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED
3	CAIVAS KR 37 34 108	Divisiones en vidrio en piso 2 y 3
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	Terminación de división Drywall y techo en PVC
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Implementación de recepción de recibo de documentos ventanilla única

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

DESARROLLO
Se realiza una medición para determinar las cantidades básicas a implementar. Se hace levantamiento fotográfico de los sitios antes de intervención Se realiza registro de grafico que permite hacer seguimiento a intervenciones. Con los diseños arquitectónicos de la sede de CAIVAS se ajustan las necesidades y ubicación de divisiones.

COMPROMISOS			
#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha de entrega
1	Elaboración de presupuesto de sitios visitados	Contratista	2023-09-23
2	Elaboración de Cronograma de intervención sitios visitados	Contratista	2023-09-23
3	Realizar visita a los sitios de San José de Guaviare y Retorno en Guaviare	Contratista – Interventoría	2023-09-20
4	Realizar visita a la Sede en Inírida Guainía	Contratista – Interventoría	2023-09-22

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Sede Palacio de Justicia




CAIVAS



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

NUEVA BODEGA DE EVIDENCIAS

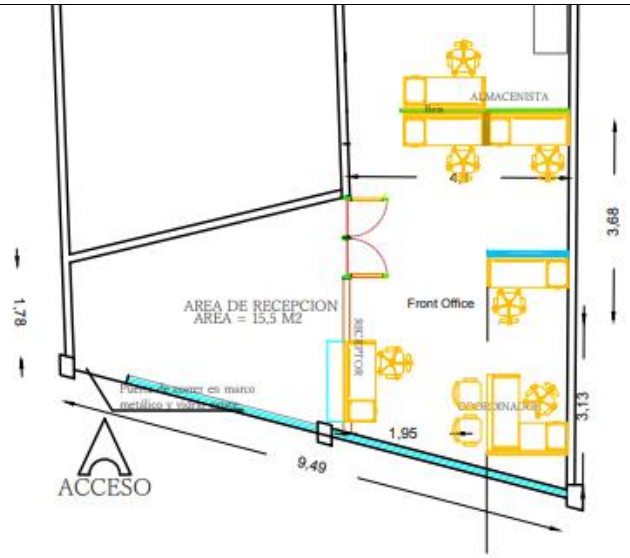

PISO 1

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO EJECUCION 120 DIAS

BERMORI GRANADA VALENCIA - GRANVAL INGENIERIA NIT 76325377-3	**OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**
CONTRATO DE OBRA: FGN-RO-0021-2023	**FECHA INICIO 30/08/2023** — **FECHA FIN 29/12/2023**

No.	ITEMS	MES 1					MES 2					MES 3				MES 4				
		27/08/2023	3/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	24/09/2023	1/10/2023	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023
	SEDES A INTERVENIR																			
0	DIAGNOSTICO SEDES A INTERVENIR	0			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1	VILLAVICENCIO - GUATIQUIA				X	Y	X	X	X	X	X	X	X							
2	VILLAVICENCIO - URI				X	Y	X	Y	Y	Y	X	X	X	X						
3	VILLAVICENCIO - CAIVAS				X	Y	X	Y	Y	X	X	X								
4	VILLAVICENCIO - ARCHIVO						X	Y	X	X	X	X	X							
5	VILLAVICENCIO - PALACIO JUSTICIA						X	Y	Y	Y	Y	X	X							
6	SAN JOSE DEL GUAVIARE						X	Y	X	X	X	X								
7	EL RETORNO - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						X	Y	Y	Y	Y	X	X	X	X	X				
8	PUERTO INIRIDA - VICHADA						X	Y	Y	X	X	X	X	X	X					
0	**LOGISTICA INGRESO PERSONAL Y MATERIAL REQUERIDO**																			

Página 1

BERMORI GRANADA VALENCIA -
GRANVAL INGENIERIA
NIT 76325377-3

X EJECUCION EN CAMPO

Y EJECUCION EN TALLER/CONSECUCION Y LOGISTICA DE MATERIALES

Buenaventura, 25 de septiembre de 2023

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA
Villavicencio, Meta

Contrato de Obra N° **FGN-RO-0021-2023**.
Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO - PERSONAL DE OBRA**.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del objeto "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS FIJOS", me permito solicitar el ingreso para recorrido y consolidación de cantidades de obra para el diagnóstico en sitio. A continuación, se entrega listado de personal que participará en la actividad anteriormente mencionada, para que así mismo les sea autorizado el ingreso a las instalaciones objeto de intervención:

NOMBRE Y APELLIDO	NO. DE IDENTIFICACIÓN
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	CC 31.655.741
CARLOS ANDRÉS CUBIDES SANTOS	CC 86.050.461
JAVIER ESNEIDER TOVAR AMUD	CC 1.018.455.674
AUBIN LAMPREA GOMEZ	CC 4.082.932
JULIO ENRIQUE MORENO CRUZ	CC 17.130.720

De ustedes atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)
T.P. 19202-094987 CAU



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.655.741

CORREA ORTIZ
APELLIDOS

EULHYN MAYRELL
NOMBRES

Eulhyn Mayrell Correa
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1983
MIRANDA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

27-NOV-2001 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00629693-F-0031655741-20141003 0040365097A 1 1283026659

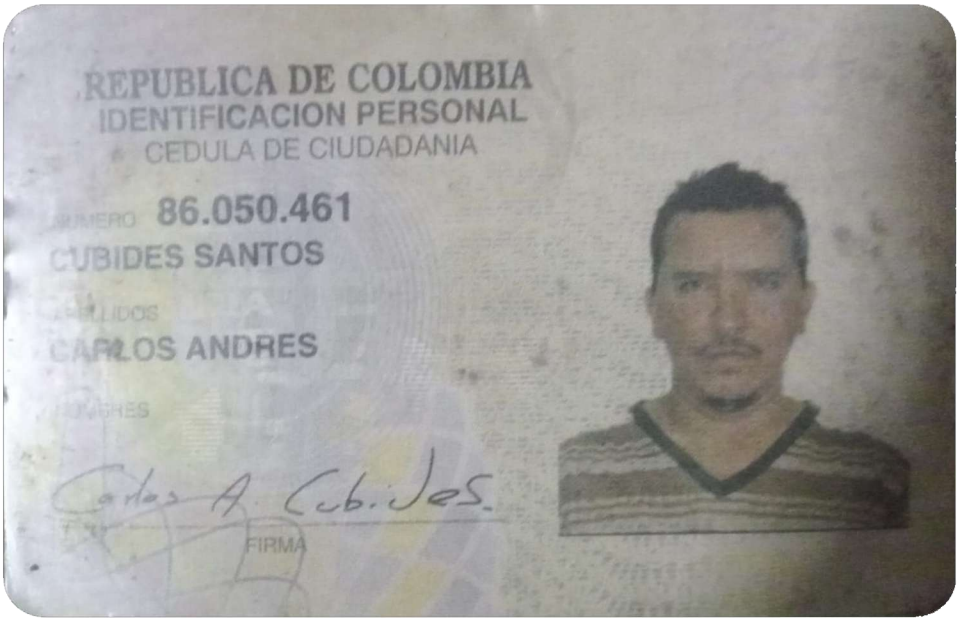

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.050.461
CUBIDES SANTOS

APELLIDOS
CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1976
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

31-OCT-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00249216-M-0086050461-20100811 00233865430A 1 6710870993

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.455.674**

TOVAR AMUD

APELLIDOS

JAVIER ESNEIDER

NOMBRES

Javier Sneider Tovar Amu

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1992**

SAN JOSE DEL GUAVIARE
(GUAVIARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-NOV-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00278799-M-1018455674-20110127 **00256**22233A 1 36007488



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.082.932**


LAMPREA GOMEZ

APELLIDOS

AUBIN

NOMBRES

FIRMA

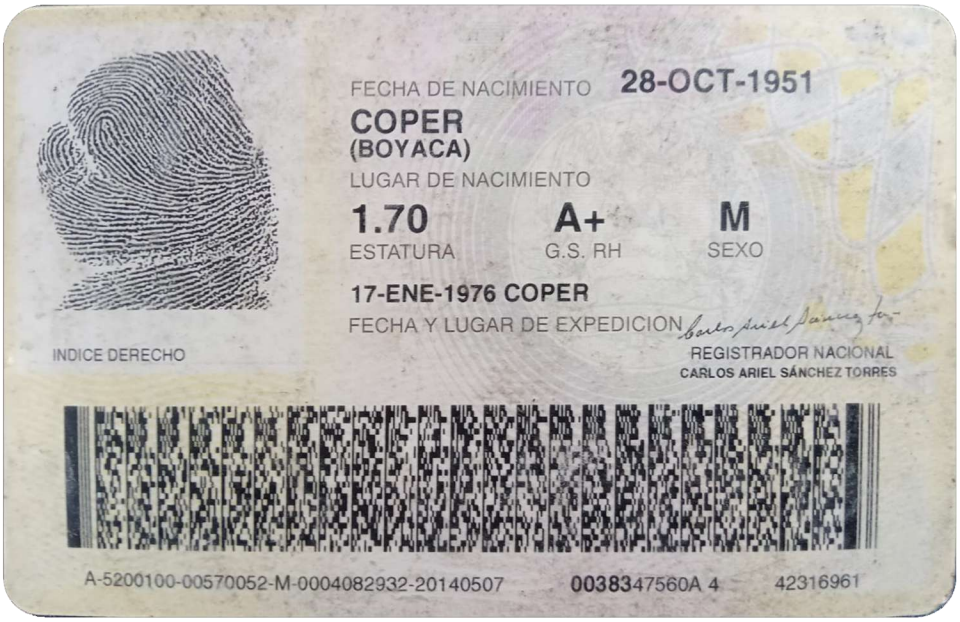

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1951**

COPER
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

17-ENE-1976 COPER
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00570052-M-0004082932-20140507 **00383**47560A 4 42316961

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.130.720

MORENO CRUZ
APELLIDOS

JULIO ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1945
LA VEGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-OCT-1966 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00416179-M-0017130720-20121210 0031880255A 1 6712142471

Buenaventura, 26 de septiembre de 2023

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA
Villavicencio, Meta

Contrato de Obra N° **FGN-RO-0021-2023**.
Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO - PERSONAL DE OBRA**.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del objeto "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS FIJOS", me permito solicitar la autorización para el ingreso del siguiente personal a todas las sedes objeto de intervención:

NOMBRE Y APELLIDO	NO. DE IDENTIFICACIÓN
DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CC 75.094.586

De ustedes atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)
T.P. 19202-094987 CAU

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.094.586**

LONDOÑO GOMEZ

APELLIDOS

DANIEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1980**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

13-JUL-1998 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00166104-M-0075094586-20090804 **0014**30021A 1 6730006516

				VVC GUATIQUIA		VVC URI		VVC CAIVAS		VVC ARCHIVO		VVC PA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	2 años	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.
1	PRELIMINARES	UND	VALOR UNITARIO									
1.1	Demolición de piso existente.	M2	$ 19.963,00	180,80	$ 3.609.310,40		$ -		$ -		$ -	
1.2	Demolición de mampostería	M2	$ 15.321,00	1,20	$ 18.385,20		$ -		$ -		$ -	
1.4	Desmonte de marcos y puertas	UN	$ 20.741,00	7,00	$ 145.187,00		$ -		$ -		$ -	
1.5	Regata instalación sanitaria	ML	$ 16.682,00	25,00	$ 417.050,00		$ -		$ -		$ -	
1.6	Demolición de guardaescobas existente	ML	$ 5.379,00	40,00	$ 215.160,00		$ -		$ -		$ -	
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	$ 20.494,00	6,40	$ 131.161,60		$ -		$ -		$ -	3,70
1.12	Desmonte de canaleta metalica	ML	$ 6.776,00	3,00	$ 20.328,00		$ -		$ -		$ -	
1.13	Desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tuberia, griferia	UN	$ 30.083,00	2,00	$ 60.166,00		$ -		$ -		$ -	
1.14	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	M3	$ 92.401,00	22,50	$ 2.079.022,50		$ -		$ -		$ -	
1.16	Desmonte de teja eternit con Fibrocemento	M2	$ 13.884,00		$ -	31,00	$ 430.404,00		$ -		$ -	
2.2	Elaboración de Columna en concreto armado	M3	$ 1.126.364,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
2,4	Placa en concreto 3500 psi E=0.12 m acabado estriado tipo trasmilenio .	M2	$ 116.168,00	151,00	$ 17.541.368,00		$ -		$ -		$ -	
2,5	Suministro e instalación malla electrosoldada 5mm. Incluye corte y fijación.	kg	$ 45.218,00	619,10	$ 27.994.463,80		$ -		$ -		$ -	
3.2	Elaboración de muro en bloque No. 4	M2	$ 58.512,00	6,00	$ 351.072,00		$ -		$ -		$ -	
4.1	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	M2	$ 35.279,00	12,00	$ 423.348,00		$ -		$ -		$ -	
4.3	Estuco incluye filos y dilataciones lineales	M2	$ 17.386,00	1,89	$ 32.859,54		$ -		$ -		$ -	
5.1	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	$ 34.208,00	30,80	$ 1.053.606,40		$ -		$ -		$ -	
5.3	Ceramica piso de 50 X 50 cm	M2	$ 83.844,00	36,74	$ 3.080.428,56		$ -		$ -		$ -	
5.8	Guardaescoba en ceramica de .08 m	ML	$ 36.556,00	27,90	$ 1.019.912,40		$ -		$ -		$ -	
6.1	Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo.(dos manos).	M2	$ 26.924,00		$ -	2,81	$ 75.602,59		$ -		$ -	
6.2	Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores , incluye todo para su correcto funcionamiento	M2	$ 541.427,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
6.6	Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación.	M2	$ 590.502,00	5,67	$ 3.348.146,34		$ -		$ -	3,30	$ 1.948.656,60	
6.8	Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento	M2	$ 908.317,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
7.2	Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos)	M2	$ 20.619,00	32,16	$ 663.107,04	10,00	$ 206.190,00		$ -		$ -	
7.3	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	$ 22.155,00	118,21	$ 2.619.016,40		$ -		$ -		$ -	
7.6	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	M2	$ 78.872,00		$ -		$ -		$ -	35,00	$ 2.760.520,00	
7.9	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	M2	$ 99.473,00		$ -		$ -		$ -	24,86	$ 2.472.401,42	
7.10	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	$ 32.248,00	12,00	$ 386.976,00		$ -		$ -		$ -	20,00
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	$ 32.446,00	564,20	$ 18.306.150,01		$ -		$ -		$ -	20,00
7.15	Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate	M2	$ 78.205,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
7.16	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	ML	$ 32.380,00		$ -		$ -		$ -	278,00	$ 9.001.640,00	
7.17	Suministro e instalación de Pintura Tipo esmalte a dos manos, color por definir .	ML	$ 18.348,00	17,82	$ 326.961,36		$ -		$ -		$ -	
8,2	Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales	ML	$ 25.123,00	3,00	$ 75.369,00		$ -		$ -		$ -	
8,9	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar de 6mm incluye todos los accesorios para su correcta instalación	M2	$ 202.258,00		$ -	4,00	$ 809.032,00		$ -		$ -	
9.3	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	ML	$ 72.987,00	25,00	$ 1.824.675,00		$ -		$ -		$ -	
9.17	Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	$ 146.263,00	3,00	$ 438.789,00		$ -		$ -		$ -	
9.21	Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa	UN	$ 119.639,00	3,00	$ 358.917,00		$ -		$ -		$ -	

				VVC GUATIQUIA		VVC URI		VVC CAIVAS		VVC ARCHIVO		VVC PA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	2 años	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.
9.22	Cajas de inspeccion de 1*1 mts	UN	$ 489.923,00	2,00	$ 979.846,00		$ -		$ -		$ -	
9,23	Reposición e Instalación de Bajante PVC 4" .	ML	$ 80.431,00	6,00	$ 482.586,00		$ -		$ -		$ -	
10,5	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	UN	$ 150.296,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 150.296,00	
10,6	Suministro e instalación de Lampara LED. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable rencauchutado #12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	$ 263.072,00		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 1.578.432,00	
11,1	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	$ 692.303,00		$ -	2,16	$ 1.495.374,48		$ -		$ -	
11,2	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	$ 453.292,00		$ -	1,20	$ 543.950,40		$ -		$ -	
11,3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	$ 495.844,00		$ -		$ -	44,00	$ 21.817.136,00		$ -	3,70
11,4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	$ 590.223,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
11,5	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	M2	$ 179.305,00	6,40	$ 1.147.552,00		$ -		$ -		$ -	
IC.001	(14010223) Demolicion mecanica andenes	M2	$ 52.000,00	180,80	$ 9.401.600,00		$ -		$ -		$ -	
IC.002	(14010212) Desmonte de marco y puerta	UN	$ 113.064,00	2,00	$ 226.128,00		$ -		$ -		$ -	
IC.003	(14040101)Estructura en acero estructural	KG	$ 27.795,00		$ -		$ -		$ -	184,25	$ 5.121.228,75	
IC.004	(14100401) Teja termoacustica	M2	$ 74.872,10		$ -	31,00	$ 2.321.035,10		$ -		$ -	
IC.005	Concreto 17.2 Mpa (2500 Psi) Solado, Concreto De Limpieza, Espesor= 6 Cm	M2	$ 40.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
IC.006	Concreto Zapata 20.7 Mpa (3000 Psi) No Incluye Acero	M3	$ 1.100.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
IC.008	Suministro e Instalacion De Canal En Lamina Cal 20 . L=0.6 M, Según Diseño, Incluye Acccesoris De Instalacion .	ML	$ 130.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
IC.009	Suministro E Instalacion De Ventana En Aluminio Tipo Persiana	M2	$ 780.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
IC.010	Desmonte Y Re-Instalacion De Puertas En Vidrio Templado De 10 Mm, Incluye Samblasting, Herrajes Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento	M2	$ 280.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
IC.012	Desmonte cielo razo	M2	$ 9.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
IC.014	Demolicion concreto reforzado	M3	$ 450.000,00	4,61	$ 2.073.375,00		$ -		$ -		$ -	
	TOTAL COSTOS INDIRECTO		$ 24.818.655,10		$ 100.852.023,55		$ 5.881.588,57		$ 21.817.136,00		$ 23.033.174,77	
	ADMINISTRACION	15%	$ 3.722.798,00		$ 15.127.804,00		$ 882.238,00		$ 3.272.570,00		$ 3.454.976,00	
	IMPREVISTOS	3%	$ 744.560,00		$ 3.025.561,00		$ 176.448,00		$ 654.514,00		$ 690.995,00	
	UTILIDAD	3%	$ 744.560,00		$ 3.025.561,00		$ 176.448,00		$ 654.514,00		$ 690.995,00	
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	19%	$ 141.466,00		$ 574.857,00		$ 33.525,00		$ 124.358,00		$ 131.289,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 5.353.384,00		$ 21.753.783,00		$ 1.268.659,00		$ 4.705.956,00		$ 4.968.255,00	
	TOTAL		**$ 30.172.039,10**		**$ 122.605.806,55**		**$ 7.150.247,57**		**$ 26.523.092,00**		**$ 28.001.429,77**	

		LACIO JUSTICIA	SAN JOSE		EL RETORNO		PUERTO INIRIDA		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES									
1.1	Demolición de piso existente.	$ -		$ -		$ -	15,66	$ 312.700,43	196,46	$ 3.922.010,83
1.2	Demolición de mampostería	$ -		$ -	21,32	$ 326.643,72		$ -	22,52	$ 345.028,92
1.4	Desmonte de marcos y puertas	$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 145.187,00
1.5	Regata instalación sanitaria	$ -		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 417.050,00
1.6	Demolición de guardaescobas existente	$ -		$ -		$ -		$ -	40,00	$ 215.160,00
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	$ 75.827,80		$ -		$ -	2,18	$ 44.676,92	12,28	$ 251.666,32
1.12	Desmonte de canaleta metalica	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 20.328,00
1.13	Desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tuberia, griferia	$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 60.166,00
1.14	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	$ -		$ -		$ -	1,02	$ 94.618,62	23,52	$ 2.173.641,12
1.16	Desmonte de teja eternit con Fibrocemento	$ -		$ -	179,40	$ 2.490.765,16		$ -	210,40	$ 2.921.169,16
2.2	Elaboración de Columna en concreto armado	$ -		$ -		$ -	0,10	$ 112.636,40	0,10	$ 112.636,40
2,4	Placa en concreto 3500 psi E=0.12 m acabado estriado tipo trasmilenio .	$ -		$ -		$ -	41,25	$ 4.791.930,00	192,25	$ 22.333.298,00
2,5	Suministro e instalación malla electrosoldada 5mm. Incluye corte y fijación.	$ -		$ -		$ -	84,56	$ 3.823.747,13	703,66	$ 31.818.210,93
3.2	Elaboración de muro en bloque No. 4	$ -		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 351.072,00
4.1	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	$ -		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 423.348,00
4.3	Estuco incluye filos y dilataciones lineales	$ -		$ -		$ -		$ -	1,89	$ 32.859,54
5.1	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	$ -		$ -		$ -	15,66	$ 535.697,28	46,46	$ 1.589.303,68
5.3	Ceramica piso de 50 X 50 cm	$ -		$ -		$ -	15,66	$ 1.312.997,04	52,40	$ 4.393.425,60
5.8	Guardaescoba en ceramica de .08 m	$ -		$ -		$ -	26,00	$ 950.456,00	53,90	$ 1.970.368,40
6.1	Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo.(dos manos).	$ -		$ -		$ -		$ -	2,81	$ 75.602,59
6.2	Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores , incluye todo para su correcto funcionamiento	$ -		$ -		$ -	6,50	$ 3.519.275,50	6,50	$ 3.519.275,50
6.6	Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación.	$ -	2,16	$ 1.275.484,32		$ -		$ -	11,13	$ 6.572.287,26
6.8	Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento	$ -		$ -		$ -	7,50	$ 6.812.377,50	7,50	$ 6.812.377,50
7.2	Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos)	$ -		$ -		$ -		$ -	42,16	$ 869.297,04
7.3	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	$ -		$ -		$ -		$ -	118,21	$ 2.619.016,40
7.6	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	$ -		$ -	19,18	$ 1.512.764,96		$ -	54,18	$ 4.273.284,96
7.9	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	$ -	15,33	$ 1.524.921,09		$ -	9,45	$ 940.019,85	49,64	$ 4.937.342,36
7.10	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	$ 644.960,00		$ -	87,54	$ 2.822.943,48		$ -	119,54	$ 3.854.879,48
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	$ 648.920,00		$ -	297,12	$ 9.640.355,52	249,12	$ 8.082.785,29	1130,44	$ 36.678.210,82
7.15	Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate	$ -		$ -	19,18	$ 1.499.823,31	97,50	$ 7.624.987,50	116,68	$ 9.124.810,81
7.16	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	$ -		$ -		$ -		$ -	278,00	$ 9.001.640,00
7.17	Suministro e instalación de Pintura Tipo esmalte a dos manos, color por definir .	$ -		$ -		$ -		$ -	17,82	$ 326.961,36
8,2	Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 75.369,00
8,9	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar de 6mm incluye todos los accesorios para su correcta instalación	$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 809.032,00
9.3	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	$ -		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 1.824.675,00
9.17	Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 438.789,00
9.21	Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 358.917,00

		LACIO JUSTICIA	SAN JOSE		EL RETORNO		PUERTO INIRIDA		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
9.22	Cajas de inspeccion de 1*1 mts	$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 979.846,00
9,23	Reposición e Instalación de Bajante PVC 4" .	$ -		$ -		$ -	7,00	$ 563.017,00	13,00	$ 1.045.603,00
10,5	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 150.296,00	2,00	$ 300.592,00
10,6	Suministro e instalación de Lampara LED. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable rencauchutado #12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 263.072,00	7,00	$ 1.841.504,00
11,1	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$ -		$ -		$ -		$ -	2,16	$ 1.495.374,48
11,2	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$ -		$ -		$ -		$ -	1,20	$ 543.950,40
11,3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$ 1.834.622,80		$ -		$ -		$ -	47,70	$ 23.651.758,80
11,4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$ -	23,83	$ 14.067.788,14		$ -		$ -	23,83	$ 14.067.788,14
11,5	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	$ -		$ -		$ -	1,50	$ 268.957,50	7,90	$ 1.416.509,50
IC.001	(14010223) Demolicion mecanica andenes	$ -		$ -		$ -		$ -	180,80	$ 9.401.600,00
IC.002	(14010212) Desmonte de marco y puerta	$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 226.128,00
IC.003	(14040101)Estructura en acero estructural	$ -		$ -		$ -	1220,00	$ 33.909.900,00	1404,25	$ 39.031.128,75
IC.004	(14100401) Teja termoacustica	$ -		$ -	155,64	$ 11.653.136,77	53,63	$ 4.015.016,36	240,27	$ 17.989.188,23
IC.005	Concreto 17.2 Mpa (2500 Psi) Solado, Concreto De Limpieza, Espesor= 6 Cm	$ -		$ -		$ -	1,28	$ 51.200,00	1,28	$ 51.200,00
IC.006	Concreto Zapata 20.7 Mpa (3000 Psi) No Incluye Acero	$ -		$ -		$ -	0,32	$ 352.000,00	0,32	$ 352.000,00
IC.008	Suministro e Instalacion De Canal En Lamina Cal 20 . L=0.6 M, Según Diseño, Incluye Acccesoris De Instalacion .	$ -		$ -		$ -	20,00	$ 2.600.000,00	20,00	$ 2.600.000,00
IC.009	Suministro E Instalacion De Ventana En Aluminio Tipo Persiana	$ -	1,29	$ 1.006.200,00		$ -	5,00	$ 3.900.000,00	6,29	$ 4.906.200,00
IC.010	Desmonte Y Re-Instalacion De Puertas En Vidrio Templado De 10 Mm, Incluye Samblasting, Herrajes Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento	$ -		$ -		$ -	2,18	$ 610.400,00	2,18	$ 610.400,00
IC.012	Desmonte cielo razo	$ -		$ -	19,18	$ 182.191,95		$ -	19,18	$ 182.191,95
IC.014	Demolicion concreto reforzado	$ -		$ -		$ -		$ -	4,61	$ 2.073.375,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTO	$ 3.204.330,60		$ 17.874.393,55		$ 30.128.624,88		$ 85.642.764,32		$ 288.434.036,23
	ADMINISTRACION	$ 480.650,00		$ 2.681.159,00		$ 4.519.294,00		$ 12.846.415,00		$ 43.265.105,00
	IMPREVISTOS	$ 96.130,00		$ 536.232,00		$ 903.859,00		$ 2.569.283,00		$ 8.653.021,00
	UTILIDAD	$ 96.130,00		$ 536.232,00		$ 903.859,00		$ 2.569.283,00		$ 8.653.021,00
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	$ 18.265,00		$ 101.884,00		$ 171.733,00		$ 488.164,00		$ 1.644.074,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 691.175,00		$ 3.855.507,00		$ 6.498.745,00		$ 18.473.145,00		$ 62.215.221,00
	TOTAL	**$ 3.895.505,60**		**$ 21.729.900,55**		**$ 36.627.369,88**		**$ 104.115.909,32**		**$ 350.649.257,23**
										$ 350.649.261,23

Buenaventura, 26 de septiembre de 2023

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA
Villavicencio, Meta

Contrato de Obra N° **FGN-RO-0021-2023**.
Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO - PERSONAL DE OBRA**.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del objeto "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS FIJOS", me permito solicitar la autorización para el ingreso del siguiente personal a todas las sedes objeto de intervención:

NO. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	ACTIVIDAD	TELÉFONO	SEDE A LABORAR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CC 75.094.586	DANIEL LONDOÑO GÓMEZ	ARQUITECTO APOYO	3003012419	SEDES A INTERVENIR EN EL CONTRATO	26-09-2023	31-12-2023

De ustedes atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)
T.P. 19202-094987 CAU

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.094.586**

LONDOÑO GOMEZ

APELLIDOS

DANIEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1980**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

13-JUL-1998 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00166104-M-0075094586-20090804 **0014**30021A 1 6730006516

Buenaventura, 04 de octubre de 2023

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA
Villavicencio, Meta

Contrato de Obra N° **FGN-RO-0021-2023**.
Asunto: REEMPLAZO DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA.

Cordial saludo,


Por medio del presente, en mi calidad de contratista, de forma respetuosa y amable me permito manifestar que nos hemos visto obligados a realizar el reemplazo del PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA, la señora JESIKA LORENA SARZOSA CERÓN, por decisiones personales.

Por lo anterior, solicito amablemente, se revise y apruebe la hoja de vida de la profesional DANIEL LONDOÑO GOMEZ, quien pasaría a ocupar esta vacante, pues cumple a cabalidad con lo requerido por la Entidad.

De ustedes atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)
T.P. 19202-094987 CAU

Hoja de Vida



INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES		Londoño Gómez
APELLIDOS	:	Daniel
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	:	75.094.586 de Manizales
FECHA DE NACIMIENTO	:	junio 03, 1980 Medellín, Colombia
ESTADO CIVIL	:	Casado
DIRECCIÓN RESIDENCIAL 1	:	Calle 48 F sur # 39B-314 Apto 905 Envigado, Antioquia, Colombia.
DIRECCIÓN RESIDENCIAL 2	:	Diagonal 6 Sur # 40B-124 T7 Apto 502 Villavicencio, Meta, Colombia
TELÉFONO	:	(+57)300 301 24 19 – 315 345 57 47
CIUDAD	:	Villavicencio
CORREO	:	dalogo19@gmail.com

CIP: Matricula Profesional (colombiana) 17202110748CLD
Inscripción en trámite ante la SUNEDU y colegio de Ingenieros del Perú.

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil con experiencia en gestión, ejecución y supervisión de edificaciones e infraestructuras, tales como centros comerciales, edificios multifamiliares, torres y líneas de alta tensión, retail y edificios industriales e institucionales, manejo en situaciones contractuales con los clientes, dando énfasis a la parte comercial, sin ir en decremento del proyecto o mi empleador. Con experiencia en la coordinación de suministros y ejecución de proyectos de líneas de transmisión de alta, media y baja tensión desde su suministro hasta su entrega, incluso con la intervención de nuevas tecnologías en su ejecución; Elaboración de desarrollo de programación, costos, presupuestos, inspección, seguimiento de obra y licitación pública. Ejecutar y perfeccionar los procesos que lleven a un mejoramiento y rentabilidad en obra, en la parte preliminar y durante su ejecución, con énfasis en los programas de obra enlazados a plazos contractuales, rendimientos y costos. Adaptar y asegurar que los procesos en obra cumplan con especificaciones claras de calidad y seguridad. Adelantar negociaciones con comunidades, empresas o personas, que permitan de una forma rentable cumplir el objeto de mi empleador. Habilidad y destreza en tareas gerenciales, de campo y administrativa.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

2002 – 2003 **Centro Educativo: Universidad Nacional de Colombia (Sede Manizales)**
Curso: Modulo de Elasticidad de las Mezclas Asfálticas, Utilizando el Ensayo de Tensión Indirecta
Área: Área de estadística y Pavimentos
Cargo: Asistente de investigación

1998 – 2003 **Centro Educativo:** Universidad Nacional de Colombia
Título: Ingeniero Civil

1992 – 1997 **Centro Educativo:** Colegio Padre Manyanet
Estudios: Secundaria

1986 – 1991 **Centro Educativo:** Colegio Nuestra Señora
Estudios: Primaria

EXPERIENCIA LABORAL

Abril 2023 – Actual
Empresa: UT Metropolitano 2022
Cargo: Ingeniero Museo – Contratista MO

Enero 2021 – febrero 2023
Empresa: GTA COLOMBIA SAS
Cargo: Director Obra

Diciembre 2020 – enero 2021
Empresa: Unión Eléctrica SA
Cargo: Ingeniero Civil
Proyecto: Metro Cable Picacho – Torre T18N

Abril 2020 – noviembre 2020
Empresa: INTELEC SAS
Cargo: Ingeniero Residente
Proyecto: Trasposición Línea 500 Kv ANCE Y ANPO – SITU – ITCO

Marzo 2017 – abril 2020
Empresa: GTA COLOMBIA SAS
Cargo: Residente y director
Proyecto: línea de transmisión de energía entre las subestaciones Antioquia - Porce 111 500 kV, asociada a la convocatoria UPME 03-2014
.
Septiembre 2015 – marzo 2017
Empresa: VR Constructores
Cargo: Director Técnico y de Presupuestos
Proyecto: Edificio MALKA 145 (Bogotá)

Febrero 2015 – septiembre 2015
Empresa: PROYECTA INSPECTORA TECNICA DE OBRA (Perú)
Cargo: Jefe de Proyectos
Proyecto: AMPLIACION CINES Y PLAZA CONQUISTADORES – MEGAPLAZA INDEPENDENCIA
Propietario: Inmuebles Panamericana (MEGAPLAZA)
Área: 20,420.00 m2
Monto: US$ 16’250,942.17
Descripción: Gestión enfocada a la los tiempos entre el cliente y el locatario (CINES), ayudando a la toma de decisiones sobre sistemas constructivos que ayuden al objetivo principal, siempre en contacto con el locatario para llevar los tiempos a sus necesidades, reuniendo soluciones para su entrada en servicio según las fechas contractuales.
Además de esto se enfocó la gestión al control del presupuesto flexibilizándolo según los topes internos a nuevos requerimientos.
Un Edificio nuevo en concreto prefabricado hasta el nivel +22,57 de donde remata una estructura metálica hasta el nivel + 33.00, que son las 6 nuevas sales de cine del centro comercial que se unen a través del nivel +11.40 con la ampliación de plaza conquistadores, que aloja estructuras de concreto y acero, que forman el lobby del cine un patio de comidas y una zona de restaurantes.

Marzo 2014 – enero 2015
Cargo: Jefe de Proyectos
Proyecto: PROYECTOS AULARIO Y BIBLIOTECA FACI
Propietario: PUCP
Área: 26,783.35 m2 y 27,071.6 m2
Monto: US$ 17´337,725.66 y US$ 20´898,597.45
Descripción: Aulario de 03 sótanos, 07 pisos de aulas y espacios públicos, formado por una estructura de concreto armado y estructuras metálicas externas, aisladores sísmicos, muros anclados. Con acabados de altísimos estándares. Y un Edificio de 02 sótanos y 04 pisos de salas de lectura (Biblioteca), con estructura en concreto pigmentado caravista, con aisladores sísmicos y acabados de altos estándares.

Noviembre 2012 – febrero 2014
Empresa: MASEDI Contratistas Generales SAC (Perú)
Cargo: Gerente de Operaciones
Proyecto: Ampliación estación de servicio Cantolao
Propietario: PETROCORP
Área: 2,625.25 m2
Monto: US$ 733, 267.07
Descripción: Ampliación de Estación de Servicios Cantolao obra civil, acabados y vías, remodelación de estructura convencional sobre estructura existente y ampliación de la misma, adicional a esto se ejecutó la estación de carga GNV para la estación.

Proyecto: Ampliación maestranza
Propietario: CLUB REGASTAS
Área: 6,139.98 m2
Monto: US$ 1´533,640.25
Descripción: El proyecto consiste en la intervención sobre el segundo nivel que hoy ocupa la Cancha de Tenis actual y en cuyo primer piso se ubica la Maestranza y almacén del club Regatas Lima, sede Chorrillos.
El primer nivel de la zona a intervenir, está compuesta por áreas de servicio (tales como maestranza, depósitos, vestidores, cuarto de desperdicios) y el almacén principal del club. El segundo piso, a edificar en el presente proyecto de carácter cultural y deportivo, se bifurca en dos alas, el ala derecha dedicada al uso cultural (salones de baile, talleres, sala de ensayos), mientras que el ala izquierda se dedica a un gimnasio, vestidores y servicios higiénicos, y una cafetería. El carácter del tercer piso es netamente de deportes (canchas de tenis y SSHH).

Proyecto: Edificio San Carlos
Propietario: TWB
Área: 1,520.97 m2
Monto: US$ 402,187.49
Descripción: El proyecto consta de un Edificio Multifamiliar de 5 pisos + azotea, estructura tipo a porticada, con placas laterales y vigas de amarre en concreto armado, no menor a 210kg/cm2. La albañilería será con ladrillo kk de 18 huecos. Las losas serán aligeradas de 20cm en los departamentos y para el área de la escalera será losa armada con doble malla de 20cm de espesor. Cabe señalar que la luz mayor que cubren las vigas es de 6.60m. Pisos Laminado de 7mm de espesor, tipo madera, Contra zócalos Madera laqueada de 7cm de altura, Pintado en Látex Pato color blanco humo y carpintería en Melanina lanco 18mm.

Proyecto: Edificio Carolina
Propietario: José Heighes
Área: 1,845.20 m2
Monto: US$ 676,534.58
Descripción: (solo estructura) El proyecto consta de un Edificio Multifamiliar de 4 pisos + azotea, 7 estacionamiento(s) Simple(s) y 1 estacionamiento Doble con estructura tipo a porticada, con placas laterales y vigas de amarre en concreto armado, no menor a 210kg/cm2. La albañilería será con ladrillo kk de 18 huecos. Las losas serán aligeradas de 40 cm en los departamentos y para el área de la escalera será losa armada con doble malla de 30 cm de espesor.

Proyecto: Edificio Parque Bollar
Propietario: GRUPO INMOBILIARIO CIMA PRINCE SAC
Área: 4,857.8 m2
Monto: US$ 2’288,255.12
Descripción: La edificación consta de un solo bloque de forma alargada dividido en dos zonas limitadas por la caja del ascensor y de la escalera, una zona con vista a la Av. Arequipa y Olavide y la otra en la parte posterior solo con vista a la Av. Olavide. La edificación tiene un sótano, 10 niveles y azotea. En el sótano y el primer piso son exclusivamente estacionamientos. En la zona con vista a la Av. Arequipa del segundo al octavo piso se tienen dos departamentos por piso, y en el noveno piso se tienen dos dúplex; en la otra zona se tienen del segundo al noveno piso un departamento por piso más cuatro dúplex. El ingreso es por la Av. Olavide tanto el ingreso peatonal y vehicular, el ingreso vehicular llega a la zona de recepción donde se encuentran los dos ascensores y la escalera de los cuales se tiene acceso a todos los niveles. En el sótano se encentra la cisterna.

Diciembre 2011 – octubre 2012
Empresa: VIVIENDAS DEL PERU SAC (URBANA PERU) (Perú)
Cargo: Director de Obra (Gerente de obra)
Proyecto: CONJUNTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES PORTAL DE SANTA MARIA
Propietario: VIVIENDAS DEL PERU SAC (URBANA PERU)
Área: 6,472 m2
Monto: US$ 2’481,134.26
Descripción: Distrito Carabayllo, Av. Santa María km 2.5 Carabayllo,

Conjunto residencial con casas de 2 y 3 pisos, Área Desde 50m² hasta 75m², Casa club, 2 parques por cada etapa, Instalaciones subterráneas, Calles y av. internas de circulación peatonal y vehicular.
Servicios independientes para cada casa, Jardines externos por cada casa para parqueo de vehículo.

Cargo: Residente de obra
Proyecto: Proyecto Alameda San Juan - Carabayllo
Propietario: VIVIENDAS DEL PERU SAC (URBANA PERU)
Área: 11’676.88 m2
Monto: US$ 4’476,499.84 aprox.
Descripción: La Alameda de San Juan se encuentra ubicada sobre la Av. San Juan o Sacco Rojas s/n con Av. Uno en el distrito de Carabayllo (altura Km. 30 de la Panamericana Norte). El proyecto es un condominio cerrado de 234 casas que tiene un gran parque interno con juegos para niños, salón de reuniones, alamedas y Caminos para la Circulación y 88 Estacionamientos de uso libre.

Mayo 2010 – diciembre 2011
Empresa: MANTTO S.A.C. (Perú)
Cargo: Jefe de Campo
Proyecto: KAIA BEACH HOUSE & LOTS (estructura 7 casas)
Propietario: DLP Arqdesign
Área: 3,653.14 m2
Monto: US$ 4’752,116.10
Descripción: Proyecto de 13 casas de playa, que consistía en adecuar el macizo rocoso para acondicionar los terraplenes donde se ubicarían las cimentaciones de las casas que consistían en plateas de cimentación con anclajes y shotcrete en los taludes de la roca cortada, edificaciones de estructuras a porticadas, todas diferentes.

Cargo: Planning, Jefe de Campo y Obra
Proyecto: Construcción de 1050 viviendas para el reasentamiento de la ciudad de Morococha
Propietario: Minera Chinalco Peru s.a. (MCP)
Área: 44,541.50 m2 (iniciales)
Monto: US$ 19’374,805.75
Descripción: El proyecto consistía en la construcción de viviendas, (1° etapa), que se enmarcan dentro del plan de reubicación de la ciudad de Morococha, El proyecto

contempla la construcción de 1050 viviendas de tres tipos, (1° etapa),

VIVIENDA TIPO A

Parámetros urbanísticos: Tamaño de lote: 108 m2 (6.0mx18.0m) Altura máxima de edificación: tres pisos. Área libre: 40%. No se exige retiro. Construcción a plomo de vereda.

Primera etapa:

El módulo inicial tiene una sala comedora, un área de cocina con ubicación central en la vivienda para contribuir con el confort térmico.

En el primer nivel, el baño con ducha agregada está al lado de la cocina y ventila a través de un ducto en la parte superior que coincide en ambos niveles. Completan esta etapa, dos dormitorios con los cuales se alcanza un área compacta de 40.15 m2 iníciales. El espacio para la futura escalera se ubica en la parte de atrás de la vivienda, coincidiendo con una circulación de salida hacia el patio y el lavadero.

VIVIENDA TIPO B

Parámetros urbanísticos: Tamaño de lote: 108 m2 (6.0mx18.0m) Altura Máxima edificación: tres pisos Área libre: 40%. No se exige retiro. Construcción a plomo de vereda.

Primera etapa:

El programa del módulo inicial es el mismo de la vivienda tipo A (40.15 m2), con la excepción que el dormitorio ubicado hacia la fachada se convierte en una pequeña tienda o taller, con puerta directa al exterior.

En algunos casos, los lotes en esquina de la Vivienda tipo B tendrán un retiro diagonal (ochavo) con una longitud de 3.00ml, medido sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo (45° en todos los casos) formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina (Según RNE, Norma A.010 art. 13) solo en el 1er nivel. Estas viviendas tendrán áreas techadas iguales, pero su tienda se reducirá en 2.11 m2.

VIVIENDA TIPO C

Parámetros urbanísticos: Tamaño de lote: 129.60 m2 (7.20m x 18.00m) Altura edificación: 3 pisos Área libre: 40%. No se exige retiro. Construcción a plomo de vereda.

Empresa: MANTTO S.A.C.
Cargo: Jefe de Campo
Proyecto: Obra Surco Nuevo
Propietario: Parámetros inmobiliarios
Área: 47’295.48 m2
Monto: US$ 16’076,481.87
Descripción: El terreno donde se desarrolla este proyecto, se encuentra ubicado en el Distrito de Santiago de Surco, ocupando un Área Bruta de 59, 967.00m2.
El proyecto propone un Conjunto Residencial cerrado con edificaciones multifamiliares y áreas destinadas a: servicios de variada índole, Áreas recreacionales, parques y jardines que le dan el concepto de ECOLOGICO al proyecto, para ser de beneficio para sus habitantes; cuenta con circulación vehicular interna para el ingreso hacia las zonas de estacionamiento y para que sirvan como ingresos de emergencia.
Parte importante del proyecto la componen las áreas libres de recreación que en su conjunto equivale a más del 60% del área total, dándole una característica real de Jardín, reforzando el aspecto ecológico del proyecto.
Piso Laminado en sala comedor y dormitorios.
Pisos cerámicos Célima en baños, cocina y lavandería.
Carpintería de madera
Puertas Interiores contra placadas pintadas al duco.
Aparatos Sanitarios
Aparatos sanitarios de primera calidad marca Trébol ó similar.
Grifería Trébol o similar.

Etapa I
La primera Etapa está constituida por 4 Torres de departamentos.
Las torres son de las siguientes características: 2 Torres de 8 Pisos, 1 Torre de 10 Pisos y 1 Torre de 12 Pisos.
En cuanto al diseño de los departamentos se están considerando departamentos de 3, 2 y 1 dormitorios.
Dando como resultado 380 Departamentos con una cantidad de 992 habitantes.
Para el parqueo se toma la consideración de 1 Estacionamiento por 1 Departamento, previendo 383 plazas de estacionamiento, satisfaciendo así los requerimientos solicitados.
El proyecto propone una distribución de 2 alas en cada torre, cada a la cuenta con 5 departamentos, dando como resultado 10 dptos. por piso.
El diseño del proyecto está compuesto de una serie de balcones que funcionan

como jardineras, distribuidas de forma irregular dándole un carácter más orgánico al proyecto. Esto se complementa con la cantidad de áreas verdes que tendrá el proyecto y el tratamiento que se le va a dar a estas.
Tiene 2 ascensores por cada torre. Y en los últimos pisos tiene áreas comunes: piscina, terrazas, bbq y baños.

Octubre 2009 – mayo 2010
Empresa: CONSORCIO MALLORCA A&G. (Perú)
Cargo: Ingeniero de Proyectos
Proyecto: Segunda etapa - anexo construcción de galpón
Propietario: conductores y cables del Perú s.a.c.
Área: 2,125 m2
Monto: US$ 463,638.91
Descripción: Construcción de galpón, planta sioplas & pvc, sala de pruebas de nivel, sala de sub estación. Cerramiento lateral de techo metálico con columnas y muro de concreto

Cargo: Ingeniero de Proyectos
Proyecto: Trabajos de mantenimiento y mecánicos – en múltiples sedes
Propietario: BACKUS
Área:
Monto: US$ 250,000.00
Descripción: coordinación de obras metalmecánicas al interior de plantas múltiples de la empresa BACKUS

Junio 2008– septiembre 2009
Empresa: H.A. ENGINEERING, INC. (Panamá)
Cargo: Residente de Presupuestos y fachadas
Proyecto: Complejo Turístico Centro Comercial Metromall
Propietario: GRUPO ROBLES
Área: 132.000 m2
Monto: US$ 74´907,452.30
Descripción:

Cargo: Residente de Estructuras
Proyecto: Proyecto Panamaes Beach Resort
Propietario: BEST INVESTMENT PROPERTIES, S.A
Área: 2712.85 m2
Monto: US$ 14´513,933.53

Febrero 2006 – mayo 2008
Empresa: ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA. (Colombia)
Cargo: Asistente Técnico – Coordinador país (Panamá)
Proyecto: Proyecto SIEPAC
Propietario: Proyecto Mesoamérica
Área: 150.42 kms
Monto: US$ 7’079,263.52 aprox.
Descripción: La infraestructura del Proyecto SIEPAC consiste en la ejecución del Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional que reforzará la red eléctrica de América Central. Consiste en el diseño, ingeniería y construcción de una línea de transmisión eléctrica de 1,790 Kilómetros de longitud de 230 Kv y 28 bahías de acceso en 15 subestaciones, a través de 6 países de América Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Con la red ya instalada, se dispondrá de una capacidad confiable y segura de transporte de energía de hasta 300 mega watts (MW).

Cargo: Ingeniero Residente
Proyecto: Proyecto Anillos Internexa
Propietario: Unión Eléctrica
Área: 76 kms
Monto: US$ 1´413,527.82 aprox.
Descripción: suministro, montaje, pruebas en sitio de cables de fibra óptica para la entrega de condiciones aptas de explotación comercial.

Cargo: Ingeniero Residente
Proyecto: Proyecto UPME1 Línea de transmisión a 230Kv Betania -Frontera
Propietario: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P
Área: 136 kms
Monto: US$ 3´667,732.72 aprox.
Descripción: Construcción de obra civil y montaje electromecánico de la línea de transmisión eléctrica a 230Kv del tramo Jamundino (Pasto) - Mocoa en Circuito Doble.

Junio 2005 – enero 2006
Empresa: CEINGEL S. A (Colombia)
Cargo: Ingeniero Residente
Proyecto: Proyecto UPME2 Línea de transmisión a 500Kv Primavera – P. Parra
Propietario: Unión Eléctrica
Área: 78 Kms
Monto: US$ 2´103,552.59 aprox.
Descripción: tramo de línea a 500 Kv Primavera-Puerto Parra, que hace parte del proyecto UPME 02 de 2003, que consistía de las obras civiles y montajes electromecánicos de la torre 1 a la torre 117.

Octubre 2004 – mayo 2005
Empresa: U.T. Construcciones y vías (Colombia)
Cargo: Ingeniero Residente
Proyecto: Proyecto Bulevar vial calle 33
Propietario: Alcaldía de Medellín
Área: 300 Ton. de asfalto, 15000m2 de adoquín
Monto: US$ 930´476.26 aprox.
Descripción: Remodelación urbanística en adoquín según el nuevo manual de espacio público, a lo largo de la calle 33 de la Autopista Regional a la Carrera 65C

REFERENCIAS LABORALES

Felipe Toro
Ingeniero Mecánico
Gerente General
GTA COLOMBIA SAS
Felipe.toro@gtaingenieria.com.co
Teléfono:(+57) 312 257 4895

Julio Cesar Rojas J.
Arquitecto
Gerente De Diseño y Construcción.
VR Constructores
Teléfono:(57) 311 790 57 21

Alexander Rodríguez
Ingeniero Civil
Gerente de Construcciones a Terceros.
Viviendas del Perú SAC (URBANA PERU)
alexander.rodrigez@urbanaperu.com.pe
Teléfono:(+51) 994 180 834

Gustavo Mora
Arquitecto
Gerente de Proyectos
Proyecta
gmora@proyecta.net.pe
Teléfono:(+51) 997 378 090

REFERENCIAS PERSONALES

Gabriel Ciriani Fuste.
Gerente General
Constructora Mallorca
Av. Caminos Del Inca Nro. 241 Int. 344 urb. Chacarilla Del Estanque Lima - Lima - Santiago De Surco
Teléfono (+511) 255 37 12
Entel 994 203 145

Elizabeth Londoño Gómez
Product Owner
Proyecto Casa para Mi
elondono@argos.com.co
Teléfono: (+57) 316 8627668

Erika Londoño Gómez
Ingeniera Geologa
Teléfono (+57) 311 383 46 84

RELACION EMPLEADORES

a. U.T. CONSTRUCCIONES Y VIAS.
b. CEINGEL.
c. ELECTRICAS DE MEDELLIN.
d. H.A. ENGINEERING.
e. CONSORCIO MALLORCA A&G.
f. MANTTO.
g. URBANA PERU.
h. MASEDI.
i. PROYECTA INSPECTORA TECNICA DE OBRA.
j. VR CONSTRUCTORES.
k. GTA COLOMBIA SAS.
l. INTELEC SAS.
m. UNION ELECTRICAS SA.
n. GTA COLOMBIA SAS
o. UT METROPOLITANO 2022.

CUANTIFICACION DE EXPERIENCIA

FECHA INIC	FECHA FIN	DIAS EXP	AÑOS EXP	EMPRESA	CLIENTE	CARGO
01/10/2004	30/05/2005	242	0.7	UT CONSTRUCCIONES Y VIAS	ALCALDIA DE MEDELLIN	Residente
01/06/2005	20/01/2006	234	0.6	Ceingel	UNION ELECTRICA	Residente
10/05/2006	27/04/2008	719	2.0	Electrica Medellin	GEB	Residente
03/06/2008	26/09/2009	481	1.3	AIA	GRUPO ROBLES	Residente
14/10/2009	06/05/2010	205	0.6	Mallorca	VARIOS	Ing de Proyectos
10/05/2010	31/12/2011	601	1.6	Mantto	VARIOS	Ing de Campo
12/12/2011	31/10/2012	325	0.9	Urbana	VARIOS	Director Obra
01/11/2012	28/02/2014	485	1.3	Masedi	VARIOS	Gerente de Operación
01/03/2014	31/03/2016	762	2.1	Proyecta	VARIOS	Jefe de Proyectos
01/04/2016	31/08/2016	153	0.42	GTA PERU	ISA REP	Director
01/09/2016	02/03/2017	183	0.5	VR	PROPIA	Director Tecnico y de Presupuesto
03/03/2017	28/04/2020	1153	3.2	GTA	ISA ITCO	Director
29/04/2020	18/11/2020	204	0.6	Instelec	ISA ITCO	Residente
01/12/2020	31/01/2021	62	0.2	Union Electrica	METRO	Residente
01/02/2021	13/02/2021	13	0.0	GTA	VARIOS	Director
		5580	16.0			


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 75.094.586
LONDOÑO GOMEZ
APELLIDOS
DANIEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1980
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-JUL-1998 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5200100-00166104-M-0075094586-20090804
0014430021A 1
6730006516


REPÚBLICA DEL PERÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN
CALIDAD MIGRATORIA: WRA TRABAJADOR
LONDOÑO GOMEZ
DANIEL
COLOMBIANA
03 Jun 1980
M
15 Abr 2011
S
000657461
CARNÉ DE EXTRANJERÍA Nº: ****


TASA ANUAL DE EXTRANJERÍA (TAE)
2014
PRORROGA DE RESIDENCIA (PDR)
Anual
Nº Pasaporte: CC75094586
Fec. Inscripción: 21 Abr 2010
Fec. Emisión: 27 Abr 2010
Fec. Caducidad: 27 Abr 2015
Lug. Expedición: LIM
C<COLLONDOXXO<GOMEZ<<DANIEL<<<<<<<<<
0006574611COL8006031M1504273<<<<<<<2

NOTARIA CAMPOS
FEDERICO J. CAMPOS ECHEANDIA
Av. Sta. José Nº 610 - 620 Urb. San José Ballavista - Callao
Teléfonos: 562-1886 - 562-1711 - 562-2195

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FEDERICO J. CAMPOS ECHEANDIA - NOTARIO -

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

Daniel Londoño Gómez

C.C. No. 75.094.586 EXPEDIDA EN MANIZALES

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE MANIZALES A 2 DE ABRIL DEL 2004

DECANATURA DE LA FACULTAD

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 36/638 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 1
DE LA SEDE DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

0073941

LEGALIZACION NOTARIAL AL REVERSO
NOTARIA CAMPOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ACTA DE GRADO NÚMERO 1630

El Consejo de la Facultad en su sesión del día 16 de marzo de 2004, Acta N° 09 considerando que:

Daniel Londoño Gómez

c.c. 75.094.586 de Manizales

Cumplió satisfactoriamente todos los requisitos exigidos por los estatutos de la Universidad, resolvió otorgarle el título de:

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional, previo el juramento de rigor, el Decano hizo entrega del diploma N° 0073941 registrado al Folio N° 36/638 del libro de diplomas N°1 de la Facultad.

En testimonio de lo anterior, se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Manizales a los 2 días del mes de abril de 2004.

JORGE EDUARDO SALAZAR TRUJILLO
Presidente
Consejo de Facultad

MANUEL AUGUSTO LUGO PIEDRAHITA
Secretario Académico
Consejo de Facultad

PRAXIS LABORATORY INSTITUTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PRAXIS LABORATORY DE COLOMBIA
ENGLISH

Certifies that

Daniel Londoño Gómez

Has satisfactorily completed the basic and advanced courses of study prescribed by this Institute and is hereby awarded this


DIPLOMA

Given this month of *December*, one thousand nine hundred and *Ninety Seven*

PRAXIS LABORATORY DE COLOMBIA
DIRECTOR NACIONAL
National Director

Academic Advisor



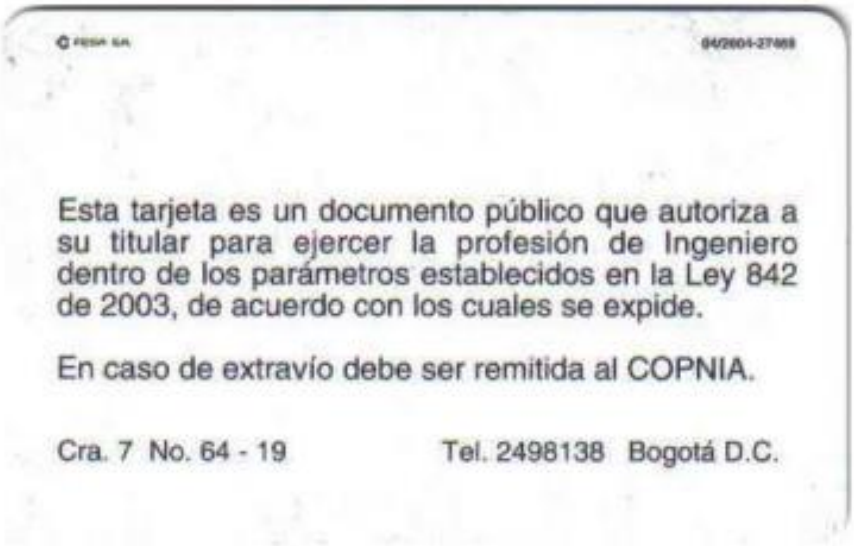

Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 842 de 2003, de acuerdo con los cuales se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19 Tel. 2498138 Bogotá D.C.

Cúcuta, 10 de febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

U.T. Construcciones y vías, certifica que el señor **DANIEL LONDOÑO GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 75.094.586**, laboró al servicio de nuestra empresa, con un contrato Individual de Trabajo a Término Obra o Labor contratada.

Periodos laborados:

DESDE: 01 de octubre de 2004

HASTA: 30 de mayo de 2005

CARGO: INGENIERO RESIDENTE

OBRA: Proyecto Bulevar vial calle 33 (Medellín)

Se expide constancia laboral a petición del trabajador para trámites personales.

HECTOR HERNANDO CUELLAR DE FEX
Representante Legal
Correo: cuellarvalencialtda@gmail.com
Teléfono: 313761286 – (037) 5894260
CC: 88.230.626 de Cúcuta

CEINGEL
COMPAÑÍA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL Y DE INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.
DIRECCIÓN: CALLE 27 # 43f - 71 (MEDELLÍN – COLOMBIA)
TEL / FAX. 57 4 232 28 10

Medellín, 05 de mayo de 2006

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La **Compañía Electromecánica Industrial y de Ingeniería ELÉCTRICA S.A. (CEINGEL)** con **NIT: 900047051-3**, certifica que el señor **DANIEL LONDOÑO GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 75.094.586**, laboró al servicio de nuestra empresa, con un contrato Individual de Trabajo a Término de Obra como se describe a continuación:

Periodos laborados:

DESDE: 1 de junio de 2005
HASTA: 30 de abril de 2006
CARGO: INGENIERO RESIDENTE
OBRA: Proyecto UPME2 Línea de transmisión a 500Kv Primavera – P. Parra

Se expide constancia laboral a petición del trabajador para trámites personales.

Carlos M. Zuluaga Santa
Representante Legal
Correo: santagu@une.net.co
Telefono: 310-505-8188
CC: 1.037.584.243

Carrera 52 No. 10 – 131
CONMUTADOR
385 65 00

ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA.
INGENIEROS CONTRATISTAS
MEDELLIN - COLOMBIA

Apartado Aereo: 2501
Fax: 385 65 01
Nit. 890.906.413-7

Medellin, 21 de mayo de 2008

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICA QUE:

El señor(a): **DANIEL LONDOÑO GOMEZ,** identificado(a) con cédula número, 75.094.586, Laboró en **ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA**, con Nit. **890.906.413,** desde el día 10 de mayo de 2006, hasta el día 27 de abril del 2008, Desempeño el cargo de **INGENIERO RESIDENTE,** en las obras de:

UPME SANCARLOS PRIMAVERA – CERRO MATOSO, línea de 500KV
BETANIA FRONTERA, Línea 230K.V
ANILLO INTERNEXA, Fibra óptica.
PROYECTO SIEPAC, Línea de interconexión eléctrica (PANAMA).

Durante el tiempo que laboro en la empresa demostró ser una persona responsable y colaboradora.

Su retiro fu voluntario.

Este certificado se expide a petición del interesado para trámites personales.

Cualquier información adicional en el teléfono 3-65-65-00

Atentamente,

Electricas de Medellin LTDA
Ingenieros Contratistas

Andrea del Mar Rivera Valencia
Jefe de Recursos Humanos

/Judith

AIA

CONSTRUIMOS POR NATURALEZA

Medellin, 18 de agosto de 2016

EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que el Señor DANIEL LONDOÑO GOMEZ, con cédula N°. 75.094.586, laboró al servicio de la empresa ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. con Nit 890.904.815-5, domiciliada en la Carrera 35A # 15B – 35, durante los siguientes contratos:

Desde	Hasta	Obra
03/06/2008	26/10/2008	Pedasi
27/10/2008	30/09/2009	Metro Mall

Se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA I, con un contrato DURACIÓN DE OBRA O LABOR DETERMINADA.

Cualquier información adicional, con gusto le será suministrada.

Atentamente,

María A. Llo.

MARIA ANDREA JARAMILLO OCAMPO
Coordinadora de Talento Humano

consorcio
MALLORCA - A&G

A&G
INMOBILIARIA
ASOCIADOS S.R.L.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Administrador de **"A&G Inmobiliaria Asociados SRL"**, Sr. Oscar Andrés Heraud Pardo Figueroa

CERTIFICA QUE:

La Sr. Daniel Londoño Gomez con Cédula 75094586, laboró en esta Empresa desempeñándose como **Ingeniero de Proyectos,** en el período desde el 14 de Octubre del 2009 hasta 06 de Mayo del 2010, demostrando en todo momento eficiencia, responsabilidad, y puntualidad en la realización de sus funciones.

Presentando su renuncia el día 04 del presente mes aduciendo una mejora laboral y económica en otra empresa, es por ello que se pone fin al vínculo el día 06 de Mayo de 2010.

Se emite el presente Certificado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 06 de Mayo del 2010

CONSORCIO MALLORCA - A & G
OSCAR A. HERAUD PARDO FIGUEROA
Apoderado General

MANTTO

CERTIFICADO LABORAL

Como representante legal de la Empresa **Mantenimiento, Construcción y Proyectos Generales SAC** con RUC No. **20106758477:**

CERTIFICA

Que el señor **DANIEL LONDOÑO GÓMEZ**, identificado con Carnet de Extranjería N° 000657461, ha laborado en nuestra empresa desde el 01 de mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, ocupando el cargo de **Ingeniero de Campo**

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 21 de junio de 2,018.

Hector Ricardo Ayllón Quiroz
Representante Legal
hrayllon@mantto.com.pe / +51 972 734 094
DNI N° 09751810

URBANA
PERÚ

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de Viviendas del Perú S. A. C., con RUC Nº 2051269529

CERTIFICA

Que el señor **DANIEL LONDOÑO GÓMEZ**, identificado con Carnet de Extranjería Nº 000657461, ha laborado en nuestra empresa desde el 12 de diciembre de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012, ocupando el cargo de **Jefe de Obra**.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

San Isidro, 31 de octubre de 2,012.

VIVIENDAS DEL PERÚ S.A.C.
Walter Chávez Ruiz
AREA ADMINISTRATIVA - LEGAL

Av. República de Colombia Nº 791, piso 9 oficina 904, San Isidro, Lima-Perú. Telf. 7191050 / 7191051

MASEDI
Contratistas Generales S.A.C.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SAC., con RUC 20426128803

CERTIFICA

Que el señor **DANIEL LONDOÑO GÓMEZ**, identificado con Carnet de Extranjería **N° 000657461**, ha laborado en nuestra empresa desde Noviembre de 2012 hasta Febrero de 2014, ocupando el cargo de **GERENTE DE OPERACIONES**

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de Marzo de 2,014.

Jr. Leonardo Barbieri (ex - Junin) 1374 Surquillo, Lima - Perú. Telefax: (511) 3230 Nextel (511) 9 9817*3160
informes@masedi.com.pe / www.masedi.com.pe

PROYECTA
Supervisión de Proyectos

CERTIFICADO DE TRABAJO

La empresa **Proyecta Inspectora Técnica de Obra S.A.C.** con R.U.C. N° **20549170235** certifica que el Señor **Daniel Londoño Gomez** identificado con Carnet de Extranjería N° **000657461,** laboró en nuestra empresa desde el **01 de Marzo del 2014 al 31 de Marzo del 2016**, ocupando el cargo de **Jefe de Proyecto**, en la obra **Ampliación de C.C. Mega Plaza.** Demostrando responsabilidad, eficiencia y dedicación en el desempeño de sus funciones que le fueron asignadas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Surco, 31 de marzo del 2016.

Ricardo Del Aguila Herrera
Gerente General

Envigado, 09 de Febrero del 2021

LA EMPRESA G.T.A. COLOMBIA S.A.S.
NIT 811.022.908

HACE CONSTAR QUE:

El (La) Señor(a) **DANIEL LONDOÑO GOMEZ** identificado con CC **75.094.586** laboro en nuestra empresa desde el 01 de Abril de 2016 al 31 de Agosto de 2016, con un contrato a término Indefinido, en el cargo de **DIRECTOR DE PROYECTOS** en la línea de transmisión MANTARO-MONTALVO 500KV.

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos en el teléfono (4) 6071529.

Atentamente,

Silvia Restrepo Peña.
Analista de Nómina y Talento Humano
G.T.A. Colombia S.A.S.

Transv 34A Sur 32D-13
Envigado – Antioquia
Tel: (4) 607 15 29
+57 312 258 7421
GTAColombiaSAS
www.gtaingenieria.com

VILLAMIZAR Y ROJAS CONSTRUCTORES

CERTIFICADO DE LABORAL

El que suscribe, en representación de VR CONSTRUCTORES SAS., con NIT Nº 900.335.274-4

CERTIFICA

Que el señor **DANIEL LONDOÑO GÓMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 75.094.584, ha laborado en nuestra empresa desde el 01 de septiembre de 2015 hasta el 02 de marzo de 2017, ocupando el cargo de **Director Técnico y de Presupuestos**

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Bogotá, 20 de junio de 2.018.

VR CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900.335.274-4

SERGIO ANDRES VILLAMIZAR JAIMES
Representante legal
VR CONSTRUCTORES S.A.S.
CC No.13.544.902

Envigado, 09 de Febrero del 2021

LA EMPRESA G.T.A. COLOMBIA S.A.S.
NIT 811.022.908

HACE CONSTAR QUE:

El (La) Señor(a) **DANIEL LONDOÑO GOMEZ** identificado con CC **75.094.586** laboro en nuestra empresa desde el 03 de Marzo de 2017 al 30 de Junio de 2018, con un contrato a término Indefinido, en el cargo de **COORDINADOR DE PROYECTOS** en la línea de transmisión MONTERIA-URABA Y SUBESTACIÓN MONTERIA A 230KV.

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos en el teléfono (4) 6071529.

Atentamente,

Silvia Restrepo Peña.
Analista de Nómina y Talento Humano
G.T.A. Colombia S.A.S.

Transv 34A Sur 32D-13
Envigado – Antioquia
Tel: (4) 607 15 29
+57 312 258 7421
GTAColombiaSAS
www.gtaingenieria.com

INSTELEC S.A.S.
INGENIEROS ELECTRICISTAS
NIT: 890 911 324 -1

INSTELEC S.A.S.
INGENIEROS ELECTRICISTAS
Carrera 52 No. 9 – 33 Medellín-Colombia
Conmutador: (57-4) 2 85 77 11 Fax: (57-4) 2 55 27 54
Email: gerencia@instelec.com.co-Apartado Aéreo 52157

48 AÑOS

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

www.instelec.com.co

Medellín, 04 de diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

INSTELEC SAS con NIT: 890911324-1, certifica que el señor **DANIEL LONDOÑO GOMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No**. 75.094.586,** laboró al servicio de nuestra empresa, con un contrato Individual de Trabajo a Término Obra o Labor contratada.

Periodos laborados:

DESDE	HASTA	CARGO	OBRA
ABRIL 29-2020	NOVIEMBRE 18-2020	INGENIERO RESIDENTE	TRANSPOSICION LINEA 500 kV ANCE UT CERRO

Se expide constancia laboral a petición del trabajador para trámites personales.

Atentamente,

INSTELEC S.A.S
Ingenieros Electricista
Nit. 890.911.324-1

CATHERINE PARRA RUIZ
Directora Gestion Humana y SST.
INSTELEC SAS.

Envigado, 09 de Febrero del 2021

LA EMPRESA G.T.A. COLOMBIA S.A.S.
NIT 811.022.908

HACE CONSTAR QUE:

El (La) Señor(a) **DANIEL LONDOÑO GOMEZ** identificado con CC **75.094.586** laboro en nuestra empresa desde el 01 de Julio de 2018 al 24 de Abril de 2020, con un contrato a término Indefinido, en el cargo de **COORDINADOR DE PROYECTOS** en la línea de transmisión ANTIOQUIA-PORCE III a 500KV.

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos en el teléfono (4) 6071529.

Atentamente,

Silvia Restrepo Peña.
Analista de Nómina y Talento Humano
G.T.A. Colombia S.A.S.

Transv 34A Sur 32D-13
Envigado – Antioquia
Tel: (4) 607 15 29
+57 312 258 7421
GTAColombiaSAS
www.gtaingenieria.com

Envigado, 08 de Febrero del 2021

LA EMPRESA G.T.A. COLOMBIA S.A.S.
NIT 811.022.908

HACE CONSTAR QUE:

El (La) Señor(a) **DANIEL LONDOÑO GOMEZ** identificado con CC **75.094.586** labora en nuestra empresa desde el 01 de Febrero de 2021 con un contrato a término Indefinido en el cargo de **COORDINADOR DE PROYECTOS** en la líneas de transmisión ANPO-PORCE III A 500KV y la línea de transmisión MEDELLÍN-LA VIRGINIA A 500KV.

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos en el teléfono (4) 6071529.

Atentamente,

Silvia Restrepo Peña.
Analista de Nómina y Talento Humano
G.T.A. Colombia S.A.S.

Transv 34A Sur 32D-13
Envigado – Antioquia
Tel: (4) 607 15 29
+57 312 258 7421
GTAColombiaSAS
www.gtaingenieria.com

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de octubre de 2023, a las 13:00:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	75094586
Código de Verificación	75094586231003130032

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:02:56 PM horas del 03/10/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **75094586**

Apellidos y Nombres: **LONDONO GOMEZ DANIEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 232434719

PIB
13:05:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL LONDOÑO GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 75094586:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Buenaventura, 04 de octubre de 2023

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA
Villavicencio, Meta

Contrato de Obra N° **FGN-RO-0021-2023**.
Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO - PERSONAL DE OBRA**.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del objeto "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS FIJOS", me permito solicitar la autorización para el ingreso del siguiente personal a todas las sedes objeto de intervención:

NO. DE IDENTIF.	NOMBRE Y APELLIDO	ACTIVIDAD	TELÉFONO	SEDE A LABORAR	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CC 76.325.377	BERMORI GRANADA VALENCIA	CONTRATISTA	3154970774	SEDES OBJETO CONTRATO	31-08-2023	31-12-2023
CC 31.655.741	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	DIRECTORA PROYECTOS	3144434361	SEDES OBJETO CONTRATO	31-08-2023	31-12-2023
CC 75.094.586	DANIEL LONDOÑO GÓMEZ	RESIDENTE OBRA	3003012419	SEDES OBJETO CONTRATO	26-09-2023	31-12-2023
CC 40.325.117	BETSY ANDREA FIERRO GUZMÁN	SST	3507574763	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 43.455.805	ERIKA LONDOÑO GOMEZ	INGENIERO APOYO	3113834684	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 16. 114.293	HOOVER ANTONIO LÓPEZ GIRALDO	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	3114597748	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 1.113.631.738	ALEXANDER CASTRO MUÑOZ	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	3213458885	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 18.201.670	DONALDO VALENCIA RODRÍGUEZ	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	3213656218 3138293485	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023

CC 1.052.572.417	YOLVIS RODRIGO PARADA	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	3137351918	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 1.121.831.459	LIBARDO GUTIÉRREZ	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	3115566286	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 86.050.461	CARLOS ANDRÉS CUBIDES SANTOS	CARPINTERÍA ALUMINIO	3114849011	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023
CC 4.082.932	AUBIN LAMPREA GÓMEZ	CARPINTERÍA ALUMINIO	3114849011	SEDES OBJETO CONTRATO	05-10-2023	31-12-2023

De ustedes atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)
T.P. 19202-094987 CAU


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 76.325.377
GRANADA VALENCIA
APELLIDOS
BERMORI
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1977
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
27-FEB-1995 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1100100-00242403-M-0076325377-20100624
0022461539A 1
7750780626


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 31.655.741
CORREA ORTIZ
APELLIDOS
EULHYN MAYRELL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1983
MIRANDA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-NOV-2001 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2900100-00629693-F-0031655741-20141003 0040365097A 1 1283026659


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 75.094.586
LONDOÑO GOMEZ
APELLIDOS
DANIEL
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1980
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-JUL-1998 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-5200100-00166104-M-0075094586-20090804
0014430021A 1
6730006516


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 40.325.117
FIERRO GUZMAN
APELLIDOS
BETSY ANDREA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1983
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-ABR-2001 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-5200100-01121767-F-0040325117-20191223
0069448663A 1
6735699199


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.455.805
LONDOÑO GOMEZ
APELLIDOS
ERIKA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1984
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-ENE-2002 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0116600-00316438-F-0043455805-20110725
0027552428A 1
2531428182

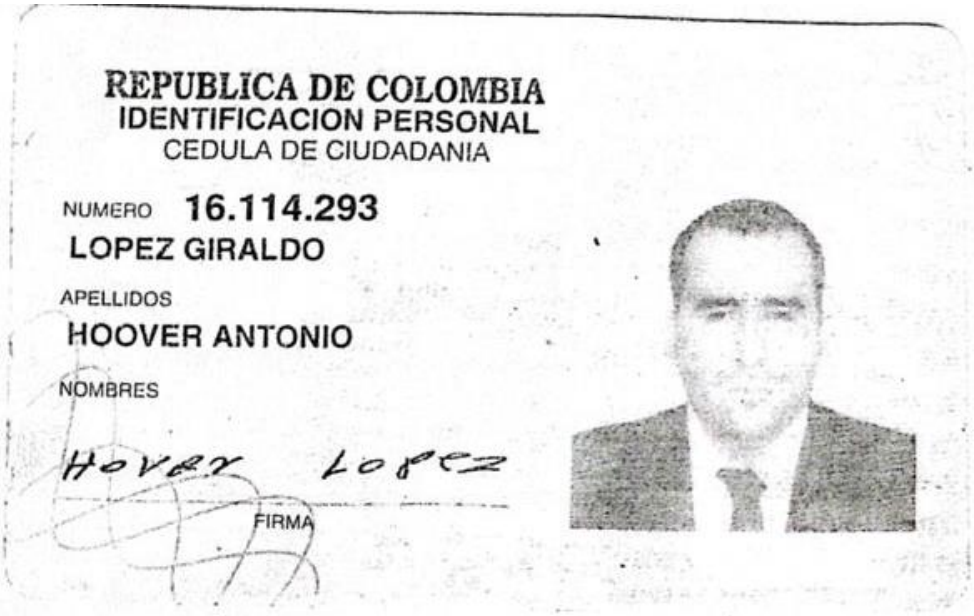

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.114.293
LOPEZ GIRALDO
APELLIDOS
HOOVER ANTONIO
NOMBRES

Hoover Lopez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1980
SAMANA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
10-JUN-1998 SAMANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0311500-00163159-M-0016114293-20090716 0013564711A 1 30654188



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.113.631.738

CASTRO MUÑOZ

ALEXANDER

ALEXANDER CASTRO



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1988
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.74 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO


17-FEB-2006 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3107900-65148842-M-1113631738-20060830 05165 06241A 02 176269553

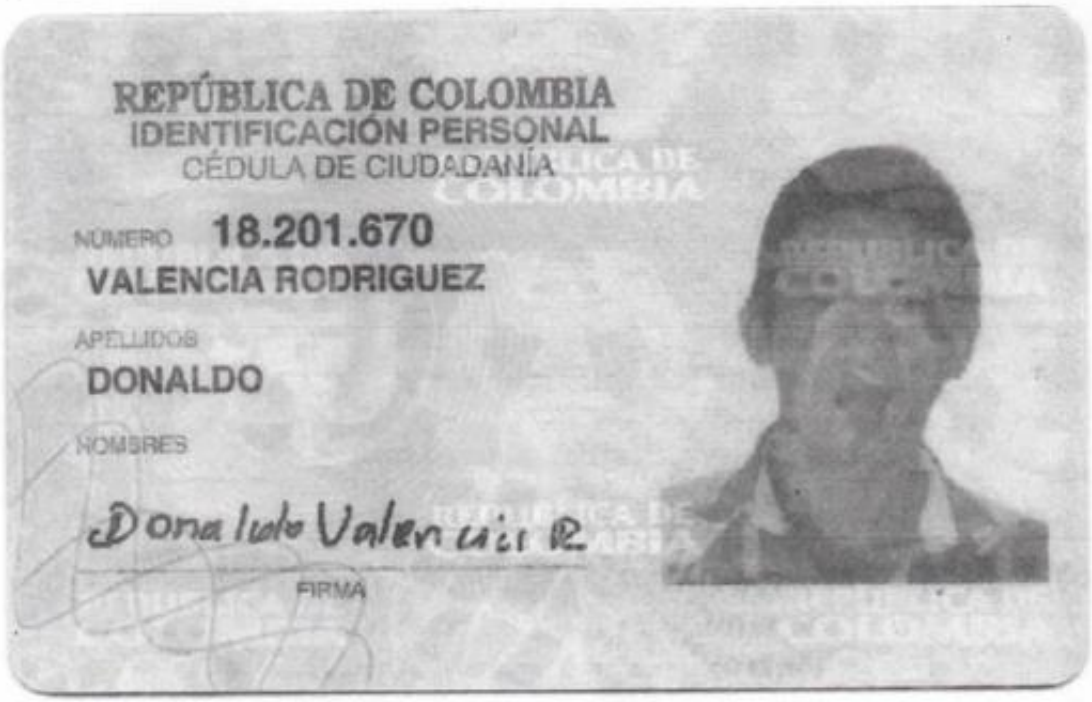
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 18.201.670
VALENCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS
DONALDO
NOMBRES
FIRMA

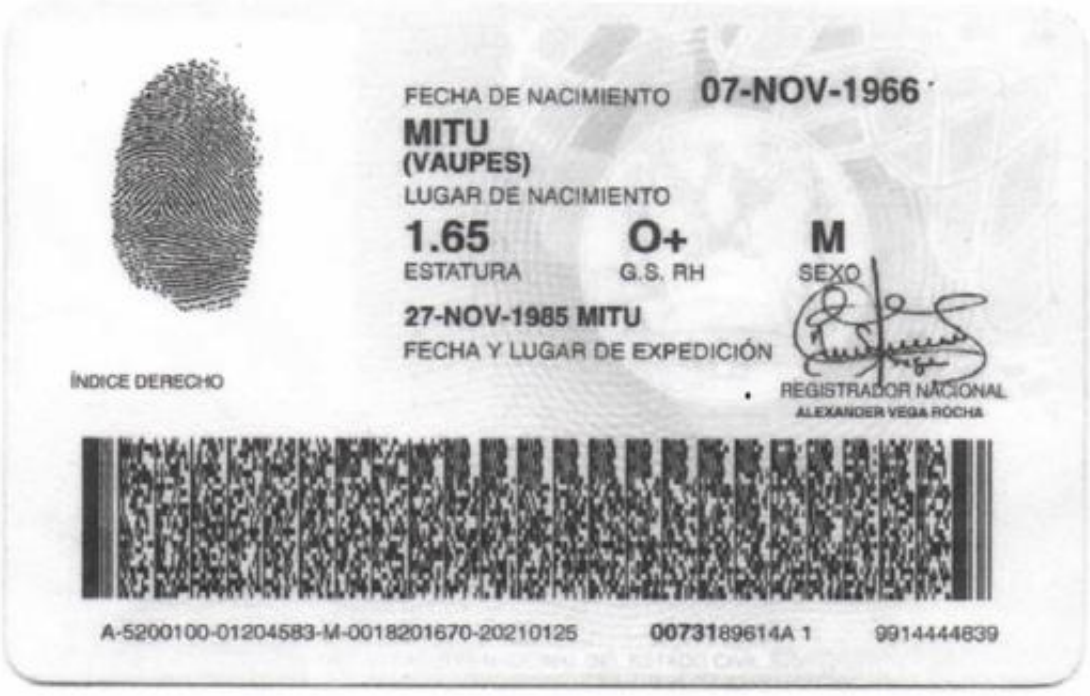
FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1966
MITU
(VAUPES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-NOV-1985 MITU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO
A-5200100-01204583-M-0018201670-20210125
0073189614A 1
9914444839

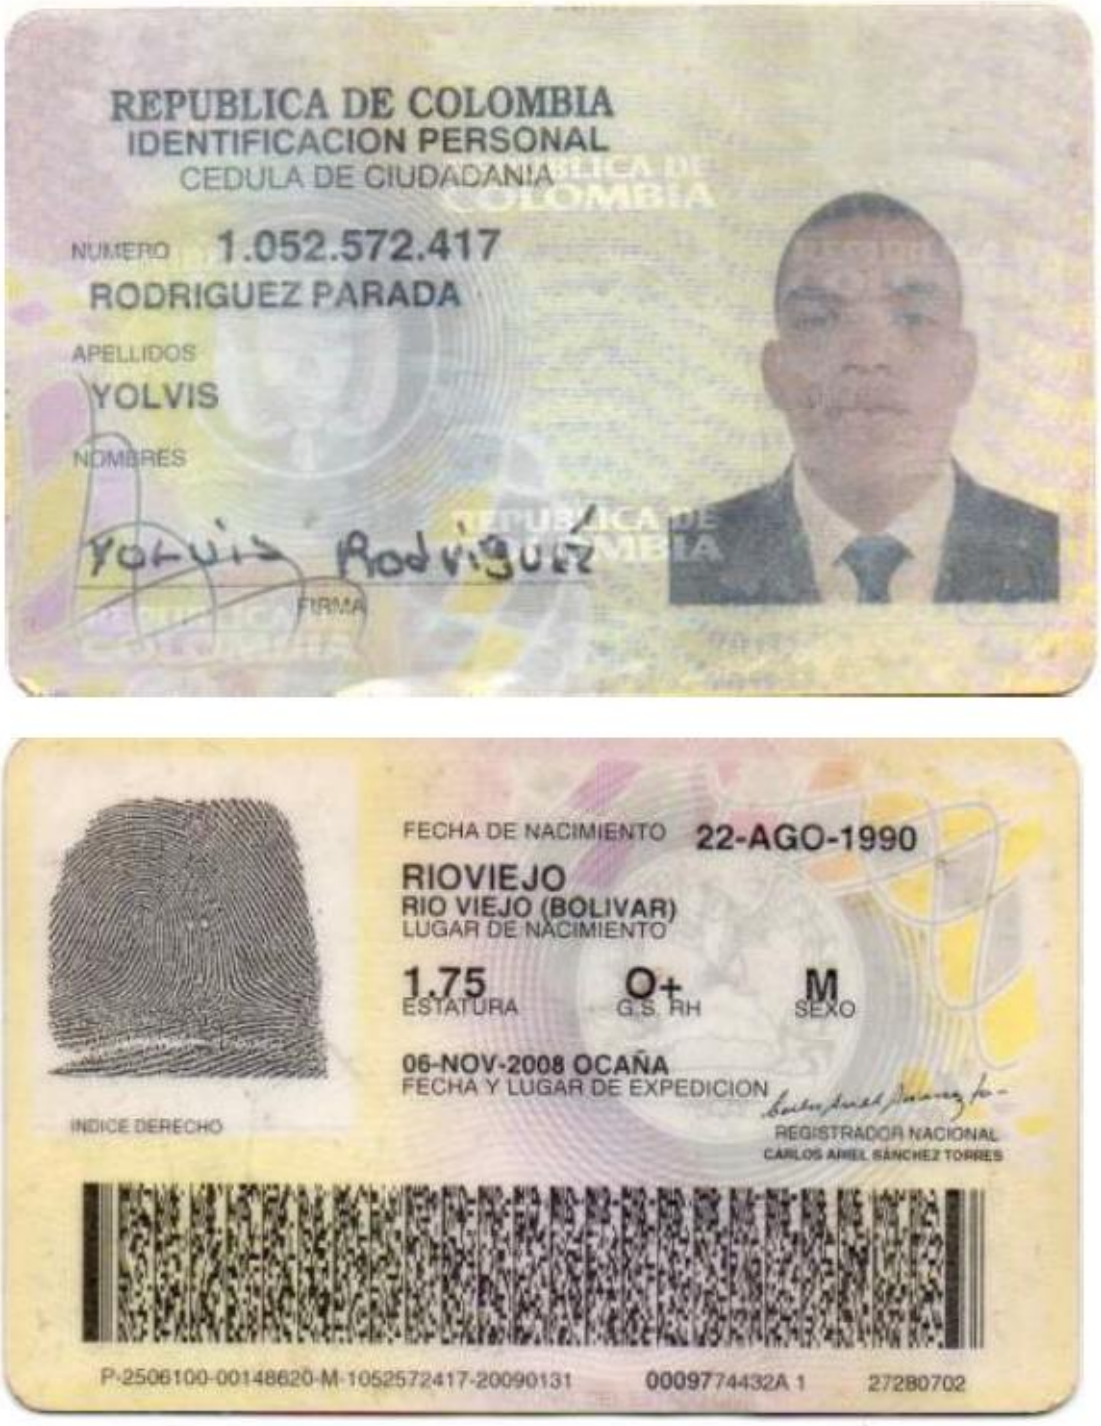
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.052.572.417
RODRIGUEZ PARADA
APELLIDOS
YOLVIS
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1990
RIOVIEJO
RIO VIEJO (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-NOV-2008 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2506100-00148620-M-1052572417-20090131
0009774432A 1
27280702

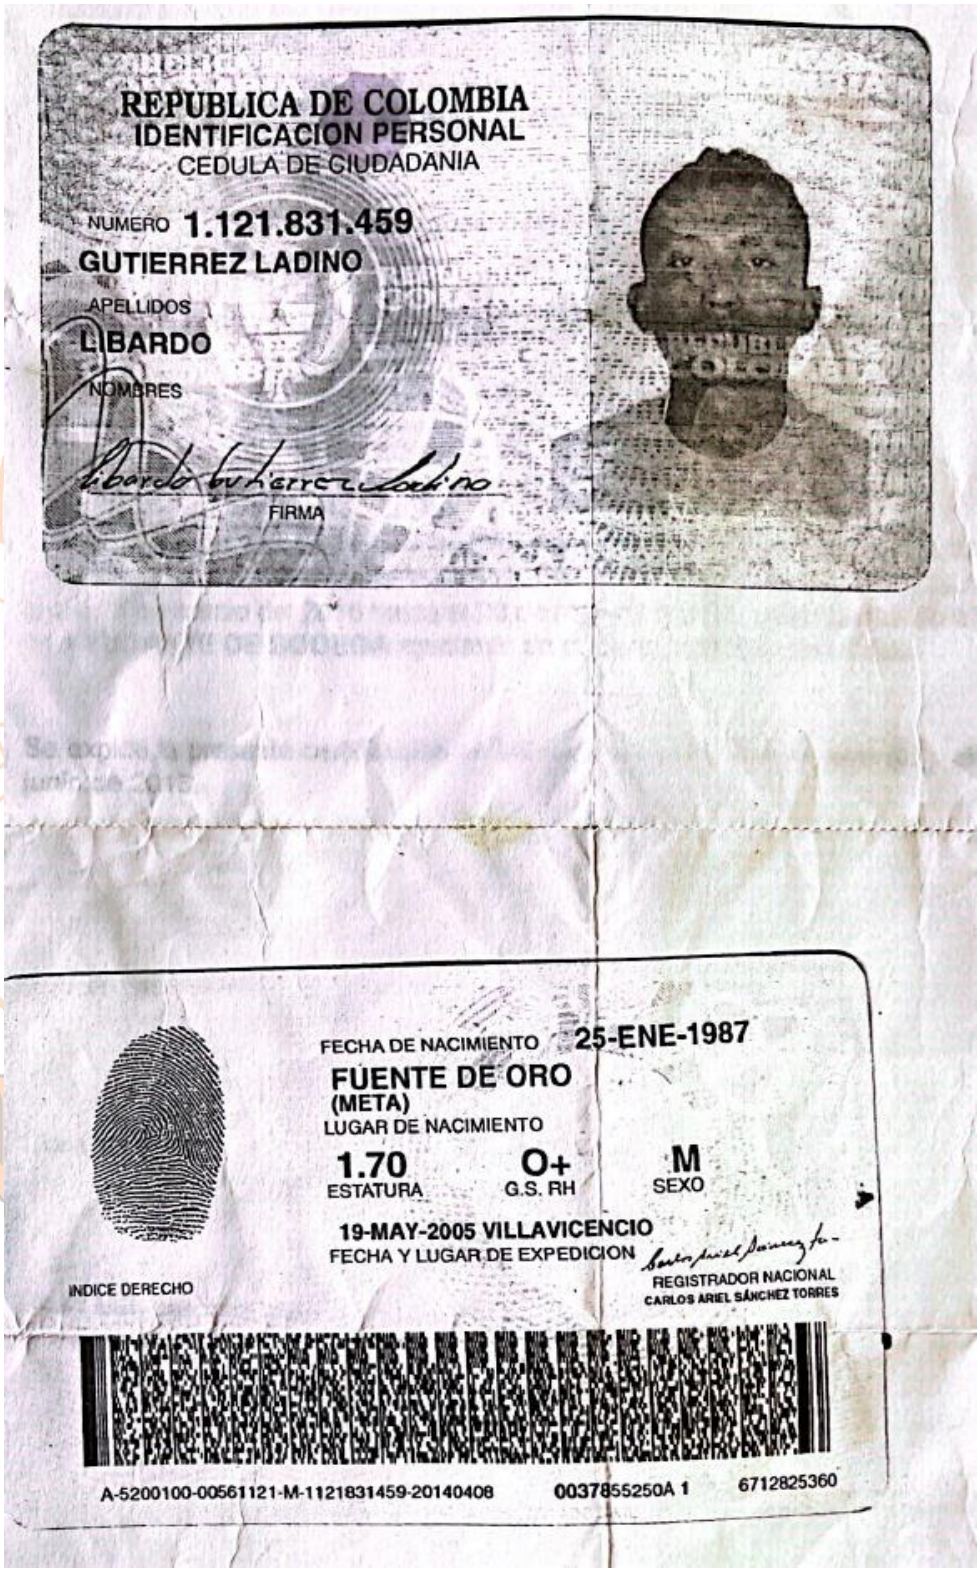
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.121.831.459
GUTIERREZ LADINO
APELLIDOS
LIBARDO
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1987
FUENTE DE ORO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-MAY-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5200100-00561121-M-1121831459-20140408
0037855250A 1
6712825360


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
86.050.461
CUBIDES SANTOS
CARLOS ANDRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1976
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
31-OCT-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 4.082.932
LAMPREA GOMEZ
APELLIDOS
AUBIN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1951
COPER
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 COPER
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5200100-00570052-M-0004082932-20140507
0038347560A 4
42316961
