INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL (SEMANAL) __33____ FINAL _____

PERIODO DE: 27 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No.	: 131 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN	: No. IP 013 de 2022
OBJETO	: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".
LOCALIZACIÓN	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
VALOR INICIAL	: $59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos)
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	: $ 5.999.868 (Cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos)
VALOR ADICIÓN	: $ 43.588.442 (Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
VALOR FINAL	: $ 97.388.574 (Noventa y siete millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro mil pesos)
PLAZO INICIAL	: Hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	: 8 de septiembre de 2022
SUSPENSIÓN No 1	: 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 : 156 días

TERMINACION FINAL DEL CONTRARO :11 de noviembre de 2023

CONSULTOR INTERVENTORÍA : BRV Ingeniería y planeación SAS

CONTRATISTA : CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)

CONTRATO No. : 147 DE 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN : No. 07 de 2022

OBJETO : Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

LOCALIZACIÓN Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

VALOR : $1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos)

PLAZO INICIAL : Hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIO : 8 de septiembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 **:** 156 días

TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO **:**11 de noviembre de 2023

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El presente informe semanal, pertenece a la semana número 33 del contrato de interventoría No. 131 de 2022, dicha semana está comprendida entre el 27 de septiembre al 03 de octubre de 2023.

A continuación, se relacionan las actividades y oficios enviados por la **consultoría** en el avance de la semana No. 33:

- El 27/09/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-368-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 20. INFORME CATASTRAL, SEDE CONCORDIA. V1

- El 28/09/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-369-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 20. INFORME CATASTRAL, SEDE BARRACOMINAS. V1

- El 28/09/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-370-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, ARQUITECTURA. MOBILIARIO. SEDE OROCUÉ. V0

- El 28/09/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-371-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, INFORME SEMANAL No 31.

- El 02/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-372-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 3. GEOFÍSCA Y SUELOS. SEDE BOLÍVAR, V1.

- El 02/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-373-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 6. ESTRUCTURAL. SEDE CONCORDIA, V1.

- El 02/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-374-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 6. ESTRUCTURAL. SEDE BOLÍVAR, V1.

- El 03/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-375-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 3. GEOFÍSICA Y SUELO. SEDE OROCUÉ, V1.

- El 03/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-376-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 10. AMBIENTAL SEDE CONCORDIA, V0.

- El 03/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-377-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 10. AMBIENTAL SEDE ZIPAQUIRÁ, V0.

- El 03/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-378-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 3. GEOFÍSCA Y SUELOS. SEDE LA PRIMAVERA, V1.

- El 03/10/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-379-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, TOMO 10. AMBIENTAL. SEDE BOLÍVAR, V0.

A continuación, se relacionan las actividades contractuales y oficios enviados por la **interventoría,** en el avance de la semana No. 33 del contrato:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-324-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-306-2023. Aval Condicionado al informe de	Consultoría

		revisión y diagnóstico complementario para el sistema de suministro, sistema de agua residual, sistema pluvial, sistema subdrenajes y sistema contraincendios para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 0.	
BRV-INT-CSJ-325-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-312-2023. Aval Condicionado del diagnóstico complementario al sistema eléctrico y sistemas anexos para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 0.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-328-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-300-2023. Aval del Informe de Topografía Sede La	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Primavera (Vichada) Versión No. 1.	
BRV-INT-CSJ-329-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-319-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Orocué (Casanare) Versión No. 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-330-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-320-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Bolívar (Cauca) Versión No. 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-331-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-321-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Concordia (Magdalena) Versión No. 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-332-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-343-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Barrancominas	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		(Guainía) Versión No. 1.	
BRV-INT-CSJ-333-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-348-2023. Aval del Informe de Transporte Vertical Sede Orocué (Casanare) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-334-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-351-2023. Aval del Informe de Transporte Vertical Sede Barrancominas (Guainía) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-335-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-352-2023. Aval del Informe de Transporte Vertical Sede La Primavera (Vichada) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-336-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-334-2023. Aval del Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		(Cundinamarca) Versión 2.	
BRV-INT-CSJ-337-2023	29/09/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-362-2023 – Solicitud de firmas para Formularios Únicos Nacionales FUN para trámite de licencias de construcción.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-338-2023	02/10/2023	Alcance a los oficios DEAJUIFO23-320, DEAJUIFO23-337, DEAJUIFO23-340, DEAJUIFO23-351 y CEGG-CON-147-52-359-2023 – Solicitud de concepto por la interventoría para la conexión eléctrica definitiva para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consejo Superior de la Judicatura UIF

En la semana número 33 la **interventoría** hizo él envió de diferentes oficios dando respuesta y remitiendo información ya sea a la entidad o a la consultoría como se muestra en la anterior tabla. El día 03/10/2023 se hizo la remisión de los avales a los informes de Topografía de las Sedes nuevas a construir en su versión No. 1.

1.2. GARANTÍAS

INTERVENTORÍA:

- La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 0 conforme al contrato, fue cargada en la plataforma SECOP II el 8/08/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se debían hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el SECOP II el día 25/08/2022.
- La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexos 1,2 y 3 al acta de inicio, fue cargada a la plataforma SECOP II el 26/09/2022 y aprobada en SECOP II el 04/10/2022.
- La póliza correspondiente al reinicio 1 fue cargada por la interventoría el 22/02/2023 y fue aprobada en SECOP II el 09/03/2023.
- La póliza correspondiente al reinicio 2 fue cargada al SECOP II el día 21 de junio de 2023 y después de ser revisada por parte de la entidad fue aprobada el 14 de julio de 2023.

Tabla No. 1 garantías de la interventoría conforme al acta de suspensión 2, reinicio 2 y modificación 1

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 14/07/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	11/11/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	11/03/2023	11/03/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	11/03/2026	$ 8.970.000.00

CONSULTORÍA:

- La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 22/08/2022 y aprobada en SECOP II el 24/08/2022 por parte de la entidad.

- La actualización de la póliza conforme al acta de inicio se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 05/10/2022 mediante comunicado CEGG-

CON-147-52-060-2022, nuevamente se carga anexos 1 y 2 de la póliza al SECOP II con las indicaciones dadas por la entidad aún están pendiente de aprobación en la plataforma.

- La actualización de póliza con relación al reinicio 1 se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 21/02/2023 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-161-2023, y con aprobación por parte del CSJ.

- Una vez suplido los requerimientos de la Entidad, la Póliza No. 14-44-101160700 fue aprobada por el CSJ.

- Por condiciones del contrato se genera suspensión No 2 el 3 de marzo de 2023 y se reinicia el 31 de mayo de 2023, se prorroga el contrato evento aprobado en SECOP II el 5 de Junio de 2023 Anexo 8, por lo que se procede a la actualización de póliza y mediante comunicado CEGG-CON-147-52-213-2023 del 6 de Junio de 2023 se remite a interventoría y la entidad las pólizas y de lo cual el 20 de junio, la entidad hace observaciones y se procede a traslado de las mismas ante la aseguradora y el 29 de junio de 2023, se remite por correo electrónico a la entidad de la Dra. María Alejandra Montoya la póliza ajustada para revisión y aprobación para proceder a ser cargada a la plataforma, se carga la respectiva póliza y es aprobada por la entidad el 10 de Julio de 2023, quedando atendido por parte del consultor lo correspondiente a pólizas en su anexo 9.

Tabla No. 2 garantías de la consultoría conforme al reinicio

GARANTÍAS ACTUALIZADAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS y MODIFICACIONES			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
Anexo	9		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	11/05/2024	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2022	11/05/2024	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/09/2022	11/11/2026	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	11/11/2023	11/11/2028	$ 301.191.224.50

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el siguiente cuadro se presenta el avance del contrato concurrida la semana número 33, en el cuadro se discrimina el avance para cada 1 de las sedes que se piensan diseñar:

Tabla No.3 Avance físico programado y ejecutado

AVANCE FÍSICO ACUMULADO							
SEMANA No 33							
PERIODO DE 27 SEPTIEMBRE A 03 OCTUBRE 2023							
GENERALIDADES			AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO		AVANCE Y/O ATRASO
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL PROGRAMADO	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL EJECUTADO	
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	90,52%	4,49%	88,41%	4,39%	-2,11%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	90,52%	4,49%	88,41%	4,39%	-2,11%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	4,96%	90,52%	4,49%	88,41%	4,39%	-2,11%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	90,52%	12,87%	88,41%	12,57%	-2,11%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	90,52%	15,03%	88,41%	14,68%	-2,11%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	91,93%	23,33%	85,00%	21,57%	-6,93%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	100,00%	6,29%	100,00%	6,29%	0,00%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	92,96%	21,02%	93,23%	21,09%	0,27%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	**100,00%**		**92,03%**		**89,36%**	**-2,66%**

El avance del contrato de consultoría físico total programado como lo describe la anterior tabla corresponde al 92,03% en la semana número 33 de trabajo, aun así, hasta el corte de la semana 33 se ha ejecutado un avance total de 89,36%, lo que genera un valor de avance negativo de -2,66%.

Como se observa para todas las sedes se empieza a presenta un atraso, considerando como causa principal del atraso la revisión de parte de la interventoría del informe de vulnerabilidad de la sede de Zipaquirá Cundinamarca.

En el **anexo No. 1** del presente informe se muestra el cronograma actualizado aprobado por la **interventoría** que sirve como base para la elaboración de la **Tabla No. 3 Avance físico programado y ejecutado.**

Avance Físico. Contrato 147/2022:

Se presenta a continuación el análisis resumido efectuado para la determinación del avance físico de cada una de las sedes, así como el avance integral total del contrato.

Criterios para evaluación:

Teniendo en cuenta el número de sedes, así como de los entregables en cada una de las mismas, para la determinación de los avances físicos se definieron los siguientes criterios:

- Para cada sede se asigna un porcentaje (%) en peso de cada componente estableció en el Anexo Técnico de Entregables.
- Con lo anterior y el cronograma de ejecución del contrato, se establecen los avances físicos programados de cada actividad.
- Para la determinación del avance ejecutado de actividad para cada sede se asigna un porcentaje de acuerdo con el avance real estimado por el mismo CONSORCIO JMS-C.
- Para la determinación del avance integral, se estima el peso de cada sede en particular del contrato.

Peso en % de entregables para cada sede:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de las sedes de la Primavera, Concordia, Barrancominas, Orocué y Bolívar; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

PESO (%) POR COMPONENTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES	SEDES				
		LA PRIMAVERA	CONCORDIA	BARRANCOMINAS	OROCUÉ	BOLÍVAR
		PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)
1	ASPECTOS GENERALES	1%	1%	1%	1%	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	6%	6%	6%	6%	6%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	8%	8%	8%	8%	8%
4	TOPOGRAFÍA	6%	6%	6%	6%	6%
5	ARQUITECTÓNICO	12%	12%	12%	12%	12%
5,3	Esquema Básico Arquitectónico					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico					
5,5	Diseño Arquitectónico					
5,6	Mobiliario					
5,7	Señalización					

5,8	Paisajismo					
6	ESTRUCTURAL	10%	10%	10%	10%	10%
7	HIDROSANITARIO	5%	5%	5%	5%	5%
8	ELÉCTRICO	6%	6%	6%	6%	6%
9	AÍRE ACONDICIONADO	4%	4%	4%	4%	4%
10	AMBIENTAL	3%	3%	3%	3%	3%
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4%	4%	4%	4%	4%
12	SEGURIDAD Y CONTROL	3%	3%	3%	3%	3%
13	TRANSPORTE VERTICAL	3%	3%	3%	3%	3%
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	10%	10%	10%	10%	10%
15	PRESUPUESTO	4%	4%	4%	4%	4%
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4%	4%	4%	4%	4%
17	LICENCIAS Y PERMISOS					
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO	3%	3%	3%	3%	3%
19	INFORMACIÓN CATASTRAL	5%	5%	5%	5%	5%
20	BIM	3%	3%	3%	3%	3%
		100%	100%	100%	100%	100%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. VULNERABILIDAD:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto a la vulnerabilidad del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

ÍTEM	ACTIVIDADES	PESO (%)
0	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	100%
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)	1,00%
2	VISITAS TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE	1,00%

3	ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN	5,00%
3,1	Análisis y diagnóstico de Estudio de Patología de la Sociedad Colombiana de Ingenieros	
3,2	Análisis de estudios de suelos realizados	
3,3	Análisis de la información referente a diseños estructurales realizados	
4	VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL	4,00%
5	PATOLOGÍA ESTRUCTURAL (ADICIONAL)	
5,1	Definición de programa de ensayos	1%
5,2	Metodología de ensayos y programación general de actividades	3%
5,3	Ejecución de ensayos	7%
5,4	Ensayos de laboratorios y resultados	5%
5,5	Análisis de Resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	7%
6	ESTUDIO DE SUELOS	
6,2	Análisis de la información secundaria	2%
6,2	Definición de programada y metodología	3%
6,3	Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	14%
6,4	Ensayos de laboratorio	8%
6,5	Estudio de suelos y recomendaciones	7%
7	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	7%
7,1	Memorias	
7,2	Planos	
8	ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO	1%
8,1	Alternativa 1	
7,2	Alternativa 2	
7,3	Alternativa 3	
9	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	15%
8,2	Memorias	
8,3	Planos	
10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO	2,50%
11	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	2,50%
12	PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA	2,00%
13	TRÁMITE DE LICENCIA	2,00%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. DIAGNÓSTICO:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto al diagnóstico del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

1	ASPECTOS GENERALES	0,50%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	3,50%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	2,00%
	Exploración e campo	
3,1	Ensayos y Resultados	
3,2	Geofísica	
3,3	Geotecnia	
3,4	Sísmica	
4	TOPOGRAFÍA	2,00%
4,1	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	
4,2	Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión. Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá)	
5	ESTRUCTURAL	1,50%
5,1	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación	
6	HIDROSANITARIO	
6,1	Definición de alternativas	0,50%
6,2	Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
6,3	Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
7	FIBRA ÓPTICA	1,50%
	Memoria técnica y planimetría para la conexión de fibra óptica	
8	AMBIENTAL	2,00%
8,1	Riesgos ambientales	
8,2	Informe de Arborización existente	
9	PRESUPUESTO	2,50%
	Presupuesto	
10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	2,50%

	Especificaciones de Obra	
11	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	1,50%
	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	
	2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	
	3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	
	4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	
	5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	
	6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	
12	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO	
12,1	DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO	1,00%
12,2	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE REDES ELÉCTRICAS	1,00%
12,3	DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO	1,00%
12,4	DIAGNÓSTICO SISTEMA CONTRAINCENDIOS	1,00%
13	PRUEBAS (ADICIONAL) - PRUEBAS E INFORMES	
13,1	SISTEMA HIDROSANITARIO	

13,1,1	Pruebas red de suministro de agua potable	3,00%
13,1,2	Pruebas de sistema sanitario	3,00%
13,1,3	Pruebas sistema de aguas lluvias	2,00%
13,1,4	Pruebas sistema bombeo	3,00%
13,2	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	
13,2,1	Pruebas redes sistema Contraincendios	8,00%
13,2,2	Pruebas sistema bombeo	7,00%
13,3	SISTEMA ELÉCTRICO	
13,3,1	Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	15,00%
13,3,2	Pruebas redes eléctricas, voz y datos	25,00%
14	TRABAJOS EN ALTURA	
14,1	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	1,00%
14,2	2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	1,00%
15	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	
15,1	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1,00%
16	INFORMACIÓN CATASTRAL	
16,1	Diagnóstico Catastral	2,00%
16,2	Trámites saneamiento.	2,00%

Los porcentajes de avance físico en el periodo del contrato de **interventoría** son iguales a los del contrato de consultoría ya que los dos contratos van ligados y llevan el mismo avance de la siguiente manera:

Contrato 147 de 2022 Estudios y diseños:

Avance Físico Programado 92,03%

Avance Ejecutado físico 89,36%

Contrato 131 de 2022 Interventoría:

Avance Físico Programado 92,03%

Avance Ejecutado físico 89,36%

Avance sedes de Barrancominas, Bolívar, Concordia, la primavera y Orocué:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte	Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 33 del 27 de septiembre al 03 de octubre del año 2023	Sin aval de interventoría
	Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables			Sedes				
N°	**Tomos**	**Capítulos (mínimo:**	**Barrancominas (Guainía)**	**Bolívar (Cauca)**	**Concordia (Magdalena)**	**La Primavera (Vichada)**	**Orocué (Casanare).**
1	**Aspectos generales**	Información general del contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
2	**Informe base preliminar**		Mediante oficio BRV-INT-CSJ-242-2023 enviado el 06 de julio de 2023 dio aval interventoría, mediante oficio No. DEAJUIFO23-271 enviado el 14 de julio de 2023 la entidad acepto el aval.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-234-2023 enviado el 06 de julio de 2023 dio aval la interventoría, mediante oficio No. DEAJUIFO23-263 enviado el 07 de julio de 2023 la enitdad acepto el aval.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-239-2023 enviado el 11 de julio de 2023 dio aval la interventoría, mediante oficio No. DEAJUIFO23-272 enviado el 14 de julio de 2023 la entidad acepto el aval.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-243-2023 enviado el 06 de julio de 2023 dio aval la interventoría, mediante oficio No. DEAJUIFO23-273 enviado el 14 de julio de 2023 la entidad acepto el aval.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-240-2023 enviado el 11 de julio de 2023 dio aval la interventoría, mediante oficio No. DEAJUIFO23-274 enviado el 14 de julio de 2023 la entidad acepto el aval.
3	**Geofísica y suelos**	Constantes elásticas	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-323-2023 del 21/09/2023 se enviaron observaciones al informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas (Guainía) - Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-308-2023 del 18/09/2023 se enviaron observaciones al informe de Geofísica y Suelos Sede Bolívar (Cauca) - Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-309-2023 del 18/09/2023 se enviaron observaciones al informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia (Magdalena) - Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-322-2023 del 20/09/2023 se enviaron observaciones al informe de Geofísica y Suelos Sede La Primavera (Vichada) - Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-310-2023 del 18/09/2023 se enviaron observaciones al informe de Geofísica y Suelos Sede Orocué (Casanare) - Versión 1.
4	**Topografía**	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-300-2023 enviado el 05 de septiembre de 2023 se enviaron observaciones al Informe de levantamiento topográfico enviado por el consultor mediante oficio CEGG-CON-147-52-299-2023 del 26 de agosto de 2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-257-2023 enviado el 09 de agosto de 2023 se enviaron observaciones al Informe de levantamiento topográfico enviado por el consultor mediante oficio CEGG-CON-147-52-241-2023 del 03 de julio de 2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-258-2023 enviado el 09 de agosto de 2023 se enviaron observaciones al Informe de levantamiento topográfico enviado por el consultor mediante oficio CEGG-CON-147-52-244-2023 del 04 de julio de 2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-260-2023 enviado el 11 de agosto de 2023 se enviaron observaciones al Informe de levantamiento topográfico enviado por el consultor mediante oficio CEGG-CON-147-52-263-2023 del 01 de agosto de 2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-259-2023 enviado el 09 de agosto de 2023 se enviaron observaciones al Informe de levantamiento topográfico enviado por el consultor mediante oficio CEGG-CON-147-52-245-2023 del 05 de julio de 2023.
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-332-2023 del 03/10/2023 se dio el Aval del Informe de Topografía en su Versión No. 1.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-330-2023 del 03/10/2023 se dio el Aval del Informe de Topografía en su Versión No. 1.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-331-2023 del 03/10/2023 se dio el Aval del Informe de Topografía en su Versión No. 1.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-328-2023 del 03/10/2023 se dio el Aval del Informe de Topografía en su Versión No. 1.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-329-2023 del 03/10/2023 se dio el Aval del Informe de Topografía en su Versión No. 1.
5	**Arquitectónico**	Memoria Técnica arquitectónica	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).
		Diseño arquitectónico	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.
		Diseño Mobiliario	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-226-2023 se envío a la entidad la Aprobación Esquema Básico Arquitectónico y Memoria para la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía) Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-231-2023 se envío a la entidad la Aprobación Esquema Básico Arquitectónico y Memoria para la Sede Judicial de Bolívar (Cauca) Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-224-2023 se envío a la entidad la Aprobación Esquema Básico Arquitectónico y Memoria para la Sede Judicial de Concordia (Magdalena) Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-225-2023 se envío a la entidad la Aprobación Esquema Básico Arquitectónico y Memoria para la Sede Judicial de la Primavera (Vichada) Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-223-2023 se envío a la entidad la Aprobación Esquema Básico Arquitectónico y Memoria para la Sede Judicial de Orocué (Casanare) Versión 1.
		Señalización	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-286-2023 del 23/08/2023 se envío a la consultoría las observaciones al levantamiento arquitectonico entregado bajo radicado No. CEGG-CON-147-52-286-2023 del 19/08/2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-275-2023 del 23/08/2023 se envío a la consultoría las observaciones al levantamiento arquitectonico entregado bajo radicado No. CEGG-CON-147-52-285-2023 del 18/08/2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-273-2023 del 18/08/2023 se envío a la consultoría las observaciones al levantamiento arquitectonico entregado bajo radicado No. CEGG-CON-147-52-275-2023 del 08/08/2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-277-2023 del 23/08/2023 se envío a la consultoría las observaciones al levantamiento arquitectonico entregado bajo radicado No. CEGG-CON-147-52-287-2023 del 22/08/2023.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-274-2023 del 22/08/2023 se envío a la consultoría las observaciones al levantamiento arquitectonico entregado bajo radicado No. CEGG-CON-147-52-277-2023 del 10/08/2023.
		Paisajismo	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-323-2023 del 21/09/2023 se envío Aval del Anteproyecto Arquitectónico V1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-312-2023 del 21/09/2023 se envío Aval del Anteproyecto Arquitectónico V1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-314-2023 del 21/09/2023 se envío Aval del Anteproyecto Arquitectónico V1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-313-2023 del 21/09/2023 se envío Aval del Anteproyecto Arquitectónico V1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-311-2023 del 21/09/2023 se envío Aval del Anteproyecto Arquitectónico V1.

13	**Transporte vertical**	Memoria técnica	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-334-2023 del 03/10/2023 se dio el aval del Informe de Transporte Vertical Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-304-2023 del 18/09/2023 se dio el aval del Informe de Transporte Vertical Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-305-2023 del 18/09/2023 se dio el aval del Informe de Transporte Vertical Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-335-2023 del 18/09/2023 se dio el aval del Informe de Transporte Vertical Versión 1.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-333-2023 del 18/09/2023 se dio el aval del Informe de Transporte Vertical Versión 1.
20	**Información catastral**	Diagnóstico Catastral	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-306-2023 del 18/09/2023 se envío a la consultoría las observaciones al InformeCatastral Sede Barrancominas (Guianía) - Versión 0.		Mediante oficio BRV-INT-CSJ-293-2023 del 31/08/2023 se envío a la consultoría las observaciones al InformeCatastral Sede Concordia (Magdalena) - Versión 0.		

Avance sede de Zipaquirá Cundinamarca:

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 4
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte	Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 33 del 27 de septiembre al 03 de octubre del año 2023	Sin aval de interventoría
	Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables			**Sedes**	
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**
1	**ASPECTOS GENERALES**	**Información general del contrato**	1.- Nº contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
			2.- Objeto	
			3.- Valor	
			4.- Duración	
			5.- Interventoría	
			6.- Supervisor	
			7.- Pólizas.	
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-047-2022 para que sea revisado y aporbado por el Consejo Superior de la Judicatura.
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-787 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-088-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Zipaquirá (Cundinamarca) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Mediante oficio DEAJUIFO22-967 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Zipaquirá.
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-336-2023 del 03 de octubre de 2023 se dio Aval del Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá (Cundinamarca) Versión 2.
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	
			7.- Conclusiones	

3	GEOFÍSICA Y SUELOS	**Constantes elástic**	Ensayos y resultados	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-178-2023 del 26 de abril de 2023 se dio Aprobación de la justificación, alcance, costo y programación de Estudio de Suelos, Geotecnia y Geofísica recomendado para estudio de Vulnerabilidad – Sede Judicial Zipaquirá.
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	
			3.- Espectro elástico de diseño	
		Geotécnica	Estudio de suelos	
			1.- Introducción	
			2.- Generalidades	
			3.- Trabajos de investigación	
			4.- Estratigrafía	
			5.- Propiedades del suelo	
			6.- Capacidad portante	
			7.- Estabilidad de taludes	
			8.- Conclusiones y recomendaciones	
			a.- Suelos	
			b.- Sistema de fundación	
			c.- Sistema estructural	
			d.- Muros de contención	
			e.- Excavaciones	
			f.- Pisos y pavimentos	

		Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	1 - Informe General	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-267-2023 se enviaron observaciones al Informe de levantamiento topográfico a la consultoría.
			a - Introducción.	
			b - Objeto.	
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	
			d - Personal.	
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	
			f - Posproceso de la información topográfica.	
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	
			i - Nivelación geométrica.	
			j - Levantamiento topográfico.	
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	
			l - Plano topográfico.	
			m - Especificaciones equipos topográficos.	
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	
			o - Certificaciones profesionales.	
			p - Profesional responsable.	
			q - Carta de responsabilidad.	
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	
			3 - Cálculos, coordenadas.	

5	ESTRUCTURAL	**Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación**	1.- Descripción general	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-177-2023 del 26 de abril de 2023 se dio aprobación de recomendaciones para el complemento del Estudio de Patología entregado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para estudio de Vulnerabilidad – Sede Judicial Zipaquirá.
			2.- Cargas de diseño	
			3.- Combinación de cargas	
			4.- Análisis estructural	
			5.- Diseño estructural	
			6.- Especificación de materiales	
			7.- Modelo estructural.	

HIDROSANITARIO	**Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas**	1.- Generalidades	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-179-2023 del 26 de abril de 2023 se dio Aprobación de pruebas complementarias recomendadas a Redes Hidrosanitarias, Red de Subdrenaje y Sistema Contraincendios – Sede Judicial Zipaquirá.
		a.- Localización	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-181-2023 del 26 de abril de 2023 se dio Aprobación de realizar la desinfección biológica y química de zonas húmedas para posteriormente desarrollar las pruebas recomendadas en el sistema hidrosanitario – Sede Judicial Zipaquirá.
		b.- Bases técnicas	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-194-2023 del 12 de mayo de 2023 se dioAprobación del Informe de diagnóstico redes hidrosanitarias, red de subdrenaje y sistema contra incendio para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
		c.- Materiales de construcción	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-217-2023 del 21 de junio de 2023 se enviaron Observaciones al Informe de diagnóstico redes hidrosanitarias, red de subdrenaje y sistema contra incendio para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca)
		2.- Instalaciones pluviales	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-241-2023 del 14 de julio de 2023 se dio aval por parte de interventoríadel diseño hidráulico del sistema pluvial y sanitario para la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca Versión No. 1.
		a.- Alcantarillado pluvial	
		b.- Calculo de bajantes A.LL.	
		c.- Calculo de colectores A.LL.	
		d.- Sistema de drenaje de aguas lluvias	
		e.- Calculo del caudal	
		3.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	
		e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	
	Red y equipos de detección y extinción de incendios	1. Informe	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-324-2023 del 03 de octubre de 2023 se dio Aval Condicionado al informe de revisión y diagnóstico complementario para el sistema de suministro, sistema de agua residual, sistema pluvial, sistema subdrenajes y sistema contraincendios versión 1.
		a - Diagnóstico de redes instaladas	
		b - Diagnóstico de equipos instalados	
		c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	
		d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	
		e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	
	Red y equipos de ascensor	1. Informe	
		a - Diagnóstico de redes instaladas	
		b - Diagnóstico de equipos instalados	
		c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	
		d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	
		e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	
	Red y equipos de aire acondicionado	1. Informe	
		a - Diagnóstico de redes instaladas	
		b - Diagnóstico de equipos instalados	
		c.- Levantamiento en planos de la red y equipos de aire acondicionado	
		d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	
		e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	
		1. Informe	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-325-2023 del 03 de octubre de 2023 se dio Aval Condicionado del diagnóstico complementario al sistema eléctrico y sistemas anexos versión 1.

13	TRABAJOS EN ALTURA	Propuesta técnica para hacer trabajos en altura	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-307-2023 del 19/09/2023 se enviaron al consultor las Observaciones al informe de trabajos en altura de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión 0.
			2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	
14	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1. Informe	
			2. Tramites y permisos desplegados para la obtener la autorización del Plan de Manejo de Tráfico.	
			3. Radicación del PMT junto con la totalidad de los documentos necesarios.	
15	INFORMACIÓN CATASTRAL	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-266-2023 de 16/08/2023 se dio el aval de interventoría del Informe catastral para la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca Versión No. 0.
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	
			a - áreas.	
			b - Cabida y Linderos.	
			c - titularidad.	
			d - Personas que intervienen en el acto.	
			e - Titularidad de dominio	
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 3
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VULNERABILIDAD SISMICA

Periodo de corte	
Semana 33 del 27 de septiembre al 03 de octubre del año 2023	Por aprobar UIF (CSJ)
	Sin aprobar (consultor está haciendo ajustes)
	Aprobado por interventoría y UIF (CSJ)
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables		Sedes		
Nº	Tomos	Capítulos mínimos	Contenido mínimo	Zipaquirá (Cundinamarca)
		1. Relación total de documentos existentes que se utilizaron en la construcción de la estructura original y los cuales fueron utilizados como parte de la evaluación y diseño.	1. Informe de revisión del estudio geotécnico, perfil sísmico y especificaciones de la NSR-10.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-177-2023 del 26 de abril de 2023 se dio Aprobación de recomendaciones para el complemento del Estudio de Patología entregado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para estudio de Vulnerabilidad - Sede Judicial Zipaquirá.
			2. Informe de revisión del Estudio de suelos.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-131-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio Aprobación del informe de Metodología para el Estudio de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
		2. Evaluación del estado actual de la edificación.	3. Informe revisión geotecnia (Informe de revisión del estudio de suelos y análisis de la cimentación para la vulnerabilidad sísmica edificio consejo superior de la Judicatura Sede Zipaquirá.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-215-2023 del 21 de junio de 2023 se enviaron Observaciones al informe de Metodología para el Estudio de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
			4. Informe de revisión de los diseños presentados por CSJ frente a la NSR-10. incluye revisión de los títulos J y K de la misma.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-284-2023 del 24 de agosto de 2023 se enviaron Observaciones al informe complementario del estudio de patología.
		3. Descripción de la definición de los parámetros de evaluación y diseño que proviene del estudio de la situación actual.	5. Informe de revisión reforzamiento (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de muro perimetral, revisión de accesos peatonal, vehicular y plataforma de parqueaderos, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento).	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-285-2023 del 24 de agosto de 2023 se enviaron Observaciones al informe complementario del estudio de patología.
			6. Informe de revisión de diseños (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de diseño de la cimentación, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento)	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-298-2023 del 05 de septiembre de 2023 se enviaron ObservacionesInforme Patológico de Suelos y Geotecnia para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 0.
		4. Recomendaciones necesarias para la recuperación de los elementos deteriorados.	7. Informe de revisión del diseño de la cimentación presentada por CSJ.	
			8. Propuesta de solución de reforzamiento con especificaciones, APU, presupuesto y cotizaciones.	
			9. Propuesta de solución de reforzamiento estructural que incluya especificaciones de construcción, proceso constructivo, presupuesto detallado y análisis de precios unitarios de cada ítem con sus respectivas cotizaciones.	
		5. Memorias de cálculo del diseño de las modificaciones que se tengan que realizar con la correspondiente justificación (la estructura final tendrá la resistencia y comportamientos esperados cuando actúa en conjunto con la estructura preexistente.)	a. Propuesta de solución de reforzamiento sísmico de la estructura b. Especificaciones técnicas de reforzamiento edificio Zipaquirá	
			c. Presupuesto de vulnerabilidad y reforzamiento de Zipaquirá - judicatura. (Presupuesto, Cantidades y APUs)	
		6. Planos necesarios para el desarrollo de la actualización o reforzamiento para la construcción de nuevos elementos.	d. Fase de estudios complementarios: especificaciones de construcción e. Cotizaciones de vulnerabilidad y reforzamiento Zipaquirá - judicatura	
	Análisis de vulnerabilidad Sísmica	7. Memorias de cálculo de la evaluación de vulnerabilidad con resultados de sobre esfuerzos, flexibilidad y memorias de diseño del reforzamiento seleccionado de las alternativas presentadas, indicando el grado de capacidad de disipación de energía, verificación de derivas Planos estructurales constructivos de la intervención, plantas detalles, cortes,	10. Informe de revisión de la coherencia de los planos arquitectónicos, con los planos estructurales de reforzamiento, verificaciones de ejes e impacto del reforzamiento en la distribución de espacios.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-244-2023 del 14 de julio de 2023 se dio aval por parte de la interventoría del diagnóstico arquitectónico Fase I y II para la Sede Judicial de Zipaquirá Cundinamarca Versión No. 1.
		8. Planos Estructurales con los despieces de elementos estructurales y no estructurales, y todas las especificaciones técnicas que se necesiten para estructurales, y todas las especificaciones técnicas que se necesiten para este proyecto, debidamente firmados por un ingeniero civil especializado en estructuras; los planos serán digitalizados en AutoCAD.	a. Informe de revisión del diseño del sistema contra incendio. b. Informe de revisión redes de protección contra incendio. c. Memorias diseño actualizado red contra incendio.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-319-2023 del 18 de septiembre de 2023 se enviaron Observaciones al estudio de vulnerabilidad y alternativas de reforzamiento estructural para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) - Versión 1.
		9. Memorias de actividades de obra para el reforzamiento estructural, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de dichas actividades.	11. Informe de resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	

Página 1

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

En cuanto al contrato de consultoría el avance financiero en la semana número 33 de trabajo se ha mostrado de la siguiente manera:

Tabla No. 4 Avance financiero programado vs ejecutado

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO							
SEMANA No 33							
PERIODO DE 27 SEPTIEMBRE A 03 OCTUBRE 2023							
GENERALIDADES			FINANCIERO				
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	PROGRAMADO POR SEDE		EJECUTADO POR SEDE		AVANCE Y/O ATRASO
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 35.302.800,00	90,52%	$ 34.479.900,00	88,41%	-2,11%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 35.302.800,00	90,52%	$ 34.479.900,00	88,41%	-2,11%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 35.302.800,00	90,52%	$ 34.479.900,00	88,41%	-2,11%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	$ 101.156.100,00	90,52%	$ 98.798.175,00	88,41%	-2,11%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	$ 118.128.600,00	90,52%	$ 115.375.050,00	88,41%	-2,11%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	$ 183.302.468,52	91,93%	$ 169.484.497,16	85,00%	-6,93%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	$ 49.407.082,45	100,00%	$ 49.407.082,45	100,00%	0,00%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	$ 165.205.572,94	92,96%	$ 165.685.408,40	93,23%	0,27%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	**100,00%**	**$ 723.108.223,91**	**92,03%**	**$ 702.189.913,01**	**89,36%**	**-2,66%**

% de avance financiero semanal programado: 2,17%

% de avance financiero semanal ejecutado: 0,66%

% de avance financiero programado acumulado: 92,03%

% de avance financiero ejecutado acumulado: 89,36%

Se aclara que los porcentajes de avance ejecutado en la **tabla No. 4** no es en su totalidad de dinero que se ha cobrado o ha sido suministrado el Consejo Superior de la Judicatura, parte de este porcentaje se adquiere debido al dinero que ha invertido el consultor en este caso el consorcio JMS-C de sus propias arcas. Por lo cual, el avance financiero ejecutado acumulado en el contrato es del 50%, que corresponde al valor del anticipo.

El avance financiero de la **interventoría** no se calcula debido a que la empresa en este caso BRV Ingeniería y planeación SAS rechazo el anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos. Como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad:



BRV SAS INGENIERÍA Y PLANEACIÓN NIT 900.654.302-3

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS
GEOTECNIA – TRANSITO Y TRANSPORTE

BRV – 016 – 2022

Bogotá D. C., 27 de Julio de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección ejecutiva de administración judicial
Ciudad.

Asunto: **Rechazo al anticipo estipulado en la invitación pública del proceso IP-013-2022.**

Referencia: **Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barranco minas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**

Cordial saludo,

De acuerdo con el mensaje recibido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II el día 26 de julio de 2022, con objeto "ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL ANTICIPO", Yo Gabriel Andrés Velandia García, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. con NIT. 900.654.302-3, por medio de la presente **RECHAZO** el anticipo estipulado en la invitación pública del proceso en mención, para de este modo poder continuar con el trámite de inicio de dicho proceso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de la entidad.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Gabriel Andrés Velandia García
C.C. 80.074.228 de Bogotá D.C.
Representante legal BRV Ingeniería y Planeación SAS.

Ingenieros
Consultores – Estudios Geotécnicos y Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte
Carrera 7ª No. 156 – 52, Oficina 405 en Bogotá D. C. – Colombia / *Tele fax:* 672 28 28,
Cel: 301 245 44 55 / 310 789 27 53 *E-mail:* brvingenieria@gmail.com, contacto@brvingenieria.com

De igual manera se aclara que el pago de la interventoría se efectuara mediante LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL de cada proyecto, se solicitó la adición del contrato 131 de 2022 por el tiempo a extender el mismo (4 meses), adicional a los cinco (5) meses estipulados para ejecutar dicho contrato en un inicio, después se sumaron los valores de todas las sedes descontando la sede de Neiva Huila debido al retiro de dicha sede del proyecto, por ende se organizaron y pactaron los pagos de la siguiente manera:

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022			
Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Vr. Establecido contrato (7 sedes)	$ 11.960.000,00	5	$ 59.800.000,00
Vr. Ejecutado con 7 sedes	$ 11.960.000,00	3	$ 35.880.000,00
Vr. Ejecutado con 6 sedes	$ 10.251.429,00	2	$ 20.502.858,00
Saldo contrato a favor de la Entidad			$ 3.417.142,00

Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Adición requerida	$ 10.251.429,00	4	$ 41.005.716,00
Saldo condiciones iniciales contrato			$ 3.417.142,00
Valor adición del contrato			**$ 37.588.574,00**
Valor total del contrato			**$ 97.388.574,00**

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL (FACTURADO)

Dentro del presente informe no se reporta avance en gasto presupuestal, teniendo en cuenta que no se ha facturado a la fecha, debido a que se han generado gastos en el contrato No. 147 de 2022 pero que han sido asumidos por el **consultor**. De igual manera se aclara que ya se ha desembolsado el anticipo pactado por parte de la entidad el Consejo Superior de la Judicatura el día 23 de noviembre de 2022. Está pendiente por facturar el costo generado de la Sede Neiva, de acuerdo con las condiciones de modificatorio contractual.

En cuanto al contrato de **interventoría** no se reporta avances en gasto presupuestal ya que se han generado gastos, pero son asumidos por la interventoría debido a que se rechazó el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Los recursos provenientes del pago del anticipo se invertirán conforme al documento del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-125-2022 del 7 de diciembre y CEGG-CON-147-52-126-2022 del 8 de diciembre de 2022 se remite a la interventoría la solicitud de retiro No 1 y retiro No 2. El cual fue aprobado mediante comunicado BRV-INT-CSJ-132-2022.

Mediante comunicado enviado por la consultoría No. CEGG-CON-147-52-214-2023 del 8 de junio de 2023 se remitió a esta interventoría la solicitud de Retiro No 3 la cual el 15 de junio de 2023, mediante comunicado BRV-INT-CSJ-210-2023 está interventoría da la aprobación correspondiente.

Retiro No 1	$34.072.714.00
Retiro No 2	$52.424.038.00
Retiro No 3	$268.648.394.00
Total	$355.145.146.00

La interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS renuncio al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos, como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad.

Tabla No.5 Plan de inversión del anticipo consultoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICPO							
VALOR CONTRATO		$ 1.204.764.898,00					
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 602.382.449,00					
ÍTEM	CONCEPTO DE VALOR			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALOR 1. COSTO DIRECTO						
1,1	SALARIOS PERSONAL PROFESIONALES			$ 49.500.000,00	$ 53.500.000,00	$ 54.500.000,00	$ 56.500.000,00
1,2	SALARIOS PERSONAL ADMINSITRATIVO (Adminsitrador, secretaria, contador)			$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00
1,3	IMPUESTOS -POLIZAS			$ 7.013.178,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,4	GASTOS DE OFICINA (ARRIENDO/SERVICIOS)			$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA			$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD/DOTACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,7	ELABORACIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, IMPRESIONES/COMPRA DE INFORMACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,8	TRASLADOS/TRANSPORTE			$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 1.039.534,00
	TOTAL VALOR 1. COSTO DIRECTOS/MES			$ 78.190.625,00	$ 78.177.447,00	$ 78.177.447,00	$ 78.216.981,00
	TOTAL GASTOA DIRECTOS ACUMULADOS			$ 78.190.625,00	$ 156.368.072,00	$ 234.545.519,00	**$ 312.762.500,00**
2	VALOR 2. COSTOS POR PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES						
	PROVISIÓN/MES			$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.990,00
	PROVISIÓN ACUMULADO			$ 4.562.988,00	$ 9.125.976,00	$ 13.688.964,00	**$ 18.251.954,00**
	SUB TOTAL . SUMA VALOR 1 + VALOR 2			$ 82.753.613,00	$ 82.740.435,00	$ 82.740.435,00	$ 82.779.971,00
	ACUMULADO SUB TOTAL (1+2)			$ 82.753.613,00	$ 165.494.048,00	$ 248.234.483,00	**$ 331.014.454,00**
3	VALOR 3. IVA (19% DE 1+2)						
	IVA/MES			$ 15.723.186,47	$ 15.720.682,65	$ 15.720.682,65	$ 15.728.194,49
	IVA ACUMULADO			$ 15.723.186,47	$ 31.443.869,12	$ 47.164.551,77	**$ 62.892.746,26**
	VALOR 4. PROVISIÓN PARA TRÁMITES, LICENCIAS, ETC						
4	"PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"			$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00
	ACUMULADO PROVISIÓN			$ 52.118.812,00	$ 104.237.624,00	$ 156.356.436,00	**$ 208.475.248,00**
							$ 602.382.448,26
NOTAS:							
1. Por ser integral el contrato de consultoría el rubro correspondiente a VALOR 2 "PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES", se estimó tentativo por mes, para ser utilizado según necesidades en cada una de las sedes. Este rubro tendrá una contabilidad de uso según requerimientos aprobados							
2, La distribución de este rubro "VALOR 3 "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD" , se distribuyó por sede tentativamente, ya que inicialmente se desconoce los requerimientos de pago para cada sede en particular. Los gastos de este rubro tendrá la contabilidad correspondiente							

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el contrato de **consultoría** se efectuó el desembolso del anticipo por parte de la entidad contratante el 23 de noviembre de 2022.

Los rendimientos financieros generados por el desembolso del anticipo se desglosan a continuación. El reporte aquí consignado es a corte de 31 de julio de 2023, extraído del extracto y de lo cual será consignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al finalizar el retiro total del anticipo:

Periodo	Interés del Periodo
1 noviembre a 30 de noviembre de 2022	$3.873.97
1 diciembre a 31 de diciembre de 2022	$16.718.94
1 de enero a 31 de enero de 2023	$14.470.51
1 de febrero a 28 de febrero de 2023	$13.070.53
1 de marzo a 31 de marzo de 2023	$14.471.34
1 de Abril a 30 de Abril de 2023	$14.004,99
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023	$14.472,23
1 de Junio a 30 de Junio de 2023	$ 9.976,06
1 de julio a 31 de Julio de 2023	$ 6.144,82
Total, a la fecha (Julio de 2023)	**$107.203.32**

En el contrato de **interventoría** no hay excedentes o rendimientos financieros debido a que la interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

En el contrato de **consultoría** se presenta a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad y actualmente se encuentra adscrito a la empresa JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC. como parte del Consorcio JMS-C, y así se mantendrá a lo largo de la ejecución del contrato.

Personal en condición de discapacidad del consultor:

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco.	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

En el contrato de **interventoría** de acuerdo con el decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad" la interventoría declara que en su personal de trabajo no se encuentran personas en condición de discapacidad y cumple con la norma antes mencionada debido al bajo número total de trabajadores de la planta de personal del proponente.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Hasta la fecha de elaboración del presente informe semanal no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago tanto en el contrato de **consultoría** e **interventoría.**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 33:

- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-324-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval Condicionado al informe de revisión y diagnóstico complementario para el sistema de suministro, sistema de agua residual, sistema pluvial, sistema subdrenajes y sistema contraincendios para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 0.
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-325-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval Condicionado del diagnóstico complementario al sistema eléctrico y sistemas anexos para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 0.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-338-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Topografía Sede La Primavera (Vichada) Versión No. 1.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-329-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Topografía Sede Orocué (Casanare) Versión No. 1.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-330-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Topografía Sede Bolívar (Cauca) Versión No. 1.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-331-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Topografía Sede Concordia (Magdalena) Versión No. 1.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-332-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Topografía Sede Barrancominas (Guainía) Versión No. 1.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-333-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Transporte Vertical Sede Orocué (Casanare) Versión 0.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-334-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Transporte Vertical Sede Barrancominas (Guainía) Versión 0.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-335-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe de Transporte Vertical Sede La Primavera (Vichada) Versión 0.

- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-336-2023 del 03 de octubre de 2023 el Aval del Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá (Cundinamarca) Versión 2.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-337-2023 del 29 de septiembre de 2023 la Solicitud de firmas para Formularios Únicos Nacionales FUN para trámite de licencias de construcción.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-338-2023 del 02 de octubre de 2023 la Solicitud de concepto por la interventoría para la conexión eléctrica definitiva para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
- Se continua con la revisión y envió de observaciones o avales de los diferentes informes del contrato entregados por la consultoría.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

- Demoras en respuestas por parte de las entidades involucradas en el proceso, para la obtención de permisos, licencias, factibilidad de servicios.

- Riesgo por demora en envió de aval u observaciones por parte de la interventoría a los diferentes informes presentados por la consultoría, que generan atrasos.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La **consultoría** manifiesta el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales, estos serán presentados durante la ejecución del contrato en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA” el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.

PROGRAMA 1. COMPRAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LOS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA 2. CONTROL AL CONSUMO DE PAPEL
PROGRAMA 3. GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
PROGRAMA 4. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA 5. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 7. CAPACITACIÓN PERMANENTE

El PGAS para cada sede se hará entrega de éste de acuerdo en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría siguiendo las etapas conforme se presenta en el cronograma aprobado por la interventoría.

La **interventoría** acoge dicho componente ambiental que será implementado al contrato No. 131 de 2022.

7.1 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cronograma estipulado por la consultoría en el plan de gestión de sistema de seguridad y salud en el trabajo, las reuniones de sana convivencia en el ambiente y discriminación laboral; para la fecha final del presente informe ya se realizaron con el equipo de trabajo, como se muestra:

Tabla No.6 Cronograma de actividades del PSST

Fecha	Tema
Septiembre 30 de 2022	Sana Convivencia en el Ambiente Laboral. Buenas Prácticas Laborales
Noviembre 25 de 2022	Discriminación Laboral

La **interventoría** acogió dicho calendario para realizar y compartir con su equipo de trabajo las respectivas reuniones que ya fueron realizadas en las fechas estipuladas.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- La interventoría, cuenta con los protocolos y controles internos en la metodología de trabajo para el óptimo desarrollo de las actividades técnicas.
- El contrato está presentando un atraso porque la interventoría está tardando en las revisiones de los diferentes productos entregados por la consultoría, esta interventoría está intentando nivelar dicho atraso agilizando las revisiones y enviándolas a quien corresponda.
- La consultoría e interventoría en los diferentes documentos generados genera los mecanismos de control de calidad requeridos por la entidad.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SEGUIMIENTO SECOP II)

Los documentos mostrados a continuación son los cargados por parte de la interventoría en la plataforma del SECOP II:

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Comprador
	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Proveedor
	Plan de inversión General.pdf	Plan de inversión General.pdf	Proveedor
	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Proveedor
	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	Proveedor
	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	Proveedor
	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	Proveedor
	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	Proveedor
	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	Proveedor
	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Proveedor
	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Proveedor
	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Proveedor
	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 1.pdf	Informe supervisor semana 1.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 2.pdf	Informe supervisor semana 2.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 3.pdf	Informe supervisor semana 3.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 4.pdf	Informe supervisor semana 4.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 5.pdf	Informe supervisor semana 5.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 6.pdf	Informe supervisor semana 6.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 7.pdf	Informe supervisor semana 7.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 8.pdf	Informe supervisor semana 8.pdf	Comprador
	Informe supervisor semana 9.pdf	Informe supervisor semana 9.pdf	Comprador
	Informe de supervision semana 10.pdf	Informe de supervision semana 10.pdf	Comprador
	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	Comprador
	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador
	1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	Comprador
	Informe supervisor mes 1.pdf	Informe supervisor mes 1.pdf	Comprador
	Informe supervisor mes 2.pdf	Informe supervisor mes 2.pdf	Comprador
	Acta Reinicio 1 Consultoría CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Consultoría CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor
	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor
	Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Comprador
	INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Proveedor
	Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Proveedor
	Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Proveedor
	Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Proveedor
	14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Comprador
	RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
	RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
	RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
	R.P. 107823 U2.pdf	R.P. 107823 U2.pdf	Comprador
	BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	Proveedor
	INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Proveedor
	ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR.pdf	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR ANEXO 1. CRONOGRAMAS.pdf	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR ANEXO 1. CRONOGRAMAS.pdf	Comprador

☐	INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	17. INF. SEM. 17 SUPERVISOR.pdf	17. INF. SEM. 17 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 17 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 17 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 1 A LA 17.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 1 A LA 17.pdf	Proveedor
	19. INF. SEM. 19 SUPERVISOR.pdf	19. INF. SEM. 19 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	18. INF. SEM. 18 SUPERVISOR.pdf	18. INF. SEM. 18 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	20. INF. SEM. 20 SUPERVISOR.pdf	20. INF. SEM. 20 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	ACTAS DE COMITE SEMANAS 18 Y 19.pdf	ACTAS DE COMITE SEMANAS 18 Y 19.pdf	Proveedor
	21. INF. SEM. 21 SUPERVISOR.pdf	21. INF. SEM. 21 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 21 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 21 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	22. INF. SEM. 22 SUPERVISOR.pdf	22. INF. SEM. 22 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 22 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 22 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	23. INF. SEM. 23 SUPERVISOR.pdf	23. INF. SEM. 23 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 20 A LA 23.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 20 A LA 23.pdf	Proveedor
☐	BRV-016-2022 Rechazo anticipo.pdf	BRV-016-2022 Rechazo anticipo.pdf	Proveedor
	24. INF. SEM. 24 SUPERVISOR.pdf	24. INF. SEM. 24 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	25. INF. SEM. 25 SUPERVISOR.pdf	25. INF. SEM. 25 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	26. INF. SEM. 26 SUPERVISOR.pdf	26. INF. SEM. 26 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 27 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 27 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	Informe Mensual No 6 de Supervision.rar	Informe Mensual No 6 de Supervision.rar	Comprador
☐	INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	27. INF. SEM. 27 SUPERVISOR.pdf	27. INF. SEM. 27 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	28. INF. SEM. 28 SUPERVISOR.pdf	28. INF. SEM. 28 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 24 A LA 26.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 24 A LA 26.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 28 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 28 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	29. INF. SEM. 29 SUPERVISOR.pdf	29. INF. SEM. 29 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL 29 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 29 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	Informe Mensual No 7 de Supervision.rar	Informe Mensual No 7 de Supervision.rar	Comprador
☐	INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor

Hasta la fecha final del presente informe el contrato de interventoría y consultoría han cargado los correspondientes documentos en el sistema SECOP II encontrándose al día en el cargue de documentos.

10. OBSERVACIONES

- El contrato presenta un porcentaje de atraso de avance hasta la fecha final del presente informe.
- El comité correspondiente a la presente semana se realizará el día 03 de octubre de 2023.
- Se reiniciaron los contratos de interventoría y consultoría el día 31 de mayo de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 04 días, del mes de octubre de 2023.



Carol Fernanda González Atehortúa
Representante Legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Contratista

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
CEGG-CON-147-52-368	27/09/2023	Alcance a Comunicado CEGG-CON-147-52-347-2023 del 19 de septiembre de 2023 TOMO 20 Respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-293-2023 - Observaciones al Informe Catastral de la Sede Judicial de Concordia (Magdalena) y comunicado DEAJUIFO23-B18 del 20 de septiembre de 2023 Atención al comunicado CEGG-CON-147-52-305-2023. Observaciones a la entrega del Tomo 20. Información Catastral V0 Sede Concordia (Magdalena).	Interventoría
CEGG-CON-147-52-369	28/09/2023	Atención a comunicados BRV-INT-CSJ-306-2023- Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-322-2023- Observaciones al Informe Catastral de la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía) - Versión 0 del 19 de septiembre de 2023 y DEAJUIFO23-B19 del 20 de septiembre de 2023 Atención al comunicado CEGG-CON-147-52-322-2023. Observaciones a la entrega del Tomo 20. Catastral Sede Barrancominas (Guainía) V0.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-370	28/09/2023	entrega del Componente de Mobiliario Sede Orocué (Casanare) V0	Interventoría
CEGG-CON-147-52-371	28/09/2023	Remisión de Informe Semanal No 31 Contrato 147-2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-372	02/10/2023	Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-308-2023. GEOFÍSICA Y SUELOS. SEDE BOLÍVAR V1	Interventoría
CEGG-CON-147-52-373	02/10/2023	Respuesta a comunicado DEAJUIFO23-369 del 21 septiembre de 2023 y observaciones de interventoría	Interventoría

CEGG-CON-147-52-374	02/10/2023	Respuesta a comunicado DEAJUIFO23-368 del 21 septiembre de 2023 y observaciones de interventoría	Interventoría
CEGG-CON-147-52-375	03/10/2023	Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-310-2023. GEOFÍSICA Y SUELOS. SEDE OROCUÉ V1	Interventoría
CEGG-CON-147-52-376	03/10/2023	Remisión de TOMO 10. AMBIENTAL. SEDE CONCORDIA, MAGDALENA.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-377	03/10/2023	Remisión de TOMO 8. AMBIENTAL. SEDE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA. Documento AMB-147-001-V0-ZIPAQUIRÁ	Interventoría
CEGG-CON-147-52-378	03/10/2023	Respuesta BRV-INT-CSJ-322-2023 Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-342-2023 - Observaciones al Informe de Geofísica y Suelos para la Sede Judicial de La Primavera (Vichada)	Interventoría
CEGG-CON-147-52-379	03/10/2023	Remisión de TOMO 10. AMBIENTAL. SEDE BOLÍVAR, CAUCA V0, Documento AMB-147-001-V0-BOLÍVAR	Interventoría
DEAJUIFO23-437	03/10/2023	Atención a comunicados CEGG-CON-147-52-359-2023 y BRV-INT-CSJ-338-2023. Alcance de actividades contractuales del contrato 147 de 2022 respecto a la conexión definitiva de la red eléctrica para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca). Contrato de Consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.	Interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-324-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-306-2023. Aval	Consultoría

		Condicionado al informe de revisión y diagnóstico complementario para el sistema de suministro, sistema de agua residual, sistema pluvial, sistema subdrenajes y sistema contraincendios para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 0.	
BRV-INT-CSJ-325-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-312-2023. Aval Condicionado del diagnóstico complementario al sistema eléctrico y sistemas anexos para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) Versión No. 0.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-328-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-300-2023. Aval del	Consejo Superior de la Judicatura UIF


		Informe de Topografía Sede La Primavera (Vichada) Versión No. 1.	
BRV-INT-CSJ-329-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-319-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Orocué (Casanare) Versión No. 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-330-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-320-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Bolívar (Cauca) Versión No. 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-331-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-321-2023. Aval del Informe de Topografía Sede Concordia (Magdalena) Versión No. 1.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-332-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-343-2023. Aval del Informe de Topografía Sede	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Barrancominas (Guainía) Versión No. 1.	
BRV-INT-CSJ-333-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-348-2023. Aval del Informe de Transporte Vertical Sede Orocué (Casanare) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-334-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-351-2023. Aval del Informe de Transporte Vertical Sede Barrancominas (Guainía) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-335-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-352-2023. Aval del Informe de Transporte Vertical Sede La Primavera (Vichada) Versión 0.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-336-2023	03/10/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-334-2023. Aval del Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		(Cundinamarca) Versión 2.	
BRV-INT-CSJ-337-2023	29/09/2023	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-362-2023 – Solicitud de firmas para Formularios Únicos Nacionales FUN para trámite de licencias de construcción.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-338-2023	02/10/2023	Alcance a los oficios DEAJUIFO23-320, DEAJUIFO23-337, DEAJUIFO23-340, DEAJUIFO23-351 y CEGG-CON-147-52-359-2023 – Solicitud de concepto por la interventoría para la conexión eléctrica definitiva para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consejo Superior de la Judicatura UIF

ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES SEDES APROBADO POR LA INTERVENTORÍA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE BARRANCOMINAS GUAINÍA**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**mié 15/02/23**
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**vie 3/03/23**	**mar 30/05/23**
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 7/06/23	mié 7/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	lun 17/07/23
16		Diseño Arquitectónico	lun 17/07/23	mié 16/08/23
17		Mobiliario	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Señalización	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		Paisajismo	mar 1/08/23	mié 16/08/23
20		**ESTRUCTURAL**	dom 16/07/23	mié 30/08/23
21		**HIDROSANITARIO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
22		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
23		**AIRE ACONDICIONADO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
24		**AMBIENTAL**	vie 15/09/23	lun 30/10/23
25		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
26		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mar 15/08/23	vie 15/09/23
27		**TRANSPORTE VERTICAL**	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
28		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	mar 1/08/23	lun 16/10/23
29		**PRESUPUESTO**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
31		**LICENCIAS Y PERMISOS**	vie 1/09/23	lun 16/10/23
32		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOB**	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
33		**INFORMACION CATASTRAL**	vie 1/09/23	lun 30/10/23
34		**BIM**	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
35		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23

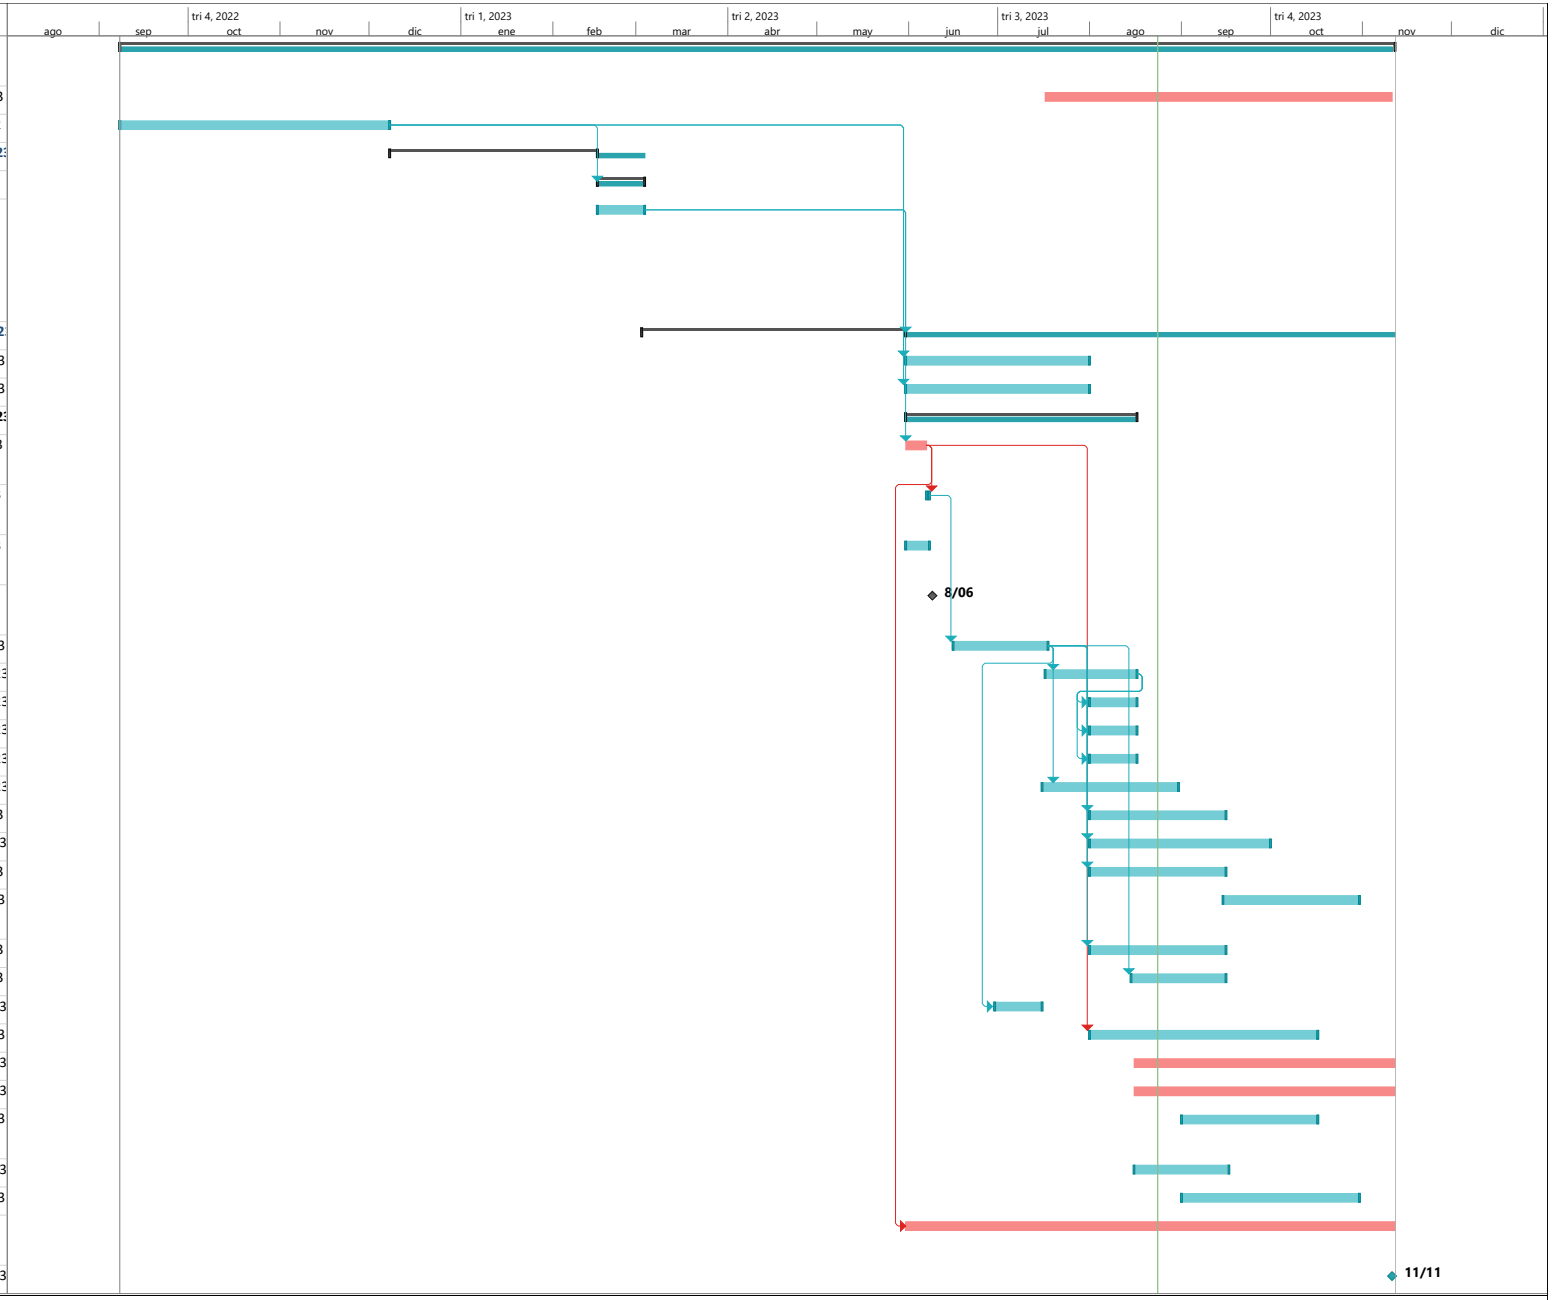

Proyecto: Sede Barrancominas Guainía
Fecha: 31-05-2023

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE BOLÍVAR CAUCA**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**mié 15/02/23**
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**vie 3/03/23**	**mar 30/05/23**
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 7/06/23	mié 7/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	lun 17/07/23
16		Diseño Arquitectónico	lun 17/07/23	mié 16/08/23
17		Mobiliario	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Señalización	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		Paisajismo	mar 1/08/23	mié 16/08/23
20		**ESTRUCTURAL**	dom 16/07/23	mié 30/08/23
21		**HIDROSANITARIO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
22		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
23		**AIRE ACONDICIONADO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
24		**AMBIENTAL**	vie 15/09/23	lun 30/10/23
25		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
26		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mar 15/08/23	vie 15/09/23
27		**TRANSPORTE VERTICAL**	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
28		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	mar 1/08/23	lun 16/10/23
29		**PRESUPUESTO**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
31		**LICENCIAS Y PERMISOS**	vie 1/09/23	lun 16/10/23
32		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
33		**INFORMACION CATASTRAL**	vie 1/09/23	lun 30/10/23
34		**BIM**	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
35		**TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**sáb 11/11/23**	**sáb 11/11/23**

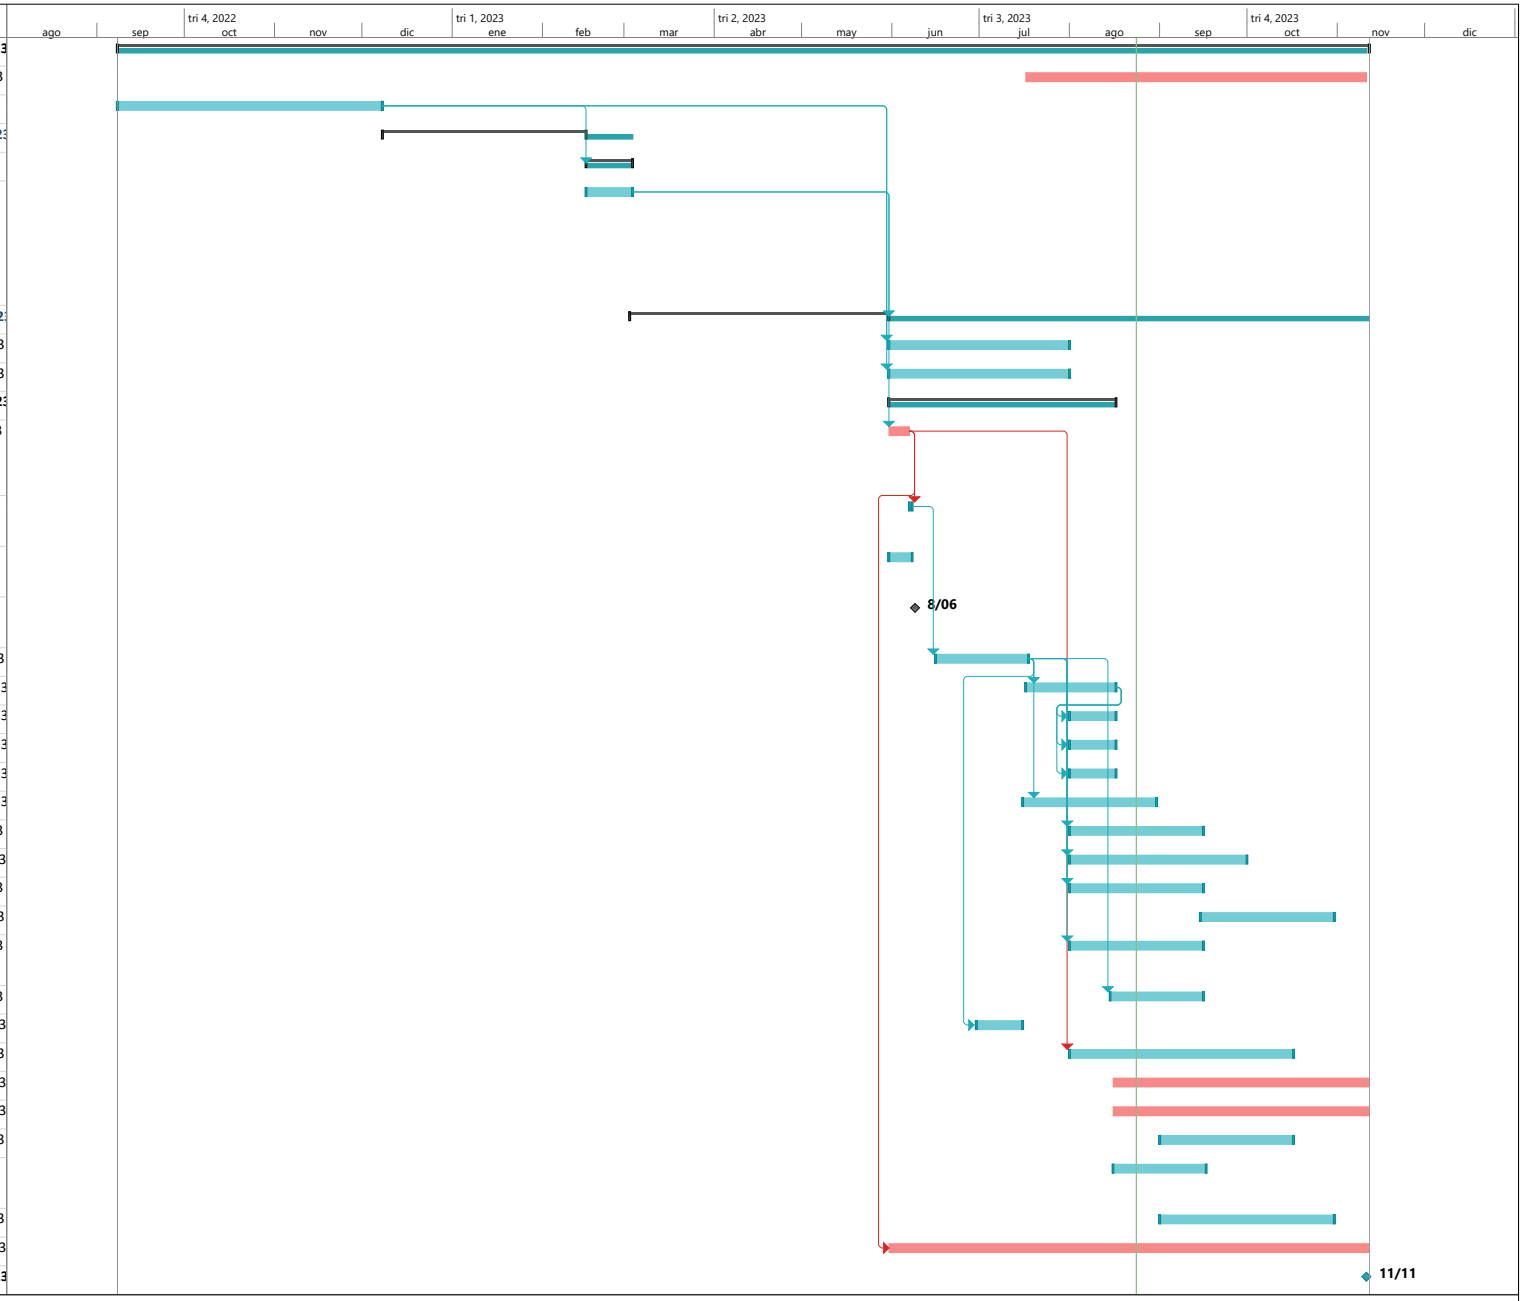

Proyecto: Sede Bolívar Cauca
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea		Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE CONCORDIA MAGDALENA**	**309 d**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	85 d	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	65 d	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**51 d**	**jue 8/12/22**	**mié 15/02/23**
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	**12 d**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	12 días	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 d**	**vie 3/03/23**	**mar 30/05/23**
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	44 d	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	44 d	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**56 d**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	5 días	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	1 día	mié 7/06/23	mié 7/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	22 días	vie 16/06/23	lun 17/07/23
16		Diseño Arquitectónico	23 d	lun 17/07/23	mié 16/08/23
17		Mobiliario	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Señalización	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		Paisajismo	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
20		**ESTRUCTURAL**	34 d	dom 16/07/23	mié 30/08/23
21		**HIDROSANITARIO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
22		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	45 d	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
23		**AIRE ACONDICIONADO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
24		**AMBIENTAL**	32 d	vie 15/09/23	lun 30/10/23
25		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	34 días	mar 1/08/23	vie 15/09/23
26		**SEGURIDAD Y CONTROL**	24 d	mar 15/08/23	vie 15/09/23
27		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 d	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
28		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	55 d	mar 1/08/23	lun 16/10/23
29		**PRESUPUESTO**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
31		**LICENCIAS Y PERMISOS**	32 d	vie 1/09/23	lun 16/10/23
32		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	24 días	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
33		**INFORMACION CATASTRAL**	42 d	vie 1/09/23	lun 30/10/23
34		**BIM**	119	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
35		**TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**0 días**	**sáb 11/11/23**	**sáb 11/11/23**

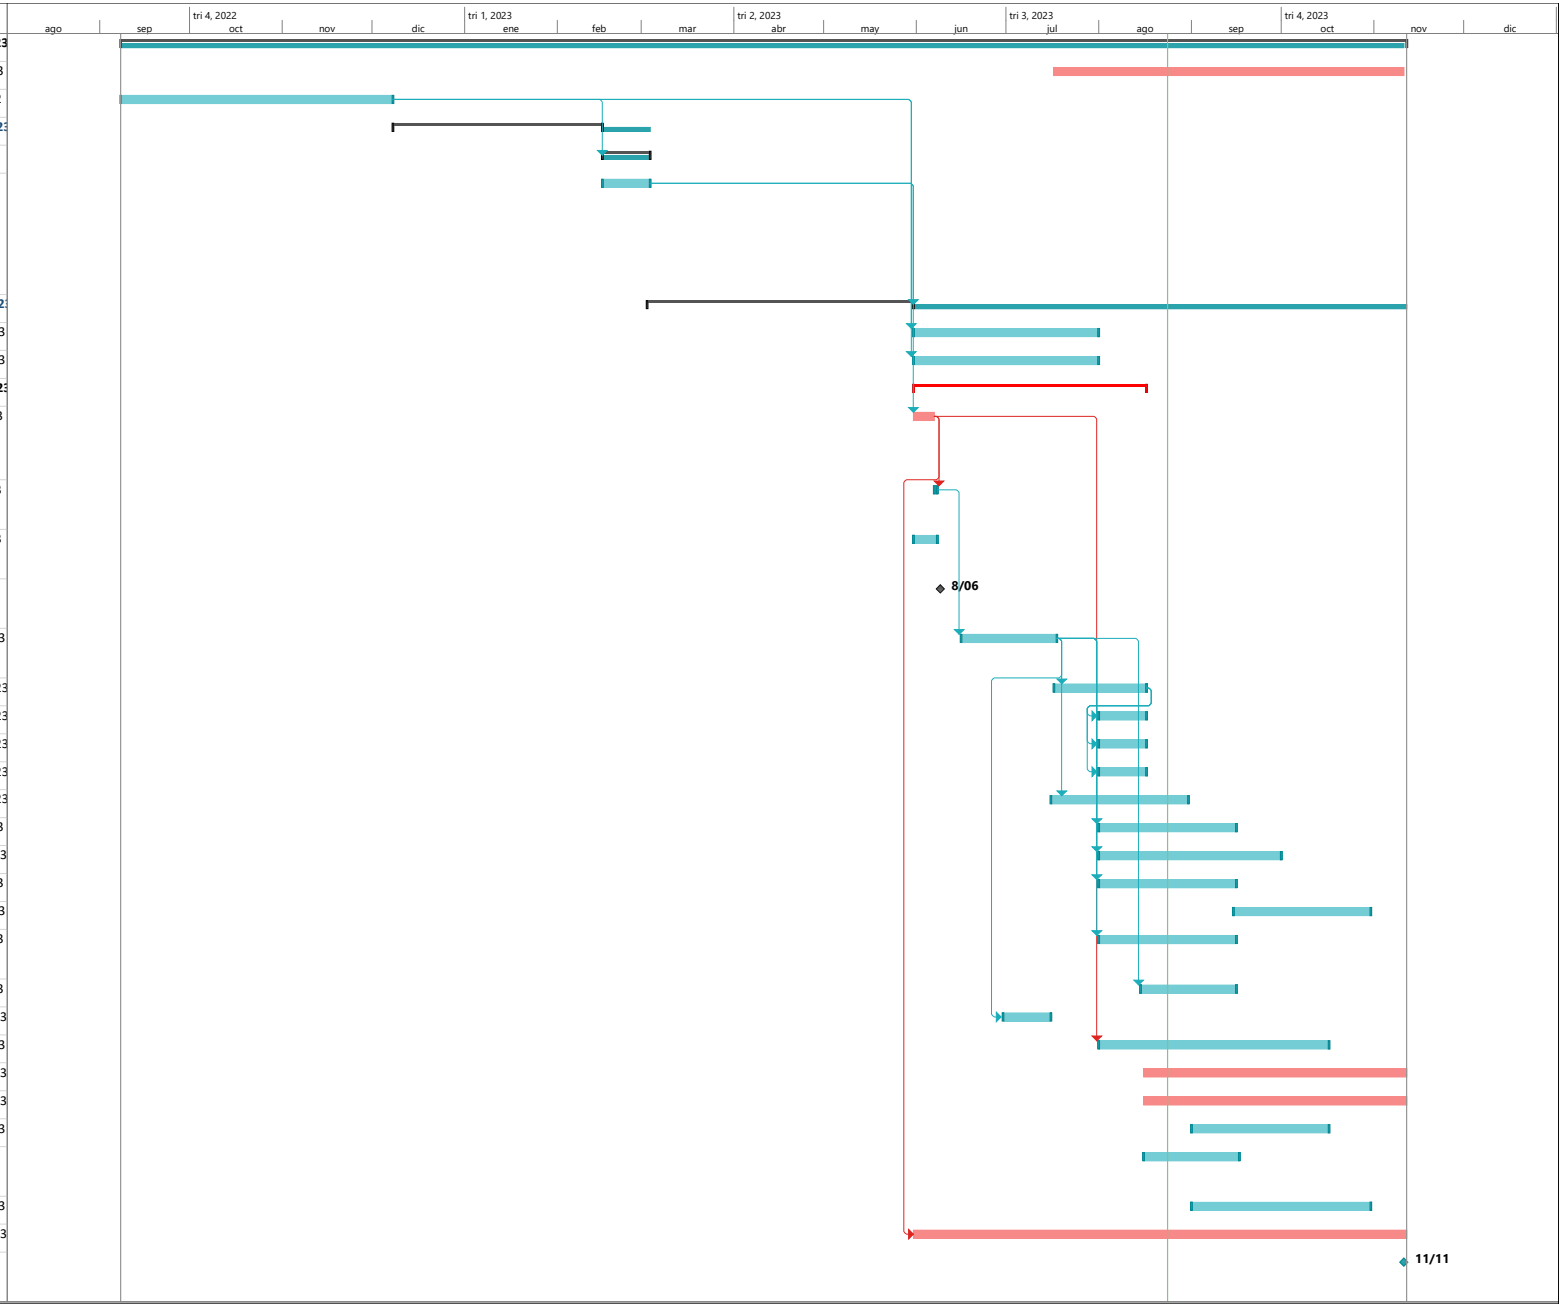

Proyecto: Sede Concordia Magdalena
Fecha: 31-03-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**SEDE LA PRIMAVERA VICHADA**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**	
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 17/07/23	vie 10/11/23	
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22	
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**mié 15/02/2**	
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23	**3**
6		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23	
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**vie 3/03/23**	**mar 30/05/2**	6
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23	3
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23	3
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/2**	**mié 16/08/2**	
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23	6
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 7/06/23	mié 7/06/23	11
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23	
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23	
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	lun 17/07/23	12
16		Diseño Arquitectónico	lun 17/07/23	mié 16/08/23	15
17		Mobiliario	mar 1/08/23	mié 16/08/23	16
18		Señalización	mar 1/08/23	mié 16/08/23	16
19		Paisajismo	mar 1/08/23	mié 16/08/23	16
20		**ESTRUCTURAL**	dom 16/07/2	mié 30/08/23	15
21		**HIDROSANITARIO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23	15
22		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	15
23		**AIRE ACONDICIONADO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23	15
24		**AMBIENTAL**	vie 15/09/23	lun 30/10/23	
25		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	mar 1/08/23	vie 15/09/23	15
26		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mar 15/08/2	vie 15/09/23	15
27		**TRANSPORTE VERTICAL**	vie 30/06/23	sáb 15/07/23	15
28		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	mar 1/08/23	lun 16/10/23	11
29		**PRESUPUESTO**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23	
30		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23	
31		**LICENCIAS Y PERMISOS**	vie 1/09/23	lun 16/10/23	
32		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	mié 16/08/23	sáb 16/09/23	
33		**INFORMACION CATASTRAL**	vie 1/09/23	lun 30/10/23	
34		**BIM**	mié 31/05/23	sáb 11/11/23	11
35		**TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**sáb 11/11/23**	**sáb 11/11/23**	
36					

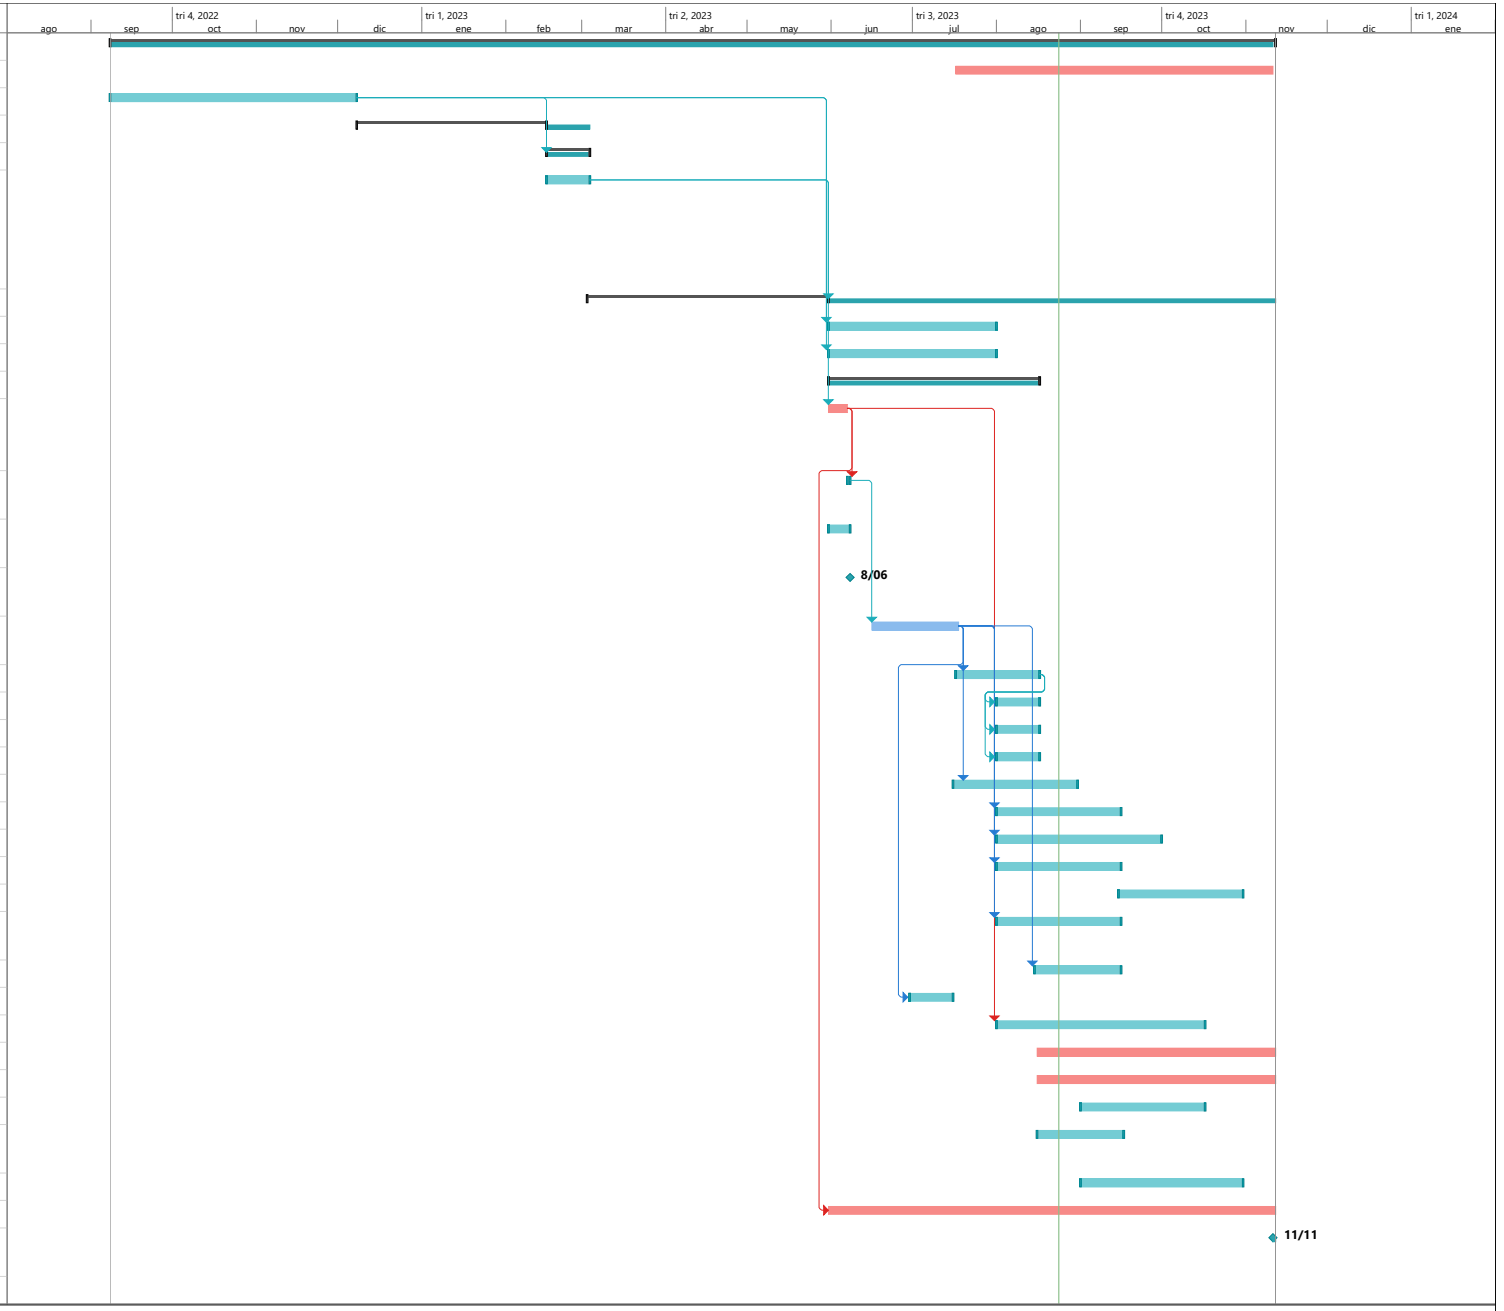

Proyecto: Sede La Primavera Vichada
Fecha: 31-05-2023

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE OROCUE CASANARE**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**mié 15/02/23**
5		**ARQUITECTÓNICO 1 PARTE**	jue 16/02/23	vie 3/03/23
6		Esquema Básico Arquitectónic	jue 16/02/23	vie 3/03/23
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**vie 3/03/23**	**mar 30/05/23**
8		**GEOFISICA Y SUELOS**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
9		**TOPOGRAFÍA**	mié 31/05/23	lun 31/07/23
10		**ARQUITECTÓNICO 2 PARTE**	**mié 31/05/23**	**mié 16/08/23**
11		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
12		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 7/06/23	mié 7/06/23
13		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
14		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
15		Anteproyecto Arquitectónico	vie 16/06/23	lun 17/07/23
16		Diseño Arquitectónico	lun 17/07/23	mié 16/08/23
17		Mobiliario	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Señalización	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		Paisajismo	mar 1/08/23	mié 16/08/23
20		**ESTRUCTURAL**	dom 16/07/23	mié 30/08/23
21		**HIDROSANITARIO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
22		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
23		**AIRE ACONDICIONADO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
24		**AMBIENTAL**	vie 15/09/23	lun 30/10/23
25		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓ**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
26		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mar 15/08/23	vie 15/09/23
27		**TRANSPORTE VERTICAL**	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
28		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	mar 1/08/23	lun 16/10/23
29		**PRESUPUESTO**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
31		**LICENCIAS Y PERMISOS**	vie 1/09/23	lun 16/10/23
32		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOB**	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
33		**INFORMACION CATASTRAL**	vie 1/09/23	lun 30/10/23
34		**BIM**	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
35		**TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**sáb 11/11/23**	**sáb 11/11/23**

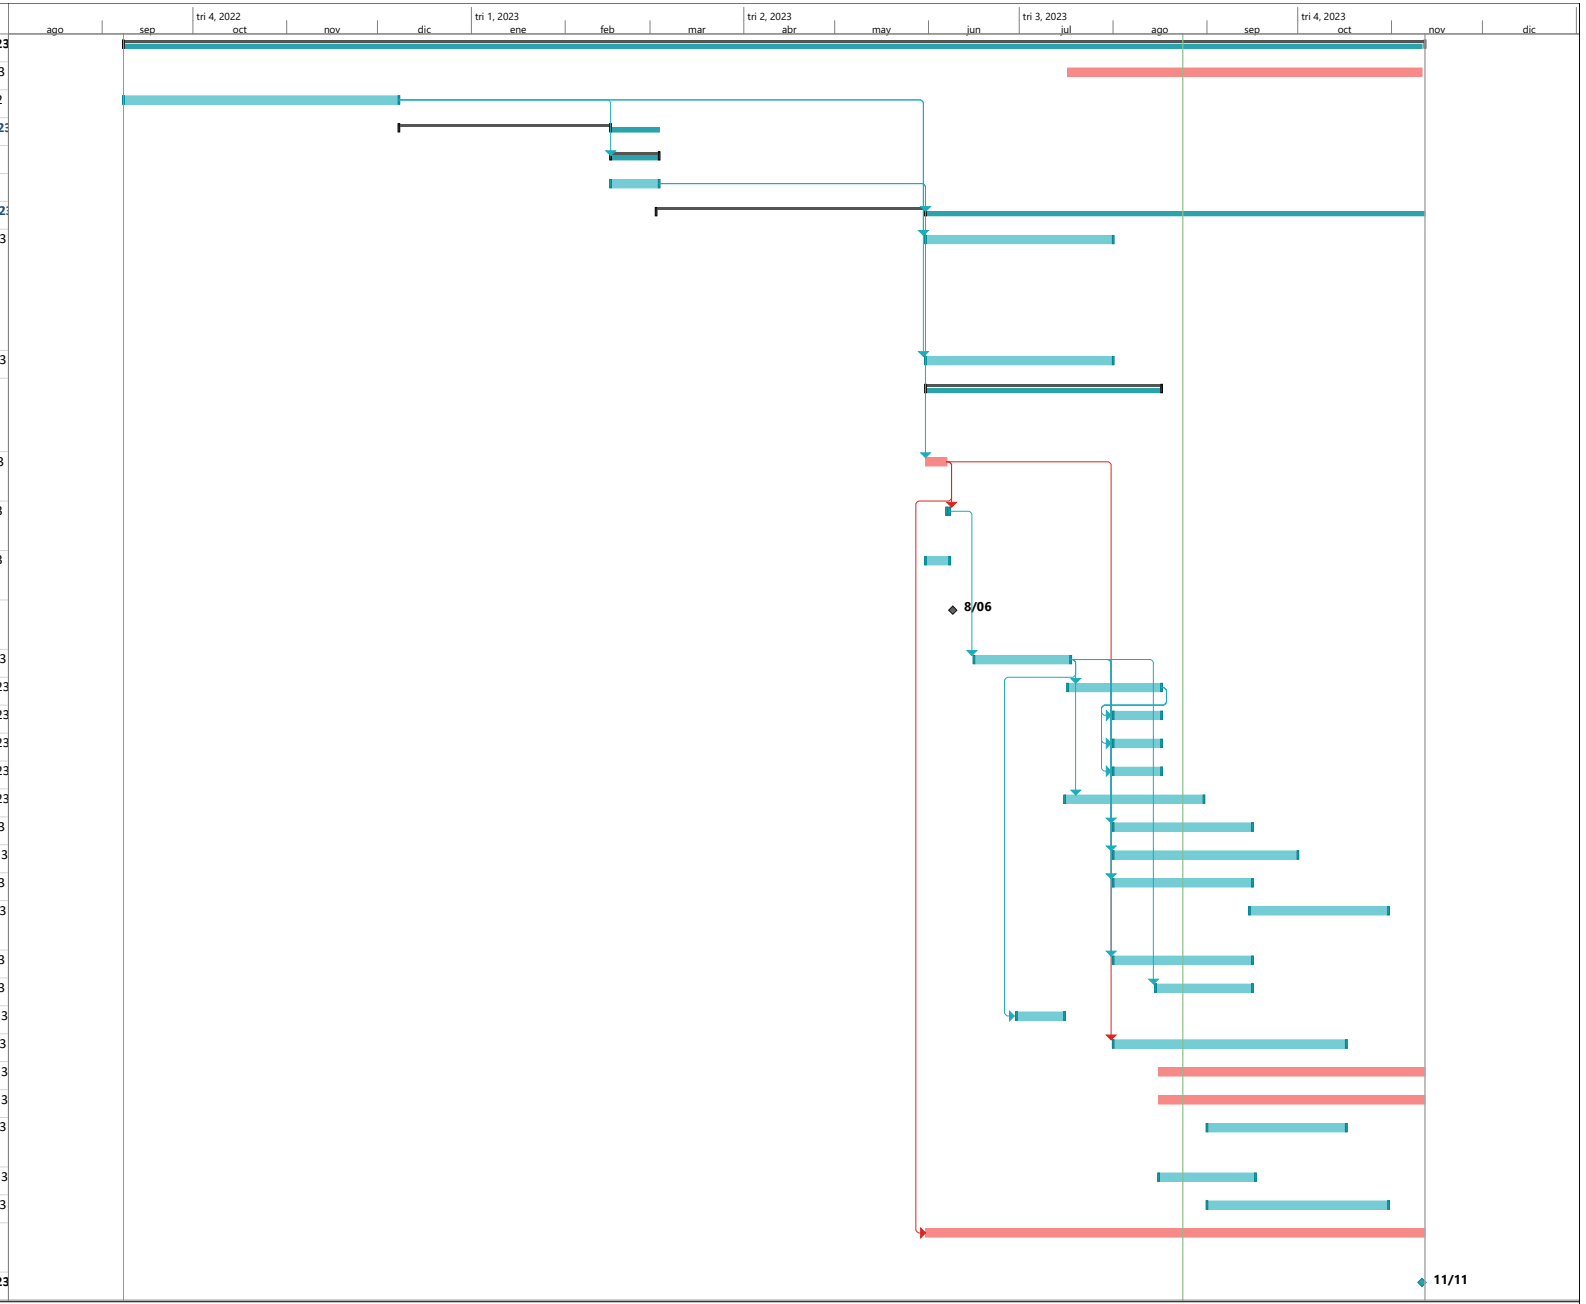

Proyecto: Sede Orocué Casanare
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA DIAGNÓSTICO**	**309 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ACTIVIDADES PREVIAS**	**308 días**	**jue 8/09/22**	**vie 10/11/23**
3		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ENTREGADA POR ENTIDAD	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		VISITA TECNICA DETALLADA	7 días	jue 8/09/22	vie 16/09/22
5		SOLICTUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
6		ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE	12 días	lun 26/09/22	mar 11/10/22
7		**ASPECTOS GENERALES**	95 días	lun 3/07/23	vie 10/11/23
8		**INFORME BASE PRELIMINAR**	23 días	jue 8/09/22	sáb 8/10/22
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 días**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
10		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 días**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
11		**DEFINICIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EPZ**	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
12		Terminación del Contrato (Sin prór	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23
13		**GEOFÍSICA Y SUELOS**	**51 días**	**lun 12/06/23**	**lun 21/08/23**
14		Exploración de campo	16 días	lun 12/06/23	lun 3/07/23
15		Ensayos y Resultados	13 días	mar 4/07/23	jue 20/07/23
16		Geofísica	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23
17		Geotécnia	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23
18		Sísmica	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23
19		**TOPOGRAFÍA**	23 días	lun 12/06/23	mié 12/07/23
20		**ESTRUCTURAL (Anclajes casetón)**	22 días	**jue 27/07/23**	**vie 25/08/23**
21		**HIDROSANITARIO**	24 días	**mar 22/08/2**	**vie 22/09/23**
22		**FIBRA ÓPTICA**	34 días	**mar 22/08/2**	**vie 6/10/23**
23		**AMBIENTAL**	34 días	**mar 1/08/23**	**vie 15/09/23**
24		**PRUEBAS (ADICIONALES) - PRUEBAS E INFORMES**	**59 días**	**lun 12/06/23**	**jue 31/08/23**
25		**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**56 días**	**lun 12/06/23**	**lun 28/08/23**
26		Pruebas red de suministro de agua potable	12 días	lun 12/06/23	mar 27/06/23
27		Pruebas de sistema sanitario	11 días	mié 28/06/23	mié 12/07/23
28		Pruebas sitema deaguas lluvia	12 días	jue 13/07/23	vie 28/07/23
29		Pruebas sistema bombeo	12 días	vie 28/07/23	sáb 12/08/23
30		Elaboración de Informe de Resultados	11 días	lun 14/08/23	lun 28/08/23
31		**SISTEMA CONTRAINCENDIOS**	**14 días**	**sáb 12/08/23**	**jue 31/08/23**
32		Pruebas redes sistema contraincendio	12 días	sáb 12/08/23	dom 27/08/23
33		Pruebas sistema bombeo	4 días	vie 18/08/23	mié 23/08/23
34		Elaboración de Informe de Resultados	4 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23
35		**SISTEMA ELÉCTRICO**	**56 días**	**lun 12/06/23**	**lun 28/08/23**
36		Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	7 días	lun 12/06/23	mar 20/06/23
37		Pruebas redes electricas,voz y datos	30 días	mar 20/06/23	lun 31/07/23
38		Elaboración de Informe de Resultados	20 días	mar 1/08/23	lun 28/08/23
39		**INFORME DE TRABAJO DE ALTURAS**	22 días	jue 31/08/23	vie 29/09/23
40		**PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	23 días	jue 8/06/23	lun 10/07/23
41		**INFORMACION CATASTRAL**	45 días	mié 12/07/23	mar 12/09/23
42		**PRESUPUESTO**	32 días	lun 9/10/23	mar 21/11/23
43		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	32 días	vie 29/09/23	sáb 11/11/23
44		**LICENCIAS Y PERMISOS**	67 días	sáb 12/08/23	sáb 11/11/23
45		1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	34 días	sáb 12/08/23	mié 27/09/23
46		2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	23 días	sáb 12/08/23	mar 12/09/23
47		3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	67 días	sáb 12/08/23	sáb 11/11/23
48		4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	45 días	mar 12/09/23	sáb 11/11/23
49		5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	45 días	mar 12/09/23	sáb 11/11/23
50		6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	45 días	mar 12/09/23	sáb 11/11/23
51		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23

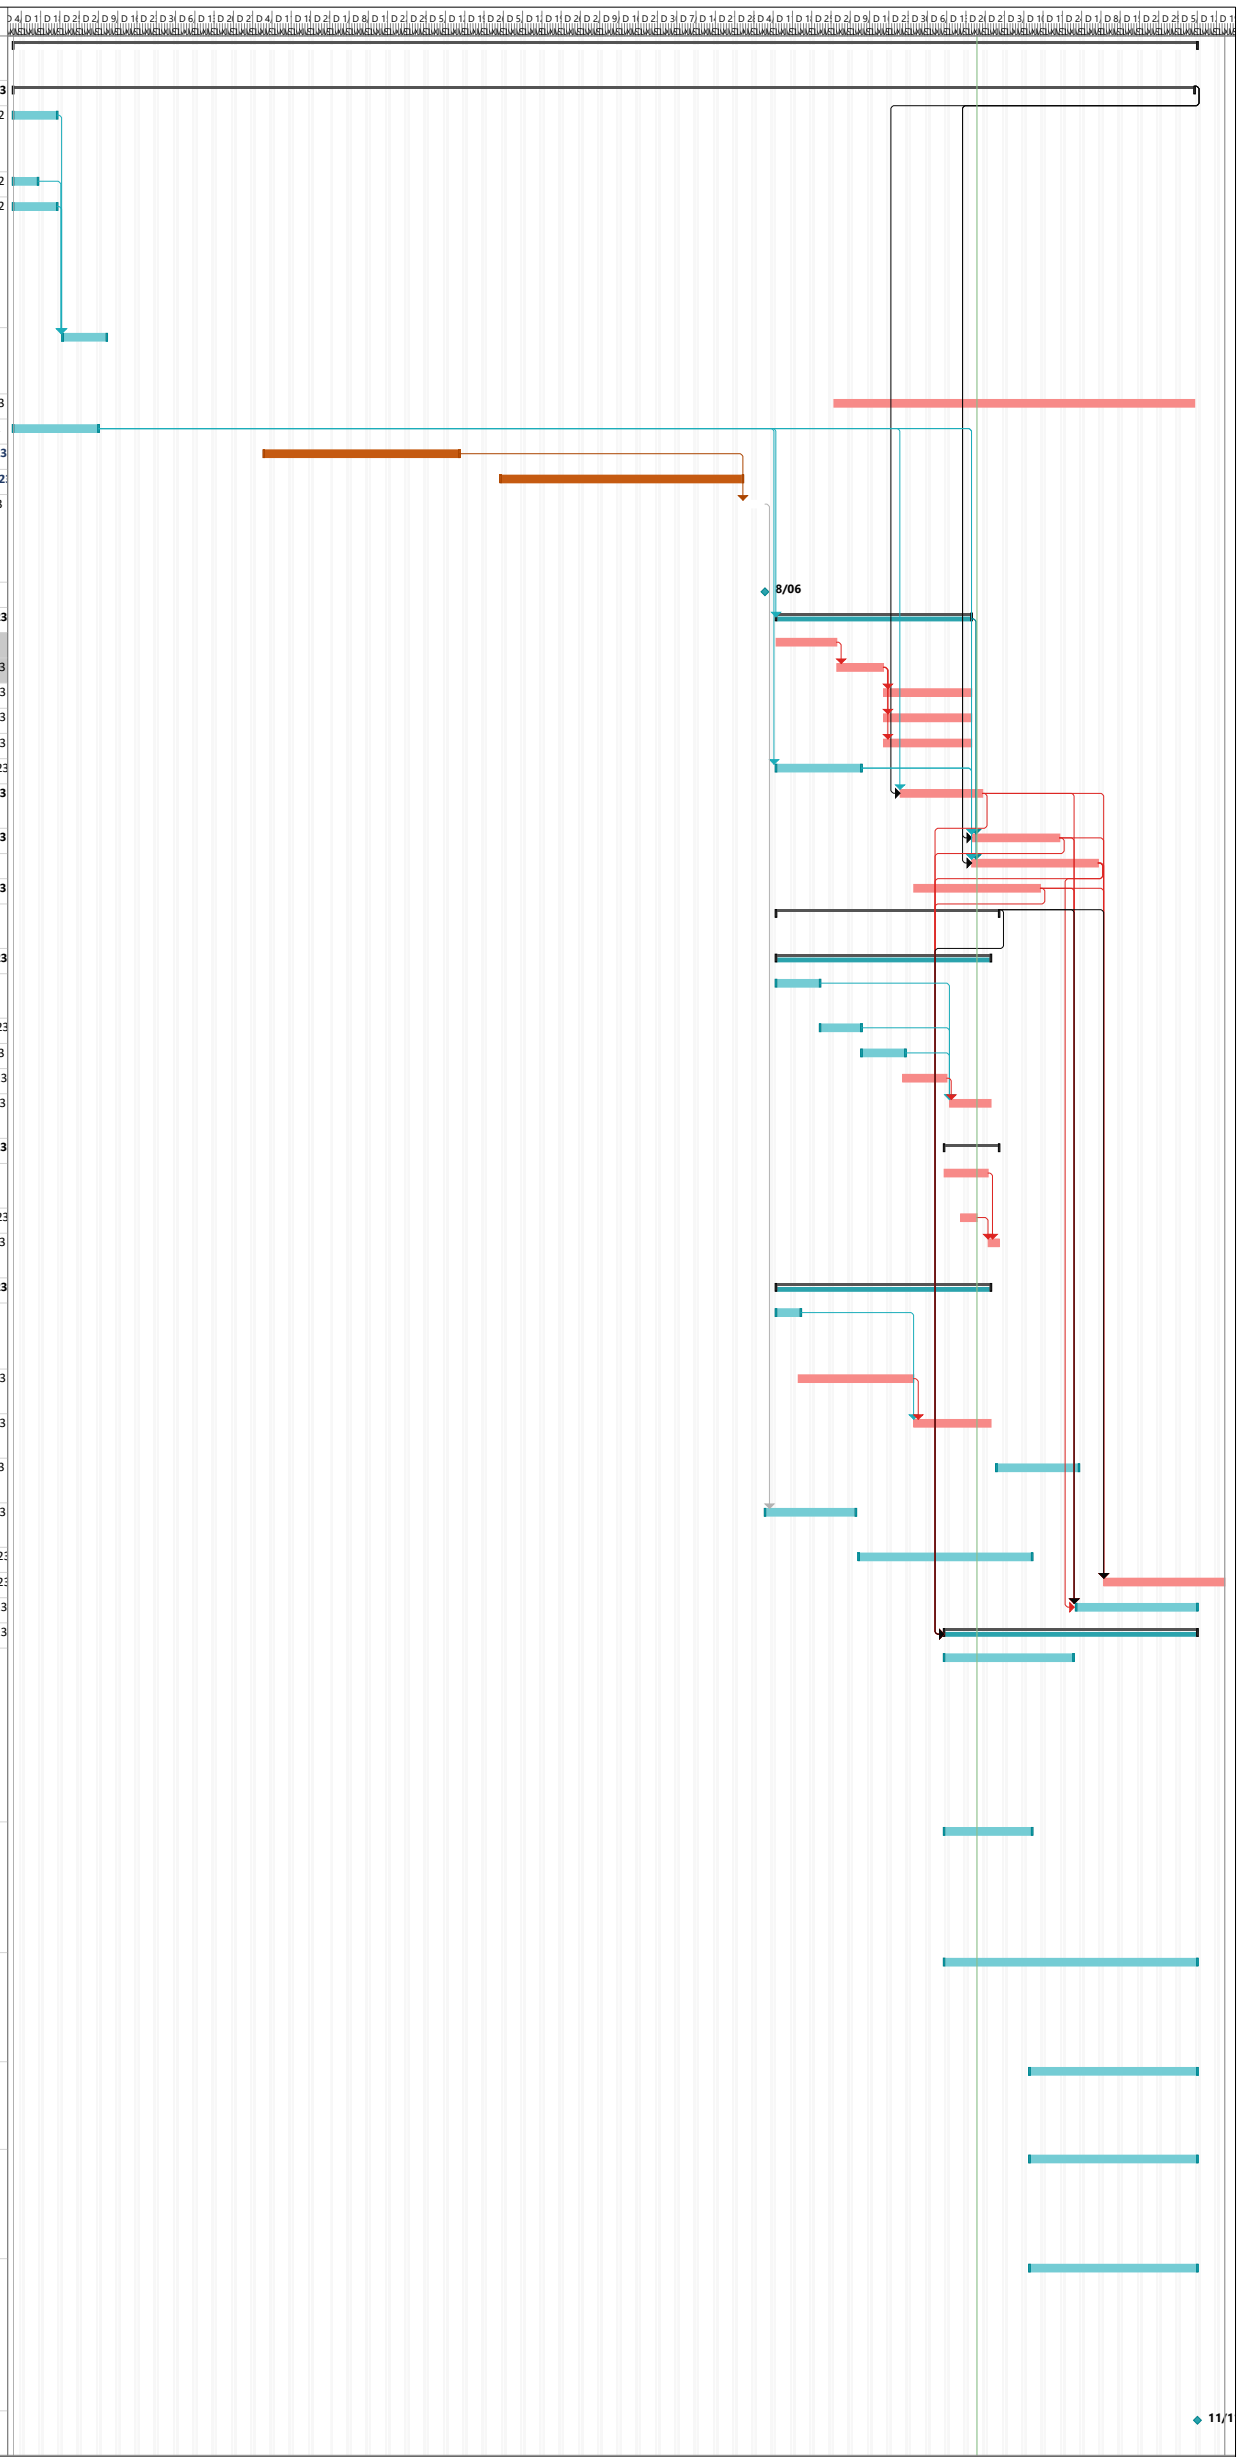

Proyecto: Zipaquirá Diagnóstic
Cundinamarca
Fecha: 31-05-2023

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base		
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso		
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA VULNERABILIDAD**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)**	jue 8/09/22	vie 23/09/22
3		**VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMEINTO OBRA EXISTENTE**	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		**ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN**	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
5		**VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL**	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
6		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
8		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
9		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	vie 9/06/23	vie 9/06/23
10		**PATOLOGÍA ESTRUCTURAL**	**mié 31/05/2**	**lun 24/07/23**
11		Definición de programa de ensayos	mié 31/05/23	mié 7/06/23
12		Metodologia de ensayos	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Ejecución de ensayos	lun 12/06/23	mar 27/06/23
14		Ensayos de laboratorios y resultados	mié 28/06/23	lun 17/07/23
15		Análisis de resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	mar 18/07/23	lun 24/07/23
16		**ESTUDIOS DE SUELOS**	**mié 31/05/2**	**mar 29/08/2**
17		Análisis de la información secundaria	mié 31/05/23	mié 7/06/23
18		Definición de programana y metodología	jue 8/06/23	jue 15/06/23
19		Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	vie 16/06/23	vie 7/07/23
20		Ensayos de laboratorio	lun 10/07/23	mié 26/07/23
21		Estudio de suelos y recomendaciones	jue 27/07/23	mar 29/08/23
22		**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD**	lun 24/07/23	mié 23/08/23
23		**ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO**	jue 24/08/23	jue 31/08/23
24		**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**	vie 1/09/23	lun 2/10/23
25		**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFORZAMIENTO**	sáb 30/09/23	vie 20/10/23
26		**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	sáb 30/09/23	vie 20/10/23
27		**PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA**	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
28		**TRAMITE DE LICENCIA**	mar 3/10/23	sáb 11/11/23
29		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
30				

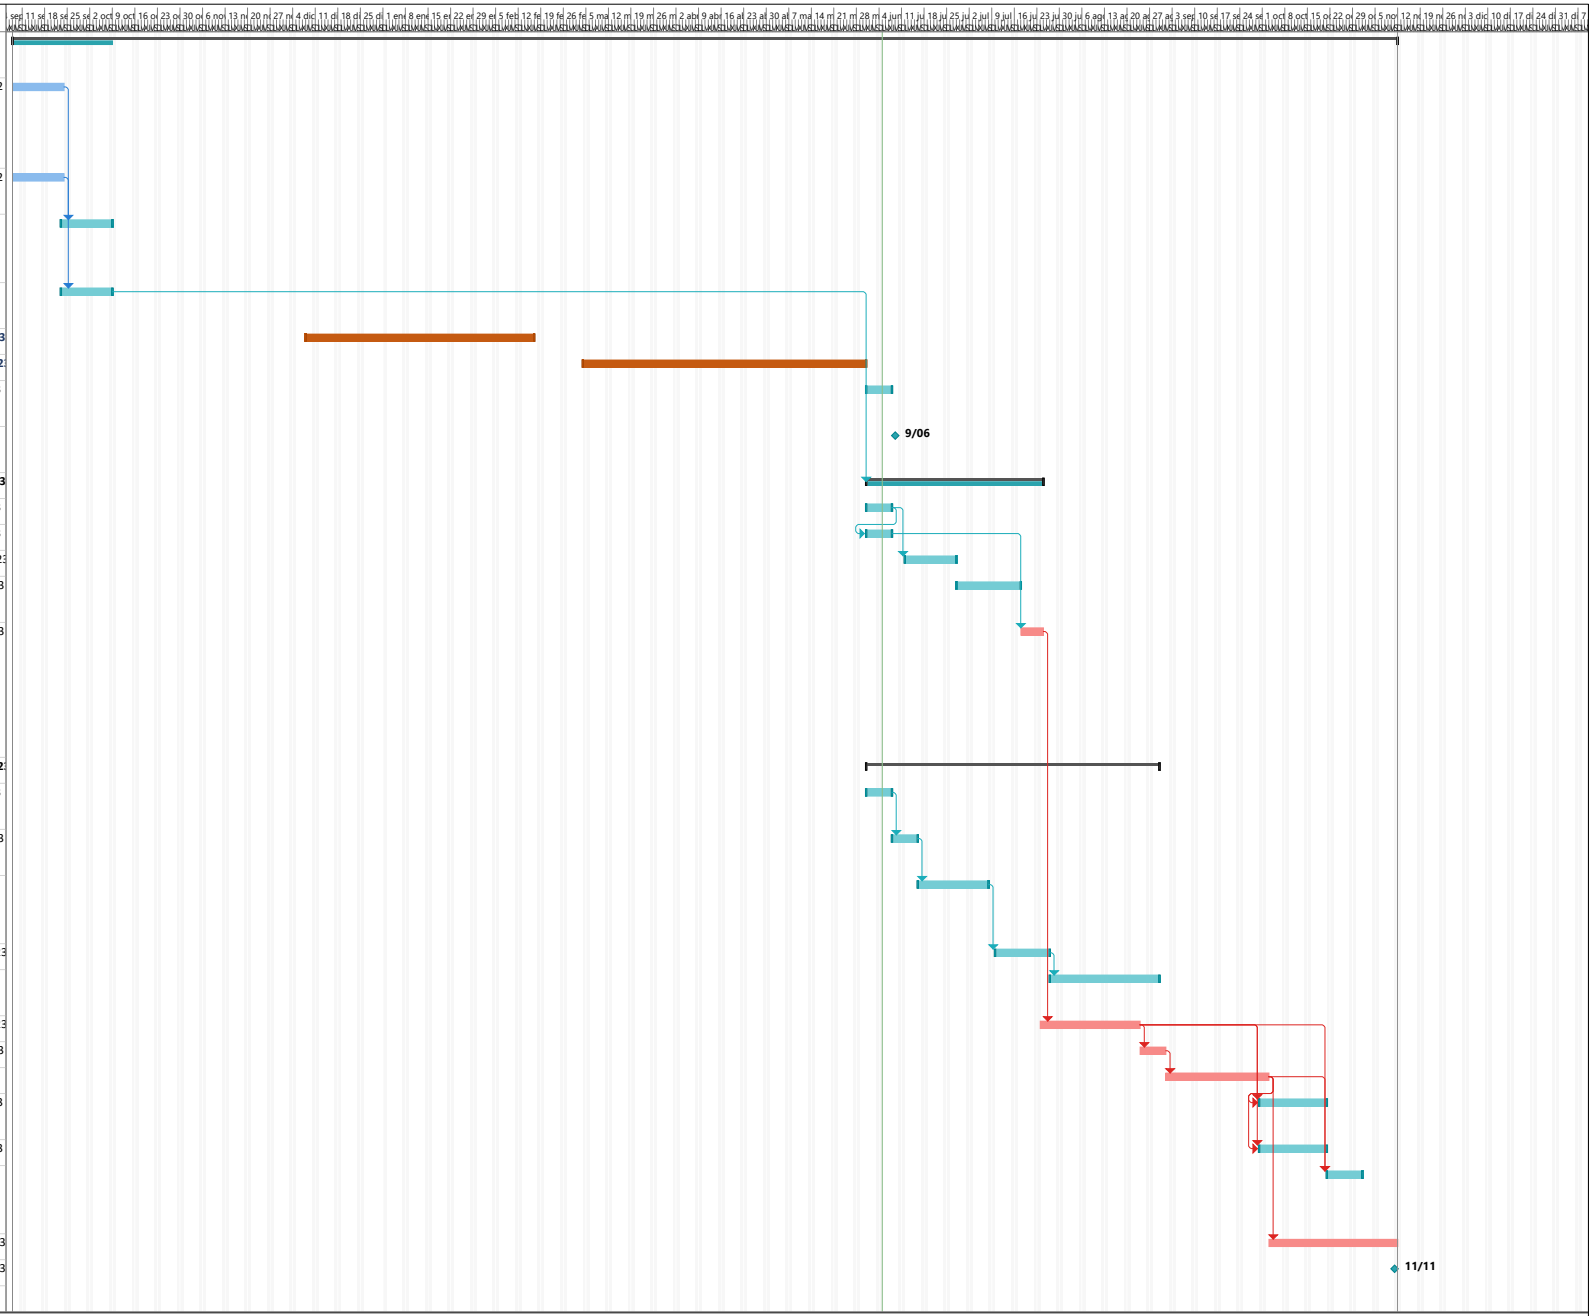

Proyecto: Sede Zipaquira Vulnerabilidad
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
