	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 2.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 50 **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No IDU-1279-2020 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA LICITACIÓN PÚBLICA No. IDU-LP-SGI-010-2020 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL IDU (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 901-407-148-8

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

SAIN ESPINOSA MURCIA (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	30 %
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	30 %
INGESEM S.A.S (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	20 %
INNOVACONST S.A.S (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	20 %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. IDU-1504-2020 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 900139110-5 (Escriba el NIT del Interventor)

MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor designado por el IDU para el contrato de interventoría)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU CATALINA CAÑAS MARQUEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU asignado para el contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTE (20) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 30,298,701,569.00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

2. ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	**DE FECHA**	27/2/2021	**PLAZO**	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.	2	**DE FECHA**	14/9/2022	**PLAZO**	NUEVE (9) MESES
PRÓRROGA No.	3	**DE FECHA**	29/12/2022	**PLAZO**	DOS (2) MESES
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	ONCE (11) MESES + 15 DÍAS

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**No. DÍAS**	N.A.
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**No. DÍAS**	N.A.
ACTA DE REINICIO No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DÍAS**	N.A.

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TREINTA Y UN (31) MESES + QUINCE (15) DÍAS (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN 14 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	N.A	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				**VALOR**	$ -

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	29/12/2021	**VALOR**	$ 3,559,356,425.00
ADICIÓN No.	2	**DE FECHA**	14/9/2022	**VALOR**	$ 539,355,006.00
ADICIÓN No.	3	**DE FECHA**	29/12/2022	**VALOR**	$ 3,184,061,508.00
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 7,282,772,939.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 37,581,474,508.00

3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	ESTADO
1	TRAMO 1 CALLE 94 desde la Autopista Norte hasta la Carrera 9	CON NO CONFORMIDADES
2	TRAMO 2 CALLE 92 desde la NQS hasta la Carrera 7 A.	CON NO CONFORMIDADES
3	TRAMO 3 Calle 88 entre la Carrera 8 y Carrera 7A	CON NO CONFORMIDADES
4	TRAMO 4 Carrera 7A entre la Calle 88 y Calle 92	OTRA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: **CONSTRUCCIONES** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No **50** **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLES FALTANTES

TRAMO 1 CALLE 94

N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE ENTREGA
1	Transversal 23 – Autopista norte costado norte	Transversal 23 – Autopista norte costado norte; Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
2	Transversal 23 – Autopista norte costado sur	Transversal 23 – Autopista norte costado sur; Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
3	Entre Carrera 16 a Carrera 15 costado norte.	Entre las abscisas K0+000 a K0+115. ESPACIO PÚBLICO Pendiente instalación bolardos, mobiliario y terminación de cajas. En APU y descripción del Ítem 2.032 se incluye acabado en color ocre en rampa vehicular MR 4 MPa. no se aplicó el color. No se realizó la instalación de cinta guía podo táctil poliuretano sobre tapas. En calle 94 frente al # 15-32 el acabado de la rampa no cumple especificación y el estampado de la guía táctil no se realizó. Las tapas domiciliarias están sin marquilla de identificación, estas tapas no corresponden con las aprobadas en diseño. Pendiente construcción de vado de empalme completo de la Calle 94 hacia bocacalle de Carrera 15. Pendiente completar la instalación de la arena de sello en losetas. Pendiente la reposición de losetas fracturadas. REDES HIDROSANITARIAS Pendiente construcción de redes pluviales y sanitarias conforme con los diseños no objetados por la EAAB. Las pruebas de tubería de acueducto no se realizaron debido a que el contratista no completó la instalación de red menor en el tramo funcional. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Se evidencia que las cintas de las tapas de ENEL presentado fisuras. Pendiente nivel de acabado y tapa de cámara ETB de la carrera 15 esquina norte. REDES DE SEMAFORIZACIÓN Pendiente la instalación de toda la red de semaforización en el cruce de la carrera 15 con calle 94 costado norte.	15/8/2023
4	Entre carrera 16 y Carrera 15 esquina, separador	Se presenta una intervención de 263,75 m2 en 324,26 m2 proyectados a la fecha de terminación entre K0+000 a las K0+114. ESPACIO PÚBLICO No se realizó la construcción de estructura del vado de acuerdo con diseño de pavimento aprobado. Pendiente renivelación de zonas verdes. Losetas fracturadas en todo el tramo. Pendiente limpieza de losetas manchadas y/o salpicadas con mortero o concreto.. Se presenta desniveles en losetas instaladas. Se presentan eflorescencias en losetas, de la misma manera se evidencia ausencia de arena de sello. Pendiente reposición de mortero en juntas de bordillos. Se evidencia que las cintas de ajustes están deterioradas. REDES HIDROSANITARÍAS Pendiente red pluvial en todos sus componentes.(Pozos, redes y sumideros) REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Se evidencia postes instalados inclinados para las luminarias del alumbrado público, por tal razón no se entregó el tramo funcional y por tanto no se pudo entregar la infraestructura a ENEL. REDES DE SEMAFORIZACIÓN No se instaló la Semaforización en vado sobre Carrera 15 costado occidental.	15/8/2023
5	Carrera 15 y Carrera 16 costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
		Entre Carrera 15 y Carrera 13 costado sur, entre K0+124-K0+380 Se muestran las observaciones específicas: ESPACIO PÚBLICO No se realizó intervención en los vados en los dos costados (ORIENTAL EN CARRERA 13 Y OCCIDENTAL EN CARRERA 15), quedando pendiente la estructura de espacio público, renivelación de cámaras, instalación de adoquín y mobiliario. Se evidencian losetas que presentan desniveles, fisuras, fracturas, desportillamientos y salpicaduras de mortero y concreto, pendiente detalles de acabados, cambio de las mismas y arena de sello en las juntas.	

		Pendiente entregar infraestructura sobre espacio público a las ESP. Pendiente instalación de bolardos. Pendiente instalación de canecas y mobiliario urbano. Pendiente estampado de guía en rampa vehicular, no cumple especificación. Pendiente color ocre en rampa vehicular MR 4 MPa en todas las rampas. Pendiente protector de árboles. REDES HIDROSANITARIAS Debido a que no se construyó en ni entrego en su totalidad la tubería de red menor, no fue posible realizar las pruebas de red menor de acueducto por no tener tramos funciónales. No se realizó instalación de redes de alcantarillado pluvial ni sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) No se terminó la instalación de infraestructura de red MT-BT ni alumbrado público para ENEL, se encuentra la discriminación a continuación. REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 15 con calle 94 costado sur oriental.. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada. Se presenta el estado de los subtramos específicos Calle 94 entre carrera 14 y carrera 13 (K0+124 a K0+230). ESPACIO PÚBLICO Se realizó intervención sobre el sector del paradero entre K0+211.5 y K0+226.5, no se realizó acabado de espacio público conforme con los diseños urbanísticos y los de movilidad para el paradero. No se realizó acabado en loseta en espacio público entre K0+203 y K0+211.5. No se construyó estructura de rampa peatonal ni acabado con adoquín en entre K0+226.5 y K0+237.0.	
6	Entre Carrera 15 a Carrera 13 costado sur	REDES HIDROSANITARIAS Debido a que no se construyó en ni entrego en su totalidad la tubería de red menor, no fue posible realizar las pruebas de red menor de acueducto por no tener tramos funciónales. No se realizó instalación de redes de alcantarillado pluvial ni sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) No se realizó construcción de infraestructura para redes MT-BT y Alumbrado Público de Enel entre K0+206 y K0+232.0, faltan nivelación de cajas CS 277 en K0+206 y en K0+232.0. Pendiente renivelación de cámara ETB T14 en K0+211.0 y K0+229.0 contra parque, Calle 94 entre carrera 14 carrera 13 entre K0+230 a K0+380: ESPACIO PÚBLICO Falta conformación y acabados de rampa vehicular de los edificios relacionados a continuación: - Edificios Mepal y Vanguardia entre K0+280.5 y K0+288.0 - Edificio Colpensiones entre K0+321.9 y K0+325.6 Se requiere renivelación de paños de loseta en espacio público en dos tramos para evitar desniveles con la rampa colindante de los edificios Mepal y Colpensiones en los tramos K0+275.0 K0+280.5 y K0+325.6 y K0+332.6. De igual manera sigue pendiente la corrección de acabados de loseta y arena de sello. No se realizó la instalación de cinta guía podo táctil poliuretano sobre tapas. No se realizó siembra de grama en franja de paisajismo en este tramo. El acabado de la loseta guía estampada no cumple con las especificaciones de diseño. No se realizó intervención en los vados en los dos costados (ORIENTAL EN CARRERA 13 Y OCCIDENTAL EN CARRERA 15), quedando pendiente la estructura de espacio público, renivelación de cámaras, instalación de adoquín y mobiliario.	15/8/2023

		REDES HIDROSANITARIAS Debido a que no se construyó en ni entrego en su totalidad la tubería de red menor, no fue posible realizar las pruebas de red menor de acueducto por no tener tramos funciónales. No se realizó instalación de redes de alcantarillado pluvial ni sanitario. Pendiente instalación de tapas de cajas domiciliarias. Se evidencia afectación fachada del predio de Calle 94 No. 13-11 debido al remate del espacio público contra la misma. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) No se terminó ninguna caja CS274 para alumbrado público, no tienen tapas y falta terminar la mampostería y las cintas de acabado. Debido a esto no fue posible entregar la infraestructura a ENEL ya que no hay un tramo funcional completo. REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 13 con calle 94 costado sur occidental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada	
7	Entre carrera 15 a carrera 13 costado norte	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15-08-2023
8	Carrera 13 a Carrera 11 costado norte	Entre carrera 13 y carrera 11 costado norte K0+389.5 a k0+657.5 ESPACIO PÚBLICO No se realizó intervención en los vados en los dos costados (ORIENTAL EN CARRERA 11 Y OCCIDENTAL EN CARRERA 13) Falta intervención, conformación y/o acabados de rampa vehicular de los edificios relacionados a continuación: - Edificio Mónica I entre K0+429.0 y K0+433.6 - Edificio Mónica II entre K0+465.3 y K0+470.6 - Edificio Juventus entre K0+505.4 y K0+518.5 - Edificio ubicado entre K0+621.50 y K0+628.00 (Calle 94 No. 11-30) - Edificio ubicado entre K0+631.9 y K0+636.00 Se evidencia falta de sellos en juntas de loseta en lugares de instalación sobre todo el tramo. Se evidencia que el muro construido frente a edificio Mónica I entre K0+433.6 y K0+465.3 se encuentra desalineado, falta la corrección de las observaciones realizadas por la interventoría. Pendiente conformación y acabados de rampa peatonal ubicada entre abscisas K0+575.20 y K0+584.00. Pendiente construcción de materas e instalación de grama en todo el tramo. Se Evidencia falta de remates de espacio público, sellado con arena de juntas de losetas, losetas desniveladas, eflorescencia en prefabricados, losetas salpicadas con concreto o mortero. Pendiente por terminar instalación de grama. Se evidencia un desnivel proyectado entre el espacio público intervenido y que no se encuentra terminado y el anden existente en K0+643.00 El paradero ubicado entre K0+552 y K0+568,00 no se encuentra intervenido. REDES HIDROSANITARIAS No se instaló hidrante proyectado en diseño no objetado por la EAAB en K0+548.50. Debido a que no se construyó en ni entrego en su totalidad la tubería de red menor, no fue posible realizar las pruebas de red menor de acueducto por no tener tramos funciónales. No se realizó instalación de redes de alcantarillado pluvial ni sanitario. Se interviene sumidero existente en K0+580.00 al realizar la ampliación del espacio público, no se realiza su recuperación debido a que no se realiza ninguna instalación de red de alcantarillado pluvial. Falta construcción de caja domiciliaria para alcantarillado sanitario y pluvial en Edificio Juventus. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) No se realizó de manera completa la instalación de infraestructura de red para alumbrado público, por lo tanto, no se pudo realizar entrega de la misma a ENEL para la realización de maniobras por su parte.	15/8/2023

		En Calle 94 con Carrera 11A costado norte se interviene espacio público contiguo por el occidente al paradero del SITP, falta renivelación de cámara ETB T14 en K0+555.25 y complementación de bancoducto para red MT-BT entre K0+552.70 y K0+584.00. No se ha realizó canalización 6Phi6" + 2Phi3" en rampas de los edificios Mónica I y Mónica II entre K0+429.0 y K0+433.6 y K0+465.3 y K0+470.6 respectivamente. De la misma manera no se realizó empate de niveles de infraestructura de ENEL en rampas sobre el espacio público en estas rampas. Falta retirar el plafón de cámaras ETB T14 en K0+445.00 y K0+478.00 sobre espacio público. Falta realizar construcción de cámara ETB T14-A en rampa vehicular Edificio Juventus en K0+510.60. Faltan marco y cintas de ajuste en cajas dobles y sencillas de paso ETB, de la misma manera en cajas CS-276 de ENEL desde K0+620.00 hasta K0+640.00 Falta renivelación de caja CS276 de Enel en K0+677.50 REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 13 con calle 94 costado nororiental ni en Carrera 11 costado noroccidental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada.	
9	Entre carrera 13 y carrera 11 separador	Entre Carrera 13 y Carrera 11 costado sur, entre K0+390-K0+658 ESPACIO PÚBLICO No se realizó intervención en los vados en los dos costados (ORIENTAL EN CARRERA 11 Y OCCIDENTAL EN CARRERA 13) Se evidencia deterioro prematuro de los morteros en confinamiento con bordillo A80 de espacio público. Se evidencia presencia de hierba en las juntas de la loseta instalada, adicionalmente se presenta eflorescencia sobre la misma ocasionado por la falta de arena de sello. También se evidencia fracturas en la loseta instalada y deterioro prematuro de la loseta guía y táctil A55 y A56. Se evidencia deterioro prematuro de cintas de ajuste transversales en el sendero. Pendiente la renivelación de zona verde para empatar hacia nivel de rasante del sendero. REDES HIDROSANITARIAS No se realizaron actividades concernientes a redes hidrosanitarias en todo el frente REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Los pedestales instalados por el contratista para el izaje de las luminarias de alumbrado público no cumplen la especificación técnica al igual que las cajas CS274, por lo tanto, la interventoría no recibe dicha infraestructura. REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 13 con calle 94 costado oriental ni en Carrera 11 costado occidental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada.	15/8/2023
10	Entre Carrera 13 a carrera 11A costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total
		ESPACIO PÚBLICO Se evidencia que hay espacio público conformado sin arena de sello y con deterioro prematuro en loseta entre K0+582.5 y K0+614.00, se requiere renivelar espacio público a nivel de rampa existente en K0+614.00. Se evidencia Mortero de junta de bordillos desgastados y fracturados. Pendiente terminación de sardinel A10. Pendiente rampa de cruce peatonal. Pendiente terminación de instalación de grama. Pendiente construcción de vado completo en intersección Calle 94 con Carrera 15 costado	

11	Carrera 11 y Carrera 11 A entre k0+580 –k0+660 Costado sur	suroccidental. Pendiente remate espacio público contra fachada. Pendiente instalación de bordillos Pendiente intervención de rampa en dos accesos vehiculares de Edificio Casa Imperial entre K0+614.00 y K0+623. Pendiente intervención de espacio público en frente del Edificio Casa Imperial y Decorcerámica entre K0+623.00 y K0+641.3 Se evidencia asentamiento del espacio público frente a Edificio Casa imperial. Pendiente conformación de espacio público y acabados entre K0+632.2 y K0+650.00 REDES HIDROSANITARIAS No se instaló hidrante proyectado en diseño no objetado por la EAAB Debido a que no se construyó en ni entrego en su totalidad la tubería de red menor, no fue posible realizar las pruebas de red menor de acueducto por no tener tramos funciónales. Se instala Tubería de 4" para red menor entre K0+582.5 y K0+614.00, No se realizó instalación de redes de alcantarillado pluvial ni sanitario. Se interviene sumidero existente en K0+580.00 al realizar la ampliación del espacio público, no se realiza su recuperación debido a que no se realiza ninguna instalación de red de alcantarillado pluvial. Falta construcción de caja domiciliaria para alcantarillado sanitario y pluvial Edificio Decorcerámica. Pendiente renivelación de caja de inspección sanitaria domiciliaria Edificio Casa imperial en K0+630.00 Pendiente renivelación de poso en espacio público en K0+633.00 REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Se evidencia caja CS-276 en K0+595.85. no está terminada, falta escalera de Gato y acabados. Pendiente tapas acordes a la norma en la caja Pendiente renivelación de cámara ETB T-13 en K0+632.2 Pendiente construcción de 2 cajas CS-276 en K0+645.00 y K0+650.00 Pendiente reconstrucción de cámara ETB T14 en K0+646.00 Pendiente renivelación de caja CS-280 en rampa vehicular del edificio Casa Imperial. Pendiente renivelación de Caja de paso doble de Movistar Pendiente reparación de muro en cámara ETB T-14 en K0+650.00 REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 13 con calle 94 costado sur occidental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada.	15/8/2023
14	Carrera 11 y Carrera 9 costado norte	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total
15	Entre Carrera 11 a carrera 9 separador	ESPACIO PÚBLICO No se realizó la construcción de estructura del vado de acuerdo con diseño de pavimento aprobado. Pendiente renivelación de zonas verdes. Losetas fracturadas en todo el tramo. Pendiente limpieza de losetas manchadas y/o salpicadas con mortero o concreto.. Se presenta desniveles en losetas instaladas. Se presentan eflorescencias en losetas, de la misma manera se evidencia ausencia de arena de sello. Pendiente reposición de mortero en juntas de bordillos. Se evidencia que las cintas de ajustes están deterioradas. Se encuentra acopio de prefabricados en zona verde REDES HIDROSANITARÍAS Pendiente red pluvial en todos sus componentes.(Pozos, redes y sumideros) REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Se evidencia pedestales para postes de luminarias del alumbrado público, por tal razón no se entregó el tramo funcional y por tanto no se pudo entregar la infraestructura a ENEL, así mismo las cajas CS-274 no cumplen con especificación. Falta renivelación de redes de ENEL y ETB en vados REDES DE SEMAFORIZACIÓN No se instaló la Semaforización en vado sobre Carrera 11 costado oriental ni en vado sobre Carrera 9 costado occidental BIENES INMUEBLES Se evidencia monumento Menorah con protección de madera, se requiere consultar con el IDPC sobre su reparación y conservación.	15/8/2023

16	Carrera 11 y carrera 9 costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU	Incumplimiento total 15/08/2023
17	Carrera 9 y carrera 7 costado norte	ESPACIO PÚBLICO Pendiente construcción de vados en Carrera 9 y Carrera 7A Se evidencia construcción de espacio público entre K0+987 y K0+105 Pendiente nivelación para construcción de paisajismo en todo el tramo Pendiente instalación de sardinel entre K1+120 y K01+140 Se evidencian losetas Desniveladas, carente de arena de sello y acabados según especificación de espacio público. Falta conformación y acabados de estructura de espacio público entre K0+982 y K0+987 Pendiente Conformación de estructura y acabados de espacio público entre K1+120 y K1+140 Pendiente por corregir acabado de hombros en las rampas vehiculares. Ninguna instalación de loseta ni adoquín cumple con la norma Pendiente por terminar el espacio público e instalar paraderos de acuerdo a especificaciones de mobiliario. Pendiente instalación de zona verde REDES HIDROSANITARIAS No se instaló hidrante proyectado en diseño no objetado por la EAAB Debido a que no se construyó en ni entrego en su totalidad la tubería de red menor, no fue posible realizar las pruebas de red menor de acueducto por no tener tramos funciónales. Se instala Tubería de 4" en toda la extensión de espacio público No se realizó instalación de redes de alcantarillado pluvial ni sanitario. Pendiente renivelación de 2 cajas de inspección sanitarias domiciliarias en K1+109 REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Se evidencia caja CS-276 en K0+595.85. no está terminada, falta escalera de Gato y acabados. Pendiente tapas acordes a la norma en la caja Pendiente renivelación de Caja Enel CS-277 en K1+113. Pendiente construcción de 2 cajas CS-276 en K1+106 Pendiente reconstrucción de cajas de paso doble de ETB Pendiente tapa de caja CS-280 en rampa vehicular en K1+161.00 Pendiente construcción de cajas CS-274 para alumbrado público en espacio público REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 9 con calle 94 costado nor-oriental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada.	15/8/2023
18	Carrera 9 separador costado oriental	ESPACIO PÚBLICO Pendiente construcción de vado en Carrera 9 Costado oriental Se encuentra material de excavación y prefabricados acopiados sobre zona verde REDES HIDROSANITARIAS No se realizaron actividades de redes hidrosanitarias en este frente REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) No se realizaron actividades de redes secas en este tramo REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 9 con calle 94 costado oriental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada.	14/8/2023

19	Entre Carrera 8 a Carrera 7 A costado sur	ESPACIO PÚBLICO Pendiente conformación de estructura y acabados de espacio público en todo el tramo Pendiente conformación de estructura y acabados de vados en costado oriental y occidental Se encuentra material de excavación y material granular acopiados REDES HIDROSANITARIAS No se realizaron actividades de redes hidrosanitarias en este frente, pendiente instalación de red menor e hidrante proyectado en diseños no objetados de la EAAB, no se realizaron actividades de alcantarillado pluvial y sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) No se realizaron actividades de redes secas en este tramo, pendiente renivelación de dos cajas CS-276 REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se requerían actividades de red de semaforización, pendiente reinstalación de mobiliario de señalización vertical	14/8/2023
	Entre Carrera 8ª a Carrera 9 costado sur	ESPACIO PÚBLICO No se realizaron actividades en vados por carrera 9 costado sur oriental y Carrera 7A. Pendiente cortar aceros aflorados en muro de contención construido en costado sur del espacio público Pendiente construcción de contendores de raíces en K0+994, K1+002, K1+011, K1+019 y K1+029 Falta instalación de mobiliario urbano Pendiente empalme a anden existente en vados sin intervención REDES HIDROSANITARIAS No se realizaron actividades de redes hidrosanitarias en este frente, pendiente instalación de red menor e hidrante proyectado en diseños no objetados de la EAAB, no se realizaron actividades de alcantarillado pluvial y sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Pendiente renivelación de Caja CS-276 en K0+998 Pendientes acabados de caja CS-276 en K0+985, K0+992 y K1+021 contra el parque al costado oriental Pendiente tapas de las cajas REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 9 con calle 94 costado oriental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada.	14/8/2023
20	Entre Carrera 8 y Carrera 7	No se realizaron actividades en este tramo por el CVI	
		TRAMO 2 CALLE 92	
21	Carrera 7ª a Carrera 11 costado norte	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
22	Carrera 7ª a carrera 9 costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
23		ESPACIO PÚBLICO No se realizaron actividades en vado por carrera 11 Se evidencia eflorescencias sobre la loseta y adoquín instalado en paso peatonal en Carrera 9 entre K1+521 y K1+528, de igual manera se evidencian losetas fracturadas, desniveladas con plántulas nacientes en las juntas. Se evidencia eflorescencias sobre la loseta y adoquín instalado en paso peatonal en Carrera 9 entre K1+424 y K1+435, de igual manera se evidencian losetas fracturadas, desniveladas con plántulas nacientes en las juntas.	

	Carrera 7ª a la carrera 11 separador	Se evidencia la mezcla asfáltica abierta en algunos tramos, extracción de núcleos sin reparación de las aperturas. No se encuentra empate de vado existente a ciclorruta en Carrera 11 Pendiente instalación de contenedores de raíz y conformación de estructura y acabados de espacio público en Carrera 7A. REDES HIDROSANITARIAS No se realizaron actividades de redes hidrosanitarias en este frente, pendiente instalación de red menor e hidrante proyectado en diseños no objetados de la EAAB, no se realizaron actividades de alcantarillado pluvial y sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Pendiente renivelación de Caja CS-276 en vado costado oriental carrera 11 REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 11 con calle 92 costado oriental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada, pendiente señalización horizontal y vertical en ciclorruta	15/8/2023
24	Carrera 9a a Carrera 11 costado sur	ESPACIO PÚBLICO No se realizaron actividades en vado por carrera 11 Se evidencian desniveles en adoquín instalado en vado sobre Carrera 9 entre K1+400 y K1+406, de igual manera se evidencian losetas fracturadas, desniveladas con plántulas nacientes en las juntas. Se evidencia eflorescencias sobre la loseta en todo el tramo de espacio público, de igual manera falta sello de juntas entre losetas, losetas fracturadas, discontinuidad en loseta guía y toperol entre K1+265 y K1+400 Falta conformación de estructura y acabados de espacio público entre K1+240 y K1+257 Falta conformación y acabado de rampa vehicular entre K1+257 y K1+260 Pendiente construcción de contenedor de raíz en K1+248 Pendiente instalación de guía podotáctil en poliuretano sobre las tapas REDES HIDROSANITARIAS Se encuentra instalación de red menor e hidrante proyectado en diseños no objetados de la EAAB, sin embargo, debido a que no se realizaron empates no es posible realizar ensayos para el recibo de la tubería. No se realizaron actividades de alcantarillado pluvial y sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS Pendientes renivelaciones de Caja CS-276 y CS-274 en K1+255 Pendiente renivelación de caja de paso doble ETB en K1+240 Pendiente cambio de tapas de norma en Cajas en todo el tramo Pendiente construcción de infraestructura de Alumbrado público REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 11 con calle 92 costado sur-oriental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada, pendiente señalización horizontal y vertical en ciclorruta	15/8/2023
25	Carrera 11 a carrera 13 costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
		ESPACIO PÚBLICO No se realizaron actividades en vado por carrera 11 costado oriental Falta renivelación de zona verde para empate a rasante de ciclorruta Se evidencia pérdida de alineamiento del bordillo de confinamiento del sendero y ciclorruta Se evidencia falta de arena de sello en loseta sobre sendero peatonal Se evidencian sectores sin loseta en sendero peatonal Faltan cintas de ajuste Las losetas presentan fracturas y dilataciones de hasta 5 cm.	

26	Carrera 11 a Carrera 15 separador	REDES HIDROSANITARIAS No se realizaron actividades de alcantarillado pluvial y sanitario. REDES SECAS (ETB, ENEL, VANTI Y OTRAS) Pendientes renivelaciones de Caja CS-276 y CS-274 Los pedestales no cumplen especificación ENEL AP-217 Las cajas CS-274 no cumplen la especificación ENEL No se encuentra en su totalidad el tramo funcional por lo cual no se hace entrega de la infraestructura ni a la interventoría ni a ENEL REDES DE SEMAFORIZACIÓN Y MOBILIARIO DE MOVILIDAD No se realizó Instalación de semaforización en vado de Carrera 11 con calle 92 costado sur-oriental ni en vado de Carrera 15 Calle 92 costado oriental. Pendiente reinstalar señalización vertical desinstalada, pendiente señalización horizontal y vertical en ciclorruta.	15/8/2023
27	Carrera 11 a carrera 13 costado norte:	. Carrera 11 y carrera 13 costado norte: No se realizó la construcción del vado con toda su estructura y acabados. Pendiente renivelación de cajas CS 280 No se realizó la construcción de rampa de edificio Cervantes No se realizó el cambio de losetas fracturadas y faltante de arena de sello. Pendiente niveles e instalación de tapas de cajas. Pendiente instalación de losetas podo táctiles. Pendiente acabado final de rampa, impermeabilización y color ocre Pendiente losetas guía, estampada en MR 4 MPa, en rampa Carrera 11 A-36 edificio L´Avenida, Pendiente construcción de rampas, esmaltado de rampas de entrada y salida en el edificio Siena Pendiente espacio público, estructura y acabados. Pendiente realce de cajas en la 92-12 Pendiente esmaltado rampa en edificio Alcazar 12-12 Pendiente realce de infraestructura de redes y toda la estructura del espacio público Pendiente nivelar tapa de caja CS 275 en Edificio Villa y a su vez pendiente la reparación de hombro de la rampa. Pendiente caja de medidor de agua en el Edificio Pijao Pendiente esmaltado de rampa en el Edificio Pijao En la embajada de España pendiente estructura del espacio público, pendiente construcción de rampa, pendiente estructura de espacio público y acabados, empalme de red menor de acueducto.	14/8/2023
28	Carrera 13 a carrera 13 A costado norte	Este tramo no se intervenido por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total
29	Carrera 13 a carrera 13 A costado sur	Entre Carrera 13 y carrera 13 A costado sur: En el Edificio Casa blanca pendiente la terminación de losetas y acabados. Pendiente esmaltado en rampa y color ocre. Pendiente sumidero red pluvial. Pendiente construcción del vado Pendiente construcción del espacio público total del edificio torre la Piazzetta Solo se realizo la intervención del espacio publico frente al edificio Casa Blanca. Quedo pendiente las otras áreas de este costado.	14/8/2023
30	Carrera 13ª a carrera 15 costado sur	Entre carrera 13 A – Carrera 15 costado sur: Pendiente terminación de vados y caja Cs 275 Pendiente construcción de sumideros y red pluvial. Pendiente alumbrado público Observación general, se evidencia falta de sellos, fisuras y destornillamientos en losetas Ajustar instalación de tapas de caja CS-276, Pendiente limpieza en general. Pendiente estampado de loseta guía en rampa de edificio Massilia con MR 4 MPa. Pendiente esmaltado y sello de losa de concreto MR 4 MPa Pendiente en los puntos donde se genera interferencia con postes existentes, instalar losetas guías y táctil de acuerdo a los lineamientos Pendiente reemplazar losetas que no cumplen con especificaciones de corte inferior a 1/3 de longitud Pendiente esmaltado de rampa vehicular de edificio Massilia de salida Pendiente terminación de infraestructura de urbanismo, en el edificio Max 92 queda pendiente terminación de caja CS 280 y pendiente vado de la carrera 15.	15/8/2023

31	Carrera 15 a carrera 19 costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
32	Carrera 15 a carrera 18 separador	Entre Carrera 15 y carrera 18 separador: Pendiente vados, semaforización Pendiente señalización horizontal y vertical Pendiente alumbrado público, Pendiente reparar fisuras en carpeta asfáltica No se corrigieron las cintas de ajuste, No se terminó la instalación de carpeta asfáltica Pendiente cruce de semaforización.	15/8/2023
33	Carrera 15 a carrera 18 costado norte:	Punto 31. Entre carrera 15 y carrera 18 costado norte: Pendiente acabado de loseta y arena de sello. Pendiente contenedor y protector de árboles Pendiente esmaltado de rampa vehicular de edificio Areacon. Pendiente Instalar tapas de cajas de ESP. Pendiente instalación de loseta podo táctil, pendiente acabados, pendiente arena de sello, pendiente nivelación, pendiente cambio de losetas fracturadas y desportilladas, se evidencia eflorescencia. En el edificio Tinkko pendiente dilatación de bordillo, pendiente estampado de loseta guía en rampa, pendiente sumidero, pendiente cambio de caja metálica, pendiente loseta tipo panot A20, pendiente el paradero debe de ir sobre mortero de asiento. Edificio Liquidambar pendientes color ocre en rampa vehicular costado oriental, se evidencia que la loseta guía no cumple con las especificaciones, pendiente rampa en costado occidental. En el punto Av Alejandro Obregón Calle 92 con Carrera 18, pendiente espacio público completo, pendiente sumidero red pluvial.	15/8/2023
34	Carrera 18 a NQS costado norte	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
35	Carrera 19 a carrera 19 A costado sur	Pendiente acabado de loseta, arena de sello, pendiente paisajismo, pendiente cambio de losetas desportilladas, pendiente nivelación de pozo y confinamiento sobre este, pendiente alumbrado público y sumidero red pluvial.	15/8/2023
36	Carrera 19 A a NQS costado sur	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total 15/08/2023
37	Carrera18 a carrera 19 B Separador	Pendiente alumbrado público Pendiente rematar carpeta asfáltica contra vados.	15/8/2023
38	Carrera 19 B a NQS separador	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU.	Incumplimiento total
		TRAMO 3 Calle 88 entre la Carrera 8 y Carrera 7A	
39	Calle 88 entre la Carrera 8 a Carrera 7 A	Observaciones de acabado en las losetas en general.	15/8/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano	**FORMATO** ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
D 2	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 2.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: **CONSTRUCCIONES** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No **50** **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

TRAMO 4 Carrera 7A entre la Calle 88 y Calle 92

40	Carrera 7 A entre la Calle 88 a Calle 92	Este tramo no se intervino por parte del Consorcio Vial IDU. Urbanismo táctico.	Incumplimiento total

NOTAS:

1. El Acta de Terminación del contrato de obra se elaboró y se envió para firma al Contratista el 15 de agosto de 2023, en cumplimiento del numeral 21 de la Cláusula 12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO del contrato de Interventoría: " Suscribir junto con el Contratista el acta de terminación de obra a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución, en la cual se deberá dejar constancia sobre el estado de las obras, el estado de las aprobaciones y/o entrega de los productos objeto del contrato de obra, así como también se dejará constancia de los compromisos del contratista de obra para obtener las aprobaciones pendientes por parte de las ESP, entes competentes e Interventoría", La cual al no haber sido suscrita por el Contratista de obra se remite como anexo a la presente acta debidamente suscrita por la Interventoría

2. El 15 de agosto de 2023 mediante comunicación MAB-2-1504-1170-23 con radicado IDU 202352601399072 se remitió Acta de terminación de obra.

3. El 16 de agosto de 2023 mediante Acta Nº 51, se adelantó la Toma de Posesión Física de la Obra, convocada por el IDU, donde se plasmó el estado final de las obras.

4. Con posterioridad a la fecha de terminación del contrato de Interventoría, 14 de agosto de 2023, la Interventoría ha adelantado diferentes recorridos tanto con la Alcaldía como con la Empresas de Servicio Públicos y la Unidad de Mantenimiento Vial, con el fin de entregar la información técnica requerida, para las gestiones tendientes a la intervención por parte de estas entidades y habilitar los tramos que a la fecha de la toma de posesión física de la obra quedaron sin terminar por parte del contratista y generan riesgo para la ciudadanía.

5. El 5, 12, 19 y 27 de septiembre de 2023 y el 4 y 11 de octubre de 2023 se realizó Comité de seguimiento fase de liquidación, no obstante, el Contratista no asistió a dichos comités, por lo cual la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1504-1236-23 con radicado IDU 202352601553882 del 1 de septiembre de 2023, comunicación MAB-2-1504-1256 radicado IDU 202352601608322 del 11 de septiembre de 2023, comunicación MAB-2-1504-1271-23 radicado IDU 202352601713752 del 25 de septiembre de 2023, comunicación MAB-2-1504-1297-232 radicado IDU 202352601780792 del 11 de septiembre de 2023 y comunicación MAB-2-1504-1307-23 con radicado IDU 202352601816262 del 10 de octubre de 2023 se remitió las respectivas actas de seguimiento en las que se les informa los documentos pendientes por tramitar por parte del Consorcio Vial IDU, entre los cuales se encuentra el acta de terminación de obra. A la fecha no se ha recibido respuesta a las comunicaciones.

6. Con la comunicación MAB-2-1504-1286-23 con radicado IDU 202352601733222 del 27 de septiembre de 2023 y comunicación MAB-2-1504-1303-23 con radicado IDU 202352601813892 del 10 de octubre de 2023 se reiteró la solicitud de remisión de dicha acta debidamente firmada, a la fecha el Contratista no ha dado respuesta.

7. La Entidad mediante oficio STESV 202333601776491 del 2 de octubre remitió observaciones al acta de terminación del contrato de obra remitida con comunicación comunicado MAB-2-1504-1170-23 con radicado IDU 202352601399072 del 16 de agosto de 2023, ajustes que se incluyen y se envían en versión definitiva el 13 de octubre de 2023.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Así mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Trece	(13)	días del mes de	Octubre	de	2023
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)	(Firma)
(Nombre) SAÍN ESPINOSA MURCIA Representante Legal del Contratista CONSORCIO VIAL IDU	(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ Representante Legal Suplente del Interventor MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICO





Foto No.:	1
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #19-16 costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad

Foto No.:	2
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad





Foto No.:	3
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #19-19 costado sur
Descripción:	tramo sin intervención

Foto No.:	4
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #19-19 costado sur
Descripción:	tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DE 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	5
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #18-19 separador
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	6
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	7
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	calle 92 #18 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	8
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #17-63 costado sur
Descripción:	tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVIDAD GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	9
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #19-16 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	10
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	11
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #16 costado norte
Descripción:	Instalación de tapas y nivelación de cajas



Foto No.:	12
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 17-31 costado norte
Descripción:	nivelación de caja

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	13
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #19-16 separador
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	14
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	15
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 16-30 costado norte
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	16
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #16-30 costado norte
Descripción:	Espacio público, falta tapa

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:**



Foto No.:	17
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #19-15-90 costado norte
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	18
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Renivelación de caja



Foto No.:	19
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 15-63 costado norte
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	20
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #15-30 costado norte
Descripción:	Renivelación de caja e instalación de tapa

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	21
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 15-38 costado norte
Descripción:	Instalación de tapa



Foto No.:	22
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	23
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 15-10 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	24
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 15-10 separador
Descripción:	tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DE 1504 **ÁREA:** TÉCNICA

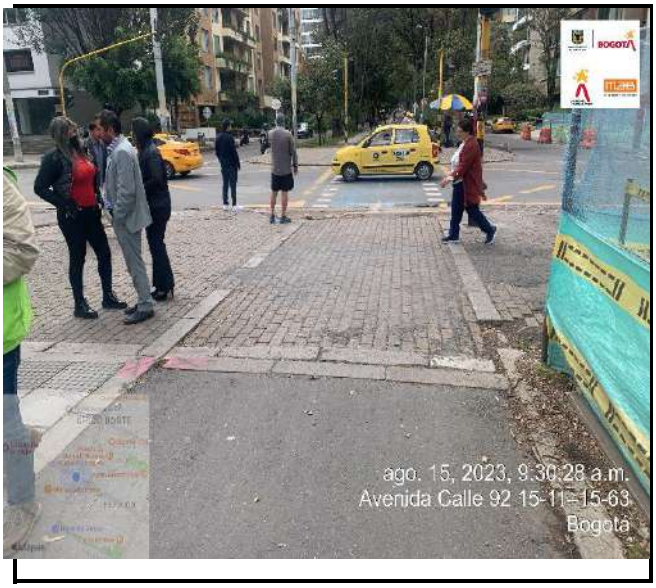


Foto No.:	25
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #15-11 separador
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	26
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	27
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #14-61 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	28
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 15-7 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



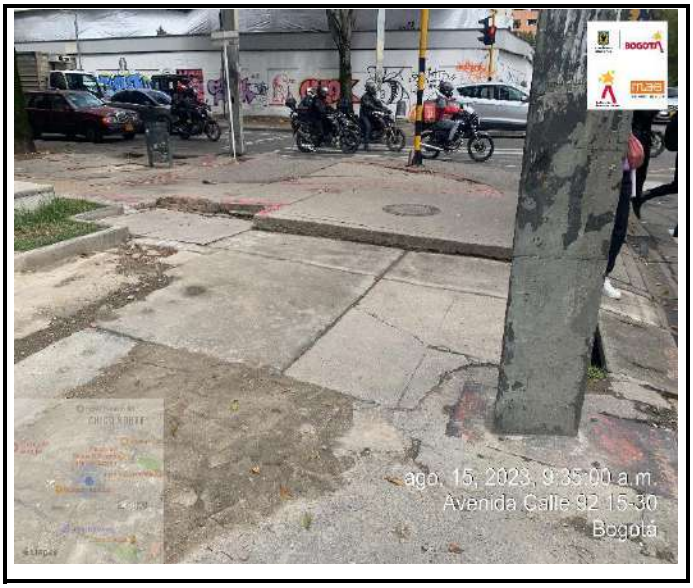


Foto No.:	29
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #15-91 costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad

Foto No.:	30
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad





Foto No.:	31
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #14-1 costado sur
Descripción:	Espacio público

Foto No.:	32
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #14-45 separador
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	33
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 14-45 costado norte
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	34
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	35
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #14-21 costado sur
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	36
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 14-1 costado sur
Descripción:	Espacio público

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 185 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	37
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 14-1 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	38
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	39
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 13A-1 costado norte
Descripción:	Espacio público



Foto No.:	40
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13A-1
Descripción:	Espacio público

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	41
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13A-1 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	42
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	43
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 13A costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	44
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13A-1 separador
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	45
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13A costado norte
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	46
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	47
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13-21 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	48
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13-21 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	49
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13-21 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	50
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	51
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13-21 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	52
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #13-21 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	53
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 15-5 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	54
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	55
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #12-5 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	56
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 12-5 costado norte
Descripción:	espacio publico

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	57
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #12-5 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	58
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	59
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #12 costado norte
Descripción:	Espacio publico

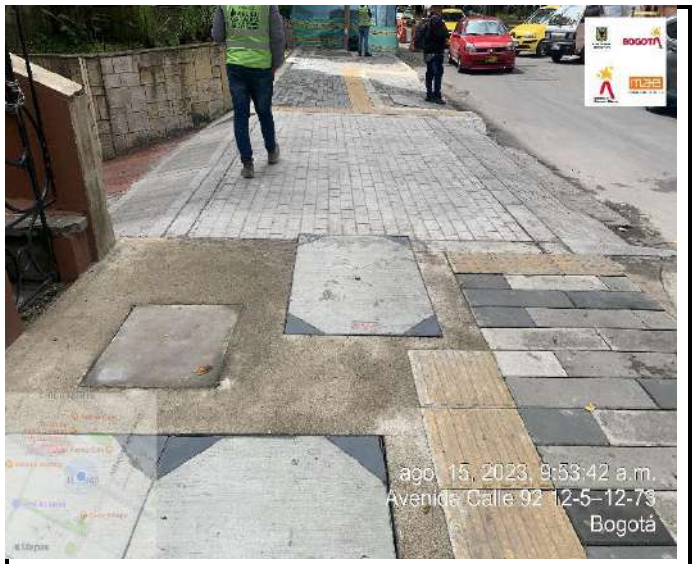


Foto No.:	60
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #12-5 costado norte
Descripción:	Espacio publico

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	61
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #12-1 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	62
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	63
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11A-17 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	64
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #12 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA

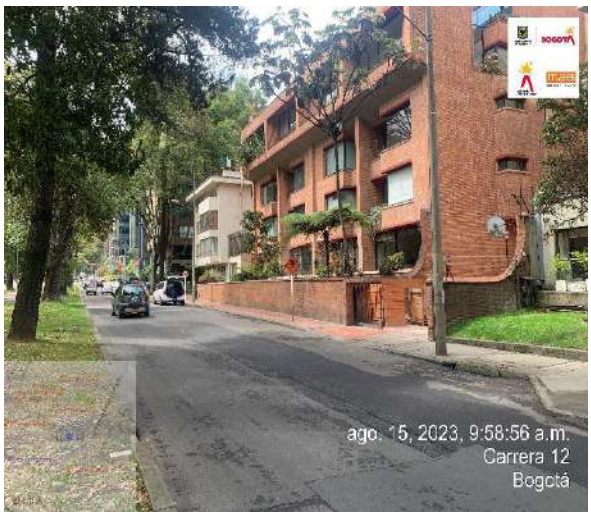




Foto No.:	65
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 12 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención

Foto No.:	66
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Espacio publico





Foto No.:	67
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11A-22 costado norte
Descripción:	Espacio publico

Foto No.:	68
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11A-22 separador
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	69
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	70
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	71
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

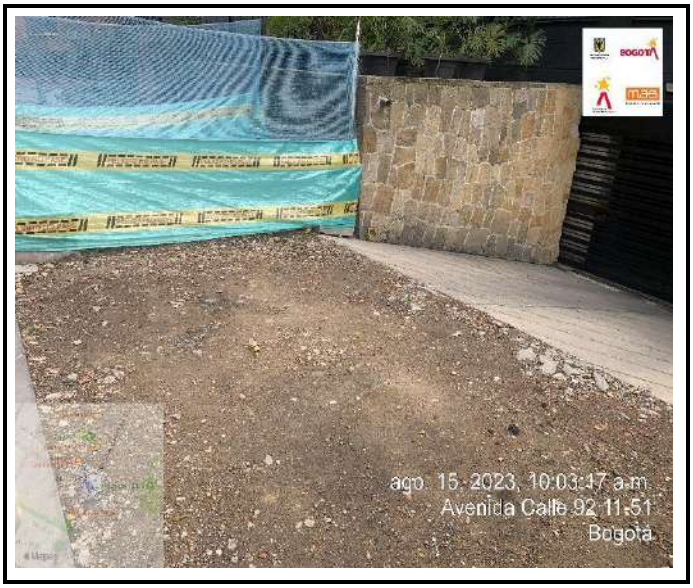


Foto No.:	72
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92#11-51 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO 2023 **ÁREA:** TÉCNICO



Foto No.:	73
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	74
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	75
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92#11-51 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	76
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	77
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	78
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	79
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	80
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	81
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	82
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #11-51 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	83
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #10-55 costado sur
Descripción:	Tamo sin intervención



Foto No.:	84
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 10-55 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO 2023 **ÁREA:** TÉCNICO



Foto No.:	85
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #10-55 costado sur
Descripción:	Espacio publico



Foto No.:	86
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #10-55 costado sur
Descripción:	Espacio publico



Foto No.:	87
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92-10 separador
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	88
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92-10 costado sur
Descripción:	Espacio publico

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	89
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9A-15 separador
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	90
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9A-91 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	91
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9A-91 separador
Descripción:	Tramo sin actividad

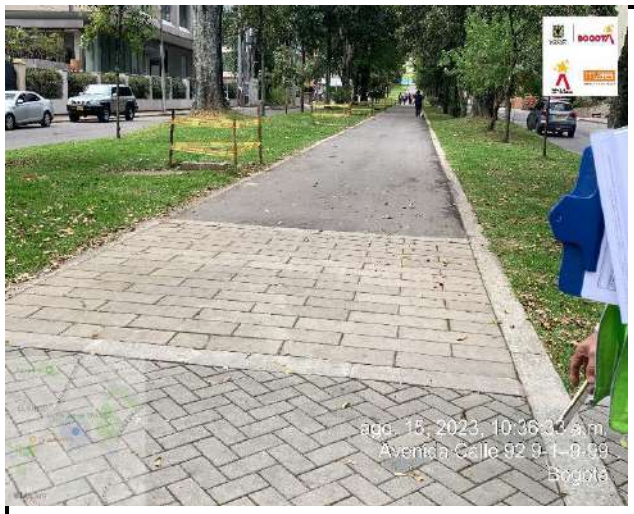


Foto No.:	92
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9-99 separador
Descripción:	

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	93
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	94
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	95
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 9 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	96
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #9 separador
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	97
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 7A costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	98
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 # 9 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion

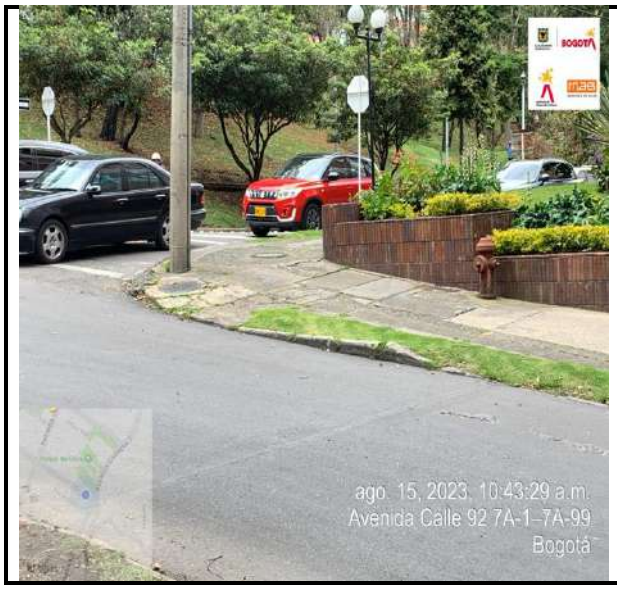


Foto No.:	99
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A-1 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	100
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A-1 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	101
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A-1 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	102
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A-1 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	103
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A-1 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	104
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A-1 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	105
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 88
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	106
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 88
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	107
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 88
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	108
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 92 #7A
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	109
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	110
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	111
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	112
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle #7A- costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	113
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-47 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	114
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 7A-47 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	115
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-47 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	116
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-39 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	117
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-39 costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	118
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 7A-39 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	119
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-39 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	120
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-39 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	121
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 7A-39 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	122
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-39 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	123
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-53 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	124
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-53 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	125
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-53 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	126
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94#7A-75 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	127
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 7A-40 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	128
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-40 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	129
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 7A-99 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	130
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-80 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	131
Fecha de toma:	15/085/2023
Localización:	Calle 94 #9-10 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	132
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 9 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	133
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #7A-52 separador
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	134
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-94 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	135
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-29 separador
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	136
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-81 separador
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	137
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-9 costdo norte
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	138
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-9 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	139
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-81 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	140
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-1 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	145
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #9-9 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	146
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94#9-63 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	147
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #10-2 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	148
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 10 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA





Foto No.:	149
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #10 separador
Descripción:	Tamo sin actividad

Foto No.:	150
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 10costado sur
Descripción:	Tramo sin intervención





Foto No.:	151
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #10 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion

Foto No.:	152
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #10 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	153
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	154
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 11 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	155
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-25 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	156
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-25 separador
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	157
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-25 separador
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	158
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-17 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	159
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-17 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	160
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-17 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	161
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-25 costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	162
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-25 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	163
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11A costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	164
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 11A separador
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA

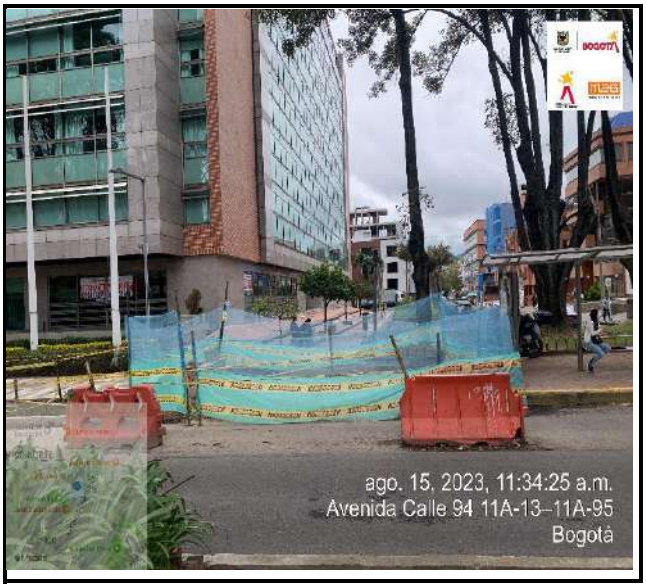


Foto No.:	165
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11A-13 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	166
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11A-13 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	167
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11A-13 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención



Foto No.:	168
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11A-13 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervención

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	169
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11-13 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	170
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #11A separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	171
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13-57 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	172
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	calle 94 #13-57 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	173
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 13-11 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	174
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 13-11 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	175
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13-11 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	176
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13-11 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	177
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13 costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	178
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	179
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 13-11 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	180
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 # 13-11 costado norte
Descripción:	Tramo sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	181
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13-61 costado norte
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	182
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #13-61 costado sur
Descripción:	Tramo sin actividad

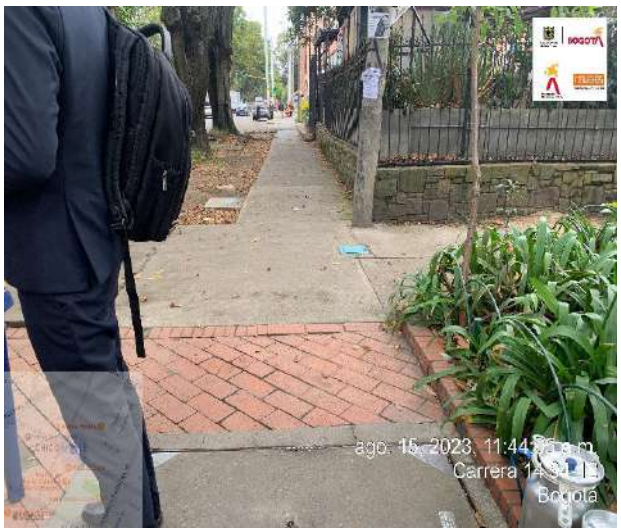


Foto No.:	183
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #14 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	184
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #14 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	185
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15 costado sur
Descripción:	Tamo sin actividad



Foto No.:	186
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15-27 separador
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	187
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15-27 separador
Descripción:	Tramo sin actividad



Foto No.:	188
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15-27 separador
Descripción:	Tramo Sin actividad

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	189
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15-19 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	190
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15-23 costado norte
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	191
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15-33 separador
Descripción:	Tramo sin activiudad



Foto No.:	192
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #15 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES ´PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FR-INT-53
Versión: 30/09/2022

PROYECTO: IDU-1504

PERÍODO: 15 DE AGOSTO DEL 2023 **ÁREA:** TÉCNICA



Foto No.:	193
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #23-17 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	194
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #23-39 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	195
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #23-39 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion



Foto No.:	196
Fecha de toma:	15/08/2023
Localización:	Calle 94 #23-17 costado sur
Descripción:	Tramo sin intervencion

Elaboró:

ANGIE CAMILA CORRALES PORTILLA

Revisó:

JULIAN DAVID GONZALEZ SACHICA
