
FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo restante	Costo	Variación de costo
$ 0.00	$ 19,621,435,784.00	$ 19,621,435,784.00	$ 0.00

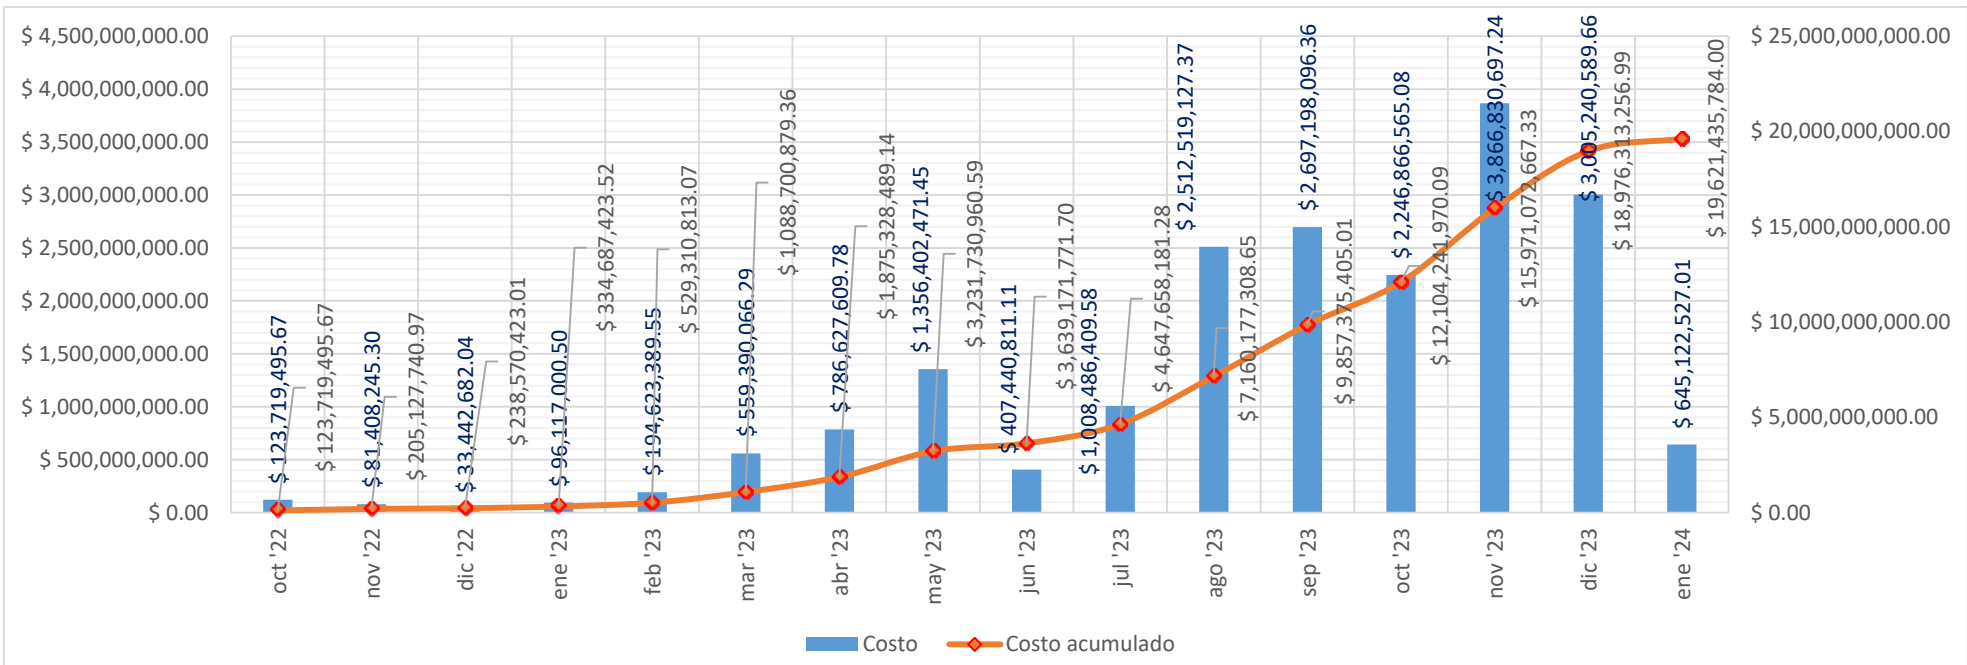

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CPTP
COP 690 DE 2022	$ 19,621,435,784.00	$ 0.00	$ 19,621,435,784.00	$ 2,803,953,205.39
ACTA DE INICIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
FASE PRELIMINARES	$ 215,764,555.00	$ 0.00	$ 215,764,555.00	$ 215,764,555.00
Inicio de la etapa de preliminares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Visita de inicio a segmentos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Relación del equipo mínimo obligatorio	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Programación detallada Fase Preliminar	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
Desglose del AIU ofertado	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Plan de manejo de tránsito- PMT general	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Gestión inicial ante las Empresas de Servicios Publicos - ESP	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTE TECNICO	$ 10,788,227.75	$ 0.00	$ 10,788,227.75	$ 10,788,227.75
Listado de priorización de segmentos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Plan de calidad y plan de inspección y ensayos	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Programación del Plan Anual de Caja - PAC	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Cronograma detallado de Fase de obra	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Presupuesto de obra	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Plan de manejo de tránsito- PMT especifico por tramo	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 103,566,986.40	$ 0.00	$ 103,566,986.40	$ 103,566,986.40
REVISIÓN 1ER 50% DE SEGMENTOS	$ 51,783,493.20	$ 0.00	$ 51,783,493.20	$ 51,783,493.20
REVISIÓN 2DO 50% DE SEGMENTOS	$ 51,783,493.20	$ 0.00	$ 51,783,493.20	$ 51,783,493.20
COMPONENTE AMBIENTAL	$ 12,945,873.30	$ 0.00	$ 12,945,873.30	$ 12,945,873.30
Inventario de sumideros	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Inventario Forestal	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
Manual ambiental de obra - MAO (Capitulo Ambiental)	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
COMPONENTE SST	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
Manual ambiental de	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55

	obra - MAO (Capitulo SST)				
	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
COMPONENTE SOCIAL		$ 66,887,012.05	$ 0.00	$ 66,887,012.05	$ 66,887,012.05
	Actualización del directorio de actores	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	Metodología y cronograma del plan componente social	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	Plan de diálogo ciudadano y comunicación estrategica	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	Mesa de trabajo para revisión de lista de chequeo social	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Diseño elaboración de plantillas para piezas de divulgación para actas de vecindad	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Instalación del punto PAC	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Gestión aviso punto PAC	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Diseño y elaboración de plantilla para reuniones	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Diseño elaboración de plantillas para piezas de divulgación para actas de vecindad	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Diseño elaboración y tramite de piezas de divulgación afiche medio pliego	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Ajuste de formatos para el plan de dialogo ciudadano	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Metodologia y cronograma de actas de vecindad	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Diseño piezas divugación PMT segun COI	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	Logistica para reuniones de inicio una por cada junta de acción comunal	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Presentación de las reuniones de incio	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	Desarrollo de reuniones de inicio	$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	Instalación de puntos satélites de información	$ 6,472,936.65	$ 0.00	$ 6,472,936.65	$ 6,472,936.65
	Levantamiento de actas de vecindad para 10 tramos	$ 6,472,936.65	$ 0.00	$ 6,472,936.65	$ 6,472,936.65
	Registros filmicos de vias utilizadas para desvio y espacios públicos	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Levantamiento de actas de de acceso vehicular	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Levantamiento de actas de compromiso por suspensión acceso vehicular	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Gestión previa para contratación de mano de obra de la localidad	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
INFORMES		$ 4,315,291.10	$ 0.00	$ 4,315,291.10	$ 4,315,291.10
	REVISIÓN 1ER 50% DE SEGMENTOS Informe parcial de apropiación	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	REVISIÓN 2DO 50% DE SEGMENTOS Informe final de apropiación	$ 2,157,645.55	$ 0.00	$ 2,157,645.55	$ 2,157,645.55
	Informe de cierre etapa de preliminares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

INFORMES MENSUALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Fin de la etapa de preliminares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
EJECUCION DE OBRA	$ 17,488,085,391.92	$ 0.00	$ 17,488,085,391.92	$ 2,089,760,639.97
Acta Inicio etapa de Obra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
FASE 1	$ 4,398,100,110.38	$ 0.00	$ 4,398,100,110.38	$ 2,089,519,296.04
TRAMO 81-82	$ 777,509,047.71	$ 0.00	$ 777,509,047.71	$ 636,907,394.55
TRAMO 60-61	$ 769,637,540.84	$ 0.00	$ 769,637,540.84	$ 498,888,485.89
TRAMO 64-65	$ 813,197,960.87	$ 0.00	$ 813,197,960.87	$ 501,825,954.78
TRAMO 73	$ 329,703,608.28	$ 0.00	$ 329,703,608.28	$ 225,362,285.74
TRAMO 76-75	$ 384,187,254.03	$ 0.00	$ 384,187,254.03	$ 58,689,822.25
TRAMO 74	$ 411,085,842.43	$ 0.00	$ 411,085,842.43	$ 87,900,848.58
TRAMO 44	$ 561,510,571.86	$ 0.00	$ 561,510,571.86	$ 41,704,020.81
TRAMO 66	$ 351,268,284.36	$ 0.00	$ 351,268,284.36	$ 38,240,483.45
FASE 2	$ 3,923,095,180.78	$ 0.00	$ 3,923,095,180.78	$ 0.00
TRAMO 50	$ 831,767,962.14	$ 0.00	$ 831,767,962.14	$ 0.00
TRAMO 49-48	$ 1,293,885,374.00	$ 0.00	$ 1,293,885,374.00	$ 0.00
TRAMO 56	$ 409,459,282.17	$ 0.00	$ 409,459,282.17	$ 0.00
TRAMO 92	$ 516,781,569.91	$ 0.00	$ 516,781,569.91	$ 0.00
TRAMO 47-46	$ 871,200,992.56	$ 0.00	$ 871,200,992.56	$ 0.00
FASE 3	$ 3,217,086,534.33	$ 0.00	$ 3,217,086,534.33	$ 241,343.93
TRAMO 68-69	$ 747,061,008.48	$ 0.00	$ 747,061,008.48	$ 241,343.93
TRAMO 70-71	$ 765,754,050.57	$ 0.00	$ 765,754,050.57	$ 0.00
TRAMO 89	$ 563,927,648.60	$ 0.00	$ 563,927,648.60	$ 0.00
TRAMO 93-72	$ 732,049,164.10	$ 0.00	$ 732,049,164.10	$ 0.00
TRAMO 67	$ 408,294,662.58	$ 0.00	$ 408,294,662.58	$ 0.00
FASE 4	$ 1,330,655,864.46	$ 0.00	$ 1,330,655,864.46	$ 0.00
TRAMO 86-85-84-83	$ 566,448,146.83	$ 0.00	$ 566,448,146.83	$ 0.00
TRAMO 55-91-57-78-90	$ 764,207,717.63	$ 0.00	$ 764,207,717.63	$ 0.00
FASE 5	$ 2,617,668,733.06	$ 0.00	$ 2,617,668,733.06	$ 0.00
TRAMO 79	$ 577,123,847.61	$ 0.00	$ 577,123,847.61	$ 0.00
TRAMO 77	$ 561,675,970.66	$ 0.00	$ 561,675,970.66	$ 0.00
TRAMO 80	$ 669,081,735.60	$ 0.00	$ 669,081,735.60	$ 0.00
TRAMO 62-63	$ 809,787,179.19	$ 0.00	$ 809,787,179.19	$ 0.00
FASE 6	$ 2,001,478,968.91	$ 0.00	$ 2,001,478,968.91	$ 0.00
TRAMO 58-59	$ 818,787,834.56	$ 0.00	$ 818,787,834.56	$ 0.00
TRAMO 52	$ 396,096,524.25	$ 0.00	$ 396,096,524.25	$ 0.00
TRAMO 45	$ 786,594,610.10	$ 0.00	$ 786,594,610.10	$ 0.00
Fin etapa de Obra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
COMPONENTES	$ 1,917,585,837.08	$ 0.00	$ 1,917,585,837.08	$ 498,428,010.42
Ambiental y SST	$ 726,092,576.00	$ 0.00	$ 726,092,576.00	$ 275,915,178.88
Diciembre 2022	$ 7,260,925.76	$ 0.00	$ 7,260,925.76	$ 7,260,925.76
Enero 2023	$ 14,521,851.52	$ 0.00	$ 14,521,851.52	$ 14,521,851.52
Febrero 2023	$ 14,521,851.52	$ 0.00	$ 14,521,851.52	$ 14,521,851.52
Marzo 2023	$ 7,260,925.76	$ 0.00	$ 7,260,925.76	$ 7,260,925.76
Abril 2023	$ 14,521,851.52	$ 0.00	$ 14,521,851.52	$ 14,521,851.52
Mayo 2023	$ 363,046,288.00	$ 0.00	$ 363,046,288.00	$ 217,827,772.80
Junio 2023	$ 36,304,628.80	$ 0.00	$ 36,304,628.80	$ 0.00
Julio 2023	$ 36,304,628.80	$ 0.00	$ 36,304,628.80	$ 0.00
Agosto 2023	$ 29,043,703.04	$ 0.00	$ 29,043,703.04	$ 0.00
Septiembre 2023	$ 43,565,554.56	$ 0.00	$ 43,565,554.56	$ 0.00
Octubre 2023	$ 58,087,406.08	$ 0.00	$ 58,087,406.08	$ 0.00
Noviembre 2023	$ 43,565,554.56	$ 0.00	$ 43,565,554.56	$ 0.00
Diciembre 2023	$ 43,565,554.56	$ 0.00	$ 43,565,554.56	$ 0.00
Enero 2024	$ 14,521,851.52	$ 0.00	$ 14,521,851.52	$ 0.00
Social	$ 258,470,067.00	$ 0.00	$ 258,470,067.00	$ 98,218,625.46
Diciembre 2022	$ 2,584,700.67	$ 0.00	$ 2,584,700.67	$ 2,584,700.67
Enero 2023	$ 5,169,401.34	$ 0.00	$ 5,169,401.34	$ 5,169,401.34
Febrero 2023	$ 5,169,401.34	$ 0.00	$ 5,169,401.34	$ 5,169,401.34
Marzo 2023	$ 2,584,700.67	$ 0.00	$ 2,584,700.67	$ 2,584,700.67
Abril 2023	$ 5,169,401.34	$ 0.00	$ 5,169,401.34	$ 5,169,401.34

	Mayo 2023	$ 129,235,033.50	$ 0.00	$ 129,235,033.50	$ 77,541,020.10
	Junio 2023	$ 12,923,503.35	$ 0.00	$ 12,923,503.35	$ 0.00
	Julio 2023	$ 12,923,503.35	$ 0.00	$ 12,923,503.35	$ 0.00
	Agosto 2023	$ 10,338,802.68	$ 0.00	$ 10,338,802.68	$ 0.00
Mostrando 120 de 147 filas. Project solo puede mostrar 120 filas. Intente usar un filtro para obtener mejores resultados					
