Tunja, 18 de octubre de 2023 Oficio N° 019

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023
Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
Asunto: Radicación informe de liquidación con lista de chequeo

Cordial saludo;

La presente tiene como fin llevar a cabo la radicación de la documentación para proceder con la liquidación del contrato de obra N° 845 - 2023, el cual tiene por objeto "SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ", de la siguiente manera:

1. Acta de Terminación
2. Acta de Recibo Final
3. Cuadro de cantidades
4. Factura de venta
5. Certificación bancaria
6. Informe de obra
7. Actas de comité
8. Registro fotográfico
9. Certificado de materiales y fuentes
10. Actas de vecindad
11. Correspondencia enviada y recibida
12. Bitácora de obra
13. Planillas de seguridad social
14. Certificación del pago de Seguridad Social
15. Paz y salvo Empleados y/o Proveedores
16. Certificado Comfaboy
17. Actualización de pólizas
18. Certificación Fic – Sena
19. Certificación de parafiscales
20. Plano record

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Ing. YEISON FABIAN VELOZA VALCÁRCEL
R/L DINCO S.A.S

Con Copia: Archivo
Anexo: 245 folios

ACTA DE TERMINACIÓN

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO No. 845 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS NIT No. 900624568-4 Representado Legalmente por YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL C.C. No. 1.049.616.490

JUAN CARLOS CRUZ MARTÍNEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7173554, en su calidad de Director de la Unidad Especial de Contratación Estatal del Municipio de Tunja, nombrado mediante decreto número 0172 del 22 de marzo de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Municipal de Delegación No. 0009 de enero 2 de 2023, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TUNJA,** con NIT 891800846-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **MUNICIPIO** o Contratante, por una parte y por la otra **YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL,** identificado(a) con **C.C 1.049.616.490** obrando en nombre y representación legal de **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS con NIT No. 900624568-4**, hemos acordado suscribir la presente Acta de Terminación Anticipada de Mutuo Acuerdo previo las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1.- Que las partes suscribieron el 02 de junio de 2023 el contrato No. 845 DE 2023, cuyo objeto es: **SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.**

2.- Que el plazo de ejecución inicial era de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio.

3.- Que, el diecisiete (17) de julio de 2023 se suscribió acta de inicio; en vista de lo anterior, la fecha de terminación del mismo está prevista para el dieciséis (16) de octubre de 2023.

4.- Que el día 06 de septiembre de año 2023 se recibe la terminación total de la obra cumpliendo así con lo contratado y solicitado en el objeto contractual.

5.- Que por lo anterior se entiende que las partes supervisor y contratista, concertan la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de obra 845 de 2023 que tenía ejecución desde 17 de julio de 2023, terminándolo anticipadamente de mutuo acuerdo el día **06 DE SEPTIEMBRE DE 2023**.

6.- Que "la terminación por mutuo acuerdo es un negocio jurídico en virtud del cual las partes acuerdan extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal celebrado" en consecuencia, al momento de suscribir el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato suscrito entre el municipio de Tunja y **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS** representado legalmente por el señor

YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL, se establece que la terminación de la obra fue realizada de manera ordenada y cumpliendo con cada uno de los ítems previstos y no previstos.

7.- Así como se realizó la evaluación detallada por parte de la supervisión de cada una de las actividades realizadas en obra cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades contratadas.

8.- Que "La terminación por mutuo acuerdo es un negocio jurídico en virtud del cual las partes acuerdan extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal celebrado"; en consecuencia, al momento de suscribir la presente acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato suscrito entre el Municipio de Tunja y **YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL,** obrando en nombre y representación legal de **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS**, se establece que la causa es haber recibido por parte de la supervisión las obras contratadas ejecutadas en un tiempo menor al inicialmente previsto.

9.- Que la terminación anticipada del contrato 845 de 2023 por mutuo acuerdo entre las partes resulta procedente, considerando la motivación para la terminación y el aval de la supervisión del contrato plasmado en el documento de solicitud de modificación contractual en donde se establece que el plazo total de ejecución del contrato 845 de 2023 es de **17 DE JULIO A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

10.- Que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece "De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales. Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1896 y Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 4266 de 2010. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.

11.- Que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece "*De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales.* ***Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales*** 1896 ***y*** , Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 4266 de 2010. *Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.*

12.- Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala*: "**Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (…)*

13.- Que de acuerdo con el código civil artículo 1495 Contrato es "*un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer, o no hacer alguna cosa, Cada parte puede ser de una o muchas personas*"

En consecuencia, las partes

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Terminar anticipadamente y por Mutuo Acuerdo el CONTRATO **845 DE 2023**, suscrito entre las partes, con efectos fiscales y económicos hasta el día **06 de septiembre de 2023, inclusive**, de acuerdo con la parte motiva del presente documento.

ARTICULO SEGUNDO: Procédase a la liquidación del contrato objeto de esta acta en los términos y con los valores establecidos por el supervisor del contrato, previa acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor en los términos del contrato y por el tiempo ejecutado del mismo.

ARTICULO QUINTO: La presente acta se perfecciona con las firmas electrónicas de las partes a través de la plataforma **SECOP II** y los efectos fiscales y económicos de la relación contractual se producirán hasta el **06 de septiembre de 2023.**

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 845 DE 2023 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II.

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

FECHA PRESENTE ACTA	06 de Septiembre de 2023		
CONTRATO _CONVENIO __	845	FECHA	Febrero de 2023
OBJETO:	SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($24.204.806)**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES.		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS NIT No. 900624568-4		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		
FECHA INICIO	17 DE JUILIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° 1 VALOR $	$ 4.312.976 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.		
PRORROGA N° _____TIEMPO			
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	17 DE JULIO 2023 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los seis (06) días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Territorial, el señor(a) JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.628.673 , obra como Supervisor del Contrato 845 de 2023 y el señor(a) YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL , identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.616.490 , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION , correspondiente al periodo total del: 17 de Julio de 2023 al 06 de septiembre de 2023, en los siguientes términos:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:	Para recibo a satisfaccion del contrato, el contratista debe adjuntar el Informe Final y demas documentos estipulados en el prielgo de condiciones.

FIRMA:

NOMBRE: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		Richard Mauricio Chaves Vacca	apoyo a la supervision	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

ACTA DE RECIBO FINAL

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 02**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**	**CÓDIGO: CON-F-077**

FECHA PRESENTE ACTA	20 SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATO __	845	FECHA	Febrero de 2023
OBJETO:	SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($24.204.806)**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES.		
CONTRATANTE__ PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS NIT No. 900624568-4		
CONTRAPARTE __ INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		
FECHA INICIO	17 DE JUILIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° 1 VALOR $	$ 4.312.976 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.		
PRORROGA N°			
FECHA DE TERMINACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PERIODO TOTAL DE	17 DE JULIO 2023 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Territorial, el señor(a) JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.628.673 , obra como Supervisor del Contrato 845 de 2023 y el señor(a) YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL , identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.616.490, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 06 de Septiembre de 2023 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 02**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**	**CÓDIGO: CON-F-077**

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: YEISON FABIÁN VELOZA VALCARCEL
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Richard Mauricio Chaves Vacca	apoyo a supervision	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

SÁBANA Y MEMORIAS DE CANTIDADES

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CON-F046
	FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	

ACTA N°	Cantidades Ejecutadas	FECHA PRESENTE ACTA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATO DE OBRA (N° /	845 DE 2023

OBJETO: SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓNLOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

		VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 24.204.806,00
FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION No. 01	14 DE AGOSTO DE 2023	VALOR TOTAL ADICIONES	$ 4.312.976,00
CONTRATO DE OBRA No :	845 DE 2023	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 4.312.976,00
CONTRATISTA:	ING. YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)	$ 28.517.778,00
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	ING. JULIAN FERNANDO HERNANADEZ	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. JULIAN FERNANDO HERNANADEZ	VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA	$ 28.517.778,00
PLAZO TOTAL	3 MESES	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	$ 28.517.778,00

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:

1. Que analizando las condiciones reales, obras preliminares, prioritarias dentro de la remodelacion, y adecuacion de la infraestructura a intervenir y una vez efectuado un replanteo del objeto y alcance del contrato en mencion, se ve la necesidad de crear items requeridos y obligatorios, asi como la modificacion de algunas cantidades, para realizar la totalidad de actividades de mantenimiento y adecuacion, que garanticen a su vez la calidad y estabilidad de las obras a realizar. Todo esto con el fin de obtener obras terminadas y funcionales, tendientes al cumplimiento del objteo del presente contrato.

2.

3.

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
							MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES				
ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
							1.01. PRELIMINARES				
1,1	1.01.21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CM/S	M2	18,75	$ 24.320,00	$ 456.000	-	-2,25	- 54.720,00	16,50	$ 401.280,00
1,2	1.01.59	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	9,45	$ 6.896,00	$ 65.167	+	8,55	58.961,00	18,00	$ 124.128,00
1,3	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	18,75	$ 4.105,00	$ 76.969	-	-2,25	- 9.236,00	16,50	$ 67.733,00
							1.02. CIMENTACION Y DESAGUES				
2,1	1.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts 14 MPa - (2000 PSI)	M2	16,56	$ 25.441,00	$ 421.303	-	-12,94	- 329.207,00	3,62	$ 92.096,00
2,2	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	1,00	$ 305.017,00	$ 305.017	=	0,00	-	1,00	$ 305.017,00
2,3	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	M3	1,29	$ 605.847,00	$ 781.543	-	-0,04	- 24.234,00	1,25	$ 757.309,00
2,4	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,37	$ 579.843,00	$ 214.542	=	0,00	-	0,37	$ 214.542,00
2,5	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,51	$ 56.221,00	$ 84.894	+	5,39	303.031,00	6,90	$ 387.925,00
2,6	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	ML	4,15	$ 19.534,00	$ 83.020	-	-2,85	- 55.672,00	1,40	$ 27.348,00
2,7	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	4,10	$ 15.325,00	$ 62.833	+	0,70	10.728,00	4,80	$ 73.560,00
2,8	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	408,15	$ 5.613,00	$ 2.290.946	-	-4,47	- 25.090,00	403,68	$ 2.265.856,00
2,9	1.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KG	30,75	$ 5.244,00	$ 161.253	+	3,53	18.511,00	34,28	$ 179.764,00
							1.03. ESTRUCTURAS				
3,1	1.03.02	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3	M3	1,03	$ 1.059.619,00	$ 1.091.408	-	-0,28	- 296.693,00	0,75	$ 794.714,00
3,2	1.03.24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,75	$ 735.966,00	$ 551.975	=	0,00	-	0,75	$ 551.975,00
							1.04. MAMPOSTERIA				
4,1	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	23,51	$ 50.311,00	$ 1.178.110	-	-4,40	- 220.488,00	19,11	$ 957.621,00

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CON-F046
	FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	

ACTA N°	Cantidades Ejecutadas	FECHA PRESENTE ACTA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATO DE OBRA (N° /	845 DE 2023

OBJETO: SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓNLOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

							1.05. PAÑETES				
5,1	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	43,11	$ 6.804,00	$ 293.320	+	25,91	176.292,00	69,02	$ 469.612,00
5,2	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	77,71	$ 17.160,00	$ 1.333.504	-	-1,25	- 21.450,00	76,46	$ 1.312.054,00
							1.06 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
6,1	1.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ML	2,70	$ 29.959,00	$ 80.889	-	-0,90	- 26.963,00	1,80	$ 53.926,00
6,2	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	6,00	$ 63.936,00	$ 383.616	-	-6,00	- 383.616,00	0,00	$ -
6,3	1.06.14	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2,00	$ 73.759,00	$ 147.518	=	0,00	-	2,00	$ 147.518,00
6,4	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P	ML	3,73	$ 8.655,00	$ 32.283	=	0,00	-	3,73	$ 32.283,00
6,5	1.06.24	SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE	UND	1,00	$ 34.599,00	$ 34.599	=	0,00	-	1,00	$ 34.599,00
							1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	1.07.04	SALIDA LAMPARA TOMA EN PVC COMPLETA	UND	4,00	$ 113.958,00	$ 455.832	-	-1,00	113.958,00	3,00	$ 341.874,00
7,2	1.07.06	SALIDA T.V. PVC COMPLETA	UND	1,00	$ 100.483,00	$ 100.483	+	1,00	100.483,00	2,00	$ 200.966,00
							1.09. PINTURA				
8,1	1.09.08	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	7,81	$ 9.400,00	$ 73.414	+	27,48	258.312,00	35,29	$ 331.726,00
8,2	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	77,71	$ 10.746,00	$ 835.072	+	168,66	1.812.371,00	246,37	$ 2.647.443,00
							1.10. ENCHAPES				
9,1	1.10.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3	UND	1,00	$ 9.912,00	$ 9.912	=	0,00	-	1,00	$ 9.912,00
							1.11 PISOS– BASES- ACABADOS				
10,1	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	15,51	$ 28.722,00	$ 445.478	-	-0,59	- 16.946,00	14,92	$ 428.532,00
10,2	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	23,27	$ 48.490,00	$ 1.128.362	-	-20,29	- 983.862,00	2,98	$ 144.500,00
10,3	1.11.15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	20,51	$ 42.047,00	$ 862.384	-	-5,59	- 235.043,00	14,92	$ 627.341,00
10,4	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI	M2	15,51	$ 56.897,00	$ 882.472	-	-0,59	- 33.569,00	14,92	$ 848.903,00
							1.12 CUBIERTAS				
11,1	1.12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA	ML	17,91	$ 83.637,00	$ 1.497.939	+	0,09	7.527,30	18,00	$ 1.505.466,00
11,2	1.12.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO	M2	15,70	$ 44.378,00	$ 696.735	-	-6,70	- 297.333,00	9,00	$ 399.402,00
11,3	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	ML	5,97	$ 30.559,00	$ 182.437	+	3,03	92.594,00	9,00	$ 275.031,00
							1.13. CIELO RASOS				
12,1	1.13.06	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	9,08	$ 51.086,00	$ 463.861	+	9,63	491.958,00	18,71	$ 955.819,00
							3.03 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION				
13,1	3.03.09	DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"	ML	5,20	$ 164.229,00	$ 853.991	-	-0,30	- 49.269,00	4,90	$ 804.722,00
							ITEMS NO PREVISTOS				
14,1	1.12.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2	0,00	$ 61.861,61	$ -	+	9,00	556.754,00	9,00	$ 556.754,00
14,2	1.01.49	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	0,00	$ 5.809,30	$ -	+	6,00	34.856,00	6,00	$ 34.856,00
14,3	1.01.34	DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	0,00	$ 6.090,93	$ -	+	52,21	318.007,00	52,21	$ 318.007,00
14,4	2.05.31	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	0,00	$ 5.553,66	$ -	+	8,00	44.429,00	8,00	$ 44.429,00
14,5	2.05.32	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3"	UND	0,00	$ 9.589,66	$ -	+	3,00	28.769,00	3,00	$ 28.769,00
14,6	1.11.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM	ML	0,00	$ 12.660,29	$ -	+	20,42	258.523,00	20,42	$ 258.523,00
14,7	1.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER	UND	0,00	$ 34.726,02	$ -	+	13,00	451.438,00	13,00	$ 451.438,00
14,8	1.09.22	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	0,00	$ 17.044,94	$ -	+	4,69	79.941,00	4,69	$ 79.941,00
14,9	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	0,00	$ 17.576,11	$ -	+	10,12	177.870,00	10,12	$ 177.870,00
14,10	1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	0,00	$ 16.684,41	$ -	+	3,83	63.901,00	3,83	$ 63.901,00
14,11	1.04.15	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	0,00	$ 51.834,72	$ -	+	3,72	192.825,00	3,72	$ 192.825,00
14,12	1.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO	ML	0,00	$ 74.262,48	$ -	+	6,00	445.575,00	6,00	$ 445.575,00

4

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CÓDIGO: CON-F048

ACTA N°	Cantidades Ejecutadas	FECHA PRESENTE ACTA	14 DE AGOSTO DE 2023	CONTRATO DE OBRA (N° /	845 DE 2023

OBJETO: SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓNLOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

14,13	1.18.03	ASEO GENERAL ENTREGA		M2	0,00	$ 7.119,00	$ -	+	71,63	511.367,00	71,63	$ 511.367,00
			AJUSTE AL PESO									
			TOTAL COSTO DIRECTO				$ 18.619.078,00			$ 3.317.674,00		$ 21.936.752,00
			ADMINISTRACION	23%			$ 4.282.388,00			$ 763.065,00		$ 5.045.453,00
			IMPREVISTOS	2%			$ 372.382,00			$ 66.353,00		$ 438.735,00
			UTILIDAD	5%			$ 930.954,00			$ 165.884,00		$ 1.096.838,00
			TOTAL AIU	30%			$ 5.585.723,00			$ 995.302,00		$ 6.581.026,00
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 24.204.802,00			$ 4.312.976,00		$ 28.517.778,00

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR CONTRATO

Ing. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Vo.Bo. SECRETARIO DE LA SECTORIAL

Ing. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA

FIRMA CONTRATISTA

Ing. YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FACTURA DE VENTA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS

NIT 900624568-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764054188846
Fecha 22/08/2023 - 22/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FVD28 al FVD50

Departamento	Fecha		
Boyacá	21	09	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FVD29

Cliente:	MUNICIPIO DE TUNJA	**NIT:**	891800846-1	**Fecha de firmado:**	21/09/2023 15:44:52
Dirección:	CALLE 19 N 9 - 69	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	87405770
Email:	hacienda@tunja.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Septiembre 21 del 2023	**Hora emisión:**	15:44:50	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	001	1,00	COSTO DIRECTO LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N 845 DE 2023 CUYO OBJETO ES SIT-92 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017-046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA.	WSD	$21.936.752,00	$21.936.752,00
2	AIU01	1,00	ADMINISTRACION 23%	WSD	$5.045.453,00	$5.045.453,00
3	AIU02	1,00	IMPREVISTOS 2%	WSD	$438.735,00	$438.735,00
4	AIU03	1,00	UTILIDAD 5%	WSD	$1.096.838,00	$1.096.838,00

SON: (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS)
CUFE: 6fbcea2b2614e381469465a0b7441011594a110ef906cc803b8bd7805b91ffa54883c30a0402ab9b99d3e923ee992aef

NOTAS:

SUBTOTAL:	$28.517.778,00
TOTAL:	$28.517.778,00

Firma Digital: M+KuihkTQolLmN5vTGrZUMuGhoUukwNh5yiOs5cuE4/NDJxkrj+CQOOeZg5c7Hs/
bNkqBx8cuW8e2pMMdol4FHee8yYVQk+RGT4tlXtv5KmCKpgeMG
fUV4QEbv7A1rvw OlMqZVyRViU0sgf5SByC5i++Xct2BsduN0Gl05VEwi2nwTp3xnjQSBnWbTomcmeX zQUmsT4jg2gQPUsf47OOftLiWjhpau86Alz
XfswuLl5oQqZep1MhpdsrnNtBV5q5 F9FwB1rujnTTBKYROmcW74fRya5D+ACG0WGSk5eRs19a523+VAmY+Rvbtp4GOscp H9KevQLOVc/XMfb2DJUc
Eg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 15/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS** con **NIT 900.624.568-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 176500050321

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE OBRA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

8

INFORME DE OBRA										DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS			
INFORME DE OBRA No:		7		FECHA:	4	de	SEPTIEMBRE	de	2023				
PERIODO:	DEL	17	de	JULIO	de	2023	AL	31	de	AGOSTO	de	2023	
CONTRATO No:	845	DE	2023										

OBJETO:

SIT-92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTRABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA- BOYACÁ

LOCALIZACION:

CARRERA 13 # 21 - 12

CONTRATANTE

TUNJA (BOY)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS	YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL DE OBRA N° 1	$ 4,312,976.00	N/A
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 4,312,976.00	

VALOR INICIAL:	$ 24,204,806.00	VALOR ADICIONALES:	$ 4,312,976.00	VALOR TOTAL:	$ 28,517,782.00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	16	de	OCTUBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	16	de	OCTUBRE	de	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	45.6%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.0%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	50.07%



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	51-44-101022811	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							24	8	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	7	2023	27	7	2024	$ 5,703,556.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	7	2023	27	1	2027	$ 5,703,556.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31	8	2023	31	8	2028	$ 5,703,556.40

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan lluvias, el 90% de las lluvias en horas de la tarde

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa
ACTA DE INICIO	17	7	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Demolición de pisos de concreto <=10 cms	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Desmonte estructura madera teja en asbesto cemento	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Localización y replanteo obra arquitectónica	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Base en concreto pobre e=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Cajas de inspección de 60x60x60 cm ladrillo	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Concreto de zapatas 21MPa + formaleta	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Concreto viga de amarre 21,1 MPa, seccion rectangular	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Excavación manual en material común (Incluye retiro)	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación tubería pvc sanitaria d= 3"	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación tubería PVC sanitaria d= 2"	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161

3

INFORME DE OBRA	DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS
Suministro figurada y amarre de acero 60000 psi 420 MPa	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación malla electrosoldada u-84	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Columnas en concreto 21 MPa (3000 psi), altura mayor a 3 mts-formaleta madera	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Viga amarre sobre muro 21 MPa - (3000 psi)	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Muro tolete común e=0.10 mts.	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Filos y dilataciones en pañetes	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Pañete liso muros 1:4	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de bajante de agua lluvia. pvc. 3.	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de canal en lamina cold rolled cal. 20 d=0.75 con pintura y anticorrosivo	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Punto agua fría pvc-p 1/2" paral de techo	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de red suministro tubería pvc-p 1/2" rde 9	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación registro cortina roscado red-white 1/2"	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Salida lampara toma en pvc completa	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Salida t.v. pvc completa	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Esmalte marcos lamina 3 manos	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Estuco y vinilo tres manos en muros	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de rejillas plásticas sosco 4*4*3	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Alistado piso e= 4 cm - 1:5	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Base en material de afirmado compactado	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Piso cerámica 25*25 cm	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Placa base en concreto e=10cm 2500 psi	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de estructura metálica p/teja fibrocemento	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento numero 10	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación flanche en lamina	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Alistado piso e= 4 cm - 1:5	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Base en material de afirmado compactado	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Piso cerámica 25*25 cm	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Placa base en concreto e=10cm 2500 psi	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de estructura metálica p/teja fibrocemento	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento numero 10	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación flanche en lamina	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Cielo raso en drywall ½	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Drenes horizontales tubería PVC perforada con filtro 2"	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación cubierta en teja transparente no. 6 no incluye entramado	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Desmonte canales - bajantes	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Demolición pañetes	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación codo PVC sanitario d=2"	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación codo PVC sanitario d=3"	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de guarda escoba virola 8 cm	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación panel led sobreponer	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Vinilo tipo II sobre pañete dos manos bajo placa	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Pintura fachada en vinilo para exteriores	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Esmalte lamina llena 3 manos	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Muro en bloque No.5 e=0.12 mts	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Suministro e instalación de canal pavco raingo	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161
Aseo general entrega	Tunja - Boyacá 5.504772 -73.375161

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Volqueta	Retiro de escombro	10%	No se generarón
Vibro de concreto	Concretos	30%	No se generarón
Pulidora	Demoliciones	40%	No se generarón

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Cemento	GyJ	No se generarón
Arena	Ferreteria del sur	No se generarón
Gravilla	Ferreteria del sur	No se generarón
Acero	GyJ	No se generarón

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		NO APLICA
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		NO APLICA

INFORME DE OBRA	DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
8/06/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 1: Solicitud de ajuste de precios y comité de obra	Respuesta de oficio 01 de fecha 08 de junio de 2023
6/07/2023	Dinco SAS	Oficio 1.10.1-2-1 045: Solicitud de infomación	Oficio N° 2
10/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 2: Respuesta oficio 1.10.1-2-1 045 del 7 de julio 2023	Respuesta el 7/13/2023
13/07/2023	Dinco SAS	Reiteración de observaciones	Oficio N° 4
14/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Mail para adjuntar polizas actualizadas	Aprobado
17/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 3: Radicación documentos para acta de inicio	Respuesta Oficio N 1.10.1-2-3 955
24/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 4:Radicación documentación faltante	Respuesta Oficio N 1.10.1-2-3 955
25/07/2023	Dinco SAS	Oficio N 1.10.1-2-3 955: Verificación de la información solicitada (PMA, PMT, AFILIACIONES) y solicitud de la radicación del primer informe semanal.	Oficio N° 5 y N° 6
31/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 5: Radicación informe de avance de obra semanal N°1	Aprobado
25/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 6: Respuesta Oficio N 1.10.1-2-3 955	Aceptación de respuesta
31/07/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 7: Radicación informe de avance de obra semanal N° 2	Aprobado
3/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 8: Radicación de balances de obra	Aprobado
8/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 9: Radicación informe de avance de obra semanal N° 3	Aprobado
10/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 10: Radicación de balance de obra	Observaciones expresadas en el comité N° 4 realizado el dia 8/10/2023
10/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 11: Radicación de balance de obra ajustado	Aprobado
11/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 12: Radicación de balance de obra ajustado	Aprobado
14/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 13: Radicación informe de avance de obra semanal N° 4	Aprobado
22/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 14: Radicación informe de avance de obra semanal N° 5	Aprobado
25/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 15: Radicación polizas con adición N° 1	Aprobado
31/08/2023	Secretaria de Infraestructura territorial	Oficio N° 16: Radicación informe de avance de obra semanal N° 6	Aprobado

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Yeison Fabian Veloza Valcarcel	1,049,616,490	x	x	x	17	7	2023	26	8	2023
Felkin Oswaldo Garcia Agudelo	1,049,614,604	x	x	x	17	7	2023	26	8	2023
Jorge Enrique Muñoz Villate	1,193,374,254	x	x	x	17	7	2023	26	8	2023
Gustavo Bohorquez Castro	4,287,638	x	x	x	17	7	2023	26	8	2023
Carlos Andres Muñoz Villate	1,002,687,612	x	x	x	17	7	2023	26	8	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Residente de obra	Yeison Fabian Veloza Valcarcel	1,049,616,490
Axiliar de residente de obra	Felkin Oswaldo Garcia Agudelo	1049614604

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

INFORME DE OBRA	DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN
NO APLICA				NO APLICA

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Cemento			
Base Granular			
Arena			
Gravilla			

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN
Acta de Comité de Obra No 1	19	7	2023	Dar continuidad con las actividades contratadas y proxima reunión se tomaran las acciones a preoceder, apenas se encuentre la caja mas baja del desague
Acta de Comité de Obra No 2	25	7	2023	Avanzar en actividades de amarre y acero debidamente amarrado como lo indica la norma NSR10 y evaluar el acople de canal habitación y patio para no tener vertimientos del agua
Acta de Comité de Obra No 3				
Acta de Comité de Obra No 4	10	8	2023	Solicitud de modificación de contrato ítems no previstos. Se entrega bitácora con un avance de obra del 45%. Se coordina las actividades que se desarrollaran la siguiente semana
Acta de Comité de Obra No 5	24	8	2023	Para la terminación del contrato faltaria remates de pintura, acabados y aseo general de la vivienda
Acta de Comité de Obra No 6	29	8	2023	Se programa de recibo de obra para el día jueves 1 de septiembre de 2023 teniendo en cuenta los compromisos como aseo general y pañete del muro y para el día 4 de septiembre de 2023 se entregan informe final.

RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa	OBSERVACIÓN
Radicación informe de avance de obra semanal N°1	17	7	2023	22	7	2023	Aprobado por entidad
Radicación informe de avance de obra semanal N°2	24	7	2023	29	7	2023	Aprobado por entidad
Radicación informe de avance de obra semanal N°3	31	7	2023	5	8	2023	Aprobado por entidad
Radicación informe de avance de obra semanal N°4	7	8	2023	12	8	2023	Aprobado por entidad
Radicación informe de avance de obra semanal N°5	14	8	2023	19	8	2023	Aprobado por entidad
Radicación informe de avance de obra semanal N°6	21	8	2023	26	8	2023	Aprobado por entidad

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Dinco SAS / RL Interventoría

NOMBRE: Yelson Fabian Veloza Valcárcel

SÁBANA Y MEMORIAS DE CANTIDADES

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

AVANCE DE OBRA - INFORME DE LIQUIDACIÓN

SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

			CONDICIONES ORIGINALES MODIFICADAS CON ADICIÓN N° 1					CANTIDADES EJECUTADAS PARA RECIBO FINAL	
ITEM	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1			1.01 PRELIMINARES						
1.1	1.01.21		DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	16.50	$ 24,320.00	$ 401,280.00	16.50	$ 401,280.00
1.2	1.01.59		DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	18.00	$ 6,896.00	$ 124,128.00	18.00	$ 124,128.00
1.3	1.01.68		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	16.50	$ 4,105.00	$ 67,733.00	16.50	$ 67,733.00
2			1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES						
2.1	1.02.01		BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	3.62	$ 25,441.00	$ 92,096.00	3.62	$ 92,096.00
2.2	1.02.04		CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	1.00	$ 305,017.00	$ 305,017.00	1.00	$ 305,017.00
2.3	1.02.11		CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	M3	1.25	$ 605,847.00	$ 757,309.00	1.25	$ 757,309.00
2.4	1.02.13		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0.37	$ 579,843.00	$ 214,542.00	0.37	$ 214,542.00
2.5	1.02.17		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6.90	$ 56,221.00	$ 387,925.00	6.90	$ 387,925.00
2.6	1.02.38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	ML	1.40	$ 19,534.00	$ 27,348.00	1.40	$ 27,348.00
2.7	1.02.37		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	4.80	$ 15,325.00	$ 73,560.00	4.80	$ 73,560.00
2.8	1.02.42		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	403.68	$ 5,613.00	$ 2,265,856.00	403.68	$ 2,265,856.00
2.9	1.02.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KG	34.28	$ 5,244.00	$ 179,764.00	34.28	$ 179,764.00
3			1.03 ESTRUCTURAS						
3.1	1.03.02		COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA MADERA	M3	0.75	$ 1,059,619.00	$ 794,714.00	0.75	$ 794,714.00
3.2	1.03.24		VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0.75	$ 735,966.00	$ 551,975.00	0.75	$ 551,975.00
4			1.04 MAMPOSTERIA						
4.1	1.04.30		MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	19.11	$ 50,111.00	$ 957,621.00	19.11	$ 957,621.00
5			1.05 PAÑETES						
5.1	1.05.02		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	69.02	$ 6,804.00	$ 469,612.00	69.02	$ 469,612.00
5.2	1.05.13		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	76.46	$ 17,160.00	$ 1,312,054.00	76.46	$ 1,312,054.00
6			1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
6.1	1.06.05		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ML	1.80	$ 29,959.00	$ 53,926.00	1.80	$ 53,926.00
6.2	1.06.09		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	0.00	$ 63,936.00	$ -	0.00	$ -
6.3	1.06.14		PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2.00	$ 73,759.00	$ 147,518.00	2.00	$ 147,518.00
6.4	1.06.23		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	3.73	$ 8,655.00	$ 32,283.00	3.73	$ 32,283.00
6.5	1.06.24		SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	UND	1.00	$ 34,599.00	$ 34,599.00	1.00	$ 34,599.00
7			1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.1	1.07.04		SALIDA LAMPARA TOMA EN PVC COMPLETA	UND	3.00	$ 113,958.00	$ 341,874.00	3.00	$ 341,874.00
7.2	1.07.06		SALIDA T.V. PVC COMPLETA	UND	2.00	$ 100,483.00	$ 200,966.00	2.00	$ 200,966.00
8			1.09 PINTURA						
8.1	1.09.08		ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	35.29	$ 9,400.00	$ 331,726.00	35.29	$ 331,726.00
8.2	1.09.13		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	246.37	$ 10,746.00	$ 2,647,443.00	246.37	$ 2,647,443.00
9			1.10 ENCHAPE						
9.1	1.10.17		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4"4"3	UND	1.00	$ 9,912.00	$ 9,912.00	1.00	$ 9,912.00
10			1.11 PISOS– BASES- ACABADOS						
10.1	1.11.04		ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	14.92	$ 28,722.00	$ 428,532.00	14.92	$ 428,532.00
10.2	1.11.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	2.98	$ 48,490.00	$ 144,500.00	2.98	$ 144,500.00
10.3	1.11.15		PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	14.92	$ 42,047.00	$ 627,341.00	14.92	$ 627,341.00
10.4	1.11.26		PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI	M2	14.92	$ 56,897.00	$ 848,903.00	14.92	$ 848,903.00
11			1.12 CUBIERTAS						
11.1	1.12.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	ML	18.00	$ 83,637.00	$ 1,505,466.00	18.00	$ 1,505,466.00
11.2	1.12.23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	9.00	$ 44,378.00	$ 399,402.00	9.00	$ 399,402.00
11.3	1.12.37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	ML	9.00	$ 30,559.00	$ 275,031.00	9.00	$ 275,031.00
12			1.13 CIELO RASOS						
12.1	1.13.06		CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	18.71	$ 51,086.00	$ 955,819.00	18.71	$ 955,819.00
13			3.03 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION						
13.1	3.03.09		DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"	ML	4.90	$ 164,229.00	$ 804,722.00	4.90	$ 804,722.00
14									
14.1	1.12.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2	9.00	$ 61,861.61	$ 556,754.00	9.00	$ 556,754.00
14.2	1.01.49		DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	6.00	$ 5,809.30	$ 34,856.00	6.00	$ 34,856.00
14.3	1.01.34		DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	52.21	$ 6,090.93	$ 318,007.00	52.21	$ 318,007.00
14.4	2.05.31		SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	8.00	$ 5,553.66	$ 44,429.00	8.00	$ 44,429.00
14.5	2.05.32		SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3"	UND	3.00	$ 9,589.66	$ 28,769.00	3.00	$ 28,769.00
14.6	1.11.40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM	ML	20.42	$ 12,660.29	$ 258,523.00	20.42	$ 258,523.00
14.7	1.07.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER	UND	13.00	$ 34,726.02	$ 451,438.00	13.00	$ 451,438.00
14.8	1.09.22		VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	4.69	$ 17,044.94	$ 79,941.00	4.69	$ 79,941.00
14.9	1.09.17		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	10.12	$ 17,576.11	$ 177,870.00	10.12	$ 177,870.00
14.10	1.09.05		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	3.83	$ 16,684.41	$ 63,901.00	3.83	$ 63,901.00
14.11	1.04.15		MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	3.72	$ 51,834.72	$ 192,825.00	3.72	$ 192,825.00
14.12	1.12.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO	ML	6.00	$ 74,262.48	$ 445,575.00	6.00	$ 445,575.00
14.13	1.18.03		ASEO GENERAL ENTREGA	M2	71.63	$ 7,139.00	$ 511,367.00	71.63	$ 511,367.00
						COSTOS DIRECTOS	$ 21,936,752.00		$ 21,936,752.00
						ADMINISTRACION (23%)	$ 5,045,453.00		$ 5,045,453.00
						IMPREVISTOS (2%)	$ 438,735.00		$ 438,735.00
						UTILIDAD (5%)	$ 1,096,838.00		$ 1,096,838.00
						COSTOS DIRECTOS	$ 28,517,778.00		$ 28,517,778.00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1, PRELIMINARES	
ÍTEM	1.1	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.72	3.03				8.24
Habitación	2.86	2.80				8.01
Bocapuerta habitación	0.90	0.15				0.14
Bocapuerta cocina a patio	0.76	0.15				0.11
TOTAL						16.50

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA


MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1, PRELIMINARES
ÍTEM	1.2 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	3.00	3.00				
Habitacion	3.00	3.00				9.00
TOTAL						9.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBO

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1, PRELIMINARES	
ÍTEM	1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.72	3.03				8.24
Habitación	2.86	2.80				8.01
Bocapuerta habitación	0.90	0.15				0.14
Bocapuerta cocina a patio	0.76	0.15				0.11
TOTAL						16.50

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES
ÍTEM	2.2 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO
UNIDAD	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio					1.00	1.00
TOTAL						1.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES	
ÍTEM	2.3	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA
UNIDAD	M3	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA







DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Zapatas laterales	1.00	1.00	0.42		2.00	0.84
Zapata central	1.40	0.70	0.42		1.00	0.41
TOTAL						1.25

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

FIRMA:

APROBÓ

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES
ÍTEM	2.4 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Viga de amarre	5.97	0.25	0.25		1.00	0.37
TOTAL						0.37

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES
ÍTEM	2.5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Zapatas laterales	1.00	1.00	1.05		2.00	2.10
Zapata central	1.40	0.70	1.05		1.00	1.03
Viga de amarre	2.57	0.25	0.58		1.00	0.37
Patio	2.72	3.03	0.20		1.00	1.65
Habitacion	2.86	2.80	0.20		1.00	1.60
Caja de inspección	0.60	0.60	0.40		1.00	0.14
TOTAL						6.90

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 045 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES	
ÍTEM	2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio					1.80	1.80
TOTAL						1.80

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES	
ÍTEM	2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

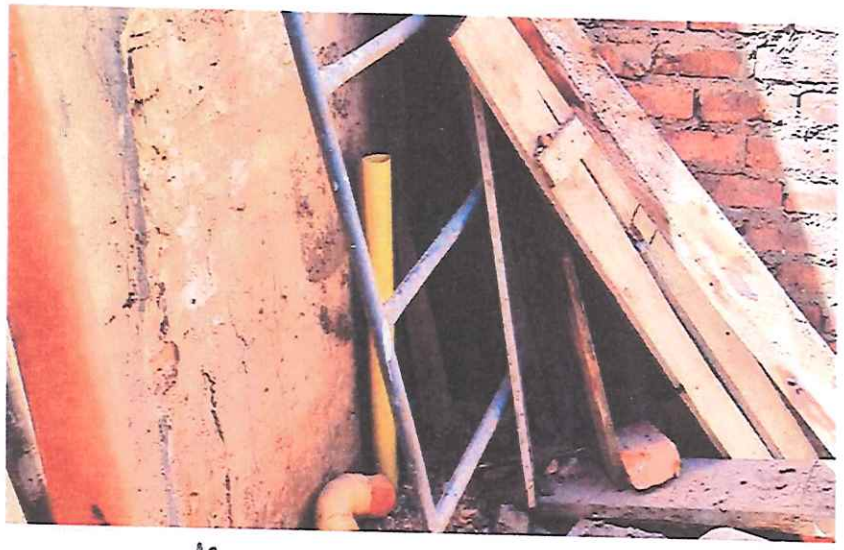

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio Lavadero					2.05	2.05
TOTAL						2.05

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES	
ÍTEM	2.8	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa
UNIDAD	KG	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA









DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Zapatas Esquineras (2 Und)	1.25			0.996	20.00	24.90
Zapata Medianera (1 Und)	0.95			0.996	5.00	4.73
	1.65			0.996	8.00	13.15
Viaga de amarre (1 Und)	6.00			0.996	4.00	23.90
	0.56			0.560	50.00	15.68
Viaga de aérea (2 Und)	6.00			0.996	8.00	47.81
	0.56			0.560	100.00	31.36
Columnas (3 Und)	6.00			1.560	12.00	112.32
	0.34			0.560	276.00	129.83
TOTAL						403.68

ELABORÓ:	REVISÓ: APROBÓ
FIRMA:	FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES
ÍTEM	2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84
UNIDAD	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.58	2.85		2.08		15.28
Habitación	2.65	2.65		2.08		14.59
Bocapuerta habitación	0.90	0.15		2.08		0.28
Bocapuerta cocina a patio	0.76	0.15		2.08		0.24
TOTAL						30.39

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.03 ESTRUCTURAS
ÍTEM	3.1 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA MADERA
UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Columnas	4.00	0.25	0.25		3.00	0.75
TOTAL						0.75

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.03 ESTRUCTURAS	
ÍTEM	3.2	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)
UNIDAD	M3	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Viga de amarre	5.97	0.25	0.25		2.00	0.75
TOTAL						0.75

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.04 MAMPOSTERIA
ÍTEM	4.1 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

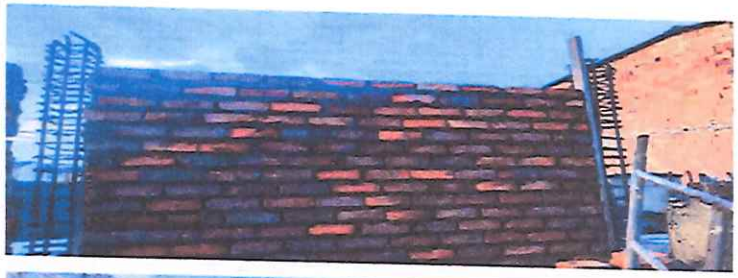



DESCRIPCIÓN	AULTURA (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Muro patio	2.45	2.30				5.64
	1.45	2.30				3.34
Muro Habitación	2.45	2.60				6.37
	1.45	2.60				3.77
TOTAL						19.11

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.05 PAÑETES
ÍTEM	5.1 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
UNIDAD	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Muro patio	2.45				4.00	9.80
	1.45				4.00	5.80
	2.30				4.00	9.20
TOTAL						24.80

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.0S PAÑETES
ÍTEM	S.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

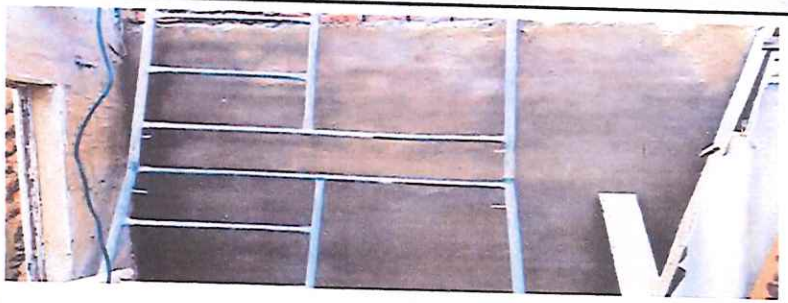



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Muro patio	2.80	2.70			1.00	7.56
Muro Habitación	2.60	2.70			1.00	7.02
TOTAL						14.58

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBO

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
ÍTEM	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

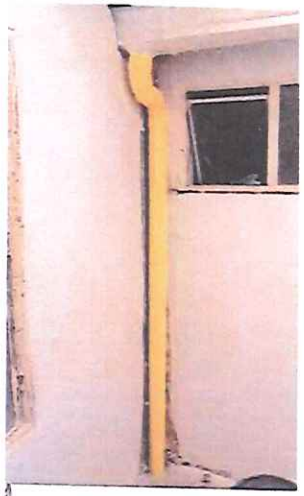

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Muro patio					1.80	1.80
TOTAL						1.80

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
ÍTEM	6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Unión cubiertas					-	-
TOTAL						0.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
ÍTEM	6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO
UNIDAD	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio					2.00	2.00
TOTAL						2.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
ÍTEM	6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

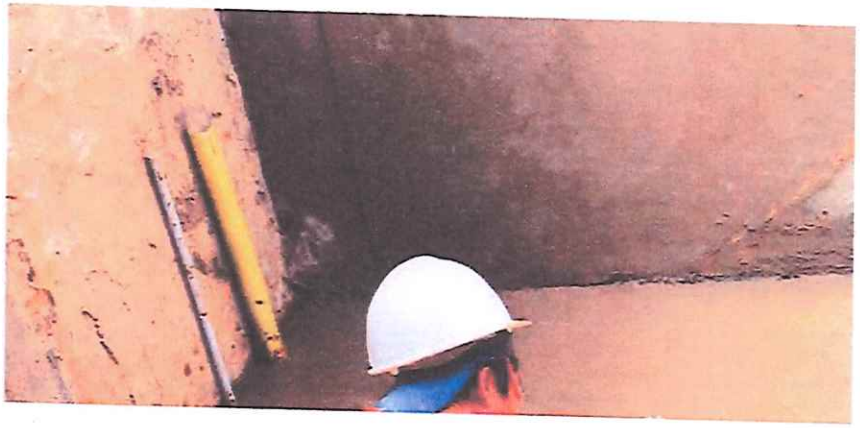

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio						
					3.73	3.73
TOTAL						3.73

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
ÍTEM	6.5	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"
UNIDAD	UND	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

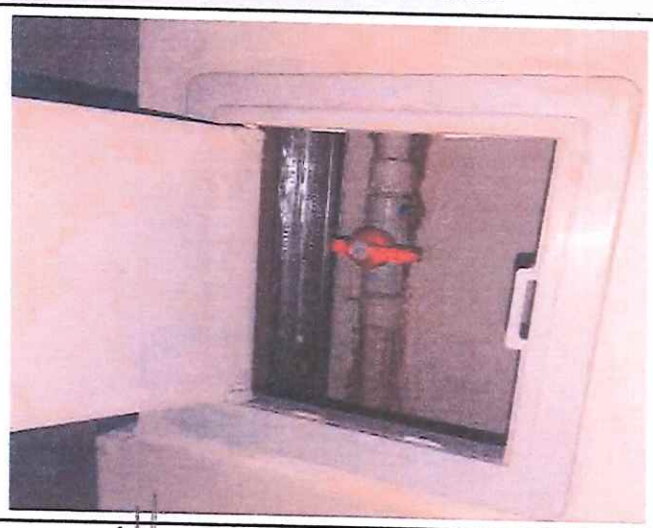

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio					1.00	1.00
TOTAL						1.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS
ÍTEM	7.1 SALIDA LAMPARA TOMA EN PVC COMPLETA
UNIDAD	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio						
Habitación trasera					1.00	1.00
Habitación delantera					1.00	1.00
					1.00	1.00
TOTAL						3.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS
ÍTEM	7.2 SALIDA T.V. PVC COMPLETA
UNIDAD	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

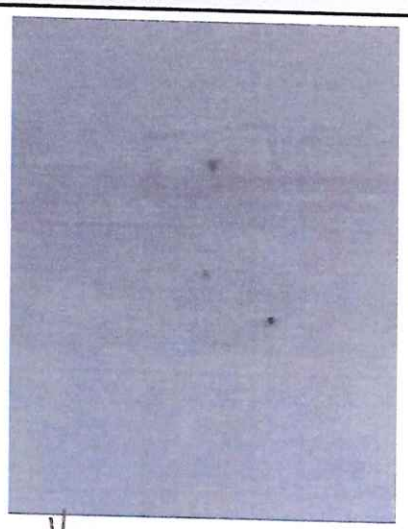

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Habitación					2.00	2.00
TOTAL						2.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA


MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.09 PINTURA	
ÍTEM	8.1	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

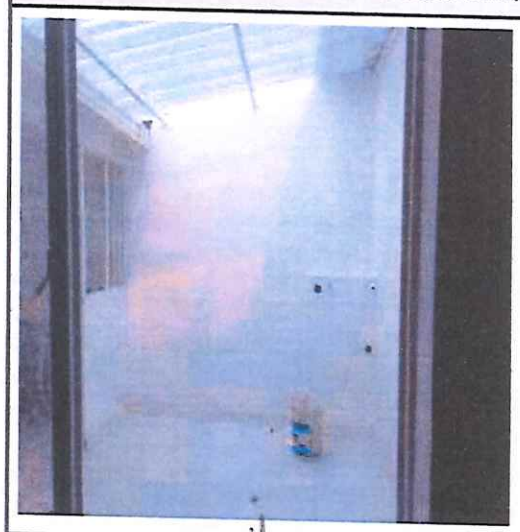

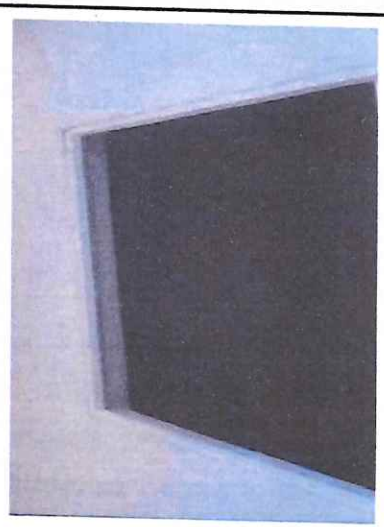

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Marco ventana baño					2.60	2.60
Ventana y marco cocina					8.29	8.29
Marco ventana habitación					4.80	4.80
Ventanas fachada					19.60	19.60
TOTAL						35.29

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.09 PINTURA
ÍTEM	8.2 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

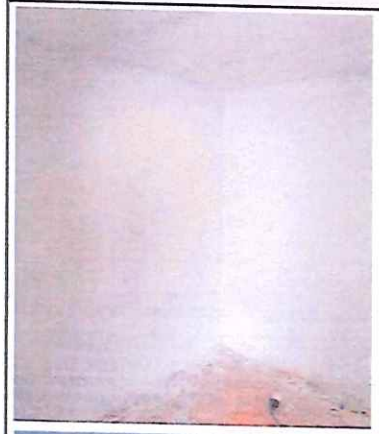





DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	4.40	2.73				12.01
	2.70	2.90				7.83
	2.70	2.90				7.83
	2.70	1.30				3.51
	1.00	0.80				0.80
	0.25	1.70				0.43
Habitacion	4.40	2.80				12.32
	2.70	2.80				7.56
	2.70	2.80				7.56
	2.70	2.80				7.56
Ventana	- 1.20	1.20				- 2.88
Puerta habitacion	- 1.90	0.90				- 3.42
Cocina	2.46	1.46				7.18
sala comedor muro 1	7.20	2.13				30.67
muro 2	4.76	2.13				20.28
muro 3	1.50	0.84				2.52
	2.13	0.36				1.53
muro 4	1.41	2.13				6.01
	0.78	0.20				0.31
	1.95	0.17				0.66
Viga sala comedor	0.17	0.17				0.06
	0.78	0.17				0.27
tacion continua a baño mu	2.94	2.20				12.94
muro 2	2.94	2.20				12.94
	2.23	2.80				12.49
	2.23	2.80				12.49
Estudio muro 1	3.08	1.93				11.89
muro 2	2.72	1.94				10.55
muro 3	3.18	1.70				10.81
muro 4	1.16	1.72				3.99
entre vigas	1.12	1.18				2.64
	0.76	0.77				1.17
vigas	0.25	0.70				0.35
	0.25	0.70				0.35
Habitacion entrando mano derecha	2.02	1.70				6.87
	- 1.20	1.200				- 2.88
	2.76	2.00				11.04
	- 1.50	1.20				- 3.60
	2.03	1.78				7.23
	2.03	1.11				4.51
TOTAL						246.37

ELABORO:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.10 ENCHAPE	
ÍTEM	9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4"4"3
UNIDAD	UND	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

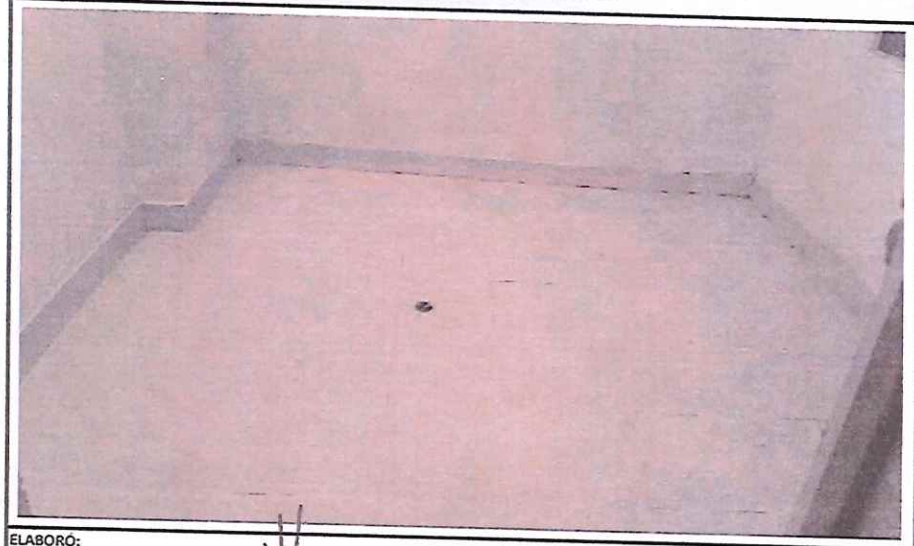

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio					1.00	1.00
TOTAL						1.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.11 PISOS– BASES- ACABADOS
ÍTEM	10.1 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Habitacion	2.60	2.80				7.28
Bocapuerta habitación	0.90	0.15				0.14
TOTAL						7.42

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 045 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.11 PISOS– BASES- ACABADOS	
ÍTEM	10.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
UNIDAD	M3	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.62	2.82	0.20			1.48
Habitación	2.60	2.80	0.20			1.46
Bocapuerta habitación	0.90	0.15	0.20			0.03
Bocapuerta cocina a patio	0.76	0.15	0.20			0.02
TOTAL						2.98

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.11 PISOS– BASES- ACABADOS
ÍTEM	10.3 PISO CERÁMICA 25*25 CM
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.62	2.82				7.39
Habitación	2.60	2.80				7.28
Bocapuerta habitación	0.90	0.15				0.14
Bocapuerta cocina a patio	0.76	0.15				0.11
TOTAL						14.92

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA


MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.11 PISOS– BASES- ACABADOS	
ÍTEM	10.4	PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



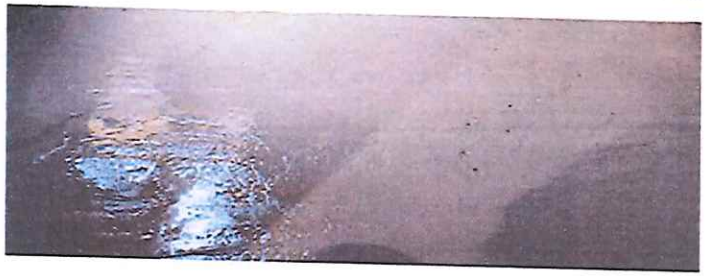

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.62	2.82				7.39
Habitación	2.60	2.80				7.28
Bocapuerta habitación	0.90	0.15				0.14
Bocapuerta cocina a patio	0.76	0.15				0.11
TOTAL						14.92

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.12 CUBIERTAS	
ÍTEM	11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	3.00					-
Habitación	3.00				3.00	9.00
TOTAL						9.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.12 CUBIERTAS	
ÍTEM	11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Habitación	3.00	3.00				9.00
TOTAL						9.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	1.12 CUBIERTAS	
ÍTEM	11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

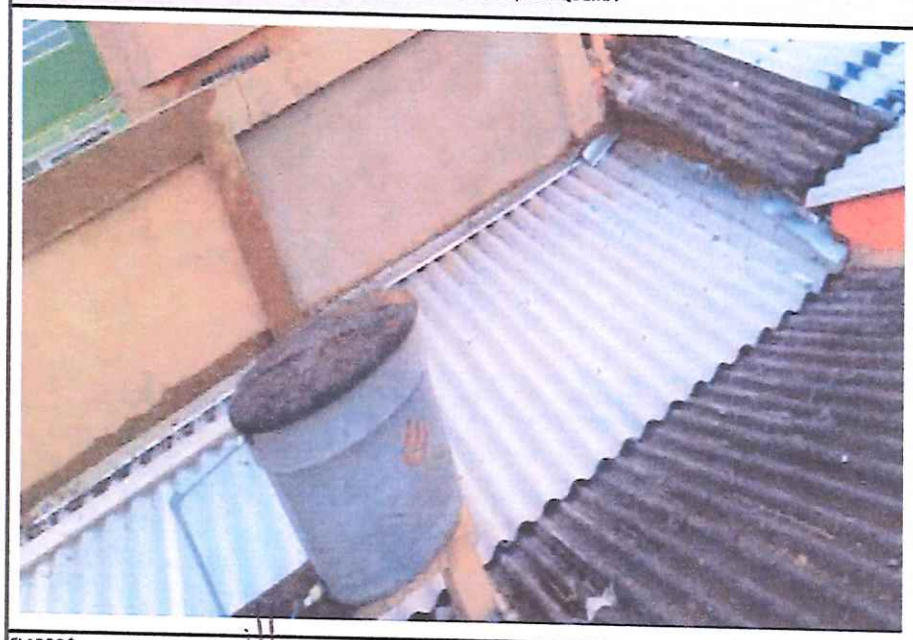

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	3.00				1.00	3.00
Habitación	3.00				2.00	6.00
TOTAL						9.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

42


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	1.13 CIELO RASOS
ÍTEM	12.1 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

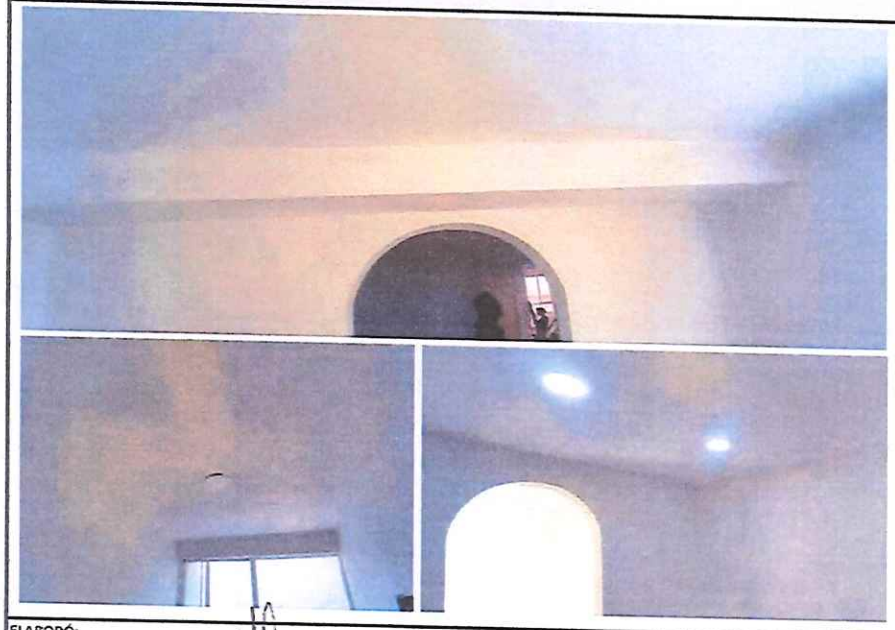

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Habitacion	2.60	2.80				7.28
Cocina	2.46	1.46				3.59
Cuarto contiguo habitación	2.80	2.80				7.84
TOTAL						18.71

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	3.03 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION	
ÍTEM	13.1	DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	2.30				1.00	2.30
Habitacion	2.60				1.00	2.60
TOTAL						4.90

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	
ÍTEM	14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	3.00	3.00				9.00
TOTAL						9.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.2 DESMONTE CANALES - BAJANTES.
UNIDAD	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	3.00					3.00
Habitación	3.00					3.00
TOTAL						6.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.3 DEMOLICIÓN PAÑETES
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

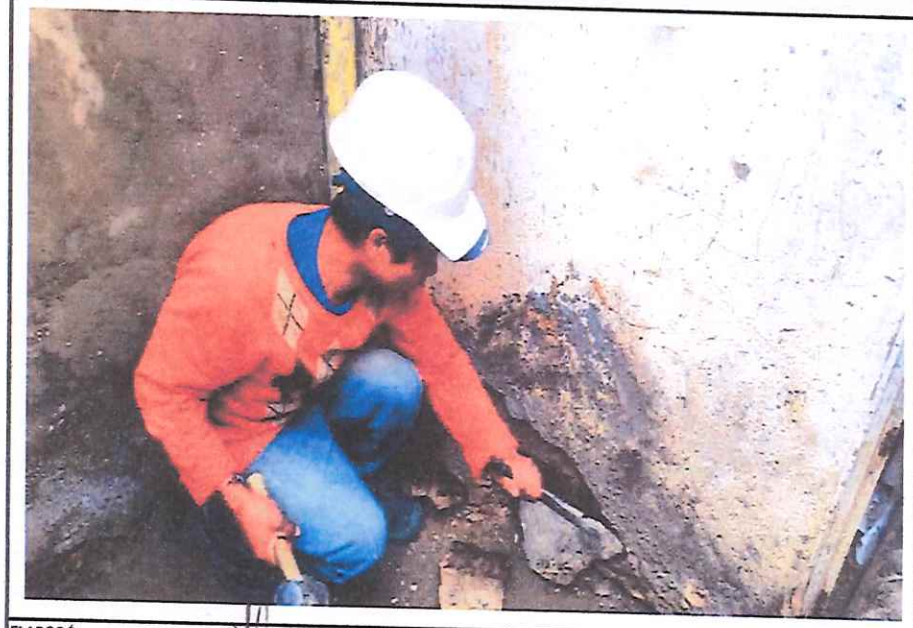

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Muro patio	2.80	2.70			1.00	7.56
	1.45	2.80			1.00	4.06
	1.26	2.23			1.00	2.81
	0.83	0.52			- 1.00	- 0.43
	1.56	0.25			1.00	0.39
	0.75	0.94			1.00	0.71
	2.60	2.70			2.00	14.04
	1.20	1.20			- 1.00	- 1.44
Muro Habitación	2.10	1.10			1.00	2.31
	2.10	0.80			1.00	1.68
	2.60	2.70			2.00	14.04
	1.20	1.20			- 1.00	- 1.44
	0.90	0.35			1.00	0.32
	2.82	2.70			1.00	7.61
TOTAL						52.21

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.4 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"
UNIDAD	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Dren patio					2.00	2.00
Dren habitación					2.00	2.00
Lavadora					2.00	2.00
Lavadero					2.00	2.00
TOTAL						8.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.5 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3"
UNIDAD	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Bajante					3.00	3.00
TOTAL						3.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM
UNIDAD	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

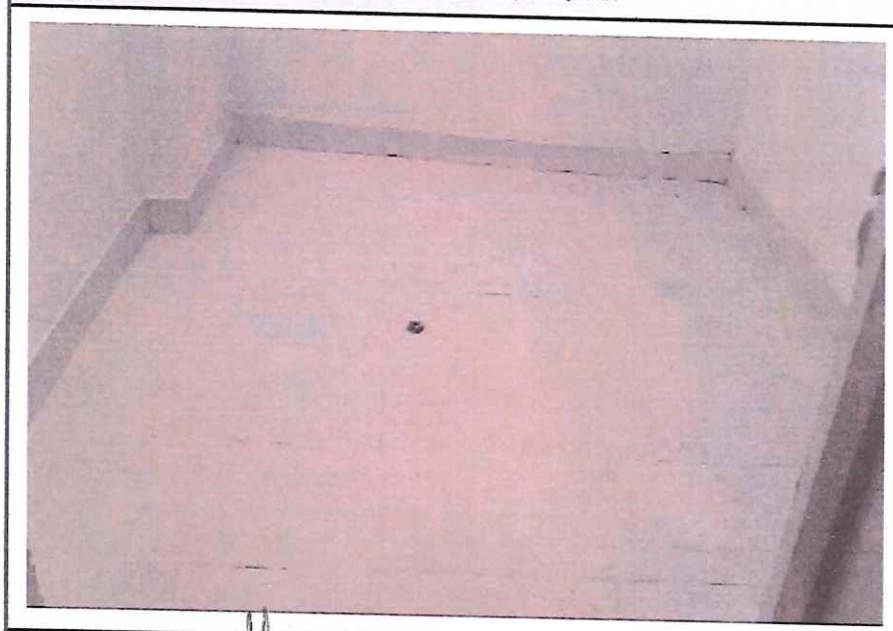

DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio	10.09					10.09
Habitación	10.33					10.33
TOTAL						20.42

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	
ÍTEM	14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER
UNIDAD	UND	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

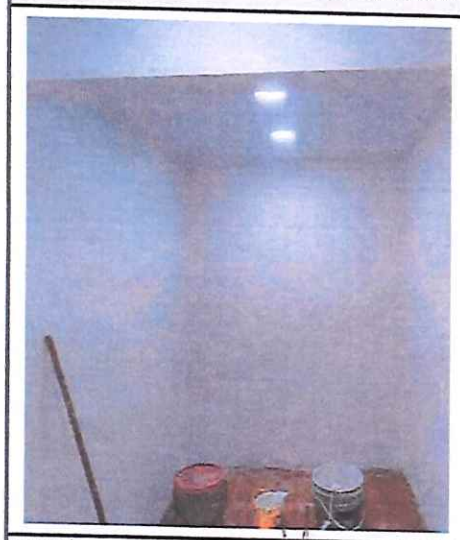



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Patio					1.00	1.00
Habitacion trasera					1.00	1.00
Habitacion delantera					1.00	1.00
Cocina					1.00	1.00
Sala					2.00	2.00
Comedor					3.00	3.00
Estudio					4.00	4.00
TOTAL						13.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	
ÍTEM	14.8	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

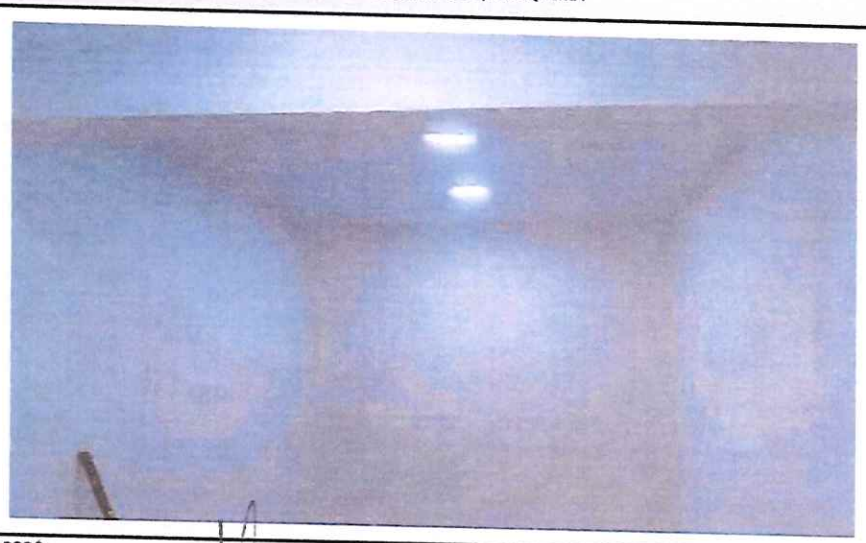

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
ESTUDIO	2.76	1.70				4.69
TOTAL						4.69

ELABORÓ:	REVISÓ: APROBÓ
FIRMA:	FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.9 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
FACHADA	5.90	2.65			1.00	15.64
VENTANAS	1.50	1.20			- 2.00	- 3.60
PUERTA	2.13	0.90			- 1.00	- 1.92
TOTAL						10.12

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	
ÍTEM	14.10	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS
UNIDAD	M2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA

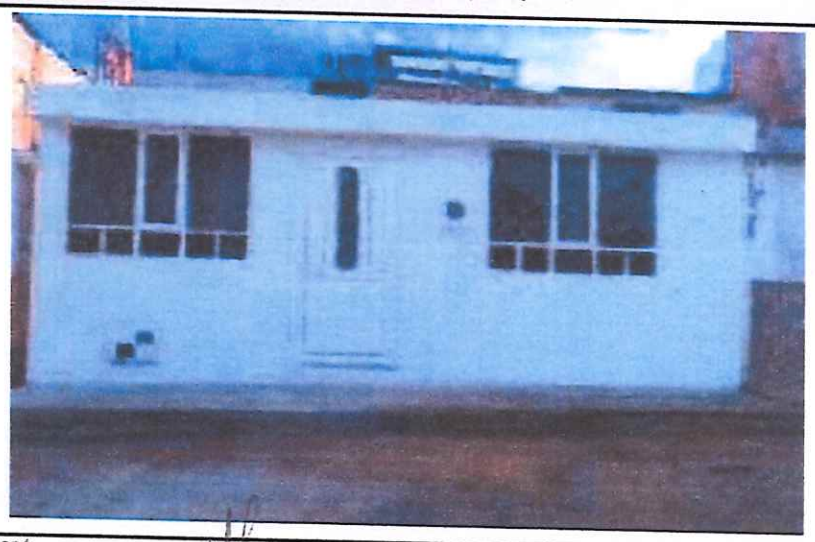

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA	2.13	0.90			2.00	3.83
TOTAL						3.83

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.11 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
MURO PERIMETRAL POSTERIO	6.00	0.62				3.72
TOTAL						3.72

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	
ÍTEM	14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO
UNIDAD	ML	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
Unión cubiertas					6.00	6.00
TOTAL						6.00

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

MEMORIAS DE CANTIDADES


FECHA ELABORACIÓN	31/08/2023	CONTRATO DE OBRA N° 845 de 2023	1	DE	1

PROYECTO	SI – 218 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS
ÍTEM	14.13 ASEO GENERAL ENTREGA
UNIDAD	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ESQUEMA





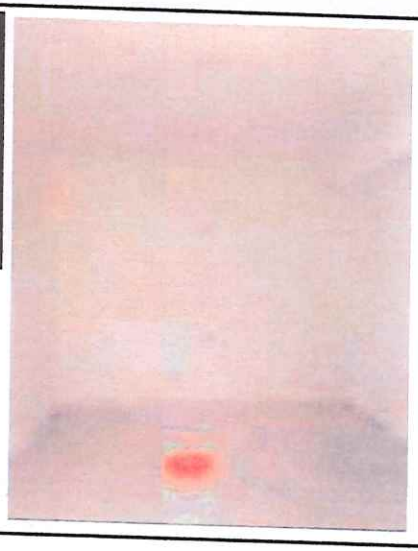

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	PESO (Kg)	CANTIDAD	TOTAL
CASA	12.35	5.80			1.00	71.63
TOTAL						71.63

ELABORÓ:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

APROBÓ

FIRMA:

SUPERVISIÓN

ACTAS DE COMITÉ

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

11.03

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/05/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: GIN-F-034

En Tunja a la Hora: 11:00 del Día: 19 del Mes: Julio. Año 2023.

Se reunieron en el Sitio: CASA DE LA SEÑORA MARIA ALIX TORRES.
Cra 13 H 21-12

Con el fin de suscribir la presente acta de visita ocular por parte de profesionales de apoyo de la Secretaría de Infraestructura, relacionado con el siguiente:

Asunto: VISITA Inspección ocular INICIO de obra

ASISTENTES	DEPENDENCIA	IDENTIFICACION	FIRMA
Julián Hernandez	SEC INFRAESTRUCTURA	Sup Supervisor.	
Yeison Fabián Velosa Valdivieso	Dinco SAS	1049616490	
Felkin Garcia Agudelo	DINCO SAS	1049614604	
andrea Barrera	CL 984 638		

DESCRIPCION GENERAL
Se hace visita de inspección ocular en la casa de la Señora Maria Alix Torres. donde nos encontramos con el contratista Yeison Velosa, y el maestro de obra Gustavo Borquez y Ingeniero Felkin Garcia.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/05/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: GIN-F-034

Se observan materiales de seguridad, como Colombinas, cinta de cerramiento, se observa el material de demolición debidamente acopiado dentro de la casa.

→ Se entregan los respectivos soportes del personal auxiliar, maestro obra y residente.

→.

ASPECTOS TECNICOS

→. Una vez iniciadas las excavaciones y demoliciones. para la zapata de la parte ~~Separtor~~. posterior de la casa. (patio, y habitación).

→ Se evidencia avance de cantidades en demolición, de placa de contra piso y excavación manual.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/05/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: GIN-F-034

→ acopio de material y equipo de construcción

→ Ambiental planchones, camillas.

→ Se tiene el respectivo equipo para seguridad industrial.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Dar continuidad con las actividades contratadas y proxima reunion. se tomaran las acciones a proceder apenas se encuentre la cota mas baja del drenaje (caja).

Siendo las _____, y en fe de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en la primera página.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/05/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: GIN-F-034

En Tunja a la Hora: 8:30 del Día: 25 del Mes: Julio Año 2023

Se reunieron en el Sitio: CASA SEÑORA MARIA ALIX TORRES. MZ 4 CASA 14 SECTOR. SAN FRANCISCO Cra 13 # 21-12

Con el fin de suscribir la presente acta de visita ocular por parte de profesionales de apoyo de la Secretaría de Infraestructura, relacionado con el siguiente:

Asunto: inspección ocular avance de obra bajo el objeto "mejoramiento adecuación y reparación locativa de la Señora maria Alix Torres) Cancelada Aprobada por la alta instancia.

ASISTENTES	DEPENDENCIA	IDENTIFICACION	FIRMA
Julián Hernandez	SEC INFRAESTRUCTURA	Supervisor	
Yeison F. Ueloza U.	DINCO SAS	Rep legal	
Felkin Garcia Agudelo	DINCO SAS	Auxiliar de ingeniería	

DESCRIPCION GENERAL
Al día de hoy 25 Julio de 2023 nos reunimos en obra con el ingeniero Yeison Ueloza y el ingeniero Felkin.
→ Se observa un avance de obra al día de hoy de 1,75 %, en actividades de demolición para construcción de zapata, excavación, 1 m^3 de excavación, también excavación de viga.

Powered by CamScanner

→ Se observa el material de excavación obtenido acopiado en lonas.

→ Se evaluaron los procesos internos con el jurídico y Soc Infraestructura.

→ Se ve en su totalidad la demolición y excavación de la habitación del patio.

ASPECTOS TECNICOS

→ Demolición de piso y excavación para amarre de vigas y zapatas.

→ Extracción de material de excavación.

→ Se evaluara en la semana 2 en las actividades Solado, amarre de acero y Fundido de Concreto para zapatas y viga.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/05/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: GIN-F-034

→ Se observa material de acero que cumple con lo estipulado en los planos.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

→ Avanzar en actividades de cimentación y acero de refuerzo amarrado como lo indica la norma NSR10.

→ Evaluar el acople de canal, habitación y patio para no tener variaciones de agua interna.

Siendo las _____, y en fe de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en la primera página.

Powered by CamScanner

Firma:
C.C.: 1049616990 Tunja.

Firma:
C.C.:

Firma:
C.C.: 1049694604 Tunja

Firma:
C.C.:

Firma:
C.C.: 1049688613.

Firma:
C.C.:

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR :	FECHA	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
4		10:08 2023	10:36 a.m	11:00 am
RESPONSABLE:				

OBJETIVO

CONTRATO DE Obra No. 845 de 2023

ORDEN DEL DÍA

Comite de Obra

CONTENIDO

-> Solicitud de modificacion de contrato Item's no previstas.

-> Se entrega Vitacora con un avance de obra de 45 %

-> Se coordina las actividades que se desarrollaran la siguiente semana.

-> Revisando el muro posterior se llega a un acuerdo con el contratista, de remover el manto fiberglas a cambio de bloque.

Powered by CamScanner

Supervisor.

R/L Unidad SIS.

Auxiliar de Residente

Apoyo Supervision.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
		24-08-2023	11:30 a.m	12:00 p.m
RESPONSABLE:				

OBJETIVO

CONTRATO DE Obra No. 845 de 2023

ORDEN DEL DÍA

Avance de Obra

CONTENIDO

Se realiza visita tecnica en compañia con el Contratista para verificar las Item's contratados VS las ejecutadas dependiendo la programacion del contrato. A la Fecha se lleva un 80% de ejecucion del contra con su adicional.

- Instalacion de puntos led
- Enchape de pisos
- Pintura Interiores
- Pintura Fachadas
- Muro posterior de la vivienda
- Instalacion de canal y pintura

Para la terminacion del contra faltaria remates de pintura, acabados y aseo general de la vivienda

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	CÓDIGO: GIN-F019

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Julian Hernández	Supervisor	
Yeison F. Vélez V.	R/L Dinco SAS	
Richard M. Chaves	Apoyo Supervisión	

	ALCALDÍA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	FECHA: 18/08/2015 VERSIÓN: 02 CÓDIGO: GIN-F019

ACTA OBRA No.	LUGAR:	FECHA: 29.08.2023	HORA DE INICIO: 2:40 pm	HORA FINAL:
RESPONSABLE:				

OBJETIVO

CONTRATO DE Obra No. 845 de 2023

ORDEN DEL DÍA

Avance de Obra

CONTENIDO

Se realiza una inspeccion ocular de la vivienda revisando pintura, acabados luminarias. Igualmente se revisa el muro posterior el cual se solicita un mejoramiento en pañete.

- Se programa recibo de obra para el dia jueves 01 de septiembre de 2023 teniendo en cuenta los compromisos como aseo general y pañete del muro
- Para el dia lunes 04 de septiembre de 2023 se entregan Informes:
  - Final
  - Polizas

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/08/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: GIN-F019
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OBRA CON SUPERVISIÓN DELEGADA	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Julia Hernandez C	Supervisor	
Yewon F. Vebra V.	L/L Dinco	
Richard M Chaves	Apoyo Supervision	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

11,04

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.01PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM



TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.2 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO

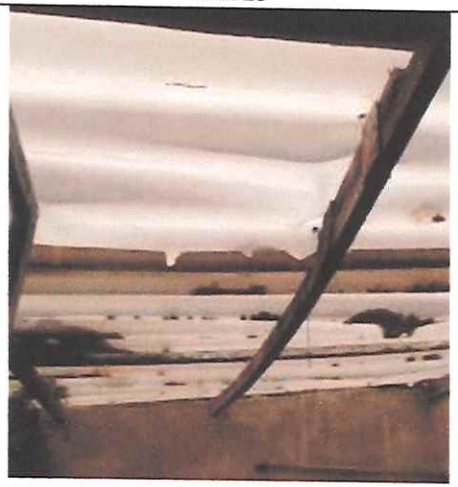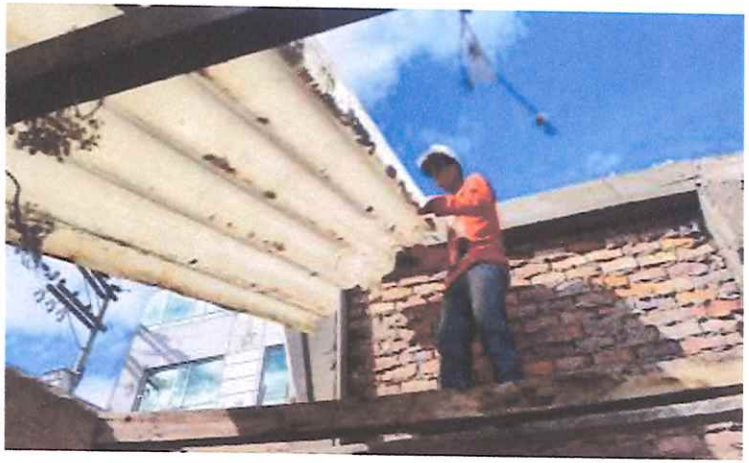ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM



TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

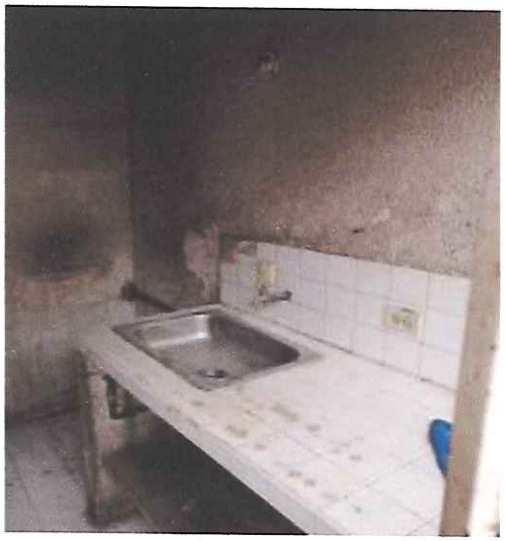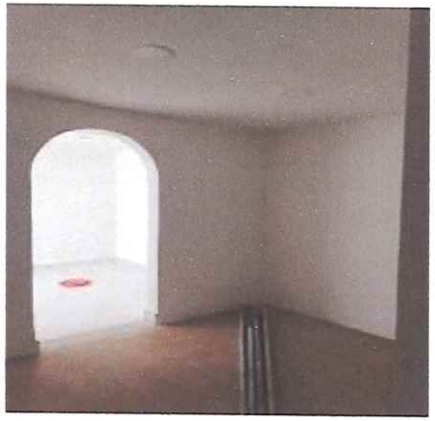ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801



DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES

2.1 BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)

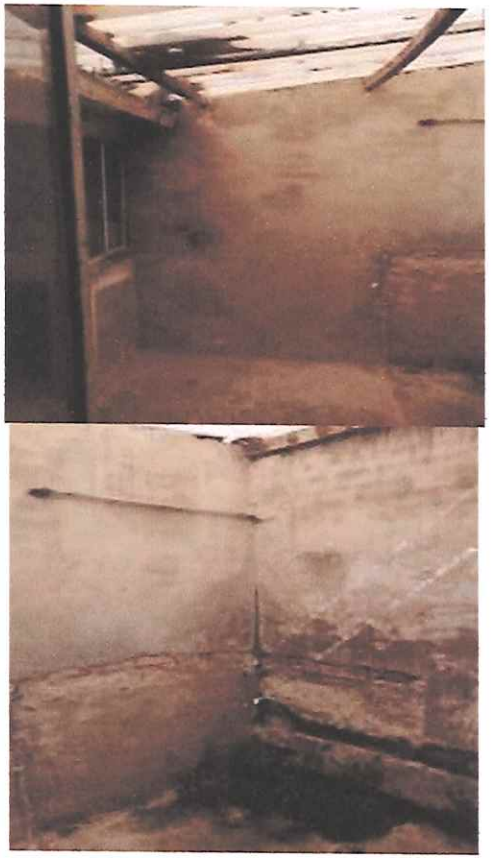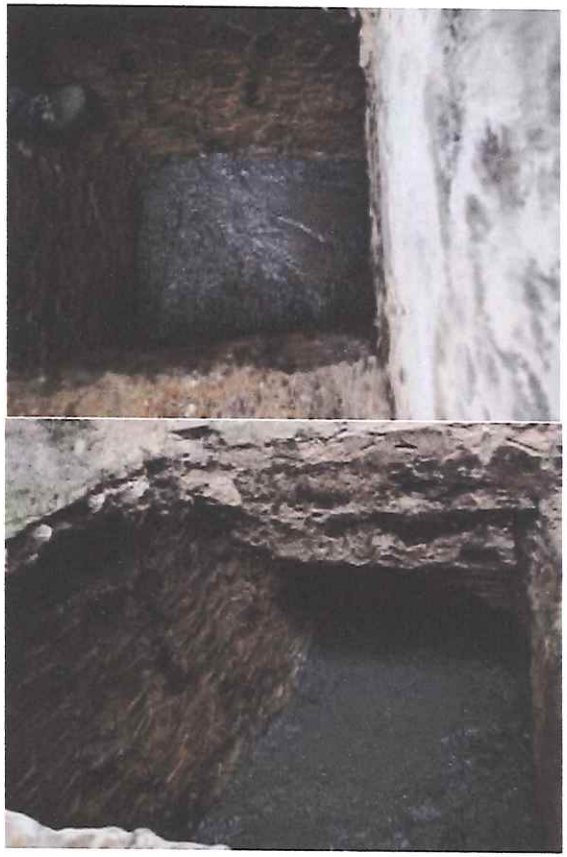ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801



2.2 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4


2.3 CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA

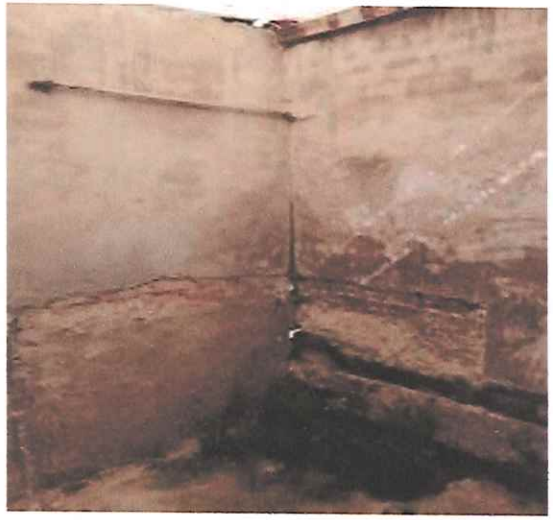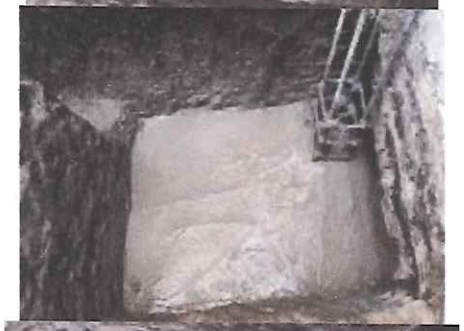ANTES	DURANTE	DESPUES
 	  	 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4


2.4 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

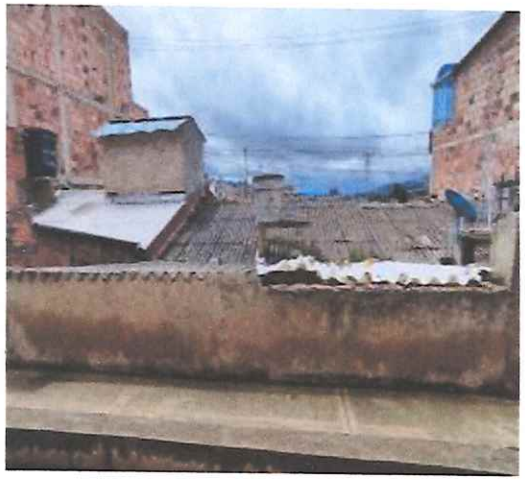ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

2.5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

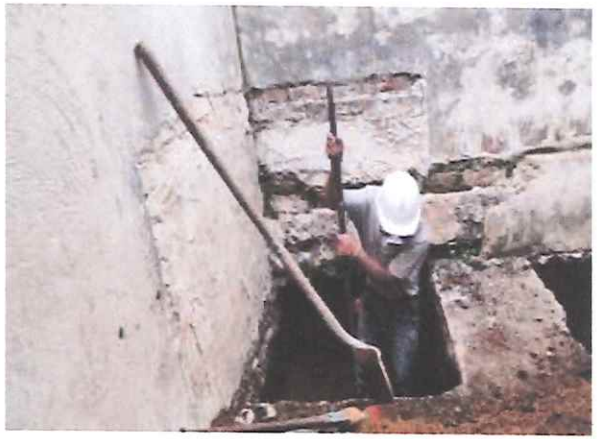ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801


2.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4



2.8 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

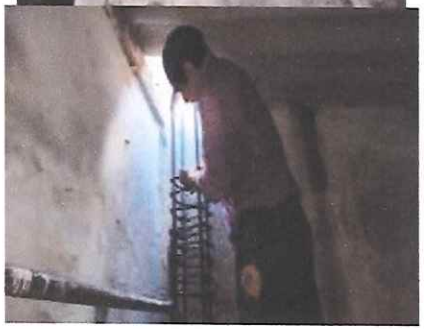ANTES	DURANTE	DESPUES
 	  	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84

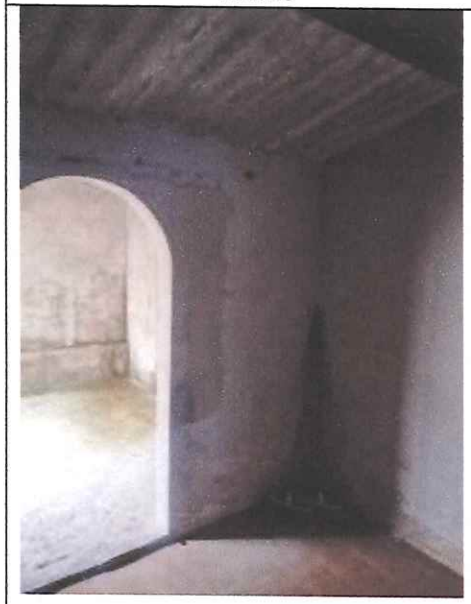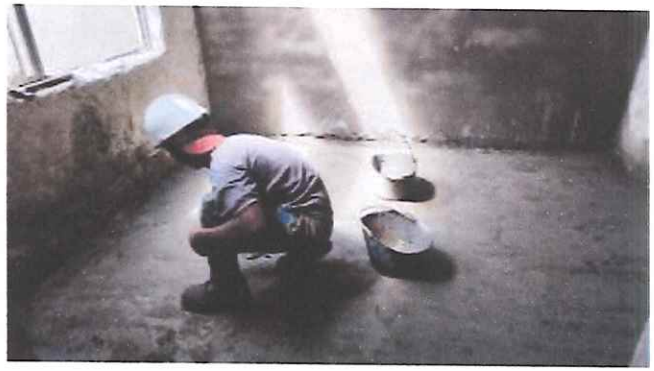ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

1.03 ESTRUCTURAS

3.1COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA MADERA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 		 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801


DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.04MAMPOSTERIA

MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.

ANTES	DURANTE	DESPUES
 	  	 



CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

1.05PAÑETES
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

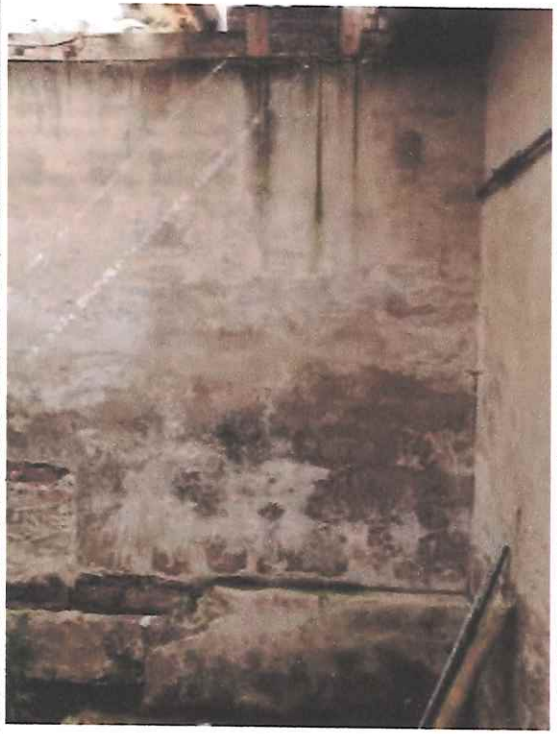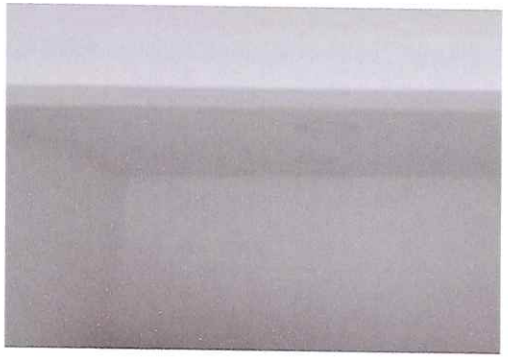ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	 





CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

PAÑETE LISO MUROS 1:4

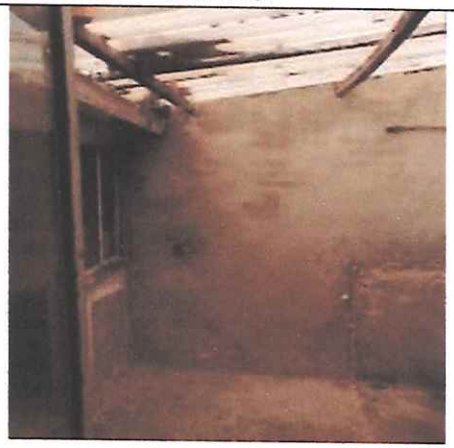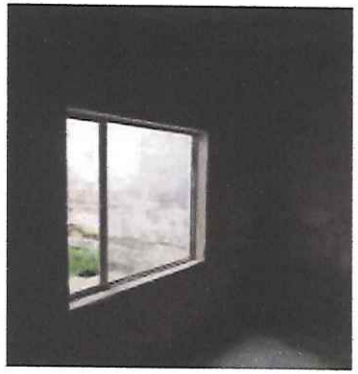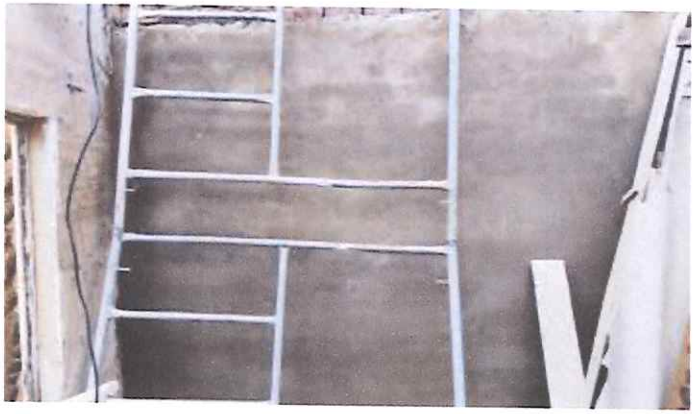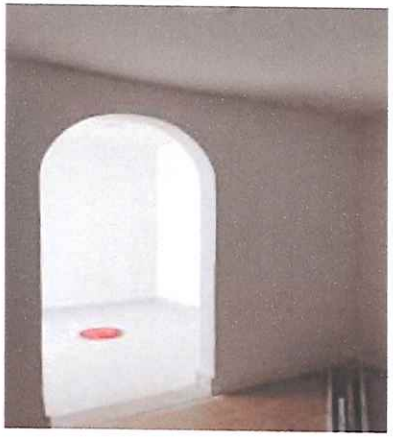ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4


1.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.

ANTES	DURANTE	DESPUES
 		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO

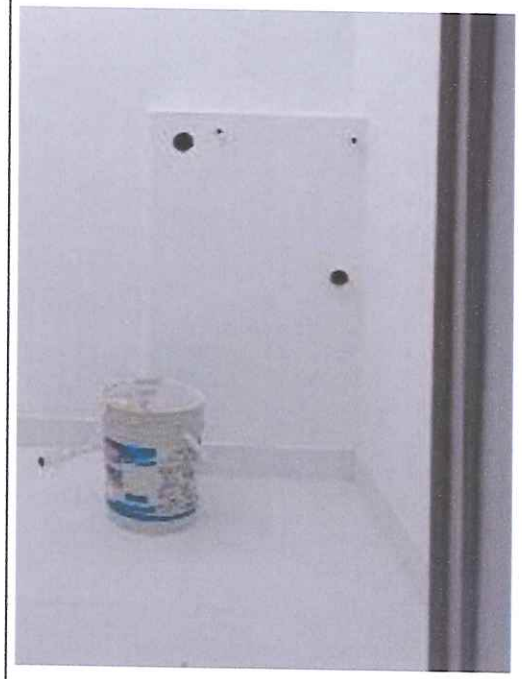ANTES	DURANTE	DESPUES
		



CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9

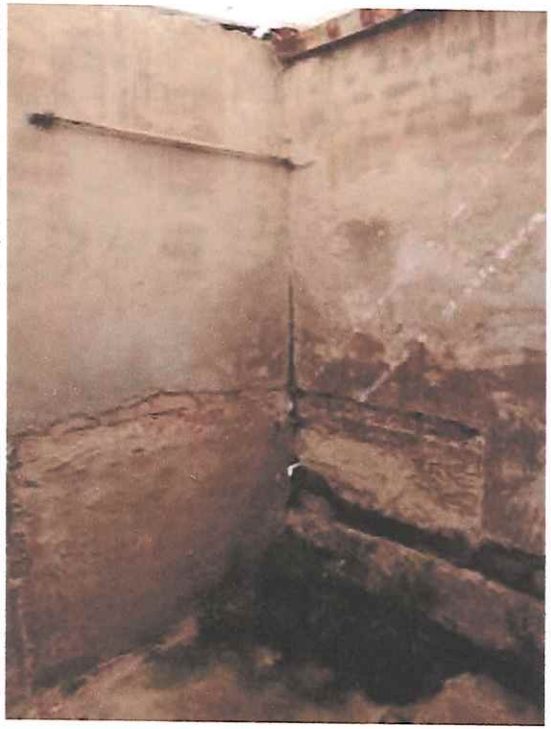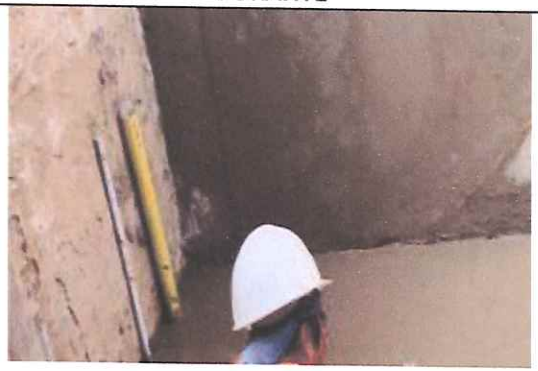
ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

6.5 SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"

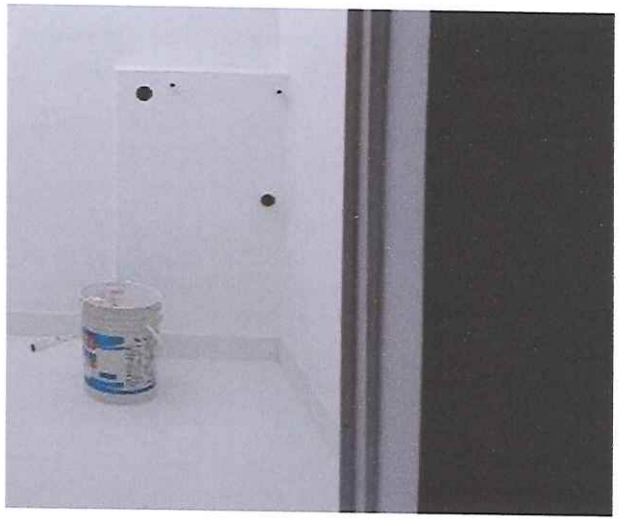ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801




DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 SALIDA LAMPARA TOMA EN PVC COMPLETA

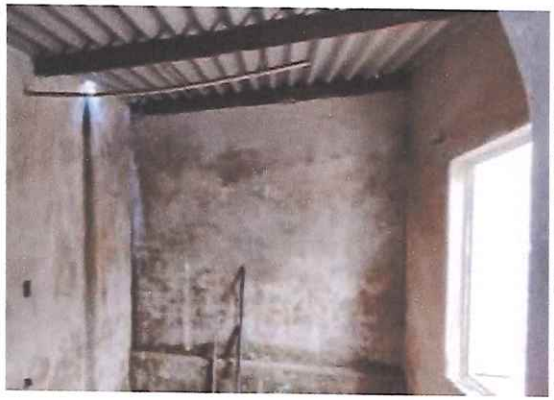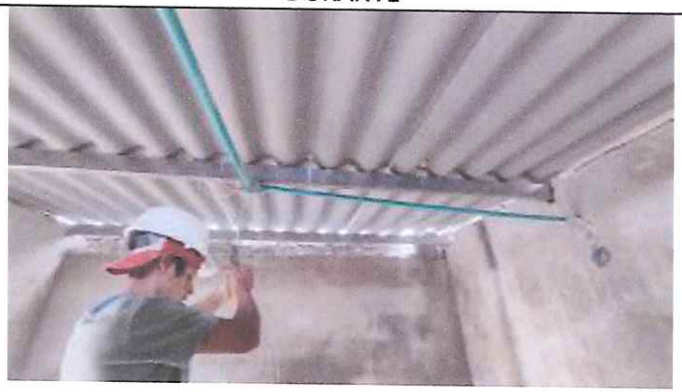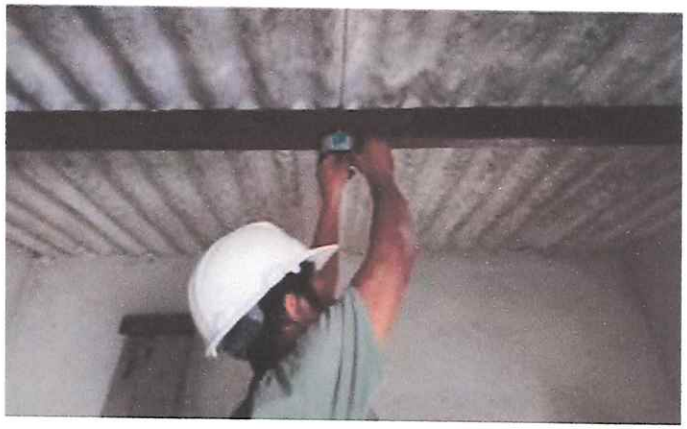ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		


CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

SALIDA T.V. PVC COMPLETA

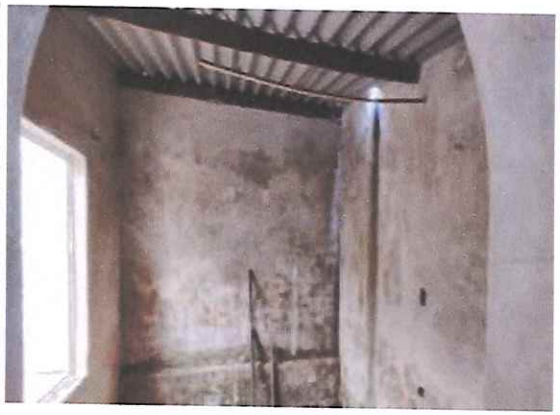ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.09 PINTURA

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)


E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM


TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

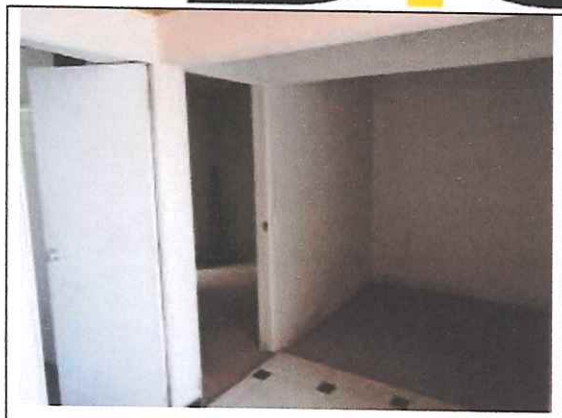

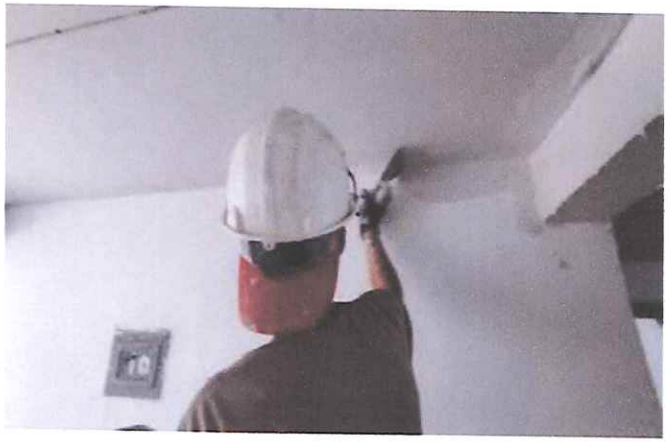









CALLE 55 N° 88 – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)



E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

1.10 ENCHAPE

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3

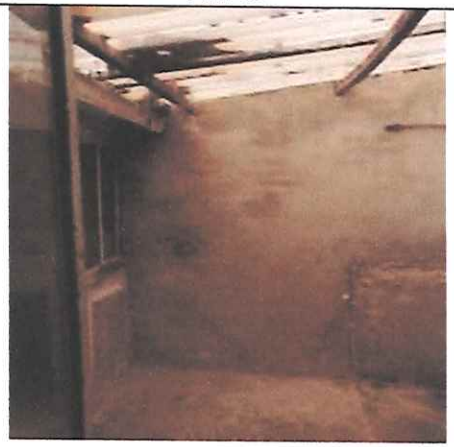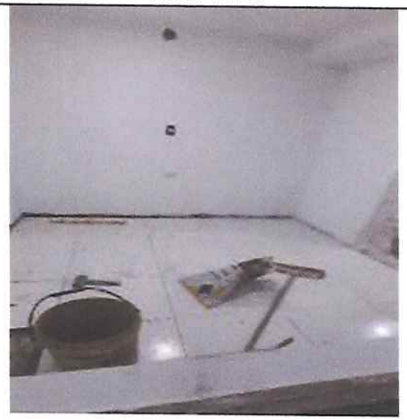ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801





DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

1.11 PISOS-- BASES- ACABADOS

10.1ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

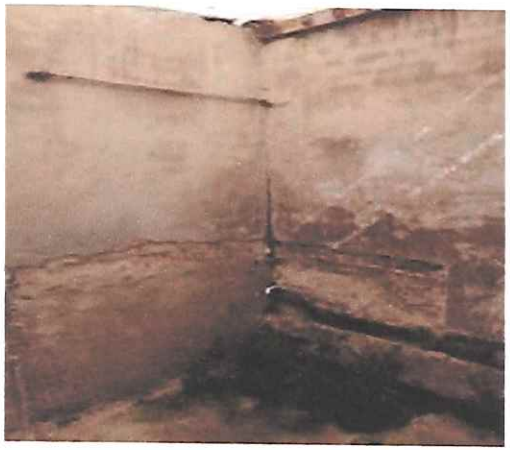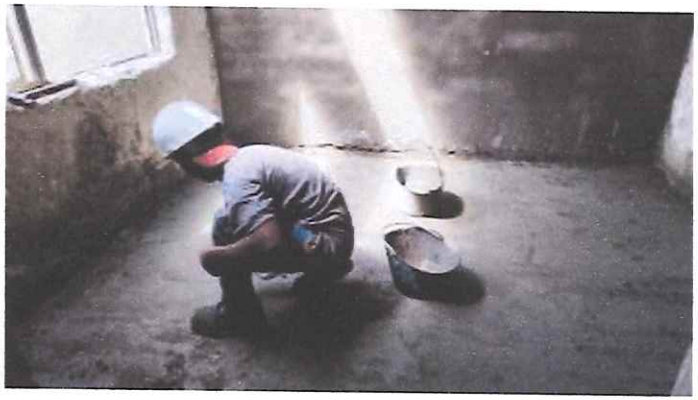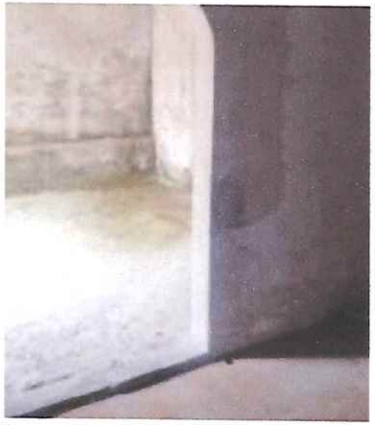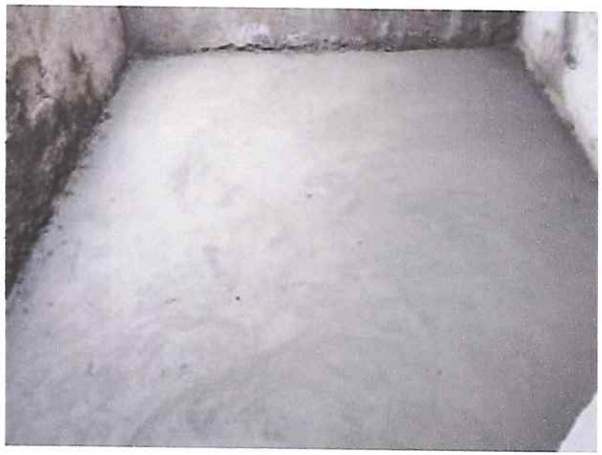ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		




CALLE 55 N° 88 – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

10.2 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

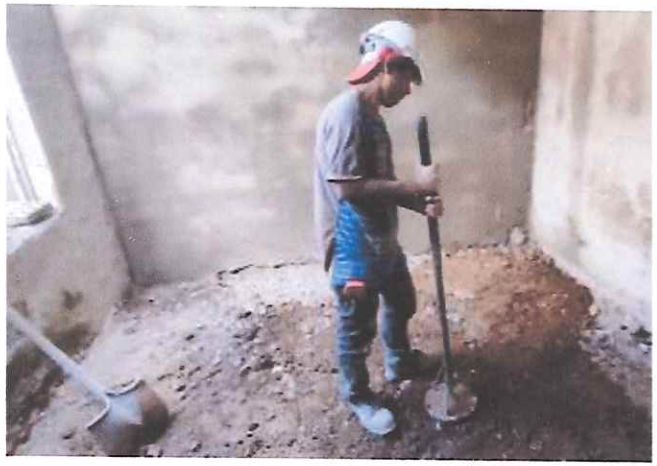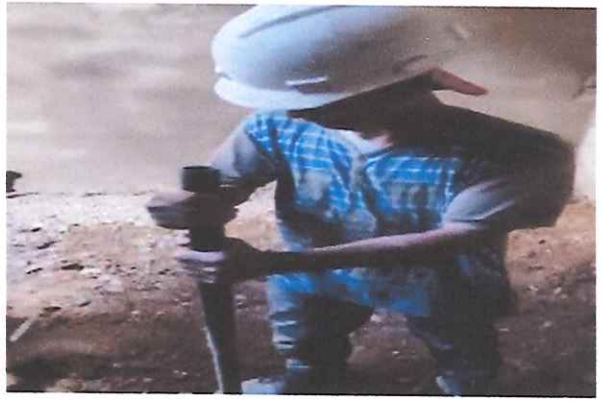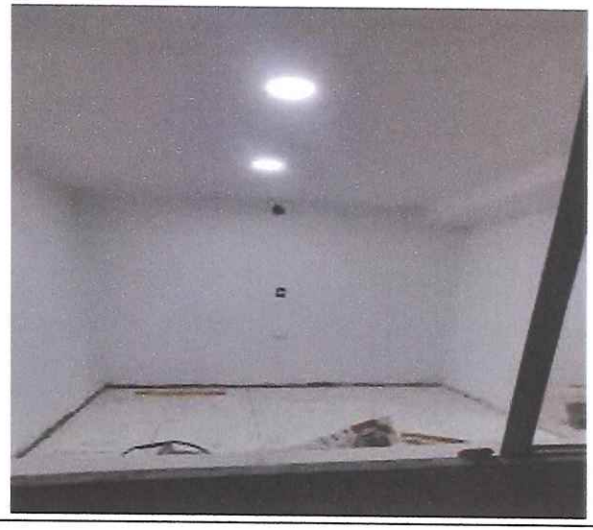ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

10.3 PISO CERÁMICA 25*25 CM

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		


CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

10.4 PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI

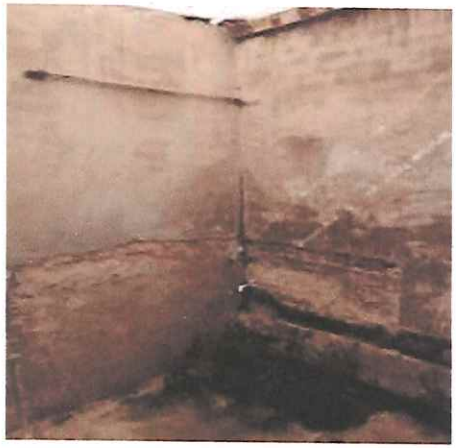ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

1.12 CUBIERTAS

11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		


CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10

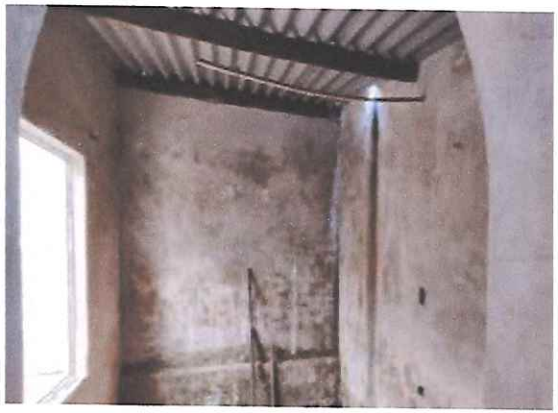ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)



E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

1.13 CIELO RASOS

CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

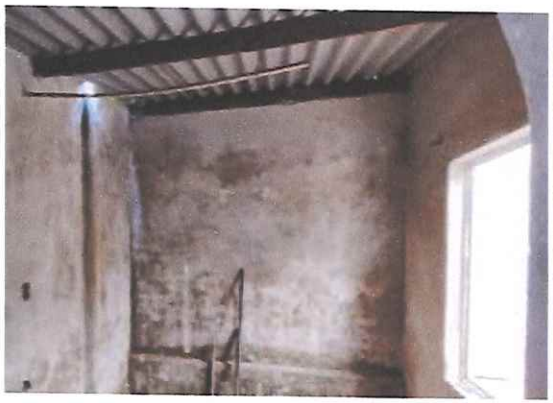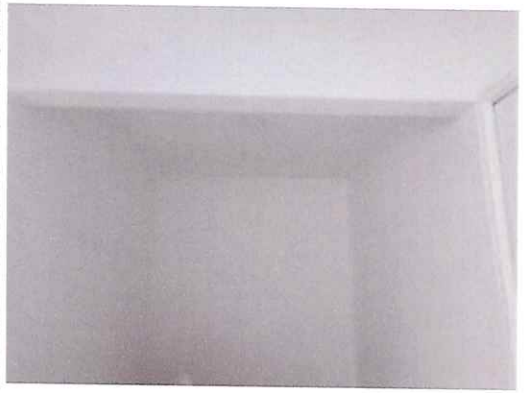ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

3.03 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION

13.1 DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	


CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO

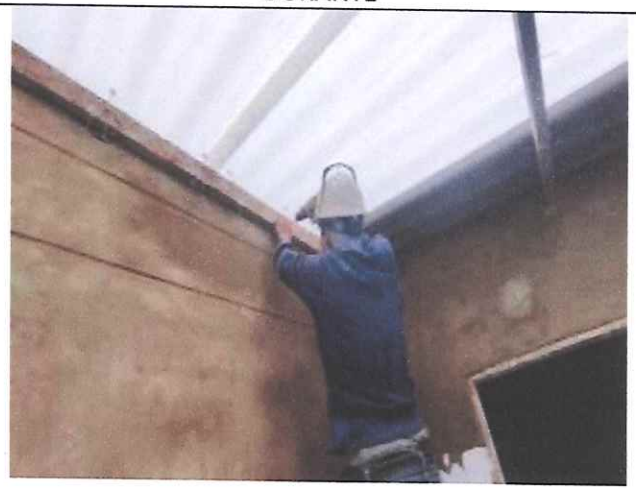ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

DESMONTE CANALES - BAJANTES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

DEMOLICIÓN PAÑETES

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM


TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"

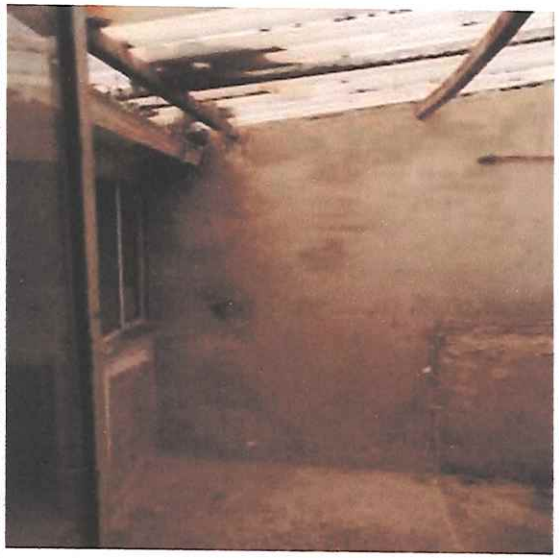ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3"

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM


TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM

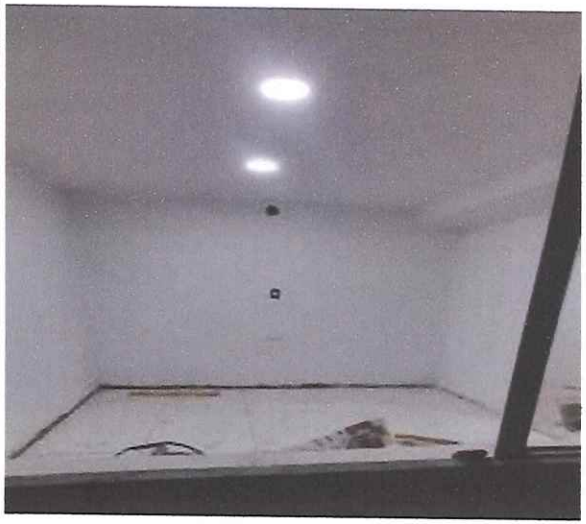ANTES	DURANTE	DESPUES
 		 

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM


TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER

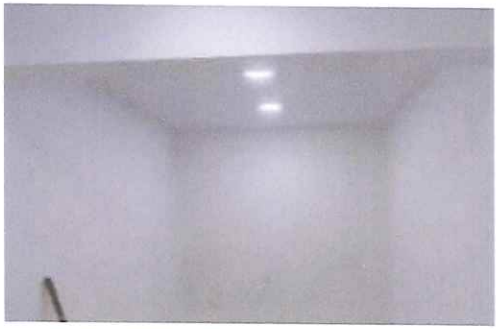ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM


TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA

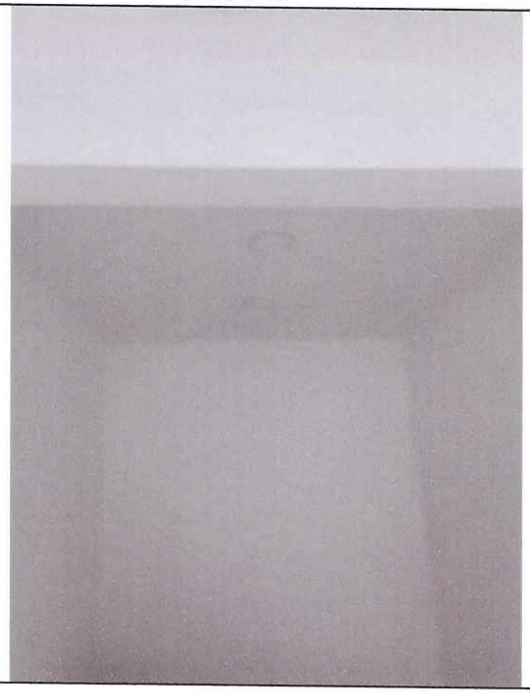ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM



TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS

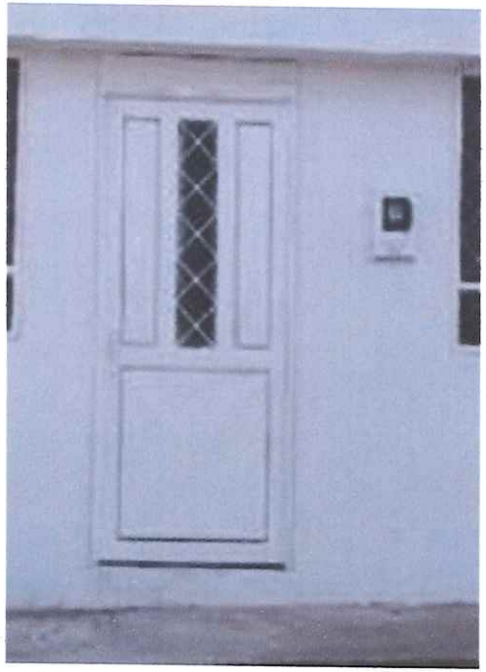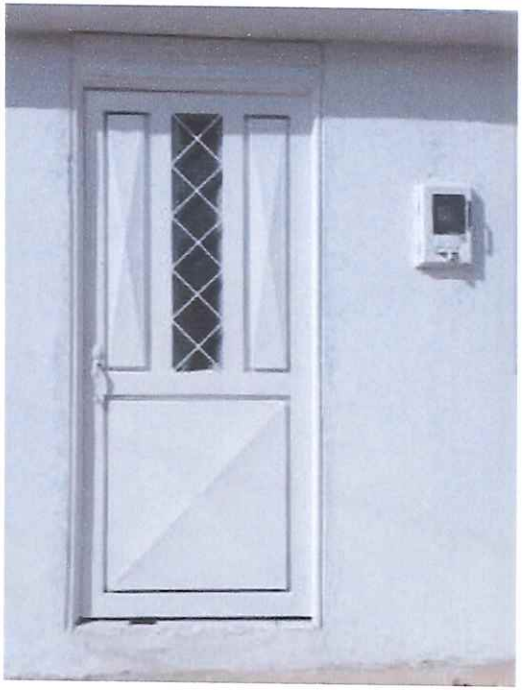ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 88 – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM



TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

ASEO GENERAL ENTREGA

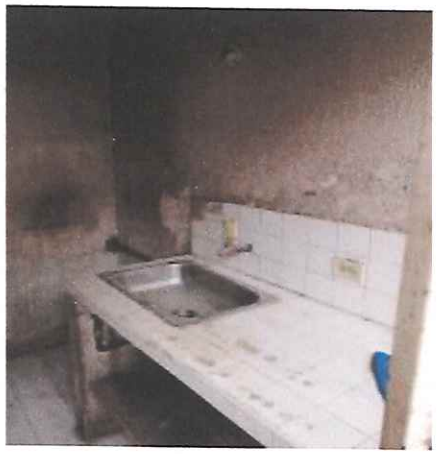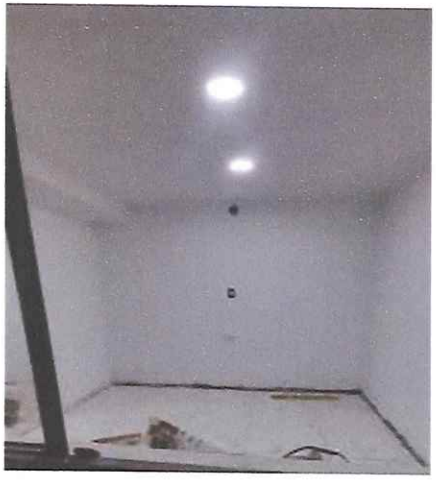ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM


TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801


DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4



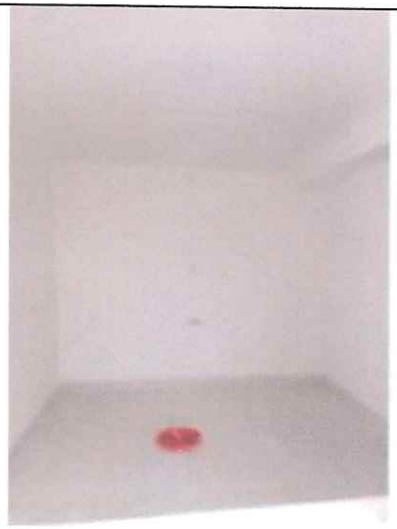

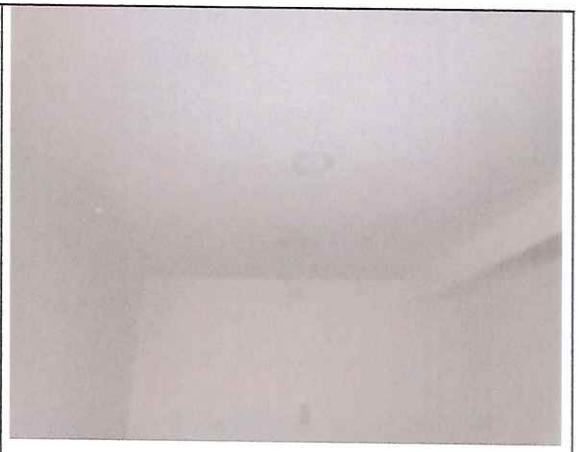

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

CERTIFICADO DE MATERIALES Y FUENTES

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

11,08

Tunja, 20 de septiembre de 2023

SEÑORES:
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS
NIT. 900.624.568
Ciudad

REF: Certificación de productos

Apreciado señor.

Por medio de la presente, **GYJ FERRETERIAS S.A. NIT 800.130.426** certifica que los materiales vendidos y suministrados por nosotros para su obra cumplen con las exigencias legales los cuales tienen certificados que avalan y aprueban los estándares mínimos de calidad de producto de acuerdo con las siguientes facturas:

1. Factura electrónica de venta N°11812720 con certificado de calidad N°16823-23759405-7
2. Factura electrónica de venta N°11812720 con certificado de calidad N°050113
3. Factura electrónica de venta N°11812720 con certificado de calidad N°050076
4. Factura electrónica de venta N°11878441 con certificado de calidad N°18426-24327607-7
5. Factura electrónica de venta N°11878942 con certificado de calidad N°82013
6. Factura electrónica de venta N°11878903 con informe de producto terminado donde avala que el producto es libre de radioactividad
7. Factura electrónica de venta N°11878840 con certificado de calidad RCV00005431

De antemano agradecemos su confianza en nuestros productos y en nosotros como empresa. Trabajaremos para seguir contribuyendo con calidad en sus proyectos.

Cordialmente,

Ing. Kenia Alejandra Ruiz Gaona
Coordinadora SGI –GYJ FERRETERIAS SA.

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA
Ciudad: Tunja - Boyacá
Telefonos: 7457093/7457094/95 Fax: 74570
E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118 61812720
Fecha Emision: 21 de Julio de 2023 09:46
Fecha Vencimiento: 21 de Agosto de 2023

Pedido: PED11878833 Orden de compra: 140723DINCO Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0826 CARDENAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS**
Cliente:
NIT: 900624568-4
Dir.Rad: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com

Despachar a:
Nombre: 118-DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINC
Direccion: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com
Contacto: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1366	CHIPA CORRUGADA 3/8" G60 Kg	0,000 MTS	198,00	KGS	61812720	19	$4,000,00	$792,000
2	17025	ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg	0,000 MTS	112,25	KGS	61812720	19	$3,800,00	$426,550
3	17026	ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg	0,000 MTS	106,70	KGS	61812720	19	$3,800,00	$405,460
4	40005	SERVICIO LOGISTICO, BODEGAJE Y CARGUE		218,95	KGS	61812720	19	$50,00	$10,948

Valor en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Observaciones: POR FAVOR DESPACHAR TUNJA BARRIO SAN FRANCISCO CRA 5 CALLE 8 SUR RECIBE INGENIERO FELKIN GARCIA cel 3102265339 ingeniero yeison veloza celular 3192193801

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1,634,958,00	$19,00	$310,642

Subtotal	$1,634,958
+ Iva	$310,642
Neto	$1,945,600

NUEVO SALDO CARTERA: $3,104,385.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeración HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T11861830001, Vigencia desde: 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

CTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No 25800002343.

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: dina.ortiz

Fecha y Hora de generación: JUL 21 de 2023 9:46:31AM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 0c1624ed33e43c5f1c5bccb4827a743463e51f6eab676494c68ee93aead6fc79f8f7f393d2d4a427972336b830de9e0d

DEACERO®

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	16823 - 23759405 - 7
Fecha / Date:	28/04/2022

Hecho en México / Made in Mexico

DATOS DEL CLIENTE / SOLD TO		CLIENTE CONSIGNADO / SHIP TO		DATOS DEL EMBARQUE / SHIPPING INFORMATION
Cliente / Customer: G Y J FERRETERIAS SA		Cliente / Customer: G Y J FERRETERIAS SA		Núm. Viaje / Travel No: 16823
Dirección / Address: CR 65 B 12A 65 - -		Dirección / Address: - POR ASIGNAR		Núm. Factura / Invoice No: IL2315
Ciudad / City: Santafe De Bogota	Estado / State: CUNDINAMARCA	Ciudad / City: BARRANQUILLA	Estado / State: COLOMBIA	Pedido / Customer Order No: 23759405
Teléfono / Phone: 2906900	País / Country: Colombia C.P./ZIP -			Núm. Plan / Shipping Plan: 86
Correo Electrónico / eMail: gerenciacucuta@gyj.com.co; calidad.giron@gyj.com.c				Fecha Embarque / Date: 28/04/2022

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C AVG	% Mn AVG	% Si AVG	% P AVG	% S AVG	% Cu AVG	% Cr AVG	% Ni AVG	% Mo AVG	% V AVG	% Nb AVG	CE AVG
128092	126966	11821	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	0.273	1.127	0.185	0.009	0.026	0.273	0.084	0.074	0.022	0.041	0.002	0.476 1
128093	126967	11821	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	0.274	1.111	0.149	0.010	0.027	0.282	0.104	0.075	0.021	0.043	0.002	0.476 3
130032	126969	11821	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	0.275	1.123	0.199	0.009	0.015	0.248	0.092	0.089	0.019	0.040	0.003	0.477 9
130742	126968	11821	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	0.271	1.103	0.200	0.006	0.014	0.226	0.098	0.076	0.020	0.040	0.004	0.470 6
124220	137368	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.264	0.954	0.178	0.007	0.008	0.188	0.090	0.063	0.013	0.041	0.001	0.436 0
127106	124214	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.246	0.951	0.143	0.013	0.016	0.253	0.097	0.072	0.016	0.040	0.001	0.420 7
127107	124213	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.246	0.952	0.140	0.013	0.021	0.281	0.113	0.078	0.020	0.040	0.001	0.423 1
128031	141264	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.244	0.957	0.171	0.009	0.016	0.185	0.082	0.061	0.016	0.041	0.002	0.415 4
130015	143136	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.245	1.022	0.132	0.010	0.017	0.240	0.129	0.094	0.024	0.041	0.003	0.434 8
130021	126129	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.258	0.957	0.181	0.008	0.025	0.261	0.086	0.095	0.019	0.042	0.003	0.433 1
131475	126545	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.246	0.952	0.178	0.008	0.019	0.232	0.113	0.068	0.018	0.040	0.003	0.421 3
131476	126558	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.242	0.961	0.189	0.005	0.018	0.234	0.077	0.066	0.016	0.041	0.002	0.415 5
131477	126546	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.249	0.966	0.199	0.007	0.029	0.235	0.073	0.074	0.017	0.042	0.002	0.423 1
131480	126554	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.248	0.970	0.165	0.003	0.007	0.223	0.087	0.082	0.019	0.042	0.002	0.423 5
131482	126547	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.246	0.952	0.125	0.005	0.013	0.224	0.107	0.076	0.019	0.040	0.002	0.420 6
131483	126552	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.252	0.996	0.195	0.010	0.013	0.214	0.119	0.071	0.017	0.042	0.003	0.434 6
131486	126549	11833	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	0.255	0.955	0.142	0.011	0.013	0.230	0.137	0.072	0.019	0.042	0.002	0.433 1

G Y J FERRETERIAS S.A
NIT 830.025.326-3
EMPRESAS DE ACERO
HIERRO LOGISTICA

Factura # 61812720.
21-jul-2023.
Chipa 3/8" — Maquila.

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

DEACERO +VERDE

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015
NO. 2021CRE-895
CERTIFICADO DESDE 2021-01-08

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	16823 - 23759405 - 7
Fecha / Date:	28/04/2022

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C AVG	% Mn AVG	% Si AVG	% P AVG	% S AVG	% Cu AVG	% Cr AVG	% Ni AVG	% Mo AVG	% V AVG	% Nb AVG	CE AVG
132034	145142	23837	VARILLA DA- 2289 G60 C2 7/8" 14.0 m P80 R	0.264	0.998	0.176	0.007	0.019	0.261	0.101	0.073	0.016	0.004	0.003	0.4510

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm² AVG	TS MPa AVG	% Elong / Elong AVG	LF kg/mm² AVG	YS MPa AVG	RT/LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado Punto 11 de la Norma NTC2289 /	Peso metro (Kg/m) AVG	Máx. Espaciamiento AVG	Min. Altura AVG	Separación Extr. Resaltes AVG
128092	126966	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	G60	1/2"	1	70.20	688.46	14.96	49.77	488.16	1.41	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.99	7.84	0.62	2.94
128093	126967	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	G60	1/2"	36	70.22	688.63	15.70	47.66	467.46	1.47	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.00	7.81	0.63	2.95
130032	126969	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	G60	1/2"	30	71.20	698.28	15.67	47.85	469.29	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.99	7.82	0.62	2.92
130742	126968	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/2" 1.4T C	G60	1/2"	73	70.73	693.68	14.70	47.64	467.23	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.00	7.82	0.62	2.92
124220	137368	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	65.31	640.53	14.69	45.45	445.71	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.15	0.49	1.73
127106	124214	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	63.92	626.89	15.00	44.12	432.72	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.24	0.64	2.01
127107	124213	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	64.30	630.63	15.51	44.74	438.75	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.13	0.75	1.87
128031	141264	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	2	67.32	660.25	15.43	44.94	440.78	1.49	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.30	0.64	3.05
130015	143136	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	6	71.64	702.55	15.52	46.24	453.50	1.54	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.10	0.61	2.50
130021	126129	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	68.99	676.62	14.94	47.39	464.80	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.40	0.78	1.50
131475	126545	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	66.16	648.80	14.74	46.98	460.72	1.40	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.54	6.11	0.52	3.00
131476	126558	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	66.80	655.10	14.76	45.63	447.49	1.46	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.14	0.58	3.01
131477	126546	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	2	65.71	644.39	15.81	45.38	445.03	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.14	0.51	3.01
131480	126554	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	2	67.34	660.38	16.30	46.73	458.35	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.04	0.77	1.55
131482	126547	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	66.36	650.82	14.98	45.74	448.59	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.14	0.49	3.01
131483	126552	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	28	70.95	695.85	16.30	46.90	460.01	1.51	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	5.98	0.74	1.86

G Y J FERRETERIAS S.A
EMPRESA DE ACERO
JEFE DE LOGISTICA

Factura # 61812770
21-Julio 2023
Chipa 3/8" - Maquila.

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015
NO. 2021CRE-895
CERTIFICADO DESDE 2021-01-08

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

GSR GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Rto 1554:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 050113

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA
14/07/2023

CLIENTE	G&J FERRETERIAS S.A.
DESTINO	TUNJA
PLACA	XIE 509
NORMA	NTC 2289
GRADO	420
PEDIDO No.	23029
REMISIÓN No.	23057
FACTURA No.	71952

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
					DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN				C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
						FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F																	
R - No. 5	12	20231893	11	1836	✓	477.7	618.1	15.9	1.29	0.26	1.12	0.01	0.036	0.18	0.21	0.08	0.05	0.029	0.00082	0.0023	0.46	1.531	1.150	10.590	71.5	1.960
		20231892	6		✓	488.7	622.5	15.6	1.27	0.24	1.15	0.00997	0.034	0.17	0.22	0.10	0.07	0.029	0.00100	0.0023	0.45	1.519	1.200	10.590	71.5	1.760
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55		(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1

G&J
G Y J FERRETERIAS S.A
NIT.800.130.425-3
EMPRESAS DE ACERO
JEFE DE LOGISTICA

Factura # 61812720
21-julio/2023
Acero figurado 5/8"
Cartilla # 12385

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: impuestos@gyj.com.co;analista.compras@gyj.com.co;siso@gyj.com.co;aprendiz.calidad@gyj.com.co;

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289:2021 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Res. 1554:2247 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 050076

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 13/07/2023

CLIENTE	G&J FERRETERIAS S.A.

DESTINO	TUNJA	**NORMA**	NTC 2289
PLACA	SZX 447	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23016
REMISIÓN No.	23043
FACTURA No.	71887

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F
R - No. 4	12	20231658	6	2856	✓	483.2	623.5	16.0	1.29
		20231660	9		✓	478.5	626.3	15.7	1.31
		20231745	1		✓	476.3	619.4	16.8	1.30
		20231614	1		✓	476.3	614.7	15.8	1.29

ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.

C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
0.26	1.17	0.00867	0.038	0.17	0.20	0.08	0.06	0.022	0.00024	0.0020	0.47
0.25	1.17	0.00887	0.039	0.17	0.26	0.10	0.06	0.022	0.00037	0.0021	0.46
0.26	1.16	0.0099	0.039	0.19	0.27	0.08	0.08	0.018	0.00066	0.0023	0.47
0.26	1.17	0.00927	0.034	0.17	0.24	0.07	0.07	0.030	0.00067	0.0023	0.47

RESULTADOS DIMENSIONALES

PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
0.985	0.920	8.430	74.0	1.960
0.987	0.870	8.430	74.0	1.920
0.974	0.880	8.540	71.6	1.570
0.973	0.960	8.370	68.4	1.780

ESPECIFICACIONES DE NORMA

R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9

G&J
G Y J FERRETERIAS S.A
NIT.800.130.436-3
EMPRESAS DE ACERO
JEFE DE LOGISTICA

Factura #61812720
21- julio 12023
Acero Figurado de 1/2"
Cuadilla #12335.

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: impuestos@gyj.com.co;analista.compras@gyj.com.co;siso@gyj.com.co;aprendiz.calidad@gyj.com.co;

G&J FERRETERIAS
EMPRESAS DE ACERO

DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
ACERO FIGURADO - RETIRAN
LISTADO PARA DESPACHO

CLIENTE: DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS
OBRA: DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINC (DISEÑO INTERVENTORIA
CARTILLA: 12335 (Ped Nº 11878833 OPF Nº 12495 DISEÑO INVTERVENTORIA Y CONSTRU. - RETIRAN)

Lista de barras #4

	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
1	0.20 — 5.55 — 0.20	12	#4	5.95	71.40	
2	0.20 — 1.25 — 0.20	5	#4	1.65	8.25	
3	0.20 — 0.85 — 0.20	20	#4	1.25	25.00	
4	0.20 — 0.55 — 0.20	8	#4	0.95	7.60	

Peso total barras #4 =112.25 kg

Lista de barras #5

5	0.20 — 5.30 — 0.20	12	#5	5.70	106.70	

Peso total barras #5 =106.70 kg

PESO TOTAL = 218.95 kg

G & J FERRETERIAS S.A.
NIT: 800.130.426 - 3
UNES TUNJA
ENTREGADO BODEGA
UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL
NO SE ACEPTA CAMBIOS, RECLAMOS
NI DEVOLUCIONES. POR FAVOR VERIFIQUE.

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
NOMBRE: Gilberto Valderrama C.
C.C. No. 7167-247
FIRMA: Gilberto Valderrama C.
FECHA: 07-21-2023

TRAZABILIDAD

PRODUCTO	PROVEEDOR	# COLADA / LOTE
#4	Sidenal	2023-1658
#5	Sidenal	2023-1892

PLANTA PRODUCCIÓN G Y J TUNJA

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA
Ciudad: Tunja - Boyacá
Telefonos: 7457093/7457094/95 Fax: 74570
E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA o ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118
61812281
Fecha Emision: 06 de Junio de 2023 08:14
Fecha Vencimiento: 07 de Junio de 2023

Pedido: PED11878441 Orden de compra: JUNIO 2023. Condicion de pago: CréditoCREDITO 3 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0826 CARDENAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS**
Cliente:
NIT: 900624568-4
Dir.Rad: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com

Despachar a:
Nombre: 118-DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINC
Direccion: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com
Contacto: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	809	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	1.00	UND	61812281	19	$12,936.00	$12,936
2	843	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	28.00	UND	61812281	19	$22,500.00	$630,000
3	7644	PUNTILLA 2 1/2" (63.50mm)CTILLA 500 Gr	0.000 MTS	3.00	LB	61812281	19	$3,600.00	$10,800
4	7710	TUBO PVC ALCANTARILLADO 8" (200 mm)		2.00	UND	61812281	19	$160,000.00	$320,000
5	7764	TUBO PVC CONDUIT PESAD.1/2"		1.00	UND	61812281	19	$4,400.00	$4,400
6	16809	MALLA ELECTRO XX-257 (7.0 x 7.0mm)15X15	0.000 MTS	7.00	UND	61812281	19	$259,800.00	$1,818,600
7	32839	CEMENTO GRIS 50 Kg Patriotas NTC121	0.000 MTS	15.00	UND	61812281	19	$22,689.00	$340,335

Valor en Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE**********

Observaciones: RETIRA HIPOLITO CC 71725260 PLACA SMP 765

Subtotal	$3,137,071
+ Iva	$596,043
Neto	$3,733,114

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$3,137,071.00	$19.00	$596,043

NUEVO SALDO CARTERA: $3,733,114.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeración HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T11861830001, Vigencia desde: 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2016 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

ECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA, CTA DE AHORROS No 25800002343.

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: dina.ortiz

Fecha y Hora de generación: JUN 06 de 2023 8:15:01AM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 22514a62b023ca7134b94703b650f3c04373f31e8ee5a461ee3d3e909aff7fa6fb03a41b9cbe78063a992b4f863bc66c

DEACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	18426 - 24327607 - 7
Fecha / Date:	25/01/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C AVG	% Mn AVG	% Si AVG	% P AVG	% S AVG	% Cu AVG	% Cr AVG	% Ni AVG	% Mo AVG	% V AVG	% Nb AVG	CE AVG
138813	151970	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.274	1.020	0.135	0.011	0.023	0.287	0.132	0.088	0.024	0.003	0.005	0.468 3
138814	151971	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.268	1.003	0.150	0.011	0.021	0.284	0.153	0.096	0.025	0.002	0.005	0.462 2
138815	151972	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.264	0.998	0.147	0.010	0.015	0.281	0.117	0.088	0.022	0.002	0.005	0.453 0
138816	151973	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.279	0.985	0.137	0.011	0.012	0.287	0.124	0.094	0.024	0.003	0.005	0.466 9
138817	151974	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.286	0.995	0.164	0.013	0.021	0.299	0.161	0.086	0.023	0.003	0.005	0.479 6
138818	151975	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.281	0.994	0.133	0.010	0.012	0.263	0.136	0.088	0.022	0.003	0.005	0.471 0
138819	151976	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.267	0.999	0.151	0.012	0.014	0.280	0.142	0.088	0.024	0.003	0.005	0.458 3
138820	151977	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.285	1.009	0.145	0.011	0.010	0.265	0.110	0.093	0.025	0.003	0.006	0.475 1
138821	151978	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.274	0.994	0.136	0.011	0.023	0.273	0.135	0.091	0.025	0.003	0.005	0.464 3
138822	151979	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.279	0.982	0.138	0.010	0.012	0.273	0.157	0.085	0.024	0.003	0.005	0.469 6
138823	151980	23818	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 12.0 m P70 R	0.278	0.983	0.140	0.013	0.015	0.285	0.166	0.086	0.026	0.002	0.005	0.470 1
138968	152415	23817	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 14.0 m P71 R	0.271	1.005	0.150	0.009	0.016	0.233	0.112	0.105	0.025	0.003	0.006	0.460 2
138969	152414	23817	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 14.0 m P71 R	0.274	0.980	0.125	0.011	0.017	0.238	0.113	0.116	0.027	0.003	0.005	0.460 1
138970	152413	23817	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 14.0 m P71 R	0.271	0.990	0.135	0.009	0.021	0.234	0.109	0.122	0.028	0.003	0.005	0.459 0
137302	150812	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.281	0.980	0.136	0.010	0.019	0.291	0.131	0.096	0.026	0.003	0.004	0.469 4
137611	151083	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.268	0.994	0.179	0.009	0.021	0.290	0.139	0.098	0.025	0.004	0.004	0.459 7
138012	151511	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.262	1.000	0.143	0.008	0.019	0.262	0.118	0.087	0.021	0.002	0.004	0.450 8
138017	151515	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.271	1.028	0.150	0.009	0.025	0.256	0.105	0.078	0.022	0.002	0.004	0.462 7
138018	151514	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.261	0.983	0.146	0.007	0.026	0.272	0.097	0.079	0.020	0.002	0.004	0.445 3
138019	151513	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.266	1.029	0.143	0.007	0.032	0.249	0.098	0.079	0.020	0.002	0.003	0.457 7
138020	151512	23819	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	0.279	1.020	0.140	0.008	0.024	0.280	0.097	0.079	0.021	0.003	0.004	0.470 0

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015
NO. 2021CRI-895
CERTIFICADO DESDE 2021-01-05

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	18426 - 24327607 - 7
Fecha / Date:	25/01/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm²	TS MPa	% Elong / Elong	LF kg/mm²	YS MPa	RT/LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado	Peso metro (Kg/m)	Máx. Espaciamiento	Min. Altura	Separación Extr. Resaltes
						AVG	AVG	AVG	AVG	AVG			Punto 11 de la Norma NTC2289 /	AVG	AVG	AVG	AVG
138968	152415	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 14.0 m P71 R	G60	1/2"	5	63.63	623.99	16.00	49.29	483.37	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.40
138969	152414	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 14.0 m P71 R	G60	1/2"	29	64.24	630.01	16.00	49.63	486.77	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.30	0.85	3.87
138970	152413	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 14.0 m P71 R	G60	1/2"	17	63.73	625.01	16.00	49.24	482.94	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.42	0.80	3.85
137302	150812	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	14	64.73	634.84	14.82	50.86	498.85	1.27	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.96	8.40	0.85	3.65
137611	151083	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	15	65.64	643.75	16.31	49.31	483.62	1.33	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.95	8.42	0.86	3.39
138012	151511	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	16	63.87	626.41	17.50	49.29	483.40	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138017	151515	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	4	61.94	607.46	16.50	47.69	467.70	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138018	151514	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	28	61.85	606.61	16.00	48.56	476.27	1.27	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.30	0.84	3.25
138019	151513	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	41	62.65	614.41	17.25	48.41	474.74	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138020	151512	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	17	62.49	612.84	17.62	48.95	480.10	1.27	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138021	151510	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	12	62.53	613.25	16.50	49.35	483.99	1.26	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.95	8.33	0.84	3.25
138022	151508	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	10	62.63	614.18	17.07	48.87	479.33	1.28	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.95	7.90	0.80	3.25
138808	151982	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	9	64.30	630.63	16.00	47.81	468.93	1.34	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.30	0.84	3.25
138808	151991	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	15	64.30	630.63	17.00	47.82	469.01	1.34	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.25	0.68	3.28
138823	151981	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	25	64.30	630.63	16.00	47.81	468.93	1.34	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138824	151983	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	35	66.09	648.15	16.00	50.70	497.28	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.80	3.25
138825	151984	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	36	69.72	683.75	16.00	46.36	454.65	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138826	151985	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	27	69.68	683.36	16.00	46.36	454.65	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.33	0.84	3.25
138827	151986	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	36	66.09	648.15	16.00	51.10	501.13	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.31	0.79	3.25
138828	151987	VARILLA DA- 2289 G60 C2 1/2" 6.0 m P68 R	G60	1/2"	28	65.09	638.34	16.00	47.82	469.01	1.36	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.94	8.30	0.80	3.25

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015
NO. 2021CRE-895
CERTIFICADO DESDE 2021-01-08

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	18918 - 24475684 - 7
Fecha / Date:	22/04/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Clave / Code	Producto / Description of Goods	% C AVG	% Mn AVG	% Si AVG	% P AVG	% S AVG	% Cu AVG	% Cr AVG	% Ni AVG	% Mo AVG	% V AVG	% Nb AVG	CE AVG
201466	185718	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.251	1.368	0.166	0.015	0.018	0.218	0.092	0.074	0.016	0.027	0.002	0.4948
201467	185716	23816	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	0.256	1.367	0.179	0.015	0.018	0.257	0.087	0.085	0.017	0.028	0.002	0.5001

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm² AVG	TS MPa AVG	% Elong / Elong AVG	LF kg/mm² AVG	YS MPa AVG	RT/LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado Punto 11 de la Norma NTC2289 /	Peso metro (Kg/m) AVG	Máx. Espaciamiento AVG	Min. Altura AVG	Separación Extr. Resaltes AVG
138237	129586	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	1	61.31	601.27	15.30	46.16	452.74	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.25	3.80	0.47	1.40
140542	130193	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	18	57.66	565.47	15.52	44.38	435.25	1.29	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.25	3.95	0.55	0.62
140542	130462	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	69	59.56	584.09	14.70	44.64	437.84	1.33	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.24	4.15	0.56	1.34
140543	130192	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	8	63.45	622.22	15.19	43.99	431.44	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.25	3.93	0.44	0.49
197855	129293	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	2	64.18	629.40	15.25	45.22	443.51	1.41	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.24	3.80	0.45	1.30
197856	129292	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	8	67.45	661.49	14.60	47.84	469.21	1.40	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.24	3.80	0.35	1.30
201571	130463	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	71	63.54	623.18	14.85	45.43	445.52	1.39	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.25	4.19	0.49	1.50
201572	130464	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	69	64.49	632.50	15.01	44.96	440.91	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.25	4.21	0.46	1.57
201573	130465	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 1/4" 1.4T C	G60	1/4	37	67.45	661.51	15.12	45.03	441.65	1.49	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.24	4.25	0.55	2.23
140545	130142	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	21	68.00	666.88	15.30	45.86	449.82	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.28	0.48	1.93
140551	130135	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	10	66.58	652.93	16.28	44.92	440.58	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.56	6.08	0.68	2.16
140552	130134	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	48	67.82	665.13	16.00	46.58	456.88	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.09	0.68	2.08
140553	130133	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	16	65.99	647.16	15.19	44.80	439.35	1.47	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.08	0.65	2.17
140558	130126	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	1	65.01	637.53	15.14	45.09	442.19	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	5.99	0.51	1.56
199202	129837	ALAMBRON CORRUGADO DA- 2289 G60 C2 3/8" 1.4T C	G60	3/8"	3	68.82	674.93	15.64	46.82	459.16	1.46	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.55	6.00	0.56	1.49

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañia, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015 NO. 2021CRE-895 CERTIFICADO DESDE 2021-01-08

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

DEACERO
EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya
Carretera 45 Panamericana Km 64.8 Poblado el Chinaco
C.P./ZIP 38260 MPIO. VILLAGRAN, GUANAJUATO
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
MX 01 800 021 3322, USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No:	18918 - 24475684 - 7
Fecha / Date:	22/04/2023

Hecho en México / Made in Mexico

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties

Colada / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm²	TS MPa	% Elong / Elong	LF kg/mm²	YS MPa	RT/LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado	Peso metro (Kg/m)	Máx. Espaciamiento	Min. Altura	Separación Extr. Resaltes
						AVG	AVG	AVG	AVG	AVG			Punto 11 de la Norma NTC2289 /	AVG	AVG	AVG	AVG
140917	154403	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 6.0 m P75 R	G60	3/4"	12	62.99	617.72	17.57	48.35	474.22	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.14	12.88	1.34	4.96
140918	154402	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 6.0 m P75 R	G60	3/4"	5	62.86	616.45	17.32	48.19	472.62	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.13	12.88	1.34	4.96
140919	154401	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 6.0 m P75 R	G60	3/4"	8	62.89	616.76	17.27	48.11	471.84	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.13	12.88	1.34	4.96
140911	154409	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	G60	3/4"	17	63.10	618.85	17.10	48.46	475.26	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.11	12.78	1.15	3.25
140913	154408	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	G60	3/4"	25	61.43	602.50	15.50	46.56	456.60	1.31	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.14	12.78	1.19	3.25
140914	154407	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	G60	3/4"	21	61.45	602.64	16.00	46.56	456.64	1.31	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.15	12.78	1.16	3.25
140915	154406	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	G60	3/4"	25	61.96	607.69	16.18	47.44	465.30	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.13	12.78	1.16	3.25
140916	154405	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/4" 9.0m P76 R	G60	3/4"	2	63.11	618.91	17.10	48.30	473.69	1.30	Cumple / Successfully	CUMPLE	2.16	12.88	1.29	5.11
137481	185717	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	24	67.35	660.54	15.01	44.83	439.69	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.45	0.67	2.68
140573	185715	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	27	63.34	621.16	17.09	45.32	444.45	1.39	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.34	0.54	2.18
140577	185713	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	52	67.22	659.22	15.99	44.33	434.75	1.51	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.34	0.58	2.18
140578	185714	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	11	64.17	629.29	16.46	45.25	443.77	1.41	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.54	6.34	0.55	2.17
201461	185722	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	40	70.04	686.86	17.25	50.18	492.18	1.39	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.30	0.68	2.28
201463	185721	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	50	69.84	684.93	17.50	49.89	489.29	1.39	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.31	0.68	2.28
201464	185720	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	57	65.53	642.65	15.54	43.81	429.70	1.49	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.34	0.56	2.18
201465	185719	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	52	66.30	650.18	15.17	44.65	437.94	1.48	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.54	6.34	0.58	2.18
201466	185718	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	51	66.05	647.74	16.20	45.75	448.74	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.39	0.66	2.65
201467	185716	VARILLA DA- NTC 2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	54	68.38	670.62	16.40	46.28	453.87	1.47	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.34	0.51	2.17

DEACERO +VERDE

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289:2020 y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto Resolución1856 de 2017 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289:2020. All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015 Gestión de calidad
CERTIFICADO ISO 9001:2015
NO. 2021CR1-895
CERTIFICADO DESDE 2021-01-08

ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality Assurance Manager

LABORATORIO G y J MOSQUERA

RESULTADO DE ENSAYO – MALLA ELECTROSOLDADA

FECHA IMPRESION	lunes, 20 de febrero de 2023		
CLIENTE y/o UNIDAD DE NEGOCIO	GYJ FERRETERIAS		MALAMBO
INFORME No.	BMS-200223-564	REFERENCIA	Malla Electrosoldada XX-257 (7.0 X 7.0mm)
No. COPIA	1	FECHA ENSAYO	20/02/2023


CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA (NTC 5806 Numeral 11)

DESCRIPCION	UNIDAD	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Lote	N.A.	TEC01-450	TEC01-450
Peso Muestra	g	2416	1407.32
Longitud Muestra	mm	500	3330

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES NOMINAL	VALORES REAL	VALORES NOMINAL	VALORES REAL	ICONTEC NTC 5806 Fecha revisión 2019-06-19
Diametro	mm	7	7.01	7	7.01	CUMPLE Numeral 7.2.7.1 peso Tabla 6 diámetro y área cumple
Área	mm²	38.5	38.59	38.5	38.59	
Peso gratil por metro	g/m	302		302		
Tolerancia en peso máxima = ± 6%						

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES LONGITUDINAL ESPECIFICADO	VALORES LONGITUDINAL OBTENIDO	VALORES TRANSVERSAL ESPECIFICADO	VALORES TRANSVERSAL OBTENIDO	Requisitos norma ICONTEC NTC 5806 Fecha revisión 2019-06-19
Dimensión de la malla		mm	6000	5980	2350	2330	
Tolerancia en longitud = ± 1%		%	-0.33		N.A.		CUMPLE Numeral 10
Tolerancia del ancho = ± 25 mm		mm	N.A.		-20.00		CUMPLE Numeral 10.1
Longitud de pelos		mm	75	74.8	50	49.80	CUMPLE Numeral 10.3 Tabla 11
Número de barras por malla		N.A.	16		40		CUMPLE Numeral 10 Tabla 11
Ensayos de tracción numeral 7.2.5	resistencia a la tracción	MPa	Min 550	650.75	Min 550	653.03	CUMPLE Numeral 7.2.5.3 Tabla 9
	incertidumbre 2.16 MPa						
	Resistencia a la fluencia	MPa	Min 485	628.63	Min 485	628.59	CUMPLE Numeral 7.2.5.3 Tabla 9
	incertidumbre 1,8 MPa						
Espaciamiento entre alambres	Nominal	mm	150	+/- 6.35	150	+/- 6.35	CUMPLE Numeral 10.6
	Promedio real		151		150		
	Variación		1		0		
Resaltes	Altura promedio (incertidumbre 0,02 mm)	mm	Min 0.31	0.34	Min 0.31	0.34	CUMPLE Numeral 7.2.4.4 Tabla 6 y 7
	Ángulo de inclinación (incertidumbre 0,44°)	°	Mayor a 45	57	Mayor a 45	57	
	Espaciamiento promedio (incertidumbre 0.062 mm)	mm	4.62 a 7.24	6.69	4.62 a 7.24	6.69	CUMPLE Numeral 7.2.4.5
	Resaltes por 25,4 mm	N.A.	3.5 a 5.5	4	3.5 a 5.5	4	
	dos o mas lineas de resaltes						CUMPLE Numeral 7.2.4.2
Resistencia al corte en la soldadura		N	OBTENIDO		ESPECIFICADO		CUMPLE Numeral 6.3
			18019		9279		
ENSAYO DE DOBLADO A 90° SIN PRESENTAR AGRIETAMIENTO							CUMPLE Numeral 7.2.6 Tabla 10

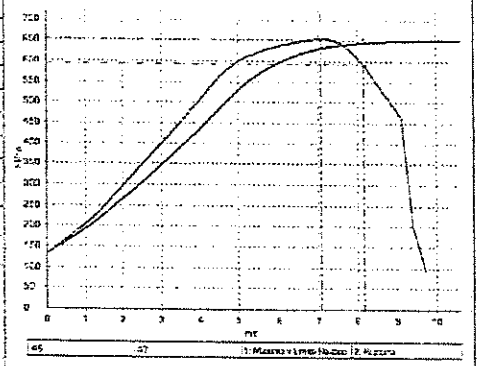

TEMPERATURA DE ENSAYO (°C)	18
HUMEDAD (%)	63

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. CF 3485 MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS. SUMINISTRADO POR METROTEST.

Método De Ensayo Ensayos Mecánicos Especificado En La Ntc 3353 Método Ensayo Dimensionales Ntc 5806

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente. excepto con previa autorización por escrito de G&J

Los productos relacionados en este certificado han sido fabricados con la norma NTC5806 reglamentada por la resolución 277 de 2015

Sello de Calidad

NTC 5806 (2018) CSC-CER 525778 Malla Electrosoldada

Sello con Reglamento Técnico

Resolución 277 de 2015 CSR-CER 443184 Malla Electrosoldada

Responsable del ensayo	Ing. David Galvis	Responsable de aprobación del ensayo	Ing. Maribe Badal
Cargo	LABORATORISTA DE CALIDAD	Cargo	DIRECTORA S.G.I

CALLE 3 No 11a-10 MOSQUERA CUNDINAMARCA
laboratorio@gyj.com.co

———FIN DEL INFORME———

G Y J FERRETERIAS S.A.

CONSTRUYENDO REALIDADES

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA
Ciudad: Tunja - Boyacá
Telefonos: 7457093/7457094/95 Fax: 74570
E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118
61812821
Fecha Emision: 29 de Julio de 2023 10:27
Fecha Vencimiento: 29 de Agosto de 2023

Pedido: PED11878942 Orden de compra: CERM260723 Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0826 CARDENAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS**
Cliente:
NIT: 900624568-4
Dir.Rad: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com

Despachar a:
Nombre: 118-DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINC
Direccion: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com
Contacto: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12529	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2"ESP .075"	6.000 MTS	10.00	UND	61812821	19	$93,680.00	$936,800

Valor en Letras: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Observaciones: DESPACHAR SÁCHICA. ALCALDÍA DE SÁCHICA. RECIBE ING FELKIN GARCIA CEL: 310 2265339 O ING YEISON VELOZA CEL: 319 2193801

Subtotal	$936,800
+ Iva	$177,992
Neto	$1,114,792

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$936,800.00	$19.00	$177,992

NUEVO SALDO CARTERA: $4,401,890.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeración HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T11861830001, Vigencia desde: 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856/2017 varilla corrugada y figurados y 277. 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con la norma RTC 5806 Rto 7.2

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No 25800002343.

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, sino reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley"

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: victor.rodriguez

Fecha y Hora de generación: JUL 29 de 2023 10:27:03AM ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 34d87f366efa9n8a54fe6c081f4aa6612487e684485eac6n5fe335c88e23d39f99fee9cf1e52bd5f64df7a300be50b41

F.Expedicion: 2023-07-29 10:27:29-05:00

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL SAS
ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO
CERTIFICADO DE CALIDAD F-C-620-013

FECHA: 2/20/2023 CLIENTE: G Y J FERRETERIAS S A CERTIFICADO No.: 82013 REMISION DE DESPACHO: 78165

No	REFERENCIA	TIPO	Cant. Un.	COLADA	NORMA	ASPECTOS DIMENSIONALES								COMPOSICION QUIMICA				PM Mecanicas			PESO REC.	PRUEBAS Y ENSAYOS			
						Diam (pulg)	Esp (pulg)	Long (m)	Diam (pulg)	Esp (pulg)	Long (m)	LadoA(mm)	LadoB(mm)	C x10 -2	Mn x10 -2	P x10 -3	S x10 -3	LS	TS	EL		Aboc	Aplast	Hidrost	Neumatic
						NOM	NOM	NOM	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					PSI	PSI	%	g/m2			PSI	PSI
1	CA07500236006000N	TUBERIA CERRAMIENTO NEGRO	37	124917-179811C26-1512450-1531921	NTC 1560	2"	0.075" L. CALIENTE	6.000 MTS	2360.5	0.074	6015	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONFORME	CONFORME	N/A	N/A

NIC= Norma Interna Colmena NOM = Nominal pulg = PULGADAS m = METROS N/A = No aplica tol = tolerancia SI = Conforme NO = No conforme Diam = Diametro/ Dimensiones Esp = Espesor Long = Longitud CUAD. = Cuadrado RECT. = Rectangular RED. = Redondo Aboc = Abocardado Aplast= Aplastamiento Hidrost = Prueba Hidrostatico Neumatic = Prueba Neumatica

SE CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO FORMADOS , INSPECCIONADOS Y PROBADOS DE ACUERDO A LA NORMA ESPECIFICADA PARA CADA REFERENCIA. LA INFORMACION DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y MECANICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SON VALORES OBTENIDOS DE LOS CERTIFICADOS DE MATERIA PRIMA.

IDENTIFICACION		OPR
1	COLMENA CERRAMIENTO NTC 1560 DA (XXXX) ESP (XXX) mm.	18687

EMITIDO POR:
Representante Colmena: EDGAR ALEXANDER GUERRERO
Fecha Emision: 2/20/2023 8:25:33 AM

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA
Ciudad: Tunja - Boyacá
Telefonos: 7457093/7457094/95 Fax: 74570
E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118
61812747
Fecha Emision: 24 de Julio de 2023 14:26
Fecha Vencimiento: 24 de Agosto de 2023

Pedido: PED11878903 Orden de compra: 24072333 Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0826 CARDENAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores:	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	Despachar a:	
Cliente:		Nombre:	118-DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINC
NIT: 900624568-4		Direccion:	CL 55 8 B 34
Dir.Rad:	CL 55 8 B 34	Ciudad:	Bogotá, D.C. - Bogotá
Ciudad:	Bogotá, D.C. - Bogotá	Tel:	3208963029 3192193801
Tel:	3208963029 3192193801	Email:	empresa.dinco.sas@gmail.com
Email:	empresa.dinco.sas@gmail.com	Contacto:	YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	730	ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG	0.000 MTS	30.00	KGS	61812747	19	$5,118.00	$153,540

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE**********

Observaciones: RETIRA SR FELKIN GARCIA CC 1049614304 PLACA QFR 159

Subtotal	$153,540
+ Iva	$29,173
Neto	$182,713

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$153,540.00	$19.00	$29,173

NUEVO SALDO CARTERA: $3,287,098.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeración HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T11861830001, Vigencia desde: 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1858'2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega abqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No 25800002343.

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: victor.rodriguez

Fecha y Hora de generación: JUL 24 de 2023 2:26:18PM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: f5e97da5ce08c78b6e8c847e41037a6f6061c991adafa434196f22d3294d7670e76905e5a5621e28d012137b522c54aa

PROALCO BEKAERT	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	6

NUMERO DE INFORME
DCE-35-2023

FECHA DE ELABORACION
04/02/2023

	CLIENTE	CIUDAD
	G y J FERRETERIAS S.A	TUNJA
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg	

CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ007981
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	38	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
160	25	4.000

OBSERVACIONES :
Material libre de Radiactividad.

PROALCO BEKAERT

Se recomienda que la selección, separación y disposición de residuos de los Productos de Proalco S.A.S. se realice de acuerdo a la Norma Minera Colombiana GTC 24

G Y J FERRETERIAS S.A.

CONSTRUYENDO REALIDADES

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A PAIPA
Ciudad: Tunja - Boyacá
Telefonos: 7457093/7457094/95 Fax: 74570!
E-mail: gerenciatunja@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T118
61812719
Fecha Emision: 21 de Julio de 2023 09:42
Fecha Vencimiento: 21 de Agosto de 2023

Pedido: PED11878840 Orden de compra: 170723 Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0826 CARDENAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS**
Cliente:
NIT: 900624668-4
Dir.Rad: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com

Despachar a:
Nombre: 118-DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINC
Direccion: CL 55 8 B 34
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Tel: 3208963029 3192193801
Email: empresa.dinco.sas@gmail.com
Contacto: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5594	TUBO MUEBLE RECT 38X76 1.10 mm	6.000 MTS	3.00	UND	61812719	19	$55,042.01	$165,126
2	7717	TUBO PVC SANITARIO 2"X6 M		1.00	UND	61812719	19	$38,592.92	$38,593
3	7719	TUBO PVC SANITARIO 3"X6 M		1.00	UND	61812719	19	$56,547.00	$56,547
	027	CODO 90° 1/4" SANITARIA CXC 2"		4.00	UND	61812719	19	$1,606.00	$6,424
5	8028	CODO 90° 1/4" SANITARIA CXC 3"		1.00	UND	61812719	19	$3,718.00	$3,718
6	32839	CEMENTO GRIS 50 Kg Patriotas NTC121	0.000 MTS	31.00	UND	61812719	19	$22,689.07	$703,361

Valor en Letras: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE* * * * *

Observaciones: POR FAVOR DESPACHAR TUNJA BARRIO SAN FRANCISCO CRA 5 CON CALLE 8 SUR, ADJUNTO MAPA, RECIBE ING FELKIN GARCIA CEL: 310 2265339 O ING YEISON VELOZA CEL: 319 2193801

Subtotal	$973,769
+ Iva	$185,016
Neto	$1,158,785

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$973,769.00	$19.00	$185,016

NUEVO SALDO CARTERA: $1,158,785.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040101233, Numeración HABILITADA Rango desde: T11861810662 al T11861830001, Vigencia desde: 23/11/2022 hasta 2024/05/23 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque. se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 616431987 o BANCOLOMBIA. CTA DE AHORROS No 25800002343.

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890,319.193-3

Usuario: dina.ortiz

Fecha y Hora de generación: JUL 21 de 2023 9:42:42AM ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o Ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: a9660e49c4fad31bf085b09c4f9618fed90634cb22ea20423cf869d424bf155467976ecb176e72f8ca8fed4ae5dc6b8a

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO SANITARIO - TUBO VENTILACIÓN - TUBERÍA PRESIÓN AGUA POTABLE - TUBERÍA DE RIEGO AGRÍCOLA - TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON UNIÓN ELASTOMÉRICA - ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE - TUBO DUCTO CORRUGADO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CPVC - ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN - TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA - ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO - ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA.

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín Kilómetro 2, 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 860.502.509-1**

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellin Kilómetro 2, 600 metros Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia,** identified with **NIT number 860.502.509-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico de tuberías y accesorios

Technical regulation about pipes and accessories

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR -CER602683
Certificate

Fecha de Aprobación:	**2018-04-13**	**Fecha Última Modificación:**	**2023-03-31**
Approval Date:		Last Modification Date:	
Fecha de Renovación:		**Fecha de Vencimiento:**	**2024-04-12**
Renewal Date:		Expiration Date:	

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

PROCEMCOL S.A.S
NIT: 900.882.921-7 S.A.S

PROCEMCOL S.A.S

CALLE 67#10-199-SOGAMOSO

CEMENTO PATRIOTA DE NUESTRA TIERRA

CC-F-012 CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO NO.	RVC-00005431	**FECHA:**	13/07/2023
CLIENTE:			TUNJA

CANTIDAD [Ton]	36	**TIPO DE CEMENTO:**	UG	**NORMA:**	**Peso c/Bulto:**	50 Kg	

RESULTADOS DE ANÁLISIS

ENSAYO		Método	Valor de Control*	LOTES				
				0907	1207			
Superficie Especifica[m2/Kg]		NTC 33	NE	5820	56,43			
Finura %RM 325		NTC 294	NE	96,26%	96,14%			
Fraguado [min]	Inicial	NTC 118	≥45	180	175			
	Final		≤ 420	290	285			
Resistencias [MPa]	1 día	NTC 220	≥3.0	4,20	5,09			
	3 días		≥8,0	10,88	10,65			
	7 días		≥ 15,0	15,46	15,38			
	28 días		≥ 24,0	24,20	25,52			

* Según NTC 121 NE: No Especifica

RECOMENDACIONES DE USO

- Verificar siempre el tipo de arenas y gravas a utilizar en cuanto a tamaño, pureza y calidad.
- Usar la cantidad adecuada de agua para la producción de la mezcla.
- Realizar la mezcla de agregados y cemento sobre superficies limpias y duras.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Manténgase en un ambiente alejado de humedad y bajo techo.
- No colocar sobre el suelo directamente, utilizar estibas de madera y manténgase alejado de las
- En caso de contacto con los ojos lávese con abundante agua.
- Evite inhalar el contenido del saco.

*LOS DATOS REGISTRADOS CARACTERIZAN EL PROMEDIO DEL LOTE CORESPONDIENTE.

Visto Bueno.	*Leidy Rojas* DIRECTOR CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE EQUIPOS

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

17,05

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT 900624568-4

CONTROL DE EQUIPOS											
DIA	CAMILLAS DE MADERA	COLOMBINAS	CAMILLA SEGURIDAD INDUSTRIAL	BOTIQUÍN SEGURIDAD INDUSTRIAL	CUELLO INMOVILIZADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL	SECCIONES DE ANDAMIO TUBULAR CON CRUCETA	PLANCHÓN DE MADERA	VIBRADOR ELECTRICO DE CONCRETO	PARALES	CERCHAS	EXTENSION
lunes, 17 de julio de 2023											
martes, 18 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
miércoles, 19 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
jueves, 20 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
viernes, 21 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
sábado, 22 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
domingo, 23 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
lunes, 24 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X				
martes, 25 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X			
miércoles, 26 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X			
jueves, 27 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X			
viernes, 28 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sábado, 29 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
domingo, 30 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
lunes, 31 de julio de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
martes, 1 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
miércoles, 2 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
jueves, 3 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
viernes, 4 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sábado, 5 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
domingo, 6 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
lunes, 7 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
martes, 8 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
miércoles, 9 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
jueves, 10 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
viernes, 11 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sábado, 12 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
domingo, 13 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
lunes, 14 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
martes, 15 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
miércoles, 16 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
jueves, 17 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
viernes, 18 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sábado, 19 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
domingo, 20 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
lunes, 21 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
martes, 22 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
miércoles, 23 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
jueves, 24 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
viernes, 25 de agosto de 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sábado, 26 de agosto de 2023											

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)

E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM

TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

CONTROL DE CLIMA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

CONTROL DEL CLIMA			
DIA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
lunes, 17 de julio de 2023	X		
martes, 18 de julio de 2023	X		
miércoles, 19 de julio de 2023			X
jueves, 20 de julio de 2023	X		
viernes, 21 de julio de 2023	X		
sábado, 22 de julio de 2023	Dia no laborado		
domingo, 23 de julio de 2023	Dia no laborado		
lunes, 24 de julio de 2023	X		
martes, 25 de julio de 2023	X		
miércoles, 26 de julio de 2023	X		
jueves, 27 de julio de 2023	X		
viernes, 28 de julio de 2023	X		
sábado, 29 de julio de 2023		X	
domingo, 30 de julio de 2023	Dia no laborado		
lunes, 31 de julio de 2023	X		
martes, 1 de agosto de 2023	X		
miércoles, 2 de agosto de 2023	X		
jueves, 3 de agosto de 2023	X		
viernes, 4 de agosto de 2023	X		
sábado, 5 de agosto de 2023		X	
domingo, 6 de agosto de 2023	Dia no laborado		
lunes, 7 de agosto de 2023		X	
martes, 8 de agosto de 2023	X		
miércoles, 9 de agosto de 2023	X		
jueves, 10 de agosto de 2023	X		
viernes, 11 de agosto de 2023	X		
sábado, 12 de agosto de 2023		X	
domingo, 13 de agosto de 2023	Dia no laborado		
lunes, 14 de agosto de 2023	Dia no laborado		
martes, 15 de agosto de 2023	Dia no laborado		
miércoles, 16 de agosto de 2023	Dia no laborado		
jueves, 17 de agosto de 2023	Dia no laborado		
viernes, 18 de agosto de 2023	Dia no laborado		
sábado, 19 de agosto de 2023	Dia no laborado		
domingo, 20 de agosto de 2023	Dia no laborado		
lunes, 21 de agosto de 2023	Dia no laborado		
martes, 22 de agosto de 2023	X		
miércoles, 23 de agosto de 2023	X		
jueves, 24 de agosto de 2023	X		
viernes, 25 de agosto de 2023	X		
sábado, 26 de agosto de 2023		X	

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801


ACTAS DE VECINDAD

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

ALCALDIA DE TUNJA	FECHA:09/09/2019
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION:01
PROCESO:GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	
FORMATO: ACTA VECINDAD	CODIGO:GIN-F -24

CONTRATO No. :	845-2023								Hoja	1	de
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.										
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DINCO S.A.S										
INTERVENTOR:	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ										
REGISTRO No.		**FECHA**	31	8	2023	**ELABORÓ**	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DINCO S.A.S	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

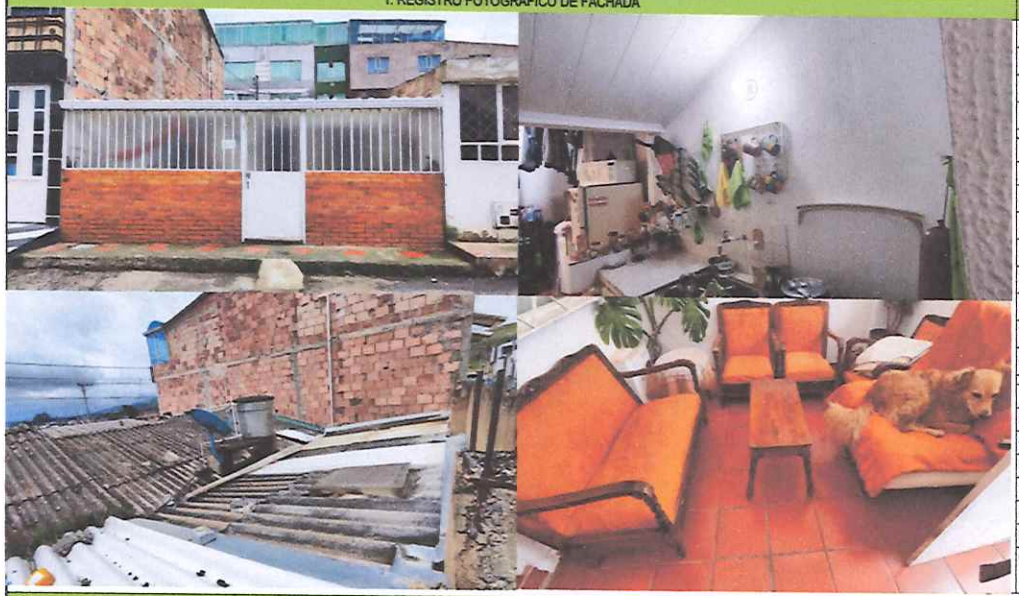

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Los muros de la vivienda se encunetran con humedad en el patio y la cocina, los pisos se encuentran en buen estado.

Firma Libia Inés Nieto M.
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre:
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
INTERVENTOR

Original: MUNICIPIO Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ALCALDIA DE TUNJA	FECHA:09/09/2019
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION:01
PROCESO:GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	
FORMATO: ACTA VECINDAD	CODIGO:GIN-F -24

CONTRATO No. :	845 DEL 2023						Hoja	1	de
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.								
CONTRATISTA:	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DINCO S.A.S								
INTERVENTOR:	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ								
REGISTRO No.		**FECHA**	31	8	2023	**ELABORÓ**	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES DINCO S.A.S	**REVISÓ**	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA






2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Al fin de la obra la señora nunca fiirmo, solo nos permitio entrar y tomar fotos del estado de su vivienda, y aunque en reiteradas ocaciones se busca ella no se encuentra y cuando nos atiende no nos firma el acta de vecindad.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre:
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
INTERVENTOR

Original: MUNICIPIO Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Respuesta oficio 01 de fecha 08 de junio de 2023_CR

1 mensaje

Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co> 30 de junio de 2023, 11:29
Para: "empresa.dinco.sas@gmail.com" <empresa.dinco.sas@gmail.com>
CC: Juan Carlos Ramirez Villate <jucarravi@hotmail.com>

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura Territorial

Secretaría de Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

Respuesta oficio 01 de fecha 08 de junio de 2023_CR.pdf
265K

Secretaría de Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

1.10.1-2-3 910

Tunja, 30 de junio de 2023

Señores
DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS
Contratista
empresa.dinco.sas@gmail.com

Asunto: Respuesta oficio 01 de fecha 08 de junio de 2023

Cordial Saludo,

Atendiendo a su solicitud en cuanto al ajuste de precios del contrato No 845 de 2023, la Entidad aclara que procederá a realizar el estudio de reajuste o revisión de precios una vez se suscriba la respectiva acta de inicio actualización de polizas y acreditación de la variación de los respectivos costos, lo anterior conforme al principio de conmutatividad y equivalencia de obligaciones, que permiten ajustar los precios de los contratos con el fin de obtener el equilibrio financiero, satisfacer la expectativa de utilidad del contratista, asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés público.

Conforme a lo anterior se hace necesario, que el contrato se encuentre en ejecución y demostrar el aumento exagerado de los precios de los elementos o insumos que se requieren para la ejecución del contrato, así las cosas la Secretaria de Infraestructura establece como fecha para llevar a cabo comité de obra con el propósito de definir supervisor y suscripción de acta de inicio, el día 05 de julio de 2023 a las 8:00 am. En las oficinas de esta dependencia.

Cordialmente,

Ing. PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
Secretario de Infraestructura Territorial

Proyecto: Juan Carlos Ramirez - Contratista

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Solicitud informacion contrato 845 de 2023

1 mensaje

Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co> 6 de julio de 2023, 17:52
Para: "empresa.dinco.sas@gmail.com" <empresa.dinco.sas@gmail.com>
CC: "julianhr2021@gmail.com" <julianhr2021@gmail.com>

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura Territorial

Secretaría de Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

Solicitud informacion contrato 845 de 2023.pdf
1087K

Secretaría de Infraestructura
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

1.10.1-2-1 045

Tunja 07 Julio de 2023

Señores,
DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS Representante Legal
YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com

Ciudad de Tunja

Asunto: Contrato de obra 845 de 2023, Cuyo objeto es **"SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"**

Cordial saludo,

La presente, para comunicarle que mediante oficio, proveniente de Secretaría de Contratación, Licitaciones y Suministros, se me asignan funciones de supervisión del contrato de obra de la referencia, cuyo objeto corresponde a " **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"**

Por lo anterior, le solicito con carácter urgente acercarse a este despacho a firmar la referida acta de iniciación. Solicitándole como requisito previo a la suscripción de la referida acta de inicio, allegue de forma inmediata a esta supervisión la afiliación a seguridad social de los siguientes profesionales que fueron establecidos en su propuesta:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA : **YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL**
Con experiencia mínima de TRES (03) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con susrrespectivas certificaciones.
DEDICACION: 100%

MAESTRO DE OBRA: Debe tener experiencia específica mínima de dos (2) certificaciones ejerciendo como Maestro de obra y/o Técnico Constructor, en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
DEDICACION: 100%

NIT 891500356-1
Calle 19 N° 9 - 45 cuarto piso edificio municipal
Tunja-Boyacá - 7405720 • infraestructura@tunja-boyaca.gov.co
• www.tunja-boyaca.gov.co •

Powered by CamScanner

Secretaría de Infraestructura
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos une

Se solicita la afiliación a seguridad social de estos profesionales (pensión, salud y riesgos profesionales de acuerdo con la actividad y nivel de riesgo). Así como las afiliaciones a seguridad social de la totalidad del personal operativo y que permanecerá en obra, **haciendo especial énfasis en que dicho personal es el que deberá permanecer en la obra de acuerdo con su porcentaje de dedicación.**

Igualmente, le solicito que en la ejecución del contrato se tengan en cuenta las siguientes consideraciones al igual que el cumplimiento total de las cláusulas del contrato y de lo que a continuación se solicita:

- Entregar a este despacho la afiliación y planillas de pago de los trabajadores de la totalidad del personal que estará en obra. Haciendo especial énfasis en que todo el personal que permanezca en obra debe estar debidamente afiliado a seguridad social con cargo al contrato de obra 845 de 2023.
- Cronograma de ejecución de obra y programa general de trabajos e inversiones el cual será publicado junto con el acta de inicio en la plataforma Secop II.
- Llevar el libro o bitácora de obra conjunta entre el contratista y la supervisión, donde se registraron las actividades ejecutadas y los aspectos inherentes a la ejecución de obra a diario incluyendo observaciones del contratista y de la supervisión.
- Lista o relación del personal operativo a participar.
- Registro fotográfico antes y después de la intervención, así como de la secuencia de ejecución del contrato, con su respectiva descripción.
- Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales a emplear. Incluyendo: certificado de calidad del vinilo a emplear, certificado de calidad de la tubería a emplear, certificado de calidad del enchape a emplear, certificado de calidad de lámparas o panel de sobreponer, certificado de calidad de las divisiones en acero inoxidable calibre 20 ref. 304 satinado, certificado de calidad de sanitarios Montecarlo advance corona, certificado de calidad de secador eléctrico para manos automático en acero inoxidable tipo potenza o similar, certificado de calidad de lavamanos sobreponer, certificado de calidad de orinal mediano completo, entre otros.
- Cantidades de obra indicando con planos y detalles, las mediciones efectuadas: Largo, ancho, profundidad, espesores, etc.

Powered by CamScanner

Secretaría de Infraestructura
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos une

- Informes semanales a la supervisión de acuerdo con el clausulado del contrato, donde se evidencie avance de obra, control de calidad de materiales, control de seguridad industrial de obra, control de afiliaciones a seguridad social de todo el personal de obra incluyendo Residente, copia de bitácora de obra, registro fotográfico, descripción de las actividades realizadas, entre otras.
- La respectiva señalización en el sitio de obras, a fin de reducir riesgos de accidentalidad para los trabajadores.
- Dar cumplimiento total a los protocolos Bioseguridad.
- El personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato deberá estar dotado de los respectivos implementos para su seguridad industrial incluyendo cascos, guantes, etc. Y se deberá disponer en el sitio de las obras de un botiquín de primeros auxilios.
- El contrato no tendrá ningún tipo de adicional en valor y cualquier obra ejecutada o ítem no previsto, sin la autorización de la alcaldía no podrá ser recibida.
- Es importante además, que toda ACTA de obra se publique el mismo día en la plataforma Secop ii.

Le informo que ha sido programada visita al sitio de obras donde asistirán los profesionales que elaboraron el presupuesto del presente proyecto, motivo por el cual le solicitó asistir con su personal ofrecido (Residente de obra, maestro de obra), con el fin de evidenciar en forma clara los sectores a intervenir. Teniendo en cuenta la disponibilidad de los profesionales que elaboraron el proyecto, se ha programado como fecha indicada para la misma, el día lunes 10 de julio del año en curso a las 9 de la mañana, con sitio de encuentro en la Secretaría de Infraestructura de Tunja.

Cordialmente,

ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Supervisor

NIT 891800498-1
Carrera 19 No. 22-62 Centro Cívico Tunja, Boyacá, Colombia
Código Postal 150001
• | • www.tunja-boyaca.gov.co •

Powered by CamScanner

Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Social
Notificaciones 13
Foros
Promociones
Más

Etiquetas
Notes
Más

OBSERVACION POLIZA CTO 845_2023 JULIO 10_2023

Recibidos ×

DANIEL PIÑA
Tunja, 10 de julio de 2023 Señores SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Supervisor Señor: Diseño Interventoria y Construcción Dinc

5

DANIEL PIÑA
Buenos días se adjunta el documento solicitado debidamente firmado de mi parte, como profesional Universitario Grado 9 adscrito a la

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
para **segurosvaliant**

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OBSERVACION P...

Responder Reenviar

Gmail **Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>**

Actualización de pólizas Contrato 845 de 2023

2 mensajes

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com> 14 de julio de 2023, 16:28
Para: contratacionestatal@tunja.gov.co
CC: infraestructura@tunja.gov.co, DANIEL PIÑA <ingdanrip@gmail.com>, linirojass@gmail.com

Cordial saludo

Adjunton pólizas actualizadas de acuerdo al oficio emitido para los fines pertinentes

--
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
---------a menos que sea completamente necesario

Pólizas firmadas.pdf
2004K

DANIEL PIÑA <ingdanrip@gmail.com> 17 de julio de 2023, 10:19
Para: Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Buenos días;

Las polizas ya fueron aprobadas en la plataforma, por lo cual ya corresponde solicitarle a la secretaría encargada de la supervisión la suscripción del acta de inicio.

Como lo manifestó la aseguradora en un correo anterior que usted remitió a la Unidad de Contratación y como se dejó constancia en la aprobación de la garantía, SE HACE NECESARIO QUE UNA VEZ TENGAN SUSCRITA EL ACTA DE INICIO, SE ACTUALICEN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS.

Cordialmente;

[Texto citado oculto]
--

DANIEL RICARDO PIÑA M.
Profesional Universitario
Ingeniero Civil
Especialista en Contratación Estatal
Correo: ingdanrip@gmail.com

Alcaldía Mayor de Tunja
1.10.1-2-3 955

Tunja La Capital que nos une

ATU2023ER034810
ATU2023EE034532

Tunja, 25 de julio de 2023

Señores
DINCO S.A.S.
empresa.dinco.sas@gmail.com
Tunja, Boyacá

Asunto: 1.10.1-2-3 955

ASUNTO: ATU2023ER034810

En atención a petición del asunto me permito anexar respuesta.

Atentamente,

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL.

Proyectó: JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Revisó: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA

Anexos: solicitud 3 contrato 845 de 2023 .docx.pdf

Secretaría de Infraestructura
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja
La Capital que nos UNE

1.10.1-2-3 955

Tunja 25 de julio de 2023

Señores,
DISEÑO INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS Representante Legal
YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com

Asunto: Verificación de la información solicitada (PMA, PMT,AFILIACIONES).

Cordial Saludo,

La presente, para comunicarles que se realizará la verificación del informe allegado sobre PMA Y PMT, así como también las afiliaciones y hojas de vida del personal requerido ya se encuentra en evaluación por parte secretaria de contratación, con el fin de evaluar y allegar las respectivas correcciones a lugar.

También se está a la espera de la radicación del primer informe semanal para su respectiva evaluación.

Agradezco su atención,

Julián Fernando Hernández Rodriguez
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura territorial

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 001 - Solicitud comité de obra contrato N° 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com> 8 de junio de 2023, 16:58
Para: atencionalciudadano@tunja.gov.co, contratacionestatal@tunja.gov.co, juan.cruz@tunja.gov.co

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes, para dar continuidad al contrato en el asunto, el cual tiene por objeto SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

–
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
----------a menos que sea completamente necesario

1. Oficio N° 001 Solicitud de ajuste de precios y comité de obra.pdf
628K

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 16 - Contrato de Obra N° 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com> 31 de agosto de 2023, 14:11
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: julianhr2021@gmail.com

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes

–
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo ----------a menos que sea completamente necesario

16. Oficio N° 016 Radicación informe semanal N° 6.pdf
13898K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 28 de agosto de 2023

Oficio N° 016

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación informe de avance de obra semanal N° 6

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación de la siguiente información, con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como contratistas:

- Informe semanal de avance de obra del 22 al 26 de agosto de 2023
- Sabana y memorias de control de ejecución de actividades
- Bitácora de obra

Quedando atento a sus observaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño, Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (55 folios)

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 17 - Contrato de obra N° 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co, julianhr2021@gmail.com

4 de septiembre de 2023, 18:35

Cordial saludo,

Adjunto oficio para los fines pertinentes

17. Oficio N° 017 Radicación informe de liquida...

–
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo ---------a menos que sea completamente necesario

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 04 de septiembre de 2023

Oficio N° 017

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación informe de liquidación

Cordial saludo;

La presente tiene como fin llevar a cabo la radicación de la documentación para proceder con la liquidación del contrato de obra N° 845 - 2023, el cual tiene por objeto "SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ", de la siguiente manera:

1. Informe de obra (del folio 02 al 06)
2. Sábana y memorias de cantidades (del folio 07 al 57)
3. Registro fotográfico (del folio 58 al 107)
4. Certificado Comfaboy (del folio 108 al 109)
5. Actualización de pólizas (del folio 110 al 113)
6. Certificación Fic – Sena (del folio 114 al 115)
7. Bitácora de obra (del folio 116 al 151)
8. Planillas de seguridad social (del folio 152 al 156)
9. Certificación de parafiscales (del folio 157 al 160)
10. Certificación bancaria (del folio 161 al 162)
11. Factura de venta (del folio 163 al 164)

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Ing. YEISON FABIAN VELOZA VALCÁRCEL
R/L DINCO S.A.S

Con Copia: Archivo
Anexo: 164 folios

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 15 - Contrato de obra N° 845
1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: DANIEL PIÑA <ingdanrip@gmail.com>, julianhr2021@gmail.com
25 de agosto de 2023, 08:51

Cordial saludo;

Adjunto para los fines pertinentes

--
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
--------a menos que sea completamente necesario

15. Oficio N° 015 Radicación pólizas con adicional.pdf
2368K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 25 de agosto de 2023

Oficio N° 015

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación pólizas con adición N° 1

Cordial saludo;

De acuerdo a la adición en valor N° 1 realizada por la entidad, me permito llevar a cabo la radicación de las garantías actualizadas para los fines pertinentes.

Quedando atento a sus observaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com - gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (04 folios)

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 14 - Contrato de obra N° 845

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co, julianhr2021@gmail.com

25 de agosto de 2023, 09:17

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes

--
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo ---------a menos que sea completamente necesario

14. Oficio N° 014 Radicación informe semanal N° 5.pdf
5679K

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 22 de agosto de 2023

Oficio N° 014

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación informe de avance de obra semanal N° 5

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación de la siguiente información, con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como contratistas:

- Informe semanal de avance de obra del 14 al 19 de agosto de 2023
- Sabana y memorias de control de ejecución de actividades
- Bitácora de obra

Quedando atento a sus observaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (22 folios)

Gmail

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com>

Oficio N° 13 - Contrato de obra N° 845 de 2023
1 mensaje

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com> 14 de agosto de 2023, 15:12
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: julianhr2021@gmail.com, empresa.dinco.sas@gmail.com

Cordial saludo;

Adjunto para los fines pertinentes;

Atentamente;

Dinco SAS

13. Oficio N° 013 Radicación informe semanal N° 4.pdf
5600K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 14 de agosto de 2023

Oficio N° 013

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación informe de avance de obra semanal N° 4

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación de la siguiente información, con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como contratistas:

- Informe semanal de avance de obra del 08 al 12 de agosto de 2023
- Sabana y memorias de control de ejecución de actividades
- Bitácora de obra

Quedando atento a sus observaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (21 folios)

Gmail

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com>

Oficio N° 12 - Contrato 845 de 2023
1 mensaje

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com> 11 de agosto de 2023, 11:04
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: julianhr2021@gmail.com

Cordial saludo;

Adjunto para los fines pertinentes;

Atentamente;

Dinco SAS

12. Oficio N° 012 Radicación balance de obra definitivo.pdf
5296K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 11 de agosto de 2023

Oficio N° 012

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación de balance de obra ajustado

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación del balance de obra de acuerdo a las observaciones expresadas por usted en el comité de obra del día de hoy, incluyendo la totalidad de actividades y cantidades de obra a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual, pero en el cual se evidencia que se requiere de una adición de dinero por un valor de ($4.312.976,00), correspondiente al 17.82% del valor inicialmente pactado, así mismo, se ve la necesidad de la inclusión de 13 ítems no previstos, los cuales son de imperiosa necesidad para poder dar cumplimiento al objeto del contrato, siguiendo el proceso constructivo. (51 folios).

La inclusión de los ítems no previstos se justifica de la siguiente manera:

14.1. 1.12.30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO: Necesaria para darle iluminación al patio de ropas y que permita el secado de ropa evitando humedades en la casa, toda vez que generaría más calor y permite el secado de manera rápida.

14.2. 1.01.49. DESMONTE CANALES – BAJANTES: Actividad necesaria para llevar a cabo el cambio de la misma, teniendo en cuenta que la existente está colmatada de tierra, la cual hace que el agua de escorrentía de la cubierta no sea evacuada de manera óptima y no sea rebosada por encima de la misma.

14.3. 1.01.34. DEMOLICIÓN PAÑETES: Actividad necesaria para hacer el retiro de los pañetes existente que presentan humedades y moho en los mismo, lo cual puede afectar la calidad de obra como la aplicación del estuco, saltando y dañando el mismo.

14.4. 2.05.31. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2": Accesorio necesario para poder dirigir el agua de los drenes y puntos hidráulicos de lavadero y lavadora.

14.5. 2.05.32. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3": Accesorio necesario para poder dirigir el agua de la bajante.

14.6. 1.11.40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM: Actividad necesaria para darle el acabado al enchape a instalar en el patio y la habitación.

14.7. 1.07.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER: Actividad necesaria para darle iluminación a la vivienda, toda vez que presenta rosetas en mal estado.

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

14.9. 1.09.17. PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES: Actividad necesaria para mejorar el aspecto de la fachada existente, la cual se encuentra pintura soplada, descascaramiento de la misma, presentando humedad y moho.

14.10. 1.09.05. ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS: Actividad necesaria para el mejoramiento de la puerta metálica existente, la cual se encuentra con oxidada en sectores.

14.11. 1.12.42. SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN MANTO FIBERGLASS: Actividad necesaria para la impermeabilización del muro construido con el muro existente.

14.12. 1.12.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO: Actividad necesaria para la recolección del agua lluvia de las cubiertas y que disminuya el ruido generado por el agua.

14.13. 1.18.05. ASEO GENERAL ENTREGA: Actividad necesaria para llevar a cabo la entrega de obra, la cual al estar abandonada se encuentra en mal estado de aseo, con tierra y mal estado en general.

Quedando atento a sus observaciones y pronta respuesta de cual balance será ejecutado, con el fin de ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (27 folios)

Gmail

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com>

Oficio N° 11 - Contrato N° 845 de 2023

1 mensaje

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com> 10 de agosto de 2023, 14:48
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: julianhr2021@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto para los fines pertinentes

Atentamente

Dinco SAS

11. Oficio N° 011 Radicación balance de obra definitivo.pdf
5296K

Gmail

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com>

Oficio N° 10 - Contrato 845 de 2023

1 mensaje

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com> 10 de agosto de 2023, 10:09
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: julianhr2021@gmail.com

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes

Att;

Dinco SAS

10. Oficio N° 010 Radicación balance de obra.pdf
7090K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 10 de agosto de 2023

Oficio N° 010

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación de balance de obra

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación del balance de obra, incluyendo la totalidad de actividades y cantidades de obra a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual, pero en el cual se evidencia que se requiere de una adición de dinero por un valor de ($4.312.976,00), correspondiente al 17.82% del valor inicialmente pactado, así mismo, se ve la necesidad de la inclusión de 13 Ítems no previstos, los cuales son de imperiosa necesidad para poder dar cumplimiento al objeto del contrato, siguiendo el proceso constructivo. (51 folios).

La inclusión de los ítems no previstos se justifica de la siguiente manera:

14.1. 1.12.30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO: Necesaria para darle iluminación al patio de ropas y que permita el secado de ropa evitando humedades en la casa, toda vez que generaría más calor y permite el secado de manera rápida.

14.2. 1.01.49. DESMONTE CANALES – BAJANTES: Actividad necesaria para llevar a cabo el cambio de la misma, teniendo en cuenta que la existente está colmatada de tierra, la cual hace que el agua de escorrentía de la cubierta no sea evacuada de manera óptima y no sea rebosada por encima de la misma.

14.3. 1.01.34. DEMOLICIÓN PAÑETES: Actividad necesaria para hacer el retiro de los pañetes existente que presentan humedades y moho en los mismo, lo cual puede afectar la calidad de obra como la aplicación del estuco, saltando y dañando el mismo.

14.4. 2.05.31. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2": Accesorio necesario para poder dirigir el agua de los drenes y puntos hidráulicos de lavadero y lavadora.

14.5. 2.05.32. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3": Accesorio necesario para poder dirigir el agua de la bajante.

14.6. 1.11.40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM: Actividad necesaria para darle el acabado al enchape a instalar en el patio y la habitación.

14.7. 1.07.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER: Actividad necesaria para darle iluminación a la vivienda, toda vez que presenta rosetas en mal estado.

14.8. 1.09.22. VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA: Actividad necesaria para darle un buen acabado a la cubierta que presenta mal estado en el cuarto aledaño a las habitaciones.

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

Gmail

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com>

Oficio N° 9 - Contrato 845 de 2023
1 mensaje

Yeison Fabián Veloza Valcárcel <gerenciadincosas@gmail.com> 10 de agosto de 2023, 12:24
Para: infraestructura@tunja.gov.co
CC: julianhr2021@gmail.com

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes, el documento ya fue radicado de manera física

Atentamente

Dinco SAS

9. Oficio N° 009 Radicación informe semanal N° 3.pdf
6378K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 08 de agosto de 2023

Oficio N° 009

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación informe de avance de obra semanal N° 3

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación de la siguiente información, con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como contratistas:

- Informe semanal de avance de obra del 31 de julio al 05 de agosto de 2023
- Sabana y memorias de control de ejecución de actividades
- Bitácora de obra

Quedando atento a sus observaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoria y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matricula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (25 folios)

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 8 - Contrato 845 de 2023
1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co, julianhr2021@gmail.com
3 de agosto de 2023, 16:50

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes

–
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
--------a menos que sea completamente necesario

8. Oficio N° 008 Radicación balance de obra.pdf
8255K

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 03 de agosto de 2023

Oficio N° 008

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación de balances de obra

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación de dos balances de obra, así:

- El primero incluyendo la totalidad de actividades y cantidades de obra a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual, pero en el cual se evidencia que se requiere de una adición de dinero por un valor de ($4.312.976,00), correspondiente al 17.82% del valor inicialmente pactado, así mismo, se ve la necesidad de la inclusión de 13 ítems no previstos, los cuales son de imperiosa necesidad para poder dar cumplimiento al objeto del contrato, siguiendo el proceso constructivo. (51 folios)
- El segundo incluyendo la totalidad de actividades y cantidades de obra a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo al proceso constructivo, ajustándolo al valor contractual, donde quedaría un saldo a favor del municipio de ($527,00), correspondiente al 0.002% del valor inicialmente pactado. (51 folios)

Quedando atento a sus observaciones y pronta respuesta de cual balance será ejecutado, con el fin de ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (102 folios)

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 7 - Contrato de obra 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co, julianhr2021@gmail.com, fogarcia@jdc.edu.co

31 de julio de 2023, 09:51

Cordial saludo;

Adjunto oficio para los fines pertinentes

–
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
---------a menos que sea completamente necesario

7. Oficio N° 007 Radicación informe semanal N° 2.pdf
5191K

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 31 de julio de 2023

Oficio N° 007

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación informe de avance de obra semanal N° 2

Cordial saludo;

De acuerdo al contrato en referencia, me permito llevar a cabo la radicación de la siguiente información, con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como contratistas:

- Informe semanal de avance de obra del 24 al 29 de julio de 2023
- Sabana y memorias de control de ejecución de actividades
- Bitácora de obra

Quedando atento a sus observaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexa (18 folios)

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 6 - Contrato 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com> 25 de julio de 2023, 17:55
Para: infraestructura@tunja.gov.co, julianhr2021@gmail.com

Cordial saludo;

Adjunto para los fines pertinentes

--
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
---------a menos que sea completamente necesario

6. Oficio N° 006 Respuesta oficio.pdf
486K

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 25 de julio de 2023

Oficio N° 006

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Respuesta oficio N° 1.10.1-2-3 955

Cordial saludo;

De acuerdo al oficio en el asunto, me permito resaltar que estaremos atentos a sus observaciones en caso de existir para tomar las medidas necesarias en caso de ser necesaria, y con respecto al primer informe semanal fue el que le radicamos de manera física, del cual también estaremos atentos a sus observaciones.

Quedando atento a sus indicaciones,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	(608)7490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño, Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo

DINCO S.A.S.

DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

Tunja, 17 de julio de 2023

Oficio N° 003

Señores
MUNICIPIO DE TUNJA
ING. JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRÍGUEZ
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° 845 de 2023

Objeto: SIT – 92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Radicación documentos para acta de inicio

Cordial saludo;

En atención al oficio en el asunto, me permito dar respuesta de la siguiente manera:

1. Se anexan las hojas de vida del personal mínimo presentado en oferta y que ejecutará el contrato.
2. Se anexa el cronograma con flujo de caja del proyecto de acuerdo a las actividades contratadas.
3. Soportes de seguridad social.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto:	Yeison Fabián Veloza Valcárcel		
Dirección y ciudad:	Calle 55 N° 8b – 34 Tunja		
Teléfono:	6087490983	**Celular:**	3192193801
Correo electrónico:	empresa.dinco.sas@gmail.com gerenciadincosas@gmail.com		

Atentamente;

Nombre del contratista: Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Nombre del Representante Legal: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja Matrícula Profesional N° 15202185741BYC
Dirección de correo: Calle 55 N° 8b – 34 Tunja
Correo electrónico: empresa.dinco.sas@gmail.com
Teléfono o celular: 3192193801

Con Copia: Archivo
Se anexan: 15 folios

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 4 - Contrato 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com> 24 de julio de 2023, 11:10
Para: infraestructura@tunja.gov.co, julianhr2021@gmail.com
CC: fogarcia@jdc.edu.co, Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto oficio para los fines pertinentes

–
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo ----------a menos que sea completamente necesario

4. Oficio N° 004 Radicación documentos.pdf
6369K

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 2 - Contrato de obra N° 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co

10 de julio de 2023, 11:57

Cordial saludo;

Adjunto para los fines pertinentes

--
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
---------a menos que sea completamente necesario

2. Oficio N° 002 Respuesta oficio 1.101-2-1 045.pdf
3274K

Gmail

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>

Oficio N° 3 - Contrato 845 de 2023

1 mensaje

Dinco Sas <empresa.dinco.sas@gmail.com>
Para: infraestructura@tunja.gov.co

17 de julio de 2023, 11:57

Cordial saludo;

Adjunto para los fines pertinentes

--
Cordialmente;

DINCO S.A.S
Calle 55 N° 8B - 34 Prados del Norte
Tunja - Boyacá
Tel. (8) 749 23 21 - Móvil. 319 219 38 01
http://admondincosas.wix.com/inicio
https://www.facebook.com/DINCO-SAS-451730371678098/?ref=aymt_homepage_panel

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse a la línea (8) 7 49 23 21 y/o empresa.dinco.sas@gmail.com, su retroalimentación es muy importante para el mejoramiento continuo de nuestros Servicios.

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo
---------a menos que sea completamente necesario

3. Oficio N° 003 Radicación documentos.pdf
2489K

BITÁCORA DE OBRA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624519-6


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA	LUNES 17 DE JULIO DE 2023			ACTA	#	SIGUIENTE
CLIMA	MAÑANA	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO
	TARDE	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO

ESQUEMA DE OBRA:




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cubierta	
Cimentación		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminada	
Inst.o electricas		Entregada	
Inst.o hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS

Ubicación	Actividad Ejecutada
Administrativa	Se hace acta de inicio

REGISTRO FOTOGRAFICO:

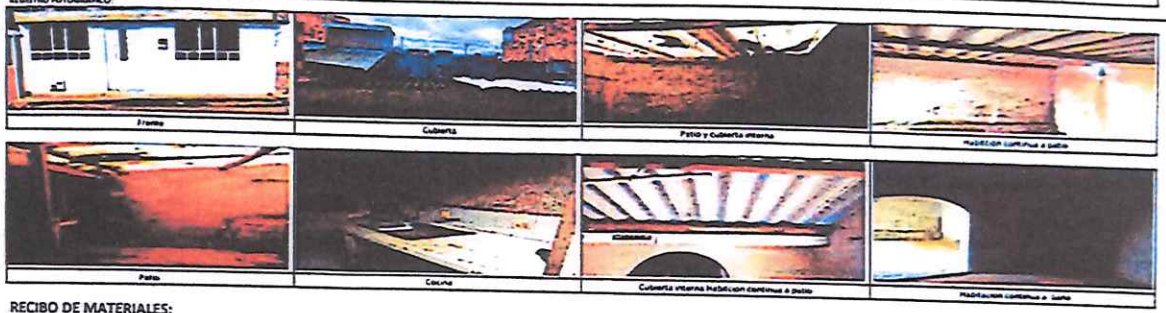

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor	1	Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes de Obra		

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900625569-6


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

[1 - AVANCE]

FECHA:	MARTES 18 DE JULIO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cadenado Elevtr	
Cimentación		Cimamentación	
Placa Piso P2		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminado	
insta electricas		Entrega de	
insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa de la señora María Alix Torres	Llegada de herramientas
Patio y habitación	Excavación manual para cimentación

REGISTRO FOTOGRAFICO:



SEGURIDAD INDUSTRIAL



PMT



Camillas



Secciones de Andamios



Planchones y Viga de Cimentación para el Baño



Bolgues y camillas para proteccion de cimientos



Excavacion manual Patio



Excavacion manual habitacion

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidos	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Camilla inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamios Tubular con Cruceta	6	Propia
Planchón de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Preliminares
Supervisor	-	Preliminares
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Preliminares
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes De Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.


BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)							
ELIMA:	Mañana:	SOLEADO		MUY BUENO		TERMINADO	
	TARDE	SOLEADO		MUY BUENO		TERMINADO	X

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

	X		
Preliminares		Cubierta Techo	
Cimentación		Complementarios	
Placa Piso P1		Culatería	
Mamp. Piso 1		Terminada	
Instal eléctricas		Entregada	
Instal hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos eléctr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio y habitación	Demolición piso de cemento
Patio y habitación	Excavación manual para cimentación

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación manual — Demolición piso de cemento — Demolición muro de cerramiento — Visita supervisor

Excavación manual — Excavación manual — Excavación manual — Refuerzo

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cor. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	30	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cartilla Inmovilizador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Preliminares
Supervisor	1	Preliminares
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Preliminares
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes de Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

Descripción General. Se hace visita de inspección ocular en la casa de la señora María Alix Torres donde nos encontramos con el contratista Tomas Veloza, el maestro de obra Gustavo Buitrago y el Auxiliar de residente Fabian Garcia.

Se observa materiales de seguridad con colombinas, casco de cerramiento, se observa el material de demolición debidamente alejando dentro de la casa.

Se entregan las afiliaciones del personal auxiliar

Maestro de obra y residente.

Aspectos Tecnicos. Una vez iniciada las actividades y demoliciones para las zapatas de la parte posterior de la casa se evidencia avance de cuadrados en demolición de piso y de cerramiento y excavación manual. Almacén material y equipo de construcción.

Adicionar,

planchones y camillas.

Se tener el respectivo equipo

para seguridad industrial.

Conclusiones y Recomendaciones. Dar continuidad con las actividades constructivas y en presente informe se informan las acciones a proceder apenas se encuentre la caja del desagüe para

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900625585-4

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 045 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	JUEVES 20 DE JULIO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cableado Electr	
Cimentacion		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminada	
Inst. electricas		Entregada	
Inst hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS

Ubicación	Actividad Ejecutada
Habitacion	Demolicion placa de contrapiso
Patio e habitacion	Excavacion manual para cimentacion

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavacion manual



Acopio de material de excavacion



Demolicion placa de contrapiso



Excavacion manual



Demolicion placa de contrapiso



Excavacion manual



Excavacion manual



Excavacion manual

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(un.):		Cemento (uno):	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	*Cantidad*	*Alq./Propia*
Canales de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Casilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello Inmovilizador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con Cruceta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	*Cantidad*	*Cuadrilla De:*
Ingeniero Residente	1	Preliminares
Supervisor	-	Preliminares
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Preliminares
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes de Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900625568-6

BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	VIERNES 21 DE JULIO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
				NUBLADO		LLUVIOSO	X
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	X

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cableado Fluvo	
Cimentación		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminado	
Inst. eléctricas		Entregado	
Inst. hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa de la señora Maria Alix Torres	Llegada de material
Patio y habitación	Excavación manual para cimentación

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Llegada de material



Llegada de material



Llegada de material



Llegada de material



Excavación manual



Excavación manual



Excavación manual



Excavación manual

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									
REMISIÓN Nº 118-RVC-01012720	Acero, cemento, tubos pvc, tubo manbra rect y codos									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Cortadora de madera	10	Propia
Columnas	4	Propia
Casco Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cono señalizador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con Cruceta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Preliminares
Supervisor	-	Preliminares
Ingeniero Auxiliar De Residente	1	Preliminares
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes de Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 900926569-4

BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	SABADO 22 DE JULIO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cableado Electr	
Cimentación		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminada	
Insta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa de la señora Maria Alix Torres	Ese dia no se trabajo como compensatorio del dia 20 de Julio de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									
REMISION № 138-RVC-61812720	Acero, cemento tubos pvc, tubo mueble rect y codos									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	*Cantidad*	*Alq./Propia*
Camilla de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad Industrial	2	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Plancha de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	*Cantidad*	*Cuadrilla De:*
Ingeniero Residente	-	Preliminares
Supervisor	-	Preliminares
Ingeniero Auxiliar de Residente	-	Preliminares
Maestro General	-	Preliminares
Ayudantes de Obra	-	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900635814-4


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) LUNES 24 DE JULIO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cableado Electr.	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P3		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminada	
Insta electricas		Entregada	
Insta Hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS.

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio	Demolición placa de contrapiso
Patio	Traspaleo y acopio de escombros y tierra
Patio y habitacion	Excavación manual pata cimentacion


REGISTRO FOTOGRAFICO:



Demolicion placa de contrapiso



Excavacion manual



Excavacion manual



Excavacion manual



Excavacion manual



Demolicion placa de contrapiso



Traspaleo y acopio de escombros y tierra



Traspaleo y acopio de escombros y tierra

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	6	Propia
Camilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Camilla Inmovilizador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con Guarda	6	Propia
Plantilla de madera	4	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes de Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
CONSTRUCTORA + CONSTRUCCIÓN
N.I.T. 900215168-6

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 015 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ


R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

[X - AVANCE]

FECHA: PRIMERO (1) DE JULIO DE 2023

CLIMA:				ACTIVA	X	SUPERVISOR
	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		HUMANO
	TARDE	SOLEADO	X	NUBLADO		HUMANO

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cubierta Electr.	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminado	
Inst.a eléctricas		Entregado	
Inst.a hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos elect.			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio	Acceso Material de Excavación
Patio y habitacion	Se realizo toma de muestra para tuteleo y se hizo respectivo
Patio y habitacion	Se realizo la humidad de tuteleo de zapatas

REGISTRO FOTOGRAFICO



Acceso Material de Excavación




Toma de muestra para tuteleo



Toma de muestra para tuteleo



Tuteleo Zapata



Tuteleo Zapata



Tuteleo Zapata



Replanteo



Tuteleo Zapata

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Latonderos	4	Propia
Cumplir seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cumplir normatividad Seguridad industrial	1	Propia
Señalamiento Tubular con cinta roja	4	Propia
Planchon de madera	5	Propia
Video	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativos
Supervisor	1	Administrativos
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativos
Maestro General	1	Profesional en
Ayudantes de Obra	2	Profesional en

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

Descripción General: El dia de hoy 25 de Julio de 2023 nos reunimos en la obra con el Ingeniero Yeison Veloza y el Ingeniero Felipe. Se observa un avance de obra al dia de hoy de 1,75%, en actividades de demolición para construccion de zapata , excavación 1 m3 de excavación, tambien excavación para vigas. Se observa el material de excavación debidamente acopiado en obra. Se realizan las pruebas undarias con el jundico y de infiltrometro. Se se en su totalidad la demolición y excavacion de la habitacion y el patio.

Pendiente Terminar: Demolición de piso y excavación para armado de vigas y zapatas. Localización de material de excavación. Se evenia en la semana 2 con en las actividades de solado, armado de acero, y fundido de concreto para zapatas y vigas. Se observa material de acero que cumple con lo estipulado en los planos.

Conclusiones y recomendaciones: Avanzar con las actividades de armado de acero establecidas como lo indica la norma NSR 10. Evaluar el riesgo y el nivel freatico y proporcionar no tener variaciones de agua externas.

FIRMA:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 900624558-6


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cableado Electr.	
Cimentacion	X	Ornamentacion	
Placa Piso P3		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminado	
Insta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa señora Alix Torres	Llegada de material
Patio y habitacion	Amarre de acero e instlacion de parrila y columnas para Cimentación
Patio y habitacion	Se realizo fundida de zapatas

REGISTRO FOTOGRAFICO



Llegada de material



Amarre de acero



Instalacion de parrilla y columna para cimentacion



Amarre de acero



Concreto para fundida de zapatas



Fundida de zapata



Fundida de zapata



Fundida de Zapata

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):	2	Arena Cer. (M3):	2	Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidos	Material (Observaciones)									
Arena y grava	Llegan a obra 2 metros de arena lavada y 2 metros de gravilla.									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Columbines	6	Propia
Camilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con Cruceta	6	Propia
Planchón de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor	-	Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Prestacionales
Ayudantes de Obra	2	Prestacionales

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
Nit 900625588-6


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 045 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	[1 - AVANCE] JUEVES 27 DE JULIO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cubierta	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Pno P1		Cubierta	
Mamp. Pno 1		Terminada	
Insta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos elect			
Aparatos sanit			


TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio	Se realizo demolicion para pasar la viga
Patio y habitacion	Se realiza solado para viga de cimentacion
Patio y habitacion	Se realizo amarre de acero y testeros para fundida de viga
Patio y habitacion	Se realizo vibracion para fudida de viga se fundio la viga

REGISTRO FOTOGRAFICO:


Demolicion para pasar la viga



Solado de viga


Solado de viga


Amarre de acero y testeros


Testero para fudida de viga


Vibro para fundida de viga


Fundida de viga


Fundida de viga

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava [M3]:		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo (und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									
Arena y grava	Llegan a obra 2 metros de arena lavada y 2 metros de gravilla									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colominas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Plancha de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor	-	Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Profesionales
Ayudantes de Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTEVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT 901230518-6

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	VIERNES 28 DE JULIO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cubierta Losa	
Cimentacion	X	Ornamentacion	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminado	
Inst. electricas		Entregada	
Inst. hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa señora Alix Torres	Llegada de material
Patio y habitación	Se realizó amarre de llaves para columnas
Patio y habitación	Se realizó huecos en tuberia de 2" para realizar drenaje

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Llegada de material



Armado de acero



Armado de acero



Armado de acero



Armado de acero



Armado de acero



Huecos para drenaje



Huecos para drenaje

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Acerta Lav. (M3):		Ladrillo(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									
Ladrillos	Llego a obra 1000 ladrillos									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Cepillo	4	Propia
Cepillo Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cuello antisalpicadura Seguridad industrial	1	Propia
Señalizacion de Seguridad Trabajo Con Concreto	6	Propia
Planchon de madera	10	Propia
Viga	1	Propia
Parales	12	Propia
Cerchas	6	Propia
Extension extraelectrica	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativo
Supervisor	1	Administrativo
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativo
Maestro General	1	Profesionales
Ayudantes de Obra	2	Profesionales

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMA:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900[illegible]-5

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

A/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	SABADO 29 DE JULIO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
	TARDE	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	X

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares	X	Cableado Electr	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Piso 1		Terminados	
osta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio y habitación	Se realizo levantamiento de mamposteria de 3m hilada para realizar el alistado de pisos de drenaje
Patio y habitación	Se realizo saloda con media caña para instalación de drenaje
Patio y habitación	Se realizo instalacion de tuberia de 3" con bocas para el drenaje con instalación de geotextil y grawila para su filtración
Patio y habitación	Se realizo cubierta de zinc
Patio y habitación	Se realizo levantamiento de mamposteria en patio y habitación

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Levantamiento de mamposteria patio



Media caña para drem



Instalacion de tubo y geotextil para drem



Drenaje instalado




Arbuto de acero y levantamiento de mamposteria



Levantamiento de mamposteria patio



Levantamiento de mamposteria habitacion



Levantamiento de mamposteria patio

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):	1 y 1/2	Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas & Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									
Aveva	llega a obra motrar y media de arena de pella									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camilla de madera	10	Propia
Camillas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Soluciones de Anticuerpo Tubular con cubeta	6	Propia
Plomada de madera	10	Propia
Vidrio	1	Propia
Paraiso	12	Propia
Cerchas	6	Propia
Extension encauchetada	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativos
Supervisor	-	Administrativos
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativos
Maestro General	1	Preliminares
Ayudantes de Obra	2	Preliminares

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMA:

DINCO S.A.S.

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 045 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNIA - BOYACÁ

R/L: DIS YENON FABIAN VELOZA VARGAS CC

FECHA: [illegible]

CLIMA: [illegible]

ESQUEMA DE OBRA



ACTIVIDADES SOLICITADAS

Demolición		Cubierta en teja	
Limpieza	X	Cielo raso en yeso	
Placa Piso P1		Pañetes	
Muros Nuevos	X	Pintura	
Instalaciones eléctricas		Enchapes	
Instalaciones hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería metálica			
Aparatos sanitarios			
Aparatos eléctricos			

TRABAJOS EJECUTADOS

Ubicación	Actividad Ejecutada
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo (und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	*Cantidad*	*Alq./Propia*
Cortes de madera	1/2	Propia
Vibrador	4	Propia
Cortadora de concreto manual	1	Propia
Rotomartillo eléctrico	1	Propia
Taladro inalámbrico de gravedad industrial	1	Propia
Generador de energía tipo camioneta	1/2	Propia
Plancha de madera	1/2	Propia
Vibrador	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	*Cantidad*	*Cuadrilla De:*
Ingeniero Residente	1	Administrativo
Supervisor		Administrativo
Maestro Auxiliar de Albañilería	1	Oficios varios
Maestro General	1	Oficios varios
Ayudantes de obra	2	Construcción
		Construcción

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALBE TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

RA | ING WINDS FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA	(D - A/M/AÑO)						
CLIMA							

ESQUEMA DE OBRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRABAJOS EJECUTADOS

Ubicación	Actividad Ejecutado

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Cantidad(M3):	Volumen en (M3):	Precio Por M3($):	Total($):	Consumo real:
Facturas o Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)				

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:

ACTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Observaciones Generales

Firma Residente

Firma

DINCO S.A.S.


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: INGYEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	13 - AVANCE 1						
CLIMA:	MAÑANA	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta en teja	
Cimentación	X	Instalaciones eléctricas	
Pisos en P1		Cubierta	
Muros, Viga	X	Instalaciones hidrosanitarias	
Instalaciones eléctricas		Enchapes	
Instalaciones hidrosanitarias		Aparatos	
Enchapes		Pisos y Pintura	
Aparatos		Carpintería madera	
Pisos y Pintura		Aparatos eléctricos	
Carpintería madera		Aparatos sanitarios	
Aparatos eléctricos			
Aparatos sanitarios			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Pisos y Habitaciones	Se realizó demolición de [illegible] para [illegible]
Pisos y Habitaciones	Se realizó demolición con [illegible]
Pisos y Habitaciones	Se realizó demolición con [illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3)		Arena Cer (M3)		Arena Lav. (M3)		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas o Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Cambio de material	1m	Propia
[illegible]	4	Propia
[illegible]	1	Propia
Polipasto manual de [illegible]	1	Propia
Cargador de [illegible]	1	Propia
Mezcladora [illegible]	1	Propia
[illegible]	4	Propia
Plancha de vibrado	1	Propia
Otros	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	[illegible]
Inspectores	1	[illegible]
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	[illegible]
Maestro General	1	[illegible]
Ayudantes de Obra	4	[illegible]

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.

BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEIMON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA	(1 - AVANCE)						
CLIMA	MAÑANA						
	TARDE						

ESQUEMA DE OBRA




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta Teja	
Cimentacion	6	Impermeabilizacion	
Obra Negra		Cubierta	
Mamp. Bloq	3	Enchapado	
Inst. Hidrosanitarias		Enchapado	
Inst. Electricas			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aseo Obra			
Aparatos sanit.			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada

REGISTRO FOTOGRAFICO:

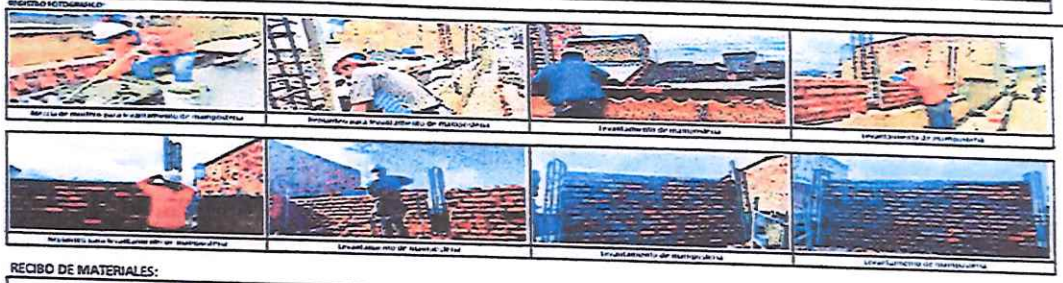

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3)		Ladrillo (und)		Cemento (und)	
Factura o Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq /Propia
	10	Propia
	4	Propia
	1	Propia
	1	Propia
	1	Propia
	4	Propia
	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
	1	
	1	
	1	
	2	

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMA

DINCO S.A.S.

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

	FECHA	(1 - AVANCE)					
	CLIMA	SEMANA					
		TARDE					


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Fabricación Elem. Concreto Reforz.	
Cimentación	4	Cubierta	
Placa Piso P1		Terminados	
Mampostería	4	Entregado	
Vivienda afectada			
Redes Hidrosanitarias			
Enchapes			
Aparatos			
Ubicación y Retiro			
Carpintería madera			
Aparatos Hierro			
Aparatos sanit.			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutado

REGISTRO FOTOGRAFICO:

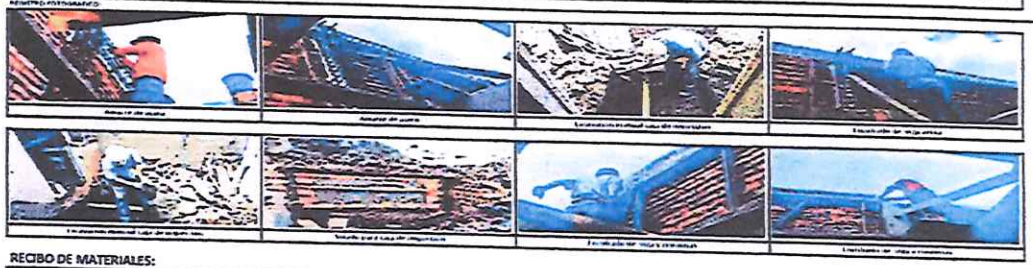

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:									
Tornillos o Brocas Rotas	Material (Observaciones)								
Arena Lavada									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACION LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

RESIDENTE: RAIMAN VELOZA VALENCIA

OBRA

(3 - AVANCE)

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Preliminares
Cimentación
Mampostería
Instalaciones
Pañetes
Cubierta
Carpintería madera
Aparatos sanit.
Aparatos elect.
Enchape
Estructura
Pavimento

Ubicación	Actividad Ejecutada

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Material (Observaciones)
Suministro de Arena	

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camión de materiales	10	Propia
Volqueta	6	Propia
Retroexcavadora	1	Propia
Mezcladora	1	Propia
Vibrador	1	Propia
Compactador	1	Propia
Andamios	10	Propia
Vibro	1	Propia
Extensión eléctrica	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativo
Inspectores	-	Administrativo
Auxiliares Ambulancia	1	Administrativo
Maestro General	1	Operarios
Ayudantes de Obra	7	Operarios

NOTAS DE OBSERVANCIA Y/O SUPERVISIÓN

FIRMAS

DINCO S.A.S.


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNIA - BOYACÁ

R/L: INGENIERO FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE)						
CLIMA:	SEMANA	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	FAVOR:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

PROGRAMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta Liviana	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Enchapes	
Inst.a Hidrosanitarias		Entregados	
Inst.a Hidroneumáticas			
Enchapes			
Pisos y Pintura			
Carpintería Madera			
Aparatos Hidrá			
Aparatos Sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Habitación	Se realizó demolición de placa de contrapiso para excavación para cimentación, cimentación y fundición de placa
Baño	Se realizó demolición de muro de baño para instalación de tubería para hidrosanitarias, cubierta y enchape
Habitación	Se realizó pañetes en muro interior

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Cimentación placa de contrapiso

Instalación de tubería hidrosanitaria

Pañetes en muro interior

Pañetes en muro interior

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cor. (M3):		Arena Laz. (M3):		Ladrillo (und):	1000	Cemento (und):	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Carretilla de Madera	10	Propia
Formaletas	4	Propia
Equipo de protección individual	1	Propia
Equipo de protección individual	1	Propia
Equipo comunicación seguridad individual	1	Propia
Señalización preventiva temporal	6	Propia
Escalera de madera	10	Propia
Vibrador	1	Propia
Extensiones eléctricas	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Cuadrilla de
Auxiliares de Obra	7	Cuadrilla de

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:


DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT. 900635565-4

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	[1 - AVANCE] MARTES 08 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA	SOLEADO	X	ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso Pa		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Terminado	
Insta electricas		Entregado	
Insta hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio y habitacion	Se realizó demolicion placa de contrapiso y salida de tierra y escombro
Patio y habitacion	Se realizo desmonte de estructura tela asbesto cemento
Patio y habitacion	Se realizo pañete y dilataciones en patio

REGISTRO FOTOGRAFICO:


Demolicion placa de contrapiso


Desmonte estructura madera teja en asbesto cemento


Desmonte estructura madera teja en asbesto cemento


Salida de tierra y escombro


Demolicion placa de contrapiso


Pañete patio


Dilataciones patio


Pañete parte alta de habitacion

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camión de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camión Seguridad industrial	1	Propia
Botiquín Seguridad industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Seccionet de Andamio Tubular con Crucetas	9	Propia
Plancheta de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativo
Supervisor	-	Administrativo
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativo
Maestro General	1	Construccion
Ayudantes de Obra	2	Construccion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMA:

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT. 9004243691-1


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) MIERCOLES 09 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
				NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Terminada	
Insta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos a'elctr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Habitacion	Se realizo excavacion manual y relleno para instalacion de malla electrosoldada
Habitacion	Se realizo instalación de malla electrosoldada para fundidada de concreto
Patio y habitacion	Se realizo fundica de piso e instlacion de perfiles para cuberta

REGISTRO FOTOGRAFICO:


Instalacion de Perfiles


Excavacion Manual


Excavacion manual


Relleno compactado con pison


Relleno compactado con pison


Instalacion malla electrosoldada


Fundida de piso


Fundida de piso

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Plancha de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor	-	Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	3	Cimentacion
Ayudantes de Obra	2	Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 900xxxxxx-x


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VASCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	JUEVES 03 DE AGOSTO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cielo Falso Electr	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muros	X	Terminados	
Inst. eléctricas		Entregada	
Inst. hidrosanitarias			
Enchapes			
Pisos			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio	Se realizó excavación manual y cortes para instalación de malla electrosoldada
Habitación	Se realizó picadeo de zona de habitación.
Habitación	Se realizo instalación de soj bánderamenta en habitación
Patio	Se realizó instalación de malla electrosoldada y fundida de concreto para piso de patio

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Instalacion de malla electrosoldada y fundida de piso



Instalacion de malla electrosoldada y fundida de piso



Fundida de piso



Fundida de piso



Adecuado de piso



Picadeo de piso



Instalacion de tuberia hidrosanitaria

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cor. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(uno)		Cemento (uno)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camilas de madera	10	Propia
Cobijadoras	4	Propia
Cuello Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cuello Amortiguador Seguridad industrial	1	Propia
Soporte de Andamio Tubular con Guayda	6	Propia
Plataforma de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativo
Supervisor	1	Administrativo
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativo
Maestro Sanitario	1	Construcción
Ayudantes de Obra	2	Construcción

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

Construcción General: Solicitud de modificación de cortado tiene no previstos. Se aprueba la solicitud con un porcentaje de 45%. Se coordinan las actividades que se desarrollaran en la semana. Recuerdo el mure posterior se llega de acuerdo con el contratista de remover el mismo Mangon o Lambo de Bloque

FIRMAS:


DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN ARQUITECTURA

BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA		
CLIMA	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO		
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO		

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta/ Techo	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Terminada	
Instal electricas		Entregada	
Instal hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Habitacion y habitacion continua	Se realizo instalacion electrica en piso en habitacion, habitacion contigua y patio
Patio	Se realizo fundida de tapa para caja de inspeccion
Cocina	Se realizo instalacion de estuco en cocina

REGISTRO FOTOGRAFICO


Instalacion electrica en piso


Instalacion electrica en piso


Instalacion electrica en piso


Estuco


Estuco


Fundida de tapa caja de inspeccion


Fundida de tapa caja de inspeccion


Estuco

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3)		Arena Cor. (M3):		Arena Lav. (M3):	1	Ladrillo(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									
Arena lavada	Llegada a obra de 1 metro de arena lavada									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camilla de madera	10	Propia
Extintores	4	Propia
Cartilla seguridad industrial	1	Propia
Botiquin seguridad industrial	1	Propia
Curso capacitacion Seguridad industrial	1	Propia
Señales de Andamio tubular con escalera	6	Propia
Plancha de madera	10	Propia
Nivel	1	Propia
Extension electrica	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Cimentacion
Ayudantes de Obra	2	Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMA:

DINCO S.A.S.


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING. YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	[1 - AVANCE] SABADO 12 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		ACTIVA	x	SUSPENDIDA	
				NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	x	NUBLADO		LLUVIOSO	x

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta Liviana	
Cimentación	x	Cubierta	
Placa Piso P1		Terminados	
Mamp. Muro	x	Entregada	
Inst. eléctricas			
Inst. hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos eléctr.			
Aparatos sanit.			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa doña Alix Torres	No se realiza ninguna actividad hasta tanto la supervisión no nos autorice los items no previstos

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	*Cantidad*	*Alq./Propia*
Camilla de madera	10	Propia
Columbrero	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cartilla antiestatica Seguridad industrial	1	Propia
Señalizacion de Andamio Tubular con cinceta	6	Propia
Plancha de madera	20	Propia
Vibro	1	Propia
Extension encauchetada	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	*Cantidad*	*Cuadrilla De:*
Ingeniero Residente		Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente		Administrativa
Maestro General		Comunidad
Ayudantes de Obra		Comunidad

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMA:


DINCO S.A.S.
DISEÑO INDEPENDIENTE Y CONSTRUCCIÓN

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	[1 - AVANCE] LUNES 14 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr	
Cimentación		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro		Terminada	
Insta eléctricas		Entregada	
Insta hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa doña Maria Alix Torres	No se realiza ninguna actividad hasta tanto la supervisión no nos autorice los ítems no previstos debido al proceso constructivo que se debe llevar para el proceso

REGISTRO FOTOGRAFICO

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Cuadrilla de madera	10	Propia
Colombianas	4	Propia
Camilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad Industrial	1	Propia
Señalamos de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Plancha de madera	5	Propia
Video	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente		Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente		Administrativa
Maestro General		Construcción
Ayudantes de Obra		Construcción

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
D SEMI INGENIEROS Y CONSTRUCCIÓN
Nit 900276580-4


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YESON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	[1 - AVANCE]						
	MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr	
Cimentacion		Elevamiento ac	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro		Terminacio	
Insta electricas		Entregado	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa dona Maria Alix Torres	No se realiza ninguna actividad hasta tanto la supervision no nos autorice los items no previstos debido al proceso constructivo que se debe llevar para el proceso

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cor. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Seccionm. de Andamio Tubular con ruedas	4	Propia
Plancha de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente		Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar Sst Residente		Administrativa
Maestro General		Cimentacion
Ayudantes de Obra		Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:


DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 900263587-6

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

FECHA:	(1 - AVANCE)						
	MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
				NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr.	
Cimentación		Ornamentación	
Placa Piso P3		Cubierta	
Mamp. Muro		Terminada	
Inst. eléctricas		Entregada	
Inst. hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa doña Maria Alix Torres	No se realiza ninguna actividad hasta tanto la supervisión no nos autorice los ítems no previstos debido al proceso constructivo que se debe llevar para el proceso

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Canillas de madera	10	Propia
Coombinas	4	Propia
Camila Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Casco amarillo otro Seguridad industrial	1	Propia
Seccionen de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente		Administrativo
Supervisor		Administrativo
Ingeniero Auxiliar de Residente		Administrativo
Maestro General		Cimentación
Ayudantes de Obra		Cimentación

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

143

DINCO S.A.S.


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

[1 - AVANCE]							
FECHA:	JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	

EVIDENCIA DE OBRA



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta Cuerp	
Cimentacion		Ornamentacion	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro		Terminada	
Instal electricas		Entregada	
Instal hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJO EJECUTADO:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa Doña María Alix Torres	Para la ejecución de cualquier actividad, tanto para la supervisión, en este, así como las personas dentro de proceso constructivo que se debe llevar para el proceso

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Gor (M3):		Arena Lav (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Factura & Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propio
Cortadora de madera	10	Propia
Taladros	6	Propia
Cascos Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cartel Señalizacion Seguridad Industrial	1	Propia
Uniformes de Dotacion Trabajar con Dignidad	6	Propia
Planchas de madera	6	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente		Administrativo
Supervisor		Administrativo
Residente Auxiliar - En Sustitución		Administrativo
Maestro General		Construcción
Ayudantes de Obra		Construcción

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

(1 - AVANCE)

FECHA:	VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta Fierro	
Cimentacion		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mampo. Muro		Terminado	
Instal electricas		Entregado	
Instal hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa dirha Maria Alix Torres	No se realiza ninguna actividad hasta tanto la supervisión no nos autorice los items no previstos dirigido al proceso constructivo que se debe llevar para el proyecto

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava [M3]:		Arena Cor. [M3]:		Arena Lav. [M3]:		Ladrillo(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									
Arena lavada	Llegada a obra de 5 metros de arena lavada									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camilas de madera	10	Propia
Columbinas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Camilla inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Sistemas de Andamio Tubular con cremallo	6	Propia
Plancha de madera	10	Propia
Vidrio	1	Propia
Extensión encauchetado	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente		Administrativo
Supervisor		Administrativo
Ingeniero Auxiliar de Residente		Administrativo
Maestro General		Comunidad
Ayudantes de Obra		Comunidad

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DIVISIÓN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
NIT. 900276566-4

BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ


R/L: ING TEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

[1 - AVANCE]

FECHA:	SABADO 19 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	

ACTIVA | X | SUSPENDIDA | X

FOTO FINAL DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cerámica Pisos	
Cimentación		Ornamentación	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muros		Terminada	
Inst.a eléctricas		Entregada	
Inst.a hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Casa doña María Alix Torres.	No se realiza ninguna actividad hasta tanto la supervisión no nos autorice los diseños, no queremos dañarlo el proceso constructivo que se debe llevar para el proceso

REGISTRO FOTOGRAFICO:

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava [M3]:		Arena Cer. [M3]:		Arena Lav. [M3]:		Ladrillo[und]	1000	Cemento [und]	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Canastilla de madera	10	Propia
Columpiadora	6	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cinturon Seguridad Seguridad industrial	1	Propia
Señalamiento Preventivo Tubular con Cinta	6	Propia
Plancha de madera	10	Propia
Video	1	Propia
Extensión multitomada	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente		Administrativo
Supervisor		Administrativo
Ingeniero Auxiliar de Residente		Administrativo
Maestro General		Construcción
Ayudantes de Obra		Construcción

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:


DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT: 900420169-0

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) MARTES 22 DE AGOSTO DE 2023			ACTIVA	X	SUSPENDIDA	
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cubierta	
Cimentación	X	Ornamentación	
Placa Piso P.1		Cubierta	
Mamp. Muros	X	Terminada	
Insta eléctricas		Entregada	
Insta Hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpintería madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Habitación	Se realizo dilatacion instalacion tubo pvc 1/2" e instalacion de estructura para drywall
Patio y habitacion	Se realizo instalacion de canal de aguas lluvia
Patio y habitacion	Se realizo pañete de patio y habitacion e instalacion de estructura para drywall en cocina


REGISTRO FOTOGRAFICO:


Dilatacion habitación


Instalacion electrica tubo pvc 1/2" e instalacion de estructura drywall


Instalacion de canal


Salida de canal


Pañete patio


Pañete patio


Pañete habitacion


Instalacion estructura para Drywall

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cor. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad Industrial	1	Propia
Bloqueo Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Cimentacion
Ayudantes de Obra	2	Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
"LOS PROFESIONALES"


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 045 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ACTIVA X SUSPENDIDA

ESQUEMA DE OBRA:




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr.	
Cimentacion	X	Ornamentacion	
Placa Piso P3		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Terminada	
Insta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Cocina, Estudio y Patio	Se realiza instalacion de estuco en paredes de cocina, estudio y patio
Habitacion continua y Habitación	Se realiza instalacion de estructura para drywall en habitacion continua e instalacion de drywall en habitacion
Patio y habitacion continua	Se realiza instalacion de estuco en patio y habitacion continua


REGISTRO FOTOGRAFICO:


Estuco


Estuco cocina


Tapa caja de inspeccion


Instalacion estructura para drywall


Instalacion Dryball habitacion


Instalacion Estuco


Instalacion Estuco


Instalacion Estuco

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con Graveta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia
Vibro	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor	1	Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Cimentacion
Ayudantes de Obra	2	Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

148

DINCO S.A.S.
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 900425518-6


BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.
OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA AUX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE) JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ACTIVA	X	SUSPENDIDA

ESQUEMA DE OBRA:




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr.	
Cimentacion	X	Ornamentacion	
Placa Piso P3		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Terminada	
Insta electricas		Entregada	
Insta hidrosanitaria			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura			
Carpinteria madera			
Aparatos electr			
Aparatos sanit			


TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Patio	Se realizo instalacion de bajante de aguas lluvia
Habitacion	Se realizo instalacion de estuco y drywall en habitacion
Estudio y Cocina	Se realizo instalacion de drywall en estudio y cocina
Habitacion, habitacion continua y habitacion	Se realizó instalación de lamparas en habitacion y habitacion continua, y se pinto la habitacion

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Instalacion bajante de aguas lluvia



Estuco habitacion e instalación de drywall




Instalacion de drywall estudio



Instalacion de drywall estudio



Instalacion de drywall cocina



Instalacion lamparas habitacion



Instalacion lamparas habitacion continua



Pintura habitacion

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrillo(und)		Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	Material (Observaciones)									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	2	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello inmovilizador Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Planchon de madera	5	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor	1	Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Cimentacion
Ayudantes de Obra	2	Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.
Nit 9006546xxx-x

BITACORA CONTRATO DE OBRA Nº 845 DE 2023.


OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	(1 - AVANCE)						
	VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	

ACTIVA	X	SUSPENDIDA	

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr.	
Cimentacion	X	Ornamentacion	
Placa Piso P1		Cubierta	
Mamp. Muro	X	Terminada	
Insta electricas	X	Entregada	
Insta hidrosanitaria	X		
Enchapes	X		
Pañetes			
Estuco y Pintura	X		
Carpinteria madera			
Aparatos elect			
Aparatos sanit			

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Baño	Se realizo instalacion de drywall en baño y ductos para tuberia
Patio, estudio y sala comedor	Se realizo instalacion de lamparas en habitacion, estudio y sala comedor
Patio, y habitación	Se realizo enchape y guardaescoba de la habitacion y el patio de ropa
Cocina	Se realizo pintada de cielo


REGISTRO FOTOGRAFICO:



Instalacion electrica en pvc



Instalacion lamparas habitacion



Instalacion lamparas estudio



Pintura cocina



Estuco



Instalacion lamparas sala comedor



Enchape patio



Enchape habitacion

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):	1	Ladrillo(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Camillas de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Casilla Seguridad Industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad Industrial	1	Propia
Cuello amortiguador Seguridad Industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con Cruceta	9	Propia
Planchón de madera	10	Propia
Vitaro	1	Propia
Extension encauchetada	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniero Residente	1	Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente	1	Administrativa
Maestro General	1	Cimentacion
Ayudantes de Obra	2	Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

DINCO S.A.S.


BITACORA CONTRATO DE OBRA № 845 DE 2023.

OBJETO: SIT-92 MATENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 - 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ

R/L: ING YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

FECHA:	[1 - AVANCE] SABADO 26 DE AGOSTO DE 2023						
CLIMA:	MAÑANA:	SOLEADO		NUBLADO		LLUVIOSO	
	TARDE:	SOLEADO	X	NUBLADO		LLUVIOSO	X

ESQUEMA DE OBRA:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Preliminares		Cableado Electr.	
Cimentacion		Ornamentacion	
Placa Piso		Cubierta	
Mamp. Muro		Terminado	X
Inst. electricas		Entregado	
Inst. Hidrosanitarias			
Enchapes			
Pañetes			
Estuco y Pintura	X		
Carpinteria madera	X		
Aparatos electr			
Aparatos sanit	X		

TRABAJOS EJECUTADOS:

Ubicación	Actividad Ejecutada
Muro costado posterior	Se termina pañete del muro costado
Puertas y ventanas	Se instala fijación y hojas de puertas y ventanas metálicas
Casa	Se terminan detalles de construcción y acabados de la batahola en la obra
	Se da por

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fachada




Sala comedor



Baño



Cocina



Habitaciones



Estudio 1



Estudio 2



Patio

RECIBO DE MATERIALES:

Ingreso de Agregados:	Grava (M3):		Arena Cer. (M3):		Arena Lav. (M3):		Ladrilla(und)	1000	Cemento (und)	
Facturas ó Remisiones Recibidas	*Material (Observaciones)*									

MAQUINARIA EN OBRA:

Maquinaria	Cantidad	Alq./Propia
Canastilla de madera	10	Propia
Colombinas	4	Propia
Camilla Seguridad industrial	1	Propia
Botiquin Seguridad industrial	1	Propia
Cuello ortopedico Seguridad industrial	1	Propia
Secciones de Andamio Tubular con cruceta	6	Propia
Planchon de madera	10	Propia
Vibro	1	Propia
Extension encauchetada	1	Propia

PERSONAL EN OBRA:

Personal	Cantidad	Cuadrilla De:
Ingeniera Residente		Administrativa
Supervisor		Administrativa
Ingeniero Auxiliar de Residente		Administrativa
Maestro General		Comunicacion
Ayudantes de Obra		Cimentacion

NOTAS DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

FIRMAS:

51

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900624568	4	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 55 N 8B 34		7492321			EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27445612	E	2023-08-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.965.000	18.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	27445612	2023-08-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4287638	BOHORQUEZ CASTRO GUSTAVO	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	464.000	74.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	464.000	18.600	COMFABOY-CCF10	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5742101
2	CC 1002687612	MUÑOZ VILLATE CARLOS ANDRES	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	464.000	74.300	0	0	SANITAS-EPS005	464.000	18.600	COMFABOY-CCF10	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5742101
3	CC 1002726061	SOTELO CARDENAS ANGIE TATIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5742101
4	CC 1049614604	GARCIA AGUDELO FELKIN OSWALDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5742101
5	CC 1049616490	VELOZA VALCARCEL YEISON FABIAN	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFABOY-CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5742101
6	CC 1049651513	ESCOBAR PATIÑO ALEJANDRO	1.160.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PROTECCION -230201	154.667	24.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	154.667	6.200	COMFABOY-CCF10	161.111	6.500	154.667	10.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	48.300	S	5742101
7	CC 1052414997	VARGAS ROJAS MARIA FERNANDA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	5742101
8	CC 1193374254	MUÑOZ VILLATE JORGE ENRIQUE	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	464.000	74.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	464.000	18.600	COMFABOY-CCF10	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5742101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900624568	4	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 55 N BB 34		7492321		EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27445612	E	2023-08-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.965.000	18.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	27445612		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.526.667	6.526.667	6.526.667	6.533.111	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.044.500	0	9.500	0	1.054.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	74.300	0	700	0	75.000
PORVENIR	230301	800224808	8	6	945.400	0	8.500	0	953.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	24.800	0	300	0	25.100
EPS(Administradoras: 4)				8	261.200	0	2.600	0	263.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	18.600	0	200	0	18.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	3	71.200	0	700	0	71.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	78.600	0	800	0	79.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	92.800	0	900	0	93.700
ARP(Administradoras: 1)				8	379.800	0	3.500	0	383.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	379.800	0	3.500	0	383.300
CCF(Administradoras: 1)				8	261.500	0	2.400	0	263.900
COMFABOY	CCF10	891800213	8	8	261.500	0	2.400	0	263.900
Gran Total					1.947.000	0	18.000	0	1.965.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900624568	4	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 55 N 8B 34		7492321		EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27500348	E	2023-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.420.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	27500348	2023-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4287638	BOHORQUEZ CASTRO GUSTAVO	1.160.000	F		X														0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.005.334	160.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.005.334	40.300	COMFABOY-CCF10	1.066.556	42.700	1.005.334	70.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	313.900	S	5742101
2	CC 1002687612	MUÑOZ VILLATE CARLOS ANDRES	1.160.000	F		X														0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.005.334	160.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.005.334	40.300	COMFABOY-CCF10	1.066.556	42.700	1.005.334	70.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	313.900	S	5742101
3	CC 1002726061	SOTELO CARDENAS ANGIE TATIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5742101
4	CC 1049614604	GARCIA AGUDELO FELKIN OSWALDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5742101
5	CC 1049616490	VELOZA VALCARCEL YEISON FABIAN	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFABOY-CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5742101
6	CC 1052414997	VARGAS ROJAS MARIA FERNANDA	1.160.000	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.456.444	58.300	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	296.400	S	5742101
7	CC 1193374254	MUÑOZ VILLATE JORGE ENRIQUE	1.160.000	F		X														0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.005.334	160.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.005.334	40.300	COMFABOY-CCF10	1.066.556	42.700	1.005.334	70.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	313.900	S	5742101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900624568	4	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 55 N 8B 34		7492321			EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27500348	E	2023-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.420.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	27500348		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.996.002	7.996.002	7.996.002	8.476.112	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.279.500	0	0	0	1.279.500
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.118.600	0	0	0	1.118.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.900	0	0	0	160.900
EPS(Administradoras: 5)				7	320.100	0	0	0	320.100
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	86.700	0	0	0	86.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	100.300	0	0	0	100.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	40.300	0	0	0	40.300
ARP(Administradoras: 1)				7	482.100	0	0	0	482.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	482.100	0	0	0	482.100
CCF(Administradoras: 1)				7	339.200	0	0	0	339.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	339.200	0	0	0	339.200
Gran Total					2.420.900	0	0	0	2.420.900

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS
Nit 900.624.568-4

CONTRATO DE OBRA N° 845 - 2023

CERTIFICAN

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Yeison Fabián Veloza Valcárcel, identificado con CC 1.049.616.490 de Tunja, en mi condición de Representante Legal y Flor Leidy Corredor Pirazán con CC 1.049.628.518 en mi calidad de Contador Público de **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN DINCO SAS** identificado con Nit 900.624.568-4, certificamos bajo gravedad juramento el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Tunja, a los (20) veinte días del mes de septiembre de 2023

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Yeison Fabián Veloza Valcárcel
CARGO: Representante Legal

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Flor Leidy Corredor Pirazán
CARGO: Contadora
TP 208006-T

159


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
208006-T
FLOR LEIDY
CORREDOR PIRAZAN
C.C. 1049628518
RESOLUCION INSCRIPCION 680
FECHA 14/10/2015
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
221757


210586
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

160

Certificado No:

B 0 0 C 0 0 4 0 7 2 6 8 A 1 4 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FLOR LEIDY CORREDOR PIRAZAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049628518 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 208006-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAZ Y SALVO EMPLEADOS

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

PAZ Y SALVO

Yo, Yeison Fabián Veloza Valcárcel, identificado con cédula de ciudadanía № 1.049.616.490 certifico que la empresa Diseño Interventoría y Construcción DINCO S. A. S, identificada con NIT: 900624568-4 para cual fui Residente de Obra en la ejecución del contrato de obra 845 de 2023 cuyo objeto era "SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ", se encuentra a paz y salvo conmigo por todo concepto hasta la fecha de hoy.

Para constancia se firma en Tunja a los (19) diecinueve días del mes de septiembre de 2023.

Yeison Fabián Veloza Valcárcel
Celular: 3192193801
C.C. 1.049.616.490

PAZ Y SALVO

Yo, Felkin Oswaldo García Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía № 1.049.614.604 certifico que la empresa Diseño Interventoría y Construcción DINCO S. A. S, identificada con NIT: 900624568-4 para cual fui Auxiliar de Residente de Obra en la ejecución del contrato de obra 845 de 2023 cuyo objeto era "SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ", se encuentra a paz y salvo conmigo por todo concepto hasta la fecha de hoy.

Para constancia se firma en Tunja a los (19) diecinueve días del mes de septiembre de 2023.

Felkin Oswaldo Garcia Agudelo
Celular: 3102265339
C.C. 1.049.614.604

DINCO S.A.S.
DISEÑO, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN
NIT 900624568-4

PAZ Y SALVO

Yo, Gustavo Bohórquez, identificado con cédula de ciudadanía № 4.287.638 certifico que la empresa Diseño Interventoría y Construcción DINCO S. A. S, identificada con NIT: 900624568-4 para cual fui maestro general en la ejecución del contrato de obra 845 de 2023 cuyo objeto era "SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ", se encuentra a paz y salvo conmigo por todo concepto hasta la fecha de hoy.

Para constancia se firma en Tunja a los (19) diecinueve días del mes de septiembre de 2023.

Gustavo Bohórquez Castro
Celular: 3218995891
C.C. 4.287.638

CALLE 55 N° 8B – 34 PRADOS DEL NORTE – TUNJA (BOYACÁ)
E-MAIL: EMPRESA.DINCO.SAS@GMAIL.COM
TEL: (098)7492321 - CEL.: 3192193801

CERTIFICADO COMFABOY

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa DISENO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS con nit 900624568 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
27/02/2023	8625685963	2	70,900	202301	70,900	$1,770,667	$1,770,667
21/03/2023	8625875209	4	149,800	202302	149,800	$3,742,667	$3,742,667
25/04/2023	8626267527	6	165,400	202303	165,400	$4,130,945	$4,130,945
24/05/2023	8626529840	13	366,100	202304	366,100	$9,138,281	$9,138,281
14/06/2023	8626760396	8	374,800	202305	374,800	$9,368,667	$9,368,667
03/08/2023	8627249212	7	233,300	202306	233,300	$5,827,445	$5,827,445
24/08/2023	8627445612	8	261,500	202307	261,500	$6,533,111	$6,533,111
TOTALES:			$1,621,800		$1,621,800	$40,511,783	$40,511,783

FECHA DE EXPEDICION: 01/09/2023

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-44-101022811**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2023**	**17**	**07**	**2023**	**00:00**	**16**	**10**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	**NIT: 900.624.568-4**	CL 55 NRO. 8 B - 34	TUNJA, BOYACA	3192193801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE TUNJA	**NIT: 891.800.846-1**	CL 19 9 95	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO No. 845 DE 2023 CUYO OBJETO ES: SIT92 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**17/07/2023**	**27/07/2024**	**$5,703,556.40**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**17/07/2023**	**27/01/2027**	**$5,703,556.40**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**20/09/2023**	**20/09/2028**	**$5,703,556.40**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE FECHA 20/09/2023. SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******17,110,669.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ADRIANA PILAR CARDOZO ALARCON	230568	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101022811

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-44-101022811**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2023**	**17**	**07**	**2023**	**00:00**	**16**	**10**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS	**NIT: 900.624.568-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 55 NRO. 8 B - 34	TUNJA, BOYACA	3192193801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TUNJA	**NIT: 891.800.846-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 19 9 95	TUNJA, BOYACA	0

ADICIONAL:

PSE

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******17,110,669.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ADRIANA PILAR CARDOZO ALARCON	230568	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101022811	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	09	2023	17	07	2023	00:00	16	10	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS		**NIT: 900.624.568-4**
DIRECCIÓN: CL 55 NRO. 8 B - 34	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3192193801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TUNJA		**NIT: 891.800.846-1**
DIRECCIÓN: CL 19 9 95	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

51-44-101022811

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

GLORIAABELLO

CERTIFICACIÓN FIC – SENA

Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social DISENO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS identificado con el NIT 900624568, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
845 DE 2023	MNTO ADEC REPAR LOCT VIVIENDA	TUNJA	60,550	2023-08	31-AGO-2023	95998141
		Total	60,550			

Expedido por el SENA, a los un (01) dias del mes de Septiembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-09-01

Generado por : MYRIAM YOLANDA ROJAS ESPINOSA


¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1338033896 - 219986

SENA, MÁS TRABAJO


Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

PLANO RECORD


Calle 55 n° 8b – 34 prados del norte – Tunja (Boyacá)
e-mail: empresa.dinco.sas@gmail.com
Tel: (098)7490983 - Cel.: 3192193801




PLANTA
ESC.--- 1:50

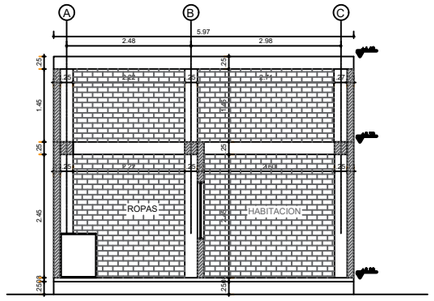

CORTE A-A
ESC.--- 1:50

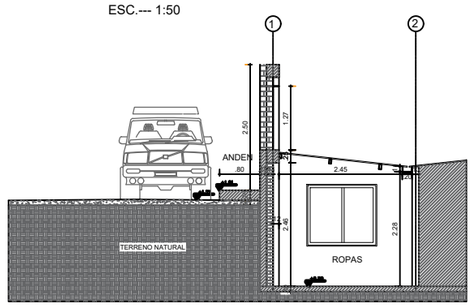


CORTE A-A
ESC.--- 1:50




PLANTA CUBIERTA
ESC.--- 1:50


ARQUITECTONICOS



PLANTA DESAGUE
ESC.--- 1:50

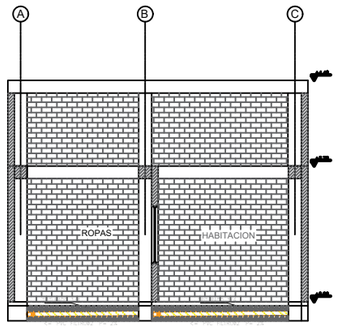


CORTE LONGITUDINAL
ESC.--- 1:50

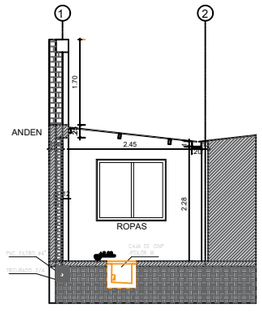


CORTE TRANVERSAL
ESC.--- 1:50

HIDRAULICOS




PLANTA CIMENTACION
ESC.--- 1:50




PLANTA VIGA AEREA NIVEL 2.70 m- 4.40m
ESC.--- 1:50

DESPIECE VIGA DE CIMENTACIÓN



DESPIECE VIGA AEREA



NOMENCLATURA PARA REFERENCIA DE DESPIECES

Cantidad de varillas — Ø de varillas — Long. de las varillas más Gancho

5#4L=2.8/3.0

Long. de las varillas

DEBEN VERIFICARSE EN OBRA Y CUMPLIR COMO MINIMO CON LOS SIGUIENTES VALORES PARA CADA DIAMETRO

LONGITUD DE TRASLAPOS EN VIGAS

DIAMETRO BARRA	LONGITUD TRASLAPO REFUERZO SUPERIOR (cm)	LONGITUD TRASLAPO REFUERZO INFERIOR (cm)
Ø3/8"	55	45
Ø 1/2"	75	60
Ø5/8"	90	70
Ø3/4"	105	90
Ø7/8"	120	100
Ø ↑	150	110


GANCHOS NORMALES A TRACCION. DIMENSIONES (mm)





Barra Nº	Gancho 90º			Gancho 180º		
	D	L	C	L	C	M
4	76	200	181	150	120	102
5	95	250	227	200	130	127
6	115	300	272	250	150	153
7	133	350	317	300	180	178
8	152	400	363	350	200	203
9	230	500	425	450	300	287
10	258	550	473	500	300	323


ESTRUCTURALES


DESPIECE VIGA DE COLUMNA

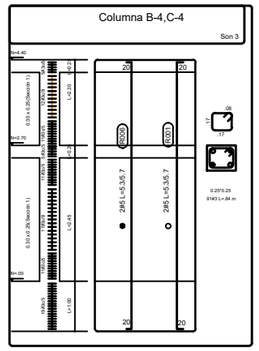



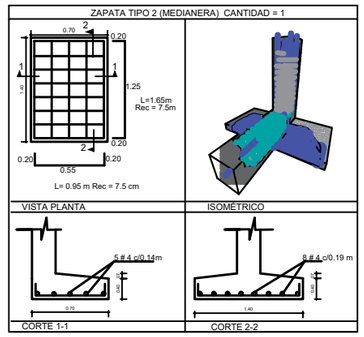

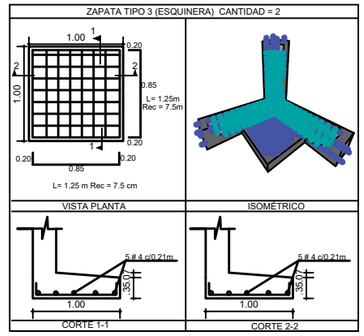

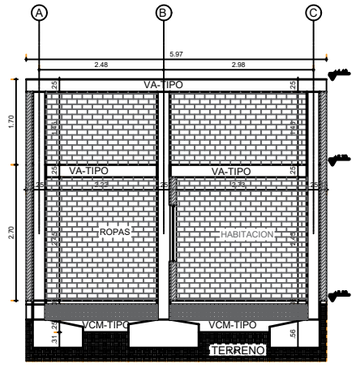

CORTE LONGITUDINAL
ESC.--- 1:50

AÑO DEL PLANO	2023
PLANO Nº	EI-005
REVISION	
FECHA	SEPTIEMBRE 2023
ESCALA	1:50
FORMATO	1000 x 610
DIBUJO	DINCO S.A.S

CONTRATISTA:

DINCO S.A.S.
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. YEISON VELOZA VALCARCEL
C.C. 1.049.616.490 DE TUNJA

CONTRATANTE:

Tunja La Capital que nos UNE

Vo.Bo. Supervisor

ING. JULIAN HERNÁNDEZ R.
C.C. 1.049.673.490 DE TUNJA

PLANO RÉCORD CONTRATO 845 2023

OBJETO: SIT-92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

REVISIONES

REV No	FECHA	DESCRIPCION
1	14-07-2023	VERSION FINAL

REGLAMENTO COLOMBIANO SISMO RESISTENTE N.S.R-10

TUNJA:
Zona de Amenaza Sísmica Intermedia.
Capacidad de Disipación de Energía Moderado (D.M.O).
- Sistema Estructural Porticos.
- Capacidad de Energía Ro-5.0
-Grupo de Uso – I
- Nivel de Importancia I=1.00
- El tipo de Suelo se clasifica: Tipo Perfil D.
- Parámetros a tener en cuenta según la región:
Aa= 0.20 Av= 0.20 Ae= 0.15 Ad= 0.07
- Carga Muerta: 9.90 KN/m2
- Carga Viva : 1.80 KN/m2 (B.4.2.1-1)
- La capacidad portante del suelo es de: 15.00 Ton/m2.
- Nivel de profundización -1.00m a partir del nivel Indicado.
- Tipo de cimentación: Superficial- Vigas de Amarre
-Grado de desempeño de elementos no estructurales – I BUENO Tabla A.9.2.1
-Coeficiente de amplificación dinamica ap=2.5

Materiales:

Concreto fc – 21.1 MPa Para Columnas
Concreto fc – 21.1 MPa Para Vigas Amarre
Concreto fc – 21.1 MPa Para Vigas Aéreas
Concreto fc – 21.1 Pa Placas

Modulo de Elasticidad 21.1 MPa= 21589,00 MPa

Acero fy = 420 MPa Ø1/2" y mayores
Acero fy = 420 MPa Ø3/8" y menores

Recubrimientos:

Vigas de cimentación	– 0.075 m
Escaleras	– 0.04 m
Vigas Aéreas	– 0.04 m
Columnas	– 0.04 m

CONTENIDO:

PLANTA MUROS PRIMER PISO
PLANTA CIMENTACION NIVEL +0.00
PLANTA VIGAS DE CIERRE + 2.50 m
PLANTA ENTRAMADO METALICO
DESPIECE VIGA CIMENTACION TIPO
DESPIECE DE VIGA AEREA TIPO
DESPIECE DE COLUMNETA
DETALLE DE MURO
CORTE ESTRUCTURAL EJE G

ARCHIVO DE REFERENCIA:	
PLANO No.:	PLANO RECORD CONTRATO 845 2023
ESCALA: 1:50	FECHA: SEPTIEMBRE/2023
FORMATO: 1000 x 610	DIBUJO: DINCO S.A.S
REVISION:	PLANO No: 2023 EI-005
	PLANCHA No: 2 DE 2
