
INFORME MENSUAL NÚMERO 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-009-2023 Y No INTERNO 1391 DE 2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELO, GENETICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTREO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

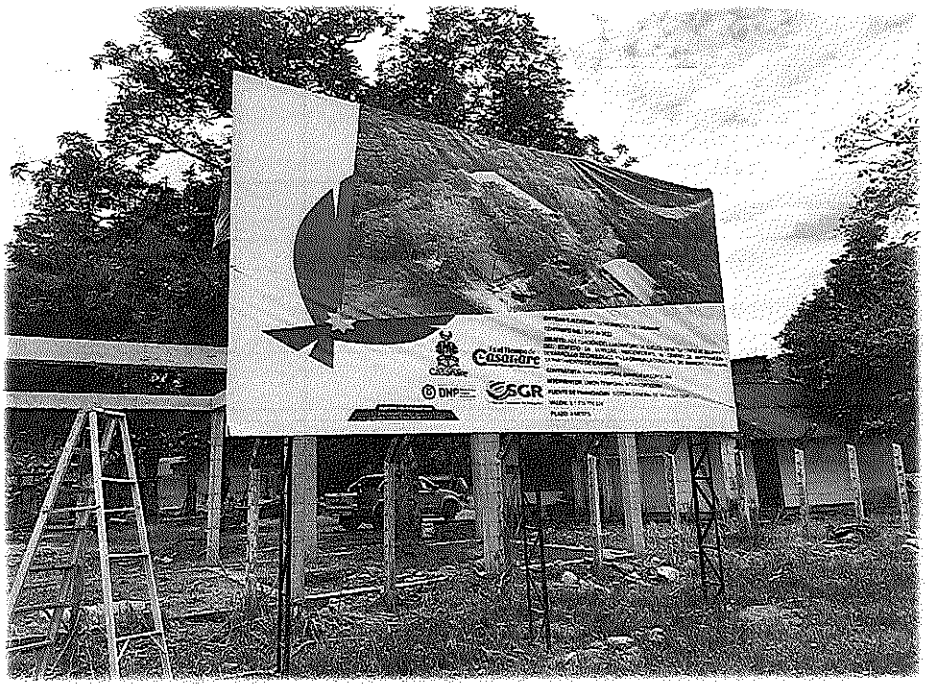

YOPAL, AGOSTO DE 2023

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

REVISIÓN Y APROBACIÓN

NÚMERO DE REVISIÓN		No.	
Índice de revisión	**Sección modificada**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**
1			
2			
3			

Versión		**V.01**
Responsable por la elaboración	Firma	
	Nombre	**Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO G** Director de Interventoría
Responsable por la revisión	Firma	
	Nombre	**Ing. Wilian Gualdrón Vivas** R/L Unión Temporal inter corocora
Responsable por la aprobación	Firma	
	Nombre	**Alexander Barrera Girón** supervisor
Fecha		09 de Agosto 2023

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 7
2.1 NECESIDAD Y FINALIDAD DEL PROYECTO 7
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10
3 ÁREA ADMINISTRATIVA 15
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.1.1 Informe contractual – ficha técnica del contrato de interventoría 15
3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.2.1 Póliza Según Minuta De Interventoría Anexo: 0 16
3.2.2 Póliza Según Minuta De Interventoría Anexo: 1 (Actualización de acuerdo con acta de inicio) 17
3.3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 0826 DE 2023 18
3.3.1 Informe contractual – ficha técnica del contrato de obra pública 18
3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 19
3.4.1 Póliza Según Minuta Del contrato de obra pública Anexo: 0 19
3.4.2 Póliza Según Minuta Del contrato de obra pública Anexo: 1 20
3.4.3 Póliza Según Minuta Del contrato de obra pública Anexo: 2 (Actualización de acuerdo con acta de inicio) 21
3.4.4 Actos Administrativos 22
3.5 PERSONAL 22
3.5.1 Personal administrativo 22
3.5.2 Personal operativo 23
3.6 COMITÉS TÉCNICOS 23
3.6.1 Comité número 01, 10 de julio de 2023 23
3.6.2 Estado del tiempo 24
Índice de precipitaciones 24
3.6.3 Estado del clima aguazul. 25
3.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL PERIODO 26

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.8 Evidencia fotográfica. 27
4 ANEXOS 28
4.1 Acta de inicio del contrato de interventoría. 28
4.2 Pólizas de garantía del contrato de interventoría. 28
4.3 Planillas de seguridad social del personal de interventoría. 28
4.4 Acta de inicio del contrato de obra. 28
4.5 Acta visitas técnicas. 28
4.6 Correspondencia enviada y recibida. 28

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad presentar el control, la revisión y supervisión del proyecto contemplado como:

El contrato de obra pública, No. **CAS-OAJ-LP-001-2023 ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE**, firmado entre **EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** con **NIT.** 901.691.000-2 representado legalmente por **YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ,** identificado con cedula de ciudadanía número **1.118.561.079 de Yopal Casanare**

Debido a la complejidad del contrato anteriormente mencionado, y a la necesidad de contar con personal técnico especializado para realizar su seguimiento, se hizo necesario realizar el proceso de contratación de una interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica, para realizar el seguimiento y control a dichos contratos, de esta forma se realiza el proceso de contratación al contrato de interventoría **No. 1391 de 2023**, celebrado entre **EL DEPARTAMENTO DE CASANARE y LA UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA** con **NIT**. 901720956-3 representado legalmente por **WILIAN ALEXY GUADRÓN VIVAS** con cedula de ciudadanía número **1.080.936.164 de Timaná Huila**, tiene como objeto: "**REALIZAR INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE** ".

El día 10 de julio de 2023 se firma el acta de inicio del contrato de interventoría **No. 1391 de 2023** y de acuerdo con el plazo contractual la fecha de finalización será el 09 de diciembre del 2023.

En el marco de la fase preliminar para dar inicio al contrato de obra, se llevaron a cabo reuniones con el objetivo de verificar la información disponible del proyecto, realizar reconocimiento de la zona objeto de desarrollo. Como resultado de estas actividades iniciales, la firma consultora encargada de la interventoría presenta

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

este informe a la entidad contratante para su análisis y aprobación, correspondiente a la fase pre-constructiva.

La interventoría se basa en los principios básicos de control, asesoramiento e informe, con el fin de garantizar la calidad del proyecto contratado en términos de costos y plazos, y cumplir con los requisitos ambientales, legales y contractuales. En este informe se realizó la verificación de los aspectos necesarios para el inicio de las actividades, de acuerdo con las especificaciones de los estudios y planos de diseño del proyecto. Además, se busca asegurar que se cumpla todas las condiciones previas para el inicio de la construcción de manera adecuada.

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 NECESIDAD Y FINALIDAD DEL PROYECTO

La economía del Departamento del Casanare se sustenta en actividades agropecuarias, servicios e industria, siendo las actividades agrícolas las principales fuentes de empleo y generación de ingresos. La actividad arrocera por su parte no solo nutre las líneas de la economía departamental, sino que es la mayor generadora de mano de obra, así como demanda de insumos y repuestos agrícolas que genera una actividad comercial e industrial que sustenta aún más la importancia socioeconómica de estos cultivos. En la actualidad y previa la aprobación el proyecto se tiene como cofinanciadores al Departamento de Casanare, FEDEARROZ, Municipio de Aguazul y UNITROPICO, por lo que, en el proceso de ejecución de los acuerdos institucionales, se ha acordado la adecuación y dotación de las instalaciones de la granja La Corocora ubicada en el Municipio de Aguazul, lugar que será establecido como centro de investigación y cuyos procesos están en marcha.

Teniendo en cuenta la importancia del cultivo para el departamento, existe gran interés por parte de la Gobernación de Casanare, FEDEARROZ, de la Alcaldía de Aguazul y de las instituciones universitarias del departamento en apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y los programas de extensión a través de la Federación Nacional de Arroceros, mediante la Adecuación y puesta en marcha del Centro de Investigación para el Arroz

en el municipio de Aguazul (Casanare). Por lo anterior, se realizó el proyecto denominado ASISTENCIA OBTENER VARIEDADES DE ARROZ MÁS PRODUCTIVAS, TOLERANTES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LOS PROBLEMAS DE SANIDAD AGUAZUL CASANARE, ORINOQUIA el cual se enmarca en el plan de desarrollo 2013-2015 ya que contribuye al logro de metas establecidas en el PROGRAMA 2.1.1: GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, PISCÍCOLAS Y FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, SUB PROGRAMA Fortalecimiento Integral de las Cadenas Productivas de Casanare, cuyo alcance pretende por la promoción de los encadenamientos y la generación de valor agregado en la producción agropecuaria del Departamento, aplicando procesos de CTeI, buenas prácticas para la productividad y competitividad, asistencia técnica directa rural y acciones complementarias dentro de una estrategia de articulación

Nacional, Departamental y Municipal, promoviendo el acceso a la propiedad, legalización y adecuación de tierras y otros servicios de asistencia social rural, cimentadas en una organización social sólida que genere empresa y consolide las cadenas productivas; teniendo por objetivo, el promocionar y fortalecer la producción agropecuaria del Departamento y acceso a mercados para incrementar la productividad y por ende los niveles de competitividad. De igual manera el proyecto se incluyó en el Plan de Desarrollo 2016-2019, Casanare con Paso Firme, dicho proyecto se estableció como meta de producto, implementar el proyecto de ciencia, tecnología e innovación denominado ASISTENCIA OBTENER VARIEDADES DE ARROZ MÁS PRODUCTIVAS, TOLERANTES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LOS PROBLEMAS DE SANIDAD AGUAZUL CASANARE, ORINOQUIA. Igualmente, el proyecto se integra al Plan de Desarrollo 2020 - 2023, "Es el Tiempo de Casanare, productivo, Equitativo y Sostenible", en el SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL PROGRAMA: es el tiempo de Casanare en ciencia, tecnología e innovación. subprograma: Casanare se prepara para la consolidación del ecosistema de ctel. meta de producto: promover la generación, divulgación, transferencia y uso del conocimiento.

En consecuencia, el proceso cuyo objeto es **ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

la entidad debe adelantar el respectivo proceso de interventoría para vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado con el fin de proteger la moralidad administrativa prevenir la ocurrencia de actos de corrupción X de tutelar la transparencia de la actividad contractual. La normatividad antes transcrita, así como la especialidad del proyecto y justifican la necesidad de contratar la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Conforme a las previsiones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, en especial en cuanto a la obligación que le asiste a las entidades

territoriales, de realizar el seguimiento periódico y verificación al cumplimiento del objeto contractual y las demás normas que las modifiquen, complementen y adicionen la Supervisión del contrato de interventoría que resulte del presente proceso estará a cargo del Secretario de desarrollo económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Departamento, o quien este designe, quien deberá dar aplicación a lo dispuesto en las normas en cita y en especial a la Resolución No. 256 de 2004,en virtud de la cual se adopta el manual de interventoría para el Departamento de Casanare.

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la granja "LA COROCORA", en el area urbana de municipio de Aguazul, departamento de Casanare, distancia de la capital departamental, 27 Km y de Bogota 361 Km. Este municipio se destaca como la capital arrocera del departamento, cuenta con 36.915 habitantes de los cuales 26.517 residen en el casco urbano, según Dane.

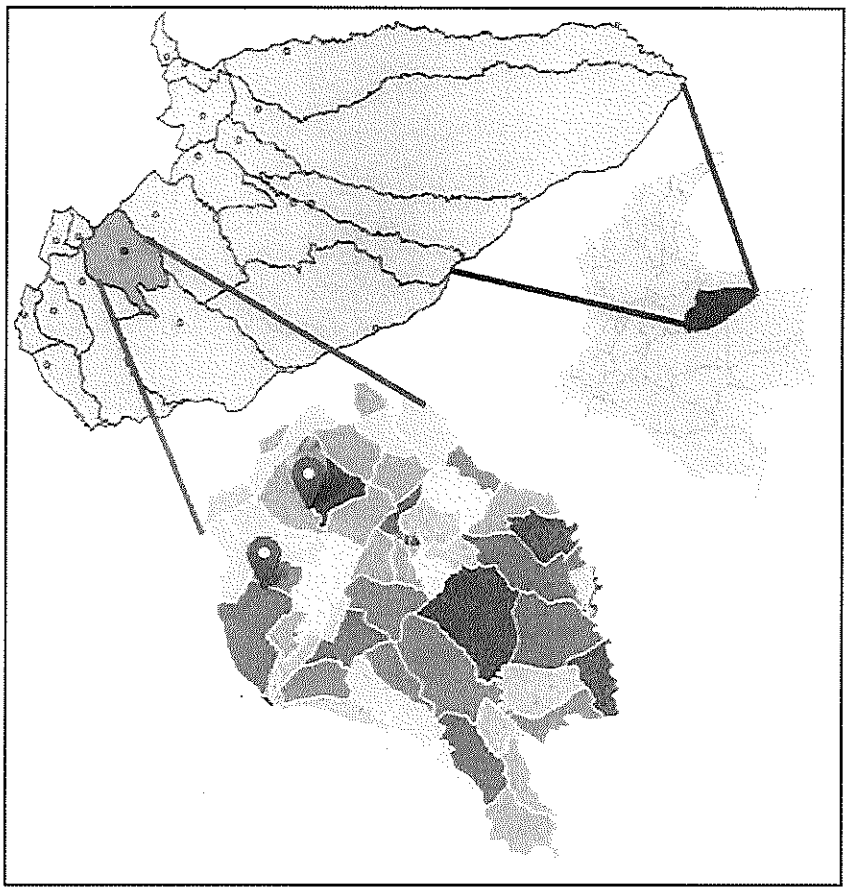


Ilustración 2.1 Ubicación Del Departamento De Casanare Y El Municipio De Aguazul En El Territorio Nacional
Fuente: Elaboración propia

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

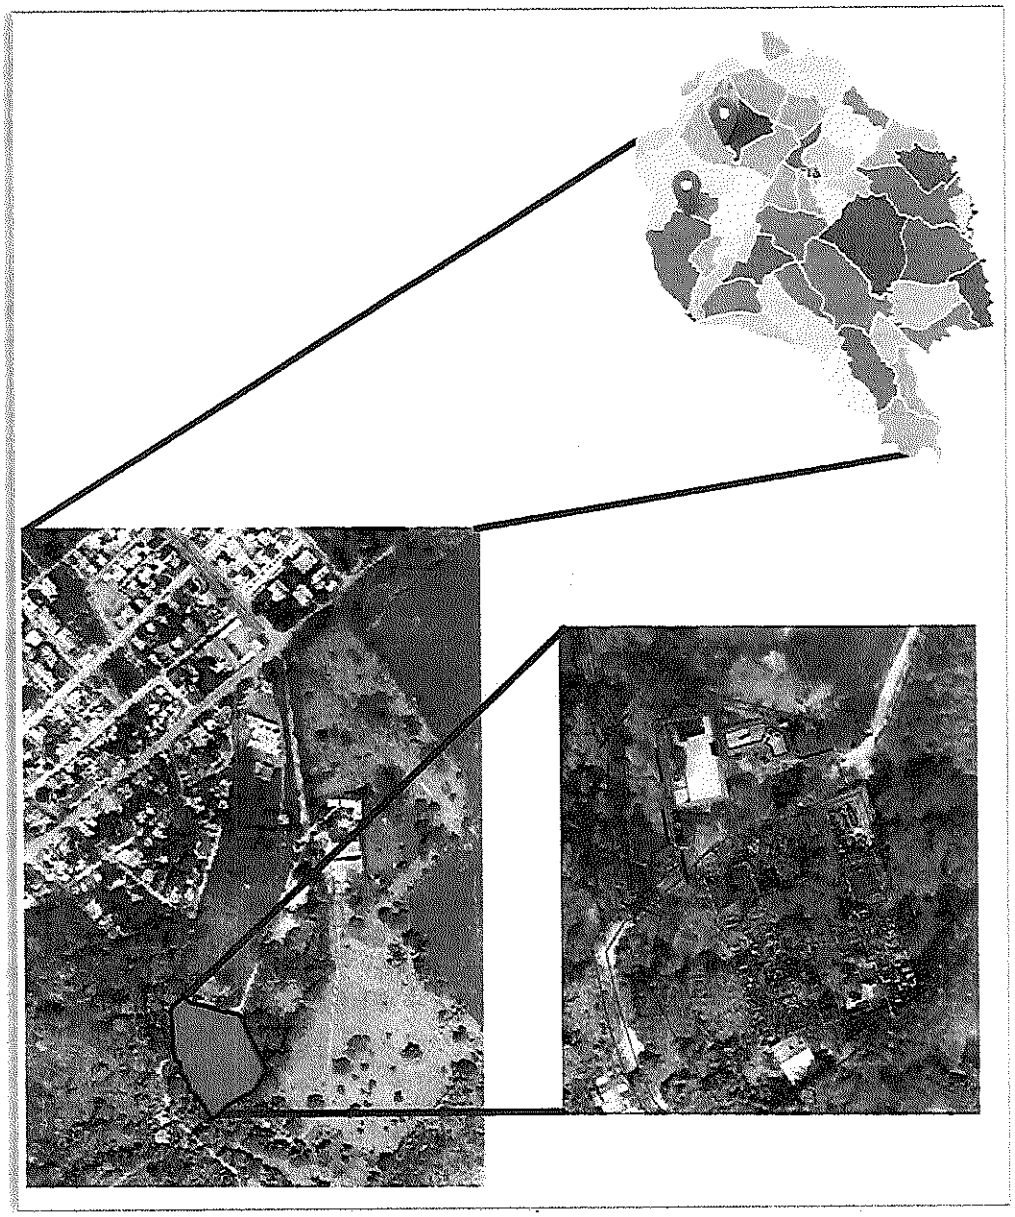


Ilustración 2.2 Ubicación Del Proyecto En El Municipio De Aguazul – Casanare
Fuente: Elaboración propia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1391 DE 2023
Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

El proyecto del presente informe el cual tiene como objeto ***"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".***

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La economía del departamento del Casanare se sustenta en actividades agropecuarias, servicios e industrias, siendo las actividades agrícolas las principales fuentes de empleo y generación de ingresos. La actividad arrocera por su parte no solo nutre las líneas de la economía departamental, sino que es la mayor generadora de mano de obra, así como demanda de insumo y repuestos agrícolas que genera una actividad comercial e industrial que sustenta aún más la importancia socioeconómica de estos cultivos.

En la actualidad y previa la aprobación el proyecto se tiene como cofinanciadores al departamento de Casanare, FEDEARROZ, municipio de aguazul y UNITRÓPICO, por lo que, en el proceso de ejecución de los acuerdos institucionales, se ha acordado la adecuación de y dotación de las instalaciones de la granja La corocora ubicada en el municipio de aguazul, lugar que será establecido como centro de investigación y cuyos procesos están en marcha.

Asimismo, existe gran interés por parte de la gobernación de Casanare, FEDEARROZ, la alcaldía de aguazul y las instituciones universitarias del departamento en apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y los programas de extensión a través de la federación nacional de arroceros, mediante la adecuación y puesta en marcha del centro de investigación para le arroz en el municipio de aguazul (Casanare), esto teniendo en cuanta que las crisis agrícolas se han generado a partir de la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas, de las perturbaciones de la economía y ahora del efecto del cambio climático mundial, que ha dado paso a una nueva era de desafíos y oportunidades para la agricultura y la gestión de recursos naturales, por lo que hoy en día uno de los principales desafíos lo constituye el cambio climático que ejerce presión sobre la genética de las plantas y la capacidad productiva de las tierras agrícolas afectando el crecimiento económico, agrícola de las regiones.

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

Por lo anterior, se realizó el proyecto denominado "asistencia obtener variedades de arroz más productivas, tolerantes a los efectos del cambio climático y a los problemas de sanidad aguazul Casanare, y la Orinoquia" el cual se enmarca en plan de desarrollo 2013-2015 ya que contribuye al logro de metas establecidas en el programa 2.1.1 gestión e implementación de proyectos productivos, agropecuarios, piscícolas y forestales del departamento de Casanare.

Dicho proyecto de investigación fue aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) fondo de ciencia, tecnología e innovación y tiene como objetivo promover la colaboración interinstitucional entere las partes, sumando esfuerzos y recursos humanos y administrativos para el desarrollo de investigación en el cultivo de arroz que permita obtener variedades de arroz más productivas, tolerantes a los efectos del cambio climático y a los problemas de sanidad, mediante los modelos de investigación agrícola y transferencia de tecnología, además desarrollar una tecnología de producción arrocera de acuerdo con las condiciones agroecológicas del departamento de Casanare.

Por tanto, el 21 de Junio de 2023 se firma el contrato de consultoría (interventoría) N° 1391 entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE cuyo objeto es "**REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** Por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. (124´229.716,00), con un plazo inicial de ejecución de cinco (5) meses.

Esto con el fin de realizar el seguimiento al Contrato de Obra No. 0826 de marzo 10 del año 2023, que será ejecutado por la UNIÓN TEMPORAL GRANJA LA COROCORA, representado legalmente por YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ.

En cuanto al alcance del contrato de interventoría técnica incluye actividades, administrativas, técnicas, financiera, contable, jurídica, y ambiental al contrato de obra antes mencionado.

El Contrato de Obra No. 0826 de marzo 10 del año 2023, fue suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE CASANARE** y la UNIÓN TEMPORAL GRANJA COROCORA, R/L YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ, EL CUAL TIENE POR

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

OBJETO **"ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.";** por valor de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/cte. **($1.718.776.824,00).**

El predio de la granja La Corocora se identifica mediante matricula inmobiliaria No. 470 – 39194 y cedula catastral 000000010462000, se encuentra localizado en el barrio Porvenir, el cual pertenece al área urbana del Municipio de Aguazul

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3 ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1.1 Informe contractual – ficha técnica del contrato de interventoría

Tabla 3.1 Descripción del contrato de interventoría 1391 de 2023

DATOS GENERALES DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA
NIT	901720956-3
REPRESENTANTE LEGAL	Wilian Alexy Gualdrón Vivas
DATOS DEL INFORME	
MES Y AÑO DEL INFORME	Agosto 2023
NOMBRE DEL INFORME	Informe mensual número 1
CONSECUTIVO DEL INFORME	01
PERIODO DEL INFORME	10/julio/2023 hasta el 09 de agosto de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	09/agosto/2023
TABLA DE CONTENIDO	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Interventoría.
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Gobernación de Casanare
SUPERVISORES DEL CONTRATO	ALEXANDER BARRERA GIRÓN **Director Técnico De Desarrollo Rural** ARQ: LUIS EDISON CABALLERO **Apoyo a la Supervisión**
NÚMERO DE CONTRATO	1391 de 2023
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	10 de julio del 2023
VALOR FISCAL	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. (124´229.716,00).
PORCENTAJE ANTICIPO	40%
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Granja la cororcora - Aguazul Casanare.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIACIÓN	10/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	09/12/2023

Fuente: Elaboración propia

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con las garantías exigidas por el departamento de Casanare, en el contrato de consultoría número 1391 de 2023, se suscribe con la compañía **Seguros del estado S.A**, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual así:

3.2.1 Póliza Según Minuta De Interventoría Anexo: 0

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
TIPO PÓLIZA	**N° PÓLIZAS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA No: 605-47-994000102177 ANEXO: 0				
Cumplimiento del contrato	605-47-994000102177	21/06/2023	21/03/2024	$ 12,422,971.60
Anticipos	605-47-994000102177	21/06/2023	21/03/2024	$ 49,691,886.40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	605-47-994000102177	21/06/2023	21/11/2026	$ 6,211,485.80
Calidad del servicio	605-47-994000102177	21/11/2023	21/11/2028	$ 12,422,971.60
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PÓLIZA No: 605-74-994000022277 ANEXO: 0				
Predios, labores y operaciones	605-74-994000022277	21/06/2023	21/11/2023	$ 232,000,000.00

Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Póliza Según Minuta De Interventoría Anexo: 1 (Actualización de acuerdo con acta de inicio)

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
TIPO PÓLIZA	**N° PÓLIZAS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA No: 605-47-994000102177 ANEXO: 1				
Cumplimiento del contrato	605-47-994000102177	10/07/2023	10/04/2024	$ 12,422,971.60
Anticipos	605-47-994000102177	10/07/2023	10/04/2024	$ 49,691,886.40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	605-47-994000102177	10/07/2023	10/12/2026	$ 6,211,485.80
Calidad del servicio	605-47-994000102177	10/12/2023	10/12/2028	$ 12,422,971.60
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PÓLIZA No: 605-74-994000022277 ANEXO: 1				
Predios, labores y operaciones	605-74-994000022277	10/07/2023	10/12/2023	$ 232,000,000.00

Fuente: Elaboración propia

3.3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 0826 DE 2023

3.3.1 Informe contractual – ficha técnica del contrato de obra pública

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL GRANJA LA COROCORA
NIT	901.691.000-2
REPRESENTANTE LEGAL	YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CASANARE
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA R/L. WILIAN ALEXY GUALDRÓN VIVAS
NÚMERO DE CONTRATO	0826 DE 2023
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	02/Agosto/2023
VALOR FISCAL	MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte. **($1.718.776.824,00).**
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	AGUAZUL CASANARE GRANJA LA COROCORA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cuatro meses (4)
FECHA DE INICIACIÓN	02 de agosto 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	01 de diciembre del 2023

Tabla 3.2 Descripción del contrato de obra pública 0826 de 2023
Fuente: Elaboración propia

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

De acuerdo con las garantías exigidas por el departamento de Casanare, en el contrato de obra pública número 0826 de 2023, se suscribe con la compañía **aseguradora solidaria de Colombia**, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual así:

3.4.1 Póliza Según Minuta Del contrato de obra pública Anexo: 0

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
TIPO PÓLIZA	**N° PÓLIZAS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA No: 605-47-994000100880 ANEXO: 0				
Cumplimiento del contrato	605-47-994000100880	10/03/2023	10/11/2023	$ 171,877,682.40
Anticipos	605-47-994000100880	10/03/2023	10/11/2023	$ 687,510,729.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	605-47-994000100880	10/03/2023	10/07/2026	$ 85,938,841.20
Estabilidad y calidad de la obra	605-47-994000100880	5 años después de entrega final de obra		$ 171,877,682.40
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PÓLIZA No: 605-74-994000021856 ANEXO: 0				
Predios, labores y operaciones	605-74-994000021856	10/03/2023	10/08/2023	$ 464,000,000.00

Fuente: Elaboración propia.

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.4.2 Póliza Según Minuta Del contrato de obra pública Anexo: 1

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
TIPO PÓLIZA	**N° PÓLIZAS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA No: 605-47-994000100880 ANEXO: 1				
Cumplimiento del contrato	605-47-994000100880	10/03/2023	10/11/2023	$ 171,877,682.40
Anticipos	605-47-994000100880	10/03/2023	10/11/2023	$ 687,510,729.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	605-47-994000100880	10/03/2023	10/07/2026	$ 85,938,841.20
Estabilidad y calidad de la obra	605-47-994000100880	5 años después de entrega final de obra		$ 171,877,682.40
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PÓLIZA No: 605-74-994000021856 ANEXO: 1				
Predios, labores y operaciones	605-74-994000021856	10/03/2023	10/08/2023	$ 464,000,000.00

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.4.3 Póliza Según Minuta Del contrato de obra pública Anexo: 2 (Actualización de acuerdo con acta de inicio)

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
TIPO PÓLIZA	**N° PÓLIZAS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA No: 605-47-994000100880 ANEXO: 2				
Cumplimiento del contrato	605-47-994000100880	02/08/2023	02/04/2024	$ 171,877,682.40
Anticipos	605-47-994000100880	02/08/2023	02/11/2024	$ 687,510,729.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	605-47-994000100880	02/08/2023	02/12/2026	$ 85,938,841.20
Estabilidad y calidad de la obra	605-47-994000100880	5 años después de entrega final de obra		$ 171,877,682.40
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PÓLIZA No: 605-74-994000021856 ANEXO: 2				
Predios, labores y operaciones	605-74-994000021856	02/08/2023	02/12/2023	$ 464,000,000.00

3.4.4 Actos Administrativos

Durante la ejecución del contrato de interventoría con corte en la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Fecha	Acto administrativo	Motivo del acto administrativo	Suscrita por
10/07/2023	Suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría número 1391 DE 2023	Inicio de ejecución de la interventoría	Unión temporal inter corocora R/L Wilian Alexy Gualdrón Vivas Interventor Alexander Barrera Girón Supervisor.

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos

Fecha	Acto administrativo	Motivo del acto administrativo	Suscrita por
02/08/2023	Suscripción del acta de inicio del contrato de obra número 0826 DE 2023	Inicio de ejecución del contrato de obra.	Unión temporal granja la corocora. RL/ Yury Alejandra Contreras Ruiz Contratista. Unión temporal inter corocora R/L Wilian Alexy Gualdrón Vivas Interventoria

3.5 PERSONAL

3.5.1 Personal administrativo

El personal profesional y administrativo que participa en el proyecto a partir del periodo del presente informe es el mismo que se presenta en el informe pre-constructivo y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo de la interventoría y las planillas de pago de cada uno de ellos a la fecha del presente informe.

Nombre	Tipo de contrato / Dedicación	Cargo	Fecha de ingreso	Retiro	EPS	AFP	ARL
EDWAR ALEXANDER BARRETO	Nómina 20%	Director de interventoría	10/07/23	Activo	Sanitas	Colpensiones	Positiva

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

Nombre	Tipo de contrato / Dedicación	Cargo	Fecha de ingreso	Retiro	EPS	AFP	ARL
GUTIÉRREZ							
LUIS ALEJANDRO PEÑA ÁLVAREZ	Nómina 100%	Residente de interventoría	16/07/23	Activo	Caja-Copi	Porvenir	Positiva
YEFFERSON BELISARIO SALAZAR SUAREZ	12.5%	Ingeniero Eléctrico	29/07/23	Activo	Sanitas	Colpensiones	Positiva
DAYAN CAMILO NOCUA CARDOZO	12.5%	Ingeniero Ambiental y Sanitario	29/07/23	Activo	Nueva E.P.S	Porvenir	Positiva
JENNIFER GUERRERO MONCAYO	12.5%	Residente HSEQ	29/07/23	Activo	Nueva E.P.S	Colfondos	Positiva
JULIANA CASTILLO PANEZZO	50%	Profesional en el área de derecho	24/07/23	Activo	SANITAS	Positiva	Positiva
MARÍA NINFA PERILLA MENDOZA	50%	Profesional Administrativo o contador	29/07/23	Activo	Nueva E.P.S	Porvenir	Positiva

3.5.2 Personal operativo

Debido a que no se ha iniciado actividades de obra, el personal operativo, a la fecha del presente informe no ha sido vinculado.

3.6 COMITÉS TÉCNICOS

3.6.1 Comité número 01, 10 de julio de 2023

Asistentes	Cargo	Fecha	Lugar	Tema
Wilian Alexy Gualdrón Vivas	Representante legal de la Unión temporal inter cad tilodiran Representante legal Interventoría.	10/07/2023	Secretaria de agricultura.	1. Dar acta de inicio al contrato 1931 del 2023 de la interventoría. 2. Otro si modificatoria al contrato 1391 de
Luis Edison Caballero	Apoyo a la supervisión.			

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921


Asistentes	Cargo	Fecha	Lugar	Tema
René Rodríguez Silva	Coordinador del proyecto.			2023

3.6.2 Estado del tiempo.

En el territorio nacional se destacaron las lluvias entre las categorías normal y por debajo de esta condición.

Las categorías por encima y muy por encima de los valores medios de lo normal se registraron en el centro del Caribe continental, el nororiente de la región Andina y zonas del piedemonte llanero.

Índice de precipitaciones

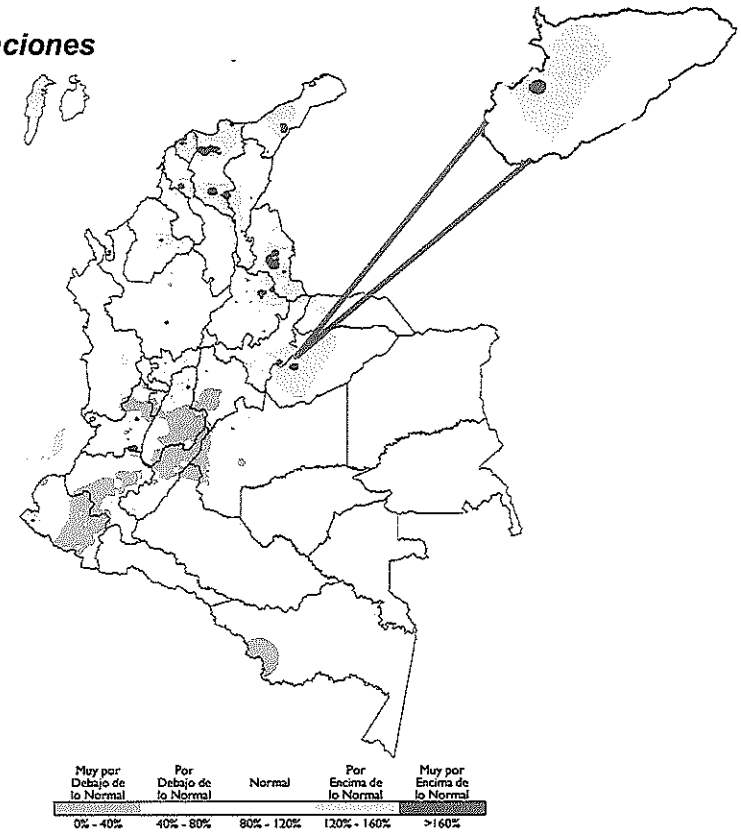

FUENTE: Ideam.Gov.Co

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.6.3 Estado del clima aguazul.

Julio 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

FUENTE: Ideam.Gov.Co

Agosto 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

FUENTE: Ideam.Gov.Co

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL PERIODO

Durante la ejecución de las actividades el contratista, de manera autónoma realizó pruebas hidrostáticas y una inspección del estado eléctrico en la construcción existente, para preveer inconvenientes futuros, esto a razón de la visita de inspección realizada por obra e interventoría en la que se vio necesario realizar dichas pruebas.

La prueba hidrostática evidencio fugas en el registro de agua potable del baño de mujeres, por otro lado, el especialista eléctrico encontró daños en las lámparas y red eléctrica del edificio existente.


En cuanto a la ejecución del contrato de obra No 0826 de 2023 se encuentra que tiene avance en la verificación de cantidades y del balance presupuestal, esto entendiendo las condiciones reales respecto a los estudios y diseños formulados el año anterior.

Mediante radicado 07843 del día 26 del mes julio se formalizó la entrega del informe preconstructivo, para la respectiva revisión y aprobación por parte de la supervisión, esto de acuerdo con las actividades contractuales de esta interventoría.

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

3.8 Evidencia fotográfica.

Se anexa evidencia fotográfica de las pruebas hidrostáticas y eléctricas realizadas.

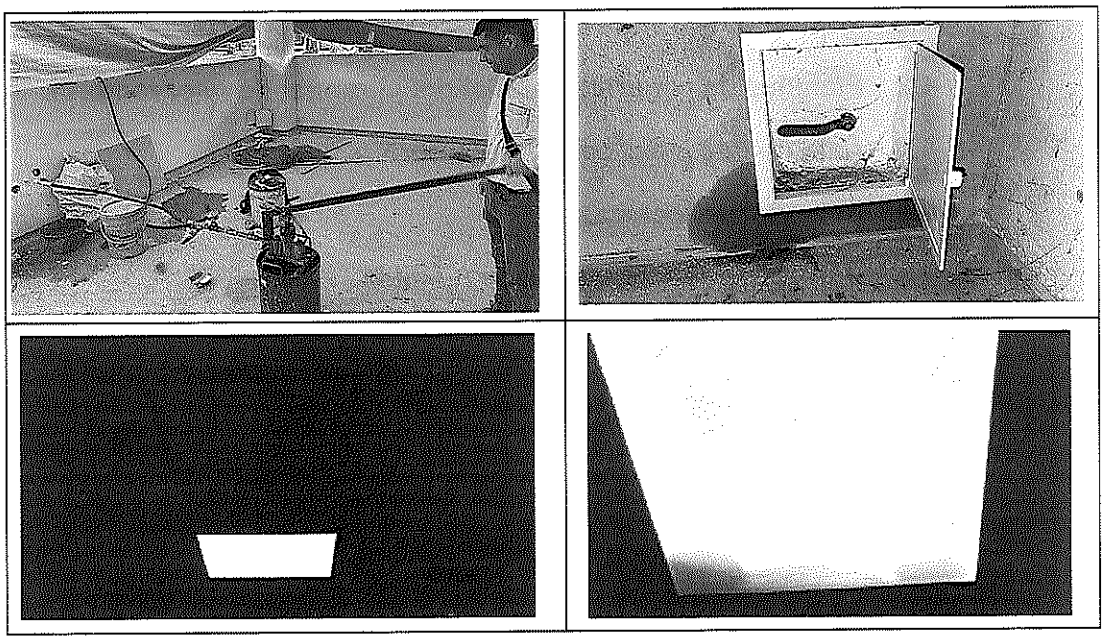

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1391 DE 2023
Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

4 ANEXOS

4.1 Acta de inicio del contrato de interventoría.

4.2 Pólizas de garantía del contrato de interventoría.

4.3 Planillas de seguridad social del personal de interventoría.

4.4 Acta de inicio del contrato de obra.

4.5 Acta visitas técnicas.

4.6 Correspondencia enviada y recibida.

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454700269	9454700269	E	2023/08/14	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,642,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$3,718,670	$595,200			$3,718,670	$465,000			$3,718,670	$148,900			$3,718,670	$246,700		$3,718,670	$186,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRITVO (2 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$193,334	$7,800			$193,334	$1,200		$193,334	$9,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$193,334	$7,800			$193,334	$1,200		$193,334	$9,900
1	CC	1094889687	CASTILLO JULIANA	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$14,500	CCF69	3	$116,000	$4,700	14-23	3	$116,000	$700	3	$116,000	$5,900
2	CC	47438376	PERILLA MARIA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$500	2	$77,334	$4,000
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)						$3,525,336	$564,200			$3,525,336	$440,800			$3,525,336	$141,100			$3,525,336	$245,500		$3,525,336	$176,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)						$3,525,336	$564,200			$3,525,336	$440,800			$3,525,336	$141,100			$3,525,336	$245,500		$3,525,336	$176,800
3	CC	79799614	BARRETO EDWAR	230301	17	$793,334	$127,000	EPS005	17	$793,334	$99,200	CCF69	17	$793,334	$31,800	14-23	17	$793,334	$55,300	17	$793,334	$39,800
4	CC	1081701157	GUERRERO YENNIFER	231001	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
5	CC	1118558350	NOCUA DAYAN	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
6	CC	1122126489	PEÑA LUIS	25-14	15	$2,500,000	$400,000	CCFC55	15	$2,500,000	$312,500	CCF69	15	$2,500,000	$100,000	14-23	15	$2,500,000	$174,000	15	$2,500,000	$125,000
7	CC	1118531535	SALAZAR YEFFERSON	230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
Total Afiliados(7)						$3,718,670	$595,200			$3,718,670	$465,000			$3,718,670	$148,900			$3,718,670	$246,700		$3,718,670	$186,700

2023/09/18 05:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454700269	9454700269	E	2023/08/14	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,642,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$595,200	$0	$0	$595,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$12,400	$0	$0	$12,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$418,600	$0	$0	$418,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$164,200	$0	$0	$164,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$246,700	$0	$0	$246,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$246,700	$0	$0	$246,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$148,900	$0	$0	$148,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$148,900	$0	$0	$148,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$465,000	$0	$0	$465,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$312,500	$0	$0	$312,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$19,400	$0	$0	$19,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,700	$0	$0	$9,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$123,400	$0	$0	$123,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$112,000	$0	$0	$112,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$112,000	$0	$0	$112,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$74,700	$0	$0	$74,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$74,700	$0	$0	$74,700
TOTAL				7	$1,642,500	$0	$0	$1,642,500

2023/09/18 05:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159466111	9456264659	E	2023/09/13	2023/09/14	BANCOLOMBIA	1	$2,638,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal Principal (7 Afiliados)						$5,821,335	$981,600			$5,821,335	$728,000			$5,821,335	$233,000			$5,821,335	$400,500		$5,821,335	$291,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRTIVO (2 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,800			$77,334	$3,200			$77,334	$600		$77,334	$4,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,800			$77,334	$3,200			$77,334	$600		$77,334	$4,000
1	CC	1094889687	CASTILLO JULIANA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$4,900	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$38,667	$2,000
2	CC	47438376	PERILLA MARIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$38,667	$2,000
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)						$5,744,001	$969,200			$5,744,001	$718,200			$5,744,001	$229,800			$5,744,001	$399,900		$5,744,001	$287,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)						$5,744,001	$969,200			$5,744,001	$718,200			$5,744,001	$229,800			$5,744,001	$399,900		$5,744,001	$287,400
3	CC	79799614	BARRETO EDWAR	230301	6	$280,000	$44,800	EPS005	6	$280,000	$35,000	CCF69	6	$280,000	$11,200	14-23	6	$280,000	$19,500	6	$280,000	$14,000
4	CC	1081701117	GUERRERO YENNIFER	231001	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$19,400	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800
5	CC	1118558350	NOCUA DAYAN	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$19,400	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800
6	CC	1122126489	PEÑA LUIS	25-14	30	$5,000,000	$850,000	CCFC55	30	$5,000,000	$625,000	CCF69	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$5,000,000	$250,000
7	CC	1118531535	SALAZAR YEFFERSON	230301	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$19,400	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800
Total		**Afiliados(7)**				$5,821,335	$981,600			$5,821,335	$728,000			$5,821,335	$233,000			$5,821,335	$400,500		$5,821,335	$291,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159466111	9456264659	E	2023/09/13	2023/09/14	BANCOLOMBIA	1	$2,638,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$981,600	$1,400	$0	$983,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$24,800	$100	$0	$24,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$856,200	$1,100	$0	$857,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$100,600	$200	$0	$100,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$400,500	$500	$0	$401,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$400,500	$500	$0	$401,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$233,000	$300	$0	$233,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$233,000	$300	$0	$233,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$728,000	$900	$0	$728,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$625,000	$700	$0	$625,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$43,700	$100	$0	$43,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$59,300	$100	$0	$59,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$174,900	$200	$0	$175,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$174,900	$200	$0	$175,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$116,500	$200	$0	$116,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$116,500	$200	$0	$116,700
TOTAL				7	$2,634,500	$3,500	$0	$2,638,000

2023/09/14 08:50 AM

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052770408

PÓLIZA No: 605 - 47 - 994000100880 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2023	03	08	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.691.000-2**

DIRECCIÓN: CALLE 40 NO. 42-45 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3156214265

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/08/2023	02/04/2024	171,877,682.40
ANTICIPO	02/08/2023	02/04/2024	687,510,729.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/08/2023	02/12/2026	85,938,841.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		171,877,682.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900903344 - J R INGENIEROS & ASOCIADOS SAS - PART: 70.00%
NIT 844001593 - FERREAGUAS & ASOCIADOS S A S - PART: 25.00%
NIT 900446925 - APP CONTROL INGENIERIA SAS - PART: 5.00%

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 02/08/2023.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,117,204,935.60	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605277040

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8257A070DF57E58

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000100880** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.691.000-2**

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.0826 DE 2023-03-10, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENETICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052770614

PÓLIZA No: 605 -74 - 994000021856 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGE: 605 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
03	08	2023		10	08	2023	23:59		02	12	2023	23:59		114	03	08	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	10	08	2023	23:59		02	12	2023	23:59		114

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.691.000-2

DIRECCIÓN: CALLE 40 NO. 42-45 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3156214265

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.691.000-2

DIRECCIÓN: CALLE 40 NO. 42-45 CIUDAD: **YOPAL, CASANARE** TELÉFONO: 3156214265

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA NIT : 901691000

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: AGUAZUL

DIRECCION: GRANJA LA COROCORA AGUAZUL

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 464,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

BENEFICIARIOS
NIT 901691000 - UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA

ASEGURADO/BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT. 892.099.216-6

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 02/08/2023.

VIGENCIA TOTAL DESDE 02/08/2023 HASTA 02/12/2023

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***464,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605277061

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

EROJASPATRI 0

C8D8257A070DF57E56 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000021856** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.691.000-2**

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.691.000-2**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.0826 DE 2023-03-10, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,RELACIONADO CON ADECUACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENETICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000021856** ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 3

TOMADOR: **UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA** IDENTIFICACION: **901.691.000-2**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	UNION TEMPORAL GRANJA LA COR	901691000-2	GRANJA LA COROCORA AGUAZUL	AGUAZUL	464,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

MEMORANDO

Yopal, 10 de Julio del 2023.

PARA: ALEXANDER BARRERA GIRÓN DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL

DE: WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.

Me permito comunicarle que a partir de la fecha ha sido designado(a) como Supervisor(a) del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1391 del Veintiuno(21) de Junio de 2023, cuyo Objeto es "REALIZAR INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

Para tal efecto debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Resolución No. 0256 de 2004, y Decreto 0228 del 28 de julio de 2017 "Por medio del cual se define y se delega el ejercicio de funciones en materia contractual" proferida por el Gobernador de Casanare, y normas que lo modifiquen o complementen.

Para el cumplimiento de las funciones asignadas, le solicito ponerse en contacto con el contratista WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1080936134 de TIMANA, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL INTER COROCORA con NIT 901720956-3, número de celular 3114981921.

Atentamente,

WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA

Elaboró: LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-009-2023 1391 de 2023-06-21 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE CONSULTORÍA **No.** SECOP II CAS-OAJ-CMA-009-2023 - 1391

FECHA DEL CONTRATO: 2023-06-21

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER COROCORA

FECHA DE INICIO: 2023-07-10

FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-12-09

APORTE ENTIDAD: $124.229.716,00 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: $0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: $124.229.716,00 M.L.C.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO: Cinco (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Diez(10) días del mes de Julio de 2023, se reunieron ALEXANDER BARRERA GIRÓN, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION DEL CONTRATO, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1080936134 de TIMANA, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL INTER COROCORA con NIT 901720956-3 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que UNION TEMPORAL INTER COROCORA, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.
2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Cinco (5) MESES.
3. Que UNION TEMPORAL INTER COROCORA, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: Se entregará un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato previa suscripción del acta de inicio. El manejo de los recursos entregados al contratista

Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-009-2023 1391 de 2023-06-21 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, deberán reintegrarse a la entidad. El valor del Contrato se pagará mediante actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato con amortización del anticipo, suscritas con el supervisor del contrato y se entregará un pago final correspondiente al saldo restante del valor facturado que no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato previa suscripción del acta de liquidación. Para los pagos que la gobernación haga al contratista, éstos se harán previo el cumplimiento de los siguientes requisitos que el Contratista debe acreditar: • La entrega al supervisor de un informe mensual en donde se indicarán las actividades desarrolladas durante el mes. • La obtención de certificación de cumplimiento de la gestión por parte del supervisor. • La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones para fiscales (SENA, ICBF, caja de Compensación familiar), a que haya lugar. • La radicación de la factura o cuenta de cobro, con los soportes legales.

OBSERVACIONES:

ALEXANDER BARRERA GIRÓN
Supervisor(a)

WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA
Contratista.

Revisó:

Elaboró: LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052794416

PÓLIZA No: 605 - 47 - 994000101658 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	05	2023	19	05	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: . **UNION TEMPORAL INTER COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT

DIRECCIÓN: CARRERA 29 17-59 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3115658639

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	25/05/2023	25/09/2023	12,422,971.60

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 901497998 - FENIX ECOSOLUCIONES S.A.S. - PART: 75.00%
CC 79799614 - BARRETO GUTIERREZ, EDWAR ALEXANDER - PART: 25.00%

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CAS-OAJ-CMA-009-2023, RELACIONADA CON REALIZAR INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENETICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****12,422,971.60	$ **********25,000	$****11,000.00	$ ********6,840	$ **********42,840

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000605279441

Wilson Gualdron

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8257A0806F87A5E

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE CAJA No. 605098558

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre juntos a ti !

AGENCIA YOPAL	TRANSACCIÓN Nro. 605128852	FECHA DE RECAUDO 19/05/2023	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR UNION TEMPORAL INTER COROCORA .			C.C o NIT 901497998
TOMADOR PÓLIZA UNION TEMPORAL INTER COROCORA .			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000101658 - NRO. ELECTRÓNICO 6052794416			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS			VALOR RECIBO $ 42,840.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000101658 - ANEXO 0 AGENCIA YOPAL, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901497998 UNION TEMPORAL INTER COROCORA . . VALOR PAGADO $ 42,840.00 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 605128852			

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052809586

PÓLIZA No: 605 -74 - 994000022277 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGE: 605 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
11 / 07 / 2023		21 / 11 / 2023 / 23:59	10 / 12 / 2023 / 23:59	19	11 / 07 / 2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS
	21 / 11 / 2023 / 23:59	10 / 12 / 2023 / 23:59	19

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: UNION TEMPORAL INTER COROCORA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.720.956-3

DIRECCIÓN: CL 45 11A 105 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3114981921

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

DIRECCIÓN: CARRERA 20 NO 8-02 YOPAL CASANARE CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3142471554

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT : 892099216

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: AGUAZUL

DIRECCION: GRANJA LA COROCORA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE CONSULTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/07/2023.

VIGENCIA TOTAL DESDE 10/07/2023 HASTA 10/12/2023

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-009-2023 No. INTERNO 1391 DE FECHA 21/06/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENETICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605280958

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

EROJASPATRI 0

C8D8257A070EF47F56

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAMO: 74 No POLIZA: 994000022277 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL INTER COROCORA** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.720.956-3

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000022277 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TOMADOR: UNION TEMPORAL INTER COROCORA IDENTIFICACION: 901.720.956-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DEPARTAMENTO DE CASANARE	892099216-6	GRANJA LA COROCORA	AGUAZUL	232,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052809578

PÓLIZA No: 605 - 47 - 994000102177 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2023	11	07	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: UNION TEMPORAL INTER COROCORA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.720.956-3

DIRECCIÓN: CL 45 11A 105 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3114991921

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/07/2023	10/04/2024	12,422,971.60
ANTICIPO	10/07/2023	10/04/2024	49,691,886.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/07/2023	10/12/2026	6,211,485.80
CALIDAD DEL SERVICIO	10/12/2023	10/12/2028	12,422,971.60

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901497998 - FENIX ECOSOLUCIONES S.A.S. - PART: 75.00%
CC 79799614 - BARRETO GUTIERREZ, EDWAR ALEXANDER - PART: 25.00%

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/07/2023.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****80,749,315.40	$ ****************0	$*********0.00	$ ************0	$ ****************0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605280957

Wilian Gualdron
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

C8D8257A070EF47F57

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor lenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2609 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000102177 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL INTER COROCORA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.720.956-3

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-009-2023 No. INTERNO 1391 DE FECHA 21/06/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENETICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CLIENTE

ANEXO 3

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1391 DE 2023
Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09			E	2023/09/13			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Empresa Principal (7 Afiliados)						$5,821,335	$981,600			$5,821,335	$728,000			$5,821,335	$233,000			$5,821,335	$400,500		$5,821,335	$291,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRTIVO (2 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,800			$77,334	$3,200			$77,334	$600		$77,334	$4,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$9,800			$77,334	$3,200			$77,334	$600		$77,334	$4,000
1	CC	1094889687	CASTILLO JULIANA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$4,900	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$38,667	$2,000
2	CC	47438376	PERILLA MARIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$38,667	$2,000
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)						$5,744,001	$969,200			$5,744,001	$718,200			$5,744,001	$229,800			$5,744,001	$399,900		$5,744,001	$287,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)						$5,744,001	$969,200			$5,744,001	$718,200			$5,744,001	$229,800			$5,744,001	$399,900		$5,744,001	$287,400
3	CC	79799614	BARRETO EDWAR	230301	6	$280,000	$44,800	EPS005	6	$280,000	$35,000	CCF69	6	$280,000	$11,200	14-23	6	$280,000	$19,500	6	$280,000	$14,000
4	CC	1081701117	GUERRERO YENNIFER	231001	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$19,400	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800
5	CC	1118558350	NOCUA DAYAN	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$19,400	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800
6	CC	1122126489	PEÑA LUIS	25-14	30	$5,000,000	$850,000	CCFC55	30	$5,000,000	$625,000	CCF69	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$5,000,000	$250,000
7	CC	1118531535	SALAZAR YEFFERSON	230301	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$19,400	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800
Total			**Afiliados(7)**			$5,821,335	$981,600			$5,821,335	$728,000			$5,821,335	$233,000			$5,821,335	$400,500		$5,821,335	$291,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09			E	2023/09/13			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$981,600	$0	$0	$981,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$24,800	$0	$0	$24,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$856,200	$0	$0	$856,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$100,600	$0	$0	$100,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$400,500	$0	$0	$400,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$400,500	$0	$0	$400,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$233,000	$0	$0	$233,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$233,000	$0	$0	$233,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$728,000	$0	$0	$728,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$43,700	$0	$0	$43,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$59,300	$0	$0	$59,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$174,900	$0	$0	$174,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$174,900	$0	$0	$174,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$116,500	$0	$0	$116,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$116,500	$0	$0	$116,500
TOTAL				7	$2,634,500	$0	$0	$2,634,500

2023/09/06 02:37 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454700269	9454700269	E	2023/08/14	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,642,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$3,718,670	$595,200			$3,718,670	$465,000			$3,718,670	$148,900			$3,718,670	$246,700		$3,718,670	$186,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRITIVO (2 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$193,334	$7,800			$193,334	$1,200		$193,334	$9,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$24,200			$193,334	$7,800			$193,334	$1,200		$193,334	$9,900
1	CC	1094889687	CASTILLO JULIANA	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$14,500	CCF69	3	$116,000	$4,700	14-23	3	$116,000	$700	3	$116,000	$5,900
2	CC	47438376	PERILLA MARIA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$500	2	$77,334	$4,000
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)						$3,525,336	$564,200			$3,525,336	$440,800			$3,525,336	$141,100			$3,525,336	$245,500		$3,525,336	$176,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)						$3,525,336	$564,200			$3,525,336	$440,800			$3,525,336	$141,100			$3,525,336	$245,500		$3,525,336	$176,800
3	CC	79799614	BARRETO EDWAR	230301	17	$793,334	$127,000	EPS005	17	$793,334	$99,200	CCF69	17	$793,334	$31,800	14-23	17	$793,334	$55,300	17	$793,334	$39,800
4	CC	1081701117	GUERRERO YENNIFER	231001	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
5	CC	1118558350	NOCUA DAYAN	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
6	CC	1122126489	PEÑA LUIS	25-14	15	$2,500,000	$400,000	CCFC55	15	$2,500,000	$312,500	CCF69	15	$2,500,000	$100,000	14-23	15	$2,500,000	$174,000	15	$2,500,000	$125,000
7	CC	1118531535	SALAZAR YEFFERSON	230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$9,700	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
Total			**Afiliados(7)**			$3,718,670	$595,200			$3,718,670	$465,000			$3,718,670	$148,900			$3,718,670	$246,700		$3,718,670	$186,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901720956	3	UNION TEMPORAL INTER COROCORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 45 11 A 105	YOPAL-CASANARE	6344422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454700269	9454700269	E	2023/08/14	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,642,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$595,200	$0	$0	$595,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$12,400	$0	$0	$12,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$418,600	$0	$0	$418,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$164,200	$0	$0	$164,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$246,700	$0	$0	$246,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$246,700	$0	$0	$246,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$148,900	$0	$0	$148,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$148,900	$0	$0	$148,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$465,000	$0	$0	$465,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$312,500	$0	$0	$312,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$19,400	$0	$0	$19,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,700	$0	$0	$9,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$123,400	$0	$0	$123,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$112,000	$0	$0	$112,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$112,000	$0	$0	$112,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$74,700	$0	$0	$74,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$74,700	$0	$0	$74,700
TOTAL				7	$1,642,500	$0	$0	$1,642,500

2023/09/06 02:35 PM

ANEXO 4

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 0826 de 2023-03-10 cuyo Objeto: ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **No.** SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 - 0826

FECHA DEL CONTRATO: 2023-03-10

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA

FECHA DE INICIO: 2023-08-02

FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-12-01

APORTE ENTIDAD: $1.718.776.824,00 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: $0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: $1.718.776.824,00 M.L.C.

OBJETO: ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO: Cuatro (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Dos(02) días del mes de Agosto de 2023, se reunieron ALEXANDER BARRERA GIRÓN, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL, quien actúa en su calidad de supervisor, UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, como interventor, de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1118561079 de YOPAL, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA con NIT 901691000-2 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Cuatro (4) MESES.

3. Que UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: El Departamento pagará el contrato de la siguiente manera en la modalidad de precios unitarios, así: a) Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por el interventor y certificación de la constitución de la fiduciaria o

Powered by CamScanner

Casanare

Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECCA II CASO-LP-SA-2020 CUYO OBJETO ES: "PARA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA DE: MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

patrimonio autónomo irrevocable y demás soportes correspondientes de la fiduciaria encargada del manejo de estos recursos conforme lo contemplado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo Artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015) y guía G-MACFMI-01 "para el manejo de anticipos mediante contrato de fiduciaria mercantil irrevocable" emitido por la Agencia de Colombia Compra Eficiente. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, deberá reintegrarse a la entidad. b) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato mediante actas parciales según el avance de obra. El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado mediante cada acta parcial y en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo será descontado mediante el acta final. C) El veinte por ciento (20%) restante, una vez se suscriban las actas de terminación y de liquidación del contrato, previo informe del interventor del contrato. Al contratista se le exigirán los soportes que correspondan para la constatación del cumplimiento de las obligaciones y de las condiciones para el pago de los valores pactados en porcentajes del valor total del contrato.

OBSERVACIONES:

ALEXANDER BARRERA GIRÓN
Supervisor(a)

YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ R/L UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA
Contratista.

Wilian Gualdrón
UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS Interventor(a)

Revisó: OSCAR FABIAN AMAYA ALFONSO
PROFESIONAL CONTRATADO(A)

Elaboró: LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN

Powered by CamScanner

Gobernación de Casanare

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

920.205.40

Yopal, 02 de agosto de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	CAS-OAJ-LP-001-2023 y No INTERNEO 0826 2023-03-10
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE MARZO DE 2023
OBJETO	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ R/L UNIÓN TEMPORAL GRANJA LA COROCORA

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	OFICIO DE RADICACION No 07947	1
2	ACTA DE INICIO	2
5	LIQUIDACION ESTAMPILLAS	1
6	PAGO DE ESTAMPILLAS	5
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		9

Cordialmente;

ALEXANDER BARRERA GIRON
Supervisor contrato No. 1456 del 2023

Proyectó: LUIS ÉDISON CABALLERO BARRAGÁN
Apoyo a la Supervisión CPSP – 2023

Powered by CamScanner

ANEXO 5

ACTAS VISITAS TÉCNICAS.

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

Yopal 09 de agosto de 2023

UT-COE-OBRA-03

Señor:
UNION TEMPORAL INTER COROCORA.
RL/ Ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA* ***NO. 0826 DE 2023*** *¨ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE ¨*

Cordial saludo.

Por medio de la presente se informa a la interventoría que en la inspección visual realizada en las instalaciones a intervenir se evidenciaron daños en el sistema hidráulico y en el sistema eléctrico los cuales no se encuentran cuantificados dentro del balance de obra, por tanto, estos serán anexados debidamente.


Anexos: evidencia fotográfica.

Cordialmente.

Ing ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
RL/ UNIÓN TEMPORAL GRANJA LA COROCORA.
Calle 40 #42-45

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
2 LUMINARIAS DE 16 W. PARA CAMBIAR. NO ENCIENDEN.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

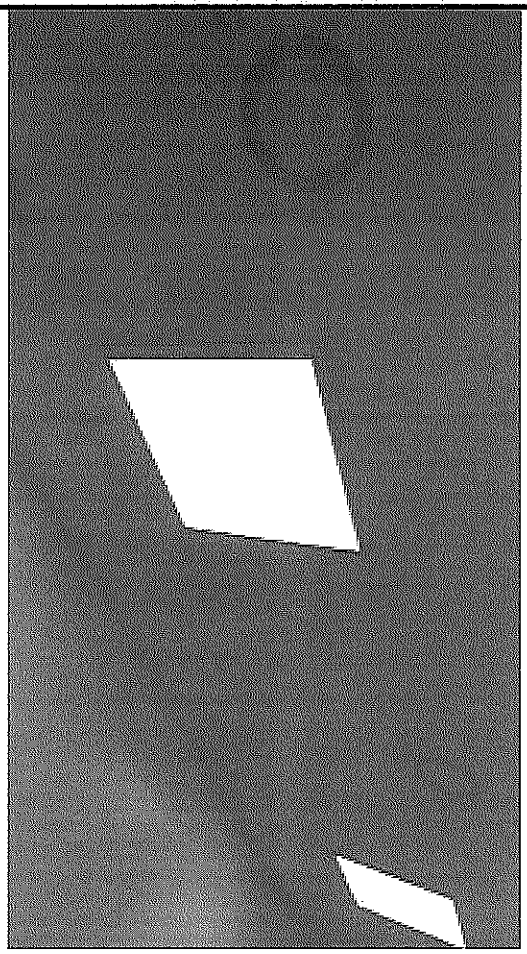

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA


4 LUMINARIAS DE 22 W. PARA CAMBIAR.. NO ENCIENDEN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

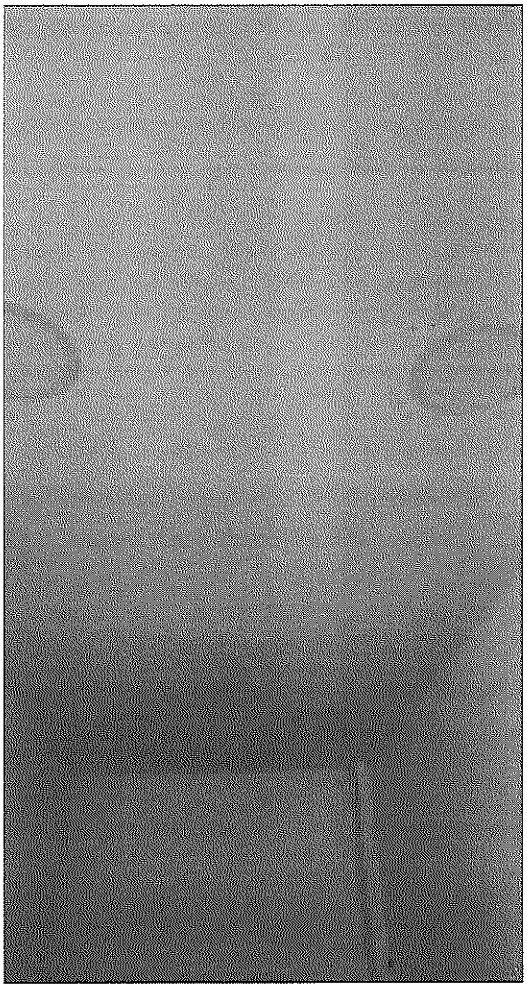


DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
7 LUMINARIAS DE 42 W. 1 NO ENCIEWNDE Y LAS OTRAS 6 POR COLORES DENTRO DE LA LUMINARIA.
2 LUMINARIAS DE 10W.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

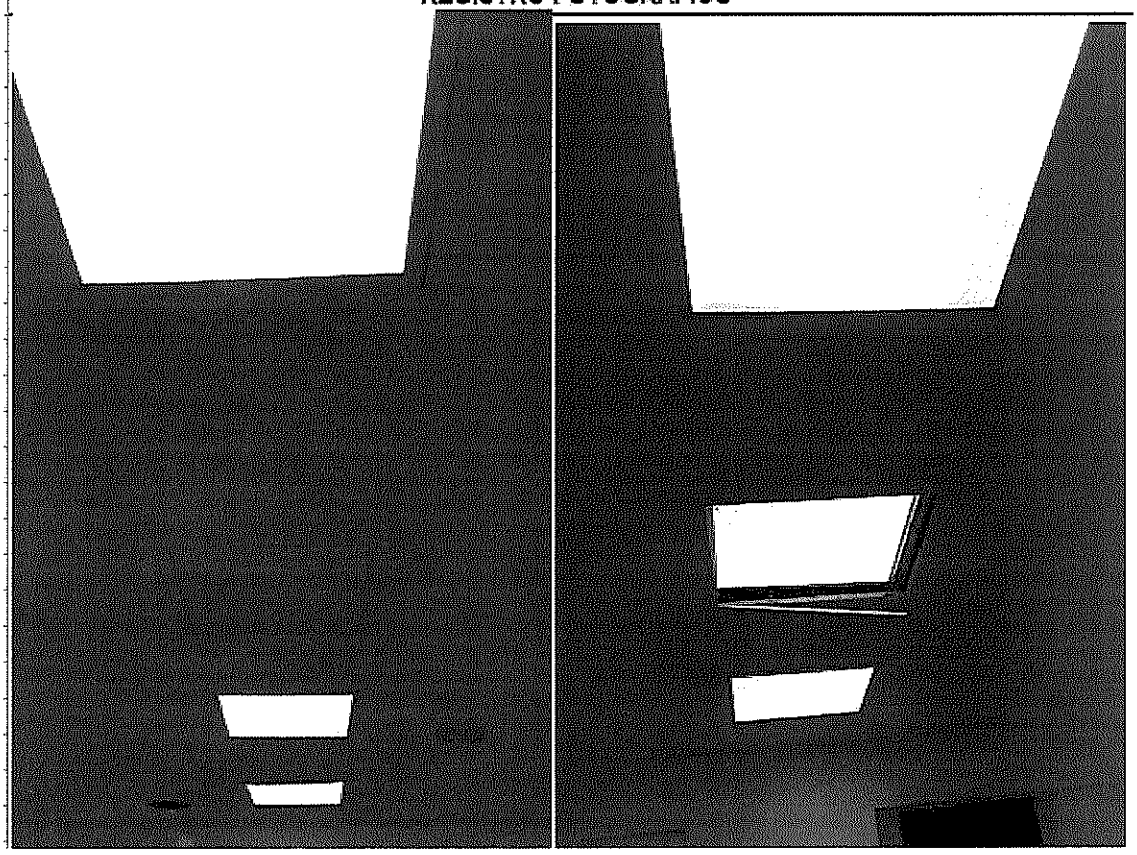

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
6 LUMINARIAS DE 42 W. PARA CAMBIAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

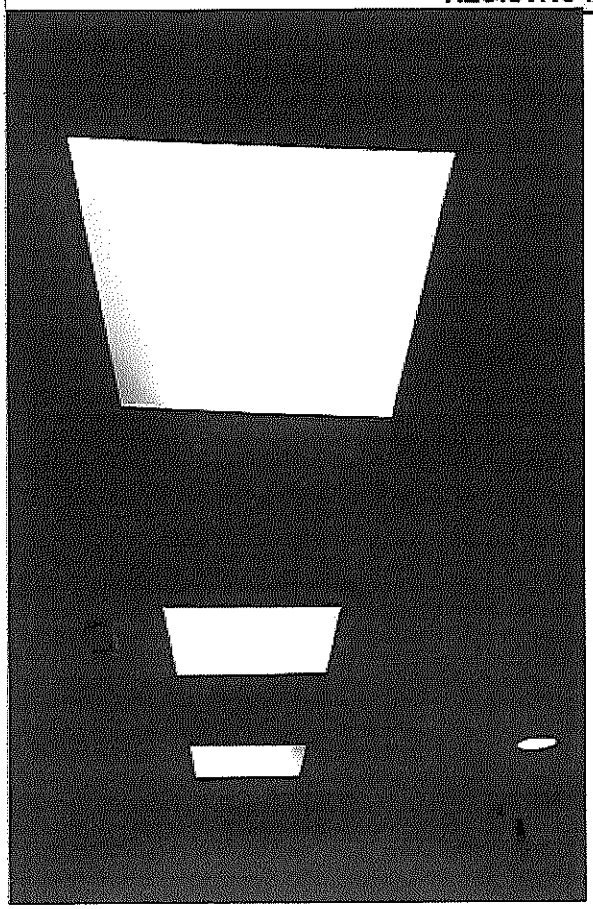

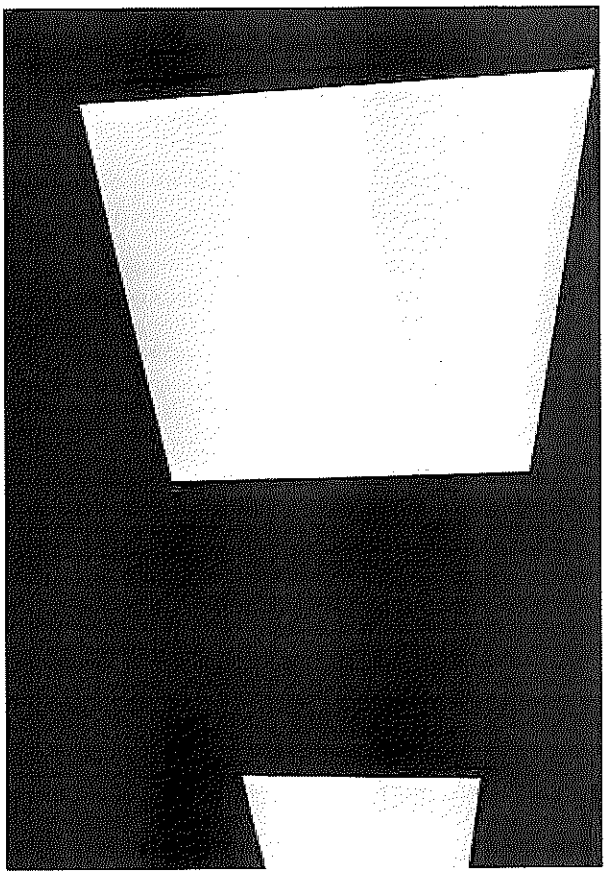

Calle 40 # 42 – Yopal (Casanare)
utlaboratoriocorocora@gmail.com
311 - 498 - 1921

ANEXO 6

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1391 DE 2023
Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

UT INTER COROCORA	CORRESPONDENCIA	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
11 JUL 2023
Hora: 8:56a
No. de Radicación: 07177

Yopal, 11 de julio de 2023

Doctor,

ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023**

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Cordial saludo,

En calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA**, interventor del contrato en referencia, por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de radicar la documentación necesaria para realizar la solicitud de anticipo, para llevar a buen término la realización del contrato.

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: Ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría

Anexos.
Anexo 1 – Formato de plan de inversión del anticipo
Anexo 2 – Acta de entrega de anticipo
Anexo 3 – Documentos de seguridad social y parafiscales
Anexo 4 – Rut de unión temporal
Anexo 5 – Certificación de cuenta bancaria
Anexo 6 – Acta de inicio
Anexo 7 – Formato de verificación

U.T INTER COROCORA	CORRESPONDENCIA	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-02

Yopal, 11 de julio de 2023

GOBERNACIÓN DEL CASANARE
OFICINA ASESORA JURÍDICA
FECHA: 11/7/23 HORA: 4:21 PM
RADICADO No. 402
RECIBIDO POR: Andrea
PG

Doctor,

CARMEN HIMELDA GONZÁLES PINILLA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

ASUNTO: Actualización de pólizas de cumplimiento de contrato de interventoría

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en desarrollo del contrato en referencia remito las pólizas actualizadas con fecha de acta de inicio del contrato de interventoría No. Interno 1391 de fecha 21/06/2023 celebrado entre las partes, relacionado con la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para la adecuación del laboratorio de suelos, genética y patio de secamiento del edificio de semillas, pertenecientes al centro de investigación y desarrollo tecnológico, en la granja la corocora, del municipio de aguazul departamento de Casanare."

Póliza No. 605-47-994000102177 ANEXO: 1
Póliza No. 605-74-994000022277ANEXO: 1

Wilian Gualdrón

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoria

Anexos:
Anexo 1 – Póliza No 605-47-994000102177 ANEXO. 1
Anexo 1 – Póliza No. 605-74-994000022277ANEXO 1

Powered by CamScanner

U.T INTER COROCORA	CORRESPONDENCIA	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-03

Yopal, 14 de julio de 2023

CORRESPONDENCIA
14 JUL 2023
Hora: 10:30 AM
No. de Radicado: -07303-

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

***Asunto:** Solicitud de información precontractual*

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA** y de acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas, mediante la presente, amablemente se requiere la información de estudios y diseños del contrato en mención para llevar acabo un adecuado desarrollo de la etapa pre-constructiva

Lo anterior, correspondiente al contrato de referencia

Sin otro en particular

Atentamente,

Wlian Gualdrón

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
311 - 498 - 1921

Powered by CamScanner

UT INTER COROCORA	**CORRESPONDENCIA**	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

UT-COE-IC-04

Yopal, 17 de julio de 2023

17 JUL 2023
Hora 2:38 Código KNS
N° de Radicación E- - 07397

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: *Respuesta Solicitud, Radicado 920.205.40 - 278*

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA** y de acuerdo con las obligaciones contractuales adquiridas, mediante la presente, se adjunta la programación de obra contemplando las fechas contractuales, para llevar a cabo tanto el contrato de interventoría como el de obra (0826 de 2023).

Respecto al plan de choque, no se relaciona dicho documento, esto entendiendo que actualmente estamos dentro de los tiempos contractuales, por lo que a la fecha no se tiene algún tipo de retraso en el desarrollo de las actividades que enmarcan los contratos.

Sin otro en particular

Atentamente,

Wlian Gualdrón

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría
Anexo 1: Programación De Obra (4 Folios)
Anexo 2: Resumen De Programación De Obra (1 Folio)
Anexo 3: Programación De Obra (Formato .MPP)

UT INTER COROCORA	**CORRESPONDENCIA**	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-05

Yopal, 24 de julio de 2023

24 JUL 2023
Hora: 10:46 am Brayan
No. de Radicación: 07592

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: solicitud de información del estudio previo 0042 de 2023.

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA** y mediante la presente, amablemete solicito, la información técnica empleada para la formulación del estudio previo 0042 del 4 de enero de 2023, el cual fue aprobado el 16 de enero de 2023, lo anterior en relación con las obligaciones contractuales adquiridas, entendiendo la etapa contractual en la que nos encontramos (Etapa preconstructiva).

Sin otro en particular

Atentamente,

Wlian Gualdron

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría

U.T INTER COROCORA	**CORRESPONDENCIA**	**PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS**	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-06

Yopal, 26 de julio de 2023

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe preconstructivo del contrato de interventoria **No. 1391 de 2023**

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA,** interventor del contrato en referencia, por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de radicar el documento correspondiente al informe preconstructivo del contrato mencionado, para su respectiva revisión y aprobación.

Sin otro en particular

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
26 JUL 2023
Hora: 17:02 h
No. de Radicación: 07843

Atentamente,

Wilian Gualdron

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría

Anexos:
Anexo 1 – Informe preconstructivo 46 folios

Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
311 - 498 - 1921

U.T INTER COROCORA	**CORRESPONDENCIA**	**PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS**	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

UT-COE-IC-07

Yopal, 27 de julio de 2023

27 JUL 2023
Hora 4:38 P Código
N° de Radicación E- - 07947

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de documentación necesaria para acta de inicio del contrato de obra **No. 0826 de 2023**

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA**, interventor del contrato en referencia, por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de radicar la documentación necesaria para dar tramite al acta de inicio del contrato de obra pública No. 0826 de 2023, esto una vez revisada y aprobada la información radicada por la Unión Temporan Granja La Corocora mediante Oficio UT-COE-OBRA-01, atendiendo los compromisos contractuales adquiridos.

Sin otro en particular, estamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Wilian Gualdrón

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría

Anexos:
Anexo 1 – Acta de inicio (2 folios)
Anexo 2 - Hojas de vida del equipo de trabajo (204 folios)
Anexo 3 – Pago de seguridad social, certificado de parafiscales y seguridad social (4 folios)
Anexo 4 – Certificado de pago de estampillas (5 folios)
Anexo 5 – Pólizas de cumplimiento aprobadas (13 folios)
Anexo 6 – Programación de obra y cronograma de actividades (11 folios)

UT INTER COROCORA	CORRESPONDENCIA	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-08

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
03 AGO 2023
Hora 4:57pm. Folios T.
No. de Radicación 08345

Yopal, 03 de agosto de 2023

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de documentación necesaria para solicitud de anticipo del contrato de obra **No. 0826 de 2023**

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA**, interventor del contrato en referencia, por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de radicar la documentación necesaria para dar trámite a la solicitud de anticipo del contrato de obra pública No. 0826 de 2023, esto una vez revisada y aprobada la información radicada por la Unión Temporal Granja La Corocora mediante Oficio UT-COE-OBRA-02, atendiendo los compromisos contractuales adquiridos.

Sin otro en particular, estamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Wilian Gualdrón

UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WILIAN ALEXY GUALDRÓN VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – Director de Interventoría

Anexos:
Anexo 1 – Formato de plan de inversión del anticipo
Anexo 2 - Acta de entrega de anticipo
Anexo 3 – Documentos de seguridad social y parafiscales
Anexo 4 – Rut de unión temporal
Anexo 5 – Certificación de la fiducia
Anexo 6 – Acta de inicio
Anexo 7 – Formato de verificación

	CORRESPONDENCIA	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

UT-COE-IC-010

17 AGO 2023

Hora: 10:25 AM Folios 59

No. de Radicación: -08848

Yopal, 17 de agosto de 2023

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de información técnica, respecto al sistema de aires acondicionados

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA**, interventor del contrato en referencia, por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar información técnica respecto al sistema de aires acondicionados que se proyectan instalar en el bloque 1 - área de laboratorios;

- Planos de diseño de la distribución de los aires acondicionados.
- Carga eléctrica necesaria para el funcionamiento del sistema de aires acondicionados.
- Memorias de cálculo del componente eléctrico para el sistema de aires acondicionados.

esto con el fin de verificar las respectivas acometidas que requiere el sistema.

Sin otro en particular, estamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Wilian Gualdrón

UNIÓN TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WILIAN ALEXY GUALDRÓN VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – Director de Interventoria

	UNION TEMPORAL INTER CORORCORA	PROCESO:	
UT INTER COROCORA		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-011

Yopal 02 de agosto del 2023

Señores.

Ing ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
RL/ UNIÓN TEMPORAL GRANJA LA COROCORA.
Calle 40 #42-45
Yopal – Casanare.

REF: Visita técnica.

Cordial Saludo.

La unión temporal inter corocora solicita la visita técnica a la obra ubicada en la **GRANJA LA COROCORA AGUAZUL- BARRIO PORVENIR**, el día jueves 03 de agosto a las 8:00 am, con el fin de realizar el seguimiento al avance de obra.

Sin otro particular.

Cordialmente.

Ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
RL/ UT INTER COROCORA.

	UNION TEMPORAL INTER CORORCORA	PROCESO:	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-012

Yopal 10 de agosto del 2023

Señores.

YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
RL/ UNIÓN TEMPORAL GRANJA LA COROCORA.
Calle 40 #42-45
Yopal – Casanare.

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NO. 0826 DE 2023** "ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud balance de obra.

Cordial Saludo.

En respuesta al oficio UT-COE-OBRA-04, solicitamos la entrega del balance de obra, para su validación.

Sin otro particular.

Cordialmente.

Ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
RL/ UT INTER COROCORA.

UT INTER COROCORA	**CORRESPONDENCIA**	**PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS**	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	21-06-2023

UT-COE-IC-05

Yopal, 24 de julio de 2023

22 JUL 2023
Hora 10:46 am Prayan
07592

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: solicitud de información del estudio previo 0042 de 2023.

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA** y mediante la presente, amablemete solicito, la información técnica empleada para la formulación del estudio previo 0042 del 4 de enero de 2023, el cual fue aprobado el 16 de enero de 2023, lo anterior en relación con las obligaciones contractuales adquiridas, entendiendo la etapa contractual en la que nos encontramos (Etapa preconstructiva).

Sin otro en particular

Atentamente,

0633

Wilian Gualdron

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoría

24/7/23
3:40
Julio 25/23
4:01 p.m.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1391 DE 2023
Calle 12 # 15 – 35 Aguazul (Casanare)
utintercorocora@gmail.com
CEL: 311 498-1921

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

920.205.40
278

Yopal 11 de julio 2023

PARA: WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA Contratista. Correo. utintercorocora@gmail.com

DE: Director Técnico de Desarrollo Rural

OBJETO: SOLICITUD DE PLAN DE CHOQUE Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUATRO (4) MESES PROGRAMADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y N° INTERNO 0826 DE 2023-03-10

Como es de su conocimiento la importancia del proyecto de obra cuyo objeto es ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Teniendo en cuenta que la INTERVENTORIA con contrato N° 1391 – 2023 ya cuenta con el Acta de Inicio del 10 de julio de 2023, se le solicita a la interventoría de manera formal nos alleguen el plan de choque y programación de obra que tienen contemplada para la ejecución en los cuatro (4) meses que tiene de plazo el contrato de obra N° 0826 – 2023. Esto con el fin de dar cumplimiento a los plazos contemplados en el contrato.

Atentamente,

ALEXANDER BARRERA GIRON
Supervisor contrato No. 1456 del 2023

Proyectó: LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN
Apoyo a la Supervisión CPSP 1456 – 2023

UT-COE-OBRA-01

Yopal, 27 de JULIO de 2023

Señores,
UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA* ***NO. 0826 DE 2023*** *"ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE "*

ASUNTO: Entrega de documentación para firma de acta de inicio

Cordial saludo,

Por medio del presente, adjunto la documentación requerida para que se realicen los trámites pertinentes con el fin de dar inicio al contrato en mención.

- **Hojas de vida del equipo de trabajo.**
- **Planillas de seguridad social del representante legal.**
- **Certificación de parafiscales y seguridad social con los respectivos anexos De la documentación del contador.**
- **Certificado de pagos de estampillas.**
- **Pólizas de cumplimiento aprobadas.**
- **Programación de obra y cronograma de actividades.**

Sin otro en particular

Atentamente,

UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA
R/L YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
CC 1.118.561.079 DE YOPAL – CASANARE

Elaboró: ing. Diego Armando Corredor – director de Obra

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

920.205.40
294

Yopal 28 de julio 2023

PARA: WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA Contratista. Correo. utintercorocora@gmail.com

DE: Director Técnico de Desarrollo Rural

OBJETO: RESPUESTA AL OFICIO DE RADICACION No 0604 DEL 14 DE JULIO DE 2023. DONDE SOLICITAN LA INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO. PARA REALIZAR LA ETAPA PRE-CONSTRUTIVA.

En respuesta a su solicitud nos reunimos con el representante legal de la UNION TEMPORAL INTER COROCORA, ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, el residente de interventoría ing. HERNAN DANILO VASQUEZ, suministrándoles la información correspondiente a la planimetría de cada uno de los componentes que hacen parte de los estudios y diseños del contrato de obra. A continuación, se relacionan así:

1. Arquitectónicos laboratorios. 12 planos
2. Detalles arquitectónicos. 1 planos
3. Estructura complemento laboratorios. 1 planos
4. Estructural hangar corocora. 1 planos
5. Estructural edificio final. 4 planos
6. Refuerzos. 2 planos
7. Hidráulicos corocora. 12 planos
8. Aguas lluvias corocora. 12 planos
9. Red contraincendios. 8 planos
10. Diseños sanitarios corocora. 6 planos

Se remite la información correspondiente a los estudios y diseños con el fin de dar cumplimiento y dar a conocer la información que requieren para dar continuidad al proceso que vienen adelantando del pre-constructivo del contrato de obra No 0826 del 10 de marzo de 2023.

Atentamente,

ALEXANDER BARRERA GIRON
Supervisor contrato No. 1456 del 2023

Proyectó: LUIS EDISON CABALLERO BARRAGÁN
Apoyo a la Supervisión CPSP 1456 – 2023

UT-COE-OBRA-02

Yopal, 28 de julio de 2023

Señores,
UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WILIAN ALEXY GUALDRÓN VIVAS

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA* ***NO. 0826 DE 2023*** *"ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE "*

ASUNTO: Entrega de documentación para solicitud de anticipo

Cordial saludo,

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con el fin de radicar la documentación necesaria para realizar la solicitud de anticipo, para llevar a buen término la realización del contrato en referencia.

Sin otro en particular

Atentamente,

UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA
R/L YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
CC 1.118.561.079 DE YOPAL – CASANARE

Elaboró: Ing. Diego Armando Corredor – Director de Obra

Anexos:
Anexo 1 – Formato de plan de inversión del anticipo
Anexo 2 – Acta de entrega de anticipo
Anexo 3 – Certificación de seguridad social y parafiscales
Anexo 4 – Rut de la unión temporal
Anexo 5 – Certificación de la fiducia
Anexo 6 – Formato de verificación

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

920.205.40
299

Yopal 01 de agosto 2023

PARA: WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA Contratista. Correo. utintercorocora@gmail.com

DE: Director Técnico de Desarrollo Rural

OBJETO: SOLICITUD LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No 0826 DE 2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1391 DE 2023 PARA EL INGRESO A LA GRANJA COROCORA DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Como es de su conocimiento la importancia del proyecto de obra cuyo objeto es ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. y teniendo en cuenta que el predio donde se quiere realizar la ejecución de la obra está a cargo de la Alcaldía Municipal de Aguazul, en la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por lo que se hace necesario contar con la autorización de dicha secretaria para el ingreso del personal que va laborar en las instalaciones de la Granja la Corocora de Aguazul.

Se le solicita al R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA Ing. Wilian Alexy Gualdron Vivas. Hacer llega el listado con la siguiente información: nombre completo, cedula de ciudadanía, cargo y numero de celular.

Atentamente,

ALEXANDER BARRERA GIRON
Supervisor contrato No. 1456 del 2023

Proyectó: LUIS EDISON CABALLERO BARRAGÁN
Apoyo a la Supervisión CPSP 1456 – 2023

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

920.205.40
No. 314

Yopal, 18 de agosto de 2023

Interventor,
UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
Calle 12 No 15 – 35, Aguazul
utintercorocora@gmail.com

Asunto: Respuesta a solicitud de información solicitada de los planos que se encuentran en la Oficina Asesora de Jurídica.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se informa que la Oficina Asesora de Jurídica dio respuesta a la solicitud que la UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, en su momento había solicitado los planos que se encuentran en el proyecto inicial del proyecto de obra cuyo objeto es: ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE, que la oficina Jurídica pone a disposición la información requerida para que en compañía de un funcionario de la entidad se realice el proceso en el archivo de la vigencia para realizar la toma de la copia de los planos anexos del Estudio Previo 0042-2023.

Se le informa que el costo de las copias generadas de los planos será asumido por el interesado.

Atentamente,

JAVIER ABRIL FORERO
Director Técnico de Desarrollo Rural (E)
Resolución No. 0770 del 10 de Julio de 2023

Elaboro: Luis Edison Caballero Barragan
C.P.S.P No. 1456 – 2023
