FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 31 **DEL** 25/9/2023 **AL** 1/10/2023

CONTRATO No 177 de 2022 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 159 DE 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.698.776-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 900644351-9 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. FABIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	26	**DE**	10	**DE**	2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	17	**DE**	4	**DE**	2023
PRORROGA	30 DIAS CALENDARIO				
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20	**DE**	10	**DE**	2023

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	12	No. empleos Directos generados	3
No. empleos Indirectos generados	10	No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,85%	100,00%	0,20%	8,18%
Valor del Trabajo Programado	$ 68.381.660,00	$ 3.696.922.405,00	$ 7.190.698,00	$ 302.384.494,00
ETAPA/FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	100,00%	100,0%	0,00%	85,00%
Valor del Trabajo Programado	$ 88.309.558,00	$ 88.309.558,00	$ -	$ 75.063.124,00
ETAPA/FASE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,85%	97,61%	0,20%	6,30%
Valor del Trabajo Programado	$ 68.381.660,00	$ 3.608.612.847,00	$ 7.190.698,00	$ 227.321.370,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	100,00%	85,00%		0%		definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	100,00%	85,00%		0%		definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	100,00%	85,00%		0%		definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	100,00%	85,00%		0%		definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	100,00%	85,00%		0%		definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	100,00%	85,00%		0%		definición de la alternativa a utilizar por parte del contratista de obra
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	100,00%	85,00%	100,00%	1,50%		Se estan adelantando actividades de cambio de tuberia para domiciliarias, sin embargo el rendimiento que se observa es minimo.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ASPECTO TECNICO

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso general contrato del 92,02 % en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar , e inicio de actividades de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 2023, se estan ejecutando actividades actividades en el frente de obra de la calle 46 entre carreras 5 y 6, sin embargo el rendimiento en mínimo debido a que el contratista de obra solo cuenta con (un ayudante, operador de maquinaria, auxiliares de trafico, topografia, inspector sst, residente de obra) en el frente de obra, se le ha realizado las observaciones respectivas al residente de obra.
• Durante la semana no se realizaron acciones de movilidad.
• El 25 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-328-2023, interventoria aprueba hoja de vida y docuemntación del nuevo inspector de obra.
• El 25 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-329-2023, interventoria
• E 26 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-332-2023 como respuesta a oficio ZPPM-266-COOR-2023, interventoria reitara las observaciones realizadas a los oficios DON-CIN-177-FDLCH-282-2023 de fecha 07 de septiembre de 2023 y oficio DON-CIN-177-FDLCH-293-2023 de 11 de septiembre de 2023,oficios DON-CIN-177- FDLCH-282-2023 de fecha 07 de septiembre de 2023 y oficio DON-CIN-177-FDLCH-293-2023 del 11 de septiembre de 2023 correpondientes al primer y segundo apremio por entrega de informes mensuales respectivamente.
• El 26 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-333-2023, interventoria realiza solicitud de los soportes de consignacion de redimientos financieros.
• El 26 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-335-2023 como respuesta a oficio ZPPM-263-COOR-2023, interventoria informa sobre las grabaciones de las actas de comitmité solicitadas por el contratista.
• El 26 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-336-2023, interventoria relaciona respuesta del acueducto frente a la inspección con CCTV EN EL CIV 2001416 TV1 E entre KR 2E y Cll 68.
• El 27 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-337-2023, remite oficio con respecto al estado actual del contrato de obra No 159 de 2022.
• El 27 de septimbre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-340-2023 con numero de radicado 20235210108242, remite informe actualizado de presunto incumplimiento por atraso en la obra.

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

• El 27 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-339-2023, interventoria realiza observaciones al informe mensual SST No 5.
• Durante la semana, interventoría realiza recorrido en el frente de obra, verificando el cumplimiento ambiental y sst


ASPECTO SOCIAL

• El 27 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-315-2023, interventoria realiza apremio por inclumpliento en la programación de la reunión extraordinaria 29 de septiembre 2023 y atención de actividades previas.
• Atención punto virtual de lunes a viernes, No se recibe ninguna PQRSD.
• Atención a solicitudes y observaciones realizadas por la Interventoria al componente social.
• Atención a la comunidad

ASPECTO TRANSITO

• El 26 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-330-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-273-COOR-2023, interventoria aprueba PMT para acciones de movilidad del CIV 2001851.
• El 26 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-331-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-274-COOR-2023, interventoria realiza observaciones al PMT para acciones de movilidad del CIV 2000202.
• El 26 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-334-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-255-COOR-2023, interventoria aprueba el informe mensual de transito No 5.
• El 27 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-338-2023, interventoria realiza llamado de atencion por la no ejecución de acciones de movilidad desde el 17 de septiembre.
• El 28 de septiembre de 2023, mediante DON-CIN-177-FDLCH-342-2023 como respuesta al comunicado ZPPM-275-COOR-2023, interventoria aprueba PMT para acciones de movilidad en CIV 2001212.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

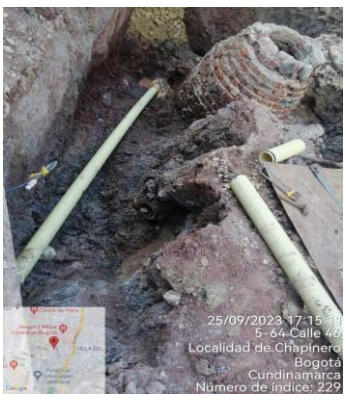





Descripción Foto 1, 2 Y 3

CAMBIO DE TUBERIA DE GRES POR TUBERIA EN PVC





Descripción foto 4 Y 5

RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CORRESPONDIESNTES A ACCIONES DE MOVILIDAD







Descripción Foto 8 ,9 Y 10

LLEGADA DE MATERIAL B200 PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA









Descripción Fotos 11, 12 , 13 Y 14

COMPACTACIÓN MANUAL Y RELLENO PARA PROTECCION DE TUBERIA



















Descripción Fotos 15 a la 23

EXTRACCIÓN DE NUCLEOS CIV 2001850













Descripción Fotos de la 24 a la 29

EXTRACCIÓN DE NUCLEOS CIV 20011142

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOS (Día en letras) (2) (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre) ING. DIEGO IGNACIO ARENAS
Director de Interventoría.
CONSULTORES DONOVAN SAS
