# DEPARTAMENTO DE SUCRE
# GOBERNACIÓN

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# PARA
# INFORMES DE INTERVENTORÍA No. 2 Y No. 3 (FINAL)

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023**

## CONTRATO No. MC-SID-056-2022

## OBJETO:

## INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL BARRIO NUEVO MAJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE

**RAFAEL HERRERA PANZZA**
**Ingeniero de apoyo a la Supervisión**

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

## 5 DE MAYO DE 2023

## Ficha Técnica del Contrato de Interventoría

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | No. CM-SID-056-2022 |
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL BARRIO NUEVO MAJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE" |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($47.371.500). |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA |
| **TIPO DE PROCESO** | MÍNIMA CUANTÍA |
| **PLAZO DE EJECUCION** | TRES (3) MESES. |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 30-ENERO-2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 DE ABRIL DE 2023 |
| **ESTADO DEL PROYECTO** | TERMINADO 100% |
| **% DE ANTICIPO** | **0%** |
| **% DE EJECUCION** | **100%** |


## LOCALIZACION DEL PROYECTO




**Figura 2.** Localización del proyecto en el Municipio de Sincelejo
Fuente Google Earth Pro.

A continuación, se relacionan cada uno de los tramos viales a intervenir ubicados en el barrio Nuevo Majagual del municipio de Sincelejo, con su respectiva dirección y coordenada geográfica:

| N° | DIRECCIÓN | LONGITUD | COORDENADAS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calle 27, entre transversal 25c y 25d | 56 | 9°17'43.79"N-75°24'5.97"O | 9°17'45.20"N-75°24'4.72"O |
| 2 | Transversal 25c, entre calles 27d y 27 | 63 | 9°17'42.92"N-75°24'3.92"O | 9°17'43.85"N-75°24'5.77"O |
| 3 | Transversal 25b, entre calles 27d y 27 | 55 | 9°17'44.04"N-75°24'3.38"O | 9°17'44.80"N-75°24'5.00"O |

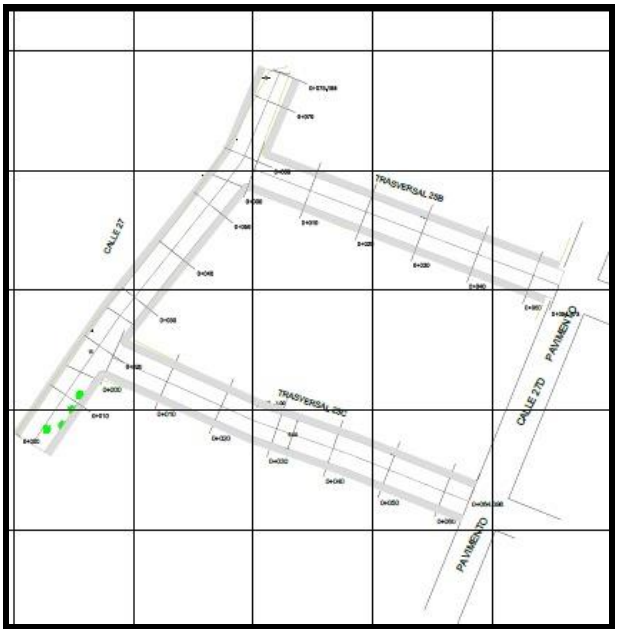


Las vías por intervenir se encuentran ubicadas en el barrio Nuevo Majagual en la zona urbana del municipio de Sincelejo, Dicha vía, en la actualidad tiene deficiencia en su infraestructura vial, no cuenta con una estructura de pavimento adecuada para el tránsito de la zona.

## ALCANCE DEL PROYECTO

Metas físicas:

- **PAVIMENTO**: 211 ml de pavimento en concreto rígido de ancho =5 mts, e=0.20
- **ALCANTARILLADO**: 183 ml de tubería PVC de 8” y 38 domiciliarias en tubería de PVC 6”.
- **ACUEDUCTO**: 203 ml de tubería de 3” PEAD y 38 domiciliarias en tubería de ½” PEAD.


# REGISTRO FOTOGRAFICO







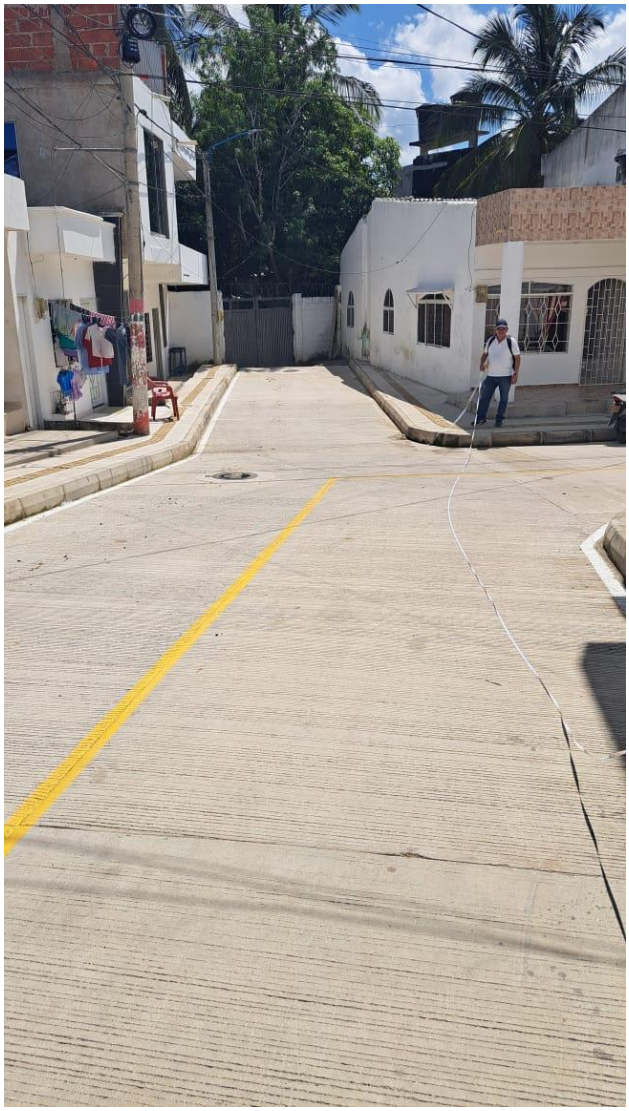

# CONCLUSIONES

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA POR LA INTERVENTORÍA**: En visitas realizadas a la obra se evidenció la presencia de ingeniero residente y se constató el seguimiento técnico y de control de calidad de las actividades de la obra como:

- Obras de alcantarillado sanitario( excavaciones, rellenos, instalaciones de tuberías principal y acometidas, construcción de pozos de inspección)
- Obras de Acueducto (excavaciones, rellenos, instalaciones tuberías de presión de 3" PVC, acometidas domiciliarias)
- Excavaciones para calzada de pavimento incluye retiro de material
- Mejoramiento con piedra rajón + balasto con espesor de 30 cm.
- Instalación de Geotextil
- SubBase granular con espesor de 20 cm
- Pavimento en concreto Hidráulico con espesor de 20 cm incluye la colocación de dovelas de 1" y acero de transferencia de ½".
- Bordillos en concreto a lado y lado de la vía

El contratista de interventoría presentó los informes de interventoría No. 2 y No. 3 (final), correspondientes al periodo del 1 de marzo al 29 de abril 2023, el cual fue aprobado por la supervisión.

El contratista de interventoría presentó a la Secretaría de Infraestructura el acta final de interventoría, correspondiente al periodo del 1 de marzo al 29 de abril 2023.

Una vez revisada el acta final de interventoría y de acuerdo con los informes entregados y las visitas de la supervisión a la obra de los frentes de trabajo, se da concepto favorable

El acta final de interventoría presentada por el contratista fue avalada y firmada por la supervisión de la Secretaría de Infraestructura.

**ESTADO DEL CONTRATO:** Actualmente las obras del contrato se encuentran terminadas, y los contratos de obra e interventoría se encuentran terminados.

**RAFAEL HERRERA PANZZA**
Ingeniero de apoyo a la supervisión
Secretaría de Infraestructura
