ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 08
PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023









CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146302

OBJETO CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
VERSIÓN	**FECHA ELABORACIÓN**	**OBJETO**	**ELABORADO POR**	**APROBADO POR**
1	**28-AGOSTO-23**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 08** **PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023**	**JUAN CAMILO CALDERÓN U.** **ANDRÉS FELIPE CANCHÓN M.**	**DIEGO FERNANDO CLARO C.**
			RESIDENTES DE INTERVENTORÍA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..... 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES. 5
2.2. LOCALIZACIÓN. 6
2.3. VERIFICACIÓN PREVIA Y DIAGNOSTICO. 7
3. CONTRATO DE OBRA 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 9
3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA. *10*
3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISION DE POLIZAS. *10*
3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO. *11*
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE OBRA..... 12
3.2.1. PERSONAL APROBADO. *12*
3.2.2. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMA *13*
3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE POR FRENTE A INTERVENIR *14*
3.2.4. COLEGIOS DE EMERGENCIA. *19*
3.2.5. PROGRAMACIÓN GENERAL *22*
3.2.6. BALANCE PRESUPUESTAL *25*
3.2.7. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO *27*
3.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD. 50
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 51
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 51
4.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. *52*
4.1.2. RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA. *52*
4.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS. *53*
4.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 53
4.2.1 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORIA. *53*
4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA *55*
4.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD 55
4.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA. *55*
4.4 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 57

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización intervenciones Tunjuelito. 6
Ilustración 2. Localización intervenciones Usme. 7

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Información General Contrato de obra. 9
Tabla 2. Aspectos Contractuales del Contrato de obra. 10
Tabla 3. Revisión y estado de las pólizas Contrato de Obra. 10
Tabla 4. Personal Aprobado de Obra. 12
Tabla 5. Alcance de las intervenciones. 14
Tabla 6. Resumen emergencias. 19
Tabla 7. Programación general. 22
Tabla 8. Porcentajes de avance por frente. 23
Tabla 9. Porcentaje de avance general. 24
Tabla 10. Balance presupuestal. 25
Tabla 11. Estado financiero contrato de obra. 27
Tabla 12. Actividades ejecutadas. 29
Tabla 13. Información General del Proyecto de Interventoría. 51
Tabla 14.Documentos suscritos a la fecha. 52
Tabla 15. Relación de Pólizas Contrato de Interventoría. 52
Tabla 16. Estado financiero contrato de interventoría. 53
Tabla 17. Personal Aprobado Por Interventoría. 54
Tabla 18. Actividades ejecutadas. 56

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen las actividades contempladas en el marco de los contratos de obra e interventoría, las cuales serán objeto de ejecución y seguimiento durante el desarrollo de estos.

Con base en lo anterior, La Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, elaboró los documentos y estudios previos con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a contratar la, *"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".*

Teniendo en cuenta lo anterior el pasado 23 de noviembre de 2022 se celebra el contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146302 de 2022, entre la Secretaria de Educación del Distrito (SED) y el señor Carlos Mario Rolón Amaya Representante Legal del Consorcio Servicio Educativo cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

En este informe se presentan los procedimientos y alcances e intervenciones ejecutadas en las diferentes Instituciones Educativas del Distrito ubicadas en las localidades de Usme y Tunjuelito durante el octavo mes de ejecución, contemplado entre el 28 de Julio y el 27 de Agosto de 2023, para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato de obra en el ámbito técnico, administrativo, social, seguridad, ambiental y de control presupuestal, con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar.

La fecha de elaboración del presente informe corresponde al 28 de Agosto de 2023, en cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas de esta interventoría, siguiendo las especificaciones técnicas contempladas en el Contrato y demás normas vigentes e inherentes al proyecto, verificando que se realicen todas las actividades, cumpliendo los lineamientos y especificaciones, de acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en las condiciones y términos del Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022 y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo necesarios para el buen desarrollo del contrato.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,” se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.

La estructura organizacional de La Secretaría de Educación Distrital, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

En virtud a los lineamientos generales de política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: La política educativa de Bogotá D.C., se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C, Programa Línea Estratégica: Inclusión Educativa para la Equidad, Proyecto Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los Colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad.

2.2. LOCALIZACIÓN.

Las intervenciones objeto del presente contrato se ejecutarán en veinticuatro (24) Instituciones Educativas de las localidades de USME y Tunjuelito, distribuidas de la siguiente forma:

TUNJUELITO

1. IED JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A
2. IED VENECIA SEDE B
3. IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A
4. IED INEM SANTIAGO PÉREZ SEDE A
5. D L E TUNJUELITO

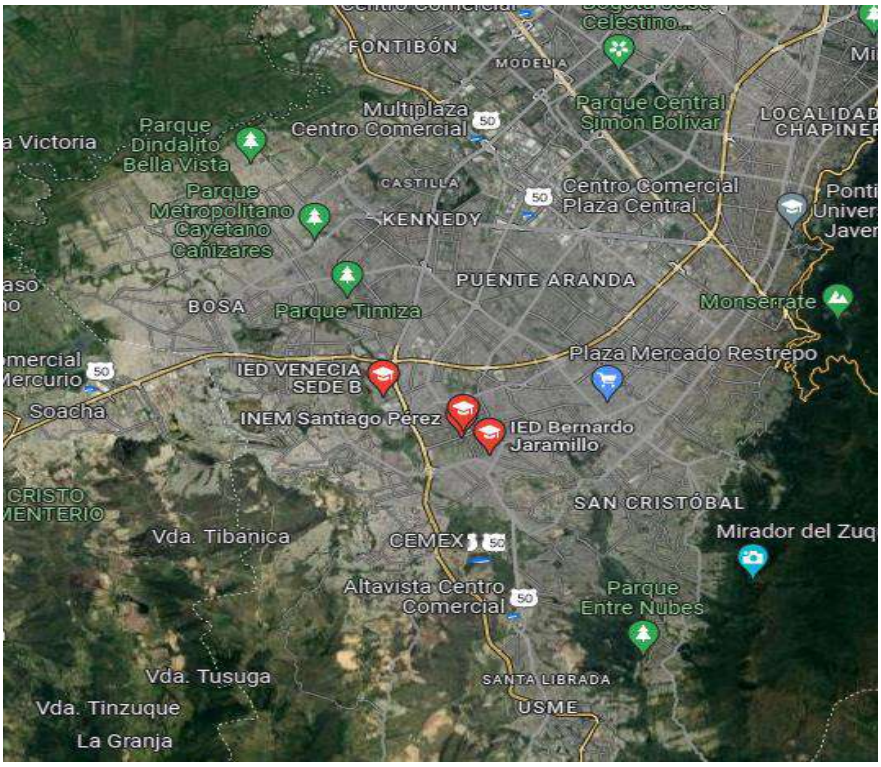


Ilustración 1. Localización intervenciones Tunjuelito.

USME

1. IED USMINIA SEDE C
2. IED BRASILIA SEDE A
3. IED CURUBITAL SEDE A
4. IED EL DESTINO SEDE A
5. IED EL UVAL SEDE A
6. IED FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A
7. IED LOS ANDES SEDE A
8. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C

9. IED LA ARGENTINA SEDE A
10. IED LA UNIÓN SEDE A
11. IED LAS MERCEDES SEDE A
12. IED LOS ARRAYANES SEDE A
13. IED NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS SEDE A
14. IED PROVINCIA DE QUEBEC SEDE A
15. IED OSWALDO GUAYASAMÍN SEDE B
16. IED LOS TAJARES SEDE B
17. IED FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C
18. IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B
19. D L E USME

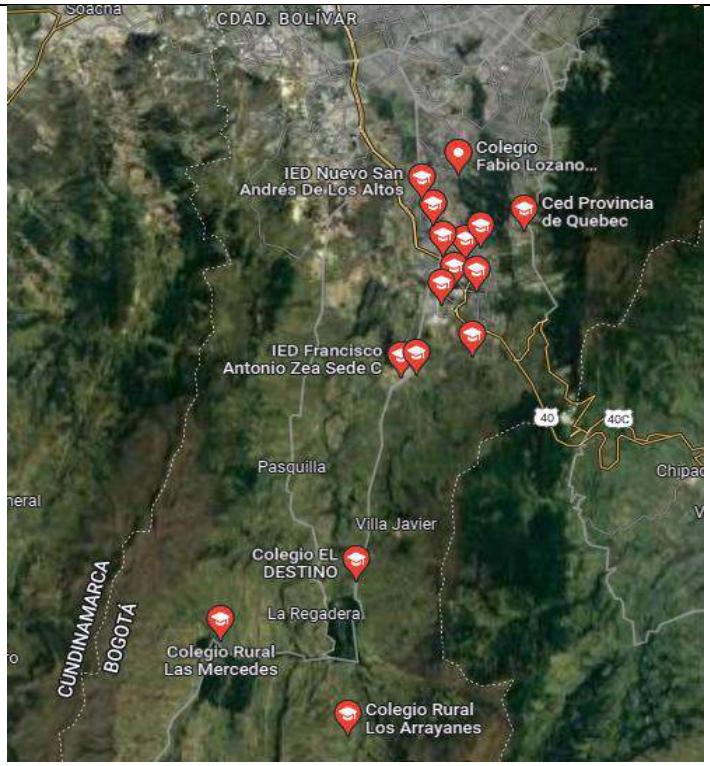


Ilustración 2. Localización intervenciones Usme.

2.3. VERIFICACIÓN PREVIA Y DIAGNOSTICO.

Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial.

De forma previa, para el inicio y desarrollo de las obras programadas, se realizará visita de diagnóstico inicial conjunta, entre la SED, el rector de la Institución o quien este delegue, la interventoría y el contratista de obra, en la cual se validará el diagnóstico inicial, dejando

constancia de las obras a realizar con su respectivo alcance, de conformidad con lo previsto en el estudio previo sobre este particular.

Como resultado de las vistas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando cantidades y valor por cada ítem a ejecutarse, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta económica inicial.

Las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED se clasifican en mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

PROGRAMADA: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

La información general del proyecto es la siguiente:

Tabla 1.Información General Contrato de obra.

INFORMACIÓN GENERAL OBRA	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077396
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.073.796.813
PLAZO:	DOCE (12) MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSIDERACIONES.

El Contratista deberá tener en cuenta que es un contrato de ejecución con Dos (02) modalidades de ejecución económica:

1. PROGRAMADA: es decir de acuerdo con unas sedes ya establecidas por la entidad, con ítems y cantidades detalladas y específicas, con un valor total.
2. EMERGENCIAS O POR NECESIDAD: Es decir intervenciones a:
   - **2.1.** Sedes de la Secretaría de Educación que no están programadas y que por la necesidad de cada proyecto o circunstancia deben ser intervenidas de forma inmediata.
   - **2.2.** Actividades o cantidades no programadas que no se hayan incluido en el diagnóstico inicial y se presentan realizado a cada equipamiento postulado, por circunstancias inesperadas.

Debe tenerse en cuenta que la SED se ha basado en la información disponible para realizar un ejercicio aproximado que permita estimar el alcance de las obras a ejecutar en el proyecto, sin que esto signifique compromiso alguno para la SED para garantizar la ejecución de dichos ítems y los respectivos precios unitarios.

Para esta modalidad se debe tener presente los ítems aprobados por la SED en este contrato, es decir, se ejecuta a medida que se van requiriendo cada una de las actividades de obra de mantenimiento y se adjudicará el valor total del presupuesto asignado PARA CADA GRUPO, de conformidad con los valores unitarios fijos y precios establecidos en la oferta económica del proponente sin fórmula de reajuste.

Adicionalmente, es necesario aclarar que dependiendo del tiempo en que tarde la ejecución del contrato, las necesidades en las sedes educativas PROGRAMADAS pueden variar, (incrementar o disminuir). En caso de que las necesidades aumenten, se debe tener presente que se debe incurrir en la afectación del valor de la modalidad EMERGENCIAS o por necesidad (intervención por necesidad), se debe balancear el contrato y priorizar su alcance de conformidad con los valores unitarios fijos aprobados por la entidad y establecidos en la oferta económica sin fórmula de reajuste.

3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se observan a continuación:

Tabla 2. Aspectos Contractuales del Contrato de obra.

DOCUMENTO	FECHA
CONTRATO DE OBRA	08 DE NOVIEMBRE 2022
ACTA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2022

***Una vez aprobadas las garantías por parte de la SED, el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles deberá entregar a la interventoría contratada, los documentos necesarios para la suscripción del **acta de inicio** de obra, los cuales se encuentran señalados en las obligaciones administrativas, las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual y los programas detallados para la ejecución de la obra establecidas en el presente documento.*

3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISION DE POLIZAS.

A la fecha del presente informe se encuentran vigentes las siguientes pólizas.

Tabla 3. Revisión y estado de las pólizas Contrato de Obra.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGUROS	ESTADO / REVISIÓN
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101397742	$2.414.759.362,60	28/12/2022	05/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO	ACTUALIZADAS

PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.		$1.207.379.681,30	28/12/2022	28/12/2026		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101397742	$2.414.759.362,60	28/12/2023	28/12/2025		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101199562	$603.689.840,65	28/12/2022	28/12/2023		
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN	21-18101001088	$668.594.957,66	28/12/2022	28/12/2023	SEGUROS DEL ESTADO	ACTUALIZADAS

3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO.

La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, conforme al estudio realizado por la SED, valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado, en consecuencia, el valor real del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfacción a la SED por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem.

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salarial y prestacional, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo, del contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del contratista, transporte, garantías y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U.

Para el presente contrato, no se contempla el pago de anticipo, por la naturaleza de las obras a contratar la cual corresponde a obras de mejoramiento en general en donde las inversiones son puntuales e identificadas con antelación al inicio de las obras.

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1. PERSONAL APROBADO.

Teniendo en cuenta el Anexo 1. – Anexo Técnico del proceso No. SED-LP-DCCEE-039-2022 el Numeral de Personal y perfiles se menciona:

> *"El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección.*

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Un (1) director de obra.
Dos (2) residente de obra.
Un (1) asesor estructural.
Un (1) asesor Ambiental.
Cuatro (4) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
Un (1) asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
Un (1) Asesor Hidrosanitario - Red Contra Incendios y gas.
Un (1) profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
Cuatro (4) Inspector de obra.
Un (1) maestro de obra.

A continuación, se hace entrega de la relación del personal aprobado y el cual se encontró laborando en este periodo.

Tabla 4. Personal Aprobado de Obra.

PROFESIONAL	CARGO	COMUNICADO CONTRATISTA	COMUNICADO DE APROBACION INTERVENTORIA
DIRECTOR	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
RESIDENTE 1	ANA MILENA GÓMEZ SÁNCHEZ	CO.EDUCACION.BOG-156-2022	CINP-BTA-529-0282-2953
RESIDENTE 2	JUAN CAMILO VELASCO MÉNDEZ	CO.EDUCACION.BOG-007-2022	CINP-BTA-529-0011-6990
ASESOR ESTRUCTURAL	ANCISAR PÉREZ CERVERA	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
ASESOR AMBIENTAL	YINETH MARCELA BERNAL	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838

TÉCNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 01	YULI TATIANA SÁNCHEZ	CO.EDUCACION.BOG-087-2022	CINP-BTA-529-0163-1393
TÉCNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 02	GINA ALEJANDRA PÉREZ CASTRO	CO.EDUCACION.BOG-009-2022	CINP-BTA-529-0190-1696
TÉCNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 03	NICOLL DANIELLA ROJAS PÉREZ	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
TÉCNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 04	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	CO.EDUCACION.BOG-007-2022	CINP-BTA-529-0011-6990
ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS VOZ Y DATOS	JOSÉ MANUEL REDONDO	CO.EDUCACION.BOG-010-2022	CINP-BTA-529-0023-7174
ASESOR HIDROSANITARIO	ANGELA ISABEL RÍOS FRESNEDA	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	JHON FREDY LÓPEZ	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
INSPECTOR DE OBRA 1	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	CO.EDUCACION.BOG-066-2022	CINP-BTA-529-0133-1139
INSPECTOR DE OBRA 2	ÁLVARO ANDRÉS GARZÓN	CO.EDUCACION.BOG-051-2022	CINP-BTA-529-0111-0954
INSPECTOR DE OBRA 3	SERGIO MAURICIO UNAQUE BENAVIDES	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
INSPECTOR DE OBRA 4	CINDY VIVIANA GÓMEZ SÁNCHEZ	CO.EDUCACION.BOG-031-2022	CINP-BTA-529-0296-3106
MAESTRO DE OBRA	LUIS EDUARDO GÓMEZ RIVERA	CO.EDUCACION.BOG-009-2022	CINP-BTA-529-0014-7064

3.2.2. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMA

Para el desarrollo de la obra, se deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, para el desarrollo de cada actividad prevista en los frentes a intervenir.

De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes.

De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad, avance del proyecto, el contratista puede plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.

El contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra.

Es de aclarar que por la naturaleza de las obras (mantenimientos y remodelaciones), no se hace necesario el uso de equipos de gran envergadura superiores a los catalogados como herramientas menores, tal y como se especifica en el plan de suministro de equipos remitido por esta Interventoría a la Entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0031-7320 del 21 de diciembre de 2022. No obstante, de llegar a requerirse el uso extraordinario de algún equipo de estas características se realizará la inspección y seguimiento correspondiente que este demande.

3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE POR FRENTE A INTERVENIR

Teniendo en cuenta que intervención de los frentes de obra se realizará de manera progresiva manteniendo un mínimo de 8 frentes abiertos de forma simultánea según lo exigido por el Anexo Técnico del pliego de condiciones del contrato de obra, a continuación, se relaciona el alcance de los frentes intervenidos a la fecha en la primera fase del contrato la cual cuenta con un total de 8 frentes de obra, se ha realizado una actualización del alcance de intervención para cada sede por lo que se tienen en cuenta a partir del presente informe.

Tabla 5. Alcance de las intervenciones.

IED USMINIA SEDE C		
		- Pintura total - Cambio de cubiertas - Cambio de ventanería - Cambio pisos - Corredor perimetral de salones

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">COLEGIO RURAL EL UVAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Cambio de cubiertas.
- Adecuación de baños.
- 3 aulas modulares.
- Estructurar red eléctrica e hidráulica.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">IED PROVINCIA DE QUEBEC SEDE C</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Mantenimiento de cubiertas
- Cambio de luminarias en aulas de los edificios 1, 2 y 4
- Mejoramiento en la ventilación
- Cambio, mantenimiento y ajuste en la ventanería (Parcial).</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">IED TEJARES SEDE B</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">-Reforzamiento muro de ingreso
-Mejoramiento de cubiertas
-Adecuación de iluminación en aulas.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

IED ESTANISLAO ZULETA SEDE C		
		- Mantenimiento de cubiertas en edificio 1, 2 - Cambio de luminarias en aulas
		
IED BRASILIA SEDE A		
		- Mantenimiento de cubiertas en edificio 1, 2, 3 y 4 -cambio de luminarias en aulas
		

<table>
<tr><th colspan="3">COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ – Sede A</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Adecuación de batería de baños</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS (IED) – Sede A</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Cambio de cubierta para los bloques establecidos por la entidad.
- Pintura interna, color establecido por la entidad.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

3.2.4. COLEGIOS DE EMERGENCIA.

Actualmente se cuenta con un total de veinte (20) sedes asignadas que son denominados por la Secretaría de Educación Distrital como tipo de emergencia, de acuerdo con esto, a continuación, se relación el estado de las intervenciones realizadas por el contratista a dichas emergencias.

Tabla 6. Resumen emergencias.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR-40779396							
No.	**EMERGENCIA**	**FECHA VISITA**	**FECHA ATENCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**% AVANCE**	**DOCUMENTOS APROBADOS**	**DOCUMENTOS PENDIENTE Y/O OBSERVACIONES**
1	PAULO FREIRE	12/01/2023	21/01/2023	23/01/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra -Manual de mantenimiento	-Finalizada
2	FEDERICO GARCIA LORCA	30/01/2023	05/02/2023	18/04/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra -Manual de mantenimiento	-Finalizada
3	ALMIRANTE PADILLA	31/01/2023	15/02/2023	28/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
4	LOTE VILLA ROSITA	17/01/2023	13/02/2023	18/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Se da por atendida ya que la SED informa la no intervención.
5	SANTA MARTA	16/02/2023	21/02/2023	18/03/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada

6	ORLANDO FALS BORDA	31/01/2023	17/02/2023	21/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
7	SAN CAYETANO	31/01/2023	13/02/2023	15/03/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
8	RURAL LA MAYORÍA	30/01/2023	11/02/2023	17/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
9	DILE USME	30/01/2023	15/02/2023	22/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
10	OFELIA URIBE	01/02/2023	26/02/2023	30/03/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
11	JUAN LUIS LONDOÑO	03/02/2023	13/02/2023	13/03/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
12	QUEBEC	17/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra -Manual de mantenimiento	-Finalizada
13	SANTA LIBRADA	31/01/2023	24/02/2023	06/03/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
14	MIGUEL DE CERVANTES	06/02/2023	07/03/2023	29/03/2023	0.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-No se ha iniciado ejecución

15	RAFAEL URIBE URIBE	11/02/2023	17/02/2023	18/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	--Finalizada
17	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	20/03/2023	24/04/2023	19/05/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
18	FERNANDO GONZALES OCHOA	21/06/2023	1/06/2023	10/07/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
19	PAULO FREIRE ETAPA 2	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
20	RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	31/05/2023	31/05/2023	21/06/2023	100%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada

Durante el periodo del presente informe no se incluyeron nuevas emergencias, se está a la espera de la actualización del balance para determinar el valor total de estas emergencias.

3.2.5. PROGRAMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la programación general de obra para cada uno de los frentes, aclarando que las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.

Tabla 7. Programación general.

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PÉREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARÍA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNIÓN SEDE A - LA UNIÓN												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMÍN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A - JOSÉ MARÍA CÓRDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												


A continuación, se relaciona el estado físico de las intervenciones de las sedes en ejecución a fecha de corte del presente informe:

Tabla 8. Porcentajes de avance por frente.

No.	COLEGIO (SEDE)	LOCALIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	IED USMINIA SEDE C	USME	100,00%	100,00%
2	IED BRASILIA SEDE A	USME	100,00%	100,00%
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	USME	89,00%	87,00%
4	IED NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS	USME	100,00%	100,00%
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	USME	87,00%	93,00%
6	IED LOS TEJARES	USME	100,00%	100,00%
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	USME	100,00%	100,00%
8	INEM SANTIAGO PÉREZ	TUNJUELITO	100,00%	100,00%
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	USME	0,00%	0,00%
10	COLEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	USME	100,00%	100,00%
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	USME	62,00%	57,00%
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	USME	0,00%	0,00%
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	USME	39,00%	100,00%
14	COLEGIO RURAL LA UNIÓN SEDE A	USME	0,00%	100,00%
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	USME	66,00%	100,00%
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	USME	100,00%	100,00%
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	USME	100,00%	100,00%
18	IED OSWALDO GUAYASAMÍN SEDE B	USME	100,00%	100,00%
19	IED FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	USME	59,00%	99,00%
20	IED JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A	TUNJUELITO	53,00%	81,00%
21	IED VENECIA SEDE B	TUNJUELITO	40,00%	99,00%
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	TUNJUELITO	88,00%	100,00%
23	DLE USME	USME	20,00%	49,00%
24	DLE TUNJUELITO	TUNJUELITO	21,00%	67,00%

A continuación, presenta el avance general del contrato a la fecha, contando con un porcentaje ejecutado del 80.85% y un porcentaje programado del 70.48%, lo cual evidencia un adelanto del 10.37% con respecto a la programación contractual.

Tabla 9. Porcentaje de avance general.

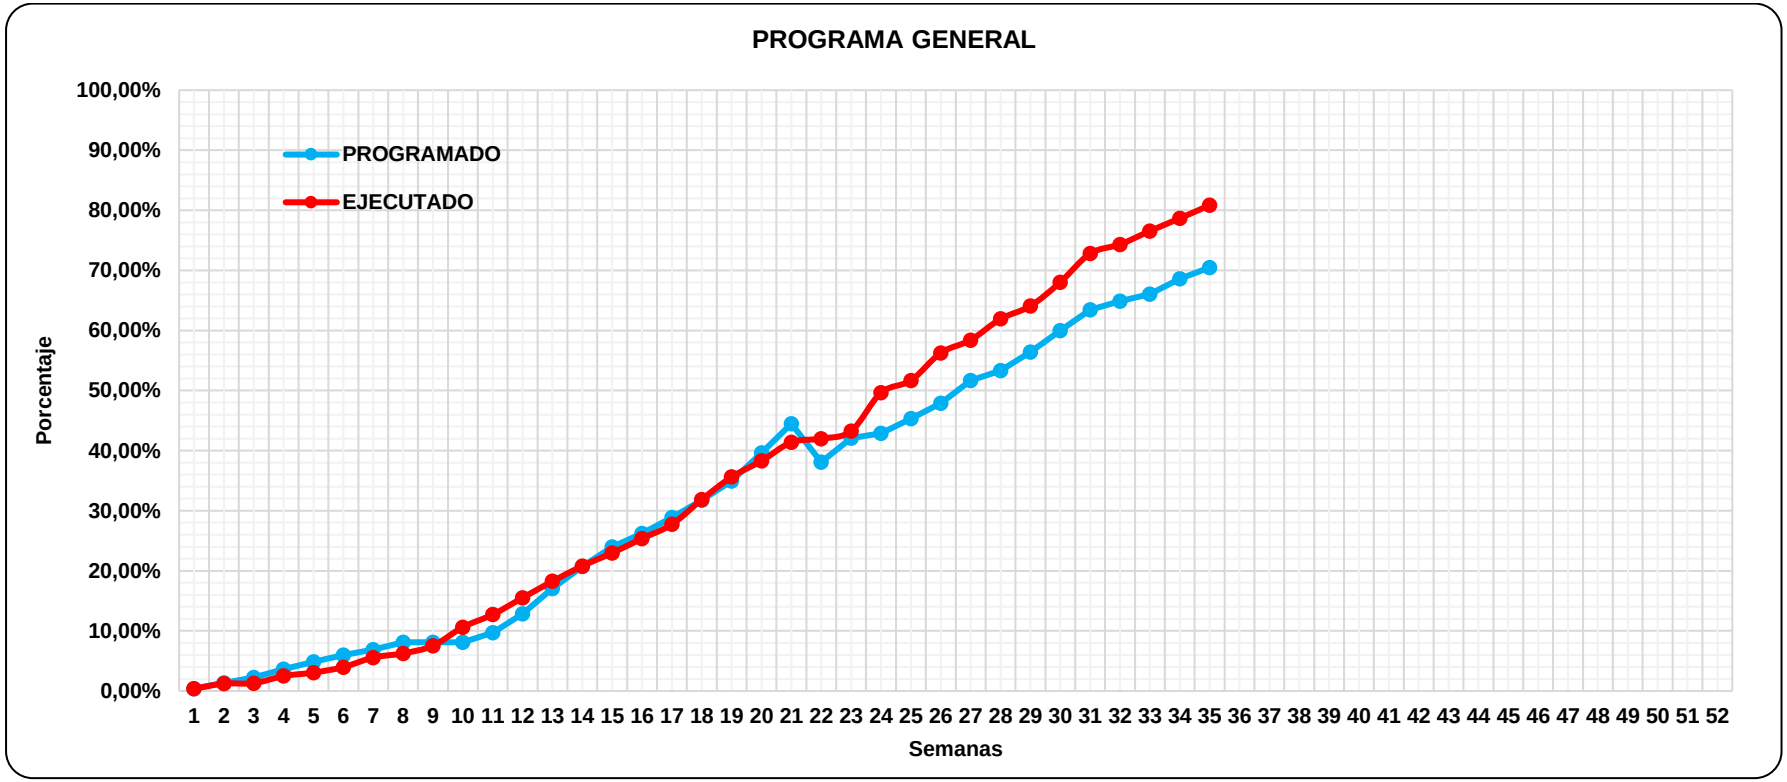

3.2.6. BALANCE PRESUPUESTAL

A continuación, se relaciona el resumen del balance presupuestal por sedes a fecha de corte del presente informe, dicho balance corresponde a los ajustes realizados por el contratista y avalados por esta interventoría de acuerdo a la definición de alcances establecida por la SED en el comité técnico del pasado 17 de marzo.

Tabla 10. Balance presupuestal.

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PÉREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COLEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00

11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNIÓN SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMÍN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96

23	DEL USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DEL TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL, OBRAS PROGRAMADAS				$ 11.065.642.509,00	$ 10.709.986.731,12	$ -355.657.777,88
TOTAL, EMERGENCIAS				$ 1.008.154.304,00	$ 1.198.868.110,01	$ 190.713.806,01
TOTAL, CONTRATO DE OBRA				$ 12.073.796.813,00	$ 11.908.852.841,13	$ 164.943.971,87

En la siguiente tabla se evidencia el estado financiero del contrato de obra aclarando que a fecha de corte del presente informe no se ha realizado pago del acta No. 8:

Tabla 11. Estado financiero contrato de obra.

ACTA	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ACTA	VALOR PAGADO	SALDO
1	1	$369.458.182	$585.579.145	$ 117.790.703	$ 117.790.703	$11.956.006.110
2	2	$386.361.498	$396.020.535	$ 387.009.813	$ 387.009.813	$11.568.996.297
3	3	$1.448.855.618	$1.078.190.056	$ 863.616.581	$ 863.616.581	$10.705.379.716
4	4	$1.144.595.937	$1.427.122.783	$ 1.026.228.017	$ 1.026.228.017	$9.679.151.669
5	5	$1.436.781.822	$1.137.351.660	$ 1.743.190.195	$ 1.743.190.195	$7.935.961.504
6	6	$2.141.891.553	$2.169.661.288	$1.518.098.179	$1.518.098.179	$6.417.863.325
7	7	$1.861.779.489	$865.691.231	$2.406.445.015	$2.406.445.015	$4.011.418.310
8	8	$1.107.119.554	$849.995.295	$1.834.465.130		
	9					
	10					
	11					
	12					
TOTAL		$9.896.843.633	$8.509.611.993	$9.896.843.633	$8.062.378.503	$4.011.418.310

3.2.7. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se relaciona el estado de las obras ejecutadas durante el presente periodo en cada uno de los frentes de obra en ejecución con la supervisión de la interventoría.

Tabla 12. Actividades ejecutadas.


<table>
<tr><th colspan="3">IED BRASILIA SEDE A</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Impermeabilización de terraza.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL EL UVAL</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
</table>

		Actividades ejecutadas: - Pañete sobre muros. - Instalación de enchape sobre muros. - Desmonte de cubierta y ventanería. - Enchape de pisos aula modular. - Fabricación de estructura metálica. - Montaje de estructura metálica. - Reposición cintas antideslizantes. - Adecuación de cerraduras. - Instalación de estructura metálica. - Instalación de cubierta. - Instalación y emboquillado de enchape de baños. - Aseo final aula modular.
		


IED NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Aseo final etapa III. - Instalación de divisiones en vidrio área administrativa.


		
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC SEDE C USME		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación de estructura metálica. - Resane de muros. - Instalación de cubierta. - Instalación de red eléctrica. - Instalación de luminarias.
		
IED FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A		

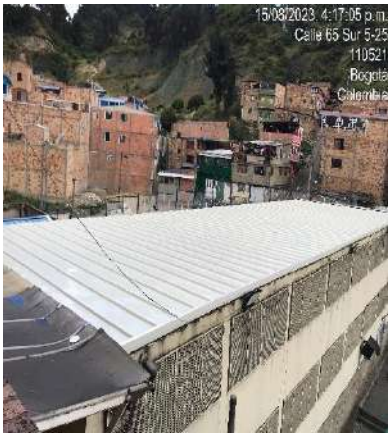
Durante	Durante	Actividades ejecutadas
		Actividades ejecutadas: - Instalación de estructura metálica. - Instalación de cubierta. - Resane y pintura de muros. - Instalación de canal. - Instalación de red eléctrica. - Instalación de luminarias.
		
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**

		Actividades ejecutadas: - Instalación de aparatos sanitarios. - Resane de vanos. - Impermeabilización de viga canal. - Aseo final aulas.
		
COLEGIO RURAL LA UNIÓN SEDE A		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación de estructura metálica. - Instalación de cubierta. - Instalación de ventanería. - Instalación de cielo raso. - Instalación de red eléctrica. - Resane de ventanas. - Aseo final etapa II.

		
IED FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Pintura bajo placa. - Instalación de luminarias. - Desmonte tanque de almacenamiento. - Instalación tanque de 1000 L. - Instalación de desagües en patio. - Instalación de piso grano caucho. - Demolición de mesones. - Instalación ventana en patio. - Resane y pintura de muros. - Aseo final.
		
IED JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A		

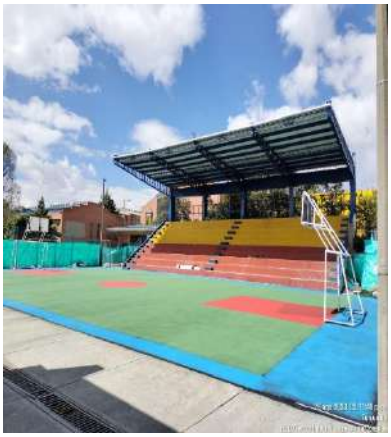Durante	Durante	Actividades ejecutadas
		Actividades ejecutadas: - Instalación de luminarias. - Retiro de carpeta asfáltica afectada. - Instalación de carpeta asfáltica. - Mantenimiento de barandas. - Pintura de cancha. - Mantenimiento de cerramiento.
		
IED VENECIA SEDE B		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**

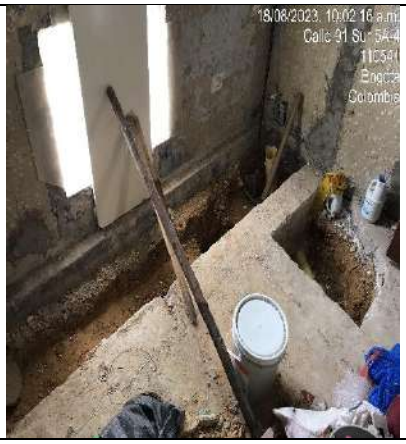		Actividades ejecutadas: - Instalación de carpeta asfáltica. - Demolición de andenes. - Reparación portón. - Fundida de losas. - Instalación de cielo raso. - Instalación de muros en drywall. - Resane de cárcamo. - Instalación rejillas de cárcamo. - Instalación de porterías. - Pintura de cancha. - Instalación de puertas.
		
DLE USME		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Resane de regatas en muros. - Demolición de placa de piso. - Excavación para instalación de tuberías. - Retiro lámparas existentes en los baños. - Pintura de muros en baño. - Instalación de divisiones. - Fundida de rampa.

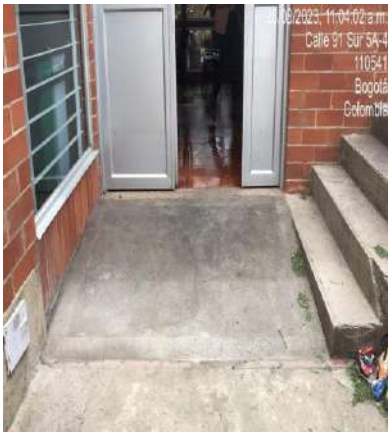		
DLE TUNJUELITO		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Mantenimiento de cerramientos. - Desmonte tanque de almacenamiento. - Fundida de placa para tanque. - Instalación de divisiones de baños. - Resane de muros. - Limpieza de canales. - Picado de muros para instalación de enchape. - Ampliación de cárcamo.
		

<table>
<tr><th colspan="3">COLEGIO OFELIA URIBE (EMERGENCIA)</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Instalación de luminarias.
- Instalación de lavamanos y aparatos sanitarios.
- Elaboración de mediacañas.
- Instalación de canal.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL LA MAYORÍA (EMERGENCIA)</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Demolición cuarto bodega.
- Pañete y pintura sobre muros.</td></tr>
</table>


		
IED BRASILIA SEDE A		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación red eléctrica y luminarias. - Resane muros y culatas.
		

<table>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL EL UVAL</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Pañete sobre muros.
- Pintura sobre muros.
- Instalación de aula modular.
- Instalación red hidráulica baños.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">IED NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Instalación de estructura metálica.
- Instalación cubierta.
- Resane de muros.
- Pintura de muros.</td></tr>
</table>


		

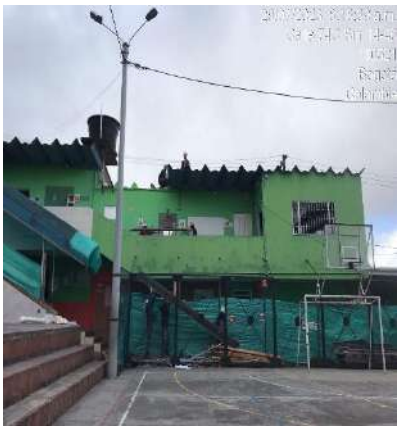COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC USME		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación red eléctrica y luminarias etapa 3. - Instalación de cerramiento etapa 3. - Desmonte de red eléctrica. - Desmonte de cubierta.
		

IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación de estructura metálica. - Instalación cubierta. - Instalación red eléctrica. - Resane de muros. - Pintura fachadas bloque 1. - Aseo final.
		

IED FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación cerramiento etapa 2. - Desmonte red eléctrica. - Desmonte de cubierta. - Instalación estructura metálica.

		
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Cambio de ventanas. - Resane y pintura de muros. - Enchape de muros. - Instalación de cielo raso. - Instalación de red eléctrica. - Instalación de luminarias.
		
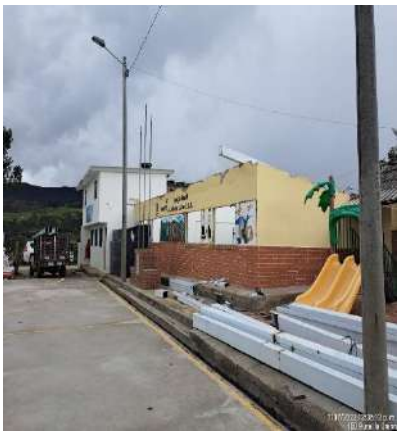
<table>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL LA UNIÓN SEDE A</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Desmonte de cubierta.
- Desmonte de cielo raso.
- Desmonte de luminarias y red eléctrica.
- Instalación estructura metálica.
- Instalación de cubierta.
- Cambio de ventanas.
- Pintura de muros.
- Instalación red eléctrica.
- Aseo final etapa I.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Aseo final.</td></tr>
</table>

		
IED OSWALDO GUAYASAMÍN SEDE B		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación de ventanas. - Pintura bajo placa. - Instalación de flanches. - Instalación de rejas. - Aseo final.
		

<table>
<tr><th colspan="3">IED FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Instalación estructura metálica.
- Instalación de cubierta.
- Instalación red eléctrica.
- Resane y pintura de muros.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">IED JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Desmonte de cubierta.
- Instalación de estructura metálica.
- Instalación de cubierta.
- Pintura de barandas.
- Limpieza viga canal.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">IED VENECIA SEDE B</td></tr>
<tr><td>Durante</td><td>Durante</td><td>Actividades ejecutadas</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Demolición placa cancha.
- Excavación mecánica cancha.
- Relleno material granular cancha.
- Instalación carpeta asfáltica cancha.
- Instalación estructura cancha.
- Instalación estructura metálica.
- Instalación de cubierta.
- Instalación red eléctrica.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">DLE USME</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Demolición enchape de baños.
- Desmonte de divisiones y aparatos sanitarios.
- Demolición de pañetes.
- Regatas en muros.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">DLE TUNJUELITO</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Instalación de cerramiento.
- Mantenimiento de cerramiento existente.</td></tr>
</table>

		
IED RURAL ARRAYANES		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación lavamanos. - Enchape de pisos.
		

COLEGIO OFELIA URIBE		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Instalación módulos de muro. - Instalación marcos cajas de inspección. - Instalación y emboquillado enchape de piso. - Montaje divisiones baños.
		

3.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD.

Está interventoría aprueba y remite a la entidad el plan de calidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0024-7178 del 16 de diciembre de 2022, bajo el radicado No. E-2022219699.

Durante el periodo del presente informe el contratista realizó actividades de verificación de tintas penetrantes en soldadura y pruebas de densidades del suelo, los resultados de estos ensayos se encuentran adjuntos al informe de calidad del contrato de obra y se adjunta registro fotográfico en el numeral 4.3 del presente informe.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La información general del proyecto es la siguiente:

Tabla 13. Información General del Proyecto de Interventoría.

INFORMACIÓN GENERAL INTERVENTORÍA	
TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO NO:	CO1.PCCNTR.4146302
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 952.549.780
PLAZO:	TRECE (13) MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	13/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/01/2024

El alcance contempla en general los siguientes aspectos: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al desarrollo del contrato de obra, el cual debe realizar la inspección apropiada de la construcción, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, ambientales, sociales y financieros, establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de interventoría. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

Dentro del contrato derivado del presente proceso de selección, se incluyen las obligaciones a cargo del contratista de supervisar, revisar, vigilar, controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento bajo las condiciones y términos del contrato de obra dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente, así como de informar periódicamente a la SED sobre el desarrollo del proyecto, para que esta última pueda tomar decisiones oportunas que correspondan en relación con el objeto principal contratado.

En desarrollo del contrato de Interventoría debe realizarse la revisión de los trabajos de obra, exigiendo calidad y verificando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, como también prestando colaboración y apoyo permanente a las partes involucradas para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración del informe preliminar de interventoría y la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación del contrato de interventoría. Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan debido a la liquidación del contrato de obra.

Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

4.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se observan a continuación:

Tabla 14.Documentos suscritos a la fecha.

DOCUMENTO	FECHA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22 NOVIEMBRE 2022
ORDEN DE INICIACIÓN	13 DICIEMBRE 2022

4.1.2. RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del presente informe las pólizas se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 15. Relación de Pólizas Contrato de Interventoría.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGUROS	ESTADO / REVISIÓN
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CSC-100027139	$190.509.956,00	13/12/2022	13/07/2024	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ACTUALIZADAS CONTRA EL ACTA DE INICIO
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.		$47.627.489,00	13/12/2022	12/01/2027		

CALIDAD DEL SERVICIO		$190.509.956,00	13/12/2022	12/01/2025		

4.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS.

Tabla 16. Estado financiero contrato de interventoría.

ACTA	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ACTA	VALOR PAGADO	SALDO
1	1	$8.868.238	$8.868.238	$8.868.238	$8.868.238	$943.681.542
2	2	$28.957.514	$28.957.514	$28.957.514	$28.957.514	$914.724.028
3	3	$64.701.943	$64.701.943	$64.701.943	$64.701.943	$850.022.085
4	4	$86.362.926	$86.362.926	$86.362.926	$86.362.926	$763.659.159
5	5	$135.357.324	$135.357.324	$135.357.324	$135.357.324	$628.301.835
6	6	$119.735.507	$119.735.507	$119.735.507	$119.735.507	$508.566.328
7	7	$189.938.428	$189.938.428	$189.938.428	$189.938.428	$318.627.902
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
TOTAL		$633.921.452	$633.921.452	$633.921.452	$633.921.452	$318.627.902

4.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

4.2.1 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORIA.

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones el cual menciona en el 7.5.6.3.13.1. PERSONAL CLAVE PARA CADA GRUPO, *La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:*

Un (1) director de interventoría

Dos (2) residente de interventoría
Un (1) asesor estructural
Un (1) asesor ambiental y seguridad industrial
Un (1) asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
Un (1) asesor hidro sanitario-red contra incendios y gas
Un (1) asesor en costos, presupuestos y programación de obra
Un (1) asesor jurídico
Dos (2) inspectores de interventoría
Un (1) maestro de obra
Dos (2) técnico o tecnólogo SST
Un (1) mensajero

Mediante comunicado CINP-BTA-529-0001-6362 del 11 de noviembre se radica ante la secretaria de educación distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoria, radicado entregado por la entidad E-2022198341.

El 01 de diciembre de 2022, se recibe el oficio No. S-2022369741 en el cual la entidad menciona que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS SED-CM-A-DCCEE-050-2022 los siguientes profesionales cumplen.

Tabla 17. Personal Aprobado Por Interventoría.

PERSONAL INTERVENTORÍA	
CARGO	**NOMBRE Y APELLIDO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
RESIDENTES DE INTERVENTORIA	ANDRÉS FELIPE CANCHÓN MOLINA JUAN CAMILO CALDERÓN
ASESOR ESTRUCTURAL	JAIME ARTURO CURVELO GARCÍA-MAYORCA
ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	HERNANDO GÓMEZ CASAS
ASESOR HIDRO SANITARIO – RED CONTRA INCENDIO Y GAS	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ DE CASTRO
ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ
ASESOR AMBIENTAL	CARMEN MILENA SOTO POLOCHE
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	NELSON BENITO JESSICA GUZMÁN
MAESTRO DE OBRA	JOAN SEBASTIÁN MUÑOZ MOSQUERA
TÉCNICO O TECNÓLOGO SST	DIANA PÁEZ ANDREA PÉREZ
MENSAJERO	FRANCISCO ESCOBAR

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del presente informe se han realizado las siguientes actividades:

- Realizar requerimientos al contratista para la subsanación de las diferentes observaciones que se verifican y realizan durante la ejecución de las actividades de interventoría.
- Acompañamiento a las visitas y reuniones con los colegios rurales y urbanos para informar el estado y/o programación que se tiene para cada una de las sedes.
- Atender toda consulta que haga el contratista, o darle el trámite ante la Entidad, haciendo seguimiento a la atención de estas.
- Revisión y verificación del personal de obra que va a ingresar a cada uno de los frentes.
- Acompañamiento a mesas de trabajo con el personal de la entidad y con el contratista.
- Acompañamiento a la realización de las actas de vecindad de las sedes que inician obras.
- Se realiza los informes semanales de interventoría del No. 33 al 37.
- Supervisión y acompañamiento de las actividades ejecutadas en las obras de las sedes de la primera etapa.
- Solicitar al contratista los documentos y soportes para el correcto desarrollo del proyecto.
- Revisión de fichas técnicas y visitas a las emergencias establecidas por la SED.

4.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD

4.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.

Está interventoría aprueba y remite a la entidad el plan de calidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0024-7178 del 16 de diciembre de 2022, bajo el radicado No. E-2022219699.

Por otra parte, se informa que en el siguiente periodo se contara con ensayos de tintas penetrantes para la verificación de soldaduras de la estructura metálica de cubiertas y su posterior aprobación por parte de la Interventoría. Los resultados de estos ensayos se adjuntan en el informe mensual de obra, se presenta registro fotográfico de la supervisión de dichas pruebas:

Tabla 18. Actividades ejecutadas.

<table>
<tr><th colspan="3">PRUEBAS DE TINTAS</th></tr>
<tr><th>Colegio El Uval</th><th>Colegio El Uval</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="3">-Ensayo de tintas penetrantes.</td></tr>
<tr><th>Colegio Fabio Lozano Simonelli</th><th>Colegio Provincia de Quebec</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

4.4 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- A la fecha del presente informe, se cuenta con un porcentaje de obra programado del 70.48% contra un ejecutado del 80.85%, esto evidencia un avance a favor del 10.37%, por lo cual a la fecha no se presentan irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses de la entidad frente a la ejecución y entrega de las obras.
- A la fecha del presente informe el contratista cuenta con 8 frentes en ejecución por lo que el contratista se encuentra cumpliendo lo establecido en los pliegos de condiciones, 14 frentes terminados en su totalidad y 2 pendientes de intervención.
- A la fecha de elaboración de este informe, se tiene 20 fichas técnicas para atender emergencias, de las cuales actualmente se tienen 1 en ejecución, 18 finalizadas y 1 pendientes por dar inicio, se debe tener en cuenta el presupuesto estipulado para las emergencias ya que, por la cantidad de fichas técnicas, se evidencia que no es posible ejecutar la totalidad de emergencias dadas por la SED por lo que se requiere la verificación de las prioridades de ejecución.

ANEXOS TECNICOS

ANEXO No. 01

PROGRAMA DE EJECUCION

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0578-5329

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-329-2023; Entrega de programación actualizada Colegio Rural el Uval -Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir la programación de la siguiente sede:

- Colegio Rural El Uval.

Es de aclarar que esta información cuenta con el aval de esta interventoría y será implementada en el proceso de seguimiento y control de las obras a ejecutar.

Cordialmente;


CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).


Id	Mode de tar	COD	Task Name	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**		**208 días**	**lun 9/01/23**	**vie 29/09/23**
2			ACTAS DE VECINDAD		5 días	lun 9/01/23	vie 13/01/23
3			**USME**		**203 días**	**sáb 14/01/23**	**vie 29/09/23**
4		**520**	**USME EL UVAL A EL UVAL**		**203 días**	**sáb 14/01/23**	**vie 29/09/23**
5		**1**	**1- PRELIMINARES**		**73 días**	**sáb 14/01/23**	**lun 17/04/23**
6		1.1.1	REPLANTEO	2	2 días	sáb 14/01/23	mar 17/01/23
7		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3,0 M)	6	10 días	mar 17/01/23	lun 30/01/23
8		1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	7	12 días	lun 30/01/23	mar 14/02/23
9		1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0,10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	8	10 días	mar 14/02/23	lun 27/02/23
10		1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	9	5 días	lun 27/02/23	sáb 4/03/23
11		1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	8	0 días	mar 14/02/23	mar 14/02/23
12		1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	11	4 días	mar 14/02/23	sáb 18/02/23
13		1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	11	10 días	mar 14/02/23	lun 27/02/23
14		1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC,, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	13	6 días	lun 27/02/23	lun 6/03/23
15		1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	14	7 días	mar 7/03/23	mié 15/03/23
16		1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	9	12 días	lun 27/02/23	mar 14/03/23
17		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC,, (	16	21 días	mar 14/03/23	lun 10/04/23
18		1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	13	3 días	lun 27/02/23	jue 2/03/23
19		1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	16	3 días	mar 14/03/23	vie 17/03/23
20		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17	6 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23
21		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	18	9 días	jue 2/03/23	mar 14/03/23
22		1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17	2 días	lun 10/04/23	mié 12/04/23
23		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	22	2 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23
24		**2**	**2- ESTRUCTURA**		**68 días**	**lun 10/04/23**	**mié 5/07/23**
25		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	17	3 días	lun 10/04/23	jue 13/04/23
26		2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMED	25	2 días	jue 13/04/23	sáb 15/04/23
27		2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	26	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23

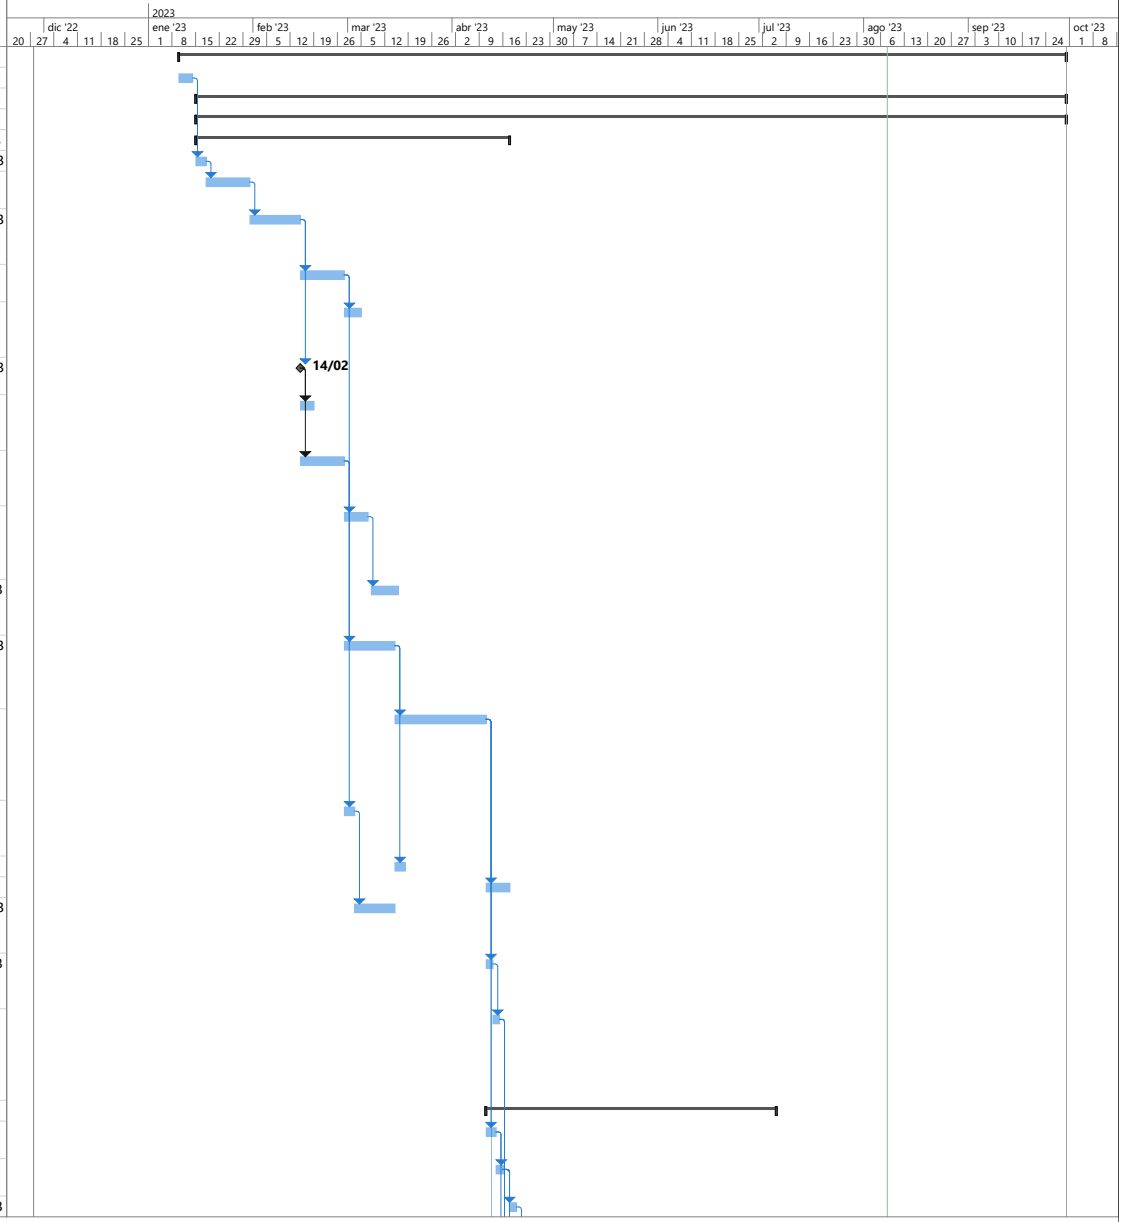

Project: PROGRAMACION SED-
Date: mar 8/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress


Id	Mode de tar	COD	Task Name	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin
28		2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN),	27	9 días	jue 20/04/23	lun 1/05/23
29		2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	25	3 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23
30		2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	28	1 día	mar 2/05/23	mar 2/05/23
31		2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	30	7 días	mié 3/05/23	jue 11/05/23
32		2.3.12	CUNETA EN CONCRETO 30 x 30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	31	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23
33		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M	30	7 días	mié 3/05/23	jue 11/05/23
34		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	17	68 días	lun 10/04/23	mié 5/07/23
35		**4**	**4- INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO**		**8 días**	**vie 14/04/23**	**mar 25/04/23**
36		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	26	2 días	lun 17/04/23	mar 18/04/23
37		4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	26	2 días	lun 17/04/23	mar 18/04/23
38		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	37	3 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23
39		4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	37	3 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23
40		4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	37	1 día	mié 19/04/23	mié 19/04/23
41		4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	23	3 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23
42		4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2''	23	3 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23
43		4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	42	2 días	mié 19/04/23	jue 20/04/23
44		4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2	42	2 días	mié 19/04/23	jue 20/04/23
45		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	40	2 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23
46		4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	39	2 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23
47		4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
48		4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
49		**5**	**5- INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES**		**22 días**	**lun 17/04/23**	**sáb 13/05/23**
50		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,	26	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
51		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	26	7 días	lun 17/04/23	mar 25/04/23
52		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN,	26	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
53		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN,	26	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
54		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	53	2 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23
55		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	53	2 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23
56		5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	53	2 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23
57		5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	53	5 días	sáb 22/04/23	vie 28/04/23

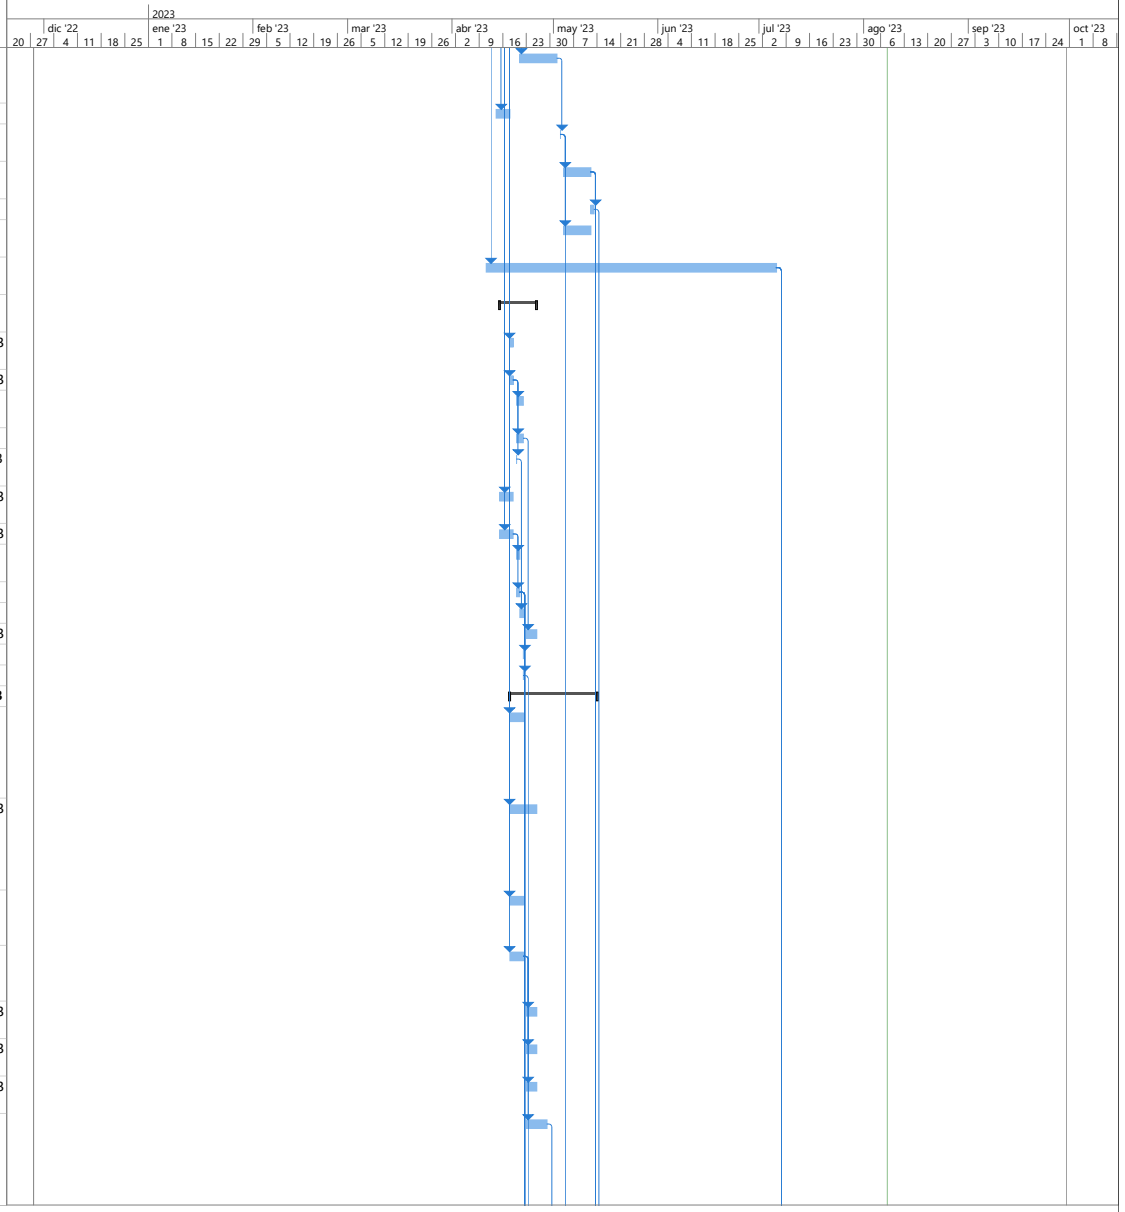

Project: PROGRAMACION SED-
Date: mar 8/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress


Id	Mode de tar	COD	Task Name	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin
58		5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	57	12 días	vie 28/04/23	sáb 13/05/23
59		**7**	**7- PISOS**		**9 días**	**jue 11/05/23**	**mar 23/05/23**
60		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	31	3 días	jue 11/05/23	lun 15/05/23
61		7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	60	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23
62		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	60	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23
63		7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	60	5 días	mar 16/05/23	lun 22/05/23
64		7.2.39	WIN DE ALUMINIO	63	1 día	lun 22/05/23	mar 23/05/23
65		7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	32	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
66		7.2.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA HUELLA BALDOSA LOSETA CONCRETO PREPULIDA LISTÓN GRIS ESTRIADO, CONTRAHUELLA EN GRAVILLA LAVADA MONA, MEDIA CAÑA EN GRAVILLA MONA. INCLUYE ALISTADO.	63	1 día	lun 22/05/23	mar 23/05/23
67		**8**	**8- MAMPOSTERIA SECA**		**6 días**	**mar 16/05/23**	**mar 23/05/23**
68		8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	86	6 días	mar 16/05/23	mar 23/05/23
69		**9**	**9- CARPINTERIA METÁLICA**		**8 días**	**mié 5/07/23**	**vie 14/07/23**
70		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS, (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	34	8 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23
71		9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	34	5 días	mié 5/07/23	mar 11/07/23
72		**11**	**11- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**		**5 días**	**vie 21/04/23**	**jue 27/04/23**
73		11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
74		11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	44	3 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23
75		11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
76		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
77		11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	44	5 días	vie 21/04/23	jue 27/04/23
78		11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
79		11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	44	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
80		11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	48	1 día	sáb 22/04/23	lun 24/04/23
81		**12**	**12- APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES**		**8 días**	**sáb 22/04/23**	**mar 2/05/23**
82		12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF, 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	74	6 días	mar 25/04/23	mar 2/05/23
83		12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	76	2 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23
84		**13**	**13- PAÑETE Y PINTURA**		**58 días**	**jue 11/05/23**	**lun 24/07/23**
85		13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	31	5 días	jue 11/05/23	mié 17/05/23
86		13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	31	3 días	jue 11/05/23	lun 15/05/23
87		13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADC	86	15 días	mar 16/05/23	vie 2/06/23

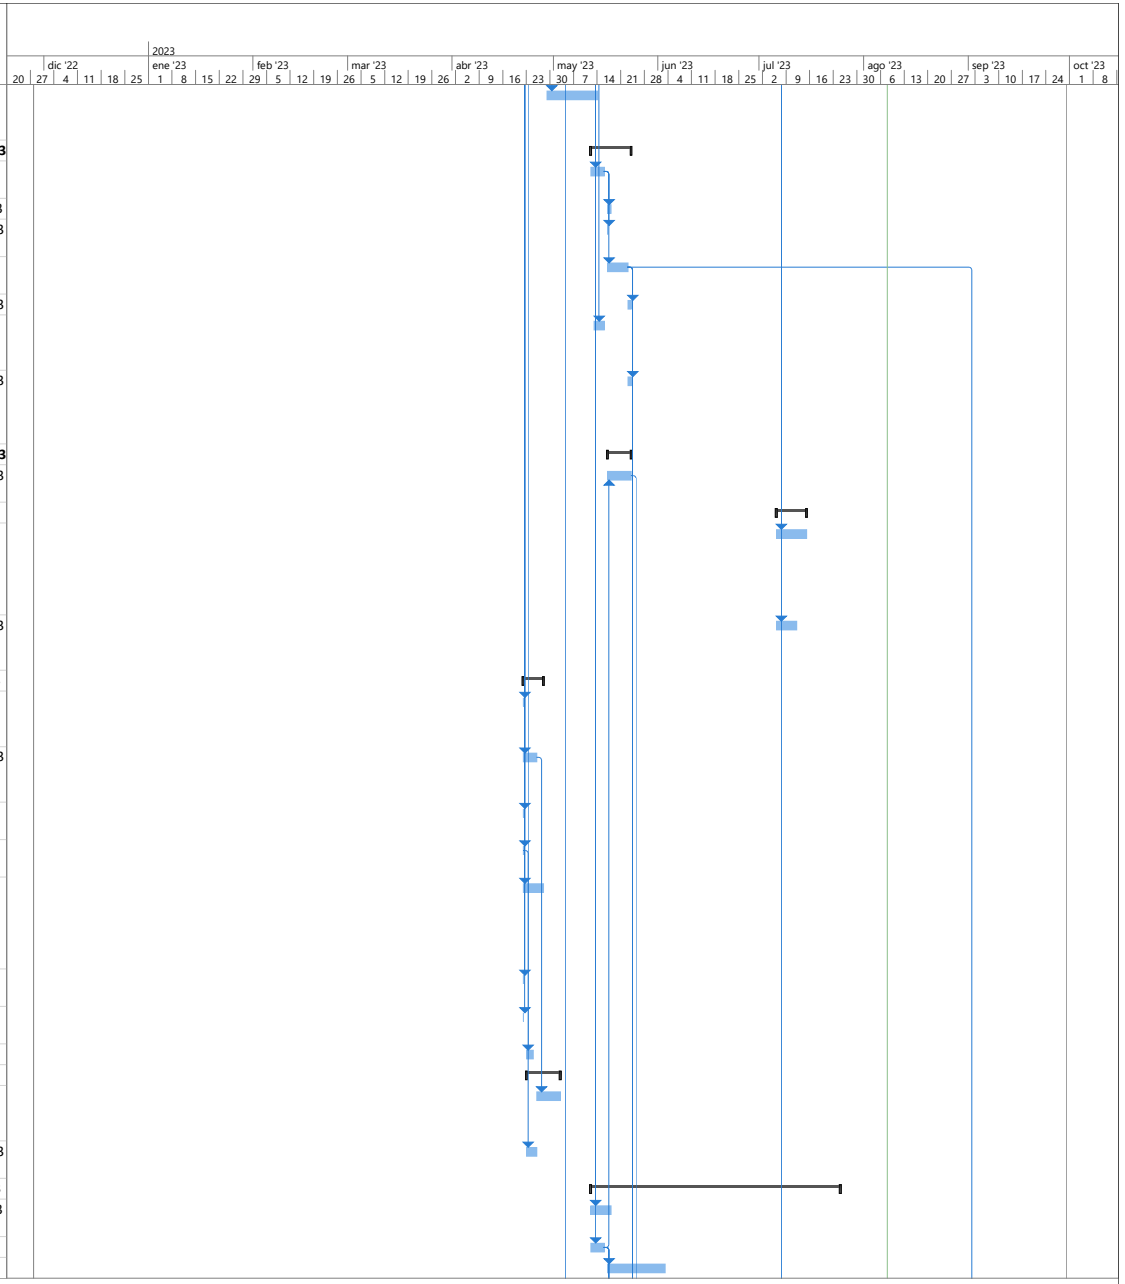

Project: PROGRAMACION SED-
Date: mar 8/08/23

Task | Summary | Inactive Milestone | Duration-only | Start-only | External Milestone | Manual Progress
Split | Project Summary | Inactive Summary | Manual Summary Rollup | Finish-only | Deadline
Milestone | Inactive Task | Manual Task | Manual Summary | External Tasks | Progress

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin
88		13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	86	15 días	mar 16/05/23	vie 2/06/23
89		13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	86	36 días	mar 16/05/23	jue 29/06/23
90		13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	86	36 días	mar 16/05/23	jue 29/06/23
91		13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	34	15 días	mié 5/07/23	lun 24/07/23
92		**15**	**15- CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**		**15 días**	**mar 23/05/23**	**sáb 10/06/23**
93		15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE E =4 MM	68	15 días	mar 23/05/23	sáb 10/06/23
94		**16**	**16- OBRAS EXTERIORES Y VARIOS**		**9 días**	**mié 3/05/23**	**sáb 13/05/23**
95		16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO,	30	9 días	mié 3/05/23	sáb 13/05/23
96		**17**	**17- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**		**61 días**	**mié 5/07/23**	**mié 20/09/23**
97		17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	100FC-21 días	20 días	jue 24/08/23	lun 18/09/23
98		17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	97	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23
99		17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	34	1 día	mié 5/07/23	jue 6/07/23
100		17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm,) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm,y 40 mm, ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm, - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	34	60 días	mié 5/07/23	mar 19/09/23
101		17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	100	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23
102		**20**	**20- ASEO Y DISPOSICION FINAL**		**103 días**	**lun 22/05/23**	**vie 29/09/23**
103		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	63FC+18 días	22 días	vie 1/09/23	vie 29/09/23
104		20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	63	15 días	lun 22/05/23	vie 9/06/23
105		20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	101FC-3 días	8 días	lun 18/09/23	mié 27/09/23
106			**ENTREGA DE OBRA**	103	0 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23

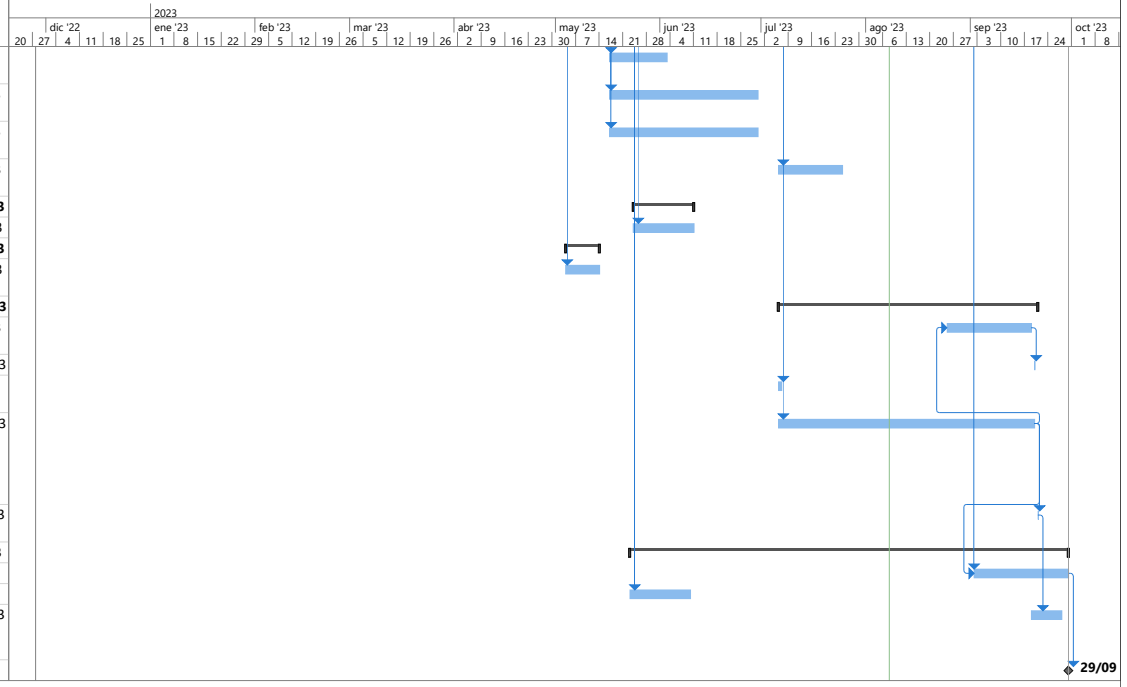

Project: PROGRAMACION SED-
Date: mar 8/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0597-5508

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Reprogramaciones Frentes – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir las programaciones de obra correspondientes a los siguientes frentes:

- Nuevo San Andrés de los Altos.
- Provincia de Quebec.
- Fabio Lozano Simonelli.
- Programación general del contrato de obra.

Aclaramos que esta información se encuentra debidamente verificada y avalada por esta Interventoría.

Cordialmente;


CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en siete (07) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

Id	Modo de tarea	Notas comité 26-5-23	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**312 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/12/23**
2			ACTA DE INICIO	1 día	mié 28/12/22	jue 29/12/22
3			**USME**	**302 días**	**lun 9/01/23**	**mié 27/12/23**
4			USME USMINIA- C CANTONIO JOSE DE SUCRE	119 días	mié 18/01/23	mar 6/06/23
5			USME BRASILIA- A BRASILIA	166 días	mié 18/01/23	lun 31/07/23
6			USME RURAL CURUBITAL A RURAL CURUBITAL	143 días	lun 10/07/23	sáb 23/12/23
7			USME RURAL EL DESTINO A RURAL EL DESTINO	60 días	mié 26/04/23	mié 5/07/23
8		Realizar solicitud y ajuste en la programa	USME EL UVAL A EL UVAL	226 días	lun 9/01/23	vie 29/09/23
9		Realizar solicitud y ajuste en la programacion detallada	USME FABIO LOZANO SIMONELI A FABIO LOZANO SIMONELI	142 días	mar 9/05/23	sáb 21/10/23
10			USME RURAL LOS ANDES A RURAL LOS ANDES	104 días	mié 15/03/23	vie 14/07/23
11			USME FRANCISCO ANTONIO ZE- C MARIA AUXILIADORA	77 días	jue 28/09/23	mié 27/12/23
12			USME RURAL LA ARGENTINA A RURAL LA ARGENTINA	93 días	vie 14/07/23	mar 31/10/23
13			USME LA UNION A LA UNION	71 días	lun 2/10/23	sáb 23/12/23
14			USME RURAL LAS MERCEDES A RURAL LAS MERCEDES	78 días	sáb 1/07/23	sáb 30/09/23
15			USME RURAL LOS ARRAYANES A RURAL LOS ARRAYANES	70 días	lun 24/04/23	vie 14/07/23
16		Ya se aprobo se debe realizar ajuste a la programacion detallada	USME NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS A NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	183 días	mié 18/01/23	sáb 19/08/23
17		Realizar solicitud y ajuste en la programacion detallada	USME PROVINCIA DE QUEBEC A PROVINCIA DE QUEBEC	210 días	mié 18/01/23	mié 20/09/23
18			USME OSWALDO GUAYAS A MINBVIRREY	66 días	lun 15/05/23	lun 31/07/23
19			USME LOS TEJARES -B EL CURUBO	59 días	mié 18/01/23	mar 28/03/23
20			USME FEDERICO GARCIA LORCA- C CBETANIA	93 días	mié 14/06/23	sáb 30/09/23
21			USME ESTANISLAO ZULETA- B LA ALBORADA	136 días	mié 18/01/23	lun 26/06/23
22			USME D L E USME D L E USME	118 días	sáb 1/07/23	jue 16/11/23
23			**TUNJUELITO**	**254 días**	**lun 13/02/23**	**mié 6/12/23**
24			TUNJUELITO JOSE MARIA CORDOBA- A JOSE MARIA CORDOBA	100 días	vie 16/06/23	mié 11/10/23
25			TUNJUELITO VENECIA- B NUEVO MUZU	109 días	lun 5/06/23	mar 10/10/23
26			TUNJUELITO BERNARDO JARAMILLO-A BERNARDO JARAMILLO	53 días	mar 4/07/23	lun 4/09/23
27			TUNJUELITO INEM SANTIAGO PEREZ- A INEM SANTIAGO PEREZ	111 días	lun 13/02/23	jue 22/06/23
28			TUNJUELITO D L E TUNJUELITO D L E TUNJUELITO	116 días	lun 24/07/23	mié 6/12/23

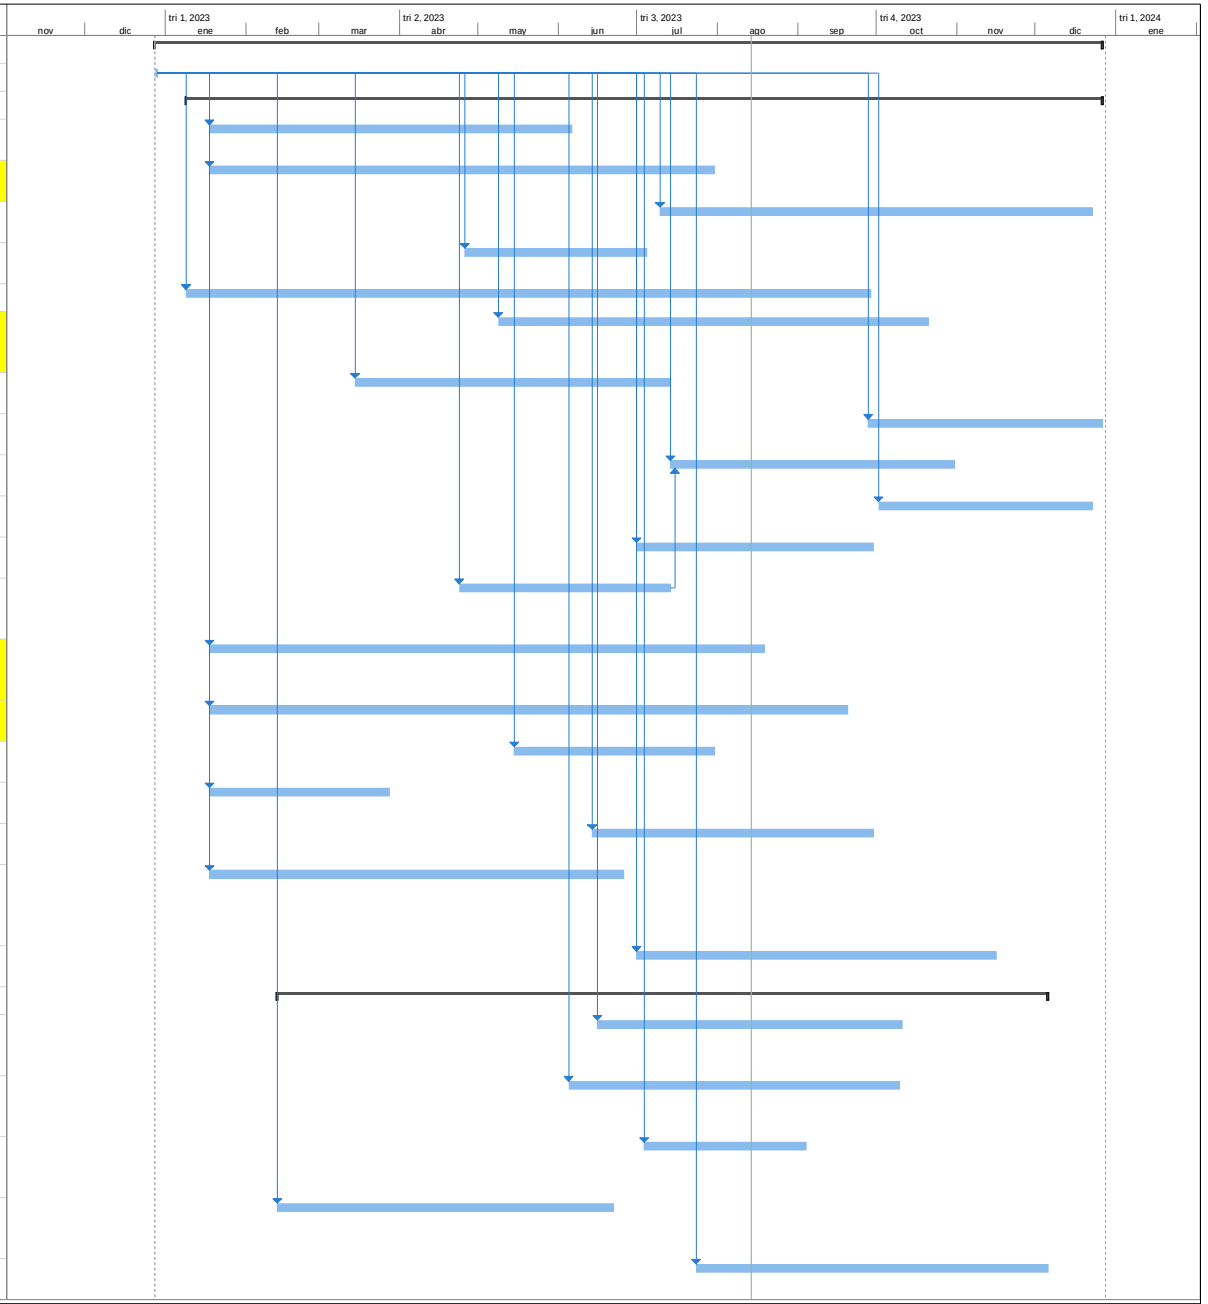


Proyecto: RESUMEN GENERAL
Fecha: lun 14/08/23

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**111 días**	**mar 9/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mar 9/05/23	lun 15/05/23	$ 0.00
3			**USME**	**106 días**	**mar 16/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
4		**CPF 523**	**FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**	**106 días**	**mar 16/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
5		1.1.1	REPLANTEO	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.605.120.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 1.413.160.00
7		1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	6 días	mar 23/05/23	mar 30/05/23	$ 576.178.20
8		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	15 días	mié 31/05/23	jue 22/06/23	$ 14.554.927.20
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	vie 23/06/23	mar 27/06/23	$ 181.008.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	3 días	mar 27/06/23	jue 29/06/23	$ 1.709.000.00
11		1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC	9 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 4.021.250.00
12		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	39 días	vie 23/06/23	mar 22/08/23	$ 181.565.660.00
13		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	4 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	$ 1.971.045.00
14		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	6 días	vie 1/09/23	vie 8/09/23	$ 8.062.992.00
15		5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	3 días	vie 14/07/23	mar 18/07/23	$ 1.512.226.00
16		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	11 días	mié 19/07/23	jue 3/08/23	$ 6.748.800.00

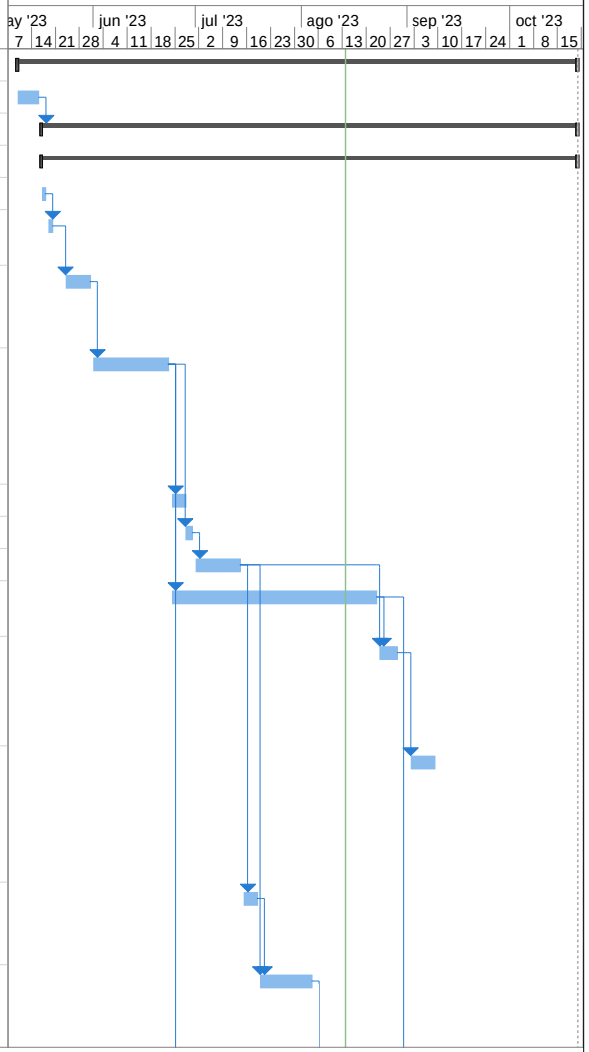


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mo de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
17			5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	10 días	vie 4/08/23	vie 18/08/23	$ 6.062.720.00
18			5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 3.046.240.00
19			5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 3.650.880.00
20			5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 8.421.120.00
21			5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	9 días	mar 22/08/23	vie 1/09/23	$ 16.701.237.00
22			5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	9 días	lun 4/09/23	jue 14/09/23	$ 12.201.777.00
23			5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	9 días	lun 4/09/23	jue 14/09/23	$ 3.474.702.00
24			17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	6 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	$ 6.829.380.00
25			17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	26 días	mié 30/08/23	mié 4/10/23	$ 146.827.591.04
26			17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	2 días	jue 5/10/23	vie 6/10/23	$ 6.606.578.40
27			20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	10 días	vie 6/10/23	vie 20/10/23	$ 2.704.358.40
28			20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	21 días	vie 23/06/23	mar 25/07/23	$ 28.089.600.00
29				**ENTREGA DE OBRA**	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 0.00

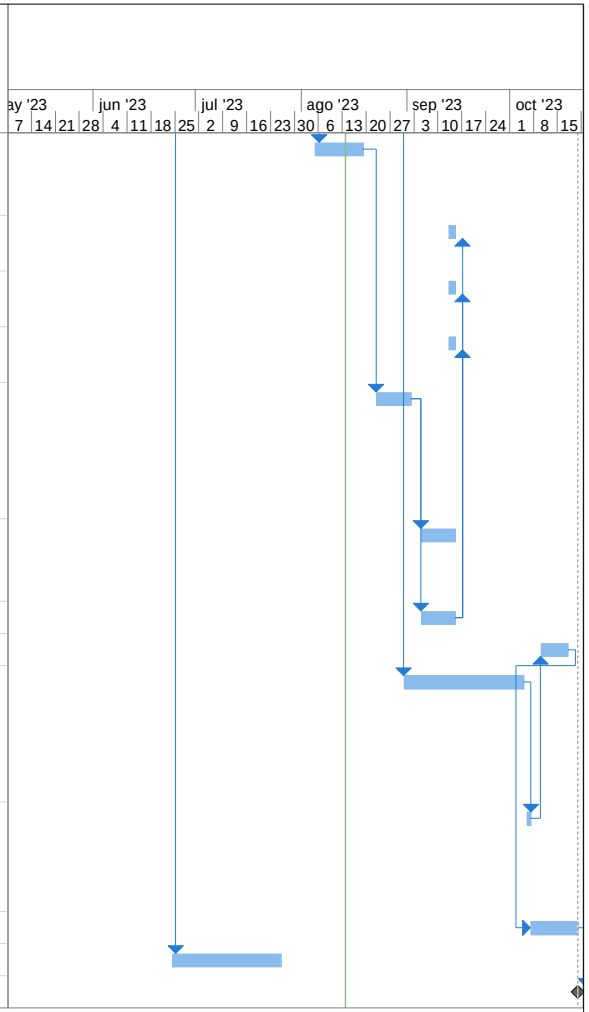


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**143 días**	**mié 18/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mié 18/01/23	mar 24/01/23	$ 0.00
3			**USME**	**138 días**	**mié 25/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
4		**CPF 543**	**NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**	**138 días**	**mié 25/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
5		1.1.1	REPLANTEO	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23	$ 3.079.360.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	3 días	lun 30/01/23	mié 1/02/23	$ 8.266.986.00
7		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	18 días	jue 2/02/23	lun 27/02/23	$ 26.545.622.11
8		1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	3 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 471.625.00
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	vie 3/03/23	mar 7/03/23	$ 50.280.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	12 días	mié 8/03/23	vie 24/03/23	$ 273.440.00
11		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	42 días	lun 27/03/23	lun 29/05/23	$ 226.815.920.00
12		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	$ 3.923.443.00
13		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8 días	vie 14/07/23	mié 26/07/23	$ 3.769.552.00
14		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	8 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	$ 19.709.536.00
15		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	14 días	mar 30/05/23	mar 20/06/23	$ 10.966.800.00
16		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	9 días	mié 21/06/23	mar 4/07/23	$ 12.314.900.00
17		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 4.188.580.00
18		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 5.019.960.00
19		5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 11.579.040.00

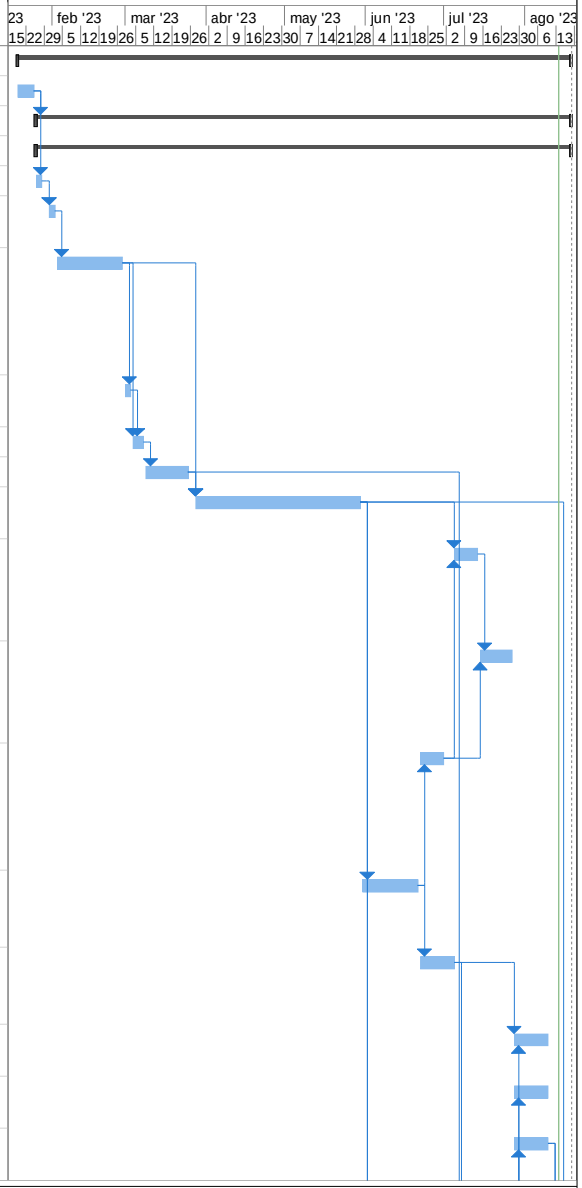


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
20			5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	15 días	mié 5/07/23	mié 26/07/23	$ 23.328.712.00
21			5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23	$ 17.043.752.00
22			5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23	$ 4.853.552.00
23			7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	2 días	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 69.505.00
24			13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	lun 24/07/23	vie 4/08/23	$ 18.825.504.96
25			13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	13 días	vie 21/07/23	mié 9/08/23	$ 7.968.000.00
26			13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	6 días	mar 30/05/23	mar 6/06/23	$ 26.096.400.00
27			17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM	3 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 5.667.360.00
28			17.1.7	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	2 días	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 10.404.00
29			17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	28 días	mar 6/06/23	mar 18/07/23	$ 216.515.517.13
30			17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	3 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 5.505.534.00
31			17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	5 días	mar 30/05/23	lun 5/06/23	$ 11.452.320.00
32			20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	7 días	jue 10/08/23	vie 18/08/23	$ 7.468.983.50
33			20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	21 días	jue 6/07/23	vie 4/08/23	$ 38.314.400.00
34			0	ENTREGA DE OBRA	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	$ 0.00




Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**165 días**	**mié 18/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mié 18/01/23	mar 24/01/23	$ 0.00
3			**USME**	**160 días**	**mié 25/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
4		**CPF 554**	**PROVINCIA DE QUEBEC SEDE A**	**160 días**	**mié 25/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
5		1.1.1	REPLANTEO	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23	$ 2.677.568.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	5 días	lun 30/01/23	vie 3/02/23	$ 3.886.190.00
7		1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	lun 6/02/23	mar 14/02/23	$ 787.475.80
8		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	20 días	mié 15/02/23	mar 14/03/23	$ 24.282.586.28
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	$ 522.912.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	5 días	mar 21/03/23	lun 27/03/23	$ 3.486.360.00
11		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	52 días	mar 28/03/23	mié 14/06/23	$ 296.997.863.36
12		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 5.368.922.00
13		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	6 días	jue 29/06/23	vie 7/07/23	$ 14.782.152.00
14		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	3 días	jue 15/06/23	mar 20/06/23	$ 2.530.800.00
15		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	3 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23	$ 1.894.600.00
16		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23	$ 1.142.340.00
17		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23	$ 912.720.00

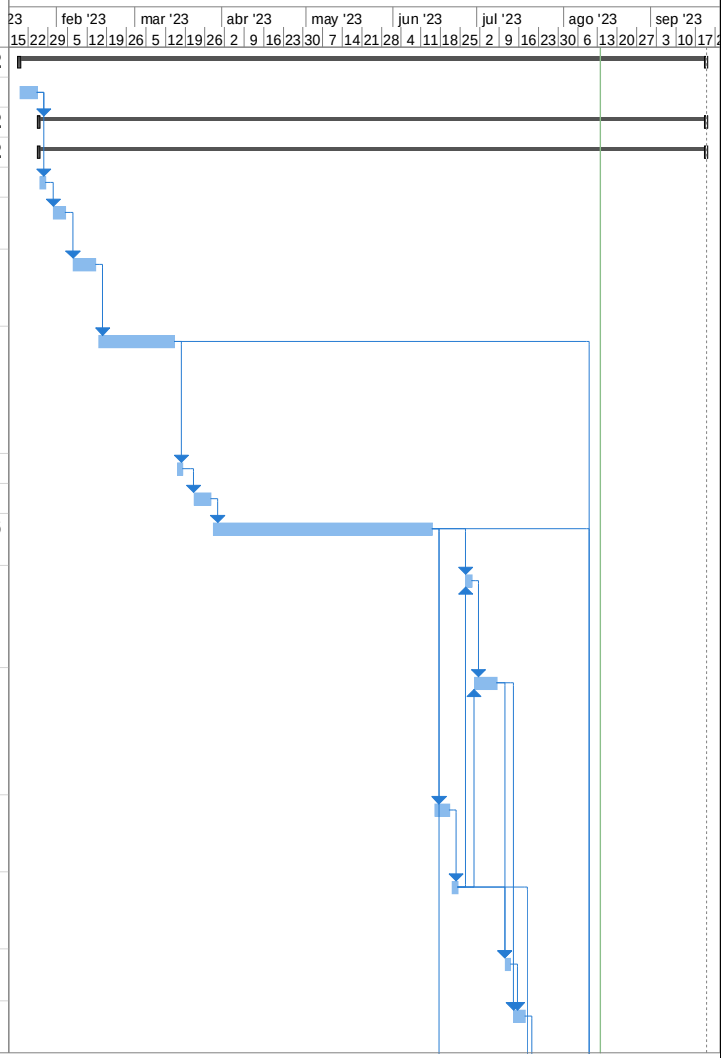


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mo de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
18		5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	6 días	mar 18/07/23	mié 26/07/23	$ 28.895.791.00
19		5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 21.111.011.00
20		5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA	8 días	jue 10/08/23	mar 22/08/23	$ 354.530.00
21		5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	8 días	jue 10/08/23	mar 22/08/23	$ 6.011.786.00
22		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	11 días	mié 9/08/23	jue 24/08/23	$ 35.042.701.40
23		9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	6 días	vie 25/08/23	vie 1/09/23	$ 3.068.867.00
24		13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	9 días	lun 28/08/23	jue 7/09/23	$ 17.210.700.00
25		13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	6 días	jue 31/08/23	jue 7/09/23	$ 5.851.500.00
26		17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	5 días	mié 25/01/23	mar 31/01/23	$ 2.529.400.00
27		17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	28 días	jue 15/06/23	jue 27/07/23	$ 208.077.006.98
28		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	9 días	vie 8/09/23	mié 20/09/23	$ 6.408.306.70
29		20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	13 días	mié 9/08/23	lun 28/08/23	$ 44.745.040.00
30			ENTREGA DE OBRA	0 días	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 0.00

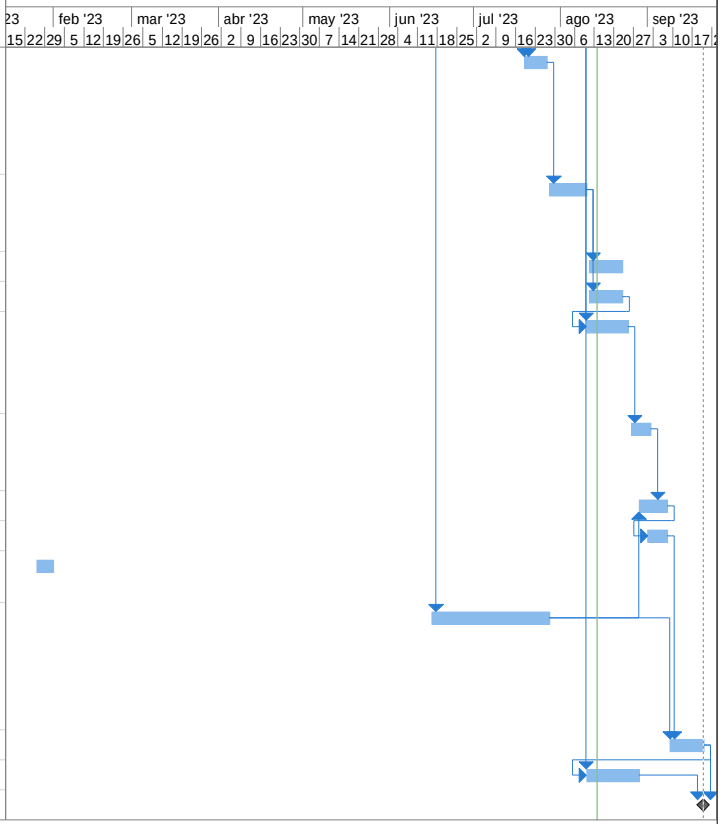

Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ANEXO No.02

BITACORAS DE OBRA

IED RURAL EL UVAL

lunes. 31-07-2023.

se observa qce el Area Nueva a Intervenir el Colegio Esta usando Dos salones y a la Fecha no se ha retirado la antena ni el Rack Comunicaciones ubicado en el Area de sistemas,

Fabian C.

Martes 01-08-2023

se realiza cerramiento Provicional de obra en bloque nuevo a intervenir Con Polisombra Verde y Varas Rollizas. se observa Canal de Aguas lluvias en la Parte Posterior del Aula de Sistemas la Cual Suministra Agua a los tanques de riego de la huerta. Esta Canal debe retirarse Para la ejecución de la obra.

FABIAN. C.

Miercoles 02-08-2023

se Inician Actividade de EnchaPe en Aula Modular se Programa Instalación de Ventanas el dia juevez 03-08-2023.

Fabian Cubillos.

Jueves 03-08-2023.

Continuaron Con trabajos de enchaPe en el Aula modular E instalación de Ventanas en Aula modular, se realiza remate de Baños e Instalaciones hidraulicas.

Fabian Cubillos.

Viernes 04-08-2023.

Se finaliza enchaPe de aula modular se Atiende obsevaciones de Ventanas en bloque ya Intervenido.

Fabian C.

07/08/2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra. inspector SST. Oficial (1) cubierta (3)
clima. mañana. lluvia 8:00 a 9:30 am tarde soleado
Actividades: se realizo desmonte de cubierta zona dantas
Continua actividad enchape de muros de piso Baños. Cargues zona dantas
Aldair Venegas
Insp obra

08/08/2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría. inspector técnico obra. inspector SST
clima: mañana nublado, tarde nublada
Actividades: oficial (1) ayudante (1) cubierta (2) se realiza acopio de material RCD y teja en sitio de acopio, se realiza (de un) demolición de enchapado zona dantas, Continuo actividad. enchape de muros y piso. Baños
Aldair Venegas
Insp obra

09/08/2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, inspector SST, oficial (1) ayudante (1) enchape (2)
clima mañana nublado. tarde soleado
Actividades. Se realizan resanes y retiros en muros.

Se realizan Asos en marcos de compuertas, tratamos retiradas.
Area dentas,
Contiuo rechope de baños Configuración dentas.

1/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector SST. estructura metálica (5) oficial (1) ayudante (1)
Clima: mañana soleado, tarde: soleado
Actividades, relleno hitope estructura metálica. y resanados perfiles longitudinales 2C 220x80mm, Continuo rechope de baños Configuros. y area dentas.

Reclan Vanegas
Insp obra

1/08/2023 personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST. estructura metálica (5) oficial (1) ayudante (2) rechope (2)
Clima: nublado mañana, nublado tarde
Actividades Continuo hitope y armado de estructura metálica cordones de soldadura en perfiles metalicos transversales torreas 150x50 mm, Continua rechope de baños, Se realizan resanes y retoques de moral y curatas
Reclan vanegas
Insp obra

12-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector sst. estructura metálica (5) oficial (1) ayudante (1) encofrador (2)

Clima, lluvia 7:30 - 10:50 am.

actividades: debido a condiciones meteorológicas no se pudieron realizar actividades que requerían trabajo en altura con normalidad. Se continuó armado de estructura metálica aplicación de cordones de soldadura a perfiles metálicos bandeja, conos 160x60 mm.

- resanes preparar para pintar y colocar
- encofrar bases contiguas a Aula dantas.
- se coloca cubierta AC color. tercero y cuarto grado

Aidan venegas
insp obra

14-08-2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, sector 1 inspector técnico sst. estructura metálica (5) oficial (1) ayudante (1)

Clima: mañana soleada, tarde: soleada.

actividades: se realiza pinche de todos penetrantes en Aula dantas., se pasa primer de tintol y se realiza retoque de pintura en estructura metálica

Norma

Se continua con montaje de estructura metalica en aulas cuarto y tercer grado, realizando cordones de soldadura en perfiles metalicos, longitudinales y perimetrales a la estructura 2C 220 x 80 mm se continuan rieles y rieles en muros y colocar aula tercero y cuarto grado.

Aidan Venegas
Inspector obra

15-08-2022 personal en obra : inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, inspector SST, estructura metalicas (5), oficial (1) ayudante (1) clima : mañana soleado tarde : soleado.
Actividades: se continua armado de estructura metálicas, aplicación de cordones de soldadura (en) soldar, perfiles metalicos transversales, aulas tercer y cuarto grado.
- continuar rieles y rieles en muros y colocar con madera.
- se socializo el colegio cubrir espacio donde se ubica maderas y dejarlo bien protegido, los contratista es de hora responsable por daños ocasionados durante la ejecucion de las obras.

Aidan venegas
Insp obra

16-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoria, inspector sst. pintura (1), Obras (2) ayudante (2)

Clima: mañana soleado tarde lluvia

Actividades: se continua con resanes y retoques de nivel -Aula tercer y cuarto grado

- se realizan retoques de pintura en estructura metálica con pintura 3 en 1
- se realiza recolección de residuos rco para disposición en acopio.

Redes vainegen

Fase obra

17-08-2023 personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoria, inspector sst. cubierta (3) Obras (2) ayudante (2)

- Clima: soleado (día), mañana, soleado tarde
- actividades: se realizo entrega de espacios aula modulo y entrega de llaves y juego de tres llaves en compañía de interventoria a rector de colegio se realizo levantamiento de cubierta Arcadia y auto de informatico, se solicito a rector y administrativo de

cargio desmontal plastico de hoerita que queda en parte posterior a toda sistemas, pues si este permanece, es posible que presente daños. por los cuales el Contratista no se hara responsable.

- hace ingreso a obra materia leso termoacustico tipo sandwich

Pedan ponegal

Sasl obra

(Gastos) personal en obra: inspector tecnico obra, inspector tecnico interlocutoria, inspector sst, cubierta (3), estructura metalica (5) oficiales (2) ayudante (1)

turno: mañana, solcada, tarde, soleada,

Actividades: Se realiza instalacion de cubierta Aula C. 3ro y 4to se inicia con montaje de estructura metalica, Atornacea y soldadura tetormatica, hitado de perfiles y soldadura de cordones estructura perimetral PM 220x80mm., se realiza jornada de orden y aseo.

Pedan ponega

Pasl obra.

: 19-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST., estructura metálica (4) cubierta (2) oficial (1) ayudante (2)

Clima: mañana soleada.

actividades: Se continua con armado de estructura metálica, cortando y soldando perfiles metálicos transversales, "correas" 160 x 60.

- Se continua con instalación de cubierta termoacustica tipo sandwich, saliendo 3er apto

- Se continua recibiendo personal en obra, con novedad Andrew Jaramillo SNS obra

· 22-08-2023 personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST. ing ambientales, estructura metalica (4) cubierta (2) oficial (1) ayudante (3)

Clima: mañana nublado, tarde soleada

actividades: terminar actividad hutado y armado de estructura metálica. iniciar actividad, pintura de la misma.

- Se desinstala cafetería ducal Salon Fontas, 3ro apto.

- Se continua fuera en marcha de cafetería desinstalada.

Reclam varenger
SNS obra

23/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, ingeniera ambiental.
En (2) oficial (1) ayudante (1) cubierta (2)
Clima: mañana. Soleada tarde Soleada
actividades: Continua actividad Pintura estructura metálica aulas sistemas y almacen
- Se desinstala ventanería, aulas sistemas y almacen.
No se desinstala ventana de muro colindante a Rack pues al ser un equipo de computo costoso y delicado podría verse afectado durante los procesos constructivos
- Termina alcance instalación de cubierta aulas 3ro y 4to., - Se realiza retiro de material, fisca arbusto Escombro para disposición final, Picado embalaje de misma.

Aldair Zanegra
Estp obra.

24/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector SST. oficial (1) ayudante (2) pintor en (1)
Clima: mañana Soleado
Actividades: Se continuan retoques y resanes en muros

Norma

Se continua pintura de estructura metalica.
Nota: el día de ayer no fue posible realizar todo el retiro de tejas pa AC Pendiente Programar retiro

Adair Venegas
Sssl obra.

25/08/2023 Personal en obra: inspector técnico soldadora, inspector técnico obra, inspector SST. oficial (1) ayudante. (2)
Cubierta (1)
Clima: mañana soleada
Actividades: Se inicia actividad instalación de cubierta termoacustico tipo sandwich en techo Sistema y alineación terminar actividad pintura estructura metálica
Se continuan retiros y reparar en muros con mortero.
Adan Venegas
Insp obra.

26/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico soldadora, inspector SST, oficial (1) ayudante (1)
Clima: mañana soleada
Actividades: terminar actividad instalación cubierta

termoacustica tipo Sandwich en cubiertas y alonacena
- Se continuan retanqueo y remates en muros y perfiles con mortero

Aidan Vanegas Ramirez
resp obra

16/03 personal en obra: inspector tecnico obra, inspector técnico interventoria, inspector SST. oficial (1) ayudante (1) pintor (2)
Clima: mañana soleada tarde: soleada
Actividades: se realiza actividad, pintura fachada interna salones. dantos tercero y cuarto, con retoques en masilla y primera mano.
Se continuan retoques y remates en muros y colocar con mortero
- se realiza disposición final de teja en asbesto cemento por operador.
- Se realiza prueba de fugas penetrantes en conjunto con interventoria sin novedad.

Aidan Vanegas
insp obra.

29/08/2023 personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, ingeniero ambiental, oficial (1) pintor (2)

Clima: mañana soleada

actividades: Se continúa actividad pintura fachada interna y externa. salones. dantes tercero y cuarto.

Se recluta arena y arco.

2

Rudan Venegas

Insp obra

30/08/2023 personal en obra; inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, pintor (2) oficial (1) ayudante (1)

Clima, mañana soleado. tarde soleado

actividades: Se retiraron resanes y rocíales en muros y colocar con mortero

- Se continua pintura de fachadas internas y externas de Aulas almacen y sistemas.

2

Rudan Venegas

Inspector obra

31/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, pintor (1) oficiales (1) ayudante (2) eléctricos (2)
Clima: mañana soleada tarde soleada
actividades: termina actividad pintura fachada interna y externa de casas.
- Llegada a obra material para acceso de actividades arranque toda & instalación aparatos eléctricos
- Se realiza video y arco

Aldair Venegas
Insp obra.

01/09/2023 Personas en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST oficial (1) ayudante (2) eléctricos (2)
Clima mañana soleada
actividades: Se realiza retiro para disposición final de escombros
- Se realiza video y arco
- Se continua actividad instalación de tubería PVC para instalación & acometida y aparatos eléctricos

Aldair Venegas
Insp obra

FEDERICO GARCÍA LORCA

24-07-23 VISITA DE VERIFICACION SST INTERVENTORIA, RECOMIENTO ORDEN Y ASEO - DIANA PAEZ

Fabian C.

25-07-23 se Continua Trabajos Electricos en las aulas del segundo se Instala Paneles led en Corredor, se realiza el Retiro de Cubierta e Intalacion de teja tipo sandwinsh en el area de los baños Primer Piso, se Continua Con Pintura de salones 2° Piso Color blanco.

Fabian C

26-07-2023 clima = Soleado

Personal en obra= 02 Electricos

01 Residente.

se Continuan trabajos de redes electricas 1° y 2° Piso,

Nelson Bello

Insp Interventoria

Fabian C.

Inspectora Interventora

27-07-2023. Personal en obra = 02 Electricos
01 SST
01 Residente.

Clima = lluvioso=mañana Tarde = soleado.

Actividades en obra= se realiza remate de muros zona del Patio que Presentava humedad, se Cambia el soPorte de la bajante de la canal frontal Por lamina, se finaliza Intalación de lamParas y Acometida electrica, se realiza jornada de orden y aseo.=

Ing Fabián Cubillos

Inspectora Interventoría

28-07-2023. Personal en obra 03-Pintores
01-Inspector.

Clima = sobrado
Actividades en obra = se Continua Con trabajos de Pintura en las aulas del segundo Piso Color Azul, se Inicia Pintura de Vigas en baños niños y Niñas Primer Piso.

Inspectora Interventoría

Sabado 29-07-2023. se realiza remates de Pintura
aulas 02° Piso y Baños Primer Piso
se Inicia Pintura de Vigas Columnas
en Protector tipo coraza zona exterior.

Lunes 31-07-2023
Se realiza Cambio de tanque agua Potable
Baños 1° Piso, Clima lluvioso Personal
en obra 02 Plomeros 02 Ayudantes
se realiza jornada de orden y aseo
Para Entrega salones 02 Piso.

Inspectora Interventoría

Fabian Cubillos G.

Martes 01-08-2023
Se realiza remate de Pintura en fachada
Protector Azul, se Continua Trabajos en el
Tanque de almacenamiento.

Miercoles 02-08-2023

Clima = lluvioso

Personal en obra: 02 Trabajadores

Se realiza Recorrido Con Interventoria Para entrega de espacios Aulas segundo Piso y Baños 1° Piso, El Colegio Informa que es necesario demoler los mesones que estan dentro de Aula, Es de Aclarar que no estaba Contemplado en el Alcance Inicial.

Fabian Cubillos. Inspector Interventoría

Jueves 03-08-2023. Clima = soleado

Personal en obra = 02 Ayudantes.

Se realiza Jornada de orden y Aseo en el Colegio, se Programa Por Parte del Colegio realiza el traslado de sillas mesas y demas Cosas el dia Viernes. Para desocupar las Aulas del Primer Piso

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 04-08-2023. Clima = Soleado

No se realizan Actividades de obra, en el Colegio.

Ing = Fabian C.

Sabado 05-08-2023 Clima = soleado.

Se observa que el Colegio deja gabinetes En las Aulas del Primer Piso se ubican en el Centro de los Espacios y se Programa Iniciar Actividades de Pintura Para estos espacios la otra semana.

Fabian C.

Lunes 07-08-2023. Clima = soleado

Dia festivo no se reportan actividades.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 08-08-2023. Clima = Soleado.

Se realiza Resane de Pintura en muros Con masilla Plastica, se aPlica Primera mano de Pintura en aclas. del Primer Piso.

Fabian C. — Inspector Interventoría

Miercoles 09-08-2023 Clima = Soleado

Se Continuan trabajos de Pintura en las aclas del Primer Piso, se realiza Instalación de sifon y Arreglo toberia 1º Piso Area del Patio,

Fabian C. — Inspector Interventoría

JUEVES 10-08-2023 VISITA DE VERIFICACION SST INTERVENTORIA, PARA SUBSANACION ROTULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. ORDEN Y ASEO. DIANA PAEZ

(Miercoles)

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 10-2023-Agosto

Se Continua trabajos de Pintura en el Area del Primer Piso, se realiza disposición de residuos Escombros,

Fabian Cabillos.

Inspector Interventoría

JUEVES 10-08-2023

SE REALIZA VERIFICACION CON LOS PINTORES EN DONDE FINALIZAN HOY LO CUAL SE LES INDICA LA IMPORTANCIA DEL USO OBLIGATORIO DE LOS E.P.P Y ORDEN Y ASEO.

Viernes 11-08-2023.

Clima = lluvioso =

Personal en obra = 02 Pintores.

Se Continuan trabajos de Pintura, Resanes y remates de los muros 1° Piso, se toma medidas para Instalacion de Piso en Grano de Caucho,

Inspector Interventoría

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 12-08-2023

Clima = soleado

Personal en obra = 03 Trabajadores.

se realiza instalación de Piso en Grano de Caucho 0,01m de espesor en Color negro "Base" 0,01m en Color de acuerdo a especificación Aprobada.

Fabian C. =

Inspector Interventoría

Lunes 14-08-2023

Clima = soleado

Personal en obra = 02 Trabajadores

se realiza Correccion de soportes de Cubierta se Programa demolición de mesones en aulas del segundo Piso, Le recogida de material en lonas.

Fabian C. =

Norma

Powered by CamScanner

martes 15- 08- 2023.

Se realiza recorrido Con Interventoría Para chequeo y Verificación de Pendientes en Pintura y acabados, se subsanan las observacion y quedan Verificadas,

Fabian C.

Inspector Interventoría

miercoles 16-08-2023.

se realiza retiro de escombro EmPacado en lonas se organiza salones Aseo y limPieza, se realiza Remate de filo Contra Ventana. Patio Costado Izquierdo,

Fabian C.

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

DILE USME

Martes 25-07-23 Personal en obra 01 oficial.
Clima = lluvioso.
Se Continuan trabajos de demolición de Paredes enchape muros en el Baño 1° Piso,

Fabian C.

Miercoles 26-07-2023
Clima = soleado
Personal en obra = 01 oficial
Se realiza traslado Provicional de Interruptor Para iluminación Baño 1° Piso, se Continua Con la Demolición de enchape Pisos y muros

Fabian C.

Inspectora Interventoría

Jueves 27-07-2023.
Clima = lluvioso mañana soleado Tarde
Se realiza jornada de orden y aseo en el baño 1° Piso se acopia escombros en el Parqueadero dentro del cerramiento.

Fabian C.

Viernes 28-07-2023. Clima = Soleado.
Se realiza toma de medida diviciones en Acero Inoxidable. Baños 2° Piso y Baño mujeres 1° Piso Para Cambio,

Fabian C.

Sabado 29-07-2023

Personal en obra = 01 Ayudante
Se organiza Cerramiento Provicional zona de Parqueade, Se realiza jornada de orden y aseo.

Fabian C.

lunes 31-07-2023.
Personal en obra 01 Residente
01 Ing Redes.

Se realiza RePlanteo de redes hidraulicas Para nueva acometida de Baño 01 Piso.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 01-08-2023.

No se realizan Actividades de obra en el baño, se Realiza Trabajos En taller Para fabricación de diviciones Baños segundo Piso, y Baño Dama Primer Piso,

Fabian Cubillos G.

Miercoles 02-08-2023.

No se Ejecutan Actividades de obra, se Continuo Trabajos de fabricación en talles de diviciones en Acero, Se realiza recorrido Con Interventoria "Ing Andres Chacon" Se define no realizar el retiro de la Ventana Inferior del baño Por que se Cambia la fachada es necesario Colocar Pelicula san-blasting Al Vidrio Para evitar Ver el Personal Interno.

Ing-Fabian Cubillos.

Jueves 03-2023 = Se Inicia demolición de Piso regados Para Instalación de redes hidraulicas

Powered by CamScanner

en el baño de 1° Piso,

Ing. Fabian Cubillos. Inspectora Interventoría

Viernes 04-08-2023. Clima = soleado

se Continua Con trabajos de demolición de Piso Baños 1° Piso, Y excavación Para instalacion de redes hidro-sanitarias, se realiza Acopio de Escombro. en zona de Parqueadero.

Fabian Cubillos. Inspectora Interventoría

Sabado 05-08-2023. Clima= soleado

No se realizan Actividades en obra, se Continua trabajo en taller de las divisiones de los baños se Programara Instalación de divisione en una fecha que no afecte Con la funsionalidad dela Direccion local

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 07-08-2023 Dia festivo. No hay actividades de obra.

Martes 08-08-2023 Clima = soleado.

Se realiza jornada de aseo y orden en el baño y ACOPio, se continua con trabajos de demolicion y excavación en Baño Para redes hidraulicas.

Ing. Fabian Cubillos C.

Miercoles 09-08-2023

Se continua con trabajos en los baños del Primer Piso se organiza material de excavacion y demolición en el ACOPio.

Fabian Cubillos

Jueves 10-08-2023

NO se realizan actividades de obra en el dia.

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes.- 11 - 08

se rectifican medidas de diviciones En Acero se Programa retiro e Intalación Para el transcurso de la siguiente semana.

Fabian C

sabado - 12 - 08

No se Ejecutan Actividades de obra se Pregrama retiro de escombros y material sobrante en el transcurso de la semana

Fabian C.

lunes - 13 - 08 se realiza Cerramiento Provicional Para demolición de rampa Acceso Peatonal se Programa recogida de escombros.

Fabian C.

Inspectora Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Martes 14-08-2023

se Continua Con demolición de rampa de Acceso Peatonal, se realiza raspado y retiro de Pintura en zona de los baños.

Fabian C. — Inspectora Interventoría

Miercoles 15-08-2023

se realiza resane y Pintura de muros de Baños Primer Piso.

Inspectora Interventoría

Fabian C.

Sueves 16-08-2023

Se Continuan Trabajos de arreglo muros de baños 1° y 2° Piso Pintura y Estuco,

Inspector Interventoría

Viernes 17-08-2023

se realiza remate de baños mujeres en el 2° Piso se Evidencia que la humedad

Norma

Powered by CamScanner

del baño de hombres segundo Piso Persiste,

Fabian C.

Inspectora Interventoría

Sabado 18-08-2023.

se Continua Con la Conformación de la rampa de acceso Peatonal Para Programar fundida, se Programa Instalación de diviciones el dia martes.

Fabian C.

Inspectora Interventoría

Martes 21-08-2023.

Se desmontan diviciones metalicas de los baños del 1° y 2° Piso Para cambio de diviciones. se Cambian Para diviciones en Acero.

Fabian C.

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 22 - 08 - 2023.

se realiza Conformacion de rampa lleno en material seleccionado y demolicion de rocas. Para Conformación de terreno y Posterior Excavación de rampa.

Inspector Interventoría

Fabian C.

Jueves 23 - 08 - 2023.

Personal en obra: 02 obreos

Clima = soleado

Se Continuan trabajos de Conformacion rampa de Acceso, se realiza rePlanteo de rampa Peatonal Porteria Principal,

Inspector Interventoría

Fabian C.

Viernes 24 - 08 - 2023

Pasonal en obra = 03 Trabajadores

Clima = soleado =

Norma

Powered by CamScanner

se Realiza figorada y Amarrado de Acero Para rampa de Acceso Peatonal se Programa fundida de rampa el dia sabado 25-08-2023

Fabian C.

Sabado 26-08-2023

Personal en obra = 04 Personas.
Clima = soleado =

se realiza demolición de Anden en Puerta Principal Para Conformación de rampa, se funden las dos rampas de Acceso Peatonal se deja rematado y Señalizado.

Fabian C.

Inspector Interventoría

Lunes 28-08-2023

Se realiza fundida de bordillo en rampa de Acceso Peatonal Contra Talud en tierra,

Inspector Interventoría

Fabian C.

Martes 29-08-2023

Personal en obra = 02 Trabajadores

Clima = soleado

se retira formaleta de Bordillo se remata Concreto se Perfila terreno Para Conformacion del sitio de rampa,

Inspector Interventoría

Miercoles 30-08-2023

se realiza retiro de Cerramiento Provicional Rampa de Acceso se organiza acopio Jornada de orden y aseo

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 31 de Agosto 2023

Clima = soleado

Personal en obra = 02 Ayudantes.

Se realiza retiro de escombro Para dejar zona limPia. No se Ejecota mas actividades.

Norma

Powered by CamScanner

IED RURAL CURUBITAL

28/08/2023 Personal: Residente contratista, Inspector Interventoria

Clima: soleado

Actividades: Se realiza acta de vecidad con compañia de los representantes del colegio. Nelson Benito-Interventoria

29/08/2023 Personal: Inspector interventoria, Inspector contratista, SST contratista, Ambiental contratista, cubierta (4), obra civil (2).

Clima: soleado

Actividades: Se inicia con desmonte de Red electrica, Ventanas y cubierta. Nelson Benito-Interventoria

30/08/2023 Personal: Inspector interventoria, Inspector contratista, obra civil (2) cubierta (4)

Clima: soleado

Actividades: Se continua con desmonte de cubierta, puertas, cielo razo y ventanas. Nelson Benito-Interventoria

31/08/2023 Personal: Inspector interventoria, Inspector contratista, cubierta (4), obra civil (2), Estructura (8)

clima: soleado

Actividades: Se inicia montaje de estructura metalica y se continua con retiro de cubierta y ventanas.

Nelson Benito

Inspector Interventoria

Norma

SIMONELLI

- Miercoles 26 de Julio 2023.
- clima = Nublado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se realiza el desmonte de cubierta en asbesto-cemento (canaleta) de la etapa de intervencion # 2 y se inicia el respectivo acopio.
- Se realiza demolición de encorozado de culatas muros para izaje de estructura metalica.

Residente de Obra Inspectora Interventoría

- Jueves 27 de Julio 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (3) oficiales (3) Ayudantes
→ Actividades = se inicia izaje de estructura metalica para cubierta de los perfiles principales fachados y se termina el acopio de teja en asbesto-cemento.

Residente de Obra Inspectora Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

- Viernes 28 de Julio 2023
- clima = Nublado
- Personal = (2) Oficiales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con el izaje de perfiles metalicos de estructura metalica de cubierta de etapa #2. y se realiza aseo de las zonas intervenidas.

Residente de Obra — Inspectora Interventoría

- Sabado 29 de Julio 2023
- clima = Soleado
- Personal = (3) oficiales (1) Ayudante
→ Actividades = Se continua con corte de perfiles longitudinales tipo U y se realiza aseo de dom de salones, recogida de escombros y traslado ~~de~~ ~~acop~~ sitio de acopio

Residente de Obra — Inspectora Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

- Lunes 31 de Julio 2023
- clima = Nublado
- Personal = (3) opicides (2) Ayudantes
→ Actividades = Se realiza retiro de teja asbesto-cemento por empresa umbiental certificada y se continua con armado de estructura metalica para cubierta

Residente de Obra, Inspectora Interventoría, Interventoría

- Martes 01 de Agosto 2023
- clima = Lluvias constantes
- Personal = (3) opicales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con corte de perfiles metalicos tipo C para cubierta, La constantes lluvias retrasaron las actividades de obra.

Residente de Obra, Inspectora Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

- Miercoles 02 de Agosto 2023
- clima = Lluvioso
- Personal = (3) opiciales (2) Ayudantes
→ Actividades = se continua con armado de estructura metalica para cubierta etapa 2 piso 3 con perfiles tipo C.

Residente de Obra Inspector Interventoría

- Jueves 03 de Agosto 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (3) opiciales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con armado de estructura metalica para cubierta en etapa 2 piso 3 con la instalacion de correas tipo C longitudinales.
- Se inicia sello de culatas de cubierta con mortero.

Residente de Obra Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

MARTES. 8 DE AGOSTO 2023.
VISITA DE INTERVENTORIA. SST:
VERIFICACIÓN ORDEN Y ASEO, PUNTO DE ACOPIO. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
DIANA PAEZ

08-08-23 Personal en obra: estructura metalica (5) Oficial (1) inspector tecnico obra, inspector tecnico interventoria inspector sst
Clima: mañana soleado, tarde soleada
Actividades: SS. Continua armado de estructura metálica para cubierta Piso 3 Etapa 2. Resoldado, se continua con pintura. estructura metálica., se continua con resanes de muros y culatas. con mortero.
- ingresa a obra, materiales, (teja y Polietileno) para cubierta.

Aldair Vanegas
Insp obra.

Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

9/08/2023 Personal en obra: Inspectora Interventoría, residentes Interventoría, Inspectores Técnicos de obra, oficiales, ayudantes, representante Secretaría Edu.
Clima: nublado, precipitación: llovizna
Actividad: Se realiza la inspección mediante líquidos penetrantes a la estructura metálica en tres superficies, no se detecta discontinuidad. Se solicita al contratista quitar el óxido de los perfiles, antes de aplicar la capa de pintura.

Inspectora Interventoría

Aldair Donegan R.
resp obra

10/08/2023 Personal en obra: inspector interventoría, inspector obra, inspector SSE, oficial en estructura metálica (4)
Clima: Soleado mañana. tarde soleada
Actividades, Se continúa con pintura estructura metálica
-ingreso a obra material faja tipo sandunga para cubierta.

Aldair Donegal
resp obra

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

11-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría
Clima: nublado 7:30 - 9:30. Iride Soleada
- Actividades: Continuo (ptes) actividad Pintura de estructura metálica, se recalca orden y aseo
Notas: resto de personal en obra, estructura metálica (4) oficial (2)

Aldair Vanegas
Sup obra

Inspector Interventoría

18-08-2023 VISITA DE VERIFICACIÓN SST
INTERVENTORIA ORDEN Y ASEO. PUNTO DE ACOPIO
PUNTO ECOLOGICO. SUBSANACIÓN TRABAJO
DE ALTO RIESGO CAPACITACIÓN DE ALTURAS
PUNTO DE ANCLAJE Y ACTOS INSEGUROS.
DIANA PAEZ


12-08-23 Personal en obra: inspector técnico interventoria, inspector técnico obra, inspector SST. Oficial (4) pintura EU (2)
Clima: mañana lluvia 8:00 - 11:00
Actividades: lluvia impide avance varias de las actividades
Se recalca Pintura de estructura metálica, llega a obra

Norma

Powered by CamScanner

Material teja tipo sandwich para cobertura

Aldair Zamora Ing. Obra



Inspector Interventoría

14-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, carpintero SST. Oficial en cubierta (2)

Clima (→ pintores en (2)


Clima: mañana: Soleado tarde: soleada

Actividades: se realiza instalación Primera capa cubierta.

- Se continúa con trabajos y reparación en interior y exterior
- Se realizan últimos retoques pintura en

Aldair Zamora

Ing. Obra



Inspector Interventoría

15-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, oficial en cubierta (2)

Clima: Soleado Mañana y tarde

Actividades: Continua instalación de cubierta tipo sandwich

Norma

Powered by CamScanner

Se realiza retiro de Material Rcd para disposicion final
- Se confiacan rejones y remates de muros.

Inspector Interventoría

16-08-23 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST oficial civil

Clima: Soleado mañana y tarde

Actividades: Se continuo con rejones y remates en muros y locales, se realiza cordra y otro en salones.

-Se retira cerramiento provisional perfil bloque intervenido.

Adair Vanegas

Insp obra:

Inspector Interventoría

MARTES 22 AGOSTO. VISITA DE VERIFICACIÓN SST INTERVENTORIA, ORDEN Y ASEO. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, PUNTO DE ACOPIO, PUNTO ECOLOGICO, DIANA PAEZ

22/8/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría pintor (3)

Clima: Soleado tarde. Soleado mañana

Actividades: Continua pintura en ciclo blanco pared y guardaescobas negro.
Nda afiliados inicio el dia Sabado 19 ago, 12023.

Aldair Zarate
Jefe obra ..... Inspector Interventoría

JUEVES 24 AGOSTO VISITA DE VERIFICACION SST INTERVENTORIA, ORDEN Y ASEO, PUNTO ECOLOGICO, CENTRO DE ACOPIO REVISION DE PERMISOS, ATURAS, TRABAJO EN CALIENTE, ATS, INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS. RARA LA ACTIVIDAD. DIANA PAEZ

24/08/2023 Personal en obra: inspector técnico intervenatoria, inspector técnico obra, inspector SST, instalacion canal (2)
Clima: mañana soleada, tarde soleada
Actividades: se continua instalacion de canal galvanizada en Bloque 2 piso 2 y de etapa intervencion intermedio pendiente instalacion de tuberia poc pesada 3"

Aldair Zarate
Jefe obra

Inspector Interventoría

Powered by CamScanner

25/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST.
Clima: mañana soleada, tarde soleada
actividades. Se realizo orden y aseo, ingresa a obra materiales perfiles metalicos 100 x 60 mm.

Aldair Vanegas
Sasp obra

26-08-2023 Personal en obra. inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector SST estructura Metálica (3), electricos (3)
clima: mañana soleada
actividades: se inicia actividad instalación de tubería para aparatos electricos, se inicia armado de pachas perfileria 100 x 60 mm.

Aldair Vanegas
Sasp obra

Inspector Interventoría

29/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector SST, CM (4) electricos (2)
Clima: mañana soleada, tarde soleada.

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: Se inicia actividad cronado de canal galvanizada bloque 2 tercer piso.

· Continua instalación de acometidas y aparatos electricos

Redam Vanegas

Insp obra

Inspector Interventoría

29 Agosto Martes. INTERVENTORIA SST.
Se realiza Verificación de permisos
Se verifica epp. y dotación
Se Solicita Orden y aseo y demarcación de areas.

Andrea Perez SST-ma.-
DIANA PAEZ

29-08-2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, inspector SST, electricos (2) EM (3) oficial (1) ayudante (1)

Clima: mañana. nublado

actividades realizadas actividad instalacion de acometidas y aforadores electricos,

· Continua cronado de canal metalica galvanizada

Norma

Powered by CamScanner

, y soldadura de pie de amigos en estructura metálica
- se retiro formaleta en parte posterior de bloque
- se realizo orden y aseo

Aldair Vanegas
Resp obra

Inspector Interventoría

30/08/2023 Personal en obra: inspector ferreo obra, inspector técnico interventoría, inspector sst. EM (3), oficial (1) ayudante (1).
Clima: mañana: soleada tarde: nublada
actividades: se realizo instalación de canal metálico galvanizado en bloque A tercer piso
- se realiza ferramenta en pluscombra. Zona actividades. Primer piso, (se)

Aldair Vanegas
Resp obra.

Inspector Interventoría

31/08/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector sst, EM (3)
Clima: mañana soleado
Actividades: se realiza aplicación de epoxico Sikafloor

Norma

Powered by CamScanner

en uniones de conecc:

- se inicia armado de estructura metálica perfiles metalicos doble c 200x60 mm.

Atentamente:

Jefe obra.

Inspector Interventoría

JOSÉ MARÍA CÓRDOBA



AGOSTO

- Martes 01 de Agosto 2023.

- clima = Soleado
- Personal = (2) Oficiales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con la instalación de bajantes de cubierta en zona gradas. Se identifican fallos en zona de cancha los cuales se requieren ser adecuados para poder realizar asfaltado.

Residente de Obra

Joan Muñoz
insp. Interventoria

- Miercoles 02 de Agosto 2023.

- clima = Soleado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se realiza adecuaciones de las redes electricas de cubierta quedando en funcionamiento (3) reflectores y 4 bafles de sonido con su respectivo calleado y tubería EMT segun aprobado por interventoria.

Residente de Obra

Joan Muñoz
insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Viernes 04 de Agosto 2023.
- clima= Soleado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudantes

→ Actividades = se inicia demolición de carpeta asfaltica existente en las zonas de los fallos de acuerdo a la aprobación por parte de interventoria para el mejoramiento de estas zonas.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Sabado 05 de Agosto 2023.
- clima= Soleado
- Personal= (2) oficiales (2) Ayudantes.

→ Actividades= Se termina demolición de carpeta asfaltica existente en zona de fallos y se realiza la respectiva compactacion de subrasante para su nivelacion con material granular compactado.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

• Martes 08 de Agosto 2023
- clima= Soleado
- Personal = (3) oficiales (3) Ayudantes
→ Actividades = Se realiza imprimación de area de cancha y se inicia la explanación y compactación de primera capa de carpeta asfaltica con su respectivo bombeo.

Residente de obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Miercoles 09 de Agosto 2023
- clima= Lluvioso.
- Personal = (3) oficiales (3) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con la explanación y compactación de primera capa de carpeta asfaltica en cancha deportiva garantizando que no se presenten estancamientos de agua con su respectivo pendientado.

Residente de obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Jueves 10 de Agosto 2023.
- Clima = Soleado.
- Personal=

→ Se realiza visita tecnica con interventoria y supervisión de la SED. en conjunto con rectoria del colegio en la cual se aclara el alcance de la obra. y se plantea la posible ejecucion de un carcamo en concreto en la zona posterior de gradas y pintura de fachada de las mismas

→ Actividades = Se continua con asfaltado de cancha con la explanación de rodadura asfaltica segunda capa en zona cancha y se continua con la compactación de primera capa de carpeta asfaltica realizando el respectivo confinamiento y dando cumplimiento a las pendientes de bombeo.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 10 de agosto 2023.

*Personal de obra sin epp. (casco y protección respiratoria).
* No se evidencian permisos de trabajo.
* se solicita Orden y aseo.

Ana. a Perez SST-na interventora

• Viernes 11 de Agosto 2023.
- clima = Soleado.
- Personal = (3)oficiales (3) Ayudantes.
→ Actividades = Se termina la nivelación y compactación de carpeta asfaltica de acuerdo a las especificaciones tecnicas aprobadas y teniendo en cuenta los niveles y pendientes aprobados por Interventoria para dar por finalizada esta actividad.

Joan Muñoz
insp. Interventoria

- Lunes 14 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se realiza aseo de obra y se inicia el tiempo de curado de cancha para poder realizar la pintura.
En comite de obra se aprueba la construccion de carcamo para desagüe en zona posterior a gradas.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Martes 15 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se realiza replanteo de carcamo a construir de acuerdo a lo aprobado en comite y se inician detalles de pintura en vigas y columnas

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Powered by CamScanner

• Miercoles 16 de Agosto 2023
- clima= Soleado
- Personal= (1) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se termina de instalar remates pendientes en teja y se recibe cubierta a satisfacción de interventoria.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Jueves 17 de Agosto 2023
- clima= Soleado
- Personal= (1) Oficial (1) Ayudante
→ Actividades= se realiza remates de pintura en vigas y columnas en concreto de acuerdo a las observaciones emitidas por interventoria y se inicia la pintura de bajantes segun lo aprobado.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

• Viernes 18 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se inicia mantenimiento de cerramiento existente en la zona del costado del parqueadero de acuerdo a las exigencias de la obra

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Martes 22 de Agosto 2023
- clima = Nublado
- Personal = (1) oficial
→ Actividades = Se realiza comité de obra y se realiza aprobuebos de cambio de arcos canchas y rejillas de carcamo de cancha. a plasticas.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Miercoles 23 de Agosto 2023
- clima: Soleado
- Personal = (1) opicial (1) Ayudante
→ Actividades = se realiza visita tecnica para realizar la impermeabilizacion de las gradas.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Residente de Obra

- Jueves 24 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante.
→ Actividades = Se evidencia que la cancha a culminado el proceso de curado y se puede dar inicio a la pintura de cancha deportiva.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Residente de Obra

- Lunes 28 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) opical (2) Ayudantes
→ Actividades = Se inicia pintura de cancha con aplicación de imprimante especial para pintura de trapico canchas.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Martes 29 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) opical (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con pintura para canchas deportivas de acuerdo a los colores aprobados por interventoria y supervision para esta cancha

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

• Miercoles 30 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes
→ Actividades = Se inicia la demarcación de cancha deportiva y se continua dando fondo de acuerdo a los colores de la cancha

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Jueves 31 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continúa con la demarcación con pintura blanca para cancha deportiva multiple con sus dos respectivos arcos deportivos.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

DILE TUNJUELITO

31-07-2023 se realiza resane de muro Posterior que se encontraba fisurado se utiliza mortero de reparación Corona. Clima= soleado

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

-08-2023= se Continuan trabajos de Pintura en el Cerramiento, Se realiza limPieza de Canales Cubierta,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

-08-2023 se realiza remate de Pintura Cerramie se Programa recorrido y retiro de tanque almacenamiento el dia de mañana 03-08-

Fabian C.

Clima= soleado

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

-08-2023 se Continua Con trabajos de cerramiento se realiza Conexión Provicional de agua Potable Para Poder Retirar los tanques de almacenamiento, se realiza recorrido Con Arq Sandra

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

04-08-2023
Clima: Soleado
Personal: 2 Trabajadores, 1 insp. tecnico contratis
1 insp. tecnico interventoria
Actividades: llega material, se realiza cerrami-
ento

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

05-08-2023
Clima: Soleado
Se realiza limpieza de rejas y se pintan,
-se finaliza retiro de tanque de agua

Joan Muñoz
insp. Interventoria

08-08-2023
Clima: Nublado
- Se realiza resane de muros
- Se finaliza con pintura y limpieza de rejas

Joan Muñoz
insp. interventoria

Norma

Powered by CamScanner

09-08-2023
Clima: Soleado
-Se finaliza resane de muros
-Se pintan muros con los mismos colores existentes

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

10 de agosto Jueves /2023.
Se deja en bitacora que no se evidencian permisos de trabajo.
se evidencia personal sin casco
se solicita Orden y aseo y demarcacion de acopios

Andrea Perez SST-ma.

11- de agosto - 2023
se Realiza desmonte de tanques existentes en la zona superior de los Baños se dejan acopiados en el Patio.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 14 de Agosto 2023.

se Verifica funcionalidad de la Conexion Provicional de agua Potable, funciona Bien no se Presenta fugas ni goteras. se Inicia Corte y Retiro de regillas Carcamo,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 15 de Agosto 2023.

se realiza lavado de Cerramiento Con hidrolavadora Industrial Para retiro de material contra Perfil se Programa Pintura de Cerramiento, se Continua demolicion y Corte de rejillas del Carcamo.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabrica.

Miercoles 16 de Agosto 2023.

se Programa Cambio de diviciones en Acero Para baños funcionarios, Se realiza desmonte y instalación de Diviciones en el baño hombre

se Continua trabajos en la zona del Parqueadero Patio en la rejilla.

Joan Muñoz
insp. Interventoria

Fabian C.

Jueves 17 de Agosto.

se realiza fundida de Placa Para soPorte de tanques de almacenamiento en la zona de los baños, se Continua Con el Cambio de divicion Baño de Mujeres.

Joan Muñoz
insp. Interventoria

Fabian C.

Viernes 18 de Agosto.

se Continua Con la demolición y resane de Caricamo zona Exterior Parqueadero, se realiza remates y Emboquillada de divisiones Baños.

Joan Muñoz
Insp. Intervento

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 19- de Agosto. 2023.

se Continua trabajos de demolicion y resane de Carcamo. En zona exterior Parqueadero.

Fabian C.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 22- de Agosto 2023.

Se Inicia Picada de muro en Auditorio Para enchape de muros, se evidencia que Personal del dile realiza retiro de Canaleta de Voz y datos y Red Regulada en zona del Auditorio.

Joan Muñoz
Insp. Intesventoria

Miercoles 23- de Agosto 2023

se Continua Con resane de muro auditorio y realiza demolicion de Carcamo y de grieta exterio Muro Contra jardin Comun tario ,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 24 - de Agosto

se realiza Pintura de muro zona exterior Contra jardinera Comunitaria en Color similar al existente.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Viernes. 25 de Agosto

Se Inicia armada de tantes e Instalacion de red hidraulica. en los baños.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

VENECIA

• Martes 25 de Julio 2023.
- clima= Soleado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes (1) operario.
→ Actividades = Se inicia las instalaciones electricas en zona administrativa en 2do piso con instalacion de tuberia EMT 3/4 y puntos electricos, se continua compactacion de base y excavación para placa en zona patio.

Residente de Obra — Joan Muñoz Insp. Interventoria

• Miercoles 26 de Julio 2023
- clima= Soleado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes (3) electricos (2) pintores (1) operario.
→ Actividades = Se realiza prueba de compactación con densimetro nuclear en zona cancha las cuales son avaladas y aprobadas con la supervisión de interventoria para dar continuidad a las otras actividades de obra en zona cancha con aspaltado.

Norma

Powered by CamScanner

- Se continuan con la instalación de redes dectricas en zona admin
- Se inicia con la instalación de muros en superboard para divisiones de oficina.
- Se inicia construcción de caja de inspeccion en zona cancha y delimitacion de areas de trabajo.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Jueves 27 de Julio 2023
- Clima = Soleado
- Personal = (2) oficiales (1) Ayudante
→ Actividades = Se termina construcción de caja de inspeccion y se instala su respectivo contramarco, se continua con excavacion de zanja para tuberia de desagüe cancha y con remate de culatas en piso 2

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

• Viernes 28 de Julio 2023

- Clima = Soleado
- Personal = (3) oficiales (3) Ayudantes

→ Actividades = Se inicia la explanación de asfalto en zona cancha, verificando su respectiva temperatura y los niveles de acuerdo a los requerimientos de interventoria.

Residente de Obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Sabado 29 de Julio 2023.

- Clima = Soleado
- Personal = (3) oficiales (3) Ayudantes

→ Actividades = Debido a que se ~~frena~~ la planta de asfalto no se puede continuar con la actividad en cancha se realiza compactación de recebo para placas en patio y aseo general de obra.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Lunes 31 de Julio 2023.
- clima = Soleado - Lluvioso (Mañana)
- Personal = (3) opiciales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua actividad de asfalto de zona cancha. e instalación de tubería de desagüe de 6". Se termina actividades electricas en segundo piso.

Residente de Obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Martes 01 de Agosto 2023.
- clima = Lluvioso
- Personal = (3) opiciales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se termina el asfaltado de cancha deportiva de acuerdo con los niveles establecidos cumpliendo los requerimientos de interventoria.
- Se continua sello de culatas en segundo piso con mortero.

Residente de Obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

• Miercoles 02 de Agosto 2023.
- Clima - Nublado
- Personal = 1 Oficial 2 Ayudantes.
→ Actividades = Se realiza picado de placa en concreto en costado de ingreso a cancha para realizar la renivelacion de piso y evitar posibles estancamientos de agua a futuro.

Residente de Obra


Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Jueves 03 de Agosto 2023.
- Clima = Nublado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes
→ Actividades = Se inicia fundida de placa en concreto de la zona perimetral de cancha para realizar el respectivo pendientado y acabado de la cancha. Se termino las mediacaña y acabado de caja de inspeccion de zona cancha.


Norma

Powered by CamScanner

- En visita tecnica con interventoria y supervision de SED se aprueba la realización de dos minicanchas en el area de deportes, ademas la construcción de una banca en concreto, la fundida de placa en concreto en zona patio "completa" y las puertas para las divisiones en el segundo piso son en aluminio una con ventana en la parte superior y la otra sin ventana como lo indica el siguiente esquema:

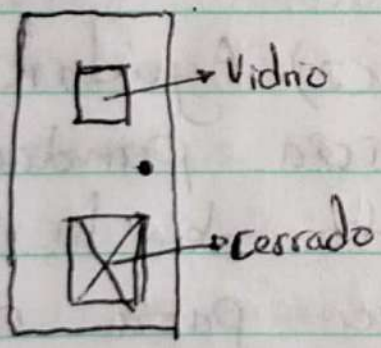

Puerta oficina



Puerta Orientación

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Residente de Obra

Norma

Powered by CamScanner

• Viernes 04 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con las actividades de estuco y lijado de divisiones en superboard en oficinas
- Se continua con renivelación de placas en concreto en zona de perimetro cancha.

Residente de obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoría

• Sabado 05 de Agosto de 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante (1) pintor
→ Actividades = Se continua con estuco y lijado de divisiones en superboard para oficinas (2) piso y se continua con fundida de placas en concreto en el contorno de cancha de acuerdo a los respectivos niveles y pendientes.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Miercoles 09 de Agosto 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante (2) pintores
→ Actividades = Se continua con demolicion de placa en zona patio para poder realizar la respectiva fundida en concreto y se continua con el estuco y lijado de divisiones en superboard. Se realizo adecuación de puerta ingreso principal y cerramiento en zona cancha.

Residente de Obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

10 de agosto Jueves 2023.
Se realiza Verificación de documentos. Los cuales no se evidencian: permisos de trabajo, ni inspecciones. Se deja por escrito que la interventoria considera que no se debe trabajar de esta forma, se solicita demarcación de areas ya que los niños del colegio estan expuestos y muy cerca al lugar de trabajo.

Norma

Powered by CamScanner

Se solicita demarcación y señalización de acopios, se solicita retiro de RCD.
se solicita capacitación al personal de uso correcto de EPP.
se solicita, Orden y aseo.

Andrea Pérez SST- ma interventoría

-Nota: El colegio hace uso de espacios que no se han entregado, en la cancha se estan dando clases y los estudiantes en descanso la ocupan, se le solicita al contratista volver a poner el cerramiento.

Joan Muñoz
Insp. Interventoría

Viernes 11 de Agosto

→ Actividades.= Se realiza fundida de placa en concreto de zona patio e=15cm con su respectiva malla electrosoldada y acabado.

Presidente de Junta

Joan Muñoz
Insp. Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

- Lunes 14 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (2) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se inicia pintura de concha con imprimacion, se aclara que se pintaran (2) minicanchas de acuerdo a lo aprobado. Se realizo adecuacion de placa ingreso para fundida de placa en concreto

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Martes 15 de Agosto 2023
- clima = soleado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con pintura cancha y con sello de culatas en mamposteria segundo piso

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Miercoles 16 de AGosto 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se continua con pintura de cancha en color azul con su respectiva delimitación para dos minicanchas. se Inicia fundida de placa en concreto 3000psi e=15cm para el ingreso principal del colegio. con su respectivo acabado

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Jueves 17 de Agosto 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudante
→ Actividades = Se continua con pintura general de cancha, se realiza aseo de zona patio y se inicia la instulacion de rejillas plasticas para carcamo.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Viernes 18 de Agosto 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con pintura de cancha (2 minicanchas) se termina de instalar las rejillas plasticas en carcamo de cancha. Se realiza retiro de escombros. a sitio autorizado por medioambiente

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Sabado 19 de Agosto 2023.
- clima = Soleado
- Personal = (2) oficial (2) Ayudantes
→ Actividades = Se continua con pintura de cancha, llega a obra arcos de microfutbol y baloncesto pequeños para cancha y se inicia su respectiva instalacion

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

• Martes 22 de Agosto 2023
- Clima = Soleado
- Personal = (1) Oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se continua con pintura cancha y pintura de vigas aereas en zona de segundo piso.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

• Miercoles 23 de Agosto 2023
- Clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante
→ Actividades = Se realiza instalación de puertas en aluminio y se continua con pintura de vigas aereas 2do piso. Se inicia trazado de demarcación en zona cancha.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Jueves 24 de Agosto 2023.
- clima = Soleado.
- Personal = (1) opical (1) Ayudante
→ Actividades = Se termina pintura de vigas aereas en concreto con color gris basalto.

Residente de Obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Viernes 25 de Agosto 2023.
- clima = Nublado - Soleado
= Personal = (1) opiaal (1) Ayudante.
→ Actividades = Se realiza instalación de lamparas pendientes en 1er piso y baños segundo piso, se continua con demarcación de cancha deportiva.

Residente de Obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- Lunes 28 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (2) oficiales (2) Ayudantes

→ Actividades = Se termina demarcación de canchas pequeñas con pintura blanca resistente al trafico. Se realiza orden y aseo general de obra

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

- Martes 29 de Agosto 2023
- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (2) Ayudantes

→ Actividades = Se organizan arcos de canchas en su ubicación, se termina detalles de pintura exigidos por interventoria. Se dan porterminadas todas las actividades de obra contractuales y se plantea realizar la entrega el dia jueves 31 de Agosto 2023.

Residente de obra.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 31 de Agosto 2023.

- clima = Soleado
- Personal = (1) oficial (1) Ayudante
- Actividades = Se realiza entrega de espacios intervenidos (Bloque administrativo) (Zona cancha) a satisfacción de la institución educativa e interventoria con su respectiva acta de cierre de vecindad.

Residente de Obra

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

ANEXO No. 03

INFORMES SEMAMALES

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 28 de 2023
CINP-BTA-529-0611-5715

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 37.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 37 correspondiente al periodo comprendido del 21 de agosto al 27 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en diecinueve (19) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	28-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**37**		**Del :**	21/08/2023	**AL:** 27/08/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**257**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,86%**	**70,48%**	**(%) Ejecutado**	**2,18%**	**80,85%**
Valor programado ($)		**$ 8.509.611.993,80**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 9.761.664.723,31**
			Evaluación	**10,37%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	28-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**37**		**Del :**	21/08/2023	**AL:** 27/08/2023
Plazo Total	**396**	días			

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	IED USMINIA SEDE C		USME	$ 372.412.811	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	IED BRASILIA SEDE A		USME	$ 720.239.927	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	COLEGIO RURAL EL UVAL		USME	$ 1.346.746.630	89,00%	87,00%	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS		USME	$ 853.433.498	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC		USME	$ 550.424.024	87,00%	93,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA **INSTALACIÓN DE PISO
6	IED LOS TEJARES		USME	$ 181.308.494	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		USME	$ 628.394.933	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	INEM SANTIAGO PEREZ		TUNJUELITO	$ 362.348.937	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A		USME	$ 852.869.715	0,00%	0,00%		
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A		USME	$ 516.609.542	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A		USME	$ 623.938.623	62,00%	57,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN DE CANALES	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C		USME	$ 388.064.062	0,00%	0,00%		
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		USME	$ 351.263.110	39,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A		USME	$ 418.617.430	0,00%	100,00%	**ENTREGA DE ESPACIOS	**FRENTE TERMINADO
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A		USME	$ 293.731.567	66,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A		USME	$ 376.450.691	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A		USME	$ 255.186.272	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B		USME	$ 299.060.323	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C		USME	$ 179.004.711	59,00%	99,00%	**SIN ACTIVIDAD	**ENTREGA DE ESPACIOS

								VERSIÓN	1
								Fecha	28-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No		**37**				**Del :**	21/08/2023	**AL:**	27/08/2023
Plazo Total		**396**	días						
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 443.348.816**	53,00%	81,00%	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS Y BARANDAS **DEMARCACIÓN DE CANCHA	**DEMARCACIÓN DE CANCHA **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 428.177.761**	40,00%	99,00%	**PINTURA CANCHA **INSTALACION PORTERÍAS CANCHA **INSTALACIÓN DE PUERTAS	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **ASEO GENERAL
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.607.658**	88,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$ 117.815.760**	20,00%	49,00%	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES **PERFILADO DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACION DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS **CONSTRUCCIÓN RAMPA DE ACCESO
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$ 74.929.438**	21,00%	67,00%	**AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO **PICADO DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE ENCHAPES	**INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO **IMPERMEABILIZACIÓN **REJILLAS DE CÁRCAMO

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0608-5641 del 23 de agosto de 2023 se solicita al Consorcio Educación Bogotá la entrega de los informes mensuales No. 07 del contrato de obra. Los cuales habían sido aprobados mediante los comunicado CINP-BTA-529-0599-5541; CINP-BTA-529-0586-5386; CINP-BTA-529-0574-5267 Y CINP-BTA-529-CINP-BTA-0580-5331.**

****Se continua con la revision y tramite de los ingresos de personal del contrato de obra.**

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 37.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
***Comite de obra 22 de agosto de 2023.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	28-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**37**		**Del :**	21/08/2023	**AL:** 27/08/2023
Plazo Total	**396**	días			

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**8.062.378.503,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 8.062.378.503,00
% Avance facturado Acumulado
66,78%
Saldo por Facturar
$ 4.011.418.310,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 137.548.188,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	$ 189.938.426,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**636.112.742,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 636.112.742,00
% Avance facturado Acumulado
66,78%
Saldo por Facturar
$ 316.437.038,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	28-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**37**		**Del :**	21/08/2023	**AL:** 27/08/2023
Plazo Total	**396**	días			


OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, Federico García Lorca sede C, José María Córdoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.

2. De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 10.37%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 8 frentes de obra adicionalmente al frente de emergencia Ofelia Uribe Acosta.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en las sedes Uval y Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23	
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				$ 1.008.154.304,00	$ 1.198.868.110,01	$ 190.713.806,01

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 1.008.154.304,00

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.908.852.841
		DIFERENCIA	$ 164.943.972

OBSERVACIONES:

Se evidencia saldo a favor de $164.943.972, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.709.984.731**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**70,48%**	**80,85%**	**10,37%**	**295,10**	**257,26**	**37,84**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	29/09/2023	263,00	89,00%	87,00%	-2,00%	228,81	234,07	-5,26
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	100,00%	0,00%	214,00	214,00	0,00
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	20/09/2023	245,00	87,00%	93,00%	6,00%	227,85	213,15	14,70
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	10/07/2023	23/12/2023	166,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	21/10/2023	165,00	62,00%	57,00%	-5,00%	94,05	102,30	-8,25
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	39,00%	100,00%	61,00%	109,00	42,51	66,49
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	100,00%	100,00%	82,00	0,00	82,00
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	66,00%	100,00%	34,00%	91,00	60,06	30,94
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	59,00%	99,00%	40,00%	106,92	63,72	43,20
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	53,00%	81,00%	28,00%	94,77	62,01	32,76
21	IED VENECIA SEDE B	$ 428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	40,00%	99,00%	59,00%	125,73	50,80	74,93
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	88,00%	100,00%	12,00%	62,00	54,56	7,44
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	20,00%	49,00%	29,00%	67,62	27,60	40,02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ


CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23

24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	21,00%	67,00%	46,00%	92,46	28,98	63,48
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$ 10.709.984.731**									
1	IED PAULO FREILE	$ 5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$ 367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$ 40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
4	LOTE VILLA ROSITA	$ -	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	IED SANTA MARTA	$ 36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$ 4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	IED SAN CAYETANO	$ 49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	RURAL LA MAYORIA	$ 13.904.344	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00
9	DIRECCION LOCAL USME	$ 31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$ 446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	100,00%	0,00%	30,00	30,00	0,00
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$ 20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	IED SANTA LIBRADA	$ 1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$ 298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$ 598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$ 29.389.803	21/08/2023	27/08/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$ 14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$ 1.198.868.110**									

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23

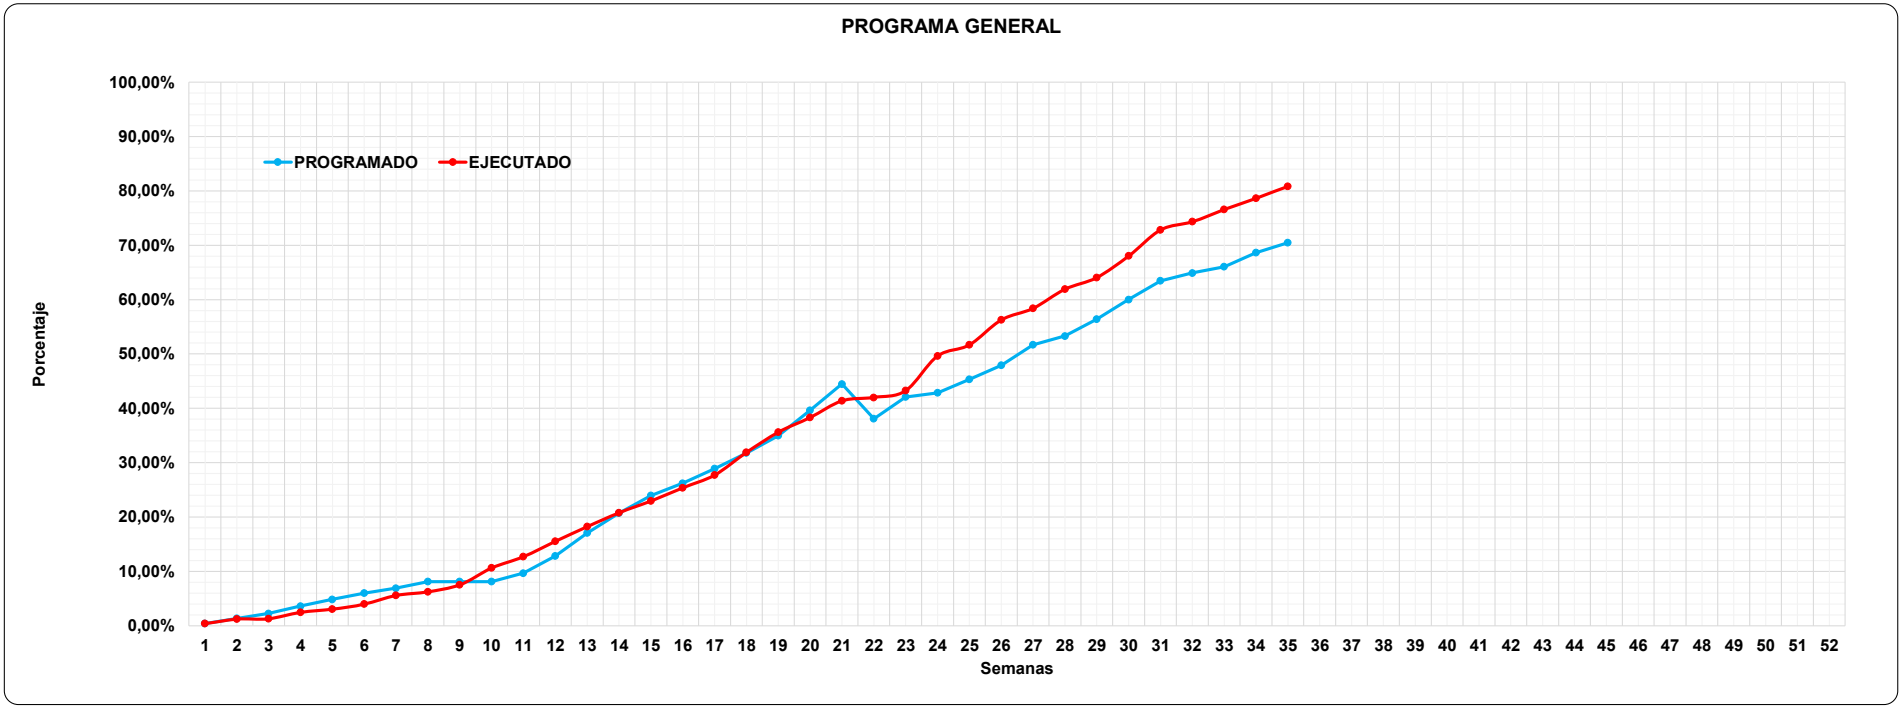

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 10.37%, presentándose atrasos puntuales en las sedes El Uval y Fabio Lozano Simonelli.
- Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance.
- Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
- Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

SEMANA No.	37		21-ago-23	AL	27-ago-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



EMBOQUILLADO DE ENCHAPE BAÑOS

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS

OFELIA URIBE ACOSTA (EMERGENCIA)



ORDEN Y ASEO




INSTALACION DE ORINALES



INSTALACION DE CANAL

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A

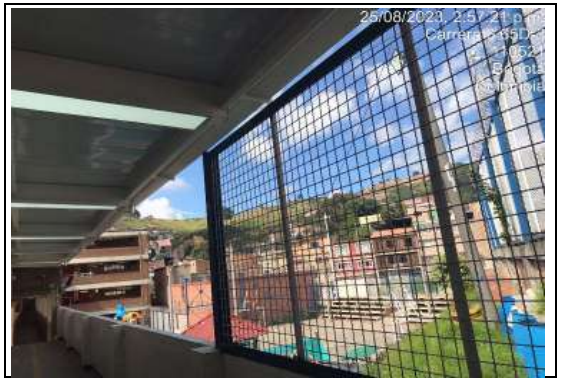

INSTALACION DE CANALES



INSTALACION DE CANALES



RESANE Y PINTURA DE MUROS



RESANE Y PINTURA DE MUROS



RESANE Y PINTURA DE MUROS



RESANE Y PINTURA DE MUROS

COLEGIO RURAL LA UNION



ESTADO FINAL ETAPA II



ESTADO FINAL ETAPA II



ESTADO FINAL ETAPA II



ESTADO FINAL ETAPA II



ESTADO FINAL ETAPA II



ESTADO FINAL ETAPA II

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



PINTURA DE CANCHA



PINTURA DE CANCHA



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO

IED VENECIA - SEDE B



INSTALACION DE PORTERIAS



INSTALACION DE PORTERIAS



PINTURA DE CANCHA



PINTURA DE CANCHA



INSTALACION DE PUERTAS



INSTALACION DE PUERTAS

DILE USME



NIVELACION DE TERRENO PARA FUNDIDA DE RAMPA



INSTALACION DE DIVISIONES



INSTALACION DE DIVISIONES

DILE TUNJUELITO



PICADO DE MUROS PARA INSTALACION DE ENCHAPE



PICADO DE MUROS PARA INSTALACION DE ENCHAPE



AMPLIACION DE CARCAMO

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

			PERSONAL ADMINISTRATIVO		
SEMANA No.	37	**DEL**	21-ago-23	**AL**	27-ago-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022	P	Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	**AFECTACIONES - EVENTUALIDADES**

SEMANA No.	37	DEL	21-ago-23	AL	27-ago-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1			7/8/23			
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones durante el periodo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 22 de 2023
CINP-BTA-529-0602-5598

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 36.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 36 correspondiente al periodo comprendido del 14 de agosto al 20 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en veinte (20) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	22-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**36**		**Del :**	14/08/2023	**AL:** 20/08/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**250**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**2,56%**	**68,62%**	**(%) Ejecutado**	**2,11%**	**78,67%**
Valor programado ($)	**$ 8.285.039.373,08**		**Valor ejecutado ($)**	**$ 9.498.455.952,79**	
			Evaluación	**10,05%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

VERSIÓN	1
Fecha	22-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**36**	**Del :**	14/08/2023	**AL:**	20/08/2023
Plazo Total	**396** días				

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**IED USMINIA SEDE C**		**USME**	**$ 372.412.811**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	**IED BRASILIA SEDE A**		**USME**	**$ 720.239.927**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**		**USME**	**$ 1.346.746.630**	88,00%	82,00%	**ENTREGA DE AULA MODULAR **INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA **DESMONTE DE CUBIERTA **INSTALACION DE CUBIERTA	**INSTALACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACION DE CUBIERTAS
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**		**USME**	**$ 853.433.498**	100,00%	99,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**ENTREGA ESPACIOS AREA ADMINISTRATIVA
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**		**USME**	**$ 550.424.024**	83,00%	91,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACION DE CUBIERTA	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION RED ELÉCTRICA **INSTALACION DE PISO
6	**IED LOS TEJARES**		**USME**	**$ 181.308.494**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	**IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B**		**USME**	**$ 628.394.933**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	**INEM SANTIAGO PEREZ**		**TUNJUELITO**	**$ 362.348.937**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	**COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A**		**USME**	**$ 852.869.715**	0,00%	0,00%		
10	**COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A**		**USME**	**$ 516.609.542**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	**IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**		**USME**	**$ 623.938.623**	58,00%	55,00%	**INSTALACION DE CUBIERTA	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION RED ELÉCTRICA
12	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C**		**USME**	**$ 388.064.062**	0,00%	0,00%		
13	**COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A**		**USME**	**$ 351.263.110**	31,00%	100,00%	**INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO **INSTALACION DE LAVAMANOS **ENTREGA DE ESPACIOS	**FRENTE TERMINADO
14	**COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A**		**USME**	**$ 418.617.430**	0,00%	88,00%	**CAMBIO DE VENTANAS **INSTALACION ELÉCTRICA	**PINTURA DE MUROS
15	**COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A**		**USME**	**$ 293.731.567**	54,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	**COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A**		**USME**	**$ 376.450.691**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	**COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A**		**USME**	**$ 255.186.272**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**		**USME**	**$ 299.060.323**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO

							VERSIÓN	1
							Fecha	22-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**36**				**Del :**	14/08/2023	**AL:**	20/08/2023
Plazo Total	**396**	días						

19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$ 179.004.711**	53,00%	99,00%	**INSTALACION RED ELÉCTRICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS	**ENTREGA DE ESPACIOS
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 443.348.816**	48,00%	71,00%	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS Y BARANDAS	**DEMARCACIÓN DE CANCHA **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 428.177.761**	35,00%	95,00%	**PINTURA CANCHA **FUNDIDA DE LOSA **INSTALACION DE REJILLAS DE CÁRCAMO	**INSTALACION PORTERÍAS CANCHA
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.607.658**	80,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$ 117.815.760**	14,00%	44,00%	**PINTURA SOBRE MUROS **DEMOLICIÓN DE RAMPA DE ACCESO	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACION DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$ 74.929.438**	16,00%	45,00%	**DEMOLICIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO **LIMPIEZA DE CANALES **INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO	**INSTALACION DE LUMINARIAS **INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO **IMPERMEABILIZACIÓN **AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0594-5432 se hace un llamado de atención al Consorcio Educación Bogotá, desde el componente de seguridad y salud en el trabajo, debido a que el 11 de agosto de 2023 se evidencio que en el Colegio Quebec se estaban realizando trabajos de alto riesgo sin las medidas preventivas y actos inseguros que podían conllevar accidentes o un incidente.**
****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0598-5510 se hace un tercer llamado de atención por la falta de documentación legal vigente en los frentes de obra del Colegio IED Venecia Muzu sede B, Colegio integral José María Córdoba y Dile Tunjuelito.**

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, La Union, La Argentina, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 36.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
***Comite de obra 14 de agosto de 2023.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	22-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**36**	**Del :**	14/08/2023	**AL:**	20/08/2023
Plazo Total	**396** días				

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**8.062.378.503,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 8.062.378.503,00
% Avance facturado Acumulado
66,78%
Saldo por Facturar
$ 4.011.418.310,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 135.357.324,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**443.983.452,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 443.983.452,00
% Avance facturado Acumulado
46,61%
Saldo por Facturar
$ 508.566.328,00

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, La Unión, La Argentina, Federico García Lorca sede C, José María Córdoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.

2. De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 10.05%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 11 frentes de obra adicionalmente a los frentes de emergencia Ofelia Uribe Acosta y La Mayoría.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en las sedes Uval y Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

6	**IED ORLANDO FALS BORDA**	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	**IED SAN CAYETANO**	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	**RURAL LA MAYORIA**	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	**DIRECCION LOCAL USME**	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	**IED OFELIA URIBE DE ACOSTA**	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	**IED JUAN LUIS LONDOÑO**	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	**IED SANTA LIBRADA**	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	**IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	**FRANCISCO ANTONIO ZEA**		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	**IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO**	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	**IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA**		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	**IED PAULO FREILE ETAPA 2**		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	**IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2**	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.198.868.110,01**	**$ 190.713.806,01**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	**VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS**	$ 11.908.852.841

DIFERENCIA	$ 164.943.972

OBSERVACIONES:
Se evidencia saldo a favor de $164.943.972, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	$ 10.709.984.731	27/12/2022	26/12/2023	365,00	68,62%	78,67%	10,05%	287,16	250,48	36,68
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	29/09/2023	263,00	88,00%	82,00%	-6,00%	215,66	231,44	-15,78
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	99,00%	-1,00%	211,86	214,00	-2,14
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	20/09/2023	245,00	83,00%	91,00%	8,00%	222,95	203,35	19,60
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	10/07/2023	23/12/2023	166,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	21/10/2023	165,00	58,00%	55,00%	-3,00%	90,75	95,70	-4,95
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	31,00%	100,00%	69,00%	109,00	33,79	75,21
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	88,00%	88,00%	72,16	0,00	72,16
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	54,00%	100,00%	46,00%	91,00	49,14	41,86
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	53,00%	99,00%	46,00%	106,92	57,24	49,68
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	48,00%	71,00%	23,00%	83,07	56,16	26,91
21	IED VENECIA SEDE B	$ 428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	35,00%	95,00%	60,00%	120,65	44,45	76,20
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	80,00%	100,00%	20,00%	62,00	49,60	12,40
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	14,00%	44,00%	30,00%	60,72	19,32	41,40

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

24	**DILE TUNJUELITO**	$	74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	16,00%	45,00%	29,00%	62,10	22,08	40,02
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**10.709.984.731**									
1	**IED PAULO FREILE**	$	5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	**IED FEDERICO GARCIA LORCA**	$	367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	**IED ALMIRANTE PADILLA**	$	40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
4	**LOTE VILLA ROSITA**	$	-	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	**IED SANTA MARTA**	$	36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	**IED ORLANDO FALS BORDA**	$	4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	**IED SAN CAYETANO**	$	49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	**RURAL LA MAYORIA**	$	13.904.344	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00
9	**DIRECCION LOCAL USME**	$	31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	**IED OFELIA URIBE DE ACOSTA**	$	446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	98,00%	-2,00%	29,40	30,00	-0,60
11	**IED JUAN LUIS LONDOÑO**	$	20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**	$	11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	**IED SANTA LIBRADA**	$	1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
14	**IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	$	26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	$	298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1**	$	598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	**IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO**	$	98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	**IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA**	$	699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	**IED PAULO FREILE ETAPA 2**	$	29.389.803	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	**IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2**	$	14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**1.198.868.110**									

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

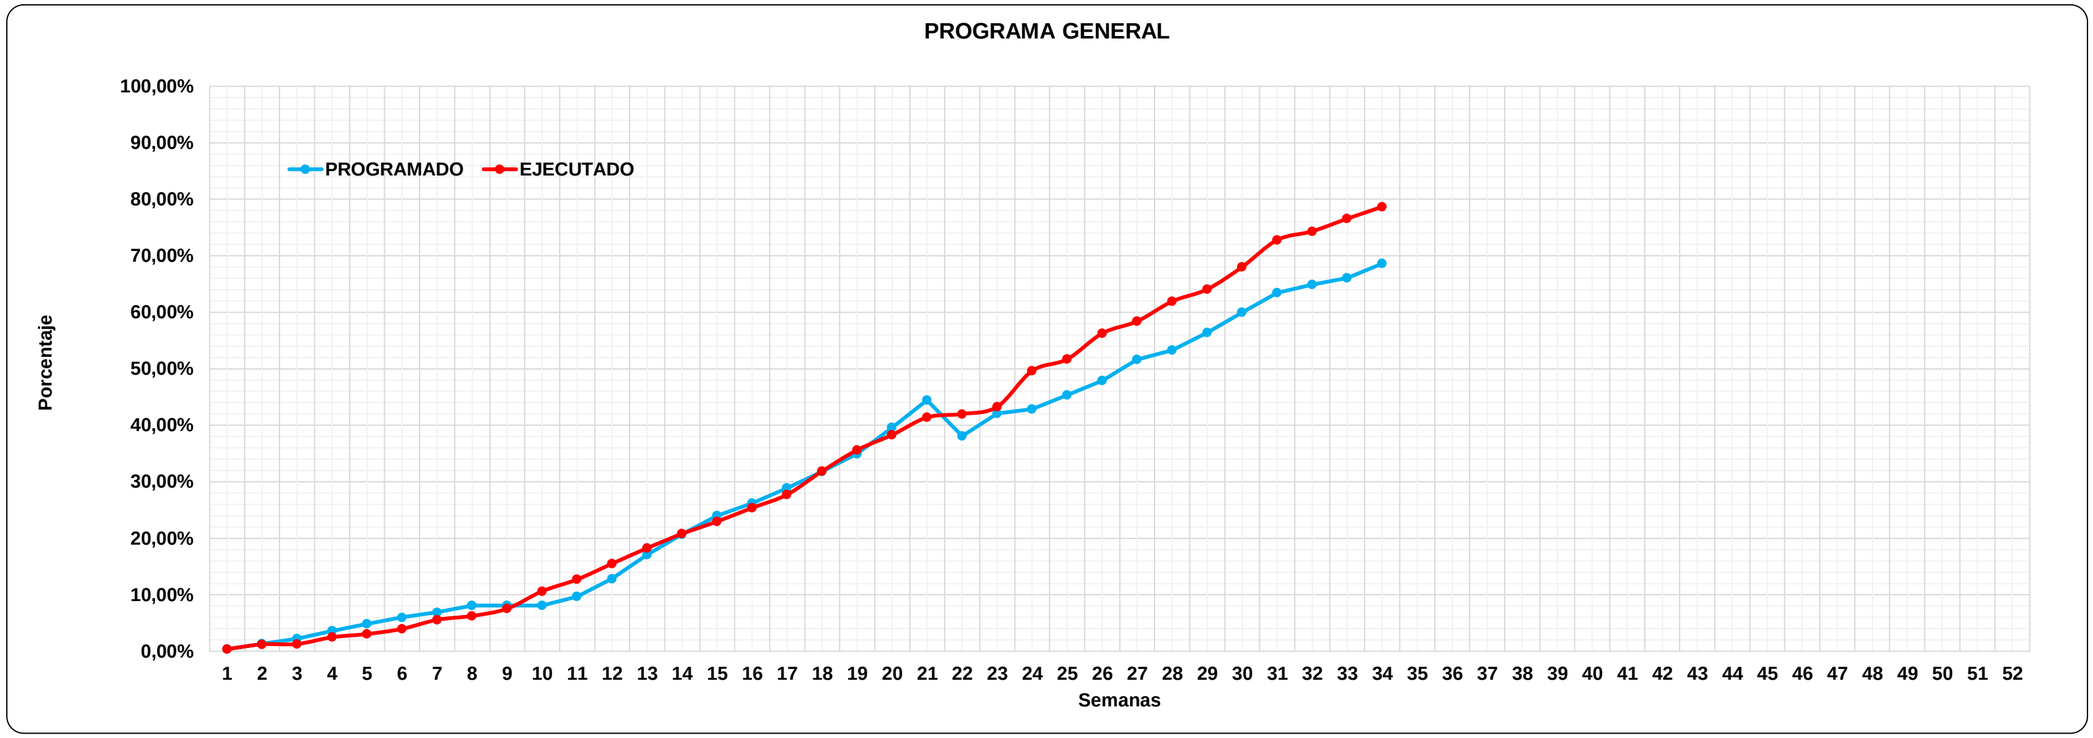

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 10.05%, se realiza actualización de programación de las sedes Provincia de Quebec, Nuevo San Andres, El Uval y Fabio Lozano Simonelli.
- Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance
- Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
- Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

SEMANA No.	36		14-ago-23	**AL**	20-ago-23

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

COLEGIO RURAL EL UVAL



DESMONTE DE CUBIERTA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE ENCHAPE DE BAÑOS



INSTALACION DE ENCHAPE DE BAÑOS



ENTREGA AULA MODULAR

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA

OFELIA URIBE ACOSTA (EMERGENCIA)



INSTALACION DE LAVAMANOS



INSTALACION DE LAVAMANOS



AVANCE GENERAL DE OBRA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA

COLEGIO RURAL LA UNION



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CIELO RASO



INSTALACION CUBIERTA



RESANE DE VENTANAS

COLEGIO RURAL LA ARGENTINA



ESTADO FINAL AULAS



ESTADO FINAL BAÑOS



ESTADO FINAL BAÑOS



ESTADO FINAL AULAS



ESTADO FINAL PATIO



ESTADO FINAL PATIO

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



MANTENIMIENTO DE BARANDAS



MANTENIMIENTO DE BARANDAS



MANTENIMIENTO DE BARANDAS



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO



RETIRO DE RCD

IED FEDERICO GARCIA LORCA - SEDE C




DESMONTE DE CERRAMIENTOS




INSTALACION DE LUMINARIA



RESANE DE MUROS

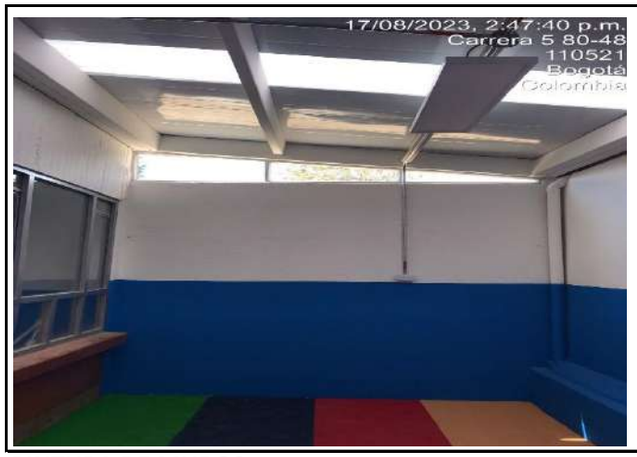

PINTURA DE MUROS

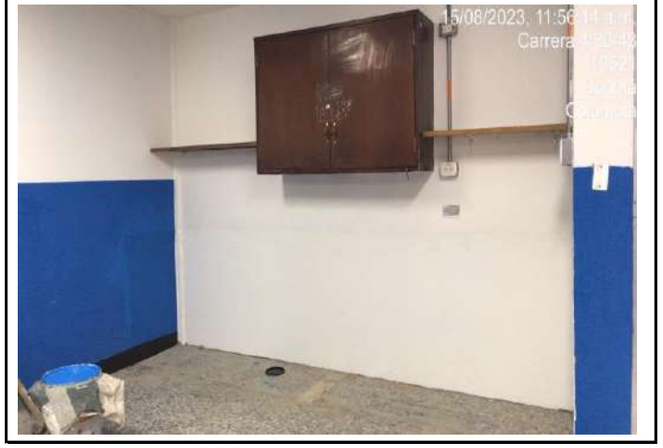

PINTURA DE MUROS



FACHADA PRINCIPAL

IED VENECIA - SEDE B



PINTURA DE CANCHA



PINTURA DE CANCHA



PINTURA DE CANCHA



RESANE DE CARCAMO



INSTALACION REJILLAS DE CARCAMO



ORDEN Y ASEO

DILE USME



PINTURA DE MUROS



PINTURA DE MUROS



PINTURA DE MUROS

DILE TUNJUELITO



INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS



RESANE DE MUROS



LIMPIEZA DE CANALES

COLEGIO RURAL LA MAYORIA



PAÑETE SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



ESTADO FINAL

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

AFECTACIONES - EVENTUALIDADES

SEMANA No.	36	DEL	14-ago-23	AL	20-ago-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	COLEGIO EL UVAL		7/8/23			SE REGISTRAN ATRASOS EN EL INICIO DEL BLOQUE DE PRIMARIA DEBIDO A QUE AUN SE PRESENTAN EQUIPOS COMO EL RACK DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENA DE INTERNET INSTALADOS EN ESTE BLOQUE.
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 14 de 2023
CINP-BTA-529-0592-5429

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 35.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 35 correspondiente al periodo comprendido del 07 de julio de 2023 al 13 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en veintiún (21) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	14-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**35**		**Del :**	7/08/2023	**AL:** 13/08/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**243**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,16%**	**66,06%**	**(%) Ejecutado**	**2,23%**	**76,56%**
Valor programado ($)		**$ 7.975.950.174,67**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 9.243.698.840,03**
			Evaluación	**10,50%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	14-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**35**	**Del :**	7/08/2023	**AL:**	13/08/2023
Plazo Total	**396** días				

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**IED USMINIA SEDE C**		**USME**	**$ 372.412.811**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	**IED BRASILIA SEDE A**		**USME**	**$ 720.239.927**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**		**USME**	**$ 1.346.746.630**	87,00%	79,00%	**INSTALACION DE AULA MODULAR **INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA **DESMONTE DE CUBIERTA **ENCHAPE DE BAÑOS	** INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS ** INSTALACIÓN DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ** INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ** INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**		**USME**	**$ 853.433.498**	96,00%	99,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES **ENTREGA ESPACIOS ÁREA ADMINISTRATIVA
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**		**USME**	**$ 550.424.024**	75,00%	88,00%	**INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA	**INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN DE CUBIERTA **INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA **INSTALACIÓN DE PISO
6	**IED LOS TEJARES**		**USME**	**$ 181.308.494**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	**IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B**		**USME**	**$ 628.394.933**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	**INEM SANTIAGO PEREZ**		**TUNJUELITO**	**$ 362.348.937**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	**COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A**		**USME**	**$ 852.869.715**	0,00%	0,00%		
10	**COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A**		**USME**	**$ 516.609.542**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	**IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**		**USME**	**$ 623.938.623**	54,00%	53,00%	**INSTALACION DE CUBIERTA	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN DE CUBIERTA **INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA
12	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C**		**USME**	**$ 388.064.062**	0,00%	0,00%		
13	**COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A**		**USME**	**$ 351.263.110**	20,00%	96,00%	**SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑO	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO **INSTALACIÓN DE LAVAMANOS
14	**COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A**		**USME**	**$ 418.617.430**	0,00%	72,00%	**INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTA	**CAMBIO DE VENTANAS **PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN ELECTICA
15	**COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A**		**USME**	**$ 293.731.567**	37,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO

							VERSIÓN	1
							Fecha	14-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No		**35**				**Del :**	7/08/2023	**AL:**	13/08/2023
Plazo Total		**396**	días						
16	**COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A**		**USME**	**$ 376.450.691**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	**COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A**		**USME**	**$ 255.186.272**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**		**USME**	**$ 299.060.323**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$ 179.004.711**	45,00%	90,00%	**INSTALACIÓN DE PISO GRANO CAUCHO **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACIÓN DE DESAGÜE	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 443.348.816**	40,00%	70,00%	**INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA CANCHA	**DEMARCACIÓN DE CANCHA **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 428.177.761**	30,00%	88,00%	**INSTALACIÓN DE MUROS EN DRYWALL **FUNDIDA DE ANDENES	**PINTURA CANCHA **INSTALACIÓN PORTERÍAS CANCHA
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.607.658**	71,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$ 117.815.760**	9,00%	20,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$ 74.929.438**	9,00%	30,00%	**DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE **ADECUACIÓN DE PLACA PARA INSTALACION DE NUEVO TANQUE	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS **INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO **IMPERMEABILIZACIÓN **AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0587-5387 del 10 agosto de 2023 se hace entrega a la supervision del contrato el informe forestal de la emergencia IED Almirante Padilla Sede A entregado por el contratista de obra, mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-331-2022.**
****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0580-5350 del 09 de agosto de 2023 se da aprobacion al informe mensual No. 07 del componente de seguridad y salud en el trabajo del contrato de obra.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	14-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**35**	**Del :**	7/08/2023	**AL:**	13/08/2023
Plazo Total	**396** días				

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Brasilia, Fabio Simonelli, La Union, La Argentina, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 35.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
***Comite de obra 09 de agosto de 2023.**
*** Inforeme mensual de interventoria No. 07.**

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**8.062.378.503,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 8.062.378.503,00
% Avance facturado Acumulado
66,78%
Saldo por Facturar
$ 4.011.418.310,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 137.548.188,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**446.174.316,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 446.174.316,00
% Avance facturado Acumulado
46,84%
Saldo por Facturar
$ 506.375.464,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	14-ago-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**35**	**Del :**	7/08/2023	**AL:**	13/08/2023
Plazo Total	**396** días				


OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Brasilia, Fabio Simonelli, La Unión, La Argentina, Federico García Lorca sede C, José María Córdoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.

2. De acuerdo a los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 10.50%, se realiza actualización de programación de las sede Provincia de Quebec, Nuevo San Andres , El Uval y Fabio Lozano Simonelli.

3. A la fecha se encuentran abiertos 12 frentes de obra adicionalmente a los frentes de emergencia Ofelia Uribe Acosta y La Mayoría.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en las sedes Uval y Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	35	DEL	7-ago-23	AL	13-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

SEMANA No.	35	DEL	7-ago-23	AL	13-ago-23

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.198.868.110,01**	**$ 190.713.806,01**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 1.008.154.304,00

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.908.852.841
		DIFERENCIA	$ 164.943.972

OBSERVACIONES:

Se evidencia saldo a favor de $164.943.972, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN


SEMANA No.	35	DEL	07-ago-23	AL	13-ago-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.709.984.731**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**66,06%**	**76,56%**	**10,50%**	**279,43**	**241,12**	**38,31**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	29/09/2023	263,00	87,00%	79,00%	-8,00%	207,77	228,81	-21,04
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	96,00%	99,00%	3,00%	211,86	205,44	6,42
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	20/09/2023	245,00	75,00%	88,00%	13,00%	215,60	183,75	31,85
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	10/07/2023	23/12/2023	166,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	21/10/2023	165,00	54,00%	53,00%	-1,00%	87,45	89,10	-1,65
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	20,00%	96,00%	76,00%	104,64	21,80	82,84
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	72,00%	72,00%	59,04	0,00	59,04
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	37,00%	100,00%	63,00%	91,00	33,67	57,33
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	45,00%	90,00%	45,00%	97,20	48,60	48,60
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	40,00%	70,00%	30,00%	81,90	46,80	35,10
21	IED VENECIA SEDE B	$ 428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	30,00%	88,00%	58,00%	111,76	38,10	73,66

										CONTROL DE PROGRAMACIÓN		
SEMANA No.		35	DEL	07-ago-23				AL		13-ago-23		
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	71,00%	100,00%	29,00%	62,00	44,02	17,98	
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	9,00%	20,00%	11,00%	27,60	12,42	15,18	
24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	9,00%	30,00%	21,00%	41,40	12,42	28,98	
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 10.709.984.731										
1	IED PAULO FREILE	$ 5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00	
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$ 367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00	
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$ 40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	90,00%	90,00%	0,00%	6,30	6,30	0,00	
4	LOTE VILLA ROSITA	$ -	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
5	IED SANTA MARTA	$ 36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00	
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$ 4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00	
7	IED SAN CAYETANO	$ 49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00	
8	RURAL LA MAYORIA	$ 13.904.344	13/08/2023	18/08/2023	5,00	20,00%	20,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
9	DIRECCION LOCAL USME	$ 31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00	
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$ 446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	93,00%	-7,00%	27,90	30,00	-2,10	
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$ 20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00	
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00	
13	IED SANTA LIBRADA	$ 1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00	
15	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$ 298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$ 598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00	
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00	
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$ 29.389.803	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$ 14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 1.198.868.110										

CONTROL DE PROGRAMACIÓN					
SEMANA No.	35	DEL	07-ago-23	AL	13-ago-23

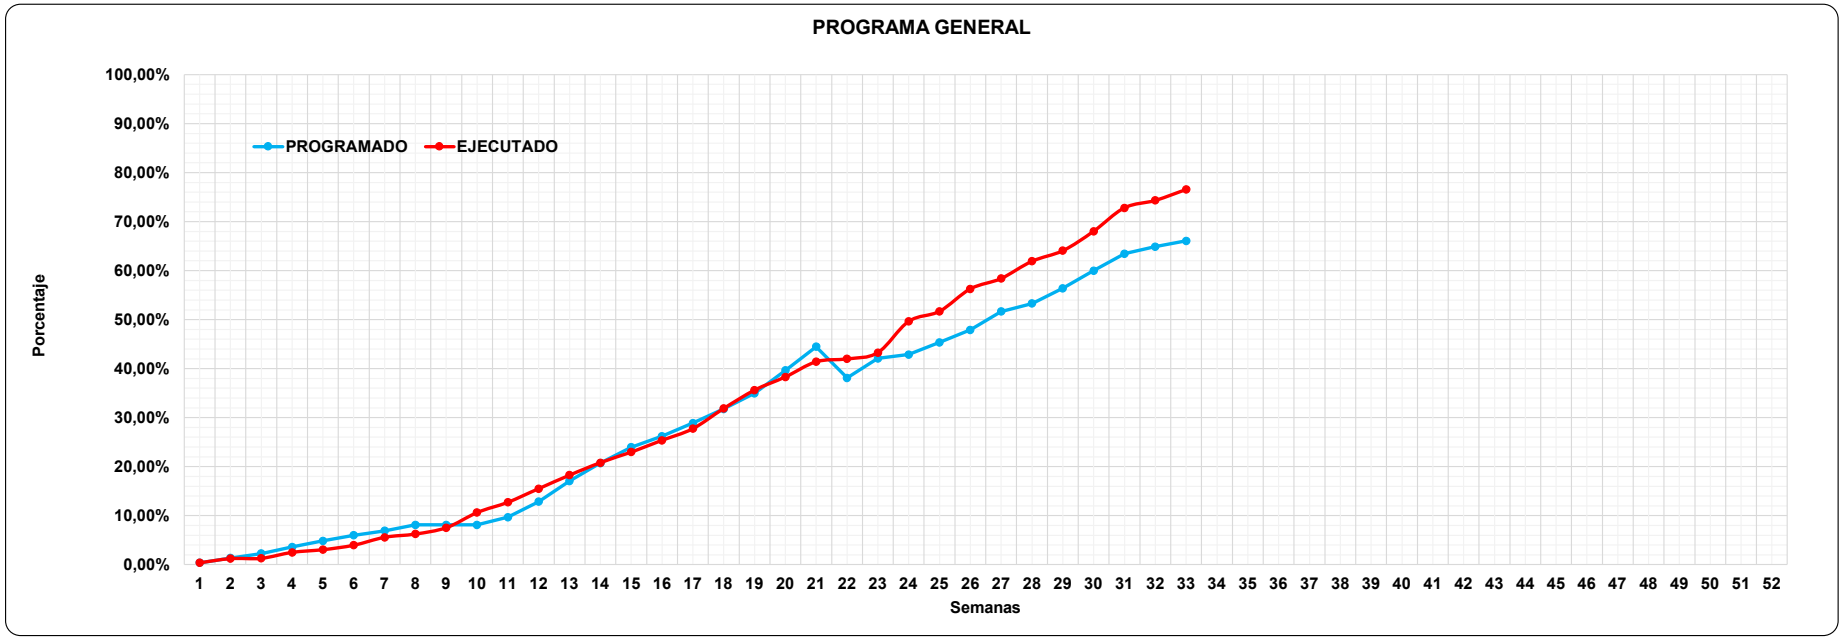

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 10.50%, se realiza actualización de programación de las sedes Provincia de Quebec, Nuevo San Andres, El Uval y Fabio Lozano Simonelli.
- Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance
- Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
- Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ					REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO
SEMANA No.	35		07-ago-23	**AL**	13-ago-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA



MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA



REPOSICION CINTAS ANTIDESLIZANTES



ADECUACION DE CERRADURAS

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

BRASILIA - SEDE A



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS

OFELIA URIBE ACOSTA (EMERGENCIA)



INSTALACION DE MEDIACAÑAS



INSTALACION DE MEDIACAÑAS



AVANCE GENERAL DE OBRA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS



INSTALACION DE CUBIERTA

COLEGIO RURAL LA UNION



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE VENTANERÍA



INSTALACION DE RED ELECTRICA



INSTALACION DE RED ELECTRICA

COLEGIO RURAL LA ARGENTINA



SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑO



SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑO



SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑO

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA

IED FEDERICO GARCIA LORCA - SEDE C



PINTURA BAJO PLACA



DEMOLICION DE MESONES



DEMOLICION DE MESONES



DEMOLICION DE MESONES



INSTALACION DE DESAGUES EN PATIO



INSTALACION DE PISO GRANOCAUCHO

IED VENECIA - SEDE B



REPARACION PORTON



FUNDIDA DE LOSAS



INSTALACION DE CIELO RASO



INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL



INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL



INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL

DILE TUNJUELITO		
		
DESMONTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	ADECUACION DE PLACA PARA TANQUE	FUNDIDA DE PLACA PARA TANQUE
COLEGIO RURAL LA MAYORIA		
		
DEMOLICION CUARTO BODEGA	DEMOLICION CUARTO BODEGA	DEMOLICION CUARTO BODEGA

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	35	DEL	7-ago-23	AL	13-ago-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

				PERSONAL ADMINISTRATIVO		
SEMANA No.		35	**DEL**	7-ago-23	**AL**	13-ago-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

				AFECTACIONES -EVENTUALIDADES

SEMANA No.	35	DEL	7-ago-23	AL	13-ago-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	COLEGIO EL UVAL		7/8/23			SE REGISTRAN ATRASOS EN EL INICIO DEL BLOQUE DE PRIMARIA DEBIDO A QUE AUN SE PRESENTAN EQUIPOS COMO EL RACK DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENA DE INTERNET INSTALADOS EN ESTE BLOQUE.
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0581-5332

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 34.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 34 correspondiente al periodo comprendido del 31 de julio de 2023 al 06 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en veintidós (22) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**34**		**Del :**	31/07/2023	**AL:** 6/08/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**236**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,46%**	**64,90%**	**(%) Ejecutado**	**1,53%**	**74,33%**
Valor programado ($)		**$ 7.835.894.131,64**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 8.974.453.171,10**
			Evaluación	**9,43%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 34 **Del :** 31/07/2023 **AL:** 6/08/2023

Plazo Total 396 días

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**IED USMINIA SEDE C**		**USME**	**$ 372.412.811**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	**IED BRASILIA SEDE A**		**USME**	**$ 720.239.927**	100,00%	99,00%	**IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA	**FRENTE TERMINADO
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**		**USME**	**$ 1.346.746.630**	86,00%	75,00%	**INSTALACION DE AULA MODULAR **ENCHAPE SOBRE MUROS **INSTALACION RED HIDRÁULICA BAÑOS **DESMONTE DE VENTANAS **DESMONTE DE CUBIERTA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA	**INSTALACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACION DE ENCHAPES **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**		**USME**	**$ 853.433.498**	93,00%	99,00%	**ENTREGA AULAS ETAPA III **INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO	**SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES **ENTREGA ESPACIOS ÁREA ADMINISTRATIVA
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**		**USME**	**$ 550.424.024**	82,00%	87,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELÉCTRICA **INSTALACION DE PISO
6	**IED LOS TEJARES**		**USME**	**$ 181.308.494**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	FRENTE TERMINADO
7	**IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B**		**USME**	**$ 628.394.933**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	**INEM SANTIAGO PEREZ**		**TUNJUELITO**	**$ 362.348.937**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	**COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A**		**USME**	**$ 852.869.715**	0,00%	0,00%		
10	**COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A**		**USME**	**$ 516.609.542**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	**IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**		**USME**	**$ 623.938.623**	54,00%	50,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELÉCTRICA
12	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C**		**USME**	**$ 388.064.062**	0,00%	0,00%		
13	**COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A**		**USME**	**$ 351.263.110**	12,00%	92,00%	**INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	**INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO **INSTALACION DE LAVAMANOS
14	**COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A**		**USME**	**$ 418.617.430**	0,00%	68,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA	**INSTALACION DE CUBIERTA **CAMBIO DE VENTANAS **PINTURA DE MUROS **INSTALACION ELÉCTRICA

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 34 **Del :** 31/07/2023 **AL:** 6/08/2023

Plazo Total 396 días

15	**COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A**		**USME**	**$**	**293.731.567**	21,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
16	**COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A**		**USME**	**$**	**376.450.691**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	**COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A**		**USME**	**$**	**255.186.272**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**		**USME**	**$**	**299.060.323**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$**	**179.004.711**	40,00%	84,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS	**INSTALACION RED ELÉCTRICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$**	**443.348.816**	34,00%	43,00%	**INSTALACION RED ELÉCTRICA GRADERÍAS **ADECUACIÓN CANCHA PARA INSTALACION DE CARPETA ASFÁLTICA	**REPOSICIÓN CANCHA **IMPERMEABILIZACION GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$**	**428.177.761**	26,00%	85,00%	**CARPETA ASFÁLTICA CANCHA **DEMOLICIÓN DE ANDENES	**PINTURA CANCHA **INSTALACION PORTERÍAS CANCHA **INSTALACION RED ELÉCTRICA
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$**	**75.607.658**	63,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$**	**117.815.760**	8,00%	20,00%	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO **EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERÍA	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACION DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$**	**74.929.438**	7,00%	21,00%	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	**INSTALACION DE LUMINARIAS **INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO **IMPERMEABILIZACION

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0568-5199 del 01 de agosto de 2023 se da respuesta al comunicado CO.EDUCACION.BOG-320-2022 con el cual el contratista de obra realizo la entrega del informe ambiental No. 07, se emitieron una serie de observaciones con el fin de que estas sean atendidas en el menor tiempo posible.**
****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0574-5267 del 04 de agosto de 2023 se da respuesta al comunicado CO.EDUCACION.BOG-322-2022 con el cual el contratista hace entrega de la subsanacion de observaciones del informe mensial ambiental No. 07, el cual se encontro procedente.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**34**	**Del :**	31/07/2023	**AL:**	6/08/2023
Plazo Total	**396** días				

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Brasilia, Fabio Simonelli, La Union, La Argentina, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 34.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
*** Inforeme mensual de interventoria No. 07.**

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**8.062.378.503,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 8.062.378.503,00
% Avance facturado Acumulado
66,78%
Saldo por Facturar
$ 4.011.418.310,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 135.357.324,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**443.983.452,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 443.983.452,00
% Avance facturado Acumulado
46,61%
Saldo por Facturar
$ 508.566.328,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**34**	**Del :**	31/07/2023	**AL:**	6/08/2023
Plazo Total	**396** días				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Brasilia, Fabio Simonelli, La Unión, La Argentina, Federico García Lorca sede C, José María Córdoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.

2. • De acuerdo a los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.43%, se realiza actualización de programación general de las sede Provincia de Quebec, El Uval y Fabio Lozano Simonelli, sin embargo dado que a la fecha no se ha actualizado la programación especifica de estas sedes, se realiza seguimiento del avance programado de manera lineal con el tiempo transcurrido.

3. A la fecha se encuentran abiertos 12 frentes de obra adicionalmente al frente de emergencia Ofelia Uribe Acosta.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en las sedes Uval y Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.198.868.110,01**	**$ 190.713.806,01**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.908.852.841
		DIFERENCIA	$ 164.943.972

Observaciones:
Se evidencia saldo a favor de $164.943.972, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.709.984.731**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**64,90%**	**74,33%**	**9,43%**	**271,30**	**236,90**	**34,41**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	99,00%	-1,00%	165,33	167,00	-1,67
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	29/09/2023	263,00	86,00%	75,00%	-11,00%	197,25	226,18	-28,93
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	93,00%	99,00%	6,00%	211,86	199,02	12,84
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	20/09/2023	245,00	82,00%	87,00%	5,00%	213,15	200,90	12,25
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	10/07/2023	23/12/2023	166,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	21/10/2023	165,00	54,00%	50,00%	-4,00%	82,50	89,10	-6,60
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	12,00%	92,00%	80,00%	100,28	13,08	87,20
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	68,00%	68,00%	55,76	0,00	55,76
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	21,00%	100,00%	79,00%	91,00	19,11	71,89
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	40,00%	84,00%	44,00%	90,72	43,20	47,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	34,00%	43,00%	9,00%	50,31	39,78	10,53

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

21	IED VENECIA SEDE B	$	428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	26,00%	85,00%	59,00%	107,95	33,02	74,93
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$	75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	63,00%	100,00%	37,00%	62,00	39,06	22,94
23	DILE USME	$	117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	8,00%	20,00%	12,00%	27,60	11,04	16,56
24	DILE TUNJUELITO	$	74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	7,00%	21,00%	14,00%	28,98	9,66	19,32
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**10.709.984.731**									
1	IED PAULO FREILE	$	5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$	367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$	40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	90,00%	90,00%	0,00%	6,30	6,30	0,00
4	LOTE VILLA ROSITA	$	-	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	IED SANTA MARTA	$	36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$	4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	IED SAN CAYETANO	$	49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	RURAL LA MAYORIA	$	13.904.344	10/04/2023	15/04/2023	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	DIRECCION LOCAL USME	$	31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$	446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	90,00%	-10,00%	27,00	30,00	-3,00
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$	20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$	11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	IED SANTA LIBRADA	$	1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
15	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$	26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$	298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$	598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$	98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$	699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$	29.389.803	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$	14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**1.198.868.110**									

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

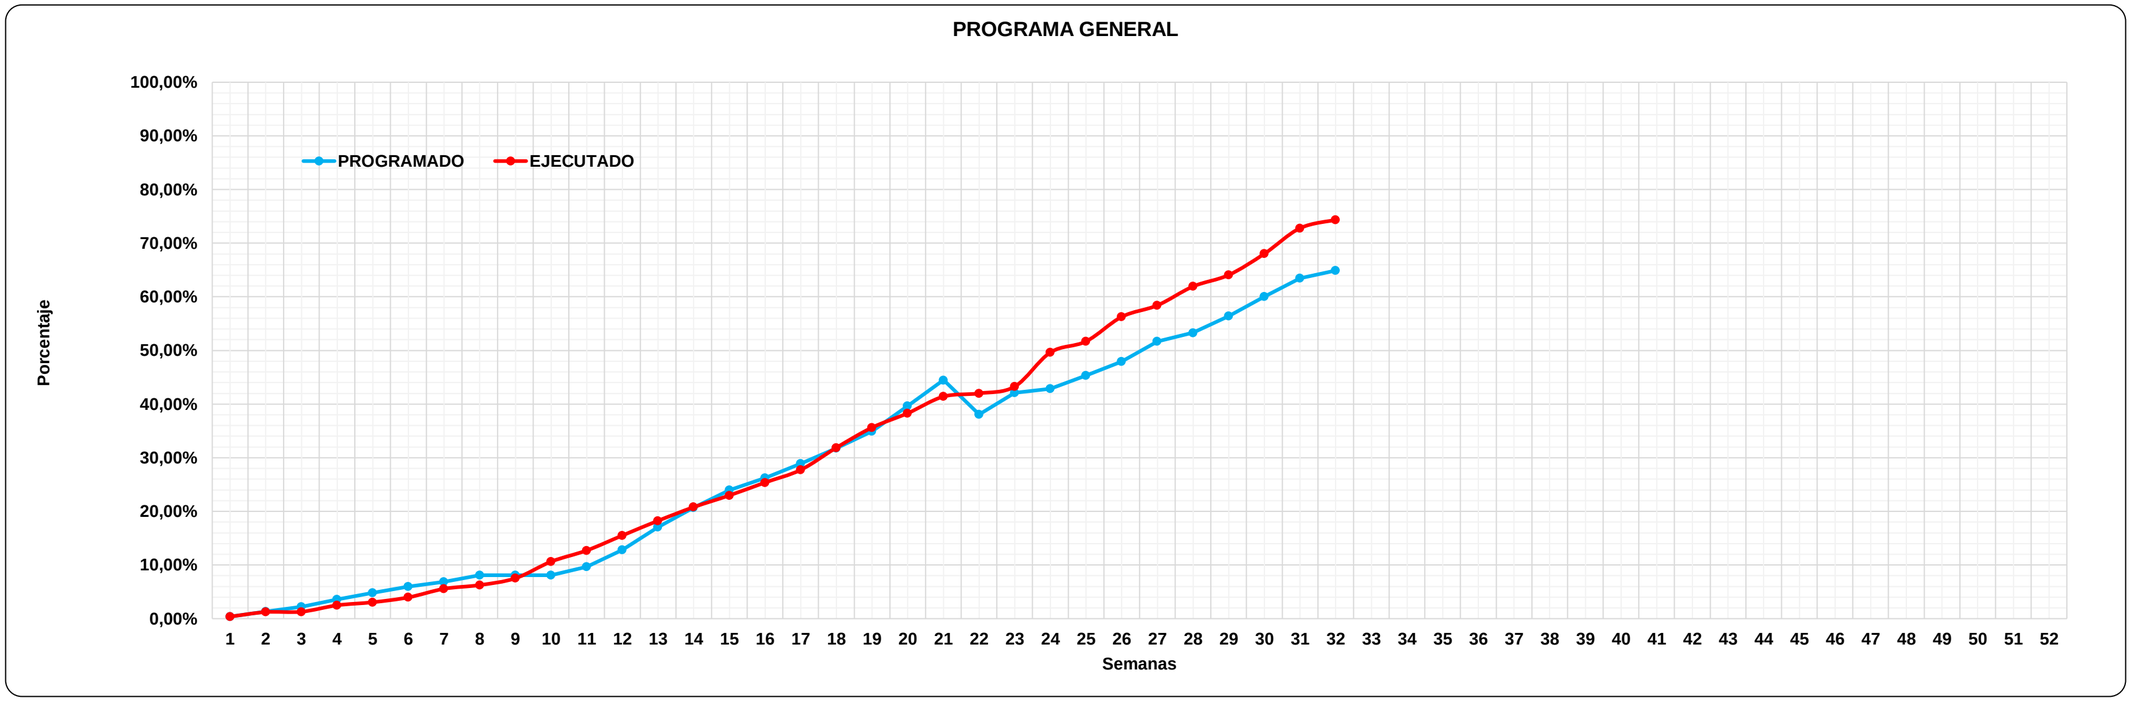

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.43%, se realiza actualización de programación general de las sedes Provincia de Quebec, El Uval y Fabio Lozano Simonelli, sin embargo, dado que a la fecha no se ha actualizado la programación especifica de estas sedes, se realiza seguimiento del avance programado de manera lineal con el tiempo transcurrido.
• Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance
• Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
• Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

SEMANA No.	34		31-jul-23	AL	6-ago-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



DESMONTE DE CUBIERTA Y VENTANERÍA



ENCHAPE DE PISOS AULA MODULAR



ENCHAPE DE PISOS AULA MODULAR

COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS - SEDE A



ESTADO FINAL ETAPA III



ESTADO FINAL ETAPA III



ESTADO FINAL ETAPA III



ESTADO FINAL ETAPA III




ESTADO INCIAL AREA ADMINISTRATIVA



INSTALACION DE DIVISIONES AREA ADMINISTRATIVA

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C

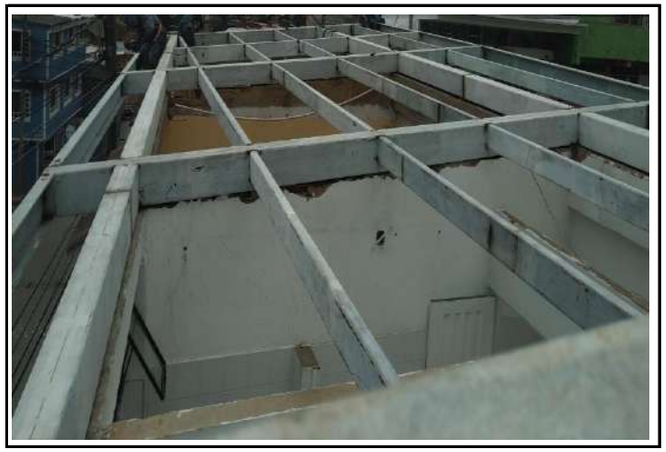

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

BRASILIA - SEDE A



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS

OFELIA URIBE ACOSTA (EMERGENCIA)



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



AVANCE GENERAL DE OBRA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

COLEGIO RURAL LA UNION



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

COLEGIO RURAL LA ARGENTINA



INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



RESANE DE VANOS



IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL



AVANCE GENERAL DE OBRA



AVANCE GENERAL DE OBRA

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



RETIRO DE CARPETA ASFALTICA AFECTADA



RETIRO DE CARPETA ASFALTICA AFECTADA



AVANCE GENERAL CANCHA



RETIRO DE RCD

IED FEDERICO GARCIA LORCA - SEDE C



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL BAÑOS



ESTADO FINAL BAÑOS

IED VENECIA - SEDE B



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



DEMOLICION DE ANDENES

DILE USME



RESANE DE REGATAS EN MUROS



RESANE DE REGATAS EN MUROS



RESANE DE REGATAS EN MUROS



DEMOLICION DE PLACA DE PISO



INSTALACION DE TUBERIAS



EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS

DILE TUNJUELITO



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA						
NUMERO	**NOMBRE**	**CARGO**	**SEDES A CARGO**	**INGRESO**	**RETIRO**	**OBSERVACION**
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17						
Observaciones:						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO · SECRETARÍA DE EDUCACIÓN · BOGOTÁ	**AFECTACIONES - EVENTUALIDADES**

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	FABIO LOZANO SIMONELLI		24/7/23			SE REGISTRA ATRASO NE LA PROGRAMACIÓN DE LA SEDE, NO OBSTANTE ESTO SE DEBE A QUE SE AMPLÍAN LOS ALCANCES DE LA MISMA, POR LO CUAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Julio 31 de 2023
CINP-BTA-529-0566-5127

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 33.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 33 correspondiente al periodo comprendido del 24 de julio de 2023 al 30 de julio de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en veintiun (21) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	25-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**33**		**Del :**	24/07/2023	**AL:** 30/07/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**229**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**3,43%**	**63,44%**	**(%) Ejecutado**	**4,77%**	**72,80%**
Valor programado ($)	**$ 7.659.616.698,17**		**Valor ejecutado ($)**	**$ 8.789.724.079,86**	
			Evaluación PP	**9,36%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	25-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 33 **Del :** 24/07/2023 **AL:** 30/07/2023
Plazo Total 396 días

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	IED USMINIA SEDE C		USME	$ 372.412.811	100,00%	100,00%	**ASEO FINAL	**ENTREGA DE ESPACIOS
2	IED BRASILIA SEDE A		USME	$ 720.239.927	100,00%	99,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**IMPERMEABILIZACION DE PLACA
3	COLEGIO RURAL EL UVAL		USME	$ 1.346.746.630	82,00%	74,00%	**INSTALACION DE AULA MODULAR **PAÑETES SOBRE MUROS **INSTALACION RED HIDRAULICA BAÑOS	**INSTALACION RED ELECTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACION DE ENCHAPES **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS		USME	$ 853.433.498	90,00%	95,00%	**PINTURA DE MUROS **RESANE DE MUROS	**INSTALACION RED ELECTRICA **INSTALACION DE DIVISIONES
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC		USME	$ 550.424.024	83,00%	83,00%	**DESMONTE DE CUBIERTA **DESMONTE DE RED ELECTRICA	**INSTALACION ESTRUCTURA METALICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELECTRICA **INSTALACION DE PISO
6	IED LOS TEJARES		USME	$ 181.308.494	100,00%	100,00%	FRENTE TERMINADO	FRENTE TERMINADO
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		USME	$ 628.394.933	100,00%	100,00%	**ASEO FINAL **ENTREGA ETAPA DE ESPACIOS III	**FRENTE TERMINADO
8	INEM SANTIAGO PEREZ		TUNJUELITO	$ 362.348.937	100,00%	100,00%	FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A		USME	$ 852.869.715	0,00%	0,00%		
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A		USME	$ 516.609.542	100,00%	100,00%	FRENTE TERMINADO	FRENTE TERMINADO
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A		USME	$ 623.938.623	64,00%	45,00%	**DESMONTE RED ELECTRICA **DESMONTE DE CUBIERTA **INSTALACION ESTRUCTURA METALICA	**INSTALACION ESTRUCTURA METALICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELECTRICA
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C		USME	$ 388.064.062	0,00%	0,00%		
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		USME	$ 351.263.110	7,00%	84,00%	**INSTALACION DE LUMINARIAS **INSTALACION DE RED ELECTRICA **ENCHAPE DE MUROS	**INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A		USME	$ 418.617.430	0,00%	65,00%	**DESMONTE DE CUBIERTA **DESMONTE DE CIELO RASO **DESMONTE DE LUMINARIAS Y RED ELECTRICA	**INSTALACION ESTRUCTURA METALICA **INSTALACION DE CUBIERTA **CAMBIO DE VENTANAS **PINTURA DE MUROS **INSTALACION ELECTICA
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A		USME	$ 293.731.567	9,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A		USME	$ 376.450.691	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A		USME	$ 255.186.272	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B		USME	$ 299.060.323	99,00%	100,00%	**INSTALACION DE REJAS	**FRENTE TERMINADO
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C		USME	$ 179.004.711	34,00%	83,00%	**INSTALACION RED ELECTRICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS	**RESANE Y PINTURA DE MUROS

							VERSIÓN	1
							Fecha	25-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 33 **Del :** 24/07/2023 **AL:** 30/07/2023
Plazo Total 396 días

20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 443.348.816**	27,00%	41,00%	**PINTURA DE BARANDAS	**INSTALACION RED ELECTRICA **REPOSICION CANCHA **IMPERMEABILIZACION GRADERIAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 428.177.761**	21,00%	79,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA CANCHA **CARPETA ASFALTICA CANCHA **INSTALACION RED ELECTRICA	**PINTURA CANCHA **INSTALACION PORTERIAS CANCHA **INSTALACION ESTRUCTURA METALICA **INSTALACION RED ELECTRICA
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.607.658**	45,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$ 117.815.760**	6,00%	17,00%	**DEMOLICION ENCHAPE DE BAÑOS **DEMOLICION DE PAÑETES **REGATAS EN MUROS	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAOE DE PISOS **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACION DE RED ELECTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$ 74.929.438**	3,00%	17,00%	**INSTALACION DE CERRAMIENTO **MANTENIMEINTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	**INSTALACION DE LUMINARIAS **INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO **IMPERMEABILIZACION

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

**** El 24 de julio de 2023 mediante comunicado CINP-BTA-529-0548-4963 se emiten una serie de obsercaiones al Componente de seguridad y salud en el trabajo, debido a que el 18 de julio de 2023, se evidenciaron una serie de falencias durante los recorridos.**
***** No se evindencio en campo la documentacion requerida para el inicio de actividades,**
***** No contaban con los permisos de altura.**
***** Andamios mal armados.**
**** El 26 de julio de 2023 mediante comunicado CINP-BTA-529-0556-5031 se emiten una seride de observaciones al componente Ambiental en las siguientes sedes de intervencion (IED Venecia sede B, IED Nuevo San Andres IED Fabio Lozano Simonelli),**
**** Mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5034 se solicia e cambio del inspector de obra del contrato de interventoria, teniendo en cuenta que el profesional aprobado inicialmemnte, por razones personales presento su retiro al proyecto.**
**** El 28 de julio de 2023, mediante comunicado CINP-BTA-529-0564-5079 cuyo asunto es " Comunicado CO.EDUCACION.BOG-305-2023 Reporte No. 02 Novedades IED Almirante Padilla " en donde el contratista de obra reporta novedades con respecto a la atencion de la emergencia correspondientes a los tratamientos Silviculturales en el IED Almirante Padilla , esta interventoria solicita la entrega de una serie de informacion con respecto a dichas actividades.**

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, Brasilia, Fabio Simonelli, La Union, La Argentina, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Comite técnico 05 de julio de 2023
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 30.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

		VERSIÓN	1
		Fecha	25-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**33**		**Del :**	24/07/2023	**AL:** 30/07/2023
Plazo Total	**396**	días			

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**5.655.933.488,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 5.655.933.488,00
% Avance facturado Acumulado
46,84%
Saldo por Facturar
$ 6.417.863.325,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 137.548.188,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**446.174.316,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 446.174.316,00
% Avance facturado Acumulado
46,84%
Saldo por Facturar
$ 506.375.464,00

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, Brasilia, Fabio Simonelli, La Union, La Argentina, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.

2. De acuerdo a los planes de contingencia y reprogramacion presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.36%, se realiza actualizacion de programacion general de las sede Provincia de Quebec, El Uval y Nuevo San Andres de los Altos, sin embargo dado que a la fecha no se ha actualizado la programacion especifica de estas sedes, se realiza seguimiento del avance programado de manera lineal con el tiempo tanscurrido.

3. A la fecha se encuentran abiertos 13 frentes de obra, adicionalmente al frente de emergencia Ofelia Uribe Acosta.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en las sedes Uval, Fabio Simonelli y Brasilia.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.198.868.110,01**	**$ 190.713.806,01**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.908.852.841
		DIFERENCIA	$ 164.943.972

Observaciones:
Se realiza actualización de balance financiero, se evidencia saldo a favor de $164.943.972, por lo cual se pondra a consideracion de la entidad la destinacion de este recurso.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.709.984.731**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**63,66%**	**72,80%**	**9,36%**	**265,73**	**232,38**	**33,35**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	99,00%	-1,00%	165,33	167,00	-1,67
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	11/09/2023	245,00	82,00%	74,00%	-8,00%	181,30	200,90	-19,60
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	90,00%	95,00%	5,00%	203,30	192,60	10,70
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	27/06/2023	160,00	83,00%	83,00%	0,00%	132,80	132,80	0,00
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	10/07/2023	23/12/2023	166,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	28/08/2023	111,00	64,00%	45,00%	-19,00%	49,95	71,04	-21,09
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	7,00%	84,00%	77,00%	91,56	7,63	83,93
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	65,00%	65,00%	53,30	0,00	53,30
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	9,00%	100,00%	91,00%	91,00	8,19	82,81
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	99,00%	100,00%	1,00%	77,00	76,23	0,77
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	34,00%	83,00%	49,00%	89,64	36,72	52,92
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	27,00%	41,00%	14,00%	47,97	31,59	16,38
21	IED VENECIA SEDE B	$ 428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	21,00%	79,00%	58,00%	100,33	26,67	73,66
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	45,00%	100,00%	55,00%	62,00	27,90	34,10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

23	**DILE USME**	$	117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	6,00%	17,00%	11,00%	23,46	8,28	15,18
24	**DILE TUNJUELITO**	$	74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	3,00%	17,00%	14,00%	23,46	4,14	19,32
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**10.709.984.731**									
1	**IED PAULO FREILE**	$	5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	**IED FEDERICO GARCIA LORCA**	$	367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	**IED ALMIRANTE PADILLA**	$	40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	90,00%	90,00%	0,00%	6,30	6,30	0,00
4	**LOTE VILLA ROSITA**	$	-	RETIRADO	RETIRADO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	**IED SANTA MARTA**	$	36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	**IED ORLANDO FALS BORDA**	$	4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	**IED SAN CAYETANO**	$	49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	**RURAL LA MAYORIA**	$	13.904.344	10/04/2023	15/04/2023	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	**DIRECCION LOCAL USME**	$	31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	**IED OFELIA URIBE DE ACOSTA**	$	446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	87,00%	-13,00%	26,10	30,00	-3,90
11	**IED JUAN LUIS LONDOÑO**	$	20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**	$	11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	**IED SANTA LIBRADA**	$	1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
15	**IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	$	26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	$	298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1**	$	598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	**IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO**	$	98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	**IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA**	$	699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	**IED PAULO FREILE ETAPA 2**	$	29.389.803	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	**IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2**	$	14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**1.198.868.110**									

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ					CONTROL DE PROGRAMACIÓN
SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

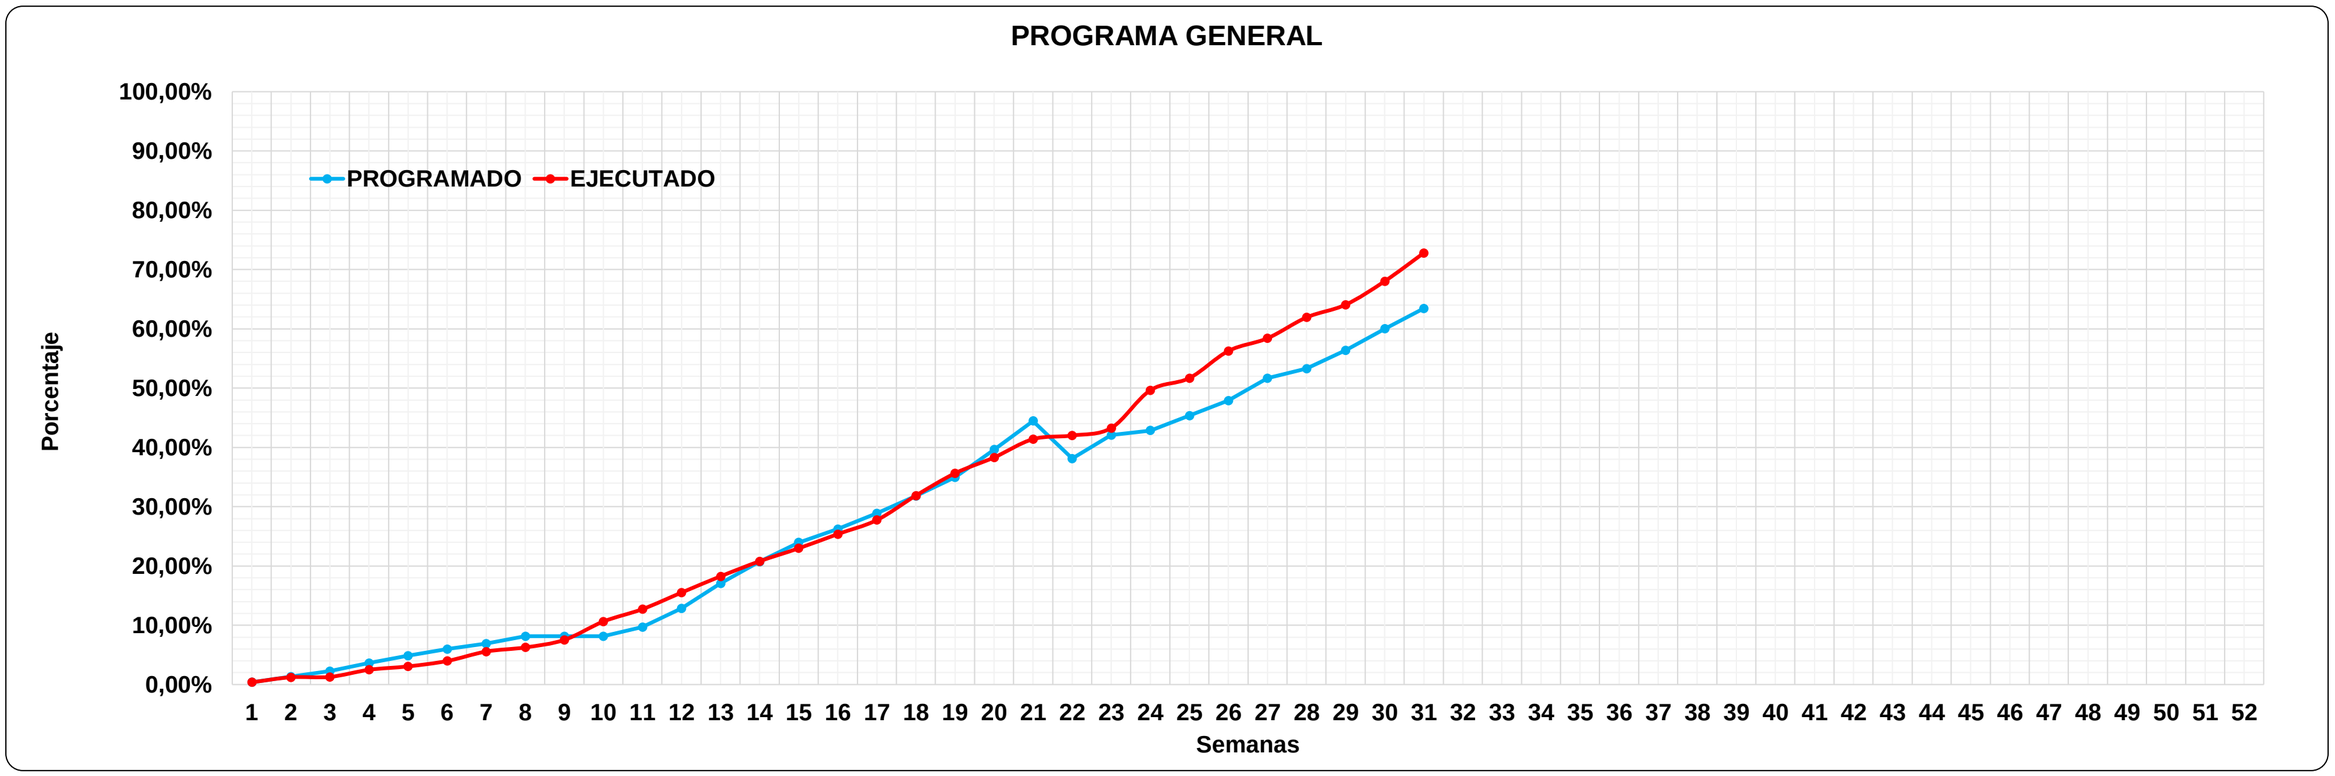

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• De acuerdo a los planes de contingencia y reprogramacion presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.37%, se realiza actualizacion de programacion general de las sede Provincia de Quebec, El Uval y Nuevo San Andres de los Altos, sin embargo dado que a la fecha no se ha actualizado la programacion especifica de estas sedes, se realiza seguimiento del avance programado de manera lineal con el tiempo tanscurrido.
• Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo al ultimo balance remitido por el contratista de obra mediante correo electronico del dia 17 de julio de 2023.
• Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
• Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y seran ajustadas de acuerdo a la prioridad de cada emergencia.

SEMANA No.	33		24-jul-23	AL	30-jul-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



INSTALACION DE PANELES AULA MODULAR



INSTALACION DE PANELES AULA MODULAR



AVANCE GENERAL AULA MODULAR



INSTALACION DE RED HIDRAULICA EN BAÑOS



PAÑETE SOBRE MUROS EN BAÑOS



INSTALACION DE CERRAMIENTO ETAPA III

COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS - SEDE A



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



AVANCE GENERAL ETAPA III

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



DESMONTE DE RED ELECTRICA



DESMONTE DE RED ELECTRICA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE RED ELECTRICA



DESMONTE DE RED ELECTRICA



DESMONTE DE CUBIERTA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

COLEGIO RURAL LA UNION



ESTADO INICIAL CUBIERTA



ESTADO INICIAL CIELO RASO AULAS



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA

COLEGIO RURAL LA ARGENTINA



ENCHAPE DE BAÑOS



EMBOQUILLADO ENCHAPE DE BAÑOS



INSTALACION DE CIELO RASO



INSTALACION DE CIELO RASO



INSTALACION DE CIELO RASO



ENCHAPE DE BAÑOS

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



PINTURA DE BARANDAS



PINTURA DE BARANDAS



PINTURA DE BARANDAS



ADECUACION PUNTO DE ACOPIO



AVANCE GENERAL GRADERIAS



AVANCE GENERAL GRADERIAS

IED FEDERICO GARCIA LORCA - SEDE C



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS

IED VENECIA - SEDE B



FUNDIDA DE CAJA DE INSPECCION



INSTALACION DE TUBERIA A.LL.



IMPRIMACION DE CANCHA



EXTENDIDO DE CARPETA ASFALTICA



NIVELACION DE CARPETA ASFALTICA



COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA

DILE USME



REGATAS EN MUROS



REGATAS EN MUROS



DEMOLICION DE ENCHAPES



DEMOLICION DE ENCHAPES



DEMOLICION DE ENCHAPES



DEMOLICION DE ENCHAPES

DILE TUNJUELITO



ESTADO INICIAL DE CERRAMIENTO



ESTADO INCIAL CARCAMO



INSTALACION DE CERRAMIENTO



INSTALACION DE CERRAMIENTO



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

SEMANA No.	33	DEL	24-jul-23	AL	30-jul-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	FABIO LOZANO SIMONELLI		24/7/23			SE REGISTRA ATRASO NE LA PROGRAMACION DE LA SEDE, NO OBSTANTE ESTO SE DEBE A QUE SE AMPLIAN LOS ALCANCES DE LA MISMA, POR LO CUAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

ANEXO No. 04

ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

ACTA No:	
FECHA:	09/08/23
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No:	CO1.PCCNTR.4077396
INTERVENTOR	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CO1.PCCNTR.4146302
SUPERVISOR	FERNEY JIMENEZ NEIRA

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

- Compromisos de entrega de programaciones — OK
- Observaciones colegio INEM y Bernardo Jaramillo - OK
- Recorrido Sedes Nuevas (Posibles) — OK

TEMAS PRESENTE ACTA

- Revisión de compromisos
- Revisión de Actividades ejecutadas.

Scanned by TapScanner

Aspectos Administrativos

- Supervisión solicita firma de acta de entrega y la entrega del paquete
- Supervisión solicita revisar si existe presupuesto para incluir rejas en el colegio las mercedes.
- Se solicita iniciar contramite de NP para el piso Podotactil del DILE Usme y Tunjuelito.

Aspectos Técnicos

- Se informa de actividades ejecutadas durante la ultima semana.
- Se informa actividades de las zonas de emergencia.
- Se requiere se informe cuando inicia la entrega de los colegios rural la mayoría, indicar fecha el proximo comité cuando se puede iniciar con miguel de cervantes. y si se adelanta colegio Francisco Antonio Zea.

Scanned by TapScanner

Aspectos Presupuestales:

- Se requiere actualizar datos para acta parcial 8.

Aspectos de seguridad

Aspectos sociales y/o ambientales

COMPROMISOS DE LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar fecha de inicio cologo La Mayarica	Contratista	14/08/23
Fecha de inicio Miguel de cervantes	Contratista	14/08/23

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Angela Tatiana Celis	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Juan Camilo Calderón Urueña	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Andrés Felipe Canchón	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Santiago Ángel Uribe	Firma
En Representación de	DCCEE – SED	
Correo electrónico	sangelu@educacionbogota.gov.co	
Teléfono	3108719797	
NOMBRE	Fabian Cubillos G.	Firma
En Representación de	Consorcio Educación Bogota	
Correo electrónico	Emergencia 610G4@Gmail.Com	
Teléfono	3127642274	
NOMBRE	Viviana Gomez Sanchez	Firma
En Representación de	Consorcio educacion Bogota	
Correo electrónico	Viviana.Gomez@gmail.com.	
Teléfono	3108554702.	
NOMBRE	JULIO 80981642	Firma
En Representación de	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA	
Correo electrónico		
Teléfono	310 3251693	
NOMBRE	Jhonathan Talero R.	Firma
En Representación de	Consorcio Educacion Bogotá	
Correo electrónico		
Teléfono	3125143579	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

ACTA No:	
FECHA:	14/08/23
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No:	CO1.PCCNTR.4077396
INTERVENTOR	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CO1.PCCNTR.4146302
SUPERVISOR	FERNEY JIMENEZ NEIRA

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

- Revisión de compromisos → De cumplir - se inicio colegio La Alqueria
  → Miguel de Cervantes - Se esta en fabricación
  Por lo que se tiene
  Pendiente fecha de entrega

TEMAS PRESENTE ACTA

- Revisión de compromisos.
- Revision de actividas ejecutadas
- Reunion colegio Francisco Antonio Zea.

Scanned by TapScanner

Aspectos Administrativos

- Se solicita nuevamente el retiro de antena y rack a el colegio el Vial y su agenda retiro de división existente y su remplazo por dry wall la entrega en el área donde falta por retirar la antena.
- El contratista informa entrega colegio La Unión para 30 de agosto.
- La supervisión informa que se debe ejecutar descarcamo para el colegio José María Córdoba. No pintura, de graderías.
- Se debe revisar aparatos hidrosanitarios de colegio Olga Uribe debido a la presión del agua. Se solicita a la supervisión de revisión para dar solución.
- Se solicita corrección de observaciones de la NPR, contratista informa que radicará el día de hoy

Aspectos Técnicos

- Se informa el inicio de emergencia colegio rural La Magnolia.
- Se informa actividades ejecutadas en todos los salones.
- Se realiza verificación con especialista técnico estructural para la verificación del nivel de entrepiso del colegio el vial. Se solicita al contratista realizar una nueva propuesta para realizar una verificación de acuerdo a las observaciones realizadas y pode realizar una nueva revisión con especialistas.

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

Reunión Colegio Fnc. Zca Aspectos Presupuestales:

- Se deberá finalizar con actualización presupuestal para posible adición.
- Se realiza reunión en colegio Francisco Antonio Zea en donde se informa el alcance al contrato y se indica que se realizará cambio de cubierta y mejoramiento de batería de baños, se revisará presupuesto para determinar si se puede cambiar la ventanería interna.
- Se solicita verificar el estado de la red eléctrica para determinar la intervención el colegio informa de todos los aparatos eléctricos que usan en esta sede.
- La intervención no iniciará hasta que OTIC no realice la valoración adecuada y realice el retiro de los equipos que requieran.
- De acuerdo al resultado de la revisión eléctrica y se determina que se debe realizar, se determinará si se realiza o no el cambio de ventanería.

Aspectos de seguridad

- La rectora del colegio solicita incluir en el acta de información entregada de que la dirección de construcciones no realiza y no es encargado del plan de contingencia.
- Se informa reunión del jueves 24 de Agosto con OTIC en colegio Francisco Antonio Zea.

Aspectos sociales y/o ambientales

- Se determine pintura interna Eadanca y zocalo verde.

COMPROMISOS DE LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Nueva Propuesta y reunion - Muro col. el Uval	Contratista	17/08/23
Reunio 24 Agosto con OTIC col. Francisco Zea	Contratista	24/08/23

Scanned by TapScanner

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Angela Tatiana Celis	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Juan Camilo Calderón Urueña	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Andrés Felipe Canchón	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Santiago Ángel Uribe	Firma
En Representación de	DCCEE – SED	
Correo electrónico	sangelu@educacionbogota.gov.co	
Teléfono	3108719797	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono	3562690	
NOMBRE	JULIO RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA	
Correo electrónico	CONSORCIOSED GRUPO4@GMAIL.COM.	
Teléfono	310 5251693	
NOMBRE	Viviana Gomez Sanchez	Firma
En Representación de	consorcio educación Bogotá	
Correo electrónico	viviana.gomez@gmail.com	
Teléfono	3108534702	
NOMBRE	Amanda Nuñez Caicedo	Firma
En Representación de	Colegio Fco Antonio Zea de Usme	
Correo electrónico	amandacaicedo2014@gmail.com	
Teléfono	3212004402	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Scanned by TapScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

ACTA No:	
FECHA:	22 Agosto - 2023
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No:	CO1.PCCNTR.4077396
INTERVENTOR	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CO1.PCCNTR.4146302
SUPERVISOR	FERNEY JIMENEZ NEIRA

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

- Propuesta muro colegio el Uval - Contratista informa que se está Verificando

TEMAS PRESENTE ACTA

- Revisión de compromisos
- Verificación actividades ejecutadas durante la semana.

Powered by CamScanner

Aspectos Administrativos

- Se verificará la intervención o no del mismo de anteriormente en el colegio el Uval
- Se notifica finalización colegio Nuevo San Andrés
- Se requiere la información de como se hará la intervención en el colegio Fabio Simonelli para la etapa 03.
- Se informa entrega colegios Federico García Lorca y Ofelia Uribe.

Aspectos Técnicos

- Se informa las actividades ejecutadas durante la última semana.
- Se solicita al contratista realizar visita para verificar intervención a realizar en colegio Miguel de Cervantes.
- Se definen colores para las graderías del colegio José Horacio Cardenas. Se debe tener huella y contrahuella del mismo color, se aprueba colores rojo y gris basalto u oscuro.
- Se solicita al contratista realizar mantenimiento para las canchas para finales de octubre, y así se cierra el frente de DELE Tunjuelito.

Powered by CamScanner

Aspectos Presupuestales:



Aspectos de seguridad



Aspectos sociales y/o ambientales






COMPROMISOS DE LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar Entrega oficial Fiduciaria Occidente	Contratista	28/08/23

Powered by CamScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Angela Tatiana Celis	Firma 
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Juan Camilo Calderón Urueña	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Andrés Felipe Canchón	Firma 
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Santiago Ángel Uribe	Firma 
En Representación de	DCCEE – SED	
Correo electrónico	sangelu@educacionbogota.gov.co	
Teléfono	3108719797	
NOMBRE	Viviana Gomez Sanchez	Firma 
En Representación de	consorcio educación Bogota	
Correo electrónico	viviana.gomez.amg@gmail.com	
Teléfono	3108534702	
NOMBRE	JULIO RODRIGUEZ	Firma 
En Representación de	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA	
Correo electrónico		
Teléfono	3105251693	
NOMBRE	Juan Camilo Velosco Mendez	Firma 
En Representación de	Consorcio educacion Bogota	
Correo electrónico	residentes1.amg@gmail.com	
Teléfono	3132271717	
NOMBRE	Diego Fdo. Cano C	Firma 
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono	3562690	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Powered by CamScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

ACTA No:	
FECHA:	04/09/23
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No:	CO1.PCCNTR.4077396
INTERVENTOR	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CO1.PCCNTR.4146302
SUPERVISOR	FERNEY JIMENEZ NEIRA

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

- Entrega informe observaciones colegio Usminia → OK
- Inicio de actividades colegio rural Cundital → OK
- Informe técnico envio de cotación colegio el Uval
  & Pendiente de revisión presupuestal.

TEMAS PRESENTE ACTA

- Revisión de compromisos
- Revisión de actividades ejecutadas
- Recorrido colegio Paulo Freire y Santa Librada.

Powered by CamScanner

Aspectos Administrativos

- Se informa que de llegarse a intervenir el colegio Francisco Antonio Zea, se dedará realizar en epoca de vacaciones (Navidad).
- Se programa reunion de revisión del balance para el dia de mañana 05/04/23
- Se requiere definir de ubicación de las motos que se deben colocar en los colegios.
- Se informa actividades ejecutadas.

Aspectos Técnicos

- Se da alternativa de anclar el muro del colegio Santa Librada, la SED entregará la ficha para incluido por emergencia.
- Para cubierta de escaleras en colegio Quiroga se deberá instalar toja acu-roof. trasparente.
- En la zona de ingreso al cuarto de bombas se inspeccionará la fuga presentada para determinar daños presentados en el colegio Pueblo Fraire.

Aspectos Presupuestales:

Powered by CamScanner

Aspectos de seguridad

Aspectos sociales y/o ambientales



COMPROMISOS DE LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisión Balance Presupuestal	Contratista	05/09/23
De acuerdo al balance → Propuesta muro del Jual	Contratista	Por definir.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Angela Tatiana Celis	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Juan Camilo Calderón Urueña	Firma
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	


Powered by CamScanner

BOGOTÁ	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-07

NOMBRE	Andrés Felipe Canchón	Firma 
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Diego Fernando Claro Carrascal	Firma 
En Representación de	Consorcio servicio educativo	
Correo electrónico	consorcioservicioeducativo@gmail.com	
Teléfono	3562690 – 3562691	
NOMBRE	Santiago Ángel Uribe	Firma 
En Representación de	DCCEE – SED	
Correo electrónico	sangelu@educacionbogota.gov.co	
Teléfono	3108719797	
NOMBRE	JULIO RODRIGUEZ	Firma 
En Representación de	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA	
Correo electrónico		
Teléfono	3105251693	
NOMBRE	Viviana Gomez Sanchez	Firma 
En Representación de	Consorcio Educacion Bogota	
Correo electrónico	Viviana.Gomez.9406@gmail.com	
Teléfono	3108534702.	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 
Nombre: JULIO RODRIGUEZ
CONTRATISTA[1]

Firma 
Nombre: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR SED

1

Powered by CamScanner

ANEXO No. 05

CORRESPONDENCIA

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 28 de 2023
CINP-BTA-529-0612-5731

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Solicitud de ingreso de personal del contrato de obra.

Cordial saludo;

En atención al correo electrónico recibido el 25 de agosto de 2023, en el cual solicita la aprobación de ingreso a obra del siguiente trabajador:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DOCUMENTOS REVISADOS
ÁNGEL JOSÉ SÁNCHEZ	PT 6417856	OFICIOS VARIOS	VERIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, EMO, REGISTRO DE INDUCCIÓN, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, AFP, ARL.

Una vez verificada la información, nos permitimos mencionar que esta es procedente y en consecuencia el trabajador puede iniciar sus labores en campo.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: DJPT.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 24 de 2023
CINP-BTA-529-0610-5670

Señores
COLEGIO RURAL LA UNIÓN
Kilómetro 22 vía Usme – San Juan de Sumapaz
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Entrega informe técnico y manual de mantenimiento.

Cordial saludo;

Mediante el presente documento, se hace entrega formal del informe técnico y manual de mantenimiento correspondiente a las adecuaciones ejecutadas en el Colegio Rural La Unión.

En dicho manual se relacionan las unidades y equipos entregados por parte del contratista a la institución, así como la descripción de los espacios correspondientes.

VII. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Bogotá, localidad de Usme. Colegio Rural La Unión. El día 24 de agosto de 2023.

VIII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

- Informe técnico de obra (folio 1 al 8).
- Manual de mantenimiento y conservación (folio 9 al 34).
- Directorio de obra (folio 35).
- Anexo fichas técnicas (folio 36 al 94).

Cordialmente;

SANTIAGO ÁNGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4

DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
Director de Interventoría
Consorcio Servicio Educativo

Recibe/Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Elaboró: Ing. Juan Camilo Calderón Urueña
Revisó: Ing. Diego Fernando Claro Carrascal

Copia: Archivo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 23 de 2023
CINP-BTA-529-0609-5661

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Acta de visita acueducto al Colegio Paulo Freile.

Cordial saludo;

Adjunto a la presente, nos permitimos remitir copia del acta de visita realizada el pasado 18 de julio de 2023 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al Colegio Paulo Freile, en donde se evidencia que no se encuentran fugas perceptibles en la red de agua potable de la institución, razón por la cual se solicita dar por terminadas las intervenciones en esta sede y remitir la documentación de cierre correspondiente en un término no mayor a tres (03) días posteriores a la entrega del presente comunicado.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 – Ciudad. (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 23 de 2023
CINP-BTA-529-0608-5641

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Solicitud Informes mensuales No. 07 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.40773996.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta los comunicados CINP-BTA-529-0599-5541 del 15 de agosto de 2023; CINP-BTA-529-0586-5386 del 10 de agosto de 2023; CINP-BTA-529-0580-5331 del 08 de agosto de 2023 y CINP-BTA-529-574-5267 del 04 de agosto de 2023, con el cual esta interventoría emitió conceptos favorables a los informes mensuales No. 07 en cada uno de sus componentes (Ambiental, Técnico, Calidad y seguridad y salud en el trabajo) y se solicitó la entrega de los mismos en un (01) Documento consolidado en formato PDF y un documento físico de cada uno de los informes mensuales por componente, aclarando que los anexos deben ser entregados en un (01) CD, nos permitimos reiterar dicha solicitud toda vez que a la fecha no se cuenta con ningún documento.

Lo anterior, se requiere en un tiempo no mayor a dos (02) días contados a partir de la recepción del presente comunicado, esto con el fin de dar cumplimiento a las directrices entregadas por la supervisión del contrato en comités técnicos y a sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: SMRC.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 – Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 22 de 2023
CINP-BTA-529-0607-5614

Señores
I.E.D. NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
Calle 69 a sur No. 1-7
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Entrega informe técnico y manual de mantenimiento.

Cordial saludo;

Mediante el presente documento, se hace entrega formal del informe técnico y manual de mantenimiento correspondiente a las adecuaciones ejecutadas en el Colegio Nuevo San Andrés de Los Altos.

En dicho manual se relacionan las unidades y equipos entregados por parte del contratista a la institución, así como la descripción de los espacios correspondientes.

V. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Bogotá, localidad de Usme. I.E.D. Nuevo San Andrés de Los altos. El día 22 de agosto de 2023.

VI. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

- Informe técnico de obra (folio 1 al 8).
- Manual de mantenimiento y conservación (folio 9 al 27).
- Directorio de obra (folio 28).
- Anexo fichas técnicas (folio 29 al 85).

Cordialmente;

SANTIAGO ÁNGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4

DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
Director de Interventoría
Consorcio Servicio Educativo

Recibe/Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Elaboró: Ing. Juan Camilo Calderón Urueña
Revisó: Ing. Diego Fernando Claro Carrascal

Copia: Archivo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 22 de 2023
CINP-BTA-529-0606-5613

Señores
I.E.D. BRASILIA SEDE A
Carrera 1 bis b este No. 73 b Sur - 97
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Entrega informe técnico y manual de mantenimiento.

Cordial saludo;

Mediante el presente documento, se hace entrega formal del informe técnico y manual de mantenimiento correspondiente a las adecuaciones ejecutadas en el Colegio Brasilia sede A.

En dicho manual se relacionan las unidades y equipos entregados por parte del contratista a la institución, así como la descripción de los espacios correspondientes.

III. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Bogotá, localidad de Usme. I.E.D. Brasilia sede A El día 22 de agosto de 2023.

IV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

- Informe técnico de obra (folio 1 al 9).
- Manual de mantenimiento y conservación (folio 10 al 28).
- Directorio de obra (folio 29).
- Anexo fichas técnicas (folio 30 al 86).

Cordialmente;

SANTIAGO ÁNGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4

DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
Director de Interventoría
Consorcio Servicio Educativo

Recibe/Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Elaboró: Ing. Juan Camilo Calderón Urueña
Revisó: Ing. Diego Fernando Claro Carrascal

Copia: Archivo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 22 de 2023
CINP-BTA-529-0605-5612

Señores
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA
Kilómetro 12 vía Usme – San Juan de Sumapaz
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Entrega informe técnico y manual de mantenimiento.

Cordial saludo;

Mediante el presente documento, se hace entrega formal del informe técnico y manual de mantenimiento correspondiente a las adecuaciones ejecutadas en el Colegio Rural La Argentina.

En dicho manual se relacionan las unidades y equipos entregados por parte del contratista a la institución, así como la descripción de los espacios correspondientes.

I. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Bogotá, localidad de Usme. Colegio Rural La Argentina. El día 22 de agosto de 2023.

II. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

- Informe técnico de obra (folio 1 al 10).
- Manual de mantenimiento y conservación (folio 11 al 52).
- Directorio de obra (folio 53).
- Anexo fichas técnicas (folio 53 al 148).

Cordialmente;

SANTIAGO ÁNGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4

DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
Director de Interventoría
Consorcio Servicio Educativo

Recibe/Firma:
Nombre: WILSON ORLANDO SUAREZ PARRADO
Fecha:

Elaboró: Ing. Juan Camilo Calderón Urueña
Revisó: Ing. Diego Fernando Claro Carrascal

Copia: Archivo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 22 de 2023
CINP-BTA-529-0604-5601

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104 – 76 Oficina 203
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Requerimiento informe cableado de datos Colegio Brasilia - Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Mediante la presente, esta interventoría le solicita remitir un informe respecto al estado del cableado de datos del Colegio Brasilia, teniendo en cuenta que, mediante correo electrónico del 11 de agosto de 2023 se realiza el siguiente requerimiento por parte de la institución:

> ***"…De manera atenta, pongo en conocimiento lo ocurrido en la institución educativa Brasilia Usme, frente al cableado de internet.***
>
> ***En el aula de bilingüismo, aula 208, biblioteca y el cableado del bloque c al rack de la biblioteca, se presentan inconvenientes de ruptura del cableado., hecho que afecta la conectividad de internet wifi en varias zonas de la institución..."***

Por lo anterior, se le solicita realizar entrega de este informe en un término no mayor a tres (03) días posteriores a la entrega del presente comunicado.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLON AMAYA.
Representante Legal.

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en dos (02) folios.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad. (Sin Anexos).

---------- Forwarded message ---------
De: **SANTIAGO ANGEL URIBE** <sangelu@educacionbogota.gov.co>
Date: vie, 11 ago 2023 a las 16:05
Subject: RV: Solicitud Colegio Brasilia Usme IED
To: consorciosedgrupo4@gmail.com <consorciosedgrupo4@gmail.com>, consorcioeducacionbogota@gmail.com <consorcioeducacionbogota@gmail.com>
Cc: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO <consorcioservicioeducativo@gmail.com>

Buenas tardes,

Reenvío la solicitud presentada por el colegio Brasilia (correo que antecede) en la que menciona:

"***De manera atenta, pongo en conocimiento lo ocurrido en la institución educativa Brasilia Usme, frente al cableado de internet.***

En el aula de bilingüismo, aula 208, biblioteca y el cableado del bloque c al rack de la biblioteca, se presentan inconvenientes de ruptura del cableado., hecho que afecta la conectividad de internet wifi en varias zonas de la institución."

En razón a lo anterior se programará una visita conjunta. Una vez se tenga la fecha y hora se estará informando, sin embargo, si me gustaría conocer de las partes (obra e interventoría) que esta pasando con el cableado, pues se están recibiendo bastantes quejas de los colegios y esto no estaba sucediendo al principio

Quedo atento

ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE
Secretaría de Educación del Distrito
Av. El Dorado No. 66 – 63
CEL 3108719797

De: COLEGIO BRASILIA USME (IED) <cedbrasiliausme5@educacionbogota.edu.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 15:38
Para: SANTIAGO ANGEL URIBE <sangelu@educacionbogota.gov.co>; CORINA ALEJANDRA MARTINEZ SILVA <cmartinezs@educacionbogota.gov.co>; FERNEY JIMENEZ NEIRA <fjimenez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Solicitud Colegio Brasilia Usme IED

Respetados señores
Construcciones escolares

Reciban un cordial saludo,

De manera atenta, pongo en conocimiento lo ocurrido en la institución educativa Brasilia Usme, frente al cableado de internet.

En el aula de bilingüismo, aula 208, biblioteca y el cableado del bloque c al rack de la biblioteca, se presentan inconvenientes de ruptura del cableado., hecho que afecta la conectividad de internet wifi en varias zonas de la institución.

Por este motivo solicitamos su amable colaboración para la programación de una reunión entre el área de construcciones escolares, o tic y las personas de la obra con el fin de determinar la responsabilidad de cada uno frente a los daños.

Agradezco su atención

Atentamente,

Nilson Traslaviña Díaz
Rector
Colegio Brasilia Usme
Cr 12B # 73B - 97 Sur
PBX: (+571) 7622130

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 22 de 2023
CINP-BTA-529-0603-5599

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104 – 76 Oficina 203
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Diseño Piso Podotáctil direcciones locales.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente remitimos los diseños correspondientes al piso podotáctil de las direcciones locales de Usme y Tunjuelito, remitidos por la entidad mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA.
Representante Legal.

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad. (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 18 de 2023
CINP-BTA-529-0601-5581

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Solicitud de ingreso de personal del contrato de obra.

Cordial saludo;

En atención al correo electrónico recibido el 16 de agosto de 2023, en el cual solicita la aprobación de ingreso a obra del siguiente trabajador:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DOCUMENTOS REVISADOS
JAIRO HUMBERTO VARGAS DÍAZ	19.464.417	INSTALADOR	VERIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, EMO, REGISTRO DE INDUCCIÓN, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, AFP, ARL.

Una vez verificada la información, nos permitimos mencionar que esta es procedente y en consecuencia el trabajador puede iniciar sus labores en campo.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: DJPT.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 18 de 2023
CINP-BTA-529-0600-5580

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-335-2023; Respuesta requerimiento de atención de observaciones Colegio Rural El Uval.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos la respuesta realizada por el contratista a las observaciones realizadas el Colegio Rural el Uval, a lo anterior, esta interventoría realizará el seguimiento correspondiente para cada una de las subsanaciones realizadas.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en cuatro (04) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CO.EDUCACION.BOG-335-2023

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2023
Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Atn: Dr. Carlos Mario Rolón Amaya
Representante Legal Interventoría
AV 19 No. 120 – 71 Oficina 104
Tel: (601) 3562690 - 3562691
Ciudad. Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077396

OBJETO: *ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

ASUNTO: *RESPUESTA REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES COLEGIO EL UVAL*

El CONSORCIO EDUCACION BOGOTA. En lo establecido al Contrato de Obra, y de acuerdo con lo solicitado; damos atención y cierre a las observaciones dadas mediante el comunicado del día 2 de agosto 2023;

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. En las aulas del bloque de bachillerato se están evidenciando filtraciones de agua constante cuando llueve por los marcos de las ventanas instaladas.

Rtt/ En atención a la solicitud y se realiza sello externo para evitar mas filtraciones.



2. En los escalones de la escalera de entrada a los salones de primara infancia, se instalaron las cintas antideslizantes, pero en poco tiempo se despegaron.

Rtt/ Se realizo instalación de nuevas citas antideslizantes, se implementó un nuevo método de instalación, igualmente daremos seguimiento si se presenta desprendimiento de ellas para reevaluar otro método de instalación.



3. La canal del suelo que pasa por debajo de la escalera de entrada a los salones de primera infancia, tenía un tuvo que llevaba el agua lluvia desde la parte de abajo de dicha escalera hasta una caja que se encuentra al frente de la oficina de rectoría, pasando por debajo del camino en cemento, ahora ya no hace ese recorrido porque se encuentra tapado dicho tubo y esto genera que se inunde la canal y el agua brote por un costado del camino y salga por encima de la placa de cemento.

Rtt/ Se idéntica área de intervención se realiza adecuación para despeja el área para continue el flujo de agua sin que presente alteraciones.



4. En la oficina de Orientación que se encuentra en medio de 2 salones en el bloque de bachillerato, se hizo un corte del marco para dividir la ventana de la puerta y asi instalar la nueva ventanera, esto produjo un desnivel del marco de la puerta lo que se ha dificultado la apertura de esta.


Rtt/ Se realizo adecuación de verificación al marco de la puerta para que esta no presente indicaciones ni observaciones en su funcionamiento.



Según la solicitud; damos cierre al hallazgo realizados;

Dado el caso que se presenta alguno adicional en observaciones estamos atentos para atenderlos y hacer su pronta subsanación.

Cordialmente,



CONSORCIO EDUCACION BOGOTA
JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE
Director de Obra.
Elaboró: Ing. viviana gomez sanchez
Revisó: Ing. Julio Rodríguez
C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – **Arq. Santiago Ángel Uribe** – Apoyo a la supervisión Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0599-5541

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-332-2023; Informe mensual No. 07 del componente técnico – Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Atendiendo el comunicado del asunto, con el cual hace entrega del informe mensual Técnico No. 07, esta interventoría se permite informar que el mismo se encuentran procedente, por lo que se le recuerda al contratista de obra, que una vez cuente con la aprobación total de los informes mensuales en cada uno de sus componentes, debe hacer entrega de estos de la siguiente manera.

1. Un (01) Documento consolidado en formato PDF (peso no mayor a 50.000 KB).
2. Entrega física de cada uno de los informes mensuales por componente, los anexos deben ser entregados en un (01) CD.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las directrices entregadas por la supervisión del contrato en comités técnicos.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0598-5510

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Tercer Llamado de atención por falta de documentación legal vigente en los frentes de obra.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a su contrato y los comunicados CINP-BTA-529-0404-4040 del 07 de junio de 2023 y CINP-BTA-529-0361-3837 del 29 de mayo de 2023, esta interventoria desde el componente de seguridad y salud en el trabajo nuevamente hace un llamado de atención al Contratista, debido a que el día 10 de agosto de 2023 en los frentes de trabajo del Colegio IED Venecia Muzu sede B, Colegio integral José María Córdoba, y DILE de Tunjuelito, se evidencio nuevamente que el personal no contaba con la totalidad de la siguiente documentación necesaria para el desarrollo y seguimiento de las labores en obra, ni con el debido acompañamiento del profesional de seguridad y salud en el trabajo:


1. ATS (análisis de trabajo seguro)
2. Inspección de manejo de herramientas eléctricas
3. Inspección de herramientas de mano
4. Inspección de pulidora
5. Inspección de equipo de soldadura
6. Inspección de EPP.
7. Inspección de andamios
8. Inspección de escaleras
9. Inspección extintor
10. Inspección del kit de emergencias
11. Listas de chequeo de orden y aseo
12. Verificación de personal autorizado en obra
13. Charlas y capacitaciones al personal

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

De acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y en virtud de lo anterior, se le recuerda al Contratista de obra, que se encuentra incurriendo en un posible incumplimiento de acuerdo con lo señalado en sus obligaciones contractuales.

Así las cosas, que se requiere la entrega de la subsanación de la documentación anteriormente mencionada, en un plazo no mayor a dos (02) días calendario contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cordialmente;



CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JAPC.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0597-5508

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Reprogramaciones Frentes – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir las programaciones de obra correspondientes a los siguientes frentes:

- Nuevo San Andrés de los Altos.
- Provincia de Quebec.
- Fabio Lozano Simonelli.
- Programación general del contrato de obra.

Aclaramos que esta información se encuentra debidamente verificada y avalada por esta Interventoría.

Cordialmente;


CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en siete (07) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

Id	Modo de tarea	Notas comité 26-5-23	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**312 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/12/23**
2			ACTA DE INICIO	1 día	mié 28/12/22	jue 29/12/22
3			**USME**	**302 días**	**lun 9/01/23**	**mié 27/12/23**
4			USME USMINIA- C CANTONIO JOSE DE SUCRE	119 días	mié 18/01/23	mar 6/06/23
5			USME BRASILIA- A BRASILIA	166 días	mié 18/01/23	lun 31/07/23
6			USME RURAL CURUBITAL A RURAL CURUBITAL	143 días	lun 10/07/23	sáb 23/12/23
7			USME RURAL EL DESTINO A RURAL EL DESTINO	60 días	mié 26/04/23	mié 5/07/23
8		Realizar solicitud y ajuste en la programa	USME EL UVAL A EL UVAL	226 días	lun 9/01/23	vie 29/09/23
9		Realizar solicitud y ajuste en la programacion detallada	USME FABIO LOZANO SIMONELI A FABIO LOZANO SIMONELI	142 días	mar 9/05/23	sáb 21/10/23
10			USME RURAL LOS ANDES A RURAL LOS ANDES	104 días	mié 15/03/23	vie 14/07/23
11			USME FRANCISCO ANTONIO ZE- C MARIA AUXILIADORA	77 días	jue 28/09/23	mié 27/12/23
12			USME RURAL LA ARGENTINA A RURAL LA ARGENTINA	93 días	vie 14/07/23	mar 31/10/23
13			USME LA UNION A LA UNION	71 días	lun 2/10/23	sáb 23/12/23
14			USME RURAL LAS MERCEDES A RURAL LAS MERCEDES	78 días	sáb 1/07/23	sáb 30/09/23
15			USME RURAL LOS ARRAYANES A RURAL LOS ARRAYANES	70 días	lun 24/04/23	vie 14/07/23
16		Ya se aprobo se debe realizar ajuste a la programacion detallada	USME NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS A NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	183 días	mié 18/01/23	sáb 19/08/23
17		Realizar solicitud y ajuste en la programacion detallada	USME PROVINCIA DE QUEBEC A PROVINCIA DE QUEBEC	210 días	mié 18/01/23	mié 20/09/23
18			USME OSWALDO GUAYAS A MINBVIRREY	66 días	lun 15/05/23	lun 31/07/23
19			USME LOS TEJARES -B EL CURUBO	59 días	mié 18/01/23	mar 28/03/23
20			USME FEDERICO GARCIA LORCA- C CBETANIA	93 días	mié 14/06/23	sáb 30/09/23
21			USME ESTANISLAO ZULETA- B LA ALBORADA	136 días	mié 18/01/23	lun 26/06/23
22			USME D L E USME D L E USME	118 días	sáb 1/07/23	jue 16/11/23
23			**TUNJUELITO**	**254 días**	**lun 13/02/23**	**mié 6/12/23**
24			TUNJUELITO JOSE MARIA CORDOBA- A JOSE MARIA CORDOBA	100 días	vie 16/06/23	mié 11/10/23
25			TUNJUELITO VENECIA- B NUEVO MUZU	109 días	lun 5/06/23	mar 10/10/23
26			TUNJUELITO BERNARDO JARAMILLO-A BERNARDO JARAMILLO	53 días	mar 4/07/23	lun 4/09/23
27			TUNJUELITO INEM SANTIAGO PEREZ- A INEM SANTIAGO PEREZ	111 días	lun 13/02/23	jue 22/06/23
28			TUNJUELITO D L E TUNJUELITO D L E TUNJUELITO	116 días	lun 24/07/23	mié 6/12/23

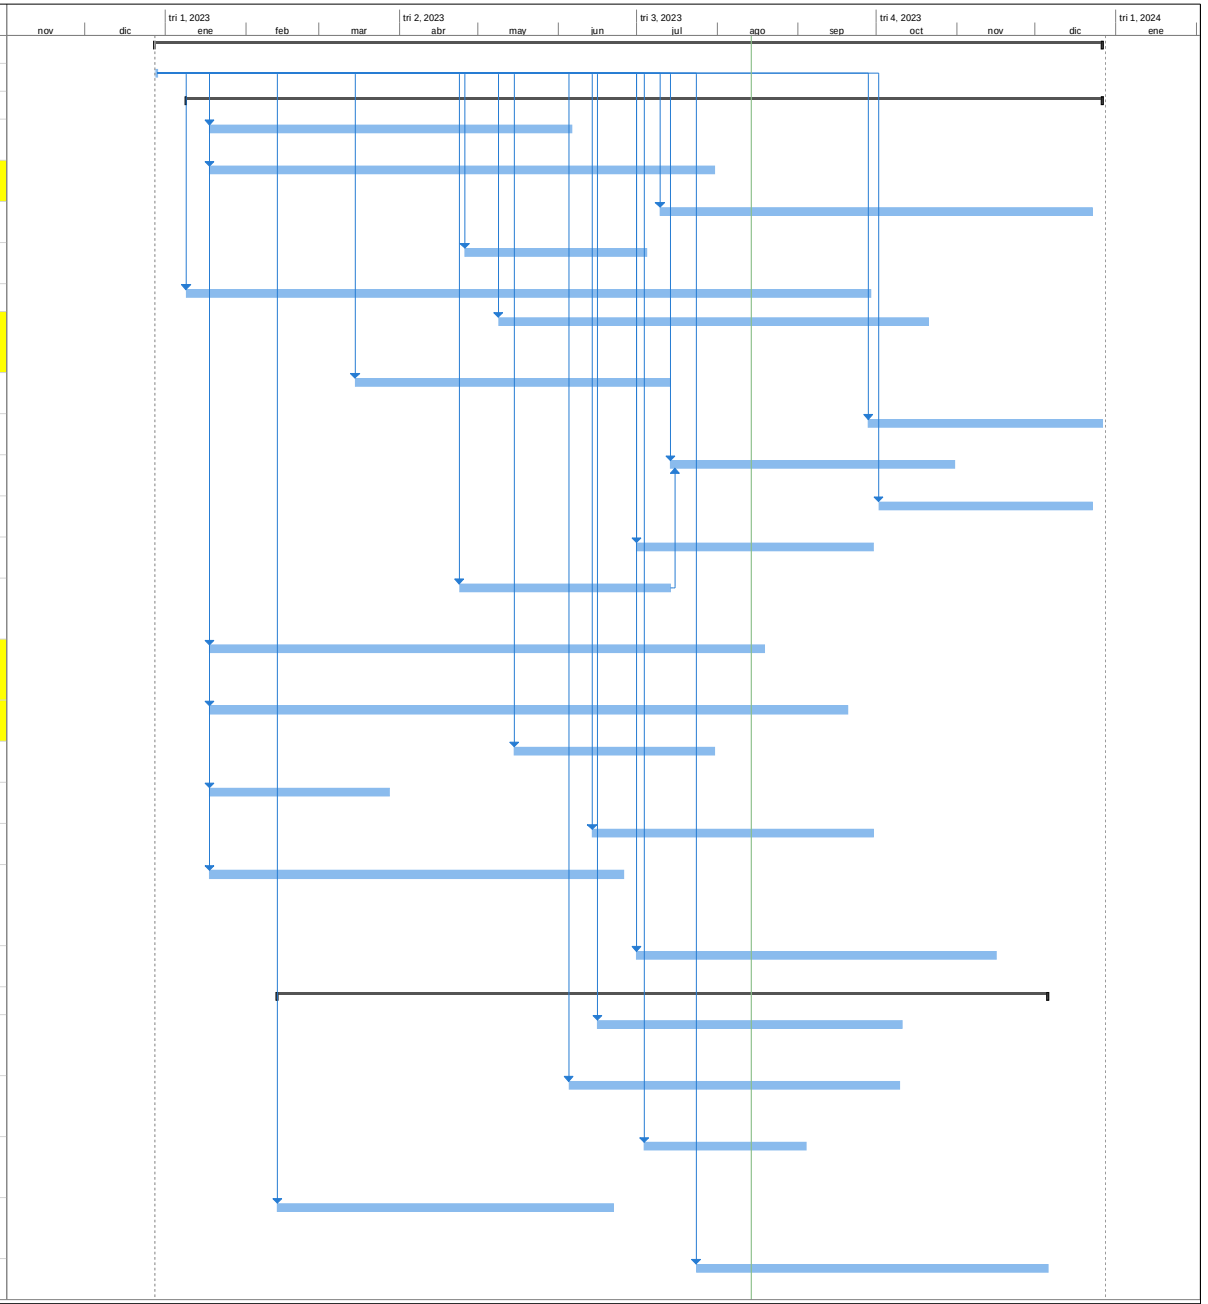


Proyecto: RESUMEN GENERAL
Fecha: lun 14/08/23

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**111 días**	**mar 9/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mar 9/05/23	lun 15/05/23	$ 0.00
3			**USME**	**106 días**	**mar 16/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
4		**CPF 523**	**FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**	**106 días**	**mar 16/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
5		1.1.1	REPLANTEO	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.605.120.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 1.413.160.00
7		1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	6 días	mar 23/05/23	mar 30/05/23	$ 576.178.20
8		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	15 días	mié 31/05/23	jue 22/06/23	$ 14.554.927.20
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	vie 23/06/23	mar 27/06/23	$ 181.008.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	3 días	mar 27/06/23	jue 29/06/23	$ 1.709.000.00
11		1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC	9 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 4.021.250.00
12		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	39 días	vie 23/06/23	mar 22/08/23	$ 181.565.660.00
13		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	4 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	$ 1.971.045.00
14		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	6 días	vie 1/09/23	vie 8/09/23	$ 8.062.992.00
15		5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	3 días	vie 14/07/23	mar 18/07/23	$ 1.512.226.00
16		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	11 días	mié 19/07/23	jue 3/08/23	$ 6.748.800.00

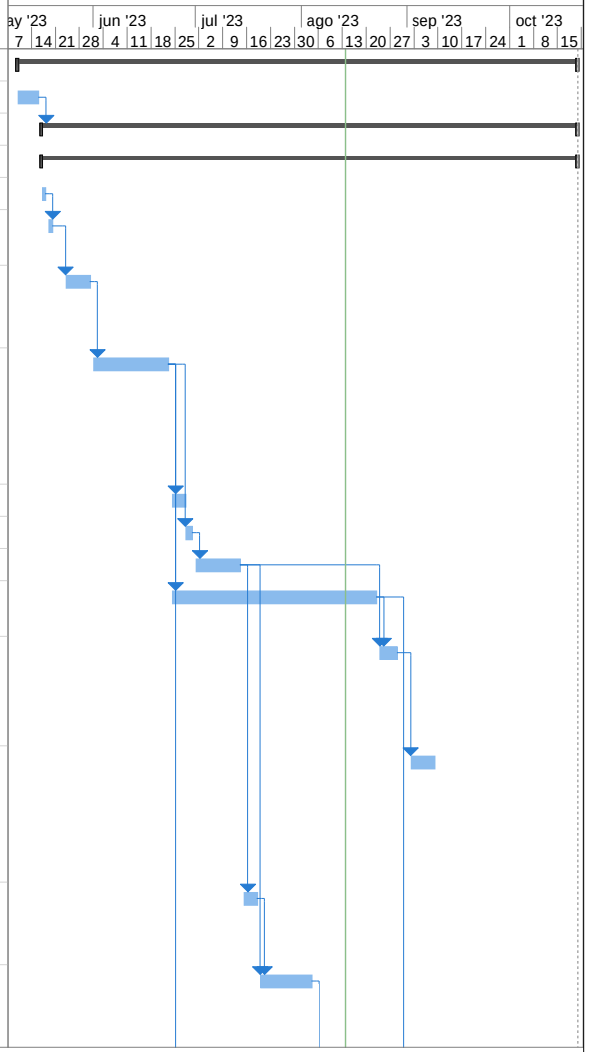


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mo de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
17			5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	10 días	vie 4/08/23	vie 18/08/23	$ 6.062.720.00
18			5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 3.046.240.00
19			5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 3.650.880.00
20			5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 8.421.120.00
21			5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	9 días	mar 22/08/23	vie 1/09/23	$ 16.701.237.00
22			5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	9 días	lun 4/09/23	jue 14/09/23	$ 12.201.777.00
23			5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	9 días	lun 4/09/23	jue 14/09/23	$ 3.474.702.00
24			17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	6 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	$ 6.829.380.00
25			17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	26 días	mié 30/08/23	mié 4/10/23	$ 146.827.591.04
26			17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	2 días	jue 5/10/23	vie 6/10/23	$ 6.606.578.40
27			20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	10 días	vie 6/10/23	vie 20/10/23	$ 2.704.358.40
28			20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	21 días	vie 23/06/23	mar 25/07/23	$ 28.089.600.00
29				**ENTREGA DE OBRA**	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 0.00

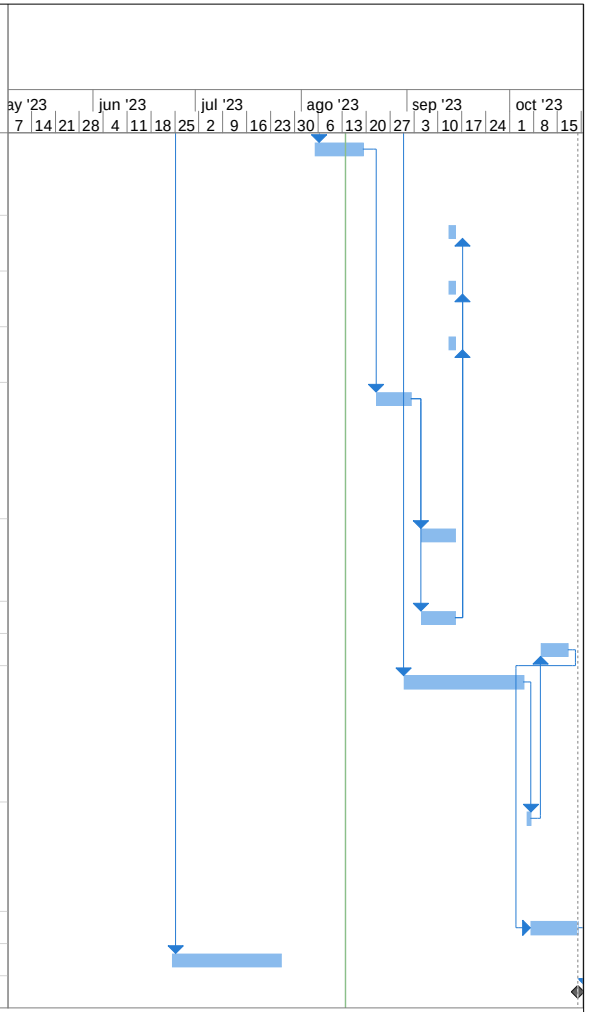


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**143 días**	**mié 18/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mié 18/01/23	mar 24/01/23	$ 0.00
3			**USME**	**138 días**	**mié 25/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
4		**CPF 543**	**NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**	**138 días**	**mié 25/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
5		1.1.1	REPLANTEO	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23	$ 3.079.360.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	3 días	lun 30/01/23	mié 1/02/23	$ 8.266.986.00
7		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	18 días	jue 2/02/23	lun 27/02/23	$ 26.545.622.11
8		1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	3 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 471.625.00
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	vie 3/03/23	mar 7/03/23	$ 50.280.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	12 días	mié 8/03/23	vie 24/03/23	$ 273.440.00
11		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	42 días	lun 27/03/23	lun 29/05/23	$ 226.815.920.00
12		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	$ 3.923.443.00
13		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8 días	vie 14/07/23	mié 26/07/23	$ 3.769.552.00
14		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	8 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	$ 19.709.536.00
15		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	14 días	mar 30/05/23	mar 20/06/23	$ 10.966.800.00
16		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	9 días	mié 21/06/23	mar 4/07/23	$ 12.314.900.00
17		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 4.188.580.00
18		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 5.019.960.00
19		5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 11.579.040.00

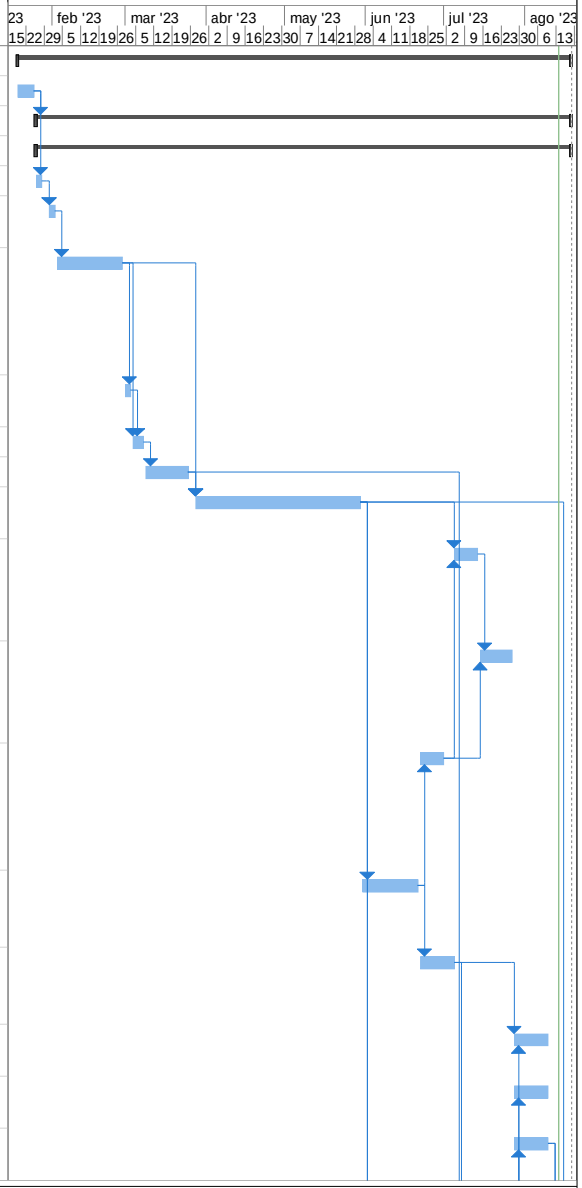


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
20			5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	15 días	mié 5/07/23	mié 26/07/23	$ 23.328.712.00
21			5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23	$ 17.043.752.00
22			5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23	$ 4.853.552.00
23			7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	2 días	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 69.505.00
24			13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	lun 24/07/23	vie 4/08/23	$ 18.825.504.96
25			13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	13 días	vie 21/07/23	mié 9/08/23	$ 7.968.000.00
26			13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	6 días	mar 30/05/23	mar 6/06/23	$ 26.096.400.00
27			17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM	3 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 5.667.360.00
28			17.1.7	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	2 días	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 10.404.00
29			17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	28 días	mar 6/06/23	mar 18/07/23	$ 216.515.517.13
30			17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	3 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 5.505.534.00
31			17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	5 días	mar 30/05/23	lun 5/06/23	$ 11.452.320.00
32			20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	7 días	jue 10/08/23	vie 18/08/23	$ 7.468.983.50
33			20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	21 días	jue 6/07/23	vie 4/08/23	$ 38.314.400.00
34			0	ENTREGA DE OBRA	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	$ 0.00




Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**165 días**	**mié 18/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mié 18/01/23	mar 24/01/23	$ 0.00
3			**USME**	**160 días**	**mié 25/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
4		**CPF 554**	**PROVINCIA DE QUEBEC SEDE A**	**160 días**	**mié 25/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
5		1.1.1	REPLANTEO	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23	$ 2.677.568.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	5 días	lun 30/01/23	vie 3/02/23	$ 3.886.190.00
7		1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	lun 6/02/23	mar 14/02/23	$ 787.475.80
8		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	20 días	mié 15/02/23	mar 14/03/23	$ 24.282.586.28
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	$ 522.912.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	5 días	mar 21/03/23	lun 27/03/23	$ 3.486.360.00
11		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	52 días	mar 28/03/23	mié 14/06/23	$ 296.997.863.36
12		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 5.368.922.00
13		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	6 días	jue 29/06/23	vie 7/07/23	$ 14.782.152.00
14		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	3 días	jue 15/06/23	mar 20/06/23	$ 2.530.800.00
15		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	3 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23	$ 1.894.600.00
16		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23	$ 1.142.340.00
17		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23	$ 912.720.00

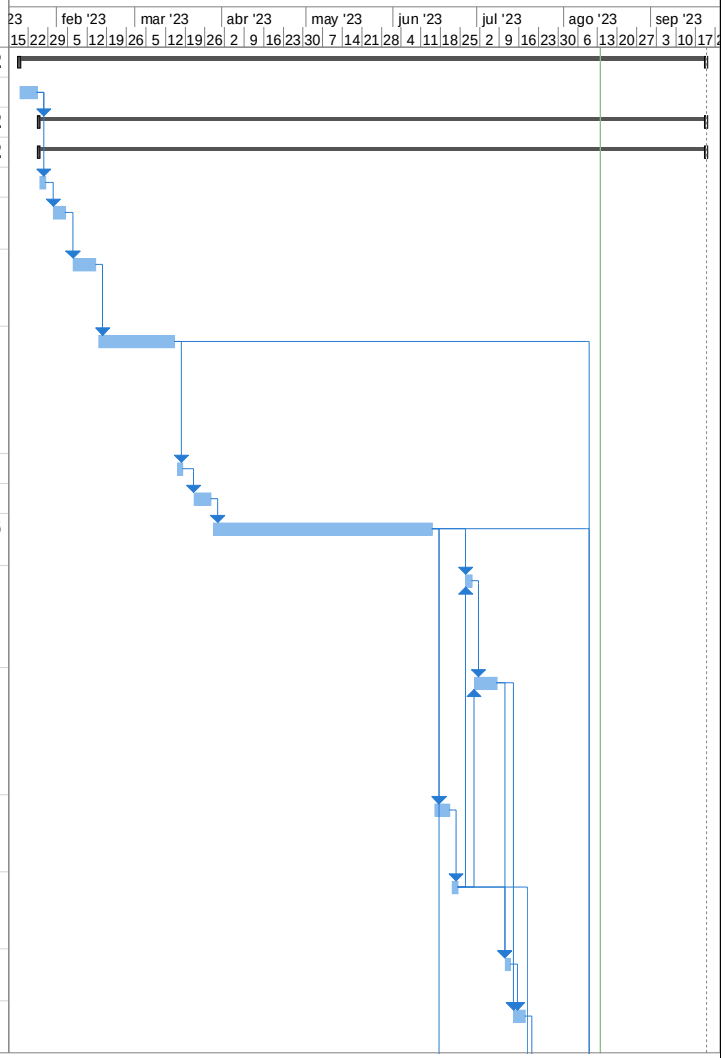


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mo de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
18		5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	6 días	mar 18/07/23	mié 26/07/23	$ 28.895.791.00
19		5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 21.111.011.00
20		5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA	8 días	jue 10/08/23	mar 22/08/23	$ 354.530.00
21		5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	8 días	jue 10/08/23	mar 22/08/23	$ 6.011.786.00
22		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	11 días	mié 9/08/23	jue 24/08/23	$ 35.042.701.40
23		9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	6 días	vie 25/08/23	vie 1/09/23	$ 3.068.867.00
24		13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	9 días	lun 28/08/23	jue 7/09/23	$ 17.210.700.00
25		13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	6 días	jue 31/08/23	jue 7/09/23	$ 5.851.500.00
26		17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	5 días	mié 25/01/23	mar 31/01/23	$ 2.529.400.00
27		17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	28 días	jue 15/06/23	jue 27/07/23	$ 208.077.006.98
28		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	9 días	vie 8/09/23	mié 20/09/23	$ 6.408.306.70
29		20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	13 días	mié 9/08/23	lun 28/08/23	$ 44.745.040.00
30			ENTREGA DE OBRA	0 días	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 0.00

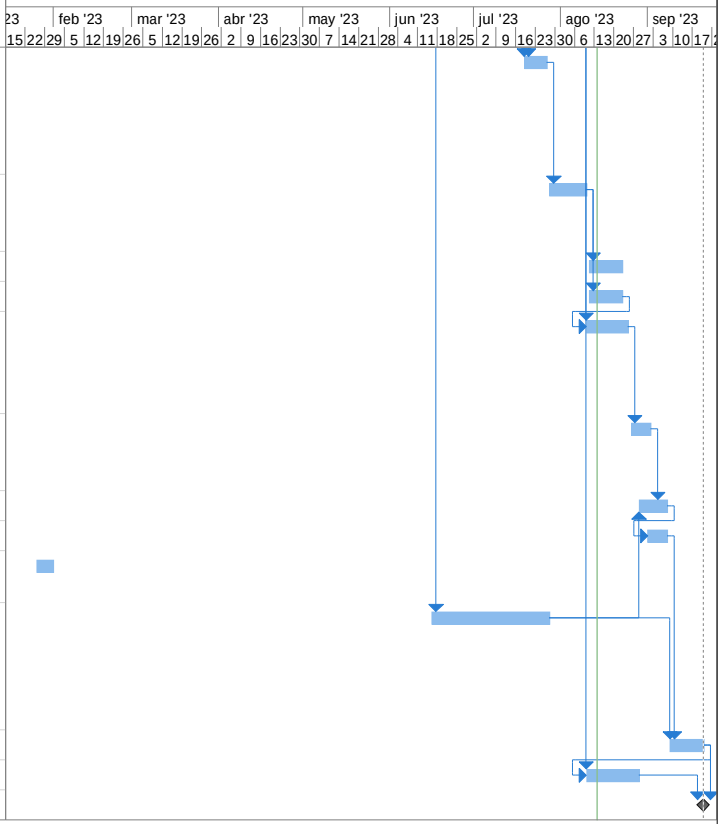

Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0596-5507

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104 – 76 Oficina 203
Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría – Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Solicitud nueva alternativa muro de contención Colegio Rural el Uval.

Cordial saludo;

Atendiendo el correo electrónico del 14 de agosto de 2023, en el cual la supervisión del contrato menciona que de acuerdo con la solicitud realizada respecto a la consulta técnica del muro de contención del Colegio Rural el Uval y la reunión sostenida con los especialistas de la SED se requiere lo siguiente.

> *"…que el contratista de obra presente una nueva alterativa con las observaciones y recomendaciones realizadas el día de hoy…".*

Por lo anterior, se requiere que el Consorcio Educación Bogotá realice la entrega de la nueva alternativa en un tiempo no mayor a dos (02) días contados a partir de la recepción del presente comunicado, toda vez que dicho requerimiento fue realizado en el comité de obra del 14 de agosto de 2023 por el especialista estructural de la SED.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) folio.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad. (Sin anexos).

-------- Forwarded message --------
De: **SANTIAGO ANGEL URIBE** <sangelu@educacionbogota.gov.co>
Date: lun, 14 ago 2023 a las 19:24
Subject: RE: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO ; COMUNICADO CINP-BTA-529-0569-5226; COMUNICADO CO.EDUCACION.BOG-315-2022; CONSULTA TÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN COLEGIO EL UVAL
To: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO <consorcioservicioeducativo@gmail.com>
Cc: diego.claro@ingeco.com.co <diego.claro@ingeco.com.co>, angela.celis@ingeco.com.co <angela.celis@ingeco.com.co>, FERNEY JIMENEZ NEIRA <fjimenez@educacionbogota.gov.co>, Educacion SED <consorcioeducacionbogota@gmail.com>, Consorcio Grupo 4 <consorciosedgrupo4@gmail.com>, RC ARQUITECTOS S.A.S <rcarquitectossas@gmail.com>

Buenas noches,

En atención a la consulta realizada y dando alcance a la reunión sostenida el día de hoy en el colegio El Uval con los especialistas de la SED, se requiere según lo acordado, que el contratista de obra presente una nueva alterativa con las observaciones y recomendaciones realizadas el día de hoy.

Es pertinente mencionar que cuando se requiere un aval de la SED, el documento que se presenta ya tiene un aval y/o recomendaciones de la interventoría.

ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE
Secretaría de Educación del Distrito
Av. El Dorado No. 66 – 63
CEL 3108719797

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0595-5506

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104 – 76 Oficina 203
Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría – Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Observaciones De Obra Colegio Usminia – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;


Atendiendo el correo electrónico del 09 de agosto de 2023, con el cual la supervisión del contrato hace entrega de una copia del oficio No. SED-LOC-IEDU-CRP-2023-112 emitido por el personal administrativo del Colegio Usminia IED en el cual informan una serie de novedades, esta interventoria se permite mencionar que el 15 de agosto de 2023 se llevo a cabo un recorrido de obra con el fin de verificar cada uno de los requerimientos realizados en el oficio en mención, por ello nos permitimos solicitar lo siguiente:

1. Se requiere verificar y corregir las filtraciones de agua en los salones rojo, rosado, verde y baño de niñas
2. Se debe realizar la conexión del parlante en la entrada del baño de niños.
3. Se debe verificar el estado de la sirena ubicada en la entrada de los baños, deberá garantizarse que queda funcional.
4. Se le notificó al personal del colegio que debido a fallas en la zona la OTIC no ha podido verificar el funcionamiento adecuado de las redes de internet, por lo que anterior, esta observación no le compete al contratista de obra.

Por lo anterior, esta interventoría le solicita al Consorcio Educación Bogotá atender las observaciones a las que haya lugar, una vez subsanadas hacer entrega del respectivo registro fotográfico, toda vez que se debe dar respuesta a

dicho requerimiento a la SED, así que se debe radicar ante esta interventoría el informe correspondiente en un tiempo no mayor a tres (03) días contados a partir de la recepción del presente comunicado.

Cordialmente;



CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en ocho (08) folios.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad. (Sin anexos).

---------- Forwarded message ---------
De: **SANTIAGO ANGEL URIBE** <sangelu@educacionbogota.gov.co>
Date: mié, 9 ago 2023 a las 17:05
Subject: REQUERIMIENTO COLEGIO USMINIA
To: consorciosedgrupo4@gmail.com <consorciosedgrupo4@gmail.com>, consorcioeducacionbogota@gmail.com <consorcioeducacionbogota@gmail.com>
Cc: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO <consorcioservicioeducativo@gmail.com>

Buenas tardes,

Remito comunicado enviado el día de hoy por la rectora del colegio Usminia para su conocimiento y trámite respectivo.

En razón a lo anterior se solicitó a la rectora una reunión para el miércoles 15 de agosto a las 8:00 am, reunión pendiente por confirmar

ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE
Secretaría de Educación del Distrito
Av. El Dorado No. 66 – 63
CEL 3108719797

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria
Educación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL USMINIA
Resolución No. 5581 del 11 de agosto de 1997 Reconocimiento oficial
Grados Aprobados de 0º a 9º
Resolución de Integración de la Institución No 2381 de Agosto 14 de 2002
Resolución de aprobación 098 de Enero 14 de 2002
Resolución No. 050292 del 11 de agosto de 2016 Reconocimiento oficial
Grados Aprobados de 10º y 11º
Carrera 9ª 103 A – 17 Sur (Usminia)
Tel. SEDE A 7671614-7630657 SEDE B 7671595-SEDE C 7672037
Localidad 5ª. (Usme) DANE 111001065234
Mail: iedusminia@educacionbogota.edu.co / rectoriausminia@gmail.com
Nit: 830074780-5

SED – LOC – IEDU – CRP – 2023 -112

Bogotá 8 de agosto de 2023

Señor:
CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
Subsecretario de Acceso y Permanencia – SED
Secretaría de Educación del Distrito

Asunto: Respuesta radicado I-2023-87246.

Como respuesta a las novedades que ustedes afirman haber sido subsanadas como resultado de la intervención realizada en la sede C del colegio Usminia, le informamos que algunas de ellas persisten y de hecho otras no fueron resueltas, e incluso al intentar poner en funcionamiento el servicio de internet por parte de los técnicos de la OTIC no se pudo, por falta de energización del rack.

A continuación, se relaciona específicamente cada una de las novedades que persisten y no han sido resultas:

1. Filtraciones de agua en las siguientes áreas: Salón rojo, salón rosado, salón verde y baños de niñas.

2. Uno de los parlantes ubicado a la entrada del baño de los niños no fue conectado y por consiguiente no funciona.

3. La sirena ubicada en la entrada de los baños, igualmente no funciona, fue retirada y el cableado y dispositivo (interruptor) que la activaba en situaciones de emergencia no funciona.

4. No fue posible restablecer el servicio de internet en el rack general ya que no se encuentra energizado, debido que al colocar las luminarias en el salón naranja fue cortado un cable que pasaba por la tubería y que energizaba el rack.

Adjuntamos registro fotográfico.


Quedo atenta a resolver cualquier otro requerimiento de su parte.

Cordialmente,

Mary Luz Prieto Acosta
Rectora
Colegio Usminia IED

SALON ROJO



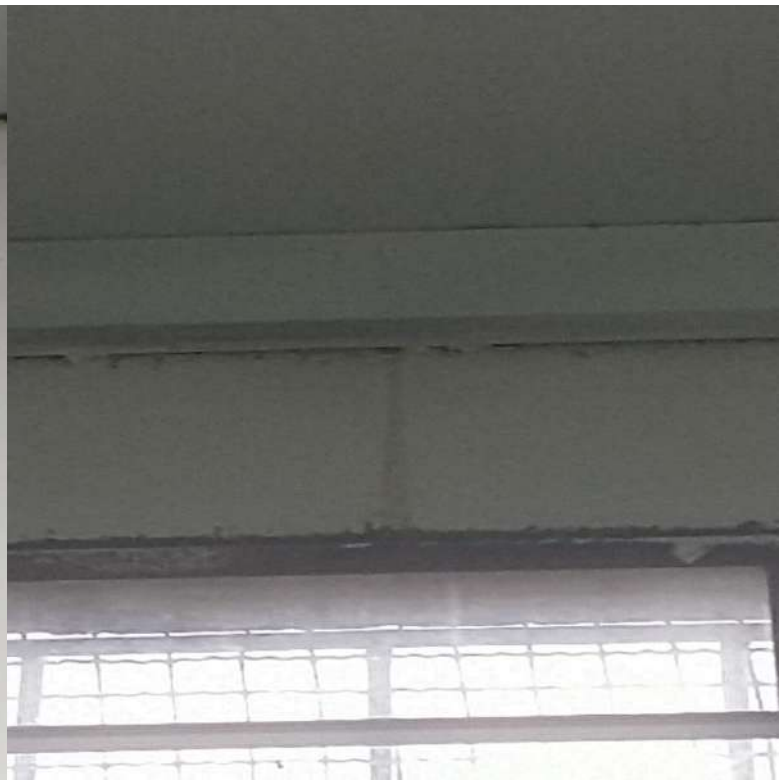



SALON ROSADO





BAÑOS NIÑA







SIRENA PANICO EMERGENCIA AFUERA DE LOS BAÑOS



PARLANTE AFUERA DE LOS BAÑOS





CABLE CORTADO(ENERGIZACION DEL RACK DE INTERNET OTIC) DURANTE LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS SALON NARANJA



CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 14 de 2023
CINP-BTA-529-0594-5432

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104 – 76 Oficina 203
Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría – Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Observaciones al componente de seguridad y salud en el trabajo – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a su contrato, se hace necesario hacer un llamado de atención al Consorcio Educación Bogotá, considerando las falencias en el componente de seguridad y salud en el trabajo, evidenciadas en los recorridos realizados el 11 de agosto de 2023, por lo que es imperativo que efectué el cumplimiento completo del sistema de gestion de seguridad, aprobado en primera instancia por la interventoría, a continuación, se detallan las observaciones:


Colegio Quebec:

- Realización de trabajos de alto riesgos sin las medidas preventivas.
- Actos inseguros que pueden conllevar a un accidente o un incidente.







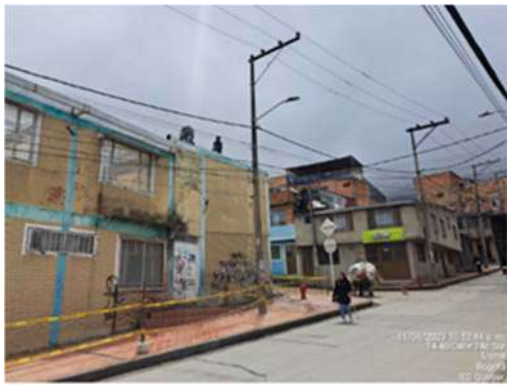


Por lo anterior, se requiere al contratista, para que realice las acciones correctivas en obra, de forma inmediata, con el fin de dar cumplimiento total a lo requerido tanto normativa como contractualmente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así mismo las acciones que se realicen para la corrección de las observaciones, sean de forma constante y con seguimiento respectivo.

Finalmente, se reitera lo mencionado en los comunicados CINP-BTA-529-0445-4276 del 20 de junio de 2023 y CINP-BTA-529-0463-4395 del 23 de junio de 2023 con relación a que esta interventoría no se hace responsable por los posibles incidentes o accidentes que estas situaciones puedan conllevar si no se ejercen la debida supervisión y control de inspector de seguridad y salud en el trabajo del contratista.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JAPC - SMRC.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 14 de 2023
CINP-BTA-529-0593-5430

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104 – 76 Oficina 203
Ciudad.

REF: Contrato de Interventoría – Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Consulta técnica en el Colegio Rural la Unión – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

En atención a la consulta técnica realizada por el contratista de obra mediante correo electrónico, referente a la estructura de la cubierta para el Colegio Rural La Unión, esta interventoría da por aprobado dicho planteamiento, teniendo en cuenta que se adapta a la distribución del proyecto para esta sede.

Se aclara que las medidas definitivas para cuantificación de cantidades y pago correspondiente serán verificadas en obra una vez se cuente con la totalidad de la instalación.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 11 de 2023
CINP-BTA-529-0591-5422

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correos electrónicos; Solicitud de ingreso de personal del contrato de obra.

Cordial saludo;

En atención a los correos electrónicos recibidos el día 09 de agosto y 10 de agosto de 2023, en el cual solicita la aprobación de ingreso a obra de los siguientes trabajadores:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DOCUMENTOS REVISADOS
LUIS ROBERTO PÉREZ MUEGUES	1.237.690.940	OFICIOS VARIOS	VERIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, EMO, REGISTRO DE INDUCCIÓN, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, AFP, ARL.
CARLOS JAVIER ROMERO OCHOA	1.233.701.836	OPERARIO	VERIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, EMO, REGISTRO DE INDUCCIÓN, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, AFP, ARL.

Una vez verificada la información, nos permitimos mencionar que esta es procedente y en consecuencia los trabajadores pueden iniciar sus labores en campo.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: DJPT.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 11 de 2023
CINP-BTA-529-0590-5410

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Remisión acta de entrega física de la obra.

Cordial saludo;

Atendiendo el correo electrónico del 11 de agosto de 2023, adjunto a la presente nos permitimos remitir el acta de entrega física de la obra de la siguiente sede, de acuerdo a las observaciones realizadas:

- IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en dos (02) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4077396 DE 2022
COLEGIO DEL DISTRITO : IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B - CPF 529
DIRECCIÓN : KR 4 ESTE 90D - 24 SUR
LOCALIDAD : 05 USME
FECHA DE ENTREGA : 10 DE AGOSTO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de Ing. Supervisor de Proyecto – DCCEE-SED

POR LA INTERVENTORIA. – DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL, representante del CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO en calidad de Director de Interventoría. (CTO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146302-2022)

POR EL CONTRATISTA. JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE representante del CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ en calidad de Director de obra. (CTO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077396-2022)

I. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B Ubicado en la Localidad 05 DE USME de la ciudad de Bogotá D.C., Distinguido en la nomenclatura actual con el número 93 Sur - 18 de la Carrera 5h sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BLOQUE 1	TIENDA ESCOLAR Y REFRIGERIOS AULA 5 AULA 4 AULA 3 AULA 2 AULA 1A AULA 1 PASILLOS BAÑOS ORIENTACION Y SALON DE MATERIALES COORDINACION SALA DE SISTEMAS LUDOTECA Y CAFETERIA	532.67 m2	• CAMBIO DE CUBIERTAS POR CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH • CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, • INSTALACIÓN DE LUMINARIAS • PINTURA SOBRE MUROS INTERIORES Y FACHADAS.
BLOQUE 2	AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 BAÑOS	285.40 m2	• CAMBIO DE CUBIERTAS POR CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH • CAMBIO DE RED ELÉCTRICA • INSTALACIÓN DE LUMINARIAS • PINTURA SOBRE MUROS INTERIORES Y FACHADAS.
BLOQUE 3	SALON 1 BAÑOS	81.45 m2	• CAMBIO DE CUBIERTAS POR CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH. • CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. • INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. • PINTURA SOBRE MUROS INTERIORES Y FACHADAS.

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

II. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	No aplica
Agua	No aplica	No aplica	No aplica
Gas	No aplica	No aplica	No aplica

Nota: La verificación definitiva de los servicios públicos se hará en el informe para paz y salvos de servicios públicos, que es requisito para la liquidación del contrato**.**

3.- Descripción de los equipos entregados

NO APLICA

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

S [ ] **NO** [X]

III. OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecutan las obras de acuerdo al alcance propuesto.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los (10) días del mes de AGOSTO del año 2023, por los que en ella intervinieron.

JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ

DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

FERNEY JIMENEZ NEIRA
SUPERVISOR DELEGADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 10 de 2023
CINP-BTA-529-0589-5393

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Remisión acta de entrega física de la obra.

Cordial saludo;

Atendiendo el correo electrónico del 10 de agosto de 2023, adjunto a la presente nos permitimos remitir el acta de entrega física de la obra de la siguiente sede, de acuerdo a las observaciones realizadas:

- IED OSWALDO GUAYASAMÍN SEDE B.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en dos (02) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077396 DE 2022
COLEGIO DEL DISTRITO	:	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B - CPF 561
DIRECCIÓN	:	Diagonal 93b Sur No. 4a Este - 99
LOCALIDAD	:	05 USME
FECHA DE ENTREGA	:	3 DE AGOSTO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de Ing. Supervisor de Proyecto – DCCEE-SED

POR LA INTERVENTORIA. – DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL, representante del CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO en calidad de Director de Interventoría. (CTO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146302-2022)

POR EL CONTRATISTA. JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE representante del CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ en calidad de Director de obra. (CTO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077396-2022)

I. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B Ubicado en la Localidad 05 DE USME de la ciudad de Bogotá D.C., Distinguido en la nomenclatura actual con el número 4a Este - 99 de la Diagonal 93b sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BLOQUE AULAS	PASILLO PISO 1 CUARTO ELECTRICO SALON 101 SALON 102 SALON 103 BAÑOS PISO 2 PASILLO PISO 2 SALON 201 SALON 202 SALON 203 BAÑOS PISO 3 PASILLO PISO 3 SALON 301 SALON 302 SALON 303	461.06 m2	• CAMBIO DE CUBIERTAS EN ASBESTO CEMENTO POR CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH, • MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN • CAMBIO DE VENTANERÍA INTERNA (3 PISOS), • PINTURA INTERIOR • SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS PARA VENTANAS EN PRIMER PISO

II. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	No aplica
Agua	No aplica	No aplica	No aplica
Gas	No aplica	No aplica	No aplica

Nota: La verificación definitiva de los servicios públicos se hará en el informe para paz y salvos de servicios públicos, que es requisito para la liquidación del contrato**.**

3.- Descripción de los equipos entregados

NO APLICA

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI [ ] **NO** [X]

III. OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecutan las obras de acuerdo al alcance propuesto.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los (03) días del mes de AGOSTO del año 2023, por los que en ella intervinieron.

JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ

DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

FERNEY JIMENEZ NEIRA
SUPERVISOR DELEGADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 10 de 2023
CINP-BTA-529-0588-5388

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Documentos de cierre IED Estanislao Zuleta sede B.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos los siguientes documentos correspondientes al cierre del Colegio Estanislao Zuleta sede B.

- Actas de entrega de espacios (29 folios).
- Actas de vecindad (06 folios).
- Cierre de actas de vecindad (01 folio).
- Carta entrega manual de mantenimiento (01 folio).
- Acta de entrega Física (03 folios).

Agradecemos de ante mano se remita copia del acta de entrega física una vez sea suscita por todas las partes correspondientes.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 10 de 2023
CINP-BTA-529-0587-5387

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-331-2022 Informe Forestal Emergencia IED Almirante Padilla Sede A – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, se remite el Informe Forestal Emergencia IED Almirante Padilla Sede A, entregado por el contratista, correspondiente al Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396, Grupo 4, el mismo se encuentra revisado y aceptado por parte de la Interventoría.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: SMRC.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 10 de 2023
CINP-BTA-529-0586-5386

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-324; Remisión de informe del componente de Calidad No. 07 – Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Atendiendo el comunicado del asunto, con el cual hace entrega del informe mensual de calidad No. 07, esta interventoría se permite informar que el mismo se encuentran procedente, por lo que se le recuerda al contratista de obra, que una vez cuente con la aprobación total de los informes mensuales en cada uno de sus componentes, debe hacer entrega de estos de la siguiente manera.

1. Un (01) Documento consolidado en formato PDF (peso no mayor a 50.000 KB).
2. Entrega física de cada uno de los informes mensuales por componente, los anexos deben ser entregados en un (01) CD.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las directrices entregadas por la supervisión del contrato en comités técnicos.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: CMSP.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 09 de 2023
CINP-BTA-529-0585-5350

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Atención de observaciones a los Apu´s Ítems No Previstos 07-08.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta el correo electrónico del 08 de agosto de 2023, con el cual la SED hace entrega de una serie de observaciones a los análisis de precios unitarios NP007 y NP008, esta interventoria se permite hacer entrega de una copia de este y se permite enunciar lo siguiente.


"…Cómo se describe en el radicado I-2023-88124 me permito enviar las observaciones que se realizaron en el archivo de Excel enviado por la interventoría en la columna (M) destinada para el área de estudios previos, por otra parte, se solicita muy respetuosamente socializar las observaciones con la interventoría para que realicen los ajustes correspondientes con el ánimo de esclarecer dudas, por favor programar mesa de trabajo lo más pronto posible para tratar estos no previstos y otros que se encuentren pendientes, es de aclarar que pueden surgir otras observaciones o inquietudes no relacionadas en el archivo adjunto, las cuales se deben aclarar en este mismo espacio.

NOTA: A partir de recibido este correo se tendrán ocho (8) días hábiles (jueves 17 de agosto de 2023) para dar respuesta a las observaciones, en caso contrario se procederá a la devolución del memorando…"

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Por lo anterior, se solicita la atención de las observaciones en un tiempo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la recepción del presente comunicado, esto con el fin de no superar el plazo establecido por el área de estudios previos.

Cordialmente;



CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA.
Representante Legal.

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WINRAR.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad. (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 09 de 2023
CINP-BTA-529-0584-5347

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Remisión informe mensual de interventoria No. 07.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, nos permitimos hacer entrega del informe mensual No. 07 del contrato de la referencia, el cual comprende el periodo del 28 de junio de 2023 al 27 de julio de 2023, con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: SMRC.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en cincuenta y dos (52) folios y un (01) CD.

Radicado Nº **E-2023-116946**
Fecha: 10-08-2023 - 14:29
Folios: 1 Anexos: 1 CARPETA Y 1 CD
icador: YEIMY MILENA RINCON VANEGAS - 5310
tino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **Z9FN7**

consorcioservicioeducativo@gmail.com
DIRECCIÓN: Avenida 19 No. 120 - 71 Oficina 104 Bogotá-Colombia
TELÉFONOS: (601) 3562690 - 3562691

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 09 de 2023
CINP-BTA-529-0583-5335

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correos electrónicos; Remisión actas de entrega física sedes intervenidas.

Cordial saludo;

Atendiendo los correos electrónicos del 04 y 08 de agosto de 2023, adjunto a la presente nos permitimos remitir el consolidado de las actas de las siguientes sedes intervenidas, de acuerdo a las observaciones realizadas:

- IED TEJARES SEDE B.
- COLEGIO RURAL LOS ANDES.
- COLEGIO RURAL EL DESTINO.
- IED USMINIA SEDE C.
- COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ.
- COLEGIO RURAL LAS MERCEDES.
- COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES.
- IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A.

Adicionalmente, se remite las actas correspondientes a la atención de emergencias de las siguientes sedes:

- IED PAULO FREIRE – ETAPA I
- IED PROVINCIA DE QUEBEC.
- IED SANTA MARTA.
- IED SAN CAYETANO SEDE A.
- IED ORLANDO FALS BORDA SEDE A.
- IED RAFAEL URIBE URIBE – ETAPA I
- DIRECCIÓN LOCAL DE USME.
- IED FRANCISCO ANTONIO ZEA – ETAPA I
- IED RAFAEL URIBE URIBE – ETAPA II.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

- IED JUAN LUIS LONDOÑO – LA SALLE.
- IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA.
- IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
- IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE B.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: SMRC.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 09 de 2023
CINP-BTA-529-0582-5333

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-328-2022; Consulta Técnica Colegio en la Unión– Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

En atención a la consulta técnica realizada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, referente a la estructura de la cubierta del Colegio Rural La Unión, esta interventoría le solicita adjuntar a la consulta técnica el proceso constructivo que se llevará a cabo para dicha cubierta.

Por lo anterior, se solicita la complementación de la consulta técnica en un tiempo no mayor a un dia (01) contado a partir de la recepción del presente comunicado, esto con el fin de continuar con la respectiva revisión.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0581-5332

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 34.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 34 correspondiente al periodo comprendido del 31 de julio de 2023 al 06 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en veintidós (22) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**34**		**Del :**	31/07/2023	**AL:** 6/08/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**236**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,46%**	**64,90%**	**(%) Ejecutado**	**1,53%**	**74,33%**
Valor programado ($)		**$ 7.835.894.131,64**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 8.974.453.171,10**
			Evaluación	**9,43%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 34 **Del :** 31/07/2023 **AL:** 6/08/2023

Plazo Total 396 días

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**IED USMINIA SEDE C**		**USME**	**$ 372.412.811**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	**IED BRASILIA SEDE A**		**USME**	**$ 720.239.927**	100,00%	99,00%	**IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA	**FRENTE TERMINADO
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**		**USME**	**$ 1.346.746.630**	86,00%	75,00%	**INSTALACION DE AULA MODULAR **ENCHAPE SOBRE MUROS **INSTALACION RED HIDRÁULICA BAÑOS **DESMONTE DE VENTANAS **DESMONTE DE CUBIERTA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA	**INSTALACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACION DE ENCHAPES **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**		**USME**	**$ 853.433.498**	93,00%	99,00%	**ENTREGA AULAS ETAPA III **INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO	**SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES **ENTREGA ESPACIOS ÁREA ADMINISTRATIVA
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**		**USME**	**$ 550.424.024**	82,00%	87,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELÉCTRICA **INSTALACION DE PISO
6	**IED LOS TEJARES**		**USME**	**$ 181.308.494**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	FRENTE TERMINADO
7	**IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B**		**USME**	**$ 628.394.933**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	**INEM SANTIAGO PEREZ**		**TUNJUELITO**	**$ 362.348.937**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	**COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A**		**USME**	**$ 852.869.715**	0,00%	0,00%		
10	**COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A**		**USME**	**$ 516.609.542**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	**IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**		**USME**	**$ 623.938.623**	54,00%	50,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELÉCTRICA
12	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C**		**USME**	**$ 388.064.062**	0,00%	0,00%		
13	**COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A**		**USME**	**$ 351.263.110**	12,00%	92,00%	**INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	**INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO **INSTALACION DE LAVAMANOS
14	**COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A**		**USME**	**$ 418.617.430**	0,00%	68,00%	**INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA	**INSTALACION DE CUBIERTA **CAMBIO DE VENTANAS **PINTURA DE MUROS **INSTALACION ELÉCTRICA

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 34 **Del :** 31/07/2023 **AL:** 6/08/2023

Plazo Total 396 días

15	**COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A**		**USME**	**$**	**293.731.567**	21,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
16	**COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A**		**USME**	**$**	**376.450.691**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	**COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A**		**USME**	**$**	**255.186.272**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**		**USME**	**$**	**299.060.323**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$**	**179.004.711**	40,00%	84,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS	**INSTALACION RED ELÉCTRICA **RESANE Y PINTURA DE MUROS
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$**	**443.348.816**	34,00%	43,00%	**INSTALACION RED ELÉCTRICA GRADERÍAS **ADECUACIÓN CANCHA PARA INSTALACION DE CARPETA ASFÁLTICA	**REPOSICIÓN CANCHA **IMPERMEABILIZACION GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$**	**428.177.761**	26,00%	85,00%	**CARPETA ASFÁLTICA CANCHA **DEMOLICIÓN DE ANDENES	**PINTURA CANCHA **INSTALACION PORTERÍAS CANCHA **INSTALACION RED ELÉCTRICA
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$**	**75.607.658**	63,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$**	**117.815.760**	8,00%	20,00%	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO **EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERÍA	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACION DE DIVISIONES **INSTALACION DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$**	**74.929.438**	7,00%	21,00%	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	**INSTALACION DE LUMINARIAS **INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO **IMPERMEABILIZACION

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0568-5199 del 01 de agosto de 2023 se da respuesta al comunicado CO.EDUCACION.BOG-320-2022 con el cual el contratista de obra realizo la entrega del informe ambiental No. 07, se emitieron una serie de observaciones con el fin de que estas sean atendidas en el menor tiempo posible.**
****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0574-5267 del 04 de agosto de 2023 se da respuesta al comunicado CO.EDUCACION.BOG-322-2022 con el cual el contratista hace entrega de la subsanacion de observaciones del informe mensial ambiental No. 07, el cual se encontro procedente.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**34**	**Del :**	31/07/2023	**AL:**	6/08/2023
Plazo Total	**396** días				

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Brasilia, Fabio Simonelli, La Union, La Argentina, Federico Garcia Lorca sede C, Jose Maria Cordoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 34.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
*** Inforeme mensual de interventoria No. 07.**

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**8.062.378.503,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 8.062.378.503,00
% Avance facturado Acumulado
66,78%
Saldo por Facturar
$ 4.011.418.310,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 135.357.324,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**443.983.452,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 443.983.452,00
% Avance facturado Acumulado
46,61%
Saldo por Facturar
$ 508.566.328,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	8-jul-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**34**	**Del :**	31/07/2023	**AL:**	6/08/2023
Plazo Total	**396** días				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, San Andres de los Altos, Provincia de Quebec, Brasilia, Fabio Simonelli, La Unión, La Argentina, Federico García Lorca sede C, José María Córdoba, Venecia, DLE Usme, DLE Tunjuelito.

2. • De acuerdo a los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.43%, se realiza actualización de programación general de las sede Provincia de Quebec, El Uval y Fabio Lozano Simonelli, sin embargo dado que a la fecha no se ha actualizado la programación especifica de estas sedes, se realiza seguimiento del avance programado de manera lineal con el tiempo transcurrido.

3. A la fecha se encuentran abiertos 12 frentes de obra adicionalmente al frente de emergencia Ofelia Uribe Acosta.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en las sedes Uval y Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.198.868.110,01**	**$ 190.713.806,01**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.908.852.841
		DIFERENCIA	$ 164.943.972

Observaciones:
Se evidencia saldo a favor de $164.943.972, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.709.984.731**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**64,90%**	**74,33%**	**9,43%**	**271,30**	**236,90**	**34,41**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	99,00%	-1,00%	165,33	167,00	-1,67
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	29/09/2023	263,00	86,00%	75,00%	-11,00%	197,25	226,18	-28,93
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	93,00%	99,00%	6,00%	211,86	199,02	12,84
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	20/09/2023	245,00	82,00%	87,00%	5,00%	213,15	200,90	12,25
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	10/07/2023	23/12/2023	166,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	21/10/2023	165,00	54,00%	50,00%	-4,00%	82,50	89,10	-6,60
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	12,00%	92,00%	80,00%	100,28	13,08	87,20
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	68,00%	68,00%	55,76	0,00	55,76
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	21,00%	100,00%	79,00%	91,00	19,11	71,89
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	40,00%	84,00%	44,00%	90,72	43,20	47,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	34,00%	43,00%	9,00%	50,31	39,78	10,53

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

21	IED VENECIA SEDE B	$	428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	26,00%	85,00%	59,00%	107,95	33,02	74,93
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$	75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	63,00%	100,00%	37,00%	62,00	39,06	22,94
23	DILE USME	$	117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	8,00%	20,00%	12,00%	27,60	11,04	16,56
24	DILE TUNJUELITO	$	74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	7,00%	21,00%	14,00%	28,98	9,66	19,32
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**10.709.984.731**									
1	IED PAULO FREILE	$	5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$	367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$	40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	90,00%	90,00%	0,00%	6,30	6,30	0,00
4	LOTE VILLA ROSITA	$	-	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	IED SANTA MARTA	$	36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$	4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	IED SAN CAYETANO	$	49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	RURAL LA MAYORIA	$	13.904.344	10/04/2023	15/04/2023	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	DIRECCION LOCAL USME	$	31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$	446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	90,00%	-10,00%	27,00	30,00	-3,00
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$	20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$	11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	IED SANTA LIBRADA	$	1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
15	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$	26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$	298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$	598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$	98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$	699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$	29.389.803	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$	14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**1.198.868.110**									

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

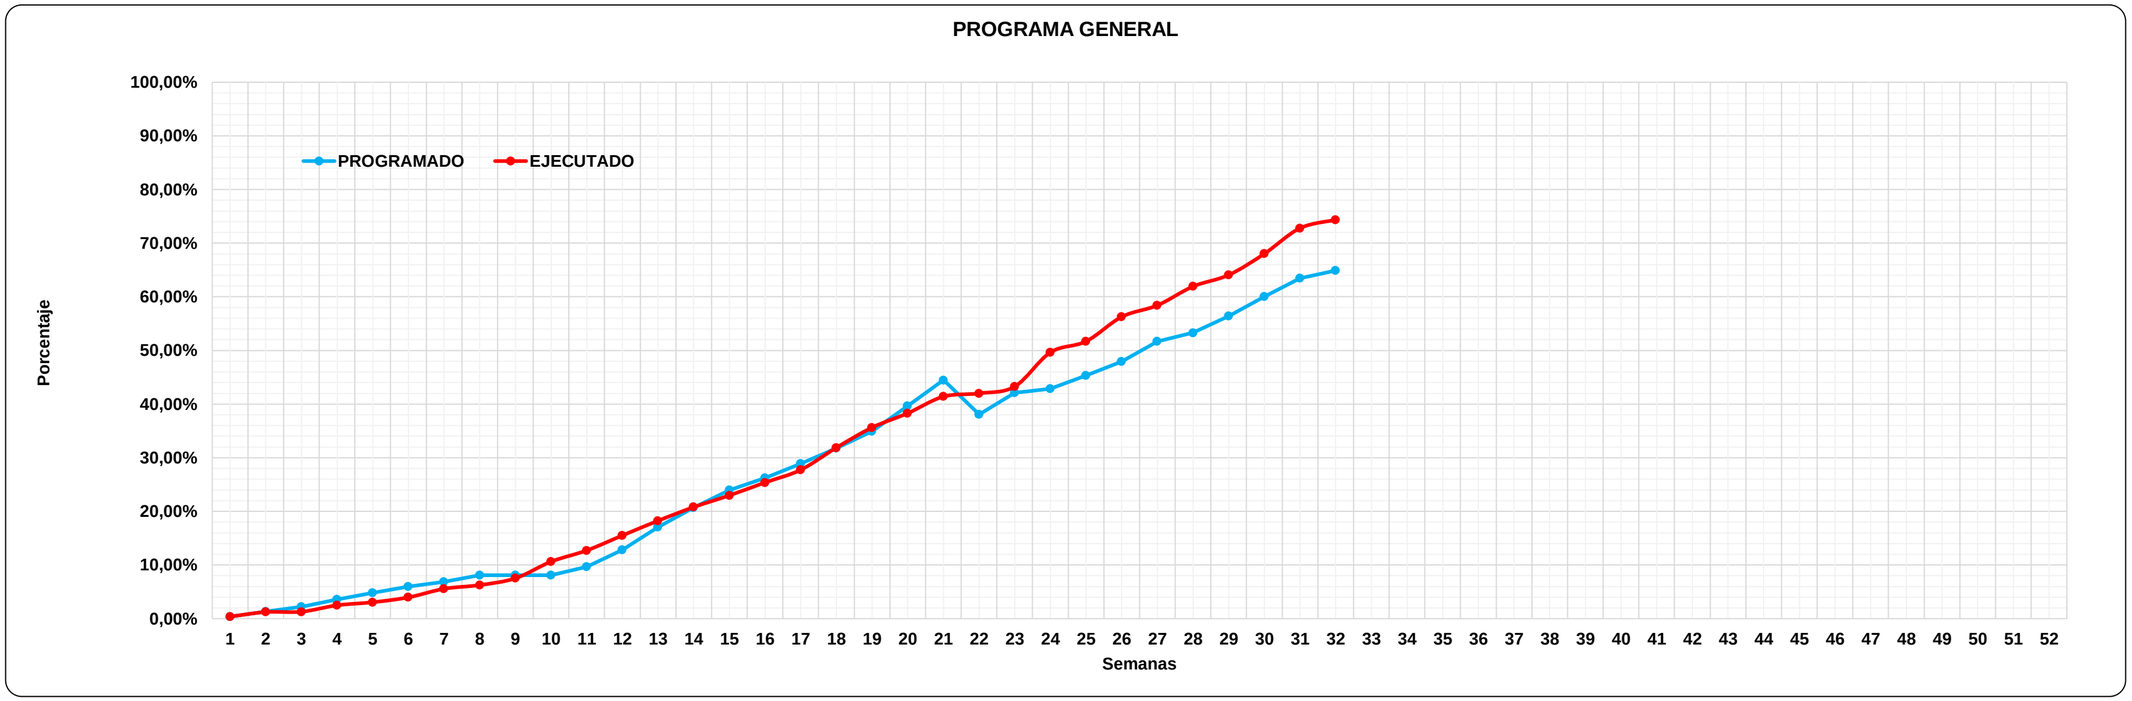

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.43%, se realiza actualización de programación general de las sedes Provincia de Quebec, El Uval y Fabio Lozano Simonelli, sin embargo, dado que a la fecha no se ha actualizado la programación especifica de estas sedes, se realiza seguimiento del avance programado de manera lineal con el tiempo transcurrido.
• Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance
• Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
• Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

SEMANA No.	34		31-jul-23	AL	6-ago-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



DESMONTE DE CUBIERTA Y VENTANERÍA



ENCHAPE DE PISOS AULA MODULAR



ENCHAPE DE PISOS AULA MODULAR

COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS - SEDE A



ESTADO FINAL ETAPA III



ESTADO FINAL ETAPA III



ESTADO FINAL ETAPA III



ESTADO FINAL ETAPA III




ESTADO INCIAL AREA ADMINISTRATIVA



INSTALACION DE DIVISIONES AREA ADMINISTRATIVA

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C

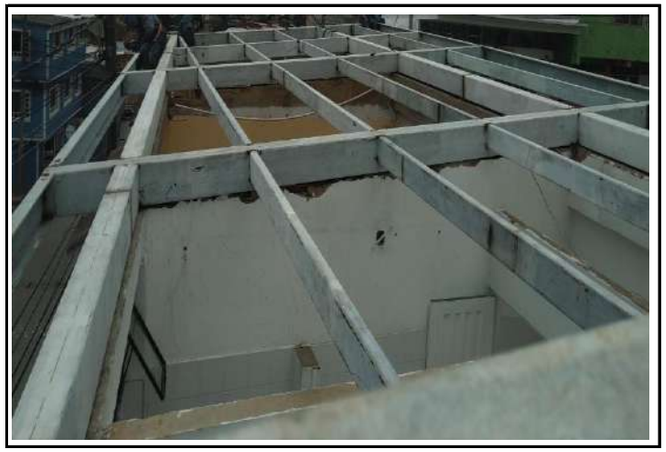

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

BRASILIA - SEDE A



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS



IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS

OFELIA URIBE ACOSTA (EMERGENCIA)



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



AVANCE GENERAL DE OBRA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

COLEGIO RURAL LA UNION



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

COLEGIO RURAL LA ARGENTINA



INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



RESANE DE VANOS



IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL



AVANCE GENERAL DE OBRA



AVANCE GENERAL DE OBRA

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



RETIRO DE CARPETA ASFALTICA AFECTADA



RETIRO DE CARPETA ASFALTICA AFECTADA



AVANCE GENERAL CANCHA



RETIRO DE RCD

IED FEDERICO GARCIA LORCA - SEDE C



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL AULAS SEGUNDO PISO



ESTADO FINAL BAÑOS



ESTADO FINAL BAÑOS

IED VENECIA - SEDE B



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA



DEMOLICION DE ANDENES

DILE USME



RESANE DE REGATAS EN MUROS



RESANE DE REGATAS EN MUROS



RESANE DE REGATAS EN MUROS



DEMOLICION DE PLACA DE PISO



INSTALACION DE TUBERIAS



EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS

DILE TUNJUELITO



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA						
NUMERO	**NOMBRE**	**CARGO**	**SEDES A CARGO**	**INGRESO**	**RETIRO**	**OBSERVACION**
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17						
Observaciones:						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO · SECRETARÍA DE EDUCACIÓN · BOGOTÁ	**AFECTACIONES - EVENTUALIDADES**

SEMANA No.	34	DEL	31-jul-23	AL	6-ago-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	FABIO LOZANO SIMONELLI		24/7/23			SE REGISTRA ATRASO NE LA PROGRAMACIÓN DE LA SEDE, NO OBSTANTE ESTO SE DEBE A QUE SE AMPLÍAN LOS ALCANCES DE LA MISMA, POR LO CUAL SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0580-5331

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-327-2022; Remisión de informe del componente SST No. 07 – Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Atendiendo el comunicado del asunto, con el cual hace entrega del informe mensual del componente de seguridad y salud en el trabajo No. 07, esta interventoría se permite informar que el mismo se encuentran procedente, por lo que se le recuerda al contratista de obra, que una vez cuente con la aprobación total de los informes mensuales en cada uno de sus componentes, debe hacer entrega de estos de la siguiente manera.

1. Un (01) Documento consolidado en formato PDF (peso no mayor a 50.000 KB).
2. Entrega física de cada uno de los informes mensuales por componente, los anexos deben ser entregados en un (01) CD.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las directrices entregadas por la supervisión del contrato en comités técnicos.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: CMSP.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0579-5330

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-330-2023 Respuesta requerimiento de atención de observaciones Colegio Arrayanes -Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos hacer entrega de una copia del comunicado del asunto, con el cual el Consorcio Educación Bogotá da respuesta a las observaciones realizadas en la entrega de las sedes del Colegio Rural Los Arrayanes, a lo anterior, esta interventoría se permite mencionar que realizará el seguimiento correspondiente al compromiso pendiente con respecto a la división de baño, si bien el contratista de obra informa que dará cierre a dicha observación el 11 de agosto de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en tres (03) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CO.EDUCACION.BOG-330-2023

Bogotá D.C., 3 de argentina de 2023
Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Atn: Dr. Carlos Mario Rolón Amaya
Representante Legal Interventoría
AV 19 No. 120 – 71 Oficina 104
Tel: (601) 3562690 - 3562691
Ciudad. Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077396

OBJETO: *ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

ASUNTO: *RESPUESTA REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES COLEGIO ARRAYANES*

El CONSORCIO EDUCACION BOGOTA. En lo establecido al Contrato de Obra, y de acuerdo con lo solicitado; damos atención y cierre a las observaciones dadas mediante el comunicado del día 12 de julio 2023;

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Se requiere corregir el amarre de las luminarias ya que por presentación no se aceptan los amarres con alambre a la estructura metálica

Rtt/ En atención a la solicitud y se ajusta amarres de lámparas;



2. Se debe instalar tapones en los espacios que quedaron debido a la instalación, lo anterior por seguridad de la comunidad educativa, ya que algunos de estos espacios quedan con filos.

Rtt/ Se realizo instalación de tapones en puertas;



3. Se requiere corregir la división del sanitario de primera infancia para que cubra adecuadamente el espacio.

Rtt/ Se idéntica área de intervención y se envia a fabricación suplemento inferior en la división esta será instalada en día que se instale las divisiones del colegio argentina fecha tentativa el día 11 de agosto del 2023.

4. Se solicita la instalación de un flanche en la cubierta del pasillo frente a los baños, lo anterior, para evitar goteras que se puedan presentar en el espacio que quedó entre la cubierta nueva y la existente.

   Rtt/ Se realizo adecuación e instalación de flanche;



Según la solicitud; damos cierre al hallazgo realizados;

Dado el caso que se presenta alguno adicional en pendientes estamos atentos para atenderlos y hacer su pronta subsanación.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION BOGOTA
JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE
Director de Obra.
Elaboró: Ing. viviana gomez sanchez
Revisó: Ing. Julio Rodríguez
C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – **Arq. Santiago Ángel Uribe** – Apoyo a la supervisión Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0578-5329

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-329-2023; Entrega de programación actualizada Colegio Rural el Uval -Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir la programación de la siguiente sede:

- Colegio Rural El Uval.

Es de aclarar que esta información cuenta con el aval de esta interventoría y será implementada en el proceso de seguimiento y control de las obras a ejecutar.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0577-5321

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Observaciones de obra Colegio Rural el Uval – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Atendiendo el correo electrónico del 03 de agosto de 2023, en el cual la Supervision del contrato hace entrega de una copia del oficio sin consecutivo emitido por las directivas del Colegio Rural el Uval, esta interventoría se permite a hacer entrega de una copia de este junto con todos sus soportes y en donde se notifica lo siguiente por la entidad.

(…)

Adjunto al presente remito la comunicación enviada por el colegio relacionado en el asunto, observaciones que deben ser atendidas en un plazo no mayor al 11 de agosto, así como la presentación del informe correspondiente

(…)

Por lo anterior, esta interventoría le solicita al Consorcio Educación Bogotá atender las observaciones a las que haya lugar, una vez subsanadas hacer entrega del respectivo registro fotográfico, toda vez que se debe dar respuesta a dicho requerimiento a más tardar el 11 de agosto a la SED, por lo que se debe radicar ante esta interventoría el informe correspondiente por lo menos con dos (02) días de anterioridad, con el fin de llevar a cabo la respectiva revisión.

Cordialmente,

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en cuatro (04) folios.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad. (Sin Anexos).

-------- Forwarded message ---------
De: **SANTIAGO ANGEL URIBE** <sangelu@educacionbogota.gov.co>
Date: jue, 3 ago 2023 a las 12:22
Subject: OBSERVACIONES DE OBRA COLEGIO EL UVAL 2 DE AGOSTO DE 2023
To: consorciosedgrupo4@gmail.com <consorciosedgrupo4@gmail.com>, consorcioeducacionbogota@gmail.com <consorcioeducacionbogota@gmail.com>
Cc: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO <consorcioservicioeducativo@gmail.com>, FERNEY JIMENEZ NEIRA <fjimenez@educacionbogota.gov.co>, NICOLAS VERDUGO BECERRA <nverdugob@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Adjunto al presente remito la comunicación enviada por el colegio relacionado en el asunto, observaciones que deben ser atendidas en un plazo no mayor al 11 de agosto, así como la presentación del informe correspondiente

Sin otro particular

ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión Grupo 4
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE
Secretaría de Educación del Distrito
Av. El Dorado No. 66 – 63
CEL 3108719797

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Un archivo adjunto• Analizado por Gmail



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO RURAL EL UVAL
(INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL)
JORNADAS MAÑANA, TARDE Y UNICA
(Km. 8 Autopista al Llano, Vereda El Uval, Localidad 5ª Usme)
RESOLUCION Nº. 3577 de Nov.12 de 2002 y 050070 Sep. 9 de 2009
RESOLUCION N° 050196 del 24 de enero de 2011
DANE 211850000981 - NIT 830041796-0
Email: cedeluval5@educacionbogota.edu.co
Celular: 3002071007


Bogotá D.C. 02 de agosto de 2023

Señores:
Dirección de Construcciones
Secretaria de Educación Distrital


Cordial saludo, sabiendo que el colegio se encuentra en proceso de obra en el presente año y ya se ha entregado la primer fase de ejecución y de la segunda fase solo el bloque de bachillerato, podemos evidenciar una serie de inconsistencias presentadas, en las fases entregadas a la institución, que se han venido presentando en las últimas 2 semanas, la finalidad de este comunicado es poder darles a conocer las inconsistencias y de esta manera se puedan subsanar de manera oportuna para que esto no afecte el buen funcionamiento de las aulas y los espacios exteriores de la institución y así no ver más afectado la seguridad y salud de los alumnos y docentes.

A continuación, presentamos registros fotográficos de las inconsistencias presentadas a la fecha:


1. **En las aulas del bloque de bachillerato se están evidenciando filtraciones de agua constante cuando llueve por los marcos de las ventanas instaladas.**

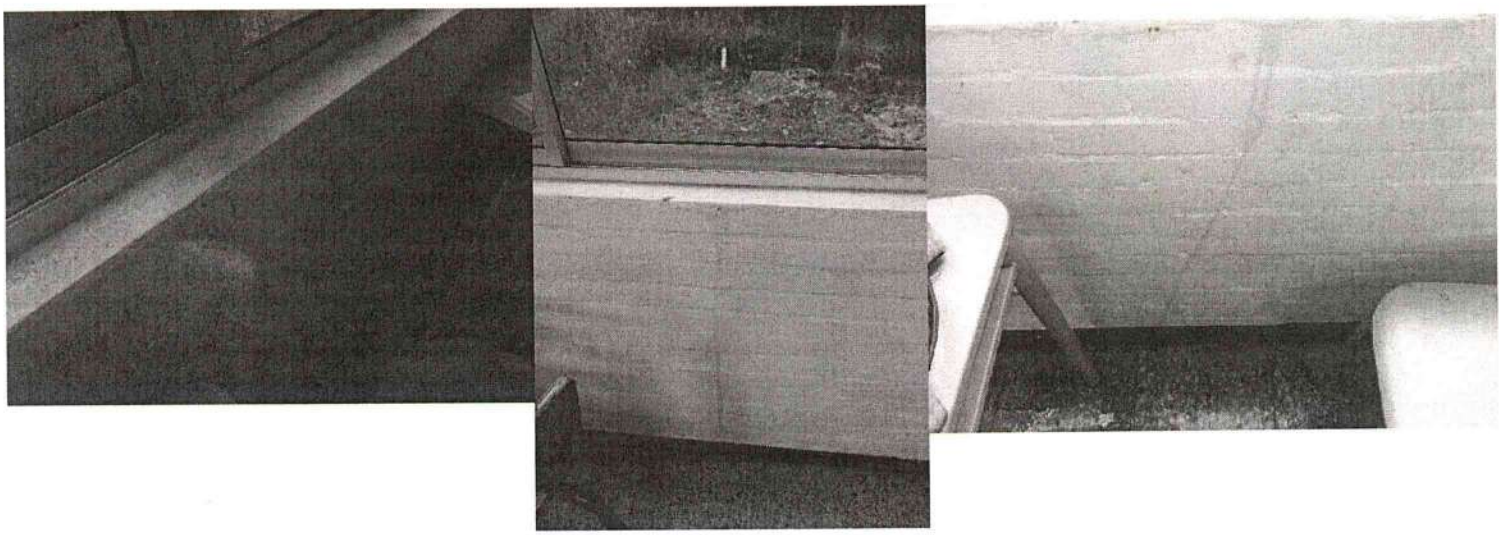

2. **En los pasos de la escalera de entrada a los salones de primera infancia, se instalaron las cintas antideslizantes, pero en poco tiempo se despegaron.**

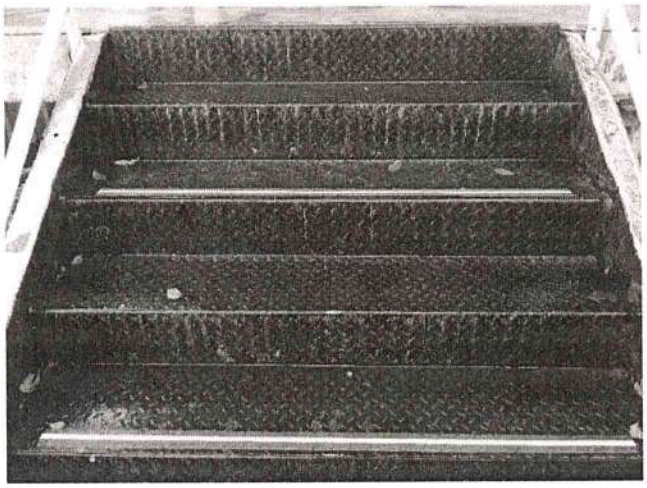

3. **La canal del suelo que pasa por debajo de la escalera de entrada a los salones de primera infancia, tenía un tuvo que llevaba el agua lluvia desde la parte de abajo de dicha escalera hasta una caja que se encuentra al frente de la oficina de rectoría, pasando por debajo del camino en cemento, ahora ya no hace ese recorrido porque se encuentra tapado dicho tubo y esto genera que se inunde la canal y el agua brote por un costado del camino y salga por encima de la placa de cemento.**

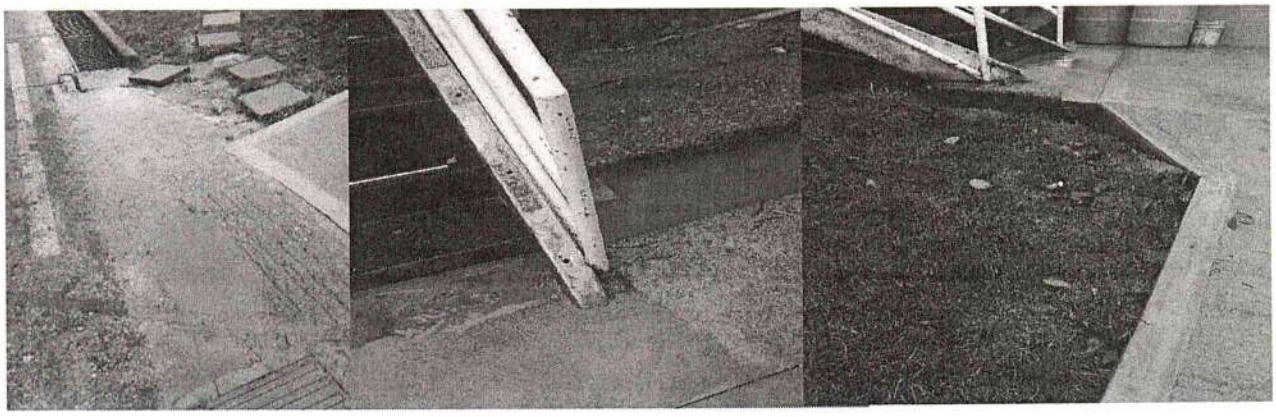

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO RURAL EL UVAL
(INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL)
JORNADAS MAÑANA, TARDE Y UNICA
(Km. 8 Autopista al Llano, Vereda El Uval, Localidad 5ª Usme)
RESOLUCION Nº. 3577 de Nov.12 de 2002 y 050070 Sep. 9 de 2009
RESOLUCION N° 050196 del 24 de enero de 2011
DANE 211850000981 - NIT 830041796-0
Email: cedeluval5@educacionbogota.edu.co
Celular: 3002071007

4. **En la oficina de Orientación que se encuentra en medio de 2 salones en el bloque de bachillerato, se hizo un corte del marco para dividir la ventana de la puerta y así instalar la nueva ventanería, esto produjo un desnivel del marco de la puerta lo que ha dificultado la apertura de la misma.**



De antemano agradecemos la atención prestada y solicitamos una pronta respuesta a dichas solicitudes.

Cordialmente;

TARSICIO PEREZ CUBILLOS
Rector

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0576-5320

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Comunicado CO.EDUCACION.BOG-325-2022 Reprogramación frentes – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

En atención a la solicitud realizada para poder realizar la actualización de la programación de los colegios IED Provincia de Quebec y IED Fabio Simonelli, esta interventoría considera acorde los tiempos solicitados debido a los inconvenientes y/o solicitudes presentados en estas dos sedes, por lo que se requiere las programaciones detalladas y general con las nuevas fechas de intervención en un plazo no mayor a tres (03) dias contados a partir de la fecha de recibo de este comunicado, con el fin de poder continuar con el seguimiento adecuado por parte de esta interventoría.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 08 de 2023
CINP-BTA-529-0575-5319

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Documentos de cierre IED Bernardo Jaramillo sede A – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos los siguientes documentos correspondientes al cierre del Colegio Berrado Jaramillo sede A.

- Actas de entrega de espacios (04 folios).
- Actas de vecindad (01 folio).
- Cierre de actas de vecindad (03 folios).
- Carta entrega manual de mantenimiento (01 folio).
- Acta de entrega Física (03 folios).

Agradecemos de ante mano se remita copia del acta de entrega física una vez sea suscita por todas las partes correspondientes.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 04 de 2023
CINP-BTA-529-0574-5267

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ
ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ
Representante Legal
Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-322-2022; Atención de observaciones informe ambiental No. 07 – Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Atendiendo el comunicado del asunto, con el cual hace entrega de la subsanación de observaciones del informe mensual del componente ambiental No. 07, esta interventoría se permite informar que el mismo se encuentran procedente, por lo que se le recuerda al contratista de obra, que una vez cuente con la aprobación total de los informes mensuales en cada uno de sus componentes, debe hacer entrega de estos de la siguiente manera.

1. Un (01) Documento consolidado en formato PDF (peso no mayor a 50.000 KB).
2. Entrega física de cada uno de los informes mensuales por componente, los anexos deben ser entregados en un (01) CD.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las directrices entregadas por la supervisión del contrato en comités técnicos.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: CMSP.
Revisó: DFCC.

C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - Ferney Jiménez Neira - Supervisor Grupo 4 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 03 de 2023
CINP-BTA-529-0573-5247

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Documentos de cierre IED Oswaldo Guayasamín sede B.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos los siguientes documentos correspondientes al cierre del Colegio Oswaldo Guayasamín Sede B.

- Actas de entrega de espacios (15 folios).
- Actas de vecindad (01 folio).
- Cierre de actas de vecindad (03 folios).
- Carta entrega manual de mantenimiento (01 folio).
- Acta de entrega Física (03 folios).

Agradecemos de ante mano se remita copia del acta de entrega física una vez sea suscita por todas las partes correspondientes.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 03 de 2023
CINP-BTA-529-0572-5238

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-319-2022; Presentación de NP 007 - NP008.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, nos permitimos remitir la información requerida para el trámite de los ítems no previstos presentados por el Consorcio Educación Bogotá, mediante el comunicado del asunto.

Cabe mencionar, que los análisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista de obra fueron verificados por esta interventoría de acuerdo a los establecido en el anexo técnico No. 01 del pliego de condiciones del contrato de obra y a las directrices entregadas por el área de estudios previos de la SED, por lo que se encuentran procedentes y se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-007	MARCO PARA LUMINARIA SOBREPONER DE 120 CM X 30 CM	UND	$70.724
NP-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	$229.515

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (01) Archivo WinRAR.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 03 de 2023
CINP-BTA-529-0571-5233

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-321-2023; Acta de entrega por espacios Colegio Federico García Lorca Sede C.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir copia de las actas de entrega de espacios correspondiente al Colegio Federico García Lorca Sede C, que incluye los siguientes espacios:

- Salón 01.
- Salón 02.
- Fachada y pasillos
- Baños

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: AFCM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en ocho (08) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA: 02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros estructura metálica para cubierta

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
6	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
1	INTERRUPTOR SENCILLO
6	TOMA CORRIENTE

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

:EPRESENTANTE OBRA - EDUCACION BOGOTA

NOMBRE: Fabian Cubillos

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIV(

NOMBRE: Andres Felipe Rendon M.

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR CONTRATISTA E INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA: 02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros estructura metálica para cubierta

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
6	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
1	INTERRUPTOR SENCILLO
6	TOMA CORRIENTE

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE OBRA - EDUCACION BOGOTA

NOMBRE: Fabian Cubillos.

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIV(

NOMBRE: Andrés Felipe Sanchez M.

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR CONTRATISTA E INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA: 02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros estructura metálica para cubierta

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
3	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
1	INTERRUPTOR SENCILLO
1	TOMA CORRIENTE
1	CANAL METALICA con bajante

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

:EPRESENTANTE OBRA - EDUCACION BOGOTA

NOMBRE: Fabian Cubillos.

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIV(

NOMBRE: Andrés Felipe Sanchez M.

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR CONTRATISTA E INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA: 02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
3	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
3	INTERRUPTOR SENCILLO
1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000L

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE OBRA - EDUCACION BOGOTA

NOMBRE: Fabian Cubillos

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIV(

NOMBRE: Andres Felipe Cuadros M.

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR CONTRATISTA E INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA:02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros estructura metálica para cubierta

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
3	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
1	INTERRUPTOR SENCILLO
1	TOMA CORRIENTE
1	CANAL METALICA con bajante

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIVO

NOMBRE: Andrés Felipe Ondón M.

REPRESENTANTE INSTITUCION

NOMBRE: Yoros Salamanca

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR INTERVENTORIA E INSTITUCION

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA:02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
3	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
3	INTERRUPTOR SENCILLO
1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000L

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIVO

NOMBRE: Andrés Felipe Sanchez M

REPRESENTANTE INSTITUCION

NOMBRE: Marcos Salamanca


NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR INTERVENTORIA E INSTITUCION

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	CONTRATISTA

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA:02-08-2023

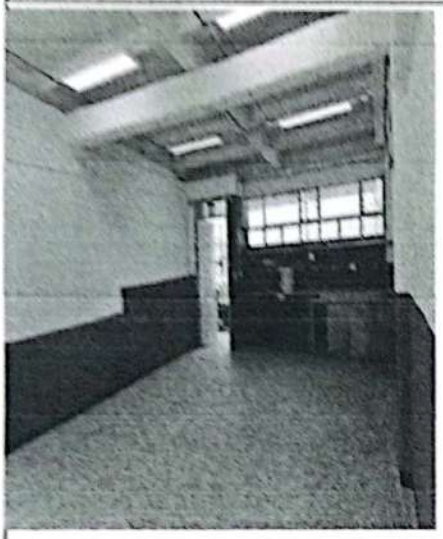ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros estructura metálica para cubierta

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
6	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
1	INTERRUPTOR SENCILLO
6	TOMA CORRIENTE

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIVO

NOMBRE: Andrés Felipe Londoño M

REPRESENTANTE INSTITUCION

NOMBRE: Yoccs Salamanca

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR INTERVENTORIA E INSTITUCION

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	INTERVENTORIA
CO1.PCCNTR.4077396	
OBJETO	**CONTRATISTA**

ACTA DE ENTREGA POR ESPACIOS

INSTITUCIÓN:	FEDERICO GARCÍA LORCA SEDE C	FECHA: 02-08-2023

ESPACIO A ENTREGAR:	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	Cambio de cubierta cambio de acometida lámparas y red eléctrica pintura de muros estructura metálica para cubierta

INVENTARIO:	OBSERVACIONES O PENDIENTES:
6	LAMPARAS PANELES LED 0.30 x 1.20
1	CUBIERTA TIPO SANDWICH
1	INTERRUPTOR SENCILLO
6	TOMA CORRIENTE

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE INTERVENTORIA- SERVICIO EDUCATIVO

NOMBRE: Andres Felipe Sanchez M

REPRESENTANTE INSTITUCION

NOMBRE: Carlos Sarmiento R

NOTA: ESTA ACTA UNICAMENTE SE FIRMA POR INTERVENTORIA E INSTITUCION

Powered by CamScanner

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 02 de 2023
CINP-BTA-529-0570-5227

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Comunicado CO.EDUCACION.BOG-318-2022; Actas de vecindad Colegio El Uval etapa 3.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir copia de las actas de vecindad correspondientes a la tercera fase de ejecución del Colegio El Uval las cuales se encuentran debidamente avaladas por esta Interventoría.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en un (03) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

			ACTA DE VECINDAD			CODIGO CL-AT-17	
						VERSION 0 20/09/2021	
No. del Contrato	CO1.PCCNTR.4077396		Objeto del Contrato	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".			
Contratante	SED		Contratista	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA		Interventoria:	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Establecimiento		COLEGIO EL UVAL				Fecha :	26/07/2023

Localizacion	Inventario		Instalaciones	Bueno(B) Regular (R) Malo (M)	Observaciones
	Cant	Elemento	SALA DE SISTEMAS		
SALA DE SISTEMAS 	1	RACK DE VOZ Y DATOS	Piso	BUENO	piso en baldosa con degaste natural por uso se evidencian grietas , fisuras y falta de piezas en algunos puntos,
	1	UPZ	muros	Buenos	muros en mamposteria panetados y pintados en color blanco
	1	ANTENA DE INTERNET	ventanas	Buenas	se evidencia un vidrios rotos en la zona del rack y en la sala de sistemas
	1	REFLECTOR	Cubierta	mala	en teja acanalada de asbesto tipo 90
	5	VENTANAS	Carpinteria metalica	Buenas	Puertas de accceso metalixas con deterioro normal por uso
	1	PUERTTA	Intalaciones electricas	buenas	no se verifica funcionamiento de red regulada
	4	LAMPARAS DE TECHO	Intalaciones Hidraulicas	N/A	no se evidencian instalaciones en este espacio
Localizacion	Inventario		Instalaciones	Bueno(B) Regular (R) Malo (M)	Observaciones
corredor acceso sala de profesore 	Cant	Elemento	CORREDOR		
	2	LAMPARAS DE TECHO	Piso	BUENO	piso en baldosa con degaste natural por uso se evidencian grietas , fisuras y falta de piezas en algunos puntos,
	1	DIVICION	muros	Buenos	muros en mamposteria panetados y pintados en color blanco
			ventanas	Buenas	se evidencia un vidrios rotos en la zona del rack y en la sala de sistemas
			Cubierta	mala	en teja acanalada de asbesto tipo 90
			Carpinteria metalica	Buenas	Puertas de accceso metalixas con deterioro normal por uso
			Intalaciones electricas	buenas	Se evidencian lamparas de techo
Localizacion	Inventario		Intalaciones Hidraulicas	N/A	no se evidencian instalaciones en este espacio
ALMACEN 	Cant	Elemento	ALMACEN		
	2	ARMARIOS	Piso	Bueno	piso en baldosa con degaste natural por uso
	2	LAPARAS HERMETICA DE TECHO	Acabado muros	Bueno	muros en mamposteria panetados y pintados en color blanco
			Cubierta	BUENA	en teja acanalada de asbesto tipo 90
			Carpinteria metalica	Buena	Puertas de accceso metalixas con deterioro normal por uso DIVIDIDA A LA MITAD
			Intalaciones electricas	Bueno	Se evidencian lamparas de techo y toma corrientes
			Intalaciones Hidraulicas	Buenas	no se evidencian instalaciones en este espacio
