ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 09
PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023









CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146302

OBJETO CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
VERSIÓN	**FECHA ELABORACIÓN**	**OBJETO**	**ELABORADO POR**	**APROBADO POR**
1	**28-SEPTIEMBRE-23**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 09** **PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	**JUAN CAMILO CALDERON U.** **ANDRES FELIPE CANCHON M.**	**DIEGO FERNANDO CLARO C.**
			RESIDENTES DE INTERVENTORÍA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..... 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

2.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES. 5
2.2. LOCALIZACIÓN. 6
2.3. VERIFICACIÓN PREVIA Y DIAGNOSTICO. 7

3. CONTRATO DE OBRA 9

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 9

3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA. 10
3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISION DE POLIZAS. 10
3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO. 11
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE OBRA. 11
3.2.1. PERSONAL APROBADO. 11
3.2.2. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMA 13
3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE POR FRENTE A INTERVENIR 13
3.2.4. COLEGIOS DE EMERGENCIA. 18
3.2.5. PROGRAMACIÓN GENERAL 21
3.2.6. BALANCE PRESUPUESTAL 24
3.2.7. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 26
3.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD. 32

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 33

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 33
4.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 34
4.1.2. RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA. 34
4.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS. 35
4.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 35
4.2.1 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORIA. 35
4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 36
4.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD 37
4.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA. 37
4.4 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 38

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización intervenciones Tunjuelito. 6
Ilustración 2. Localización intervenciones Usme. 7

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.Información General Contrato de obra. 9
Tabla 2. Aspectos Contractuales del Contrato de obra. 10
Tabla 3. Revisión y estado de las pólizas Contrato de Obra. 10
Tabla 4. Personal Aprobado de Obra. 12
Tabla 5. Alcance de las intervenciones. 14
Tabla 6. Resumen emergencias. 18
Tabla 7. Programación general. 21
Tabla 8. Porcentajes de avance por frente. 22
Tabla 9. Porcentaje de avance general. 23
Tabla 10. Balance presupuestal 24
Tabla 11. Estado financiero contrato de obra. 26
Tabla 12. Actividades ejecutadas. 27
Tabla 13. Información General del Proyecto de Interventoría. 33
Tabla 14.Documentos suscritos a la fecha. 34
Tabla 15. Relación de Pólizas Contrato de Interventoría. 34
Tabla 16. Estado financiero contrato de interventoría. 35
Tabla 17. Personal Aprobado Por Interventoría. 36

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen las actividades contempladas en el marco de los contratos de obra e interventoría, las cuales serán objeto de ejecución y seguimiento durante el desarrollo de estos.

Con base en lo anterior, La Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, elaboró los documentos y estudios previos con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a contratar la, *"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".*

Teniendo en cuenta lo anterior el pasado 23 de noviembre de 2022 se celebra el contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146302 de 2022, entre la Secretaria de Educación del Distrito (SED) y el señor Carlos Mario Rolón Amaya Representante Legal del Consorcio Servicio Educativo cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

En este informe se presentan los procedimientos y alcances e intervenciones ejecutadas en las diferentes Instituciones Educativas del Distrito ubicadas en las localidades de Usme y Tunjuelito durante el noveno mes de ejecución, contemplado entre el 28 de Agosto y el 27 de Septiembre de 2023, para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato de obra en el ámbito técnico, administrativo, social, seguridad, ambiental y de control presupuestal, con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar.

La fecha de elaboración del presente informe corresponde al 28 de Septiembre de 2023, en cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas de esta interventoría, siguiendo las especificaciones técnicas contempladas en el Contrato y demás normas vigentes e inherentes al proyecto, verificando que se realicen todas las actividades, cumpliendo los lineamientos y especificaciones, de acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en las condiciones y términos del Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022 y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo necesarios para el buen desarrollo del contrato.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,” se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.

La estructura organizacional de La Secretaría de Educación Distrital, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

En virtud a los lineamientos generales de política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: La política educativa de Bogotá D.C., se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C, Programa Línea Estratégica: Inclusión Educativa para la Equidad, Proyecto Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los Colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad.

2.2. LOCALIZACIÓN.

Las intervenciones objeto del presente contrato se ejecutarán en veinticuatro (24) Instituciones Educativas de las localidades de USME y Tunjuelito, distribuidas de la siguiente forma:

TUNJUELITO

1. IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A
2. IED VENECIA SEDE B
3. IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A
4. IED INEM SANTIAGO PEREZ SEDE A
5. D L E TUNJUELITO

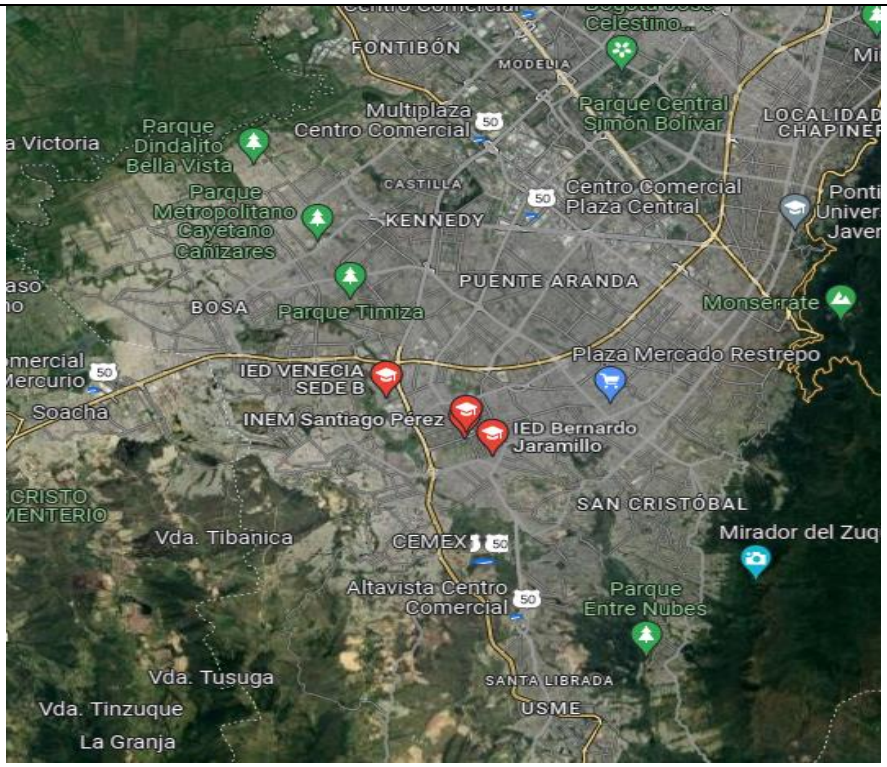


Ilustración 1. Localización intervenciones Tunjuelito.

USME

1. IED USMINIA SEDE C
2. IED BRASILIA SEDE A
3. IED CURUBITAL SEDE A
4. IED EL DESTINO SEDE A
5. IED EL UVAL SEDE A
6. IED FABILO LOZANO SIMONELLI SEDE A
7. IED LOS ANDES SEDE A
8. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C
9. IED LA ARGENTINA SEDE A

10. IED LA UNION SEDE A
11. IED LAS MERCEDES SEDE A
12. IED LOS ARRAYANES SEDE A
13. IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS SEDE A
14. IED PROVINCIA DE QUEBEC SEDE A
15. IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B
16. IED LOS TAJARES SEDE B
17. IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C
18. IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B
19. D L E USME

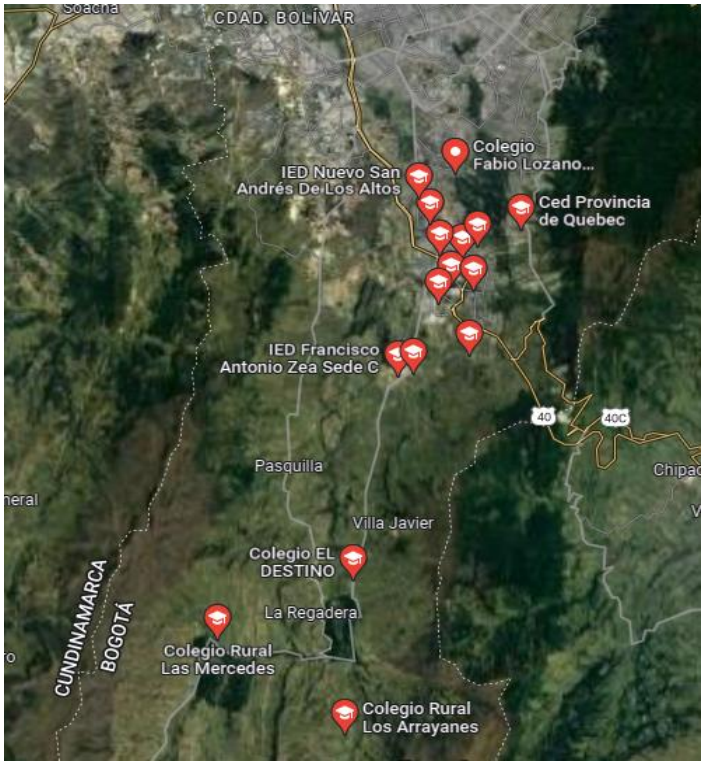


Ilustración 2. Localización intervenciones Usme.

2.3. VERIFICACIÓN PREVIA Y DIAGNOSTICO.

Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial.

De forma previa, para el inicio y desarrollo de las obras programadas, se realizará visita de diagnóstico inicial conjunta, entre la SED, el rector de la Institución o quien este delegue, la interventoría y el contratista de obra, en la cual se validará el diagnóstico inicial, dejando constancia de las obras a realizar con su respectivo alcance, de conformidad con lo previsto en el estudio previo sobre este particular.

Como resultado de las vistas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando cantidades y valor por cada ítem a ejecutarse, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta económica inicial.

Las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED se clasifican en mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

PROGRAMADA: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

La información general del proyecto es la siguiente:

Tabla 1.Información General Contrato de obra.

INFORMACIÓN GENERAL OBRA	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077396
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.073.796.813
PLAZO:	DOCE (12) MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSIDERACIONES.

El Contratista deberá tener en cuenta que es un contrato de ejecución con Dos (02) modalidades de ejecución económica:

1. PROGRAMADA: es decir de acuerdo con unas sedes ya establecidas por la entidad, con ítems y cantidades detalladas y específicas, con un valor total.
2. EMERGENCIAS O POR NECESIDAD: Es decir intervenciones a:
   - **2.1.** Sedes de la Secretaría de Educación que no están programadas y que por la necesidad de cada proyecto o circunstancia deben ser intervenidas de forma inmediata.
   - **2.2.** Actividades o cantidades no programadas que no se hayan incluido en el diagnóstico inicial y se presentan realizado a cada equipamiento postulado, por circunstancias inesperadas.

Debe tenerse en cuenta que la SED se ha basado en la información disponible para realizar un ejercicio aproximado que permita estimar el alcance de las obras a ejecutar en el proyecto, sin que esto signifique compromiso alguno para la SED para garantizar la ejecución de dichos ítems y los respectivos precios unitarios.

Para esta modalidad se debe tener presente los ítems aprobados por la SED en este contrato, es decir, se ejecuta a medida que se van requiriendo cada una de las actividades de obra de mantenimiento y se adjudicará el valor total del presupuesto asignado PARA CADA GRUPO, de conformidad con los valores unitarios fijos y precios establecidos en la oferta económica del proponente sin fórmula de reajuste.

Adicionalmente, es necesario aclarar que dependiendo del tiempo en que tarde la ejecución del contrato, las necesidades en las sedes educativas PROGRAMADAS pueden variar, (incrementar o disminuir). En caso de que las necesidades aumenten, se debe tener presente que se debe incurrir en la afectación del valor de la modalidad EMERGENCIAS o por necesidad (intervención por necesidad), se debe balancear el contrato y priorizar su alcance de conformidad con los valores unitarios fijos aprobados por la entidad y establecidos en la oferta económica sin fórmula de reajuste.

3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se observan a continuación:

Tabla 2. Aspectos Contractuales del Contrato de obra.

DOCUMENTO	FECHA
CONTRATO DE OBRA	08 DE NOVIEMBRE 2022
ACTA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2022

***Una vez aprobadas las garantías por parte de la SED, el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles deberá entregar a la interventoría contratada, los documentos necesarios para la suscripción del **acta de inicio** de obra, los cuales se encuentran señalados en las obligaciones administrativas, las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual y los programas detallados para la ejecución de la obra establecidas en el presente documento.*

3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISION DE POLIZAS.

A la fecha del presente informe se encuentran vigentes las siguientes pólizas.

Tabla 3. Revisión y estado de las pólizas Contrato de Obra.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGUROS	ESTADO / REVISIÓN
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101397742	$2.414.759.362,60	28/12/2022	05/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO	ACTUALIZADAS
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.		$1.207.379.681,30	28/12/2022	28/12/2026		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101397742	$2.414.759.362,60	28/12/2023	28/12/2025		

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101199562	$603.689.840,65	28/12/2022	28/12/2023		
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN	21-18101001088	$668.594.957,66	28/12/2022	28/12/2023	SEGUROS DEL ESTADO	ACTUALIZADAS

3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO.

La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, conforme al estudio realizado por la SED, valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado, en consecuencia, el valor real del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfacción a la SED por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem.

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salarial y prestacional, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo, del contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del contratista, transporte, garantías y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U.

Para el presente contrato, no se contempla el pago de anticipo, por la naturaleza de las obras a contratar la cual corresponde a obras de mejoramiento en general en donde las inversiones son puntuales e identificadas con antelación al inicio de las obras.

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1. PERSONAL APROBADO.

Teniendo en cuenta el Anexo 1. – Anexo Técnico del proceso No. SED-LP-DCCEE-039-2022 el Numeral de Personal y perfiles se menciona:

> *“El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección.*

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Un (1) director de obra.
Dos (2) residente de obra.
Un (1) asesor estructural.
Un (1) asesor Ambiental.
Cuatro (4) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
Un (1) asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
Un (1) Asesor Hidrosanitario - Red Contra Incendios y gas.
Un (1) profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
Cuatro (4) Inspector de obra.
Un (1) maestro de obra.

A continuación, se hace entrega de la relación del personal aprobado y el cual se encontró laborando en este periodo.

Tabla 4. Personal Aprobado de Obra.

PROFESIONAL	CARGO	COMUNICADO CONTRATISTA	COMUNICADO DE APROBACION INTERVENTORIA
DIRECTOR	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
RESIDENTE 1	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	CO.EDUCACION.BOG-156-2022	CINP-BTA-529-0282-2953
RESIDENTE 2	JUAN CAMILO VELASZO MENDEZ	CO.EDUCACION.BOG-007-2022	CINP-BTA-529-0011-6990
ASESOR ESTRUCTURAL	ANCISAR PEREZ CERVERA	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
ASESOR AMBIENTAL	YINETH MARCELA BERNAL	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 01	YULI TATIANA SANCHEZ	CO.EDUCACION.BOG-087-2022	CINP-BTA-529-0163-1393
TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 02	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	CO.EDUCACION.BOG-009-2022	CINP-BTA-529-0190-1696
TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 03	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO No. 04	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	CO.EDUCACION.BOG-007-2022	CINP-BTA-529-0011-6990
ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS VOZ Y DATOS	JOSE MANUEL REDONDO	CO.EDUCACION.BOG-010-2022	CINP-BTA-529-0023-7174
ASESOR HIDROSANITARIO	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	JHON FREDY LOPEZ	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838
INSPECTOR DE OBRA 1	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	CO.EDUCACION.BOG-066-2022	CINP-BTA-529-0133-1139
INSPECTOR DE OBRA 2	ALVARO ANDRES GARZON	CO.EDUCACION.BOG-051-2022	CINP-BTA-529-0111-0954
INSPECTOR DE OBRA 3	SERGIO MAURICIO UNAQUE BENAVIDES	CO.EDUCACION.BOG-004-2022	CINP-BTA-529-0006-6838

INSPECTOR DE OBRA 4	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	CO.EDUCACION.BOG-031-2022	CINP-BTA-529-0296-3106
MAESTRO DE OBRA	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	CO.EDUCACION.BOG-009-2022	CINP-BTA-529-0014-7064

3.2.2. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMA

Para el desarrollo de la obra, se deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, para el desarrollo de cada actividad prevista en los frentes a intervenir.

De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes.

De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad, avance del proyecto, el contratista puede plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.

El contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra.

Es de aclarar que por la naturaleza de las obras (mantenimientos y remodelaciones), no se hace necesario el uso de equipos de gran envergadura superiores a los catalogados como herramientas menores, tal y como se especifica en el plan de suministro de equipos remitido por esta Interventoría a la Entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0031-7320 del 21 de diciembre de 2022. No obstante, de llegar a requerirse el uso extraordinario de algún equipo de estas características se realizará la inspección y seguimiento correspondiente que este demande.

3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE POR FRENTE A INTERVENIR

Teniendo en cuenta que intervención de los frentes de obra se realizará de manera progresiva manteniendo un mínimo de 8 frentes abiertos de forma simultánea según lo exigido por el Anexo Técnico del pliego de condiciones del contrato de obra, a continuación, se relaciona el alcance de los frentes intervenidos a la fecha en la primera fase del contrato la cual cuenta con un total de 8 frentes de obra, se ha realizado una actualización del alcance de intervención para cada sede por lo que se tienen en cuenta a partir del presente informe.

Tabla 5. Alcance de las intervenciones.

<table>
<tr><th colspan="3">IED USMINIA SEDE C</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Pintura total
- Cambio de cubiertas
- Cambio de ventanería
- Cambio pisos
- Corredor perimetral de salones</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL EL UVAL</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Cambio de cubiertas.
- Adecuación de baños.
- 3 aulas modulares.
- Estructurar red eléctrica e hidráulica.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

IED PROVINCIA DE QUEBEC SEDE C









- Mantenimiento de cubiertas
- Cambio de luminarias en aulas de los edificios 1, 2 y 4
- Mejoramiento en la ventilación
- Cambio, mantenimiento y ajuste en la ventanería (Parcial).

IED TEJARES SEDE B









-Reforzamiento muro de ingreso
-Mejoramiento de cubiertas
-Adecuación de iluminación en aulas.

<table>
<tr><th colspan="3">IED ESTANISLAO ZULETA SEDE C</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Mantenimiento de cubiertas en edificio 1, 2
- Cambio de luminarias en aulas</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">IED BRASILIA SEDE A</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">- Mantenimiento de cubiertas en edificio 1, 2, 3 y 4
-cambio de luminarias en aulas</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ – Sede A		
		- Adecuación de batería de baños
		
COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED) – Sede A		
		- Cambio de cubierta para los bloques establecidos por la entidad. - Pintura interna, color establecido por la entidad.
		

3.2.4. COLEGIOS DE EMERGENCIA.

Actualmente se cuenta con un total de veinte (20) sedes asignadas que son denominados por la Secretaría de Educación Distrital como tipo de emergencia, de acuerdo con esto, a continuación, se relación el estado de las intervenciones realizadas por el contratista a dichas emergencias.

Tabla 6. Resumen emergencias.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR-40779396							
No.	**EMERGENCIA**	**FECHA VISITA**	**FECHA ATENCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**% AVANCE**	**DOCUMENTOS APROBADOS**	**DOCUMENTOS PENDIENTE Y/O OBSERVACIONES**
1	PAULO FREIRE	12/01/2023	21/01/2023	23/01/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra -Manual de mantenimiento	-Finalizada
2	FEDERICO GARCIA LORCA	30/01/2023	05/02/2023	18/04/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra -Manual de mantenimiento	-Finalizada
3	ALMIRANTE PADILLA	31/01/2023	15/02/2023	28/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
4	LOTE VILLA ROSITA	17/01/2023	13/02/2023	18/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Se da por atendida ya que la SED informa la no intervención.
5	SANTA MARTA	16/02/2023	21/02/2023	18/03/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
6	ORLANDO FALS BORDA	31/01/2023	17/02/2023	21/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada

7	SAN CAYETANO	31/01/2023	13/02/2023	15/03/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
8	RURAL LA MAYORIA	30/01/2023	11/02/2023	17/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
9	DILE USME	30/01/2023	15/02/2023	22/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
10	OFELIA URIBE	01/02/2023	26/02/2023	30/03/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
11	JUAN LUIS LONDONO	03/02/2023	13/02/2023	13/03/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
12	QUEBEC	17/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra -Manual de mantenimiento	-Finalizada
13	SANTA LIBRADA	31/01/2023	24/02/2023	06/03/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
14	MIGUEL DE CERVANTES	06/02/2023	07/03/2023	29/03/2023	95.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-En ejecución
15	RAFAEL URIBE URIBE	11/02/2023	17/02/2023	18/02/2023	100.0%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	--Finalizada

17	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	20/03/2023	24/04/2023	19/05/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
18	FERNANDO GONZALES OCHOA	21/06/2023	1/06/2023	10/07/2023	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
19	PAULO FREIRE ETAPA 2	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	100.00%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada
20	RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	31/05/2023	31/05/2023	21/06/2023	100%	- Informe diagnostico - Registro fotográfico - Cantidades de obra	-Finalizada

Durante el periodo del presente informe no se incluyeron nuevas emergencias, se está a la espera de la actualización del balance para determinar el valor total de estas emergencias.

3.2.5. PROGRAMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la programación general de obra para cada uno de los frentes, aclarando que las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.

Tabla 7. Programación general.

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												


A continuación, se relaciona el estado físico de las intervenciones de las sedes en ejecución a fecha de corte del presente informe:

Tabla 8. Porcentajes de avance por frente.

No.	COLEGIO (SEDE)	LOCALIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	**IED USMINIA SEDE C**	**USME**	100,00%	100,00%
2	**IED BRASILIA SEDE A**	**USME**	100,00%	100,00%
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**	**USME**	100,00%	99,00%
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**	**USME**	100,00%	100,00%
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**	**USME**	100,00%	99,00%
6	**IED LOS TEJARES**	**USME**	100,00%	100,00%
7	**IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B**	**USME**	100,00%	100,00%
8	**INEM SANTIAGO PEREZ**	**TUNJUELITO**	100,00%	100,00%
9	**COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A**	**USME**	29,00%	91,00%
10	**COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A**	**USME**	100,00%	100,00%
11	**IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**	**USME**	90,00%	73,00%
12	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C**	**USME**	0,00%	0,00%
13	**COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A**	**USME**	72,00%	100,00%
14	**COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A**	**USME**	0,00%	100,00%
15	**COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A**	**USME**	100,00%	100,00%
16	**COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A**	**USME**	100,00%	100,00%
17	**COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A**	**USME**	100,00%	100,00%
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**	**USME**	100,00%	100,00%
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**	**USME**	100,00%	100,00%
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**	**TUNJUELITO**	93,00%	99,00%
21	**IED VENECIA SEDE B**	**TUNJUELITO**	95,00%	100,00%
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**	**TUNJUELITO**	100,00%	100,00%
23	**DLE USME**	**USME**	64,00%	64,00%
24	**DLE TUNJUELITO**	**TUNJUELITO**	64,00%	95,00%

A continuación, presenta el avance general del contrato a la fecha, contando con un porcentaje ejecutado del 92.60% y un porcentaje programado del 83.90%, lo cual evidencia un adelanto del 8.70% con respecto a la programación contractual.

Tabla 9. Porcentaje de avance general.

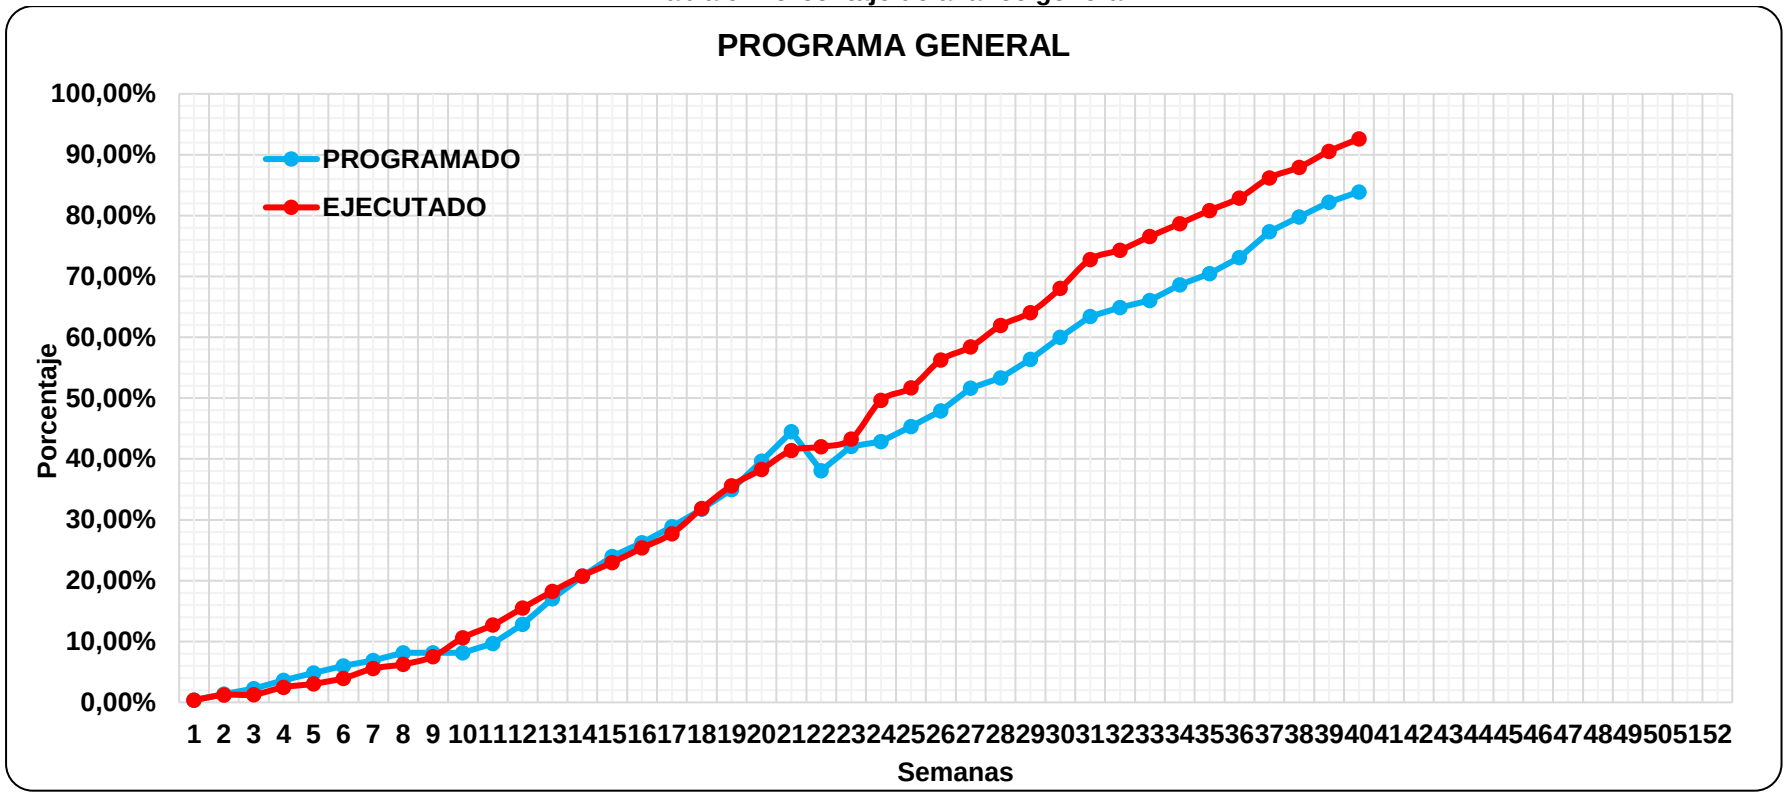

3.2.6. BALANCE PRESUPUESTAL

A continuación, se relaciona el resumen del balance presupuestal por sedes a fecha de corte del presente informe, dicho balance corresponde a los ajustes realizados por el contratista y avalados por esta interventoría de acuerdo a la definición de alcances establecida por la SED y al último balance remitido por el contratista el pasado 06 de septiembre de 2023, sin embargo es de aclarar que a la fecha se encuentra pendiente la actualización del balance de acuerdo a los alcances finales establecidos para las sedes Francisco Antonio Zea sede C y Ofelia Uribe sede B.

Tabla 10. Balance presupuestal.

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 363.223.880,19	-$ 260.734.682,07
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 804.891.865,76	$ 347.671.889,15
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.171.229.567,51	-$ 349.634.217,45
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 763.066.358,42	$ 403.653.644,73
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 777.055.526,91	-$ 24.293.012,31
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 184.605.620,74	$ 84.359.256,10
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 614.017.876,76	$ 261.547.548,62
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 351.630.774,27	$ 77.988.748,45
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 456.055.373,73	-$ 194.258.762,03
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 704.439.172,88	$ 270.491.408,00

12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 153.809.158,52	-$ 190.286.200,05
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 327.478.143,93	-$ 204.279.122,72
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 477.565.111,13	$ 210.289.122,73
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.925.809,73	-$ 86.175.167,12
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 374.852.027,09	-$ 178.890.294,06
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 268.089.312,39	-$ 242.909.551,41
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 335.459.416,92	-$ 18.849.617,66
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 190.736.713,24	-$ 242.294.009,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 459.689.589,81	-$ 92.685.769,33
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 444.538.322,65	-$ 132.136.545,99
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.812.263,51	$ 46.235.149,63
23	DEL USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DEL TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL, OBRAS PROGRAMADAS				$ 11.065.642.509,00	$ 10.637.786.799,49	$ -427.855.709,51
TOTAL, EMERGENCIAS				$ 1.008.154.304,00	$ 1.144.817.634,31	$ 136.663.330,31
TOTAL, CONTRATO DE OBRA				$ 12.073.796.813,00	$ 11.782.604.434,80	$ 291.192.379,20

En la siguiente tabla se evidencia el estado financiero del contrato de obra aclarando que a fecha de corte del presente informe no se ha realizado pago del acta No.9:

Tabla 11. Estado financiero contrato de obra.

ACTA	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ACTA	VALOR PAGADO	SALDO
1	1	$369.458.182	$585.579.145	$ 117.790.703	$ 117.790.703	$11.956.006.110
2	2	$386.361.498	$396.020.535	$ 387.009.813	$ 387.009.813	$11.568.996.297
3	3	$1.448.855.618	$1.078.190.056	$ 863.616.581	$ 863.616.581	$10.705.379.716
4	4	$1.144.595.937	$1.427.122.783	$ 1.026.228.017	$ 1.026.228.017	$9.679.151.669
5	5	$1.436.781.822	$1.137.351.660	$ 1.743.190.195	$ 1.743.190.195	$7.935.961.504
6	6	$2.141.891.553	$2.169.661.288	$1.518.098.179	$1.518.098.179	$6.417.863.325
7	7	$1.861.779.489	$865.691.231	$2.406.445.015	$2.406.445.015	$4.011.418.310
8	8	$1.107.119.554	$849.995.295	$1.852.453.371	$1.852.453.371	$2.158.964.939
9	9	$1.283.492.215	$1.620.303.593	$913.257.933		
	10					
	11					
	12					
TOTAL		$11.180.335.848	$10.129.915.526	$10.828.089.807	$9.914.831.873	$2.158.964.939

3.2.7. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se relaciona el estado de las obras ejecutadas durante el presente periodo en cada uno de los frentes de obra en ejecución con la supervisión de la interventoría.

Tabla 12. Actividades ejecutadas.



<table>
<tr><th colspan="3">COLEGIO RURAL EL UVAL</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Pintura interior y exterior.
- Limpieza de red sanitaria.
- Instalación de divisiones y mesones.
- Instalación de enchape sobre muros.
- Suministro de aparatos sanitarios.
- Aseo final aulas.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC SEDE C USME</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Pintura sobre muros.
- Instalación red eléctrica.
- Instalación de luminarias.
- Instalación de pisos.
- Remates de pintura.
- Resane de muro para instalación de enchape.
- Instalación de tableros.</td></tr>
</table>


		
COLEGIO RURAL EL CURUBITAL		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Desmonte de cubierta. - Desmonte de ventanas. - Instalación estructura metálica. - Resane de vanos. - Instalación de cubierta. - Instalación de red eléctrica. - Demolición de muros en baños. - Demolición de lavamanos corrido. - Instalación de ventanas. - Instalación de piso.
		

<table>
<tr><th colspan="3">IED FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

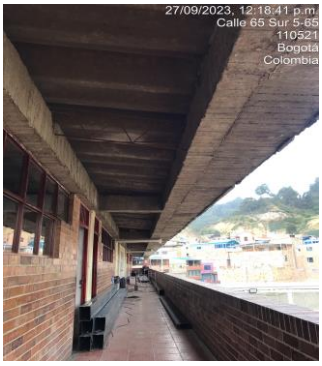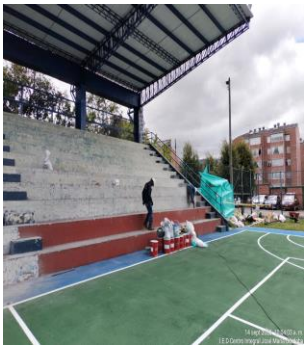- Desmonte de cubierta en pasillo.
- Instalación red eléctrica.
- Instalación de canales. instalación de bajantes.
- Instalación estructura cubierta pasillo.
- Instalación de cubierta pasillo.
- Aseo final.
- Entrega etapa II.
- Retiro de lámparas existentes.
- Desmonte de red eléctrica.
- Desmonte de cielo raso.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">IED JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE A</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Pintura de cancha.
- Retiro de pintura existente graderías.
- Fundida de cárcamo para aguas lluvias.
- Resane de fisuras en graderías.
- Retiro de pintura existente.
- Pintura de graderías.
- Instalación rejillas cárcamo.</td></tr>
</table>

		
DLE USME		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Excavación para instalación de red sanitaria. - Fundida de rampas. - Pañete muros. - Instalación red acueducto y alcantarillado. - Pintura bajo placa.
		
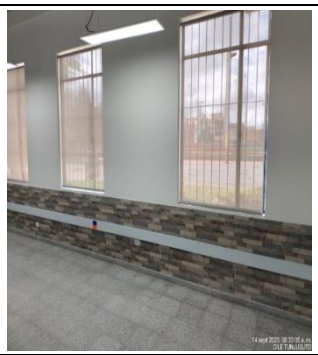
<table>
<tr><th colspan="3">DLE TUNJUELITO</th></tr>
<tr><th>Antes</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Actividades ejecutadas:

- Resane de muros.
- Enchape de muros.
- Instalación rejillas de cárcamo.
- Impermeabilización de fachada.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">COLEGIO OFELIA URIBE SEDE B</th></tr>
<tr><th>Durante</th><th>Durante</th><th>Actividades ejecutadas</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actividades ejecutadas:

- Adecuación de espacios para fundida de placa.
- Fundida de placa para equipo de bombeo.
- Suministro tanque de almacenamiento.
- Instalación de bajantes.
- Retoques de pintura.</td></tr>
</table>

		
IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A		
Durante	**Durante**	**Actividades ejecutadas**
		Actividades ejecutadas: - Desmonte de ventanas. - Construcción de muro aulas. - Instalación de ventanas. - Demolición de muro jardinera. - Construcción muro jardinera. - Fundida viga de amarre.
		

3.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD.

Está interventoría aprueba y remite a la entidad el plan de calidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0024-7178 del 16 de diciembre de 2022, bajo el radicado No. E-2022219699.

Durante el periodo del presente informe el contratista realizó actividades de verificación de tintas penetrantes en soldadura y pruebas de densidades del suelo, los resultados de estos ensayos se encuentran adjuntos al informe de calidad del contrato de obra y se adjunta registro fotográfico en el numeral 4.3 del presente informe.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La información general del proyecto es la siguiente:

Tabla 13. Información General del Proyecto de Interventoría.

INFORMACIÓN GENERAL INTERVENTORÍA	
TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO NO:	CO1.PCCNTR.4146302
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 952.549.780
PLAZO:	TRECE (13) MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	13/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/01/2024

El alcance contempla en general los siguientes aspectos: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al desarrollo del contrato de obra, el cual debe realizar la inspección apropiada de la construcción, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, ambientales, sociales y financieros, establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de interventoría. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

Dentro del contrato derivado del presente proceso de selección, se incluyen las obligaciones a cargo del contratista de supervisar, revisar, vigilar, controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento bajo las condiciones y términos del contrato de obra dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente, así como de informar periódicamente a la SED sobre el desarrollo del proyecto, para que esta última pueda tomar decisiones oportunas que correspondan en relación con el objeto principal contratado.

En desarrollo del contrato de Interventoría debe realizarse la revisión de los trabajos de obra, exigiendo calidad y verificando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, como también prestando colaboración y apoyo permanente a las partes involucradas para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y

ambientales establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración del informe preliminar de interventoría y la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación del contrato de interventoría. Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan debido a la liquidación del contrato de obra.

Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

4.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se observan a continuación:

Tabla 14.Documentos suscritos a la fecha.

DOCUMENTO	FECHA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22 NOVIEMBRE 2022
ORDEN DE INICIACIÓN	13 DICIEMBRE 2022

4.1.2. RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del presente informe las pólizas se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 15. Relación de Pólizas Contrato de Interventoría.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGUROS	ESTADO / REVISIÓN
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CSC-100027139	$190.509.956,00	13/12/2022	13/07/2024	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ACTUALIZADAS CONTRA EL ACTA DE INICIO
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.		$47.627.489,00	13/12/2022	12/01/2027		
CALIDAD DEL SERVICIO		$190.509.956,00	13/12/2022	12/01/2025		

4.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS.

Tabla 16. Estado financiero contrato de interventoría.

ACTA	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ACTA	VALOR PAGADO	SALDO
1	1	$8.868.238	$8.868.238	$8.868.238	$8.868.238	$943.681.542
2	2	$28.957.514	$28.957.514	$28.957.514	$28.957.514	$914.724.028
3	3	$64.701.943	$64.701.943	$64.701.943	$64.701.943	$850.022.085
4	4	$86.362.926	$86.362.926	$86.362.926	$86.362.926	$763.659.159
5	5	$135.357.324	$135.357.324	$135.357.324	$135.357.324	$628.301.835
6	6	$119.735.507	$119.735.507	$119.735.507	$119.735.507	$508.566.328
7	7	$189.938.428	$189.938.428	$189.938.428	$189.938.428	$318.627.902
8	8	$146.121.136	$146.121.136	$146.121.136	$146.121.136	$170.315.902
9	9	$72.012.763	$72.012.763	$72.012.763		
	10					
	11					
	12					
TOTAL		$854.246.641	$854.246.641	$854.246.641	$782.233.878	$170.315.902

4.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

4.2.1 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORIA.

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones el cual menciona en el 7.5.6.3.13.1. PERSONAL CLAVE PARA CADA GRUPO, *La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:*

Un (1) director de interventoría
Dos (2) residente de interventoría
Un (1) asesor estructural
Un (1) asesor ambiental y seguridad industrial
Un (1) asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
Un (1) asesor hidro sanitario-red contra incendios y gas
Un (1) asesor en costos, presupuestos y programación de obra
Un (1) asesor jurídico
Dos (2) inspectores de interventoría
Un (1) maestro de obra
Dos (2) técnico o tecnólogo SST
Un (1) mensajero

Mediante comunicado CINP-BTA-529-0001-6362 del 11 de noviembre se radica ante la secretaria de educación distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoria, radicado entregado por la entidad E-2022198341.

El 01 de diciembre de 2022, se recibe el oficio No. S-2022369741 en el cual la entidad menciona que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MERITOS SED-CM-A-DCCEE-050-2022 los siguientes profesionales cumplen.

Tabla 17. Personal Aprobado Por Interventoría.

PERSONALINTERVENTORIA	
CARGO	**NOMBRE Y APELLIDO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
RESIDENTES DE INTERVENTORIA	ANDRES FELIPE CANCHON MOLINA JUAN CAMILO CALDERON
ASESOR ESTRUCTURAL	JAIME ARTURO CURVELO GARCIA-MAYORCA
ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS	HERNANDO GOMEZ CASAS
ASESOR HIDRO SANITARIO – RED CONTRA INCENDIO Y GAS	JOJANNA CAROLINA LUQUE LÓPEZ
ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ
ASESOR AMBIENTAL	CARMEN MILENA SOTO POLOCHE
ASESOR JURÍDICO	CATALINA MOLANO LOZANO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	NELSON BENITO JESSICA GÚZMAN
MAESTRO DE OBRA	JOAN SEBASTIAN MUNOZ MOSQUERA
TECNICO O TECNOLOGO SST	DIANA PAEZ ANDREA PEREZ
MENSAJERO	DAMARIS MOSQUERA IBARGUEN

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del presente informe se han realizado las siguientes actividades:

- Realizar requerimientos al contratista para la subsanación de las diferentes observaciones que se verifican y realizan durante la ejecución de las actividades de interventoría.
- Acompañamiento a las visitas y reuniones con los colegios rurales y urbanos para informar el estado y/o programación que se tiene para cada una de las sedes.
- Atender toda consulta que haga el contratista, o darle el trámite ante la Entidad, haciendo seguimiento a la atención de estas.
- Revisión y verificación del personal de obra que va a ingresar a cada uno de los frentes.
- Acompañamiento a mesas de trabajo con el personal de la entidad y con el contratista.
- Acompañamiento a la realización de las actas de vecindad de las sedes que inician obras.
- Se realiza los informes semanales de interventoría del No. 38 al 41.

- Supervisión y acompañamiento de las actividades ejecutadas en las obras de las sedes de la primera etapa.
- Solicitar al contratista los documentos y soportes para el correcto desarrollo del proyecto.
- Revisión de fichas técnicas y visitas a las emergencias establecidas por la SED.

4.3 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD

4.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.

Está interventoría aprueba y remite a la entidad el plan de calidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0024-7178 del 16 de diciembre de 2022, bajo el radicado No. E-2022219699.

4.4 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- A la fecha del presente informe, se cuenta con un porcentaje de obra programado del 83.90% contra un ejecutado del 92.60%, esto evidencia un avance a favor del 8.70%, por lo cual a la fecha no se presentan irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses de la entidad frente a la ejecución y entrega de las obras.
- A la fecha del presente informe el contratista cuenta con 7 frentes en ejecución por lo que el contratista se encuentra cumpliendo lo establecido en los pliegos de condiciones, 16 frentes terminados en su totalidad y 1 pendientes de intervención.
- A la fecha de elaboración de este informe, se tiene 20 fichas técnicas para atender emergencias, de las cuales actualmente se tienen 2 en ejecución y 18 finalizadas, se debe tener en cuenta el presupuesto estipulado para las emergencias ya que, por la cantidad de fichas técnicas, se evidencia que no es posible ejecutar la totalidad de emergencias dadas por la SED por lo que se requiere la verificación de las prioridades de ejecución.
- Dado el adecuado desempeño presentado por el contratista de obra en cuanto a calidad y cumplimiento en los tiempos de ejecución de las actividades contratadas esta Interventoría recomienda a la Entidad adelantar los tramites correspondientes a una posible adición del contrato de obra toda vez que los resultados obtenidos con el actual contratista han sido óptimos.

ANEXOS TECNICOS

ANEXO No. 01

PROGRAMA DE EJECUCION

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Agosto 15 de 2023
CINP-BTA-529-0597-5508

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Correo electrónico; Reprogramaciones Frentes – Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077396.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir las programaciones de obra correspondientes a los siguientes frentes:

- Nuevo San Andrés de los Altos.
- Provincia de Quebec.
- Fabio Lozano Simonelli.
- Programación general del contrato de obra.

Aclaramos que esta información se encuentra debidamente verificada y avalada por esta Interventoría.

Cordialmente;


CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en siete (07) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Sin Anexos).

Id	Modo de tarea	Notas comité 26-5-23	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**312 días**	**mié 28/12/22**	**mié 27/12/23**
2			ACTA DE INICIO	1 día	mié 28/12/22	jue 29/12/22
3			**USME**	**302 días**	**lun 9/01/23**	**mié 27/12/23**
4			USME USMINIA- C CANTONIO JOSE DE SUCRE	119 días	mié 18/01/23	mar 6/06/23
5			USME BRASILIA- A BRASILIA	166 días	mié 18/01/23	lun 31/07/23
6			USME RURAL CURUBITAL A RURAL CURUBITAL	143 días	lun 10/07/23	sáb 23/12/23
7			USME RURAL EL DESTINO A RURAL EL DESTINO	60 días	mié 26/04/23	mié 5/07/23
8		Realizar solicitud y ajuste en la programa	USME EL UVAL A EL UVAL	226 días	lun 9/01/23	vie 29/09/23
9		Realizar solicitud y ajuste en la programacion detallada	USME FABIO LOZANO SIMONELI A FABIO LOZANO SIMONELI	142 días	mar 9/05/23	sáb 21/10/23
10			USME RURAL LOS ANDES A RURAL LOS ANDES	104 días	mié 15/03/23	vie 14/07/23
11			USME FRANCISCO ANTONIO ZE- C MARIA AUXILIADORA	77 días	jue 28/09/23	mié 27/12/23
12			USME RURAL LA ARGENTINA A RURAL LA ARGENTINA	93 días	vie 14/07/23	mar 31/10/23
13			USME LA UNION A LA UNION	71 días	lun 2/10/23	sáb 23/12/23
14			USME RURAL LAS MERCEDES A RURAL LAS MERCEDES	78 días	sáb 1/07/23	sáb 30/09/23
15			USME RURAL LOS ARRAYANES A RURAL LOS ARRAYANES	70 días	lun 24/04/23	vie 14/07/23
16		Ya se aprobo se debe realizar ajuste a la programacion detallada	USME NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS A NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	183 días	mié 18/01/23	sáb 19/08/23
17		Realizar solicitud y ajuste en la programacion detallada	USME PROVINCIA DE QUEBEC A PROVINCIA DE QUEBEC	210 días	mié 18/01/23	mié 20/09/23
18			USME OSWALDO GUAYAS A MINBVIRREY	66 días	lun 15/05/23	lun 31/07/23
19			USME LOS TEJARES -B EL CURUBO	59 días	mié 18/01/23	mar 28/03/23
20			USME FEDERICO GARCIA LORCA- C CBETANIA	93 días	mié 14/06/23	sáb 30/09/23
21			USME ESTANISLAO ZULETA- B LA ALBORADA	136 días	mié 18/01/23	lun 26/06/23
22			USME D L E USME D L E USME	118 días	sáb 1/07/23	jue 16/11/23
23			**TUNJUELITO**	**254 días**	**lun 13/02/23**	**mié 6/12/23**
24			TUNJUELITO JOSE MARIA CORDOBA- A JOSE MARIA CORDOBA	100 días	vie 16/06/23	mié 11/10/23
25			TUNJUELITO VENECIA- B NUEVO MUZU	109 días	lun 5/06/23	mar 10/10/23
26			TUNJUELITO BERNARDO JARAMILLO-A BERNARDO JARAMILLO	53 días	mar 4/07/23	lun 4/09/23
27			TUNJUELITO INEM SANTIAGO PEREZ- A INEM SANTIAGO PEREZ	111 días	lun 13/02/23	jue 22/06/23
28			TUNJUELITO D L E TUNJUELITO D L E TUNJUELITO	116 días	lun 24/07/23	mié 6/12/23

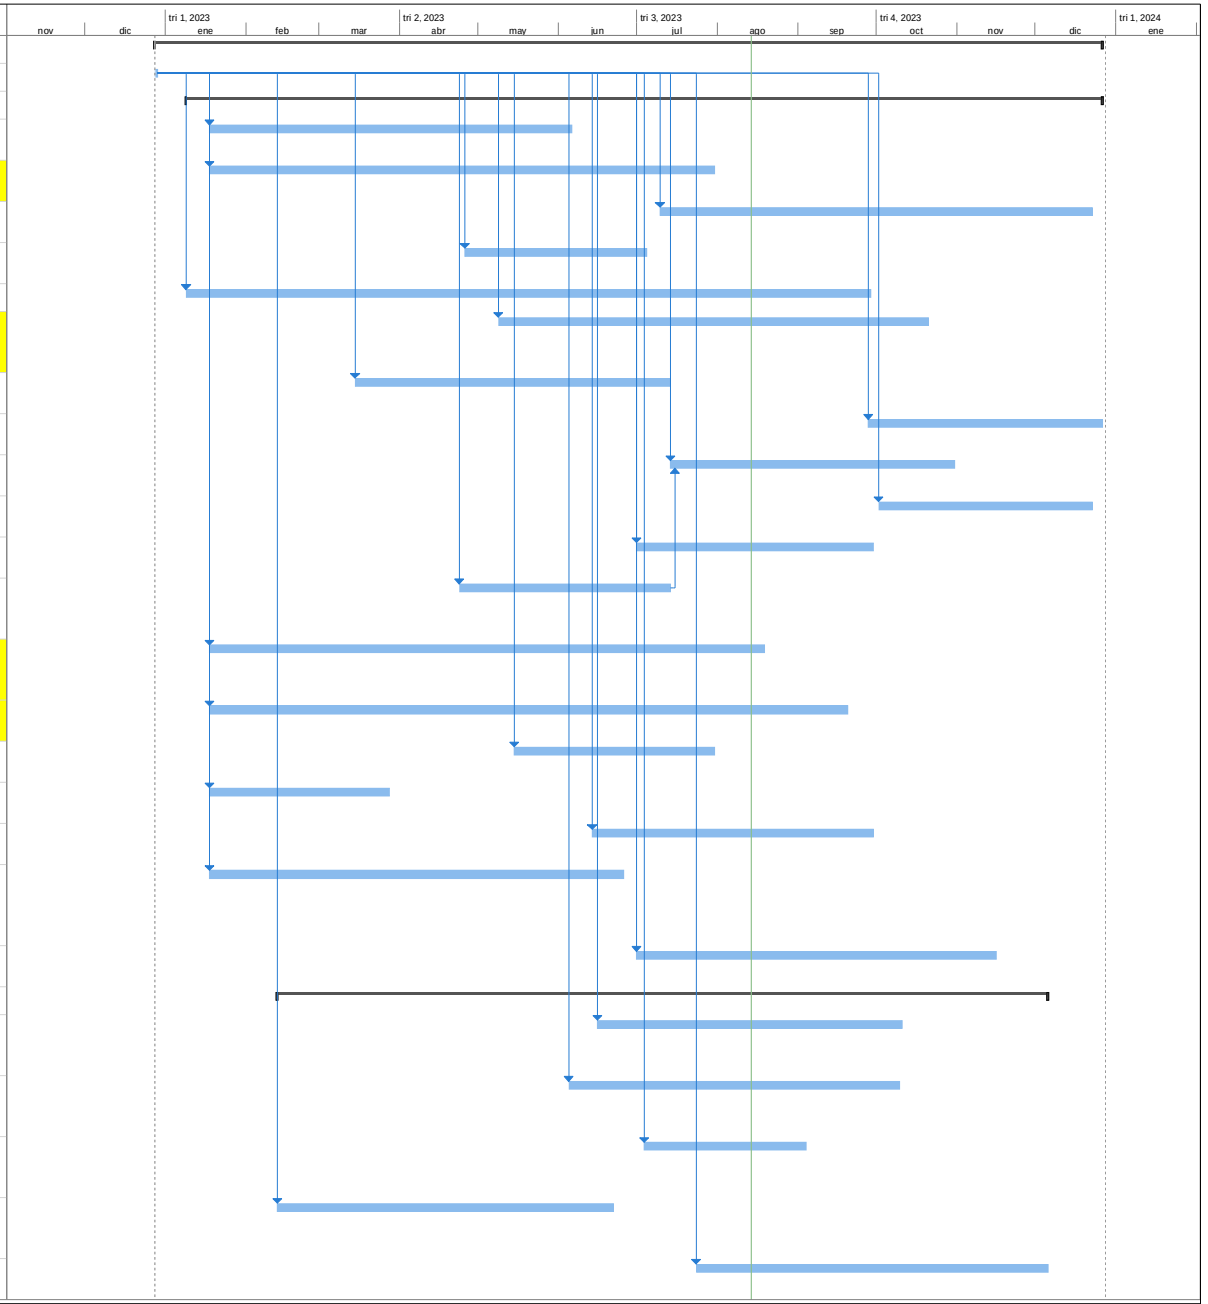


Proyecto: RESUMEN GENERAL
Fecha: lun 14/08/23

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mo de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1				**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**111 días**	**mar 9/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
2				**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mar 9/05/23	lun 15/05/23	$ 0.00
3				**USME**	**106 días**	**mar 16/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
4			**CPF 523**	**FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**	**106 días**	**mar 16/05/23**	**vie 20/10/23**	**$ 468.537.550.24**
5			1.1.1	REPLANTEO	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1.605.120.00
6			1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 1.413.160.00
7			1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	6 días	mar 23/05/23	mar 30/05/23	$ 576.178.20
8			1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	15 días	mié 31/05/23	jue 22/06/23	$ 14.554.927.20
9			1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	vie 23/06/23	mar 27/06/23	$ 181.008.00
10			1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	3 días	mar 27/06/23	jue 29/06/23	$ 1.709.000.00
11			1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC	9 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 4.021.250.00
12			2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	39 días	vie 23/06/23	mar 22/08/23	$ 181.565.660.00
13			5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	4 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	$ 1.971.045.00
14			5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	6 días	vie 1/09/23	vie 8/09/23	$ 8.062.992.00
15			5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	3 días	vie 14/07/23	mar 18/07/23	$ 1.512.226.00
16			5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	11 días	mié 19/07/23	jue 3/08/23	$ 6.748.800.00

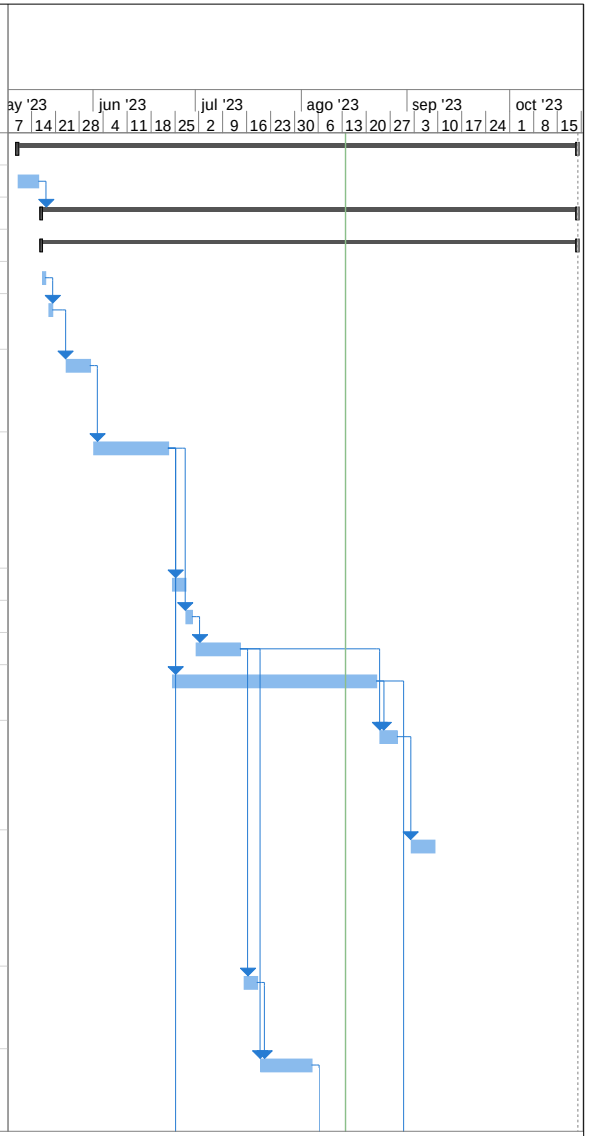


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mo de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
17			5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	10 días	vie 4/08/23	vie 18/08/23	$ 6.062.720.00
18			5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 3.046.240.00
19			5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 3.650.880.00
20			5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	3 días	mar 12/09/23	jue 14/09/23	$ 8.421.120.00
21			5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	9 días	mar 22/08/23	vie 1/09/23	$ 16.701.237.00
22			5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	9 días	lun 4/09/23	jue 14/09/23	$ 12.201.777.00
23			5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	9 días	lun 4/09/23	jue 14/09/23	$ 3.474.702.00
24			17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	6 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	$ 6.829.380.00
25			17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	26 días	mié 30/08/23	mié 4/10/23	$ 146.827.591.04
26			17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	2 días	jue 5/10/23	vie 6/10/23	$ 6.606.578.40
27			20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	10 días	vie 6/10/23	vie 20/10/23	$ 2.704.358.40
28			20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	21 días	vie 23/06/23	mar 25/07/23	$ 28.089.600.00
29				**ENTREGA DE OBRA**	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 0.00

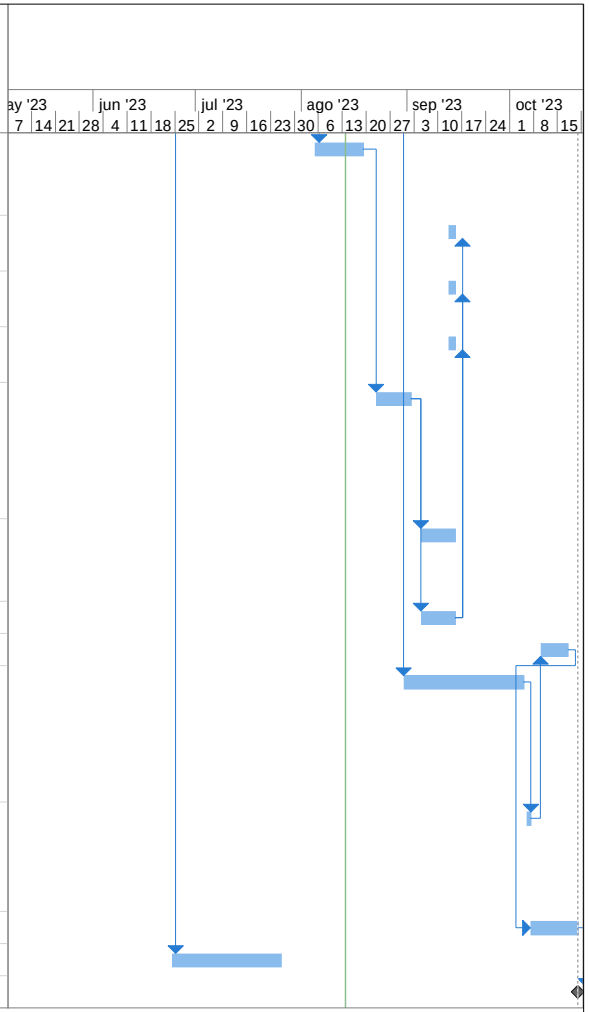


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**143 días**	**mié 18/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mié 18/01/23	mar 24/01/23	$ 0.00
3			**USME**	**138 días**	**mié 25/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
4		**CPF 543**	**NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**	**138 días**	**mié 25/01/23**	**vie 18/08/23**	**$ 720.094.988.70**
5		1.1.1	REPLANTEO	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23	$ 3.079.360.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	3 días	lun 30/01/23	mié 1/02/23	$ 8.266.986.00
7		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	18 días	jue 2/02/23	lun 27/02/23	$ 26.545.622.11
8		1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	3 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 471.625.00
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	vie 3/03/23	mar 7/03/23	$ 50.280.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	12 días	mié 8/03/23	vie 24/03/23	$ 273.440.00
11		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	42 días	lun 27/03/23	lun 29/05/23	$ 226.815.920.00
12		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	$ 3.923.443.00
13		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	8 días	vie 14/07/23	mié 26/07/23	$ 3.769.552.00
14		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	8 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	$ 19.709.536.00
15		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	14 días	mar 30/05/23	mar 20/06/23	$ 10.966.800.00
16		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	9 días	mié 21/06/23	mar 4/07/23	$ 12.314.900.00
17		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 4.188.580.00
18		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 5.019.960.00
19		5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 11.579.040.00

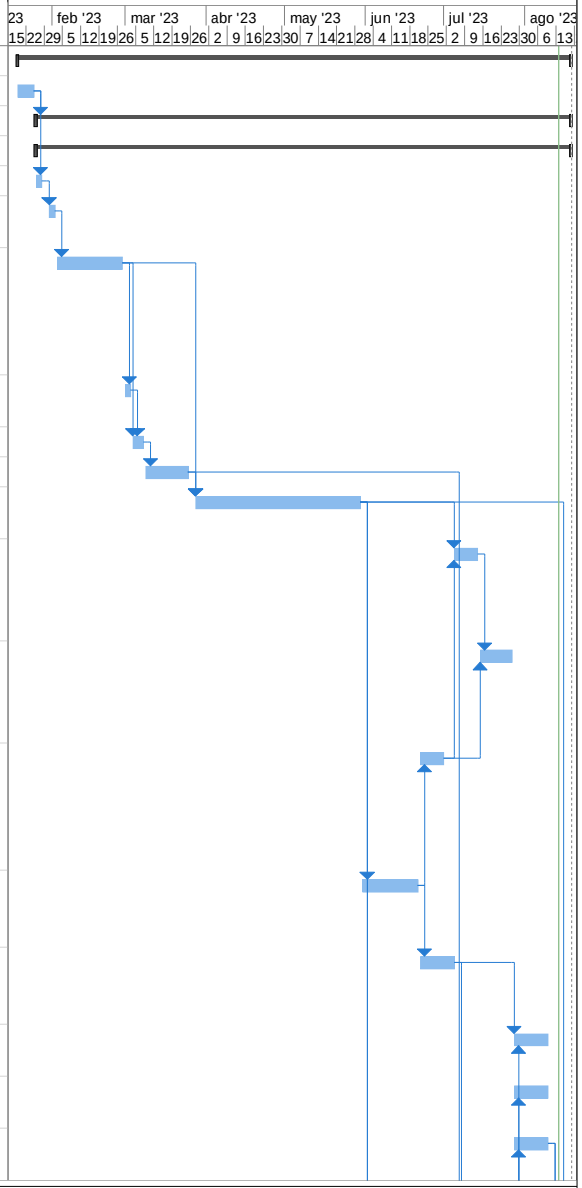


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id		Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
20			5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	15 días	mié 5/07/23	mié 26/07/23	$ 23.328.712.00
21			5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23	$ 17.043.752.00
22			5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	3 días	jue 10/08/23	lun 14/08/23	$ 4.853.552.00
23			7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	2 días	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 69.505.00
24			13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	lun 24/07/23	vie 4/08/23	$ 18.825.504.96
25			13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	13 días	vie 21/07/23	mié 9/08/23	$ 7.968.000.00
26			13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	6 días	mar 30/05/23	mar 6/06/23	$ 26.096.400.00
27			17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM	3 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 5.667.360.00
28			17.1.7	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	2 días	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 10.404.00
29			17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	28 días	mar 6/06/23	mar 18/07/23	$ 216.515.517.13
30			17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	3 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 5.505.534.00
31			17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	5 días	mar 30/05/23	lun 5/06/23	$ 11.452.320.00
32			20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	7 días	jue 10/08/23	vie 18/08/23	$ 7.468.983.50
33			20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	21 días	jue 6/07/23	vie 4/08/23	$ 38.314.400.00
34			0	ENTREGA DE OBRA	0 días	vie 18/08/23	vie 18/08/23	$ 0.00




Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**COLEGIOS SED GRUPO 4**	**165 días**	**mié 18/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
2			**ACTAS DE VECINDAD**	5 días	mié 18/01/23	mar 24/01/23	$ 0.00
3			**USME**	**160 días**	**mié 25/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
4		**CPF 554**	**PROVINCIA DE QUEBEC SEDE A**	**160 días**	**mié 25/01/23**	**mié 20/09/23**	**$ 738.579.129.52**
5		1.1.1	REPLANTEO	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23	$ 2.677.568.00
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	5 días	lun 30/01/23	vie 3/02/23	$ 3.886.190.00
7		1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	7 días	lun 6/02/23	mar 14/02/23	$ 787.475.80
8		1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	20 días	mié 15/02/23	mar 14/03/23	$ 24.282.586.28
9		1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS	3 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	$ 522.912.00
10		1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	5 días	mar 21/03/23	lun 27/03/23	$ 3.486.360.00
11		2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	52 días	mar 28/03/23	mié 14/06/23	$ 296.997.863.36
12		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 5.368.922.00
13		5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	6 días	jue 29/06/23	vie 7/07/23	$ 14.782.152.00
14		5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	3 días	jue 15/06/23	mar 20/06/23	$ 2.530.800.00
15		5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	3 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23	$ 1.894.600.00
16		5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23	$ 1.142.340.00
17		5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	3 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23	$ 912.720.00

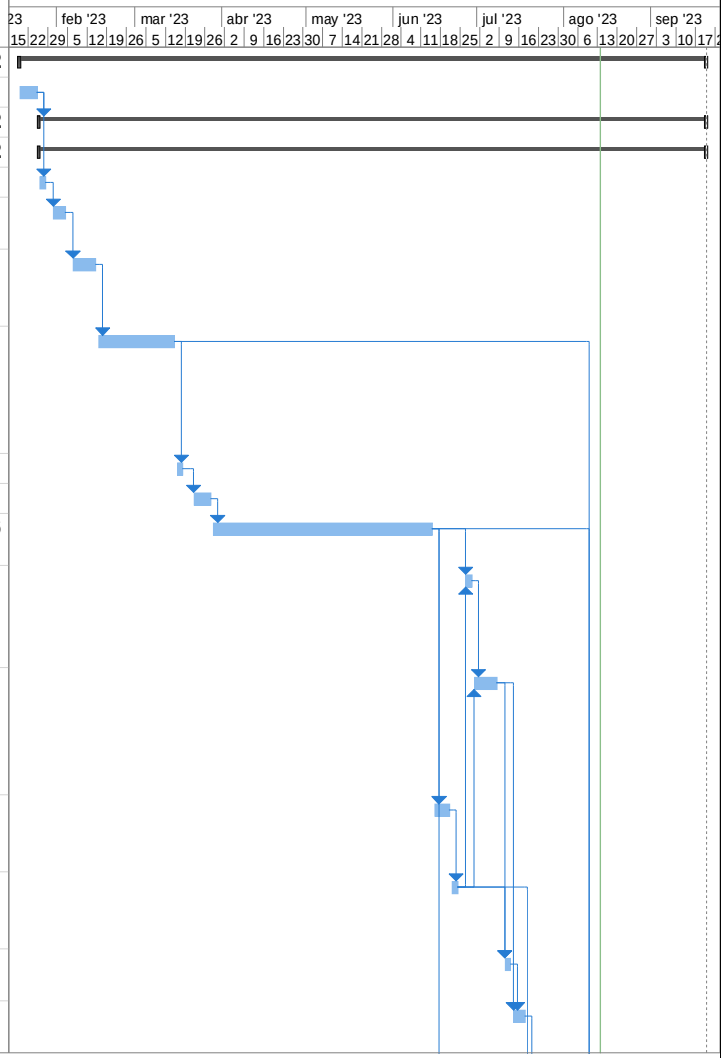


Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Id	Mode de tar	COD	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
18		5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	6 días	mar 18/07/23	mié 26/07/23	$ 28.895.791.00
19		5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	9 días	jue 27/07/23	mié 9/08/23	$ 21.111.011.00
20		5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA	8 días	jue 10/08/23	mar 22/08/23	$ 354.530.00
21		5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	8 días	jue 10/08/23	mar 22/08/23	$ 6.011.786.00
22		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	11 días	mié 9/08/23	jue 24/08/23	$ 35.042.701.40
23		9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	6 días	vie 25/08/23	vie 1/09/23	$ 3.068.867.00
24		13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	9 días	lun 28/08/23	jue 7/09/23	$ 17.210.700.00
25		13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	6 días	jue 31/08/23	jue 7/09/23	$ 5.851.500.00
26		17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	5 días	mié 25/01/23	mar 31/01/23	$ 2.529.400.00
27		17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	28 días	jue 15/06/23	jue 27/07/23	$ 208.077.006.98
28		20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	9 días	vie 8/09/23	mié 20/09/23	$ 6.408.306.70
29		20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	13 días	mié 9/08/23	lun 28/08/23	$ 44.745.040.00
30			ENTREGA DE OBRA	0 días	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 0.00

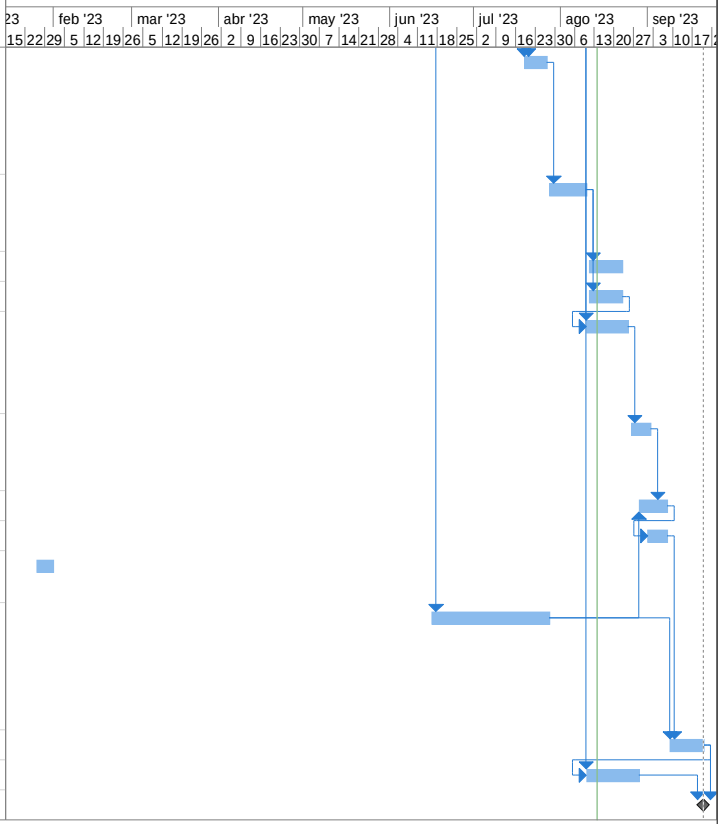

Project: PROGRAMACION SED-
Date: lun 14/08/23

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ANEXO No.02

BITÁCORAS DE OBRA

DILE TUNJUELITO

BITACORA DE OBRA	
CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTA	**REFERENCIA**: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**DILE DE TUNJUELITO**
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA
INTERVENTORIA	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
INTEGRANTES DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**: JULIO CESAR RODRIGUEZ
	RESIDENTE DE OBRA: MILENA GOMEZ SANCHEZ
	INSPECTOR DE OBRA: SERGIO UBAQUE - VIVIANA GOMEZ
INTEGRANTES DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE OBRA:**
	RESIDENTE DE OBRA:
	INSPECTOR DE OBRA:
SUPERVICIOR SED	ARQ. SANTIAGO ANGEL
RECTOR DEL COLEGIO	

Powered by CamScanner

26-07-2023 Se Inician Actividades de obra en la dirección local de tunjuelito, se Inicia Con Cerramiento Provicional de Parqueadero Para zreglo de Cerramiento Perimetral.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Ing Fabian C.

Clima = lluvioso.

27-07-2023 se Continuan trabajos de limpieza de Cerramiento zona Exterior llega material "Pintura y thinner" Para Cerramiento

Joan Muñoz
Insp. Interventoría

Ing Fabian C.

Clima = lluvioso

28-07-2023 se Inicia Pintura Primera mano de Cerramiento se Identifica Pontos criticos Para mantenimiento se Progama trabajos de soldadura

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

Clima = lluvioso.

29-07-2023

se realiza Pintura de Puerta de acceso Vehicular, limpieza, mantenimiento,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Powered by CamScanner

31-07-2023 se realiza resane de muro Posterior que se encontraba fisurado se utiliza mortero de reparación Corona. Clima= soleado

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

01-08-2023= se Continuan trabajos de Pintura en el Cerramiento, Se realiza limpieza de Canales Cubierta,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

02-08-2023 se realiza remate de Pintura Cerramie se Programa recorrido y retiro de tanque almacenamiento el dia de mañana 03.08-

Fabian C.

Clima= soleado
Joan Muñoz
Insp. Interventoria

03-08-2023 se Continua Con trabajos de cerramiento se realiza Conexión Provicional de agua Potable Para Poder Retirar los tanques de almacenamiento, se realiza recorrido Con Arq Santiz

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

Powered by CamScanner

04-08-2023
Clima: Soleado
Personal: 2 Trabajadores, 1 insp. tecnico contratista
1 insp. tecnico interventoria
Actividades: llega material, se realiza cerramiento

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

05-08-2023
Clima: Soleado
Se realiza limpieza de rejas y se pintan,
-se finaliza retiro de tanque de agua

Joan Muñoz
insp. Interventoria

08-08-2023
Clima: Nublado
- Se realiza resane de muros
- Se finaliza con pintura y limpieza de rejas

Joan Muñoz
insp. interventoria

Norma

Powered by CamScanner

09-08-2023
Clima: Soleado
-Se finaliza resane de muros
-Se pintan muros con los mismos colores existentes

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

10 de agosto Jueves /2023.
Se deja en bitacora que no se evidencian permisos de trabajo.
se evidencia personal sin Casco
se solicita Orden y aseo y demarcacion de acopios

Andrea Perez SST-ma.

11- de agosto - 2023
se Realiza desmonte de tanques existentes en la zona superior de los Baños se dejan acopiados en el Patio.
Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 14 de Agosto 2023.

se Verifica funcionalidad de la Conexion Provicional de agua Potable, funciona Bien no se Presenta fugas ni goteras. se Inicia Corte y Retiro de regillas Carcamo,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 15 de Agosto 2023.

se realiza lavado de Cerramiento Con hidrolavadora Industrial Para retiro de material contra Perfil se Programa Pintura de Cerramiento, se Continua demolicion y Corte de rejillas del Carcamo.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Miercoles 16 de Agosto 2023.

se Programa Cambio de diviciones en Acero Para baños funcionarios, Se realiza desmonte e intalación de Diviciones en el baño hombre

se Continua trabajos en la zona del Parqueadero Patio en la rejilla.

Joan Muñoz
insp. Interventoria

Fabian C.

Jueves 17 de Agosto.

se realiza fundida de Placa Para soPorte de tanques de almacenamiento en la zona de los baños, se Continua Con el Cambio de divisio Baño de Mujeres.

Joan Muñoz
insp. InterVentoria

Fabian C.

Viernes 18 de Agosto.

se Continua Con la demolición y resane de Caicamo zona Exterior Parqueadero, se realiza remates y Emboquillada de divisiones Baños.

Joan Muñoz
insp. Interventor

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 19- de Agosto. 2023.

se Continua trabajos de demolicion y resane de Carcamo. En zona exterior Parqueadero.

Fabian C.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 22- de Agosto 2023.

Se Inicia Picada de muro en Auditorio Para enchape de muros, se evidancia que Personal del dile realiza retiro de Canaleta de Voz y datos y Red Regulada en zona del Auditorio.

Joan Muñoz
Insp. Intesventoria

Miercoles 23- de Agosto 2023

se Continua Con resane de muro auditorio y realiza demolicion de Carcamo y de grieta exterio muro Contra jardin Comunitario,

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Jueves 24 - de Agosto

se realiza Pintura de muro zona exterior Contra jardinera Comunitaria en Color similar al existente.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Viernes. 25 de Agosto

se Inicia armada de tantes e Instalacion de red hidraulica. en los baños.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

Sabado 26 - de Agosto.

Retiro de Pintura suelta en Baños hombres se Verifica e Instala el tanque de Agua Bfable.

Fabian C.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 28- Agosto- 2023.

Personal en obra: 01 oficial.
Clima = Soleado.
se realiza Picado de junta en la zona exterior del muro Para recibir obra Contra el Parque.

Juan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 29- Agosto 2023

Personal en obra = 01 Oficial.
Clima = soleado.
se Continuan trabajos de tratamiento de fisura en la Parte exterior Contra el Parque se utiliza mortero de reparación Para fisuras.

Juan Muñoz
Insp. Interventoria

Miercoles 30 de Agosto. 2023.
se realiza Visita Con Personal de la Secretaria del dile Interventoria y obra Para recibir

Intervencion sobre Canaleta retirada Por Parte de otic. en el Area de SALA de reuniones o Auditorio, en la Cual se determina Instalar nuevamente la Canaleta metalica y Posterior Intalacion de enchape.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Fabian C.

Jueves 31-08-2023

Personal en obra = 02 Personas
Clima = soleado.

se Continuan trabajos de resane fisuras en la Parte exterior muro al Parque, se Inicia trabajos de resane y Pintura en bs baños de Hombres y mujeres, Pintura Cobra blanco.

Joan Muñoz
Insp. Interventorra

Viernes 01-09-2023.

se realiza resane de Pintura en Placa Baño mujeres Con estuco Plastico se Pintan muros y Techo en Vinilo.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado 02-09-2023
se realiza Recorrido de inicio Auditorio Para enchape en Embocadilla Canaleta Instalada Por Personal de otic.

Fabian C. Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Lunes 04-09-2023.
se Programa Instalacion de Enchape auditorio el dia Martes 05-09-2023, Personal del dile tiene reunión en este espacio el dia de hoy. lunes 04-09.

Fabian C. Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 05-09-2023
se realiza Instalación de enchape en oficina Auditorio se realiza Corte de Pieza Parte Inferior de la Canaleta sin Afectar la instalación Por otic.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 06-09-2023
se finaliza la Instalación de enchape En zona Auditorio muro lateral Contra Parqoe, se Programa Pintura en Color blanco de acuerdo a lo Conversado Inicialmente Con Interventoría y Secretaría.

Fabian C. - Joan Muñoz
Insp. Interventoría

Jueves 07-09-2023.
se realiza Pintura de muro Posterior y lateral del Auditorio El Cual fue enchapado, de Acuerdo al Programado se solicita desocupar la oficina de Coordinación Para Continuar las actividades.

Fabian C. - Joan Muñoz
Insp. Interventoría

Viernes 08-09-2023.
la direccion local Programa el retiro de mesas Computadores y muebles ubicados en la oficina de Coordinación en horas de la tarde, se Programa Inicio.

Norma

Powered by CamScanner

de actividades el dia sabado 09-09-2023 Con Retiro de Pintura y Picado de muro Posterior Parte Inferior.

Fabian Cubillos.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Sabado 09-09-2023

se Inician trabajos de Picada de muro en zona Posterior oficina de Coordinacion, se Evidencia Pañete en mal estado y Con bastante humedad se Procede a realizar el retiro y Aplicar mortero Impermeabilizado.

Fabian C.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Lunes 10-09-2023.
se Continuan trabajos en muro oficina de Coordinacion, se Inicia enchape del

Fabian C.

Joan Muñoz
Insp. Interventoria

Martes 11-09-2023
se finaliza enchape de muro se entrega pila enchape, se realiza orden y Aseo de la zona Intervenida. Se Programa Pintura de este Muro.
Joan Muñoz
Insp. Interventoria Fabian C.

Miercoles 12-09-2023.
se realiza Pintura de Muro en oficina Cordinación de Color blanco se realiza Jornada de orden y Aseo se Programa entrega de espacio Para el dia Jueves 13-09-2023 en Conjunto Con Interventoria Contratista y Personal del dile.
Joan Muñoz
Insp. Interventoria Fabian C.

Jueves 13-04-2023.

Se realiza recorrido con Interventoría y Contratista para la respectiva entrega de Obras, se atienden observaciones y se procede con la entrega al señor William Almanzista de la dirección local,

Se realiza la entrega del Baño Hombres con sus divisiones y Pintura de muros, Baño Mujeres Con las divisiones en Acero y Pintura de muros, Obras Coordinación y Auditorio enchapé Parte Interior y Pintura de muros, Tanques de Almacenamiento 02 Tanques de 500 Litros con sus respectivas Conexiones y en Buen funcionamiento Zonas exteriores, Canecos y rejillas resane de muro Contra Vivero y Pintura del mismo, Pintura de Cerramiento Adicional la Puerta de acceso Vehiculas debidamente Pintado.

Ivan Muñoz
Insp. Interventoria

Ing Fabian Ubillus.

DILE USME

Jueves 31 de Agosto 2023

Clima = soleado

Personal en obra = 02 Ayudantes.

se realiza retiro de escombro Para dejar zona limPia. No se Ejecuta mas actividades.

Viernes 01 de septiembre.

Clima = soleado

Personal en obra = 02 Personas.

Se Realiza remate de Pintura en el baño Damas 2° Piso N se Continua Con Trabajos en el Baño 1° Piso.

Fabian C.

Lunes 04 de septiembre.

No se ejecutan actividades de obra en el dia.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 05 de septiembre.
No se ejecutan Actividades de obra

Miercoles 06 de septiembre.

se realiza recorrido Con Hidraulica Para Verificar funcionamiento de Conexión medidor arreglado por el acueducto.

Fabrun C.

Jueves 07 de septiembre
No se realizan Actividades en obra.

Viernes 08 de septiembre.
Se realiza retiro de materiales sobrantes del acopio Que no se utilizan en la obra del dile
Se realiza orden y aseo.

Fabrun C.

Norma

Powered by CamScanner

lunes 11 de septiembre.

llega material redes, Para instación de Araña Baño discapisitados ubicado en el Primer Piso.

Fabian C.

Martes 12 de septiembre

No se realiza Actividades en obra se Programa Instalaciones hidraulicas, el dia miercoles

Fabian C.

Miercoles 13 de septiembre.

Se Inicia Excavación y demolición de Viga Para Cruze de redes sanitarias, se evidencia reguero de agua en la Parte exterior del dile la cual no es Por temas de la obra,

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 14 de septiembre.

Se realiza arreglo de mamposteria en medidor de agua afectado por el acueducto.

Fabian C.

Viernes 15 de septiembre.
se continua con remate de mamposteria en zona exterior medidor de agua.

Fabian C.

Lunes 18 de septiembre.
No se realizan actividades de obra a espera de accesorios hidraulicos para la Instalación de redes.

Martes 19 de septiembre.
llega material a obra para Intalación de redes hidraulicas, se realiza replanteo para

Norma

Powered by CamScanner

Redes, se Inicia demolición de Placa en Concreto regatas.

Fabian C.

Miercoles 20 de septiembre

Personal en obra = 02 oficiales.
Clima = soleado.

se Inicia retiro de Pegator del Enchape antiguo Para inicio de Pañete y remates. de muros.

Fabian C. =

Inspector Interventoría

Jueves 21 de septiembre.

se realiza Pañete de muros, Con mortero se Continua demolicion de Placa de 0,20 m de espesor Para Cruce de redes.

Fabian C.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 22 de septiembre.

Se Inicia Instalación de red sanitaria de desague. usando la Conexión existente a la Caja sanitaria Existente.

Personal en obra = 02 Oficiales
- 02 Plomeros
Clima = soleado =

Sabado 23 de septiembre.

Inspector Interventoría

Se realiza Corte Con Polidora en regatas de muros se realiza retiro y Suspensión de Tuberia Potable existente, se Continua Con Instalación de Redes Potables.

Personal en obra = 02 Personas
Clima = soleado

Norma

Powered by CamScanner

lunes 25 de septiembe 2023.

se finaliza Instalación de redes hidraulicas "Potable y sanitaria"; se Inicia Con lleno en recebo Para Protección y. tape de tuberias.

Fabian C.

Inspector Interventoría

Martes 26 de septiembre 2023.

se Realiza fundida de Placa en concreto Para reposición de Piso, se Intala malla electrosoldada de 6mm 15×15, se funde Placa de Piso,

Personal en obra = 02 Oficiales.

Clima = soleado.

Fabian C.

Inspector Interventoría

Miercoles 27 de septiembre.

se realiza retiro de cableado Para interrup en el baño 1° Piso "Baño accesible" — —

Norma

Powered by CamScanner

se Sospenden Cajas de Paso que no estan en servicio.

Fabian C. -

Jueves 28 de septiembre.

se Pasan niveles de acabado de Piso Para fundida de sobrePiso dejando Pendiente al sifon de Instalado, se realiza remate de filos Ventanas, se solicita a la Direccion local el retiro de Gabinete o Cartelera ubicada en la escalera Inicial Costado Izquierdo Para Intalación y toma de medidas Baranda o Pasamanos metalico, es necesario realizar el retiro antes de la Instalación.

Fabian C. -

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

DILE SIMONELLI

en uniones de conales:
- Se inicia armado de estructura metálica perfiles metalicos doble c 200x60 mm.

Aidan vanegas
Jefe obra.

Inspector Interventoría

01/08/2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, estructura metálica. (4) inspector SST
Clima: mañana soleada, tarde soleada
Actividades: se realiza cerramiento en. pasillo 1° segundo y tercer piso bloque B. en formaleta., se cubren 8 cuadros lucernas. (que forman) que quedan debajo de la zona de cubierta a retirar. con el fin de que no sufran ningun daño sin embargo se realiza a almacenista y retiro de obrero que si los cuadros llegaran a sufrir alguna clase de daño, no sera cargo del contratista, pues se solicito a este que retirar o cubriera los cuadros.
- Se saca, retiro de estructura metálica soldada que une bloque A con bloque B.
- Se continua armado de estructura metálica

Aidan vanegas
Jefe obra

Inspector Interventoría

Powered by CamScanner

02/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST. estructura metálica (3)
clima: Soleado mañana
actividades: Se continua con desmonte de estructura metálica pasillo. armado y fundida de perfiles metalicos, doble c 160x60 mm

Aldair vanegas
resp obra.

Inspector Interventoría

04/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría. inspector SST., estructura metálica (2)
clima: mañana nublada
actividades: inicio actividad hincado estructura metálica perfiles longitudinales doble c 160x60. previo anclaje de platina 30 x 30 con con 4 chatos cada uno de 1". en loza Bloque 3 tercer piso.

Aldair vanegas
Resp obra.

Inspector Interventoría

04.09.23 REPORTE DE VERIFICACIÓN SST INTERVENTORIA
SE DEJA REGISTRO DE ORDEN Y ASEO. SEPARACIÓN DE RESIDUOS. MODIFICACIÓN DE CERRAMIENTO POR EL PASO DE

Norma

Powered by CamScanner

ESTUDIANTES SENA DEL AREA EN TRABAJO DE SOLDADURA Y ESTA DETERIORADO LEZ AGRADEZCO. CIERRE EN BITACORA. DIANA PAEZ.


05-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, estructura metálica (2)
Clima: mañana 8:00 - 10:00. tarde nublada
actividades: Se continua armado de estructura metálica para cubierta. soldado de estructura, se realiza orden y aseo en áreas y acopio de materiales, se realiza señalización
Aldair vanegas
Inspector obra

Inspector Interventoría

06-08-2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, inspector SST, estructura metálica (2)
clima: mañana soleada, tarde soleada
actividades: Se realiza corte en pintura de muro soldadores por interventoria
- Se realiza pintura de estructura metálica

- Se realiza actividad instalación de bajantes canal bloque A tercer piso.


Aldan Vanegas
Inspector obra



Inspector Interventoría

07-08-2023 Personal en obra: inspector técnico interventoria, inspector técnico obra. instalacion bajantes (2) inspector SST
Clima: mañana Soleada, tarde soleada
actividades: se termina actividad instalación de bajantes bloque A tercer piso y bloque . segundo piso
-Se realiza orden y aseo

Aldan Vanegas.
Insp obra.



Inspector Interventoría

08-08-2023 Personal en obra: inspector tecnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST.
Clima: mañana: Soleada
actividades: Se realiza aseo y limpieza final de bloque intervenido
Aldan Vanegas
Insp obra



09-08-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, ofician en clima: Soleado mañana

actividades: Se realizan correcciones realizadas por interventoría, respecto a pintura de salones.

Nota: el colegio se encontraba realizando traslado de mobiliario a los salones, se solicito detener la actividad Pues no se ha realizado entrega de espacios formal al colegio ni a interventoría, se programa entrega de espacios para el día Lunes.

Adjuntar imagenes

insp obra

11/09/2023 Personal en obra: inspector tecnico interventoría, inspector técnico obra, inspector SST obra e interventoría

Clima: mañana soleada

actividades: Se realiza acta de entrega de espacios y cierre de acta de vecindad. Firmada por administradora pues señora no puede hacer presencia

Inspector Interventoría

Powered by CamScanner

12/09/23 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST.
Clima: mañana soleada. tarde soleada
actividades: ingreso a obra. material, Poliuretano y teja para cubierta tipo sandwich

Aidan Vanegas
Ing obra

13/09/23 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría. inspector SST. cubierta 1/1
Clima: mañana soleada
actividades. se realiza instalación de cubierta tipo sandwich capota. entre pasillo bloque B y 3

Aidan Vanegas
Ing obra

Inspector Interventoría

14/09/23 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría. inspector SST.
Clima: mañana soleada. tarde soleada
actividades: junto con interventoría. se realiza

Socavación de Pedraplén en bloque entregado, Pantanos.

Aidan Vanegas
Insp obra

Inspector Interventoría

15/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, estructura metálica
Clima: mañana nublado, tarde nublado
actividades: se recibe en obra material para cubierta estructura metálica, perfiles 400x200 y 220x200, se realizo cementado con malla en la plataforma en sitio de acopio

Aidan Vanegas
Insp obra

16/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST.
Clima: nublado mañana
actividades, no se realizan actividades, colegio inca inundado de escombros de salones. Pedraplén entrega a espera por parte del colegio el día martes.

Aidan Vanegas
Insp obra

18/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST.
Clima: mañana nublada
Actividades: Junto con interventoría, se realiza recorrido de espacios bloque B. cuarto piso. Se verifica que algunos salones, ya se encuentran descapados. Se solicita al colegio retiro de AP de salones y cámara de seguridad cuarto piso, pues se encuentra fijo reclamaron que ya desinstalarse.

Atdar vanegas
Ing obra.

19/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector SST, ing ambiental, oficial (1) ayudante (1)
Clima: mañana nublada.
Actividades, se realiza cerramiento zona parque infantil en polisombra. se realiza vida y arco en [acopio] zona acopio de materiales

Atdair vanegas
SST obra

20-09-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, oficial (1), ayudante (4)
Clima: mañana soleada, tarde soleada
actividades; se continúa con remanentes en polisombra en toda cancha de colegio y pasillos. Vaciando y fraguando pisos
Adam Arango

21-09-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, oficial (1) ayudantes (4) estructura metálica (4)
Clima: mañana soleada, tarde soleada
actividades, se realiza entrega de espacios por parte de colegio a contratista. junto con interventoría
- se realiza actividad recreativa
- se realiza retiro de estructura metálica para fraguado de concreto y instalación de acrotejas en sector de pasillos. se realiza retiro de polisombra para fraguado de concreto para armado de pechos.

Adam Arango
Jefe obra

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

22-09-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico fabricación, inspector SST. estructura metálica (4) oficial (1) ayudante (1)

Clima: mañana soleada, tarde soleada

actividades: fabricación armado de perfiles metálicos, a cuarto piso, sacar armado de pachar montar perfiles 2C 220x80mm.

Aldair Vanegas
Insp obra

Inspector Interventoría

23-09-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, electricos (2). estructura metálica (4) oficial (1) ayudante (1)

Clima: mañana soleada

actividades: se continua armado de perfiles doble c perimetrales 220x80mm. 9.60m. y pintura de los mismos.

- Se realiza desmonte de puntos electricos en todas las aulas del bloque se retira y enrosca cable de datos. se desmonta tubería MT

Aldair Vanegas
Insp obra

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

25/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST, EM (4) oficial (1) ayudante (4)
Clima: soleado mañana. Soleado tarde
actividades: se continuo con armado de viga doble c pernos-trales. y pintura de las mismas.

Ardon vanegas

Inspector Interventoría

26/09/2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector SST. EM (4) cubierta (3) oficial (1) ayudante (1)
Clima mañana soleado, tarde soleada
actividades, se continuo armado de estructura metálicas
perfiles metálicos doble c 220 x 80 mm perimetrales
pintura de perfiles metálicos
se realizo desmonte de cielo raso falso.
se realizo acopio de ejes faltantes. en silico de acopio
front o colegio

Ardon vanegas
Ios obra

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

27-09-2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, inspector sst, estructura metálica (1) (2) oficial (1) ayudante (1).

Clima: soleado mañana, soleado tarde

actividades: Continua armado de estructura metalica vigas 2C 220x80 mm y pintura de las mismas

Ingresa a obra materia 5 m3 arena y 5 bultos de concreto

Aidan Vanegas

Asp obras

Inspector Interventoría

28-09-2023 personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría inspector sst. estructura metálica (1) oficial (1) ayudante (1)

Clima: mañana soleada, tarde: lluvia 15:00 - 16:00

actividades: Continua armado y pintura de estructura metalica perfiles 2C 220x80 mm.

-se realiza pintura de perfiles 160x60 mm

Aidan vanegas

Asp obra

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

29-09-2023 Personal en obra: inspector técnico interventoría, inspector técnico obra, inspector sst. estructura metálica

Clima: mañana nublada

Actividades: Cambio viroda de PM 2C 220x80 y Pintura

Cambio pintura de PM 150x60

Aidan Vanegas

Sasf obra

Inspector Interventoría

30-09-2023 Personal en obra: inspector técnico obra, inspector técnico interventoría, inspector sst, estructura metálica (2), desmonte de cubierta (4), oficial (1) ayudante (2)

Clima: mañana Soleada

-Actividades: Cambio Pintura de Perfiles metalicos 2C 220x80 mm y 150x60mm.

- JC realiza desmonte de Cubierta AC Sectores B3 A B5

- Aidan Vanegas

Sasf obra.

Inspector Interventoría

Norma

Powered by CamScanner

ANEXO No. 03

INFORMES SEMAMALES

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Septiembre 04 de 2023.
CINP-BTA-529-0625-5859

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 38.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 38 correspondiente al periodo comprendido del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en dieciocho (18) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	VERSIÓN	1
	Fecha	4-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	38		**Del :**	28/08/2023	**AL:** 3/09/2023
Plazo Total	396	días			
Plazo Transcurrido	264	días			
Nombre del Supervisor :	FERNEY JIMÉNEZ NEIRA				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,60%	73,08%	**(%) Ejecutado**	2,05%	82,90%
Valor programado ($)	$ 8.823.530.710,94		**Valor ejecutado ($)**	$ 10.009.177.557,98	
			Evaluación	9,82%	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**IED USMINIA SEDE C**		**USME**	**$ 372.412.811**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	**IED BRASILIA SEDE A**		**USME**	**$ 720.239.927**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**		**USME**	**$ 1.346.746.630**	91,00%	93,00%	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**		**USME**	**$ 853.433.498**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO

								VERSIÓN	1
								Fecha	4-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No		**38**				**Del :**	28/08/2023	**AL:**	3/09/2023
Plazo Total		**396**	días						
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**		**USME**	**$ 550.424.024**	93,00%	98,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN DE PISO
6	**IED LOS TEJARES**		**USME**	**$ 181.308.494**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	**IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B**		**USME**	**$ 628.394.933**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	**INEM SANTIAGO PEREZ**		**TUNJUELITO**	**$ 362.348.937**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	**COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A**		**USME**	**$ 852.869.715**	5,00%	8,00%	**LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD **DESMONTE DE CUBIERTA **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA **DESMONTE DE VENTANAS **INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTA **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA **CAMBIO DE VENTANERÍA **PINTURA SOBRE MUROS **CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO **REPOSICIÓN DE CANCHAS
10	**COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A**		**USME**	**$ 516.609.542**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	**IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A**		**USME**	**$ 623.938.623**	67,00%	65,00%	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA **DESMONTE CUBIERTA PASILLO	**CAMBIO CUBIERTA PASILLO
12	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C**		**USME**	**$ 388.064.062**	0,00%	0,00%		
13	**COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A**		**USME**	**$ 351.263.110**	50,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
14	**COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A**		**USME**	**$ 418.617.430**	0,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
15	**COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A**		**USME**	**$ 293.731.567**	78,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	**COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A**		**USME**	**$ 376.450.691**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	**COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A**		**USME**	**$ 255.186.272**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**		**USME**	**$ 299.060.323**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$ 179.004.711**	66,00%	100,00%	**ENTREGA DE ESPACIOS	**FRENTE TERMINADO
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 443.348.816**	59,00%	83,00%	**DEMARCACIÓN DE CANCHA	**CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 428.177.761**	50,00%	100,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **ASEO GENERAL	**FRENTE TERMINADO
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.607.658**	98,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO

								VERSIÓN	1
								Fecha	4-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No		**38**				**Del :**	28/08/2023	**AL:**	3/09/2023
Plazo Total		**396**	días						
23	**DLE USME**		**USME**	**$**	**117.815.760**	28,00%	53,00%	**EXCAVACIÓN PARA INSTALACION DE RED SANITARIA **FUNDIDA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$**	**74.929.438**	31,00%	68,00%	**RESANE DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE ENCHAPES	**IMPERMEABILIZACIÓN **REJILLAS DE CÁRCAMO **ENCHAPE DE MUROS

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

**Se revisan las solicitudes de ingreso del personal del contrato de obra , con el fin de que los trabajadores puedan iniciar sus labores de trabajo.

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

- **Seguimiento a la ejecución de obras en frentes: Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital.**
- **Revisión y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.**
- **Programación y visitas técnicas para atención de emergencias.**
- **Elaboración informe semanal de interventoría No. 38.**
- **Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
- **Comité de obra 28 de agosto de 2023.**
- **elaboración informe mensual de interventoría No. 08.**

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8	ago-23	$ 1.834.465.130,00
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**9.896.843.633,00**

AVANCE FINANCIERO	
Valor Total Contrato Obra	$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra	$ 9.896.843.633,00
% Avance facturado Acumulado	81,97%
Saldo por Facturar	$ 2.176.953.180,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	4-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**38**		**Del :**	28/08/2023	**AL:** 3/09/2023
Plazo Total	**396** días				

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 135.357.324,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	$ 189.938.426,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**633.921.878,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 633.921.878,00
% Avance facturado Acumulado
66,55%
Saldo por Facturar
$ 318.627.902,00

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital.

2. De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.82%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 7 frentes de obra adicionalmente al frente de emergencia Ofelia Uribe Acosta.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en la sede Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 372.412.810,50	-$ 251.545.751,76
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 720.239.927,04	$ 263.019.950,43
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.346.746.629,53	-$ 174.117.155,43
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 853.433.497,74	$ 494.020.784,05
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 550.424.024,39	-$ 250.924.514,83
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 181.308.494,17	$ 81.062.129,53
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 628.394.933,00	$ 275.924.604,86
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 362.348.936,68	$ 88.706.910,86
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 516.609.541,76	-$ 133.704.594,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 623.938.623,00	$ 189.990.858,12
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 388.064.061,76	$ 43.968.703,19
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 351.263.109,53	-$ 180.494.157,12
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 418.617.430,00	$ 151.341.441,60
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.731.567,07	-$ 86.369.409,78
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 376.450.690,95	-$ 177.291.630,20
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 255.186.272,00	-$ 255.812.591,80
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 299.060.322,73	-$ 55.248.711,85
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 179.004.711,40	-$ 254.026.011,36
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 443.348.815,63	-$ 109.026.543,51
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 428.177.761,00	-$ 148.497.107,64
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.607.657,84	$ 46.030.543,96
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.709.984.731,12**	**-$ 355.657.777,88**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS	PRESUPUESTO

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 5.076.337,61	$ 5.076.337,61
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 367.995.747,09	$ 367.995.747,09
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 40.249.089,00	$ 40.249.089,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 4.183.908,59	$ 4.183.908,59
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 49.457.222,65	$ 49.457.222,65
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 13.904.344,16	$ 13.904.344,16
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 31.365.231,00	$ 31.365.231,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 446.257.154,71	$ 446.257.154,71
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.500.991,06	$ 20.500.991,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 11.877.779,00	$ 11.877.779,00
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 1.010.250,00	$ 1.010.250,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 98.426.039,49	$ 98.426.039,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 14.403.682,00	$ 14.403.682,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				$ 1.008.154.304,00	$ 1.198.868.110,01	$ 190.713.806,01

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 1.008.154.304,00

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.908.852.841
		DIFERENCIA	$ 164.943.972

OBSERVACIONES:
Se evidencia saldo a favor de $164.943.972, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.709.984.731**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**73,08%**	**82,90%**	**9,81%**	**302,57**	**266,76**	**35,81**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 372.412.811	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 720.239.927	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.346.746.630	9/01/2023	29/09/2023	263,00	91,00%	93,00%	2,00%	244,59	239,33	5,26
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 853.433.498	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	100,00%	0,00%	214,00	214,00	0,00
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 550.424.024	18/01/2023	20/09/2023	245,00	93,00%	98,00%	5,00%	240,10	227,85	12,25
6	IED LOS TEJARES	$ 181.308.494	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 628.394.933	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 362.348.937	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	28/08/2023	23/12/2023	117,00	5,00%	8,00%	3,00%	9,36	5,85	3,51
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 516.609.542	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 623.938.623	9/05/2023	21/10/2023	165,00	67,00%	65,00%	-2,00%	107,25	110,55	-3,30
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 388.064.062	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 351.263.110	14/07/2023	31/10/2023	109,00	50,00%	100,00%	50,00%	109,00	54,50	54,50
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 418.617.430	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	100,00%	100,00%	82,00	0,00	82,00
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.731.567	1/07/2023	30/09/2023	91,00	78,00%	100,00%	22,00%	91,00	70,98	20,02
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 376.450.691	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 255.186.272	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 299.060.323	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 179.004.711	14/06/2023	30/09/2023	108,00	66,00%	100,00%	34,00%	108,00	71,28	36,72
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 443.348.816	16/06/2023	11/10/2023	117,00	59,00%	83,00%	24,00%	97,11	69,03	28,08
21	IED VENECIA SEDE B	$ 428.177.761	30/06/2023	4/11/2023	127,00	50,00%	100,00%	50,00%	127,00	63,50	63,50
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.607.658	4/07/2023	4/09/2023	62,00	98,00%	100,00%	2,00%	62,00	60,76	1,24
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	28,00%	53,00%	25,00%	73,14	38,64	34,50
24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	31,00%	68,00%	37,00%	93,84	42,78	51,06






CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**10.709.984.731**									
1	**IED PAULO FREILE**	$	5.076.338	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	**IED FEDERICO GARCIA LORCA**	$	367.995.747	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	**IED ALMIRANTE PADILLA**	$	40.249.089	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
4	**LOTE VILLA ROSITA**	$	-	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	**IED SANTA MARTA**	$	36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	**IED ORLANDO FALS BORDA**	$	4.183.909	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	**IED SAN CAYETANO**	$	49.457.223	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	**RURAL LA MAYORIA**	$	13.904.344	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00
9	**DIRECCION LOCAL USME**	$	31.365.231	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	**IED OFELIA URIBE DE ACOSTA**	$	446.257.155	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	98,00%	-2,00%	29,40	30,00	-0,60
11	**IED JUAN LUIS LONDOÑO**	$	20.500.991	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**	$	11.877.779	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	**IED SANTA LIBRADA**	$	1.010.250	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
14	**IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	$	26.272.480	24/04/2023	15/05/2023	21,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	**IED RAFAEL URIBE URIBE**	$	298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	**IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1**	$	598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	**IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO**	$	98.426.039	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	**IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA**	$	699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	**IED PAULO FREILE ETAPA 2**	$	29.389.803	21/08/2023	27/08/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
19	**IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2**	$	14.403.682	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$**	**1.198.868.110**									

CONTROL DE PROGRAMACIÓN					
SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

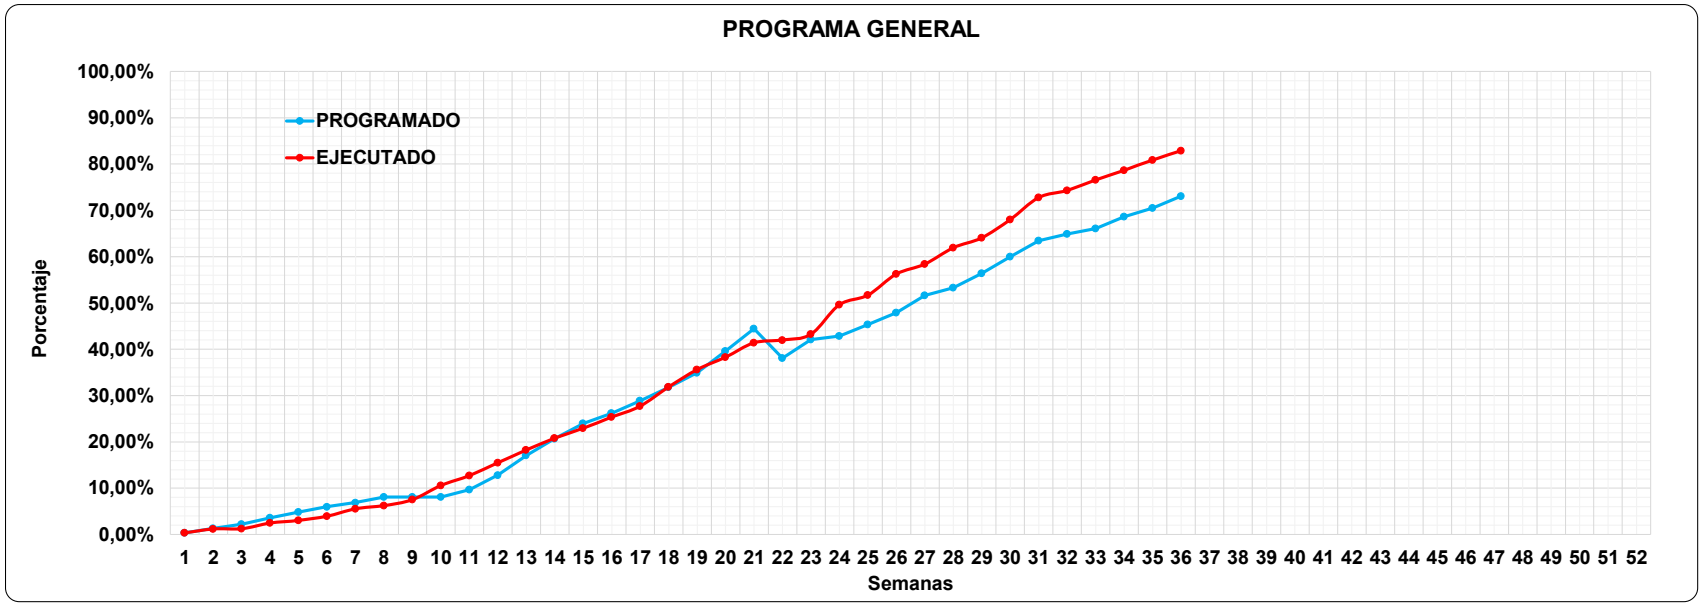

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 9.81%, presentándose atrasos puntuales en la sede Fabio Lozano Simoneli.
- Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance.
- Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
- Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

SEMANA No.	38		28-ago-23	AL	3-sep-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



PINTURA EXTERIOR



PINTURA INTERIOR



PINTURA EXTERIOR



PINTURA EXTERIOR



PINTURA INTERIOR



LIMPIEZA DE RED SANITARIA

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



PINTURA SOBRE MUROS



PINTURA SOBRE MUROS



INSTALACION RED ELECTRICA PASILLOS



INSTALACION RED ELECTRICA



INSTALACION RED ELECTRICA



INSTALACION RED ELECTRICA

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



DESMONTE DE CUBIERTA EN PASILLO



DESMONTE DE CUBIERTA EN PASILLO



INSTALACION RED ELECTRICA



INSTALACION RED ELECTRICA




INSTALACION RED ELECTRICA



INSTALACION DE CANALES

COLEGIO RURAL EL CURUBITAL

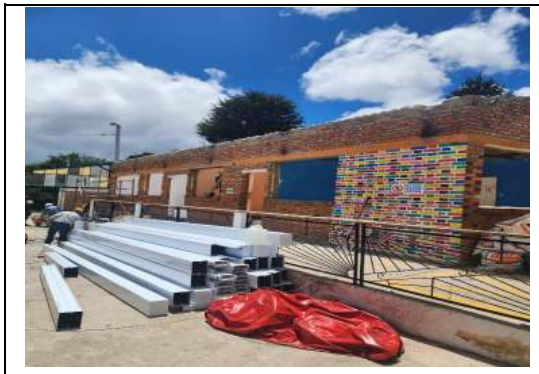

DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE VENTANAS



INSTALACION ESTRUCTURA METALICA



DESMONTE DE CUBIERTA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A		
		
PINTURA DE CANCHA	PINTURA DE CANCHA	PINTURA DE CANCHA
IED VENECIA - SEDE B		
		
ESTADO FINAL CANCHA	ESTADO FINAL AULAS	ESTADO FINAL AULAS
		
ESTADO FINAL AULAS	ESTADO FINAL AULAS	ESTADO FINAL AULAS

DILE USME



EXCAVACION PARA INSTALACION DE RED SANITARIA



FUNDIDA DE RAMPAS



FUNDIDA DE RAMPAS

DILE TUNJUELITO



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS



RESANE DE MUROS

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	JORGE SANTOS	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

AFECTACIONES - EVENTUALIDADES

SEMANA No.	38	DEL	28-ago-23	AL	3-sep-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1			7/8/23			
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones durante el periodo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Septiembre 08 de 2023.
CINP-BTA-529-0645-5999

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 39.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 39 correspondiente al periodo comprendido del 04 de septiembre de 2023 al 10 de septiembre de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en diecinueve (19) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	11-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**39**		**Del :**	4/08/2023	**AL:** 10/08/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**240**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**3,58%**	**77,38%**	**(%) Ejecutado**	**3,30%**	**86,20%**
Valor programado ($)		**$ 9.342.703.973,90**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 10.407.612.852,81**
			Evaluación	**8,82%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	11-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**39**		**Del :**	4/08/2023	**AL:** 10/08/2023
Plazo Total	**396**	días			

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	IED USMINIA SEDE C		USME	$ 363.223.880	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	IED BRASILIA SEDE A		USME	$ 804.891.866	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	COLEGIO RURAL EL UVAL		USME	$ 1.171.229.568	94,00%	96,00%	**INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS **REMATES DE PINTURA
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS		USME	$ 763.066.358	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC		USME	$ 777.055.527	97,00%	98,00%	**RESANE Y PINTURA DE MUROS **INSTALACIÓN DE PISO	**REMATES DE PINTURA
6	IED LOS TEJARES		USME	$ 184.605.621	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		USME	$ 614.017.877	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	INEM SANTIAGO PEREZ		TUNJUELITO	$ 351.630.774	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A		USME	$ 852.869.715	15,00%	23,00%	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTA	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTA **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA **CAMBIO DE VENTANERÍA **PINTURA SOBRE MUROS **CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO **REPOSICIÓN DE CANCHAS
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A		USME	$ 456.055.374	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A		USME	$ 704.439.173	76,00%	66,00%	**CAMBIO CUBIERTA PASILLO	**CAMBIO CUBIERTA PASILLO **INICIO ETAPA III
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C		USME	$ 153.809.159	0,00%	0,00%		
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		USME	$ 327.478.144	57,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A		USME	$ 477.565.111	0,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A		USME	$ 293.925.810	86,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A		USME	$ 374.852.027	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A		USME	$ 268.089.312	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B		USME	$ 335.459.417	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO

		VERSIÓN	1
		Fecha	11-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No		**39**				**Del :**	4/08/2023	**AL:**	10/08/2023
Plazo Total		**396**	días						
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$ 190.736.713**	73,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 459.689.590**	64,00%	86,00%	**RETIRO PINTURA EXISTENTE DE GRADERÍAS **CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO	**CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 444.538.323**	64,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.812.264**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$ 117.815.760**	39,00%	53,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAOE DE PISOS **INSTALACION DE RED ELECTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$ 74.929.438**	43,00%	86,00%	**REJILLAS DE CÁRCAMO **ENCHAPE DE MUROS	**IMPERMEABILIZACIÓN **ENCHAPE DE MUROS

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0639-5927 del 06 de septiembre de 2023, se hace necesario hacer un llamado de atencion al contratista de obra, considerando las falencias ambientales, evidenciadas en la IED Fabio Lozano Simonelli , por lo que se le reitera que es necesario que efectue el cumplimiento completo del Plan Manejo Ambiental.**
****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0627-5869 del 04 de septiembre de 2023 se hace devolucion del informe mensual No. 08 del componente Ambiental y se hace entrega de una serie de observaciones.**

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecucion de obras en frentes: Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, Jose Maria Cordoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra.
• Revision y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programacion y visitas tecnicas para atencion de emergencias.
• Elaboracion informe semanal de interventoria No. 39.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
***Comite de obra 04 de agosto de 2023.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	11-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**39**		**Del :**	4/08/2023	**AL:** 10/08/2023
Plazo Total	**396**	días			

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8	ago-23	$ 1.834.465.130,00
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**9.896.843.633,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 9.896.843.633,00
% Avance facturado Acumulado
81,97%
Saldo por Facturar
$ 2.176.953.180,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 135.357.324,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	$ 189.938.426,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**633.921.878,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 633.921.878,00
% Avance facturado Acumulado
66,55%
Saldo por Facturar
$ 318.627.902,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	11-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**39**	**Del :**	4/08/2023	**AL:**	10/08/2023
Plazo Total	**396** días				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra.

2. De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.82%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 7 frentes de obra adicionalmente a los frentes de emergencia Ofelia Uribe Acosta, Miguel de Cervantes Saavedra.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en la sede Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	**BALANCE FINANCIERO**

SEMANA No.	39	**DEL**	4-ago-23	**AL**	10-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 363.223.880,19	-$ 260.734.682,07
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 804.891.865,76	$ 347.671.889,15
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.171.229.567,51	-$ 349.634.217,45
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 763.066.358,42	$ 403.653.644,73
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 777.055.526,91	-$ 24.293.012,31
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 184.605.620,74	$ 84.359.256,10
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 614.017.876,76	$ 261.547.548,62
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 351.630.774,27	$ 77.988.748,45
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 456.055.373,73	-$ 194.258.762,03
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 704.439.172,88	$ 270.491.408,00
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 153.809.158,52	-$ 190.286.200,05
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 327.478.143,93	-$ 204.279.122,72
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 477.565.111,13	$ 210.289.122,73
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.925.809,73	-$ 86.175.167,12
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 374.852.027,09	-$ 178.890.294,06
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 268.089.312,39	-$ 242.909.551,41
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 335.459.416,92	-$ 18.849.617,66
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 190.736.713,24	-$ 242.294.009,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 459.689.589,81	-$ 92.685.769,33
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 444.538.322,65	-$ 132.136.545,99
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.812.263,51	$ 46.235.149,63
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.637.786.799,49**	**-$ 427.855.709,51**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	**$ 11.065.642.509,00**

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS	**PRESUPUESTO**

SEMANA No.	39	DEL	4-ago-23	AL	10-ago-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 6.145.206,86	$ 6.145.206,86
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 436.139.844,63	$ 436.139.844,63
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 50.297.065,00	$ 50.297.065,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 6.586.950,71	$ 6.586.950,71
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 30.681.725,51	$ 30.681.725,51
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 9.553.145,67	$ 9.553.145,67
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 34.103.091,00	$ 34.103.091,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 334.849.212,85	$ 334.849.212,85
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.096.878,06	$ 20.096.878,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 12.823.028,88	$ 12.823.028,88
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 600.221,00	$ 600.221,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 99.703.707,49	$ 99.703.707,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 9.077.223,00	$ 9.077.223,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.144.817.634,31**	**$ 136.663.330,31**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.782.604.434

DIFERENCIA	$ 291.192.379

OBSERVACIONES:
Se evidencia saldo a favor de $291.192.379, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.






CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	39	DEL	04-ago-23	AL	10-ago-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA


	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	$ 10.637.786.799	27/12/2022	26/12/2023	365,00	77,38%	86,20%	8,82%	314,63	282,44	32,18
1	IED USMINIA SEDE C	$ 363.223.880	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 804.891.866	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.171.229.568	9/01/2023	29/09/2023	263,00	94,00%	96,00%	2,00%	252,48	247,22	5,26
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 763.066.358	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	100,00%	0,00%	214,00	214,00	0,00
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 777.055.527	18/01/2023	20/09/2023	245,00	97,00%	98,00%	1,00%	240,10	237,65	2,45
6	IED LOS TEJARES	$ 184.605.621	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 614.017.877	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 351.630.774	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	28/08/2023	23/12/2023	117,00	15,00%	23,00%	8,00%	26,91	17,55	9,36
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 456.055.374	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 704.439.173	9/05/2023	21/10/2023	165,00	76,00%	66,00%	-10,00%	108,90	125,40	-16,50
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 153.809.159	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 327.478.144	14/07/2023	31/10/2023	109,00	57,00%	100,00%	43,00%	109,00	62,13	46,87
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 477.565.111	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	100,00%	100,00%	82,00	0,00	82,00
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.925.810	1/07/2023	30/09/2023	91,00	86,00%	100,00%	14,00%	91,00	78,26	12,74
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 374.852.027	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 268.089.312	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 335.459.417	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 190.736.713	14/06/2023	30/09/2023	108,00	73,00%	100,00%	27,00%	108,00	78,84	29,16
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 459.689.590	16/06/2023	11/10/2023	117,00	64,00%	86,00%	22,00%	100,62	74,88	25,74
21	IED VENECIA SEDE B	$ 444.538.323	30/06/2023	4/11/2023	127,00	64,00%	100,00%	36,00%	127,00	81,28	45,72



SEMANA No.	39	DEL	04-ago-23	AL	10-ago-23

22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.812.264	4/07/2023	4/09/2023	62,00	100,00%	100,00%	0,00%	62,00	62,00	0,00
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	39,00%	53,00%	14,00%	73,14	53,82	19,32
24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	43,00%	86,00%	43,00%	118,68	59,34	59,34
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 10.637.786.799									
1	IED PAULO FREILE	$ 6.145.207	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$ 436.139.845	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$ 50.297.065	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
4	LOTE VILLA ROSITA	$ -	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	IED SANTA MARTA	$ 36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$ 6.586.951	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	IED SAN CAYETANO	$ 30.681.726	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	RURAL LA MAYORIA	$ 9.553.146	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00
9	DIRECCION LOCAL USME	$ 34.103.091	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$ 334.849.213	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	98,00%	-2,00%	29,40	30,00	-0,60
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$ 20.096.878	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 12.823.029	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	IED SANTA LIBRADA	$ 600.221	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 26.272.480	4/09/2023	25/09/2023	21,00	33,33%	20,00%	-13,33%	4,20	7,00	-2,80
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$ 298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$ 598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 99.703.707	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$ 29.389.803	21/08/2023	27/08/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$ 9.077.223	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 1.144.817.634									

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	BOGOTÁ	CONTROL DE PROGRAMACIÓN		
SEMANA No.	39	**DEL**	04-ago-23	**AL**	10-ago-23

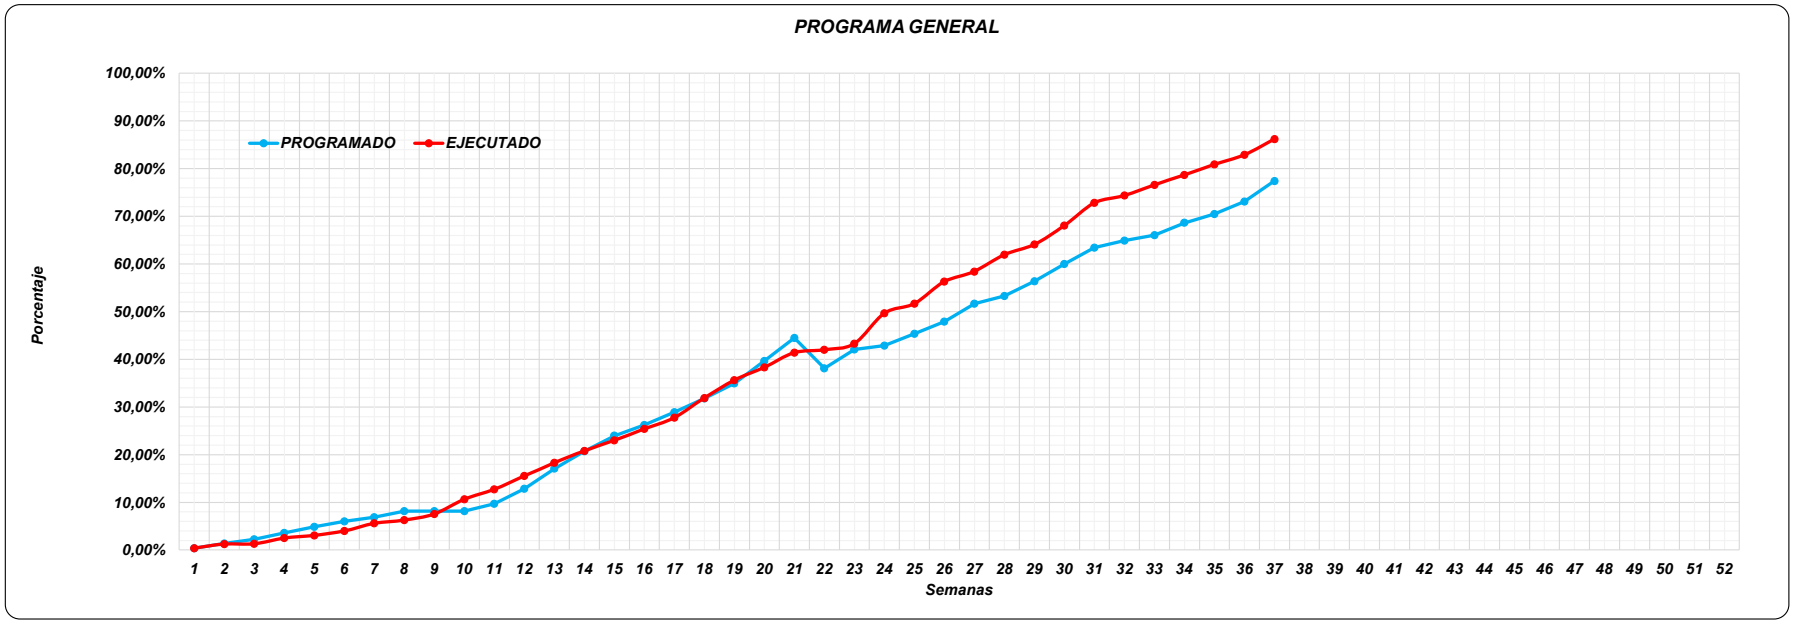

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.82%, presentándose atrasos puntuales en la sede Fabio Lozano Simoneli.
• Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 06 de septiembre de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance.
• Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
• Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y serán ajustadas de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	BOGOTÁ	**REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO**	

SEMANA No.	39		04-ago-23	**AL**	10-ago-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



PINTURA EXTERIOR



PINTURA INTERIOR



PINTURA EXTERIOR



PINTURA EXTERIOR



PINTURA INTERIOR



LIMPIEZA DE RED SANITARIA

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS




INSTALACION DE PISOS

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE BAJANTES

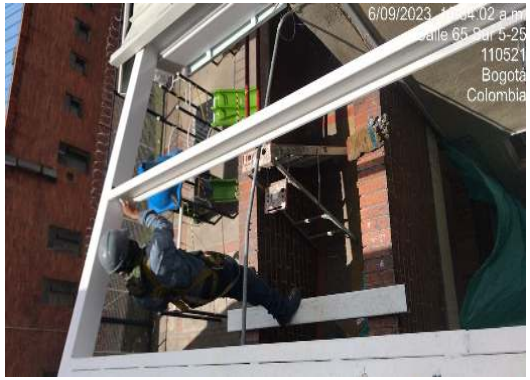

INSTALACION ESTRUCTURA CUBIERTA PASILLO



ASEO PARA ENTREGA ETAPA II

COLEGIO RURAL EL CURUBITAL



RESANE DE VANOS



RESANE DE VANOS



RESANE DE VANOS



RESANE DE VANOS



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



RETIRO DE PINTURA EXISTENTE GRADERIAS



RETIRO DE PINTURA EXISTENTE GRADERIAS



FUNDIDA DE CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS

IED MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA - SEDE A



ESTADO INICIAL MUROS



ESTADO INICIAL VENTANAS



DESMONTE DE VENTANAS

DILE TUNJUELITO



ENCHAPE DE MUROS



INSTALACION REJILLAS DE CARCAMO



IMPERMEABILIZACION DE FACHADA

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	39	DEL	4-ago-23	AL	10-ago-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												






PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	39	DEL	4-ago-23	AL	10-ago-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOJANNA CAROLINA LUQUE LOPEZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	6/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0638-5924 para su respectiva revision y aprobacion
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	CATALINA MOLANO LOZANO	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	7/09/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0642-5954 para su respectiva revision y aprobacion
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	**AFCETACIONES - EVENTUALIDADES**

SEMANA No.	39	**DEL**	4-ago-23	**AL**	10-ago-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1						
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones durante el periodo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Septiembre 18 de 2023.
CINP-BTA-529-0661-6158

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 40.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 40 correspondiente al periodo comprendido del 11 de septiembre de 2023 al 17 de septiembre de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en diecisiete (17) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	18-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**40**		**Del :**	11/09/2023	**AL:** 17/09/2023
Plazo Total	**396** días				
Plazo Transcurrido	**278** días				
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**2.38%**	**79.76%**	**(%) Ejecutado**	**1.74%**	**87.94%**
Valor programado ($)	**$ 9.630.060.338,05**		**Valor ejecutado ($)**	**$ 10.617.696.917,35**	
			Evaluación	**8.18%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**IED USMINIA SEDE C**		**USME**	**$ 363.223.880**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	**IED BRASILIA SEDE A**		**USME**	**$ 804.891.866**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	**COLEGIO RURAL EL UVAL**		**USME**	**$ 1.171.229.568**	96,00%	98,00%	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES **PINTURA SOBRE MUROS **INSTALACIÓN DE MESONES	**INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS **REMATES DE PINTURA
4	**IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS**		**USME**	**$ 763.066.358**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
5	**IED PROVINCIA DE QUEBEC**		**USME**	**$ 777.055.527**	99,00%	98,00%	**REMATES DE PINTURA	**CAMBIO CUBIERTA ESCALERA

		VERSIÓN	1
		Fecha	18-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	40			Del :	11/09/2023	AL:	17/09/2023
Plazo Total	396	días					

6	IED LOS TEJARES		USME	$ 184.605.621	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		USME	$ 614.017.877	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	INEM SANTIAGO PEREZ		TUNJUELITO	$ 351.630.774	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A		USME	$ 852.869.715	17,00%	38,00%	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTA **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA	**INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA **CAMBIO DE VENTANERÍA **PINTURA SOBRE MUROS **CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO **REPOSICIÓN DE CANCHAS
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A		USME	$ 456.055.374	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A		USME	$ 704.439.173	86,00%	69,00%	**CAMBIO CUBIERTA PASILLO **ENTREGA DE ESPACIOS ETAPA II **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO ETAPA II	**INICIO ETAPA III
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C		USME	$ 153.809.159	0,00%	0,00%		
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		USME	$ 327.478.144	64,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A		USME	$ 477.565.111	0,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A		USME	$ 293.925.810	94,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A		USME	$ 374.852.027	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A		USME	$ 268.089.312	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B		USME	$ 335.459.417	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C		USME	$ 190.736.713	81,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A		TUNJUELITO	$ 459.689.590	70,00%	90,00%	**CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS	**CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO **IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS
21	IED VENECIA SEDE B		TUNJUELITO	$ 444.538.323	74,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A		TUNJUELITO	$ 75.812.264	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	DLE USME		USME	$ 117.815.760	49,00%	53,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**PAÑETE DE MUROS **ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACIÓN PISO PODO TÁCTIL
24	DLE TUNJUELITO		TUNJUELITO	$ 74.929.438	51,00%	95,00%	**IMPERMEABILIZACIÓN **ENCHAPE DE MUROS **ENTREGA DE ESPACIOS	**INSTALACIÓN PISO PODO TÁCTIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

**Mediante comunicado CINP-BTA-529-0657-6127 del 15 de septiembre de 2023, se hizo un llamado de atención al Consorcio Educación Bogotá desde el componente de seguridad y salud en el trabajo, debido a que el personal administrativo y operativo no está realizando el porte de elementos de protección personal.
**El 14 de septiembre de 2023 mediante comunicado CINP-BTA-529-0654-6073 se hace el tercer llamado de atención con respecto al ingreso de personal no autorizado.
**Mediante comunicado CINP-BTA-529-0652-6061 del 13 de septiembre de 2023, se solicita el informe mensual No. 08 del componente de seguridad y salud en el trabajo.
**El 12 de septiembre de 2023 mediante comunicado CINP-BTA-529-0650-6042 se da aprobacion al informe mensual No. 08 del componente ambiental.

		VERSIÓN	1
		Fecha	18-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**40**	**Del :**	11/09/2023	**AL:**	17/09/2023
Plazo Total	**396** días				

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecución de obras en frentes: Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra, Ofelia Uribe.
• Revisión y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programación y visitas técnicas para atención de emergencias.
• Elaboración informe semanal de interventoria No. 40.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
***Comité de obra 12 de septiembre de 2023.**

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8	ago-23	$ 1.834.465.130,00
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**9.896.843.633,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 9.896.843.633,00
% Avance facturado Acumulado
81,97%
Saldo por Facturar
$ 2.176.953.180,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 135.357.324,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	$ 189.938.426,00
8		
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**633.921.878,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 633.921.878,00
% Avance facturado Acumulado
66,55%
Saldo por Facturar
$ 318.627.902,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	18-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**40**	**Del :**	11/09/2023	**AL:**	17/09/2023
Plazo Total	**396** días				


OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra, Ofelia Uribe.

2. De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.18%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 7 frentes de obra adicionalmente a los frentes de emergencia Ofelia Uribe Acosta, Miguel de Cervantes Saavedra.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en la sede Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 363.223.880,19	-$ 260.734.682,07
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 804.891.865,76	$ 347.671.889,15
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.171.229.567,51	-$ 349.634.217,45
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 763.066.358,42	$ 403.653.644,73
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 777.055.526,91	-$ 24.293.012,31
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 184.605.620,74	$ 84.359.256,10
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 614.017.876,76	$ 261.547.548,62
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 351.630.774,27	$ 77.988.748,45
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 456.055.373,73	-$ 194.258.762,03
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 704.439.172,88	$ 270.491.408,00
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 153.809.158,52	-$ 190.286.200,05
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 327.478.143,93	-$ 204.279.122,72
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 477.565.111,13	$ 210.289.122,73
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.925.809,73	-$ 86.175.167,12
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 374.852.027,09	-$ 178.890.294,06
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 268.089.312,39	-$ 242.909.551,41
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 335.459.416,92	-$ 18.849.617,66
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 190.736.713,24	-$ 242.294.009,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 459.689.589,81	-$ 92.685.769,33
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 444.538.322,65	-$ 132.136.545,99
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.812.263,51	$ 46.235.149,63
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.637.786.799,49**	**-$ 427.855.709,51**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 6.145.206,86	$ 6.145.206,86
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 436.139.844,63	$ 436.139.844,63
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 50.297.065,00	$ 50.297.065,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 6.586.950,71	$ 6.586.950,71
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 30.681.725,51	$ 30.681.725,51
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 9.553.145,67	$ 9.553.145,67
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 34.103.091,00	$ 34.103.091,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 334.849.212,85	$ 334.849.212,85
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.096.878,06	$ 20.096.878,06

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 12.823.028,88	$ 12.823.028,88
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 600.221,00	$ 600.221,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 99.703.707,49	$ 99.703.707,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 9.077.223,00	$ 9.077.223,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.144.817.634,31**	**$ 136.663.330,31**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	**VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS**	$ 11.782.604.434
		DIFERENCIA	$ 291.192.379

OBSERVACIONES:
Se evidencia saldo a favor de $291.192.379, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA


	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.637.786.799**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**79,76%**	**87,94%**	**8,19%**	**321,00**	**291,11**	**29,88**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 363.223.880	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 804.891.866	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.171.229.568	9/01/2023	29/09/2023	263,00	96,00%	98,00%	2,00%	257,74	252,48	5,26
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 763.066.358	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	100,00%	0,00%	214,00	214,00	0,00
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 777.055.527	18/01/2023	20/09/2023	245,00	99,00%	98,00%	-1,00%	240,10	242,55	-2,45
6	IED LOS TEJARES	$ 184.605.621	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 614.017.877	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 351.630.774	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	28/08/2023	23/12/2023	117,00	17,00%	38,00%	21,00%	44,46	19,89	24,57
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 456.055.374	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 704.439.173	9/05/2023	21/10/2023	165,00	86,00%	69,00%	-17,00%	113,85	141,90	-28,05
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 153.809.159	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 327.478.144	14/07/2023	31/10/2023	109,00	64,00%	100,00%	36,00%	109,00	69,76	39,24
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 477.565.111	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	100,00%	100,00%	82,00	0,00	82,00
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.925.810	1/07/2023	30/09/2023	91,00	94,00%	100,00%	6,00%	91,00	85,54	5,46
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 374.852.027	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 268.089.312	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 335.459.417	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 190.736.713	14/06/2023	30/09/2023	108,00	81,00%	100,00%	19,00%	108,00	87,48	20,52

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 459.689.590	16/06/2023	11/10/2023	117,00	70,00%	90,00%	20,00%	105,30	81,90	23,40
21	IED VENECIA SEDE B	$ 444.538.323	30/06/2023	4/11/2023	127,00	74,00%	100,00%	26,00%	127,00	93,98	33,02
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.812.264	4/07/2023	4/09/2023	62,00	100,00%	100,00%	0,00%	62,00	62,00	0,00
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	49,00%	53,00%	4,00%	73,14	67,62	5,52
24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	51,00%	95,00%	44,00%	131,10	70,38	60,72
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 10.637.786.799									
1	IED PAULO FREILE	$ 6.145.207	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$ 436.139.845	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$ 50.297.065	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
4	LOTE VILLA ROSITA	$ -	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	IED SANTA MARTA	$ 36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$ 6.586.951	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	IED SAN CAYETANO	$ 30.681.726	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	RURAL LA MAYORIA	$ 9.553.146	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00
9	DIRECCION LOCAL USME	$ 34.103.091	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$ 334.849.213	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	98,00%	-2,00%	29,40	30,00	-0,60
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$ 20.096.878	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 12.823.029	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	IED SANTA LIBRADA	$ 600.221	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 26.272.480	4/09/2023	25/09/2023	21,00	66,67%	70,00%	3,33%	14,70	14,00	0,70
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$ 298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$ 598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$	99.703.707	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$	699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$	29.389.803	21/08/2023	27/08/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$	9.077.223	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$	1.144.817.634									

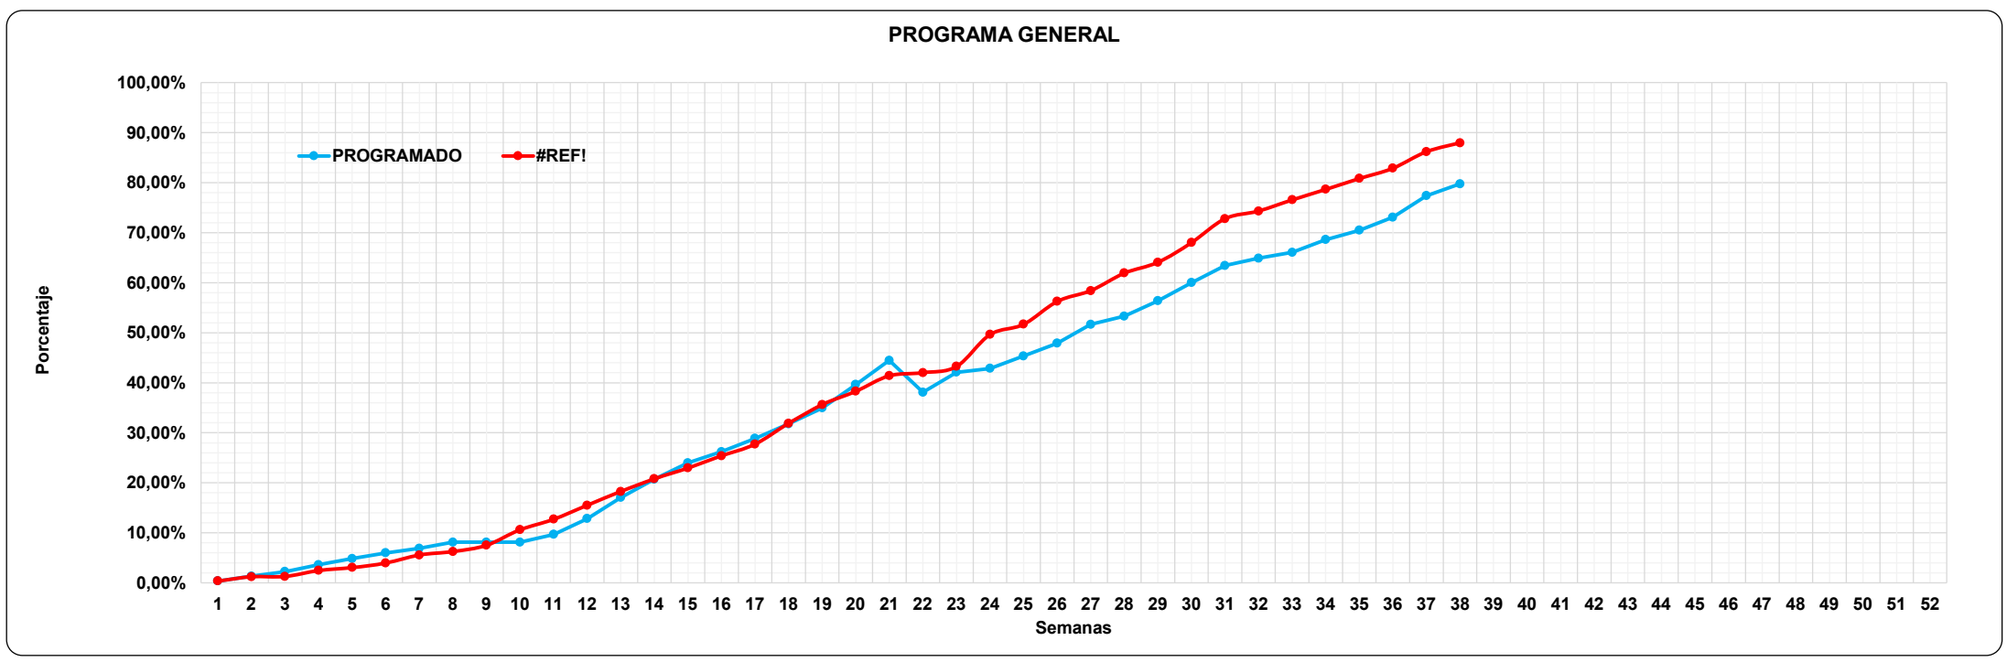

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- De acuerdo a los planes de contingencia y reprogramacion presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.19%, presentandose atrasos puntuales en la sede Fabio Lozano Simoneli.
- Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo al ultimo balance remitido por el contratista de obra mediante correo electronico del dia 06 de septiembre de 2023, no obstante se encuentra pendiente realizar la actualizacion de dicho balance.
- Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
- Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y seran ajustadas de acuerdo a la prioridad de cada emergencia.

SEMANA No.	40		11-sep-23	AL	17-sep-23

COLEGIO RURAL EL UVAL



INSTALACION DE DIVISIONES Y MESONES



INSTALACION DE DIVISIONES Y MESONES



ESTADO FINAL FACHADAS



ESTADO FINAL AULAS



ESTADO FINAL AULAS



ESTADO FINAL AULAS

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE C



REMATES DE PINTURA



REMATES DE PINTURA



REMATES DE PINTURA



REMATES DE PINTURA



RESANE DE MURO PARA INSTALACION DE ENCHAPE



INSTALACION TABLEROS

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



INSTALACION DE CUBIERTA PASILLO



INSTALACION DE CUBIERTA PASILLO



INSTALACION DE CERRAMIENTO

COLEGIO RURAL EL CURUBITAL



RESANE DE VANOS



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE RED ELECTRICA

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



RESANE DE FISURAS EN GRADRIAS



RETIRO DE PINTURA EXISTENTE



PINTURA DE GRADERIAS

IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - SEDE A



CONSTRUCCION DE MURO AULAS



INSTALACION DE VENTANAS



DEMOLICION DE MURO JARDINERA

DILE TUNJUELITO



ESTADO FINAL ENCHAPE DE MUROS



ESTADO FINAL DIVISIONES DE BAÑO



ESTADO FINAL CARCAMO

IED OFELIA URIBE - SEDE B



ADECUACION DE ESPACIOS PARA FUNDIDA DE PLACA



FUNDIDA DE PLACA PARA EQUIPO DE BOMBEO



FUNDIDA DE PLACA PARA EQUIPO DE BOMBEO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												






PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	14/09/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0656-6101 para su respectiva revision y aprobacion.
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOJANNA CAROLINA LUQUE LOPEZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	6/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0638-5924 para su respectiva revision y aprobacion
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	CATALINA MOLANO LOZANO	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	7/09/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0642-5954 para su respectiva revision y aprobacion
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

AFECTACIONES - EVENTUALIDADES

SEMANA No.	40	DEL	11-sep-23	AL	17-sep-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	PROVINCIA DE QUEBEC	A	11/9/23			SE PRESENTA LEVE ATRASO DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCALERA MIENTRAS EL COLEGIO CUENTE CON ESTUDIANTES, POR LO CUAL SE PROGRAMARA ESTA ACTIVIDAD PARA LA SEMANA DE RECESO.
2						
3						
4						

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones durante el periodo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Septiembre 25 de 2023.
CINP-BTA-529-0665-6293

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 41.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 41 correspondiente al periodo comprendido del 18 de septiembre de 2023 al 24 de septiembre de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en diecisiete (17) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	25-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**41**		**Del :**	18/09/2023	**AL:** 24/09/2023
Plazo Total	**396** días				
Plazo Transcurrido	**285** días				
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**2,42%**	**82,18%**	**(%) Ejecutado**	**2,63%**	**90,57%**
Valor programado ($)		**$ 9.922.246.220,92**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 10.935.237.773,53**
			Evaluación	**8,39%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

VERSIÓN	1
Fecha	25-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 41 **Del :** 18/09/2023 **AL:** 24/09/2023

Plazo Total 396 días

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	IED USMINIA SEDE C		USME	$ 363.223.880	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	IED BRASILIA SEDE A		USME	$ 804.891.866	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	COLEGIO RURAL EL UVAL		USME	$ 1.171.229.568	99,00%	99,00%	**ENTREGA AULAS ETAPA II **ENCHAPE DE MUROS **INSTALACIÓN DE APARATOS	**INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS		USME	$ 763.066.358	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC		USME	$ 777.055.527	100,00%	99,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**CAMBIO CUBIERTA ESCALERA
6	IED LOS TEJARES		USME	$ 184.605.621	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		USME	$ 614.017.877	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	INEM SANTIAGO PEREZ		TUNJUELITO	$ 351.630.774	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A		USME	$ 852.869.715	23,00%	68,00%	**INSTALACION DE RED ELÉCTRICA **PINTURA SOBRE MUROS **DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS Y MUROS DE BAÑO **INSTALACION DE CIELO RASO **CAMBIO DE VENTANERÍA	**INSTALACION DE RED ELÉCTRICA **PINTURA SOBRE MUROS **CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO
10	COLEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A		USME	$ 456.055.374	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A		USME	$ 704.439.173	88,00%	70,00%	**LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD ETAPA III **SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESTRUCTURA METÁLICA	**DESMONTE DE CUBIERTA **DESMONTE RED ELÉCTRICA EXISTENTE **INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACION DE CUBIERTA **INSTALACION RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C		USME	$ 153.809.159	0,00%	0,00%		
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		USME	$ 327.478.144	68,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A		USME	$ 477.565.111	0,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A		USME	$ 293.925.810	98,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A		USME	$ 374.852.027	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A		USME	$ 268.089.312	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B		USME	$ 335.459.417	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C		USME	$ 190.736.713	91,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A		TUNJUELITO	$ 459.689.590	81,00%	95,00%	**IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS	**IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS

VERSIÓN	1
Fecha	25-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No 41 **Del :** 18/09/2023 **AL:** 24/09/2023

Plazo Total 396 días

21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$**	**444.538.323**	89,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$**	**75.812.264**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$**	**117.815.760**	57,00%	57,00%	**PAÑETE DE MUROS	**ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACION DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACION PISO PODO TÁCTIL
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$**	**74.929.438**	57,00%	95,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**INSTALACIÓN PISO PODO TÁCTIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

**Mediante comunicado CINP-BTA-529-0663-6162 del 18 de septiembre de 2023 se hace entrega de una serie de observaciones al informe mensual de interventoría No. 08 del componente de seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecución de obras en frentes: Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra, Ofelia Uribe.
• Revisión y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• Programación y visitas técnicas para atención de emergencias.
• Elaboración informe semanal de interventoría No. 41.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
***Comité de obra 18 de septiembre de 2023.**

		VERSIÓN	1
		Fecha	25-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**41**		**Del :**	18/09/2023	**AL:** 24/09/2023
Plazo Total	**396**	días			

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8	ago-23	$ 1.852.453.370,79
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**9.914.831.873,79**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 9.914.831.873,79
% Avance facturado Acumulado
82,12%
Saldo por Facturar
$ 2.158.964.939,21

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 137.548.188,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	$ 189.938.426,00
8	ago-23	$ 146.121.136,00
9		
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**782.233.878,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 782.233.878,00
% Avance facturado Acumulado
82,12%
Saldo por Facturar
$ 170.315.902,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	25-sep-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**41**		**Del :**	18/09/2023	**AL:** 24/09/2023
Plazo Total	**396**	días			

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra, Ofelia Uribe.

2 De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.39%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 7 frentes de obra adicionalmente a los frentes de emergencia Ofelia Uribe Acosta, Miguel de Cervantes Saavedra.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en la sede Fabio Simonelli, no obstante, estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 363.223.880,19	-$ 260.734.682,07
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 804.891.865,76	$ 347.671.889,15
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.171.229.567,51	-$ 349.634.217,45
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 763.066.358,42	$ 403.653.644,73
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 777.055.526,91	-$ 24.293.012,31
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 184.605.620,74	$ 84.359.256,10
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 614.017.876,76	$ 261.547.548,62
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 351.630.774,27	$ 77.988.748,45
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 456.055.373,73	-$ 194.258.762,03
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 704.439.172,88	$ 270.491.408,00
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 153.809.158,52	-$ 190.286.200,05
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 327.478.143,93	-$ 204.279.122,72
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 477.565.111,13	$ 210.289.122,73
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.925.809,73	-$ 86.175.167,12
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 374.852.027,09	-$ 178.890.294,06
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 268.089.312,39	-$ 242.909.551,41
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 335.459.416,92	-$ 18.849.617,66
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 190.736.713,24	-$ 242.294.009,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 459.689.589,81	-$ 92.685.769,33
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 444.538.322,65	-$ 132.136.545,99
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.812.263,51	$ 46.235.149,63
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.637.786.799,49**	**-$ 427.855.709,51**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 6.145.206,86	$ 6.145.206,86
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 436.139.844,63	$ 436.139.844,63
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 50.297.065,00	$ 50.297.065,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 6.586.950,71	$ 6.586.950,71
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 30.681.725,51	$ 30.681.725,51
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 9.553.145,67	$ 9.553.145,67
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 34.103.091,00	$ 34.103.091,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 334.849.212,85	$ 334.849.212,85
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.096.878,06	$ 20.096.878,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 12.823.028,88	$ 12.823.028,88
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 600.221,00	$ 600.221,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 99.703.707,49	$ 99.703.707,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 9.077.223,00	$ 9.077.223,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				$ 1.008.154.304,00	$ 1.144.817.634,31	$ 136.663.330,31

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 1.008.154.304,00

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.782.604.434

DIFERENCIA	$ 291.192.379

OBSERVACIONES:

Se evidencia saldo a favor de $291.192.379, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 10.637.786.799**	**27/12/2022**	**26/12/2023**	**365,00**	**82,18%**	**90,57%**	**8,39%**	**330,57**	**299,94**	**30,63**
1	IED USMINIA SEDE C	$ 363.223.880	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 804.891.866	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.171.229.568	9/01/2023	29/09/2023	263,00	99,00%	99,00%	0,00%	260,37	260,37	0,00
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 763.066.358	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	100,00%	0,00%	214,00	214,00	0,00
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 777.055.527	18/01/2023	20/09/2023	245,00	100,00%	99,00%	-1,00%	242,55	245,00	-2,45
6	IED LOS TEJARES	$ 184.605.621	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 614.017.877	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 351.630.774	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	28/08/2023	23/12/2023	117,00	23,00%	68,00%	45,00%	79,56	26,91	52,65
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 456.055.374	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 704.439.173	9/05/2023	21/10/2023	165,00	88,00%	70,00%	-18,00%	115,50	145,20	-29,70
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 153.809.159	28/09/2023	27/12/2023	90,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 327.478.144	14/07/2023	31/10/2023	109,00	68,00%	100,00%	32,00%	109,00	74,12	34,88
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 477.565.111	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	100,00%	100,00%	82,00	0,00	82,00
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.925.810	1/07/2023	30/09/2023	91,00	98,00%	100,00%	2,00%	91,00	89,18	1,82
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 374.852.027	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 268.089.312	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 335.459.417	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 190.736.713	14/06/2023	30/09/2023	108,00	91,00%	100,00%	9,00%	108,00	98,28	9,72
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 459.689.590	16/06/2023	11/10/2023	117,00	81,00%	95,00%	14,00%	111,15	94,77	16,38
21	IED VENECIA SEDE B	$ 444.538.323	30/06/2023	4/11/2023	127,00	89,00%	100,00%	11,00%	127,00	113,03	13,97
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.812.264	4/07/2023	4/09/2023	62,00	100,00%	100,00%	0,00%	62,00	62,00	0,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ


CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	57,00%	57,00%	0,00%	78,66	78,66	0,00
24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	57,00%	95,00%	38,00%	131,10	78,66	52,44
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$ 10.637.786.799**									
1	IED PAULO FREILE	$ 6.145.207	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$ 436.139.845	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$ 50.297.065	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
4	LOTE VILLA ROSITA	$ -	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	IED SANTA MARTA	$ 36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$ 6.586.951	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00
7	IED SAN CAYETANO	$ 30.681.726	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00
8	RURAL LA MAYORIA	$ 9.553.146	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00
9	DIRECCION LOCAL USME	$ 34.103.091	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$ 334.849.213	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	98,00%	-2,00%	29,40	30,00	-0,60
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$ 20.096.878	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 12.823.029	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00
13	IED SANTA LIBRADA	$ 600.221	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 26.272.480	4/09/2023	25/09/2023	21,00	100,00%	95,00%	-5,00%	19,95	21,00	-1,05
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$ 298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$ 598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 99.703.707	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$ 29.389.803	21/08/2023	27/08/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$ 9.077.223	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	**$ 1.144.817.634**									

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	BOGOTÁ	CONTROL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

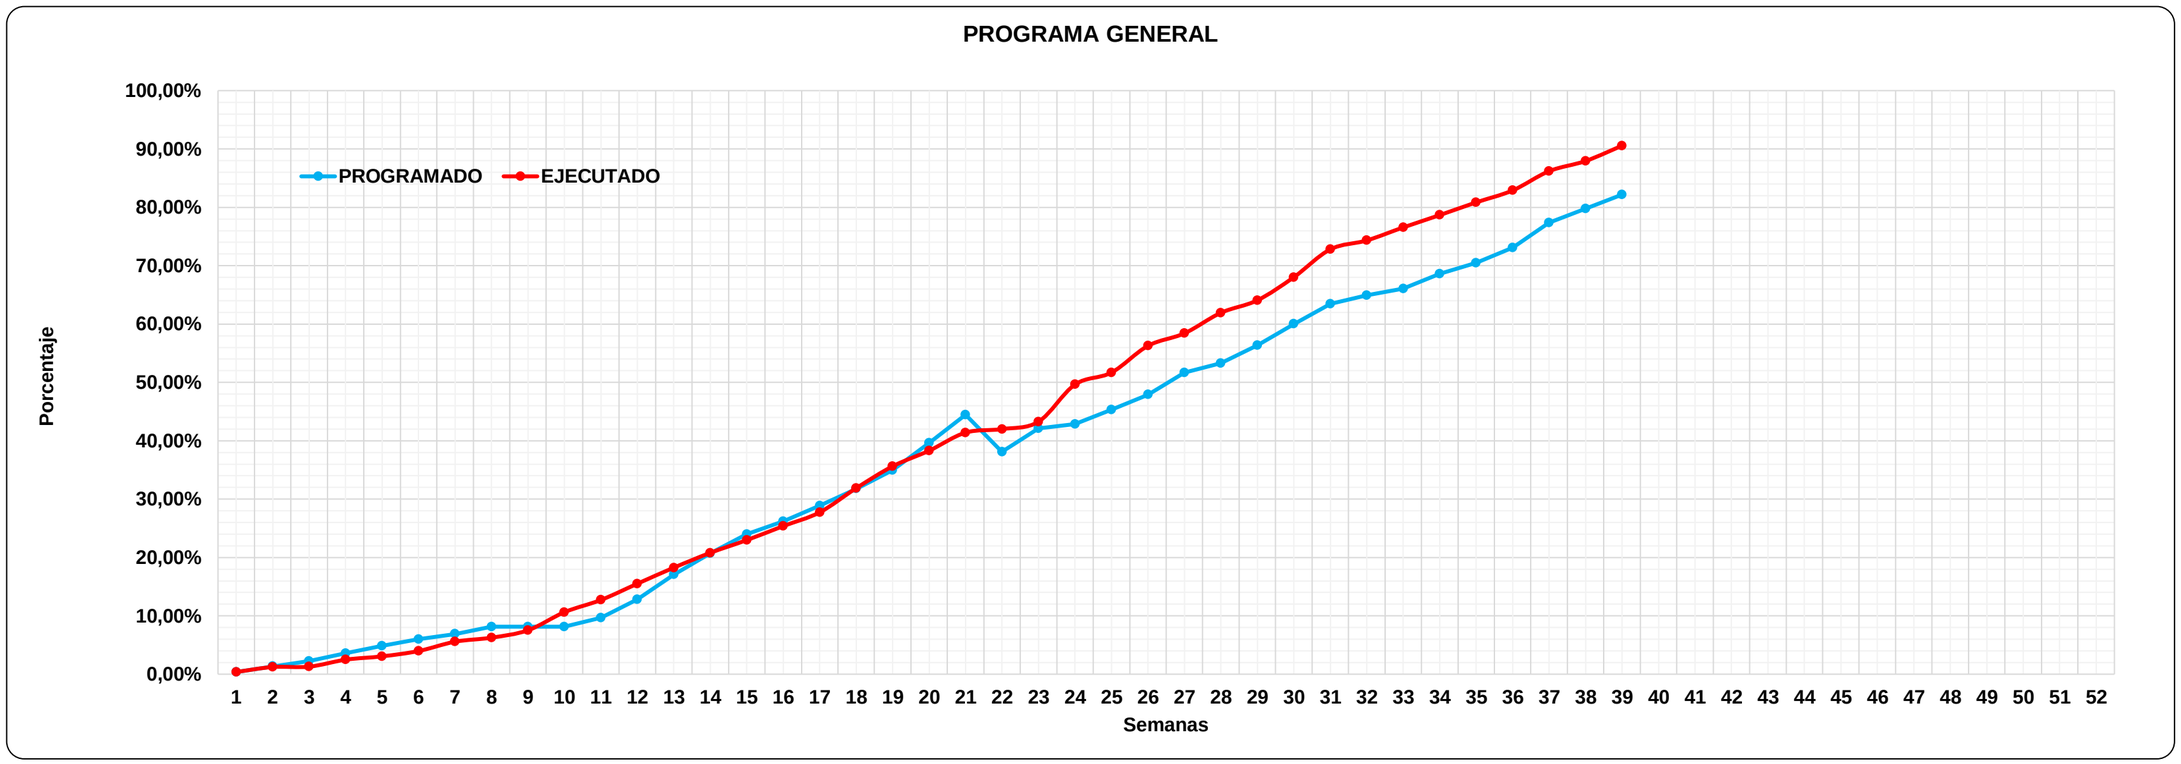

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- **De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.19%, presentándose atrasos puntuales en la sede Fabio Lozano Simoneli.**
- **Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 06 de septiembre de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance.**
- **Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.**
- **Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y se ajustarán de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.**

SEMANA No.	41		18-sep-23	**AL**	24-sep-23

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

COLEGIO RURAL EL UVAL



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



INSTALACION DE ENCHAPE SOBRE MUROS



SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



PRUEBA RED DE DATOS OTIC



SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION LINEAS DE VIDA

COLEGIO RURAL EL CURUBITAL



DEMOLICION DE MUROS EN BAÑOS



DEMOLICION DE MUROS EN BAÑOS



DEMOLICION DE LAVAMANOS CORRIDO



INSTALACION DE VENTANAS



INSTALACION DE VENTANAS



INSTALACION DE VENTANAS

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A



PINTURA DE GRADERIAS



PINTURA DE GRADERIAS



PINTURA DE GRADERIAS

IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - SEDE A



ESTADO FINAL VENTANERÍA AULAS



ESTADO FINAL MURO AULAS



CONSTRUCCION MURO JERDINERA

IED OFELIA URIBE - SEDE B



SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO



INSTALACION DE BAJANTES



RETOQUES DE PINTURA

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

OBRAS PROGRAMADAS

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
USME	USMINIA- C												
USME	BRASILIA- A												
USME	EL UVAL												
USME	NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS												
USME	PROVINCIA DE QUEBEC												
USME	LOS TEJARES												
USME	ESTANISLAO ZULETA- B												
TUNJUELITO	INEM SANTIAGO PEREZ												
USME	RURAL CURUBITAL SEDE A - RURAL CURUBITAL												
USME	RURAL EL DESTINO SEDE A - RURAL EL DESTINO												
USME	FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A - FABIO LOZANO SIMONELI												
USME	FRANCISCO ANTONIO ZE SEDE C - MARIA AUXILIADORA												
USME	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A - RURAL LA ARGENTINA												
USME	COLEGIO LA UNION SEDE A - LA UNION												
USME	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A - RURAL LAS MERCEDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A - RURAL LOS ANDES												
USME	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A - RURAL LOS ARRAYANES												
USME	COLEGIO OSW ALDO GUAYASAMIN SEDE B - VIRREY												
USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C - BETANIA												
TUNJUELITO	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA												
TUNJUELITO	COLEGIO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU												
TUNJUELITO	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO SEDE A - BERNARDO JARAMILLO												
USME	DILE USME SEDE - D L E USME												
TUNJUELITO	DILE TUNJUELITO SEDE - D L E TUNJUELITO												

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SEMANA No.	41	DEL	18-sep-23	AL	24-sep-23

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORIA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
2	ANDRES FELIPE CANCHON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El Uval, Usminia, San Andrés de los Altos, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
3	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tejares, Brasilia, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
4	JAIME CURVELO	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
5	MILENA SOTO POLOCHE	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-376544
6	HERNANDO GOMEZ CASAS	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
7	JOJANNA CAROLINA LUQUE LOPEZ	ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	6/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0638-5924 para su respectiva revision y aprobacion
8	ANGELA TATIANA CELIS DIAZ	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2022369741
9	CATALINA MOLANO LOZANO	ASESOR JURIDICO	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	7/09/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0642-5954 para su respectiva revision y aprobacion
10	NELSON BENITO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	El Uval, Brasilia, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623
11	JESSICA TATIANA GUZMAN CARVAJAL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	Tejares, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta	26/07/2023		Remitida a la entidad mediante comunicado CINP-BTA-529-0557-5037 para su respectiva revision y aprobacion
12	SEBASTIAN MUÑOZ	MAESTRO DE OBRA	Usminia, San Andres de los Altos	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-393447
13	JULIE ANDREA PEREZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante el oficio No. S-2023-17664
14	DIANA PAEZ	TEGNOLOGO SST	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	13/12/2022		Aprobada mediante oficio No. S-2022-398623

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 14

Observaciones:
Mediante comunicado CINP-BTA-529-0664-6166 del 18 de septiembre de 2023 , se da alcance al comunicado CINP-BTA-529-06565-6101 del 14 de septiembre de 2023 en donde se informa a la entidad omitir la solicitud de cambio de profesional (Director de obra).

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO OBRA

NUMERO	NOMBRE	CARGO	SEDES A CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACION
1	JULIO CESAR RODRIGUEZ RIPE	DIRECTOR DE OBRA	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
2	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 1		21/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0282-2953, como cambio al ingeniero Larry Javier Palacio
3	JUAN CAMILO VELASCO MENDEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
4	ANCISAR PEREZ CERVERA	ASESOR ESTRUCTURAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
5	YINETH MARCELA BERNAL	ASESOR AMBIENTAL	El Uval, Usminia, Tejares, Brasilia, San Andrés de los Altos, Provincia de Quebec, Estanislao Zuleta, INEM Santiago Perez.	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
6	YULI TATIANA SANCHEZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1		21/02/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0163-1393 como cambio de Amable Alexander Burbano Pava
7	GINA ALEJANDRA PEREZ CASTRO	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2		2/03/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0190-1696, como cambio de Lissette Alexandra Lozano Oviedo
8	NICOLL DANIELLA ROJAS PEREZ	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
9	LUIS FELIPE PATILLO FONSECA	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0011-6990 - Radicado SIGA E-2022217709
10	JOSE MANUEL REDONDO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS , VOZ Y DATOS	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0023-7174- Radicado SIGA E-2022219693 en cambio de FABER ALI PARRA RAMIREZ
11	ANGELA ISABEL RIOS FRESNEDA	ASESOR HIDROSANITARIO	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
12	JHON FREDY LOPEZ	PROFESIONAL DE COSTOS , PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
13	ELKIN FABIAN PARRA CUBILLOS	INSPECTOR DE OBRA 1	Emergencias	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
14	ALVARO ANDRES GARZON	INSPECTOR DE OBRA 2	Provincia de Quebec, Inem, Bernardo Jaramillo	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
15	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	INSPECTOR DE OBRA 3	El Uval, Brasilia, Federico Garcia Lorca	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0006-6838 - Radicado SIGA E-2022211802
16	CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ	INSPECTOR DE OBRA 4		27/04/2023		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0296-3106 , como cambio de Leidy Yohana Alarcon Mora
17	LUIS EDUARDO GOMEZ RIVERA	MAESTRO DE OBRA	Solicitado mediante comunicado CINP-BTA-529-0107-0929 del 02/02/2023	27/12/2022		Aprobado mediante comunicado CINP-BTA-529-0014-7064- Radicado SIGA E-2022218323

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17

Observaciones:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ						**AFECTACIONES - EVENTUALIDADES**

SEMANA No.	41	**DEL**	18-sep-23	**AL**	24-sep-23

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA	LLUVIAS FUERTES	ESTADO CRITICO DE VIAS	AFECTACIONES (EXTERNOS, COMUNIDAD, INSTITUCION EDUCATIVA,ETC.)
1	PROVINCIA DE QUEBEC	A	79			SE PRESENTA LEVE ATRASO DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS EN LA ESCALERA MIENTRAS EL COLEGIO CUENTE CON ESTUDIANTES, POR LO CUAL SE PROGRAMARA ESTA ACTIVIDAD PARA LA SEMANA DE RECESO.
2	FABIO LOZANO SIMONELI	A	21/9/23			SE PRESENTAN DEMORAS EN LA ENTREGA DE ESPACIOS POR CORRESPONDIENTES A LA ETAPA 3 POR PARTE DEL COLEGIO, SE PRESENTA PERDIDA DE 7 DIAS DE TRABAJO.
3						
4						

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones durante el periodo.

CONSORCIO
SERVICIO
EDUCATIVO

Bogotá D.C.; Octubre 02 de 2023.
CINP-BTA-529-0680-6483

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor Grupo 4
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.4146302; Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.

ASUNTO: Informe semanal de Interventoría No. 42.

Cordial saludo;

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto a la presente remitimos el Informe semanal de Interventoría No. 42 correspondiente al periodo comprendido del 25 de septiembre de 2023 al 01 de octubre de 2023.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en dieciocho (18) folios.

C.C.: CONSORCIO EDUCACIÓN BOGOTÁ - ROBINSON NOE CRISTANCHO GÓMEZ - Representante Legal - Carrera 15 No. 104-76 Oficina 204 – Ciudad (Con Anexos).

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	2-oct-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**42**		**Del :**	25/09/2023	**AL:** 1/10/2023
Plazo Total	**396**	días			
Plazo Transcurrido	**292**	días			
Nombre del Supervisor :	**FERNEY JIMÉNEZ NEIRA**				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,72%**	**83,90%**	**(%) Ejecutado**	**2,03%**	**92,60%**
Valor programado ($)		**$ 10.129.915.526,11**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 11.180.335.848,84**
			Evaluación	**8,70%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**Contratista:**	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
Contrato No:	CO1.PCCNTR.4077396	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.4146302
Valor del contrato:	$ 12.073.796.813	**Valor del contrato:**	$ 952.549.780,00
Plazo:	365 DIAS	**Plazo:**	396 DIAS
Fecha de iniciación:	28-dic-22	**Fecha de iniciación:**	13-dic-22
Fecha de terminación:	27-dic-23	**Fecha de terminación:**	12-ene-24
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	365 DIAS	**Plazo final:**	396 DIAS
Fecha de vencimiento final:	27-dic-23	**Fecha de vencimiento final:**	12-ene-24
Valor total contrato	$ 12.073.796.813	**Valor total contrato**	$ 952.549.780

		VERSIÓN	1
		Fecha	2-oct-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**42**		**Del :**	25/09/2023	**AL:** 1/10/2023
Plazo Total	**396**	días			

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	IED USMINIA SEDE C		USME	$ 363.223.880	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
2	IED BRASILIA SEDE A		USME	$ 804.891.866	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
3	COLEGIO RURAL EL UVAL		USME	$ 1.171.229.568	100,00%	99,00%	**INSTALACIÓN DE ESPEJOS	**ADECUACIÓN TANQUES **ENTREGA BAÑOS BACHILLERATO
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS		USME	$ 763.066.358	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC		USME	$ 777.055.527	100,00%	99,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**CAMBIO CUBIERTA ESCALERA
6	IED LOS TEJARES		USME	$ 184.605.621	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B		USME	$ 614.017.877	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
8	INEM SANTIAGO PEREZ		TUNJUELITO	$ 351.630.774	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**ENTREGA DE ESPACIOS
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A		USME	$ 852.869.715	29,00%	91,00%	**INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA **INSTALACIÓN DE CIELO RASO **REPOSICIÓN ENCHAPE BAÑOS **INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO **ADECUACIÓN REDES HIDROSANITARIAS BAÑOS	**CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO **GUARDA ESCOBAS **INSTALACIÓN LAVAMANOS
10	COLEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A		USME	$ 456.055.374	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A		USME	$ 704.439.173	90,00%	73,00%	**FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN SITIO **DESMONTE RED ELÉCTRICA EXISTENTE **DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	**DESMONTE DE CUBIERTA **INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA **INSTALACIÓN DE CUBIERTA **INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **PINTURA SOBRE MUROS
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C		USME	$ 153.809.159	0,00%	0,00%		
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A		USME	$ 327.478.144	72,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A		USME	$ 477.565.111	0,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A		USME	$ 293.925.810	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A		USME	$ 374.852.027	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A		USME	$ 268.089.312	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO

VERSIÓN	1
Fecha	2-oct-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No		**42**				**Del :**	25/09/2023	**AL:**	1/10/2023
Plazo Total		**396**	días						
18	**IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B**		**USME**	**$ 335.459.417**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
19	**IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C**		**USME**	**$ 190.736.713**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
20	**IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 459.689.590**	93,00%	99,00%	***IMPERMEABILIZACIÓN GRADERÍAS **INSTALACION DE REJILLAS PARA CÁRCAMO	**RETIRO DE CERRAMIENTO **ASEO GENERAL
21	**IED VENECIA SEDE B**		**TUNJUELITO**	**$ 444.538.323**	95,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
22	**IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A**		**TUNJUELITO**	**$ 75.812.264**	100,00%	100,00%	**FRENTE TERMINADO	**FRENTE TERMINADO
23	**DLE USME**		**USME**	**$ 117.815.760**	64,00%	64,00%	**PAÑETE DE MUROS **SOBRE PISO **INSTALACIÓN PUNTOS SANITARIOS	**ENCHAPE DE MUROS **ENCHAPE DE PISOS **INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS **INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS **INSTALACIÓN PISO PODO TÁCTIL
24	**DLE TUNJUELITO**		**TUNJUELITO**	**$ 74.929.438**	64,00%	95,00%	**NO SE REGISTRA ACTIVIDAD	**INSTALACIÓN PISO PODO TÁCTIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0668-6296 del 25 de septiembre de 2023, se hace devolución del informe mensual No. 08 del componente de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que se evidencia que no se llevaron a cabo las correcciones solicitadas.**

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0676-6387 del 25 de septiembre de 2023 se hace entrega de una serie de observaciones a la hoja de vida del técnico en salud y seguridad en el trabajo No. 01.**

****Mediante comunicado CINP-BTA-529-0679-6439 del 29 de septiembre de 2023 se hace entrega de la respuesta efectuada por parte de la entidad , frente a los reportes de RCD según la resolución 1257 de 2021, donde dan aval para el respectivo cargue al aplicativo de la Secretaria Distrital de Ambiente.**

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoria desarrollo las siguientes actividades:

• Seguimiento a la ejecución de obras en frentes: Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra, Ofelia Uribe.
• Revisión y tramite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
• programación y visitas técnicas para atención de emergencias.
• elaboración informe semanal de interventoría No. 42.
*** Requerimiento por observaciones de obra por sede.**
*** Comité de obra 25 de septiembre de 2023.**
*** Revisión y tramite acta parcial de obra No. 09**

		VERSIÓN	1
		Fecha	2-oct-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**42**	**Del :**	25/09/2023	**AL:**	1/10/2023
Plazo Total	**396** días				

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 117.790.703,00
2	feb-23	$ 387.009.813,00
3	mar-23	$ 863.616.581,00
4	abr-23	$ 1.026.228.017,00
5	may-23	$ 1.743.190.195,00
6	jun-23	$ 1.518.098.179,00
7	jul-23	$ 2.406.445.015,00
8	ago-23	$ 1.852.453.370,79
9	sep-23	$ 913.257.933,00
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**10.828.089.806,79**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 12.073.796.813,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 10.828.089.806,79
% Avance facturado Acumulado
89,68%
Saldo por Facturar
$ 1.245.707.006,21

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	ene-23	$ 8.868.238,00
2	feb-23	$ 28.957.514,00
3	mar-23	$ 64.701.943,00
4	abr-23	$ 86.362.926,00
5	may-23	$ 137.548.188,00
6	jun-23	$ 119.735.507,00
7	jul-23	$ 189.938.426,00
8	ago-23	$ 146.121.136,00
9	sep-23	$ 72.012.763,00
10		
11		
12		
Total Acumulado	**$**	**854.246.641,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 952.549.780,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 854.246.641,00
% Avance facturado Acumulado
89,68%
Saldo por Facturar
$ 98.303.139,00

		VERSIÓN	1
		Fecha	2-oct-23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

Semana No	**42**	**Del :**	25/09/2023	**AL:**	1/10/2023
Plazo Total	**396** días				

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. Continua obra física en sedes El Uval, Provincia de Quebec, Fabio Simonelli, José María Córdoba, DLE Usme, DLE Tunjuelito, Curubital, Miguel de Cervantes Saavedra, Ofelia Uribe.

2. • De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, se realiza ajuste de las programaciones por lo cual la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.70%.

3. A la fecha se encuentran abiertos 7 frentes de obra adicionalmente a los frentes de emergencia Ofelia Uribe Acosta, Miguel de Cervantes Saavedra.

4. A la fecha se presentan atrasos puntuales en la sede Fabio Simonelli, no obstante estas no ponen en riesgo el avance general de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	42	DEL	25-sep-23	AL	1-oct-23

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED USMINIA SEDE C	C	USME	$ 623.958.562,26	$ 363.223.880,19	-$ 260.734.682,07
2	IED BRASILIA SEDE A	A	USME	$ 457.219.976,61	$ 804.891.865,76	$ 347.671.889,15
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	N/A	USME	$ 1.520.863.784,96	$ 1.171.229.567,51	-$ 349.634.217,45
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS	N/A	USME	$ 359.412.713,69	$ 763.066.358,42	$ 403.653.644,73
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	N/A	USME	$ 801.348.539,22	$ 777.055.526,91	-$ 24.293.012,31
6	IED LOS TEJARES	B	USME	$ 100.246.364,64	$ 184.605.620,74	$ 84.359.256,10
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	B	USME	$ 352.470.328,14	$ 614.017.876,76	$ 261.547.548,62
8	INEM SANTIAGO PEREZ	N/A	TUNJUELITO	$ 273.642.025,82	$ 351.630.774,27	$ 77.988.748,45
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	A	USME	$ 722.371.291,19	$ 852.869.715,00	$ 130.498.423,81
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	A	USME	$ 650.314.135,76	$ 456.055.373,73	-$ 194.258.762,03
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	A	USME	$ 433.947.764,88	$ 704.439.172,88	$ 270.491.408,00
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE	C	USME	$ 344.095.358,57	$ 153.809.158,52	-$ 190.286.200,05
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA	A	USME	$ 531.757.266,65	$ 327.478.143,93	-$ 204.279.122,72
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	A	USME	$ 267.275.988,40	$ 477.565.111,13	$ 210.289.122,73
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES	A	USME	$ 380.100.976,85	$ 293.925.809,73	-$ 86.175.167,12
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	A	USME	$ 553.742.321,15	$ 374.852.027,09	-$ 178.890.294,06
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES	A	USME	$ 510.998.863,80	$ 268.089.312,39	-$ 242.909.551,41
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	B	USME	$ 354.309.034,58	$ 335.459.416,92	-$ 18.849.617,66
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE	C	USME	$ 433.030.722,76	$ 190.736.713,24	-$ 242.294.009,52
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 552.375.359,14	$ 459.689.589,81	-$ 92.685.769,33
21	IED VENECIA SEDE B	B	TUNJUELITO	$ 576.674.868,64	$ 444.538.322,65	-$ 132.136.545,99
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	A	TUNJUELITO	$ 29.577.113,88	$ 75.812.263,51	$ 46.235.149,63
23	DLE USME	N/A	USME	$ 169.805.611,49	$ 117.815.760,40	-$ 51.989.851,09
24	DLE TUNJUELITO	N/A	TUNJUELITO	$ 66.103.535,92	$ 74.929.438,00	$ 8.825.902,08
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 11.065.642.509,00**	**$ 10.637.786.799,49**	**-$ 427.855.709,51**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 11.065.642.509,00

SEMANA No.	42	DEL	25-sep-23	AL	1-oct-23

OBRAS PRIORITARIAS Y EMERGENCIAS				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	IED PAULO FREILE	A	USME	$ 0,00	$ 6.145.206,86	$ 6.145.206,86
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	B	USME	$ 0,00	$ 436.139.844,63	$ 436.139.844,63
3	IED ALMIRANTE PADILLA	A	USME	$ 0,00	$ 50.297.065,00	$ 50.297.065,00
4	LOTE VILLA ROSITA	N/A	USME	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	IED SANTA MARTA	A	USME	$ 0,00	$ 36.901.806,06	$ 36.901.806,06
6	IED ORLANDO FALS BORDA	A	USME	$ 0,00	$ 6.586.950,71	$ 6.586.950,71
7	IED SAN CAYETANO	A	USME	$ 0,00	$ 30.681.725,51	$ 30.681.725,51
8	RURAL LA MAYORIA	A	USME	$ 0,00	$ 9.553.145,67	$ 9.553.145,67
9	DIRECCION LOCAL USME	N/A	USME	$ 0,00	$ 34.103.091,00	$ 34.103.091,00
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	B	USME	$ 0,00	$ 334.849.212,85	$ 334.849.212,85
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	A	USME	$ 0,00	$ 20.096.878,06	$ 20.096.878,06
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	A	USME	$ 0,00	$ 12.823.028,88	$ 12.823.028,88
13	IED SANTA LIBRADA	A	USME	$ 0,00	$ 600.221,00	$ 600.221,00
14	IED MIGUEL DE CERVANTES	A	USME	$ 0,00	$ 26.272.480,04	$ 26.272.480,04
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 298.553,90	$ 298.553,90
16	FRANCISCO ANTONIO ZEA		USME	$ 0,00	$ 598.660,85	$ 598.660,85
17	IED CIEUDAD DE VILLAVICENCIO	C	USME	$ 0,00	$ 99.703.707,49	$ 99.703.707,49
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA		USME	$ 0,00	$ 699.029,40	$ 699.029,40
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2		USME	$ 0,00	$ 29.389.803,40	$ 29.389.803,40
20	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	A	TUNJUELITO	$ 0,00	$ 9.077.223,00	$ 9.077.223,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 1.008.154.304,00**	**$ 1.144.817.634,31**	**$ 136.663.330,31**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	**$ 1.008.154.304,00**

VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.073.796.813	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 11.782.604.434
		DIFERENCIA	$ 291.192.379

Observaciones:
Se evidencia saldo a favor de $291.192.379, sin embargo, a la fecha se han asignado parte de estos recursos a otras actividades, por lo cual se encuentra pendiente realizar actualización del balance por parte del contratista de obra.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN


SEMANA No.	42	DEL	25-sep-23	AL	1-oct-23

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	INICIO	FIN	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	$ 10.637.786.799	27/12/2022	26/12/2023	365,00	83,90%	92,60%	8,69%	337,98	306,24	31,73
1	IED USMINIA SEDE C	$ 363.223.880	18/01/2023	6/06/2023	139,00	100,00%	100,00%	0,00%	139,00	139,00	0,00
2	IED BRASILIA SEDE A	$ 804.891.866	13/02/2023	30/07/2023	167,00	100,00%	100,00%	0,00%	167,00	167,00	0,00
3	COLEGIO RURAL EL UVAL	$ 1.171.229.568	9/01/2023	29/09/2023	263,00	100,00%	99,00%	-1,00%	260,37	263,00	-2,63
4	IED NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS	$ 763.066.358	18/01/2023	20/08/2023	214,00	100,00%	100,00%	0,00%	214,00	214,00	0,00
5	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 777.055.527	18/01/2023	20/09/2023	245,00	100,00%	99,00%	-1,00%	242,55	245,00	-2,45
6	IED LOS TEJARES	$ 184.605.621	18/01/2023	28/03/2023	69,00	100,00%	100,00%	0,00%	69,00	69,00	0,00
7	IED ESTANISLAO ZULETA SEDE B	$ 614.017.877	18/01/2023	28/07/2023	191,00	100,00%	100,00%	0,00%	191,00	191,00	0,00
8	INEM SANTIAGO PEREZ	$ 351.630.774	13/02/2023	22/06/2023	129,00	100,00%	100,00%	0,00%	129,00	129,00	0,00
9	COLEGIO RURAL CURUBITAL SEDE A	$ 852.869.715	28/08/2023	23/12/2023	117,00	29,00%	91,00%	62,00%	106,47	33,93	72,54
10	COEGIO RURAL EL DESTINO SEDE A	$ 456.055.374	26/04/2023	5/07/2023	70,00	100,00%	100,00%	0,00%	70,00	70,00	0,00
11	IED FABIO LOZANO SIMONELI SEDE A	$ 704.439.173	9/05/2023	21/10/2023	165,00	90,00%	73,00%	-17,00%	120,45	148,50	-28,05
12	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C	$ 153.809.159	14/11/2023	27/12/2023	43,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA SEDE A	$ 327.478.144	14/07/2023	31/10/2023	109,00	72,00%	100,00%	28,00%	109,00	78,48	30,52
14	COLEGIO RURAL LA UNION SEDE A	$ 477.565.111	2/10/2023	23/12/2023	82,00	0,00%	100,00%	100,00%	82,00	0,00	82,00
15	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A	$ 293.925.810	1/07/2023	30/09/2023	91,00	100,00%	100,00%	0,00%	91,00	91,00	0,00
16	COLEGIO RURAL LOS ANDES SEDE A	$ 374.852.027	15/03/2023	14/07/2023	121,00	100,00%	100,00%	0,00%	121,00	121,00	0,00
17	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES SEDE A	$ 268.089.312	24/04/2023	14/07/2023	81,00	100,00%	100,00%	0,00%	81,00	81,00	0,00
18	IED OSWALDO GUAYASAMIN SEDE B	$ 335.459.417	15/05/2023	31/07/2023	77,00	100,00%	100,00%	0,00%	77,00	77,00	0,00
19	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	$ 190.736.713	14/06/2023	30/09/2023	108,00	100,00%	100,00%	0,00%	108,00	108,00	0,00
20	IED JOSE MARIA CORDOBA SEDE A	$ 459.689.590	16/06/2023	11/10/2023	117,00	93,00%	99,00%	6,00%	115,83	108,81	7,02
21	IED VENECIA SEDE B	$ 444.538.323	30/06/2023	4/11/2023	127,00	95,00%	100,00%	5,00%	127,00	120,65	6,35

										CONTROL DE PROGRAMACIÓN		
SEMANA No.	42	DEL	25-sep-23				AL		1-oct-23			
22	IED BERNARDO JARAMILLO SEDE A	$ 75.812.264	4/07/2023	4/09/2023	62,00	100,00%	100,00%	0,00%	62,00	62,00	0,00	
23	DILE USME	$ 117.815.760	10/07/2023	25/11/2023	138,00	64,00%	64,00%	0,00%	88,32	88,32	0,00	
24	DILE TUNJUELITO	$ 74.929.438	10/07/2023	25/11/2023	138,00	64,00%	95,00%	31,00%	131,10	88,32	42,78	
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 10.637.786.799										
1	IED PAULO FREILE	$ 6.145.207	28/01/2023	9/02/2023	12,00	100,00%	100,00%	0,00%	12,00	12,00	0,00	
2	IED FEDERICO GARCIA LORCA	$ 436.139.845	5/02/2023	15/06/2023	130,00	100,00%	100,00%	0,00%	130,00	130,00	0,00	
3	IED ALMIRANTE PADILLA	$ 50.297.065	22/07/2023	29/07/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00	
4	LOTE VILLA ROSITA	$ -	RETIRADO	RETIRADO	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
5	IED SANTA MARTA	$ 36.901.806	15/02/2023	19/03/2023	32,00	100,00%	100,00%	0,00%	32,00	32,00	0,00	
6	IED ORLANDO FALS BORDA	$ 6.586.951	14/04/2023	21/04/2023	7,00	100,00%	100,00%	0,00%	7,00	7,00	0,00	
7	IED SAN CAYETANO	$ 30.681.726	3/04/2023	2/05/2023	29,00	100,00%	100,00%	0,00%	29,00	29,00	0,00	
8	RURAL LA MAYORIA	$ 9.553.146	13/08/2023	18/08/2023	5,00	100,00%	100,00%	0,00%	5,00	5,00	0,00	
9	DIRECCION LOCAL USME	$ 34.103.091	17/03/2023	23/03/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00	
10	IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	$ 334.849.213	10/04/2023	10/05/2023	30,00	100,00%	98,00%	-2,00%	29,40	30,00	-0,60	
11	IED JUAN LUIS LONDOÑO	$ 20.096.878	14/03/2023	17/04/2023	34,00	100,00%	100,00%	0,00%	34,00	34,00	0,00	
12	IED PROVINCIA DE QUEBEC	$ 12.823.029	1/02/2023	5/02/2023	4,00	100,00%	100,00%	0,00%	4,00	4,00	0,00	
13	IED SANTA LIBRADA	$ 600.221	16/03/2023	25/03/2023	9,00	100,00%	100,00%	0,00%	9,00	9,00	0,00	
14	IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	$ 26.272.480	4/09/2023	25/09/2023	21,00	100,00%	99,00%	-1,00%	20,79	21,00	-0,21	
15	IED RAFAEL URIBE URIBE	$ 298.554	17/02/2023	18/02/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
16	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA ETAPA 1	$ 598.661	26/04/2023	27/04/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
17	IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO	$ 99.703.707	25/05/2023	19/06/2023	25,00	100,00%	100,00%	0,00%	25,00	25,00	0,00	
18	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 699.029	21/06/2023	10/07/2023	19,00	100,00%	100,00%	0,00%	19,00	19,00	0,00	
19	IED PAULO FREILE ETAPA 2	$ 29.389.803	21/08/2023	27/08/2023	6,00	100,00%	100,00%	0,00%	6,00	6,00	0,00	
19	IED RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2	$ 9.077.223	31/05/2023	21/05/2023	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	1,00	1,00	0,00	
	VALOR PRESUPUESTADO OBRA PROGRAMADA	$ 1.144.817.634										

CONTROL DE PROGRAMACIÓN					
SEMANA No.	42	DEL	25-sep-23	AL	1-oct-23

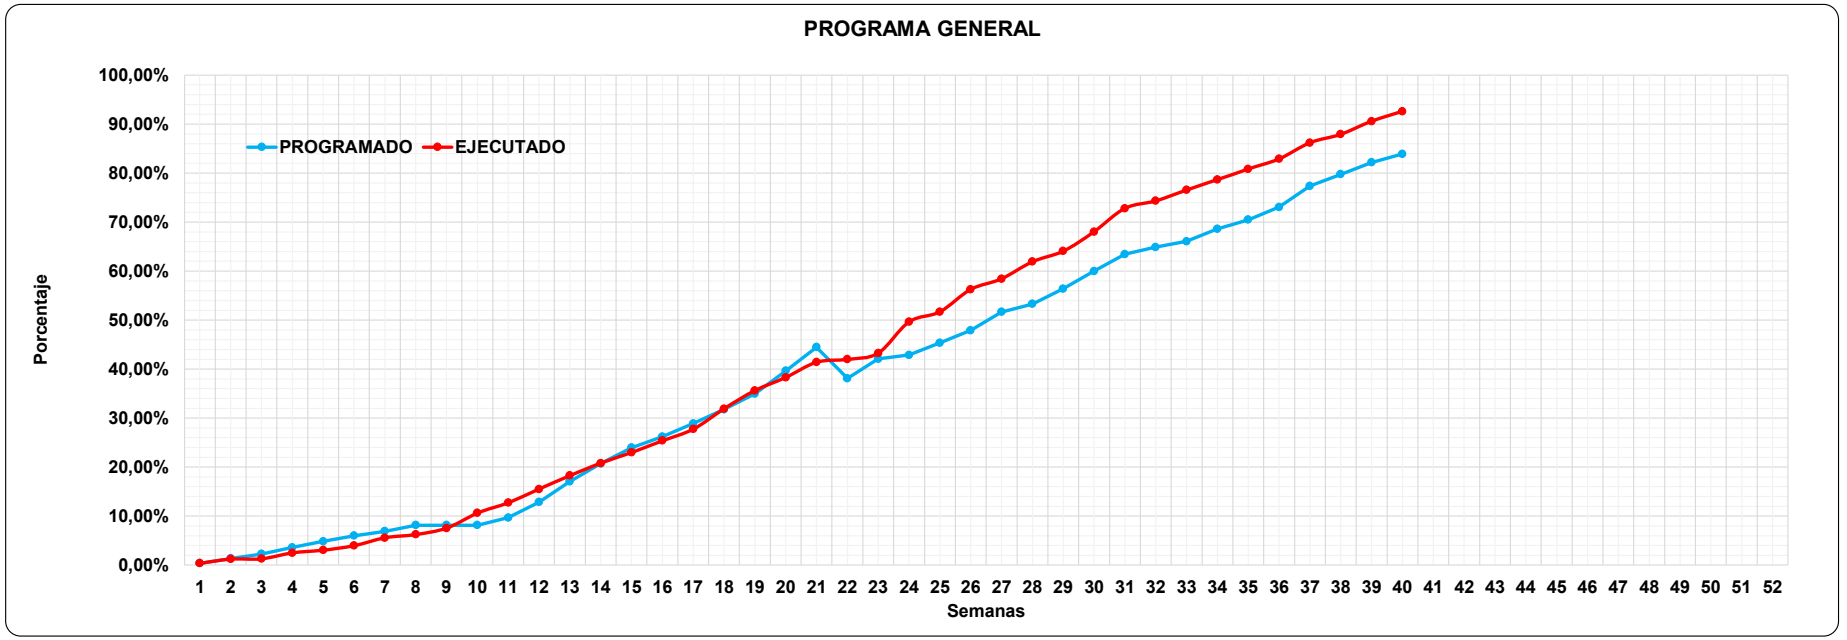


OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- De acuerdo con los planes de contingencia y reprogramación presentados por el contratista mediante comunicado CO.EDUCACION.BOG-223-2022, a la fecha se cuenta con un avance a favor del 8.69%, presentándose atrasos puntuales en la sede Fabio Lozano Simoneli.
- Se realiza ajuste de los valores presupuestados de acuerdo con el último balance remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico del día 06 de septiembre de 2023, no obstante, se encuentra pendiente realizar la actualización de dicho balance.
- Las fechas de programación de las intervenciones son las propuestas por el contratista en la programación general vigente.
- Las fechas de programación de las emergencias son las propuestas por el contratista y aprobadas por esta interventoría, estas fechas son tentativas y se ajustarán de acuerdo con la prioridad de cada emergencia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ					**REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO**

SEMANA No.	42		25-sep-23	**AL**	1-oct-23

COLEGIO RURAL EL UVAL

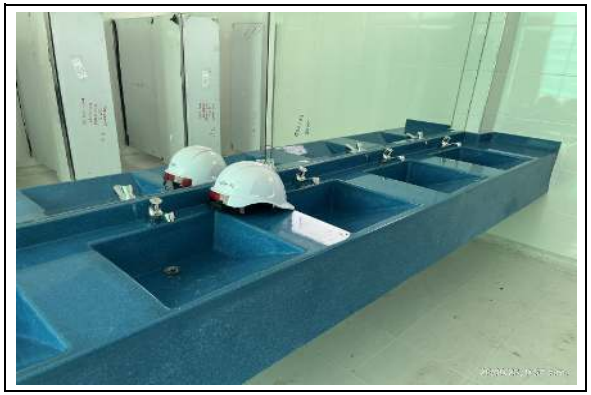

INSTALACION DE ESPEJOS



INSTALACION DE ESPEJOS



TANQUES DE ALMACENAMIENTO

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI - SEDE A



FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA



PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA



DESMONTE DE CIELO RASO

COLEGIO RURAL EL CURUBITAL



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE LUMINARIAS



INSTALACION DE PISOS EN GRANITO



INSTALACION DE PUNTOS SANITARIOS



REPISICION DE ENCHAPE

IED JOSE MARIA CORDOBA - SEDE A		
		
PINTURA DE GRADERIAS	INSTALACION DE REJILLAS EN CARCAMO NUEVO	INSTALACION DE REJILLAS EN CARCAMO EXISTENTE
IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - SEDE A		
		
FUNDIDA DE VIGA CORONA MURO JARDINERA	FUNDIDA DE VIGA CORONA MURO JARDINERA	ADECUACION DE TERRENO NATURAL

DILE USME		
		
FUNDIDA AFINADO DE PISO	**FUNDIDA AFINADO DE PISO**	**INSTALACION DE PUNTOS SANITARIOS**
