ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

Contrato No. CMA-SIP040-2022-11133

1. Fecha de elaboración del informe:

DÍA:	**23**	**MES:**	**12**	**AÑO:**	**2022**

2. Término de ejecución

Fecha Inicial:	**23/11/2022**	**Fecha Final:**	**31/12/2022**

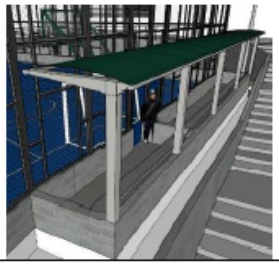
3. Información del contrato:

Contratista:	ANDRES OCHOA OJEDA
Lugar de ejecución:	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Objeto Contractual:	CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCION UNIVERSITARIA a entregar en compraventa: Cortinas Metálicas Enrollables en fleje plano Micro Perforado, con operador lateral (motor referencia HULK750), cortina enrollable en lamas metálicas microperforadas con operación manual, puerta con módulos fijos y dos alas batientes con estructura metálica y lámina microperforada, módulo fijo con perfiles metálicos PTE, lámina galvanizada calibre 18 tipo U anclada o fijada, bancas en concreto, carpa tipo concha en lona, Mobiliario de dotación, malla tipo Nylon entregados en operación, de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones comerciales que se detallan en el presente contrato.
Especificaciones del objeto-alcance:	Compraventa: Cortinas Metálicas Enrollables en fleje plano Micro Perforado, con operador lateral (motor referencia HULK750), cortina enrollable en lamas metálicas microperforadas con operación manual, puerta con módulos fijos y dos alas batientes con estructura metálica y lámina microperforada, módulo fijo con perfiles metálicos PTE, lámina galvanizada calibre 18 tipo U anclada o fijada, bancas en concreto, carpa tipo concha en lona, Mobiliario de dotación, malla tipo Nylon entregados en operación, de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones comerciales que se detallan en el presente contrato.
Actividades	

LOTE#2 MOBILIARIO EXTERIORES

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro, transporte y entrega en la institución de bancas de concreto reforzado tipo metro en forma prismática, prefabricadas, de peso 269kg dimensiones 2,30mx0,45mx0,45m, construida en micro concretos y granito de alta resistencia a la vista, la banca debe corresponder a la imagen de referencia, Debe entregarse en el sitio indicado por la institución. 	Unidad	12
Suministro, transportes y entrega en la institución de bancas de concreto reforzado tipo metro, frontal semicurva, trasero recto, prefabricadas, de peso 400kg dimensiones 2,50mx0,45mx0,45m, construida en micro concretos y granito pulido de alta resistencia a la vista, la banca debe corresponder imagen de referencia, Debe entregarse en el sitio indicado por la institución. 	Unidad	4

LOTE#3 CARPA GRADERIA DE JUGADORES

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cubierta tipo carpa instalada y puesta en funcionamiento en lona brigadier 1000 (color verde institucional), tela poliéster de alta tenacidad, impregnada con PVC flexible 100% impermeable, con protección biosida y contra la acción de los rayos U.V, en estructura metálica sobre gradería de jugadores dimensiones de la cubierta 15mx1,80m, semi curva, soportes en estructura metálica cada 3 metros en tubería cuadrada 150mmx150mm en voladizo, anclada sobre el piso y estructura metálica para dicha cubierta. En pintura electrostática. Incluye faldón perimetral de 20cm de alto y logos a lo largo del faldón y un logo institucional a color central sobre la lona de 1,20 de altura x2,50 de ancho full print, incluye sellos, fijaciones y ajustes, (Color a definir y verificación de medidas en sitio cuando se adjudique) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y estabilidad. Según imagen de referencia. 	Global	1

<table>
<tr><th colspan="4">Duración del contrato</th></tr>
<tr><td>Fecha de Inicio:</td><td>23/11/2022</td><td>Fecha terminación:</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td>Valor del contrato:</td><td colspan="3">$53.198.950</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Forma de pago:</td><td colspan="3">El pago se hará efectivo dentro de los treinta días calendario siguiente a la facturación y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. No habrá lugar a anticipos.</td></tr>
<tr><td>Póliza</td><td colspan="3">POLIZA No. 11-44-101194020
<table>
<tr><th rowspan="2">Tipo de Amparo</th><th colspan="2">Cobertura de la Póliza</th><th rowspan="2">Valor Amparado</th></tr>
<tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>21/11/2022</td><td>10/07/2023</td><td>$7.979.842.50</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>21/11/2022</td><td>10/07/2023</td><td>$5.319.895</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>21/11/2022</td><td>10/07/2023</td><td>$5.319.895</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>21/11/2022</td><td>10/01/2026</td><td>$5.319.895</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Interventor o Supervisor:</td><td colspan="3">JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO</td></tr>
</table>

En Medellín, a los dos (23) días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en la Carrera 78 no. 65-46 de la ciudad de Medellín, Andrés Ochoa Ojeda mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.79.949.302 expedida en el municipio de Silvia, actuando como persona NATURAL quien concurre en calidad de CONTRATISTA y Jorge William Arredondo Arango identificado con cédula de ciudadanía No.71.719.090 expedida en el municipio de Medellín, en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

ELEMENTOS	CANTIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES
Suministro, transporte y entrega en la institución de bancas de concreto tipo metro en forma prismática, prefabricadas, de peso 269kg dimensiones 2,30mx0,45mx0,45m resistencia xx, construida en micro concretos y granito de alta resistencia a la vista y la banca debe corresponder a la imagen de referencia.	12	SI	N/A
Suministro, transportes y entrega en la institución de bancas de concreto tipo metro, frontal semicurvo, trasero recto, prefabricadas, de peso 400kg dimensiones 2,50mx0,45mx0,45m resistencia xx, construida en micro concretos y granito pulido de alta resistencia a la vista y la banca debe corresponder imagen de referencia.	4	SI	N/A
ST Cubierta tipo carpa en lona brigadier 1000 (color verde institucional), tela poliéster de alta tenacidad, impregnada con PVC flexible 100% impermeable, con protección biosida y contra la acción de los rayos U.V, en estructura metálica sobre gradería de jugadores dimensiones de la cubierta 15mx1,80m, semi curva, soportes en estructura metálica cada 3 metros en tubería cuadrada 150mmx150mm en voladizo, anclada sobre el piso y estructurura metálica para dicha cubierta. En pintura electrostática. Incluye faldón frontal de 20cm de alto y logos a lo largo del faldón y un logo institucional a color central sobre la lona de 1,20 de altura x2,50 de ancho full print. Según imagen de referencia.	1	SI	N/A

OBSERVACIONES
No se presentan Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los insumos del objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Las actividades descritas han sido verificadas en su calidad y cantidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Medellín el 23 de diciembre de 2022.

ANDRES OCHOA OJEDA
C.C. 79.949.302
EL CONTRATISTA

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
C.C. 71.719.090
EL VERIFICADOR-SUPERVISOR

JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA
C.C. 15.459.054
APOYO A LA SUPERVISION

FRANCISCO CASTAÑO GIRALDO
C.C. 1.037.634.751
APOYO A LA SUPERVISION

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar constancia en esta acta en el ítem de observaciones, indicando la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, equipos biomédicos, etc.
