CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023

“ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1”

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA

PERIODO DEL 01/08/2023 al 31/08/2023

Presentado por:

CONSORCIO SANTANDER

BUCARAMANGA
COLOMBIA
2023

TABLA DE CONTENIDO.

Descripción del Proyecto..... 3

Diagnostico de la situación actual según lo establecido en el Plan de Gerencia....¡Error! Marcador no definido.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA. .....¡Error! Marcador no definido.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ALCANCE. 3

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE REQUISITOS. 7

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TIEMPO. 8

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COSTOS. 13

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 13

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 14

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 14

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO. 17

INFORME No. 4 – SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CONTRATO DE OBRA No. 22 de 2023.

Descripción del Proyecto

El objetivo de este PLAN DE GERENCIA DE OBRA es determinar los lineamientos para establecer e implementar la política integral del CONSORCIO SANTANDER y su organización; y establecer las acciones integrales a ser adoptadas para cumplir con esta política en la ejecución del Contrato de obra "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1". El plan de gerencia esbozado en este seguimiento cumple con los lineamientos básicos del PMBOK y los requisitos del proceso de contratación del mismo.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ALCANCE.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión del alcance se abordan las siguientes definiciones con los formatos a los que haya lugar.

- Roles y Responsabilidades

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 1.1. - DEFINICIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"			
GESTIÓN DEL ALCANCE			
FORMATO 1.1. - DEFINICIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES			
NOMBRE	**PAPEL**	**CORREO**	**RESPONSABILIDADES**
Ernesto Montañez Mora	Director de obra	consorciosantander2023@gmail.com	Realizar gestión y control sobre el avance y desarrollo del proyecto.
Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	consorciosantander2023@gmail.com	Realizar la implementación y el seguimiento al Plan de Gerencia del Proyecto.
Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	residenteobracs@gmail.com	Realizar la gestión en campo del desarrollo del proyecto.
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	consorciosantanderbga@gmail.com	Realizar la gestión social del proyecto con la comunidad beneficiada e interesado del área de insidencia.
Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com	Realizar la gestión de la salud, seguridad, medio ambiente y calidad en el desarrollo del proyecto.
Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com	Realizar el control del cumplimiento al alcance y requisitos de actividades en campo del proyecto.
Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	inspector3obracs@gamil.com	Realizar la supervisión al cumplimiento de las responsabilidades del interventor y el ejecutor.
Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra	inspector2obracs@gmail.com	Representar al propietario del proyecto y sus intereses ante el ejecutor, la interventoría e interesados.
Comunidad el barrio Buena Vista	Beneficiarios del proyecto - Veedores del proyecto		Velar por el adecuado cumplimiento del alcance del proyecto.

- Definición alcance

El alcance principal es dar feliz término y cumplimiento al contrato de obra No. 022 de 2023 cuyo objeto es: "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1**".

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación de espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por ultimo, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieran.

A continuación se presentan las zonas donde se realizaran las intervenciones del proyecto:

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

- Información general del contrato de Obra

CONTRATO No:	**22 DE 2023**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901677862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
FECHA DE LA SUSPENSIÓN	13 JULIO DE 2023
FECHA DEL REINICIO	24 JULIO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIIAL:	15 DE JULIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

- Estructura del desglose del trabajo

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 1.2. - DICCIONARIO DE LA EDT**" del Plan de Gerencia.

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código CCE-EICP-FM-14 **Versión** 3


FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00
Subtotal								**$ 15.356.640,00**
				DEMOLICIONES				
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00
Subtotal								**$ 270.062.100,00**
				EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00
Subtotal								**$ 284.279.700,00**
				ESPACIO PUBLICO				
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00
Subtotal								**$ 1.134.170.160,00**
				OBRAS COMPLEMENTARIAS				
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00
Subtotal								**$ 47.205.700,00**

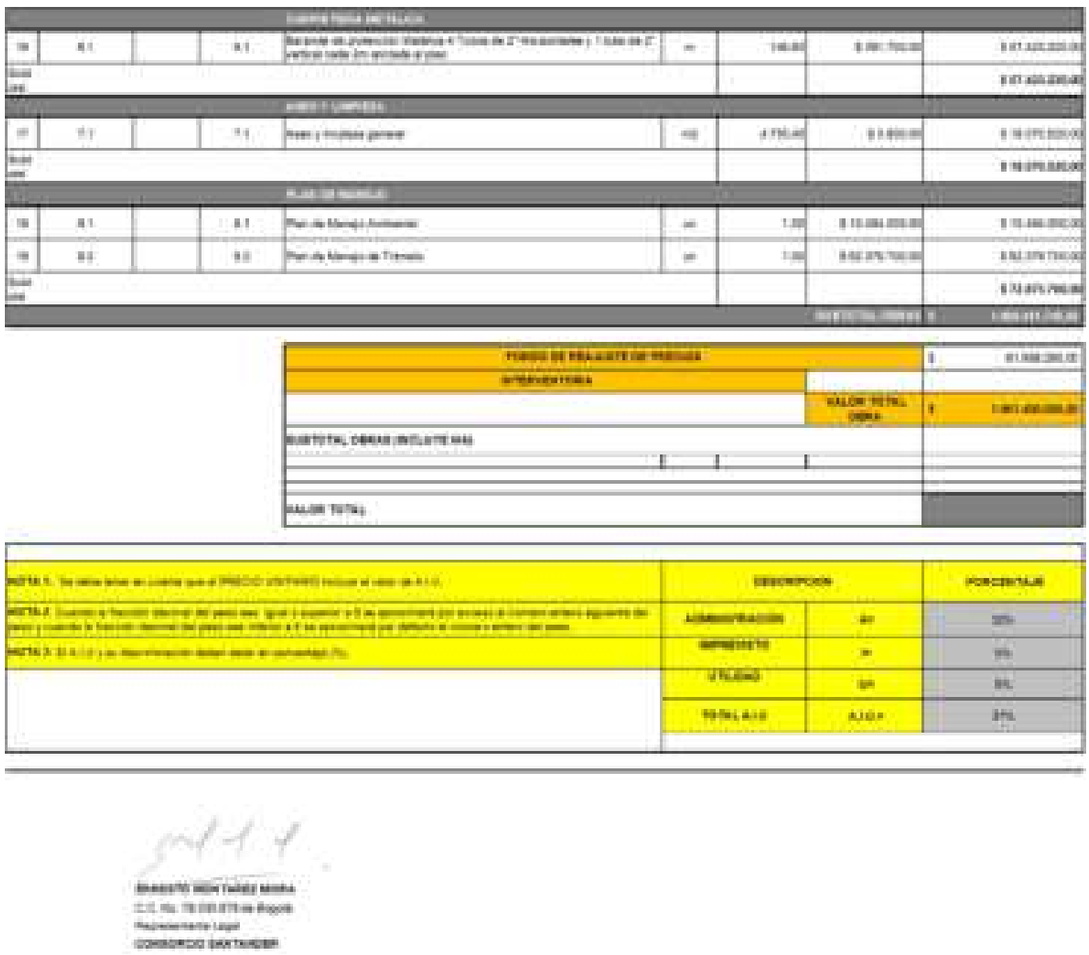

- Verificación del Alcance

Se realizaron las verificaciones del alcance de obra semanal y mensual, mediante la entrega de informes y la socialización en los comités de obra.

- Control del Alcance

Se actualizo el alcance del contrato con la firma del adicional del presente contrato de obra dada las condiciones encontradas en la ejecución de las obras desarrolladas.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE REQUISITOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de requisitos se abordan las definiciones de enfoque de gestión, configuración, priorización y medidas lo cual se plasma y refleja en el "**FORMATO 2.1. – MATRIZ DE TRAZABILIDAD A REQUISITOS**" del plan de gerencia anexa al presente informe.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"	
GESTIÓN DE REQUISITOS	
FORMATO 2.1. - MATRIZ DE TRAZABILIDAD A REQUISITOS	
Fecha de Implementación:	PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

Requisito #	Requisito Descripción	Diseño Documento de Referencia	Caso de prueba de referencia	Validación de aceptación del usuario	Comentarios
1	Cortes semanales	Informe cortes semanales	Reporte del avance en actividades según mediciones de campo	Presentación de avance acordado entre ejecutor e interventoría	Ejecutado
2	Reporte mensual sobre el avance del proyecto	Informe mensual de avance	Situación detallada del avance del proyecto.	Presentación del informe ante interventoría y municipio	Se presentaron demoras en su cumplimiento

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TIEMPO.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión del tiempo se presenta el **cronograma y programación de la obra en el programa Project**, aprobado por interventoría, que hace parte del plan de gerencia y se anexa al presente informe.

Con base en la programación presentada, y a los hitos definidos para la gestión del tiempo en el Plan de Gerencia, se presenta la siguiente table sobre el alcance y cumplimiento de los mismos:

	HITOS DE CONTROL DE AVANCE	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	Fin	ESTADO	CUMPLIMIENTO
1.	CRA 34 CLL 13 Y 14 FANJAR ORIENTAL LOS PINOS	50 días	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	ENTREGADO
2.	CRA 34 CLL 12 Y 13 FRANJA ORIENTAL LOS PINOS	50 días	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	ENTREGADO
3.	ENTRADA LA VEGA MORRORICO	49 días	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	ENTREGADO
4.	17 COMUNA 13 SAN ALONSO	125 días	10/04/2023	12/08/2023	INICIADO	ENTREGADO
5.	CRA 29 ENTRE CLL 10 Y 11 LA UNIVERSIDAD	23 días	29/05/2023	20/06/2023	TERMINADO	ENTREGADO
6.	CLL 9A ENTRE 24 Y 25 SECTOR IMPAR BARRIO UNIVERSIDAD	72 días	29/05/2023	8/08/2023	INICIADO	ENTREGADO
7.	CRA 17, 16 Y 15 CON CALLE 4 Y 5 CHAPINERO	103 días	6/06/2023	16/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
8.	CLL 31 CON CRA 28 LA AURORA	70 días	10/06/2023	18/08/2023	INICIADO	ENTREGADO
9.	CAMPO MADRID	68 días	25/07/2023	30/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
10.	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA SUR SAN ALONSO	24 días	9/08/2023	1/09/2023	INICIADO	ENTREGADO
11.	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA NORTE SAN ALONSO	19 días	14/08/2023	1/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
12.	18 COMUNA 14 LIMONCITO	89 días	28/08/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
13.	1 COMUNA 1 EL ROSAL	85 días	1/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
14.	4 COMUNA 2 LA JUVENTUD	84 días	2/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
15.	3 COMUNA 2 LA INDEPENDENCIA	75 días	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
16.	CRA 25 CLL 3 Y 5 LA INDEPENDENCIA	75 días	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
17.	CRA 23A #2-22	54 días	2/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
18.	ALBANIA COMUNA 14	33 días	23/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR

Línea Base Control del Tiempo

Según el cronograma y programación presentados y aprobados para la moderatoria del contrato se actualizo el programa de trabajo. Se presenta la siguiente curva S o línea base del proyecto para con ella realizar el seguimiento a la gestión del tiempo del proyecto:

SEM	FECHA INICIAL	FECHA TERMINACION	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
1	16/03/2023	19/03/2023	$ 12.348.018,00	$ 12.348.018,00	0,49%	0,49%
2	20/03/2023	26/03/2023	$ 25.452.038,00	$ 37.800.056,00	1,01%	1,50%
3	27/03/2023	2/04/2023	$ 17.640.026,00	$ 55.440.082,00	0,70%	2,20%
4	3/04/2023	9/04/2023	$ 22.680.034,00	$ 78.120.116,00	0,90%	3,10%
5	10/04/2023	16/04/2023	$ 55.440.083,00	$ 133.560.199,00	2,20%	5,30%
6	17/04/2023	23/04/2023	$ 30.240.045,00	$ 163.800.244,00	1,20%	6,50%
7	24/04/2023	30/04/2023	$ 5.460.008,00	$ 169.260.252,00	0,22%	6,72%
8	1/05/2023	7/05/2023	$ 20.160.030,00	$ 189.420.282,00	0,80%	7,52%
9	8/05/2023	14/05/2023	$ 37.800.056,00	$ 227.220.338,00	1,50%	9,02%
10	15/05/2023	21/05/2023	$ 70.560.105,00	$ 297.780.443,00	2,80%	11,82%
11	22/05/2023	28/05/2023	$ 38.052.057,00	$ 335.832.500,00	1,51%	13,33%
12	29/05/2023	4/06/2023	$ 30.744.046,00	$ 366.576.546,00	1,22%	14,55%
13	5/06/2023	11/06/2023	$ 45.612.068,00	$ 412.188.614,00	1,81%	16,36%
14	12/06/2023	18/06/2023	$ 29.484.044,00	$ 441.672.658,00	1,17%	17,53%
15	19/06/2023	25/06/2023	$ 48.132.072,00	$ 489.804.730,00	1,91%	19,44%
16	26/06/2023	2/07/2023	$ 57.052.885,00	$ 546.857.615,00	2,26%	21,70%
17	3/07/2023	9/07/2023	$ 30.744.046,00	$ 577.601.661,00	1,22%	22,92%
18	10/07/2023	12/07/2023	$ 39.060.058,00	$ 616.661.719,00	1,55%	24,47%
19	24/07/2023	30/07/2023	$ 103.068.153,00	$ 719.729.872,00	4,09%	28,56%
20	31/07/2023	6/08/2023	$ 80.892.120,00	$ 800.621.992,00	3,21%	31,77%
21	7/08/2023	13/08/2023	$ 93.240.139,00	$ 893.862.131,00	3,70%	35,47%
22	14/08/2023	20/08/2023	$ 83.160.124,00	$ 977.022.255,00	3,30%	38,77%
23	21/08/2023	27/08/2023	$ 74.340.111,00	$ 1.051.362.366,00	2,95%	41,72%
24	28/08/2023	3/09/2023	$ 98.028.146,00	$ 1.149.390.512,00	3,89%	45,61%
25	4/09/2023	10/09/2023	$ 100.044.149,00	$ 1.249.434.661,00	3,97%	49,58%
26	11/09/2023	17/09/2023	$ 105.840.158,00	$ 1.355.274.819,00	4,20%	53,78%
27	18/09/2023	24/09/2023	$ 106.092.158,00	$ 1.461.366.977,00	4,21%	57,99%
28	25/09/2023	1/10/2023	$ 150.948.225,00	$ 1.612.315.202,00	5,99%	63,98%
29	2/10/2023	8/10/2023	$ 142.128.212,00	$ 1.754.443.414,00	5,64%	69,62%
30	9/10/2023	15/10/2023	$ 170.856.254,00	$ 1.925.299.668,00	6,78%	76,40%
31	16/10/2023	22/10/2023	$ 82.152.122,00	$ 2.007.451.790,00	3,26%	79,66%
32	23/10/2023	29/10/2023	$ 102.312.152,00	$ 2.109.763.942,00	4,06%	83,72%
33	30/10/2023	5/11/2023	$ 143.388.213,00	$ 2.253.152.155,00	5,69%	89,41%
34	6/11/2023	12/11/2023	$ 86.940.129,00	$ 2.340.092.284,00	3,45%	92,86%
35	13/11/2023	19/11/2023	$ 112.140.167,00	$ 2.452.232.451,00	4,45%	97,31%
36	20/11/2023	24/11/2023	$ 67.771.300,00	$ 2.520.003.750,00	2,69%	100,00%

Se tiene un cronograma d trabajo proyectado a 36 semanas de trabajo, desde la firma del acta de inicio de fecha 16 de marzo de 2023 hasta el 24 de noviembre del 2023, teniendo en cuenta que se presentó una suspensión de obra el día 14 de julio y un reinicio el 25 de julio del año en curso.




Se presenta el resumen de los valores reportados y ejecutados hasta la semana No. 24 que corresponde a la fecha de corte del 30 de Agosto de 2023.

SEMANA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	16/03/2023	19/03/2023	$ 12.348.018,38	$ 12.348.018,38	0,49%	0,49%
2	20/03/2023	26/03/2023	$ 25.452.037,89	$ 37.800.056,27	1,01%	1,50%
3	27/03/2023	2/04/2023	$ 17.640.026,26	$ 55.440.082,52	0,70%	2,20%
4	3/04/2023	9/04/2023	$ 22.680.033,76	$ 78.120.116,28	0,90%	3,10%
5	10/04/2023	16/04/2023	$ 55.440.082,52	$ 133.560.198,80	2,20%	5,30%
6	17/04/2023	23/04/2023	$ 30.240.045,01	$ 163.800.243,82	1,20%	6,50%
7	24/04/2023	30/04/2023	$ 5.544.008,25	$ 169.344.252,07	0,22%	6,72%
8	1/05/2023	7/05/2023	$ 20.160.030,01	$ 189.504.282,08	0,80%	7,52%
9	8/05/2023	14/05/2023	$ 37.800.056,27	$ 227.304.338,34	1,50%	9,02%
10	15/05/2023	21/05/2023	$ 70.560.105,03	$ 297.864.443,37	2,80%	11,82%
11	22/05/2023	28/05/2023	$ 38.052.056,64	$ 335.916.500,01	1,51%	13,33%
12	29/05/2023	4/06/2023	$ 30.744.045,76	$ 366.660.545,77	1,22%	14,55%
13	5/06/2023	11/06/2023	$ 45.612.067,89	$ 412.272.613,66	1,81%	16,36%
14	12/06/2023	18/06/2023	$ 29.484.043,89	$ 441.756.657,55	1,17%	17,53%
15	19/06/2023	25/06/2023	$ 48.132.071,64	$ 489.888.729,19	1,91%	19,44%
16	26/06/2023	2/07/2023	$ 56.952.084,77	$ 546.840.813,97	2,26%	21,70%
17	3/07/2023	9/07/2023	$ 30.744.045,76	$ 577.584.859,73	1,22%	22,92%

18	10/07/2023	12/07/2023	$ 39.060.058,14	$ 616.644.917,87	1,55%	24,47%
19	24/07/2023	30/07/2023	$ 103.068.153,42	$ 719.713.071,29	4,09%	28,56%
20	30/07/2023	6/08/2023	$ 281.484.418,99	$ 1.001.197.490,27	11,17%	39,73%
21	6/08/2023	13/08/2023	$ 20.916.031,13	$ 1.022.113.521,41	0,83%	40,56%
22	13/08/2023	20/08/2023	$ 20.916.031,13	$ 1.043.029.552,54	0,83%	41,39%
23	20/08/2023	27/08/2023	$ 20.664.030,76	$ 1.063.693.583,30	0,82%	42,21%
24	27/08/2023	3/09/2023	$ 20.844.666,86	$ 1.084.538.250,16	0,83%	43,04%

Se tiene un avance de obra ejecutado del 43.04% y financieramente del 27,01% .



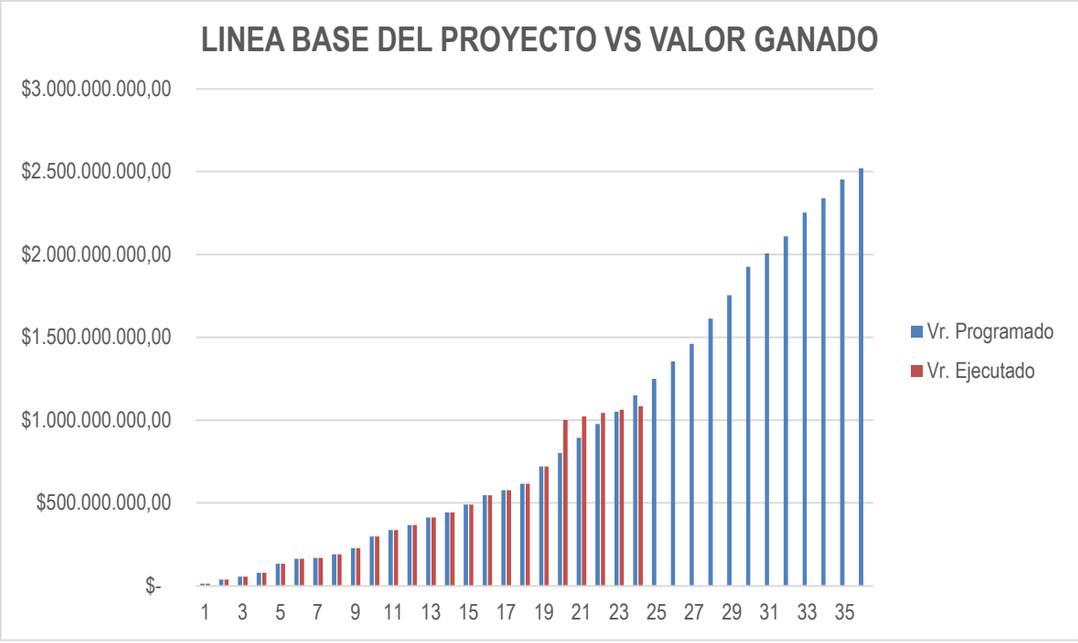

Medición Línea Base

SPI - Schedule Performance Index

$$SPI = EV/PV$$


EV = Valor ganado (ejecución real)
PV = Valor planeado (según programación)

Según lo estimado en campo y en los cortes semanales de medición del alcance nuestro EV será 43.04%, y según la programación presentada para la presente fecha de corte nuestro PV será 45.61%.

$$SPI = 0{,}4304/0{,}4561$$

$$SPI = 0{,}94$$

Al obtener un resultado del SPI menor a uno, se puede decir que a la fecha de corte la ejecución física presenta atraso con respecto a la ejecución planeada. El atraso es del **2.57%.** Una vez se modifico el contrato y se actualizo el programa de obra, se ajusta la planificación de los trabajos de acuerdo a la ejecución real y la programación de las obras por ejecutar.

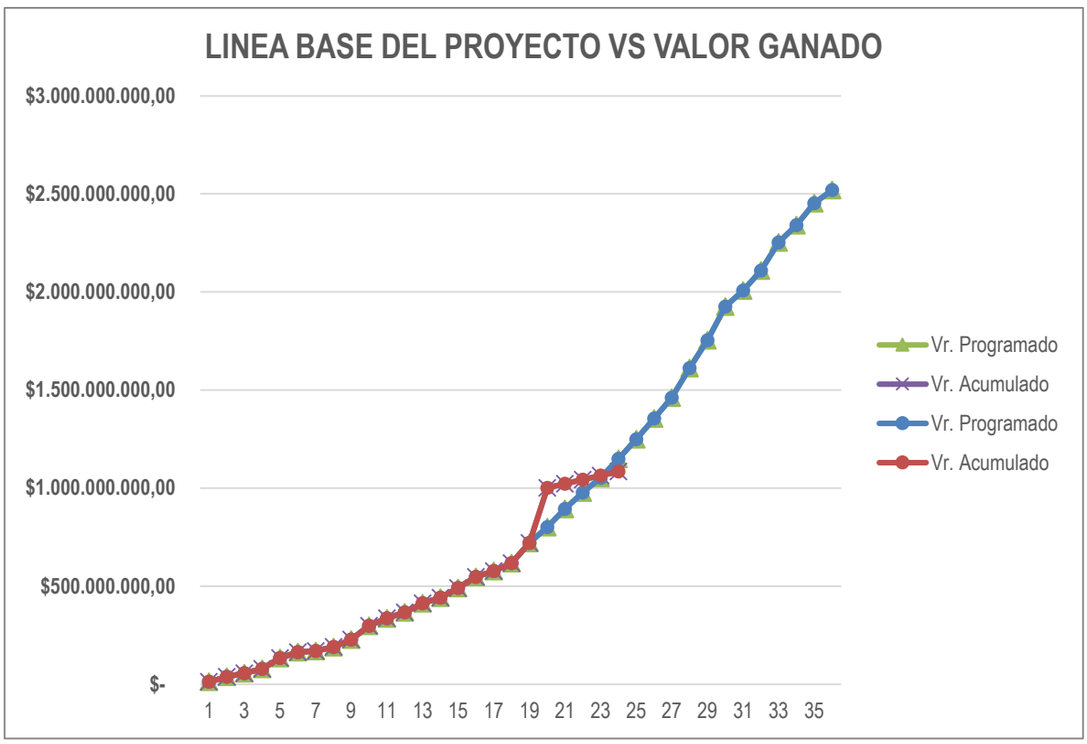

De igual manera, y según lo programada se presenta la curva S o línea base comparada con el EV obtenido en el periodo de presentación de este seguimiento, de forma que se pueda apreciar el estado de avance o atraso que se presenta en el proyecto.

Al momento no se presentan cambios al cronograma inicial ni variación al tiempo definido para el proyecto, se está trabajando en un plan de contingencia para presentar a la interventoría para contrarrestar los atrasos presentados.

Si se identificó la necesidad de aumentar los frentes de obra para nivelar el atraso evidenciado en la EDT, el cual no afectaría el tiempo inicial definido para el proyecto.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COSTOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de costos se presenta el presupuesto general de obra junto con sus documentos anexos que hacen parte formal del contrato de obra No. 022 de 2023; donde se estipula el tipo y método de estimación de los costos del proyecto y su unidad de medida.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de la calidad se presenta el Plan de Gestión de la Calidad que presentó, adoptó y fue aprobado para el ejecutor del proyecto; donde se les da alcance a los propósitos de la gestión de la calidad estipulados en el Plan de Gerencia:

- Está previsto Asegurar la calidad

Se cuenta con la póliza de Estabilidad y calidad de la obra, emitida por SEGUROS DEL ESTADO.

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 196.140.000,00
Predios Labores y Operaciones.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 392.280.000,00
Contratistas y Subcontratistas.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

- Definir cómo se gestionará la calidad

  Se gestionara llevando el control de las actividades mediante las especificaciones técnicas de cada ítem, así como la calidad de los insumos a usar. Se deberá entregar por parte del equipo técnico la certificación de los insumos a usar.

Se garantiza la adopción e implementación de este plan por parte del profesional encargado del área HSEQ, y como soporte de esto se presenta de la misma manera en que se presenta el presente informe, un informe de seguimiento mensual del área HSEQ, en el cual se encuentra desarrollado de aseguramiento de la calidad.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de recursos humanos se toma como referencia el informe mensual presentado por el área HSEQ, donde se incluye un componente completo sobre la gestión del personal con todos los requerimientos exigidos para tal fin.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de las comunicaciones se abordan las siguientes definiciones con los formatos a los que haya lugar.

- Enfoque de la gestión de las comunicaciones

Se define que la gestión de la comunicación velará porque toda información relevante del proyecto sea transmitida de manera ágil y óptima, manejando una cadena de circulación de la información para que cada interesado reciba la información que requiere oportunamente.

El enfoque de la gestión de las comunicaciones será formulado por el profesional para la gerencia del proyecto, e implementado y gestionado por el director de obra el cual velará por que cada rol para la gestión de las comunicaciones entienda su labor dentro de la cadena de circulación de la información.

- Restricciones de la gestión de las comunicaciones

El profesional para la gerencia del proyecto define las restricciones para la gestión de las comunicaciones, y el director de obra las comunica, gestiona e implementa.

Las restricciones definidas para las comunicaciones se resumen básicamente en que cualquier miembro del equipo del proyecto notifica al director de obra. El director de obra se encargará de direccionar a cada interesado que el considere dentro del equipo del proyecto.

Si la comunicación tiene alcance fuera del equipo del proyecto, el director deberá notificar única y exclusivamente a la interventoría. Desde allí la interventoría se encargará de distribuir a los interesados del proyecto de la manera que ella considere.

- Roles

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 4.1. – ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"				
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
FORMATO 4.1. - ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
Papel	**Nombre**	**Cargo**	**Organización / Departamento**	**Email**
Director de Obra	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantander2023@gmail.com
Gerente de Proyectos	Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantander2023@gmail.com
Residente de Obra	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	CONSORCIO SANTANDER	residenteobracs@gmail.com
Profesional Social	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantanderbga@gmail.com
Inspector HSEQ	Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ	CONSORCIO SANTANDER	inspectorhseqcs@gmail.com
Inspector de Obra	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector1obracs@gmail.com
Inspector de Obra	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector3obracs@gamil.com
Inspector de Obra	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector2obracs@gmail.com

- Métodos de comunicación

Las comunicaciones internas dentro del equipo del proyecto se manejaran por un grupo en la aplicación WhatsApp, y cuando se requiere comunicación privada entre dos miembros se hará mediante llamada telefónica al número móvil registrado para cada miembro del equipo.

En el correo electrónico destinado para el ejecutor del proyecto se recibirán las comunicaciones que provengan de fuera del equipo del proyecto y serán gestionadas por el director de obra y el residente.

- Matriz de las comunicaciones

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 4.2. – MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"				
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
FORMATO 4.2. – MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES				
Tipo de comunicación	**Objetivo de la Comunicación**	**Medio**	**Frecuencia**	**Formato**
Directa entre miembros del equipo del proyecto	Temas que requieren atención inmediata	Número móvil registrado de cada mienbro del equipo	Cada vez que se requiera	N.A
Virtual abierta entre mienbros del equipo del proyecto	Temas que requieren atención inmediata	App móvil - Whatsapp	Cada vez que se requiera	Grupo creado en Whatsapp
Reuniones técnico - diseño	Comités de obra para aspectos técnicos del proyecto	Presencial	Semanal	Acta de comité de obra
Reunión interna del equipo técnico del ejecutor del proyecto	Comités internos del ejecutor para evaluar y programar avance	Presencial	Semanal	Acta de comité interno
Bitácora de obra	Plasmar nformación importante y relevante de la ejecución diaria del proyecto	Escrito	Diario	De forma escrita en Bitácora de obra
Informes técnicos mensuales de avance	Reportar formalmente y dejar evidencia física del avance mensual del proyecto.	Escrito	Mensual	Informe presentado por el ejecutor

- Proceso de escalonamiento de las comunicaciones

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 4.3. – ESCALONAMIENTO Y PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"			
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES			
FORMATO 4.3. – ESCALONAMIENTO Y PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES			
Prioridad	**Definición**	**Decisión del Órgano de**	**Plazo para la Resolución**
Prioridad 1	El mayor impacto de las operaciones del proyecto o negocio. Si no se resuelve rápidamente, habrá un impacto adverso significativo a los ingresos y / o horario.	Representante legal y socios del Consorcio	El plazo de un día hábil
Prioridad 2	Impacto medio para las operaciones del proyecto o negocio que puede resultar en un impacto adverso a los ingresos y / o horario.	Patrocinador del Proyecto	El plazo de tres días hábil
Prioridad 3	Impacto leve que puede causar algunas dificultades de programación menores con el proyecto, pero no de impacto para las operaciones de negocios o ingresos.	Gerente de Proyectos	Dentro de los cinco días hábiles
Prioridad 4	Impacto insignificante de los proyectos, pero puede haber una solución mejor.	Gerente de Proyectos	El trabajo continúa y se presentan las medidas a corregir

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de riesgos, una vez estudiada y revisada, se implementa la matriz de riesgo definida en el proceso de contratación, donde se incluyen todos los componentes necesarios para la gestión del riesgo y se cumple con los requerimientos exigidos para tal fin.

Dicha matriz es anexo formal del presente informe con el fin de marcar la identificación y el seguimiento a los riesgos definidos en la misma.

Para el presente periodo no se presentaron la identificación de otros riesgos diferentes a los registrados.



YEISON ANDRES GARCES ORTEGA
PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6
PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER



Firma		
Nombre	LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES	LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
Cargo	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORÓ	APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1.GENERALIDADES 4

1.1INTRODUCCIÓN..... 4

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 5

1.3DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

1.4 ANTECEDENTES 8

1.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 9

1.6 DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL 10

1.7 ACTA DE INICIO 11

1.8 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 13

1.9 REACTIVACIÓN DEL CONTRATO 16

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA..... 18

2.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS 18

3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO 19

3.1 AVANCE DE PROGRAMACIÓN FISICA 19

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL 20

4.1 PRESUPUESTO 20

4.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO 22

4.3 AVANCE PRESUPUESTAL 23

5. INFORMACION Y ASPECTOS TÉCNICOS 24

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.1.1 ITEM 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 24

5.1.2 ITEM 2.1 DEMOLICIÓN DE VARIAS EN CONCRETO..... 27

5.1.3 ITEM 3.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 29

5.1.4 ITEM 4.3 CONSTRUCCION DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES 30

5.1.5 ITEM 4.4 CONSTRUCCION DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES 31

5.1.6 ITEM 4.5 FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO 33

5.1.7 ITEM 4.7 PISO ADOQUIN PEATONAL RECTANGULAR 34

5.1.8 ITEM 5.1 REALCE DE CAJAS DE SERVICIOS PUBLICOS 35

5.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

5.2.1 NP-1 CORTE DE PAVIMENTO 44

5.2.2 NP-2 RESANE EN CONCRETO 3000 PSI ZANJA EN CALZADA 45

5.2.4 NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE 46

5.2.6 NP-6 DESCAPOTE 47

5.2.6 NP-10 REPARACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO 48

5.2.7 NP-12 BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO 0,3X0,10 49

5.2.8 NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM 50

5.2.10 NP-15 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 51

5.3 RELACIÓN DE LLUVIA 52

5.4 ENSAYOS DENSIDADES 53

6. ANEXOS 56

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga – secretaria de Infraestructura mediante contrato suscrito el: 22-2023 del 10 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; cuyo objeto establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DEBUCARMANGA, SANTANDER – GRUPO 1,** para las comunas**:** NORTE, NORORIENTAL, SAN FRANCISCO, ORIENTAL Y MORRORICO.

Como propósito el presente informe permite consignar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el consorcio, iniciadas a partir de la firma de Acta de Inicio, con las actividades contractuales para el buen desarrollo del proyecto, cuyo periodo está comprendido entre el 16 de marzo y 31 de marzo de 2023.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio del mismo.

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los sectores a intervenir se encuentran en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander.

	
Ubicación del departamento de Santander en Colombia	Ubicación de Bucaramanga en el departamento de Santander

Fuente Google



Fuente Google Earth

Puntos a intervenir.

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

Fuente propia

Cambio de Chapinero, aclaración

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

La Secretaria de Infraestructura mediante proyecto cuyo objeto es la “ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” como resultado de la utilización de recursos propios y de la implementación de la estrategia general de los Presupuestos Participativos, soportada por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012 así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 100 de la Ley 1757 de 2015 y reglamentada para el Municipio de Bucaramanga por el Acuerdo 036 de 2012 y el Decreto Municipal 0159 de 2021 trazando lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y Ejecución de los proyectos que la comunidad viabilizó, resultado de la ejecución exitosa de la estrategia previamente citada.

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación de espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por último, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieran.

1.4 ANTECEDENTES

Para la recuperación del espacio público, la Secretaría de Infraestructura determino realizar intervención para la adecuación de los espacios públicos que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que por la actualización de la norma no cumplen con las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, conforme lo establecido en el POT, el MEPB y Normas Técnicas vigentes.

Por lo anterior se fue asignado a este grupo realizar la intervención para la recuperación del espacio público mediante contrato, cuyo alcance de éste proyecta inicialmente realizar recuperación de 4.645 metros cuadrados (m²) de espacio público, distribuido en cinco (5) comunas y trece (13) barrios.

1	1.NORTE	2 Barrios
2	2.NOR-ORIENTAL	3 Barrios
3	3.SAN FRANCISCO	2 Barrios
4	12. ORIENTAL	3 Barrios
5	14. MORRORICO	3 Barrios

1.5 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	**22 DE 2023**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
VALOR ADICIÓN:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS, ONCE PESOS M/CTE. ($ 620.562.011,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901677862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	13 JULIO 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.6 DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CARGO	CORREO
Angie Lorena Monsalve Ordoñez	Director de Obra	consorciosantander2023@gmail.com
Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	consorciosantander2023@gmail.com
Layde Iliana Velandia Torres	Residente de Obra	residenteobracs@gmail.com
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional Social	consorciosantanderbga@gmail.com
Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com
Kevin Farid Rodríguez Sarmiento	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com
Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	inspector3obracs@gamil.com
Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra	inspector2obracs@gmail.com

1.7 ACTA DE INICIO

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-[illegible] Versión: 0.0 Fecha: [illegible] Página: 1 de 3

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	22 - 23/02/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	REHABILITACIÓN DE ANDENES, BACHEADAS Y PAVIMENTO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER
	C.C./NIT	901077842
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
	C.C	79330819
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	LUIS JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278619
INTERVENTOR	NOMBRE:	JESAR DAZ
	C.C./NIT	91532988
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.961.430.000,00	
ANTICIPO 30,00 %	$ 588.429.000,00	
CDP	NUMERO:	2716
	FECHA:	01/02/2023
RP	NÚMERO	4110
	FECHA	27/02/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	16/03/2023
	FECHA FIN:	15/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron VLADIMIR POLO DAZ en representación de JESAR DAZ, en calidad de Interventor y por la otra ERNESTO MONTAÑEZ MORAen representación de CONSORCIO SANTANDER, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRAPÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 10 de Marzo de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Beneficiario	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
CONSORCIO SANTANDER	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	[illegible]	16/03/2023	15/07/2023	$ 588.429.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	[illegible]	16/03/2023	16/03/2026	$ 392.286.000,00
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	[illegible]	16/03/2023	16/04/2023	$ 196.000.000,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	[illegible]	16/03/2023	16/03/2026	$ 392.286.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	[illegible]	16/04/2023	16/04/2028	$ 392.286.000,00
	CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES	[illegible]	16/03/2023	16/04/2023	$ 196.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	[illegible]	16/03/2023	16/04/2023	$ 196.000.000,00
	CALIDAD SERVICIO Y NO PAGO DE	[illegible]	16/03/2023	16/04/2023	$ 196.000.000,00



ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GI-[illegible]
Versión: 0.0
Fecha: [illegible]
Página: 1 de 1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

- Que el Contratista acredita que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 22 de fecha 24/02/2021, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 16 de Marzo de 2021.

Interventor

[illegible]

Contratista

ROBERTO HERNÁNDEZ MORA
CONSORCIO SANTANDER

Elaboró: [illegible]
Revisó: [illegible]

1.8 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura			
ACTA No.	1			
FECHA DEL ACTA	14/07/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023			
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública			
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga			
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER		
	C.C/ NIT	901577862_6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA		
	C.C	79.330.879		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
	C.C	91278629		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ		
	C.C/ NIT	91243324		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	N.A	
		APORTE CONVENIDO	N.A	
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	N.A	
		APORTE CONVENIDO	N.A	
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00			
CDP	NUMERO:	6583		
	FECHA:	28/09/2022		
RP	NUMERO:	3010		
	FECHA:	27/02/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023		
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023		
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023		
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N.A.			
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238.37-087 Versión: 2.0 Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 Página 2 de 3

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	27/04/2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. Que en la ejecución de las actividades del contrato de obra se han presentado situaciones que ameritan modificación en las cantidades contractuales y pactación de ítems no previstos, que requieren de mayor tiempo para su desarrollo, sumado a los inconvenientes derivados de la oposición o inconformidades y tramites de peticiones de la comunidad, respecto la intervención de los espacios públicos, manifestándose reiteradamente descontento con temas como árboles, acceso a Parqueaderos, así como requerimientos adicionales después de socializadas las actividades. Situaciones que originaron y fundamentaron la necesidad de tramitar oportunamente por parte de los contratista de obra la prórroga y adición del contrato mediante oficio CS 2023 COM – 060 adiado 03 de junio de 2023, remitida oportunamente a la entidad con oficio de interventoría JSK-MB-429-240 del 5 de junio de 2023 para los fines contractuales pertinentes, hallándose está en trámite aún a la fecha para su estudio, verificación y aprobación, resultando imperativa la suspensión del contrato en virtud de la proximidad de la fecha de terminación.
2. Que existen razones contractuales constitutivas de Fuerza Mayor, no imputables al CONTRATISTA, requeridas para preservar el vínculo contractual y la primacía del interés público, que motivan la necesidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.
3. Para el cumplimiento del objeto contractual y los fines de la contratación pública, es necesario culminar los trámites de solicitud de adición y prorroga en curso, para la aprobación respectiva.

ACUERDAN

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra No. 22 de 2023 del 24 de febrero de 2023, a partir de la fecha y hasta cuando se den las condiciones para su reinicio, o sea una vez se cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal que soporte el compromiso del valor adicional requerido, y con la elaboración y aprobación de la justificación del mismo, necesario para elaborar la respectiva minuta del adicional N° 1 en valor y plazo, con la cual una vez aprobada, se solicita el certificado de registro presupuestal.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas y allegarlas

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140.238.37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 3 de 3

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 14 de JULIO de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

1.9 REACTIVACION DEL CONTRATO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238.37-088 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Mayo-15-2020 Página **1** de **2**

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	24/07/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023		
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER	
	C.C/ NIT	901677862_6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA	
	C.C	79.330.879	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ	
	C.C/ NIT	91243324	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00		
CDP	NUMERO:	6583	
	FECHA:	28/09/2022	
RP	NÚMERO:	3010	
	FECHA:	27/02/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023	
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JULIO DE 2023	
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	10 Días	14/jul/2023	23/jul/2023
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

CONSIDERACIONES

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238.37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página **2** de **2**

partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato Nº 22 suscrito el 24 de febrero de 2023, a partir del día 24 de julio de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 25 de julio 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de Julio de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - Interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS

AMPAR0	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	NUMERO DE PÓLIZA
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 196.140.000,00
Predios Labores y Operaciones.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 392.280.000,00
Contratistas y Subcontratistas.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO

3.1 AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA

	HITOS DE CONTROL DE AVANCE	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	FIN	ESTADO	CUMPLIMIENTO
1	CRA 34 CLL 12 Y 13 FRANJA ORIENTAL LOS PINOS	50	10/04/2023	29/05/2023	INICIADO	TERMINADO
2	CRA 34 CLL 13 Y 14 FANJAR ORIENTAL LOS PINOS	50	10/04/2023	29/05/2023	INICIADO	TERMINADO
3	ENTRADA LA VEGA MORRORICO	49	10/04/2023	28/05/2023	INICIADO	TERMINADO
4	17 COMUNA 13 SAN ALONSO	125	10/04/2023	12/08/2023	INICIADO	TERMINADO
5	CRA 29 ENTRE CLL 10 Y 11 LA UNIVERSIDAD	23	29/05/2023	20/06/2023	INICIADO	TERMINADO
6	CLL 9A ENTRE 24 Y 25 SECTOR IMPAR BARRIO UNIVERSIDAD	72	29/05/2023	8/08/2023	INICIADO	TERMINADO
7	CLL 31 CON CRA 28 LA AURORA	59	21/06/2023	18/08/2023	INICIADO	TERMINADO
8	CRA 17, 16 Y 15 CON CALLE 4 Y 5 CHAPINERO	73	6/07/2023	16/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
9	CAMPO MADRID	68	25/07/2023	30/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
10	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA SUR SAN ALONSO	31	9/08/2023	8/09/2023	INICIADO	TERMINADO
11	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA NORTE SAN ALONSO	31	14/08/2023	13/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
12	18 COMUNA 14 LIMONCITO	89	28/08/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
13	1 COMUNA 1 EL ROSAL	85	1/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
14	4 COMUNA 2 LA JUVENTUD	84	2/09/2023	24/11/2023	INICIADO	ADELANTADO
15	3 COMUNA 2 LA INDEPENDENCIA	75	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
16	CRA 25 CLL 3 Y 5 LA INDEPENDENCIA	75	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
17	TRANSICIÓN V CRA 23A #2-22	54	2/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
18	ALBANIA COMUNA 14	33	23/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

4.1 PRESUPUESTO

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código CCE-EICP-FM-14 **Versión** 3


FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00
Subtotal								**$ 15.356.640,00**
				DEMOLICIONES				
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00
Subtotal								**$ 270.062.100,00**
				EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00
Subtotal								**$ 284.279.700,00**
				ESPACIO PUBLICO				
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00
Subtotal								**$ 1.134.170.160,00**
				OBRAS COMPLEMENTARIAS				
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00
Subtotal								**$ 47.205.700,00**

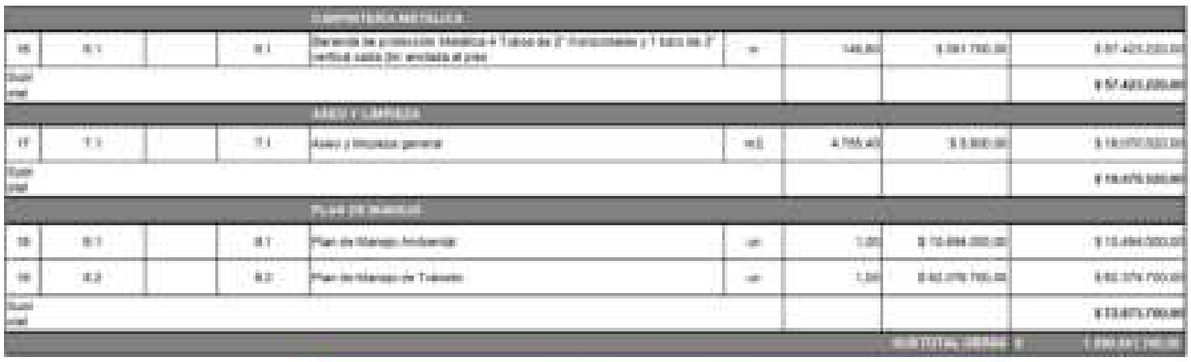

16	6.1		6.1	Barrera de protección Metálica A Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 3" vertical cada 2m anclada al piso	un	146,80	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00
Costo total								$ 57.423.220,00
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	mes	4.795,40	$ 3.900,00	$ 18.970.320,00
Costo total								$ 18.970.320,00
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.894.000,00	$ 10.894.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Trabajo	un	1,00	$ 62.979.700,00	$ 62.979.700,00
Costo total								$ 73.873.700,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 1.000.000.000,00

FONDO DE BALASTO DE PRECIOS		$ 97.000.000,00
INTERVENTORIA		
	VALOR TOTAL OBRA	$ 1.000.000.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del paso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del paso, y cuando la fracción decimal del paso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del paso.	ADMINISTRACIÓN	A=	10%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben venir en porcentaje (%)	IMPREVISTO	I=	0%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A+I+U	15%

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SANTANDER

4.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

BALANCE SOLICITUD DE ADICION No 1 - ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I											
PRESUPUESTO CONTRACTUAL								REVISIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE A+U)	VALOR TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR									
				PRELIMINARES								
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00			6.676,80	$ 15.356.640,00
				DEMOLICIONES								
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00		159,83	1.139,17	$ 236.833.443,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00		72,11	823,49	$ 63.244.032,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00		52,52	969,28	$ 204.421.152,00
				ESPACIO PUBLICO								
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00		160,3	994,30	$ 137.412.260,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00		130,77	2.179,03	$ 184.563.841,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00		9,84	131,96	$ 49.537.784,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00		13,9	106,50	$ 28.297.050,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00			2.014,20	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		11,29	103,11	$ 101.202.465,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00		275,99	1.773,21	$ 278.393.329,52
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00		27,17	255,83	$ 208.578.199,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS								
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00		32,33	172,67	$ 24.899.014,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00			47,40	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00			44,20	$ 6.055.400,00
				CARPINTERIA METÁLICA								
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00		14,14	132,46	$ 51.884.582,00
				ASEO Y LIMPIEZA								
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00			4.755,40	$ 18.070.520,00
				PLAN DE MANEJO								
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00			1,00	$ 10.494.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00			1,00	$ 62.379.700,00
								$ 1.899.440.740,00				**$ 1.722.217.191,52**
				NO PREVISTOS								
20	NP1		9.1	Corte de pavimento hasta 3 cm	M	2.434,00	$ 14.306,30		2.434,00		2.434,00	$ 34.821.534,20
21	NP2		9.2	Resane en concreto de 3000 psi zanja en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm.	M	2.434,00	$ 11.609,62		2.434,00		2.434,00	$ 28.257.815,08
22	NP3		9.3	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tubería PVC hasta 3"	M	60,00	$ 25.174,42		60,00		60,00	$ 1.510.465,20
24	NP5		9.4	Poda radicular	UND	20,00	$ 324.920,49		20,00		20,00	$ 6.498.409,80
25	NP6		9.5	Desmonte bolardo existente	UND	30,00	$ 13.314,49		30,00		30,00	$ 399.434,70
26	NP7		9.6	Descapote	M2	150,00	$ 47.612,35		150,00		150,00	$ 7.141.852,50
28	NP9		9.7	Losa en concreto 4000 psi.	M3	10,00	$ 849.309,68		10,00		10,00	$ 8.493.096,80
30	NP11		9.8	Transplante de árboles altura 2m	UND	10,00	$ 456.705,86		10,00		10,00	$ 4.567.058,60
31	NP12		9.9	Sardinel prefabricado S10 L= 0,2 m norma MEPB	M	200,00	$ 134.973,74		200,00		200,00	$ 26.994.748,00
32	NP13		9.10	Reparación acometida acueducto.	UND	150,00	$ 33.302,97		150,00		150,00	$ 4.995.445,50
33	NP14		9.11	Siembra de árboles Pomarroso Brasileño H Prom = 1.5 m	UND	5,00	$ 212.033,11		5,00		5,00	$ 1.060.165,55
34	NP15		9.12	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 54.836,97		250,00		250,00	$ 13.709.242,50
35	NP16		9.13	Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm	Kg	320,00	$ 9.512,58		320,00		320,00	$ 3.044.025,60
36	NP17		9.14	Muro y zarpa en concreto de 3000 Psi	M3	15,00	$ 902.802,26		15,00		15,00	$ 13.542.033,90
37	NP18		9.15	Relleno manual compactado con material de excavación	M3	150,00	$ 40.679,91		150,00		150,00	$ 6.101.986,50
38	NP19		9.16	Desponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el mupi.	Glo	1,00	$ 2.410.066,05		1,00		1,00	$ 2.410.066,05
			9.17	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 33.619,20		250,00		250,00	$ 8.404.800,00
39	NP20		9.18	Refuerzo PDR 60	Kg	600,00	$ 8.787,28		600,00		600,00	$ 5.272.368,00
								SUBTOTAL SUBCONTRATO OBRAS				**$ 177.224.548,48**

	$ 1.899.441.740,00	**$ 1.899.441.740,00**
SOLICITUD DE ADICIÓN		**$ 540.958.132,00**
TOTAL		**$ 2.440.399.872,00**
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	**$ 61.958.260,00**	**$ 79.603.879,00**
VALOR TOTAL OBRA	**$ 1.961.400.000,00**	**$ 2.520.003.751,00**

4.3 AVANCE PRESUPUESTAL

FLUJO DE CAJA CON VALOR ADICIONAL								
SEMANA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	% programado acumulado	% Acumulado Ejecutado	% ATRASO
1	jueves, 16 de marzo de 2023	domingo, 19 de marzo de 2023	$ 12.348.018	0,49%	$ 12.348.018	0,49%	0,49%	0,00%
2	lunes, 20 de marzo de 2023	domingo, 26 de marzo de 2023	$ 25.452.038	1,01%	$ 37.800.056	1,50%	1,50%	0,00%
3	lunes, 27 de marzo de 2023	domingo, 2 de abril de 2023	$ 17.640.026	0,70%	$ 55.440.083	2,20%	2,20%	0,00%
4	lunes, 3 de abril de 2023	domingo, 9 de abril de 2023	$ 22.680.034	0,90%	$ 78.120.116	3,10%	3,10%	0,00%
5	lunes, 10 de abril de 2023	domingo, 16 de abril de 2023	$ 55.440.083	2,20%	$ 133.560.199	5,30%	5,30%	0,00%
6	lunes, 17 de abril de 2023	domingo, 23 de abril de 2023	$ 30.240.045	1,20%	$ 163.800.244	6,50%	6,50%	0,00%
7	lunes, 24 de abril de 2023	domingo, 30 de abril de 2023	$ 5.460.008	0,22%	$ 169.260.252	6,72%	6,72%	0,00%
8	lunes, 1 de mayo de 2023	domingo, 7 de mayo de 2023	$ 20.160.030	0,80%	$ 189.420.282	7,52%	7,52%	0,00%
9	lunes, 8 de mayo de 2023	domingo, 14 de mayo de 2023	$ 37.800.056	1,50%	$ 227.220.338	9,02%	9,02%	0,00%
10	lunes, 15 de mayo de 2023	domingo, 21 de mayo de 2023	$ 70.560.105	2,80%	$ 297.780.443	11,82%	11,82%	0,00%
11	lunes, 22 de mayo de 2023	domingo, 28 de mayo de 2023	$ 38.052.057	1,51%	$ 335.832.500	13,33%	13,33%	0,00%
12	lunes, 29 de mayo de 2023	domingo, 4 de junio de 2023	$ 30.744.046	1,22%	$ 366.576.546	14,55%	14,55%	0,00%
13	lunes, 5 de junio de 2023	domingo, 11 de junio de 2023	$ 45.612.068	1,81%	$ 412.188.614	16,36%	16,36%	0,00%
14	lunes, 12 de junio de 2023	domingo, 18 de junio de 2023	$ 29.484.044	1,17%	$ 441.672.657	17,53%	17,53%	0,00%
15	lunes, 19 de junio de 2023	domingo, 25 de junio de 2023	$ 48.132.072	1,91%	$ 489.804.729	19,44%	19,44%	0,00%
16	lunes, 26 de junio de 2023	domingo, 2 de julio de 2023	$ 57.052.885	2,26%	$ 546.857.614	21,70%	21,70%	0,00%
17	lunes, 3 de julio de 2023	domingo, 9 de julio de 2023	$ 30.744.046	1,22%	$ 577.601.660	22,92%	22,92%	0,00%
18	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023	$ 39.060.058	1,55%	$ 616.661.718	24,47%	24,47%	0,00%
19	lunes, 24 de julio de 2023	domingo, 30 de julio de 2023	$ 103.068.153	4,09%	$ 719.729.871	28,56%	28,56%	0,00%
20	lunes, 31 de julio de 2023	domingo, 6 de agosto de 2023	$ 80.892.120	3,21%	$ 800.621.992	31,77%	39,73%	7,96%
21	lunes, 7 de agosto de 2023	domingo, 13 de agosto de 2023	$ 93.240.139	3,70%	$ 464.392.787	35,47%	40,56%	5,09%
22	lunes, 14 de agosto de 2023	domingo, 20 de agosto de 2023	$ 83.160.124	3,30%	$ 977.022.254	38,77%	41,39%	3%
23	lunes, 21 de agosto de 2023	domingo, 27 de agosto de 2023	$ 74.340.111	2,95%	$ 1.051.362.365	41,72%	42,21%	0,49%
24	lunes, 28 de agosto de 2023	domingo, 3 de septiembre de 2023	$ 98.028.146	3,89%	$ 1.149.390.511	45,61%	43,04%	-3%

Total, ejecutado a la fecha $1084.538.250,16

Porcentaje ejecutado: 43,04%

Porcentaje de atraso: 3%

5. INFORMACION Y ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

5.1.1 ACTIVIDAD ITEM 1.1. Localización y replanteo manual.

Este ítem hace referencia a los replanteos manuales que se realizaran para obras de adecuaciones. Se debe determinar como referencia lo existente en las zonas a intervenir. Se deben verificar los linderos y alcance de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
1.1	Localización y replanteo manual	M2	6676,80	493,87

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Calle 20 entre Cra 29 y 30 Sur	16,27 m²







COMUNA 2. NORORIENTAL		
Juventud	Calle 1n con Cra 20c	90,40 m²






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Calle 4 entre Cra 16 y 17	387,20 m²



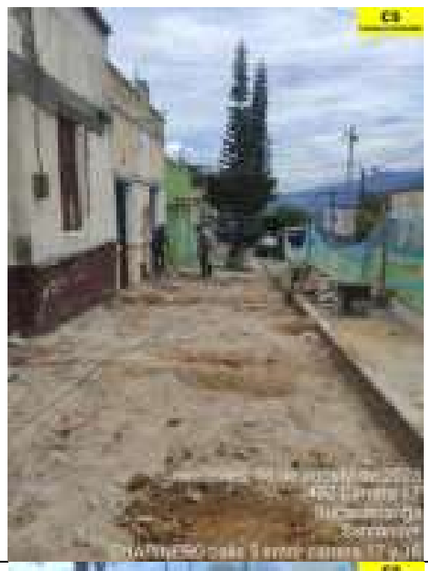





5.1.2 ACTIVIDAD ITEM 2.1 Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.

Este ítem se refiere a la demolición de los pisos en general y sardinel existente que deberá ser retirado para ejecución de la obra. La demolición se plantea realizarla con martillo hidráulico y herramienta menor de acuerdo a las especificaciones de demoliciones. Los materiales resultantes se apilarán en el lugar de acopio de los escombros, serán cargados y retirados de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	1288	65,83

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Calle 4 entre Cra 16 y 17	52,27 m³











COMUNA 2. NORORIENTAL		
Juventud	Calle 1n con Cra 20c	13,56 m²

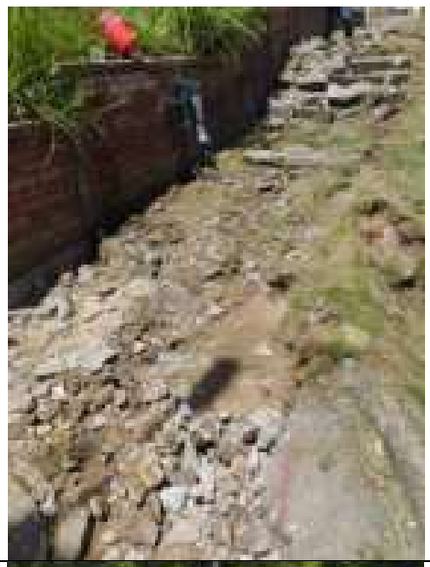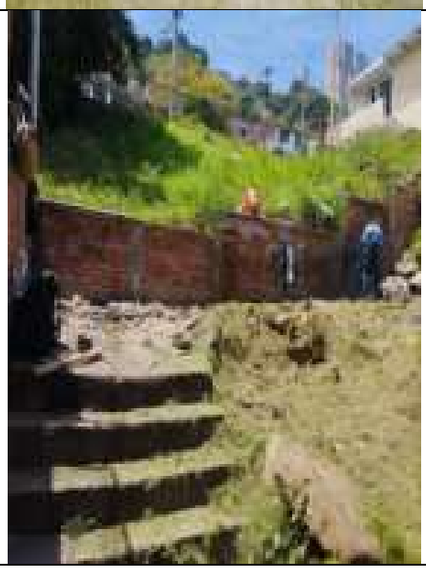
5.1.3 ACTIVIDAD ITEM 3.1 Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.

Esta actividad se refiere a la excavación manual sin entibado de material común necesaria para bordillos, para cajas que requieran ser llevadas a niveles de construcción y para la adecuación de la aplicación de sub base granular para cumplimiento de niveles, incluye retiro y disposición final del material sobrante.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	695,6	9,944

COMUNA 2. NORORIENTAL		
Juventud	Calle 1n con Cra 20c	9,944 m³





5.1.4 ACTIVIDAD ITEM 4.3 Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB.

Actividad que comprende la construcción de rampas peatonales de acuerdo a lo descrito en el MEPB, concreto 3000 Psi, bordeadas con loseta visual (de color amarilla), con pendientes que pueden ir de 12% a 20% según lo del ancho transversal del anden y garantizando el paso peatonal en la franja de circulación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.3	Construcción de rampas peatonales	UND	205	2

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cra 17 entre calles 4 y 5	2 Und









5.1.5 ACTIVIDAD ITEM 4.4 Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB.

Actividad que comprende la construcción de rampas vehiculares para acceso a garajes o parqueaderos ocupando un espacio de 0,40 m de la servidumbre de vía máximo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.4	Construcción de rampas vehiculares	UND	205	4

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Calle 20 entre Cra 29 y 30 Norte	2 Und









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cra 17 entre calles 4 y 5	2 Und






5.1.6 ACTIVIDAD ITEM 4.5 Franja de ajuste al predio.

Es la franja funcional localizada contra la línea de paramento ya sea del lote o edificiación que sirve para absorber las diferencias en las medidas del anden con relación las dimensiones típicas de las franjas que lo componen, este es construido en concreto fundido en sitio no superando un ancho de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.5	Franja de ajuste al predio	m	2014,2	240

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cra 17 entre calles 4 y 5	240 m









5.1.7 ACTIVIDAD ITEM 4.7 Piso adoquin peatonal rectangular 10x20x6 cm en concreto tipo UC-A30.

Actividad que comprende la instalación de adoquín para dar acabado de franjas ambientales, tratada como zona verde donde requiere permitir el paso peatonal y vehicular, permitiendo un adecuado drenaje.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.7	Piso adoquin peatonal rectangular	m²	2049,2	130,64

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cra 17 entre calles 4 y 5	130,64 m²









5.1.8 ACTIVIDAD ITEM 5.1 Realce de cajas de servicios públicos.

Actividad que comprende nivelar las cajas de servicios públicos de las viviendas a los niveles de diseño del anden a construir. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando la protección de los medidores.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.1	Realce de cajas de servicios públicos.	UND	205	125

COMUNA 13. ORIENTAL		
Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	28 Und






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Cra 17 entre calles 4 y 5	9 Und






COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Calle 20 entre Cra 29 y 30 Norte	28 Und






COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Calle 20 entre Cra 29 y 30 Sur	60 Und






5.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En el desarrollo de la obra se presentaron actividades que no se tenían contempladas en los ítems contractuales, por lo tanto, se solicitó a interventoría integrar al contrato de obra 022 de 2023, dieciocho (18) actividades denominadas NO PREVISTOS según un acta de pactación de precios unitarios.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-0000-238,37-040 Versión: 1.0 Página 1 de 5

NUMERO DEL CONTRATO DE OBRA:	22 del 24 de febrero de 2023
OBJETO:	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo I
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
CÉDULA O NIT:	901.677.862-6
INTERVENTOR:	JESAK SAS
VALOR FISCAL:	$1.961.400.000,00 (Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos mil pesos) (M.L). incluido AU del 37,00%
VALOR ADICIONAL:	N.A.
PLAZO ACTUAL:	Cuatro (4) meses.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio de 2023.
GARANTÍAS	Póliza cumplimiento No. 21-44-101407105 Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA
PRESUPUESTO:	RP 3010 DEL 27/03/2023

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS #1

En Bucaramanga, a los ocho (8) días del mes de junio de dos mil veinte tres (2023), se reunieron, **IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS**, Secretario de Infraestructura, **VLADIMIR POLO PAZ** en representación de JESAK SAS como interventor, **ERNESTO MONTAÑEZ MORA** como representante legal de CONSORCIO SANTANDER como contratista de obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERANDO

- Que entre el MUNICIPIO y CONSORCIO SANTANDER se suscribió el veinte siete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023) el contrato de obra No. 22-2023 con el siguiente objeto: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", grupo I, por valor

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000.238.37-040
		Versión: 1.0
		Página 2 de 5

inicial de $1.961.400.000,00 (Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos mil pesos) (M.L). incluido AIU del 37,00%, y un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses.

- Que el contrato de obra No 22 de 2023, inicio actividades constructivas el día diez y seis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), programando la terminación el día quince (15) de julio de dos mil veintitrés (2023).

- Que durante los recorridos, valoración preliminar de los tramos y una vez iniciada la ejecución de las se puede apreciar que existen actividades que no están incluidas dentro del presupuesto contractual y son necesarias para el normal desarrollo de las obras.

- Que los ítems no previstos presentados obedecen a necesidades definidas en campo directamente con interventoría y socializadas con la supervisión en comités y visitas de obra.

- Que los apu's no previstos realizados por el contratista fueron revisados previamente por interventoría y su aprobación queda definida en este documento.

- Que cada actividad no prevista, cuenta con cotizaciones de sus insumos y materiales discriminados en los análisis de precios unitarios, que no existían en la propuesta inicial y sus especificaciones técnicas particulares.

- NP-1 CORTE DE PAVIMENTO: Esta actividad fue considerada su ejecución para dar lineamiento en la instalación del sardinel prefabricado, garantizando uniformidad en la franja de ajuste del pavimento con el sardinel instalado.

- NP-2 RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3CM Y 5 CM, ESPESOR 30 CM: Actividad requerida para dar sello y ajuste del sardinel con la vía.

- NP-3 REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC HASTA 3": Se vio la necesidad de esta actividad no contemplada de los bajantes de agua lluvia provenientes de las viviendas en las zonas a intervenir, con el fin de darle la continuidad del flujo de agua lluvia hacia la vía.

- NP-4 PODA RADICULAR: Debido a la directriz de ampliación de un andén se vio la necesidad de tratar unos árboles que requerían tratamiento de poda radicular y aérea para garantizas su supervivencia.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5020-238.37-048
		Versión: 1.0
		Página 3 de 5

- NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE: En la localización del proyecto se evidencio la existencia de bolardos en tubo de perforación que no fue contemplada su actividad de desmonte y los cuales impiden el libre desarrollo de la ejecución de actividades.

- NP-6 DESCAPOTE: Se pudo evidenciar en varios sectores la necesidad de realizar descapote debido a la presencia de alto volumen de capa vegetal que no permiten desarrollar las actividades contractuales y no fue contemplada.

- NP-7 LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI: De acuerdo a la directriz de ampliación de anden en un sector, se dio la necesidad de recuperar vía vehicular, por lo tanto, es requerida la actividad para dar cumplimiento a lo establecido por supervisión del contrato.

- NP-8 TRANSPLANTE DE ARBOLES ALTURA 2M: Se crea la necesidad de la actividad ya que para dar cumplimiento con los perfiles viales de un sector se debe recuperar área y es necesario realizar el trasplante de unas especies especificas, cumpliendo con el proceso requerido y garantizando su supervivencia.

- NP-9 SARDINEL PREFABRICADO S10 L=0.2M; NORMA MEPB: En el desarrollo de las actividades se vio la necesidad de realizar las curvas de las esquinas en sardinel prefabricado de 0,2m para dar cumplimiento con el radio de giro y garantizar la estética de la curva.

- NP-10 REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO: Esta actividad corresponde a las adecuaciones que deben realizarse al momento de realzar las cajas de servicios públicos, giros y/o ampliaciones de los accesorios de PVC para que la caja quede en el nivel requerido del sector a intervenir.

- NP-11 SIEMBRA DE ARBOLES POMARROSO BRASILEÑO H PROM= 1,5M: Actividad que corresponde a la compensación o reemplazo de árboles que no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para un traslado.

- NP-12 BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,1M*0,3M, FUNDIDO EN SITIO: Esta actividad resulta de la necesidad de dar confinamiento de la loseta en zonas que no presenta las condiciones requeridas y que no se ajusta a lo habitual del desarrollo de la actividad de Construcción de Espacio Público.

- NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM, HUECO DE 15*15CM: Actividad que es requerida como complemento del item Construcción de rampas vehiculares, ya que esta actividad no contempla la instalación de malla electrosoldada como refuerzo de las rampas en concreto.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-040
		Versión: 1.0
		Página 4 de 5

- NP-14 MURO Y ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI: De acuerdo a las directrices dadas y en cumplimiento de lo requerido se vio la necesidad de construir una viga con muro de contención para confinar un talud y permitir darle continuidad a la obra y garantizar que el peatón tenga mayor tramo de circulación y de manera segura.

- NP-15 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL EXCAVACIÓN: Para las actividades de demolición de bordillo existente, es requerida una excavación para retirar el material que está enterrado, por lo tanto, esta excavación debe ser nuevamente rellenada para dar con los niveles requeridos, igualmente otra necesidad de rellenos manuales se presenta cuando los niveles no cumplen con lo requerido y debemos rellenar para llegar a dichos niveles mínimos requeridos.
- NP-16 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PARADERO METÁLICO E INCLUYE EL MUPI: Actividad puntual presentada en el sector de San Alonso, donde una parada de Metrolínea debe ser retirada y nuevamente instalada para que quede a los niveles de diseño en cumplimiento de MEPB y garantizando esta también cumpla con las alturas de diseño normativo establecidas.


- NP-17 BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO DE 0,1M*0,3M: se requiere para el confinamiento de raíces y arboles existentes en dónde se deba ejecutar el contrato, en las franjas ambientales con el fin de proteger tanto al ser vivo como el trabajo a realizar.

- NP-18 ACERO REFUERZO PDR 60: Se requiere para adicionarle a los elementos en concreto en los cuales se debe garantizar su durabilidad y resistencia

ACUERDAN:

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas particulares.

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir AU)
NP-1	CORTE DE PAVIMENTO HASTA 3 CM	ML	$14.306,30
NP-2	RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3CM Y 5 CM, ESPESOR 30 CM	ML	$11.609,62
NP-3	REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERÍA PVC HASTA 3"	ML	$25.174,42
NP-4	PODA RADICULAR	UND	$324.920,49
NP-5	DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE	UND	$13.314,49

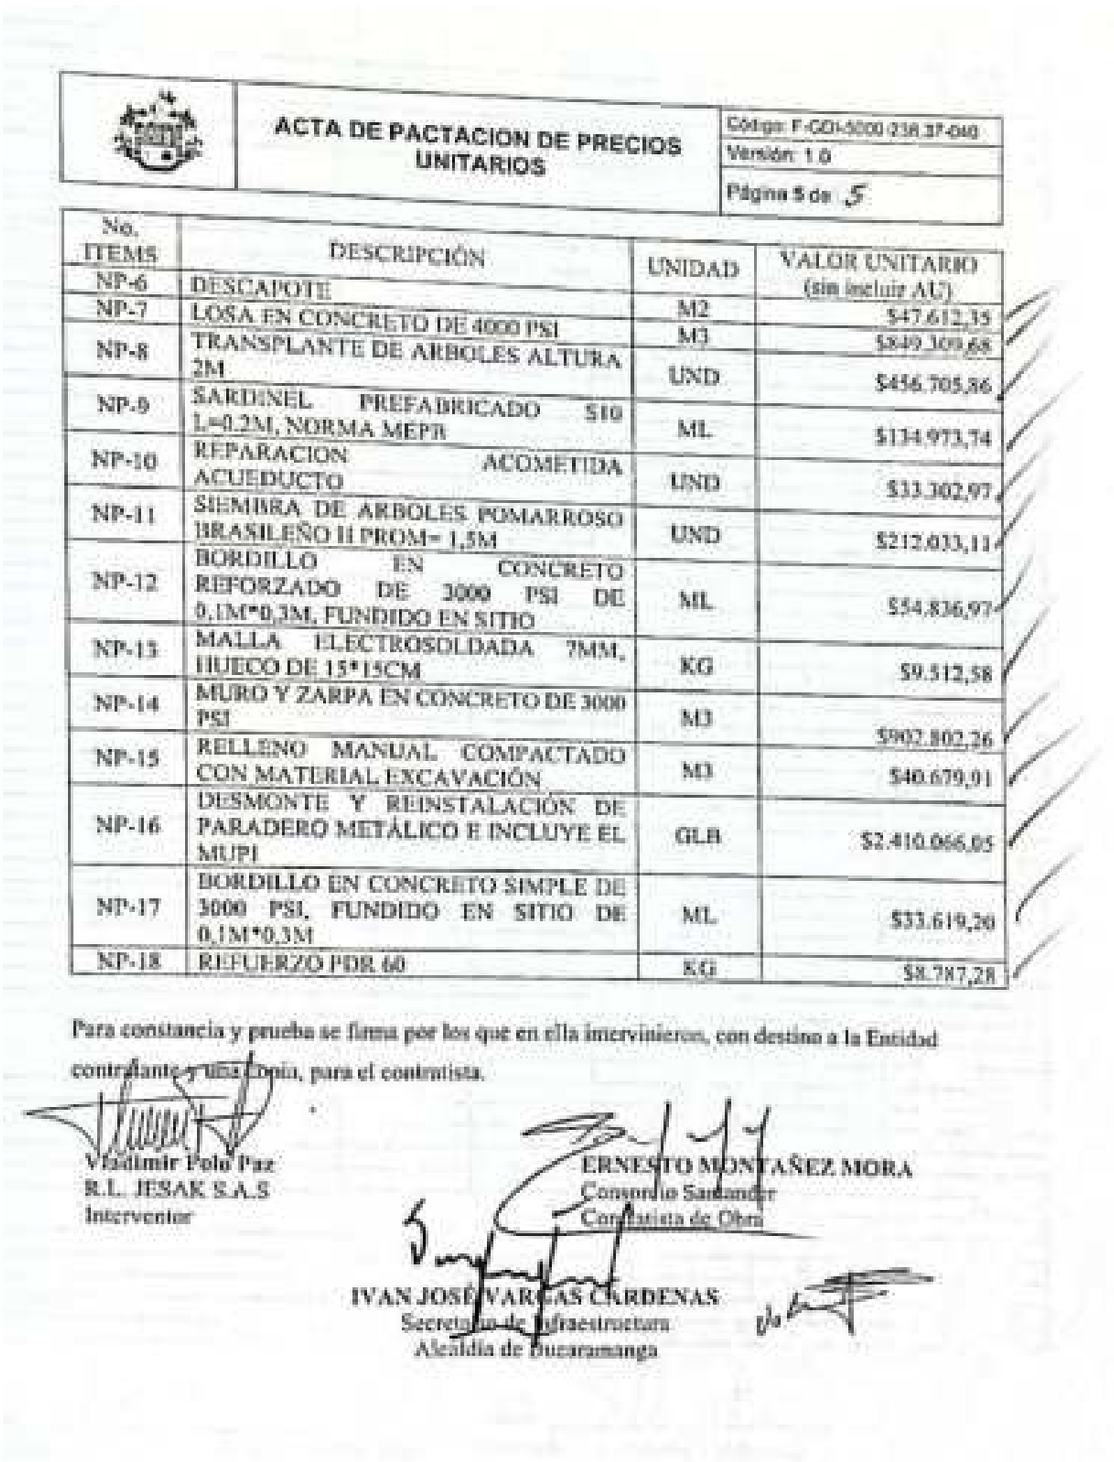

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000.238.37-040
	Versión: 1.0
	Página 5 de 5

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir AU)
NP-6	DESCAPOTE	M2	$47.612,35
NP-7	LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$849.309,68
NP-8	TRANSPLANTE DE ARBOLES ALTURA 2M	UND	$456.705,86
NP-9	SARDINEL PREFABRICADO S10 L=0.2M, NORMA MEPB	ML	$134.973,74
NP-10	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO	UND	$33.302,97
NP-11	SIEMBRA DE ARBOLES POMARROSO BRASILEÑO H PROM= 1,5M	UND	$212.033,11
NP-12	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,1M*0,3M, FUNDIDO EN SITIO	ML	$54.836,97
NP-13	MALLA ELECTROSOLDADA 7MM, HUECO DE 15*15CM	KG	$9.512,58
NP-14	MURO Y ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$902.802,26
NP-15	RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL EXCAVACIÓN	M3	$40.679,91
NP-16	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PARADERO METÁLICO E INCLUYE EL MUPI	GLB	$2.410.066,05
NP-17	BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO DE 0,1M*0,3M	ML	$33.619,20
NP-18	REFUERZO PDR 60	KG	$8.787,28

Para constancia y prueba se firma por los que en ella intervinieron, con destino a la Entidad contratante y una copia, para el contratista.

Vladimir Polo Paz
R.L. JESAK S.A.S
Interventor

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Consorcio Santander
Contratista de Obra

IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

Por lo anterior se relacionan las actividades no previstas desarrolladas desde el inicio de la obra.

5.2.1 NP-1 CORTE DE PAVIMENTO

FRENTE DE TRABAJO	M
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	176,7
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	176,7
TOTAL =	353,4





5.2.2 NP-2 RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3 Y 5CM, ESPESOR 30CM.

FRENTE DE TRABAJO	M
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	176,7
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	176,7
TOTAL =	353,4





5.2.3 NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE

FRENTE DE TRABAJO	Und
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	6
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	2
TOTAL =	8





5.2.4 NP-6 DESCAPOTE

FRENTE DE TRABAJO	M²
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	15,6
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	15,6
TOTAL =	31,20





5.2.5 NP-10 REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO.

FRENTE DE TRABAJO	Punto
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	4
TOTAL =	4





5.2.6 NP-12 BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE O.1X0.3 M FUNDIDO EN SITIO.

FRENTE DE TRABAJO	M
Chapinero Cra 17 entre Calles 4 y 5	43,2
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	42,7
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	41,87
TOTAL =	127,77





5.2.7 NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM HUECO 15X15 CM.

FRENTE DE TRABAJO	Kg
Chapinero Cra 17 entre Calles 4 y 5	75,41
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	73,00
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	26,02
TOTAL =	174,43





5.2.8 NP-15 RELLENO MANUALCOMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION.

FRENTE DE TRABAJO	M³
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Norte	5,58
San Alonso Calle 20 entre Cra 29 y 30 Costado Sur	5,88
TOTAL =	11,76





5.3 RELACION DE LLUVIAS

CS Consorcio Santander	REPORTE DEL CLIMA	Codigo	CS-FO-OBR-002
		Fecha	22/03/2023
		Version	0
		Pagina	1 de 1

MES: AGOSTO — DIRECCIÓN: REPORTE GENERAL DE LOS 2 FRENTES — AÑO: 2023

B LLUVIAS DE BAJA INTENSIDAD — F LLUVIAS FUERTES — S SOLEADO — N NEBLINA

HORA / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1:00 -2:00																															
2:00 -3:00																															
3:00 -4:00																															
4:00 -5:00																															
5:00 -6:00																															
6:00 -7:00																															
7:00 -8:00	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S
8:00 -9:00	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S
9:00 -10:00	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S
10:00 -11:00	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S
11:00 -12:00	S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	S
12:00 -13:00	S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S			B	S	S	S
13:00 -14:00	S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	S	S				S	S	S	S			B	S	S	B
14:00 -15:00	S	S	S	S				S	S	B	F			S	S	S	S	S				S	S	S	S			B	S	S	B
15:00 -16:00	S	S	S	S				S	S	B	F			S	S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	B
16:00 -17:00	S	S	S	S				S	S	B	F			S	S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	B
17:00 -18:00																															
18:00 -19:00																															
19:00 -20:00																															
20:00 -21:00																															
21:00 -22:00																															
22:00 -23:00																															
23:00 -24:00																															
24:00 -1:00																															

5.4 ENSAYOS DENSIDAD FRENTES ACTIVOS

SAN ALONSO CALLE 20 ENTRE CRA 29 Y 30 COSTADO NORTE

ALDIG

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.892 - 6			**FECHA:**	31-08-2023
LOCALIZACION:	CARRERA 29 CON CALLE 20 BUCARAMANGA			**TRAMO**	2
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07 gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE		

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	5.069	5.020	4.986
W. CONO DESPUES	1.469	1.460	1.921
W. ARENA CONO	3600.0	3.360	3.065
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	3.276	2.984	2.549
W. PLATON	112	112	112
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	3.164	2.872	2.437
EQUIVALENTE DEL CONO	1.424	1.424	1.424
W.ARENA EN EL HUECO	2.176	1.936	1.641
DENSIDAD DE LA ARENA gr/Cm3	1,46	1,46	1,46
VOLUMEN DEL HUECO	1.490	1.326	1124.0

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,8	6,8	6,90

MUESTRA TOTAL SECA	2.963	2.689	2.280
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	1,99	2,03	2,03
% DE COMPACTACION	96,03%	97,97%	97,98%

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

Ver anexos

SAN ALONSO CALLE 20 ENTRE CRA 29 Y 30 COSTADO SUR

ALDIG

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	23-08-2023
LOCALIZACION:	CARRERA 29 CON CALLE 20 BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07	gr/cm3	**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	4.366	4.283	4.244
W. CONO DESPUES	1.158	1.780	1.337
W. ARENA CONO	3206,0	2.503	2.907
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.780	1.702	2.286
W. PLATON	112	112	113
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.668	1.590	2.173
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	1.424
W ARENA EN EL HUECO	1.784	1.079	1.483
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm3	1,46	1,46	1,46
VOLUMEN DEL HUECO	1.222	739	1015,8

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	7,6	7,2	7,20

MUESTRA TOTAL SECA	2.482	1.483	2.027
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,03	2,01	2,00
% DE COMPACTACION	98,12%	96,95%	96,41%

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

CHAPINERO CRA 17 ENTRE CALLE 4 Y 5

ALDIG

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO I			
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6		FECHA:	26-08-2023
LOCALIZACION:	CALLE 5 CON CARRERA 18 - 11 BUCARAMANGA		TRAMO	I
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07 gr/cm3	TIPO DE SUELO	SUB BASE	

ENSAYO No.	1	2	
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	
W. CONO ANTES	5.309	5.293	
W. CONO DESPUES	2.393	2.237	
W. ARENA CONO	2984,0	3.056	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.406	2.530	
W. PLATON	112	112	
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.294	2.418	
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	
W ARENA EN EL HUECO	1.542	1.632	
DENSIDAD DE LA ARENA gr/ Cm3	1.46	1.46	
VOLUMEN DEL HUECO	1.056	1.118	

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6,8	6,8	

MUESTRA TOTAL SECA	2.148	2.264	
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,03	2,03	
% DE COMPACTACION	98,25%	97,85%	

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO: LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

Ver anexos.

6. ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ
FLUJO DE CAJA
BÍTACORA DE OBRA
PROGRAMA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 022
DE 2023

CUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 2

Powered by CamScanner

pendientes por ajustar y arreglar, tales como: losetas hundidas o con tropezo, descuadres en alineamiento muy notorios tanto en visual amarilla como en losetas, brechas que superan los 4 mm, zonas sin baldosa, brechas en curvas en los esquinas de la visual amarilla aun pendientes, mezcla de ajuste en regilla contadora hay que mejorarla entre otras observaciones que no se pueden revisar a cabalidad por el barro que se forma cuando llueve e impide la correcta revision, se programa para el miercoles 2 de agosto a las 2 pm, nuevamente revision con el fin de poder recibir a satisfaccion total el frente y no dejar pendientes posteriores a la entrega con la comunidad. Asi mismo se le remendo al contratista terminar los pendientes de los 2 frentes de pinos que aun deben realizarse, como tambien la entrega del frente c10 29 entre cll 10 - 11 que esta pendiente.

Kelly Jimenez
Insp. Interv

Se arreglan brechas y alineamiento, se ajustan tablas que se encuentran altas o hundidas. Solicitado por interventoria.

Insp. obra. Residente

108/23. Clima Soleado / Lluvias 3:30 - 5 pm.
Se continuan con actividades de construccion de espacio público, arreglos pendientes. Se recibe visita por parte de la Sep. de la alcaldia Ing Daniel, la interventoria Ing Vladimir, Ing Edwar profesional Social Slendy y HSEQ Beatriz e Ing. Kel por parte contratista la Ing Iliana Velandia, Ing. Oscar pardes, Ing Bernardo Suarez y Profesional Social Andrea Ayala e Insp. Melissa Suarez. Se realiza recorrido por calle 9a la universidad Deprimido as que en esquina de la carrera 25 se va a

prolongar la construcción del espacio público 23 mts para con el fin de entregar una pendiente menor al 12%

Fis interv

Continuan con arreglos solicitados para entrega final, se define rampa cra 25 y arreglo agada, para que el contratista tenga via libre y se pueda terminar el frente completo.

Mulla Sanguinetti Calle — Jaime Fenández — Kelly Jimenez Insp. Interv — Fis interv

INSP OBRA

04/08/23 Clima Soleado

Se inicia actividades 7:00 am. Se continua con demolición de andén existente en cr 25 con calle 9a, y excavación para instalación sardinel. Personal en obra (2 Ayudantes).

Mulla Sanguinetti Calle — Jaime Fernández

INSP. OBRA

03/08/23 Clima: Soleado

Se continuan con actividades de instalación de sardinel y repartos para construcción de espacio público, Se realiza demolición de escalera existente para genera el cambio de pendiente en loseta y rampa en casa indicado por supervisión e interventoria. Personal Obra (3 oficia y 3 Ayudantes) Llega material peatonal y prefabricados.

Mulla Sanguinetti Calle — Jaime Fernández — Fis interv

INSP OBRA.

02/08/23 Se inician actividades 7:00 am con construcción de espa publico sobre la carrera 25 con calle 9a, se realiza fundición de escalera y bordillo repartido para cambio de nivel. Personal en obra (1 oficial y 3 Ayudantes)

Mulla Sanguinetti Calle — Jaime Fernández

INSP OBRA. Fis interv.

01/08/23 Clima Soleado

Se inician actividades 7:00 am con construcción de espac Pública y construcción de rampa en parqueadero casa (24-31). Personal en obra (1 oficial, 3 Ayudantes)

Powered by CamScanner

Se continua con actividad de brechar y jornada aseo y limpieza.
Mullin Sustaeta
INSP OBRA

08/08/2023 Clima. Soleado.
Se inician actividades 7:00 am, Se continua con actividad de construcción espacio público y arreglos solicitados por interventoria. Personal Obra 3 oficial y 3 Ayudantes). Se realiza recorrido para entrega a interventoria frente 9ª La universidad se definen detalles finales tales como losetas q/ caidas o con tropiezos, arreglo de sumidero brechar, cambiar chazos desalineados, arreglo del desague casa 24-79, embone paramentos casas donde sea necesario, cambiar amarilla pactriada (4x40) y Aseo y limpieza en presencia de Insp. Kelly Jimenez, Ing Eduar Ipia Ing Iliana Velandia e Insp. Melisa Suarez.
Se realiza recorrido de interventoria (Residente ins-pector) en compañia del contratista (Residente, ins-pector y Director) y se definen los arreglos pendientes para el recibo. Se le recuerda al contra-tista que el aseo de obra no es barrer, es necesario descrachar, lavar o lo necesario para dejar la vio tal cual se encontro (libre de todos estos residuos, adicional a lo anterior mencionado, deberan cambiar las losetas necesarias rotas por topes) en las siguientes situaciones: cambio de sentido, cambios de pendientes, indicando el inicio y el fin, ó si sobre la proyeccion de la guia se encuentra alguna tapa de servicio publico, si alguno de los situaciones anteriormente mencionados en la construccion del espacio publico no esta cumpliendo, debera realizarse el cambio, la inter-ventoria queda atenta a la fecha y hora para la entrega donde debera estar listo, todo lo

11/08

anterior mencionado. Insp Interv. Kelly Jimenez

Ra interv

La instrucción de colocación en cambios de nivel fue dada hoy 8 de Agosto de tableta tapered, entre tanto el consorcio entrara a revisar la solicitud dada por la interventoria.

Maleu Sanguinetti
Insp OBRA.

Capataz
Residente

9/08/23 Clima Soleado.

Se inician actividades 7:00 am, se continua con instalación de loseta en carrera 25 con calle 9ª, se continuan con arreglos solicitados con interventoria como lo son losetas caidas o con trapiezes, arreglo sumidero, brechar, cambio de chazos desalineados tanto en loseta amarilla como gris, arreglo del desague cra 24-9a, embone paramentos de casas y Aseo y limpieza Personal en obra (1 oficial, 3 Ayudantes) Se realiza franja de ajuste y bordillo que confina anden existente con loseta. Aseo y limpieza en campamento.

Maleu Sanguinetti
INSP OBRA.

Capataz
Residente

Ra - Interv

10/08/23 Continua sin entregasen los siguientes frentes a satisfaccion a la interventoria: Barrio Pino; frentes entre cra 24 clls 12 y 13 y calles 13 y 14, Barrio la universidad cra 29 entre calle 10 y 11 y cll 9a entre cra 24 y 25. Todas las observaciones tecnicos y de acalados el contratista ya las conoce. la interventoria continua a la espera de la fecha por parte del contratista, cabe recordales que la entrega a la comunidad es ajena y aparte de la entrega a la interventoria.

Ra interv

Capataz
Residente

14/08/2023	Inician Demolición placa existente en Frente cll 20 entre cra 29 y 30 Barrio San Alonso, Personal en obra (3 ayudantes). Se realizó cerramiento de la zona a intervenir. Kelly Jimenez Insp. Int. Insp. obra. Res. interv. Residente
21/08/23.	Clima Soleado. Se inicia actividades 7:00 am personal en obra (3 ayudantes), Se continua con demolición de varias en concreto en calle 20 entre cr 29 y 30. Insp obra. Res. interv. Residente
14/09/23	Clima: Soleado / lluvias moderadas Se inician actividades 7:00 am se continua con demolición de varias en concreto en calle 20 entre cr 29 y 30. Barrio San Alonso. (Personal en obra 1 oficial y 3 ayudantes) Insp obra. Res. interv. Residente
15/09/23.	Clima Soleado / lluvias moderadas. Se inician actividades 7:00 am, Se continua con actividades de demolición de varias en concreto en calle 20 entre cr 29 y 30 Barrio San Alonso (Personal en obra 2 oficiales y 6 ayudantes). Continuan con demolicion placa existente cll 20 entre cra 29 y 30 Barrio San Alonso. Kelly Jimenez M Insp obra. Insp Interv. Res. interv.
16/09/23.	Se continua con actividades de demolición en calle 20 entre cra 29 y 30 Barrio San Alonso (Llega otra pareja), Sin presencia de interventoría. Personal en obra (3 oficial y 4 ayudantes) Llueve. Insp. obra. Res. interv. Residente
19/09/23	Clima: Soleado Se inician actividades 7:00 am, se continuan con demolición de varias en concreto. En calle

Powered by CamScanner

23 entre Cr 29 y 30 barrio San Nunes. Personal en obra (1 oficial y 4 ayudantes) Llega material petreo. Continuan con demolicion placa existente frente a predio # 29-42, a la fecha el % de demolicion de 6 dias de trabajo es aproximadamente del 50%. del total delarea a demoler. Aun no se inician actividade de replanteo, instalacion sub base y construccion de espacio publico en las áreas ya demolidas.

Kelly Jimenez
Insp. Interv.

Res. Interv.

Se recibe visita de interventoria Insp. Kelly Jimenez a las 10:10 am, se retira de la obra 11:60 am. Se continua con actividad de excavación para instalación de sardinel, llegan material de cemetera y Petréos.

Maikol Suarez Tabla
Insp. OBRA

Ingeniero Residente

3/08/23 Clima: Soleado.
Se inician actividades 7:00 am personal en obra (3 oficiales y 7 ayudantes) Se continua con actividades de demolicion, excavacion y corte de pavimento sin presencia de interv. Se recibe acompañamiento de Insp. Kelly Jimenez 3:00pm hasta las 5:00pm. Se inicia replanteo en zona a intervenir y se instala Sardineles.

Maikol Suarez Tabla
Insp. OBRA.

Ingeniero Residente

4/08/23 Clima: Soleado.
Se inician actividades 7:00 am, se continuan actividades de replanteo instalación de Sub-base, relleno compactado (Personal en obra 3 oficiales 7 ayudantes).

5/08/23 Clima Soleado.
Se inician actividades 7:00 am, se continua con demolicion de varios en concreto Rigido, excavación y replanteo (Personal en obra 3 oficiales 5 Ayudantes) en Presencia del contratista se encuentra en obra Ing Lorena Monsalve se entrega boletin # 01 (29-60

El dia de Hoy no hay presencia del inspector de obra encargado del frente cll 20 entre cra 28 y 29 barrio San Alonso, tampoco hay presencia del HSEQ y se observan varias inconsistencias en esta area como: obreros sin casco, guantes, protectores de oidos y camisas manga cortas, asi mismo el cerramiento es deficiente, no hay sendero peatonal y la señalizacion incompleta, se le informa al HSEQ de interventoria para que haga las acciones correctivas al contratista. Continuan con demolicion de placa existente, replanteo y localizacion. Se le solicita al contratista realizar los cortes con pulidora pertinentes y necesarios previos a la demolicion para evitar afectar el piso existente de los predios o negocios, como se evidencio hoy en la visita de la interventoria, se les recuerda la toma de ensayos de densidad, NO se autoriza la construccion e instalacion de espacio publico sin los respectivos ensayos, al dia de hoy en lo que fue la jornada de la mañana no se evidencia llegada de loseta. a Los frentes de los barrios Pinos (2) y barrio la universidad (2) continuan sin ser entregados y recibidos a total satisfaccion por la interventoria, cabe aclarar que a pesar de que el contratista ha realizado algunos de los arreglos solicitados por la interventoria, al dia de hoy hacen falta, Los frentes no solo deben ser funcionales, si no estetricamente aceptables como lo estipula el MEPB, esto incluye el Aseo correspondiente a la via.

Kelly Jimenez
Insp. Interv.


Se recibe visita interventoria Ing. Kelly Jimenez
8:30 am y se retiran 10:30 de la obra en
calle 20 San Alonso según soporte Directora Obra Ing.
Lorena Manzalva.
La interventoria Realiza acompañamiento constante en cada una
Directrices HSEQ. de los frentes

Ing - interv.

23/08/23 Clima: Soleado
Se inician actividades 7:00 am se continuan con
actividades de demolición de muros en funcheado, replanteo
instalación sanitario (Regaderas en obra (3 regaderas, 1 sanitario)
Nota HSEQ: Al cierre de la jornada del día 18 de agosto,
se deja cerramiento en perfectas condiciones, señalización
provisional de PMT y delimitación en la obra. Los días
19 y 22 de agosto me encontraba en un permiso laboral y
es de aclarar también que soy el unico profesional HSEQ
que hay para todos los frentes activos, por ende no puedo
estar toda una jornada en un solo punto pues me encuentro
realizando recorridos. Bernardo Sierra Gomez - HSEQ
El día 24 de agosto se envia oficio a interventoria con los
evidencias de los cerramientos arreglados de todos los frentes
activos.
El día de hoy no se presenta en la obra
el personal minimo de obra, teniendo inconvenientes
en los procesos constructivos, ya se estaban niveles
de instalación de sub base, Bordillos, Alcantarillado
y demas, todo esto no sera tenido en cuenta
Pero Actividades representativas en el avance Financiero
Con llegada de materiales pedidos en pesimas
condiciones y Solicitando reintegros que no
Son Aprobados pues la instalación de dichos materiales
El incumplimiento del Personal en obra Generan
pausas Innecesarias en el Contrato.

Ing - Interventoria

Nota HSEQ: dando respuesta a la solicitud contenido en bitacora el dia 22 de agosto de 2023 se le recuerda a la interventoria portar los EPP necesarios al ingresar a obra. Como evidencia se adjunta registro fotografico:

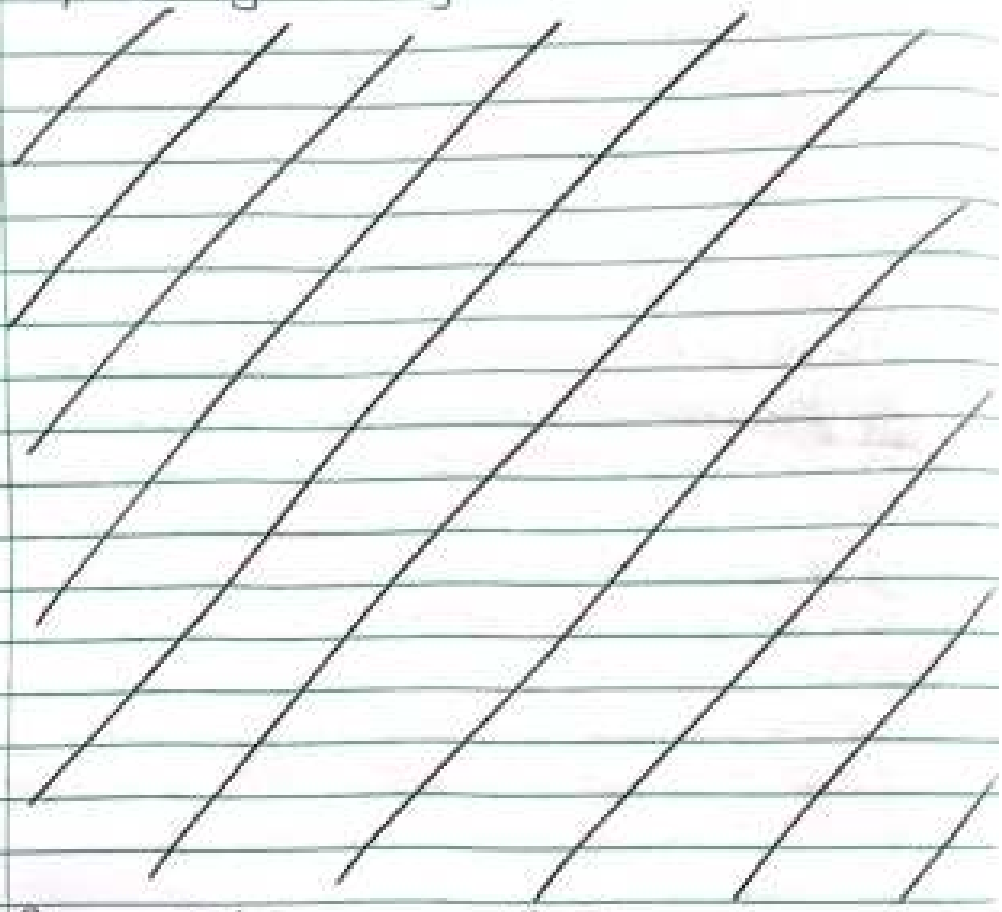

* Bernardo Suárez Carrero - HSEQ

En jornada de la tarde continuan con demolicion de placa existente, el avance es minimo en esta actividad ya que la capacidad de la planta no da abasto con el taladro, llevan 11 dias en esta actividad. Sobre la 3pm el personal operativo queda "parado" por falta de materiales, No hay sub base granular, ni loseta tampoco se puede avanzar en la actividad de replanteo. El personal administrativo Residente, inspectos, HSEQ desde ayer no hace presencia en obra, sin embargo llevan bitacora, la información escrita por el personal es suministrada por la ing. Lorena quien es la unica profesio

nal que esta asistiendo al frente. se le recuerda al contratista que la Bitacora debe permanecer en obra y en el frente correspondiente, sin importar si el profesional encargado asiste o No, como tambien este requerimiento es indiferente si tienen o No campamento, pues una gestion que le corresponde al contratista realizar.
La sub base instalada frente al predio esquinero en la cra 30 debera ser retirada, pues como lo expresa el residente de interventoria no cumple con las especificaciones tecnicas estipulados en el MEPB, dicha sub base fue recibida por personal operativo, ya que no habia ningun profesional por parte del contratista cuando llego. Se le recuerda al contratista la toma de ensayos de densidad previa a la instalacion de loseta y adoquin, de No realizarse No se autorizara la ejecución de estas actividades, ni se tendria en cuenta estas cantidades para el avance semanal.
La interventoria le recuerda al contratista que sigue a la espera de la entrega de los siguentes frentes:
BARRIO PINOS = Cra 34 entre cll 12 y 13 y cra 34 entre cll 13 y 14, a pesar que se realizo entrego a la comunidad, aún falta entregar a total conformidad la parte tecnica a la interventoria. La entrega a la comunidad no lo exime de la Parte tecnica pendiente.
BARRIO LA UNIVERSIDAD = cll 9a entre cra 24 y 25 sigue pendiente entrega a la interventoria, Frente cra 29 entre cll 10 y 11 sigue tambien sin entregar a la interventoria.
El contratista conoce los arreglos pendientes en cada frente, se han consignado en bitacora y realizado recorridos con el residente e inspector.

Kelly Jimenez
Insp. Int.

Residente

Powered by CamScanner

24/08/23 Se inician labores a las 7:00 am clima parcialmente soleado con 2 oficiales y 5 ayudantes, el dia de hoy llega nueva sub base granular, aun no llega loseta ni adoquin, continuan con demolicion de placa existente, instalacion sardinel 980 m, instalacion sub base.
Solo hace presencia en la obra la ing. Lorena, los demas profesionales siguen sin presentarse en el frente. Se le recuerda al contratista no usar la sub base que llego el dia de ayer y no se aprobo su instalacion, ya que aun no se ha realizado el retiro de este material en la obra; Asi mismo la interventoria les recuerda el uso de hilos longitudinales y transversales durante todas las actividades y ejecucion del espacio publico y garantizar Asi los niveles y pendientes; es importante que la interventoria tenga los resultados de los ensayos de densidad tomamados el dia de ayer y aprobarlos, antes de iniciar esta actividad. No se aceptaran en ningun caso prefabricados que no cumplan con las especificaciones tecnicas del MEPB.

Kelly Jimenez
Res. interv. Insp. Interv.

Se continuan actividades de demolición en placas reforzadas con malla electrosoldada con espesores superiores a 15 cm. Atendiendo a las solicitudes del retiro del material sobrante se realizo el mismo dia de ayer frente al personal de interventoria y con la llegada de nuevo material se instala sobrante y se realiza compactacion. Se manifiesta a la inspectora de interventoria que el dia 25 de agosto fueron tomadas las densidades y serán entregadas el dia 25 de agosto, la evidencia de la actividad la trae el ing. residente de interventoria.
Se recibe visita por parte de profesional HSE e inspector de interv

kelly Jimenez en la jornada de la mañana.

Capataz / residente.

Res - interv.

25/08/23 Clima Soleado / lluvias 1:30 pm a 3:30 aprox. dl 20 entre cl 29/3
Se inician labores a la 7:00 am con 2 ofc y 5 ayudante continuan con trabajos de demolicion de placa esquina cra 30, replanteo y aplicacion sub base granular. En la jornada de la tarde llega 1 oficial y un ayudante mas. El dia de hoy el personal administrativo (inspector) realiza presencia para medir cantidades de actividades ejecutas en la semana; sin embargo por falta de solucion en el pago, la ing. Lorena es la unica profesional como tal esta ejerciendo 100%. El dia de hoy se esperaba llegada de material prefabricado (Losetas - adoquin) sin embargo al finalizar la jornada no se evidencio esto. En comite el contratista afirma haber realizado cerramiento del frente NORTE, sin embargo solo se aprecia en obra dos tramos de cerramiento en polisombra verde iniciando la cra 30 hacia la cra 29 en la dl 20 aproximadamente 6 m lineales en todo el costado Norte. Se define "bajar" o "enterrar" tubo electrico del predio # que se encuentra transversalmente y diagonal al poste electrico ubicado sobre la construccion del nuevo espacio publico, lo mas que se pueda sin afectar internamente el predio o su funcionamiento, de manera tal que este se pueda "tapar" con la sub base y de ser necesario encamisar el tubo con concreto y garantizar que no sufra cambios en su capacidad resistente, al momento de la construccion e instalacion del nuevo espacio publico y posterior uso por los peatones. Se le solicita y sugiere al contratista NO dejar espacios en blanco o pendientes por llenar en la bitacora, de ser necesario algun anexo,

Powered by CamScanner

realizarlo en el menor tiempo posible.
La interventoria continua a la espera de los resultados de los ensayos de densidad tomados el dia miercoles 23 de Agosto/2023 para la aprobacion de la instalacion del espacio publico y franja ambiental; se les reitera que sin estos resultados la interventoria NO autoriza estas actividades, adicional deberan tomar los ensayos de densidad pendientes en las demas areas, toda vez que se ha evidenciado "baja" calidad en este material granulado en este frente.

Kelly Jimenez
Insp. Int.

En respuesta la entrega de los ensayos fue realizada al ing Residente de interventoria y fue avaluados las indicaciones del material que yo fi e cambiado dia atrick Sitio Negociado prefabricado lastra lisa alfrente le realizan demoliciones de para refrezada predio 29-50, actividad de base y compactación

26/08/2023 Clima Soleado / SAN ALONSO CLL 20 29 y 30

Se Inician labores a las 7 am 4 oficiales y 5 ayudantes, en el costado SUR continuan con instalacion sub base, llega Material (Loceta y adoquin) e inician construccion e instalacion de Espacio publico y Franja ambiental Frente la predio # 29-42. En costado Norte aún no se inician actividades, en este costado se observa aprox. 6 mts lineales del cerramiento iniciando la cra 30 hacia la cra 29 frente al predio # 29-71. El dia de hoy tampoco hay presencia del inspector por pate del contratista. La cantidad del material que llega a obra no es el suficiente para el avance que el contratista debe realizar segun lo planteado y expresado por el en el comite. Se les recuerda segur

teniendo en cuenta todos los requerimientos técnicos que se le han venido exigiendo y manejando
Kelly Jimenez M
Insp. Int.

Llegada de material vista gravilla, adoquines, presencia de inspectora Oscar Rocha. Se realizan actividades de instalación de cuneta, instalación de loseta cuneta, vista gravilla y adoquines. Se finaliza franja de apoyo y rampa de acceso en el predio 20-12 y 20-34.
Rej. interv.

20/08/23 Clima Soleado / San Alonso cll 20 entre cra 29 y 30
Inician labores 7am con 1 oficiales 5 ayudantes, se realizan actividades de demolicion concreto del bordillo sardinel del costado norte cale 20 entre cra 29 y 30. Actividades de excavación de bordillos, actividades hechas con cortadora electrica y pica mixta manual y señalizacion con conos y cinta peligro.
En costado sur no se realizan actividades por falta de Material (Losetas y adoquines). En costado Norte Inician actividades de demolicion placa y sardinel existente, excavacion para sardinel prefabricado nuevo. El dia de hoy no hay presencia de inspector por parte del contratista. Kelly Jimene
Rej. interv. Ins. Int.

19/08/23 Clima Soleado / San Alonso cll 20 entre cra 29 y 30
Inician Actividades 7 am con 2 oficiales y 4 Ayudantes, mas 1 ayudante vial. En costado Norte continuan con actividades de demolicion placa y sardinel, excavacion para sardinel nuevo. En costado Sur no hay personal trabajando aun, por falta de Material. Kelly J Insp I

Llega material prefabricado; losetas; adoquines; visita de la inspectora Kelly jimenez a las 8:30 am y se retira a las 11:00 am.
Continuan con actividades de demolicion y excavacion en costado norte.

Rej. interv.

30/08/2023 Clima Soleado / San Alonso cll 20 entre cra 29 y 30
Inician actividades con 4 oficiales y 4 ayudantes, mas 1 ayudante vial; Continuan con demolicion placa y sardinel, excavacion para sardinel nuevo e instalacion costado Norte.
En costado sur retoman actividades de instalacion sub base, construccion espacio publico y franja Ambiental, instalación sardinel. Llega Material prefabricado, sardinel y Loseta. Se les recuerda el uso de hilos tranversales y longitudinales durante toda la ejecucion de las actividades donde se requiera (replanteo, Instalacion sub base, sardinel, construccion Espacio publico y franja ambiental.) realizan fundida franja de ajuste y vados peatonales, redes de cajas servicios publicos.


Yuliet Kelly Jimenez
Insp. Interv

Se retoman actividades de replanteo, excavacion e instalación de Espacio publico según MEPB. Se asiste de la inspectora Kelly a las 10:00 AM se acuerda sus recomendaciones y se retira a las 11:17 AM. Llega material prefabricado para continuar la construcción del Espacio Publico Según MEPB.

31/08/2023 Clima soleado / san Alonso calle 20 entre cra 29 y 30
Inician Actividades 7 am, con 6 oficiales y ayudantes, mas 1 ayudante vial. En visita de Ing. Daniel apoyo a la sup. de la alcaldia, Ing. Vladimir Director interventoria, Ing. Jose Domingo por parte del contratista; se define lo siguiente:
1. En el Area de franja Ambiental se dejaran alcaques cada 5 mts.
En relacion a la confusion por el personal profesional del contratista en la anterior men

nado se aclara lo siguiente: EN ZONAS RESIDENCIALES DONDE SEGUN EL PERFIL VIAL CONTENGAN FRANJA AMBIENTAL, LA FRANJA AMBIENQUEDARA EN GRAMA, VEGETACION O GRAMOQUIN. EN ZONAS COMERCIALES SE DEBE ENDURECER CON ADOQUIN DE CONCRETO DEJANDO ALCORQUES CADA 5 METROS DEPENDIENDO DE RAMPAS VEHICULARES O PEATONALES, POR LOCUAL PARA EL FRENTE DE LA CALLE 20 BARRIO SAN ALONSO CORRESPONDE A ZONA RESIDENCIAL, POR LO TANTO LA FRANJA AMBIENTAL DEBE QUEDAR EN GRAMA, VEBETACION O GRAMOQUIN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ESPACIO PUBLICO DE BUCARAMANGA MEPB.

Andén tipo zonas I

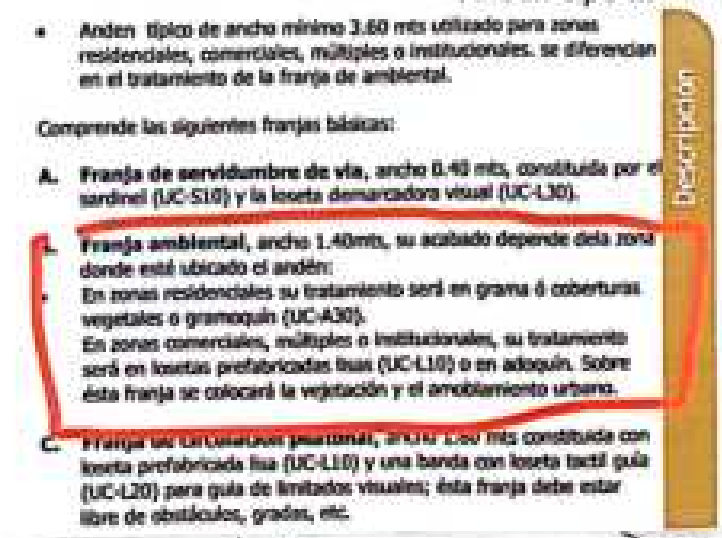

El Contratista debe solicitar a la Ingeniera Nidia Centero Profesional Ambiental de la Alcaldia de Bucaramanga las especies y/o individuos arboreos, necesarios para cada Frente. Recuerda leer HSEQ Interventoria.
Se debe tener en cuenta que los vados vehiculares en donde el sardinel se despatillo o afecto por causas que obedecen a responsabilidad del contratista, deberian ser cambiados si es el caso, para la entrega final del frente se le recuerda al contratista que todo debera ser funcional y estetica-

Powered by CamScanner

mente aceptable como esta estipulado en el Manual de Espacio publico de Bucaramanga

Kelly Jimenez M
Insp. Interventoria

Se reciben 172 cuotas de las cuales se confirman construcción de espacio publico según MEPB visita de la inspectora 9:30am se retira 5 oagar. La interventoria se Retira a las 5:15 pm Kelly Jimenez M.

01-09-23 Oficio Solicita
Inician labores a las 7:00 am con 8 oficiales y 3 ayudantes en 20 cuadrillas 30 son presencia de interventoria para continuar labores de demolicion, construccion de Espacio publico según MEPB: Excavacion y demolicion.
En cll 20 entre cra 29 y 30 San Alonso. costado Sur, continuan con instalacion sub base construccion Espacio publico y franja ambiental. Realce de cajas servicios publicos, construccion Alcorques, franja de ajuste. En costado Norte continuan con demolicion de placa existente, excavacion e instalacion saidinel 0,80 m.
El dia de hoy solo se esta usando un tablado para la actividad de demolicion.
El inspector contractual Oscar Parado hace presencia 2:45pm, y el encargado de esta funcion llega y realiza presencia presencia en la jornada de la tarde de 1:40 a 5:00 pm. En costado Norte en la jornada de la tarde solo se encuentra una cuadrilla de 1 ofc y 4 ayudantes adelantando la actividad de demolicion, Inician instalacion de sub base granular; adelantan y excavacion para construccion espacio publico y Franja ambiental.

Kelly Jimenez
Insp. Intv.

CONTRATO DE OBRA No. 022
DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1
- LA VEGA
- LA AURORA

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 3

Powered by CamScanner

terminación ó acabados no cumplan con las especificaciones técnicas, así mismo continuar alerta a la calidad pues en la instalación del adoquín el día de hoy, algunos piezas se fracturaron al golpearlos con el mazo de goma para su asentamiento

Kelly Jiménez
Inspector de Obra — Residente — Insp. Interv. — Res. Interv.

31-07-23 Última Jornada
iniciamos actividades con 2 oficiales y ayudantes para aplicar sub-base y levantar las losas, se reciben 2000 adoquines. continuamos instalando losetas. llueve desde las 2:00 pm hasta las 5:30 pm se suspenden labores desde las 2:00 hasta las 4:30 se revisan los adoquines para verificar que estén en perfectas condiciones para su aplicación. sujeto a verificación por interventoría.
iniciamos actividades a las 7:00 AM con 2 ayudantes y 2 oficiales para continuar instalando adoquín y losetas

Inspector de Obra — Residente — Res. Interv.


01-08-2023 Última Jornada
iniciamos labores a las 7:00 AM con 2 oficiales y 4 ayudantes. sin presencia de la interventoría para verificar trabajos de instalación de adoquines y losetas para el espacio público. llegan 5 m³ de sub-base
Continua instalación Espacio público y franja ambiental, se presentan durante el día lloviznas de menor intensidad que no requiere parar

actividades. Se le recuerda al contratista el uso de hilos y nivel o regla metalica para conservar el alineamiento y nivel , tanto longitudinal como transversal. Se les recomienda realizar replanteo para la instalacion de los prefabricados, antes de la actividad , para evitar chazos o "rellenos" con concreto, en areas donde se pueda instalar los prefabricados completos, los ajustes con mortero o concreto solo seran aceptados si llega a ser necesario, de lo contrario se tendra en cuenta para el recibo final del frente lo que estipula el MEPB. (leer pag 5.2.9.41 y 5.2.A.2 pag 31-32), asi mismos estos cortes deberan ser esteticamente aceptables.

Kelly Jimenez M.
Insp. Interv.

Rel. Interv.

En visita de Interventoria Ing. Vladimir Polo, Supervisor del contrato Ing. Daniel, Auxiliar de Ing Bapro y contratista se define lo siguiente. Dejar alcorques frente a los residencias que no tengan cumplimiento separación minima de 3m, rampa vehicular del predio 38-38 dejar pendiente minima en rampa, correr franja de circulacion para dar quiebre.

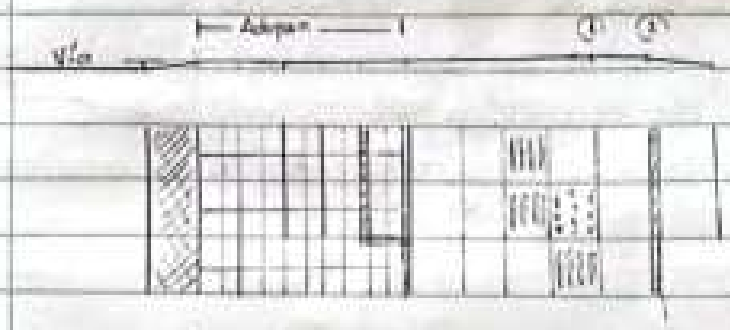

Ing. Daniel se lleva la solicitud de ampliacion de espacio publico a Cu esquina, se solicito a los residentes sociales empresa e interventoria hablar con encargados del edificio para realizar PQR y dar tramite ante e

Supervisor.

Residente.

Rel interv.

02/04/2023 clima soleado
Se inician labores 7:00 am, ingresa personal nuevo para un total de 7 ayudantes, y oficial Continuan con actividades de instalacion y compactacion sub base esquina cra 29, construccion espacio publico y franja ambiental, fundida franja de ajuste. Se espera durante el dia llegue el martillo demoledor para continuar con demolicion de placa frente a parqueaderos de todos los predios.
Se le recuerda al contratista nuevamente usar los hilos necesarios para garantizar y conservar el alineamiento nivel tanto transversal como longitudinalmente se sugiere cordeles de 2,5 a 3 m como lo estipula el MEPE, Asi mismo evitar ajustes con mortero o concreto, Si los cortes de adoquines con disco diamante se les complica, revisar la opcion de realizarlos con otras herramientas (cincalla o peldicera metalica) los biechos deben ser de 2 mm a caso maximo 4mm. No usar los pelabicados que presenten desperfectos en su acabado (fisuras, desportilles, cambios de tono demasiado notorios... etc). Los rellenos que sean necesarios deberan realizarse con Material de excavacion seleccionado, que se deba aranar, proteger y guardar de la excavaciones realizados en el frente.

Kelly Jimenez
Insp. Int.

Ing. Residente de Obra

Pos-interv

Se le recuerdo al contratista la toma de ensayos de densidad, No se autoriza (instacion) instalacion de espacio publico ni franja ambiental sin estos ensayos, de realizarse deberan en su momento levantar el area que la interventoria solicite para realizarlo.

Kelly Jimenez
Insp Int.

Pos interv

03/08/2023 soleado
Se inician labores 7:00 am, con 4 oficiales y 7 ayudantes continuan con instal espacio publico, demolicion de placa, compactacion sub base, construccion alcorques, cabezales esquina cra 28, retiro de cajas esquina cra 28. sobre la 9am llega el taladro pero no funciona, solo se pudo usar de 7 a 9, la demolicion de placa se esta realizando con pala.
Se le recuerda que los bordes entre las losetas deben ser de 2mm, maximo 4mm como lo estipula el MEPB # 5.2.4.4.1 pag 31, revisando el dia de hoy lo ultimo instalado frente predio # 18-29 (obra abandonada) se evidencian bordes/juntas entre 8mm y 1cm, desde el dia de ayer se le habia hecho la observacion al inspector Se le reitera el uso de hilos para conservar el alineamiento y nivel, no se aceptaran ajustes en mortero o concreto que se puedan evitar a futuro por el NO uso de hilos. Es importante que el alineamiento del espacio publico que se inicio en la esquina de la cra 29 coincida con el tramo que se venia ya instalando, pues no se aceptaran bordillos que no estipule y apruebe la interventoria. A las 10:30 am llega otro taladro para continuar la actividad de demolicion.

Inspector — Kelly Jimenez, Insp. Interv. — Res. Interv

se averió el taladro y es llevado a reparación se reciben 120 losetas lisas, 20 topos y 120 acanalladas. se recibe una carga de arena.

04/08/2023
Se inician labores 7:00 am, con 4 oficiales y 7 ayudantes, continuan con actividades de demolicion, construccion espacio publico y franja ambiental.
Se le recuerda al contratista realizar los ensayos de densidad, NO se autoriza instalacion de prefabricados [de] (loseta, adoquines) sin los ensayos. de realizar la actividad deberan en su momento levantar el

Powered by CamScanner

area que la interventoria solicite, para tomar los ensayos. Kelly Jimenez M.
Llegan 100 bultos de arena. Solo 8m³ de escombros. Llega 1/3 de sobrante. La mayoría se averia. Se recogieron a las 3 pm.

Ingeniero Obra — Res - interv

05-08-23 Obra Soleada
Se inician labores a las 7:00 AM con 4 oficiales y 5 ayudantes se reciben 8m³ de arena en malas condiciones: barro en bloque revuelto con arena no apta para utilizar en mortero de pega.
Continuamos con la instalación del espacio público; realce de aceras públicas. instalación de adoquín y demolición en perpendicular

Ingeniero Obra — Res - interv

08-08-23 Obra Soleada
Iniciamos Obra a las 7:00 AM con 3 oficiales y 5 ayudantes, Sin presencia de interventoria para seguir demoliendo las perpendiculares, instalando adoquines, fraguas de ayer. Llegan Lonchas a la obra

Ingeniero Obra — Res interv

09-08-23 Obra Soleada
Se inician labores a las 7:00 AM con 3 oficiales y 5 ayudantes para continuar la instalación de Lonchas

Powered by CamScanner

demolicion de alcorque, rampa vehicular
Sub base, base de anden.
Continua construccion de espacio publico, replanteo e instalacion sub base, construccion alcorques, fundida rampas vehiculares, franjas de ajuste y confinamie

Kelly Jimenez
Insp. Interv.

Inspector sobre

Ing Residente

10-08-23 Clima nublado.
Continuamos labores a las 7:00 AM con 4 oficiales y 6 ayudantes para continuar la construcción de espacio publico, replanteo demolición e instalación sublose, rampas vehiculares, e instalación de adoquines.

Ing Residente

11-08-23 Clima Soleado
Iniciamos labores a las 7:00 AM con 4 oficiales y 5 ayudantes; continuamos construccion de espacio publico segun MEPS; instalación de adoquines demolición de parqueaderos en el cruce franja de ajuste al predio.
Continua instalacion espacio publico y franja ambien demolicion acceso paqueaderos, fundida franja de Ajuste. Se le recuerda al contratista realizar los ensayos de densidad, No se autoriza la instalacion loseta o adoquin sin estos ensayos, de instalarse deberan levantar el area donde la interventoria considere y realizarlos. Se le recuerda al contratista arreglo solicitado en la franja ambiental junto a l palma donde realizaron ajustes con concreto por mal replanteo a la hora de la instalacion. los remates la franja de ajuste alos predios debera quedar esteticamente aceptable pues a hoy Cent la qu


Powered by CamScanner

cundieron frente a la obra abandonada predio # 18-24 no cumple con las especificaciones y no será aceptada al momento de la entrega del frente. Así mismo corregir todas las brechas que tienen casi 1 cm en los adoquines, ajustar los que estén sueltos y alinear los que estén desalineados. Así como también ir brechando para garantizar el ajuste del espacio publico y franja ambiental, esta actividad debe realizarse barriendo constantemente la arena para que ingrese en las juntas, pues no basta con solo extenderla sobre las losetas y adoquines ya que esto no garantiza que la arena llene completamente la junta además cuando llueve esta se humedece y dificulta el llenado y la revisión del espacio publico. Adjunto imagenes de lo anteriormente mencionado Kelly Jimenez N Insp. Interv.







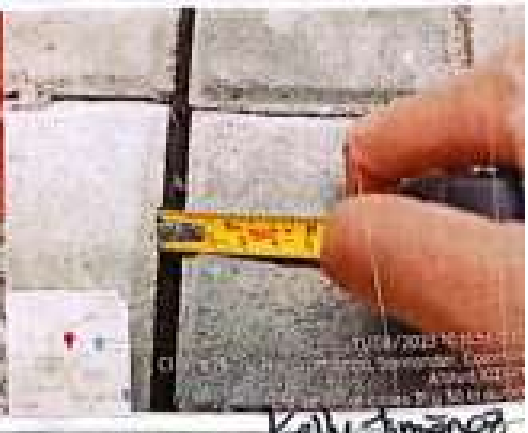

Kelly Jimenez

Lo anterior expuesto por la inspectora Kelly la cual no tuvo en cuenta lo que se está diciendo Kaindo la obra estuvo en proceso de construccion

y de acerbados. le recomiendo que deje formaleta y con sus respectivos acerbados. durante el dia de ayer no se presentó a la obra y hoy llega a las 9:15 AM y sale a las 11:00 AM. llegó recomendo en horas de la tarde entre 3 y 5 pm.

Inspector de obra — Res. Interv.

12-08-2023 Clima Soleado

Iniciamos obra a las 7:00 AM sin presencia de interventoria con 4 oficiales y 6 ayudantes para continuar trabajos de demolicion, excavación y retiro de cajas de servicios publicos.

Inspector de obra — Res. Interv.

14-08-2023 clima Soleado

Iniciamos obra a las 7:00 AM sin presencia de interventoria con 4 oficiales y 6 ayudantes. para continuar actividades de replanteo, elaboración de tacos anclajes varillas, fraile de cajas y pruebas de gente. Se hizo completo de excavacion. el formaleta adicionado no hubo presencia de interventoria.

Inspector de obra — Res. Interv.

15-05-2023

Iniciamos obra a las 7:00 con 3 oficiales y ayudantes, sin presencia de interventoria para continuar trabajos de instalacion de tacos, varillas pasadores, fraile de apoyo y limpieza. el formaleta adicionado no hubo presencia de inspectores de interventoria

Inspector de obra — Res. Interv.

Powered by CamScanner

16-08-2023 Clima Soleado
Iniciamos labores a las 7 de la mañana con 3 oficiales y 3 ayudantes para continuar trabajo de reposición de losetas elaboración de alcorques, fuimos de apoyo al predio Sin la presencia de interventoría.
Visita de interventoría a las 11:30 am salida a la 12:00 pm. se suspenden labores por lluvias intensas a las 2:30 hasta 4:00 visita del ing. Eduard Vera se establecio tener una rampa al lado del tanquilla la rampa para peatones.

Maestro de obra — Res-residente.

17-08-2023 Clima Soleado
Iniciamos labores actividades para continuar trabajo a las 7:00 am con 2 oficiales y 3 ayudantes; sin presencia de interventoría para continuar reposición rampa reposición y alcorque y cunetas detalles propios de la obra. Llega ing. Eddy 5:36 pm Salida a las 5:40 pm
Continuan actividades de construccion de espacio publico, realce de cajas, fundida alcorques y arreglos varios. personal en obra despues de medio dia 2 oficiales y dos ayudantes; el resto de personal que se encontraba en la jornada de la mañana debio ausentarse en la jornada de la tarde por falta de material (Loseta). Asi mismo se le recuerda al contratista tener todas todas las observaciones ya realizadas y en su momento durante la ejecucion de las actividades en la revision rutinaria de hoy a pesar que la interventoria conoce y tiene claro que aun estan

Powered by CamScanner

terminando y esta pendiente la entrega total del frente por parte del contratista, se evidencian las siguientes observaciones: losetas y adoquines ya fracturados, alcorques torcidos, losetas y adoquines hundidos y/o con tropiezo, franjas de confinamiento que su acabado no se ve "plano" sino "curvo" y/o por debajo del nivel del espacio publico y adoquin, pendiente pintura amarilla en areas donde no se pudo instalar la loseta guasual amarilla, construccion espacio publico y realce cajas esquina Cra 29, resane paramentos edificios, brecha espacio publico y franja ambiental, asi mismo deberan cambiar o limpiar si es posible todos los adoquines o losetas que se quemaron por el concreto utilizado para fundir las franjas de ajuste y realce de cajas.

Kelly Jimenez M
Insp. Interv.

De esta realizada revision de acuerdo a lo estipulado por interventoria, estamos dando los ultimos retoques para finalizar la obra y en espera de la prolongacion hacia la ESAP por la KR 28.

INTERVENTORIA — RES - INTERV

18. 04. 2023 Obra Suburbe
Iniciamos a las 7:00am con 2 oficiales y 1 ayudante para detallar algunos defectos que se presentaron durante el desarrollo de la obra; reparar de franjas de ajuste, realce de cajas de servicios publicos, pegar losas sueltas, aseo. En espera de losetas para rematar la curva.
Continuan con arreglos construccion espacio publico, realce de cajas, franja de Ajuste, asi mismo terminar esp

Powered by CamScanner

co publico esquina cra 28 y realce cajas.
El inspector contractual NO esta, no hace presencia en la obra, la persona que realiza la funcion es otra en obra. La interventoria sigue a la espera que el contratista indique fecha de entrega del frente, recordandole que para la entrega se tendra en cuenta todo lo ya mencionado anteriormente y lo que no cumpla con las especificaciones tecnicas estipulados en el MEPB, calidad y acabados en general deberan ser esteticamente aceptables bajo los lineamientos del MEPB que el contratista conoce y que la interventoria en reiteradas oportunidades ha solicitado. Es importante recordarle al contratista que asi mismo al momento de la entrega del frente en la cll 31 entre cra 28 y 29 Barrio la Aurora, deberan haber realizado el aseo de la via, retiro total de escombros, limpieza jardineras y material sobrante.

Kelly Jimenez
Insp. Interv.

Residente

19-08-2023 ellos solos iniciamos obra con 2 oficiales y 2 ayudantes para retirar algunos detalles de la obra, recoger baldosas, bordillo y cambios de losas fracturadas y acabados en general.

Residente

Residente

22-08-2023 ellos nuevamente laboran con 1 oficial y 1 ayudante que continuan detalles como cambio de losas fracturadas

servicios etc.
Continuan con arreglos solicitados la interventoria sige a la espera de la fecha de entrega de este frente ubicado en la dl 31 entre cra 29 y 28 barrio Aurora. El inspector contractual no hace presencia en la obra, en su reemplazo; esta labor la ejecuta otra persona diferente. Se le reitera al contratista que aun no se realizan los ensayos de densidad que se solicitaron. En la revision del dia de hoy se evidencia losetas fracturados, asi como el concreto del realce de los cajas de servicios publicos tambie se encuentran ya fracturandose.

Kelly Jimenez
Insp. Interv.

Realiza visita a las 11:00 am la inspectora Kelly jimenez y se retira a las 11:40 AM

Inspección Vía — Res. Interv.

23-08-2023 Oliver Bolaños
Continuamos obra a las 7:00 AM con 1 excavadora y 2 oficiales para restaurar tapas de Servicios publicos, cambio de losetas fracturadas, limpieza y cuco en General

Residente

Continuan con arreglos para entrega frente dl entre cra 28 y 29 barrio Aurora. El dia de hoy tampoco hace presencia en el frente el inspect Oscar parada quien el que contractualmente se encuentra establecido para esta funcion; en su reemplazo el inspector Amaury es quien llena la bitacora y esta pendiente del frente; sin embargo no es la persona que figura contratac contractualmente.

Powered by CamScanner

Se le recuerda al contratista que la interventoria continua a la espera de los resultados de la toma de ensayos de densidad, que tanto el espacio publico como la franja ambiental No se autorizo instalar SIN este ensayo.
Los ensayos que se tomaron el dia 24 de Julio 2023 se realizaron solo en el frente y costado del predio que corresponde a la Esuela de administracion Publica ubicado en la cra 28 con cll 31, el espacio en el que realizaron estos ensayos 100 m^2 aprox. que es +/- el 30% del area total intervenida.

Kelly Jimenez
Fda. interv. Insp. Int.

24/08/2023
Clima Soleado.
El dia de hoy no se encuentra personal operativo en el frente terminando los arreglos pendientes para la entrega total delas solicitudes tecnicas que la interventoria realizo. El personal admin hace presencia en el frente, pero no estan como tal laborando.


Kelly Jimenez M.
Pda-interv

25/08/23
El dia de hoy se realizo comite de obra donde se presento el personal Administrativo el dia de hoy se realizo Actividades Administrativas de Obra como Cortes y Avances Generales para el Balance Mensual.

Segun la PQRSD presentada el 02/08/23 donde se solicita por parte de la ESAP la intervencion entre la carrera 28 con calle 31 Esquina

El Señor Javier Antonio Rojas, coordinador Administrativo, Solicita la intervención del Sendero peatonal frente a la inst. Educativa se Aprueba por parte de la intervención de este sendero hasta la mitad de la cuadra unos 20 mts lineales, ya que se realiza un balance presupuestal y de cuentan con los recursos para suplir con estos temas expuestos en la solicitud presentada en, Comprendido por un sendero de Franja Peatonal y Franja Ambiental segun Corresponda en el perfil Vial de la Zona

Las Franjas presentadas en el perfil Vial Son de 2 metros de Franja Circulación y 2 metros de Franja Ambiental, Aumentando la Bordillo y la Franja de Aseo.



Powered by CamScanner

Hora 9.10 AM en visita cotidiana de todos los trabajadores se le hacen las siguientes sugerencias: Humedecer muy bien la subbase. y que debe de quedar muy bien compactada pasar niveles y alineamiento, compactar, luego Regar la subbase en 2 capas que de 0.05 cms. personal oficial, 5 ayudantes. 1 insp de obra civil, del consorcio fundandes.
Nota: sin las pruebas de densidad no se debe de colocar Losetas y adoquin. [illegible] insp interventoria
la presente llamada da la 1:52 culmina las 7:45 pm.
Para firmar; [illegible] Kevin Rodriguez.
Inspector civil
Fes interventoria

Sabado, 29 de Julio de 2023
Se continua con las actividades de excavacion para colocacion de la subbase (personal en obra 1 Oficial, 5 ayudantes)
9. AM. se observan que falta compactacion en subbase hay que avisar los Boxdan hacer sondeos para evitar futuros cambios.
personal oficial 5 ayudantes 1 inspector. [illegible] inspector
Para firmar; Kevin Rodriguez.

Lunes, 31 de Julio de 2023
Se continua con la toma de niveles para la excavacion y colocacion de la subbase
Se continua con la explanacion de la subbase en el terreno ya preparado (Personal en obra 1 Oficial) 3 ayudantes)
Y por en Rutina de mantenimiento de obra se encuentra conformidad con el personal y decision para 2 personas. Segun estudios para la colocacion de subbase. el rendimiento es muy Lento. [illegible] interventoria
Para firmar; Kevin Rodriguez.
Inspector civil
Fes interventoria

Martes 01 de Agosto de 2023
Se continua explanando la subbase en el terreno ya preparado, se solicita cantidad de subbase ya que se esta completando bien, se continua

con la colocación para la nivelación del terreno (Personal en obra 1 oficial 4 ayudantes) Se presenta Hasta las 2:30 pm hasta las 3:40pm. Se inicia con la Colocación de la loseta, peatonal. Trabajadores 10 AM se hizo visita con los señores profesionales por parte de la Alcaldía, interventoría, los señores profesionales por parte del consorcio. Instructor é inspector Bogotanos como no tienen Grados. sino Rangos que no pasan de 10% a 12% máximo. entre los ingenieros del consorcio y interventoría. llegaron al acuerdo que en el sector de loseta debe dejarse 3% por metro para contrarrestar la contra parte del adoquín. y dejar 20cms en concreto con Figuras de V para la corriente de aguas lluvias sea constante y no queden. mientras se retiran cosas de obra mal ejecutadas serán evaluadas y corregidas. Se solicita personal diestro para las actividades como loseta, adoquín y los bordes de agarre, y así sea avanzar y no seguir corrigiendo lo poco que se hace.

Inspector de interventoría.

DAU Interventoría

Miercoles, 02 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Se continua con actividades de colocación de subbase para nivelación del terreno y se sigue instalando loseta sobre la calle 5. (Personal en obra Un encargado, un oficial, cuatro Ayudantes) Hora Entrada
9 AM Se está colocando Sub base para completar la y colocar Loseta.

No sin antes rectificar los niveles y pendientes respectivas. personal en estas actividades 1 oficial 1 ayudante en pega de loseta y adoquín 2 ayudantes en replanteo, excavación y colocación de sub base, y compactando. 1 inspector de obra por parte del consorcio santander. / / / / / / / /

Inspector interventoría

Jueves, 03 de Agosto de 2023
Clima soleado
Se continua con actividades de instalación de loseta peatonal y colocación de subbase para nivelación del terreno sobre la calle 5 (personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes) Rendimiento se recomienda humedecer muy la subbase bien estendida y compactando con 10cm de espesor que es indicado y colocar en 2 capas alu de .05cm3 para compactarla y muy bien, luego tomar las densidades. y hacer autorizar la colocación de loseta que debe instalarse con mortero bien humedo y golpearla con mazo de caucho para una mejor adherencia con el mortero. personal 1 Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes. actividad es en calle 5 entre carrera 16 y 15.

Inspector interventoría.

Viernes, 04 de Agosto de 2023
Clima soleado
Actividades de replanteo, colocación de subbase, instalación de loseta sobre la calle 5 (Personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes) Rendimiento
El señor inspector de obra comenta. que ya se aprobaron las densidades. en la esquina de la carrera 16 con calle 5. se autoriza La instalación de loseta. en ese sector

la ingeniera residente hace presencia junto con el ingeniero oscar director del proyecto en ejecución. se le hacen las recomendaciones pertinentes para Evitar inconvenientes de demolición.

inspector interventoria

Sabado, 05 de Agosto de 2023

clima Soleado

Se continue con actividades de refuerzos para colocación de sobre y se hacen con la instalación del adoquin sobre la calle 5 (personal en obra, 1 oficial, 4 ayudantes) Con adoquin

8.30 AM Se recomienda colocar la loseta manteniendo y tener encuenta donde van los adoquines y la dirección de las mismo son SMTVO entre ejes y las dimenciones deben de quedar Terminados de 1.20 X 1.20 con los Bordillos .10 X .30 y colocando Malla electrosoldada y encofrado 3000 psi. y colocar la ANTISOL. para el curado. Faltar dejar el cerramiento bien asegurado y hacer cuidar daños de la gente de calle.

inspector interventoria

Martes, 08 de Agosto de 2023.

Clima Soleado

Se continua con actividades de instalación de adoquin y colocación de sobre se suspendan las actividades de tiempo por orden del capataz de intervención en la mañana con reunión de la que se llevo por parte del residente de interventoria, residente de contratista y directora de contratista, ellas son el dicho tiempo y se continuan con las actividades (suspensión de las actividades 3 horas)

(Personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes) Kevin Rodriguez
7:30AM se suspende la instalación de adoquin por mal-instalación. la dilatación muy pronunciada y sin lineamiento. se pidio el favor de la presencia de la ing residente, ing director, contratista ing Daniel para determinar las inquietudes y se pidio personal diestro para pega de adoquin y Loseta. se reinicio la instalación de Adoquin, se dijo que debe de instalarse con mazo de caucho y no colocar adoquin en mal estado, y bien ajustado Mantener el sitio de trabajo en orden. recoger el material en mal estado.

Inspector interventoria — Residente — Residente

Mesales, 09 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Se inicia con las actividades de demolición de Andén existente sobre la carrera 17, se continua con la instalación de adoquin y loseta sobre la calle 5. (Personal en obra 1 maestro, un oficial, 4 ayudantes) Kevin Rodriguez
7:30 se inicia con la demolición de la carrera 17 entre calles 5 y 4. con Taladro Electrico. actividad de 2 Ayudantes se les exija utilizar Guantes y Tapa oidos. deben de colocar cerramiento y Señalización para evitar accidentes.

Inspector interventoria — Residente — Residente

Jueves 10 de de Agosto de 2023
Clima Soleado.
Actividades de instalacion de Adoquin y loseta, demolicion de Andenes sobre la calle 5 se continua con la demolicion de Anden existente sobre la carrera 17.
(Personal en obra 1 maestro, un oficial, 4 ayudantes)
Kevin Rodriguez

9 AM — Se Demarcaron las Alcorques con lapiz Rojo en el Sardinel para Evitar disculpas que se les olvido. esto se hizo con el ing Residente, se les Reitero las dimensiones. //// inspector interventoria

Viernes, 11 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Actividades de demolicion de Anden existente sobre la carrera 13, se funde franja de apoyo a los predios sobre la calle 6, instalacion de Loseta en la calle 5 y en la carrera 16, (Personal en obra 1 maestro, 0 oficial 4 ayudantes) Luis Obregon

7:30 — se inicia a fundir cintas de apoyo en la calle 5. se sigue demoliendo en la carrera 13. se les recomendo dejar bien recogido el escombro para no incomodar los residentes del sector. y dejar señalado los huecos de las cargas y demas. //// inspector de interventoria

Sabado, 12 de Agosto de 2023
Clima Soleado.
Actividades de demolicion de Anden existente sobre la carrera 13, instalacion de loseta y adoquin sobre la calle 5, (Personal en obra 1 maestro; 1 oficial, 4 ayudantes)

9 AM — se Solicita cargar escombros para dejar la calle Limpia y Barrido, bien señalizado para evitar inconvenientes con los transeuntes. inspector interventoria

Lunes, 14 de Agosto de 2023.
Clima Soleado
Actividades de instalacion de adoquin sobre la calle 5, se funde franja de ajuste sobre los predios, se continua con la demolicion de Anden sobre la carrera 17. (Personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes) Con Retroexcavadora.
8AM se solicita dejar bien terminadas las franjas de ajuste contra los predios calle 5 y siguen demoliendo en la carrera 17, se les solicita dejar bien acopiado el escombro y demolido. Barrer dos pisos que la volqueta cargue su viaje, inspector interventoria [signature] Residente [signature] Residente

Martes, 15 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Actividades de demolicion de Anden existente sobre la carrera 17, se continua con la instalacion de adoquin y loseta sobre la calle 5. (Personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes) Con 2 dragas
8:30AM, para la calle 5 con carreras 16 y 17 llega otra persona para colocar Loseta, adoquin quedando la planta de personal 1 Maestro - 2 oficiales, 4 Ayudantes, 1 inspector por parte del consorcio Santander. inspector interventoria [signature] Residente [signature] Residente

Miercoles 16 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Actividades de instalacion de Adoquin y loseta sobre la calle 5 y loseta sobre la carrera 16, se continua con la demolicion de Anden existente sobre la carrera 17.
(Personal en obra, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes)
Con Retroexcavadora

010

Jueves, 17 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Actividades de demolicion de Anden existente sobre la carrera 17, instalacion de Adoquin y loseta sobre la calle 5 y loseta sobre la carrera 16, esquina. se funde faja de ajuste sobre costado de la calle 5. (Personal en obra 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes)

9 AM — estan en proceso de cintas de ajuste instalacion loseta, adoquin, demolicion de vados peatonales. en la calle 5 con carreras 16 y 17. en la carrera 17 con calles 5 y 4 estan haciendo limpieza de lo demolido. y arreglando el cerramiento. 1 maestro 2 oficiales 4 ayudantes 1 inspector. [illegible] inspector interventoria

Viernes, 18 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Actividades de instalacion de adoquin sobre la carrera 16 esquina, Demolicion de anden existente sobre la carrera 17. (Personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes)

10 AM. — van a replantear lo que falta por sub base en la calle 5 para completar y hacer dar pista a los 2 oficiales pegadores con los 4 ayudantes. inspector de obra residente del consorcio. se solicita dejar bien el cerramiento y hacer aseo, [illegible] inspector interventoria

Sabado 19 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Actividades de instalacion sobre la carrera 16 esquina de cabaguan y instalacion de excavacion sobre la calle 5 para nivelacion y colocacion de la subbase. (personal en obra 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes) Ruiz Rodriguez
9.am excavacion para colocar sub.base en la cual al dia de hoy no hay. el cerramiento esta en malas condiciones. El aseo y orden esta muy deplorable. se les ha insistido en que hay que mejorar. el personal operal en el apiseo de la construccion no es muy diestro. se ha tenido inconvenientes con la calidad de obra. ////
inspector interventoria

Martes, 22 de Agosto de 2023
Actividades de instalacion de tapeta sobre la calle 5 y instalacion de cabaguan y tapa de la carrera 16 esquina. se finaliza la rampa de acceso peatonal sobre la calle 5 (Personal en obra 1 maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes) Ruiz Rodriguez
9:10 a.m. al llegar a la obra se encuentra 2 viajes de sub base en la calzada especifica sin semejanza al proceso el personal administrativo se encuentra en receso laboral por falta de pago. y por ese hay muchas falencias en los sitios de trabajo. estan extendiendo sub base no hay compactador para realizar esta actividad. el jefe inspector del contrato abre la interseccion y se retira de la obra. inspector interventoria
El dia de hoy no se presenta el personal minimo de obra en este frente que se debe tener para la ejecucion de obra, las obras ejecutadas en este tiempo y los retrasos generados por especies con imputable al contratista, debido a la responsabilidad que representa el desarrollo de la actividad en este sector
inspector interventoria

Miercoles 23 Agosto 2023
10:30 AM se abre la vitacora por no haber insp. de obra por cuenta del consorcio santandereano se realiza la visita del ing edwuard veron y la HSQ Beatriz y verificaron que la señalizacion y cerramiento de esta obra es muy precaria y los Materiales fueron descargados sobre la carpeta asfaltica y no fueron señalizados al descargarlos se le pidio el favor al sector ejecutor de obra nos colaboraran para tal fin. no se dejan extender sub base por no tener cerro compactador ing. interventoria.

Jueves 24 Agosto 2023
10:AM se abre la vitacora por no haber insp de obra por cuenta del consorcio santandereano se autorizo la extendida de sub base y se compactara con un compactador de plancha "Rana" se debe de humedecer antes de compactar y se hacen en 2 capas de .15cms. bien compactadas y se deben de sacar densidades. 3 pruebas por cada cuadra. Antes de colocar Lozeta y adoquin sin este requisito no se dejara instalar. Ninguna clase de elementos en espacio publico.
ing. interventoria.

Viernes 25 Agosto 2023
Fuimos citados Al comite de obra por ingeniero Bladimir polo a 8AM. Ally se solicito a los residentes profesionales, hacer prueba de Densidad en el Sector carrera 17 del Barrio chapinero, y se hicieron sobre las 11 am sin nuestra presencias falta que envien las pruebas escritas ala interventoria en obra no ha hecho presencia el inspector Asignado para chapinero. Segun dijeron los ajudantes de la obra. que el ing oscar estuvo con el

señor que hacé las demandadas, el personal en obra al día de hoy 3 operadores 4 Ayudante y un contra maestro por parte del contratista de obra. se sugiera o se exija que la sub base sea obren Humedo para compactar y que se compacte muy bien para optima densidad. / / /

1 residente, 2 alcaldes, 4 ayudantes) Kevin Rodriguez

11:45 AM el dia de hoy se recibio la visita del Inspector Obra sector contratista en compañia de los ing Libni, Isaac y ing directora del proyecto, dialogaron con ing Daniel sobre el revestimiento de obra que esta muy lento y hicimos compromiso de emplear mas Gente para agilizar el avance para colocar sub base. se les hizo sugerencia como tener un tanque para almacenar agua y Herramientas como palas, picas, carretas, y le exigieron al contratista, ing Daniel Tener suficiente Material, saudinel para la cuneta de la carrera 17 y los Ramales bagos con sus respectivas hombros Loseta Gris, Loseta amarilla, adoquin en buen estado, se les suguiere a los señores operarios sentar bien la Loseta y que la golpeen con mazo de caucho Grandes el adoquin para Mejor adherencia, antes de extender el Mortero de pega. favor humedecer el piso "sub base", ~~Ing~~ Insp. interventor

Kevin Rodriguez
Inspector Obra

Maicao, 30 de Agosto de 2023

Clima Soleado

Actividades de instalacion de adoquin y loseta sobre la calle 5, continuacion de replanteo para colocacion de subbase sobre la carrera 17. (Personal en obra 1 maestro, 2x oficiales, 4 ayudantes).

Actividades de Construccion de alcantarillas y cunetas vehiculares. Kevin Rodriguez
Inspector Obra.

10:40 AM Sobre 8:30 am llegaron las unidades de loseta amarilla y hacer seguir con la pega de adoquin por la calle 5 N para llegar ala esquina de la carrera 17. se sigue con el replanteo excavacion y colocacion de subbase sobre la carrera 17. Se pide el favor que Humedescan bien el piso

Inspección presencia. el ing José Domingo, ing Oscar, ing Lorena. H & O Beatriz, Bernardo Suárez, sra. Social Andrea personal laborando 3 operarios 4 ayudantes. 1 contramaestro, 1 inspe residente. [illegible] inspe intermitente.

Jueves, 31 de Agosto de 2023

Clima Soleado

Actividades de instalación de agua y losa sobre la calle 5, Construcción de alcorque. calle 5. se presenta visita técnica de contratista Interventoría, supervisión ya se realizan cambios para la instalación de instalación de loseta adoquín y terminar de Agsto, Alcorque. para la carrera 17. De acuerdo a lo existente en la esq ya entra la calle 5 y calle 4 capa de arena donde la tierra vegetal está endurecida y duro se dejaron los alcorques para los arboles, y en esta que los otros costados del sector son comerciales se endurecera la franja ambiental de la cra 17 entre calle 5 y 4 costado occidental con adoquín, dejando alcorques cada 5 metros. (Personal en obra 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes Lorena Rodriguez Ingeniera de Obra

11.32AM se recibio visita de parte de los ingenieros Bladimir polo, supervisor de la alcaldía, José Domingo contratista ing Lorena, insp obras se tomaron determinaciones sobre la carrera 17 entre calles 5 y 4.
respecto a la calle 5 entre carreras 16 y 17 estan trabajando a terminar la paga de adoquin y loseta amarilla. y fundir la cuneta en V de .20 cms de ancho y .10 cms de espesor, con malla electrosoldada este concreto. debe de echarle antisol para el fraguado.
[illegible] inspi. interventoria.

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INFORME MENSUAL HSEQ No. 6
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

Firma		
Nombre	**BERNARDO SUAREZ CARREÑO**	**ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ**
Cargo	**INSPECTOR HSEQ**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORÓ	**APROBÓ**

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 6
1.1 Periodo reportado. 6
1.2 Resumen de actividades técnicas 6
1.3 Organigrama del proyecto 6
1.4 Cronograma A&SST 7
2. BITÁCORA A&SST 9
3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO SANTANDER 10
3.1 Recurso Humano. 10
3.2 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 13
3.2.1 Seguridad Social. 13
3.2.2 Capacitación y Sensibilización del Personal. 13
3.2.3 Exámenes Médicos. 15
3.2.4 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 16
3.2.5 Puntos de hidratación. 17
3.2.6 Gestión de Tareas. 17
3.2.7 Inspecciones y Preoperacionales. 18
3.2.8 Elementos de Protección Personal EPP. 19
3.2.9 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. 20
3.2.10 Indicadores Seguimiento al Plan SST 21
3.2.11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 22
3.2.12 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). 22
3.3 Plan de Calidad. 22
3.4 Manejo Ambiental en la Obra. 23
3.4.1 Fuentes de Materiales y Proveedores. 24
3.4.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. 24
3.4.3 Manejo de materiales de construcción 25
3.4.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 25
3.4.5 Manejo Residuos de Construcción (RCD). 28
3.4.6 Control de Emisiones Atmosféricas. 29
3.4.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. 30
3.4.8 Uso Eficiente de los Recursos. 30
3.4.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 31
3.4.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. 33
3.4.11 Orden y Aseo. 35
3.4.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 36

3.5 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias. 36
3.6 Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 38
3.7 Protocolo de Bioseguridad COVID-19. 38
4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 40
5. ANEXOS 41

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Cronograma de actividades A&SST. 7
Tabla 2. Personal - mano de obra calificada & no calificada. 10
Tabla 3. Novedades del personal. 12
Tabla 4. Registro de Inducción, Charlas y Capacitaciones. 14
Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales. 15
Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad. 16
Tabla 7. Gestión de Tareas (ATS, Permisos) 17
Tabla 8. Inspecciones y Preoperacionales 18
Tabla 9. Seguimiento EPP 19
Tabla 10. Indicadores cumplimiento al plan SST. 21
Tabla 11. Equipo y herramientas mínimas del proyecto. 23
Tabla 12. Material adquirido. 25
Tabla 13. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra. 26
Tabla 14. Gestión de los residuos 27
Tabla 15. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque. 28
Tabla 16. Listado de Vehículos y Maquinaria usada en obra. 30
Tabla 17. Listado de sumideros en frentes de obra. 31
Tabla 18. Listado de vegetación en frentes de obra. 33
Tabla 19. Indicadores cumplimiento Plan de Manejo Ambiental. 36
Tabla 20. Verificación de elementos de emergencia frentes de obra. 37
Tabla 21. Atención de emergencias. 37
Tabla 22. Comité de tráfico. 38
Tabla 23. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo. 38

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Organigrama – CONSORCIO SANTANDER. 6
Figura 2. Gráfica Novedades del Personal de Obra. 13
Figura 3. Gráfica Exámenes Médicos. 16
Figura 4. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad. 17
Figura 5. Clasificación de Residuos. 26
Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados. 27
Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados. 29

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1. Capacitación y Sensibilización del Personal. 15
Imagen 2. Trabajos de demolición, excavación y compactación en los frentes. 18
Imagen 3. Entrega y uso de EPP. 20
Imagen 4. Cerramientos y señalización PMT. 21
Imagen 5. Equipos y herramientas. 23

Imagen 6. Campamentos y unidades sanitarias en los frentes. 25
Imagen 7. Recolección de residuos sólidos 27
Imagen 8. Transporte de RCD. 29
Imagen 9. Cubrimiento de material. 30
Imagen 10. Firma de convenio uso de los recursos. 31
Imagen 11. Cubrimiento de sumideros. 33
Imagen 12. Conformación de tierra negra en Alcorque en los frentes San Alonso, La Universidad y la Aurora. 35
Imagen 13. Orden y aseo en los frentes. 35
Imagen 14. Comité de Tráfico 38

1. GENERALIDADES

1.1 Periodo reportado.

El informe mensual HSEQ No. 6 comprende las actividades realizadas en el periodo: del 01 al 31 de agosto del 2023.

1.2 Resumen de actividades técnicas

Dentro del periodo comprendido para este informe se realizaron las siguientes actividades propuestas dentro del plan A&SST:

- ✓ Realización de contratos al personal de obra.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP y CCF).
- ✓ Pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de junio.
- ✓ Aplicación de formatos para el control y evidencia de las actividades desarrolladas.
- ✓ Inducción, capacitación y charlas sobre temas A&SST.
- ✓ Entrega de dotación y EPPs.
- ✓ Realización de exámenes médicos de ingreso y egreso del personal contratado.
- ✓ Inspecciones a los cuatro frentes activos.
- ✓ Preoperacionales y ATS.
- ✓ Actividades varias en los frentes San Alonso, La Universidad y La Aurora, en individuos vegetales presentes en el área de intervención.

1.3 Organigrama del proyecto

Se establece el organigrama general del proyecto que contiene las líneas de mando y coordinación, los niveles de decisión, profesionales y demás recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos a realizar en la adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander (Grupo No. 1).



Figura 1. Organigrama – CONSORCIO SANTANDER.

1.4 Cronograma A&SST

Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y proveedores.

Tabla 1. Cronograma de actividades A&SST.

ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES			
Publicación y socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	17	17	100%
Inducción al personal: en riesgos, en COPASST, que hacer en caso de AT, Sistema general de riesgos laborales	17	17	100%
Divulgación y publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo	17	17	100%
Divulgación y publicación de la política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas	17	17	100%
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	6	6	100%
Subtotal cumplimiento	74	74	100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA			
Realización de exámenes de ingreso (cada vez que ingresa personal a la obra)	15	15	100%
Capacitación en autocuidado	5	5	100%
Prevención de enfermedades gastrointestinales	2	2	100%
Capacitación sobre estilos de vida saludable	2	2	100%
Capacitación sobre prevención alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia	5	5	100%
Capacitación sobre hipertensión arterial	2	2	100%
Realización de exámenes de egreso	11	11	100%
Subtotal cumplimiento	42	42	100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO			
Inspección de campamento y frentes de obra	18	18	100%
Inspección a Botiquines	5	5	100%
Elaboración de estadísticas de ausentismo	5	5	100%
Subtotal cumplimiento	28	28	100%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL			
Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal	5	5	100%
Subtotal cumplimiento	5	5	100%

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Inspección de equipos y herramientas	17	17	100%
Estadísticas de accidentalidad	7	7	100%
Subtotal cumplimiento	24	24	100%

PLAN DE EMERGENCIAS			
Capacitación en identificación y notificación de situaciones de riesgo	18	18	100%
Subtotal cumplimiento	18	18	100%
TOTAL			**100%**

Anexo 1. Cronograma de actividades A&SST.

2. BITÁCORA A&SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023, **CONSORCIO SANTANDER** realizó actividades de capacitación, verificación, acompañamiento e implementación del **PLAN SST** con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

Dentro de los anexos, se encuentra un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Esta información quedo registrada en la bitácora A&SST.

Anexo 2. Bitácora A&SST.

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO SANTANDER

3.1 Recurso Humano.

Consorcio Santander cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas específicas para el desarrollo del proyecto. Dicho equipo se encuentra integrado por:

Tabla 2. Personal - mano de obra calificada & no calificada.

#	ÁREA	CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	**ACTIVO**
2	Administrativo	1.100.963.525	Angie Lorena Monsalve Ordoñez	Director de obra	**ACTIVO**
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	**ACTIVO**
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	**ACTIVO**
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	**ACTIVO**
6	Operativo	1.103.471.378	Kevin Farid Rodriguez Sarmiento	Inspector de obra	**ACTIVO**
7	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	**ACTIVO**
8	Operativo	91.263.099	Amaury Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	**ACTIVO**
9	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	**ACTIVO**
10	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
11	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
12	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
13	Operativo	1.096.242.788	Cristian Fernando Amariz Perez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
14	Operativo	91.519.124	Nicolas Alarcón Afanador	Oficial de Obra	**ACTIVO**
15	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
16	0perativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
17	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	**ACTIVO**
18	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra (BOAL)	**ACTIVO**
19	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
20	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	**INCAPACITADO**
21	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
22	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
23	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso quintero Quintero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
24	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	**ACTIVO**
25	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	**ACTIVO**
26	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
27	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
28	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
29	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
30	Operativo	91.489.177	Edgar Martinez Quintero	Oficial de Obra	**ACTIVO**
31	Operativo	1.095.800.217	Ricardo Hernandez Aguillon	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
32	Operativo	91.255.617	Henry Mantilla Parra	Ayudante de Obra	**ACTIVO**

33	Operativo	1.234.339.539	Diego Andres Berbesi Merchan	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
34	Operativo	91.494.372	Miguel Angel Caceres Carrillo	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
35	Operativo	91.495.273	German Diaz Moyano	Oficial de Obra	**ACTIVO**
36	Operativo	1.098.712.615	Edinson Prado Paterina	Oficial de Obra	**ACTIVO**
37	Operativo	1.098.686.573	Jose Rios León	Oficial de Obra	**ACTIVO**
38	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	**RETIRADO**
39	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	**RETIRADO**
40	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	**RETIRADO**
41	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
42	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
43	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
44	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
45	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
46	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
47	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Paletera	**RETIRADO**
48	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
49	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
50	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
51	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
52	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
53	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	**RETIRADO**
54	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
55	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
56	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
57	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
58	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
61	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
62	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
63	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
64	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
65	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
69	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
70	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
73	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
74	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

75	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
78	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
80	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
81	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
83	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
84	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
85	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
86	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
87	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
88	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
89	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**RETIRADO**
90	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
91	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
92	Operativo	1.096.254.152	Cristian David Urieta Ramos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
93	Operativo	1.007.218.221	Eliecer Dario Benavides Miranda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
94	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
95	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**RETIRADO**
96	Operativo	7.120.330	Yackson Aristides Caceres Castro	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
97	Operativo	1.026.559.257	Alexander Tarazona Zambrano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
98	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
99	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**

Se realiza seguimiento y control del personal contratado durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023.

Tabla 3. Novedades del personal.

NOVEDADES DE PERSONAL CONSORCIO SANTANDER		
DESCRIPCIÓN	**CONSORCIO**	**TOTAL, DEL PROYECTO**
Número de Trabajadores Activos en el periodo anterior	29	29
No. de Ingresos en el Periodo	10	10
No. de Egresos en el Periodo	3	3
Número de Trabajadores Activos en el periodo actual	**36**	**36**

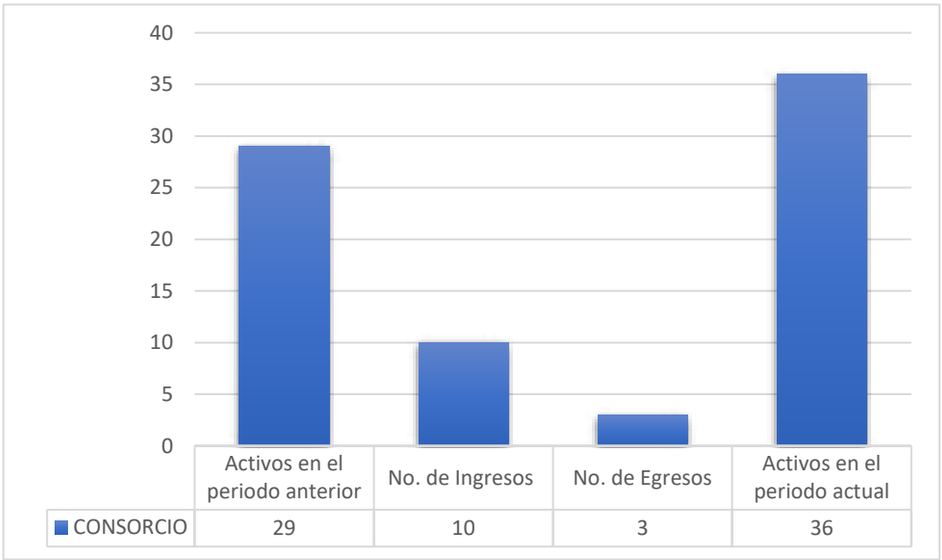


Figura 2. Gráfica Novedades del Personal de Obra.

3.2 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa CONSORCIO SANTANDER., tiene diseñado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realizó durante el periodo comprendido del presente informe, las siguientes actividades:

- ✓ Exámenes médicos de ingreso y egreso del personal contratado.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente.
- ✓ Pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de mayo.
- ✓ Proceso de Inducción & Capacitación.
- ✓ Entrega de EPPs al personal, incluyendo protección para el manejo de equipos y herramientas.

Anexo 3. Afiliaciones y retiros del personal - mano de obra calificada & no calificada.
Anexo 4. Planilla de seguridad social – Julio.
Anexo 5. Comprobante de pago de nómina – Julio.
Anexo 6. Cuadro de control de pagos de seguridad social del personal contratado.

3.2.1 Seguridad Social. Consorcio Santander realiza el pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de todo el personal de obra, incluyendo personal técnico, administrativo y operativo. Dicho documento se adjunta en este informe. De igual forma se verificó el personal que ingreso nuevo a los distintos frentes que se manejan en el proyecto, revisando que el personal cuente con documentación en regla.

3.2.2 Capacitación y Sensibilización del Personal. Durante el presente periodo, se realizaron charlas de 5 a 10 minutos en temas HSEQ a todos los trabajadores en los diferentes frentes activos y ejecución del proceso de inducción a todos los trabajadores

que ingresan al proyecto. Adicionalmente al personal nuevo se les realiza inducción, notificación de riesgo y evaluación SST con una duración aproximada de 50 minutos.

Anexo 7. Registro de charlas y capacitaciones.
Anexo 8. Inducciones y notificación de riesgos.

Tabla 4. Registro de Inducción, Charlas y Capacitaciones.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/08/2023	COMO RECONOCER CUANDO ALGUIEN ESTA ALEGRE O ENOJADO	29	5 – 10 min
2/08/2023	INDUCCIÓN / PROTECCION EN LOS PIES	35	50 min
3/08/2023	INDUCCIÓN / DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	35	50 min
4/08/2023	LEVANTAMIENTO - LESIONES DE ESPALDA	35	5 – 10 min
5/08/2023	COMUNICACIÓN DE PELIGROS	35	5 – 10 min
6/08/2023	DOMINGO		
7/08/2023	DIA NO LABORAL		
8/08/2023	HERRAMIENTAS	35	5 – 10 min
9/08/2023	INTRODUCCIÓN / RCP	36	5 – 10 min
10/08/2023	PROBLEMAS INSTESTINALES - COMO PREVENIRLOS	36	5 – 10 min
11/08/2023	HIGIENE DEL SUEÑO	36	5 – 10 min
12/08/2023	REGLAS DE ORO	36	5 – 10 min
13/08/2023	DOMINGO		
14/08/2023	HIDRATACION	36	5 – 10 min
15/08/2023	INDUCCIÓN / TIEMPOS DE DESCANSO	37	50 min
16/08/2023	PUNTOS DE ANCLAJE	37	5 – 10 min
17/08/2023	BOTAS DE SEGURIDAD	37	5 – 10 min
18/08/2023	SEGURIDAD AL CAMINAR, TROTAR O CORRER	37	5 – 10 min
19/08/2023	USO CORRECTO DE EPP	37	5 – 10 min
20/08/2023	DOMINGO		
21/08/2023	DIA NO LABORAL		
22/08/2023	PERMISO LABORAL		
23/08/2023	MEDIDAS DE SEGURIDAD AL CIRCULAR POR LA CALLE	37	5 – 10 min
24/08/2023	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXÍLIOS	37	5 – 10 min
25/08/2023	INDUCCIÓN / HIGIENE PERSONAL	38	50 min
26/08/2023	ACCIDENTE - DEFINICIÓN	38	5 – 10 min
27/08/2023	DOMINGO		
28/08/2023	OBESIDAD Y SOBREPESO - PAUSA ACTIVA	38	5 – 10 min
29/08/2023	ALCOHOLISMO	37	5 – 10 min
30/08/2023	COMUNICACIÓN ASERTIVA	37	5 – 10 min
31/08/2023	COMO LAVERSE LAS MANOS	37	5 – 10 min



Imagen 1. Capacitación y Sensibilización del Personal.

3.2.3 Exámenes Médicos. A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes médicos de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto.

Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONSORCIO SANTANDER			
	Ingreso	Reingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	4	1	0	3
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0	0
TOTAL	**4**	**1**	**0**	**3**

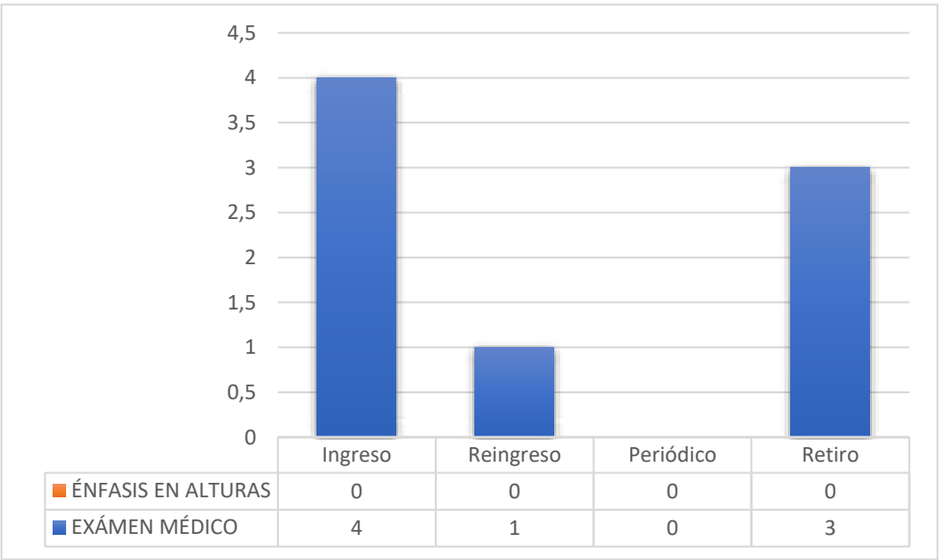


Figura 3. Gráfica Exámenes Médicos.

Anexo 9. Exámenes médicos de ingreso, reingreso y retiro.

3.2.4 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. Consorcio Santander realiza seguimiento a los indicadores en cuando a la accidentalidad y casos de ausentismo, acorde con el personal administrativo y operativo del consorcio.

Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN	CONSORCIO	TOTAL
Atención por primeros auxilios	0	0
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	0	0
Remisión ARL	0	0
TOTAL	**0**	**0**

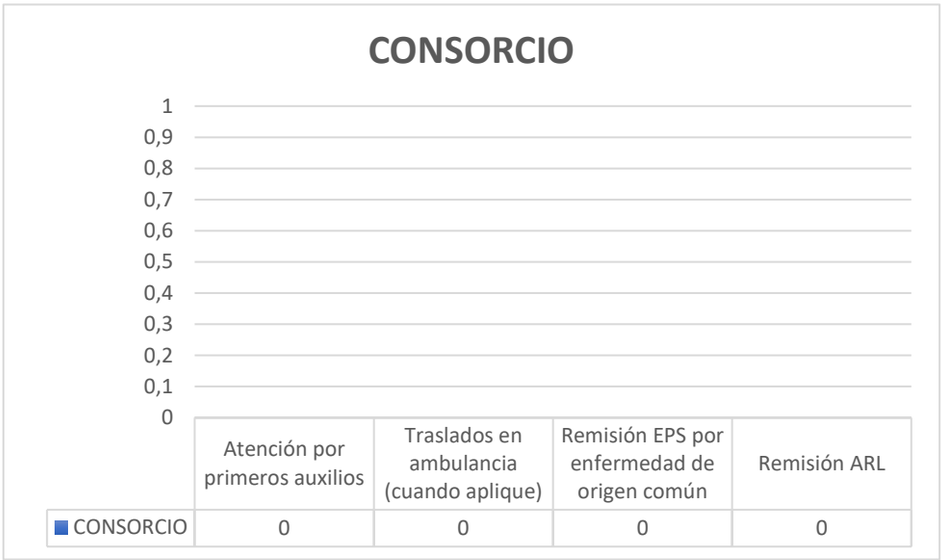


Figura 4. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad.

3.2.5 Puntos de hidratación. Se mantienen los puntos de hidratación en los frentes de obra activos, los cuales se encuentran ubicados en las áreas de trabajo del personal operativo; se dejan botellones de agua a los cuales se les realiza limpieza y llenado de los mismos.

3.2.6 Gestión de Tareas. A continuación, se describen las actividades realizadas en el presente periodo:

- **Demolición, excavación y compactación:** durante el periodo comprendido de este informe, se realiza el diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS e inspecciones de los equipos usados en el desarrollo de las actividades de

Tabla 7. Gestión de Tareas (ATS, Permisos)

Tipo de Trabajo	Descripción	No. Permisos o ATS	Observaciones
Demolición, Excavación y Compactación	**ATS**	19	Actividades de demolición, excavación e instalación de sardinel
Trabajo en alturas	**ATS**	0	Actividades de poda aérea en individuos vegetales con una altura superior a dos metros



Imagen 2. Trabajos de demolición, excavación y compactación en los frentes.

Anexo 10. Formato de ATS.

- **Trabajo Seguro en Alturas:** en el presente periodo no se realizaron actividades de alto riesgo como trabajo en alturas.

3.2.7 Inspecciones y Preoperacionales. Durante el periodo comprendido en el presente informe se realizaron inspecciones correspondientes al plan SST y preoperacionales a las máquinas y herramientas usadas en las labores diarias para las tareas de demolición.

Tabla 8. Inspecciones y Preoperacionales

Frente /Sección / Área	Tipo de Inspección

	Máquinas y Equipos	Vehículos	Maquinaria	Herramientas	EPP	Áreas de Trabajo	Sustancias Químicas	Orden y Aseo
Operativa Frentes de Obra San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero.	X	X	X	X	X	X	X	X

Anexo 11. Formatos preoperacionales a máquinas y/o herramientas.
Anexo 12. Inspecciones de seguridad.

3.2.8 Elementos de Protección Personal EPP. Durante el periodo relacionado se realiza la entrega de dotación y EPPs por parte del consorcio a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 9. Seguimiento EPP

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Cabeza	Casco	Ingreso Personal
 Protección Facial	Gafas claras y/o oscuras y careta (manejo pulidora)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección respiratoria – COVID-19	Mascarilla o tapabocas y tapabocas con filtro material particulado (manejo pulidora)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección auditiva	Tapa oído de inserción y tapa oído de copa (manejo pulidora y martillo demoledor)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección Corporal	Camisa manga larga y delantal de cuero (manejo pulidora)	Ingreso personal / Manejo de herramientas
 Protección Miembros inferiores	Botas de cuero con puntera de acero	Ingreso Personal

Anexo 13. Entrega de elementos de protección personal y dotación.



Imagen 3. Entrega y uso de EPP.

3.2.9 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. Instalación de cerramiento perimetral como medida preventiva para el aislamiento de las zonas de obra y evitar el paso de personal no autorizado a las mismas, esto mediante tela de polipropileno de color verde, malla de color azul, con una altura de 2 metros y parales de madera rolliza colocados cada 3 metros en los frentes de obra de San Alonso (Cra. 33ª y Cll. 20), La Universidad, La Aurora y Chapinero.

Consorcio Santander instala en los diferentes frentes de trabajo señalización preventiva como acción para minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. De igual manera se realiza instalación de señalización informativa y advertencias pertinentes como SENDEROS PEATONALES, CERRAMIENDO DE CARRIL, INICIO Y FIN DE OBRA, etc.

Durante la actividad de excavaciones se realiza la señalización y demarcación de las áreas de trabajo con delineadores tubulares, y cinta de peligro. De igual manera se realiza instalación de la señalización informativa (uso obligatorio de EPP), emergencias (ruta de emergencia, punto de encuentro), prohibición (prohibido el ingreso de personal) mostrando la información y advertencias pertinentes de acuerdo con la normatividad.



Imagen 4. Cerramientos y señalización PMT.

3.2.10 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Durante el periodo se realizó el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando entre otras las siguientes actividades:

Tabla 10. Indicadores cumplimiento al plan SST.

#	INDICADOR CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Registros de afiliación a EPS y ARL	Cumple 100 % No cumple: Entre 0 % y 99 %	**100 %**
Implementación del SGSST	ISGSST = % de Implementación de actividades propuesta para el mes de acuerdo con el SG-SST.	ISGSST **= 100 %**
Entrega de EPP	$\% \, CEPP = \frac{\# \, EPP \, ENTREGADO}{\# \, EPP \, REQUERIDO} * 100$	$\%CEPP = \frac{120}{120} * 100 = \mathbf{100}\%$
Uso de EPP	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Trabajadores usan correctamente los EPP })}{(\# \text{ Total Trabajadores})}$	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(38)}{(38)}$ **= 100 %**
Inducción, charlas diarias y capacitaciones.	$CI = \frac{\# \, PERSONAS \, ASISTEN}{\# \, PERSONAS \, INGRESAN} * 100$	$CI = \frac{31}{31} * 100 = \mathbf{100}\%$
Reporte de los Accidentes y enfermedades laborales.	Reporte ALEL Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99%	**100 %**
Capacitaciones SST	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Capacitaciones realizadas})}{(\# \text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(24)}{(24)}$

		= 100 %
Señalización y aislamiento	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Frentes de Trabajo y áreas señalizadas})}{(\#\text{ Frentes de Trabajo y áreas que deben señalizarse})}$	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(5)}{(5)}$ **= 100 %**
Inspecciones y Preoperacionales	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Inspección de Equipos y Preoperacionales})}{(\#\text{ Equipos, vehículos y maquinaria en obra})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(95)}{(95)}$ **= 100 %**
ATS	$\text{ATS} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ ATS realizadas})}{(\#\text{ ATS por actividades semanales y frentes})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(19)}{(19)} = \mathbf{100}\ \%$

3.2.11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Durante el presente periodo Consorcio Santander realizó la primera reunión del COPASST el día 16 de junio de 2023, según lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

De 10 a 49 Trabajadores: Un (1) representante por cada una de las partes.
De 50 a 499 Trabajadores: Dos (2) representantes por cada una de las partes.
De 500 a 999 Trabajadores: Tres (3) representantes por cada una de las partes.
De 1000 a más trabajadores: Cuatro (4) representantes por cada una de las partes.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COPASST	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/06/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	24/07/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 3	24/08/2023	Actividad Ejecutada

3.2.12 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). Se realizó la primera reunión del comité de convivencia laboral el día 11 de mayo de 2023, este quedó compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, según lo establecido en la Resolución 1356 de 2021 Art. 1. Las reuniones se programarán para realizarse cada tres (3) meses, la primera reunión se realizó el día 16 de agosto del año en curso.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COCOLA	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/08/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	16/11/2023	Actividad Programada

3.3 Plan de Calidad.

Consorcio Santander realiza revisión del Plan de Calidad y los certificados de los equipos y demás herramientas para la ejecución del proyecto. A continuación, se hace referencia a las herramientas y el equipo aprobados para obra durante el desarrollo del proyecto:

Tabla 11. Equipo y herramientas mínimas del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Volquetas	3
Mezcladora Concreto	3
Vibrador de Concreto	3
Compactador Manual tipo rana	3
Martillo demoledor	3
Pulidora	6

Fuente. Anexo Técnico.



Imagen 5. Equipos y herramientas.

3.4 Manejo Ambiental en la Obra.

CONSORCIO SANTANDER, tiene como compromiso implementar las acciones necesarias para prevenir, mitigar, corregir y controlar, los efectos e impactos ambientales negativos que se causarán con el desarrollo de las actividades de obra. Para esto fue radicado en la Alcaldía de Bucaramanga Plan de Manejo Ambiental en la Obra (MAO).

3.4.1 Fuentes de Materiales y Proveedores. Se entregan los certificados de extracción de materiales pétreos y certificado de RUCOM, expedidos por la Agencia Nacional Minera, provenientes de la ARENERA LOS PINOS LTDA identificada con Nit 900.309.138, propiedad del señor Ángel Miguel Niño Prieto identificado con CC 91.101.017, ubicada en la VEREDA SAN PEDRO FINCA LOS POTRERITOS 2 KILOMETRO ARRIBA DEL PUENTE DE PESCADERO VÍA BUCARAMANGA – SAN GIL.

3.4.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. Actualmente contamos con oficina administrativa ubicada en la Carrera 22 No. 11 – 12 Barrio San Francisco. Para el mes de agosto continúan actividades en San Alonso Cra 33a, La Universidad, La Aurora, Chapinero y se inicial labores en San Alonso Calle 20. Para este último se negocian la prestación de los servicios de agua y energía en la casa ubicada en la Calle 20 No. 29 – 14 y una parte de la misma se usa también para bodega. Para cada uno de los frentes se dispone de un baño portátil flusing con lavamanos, dando cumplimiento de protocolo de bioseguridad y normatividad legal.





Imagen 6. Campamentos y unidades sanitarias en los frentes.

Anexo 14. Certificados de limpieza de unidades sanitarias.

3.4.3 Manejo de materiales de construcción. Durante el periodo comprendido en el presente informe, se adquiere el siguiente material:

Tabla 12. Material adquirido.

Material	Volumen / Unidad
Arena	24 m^3
Triturado ¾	40 m^3
Cemento Gris	300 Und.
Loseta Toperol de 40x40x6	80 Und.
Loseta Guía de 40x40x6	440 Und.
Loseta Lisa de 40x40x6	1800 Und.
Loseta visual o amarilla de 40x40x6	600 Und.
Sardinel 0,80x0,50x0,20	116 Und.
Sardinel 0,20x0,50x0,20	72 Und.
Sardinel rampabaja 0,80x0,35x0,20	96 Und.
Transición derecha 0,60x0,50x0,20	21 Und.
Transición izquierda 0,60x0,50x0,20	21 Und.
Adoquín gris 20x10x6	8.100 Und.
Malla electrosoldada	12 m
Malla gallinero	20 rollos

3.4.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. Para el manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra, el consorcio instaló un punto ecológico en cada uno de los frentes, los cuales están protegidos contra la acción de las precipitaciones y consta de tres (3) recipientes con sus respectivas bolsas plásticas, para una correcta clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a sus características, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.




Figura 5. Clasificación de Residuos.
Fuente. Resolución 2184 de 2019.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** depósito de residuos aprovechables como plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** depósito de residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** depósito de residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, etc.

Las empresas encargadas de hacer la recolección de estos residuos sólidos son la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga) y Limpieza Urbana, quienes prestan el servicio de recolección y disposición final tres veces por semana y sean llevadas al relleno sanitario el carrasco.

Tabla 13. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
6 kg	2 kg	0 kg	Del 16 al 31 de marzo de 2023
7 kg	3 kg	0 kg	Del 01 al 30 de abril de 2023
9 kg	5 kg	0 kg	Del 01 al 31 de mayo de 2023
8 kg	4 kg	0 kg	Del 01 al 30 de junio de 2023
10 kg	6 kg	0 kg	Del 01 al 13 de 24 al 31 de julio de 2023
8 kg	5 kg	0 kg	Del 01 al 31 de agosto de 2023

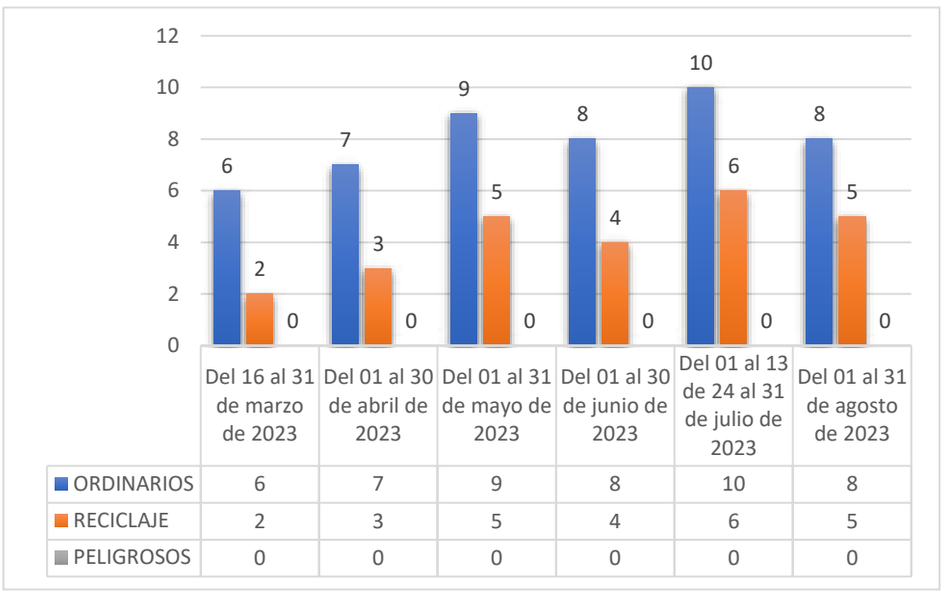

	Del 16 al 31 de marzo de 2023	Del 01 al 30 de abril de 2023	Del 01 al 31 de mayo de 2023	Del 01 al 30 de junio de 2023	Del 01 al 13 de 24 al 31 de julio de 2023	Del 01 al 31 de agosto de 2023
ORDINARIOS	6	7	9	8	10	8
RECICLAJE	2	3	5	4	6	5
PELIGROSOS	0	0	0	0	0	0

Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados.



Imagen 7. Recolección de residuos sólidos

Tabla 14. Gestión de los residuos

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICION FINAL	PERIODICIDAD
PELIGROSO	Envases contaminados químicos	Acopio temporal En la obra	Cuando se tenga la cantidad mínima para su entrega
ORDINARIO		Acopio temporal	

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICION FINAL	PERIODICIDAD
	Empaques de comida, Residuos de alimento. Desechables, toallas de papel, tapabocas o mascarillas.	EMAB (Contenedores)	3 veces por semana
		Acopio temporal Limpieza Urbana (Contenedores)	
RECICLABLE	Papel, cartón, plásticos limpios y secos, envases de vidrio, metales	Acopio temporal EMAB	2 veces por semana
		Acopio temporal Limpieza Urbana (Contenedores)	

3.4.5 Manejo Residuos de Construcción (RCD). Durante el periodo del presente informe, se realizaron labores de demolición en todos los frentes. Consorcio Santander cuenta con el equipo necesario para la recolección oportuna, el retiro, transporte y disposición final de residuos de construcción (escombros) y se tramitaron los permisos necesarios con la escombrera Botadero El Parque para la disposición final del RCD. Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

A continuación, se muestra el total de residuos generados en los frentes de obra, los cuales fueron dispuestos:

Tabla 15. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE			
Cantidad Total	**Unidad**	**Periodo**	**Cantidad Certificada**
0 m^3	METRO CUBICO	Del 16 al 31 de marzo de 2023	**0 m^3**
96 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de abril de 2023	**96 m^3**
32 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de mayo de 2023	**32 m^3**
104 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de junio de 2023	**104 m^3**
144 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 13 y del 24 al 31 de julio de 2023	**144 m^3**
168 m3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de agosto de 2023	**168 m3**

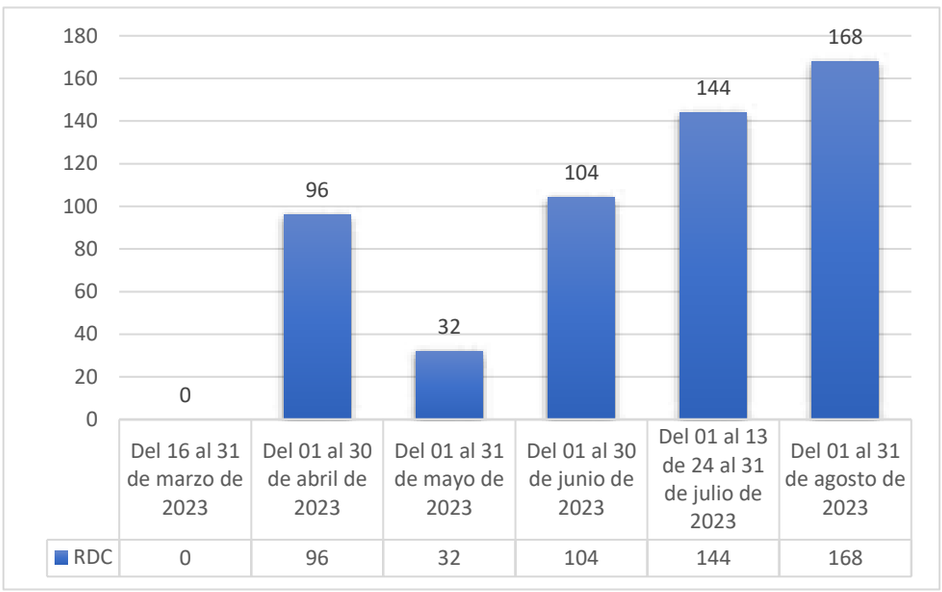


Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados.



Imagen 8. Transporte de RCD.

Anexo 15. Constancia de disposición final de residuos de construcción y demolición.

3.4.6 Control de Emisiones Atmosféricas. Durante el periodo reportado, se realizó el cubrimiento con plástico negro el material granulado que se encuentra en los puntos de acopio temporales. También para la actividad de barrido de las zonas, se hizo humectación de estas como medida de mitigación para evitar la propagación de material particulado en los frentes de trabajo.



Imagen 9. Cubrimiento de material.

3.4.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. Se realiza seguimiento a la maquinaria y Vehículos utilizados para actividades de transporte de materiales, evacuación de residuos.

Tabla 16. Listado de Vehículos y Maquinaria usada en obra.

No.	MARCA	VEHÍCULO O MAQUINA			ESTADO EN OBRA	
		PLACA	MODELO	TIPO	ACT	NO ACT
001	CHEVROLET	KFG461	1988	VOLQUETA SENCILLA	X	
002	DODGE	RDC740	1978	VOLQUETA SENCILLA	X	
003	CHEVROLET	ICF925	1982	VOLQUETA SENCILLA	X	

Se realiza el llenado de combustible de las volquetas en las estaciones de servicio, teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

3.4.8 Uso Eficiente de los Recursos. De acuerdo con los permisos de servicios necesarios para el desarrollo de la obra como agua y energía en los puntos de cada frente de obra se realizó el siguiente convenio:

- Frente San Alonso Cra 33ª se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el local El Arsenal ubicado en el predio de la Cra 33A # 17 – 38. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

- Frente La Universidad se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sra. Luz Fonseca en el predio ubicado en la Calle 9ª # 24 – 23.

- Frente La Aurora se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el edificio ubicado en el predio de

la Calle 31 # 28 – 24. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

- Frente Chapinero Cll 5 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sra. María Alexandra Lozano en el predio ubicado en la Calle 5 # 16 – 25.

- Frente Chapinero Cra 17 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sr. Jaime Carreño en el predio ubicado en la Cra 17 # 4 – 60.

- Frente San Alonso Cll 20 se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sr. Gilberto Roa en el predio ubicado en la Calle 20 # 29 – 14.

Anexo 16. Constancia de convenio uso de los recursos.



Imagen 10. Firma de convenio uso de los recursos.

3.4.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. Actualmente se cuenta con un inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua (numeración, localización, dirección, tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación) según corresponda. Se realizo para los frentes activos y se ira actualizando a medida que se habiliten más zonas a intervenir.

Tabla 17. Listado de sumideros en frentes de obra.

N° DE SUMIDERO	FRENTE	MEDIDA	ESTADO DEL SUMIDERO
1	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
2	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
3	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza

4	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
5	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
6	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
7	SAN ALONSO	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
8	LA AURORA	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
9	LA AURORA	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
10	CHAPINERO	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
11	SAN ALONSO CLL 20 CRA 29 ESQ SUR	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
12	SAN ALONSO CLL 20 CRA 29 ESQ NORTE	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
13	SAN ALONSO CRA 29 CLL 20 ESQ	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza







Imagen 11. Cubrimiento de sumideros.

3.4.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. En el presente se ejecutaron actividades de conformación de tierra negra en Alcorque en los frentes San Alonso, La Universidad y la Aurora. Dentro de las actividades que se desarrollaron se encontraba el abonado de alcorques de los frentes San Alonso Cra 33ª y Aurora.

Tabla 18. Listado de vegetación en frentes de obra.

NOMBRE COMÚN	TIPO DE INTERVENCIÓN (PODA, TALA, TRASLADO, CONSERVACIÓN)	FRENTE	OBSERVACIÓN
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
OITÍ	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A

OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
ÁRBOL PENITENTE	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
PINO SAN ALBERTO	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
YUCA PIE DE ELEFANTE	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023







Imagen 12. Conformación de tierra negra en Alcorque en los frentes San Alonso, La Universidad y la Aurora.

3.4.11 Orden y Aseo. Para esta actividad, el Consorcio dispuso de un trabajador quien es el encargado del orden y aseo dentro de los frentes activos. Se realizan actividades de barrido con previo humedecimiento de la zona para generar el levantamiento de polvo.



Imagen 13. Orden y aseo en los frentes.

3.4.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. A continuación, se presenta los indicadores de cumplimiento de acuerdo con las actividades ejecutadas y el seguimiento que se realizó en el periodo del presente informe.

Tabla 19. Indicadores cumplimiento Plan de Manejo Ambiental.

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Capacitaciones Ambientales	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Capacitaciones realizadas})}{(\#\text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(1)}{(1)}$ **= 100 %**
Manejo de Residuos sólidos	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos Reciclados})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IRS} = 100 \text{ X } \frac{(5)}{(13)}$ **= 38.4 %**
Disposición de Escombros	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos con recibo})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IDE} = 100 \text{ X } \frac{(147)}{(147)}$ **= 100%**
Vehículos Certificados	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Vehículos que cumplen})}{(\#\text{ Total de Vehículos})}$	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(3)}$ **= 100%**
Permiso de Aprovechamiento Forestal	$\text{IPAF} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Talados})}{(\#\text{ Árboles Autorizados para tala})}$	**No aplica para el periodo**
Compensación de árboles	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Sembrados})}{(\#\text{ Árboles requeridos para siembra})}$	**No Aplica para el periodo**
Limpieza de obra	0 % si no realiza limpieza de obra. 50 % si la limpieza es deficiente. 100 % si la limpieza es adecuada.	**100 %**
Cumplimiento Actividades Ambientales	$\text{ICAA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Actividades implementadas})}{(\#\text{ Actividades programadas})}$	**No Aplica para el periodo**
Áreas controladas (Emisión de polvo)	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(5)}{(5)}$ **= 100 %**
Baterías Sanitarias requeridas	$\text{UBS} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(5)}{(5)}$ **= 100 %**
Manejo de campamento e instalaciones provisionales	0 % deficiente 50 % regular 100 % adecuado.	**100 %**
Área de almacenamiento de materiales	Las áreas de almacenamiento de materiales se observan adecuadas conforme a lo estipulado en el programa: Si cumple (100%) Parcialmente (50%) No cumple (0%).	**100 %**

3.5 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Prevención de Emergencias diseñado por el consorcio, dispone para el componente de atención a emergencias: botiquín de emergencias, camilla, extintor multipropósito con recarga vigente durante la ejecución del proyecto en los frentes de obra activos (San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero).

Tabla 20. Verificación de elementos de emergencia frentes de obra.

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
Campamento de Obra Frente San Alonso	Botiquín	1	30-08-2023	Buen Estado
	Camilla	1	30-08-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 1 - 10 lb	1	30-08-2023	Buen Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra La Universidad	Botiquín	1	30-08-2023	Buen Estado
	Camilla	1	30-08-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 2 - 10 lb	1	30-08-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra La Aurora	Botiquín	1	30-08-2023	Buen Estado
	Camilla	1	30-08-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	30-08-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Chapinero	Botiquín	1	30-08-2023	Buen Estado
	Camilla	1	30-08-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	30-08-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024

Anexo 17. Inspecciones de elementos de emergencia.

Tabla 21. Atención de emergencias.

Periodo	Actividad	Fecha	Trabajadores involucrados	Observaciones
Del 16 al 31 de marzo de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 30 de abril de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 31 de mayo de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 30 de junio de 2023	Emergencias reportadas	03/06/2023	1	Accidente del Sr. Ever Carrascal
Del 01 al 13 de 24 al 31 de julio de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente

Del 01 al 31 de agosto de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente

Se mantiene el equipo de emergencias confirmado por los inspectores en cada uno de los frentes.

3.6 Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Manejo de Tráfico diseñado por el consorcio, se establece que se realizara comité mensual de tráfico con un representante por parte del contratista, interventoría y de la dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. El día 29 de agosto se realiza el tercer comité, se visitan los frentes activos y se valida que se está aplicando el PMT de acuerdo con el documento aprobado por parte de DTB.

Tabla 22. Comité de tráfico.

Actividad	Fecha	Observaciones
Reunión 1	22/06/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	31/07/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 3	29/08/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 4	22/09/2023	Actividad Programada

Anexo 18. Acta No3. Comité de Tráfico.

Imagen 14. Comité de Tráfico

3.7 Protocolo de Bioseguridad COVID-19.

Consorcio Santander con el ánimo de cumplir con la Resolución 1238 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre las medidas para la prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19, elaboró un protocolo de bioseguridad que se presentó a la aseguradora de riesgos laborales y está pendiente la respectiva aprobación por parte de ellos.

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023, el CONSORCIO SANTANDER no reporto casos positivos de COVID-19 en su personal directo y subcontratista.

Tabla 23. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo.

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0
CON CERCO EPIDEMIOLÒGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo, CONSORCIO SANTANDER ha velado porque la gestión HSEQ, se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente, los planes diseñados y lo establecido en el Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- CONSORCIO SANTANDER cuenta con la certificación expedida por la escombrera donde se realizará la disposición final del material RCD para ser presentada en este corte.

- Se continua con la implementación de los planes para mantener la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo en la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo y el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias.

- CONSORCIO SANTANDER cuenta con las Brigadas de Emergencia en los diferentes frentes de trabajo, con personal capacitado para la atención de las situaciones que se presenten.

- Se realiza carta para informar al personal retirado del Consorcio, que cuentan con 5 días hábiles para realizar los exámenes de retiro y que pasado este tiempo se da por entendido que desistió de la realización de estos.

- Durante el periodo en curso, se mantienen actualizadas las carpetas compartidas con la información correspondiente al **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA.**

- Se mantiene actualizada y con todo la información necesaria la bitácora de A&SST con la información de las actividades desarrolladas en cada uno de los diferentes frentes activos y los que ya se culminaron actividades.

5. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de actividades A&SST.
Anexo 2. Bitácora A&SST.
Anexo 3. Afiliaciones y retiros del personal - mano de obra calificada & no calificada.
Anexo 4. Planilla de seguridad social – Julio.
Anexo 5. Comprobante de pago de nómina – Julio.
Anexo 6. Cuadro de control de pagos de seguridad social del personal contratado.
Anexo 7. Registro de charlas y capacitaciones.
Anexo 8. Inducciones y notificación de riesgos.
Anexo 9. Exámenes médicos de ingreso, reingreso y retiro.
Anexo 10. Formato de ATS.
Anexo 11. Formatos preoperacionales a máquinas y/o herramientas.
Anexo 12. Inspecciones de seguridad.
Anexo 13. Entrega de elementos de protección personal y dotación.
Anexo 14. Certificados de limpieza de unidades sanitarias.
Anexo 15. Constancia de disposición final de residuos de construcción y demolición.
Anexo 16. Constancia de convenio uso de los recursos.
Anexo 17. Inspecciones de elementos de emergencia.
Anexo 18. Acta No3. Comité de Tráfico.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIÓN - SST

OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1 "

Periodo del informe: 01 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDADES	P/E	MES	16 marzo - 31 marzo 2023				01 abril - 30 abril 2023				01 mayo - 31 mayo 2023				01 junio - 30 junio 2023				01 julio - 30 julio 2023				01 agosto - 31 agosto 2023				PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN*
		SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES																														
Publicación y socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	17	17	100%	
	E																													
Inducción al personal: en riesgos, en COPASST, que hacer en caso de AT, Sistema general de riesgos laborales	P	Al ingreso del trabajador			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	17	17	100%	
	E																													
Divulgación y publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	17	17	100%	
	E																													
Divulgación y publicación de la política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	17	17	100%	
	E																													
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	P	Mensual				1				2				3				4				5				6	6	6	100%	
	E																													
Subtotal cumplimiento																											74	74	100%	
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA																														
Realización de exámenes de ingreso (cada vez que ingresa personal a la obra)	P	Al ingreso del trabajador			1				2	3			4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	15	15	100%	
	E																													
Capacitación en autocuidado	P	Durante la ejecucion de la obra			1									2				3				4				5	5	5	100%	
	E																													
Prevención de enfermedades gastrointestinales	P	Durante la ejecucion de la obra				1																				2	2	2	100%	
	E																													
Capacitación sobre estilos de vida saludable	P	Durante la ejecucion de la obra								1																2	2	2	100%	
	E																													
Capacitación sobre prevención alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia	P	Durante la ejecucion de la obra								1				2				3				4				5	5	5	100%	
	E																													
Capacitación sobre hipertensión arterial	P	Durante la ejecucion de la obra							1																	2	2	2	100%	
	E																													
Realización de exámenes de egreso	P	Al retiro de cada trabajador								1		2	3	4	5	6	7	8	9			10	11				11	11	100%	
	E																													
Subtotal cumplimiento																											42	42	100%	
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO																														
Inspección de campamento y frentes de obra	P	Semanal					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	18	18	100%	
	E																													
Inspección a Botiquines	P	Mensual								1				2				3				4				5	5	5	100%	
	E																													
Elaboración de estadísticas de ausentismo	P	Mensual								1				2				3				4				5	5	5	100%	
	E																													
Subtotal cumplimiento																											28	28	100%	
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL																														
Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal	P	Durante la ejecucion de la obra			1									2				3				4				5	5	5	100%	
	E																													
Subtotal cumplimiento																											5	5	100%	
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																														
Inspección de equipos y herramientas	P	Semanal						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	17	17	100%	
	E																													
Estadísticas de accidentalidad	P	Mensual						1	2	3				4				5				6				7	7	7	100%	
	E																													
Subtotal cumplimiento																											24	24	100%	
PLAN DE EMERGENCIAS																														
Capacitación en identificación y notificación de situaciones de riesgo	P	Al ingreso del personal y al ejecutar una nueva actividad			1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	18	18	100%	
	E																													
Subtotal cumplimiento																											18	18	100%	
TOTAL																													**100%**	

NOTA: Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identifcadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y subcontratistas

Fecha: 01/08/2023
Charla: Como reconocer cuando alguien esta alegre o enojado. Se realiza recorrido por los frentes validando caramientas, orden & aseo y uso de EPP. Aseo de unidades sanitarias instaladas en los diferentes frentes activos. Recorrido con interventoría y alcaldía.
Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso cra 33, La Universidad, Chapinero, La Aurora, Se verifica afiliaciones al personal, Se evidencian Charla de Seguridad, Limpieza y mantenimiento a unidades Sanitarias, Se Solicita al Contratista realizar Jornada de Orden, Aseo y Limpieza por los frentes de Obra.
Bruno Suarez Cano — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ. Interventoría.

Fecha: 02/08/2023
Charla: Protección en los pies. Ingresan 3 oficiales y 3 ayudantes, se realiza inducción, entrega de EPP & dotación. Renuncia el Sr. Alonso Mendez Estupiñan. Recorrido por los frentes para realizar revisión de caramientas, orden & aseo.
Se realiza recorrido por los Frentes de Obra San Alonso Cra 33, La Universidad, Chapinero, La Aurora, Se Verifica afiliaciones, Inducciones y entrega de Dotación del Personal que Ingresa, Se evidencia Charla de Seguridad a todo el Personal Se Solicita al Contratista realizar reposición de EPP al Personal que lo requiera para minimizar riesgos en Sus actividades y labores.
Bruno Suarez Cano — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof HSEQ. Interventoría.

03/08/2023 Charla: Disposición de residuos peligrosos. Ingresa 1 oficial, se realiza inducción, entrega de EPP & dotación. Se realiza recorrido por los frentes activos para realizar acomodación de caramientas, jornada de orden & aseo, implementación de PMT, uso adecuado de EPP.

Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso Cra 33, la Universidad, Chapinero y la Aurora, se verifica aplicación a Seguridad Social, se evidencia Charla de Seguridad e inducción a personal nuevo, entrega de EPP y señalización, se solicita al contratista realizar la adecuación de cerramientos en los frentes de Obra.

Bernardo Suárez Gómez — Beatriz Lozano
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoría.

04/08/23 Charla: Levantamiento - Lesiones de espalda. Se realiza aseo en las unidades sanitarias presentes en los diferentes frentes. Se recoge RCD en el frente Aurora con volqueta carpada. Se revisa cerramiento en San Alonso y se ordena nuevamente el cerramiento y sendero peatonal. Se dan recomendaciones de orden y aseo al personal. Continúan labores de construcción de espacio público sin novedad.

Se realiza recorrido por los Frentes de Obra San Alonso Cra 33, la Universidad Chapinero, la Aurora, se verifica con aplicaciones del personal en obra, se evidencia Charla de Seguridad, Mantenimiento y limpieza a Unidades Sanitarias, Retiro de escombros en Frente la Aurora, se solicita al contratista realizar implementación de señalización Preventiva de Obra, para evitar accidentes con trabajadores y comunidad.

Bernardo Suárez Gómez — Beatriz Lozano
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ. Interventoría

05/08/23 Comunicación de peligros (Charla al inicio de la jornada). Volqueta carpada recoge escombros en el frente San Alonso Cra 33a. Trabajo administrativo, continúan labores de construcción de espacio público sin novedad.

Bernardo Suárez Gómez
Inspector HSEQ

08/08/23 Charla: Herramientas. Se realiza aseo en las unidades sanitarias instaladas en los diferentes frentes activos. Se recoge residuo RCD en el frente Aurora con volqueta carpada. Continúan traba-

jos de construcción de espacio público sin novedad
Se dan recomendaciones de mantener orden y aseo en los frentes de trabajo.
Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Antonio Cra 3 La Universidad, Chapinero, La Aurora, Verificando aplicaciones del Personal, Se evidencia Charlas de Seguridad, Limpieza y mantenimiento en baterías Sanitarias, evacuando escombros del frente la Aurora, Se Solicita al Contratista Implementar Punto ecológico en Frente de Obra Chapinero y realizar reposición de epp en Frente Chapinero, deben realizar jornada de Aseo y limpieza en el mismo.

Bernardo Sierra Gómez — Inspector HSEQ
Beatriz León — Prof. HSEQ Interventoría

09/08/2023 Charla: Inducción a personal entrante (Ing. Lorena Morales - Directora de Obra) / RCP. Se realiza entrega de EPP/Dotación & notificación de riesgo. Comité de obra con interventoría. Continuan labores sin novedad en los frentes.
Se realiza recorrido por Frentes de obra, Se verifican aplicaciones del personal e ingreso de nueva directora de Obra, Se solicita al Contratista adecuación de Cerramientos en Frentes de Obra. Se realiza Comité de Obra con Personal Interventoría, Contratista y Supervisión.

Bernardo Sierra Gómez — Inspector HSEQ
Beatriz León — Prof. HSEQ Interventoría

10/08/23 Charla: Problemas intestinales - Como prevenirlos. Se terminan actividades de construcción de espacio público en el frente la Universidad Calle 9A entre 24 - 25. Continuan labores en los demás frentes activos sin novedad. Se realiza recorrido por los frentes para validar orden & aseo, cerramientos.
Se realiza recorrido por Frentes de obra San

Alonso Cra 33, Chapinero, la Aurora, y la Universidad donde estoy terminando labores el dia de hoy, Se verifican capacitaciones del personal, Se evidencia charla de Seguridad, Se Solicita al Contratista realizar el retiro de los escombros resultantes de obra, retiro del material Sobrante en el frente la Universidad y realizar Limpieza y aseo en el mismo.

Bernardo Suárez Gamón — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoría.

11/08/23 Charla: Higiene del Sueño. Se realizan aseo de las unidades sanitarias instaladas en los diferentes frentes. Volqueta cargada recoge escombro RCD del frente Aurora. Se inician labores en el frente San Alonso Calle 20. Se realiza recorrido en los frentes y se dan recomendaciones para el mantenimiento del orden & aseo.

Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso Cra 33, la Universidad, Chapinero, la Aurora, Se verifica capacitaciones del personal, Se evidencia Charla de Seguridad, retiro de escombros en frente la Aurora, Se abre nuevo Frente de Obra en San Alonso calle 20 entre Carreras 29 y 30, Se Solicita realizar Cerramiento e implementar Señalización del PMT en frente San Alonso Cra 20, así mismo se recuerda el retiro del material y escombros dejados en frente de Obra la Universidad.

Bernardo Suárez G — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoría.

12/08/23 Charla: Reglas de oro. Trabajo administrativo. Se continuan labores de construcción de espacio público sin novedades en los frentes. Se dejan recomendaciones para los cerramientos, orden & aseo por fin de semana.

Bernardo Suárez Gamón
Inspector HSEQ

14/08/23 Charla: Hidratación. Continuan labores de construcción de espacio público sin novedad. Se realiza recorrido en los frentes para organizar cerramientos, delimitar material, aseo. Se recoge material RCD del frente Aurora con volqueta carpeda.
Se realiza recorrido por Frentes de Obra, San Alanso Cra 33, San Alonso Calle 20, Chapinero, la Aurora, la Universidad, Se verifica personal afiliado, Se evidencia Charla de Seguridad, Se Solicita al Contratista realizar Jornada de Orden, Aseo y limpieza en todos los Frentes, realizar mantenimiento al Cerramiento, retiro de material y escombros, Se le recuerda al contratista que la fecha maxima de Pago de la planilla de Seguridad Social es hasta el dia de manana 15 de Agosto de 2023.
Bernardo Suárez Garzón — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof HSEQ. Interventoría

15/08/23 Charla: Tiempos de descanso. Ingreso 1 afiliación. Se realiza inducción, notificación de riesgo, entrega de EPP & dotación. Se llevan a cabo actividades de abanderado de cargues, reunión con asesor de ARL para definir plan de trabajo, aseo de unidades sanitarios de los frentes activos y recargue de escombro en el frente San Alonso Calle 20 con volqueta carpeda.
Se realiza recorrido por Frentes: San Alonso Cra 33, San Alonso Calle 20, la Universidad, la Aurora, Chapinero, Se verifican afiliaciones del Personal, Se evidencia Charlas de Seguridad, Inducción a personal nuevo, entrega de EPP y dotación, mantenimiento y limpieza de unidades Sanitarias, Se anota Oficio de Apremio al contratista por Presunto Incumplimiento, control y seguimiento

Actividades HSEQ, MAO y PMT, Se envia correo recordando los compromisos en comite del dia 09 de Agosto, Se le recuerda al Contratista el dia de hoy 15 de agosto es la fecha maxima para el pago de la planilla de Seguridad Social.

Bernardo Sierra Carreño — Escuela Leon
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ. Interventoria.

16/08/23 Charla: Puntos de anclaje. De acuerdo con la solicitud enviada por interventoria en el apremio, se realiza retiro de material del frente Universidad Calle 9A. Retiro de escombro de la Calle 31 barrio la Aurora con volqueta carpada, adicionalmente en el frente San Alonso Calle 20. continua trabajo de construccion de espacio público en los frentes sin novedad.
Se realiza recorrido por Frente de Obra San Alonso calle 20 San Alonso Cra 33a, Chapinero, la Aurora, la Universidad donde se verifican aplicaciones del personal, charla de Seguridad, retiro de escombros, retiro de material del frente la universidad y la Aurora, Se Solicita al Contratista entregar todos los EPP Necesarios para las actividades que realizan los trabajadores.

Bernardo Sierra Carreño — Escuela Leon
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoria.

17/08/23 charla: Botas de seguridad. Se recoge escombro con volqueta carpada, en el frente Chapinero. Recorrido por los frentes revisando cerramientos, orden & aseo. continua labor de construcción de espacio público sin novedad.
Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso Cra 33a, San Alonso calle 20, Chapinero, la Aurora, Se verifican Aplicaciones del Personal, Se evidencia charla de Seguridad, recogida y evacuacion de escombros en el frente Chapinero, Se Solicita al Contratista adecuar Sendero Peatonal en frente San Alonso Cra 20, Se le recuerda al Contratista que la fecha maxima de Pago de la planilla de

Seguridad Social estaba para el 15 de Agosto y al dia de hoy 17 de agosto no se han presentado dicha planilla.

Bernardo Sierra Gamero — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoría

16/08/23 Charla: Seguridad al caminar, trafico a cargo. Aseo en unidades sanitarias en los diferentes frentes activos. Retiro de material RCD en el frente San Alonso Calle 20. Continuan labores de construcción de espacio público sin novedad.
Se realiza recorrido en los frentes de Obra San Alonso Cra 33a, San Alonso Obra, Chapinero, La Aurora, Se verifican Afiliaciones a Seguridad Social, Se verifica charla de Seguridad, Se evidencia retiro de material RCD en frente San Alonso Calle 20, Se Solicita al Contratista la implementación Completa de Cerramientos y PMT en Frentes de Obra San Alonso Cll 20 y Chapinero, Se le recuerda al Contratista presentar la Planilla Paga de Seguridad Social que tenía fecha maxima de pago el dia 15 de agosto de 2023 y el dia de hoy 18 de Agosto de 2023 No la han presentado

Bernardo Sierra Gamero — Beatriz León
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoría

19/08/2023 Charla: Uso correcto de EPP. Recolección de escombros con volqueta cargada en San Alonso Calle 20. Trabajo administrativo. Se hacen recomendaciones en los frentes activos del mantenimiento del orden & aseo por fin de semana con puente festivo.

Bernardo Sierra Gamero
Inspector HSEQ

22/Agosto/23 Se realiza recorrido por frentes de obra San Alonso Calle 20, Chapinero y la Aurora, Sin presencia del HSEQ ya que manifiesta

que se encuentre en Permiso administrativo, Se Verifica el Personal en obra con sus afiliaciones a Seguridad Social, Se solicita al contratista realizar reposicion de EPP's al personal y Botacher ya que se evidencia la falta en algunos de ellos, Se Solicita la adecuacion de cerramientos, realizar orden, limpieza y aseo, e implementar Sendero Peatonal y Señalizacion Completa de PMT en Frentes San Alonso Calle 20 y Chapinero, Se le recuerda al Contratista enviar la planilla paga de Seguridad Social, ya que a la fecha no la han enviado

Fecha leída
Prof HSEQ Interventoria.

23/05/23 Charla: Medidas de seguridad al circular por la calle. Se realizan inspecciones a equipos/herramientas/EPP. Se realiza recorrido por los frentes de trabajo para validar cerramientos, mejorar recomendaciones para el orden & aseo de los mismos y adecuar cerramientos. Se terminan labores de construcción de espacio público en el frente la Aurora, en los demas frentes se continuan sin novedad alguna.
Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso Cra 33a, San Alonso Calle 20, Chapinero y la Aurora, Se verifica afiliaciones del personal, Se evidencia charlas de Seguridad, se terminan labores en Frente la Aurora y se Solicita al Contratista retirar el material Sobrante de obra, Se verifica el traslado del baño portatil de la carrera 33a a la Calle 19 como lo solicitó la comunidad, Se envian Oficios de Apremio por Presunto Incumplimiento de Implementacion del PMT en frentes de obra Chapinero y San Alonso Calle 20, Se le recuerda al contratista Presentar la planilla Paga de Seguridad Social

que tenía fecha máxima de pago el día 15 de agosto, y a la fecha no han enviado dicha planilla.

Bernardo Sabrot Carreño
Inspector HSEQ

~~Fecha~~ Jefa
Prof. HSEQ Interventoría

24/08/2023 Charla: Botiquín de primeros auxilios. Continuan trabajos de construcción de espacio público sin novedad en los frentes. Se realiza recorridos haciendo recomendación de orden & aseo, mantenimiento de cerramientos.

Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso calle 20, Chapinero, y la Aurora, Se verifican afiliaciones a Seguridad Social del personal, Se evidencia Charla de Seguridad, Se Solicita al Contratista realizar orden, aseo y limpieza en los frentes, asi mismo como la adecuación de los Cerramientos y Senderos Peatonales en San Alonso Cl 20 y Chapinero, realizar el retiro de material Sobrante en Frente La Aurora ya que estan obstaculizando la via, realizar reposición de EPP al personal, y Se le recuerda enviar la Planilla Pago de Seguridad Social que tenia fecha máxima de pago el dia 15 de agosto y a la fecha no la han Presentado.

Bernardo Sabrot Carreño
Inspector HSEQ

Beatriz Jefa
Prof. HSEQ Interventoría

25/08/2023 Charla: Higiene personal. Se realiza aseo en los unidades sanitarias instaladas en los diferentes frentes. Se terminan trabajos de construcción de cerca en el frente San Alonso Cr 33a. Ingresa 1 oficial, se realiza inducción, entrega de EPP/ Dotación y notificación de riesgo. No se presentan novedades en los frentes. Se realiza recorrido por Frentes de obra San Alonso Cll 20, Chapinero, la Aurora, se verifica

Aplicaciones del personal, Se entrega Charla de Seguridad, Limpieza y mantenimiento en las baterías Sanitarias, Se verifican inducción y entrega de EPP y dotación al personal nuevo, Se Solicita al Contratista el retiro del material Sobrante del frente de Obra la Aurora, Se Solicita realizar mantenimiento y adecuación a Cerramientos, Sendero peatonal, y Señalización para en frentes San Alonso Cll 20 y Chapinero, Se le recuerda al contratista Presentar la planilla pago de Seguridad Social que tenía fecha máxima de Pago el día **15** de agosto y a la fecha no ha sido enviada.

Bernardo Suárez Carreño
Inspector HSEQ

Beatriz León
Prof. HSEQ Interventoría

26/08/23 Charla: Accidente - Definición. Trabajo administrativo. Se realizan recomendaciones en los frentes para no dejar residuos a la vista y las herramientas adecuadas al terminar jornada. Se continuan labores sin novedad.

Bernardo Suárez Carreño
Inspector HSEQ

28/08/23 Charla: obesidad y sobrepeso. - Pausa activa. Reunión la Ing. Melisa al cargo de Inspector Obra. Continuan labores de construcción de espacio publico sin novedad. Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso Cll 20, Chapinero, Se entrega charla de Seguridad Social y Pausas Activas, La Semana Seguridad Social del personal, Se Solicita al contratista hacer el retiro de material Sobrante en Frente la Aurora, Se le recuerda al Contratista Presentar la Planilla de Seguridad Social Pago que estaba para el día 15 de Agosto y a la fecha no ha sido presentado

Bernardo Suárez Carreño
Ing. HSEQ Contratista

Beatriz León
Prof HSEQ Interventoría,

29/08/2023 Charla: Alcoholismo. Sale volqueta de San Alonso con material RCD. Realizacion de aseos en las unidades Sanitarias. Comite de Trafico en los frentes activos.
Se realiza recorrido por frentes de obra, San Alonso cll 20, Chapinero, la Aurora, Se verifican afiliaciones del personal en obra, Se evidencia charla de Seguridad, retiro de escombros del frente de obra San Alonso cll 20, Se evidencia mantenimiento y limpieza a unidades Sanitarias, Se Solicita al Contratista hacer reposición de EPP al Personal que lo requiera, Capacitar al Personal Sobre el buen uso de EPP y Dotación, Se le requiere al contratista realizar el retiro de material Sobrante del frente de Obra La Aurora, asi mismo como de la adecuación de Cerramiento de los Frentes Chapinero y San Alonso cll 20.

Bernardo Sierra Gomez — Beatriz Leon
Inspector HSEQ — Prof. HSEQ Interventoría

30/08/2023 Charla: Comunicacion asertiva. Se realizan formatos de inspección de orden y aseo, area de trabajo. Recomendaciones para el mantenimiento de los cerramientos. Continuan labores de construcción de espacio público sin novedad.
Se realiza recorrido por frentes de obra San Alonso cll 20, Chapinero, la Aurora, Se verifican Afiliaciones del personal en obra, Se evidencia charla de Seguridad al personal. Se le recuerda al contratista que debe realizar el retiro de material sobrante del frente de obra la Aurora ya que esta obstaculizando la via, Se Solicita al Contratista adecuar el Sendero Peatonal del Frente de Obra San Alonso cll 20 Se solicita al contratista

realizar Jornadas de Orden, Aseo y limpieza, en los Frentes de Obra, así como delimitar los áreas de trabajo para prevenir accidentes tanto con los trabajadores como con la comunidad en general.

Bernarda Suárez Arroyo — Inspector HSEQ

Paola León — Prof. HSEQ Interventoría

31/08/2023 Charla: Como lavarse las manos. Se entregan EPP al personal de los frentes para reposición y dotación al personal. Volqueta carpada recoge RCD en San Alonso Calle 20 continuan labores de construcción de espacio público sin novedad en los frentes. Recomendación uso de EPP al personal Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso Cll 20, Chapinero, la Aurora, se verifican Afiliaciones del Personal en obra, se evidencia Charla de Seguridad, retiro de escombros en Frente de Obra San Alonso Cll 20 En recorrido de Obra con Supervisión se define lo Siguientes en zonas residenciales donde segun el perfil vial Contenga Franja Ambiental, la franja ambiental quedará en grama, vegetación o gramaquín en zonas comerciales se debe endurecer con adoquín de concreto dejando alcorques cada 5 mt dependiendo de rampas vehiculares o peatonales, Por lo cual para el Frente de la Calle 20 San Alonso corresponde a zona residencial, por lo tanto la Franja ambiental debe quedar en grama, vegetación o gramaquín de acuerdo a lo establecido en el manual de espacio publico de Bucaramanga MEPB. Se le solicita al contratista enviar el inventario de alcorques y zonas verdes actualizados quincenalmente para ser remitidos a la Ingeniera Nidia Cantero Prof. Ambiental de la Alcaldía, Para que sean suministrados las especies arboreas a sembrar, Se le recuerda al contratista. realizar retiro de material sobrante del frente de Obra la Aurora, así como la

adecuacion del Cerramiento y Sendero Peatonal en Frente de Obra San Alonso Cll 20

Bernardo Suarez Carrero — Beatriz Leal
Inspector HSEQ — Prof HSEQ Interventoria

01/09/2023 Charla: La importancia de la salud mental. Se realiza cerramiento en la Cra 33a con calle 19 esquina al lado del colegio Liceo Patria para realizar tareas de construccion de anden en esa área. Se realizan labores de limpieza en las unidades sanitarias de San Alonso y Chapinero. Continuan labores sin novedad.
Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso Cra 33a, San Alonso cll 20, chapinero y La Aurora, se verifican Aplicaciones del personal en obra, se evidencia Charla de Seguridad, aseo, mantenimiento y limpieza de Unidades Sanitarias, Se envia oficio de Apremio por Presunto Incumplimiento actividades HSEQ, MAO y PMT. Yo que se evidencian Cerramientos en mal estado y/o incompletos, Senderos Peatonales incompletos, Señalizacion del PMT Incompleta, Personal en obra sin EPP y dotacion adecuada, Sin delimitacion de areas de trabajo, ni un adecuado orden y aseo en el area, en los Frentes, tambien se evidencia material Sobrante de Obra que no ha sido retirado del Frente la aurora. Se solicita al contratista Cumplir con dichos requerimientos.

Bernardo Suarez Carrero — Beatriz Leal
Inspector HSEQ — Prof HSEQ Interventoría

02/09/2023 Charla: Ahorro de agua. Se realiza recorrido por los frentes activos, revisando y acomodando cerramientos; revision de botiquin, kit de emergencia, material dentro de cerramientos. Se dejan recomendaciones para orden y aseo, asi como al material RCD totalmente recogido

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa Consorcio Santander.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal BUCARAMANGA

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA	C.C.	5,685,373	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
JERSON DAVID OSPINO GOMEZ	C.C.	1,005,325,662	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO	C.C.	1,065,590,063	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ	C.C.	1,092,343,342	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
OMAR LARROTA GARCIA	C.C.	1,095,804,014	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
BRAYAN SMITH REY NORIEGA	C.C.	1,098,786,346	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 03 de agosto de 2023 a las 07:51:26 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010717883	0[3]0[8]2[0]2[3]

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al tramite(s) antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1. Tipo de tramite	2. Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliacion ☐ B. Reporte de Novedades ☒	A. Individual ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ Continuidad Cobertura de Familia ☒ Beneficiario afiliado adicional ☐ D. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	(a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
REY (Primer apellido)	NORIEGA (Segundo apellido)	BRAYAN (Primer nombre)	SMITH (Segundo nombre)

7.Tipo documento de identidad	8.Número del documento de identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1026756249	Femenino ☐ Masculino ☒	27/08/1999

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de población especial
6	Tipo 3°EPS	Condición 3°P		

15. Administradores de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR PTC	1160000

18.Residencia			
CL 11 NR 1A 0 CC 19 ET 2 BAVARIA 2 (Dirección)	Teléfono fijo	3144602883 (Teléfono celular)	BRAYANREY@HOTMAIL.COM (Correo electrónico)
BUCARAMANGA (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	SANTANDER (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01			
02			
03			
04			
05			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
01				
02				
03				
04				
05				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			32. Condición	
		Tipo				
		1	2	3	1	2
01						
02						
03						
04						
05						

33. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	37.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Instituciones Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS a registrar por la EPS)
C	ALIANZA UAE CABECERA - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CR	ALBARCA08 - ALIANZACAB
9	-	-
10	-	-
11	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO SANTANDER	NIT	901077902	01

39.Ubicación				
CL 49 21 45 (Dirección)	3204751379 (Teléfono)	LUISGROS@HOTMAIL.COM (Correo electrónico)	BARRANCABERMEJA (Municipio/Distrito)	SANTANDER (Departamento)

No de Radicacion
4010717093

5. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y/o corrección datos complementarios
5. Terminación de la inscripción en la EPS
   Código:
6. Reinscripción en la EPS
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo / B. Régimen Subsidiado
14. Traslado: A. Mismo régimen / B. Diferente régimen
15. Reporte de fallecimiento
16. Reporte del inicio de protección al cesante
17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
18. Reporte de la calidad del pensionado

6. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo (Femenino / Masculino)	Fecha de nacimiento	43.Fecha (DD/MM/AAAA)

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

7. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.
48. Declaración de residencia de menores de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no inscripción del cotizante/cabeza de familia Beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr ado 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto.

8. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante / Entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Brayan Reg	

9. ANEXOS

56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0

57. Copia del dictamen de invalidez permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la suspensión de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

10. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Recuerde que la Firma, el Nro del formulario, todas las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y III. Autorizaciones, así como la veracidad de los datos información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

BRAYAN SMITH REY NORIEGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.786.346**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa Consorcio Santander.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal BUCARAMANGA

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA	C.C.	5,685,373	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
JERSON DAVID OSPINO GOMEZ	C.C.	1,005,325,662	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO	C.C.	1,065,590,063	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ	C.C.	1,092,343,342	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
OMAR LARROTA GARCIA	C.C.	1,095,804,014	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
BRAYAN SMITH REY NORIEGA	C.C.	1,098,786,346	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 03 de agosto de 2023 a las 07:51:26 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/08/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6017021	02/08/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1065590063	LUISALBERTO FLORIAN CHAMORRO	1160000	MAESTRO CONSTRUCTOR	2023-08-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Agosto del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.065.590.063**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa Consorcio Santander.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal BUCARAMANGA

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA	C.C.	5,685,373	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
JERSON DAVID OSPINO GOMEZ	C.C.	1,005,325,662	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO	C.C.	1,065,590,063	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ	C.C.	1,092,343,342	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
OMAR LARROTA GARCIA	C.C.	1,095,804,014	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
BRAYAN SMITH REY NORIEGA	C.C.	1,098,786,346	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 03 de agosto de 2023 a las 07:51:26 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_1641422

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901677862 CONSORCIO SANTANDER
Afiliado	CC 1095804014 OMAR LARROTA GARCIA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BARRANCABERMEJA CLL 49# 21 46
Fecha de ingreso	02/08/2023
Fecha de radicación	02/08/2023 12:15:28 p.m.
Código de Transacción	162611903
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 09/2023

Fecha de generación 02/08/2023

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OMAR LARROTA GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.095.804.014**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901677862
Número Afiliación: 9016441
Razón social: CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 91495273
Nombre: GERMAN DIAZ MOYANO
Fecha Ingreso: 03/08/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 002
Centro de trabajo: 002
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 02/08/2023 09:59:06 p.m.

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_1675848

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901677862 CONSORCIO SANTANDER
Afiliado	CC 91495273 GERMAN DIAZ MOYANO
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BARRANCABERMEJA CLL 49# 21 46
Fecha de ingreso	03/08/2023
Fecha de radicación	08/08/2023 05:12:30 p.m.
Código de Transacción	162930682
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 09/2023

Fecha de generación 08/08/2023

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) GERMAN DIAZ MOYANO identificado(a) con C.C No 91.495.273., se Encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 08 de agosto del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1098712615
Nombre:	EDINSON PRADO PATERNINA
Fecha Ingreso:	25/08/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	24/08/2023 07:39:16 p.m.

Bogotá, Septiembre 20 de 2023

Señor:
PRADO PATERNINA EDINSON
CC. 1098712615
CR 15 N 189 - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Mayo 3 de 2018. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
PRADO PATERNINA EDINSON	1098712615	C	May-3-2018	52	26	COTIZANTE	VIGENTE		Cambio de empleador no efectivo mes mora 1	Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
CONOSRCIO EDUCATIVO EL PLAYON 2019	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO SANTANDER	1098712615	Dependiente	VIGENTE
CONSORCIO VIVIENDA RURAL EL PLAYON	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO VIVIENDA RURAL EL PLAYON	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LTDA	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LTDA	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSTRUCCIONES EFREN DIAZ MORENO	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSTRUCCIONES EFREN DIAZ MORENO	1098712615	Dependiente	CERRADO
CONSTRUPLOMAR SAS	1098712615	Dependiente	CERRADO
GNJ CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	1098712615	Dependiente	CERRADO
URBANART INGENIERIA SAS	1098712615	Dependiente	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,



CARLOS JAVIER CARREÑO SANCHEZ
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe

informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDINSON PRADO PATERNINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.712.615**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1098686573
Nombre:	JOSE RIOS LEON
Fecha Ingreso:	15/08/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	14/8/2023 8:40:53 PM

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010847403	2020/03/20

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1.Tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒
2.Tipo afiliado: A. Individual ☐ B. Colectivo ☐ B. Institucional ☐ (Cotizante Cabeza de familia ☒ Beneficiario afiliado actualmente ☐ B. De oficio ☐)
3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Codigo (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

A. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RIOS (Primer apellido)	LEON (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	(Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	8.Número del documento de identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1098666773	Femenino ☐ Masculino ☒	1993/04/09

B. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos opcionales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de población especial
0	Tipo: PD-01 Condición: TP		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR PFC	1160000

18.Residencia			
CL 68 19 24 (Dirección)	6700000 (Telefono fijo)	(Telefono celular)	JOSERIOS97@HOTMAIL.COM (Correo electronico)
BUCARAMANGA (Municipio/Distrito)	Barrio	Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna: SANTANDER (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28.Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo I	II	III	Condición: I	II
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Solo para IPS Privadas

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Código de la IPS(a registrar por la EPS)
C	CENTRO INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD CASS - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CP	CENTROCASS - ALIANZACAB
D	-	-
E	-	-
F	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
COMERCIO SANTANDER	NIT	8913077502	01

39.Ubicación

CL 46 21 48 (Dirección)	6700001 (Telefono)	LUJ.CHRIS@HOTMAIL.COM (Correo electronico)	BARRANCABERMEJA (Municipio/Distrito)	SANTANDER (Departamento)

No de Radicacion
4210047465

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código: ☐
- ☐ 6. Reincripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o cumplimiento de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Retiro del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la cabina no pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la cabina del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		(YYMMDD)

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo/Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no cotización del cotizante potencial de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- 50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y consulte datos y copias de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos del afiliado vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr ato 1377 de 2013.
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular suyo mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o Entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Jose rios.	

IX. ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública para de constatación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la suspensión de cuerpos y escritura pública para de constatación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el solicitante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia otro acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o no sobre la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma funcionario

Recuerde que la firma, el final del formulario, validar las declaraciones marcadas y/o obligatoriedad en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE RIOS LEON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.686.573**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa Consorcio Santander.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal BUCARAMANGA

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA	C.C.	5,685,373	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
JERSON DAVID OSPINO GOMEZ	C.C.	1,005,325,662	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO	C.C.	1,065,590,063	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ	C.C.	1,092,343,342	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
OMAR LARROTA GARCIA	C.C.	1,095,804,014	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
BRAYAN SMITH REY NORIEGA	C.C.	1,098,786,346	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 03 de agosto de 2023 a las 07:51:26 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/08/2023, el empleador CONSORCIO SANTANDER identificado con NIT número 901677862 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6017054	02/08/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	5685373	JOSEROMAN ESPINOZA BAUTISTA	1160000	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2023-08-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Agosto del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **5.685.373**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa Consorcio Santander.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal BUCARAMANGA

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA	C.C.	5,685,373	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
JERSON DAVID OSPINO GOMEZ	C.C.	1,005,325,662	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO	C.C.	1,065,590,063	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ	C.C.	1,092,343,342	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
OMAR LARROTA GARCIA	C.C.	1,095,804,014	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
BRAYAN SMITH REY NORIEGA	C.C.	1,098,786,346	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 03 de agosto de 2023 a las 07:51:26 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicación	Fecha de Radicación
37543834	02 08 2023

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Ospino	Gómez	Jeison	David
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de identificación	Sexo	Fecha de nacimiento
RC	1005 325 662	M	19/10/2001

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
Compo Madrid Torre 4 Apt 3091	3127395102	Juaggzz@hotmail.com

Barrio	Ciudad	Departamento
Berlanga	Compo Madrid	Santander

Entidad	Tipo de cotizante	Valor
Sura	Pensionado	1.160.000

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de identificación	Sexo	Fecha de nacimiento

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de identificación	Sexo	Fecha de nacimiento

Parentesco	Sexo	Discapacidad	Cotizante

Nombre	Código	Departamento	Ciudad	Código de la UPC (si aplica)

Nombre de la madre o el Proveedor de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (si aplica)

Nombre o razón social	Tipo de documento de identificación	Número de identificación	Tipo de cotizante o pensionado (si aplica)
Consorcio Santander	Nit	901697862	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Ciudad	Departamento
Av Suba 106A # 28 91c 202	6015395415	[illegible]	Bogotá	

B. REPORTE DE NOVEDADES

41. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la vinculación en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reincorporación en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o suspensión de condiciones para aportar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] a. Régimen Contributivo [ ] b. Régimen Subsidiado [ ] c. Mismo Régimen [ ] d. Diferente Régimen
- [ ] 14. Traslado
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Traslado de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

42. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	# Ficha: 02 05 2023

43. CIE anterior	44. Motivo de traslado: Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de cotizar al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de vínculo de hecho mayor a dos años que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no afiliación del cotizante, cónyuge de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS valide y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cónyuge de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a los entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cónyuge de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante, cónyuge de familia o beneficiario: Jerson Ospino

55. El empleador, pensionado o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio:

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Folios [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública para dar reconocer o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de cotización o acta de entrega del anexo.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción del padre o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de la entidad por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de los organismos competentes en la que ordene la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación: D D M M A A A A	69. Fecha de validación: D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta su aceptación de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JERSON DAVID OSPINO GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.325.662**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa Consorcio Santander.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal BUCARAMANGA

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE ROMAN ESPINOZA BAUTISTA	C.C.	5,685,373	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
JERSON DAVID OSPINO GOMEZ	C.C.	1,005,325,662	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
LUIS ALBERTO FLORIAN CHAMORRO	C.C.	1,065,590,063	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ	C.C.	1,092,343,342	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
OMAR LARROTA GARCIA	C.C.	1,095,804,014	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA
BRAYAN SMITH REY NORIEGA	C.C.	1,098,786,346	02/08/2023	RIESGO V	6.960	EMPLEADOS BUCARAMANGA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 03 de agosto de 2023 a las 07:51:26 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

Radicado # 0008304606.

Fecha de Radicación: 02/08/2023

A. AFILIACIÓN

B - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Ramirez	Segundo apellido: Diaz	Primer nombre: Heider	Segundo nombre: Alexis.

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.092.343.342.	Femenino: Masculino: X	2008/19

C - DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo: Condición:		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
Sura	Porvenir	1.160.000.

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
	Carrera 23 # 7-33		3219307207.	ll-8820@hotmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Bucaramanga	Urbana: X Rural:	Comuneros.	Santander

D - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido:	Segundo apellido:	Primer nombre:	Segundo nombre:

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino: Masculino:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
D1				
D2				
D3				
D4				
D5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
D1					
D2					
D3					
D4					
D5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo			Condición	
				F	N	M	T	P
D1								
D2								
D3								
D4								
D5								

	32. Datos de residencia					33. Sede de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.)
	Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	
D1						
D2						
D3						
D4						
D5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

E - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE GRUPO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Santander	NI	901677862.	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
Av 68a 106 A # 28 apt 202	6015339575		Bogotá.	

V. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de **afiliados** adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] C. Mismo Régimen
  - [ ] D. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del estado de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
				01 08 2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar a Pagotes de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de la NO integración del cotizante, cónyuge de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.PS. solicite y obtenga datos y copia de su historia clínica del cotizante o cónyuge de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.PS. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.PS. maneje los datos personales del cotizante o cónyuge de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.PS. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cónyuge de familia o beneficiario	55. El Empleador, operador o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Heider V. Ramirez	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad
  Cantidad: CR [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que acredite la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copias del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio / Código del Departamento	67. Sabia que DEBER: Número de Folio / Planilla / Mes	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del operador comercial	Razón de radicación	Medios procesamiento
C.C. Nro		

Recuerda que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.092.343.342**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1100963525
Nombre:	ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
Fecha Ingreso:	09/08/2023
Salario básico:	3,800,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	8/8/2023 11:32:58 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

Fecha de Radicación: 19/08/2023

Radicado # 0005334994.

I - DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] — 2. Tipo de Afiliación: A. Individual [X] — 3. Régimen: A. Contributivo [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] — 5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ]

Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

4. Apellidos y nombres			
Monsalve	Ordoñez	Angie	Lorena
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.100.963.525	Femenino [X] Masculino [ ]	04/06/1993

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo: Condición:		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
Sura.	Porvenir.	3.800.000.

18. Residencia	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Calle 7 # 4-35 T1 Apt 307.		3019251962.	lulu8902@hotmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Floridablanca	Urbana [X] Rural [ ]		Santander.

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre			Femenino	Masculino	
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo			Condición	
				F	S	M	F	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Nivel de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Solicitud de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS)
Consorcio Santander	NI [ ]	901.677.862	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
Av Sba 106 A # 28 of 202	601 5339548	[illegible]	Bogotá	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  - Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad
  - ☐ A. Régimen Contributivo
  - ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado
  - ☐ A. Mismo Régimen
  - ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del traslado de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Fecha de Nacimiento: Día	Mes	Año	Fecha de Radicación	42. Fecha
☐☐☐☐☐☐☐☐						09 08 2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado (Código)	45. Caja de Compensación Familiar a Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de disponibilidad económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- ☐ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y entregue datos y copia de la historia clínica del solicitante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☐ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- ☐ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, apoderado o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Angie Monsalve.	

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CR ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ AC ☐ — Total: ☐
- ☐ 57. Copia del dictamen de invalidez permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- ☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- ☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- ☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- ☐ 62. Documento que conste la calidad de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o la orden de afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos funcionario que realiza la radicación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
☐☐☐☐☐		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Número preradicado
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.100.963.525**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1095940612
Nombre:	ALONSO MANCILLA ESTUPIÑAN
Fecha Retiro:	02/08/2023
Fecha hora transacción:	26/9/2023 9:54:58 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1098765333
Nombre:	YULY MELISA SUAREZ TABORDA
Fecha Retiro:	29/08/2023
Fecha hora transacción:	26/9/2023 9:53:23 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	INGRESO PILA
Centro de trabajo	CTRAB 005

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677862	6	CONSORCIO SANTANDER	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO SANTANDER (BCA)	CCALE 57 NO 12- 03	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	20230828095525930207	9455550768	E	2023/08/15	2023/08/28	BANCO AV VILLAS	13	$13,714,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SUCURSAL BUCARAMANGA (38 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: SUCURSAL BUCARAMANGA (38 Afiliados)																														
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (38 Afiliados)																														
1	CC	91519124	ALARCON AFANADOR NICOLAS	X																	23030 1	5	EPS005	5	CCF39	5	14-4	5	6.960%	5	Si
2	CC	91477841	ALARCON AFANADOR OSCAR JAVIER																		23030 1	30	EPS041	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
3	CC	1096242788	AMARIZ PEREZ CRISTIAN FERNANDO	X																	23030 1	26	EPS041	26	CCF39	26	14-4	26	6.960%	26	Si
4	CC	1095953039	AYALA SANMIGUEL LEIDY ANDREA																		25-14	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
5	CC	1007218221	BENAVIDES MIRANDA ELIECER DARIO	X	X																23030 1	10	ESSC24	10	CCF39	10	14-4	10	6.960%	10	Si
6	CC	1234339539	BERBESI MERCHAN DIEGO ANDRES	X																	23030 1	6	ESSC24	6	CCF39	6	14-4	6	6.960%	6	Si
7	CC	91494372	CACERES CARRILLO MIGUEL ANGEL																		23100 1	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
8	CE	7120330	CACERES CASTRO YACKSON ARISTIDES	X	X																23030 1	6	ESSC24	6	CCF39	6	14-4	6	6.960%	6	Si
9	CC	13275949	CARRASCAL DURAN EVER ANTONIO																		25-14	30	EPS041	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
10	CC	1098678191	CASTRO ARAQUE MAURICIO		X																23030 1	27	EPS005	27	CCF39	27	14-4	27	6.960%	27	Si
11	CC	17575151	CASTRO TORRES RAUL CLAVINO		X																	0	ESSC24	27	CCF39	27	14-4	27	6.960%	27	Si
12	CC	1098790946	CRISTANCHO CRISTANCHO LINA MARIA		X																23100 1	8	EPS037	8	CCF39	8	14-4	8	6.960%	8	Si
13	CC	1098663816	GARCES ORTEGA YEISON ANDRES																		23030 1	30	EPS002	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
14	CC	91229173	GARCIA HERNANDEZ DAVID	X																	23030 1	5	EPS042	5	CCF39	5	14-4	5	6.960%	5	Si
15	CC	91519899	GOMEZ DELGADO CESAR ANTONIO																		25-14	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
16	CC	1095800217	HERNANDEZ AGUILLON RICARDO																		23030 1	30	EPS002	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
17	CC	1232890403	HIGUERA ESTEBAN YEISON DUVAN																		25-14	30	EPS010	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
18	CC	1007712253	LAGUNA GOMEZ JOSE ARMANDO																		23020 1	30	EPS002	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
19	CC	1095940612	MANCILLA ESTUPIÑAN ALONSO																		23030 1	30	EPS010	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
20	CC	91255617	MANTILLA PARRA HENRY	X																	25-14	25	ESSC24	25	CCF39	25	14-4	25	6.960%	25	Si
21	CC	1098711570	MANTILLA SUPELANO TATIANA GERALDINE		X																23030 1	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
22	CC	91489177	MARTINEZ QUINTERO EDGAR																		25-14	30	EPS005	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
23	CC	91295674	MEJIA CRISTANCHO LUIS EDUARDO																		23020 1	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si

24	CC	91263099	MENDOZA GUERRERO AMAURY																		25-14	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
25	CC	1232890758	MENDOZA FLOREZ ARMANDO																		230301	30	EPS005	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
26	CC	79330879	MONTAÑEZ MORA ERNESTO		X																25-14	30	EPS005	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
27	CC	1091135202	MUÑOZ ORTEGA JAIME																		230301	30	EPS002	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
28	CC	1047341782	NARANJO GRAJALES DAINER MAKEIMIS																		230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
29	CC	1052963666	NARANJO VELILLA LUIS MIGUEL																		230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
30	CC	1098794707	PARADA NAVARRO OSCAR ALIRIO																		25-14	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
31	PT	1265732	PEÑA PEÑA SIMON GREGORIO																		230301	30	EPS002	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
32	CC	18918792	QUINTERO QUINTERO OMAR ALFONSO																		230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
33	CC	1098720790	SERRANO VARON KELLY JOHANA		X																230301	30	ESSC24	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
34	CC	1098620599	SUAREZ CARREÑO BERNARDO																		25-14	30	EPS005	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
35	CC	1098765333	SUAREZ TABORDA YULI MELISA																		230301	30	EPS037	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
36	CC	1026559257	TARAZONA ZAMBRANO ALEXANDER	X	X																230301	23	EPS005	23	CCF39	23	14-4	23	6.960%	23	Si
37	CC	1096254152	URIETA RAMOS CRISTIAN DAVID	X	X																230301	11	EPS002	11	CCF39	11	14-4	11	6.960%	11	Si
38	CC	1090363692	VELANDIA TORRES LAYDE ILIANA																		230301	30	EPS005	30	CCF39	30	14-4	30	6.960%	30	Si
Total		**Afiliados(38)**																														

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677862	6	CONSORCIO SANTANDER	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO SANTANDER (BCA)	CCALE 57 NO 12- 03	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	20230828095525930207	9455550768	E	2023/08/15	2023/08/28	BANCO AV VILLAS	13	$13,714,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$6,903,200	$101,100	$0	$7,004,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$271,000	$4,000	$0	$275,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,458,700	$36,000	$0	$2,494,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$3,802,300	$55,600	$0	$3,857,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$5,500	$0	$376,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,077,200	$45,000	$0	$3,122,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	38	$3,077,200	$45,000	$0	$3,122,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,768,000	$25,900	$0	$1,793,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	38	$1,768,000	$25,900	$0	$1,793,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$1,768,000	$26,200	$0	$1,794,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$7,800	$200	$0	$8,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$207,400	$3,100	$0	$210,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$622,200	$9,100	$0	$631,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$133,100	$2,000	$0	$135,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$254,700	$3,800	$0	$258,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$450,000	$6,600	$0	$456,600
TOTAL				**38**	**$13,516,400**	**$198,200**	**$0**	**$13,714,600**

CS Consorcio Santander	PAGO DE NOMINA	Codigo	
		Fecha	
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PAGO SALARIO - AGOSTO	FIRMA
1	Yeison Andrés Garces Ortega	1.096.663.816	Gerente de Proyectos	SI [X] NO [ ]	
2	Ernesto Montañes Mora	79.330.879	Director de obra	SI [X] NO [ ]	
3	Angie Lorena Monsalve Ordoñez	79.330.879	Director de obra	SI [X] NO [ ]	
4	Layde Ilana Valandia Torres	1.090.369.692	Residente de obra	SI [X] NO [ ]	
5	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	1.095.959.009	Profesional social	SI [X] NO [ ]	
6	Bernardo Suarez Carreño	1.096.630.599	Inspector HSEQ	SI [X] NO [ ]	
7	Oscar Alirio Parada Navarro	1.098.794.707	Inspector de obra	SI [X] NO [ ]	
8	Yuli Melisa Suarez Taborda	1.098.765.333	Inspector de obra	SI [ ] NO [X]	
9	Kevin Farid Rodrigues Sarmiento	1.103.471.378	Inspector de obra	SI [X] NO [ ]	
10	Anhaury Mendoza Guerrero	91.263.099	Inspector Auxiliar	SI [X] NO [ ]	
11	Dalner Makolmis Naranjo Gnajales	1.047.341.782	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
12	Simon Gregorio Peña Peña	1.265.732	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
13	Luis Eduardo Mejia Cristancho	91.295.674	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
14	David García Hernandez	91.229.173	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
15	Brayan Smith Rey Noriega	1,098,786,346	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
16	Luis Alberto Florian Chamorro	1,095,590,063	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
17	Omar Alfonso quintero Quintero	18.918.782	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
18	Jose Armando Laguna Gomez	1.007.712.253	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
19	Luis Miguel Naranjo Vellla	1.052.963.666	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
20	Oscar Javier Alarcon Afanador	91.477.841	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
21	Ever Antonio Carrascal Duran	13.275.949	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
22	Jaime Muñoz Ortega	1.091.135.202	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
23	Cristian Fernando Amariz Perez	1.096.242.788	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
24	Nicolas Alarcón Afanador	91.519.124	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
25	Yeison Duvan Higuera Esteban	1.232.890.403	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
26	Edgar Martinez Quintero	91.489.177	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
27	Ricardo Hernandez Agullon	1.095.800.217	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
28	Henry Mantilla Parra	91.255.617	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
29	Diego Andres Berbesi Merchan	1.234.339.539	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
30	Miguel Angel Caceres Carrillo	91.484.372	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
31	Edinson Prado Paterina	1.098.712.615	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	

33	Jose Rios León	1.098.686.573	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	Jos Rios
33	Armando Mendoza Florez	1.232.890.758	Ayudante de Obra (BOAL)	SI [X] NO [ ]	Armando M.
34	Alonso Manzilla Estupiñan	1.095.940.613	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Alonso M
35	Omar Larrota Garcia	1.095.804.014	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Omar L
36	Jerson David Ospino Gomez	1.005.325.662	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
37	Germani Diaz Mojano	91.495.275	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
38	Helder Alexis Villamizar Diaz	1.092.343.342	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	ALEX
39	Cesar Antonio Gomez Delgado	91.518.899	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	Cesar Delgado
40	Jose Roman Espinosa Bautista	5.685.373	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Jose Roman Espinosa

CS Consorcio Santander	**CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONSORCIO SANTANDER**	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/05/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

CONTRATISTA CONSORCIO SANTANDER
NIT 901.677.862-6
CONTRATO No. 022 de 2023
OBJETO ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (Nomina , CPS.Otro)	SALARIO ($)	% DEDICACION	DIAS LABORADOS - NOMINA	DIAS LABORADOS - APORTES	MES FACTURADO	IBC (SEGUN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	PENSION (16%)	SALUD (4%)	CCF (4%)	ARL (6,96%)	PARAFISCALES (0%)	TOTAL
Alarcon Nicolas	91.519.124	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	5	5	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	193.334	31.000	7.800	7.800	13.500	-	60.100
Alarcon Oscar	91.477.841	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Amariz Perez Cristian	1.098.714.150	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	26	26	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.005.334	160.900	40.300	40.300	70.000	-	311.500
Ayala Sanmiguel Leidy Andrea	1.095.953.039	Profesional social	NOMINA	2.800.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.800.000	9455550768	2.800.000	448.000	112.000	112.000	194.900	-	866.900
Benavides Miranda Eliecer	1.007.218.221	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900
Berbesi Merchan Diego	1.234.339.539	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	6	6	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	232.000	37.200	9.300	9.300	16.200	-	72.000
Caceres Miguel Angel	91.494.372	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Caceres Castro Yackson	7.120.330	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	6	6	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	232.000	37.200	9.300	9.300	16.200	-	72.000
Carrascal Duran Ever Antonio	13.275.949	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Castro Mauricio	1.098.678.191	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	27	27	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.044.000	167.100	41.800	41.800	72.700	-	323.400
Castro Raul	17.575.151	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	27	27	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.044.000	-	41.800	41.800	72.700	-	156.300
Cristancho Cristancho Lina María	1.098.790.946	Inspector de obra	NOMINA	2.000.000	100%	8	8	JUNIO-JULIO	2.000.000	9455550768	533.334	85.400	21.400	21.400	37.200	-	165.400
Garces Ortega Yeison Andrés	1.098.663.816	Gerente de Proyectos	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.300.000	9455550768	1.300.000	208.000	52.000	52.000	90.500	-	402.500
Garcia Hernandez David	91.229.173	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	5	5	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	193.334	31.000	7.800	7.800	13.500	-	60.100
Gomez Delgado Cesar Antonio	91.519.899	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Hernandez Ricardo	1.095.800.217	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Higuera Esteban Yeison Duvan	1.232.890.403	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Laguna Gomez Jose Armando	1.007.712.253	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Mancilla Alonso	1.095.940.612	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Mantilla Parra Henry	91.255.617	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	25	25	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	966.667	154.700	38.700	38.700	67.300	-	299.400
Mantilla Tatiana	1.098.711.570	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Martinez Edgar	91.489.177	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Mejia Luis	91.295.674	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Mendoza Guerrero Amaury	91.263.099	Inspector de obra	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Mendoza Flórez Armando	1.232.890.758	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Montañez Mora Ernesto	79.330.879	Director de obra	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.300.000	9455550768	1.300.000	208.000	52.000	52.000	90.500	-	402.500
Muñoz Ortega Jaime	1.091.135.202	Ayudante	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Naranjo Dainer	1.047.341.782	Oficial	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Naranjo Velilla Luis Miguel	1.052.963.666	Ayudante	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Parada Navarro Oscar Alirio	1.098.765.333	Inspector de obra	NOMINA	2.000.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	2.000.000	320.000	80.000	80.000	139.200	-	619.200
Peña Simon	1.265.732	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Quintero Quintero Omar Alfonso	18.918.792	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Rodriguez Kevin	1.103.471.378	Inspector de obra	NOMINA	2.000.000	100%	17	17	JUNIO-JULIO	2.000.000	9456835030	1.133.334	181.400	45.400	45.400	78.900	-	351.100
Serrano Kelly	1.098.720.790	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Suarez Carreño Bernardo	1.098.620.599	Inspector HSEQ	NOMINA	2.500.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.500.000	9455550768	2.500.000	400.000	100.000	100.000	174.000	-	774.000
Suarez Taborda Yuli Melisa	1.098.794.707	Inspector de obra	NOMINA	2.100.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.100.000	9455550768	2.100.000	336.000	84.000	84.000	146.200	-	650.200
Tarazona Zambrano Alexander	1.026.559.259	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	23	23	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	889.334	142.300	35.600	35.600	61.900	-	275.400
Urieta Ramos Cristian David	1.095.907.356	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	11	11	JUNIO-JULIO	1.160.000	9455550768	425.334	68.100	17.100	17.100	29.700	-	132.000
Velandia Torres Layde Iliana	1.090.363.692	Residente de obra	NOMINA	3.000.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	3.000.000	9455550768	3.000.000	480.000	120.000	120.000	208.800	-	928.800
																	$ 13.867.500
											$ 45.318.672	$ 7.084.600	$ 1.813.400	$ 1.813.400	$ 3.156.100	$ -	$ 13.867.500

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/08/2023	COMO RECONOCER CUANDO ALGUIEN ESTA ALEGRE O ENOJADO	29	5 – 10 min
2/08/2023	INDUCCIÓN / PROTECCION EN LOS PIES	35	50 min
3/08/2023	INDUCCIÓN / DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	35	50 min
4/08/2023	LEVANTAMIENTO - LESIONES DE ESPALDA	35	5 – 10 min
5/08/2023	COMUNICACIÓN DE PELIGROS	35	5 – 10 min
6/08/2023	DOMINGO		
7/08/2023	DIA NO LABORAL		
8/08/2023	HERRAMIENTAS	35	5 – 10 min
9/08/2023	INTRODUCCIÓN / RCP	36	5 – 10 min
10/08/2023	PROBLEMAS INSTESTINALES - COMO PREVENIRLOS	36	5 – 10 min
11/08/2023	HIGIENE DEL SUEÑO	36	5 – 10 min
12/08/2023	REGLAS DE ORO	36	5 – 10 min
13/08/2023	DOMINGO		
14/08/2023	HIDRATACION	36	5 – 10 min
15/08/2023	INDUCCIÓN / TIEMPOS DE DESCANSO	37	50 min
16/08/2023	PUNTOS DE ANCLAJE	37	5 – 10 min
17/08/2023	BOTAS DE SEGURIDAD	37	5 – 10 min
18/08/2023	SEGURIDAD AL CAMINAR, TROTAR O CORRER	37	5 – 10 min
19/08/2023	USO CORRECTO DE EPP	37	5 – 10 min
20/08/2023	DOMINGO		
21/08/2023	DIA NO LABORAL		
22/08/2023	PERMISO LABORAL		
23/08/2023	MEDIDAS DE SEGURIDAD AL CIRCULAR POR LA CALLE	37	5 – 10 min
24/08/2023	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXÍLIOS	37	5 – 10 min
25/08/2023	INDUCCIÓN / HIGIENE PERSONAL	38	50 min
26/08/2023	ACCIDENTE - DEFINICIÓN	38	5 – 10 min
27/08/2023	DOMINGO		
28/08/2023	OBESIDAD Y SOBREPESO - PAUSA ACTIVA	38	5 – 10 min
29/08/2023	ALCOHOLISMO	37	5 – 10 min
30/08/2023	COMUNICACIÓN ASERTIVA	37	5 – 10 min
31/08/2023	COMO LAVERSE LAS MANOS	37	5 – 10 min

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 09 AL 09 DE Agosto	Lugar: Oficina	Duración: 50 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	X
CHARLA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gamboa	1.098.620.799	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Angie Lorena Morales Ordoñez	1.100.963.525	Director De Obra
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 31 AL 5 DE Agosto	Lugar: Universidad Cll 9A	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN	X	MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Garcia	1098620729	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Omar Quintero	18918792	Ayudante
2	Jose Armando Lozano	1007712253	Oficial
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 7 AL 12 DE Agosto	Lugar: Universidad Cll 9A	Duración: 5-10min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suarez Garcia	1098610771	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Jose Laguna	1007712253	Oficial
2	Omar Quintero	1091687992	Ayudante
3	Nicolas Alarcón	Oficial	91579124
4	Oscar Narcin	91477841	Ayudante
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1		Jose Laguna	Jose Laguna	Jose Laguna		
2		Omar	Omar	Omar		
3		Nicolas	Nicolas	Nicolas		
4		Oscar	Oscar	Oscar		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN	

[Multiplicar N° total de participantes por duración en horas]

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 31 AL 5 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cra 33a	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Garcia	1098610569	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Jaime Muñoz	1091135202	Oficial
2	Luis Edo Mejia	91295674	Ayudante
3	Alonso Morella	1095940612	Ayudante
4	Daiver Naranjo	1047341782	Oficial
5	Simon Peña	1265732	Ayudante
6	David Garcia	91229173	Ayudante
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA
3	Alonso M					
4	Daiver	Daiver	Daiver	Daiver	Daiver	Daiver
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 7 AL 12 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cra 33c	Duración: 5- 10m
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sigifredo Cantero	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Luis Mejia	91295674	Ayudante
2	Daiver Naranjo	1097341782	Oficial
3	David Garcia	91229173	Ayudante
4	Jaime Murgas	1091135201	Oficial
5	Simon Peña	1265732	Ayudante
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1		LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA	LUIS MEJIA
2		Daiver	Daiver	Daiver	Daiver	Daiver
3		DEH	DEH	DEH	DEH	DEH
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2021
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 14 AL 19 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cra 33a	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carrero	1098635956	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dainer Naranjo	1047341782	Oficial
2	Simon Peña	1265732	Ayudante
3	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
4	Luis Mejia	91295674	Ayudante
5	David Garcia	91229173	Ayudante
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer	Dainer
2	Simon	Simon	Simon	Simon	Simon	Simon
3	JL	JL	JL	JL	JL	JL
4	Luis MEJIA	Luis MEJIA	Luis mejia	Luis mejia	Luis MEJIA	Luis mejia
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	
		(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 21 AL 26 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cra 33c	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carrasco	1098610594	ASEO	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Simon Pena	1265732	Ayudante
2	Luis Mejia	91295674	Ayudante
3	Danner Naranjo	1097391782	Oficial
4	David Garda	91220173	Ayudante
5	Jaime Muñoz	1091135201	Oficial
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2		Luis Mejia	Luis Mejia	Luis Mejia	Luis Mejia	
3		Danner	Danner	Danner	Danner	
4		DGH	DGH	DGH	DGH	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	
		(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 7 AL 12 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cra 20	Duración: 3 - 10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carreño	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Cesar Esmeral	91519879	Oficial
2	Gistian Amaya	1096242788	Ayudante
3	Duvan Higuera	1232890403	Ayudante
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1					CESAR	CESAR
2					YEISON	YEISON
3					Cristian	Cristian
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 14 AL 19 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Cuevas Gomez	1098620899	HSEQ	Bernardo Cuevas Gomez

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Dylan Higuera	1232810403	Ayudante
2	Cesar Gomez	91519899	Oficial
3	Cristian Amaya	1096247788	Ayudante
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	YELSON	YELSON	YELSON	YELSON	YELSON	YELSON
2	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR
3	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 21 AL 26 DE Agosto	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Brayan Sánchez Correa	1098620199	HSEQ	Brayan Sánchez

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	César Gomez	91519899	Oficial
	LUNES: / MARTES: CESAR	MIERCOLES: CESAR / JUEVES: CESAR	VIERNES: CESAR / SABADO: CESAR
2	Dulon Higuera	1232890403	Ayudante
	LUNES: / MARTES: Yeison	MIERCOLES: YEISON / JUEVES: Yeison	VIERNES: YEISON / SABADO: YEISON
3	Cristian Amaya	1096242788	Ayudante
	LUNES: / MARTES: Cristian	MIERCOLES: Cristian / JUEVES: Cristian	VIERNES: Cristian / SABADO: Cristian
4	Brayan Noriega	1098786396	Oficial
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: Brayan / SABADO: Brayan
5	Luis Florian	1065590063	Oficial
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: Luis Florian / SABADO: Luis Florian
6	Omar Lancheta	1095804014	Ayudante
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: Omar Lancheta / SABADO: Omar Lancheta
7	Jose Ramón Espinosa	5685373	Ayudante
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
8	Jerson David Ospino	1005325662	Ayudante
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
9	Heder Alexis Villamizar	1092343342	Ayudante
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: ALEX / SABADO: ALEX
10	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 28 AL 02 DE Agosto-Sept	Lugar: San Alonso Cll 20	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Deiner Naranjo	1047341782	Oficial
2	Luis Mejia	91295674	Ayudante
3	Edwar Muñoz	1091135201	Oficial
4	Simon Reis	1265732	Ayudante
5	David Gerardo	91129173	Ayudante
6	Luis Florian	1065590063	Oficial
7	Jose Espinosa	5685373	Ayudante
8	Brayan Narenjo	1098786346	Oficial
9	Omar Lamota	1095804074	Ayudante
10	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2						
3						
4						
5	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 31 AL 5 DE Agosto	Lugar: Chapinero	Duración: 5 HORAS
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carreño	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Edgar Martinez	91489177	Oficial
2	Ricardo Hernandez	1095800217	Ayudante
3	Henry Mantilla	91255617	Ayudante
4	Diego Barbosa	1234339539	Ayudante
5	Miguel Caceres	91494372	Ayudante
6	Carmen Diaz	91495273	Oficial
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1						
2	R.H.A	B.H.A.	B.H.A.	B.H.A.	B.H.A.	B.H.A.
3						
4	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	
		(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 7 AL 12 DE Agosto	Lugar: Chapinero	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Ricardo Sierra Gomez	1098620779	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Ricardo Hernandez	1095800277	Ayudante
	LUNES: / MARTES: RHA	MIERCOLES: R.H.A. / JUEVES: R.H.A.	VIERNES: R.H.A. / SABADO: R.H.A.
2	Diego Barbosa	1234339539	Ayudante
	LUNES: / MARTES: Diego B	MIERCOLES: Diego B / JUEVES: Diego B	VIERNES: Diego B / SABADO: Diego B
3	Edgar Martinez	91489177	Oficial
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
4	Miguel Cadres	91494372	Ayudante
	LUNES: / MARTES: Miguel	MIERCOLES: Miguel / JUEVES: Miguel	VIERNES: Miguel / SABADO: Miguel
5	German Diaz	91495273	Oficial
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
6	Harry Montilla	91255619	Ayudante
	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
7	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
8	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
9	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
10	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 14 AL 19 DE Agosto	Lugar: Cliente	Duración: 3-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suarez Gomez	1098607FA	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Diego Barbesi	1234339539	Ayudante
2	Miguel Gordo	91494372	Ayudante
3	Ricardo Hernandez	1095800217	Ayudante
4	Garcon Diaz	91495273	Oficial
5	Harry Montilla	91255617	Ayudante
6	Edgar Martinez	91489877	Oficial
7	Jose Rios Leon	1098686573	Oficial
8			
9			
10			

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B
miguel	miguel	miguel	miguel	miguel	miguel
RHA	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA
Harry M	Harry M	Harry M	Harry M	Harry M	Harry M
	JOSE	JOSE	JOSE	JOSE	JOSE

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 21 AL 26 DE Agosto	Lugar: Chapinero	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Garcia	1098620746	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO					
1	Edison Prado	1098712615	Oficial					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
					Edison	Edison		
2	Carmen Diaz	91495273	Oficial					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
3	Miguel Angel Caceres	91494372	Ayudante					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
4	Diego Berbesi	1234339539	Ayudante					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
		Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B		
5	Henry Martinez	9125567	Ayudante					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
6	Ricardo Hernandez	1095800217	Ayudante					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA		
7	Jose Rios	1098686573	Oficial					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
8	Edgar Martinez	91489117	Oficial					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
9	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
10	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 29 AL 2 DE Agosto - Sept.	Lugar: Chapinero	Duración: 3 h 10 min y 5
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gomez	1098620795	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Miguel Goos	91491372	Ayudante
2	Henry Montilla	91235617	Ayudante
3	Jose Rios	1095685573	Oficial
4	German Diaz	91495273	Oficial
5	Edison Prado	1098712615	Oficial
6	Diego Berbesi	1234 33953A	Ayudante
7	Edgar Martinez	91487771	Oficial
8	Ricardo Hernandez	1095E00217	Ayudante
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
2	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry
3	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
4						
5	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	Edison
6	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B
7						
8	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 31 AL 5 DE Agosto	Lugar: Aeroc.	Duración: 1:3 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Correo	1093610599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Heidi Villamizar	1092343342	Ayudante
2	Brayan Nonier	1098786346	Oficial
3	Yeison Ospino	1005325662	Ayudante
4	Luis Florian	1065596063	Oficial
5	Jose R Espinoza		
6	Omar Lobato		
7	Cesar Gomez	91519899	Oficial
8	Cristian Arenis	1096242788	Ayudante
9	Duvan Higuera	1232890403	Ayudante
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1			ALEX	ALEX	ALEX	ALEX
2			Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
3						
4			Luis Flores	Luis Flores	Luis Flores	Luis Flores
5			Jose	Jose	Jose	Jose
6			Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
7	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR
8	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
9	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 7 AL 12 DE Agosto	Lugar: Aurora	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carreño	1098620599	HSEQ	Bernardo Suárez Carreño

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Brayan Noriega	1098786346	Oficial		Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
2	Jose Espinosa				Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
3	Cesar Gomez	91519899	Oficial		CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR
4	Heider Villamizar	1092343342	Ayudante		AIEX	AIEX	AIEX	AIEX	AIEX
5	Yerson Ospino	1005325662	Ayudante						
6	Dixon Higuera	1232896403	Ayudante		YEISON	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON
7	Luis Florian			X	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian	Luis Florian
8	Omar Larrota	1095804014	Ayudante		Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
9	Cristian Amaya	1096292788	Ayudante		Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
10									

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 14 AL 19 DE Agosto	Lugar: Aurora	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Garzón	1098610554	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Helder Villamizar	1092343342	Ayudante
2	Brayan Narreco	1098186346	Oficial
3	Yerson Ospino	1005329662	Ayudante
4	Luis Florian	1065596063	Oficial
5	Jose R. Espinosa		
6	Omar Larrota		
7	Cesar Gomez		
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ALEX	ALEX	ALEX	ALEX	ALEX	ALEX
2	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
3						
4	Luis F	Luis F	Luis F	Luis F	Luis F	Luis F
5	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge
6	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L	Omar L
7	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 21 AL 26 DE Agosto	Lugar: Aurora	Duración: 5-10 m.n
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Carrillo	1098.670.596	HSEQ	Bernardo Sierra Carrillo

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Bryan Noriega		
2	Jose Espinosa		
3	Cesar Gomez		
4	Heider Villamizar		
5	Yerson Ospino		
6	Yeison Duran		
7	Omar Larreta		
8	Luis Florian		
9	Cristian Arroyo		
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1		Bryan	Bryan			
2		Jose	Jose			
3		CESAR	CESAR			
4		ALEX	ALEX			
5		Yerson	Yerson			
6		YEISON	YEISON			
7		Omar	Omar			
8		Luis F	Luis F			
9		Cristian	Cristian			
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será unicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	02/08/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Ayudante & Oficial

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: Virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECÁNICOS	X
FÍSICOS: temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: Sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Brayan Noriega	1.098.786.346	
Luis Florian	1.065.590.063	
Omar Lovera	1.095.804.014	
Jose Ramon Espinoza	5.685.373	
Jerson Ospino	1005.325662	
Heider Villamizar	1.092.343.342	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificacion se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será unicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACION DE RIESGOS se realizara previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaru que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	03/08/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECÁNICOS	X
FÍSICOS: temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. perf.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Cristian Diaz Mojica	91495273	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será unicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	09/08/2023
ACTIVIDAD	Administrativo & obra
CARGO	Director obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	MOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS: temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: Vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT:	X	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT:		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Angie Lorena Monsalve Bedoya	1.100.963.525	

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será unicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	15/08/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Oficial

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECÁNICOS	X
FÍSICOS: temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. AUT. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.	X	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
JOSE RIOS	1078580973	JOSE K

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será unicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	25/08/2023
ACTIVIDAD	Obra
CARGO	Oficial

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS: virus	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS: ruido	X	DE SEGURIDAD: MECÁNICOS	X
FÍSICOS: temp ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS: vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS: mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES: SISMO	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT:	X	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT:		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Edinson Prado	1098712615	Edinson Prado

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - x. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - x. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - x. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - x. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - x. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - x. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - x. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - x. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - x. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - x. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - x. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Brayan Navarro

FIRMA DEL TRABAJADOR 1098786346

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/09/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debo tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Luis Gomez 1.065.590.063

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2019
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Omar Londoño García
FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

[illegible] 5665393

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - x a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - x b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - x d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - x e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - x a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - x b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - x c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - x d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - x a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - x a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELÉCTRICIDAD
   - x b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

1 005 325 662

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.4

HEIDER ALEXIS VILLAMIZAR D.
FIRMA DEL TRABAJADOR 1.092.343.342

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 03/08 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.7

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 15/08 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - x a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - x b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - x d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - x e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - x a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - x b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - x c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - x d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - x a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - x a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - x b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 25/08 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - x a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - x b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - x d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - x e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - x a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - x b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - x c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - x d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - x a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - x a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - x b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Edinson Pardo

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 09 Agosto de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - x a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - x b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - x d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - x e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - x a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - x b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - x c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - x d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - x a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - x a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - x b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.434

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
02 DÍA	06 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
REY NORIEGA BRAYAN SMITH	MASCULINO	26 AÑOS 11 MESES 7 DÍAS	CC (Tipo)	1098786346 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

OFICIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
		CONTROL DE PESO
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** REY NORIEGA BRAYAN SMITH
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 1098786346

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.368

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	05 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
FLORIAN CHAMORRO LUIS ALBERTO	MASCULINO	36 AÑOS 1 MESES 26 DÍAS	CC (Tipo)	1065590063 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** FLORIAN CHAMORRO LUIS A
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 1065590063

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0

Carrera 32 No. 35 - 28 Bucaramanga Cel. 315 214 5280 Tel. 6344815643
Carrera 35 # 32-72 Bucaramanga Cel. 317 608 7077 Tel. 6395525
saludintegralsantander@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.367

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	05 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
LARROTA GARCIA OMAR	MASCULINO	34 AÑOS 4 MESES 9 DÍAS	CC (Tipo)	1095804014 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** LARROTA GARCIA OMAR
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 1095804014

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 7.057

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
01 DÍA	08 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
DIAZ MOYANO GERMAN	MASCULINO	46 AÑOS 5 MESES 1 DÍAS	CC (Tipo)	91495273 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RESTRICCIONES

Observaciones: *ALZAR PESO HASTA 10 KILOS*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
BIOMECANICAS	TEMPORAL	HASTA CORRECCION QUIRUGICA ALZAR PESO HASTA 10 KILOS

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO		
VALORACIÓN POR EPS		

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

USO DE LENTES , CONTROL ANUAL CON OPTOMETRIA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	Firma:
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	Nombre: DIAZ MOYANO GERMAN
R. M.: 12072 L.S.O.: 19379	CC: 91495273

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0

Carrera 32 No. 35 - 32 Bucaramanga Cel. 315 214 5280 Tel. 6344515643
Carrera 35 # 32-72 Bucaramanga Cel. 317 608 7077 Tel. 6996525
Floridablanca Barrancabermeja
email: saludintegralsantander.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 7.240

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
22 DÍA	08 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
PRADO PATERMINA EDINSON	MASCULINO	32 AÑOS 3 MESES 5 DÍAS	CC (Tipo)	1098712615 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico		Aspirante o Trabajador	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	Nombre:	PRADO PATERMINA EDINSON
R. M.:	12072 L.S.O.: 19379	CC:	1098712615

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 7.181

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
14 DÍA	08 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
CONSORCIO SANTANDER	**CONSORCIO SANTANDER**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RIOS LEON JOSE	MASCULINO	45 AÑOS 3 MESES 15 DÍAS	CC Tipo	1098686573 Número
	Teléfonos			

Cargo

OFICIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico		**Aspirante o Trabajador**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:**	RIOS LEON JOSE
R. M.:	12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:**	1098686573

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.362

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	05 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ESPINOZA BAUTISTA JOSE ROMAN	MASCULINO	45 AÑOS 9 MESES 17 DÍAS	CC Tipo	5685373 Número
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

USO DE MEDIDAS ANTIVARICES


Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** ESPINOZA BAUTISTA JOSE R
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 5685373

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.366

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	05 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
OSPINO GOMEZ JERSON DAVID	MASCULINO	21 AÑOS 7 MESES 18 DÍAS	CC Tipo	1005325662 Número
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	N/A

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA

R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: OSPINO GOMEZ JERSON DAVID

CC: 1005325662

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.495

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
06 DÍA	06 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
VILLAMIZAR DIAZ HEIDER ALEXIS	MASCULINO	34 AÑOS 10 MESES 2 DÍAS	CC (Tipo)	1092343342 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

CONTRAMAESTRO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RESTRICCIONES

Observaciones: *ALZAR PESO HASTA 10 KILOS*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
BIOMECANICAS	TEMPORAL	HASTA CORRECCION QUIRUGICA ALZAR PESO HASTA 10 KILOS

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	
	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 10 KILOS	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** VILLAMIZAR DIAZ HEIDER ALEXIS
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 1092343342

SAINSA IPS

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-0

Carrera 32 No. 35 - 28 Bucaramanga Cel. 315 214 5280 Tel. 6976515
Carrera 35 # 32-72 Bucaramanga Cel. 317 608 7071 Tel. 6996525
saludintegralsantander@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 7.110

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
04 DÍA	08 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MONSALVE ORDOÑEZ ANGIE LORENA	FEMENINO	30 AÑOS 1 MESES 5 DÍAS	CC (Tipo)	1100963525 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

DIRECTOR DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	SVE VISUAL	CONTROL DE PESO
	SVE CARDIOVASCULAR	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL.
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

USO DE LENTES , CONTROL ANUAL CON OPTOMETRIA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA

R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MONSALVE ORDOÑEZ ANGIE LORENA

CC: 1100963525

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 02 de Agosto de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Alonso Morgllo Estupiñan identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.095.040.612, quien trabajó en la empresa hasta el dia 02 de Agosto de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante Obra

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	x
Audiometría	x
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Alonso M

Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 29 de Agosto de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Melisa Sierra Taborda, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.765.333, quien trabajó en la empresa hasta el día 29 de Agosto de 2023, desempeñando como último cargo el de Inspector Obra.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	X

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Universidad Gallo 9A

Semana: Del 1 al 5 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Escribir)	Firma
Jose Laguna 1007712253	Jose Laguna

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Anotar cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies salientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguie
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Escribir)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Universidad Calle 9A

Semana: Del 7 al 12 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Legus 1007712253	Jose Legus

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos básicos de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Avenida Calle 31

Semana: Del 1 al 5 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez 91519698	Cesar Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidros	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitaoin, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revises controles y responda lo siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Avenida Calle 31

Semana: Del 7 al 12 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez 91.519.896	Cesar Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Electricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticos		
Hidráulicos		
Rastreras		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguie
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, replicando los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, procede con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.820.589	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Aurora Calle 31

Semana: Del 14 al 19 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez 91.519.899	Cesar Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos básicos de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda lo siguiente
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemento los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.095.920.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Aurora Calle 31

Semana: Del 21 al 26 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Laguna 1007112253	Jose Laguna

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicos		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies salientes, objetos flosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguien

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cra 33a

Semana: Del 1 al 5 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	Jaime Muñoz

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguie

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.820.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cra 33a

Semana: Del 7 al 12 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135302	Jaime Muñoz

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Electricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revise controles y responda lo siguiente
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cra 33c

Semana: Del 14 al 18 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	Jaime Muñoz

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros evidentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, delegarse y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Cra 33c

Semana: Del 21 al 26 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz 1091135202	Jaime Muñoz

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies salientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Calle 20

Semana: Del 7 al 12 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez 91519899	CESAR Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguien

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulta al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Ejecutor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Calle 20

Semana: Del MA al 15

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez 91519589	Cesar Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, realice controles y responda la siguien
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☒ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.589	BernardoSuarezCarreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Calle 20

Semana: Del 21 al 26

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Emma 91519899	Cesar Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Eléctricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticos		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosas, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.509	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: San Alonso Calle 20

Semana: Del 28 al 02 Agosto - Septiembre

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez 91579879	Cesar Gomez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos vas a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revise controles y responda la siguiente
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.520.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 1 al 5 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez 1095800071	R.H.A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicos		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de rodadar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado al paso a paso, revisen controles y responda la siguiente
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☒ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Evaluar)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chepiado

Semana: Del 7 al 12 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Herrera 1095800217	R.H.A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen fosos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEG-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 14 al 19 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Armando Ibañez Ortiz	R.H.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda lo siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 21 al 25 Agosto

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez 1095802217	R.H.G.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoídos de copa
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidora	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.068.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: Chapinero

Semana: Del 28 al 2 Agosto - Septiembre

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro
- Compactación con rana

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez 1095802217	F.N.A.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR, PLACA VIBRADORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor, placa vibradora
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies salientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender placa	Aplastamiento	Fractura	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revise controles y responda la siguiente
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jose Laguna | SEMANA: DEL 1- AL 5 Agosto Universidad Cil 9A

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		B	M	C	B	M	C	B	M	C	B	M	C	B	M	C	B	M	C			

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	15/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jose Laguna | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Universidad CIDA

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X											
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X											
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X											
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X											
	Se tiene protector de disco				X			X			X											
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X											
	El trabajador es capacitado				X			X			X											
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X											
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X											
	Cuenta con protección visual				X			X			X											
	Cuenta con protección para manos				X			X			X											
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X											
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X											
VERIFICACIÓN DIARIA					BuenaC			BuenaC			BuenaC											

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Anexo 01 31

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		B			B			B			B			B			B					

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeto

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-034
		Fecha	15/09/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Aunque el 31

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco				X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado				X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos				X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA					Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

Fuera de servicio: Sí ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Barranca Suárez Gmeto

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-RO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto Aurora Cll 31

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

V0.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/08/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto Aurora Cll 31

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X														
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X														
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X														
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X														
	Se tiene protector de disco	X			X			X														
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X														
	El trabajador es capacitado	X			X			X														
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X														
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X														
	Cuenta con protección visual	X			X			X														
	Cuenta con protección para manos	X			X			X														
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivos	X			X			X														
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X														
VERIFICACIÓN DIARIA		BarSuG			BarSuG			BarSuG														

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Barardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-HO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto San Alonso Cra 33a

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		BSuárez			BSuárez			BSuárez			BSuárez			BSuárez			BSuárez					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Devalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto San Alonso Cra 33a

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco				X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado				X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos				X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA					BuSuG			BuSuG			BuSuG			BuSuG			BuSuG					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-RO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto San Alonso Cra 33a

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		BuSol			BuSol			BuSol			BuSol			BuSol			BuSol					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto San Alonso Ote 33a

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X								
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X			X								
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X			X								
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X			X								
	Se tiene protector de disco				X			X			X			X								
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X			X								
	El trabajador es capacitado				X			X			X			X								
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X			X								
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X			X								
	Cuenta con protección visual				X			X			X			X								
	Cuenta con protección para manos				X			X			X			X								
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X			X								
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X								
VERIFICACIÓN DIARIA					B. Suárez			B. Suárez			B. Suárez			B. Suárez								

Fuera de servicio: Sí ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gómez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/05/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jose Laguna | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto San Alonso cll 20

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco				X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado				X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos				X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA					BuSal			BuSal			BuSal			BuSal			BuSal					

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmetto

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	15/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 28 AL 02 Agosto-Septiembre San Alonso AIC

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X											
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X											
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X											
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X											
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X											
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X											
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X											
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X											
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X											
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X											
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X											
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X											
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X											
VERIFICACIÓN DIARIA		B			B			B			B											

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

V0.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-024
		Fecha	16/09/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Chaparro

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		B&M			B&M			B&M			B&M			B&M			B&M					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gaviria

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE891

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Cronograma

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco				X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado				X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos				X			✓			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA					B S M O			B S M O			B S M O			B S M O			B S M O					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gaviria

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-814
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto Chapinero

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		B			B			B			B			B			B					

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto Chapinero

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar				X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones				X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre				X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco				X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla				X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado				X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual				X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos				X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas				X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA					BSG			BSG			BSG			BSG			BSG					

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomero

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 28 AL 02 Agosto - Septiembre Chapinero

No.	ITEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		B. Suárez			B. Suárez			B. Suárez			B. Suárez			B. Suárez			B. Suárez					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☑ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Aurora Calle 31

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	BUENO			BUENO			BUENO			BUENO			BUENO			BUENO					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☑ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Aurora Cll 31

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración				X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado				X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre				X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo				X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)				X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.				X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)				X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado				X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado				X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias				X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural				X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ				B Bs			B Bs			B Bs			B Bs			B Bs					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. BOSH — MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Cesar Gomez — SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto Aurora Calle 31

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta roedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	B S C			B S C			B S C			B S C			B S C			B S C					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 1 AL 3 Agosto San Alonso Cra 33a

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta rcpedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	BaSuC			BaSuC			BaSuC			BaSuC			BaSuC			BaSuC					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomeño

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto San Alonso Cra 33c

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración				X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado				X			X			X			X			X					
	Manjles de agarre				X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo				X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)				X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado				X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)				X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado				X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado				X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias				X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural				X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ				Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH — MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Jaime Muñoz — SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto San Alonso Cra 37a

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	BUENO			BUENO			BUENO			BUENO			BUENO			BUENO					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernarda Suárez Gomez

V0.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Jaime Muñoz | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto San Alonso Cra 33a

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración				X			X			X			X								
	Punta ropedora en buen estado				X			X			X			X								
	Manijas de agarre				X			X			X			X								
	Manijas bien sujetas al equipo				X			X			X			X								
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)				X			X			X			X								
	Enchufe eléctrico en buen estado.				X			X			X			X								
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)				X			X			X			X								
	Guarda en buen estado				X			X			X			X								
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado				X			X			X			X								
	Empuñaduras sin fisuras y limpias				X			X			X			X								
	Equipo sin daño estructural				X			X			X			X								
	Buenas condiciones de limpieza				X			X			X			X								
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ				BuBo			BuBo			BuBo			BuBo								

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Jose Laguna | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Sem Abril CII 20

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración													X			X					
	Punta ropedora en buen estado													X			X					
	Manijas de agarre													X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo													X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)													X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.													X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)													X			X					
	Guarda en buen estado													X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado													X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias													X			X					
	Equipo sin daño estructural													X			X					
	Buenas condiciones de limpieza													X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ													BSO			BSO					

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH — MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Diana Nakelmis Naranjo — SEMANA: DEL 13 AL 19 Agosto San Alonso Año 20

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Dainer Naranjo | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto San Alonso Gil 20

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración				X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado				X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre				X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo				X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)				X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.				X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)				X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado				X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado				X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias				X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural				X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ				BSQ			BSQ			BSQ			BSQ			BSQ					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☑ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Daiver Naranjo | SEMANA: DEL 28 AL 2 Agosto-Septiembre San Años 2023

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	B S H O			B S H O			B S H O			B S H O			B S H O			B S H O					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☑ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa o inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	BSQ			BSQ			BSQ			BSQ			BSQ			BSQ					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CI-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración				X			X			X			X			X					
	Punta repedora en buen estado				X			X			X			X			X					
	Manjias de agarre				X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo				X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e insercción)				X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.				X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)				X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado				X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado				X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias				X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural				X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ				B S Q			B S Q			B S Q			B S Q			B S Q					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gmeiro

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 13 AL 19 Agosto Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien ajetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	B&O			B&O			B&O			B&O			B&O			B&O					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración				X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado				X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre				X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo				X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)				X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.				X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)				X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado				X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado				X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias				X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural				X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza				X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ				BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC					

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/08/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. BOSH | MODELO: GHS 27 VC

OPERADOR: Ricardo Hernandez | SEMANA: DEL 28 AL 02 Agosto-Septiembre Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA	HSEQ	BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC			BuSuC					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Universidad 9A

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (baslidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1 098 620 599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Universidad 9A

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo		C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1
FECHA INSPECCIÓN	SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Aurora CII 31		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando este haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Gomeño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.826.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Aurora Cll 31

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo		C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo		C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 19 AL 19 Agosto Aurora Calle 31

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Gomero
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 24 AL 25 Agosto Celo. 31

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C					
2	Tubo de escape		C	C					
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C					
4	Placa vibratoria		C	C					
5	Cilindro vibrador		C	C					
6	Correas de transmisión		C	C					
7	Poleas de transmisión		C	C					
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C					
9	Acoples flexibles		C	C					
10	Timón de manejo		C	C					
11	Rueda para desplazamiento		C	C					
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C					
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C					
14	Yoyo de encendido del motor		C	C					
15	Estado general del equipo		C	C					

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	18/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto San Alonso Cra 33a

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN: SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto San Alonso Cra 33a

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo		C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.096.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto San Alonso Qda 330

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1
FECHA INSPECCIÓN	SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto San Alonso Cra 33a		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C			
2	Tubo de escape		C	C	C	C			
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C			
4	Placa vibratoria		C	C	C	C			
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C			
6	Correas de transmisión		C	C	C	C			
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C			
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C			
9	Acoples flexibles		C	C	C	C			
10	Timón de manejo		C	C	C	C			
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C			
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C			
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C			
14	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C			
15	Estado general del equipo		C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto San Alonso Calle 20

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las Instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto San Alonso Cll 20

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NIA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor e placa		C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo		C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
14	Voyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 28 AL 02 Agosto San Alonso 01 20

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C				
2	Tubo de escape	C	C	C	C				
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C				
4	Placa vibratoria	C	C	C	C				
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C				
6	Correas de transmisión	C	C	C	C				
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C				
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C				
9	Acoples flexibles	C	C	C	C				
10	Timón de manejo	C	C	C	C				
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C				
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C				
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C				
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C				
15	Estado general del equipo	C	C	C	C				

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1
FECHA INSPECCIÓN	SEMANA: DEL 1 AL 5 Agosto Chapinero		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (baslidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 7 AL 12 Agosto Chapinero

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo		C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

Vo.Bo Jefe inmediato / SST	
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1
FECHA INSPECCIÓN	SEMANA: DEL 14 AL 19 Agosto Chapinero		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.020.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN: SEMANA: DEL 21 AL 26 Agosto Ongínero

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor		C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo		C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 26 AL 02 Agosto-Septiembre Chapinero

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando este haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 1 al 5 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Número de tarjeta de propiedad:	10021677008	Placa del vehículo:	KFG491	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Número de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN (gases, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, suras)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			08/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gases antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, suras)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, pruebas de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación cualdo que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Fisicos Jefe(s) con Talento Humano

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUAREZ CARREÑO - Universidad SA

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098 820 599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 7 al 12 Agosto	Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad: 10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica: 22/08/2024	Número de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del cual:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			OBSOLETA
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación relaciono que la información suministrada es correcta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo no notificados a Recursos Físicos, Jurídico con Tránsito (Turbaco)

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – Universidad 9A

JOSE ANGEL ANAYA
NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

Bernardo Suárez Carreño
FIRMA HSEQ
C.C. N° 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 1 al 5 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFC461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIA(I)	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gases, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, otros)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			OBS 24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASION Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gases antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación manifiesto que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificara a Recursos Físicos. Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO — Aurora cll 31

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91352285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098 620 599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 7 al 12 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombredel conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677008	Placa del vehículo:	KFO481	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			OP/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPANSIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, junto con Tarjeta Asociada

Nombre de quien elabora: BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – Auxiliar CII 31

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91 [illegible]

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 14 al 19 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Número de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Número de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			CS/A
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, lapobocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar rastros de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación enviado que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora: BERNARDO SUAREZ CARREÑO - Asesor cil 31

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.820.098

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 21 al 26 Agosto	Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad: 10021677908	Placa del vehículo:	KFG481	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica: 22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique: elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLÓCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gases, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			CB 324
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo: medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, hipoticas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, polipovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pared, pruebas de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Jefes con Talento Humano

Nombre de quien elabora: BERNARDO SUAREZ CARREÑO – Aurora CB 31

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº CI 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.096 620 599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 28 al 02 Ag.-Sept.	Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombredel conductor:	JORGE MANRIQUE DÍAZ
Numero de tarjeta de propiedad: 4479507	Placa del vehículo:	ICF925	Modelo del vehículo:	1982
Fecha revisión tecniconvecánica: 7/02/2023	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91.341.575	Fecha de vencimiento del soat:	01/19/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplacamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, tsodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			02/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos. Junto con Talento Humano

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUAREZ CARREÑO -- Aurora

Jorge Manrique Diaz
NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91.341.575

Bernardo Suarez Carreño
FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 1 al 5 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N T A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranges de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			CB-29
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPANSIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo) medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, venda elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación considero que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se realizarán a Recursos Físicos (3005 324 Extensión Humanos)

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUAREZ CARREÑO - SA. C0332

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1.095 820 599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 7 al 12 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFC461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			08/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapobocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

* CONSULTA: considera que la información suministrada es correcta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – SA - Co 32x

Jose Anaya
NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

Bernardo Suárez Carreño
FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 14 al 19 Agosto	Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad: 10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica: 22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranguos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gases, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			CB/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPANSIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo: medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, fijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, auitatuvón)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación manifiesto que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Jefe con Talento Humano.

Nombre de quien elabora: BERNARDO SUÁREZ CARREÑO - S.A. Cto 332

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 21 al 26 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, tijeras, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			08/24
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, podopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constata que la información suministrada es veraz y cierta. De existir condiciones inseguras o defectos en el vehículo se realizarán a Recursos Físicos, junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – S.A. Cm 33m

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.999

CS
Consorcio Santander

INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
	Fecha	16/03/2022
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
	Página	1 de 1

Semana del 7 al 12 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFG481	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS)	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			OBLEA
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar rayones de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o diferentes en el vehículo es notificarlo a Recursos Físicos. Junto con nuestro número

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – SA CL 20

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 14 al 19 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFC481	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verificar elemento antideslizante, ranuras de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intencidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			08/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA AGARRE A LOS PERNOS				
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presion de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – SA. dl 20

José Angel
NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

Bernardo Suárez Carreño
FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 21 al 26 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción – conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiendo y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			CAIZA
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASION Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificará a Recursos Físicos. Junto con Talento Humano

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – S.A. 0120

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 28 al 2 Ag/Sep.	Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad: 10021677908	Placa del vehículo:	KFG481	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica: 22/06/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/06/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			09/24
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMETENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antiseptica, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes al piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

La información contada que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar novedades ocasiona o defecto en el vehículo se notificara a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO — SA. CIL 20

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 9135-3285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.620.589

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 1 al 5 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombredel conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFG481	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			CERCA
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatacion)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, pruebas de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos. Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – Chapinero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.099.620.099

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 7 al 12 Agosto	Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad: 10021677908	Placa del vehículo:	KFG461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica: 22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del SOAT:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			VENCIDA
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, polipovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación declaro que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o diferentes en el vehículo se notificará a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO - Chapinero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1.098 620 889

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 14 al 19 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Número de tarjeta de propiedad:	10021677008	Placa del vehículo:	KFC461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Número de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del SOAT:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verificar elemento antideslizante, ranges de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gases, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, polvoprovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paneles, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO — Chapinero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098.820.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 21 al 26 Agosto		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombredel conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFC461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BUTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 3 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – Chapinero

Jose Anaya

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR

C.C. Nº 91353285

Bernardo Suarez Carreño

FIRMA HSEQ

C.C. Nº 1.098.620.599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 26 al 02 Ag/Sep		Tipo de vehículo:	VOLQUETA	Nombre del conductor:	JOSE ANGEL ANAYA
Número de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFC461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/2024	Número de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	22/08/2024

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirúrgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (3 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 3 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCADA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación certifico que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificara a Recursos Físicos, Juntos con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : BERNARDO SUÁREZ CARREÑO – Chofer

Jose Anaya

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. Nº 91353285

Bernardo Suárez Carreño

FIRMA HSEQ
C.C. Nº 1.098 620 599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha **de realización de la inspección**	30/09/2023
Lugar de la inspección:	San Alonso

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombros, tierra, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "***INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES***" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL.

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	FIRMA: Bernardo Suarez Carreño
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	30/08/2023
Lugar de la inspección:	Chapinero

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					
—					
—					
—					
—					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "*INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES*" PARA DAR MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:** BernardoSuarezCarreño
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: BERNARDO SUÁREZ CARREÑO	Nombre responsable frente: Kevin Rodriguez Sarmiento
Fecha de inspección: 30/08/2023	Frente: Chapinero

LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.			X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad esta expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, vapores y nocivos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, roedores, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado			X	
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado			X	
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados			X	
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes			X	
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (Sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas			X	
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos			X	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes)			X	
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles			X	
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados)			X	
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado			X	
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (lavados y ajustados)			X	
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado			X	
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable			X	
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y ratas en áreas verdes (si aplica)			X	
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses			X	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política sin Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gomez

Firma responsable inspección

Kevin Rodriguez

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: BERNARDO SUÁREZ CARREÑO	Nombre responsable frente: Amaury Mendoza
Fecha de inspección: 30/03/22	Frente:

LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado			X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frio)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad esta expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado			X	
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado			X	
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados			X	
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes			X	
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente enfundados (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas			X	
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.			X	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y iluminiscentes)			X	
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles			X	
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).			X	
7.5	Techos en buen estado (lejos sin fisuras o rotos, sin goteras)	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	Las sillas se encuentran en buen estado			X	
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)			X	
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas,	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado			X	
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable			X	
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)			X	
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses			X	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un Incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Gómez

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-018
Fecha	10/03/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 30/08/2023
Realizado por: Bernardo Suarez Carreño
Frente: San Alonso - Calle 20

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		GUANTES		GAFAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS DIELECTRICAS		CASCO DE SEGURIDAD		CABEZA BRAGA LARGA		PANTALÓN		CAMISETA						OBSERVACIONES
			E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	E	MC	
1	Dainer Naranjo	Oficial	X		X		X		X		X		V		X		X		X						
2	Jaime Muñoz	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
3	Brayan Rey	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
4	Luis Naranjo	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		-						
5	Luis Florian	Oficial	X		X		X		X		V		V		X		X		X						
6	Omar Lemote	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		V		-						
7	Jose Lagos	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
8	Luis Mejia	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
9	Cristian Amaris	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
10	Jose Espinoza	Ayudante	X		X		X		X		X		X		V		X		—						
11	Jeison Ospino	Ayudante	X		X		X		V		X		V		X		X		—						
12	Alexis Villamizar	Oficial	X		X		X		X		V		X		X		X		X						
13	Omar Quintero	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
14	Simon Pelt	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
15	David Garcia	Ayudante	X		X		X		X		V		X		X		X		—						
16	Cesar Gomez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
17	Jeison Higuera	Ayudante	X		X		X		X		X		V		V		X		-						
18	Oscar Alarcon	Ayudante	X		X		X		X		V		X		V		V		—						
19	Nicolas Alarcon	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
20	Ever Carrascal	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS Consorcio Santander	LISTA DE CHEQUEO PARA EPP	Código	CS-FO-HSEQ-016
		Fecha	19/07/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Fecha: 10/08/2023
Realizado por: Ricardo Suarez Gomez
Frente: Ingeniero

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS DIELECTRICAS		CHALECO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALÓN		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Edgar Martinez	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X		—				
2	Ricardo Hernandez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
3	Henry Montilla	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4	Diego Barbosa	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
5	Miguel Soares	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
6	Germán Diaz	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
7	Edison Pinto	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
8	Jose Rios	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

	INSPECTOR HSEQ
FIRMA-CEDULA	Bernardo Suarez Gomez
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Brayan Smith Rey Noriega **FECHA:** 02/Agosto/23

CÉDULA: 1098.786.346 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Brayan Noriega

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Luis Alberto Florian Chamorro **FECHA:** 02/Agosto/23

CÉDULA: 1.065.590.063 **CARGO:** Oficial obra

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	-
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	-
CAPUCHON	-		-
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		-

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición. ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Luis Florian
FIRMA TRABAJADOR

Bruce Sandoval
FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Omar Ivich García **FECHA:** 02/Agosto/23

CÉDULA: 1.095.809.014 **CARGO:** Ayudante obra

CONTRATO: OC de 1013

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaz	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Omar Ivich García
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Germon Diaz Mayorga **FECHA:** 03/Agosto/23

CÉDULA: 91.495.273 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 002 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Edison Prado **FECHA:** 25/08/2023

CÉDULA: 1.098.712.615 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Edison Prado
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jose Rios León **FECHA:** 15/08/2023

CÉDULA: 1.098.686.573 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: OC2 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	1
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jose Ramon Espinola Bautista **FECHA:** 02/Agosto/23

CÉDULA: 5.685.373 **CARGO:** Ayudante obra

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2021
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Jeison David Ospino Gomez **FECHA:** 02/Agosto/23

CÉDULA: 1.005.325.662 **CARGO:** Ayudante obra

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición *** Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Heider Alexis Villamizar **FECHA:** 02/Agosto/23

CÉDULA: 1.092.343.342 **CARGO:** Ayudante obra

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición. ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Heider Villamizar.
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Angie Lorena Morelos Ordoñez **FECHA:** 09/08/2023

CÉDULA: 1.100.963.525 **CARGO:** Director Obra

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	2	PROTECTOR AUDITIVO	—
PANTALON	1	TAPABOCAS	—
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	—		—
GUANTES DE —	—		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7940

Cliente: Carnicería Santander

Ubicación: Carrera 33A Campo: 18-52

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 7 de agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Ramón Sierra Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma: 1093620999

C.C. Sierra

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón

F019 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7961

Cliente: Carnicería Santander

Ubicación: Chapinero Campo: Calle 34 - 16

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 2 de agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: No tiene Extintor

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Firma:

C.C. Cristian Sierra

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón

F019 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7828

Cliente: Carnicería Santander

Ubicación: Calle 9A sur Campo: 24

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 4 de Agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Firma: Sierra.

C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón

F019 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7669

Cliente: Carnicería Santander

Ubicación: Calle 9A Campo: 24 y 25

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 8 de Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Firma:

C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón

F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
7659

Cliente: Conjunto Santander.
Ubicación: Calle 37a sur Campo: 6.
Hora de Inicio: 4:00 p.m. Hora Final: 4:10 p.m.
Fecha: 8 de agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	7	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
CC
Nombre Operador MASSI: Firma:
CC

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
7676

Cliente: Conjunto Santander
Ubicación: Calle 5 Campo: Los Cerezos 16
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 9 Agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
CC
Nombre Operador MASSI: Firma:
CC

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
7700

Cliente: Conjunto Santander.
Ubicación: Calle 34 Campo: 29-16
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 15 de agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
CC
Nombre Operador MASSI: Firma:
CC

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE
9951

Cliente: Conjunto Santander.
Ubicación: Km 29 Campo: calle 10
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 15 de agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	1	1

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
CC
Nombre Operador MASSI: Firma:
CC

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9953

Cliente: Comercio Salud Ltda.

Ubicación: Calle 5 Cra Campo: 16

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 16 de Agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	6	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____

CC.

Nombre Operador MASSI: Andrés Firma: _____

CC.

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9975

Cliente: Cons Santander

Ubicación: Cll 20 cr 29 esquina

Hora de Inicio: 7:05 Hora Final: 7:15

Fecha: 18 - Agosto - 23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Recibió: Oscar Javier Nieto P. Firma: _____

CC.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: _____

CC.

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9859

Cliente: Cons Santander

Ubicación: Cll 5 cr 29 esquina

Hora de Inicio: 7:40 Hora Final: 8:00

Fecha: 23 - Agosto - 23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____

CC.

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

CC. FREDDY

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9879

Cliente: Cons Santander

Ubicación: Cll 20 cr 29 esquina

Hora de Inicio: 5:50 Hora Final: 6:00

Fecha: 25 - Agosto - 23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: Se deja sobrante en el Barril y se toma foto OK

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____

CC.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: _____

CC.

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9854

Cliente: Cons Santander

Ubicación: Cll 20 Cra 29

Hora de Inicio: 7:30 Hora Final: 7:40

Fecha: 22 - Agosto - 23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Oscar Tabarón Firma:

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:

C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi2016@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog DI Girón

FO19 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9908

Cliente: Consorcio Santander

Ubicación: Calle 20 con Carrera 28

Hora de Inicio: 8:14 Hora Final: 8:24

Fecha: 29-08-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: TE Firma:

C.C. 91.253178

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi2016@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog DI Girón

FO19 - V01

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Carrera 37 # 52 - 43 Of 402
Tel: 6570528
botaderoelparque@hotmail.com
Bucaramanga, Santander

ProinPark

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIÓN

No. BOT1 77-390

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICIÓN FINAL
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	CONSORCIO SANTANDER
Documento de Identificación o NIT	901.677.862-6
Representante Legal	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Dirección domicilio	AVENIDA SUBA 106A – 28 OF 202 BOGOTA
Teléfono	601 5339575
Correo electrónico	Mymingenieros.sas@gmail.com
Dirección de generación de RCD	BARRIOS AURORA, SAN ALONSO, LA UNIVERSIDAD
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	**235,2 t**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	**235,2 t**
Fecha de recepción de los RCD	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1m3 equivale a 1,4t
** Certificado ajustado a la Resolución 1257 de 2021*

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/05/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/agosto/2023 HORA INICIO: 7:00PM ACTA N°: 1

LUGAR: calle 20 #29-14 HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

1. Servicios de luz
2. Acuerdo bodega

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 29 de agosto en horas de la mañana se reunen la profesional social del contratista y la propietaria de la vivienda ubicada en la calle 20 #29-14, con la finalidad de llegar a un acuerdo de la venta o suministro de los servicios de energia por el valor de $200000 pesos, dinero que se le cta en efectivo en el mismo dia.

A su vez se acuerda del arriendo de un espacio en el garaje de la vivienda por $80000.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Ramona Mendoza	Inspectora	
Andrea Avila	Profesional Social	
Cecilia Avila Rios	propietaria	
Bernardo Suarez Carreño	HSEQ	

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/05/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 18 agosto 2023 HORA INICIO: 10:00 AM ACTA N°: 01

LUGAR: Calle 20 # 29-14 HORA FIN: 10:30 AM

1. TEMAS A TRATAR

- Solicitud venta servicio de agua
- Acuerdo de valor a pagar por consumo
- Entrega del dinero acordado

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 18 de agosto en la calle 20 #29-14 se reune Personal del contratista con el señor Gilberto Roa, / La profesional Social Andrea Ayala, Profesional HSEQ Bernardo suarez, en el cual se llego a un acuerdo de pago por el valor de $100000 consumo que si se llega a pasar dicho valor en el desvio del agua el contratista debera pagar excedente.

Periodo facturado mes mayo por el valor de $146.430.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Cecilia Ardila	Propietaria	
Bernardo Suarez C	HSEQ	
Andrea Ayala	Profesional Social	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Cecilia 3172305955.

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 096

Bogotá D.C. 14 de agosto 2023

Señor
JAIME ARMANDO CARREÑO SUPELANO
91.539.534
Propietario de la vivienda Carrera 17#4-60

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Acta de servicios de luz - Barrio Chapinero

Cordial saludo,

El día 10 de agosto con el señor Jaime Carreño propietario de la vivienda ubicada en la Cra 17 #4-60 se llegaron a los siguientes acuerdos:

- Suministrar servicio de energía y agua con la condición de pagos anticipados por la suma de $150.000, ya sea dinero en efectivo o por transferencia bancaria.
- Si los desvíos de energía y agua sobre pasan el valor acordado, el contratista deberá pagarle al propietario el excedente de la desviación.
- Propietario manifiesta que, si al terminar la ejecución de la obra el servicio de energía y agua mantiene el aumento de kilovatios usados, el consorcio Santander deberá pagar el excedente ya que su consumo promedio de los últimos 6 meses no supera los $80.000 pesos en el caso de la luz.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Recibido: 13826459
Fecha: 15/agosto/2023
Hora: 3:30pm

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C. Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAP

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-019
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	30/08/23
Lugar de la inspección:	San Alonso

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				04/24
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.00 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:** Bernardo Suárez Carreño
CARGO: PROFESIONAL HSEQ	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-019
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	30/08/23
Lugar de la inspección:	Chapinero

* **SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				04/24
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "*INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES*" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL.

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:** Bernardo Suárez Carreño
CARGO: PROFESIONAL HSEQ	

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Pagina 1 de 2

FECHA: 29/08/2023 HORA INICIO: 09:00 a.m. ACTA N°: 3

LUGAR: Frentes de obra HORA FIN: 10:00 a.m.

1. TEMAS A TRATAR

- Recorrido por los frentes de trabajo para revisar y dar observaciones a la implementación del PMT

2. AVANCES Y ACUERDOS

- Se realiza recorrido por los frentes San Alonso Cra 33a & Calle 30 La Aurora, donde se terminan labores de construcción de anden pero aún se encuentra material en estas zonas. Se encuentra delimitado pero se debe realizar el retiro del mismo.
- En el frente San Alonso Calle 20 se recomienda completar las señales faltantes del PMT, orden & caso.
- Orejinero hace falta organizar cerramientos, las señales implementadas corresponden al PMT presentado. Tambien se hacen recomendaciones referente al orden & aseo en la zona.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Mantener cerramientos, orden y aseo en los frentes	HSEQ & BOAL	Diariamente
Colocar y mantener las señales de acuerdo con el PMT presentado y aprobado	HSEQ	Diariamente

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gamero	HSEQ	Bernardo Sierra Gamero
Jose Andres Avala	Profesional Social	
Eduard R Vera	Residente interventoria	Eduard V.

INFORME MENSUAL SOCIAL N. 6

LINEAMIENTOS PARA EL COMPONENTE DE GESTION SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023

"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO N. 1

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

FRENTES DE TRABAJO:
Barrios: San Alonso, La universidad, La Aurora, Limoncito, Chapinero, La Independencia, Campo Madrid, El Rosal, La Juvetud, Transicion V y Albania.

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INFORME PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		
PROFESIONAL SOCIAL	**INGENIERA RESIDENTE**	**DIRECTOR DE OBRA**
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Layde iliana velandia torres	Angie Lorena Monsalve Ordoñez
 Elaboró	 Revisó	 Aprobó

Bucaramanga- Santander

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **5**
2. OBJETIVOS 6
2.1 Objetivos generales 6
2.2 Objetivos específicos 6
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO **7**
3.1 Localización **7**
4. ETAPA DE PRELIMINARES **9**
4.1 Metodologia y cronograma del plan de dialogo ciudadano y comunicaciones estratetigas **9**
4.2 Actividades **9**
4.3 Informe de la etapa de preliminares 9
5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA **11**
5.1 Línea Estratégica del Dialogo Ciudadano911**5.1.1** Programa de servicio a la ciudadania **11**
5.1.2 Punto de atención al ciudadano (PQRSD) 11
5.1.3 Gestionar y tramitar solicitudes peticones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz y oportuna **12**
5.1.4 Recorridos Urbanos **14**
5.1.5 Conformacion de comité de veeduría **20**
6. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA **21**
6.1 Reunion de inicio **21**
6.2 Reunion de avance de obra
6.3 Reunion de cierre de obra **21**
6.4 Programa de acompañamiento a actividades técnicas **21**
6.4.1 Actas de vecindad y/o entorno **21**
6.4.2 Otras actividades **26**
7. PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD **27**
7.1 Gestion y articulación institucional **27**
7.2 Mano de Obra no Calificada **27**
8. LINEA ENTRATEGICA – COMUNICACIÓN ESTRATEGICA **31**
8.1 Programa de información para el desarrollo del proyecto articulación contratista, interventoria y Municipio de Bucaramanga **31**
8.2 Volante de información **33**
8.2.1 Tecnologias de la información y comunicación **33**
9. DIVULGACION DE PIEZAS INFORMATIVAS AL CIUDADANO **34**
9.1 Valla informativa **34**

9.2 Divulgacion del plan de manejo de Transito - PMT **35**

9.2.1 Cintas de seguridad **35**

9.2.2 Controlador de trafico **36**

10. INFORME MENSUAL **37**

11. BITACORA SOCIAL **38**

8 **12. CONCLUSIONES** **39**

13. ANEXOS.....**40**

LISTADO DE FIGURAS

Pag.

Figura 1. Soportes de implementación **9**

LISTADO DE TABLAS

Pag.

Tabla 1. Barrios itervenidos hasta el mes de agosto **7**

Tabla 2. Direcciones de barrios intervenidos en contratación hasta el mes de agosto **8**

Tabla 3. Punto de atencion al ciudadano **11**

Tabla 4. PQRS **12**

Tabla 5. Sectores recorridos urbanos **14**

Tabla 6. Conformacion de veeduría ciudadana **20**

Tabla 7. Actas de vecindad la independencia **22**

Tabla 8. Acta de vecindad campo madrid **22**

Tabla 9. Actas de vecindad el rosal **24**

Tabla 10. Actas de vecindad en general **24**

Tabla 11. Fechas de realización actas de vecindad **24**

Tabla 12. Direcciones actas de servicios públicos y arriendo de campamento **26**

Tabla 14. Mano de obra no calificada Mujeres **20**

Tabla 15. Personal ingreso en el mes de mayo **22**

Tabla 16. Personal mano de obra no calificada controladoras de trafico **28**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades realizadas por el Consorcio Santander desde el área social en el periodo comprendido desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2023.

La Alcaldía de Bucaramanga y la secretaria de Infraestructura mediante contrato suscrito 022-2023 del 10 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; cuyo objeto establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA, SANTANDER – GRUPO 1**.

El Componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estrategica dará alcance a los lineamientos definidos en el Anexo Técnico para la Gestión Social y para ello debe existir una comunicación constante y directa con el equipo social de la secretaria de Infraestructura, los lineamientos permiten orientar la gestión del Consorcio Santander en el desarrollo de las obras; para que a partir de éste y con el liderazgo del equipo social se puedan realizar procesos tendientes a lograr la participación activa de la comunidad para la apropiación y cuidado de las obras de infraestructura, que contiene Linea estratégica de diaologo ciudadano, programa de servicio a la ciudadanía, programa de dialogo y participación ciudadana, programa acompañamiento actividades técnicas, programa de gobernanza para la movilidad.

Como propósito el presente informe permite consignar las diferentes actividades de orden social, desarrolladas por el Consorcio Santander, iniciadas a partir de la firma de Acta de Inicio, con las actividades contractuales para el buen desarrollo del proyecto, cuyo periodo esta comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2023.

El Consorio Santander certifica que el presente documento es veraz, legal y está vigente a la fecha de entrega del Informe Mensual del área Social correspondiente al Informe No 06. La información consolidada es producto de los registros consignados en el informe mensual, los datos se consideran válidos partiendo del principio constitucional de la “buena fe”.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio de este.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El consorcio Santander implemento la gestión social en las obras las cuales se adelantaran en el marco de los proyectos de infraestructura urbana en el municipio de Bucaramanga-Santander mediante procedimientos sociales adecuados, que contribuyan a reducir y mitigar los impactos de las obras en sus áreas de influencia, a través de los contratistas, trabajares y demás personas que participan en la ejecución del contrato de obra 022- del 2023 **"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"** mediante procedimientos de acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

2.2 Objetivos Especificos

Informar

- Se dio a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente de andenes, pasamanos, escaleras entre otros y las actividades que ejecutara el consorcio Santander a través de los diferentes contratos suscritos por la entidad.
- Se implemento campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población del sector.
- Generar contenidos de valor acerca de los beneficios que tiene para la ciudadanía con la construcción y las acciones de dialogo, formación y participación ciudadana.

Mitigar

- Implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos ocasionados por la ejecución de la obra andenes, pasamanos y escaleras en el municipio de Bucaramanga.
- Se dio respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por el bienestar de la comunidad, de los trabajadores y contratistas respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.

Articular

- Mediante el consocio Santander se consolidará y dinamizará estrategias de gobernanza para la coordinación y el trabajo colaborativo interinstitucional para el avance y ejecución del proyecto que potencien la transformación y integral del municipio de Bucaramanga.

Apropiar y sostener

- Se formulo y ejecuto el lineamiento para el componente de gestión social por parte del Consorcio Santander a la comunidad en general, así como las actividades que se desarrollaran en las etapas de pre-contruccion de la obra, etapa de construcción y etapa de habilitación de espacios del proyecto, con el fin de cumplir los objetivos y la sostenibilidad social.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la ejecución, dirección, planeación, formulación, control de los planes, proyectos y programas de la administración municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. Para el cumplimiento de esta función, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la convivencia, la paz y la salud. Con ello se quiere garantizar un adecuado acceso a sus comunidades, logrando la accesibilidad e inclusión. Para lo anterior la secretaria de infraestructura ejecuto el presente proyecto cuyo objeto es "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER".**

3.1 Localización

El grupo 1 del consorcio Santander expone los barrios asignados con sus respectivas direcciones.

- La población objeto del cuarto informe de gestión social corresponde a los siguientes once (11) frentes:

GRUPO	COMUNA	BARRIO
Grupo 1	**1 Norte**	El rosal
		Campo Madrid
	2 Nor- oriental	La independencia
		La juvetud
		Transicion V
	3 San francisco	Chapinero
		La universidad
	13 Oriental	San Alonso
		La aurora
	14 Morrorico	Albania

Tabla 1: Barrios intervenidos hasta el mes de agosto

- En resumen, los sitios a intervenir son los siguientes por grupo:

GRUPO 1
Costado occidente de la cra 20 desde la calle 54n hasta la calle 56n (El rosal)
Costado oriente de la cra 20 desde la calle 56n hasta la calle 58n (El rosal)
Costado oriente cll 58n desde la cra 20 hasta volver a encontrarse con la intersección con la cra 20 (El rosal)
Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo Madrid (Campo madrid)
Cra 23ª entre calle 2- 22 (Transicion V)
Cra 25 entre calles 3 y 5 (Independencia)
Cra 19 entre 3 y 4 (Independencia)
Cra 21b con cra 3 (Independencia)
Cra 24ª entre calles 3ª - 3b y 4 (Independencia)
Cra 24b entre calles 3b y 4 (Independencia)
Calle 1n entre cra 21bb hasta la cra 20ª (La juventud)
Cra 20ª entre calle 1 calle 1n (La juventud)

Cra 20c entre calle 1an y calle 2n (La juventud)
Calle 3n entre cra 21 y cra 21ª (La juventud)
Calle 7n entre cra 20 y 19 (La juventud)
Calle 5n entre cra 18 y 19 (La juventud)
Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17 (Chapinero)
Costado occidental de la cra 17 entre calles 4 y 5 (Chapinero)
Costado norte calle 5 entre carrera 17 y 16 (Chapinero)
Costado oriental cra 29 entre calle 10 y 11 (La universidad)
Calle 9ª entre carreras 24 y 25 costado norte (La universidad)
Calle 20 entre carreras 29 y 30 costado sur (San alonso)
Calle 29 entre carreras 29 y 30 costado norte (San alonso)
Costado occidental de la cra 33ª entre calles 17 y 19 (San Alonso)
Calle 31 con cra 29 hasta cra 28 (La aurora)
Cra 51 desde la casa n° 18-61 hasta la casa n° 20-67 (Albania)

Tabla 2. Direcciones de barrios intervenidos en contratación hasta el mes de Agosto

4. ETAPA DE PRELIMINARES

4.1 Metodologia y cronograma del plan de dialogo ciudadano y comunicaciones estratetigas:

El consorcio Santander realizo una revisión de la información correspondiente al contrato 022-2023 del Municipio de Bucaramanga relacionados con el proyecto, con el animo de hacer entrega de los siguientes documentos conforme a los lineamientos establecidos por el Municipio, a través de la secretaria de Infraestructura:

4.2 Actividades:

- Se realizo una Actualizacion del directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales, con la finalidad que el Consorcio Santander identificará a todas las organizaciones, lideres, instituciones y demás actores funcionales para el proyecto a ejecutar.
- Se elaboro del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación estrategia, dentro del tiempo estipulado por interventoria después de la firma del acta de inicio del contrato.
- El Consorcio Santander implemento metodologías para la elaboración de las actas necesarias, especificas en el programa de acompañamiento a Actividades Técnicas.
- Se relizaron las mesas de trabajo necesarias, con el consorcio, interventoría e Municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de infraestructura, donde se establecieron los lineamientos para la elaboración de los documentos, a fin de desarrollar las acciones de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, de acuerdo a los tiempos del contrato.

4.3 Informe de la etapa de preliminares

- Se entrego el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual fue aprobado satisfactoriamente por interventoria.
- Se realizaron las Actividades y soportes de la ejecución del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la etapa de preliminares adecuadamente.
- Se continua con la implementación de la línea telefónica y correo electrónico corporativo.




Figura 1. Soportes de implementación

- Soportes de la gestión de las piezas de comunicación necesarias para el desarrollo de la de etapa preliminares, de acuerdo con el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica aprobado por la interventoría.
- Descripción de las actas de vecindad debidamente suscritas por el contratista, interventoría y comunidad, con el listado maestro de estas.
- Demás soportes de las gestiones y/o actividades realizadas durante la etapa.
- El informe será un anexo del informe de preliminares de la interventoría.

5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

5.1 Línea Estratégica del Dialogo Ciudadano

5.1.1 Programa de Servicio a la Ciudadania:

Este ítem esta enfocado en generar e incentivar ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción conjunta del hábitat y el adecuado desarrollo del proyecto.

5.1.2 Punto de Atención al Ciudadano (PQRSD):

Desde el área social y con apoyo de la comunidad beneficiaria se crean puntos de atención al ciudadano con el fin de atender, gestionar y tramitar las diferentes PQRSD de manera oportuna y promover un dialogo directo con la comunidad en relación con la ejecución del proyecto.

Con el ánimo de mantener una comunicación constante con la comunidad, junta de acción comunal y ediles de cada uno de los residentes del área de influencia directa del contrato de obra en mención, se establece un punto de atención en cada uno de los frentes de obra y se tiene en cuenta que el horario para atención por barrio es el siguiente:

ATENCION AL CIUDADANO				
BARRIO	**HORARIO**	**UBICACIÓN:**	**LINEA TELEFONICA**	**CORREO**
La Aurora	9:00am – 12:00p	Calle 31 con cra 29 hasta cra 28	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
Chapinero	9:00am – 12:00p	Costado norte calle 5 entre cra 17 y 16	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
San Alonso	9:00am – 12:00p	Calle 20 entre cra 29 y 30	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com

Tabla 3: Punto de atención al ciudadano

Ademas se muestra evidencia fotografica de cada punto PAC en los tres frentes activos.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	01- 31 JULIO
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		

		
Punto PAC La Aurora	Punto PAC chapinero	Punto PAC San Alonso

5.1.3 Gestionar y Tramitar Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía de manera Eficaz y Oportuna

Se creó un formato de PQRS en el cual se registran los diferentes requerimientos de la comunidad aferente al proyecto, documento que se encuentra en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, teniendo en cuenta los horarios establecidos, además se les compartió el número de contacto de la profesional social y el correo electrónico con los cuales se pueden comunicar.

Mensualmente se realizá un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentan durante el período reportado, informando los tramites y las respuestas a cada una de ellas.

En este informe de ejecución se recibieron cinco (5) PQRS, las cuales se les dio tramite y su respectiva respuesta a la comunidad. *(Ver anexo 1 formatos pqrs).*

PQRS		
Fecha	**Sector**	**Entidad que da respuesta**
02 / agosto / 2023	En el barrio Aurora el señor Javier Rosas de la Territorial Santander ESAP, solicita la intervención del sendero peatonal frente a la institución ESAP ya que la ejecución de la obra existente en el barrio la aurora llego hasta la esquina donde se encuentra la institución quedando un tramo con andenes nuevos y otro con andenes deteriorados, dando respuesta postitiva, se aprueba por parte de la interventoria	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada

	este sendero hasta la mitad de la cuadra ejecutando aproximadamente 20 metros lineales, ya que se realiza un balance presupuestal y se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de la obra	
02 agosto / 2023	En el barrio la Aurora en el edificio Balcones de bologña ubicado en la calle 31 No. 28-48 solicitan amablemente que los pinos y el árbol que se encuentran en la jardinera del edificio se les perserve la vida, quitando el circulo de ladrillo y que en su defecto se haga la jardinera con el modelo del proyecto actual. Dando respuesta a lo solicitado su requerimiento procede por cuanto que en el manual de espacio publico esta contemplada que para zonas residenciales debe de contener una franja ambiental con grama, vegetación o gramoquin.	Pqrs cerrada Parte técnica contratista
11 agosto / 2023	En el barrio San Alonso en la calle 20 # 29-29 la señora Nelida Maria Balderrama, solicita amablemente se realice el desmonte del material instalado en el frente de la vivienda, ya que hace aproximadamente ocho (8) meses se instalo la loseta en cemento, para hacer uso de dicho material retirado por el contratista. Se le informa dando una respuesta positiva a la solicitud pasada, indicando al personal de obra realizar el retiro del material solicitado intentando conservar el mayor posible para ser entregado a los propietarios y que ellos puedan reutilizarlo a su conveniencia.	Pqrs cerrada Parte técnica contratista
24 agosto / 2023	En el barrio la aurora en la calle 31 No. 28-48 edificio balcones de bologna solicitan amablemente corregir el desnivel de la rampa de acceso vehicular ya que manifiestan varios propietarios que quedo muy alta y los carros se golpean por debajo al salir y entrar del edificio. En respuesta a la solicitud se manifiesta el contratista que de acuerdo al manual de espacio publico la rampa vehicular ubicada en el precio de la calle 31 No. 28-48, cumple con los diseños y especificaciones técnicas correspondientes a la	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista.

	rampa construida; no obstante, se le comunica a los residentes del edificio que el consorcio Santander en atención a la solicitud se realizara una modificación para bajar la pendiente de diseño y que esta sea funcional para el servicio de la comunidad de acuerdo a lo solicitado en la pqrs.	Pqrs cerrada
29 agosto / 2023	En el barrio San Alonso en la calle 20 #29-34 la señora Silvia Paola Diaz pasa un reclamo por medio de una pqrs debido a la demora y la no terminación del trabajo de andenes el cual se esta ejecutando en frente del negocio de ella. Por parte de contratista se emite una respuesta entendiendo la molestia de la comunidad por las obras que se realizan en la actualidad, pero la ejecución del mismo se ha realizado de acuerdo a lo estipulado, sin embargo, es importante resaltar que se ha venido afectando el desarrollo de la misma por residentes del sector. Sin embargo, la solicitud fue tomada en cuenta y desde la parte técnica se tendrá muy presente la necesidad de dar terminación en el menor tiempo posible para no generar mas impacto en la comunidad.	Pqrs cerrada Parte técnica contratista

Tabla 4: PQR

5.1.4 Recorridos Urbanos

La profesional social realizo reconocimiento y acompañamiento a los siguientes sectores en el mes de agosto, además se menciona en otros ítems del presente informe diferentes actividades que se llevaron a cabo en cada barrio:

BARRIOS	ACTIVIDADES REALIZADA
SAN ALONSO	El 01 de agosto en las horas de la mañana se realiza un recorrido de obra en compañía del contratista, interventoría Jesak SAS y el apoyo del supervisor en representación de la secretaria de infraestructura, con la finalidad de ultimar detalles para entrega del frente de San Alonso, en el cual en la cra 33ª con 17 esquina se le pide al contratista hacer una mejora en los niveles del antejardín de la vivienda 02-17 para garantizar que las aguas lluvias salgan hacia la via y no hacia la vivienda.

	A su vez se revisa una rampa de acceso vehicular ubicada en la cra 33ª #17-26 en donde la propietaria manifiesta que el radio de giro para la entrada del parqueadero quedo mal hecha, en su defecto revisa la parte técnica y según el manual de espacio publico cumple con las especificaciones técnicas. 
▪ **AURORA**	El dia 01 de agosto en las horas de la mañana se realiza un recorrido de obra en compañía del contratista, interventoría Jesak SAS y el apoyo del supervisor en representación de la secretaria de infraestructura, durante este recorrido el ingeniero Vladimir Polo solicita se haga por medio de una pqrs las peticiónes que los propietarios del edificio balcones de bologna y la Territorial Santander ESAP solicitaban, para dar su respectiva respuesta y asi oficializar la intervención de dichos tramos.  El dia 02 de agosto en horas de la tarde en compañía del inspector del frente de la aurora, se realizaron carteles informativos para informar a los propietarios de los vehículos del edficio el amo y bologña que el dia 03 de agosto se deshabilitaría la entrada y salida a los parqueaderos por motivos de los trabajos que se están realizando en el proceso constructivo de los andenes, ya que se requiere un tiempo de secado que comprende de dos a tres días en el momento de la instalación de loseta.

	
CHAPINERO	El dia 01 de agosto en las horas de la mañana se realiza un recorrido de obra en compañía del contratista, interventoría Jesak SAS y el apoyo del supervisor en representación de la secretaria de infraestructura, en este recorrido se le da respuesta a una solicitud que se había emitido a la interventoria sobre una rampa de acceso para personas con discapacidad, la cual fue negada debido a que en las inmediaciones se encuentra una rampa de acceso vehicular y /o una rampa peatonal. 
INDEPENDENCIA	El dia 11 de agosto se realiza un recorrido en compañía de la parte técnica contratista e interventoria, con la finalidad de terminar la parte técnica de actas de vecindad y actas de entorno. 
EL ROSAL	El dia 15 de agosto se realiza un recorrido en compañía de la parte técnica contratista e interventoria, con la finalidad de terminar la parte técnica de actas de vecindad y actas de entorno en el barrio el Rosal.



- **TRANSICION V**

El dia 17 de agosto se realiza la socialización de inicio de obra en el barrio transición v, en el cual se hace presentación de los asistentes, se da la información general del contrato, el origen de los recursos, se explica el plan de gestión social y se resuelven preguntas, dudas e inquietudes acerca del contrato 022-2023.



- **SAN ALONSO CALLE 20**

El dia 18 de agosto en horas de la mañana se comunica el área social del contratista con el señor Carlos Ortiz residente del edificio Frankfure para la entrega de una cesta de residuos que estaba invadiendo el espacio publico.





ALBANIA	El dia 18 de agosto se realiza socialización de inicio de obra, durante la socialización se le explica a la comunidad que el día 02 de junio se había realizado la primera reunión de socialización de inicio de obra en la cual se muestra evidencia fotográfica del estado de los andenes, como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio al tráfico de personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto Posterior a dicha reunión en la secretaria de infraestructura realizo un estudio de dimensionamiento de estructura para mejoramiento de pavimento entregado por el taller de arquitectura quienes deciden que se van hacer andenes en concreto para que cumpliera con doble función como transito peatonal y vehicular. Dicho mejoramiento se ejecutará desde la cra 51 desde la casa 18-51 hasta la vivienda 20-67, la comunidad queda muy agradecida por los cambios para el mejoramiento del pavimento. 
SAN ALONSO CALLE 20	El dia 28 de agosto en el frente de la calle 20 del barrio san alonso, se realizaron pausas activas a la mano de obra no calificada, con el fin de mejorar los procesos atencionales y de concentración a su vez estimulando la capacidad afectiva y estrés.  Siendo las 9:30am de la mañana se hace un recorrido por la obra con el señor Castor Jet administrador de la empresa de aceites ubicada en la calle 20 #29-71 en el barrio san alonso, con el fin de informarle el retiro de una jardinera la cual estaba invadiendo el espacio publico, a su vez se le informa que por unos

	días se deshabilitara el ingreso al parqueadero por actividades de demolición. 
▪ **SAN ALONSO CALLE 20**	El dia 29 de agosto en compañía de la profesional social de interventoria en horas la tarde se realizo un puerta a puerta en la calle 20 entre cra 29 y 30 barrio san alonso, informándole a la comunidad que se esta ejecutando el contrato 022-2023 de adecuación de andenes en el cual se ha venido realizando actividades necesarias para la construcción de estas, por tal motivo se necesita la colaboración para la no interrupción de estas labores, ya que requieren un tiempo de secado que comprende de dos a tres días en el momento de la instalación por tres días, por tal motivo a los residentes que cuenten con vehículos se les recomienda que para el tiempo requerido en cada actividad (Demolicion, instalacion de loseta y sardineles).  
▪ **CHAPINERO**	El dia 30 de agosto en el barrio chapinero se hizo acompañamiento al contratista ya que el presidente de junta el señor Eduardo Villamizar solicita presencia

	en el frente ya que el canal TRO realizaría una nota sobre la situación que se esta presentando en chapinero debido a los repetivos robos y problemas sociales, los cuales han impedido que la obra se ejecute de una manera eficaz.  

Tabla 5: Sectores recorridos urbanos

De la fecha del 01 al 31 de agosto, se realizaron recorridos de obra todos los días, con la finalidad de identificar y mitigar impactos de situaciones que se presentaron con los trabajadores y comunidad aledaña.

5.1.5 Conformación de Comité de Veeduría

En las reuniones de socialización de inicio en el sexto periodo del 01- al 31 de agosto se intervino el barrio (Transicion V); con el cual se conformó el comité de veeduría. con los siguientes participantes: *(Ver anexo 2 Conformacion comité veedor.)*

El Consorcio Santander realizo la convocaroria para que cuatro (4) personas de cada barrio se inscribieran en el comité de participación y veeduría los cuales se pueden observar en la siguiente tabla:

COMUNA	BARRIO	VEEDURIA	QUIENES LA CONFORMAN	INTEGRANTES
Comuna 2	Transición V	Creada	4 representastes de la comunidad	Mery Picon
				Orlando Arias
				Maria Elda Gomez
				Eliberto Romero

Tabla 6: Veeduria ciudadana

6. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Con este ítem se quiere generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER**. Además, buscamos minimizar los efectos y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados.

6.1 Reunión de Inicio

Hasta la fecha del presente informe el Consorcio Santander lleva un total de catorce(14) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada una de las comunas que se va a intervenir. A su ves dos (2) socializaciones de cierre entregando la obra a satisfaccion de la comunidad.

Durante el desarrollo de la reunión se dieron a conocer los siguientes contenidos:

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Se dieron respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

Como soporte de lo anterior se tomó registro fotográfico de las dos (2) reuniones de inicio, se diligenciaron los formatos de control de asistencia a reuniones y el formato de acta de reunión.
(Ver anexo 3 formatos de asistencia y acta de reunion).

6.2 Reunión de Avance de Obra

Se le da cumplimiento cuando se ejecuta el 50% del contrato, con fin dar a conocer a los asistentes lo que se ha realizado hasta el momento y brindarles información acerca de las actividades faltantes a la fecha del sexto informe no se cuenta con reuniones de avance de obra.

6.3 Reunión de cierre de obra

En el mes de agosto no se realizó ninguna reunión de cierre de obra, quedan pendiente para el mes de septiembre dar cierre a los barrios de Aurora, la universidad y san alonso.

6.4 Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

6.4.1 Actas de Vecindad y/o Entorno:

Este Items tiene como objetivo establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

El área de gestión social realizo acompañamiento al área técnica para el levantamiento de actas de vecindad de inicio a cargo del contratista y con el acompañamiento de la interventoría; para la toma de fotografías; con el fin de registrar el estado actual de las zonas circundantes frente a la obra; para el levantamiento de esta información, se tiene en cuenta el criterio técnico como prioridad de las zonas que posiblemente pueden verse afectadas con los trabajos a realizar, áreas susceptibles con la construcción, ademas si se evidencian rampas de acceso vehicular también se realizara el acta correspondiente como soporte del estado en el que se encuentran para el desarrollo del contrato **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS**.

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19 # 03- 07	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª # 3-11	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª # 3-10	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª # 3-17	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª #3-25	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª #3-29	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª #3-57	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 19ª #3 – 58	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de vecindad	Calle 4 #19ª -03	11 / agosto / 2023
La independencia	Acta de entorno		11 / agosto / 2023

Tabla 7: Acta de vecindad la independencia

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
Campo Madrid	Acta de entorno	Frente a las torres de campo Madrid	25 / agosto / 2023

Tabla 8: Acta de vecindad campo madrid

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-08	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-64	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-84	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-76	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-58	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-48	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-39	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-26	15 / agosto / 2023
El Rosal	Acta de entorno	Lote 1	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-14	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-10	15 / agosto / 2023
El Rosal	Acta de entorno	Lote 2	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-08	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-14	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-16	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 54n #20-8	15 / agosto / 2023
El Rosal	Acta de entorno	Lote 3	15 / agosto / 2023
El Rosal	Acta de entorno	Lote 4	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Cra 20 #55n 15 CDI	15 / agosto / 2023
El Rosal	Acta de entorno	Cancha de tierra el rosal	15 / agosto / 2023

El Rosal	Actas de vecindad	Casa rosada cra 19-31	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 58 #19n -05	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 58 #19n-05 casa naranja	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 58 #58n -44	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 58 #58n -52	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Calle 58 #58n -64	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Cra 19 #58n -80	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Cra 19 #58n -90	15 / agosto / 2023
El Rosal	Actas de vecindad	Caseta esquina	15 / agosto / 2023

Tabla 9: Acta de vecindad el rosal

CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR				
Barrio / Sector	**Actas de entorno**	**Actas de vecindad**	**Actas de vecindad por terminar**	**Actas de rampa de acceso vehicular**
La Independencia	**1**	**9**	**0**	**0**
Campo Madrid	**1**	**0**	**0**	**0**
El Rosal	**5**	**24**	**0**	**0**

Tabla 10. Actas de vecindad en general

ACTAS DE VECINDAD			
FECHA	**Barrio**	**HORA**	**SECTOR**
11 / agosto / 2023	La independencia	2:00pm	Comuna 2 nor-oriental
15 / agosto / 2023	El rosal	8:00am	Comuna 1 norte
25 / agosto / 2023	Campo Madrid	10:00am	Comuna 1 norte

Tabla 11. Fechas de realización actas de vecindad

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		

			
OBSERVACIONES:	Registro de Actas de Vecindad	OBSERVACIONES:	Registro de Actas de Vecindad

- La profesional social entrega copia de actas de vecindad de inicio en el barrio chapinero y san alonso calle 20. *(anexo 4 registro de firmas de cada propietario de los barrios mencionados anteriormente).*

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Entrega copia actas de vecindad	OBSERVACIONES:	Entrega copia actas de vecindad

6.4.2 Otras Actividades

La profesional social hace apoyo al contratista como intermediaria con la comunidad, para buscar los servicios de luz y agua y el campamento para los frentes de trabajo. (*Anexo 5 actas de servicios públicos y arriendo de campamentos)*

ACTAS DE SERVICIOS PUBLICOS ACTAS ARRIENDO CAMPAMENTO		
FECHA	**DIRECCION**	**BARRIO**
14 / agosto / 2023	Cra 17 #4-60	Chapinero
18 / agosto / 2023	Calle 20 # 29-14	San Alonso
29 / agosto / 2023	Calle 20 # 29-14	San Alonso

Tabla 11. Direcciones Actas de servicios públicos y arriendo de campamento

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Actas servicios públicos	OBSERVACIONES:	Actas servicios públicos

7. PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

7.1 Gestión y Articulación Institucional

Con este programa se quiere garantizar las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

A la fecha no se han realizado actividades de gestión y articulación institucional pero el contratista tendrá en cuenta aquellas instituciones que hacen parte del sector salud, educativo y de desarrollo económico durante la ejecución del proyecto para crear soluciones a los percanses que se presenten en el transcurso de la realización de la obra.

7.2 Mano de Obra No calificada

El consorcio Santander hasta la fecha de 31 de agosto, realizo convocatoria por medio de los presidentes de Junta de Acción Comunal JAC y en las reuniones de socialización de inicio de los sectores a intervenir para que la comunidad en general tenga conocimiento de las ofertas y oportunidades laborales que hay para el personal del área metropolitana de Bucaramanga.

Para este informe se sigue dando cumplimiento al apéndice J, donde hace referencia en la importancia que tiene la contratación de mano de obra femenina. Por medio del correo electrónico corporativo y en los puntos pac, se recibieron las hojas de vida de manera digital de las personas interesadas.

#	ÁREA	CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	ACTIVO
2	Administrativo	1.100.963.525	Angie Lorena Monsalve Ordoñez	Director de obra	ACTIVO
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	ACTIVO
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	ACTIVO
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	ACTIVO
6	Operativo	1.103.471.378	Kevin Farid Rodriguez Sarmiento	Inspector de obra	ACTIVO
7	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	ACTIVO
8	Operativo	91.263.099	Amaury Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	ACTIVO
9	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	ACTIVO
10	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	ACTIVO
11	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	ACTIVO
12	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	ACTIVO
13	Operativo	1.096.242.788	Cristian Fernando Amariz Perez	Ayudante de Obra	ACTIVO
14	Operativo	91.519.124	Nicolas Alarcón Afanador	Oficial de Obra	ACTIVO
15	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	ACTIVO
16	0perativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	ACTIVO
17	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	ACTIVO
18	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra (BOAL)	ACTIVO
19	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	ACTIVO
20	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	ACTIVO
21	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	ACTIVO

22	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Ayudante de Obra	ACTIVO
23	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso quintero Quintero	Ayudante de Obra	ACTIVO
24	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	ACTIVO
25	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	ACTIVO
26	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	ACTIVO
27	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	ACTIVO
28	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	ACTIVO
29	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	ACTIVO
30	Operativo	91.489.177	Edgar Martinez Quintero	Oficial de Obra	ACTIVO
31	Operativo	1.095.800.217	Ricardo Hernandez Aguillon	Ayudante de Obra	ACTIVO
32	Operativo	91.255.617	Henry Mantilla Parra	Ayudante de Obra	ACTIVO
33	Operativo	1.234.339.539	Diego Andres Berbesi Merchan	Ayudante de Obra	ACTIVO
34	Operativo	91.494.372	Miguel Angel Caceres Carrillo	Ayudante de Obra	ACTIVO
35	Operativo	91.495.273	German Diaz Moyano	Oficial de Obra	ACTIVO
36	Operativo	1.098.712.615	Edinson Prado Paterina	Oficial de Obra	ACTIVO
37	Operativo	1.098.686.573	Jose Rios León	Oficial de Obra	ACTIVO
38	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	RETIRADO
39	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	RETIRADO
40	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	RETIRADO
41	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	RETIRADO
42	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	RETIRADO
43	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	RETIRADO
44	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	RETIRADO
45	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	RETIRADO
46	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	RETIRADO
47	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Paletera	RETIRADO
48	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	RETIRADO
49	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	RETIRADO
50	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	RETIRADO
51	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	RETIRADO
52	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	RETIRADO
53	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	RETIRADO
54	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	RETIRADO
55	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	RETIRADO
56	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	RETIRADO
57	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	RETIRADO
58	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	RETIRADO
59	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	RETIRADO
60	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	RETIRADO
61	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	RETIRADO
62	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	RETIRADO
63	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	RETIRADO
64	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	RETIRADO
65	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	RETIRADO
66	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	RETIRADO
67	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	RETIRADO
68	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	RETIRADO
69	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	RETIRADO
70	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	RETIRADO
71	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	RETIRADO
72	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	RETIRADO
73	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	RETIRADO

74	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
75	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
78	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
80	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
81	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
83	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
84	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
85	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
86	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
87	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
88	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
89	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
90	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**RETIRADO**
91	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
92	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
93	Operativo	1.096.254.152	Cristian David Urieta Ramos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
94	Operativo	1.007.218.221	Eliecer Dario Benavides Miranda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
95	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
96	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**RETIRADO**
97	Operativo	7.120.330	Yackson Aristides Caceres Castro	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
98	Operativo	1.026.559.257	Alexander Tarazona Zambrano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
99	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
100	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**

Tabla 13. Personal ingreso en el mes de agosto

En el periodo del presente informe se realizaron charlas a los trabajadores, tratándose temas tales como:

I. Relajacion muscular.
II. Trabajo en equipo.

(Anexo 6 Listado charlas informativas a mano de obra no calificada).

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022-2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		

	
OBSERVACIONES:	Charlas Informativas Frente chapinero
	
OBSERVACIONES:	Charlas Informativas frente San Alonso
OBSERVACIONES:	Charlas Informativas frente San Alonso

8. LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

El consorcio Santander por medio de los canales comunicacionales y piezas de divulgación incluidas en el apéndice J, de manera eficiente, organizada, tuvo en cuenta la segunda fase de inicio de obra con el propósito de informar, sensibilizar, movilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, implementó una comunicación incluyente, que tiene en cuenta la población con discapacidad y de esta manera darle uso a las nuevas tecnologías, para masificar los mensajes e impactar toda la zona de influencia.

8.1 Programa de Información para el desarrollo del Proyecto Articulación Contratista, Interventoría y Municipio de Bucaramanga

El Consorcio Santander asistio a las reuniones de articulación solicitadas por el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, para definir y determinar lineamientos del quinto corte, se expusieron las dificultades y problemas que se han presentado en los diferentes frentes de trabajo, se crearon estrategias y soluciones.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Comité de obra agosto	OBSERVACIONES:	Comité de obra agosto

El día 09 y 25 de agosto 2023 se llevaron a cabo los comités de obra, una reunión con la interventoría JESAK SAS y Consorcio Santander que hacen parte del contrato 429 Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga, hicieron presencia los profesionales del área técnica, hseq y social para revisar diferentes temas como los atrasos que se presentan en obra y la importancia de agilizar en las actividades teniendo en cuenta el nuevo tiempo contractual correspondiente a los 4 meses de ejecución, desde cada área se manifestó que actividades se han ejecutado hasta la fecha, que programaciones habían pendientes y los inconvenientes que se han presentando durante el mes de agosto

En el mes de agosto igualmente la profesional social de la interventoría Jesak SAS hizo acompañamiento a la profesional social de la empresa contratista Consorcio Santander en actividades como actas de vecindad y su respectiva revisión para firmas y socializaciones de inicio.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Encuentros sociales.		

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Agosto

OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**



OBSERVACIONES:	Encuentro con la profesional social de infraestructura Xiomara Tarazona.

El dia 31 de agosto en la oficina del taller de infraestuctura desde el área social la profesional Xiomara Tarazona inicia una reunión con cada componente social de los tres grupos del presente contrato, en el cual desde el grupo 1 se expone todos los percances o dificultades que se han presentando durante a la ejecución del contrato, se plantearon posibles soluciones, se envían actas de socializaciones en los barrios donde la alcaldía ha hecho presencia en estas actividades. *(Anexo 7 acta seguimiento social andenes).*

8.2 Volante de información:

Estos fueron utilizados para informar sobre temas relacionados con el Proyecto y ejecución de la obra.

8.2.1 Tecnologias de la información y comunicación:

Por medio de este ítem se tomo en cuenta la importancia de tener recursos, herramientas, equipos, aplicaciones, redes y medios, los cuales permitieran la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmision de la infromacion por medio de:

a) *Por medio de texto (Whatsapp Bussines) – (Correo electrónico corporativo)*
b) *Por medio de imágenes, folletos, avisos o pancartas (Whatsapp Bussines)*

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 – 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		
			
Soporte medio magnético volante informativo reuniones inicio de obra			

9. DIVULGACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS AL CIUDADANO.

Se han generado canales de información claros veraces y oportunos entre la comunidad, las autoridades municipales y el proyecto. Con el fin de informar a la comunidad del área de influencia, las características de la obra, etapas de construcción, cierres parciales o totales, entre otros aspectos.

9.1 Valla Informativa:

El Consorcio Santander Instalo una (1) valla informativa móvil del proyecto de acuerdo con las condiciones para su ubicación, cuyo diseño fue solicitado a la Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido. Esta valla se instalo en cada frente de trabajo.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRAT O No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Agosto
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		



Valla Informativa aprobada por Prensa Bucaramanga

9.2 Divulgacion del Plan de Manejo de Transito- PMT:

Se han implementado señales informativas en cada frente de trabajo, con el fin de evitar índices de accidentalidad en las zonas donde se esta ejecutando la obra, generando adecuadas condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los peatones, vehículos, ciclistas.





9.2.1 Cintas de seguridad:

Las cintas retrorreflectivas ayudan a prevenir el riesgo de accidentes de transito al advertir a las personas que transitan en las vías de otros vehículos, de cerramientos o señalamientos. Los frentes activos en obra cumplen con la norma vial con sus respectivas cintas de seguridad.





9.2.2 Controlador de Trafico:

En el mes de agosto se continúa implementado esta medida, con la finalidad de organizar y controlar actividades de la zona relacionadas con el trafico y transporte terrestre. Se tiene en cuenta para la contratación la importancia de generar empleo a mujeres y apoyar a amas de casa del sector que se esta interviniendo, no obstante, este mes no se contrato personal para controladores de trafico.

10. NFORME MENSUAL

El Consorcio Santander entregará un sexto informe mensual de actividades en medio físico y magnético a la Interventoría para su revisión y aprobación, con los respectivos soportes, teniendo en cuenta las fechas de corte establecidas previamente.

11. BITACORA SOCIAL

El consorcio Santander adjunta anexos de una bitácora social de obra en la cual se registró actividades y novedades del desarrollo del plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica del mes que comprende agosto (*Anexo 8 bitacora mes de agosto)*

12. CONCLUSIONES

Informe social mensual #6 (Grupo 1), se describieron y se adjuntaron cada una de las actividades contempladas dentro del componente del Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica desde la fecha del 01 al 31 de agosto del 2023. De igual manera se entregará como anexo del presente documento, las evidencias de las actividades que se ejecutaron por el profesional social en el quinto periodo.

Todo el trabajo que se esta realizando nos ayuda a mitigar en su mayoría los impactos sociales que se puedan presentar en el transcurso de la ejecución de la obra en los diferentes frentes y sectores del municipio de Bucaramanga.

ANEXOS

Anexo 1 Formatos PQRS Y respuestas del contratista

Anexo 2 Conformacion comité veeduría

Anexo 3 Formatos de asistencia y actas de reunión

Anexo 4 registro firmas entregas copia actas de vecindad

Anexo 5 Actas de servicios públicos

Anexo 6 Listado charlas informativas mano de obra no calificada

Anexo 7 Acta de seguimiento social andenes

Anexo 8 Bitacora mes de agosto

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-AO-SOC-008
		Fecha	22/01/2021
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 17-08-2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
X				

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	ESAP-Territorial Santander.
Número del documento de identidad	800171540-1.
Dirección	Carrera 28 # 31-07 Barrio la Aurora. - Bucaramanga.
Número(s) de teléfono(s)	3153371327 - 3006611779
Correo electrónico	javier.rojas@esap.edu.co

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

En la calle 31 entre carreras 28 y 29 barrio la Aurora, se está adelantando actualmente un frente de trabajo cuyo objeto es la reparación de andenes y recuperación del espacio público. Dentro del alcance de esta obra se intervinieron algunos metros de los andenes sobre la carrera 28, justo en la esquina donde se encuentra la ESAP, pero no se tiene previsto reparar el 100% de los andenes del frente de nuestra institución educativa, los cuales se encuentran en precarias condiciones afectando la estética de la obra realizada en el sector quedando un tramo con andenes nuevos y otro con andenes viejos y deteriorados.
Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente la inclusión en este frente de trabajo de 25 metros lineales adicionales, de tal forma que la obra cubra todo el frente de la ESAP sobre la carrera 28, optimizando así la estética del sector de la obra realizada, a la vez que sería un aporte importante para esta entidad educativa pública. Se anexa registro fotográfico

Firma del peticionario:
Javier Antonio Rojas
Coordinador Administrativo
ESAP - Santander
Tel. 3153371327.

Escaneado con CamScanner

		Asunto	Info 001
	GESTION DE PETICION	Fecha	2 – agos-23
		Hoja	1-3
		Elaboro	Arq. Magda Roncancio

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE A - ESAP SANTANDER

1.1. GENERALIDADES DEL INMUEBLE.


NOMBRE DEL PREDIO: ESAP - Sede Escuela Superior de Administración Publica - Bucaramanga.

LOCALIZACIÓN: La sede se encuentra ubicada en la calle 28 No. 31-07 del barrio Aurora.



Imagen 1. Ubicación predio.

CS Escaneado con CamScanner

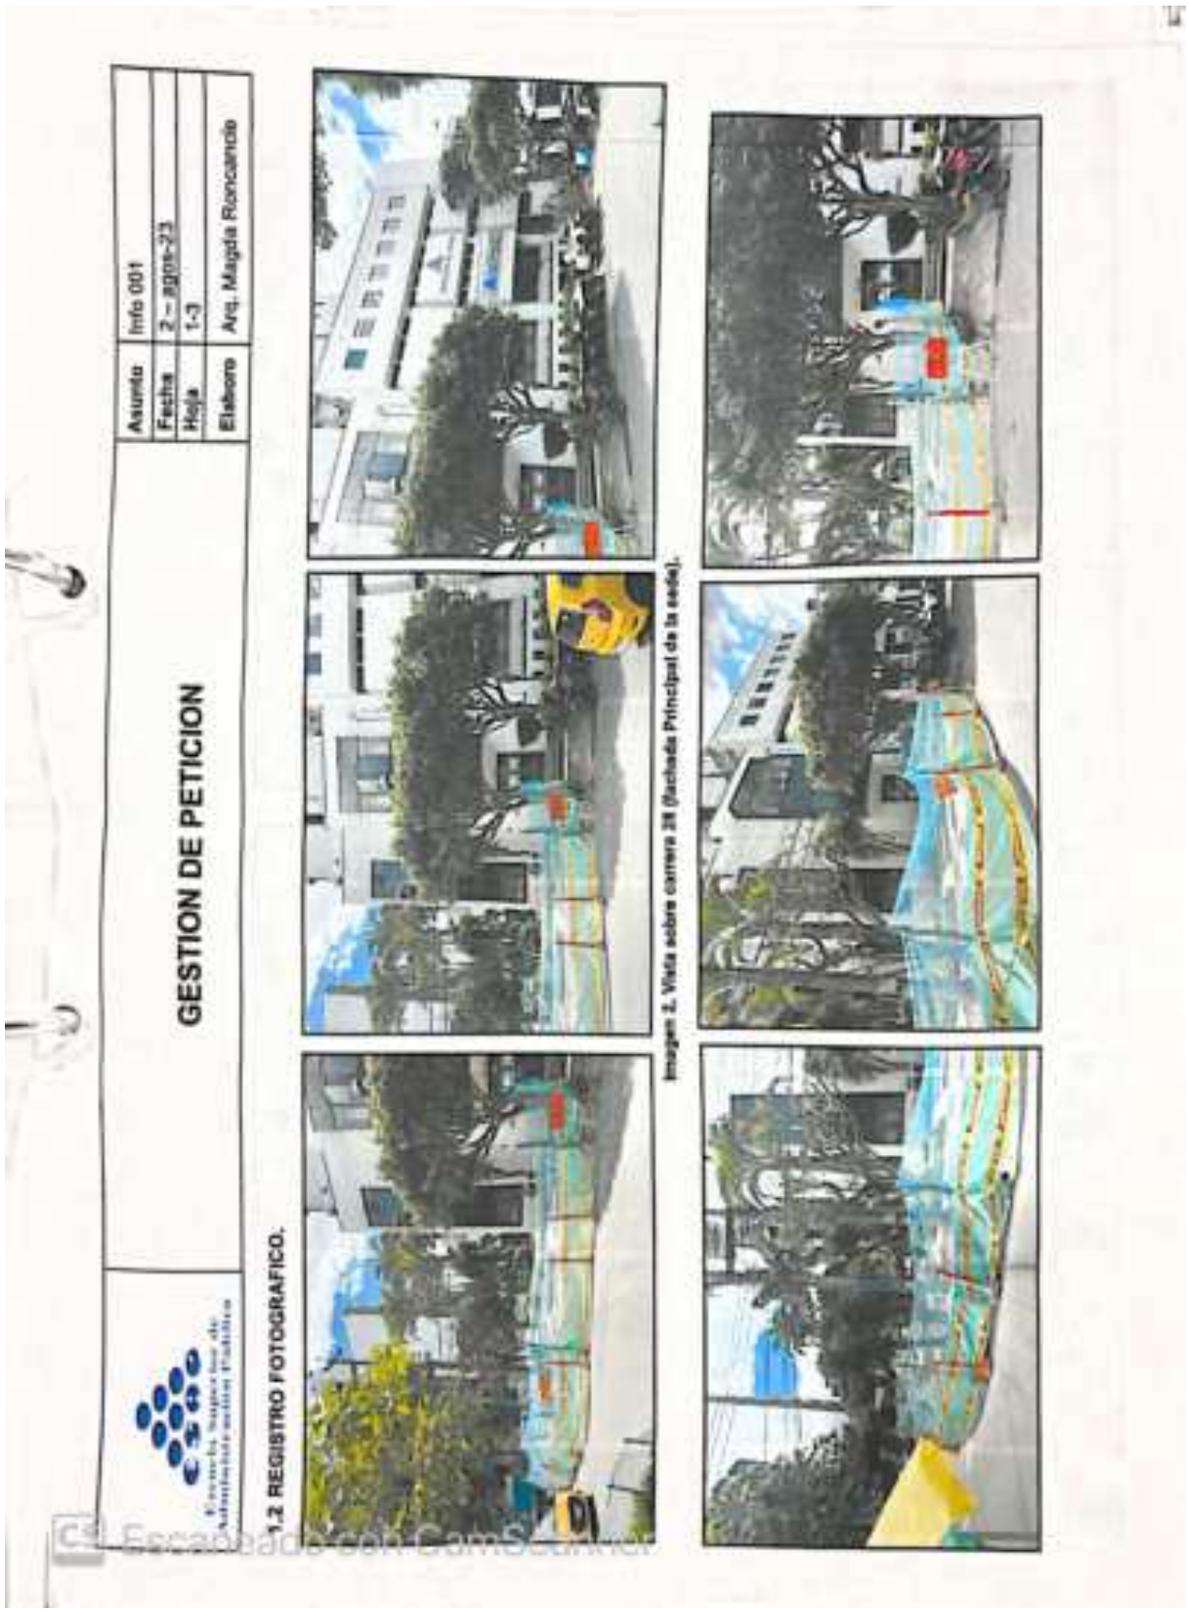


GESTION DE PETICION

Asunto	Info 001
Fecha	2 – ago-23
Hoja	1-3
Elaboro	Arq. Magda Roncancio

1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO.

Imagen 2. Vista sobre carrera 28 (Fachada Principal de la sede).

Escaneado con CamScanner

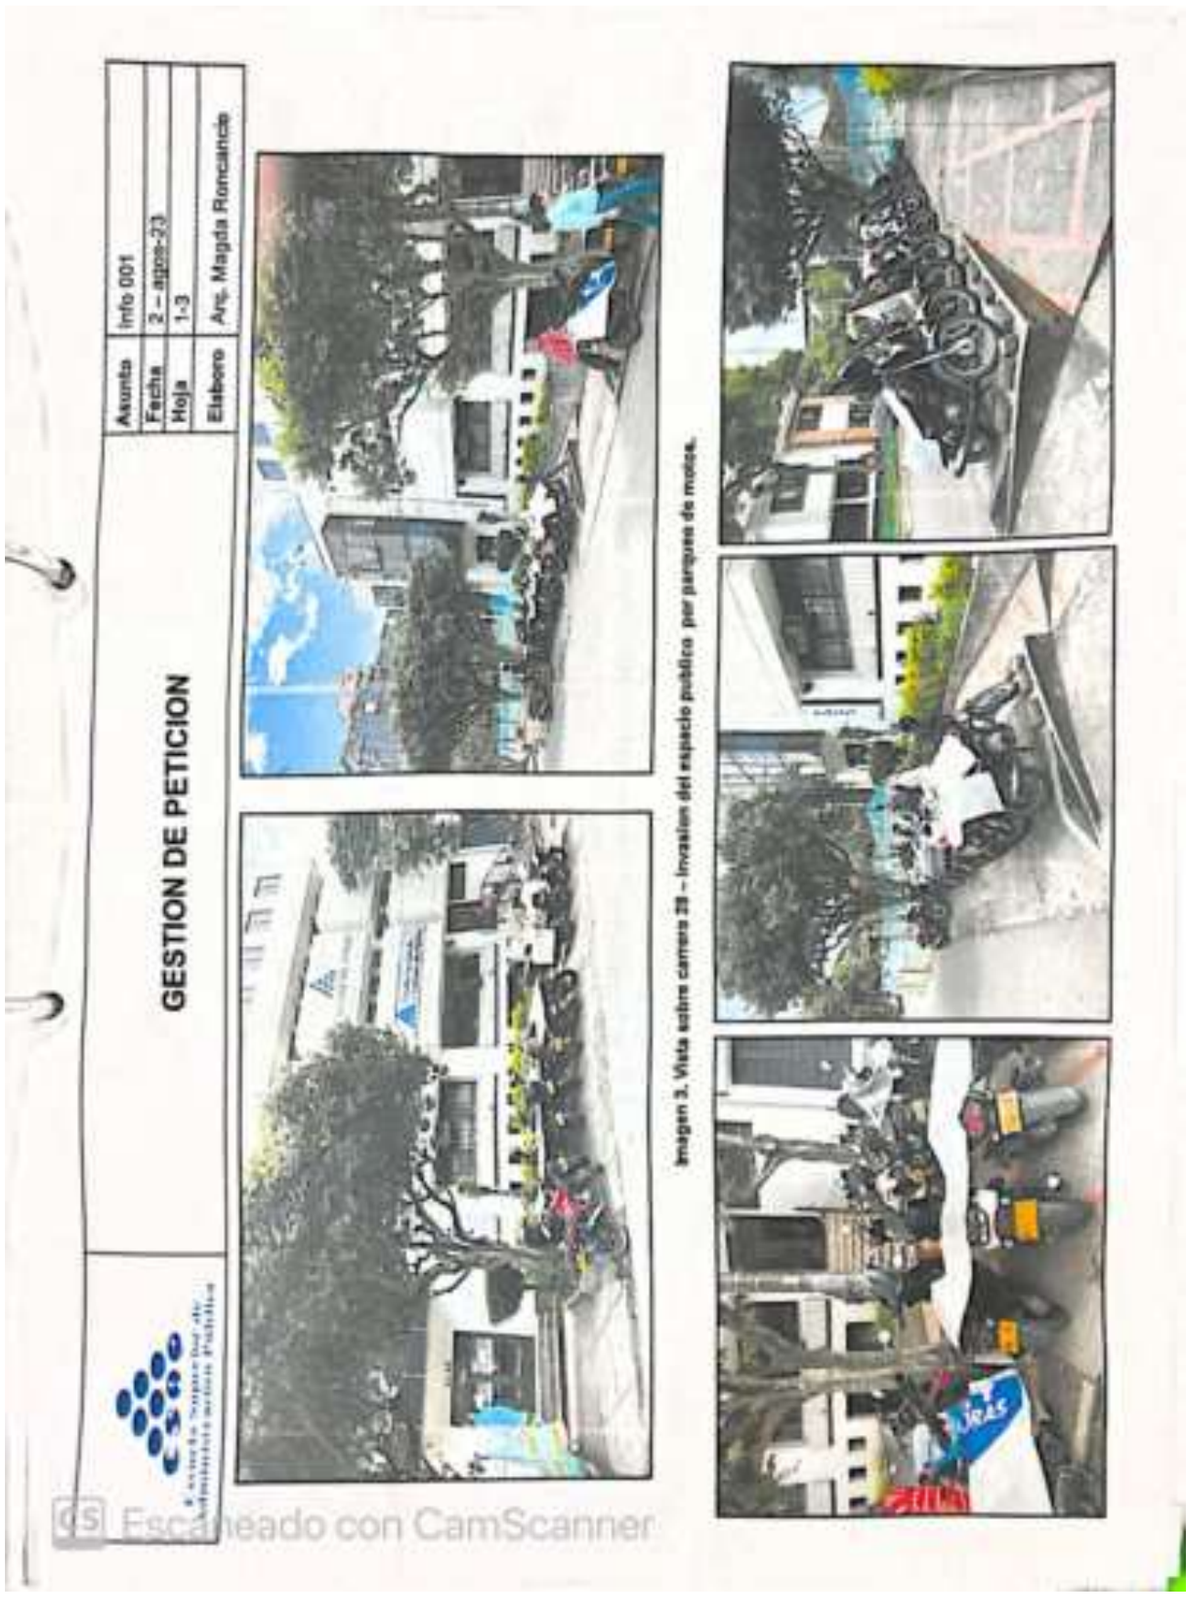
GESTION DE PETICION
Asunto info 001
Fecha 2 – agos-23
Hoja 1-3
Elaboro Arq. Magda Roncancio
Imagen 3. Vista sobre carrera 28 – invasion del espacio publico por parques de motos.
Escaneado con CamScanner


GESTION DE PETICION
Asunto Info 601
Fecha 2 – agos-23
Hoja 1-3
Elaboro Arq. Magda Roncancio
Imagen 4. Andenes sobre acceso principal de la sede.
Escaneado con CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 115

Bogotá D.C. 23 de agosto 2023

Señores
ESAP- TERRITORIAL SANTANDER
Atn. Javier Antonio Rosas
Coordinador administrativo

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER. **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio la Aurora emitida el 02 de agosto

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio la Aurora acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición de la propiedad ubicada en la Cra 28 # 31 -07, en la cual se solicita la intervención del sendero peatonal frente a la institución ESAP, dando respuesta positiva, se aprueba por parte de interventoría este sendero hasta la mitad de la cuadra ejecutando aproximadamente 20 metros lineales, ya que se realiza un balance presupuestal y se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de la obra.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

Recibido: Javier Antonio Rosas
Hora: 3:00 pm
Fecha: 23 agosto 2023

ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
C.C. No. 1.100.963.525 de San Gil
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C. Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAP

Escaneado con CamScanner

7

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD" ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	31/01/2023
		Versión	1
		Página	Página 1 de 1

Fecha: 2 Agosto /23

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Edificio Balcones de Bologna
Número del documento de identidad	804003447-2
Dirección	Calle 31 # 28-48
Número(s) de teléfono(s)	607 6351468
Correo electrónico	edificiobalconesdebologna2018@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Solicitamos: que los pinos y el Arbol que se Encuentran en la Jardinera del edificio se les preserven la Vina.
Se quite el circulo de ladrillos, y se haga la Jardinera con el modelo del proyecto de vias

Firma del peticionario: EDIFICIO BALCONES DE BOLOGNA
Administradora

CS Escaneado con CamScanner


Escaneado con CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 118

Bogotá D.C. 24 de agosto de 2023

Señora
María del Pilar Acevedo Vargas
37.820.931
Edificio balcones de bologna Calle 31No. 28-48

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio La Aurora emitida el 02 de agosto de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio La Aurora acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición del edificio balcones de Bologna, en la cual se solicita amablemente que las palmas y el árbol que se encuentran en la jardinera del edificio se les preserveren la vida, quitando el circulo de ladrillo y que en su defecto se haga la jardinera con el modelo del proyecto actual. Dando respuesta a lo solicitado su requerimiento procede por cuanto que en el manual de espacio público está contemplada que para zonas residenciales debe de contener una franja ambiental con grama, vegetación o gramoquín.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido
Hora: 24 agosto 2023
Fecha: 11:00 AM

Cordialmente,

ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
C.C. No. 1.100.963.523 de San Gil
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C. Oficina
Elaboró: [illegible]
Revisó: [illegible]
Aprobó: OAF

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD" ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	23/01/2023
		Versión	1
		Página	Página 1 de 1

Fecha: 29 Agosto

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	Queja	Reclamo	Sugerencia	Denuncia
☐	☐	☒	☐	☐

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Silvia Paola Diaz James
Número del documento de identidad	1.098.605.319
Dirección	Calle 20 # 29-34
Número(s) de teléfono(s)	3183556379.- 3013604147
Correo electrónico	Silvispaodiaz@hotmail.com

3. DESCRIPCIÓN.
Relate los motivos de su PQRSD

El Reclamo que estoy presentando el dia de hoy se debe a la demora y la no terminacion del trabajo de anden el cual se esta realizando frente al negocio : Salon de belleza Nails house del cual soy administradora, el anden con compromiso de culminacion desde el dia sabado 26 Agosto/2023 no ha tenido intervencion por obreros, llegando a hoy 29 de Agosto sin culminar. Esta demora afecta significativamente a nuestro local ya que muchos clientes tienen inconvenientes para su llegada, ademas tenemos una gran cantidad de tierra que ingreso a nuestro local Solicitamos prontitud en terminar esta obra frente a nuestro local

Firma del peticionario:

Escaneado con CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 104

Bogotá D C. 29 de agosto 2023

Señora
SILVIA PAOLA DIAZ JAIMES
Arrendataria del inmueble ubicado en la calle 20 # 29-34

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER. **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio San Alonso emitida el 29 de agosto

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio San Alonso acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición de la residencia ubicada en la calle 20 # 29-34, con el tema de los comerciantes afectados por la ejecución de la obra, es importante tener en cuenta que se están realizando las actividades según el contrato 022- 2023 suscrito con la alcaldía de Bucaramanga, direccionado por la secretaría de Infraestructura al cual se le debe de dar cumplimiento en su totalidad, entendemos la molestia de la comunidad por las obras que se realizan en la actualidad, pero la ejecución del mismo se ha realizado de acuerdo a lo estipulado, sin embargo es importante resaltar se ha venido afectando el desarrollo de la misma por residentes del sector ya que ha sido difícil coordinar la entrada y salida de vehículos, esto ha generado atrasos y reprocesos ya que se ha requerido cambiar los prefabricados afectados debido a los daños que los vehículos han causado. Desconocemos la fecha mencionada por la peticionaria referente a la terminación de la obra ya que esta no corresponde a la programada.

Sin embargo, la solicitud fue tomada en cuenta y desde la parte técnica se tendrá muy presente la necesidad de dar terminación en el menor tiempo posible para no generar más impacto en la comunidad.

Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.


Cordialmente,

ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
C.C. No. 1.100.963.523 de San Gil
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Recibido: Silvia Paola Diaz
Fecha: 5-Agosto
Hora: 11:55 am

C.C. Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DM

Escaneado con CamScanner

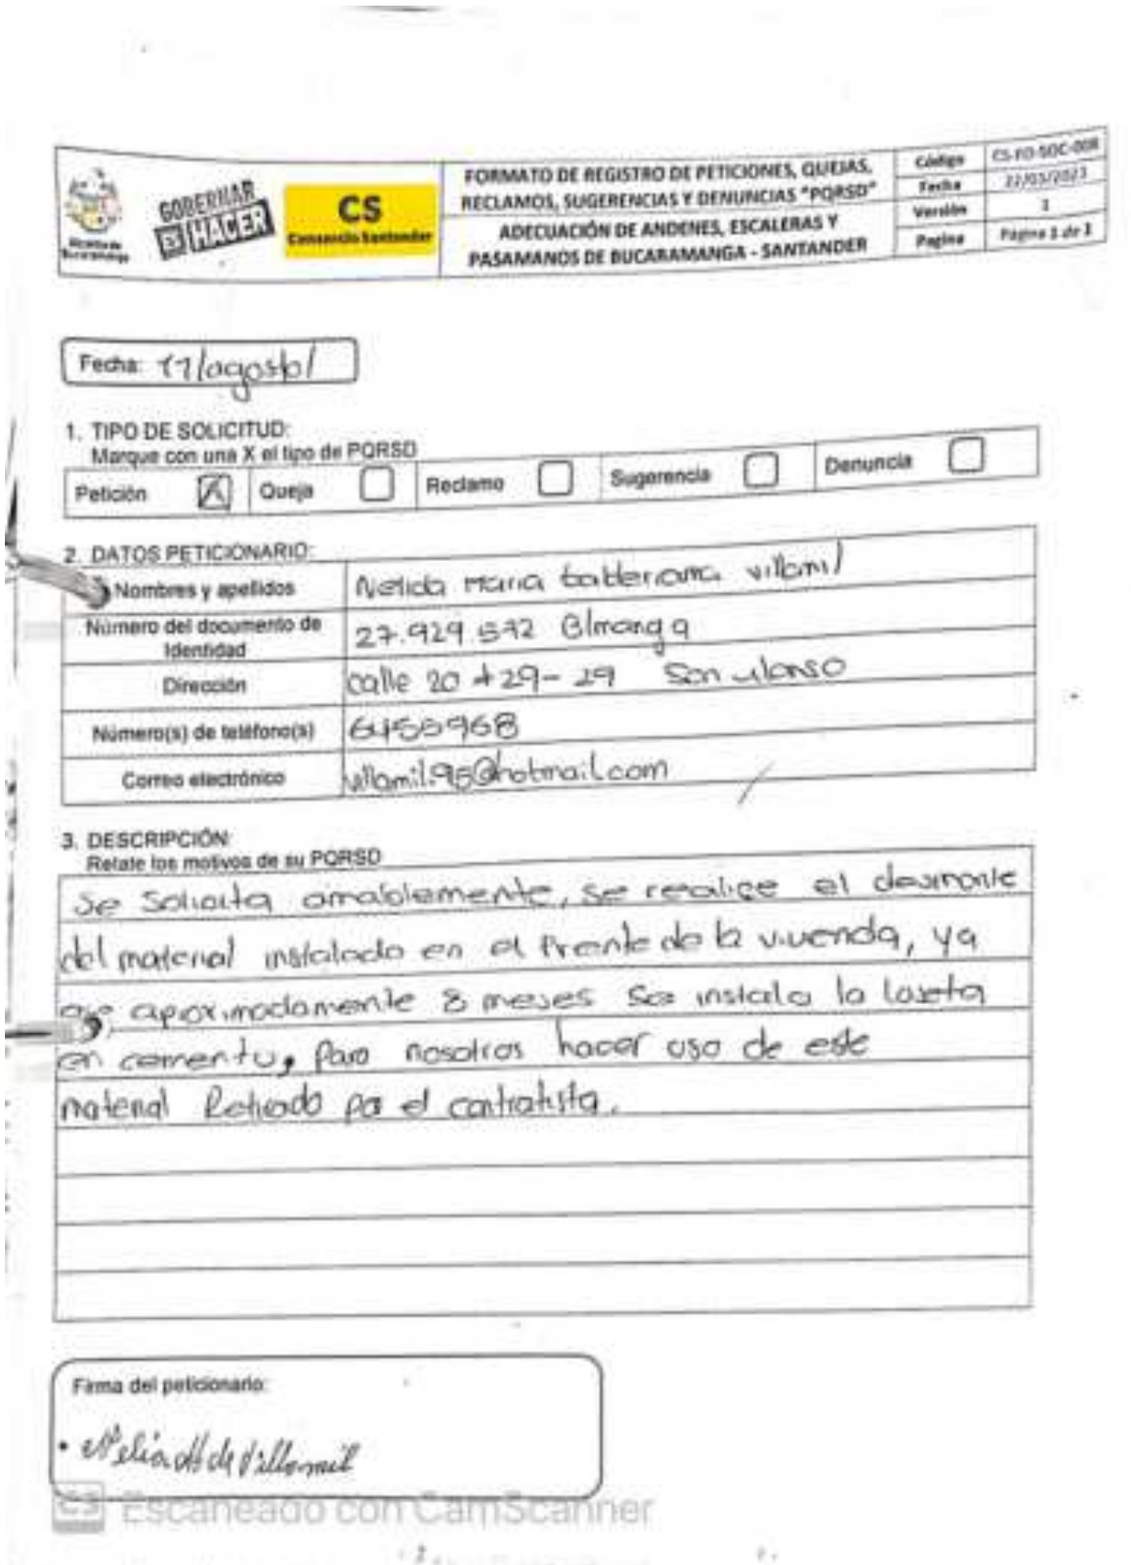

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander

FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-008
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 17 agosto

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Nelida maria tatiana villamil
Número del documento de identidad	27.929.592 Bmanga
Dirección	calle 20 #29-29 San alonso
Número(s) de teléfono(s)	6459968
Correo electrónico	villamil95@hotmail.com

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

Se solicita amablemente, se realice el desmonte del material instalado en el frente de la vivienda, ya que aproximadamente 8 meses se instala la loseta en cemento, para nosotros hacer uso de este material retirado por el contratista.

Firma del peticionario:

• Nelida M. de Villamil

Escaneado con CamScanner

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 110

Bogotá D.C. 29 de agosto 2023

Señora
NELIDA MARIA BALDERRAMA VILLAMIL
Arrendataria del inmueble ubicado en la calle 20 # 29-29

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER. **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio San Alonso emitida el 11 de agosto

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio San Alonso acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición de la residencia ubicada en la calle 20 #29-29, le informamos que damos respuesta positiva a su solicitud, indicando al personal de obra realizar el retiro del material solicitado intentando conservar el mayor posible para ser entregado a ustedes para posterior reutilización a su conveniencia.

Se adjunta registro fotográfico del retiro y acopio del material.



Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.


Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

ANGIE LORENA MONSALVE OBDOÑEZ
C.C. No. 1.100.963.522 de San Gil
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Recibido: Nelida Baldarrama
Fecha: 29/08/2023
Hora: 12:00pm

C.C. Oficina
Elaboró: [illegible]
Aprobó: DAP

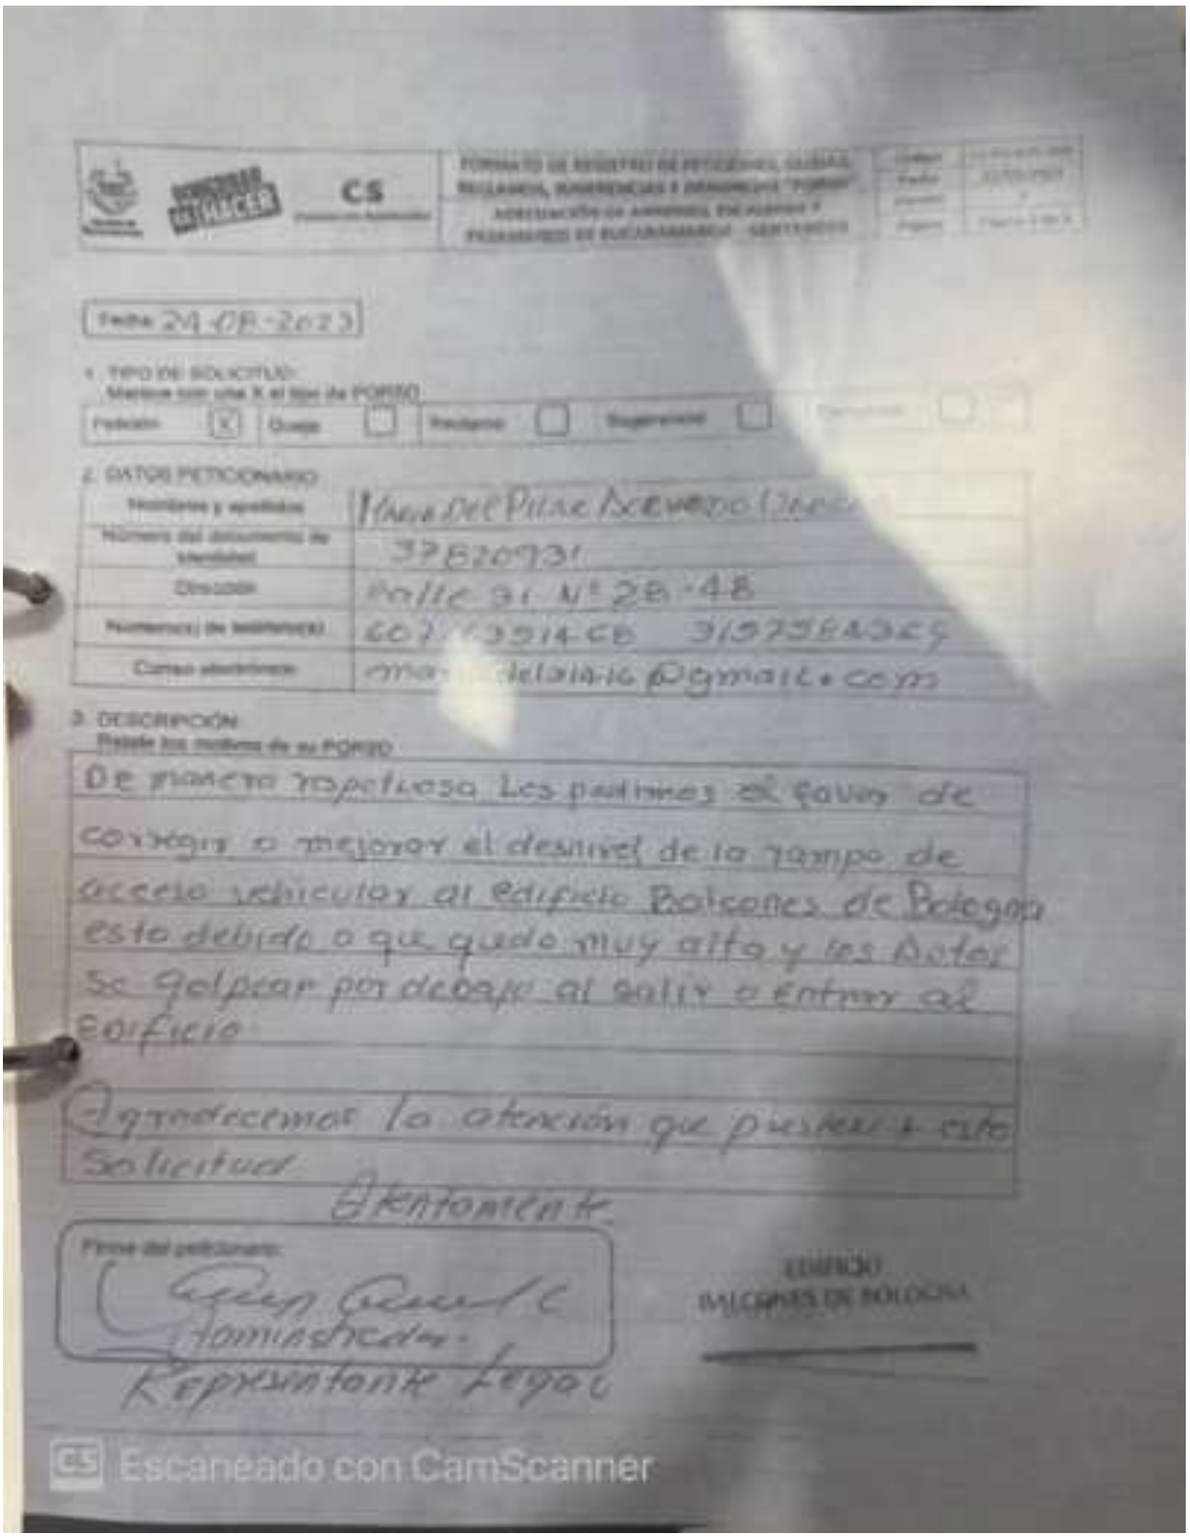

CS

Fecha 24-08-2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Felicitación	

2. DATOS PETICIONARIO

Nombres y apellidos	Maria del Pilar Acevedo Jaimes
Número del documento de identidad	37820731
Dirección	Calle 31 N° 28-48
Número(s) de teléfono(s)	607 6334466 3137584369
Correo electrónico	mar...delpilar16@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN
Relate los motivos de su PQRSD

De manera respetuosa les pedimos el favor de corregir o mejorar el desnivel de la rampa de acceso vehicular al edificio Balcones de Bolonia esto debido a que quedo muy alta y los Botes se golpean por debajo al salir o entrar al edificio.

Agradecemos la atención que prestes a esta solicitud.

Atentamente.

Firma del peticionario:

Representante Legal

EDIFICIO BALCONES DE BOLONIA

CS Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 117

Bogotá D C. 04 de septiembre de 2023

Señora
María del Pilar Acevedo Vargas
37.820.931
Edificio balcones de bologna Calle 31No. 28-48

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio La Aurora emitida el 24 de agosto de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio La Aurora acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición del edificio balcones de Bologna, en la cual se solicita amablemente corregir el desnivel de la rampa de acceso vehicular ya que manifiestan varios propietarios que queda muy alta y los carros se golpean por debajo al salir y entrar del edificio.

En respuesta a su solicitud nos permitimos manifestar que de acuerdo al manual del espacio publico la rampa vehicular ubicada en el predio de la calle 31 No. 28-48, cumple con los diseños y especificaciones técnicas correspondientes a la rampa construida; no obstante le comunicamos a los residentes del edificio que el Consorcio Santander en atención a la solicitud realizara una modificación para bajar la pendiente de diseño y que esta sea funcional para el servicio de la comunidad de acuerdo a lo solicitado en la pqrs.


Recordamos a la comunidad que Consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Cordialmente,

ANGIE LORENA MONSALVE ORDOÑEZ
C.C. No. 1.100.963.023 de San Gil
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Recibido: Administradora
Fecha: 01 sept 23
Hora: _____

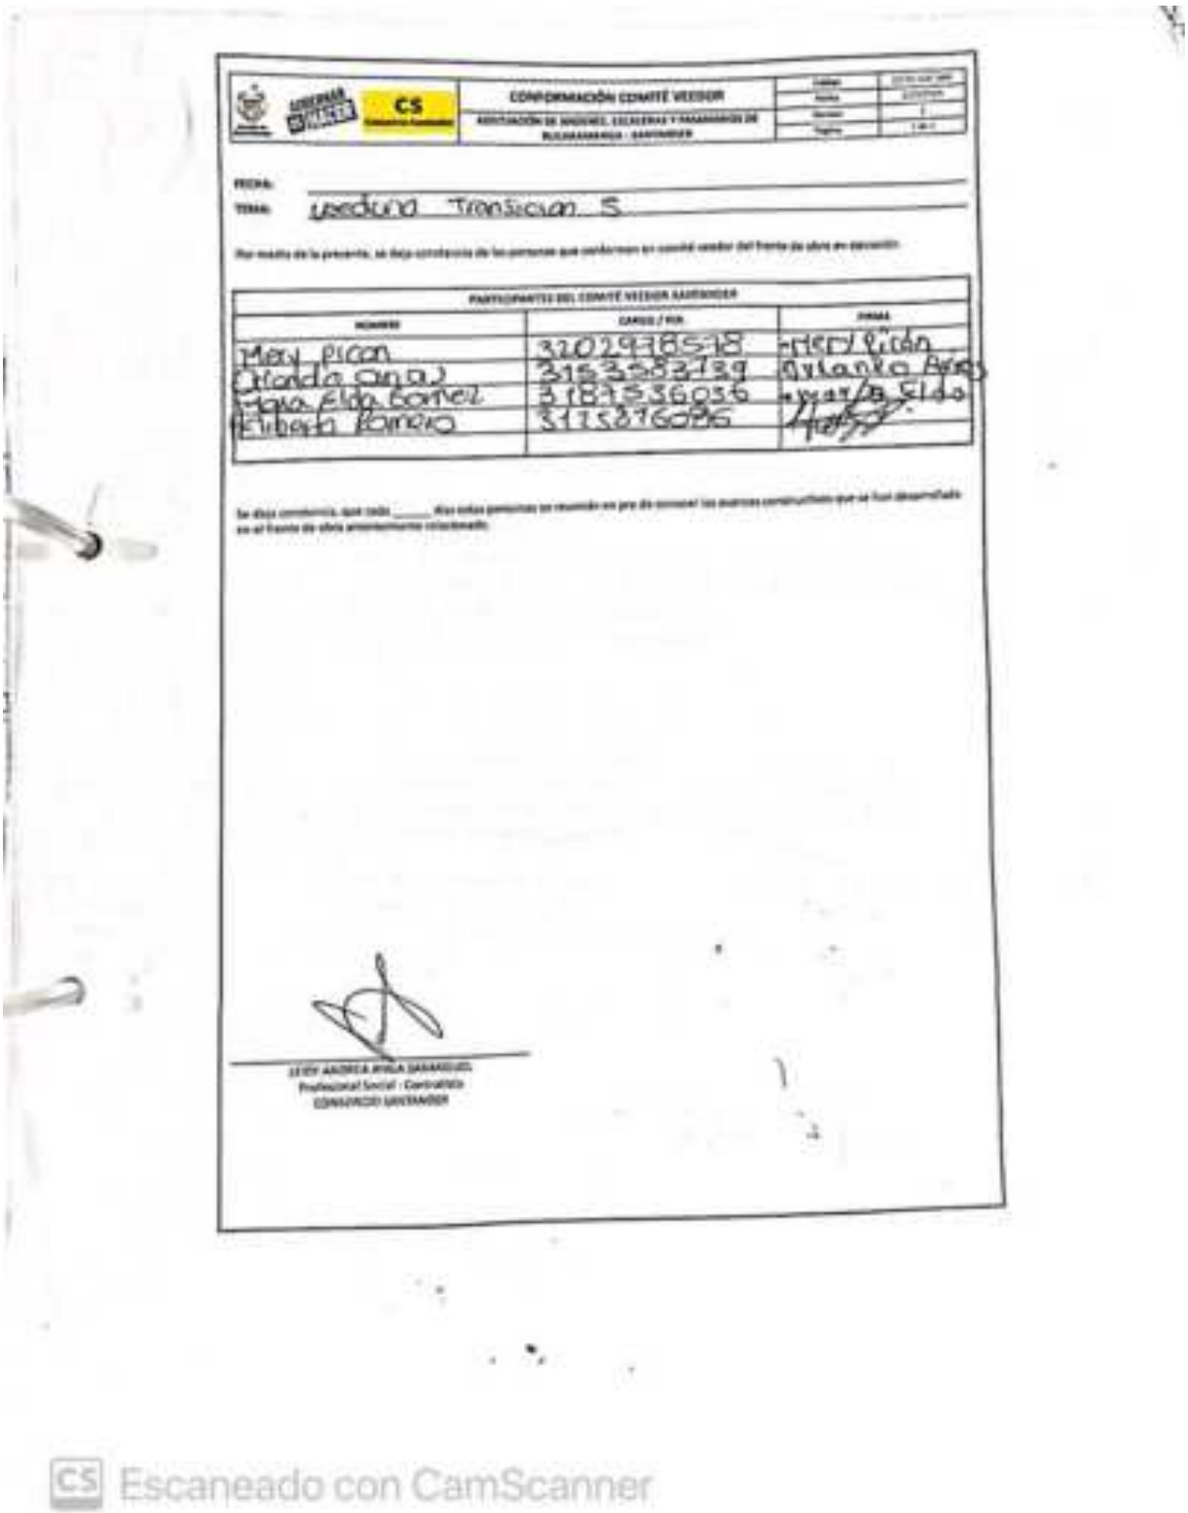

CONFORMACIÓN COMITÉ VEEDOR

ASISTENCIA DE MAQUINAS, ESCALERAS Y HAMANDOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

FECHA:

TEMA: Vecindad Transicion 5

Por medio de la presente, se deja constancia de los asistentes que conforman en comité veedor del frente de obra en ejecución

PARTICIPANTES DEL COMITÉ VEEDOR SANTANDER

NOMBRE	CARGO / CC	FIRMA
Mary Pican	3202936518	
Orlando Ariza	3153283739	
Maria Elda Gomez	3183536036	
Heriberto Romero	3135276086	

Se deja constancia, que siendo _____ días todas personas se reunieron en pro de conocer las mejoras constructivas que se han desarrollado en el frente de obra anteriormente relacionado

LEIDY ANDREA AVILA SARAVIA
Profesional Social - Contratista
CONSORCIO SANTANDER

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 6

FECHA: 17/ Agosto /2023	**HORA INICIO: 2:00 pm**	**ACTA N°: #16**
LUGAR: Salón social Cra 21B #18-04	**HORA FIN: 4:00 pm**	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de obra a construir, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas que permiten evidenciar los tramos a intervenir, especificando lo que corresponde a recursos propios y a presupuestos participativos del año 2021. A su vez se expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad la importancia de realizar y ejecutar dicha obra, se muestra evidencia fotográfica del estado de los senderos peatonales como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio de tránsito de personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto

Se reitera a la comunidad el valor total del presupuesto asignado para el barrio Transición V y el origen de cada uno de los recursos, se dan las direcciones exactas de los tramos a intervenir y el valor de ejecución.

Se resuelven dudas, preguntas e inquietudes que se presentaron respecto al tramo a intervenir, la comunidad refiere que hay otros sitios que debieron de ser priorizados, no obstante, se aclara que todas las obras son de gran importancia y que a medida que la junta de acción comunal va solicitando a la alcaldía más tramos para intervenir se van arreglando más andenes peatonales.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 6

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	Área social- Consorcio Santander	JULIO

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	Profesional del área social	
ESLENDY CORZO AGUILAR	Trabajadora social interventoria Jesak SAS	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Escaneado con CamScanner

SOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 3 de 6





Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 4 de 6

INVITACION A REUNION

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

CONTRATO 022

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

TRANSICION SECTOR 5

Fecha: 17 agosto 2023

Lugar: Salon social Cra 21b #1b -04

Hora: 2:00pm

CONSORCIO SANTANDER
Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com


INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8

Volante informativo #1

Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	21/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 9 de 6

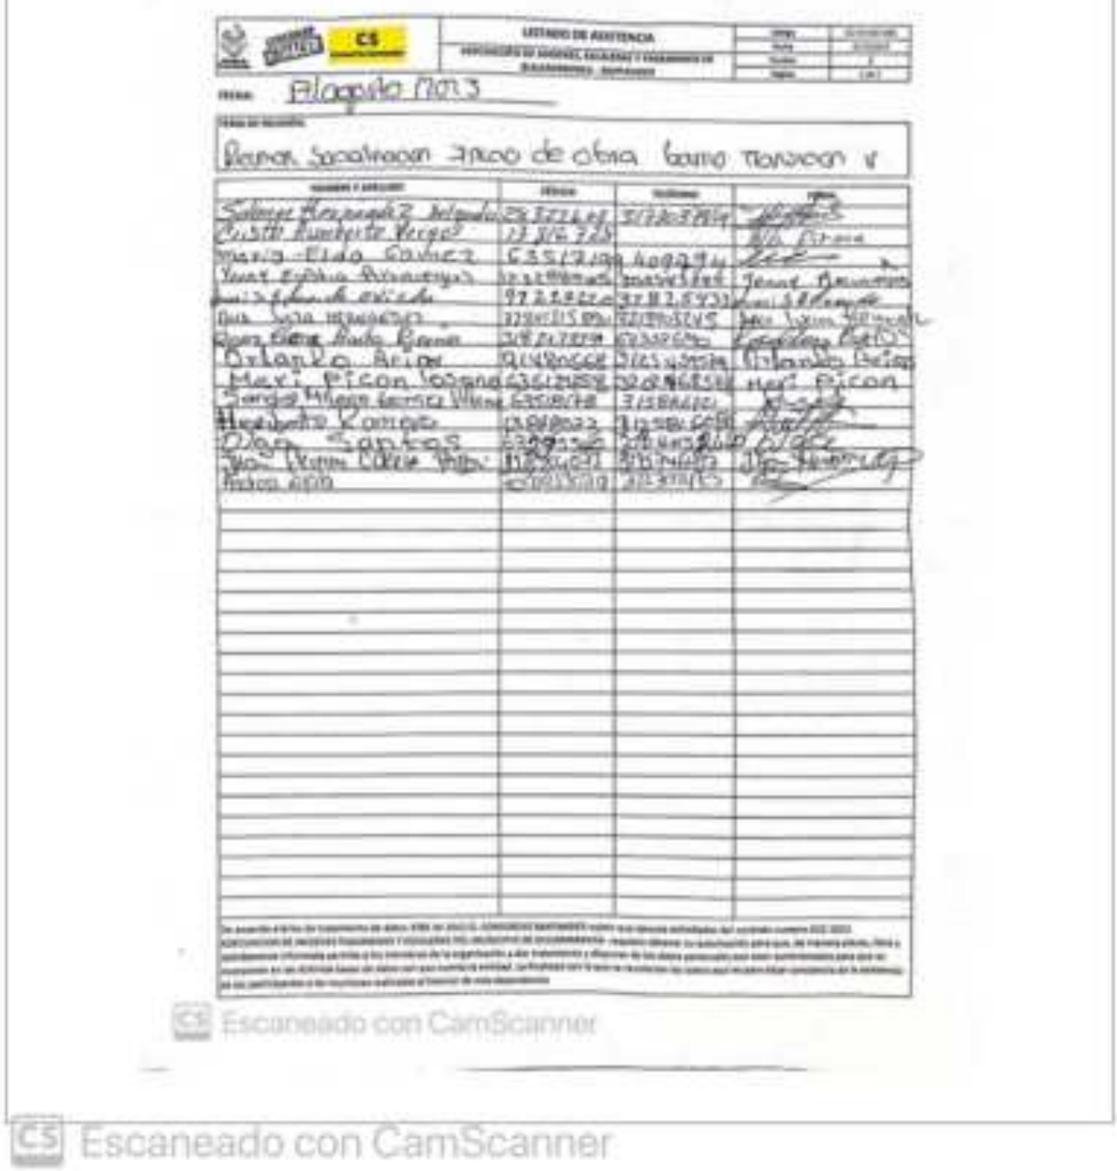

FECHA: Abril 13

Reunion Socializacion Inicio de obra barrio Mantagua II

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

SOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 5

FECHA: 18 / Agosto / 2023	HORA INICIO: 3:00 pm	ACTA N°: #15
LUGAR: FRENTE A LA TIENDA DE TATIS	HORA FIN: 5:00 pm	

1. TEMAS A TRATAR

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la Interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances y las características del contrato, además las nuevas especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir en el sector.
- Presentación del plan de gestión social y sus componentes.
- Respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

2. AVANCES Y ACUERDOS

El día 18 se realiza con la comunidad de Albania una segunda reunión de Socialización para informar el nuevo alcance del contrato, en el cual se expone el orden del día, se presenta el personal contratista de consorcio Santander, Interventoría Jesak SAS y equipo profesional social de infraestructura. Se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado.

Por parte del consorcio Santander la profesional encargada realiza la socialización y presentación de la obra, por medio de unas dispositivas informativas que permiten evidenciar los tramos a intervenir, especificando lo que corresponde a recursos propios y a presupuestos participativos del año 2021. A su vez se expone el contenido del componente de Gestión Social que incluye:

- Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto.
- Programa de información a la comunidad: Actividades que comprenden de reunión de socialización de inicio, avance y cierre.
- Programa de divulgación.
- Programa de participación ciudadana: Creación de una veeduría
- Programa de atención al ciudadano, a PQRS
- Programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Durante la socialización se le explica a la comunidad que el día 02 de junio se había realizado la primera reunión de socialización de inicio de obra en la cual se muestra evidencia fotográfica del estado de los andenes, como carecen de condiciones necesarias para prestar un adecuado servicio al tráfico de personas que circulan por el sector, además se expuso los objetivos y alcances del proyecto

Se le expone el perfil vial de la zona, en el cual especifica que la vía es peatonal mas no vehicular, la comunidad en general no está de acuerdo que se quite acceso a los vehículos ya que esto generaría un impacto social entre ellos.

Posterior a dicha reunión en la secretaria de infraestructura realizo un estudio de dimensionamiento de estructura para mejoramiento de pavimento entregado por el taller de arquitectura quienes deciden que se van hacer andenes en concreto para que cumpliera con doble función como transito peatonal y vehicular.

CS Escaneado con CamScanner

SOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 5

Dicho mejoramiento se ejecutará desde la cra 51 desde la casa 18-51 hasta la vivienda 20-67, la comunidad queda muy agradecida por los cambios para el mejoramiento del pavimento.

Nota: La reunión se desarrolla adecuadamente, no se presentaron inconvenientes de inseguridad o discordias en el sector.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Socializar avance de obra con el comité de participación ciudadana	Área social- Consorcio Santander	JUNIO
Dar respuesta a petición de la comunidad en la reunión de inicio de obra	Área social- infraestructura	JUNIO-JULIO

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
LEIDY ANDREA AYALA SANMIGUEL	Profesional del área social	
ESLENDY CORZO AGUILAR	Trabajadora social interventoria Jesak SAS	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CS Escaneado con CamScanner

SOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 3 de 5







CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 4 de 5

INVITACION A REUNION

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

CONTRATO 022
ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA

COMUNA 14 - BARRIO ALBANIA

Fecha: 18 de agosto de 2023

Lugar: Frente a la tienda de tatis, antigua tienda la chula

Hora: 3:00pm

CONSORCIO SANTANDER
Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com


INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8

Volante informativo #2

Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)

Escaneado con CamScanner

SOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 9 de 5

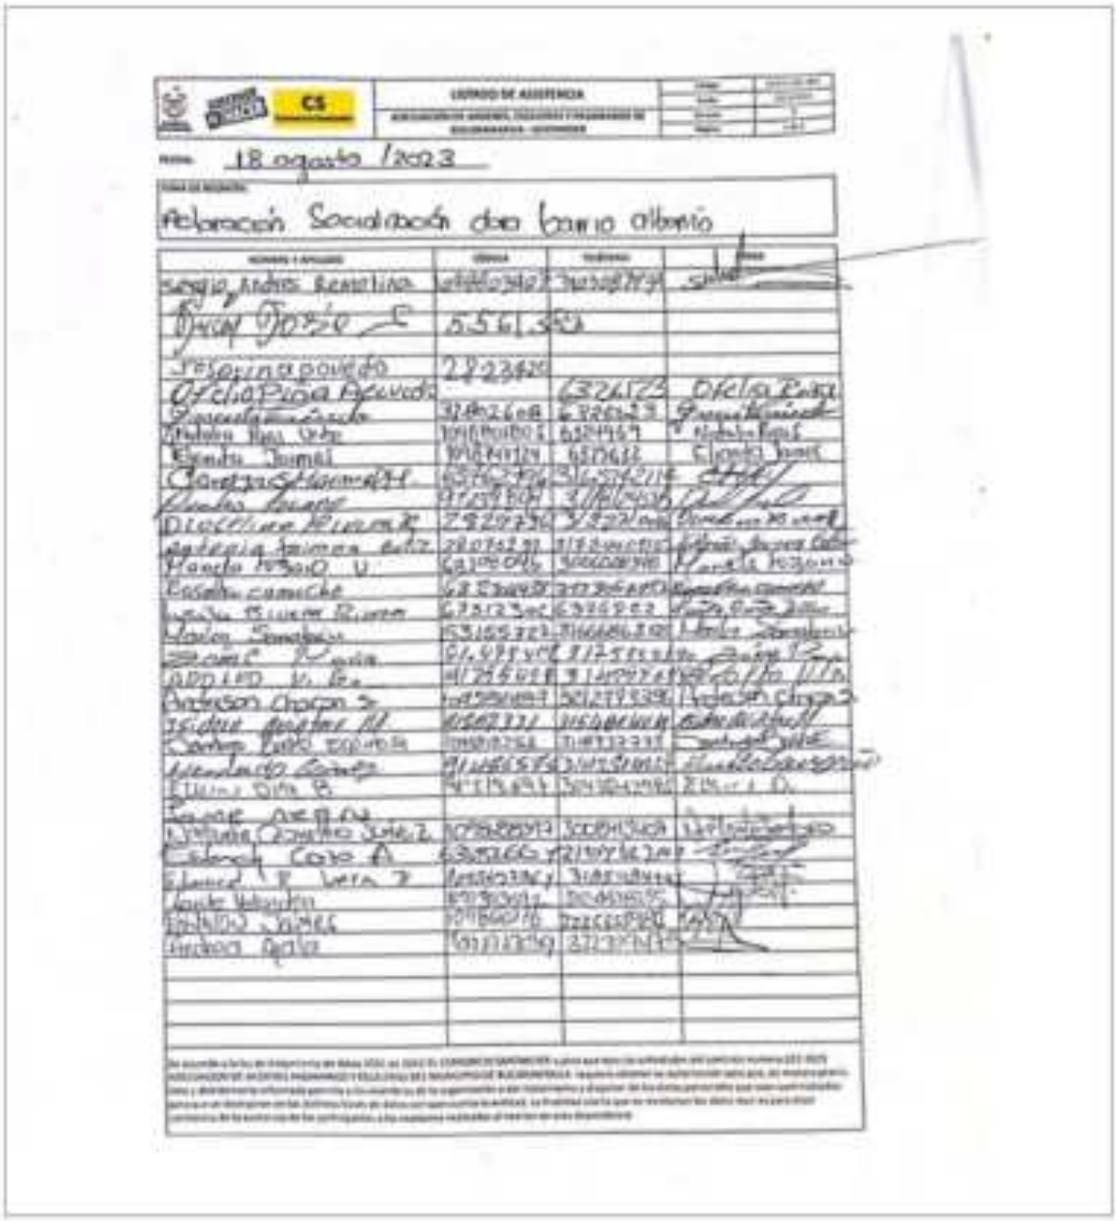

Fecha: 18 agosto 2023

Tema de reunión: Aclaración Socialización obra barrio alberto

CS Escaneado con CamScanner

	REGISTRO DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD	Código	
		Fecha	
		Versión	0
		Página	1 de 1

FECHA: 30 agosto 2023

ENTREGA DE COPIA ACTA DE VECINDAD

FRENTE	DIRECCIÓN	FIRMA
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-05	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-14	
SAN ALONSO	CALLE 20 #29-19	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-23	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-25	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-28	Nubia Rocativa
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-29	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-31	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-33	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-34	Silvia Nicola Mora
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-37	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-42	Alberto vargas
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-49	
SAN ALONSO	CALLE 20 # 29-57	
SAN ALONSO	EDIFICIO HABITAR JIMENEZ	
SAN ALONSO	EDIFICIO FRANKFURT	
SAN ALONSO	CALLE 20 #29-61	
SAN ALONSO	CALLE 20 #29-71	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER cuyos que ejecuta actividades del contrato numero 013-2021 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, preste a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que son suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

	REGISTRO DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD	Código	
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	
		Versión	0
		Página	1 de 1

FECHA: _____

ENTREGA DE COPIA ACTA DE VECINDAD CHAPINERO

FRENTE	DIRECCIÓN	FIRMA
CHAPINERO	CALLE 5 #16-11	Eddy Bruno Quiroga
CHAPINERO	CRA 17 #4 - 28	
CHAPINERO	CALLE 5 # 16-25	
CHAPINERO	CALLE 5 #16-55	Maria Judith
CHAPINERO	CALLE 5 #16-43	Nichel Vega
CHAPINERO	CALLE 5 # 16-43	
CHAPINERO	CRA 17 #4-72	Pedro J. Gomez
CHAPINERO	CRA 16 # 4-018	Elm Pena
CHAPINERO	CRA 17 # 4-66	
CHAPINERO	CRA 17 # 4-60	
CHAPINERO	CRA 17 #4- 48	
CHAPINERO	CRA 17 #4-42	
CHAPINERO	CRA 17 #4-02	Ruth Carmen Reyes
CHAPINERO	CRA 17 # 4-16	
CHAPINERO	CRA 17 # 04-04	Hilda Neira
CHAPINERO	CALLE 4 #16-60	Yolyan Reyes
CHAPINERO	CALLE 4 #16-56	Luis Eduardo S
CHAPINERO	CALLE 4 #16-50	
CHAPINERO	CALLE 4 # 16-42	
CHAPINERO	CALLE 4 #16-34	
CHAPINERO	CALLE 4 #16-24	
CHAPINERO	CALLE 4 #16-18	Freddy Badillo
CHAPINERO		
CHAPINERO		
CHAPINERO		
CHAPINERO		
CHAPINERO		

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2019 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 096

Bogotá D C. 14 de agosto 2023

Señor
JAIME ARMANDO CARREÑO SUPELANO
91.539.534
Propietario de la vivienda Carrera 17#4-60

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1**"

Asunto: Acta de servicios de luz - Barrio Chapinero

Cordial saludo.

El día 10 de agosto con el señor Jaime Carreño propietario de la vivienda ubicada en la Cra 17 #4-60 se llegaron a los siguientes acuerdos:

- Suministrar servicio de energía y agua con la condición de pagos anticipados por la suma de $150.000, ya sea dinero en efectivo o por transferencia bancaria.
- Si los desvíos de energía y agua sobre pasan el valor acordado, el contratista deberá pagarle al propietario el excedente de la desviación.
- Propietario manifiesta que, si al terminar la ejecución de la obra el servicio de energía y agua mantiene el aumento de kilovatios usados, el consorcio Santander deberá pagar el excedente ya que su consumo promedio de los últimos 6 meses no supera los $80.000 pesos en el caso de la luz.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Recibido: 13826459
Fecha: 15/agosto/2023
Hora: 3:30pm

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C: Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAP

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 18 agosto/2023 HORA INICIO: 10:00 pm ACTA N°: 01

LUGAR: Calle 20 # 29-14 HORA FIN: 10:30 Am

1. TEMAS A TRATAR

- Solicitud venta servicio de agua
- Acuerdo de valor a pagar por consumo
- Entrega del dinero acordado.

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 18 de agosto en la calle 20 #29-14 se reune Personal del contratista con el señor. Gilberto Roa. / la profesional Social Andrea Ayala, Profesional HSEQ Bernardo suarez, en el cual se llego a un acuerdo de pago pa el valor de $100000 Consumo que si se llega a pasar dicho valor en el desvio del agua el contratista debera pagar excedente.

Periodo facturado mes mayo por el valor de $146.430.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 3

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Cecilia Ardila	Propietaria	
Bernardo Suarez C	HSEQ	
Andrea Ayala	Profesional Social	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Cecilia 3142305955.

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 29/agosto/2023 HORA INICIO: 7:00PM ACTA N°: 1

LUGAR: calle 20 #29-14 HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

1. Servicios de luz
2. Acuerdo bodega

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 29 de agosto en horas de la mañana se reunen la profesional social del contratista y la propietaria de la vivienda ubicada en la calle 20 #29-14, con la finalidad de llegar a un acuerdo de la valoración de los servicios de energia por el valor de $200000 pesos, dinero que se le da en efectivo en el mismo dia.

A su vez se acuerda del arriendo de un espacio en el garaje de la vivienda por $80.000.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-TO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2


3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Ramon Mendoza	Inspector	
Andrea Ariza	Profesional Social	
Cecilia Ardila Rios	propietaria	
Bernardo Suarez Garcia	HSEQ	

CS Escaneado con CamScanner

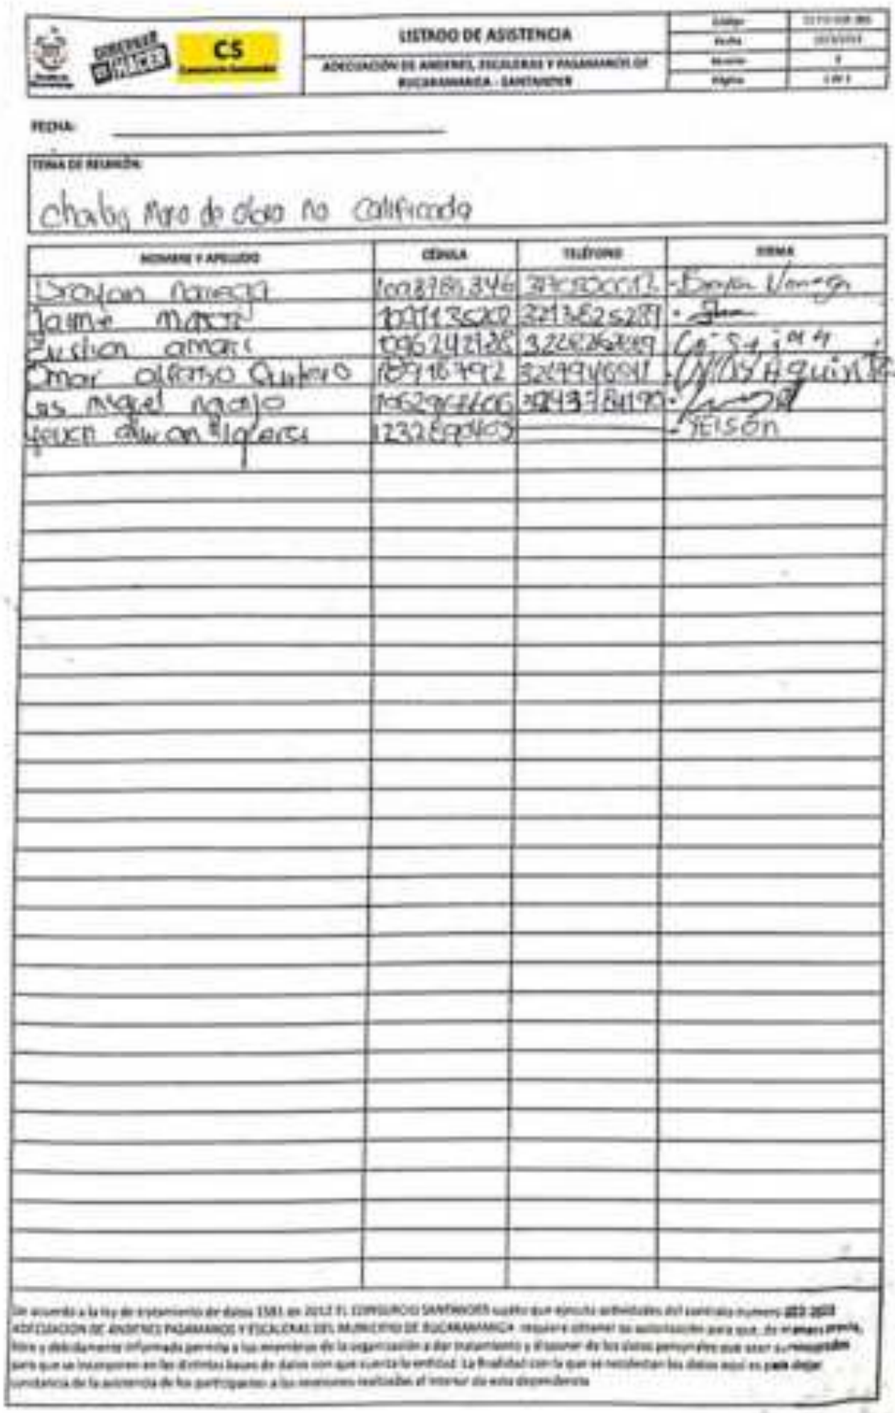

LISTADO DE ASISTENCIA

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código:
Fecha:
Versión: 0
Página:

FECHA:

TEMA DE REUNIÓN:

Charla Plan de Obra No Calificada

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Brayan Narvaez	1003786346	3[illegible]12	Brayan Narvaez
Jaime Mesa	1098135209	3213625287	Jaime
Eusebio amaris	1096242128	3226262469	Eusebio
Omar Alfonso Quintero	1098167972	3229946941	Omar Alfonso Quintero
Luis Angel Rangel	1062[illegible]4606	3[illegible]8190	Luis Angel Rangel
Yeison Alvarez Iglesias	1232[illegible]403		Yeison

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER quien ejecuta actividades del contrato numero 223 2021 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que usted suministre para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238.37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2019
		Página 1 de 2

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
9:00 am	5:00pm	Sec. Invest. Ciclista	5/09/2025

PARTICIPANTES

NOMBRE	AREA
Yomara Taylora	T.S Sr. Infraestructura
Eliandy Cotes	Social Interventoría
Andrea Ayala	Social contratista Grupo 1
Natalia Lopez	Social contratista Grupo 3
Laura Parra	Social contratista Grupo 2

OBJETIVO

Realizar seguimiento al plan de gestión social del proyecto "Andenes".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con profesionales sociales de contratista e interventoría, quienes dan a conocer:

Grupo 1 = Prof. Social Andrea Ayala (contratista)

Entregados = Vegas - Morronco → A satisfacción
Pendientes = Tinas

Abiertos actualmente: San Alonso (4 frentes), Aurora (1 frente), Chapinero (3 frentes), Universidad (2 frentes), Campo Madrid (2 frentes)

Pendientes: Umbrella, Alluvia, El Bosal, la Juventud, Transición abandonado por San Cristobal, Independencia
*Reanudar de inicio ya entregados

Inicio de cierre de actas: San Alonso, la Universidad, Aurora (Martes 05 Sept.)

Grupo 2 = Prof. Social Laura Parra (contratista)

Entregados: Ciudad Campohermoso → A satisfacción

Por entregar: Punta Estrella, Bolivar (calle 91)
Cierre actas de vecindad (05 sept - 08 Sept.)

Pendientes: la Feria, Mercados Publicos (Toma eliminación bolívar)
*Reanudar de inicio ya reabiertos.
Abiertos: Aurora, Nuevo Santander, Sotomayor, Trabo.
*Sotomayor - se debe informar que no se ejecutaron todos los tramos, ya existen actas de vecindad.

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-MC-1000-238.37-005
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-10-2019
		Página 2 de 2

CONCLUSIONES

Grupo 3 => Natalia Lopez - Social contratista
No se han entregado frentes en la fecha
Abiertos: Mutis, Sauces, Real de Minas, Diamante II, la Victoria, Puerta del Sol, Villa Alicia.
Pendientes: Diamante I, San Luis, Provenza => Ya socializados
*Caso de alerta en San Luis por intervención de peatonales,
*Protesta: falta de acción popular (solo se instalan señales)
Por socializar: Nuevos Bosques (Salud), Cardenales (Lourdes)
a espera de definir temas técnicos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
*Continuar participando de los seguimientos al Plan de gestión social	Social contratista Social interventoria	

Siendo las _____ se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (30) días del mes de Agosto de 2023 y en constancia firman los que en ella intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Natalia Tarazona	
Esteby Goyo Aguilar	
Leidy Andrea Arala S.	
Natalia Lopez	
Javier Yaliseth Perez Usiath	

El **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministradas para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner



CS Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

32/agosto/2023

En horas de la mañana en el edificio el amo se solicitó a la administradora los servicios de agua, se realiza en acta donde se le da $100.000 pesos para el consumo de un mes, se instala una llave de jardín para suministro el agua desde el

CS Escaneado con CamScanner

029

arbajador del edificio
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

el miercoles 02 en horas de la tarde en compañia del inspector del frente de la obra se realizaron carteles informativos para informale a los propietarios de los vehiculos del edificio el amo y Bolivia que el dia 03 de agosto se deshabilitara la entrada y salida a los parqueaderos por motivos de los trabajos que se estan realizando en el proceso constructivo de los anclajes, ya que se requiere un tiempo de secada que comprende de dos a tres dias en el momento de la instalación de losela.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

04/08/2023
La Pto Social hace presencia en el comite de obra en el cual se expone que actividades se han venido ejecutando hasta la fecha, se explica cuales que se han presentado con la comunidad y se deja de compromiso invitar a otras de vecindad en la juventud, hacer sensibilización de inicio de obra en el barrio transicion y y alborada. Profesional Social Pto Social
Lady Andrea Ayala Interventoria

11/08/2023
En horas de la mañana se realizan actas de veeindad y de entorno en el barrio la independencia en compañia del residente de interventoria residente del contratista, profesional HSEQ y residente de gente el señor Manuel con el fin de hacer un reconocimiento en la zona y realizar un replanteo para dejar listo el barrio [illegible] actividades constructivas.
Lady Andrea Ayala — Profesional Social.

030

14/08/2023
en la calle 70 entre 79 - 10 y 79-25 en compañía del Residente de interventoria se le informa al propietario el cierre a las rampas de acceso vehicular dejandole un solo acceso en la vivienda
Lady Andrea Ayala
Profesional Social
Residente Interventoria

15/08/2023
En el barrio el Rosal en horas de la mañana se realizan actos de vecindad y de enlace en el sector en compañia de los inspectores de interventoria y del contratista dejandole al contratista el frente listo para iniciar actividades constructivas
Lady Andrea Ayala
Profesional social.

16/08/2023
En la calle 70 entre 29 y 30 en los edificios Hotata de diamante y Hotata de Florencia en compañia del HSEQ se habla con los administradores de los edificios para el retiro de los pines que tenian a los alrededores de los edificios ya que interferian en el proceso constructivo por los ruidos de que al ingresar a los accesos de grupo
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

19/08/2023
En el barrio Transicion V se realiza Socialización de inicio de obra para informarle a la comunidad las actividades que se van a iniciar en el contrato 022-2023 con presupuestos propios del municipio, en el cual se expone el orden del dia, se presenta el personal contratista, interventoria Jesus SAS y equipo Profesional social de intervention. se le agradece a la comunidad en general por el acompañamiento y tiempo prestado

Escaneado con CamScanner

031

Reporte del consorcio Santander se expone el plan de gestor social el origen de los propósitos se explica el perfil vial, el material con el que se va a ejecutar la obra y finalmente se crea el comité de veedurías ciudadanas.

Lady Andrea Ayala
Profesional Social. Pro. Social Interventoría

18/08/2023

En el barrio Sardinel calle 20 en el edificio Frankfurt se hace entrega de una carta de bajería la cual estaba ubicada en la parte de afuera del edificio se le hace entrega al propietario del apartamento 501 se hace en cada turno por la persona que recibe la carta se hace registro fotográfico del retiro de la misma.

Lady Andrea Ayala
Profesional Social

En el barrio alborada se realiza una segunda socialización de inicio de obra con el fin de explicarle a la comunidad cual era el alcance de la obra que los ordenes ejecutaran en concreto cumpliendo una doble función tanto peatonal como vehicular a satisfacción de la comunidad quedaron agradecimos por mantenernos el contacto y dejar habilitado el paso de vehículos.

Lady Andrea Ayala
Profesional Social Pr. Social Interventoría

22/08/2023

El día 22 de agosto al propietario de la calle 20 #21-60 Barrio Sardinel se hizo entrega de una boleta los cuales se encontraban ubicados en la parte de afuera de la vivienda.

Lady Andrea Ayala
Profesional Social

CS Escaneado con CamScanner

032

24-08/2023
en el barrio la acuora en el edificio balcones de bologna se recibe una pqrs en la cual piden corregir o regular el desnivel de la rampa de acceso vehicular, esto debido a que queda muy alta y los carros se golpean por debajo al salir o entrar al edificio, se pasa solicitud al contratista encargado para realizar la respectiva gestión
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

25-08/2023
El dia 25 de agosto se realizó el comite #11 en el cual el contratista expuso los inconvenientes que se ha presentado durante el mes, informando que se da por finalizado todas las reuniones de socialización de inicio, y que quedan pendientes, actas de vecindad de intervención V y alborada, adicional se programan fechas para actas de vecindad de cierre en la acuora, la universidad y son diagonal frente!
Lady Andrea Ayala
Profesional Social
P. Social interventoria


28-08/2023
En la cra 10 #29-47 Se entabla una conversación con el señor carlos jefe administrador de la empresa de aceites con el fin de informarle el retiro de una jardinera la cual estaba invadiendo el espacio publico a su vez se le informa que para este dia se le debe habilitar el ingreso al parqueadero por actividades de demolición.
Lady Andrea Ayala.
Profesional Social.

En compañia del HSEQ y la profesional Social se realizo [illegible] en el frente de demolicion

033

calle 20 a la vereda de obra no calificada 49 que a nivel psiquico estas generan actuan aumentan la capacidad de autocontrol, disminuyen la ansiedad, el estres, la agresividad y episodios depresivos, estimulando la capacidad afectiva y mejora de los procesos de concentracion.
Leidy Andrea Arcila
Profesional Social

29-08-2013
En compañia de la profesional Social de interventoria en horas de la tarde se realizo encuesta a puerta en la calle 20 entre 29 y 30 barrio San Alonso informandole a la comunidad que se esta ejecutando el contrato 022-2013 de adecuacion de andenes, en el cual se ha venido Realizando las actividades necesarias para la construccion de estos, por tal motivo, se necesita la colaboracion para la no interrupcion de estas labores, ya que requieren un tiempo de secado que comprende de dos a tres dias en el momento de la instalacion por tal motivo a los residentes que cuenten con vehiculos se les recomienda que para el tiempo respectivo en cada actividad (Demolicion, instalacion de Bordinetes e instalacion de losetas), dejen los vehiculos guardados o en su defecto les guarden en otro lugar para poder hacer uso de ellos y asi no interfieran en la ejecucion de la obra.
Leidy Andrea Arcila
Profesional Social
Teniendo en cuenta el oficio CS2013 COM-107 enviado por el contratista se realizo visita a la calle 20 # San Alonso para indagar con la comunidad las diferentes situaciones que se vienen presentando en este frente de obra la cual manifiestan inconformidad frente a la falta de parqueadero, debiendo dejar para realizar

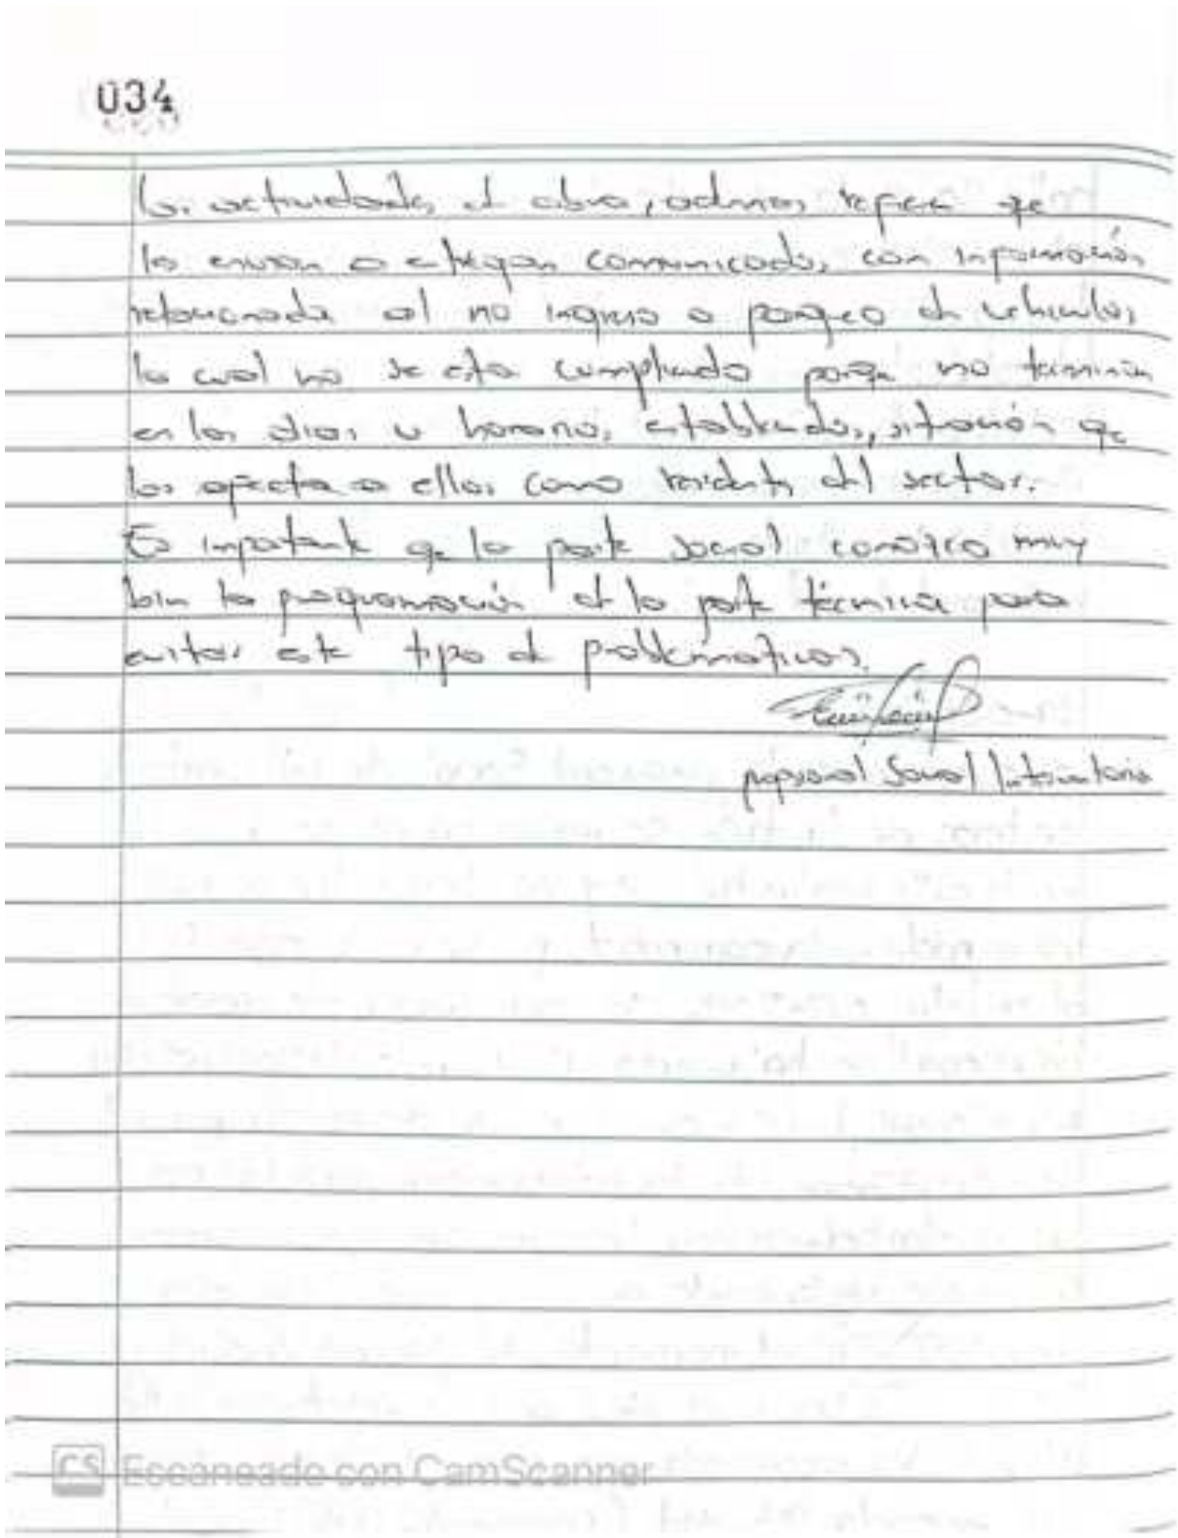

034

Las actividades de obra, además repercuten que los envíos o entregas comunicados, con información retenida al no ingreso o porteo de vehículos, la cual no se ha cumplido para no terminar en los días y horarios establecidos, situación que los afecta a ellos como vecinos del sector.

Es importante que la parte social conozca muy bien la programación de la parte técnica para evitar este tipo de problemáticas.

Personal Social Interventoría

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE ENTORNO	Código	CS-FO-SOC-006
		Fecha	22/2/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: 25 agosto /2023 PROYECTO: CONTRATO 022 - 2023

DD: | MM: | AA: | La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el cual se van a realizar las adecuaciones

TRAMO O BARRIO: Campo Madrid

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

En el barrio campo madrid, Sector parqueadero frente a las torres de campo madrid, se determina segun el alcance del contrato la instalacion de barandas para el sector.

Segun visita se totalizan 433 metros de baranda para cambio y 190 metros para mantenimiento. Estas estan distribuidas en diferentes partes de las torres y zonas comunes.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

1 de

GOBERNAR ES HACER

CS Concesión Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 9 MES OR AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Calidad de Ocupante:

Dirección: Calle 19a # 03-07

Teléfono: No. de predio:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónico	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☒ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Cuenta con dos (2) garajes: SI ☐ NO ☐

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. AGRIETAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☒ no tiene	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Techo en zinc		tabla	Vdodizo tabla		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Vivienda totalmente en retales de tabla, sin cimiento, se toma registro fotografico de la vivienda desde la vía externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: ANDREA AYALA
C.C.

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: VALENTI CUARTAS
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/04/2025
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante de seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE ESTA FORMA HACE QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y HACE CONSTAR QUE LAS OBRAS EJECUTADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL BARRIO DE ESTA DIRECCIÓN SON PROPIEDAD PRIVADA DEL CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

GOBIERNO QUE SÍ HACER — CS Comercio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-ROC-003
Fecha	[illegible]
Versión	3
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 822-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 11 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: [illegible]

Cédula de Ciudadanía: 1.095.829.431

Dirección: Calle 190 # 8-11

Teléfono: 3193326-31 No. de predio ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Independencia

SERVICIOS PUBLICOS

			OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Religioso	☐
4. Institucional y del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Existe: SI ☐ NO ☐

Uso del predio:

11. Ninguno ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIMIENTOS 3. AGRIETAMIENTOS 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Indique manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fibras, cerramiento y techos)
COMENTARIOS		Bloque visto		Teja y zinc			concreto		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAN

Elizabeth Ortiz — Representante Unidad Social — Nombre: ___ C.C. O NIT: ___

Residente de Obra - Contratista — Nombre: ILIANA VELANDIA — C.C. O NIT: [illegible]

Residente Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O NIT: [illegible]

Residente de Obra - Interventoria — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT: [illegible]

Profesional Social - Interventoria — Nombre: GREGORY CORZO — C.C. O NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-EOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Describir lo relevante al seguimiento y/o visita

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Powered by CamScanner

CS Constructor Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	31/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No: 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 19 MES 05 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Calle 19a # 3-10
Teléfono: No. de pisos:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o de Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vial	☐

ACCESO VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒
Uso del garaje:
11. Bifamiliar ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. AGRIETAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	Mal estado	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Instalar tramos de tapas, bordes y rematadas, separación metálica y de madera, en fierro inoxidable y bordes
COMENTARIOS		Regular estado							

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentran propietarios se toma registro fotografico de la vivienda desde la parte externa

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: ILIANA VELASCO
C.C. O NIT

Profesional Social - Consultoría
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O TARJETA

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VIVAS
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: EDILSON OSPINO
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBIERNAS SI HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/01/2023
		Versión	1
		Página	1 de 7

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir la referente al seguimiento y/o visita

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE SER CONFORME, CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA CONCERTADA Y LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LOS VECINOS O DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE DEBE SER NOTIFICADO POR EL CONTRATISTA

1

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Fiscalizadora, Interventoría, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Comercio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 823-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 11 MM 03 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Rafael Salazar

Cédula de Ciudadanía: 1552298

Dirección: calle 19 # 2-74

Teléfono: 6339240 No. de pisos: 1 Barrio: Independencia

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfono	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES:

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒ CAT

ESTADO DEL PREDIO: En edificación ☒ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional y del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Otros	☐

ACCESIBILIDAD VEHICULAR: Carga (no del garaje) SI ☐ NO ☒

11. Ninguno ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en líneas vecindarios y fuentes)
2. HUNDIMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. AGRIETAMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		machimbre				madera	piso en concreto		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONCEPTOS DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: casa totalmente en madera, machimbre, con teja de zinc, piso en concreto

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre: Rafael Salazar
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Sergio VELASCO
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: GILBERT CORTES
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version	2
		Pagina	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir en renglones el seguimiento que exista

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y EVALUADO RECIENTE Y BIEN ACONDICIONADO A LOS INTERESADOS A ESTAR A LO CONSTATADO EN LA VISITA EN EL MARCO DE ESTA DEBIDAS SER RATIFICADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventoría, Fiscalizador de Gestión Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Constructor Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-008
Fecha	23/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 11 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cámara de Copropiedad:

Dirección: Calle 19A 3-25

Teléfono: ____ No. de placa: ____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Independencia

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfono	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES:

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐ CLASE:

ESTADO DEL PREDIO: En edificio ☐ Casa Sola ☐ Tradicional ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: Si ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Empinado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bodega	☐
3. Industrial	☐	8. Institucional	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vías	☐

ACTIVIDADES INDUCTORAS

Comercial	SI ☐	NO ☒	
Uso del garaje			
11. Bilhares	☐		
12. Otros	☐		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	ENTRAMADO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
CAMBIOS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	Filtración manejo de aguas lluvias y residuales, escombros acumulados y de madera, en Muros, Hundimiento y Sumideros
COMENTARIOS		Muros rotos con pintura					Concreto	Escalera	

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentra a nadie en la vivienda se toma registro fotografico y filmico desde la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Ejecutor de Obra - Contratista
Nombre: JUAN VELANDIA
C.C. 01187

Profesional Social - Interventoría
Nombre: ANDREA AVILA
C.C.

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. 1188

Profesional Ambiental - Interventoría
Nombre: SERGIO CORDO
C.C.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-ICIC-003
CS Comercio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	DD/MM/AAA
		Versión	2
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Subdirección de Vivienda, Hábitat y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Comercio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-IDC-009
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 023-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 11 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Ocupante ___

Nombre del Propietario: Ruben alfonso tolet

Cédula de Ciudadanía: 1005028593

Dirección: calle 19a # 8-29

Teléfono: ___ No. de piso: ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: En sitio ☐ Otro Cual ☐ Temporal ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PROPIETARIO DEL TERRENO: Ocupado ☐ Desocupado ☒ Parte ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Agropecuario	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o de Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agroindustrial	☐	10. Vivienda	☐

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☒; Uso del garaje: 11. Ninguno ☐; 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	SUBESTRUC	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Distribuir manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en blanco: mencionar y describir
2. HUNDIMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. ASENTAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Bueno	Medio malo picado	Bueno		Malo	concreto	Escalera	

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Propietario Unidad Social: Ruben alfonso tolet
Nombre: ___
C.C. o NIT: ___

Residente de Obra - CONSORCIO: Nombre: JUANA VELANTIA
C.C. o NIT: 1098781660

Profesional Social - Consorcio: Nombre: ANDREA AVILA
C.C. 1098393708

Residente de Obra - Interventoría: Nombre: EDWARD VERA
C.C. o NIT: 1098781664

Profesional Social - Interventoría: Nombre: EDILBERTO TORRES
C.C. o NIT: 91521994

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-009
		Fecha	22/03/2023
		Versión	3
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN REALIZADA A CADA UNO DE LOS PUNTOS ACTUALES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTE CONTRATO.

Original: Archivo de Gestión del contratista
Copias: Contratista, supervisor, Administración de Bienes Inmuebles y Gestión Social

Powered by CamScanner

CONSTRUIR ES HACER · CS Constructor Santander	**ACTA DE VECINDAD** ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	22/03/2023
		Versión	3
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 21 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Calle 19a # 3-57

Teléfono: No. de placa:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Defensores

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☑ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Salud	☐	Tiene Uso del garaje: SI ☐ NO ☑	
3. Industrial	☐	8. Asistencial	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUMEDADES 3. HUNDIMIENTOS 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Instalar manejo de aguas lluvias y residuales, sanitaria sanitaria y de madera, en fincas: mandarina y limones)
COMENTARIOS		Buen estado	medio muro			con pasta y Pradaleta	Cerámica		

OBSERVACIONES: No habia nadie y no se encuentra el propietario. se toma registro fotografico y fotografico de la vivienda desde la parte exterior

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LIANA VELASCO	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: DALENNY CONDE
C.C. ☐ NIT	C.C. ☐ NIT	C.C. ☐	C.C. ☐ NIT	C.C. ☐ NIT

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

FACHA	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Usuario.
Copias: Coordinador Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CB-FO-SOC-003
		Fecha	20/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 023-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 11 MES 08 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Cle 19 a # 9-58 Barrio: Independencia

Teléfono: No. de placa:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA

SERVICIOS PÚBLICOS

	#	%	OBSERVACIONES
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfono			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	ACCESO VEHICULAR: Garaje ☐ SI ☐ NO ☒	
2. Comercial	☐	7. Salón	☐	Uso del parque	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	11. Minero	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	12. Otro	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
ASENTAMIENTOS / HUNDIMIENTO / DESPLAZAMIENTO / OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	Describir manejo de aguas lluvias y residuales, sanitarios ecológicos y en madera, en lavar, mandiles y baños)
COMENTARIOS		Bosque Estado		Regular con 2.00		Acabado a la vista	Concreto	Escalera J	

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encontro el propietario

FIRMAS

Responsable Unidad Social: Nombre: ____ C.C. ____

Profesional de Obra - Constructor: Nombre: LUIS VELASCO C.C. [illegible]

Profesional Social - Constructor: Nombre: ANDRES AVILA C.C. [illegible]

Residente de Obra - Interventoría: Nombre: EDWARD VERA C.C. [illegible]

Profesional Social - Interventoría: Nombre: [illegible] C.C. [illegible]

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Gobernación Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-GGC-009
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO NO PLASCO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PARADAS	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir la relevancia del seguimiento que existe

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁ SER RESPONSABILIDAD POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-PO-ADC-005
CS Concesión Santander	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 14 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Sandra Lorena Sánchez Rojas

Cédula de Ciudadanía: _____

Dirección: Calle 4 # 149-03

Teléfono: 3115682386 No. de predio: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin acabar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o de Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje: _____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
CAMBIOS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, viaductos y túneles)
HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEBE VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDA A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Residente Unidad Social — Nombre: _____ C.C. (I.N.F.) _____

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LINA VELASCO C.C. (I.N.F.) _____

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA C.C. (I.N.F.) _____

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA C.C. (I.N.F.) _____

Profesional Social - Interventoría — Nombre: EDUARDO GOMEZ C.C. (I.N.F.) _____

Powered by CamScanner

GOBERNAR SANTANDER

CS

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Powered by CamScanner

CONSTRUIR ES HACER CS	ACTA DE ENTORNO	Código	CI-FO-SOC-008
		Fecha	22/5/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 2023 - 0003
DÍA: 15	MES: 08	AÑO: 2023	La presente acta tiene como objetivo mantener las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las adecuaciones

TRAMO O BARRIO: La Cegadena

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

En la AC 15 entre calle 3 y 5 segun la visita de inspeccion se encontraron 31,3 metros lineales de baranda existente para mantenimiento y 6,46 metros lineales para ejecutar como nuevos.

En la zona de juegos se 19,2 metros lineales de barandales se haran de barandales.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







3. Firmas

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	Código	CI-FO-SOC-006
GOBIERNAR ES HACER · CS Construcción Sostenible	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	31/01/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 037 - 2023
DD 15	MM 08	AA 2023	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las intervenciones

TRAMO O BARRIO: Lote 1

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

Lote de acceso de vehículos con una construcción a un lado en estructura metálica y cubierta en zinc

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








3. FIRMAS

Autor - Líder del trabajo/Barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

SOBERANÍA EN HACER CS Construcción Sostenible	ACTA DE ENTORNO	Código	[illegible]
		Fecha	23/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA	PROYECTO: CONTRATO 031 - 2023
DÍA 17 MM 08 AA 2023	El presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las intervenciones
TRAMO O BARRIO: lote 12	

1. UBICACIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

lote sin uso con un encerramiento en tablas, el cual contiene en mal estado con herramientas, tejuelas y Gaviones.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








3. FIRMAS

Apoyo Social del sector/Barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

1 de

Powered by CamScanner

CONSERVAR ES HACER CS	ACTA DE ENTORNO	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/5/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 023 - 2023
DÍA: 15	MES: 08	AÑO: 2023	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las intervenciones

TRAMO O BARRIO: Cancha tierra el Rosal

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

Lote con una cancha en cerramiento en mampostería, altura metálicas y malla alrededor, existe una construcción de un cuarto para las baterías a un costado en mampostería pintada. Andén actual en Tierra.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL











3. FIRMAS

Nelly Jibeth del Castillo Ramírez	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	Código	
		Fecha	
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	
		Página	

FECHA	PROYECTO: CONTRATO 002 - 2023
DD: 15 MM: 08 AA: 2023	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las intervenciones

TRAMO O BARRIO: Lote 3

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

Lote de uso de via de acceso, se encuentra un arbol en la entrada y el anden esta en concreto con grietas y fisuras.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL








3. FIRMAS

Actor clave del sector/Barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoria	Residente de Obra - Interventoria
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS	ACTA DE ENTORNO	Código	
		Fecha	
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 033 - 2018
DÍA: 16	MES: 05	AÑO: 2018	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las intervenciones

TRAMO O BARRIO: lote 4

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

lote sin uso con gran cantidad de vegetacion, Anden existente en concreto se presenta humedad.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

1 de

Powered by CamScanner

CS	ACTA DE ENTORNO	Código	CS-FO-GDC-004
		Fecha	22/1/2021
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 222 - 2021
DÍA 15	MES 08	AÑO 2021	El presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o tramo en el cual se van a realizar las intervenciones
TRAMO O BARRIO: Parqueadero la 3 Palmas el Real			

1. DESCRIPCIÓN CONDICIONES DEL SECTOR O BARRIO

Rampa acceso vehiculares.

Jose Reinaldo
3157273944

lote de gran extensión con construcciones en estructura metálica y cubierta en zinc para uso de parqueaderos públicos. cerramiento en mampostería y un porton metalico en mal estado.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

1 de

GOBERNAR ES HACER

CS Comercio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Lucila Rodriguez

Cedula de Ciudadanía: 63428324

Dirección: Cra 21 # 52-51

Teléfono: 3012345678 No. de predio:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Poblal

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Telefonía	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: Gas

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: En edificio ☐ Otro Cto ☐ Tradicional ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PROPIETARIO DEL TERRENO: Ocupante ☐ Arrendatario ☐ Propio ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	8. Recreacional	☐
2. Comercial	☑	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Bienestar	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESO VEHICULAR

Cuenta con garaje: SI ☐ NO ☑

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	ORIENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
CIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, canaletas metálicas y de madera, en techos, canaletas y bajantes
ENTREPISOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ESCALERAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ESTRUCTURA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		mayolenta	No tiene	Teja fibrocemento	No se observo	Pintada Antigua en mal estado	Ceramica de 40x40	mal estado ☐	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social: Lucila Rodriguez — Nombre: — C.C. O NIT:

Residente de Obra: — Nombre: JUANA VELANDIA — C.C. O NIT:

Profesional Social: — Nombre: ANDREA ARIZA — C.C.

Residente de SST: — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT:

Profesional Social: — Nombre: JULIANDY GOMEZ — C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Constructora Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-005
		Fecha	22/04/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA – SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LOS PUESTOS ALEDAÑOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA LABORES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventoría, Constructora de Obras Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

CS Constructor Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ☑ Poseedor ___

Nombre del Propietario: [illegible]

Cédula de Ciudadanía: 2254253

Dirección: Calle 29 # 20-08

Teléfono: 3224524349 No. de predio ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	8. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	9. Salud	☐
3. Industrial	☐	10. Seguridad	☐
4. Institucional o de Estado	☐	11. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	12. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Cerca a vía del parque SI ☐ NO ☑

11. Ninguno ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	
3. AGRIETAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	no se observa		no tiene	falta zinc corpa	no se observa	fisurada y pintada	pendiente pintada y rotula	mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: la señora maria Recibela visita pero se niega a firma el acta

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre: ___
C.C. O NIT: ___

Residente de Obra - Contratista
Nombre: SANDY VELANDIA
C.C. O NIT: [illegible]

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT: [illegible]

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT: [illegible]

Profesional Social - Interventoria
Nombre: ___
C.C. O NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-PO-SOC-005
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PUBLICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir la relacion al siguiente ítem clara

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contratista

Copia: Contratista Interventor, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-023
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 323-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MM 03 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Rubiano Estevez

Cédula de Ciudadanía: 91519959

Dirección: calle 54 # 20-69

Teléfono: 3213206664 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Poza 1

SERVICIOS PUBLICOS

	Si	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefónica	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☒

OBSERVACIONES:

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Si ☐ No ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Quebrado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: Si ☒ No ☐

Uso del garaje:

11. Binario ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	ENTRAMADO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL:									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUMEDADES 3. HUNDIMIENTOS 4. DESPLOMAMIENTOS 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	Identificar manejo de aguas lluvias y residuales, registros metálicos y de madera, en ferrat, barandeles y bordes
COMENTARIOS	En se observa	En regular estado	En buen	Placa	No se observa	En regular estado	Cerámica Fortuna	Mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRITO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social: Rubiano Estevez — Nombre: — C.C. o NIT: 91519959

Residente de Obra - Contratista: Nombre: JUAN VELANTE — C.C. o NIT:

Profesional Social - Contratista: Nombre: ANDREA AYALA — C.C. o NIT:

Residente de Obra - Interventoría: Nombre: EDWARD VERA — C.C. o NIT:

Profesional Social - Interventoría: Nombre: VALENTY GOMEZ — C.C. o NIT:

Powered by CamScanner

SOBERNAR ES HACER · CS Constructa Santander	ACTA DE VECINDAD	Codigo
		Fecha
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version
		Pagina 1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento por obra

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE U OBRA ADICIONAL A LAS ANTERIORES ACCIONES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

1

Original: Gestion de Gestion de Calidad

Copias: Contratista, Interventor, Coordinacion de Apoyo Ambiental y Gestion Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-010
		Fecha	22/05/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2025 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DÍA 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Celular de Contacto:

Dirección: Calle 38 # 20-84 Droguería Fenix

Teléfono: Tel. de oficina:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	CUAL

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: En edificio ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional (Educativo, culto religioso)	☐	9. Cultural	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vías	☐

ACCESO VEHICULAR

Tiene vía de acceso: SI ☐ NO ☐

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. MUROS Y PISOS 2. HUNDIMIENTO 3. DESPLAZAMIENTOS 4. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas vecinales y hundidas
COMENTARIOS	No se observa	Pintadas y Empotrados	No tiene	Con Eternit	No se observan	Fachada y Pintadas	No se observa	En Mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita al predio y no se encuentra el propietario, en la vivienda se hace registro fotografico y filmico de la vivienda.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente SST - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: JUAN VELASCO	Nombre: ANDRES AYALA	Nombre: EDWARD HOYA	Nombre:
C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código
		Fecha
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión
		Página

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO NO FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo ejecutado al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA DE ESTA CONSTANCIA, SUS CONDICIONES EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA ASESORÍA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Supervisión de Obra, Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Concesión Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-800.003
Fecha	2023/03/29
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES CB AÑO 223

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Alvaro Sierra

Cédula de Ciudadanía: 91519359

Dirección: Calle 34 # 20-76

Teléfono: 3209206009 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Raval

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESIBILIDAD VEHICULAR

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje:

11. Ninguno ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL: CIMIENTOS Y MUROS / CHAMBANES / CADENAMIENTOS Y ENTREPISOS / LOSAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES ☒	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en ítems respectivos y faltantes)
COMENTARIOS	No se observa	Humedades - Fisuras y en mal estado	No hace	Falta	No se observa	Fisuras en mal estado	Concreto	Mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORresponde a la realidad

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Residente Unidad Social: Nombre: [illegible] ESTEVEZ C.C. 91519359

Residente de Obra - Contratista: Nombre: LINA VELASCO C.C.

Profesional Social - Contratista: Nombre: ANDREA AYALA C.C.

Residente de Obra - Interventoría: Nombre: EDWARD VERA C.C.

Nombre: EDWARD [illegible] C.C.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-005
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO VIS PUBLICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento de obra

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIZADA Y EL(LOS) QUE NO FIRMO O NO QUISO(QUISIERON) A LAS JUNTAS ASESORIAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA NO PARTICIPA POR EL CONTRATISTA.

1

Original: Archivo de Gestión del Contratista.
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Constructia Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	GR-PC-[illegible]
Fecha	[illegible]
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 503-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: _____

Cédula de Ciudadanía: _____

Dirección: Calle 34A # 20-58

Teléfono: _____ No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: el Rosal

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: _____

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: En edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escalonado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Bodega	☐
3. Industrial	☐	8. Asistencial	☐
4. Institucional o de Educación	☐	9. Cultural (Educación cultu religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Cerrado SI ☐ NO ☒

No. de garaje: _____

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ENCHAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	
DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, cumplimiento medidas y de madera, en fincas, transitorios y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Pintura en mal estado y Lavamanos	No tiene	Placa	No se observa	En ceramica	No se observa	En mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: De nueva visita no se encuentran propietarios, por tal se toma el registro fotografico y ficha de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	[illegible]
Nombre:	Nombre: LUISA VILLAMIZAR	Nombre: ANDREA AVILA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: [illegible]
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: [illegible]	C.C. O: [illegible]	C.C. O NIT: [illegible]	C.C. O NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Concesión Santander	ACTA DE VECINDAD	Código
		Fecha
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión: 2
		Página: 2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

MURO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE CUALQUIER CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADOS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Administración de Riesgos Profesionales y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	02/03/2023
		Versión	3
		Página	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 023-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario: Gabriel Cortes
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Calle 54 #30-48
Teléfono: 3176453096 No. de pisos:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosario

SERVICIOS PÚBLICOS

			OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminada ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO	☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACTIVIDAD COMERCIAL ANEXA: SI ☐ NO ☒
Cuál: Uso del predio

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIMIENTOS 3. DESPLAZAMIENTOS 4. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, vegetación invasiva y de basuras, en fincas Vecindarios y Santos)
COMENTARIOS	No se observa	Humedades Escalones en mal estado	Bodega	Roca	No se observa	Ventanas Grids	Enchapes Grids	Escalones en mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: CD 3135698

FIRMAS:

Propietario Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LINDA VELANDIA	Nombre: ANDREA AVILA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ERLENDY CORZO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1098781653	C.C. O NIT: 1098811018	C.C. O NIT: 1098781964	C.C. O NIT: 63531944

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-005
		Fecha	22/04/2020
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Describir lo relevante al seguimiento ya visto

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

CS Comisión Santander	**ACTA DE VECINDAD** ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Codigo: CS-FO-SOC-003 — Fecha: 22/12/2022 — Version: 1 — Pagina: 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 029

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 02 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Calidad de Ocupante: calle 31 # 20-34

Direccion:

Telefono: No. de Casa:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Real

SERVICIOS PÚBLICOS

	Existe	Suficiente
1. Acueducto	☒	☒
2. Alcantarillado	☒	☒
3. Energía	☒	☒
4. Telefonía	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES:

CUEF:

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Empinado ☐ Plano ☒ 50

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Carrera: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	ENTRAMADO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS 2.HUNDIMIENTOS 3.DESPLOMAMIENTOS 4.OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Particular manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas vecindarios y barrios)
COMENTARIOS	No se observa	No se observa	No tiene	Tejas en buen estado	No se observa	Metalica	No se observa	Rotulo	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN EL PRESENTE ACTA CORresponde a lo SOCIAL

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentran Propietarios se realiza registro fotografico y Rotulo.

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: ____ C.C. O NIT: ____

Residente de Obra - Contratista — Nombre: JUANA VELASCO — C.C. O NIT: [illegible]

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O NIT: [illegible]

Residente de Obra - Interventoria — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT: [illegible]

Profesional Social - Interventoria — Nombre: EDILENDY CORZO — C.C. O NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-ADC-000
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	2023/12/23
		Versión	1
		Página	1 de 1

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO NO PLASCO EN MEDIO MAGNETICO)

Obra:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

MURO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento ya visto

DOCHA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL ANDEN DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	**ACTA DE VECINDAD** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-005
		Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 823-2022 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicio ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Carmen elena pacheco

Cédula de Ciudadanía: 26458543

Dirección: calle 5A N # 20-36

Teléfono: 3142342420 No. de predio ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Bosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	Residencial	Comercial	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Obra Gris ☐	Terminado ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	Si ☐	No ☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vivienda	☐
		11. Mixto	☐
		12. Otro	☐

ACCESO VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

No. del garaje:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL CIMIENTOS Y PLACAS ENCHAPES ENLUCIMIENTOS ACABADOS OTROS	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☒ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☒ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☒ ☐ ☐ ☐	☐ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	☒ OBSERVACIONES ☐ ☐ ☐ ☐	(Identificar material de agua fluida o instituidas, carpintería metálica y de madera, en fibras, revestimos y bordes)
COMENTARIOS	Buena condición	Humedades Filtraciones Pintura	Buena	Placa	No se observa	Pintura en buen estado	Cerámica en buen estado	Concreto	

NOTA: SE HACE CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Carmen Pacheco
Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT:

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT: 1098361832

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT:

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT: 1098357864

Profesional Social - Interventoría
Nombre: SOLENEY CORZO
C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código
		Fecha
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión
		Página

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento de obra

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: EN CALIDAD DE CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADOS POR EL CONTRATISTA

Digital Archivo de Gestión del Contrato
Cartas: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercializa Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/04/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: 20 15 MES 05 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Jairo Antonio Romero

Cédula de Ciudadanía: 1902806 274

Dirección: calle 50A #20-167

Teléfono: 3152851312 No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒ Cac del garaje

11. Mixto ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIMIENTOS 3. DESPLOMAMIENTOS 4. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, condiciones sanitarias y de insalubridad, ver llaves, vasos/pozos y fosforos)
COMENTARIOS	No se observa	Fisuras en Estructura Columnas	No hay	Placa	No se observa	Ecemica	Cerámica en buen estado	Cerámica en mal estado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde a la realidad

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: LAINA VILLAMIZAR
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AVILA
C.C.

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social / Interventoría
Nombre: EDILENEY LOPEZ
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBIERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o visita

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INTERESTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERAN SER REPARADOS POR EL CONTRATISTA.

1

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventoría, Subdirección de Apoyo Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	**ACTA DE VECINDAD** ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código: CS-PO-900-003 ver. Fecha: 22/03/2023 Versión: 2 Página: 1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Prestado ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Calle 31N # 20-10

Teléfono: No. de placa:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

			OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒ Cual?

ESTADO DEL PREDIO: En edificación ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Empinado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Educacional	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vacío	☐

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ACCESOS	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTO	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3. ASENTAMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLOMAMIENTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Detalle manejo de aguas lluvias y residuales, cazoleta metálica y de madera, en ferrar, escalera y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Humedad filtración	No tiene	Teja zinc	No se observa	Fisuras filtración en el chalo	Cerámica en	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS COMENTARIOS DE LA PRESENTE ACTA CORresponden A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: LIANA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AVILA
C.C. O NIT

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: ERLENY GOMEZ
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBIERNO EN HACER CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	12/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

ACTA: DE DEJA CONSTANCIA, QUE LA CONFORMIDAD DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O HECHO OCURRIDO A LOS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA OBRA(NO SER REPARADOS POR EL CONTRATISTA).

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista Interventor, Subdirección de Apoyo Gerencial y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CA-FO-SOC-003
CS Concesión Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 029

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Mercedes Gamboa

Cédula de Ciudadanía: 63325208

Dirección: Cle sin # 20-a

Teléfono: 3125911849 No. de predio:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	Instalado	No instalado	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminado ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION	SI	☐	NO	☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☒	Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Binario	☐
		12. Otro	☐

ACTIVIDADES ESPECIALES

Cerrajas: SI ☐ NO ☒ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, variación vertical y de niveles, en losas, cubiertas y fuentes
HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
ASENTAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observan	Presencia de eflorescencia	No hay acceso	Regular estado de conservación	No se observan	Presencia de eflorescencia	No se observan	En concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES

FIRMAS

Propietario o Arrendatario: Mercedes Gamboa
C.C. 63325208

Residente de Obra - Contratista: LUISA VILLAMIZAR
C.C. C.N.T.

Profesional Social - Contratista: BEATRIZ AYALA
C.C.

Residente de Obra - Interventoría: EDGARD LEIVA
C.C. C.N.T.

Profesional Social - Interventoría: EILENY CORZO
C.C. C.N.T.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	
SOBERANO HACER CS Comercio Santander		Fecha	
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO) DEL PLIEGO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento del cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO ENUNCIADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCURRIDO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA OBRERA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventoría, Fiscalización de Gestión Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	[illegible]
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: [illegible]

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Heidy Vargas

Cédula de Ciudadanía: [illegible]

Dirección: Calle 31 #30-14 - Casa azul

Teléfono: 3215910699 No. de predio: [illegible]

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: En edificación ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Empinado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Escuelas, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso de garaje:

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2. HUNDIMIENTO	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3. ASENTAMIENTOS	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLOMAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Verificar traslado de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y en madera, en buen funcionamiento y fijación
COMENTARIOS	No se observa	Presenta fisuras en la parte inferior	No tiene	Eternit en regular estado	No se observa	Agrietada	Cuarteado	Cuarteado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Heidy Vargas
Responsable Unidad Social
Nombre: Heidy Vargas
C.C. O NIT 1055...

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT [illegible]

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O [illegible]

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT [illegible]

Profesional Social - Interventoría
Nombre: [illegible]
C.C. O NIT [illegible]

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-005
		Fecha	02/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version	0
		Pagina	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

MARCO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento de obra

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE SER NECESARIO, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CONSTITUYE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LOS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS
Constructor Santandereano

ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-005
ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	03/03/2023
	Versión	2
	Página	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 003-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Calle 54 # 20-16

Teléfono: No. de placa:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: En edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	7. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bienes	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Bifamiliar ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLOMAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se observa	Humedad en algunos sectores	Malla en mal estado	Teja en mal estado	No se observa	Pintura en mal estado	Cerámica en mal estado	Cerámica en mal estado	

OBSERVACIONES: La vivienda se encuentra desocupada, por tal se toma registro fotografico de la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: SAMIA VILLAMIZAR	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: SHELENDY GOMEZ
C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-ROC-003
		Fecha	23/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	3 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO YO FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento que ocurra

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y FUE LEIDO POR/ESTO Y DADO CUMPLIDO A LAS PARTES ASISTENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL BARRIO DE ESTA CIUDAD HOY REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Administración de Obras Complementarias y Gestión Social.

Powered by CamScanner

SOMOS CS HACER — CS Constructor Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-001
		Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 622-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___
Nombre del Propietario: Gloria ana dulcey
Cedula de Ciudadanía:
Dirección: calle 31A 20 - 18
Teléfono: No. de piso:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Poral

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES:

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X] Casa

ESTADO DEL PREDIO: Sin enlucir [ ] Obra gris [ ] Terminado [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Plano [X] Pendiente [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industrial		8. Educativo	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Asociación cívico religiosa)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESO VEHICULARES: Garaje SI [ ] NO [X] — Uso del garaje:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIMIENTO 3. AGRIETAMIENTOS 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, capacidad instalada y de diseño, en líneas vaporizadas y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Humedades filtración	No Leve	Teja eternit	No se observa	Pintados	En concreto	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN EL PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: La propietaria Recibe la visita pero se niega a firmar el acta ya que no esta de acuerdo con las intervenciones

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: ___ C.C. o NIT: ___

Residente de Obra - Constructor — Nombre: LIANA VILLALBA — C.C. o NIT: 1005161662

Profesional Social - Constructor — Nombre: ANDRES AYALA — C.C. o Tarjeta Prof.: ___

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. o NIT: 1098611764

Profesional Social - Interventoría — Nombre: SOLANGY CORTES — C.C. o NIT: 63531944

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-PO-800-008
		Fecha	23/05/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO) EN PÚBLICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento ya sea:

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE U OBRA ADICIONADA A LAS VIVIENDAS ALEGADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA BLOQUE DE ESTA DEBERÁN SER APROBADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	GAFO-SGC-03
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 023-2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 029

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 13 MM 02 AA 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: ENKG OLIVEROS

Cedula de Ciudadanía: CC 28 SSM = 15 CDE

Dirección: 6355309 94

Teléfono: ___ No. de predio: ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: EL BOSQUE

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulada ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bodega	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☒	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
GRIETAS Y FISURAS HUNDIMIENTOS LEVANTAMIENTOS DESPLOMAMIENTOS OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Instalar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en buen estado y funcional
COMENTARIOS	En mal estado	Requiere intervención	Requiere intervención y Reparación Parcial	Requiere intervención	Por reparar	Pintada	Concreto	Tiene concreto	

ACTA DE VECINDAD CONFORME CON LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: JUANA VELANDIA
C.C. O NIT 1095XXXXXX

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AVILA
C.C. O NIT 1095XXXXXX

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT 1098XXXXXX

Profesional Social - Interventoria
Nombre: EDILENIS CORZO
C.C. O NIT 1102XXXXXX

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código: CS-FO-SOC-005
		Fecha: 22/03/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión: 3
		Página: 1 de 1

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Describir lo relevante de seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE DICHA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD Y CUALQUIER INTERÉS O DAÑO OCURRIDO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL BARRIO DE ESTA MANERA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

CS Constructor Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-GOC-303
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 822-2022 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Cra 20 # 19- 31

Teléfono: No. de predio:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Real

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[ ]	[ ]	
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfono	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: En edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminado [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Si [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [X] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Salud	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI [X] NO [ ]; Uso del garaje

11. Minero [ ]

12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, capacidad estática y de diseño, en líneas vecindarios y fuentes)
2.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.AGRIETAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS	No se observa	Ninguna fisura	No tiene	Buena estado	En buen estado	En buen estado	En buen estado	Escalera	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita y no se encuentran propietarios. Se toma registro fotográfico del frente de la parte externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de CCSA - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LUISA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: YELENDY CORZO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT:	C.C. O:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Conexión Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-PO-ADC-008
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS SIN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

FACHADA	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

MURO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Gestión se reservare el seguimiento y/o visita

PUERTA	
ANTES	DESPUES

NOTA: DE MUY CONFORMIDAD, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCURRIDOS A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	[illegible]
		Fecha	[illegible]
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 05 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario Arrendatario Poseedor

Nombre del Propietario: [illegible]

Cabida de Cubierta:

Dirección:

Teléfono: No. de pisos: 2

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: [illegible]

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto
2. Alcantarillado
3. Energía
4. Teléfonos
5. Gas
6. Televisión cable
7. Otros

OBSERVACIONES

CUBT

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: En edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional o del Estado ☐
5. Agropecuario ☐
6. Recreacional ☐
7. Salud ☐
8. Seguridad ☐
9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
10. Mixto ☐
11. Minero ☐
12. Otro ☐

ACCESOS VEHICULARES

Pavimentado ☐ No ☒

Ver dal garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CUBIERTA	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2. HUMEDADES	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Interferencia de tuberías de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fibrocemento y bambú
COMENTARIOS	No tiene filtración	Humedad en la base	No tiene	Placa	No se observan	Tiene daños	Cerámica	Fisuras en cerámica agrietadas	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: LUNA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ALEXIS AYALA
C.C.

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: SIDNEY CORZO
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Comercio Sostenible	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-XXX-XXX
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LOS INMUEBLES ALEDAÑOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA ANDENES SERÁ RESPONSABILIDAD POR EL CONTRATISTA.

1

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventoría, Supervisión de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

CONSTRUIMOS EL HACER

CS
Constructora Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	03/03/2023
Versión	2
Página	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 439

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 02 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Apoderado del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Teresa Rodriguez

Cédula de Ciudadanía: 63491430

Dirección: Calle 58 #19n-03 casa naranja

Teléfono: 302 No. de piezas ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Poal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónico	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Empinado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional y del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES: Carros SI ☐ NO ☒ (No del garaje)

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL: 1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIMIENTO 3. AGRIETAMIENTOS 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Indicar cuando se oigan ruidos y vibración, vibración metálica y de madera, en fisuras, hundimos y fuentes)
COMENTARIOS	No se observa	Humedad a la vista	Pobre	Eternit	No se observa	Pinta de	Cerámica Buen Estado	Concreto en Estado Regular	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: Teresa Rodriguez — C.C. o NIT: 63491430

Residente de Obra - Contratista — Nombre: LIANA VELANDIA — C.C. o NIT: [illegible]

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AVILA — C.C.: [illegible]

Residente Social - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. o NIT: [illegible]

Profesional Social - Interventoría — Nombre: SOLEDAD CORZO — C.C. o NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CM-FO-ACC-005
		Fecha	12/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

MURO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento ya visto

OBRA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-PO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	3
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 08 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: calle 32 # 52 - 44

Teléfono: No. de predio:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Real

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒ CUAT ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Vacío	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒ — Uso del garaje:

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
NIVEL PISO									
1. CERCHAS Y TEJAS 2. PASAMANOS 3. ENCHAPES 4. DESPLAZAMIENTOS 5. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Indique manejo de aguas lluvias o residuales, capacidad estática y de vuelco, en Bares, cuevados y tuberías)
COMENTARIOS	NO SE OBSERVA	Humedad en la base	No hace	Teja zinc	Columnas	Humedad en la base	Concreto	Concreto	

OBSERVACIONES: Se toma registro fotografico de la fachada exterior de la vivienda y de los

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: — C.C. 0 NIT

Residente de Obra - Contratista — Nombre: EDWIN VELANDIA — C.C. 13 487 [illegible]

Profesional Social - Consultoría — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. [illegible]

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. 13 NIT [illegible]

Fiscalización Técnica de Obra — Nombre: [illegible] — C.C. 0 NIT [illegible]

Powered by CamScanner

CS Construcción Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

MUROS	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original firmado en Gestión del Cambio

Copias: Contratista Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBIERNAR ES HACER · CS Comercio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/03/2023
		Versión	2
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 023-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 029

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: calle 58 # 58N-52
Teléfono: No. de predio:
Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: el Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Escuelas, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje
11. Mixto ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	PASAMANOS	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS 2. HUNDIMIENTOS 3. DESPLOMAMIENTOS 4. OTROS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	Shaffiar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas residentes y fundas.
COMENTARIOS	No tiene	Manchados Grietas	Mala Ubicación y Reparación	Falta mantenimiento	No tiene	Pintura con Corrosión en la base	Fracturas de uso	Concreto	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se toma registro fotografico y filmico de la vivienda de la parte externa ya que propietarios no se encuentran en el predio

FIRMAS

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: SJANA VELANDIA
C.C. O NIT

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C.

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre: EDUARDO CORZO
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-103
GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander		Fecha	23/05/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 3

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento pto visita

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Powered by CamScanner

GOBIERNAR ES HACER

CS Constructor Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CAPO-SOC-005
Fecha	22/03/2023
Versión	3
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: [illegible] Gutiérrez Beltrán

Cédula de Ciudadanía: 63450196

Dirección: Calle [illegible]

Teléfono: 3104263166 No. de piso: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefonía	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin acabar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	8. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educativo, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☐ Uso del garaje

11. Mixto ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
CAMBIADO	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Unidhue manejo de aguas lluvias y residuales, suministro sanitario y de riego, en líneas hacendarias y fuentes)
CAMBIANDO	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
A REEMPLAZARSE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
A RETIRO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	No se detecta	Presencia de humedad	No tiene	Teja eternit		Presencia de humedad	Cerámica gres	Escalones	

NOTA: SE HACE CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: JUANA VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: EDILBERTO CONDO
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1095915563	C.C. 21 1095915536	C.C. O NIT: 1098978964	C.C. O NIT: 91513964

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Comercio Sostenible	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 3

ACTA DE VECINDAD REGISTRO FOTOGRAFICO NO PUBLICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE HACE CONSTAR AL USO LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Gestión del Cambio

Copias: Controladas, Alternativa: Administración de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-ICC-003
		Fecha	23/01/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 023-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 029

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 03 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: sin Francisco Velasco

Cédula de Ciudadanía: 90.2.2021

Dirección: Cra 19 # 58-50

Teléfono: 3166218126 No. de casa ___

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rocal

SERVICIOS PÚBLICOS

	Con	Sin
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES:

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO	En edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminado ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	Si	☐	No	☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☒	Plano ☐

USO ESPECIAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Bien	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒ — Uso del garaje

11. Bifamiliar ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	ORIENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. ARISTAS Y VIGAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2. MUROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. PAVIMENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Posible rotura de agua fuerte y radiadores, carpintería metálica y de madera, en fuerte ventaneros y Sanitarios
COMENTARIOS			Hongos				Tierra de Piedra	Tierra	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Predio en intervención se encuentra no con Permiso para ingresar en la Vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: ___ C.C. ___

Residente de Obra - Contratista — Nombre: ILIANA VELANTIA C.C. ___

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA C.C. ___

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA C.C. ___

Profesional Social - Interventoría — Nombre: ___ C.C. ___

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Constructora Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/11/2023
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o visita

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y EVALUADAS MEDIDAS A DARSE OCASIONADAS A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL BARRIO DE ESTA MANERA SER APROBADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contratista

Copias: Contratista, Interventoría, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Codigo	
Fecha	
Version	
Pagina	1 de 3

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Ficha: ☒ | Seguimiento: ☐ | Cierre: ☐

FECHA: [illegible]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Direccion: CLO 19 #58A-90

Barrio: El Rosal

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energia	☐	☐
4. Telefonica	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: En edificación ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Quebrado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	11. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	12. Salud	☐
3. Industrial	☐	13. Seguridad	☐
4. Institucional (del Estado)	☐	14. Culto (Edificios religiosos)	☐
5. Agropecuario	☐	15. Mixto	☐

INTERES VISUALIZABLE

Fuente: SI ☐ NO ☐

No. de pisos:

17. Bienes ☐

18. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	ENTRAMADO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	
	☐		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐		☐						
OBSERVACIONES				Teja			concreto		

OBSERVACIONES: Predio abandonado

FIRMAS

Responsable Social Social: [illegible]

Residente de Obra: [illegible]

Profesional Social: [illegible]

Residente de Obra: [illegible]

Profesional Social: [illegible]

SOBRE RUEDAS EL HACER CS	ACTA DE VECINDAD	Codigo	CS-FO-SOC-001
		Fecha	DIC/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Version	1
		Pagina	2 de 3

ACTA DE VECINDAD REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

MUROS	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento del caso.

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Pagina: Acceso de Sobre ruedas

Copia controlada, elaborado: Coordinador de Gestión Ambiental y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER | CS Consorcio Santander

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CAPTC-ACV-029
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Página	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 023-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 15 MES 02 AÑO 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Soledad campos

Cédula de Ciudadanía: 63.316.228

Dirección: Calle 1 esquina 9

Teléfono: 3219830018 No. de placa:

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: El Rosal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	RESTRICCIÓN VEHICULARES: Tarea SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐	Uso del garaje
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Escuelas, culto religioso)	☐	11. Mixtos ☐
5. Agropecuario	☐	10. Aseo	☐	12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	ORIENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	Disefiar drenaje de aguas lluvias e instalar, capacitación sanitaria y de cisterna, en fincas vecindarios y familias.
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. OTROS	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Zinc			Concreto en mal estado	Concreto	

NOTA: SE TOMA COMO BASE, LAS OBSERVACIONES DE LA PRESENTE ACTA CONSIGNADAS EN LA VISITA

OBSERVACIONES: Casa construida en mampostería a la vista con estructura en Pilastras y cubierta en Zinc

FIRMAS

Responsable Unidad Social — Nombre: ___ C.C. O NIT: ___

Residente de Obra - Contratista — Nombre: JUANA VELANDIA — C.C. O NIT: 1090363842

Profesional Social - Contratista — Nombre: ANDREA AYALA — C.C. O: 1095805339

Residente de Obra - Interventoría — Nombre: EDWARD VERA — C.C. O NIT: 1095817864

Profesional Social Interventoría — Nombre: ESLENDY CORZO — C.C. O NIT: 63537964

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	
		Fecha	
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO NO PLASMO EN MEDIO MAGNETICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

AIRE	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento grafico anterior

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Cliente
Copias: Contratista, Interventor, Coordinación de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner
