

Foto 1- Demolición de andén y sarnidel existente en concreto hidráulico, con equipo mecánico, en la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 2- Vaciado de concreto aquitectónico color onix para bordillo en calle 19 entre carreras 13B y 14, costado Oriental (Mercaldas)

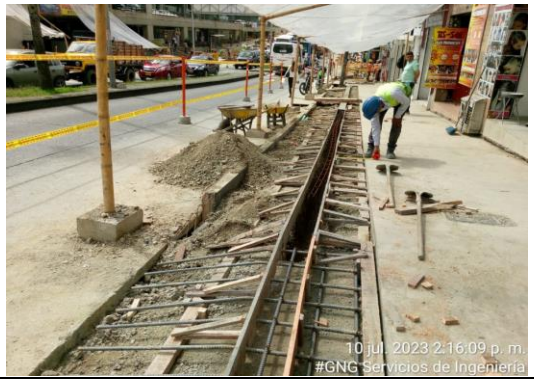


Foto 3 - Instalación de formaleta en madera y acero de refuerzo para bordillo y rampa de acceso en anden de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Mercaldas)



Foto 4 - Excavación manual en zanja para jardinera de andén de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Mercaldas)



Foto 5 - Abujardado mecánico de andenes de la calle 19 entre carreras 15 y 16, costado occidental (People Contact)



Foto 6 - Excavación manual para pilotes de muro de contención sobre la calle 19 entre carreras 13 y 13B



Foto 7- Suministro, transporte e instalación de subbase granular para andén de la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 8 - Corte, figurado y armado de de acero de refuerzo para mástil de luminaria sobre la Plaza Alfonso López



Foto 9- Remoción con volqueta y retrocargador de llantas, de escombros y tierra proveniente de excavación de caissons de pasarelas 1 y 2



Foto 10-Instalación de formaleta en madera y malla electrosoldada para para andén de la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 11- Vaciado de concreto arquitectónico premezclado color ginger para andén de la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 12- Arribo a obra de loseta podotáctil para andenes construídos
