Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 02/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **WRUSSY INGENIEROS SAS** con NIT **901.109.885-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 480969998529

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

CONTRATO DE OBRA	:	N° 0756-23
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT.	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
NIT.	:	901109885-1
REP. LEGAL	:	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CEDULA	:	80.212.380 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN	:	CALLE 8F # 79 – 94 BOGOTÁ
TELÉFONO	:	601 411 1513
CORREO ELECTRÓNICO	:	contacto@wrussyingenieros.com
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	UT INTERCOMEDOR ITSI
NIT.	:	901.683.399-1
REP. LEGAL	:	LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
C.C.	:	28.060.888 DE BARRANCABERMEJA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
VALOR	:	El valor del contrato es TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($3.684.062.560,88)
ANTICIPO	:	NO APLICA

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	DICIEMBRE 29 DE 2022
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	El plazo de duración del presente contrato será de DOCE (12) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de Febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005 por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168), Y ACUERDO FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-01132 DE FEBRERO 15 DE 2023 23-00750 DE FEBRERO 03 DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-01338 DE FEBRERO 27 DE 2023 ($3,684,062,560.88)
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.11189414 DEL 02 DE MARZO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810057 DEL 25 DE ENERO DE 2023
CEPAA	:	1133 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE INICIO	:	MARZO 06 DE 2023
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA INICIO	:	CO1.WRT.11377735 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1	:	AGOSTO 28 DE 2023

ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD N°1	:	AGOSTO 29 DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	:	MARZO 05 DE 2024
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°2	:	$468.309.769,75
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO	:	12.71%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	:	30.41%
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	:	$2.563.660.777.21
VALOR PAGADO A LA FECHA	:	$652.092.013,92
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1		SEPTIEMBRE 7 DEL 2023
ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	:	SEPTIEMBRE 13 DEL 2023
ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	:	SEPTIEMBRE 21 DEL 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	OCTUBRE 24 DE 2023

En Barrancabermeja, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de OCTUBRE de 2023, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con cédula de ciudadanía número 80.212.380 de Bogotá como representante legal de **WRUSSY INGENIEROS S.A.S** en calidad de contratista, la Señora **LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO** representante legal de la **UT INTERCOMEDOR ITSI** en calidad de interventor, El Arq. **OSCAR CONTRERAS LÁZARO** identificada con cedula de ciudadanía No. 13.885.275, en calidad de Secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 0162 del 25 de abril de 2023 y Acta de posesión No. 024 del 27 de abril de 2023, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019 que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por los Decreto número 238 del 19 de julio de 2021 y Decreto número 0272 del 05 de agosto de 2021; por medio del cual se precisan algunas disposiciones del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y demás normas como el Decreto número 125 del 30 de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios y quien para los efectos de esta acta se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq.

ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir **el ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2**, en los siguientes términos:

ACUERDAN:

1. El interventor delegado certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. El interventor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.

3. Las cantidades y los valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.

4. La presente acta se elabora de acuerdo con las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la supervisión, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, cuyas memorias de cálculos de anexan.

5. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta parcial N°1	07/09/2023	$652.092.013,92	17.70%	0,00	$652.092.013,92
Acta parcial N°2	24/10/2023	$468.309.769,75	12,71%	0,00	$468.309.769,75
Totales		$1.120.401.783,67	30.41%	0,00	$1.120.401.783,67

6. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($468.309.769,75),** a **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**, con **NIT. 901109885-1**

7. Que dicho pago se hará a través del RP 23-01338 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023, por valor de $3.684.062.560,88

Identificación presupuestal:	2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005
Concepto:	Construcción y servicios de la construcción.
Valor de la fuente:	$3.306.985.499,00
Saldo Disponible:	$2.654.893.485.00
Valor a pagar:	$468.309.769,75

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 24 de octubre de 2023:

OSCAR CONTRERAS LÁZARO
Secretario de Infraestructura
Jefe de la Dependencia

ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
Profesional Universitario II – Supervisión.
Supervisor

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS S.A.S
Contratista

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Gómez. ABG. CPS INFRAESTRUCTURA		24/10/2023
Proyectó:	Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		24/10/2023
Revisó - Aprobó:	Arq. Oscar Contreras Lázaro – secretario de Infraestructura Distrito de Barrancabermeja		24/10/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

la tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPOS TOPOGRÁFICOS.	M2	1530,00	$ 2.014,81	$ 3.082.686,67	1530	$ 3.082.686,67	1530,00	$ 3.082.686,67	0,00	$ -	1530,00	$ 3.082.686,67
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ML	132,00	$ 25.135,56	$ 3.317.893,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.03	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (Incluye retiro a sitio de disposición y todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	UND	14,00	$ 35.227,41	$ 493.183,70	14,00	$ 493.183,70	14,00	$ 493.183,70	0,00	$ -	14,00	$ 493.183,70
1.04	DESMONTE DE PUERTAS (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	UND	6,00	$ 29.585,93	$ 177.515,56	6,00	$ 177.515,56	6,00	$ 177.515,56	0,00	$ -	6,00	$ 177.515,56
1.05	DESMONTE DE VENTANAS Y VIDRIOS (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	UND	8,00	$ 52.208,15	$ 313.248,89	8,00	$ 417.665,19	8,00	$ 417.665,19	0,00	$ -	8,00	$ 417.665,19
1.06	DESMONTE DE REJA EXISTENTE EN EL PASILLO DE BAÑOS (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	M2	7,83	$ 18.120,00	$ 141.879,60	55,18	$ 999.440,31	55,18	$ 999.440,31	0,00	$ -	55,18	$ 999.440,31
1.07	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	M2	342,22	$ 14.220,74	$ 4.866.621,90	332,60	$ 4.729.775,71	332,60	$ 4.729.775,71	0,00	$ -	332,60	$ 4.729.775,71
1.08	DESMONTE DE CIELORASOS (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	M2	57,87	$ 15.988,89	$ 925.277,00	20,09	$ 321.267,94	20,09	$ 321.267,94	0,00	$ -	20,09	$ 321.267,94
1.09	DESMONTE DE SILLAS EXISTENTES (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	UND	23,00	$ 44.376,30	$ 1.020.854,81	20,00	$ 887.525,93	20,00	$ 887.525,93	0,00	$ -	20,00	$ 887.525,93
1.10	DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS (Incluye todos los elementos necesario para su correcta ejecución)	ML	14,04	$ 17.281,48	$ 242.632,00	21,18	$ 366.021,78	21,18	$ 366.021,78	0,00	$ -	21,18	$ 366.021,78
1.11	DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE (Incluye retiro de lamparas, ventiladores, cableado)	GLB	1,00	$ 581.579,26	$ 581.579,26	1,00	$ 581.579,26	1,00	$ 581.579,26	0,00	$ -	1,00	$ 581.579,26
1.12	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	12,05	$ 19.637,78	$ 236.635,22	12,05	$ 236.635,22	12,05	$ 236.635,22	0,00	$ -	12,05	$ 236.635,22
1.13	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA ESP 0.10m	M2	321,03	$ 17.751,11	$ 5.698.639,20	310,75	$ 5.516.152,81	310,75	$ 5.516.152,81	0,00	$ -	310,75	$ 5.516.152,81
1.14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES	M2	472,17	$ 11.094,07	$ 5.238.288,96	471,99	$ 5.236.292,02	471,99	$ 5.236.292,02	0,00	$ -	471,99	$ 5.236.292,02
1.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 1.00x1.00 m (Muros en ladrillo esp 0.10m y tapa y base de la caja en concreto)	UND	2,00	$ 128.715,56	$ 257.431,11	2,00	$ 257.431,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.16	DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO	M3	16,20	$ 330.519,26	$ 5.354.412,00	22,16	$ 7.325.628,86	22,16	$ 7.325.628,86	0,00	$ -	22,16	$ 7.325.628,86

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.580,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.17	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE PLACA DE ENTREPISO DE BAÑOS ESP. 0.10m	M2	69,80	$ 103.286,67	$ 7.209.409,33	59,13	$ 6.107.820,88	59,13	$ 6.107.820,88	0,00	$ -	59,13	$ 6.107.820,88
1.18	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO e=10cm	M2	468,24	$ 30.882,96	$ 14.460.638,58	503,88	$ 15.561.335,17	503,88	$ 15.561.335,17	0,00	$ -	503,88	$ 15.561.335,17
1.19	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO (Sección transversal promedio 0.076m2)	ML	81,40	$ 51.642,96	$ 4.203.737,19	74,60	$ 3.852.668,32	74,60	$ 3.852.668,32	0,00	$ -	74,60	$ 3.852.668,32
1.20	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO 0.25x0.25m	ML	118,00	$ 37.376,30	$ 4.410.402,96	154,80	$ 5.785.850,67	154,80	$ 5.785.850,67	0,00	$ -	154,80	$ 5.785.850,67
2	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN DE 0 - 2.0m	M3	337,50	$ 59.168,89	$ 19.969.618,34	993,44	$ 58.780.652,22	993,44	$ 58.780.652,22	0,00	$ -	993,44	$ 58.780.652,22
2.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Recebo)	M3	641,36	$ 90.200,00	$ 57.850.672,00	535,14	$ 48.269.711,62	535,14	$ 48.269.711,62	0,00	$ -	535,14	$ 48.269.711,62
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE ESCOMBROS	M3/Km	7910,15	$ 2.156,30	$ 17.056.627,15	18233,71	$ 39.317.283,31	18233,71	$ 39.317.283,31	0,00	$ -	18233,71	$ 39.317.283,31
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO												
3,1	CONCRETO												
3,1,1	CONCRETO DE 2000PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN ESP 0.05m	M2	129,08	$ 38.500,74	$ 4.977.420,41	246,24	$ 9.495.119,68	246,24	$ 9.495.119,68	0,00	$ -	246,24	$ 9.495.119,68
3,1,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	21,51	$ 738.423,70	$ 15.883.493,87	53,90	$ 39.801.776,05	53,90	$ 39.801.776,05	0,00	$ -	53,90	$ 39.801.776,05
3,1,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION (No incluye acero de refuerzo)	ML	241,00	$ 153.123,70	$ 36.902.812,58	211,14	$ 32.330.538,80	211,14	$ 32.330.538,80	0,00	$ -	211,14	$ 32.330.538,80
3,1,4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE ENTREPISO PARA SECCIONES TRANSVERSALES DE 0.05 m2 HASTA 0.09m2 (No incluye acero de refuerzo)	ML	213,97	$ 121.729,63	$ 26.046.488,85	213,97	$ 26.046.488,85	0,00	$ -	125,56	$ 15.284.372,30	125,56	$ 15.284.372,30
3,1,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DINTEL Y VIGA CINTA (Incluye acero de refuerzo)	ML	92,89	$ 126.084,44	$ 11.711.984,04	92,89	$ 11.711.984,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE VENTANAS DE LOCALES Y ZONA DE ALMACENAMIENTO 0.20X0.30 (Incluye acero de refuerzo)	ML	18,50	$ 151.045,19	$ 2.794.335,93	18,50	$ 2.794.335,93	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,7	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS CON SECCIONES TRANSVERSAL ENTRE 0.12-0.09 m2 (No incluye acero de refuerzo)	ML	92,26	$ 115.178,52	$ 10.626.370,12	92,26	$ 10.626.370,12	0,00	$ -	86,46	$ 9.958.334,71	86,46	$ 9.958.334,71
3,1,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS 0.12x0.20 (Incluye acero de refuerzo)	ML	51,10	$ 65.251,85	$ 3.334.369,63	51,10	$ 3.334.369,63	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,9	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES 0.30x0.30 (No incluye acero de refuerzo)	UND	8,00	$ 102.019,26	$ 816.154,07	8,00	$ 816.154,07	0,00	$ -	8,00	$ 816.154,07	8,00	$ 816.154,07
3,1,10	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES 0.50x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	UND	10,00	$ 201.574,07	$ 2.015.740,74	10,00	$ 2.015.740,74	0,00	$ -	10,00	$ 2.015.740,74	10,00	$ 2.015.740,74

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,1,11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO ESP 0.08m (incluye fibra de refuerzo)	M2	1106,00	$ 91.687,41	$ 101.406.272,59	903,27	$ 82.818.117,74	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,12	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ALFAJÍA 0.22x0.08 (Incluye acero de refuerzo)	ML	82,90	$ 43.757,78	$ 3.627.519,78	82,90	$ 3.627.519,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,13	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (No incluye acero de refuerzo)	M3	4,60	$ 935.825,93	$ 4.304.799,26	4,60	$ 4.304.799,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,14	CONCRETO DE 4000PSI PARA DE BASE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (No incluye acero de refuerzo)	M3	1,21	$ 896.068,15	$ 1.084.242,46	1,21	$ 1.084.242,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,15	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TAPA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESP 0.20m (No incluye acero de refuerzo)	M2	4,04	$ 200.351,11	$ 809.418,49	4,04	$ 809.418,49	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,16	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22, DE ESPESOR DE 0.11m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0,11, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	M2	185,00	$ 277.717,04	$ 51.377.651,85	185,00	$ 51.377.651,85	0,00	$ -	176,41	$ 48.992.118,05	176,41	$ 48.992.118,05
3,1,17	JUNTA FRIA DE CONSTRUCCIÓN PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO (Incluye adhesivo epóxico para puente de adherencia y cinta en PVC para sello de juntas o productos similares	ML	8,90	$ 83.589,63	$ 743.769,70	8,90	$ 743.769,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,18	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PARA PLACA DE CONTRAPISO (Incluye corte de junta y aplicación de sello flexible y autonivelante de poliuretano)	ML	113,00	$ 28.317,04	$ 3.199.825,19	113,00	$ 3.199.825,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1,19	IMPERMEABILIZACIÓN ACRILICA PARA PLACA DE ENTREPISO DE STEEL DECK Y MURO PERIMETRAL	M2	293,44	$ 41.934,81	$ 12.305.352,06	293,44	$ 12.305.352,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,2	ACERO												
3.2.1	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)	KG	7774,07	$ 10.089,63	$ 78.282.005,61	12234,06	$ 123.192.080,45	10296,47	$ 103.681.607,98	1937,62	$ 19.511.115,76	12234,09	$ 123.192.723,74
3.2.2	ACERO ESTRUCTURAL (Tuberia ASTM A572 GrC, pernos, anclajes y platinas ASTM A36)	KG	24239,53	$ 20.003,70	$ 484.880.376,04	24239,53	$ 484.880.376,04	0,00	$ -	12643,01	$ 252.907.067,17	12643,01	$ 252.907.067,17
4	MAMPOSTERIA Y FRISOS												
4,01	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON CAVIDAD REFORZADA UNA CARA ABUSARDADO (0.15x0.19x0.39) PARA MURO HASTA N+0.36 (Incluye mortero de relleno y acero refuerzo)	ML	40,00	$ 224.142,22	$ 8.965.688,89	40,00	$ 8.965.688,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRUCTURAL H-10 (Incluye mortero de pega y acero de refuerzo de 60.000PSI)	M2	453,77	$ 69.984,44	$ 31.756.841,36	453,77	$ 31.756.841,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRUCTURAL H-10 HASTA ALT MÁX 20cm PARA PERIMETRO DE PLACA DE ENTREPISO (Incluye mortero de pega, acero de refuerzo, pañete liso 1 3 esp 1.5)	ML	71,10	$ 47.260,74	$ 3.360.238,87	71,10	$ 3.360.238,87	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	PAÑETE LISO 1:3 e=1.50-1.20, EXTERIOR	M2	379,65	$ 27.532,59	$ 10.452.748,78	379,65	$ 10.452.748,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	PAÑETE RAYADO 1.3 e=1.50-1.20 INTERIOR	M2	508,95	$ 24.577,78	$ 12.508.860,00	508,95	$ 12.508.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo. Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.082.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5	ARQUITECTURA Y ACABADOS												
5,1	CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO												
5,1,1	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA DE SERVICIO AL PÚBLICO CON APOYO A PISO	ML	8,40	$ 328.814,07	$ 2.760.358,22	8,40	$ 2.760.358,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,2	PUERTA 01 1,40 X2,52 PUERTA BATIENTE A DOS HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON FRONTAL EN ALUMINIO SUPERIOS E INFERIOR EN ALUMINIO, FIJO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL	UND	1,00	$ 2.039.037,04	$ 2.039.037,04	1,00	$ 2.039.037,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,3	P 02 140X 3,00 PUERTA BATIENTE A DOS HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON FRONTAL EN ALUMINIO SUPERIOS E INFERIOR EN ALUMINIO, FIJO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL	UND	1,00	$ 2.390.648,89	$ 2.390.648,89	1,00	$ 2.390.648,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,4	P 03 140 X 2,60 PUERTA BATIENTE A DOS HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON FRONTAL EN ALUMINIO SUPERIOS E INFERIOR EN ALUMINIO, FIJO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL	UND	1,00	$ 2.097.638,52	$ 2.097.638,52	1,00	$ 2.097.638,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,5	P 04 70 X 2,40 PUERTA BATIENTE A UNA HOJA, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON FRONTAL EN ALUMINIO SUPERIOS E INFERIOR EN ALUMINIO, FIJO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL	UND	3,00	$ 1.072.103,70	$ 3.216.311,11	3,00	$ 3.216.311,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,6	P 0570 X 2,40 PUERTA BATIENTE A UNA HOJA, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON FRONTAL EN ALUMINIO SUPERIOS, FIJO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL	UND	1,00	$ 1.072.103,70	$ 1.072.103,70	1,00	$ 1.072.103,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,7	P 06 70 X2,60 PUERTA BATIENTE A UNA HOJA, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON FRONTAL, FIJO SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL	UND	1,00	$ 1.145.357,04	$ 1.145.357,04	1,00	$ 1.145.357,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,8	PE 01 3,0 X 3,94 PUERTA ESPECIAL CON MARCO METALICO, HOJAS CON LAMINA MICROPERFORADA EN COLLED ROLED O MALLA MICROPERFORADA SEGUN DISEÑO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLRO VERDE OSCURO.	UND	1,00	$ 7.437.840,74	$ 7.437.840,74	1,00	$ 7.437.840,74	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,9	PE 02 70 X 2,40 PUERTA BATIENTE A UNA HOJA, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR CON POLIURETANO	UND	1,00	$ 1.072.103,70	$ 1.072.103,70	1,00	$ 1.072.103,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON ENROLLABLE DE 3.00X2.50 MT PINTADO EN EL COLOR ACORDADO SEGÚN PLANO ARQUITECTÓNICO CON ESMALTE SINTÉTICO	UND	2,00	$ 3.510.027,41	$ 7.020.054,81	2,00	$ 7.020.054,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,11	V 01 1,50X 50 VENTANA 1, CORREDERA A DOS HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL.	UND	1,00	$ 422.048,15	$ 422.048,15	1,00	$ 422.048,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo. Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.884.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5,1,12	V 02 2,22 X 80 CORREDERA A DOS HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL.	UND	1,00	$ 867.345,93	$ 867.345,93	1,00	$ 867.345,93	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,13	V 03 3,38 X 80 CORREDERA A CUATRO HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL.	UND	1,00	$ 1.270.108,89	$ 1.270.108,89	1,00	$ 1.270.108,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1,14	V 04 4,65 X 80 CORREDERA A CUATRO HOJAS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURA, HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL.	UND	1,00	$ 1.711.066,67	$ 1.711.066,67	1,00	$ 1.711.066,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,2	CARPINTERIA EN MADERA Y GRANITO												
5,2,1	MESON EN GRANITO PARA BAÑOS COLOR XIAMEN WHITE (Ancho=0.60m) (Incluye estructura metálica pintada con anticorrosivo para anclaje)	ML	4,80	$ 855.698,52	$ 4.107.352,89	4,80	$ 4.107.352,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3	PISOS Y MUROS (ACABADOS)												
5,3,1	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 CON ACABADO RAYADO ESP=5CM RAMPAS	M2	91,58	$ 35.309,83	$ 3.233.655,88	91,58	$ 3.233.655,88	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,2	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 CON ACABADO PULIDO ESP=5CM CAFETERIA (Incluye aplicación de resina para la calidad de mortero)	M2	507,45	$ 69.257,04	$ 35.144.483,44	507,45	$ 35.144.483,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,3	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 CON ACABADO ESTAMPADO ESP=5CM ARBOL	M2	116,36	$ 44.962,22	$ 5.231.804,18	116,36	$ 5.231.804,18	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,4	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 CON ACABADO RUSTICO ESP=5CM LOCALES	M2	20,54	$ 36.380,74	$ 747.260,41	20,54	$ 747.260,41	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,5	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 ESP= 4CM IMPERMEABILIZADO PARA BAÑOS, COCINAS Y ZONAS AL AIRE LIBRE	M2	324,19	$ 39.242,96	$ 12.722.176,16	324,19	$ 12.722.176,16	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,6	ENCHAPE DE PISO EN GRES COLOR SEGÚN ARQUITECTURA FORMATO 20X20, BRECHA COLOR BEIGE	M2	128,09	$ 80.722,96	$ 10.339.804,33	128,09	$ 10.339.804,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,7	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICO COLOR SEGÚN ARQUITECTURA FORMATO 33.8X33.8, BRECHA COLOR GRIS	M2	12,96	$ 72.539,26	$ 940.108,80	12,96	$ 940.108,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,8	ENCHAPE DE MURO EN LAVAMANOS EN CERAMICO ESTRUCTURADA AIRES HORIZONTAL, FORMATO 60X30, BRECHA COLOR BLANCO H=3.00m	M2	24,81	$ 78.096,30	$ 1.921.949,85	24,81	$ 1.921.949,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,9	ENCHAPE DE MURO PARA ZONAS HUMEDAS Y COCINA BLANCO, FORMATO 60X30, BRECHA COLOR BLANCO H=2.60m	M2	292,02	$ 75.949,63	$ 22.178.810,84	292,02	$ 22.178.810,84	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,10	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA GRES COLOR SAHARA	ML	105,72	$ 35.206,67	$ 3.722.048,80	105,72	$ 3.722.048,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,11	ESQUINERO PARA PISO COLOR SAHARA	UND	111,00	$ 23.774,07	$ 2.638.922,22	111,00	$ 2.638.922,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,12	ESTUCO PARA MURO EXTERIORES	M2	379,65	$ 18.542,22	$ 7.039.554,67	379,65	$ 7.039.554,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,13	ESTUCO PARA EXTERIORES (Lineales)	ML	90,65	$ 9.593,33	$ 869.635,67	90,65	$ 869.635,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3,14	PINTURA EN VINILO ACRÍLICO SOBRE ESTUCO, PARA EXTERIORES (3 manos)	M2	379,85	$ 20.520,00	$ 7.790.418,00	379,85	$ 7.790.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.3.15	PINTURA EN VINILO ACRÍLICO SOBRE ESTUCO, PARA EXTERIORES LINEALES (3 manos)PLACA	ML	73,15	$ 12.392,59	$ 906.518,15	73,15	$ 906.518,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.16	PINTURA EN VINILO ACRÍLICO SOBRE PLACA TERMINADA DE FIBROCEMENTO PARA CUBIERTA	M2	593,48	$ 17.642,22	$ 10.470.306,04	593,48	$ 10.470.306,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CUBIERTA												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA FIBROCEMENTO	M2	593,48	$ 78.585,19	$ 46.638.735,70	593,48	$ 46.638.735,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN ACERO GALVANIZADO CAL 28 Y PINTADA	M2	593,48	$ 88.109,63	$ 52.291.302,99	593,48	$ 52.291.302,99	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN RH COCINA	M2	128,09	$ 79.731,85	$ 10.212.852,90	128,09	$ 10.212.852,90	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.4	MEDIACAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	105,72	$ 36.368,89	$ 3.844.918,93	105,72	$ 3.844.918,93	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.5	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADOS 1:3	MI	71,00	$ 23.162,22	$ 1.644.517,78	71,00	$ 1.644.517,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.6	PINTURA EPÓXICA PARA CIELO RASO	M2	128,09	$ 19.928,89	$ 2.552.691,38	128,09	$ 2.552.691,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN FIBRA DE VIDRIO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA	M2	191,04	$ 55.024,44	$ 10.511.869,87	191,04	$ 10.511.869,87	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.8	GRAVILLA PARA SUPERFICIE DE PLACA CUBIERTA	M2	180,20	$ 45.945,93	$ 8.279.455,85	180,20	$ 8.279.455,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.9	CUBIERTA EN POLIBARBONATO ALVEOLAR SIN TRANSPARENCIA	M2	31,50	$ 77.791,11	$ 2.450.420,00	31,50	$ 2.450.420,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.10	CANAL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA C.20 (0.12x0.10m)	ML	53,57	$ 112.348,15	$ 6.018.490,30	53,57	$ 6.018.490,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.11	BAJANTE EN PVC 6"	ML	31,50	$ 40.754,81	$ 1.283.776,67	31,50	$ 1.283.776,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	ELEMENTOS SANITARIOS Y DE COCINA												
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA A PARED (Incluye todos los accesorios de conexión e instalación)	UND	9,00	$ 413.474,07	$ 3.721.266,67	9,00	$ 3.721.266,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO O SIMILAR (Incluye grifería y accesorios de conexión e instalación)	UND	1,00	$ 451.746,67	$ 451.746,67	1,00	$ 451.746,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN MATERIAL PORCELANA VÍTREA COLOR BLANCO O SIMILAR (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación)	UND	1,00	$ 579.797,04	$ 579.797,04	1,00	$ 579.797,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6	URBANISMO												
5.6.1	GRAMOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO COLOR NATURAL	M2	136,01	$ 87.687,41	$ 11.926.364,28	136,01	$ 11.926.364,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED TIPO JAPONES	M2	95,21	$ 34.474,07	$ 3.282.276,59	95,21	$ 3.282.276,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES TIPO UVO NEGRO	UND	4,00	$ 287.133,33	$ 1.148.533,33	4,00	$ 1.148.533,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.4	ALCORQUES EN CONCRETO INSITU	ML	27,02	$ 89.005,93	$ 2.404.940,12	27,02	$ 2.404.940,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.5	BORDILLOS EN CONCRETO TERMINADO EN CEMENTO PULIDO INSITU	ML	167,42	$ 90.225,93	$ 15.105.624,52	167,42	$ 15.105.624,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO CON REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	23,87	$ 273.452,59	$ 6.527.313,39	23,87	$ 6.527.313,39	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

8

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.884.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.6.7	SUMINISTRO E ISTALACION DE PROTECTOR PARA RAICES EPDM DEL ARBOL PRINCIPAL TIPO CON 4 CM DE GROSOR	M2	5,31	$ 479.796,30	$ 2.547.718,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLAS EN ESTRUCTURA EN ALUMINIO	M2	260,00	$ 940.988,89	$ 244.657.111,11	260,00	$ 244.657.111,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL LINEAL EN ALUZINC	M2	127,00	$ 436.580,00	$ 55.445.660,00	127,00	$ 55.445.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.10	MANTENIMIENTO PARA CEIBA EXISTENTE (Incluye poda de formación y retiro de deshechos, cicatrizante y suministro de abono)	UND	1,00	$ 1.841.373,33	$ 1.841.373,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
6,1	INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
6.1.1	PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"SANITARIO TANQUE (Incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC)	UND	1,00	$ 48.631,11	$ 48.631,11	1,00	$ 48.631,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.2	PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LAVAMANOS (Incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC)	UND	12,00	$ 48.631,11	$ 583.573,33	12,00	$ 583.573,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.3	PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LAVAPLATOS (Incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC)	UND	5,00	$ 48.631,11	$ 243.155,56	5,00	$ 243.155,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.4	PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LLAVE TERMINAL MANGUERA (Incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC)	UND	1,00	$ 48.631,11	$ 48.631,11	1,00	$ 48.631,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.5	PUNTO DUCHA A.F. PVC D=1/2" (Incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC)	UND	1,00	$ 59.331,11	$ 59.331,11	1,00	$ 59.331,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC PRES RDE 9 D=1/2" (Incluye accesorioss, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	48,00	$ 19.816,30	$ 951.182,22	48,00	$ 951.182,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC PRES RDE 11 D=3/4" (Incluye accesorioss, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	6,00	$ 22.995,56	$ 137.973,33	6,00	$ 137.973,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.8	ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC RDE=9 D=3/4"	ML	66,50	$ 39.125,19	$ 2.601.824,81	66,50	$ 2.601.824,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC PRES RDE=13.5 D=1" (Incluye accesorioss, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	24,00	$ 34.549,63	$ 829.191,11	24,00	$ 829.191,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC PRES RDE=13.5 D=1 1/2" (Incluye accesorioss, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	6,00	$ 61.133,33	$ 366.800,00	6,00	$ 366.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.11	PRUEBA DE HERMETICIDAD RED INTERNA	UND	2,00	$ 901.120,74	$ 1.802.241,48	2,00	$ 1.802.241,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.12	VALVULA DE BOLA D=1/2" (Incluye accesorios, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)	UND	8,00	$ 63.017,04	$ 504.136,30	8,00	$ 504.136,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.13	VALVULA DE BOLA D=1" (Incluye accesorios, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)	UND	1,00	$ 88.963,70	$ 88.963,70	1,00	$ 88.963,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.2	CUARTO DE BOMBAS												
6.2.1	VALVULA BOLA D=3/4" (Incluye accesorios, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)	UND	1,00	$ 61.382,22	$ 61.382,22	1,00	$ 61.382,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2.2	FLOTADOR MECANICO 3/4" (Incluye accesorios, limpiador y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)	UND	1,00	$ 54.513,33	$ 54.513,33	1,00	$ 54.513,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2.3	VENTILACIONES PARA TANQUE HG D=2"	UND	2,00	$ 113.324,44	$ 226.648,89	2,00	$ 226.648,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2.4	SISTEMA DE BOMBEO (2 BOMBAS 1 HP; Q=1.59 LPS; PRESION=28 m.c.a.; HIDONEUMATICO 200 LTS (INCLUYE VALVULAS, ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 16.553.638,52	$ 16.553.638,52	1,00	$ 16.553.638,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2.5	PASAMURO D=2" L=0,5m	UND	2,00	$ 104.386,67	$ 208.773,33	2,00	$ 208.773,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	INSTALACIONES SANITARIAS												
7,01	PUNTO SANITARIO D=2" (Incluye accesorios, soldadura liquida pvc, limpiador removedor para pvc)	UND	22,00	$ 89.175,56	$ 1.961.862,22	22,00	$ 1.961.862,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	PUNTO SANITARIO D=3" (Incluye accesorios, soldadura liquida pvc, limpiador removedor para pvc)	UND	14,00	$ 117.911,11	$ 1.650.755,56	14,00	$ 1.650.755,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	PUNTO SANITARIO D=4" (Incluye accesorios, soldadura liquida pvc, limpiador removedor para pvc)	UND	1,00	$ 148.025,19	$ 148.025,19	1,00	$ 148.025,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	PUNTO VENTILACION D=2" (Incluye accesorios, soldadura liquida pvc, limpiador removedor para pvc)	UND	4,00	$ 151.522,22	$ 606.088,89	4,00	$ 606.088,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,05	TUBERIA PVC SAN D=6" (Incluye accesorios de conexión)	ML	142,00	$ 98.817,04	$ 14.032.019,26	142,00	$ 14.032.019,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,06	TUBERIA PVC SAN D=4 (Incluye accesorios de conexión)	ML	94,00	$ 75.940,74	$ 7.138.429,63	94,00	$ 7.138.429,63	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,07	TUBERIA PVC SAN D=3" (Incluye accesorios de conexión)	ML	60,00	$ 63.092,59	$ 3.785.555,58	60,00	$ 3.785.555,58	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	TUBERIA PVC SAN D=2" (Incluye accesorios de conexión)	ML	36,00	$ 55.162,22	$ 1.985.840,00	36,00	$ 1.985.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	TUBERIA PVC VENTILACION D=2" (Incluye accesorios de conexión)	ML	12,00	$ 34.788,15	$ 417.457,78	12,00	$ 417.457,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,1	SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 2" HASTA 3" EN PLATINA ALUMINIO 1"X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4" CON TUERCA Y ARANDELA TODO	UND	11,00	$ 34.062,96	$ 374.692,59	11,00	$ 374.692,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,11	SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 4" HASTA 6" EN PLATINA ALUMINIO 1"X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4" CON TUERCA Y ARANDELA TODO	UND	49,00	$ 43.738,30	$ 2.143.078,52	49,00	$ 2.143.078,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,12	TRAMPA DE GRASAS 500 LTS	UND	1,00	$ 1.105.954,81	$ 1.105.954,81	1,00	$ 1.105.954,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	ALCANTARILLADO												
8,01	TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 315mm	ML	54,00	$ 134.285,19	$ 7.251.400,00	64,00	$ 8.594.251,85	64,00	$ 8.594.251,85	0,00	$ -	64,00	$ 8.594.251,85
8,02	TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 200mm	ML	4,00	$ 67.514,07	$ 270.056,30	4,00	$ 270.056,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	POZO DE INSPECCION D=1,20 REPOSICION (Incluye marco circular de soporte en Angulo 2x1/8", platina para tapa circular en hierro fundido)	UND	2,00	$ 2.541.283,70	$ 5.082.567,41	2,00	$ 5.082.567,41	2,00	$ 5.082.567,41	0,00	$ -	2,00	$ 5.082.567,41

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA Nº 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,04	CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0 (Incluye marco de soporte en Angulo 2x1/8", platina para tapa de 2x1/4", tapa en concreto reforzado y manija metálica)	UND	1,00	$ 660.963,70	$ 660.963,70	1,00	$ 660.963,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,05	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60 (Incluye marco de soporte en Angulo 2x1/8", platina para tapa de 2x1/4", tapa en concreto reforzado y manija metálica)	UND	2,00	$ 403.300,00	$ 806.600,00	2,00	$ 806.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,06	EXCAVACION EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO	M3	52,30	$ 71.002,96	$ 3.713.454,96	118,47	$ 8.411.710,00	118,47	$ 8.411.710,00	0,00	$ -	118,47	$ 8.411.710,00
8,07	RELLENO COMPACTADA EN MATERIAL COMÚN	M3	33,44	$ 104.827,41	$ 3.505.428,50	76,16	$ 7.983.855,35	76,16	$ 7.983.855,35	0,00	$ -	76,16	$ 7.983.855,35
8,08	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL SELECCIONADO (Recebo)	M3	17,95	$ 104.827,41	$ 1.881.651,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,09	RELLENO GRANULAR PARA CIMENTACIÓN TUBERÍA	M3	11,49	$ 108.495,56	$ 1.246.613,93	30,07	$ 3.262.871,91	30,07	$ 3.262.871,91	0,00	$ -	30,07	$ 3.262.871,91
8,1	CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE	M3	18,86	$ 52.480,00	$ 989.772,80	53,73	$ 2.819.952,18	53,73	$ 2.819.952,18	0,00	$ -	53,73	$ 2.819.952,18
9	INSTALACIONES DE GAS												
9,01	TUBERA GALVANIZADA HG SCH40 D=3/4" (Incluye pintura)	ML	67,20	$ 59.917,78	$ 4.026.474,67	67,20	$ 4.026.474,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	TUBERIA HG SCH40 D=1 1/2" (Incluye pintura)	ML	24,20	$ 99.631,11	$ 2.411.072,89	24,20	$ 2.411.072,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	VALVULA T.P D=1 1/2"	UND	1,00	$ 41.494,81	$ 41.494,81	1,00	$ 41.494,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	VALVULA T.P D=3/4"	UND	6,00	$ 56.619,26	$ 339.715,56	6,00	$ 339.715,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	MEDIDOR G-16 CON P.R.E (REGULACION PRIMERA ETAPA PE=60 PSI.; PS=2 PSI)	UND	1,00	$ 6.649.922,22	$ 6.649.922,22	1,00	$ 6.649.922,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	REGULADOR ASOCIADO= D=3/4"	UND	6,00	$ 595.502,22	$ 3.573.013,33	6,00	$ 3.573.013,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	PUNTO GAS D=3/4"	UND	6,00	$ 85.598,52	$ 513.591,11	6,00	$ 513.591,11	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
10,1	CUARTO DE BOMBAS												
10.1.1	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección para baja tensión , medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	UND	4,00	$ 855.933,33	$ 3.423.733,33	4,00	$ 3.423.733,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.1.2	Suministro, transporte y colocación de tuberia 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2" . Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC, excavación,rompimiento de concreto, botada de escombros, arenilla y compactación o utilizacion de topo o equipo de perforación neumatica.	ML	60,00	$ 293.312,59	$ 17.598.755,56	60,00	$ 17.598.755,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.1.3	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#4/0 (F) +4/0(N) +6 (T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tablero de distribución cafeteria (no incluye ducteria)	ML	106,00	$ 298.820,74	$ 31.674.998,52	106,00	$ 31.674.998,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo. Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10,2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y SUBACOMETIDAS												
10.2.1	Suministro e instalación de tablero de distribución (TDTR)) monofasico de 4 circuitos.	UND	1,00	$ 110.580,00	$ 110.580,00	1,00	$ 110.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2.2	Suministro e instalación de tablero de distribución (TDTLC) trifásico con espacio para totalizador de 42 ctos.	UND	1,00	$ 3.834.216,30	$ 3.834.216,30	1,00	$ 3.834.216,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2.3	Suministro e instalación de tuberia para tablero TDTR 3/4" EMT .Incluye accesorios.	ML	4,00	$ 29.651,11	$ 118.604,44	4,00	$ 118.604,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2.4	Suministro e instalación de tuberia 3/4" EMT para tablero BOMBA).Incluye accesorios.	ML	20,00	$ 31.188,89	$ 623.777,78	20,00	$ 623.777,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2.5	Suministro, transporte e instalación de alimentador desde TDTLC hasta TDTR en calibre 1#10(F)+1#10(N)+1#12(T) THWN (no incluye ducteria).	ML	4,00	$ 28.349,63	$ 113.398,52	4,00	$ 113.398,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2.6	Suministro, transporte e instalación de alimentador desde TDTLC hasta TBOMBAS en calibre 3#10(F)+1#10(N)+1#10(T) THWN (no incluye ducteria).	ML	20,00	$ 41.039,26	$ 820.785,19	20,00	$ 820.785,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.2.7	Suministro, transporte e instalación de UPS trifasica 6 KVA 208/120 V. Incluye accesorios de instalación	UND	1,00	$ 1.755.166,67	$ 1.755.166,67	1,00	$ 1.755.166,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS												
10.3.1	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal, accesorios EMT fijación, no incluye luminaria.	UND	67,00	$ 215.481,48	$ 14.437.259,26	67,00	$ 14.437.259,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.2	Suministro e instalacion de salida de extracción en baño o campanas de cocina a 120 V en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal, accesorios EMT fijación, no incluye luminaria.	UND	8,00	$ 226.181,48	$ 1.809.451,85	8,00	$ 1.809.451,85	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.3	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal, accesorios fijación y luminaria led de emergencia o similar.	UND	11,00	$ 402.884,44	$ 4.431.728,89	11,00	$ 4.431.728,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.4	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal, accesorios fijación y luminaria aplique silicenado 25W o similar.	UND	13,00	$ 371.429,63	$ 4.828.585,19	13,00	$ 4.828.585,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.5	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal accesorios fijación y interruptor sencillo.	UND	11,00	$ 185.489,63	$ 2.040.385,93	11,00	$ 2.040.385,93	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.6	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal accesorios fijación y interruptor doble.	UND	1,00	$ 195.734,07	$ 195.734,07	1,00	$ 195.734,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.580,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10.3.7	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal accesorios fijación y interruptor triple	UND	1,00	$ 190.904,44	$ 190.904,44	1,00	$ 190.904,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.8	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tuberia EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal accesorios fijación y sensor.	UND	1,00	$ 350.276,30	$ 350.276,30	1,00	$ 350.276,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.9	Suministro e instalación de controlador horario.	UND	1,00	$ 3.673.666,67	$ 3.673.666,67	1,00	$ 3.673.666,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.10	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia EMT de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT.	UND	18,00	$ 194.798,52	$ 3.506.373,33	18,00	$ 3.506.373,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.11	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente Monofasica sistema regulado a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia EMT de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT.	UND	3,00	$ 238.432,59	$ 715.297,78	3,00	$ 715.297,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.12	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tuberia EMT de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT. tomacorriente Bifasica pata trabada	UND	6,00	$ 350.221,48	$ 2.101.328,89	6,00	$ 2.101.328,89	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.13	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica GFCI sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia EMT de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT.	UND	13,00	$ 222.931,11	$ 2.898.104,44	13,00	$ 2.898.104,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.14	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica intemperie sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia EMT de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT.	UND	12,00	$ 207.641,48	$ 2.491.697,78	12,00	$ 2.491.697,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.15	Suministro e instalacion de salida de ventilador bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tuberia EMT de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT.	UND	9,00	$ 325.834,81	$ 2.932.513,33	9,00	$ 2.932.513,33	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.16	Suministro e instalacion de salida desde TDBOMBAS hasta bomba a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tuberia EMT de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT. No incluye equipo	UND	2,00	$ 435.611,85	$ 871.223,70	2,00	$ 871.223,70	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.17	Suministro e instalacion de salida para compactadora a 220 Volts en cable 3#8+1#10(t) en tuberia EMT de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios EMT. No incluye equipo	UND	1,00	$ 602.265,93	$ 602.265,93	1,00	$ 602.265,93	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.18	Suministro e instalación de luminaria led 45 W	UND	60,00	$ 221.869,63	$ 13.312.177,78	60,00	$ 13.312.177,78	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.19	Suministro e instalación de luminaria led 36 W	UND	2,00	$ 159.727,41	$ 319.454,81	2,00	$ 319.454,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.3.20	Suministro e instalación de luminaria led 20 W	UND	1,00	$ 58.008,15	$ 58.008,15	1,00	$ 58.008,15	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.884.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10,4	SISTEMA DE COMUNICACIONES												
10,4,1	Salida para punto de Voz y Datos o TV, Cat 6 incluye tuberia EMT 3/4", cable UTP Cat 6 (4 UTP X DUCTO), caja PVC 2x4", Face plate, curvas, certificacion y marcacion,accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento.	UND	5,00	$ 972.332,59	$ 4.861.662,96	5,00	$ 4.861.662,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	EQUIPOS COCINA												
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA A GAS DE PISO LINEAL DE 3 PUESTOS QUEMADOR DOBLE. MUEBLES EN ACERO INOXIBDABLE PARTE SUPERIOR EN ACERO INOX CAL. 16-304 Y CUERPO EN ACERO INOX CAL 18-430. Consumo 150.000 BTU/H. Dimensiones 1.20x0.70x0.90 mts o similar	UND	1,00	$ 5.774.518,52	$ 5.774.518,52	1,00	$ 5.774.518,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFÓN A GAS 26 PULG, CUERPO EXTERNO Y PARTES INTERNA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, Presenta un quemador de 80.000 BTU/hora, compuesto por tres anillos concéntricos con válvulas de control independientes	UND	3,00	$ 4.143.921,48	$ 12.431.764,44	3,00	$ 12.431.764,44	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR VERTICAL 1P DE UNA PUERTA SÓLIDA, CONDENSADOR LIBRE DE POLVO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR E INTERIORMENTE. Dimensiones frente 0.71 / fondo 0.84 / altura 2.07 mts o similar	UND	1,00	$ 12.803.074,81	$ 12.803.074,81	1,00	$ 12.803.074,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR HORIZONTAL 1PTA DE PUERTA SÓLIDA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. Dimensiones frente 0.77 / fondo 0,85 / altura 0,97 mts o similar	UND	1,00	$ 16.599.059,26	$ 16.599.059,26	1,00	$ 16.599.059,26	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR HORIZONTAL 2 PTAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES CAPACIDAD INTERIOR DE 425LT. dimensiones frente 1,55 / fondo 0,76 / altura 0,902 mts o similar	UND	1,00	$ 13.899.867,41	$ 13.899.867,41	1,00	$ 13.899.867,41	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18, PISO CON REFUERZO GALVANIZADO CAL 18, BANDEJA EXTRAÍBLE RECOLECTORA DE GRASAS Y LÍQUIDOS CON 2 QUEMADORES INDEPENDIENTES. MARCO EN ACERO INOXIDABLE CAL 14.	UND	1,00	$ 5.371.050,37	$ 5.371.050,37	1,00	$ 5.371.050,37	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo. Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA Nº 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA, CON CONEXIÓN BAJO MESÓN, FILTRACIÓN EN TRES ETAPAS. INCLUYE REPUESTOS DE CARTUCHOS DE FILTROS POR CADA ETAPA DE PURIFICACIÓN.	UND	1,00	$ 757.020,00	$ 757.020,00	1,00	$ 757.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES FRENTE 1.80 / FONDO 0.45 / ALTURA 1.80 MTS	UND	1,00	$ 4.245.332,59	$ 4.245.332,59	1,00	$ 4.245.332,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ÓPTIMA POZ IZ TA 1.41X0.60m CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 PRESENTA SALPICADERO Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS., INCLUYE POZUELO AL LADO IZQUIERDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 50 X 40 CMS Y PROFUNDIDAD DE 25 CMS, PATAS EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE LARGO 1 41/ ANCHO 0.60 / ALTURA 0.91 MTS	UND	1,00	$ 3.853.554,81	$ 3.853.554,81	1,00	$ 3.853.554,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, MEDIDAS: 170 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO. MOTOR EXTRACTOR POTENCIA 138W	UND	1,00	$ 4.042.574,07	$ 4.042.574,07	1,00	$ 4.042.574,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICUADORA DE MESA 12L. 1HP LICUADORA VOLCABLE, VASO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, BASE EN TUBERÍA DE ACERO PINTADA. VASO PARA 12 LTS.	UND	1,00	$ 7.848.936,30	$ 7.848.936,30	1,00	$ 7.848.936,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLINO DE CARNE EN ACERO INOXIDABLE, INTERRUPTOR A PRUEBA DE AGUA Y PARADA DE ENERGENCIA, SWICHE DE ARRANQUE Y REVERSA. BANDEJA ALIMENTADORA REMOBIBLE, PIE DE GOMA, INCLUYE CUCHILLA DE CORTE EN ACERO INOXIDABLE, UNA PLACA DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE Y UN EMPUJADOR DE ALIMENTOS DE PLÁSTICO. CAP APROX 120 KG/H	UND	1,00	$ 5.509.178,52	$ 5.509.178,52	1,00	$ 5.509.178,52	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	OTROS												
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA EN POLIPROPILENO PARA EXTERIORES DE ALTO IMPACTO. (Incuye mesa con estructura metálica y tapas en tabla plástica de 385x80x75 cm (ancho, largo y alto) y dos bancas sin espaldar con estructura metálica y tapa en tabla plástica de 385x40x40 cm (ancho, largo y alto))	UND	35,00	$ 14.011.120,74	$ 490.389.225,93	26,00	$ 364.289.139,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO (Htb 2500 de 220v/60hz de diámetro 250cm, con cuerpo de acero protegido con pintura epóxica, hélice de aluminio de 8 palas, moto DC Brushless, con 6 velocidades de funcionamiento)	UND	6,00	$ 10.024.799,26	$ 60.148.795,56	6,00	$ 60.148.795,56	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo Barrancabermeja

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
NIT: 901.109.885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA N° 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13	DOTACIÓN												
13,01	SUMINISTRO DE LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE CAP DE 1.5LTS MULTIFUNCIONAL, MOTOR DE 38000 r.p.m. CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE Y PULSADOR, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE. Incluye motor, vaso completo con aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor y tacador	UND	1,00	$ 2.189.314,00		1,00	$ 2.189.314,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO DE BALANZA ELECTRÓNICA 5KG, PLATO EN ACERO INOXIDABLE (incluye adaptador)	UND	1,00	$ 1.113.531,00		1,00	$ 1.113.531,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,03	SUMINISTRO DE TERMÓMETRO ACEITE Y CARAMELO 100A 400°F ANÁLOGO DE PUNZÓN EN ACERO INOXIDABLE, RANGO DE TEMPERATURA 100 A 400°F	UND	1,00	$ 107.724,00		1,00	$ 107.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,04	SUMINISTRO DE MESON DE TRABAJO COCINA: MESÓN SUPERFICIE Y ENTREPAÑO EN LAMINA CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE, PATAS Y CHAMBRANA EN TUBERÍA DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18. MEDIDAS: 50 CM DE ANCHO X 84 CM DE ALTO X 150 CM DE LARGO.	UND	1,00	$ 2.815.911,00		1,00	$ 2.815.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,05	SUMINISTRO CONTENEDOR ISOTÉRMICO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS 86 LTS CON 3 AZAFATES FULL X 15 CM DE ACERO INOXIDABLE Y BASE CON RUEDAS	UND	1,00	$ 6.581.389,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	ITEMS NO PREVISTOS												
14,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC h=2,50m	ML		$ 63.993,00		149,00	$ 9.534.957,00	149,00	$ 9.534.957,00	0,00	$ -	149,00	$ 9.534.957,00
14,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN TIPO INDUSTRIAL DE MEDIDAS 4.90X3.60 MTS, EN TUBO BASE DE 3" GALVANIZADO, ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TABLEROS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO CERROJO Y PICAPORTE DE SEGURIDAD. PINTADO EN BASE ANTICORROSIVO Y ACABADO,INCLUYE COLUMNAS SECCION 0,30mx30m ,ZAPATAS 0,50mX0,50m RAMPA DE ACCESO 2mX1,50m Y ESCALERAS 1,50mX1,50m	UND		$ 8.787.188,00		1,00	$ 8.787.188,00	1,00	$ 8.787.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.787.188,00

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°0756-23
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

lo tiene todo. Barrancabermeja

					ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.684.062.560,88	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 652.092.013,92	VR DEL ACTA	$ 468.309.769,75	VR ACUMULADO	$ 1.120.401.783,67
CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S					ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%	ANTICIPO	0%
REP LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	ACTA DE INICIO:	MARZO 6 DE 2023	% DE EJECUCIÓN	17,70%						
NIT: 901.109,885-1	DURACIÓN:	12 MESES	SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.031.970.546,96	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.563.660.777,21
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	TERMINACIÓN	MARZO 5 DE 2024			% DE EJECUCIÓN	17,70%	% DE EJECUCIÓN	12,71%	% DE EJECUCIÓN	30,41%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. OSCAR CONTRERAS LÁZARO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	24 DE OCTUBRE DE 2023			PERIODO DE FACTURACIÓN	MARZO 06 DE 2023 A SEPTIEMBRE 05 DE 2023	PERIODO DE FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DEL 2023	PERIODO ACUMULADO	MARZO 06 DE 2023 A OCTUBRE 05 DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA Nº 01 MODIFICACIÓN - MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19,3	EXTRACCIÓN DE RAICES DE ARBOLES TALADOS (CEIBA, MONCORO, MANGO, GALLINAZO, OITI)	UND		$ 317.735,00		10,00	$ 3.177.350,00	10,00	$ 3.177.350,00	0,00	$ -	10,00	$ 3.177.350,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$2.615.238.053,24		$2.620.113.156,19		$451.010.219,34		$349.484.902,80		$800.495.122,14
					$915.333.318,63		$917.039.604,69		$153.343.474,58		$118.824.866,95		$272.168.341,53
		ADMÓN		29%	$758.419.035,44		$759.832.815,30		$130.792.963,61		$101.350.621,81		$232.143.585,42
		IMPREVISTOS		1%	$26.152.380,53		$26.201.131,58		$0,00		$0,00		$0,00
		UTILIDADES		5%	$130.761.902,66		$131.005.657,81		$22.550.510,97		$17.474.245,14		$40.024.756,11
	VALOR DE LA OBRA (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)				$3.530.571.371,88		$3.537.152.760,88		$604.353.693,92		$468.309.769,75		$1.072.663.463,67
	DOTACIÓN				$ 12.807.869,00		$6.226.480,00		$0,00		$0,00		$0,00
	TRAMITE Y CERTIFICACIONES RETIE				$ 6.000.000,00		$6.000.000,00		$0,00		$0,00		$0,00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 116.448.000,00		$116.448.000,00		$37.350.000,00		$0,00		$37.350.000,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 18.235.320,00		$18.235.320,00		$10.388.320,00		$0,00		$10.388.320,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 3.684.062.560,88		$ 3.684.062.560,88						
									$ 652.092.013,92		$ 468.309.769,75		$ 1.120.401.783,67

WRUSSY INGENIEROS S.A.S
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CONTRATISTA

UT INTERCOMEDOR ITSI
R.L. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
INTERVENTORIA

ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - SECDE INFRAESTRUCTURA


ARQ. OSCAR CONTRERAS LAZARO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL
JEFE DE LA DEPENDENCIA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.485-1	CONTRATO: 0756-23 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER FECHA : 06-09-2023 AL 05-10-2023	la tiene todo Barrancabermeja Nit. 890.201.900-6

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM	3.1.4	ACTIVIDAD	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE ENTREPISO PARA SECCIONES TRANSVERSALES DE 0.05 m2 HASTA 0.09m2 (No incluye acero de refuerzo)

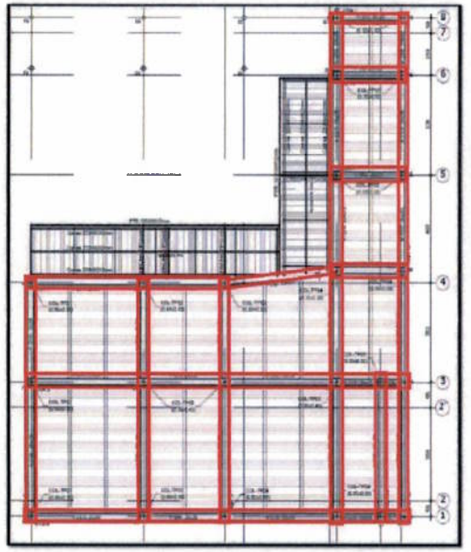





UNIDAD	ML	UBICACIÓN		ITSI	
LOZALIZACIÓN	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
VIGA 1	2,54			1,00	2,54
VIGA 2	2,54			1,00	2,54
VIGA 3	2,54			1,00	2,54
VIGA 4	15,17			1,00	15,17
VIGA 5	14,70			1,00	14,70
VIGA 6	15,00			1,00	15,00
VIGA 7	8,26			1,00	8,26
VIGA 8	8,26			1,00	8,26
VIGA 9	8,26			1,00	8,26
VIGA 10	17,34			1,00	17,34
VIGA 11	4,74			1,00	4,74
VIGA 12	9,30			1,00	9,30
VIGA 13	8,66			1,00	8,66
v-superior 1	4,74			1,00	4,74
v-superior 2	3,52			1,00	3,52
Subtotal					125,56
Vienen					
TOTAL PARCIAL					125,56

OBSERVACIONES:

WILVER FRANCINY RUSSY LADIÑO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S


LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	CONTRATO: 0756-23 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER FECHA : 06-09-2023 AL 05-10-2023	la tiene todo. Barrancabermeja Nit. 890.201.900-6

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM 3.1.7 **ACTIVIDAD** CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS CON SECCIONES TRANSVERSAL ENTRE 0.12-0.09 m2 (No incluye acero de refuerzo)

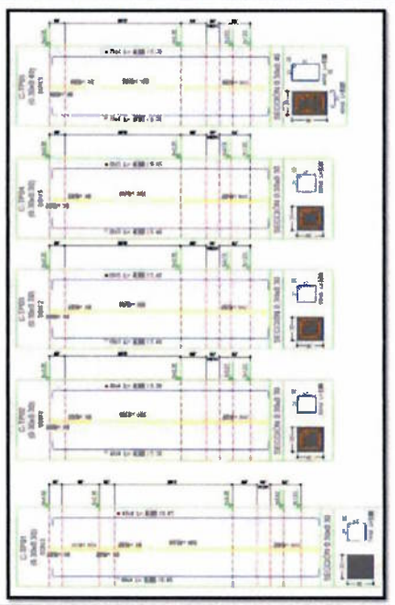





UNIDAD	ML	UBICACIÓN			ITS!	
LOZALIZACIÓN	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto			
Columna Tipo 1	5,36				3,00	16,08
Columna Tipo 2	3,91				8,00	31,28
Columna Tipo 3	3,91				2,00	7,82
Columna Tipo 4	3,91				5,00	19,55
Columna Tipo 5	3,91				3,00	11,73
				Subtotal		86,46
				Vienen		
				TOTAL PARCIAL		86,46

OBSERVACIONES:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

CONTRATO:
0756-23
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
FECHA : 06-09-2023 AL 05-10-2023


la tierra toda Barrancabermeja


Nit. 890.201.900-6

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM	3.1.9	ACTIVIDAD	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES 0.30x0.30 (No incluye acero de refuerzo)

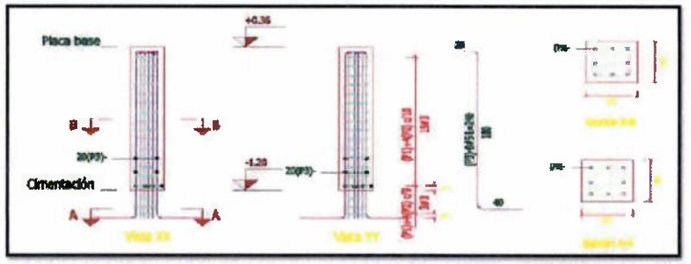

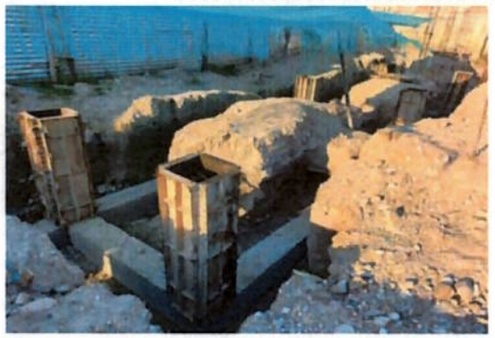



OBSERVACIONES:

UNIDAD	UND	UBICACIÓN			ITSI	
LOZALIZACIÓN		Dimensiones			Cantidad	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Pedestales					8,00	8,00
Subtotal						8,00
Vienen						
TOTAL PARCIAL						8,00

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S


LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	CONTRATO: 0756-23 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER FECHA : 06-09-2023 AL 05-10-2023	la tiene todo Barrancabermeja Nit. 890.201.900-6

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM 3.1.10 **ACTIVIDAD** CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES 0.50x0.50 (No incluye acero de refuerzo)

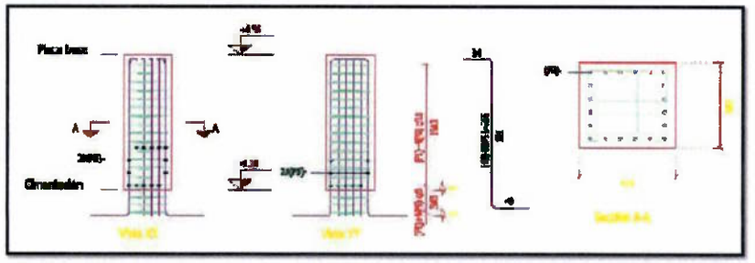





UNIDAD LOZALIZACIÓN	UNO	UBICACIÓN Dimensiones			ITSI	
		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Medida Total
Pedestales					10,00	10,00
Subtotal						10,00
Vienen						
TOTAL PARCIAL						10,00

OBSERVACIONES:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.109.885-1

CONTRATO:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
FECHA :	06-09-2023 AL 05-10-2023

la tiene todo. Barrancabermeja

Nit. 890.201.900-5

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM	9.1.16	ACTIVIDAD	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22, DE ESPESOR DE 0.11m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye tamina, Concreto de 21Mpa e=0.11, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)






UNIDAD	M2	UBICACIÓN		ITS!	
LOZALIZACIÓN	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
Placa de entrepiso	8.92	8,79		1,00	78.41
Placa de entrepiso	0.45	4,72		1,00	1.06
Placa de entrepiso	8.92	4,72		1,00	42.10
Placa de entrepiso	18.91	2,90		1,00	54.84
				Subtotal	176.41
				Vienen	
				TOTAL PARCIAL	176.01

OBSERVACIONES:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.109.885-1


CONTRATO:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
FECHA :	06-09-2023 AL 05-10-2023

la tierra toda Barrancabermeja

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM 3.2.1 **ACTIVIDAD** INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)

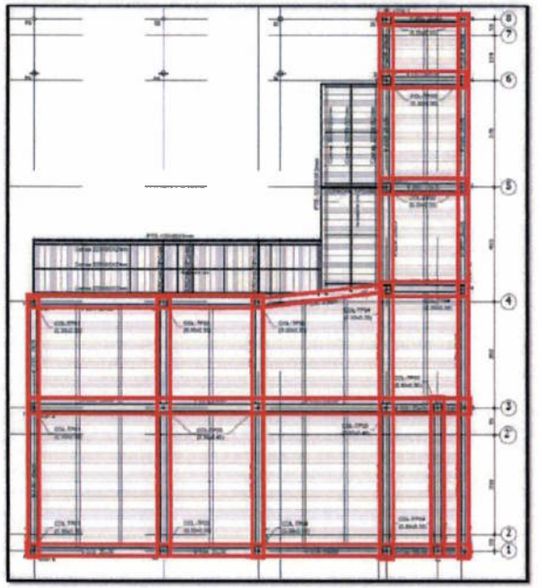





UNIDAD			KG	UBICACIÓN		ITSI	
Elemento	Tipo	Diametro	Cantidad de varillas	Longitud (m)	Peso (Kg)	Cantidad Elementos	Medida Total
PLACA ENTREPISO VIGA 1 - 2 - 3	Estribos	#3	29,00	1,03	16,70	3	50,10
	Longitudinal	#5	2,00	3,58	11,10	3	33,30
	Longitudinal	#5	2,00	4,06	12,60	3	37,80
PLACA ENTREPISO VIGA 4	Estribos	#3	164,00	1,03	94,50	1	94,50
	Longitudinal	#5	2,00	3,50	10,90	1	10,90
	Longitudinal	#5	2,00	9,00	28,00	1	28,00
	Longitudinal	#5	2,00	6,55	20,40	1	20,40
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	1	23,30
	Longitudinal	#5	2,00	6,50	20,20	1	20,20
	Longitudinal	#5	2,00	5,55	17,20	1	17,20
PLACA ENTREPISO VIGA 5	Estribos	#3	170,00	1,03	98,00	1	98,00
	Longitudinal	#5	1,00	3,00	18,24	1	18,24
	Longitudinal	#5	2,00	3,50	10,90	1	10,90
	Longitudinal	#5	2,00	9,00	28,00	1	28,00
	Longitudinal	#5	2,00	6,75	21,00	1	21,00
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	1	23,30
	Longitudinal	#5	2,00	6,50	20,20	1	20,20
	Longitudinal	#5	2,00	5,50	17,10	1	17,10
PLACA ENTREPISO VIGA 6	Estribos	#3	174,00	1,03	100,30	1	100,30
	Longitudinal	#5	2,00	3,50	10,90	1	10,90
	Longitudinal	#5	2,00	9,00	28,00	1	28,00
	Longitudinal	#5	2,00	6,75	21,00	1	21,00
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	1	23,30
	Longitudinal	#5	2,00	6,50	20,20	1	20,20
	Longitudinal	#5	2,00	5,50	17,10	1	17,10
PLACA ENTREPISO VIGAS 7 - 7A	Estribos	#3	87,00	1,03	50,20	2	100,40
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	2	46,60
	Longitudinal	#5	2,00	3,10	9,60	2	19,20
	Longitudinal	#5	2,00	1,50	4,70	2	9,40
	Longitudinal	#5	2,00	3,55	11,00	2	22,00
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	2	46,60
PLACA ENTREPISO VIGA 12	Estribos	#3	64,00	0,83	29,70	1	29,70
	Longitudinal	#4	4,00	7,50	29,80	1	29,80
	Longitudinal	#4	4,00	3,25	12,90	1	12,90
PLACA ENTREPISO VIGAS 8 - 9	Estribos	#3	87,00	1,03	50,20	2	100,40
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	2	46,60
	Longitudinal	#5	2,00	3,10	9,60	2	19,20
	Longitudinal	#5	2,00	1,50	4,70	2	9,40
				Subtotal			1.285,44
				TOTAL			1.285,44

OBSERVACIONES:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

CONTRATO:	
0756-23	
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	
FECHA :	06-09-2023 AL 05-10-2023

la tierra toda Barrancabermeja

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM	3.2.1	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)






	UNIDAD		KG	UBICACIÓN		ITSI	
Elemento	Tipo	Diametro	Cantidad de varillas	Longitud (m)	Peso (Kg)	Cantidad Elementos	Medida Total
PLACA ENTREPISO VIGAS 8 - 9	Longitudinal	#5	1,00	3,00	4,70	2	9,40
	Longitudinal	#5	2,00	3,55	11,00	2	22,00
	Longitudinal	#5	2,00	7,50	23,30	2	46,60
PLACA ENTREPISO VIGA 10	Estribos	#3	191,00	1,03	110,10	1	110,10
	Longitudinal	#5	1,00	3,00	10,30	1	10,30
	Longitudinal	#5	2,00	3,00	20,00	1	20,00
	Longitudinal	#5	2,00	6,00	18,60	1	18,60
	Longitudinal	#5	2,00	8,45	26,30	1	26,30
	Longitudinal	#5	2,00	5,00	15,50	1	15,50
	Longitudinal	#5	2,00	4,70	14,60	1	14,60
	Longitudinal	#5	2,00	9,00	28,00	1	28,00
	Longitudinal	#5	2,00	8,30	25,80	1	25,80
PLACA ENTREPISO VIGA 11	Estribos	#3	49,00	1,03	28,20	1	28,20
	Longitudinal	#5	2,00	5,78	18,00	1	18,00
	Longitudinal	#5	2,00	6,26	19,50	1	19,50
PLACA ENTREPISO VIGA 13	Estribos	#3	101,00	1,03	58,20	1	58,20
	Longitudinal	#5	2,00	5,25	16,30	1	16,30
	Longitudinal	#5	2,00	6,00	18,60	1	18,60
	Longitudinal	#3	2,00	8,50	26,40	1	26,40
	Longitudinal	#5	2,00	3,25	10,10	1	10,10
					Subtotal		542,50
					Alambre negro de amarre subtotal +6%		109,68
					TOTAL		1.987,62

OBSERVACIONES:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

CONTRATO:	
056-23	
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	
FECHA :	06-09-2023 AL 05-10-2023

Barrancabermeja la tiene todo.

Nit. 890.201.900-6

MEMORIAS DE CÁLCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

ITEM	3.2.2	ACTIVIDAD	ACERO ESTRUCTURAL (Tubería ASTM A572 Gr5, pernos, anclajes y platinas ASTM A36)






OBSERVACIONES:

UNIDAD	KG	UBICACIÓN		ITS!	
LOZALIZACIÓN	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Peso			
Columna C1	7,87	470,35		1	470,35
Columna C2	7,21	440,84		1	440,84
Columna C3	7,21	440,86		1	440,86
Columna C4	6,83	424,31		1	424,31
Columna C5	6,83	424,31		1	424,31
Columna C6	6,17	394,08		1	394,08
Columna C7	5,79	377,24		1	377,24
Columna C8	6,17	394,10		1	394,10
Columna C9	5,79	377,26		1	377,26
Columna C10	7,87	470,33		1	470,33
Columna C11	3,92	133,21		1	133,21
Columna C12	5,24	217,12		1	217,12
Columna C13	4,75	205,29		1	205,29
Columna C14	3,92	118,87		1	118,87
Columna C15	4,30	158,20		1	158,20
Columna C16	4,30	133,91		1	133,91
Columna C17	4,75	179,67		1	179,67
Columna C18	5,24	214,15		1	214,15
Cercha Lateral CL1	3,80	192,68		1	192,68
Cercha Lateral CL2	3,80	191,68		1	191,68
Cercha Lateral CL3	3,80	188,27		2	376,54
Cercha Lateral CL4	3,80	187,29		2	374,58
Cercha Lateral CL5	6,60	197,73		2	395,46
Cercha Lateral CL6	6,60	197,76		2	395,52
Cercha Lateral CL7	5,15	179,12		1	179,12
Cercha Lateral CL8	3,50	104,83		2	209,66
Cercha Lateral CL9	4,95	108,06		1	108,06
Cercha Lateral CL10	5,15	148,59		1	148,59
Cercha Lateral CL11	4,95	108,06		1	108,06
Cercha Lateral CL12	5,15	101,30		4	405,20
Cercha Lateral CL13	5,15	110,09		4	442,76
Cercha Horizontal CH4	18,00	765,05		2	1530,10
Cercha Horizontal CH1	1,94	106,20		2	212,40
Cercha Horizontal CH2	1,94	114,69		2	229,38
Cercha Horizontal CH5	18,00	765,09		1	765,09
Correa CR2	3,00	25,33		8	202,64
Correa CR3 - CR4 - CR5	3,00	25,33		3	65,40
Correas CR1	5,00	76,57		7	535,99
Subtotal					12.643,01
Vienen					
TOTAL PARCIAL					12.643,01

WILVER FRANCINY RUSSY CADINO
R/L WRUSSY INGENIEROS S.A.S

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT INTERCOMEDOR ITSI

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACION:	CC-80212380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-19
FECHA DE PAGO:	2023-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27482788
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27482788
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.000	$ 610.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71318975	$2.742.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.800	0		0		0	0	0	0	52.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	301.600	0		0		0	0	0	0	301.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	860.600	0	0	0	0	0	0		860.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	616.700				616.700	0	0	616.700			6.167	616.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	354.400	0	0	354.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	354.400	354.400
Pensión	2	1.417.400	1.417.400
Riesgos Laborales	1	616.700	616.700
CCF	1	354.400	354.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.742.900	2.742.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71318975	$2.742.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013639694	DEJOY FELICIANO JEFERSON ANDRES	1	0			S																	230201	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF24	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.060.000	649.600	0	0	0	0	EPS005	4.060.000	162.400	14-11	4.060.000	5	282.600	CCF24	4.060.000	162.400	0	0	0	0	0
3	CC	79431607	PARDO LEON DUVAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.318.667	211.000	0	0	0	0	EPS002	1.318.667	52.800	14-11	1.318.667	5	91.800	CCF24	1.318.667	52.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71320316	$1.931.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	123.200	0		0		0	0	0	0	123.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	492.500	0	0	0	0	0	0		492.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	505.600	0	0	0	0	0	0		505.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	434.300				434.300	0	0	434.300			4.343	434.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	249.600	0	0	249.600	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	249.600	249.600
Pensión	2	998.100	998.100
Riesgos Laborales	1	434.300	434.300
CCF	1	249.600	249.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.931.600	1.931.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71320316	$1.931.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S								X								230201	3.078.125	492.500	0	0	0	0	EPS010	3.078.125	123.200	14-11	3.078.125	5	214.300	CCF38	3.078.125	123.200	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF38	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA
No. Identificación: CC78323568
Dirección: CR 15 22 A 33 BRR LA INDEPENDENCIA
Telefono: 4111513
Correo: hseqwrussy@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8371359767

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA
Tipo y número de identificación	CC78323568
Número de planilla	8371359767
Fecha pago	2023-10-10
Número de autorización pago	58367305
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2023
Número de Administradoras	2
Total Pagado	330600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8371359767

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	185600	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	145000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 78323568
APELLIDOS Y NOMBRES: ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230201	1160000	1160000	0	0	145000	0	185600	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7895284132**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		215228006

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 185.600	$ 200	$ 185.800
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 200**	**$ 185.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 145.000	$ 200	$ 0	$ 145.200
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 145.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 331.000**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71491101	$6.954.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	142.200	0		0		0	0	0	0	142.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	49.900	0		0		0	0	0	0	49.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	298.800	0		0		0	0	0	0	298.800	7
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	46.900	0		0		0	0	0	0	46.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	199.700	0		0		0	0	0	0	199.700	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	46.900	0		0		0	0	0	0	46.900	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	111.700	0		0		0	0	0	0	111.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	762.700	0	0	0	0	0	0		762.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.853.600	0	0	0	0	0	0		1.853.600	11
231001	Colfondos	800227940-6	573.600	0	0	0	0	0	0		573.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	404.300	0	0	0	0	0	0		404.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.558.700				1.558.700	0	0	1.558.700			15.587	1.558.700	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	905.500	0	0	905.500	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71491101	$6.954.500	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	896.100	896.100
Pensión	4	3.594.200	3.594.200
Riesgos Laborales	1	1.558.700	1.558.700
CCF	1	905.500	905.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	6.954.500	6.954.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71491101	$6.954.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042211689	CARPIO PEÑALOZA ALVEIRO	1	0			S								X								231001	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS037	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
2	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S								X								230301	1.172.082	187.600	0	0	0	0	EPS037	1.172.082	46.900	14-11	1.172.082	5	81.600	CCF38	1.172.082	46.900	0	0	0	0	0
3	CC	91425553	ESCOBAR SAAVEDRA HECTOR JULIO	1	0			S								X								25-14	1.212.562	194.100	0	0	0	0	EPS041	1.212.562	48.600	14-11	1.212.562	5	84.400	CCF38	1.212.562	48.600	0	0	0	0	0
4	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S								X								230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS037	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
5	CC	13565252	JIMENEZ SANTAMARIA ALEXANDER	1	0			S								X								230201	1.214.375	194.300	0	0	0	0	EPS041	1.214.375	48.600	14-11	1.214.375	5	84.600	CCF38	1.214.375	48.600	0	0	0	0	0
6	CC	1096204338	RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S								X								230301	1.214.375	194.300	0	0	0	0	EPS037	1.214.375	48.600	14-11	1.214.375	5	84.600	CCF38	1.214.375	48.600	0	0	0	0	0
7	CC	1096248874	MORENO ARRIETA ISNARDO DE JESUS	1	0			S	X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF38	1.245.389	49.900	0	0	0	0	0
8	CC	1096248874	MORENO ARRIETA ISNARDO DE JESUS	1	0			S									X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF38	77.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	1096253724	CARPIO PEÑALOZA JAIR	1	0			S								X								230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS040	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
10	CC	1050918199	PEÑALOZA LARIOS JOSE ANGEL	1	0			S								X								230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	ESSC07	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
11	CC	79392925	ORTIZ MENDOZA WILMAR	1	0			S	X							X								231001	1.245.791	199.400	0	0	0	0	EPS008	1.245.791	49.900	14-11	1.245.791	5	86.800	CCF38	1.318.291	52.800	0	0	0	0	0
12	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X								230201	1.214.375	194.300	0	0	0	0	EPS005	1.214.375	48.600	14-11	1.214.375	5	84.600	CCF38	1.214.375	48.600	0	0	0	0	0
13	CC	13569557	MENDEZ PAREDES SIGILFREDO	1	0			S								X								25-14	1.313.541	210.200	0	0	0	0	EPS041	1.313.541	52.600	14-11	1.313.541	5	91.500	CCF38	1.313.541	52.600	0	0	0	0	0
14	CC	1007775962	ORTEGA CAMARGO KEVIN LEONARDO	1	0			S								X								231001	1.166.041	186.600	0	0	0	0	EPS005	1.166.041	46.700	14-11	1.166.041	5	81.200	CCF38	1.166.041	46.700	0	0	0	0	0
15	CC	1042214936	COSSIO SANTAMARIA BRAYAN ANDRES	1	0			S								X								230301	1.172.083	187.600	0	0	0	0	EPS005	1.172.083	46.900	14-11	1.172.083	5	81.600	CCF38	1.172.083	46.900	0	0	0	0	0
16	CC	12400740	BANDERA PAEZ MANUEL ARTURO	1	0			S	X							X								230301	470.041	75.300	0	0	0	0	EPS037	470.041	18.900	14-11	470.041	5	32.800	CCF38	470.041	18.900	0	0	0	0	0
17	CC	8572227	PEREZ FERRER JUAN MIGUEL	1	0			S	X							X								230301	470.042	75.300	0	0	0	0	ESSC24	470.042	18.900	14-11	470.042	5	32.800	CCF38	470.042	18.900	0	0	0	0	0
18	CC	13568501	MORA CARVAJALINO DOMINGO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	94265684	MUÑOZ LOPEZ ABELINO HOMERO	1	0			S								X								230201	1.178.125	188.500	0	0	0	0	EPS037	1.178.125	47.200	14-11	1.178.125	5	82.000	CCF38	1.178.125	47.200	0	0	0	0	0
20	CC	8572679	FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL	1	0			S								X								230301	1.245.791	199.400	0	0	0	0	EPS041	1.245.791	49.900	14-11	1.245.791	5	86.800	CCF38	1.245.791	49.900	0	0	0	0	0
21	CC	1001814868	CARPIO AGUDELO DEIBY	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No.	0756 – 23
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
NIT	901.109.885-1
REPRESENTANTE LEGAL	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACION	C.C. 80.212.380
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LP0-015-2022
OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 3.684.062.560,88)
DURACIÓN	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20220680810066. BPIN 2022680810057. Certificado por la Secretaría de Planeación el 25 de enero de 2023.
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005
FUENTE DE FINANCIACION:	CREDITO INTERNO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de febrero de 2023, con rubro 2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, concepto: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: CREDITO INTERNO, por valor de: TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499,00) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación: CREDITO INTERNO, por valor de: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168,00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	23-01338 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.11189414 DEL 02 DE MARZO DEL 2023
CEPPA No.	786 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2023 1133 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DEL 2023

En Barrancabermeja a los SEIS (06) días del mes de MARZO del 2023, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: la Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA en calidad de secretaria de Infraestructura; el Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON, profesional universitario – supervisor del contrato de Interventoría No. 0757 - 23, la firma UT INTERCOMEDOR ITSI, representada legalmente LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO, cuyo NIT es 901.683.399-1, Interventor; y la firma WRUSSY INGENIEROS S.A.S, representada legalmente por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, cuyo NIT es 901.109.885-1, contratista; con el fin de suscribir la presente acta de inicio, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 23 de febrero del 2023

2. Que mediante el Registro Presupuestal No. 23-01338 del 27 de febrero del 2023, la secretaria de Hacienda y del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.

3. Que mediante certificado de aprobación de garantías CO1.WRT.11189414 DEL 02 de marzo del 2023, la secretaria Jurídica legalizó el respectivo contrato.

4. Que el contratista presentó los documentos de afiliación al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) del personal que prestara sus servicios en la ejecución del presente contrato. Así como también la programación actualizada de las actividades del contrato arriba referido y las hojas de vida del personal

ACUERDAN:

1. Fijar el día SEIS (06) de MARZO del 2023 como fecha de iniciación del objeto contratado.
2. Fijar el día CINCO (05) de MARZO del 2024 como fecha de finalización del objeto del presente contrato a satisfacción del Distrito.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los SEIS (06) días del mes de MARZO del 2023.

UT INTERCOMEDOR ITSI
R.L./ LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
Interventor

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
R.L/ WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Contratista

JUAN CARLOS SILVA RINCON
Supervisor del contrato No. 0757-23
Profesional Universitario

ING. LUISA FERNANDA OROZCO
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

Alcaldía Municipio
de Barrancabermeja

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 23-01338

Vigencia Fiscal 2023

Fecha de Compromiso Febrero 27 de 2023

Beneficiario : WRUSSY INGENIEROS SAS — Nit : 00901109885 - 1

No. C.D.P : CD : 23-00750 — Fecha de Expedicion del C.D.P : 03-02-2023

No. C.D.P : CD : 23-01132 — Fecha de Expedicion del C.D.P : 15-02-2023

Tipo de Compromiso : CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Documento : 20230756 — Fecha : 23-02-2023 — Vence : 31-12-2023

OBJETO : CD 23-00750, CD 23-01132, SEGÚN: PROI - DOC: 2022680810057 CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO D EBARRANCABERMEJA 108-786-0765-23 SEGÚN: PROI - DOC: 2022680810057 CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 131-1133-1152-23

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	CREDITO INTERNO	3,306,985,499.00
2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	CREDITO INTERNO	377,077,061.88
		Total Compromisos	3,684,062,560.88

TORRES MURALLA ORFILIA

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111/96 Art 85 Acuerdo 101/97

Alcaldía Municipio de Barrancabermeja

Certificado No. 23-01132

Fecha de vencimiento 31-12-2023

Vigencia Fiscal 2023

Fecha de Expedición Febrero 15 de 2023

OBJETO : SEGÚN: PROI - DOC: 2022680810057 CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 131-1133-1152-23

Solicitante : SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	CREDITO INTERNO	589,678,168.00
		Total Certificado	589,678,168.00

Por un valor de : QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.

Proyecto de inversión

Código BPIN	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Valor
2022680810057	Proyecto: Construcción y dotación de comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial en el Distrito de Barrancabermeja	CREDITO INTERNO	589,678,168.00
		Total total	589,678,168.00

Código DANE funcionamiento e inversión

Código DANE	Descripción	Fuente de financiación	Valor
53290	Otras obras de ingeniería civil	CREDITO INTERNO	589,678,168.00
		Totales	589,678,168.00

ARRIETA TORRES JOHN ALBERT

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111/96 Art 85 Acuerdo 101/97

Alcaldía Municipio de Barrancabermeja

Certificado No. 23-00750

Fecha de vencimiento 31-12-2023

Vigencia Fiscal 2023

Fecha de Expedición Febrero 03 de 2023

OBJETO : SEGÚN: PROI - DOC: 2022680810057 CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO D EBARRANCABERMEJA 108-786-0765-23

Solicitante : SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
2.3-2201-0700-051-220057 -2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	CREDITO INTERNO	3,306,985,499.00
		Total Certificado	3,306,985,499.00

Por un valor de : TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte.

Proyecto de inversión

Código BPIN	Nombre del proyecto	Fuente de financiación	Valor
2022680810057	Proyecto: Construcción y dotación de comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial en el Distrito de Barrancabermeja	CREDITO INTERNO	3,306,985,499.00
		Total total	3,306,985,499.00

Código DANE funcionamiento e inversión

Código DANE	Descripción	Fuente de financiación	Valor
53290	Otras obras de ingeniería civil	CREDITO INTERNO	3,306,985,499.00
		Totales	3,306,985,499.00

APRIETA TORRES JOHN ALBERT

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS VIGENCIA 2023 El Administrador del plan anual de adquisiciones está facultado mediante el Decreto No 518 de 2019			
	Código: SGE-RFI-FO-021	Fecha 02/08/2019	Versión: 001	Página: 1

No CEPAA	1133

FECHA DE EMISION 14/02/2023
DD/ MM/AA

DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA EDUCACION

CERTIFICA QUE

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Códigos UNSPSC	Descripción	Duracion estimada del contrato	Cod. presupuestal	Cod. Fuente	Valor
72103300; 72152700; 81101500	CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	12 MESES	2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005	R030	589678168

CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO
ADMINISTRADOR DEL PAA

Proyecto:
HEIDY BERMUDEZ Z

Secretaría de Recursos físicos

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

Powered by CamScanner

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	CERTIFICACION EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS VIGENCIA 2023 El Administrador del plan anual de adquisiciones está facultado mediante el **Decreto No 518 de 2019**			
	Código: SGE-RFI-FO-021	Fecha:02/08/2019	Versión: 001	Página: 1

No CEPAA	**786**

FECHA DE EMISION 03/02/2023
DD/ MM/AA

DEPENDENCIA SOLICITANTE	**SECRETARIA EDUCACION**

CERTIFICA QUE

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Códigos UNSPSC	Descripción	Duracion estimada del contrato	Cod. presupuestal	Cod. Fuente	Valor
72103300;72152700;81101500	CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	12 MESES	2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005	R030	3306985499

CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO
ADMINISTRADOR DEL PAA

Proyecto:
HEIDY BERMUDEZ Z

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 -2023 DISTRITO MUY ESPECIAL					
Nombre del Proyecto	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**				
Número BPPID	20220680810066				
Línea Estratégica Distrital	Línea 1. Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.				
Sector de inversión territorial	Educación				
Programa Distrital	PROGRAMA 1. Cobertura Educativa				
Indicador de producto plan de desarrollo	IP 001: Número de establecimientos educativos oficiales, centro de desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos adecuados				
Número BPIN	2022680810057				
Programa Nacional	CÓDIGO 2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media				
Producto Nacional	CÓDIGO 2201052: Infraestructura educativa mejorada CÓDIGO 2201069: Infraestructura educativa dotada				
Indicador Nacional	CÓDIGO 220105211: alumnos beneficiados con el mejoramiento de ambientes escolares CÓDIGO 220106909: sedes dotadas con menaje y equipos de cocina				
Valor Total del Proyecto	$ 4.169.430.147,00				
Valor Total de la Vigencia	$ 3.534.290.898,49				
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS					
Vigencia Actual 2023		**Vigencia Futura (Ordinaria) 20##**		**Vigencia Futura (Excepcional) 20##**	
Obra:	$ 3.176.941.529,49	Obra:		Obra:	
Interventoría:	$ 227.305.400,00	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	$ 130.043.969,00	Otros:		Otros	
Total:	$ 3.534.290.898,49	Total:		Total	
Solicitud realizada por:	**Nombre: MARIBEL BENITEZ PEREA** **Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**				
Nota: Certificación con base en la Segunda actualización 2022. por vencimiento de certificación emitida el 22/12/2022.					

Se expide en Barrancabermeja a los veinticinco (25) días del mes de enero dos mil veintitrés (2023) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

OMAR ERNESTO PRADA RUEDA
Secretario de Planeación Distrital (E)
Decreto 311 del 27 de octubre de 2022

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 -2023 DISTRITO MUY ESPECIAL					
Nombre del Proyecto	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**				
Número BPPID	20220680810066				
Línea Estratégica Distrital	Línea 1. Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.				
Sector de inversión territorial	Educación				
Programa Distrital	PROGRAMA 1. Cobertura Educativa				
Indicador de producto plan de desarrollo	IP 001: Número de establecimientos educativos oficiales, centro de desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos adecuados				
Número BPIN	2022680810057				
Programa Nacional	CÓDIGO 2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media				
Producto Nacional	CÓDIGO 2201052: Infraestructura educativa mejorada CÓDIGO 2201069: Infraestructura educativa dotada				
Indicador Nacional	CÓDIGO 220105211: alumnos beneficiados con el mejoramiento de ambientes escolares CÓDIGO 220106909: sedes dotadas con menaje y equipos de cocina				
Valor Total del Proyecto	$ 4.169.430.147,00				
Valor Total de la Vigencia	$ 3.534.290.898,49				
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS					
Vigencia Actual 2023		**Vigencia Futura (Ordinaria) 20##**		**Vigencia Futura (Excepcional) 20##**	
Obra:	$ 3.176.941.529,49	Obra:		Obra:	
Interventoría:	$ 227.305.400,00	Interventoría:		Interventoría:	
Otros:	$ 130.043.969,00	Otros:		Otros	
Total:	$ 3.534.290.898,49	Total:		Total	
Solicitud realizada por:		**Nombre: MARIBEL BENITEZ PEREA**			
		Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL			
Nota: Certificación con base en la Segunda actualización 2022. por vencimiento de certificación emitida el 22/12/2022.					

Se expide en Barrancabermeja a los veinticinco (25) días del mes de enero dos mil veintitrés (2023) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

OMAR ERNESTO PRADA RUEDA
Secretario de Planeación Distrital (E)
Decreto 311 del 27 de octubre de 2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833082580

(415)7707212489984(8020) 000001483308258 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WRUSSY INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 F 79 94

42. Correo electrónico contacto@wrussyingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 1 1 1 5 1 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 3 9 0	2 0 1 7 0 8 1 8	4 1 1 2	2 0 1 7 0 8 1 8	4 3 3 0	4 2 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 13 / 18 : 21: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUSSY LADINO WILVER FRANCINY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833082580

(415)7707212489984(8020) **000001483308258 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 8 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 8 6 1 3 4 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 0 7 2 5	
81. Hasta	2 0 5 7 0 7 2 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 7 0 8 2 9		-
2	8 0	2 0 1 4 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833082580

(415)7707212489984(8020) 000001483308258 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 8 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 1 2 3 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUSSY	LADINO	WILVER	FRANCINY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833082580

(415)7707212489984(8020) **000001483308258 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 9 8 8 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 6 4 3 3 9		1 2 3 7 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RINCON	ROMERO	LIDA	YAMILE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 3 3 5 0 3 8 5 8		2 9 5 6 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTES	LLANOS	NATALIA	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	APROBACION DE GARANTIAS	Aprobado	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	23/08/2023 9:00:12 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Id de la garantía CO1.WRT.11377735
Referencia de la garantía POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RCE
Estado Aprobada
Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de póliza 11-44-101193725 y 11-40-101051776
Tomador WRUSSY INGENIEROS SAS
Beneficiario DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	736.812.513,00 COP	8/07/2024 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	368.406.257,00 COP	6/03/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	736.812.513,00 COP	28/11/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	404.000.000,00 COP	5/03/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA RCE ANEXO 2.pdf	POLIZA RCE ANEXO 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2.pdf	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3.pdf	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: WRUSSY INGENIEROS SAS 28/03/2023 12:06 PM (UTC-5 Hora)

Cancelar
